Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	VIGENCIA:	**2025/01/22**

ACTA No:	145
FECHA:	19/12/ 2025
CONTRATO No:	C.I. No.STM-CM-010-2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARTICIPANTES	
En Representación de	SMC
NOMBRE	Juan Heredia
Cargo	Supervisor
En Representación de	SMC
NOMBRE	Giovanna Naranjo
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	SMC
NOMBRE	María Virginia Rocha
Cargo	Especialista transito
En Representación de	SMC
NOMBRE	Alejandro Leguizamo Flórez
Cargo	Profesional Universitario
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Ernesto Perdomo
Cargo	Director Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Dalila Otalora
Cargo	Especialista Transito
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Bibiana Rojas
Cargo	Residente Interventoría
En Representación de	Consorcio MS
NOMBRE	Juan Diego Román
Cargo	Representante legal suplente
En Representación de	Consorcio MS
NOMBRE	María Stella Agudelo
Cargo	Especialista en Transito

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Complemento paquete NP Slurry con especificación técnica	CONSORCIO MS	X		17/12/2025 Cumplido
Plan de trabajo dirigido a concesión Guatavita	CONSORCIO MS	X		17/12/2025 Cumplido
Verificación programación visitas de recibo de acuerdo con avances de obra.	CONOSRCIO MS			
Subsanación informes finales Ubaque y Carmen de Carupa	CONSOCIO MS	X		CUMPLIDO parcialmente, enviaron Carmen de Carupa
Subsanación informe mensual 9	CONSOCIO MS	X		16/12/2025 Cumplido
Subsanación cuenta de cobro 5	CONSOCIO MS	X		16/12/2025 Cumplido
Subsanación observaciones Tocancipá.	CONSOCIO MS			
Terminación actividades sociales de la totalidad de puntos ejecutados.	CONSOCIO MS	X		CUMPLIDO parcialmente, pendientes Arbeláez y Pasca
Entrega informes finales Quetame, San Bernardo, Tenjo.	CONSOCIO MS	X		CUMPLIDO parcialmente, enviaron Quetame
Entrega planos récord y acta cantidades de los puntos a recibir en la semana del 15 dic (Arbeláez, Pasca, Paratebueno, Guatavita).	CONSOCIO MS			

TEMAS PRESENTE ACTA

Se inicia el comité con el seguimiento a compromisos del comité anterior se menciona que informes finales Quetame, Informe final recibido, San Bernardo y Tenjo, pendientes, ratificando el contratista el compromiso de entrega para el 20 de diciembre.

El contratista informa que entregara los planos récord y actas de cantidades de los puntos de: Arbeláez, Pasca, Paratebueno y Guatavita, el martes 23 de diciembre.

Interventoría informa que se continúa mesa de trabajo para la entrega y subsanación de informes finales y solicita la subsanación de observaciones de Tocancipá, el contratista indica que esta subsanando y se compromete para entregar el 20 de diciembre.

Teniendo en cuenta el proceso de liquidación interventoría informa que se entregó comunicado al contratista solicitando documentación para la liquidación del contrato, el contratista confirma recepción, y se acuerda iniciar la recopilación y revisión anticipada de documentos para evitar atrasos en la liquidación.

Aspectos Contractuales

VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.625.158.645,00	$ 4.044.608.081,00	111,57%	$ 3.566.629.945,00	98,39%

A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 98,39% del valor total del contrato.

Aspectos Técnicos

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.625.158.645,00	100%
Puntos entregados por la SMC	57	
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,55	108,48%
Puntos descartados	2	
Valor inicial puntos descartados	$ 66.704.675,40	1,84%
Valor ejecutable puntos entregados	$ 3.865.745.401,15	106,64%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	55	
Presupuesto diseños apropiados	$ 4.044.608.081,00	111,57%
Puntos en ejecución de obra	1	
Puntos terminados	54	
Puntos sin iniciar	0	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	54	
Valor ejecutado físico	$ 3.566.629.945,00	98,39%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 3.526.873.822,00	97,29%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en el municipio de Pasca el día 18 de diciembre de 2025

Un 97,29% del valor total del contrato ha sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 3.526.873.822,00, correspondiente a 54 puntos.

Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Fisico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 181.257.932					NO
3	20-may-25	10%	$ 362.515.864,50			$ 369.801.264,58	10,20%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 725.031.729	$ 401.888.576,00	11,09%	$ 807.397.167,00	22,27%	NO
5	20-jul-25	35%	$1.268.805.526	$ 783.692.162,00	21,62%	$ 1.223.717.964,00	33,76%	NO
6	20-ago-25	50%	$1.812.579.323	$ 1.000.662.552,00	27,60%	$ 1.697.861.006,00	46,84%	NO
7	20-sep-25	70%	$2.537.611.052	$ 1.595.960.014,00	44,02%	$ 2.577.624.979,00	71,10%	NO
8	20-oct-25	90%	$3.262.642.781	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.826.558.685,00	77,97%	NO
9	20-nov-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.918.208.156,00	80,50%	$ 3.305.189.896,06	91,17%	NO
10	20-dic-25	100%	$3.625.158.645	$ 3.526.873.822,00	97,29%	$ 3.566.629.945,00	98,39%	NO

Aspectos Administrativos y de SST

De los 54 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 46 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Guachetá (3), Simijaca (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Cáqueza (4), Fosca (4), Quetame (2), Une (5), Guayabetal (2), Susa (1), Tausa (1), Macheta (1) Y Junín (3), los cuales ya fueron revisados por la interventoría, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Carmen de Carupa, Cucunuba y Nemocón, los cuales ya fueron aprobados por la interventoría y remitidos a la entidad - SMC.

Aspectos sociales y/o ambientales

REPORTE INFORMES FINALES LOTE 1				
MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA	ESTADO
TABIO	3	EN REVISION INTERVENTORÍA		
GUAYABETAL	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
UBAQUE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	17/12/2025	
NEMOCON	1	RADICADO A LA SMC		APROBADO
SIMIJACA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
GUACHETA	3	EN REVISION INTERVENTORÍA	18/12/2025	
UBATE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
UBALA	1	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
SUTATAUSA	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
SUSA	1	EN REVISION INTERVENTORÍA		
QUETAME	2	EN REVISION	19/12/2025	
CARMEN DE CARUPA	3	RADICADO A LA SMC		APROBADO
CUCUNUBA	1	RADICADO A LA SMC		APROBADO
TAUSA	1	DEVUELTO AL CONTRATISTA	17/12/2025	
MACHETA	1	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
TOCANCIPA	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
FOSCA	4	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
CÁQUEZA	4	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
UNE	5	EN REVISION	19/12/2025	
JUNIN	3	EN REVISION	18/12/2025	
SAN DE RIOJADO	2	SIN ENTREGAR	17/12/2025	
ARBELAEZ	2	SIN ENTREGAR	19/12/2025	
GUAYAVETA	1	SIN ENTREGAR		
PASCA	2	SIN ENTREGAR		
1 PND	1	SIN ENTREGAR	17/12/2025	
PARATEBUENO	1	SIN ENTREGAR		

APROBADO	2
EN REVISION DE INTERVENTORIA	17
EN REVISION LA SMC	3
DEVUELTO AL CONTRATISTA	24
SIN ENTREGAR	9

La interventoría solicita programación para los cierres sociales Arbeláez y Pasca el contratista se compromete para el 23/12/2025

Aspectos Presupuestales

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	3	Tabio (3)	$ 401.888.576,00	11,09 %	$ 401.888.576,00	11,09 %
2	7	Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (2) y Cucunuba (1)	$ 598.773.976,00	16,52 %	$ 1.000.662.552,00	27,61 %
3	12	Carmen de Carupa (1), Guachetá (3), Nemocón (1), Simijaca (3), Sutatausa (2) y Tocancipá (2)	$ 595.297.462,00	16,42%	$ 1.595.960.014,00	44,02%
4	18	Cáqueza (4), Fosca (4), Guayabetal (2), Quetame (2), Ubala (1) y Une (5)	$ 1.008.884.285,00	27,83%	$ 2.604.844.299,00	71,85%
5	6	Junín (3), Machetá (1), Susa (1) y Tausa (1)	$ 313.363.857,00	8,65%	$ 2.918.208.156,00	80,50%

ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Subsanación Tocancipá	CONSORCIO MS			Compromiso para el 20/12/2025
Informes finales San Bernardo y Tenjo	CONSORCIO MS			Compromiso para el 20/12/2025
Cierres sociales Arbeláez y Pasca	CONSORCIO MS			Se pueden reprogramar máximo hasta el 23 /12/2025
Planos récord y actas de cantidades	CONSORCIO MS			Compromiso para el 23/12/2025
Subsanaciones de visitas de recibo y soportes	CONSORCIO MS			Compromiso para la semana del 23/12/2025
Definición documentos para liquidación	CONSORCIO MS			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Juan Heredia
SUPERVISOR SMC

Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Firma_____
Nombre: José Alexander Román
CONTRATISTA

Para uso exclusivo del supervisor de SMC: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR SMC

Copia: interventoría
Copia: contratista

- **REGISTRO DE ASISTENTES**

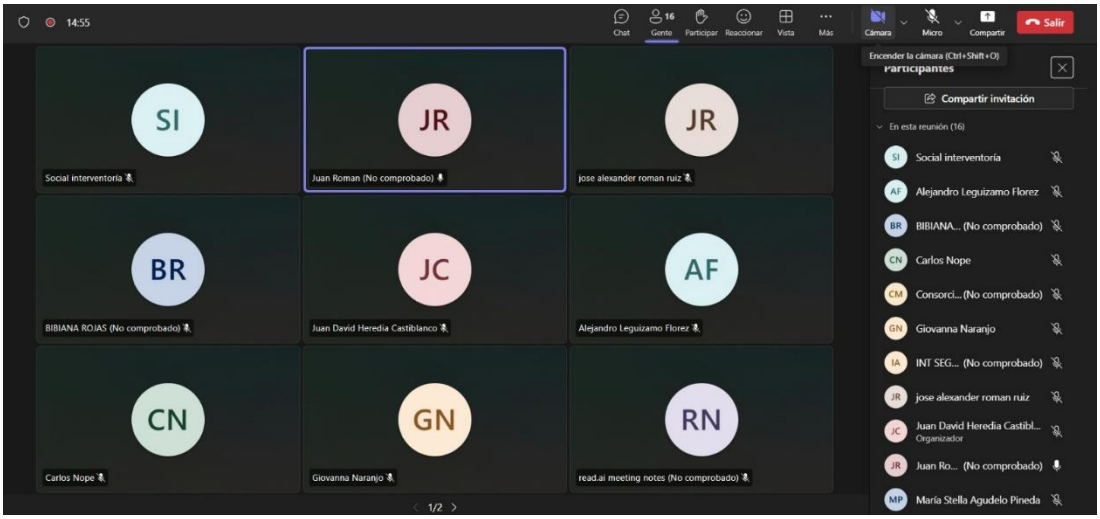

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación

escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Comité de seguimiento No. 41

Contrato de obra No. STM-LP-009-2025 (Lote 1)

Contrato de interventoría No. STM-CM-010-2025

Objeto: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Fecha 19-12-2025

CONTENIDO

1 RESUMEN CONTRACTUAL

2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

4 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

5 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

6 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Gobernación de Cundinamarca

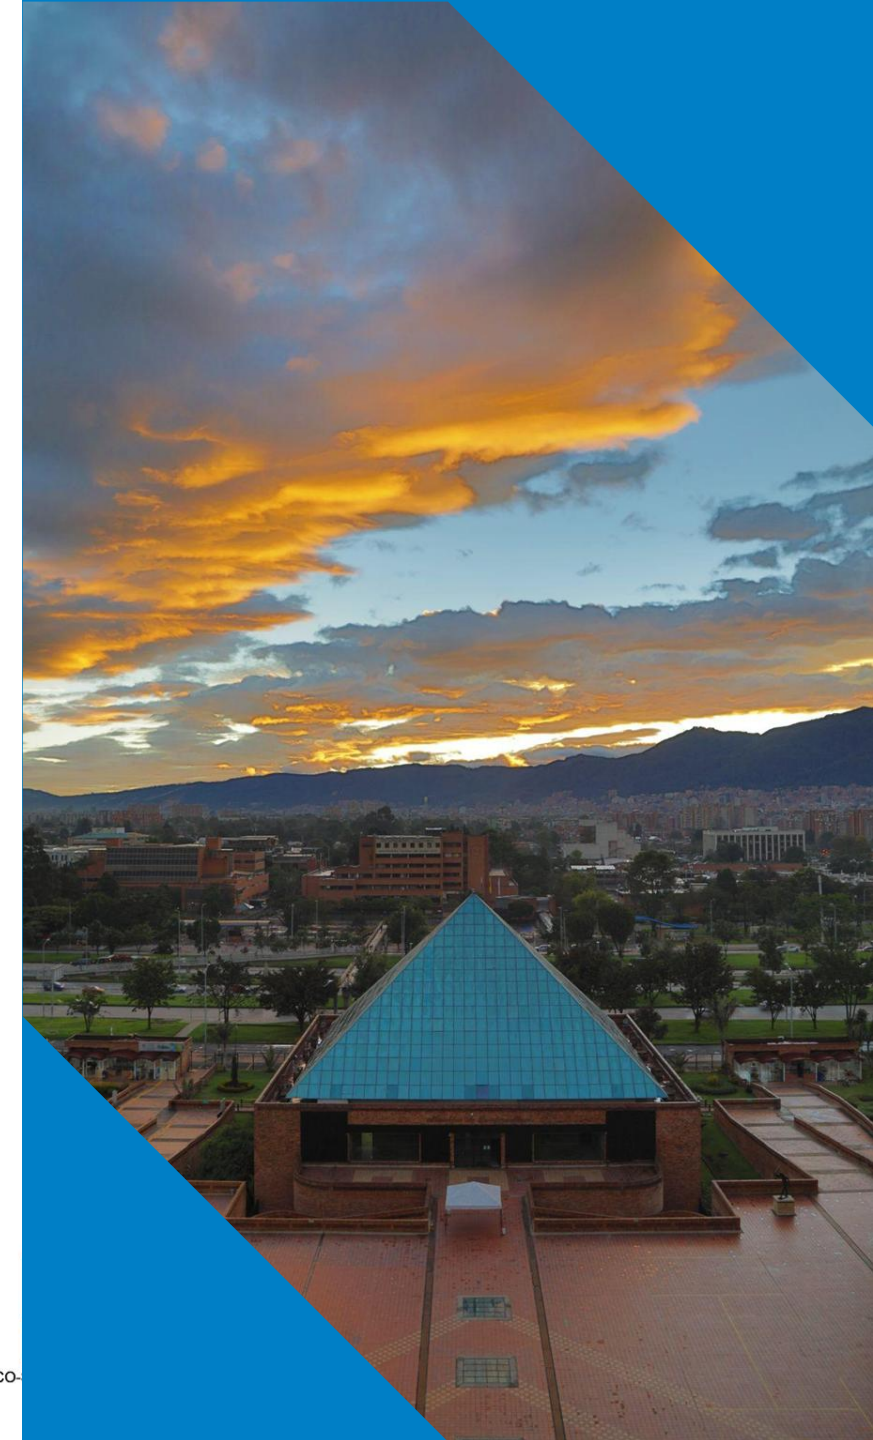

1. RESUMEN CONTRACTUAL

ALCANCE	OBRA	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	**CONSORCIO MS**	**CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL**
OBJETO CONTRACTUAL	Implementar intervenciones en infraestructura vial para **mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos** priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.	Realizar la gerencia integral para la **interventoría técnica, administrativa, financiera, operativa, jurídica, ambiental y social** al contrato cuyo objeto es: implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.
VALOR DEL CONTRATO	$3.625.158.645,00	$1.651.573.119
ADICIONES	N/A	N/A
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) Meses	Once (11) Meses
FECHA INICIO	21 de febrero 2025	21 de febrero 2025
FECHA TERMINACIÓN	20 de diciembre 2025	20 de enero 2026

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR

No.	Compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Fecha de cumplimiento	Observación
1	Complemento paquete NP slurry con especificación técnica	Contratista	15/12/2025	17/12/2025	CUMPLIDO
2	Plan de trabajo dirigido a concesión Guatavita	Contratista	15/12/2025	17/12/2025	CUMPLIDO
3	Verificación programación visitas de recibo de acuerdo con avances de obra.	Contratista			
4	Subsanación informes finales Ubaque y Carmen de Carupa	Contratista	15/12/2025		CUMPLIDO parcialmente, enviaron Carmen de Carupa
5	Subsanación informe mensual 9	Contratista	15/12/2025	16/12/2025	CUMPLIDO

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


No.	Compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Fecha de cumplimiento	Observación
6	Subsanación cuenta de cobro 5	Contratista	15/12/2025	16/12/2025	CUMPLIDO
7	Subsanación observaciones Tocancipá	Contratista	20/12/2025		
8	Terminación actividades sociales de la totalidad de puntos ejecutados	Contratista	20/12/2025		CUMPLIDO parcialmente, pendientes Arbeláez y Pasca
9	Entrega informes finales Quetame, San Bernardo y Tenjo	Contratista	20/12/2025		CUMPLIDO parcialmente, enviaron Quetame
10	Entrega planos récord y acta cantidades de los puntos a recibir en la semana del 15 de diciembre (Arbeláez, Pasca, Paratebueno y Guatavita)	Contratista			

3.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Valor contrato L1 **$ 3.625.158.645,00**

Diseños entregados por la SMC:

LOTE 1	PUNTOS	PRESUPUESTO INICIAL
ARBELAEZ	2	$ 157.992.025,62
CÁQUEZA	4	$ 220.565.574,30
CARMEN DE CARUPA	3	$ 181.559.364,95
CUCUNUBÁ	1	$ 158.827.207,97
FOSCA	4	$ 374.884.156,17
GUACHETA	3	$ 32.496.594,87
GUATAVITA	1	$ 209.470.309,00
GUAYABETAL	2	$ 102.861.825,82
JUNIN	3	$ 243.478.692,21
MACHETÁ	1	$ 7.215.762,84
NEMOCON	1	$ 46.105.043,95
PARATEBUENO	1	$ 64.083.488,17
PASCA	2	$ 188.692.115,18
QUETAME	2	$ 11.553.368,16
SAN BERNARDO	2	$ 74.351.063,00
SIMIJACA	3	$ 100.749.479,16
SUSA	1	$ 8.677.541,11
SUTATAUSA	2	$ 21.173.954,74
TABIO	3	$ 285.988.462,05
TAUSA	1	$ 12.365.123,90
TENJO	1	$ 227.937.266,83
TOCANCIPÁ	2	$ 322.193.752,89
UBALA	2	$ 139.784.706,60
UBAQUE	3	$ 161.459.558,96
UBATÉ	2	$ 283.259.096,58
UNE	5	$ 294.724.541,51
Total general	**57**	**$ 3.932.450.076,55**

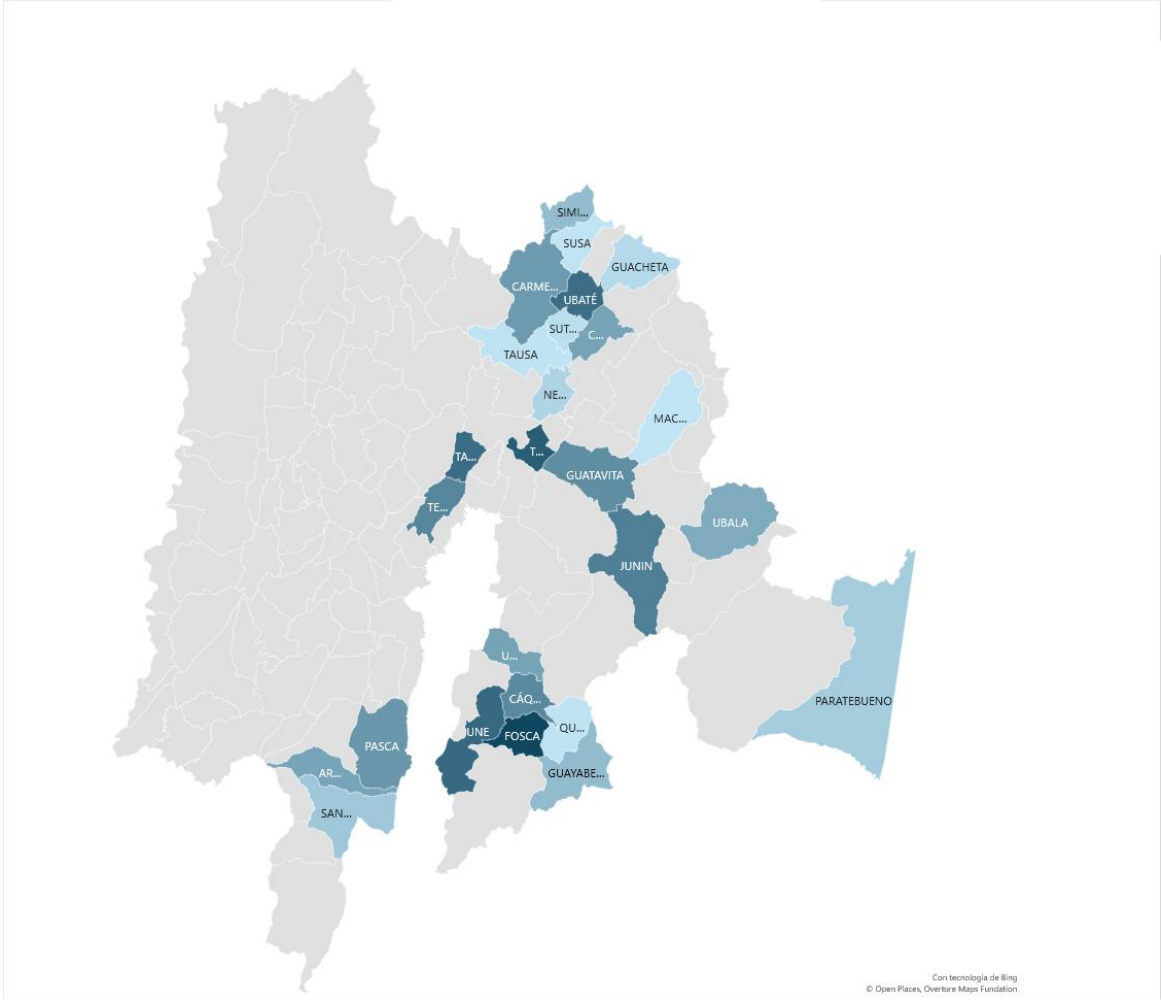

Gobernación de Cundinamarca

ENTIDAD CERTIFICADA

CO-SC-CER303297 ST-CER655785 CO-SI-CER1017570

3.2 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,55
Puntos con visita de reconocimiento	57
Puntos descartados	2
Entrega informe visita	55
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	55
Presupuesto diseños apropiados	$ 4.044.608.081,00

3.3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta Visita preliminar	Cuenta de Entrega REAL informe visita	Cuenta de Aprobación informe
GUACHETA	3	3	3	3
GUAYABETAL	2	2	2	2
NEMOCON	1	1	1	1
QUETAME	2	2	2	2
SIMIJACA	3	3	3	3
SUSA	1	1	1	1
SUTATAUSA	2	2	2	2
TABIO	3	3	3	3
UBALA	2	2	1	1
UBAQUE	3	3	2	2
TAUSA	1	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1	1
UBATÉ	2	2	2	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	3	3
MACHETÁ	1	1	1	1
CÁQUEZA	4	4	4	4
UNE	5	5	5	5
FOSCA	4	4	4	4
PARATEBUENO	1	1	1	1
TOCANCIPÁ	2	2	2	2
GUATAVITA	1	1	1	1
JUNIN	3	3	3	3
SAN BERNARDO	2	2	2	2
ARBELAEZ	2	2	2	2
PASCA	2	2	2	2
TENJO	1	1	1	1
TOTAL	**57**	**57**	**55**	**55**

NOTA: Los puntos de Ubala y Ubaque que fueron descartados no requieren informe de visita preliminar.

3.5 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.625.158.645,00	100%
Puntos entregados por la SMC	57	
Valor total estimado	$ 3.932.450.076,55	108,48%
Puntos descartados	2	
Valor inicial puntos descartados	$ 66.704.675,40	1,84%
Valor ejecutable puntos entregados	$ 3.865.745.401,15	106,64%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	55	
Presupuesto diseños apropiados	$ 4.044.608.081,00	111,57%
Puntos en ejecución de obra	1	
Puntos terminados	54	
Puntos sin iniciar	0	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	54	
Valor ejecutado físico	$ 3.566.629.945,00	98,39%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 3.526.873.822,00	97,29%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en el municipio de Pasca el día 18 de diciembre de 2025.

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO
TABIO	Via Tabio - Cajica (Gimansio Campestre Santa Rita de Casia)	20/6/2025	$ 72.327.600,44	$ 74.833.799,00	$ 72.958.463,00	2,01%
TABIO	Via Tabio - El Mirador	20/6/2025	$ 65.602.005,61	$ 66.222.302,00	$ 66.388.347,00	1,83%
TABIO	Via Tabio - Subachoque	20/6/2025	$ 148.058.856,00	$ 258.580.216,00	$ 262.541.766,00	7,24%
UBATÉ	Ubate - Guacheta	18/7/2025	$ 56.598.728,05	$ 58.724.511,00	$ 78.504.970,00	2,17%
UBATÉ	2. Intersencción Colegio Bruselas	18/7/2025	$ 226.660.368,53	$ 148.029.600,00	$ 148.553.469,00	4,10%
UBAQUE	Ubaque - Chipaque	21/7/2025	$ 97.753.384,08	$ 113.492.344,00	$ 106.364.047,00	2,93%
UBAQUE	CURVA UBAQUE - LA UNIÓN	21/7/2025	$ 54.331.837,16	$ 55.728.450,00	$ 48.381.100,00	1,33%
CARMEN DE CARUPA	2. Sector La U	19/8/2025	$ 58.381.952,38	$ 58.036.759,00	$ 50.958.139,00	1,41%
CARMEN DE CARUPA	3. Sector El Prado	5/9/2025	$ 83.638.091,86	$ 77.764.628,00	$ 75.709.222,00	2,09%
CARMEN DE CARUPA	4.Sector Peligros	19/8/2025	$ 39.539.320,71	$ 43.884.752,00	$ 44.284.303,00	1,22%
GUACHETA	ESCUELA LA ISLA	26/8/2025	$ 13.792.670,76	$ 31.444.186,00	$ 30.404.041,00	0,84%
GUACHETA	I.E. MIÑA Y TICHA	26/8/2025	$ 13.035.646,11	$ 13.511.162,00	$ 11.509.923,00	0,32%
GUACHETA	ESCUELA RURAL PUEBLO VIEJO	26/8/2025	$ 5.668.278,00	$ 7.832.442,00	$ 7.832.441,00	0,22%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
SIMIJACA	COLEGIO AGUSTIN PARRA	26/8/2025	$ 60.682.955,32	$ 59.584.972,00	$ 46.423.414,00	1,28%
SIMIJACA	ESCUELA EL FICAL	26/8/2025	$ 20.238.121,60	$ 10.901.006,00	$ 11.407.589,00	0,31%
SIMIJACA	ESCUELA EL PANTANO	26/8/2025	$ 19.828.402,24	$ 21.115.706,00	$ 22.627.387,00	0,62%
NEMOCON	Escuela La Puerta	5/9/2025	$ 46.105.043,95	$ 37.467.306,00	$ 36.562.501,00	1,01%
SUTATAUSA	ESCUELA PALACIO	16/9/2025	$ 5.459.679,72	$ 5.459.680,00	$ 5.459.679,00	0,15%
SUTATAUSA	ESCUELA HATO VIEJO	16/9/2025	$ 15.714.275,02	$ 15.714.275,00	$ 14.294.984,00	0,39%
TOCANCIPÁ	BRICEÑO - ZIPAQUIRA PARQUE JAIME DUQUE	16/9/2025	$ 298.600.598,51	$ 307.479.873,62	$ 309.473.126,62	8,54%
TOCANCIPÁ	Complemento C.R. ENTRELOMAS	16/9/2025	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	$ 23.593.154,38	0,65%
UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. EL TABOR	6/10/2025	$ 82.454.368,92	$ 88.176.030,00	$ 85.859.060,00	2,37%
CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	8/10/2025	$ 44.421.570,34	$ 47.985.697,00	$ 42.948.940,00	1,18%
CÁQUEZA	2. Escuela Ubatoque 2	8/10/2025	$ 33.370.969,16	$ 37.389.635,00	$ 36.516.713,00	1,01%
CÁQUEZA	3. Consolidado Sector El Campin	8/10/2025	$ 106.304.301,84	$ 111.048.567,00	$ 96.329.604,00	2,66%
CÁQUEZA	4. Curva Salida Caqueza - Fosca	8/10/2025	$ 36.468.732,96	$ 43.335.493,00	$ 41.426.891,00	1,14%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
FOSCA	1. Colegio IDER	8/10/2025	$ 24.920.127,94	$ 25.167.041,00	$ 22.846.901,00	0,63%
FOSCA	2. Consolidado El Tablon	8/10/2025	$ 231.072.196,83	$ 256.713.360,00	$ 179.854.339,00	4,96%
FOSCA	4. Cementerio Municipal	8/10/2025	$ 74.910.059,06	$ 79.401.526,00	$ 61.955.299,00	1,71%
FOSCA	5. Saname - Sector Finca Humberto Guevara	8/10/2025	$ 43.981.772,34	$ 17.517.093,00	$ 11.506.821,00	0,32%
QUETAME	1. Escuela Rural Granadillo	8/10/2025	$ 7.186.556,52	$ 6.640.156,00	$ 6.640.155,00	0,18%
QUETAME	2. Intersección Matemango	8/10/2025	$ 4.366.811,64	$ 7.142.509,00	$ 7.142.510,00	0,20%
UNE	Ingreso Une_ Curva Alta Siniestralidad	9/10/2025	$ 38.679.548,56	$ 57.483.723,00	$ 49.665.362,00	1,37%
UNE	Entrada Estación De Servicio Texaco	9/10/2025	$ 90.661.608,58	$ 93.018.609,00	$ 82.695.312,00	2,28%
UNE	Escuela Combura	9/10/2025	$ 51.293.279,40	$ 69.832.283,00	$ 64.540.095,00	1,78%
UNE	Punto Critico Timasita	9/10/2025	$ 46.776.621,94	$ 51.974.008,00	$ 51.057.446,00	1,41%
UNE	Sector Vda Salitre-costado Villla Natalia	9/10/2025	$ 67.313.483,03	$ 75.517.082,00	$ 71.006.743,00	1,96%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
GUAYABETAL	Vda San Antonio	9/10/2025	$ 60.847.191,37	$ 61.172.852,00	$ 56.450.044,00	1,56%
GUAYABETAL	Instituto Clara Theresia Escuela Monterredondo	9/10/2025	$ 42.014.634,45	$ 37.786.733,00	$ 40.442.050,00	1,12%
SUSA	ESCUELA EL TABLON	29/10/2025	$ 8.677.541,11	$ 15.791.947,00	$ 13.576.914,00	0,37%
TAUSA	IED SAN ANTONIO SEDE PARAMO BAJO	29/10/2025	$ 12.365.123,90	$ 22.183.503,00	$ 21.742.674,00	0,60%
JUNIN	Vía Sueva-San Roque I.E.D. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	20/11/2025	$ 67.183.349,24	$ 74.599.696,00	$ 83.766.171,00	2,31%
JUNIN	Vía Sueva-San Roque Sector turístico Campo Alegre - Vereda San Roque	20/11/2025	$ 123.628.932,61	$ 128.065.777,00	$ 135.529.683,00	3,74%
JUNIN	Intersección Vía San Roque - Junín	20/11/2025	$ 52.666.410,36	$ 53.476.141,00	$ 50.967.739,00	1,41%
MACHETÁ	ESCUELA GUINA	20/11/2025	$ 7.215.762,84	$ 7.780.676,00	$ 7.780.676,00	0,21%

3.6 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
SAN BERNARDO	2. Escuela Normal Superior de San Bernardo	1/12/2025	$ 10.363.250,00	$ 17.345.215,00	$ 17.064.451,00	0,47%
SAN BERNARDO	3. Institución Educativa Departametal San Bernardo	1/12/2025	$ 63.987.813,00	$ 47.218.098,00	$ 48.088.890,00	1,33%
TENJO	Desde Intersección El Zoque hasta Intersección Cementerio	5/12/2025	$ 227.937.266,83	$ 227.644.231,00	$ 222.693.908,00	6,14%
ARBELAEZ	SECTOR VIA SAN BERNARDO - ARBELAEZ	15/12/2025	$ 69.552.853,92	$ 69.025.528,00	$ 69.025.528,00	1,90%
ARBELAEZ	SECTOR: KIRPALAMAR	15/12/2025	$ 88.439.171,70	$ 89.192.907,00	$ 89.192.907,00	2,46%
PARATEBUENO	Colegio Josue Manrique Inspección de Maya Ingreso	17/12/2025	$ 64.083.488,17	$ 67.434.570,00	$ 47.965.714,00	1,32%
PASCA	INT. VEREDA ZAQUE - SECTOR LA CAPILLA INT. VEREDA GUCHIPAS	18/12/2025	$ 87.383.268,46	$ 90.654.141,00	$ 54.392.485,00	1,50%
PASCA	VEREDA EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO	18/12/2025	$ 101.308.846,72	$ 100.402.971,00	$ 60.241.783,00	1,66%
CUCUNUBÁ	PUNTO CRITICO PR 4+100	19/8/2025	$ 158.827.207,97	$ 163.518.183,00	$ 121.727.948,00	3,36%
TOTAL	54		$ 3.656.275.092,15	$ 3.831.037.106,00	$ 3.526.873.822,00	97,29%

3.7 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA


Avance implementación/entrega:

CODIGO DEL PUNTO	MUNICIPIO	PUNTO	VALOR INICIAL	VALOR APROPIACION DISEÑO	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN %	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE DE IMPLEMENTACION DISEÑOS APROPIADOS
25326_CN_01	GUATAVITA	Intersecciones entre Calle 2 y Calle 5A Guatavita con vía Guatavita - Sesquilé	$ 209.470.309,00	$ 213.570.975,00	$ 4.100.666,00	1,96%	$ 39.756.123,00	18,61%
TOTAL			$ 3.865.745.401,15	$ 4.044.608.081,00	$ 178.862.679,85	4,63%	$ 3.566.629.945,00	98,52%

VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.625.158.645,00	$ 4.044.608.081,00	111,57%	$ 3.566.629.945,00	98,39%

3.9 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Fecha Comité	% Ejecutado Físico Sobre el Valor del Contrato	% Planeado en Base a la Meta Contractual	Avance Reportado Entre Comités
4/6/2025	10,20%	15,00%	-
11/6/2025	13,18%	17,50%	2,98%
25/6/2025	19,06%	20,00%	5,88%
2/7/2025	22,27%	24,00%	3,21%
10/7/2025	26,52%	28,00%	4,25%
16/7/2025	29,35%	32,00%	2,83%
22/7/2025	33,70%	35,00%	4,35%
31/7/2025	37,34%	38,00%	3,64%
8/8/2025	40,40%	41,00%	3,06%
14/8/2025	45,20%	44,00%	4,80%
21/8/2025	46,84%	50,00%	1,64%
28/8/2025	49,35%	52,50%	2,51%
4/9/2025	54,09%	55,00%	4,74%
11/9/2025	59,34%	60,00%	5,25%
18/9/2025	70,19%	65,00%	10,85%
25/9/2025	71,10%	70,00%	0,91%
2/10/2025	71,78%	75,00%	0,68%
9/10/2025	73,15%	80,00%	1,37%
20/10/2025	77,97%	90,00%	4,82%
23/10/2025	78,84%	91,25%	0,87%
30/10/2025	82,05%	92,00%	3,21%
6/11/2025	83,34%	94,00%	1,29%
13/11/2025	84,05%	96,00%	0,71%
20/11/2025	88,91%	100%	4,86%
27/11/2025	91,17%	100%	2,26%
4/12/2025	91,59%	100%	0,42%
15/12/2025	94,09%	100%	2,50%
19/12/2025	98,39%	100%	4,30%

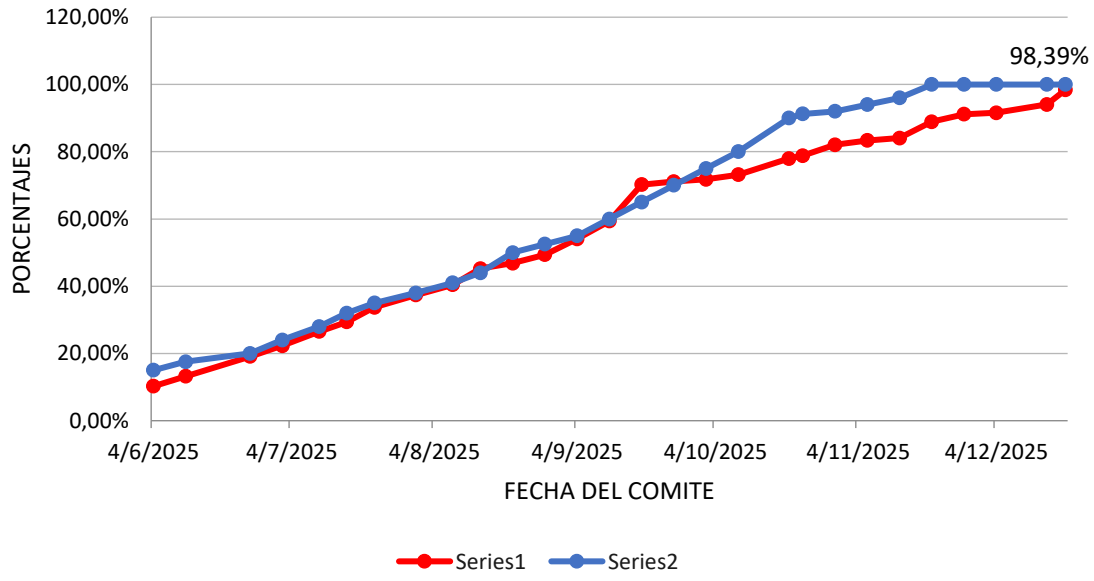

4.1 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



Seguimiento metas contractuales:

Valor contrato L1 **$3.625.158.6445**

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Fisico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 181.257.932					NO
3	20-may-25	10%	$ 362.515.864,50			$ 369.801.264,58	10,20%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 725.031.729	$ 401.888.576,00	11,09%	$ 807.397.167,00	22,27%	NO
5	20-jul-25	35%	$1.268.805.526	$ 783.692.162,00	21,62%	$ 1.223.717.964,00	33,76%	NO
6	20-ago-25	50%	$1.812.579.323	$ 1.000.662.552,00	27,60%	$ 1.697.861.006,00	46,84%	NO
7	20-sep-25	70%	$2.537.611.052	$ 1.595.960.014,00	44,02%	$ 2.577.624.979,00	71,10%	NO
8	20-oct-25	90%	$3.262.642.781	$ 2.604.844.299,00	71,85%	$ 2.826.558.685,00	77,97%	NO
9	20-nov-25	100%	$3.625.158.645	$ 2.918.208.156,00	80,50%	$ 3.305.189.896,06	91,17%	NO
10	20-dic-25	100%	$3.625.158.645	$ 3.526.873.822,00	97,29%	$ 3.566.629.945,00	98,39%	NO

4.2 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor contrato L1 **$$3.625.158.6445**

Relación pagos:

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	3	Tabio (3)	$ 401.888.576,00	11,09 %	$ 401.888.576,00	11,09 %
2	7	Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (2) y Cucunuba (1)	$ 598.773.976,00	16,52 %	$ 1.000.662.552,00	27,61 %
3	12	Carmen de Carupa (1), Guachetá (3), Nemocón (1), Simijaca (3), Sutatausa (2) y Tocancipá (2)	$ 595.297.462,00	16,42%	$ 1.595.960.014,00	44,02%
4	18	Cáqueza (4), Fosca (4), Guayabetal (2), Quetame (2), Ubala (1) y Une (5)	$ 1.008.884.285,00	27,83%	$ 2.604.844.299,00	71,85%
5	6	Junín (3), Machetá (1), Susa (1) y Tausa (1)	$ 313.363.857,00	8,65%	$ 2.918.208.156,00	80,50%
6						
7						
8						
9						
10						

5.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Actividades de implementación Arbeláez 25053_CN_03
SECTOR: KIRPALAMAR



Actividades de implementación Pasca 25535_CN_02 VEREDA
EL MOLINO ESCUELA RURAL ALTO DEL MOLINO



6. ESTADO DEL CLIMA

Ítem	Estado del Clima	lunes 8 diciembre			martes 9			miércoles 10			jueves 11			viernes 12			sábado 13			domingo 14			TOTAL SEMANAL	TOTAL ACUMULADO
		Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche		
1	Lluvioso Arbelaez																						0	0
2	Lluvioso Paratebueno																						0	0
3	Lluvioso Pasca																						0	0

7.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
Puntos con socialización diseños	57
Puntos con actas de entorno	57
Puntos con socialización de cierre	51
Puntos con actas de entorno cierre	51
Actas de inicio de vecindad	24
Actas de cierre de vecindad	16
PQR recibidas	0
PQR atendidas y cerradas	0

7.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Socialización Inicial	Cuenta de Actas de vecindad Inicial	Cuenta de Actas entorno Inicial	Cuenta de Socialización fin	Cuenta de Actas de Cierre de Vecindad	Cuenta de Actas de cierre entorno
GUACHETA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
GUAYABETAL	2	2	1	2	2	1	2
NEMOCON	1	1	N/A	1	1	N/A	1
QUETAME	2	2	N/A	2	2	N/A	2
SIMIJACA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
SUSA	1	1	N/A	1	1	N/A	1
SUTATAUSA	2	2	N/A	2	2	N/A	2
TABIO	3	3	2	3	3	2	3
UBALA	2	2	N/A	2	1	N/A	1
UBAQUE	3	3	N/A	3	2	N/A	2
TAUSA	1	1	1	1	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1	1	1	1	1
UBATÉ	2	2	N/A	2	2	N/A	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
MACHETÁ	1	1	N/A	1	1	N/A	1
CÁQUEZA	4	4	N/A	4	4	N/A	4
UNE	5	5	N/A	5	5	N/A	5
FOSCA	4	4	2	4	4	2	4
PARATEBUENO	1	1	3	1	1	3	1
TOCANCIPÁ	2	2	N/A	2	2	N/A	2
GUATAVITA	1	1	N/A	1	1	N/A	1
JUNIN	3	3	2	3	3	2	3
SAN BERNARDO	2	2	N/A	2	2	N/A	2
ARBELAEZ	2	2	1	2			
PASCA	2	2	7	2			
TENJO	1	1	4	1	1	4	1
TOTAL	**57**	**57**	**24**	**57**	**51**	**16**	**51**

NOTA: En los puntos descartados de los municipios de Ubaté y Ubala no aplica levantar actas sociales de cierre.

8.1 SEGUIMIENTO PMT

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	57
PMT radicados	57
PMT aprobados	57
Puntos con otros permisos requeridos	0
Capacitaciones	0
Accidentes laborales	0

8.2 SEGUIMIENTO PMT

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Radicación PMT	Cuenta de Aprobación PMT
GUACHETA	3	3	3
GUAYABETAL	2	2	2
NEMOCON	1	1	1
QUETAME	2	2	2
SIMIJACA	3	3	3
SUSA	1	1	1
SUTATAUSA	2	2	2
TABIO	3	3	3
UBALA	2	2	2
UBAQUE	3	3	3
TAUSA	1	1	1
CUCUNUBÁ	1	1	1
UBATÉ	2	2	2
CARMEN DE CARUPA	3	3	3
MACHETÁ	1	1	1
CÁQUEZA	4	4	4
UNE	5	5	5
FOSCA	4	4	4
PARATEBUENO	1	1	1
TOCANCIPÁ	2	2	2
GUATAVITA	1	1	1
JUNIN	3	3	3
SAN BERNARDO	2	2	2
ARBELAEZ	2	2	2
PASCA	2	2	2
TENJO	1	1	1
TOTAL	**57**	**57**	**57**

9. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES DE VISITA PRELIMINAR

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
TABIO	3	APROBADO	
GUAYABETAL	2	APROBADO	
UBAQUE	2	APROBADO	
NEMOCON	1	APROBADO	
SIMIJACA	3	APROBADO	
GUACHETA	3	APROBADO	
UBATE	2	APROBADO	
UBALA	1	APROBADO	
SUTATAUSA	2	APROBADO	
SUSA	1	APROBADO	
QUETAME	2	APROBADO	
CARMEN DE CARUPA	3	APROBADO	
CUCUNUBA	1	APROBADO	
TAUSA	1	APROBADO	
MACHETA	1	APROBADO	
TOCANCIPA	2	APROBADO	
FOSCA	4	APROBADO	
CAQUEZA	4	APROBADO	
UNE	5	APROBADO	
GUATAVITA	1	APROBADO	
PARATEBUENO	1	APROBADO	
JUNIN	3	APROBADO	
SAN BERNARDO	2	APROBADO	
ARBELAEZ	2	APROBADO	
PASCA	2	APROBADO	
TENJO	1	APROBADO	

10. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES FINALES

REPORTE INFORMES FINALES LOTE 1				
MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA	ESTADO
TABIO	3	EN REVISION INTERVENTORÍA		
GUAYABETAL	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
UBAQUE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	17/12/2025	
NEMOCON	1	RADICADO A LA SMC		**APROBADO**
SIMIJACA	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
GUACHETA	3	EN REVISION INTERVENTORÍA	18/12/2025	
UBATE	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
UBALA	1	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
SUTATAUSA	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
SUSA	1	EN REVISION INTERVENTORÍA		
QUETAME	2	EN REVISION	19/12/2025	
CARMEN DE CARUPA	3	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
CUCUNUBA	1	RADICADO A LA SMC		**APROBADO**
TAUSA	1	DEVUELTO AL CONTRATISTA	17/12/2025	
MACHETA	1	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
TOCANCIPA	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
FOSCA	4	DEVUELTO AL CONTRATISTA	19/12/2025	
CAQUEZA	4	DEVUELTO AL		
UNE	5	EN REVISION	19/12/2025	
JUNIN	3	EN REVISION	18/12/2025	
SAN BERNARDO	2	SIN ENTREGAR	13/12/2025	
ARBELAEZ	2	SIN ENTREGAR	19/12/2025	
GUATAVITA	1	SIN ENTREGAR		
PASCA	2	SIN ENTREGAR		
TENJO	1	SIN ENTREGAR	17/12/2025	
PARATEBUENO	1	SIN ENTREGAR		

APROBADO	**2**
EN REVISION DE INTERVENTORIA	**17**
EN REVISION LA SMC	**3**
DEVUELTO AL CONTRATISTA	**24**
SIN ENTREGAR	**9**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se han realizado 57 visitas preliminares de las cuales se han entregado 55 informes de visita preliminar y no se encuentra pendiente por visita preliminar ningún punto.
2. 55 puntos cuentan con actas de apropiación suscritas, de los cuales; 54 han sido terminados y se han entregado a la entidad-SMC en su totalidad; 1 está en ejecución y 0 se encuentran pendiente por iniciar.
3. De los 54 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 46 puntos ubicados en los municipios de Tabio (3), Ubaté (2), Ubaque (2), Carmen de Carupa (3), Cucunuba (1), Guachetá (3), Simijaca (3), Nemocón (1), Sutatausa (2), Tocancipá (2), Ubala (1), Cáqueza (4), Fosca (4), Quetame (2), Une (5), Guayabetal (2), Susa (1), Tausa (1), Macheta (1) Y Junín (3), los cuales ya fueron revisados por la interventoria, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoria se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Carmen de Carupa, Cucunuba y Nemocón, los cuales ya fueron aprobados por la interventoria y remitidos a la entidad - SMC.
4. Un 97,29% del valor total del contrato a sido entregado a la entidad - SMC que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 3.526.873.822,00, correspondiente a 54 puntos.
5. A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 98,39% del valor total del contrato.



Gobernación de
Cundinamarca
