Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	VIGENCIA:	**2025/01/22**

ACTA No:	146
FECHA:	19/12/ 2025
CONTRATO No:	C.I. No.STM-CM-010-2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PARTICIPANTES	
En Representación de	SMC
NOMBRE	Juan Heredia
Cargo	Supervisor
En Representación de	SMC
NOMBRE	Giovanna Naranjo
Cargo	Apoyo a la supervisión
En Representación de	SMC
NOMBRE	María Virginia Rocha
Cargo	Especialista transito
En Representación de	SMC
NOMBRE	Alejandro Leguizamo Flórez
Cargo	Profesional Universitario
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Ernesto Perdomo
Cargo	Director Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Bibiana Rojas
Cargo	Residente Interventoría
En Representación de	Consorcio INT SEGURIDAD VIAL
NOMBRE	Dalila Otalora
Cargo	Especialista en Tránsito
En Representación de	Consorcio INGENIO VIAL
NOMBRE	Héctor Gómez
Cargo	Director de obra.
En Representación de	Consorcio INGENIO VIAL
NOMBRE	Daniel Castilla
Cargo	Residente de Obra
En Representación de	Consorcio INGENIO VIAL
NOMBRE	Alexander Gómez
Cargo	Especialista de transito

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Entrega planos récord y acta cantidades de los puntos a recibir en la semana del 15 diciembre (Ricaurte 1 punto, La Mesa, Tocaima, Pacho)	CONSORCIO INGENIO VIAL			
Planos récord Vergara punto 6 y terminación Tocaima	CONSORCIO INGENIO VIAL			20/12/2025 el contratista se mantiene en la fecha de entrega
Subsanación informe mensual N° 9	CONSORCIO INGENIO VIAL		X	Sin cumplir
Paquete de cobro N° 5 CO	CONSORCIO INGENIO VIAL		X	Sin cumplir
Terminación actividades sociales de la totalidad de puntos ejecutados	CONSORCIO INGENIO VIAL	X		CUMPLIDO parcialmente, pendiente Ricaurte
Entrega informes finales Agua de Dios, Funza, San juan de Rio seco, Subachoque, Guaduas, Vergara informativas	CONSORCIO INGENIO VIAL		X	Sin cumplir

TEMAS PRESENTE ACTA

Durante el comité se realizó la revisión del estado general del contrato, la interventoría mencionó como primer compromiso la entrega de los planos récord, las actas de cantidades correspondientes a los puntos de La Mesa, Ricaurte punto (1), Pacho, mencionando que la documentación no ha sido recibida por la interventoría, el contratista informó que, Los planos récord serán entregados el martes 23 de diciembre.

La interventoría indicó que el Informe Mensual No. 9 del contratista no ha sido aprobado debido a la falta de planillas de Seguridad social, subsanación de informes técnicos y sst, por lo que se le recuerda al contratista que es indispensable tener esta aprobación para el trámite de la Cuenta de Cobro No. 5, El contratista indica que las planillas de pagos de seguridad social serán cargadas el lunes 22 de diciembre, la subsanación completa del informe se enviará ese mismo día.

Se revisó el estado de los informes finales correspondientes a los municipios de: Agua de Dios, San Juan de Río Seco, Subachoque, Guaduas, Vergara – Punto 6 (Señales informativas), el contratista indicó que se encuentran atendiendo las observaciones y se acordó como fecha de entrega definitiva el lunes 22 de diciembre.

Se informó que presentan observaciones los puntos entregados de los municipios: San Juan de Río Seco, Funza, Subachoque, Guaduas, Vergara (señales informativas), La Mesa, Ricaurte, Pacho.

El contratista indicó que dispondrá una cuadrilla adicional de remates para atender observaciones, pero no garantiza la subsanación total antes del 23 de diciembre**,** solicita flexibilidad para realizar subsanaciones entre el 29 y 30 de diciembre, por la época de festividades decembrinas.

La interventoría manifiesta que es importante realizar estas subsanaciones de manera inmediata dado que se requiere para los informes finales y para la liquidación del contrato.

Aspectos Contractuales

VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.480.023.139,00	$ 3.301.332.279,65	94,87%	$ 3.083.364.377,20	88,60%

A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 88,60% del valor total del contrato.

Aspectos Técnicos

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.480.023.139,00	100%
Puntos entregados por la SMC	80	
Valor total estimado	$ 3.474.530.312,60	99,84%
Puntos descartados	4	
Valor inicial puntos descartados	$ 194.912.577,02	5,60%
Valor ejecutable puntos entregados por la SMC	$ 3.279.617.735,58	94,24%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	80	
Presupuesto diseños apropiados	$ 3.559.371.980,65	102,28%
Valor apropiado puntos descartados	$ 258.039.701,00	7,41%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños a ejecutar	76	
Valor ejecutable puntos entregados por la SMC y apropiados	$ 3.301.332.279,65	94,87%
Puntos en ejecución de obra	1	
Puntos terminados	74	
Puntos sin iniciar	1	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	74	
Valor ejecutado físico	$ 3.083.364.377,20	88,60%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 2.971.533.454,13	85,39%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en los municipios de La Mesa y Ricaurte el día 16 de diciembre de 2025.

El 85,39% del valor total del contrato ha sido entregado a la entidad que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 2.971.533.454,13, correspondiente a 74 puntos.

Seguimiento Metas Contractuales y Cronograma Proyecto

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Físico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 174.001.157					NO
3	20-may-25	10%	$ 348.002.314			$ 354.286.974,40	10,18%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 696.004.628	$ 432.051.623,93	12,42%	$ 676.103.015,93	19,43%	NO
5	20-jul-25	35%	$ 1.218.008.099	$ 666.318.743,58	19,15%	$ 935.622.583,88	26,89%	NO
6	20-ago-25	50%	$ 1.740.011.570	$ 831.654.503,47	23,90%	$ 1.591.568.881,88	45,73%	NO
7	20-sep-25	70%	$ 2.436.016.197	$ 1.759.303.016,11	50,55%	$ 1.809.299.151,42	51,99%	NO
8	20-oct-25	90%	$ 3.132.020.825	$ 1.859.056.204,11	53,42%	$ 2.105.411.273,82	60,50%	NO
9	20-nov-25	100%	$ 3.480.023.139	$ 1.889.279.794,00	54,29%	$ 2.605.186.314,52	74,86%	NO
10	20-dic-25	100%	$ 3.480.023.139	$ 2.971.533.454,13	85,39%	$ 3.083.364.377,20	88,60%	NO

Aspectos Administrativos y de SST

De los 74 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 57 puntos ubicados en los municipios de Vergara (5), Nimaima (3), Anolaima (2), Vianí (3), Viotá (1), Agua de Dios (2), Puerto Salgar (2), La Vega (2), Pulí (1), Guayabal de Siquima (3), Alban (3), El Rosal (2), Cachipay (4), Villeta (3), Anapoima (4), El Colegio (3), Apulo (2), Nilo (3), Chaguaní (4), Caparrapí (2), Topaipí (2) y Yacopí (1), los cuales ya fueron revisados por la interventoría, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoría se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Vergara, Villeta (Bomba Brío) y Anapoima, los cuales ya fueron aprobados por la interventoría y remitidos a la entidad - SMC

Aspectos sociales y/o ambientales

REPORTE INFORMES FINALES LOTE 2

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA	ESTADO
VERGARA	5	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
VILLETA EDS BRÍO	1	RADICADO A LA SMC		APROBADO
ANOLAIMA	2	EN REVISION INTERVENTORIA		
NIMAIMA	3	EN REVISION INTERVENTORIA		
PUERTO SALGAR	2	EN REVISION INTERVENTORIA		
AGUA DE DIOS	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	17/12/2025	
PULI	1	EN REVISION INTERVENTORIA		
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	EN REVISION INTERVENTORIA		
LA VEGA	2	EN REVISION INTERVENTORIA		
VIOTA	1	EN REVISION INTERVENTORIA		
ALBAN	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
VIANI	3	EN REVISION INTERVENTORIA	19/12/2025	
APULO	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
YACOPI	1	EN REVISION INTERVENTORIA		
CHAGUANI	4	EN REVISION INTERVENTORIA	18/12/2025	
NILO	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
CAPARRAPI	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
TOPAIPI	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
EL COLEGIO	3	EN REVISION INTERVENTORIA	18/12/2025	
ANAPOIMA	4	RADICADO A LA SMC		APROBADO
CACHIPAY	4	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
EL ROSAL	2	EN REVISION INTERVENTORIA	18/12/2025	
FUNZA	2	SIN ENTREGAR	15/12/2025	
SAN JUAN DE RIOS ECO	4	SIN ENTREGAR	13/12/2025	
VILLETA	2	EN REVISION INTERVENTORIA		
SUBACHOQUE	3	SIN ENTREGAR	15/12/2025	
GUADUAS	2	SIN ENTREGAR	16/12/2025	
LA MESA	2	SIN ENTREGAR		
PACHO	1	SIN ENTREGAR		
RICAURTE	3	SIN ENTREGAR		
TOCAIMA	1	SIN ENTREGAR	SIN ENTREGA DE PUNTO	
VERGARA SEÑALES INFORMATIVAS	1	SIN ENTREGAR	16/12/2025	

APROBADO	5
EN REVISION DE INTERVENTORIA	29
EN REVISION DE LA SMC	5
DEVUELTO AL CONTRATISTA	18
SIN ENTREGAR	19

Aspectos Presupuestales

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	9	Vergara (5), Nimaima (3) y Villeta (1)	$ 298.655.383,00	8,58 %	$ 298.655.383,00	8,58 %
2	14	Anolaima (2), Vianí (3), Viotá (1), Anapoima (1), Agua de Dios (2), Puerto Salgar (2), La Vega (2) y Villeta (1)	$ 531.002.493,00	15,26 %	$ 829.657.876,00	23,84 %
3	22	Anapoima (3), Apulo (2), Cachipay (4), El Colegio (3), El Rosal (2), Guayabal de Siquima (3), Nilo (3), Pulí (1) y Villeta (1)	$ 875.336.493,00	25,15 %	$ 1.704.994.369,00	48,99 %

La interventoría dejó constancia de que las demoras en la aprobación del informe y de la cuenta de cobro son responsabilidad exclusiva del contratista, debido al incumplimiento en la entrega de los parafiscales y de las subsanaciones a las observaciones generadas por la interventoría.

ACCIONES Y COMPROMISOS FORMULADOS EN LA PRESENTE ACTA

COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Entrega de planos récord y actas de cantidades pendientes	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para la semana del 22-23 /12/2025

Inicio y finalización de actividades en Tocaima	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para el 20/12/2025
Subsanación de informe mensual N°9 (Planillas de seguridad social)	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para el 22/12/2025
Cierres sociales de Ricaurte y Tocaima	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para la semana del 20/12/2025
Subsanación de observaciones en campo	CONSORCIO INGENIO VIAL			Compromiso para antes del 30/12/2025
Envío documentación para acta de terminación	CONSORCIO INGENIO VIAL			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: Juan Heredia
SUPERVISOR SMC

Firma_____
Nombre: Ernesto Perdomo
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Héctor Gómez
CONTRATISTA

Para uso exclusivo del supervisor de SMC: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR SMC

Copia: interventoría
Copia: contratista

REGISTRO DE ASISTENTES



AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Secretaria de Movilidad Contemporánea -SMC , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página contactenos@cundinamarca.gov.co

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, SMC sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No 51-53 Bogotá D.C., al correo electrónico contactenos@cundinamarca.gov.co; o de forma verbal,

comunicándose a la línea Transparente: 57(601) 7490000, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Comité de seguimiento No. 41

Contrato de obra No. STM-LP-008-2025 (Lote 2)

Contrato de interventoría No. STM-CM-010-2025

Objeto: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

Fecha 19-12-2025

CONTENIDO

1 RESUMEN CONTRACTUAL

2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

4 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

5 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

6 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Gobernación de Cundinamarca

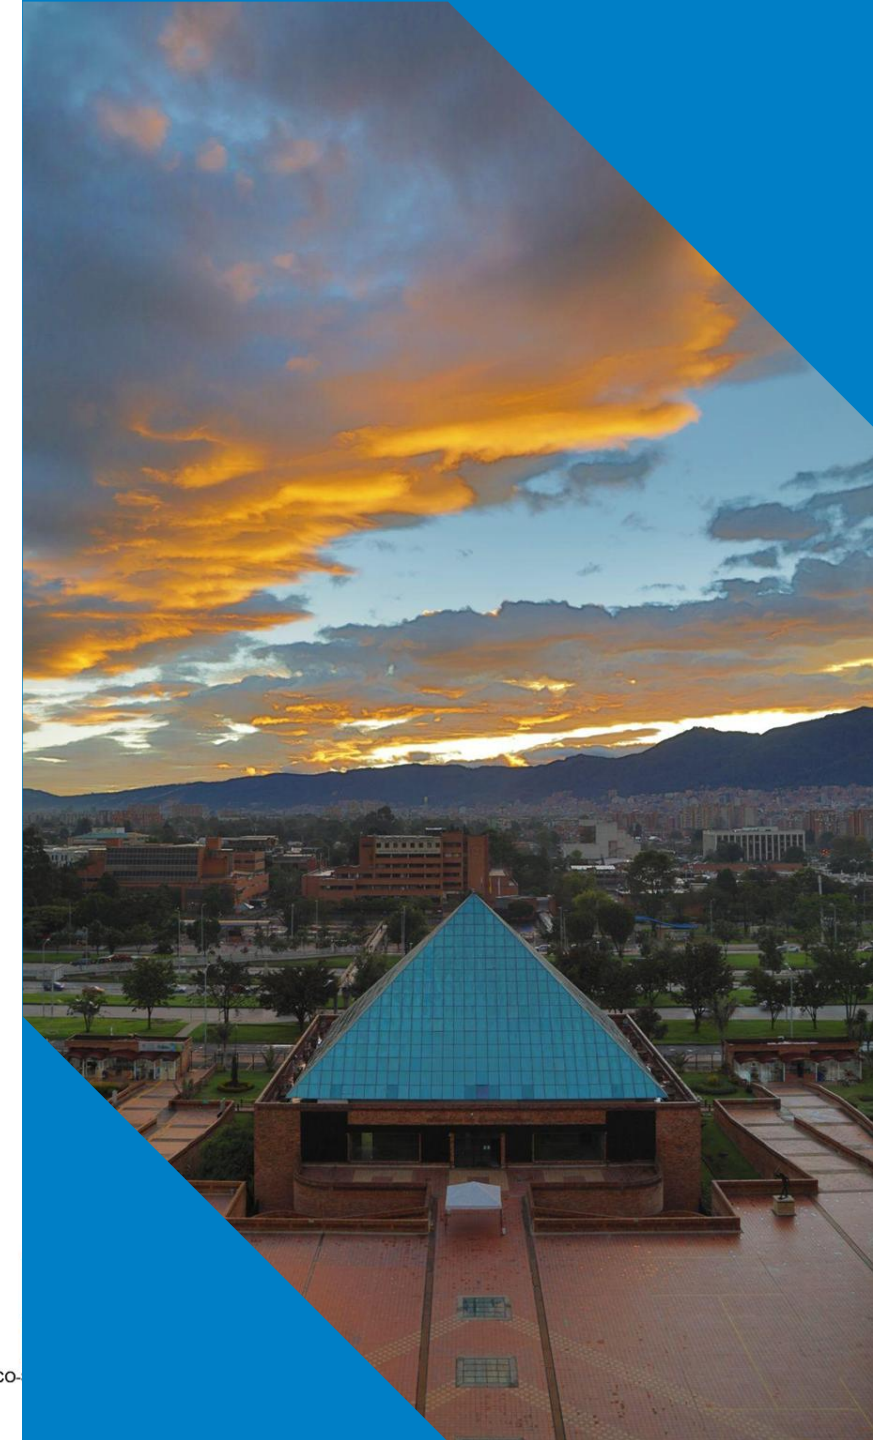

1. RESUMEN CONTRACTUAL

ALCANCE	OBRA	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA	INGENIO VIAL	CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL
OBJETO CONTRACTUAL	"Implementar intervenciones en infraestructura vial para **mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos** priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca".	Realizar la gerencia integral para la **interventoría técnica, administrativa, financiera, operativa, jurídica, ambiental y social** al contrato cuyo objeto es: implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca.
VALOR DEL CONTRATO	$3.480.023.139,00	$1.651.573.119
ADICIONES	N/A	N/A
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) Meses	Once (11) Meses
FECHA INICIO	21 de febrero 2025	21 de febrero 2025
FECHA TERMINACIÓN	20 de diciembre 2025	20 de enero 2026

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR


No.	Compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Fecha de cumplimiento	Observación
1	Entrega planos récord y acta cantidades de los puntos a recibir en la semana del 15 diciembre (Ricaurte punto 01, La Mesa, Tocaima, Pacho)	Contratista			
2	Inicio y terminación Tocaima	Contratista	20/12/2025		
3	Subsanación informe mensual 9	Contratista	15/12/2025		Sin cumplir
4	Paquete de cobro 5 CO	Contratista	20/12/2025		
5	Terminación actividades sociales de la totalidad de puntos ejecutados	Contratista	20/12/2025		CUMPLIDO parcialmente, pendiente Ricaurte
6	Entrega informes finales Agua de Dios, Funza, San juan de Rio Seco, Subachoque, Guaduas y Vergara informativas	Contratista	18/12/2025		

3.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Valor contrato L2 **$ 3.480.023.139,00**

Diseños entregados por la SMC:

Municipio	Puntos Entregados	Presupuesto Inicial
AGUA DE DIOS	2	$ 83.512.726,82
ALBAN	3	$ 54.577.022,89
ANAPOIMA	4	$ 225.502.194,48
ANOLAIMA	2	$ 78.333.675,75
APULO	2	$ 17.794.439,63
CACHIPAY	4	$ 182.021.128,28
CAPARRAPI	2	$ 28.253.752,88
CHAGUANI	4	$ 25.441.332,63
EL COLEGIO	3	$ 140.158.506,76
EL ROSAL	2	$ 45.204.237,98
FUNZA	2	$ 415.595.664,86
GUADUAS	2	$ 145.063.271,76
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	$ 70.205.100,83
LA MESA	2	$ 226.880.407,91
LA VEGA	2	$ 44.831.834,68
NILO	3	$ 85.529.576,51
NIMAIMA	3	$ 109.558.823,89
PACHO	1	$ 129.847.837,89
PUERTO SALGAR	2	$ 87.258.759,11
PULI	1	$ 41.452.521,67
RICAURTE	3	$ 52.695.584,83
SAN JUAN DE RIO SECO	4	$ 77.036.569,08
SUBACHOQUE	3	$ 162.132.760,49
TOCAIMA	1	$ 50.534.419,90
TOPAIPI	2	$ 37.176.965,13
VERGARA	6	$ 191.169.152,61
VIANI	3	$ 50.769.370,13
VILLETA	3	$ 273.344.864,62
VIOTÁ	1	$ 51.477.264,72
YACOPI	1	$ 96.257.966,88
ZIPACÓN	4	$ 194.912.577,02
Total	80	$ 3.474.530.312,60

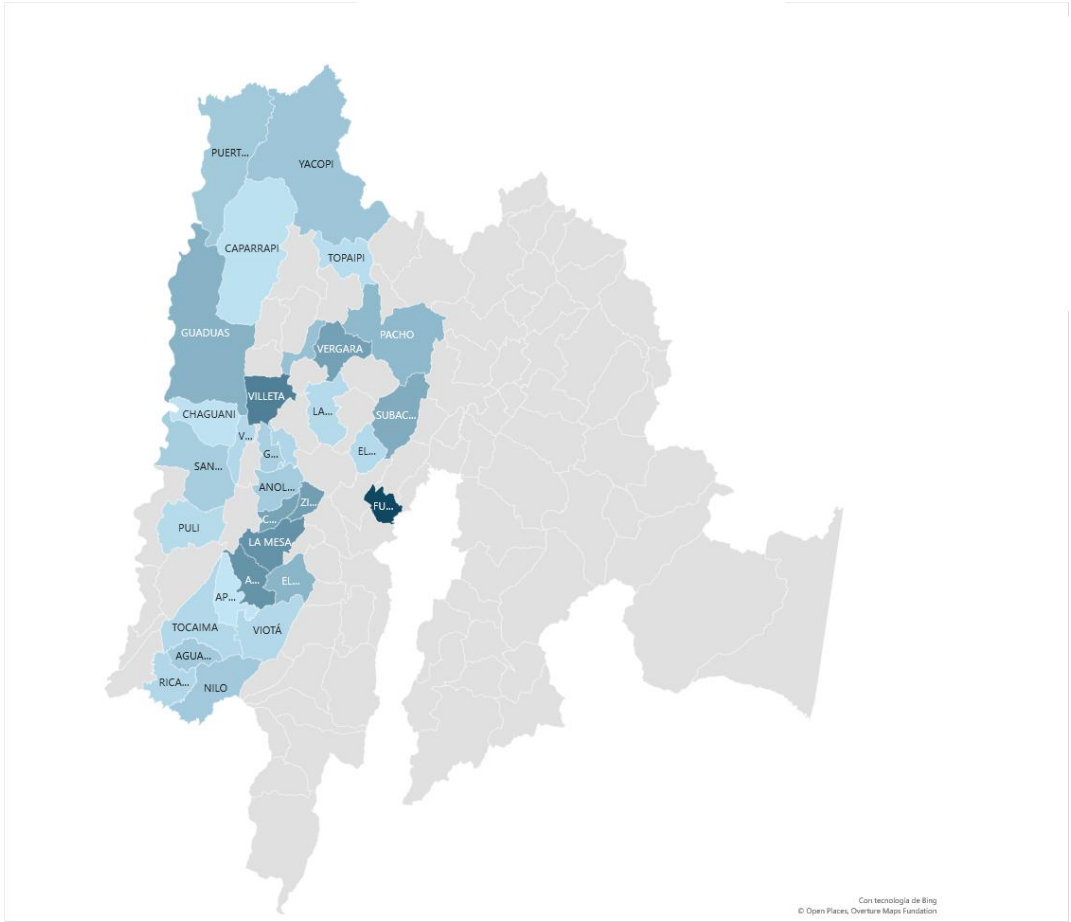

Gobernación de Cundinamarca

ENTIDAD CERTIFICADA

CO-SC-CER303297 ST-CER655785 CO-SI-CER1017570

3.2 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	80
Valor total estimado	$ 3.474.530.312,60
Puntos con visita de reconocimiento	80
Puntos descartados	4
Entrega informe visita	76
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	76
Presupuesto diseños apropiados	$ 3.301.332.279,65

3.3 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance apropiación y/o ajuste de diseños:

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Visita preliminar	Cuenta de Entrega REAL informe visita	Cuenta de Aprobación informe
AGUA DE DIOS	2	2	2	2
ALBAN	3	3	3	3
ANAPOIMA	3	3	3	3
ANAPOIMA (VIOTA)	1	1	1	1
ANOLAIMA	2	2	2	2
APULO	2	2	2	2
CACHIPAY	4	4	4	4
CAPARRAPI	2	2	2	2
CHAGUANI	4	4	4	4
EL COLEGIO	3	3	3	3
EL ROSAL	2	2	2	2
GUADUAS	2	2	2	2
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	3	3	3
LA VEGA	2	2	2	2
NILO	3	3	3	3
NIMAIMA	3	3	3	3
PUERTO SALGAR	2	2	2	2
PULI	1	1	1	1
TOPAIPI	2	2	2	2
VERGARA	6	6	6	6
VIANI	3	3	3	3
VILLETA - 1	1	1	1	1
VILLETA - 2	2	2	2	2
YACOPI	1	1	1	1
VIOTÁ	1	1	1	1
ZIPACÓN	4	4		
RICAURTE	3	3	3	3
SAN JUAN DE RIO SECO	4	4	4	4
SUBACHOQUE	3	3	3	3
FUNZA	2	2	2	2
LA MESA	2	2	2	2
TOCAIMA	1	1	1	1
PACHO	1	1	1	1
TOTAL	**80**	**80**	**76**	**76**

NOTA: No se cuentan los informes de visita preliminar y las actas de apropiación de los puntos de Zipacón que fueron descartados.

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

Hito	Puntos	% Sobre Valor Total contrato
VALOR CONTRATO OBRA	$ 3.480.023.139,00	100%
Puntos entregados por la SMC	80	
Valor total estimado	$ 3.474.530.312,60	99,84%
Puntos descartados	4	
Valor inicial puntos descartados	$ 194.912.577,02	5,60%
Valor ejecutable puntos entregados por la SMC	$ 3.279.617.735,58	94,24%
Actas suscritas de apropiación / ajuste diseños	76	
Presupuesto diseños apropiados	$ 3.301.332.279,65	94,87%
Valor apropiado puntos descartados	$ 258.039.701,00	7,41%
Valor ejecutable puntos entregados por la SMC y apropiados	$ 3.043.292.578,65	87,45%
Puntos en ejecución de obra	1	
Puntos terminados	74	
Puntos sin iniciar	1	
Puntos recibidos a satisfacción por la SMC	74	
Valor ejecutado físico	$ 3.083.364.377,20	88,60%
Valor recibido a satisfacción por la SMC	$ 2.971.533.454,13	85,39%

NOTA: Los puntos entregados más recientemente fueron los ubicados en los municipios de La Mesa y Ricaurte el día 16 de diciembre de 2025.

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO**
VERGARA	INTERSECCION NOCAIMA - LA MAGOLA	16/6/2025	$ 38.158.940,33	$ 37.977.402,00	$ 39.492.082,00	1,13%
VERGARA	SECTOR TOBIAS	16/6/2025	$ 82.481.009,87	$ 72.427.271,40	$ 65.790.453,00	1,89%
VERGARA	IED FIDEL DE LEON TRIANA	16/6/2025	$ 26.647.883,06	$ 36.579.968,00	$ 38.837.056,00	1,12%
VERGARA	HOSPITAL SANTA BARBARA	16/6/2025	$ 20.308.321,92	$ 15.528.094,00	$ 17.245.140,00	0,50%
VERGARA	Escuela EL IMPAR	16/6/2025	$ 18.220.344,17	$ 24.617.897,00	$ 21.831.951,00	0,63%
NIMAIMA	Caserio Chaguani	16/6/2025	$ 32.615.429,14	$ 30.847.603,00	$ 26.890.101,00	0,77%
NIMAIMA	Sector Hungria - Ingreso Tobia-Escuela San Juan Bosco - Tobia	16/6/2025	$ 50.104.412,27	$ 49.000.305,00	$ 47.520.938,00	1,37%
NIMAIMA	Cruce La Maria - Via Nacional	16/6/2025	$ 26.838.982,49	$ 32.949.797,00	$ 35.713.586,00	1,03%
VILLETA	Restricción carga	16/6/2025	$ 6.514.652,43	$ 6.999.034,00	$ 5.334.076,00	0,15%
ANOLAIMA	1. Centro Poblado - La Florida	26/6/2025	$ 32.110.623,45	$ 35.706.357,00	$ 34.615.485,00	0,99%
ANOLAIMA	2. Vereda La Mesita - Salida Municipio	26/6/2025	$ 46.223.052,30	$ 46.171.172,00	$ 48.825.385,00	1,40%
VIANI	1. Vereda Hatillo	26/6/2025	$ 39.840.547,61	$ 38.433.097,00	$ 38.711.313,00	1,11%
VIANI	2. Escuela Rural Hatillo	26/6/2025	$ 5.885.786,28	$ 6.265.046,00	$ 6.265.046,00	0,18%
VIANI	3. Vereda RosarioEscuela Vda. Contador	26/6/2025	$ 5.043.036,24	$ 4.979.012,00	$ 4.979.012,00	0,14%

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO
VIOTA	Intersección Pueblo de Piedra	21/7/2025	$ 51.477.264,72	$ 58.184.017,00	$ 59.493.451,00	1,71%
ANAPOIMA	Intersección Puerto Lopez	21/7/2025	$ 99.277.128,10	$ 98.040.198,00	$ 102.500.667,00	2,95%
AGUA DE DIOS	VEREDA IBAÑEZ (Fundación San Miguel y Los Chorros)	21/7/2025	$ 60.729.823,02	$ 52.404.030,00	$ 51.921.354,00	1,49%
AGUA DE DIOS	Hospital Herrera Restrepo Barrio Boyaca	21/7/2025	$ 22.782.903,81	$ 19.975.480,00	$ 16.526.396,00	0,47%
PUERTO SALGAR	Hospital Puerto Salgar "Diógenes Troncoso"	25/7/2025	$ 50.405.455,99	$ 46.519.387,00	$ 48.348.010,00	1,39%
PUERTO SALGAR	Intersección Cruce Patevaca	25/7/2025	$ 36.853.303,12	$ 36.947.894,00	$ 32.635.657,00	0,94%
LA VEGA	Caserio Patio Bonito	5/8/2025	$ 24.056.687,85	$ 16.822.366,00	$ 14.028.270,00	0,40%
LA VEGA	Colegio IED Luis Alfonso Valvuena	5/8/2025	$ 20.775.146,83	$ 12.993.161,00	$ 10.580.772,00	0,30%
GUAYABAL DE SIQUIMA	1. Escuela El Rodeo	21/8/2025	$ 6.913.468,32	$ 8.562.685,00	$ 8.562.685,00	0,25%
GUAYABAL DE SIQUIMA	2. Instituto Departamental El Trigo	21/8/2025	$ 5.110.477,68	$ 7.138.954,00	$ 7.138.954,00	0,21%
GUAYABAL DE SIQUIMA	3. Centro Poblado El Trigo	21/8/2025	$ 58.181.154,83	$ 33.020.328,00	$ 30.482.460,00	0,88%
PULI	IEDI PULI Carrera 7 con calle 9.	21/8/2025	$ 41.452.521,67	$ 37.045.925,00	$ 34.668.288,00	1,00%
EL ROSAL	Intersección entre via Subachoque - El Rosal y vía El Secreto (Hacienda San Sebastián)	28/8/2025	$ 37.139.290,74	$ 39.617.052,00	$ 35.887.145,00	1,03%
EL ROSAL	Inicio vía Subachoque-el rosal	28/8/2025	$ 8.064.947,24	$ 8.877.603,00	$ 8.877.603,00	0,26%

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO
ALBAN	1. Interseccion Chimbe - Guayacundo Bajo	28/8/2025	$ 18.547.726,64	$ 16.970.921,00	$ 16.674.006,00	0,48%
ALBAN	2. Intersección Guayacundo - Bagazal - Villeta	28/8/2025	$ 17.218.175,94	$ 16.363.160,00	$ 17.036.359,00	0,49%
ALBAN	3. Intersección La Ceibita	28/8/2025	$ 18.811.120,31	$ 18.268.407,00	$ 16.147.589,00	0,46%
CACHIPAY	Instituto Agrícola - Peña Negra - Centro Poblado	4/9/2025	$ 28.167.647,38	$ 28.317.628,00	$ 27.592.514,00	0,79%
CACHIPAY	Vereda Peña Negra - Sector Recebera	4/9/2025	$ 84.073.752,65	$ 92.076.728,00	$ 88.592.891,00	2,55%
CACHIPAY	Sector los Cuartos	4/9/2025	$ 42.237.009,61	$ 46.127.977,00	$ 41.970.725,00	1,21%
CACHIPAY	Sector Curva los Acuña	4/9/2025	$ 27.542.718,64	$ 40.941.392,00	$ 44.054.492,00	1,27%
VILLETA	LORENA ALTA/ Intersección "Brío EDS La María J"/ EL BOLIVARIANO	15/9/2025	$ 214.672.363,09	$ 171.028.140,00	$ 171.145.712,00	4,92%
EL COLEGIO	Cra 4 Cl 6 y 7	17/9/2025	$ 40.345.013,79	$ 46.104.352,00	$ 41.342.586,00	1,19%
EL COLEGIO	CASCO URBANO Carrera 8 entre Cl 9 y Cl 5	17/9/2025	$ 59.051.534,16	$ 65.297.965,00	$ 58.439.784,00	1,68%
EL COLEGIO	CASCO URBANO Calle 8 entre Cl 9 y Via 40CN03	17/9/2025	$ 40.761.958,81	$ 42.440.828,00	$ 40.393.309,00	1,16%
ANAPOIMA	p2 centro poblado Patio Bonito	17/9/2025	$ 52.974.038,67	$ 61.700.374,00	$ 62.606.353,00	1,80%
ANAPOIMA	p3, Escuela Panama	17/9/2025	$ 30.429.311,21	$ 40.371.260,00	$ 43.048.348,00	1,24%
ANAPOIMA	P4 Sector La Paz	17/9/2025	$ 42.821.716,50	$ 45.026.582,00	$ 40.680.468,00	1,17%

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO**
APULO	I.E.D.I. ANTONIO NARIÑO Sede R. Salcedo	18/9/2025	$ 4.979.010,96	$ 6.131.342,00	$ 6.131.342,00	0,18%
APULO	IEDI ANTONIO NARIÑO Sede CHARCO LARGO	18/9/2025	$ 12.815.428,67	$ 6.096.059,00	$ 6.096.059,00	0,18%
NILO	p1 puente La Aguadediosita	18/9/2025	$ 27.606.374,40	$ 27.672.637,00	$ 27.672.637,00	0,80%
NILO	p2 curva puente Sector El Manantial	18/9/2025	$ 47.863.460,99	$ 50.853.915,00	$ 29.602.193,00	0,85%
NILO	P3Salida del Casco a urbano via Pueblo Nuevo	18/9/2025	$ 10.059.741,12	$ 20.022.370,00	$ 20.349.945,00	0,58%
CHAGUANI	1. Intersección Guadas - Chaguaní	2/10/2025	$ 7.180.025,11	$ 8.524.344,00	$ 8.524.344,00	0,24%
CHAGUANI	2. Escuela Rural Polonia	2/10/2025	$ 5.885.786,28	$ 5.821.761,00	$ 5.821.761,00	0,17%
CHAGUANI	3. Intersección La Estrella	2/10/2025	$ 5.979.832,16	$ 7.963.475,00	$ 7.963.475,00	0,23%
CHAGUANI	4, Escuela Rural Campo Alegre	2/10/2025	$ 6.395.689,08	$ 6.331.664,00	$ 6.331.664,00	0,18%
CAPARRAPI	1. Escuela Boca de Monte-Vía Utica-Caparrapí.	15/10/2025	$ 11.793.603,68	$ 13.019.058,00	$ 13.381.140,00	0,38%
CAPARRAPI	Intersección alto de brisas via Utica-Caparrapi	15/10/2025	$ 16.460.149,20	$ 20.405.056,00	$ 20.405.056,00	0,59%

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	PUNTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA	VALOR ESTIMADO	VALOR APROPIADO	VALOR EJECUTADO REAL	% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO
TOPAIPI	1. SAN ANTONIO DE AGUILERA	15/10/2025	$ 21.725.980,35	$ 20.599.464,00	$ 18.593.569,00	0,53%
TOPAIPI	2. TOPAIPÍ - YACOPÍ	15/10/2025	$ 15.450.984,78	$ 19.182.827,00	$ 18.732.179,00	0,54%
YACOPI	"Tramo vial que une la Escuela Vereda Yacopí Grande Intersección Vía Topaipí-Yacopi"	19/11/2025	$ 96.257.966,88	$ 39.170.676,00	$ 37.773.362,00	1,09%
FUNZA	Calle15 entre Carrera 9 y Glorieta Ingreso a Funza	21/11/2025	$ 132.438.669,11	$ 136.648.253,00	$ 134.851.327,00	3,88%
SAN JUAN DE RIO SECO	Sector la Balsa	27/11/2025	$ 15.780.966,43	$ 16.382.846,00	$ 16.382.846,00	0,47%
SAN JUAN DE RIO SECO	Vereda El Totumo - Sector Trituradora	27/11/2025	$ 1.765.763,21	$ 2.777.019,00	$ 3.096.711,00	0,09%
SAN JUAN DE RIO SECO	IEDR - Inspección de San Nicolas	27/11/2025	$ 12.418.929,60	$ 12.079.372,00	$ 12.079.372,00	0,35%
SAN JUAN DE RIO SECO	Vereda El Totumo - Sector la Agilita vía Lagunitas	27/11/2025	$ 47.070.909,84	$ 47.420.603,00	$ 45.440.519,00	1,31%
SUBACHOQUE	SECTOR LA CUESTA	9/12/2025	$ 40.267.426,54	$ 43.682.084,00	$ 51.091.006,00	1,47%
SUBACHOQUE	IE TOMAS IRIARTE	9/12/2025	$ 60.888.839,11	$ 60.329.712,00	$ 59.013.838,00	1,70%
SUBACHOQUE	INTERSECCIÓN LA VIRGEN	9/12/2025	$ 60.976.494,84	$ 83.354.148,00	$ 79.124.296,00	2,27%

3.4 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

PUNTOS ENTREGADOS A LA SMC						
MUNICIPIO	**PUNTO ENTREGADO**	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR APROPIADO**	**VALOR EJECUTADO REAL**	**% SOBRE VALOR TOTAL CONTRATO**
FUNZA	Calle15 entre Carrera 9 y C.R. Quintas de San Isidro	9/12/2025	$ 283.156.995,75	$ 301.918.635,00	$ 293.383.613,00	8,43%
GUADUAS	Interseccion Plaza De Eventos	11/12/2025	$ 96.454.135,98	$ 101.902.474,00	$ 88.129.829,00	2,53%
GUADUAS	Colegio - Estación Bomberos	11/12/2025	$ 48.609.135,77	$ 43.319.105,00	$ 43.085.032,00	1,24%
VERGARA	SEÑALES INFORMATIVAS	11/12/2025	$ 5.352.653,25	$ 5.352.653,25	$ 8.291.821,00	0,24%
LA MESA	CALLE 8	16/12/2025	$ 215.418.508,01	$ 206.913.205,00	$ 187.152.993,92	5,38%
LA MESA	COLEGIO AMERICANO MENNO	16/12/2025	$ 11.461.899,90	$ 12.389.193,00	$ 6.291.232,21	0,18%
RICAURTE	Escuela Antonio Ricaurte, vda Las Varas	16/12/2025	$ 28.376.151,67	$ 38.305.554,00	$ 25.798.678,00	0,74%
RICAURTE	Curva condominio Bosques de Peñalisa, Cruce Peñalisa Mall	16/12/2025	$ 20.270.166,84	$ 24.483.523,00	$ 21.892.200,00	0,63%
RICAURTE	Intersección vereda Limoncitos	16/12/2025	$ 4.049.266,32	$ 4.049.267,00	$ 4.049.267,00	0,12%
VILLETA	Nativa Park Apartamentos	5/8/2025	$ 52.157.849,10	$ 82.975.652,00	$ 61.571.675,00	1,77%
TOTAL	74		$ 3.099.235.477,79	$ 3.121.744.795,65	$ 2.971.533.454,13	85,39%

3.5 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Avance implementación/entrega:

CODIGO DEL PUNTO	MUNICIPIO	PUNTO	VALOR INICIAL	VALOR APROPIACION DISEÑO	DIFERENCIA	DIFERENCIA EN %	VALOR REAL EJECUTADO	PORCENTAJE AVANCE DE IMPLEMENTACION DISEÑOS APROPIADOS
25815_CN_01	TOCAIMA	Via Municipal - Calle 4 Sector: Curva intersección "CATARNICA"	$ 50.534.419,90	$ 55.261.833,00	$ 4.727.413,10	9,35%		
25513_CN_01	PACHO	1, Vía Zipaquirá-Pacho, Sector "La M", PR23+900	$ 129.847.837,89	$ 124.325.651,00	-$ 5.522.186,89	-4,25%	$ 111.830.923,07	89,95%
TOTAL			$ 3.279.617.735,58	$ 3.301.332.279,65	$ 21.714.544,07	0,66%	$ 3.083.364.377,20	98,55%


VALOR CONTRATO OBRA	VALOR APROPIACION DISEÑO	% DE APROPIACION	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA SOBRE EL VALOR TOTAL CONTRATO
$ 3.480.023.139,00	$ 3.301.332.279,65	94,87%	$ 3.083.364.377,20	88,60%

3.7 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

MUNICIPIO	CODIFICACION	LOCALIZACION PUNTO	PROGRAMACION		FECHA REAL		ADELANTO	DIAS DE ATRASO
			FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		
TOCAIMA	25815_CN_01	Via Municipal - Calle 4 Sector: Curva intersección "CATARNICA"	20/11/2025	10/12/2025			0,00%	9
PACHO	25513_CN_01	1, Vía Zipaquirá-Pacho, Sector "La M", PR23+900	1/12/2025	8/12/2025	12/12/2025	EN EJECUCION	89,95%	11

3.7 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA

Fecha Comité	% Ejecutado Físico Sobre el Valor del Contrato	% Planeado en Base a la Meta Contractual	Avance Reportado Entre Comités
4/6/2025	9,58%	15,00%	-
11/6/2025	10,18%	17,50%	0,60%
25/6/2025	13,45%	20,00%	3,27%
2/7/2025	19,43%	24,00%	5,98%
10/7/2025	20,73%	28,00%	1,30%
16/7/2025	22,18%	32,00%	1,45%
22/7/2025	26,89%	35,00%	4,71%
31/7/2025	29,64%	38,00%	2,75%
8/8/2025	35,83%	41,00%	6,19%
14/8/2025	39,43%	44,00%	3,60%
21/8/2025	45,73%	50,00%	6,30%
28/8/2025	47,68%	52,50%	1,95%
4/9/2025	50,12%	55,00%	2,44%
11/9/2025	50,37%	60,00%	0,25%
18/9/2025	51,52%	65,00%	1,15%
25/9/2025	51,99%	70,00%	0,47%
2/10/2025	55,10%	75,00%	3,11%
9/10/2025	57,22%	80,00%	2,12%
20/10/2025	60,50%	90,00%	3,28%
23/10/2025	61,78%	91,25%	1,28%
30/10/2025	62,83%	92,00%	1,05%
6/11/2025	67,39%	94,00%	4,56%
13/11/2025	70,02%	96,00%	2,63%
20/11/2025	72,52%	100%	2,50%
27/11/2025	74,86%	100%	2,34%
4/12/2025	77,93%	100%	3,07%
15/12/2025	84,60%	100%	6,67%
19/12/2025	88,60%	100%	4,00%

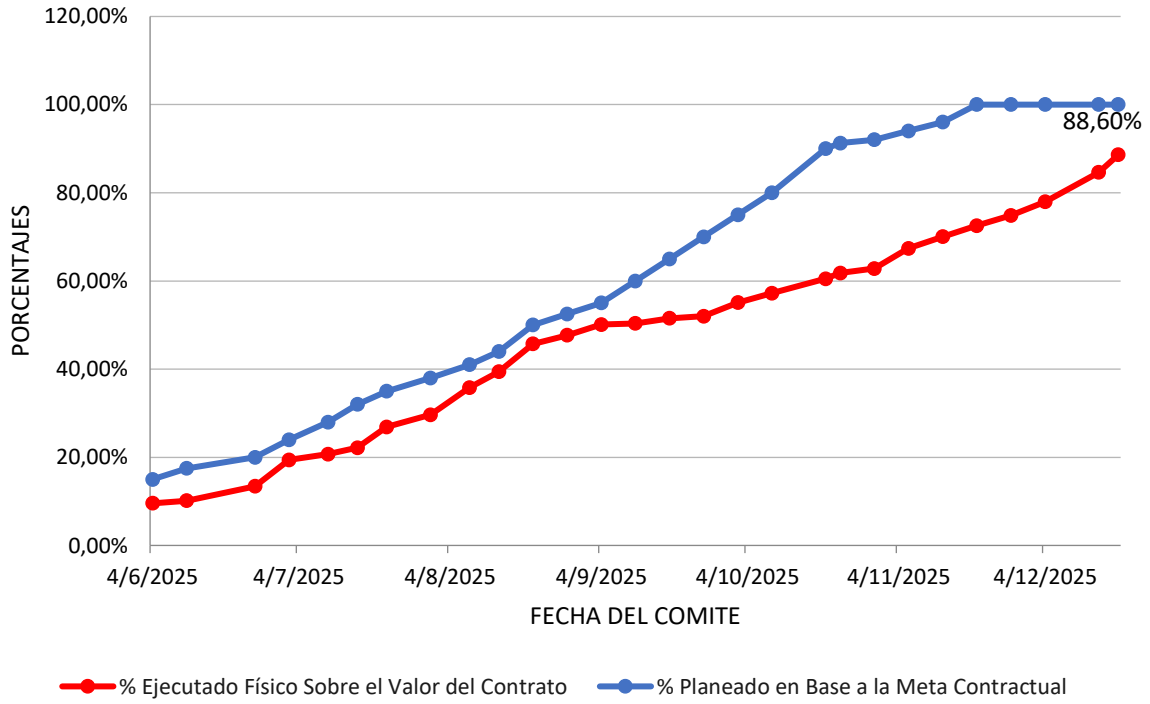

4.1 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Seguimiento metas contractuales:

Valor contrato L2 $3.480.023.139,0

Mes de ejecución	Fecha corte	Meta Contractual %	Meta Contractual $	Valor ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Porcentaje ejecutado y recibido a satisfacción acumulado	Ejecutado Físico	Porcentaje físico acumulado %	CUMPLIÓ? SI / NO
1	20-mar-25	0%	$ 0					SI
2	20-abr-25	5%	$ 174.001.157					NO
3	20-may-25	10%	$ 348.002.314			$ 354.286.974,40	10,18%	NO
4	20-jun-25	20%	$ 696.004.628	$ 432.051.623,93	12,42%	$ 676.103.015,93	19,43%	NO
5	20-jul-25	35%	$ 1.218.008.099	$ 666.318.743,58	19,15%	$ 935.622.583,88	26,89%	NO
6	20-ago-25	50%	$ 1.740.011.570	$ 831.654.503,47	23,90%	$ 1.591.568.881,88	45,73%	NO
7	20-sep-25	70%	$ 2.436.016.197	$ 1.759.303.016,11	50,55%	$ 1.809.299.151,42	51,99%	NO
8	20-oct-25	90%	$ 3.132.020.825	$ 1.859.056.204,11	53,42%	$ 2.105.411.273,82	60,50%	NO
9	20-nov-25	100%	$ 3.480.023.139	$ 1.889.279.794,00	54,29%	$ 2.605.186.314,52	74,86%	NO
10	20-dic-25	100%	$ 3.480.023.139	$ 2.971.533.454,13	85,39%	$ 3.083.364.377,20	88,60%	NO

4.2 SEGUIMIENTO METAS CONTRACTUALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO



Valor contrato L2 **$3.480.023.139,0**

Relación pagos:

Cobro No.	Cantidad de puntos cobrados	Municipio	Valor cobrado	% cobrado	Valor cobrado acumulado	% cobrado acumulado
1	9	Vergara (5), Nimaima (3) y Villeta (1)	$ 298.655.383,00	8,58 %	$ 298.655.383,00	8,58 %
2	14	Anolaima (2), Viani (3), Viotá (1), Anapoima (1), Agua de Dios (2), Puerto Salgar (2), La Vega (2) y Villeta (1)	$ 531.002.493,00	15,26 %	$ 829.657.876,00	23,84 %
3	22	Anapoima (3), Apulo (2), Cachipay (4), El Colegio (3), El Rosal (2), Guayabal de Siquima (3), Nilo (3), Pulí (1) y Villeta (1)	$ 875.336.493,00	25,15 %	$ 1.704.994.369,00	48,99 %
4	11	Alban (3), Topaipí (2), Caparrapí (2) y Chaguaní (4)	$ 149,611,142.00	4,30 %	$ 1.854.605.511,00	53,29 %
5						
6						
7						
8						
9						
10						

5.1 AVANCE APROPIACIÓN/AJUSTE DISEÑOS Y AVANCE IMPLEMENTACIÓN/ENTREGA

Actividades de implementación La Mesa 25386_CN_01
CALLE 8



Actividades de implementación Guaduas
25320_CN_02 Colegio - Estación Bomberos



6. INFORME ESTADO DEL CLIMA

Estado del clima

Ítem	Estado del Clima	lunes 8 diciembre			martes 9			miércoles 10			jueves 11			viernes 12			sábado 13			domingo 14			TOTAL	TOTAL ACUMULADO
		Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche	Mañana	Tarde	Noche		
1	Lluvioso La Mesa					4																	4	8
2	Lluvioso Vergara																						0	0
3	Lluvioso Guaduas					5																	5	5
4	Lluvioso Pacho																						0	0

7.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	80
Puntos con socialización inicial	78
Puntos con actas de entorno inicial	78
Puntos con socialización cierre	70
Puntos con actas de entorno de cierre	70
Actas de inicio de vecindad	86
Actas de cierre de vecindad	68
PQR recibidas	2
PQR atendidas y cerradas	2

7.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Socialización Inicial	Cuenta de Actas de vecindad	Cuenta de Actas entorno	Cuenta de Socialización fin	Cuenta de Actas de Cierre de Vecindad	Cuenta de Actas de cierre entorno
AGUA DE DIOS	2	2	4	2	2	4	2
ALBAN	3	3	3	3	3	3	3
ANAPOIMA	4	4	2	4	4	2	4
ANOLAIMA	2	2	4	2	2	4	2
APULO	2	2	N/A	2	2	N/A	2
CACHIPAY	4	4	2	4	4	2	4
CAPARRAPI	2	2	N/A	2	2	N/A	2
CHAGUANI	4	4	N/A	4	4	N/A	4
EL COLEGIO	3	3	15	3	3	15	3
EL ROSAL	2	2	3	2	2	3	2
GUADUAS	2	2	N/A	2	2	N/A	2
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
LA VEGA	2	2	N/A	2	2	N/A	2
NILO	3	3	N/A	3	3	N/A	3
NIMAIMA	3	3	N/A	3	3	N/A	3
PUERTO SALGAR	2	2	N/A	2	2	N/A	2
PULI	1	1	N/A	1	1	N/A	1
TOPAIPI	2	2	3	2	2	3	2
VERGARA	6	5	1	5	5	1	5
VIANI	3	3	N/A	3	3	N/A	3
VILLETA	3	2	5	2	2	5	2
YACOPI	1	1	N/A	1	1	N/A	1
VIOTÁ	1	1	1	1	1	1	1
ZIPACÓN	4	4	9	4			
RICAURTE	3	3	5	3			
SAN JUAN DE RIO SECO	4	4	2	4	4	2	4
SUBACHOQUE	3	3	2	3	3	2	3
FUNZA	2	2	4	2	2	4	2
LA MESA	2	2	17	2	2	17	2
TOCAIMA	1	1	4	1			
PACHO	1	1	N/A	1	1	N/A	1
TOTAL	**80**	**78**	**86**	**78**	**70**	**68**	**70**

NOTA 1: En los puntos Villeta-Restricción de Carga y Vergara- Señales Informativas no aplica levantar actas sociales.
NOTA 2: En los puntos descartados del municipio de Zipacón no aplica levantar actas sociales de cierre.

8.1 SEGUIMIENTO PMT

Hito	Puntos
Puntos entregados por la SMC	80
PMT radicados	80
PMT aprobados	76
Puntos con otros permisos requeridos	0
Capacitaciones	0
Accidentes laborales	0

8.2 SEGUIMIENTO PMT

MUNICIPIO	PUNTOS	Cuenta de Radicación PMT	Cuenta de Aprobación PMT
AGUA DE DIOS	2	2	2
ALBAN	3	3	3
ANAPOIMA	4	4	4
ANOLAIMA	2	2	2
APULO	2	2	2
CACHIPAY	4	4	4
CAPARRAPI	2	2	2
CHAGUANI	4	4	4
EL COLEGIO	3	3	3
EL ROSAL	2	2	2
GUADUAS	2	2	2
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	3	3
LA VEGA	2	2	2
NILO	3	3	3
NIMAIMA	3	3	3
PUERTO SALGAR	2	2	2
PULI	1	1	1
TOPAIPI	2	2	2
VERGARA	6	6	6
VIANI	3	3	3
VILLETA	3	3	3
YACOPI	1	1	1
VIOTÁ	1	1	1
ZIPACÓN	4	4	
RICAURTE	3	3	3
SAN JUAN DE RIO SECO	4	4	4
SUBACHOQUE	3	3	3
FUNZA	2	2	2
LA MESA	2	2	2
TOCAIMA	1	1	1
PACHO	1	1	1
TOTAL	**80**	**80**	**76**

9.1 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES DE VISITA PRELIMINAR

MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA
VERGARA	5	APROBADO	
VILLETA	2	APROBADO	
ANOLAIMA	2	APROBADO	
NIMAIMA	3	APROBADO	
ZIPACON	4	APROBADO	
GUADUAS	2	APROBADO	
PUERTO SALGAR	2	APROBADO	
AGUA DE DIOS	2	APROBADO	
PULI	1	APROBADO	
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	APROBADO	
LA VEGA	2	APROBADO	
VIOTA	1	APROBADO	
ALBAN	3	APROBADO	
VIANI	3	APROBADO	
APULO	2	APROBADO	
YACOPI	1	APROBADO	
CHAGUANI	4	APROBADO	
NILO	3	APROBADO	
CAPARRAPI	2	APROBADO	
TOPAIPI	2	APROBADO	
EL COLEGIO	3	APROBADO	
ANAPOIMA	4	APROBADO	
CACHIPAY	4	APROBADO	
EL ROSAL	2	APROBADO	
RICAURTE	3	APROBADO	
SUBACHOQUE	3	APROBADO	
FUNZA	2	APROBADO	
SAN JUAN DE RIO SECO	4	APROBADO	
LA MESA	2	APROBADO	
TOCAIMA	1	APROBADO	
PACHO	1	APROBADO	

10. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA ENTREGA DE INFORMES FINALES

REPORTE INFORMES FINALES LOTE 2				
MUNICIPIO	# DE PUNTOS	ESTADO DEL INFORME	COMPROMISO DE ENTREGA	ESTADO
VERGARA	5	RADICADO A LA SMC		REVISIÓN
VILLETA EDS BRÍO	1	RADICADO A LA SMC		**APROBADO**
ANOLAIMA	2	EN REVISION INTERVENTORÍA		
NIMAIMA	3	EN REVISION INTERVENTORÍA		
PUERTO SALGAR	2	EN REVISION INTERVENTORÍA		
AGUA DE DIOS	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA	17/12/2025	
PULI	1	EN REVISION INTERVENTORÍA		
GUAYABAL DE SIQUIMA	3	EN REVISION INTERVENTORÍA		
LA VEGA	2	EN REVISION INTERVENTORÍA		
VIOTA	1	EN REVISION INTERVENTORÍA		
ALBAN	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
VIANI	3	EN REVISION INTERVENTORÍA	19/12/2025	
APULO	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
YACOPI	1	EN REVISION INTERVENTORÍA		
CHAGUANI	4	EN REVISION INTERVENTORÍA	18/12/2025	
NILO	3	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
CAPARRAPI	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
TOPAIPI	2	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
EL COLEGIO	3	EN REVISION INTERVENTORÍA	18/12/2025	
ANAPOIMA	4	RADICADO A LA SMC		**APROBADO**
CACHIPAY	4	DEVUELTO AL CONTRATISTA		
EL ROSAL	2	EN REVISION INTERVENTORÍA	18/12/2025	
FUNZA	2	SIN ENTREGAR	15/12/2025	
SAN JUAN DE RIO SECO	4	SIN ENTREGAR	13/12/2025	
VILLETA	2	EN REVISION INTERVENTORÍA		
SUBACHOQUE	3	SIN ENTREGAR	15/12/2025	
GUADUAS	2	SIN ENTREGAR	16/12/2025	
LA MESA	2	SIN ENTREGAR		
PACHO	1	SIN ENTREGAR		
RICAURTE	3	SIN ENTREGAR		
TOCAIMA	1	SIN ENTREGAR	SIN ENTREGA DE PUNTO	
VERGARA SEÑALES INFORMATIVAS	1	SIN ENTREGAR	16/12/2025	

APROBADO	**5**
EN REVISION DE INTERVENTORIA	**29**
EN REVISION DE LA SMC	**5**
DEVUELTO AL CONTRATISTA	**18**
SIN ENTREGAR	**19**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se han realizado 80 visitas preliminares de las cuales se han entregado 80 informes de visita preliminar y no se encuentran puntos pendientes por visita preliminar.
2. 76 puntos cuentan con actas de apropiación suscritas, de los cuales; 74 han sido terminados y se han entregado a la entidad-SMC en su totalidad, 1 está en ejecución y 1 se encuentran pendientes por iniciar.
3. De los 74 puntos terminados el contratista ha entregado los informes finales de los 57 puntos ubicados en los municipios de Vergara (5), Nimaima (3), Anolaima (2), Vianí (3), Viotá (1), Agua de Dios (2), Puerto Salgar (2), La Vega (2), Pulí (1), Guayabal de Siquima (3), Alban (3), El Rosal (2), Cachipay (4), Villeta (3), Anapoima (4), El Colegio (3), Apulo (2), Nilo (3), Chaguaní (4), Caparrapí (2), Topaipí (2) y Yacopí (1), los cuales ya fueron revisados por la interventoria, se generaron observaciones y se remitieron al contratista, la interventoria se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes a excepción de los correspondientes a los puntos ubicados en los municipios de Vergara, Villeta (Bomba Brío) y Anapoima, los cuales ya fueron aprobados por la interventoria y remitidos a la entidad - SMC.
4. Un 85,39% del valor total del contrato a sido entregado a la entidad que corresponde a un total de valor ejecutado de $ 2.971.533.454,13, correspondiente a 74 puntos.
5. A la fecha se tiene un porcentaje ejecutado físico del 88,60% del valor total del contrato.



Gobernación de
Cundinamarca
