PEZZOTTI

PEZZOTTI ING S.A.S
NIT 901.228.129-1
CRA 93 B # 38 - 66
Tel: 3122913086
Medellín - Colombia
pezzottiing2018@gmail.com
https://pezzotticonstrucciones.com/

Factura electrónica de venta
No. P 75

Señores	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-		
NIT	800.105.497-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Guatape - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 13:05
Expedición	08/05/2026, 13:05
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	ACTA N° 1. CONTRATO OC-030-2025. CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA. ADMINISTRACION 31,20%	20,753,247.22	20,753,247.22
2	1.00	ACTA N° 1. CONTRATO OC-030-2025. CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA. UTILIDAD 5%	2,794,824.00	3,325,840.56
3	1.00	ACTA N° 1. CONTRATO OC-030-2025. CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA. POLIZAS	4,880,989.00	4,880,989.00
4	1.00	ACTA N° 1. CONTRATO OC-030-2025. CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA. VR CONTRACTUAL	66,516,818.00	66,516,818.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Noventa y cinco millones cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Total Bruto	94,945,878.22
IVA 19%	531,016.56
Total a Pagar	95,476,894.78

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 95,476,894.78

Observaciones:
ACTA N°1 NARIÑO ACTA N° 1. CONTRATO OC-030-2025.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099253163 aprobado en 20250926 prefijo P desde el número 59 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 3ad4cc54ab9b0b55c73822976 7f34524958977e459ee9228be40c7bcbc2426528a6888280f44f42026de4537ee80b5a1

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

PEZZOTTI ING SAS Identificado con NI 9012281291

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina PARQUE BERRIO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24152038685
Fecha de apertura:	15 de Enero de 2026
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a Quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 26 de Marzo de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141194718009

(415)7707212489984(8020) 000014119471800 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 8 1 2 9	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PEZZOTTI ING S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 93 B 38 66

42. Correo electrónico pezzottiing2018@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 5 4 1 3 1 8 8	3 0 4 5 5 7 6 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 8 1 0 2 5	4 2 1 0	2 0 1 8 1 0 2 5	4 6 9 0	0 1 5 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIRALDO PEZZOTTI JUAN GUILLERMO

985. Cargo Representante legal Certificado

174

Fecha generación documento PDF: 01-08-2025 02:15:39PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 71.604.072
GIRALDO PEZZOTTI
APELLIDOS
JUAN GUILLERMO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1961
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

29-AGO-1979 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0100100-00864423-M-0071604072-20161110 0052147152A 1 47236149

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901228129	1	PEZZOTI ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 93 B 38 - 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	8281760	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	9501715133	9501715133	E	2026/03/09	2026/03/24	BANCO DE BOGOTA	15	$11,593,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$1,809,269	$289,600			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$72,500			$1,809,269		$9,600		$0	$0		$444,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 PERSONAL ADMIN Y/OFICINA (2 Afiliados)																							$1,809,269	$289,600			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$72,500			$1,809,269		$9,600		$0	$0		$444,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							$1,809,269	$289,600			$1,809,269	$72,500			$1,809,269	$72,500			$1,809,269		$9,600		$0	$0		$444,200
1	CC	1053831599	AGUIRRE ARBOLEDA JHON EDUARD	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.522%	$400	1	$0	$0	Si	$14,600
2	CC	9878344	SAMPAYO MERIÑO ALEJANDRO DOMINGUEZ																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PAYENDE-SANTANDER (33 Afiliados)																							$37,432,662	$5,898,000			$39,183,567	$1,475,800			$39,183,567	$1,337,800			$39,183,567		$2,326,100		$0	$0		$11,037,700
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (33 Afiliados)																							$37,432,662	$5,898,000			$39,183,567	$1,475,800			$39,183,567	$1,337,800			$39,183,567		$2,326,100		$0	$0		$11,037,700
Ciudad: RIONEGRO Depto: SANTANDER (33 Afiliados)																							$37,432,662	$5,898,000			$39,183,567	$1,475,800			$39,183,567	$1,337,800			$39,183,567		$2,326,100		$0	$0		$11,037,700
3	CC	1065890041	AGREDO GALLARDO ELISEO	X																	230201	16	$933,816	$149,500	EPS041	16	$933,816	$37,400	CCF39	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
4	CC	1098743901	AGREDO GALLARDO JOSUE	X																	230301	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF39	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
5	CC	1052383496	ARISMENDY CASTELLANOS IVAN ALBERTO	X																	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS017	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
6	CC	1052391182	AVELLANEDA PARRA LUIS EDUARDO		X																25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	73269590	CANTILLO MARTINEZ NEYID ALFONSO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1041202705	CASTAÑO GIRALDO OSCAR ALIRIO	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS040	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
9	CC	1035924959	CORREA ROJAS ISIDRO JAVIER	X																	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
10	CC	1013342828	DIOSA CHAVARRIA DANIEL	X																	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF39	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
11	CC	1010061401	DUARTE QUINTERO GERSON YESID		X																230201	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
12	CC	1090465529	DUARTE PABA HADWARD STIVENSON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1039758567	GARCIA JHON JADER		X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
14	CC	1039597372	GARCIA AGUDELO LEON DANILO											X							230301	10	$583,635	$70,100	EPS037	10	$583,635	$0	CCF39	10	$583,635	$0	14-11	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$70,100
15	CC	1039597372	GARCIA AGUDELO LEON DANILO																		230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
16	CC	70129905	GAVIRIA RAMIREZ HERNANDO							X											25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF39	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
17	CC	70692854	GIRALDO HOYOS HECTOR EVELIO	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
18	CC	71604072	GIRALDO PEZZOTTI JUAN GUILLERMO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
19	CC	1152223615	GIRALDO ESPAÑOL LAURA CRISTINA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$6,187,600	$59,900	$0	$6,247,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$770,600	$7,500	$0	$778,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,242,200	$12,000	$0	$1,254,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,866,900	$27,700	$0	$2,894,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,307,900	$12,700	$0	$1,320,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,335,700	$22,600	$0	$2,358,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	35	$2,335,700	$22,600	$0	$2,358,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				35	$1,410,300	$13,600	$0	$1,423,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	33	$1,337,800	$12,900	$0	$1,350,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$72,500	$700	$0	$73,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				35	$1,548,300	$15,200	$0	$1,563,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$700	$0	$70,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$142,600	$1,400	$0	$144,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$205,500	$2,000	$0	$207,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$116,800	$1,200	$0	$118,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$360,100	$3,500	$0	$363,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$204,200	$2,000	$0	$206,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$217,500	$2,100	$0	$219,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$700	$0	$70,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$161,400	$1,600	$0	$163,000
TOTAL				**35**	**$11,481,900**	**$111,300**	**$0**	**$11,593,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901228129	1	PEZZOTI ING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 93 B 38 - 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	8281760	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	9503463113	9503463113	E	2026/04/10	2026/04/22	BANCO DE BOGOTA	12	$13.088.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PAYENDE-SANTANDER (28 Afiliados)																								**$43.327.370**	**$6.828.500**			**$46.303.909**	**$1.748.400**			**$46.303.909**	**$1.608.200**			**$46.303.909**		**$2.797.400**		**$0**	**$0**		**$12.982.500**
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (28 Afiliados)																								**$43.327.370**	**$6.828.500**			$46.303.909	$1.748.400			**$46.303.909**	**$1.608.200**			**$46.303.909**		**$2.797.400**		$0	$0		**$12.982.500**
Ciudad: RIONEGRO Depto: SANTANDER (28 Afiliados)																								**$43.327.370**	**$6.828.500**			$46.303.909	$1.748.400			**$46.303.909**	**$1.608.200**			**$46.303.909**		**$2.797.400**		$0	$0		**$12.982.500**
1	CC	1065890041	AGREDO GALLARDO ELISEO																			230201	30	$1.750.905	$280.200	EPS041	30	$1.750.905	$70.100	CCF39	30	$1.750.905	$70.100	14-23	30	$1.750.905	6,960%	$121.900	30	$0	$0	Si	$542.300
2	CC	1098743901	AGREDO GALLARDO JOSUE																			230301	30	$1.750.905	$280.200	EPS037	30	$1.750.905	$70.100	CCF39	30	$1.750.905	$70.100	14-23	30	$1.750.905	6,960%	$121.900	30	$0	$0	Si	$542.300
9	CC	70129905	GAVIRIA RAMIREZ HERNANDO																			25-14	30	$3.500.000	$560.000	EPS010	30	$3.500.000	$140.000	CCF39	30	$3.500.000	$140.000	14-23	30	$3.500.000	6,960%	$243.600	30	$0	$0	Si	$1.083.600
10	CC	1036190622	GIRALDO RAMOS ELIAN	X	X																	25-14	26	$1.517.451	$242.800	EPS040	26	$1.517.451	$60.700	CCF39	26	$1.517.451	$60.700	14-23	26	$1.517.451	6,960%	$105.700	26	$0	$0	Si	$469.900
11	CC	71604072	GIRALDO PEZZOTTI JUAN GUILLERMO																				0	$0	$0	EPS005	30	$1.750.905	$70.100	CCF39	30	$1.750.905	$70.100	14-23	30	$1.750.905	6,960%	$121.900	30	$0	$0	Si	$262.100
12	CC	1152223615	GIRALDO ESPAÑOL LAURA CRISTINA																			230201	30	$1.750.905	$280.200	EPS040	30	$1.750.905	$70.100	CCF39	30	$1.750.905	$70.100	14-23	30	$1.750.905	6,960%	$121.900	30	$0	$0	Si	$542.300
15	CC	1017167160	LONDOÑO RAMOS CRISTIAN ALEXANDER																			25-14	30	$1.750.905	$280.200	EPS040	30	$1.750.905	$70.100	CCF39	30	$1.750.905	$70.100	14-23	30	$1.750.905	6,960%	$121.900	30	$0	$0	Si	$542.300
21	CC	1036840151	PEREZ MARQUEZ JESUS ANTONIO																			230301	30	$1.750.905	$280.200	EPS037	30	$1.750.905	$70.100	CCF39	30	$1.750.905	$70.100	14-23	30	$1.750.905	6,960%	$121.900	30	$0	$0	Si	$542.300
22	CC	98454777	QUINTERO DAVILA DAVID ANTONIO	X																			0	$0	$0	EPS040	21	$1.225.634	$49.100	CCF39	21	$1.225.634	$49.100	14-23	21	$1.225.634	6,960%	$85.400	21	$0	$0	Si	$183.600
23	CC	98677528	RAMOS CIFUENTES CARLOS ALBERTO																			230301	30	$1.750.905	$280.200	EPS040	30	$1.750.905	$70.100	CCF39	30	$1.750.905	$70.100	14-23	30	$1.750.905	6,960%	$121.900	30	$0	$0	Si	$542.300
25	CC	1065892980	SOLANO TELLEZ ERWIN																			230301	30	$3.000.000	$480.000	EPS041	30	$3.000.000	$120.000	CCF39	30	$3.000.000	$120.000	14-23	30	$3.000.000	6,960%	$208.800	30	$0	$0	Si	$928.800
Total			**Afiliados(28)**																					$43.327.370	$6.828.500			$46.303.909	$1.748.400			$46.303.909	$1.608.200			$46.303.909		$2.797.400		$0	$0		$12.982.500

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-16, 04:10:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	ALEJANDRA TORO MONCADA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1037666466
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84448403
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	145871395
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 693.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 352.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 275.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 53.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 13.200	$ 0
			SubTotales:	$ 693.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 693.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Medellín, Antioquia, 22 de abril de 2026.

A QUIEN INTERESE:

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales –PERSONA JURÍDICA-

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 el suscrito Representante Legal **JUAN GUILLERMO GIRALDO PEZZOTTI** y el suscrito Contador Público **LUZ ELENA GÓMEZ CRUZ** de la sociedad **PEZZOTTI INGENIERIA SAS**, identificada con NIT No. **901.228.129-1 ,** debidamente inscrita en la cámara de comercio de Medellín nos permitimos certificar bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, correspondientes a las nóminas del mes de marzo de 2026 . El pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 de enero de 2017 según el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016.


Dado en Medellín a los 22 días del mes de abril del año 2026.

Firma

LUZ ELENA GÓMEZ CRUZ
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 194024-T
C.C. 1.077.968.042 de Villeta


Firma _____
JUAN GUILLERMO GIRALDO PEZZOTTI
Representante legal
C.C 71.604.072 de Medellín


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
GOMEZ CRUZ
LUZ ELENA
FIRMA

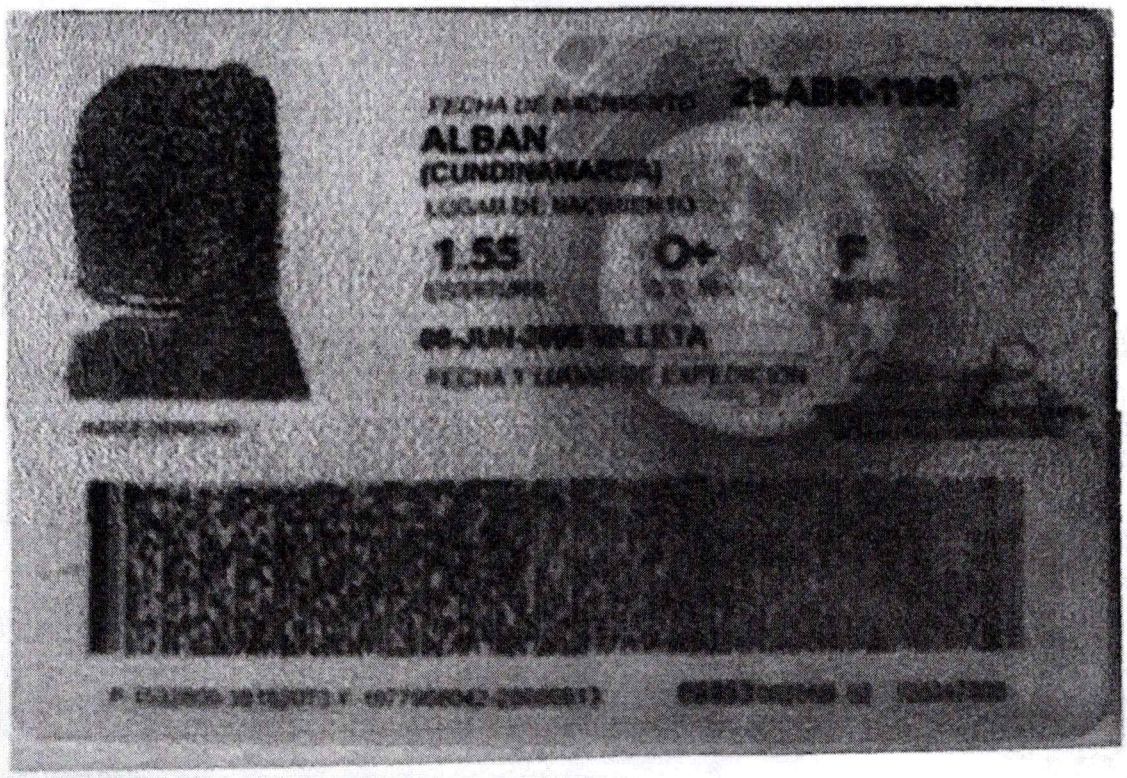
ALBAN
(CUNDINAMARCA)
1.55
O+
F

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194024-T

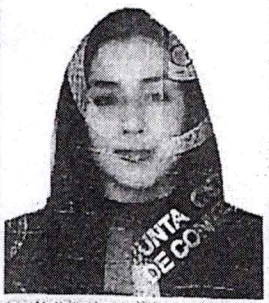

LUZ ELENA
GOMEZ CRUZ
C.C. 1077968042
RESOLUCION INSCRIPCION 1337 FECHA 09/09/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 206097

~~196360~~

Esta tarjeta es el unico documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 3 C 0 D B B 0 9 3 C 2 F C 4 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ELENA GOMEZ CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077968042 de VILLETA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 194024-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 01

UNIDAD EJECUTORA:	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE -EAG-	**ACTA No.:**	1	**VALOR TOTAL ACTA:**	$95.476.895,00	**FECHA:**	14/03/2026

CONTRATO DE OBRA No :	QC-030-2025	PLAZO INICIAL:	TRES MESES (3.0 MESES)	PLAZO ACUMULADO	TRES MESES Y MEDIO (3.5 MESES)
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA "	FECHA DE INICIACION:	30/01/2026	FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA - N/A
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING SAS / NIT. 901.228.129-1	FECHA DE REANUDACIÓN:	NO APLICA - N/A	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	CD-011-2026	VALOR INICIAL:	$591.047.626,00	VALOR ADICIÓN (INCLUÍDO IVA):	NO APLICA - N/A
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S / NIT. 900.492.461-7	VALOR TOTAL ACUMULADO	$591.047.626,00	VALOR TOTAL EN ADICIONES:	NO APLICA - N/A

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA				SALDO POR EJECUTAR	
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PARA ACTA 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA DE OBRA No. 1		EJECUTADO ACUMULADO			
									CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES								**$5.505.858,00**				**$5.505.858,00**		**$1.376.740,00**		**$1.376.740,00**		**$4.129.118**
	1.4.1			Trazado y replanteo	ml	450,00	$1.189,00	$535.050,00			450,00	$535.050,00	255,70	$304.027,00	255,70	$304.027,00	194,30	$231.023
	1.3			Descapote, desmonte y limpieza	m2	243,00	$20.456,00	$4.970.808,00			243,00	$4.970.808,00	52,44	$1.072.713,00	52,44	$1.072.713,00	190,56	$3.898.095
CAPÍTULO 2 - DEMOLICIONES PARA REDES DE ALCANTARILLADO.								**$1.565.000,00**				**$1.565.000,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$1.565.000**
	D1.1			Demolición de tubería existente y disposición final de escombros en sitios oficiales.	m3	3,00	$105.000,00	$315.000,00			3,00	$315.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	3,00	$315.000
	D1.2			Demolición de obras en concreto y disposición final de escombros en sitios oficiales.	m3	4,00	$312.500,00	$1.250.000,00			4,00	$1.250.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	4,00	$1.250.000
CAPÍTULO 3 - CORTE, ROTURA Y RETIRO DE PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS.								**$4.871.553,00**				**$4.871.553,00**		**$389.427,00**		**$389.427,00**		**$4.482.126**
	4.1.1			Corte, rotura y retiro de pavimento Rígido.	m3	8,51	$401.700,00	$3.418.467,00			8,51	$3.418.467,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	8,51	$3.418.467
	2.2			Demolición de andén en cualquier acabado (incluye retiro).	m3	6,00	$242.181,00	$1.453.086,00			6,00	$1.453.086,00	1,61	$389.427,00	1,61	$389.427,00	4,39	$1.063.659
CAPÍTULO 4 - EXCAVACIONES COLECTOR.								**$32.156.773,00**				**$32.156.773,00**		**$13.920.680,00**		**$13.920.680,00**		**$18.236.093**
	3.1.4.2			Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos. Incluye desembombe.	m3	12,60	$494.962,00	$6.236.773,00			12,60	$6.236.773,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	12,60	$6.236.773
	3.1.1			Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad.	m3	324,00	$80.000,00	$25.920.000,00			324,00	$25.920.000,00	174,01	$13.920.680,00	174,01	$13.920.680,00	149,99	$11.999.320
CAPÍTULO 5 - EXCAVACIONES DOMICILIARIAS.								**$4.524.946,00**				**$4.524.946,00**		**$1.595.154,00**		**$1.595.154,00**		**$2.929.792**
	3.1.4.2			Excavación en Roca a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad por métodos no explosivos. Incluye desembombe.	m3	3,00	$494.982,00	$1.484.946,00			3,00	$1.484.946,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	3,00	$1.484.946
	3.1.1			Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad.	m3	36,00	$80.000,00	$3.040.000,00			36,00	$3.040.000,00	19,94	$1.595.154,00	19,94	$1.595.154,00	16,06	$1.444.846
CAPÍTULO 6 - LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES PARA COLECTOR.								**$80.363.910,00**				**$80.363.910,00**		**$12.630.559,00**		**$12.630.559,00**		**$67.733.351**
	3.3.1			Lleno compactado mecánicamente con material de préstamo densidad de compactación >=95% PM.	m3	128,50	$126.584,00	$16.266.044,00			128,50	$16.266.044,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	128,50	$16.266.044
	3.3.2			Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >=95% PM.	m3	85,70	$39.400,00	$3.376.580,00			85,70	$3.376.580,00	85,70	$3.376.580,00	85,70	$3.376.580,00	0,00	$0
	3.4			Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado.	m3	250,90	$154.755,00	$38.828.030,00			250,90	$38.828.030,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	250,90	$38.828.030
	3.3.6			Colocación de base en material granular ASTM tipo II, para zanjas y apiques.	m3	14,40	$193.600,00	$2.787.840,00			14,40	$2.787.840,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	14,40	$2.787.840
	3.3.4			Lleno y apisonado con triturada clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2".	m3	108,00	$176.902,00	$19.105.416,00			108,00	$19.105.416,00	52,31	$9.253.979,00	52,31	$9.253.979,00	55,69	$9.851.437
CAPÍTULO 7 - LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES PARA DOMICILIARIAS.								**$9.025.689,00**				**$9.025.689,00**		**$446.489,00**		**$446.489,00**		**$8.579.200**
	3.3.1			Lleno compactado mecánicamente con material de préstamo densidad de compactación >=95% PM.	m3	14,00	$126.000,00	$1.764.000,00			14,00	$1.764.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	14,00	$1.764.000
	3.3.2			Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >=95% PM.	m3	14,00	$39.300,00	$550.200,00			14,00	$550.200,00	6,20	$243.522,00	6,20	$243.522,00	7,80	$306.678
	3.4			Cargue, retiro y disposición final de material excedente a sitio autorizado.	m3	27,00	$154.755,00	$4.178.385,00			27,00	$4.178.385,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	27,00	$4.178.385
	3.3.6			Colocación de base en material granular ASTM tipo II, para zanjas y apiques.	m3	1,10	$180.000,00	$198.000,00			1,10	$198.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	1,10	$198.000
	3.3.4			Lleno y apisonado con triturada clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2".	m3	12,00	$194.592,00	$2.335.104,00			12,00	$2.335.104,00	1,04	$202.967,00	1,04	$202.967,00	10,96	$2.132.137
CAPÍTULO 8 - ENTIBADOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO.								**$19.440.000,00**				**$19.440.000,00**		**$10.035.900,00**		**$10.035.900,00**		**$9.404.100**
	C5.1			ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90mcon una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado.	m2	360,00	$54.000,00	$19.440.000,00			360,00	$19.440.000,00	185,85	$10.035.900,00	185,85	$10.035.900,00	174,15	$9.404.100
CAPÍTULO 9 - SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y ACERO.								**$114.539.589,00**				**$114.539.589,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$114.539.589**
	7.64			Suministro, transporte, elaboración y colocación de concreto f'c = 3000PSI, e = 0,10m, para andén, incluye capa de entresuelo en piedra y material de recebo (e=0,2m).	m2	24,00	$195.055,00	$4.681.320,00			24,00	$4.681.320,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	24,00	$4.681.320
	4.8			Suministro, transporte, colocación y compactación de concreto rígido de 4000 PSI para vías y patios.	m3	8,51	$1.367.000,00	$11.633.170,00			8,51	$11.633.170,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	8,51	$11.633.170
	9.2.15			Construcción de caja de inspección tipo 2 (L=0,7m x a=0,70m, 1m>H<=2m) en concreto de f'c= 4.000 PSI (e=0,15), incluye base y cañuela (con losa de fondo).	ml	24,00	$1.119.200,00	$26.860.800,00			24,00	$26.860.800,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	24,00	$26.860.800
	9.2.2.1			Construcción de cilindro para cámaras de inspección de Ø=1,20 m de concreto de f'c=4000 PSI.	ml	3,00	$1.503.590,00	$4.510.770,00			3,00	$4.510.770,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	3,00	$4.510.770
	9.2.2.2			Construcción de cañuela para cámara de inspección en concreto de f'c=4000 PSI.	m3	25,00	$1.082.662,00	$27.066.550,00			25,00	$27.066.550,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	25,00	$27.066.550
				Construcción de tapaloza para cámara de inspección de 1.2 m. de diámetro en concreto f'c=4000 PSI	un	3,00	$1.123.620,00	$3.370.860,00			3,00	$3.370.860,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	3,00	$3.370.860
	9.2.2.8			Peldaños galvanizados tipo uña de gato, en acero corrugado de Ø3/4mm.	un	65,00	$72.102,00	$4.686.630,00			65,00	$4.686.630,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	65,00	$4.686.630

ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 01

EAG Empresa Autónoma de Guatapé — Oportunidades y Desarrollo para todos — NIT 800.106.497-0

PEZZOTTI ING S.A.S

UNIDAD EJECUTORA:	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE -EAG-	**ACTA No.:**	1	**VALOR TOTAL ACTA:**	$95.476.895,00	**FECHA:**	14/03/2026

CONTRATO DE OBRA No :	OC-030-2025	PLAZO INICIAL:	TRES MESES (3.0 MESES)	PLAZO ACUMULADO:	TRES MESES Y MEDIO (3.5 MESES)
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA "	FECHA DE INICIACION:	30/01/2026	FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA - N/A
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING SAS / NIT. 901.228.129-1	FECHA DE REANUDACIÓN:	NO APLICA - N/A	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2026
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	CD-011-2026	VALOR INICIAL:	$591.047.626,00	VALOR ADICIÓN (INCLUÍDO IVA):	NO APLICA - N/A
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S / NIT. 900.492.461-7	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$591.047.626,00	VALOR TOTAL EN ADICIONES:	NO APLICA - N/A

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					MODIFICACIONES				OBRA EJECUTADA				SALDO POR EJECUTAR	
									PARA ACTA 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA DE OBRA No. 1		EJECUTADO ACUMULADO			
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	9.2.2.11			Anillo y tapa polimérica circular de 0,7m de diámetro para cámaras de inspección.	un	27,00	$222.400,00	$6.004.800,00			27,00	$6.004.800,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	27,00	$6.004.800
	9.2.24			CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE EMPALME para domiciliar (0,50 x 0,50internos), incluye tapa, acero de refuerzo (60.000 psi), en concreto impermeabilizado de 28Mpa. Incluye cañuela, pares, tapa con su herraje, solado e=0,05m y todo lo necesario para su correcta ejecución.	un	20,00	$650.403,00	$13.008.060,00			20,00	$13.008.060,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	20,00	$13.008.060
	7.3.1			S.T.C. de cabezote de 250 mm en Concreto f'c = 210kg/cm2, incluye acero y formaleteria de concreto a la vista	un	2,00	$2.901.993,00	$5.803.986,00			2,00	$5.803.986,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	2,00	$5.803.986
	7.3.1			S.T.C. de cabezote de 24"en Concreto f'c = 210kg/cm2, incluye acero y formaleteria de concreto a la vista	un	1,00	$3.334.643,00	$3.334.643,00			1,00	$3.334.643,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	1,00	$3.334.643
	7.3.1			Construcción de Aliviaderos en Cámaras de inspección.	un	2,00	$1.789.000,00	$3.578.000,00			2,00	$3.578.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	2,00	$3.578.000
CAPÍTULO 10 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PARA REDES DE ALCANTARILLADO.								**$94.441.102,00**				**$94.441.102,00**		**$22.659.199,00**		**$22.659.199,00**		**$71.781.903**
	5.1.1.3			Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 - Ø200mm (8"). Incluye nivelación con comisión de topografía.	ml	47,00	$120.336,00	$5.655.792,00			47,00	$5.655.792,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	47,00	$5.655.792
	5.1.1.4			Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 Øinterno 227 mm. DN=250mm) Incluye nivelación con comisión de topografía.	ml	190,00	$167.449,00	$31.815.310,00			190,00	$31.815.310,00	135,32	$22.659.199,00	135,32	$22.659.199,00	54,68	$9.156.111
	5.1.1.5			Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 Øinterno 284 mm. DN=315mm) Incluye nivelación con comisión de topografía.	ml	120	233.500,00	$28.020.000,00			120,00	$28.020.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	120,00	$28.020.000
	5.1.1.5			Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 Øinterno 595,12 mm. DN=650mm.	ml	30,00	$965.000,00	$28.950.000,00			30,00	$28.950.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	30,00	$28.950.000
CAPÍTULO 11 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO.								**$18.593.680,00**				**$18.593.680,00**		**$3.462.670,00**		**$3.462.670,00**		**$15.131.010**
	5.1.1.2			Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidro sello de caucho - Norma NTC 5055 - Ø160mm (6").	ml	120,00	$85.000,00	$10.200.000,00			120,00	$10.200.000,00	16,05	$1.364.250,00	16,05	$1.364.250,00	103,95	$8.835.750
	5.3.4.5			Kit Silla Yee PVC alcantarillado hermético, incluye 2 abrazaderas, 1 caucho y 1 codo PVC 45° Ø160mm - Norma NTC 3722-1 - Ø250mm x Ø160mm (10"X6").	un	20,00	$419.684,00	$8.393.680,00			20,00	$8.393.680,00	5,00	$2.098.420,00	5,00	$2.098.420,00	15,00	$6.295.260
CAPÍTULO 12 - OBRAS COMPLEMENTARIAS.								**$40.727.067,00**				**$40.727.067,00**		**$0,00**		**$0,00**		**$40.727.067**
	9.3.23.2			Suministro, transporte e instalación de enchape de piso en Gress, incluye todo lo necesario para su instalación.	m2	2,80	$217.381,00	$608.667,00			2,80	$608.667,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	2,80	$608.667
	9.2.43			Televisación de redes de alcantarillado incluye el lavado de las redes e ingreso a cualquier tipo de zona.	ml	450,00	$42.780,00	$19.251.000,00			450,00	$19.251.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	450,00	$19.251.000
	18.9			Instalación de engramado con cespedones en gramalote.	m2	450,00	$46.372,00	$20.867.400,00			450,00	$20.867.400,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	450,00	$20.867.400
				VALOR COSTOS DIRECTO DE OBRA CONTRACTUAL				**$425.755.167,00**				**$425.755.167,00**		**$66.516.818,00**		**$66.516.818,00**		**$359.238.349,00**
							ADMINISTRACIÓN 31,20%	$132.835.612,10				$132.835.612,10		$20.753.247,22		$20.753.247,22		$112.082.364,89
							UTILIDAD.5,00%	$21.287.758,35				$21.287.758,35		$3.325.840,90		$3.325.840,90		$17.961.917,45
							POLIZAS.	$4.880.989,00				$4.880.989,00				$4.880.989,00		$0,00
							PGIO (gasto)	$6.288.100,00				$6.288.100,00						$6.288.100,00
							TOTAL OBRA	**$591.047.626,00**				**$591.047.626,00**		**$95.476.895,00**		**$95.476.895,00**		**$495.570.731,00**

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	**$ 591.047.626,00**
VALOR ACTA PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL	$ 0,00
VALOR CONTRACTUAL FINAL	**$ 591.047.626,00**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1	**$ 95.476.895,00**
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	16,15%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL EJECUTADO	**16,15%**

JUAN GUILLERMO GIRALDO PEZZOTTI
DIRECTOR DE OBRA
PEZZOTTI ING SAS

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO
GERENTE (E)
EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPE -EAG-

Gustavo Gulo Rentería
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQOBRAS S.A.S

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026


ACTA No.	1

ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPITULO 1 - PRELIMINARES	

ITEM 1.4.1	Trazado y replanteo	UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN

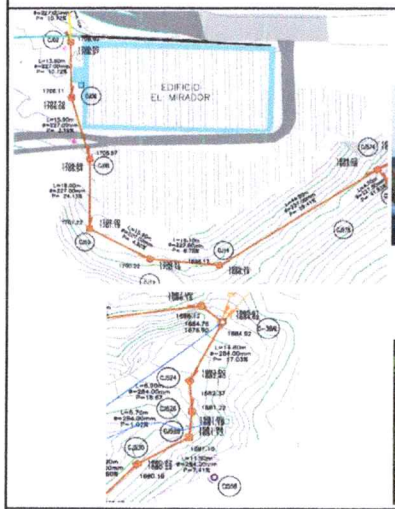







FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (día)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
11/02/2026	CJ 36-CJ522	33,80				33,80
11/02/2026	CJ 45B2-CJ02	22,60				22,60
11/02/2026	CJ 02-CJ06	13,80				13,80
11/02/2026	CJ 06-CJ08	16,00				16,00
11/02/2026	CJ 08-CJ10	17,90				17,90
11/02/2026	CJ 10-CJ12	19,80				19,80
11/02/2026	CJ 12-CJ14	23,00				23,00
11/02/2026	CJ 14-CJ578	20,30				20,30
11/02/2026	CJ 572-CJ574	31,70				31,70
11/02/2026	CJ 574-CJ578	14,90				14,90
11/02/2026	CJ 578-CJ580AL	18,20				18,20
11/02/2026	CJ 580AL-CJ522	23,70				23,70

CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA:	Raquel Yesith Ledezma Llaneda
Firma:		Firma:	
	Ing. Hernando Gaviria Ramírez		Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACUMULADA	255,70	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA	255,70

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES	
ITEM 1,3	Descapote, desmonte y limpieza
UNIDAD	m2

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN







FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (día)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
23/02/2026	CJ45B2-CAJA INTERMEDIA	12,00	1,20			14,40
23/02/2026	CJ02-CJ06	18,30	1,20			21,96
27/02/2026	CJ06-CJ08	13,40	1,20			16,08

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA: Rafael Yesith Ledezma Llaneda	OBSERVACIONES:	
Firma:	Firma:		
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda	CANTIDAD ACUMULADA: 52,44	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA: 52,44

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPÍTULO 3 - CORTE, ROTURA Y RETIRO DE PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS.	

ITEM 2,2	Demolición de andén en cualquier acabado (incluye retiro).	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN





FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (día)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
24/02/2026	CJ06-CJ08	1,70	1,20	0,40		0,82
26/02/2026	CJ02-CJ06	1,85	1,20	0,40		0,79

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA: Ropol Yesith Ledezma Lloreda	OBSERVACIONES:
Firma:	Firma:	
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda	

CANTIDAD ACUMULADA	1,61	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA	1,61

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPÍTULO 4 - EXCAVACIONES COLECTOR.	

ITEM 3,1,1	Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad.	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN



FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (dia)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
03/03/2026	CJ 45B2-CAJA INTERMEDIA-CJO2	12,00	0,80	1,45	1,00	13,92
04/03/2026	CAJA INTERMEDIA-CJO2	12,00	0,80	1,80	1,00	17,28
05/03/2026	CJ 02-CJ06	15,32	0,75	1,65	1,00	18,96
09/03/2026	CJ06-CJ08	6,00	0,80	1,70	1,00	8,16
		6,00	1,31	2,15	1,00	16,90
10/03/2026	CJ08-CJ10	17,60	0,78	1,40	1,00	19,10
11/03/2026	CJ10-CJ12	29,70	0,70	1,50	1,00	31,19
12/03/2026	CJ12-CJ14	18,00	0,70	1,20	1,00	15,12
14/03/2026	CJ14-CJ574	18,00	0,70	2,65	1,00	33,39

CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA:	
Firma:		Firma:	
	Ing. Hernando Gaviria Ramírez		Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACUMULADA	174,01	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA	174,01

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPITULO 5 - EXCAVACIONES DOMICILIARIAS.	
ITEM 3,1,1	Excavación manual o mecánica en material común o roca descompuesta a profundidad de 0-2m, bajo cualquier condición de humedad.
UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN



FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (día)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
07/03/2026	APIQUE ENTRE CAJA CJ10-CJ12	0,82	0,82	0,80	1,00	0,54
07/03/2026	APIQUE ENTRE CJ08-CJ10	0,87	1,00	1,00	1,00	0,87
07/03/2026	APIQUE ENTRE CJ10-CJ12	3,10	0,55	1,30	1,00	2,22
07/03/2026	APIQUE ENTRE CJ10-CJ12	2,00	1,00	2,00	1,00	4,00
07/03/2026	APIQUE ENTRE CJ10-CJ12	2,20	0,80	1,20	1,00	2,11
07/03/2026	APIQUE ENTRE CJ10-CJ12	2,10	0,80	1,30	1,00	2,18
10/03/2026	DM ENTRE CAJAS CJ08-CJ10	2,70	1,00	1,05	1,00	2,84
11/03/2026	DM ENTRE CJ10-CJ12	2,10	0,80	0,80	1,00	1,34
12/03/2026	DM ENTRE CJ12-CJ14	2,10	0,80	0,80	1,00	1,34
13/03/2026	DM ENTRE CJ14-CJ574	2,40	0,80	1,30	1,00	2,50

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA:	OBSERVACIONES:	
Firma:	Firma: Rafael Yesith Ledezma Lloreda		
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda	CANTIDAD ACUMULADA: 19,94	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA: 19,94

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPITULO 6 - LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES PARA COLECTOR.	

ITEM 3,3,2	Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >=95% PM.	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN



FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (dia)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
03/03/2026	CJ45B2-CAJA INTERMEDIA-CJ02	12,00	0,80	0,81		7,74
04/03/2026	CAJA INTERMEDIA-CJ02	12,00	0,80	1,06		10,18
05/03/2026	CJ02-CJ06	15,32	0,75	0,97		11,16
09/03/2026	CJ06-CJ08	6,00	0,80	1,05		5,02
09/03/2026	CJ06-CJ08	6,00	1,31	1,48		11,83
10/03/2026	CJ08-CJ10	17,60	0,80	0,80		11,26
11/03/2026	CJ10-CJ12	29,70	0,80	0,83		19,80
12/03/2026	CJ12-CJ14	18,00	0,80	0,80		11,52
14/03/2026	CJ14-CJ574	18,00	0,80	1,97		28,38

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA: Raquel Yaith Ledezma Lloreda	OBSERVACIONES:
Firma:	Firma:	
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda	

CANTIDAD ACUMULADA	116,67	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA	116,67

PEZZOTTI ING S.A.S


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPITULO 6 - LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES PARA COLECTOR.	

ITEM 3,3,4	Lleno y apisonado con triturada clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2.".	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN

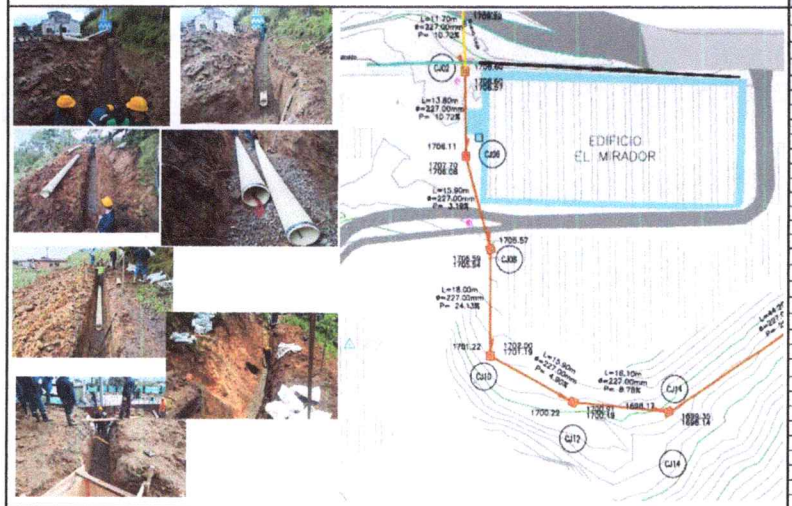

FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Menos desalojo tubería	Medida total (dia)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
03/03/2026	CJ 45B2-CAJA INTERMEDIA-CJ02	12,0	0,80	0,5540	0,61	4,71
04/03/2026	CAJA INTERMEDIA-CJO2	12,0	0,80	0,5540	0,61	4,71
05/03/2026	CJ 02-CJ06	15,3	0,80	0,5540	0,78	6,01
09/03/2026	CJ06-CJ08	6,0	0,80	0,5540	0,30	2,36
09/03/2026	CJ06-CJ08	6,0	0,85	0,5540	0,30	2,52
10/03/2026	CJ08-CJ10	17,6	0,80	0,5540	0,89	6,91
11/03/2026	CJ10-CJ12	27,9	0,80	0,5540	1,41	10,95
12/03/2026	CJ12-CJ14	18,0	0,80	0,5540	0,91	7,07
14/03/2026	CJ14-CJ574	18,0	0,80	0,5540	0,91	7,07

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORIA: Royal Yesith Ledezma Lloreda	OBSERVACIONES:
Firma:	Firma:	
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda	

CANTIDAD ACUMULADA	52,31	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA	52,31

PEZZOTTI ING S.A.S


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPITULO 7 - LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES PARA DOMICILIARIAS.	
ITEM 3,3,2	Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, densidad de compactación >=95% PM.

UNIDAD: m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN

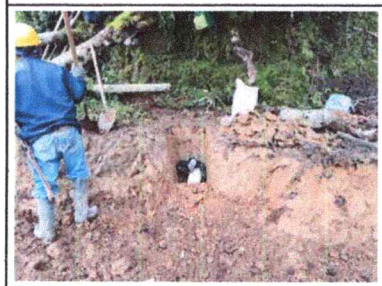

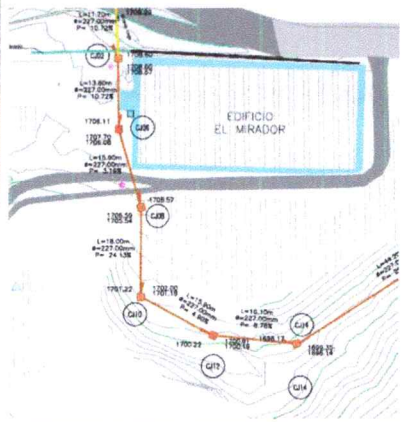

FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (día)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
11/03/2026	Entre caja CJ08-CJ10	2,15	1,00	0,75		1,61
11/03/2026	Entre caja CJ10-CJ12	2,10	0,80	0,50		0,84
11/03/2026	Entre caja CJ10-CJ12	1,50	0,80	0,60		0,72
12/03/2026	Entre caja CJ12-CJ14	2,10	0,80	0,60		1,01
13/03/2026	Entre caja CJ14-C574	2,40	0,80	1,05		2,02

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	**INTERVENTORÍA:** Royal Yesith Ledezma Lloreda	**OBSERVACIONES:**	
Firma:	**Firma:**		
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda	**CANTIDAD ACUMULADA** 6,20	**SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA** 6,20

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPITULO 7 - LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES PARA DOMICILIARIAS.	

ITEM 3,3,4	Lleno y apisonado con triturada clase 1 (ASTM D2321) 3/4" a 1/2".	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN



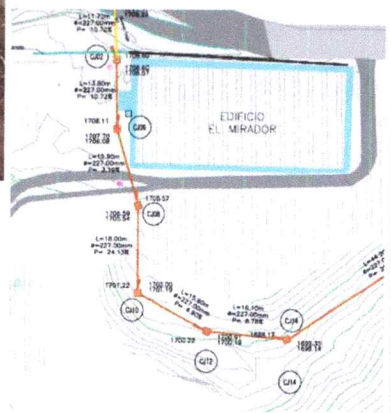

FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Desalojo de tubería	Medida total (día)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
11/03/2026	Entre caja CJ08-CJ10	2,15	0,80	0,1500	0,04	0,22
11/03/2026	Entre caja CJ10-CJ12	2,10	0,80	0,1500	0,04	0,21
11/03/2026	Entre caja CJ10-CJ12	1,50	0,80	0,1500	0,03	0,15
12/03/2026	Entre caja CJ12-CJ14	2,10	0,80	0,1500	0,04	0,21
13/03/2026	Entre caja CJ14-C574	2,40	0,80	0,1500	0,04	0,24

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA: Rafael Yesith Ledezma Lloreda
Firma:	Firma:
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACUMULADA	1,04	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA	1,04

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda


OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPITULO 6 - ENTIBADOS PARA REDES DE ALCANTARILLADO.	

ITEM C5,1	ENTIBADO TEMPORAL en TELERAS de 1.35mx0.90mcon una separación máxima de largueros de 0,35m a ejes, bajo cualquier grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de todos los elementos, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes, su medida será en el sitio. Se tendrá en cuenta para efectos de pago, solamente las áreas netas cubiertas por el entibado.	UNIDAD	m2

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN





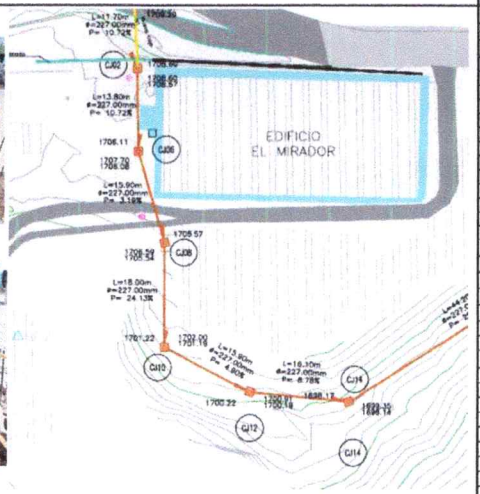

FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (dia)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
27/02/2026	Cajas CJ02 y CJ06	13,80		1,50		20,70
05/03/2026	Cajas CJ06 y CJ08	15,90		1,50		23,85
08/03/2025	Cajas CJ08 y CJ10	18,00		1,50		27,00
10/03/2026	Cajas CJ10 y CJ12	15,90		1,50		23,85
14/03/2026	Cajas CJ12 y CJ14	16,10		1,50		24,15
16/03/2026	Cajas CJ14 y CJ574	44,20		1,50		66,30

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA: Ragel Yesith Ledezma Lloreda
Firma:	Firma:
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ACUMULADA	185,85	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA	185,85


PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPITULO 10 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PARA REDES DE ALCANTARILLADO.	
ITEM 5,1,1,4	Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho - Norma NTC 5055 Øinterno 227 mm. DN=250mm) Incluye nivelación con comisión de topografía.
UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN

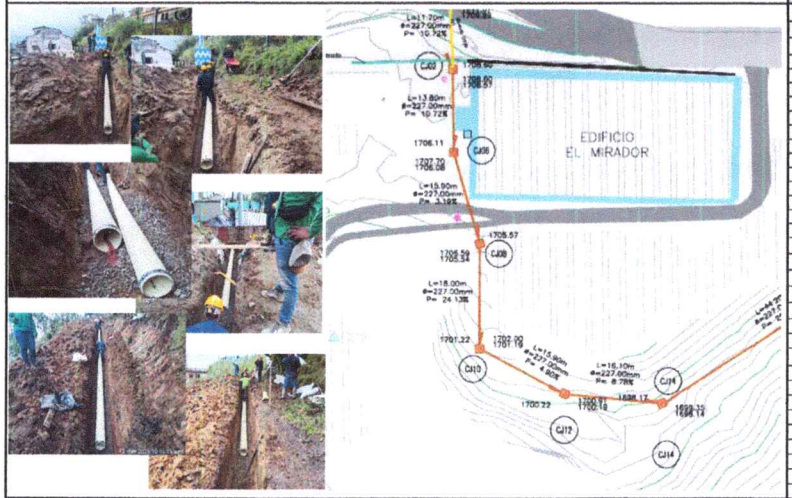

FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (dia)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
03/03/2026	CJ45B2-CAJA INTERMEDIA-CJ02	12,00				12,00
04/03/2026	CAJA INTERMEDIA-CJ02	12,00				12,00
05/03/2026	CJ02-CJ06	15,32				15,32
09/03/2026	CJ06-CJ08	12,00				12,00
10/03/2026	CJ08-CJ10	18,00				18,00
11/03/2026	CJ10-CJ12	30,00				30,00
12/03/2026	CJ12-CJ14	18,00				18,00
14/03/2026	CJ14-CJ574	18,00				18,00

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA: Rafael Yesith Ledezma Lloreda	OBSERVACIONES:	
Firma:	Firma:		
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda	CANTIDAD ACUMULADA: 135,32	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA: 135,32

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda


OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.

CAPITULO 11 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO.

ITEM 5,1,1,2	Tubería PVC alcantarillado hermético de pared estructural, interior lisa y exterior corrugada - unión mecánica, campana espigo con hidro sello de caucho - Norma NTC 5055 - Ø160mm (6").	UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN



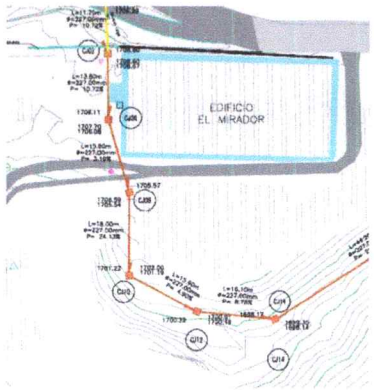

FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (día)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
09/03/2026	Caja edificio Mirador-CJ08	6,00				6,00
11/03/2026	CJ08-CJ10	2,15				2,15
11/03/2026	CJ10-CJ12	1,80				1,80
11/03/2026	CJ10-CJ12	1,50				1,50
12/03/2026	CJ12-CJ14	2,10				2,10
13/03/2026	CJ14-CJ574	2,50				2,50

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA: Rafael Yesith Ledezma Llanedo	OBSERVACIONES:
Firma:	Firma:	
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda	

CANTIDAD ACUMULADA	16,05	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA	16,05

PEZZOTTI ING S.A.S

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	14	MM	03	AAAA	2026	ACTA No.	1	ELABORÓ	Ing. Hernando Gaviria Ramírez	REVISÓ	Ing.Yesid Ledezma Lloreda

OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL SECTOR LA MILAGROSA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA."
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ -EAG-
CONTRATISTA:	PEZZOTTI ING S.A.S
INTERVENTOR:	ARQOBRAS S.A.S.
CAPITULO 11 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO.	

ITEM 5,3,4,5	Kit Silla Yee PVC alcantarillado hermético, incluye 2 abrazaderas, 1 caucho y 1 codo PVC 45° Ø160mm - Norma NTC 3722-1 - Ø250mm x Ø160mm (10"X6").	UNIDAD	un

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN



FECHA	LOCALIZACIÓN - UBICACIÓN	DIMENSIONES			Número de elementos	Medida total (dia)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
09/03/2026	CJ08-CJ10				1,00	1,00
11/03/2026	CJ10-CJ12				1,00	1,00
11/03/2026	CJ10-CJ12				1,00	1,00
12/03/2026	CJ12-CJ14				1,00	1,00
13/03/2026	CJ14-CJ574				1,00	1,00

CONTRATISTA: PEZZOTTI ING SAS	INTERVENTORÍA: Raquel Yesith Ledezma Lloreda	OBSERVACIONES:
Firma:	Firma:	
Ing. Hernando Gaviria Ramírez	Ing.Yesid Ledezma Lloreda	

CANTIDAD ACUMULADA	5,00	SUBTOTAL EJECUTADO PARA ESTA ACTA	5,00

Contrato N° OC-030-2025

Objeto: Construcción del alcantarillado combinado del sector La Milagrosa de la zona urbana del Municipio de Nariño Antioquia

Contratista: PezzoTTi Ing SAS

Valor: $ 591.194.386

Plazo: Tres (03) meses

NIT: 901.228.129-1

Fecha Inicio: 30 de enero de 2026

Fecha Terminación:

Powered by CamScanner

Febrero 5/2026 Jueves

Tiempo: Seco durante el día

Personal: Ingeniero Residente
Residente Social
Directora de obra.

Actividades:

1- Se realizan actas de vecindad y se Toma Registro fotográfico de cada una de las viviendas a las cuales se realizó actas de vecindad.

Residente obra

Residente Interventoría

Febrero 6/2026 Viernes

Tiempo: Lluvias puntes durante la noche y la madrugada hasta las 9:30 a.m

Personal: Directora obra
Residente obra
Residente social.

Actividades:

1- Se continúa con las actas de vecindad y se toma registro fotográfico de cada una de las viviendas a las cuales se realizó actas de vecindad.

Residente obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

Febrero 11/2026 Miércoles

Tiempo: Nublado en la mañana y seco en la tarde

Personal: 1 Residente de obra
1 Topógrafo
2 cadeneros

Equipo: 1 Estación Total

Actividades:

1- Se realiza la localización de las cajas CJ45B2, CJ02, CJ06, CJ08, CJ10, CJ12, CJ14, CJ578, CJ574, CJ572, CJ580A1, CJ522, CJ36

2- Se visualiza que la caja CJ14 queda en el Talud de las viviendas aledaños, se debe colocar fuera del Talud

3- las cajas CJ524, CJ526, CJ528, CJ530, CJ532, CJ534, CJ536, CJ538, CJ540, CJ542, CJ72A, CJ70, CJ72, CJ544 no se localizan pues en el plano no Tiene Topografía

4- Se visualizo que la Tubería desde la caja CJ542 a la caja CJ72A, y la caja CJ72, CJ544 pasan por construcciones existentes

Residente obra

Residente Inf.

Febrero 16/2026 lunes

Tiempo: Seco durante el día

Personal: Contratista: 1 Director obra

Powered by CamScanner

1 Residente civil obra
Interventoria: 1 Residente civil
1 Residente ambiental

Actividades

1- Se Realiza Recorrido Técnico con la interventoria
2- Se observa que el contratista de la Finca de ganado INCODE SAS construye muro de contención, ya tiene vaciada zapata y acero lowntado, la cual está localizado en la caja CJ02, se debe coordinar con INCODE SAS La construcción del alcantarillado que atraviesa el muro de contención.
3- En la caja CJ02 aledaña se encuentra un poste de energia con Transformador, Tambien entre la caja CJ02 y la caja CJ06 se encuentra una Tubería de agua potable de 2", una subestación de energia y una caja electrica, pertenecionte al edificio el mirador; se debe inspeccionar muy bien debido a que el diseño de la Red pasa la Tubería de 10".
4- Entre la caja CJ06 y CJ08 se visualiza un hidrante, se debe Tener precaución al excavar para no ganarar un daño a la Red de agua potable.
5- El alcantarillado de las viviendas se debe inspeccionar por donde va cada Tubería de cada vivienda, ya que cuando se Realizaron las actas de vecindad muchos propietarios desconocen la ubicación de las Tuberias, esto con el fin de que cuando se construya las cajas domiciliarias y antes de una socialización con la comunidad, los propietarios se puedan empalmar a dichas cajas y pueda funcionar La Red de alcantarillado combinado

Powered by CamScanner

6- en el numeral 3 de febrero 11, nuevamente se realiza el recorrido y se denota que no existe Topografía para localizar dichas cajas.

7 También el numeral 4 de febrero 11, la interventoría visualiza de que la Red pasa por construcciones existentes

8- En el diseño de la Red no están localizadas las domiciliares

9- La interventoría Toma nota de las observaciones que hay en campo, y se le dará solución lo más rápido posible, para el normal desarrollo de la obra

10- A las 3:00 pm se Tiene comité en Las oficinas de la Alcaldía, asistentes a la reunión Erica Cardona Perez - Alcaldesa, Diego Fernando Medina Orozco - Auxiliar Planeación, Yolanda Chalparizan - Auxiliar de planeación, Jhon Carlos Zuluaga - Garante de servicios públicos, Yesid Ledesma Honeda ingeniero Residente de interventoría (ARQOBRAS SAS), Sofinami Echeverri - Ambiental interventoría (ARQOBRAS SAS); Laura Giraldo Español - Directora obra (Pezzotti Ing SAS), Hernando Saviria Ramirez - Residente obra (Pezzotti Ing SAS), Sergio - Residente (INCOVE SAS), se Toman los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, con el fin de darle solución Técnica y se propone visita Técnica el día 17 de febrero de 2026 con los diseñadores en el sitio de la obra; Además el señor Horacio Arcila ciruantes dueño del Lote, la Alcaldesa se reunirá con el cuando el diseño esté completo y así pueda dar permiso para la construcción
En la reunión También estuvo virtualmente.

Powered by CamScanner

al secretario de planeación Alexander hernandez

Residente obra

Resolute Int

Febrero 17/2026 Martes

Tiempo: Seco durante el dia

Personal: Contratista: Residente civil
Interventoría: Residente civil.
Residente ambiental

Actividades:

1- Se Reune en el sitio de la obra Erica Cardona Perez - Alcaldesa, Yolanda Chalparizan - Auxiliar Planeación, Diego Fernando Medina Orozco - Auxiliar planeación, Jhon Carlos Zuluaga - Gerente de servicios Públicos, Yesid Ledesma Ilbrada - Ingeniero Residente Interventoría (ARQOBRAS SAS), Sofinami Echevarri - Ambiental (ARQOBRAS SAS), Andres Galeano C - Diseñador, Elizabeth Marin V. - Diseñadora y Hernando Gaviria Ramirez - Ingeniero Residente (Pezzotti Ing SAS)

2- Se realiza el Recorrido de la obra en el punto de inicio caja CJ4SB2 que empalma con la caja CJ02 y esta a su vez con la caja CJ06, dentro de las soluciones sugeridas está que entre la caja CJ02 y la caja CJ06 se debe realizar excavación manual en el lado izquierdo con mucho cuidado debido a que existe un poste de energía con Transformador y Tubería madre de agua potable de 2", esto con el fin de visualizar si existe obstáculos para instalar la Tubería de 10",

Powered by CamScanner

en caso de que existo obstáculos se realizará anteriores excavación manual en el lado derecho y verificar si se puede colocar la Tubería de 10" y así no interferir con la construcción del muro de contención y placas de la faria de ganado, También se debe colocar un pase de Tubería de 12" en el muro de contención y construir una caja de caída antes del muro de contención.

3- Se sigue el recorrido y la caja CJ 10 se desplazará un poco para que no quede en el Talud, la caja CJ 14 queda en el Talud de las viviendas aledañas., esta caja Tambien se Trasladará para no Tocar el Talud.

4- El Gerente de servicios públicos informa que hará acompañamiento Técnico para inspeccionar las Tuberías de las viviendas, Las cuales no se sabe como están en la actualidad, se construirán las cajas domiciliarias y se realizará La socialización para que cada propietario ó dueño de La vivienda se empalme a la caja domiciliaria.

5- Las cajas CJ572, CJ36, CJ522, CJ526, CJ528, CJ530, CJ532, CJ534, CJ536, CJ538, CJ540, CJ542, CJ72, CJ70, CJ72A, CJ544, CJ540, están localizados sin Topografía, debido a esto La Alcaldesa se pronuncia e informa que hablará con el dueño del contrato para Realizar La Topografía faltante y así los diseñadores con la Topografía Real del Terreno Realizaran el diseño general y ajustes necesarios del proyecto

6- Se debe Realizar nocería antes de iniciar

Powered by CamScanner

la Topografía, la Tubería de la caja CJ542 que empalma con la caja CJ72A debe pasar por el medio de las dos (2) viviendas existentes, Además el descole de la caja CJ544 se debe prolongar más según el presupuesto de la obra.

7- El Gerente de Servicios Públicos informa que se debe socializar el proyecto con la comunidad

Residente obra

Residente Sut

Febrero 19/2026 Jueves

Tiempo: Lluvias en la mañana hasta las 11:0 am y seco en la Tarde

Personal: Contratista: 1 Residente civil

Actividades

1 Llega a la obra la siguiente Tubería y accesorios:

20 KIT silla Yee de 10"X6"
5 Tubos de 24"
23 Tubos de 12"
34 Tubos de 10"
20 Tubos de 6"
8 Tubos de 8"
20 codos 45 x 6"

Residente obra

Residente Sut

Powered by CamScanner

Febrero 23/2026 lunes

Tiempo: Nublado en la mañana, lluvias fuertes desde las 12:30 p.m hasta 1:30 p.m ; 3:0 pm o 3:15pm

Personal: Contratista: 1 Directora de obra
1 Residente civil
1 Residente SST
1 oficial
2 Ayudantes
Interventoría: 1 Residente civil
1 Residente ambiental

Equipo: herramienta menor

Actividades:

1- Se realiza excavación entre las cajas CJ02 y CJ06
2- Se realiza descapote entre las cajas CJ02 y CJ06
3- Se realiza excavación manual entre las cajas CJ02 y CJ06
4- Se realiza mediación con interventoría

Residente obra

Residente SST

Febrero 24/2026 Martes

Tiempo: lluvias en la noche anterior, y en la madrugada de hoy, nublado en la mañana

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 oficial
2 ayudantes

Powered by CamScanner

Interventoría: 1 Residente civil
1 Residente ambiental

Equipo: herramienta menor

Actividades:

1- La excavación entre las cajas CJ02 y CJ06 está inundada debido a las lluvias, debido a esto el personal desaloja el agua estancada
2- Se continúa con la excavación manual entre las cajas CJ02 y CJ06
3- Se Realiza marcación entre los ejes de las cajas CJ06 y CJ08, CJ08 y CJ 10, CJ 10 y CJ 12
4- Excavación manual entre las cajas CJ06 - CJ08
5- Se encuentra Tubería eléctrica del poste de energía cerca a la caja CJ02 a 0.70 m del Terreno natural, También se encuentra la Tubería de agua potable de 2" entre cajas CJ02 y CJ06 margen izquierda.

Residente obra

Residente Int

Febrero 25/2026 Miércoles

Tiempo: Nublado en la mañana y Tarde

Personal: Contratista: 1 Directora
1 Residente civil
1 Residente SST
1 Oficial
2 Ayudantes
Interventoría: 1 Residente civil
1 Residente ambiental

Powered by CamScanner

Equipo: herramienta menor

Actividades:

1- Se continúa con la excavación manual entre las cajas CJ02 y CJ06

2- Se Realiza marcación para construir una caja (en) intermedia entre las cajas CJ45B2 y la caja CJ02; marcación entre la caja CJ12 y CJ14 se construirá una caja intermedia

3- Se Realiza comité de obra N°1, en este comité se Tratan los siguientes Temas:
En el sitio de obra se Reunen Diego Fernando Medina Orozco - Auxiliar Planeación, Javier Cardona Gil - Empresa Servicios Públicos, Hernando Gaviria R. - Residente obra Pezzotti Ing SAS, Yolanda Chalparizun - Auxiliar Planeación, Sofizumi Echavarri - Residente Ambiental (ARQOBRAS SAS), Yesid Ladesma Llorada (ARQOBRAS SAS), Erwin Solano Tellez - SST Pezzotti Ing SAS
a - Socialización de la obra
b - Rocería
c - Acaro de raqueo de los cajas
d - Ubicación de nuevas cajas
e - diseño definitivo

Residente obra

Residente Civil

Febrero 26/2026 Jueves

Tiempo: Seco en la mañana y Tarde

Personal: Contratista: 1 Residente civil

Powered by CamScanner

1 Residente SST
1 Oficial
2 Ayudantes

Interventoría : 1 Residente Ambiental

Equipo: herramienta manor

Actividades:

1- Se continúa con la excavación manual entre los cajas CJ02 y CJ06
2- Se encuentra piso en concreto en la caja CJ06, se Realiza demolición de concreto

Residente obra Residente Sst

Febrero 27/2026 Viernes

Tiempo: Seco durante el día

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 Oficial
Ayudantes

Interventoría: 1 Residente ambiental

Equipo: herramienta manor

Actividades:

1- Se continúa con la excavación manual entre las cajas CJ02 y CJ06
2- Se Realiza entibado entre las cajas CJ02 y CJ06

Powered by CamScanner

3- Se coloca viento con manila al poste eléctrico que tiene Transformador cerca a la caja CJ02

Residente obra

Fabrero 28/2026 Sabado

Tiempo: Seco

Personal: Contratista: 1 Maestro
1 oficial
2 ayudantes
1 Residente SST

Equipo: herramienta menor

Actividades:

1- Excavación y descapote entre las cajas CJ08 y CJ10

2- llega a la obra retro pequeña de oruga

Residente obra

Marzo 02/2026 Lunes

Tiempo: Seco durante la mañana y Tarde.

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 Maestro
1 oficial

Powered by CamScanner

4 ayudantes

Interventoría: 1 Residente civil
1 Residente ambiental

Equipo: 1 Retro pequeña o Raya, 1 canguro
herramienta menor, 1 vibrador, 1
radial, 1 paladora

Actividades:

1- Se continúa con la excavación manual entre las cajas CJ02 y CJ06
2- Se inicia excavación a máquina entre las cajas CJ08 y CJ10
3- Entre la caja CJ06 y CJ08 aparece red de gas a una profundidad de 0.85m del nivel del terreno
4 Por orden de la Alcaldesa no se puede continuar con la obra en el predio que está en negociación hasta llegar a un acuerdo con el señor

Residente obra Residente Sst

Marzo 03/2026 Martes

Tiempo: Seco en la mañana y Tarde

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 operador Retro
1 Maestro
1 oficial
5 ayudantes

Interventoría: 1 Residente civil

Powered by CamScanner

1 Residente ambiental

Equipo: 1 retro de oruga
1 cargador
1 Vibrador
1 Radial
1 pulidora
herramienta menor

Actividades:

1- Se realiza excavación mecánica en caja intermedia entre las cajas CJ45B2 y CJ02
2- Se realiza excavación mecánica caja intermedia hacia caja CJ02
3- Colocación de Tailandado 3/4" como Tubokela de 10" entre caja CJ45B2 - intermedia - CJ02
4- llenos con material seleccionado de la excavación entre cajas CJ45B2 - caja intermedia - CJ02

Residente obra

Residente Sst

Marzo 04/2026 Miércoles

Tiempo: Seco en la mañana y Tarde

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 operador retro de oruga
1 Maestro
1 oficial
5 ayudantes

Powered by CamScanner

Interventoria: 1 Residante civil
1 Residante ambiental

Equipo: 1 Retro de oruga
1 Canguro
1 Vibrador
1 Radial
1 Pulidora
herramienta menor

Actividades:

1- Excavación manual caja intermedia a la caja CJ02
2- Colocación de Triturado 3/4" cama Tubería de 10" entre caja intermedia - CJ02
3- Colocación Tubería de 10" entre caja intermedia - CJ02
4- llenos con material seleccionado de la excavación caja intermedia - CJ02
5- Se realiza comité de obra N°2

Residente obra

Marzo 05/2026 Jueves

Tiempo: lluvias en la madrugada, seco durante el día

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 Maestro
1 oficial
5 ayudantes
1 operador retro de oruga

Powered by CamScanner

Interventoría: 1 Residente ambiental

Equipo: 1 Retro de oruga
1 canguro
1 Vibrador
1 Radial
1 Pulidora
herramienta manor

Actividades:

1- Excavación manual entre ejes CJ02-CJ06
2- Colocación de cama Triturado 3/4" entre ejes CJ02 - CJ06
3- Colocación de Tablola de 10" entre ejes CJ02 - CJ06
4- Llenos con material seleccionado de la excavación entre ejes CJ02 - CJ06
5- Se evacua agua con motobomba sumergible entre ejes CJ02 - CJ06

Residente obra. Penlale Ltd

Marzo 06/2026 Viernes

Tiempo: Lluvias desde las 6:0 a.m hasta las 9:0 a.m

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 operador retro oruga
1 Maestro
1 oficial
5 ayudantes
Interventoría: 1 Residente ambiental

Powered by CamScanner

Equipo: 1 Retro de oruga
1 Canguro
1 Vibrador
1 Radial
1 Pulidora
herramienta menor

Actividades:

1- Excavación mecánica entre ejes CJ08 y CJ10
2- Se inspecciona acometidas domiciliarias a la Red existente

Residente obra

Marzo 07/2026 Sábado

Tiempo: Seco en la mañana

Personal: Contratista: 1 Residente SST
1 operador retro oruga
1 Maestro
1 oficial
5 ayudantes

Equipo: 1 Retro de oruga
1 Canguro
1 Vibrador
1 Radial
1 Pulidora
herramienta menor

Actividades:

1- Excavación mecánica entre ejes CJ10- CJ12

Powered by CamScanner

2- Excavación mecánica entre cajas CJ12-CJ12A
3- Se inspeccionan acometidas domiciliarias a la red existente

Residente obra

Residente Sst

Marzo 09/2026 lunes

Tiempo: Seco en la mañana y Tarde

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 operador Retro
1 Maestro
1 Oficial
5 ayudantes

Interventoría: 1 Residente civil
1 Residente ambiental

Equipo: 1 Retro de oruga
1 canguro
1 Vibrador
1 Radial
1 Pulidora
herramienta manor

Actividades:

1- llenos con material seleccionado de la excavación entre las cajas CJ02-CJ06
2- Excavación mecánica entre cajas: CJ06-CJ08
3- Colocación de Triturado 3/4" entre cajas CJ06-CJ08
4- Colocación de Tubería de 10" entre cajas

Powered by CamScanner

CJ06 - CJ08

5- Colocación de Tubería de 6" entre caja intermedia existente hacia caja CJ08

6- Llenos con material seleccionado cajas CJ06 - CJ08

Residente obra

Deivlate Ruiz

Marzo 10/2026 Martes

Tiempo: Seco en la mañana, llovizna leve en la tarde 3:30 p.m a 3.50 pm

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 Maestro
1 oficial
5 ayudantes
1 operador retro de oruga

Interventoría: 1 Residente civil
1 Residente ambiental

Equipo: 1 Retro de oruga
1 canguro
1 Vibrador
1 Radial
1 Pulidora
herramienta menor

Actividades:

1- Excavación mecánica entre cajas CJ08 - CJ10

2- Colocación de Triturado de 3/4" entre cajas CJ08 - CJ10

3- Colocación de Tubería de 10" entre cajas CJ08 y CJ10

4- Llenos con material seleccionado de la excavación

Powered by CamScanner

entre ejes CJ08 - CJ10

Residente obra

Pendiente final

Marzo 11/2026 Miércoles

Tiempo: nublado en la mañana y Tarde

Personal: contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 operador retro de oruga
1 Maestro
1 oficial
5 ayudantes

Interventoría: 1 Residente civil
1 Residente ambiental

Equipo: 1 Retro de oruga
1 canguro
1 Vibrador
1 Radial
1 Paleadora
herramienta manor

Actividades:

1- Colocación silla yee de 10"X6" cerca a la caja CJ08 margen izquierda
2- Colocación de Tritonado 3/4" domiciliaria cerca caja CJ08 Lado izquierdo
3- Colocación de Tubería de 6" domiciliaria margen izquierda cerca a caja CJ08
4- Planos proveniente de las excavaciones compactados entre ejes CJ08 - CJ10
5- Colocación de Tritonado 3/4" entre ejes CJ08-CJ10

Powered by CamScanner

6- Excavación mecánica entre cajas CJ10 - CJ12
7- Colocación de Triturado 3/4" entre cajas CJ10 - CJ12
8- Colocación de Tubería de 10" entre cajas CJ10 - CJ12
9- Colocación de (Tubería) llanos con material proveniente de la excavación entre cajas CJ10 - CJ12
10- Excavación manual domiciliaria margen izquierda caja CJ10
11- Colocación de silla Yee 10" X 6" cerca a la caja CJ10 margen izquierda
12- Excavación domiciliaria cerca a la caja CJ10 margen izquierda
13- Colocación de Triturado 3/4" domiciliaria cerca a la caja CJ10 margen izquierda
14- Colocación de Tubería de 6" domiciliaria cerca a la caja CJ10 margen izquierda
15- Excavación domiciliaria cerca a la caja CJ12 margen izquierda
16- Colocación de silla Yee de 10" X 6" cerca a la caja CJ12 margen izquierda
17- Colocación de Triturado 3/4" domiciliaria cerca a la caja CJ12 margen izquierda
18- Colocación de Tubería de 6" domiciliaria cerca a la caja CJ12 margen izquierda
19- Se realiza comité de obra N°3

Residente obra

Marzo 12/2026 Jueves

Tiempo: Nublado en la mañana y Tarde

Personal: Contratista: 1 Residente civil
1 Residente SST
1 operador retro de oruga

Powered by CamScanner
