

Lugar	Comunidad de cuidado hogar clarita santos
Fecha	24/03/2026 14:00 – 16:00
Tema	Soporte logístico en obra
Desarrollo	Obra hasta el 31 de marzo del 2026. El objetivo principal es garantizar el bienestar de los residentes y la continuidad de los servicios mientras se logra realizar el reforzamiento estructural en las diferentes etapas de acuerdo con los tiempos que otorgan las licencias de construcción. Por lo tanto, adjuntamos evidencias que confirman que el servicio sigue funcionando con total normalidad y sin afectaciones a pesar de las obras. **1. Ingreso:** El personal de talento humano ingresa por el porton verde que se evidencia en la primera imagen y continua derecho hasta la polisombra como se muestra en la imagen siguiente.  

El personal de la obra ingresa por el porton verde que se evidencia en la fotografia anterior y gira a la derecha por la parte de atrás de la carpa blanca como se demarca con la cinta de peligro y la señaletica de la siguiente imagen:

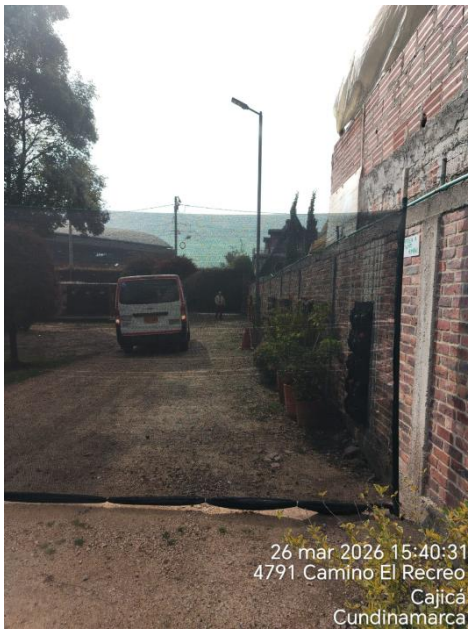


La primera entrada es el ingreso para el personal de la obra, y la siguiente entrada que se evidencia en la fotografia es para el ingreso de talento humano en la parte de atrás de la casa aquí unicamente ingresa el personal autorizado (personal de servicios generales, auxiliares de enfermeria, coordinadora y responsable ambiental) entradas independientes no hay contacto con las personas mayores.

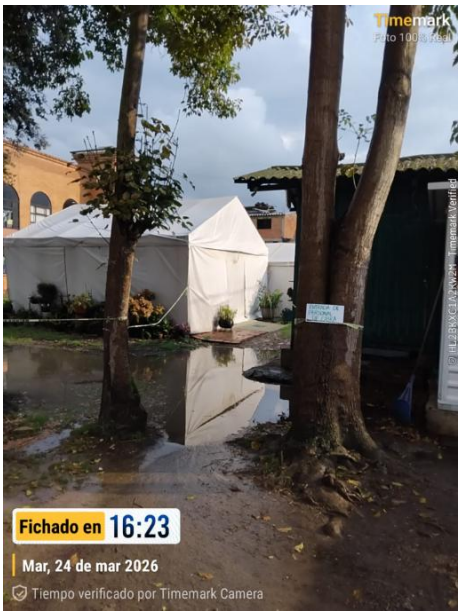

2. Cerramientos y aislamiento

Desde la parte exterior de la casa se cuenta con polisombra con el fin de impedir el paso de personal no autorizado y el transito de persona mayor en las zonas por donde ingresaran los diferentes materiales.

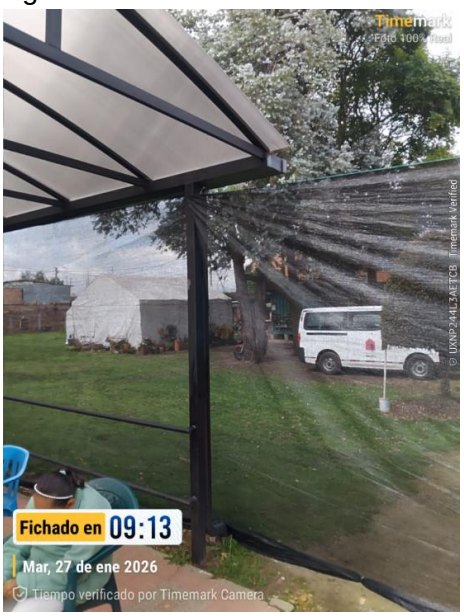


En el area de lavanderia se cuenta con un cerramiento en polisombra con el fin de evitar la polución y el ingreso de personal no autorizado sin detener los procesos del area.







Se cierra el pasillo de acceso con la marquesina y el area de fase 1 intervenida con el fin de prohibir el paso y acceso a la obra esta area se encuentra totalmente aislada de las demas con el fin de dar continuidad al servicio

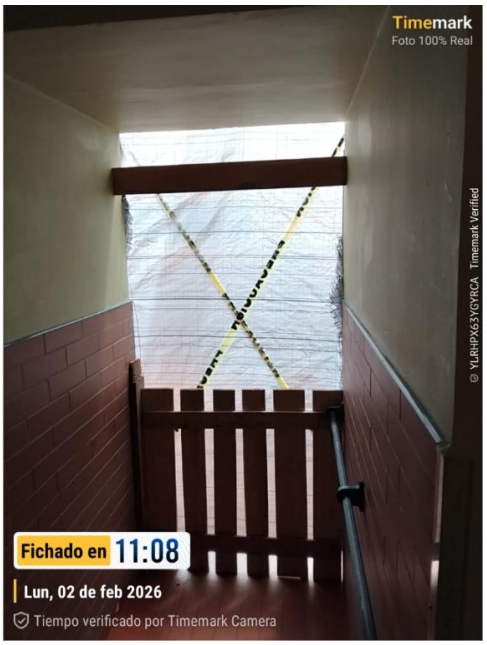



Se realizan cerramientos internos de puertas y ventanas con el fin de evitar la polucion en el area habilitada para continuar con la prestacion del servicio.

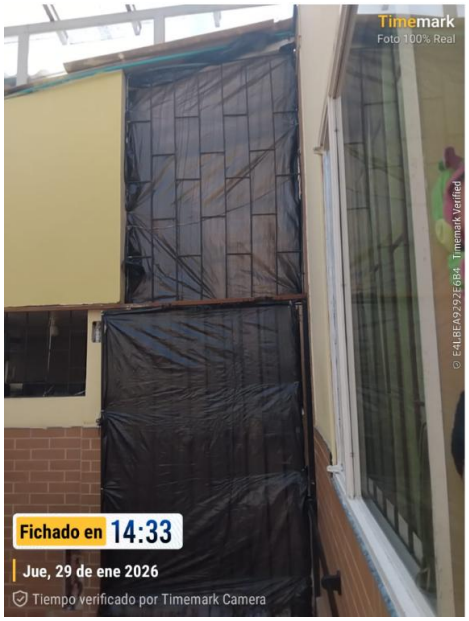

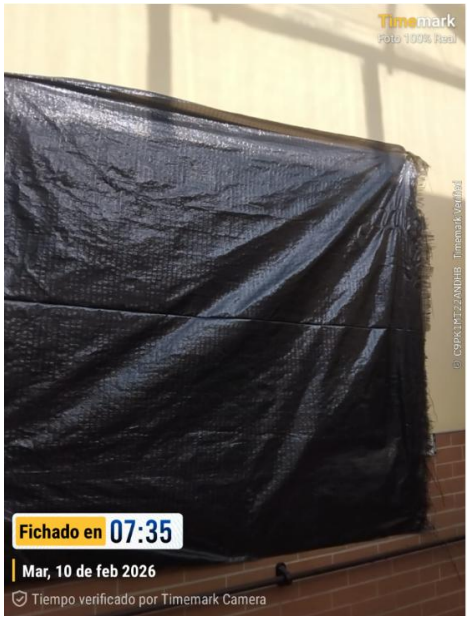

Maquinaria y herramientas

-Se cuenta con un centro de acopio para la recepcion del material de obra y se ingresa de forma segura siempre con autorizacion del personal de vigilancia.
-Como herramienta se resalta el manejo de un trompo de mezclado de cemento el cual se utiliza en la parte de atrás de la casa en donde no hay circulación de personas mayores durante la contingencia, se usa este equipo sin afectar la prestacion del servicio la herramienta de mano se guarada en el capamento respectivo el cual es de uso unicamente del personal de obra.





-cabe resaltar que la seguridad social de los trabajadores se encuentra al dia y el cumplimiento con la seguridad y salud en el trabajo de manera continua durante el desarrollo de la obra en la implementacion de herramientas equipos y dotacion de las personas que intervienen la obra.

SEÑALETICA

En los diferentes espacios se implementa señaletica de no ingreso a los espacios donde no es permito el paso unicamemente al personal autorizado.


Timemark
ENTRADA A TALLERES HUMANO
Fichado en 16:25
Mar, 24 de mar 2026
Tiempo verificado por Timemark Camera


Timemark
ACOPIO DE RESIDUOS DE OBRA
Fichado en 16:30
Mar, 24 de mar 2026
Tiempo verificado por Timemark Camera


Timemark
CAMPAMENTO
Fichado en 12:28
Jue, 26 de mar 2026
Tiempo verificado por Timemark Camera


INGRESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO
Fichado en 12:06
Lun, 09 de feb 2026
Tiempo verificado por Timemark Camera
Timemark Camera



Baño para las personas de obra sin interferir con el servicio.



MANEJOS DE RESIDUOS:

Hasta el momento no se a retirado los residuos de demolicion y construccion RCD pero se esta adelantando la gestión con la EPC empresa de servicios publicos para el tramite de recolección y disposición final de los mismos para cumplimiento de los permisos pertinenente y demás.

ESPACIO INTERVENIDO EN OBRA:

En este espacio el cual es la primera fase de la obra se encuentra totalmente aislado de las personas mayores, no afecta la continuidad del servicio.









	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Angie Melissa S.C. Angie Melissa Suarez Cuitiva	Responsable ambiental	Comunidad de cuidado hogar clarita santos
	Sor Ma Gilma C. Sor María Gilma Castro	Coordinadora	Comunidad de cuidado hogar clarita santos
	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos			
Próxima reunión	2026		
Elaboró	Angie Melissa Suarez cuitiva		
