INFORME DE AVANCE DE EJECUCION
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2025 03 0085

1. - INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO No.:	2025 03 0085
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR EL CLIMA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, ESPECIALMENTE EL AGROPECUARIO, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO PARA LA “CONSERVACIÓN DE LA CONECTIVIDAD VIAL TERRESTRE A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR”.
CONTRATISTA:	CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DEL CESAR EN REESTRUCTURACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE EMILIO OSORIO ROCHA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 1.227.623.008
PRIMER DESEMBOLSO:	$440.309.244
SEGUNDO DESEMBOLSO:	$29,389,448
TERCER DESEMBOLSO:	$442.118.010
CUARTO DESEMBOLSO:	$48.982.414
QUINTO DESEMBOLSO:	$48.982.414
SEXTO DESEMBOLSO:	$48.982.414
SEPTIMO DESEMBOLSO:	$92.424.892
OCTAVO DESEMBOLSO:	$76.434.172
FECHA DE INICIO:	13 DE AGOSTO 2025
FECHA DE TERMINACION:	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICATORIO N°1:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO EN EJECUCION:	4 MESES 18 DIAS
PLAZO EJECUCION PRORROGA N°1:	DOS (2) MESES
FECHA FINAL SEGÚN PRORROGA N°1:	28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA 2 – ADICION 1:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA FINAL SEGÚN PRORROGA 2 – ADICION 1:	13 DE JUNIO DE 2026

COBERTURAS	POLIZA N°	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios, labores y operaciones	11-40-101080847	$284.700.000	23/07/2025	30/12/2025
Vehículos propios y no propios	11-40-101080847	$284.700.000	25/07/2025	30/12/2025
Contratista y Subcontratista	11-40-101080847	$284.700.000	25/07/2025	30/12/2025
Cumplimiento del Contrato	11-44-101260650	$122.762.300	23/07/2025	30/04/2026
Buen Manejo Anticipo y correcta inversión del anticipo	11-44-101260650	$613.811.504	23/07/2025	30/04/2025
Pago de salario y Prestaciones Sociales, legales e indemnizaciones laborales	11-44-101260650	$61.381.150	23/07/2025	30/12/2028
Cumplimiento del Contrato	11-44-101260650	$122.762.300	13/08/2025	21/05/2026
Buen Manejo Anticipo y correcta inversión del anticipo	11-44-101260650	$613.811.504	13/08/2025	21/05/2026
Pago de salario y Prestaciones Sociales, legales e indemnizaciones laborales	11-44-101260650	$61.381.150	13/08/2025	20/01/2029
Predios, labores y operaciones	11-40-101080847	$284.700.000	13/08/2025	20/01/2026
Vehículos propios y no propios	11-40-101080847	$284.700.000	15/08/2025	20/01/2026
Contratista y Subcontratista	11-40-101080847	$284.700.000	15/08/2025	20/01/2026
Cumplimiento del Contrato	11-44-101260650	$122.762.300	13/08/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo y correcta inversión del anticipo	11-44-101260650	$613.811.504	13/08/2025	30/06/2026
Pago de salario y Prestaciones Sociales, legales e indemnizaciones laborales	11-44-101260650	$61.381.150	13/08/2025	01/03/2029
Predios, labores y operaciones	11-40-101080847	$284.700.000	13/08/2025	20/01/2026
Vehículos propios y no propios	11-40-101080847	$284.700.000	15/08/2025	20/01/2026

Contratista y Subcontratista	11-40-101080847	$284.700.000	15/08/2025	20/01/2026
Predios, labores y operaciones	11-40-101080847	$350.181.000	13/08/2025	01/03/2026
Vehículos propios y no propios	11-40-101080847	$350.181.000	15/08/2025	01/03/2026
Contratista y Subcontratista	11-40-101080847	$350.181.000	15/08/2025	01/03/2026

2.- INFORMACIÓN DEL CONVENIO

El proyecto tiene como objetivo realizar EL MANTENIMIENTO DE OCHENTA Y DOS (82) km DE VIAS RURALES POR MEDIO DE LA CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE (Incluye Adecuación de Vía, Excavaciones, Rellenos y Compactaciones) y novecientas (900) horas en INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS ORIGINADOS POR EVENTOS NATURALES MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA

Se busca hacer frente de manera oportuna al presente deterioro de la red terciaria que se presenten a lo largo del Departamento del Cesar garantizando la transitabilidad o restableciéndola en el menor tiempo posible en el caso de ser suspendida totalmente las vías a intervenir.

De acuerdo con la solicitud enviada a la Secretaría de Infraestructura del Departamento con fecha 04 de febrero de 2026, se requirió la prórroga del plazo y la adición de recursos al proyecto. En atención a dicha solicitud, las partes interesadas acordaron mediante la Prórroga N.º 2, de fecha 24 de febrero de 2026, adicionar recursos y ampliar el plazo de ejecución por un término de tres (3) meses y quince (15) días, contados a partir del vencimiento del plazo inicial establecido en la Prórroga N.º 1.

De acuerdo con la adición realizada al Convenio, se estableció la incorporación de cuarenta y un (41) kilómetros adicionales a la cantidad inicial del proyecto dedicadas para el MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES POR MEDIO DE LA CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE (Incluye Adecuación de Vía, Excavaciones, Rellenos y Compactaciones) y cuatrocientos cincuenta (450) horas en INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS ORIGINADOS POR EVENTOS NATURALES MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA.

3. - AVANCE DEL CONVENIO

Se llevaron a cabo actividades de mantenimiento y mejoramiento de la red vial rural, en el Corregimiento de Arjona y Municipio de Astrea Cesar; enfocadas en el mantenimiento de vías rurales por medio de la conformación y mejoramiento de calzada existente y la intervención de puntos críticos originados por eventos naturales mediante la operación del banco de maquinaria, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de transitabilidad y prevenir el deterioro progresivo, como se describe en la siguiente tabla.

MUNICIPIO	VIAS	KM INTERVENIDOS	HORAS INTERVENIDAS
ASTREA	Corregimiento de Arjona, veredas de Astrea	12	80
TOTAL		**12**	**80**

4. BALANCE GENERAL

A continuación, se adjunta un cuadro que presenta el balance general de las actividades ejecutadas hasta el periodo del presente informe. Dichas actividades comprenden la conformación y el mejoramiento de la calzada existente —incluyendo adecuación de la vía, excavaciones, rellenos y compactaciones—, así como la intervención de puntos críticos. Toda esta información se consolida en el cuadro presentado a continuación.

MUNICIPIO	VEREDA	EQUIPOS UTILIZADOS	KM INTERVENIDOS	HORAS INTERVENIDAS
EL COPEY	LA HUELGA	BANCO COMPLETO	3	-
	GARUPAL BAJO		7	-
	EL REPOSO		2	-
	TIERRA NUEVA		5	-
	SANTA RITA	VOLQUETA	-	100
	PIEDRAS BLANCAS	BANCO COMPLETO	6	
	DENTRO DE RIOS	VOLQUETA		100
CODAZZI	FERNAMBUCO MEDIO Y FERNAMBUCO ALTO	BULLDOCER	3	-
	SENA	VOLQUETA		60
VALLEDUPAR	TROCHA LIMITE GUAJIRA - BADILLO	BANCO COMPLETO	4,5	-
	LAS RAICES - ESGUARRULES		5	
	VERACRUZ	PAJARITA	-	30
	BADILLO LA VICTORIA	BANCO COMPLETO	9	
	LOS ESGUARRULES - RIO CESAR		4	
	EL CIELO		1	
	AGUAS BLANCAS		1,5	
	LOS CALABAZOS		1,5	
	LAS CASITAS		2,5	
	LA GUITARRA		10	
SAN DIEGO	LAS MERCEDES	BANCO COMPLETO	3	
	CANDELARIA		2	
	SIERRITA BAJA		2	
	NUEVO MEXICO		3	
GAMARRA	VEREDA EL SILENCIO	BANCO COMPLETO	7	-
PUEBLO BELLO	BERLIN 1	BULLDOCER		83
	BERLIN 2			109
	SANTA TIRSA			107

	MAYACAN			26
	LOS PALMITOS			150
LA PAZ	LA CABAÑA			100,5
LA GLORIA	CAÑO ALONSO	VOLQUETA (2)		120
	CAÑO ALONSO	RETRO EXCAVADORA		51
TOTAL			**82**	**1036,5**


4.1 EJECUTADO SEGÚN ADICION

MUNICIPIO	VEREDA	KM INTERVENIDOS	HORAS INTERVENIDAS
ASTREA	CORREGIMIENTO DE ARJONA, VEREDAS DE ASTREA	12	80
TOTAL		**12**	**80**

- **REGISTRO FOTOGRAFICO**
  MUNICIPIO: ASTREA

ANTES DE LA INTERVENCION



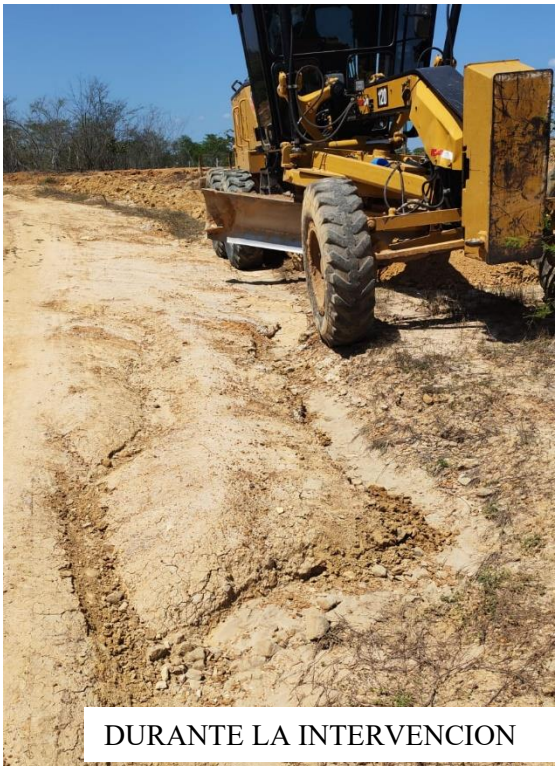



DURANTE LA INTERVENCION

DESPUES DE LA INTERVENCION





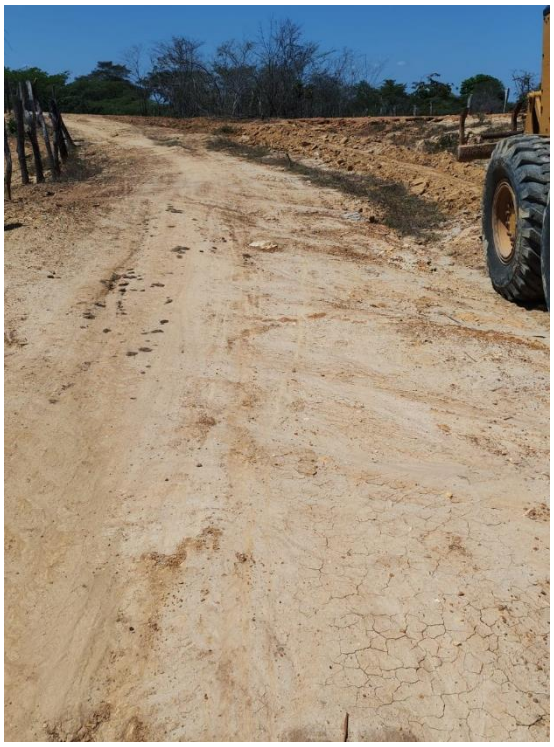

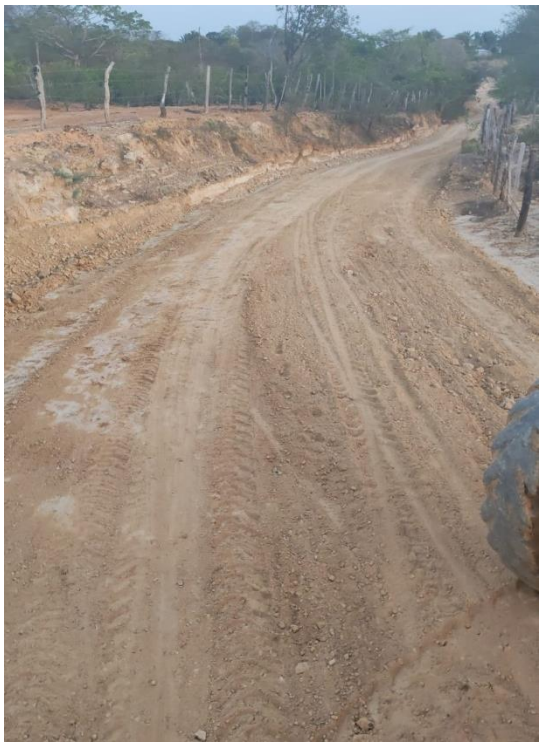

Calle 65 N°18G-49 Avenida Aeropuerto
E-mail: maquinariacdtcesar@gmail.com

5. APOYO TECNICO-OPERATIVO PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO VIAL

❖ **EQUIPO**: VOLQUETA JLO 183

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- Reconstrucción de puerta trasera


REGISTRO FOTOGRAFICO



- **EQUIPO**: BULLDOCER #55
  SERIAL OWT307227

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Cambio de aceite y filtros de combustible y aceite
- Cambio de manguera hidráulica

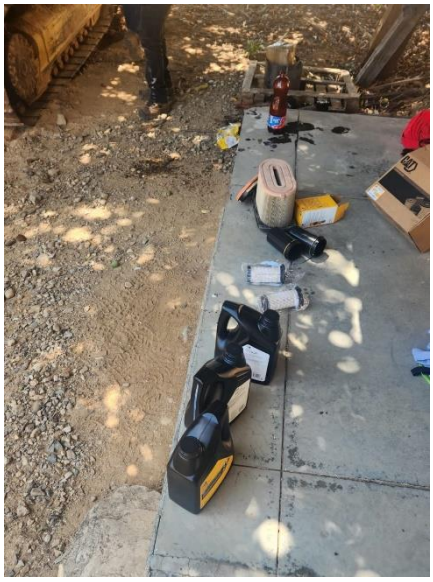REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
	

- **EQUIPO**: MOTONIVELADORA #58
  SERIAL E9200122

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Mantenimiento cambio de aceite y filtros

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	










Calle 65 N°18G-49 Avenida Aeropuerto
E-mail: maquinariacdtcesar@gmail.com

❖ **EQUIPO**: VIBRO COMPACTADOR #67
SERIAL: ORGE00259

MANTENIMIENTO PREVENTIVO


- Cambio de aceite y filtros

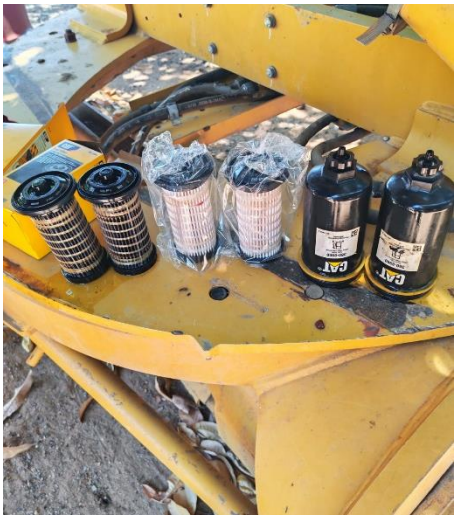REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

❖ **EQUIPO**: RETRO CARGADOR #60
SERIAL: FLEBS02102

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Cambio de aceites y filtros

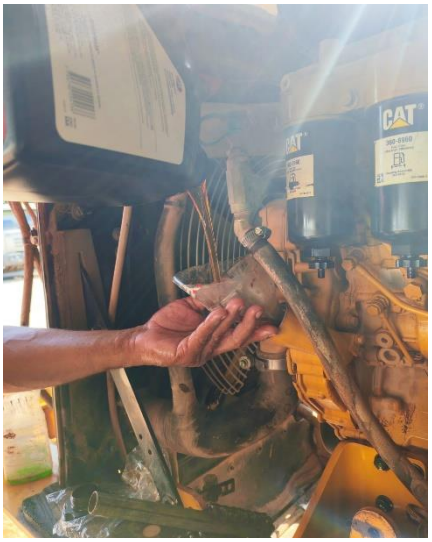REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

6. INFORME FINANCIERO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

PRESUPUESTO									EJECUTADO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026		
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD INICIAL**	**ADICION**	**CANTIDAD FINAL**	**UND/MES**	**VALOR UNITARIO**	**FM**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**MES**	**VALOR**
								$ 440.509.244			**$126.246.608**
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES POR MEDIO DE LA CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE (Incluye Adecuación de Via, Excavaciones, Rellenos y Compactaciones)	KM	82	41	123		$ 9.653.884		$ 395.809.244	12		$115.846.608
INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS ORIGINADOS POR EVENTOS NATURALES MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA	HR	900	450	1350				**$ 44.700.000**			**$ 10.400.000**
MOTONIVELADORA	HR	100	80	180		$ 130.000		$ 10.400.000	80		$ 10.400.000
VIBROCOM DINAPAC CA 15	HR	100	30	130		$ 80.000		$ 2.400.000			$ 0
PAJARITA	HR	200	60	260		$ 105.000		$ 6.300.000			$ 0
VOLQUETA 15M3	HR	100	80	180		$ 90.000		$ 7.200.000			$ 0
RETROEXCAVADORA	HR	200	80	280		$ 110.000		$ 8.800.000			$ 0
BULLDOZER	HR	200	120	320		$ 80.000		$ 9.600.000			$ 0
								$ 171.438.448			
PERSONAL ADMINISTRATIVO								**$ 74.341.115**			**$ 21.240.319**
ASISTENTE BANCO MAQUINARIA	MES	6,5	3,5	10	1	$ 2.010.450	1,99	$ 14.002.784			$ 4.000.796
CORDINADOR DE MANTENIMIENTO	MES	6,5	3,5	10	1	$ 3.163.077	1,99	$ 22.030.831			$ 6.294.523
COORDINADOR MAQUINARIA	MES	6,5	3,5	10	1	$ 5.500.000	1,99	$ 38.307.500			$ 10.945.000
GASTOS GENERALES								$ 97.097.333			**$ 27.742.095**
APOYO TECNICO-OPERATIVO PARA EQUIPOS DE MANTENIMIENTO VIAL	MES	6,5	3,5	10	1	$ 15.770.095		$ 55.195.333			$ 15.770.095
ALQUILER DE VEHICULO 4X4 DE MAS DE 2000CC (Incluye peajes y Combustible)	MES	6,5	3,5	10	1	$ 11.972.000		$ 41.902.000			$ 11.972.000
VERIFICACION DEL ESTADO OPERATIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA (MAQUINARIA DISPONIBLE)	UND	1						$ 0			
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE VEHICULOS DE TRASNPORTE PESADO	UND	1						$ 0			
								$ 611.947.692			**$ 48.982.414**

Nota: Nota: Se cobra el componente de operación (avance componente de operación), administración y gastos generales.

7. BALANCE FINANCIERO

ITEM	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2025030085		ADMON	OPERACIÓN	ESTADO
1	DESEMBOLSO	COMPONENTE DE OPERACION 50%	-	$440.309.244	PAGADO
2	DESEMBOLSO	COMPONENTE DE ADMINISTRATIVO DEL 13 AL 31 DE AGOSTO/2025	$29.389.448		PAGADO
3	DESEMBOLSO	COMPONENTE DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2025	$77.601.244		PAGADO
		COMPONENTE DE OPERACIÓN 36.5 KM EJECUTADOS Y 130 HRS INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS	-	$364.516.766	
4	DESEMBOLSO	COMPONENTE DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE/2025	$48.982.414		PAGADO
5	DESEMBOLSO	COMPONENTE DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE/2025	$48.982.414		PAGADO
6	DESEMBOLSO	COMPONENTE DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE/2025	$48.982.414		PAGADO
7	DESEMBOLSO	COMPONENTE DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO/2026	$48.982.414		PAGADO
		COMPONENTE DE OPERACIÓN 4.5 KM EJECUTADOS		$ 43.442.478	
8	DESEMBOLSO	COMPONENTE DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO/2026	$44.084.172		PAGADO
		COMPONENTE DE OPERACIÓN COMPONENTE DE OPERACIÓN EJECUTADOS Y 385,25 HRS INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS		$ 32.350.000	
9	DESEMBOLSO	COMPONENTE DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO/2026	$48.982.414		POR PAGAR
		COMPONENTE DE OPERACIÓN 12 KM EJECUTADOS Y 80 HRS INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS		$126.246.608	

JOSE EMILIO OSORIO ROCHA
Director Ejecutivo
