

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
1	**1**	**DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES, EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y LOS DISEÑOS TÉCNICOS DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA**	**197 días**	**jue 25/12/25**	**vie 25/09/26**	**$ 9.000.000.000,00**
2	**1.1**	**PRELIMINARES**	**11 días**	**jue 25/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 91.594.451,97**
3	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 0,00
4	1.1.2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	2 días	jue 25/12/25	vie 26/12/25	$ 0,00
5	1.1.3	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	2 días	lun 29/12/25	mar 30/12/25	$ 0,00
6	1.1.4	CAMPAMENTO 18 M2	1 día	mié 31/12/25	mié 31/12/25	$ 0,00
7	1.1.5	RED HIDRÁULICA PROVISIONAL	2 días	lun 29/12/25	mar 30/12/25	$ 0,00
8	1.1.6	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	10 días	sáb 27/12/25	jue 8/01/26	$ 0,00
9	**1.2**	**CIMENTACION**	**106 días**	**vie 9/01/26**	**vie 5/06/26**	**$ 816.548.319,88**
10	**1.2.1**	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**26 días**	**vie 9/01/26**	**vie 13/02/26**	**$ 0,00**
11	**1.2.1.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**26 días**	**vie 9/01/26**	**vie 13/02/26**	**$ 0,00**
12	1.2.1.1.1	"EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE	15 días	vie 9/01/26	jue 29/01/26	$ 0,00
13	1.2.1.1.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A	15 días	vie 9/01/26	jue 29/01/26	$ 0,00
14	1.2.1.1.3	RELLENO MATERIAL GRANULAR PARA TIERRA	7 días	jue 5/02/26	vie 13/02/26	$ 0,00
15	1.2.1.1.4	"RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	4 días	vie 30/01/26	mié 4/02/26	$ 0,00
16	**1.2.2**	**CONCRETOS**	**77 días**	**mié 18/02/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0,00**
17	1.2.2.1	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	10 días	mié 18/02/26	mar 3/03/26	$ 0,00
18	1.2.2.2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	12 días	mié 11/03/26	jue 26/03/26	$ 0,00
19	1.2.2.3	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	12 días	mié 11/03/26	jue 26/03/26	$ 0,00
20	1.2.2.4	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	6 días	jue 28/05/26	vie 5/06/26	$ 0,00
21	**1.2.3**	**ACERO DE REFUERZO**	**63 días**	**mié 11/03/26**	**vie 5/06/26**	**$ 0,00**
22	1.2.3.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	63 días	mié 11/03/26	vie 5/06/26	$ 0,00

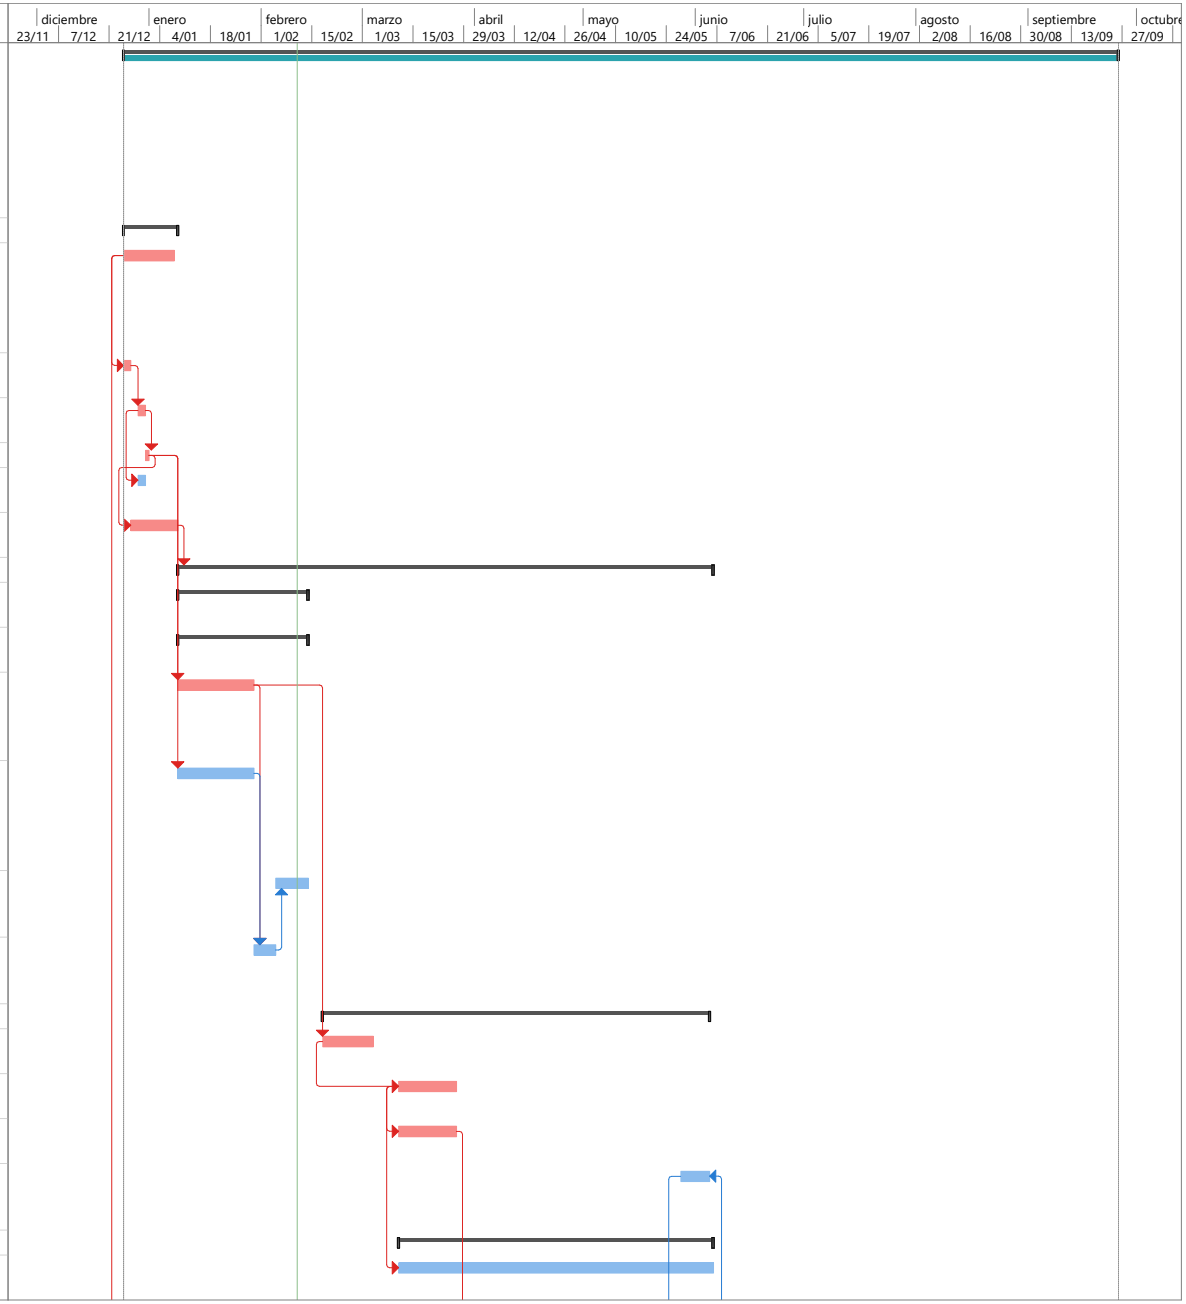

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
23	1.2.3.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	7 días	jue 28/05/26	vie 5/06/26	$ 0,00
24	**1.3**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**99 días**	**lun 2/02/26**	**jue 18/06/26**	**$ 917.199.361,40**
25	**1.3.1**	**CONCRETO**	**96 días**	**lun 2/02/26**	**lun 15/06/26**	**$ 0,00**
26	1.3.1.1	COLUMNAS 4000 PSI	38 días	vie 27/03/26	mar 19/05/26	$ 0,00
27	1.3.1.2	VIGA AÉREA 3500 PSI	15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26	$ 0,00
28	1.3.1.3	PLACA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN DISEÑO E=0,40 M PARA ENTREPISOS Y CUBIERTAS (INC. VIGAS Y	24 días	lun 2/02/26	mar 9/06/26	$ 0,00
29	1.3.1.4	PLACA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN DISEÑO E=0,60 M PARA ENTREPISOS Y CUBIERTAS (INC. VIGAS Y	20 días	vie 8/05/26	jue 4/06/26	$ 0,00
30	1.3.1.5	ESCALERAS DE CONCRETO 3000PSI DE PLANTA	7 días	vie 5/06/26	lun 15/06/26	$ 0,00
31	1.3.1.6	CONCRETO 4000 PSI	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26	$ 0,00
32	**1.3.2**	**ACERO DE REFUERZO**	**63 días**	**mar 24/03/26**	**jue 18/06/26**	**$ 0,00**
33	1.3.2.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	63 días	mar 24/03/26	jue 18/06/26	$ 0,00
34	1.3.2.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	23 días	vie 8/05/26	mar 9/06/26	$ 0,00
35	**1.4**	**MAMPOSTERIA**	**48 días**	**vie 5/06/26**	**mar 11/08/26**	**$ 292.168.343,18**
36	1.4.1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	16 días	vie 5/06/26	vie 26/06/26	$ 0,00
37	1.4.2	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	14 días	vie 5/06/26	mié 24/06/26	$ 0,00
38	1.4.3	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M	8 días	vie 5/06/26	mar 16/06/26	$ 0,00
39	1.4.4	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.15 M	7 días	mié 17/06/26	jue 25/06/26	$ 0,00
40	1.4.5	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	3 días	vie 19/06/26	mar 23/06/26	$ 0,00
41	1.4.6	COLUMNETAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 0.12*0.25 EN CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA (INC. ACERO DE REFUERZO)	15 días	mié 17/06/26	mar 7/07/26	$ 0,00
42	1.4.7	CINTAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 0.12*0.25 EN CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA (INC. ACERO DE REFUERZO)	15 días	mié 24/06/26	mar 14/07/26	$ 0,00
43	1.4.8	DINTELES EN CONCRETO DE 0,12*0,25 EN CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA (INC. ACERO DE REFUERZO)	15 días	mié 24/06/26	mar 14/07/26	$ 0,00

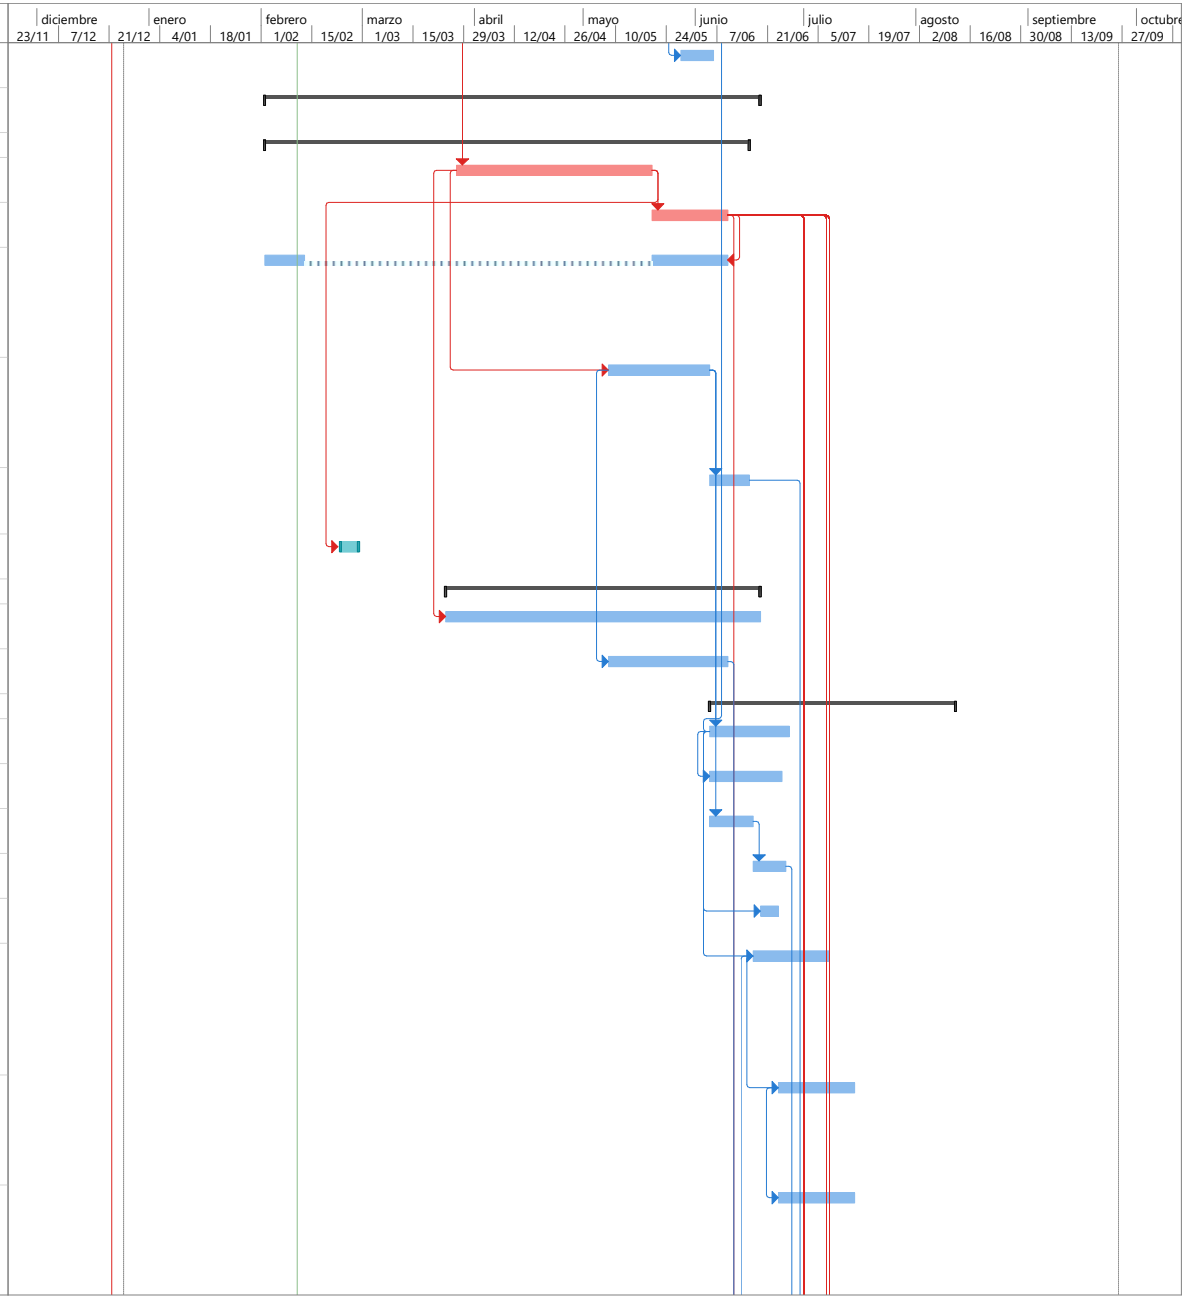

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
44	1.4.9	ANCLAJE 1/2" L=50CM	15 días	mié 17/06/26	mar 7/07/26	$ 0,00
45	1.4.10	ANCLAJE DE MANTENIMIENTO	5 días	mié 5/08/26	mar 11/08/26	$ 0,00
46	**1.5**	**PAÑETES-REVOQUES-RE**	**32 días**	**vie 26/06/26**	**lun 10/08/26**	**$ 255.108.674,99**
47	1.5.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	10 días	vie 26/06/26	jue 9/07/26	$ 0,00
48	1.5.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	10 días	vie 26/06/26	jue 9/07/26	$ 0,00
49	1.5.3	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	5 días	mar 30/06/26	lun 6/07/26	$ 0,00
50	1.5.4	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	5 días	mar 30/06/26	lun 6/07/26	$ 0,00
51	1.5.5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E= 1.5 CM	8 días	vie 3/07/26	mar 14/07/26	$ 0,00
52	1.5.6	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1;3, E= 15 CM (LINEAL)	8 días	vie 3/07/26	mar 14/07/26	$ 0,00
53	1.5.7	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	9 días	mié 29/07/26	lun 10/08/26	$ 0,00
54	**1.6**	**CUBIERTAS**	**40 días**	**mié 10/06/26**	**mar 4/08/26**	**$ 414.437.792,79**
55	1.6.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	20 días	mié 8/07/26	mar 4/08/26	$ 0,00
56	1.6.2	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES	20 días	mié 8/07/26	mar 4/08/26	$ 0,00
57	1.6.3	TEJA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL A360	2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26	$ 0,00
58	1.6.4	ESTRUCTURA DE CUBIERTA (INC. PINTURA	20 días	mié 10/06/26	mar 7/07/26	$ 0,00
59	**1.7**	**CIELOS RASOS**	**31 días**	**vie 24/07/26**	**vie 4/09/26**	**$ 148.122.174,48**
60	1.7.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	29 días	vie 24/07/26	mié 2/09/26	$ 0,00
61	1.7.2	CIELO RASO EN FIBROCEMENTO 10MM. ATORNILLADO JUNTA INVISIBLE + EST. EN PERFILERIA GALVANIZADA CAL 26 INC ESMALTE	17 días	vie 7/08/26	lun 31/08/26	$ 0,00
62	1.7.3	CIELO RASO DURACUSTIC	15 días	vie 7/08/26	jue 27/08/26	$ 0,00
63	1.7.4	TAPA DE INSPECCIÓN GYPLAC O SIMILAR DIM=60X60 CM PARA CIELO RASO	4 días	mar 1/09/26	vie 4/09/26	$ 0,00
64	**1.8**	**PISOS - BASES**	**24 días**	**jue 20/08/26**	**mar 22/09/26**	**$ 74.113.590,32**
65	1.8.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	24 días	jue 20/08/26	mar 22/09/26	$ 0,00
66	1.8.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	7 días	jue 3/09/26	vie 11/09/26	$ 0,00

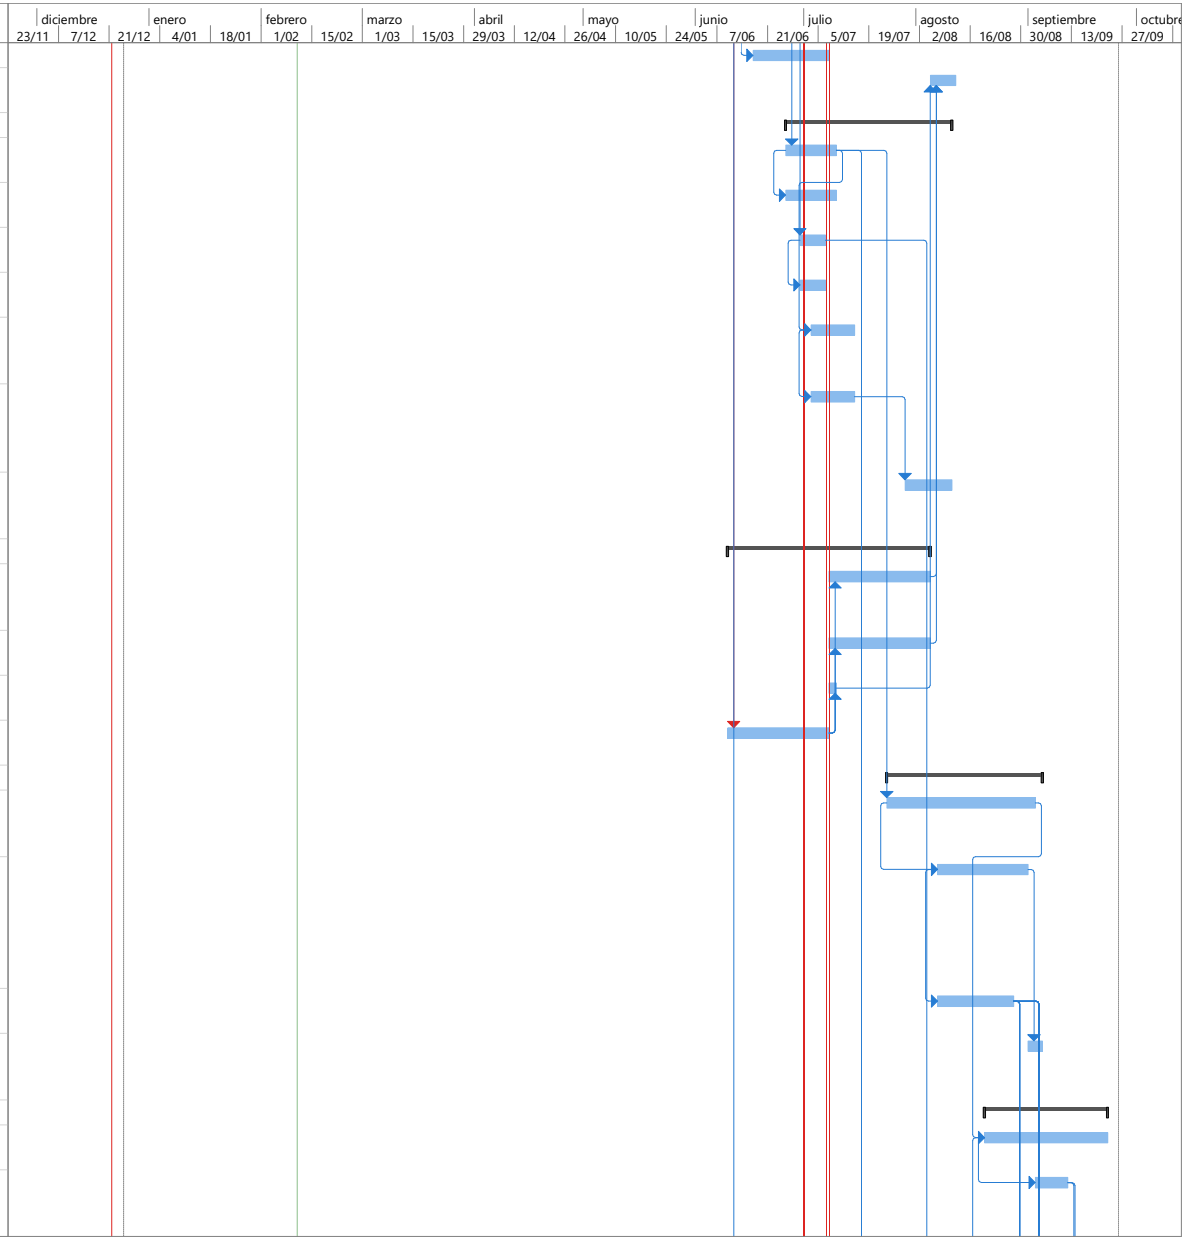

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
67	1.8.3	PISO EN CONCRETO DE 210 KG/M2 CON REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM H=7CM, PARA CUARTOS TÉCNICOS	5 días	mié 9/09/26	mar 15/09/26	$ 0,00
68	**1.9**	**PISOS - ACABADOS**	**37 días**	**mar 4/08/26**	**mié 23/09/26**	**$ 279.693.854,23**
69	1.9.1	SISTEMA DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 0,30X0,30 M	8 días	lun 14/09/26	mié 23/09/26	$ 0,00
70	1.9.2	CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0,60X0,60 M REF. CORONA O SIMILAR	10 días	jue 20/08/26	mié 2/09/26	$ 0,00
71	1.9.3	POYO EN CONCRETO BAJO MUEBLES DE H 8 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI (INC. ACERO DE REFUERZO)	6 días	jue 20/08/26	jue 27/08/26	$ 0,00
72	1.9.4	BOCAPUERTAS EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES PLASTICAS	12 días	jue 20/08/26	vie 4/09/26	$ 0,00
73	1.9.5	REVESTIMIENTO EN ALFOMBRA	8 días	mar 18/08/26	jue 27/08/26	$ 0,00
74	1.9.6	MEDIA CAÑA EN GRAN	10 días	mar 4/08/26	lun 17/08/26	$ 0,00
75	1.9.7	PASO ESCALERA GRANITO	10 días	mar 4/08/26	lun 17/08/26	$ 0,00
76	**1.10**	**CARPINTERÍA MADERA**	**11 días**	**mié 2/09/26**	**mié 16/09/26**	**$ 48.799.882,53**
77	1.10.1	PU-02 PUERTA EN MADERA DE APERTURA UNA HOJA, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18, REVESTIMIENTO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE BLANCO MATE, DOS LÁMINAS DE CEDRO, MARCO INTERNO PRENSADO, VETAS VERTICALES Y LACA NATURAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJA CROMADA, P	4 días	mié 2/09/26	lun 7/09/26	$ 0,00
78	1.10.2	PU-03 PUERTA EN MADERA DE APERTURA UNA HOJA, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18, REVESTIMIENTO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE BLANCO MATE, DOS LÁMINAS DE CEDRO, MARCO INTERNO PRENSADO, VETAS VERTICALES Y LACA NATURAL, REJILLA EN SECCIÓN	3 días	mar 8/09/26	jue 10/09/26	$ 0,00

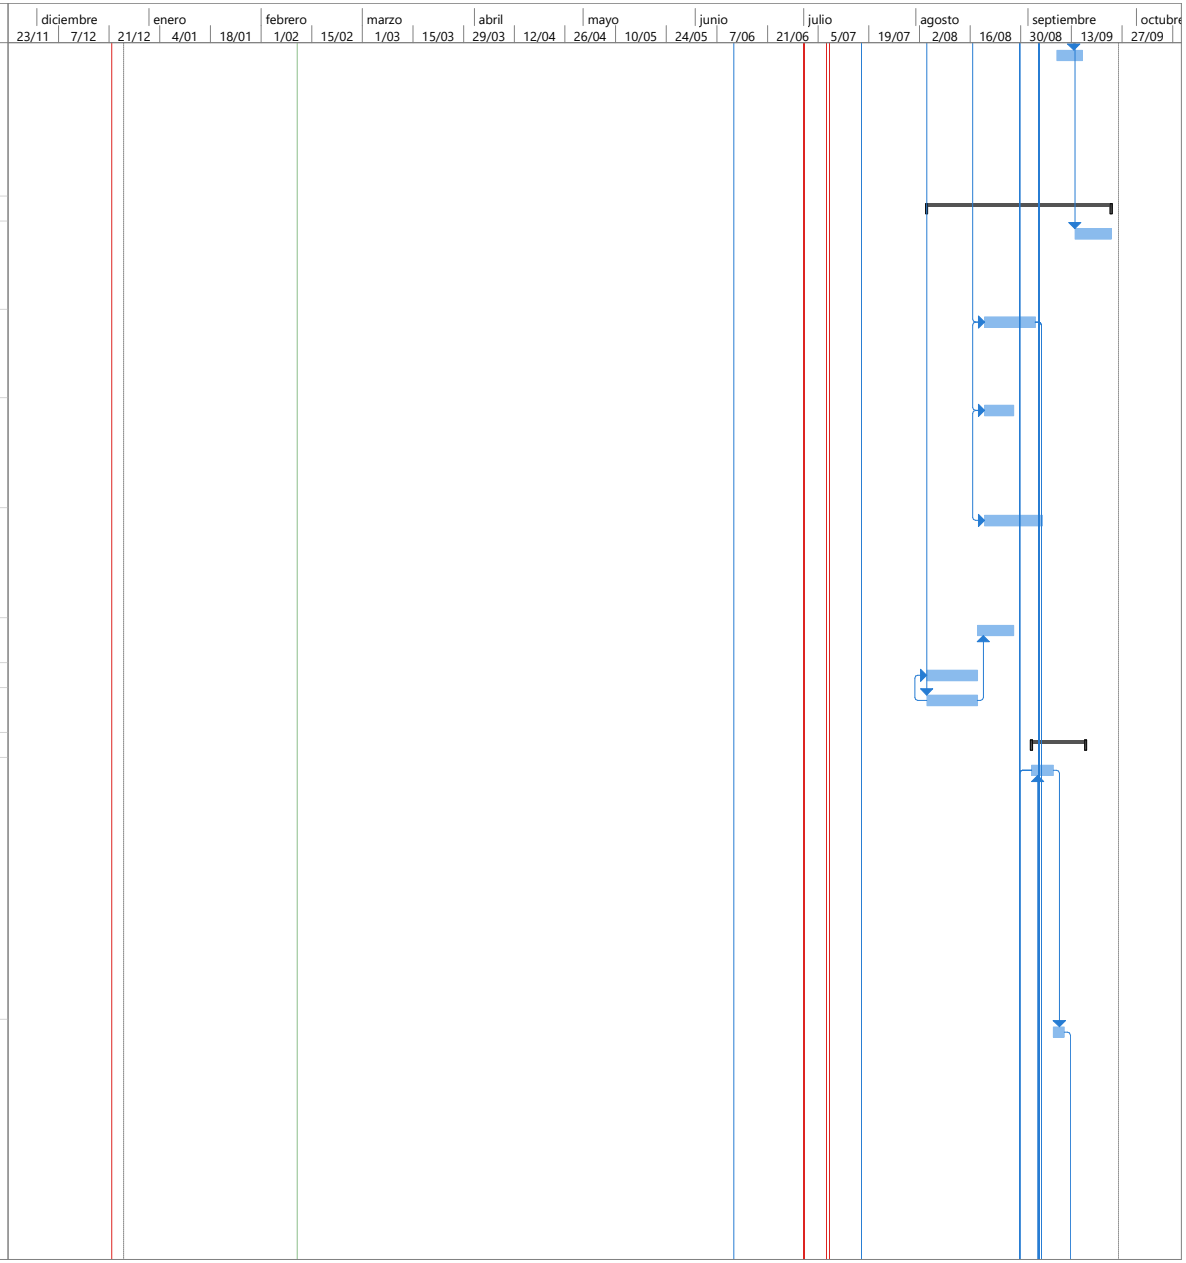

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
79	1.10.3	PU-05 PUERTA EN MADERA DE APERTURA UNA HOJA, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18, REVESTIMIENTO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE GRIS MATE, DOS LÁMINAS DE CEDRO, MARCO INTERNO PRENSADO Y REFUERZO INTERMEDIO, REVESTIMIENTO A	3 días	vie 11/09/26	mar 15/09/26	$ 0,00
80	1.10.4	PU-06 PUERTA EN MADERA DE APERTURA DOS HOJAS BATIENTE, MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18, REVESTIMIENTO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE MATE, DOS LÁMINAS DE CEDRO, MARCO INTERNO PRENSADO Y REFUERZO INTERMEDIO, REVESTIMIENTO A	1 día	mié 16/09/26	mié 16/09/26	$ 0,00
81	**1.11**	**CARPINTERÍA METALICA Y VIDRIO**	**12 días**	**mié 2/09/26**	**jue 17/09/26**	**$ 190.823.775,59**
82	1.11.1	PU-01 PUERTA APERTURA DOBLE CON HOJAS DE VIDRIO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 10 MM, BISAGRA HIDRAULICA DINTEL Y SUELO PARA VIDRIO, HERRAJES Y MANIJA EN ACERO INOXIDABLE, CERRADURA DE SEGURIDAD DE LLAVE INTERNA Y EXTERNA COLOR PLATEADO, (INC.	3 días	mié 2/09/26	vie 4/09/26	$ 0,00
83	1.11.2	PU-04 PUERTA EN LÁMINA METÁLICA FIGURADA TIPO COLD ROLLED CALIBRE 18, SECCIONES SUPERIOR E INFERIOR APERSINADA CON MÓDULOS C.R. CAL 18, REVESTIMIENTO DE ALTURA COMPLETA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE COLOR	1 día	lun 7/09/26	lun 7/09/26	$ 0,00
84	1.11.3	PU-07 PUERTA CORREDERA CON HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 10 MM, SUJETO CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN DETALLE	2 días	mar 8/09/26	mié 9/09/26	$ 0,00

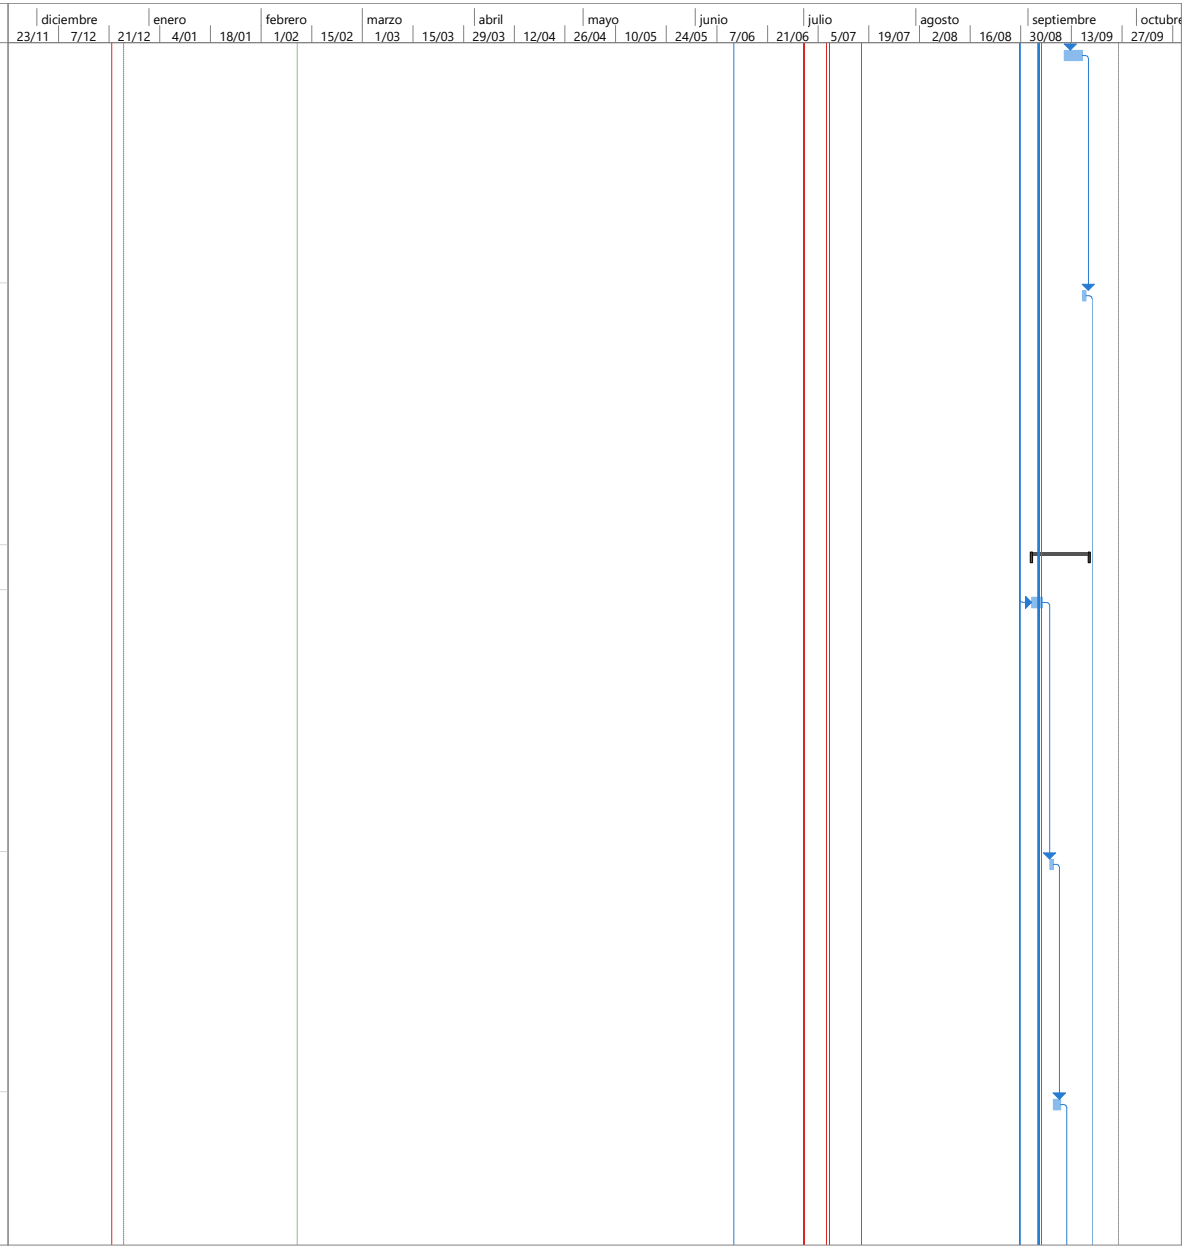

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
85	1.11.4	PU-08 PUERTA DOBLE A DOS HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 10MM, BISAGRA HIDRAULICA DINTEL Y SUELO PARA VIDRIO, CERRADURA DE SEGURIDAD, MANIJA EN ACETO INOXIDABLE, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, DIM=	1 día	jue 10/09/26	jue 10/09/26	$ 0,00
86	1.11.5	PU 09 PUERTA APERTURA DOBLE EN LÁMINA METÁLICA FIGURADA TIPO COLD ROLLED CALIBRE 18, SECCIONES SUPERIOR E INFERIOR APERSINADA CON MÓDULOS C.R. CAL 18, REVESTIMIENTO DE ALTURA COMPLETA EN ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO	1 día	vie 11/09/26	vie 11/09/26	$ 0,00
87	1.11.6	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	7 días	mié 9/09/26	jue 17/09/26	$ 0,00
88	1.11.7	ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTUTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE ANTICORROSIVO)	6 días	mié 2/09/26	mié 9/09/26	$ 0,00
89	1.11.8	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	10 días	mié 2/09/26	mar 15/09/26	$ 0,00
90	**1.12**	**ESTUCO Y PINTURA**	**46 días**	**vie 17/07/26**	**vie 18/09/26**	**$ 330.912.488,06**
91	1.12.1	PINTURA VINILO TIPO 2 MAS TRES MANOS VINILO TIPO 1	23 días	vie 17/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
92	1.12.2	ESMALTE	10 días	mié 19/08/26	mar 1/09/26	$ 0,00
93	1.12.3	PINTURA VINILO TIPO 2 MAS TRES MANOS DE PINTURA VINILO PARA EXTERIORES TIPO 1	13 días	mié 2/09/26	vie 18/09/26	$ 0,00
94	**1.13**	**APARATOS SANITARIOS-COCINA**	**15 días**	**jue 3/09/26**	**mié 23/09/26**	**$ 78.216.721,45**
95	1.13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	4 días	jue 3/09/26	mar 8/09/26	$ 0,00
96	1.13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	2 días	mié 9/09/26	jue 10/09/26	$ 0,00

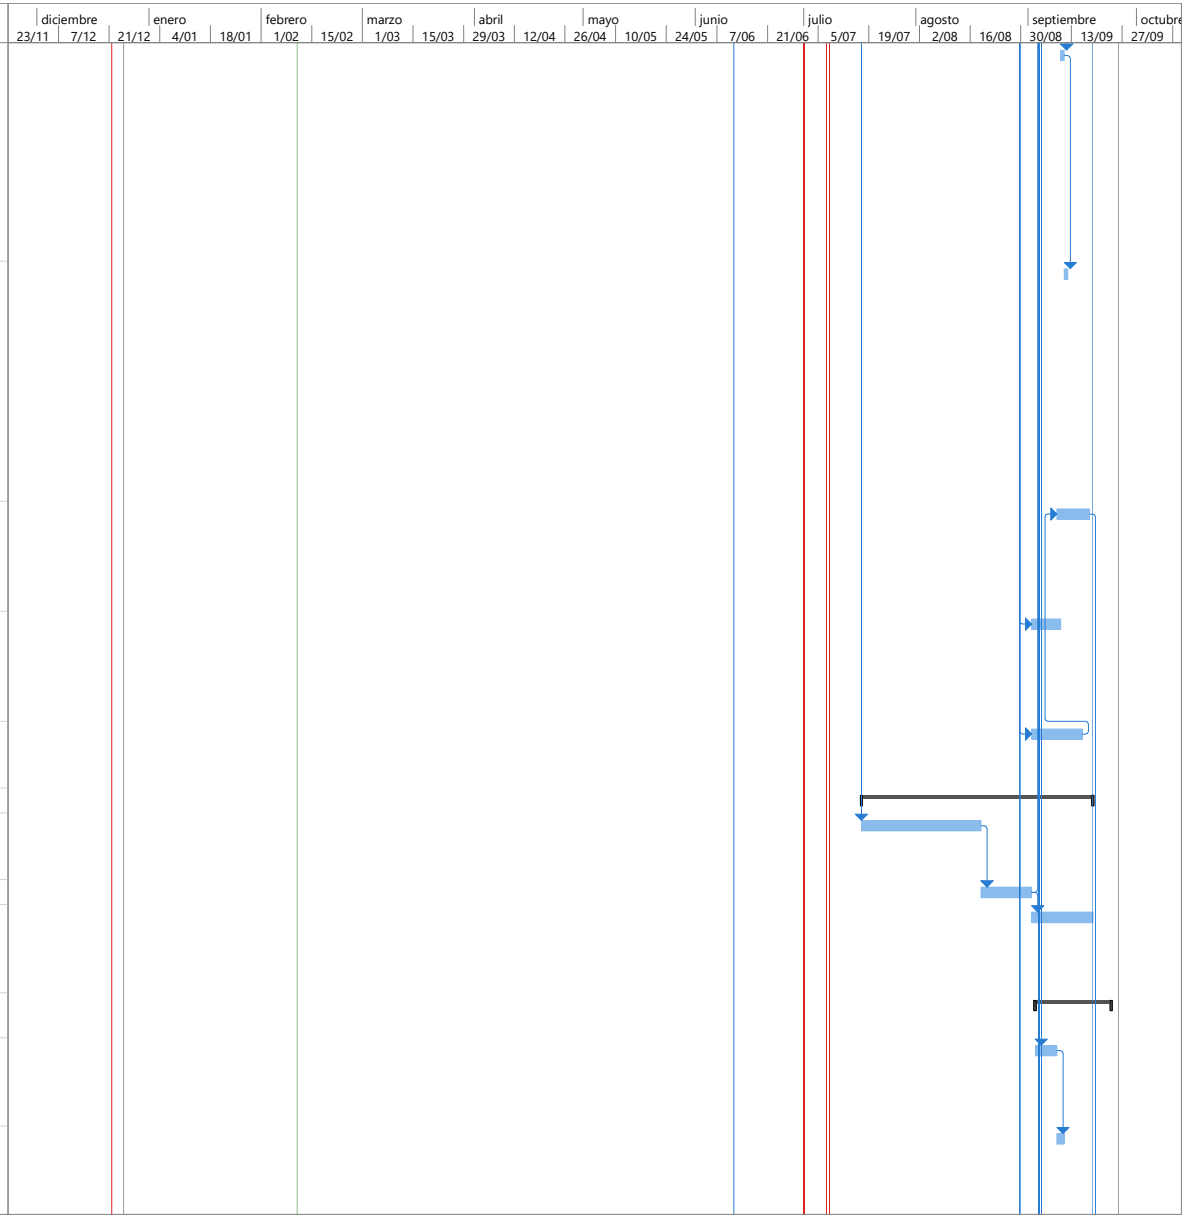

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
97	1.13.3	MESON EN GRANITO BLANCO, INCLUYE SALPICADERO 0,08, CANTOS REDONDEADOS Y BRILLADOS. INCLUYE INSTALACIÓN, GOTEROS,	2 días	jue 3/09/26	vie 4/09/26	$ 0,00
98	1.13.4	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 O SIMILAR, SISTEMA DE FIJACIÓN A MURO DIAMETRO 1 1/4, LONGITUD 24"	1 día	vie 18/09/26	vie 18/09/26	$ 0,00
99	1.13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	2 días	jue 3/09/26	vie 4/09/26	$ 0,00
100	1.13.6	PROTECTOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER	3 días	lun 21/09/26	mié 23/09/26	$ 0,00
101	1.13.7	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN LA PARED	3 días	lun 21/09/26	mié 23/09/26	$ 0,00
102	1.13.8	GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED	2 días	lun 21/09/26	mar 22/09/26	$ 0,00
103	**1.14**	**ESPEJOS Y VIDRIOS**	**2 días**	**jue 25/12/25**	**vie 26/12/25**	**$ 48.842.417,26**
104	1.14.1	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	2 días	jue 25/12/25	vie 26/12/25	$ 0,00
105	**1.15**	**URBANISMO**	**67 días**	**mié 10/06/26**	**jue 10/09/26**	**$ 741.733.061,23**
106	1.15.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	12 días	vie 21/08/26	lun 7/09/26	$ 0,00
107	1.15.2	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	12 días	vie 21/08/26	lun 7/09/26	$ 0,00
108	1.15.3	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	3 días	mar 4/08/26	jue 6/08/26	$ 0,00
109	1.15.4	PINTURA ACRÍLICA PARA PISOS	10 días	vie 7/08/26	jue 20/08/26	$ 0,00
110	1.15.5	PRADIZACIÓN EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	3 días	mar 8/09/26	jue 10/09/26	$ 0,00
111	1.15.6	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y	5 días	mar 4/08/26	lun 10/08/26	$ 0,00
112	1.15.7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR	15 días	mié 10/06/26	mar 30/06/26	$ 0,00
113	1.15.8	SUBBASE GRANULAR	4 días	lun 13/07/26	jue 16/07/26	$ 0,00
114	1.15.9	BASE GRANULAR	4 días	vie 17/07/26	mié 22/07/26	$ 0,00

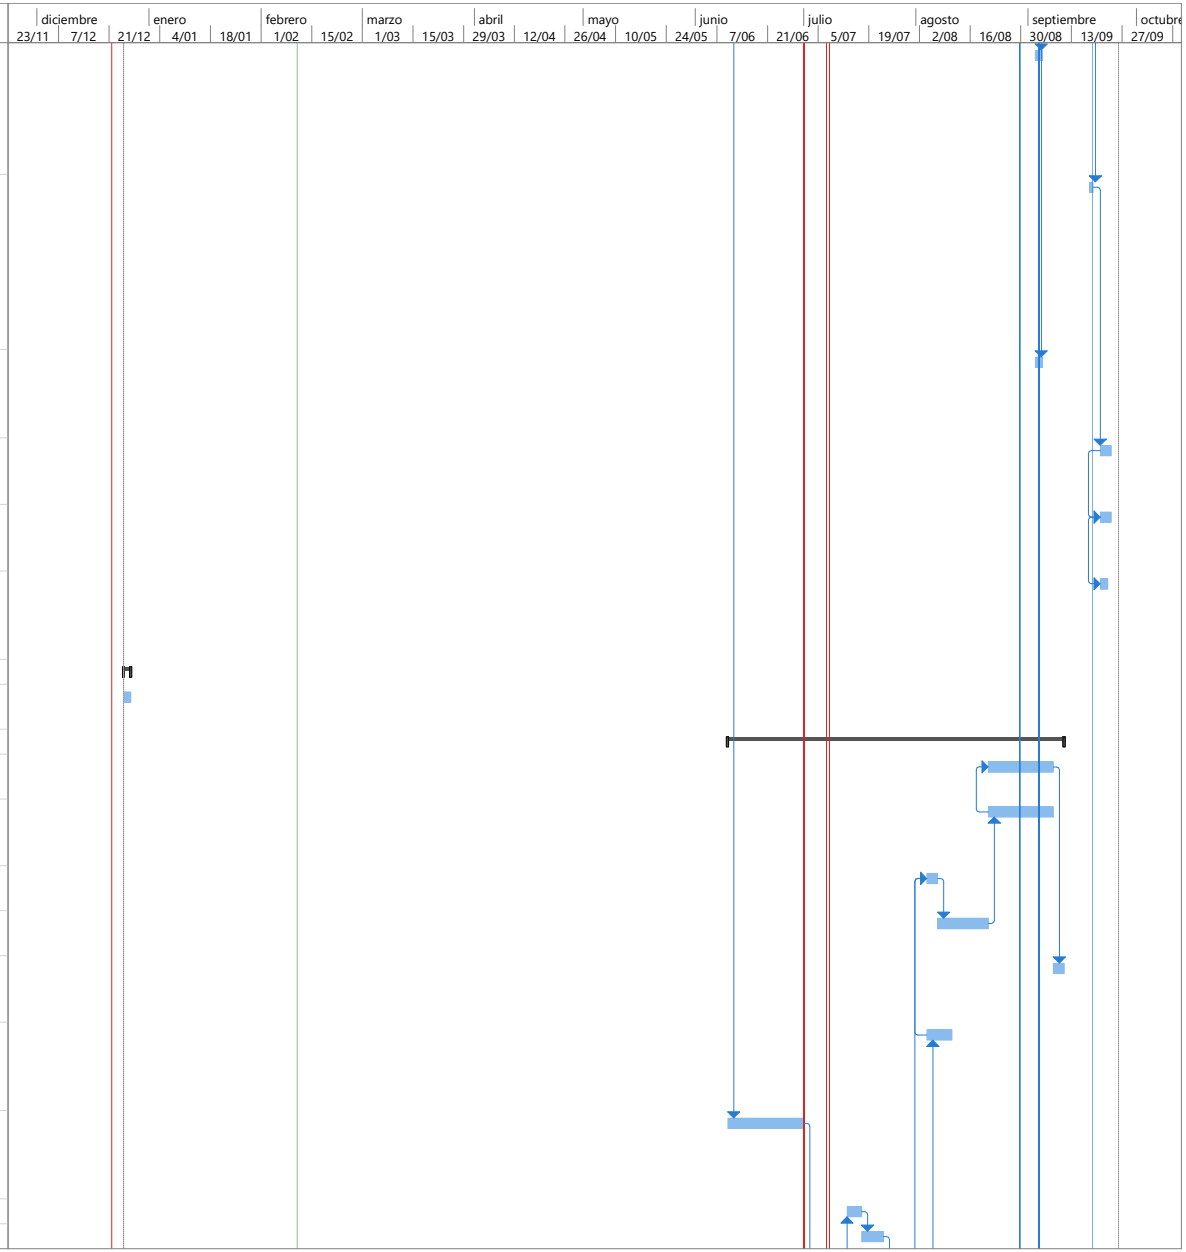

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
115	1.15.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	8 días	mié 1/07/26	vie 10/07/26	$ 0,00
116	1.15.11	SET DE 3 BANCOS + MESA COMEDOR CIRCULAR EN CONCRETO	1 día	mar 28/07/26	mar 28/07/26	$ 0,00
117	1.15.12	MATERA CIRCULAR EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO	1 día	jue 23/07/26	jue 23/07/26	$ 0,00
118	1.15.13	JARDINERA CURVA EN CONCRETO CON BANCA LATERAL	1 día	vie 24/07/26	vie 24/07/26	$ 0,00
119	1.15.14	GALERÍA SEMICIRCULAR EN BASTONES DE MADERA	4 días	mié 29/07/26	lun 3/08/26	$ 0,00
120	1.15.15	JARDINERA EN CONCRETO CON BANCA LATERAL	1 día	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0,00
121	1.15.16	CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA TIPO CR SECCIÓN CIRCULAR DE 4" REVESTIMIENTO DE ALTURA COMPLETA ANTICORROSIVO Y PINTURA DE	8 días	jue 13/08/26	lun 24/08/26	$ 0,00
122	1.15.17	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	7 días	mar 4/08/26	mié 12/08/26	$ 0,00
123	**1.16**	**OBRAS ELECTRICAS**	**75 días**	**mié 10/06/26**	**mar 22/09/26**	**$ 2.055.244.233...**
124	**1.16.1**	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, ALIMENTADORES Y CIRCUITOS RAMALES**	**60 días**	**mié 10/06/26**	**mar 1/09/26**	**$ 0,00**
137	**1.16.2**	**SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, GRUPO ELECTRÓGENO TABLEROS ELECTRICOS**	**60 días**	**mié 10/06/26**	**mar 1/09/26**	**$ 0,00**
138	1.16.2.1	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE CELDA ENTRADA SALIDA EN MT, INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA INSTALACIÓN.	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
139	1.16.2.2	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA INDIRECTA EN MT, INCLUYE MEDIDOR TRIFÁSICO BIDIRECCIONAL, 3 CT'S , SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA INSTALACIÓN.	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00

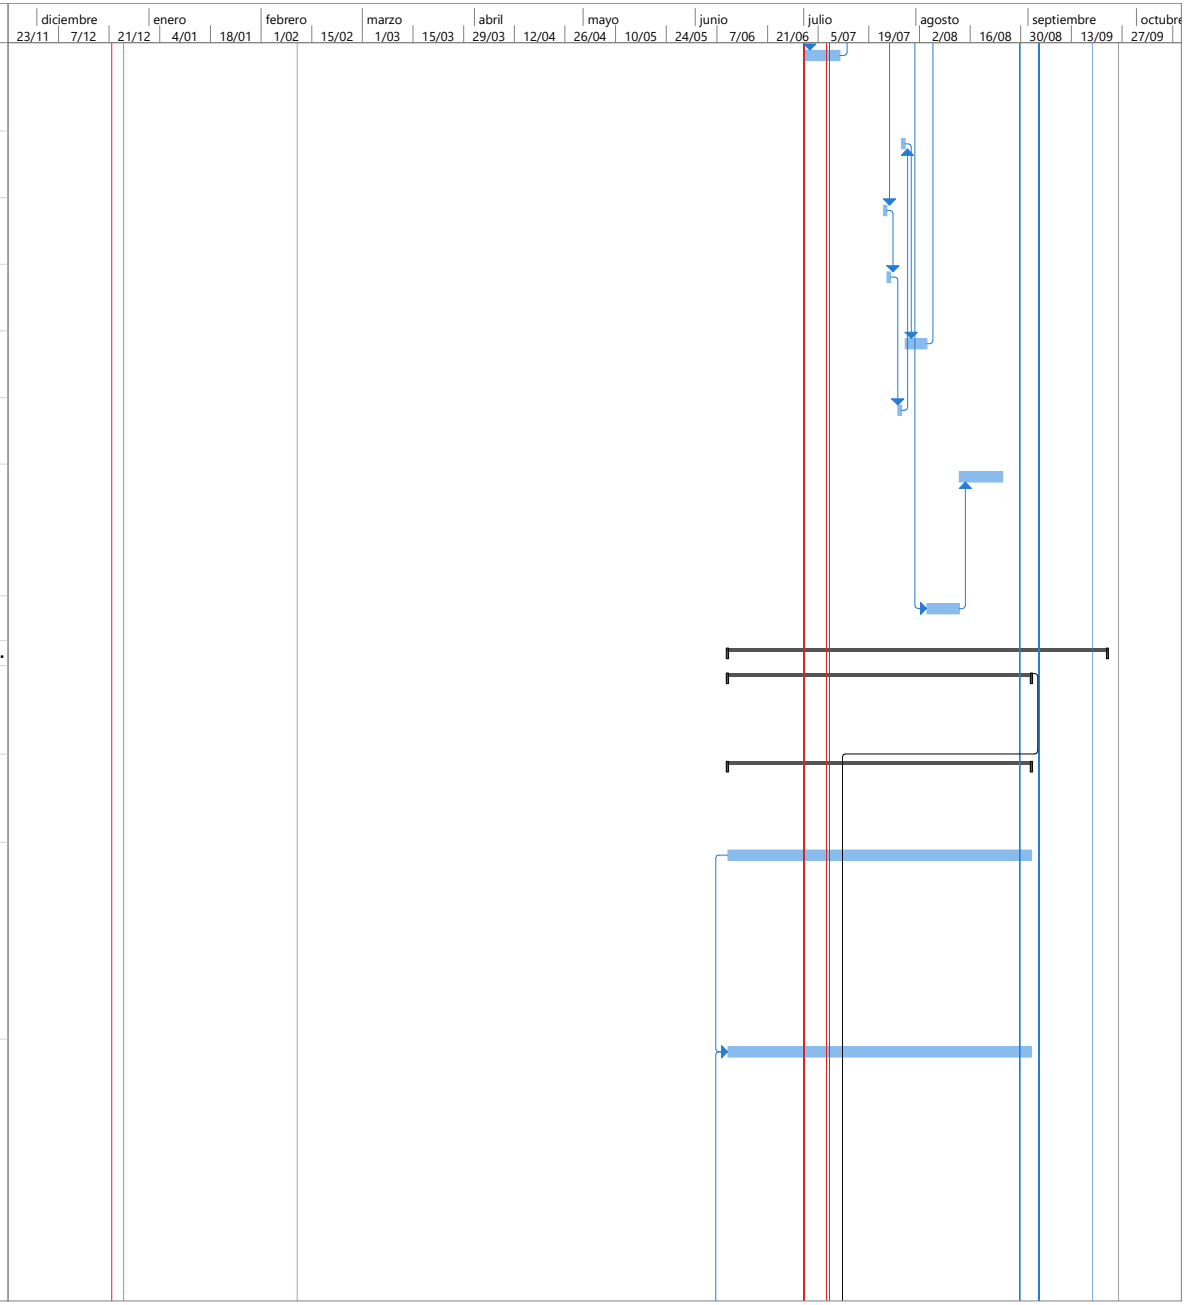

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
140	1.16.2.3	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN TIPO INTERRUPTOR SF6 EN MT, INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
141	1.16.2.4	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE CELDA DE TRANSFORMACIÓN EN MT Y TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112.5KVA, 13.2KV/220V/110V, 60 HZ, DYN5 TIPO SECO, INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA INSTALACIÓN.	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
142	1.16.2.5	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DIESEL 112.5KVA/112.5 KW EFECTIVOS 208V/120V 60HZ, TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA 8 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
143	1.16.2.6	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
144	1.16.2.7	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE COMPENSACIÓN DE REACTIVOS DE 10KVAR, INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
145	1.16.2.8	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 6KW, CINCO MINUTOS DE AUTONOMÍA, 208V 60HZ INCLUYE SOPORTES Y	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00

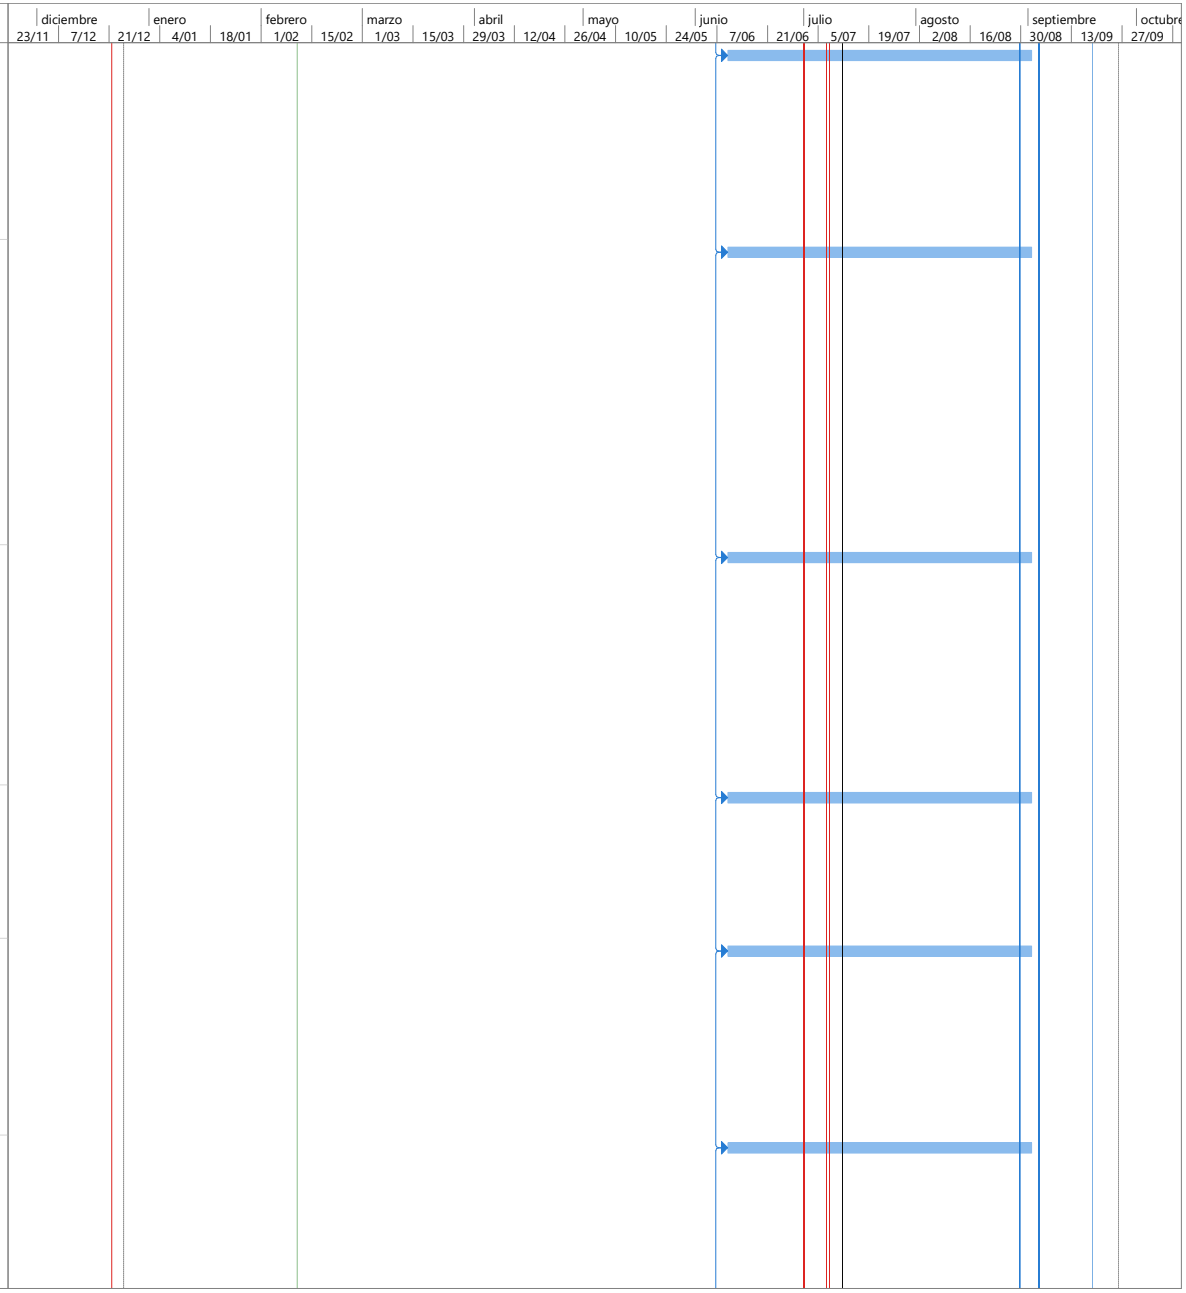

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
146	1.16.2.9	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 48 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR, INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
147	1.16.2.10	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR, INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
148	1.16.2.11	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR, INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA INSTALACIÓN.	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
149	1.16.2.12	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANFERENCIA, INCLUYE PROTECCIONES SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
150	**1.16.3**	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) Y SISTEMA DE DESCARGAS ELÉCTRICAS ATMOSFÉRICAS (SPA)**	**60 días**	**mié 10/06/26**	**mar 1/09/26**	**$ 0,00**
151	1.16.3.1	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 2/0 AWG	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00

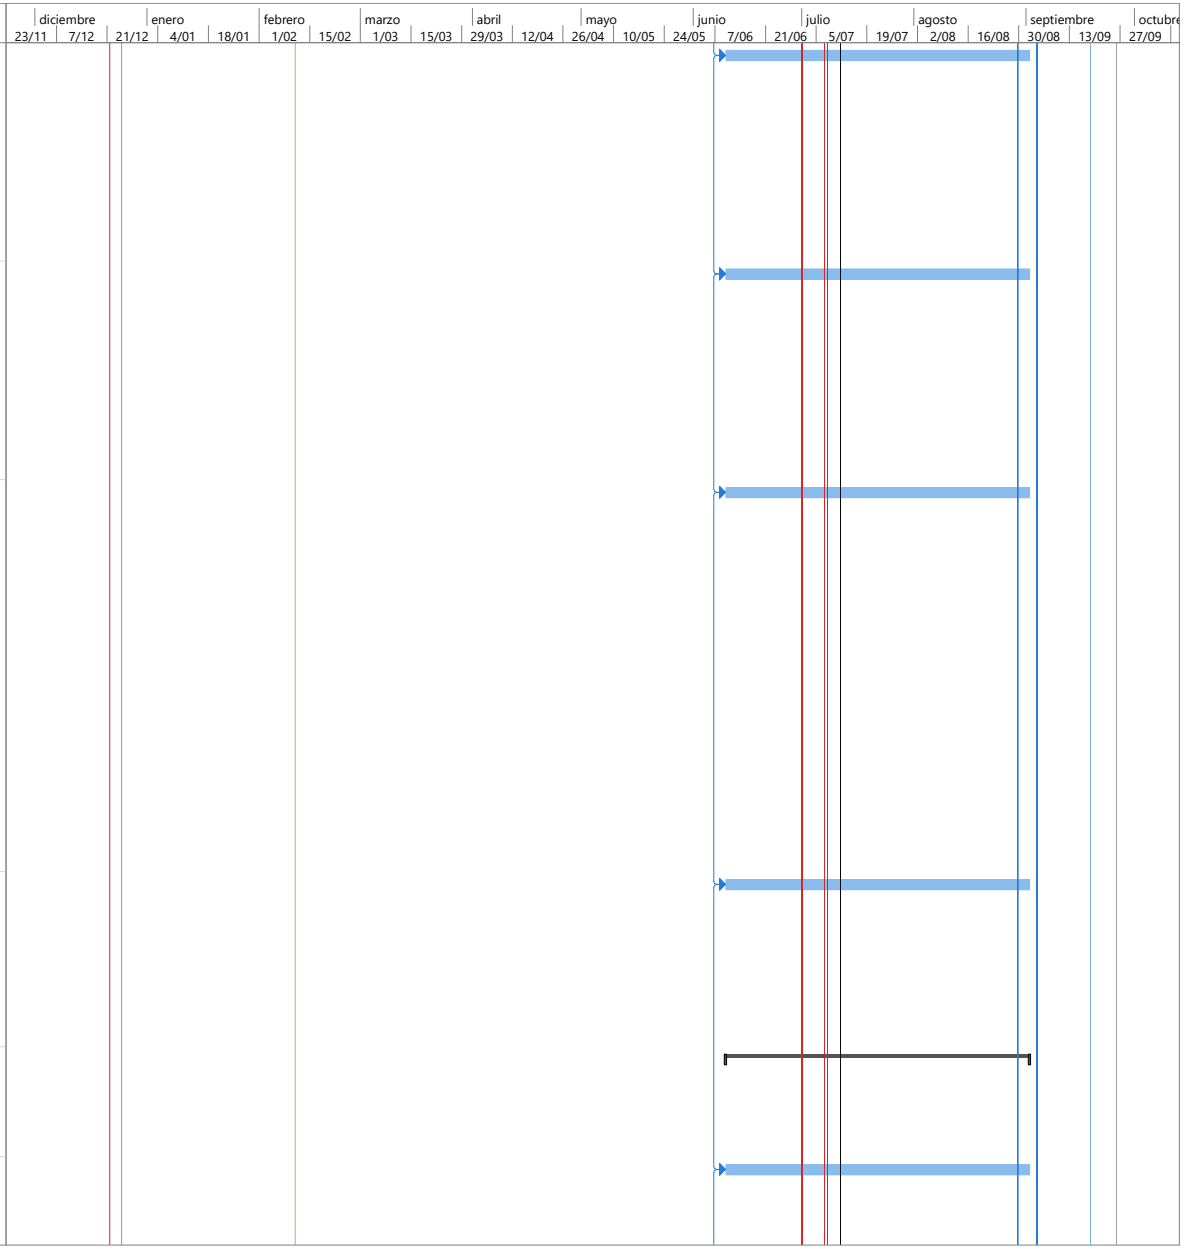

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
152	1.16.3.2	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN ANILLO PERIMETRAL SUPERIOR EN ALAMBRÓN DE 8 MM AWG PARA EL SDA	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
153	1.16.3.3	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN CONECTOR TIPO SNAP PARA EL ANILLO PERIMETRAL SUPERIOR EN ALAMBRÓN DE 8 MM AWG PARA EL SDA	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
154	1.16.3.4	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN ELECTRODO DE CAPTACIÓN PARARRAYOS TIPO FRANKLIN 5 PUNTAS F.R, INCLUYE SOPORTES Y ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA INSTALACIÓN.	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
155	1.16.3.5	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 150 GMS PARA EL SPT, INCLUYE ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA INSTALACIÓN.	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00

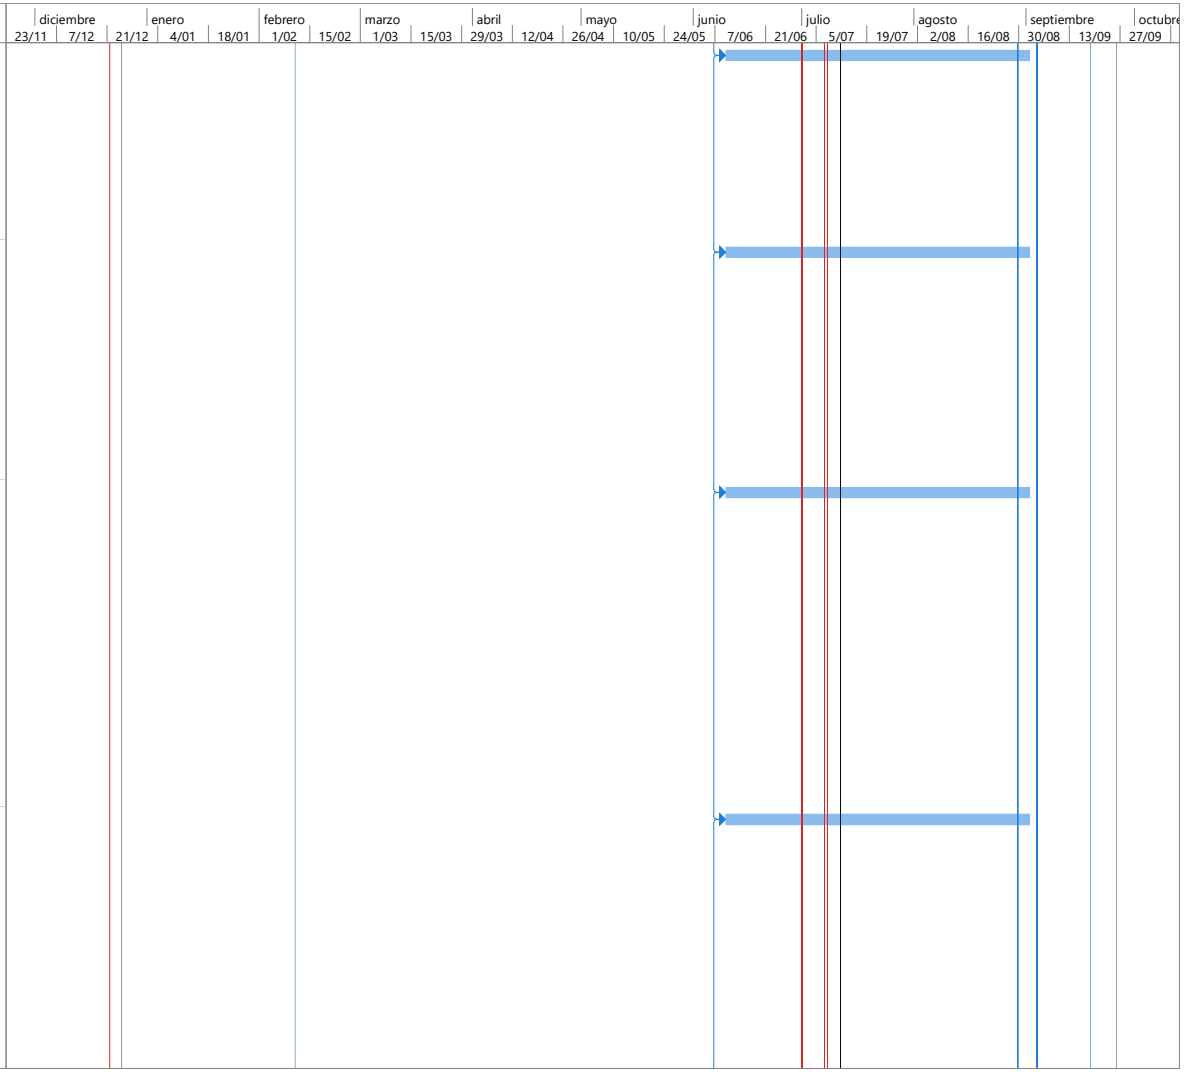

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
156	1.16.3.6	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE DIFUSIÓN A TIERRA VARILLA DE COBRE - COBRE DE 2.4 X 5/8" PARA EL SPT, INCLUYE ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA INSTALACIÓN.	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
157	1.16.3.7	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE EMT DE 1" PARA EL SPT Y SDA, INCLUYE ADITAMENTOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA INSTALACIÓN.	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
158	1.16.3.8	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA EL SPT DE 30X30X40 CON TAPA REMOVIBLE	60 días	mié 10/06/26	mar 1/09/26	$ 0,00
159	**1.16.4**	**CANALIZACIÓN CÁRCAMO Y DUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN, SALIDAS ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, CCTV, INTRUCION, DETECCION RCI**	**60 días**	**mié 1/07/26**	**mar 22/09/26**	**$ 0,00**

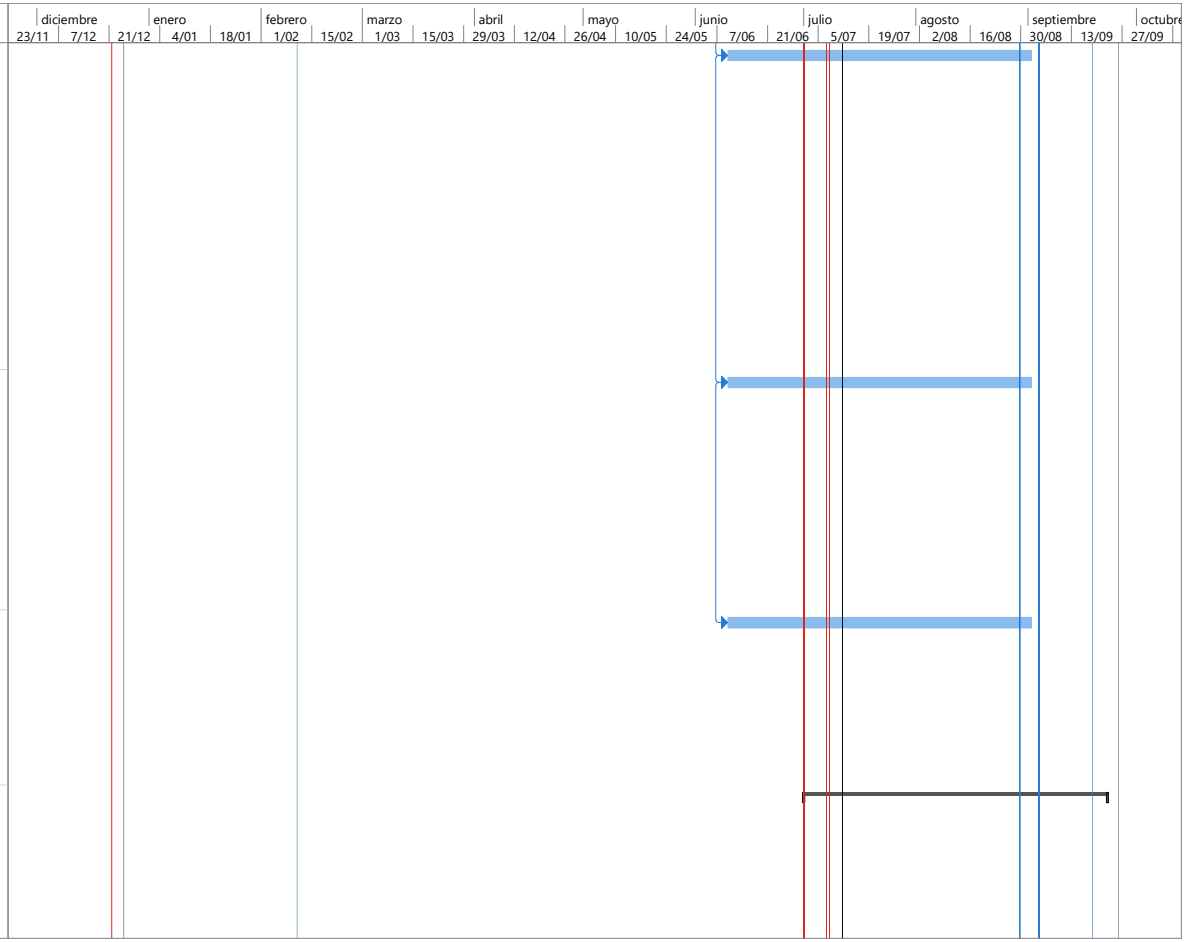

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
160	1.16.4.1	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES 600 TIPO MALLA CON DIVISIÓN, PARA EL TENDIDO ELÉCTRICO TENDIDO VOZ, DATOS, CCTV, INTRUSIÓN, RCI DETECCIÓN, INCLUYE SOPORTES EN RIEL CHANEL, VARILLA ROSCADA DE 3/8", CHAZO TIPO RL, CURVAS Y TODOS LOS	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
161	1.16.4.2	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN RECAMARA CS 276, INCLUYE TAPAS DE INSPECCIÓN REMOVIBLES, TUBO PVC 4"	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
162	1.16.4.3	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN CAJA CS 280, INCLUYE TAPAS DE INSPECCIÓN REMOVIBLES.	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
163	1.16.4.4	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA POSTE DE FERRO CONCRETO ESTRUCTURA CÓNICA PARA EL TENDIDO DE RED ELÉCTRICA EN MT. INCLUYE POSTE DE 14M X 750 KG DE CARGA DE RUPTURA, PERFORACIÓN EN SITIO, COMO EL INCIDO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQ	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00

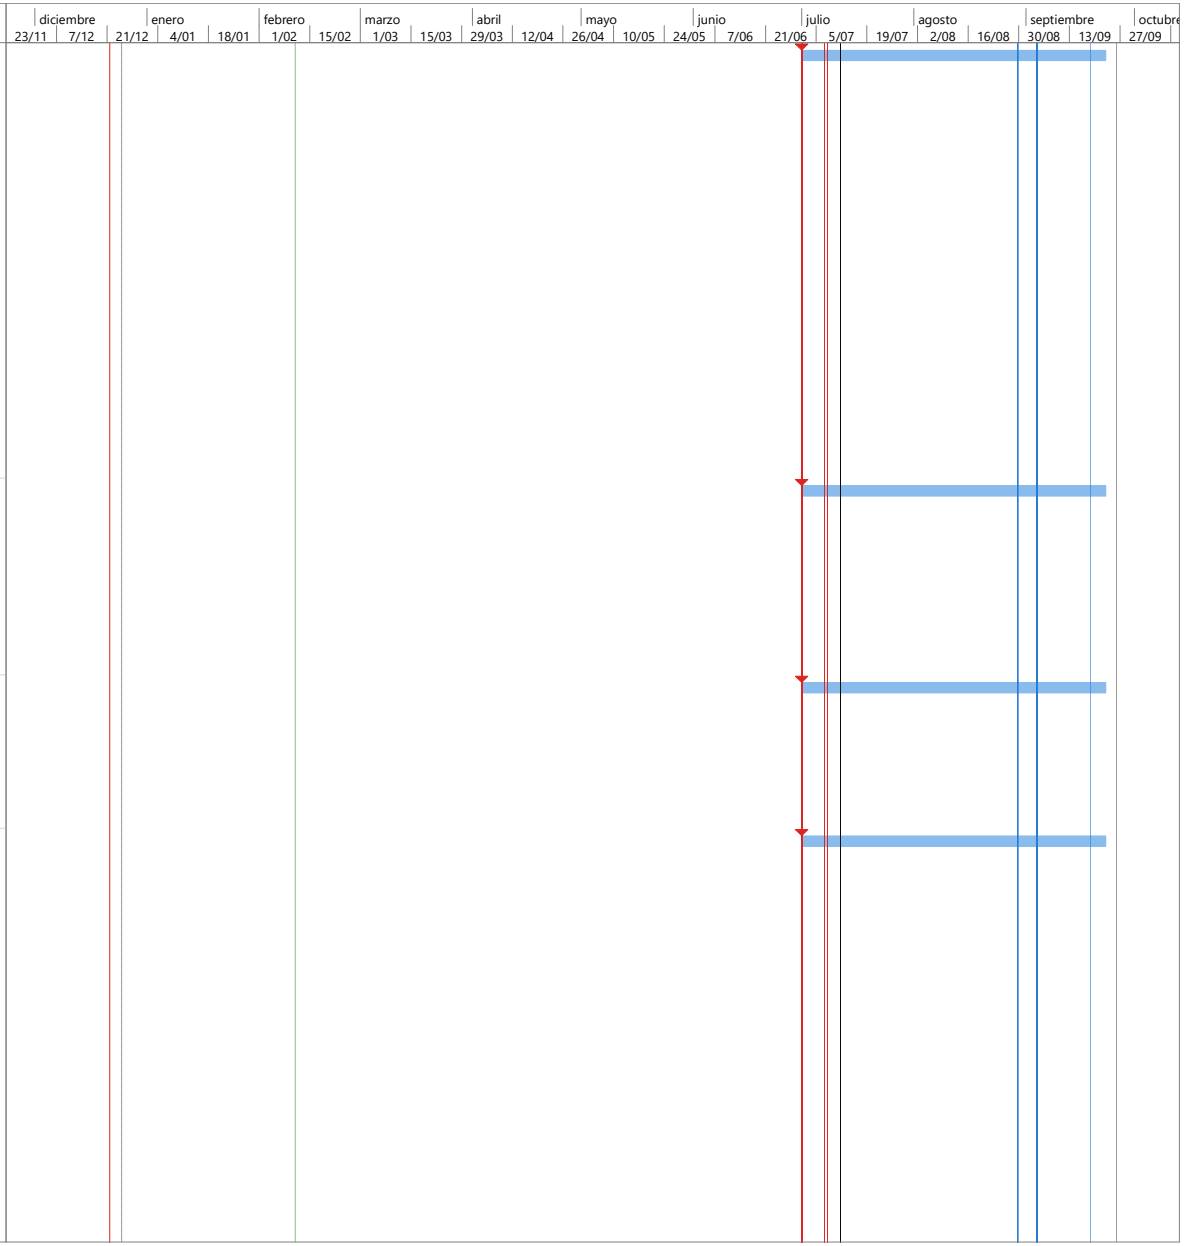

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
164	**1.16.5**	**CONTROL DE ACCESO, CABLEADO ESTRUCTURADO Y SITEMAS DE CCTV**	**60 días**	**mié 1/07/26**	**mar 22/09/26**	**$ 0,00**
165	1.16.5.1	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS. INCLUYE TROQUEL PIRAMIDAL DE 12X5 CM CON SALIDA DOBLE PARA DATOS, FASE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS, SALIDA DOBLE ELÉCTRICA NORMAL REGULADO, CINCO	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
166	1.16.5.2	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS PARA CCTV. INCLUYE CAJA 2400 + SUPLEMENTO CINCO (5) METROS PROMEDIO DE TUBERÍA PVC 1" PARA ALIMENTACIÓN DESDE BANDEJA, CINCO (5) METROS	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
167	1.16.5.3	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS PARA CCTV. INCLUYE CAJA PLÁSTICA IP 65 CINCO (5) METROS PROMEDIO DE TUBERÍA PVC 1" PARA ALIMENTACIÓN DESDE BANDEJA, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
168	1.16.5.4	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE DATOS ACCESS POINT. INCLUYE ROUTER WIFE, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE TUBERÍA PVC 1" PARA ALIMENTACIÓN DESDE BANDEJA, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE CABLE UTP CAT 5 4	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00

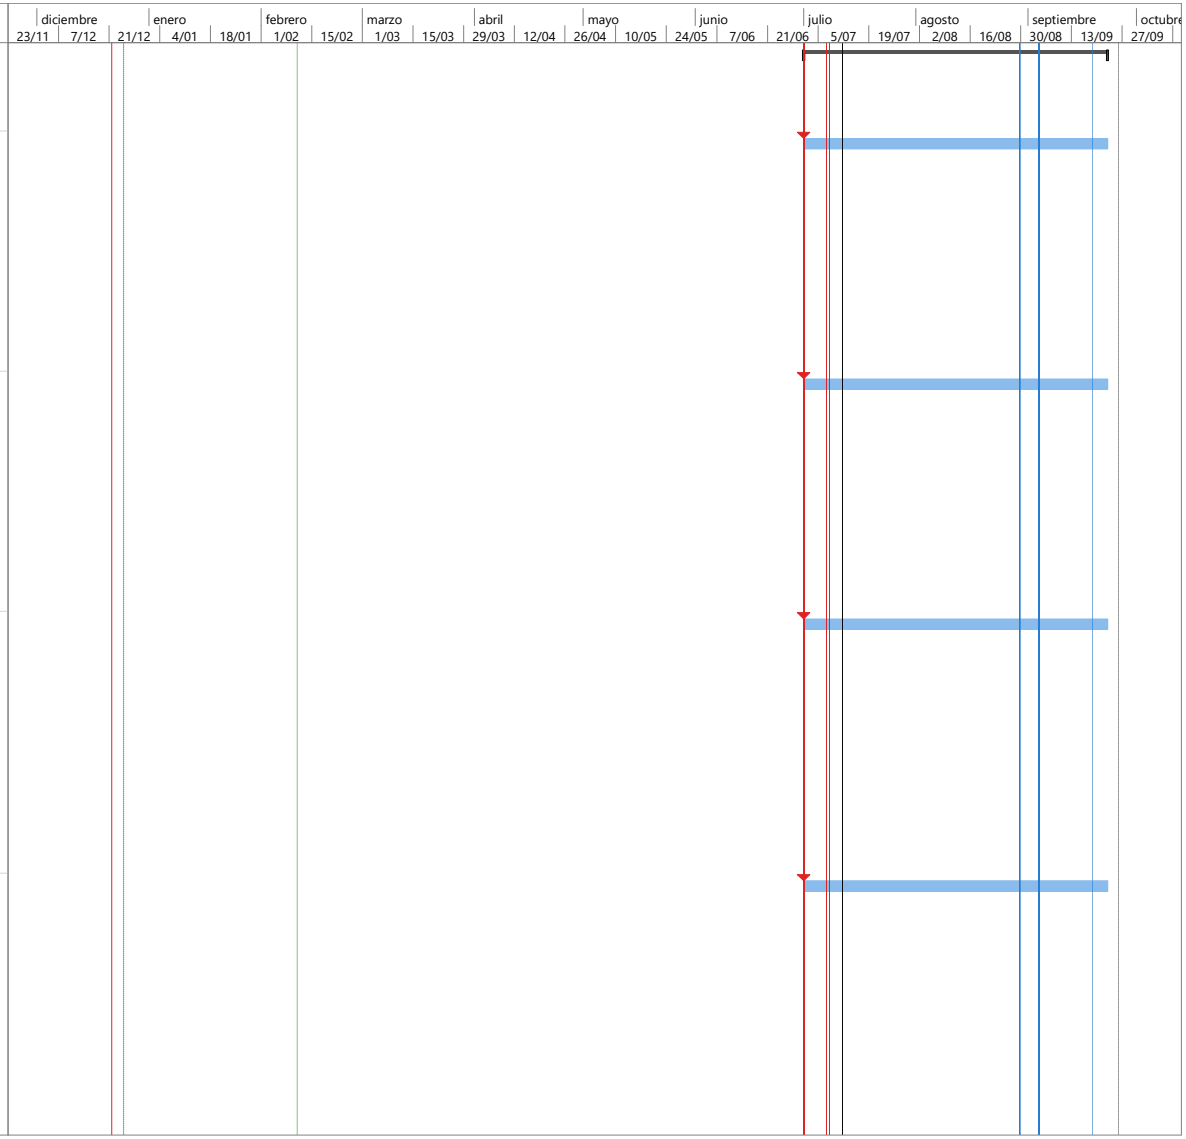

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
169	1.16.5.5	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO EXTERIOR IP 65,INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
170	1.16.5.6	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO INTERIOR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL SUMINISTRO Y CORRECTA	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
171	1.16.5.7	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN SENSOR DE HUMO, INCLUYE CINCO (5) METROS PROMEDIO DE TUBERÍA EMT 1" PARA ALIMENTACIÓN DESDE BANDEJA, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE CABLE PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO, DETECTORES DE	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
172	1.16.5.8	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL SISTEMA RCI , INCLUYE CINCO (5) METROS PROMEDIO DE TUBERÍA EMT 1" PARA ALIMENTACIÓN DESDE BANDEJA, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE CABLE PARA SISTEMAS DE	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00

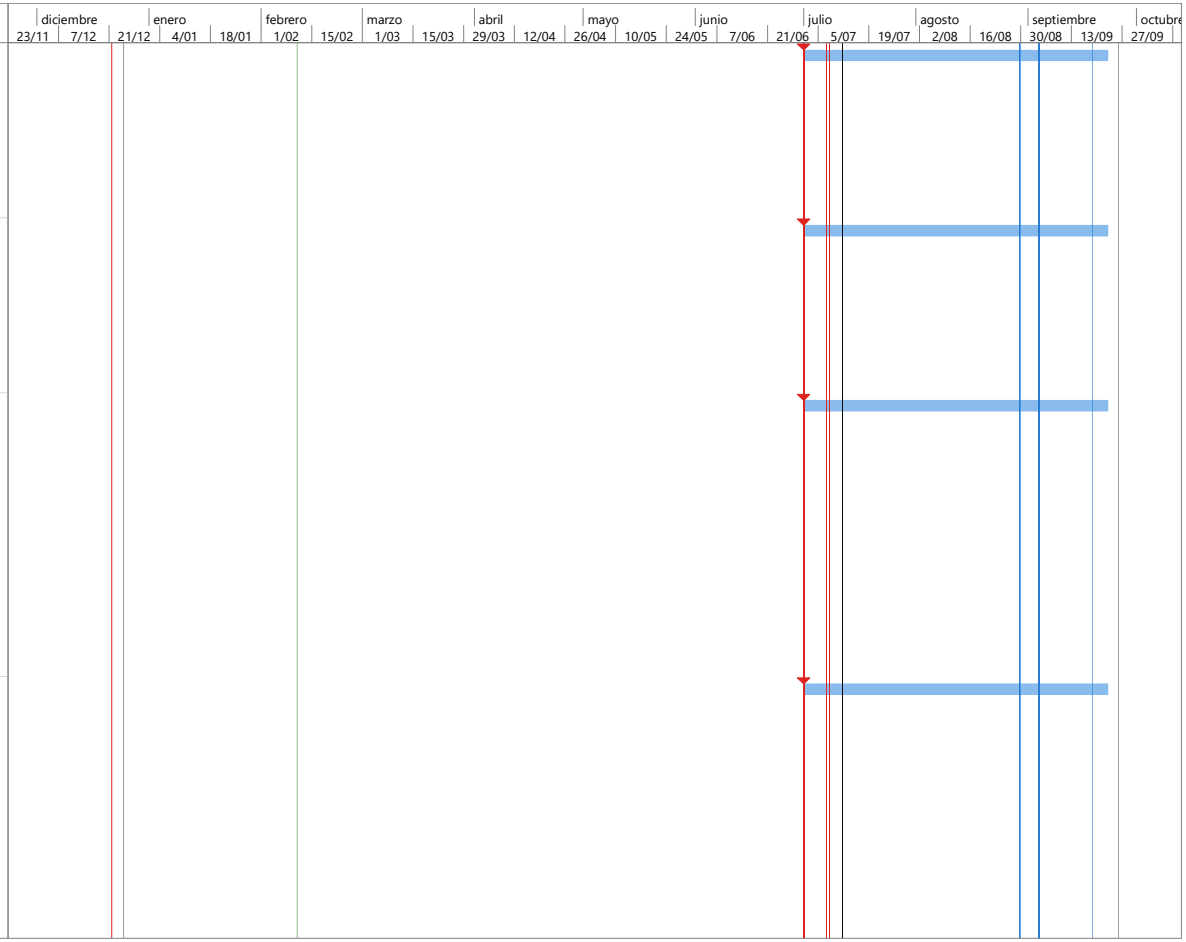

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
173	1.16.5.9	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL SISTEMA RCI, VS4 - G, CON SOPORTE DE 4 LAZOS DE 250DISPOSITIVOS, CON CAPACIDAD DE 2 BATERÍAS, INCLUYE CINCO (5) METROS PROMEDIO DE TUBERÍA EMT 1" PARA ALIMENTACIÓN DESDE BANDEJA, CINCO (5) METROS PROMED	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
174	1.16.5.10	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CONTROL PARA PTZ JOYSTICK PARA CCTV, INCLUYE, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE CIRCUITO RAMAL CABLE UTP CAT 5E, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE TUBERÍA PVC DE 1", CAJAS 2400 Y	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
175	1.16.5.11	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE MONITOR LED DE 40" HDMI, VGA, PARA MONITOREO CCTV ELEMENTOS DE ANCLAJE Y	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
176	**1.16.6**	**SALIDAS ELÉCTRICAS NORMALIZADAS Y APARATOS DE ILUMINACIÓN**	**60 días**	**mié 1/07/26**	**mar 22/09/26**	**$ 0,00**
177	1.16.6.1	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED 60X60 40W 110V. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE LUMINARIA PANEL LED 60X60 40W 110V, CINCO (5) METROS	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00

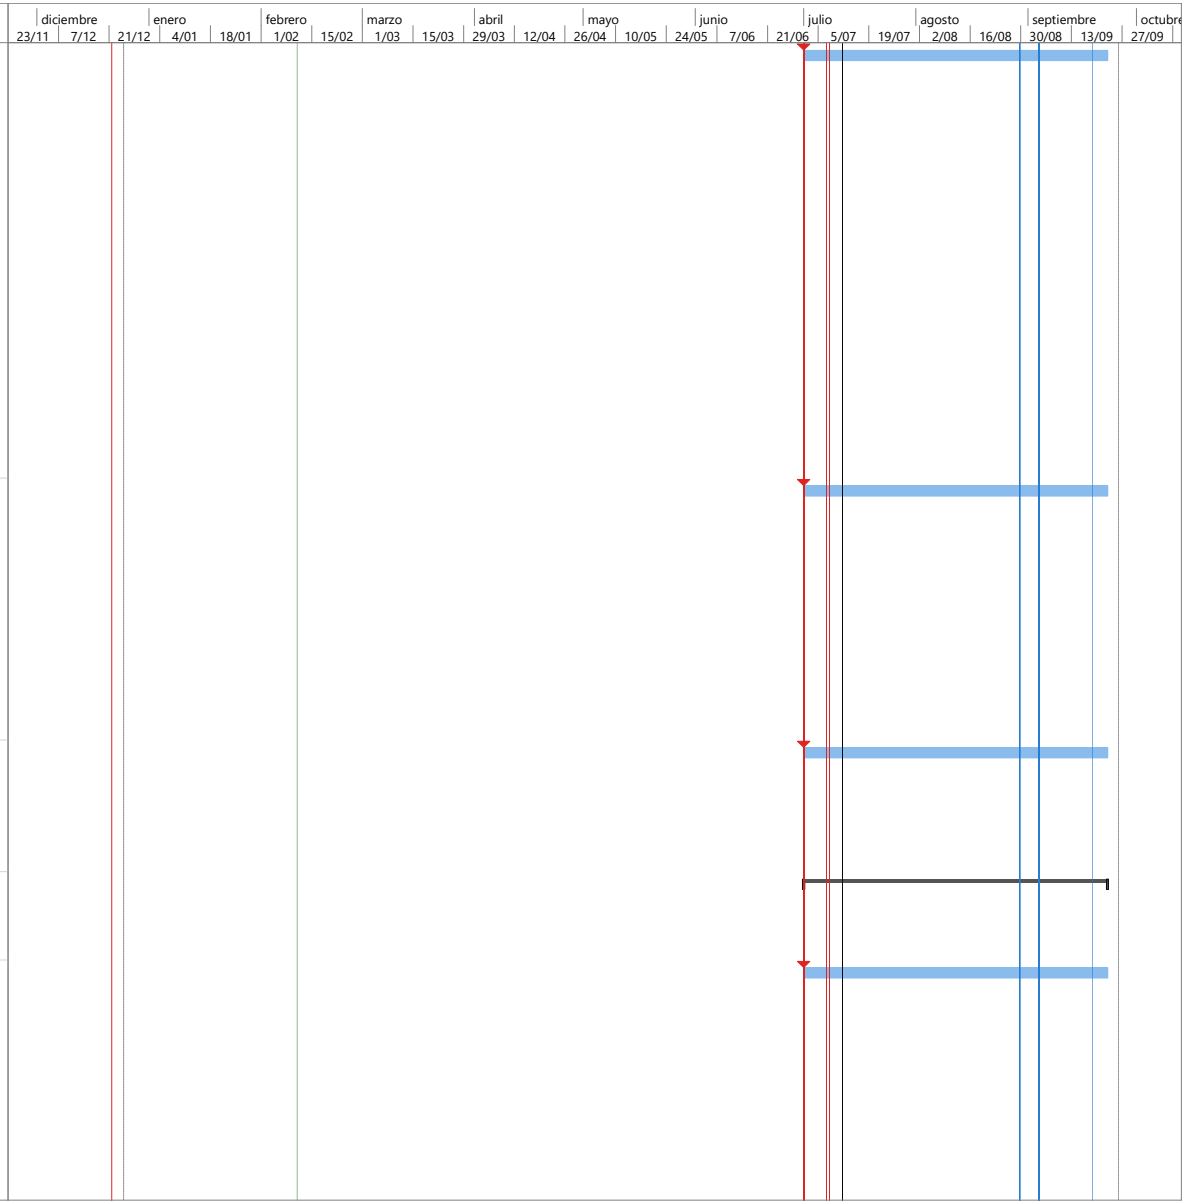

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
178	1.16.6.2	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA BALA LED LUZ BLANCA 24W CIRCULAR DE 12. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE LUMINARIA BALA LED LUZ BLANCA 24W CIRCULAR DE 12, CINCO (5)	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
179	1.16.6.3	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA BALA LED LUZ BLANCA 18W CIRCULAR DE 12. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE LUMINARIA BALA LED LUZ BLANCA 18W CIRCULAR DE 12, CINCO (5)	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
180	1.16.6.4	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W 110V. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W 110V, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
181	1.16.6.5	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA TIPO MICKEY LED, 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE LUZ DE EMERGENCIA TIPO MICKEY LED, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00

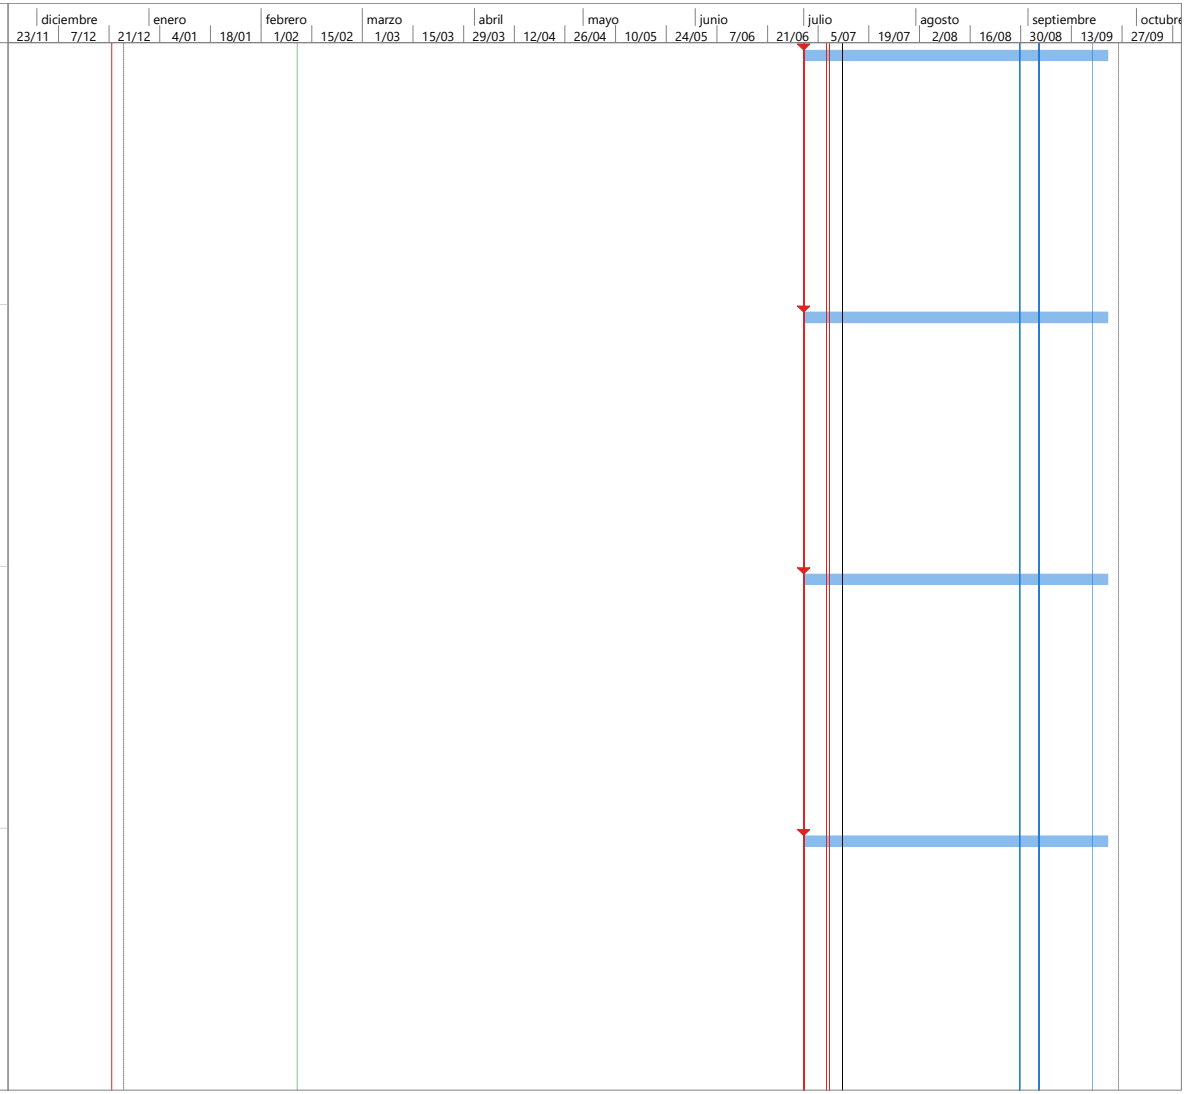

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
182	1.16.6.6	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMALIZADO CON POLO A TIERRA. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE DE 15 AMPERIOS	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
183	1.16.6.7	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICO CON POLO A TIERRA. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA BIFASICA 208V, INCLUYE TOMACORRIENTE BIFASICO DE 20 AMPERIOS NOMINALES, CINCO (5) METROS	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
184	1.16.6.8	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO NORMALIZADO CON POLO A TIERRA. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA TRIFASICA 208V, INCLUYE TOMACORRIENTE NORMAL TRIFASICO 20 AMPERIOS NOMINALES, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE CIRCUITO RAMAL 3	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00

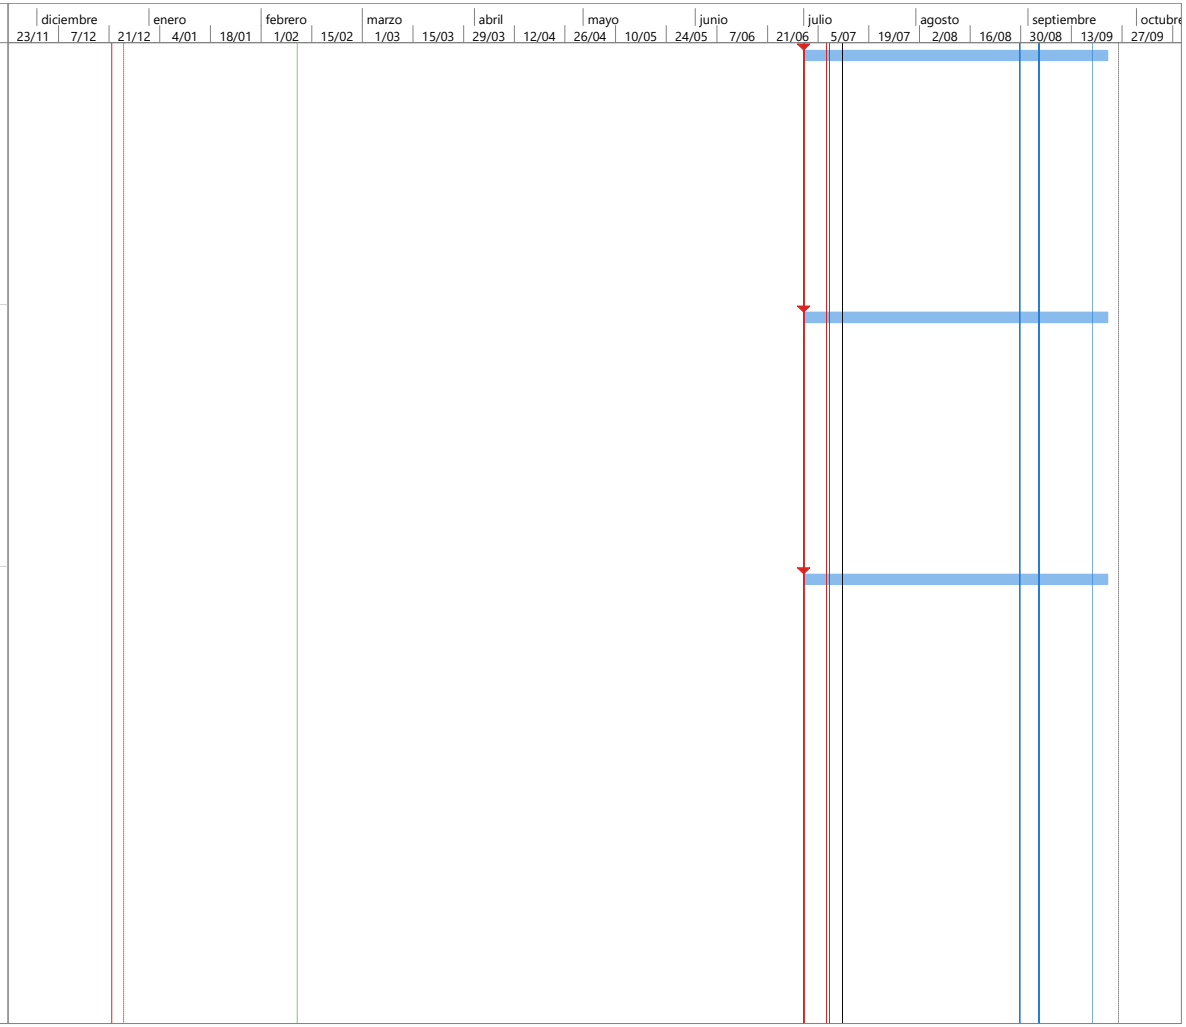

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
185	1.16.6.9	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA CON POLO A TIERRA. SALIDA ELÉCTRICA REGULADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE DE 15 AMPERIOS NOMINALES, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
186	1.16.6.10	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI DOBLE DE 15 AMPERIOS NOMINALES, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE CIRCUITO RAMAL	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
187	1.16.6.11	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO DE15A, CIRCUITO RAMAL 1X12 AWG+1X12 AWG LHFR+1X14 DESNUDO, TUBERÍA, CAJAS	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
188	1.16.6.12	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO DE15A, CIRCUITO RAMAL 1X12 AWG+1X12 AWG LHFR+1X14 DESNUDO, TUBERÍA, CAJAS	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
189	1.16.6.13	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE DE15A, CIRCUITO RAMAL 1X12 AWG+1X12 AWG LHFR+1X14 DESNUDO, TUBERÍA, CAJAS	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
190	1.16.6.14	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN SENSORES DE MOVIMIENTO 360° PARA ENCENDER LUMINARIAS 110V, CIRCUITO RAMAL 1X12 AWG+1X12 AWG LHFR+1X14 DESNUDO,	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00

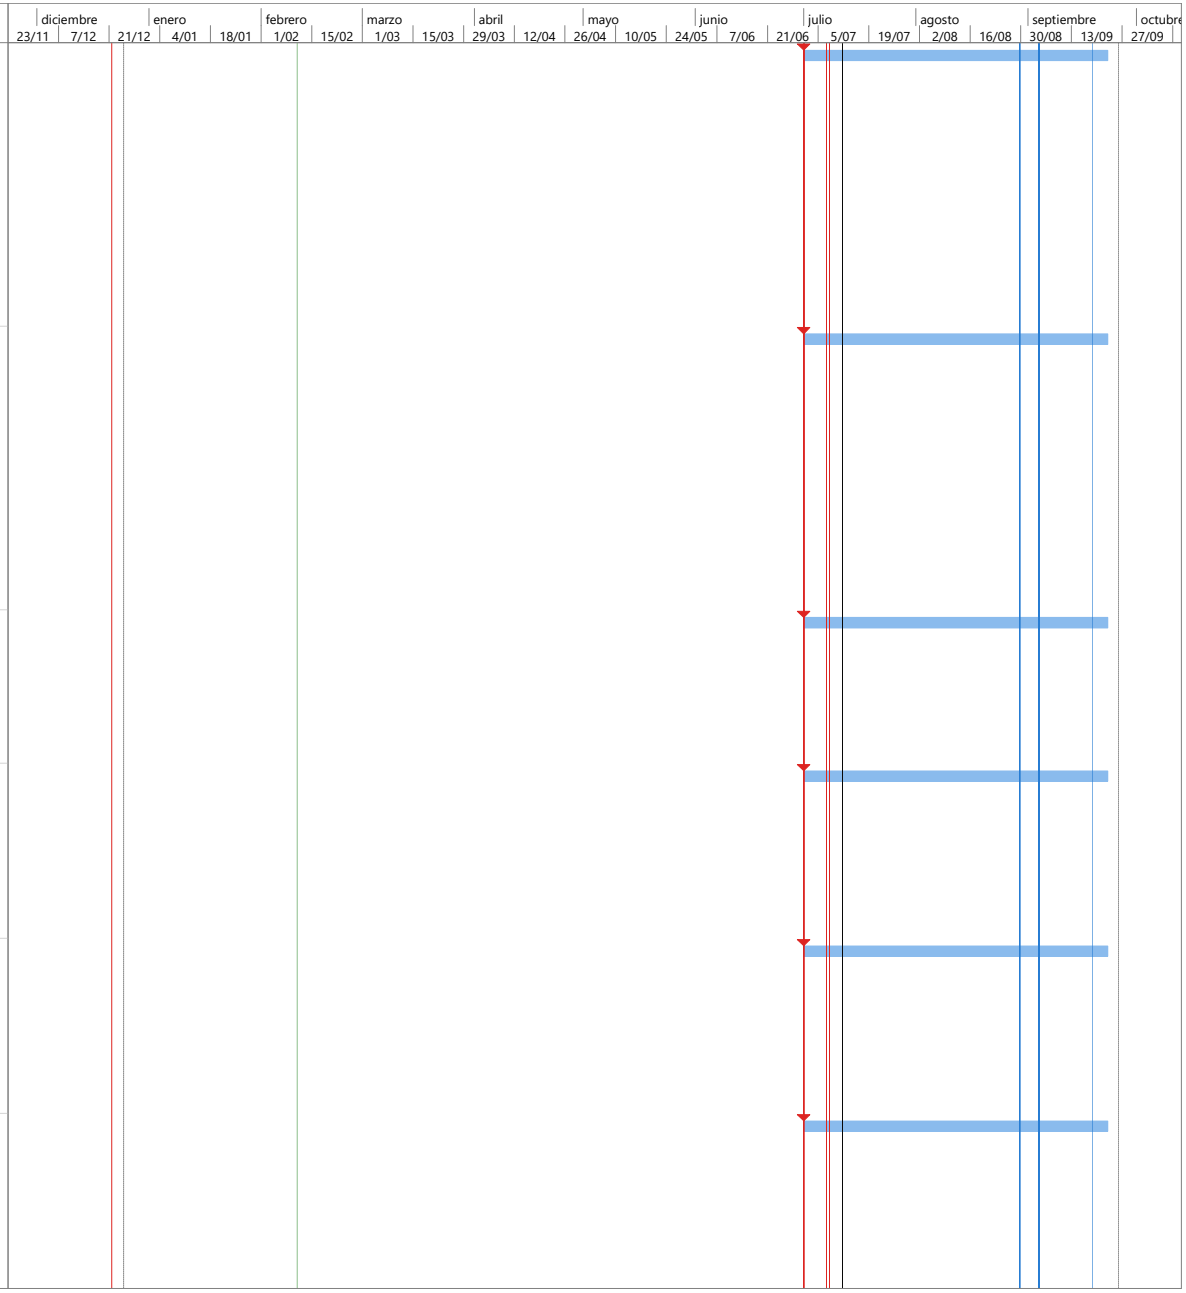

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
191	1.16.6.15	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED 25W 110V. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE LUMINARIA PANEL LED 25W 110V, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE CIRCUITO RAMAL 1X12 + 1X12 AWG	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
192	1.16.6.16	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO RIEL LED 15W 110V. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE LUMINARIA TIPO RIEL LED 15W 110V, CINCO (5) METROS	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
193	1.16.6.17	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO EXIT 2W 110V. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE LUMINARIA TIPO EXIT 2W 110V 110V, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE CIRCUITO RAMAL	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
194	1.16.6.18	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y DE CONTORNO LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED DE 40W CON FOTOCELDA. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00

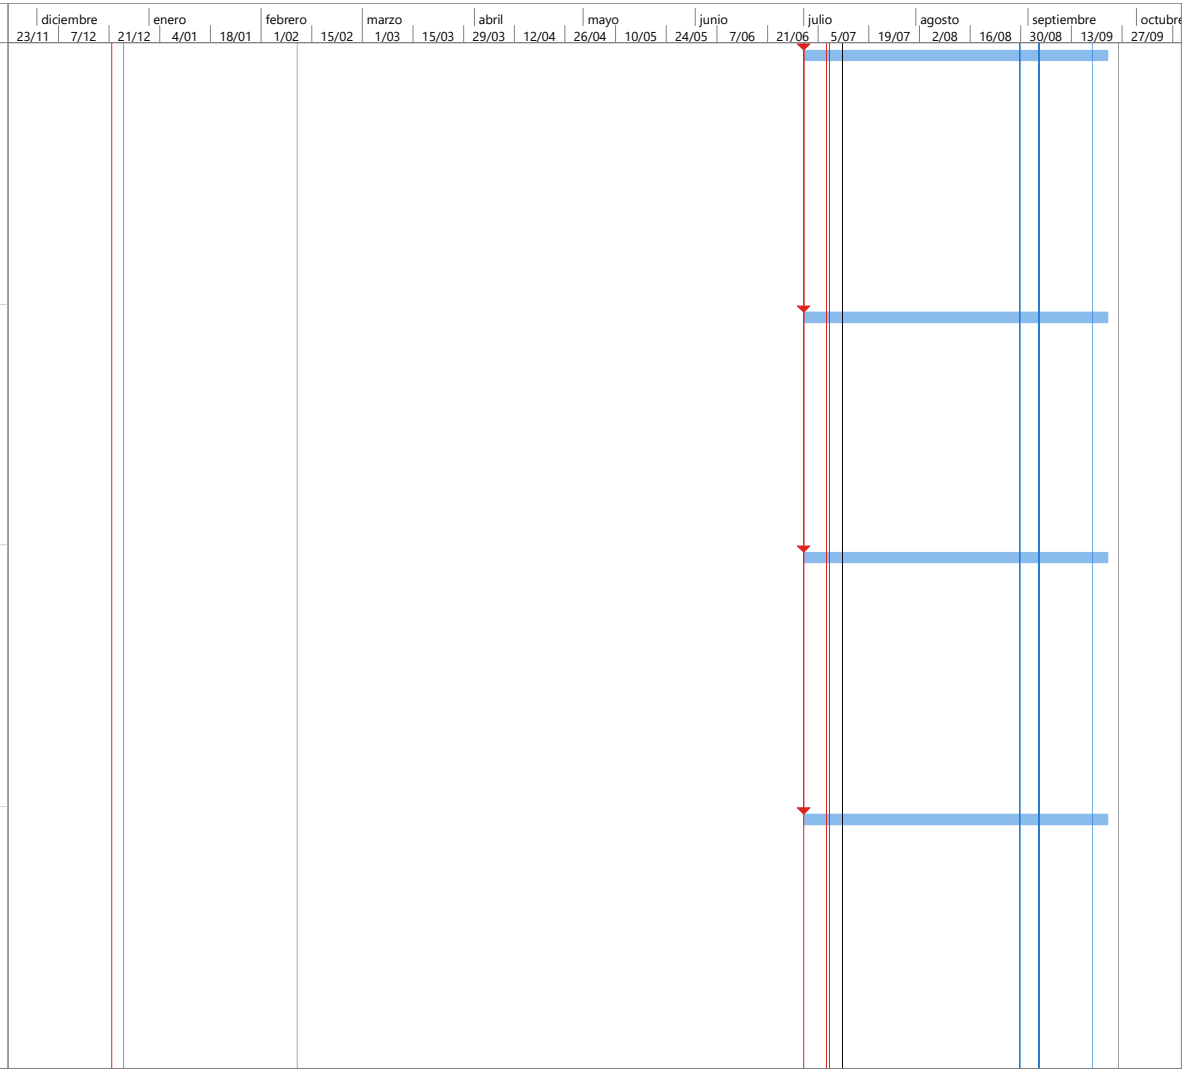

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
195	1.16.6.19	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO WALLPACK 30W 110V. SALIDA ELÉCTRICA NORMALIZADA MONOFÁSICA 110V, INCLUYE LUMINARIA WALLPACK 30W 110V, CINCO (5) METROS PROMEDIO DE	60 días	mié 1/07/26	mar 22/09/26	$ 0,00
196	**1.16.7**	**SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE AMBIENTE (HVAC)**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
198	**1.17**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	**58 días**	**mié 8/07/26**	**vie 25/09/26**	**$ 856.465.221,29**
199	**1.17.1**	**ACOMETIDA**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
200	1.17.1.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø3/4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
201	1.17.1.2	TUBERÍA ACERO GALVANIZADO SCH 40 Ø1"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
202	1.17.1.3	ACCESORIOS PRESION Ø3/4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
203	1.17.1.4	ACCESORIOS ACERO Ø1"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
204	1.17.1.5	REGISTRO PASO DIRECTO Ø3/4" PESADO	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
205	1.17.1.6	UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO Ø3/4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
206	1.17.1.7	CHEQUE CORTINA Ø3/4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
207	1.17.1.8	FLOTADOR MECÁNICO Ø3/4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
208	1.17.1.9	CAJA CONTADOR DE AGUA	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
209	1.17.1.10	STICKER IDENTIFICACION TUBERÍAS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
210	1.17.1.11	NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. Ø3/4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
211	**1.17.2**	**INSTALACIONES EQUIPO PRESION AGUA POTABLE**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
242	**1.17.3**	**INSTALACIONES EQUIPO PRESION CONTRA INCENDIO**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
272	**1.17.4**	**RED GENERAL DE AGUA FRIA POTABLE**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
308	**1.17.5**	**RED GENERAL DE AGUA CALIENTE POTABLE**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**

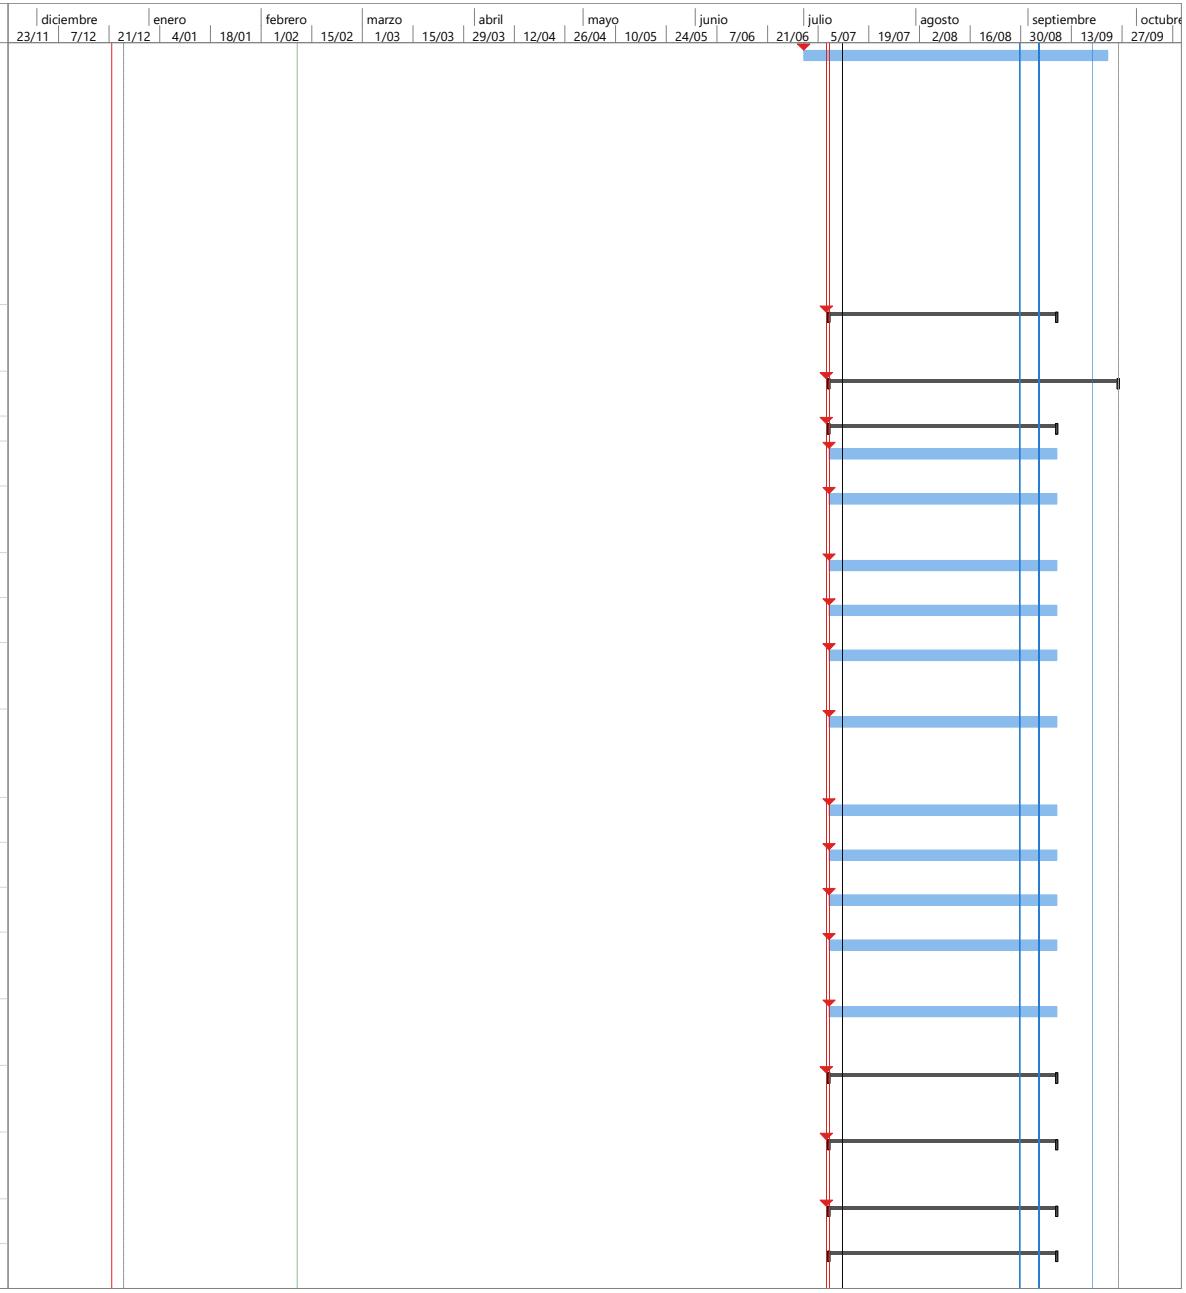

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
316	**1.17.6**	**RED GENERAL CONTRA INCENDIO**	**50 días**	**mié 8/07/26**	**mar 15/09/26**	**$ 0,00**
359	**1.17.7**	**ESTACION DE CONTROL CONTRAINCENDIO**	**50 días**	**mié 8/07/26**	**mar 15/09/26**	**$ 0,00**
367	**1.17.8**	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA POTABLE (SOLO PARALES)**	**50 días**	**mié 8/07/26**	**mar 15/09/26**	**$ 0,00**
368	1.17.8.1	PUNTO HIDRÁULICO AF PVC-P Ø1 1/4"	50 días	mié 8/07/26	mar 15/09/26	$ 0,00
369	1.17.8.2	PUNTO HIDRÁULICO AF PVC-P Ø3/4"	50 días	mié 8/07/26	mar 15/09/26	$ 0,00
370	1.17.8.3	PUNTO HIDRÁULICO AF PVC-P Ø1/2"	50 días	mié 8/07/26	mar 15/09/26	$ 0,00
371	1.17.8.4	REGATAS CON PULIDORA (NO INCLUYE RESANES)	50 días	mié 8/07/26	mar 15/09/26	$ 0,00
372	1.17.8.5	CÁMARA DE AIRE EN PVC P Ø1 1/4" (NIPLE Y TEE EN A.G.)	50 días	mié 8/07/26	mar 15/09/26	$ 0,00
373	1.17.8.6	CÁMARA DE AIRE EN PVC P Ø3/4" (NIPLE Y TEE EN A.G.)	50 días	mié 8/07/26	mar 15/09/26	$ 0,00
374	1.17.8.7	CÁMARA DE AIRE EN PVC P Ø1/2" (NIPLE Y TEE EN A.G.)	50 días	mié 8/07/26	mar 15/09/26	$ 0,00
375	**1.17.9**	**SALIDAS SANITARIAS AGUAS NEGRAS (SOLO PARALES)**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
376	1.17.9.1	SALIDAS SANITARIAS PVC-S Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
377	1.17.9.2	SALIDAS SANITARIAS PVC-S Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
378	1.17.9.3	SALIDAS SANITARIAS PVC-S Ø3"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
379	1.17.9.4	BRIDA SANITARIA PVC	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
380	1.17.9.5	TAPONES DE PRUEBA Ø4", Ø3" Y Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
381	1.17.9.6	REGATAS CON PULIDORA (NO INCLUYE RESANES)	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
382	1.17.9.7	PASES POR PLACA Ø4" CON MAQUINA SACANUCLEOS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00

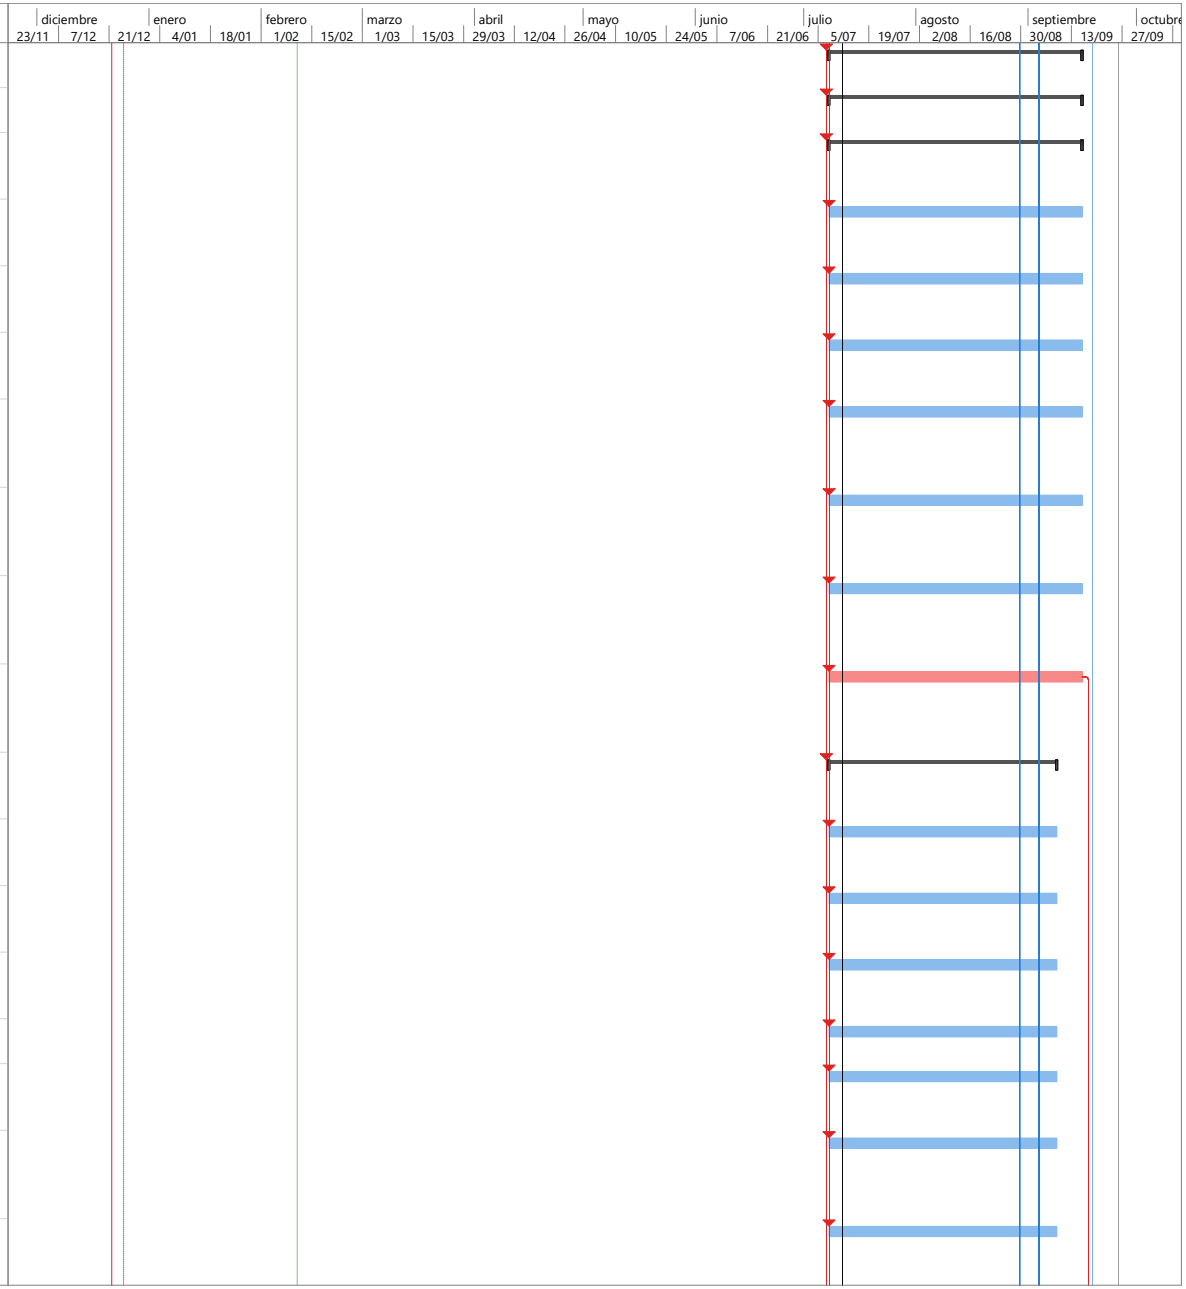

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
383	1.17.9.8	PASES POR PLACA Ø2" CON MAQUINA SACANUCLEOS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
384	**1.17.10**	**REDES AGUAS NEGRA**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
385	1.17.10.1	TUBERÍA TIPO ALCANTARILLADO Ø6"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
386	1.17.10.2	TUBERÍA TIPO ALCANTARILLADO Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
387	1.17.10.3	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
388	1.17.10.4	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø3"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
389	1.17.10.5	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
390	1.17.10.6	TUBERÍA PVC VENTILACIÓN Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
391	1.17.10.7	TUBERÍA PVC VENTILACIÓN Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
392	1.17.10.8	ACCESORIOS PVC SANITARIA Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
393	1.17.10.9	ACCESORIOS PVC SANITARIA Ø3"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
394	1.17.10.1	ACCESORIOS PVC SANITARIA Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
395	1.17.10.1	ABRAZADERA PERA/TRAPECIO Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
396	1.17.10.1	ABRAZADERA PERA/TRAPECIO Ø3"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
397	1.17.10.1	ABRAZADERA PERA/TRAPECIO Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
398	1.17.10.1	EXCAVACIÓN	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
399	1.17.10.1	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
400	1.17.10.1	CAMA ARENA BASE SOPORTE TUBERÍA	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
401	1.17.10.1	RELLENO Y COMPACTACIÓN	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
402	1.17.10.1	VIAJE VOLQUETA (5 M3) RETIRO DE ESCOMBROS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
403	1.17.10.1	STICKER IDENTIFICACION TUBERÍAS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
404	1.17.10.2	PRUEBA DE BAJANTE	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
405	1.17.10.2	PRUEBA DE FLUJO	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
406	1.17.10.2	VÁLVULA MAXIVENT Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
407	1.17.10.2	VÁLVULA MINIVENT Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00

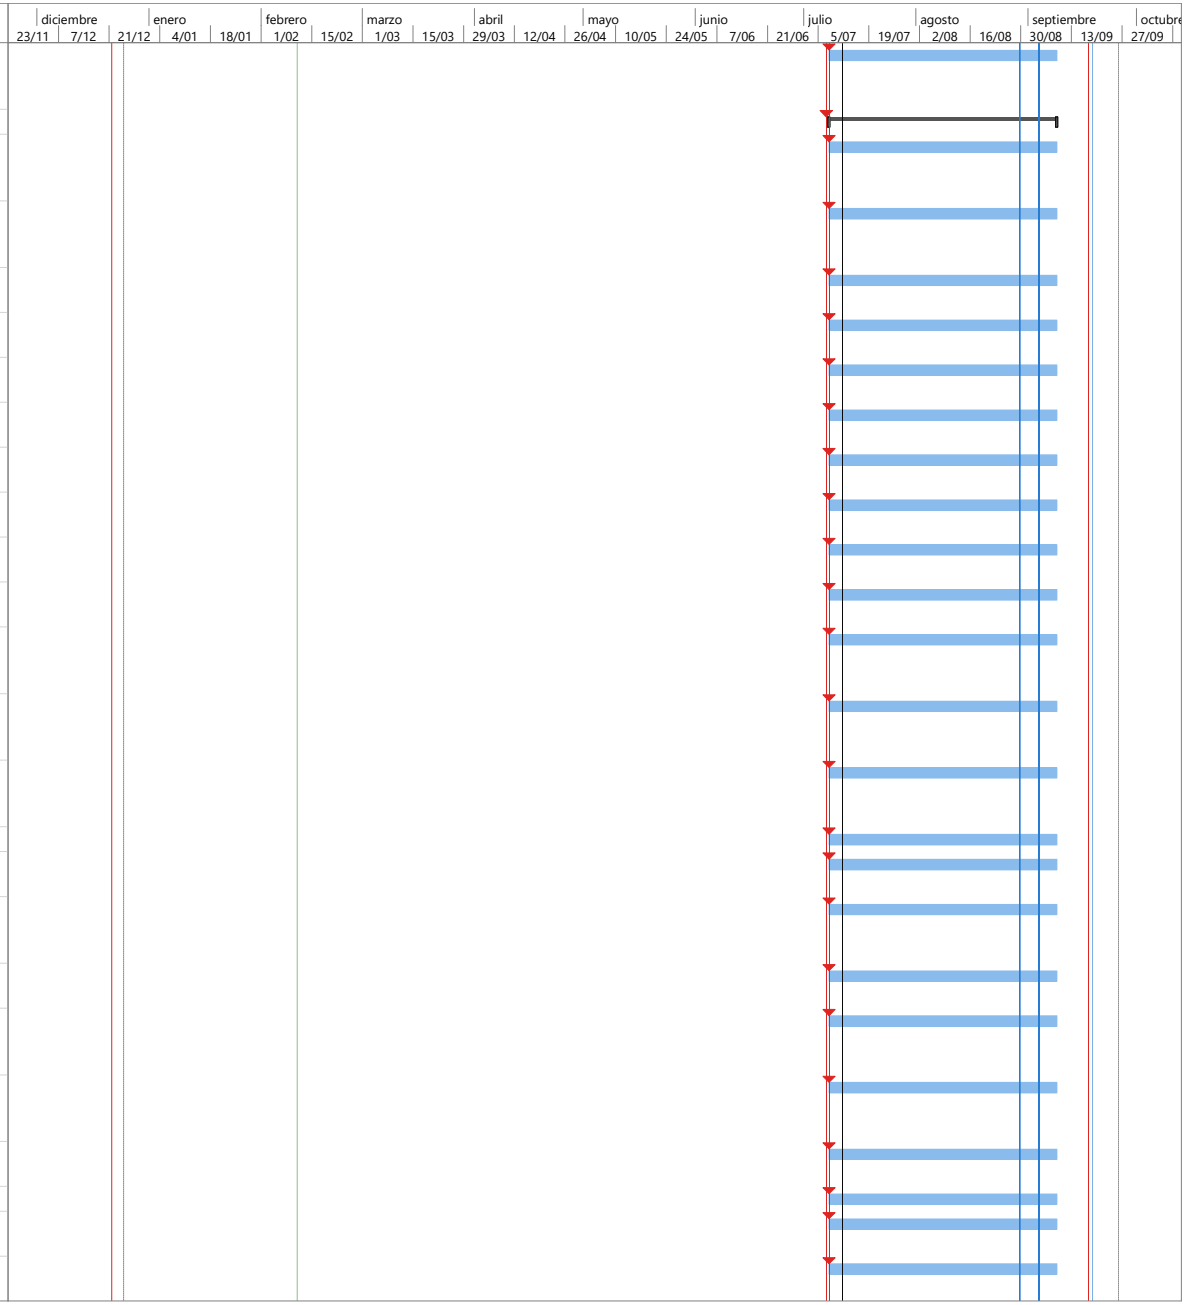

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
408	**1.17.11**	**REDES AGUAS LLUVIA**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
409	1.17.11.1	TUBERÍA TIPO ALCANTARILLADO Ø10"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
410	1.17.11.2	TUBERÍA TIPO ALCANTARILLADO Ø8"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
411	1.17.11.3	TUBERÍA TIPO ALCANTARILLADO Ø6"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
412	1.17.11.4	TUBERÍA TIPO ALCANTARILLADO Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
413	1.17.11.5	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø6"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
414	1.17.11.6	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
415	1.17.11.7	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
416	1.17.11.8	ACCESORIOS PVC SANITARIA Ø6"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
417	1.17.11.9	ACCESORIOS PVC SANITARIA Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
418	1.17.11.1	ACCESORIOS PVC SANITARIA Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
419	1.17.11.1	ABRAZADERA PERA/TRAPECIO Ø4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
420	1.17.11.1	ABRAZADERA PERA/TRAPECIO Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
421	1.17.11.1	EXCAVACIÓN	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
422	1.17.11.1	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
423	1.17.11.1	CAMA ARENA BASE SOPORTE TUBERÍA	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
424	1.17.11.1	RELLENO Y COMPACTACIÓN	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
425	1.17.11.1	VIAJE VOLQUETA (5 M3) RETIRO DE ESCOMBROS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
426	1.17.11.1	STICKER IDENTIFICACION TUBERÍAS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
427	1.17.11.1	PRUEBA DE BAJANTE	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
428	1.17.11.2	PRUEBA DE FLUJO	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
429	**1.17.12**	**CONEXIÓN DESAGUES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
430	1.17.12.1	CONEXIÓN DESAGÜE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 3/4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00

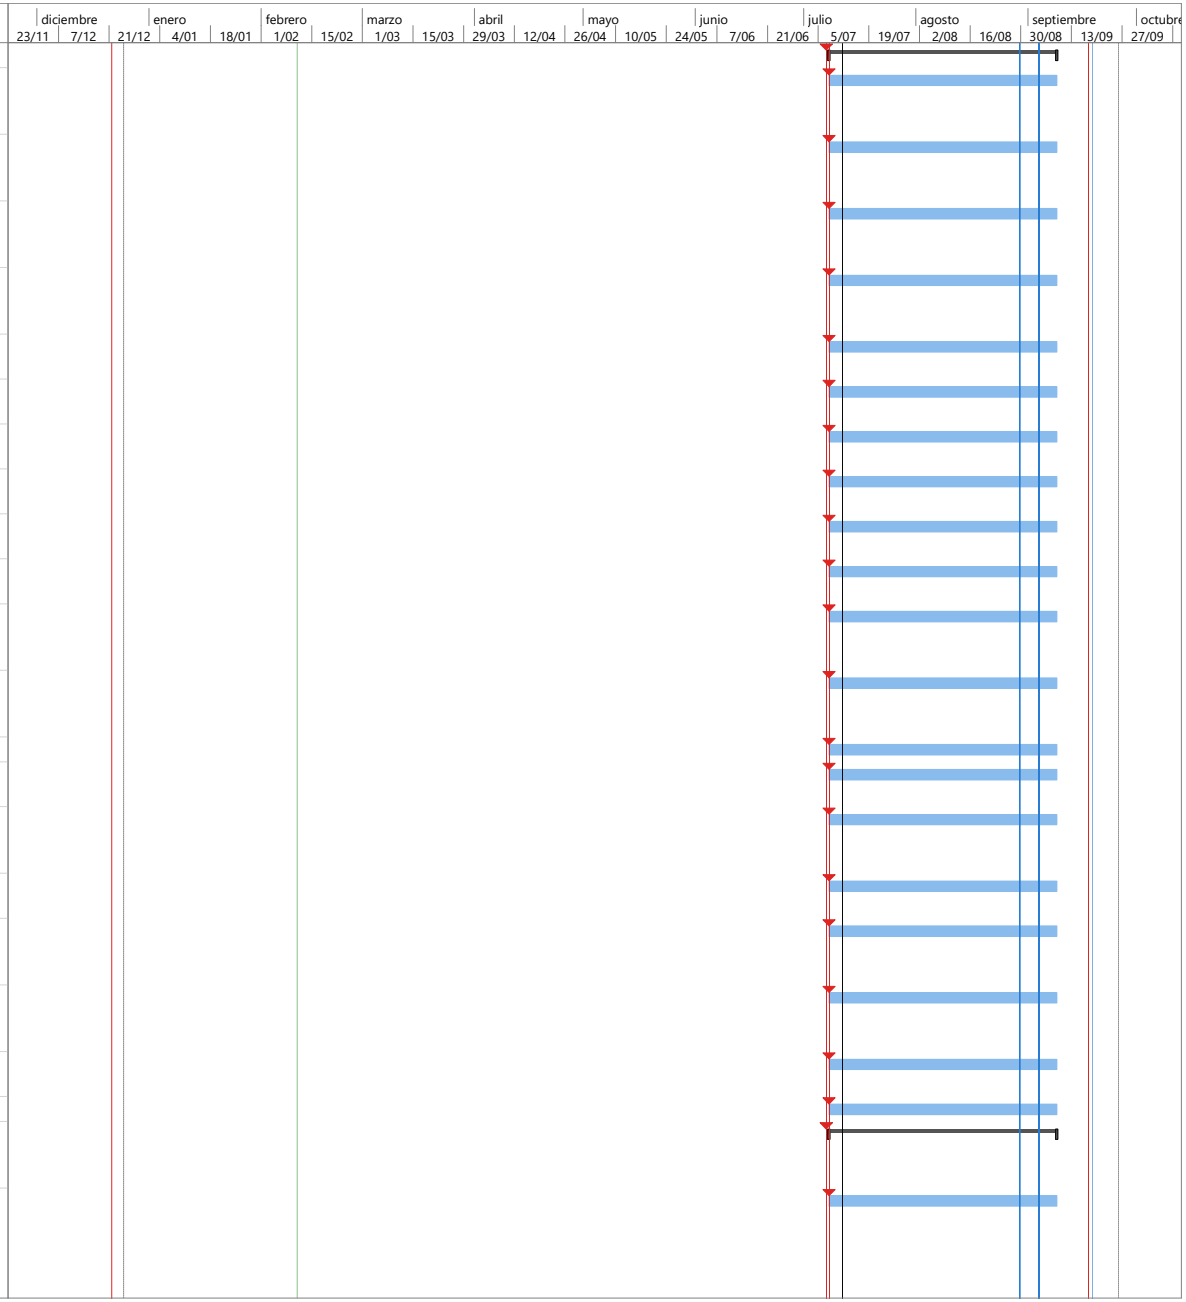

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
431	1.17.12.2	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
432	1.17.12.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø3/4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
433	1.17.12.4	ACCESORIOS PRESION Ø2"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
434	1.17.12.5	ACCESORIOS PRESION Ø3/4"	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
435	**1.17.13**	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
436	1.17.13.1	TRAMPA DE GRASAS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
437	1.17.13.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60M X 0,60M CON MARCO Y TAPA	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
438	1.17.13.3	EXCAVACIÓN	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
439	1.17.13.4	VIAJE VOLQUETA (5 M3) RETIRO DE ESCOMBROS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
440	**1.17.14**	**MONTAJE DE APARAT**	**45 días**	**mié 8/07/26**	**mar 8/09/26**	**$ 0,00**
441	1.17.14.1	MONTAJE SANITARIO PUSH	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
442	1.17.14.2	MONTAJE ORINAL	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
443	1.17.14.3	MONTAJE LAVAMANOS/LAVAP	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
444	1.17.14.4	MONTAJE LLAVE MANGUERA	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
445	1.17.14.5	MONTAJE CABEZAL DE PRUEBA	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
446	1.17.14.6	MONTAJE TOMA PARA BOMBEROS	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
447	1.17.14.7	MONTAJE GABINETE CONTRA INCENDIO	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
448	1.17.14.8	MONTAJE SIAMESA	45 días	mié 8/07/26	mar 8/09/26	$ 0,00
449	**1.17.15**	**RED DE GAS**	**30 días**	**mié 8/07/26**	**mar 18/08/26**	**$ 0,00**
450	1.17.15.1	TUBERÍA COBRE TIPO L Ø1 1/4"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
451	1.17.15.2	TUBERÍA COBRE TIPO L Ø1"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
452	1.17.15.3	TUBERÍA COBRE TIPO L Ø3/4"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
453	1.17.15.4	TUBERÍA COBRE TIPO L Ø1/2"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
454	1.17.15.5	TUBERÍA POLIETILENO GAS Ø1 1/4"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
455	1.17.15.6	TUBERÍA POLIETILENO GAS Ø1"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00



Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
456	1.17.15.7	TUBERÍA POLIETILENO GAS Ø3/4"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
457	1.17.15.8	ACCESORIOS COBRE Ø1 1/4"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
458	1.17.15.9	ACCESORIOS COBRE Ø1"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
459	1.17.15.1	ACCESORIOS COBRE Ø3/4"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
460	1.17.15.1	ACCESORIOS COBRE Ø1/2"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
461	1.17.15.1	ACCESORIOS POLIETILENO Ø1 1/4"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
462	1.17.15.1	REGISTRO PASO DIRECTO Ø1 1/4" PESADO - SECTORIZACIÓN	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
463	1.17.15.1	REGISTRO BOLA GAS Ø3/4"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
464	1.17.15.1	REGISTRO BOLA GAS Ø1 1/4"	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
465	1.17.15.1	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
466	1.17.15.1	REGATAS CON PULIDORA (NO INCLUYE RESANES)	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
467	1.17.15.1	CONEXIÓN APARATOS GAS	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
468	1.17.15.1	PRUEBAS HERMETICIDAD GAS	30 días	mié 8/07/26	mar 18/08/26	$ 0,00
469	**1.17.16**	**EQUIPOS**	**28 días**	**mié 19/08/26**	**vie 25/09/26**	**$ 0,00**
470	1.17.16.1	SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO AGUA FRIA POTABLE PARA UN CAUDAL DE 4,44 LTS/SEG Y CABEZA DINAMICA	10 días	mié 19/08/26	mar 1/09/26	$ 0,00
471	1.17.16.2	SUMINISTRO EQUIPO DE PRESION CONTRAINCENDIO PARA UN CAUDAL DE 250 GPM Y CABEZA DINAMICA TOTAL DE M.C.A. 59,00 M Y POTENCIA DE DISEÑO BOMBA LIDER DE 25 HP Y BOMBA JOCKEY CON CAUDAL DE	10 días	mié 19/08/26	mar 1/09/26	$ 0,00
472	1.17.16.3	MONTAJE BOMBA AGUA POTABLE	8 días	mié 16/09/26	vie 25/09/26	$ 0,00
473	1.17.16.4	MONTAJE BOMBA LIDER INCENDIO	8 días	mié 16/09/26	vie 25/09/26	$ 0,00
474	1.17.16.5	MONTAJE BOMBA JOCKEY INCENDIO	8 días	mié 16/09/26	vie 25/09/26	$ 0,00

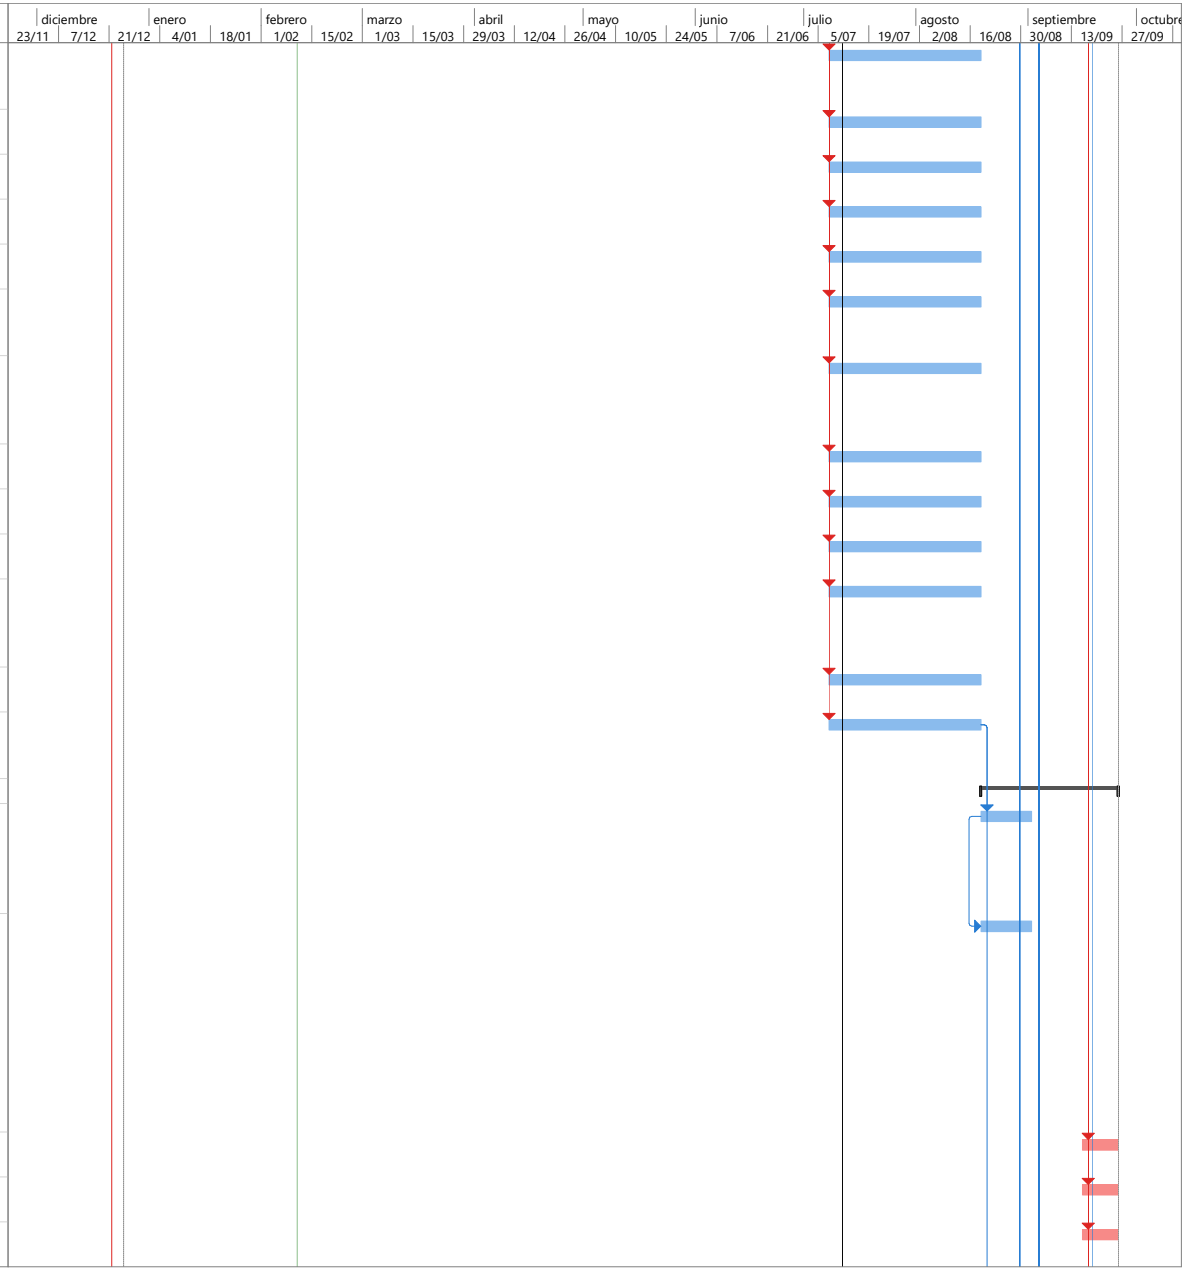

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
475	1.17.16.6	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (P R F V), VOLUMEN ÚTIL 48 M3	8 días	mié 16/09/26	vie 25/09/26	$ 0,00
476	1.17.16.7	MONTAJE HIDROACUMULADO	5 días	mié 16/09/26	mar 22/09/26	$ 0,00
477	**1.17.17**	**LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**	**2 días**	**mié 23/09/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
478	1.17.17.1	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 días	mié 23/09/26	jue 24/09/26	$ 0,00
479	**1.17.18**	**ELABORACION DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**	**10 días**	**mié 19/08/26**	**mar 1/09/26**	**$ 0,00**
480	1.17.18.1	ELABORACIÓN MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIONES	10 días	mié 19/08/26	mar 1/09/26	$ 0,00
481	**1.17.19**	**ELABORACION DE PLANOS RECORD**	**10 días**	**mié 2/09/26**	**mar 15/09/26**	**$ 0,00**
482	1.17.19.1	ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD	10 días	mié 2/09/26	mar 15/09/26	$ 0,00
483	**1.18**	**AIRE ACONDICIONADO**	**52 días**	**mié 15/07/26**	**jue 24/09/26**	**$ 266.216.754,09**
484	**1.18.1**	**EQUIPOS**	**10 días**	**mié 9/09/26**	**mar 22/09/26**	**$ 0,00**
495	**1.18.2**	**CONDUCTOS**	**20 días**	**vie 28/08/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
496	**1.18.2.1**	**DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA (UNIÓN TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN)**	**20 días**	**vie 28/08/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
497	1.18.2.1.	CAL 24	15 días	vie 28/08/26	jue 17/09/26	$ 0,00
498	1.18.2.1.	CAL 22	20 días	vie 28/08/26	jue 24/09/26	$ 0,00
499	**1.18.2.2**	**DUCTOS LAMINA NEGRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS EN LÁMINA NEGRA CALIBRE 16 CON UNIONES SOLDADAS (UNIÓN TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN)**	**20 días**	**vie 28/08/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
500	1.18.2.2.	CAL 16	20 días	vie 28/08/26	jue 24/09/26	$ 0,00

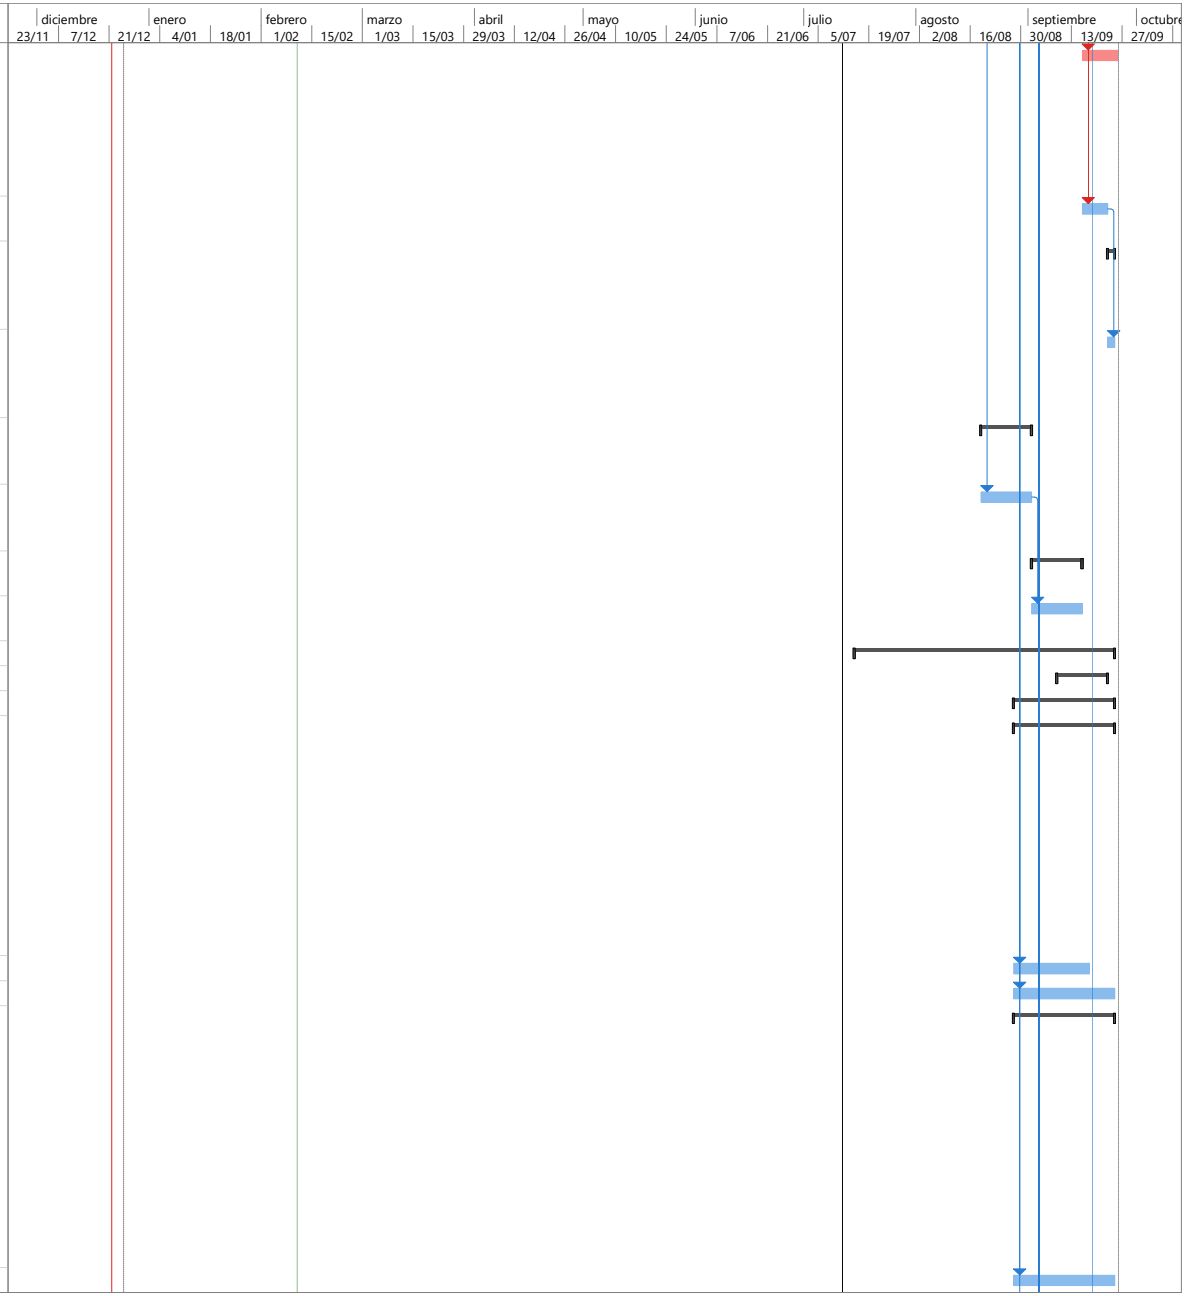

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
501	**1.18.2.3**	**DUCTOS POLIISOCIANURATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS EN POLIISOCIANURATO RECUBIERTO CON FOIL EN AMBAS CARAS (INCLUYE: MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN)**	**15 días**	**vie 28/08/26**	**jue 17/09/26**	**$ 0,00**
502	1.18.2.3.	ESPESOR 20MM INTERIORES	15 días	vie 28/08/26	jue 17/09/26	$ 0,00
503	**1.18.3**	**REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS**	**15 días**	**vie 4/09/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
504	**1.18.3.1**	**DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER**	**15 días**	**vie 4/09/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
505	1.18.3.1.	DS4V 9"x9"	15 días	vie 4/09/26	jue 24/09/26	$ 0,00
506	**1.18.3.2**	**DIFUSOR MODULAR 2 CONOS**	**15 días**	**vie 4/09/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
507	1.18.3.2.	DS 24"x24" Dia 10"	15 días	vie 4/09/26	jue 24/09/26	$ 0,00
508	**1.18.3.3**	**REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER**	**15 días**	**vie 4/09/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
509	1.18.3.3.	REAF / RRAF 8"x8"	15 días	vie 4/09/26	jue 24/09/26	$ 0,00
510	1.18.3.3.	REAF / RRAF 10"x10"	15 días	vie 4/09/26	jue 24/09/26	$ 0,00
511	1.18.3.3.	REAF / RRAF 34"x34"	15 días	vie 4/09/26	jue 24/09/26	$ 0,00
512	**1.18.3.4**	**REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER**	**15 días**	**vie 4/09/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
513	1.18.3.4.	RSDA 8"x8"	15 días	vie 4/09/26	jue 24/09/26	$ 0,00
514	**1.18.3.5**	**ANILLO DAMPER**	**15 días**	**vie 4/09/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
515	1.18.3.5.	AD 10"	15 días	vie 4/09/26	jue 24/09/26	$ 0,00
516	**1.18.3.6**	**MANGUERA FLEXIBLE AISLADA**	**15 días**	**vie 4/09/26**	**jue 24/09/26**	**$ 0,00**
517	1.18.3.6.	MF 10"	15 días	vie 4/09/26	jue 24/09/26	$ 0,00
518	**1.18.4**	**SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL**	**21 días**	**mié 15/07/26**	**mié 12/08/26**	**$ 0,00**
519	**1.18.4.1**	**TABLERO ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO ELÉCTRICO DE FUERZA. INCLUYE: (GABINETE, ACCESORIOS, MATERIAL, CABLEADO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)**	**12 días**	**mié 15/07/26**	**jue 30/07/26**	**$ 0,00**

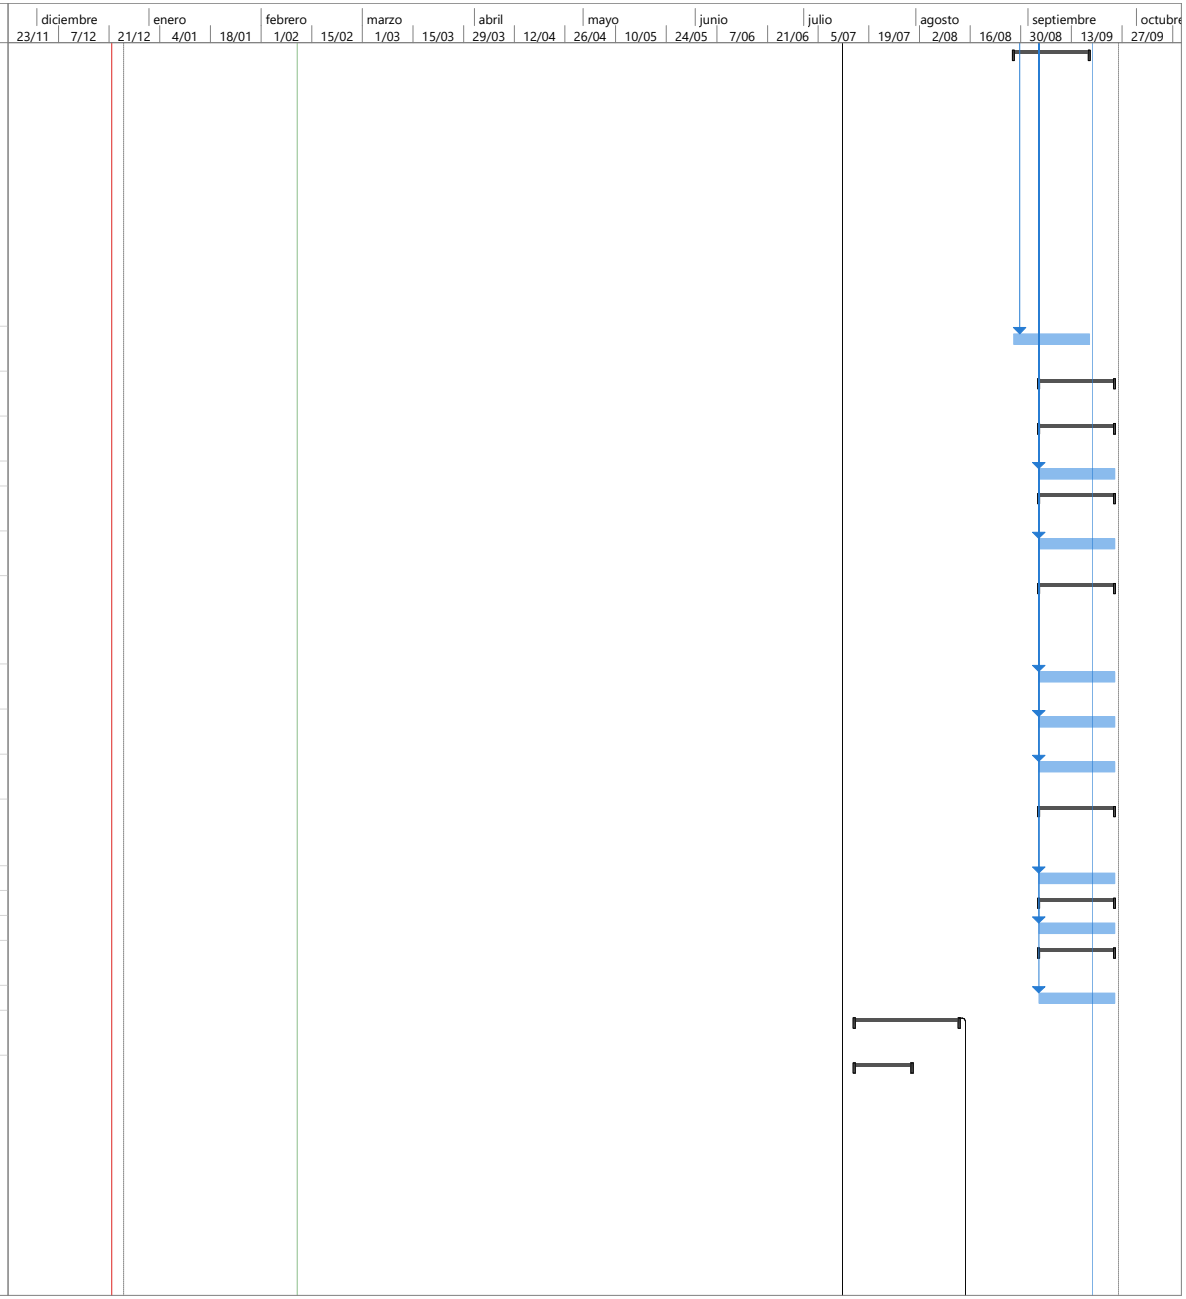

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
520	1.18.4.1.	TE-01 TABLERO ELÉCTRICO	12 días	mié 15/07/26	jue 30/07/26	$ 0,00
521	**1.18.4.2**	**SENSORES Y ACTUADORES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES. INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)**	**8 días**	**mié 15/07/26**	**vie 24/07/26**	**$ 0,00**
522	1.18.4.2.	TDA/BR TERMOSTATO DIGITAL AMBIENTE BULBO REMOTO UNA ETAPA.	8 días	mié 15/07/26	vie 24/07/26	$ 0,00
523	1.18.4.2.	IPA INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE	8 días	mié 15/07/26	vie 24/07/26	$ 0,00
524	1.18.4.2.	ON/OFF PULSADOR DE ARRANQUE	8 días	mié 15/07/26	vie 24/07/26	$ 0,00
525	**1.18.4.3**	**CABLEADO DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE CONTROL INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS)**	**12 días**	**jue 23/07/26**	**vie 7/08/26**	**$ 0,00**
526	1.18.4.3.	CB-03 2x22	12 días	jue 23/07/26	vie 7/08/26	$ 0,00
527	**1.18.4.4**	**TUBERIA IMC SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL TIPO IMC INCLUYE: (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PRUEBAS)**	**15 días**	**jue 23/07/26**	**mié 12/08/26**	**$ 0,00**
528	1.18.4.4.	DIA 1/2"	15 días	jue 23/07/26	mié 12/08/26	$ 0,00
529	**1.18.5**	**OTROS**	**10 días**	**jue 13/08/26**	**mié 26/08/26**	**$ 0,00**

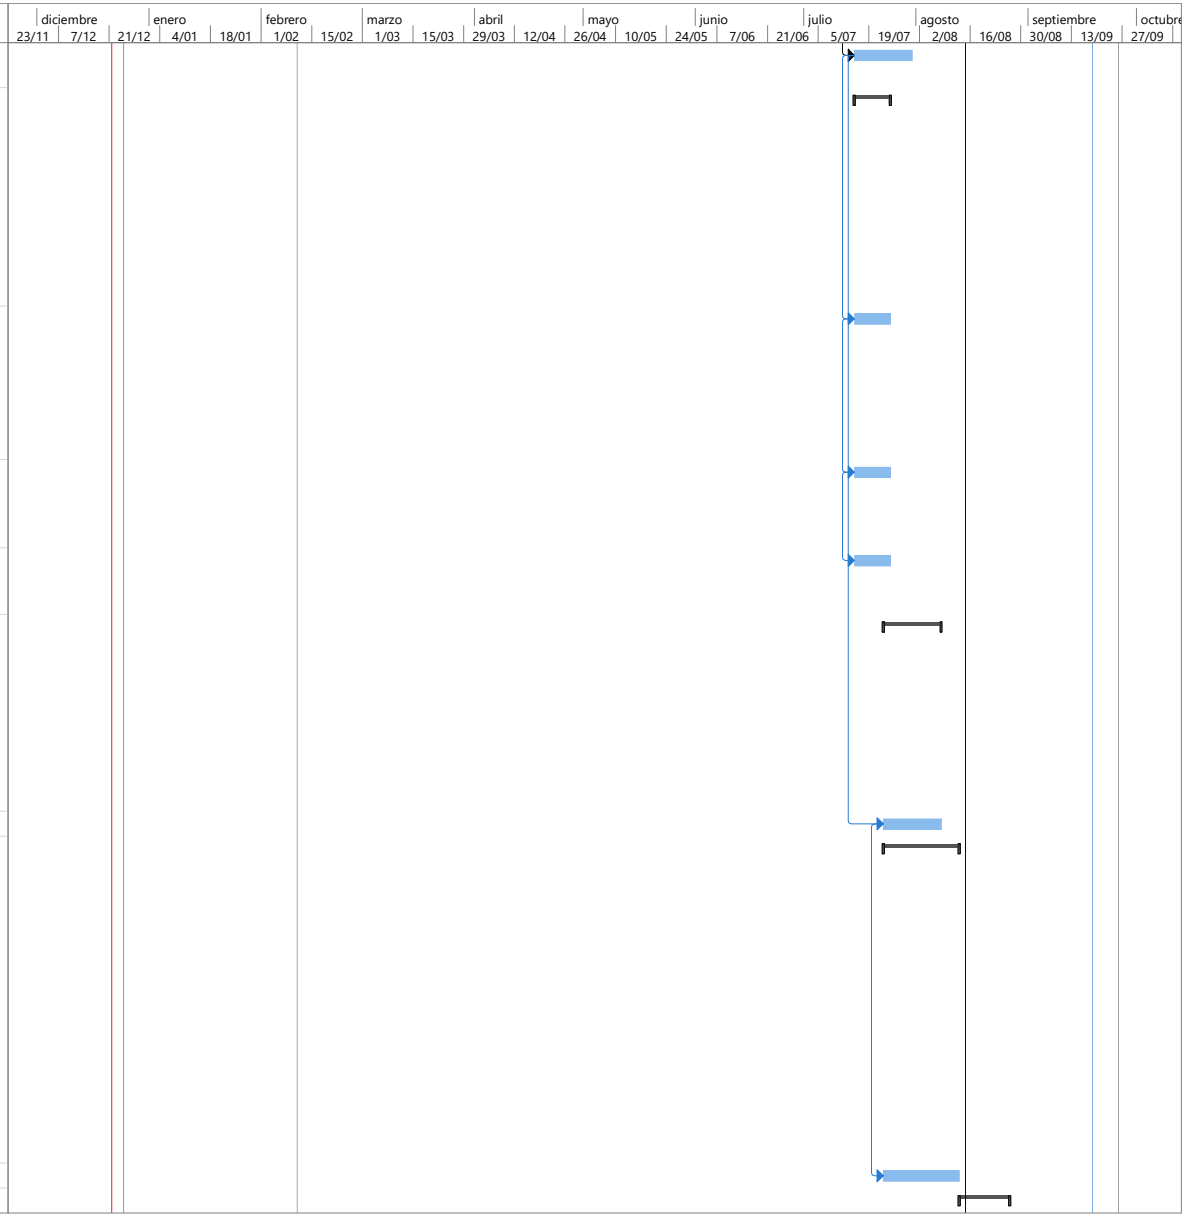

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo fijo
530	**1.18.5.1**	**INGENIERIA Y SUPERVISION SERVICIO DE INGENIERÍA, SUPERVISIÓN, TAB, BALANCEO, SANITIZACIÓN.**	**10 días**	**jue 13/08/26**	**mié 26/08/26**	**$ 0,00**
531	1.18.5.1.	I Y S INGENEIRIA Y SUPERVISIÓN	10 días	jue 13/08/26	mié 26/08/26	$ 0,00
532	1.18.5.1.	TAB PRUEBAS AJUSTE Y BALANCEO	10 días	jue 13/08/26	mié 26/08/26	$ 0,00
533	**1.19**	**PANEL MÓVIL**	2 días	jue 17/09/26	vie 18/09/26	**$ 45.824.389,24**
534	1.19.1	PANEL MOVIL EN LAMINA DE CEDRO COLOR NATURAL Y LACA MATE. 0,10 MT DE ESPESOR, 0,75 DE ANCHO Y 3,70 MT DE ALTO. PERFILERIA EN ALUMINIO. RIEL SUPERIOR SIN GUIA EN PISO.	2 días	jue 17/09/26	vie 18/09/26	$ 0,00
535	**2.20**	**ASEO DE OBRA**	**195 días**	**jue 25/12/25**	**mié 23/09/26**	**$ 2.962.242,50**
536	1.20.1	ASEO DURANTE Y FINAL DE OBRA	195 días	jue 25/12/25	mié 23/09/26	$ 0,00
537	**2.21**	**ASCENSOR**	**15 días**	**mié 8/07/26**	**mar 28/07/26**	**$ 202.381.432,00**
538	2.21.1	'SUMINISTRO HE INTALACION DE ASCENSOR ELECTRICO 2 PARADAS CON ACABADO EN CABINA, CONTROLADO CON TARJETA ELECTRÓNICA, CONTACTORES,	15 días	mié 8/07/26	mar 28/07/26	$ 0,00

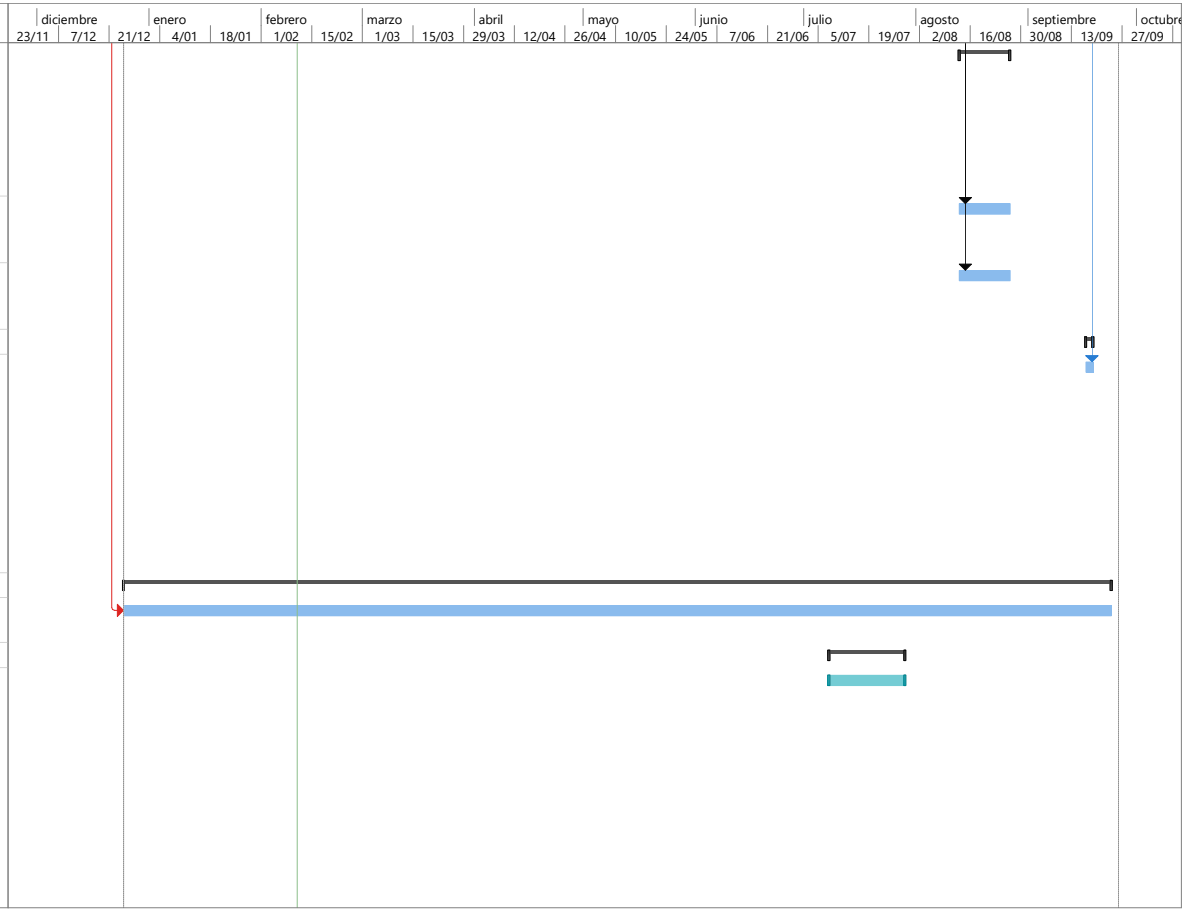

Proyecto: CAJICA
Fecha: mié 11/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
