

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo	Predecesoras
1			**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ**	**127 días**	**mar 10/02/26**	**jue 9/07/26**			**$ 1.500.000.000,00**	
2			**Preeliminares**	**25 días**	**mar 10/02/2**	**mar 10/03/2**			**$ 0,00**	
3			**Parque San Carlos 06-001**	**77 días**	**mar 24/03/2**	**mar 23/06/2**			**$ 417.357.967,00**	
4		**1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mar 24/03/2**	**mar 24/03/2**			**$ 4.858.320,00**	
5		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	mar 24/03/2	mar 24/03/2	ML	120,00	$ 4.858.320,00	
6		**2**	**DEMOLICIONES**	**6 días**	**jue 26/03/26**	**mié 1/04/26**			**$ 41.518.845,00**	
7		2,01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret	4 días	sáb 28/03/26	mié 1/04/26	M2	95,00	$ 4.006.245,00	8
8		2,03	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)	2 días	jue 26/03/26	vie 27/03/26	M2	600,00	$ 37.512.600,00	5FC+1 día
9		**3**	**DESMONTES Y RETIROS**	**8 días**	**jue 16/04/26**	**vie 24/04/26**			**$ 15.067.560,00**	
10		3,01	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10event	2 días	jue 16/04/26	vie 17/04/26	JGO	1,00	$ 150.693,00	18
11		3,07	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retir	2 días	sáb 18/04/26	lun 20/04/26	M2	55,00	$ 711.205,00	10
12		3,08	Desmonte Señal (IDG-S)	2 días	mar 21/04/2	mié 22/04/2	UN	2,00	$ 157.662,00	11
13		3,10	Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo M	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26	M2	50,00	$ 14.048.000,00	12
14		**4**	**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**21 días**	**sáb 28/03/26**	**jue 23/04/26**			**$ 103.630.680,00**	
15		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	4 días	sáb 28/03/26	mié 1/04/26	M3	350,00	$ 21.046.200,00	8
16		4,04	Compactación fondo de excavación con equipos livia	2 días	sáb 4/04/26	lun 6/04/26	M2	600,00	$ 872.400,00	15
17		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	7 días	jue 16/04/26	jue 23/04/26	M3	90,00	$ 28.925.280,00	18
18		4,08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	7 días	mié 8/04/26	mié 15/04/2	M3	120,00	$ 52.786.800,00	28
19		**5**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**			**$ 19.234.105,00**	
20		5,01	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	4 días	vie 24/04/26	mar 28/04/2	M2	155,00	$ 19.234.105,00	17
21		**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**22 días**	**sáb 25/04/2**	**mié 20/05/2**			**$ 54.086.186,00**	
22		8,07	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	6 días	sáb 25/04/26	vie 1/05/26	M2	55,00	$ 41.031.210,00	13
23		8,14	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Dem	4 días	lun 11/05/26	jue 14/05/26	UND	14,00	$ 3.396.484,00	25
24		8,15	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO	5 días	vie 15/05/26	mié 20/05/2	UND	7,00	$ 834.582,00	23
25		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	4 días	mié 6/05/26	sáb 9/05/26	M2	190,00	$ 7.420.070,00	26
26		8,22	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	4 días	vie 1/05/26	mar 5/05/26	ML	40,00	$ 1.403.840,00	39
27		**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**23 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 2/05/26**			**$ 98.975.209,00**	
28		9,05	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	M2	600,00	$ 9.903.600,00	16
29		9,06	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	1 día	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	M2	600,00	$ 52.315.800,00	30
30		9,07	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	1 día	vie 1/05/26	vie 1/05/26	M2	600,00	$ 2.068.200,00	31
31		9,08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	6 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26	ML	146,97	$ 22.235.529,00	17
32		9,14	Anden Cuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Gec	6 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26	M2	40	$ 12.452.080,00	17
33		**10**	**MOBILIARIO URBANO**	**7 días**	**jue 21/05/26**	**jue 28/05/26**			**$ 5.905.232,00**	
34		10,01	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	3 días	jue 21/05/26	sáb 23/05/26	UN	2,00	$ 1.544.400,00	24
35		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.du	2 días	lun 25/05/26	mar 26/05/2	UND	4,00	$ 2.823.772,00	34
36		10,41	Señal SC-120 2 caras (Sum + Inst)	1 día	mié 27/05/2	mié 27/05/2	UND	2,00	$ 1.158.152,00	35
37		10,45	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	1 día	jue 28/05/26	jue 28/05/26	UND	1,00	$ 378.908,00	36
38			**ITEMS NO PREVISTOS**	**44 días**	**sáb 25/04/2**	**lun 15/06/26**			**$ 53.739.126,00**	
39		NP-01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x(	5 días	sáb 25/04/26	jue 30/04/26	UND	7,00	$ 2.976.888,00	13
40		NP-04	RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(Su	7 días	lun 8/06/26	lun 15/06/26	M2	600,00	$ 50.762.238,00	29FC+30 días
41			**VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBR**	76 días	lun 16/03/26	sáb 13/06/26			$ 9.830.456,00	
42			**VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS (**	76 días	lun 16/03/26	sáb 13/06/26			$ 3.837.018,00	
43			**VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFIC**	76 días	lun 16/03/26	sáb 13/06/26			$ 6.675.230,00	
44			**Parque San Carlos Norte 06-002**	**104 días**	**lun 9/03/26**	**jue 9/07/26**			**$ 301.964.176,00**	
45		**1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 9/03/26**	**lun 9/03/26**			**$ 3.238.880,00**	
46		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	lun 9/03/26	lun 9/03/26	ML	80,00	$ 3.238.880,00	
47		**3**	**DESMONTES Y RETIROS**	**37 días**	**mar 10/03/2**	**jue 23/04/26**			**$ 45.592.299,00**	
48		3,01	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10event	4 días	mar 10/03/2	vie 13/03/26	JGO	1,00	$ 150.693,00	46
49		3,05	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	2 días	mié 22/04/2	jue 23/04/26	UNI	2,00	$ 372.922,00	51
50		3,07	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retir	4 días	sáb 14/03/26	mié 18/03/2	M2	220,00	$ 2.844.820,00	48
51		3,10	Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo M	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/2	M2	150,00	$ 42.144.000,00	61
52		3,12	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM*	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	UN	2,00	$ 79.864,00	50
53		**4**	**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/2**			**$ 4.810.560,00**	
54		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	4 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	M3	80,00	$ 4.810.560,00	49
55		**6**	**JUNTAS**	**2 días**	**jue 7/05/26**	**vie 8/05/26**			**$ 1.217.080,00**	
56		6,01	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	2 días	jue 7/05/26	vie 8/05/26	ML	20,00	$ 1.217.080,00	65
57		**7**	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**3 días**	**mié 29/04/2**	**vie 1/05/26**			**$ 1.459.020,00**	
58		7,02	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	3 días	mié 29/04/2	vie 1/05/26	M2	30,00	$ 1.459.020,00	54
59		**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**79 días**	**jue 19/03/26**	**sáb 20/06/2**			**$ 170.632.820,00**	
60		8,06	Arreglo de Graderias para Parque***	22 días	jue 19/03/26	mié 15/04/2	ML	80,00	$ 3.753.600,00	46FC+8 días
61		8,07	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	12 días	lun 6/04/26	sáb 18/04/26	M2	220,00	$ 164.124.840,...	63
62		8,15	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO	6 días	lun 15/06/26	sáb 20/06/26	UND	10	$ 1.192.260,00	69
63		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	4 días	lun 30/03/26	sáb 4/04/26	M2	40,00	$ 1.562.120,00	69
64		**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**4 días**	**sáb 2/05/26**	**mié 6/05/26**			**$ 13.879.194,00**	
65		9,02	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	4 días	sáb 2/05/26	mié 6/05/26	M2	94,00	$ 13.879.194,00	58
66		**10**	**MOBILIARIO URBANO**	**1 día**	**sáb 9/05/26**	**sáb 9/05/26**			**$ 1.179.778,00**	
67		10,42	Señal SC-80 2 caras (Sum + Inst)	1 día	sáb 9/05/26	sáb 9/05/26	UND	2,00	$ 1.179.778,00	56
68			**ITEMS NO PREVISTOS**	**30 días**	**sáb 21/03/2**	**lun 27/04/26**			**$ 45.236.321,00**	

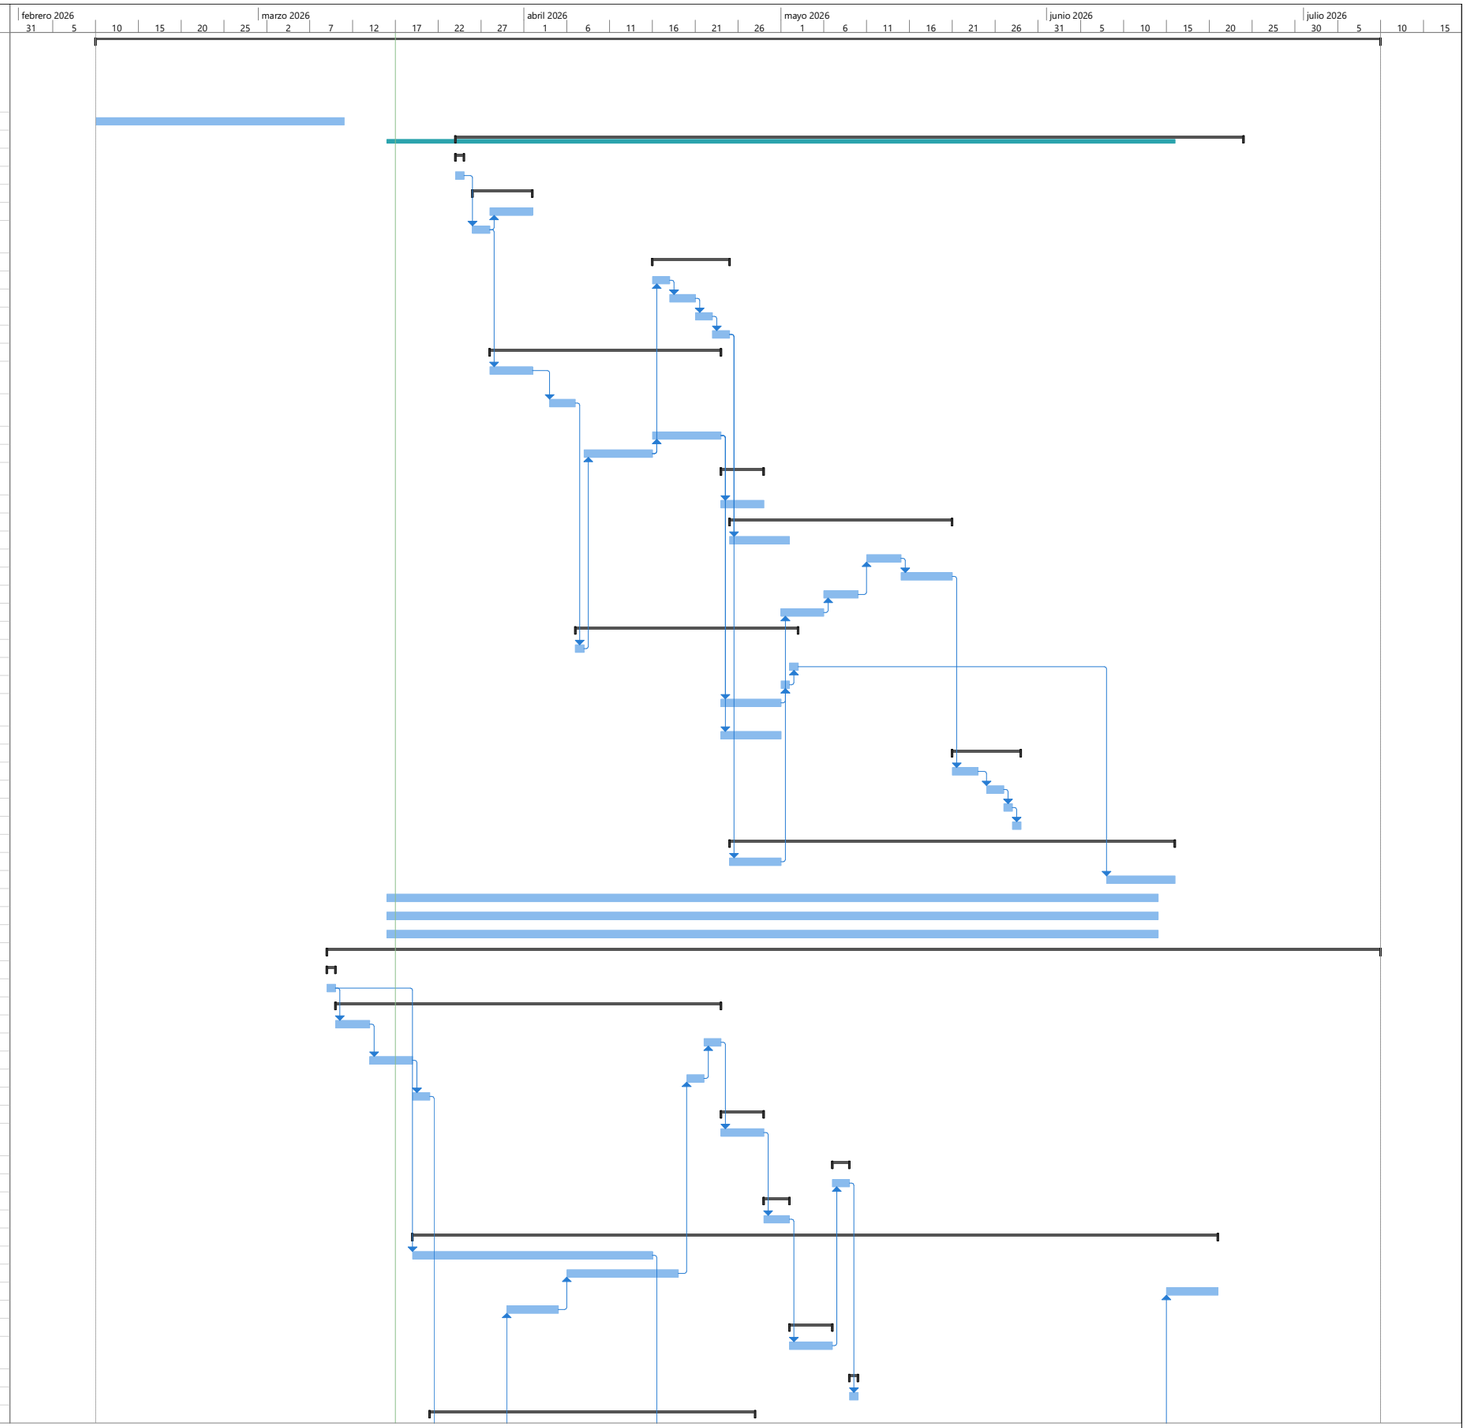

Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: mar 17/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo	Predecesoras
69		NP-01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	7 días	sáb 21/03/26	sáb 28/03/26	UND	15,00	$ 6.379.046,00	52
70		NP-02	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo +	4 días	jue 16/04/26	lun 20/04/26	M2	50,00	$ 785.596,00	60
71		NP-04	RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(SL	6 días	mar 21/04/26	lun 27/04/26	M2	450,00	$ 38.071.679,00	70
72			**VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBRAS (B)**	52 días	lun 11/05/26	jue 9/07/26			**$ 7.112.469,00**	
73			**VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS (**	52 días	lun 11/05/26	jue 9/07/26			**$ 2.776.135,00**	
74			**VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFIC**	52 días	lun 11/05/26	jue 9/07/26			**$ 4.829.620,00**	
75			**Parque Urbanizacion El Tunal II 06-024**	**92 días**	**vie 20/03/26**	**mar 7/07/26**			**$ 429.297.590,00**	
76		**1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**vie 20/03/26**	**vie 20/03/26**			**$ 4.858.320,00**	
77		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	ML	120,00	$ 4.858.320,00	
78		**2**	**DEMOLICIONES**	**3 días**	**sáb 21/03/26**	**mar 24/03/2**			**$ 55.755.456,00**	
79		2,01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret	3 días	sáb 21/03/26	mar 24/03/2	M2	96,00	$ 4.048.416,00	77
80		2,03	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue	3 días	sáb 21/03/26	mar 24/03/2	M2	800,00	$ 50.016.800,00	77
81		2,07	Demolicion Manual Gradas en Concreto +cargue	3 días	sáb 21/03/26	mar 24/03/2	M2	32,00	$ 1.690.240,00	77
82		**4**	**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**20 días**	**mié 25/03/2**	**sáb 18/04/2**			**$ 158.390.401,00**	
83		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-Blan	4 días	mié 25/03/26	sáb 28/03/26	M3	400,00	$ 24.052.800,00	80
84		4,04	Compactación fondo de excavación con equipos	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26	M2	851,60	$ 1.238.226,00	83
85		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	7 días	sáb 11/04/26	sáb 18/04/26	M3	171,60	$ 55.150.867,00	86
86		4,08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	7 días	mié 1/04/26	vie 10/04/26	M3	177,20	$ 77.948.508,00	98
87		**5**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**2 días**	**jue 7/05/26**	**vie 8/05/26**			**$ 17.248.649,00**	
88		5,01	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	2 días	jue 7/05/26	vie 8/05/26	M2	139,00	$ 17.248.649,00	92
89		**6**	**JUNTAS**	**2 días**	**sáb 9/05/26**	**lun 11/05/26**			**$ 2.616.722,00**	
90		6,01	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	2 días	sáb 9/05/26	lun 11/05/26	ML	43,00	$ 2.616.722,00	88
91		**7**	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**7 días**	**mié 29/04/2**	**mié 6/05/26**			**$ 3.890.720,00**	
92		7,02	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	7 días	mié 29/04/26	mié 6/05/26	M2	80,00	$ 3.890.720,00	99
93		**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**62 días**	**mié 25/03/2**	**sáb 6/06/26**			**$ 21.287.574,00**	
94		8,13	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	1 día	mié 25/03/26	mié 25/03/26	UND	2,00	$ 1.294.574,00	80
95		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	6 días	lun 1/06/26	sáb 6/06/26	M2	200,00	$ 7.810.600,00	96FF
96		8,18	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	4 días	mié 3/06/26	sáb 6/06/26	M2	800,00	$ 12.182.400,00	99FC+30 días
97		**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**23 días**	**mar 31/03/2**	**mar 28/04/2**			**$ 129.887.616,00**	
98		9,05	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	M2	800,00	$ 13.204.800,00	84
99		9,06	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	M2	800,00	$ 69.754.400,00	100
100		9,07	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	1 día	lun 27/04/26	lun 27/04/26	M2	800,00	$ 2.757.600,00	102
101		9,08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-co	6 días	lun 20/04/26	sáb 25/04/26	ML	206,00	$ 31.166.976,00	85
102		9,12	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 10(	6 días	lun 20/04/26	sáb 25/04/26	ML	80,00	$ 13.003.840,00	85
103		**10**	**MOBILIARIO URBANO**	**3 días**	**lun 8/06/26**	**mié 10/06/2**			**$ 11.295.088,00**	
104		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.du	3 días	lun 8/06/26	mié 10/06/26	UND	16,00	$ 11.295.088,00	96
105			**ITEMS NO PREVISTOS**	**7 días**	**jue 11/06/26**	**jue 18/06/26**			**$ 3.142.384,00**	
106		NP-02	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo +	7 días	jue 11/06/26	jue 18/06/26	M2	200,00	$ 3.142.384,00	104
107			**VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBR**	76 días	lun 2/03/26	sáb 30/05/26			$ 10.111.682,00	
108			**VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS (**	76 días	lun 2/03/26	sáb 30/05/26			$ 3.946.786,00	
109			**VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFIC**	76 días	lun 2/03/26	sáb 30/05/26			$ 6.866.192,00	
110			**Parque Urbanizacion El Tunal II 06-024**	**86 días**	**lun 30/03/26**	**jue 9/07/26**			**$ 351.380.267,00**	
111		**1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 30/03/26**	**lun 30/03/26**			**$ 4.858.320,00**	
112		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26	ML	120,00	$ 4.858.320,00	
113		**2**	**DEMOLICIONES**	**4 días**	**mar 31/03/2**	**lun 6/04/26**			**$ 47.813.116,00**	
114		2,01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret	4 días	mar 31/03/26	lun 6/04/26	M2	96,00	$ 4.048.416,00	112
115		2,03	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue	4 días	mar 31/03/26	lun 6/04/26	M2	700,00	$ 43.764.700,00	112
116		**3**	**DESMONTES Y RETIROS**	**1 día**	**mar 7/04/26**	**mar 7/04/26**			**$ 1.864.610,00**	
117		3,05	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	UNI	10,00	$ 1.864.610,00	114
118		**4**	**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**20 días**	**mié 8/04/26**	**jue 30/04/26**			**$ 117.394.760,00**	
119		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	4 días	mié 8/04/26	sáb 11/04/26	M3	350,00	$ 21.046.200,00	117
120		4,04	Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	M2	700,00	$ 1.017.800,00	119
121		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	7 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	M3	105,00	$ 33.746.160,00	122
122		4,08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	7 días	mié 15/04/26	mié 22/04/26	M3	140,00	$ 61.584.600,00	133
123		**5**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**2 días**	**sáb 25/04/26**	**lun 27/04/26**			**$ 10.423.644,00**	
124		5,01	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	2 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	M2	84,00	$ 10.423.644,00	126
125		**7**	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**2 días**	**jue 23/04/26**	**vie 24/04/26**			**$ 4.863.400,00**	
126		7,02	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26	M2	100,00	$ 4.863.400,00	122
127		**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**60 días**	**lun 13/04/26**	**sáb 20/06/26**			**$ 19.434.234,00**	
128		8,13	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	UND	2,00	$ 1.294.574,00	119
129		8,15	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS	4 días	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	UND	10,00	$ 1.192.260,00	130FF
130		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	4 días	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	M2	200,00	$ 7.810.600,00	131FF
131		8,18	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	4 días	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	M2	600,00	$ 9.136.800,00	134FC+30 días
132		**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**25 días**	**mar 14/04/2**	**mar 12/05/2**			**$ 121.953.796,00**	
133		9,05	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/26	M2	600,00	$ 9.903.600,00	120
134		9,06	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	1 día	mar 12/05/26	mar 12/05/26	M2	700,00	$ 61.035.100,00	135
135		9,07	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26	M2	700,000	$ 2.412.900,00	137
136		9,08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-co	5 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	ML	260,00	$ 39.336.960,00	121
137		9,12	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 10(	3 días	jue 7/05/26	sáb 9/05/26	ML	57,00	$ 9.265.236,00	136
138		**10**	**MOBILIARIO URBANO**	**1 día**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/26**			**$ 5.647.544,00**	
139		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.du	1 día	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	UND	8,00	$ 5.647.544,00	129FF
140			**VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBR**	70 días	lun 20/04/26	jue 9/07/26			$ 8.276.416,00	

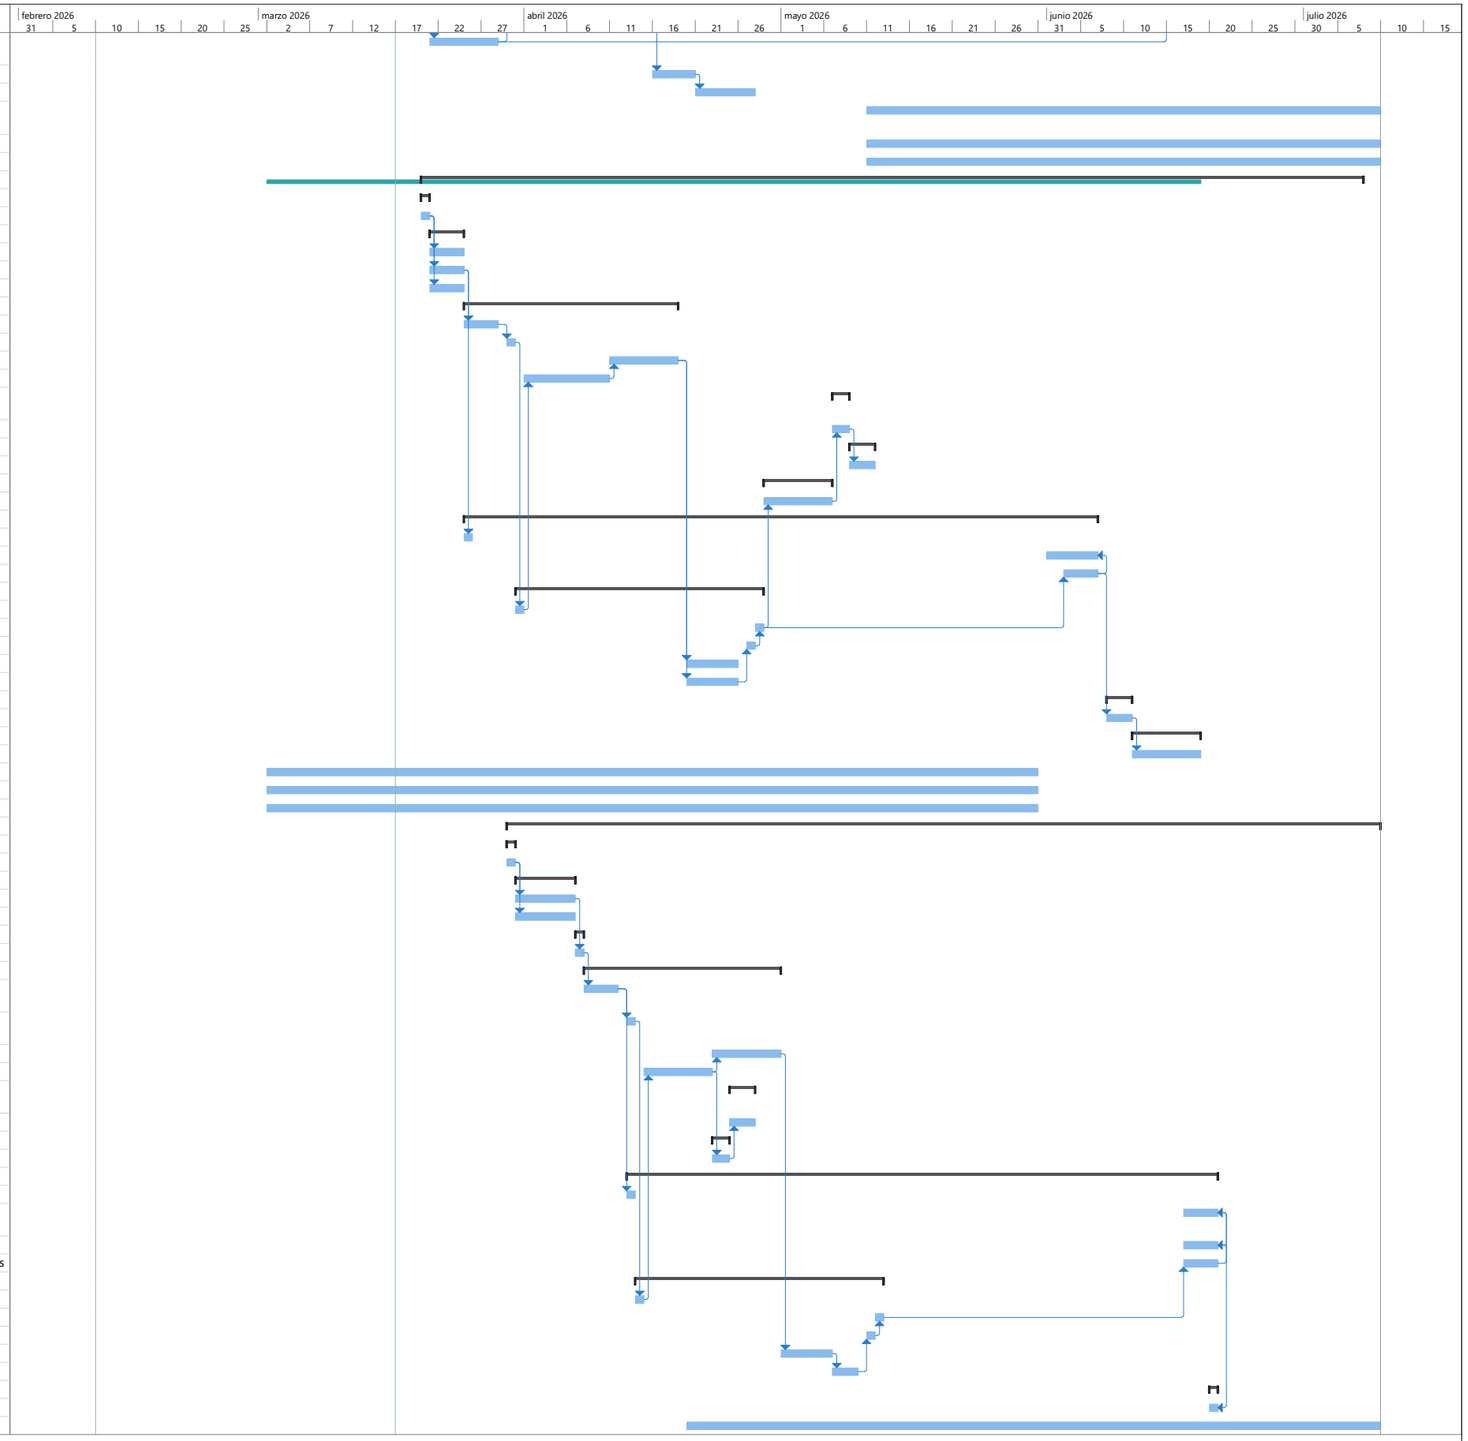

Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: mar 17/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo	Predecesoras
141			**VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS (**	70 días	lun 20/04/26	jue 9/07/26			$ 3.230.446,00	
142			**VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFIC**	70 días	lun 20/04/26	jue 9/07/26			$ 5.619.981,00	



Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: mar 17/03/26

Tarea, Hito, Resumen del proyecto, Hito inactivo, Tarea manual, Informe de resumen manual, solo el comienzo, Tareas externas, Fecha límite, Progreso manual
División, Resumen, Tarea inactiva, Resumen inactivo, solo duración, Resumen manual, solo fin, Hito externo, Progreso

Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: mar 17/03/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso



Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: mar 17/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual

División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

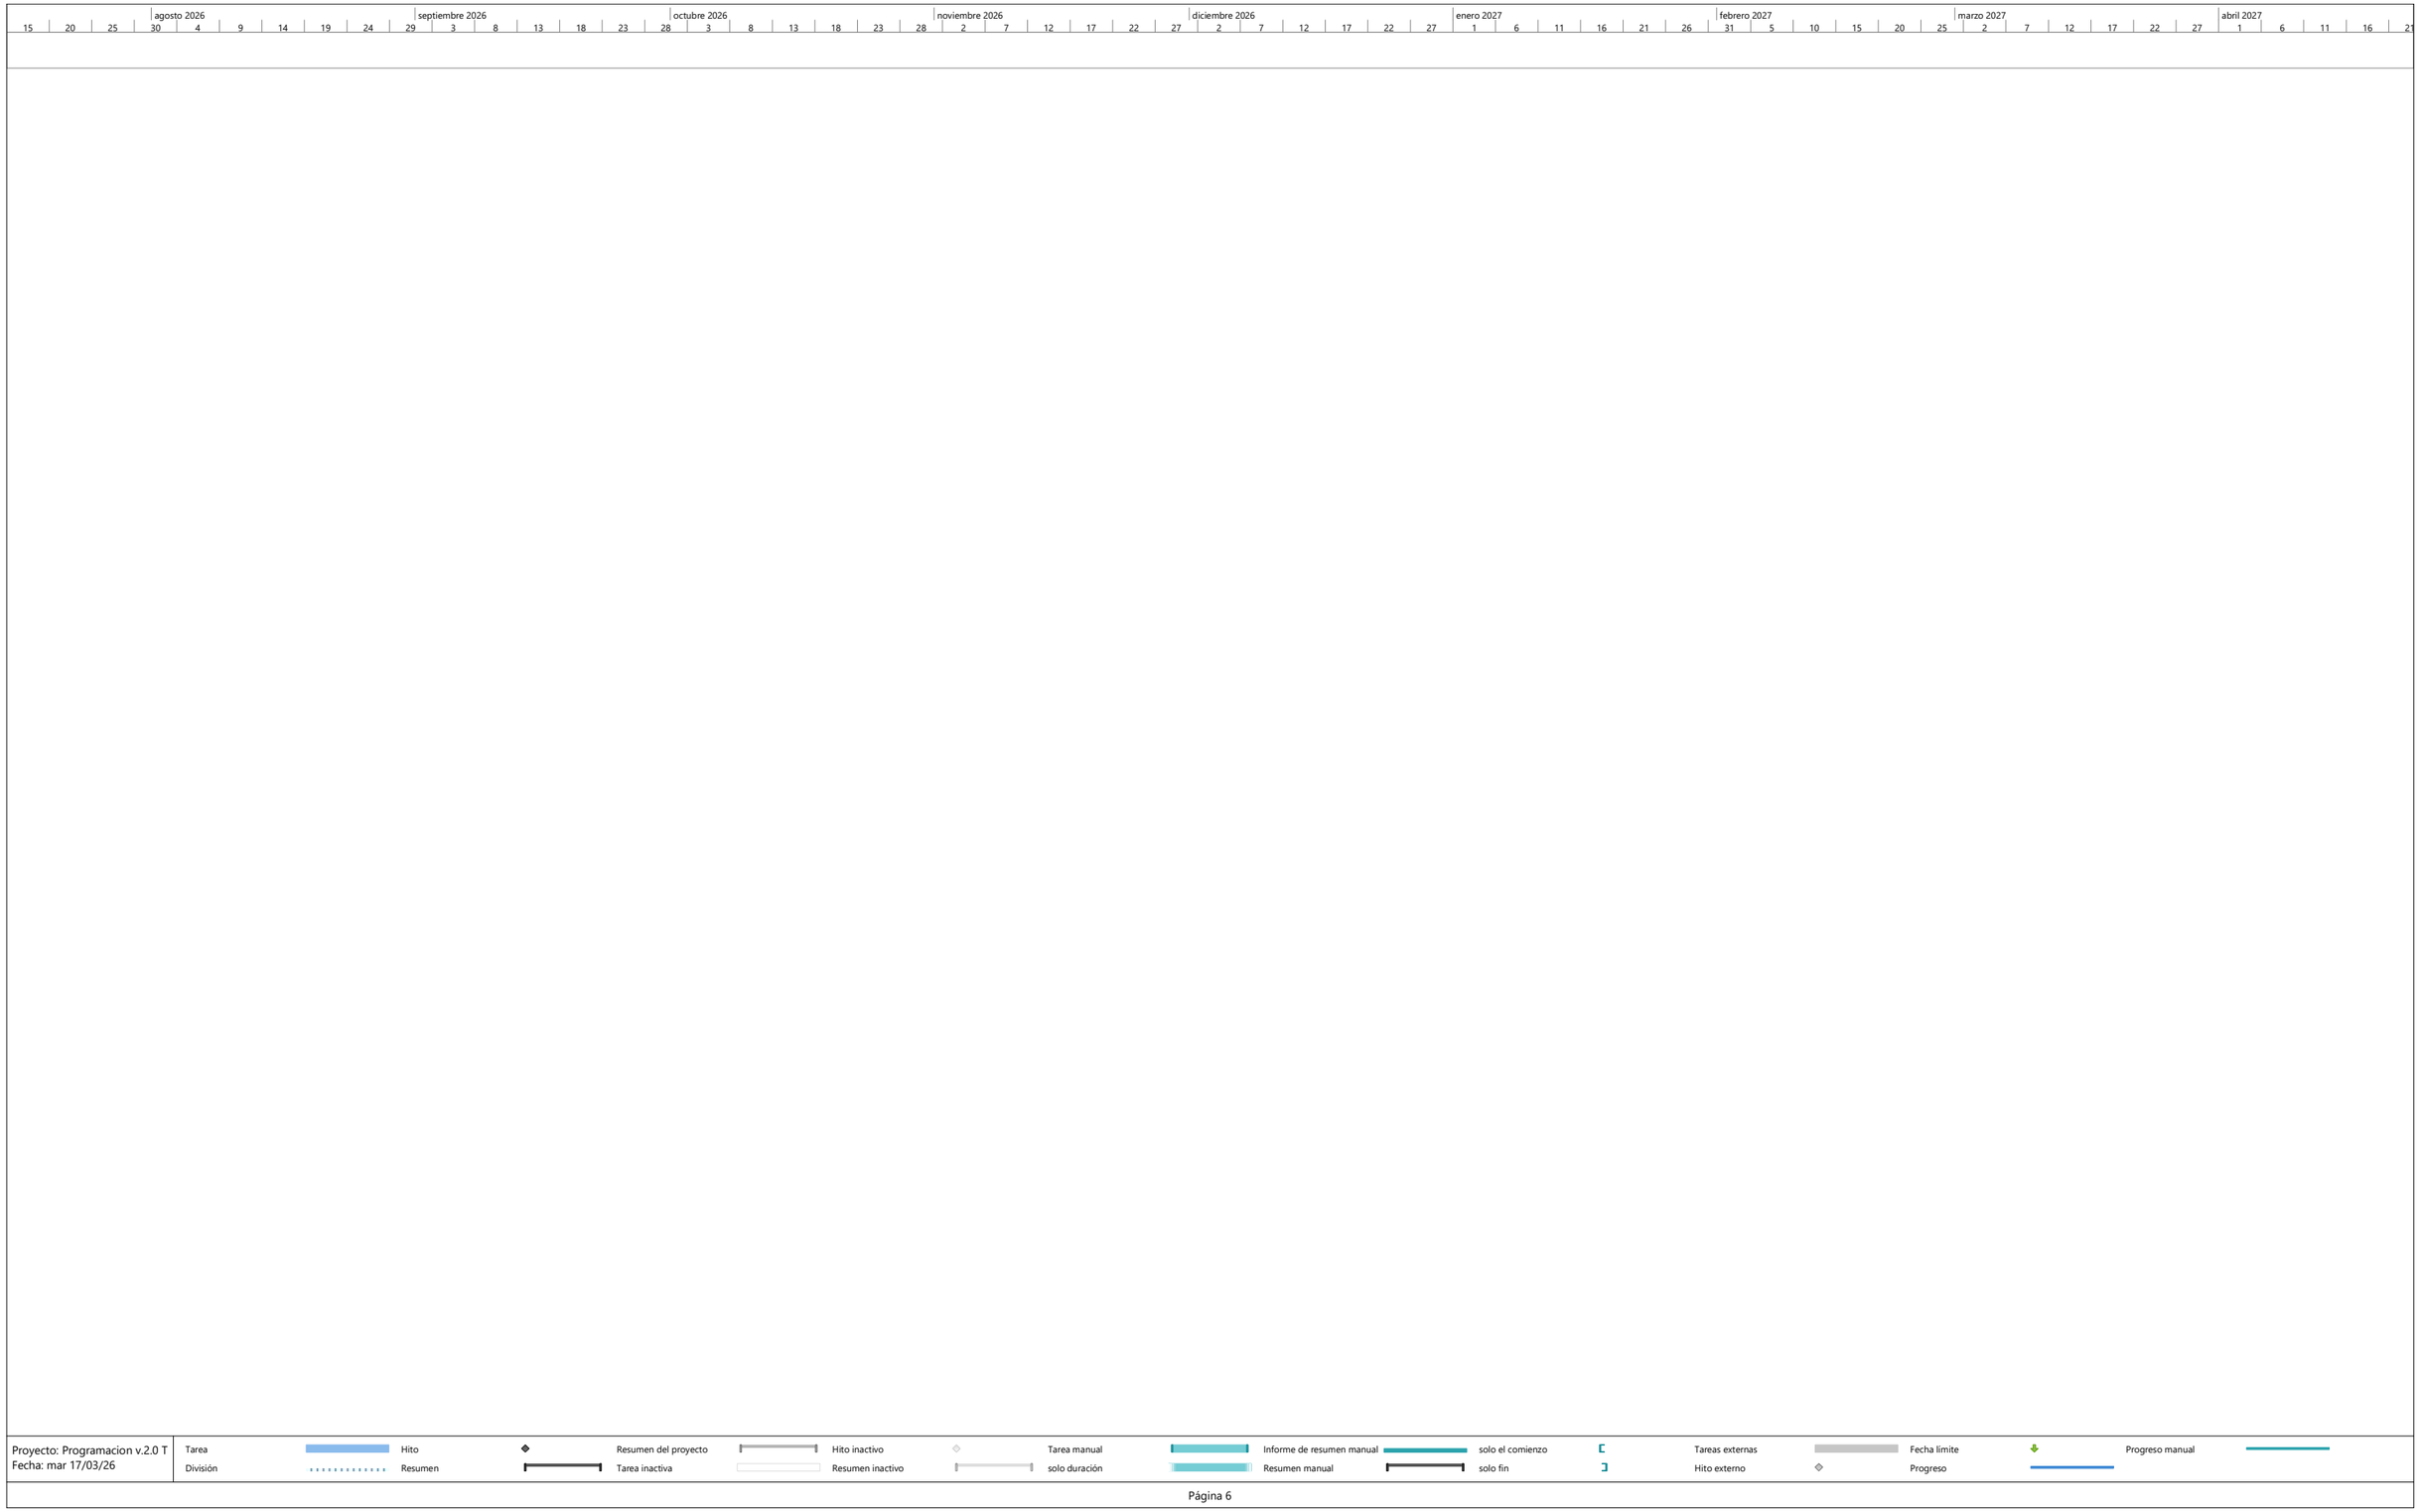

Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: mar 17/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual

División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
