GRUPO

ABC MEDIA SAS

INFORME FINAL DE OBRA E INSTALACION DE FACHADAS CONTRATO No. 100.23.21.20260047.

Proyecto: Intervencion de fachadas- Alirio Mora- Lagos- Diamante

Entidad Contratante: Red de Salud Oriente

Fecha: 12 de mayo de 2026

Empresa Ejecutora: Grupo ABC Media SAS

1. **OBJETO DEL INFORME**

   El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la entrega de las fachadas ubicadas en los sectores de Alirio Mora y Los lagos, Diamante ejecutadas para la **Red de Salud Oriente,** conforrme a los requerimientos establecidos.

2. **ALCANCE DEL PROYECTO**

   El proyecto incluyo las siguientes actividades:

   - Levantamiento y validacion de medidas en sitio
   - Diseño, fabricacion y adecuacion de estructuras metalicas

- Aplicación de acabados mediante pintura electrostatica
- Transporte de materiales
- Instalacion completa en sitio
- Ajustes finales y verificacion de Calidad

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS LETREROS Y FACHADAS

Letrero-Alirio Mora

- **Dimensiones:** 4.50 x 1.07 metros de alto
- **Estructura:** Fabricada en tubo metalico 4” x 2” calibre 18, garantizando rigidez y estabilidad estructural
- **Recubrimiento:** Forrado en lamina metalica,con cortes realizados mediante tecnologia laser en 3D bajo diseño tipo cosmos.
- **Acabado :** Aplicación de pintura electrostatica distribuida de la siguiente manera. Parte superior en color Azul Mediterraneo. Parte inferior en color Verde Primaveral.
- **Letras**
  - Elaboradas en acero inoxidable calibre 20
  - Altura de 50 cm
  - Con cantonera de 7 cm ensambladas mediante soldadura de punto. Garantizando firmeza y acabado estetico.

GRUPO

ABC MEDIA SAS

Condiciones de Instalacion

- Se reciben superficies (paredes) previamente pintadas y listas para la instalacion.
- Instalacion realizada a una altura de 3 mts
- Sistema de fijacion mediante chazos y tornillos de 2 pulgadas por ¾, asegurando anclaje firme y seguro.

Letrero – IPS Los Lagos

- **Dimensiones:** 5.70 x 1.07 metros de alto
- **Estructura:** Fabricada en tubo metalico 4” x 2” calibre 18, garantizando rigidez y estabilidad estructural
- **Recubrimiento:** Forrado en lamina metalica,con cortes realizados mediante tecnologia laser en 3D bajo diseño tipo cosmos.
- **Acabado :** Aplicación de pintura electrostatica distribuida de la siguiente manera. Parte superior en color Azul Mediterraneo. Parte inferior en color Verde Primaveral.
- **Letras**
  - Elaboradas en acero inoxidable calibre 20
  - Altura de 50 cm

  Con cantonera de 7 cm ensambladas mediante soldadura de punto

Letrero IPS Diamante

- Se implementan las mismas especificaciones tecnicas, materiales, diseño y acabados y sistema constructivo descritos para el letrero de Ips los lagos.

4. **CONDICIONES DE ENTREGA**
    - Las fachadas fueron instaladas conforme a los planos aprobados
    - Se garantiza correcta nivelacion, alineacion y fijacion estructural
    - Se verifico el cumplimiento de las condiciones esteticas y de calidad
    - Los elementos se entregan en optimas condiciones de funcionamiento y presentacion.
5. **REGISTRO FOTOGRAFICO**


    Se anexan evidencias fotograficas del antes, durante y despues del proceso de instalacion en los puntos intervenidos.
    - Los Lagos
    - Diamante

6. CONCLUSIONES

El proyecto fue ejecutado cumpliendo con las especificaciones tecnicas, tiempos establecidos y estandares de calidad requeridos por la entidad contratante. Las fachadas instaladas contribuyen a la visibilidad de los puntos de atencion de la Red de Salud del Oriente.

IPS ALIRIO MORA

PLANO

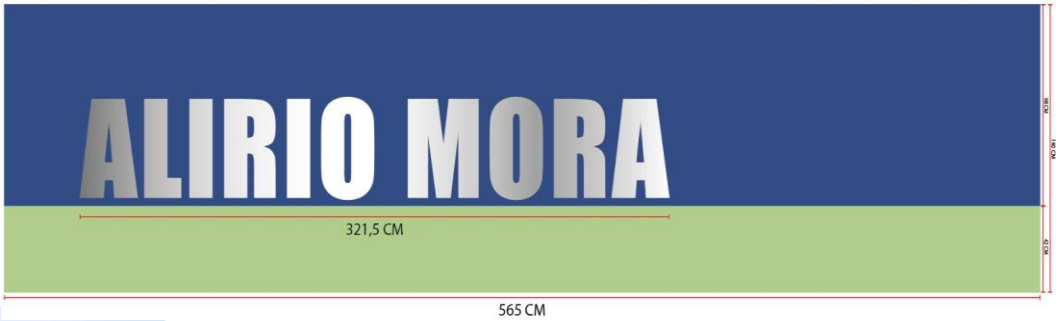



GRUPO

ABC MEDIA SAS





Av 2 CN No. 23 AN-64 B/ San Vicente Cali - Valle del Cauca

GRUPO


ABC MEDIA SAS



Av 2 CN No. 23 AN-64 B/ San Vicente Cali - Valle del Cauca

GRUPO

ABC MEDIA SAS

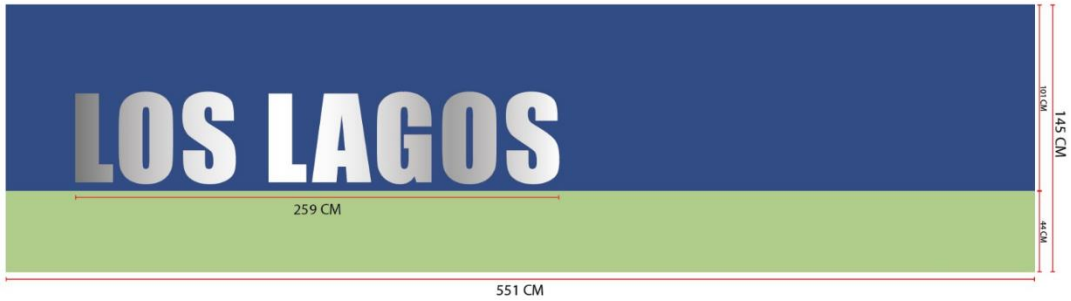

IPS LOS LAGOS



Av 2 CN No. 23 AN-64 B/ San Vicente Cali - Valle del Cauca

GRUPO

ABC MEDIA SAS





Av 2 CN No. 23 AN-64 B/ San Vicente Cali - Valle del Cauca

GRUPO

ABC MEDIA SAS



Av 2 CN No. 23 AN-64 B/ San Vicente Cali - Valle del Cauca

GRUPO

ABC MEDIA SAS

IPS DIAMANTE



Cordialmente,

Represent ante legal
