
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**PROYECTO DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL BOYACA EN LA CIUDAD DE TUNJA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**	**81 días**	**lun 22/12/25**	**lun 30/03/26**		**$441.432.853,00**
2		INICIO	0 días	lun 22/12/25	lun 22/12/25		$0,00
3		DIAGNOSTICO, INSPECCION Y RECONOCIMIENTO AREA A INTERVENIR	3 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25	2	$0,00
4		DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	6 días	mié 14/01/26	mar 20/01/26	5FC+10 días	$0,00
5		FIRMA ACTA DE INICIO DE OBRA	1 día	mar 30/12/25	mar 30/12/25	3	$0,00
6		**CAP. 1: PRELIMINARES**	**57 días**	**jue 22/01/26**	**lun 30/03/26**		**$16.004.478,00**
7		Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. VER ANEXO TÉCNICO	22 días	mié 18/02/26	sáb 14/03/26	11FC+20 días	$4.031.150,00
8		Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales), VER ANEXO TÉCNICO	20 días	mié 18/02/26	jue 12/03/26	7CC	$627.660,00
9		Demolición de enchape existente (terminado de muros). VER ANEXO TÉCNICO	25 días	mié 18/02/26	mié 18/03/26	7CC	$5.018.132,00
10		Desmonte de divisiones de baño en lámina metálica, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	8CC	$284.580,00
11		Demolición de impermeabilización de terraza (manto asfaltico) VER ANEXO TÉCNICO	3 días	jue 22/01/26	sáb 24/01/26	4FC+1 día	$765.116,00
12		Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad VER ANEXO TÉCNICO	13 días	mar 24/02/26	mar 10/03/26	7CC+5 días	$192.430,00
13		Regatas para instalación de puntos hidráulicos, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	12CC+5 días	$74.744,00
14		Pase de placa de diametro 0,12 m. VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	13CC	$36.750,00
15		Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, VER ANEXO TÉCNICO	3 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	7CC+2 días	$1.549.287,00
16		Desmonte, adecuación y reinstalación de mesas de necropsias; VER ANEXO TÉCNICO	25 días	mié 18/02/26	mié 18/03/26	7CC	$1.172.012,00
17		Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. VER ANEXO TÉCNICO	22 días	mié 18/02/26	sáb 14/03/26	16CC	$73.568,00
18		Demolición de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural VER ANEXO	1 día	mié 18/02/26	mié 18/02/26	7CC	$35.955,00
19		Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, VER ANEXO TÉCNICO	24 días	mié 18/02/26	mar 17/03/26	16CC	$87.272,00
20		Limpieza y desinfección con hipoclorito VER ANEXO TÉCNICO	3 días	vie 27/03/26	lun 30/03/26	16;173FC+1 día	$351.540,00
21		Desmonte de lavamanos quirúrgico en acero inoxidable, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	15	$68.123,00
22		Retiro de raices en terreno. VER ANEXO TÉCNICO	3 días	mié 4/03/26	vie 6/03/26	14	$349.486,00
23		Demolición de afinado en pendientado de cubiertas planas hasta encontrar placa de concreto (espesor entre 4 y 8 cms) . VER ANEXO	6 días	lun 23/02/26	sáb 28/02/26	7CC+4 días	$1.286.673,00
24		**CAP. 2: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**33 días**	**mar 3/02/26**	**jue 12/03/26**		**$1.218.846,00**
25		Suministro e instalación de Punto Sanitario de 2", incluye tubería hasta 1,50 m, accesorios PVC, limpiador, soldadura PVC, regatas, resanes y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad VER ANEXO	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	26	$126.825,00
26		Suministro e instalación de Tubería PVC-sanitaria ⌀2", incluye tubería PVC, accesorios PVC, limpiador, soldadura PVC, regatas, resanes y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la	1 día	lun 23/02/26	lun 23/02/26	30FC-15 días	$54.920,00
27		Suministro e instalación de Punto agua fría de ⌀1/2", incluye tubería hasta 1,5 m, accesorios de PVC, limpiador, soldadura PVC y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad. VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	26	$26.681,00
28		Suministro e instalación de Red agua fría PVC presión ⌀1/2", Incluye tubería de PVC RDE 9, accesorios de PVC, limpiador, soldadura PVC y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad. VER ANEXO	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	27CC	$51.840,00
29		Suministro e instalación de Registro PVC 1/2" (Válvula 235 PSI) tipo pesado, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 24/02/26	mar 24/02/26	28CC	$45.836,00
30		Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica incluye elementos y materiales VER ANEXO TÉCNICO	32 días	mar 3/02/26	mié 11/03/26	111CC	$544.236,00
31		Suministro e instalación de rejilla aluminio 4 x 3 ". VER ANEXO TÉCNICO	13 días	jue 26/02/26	jue 12/03/26	30FC-12 días	$368.508,00
32		**CAP. 3: INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS**	**40 días**	**mié 4/02/26**	**sáb 21/03/26**		**$163.067.775,00**
33		**3.1: Instalaciones electricas e iluminacion**	**39 días**	**mié 4/02/26**	**vie 20/03/26**		**$117.524.509,00**
34		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble tierra aislada normal, VER ANEXO TÉCNICO	10 días	lun 9/02/26	jue 19/02/26	109CC+10 días	$386.945,00
35		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble GFCI, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa de protección intemperie en aluminio inyectado	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	34CC	$561.026,00
36		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble GFCI, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26	35	$493.365,00
37		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, grado comercial 2P+T 15A 120V, (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, VER ANEXO	1 día	vie 13/02/26	vie 13/02/26	36	$119.114,00
38		Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 120V 1F+1N+T 30 A , VER	6 días	lun 9/02/26	sáb 14/02/26	34CC	$1.066.908,00
39		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, VER ANEXO TÉCNICO	3 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26	38	$319.338,00
40		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG LSZH, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mié 25/02/26	mié 25/02/26	109;39	$674.372,00
41		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG LSZH, VER ANEXO	2 días	jue 26/02/26	vie 27/02/26	40	$569.322,00
42		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, VER ANEXO	1 día	jue 26/02/26	jue 26/02/26	41CC	$227.334,00
43		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; (incluye tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-120V, VER ANEXO TÉCNICO	8 días	sáb 28/02/26	lun 9/03/26	165CC+6 días;42CC+2 días	$3.103.110,00
44		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de sensor de presencia para control de iluminación, Sensor 360º horizontal VER ANEXO TÉCNICO	7 días	jue 12/03/26	jue 19/03/26	43FC+2 días	$3.309.024,00
45		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable para caja 5800 VER ANEXO	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	44	$83.735,00
46		Desmonte de luminaria de incrustar existente 60 x 60 cm, VER ANEXO TÉCNICO	30 días	mié 4/02/26	mar 10/03/26	11FC+8 días	$4.755.900,00
47		Desmonte de luminaria de incrustar existente 30x120cm tubo fluorescente T8 VER ANEXO TÉCNICO	18 días	mar 17/02/26	lun 9/03/26	48FC-5 días	$953.624,00
48		Desmonte de luminaria panel circular led existente circular 18-25W VER ANEXO	15 días	jue 5/02/26	sáb 21/02/26	46CC+1 día	$1.710.510,00
49		Desmonte de luminaria de sobreponer existente 120cm tubo fluorescente T8 VER	5 días	lun 16/02/26	vie 20/02/26	48CC+9 días	$187.795,00
50		Suministro e instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 montaje de sobreponer o incrustar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte y	28 días	lun 16/02/26	jue 19/03/26	46CC+8 días;71CC+2 días	$42.431.850,00
51		Suministro e instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 30X120cm 40W, 3000K-6500K, 3848lm, VER ANEXO TÉCNICO	5 días	lun 23/02/26	vie 27/02/26	50CC+6 días	$1.293.282,00
52		Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público, con sensor de movimiento incorporado inteligente, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	50	$2.931.788,00

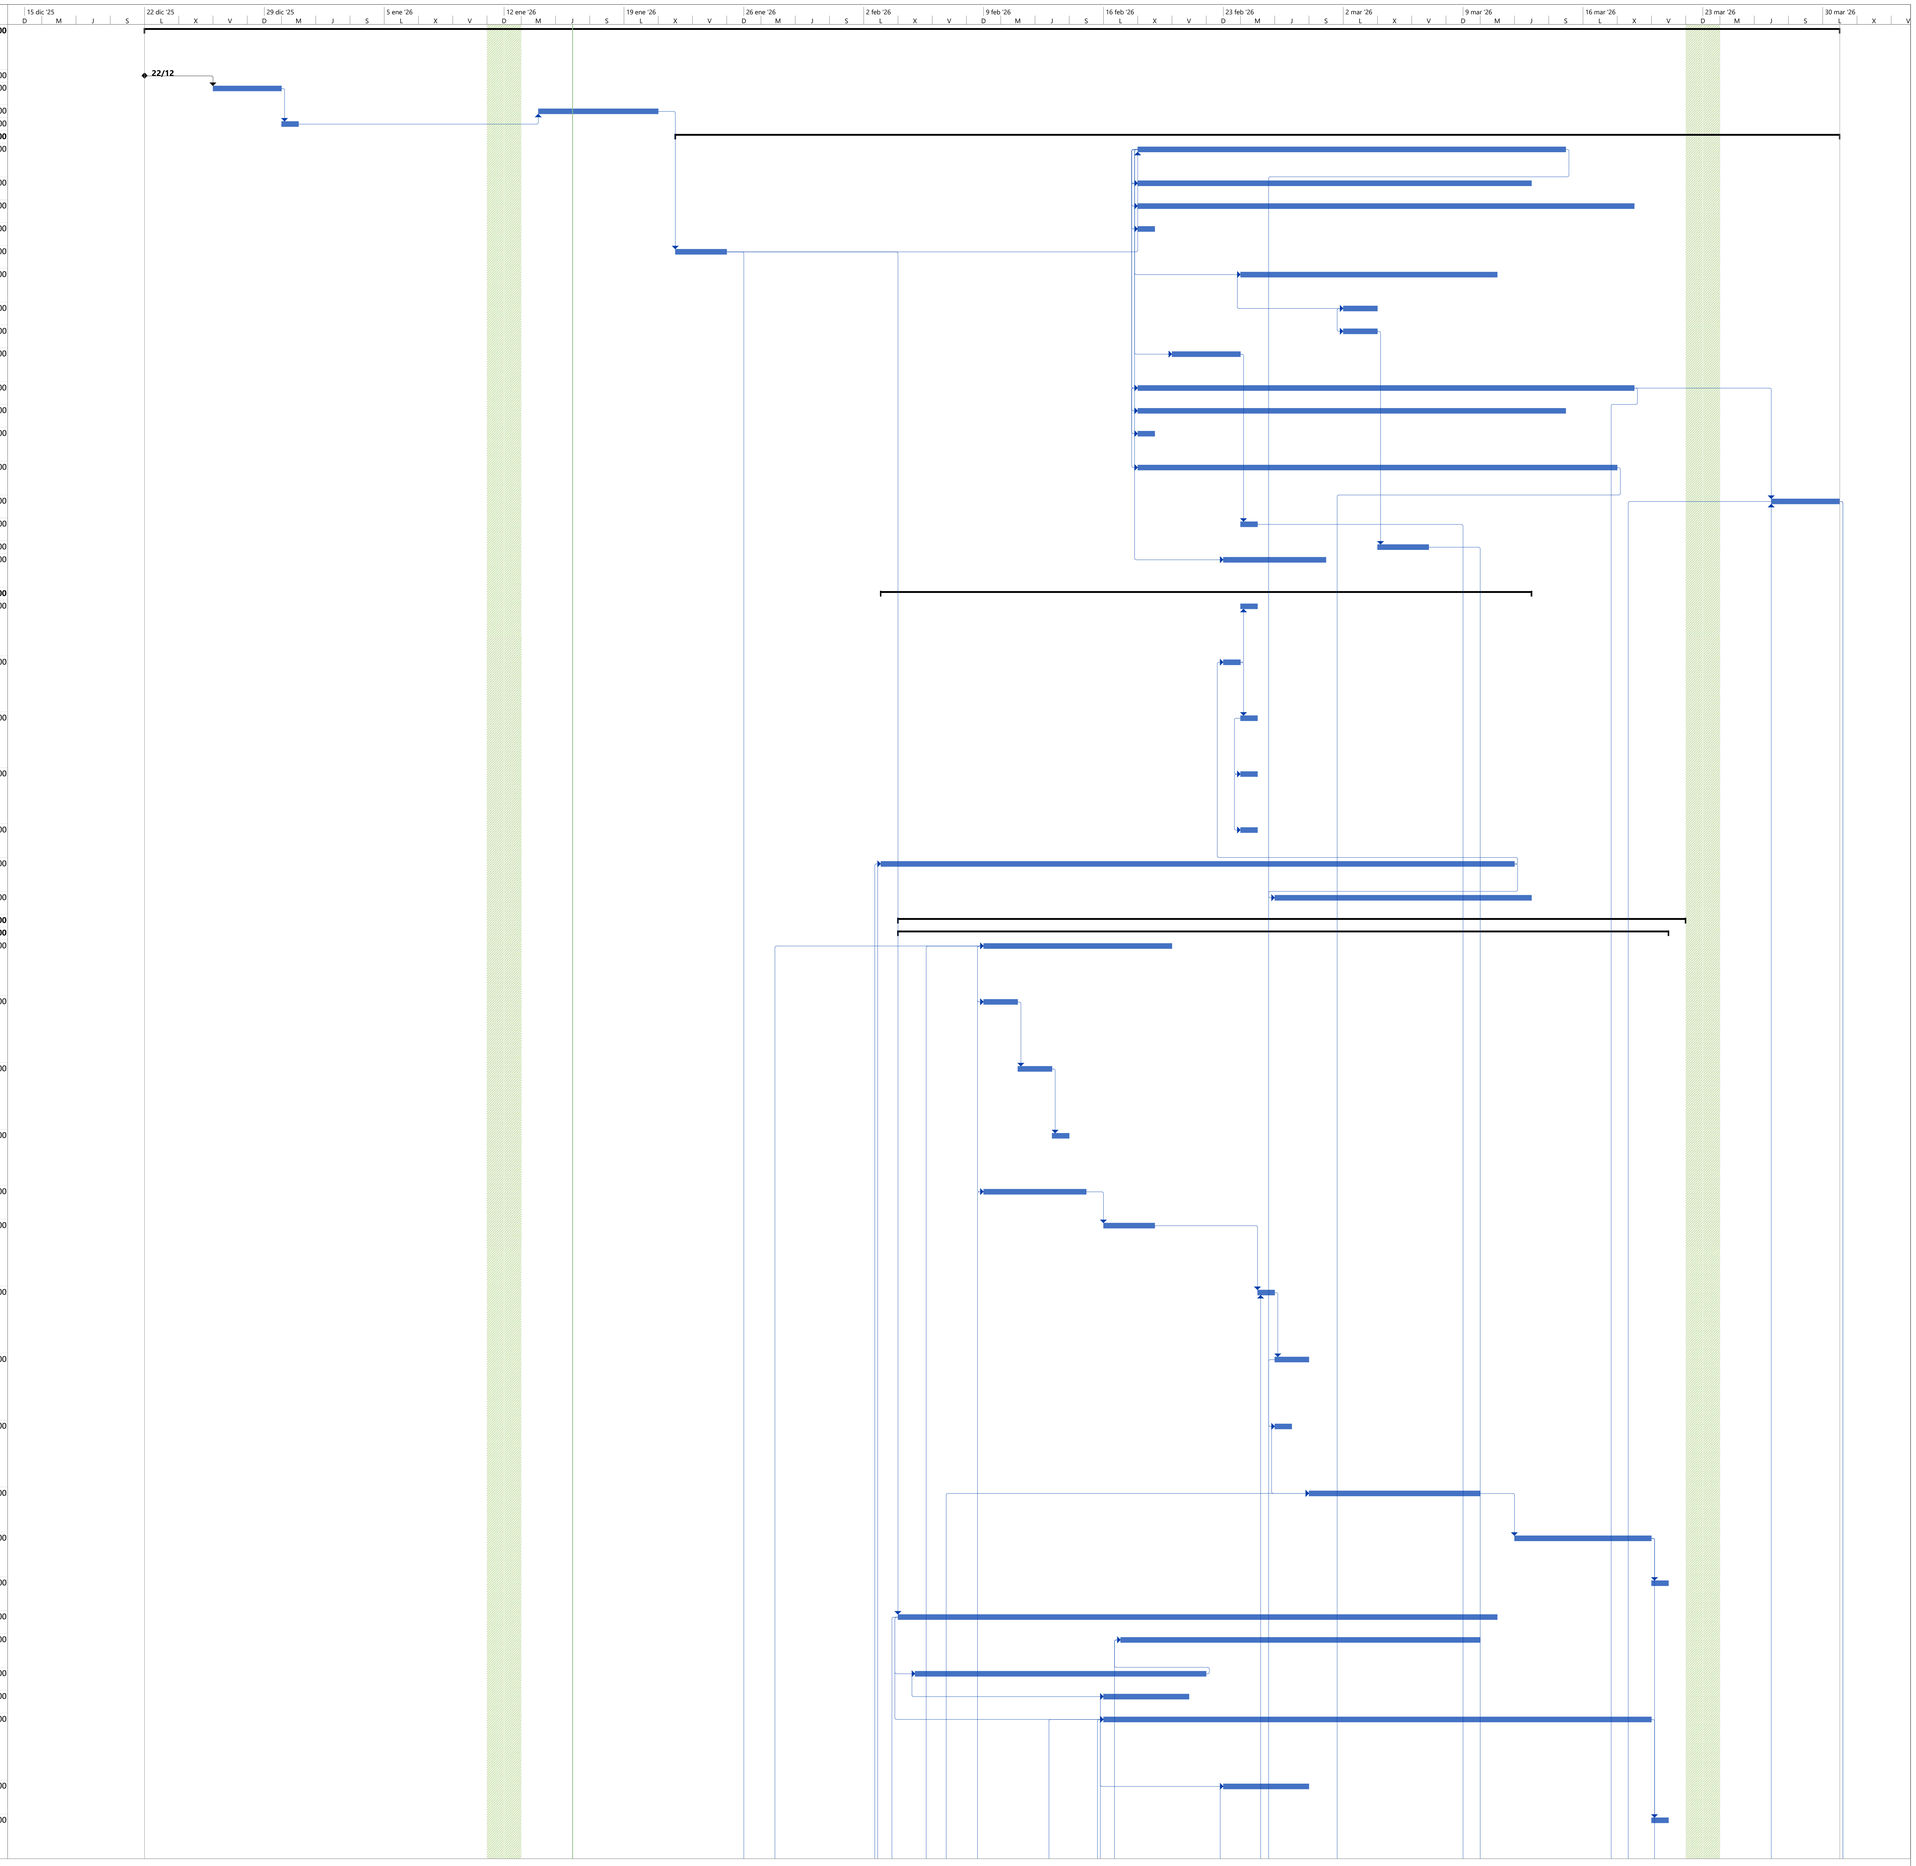


Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 16/01/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
53		Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 18W, minimo 4000K, VER ANEXO TÉCNICO	20 días	mar 24/02/26	mié 18/03/26	51CC+1 día	$3.235.775,00
54		Suministro e Instalación de luminaria tipo bala stil led Flat 22W, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 2/03/26	mar 3/03/26	53CC+5 días	$913.836,00
55		Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W VER ANEXO TÉCNICO	15 días	lun 2/03/26	mié 18/03/26	54CC	$3.421.320,00
56		Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W VER ANEXO TÉCNICO	16 días	lun 2/03/26	jue 19/03/26	55CC	$4.005.361,00
57		Suministro e Instalación de luminaria tipo bala led spot redondo 7W VER ANEXO	12 días	lun 2/03/26	sáb 14/03/26	53CC+5 días	$1.347.320,00
58		Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backligh 30X120cm 40W, VER ANEXO TÉCNICO	12 días	sáb 21/02/26	vie 6/03/26	49CC+5 días	$23.803.976,00
59		Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, VER ANEXO TÉCNICO	5 días	lun 16/02/26	vie 20/02/26	50CC	$3.113.396,00
60		Desmonte,limpieza, desinfeccion mantenimiento y reinstalacion de luminaria de incrustar o sobreponer existente de 30x120cm lo 60x60 cm VER ANEXO TÉCNICO	30 días	mié 4/02/26	mar 10/03/26	46CC	$169.547,00
61		Desmonte y reinstalacion luminaria panel circular led existente circular 18-25W , VER ANEXO TÉCNICO	25 días	mié 4/02/26	mié 4/03/26	60CC	$290.652,00
62		Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	44	$2.939.797,00
63		Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W VER ANEXO TÉCNICO	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	62FC-2 días	$1.983.846,00
64		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 1" VER ANEXO TÉCNICO	20 días	vie 6/02/26	sáb 28/02/26	34CC-2 días	$929.441,00
65		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	16 días	vie 6/02/26	mar 24/02/26	64CC	$661.305,00
66		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit IMC de 1" VER ANEXO TÉCNICO	8 días	mié 11/02/26	jue 19/02/26	71CC-2 días	$544.122,00
67		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit IMC de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	6 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	66CC+1 día	$616.656,00
68		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tubería de 1", VER ANEXO TÉCNICO	19 días	sáb 7/02/26	sáb 28/02/26	64CC+1 día	$567.028,00
69		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tubería de 3/4", VER ANEXO TÉCNICO	16 días	vie 6/02/26	mar 24/02/26	65CC	$706.644,00
70		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería flexible tipo americana conduit liquid tight de 3/4" VER	12 días	jue 19/02/26	mié 4/03/26	67	$662.857,00
71		Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 AWG LSZH fase roja, VER ANEXO TÉCNICO	12 días	vie 13/02/26	jue 26/02/26	65CC+6 días	$443.370,00
72		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 VER ANEXO	12 días	jue 5/03/26	mié 18/03/26	70	$1.989.918,00
73		**3.2: Sistemas de seguridad interior**	**20 días**	**vie 27/02/26**	**sáb 21/03/26**		**$9.595.929,00**
74		Desmonte, retiro y reintalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico , termico y elementos activos del sistema, estación manual y estrobo multicandela; VER ANEXO	8 días	vie 27/02/26	sáb 7/03/26	60FC-10 días	$1.744.480,00
75		Desmonte , retiro, mantenimiento y reinstalacion de sensor de humo electrico y elementos activos del sistema, estacion manual y estrobo multicandela VER ANEXO	7 días	vie 27/02/26	vie 6/03/26	74CC	$878.640,00
76		Desmonte retiro, mantenimiento y reinstalacion de estacion manual VER ANEXO	12 días	vie 27/02/26	jue 12/03/26	74CC	$157.678,00
77		Desmonte, retiro , mantenimiento y reinstalacion de estrobo multicandela VER ANEXO TÉCNICO	1 día	vie 13/03/26	vie 13/03/26	76	$168.912,00
78		Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico, termico o de doble tecnologia VER ANEXO TÉCNICO	9 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	74CC	$451.902,00
79		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores VER ANEXO TÉCNICO	5 días	sáb 14/03/26	jue 19/03/26	74FC+5 días	$208.046,00
80		Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL; VER ANEXO TÉCNICO	3 días	sáb 14/03/26	mar 17/03/26	79CC	$521.596,00
81		Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado UL; VER ANEXO	2 días	sáb 14/03/26	lun 16/03/26	80CC	$750.952,00
82		Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V, intensidad seleccionable, VER ANEXO	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	81	$689.128,00
83		Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre FPLR 2x16 AWG norma UL; VER ANEXO	7 días	sáb 28/02/26	sáb 7/03/26	74CC+1 día	$308.610,00
84		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4" para sistema detección de incendios; VER ANEXO TÉCNICO	5 días	vie 27/02/26	mié 4/03/26	83CC-1 día	$414.616,00
85		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de baterias para sistema detección de incendios; VER ANEXO TÉCNICO	6 días	lun 16/03/26	sáb 21/03/26	79CC+1 día	$1.881.440,00
86		Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente .Incluye mantenimiento general VER ANEXO TÉCNICO	1 día	vie 27/02/26	vie 27/02/26	83CC-1 día	$1.419.929,00
87		**3.3: Sistemas de Ventilacion Mecanica**	**16 días**	**mar 17/02/26**	**vie 6/03/26**		**$30.604.406,00**
88		Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema de inyeccion 3000 cfm, VER ANEXO TÉCNICO	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	47CC	$2.396.590,00
89		Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida del ventilador de aproximadamente 50cm de ancho, VER ANEXO TÉCNICO	4 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	88	$863.848,00
90		Suministro e instalación de pre filtros plata o similar para retención de particulas 24"X24"X2" con una eficiencia minima del 30%; VER ANEXO TÉCNICO	5 días	mar 17/02/26	sáb 21/02/26	88CC	$456.156,00
91		Suministro e instalación de fltros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores 24"X24"X2"; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo a la normativadad ambiental vigente).	2 días	mar 17/02/26	mié 18/02/26	90CC	$1.458.778,00
92		Suministro e instalación de filtros de permanganato de potasio o alumina u otro tipo de elemento germicida tipo granular o peletizado 24"X24"X11" ; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo a la normativadad ambiental vigent	3 días	jue 19/02/26	sáb 21/02/26	91	$11.918.264,00
93		Suministro e instalación de filtros HEPA para retención de partículas de 0,3 micras con una eficiencia mínima del 99.97% con estructura en aluminio 24"X24"X11" con marco en aluminio; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo	2 días	vie 20/02/26	sáb 21/02/26	88	$5.896.216,00
94		Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema de extracción 6000 cfm, VER ANEXO TÉCNICO	8 días	jue 26/02/26	vie 6/03/26	88FC+5 días	$2.398.606,00
95		Suministro e instalación de mezcla de carbón activado y alumina activada tipo granular VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 17/02/26	mar 17/02/26	91CC	$1.426.650,00
96		Mantenimiento de tablero de fuerza y control, VER ANEXO TÉCNICO	4 días	mar 17/02/26	vie 20/02/26	88CC	$3.789.298,00
97		**3.4: Bomba suministro**	**2 días**	**jue 12/02/26**	**vie 13/02/26**		**$3.416.224,00**
98		Suministro e instalacion de electrobomba de inyeccion de suministro de agua con motor SIEMENS VER ANEXO TÉCNICO	2 días	jue 12/02/26	vie 13/02/26	30CC+8 días	$3.416.224,00
99		**3.5: Planta Electrica**	**3 días**	**lun 9/02/26**	**mié 11/02/26**		**$618.525,00**
100		Mantenimiento de tablero de fuerza y control de la planta electrica VER ANEXO	3 días	lun 9/02/26	mié 11/02/26	38CC	$618.525,00
101		**3.6: Sistema de aire armerillo y archivo**	**2 días**	**mar 24/02/26**	**mié 25/02/26**		**$1.308.182,00**
102		Suministro e instalacion de ventilador de minimo 250 CFM, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mar 24/02/26	mié 25/02/26	96FC+2 días	$1.308.182,00
103		**CAP. 4: RED DE GASES**	**8 días**	**lun 9/03/26**	**mar 17/03/26**		**$5.384.516,00**
104		Desmonte, retiro y reinstalación de tubing acero inoxidable 316 L x 1/4" VER ANEXO	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	107FC+1 día	$3.519.579,00
105		Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, tubing acero inoxidable de acometidas eléctricas VER ANEXO TÉCNICO	3 días	lun 9/03/26	mié 11/03/26	74	$421.176,00
106		Pruebas de estanqueidad al 110% VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	104	$884.741,00
107		Suministro e instalación de tubing en acero inoxidable 316L X1/4""6 mts, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26	105	$559.020,00
108		**CAP. 5: MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES**	**42 días**	**mié 28/01/26**	**mar 17/03/26**		**$26.362.692,00**


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
109		Pañete liso impermeabilizado 1:3, VER ANEXO TÉCNICO	24 días	mié 28/01/26	mar 24/02/26	138CC+2 días	$1.043.900,00
110		Suministro e instalación de enchape para muros igual al existente 25x35 cm, VER ANEXO	22 días	mié 28/01/26	sáb 21/02/26	109CC	$21.513.482,00
111		Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico VER ANEXO TÉCNICO	15 días	mar 3/02/26	jue 19/02/26	110CC+5 días	$1.197.950,00
112		Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo VER ANEXO TÉCNICO	3 días	vie 20/02/26	lun 23/02/26	111	$1.165.381,00
113		Construcción de Muro en bloque N° 5 VER ANEXO TÉCNICO	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	137	$356.635,00
114		Construcción de Muro en lamina de Superboard de 6 mm doble cara, VER ANEXO TÉCNICO	10 días	vie 6/03/26	mar 17/03/26	113	$1.085.344,00
115		**CAP.6: BASES Y PISOS**	**36 días**	**mié 4/02/26**	**mar 17/03/26**		**$53.570.051,00**
116		Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	123	$102.840,00
117		Construcción de Boca puerta acabado en granito lavado, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	jue 12/03/26	jue 12/03/26	116	$396.348,00
118		Alistado de piso y pendientado en mortero impermeabilizado VER ANEXO TÉCNICO	8 días	mié 4/02/26	jue 12/02/26	138CC+8 días	$2.792.240,00
119		Suministro e instalación de piso tablón de gres vitrificado grafiado VER ANEXO TÉCNICO	11 días	lun 16/02/26	vie 27/02/26	118CC+10 días	$5.845.400,00
120		Reparación adoquín de ladrillo, incluye retiro del adoquín, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	22FC+2 días	$842.590,00
121		Reparación de piso epóxico semiliso color plano, VER ANEXO TÉCNICO	10 días	jue 26/02/26	lun 9/03/26	7FC-15 días	$25.463.685,00
122		Reparación de mediacaña (zócalo) VER ANEXO TÉCNICO	7 días	lun 23/02/26	lun 2/03/26	119CC+6 días	$4.433.360,00
123		Construcción de guarda escoba media caña en gravilla lavada de 0,10 m. x 0,10 VER ANEXO TÉCNICO	12 días	mié 25/02/26	mar 10/03/26	122CC+2 días	$5.460.192,00
124		Repulida de piso en granito, incluye sellada y brillo VER ANEXO TÉCNICO	7 días	lun 2/03/26	lun 9/03/26	119FC+1 día	$897.529,00
125		Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. VER ANEXO TÉCNICO	1 día	jue 12/03/26	jue 12/03/26	116	$899.085,00
126		Suministro e instalación de piso duropiso VER ANEXO TÉCNICO	15 días	sáb 28/02/26	mar 17/03/26	121CC+2 días	$6.436.782,00
127		**CAP.7: CUBIERTAS**	**4 días**	**jue 19/02/26**	**lun 23/02/26**		**$547.908,00**
128		Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 22, VER ANEXO TÉCNICO	4 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	139CC+15 días	$547.908,00
129		**CAP.8: CIELORRASOS**	**30 días**	**sáb 14/02/26**	**vie 20/03/26**		**$11.529.448,00**
130		Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard 6mm. VER ANEXO TÉCNICO	13 días	sáb 28/02/26	sáb 14/03/26	131	$2.603.328,00
131		Suministro e instalación de cielorraso en láminas de fibra mineral de 60*60 cm. VER ANEXO TÉCNICO	8 días	jue 19/02/26	vie 27/02/26	132CC+4 días	$1.684.185,00
132		Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral, VER ANEXO TÉCNICO	20 días	sáb 14/02/26	lun 9/03/26	140CC+3 días	$5.568.112,00
133		Suministro e instalacion de laminas acrílicas difusora de luz para claraboyas VER ANEXO TÉCNICO	9 días	mié 11/03/26	vie 20/03/26	134	$1.292.880,00
134		Suministro e instalación de cielo raso en PVC sistema GSP plano - tipo decorline VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	132	$184.538,00
135		Suministro e instalación de estructura de cielorraso en láminas de fibra mineral de 60*60 cm. VER ANEXO TÉCNICO	9 días	mié 18/02/26	vie 27/02/26	131CC-1 día	$196.405,00
136		**CAP. 9: IMPERMEABILIZACIONES**	**32 días**	**lun 26/01/26**	**mar 3/03/26**		**$31.269.854,00**
137		Reparación de humedades en mampostería existente, con resina acuosa de impregnación a dos manos. VER ANEXO TÉCNICO	20 días	lun 9/02/26	mar 3/03/26	142CC+1 día	$509.160,00
138		Impermeabilización de placa a intemperie, en manto asfaltico bicapa (hipérbato 3 mm y manto asfaltico 3,2 mm), VER ANEXO TÉCNICO	5 días	lun 26/01/26	vie 30/01/26	11	$5.137.352,00
139		Impermeabilización de placa de concreto con manto asfaltico acabado especial poliéster spund bond calibre 4mm, VER ANEXO TÉCNICO	8 días	lun 2/02/26	mar 10/02/26	138CC+6 días	$10.423.368,00
140		Corrección de filtración en cielorraso (área 30 m2 aprox), VER ANEXO TÉCNICO	3 días	mié 11/02/26	vie 13/02/26	137CC+1 día;143	$423.282,00
141		Prelavado de áreas de fachada en ladrillo a la vista, con hidro lavadora a presión media, VER ANEXO TÉCNICO	3 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26	144	$176.424,00
142		Emboquillado de fachada en ladrillo a la vista, incluye preparación de la superficie, VER ANEXO TÉCNICO	2 días	sáb 7/02/26	lun 9/02/26	141	$150.000,00
143		Siliconado perimetral de juntas de ventanas (perfil-muro y muro-borde marco prefabricado) VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	142CC+1 día	$1.489.620,00
144		Impermeabilización de Viga Canal con manto asfáltico auto protegido impermeabilizante (Calibre 3mm) VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mar 27/01/26	mar 3/02/26	138CC+1 día	$12.960.648,00
145		**CAP. 10: GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS**	**11 días**	**vie 27/02/26**	**mié 11/03/26**		**$10.395.807,00**
146		Suministro e instalación de sanitario ahorrador 4.8 Lt VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	153	$583.522,00
147		Suministro e instalación de orinal blanco de entrada superior, 0,5 lpf Gricol o similar, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	146CC	$1.049.524,00
148		Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana blanco (Happy Blanco), VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	147	$357.303,00
149		Suministro e instalación de grifería antivandálica tipo push, institucional, VER	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	148CC	$452.867,00
150		Suministro e instalación de grifería Institucional de mesa tipo push para lavamanos, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	148CC	$397.948,00
151		Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	146	$78.888,00
152		Suministro e instalación asiento sanitario color a escoger incluye todos los elementos VER ANEXO TÉCNICO	8 días	vie 27/02/26	sáb 7/03/26	146FC-10 días	$1.548.590,00
153		Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico de dos puestos accionamiento con pedal, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	lun 9/03/26	lun 9/03/26	21FC+10 días	$3.596.265,00
154		Suministro e instalación manguera flexometalica en acero inoxidable con caño interno en teflón 1/2" VER ANEXO TÉCNICO	2 días	lun 9/03/26	mar 10/03/26	153CC	$2.330.900,00
155		**CAP. 11: ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO**	**14 días**	**jue 26/02/26**	**vie 13/03/26**		**$11.050.340,00**
156		Suministro e instalación de Esquineros en ángulo de aluminio cepillado color natural 2"x2" espesor VER ANEXO TÉCNICO	4 días	jue 5/03/26	lun 9/03/26	161	$929.236,00
157		Adecuación y ajuste de puerta, incluye acondicionamiento de borde inferior para evitar ingreso de roedores, VER ANEXO	1 día	vie 13/03/26	vie 13/03/26	117;156	$670.352,00
158		Suministro e instalación de baranda (pasa manos) en tubo redondo de 2", VER ANEXO TÉCNICO	8 días	jue 26/02/26	vie 6/03/26	168CC+5 días	$8.299.116,00
159		Suministro e instalación de barra de seguridad abatible fabricada en acero inoxidable 304 Industrial, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	153	$669.868,00
160		Suministro e instalación de barra de seguridad fija de 60 cm, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	159CC	$184.981,00
161		Suministro e instalación de marco metálico para puertas de 1,00 de ancho, VER ANEXO	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	169CC	$296.787,00
162		**CAP. 12: PINTURAS**	**36 días**	**sáb 7/02/26**	**vie 20/03/26**		**$81.741.588,00**
163		Suministro e instalación de Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas), VER ANEXO	22 días	mié 11/02/26	sáb 7/03/26	137CC+2 días	$4.048.935,00
164		Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, VER ANEXO TÉCNICO	25 días	lun 16/02/26	lun 16/03/26	166CC	$5.910.960,00
165		Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos VER ANEXO TÉCNICO	31 días	sáb 7/02/26	sáb 14/03/26	139CC+5 días	$56.446.352,00
166		Suministro e instalación de pintura esmalte mate super lavable exterior dos manos VER ANEXO TÉCNICO	18 días	lun 16/02/26	sáb 7/03/26	141FC+7 días	$3.731.640,00
167		Mantenimiento hoja de puerta en madera, incluye lijado, VER ANEXO TÉCNICO	28 días	vie 13/02/26	mar 17/03/26	165CC+5 días	$299.715,00
168		Mantenimiento de baranda (pasa manos) VER ANEXO TÉCNICO	25 días	vie 20/02/26	vie 20/03/26	164CC+4 días	$3.321.411,00
169		Mantenimiento de cerramiento metálico, VER ANEXO TÉCNICO	7 días	mié 4/03/26	mié 11/03/26	168FC-15 días	$2.569.952,00
170		Suministro e instalación de pintura esmalte mate color amarillo VER ANEXO TÉCNICO	24 días	sáb 21/02/26	vie 20/03/26	168CC+1 día	$449.823,00
171		Suministro e instalación de Pintura vinilo tipo 2 dos manos para cielorrasos VER ANEXO	21 días	sáb 14/02/26	mar 10/03/26	140	$4.962.800,00
172		**CAP. 13: VARIOS**	**20 días**	**lun 2/03/26**	**mié 25/03/26**		**$29.289.550,00**
173		Suministro e instalación de cinta antideslizante foto-luminiscente VER ANEXO TÉCNICO	8 días	lun 16/03/26	mié 25/03/26	184CC+7 días	$2.406.712,00
174		Suministro e instalación de guarda camilla en PVC VER ANEXO TÉCNICO	1 día	sáb 21/03/26	sáb 21/03/26	177	$5.858.610,00
175		Suministro e instalación de terminales para guarda camilla de 20 cm de ancho, VER ANEXO TÉCNICO	4 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	20CC-6 días	$507.896,00
176		Suministro e instalación de rinconeras para guarda camilla de 20 cm de ancho, VER ANEXO TÉCNICO	3 días	jue 19/03/26	sáb 21/03/26	175CC	$208.098,00

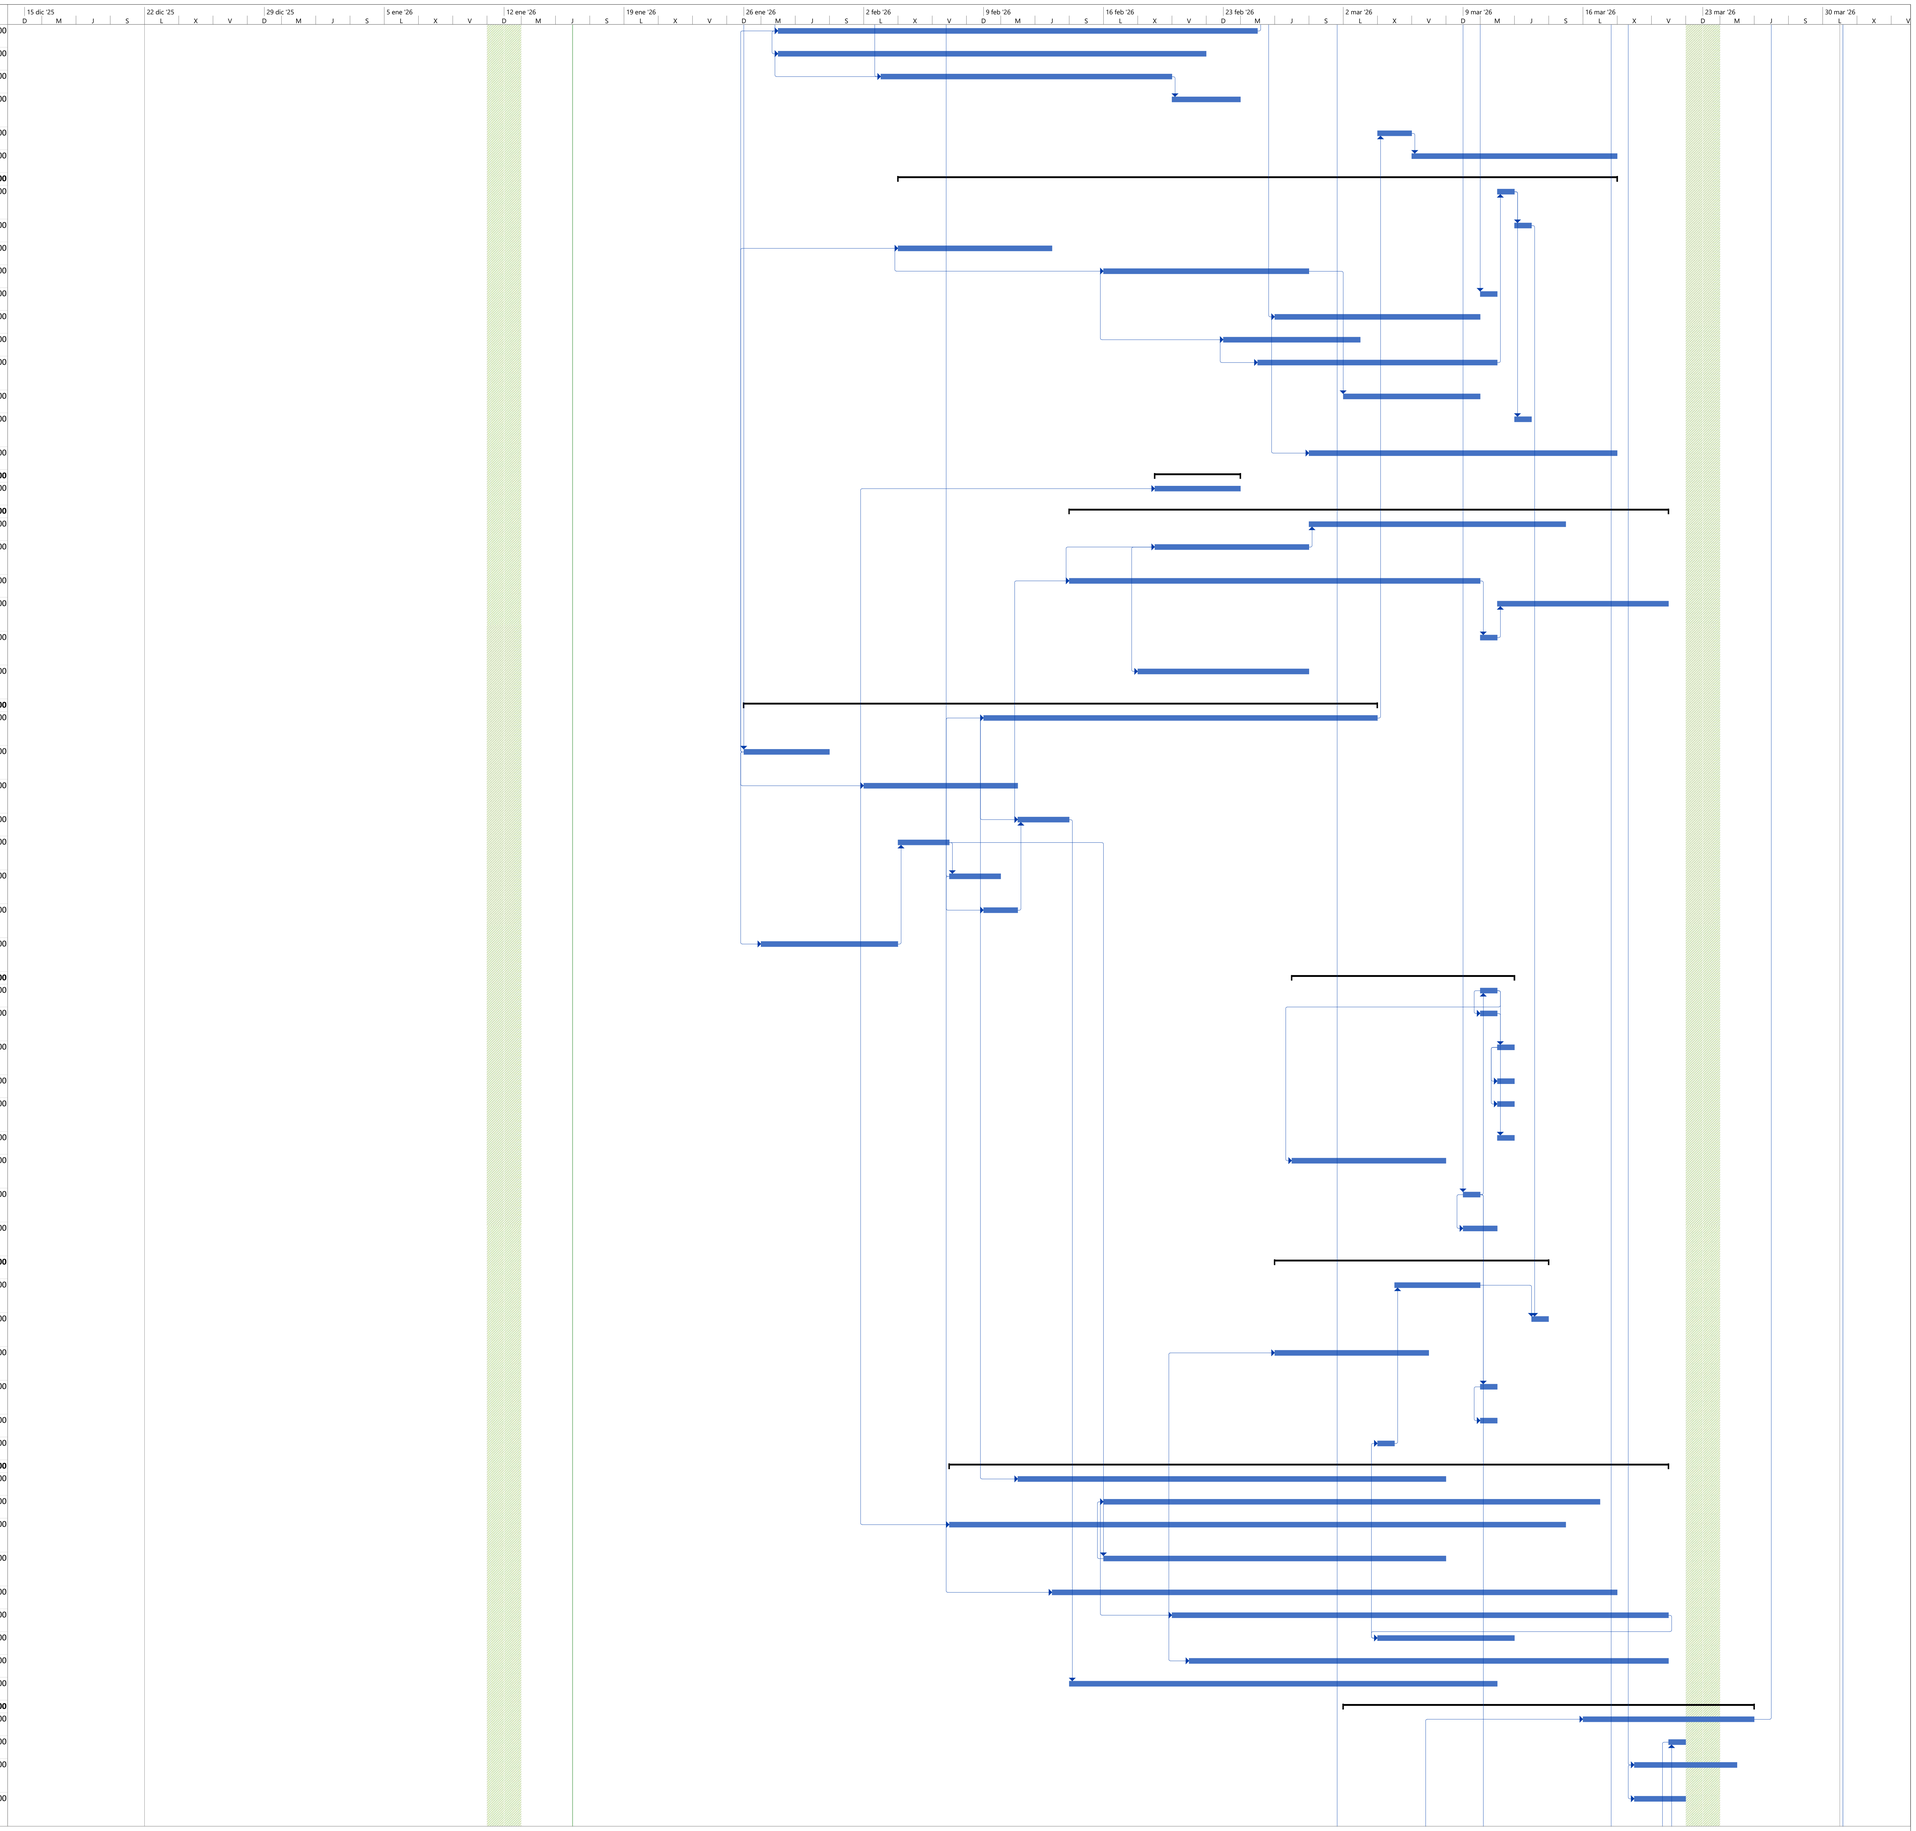

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 16/01/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
177		Suministro e instalación de esquineros para guarda camilla de 20 cm de ancho, homologando las características completas de los componentes del elemento existente en sala de necropsias, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	3 días	mié 18/03/26	vie 20/03/26	16FC-1 día	$640.689,00
178		Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	153	$632.280,00
179		Suministro e instalación de tapa registro de 20×20 cm de empotrar, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	mié 11/03/26	mié 11/03/26	178	$533.932,00
180		Suministro e instalacion de hoja de puerta entamborada en triplex, VER ANEXO TÉCNICO	1 día	sáb 21/03/26	sáb 21/03/26	174CC	$125.337,00
181		Suministro e instalacion de cerradura tipo pomo metálica VER ANEXO TÉCNICO	1 día	sáb 21/03/26	sáb 21/03/26	180CC	$606.440,00
182		Suministro e instalacion de estante metálico fabricado en Lámina Cold Rolled VER ANEXO TÉCNICO	17 días	lun 2/03/26	vie 20/03/26	19FC-14 días	$6.860.120,00
183		Suministro e instalacion de armario en acero inoxidable 304 VER ANEXO TÉCNICO	8 días	mar 10/03/26	mié 18/03/26	182CC+7 días	$9.232.320,00
184		Suministro e instalacion de espejo de 5 mm con borde pulido, VER ANEXO TÉCNICO.	12 días	sáb 7/03/26	vie 20/03/26	182CC+5 días	$1.677.116,00
185		**CIERRE CONTRACTUAL - ENTREGA**	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26	20	$0,00
186		**FIN DE OBRA**	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26	20	$0,00

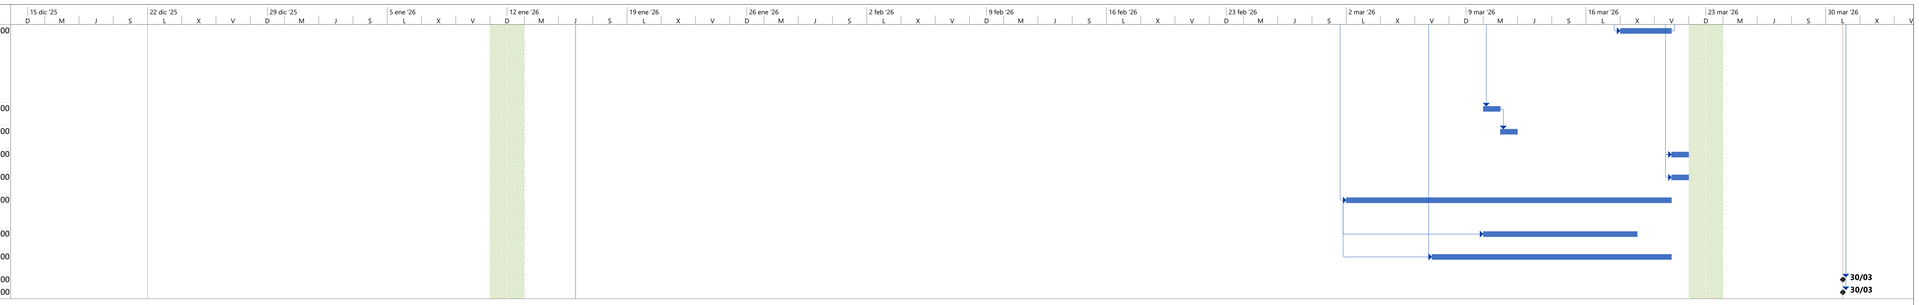

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 16/01/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
