660.39

INFORME DE SUPERVISION

Yopal, 04 de mayo de 2026

ELABORADO POR:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder de supervisión e Interventoría
Supervisor

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
Apoyo a la supervisión OPS 182-2026

Proyecto BPIN 2025005850046

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE"







INTRODUCCIÓN

El DEPARTAMENTO DE CASANARE mediante Decreto 0436 del 18 de diciembre de 2025 mediante el artículo 1° priorizó la asignación de recursos al proyecto identificado con BPIN 2025005850046 denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE", por un valor total de $ 33.991.404.852,00 ; los recursos del bienio 2025-2026 se incorporaron mediante el AGG N°053 del 08 de enero de 2026 en capítulo independiente del presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Energía de Casanare, para el bienio 2025-2026, es procedente contratar las actividades del citado proyecto de inversión.

En la actualidad el municipio de Maní es atendido por gasoducto virtual, el cual representa una solución innovadora para el transporte de gas natural, pero también conlleva una serie de problemas centrales que deben ser considerados. En primer lugar, la dependencia de la infraestructura digital y de las tecnologías de información plantea desafíos en términos de ciberseguridad. La vulnerabilidad a ataques cibernéticos puede comprometer la integridad y la disponibilidad de los recursos energéticos, poniendo en riesgo el suministro.

El municipio de Maní en su área Urbana tiene una cobertura del 92% de Gas Natural, y en su área rural el 55%, en el área rural se facilita la extensión del servicio al total de las viviendas.

Según el Plan Desarrollo Municipal 2024-2027, el municipio de Maní presenta una brecha en el tema de prestación de servicios de energía eléctrica y gas natural entre el área urbana y rural. En el caso del servicio de gas natural domiciliario el 92% del área urbana cuenta con este servicio mientras que solo el 55% del área rural accede a este servicio.

Por esto se considera como un proyecto económico de alto impacto favorecedor al medio ambiente. El alto impacto que se genera con la ejecución de este proyecto, lo convierte en uno de los proyectos bandera para los gobiernos municipales y departamental. Con este proyecto la comunidad beneficiada tendrá disponibilidad de un recurso energético, como servicio para su consumo diario. Al ser suministrado por tubería se le utiliza en la medida que se le necesita; mejorando significativamente la economía en los diferentes hogares.

En concordancia con lo anterior y observando que una de las obligaciones de La Empresa es ejercer la INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" proyecto identificado con BPIN 2025005850046, por lo anterior para realizar el control de la inversión, comprometerse jurídicamente al seguimiento de las obras en ejecución, para que se cumplan con todas las especificaciones técnicas de calidad con los materiales instalados por el contratista, bajo los estándares de responsabilidad ambiental, de igual manera la interventoría velará para que todos los compromisos contractuales para el buen término de las obras y de los servicios e inversiones de la Empresa de Energía de Casanare, así como garantizar el normal seguimiento, contando con el personal idóneo, hasta el recibo definitivo de la obra física contratada debidamente ejecutada, y recibida por la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.

Corte del informe: del 1 al 30 de abril 2026.

1. GENERALIDADES

1.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA No. 183 DE 2026			
Objeto:	CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
Contrato de Obra No.	183 DE 2026		
Entidad Contratante:	ENERCA S.A E.S.P		
Contratista :	CONSORCIO GASODUCTO MANI		
Representante Legal:	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO		
Interventoria:	UNIÓN TEMPORAL INTERTRONCAL 2026		
Representante Legal:	DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON		
Supervision:	GUSTAVO PARRA MARTINEZ		
Director de obra:	OSCAR JAVIER LETRADO ESTEVEZ		
Residentes de obra:	NELSON ARIEL TORRES PAEZ - ANGELA MILENA VARGAS GARZON		
Valor del Contrato:	$ 31.355.515.487,00		
Valor del Anticipo:	$ 12.542.206.195,00		
Plazo inicial:	DIEZ (10) MESES		
Fecha de Iniciación:	26 DE MARZO DE 2026		
Fecha de terminación inicial:	25 DE ENERO DE 2027		
Valor ejecutado:	$ 566.437.929,00		
Porcentaje ejecutado:	1,81%		
Prórroga No. 1:	N/A	FECHA:	
Suspensiones:	N/A	FECHA:	
Reinicio:	N/A		
Adiciones:	N/A		

Modificación mayores y menores cantidades :	N/A		
Otrosí	N/A	FECHA:	
Pagos Parciales	NA		
Pago parcial No.1:	N/A	Fecha:	
Valor ejecutado Parcial No.1:	N/A		
% de ejecucion parcial No.1:	N/A		
Valor amortización Anticipo Pago Parcial No. 1	N/A		
Valor total pagos Parciales:	$ 0,0		
% de ejecucion total pagos parciales:	0,0%		
Valor total amortización Anticipo	0,0%		
Valor por pagar :	$ 31.355.515.487,00		
% por pagar:	100%		
Saldo por amortizar anticipo	$ 12.542.206.195,00		
% por Amortizar:	100%		

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Calle 38 Nº 24-82 Villas de San Juan Yopal-Casanare
TELEFONOS:	3208545525
CORREO ELECTRONICO:	consorciogasoductomani@gmail.com

1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 184 DE 2026	
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	
3.1.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	ENERCA S.A E,S,P
Supervisión:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS
	Líder de Supervisión e Interventoría
Contratista :	UNIÓN TEMPORAL INTERTRONCAL 2026
Representante Legal:	DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON
Director de Interventoria	CARLOS ANDRES CORREDOR CASTELLANOS
Residentes de Interventoria	DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON – NELSON FABIAN PARRA VARGAS
Valor del Contrato:	$ 2.564.162.626,00
Valor del Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	ONCE (1) MESES
Fecha de Iniciación:	26 DE MARZO DE 2026
Fecha de terminación inicial:	25 DE FEBRERO DE 2027
Prorrogas:	N/A
Ejecución Financiera	$ 0,0
Suspensiones:	N/A
Reinicio:	N/A
Adiciones:	N/A
Modificaciones:	N/A
Otrosi:	N/A

Pagos parciales:	$ 0,0
Valor por pagar	$ 2.564.162.626,00
% Total por pagar :	100%

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 24B # 37 - 04 Barrio Villas de San Juan
TELEFONOS:	3107679331
CORREO ELECTRONICO:	intertroncal2026@gmail.com

1.3INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No.:	182-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS Líder de Supervisión e Interventoría
CONTRATISTA:	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
VALOR DEL CONTRATO:	$ 69.969.720,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	25 DE MARZO DE 2027
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	25 DE MARZO DE 2027

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Calle 6 # 21 – 28 Oficina 101 Yopal, Casanare
TELEFONOS:	3208318951
CORREO ELECTRONICO:	ing.oscar.arciniegas@gmail.com

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL PROYECTO Y SUS DERIVADOS:

CONTRATO DE OBRA:

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No. POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	103185	9/03/2026	9/05/2027	3.135.551.549,00
BUEN MANEJO ANTICIPO		103185	9/03/2026	9/05/2027	12.542.206.195,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		103185	9/03/2026	9/01/2030	3.135.551.549,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS		103185	9/01/2027	1/01/2028	6.271.103.097,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA		103185	9/01/2027	1/01/2032	6.271.103.097,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.		29990	9/03/2026	9/05/2027	3.135.551.549,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No. POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	BY100064255	10/03/2026	2/06/2027	256.416.262,60
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES		BY100064255	10/03/2026	20/02/2030	256.416.262,60
CALIDAD DEL SERVICIO		BY100064255	CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE OBRA		512.832.525,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.		BY100010940	10/03/2026	9/05/2027	256.416.262,60

CONTRATO APOYO A LA SUPERVISIÓN (OPS):

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No. POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA	62547994000005417	28/02/2026	10/07/2027	6.996.972,00
CALIDAD DEL SERVICIO		62547994000005417	28/02/2026	28/02/2028	13.993.944,00

3. INFORMACIÓN FINANCIERO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATO DE OBRA INICIAL	$ 31.355.515.487,00
TOTAL	**$ 31.355.515.487,00**
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA CONTRATO INICIAL	$ 2.564.162.626,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA	**$ 2.564.162.626,00**
VALOR APOYO SUPERVISIÓN	$ 69.969.720,00
VALOR TOTAL DE APOYO SUPERVISIÓN	**$ 69.969.720,00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 33.989.647.833,00**

3.1 INFORME FINANCIERO CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	Valor Actualizado	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor Inicial	$ 31.355.515.487,00			
Valor actualizado		$ 31.355.515.487,00		
Valor Anticipo (40 %)				$ 12.542.206.195,00
Valor Parcial				

Saldo por pagar				$ 18.813.309.292,00
Saldo a favor Empresa				
Sumas	$ 31.355.515.487,00			$ 31.355.515.487,00

3.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor contratado Inicialmente	$ 2.564.162.626,00		
Valor Anticipo (0 %)			-
Valor pago parcial No.1			
Saldo por pagar			$ 2.564.162.626,00
Sumas	**$ 2.564.162.626,00**		**$ 2.564.162.626,00**

3.3 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN


CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 69.969.720,00		
VALOR ANTICIPO			
VALOR FACTURADO		-	
VALOR POR PAGAR			$ 69.969.720,00
SUMAS IGUALES	**$ 69.969.720,00**		**$ 69.969.720,00**


3.4 PORCENTAJE FÍSICO DEL PROYECTO EJECUTADO

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA																					
AVANCE	**2**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**TOTAL**
PROGRAMADO																					**1,74%**
EJECUTADO																					**1,81%**

PORCENTAJE EJECUCIÓN OBRA:

Obra física Programada (%):	1,74%	Obra física Programada ($):	$546.459.655,00
Obra física ejecutada (%):	1,81%	Obra física ejecutada ($):	$566.437.929,00
Obra física por ejecutar (%):	98,19%	Obra física por ejecutar ($)	$ 30.789.077.558,00
Ejecución Financiera (%):	0,0%		

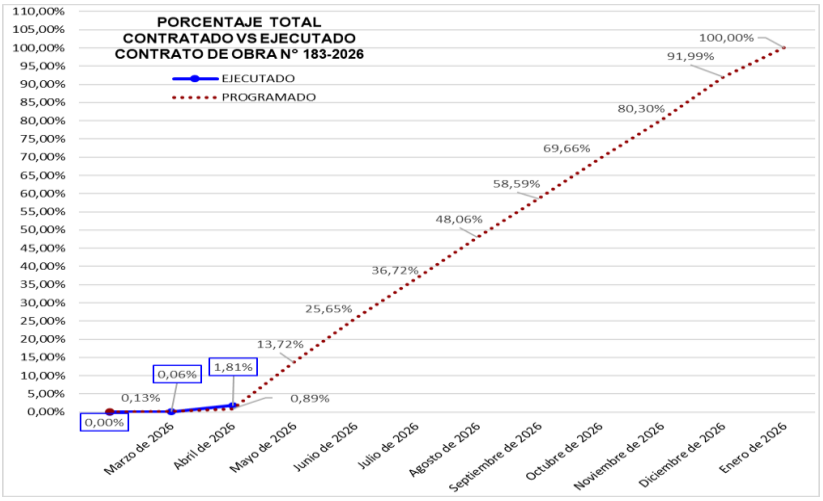

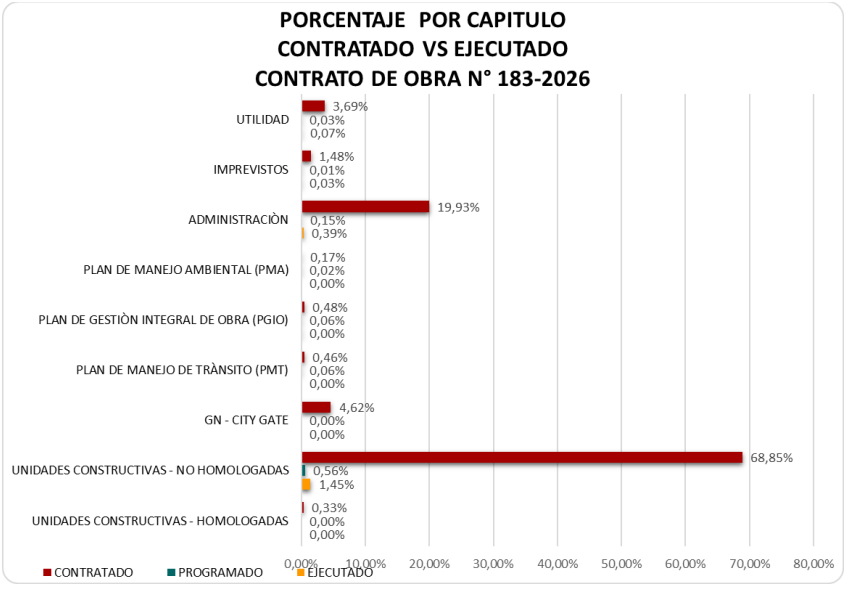

METAS E INDICADORES DEL PROYECTO SEGÚN MGA.

METAS FISICAS DEL PROYECTO	**META 1 KM RED**	**META 2 USUARIOS**
PROGRAMADO	293,740	196
EJECUTADO	0,0	0,0
(%):	**0%**	**0%**

PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA:

EJECUCIÓN (%):	**0,0%**
POR EJECUTAR (%):	100,0%

PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA APOYO A LA SUPERVISIÓN:

EJECUCIÓN (%):	**0%**
POR EJECUTAR (%):	100%

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS OBRA

Relación de Actas generadas Contrato de obra 183 de 2026	
Acta No. 1 de Iniciación:	26 DE MARZO 2026

4.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS INTERVENTORIA

Relación de Actas generadas Contrato de Consultoría 184 de 2026	
Acta No. 1 de Iniciación:	26 DE MARZO DE 2026

4.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS APOYO A LA SUPERVISIÓN

Relación de Actas generadas OPS 432 de 2025	
Acta No. 1 de Iniciación:	26 DE MARZO DE 20026

5. INFORME DE EVALUACION SOBRE LA UTILIDAD OBTENIDA PARA LA ENTIDAD CON LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Con la ejecución del contrato la empresa obtendrá el beneficio de que puede garantizar la prestación del servicio de gas natural para la veredas Socorro, Bebea y Garibay del municipio de Maní, y en general para todos los usuarios del casco urbano del municipio que actualmente se surten del combustible a través de gasoducto virtual y así mismo podrá ampliar la cobertura en estos sectores.

5.1 RECOMENDACIONES ESPECIALES

La interventoría terminó el informe preconstructivo y se encuentran algunos puntos importantes por revisar, respecto a la inclusión de la totalidad de ítems para la correcta ejecución del contrato de obra.

Se solicita adelantar comité de obra para analizar alternativas y sugerencias por parte del constructor y la interventoría para analizar su viabilidad.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN:

	 
Actividades de Replanteo	Reunión con comunidades del proyecto

CONCLUSIONES (RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, PROPUESTAS)

La interventoría hizo entrega formal del informe preconstructivo para que así mismo, el contratista de obra pueda iniciar sus actividades contractuales.

La obra se ha ejecutado de acuerdo a la programación física de ejecución superando lo programado, 1,74% programado vs 1,81 % ejecutado.

La interventoría viene adelantando sus funciones y obligaciones contractuales de acuerdo con el personal y recursos ofertados.

En este periodo se han ejecutado actividades replanteo y localización de tuberías, en las veredas del municipio de Maní.

Se realizó reunión de general del proyecto con los presidentes de las Junta de acción comunal y sus usuarios de las veredas Bebe, Garibay y Socoro del día 15 de abril de 2026, sin embargo, la comunidad está la espera de una reunión con el señor Gobernador.

Se recomienda por parte de la supervisión nuevamente acatar e implementar la aplicación de todos los lineamientos y procedimientos de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG, tanto para obra como para interventoría, así como cumplir con lo establecido en el manual de interventoría.

NOMBRE Y FIRMA DEL AUTOR O AUTORES

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder de supervisión e Interventoría
Supervisor

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
Apoyo a la supervisión OPS 182-2026

CONTRATO No.:	182 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.		4/05/2026		

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2025000650046

INTERVENTORIA: X — APOYO SUPERVISIÓN:

Semana Numero:	6	Del:	1/04/2026	Al:	30/04/2026	Mes No:	1

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 0 Meses y 6 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO GASODUCTO MANI - R/L DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
Nombre del Interventor: UNION TEMPORAL INTERTRONCAL 2026 - R/L DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON
Nombre del Apoyo a Supervisión: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	183 DE 2026	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GASODUCTO MANI - R/L DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO				
NOMBRE DEL RUBRO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	0GAO-2101-1900-2025-00985-0046	No. C.D.P.	126	No R.P.	826
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.955.515.467,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE ENERO DE 2027	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A		
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,76%	0,89%	OBRA EJECUTADA (%)	1,74%	1,81%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 236.790.697,00	$ 277.751.301,00	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 546.459.955,00	$ 566.437.929,00

CONTRATO DE CONSULTORIA - INTERVENTORIA

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	184 DE 2026	NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INTERTRONCAL 2026 - R/L DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON				
NOMBRE DEL RUBRO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	0GAO-2101-1900-2025-00985-0046	No. C.D.P.	226	No R.P.	1026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.564.162.626,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE FEBRERO DE 2027	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A		
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	182 DE 2026		DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	4/05/2026		

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
(Del Apoyo a la supervisión)

Item	Nombre de la actividad contractual	Actividad realizada
1	Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica, y demás documentos del proyecto correspondientes a la interventoría.	Se revisaron los documentos contractuales del Contrato de Consultoría (Interventoría) No.184 de 2026 para dar inicio a las actividades.
2	Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente.	Se trabajó articuladamente con el encargado de GESPROY para seguimiento del proyecto. Se entregó información de ejecución con corte a 30 de abril de 2026.
3	Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventorías PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoría	Se ha apoyado a los supervisores en las actividades establecidas en los procedimientos SIG. Líder de Supervisiones e Interventorías: Luis René Granados Vargas.
4	Entregar los informes mensuales que sean requeridos por el supervisor del contrato de interventoría objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.	Se revisó el Informe Mensual No. 1 Formato FT-MAJ-SI-07 de interventoría con corte a 30 de abril de 2026.
5	Apoyar a la oficina de contratación y jurídica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, así mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la interventoría.	No se han generado actos administrativos posteriores al inicio.
6	Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG.	Se verifica el cumplimiento del plan de salud ocupacional presentado en las propuestas.
7	Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual.	Se han hecho sugerencias en comité de obra inicial para la ejecución de las actividades de interventoría
8	Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e Interventor durante la ejecución del proyecto.	No se han generado actas posteriores al inicio.
9	Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto)	Se acopió inofrmación como actas de inicio
10	Analizar la consistencia de la información y revisar todas las actas solicitas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.	No se ha entregado información.
11	Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la interventoría) de cada uno de los contratos derivados del proyecto	N/A
12	Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría, actividades señaladas en los capítulos I Numeral 5 y 6 y capítulo II al VIII.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo a la ejecución del contrato.
13	Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolle el proyecto para verificar la permanencia de la interventoría para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras.	Se realizó acompañamiento a reuniones con los beneficiarios del proyecto, en las veredas de Mani; el día 15 de abril.
14	Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.	Se actualizaron las garantías exigidas en concordancia con el acta de inicio de interventoría.


REGISTRO FOTOGRAFICO





OBRA EJECUTADA A LA FECHA - PROYECTO

DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN DE OBRA

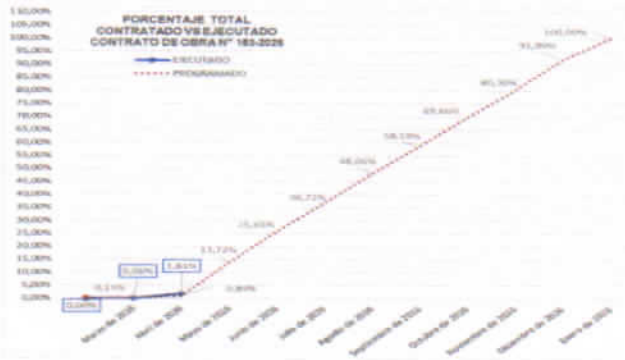

CONTRATO No.:	182 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE		4/09/2026		

REPORTE DE INDICADORES DE EJECUCIÓN

Proyecto BPIN: 2025005850046

1. EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir de la medición del cumplimiento del alcance, de acuerdo con la programación registrada, evaluando al corte de la medición el avance físico ejecutado frente al avance físico programado.

Para los proyectos con cobertura de información igual a cero (0) la eficiencia del proyecto es cero (0).

Cumplimiento de la Programación = Avance físico reportado / Avance físico programado.

Donde,

El avance físico programado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades programadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición. El avance físico reportado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición.

	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,76%	0,89%	OBRA EJECUTADA (%)	1,74%	1,81%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 236.790.597,00	$ 277.751.301,00	VALOR DE LA OBRA	$ 548.459.655,00	$ 566.437.929,00

Cumplimiento de la Programación = 2,04

2. EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL COSTO

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir de la medición del cumplimiento en el costo, de acuerdo con la programación registrada, evaluando a la fecha de la medición, el costo ejecutado frente al costo programado.

Si para el periodo de medición, la interventoría no reporta información el indicador tendrá una puntuación igual a cero.

Cumplimiento del Costo = avance físico reportado (valor ganado) / costo actual (ejecutado) del proyecto

Donde,

El avance físico reportado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición. El costo actual del proyecto corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario ejecutado de cada actividad reportado por la entidad a la fecha de medición.

	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 548.459.655,00	$ 566.437.929,00	VALOR DE LA OBRA (COSTO	$ 548.459.655,00	$ 566.437.929,00

Cumplimiento del Costo = 1,00

3. ATRASO EN LA EJECUCIÓN

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir del cumplimiento del plazo reportada por la entidad, verificando si existen desviaciones en tiempo (retrasos) respecto a los programado a la fecha de corte de medición.

Para el cálculo se consideró:

- La fecha programada en la cual se tenía previsto alcanzar el avance físico registrado a la fecha del corte de la medición.
- Plazo transcurrido al corte

Variación del tiempo = [t1 - fecha programada del avance físico actual] / Plazo transcurrido

Donde,

t1 corresponde a la fecha del corte de la medición.
Fecha programada del avance físico actual, corresponde a la fecha en la cual se tenía previsto alcanzar el avance físico reportado al corte.
Plazo transcurrido corresponde al periodo de tiempo entre el inicio del proyecto y la fecha del corte de la medición.

t1 =	30/04/2026
Fecha programada del avance actual =	30/05/2026
Plazo transcurrido (días) =	36
Variación del Tiempo (atraso en Ejecución) =	-0,06

Nota: Se deben trabajar en días de acuerdo con la programación reportada en el Gesproy

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

En constancia se firma por quienes intervinieron.

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

CONTRATO No:	182 DE 2026		DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	13	4	2026

INFORME QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2025005850046

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [x]

Quincena Número:	1	Del:	26/03/2026	Al:	10/04/2026	No:	1

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 0 Meses y 16 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO GASODUCTO MANI R/L DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
Nombre del Interventor: UNIÓN TEMPORAL INTERTRONCAL 2026 R/L DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Nombre Apoyo a la Supervisión: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	183-2026	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GASODUCTO MANI R/L DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO				
NOMBRE DEL RUBRO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2025-00585-0046	No. C.D.P.	126	No R.P.	926
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.355.515.487,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES				
VALOR ADICIONAL No 1	N/A	PLAZO PRORROGA 1	N/A				
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA	25 DE ENERO DE 2027	NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUAL			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 12.542.206.195,00	40,00%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 12.542.206.195,00	40,00%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	QUINCENAL	ACUMULADO		QUINCENAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,39%	0,39%	OBRA EJECUTADA (%)	0,30%	0,30%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 122.882.112,28	$ 122.882.112,28	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 93.258.616,89	$ 93.258.616,89

CONTRATO No:	182 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		13	4	2026

INFORME QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA		PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2025005850046	
			APOYO SUPERVISION	x	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	184-2026	NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNION TEMPORAL INTERTRONCAL 2026 R/L DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON				
NOMBRE DEL RUBRO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2025-00585-0046	No. C.D.P.	226	No R.P.	1026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.564.162.626,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
FECHA DE INCIO	26 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE FEBRERO DE 2027	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0,00

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES			
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO	
N/A	N/A	N/A	

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	182-2026	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON				
NOMBRE DEL RUBRO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2025-00585-0046	No. C.D.P.	326	No R.P.	826
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 69.969.720,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 69.969.720,00	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN					
FECHA DE INCIO	26 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE MARZO DE 2027	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			

CONTRATO No:	182 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		13	4	2026

INFORME QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2025005850046

INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [x]

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó acompañamiento al comité de Obra No. 1, el día 26 de marzo, donde se presentaron los grupos de trabajo de interventoría y obra y la supervisión dio directrices generales sobra la ejecución.

Se revisaron los informes semanales de interventoría No. 1, 2 y 3.

Se tiene un avance de obra aproximado del 0,30%, según lo informado por la interventoría en el último informe con corte a 10 de abril de 2026 correspondiente a las actividades de replanteo y localización de tuberías, en la vereda Bebea del municipio de Maní.

Se ha apoyado al supervisor en las actividades establecidas en el contrato cumpliendo con el manual de interventoria.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO No 1. Replanteo y localización de tuberías en las veredas Bebea y Garibay.



FOTO No 2. Replanteo y localización de tuberías en las veredas Bebea y Garibay.

CONTRATO No:	182 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		13	4	2026

INFORME QUINCENAL APOYO SUPERVISION

	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2025005850046
INTERVENTORIA		APOYO SUPERVISION	x

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

- Visita de acompañamiento a reunión con comunidades beneficiarias del proyecto.
- Comité de obra
- Elaboración de informes

OBSERVACIONES

Durante el presente período se continúa realizando el seguimiento y actividades de apoyo a la supervisión .

En constancia se firma.

OSCAR EDUARDO ARCINEGAS CHACON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DEL APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATO No:	182 DE 2026		DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	13	4	2026

INFORME QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2025005850046

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [x]

Quincena Número:	2	Del:	11/04/2026	Al:	25/04/2026	No:	2

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 0 Meses y 31 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO GASODUCTO MANI R/L DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
Nombre del Interventor: UNIÓN TEMPORAL INTERTRONCAL 2026 R/L DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Nombre Apoyo a la Supervisión: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	183-2026	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GASODUCTO MANI R/L DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO				
NOMBRE DEL RUBRO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2025-00585-0046	No. C.D.P.	126	No R.P.	926
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.355.515.487,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES				
VALOR ADICIONAL No 1	N/A	PLAZO PRORROGA 1	N/A				
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA	25 DE ENERO DE 2027	NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUAL			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 12.542.206.195,00	40,00%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 12.542.206.195,00	40,00%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	QUINCENAL	ACUMULADO		QUINCENAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,32%	0,71%	OBRA EJECUTADA (%)	0,45%	0,75%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 99.498.218,94	$ 222.380.331,22	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 140.626.135,11	$ 233.884.752,00

CONTRATO No:	182 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		13	4	2026

INFORME QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2025005850046

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [x]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	184-2026	NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTERTRONCAL 2026 R/L DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON				
NOMBRE DEL RUBRO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2025-00585-0046	No. C.D.P.	226	No R.P.	1026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.564.162.626,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES				
FECHA DE INCIO	26 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE FEBRERO DE 2027	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0,00

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES				
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO		
N/A	N/A	N/A		

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL - MANI Y CONSTRUCCION DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO, GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	182-2026	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON				
NOMBRE DEL RUBRO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE GAS NATURAL AGUAZUL- MANI Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS LA BEBEA, SOCORRO Y GARIBAY DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2025-00585-0046	No. C.D.P.	326	No R.P.	826
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 69.969.720,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 69.969.720,00	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN					
FECHA DE INCIO	26 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE MARZO DE 2027	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			

CONTRATO No:	182 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		13	4	2026

INFORME QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2025005850046

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [x]

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó acompañamiento al comité de Obra No. 2, el día 16 de abril, donde el contratista de obra solicitó a la interventoría, el cambio en especificaciones del ítem de tubería en acero. La interventoría revisará la mencionada solicitud y procederá en concordancia.

Se realizó acompañamiento a Visita de Obra comité de Obra No. 1 el día 15 de abril con los beneficiarios del proyecto en las veredas Bebea y Garibay, del municipio de Maní. Allí se les informó el alcance del proyecto y las acciones y obligaciones de cada uno de los actores involucrados en el proyecto.

Se revisaron los informes semanales de interventoría No. 4 y 5.

Se tiene un avance de obra aproximado del 0,75%, según lo informado por la interventoría en el último informe con corte a 25 de abril de 2026 correspondiente a las actividades de replanteo y localización de tuberías, en las veredas Bebea y Garibay del municipio de Maní.

Se ha apoyado al supervisor en las actividades establecidas en el contrato cumpliendo con el manual de interventoria.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO No 1. Reunión con comunidad beneficiaria del proyecto.



FOTO No 2. Reunión con comunidad beneficiaria del proyecto.

CONTRATO No:	182 DE 2026	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION RED TRONCAL DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS PUNTO NUEVO, MORICHAL, SAN RAFAEL Y YOPITOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		13	4	2026

INFORME QUINCENAL APOYO SUPERVISION

		PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2025005850046	
INTERVENTORIA			APOYO SUPERVISION	x	

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

	Visita de seguimiento en obra
	Comité de obra
	Elaboración de informes

OBSERVACIONES

Durante el presente período se continúa realizando el seguimiento y actividades de apoyo a la supervisión .

En constancia se firma.

OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Reviso:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DEL APOYO A LA SUPERVISION

TRD		

Tipo de Reunión	De Seguimiento

Objetivo: Realizar la reunión de inicio del contrato, en la cual se socializan lineamientos administrativos, técnicos y operativos para la ejecución del proyecto, así como la presentación de los equipos de trabajo de las partes intervinientes.

Proceso:	Planeación y Proyectos	de Gas	**ACTA N°**	01

Logística

Fecha:	26 de marzo de 2026	**Hora:**	08:00 am	**Duración Estimada:**	01(hora)

Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	CARRERA 19 No. 16-100 EDIFICIO SOSSA PACHECO - AUDITORIO

Agenda de la reunión

1. Presentación de los equipos de trabajo.
2. Socialización de formatos para la ejecución del contrato
3. Revisión de aspectos administrativos
4. Novedades de la Interventoría
5. Inicio de actividades de interventoría

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales:	**Preparación requerida:**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
GUSTAVO PARRA MARTINEZ	Supervisor	Enerca S.A. E.S.P.	SI
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	Supervisor del apoyo a la supervisión	Enerca S.A. E.S.P.	SI
OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON	Apoyo a la supervisión	Enerca S.A. E.S.P.	SI
DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON	Representante Legal y Residente de Interventoría 1	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	Representante Legal	Consorcio Gasoducto Maní	SI
CARLOS ANDRES CORREDOR CASTELLANOS	Director de Interventoría	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
OSCAR JAVIER LETRADO ESTEVEZ	Director de Obra	Consorcio Gasoducto Maní	SI
NELSON FABIAN PARRA VARGAS	Residente de Interventoría 2	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
NELSON ARIEL TORREZ PAEZ	Residente de Obra 1	Consorcio Gasoducto Maní	SI

ANGELA MILENA VARGAS GARZÓN	Residente de Obra 2	Consorcio Gasoducto Maní	SI
MARIELENA DIAZ DIAZ	Ingeniera Ambiental de Interventoría 1	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
EDITC JASMIN PACHECO REINA	Ingeniera Ambiental de Interventoría 2	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
JAISSON ROLANDO SAAVEDRA PICO	Profesional SG-SST de Interventoría 1	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
NADIA YELENA VILLAMIL NOCUA	Profesional SG-SST de Interventoría 2	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
CARLOS ORLANDO CARDENAS MUNEVAR	Especialista en Ingeniería de Gas	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
BORIS ANDRES ROA PINEDA	Especialista en Hidráulica	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
JOSE MAURICIO GUERRERO FAGUA	Especialista en Geología	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
ALFREDO MARTIN PEREZ JAIMES	Especialista Estructural	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI

Desarrollo de la Reunión

1. Presentación de equipos de trabajo

Se realizó la presentación formal de los equipos de trabajo de:

- Contratista de obra Consorcio Gasoducto Maní
- Interventoría Unión Temporal Intertroncal 2026
- Supervisión
- Apoyo a la supervisión

2. Socialización de lineamientos para entrega de información

La entidad contratante ENERCA realizó la socialización de los procedimientos y formatos establecidos para la entrega de información durante la ejecución del contrato, bajo el esquema SI 2026, indicando lo siguiente:

- La Interventoría deberá presentar:
  - Informe semanal mediante el formato FT-MAJ-SI-07.
  - Informe mensual dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, utilizando el formato FT-MAJ-SI-07.
  - Informe mensual en formato Word, conforme al modelo FT-MAJ-SI-30, el cual deberá ser presentado dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.
- El Contratista de obra deberá presentar:
  - Informe mensual en formato Word, conforme al modelo FT-MAJ-SI-30, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.
- El Apoyo a la supervisión deberá presentar:
  - Informe mensual mediante el formato FT-MAJ-SI-07.

Se aclaró que la entrega de los informes en formato Word (FT-MAJ-SI-30) es independiente de la entrega de los formatos FT-MAJ-SI-07.

Adicionalmente, se socializaron otros formatos correspondientes a:

- Actas parciales
- Informes mensuales

- Liquidación
- Demás documentos requeridos dentro del sistema de gestión SI 2026

3. Cambio de vehículo - Interventoría

La Interventoría informó el cambio de uno (1) de los vehículos propuestos para el desarrollo de las actividades del contrato, así:

- Vehículo inicialmente propuesto: Placa WDU187
- Vehículo que reemplaza: Placa LZQ716

Se deja constancia de que el nuevo vehículo será destinado para el cumplimiento de las actividades contractuales. La supervisión verificó las condiciones del vehículo reemplazante y concluye que se aprueba el cambio.

4. Informe Preconstructivo

Se dejó constancia del inicio de la elaboración del informe preconstructivo por parte del equipo de Interventoría, el cual será presentado conforme a los lineamientos establecidos.

5. Cierre de la Reunión.

Se da por finalizada la reunión, dejando constancia de los temas tratados y compromisos adquiridos por las partes.

Compromisos			
Actividades	**Responsables**	**Fecha**	**¿Cumplió?**
Dar cumplimiento a los lineamientos y formatos establecidos por ENERCA para la entrega de información.	Apoyo a la supervisión Interventoría Obra		
Presentar los informes en los tiempos y formatos definidos	Interventoría Obra		
Continuar con la estructuración y presentación del informe preconstructivo por parte de la Interventoría.	Interventoría		

pAsistentes	
Nombre	**Firma**
NELSON FABIAN PARRA VARGAS	
ANGELA MILENA CARDOZO GARZÓN	
[illegible]	
DENIS F. CASADIEGO ALARCÓN	
OSCAR ARCINIEGAS	

TRD		

Tipo de Reunión	De Seguimiento

Objetivo: Revisar la solicitud de cambio de tubería del proyecto y hacer seguimiento al estado del informe preconstructivo de la interventoría.

Proceso:	Planeación y Proyectos	de Gas	**ACTA N°**	02

Logística

Fecha:	16 de abril de 2026	**Hora:**	08:00 am	**Duración Estimada:**	01(hora)
Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	CARRERA 19 No. 16-100 EDIFICIO SOSSA PACHECO – AUDITORIO		

Agenda de la reunión

1. Revisión de solicitud de modificación de especificación de tubería.
2. Estado del informe preconstructivo de la interventoría.
3. Compromisos y conclusiones.

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales:	**Preparación requerida:**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
GUSTAVO PARRA MARTINEZ	Supervisor	Enerca S.A. E.S.P.	SI
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	Supervisor del apoyo a la supervisión	Enerca S.A. E.S.P.	SI
OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON	Apoyo a la supervisión	Enerca S.A. E.S.P.	SI
DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON	Representante Legal y Residente de Interventoría 1	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	Representante Legal	Consorcio Gasoducto Maní	SI
CARLOS ANDRES CORREDOR CASTELLANOS	Director de Interventoría	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
OSCAR JAVIER LETRADO ESTEVEZ	Director de Obra	Consorcio Gasoducto Maní	SI
NELSON FABIAN PARRA VARGAS	Residente de Interventoría 2	Unión Temporal Intertroncal 2026	SI
NELSON ARIEL TORREZ PAEZ	Residente de Obra 1	Consorcio Gasoducto Maní	SI
ANGELA MILENA VARGAS GARZÓN	Residente de Obra 2	Consorcio Gasoducto Maní	SI

Desarrollo de la Reunión

1. Solicitud del Consorcio Gasoducto Maní

El contratista informa que, mediante oficio dirigido a la interventoría, se realizó la solicitud de aprobación para la modificación en la especificación de la tubería inicialmente contemplada para la ejecución del proyecto de gasoducto.

De acuerdo con la ingeniería del proyecto, se definió el uso de tubería en acero al carbón sin costura (S/C) Ø= 2" SCH 40, bajo normas ASTM A53 / ASTM A106 / API 5L Grado B.

No obstante, el contratista manifiesta que, debido a la baja disponibilidad de este material en el mercado internacional, sumado a las condiciones logísticas actuales derivadas de la coyuntura geopolítica global, se presentan tiempos de entrega estimados entre cinco (5) y seis (6) meses, sin confirmación total de suministro, lo cual impacta directamente el cronograma del proyecto.

En consecuencia, el contratista indica que realizó una evaluación técnica de alternativas disponibles en el mercado nacional, proponiendo como opción viable la tubería ASTM A-53 (NTC 3470) ERW Schedule 40 Grado A, la cual, según lo expuesto, cumple con los requisitos técnicos y operativos del proyecto.

2. Pronunciamiento por el área de la interventoría.

La interventoría recibe la solicitud presentada por el contratista y deja constancia que realizará la respectiva revisión técnica en conjunto con el diseñador del proyecto, con el fin de verificar la viabilidad del cambio propuesto, así como el cumplimiento de las condiciones técnicas, normativas y de operación requeridas.

Se aclara que cualquier aprobación estará sujeta al concepto técnico del diseñador y al cumplimiento integral de las especificaciones del proyecto.

3. Estado del informe preconstructivo

La supervisión consulta a la interventoría sobre el estado del informe preconstructivo.

Al respecto, la interventoría informa que el documento se encuentra en proceso de elaboración y se compromete a realizar su entrega dentro de un plazo de ocho (8) días calendario, contados a partir de la fecha de la presente reunión.

4. Conclusiones

Se deja constancia que:
La solicitud de modificación de la tubería queda en proceso de evaluación técnica.
La interventoría se compromete a la entrega del informe preconstructivo en el plazo establecido.

Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?
Gestionar la revisión técnica de la alternativa propuesta con el diseñador del proyecto.	Interventoría		

Entregar el informe preconstructivo en un plazo de ocho (8) días calendario.	Interventoría		
Suministrar la información técnica adicional requerida para la evaluación. (fichas técnicas, certificaciones, soportes normativos, entre otros).	Obra		

Asistentes	
Nombre	**Firma**
Nelson Fabian Parra Vargas	
ANGELA MILENA VARGAS SARZOSA	
DENIS FERNEY CASADIEGO A	
OSCAR ARCINIEGAS	
Luis René Granados Vargas.	
Gustavo Parra Martinez	

TRD		

		Fecha:	15	04	2026
Municipio:	Maní	**Lugar de visita**	Vereda Bebea – Garibay		
Contrato No.	CONTRATO DE OBRA No. 183 DE 2026	**Contratista**	CONSORCIO GASODUCTO MANI		
Representante legal	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	**NIT**	902.043.673-3		
Objeto: Realizar la pre socialización del proyecto con las comunidades de las veredas Garibay y Bebea, dando a conocer el alcance de las actividades a ejecutar, condiciones técnicas, sociales y operativas, así como resolver inquietudes iniciales de la comunidad.					
Interventor (o Supervisor)	UNIÓN TEMPORAL INTERTRONCAL 2026				
Supervisor de interventoría	OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON				
Contrato No.	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 184 DE 2026				
Representante legal	R/L CASADIEGO ALARCON DENIS FERNEY	**NIT**	902.043.930-1		

Residente de obra. ANGELA MILENA VARGAS GARZÓN

Residente de interventoría NELSON FABIAN PARRA VARGAS

También participaron en la visita:

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad
COMUNIDAD DE LA VEREDA GARIBAY	Comunidad	Vereda Garibay
COMUNIDAD DE LA VEREDA LA BEBEA	Comunidad	Vereda La Bebea
OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON	Apoyo a la supervisión	Enerca S.A. E.S.P.
DENIS FERNEY CASADIEGO ALARCON	Representante Legal y Residente de Interventoría 1	Unión Temporal Intertroncal 2026
DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	Representante Legal	Consorcio Gasoducto Maní
NELSON FABIAN PARRA VARGAS	Residente de Interventoría 2	Unión Temporal Intertroncal 2026
ANGELA MILENA VARGAS GARZÓN	Residente de Obra 2	Consorcio Gasoducto Maní

Desarrollo de la visita:

Se realizaron dos espacios de socialización en la misma fecha, los cuales tuvieron continuidad temática y participación comunitaria, quedando consolidados en la presente acta:

Vereda Garibay – 08:30 a.m.

Se llevó a cabo la socialización inicial con la comunidad de la vereda Garibay, donde se expusieron los

siguientes temas:

- Se explicó el alcance del proyecto a ejecutar en la vereda.

Se informó que se dará inicio a actividades de replanteo, con el fin de verificar los usuarios incluidos dentro del proyecto.

- Se aclaró que el alcance del contratista comprende hasta la instalación del medidor con su respectiva cajilla.
- Se indicó a la comunidad que cada usuario debe contar con un muro para la instalación del medidor, preferiblemente con dimensiones de 1m x 1m, el cual deberá ser construido por cada beneficiario en caso de no contar con este.
- Se brindaron recomendaciones para que las instalaciones internas sean ejecutadas por personal o empresas certificadas, garantizando condiciones de seguridad.
- El contratista socializó las condiciones de vinculación de mano de obra local, indicando que se realizará contratación con cumplimiento de todas las prestaciones legales.
- Se mencionaron necesidades logísticas como hospedaje y alimentación para el personal operativo, solicitando apoyo de la comunidad en este aspecto.

Vereda Bebea – 11:30 a.m.

La segunda socialización se realizó con la comunidad de la vereda Bebea en el sector urbano del municipio de Maní, debido a la disponibilidad de los habitantes.

En esta reunión se trataron los mismos temas expuestos anteriormente, adicionando lo siguiente:

- Se manifestó la existencia de usuarios no contemplados inicialmente en el proyecto.
- Se informó que, durante el proceso de replanteo, se evaluará la posibilidad técnica y administrativa de incluir dichos usuarios, siempre que cumplan con las condiciones requeridas.

Las reuniones realizadas con las comunidades de las veredas Garibay y Bebea se desarrollaron de manera continua, manteniendo unidad temática, razón por la cual se consolidan en una sola acta, soportada con un único listado de asistencia firmado por los participantes.

Observaciones y recomendaciones
Realizar seguimiento al cumplimiento del alcance del proyecto y compromisos adquiridos, por parte de la interventoría y supervisión.

Compromisos

Actividades	Responsables	Fecha	¿Cumplió?
-Realizar el replanteo para verificación de usuarios. -Ejecutar la instalación hasta el medidor con cajilla conforme al alcance contractual.	Contratista		
-Construir los muros para instalación de medidores (en caso de no contar con ellos). -Realizar las instalaciones internas con personal certificado. -Apoyar, en la medida de lo posible, con hospedaje y alimentación para el personal de obra.	Comunidad		

Registro fotográfico













Asistentes	
Nombre	**Firma**
Jhon Jairo O.	
Hasvady Infante	
ANGEL infante	
Maria E Serrano	
Yinny NAVOA	
Luisa Fernanda orcena Mora	
Angelica maria roa	
Luisa Quiñonez	
Guillermo chavita	
elizabeth Macias	
Nicolas Daza Diaz	
Elmer Acosta	
Maria Elsa Morales	
Neidel payares	
Adith Nelva Gutierrez	
edwar Alexander Marin Gutierrez	
Luz Ayde Gutierrez	
Ivan acosta Dard	
Sose Alexander Herrera NIÑO	
edilma Herrera piño	

Hugo Victor Guababe Niño	
Henry Sargas Adán	
Alejandro Rios	Luis A. Rios
Luis Armando Castro Ovalle	Luis A. Castro C.
Yimi Alfonso Ochoa Llanos	
Edgar Gonzalez R	
Alicia Cubaque R.	
Gulberto Suarez	
Odoeme X Grosso Palencio	
Juan Carlos Vaisos Adán	
Claudia P. Moreno Ortiz	
Flor Maria Ortiz	
Natalia Ropero Rondón	
Rafael Domingo Ropero	Rafael D. Ropero.
Hector M Gonzalez	
Maria Inelda	Sanchez
Maria Evelia Martinez	Maria Evelia Martinez.
Luis Benigno Martinez A	
Jesus Antonio Cardenas Cano	
Edgar Arevalo Cano	
Gloria Patricia Aguirre Martinez	

Blanca Nelly Vargas Perez	N.U.P.
Doris Vargas Torres	
Adilia Walteros Rondon	
Lucy Dominga Walteros Rondon	Lucy D. Walteros R.
Honey Martinez Vargas	Honey Martinez V.
Luis Ignacio Roa R	
Nelson Fabian Parra Vargas Res. interventoria	
ANGELA MILENA VARGAS CABEZAS	
DENIS FERNEY CASADIEGO A.	
OSCAR ARCINIEGAS	
