CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	Hoja N20o.	De

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000 - Despacho del Alcalde
Código y nombre de la oficina productora	1030 - Oficina de contratación
Código y nombre de la serie documental	1030 - 19 Contratos
Código y nombre de la subserie documental	1030-19.07 Contratos de Obras
Nombre del expediente	1279-2023 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CONTENIDO

Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	12-03-2026	01-04-2024	Informe mensual de obra N° 12 Abril 2024	17664-17783		
2	12-03-2026	01-04-2024	Anexo informe de obra abril 2024	17784-17864		

RESPONSABLES			
Elaborado por		**Responsable del área u oficina productora**	
Nombres y apellidos:	Natalia Martinez Arévalo	**Nombres y apellidos:**	
Cargo:	Coordinadora Administrativa	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	
Fecha de cierre del expediente (AAAA-MM-DD)			

17664

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 12

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

CONTRATO 1279 de 2023



"RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

1 DE ABRIL A 26 DE ABRIL 2024

VERSION 0

Control de Aprobaciones y Versiones

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	FOLIOS
0	15/05/24	DOCUMENTO ORIGINAL	

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL DIANA CAROLINA VEGA CASTILLO ASTRID RUÍZ GONZÁLEZ MARIA DEL PILAR SEPULVÉDA SUÁREZ	
ING. APOYO TÉCNICO PROFESIONAL SST	NOMBRE: ING. YEISON GOMEZ GUERRERO DIRECTOR DE OBRA

Contenido

Contenido 3

1 INTRODUCCIÓN. 7

2 OBJETIVOS. 8

2.1 Objetivo General. 8

2.2 Objetivos Específicos. 8

3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 9

3.1 Descripción General del Proyecto. 9

3.2 Localización de Obra. 10

3.3 Implantación del Proyecto. 11

3.4 Alcance del Proyecto. 12

3.5 Control de Garantías. 13

4 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS. 16

4.1 Programación de Obra del Proyecto. 16

4.2 Análisis Programado Acumulado vs Ejecutado Acumulado. 17

4.3 Grafica de Avance Físico vs Programado. 18

5 COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA. 19

5.1 Actividades Realizadas. 19

5.1.1 Capítulo 2. Acondicionamiento del terreno 19

5.1.2 Capítulo 3. Cimentaciones (base - solados). 20

5.1.3 Capítulo 3. Cimentaciones - (Acero de Refuerzo). 21

5.1.4 Capítulo 4. Acero de Refuerzo Estructural. 22

5.1.5 Capítulo 22. Sobre Acarreo y Transporte de Material 23

4

5.1.6 ITEMS NO PREVISTOS. 24
5.1.7 Plan de Manejo de Transito (PMT). 28
5.1.8 Uso de Maquinarias y Equipos. 30
5.2 Bitácora o Libro de Obra 32
5.3 Estado del Tiempo. 32
6 GESTIÓN DE CALIDAD ACORDE AL PLAN DE CALIDAD. 33
6.1 Certificado de Calidad de Materiales y Equipos. 33
6.1.1 Equipos de Topografía. 34
6.1.2 Certificado de laboratorio. 34
6.2 Ensayos de Laboratorio 35
6.3 Ensayos In Situ. 38
6.3.1 Asentamiento o Slump. 39
7 INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 40
7.1 Relación del Personal Empleado en la Ejecución de la Obra en el Mes. 44
7.2 Registro de Entrega, Reemplazo de EPP´s y Dotación. 54
7.3 Procesos de Inducción al Ingreso de Obra. 55
7.4 Charlas de Seguridad y Capacitaciones. 57
7.5 Control de Actividades de Alto Riesgo. 60
7.6 Inspecciones Planificadas. 60
7.7 Accidentabilidad. 61
7.8 Frecuencia de Accidentalidad. 62
7.9 Severidad de Accidentalidad. 63
7.10 Ausentismo Laboral. 63
8 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL. 64

8.1 Control y Seguimiento a las Actividades de Gestión Ambiental. 64

8.2 Actividades del mes 65

8.3 MEDIO ABIOTICO 66

8.3.1 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES DE DEMOLICIÓN EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 66

8.3.2 MANEJO ADECUADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 68

8.3.3 PROGRAMA PARA EL MANEJO EFICIENTE DEL AGUA Y VERTIMIENTOS 68

8.3.4 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 69

8.3.5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES 69

8.4 MEDIO BIÓTICO 73

8.4.1 PROGRAMA DE MANEJO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DESCAPOTE 73

8.4.2 MANEJO DE FLORA 75

8.4.3 MANEJO DE FAUNA 75

8.4.4 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 75

8.4.5 MANEJO DE SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA 77

8.4.6 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA 79

8.5 MEDIO SOCIO ECONÓMICO 80

8.5.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO 80

8.6 INSPECCIÓN AMBIENTAL 80

8.7 Seguridad y Salud en el Trabajo. 85

9 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL. 86

9.1 Programa de Atención al Usuario. 86

9.1.1 Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto. 88

9.2 Metodología: 89

1.1 Programa de Contratación de Mano de Obra. 90

9.3 De acuerdo a la gráfica anterior, podemos concluir que de los 28 trabajadores de MONC, 21 de ellos pertenecen al AID del proyecto, 26 son hombre y 2 son mujeres. Cumpliendo así con el 70% en la contratación de MONC del Área de Influencia Directa del Proyecto. 95

9.4 Programa de Información y Participación Comunitaria. 95

9.5 Comité de Vigilancia y Control. 96

9.6 Programas de Compensaciones Socioeconómicas. 97

10 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 98

10.1 Comité y/o Reuniones de Obra. 98

10.2 Correspondencia Enviada. 99

11 COMPONENTE FINANCIERO. 100

11.1 Relación Inversión del Anticipo. 100

11.2 Seguimiento Financiero Control de Actas y Pagos 101

12 CONCLUSIÓN. 115

13 TABLAS 116

1 INTRODUCCIÓN.

El presente informe mensual de avance de obra a la interventoría describirá las actividades ejecutadas durante el periodo del 1 de abril al 26 de abril de 2024, en el proyecto y basados en los requisitos establecidos en el objeto del contrato "Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta"

Como parte de la ejecución que Consorcio Educación C&G-MH, efectuara la construcción del proyecto tomando en cuenta las directrices establecidas en los planes y programas determinados en el anexo técnico y se implementan las que aplican en el periodo y se mencionan a continuación:

Plan de Manejo Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-, PDT Programa Detallado de Trabajo, Diagrama de Ruta Crítica, Programa mensual de uso de equipo y maquinaria, Plan de manejo e inversión de anticipo, Programa de inversión mensual de anticipo, Programa de inversión mensual del proyecto, Manual de operación del proyecto, y Plan de Calidad.

2 OBJETIVOS.

2.1 Objetivo General.

El objetivo del presente informe es conocer el desarrollo de actividades y avances de ejecución de obra con el fin transmitir las metas alcanzadas durante el periodo del 1 de abril de 2024 al 26 de abril de 2024, enmarcado en el cumplimiento las obligaciones establecidas contrato 1279 de 2023, para la "Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta".

2.2 Objetivos Específicos.

- Informar el cumplimiento del objeto de lo contratado y el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo.
- Desarrollar estrategias de información con el propósito de conocer las metas físicas propuestas y alcanzadas para el periodo del presente informe.
- Diagnosticar desviaciones presentes en las actividades ejecutadas durante el periodo a fin de generar propuestas que mejoren su desarrollo para la consecución de metas físicas de obra.

3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 Descripción General del Proyecto.

A continuación, se aportarán datos generales del proyecto los cuales permitirán la comprensión del objeto del contrato 1279 de 2023, para su seguimiento y control, los cuales se describen a continuación:

Tabla 1

Datos Generales del Proyecto

Condiciones Generales	
Entidad Contratante	Municipio de Villavicencio
Contratista	Consorcio Educación C&G-MH
Objeto del Contrato	Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta
Representante Legal	Mauricio Mejía Hoyos
Contrato N°	1279 de 2023
BIPN	2021-50001-0023 BPPIM 2021-050001-0021
NIT	901687301-9
Valor del Contrato	$25.094.607.822,56
Anticipo	20%
Valor Anticipo	$5.018.921.564,51
Plazo Inicial	10 Meses
Plazo Modificado	7 Meses y Once Días
Fecha Acta de Inicio	20 de Mayo 2023
Fecha Prorroga No. 1	22 de diciembre de 2023
Plazo Prorroga No. 1	12 meses
Suspensión No. 1	26 de abril de 2024
Plazo Suspensión No. 1	1 mes
Fecha de Culminación del Contrato	31 de enero de 2025

3.2 **Localización de Obra.**

EL proyecto está ubicado en el corregimiento 4, del centro poblado Altos de Pompeya calle 6 # 19-36, Villavicencio capital del departamento del Meta, en un terreno de 1.8 Ha, destinado para la construcción del nuevo colegio Alfonso López Pumarejo, con una superficie de 0,3392 Km^2.

En la siguiente tabla se adjuntaron los diferentes tipos de coordenadas de ubicación geográfica del centro poblado Altos de Pompeya, información que nos permitirá realizar la ubicación de coordenadas reales para la posterior georreferenciación del proyecto.

Tabla 2

Ubicación Geográfica Centro poblado Altos de Pompeya

Ubicación Geográfica	
Coordenadas Geográficas	Norte 4°03´48" Oeste 73°23´48"
Coordenada Decimales	Norte 4,063333° Oeste -73,396667°
UTM	449304 677989 18N

Para obtener una mejor comprensión y asimilación de la ubicación geográfica del centro poblado de Altos de Pompeya en la siguiente ilustración se demostrará como el valor informativo de una imagen nos ayuda a entender lo plasmado en los párrafos antes mencionados.

Ilustración 1

Localización Geográfica del Proyecto




3.3 Implantación del Proyecto.

Implica la distribución y ordenamiento de los espacios para los diferentes fines previstos, correspondería a los diferentes módulos que componen la estructura física y obras de urbanismo del nuevo Colegio Alfonso López Pumarejo.

Ilustración 2

Implantación y Localización General

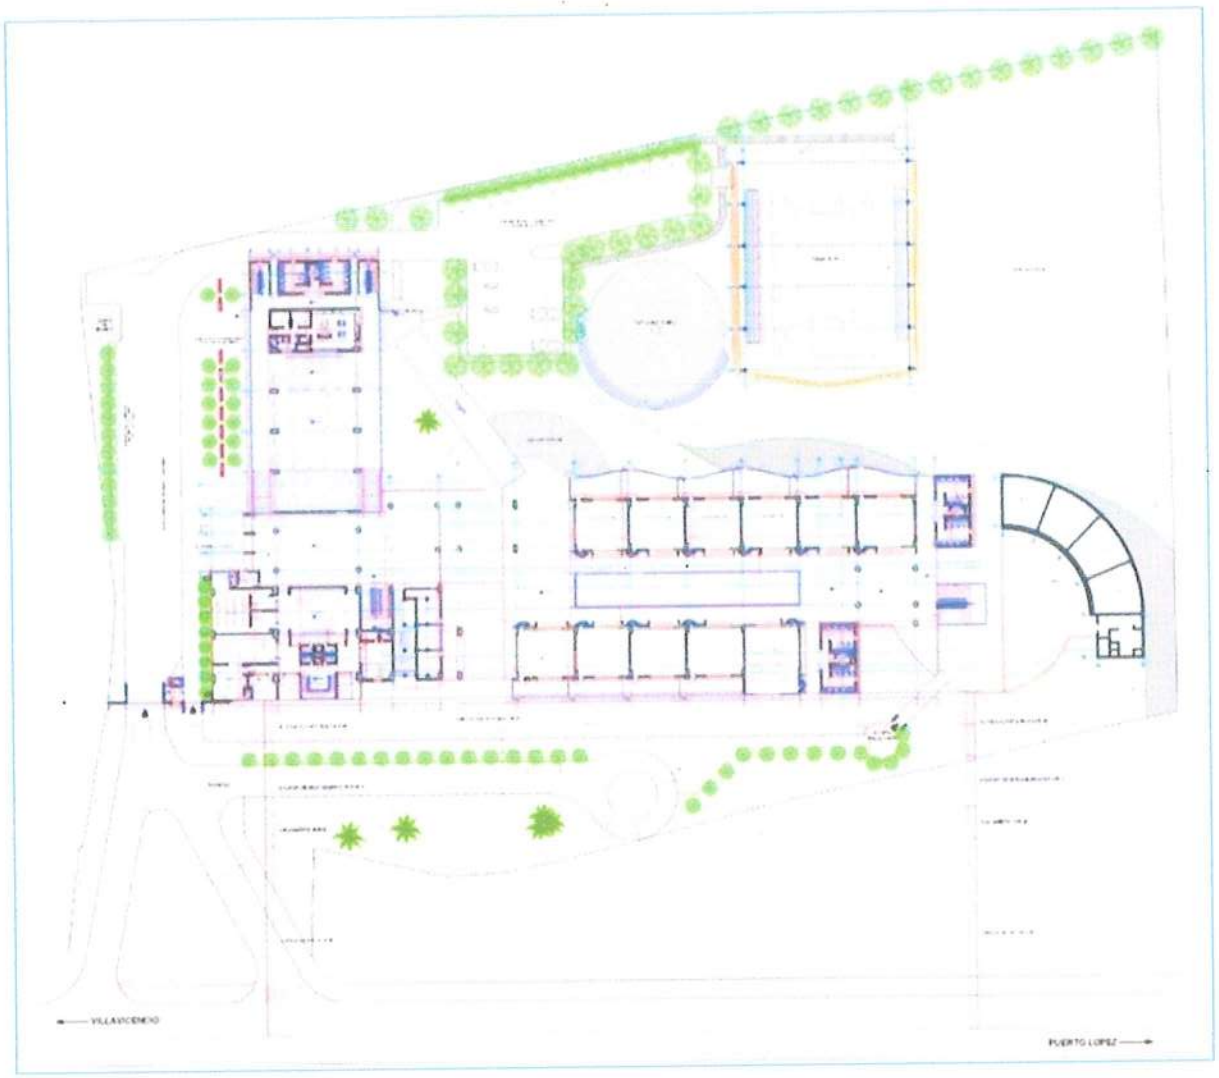

3.4 Alcance del Proyecto.

El Consorcio Educación C&G-MH, enmarcado en el alcance del contrato llevará a cabo la construcción del Colegio Alfonso López Pumarejo hasta la terminación de las edificaciones y demás construcciones en funcionamiento para ser entregada a la entidad para sus operaciones principales las cuales se describen a continuación:

Tabla 3

Áreas a Construir por Edificaciones

Cuadro de Áreas y Niveles					
Módulo	Piso	Espacios	Nivel	Área (m^2)	Área (m^2) Construida
Auditorio	1	Auditorio	0,00	781,00	2389,00
	2	Restaurante	4,24	804,00	
	3	Laboratorios/Talleres	8,00	804,00	
Administración	1	Rectoría, Recepción, Secretarias	3,60	1009,00	2980,00
	2	Sistemas, Salas de Profesores	8,00	1028,00	
	3	Biblioteca	11,65	943,00	
Educativo	1	Aulas Primarias	3,00	1784,00	5206,00
	2	Aulas Secundaria	8,00	1784,00	
	3	Talleres	11,75	1638,00	
Pre Escolar	1	Aulas Preescolar	5,30	425,00	425,00
Polideportivo	1	Polideportivo	0,99	1088,58	1088,58
Portería	1	Portería	4,45	8,89	8,89
Cuarto Residuos	1	Cuarto Residuos	0,40	15,12	15,12
TOTAL					12.112,59

Como parte de la ejecución del Consorcio Educación C&G-MH, para la construcción del proyecto se aplicarán las directrices establecidas en los planes y programas determinados que se implementaran y a continuación se mencionan: Plan de Manejo Ambiental Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-, Plan de Gestión Social, PDT Programa Detallado de Trabajo, Programa de subcontratos y compras, Plan de manejo e inversión de anticipo y plan de calidad.

3.5 Control de Garantías.

Para garantizar los reparos de daños de manera involuntaria a terceros en el transcurso de ejecución de obra o posterior a su entrega y en cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra 1279 de 2023, mediante un control de garantías a continuación, se relacionan las tablas de control de pólizas actualizadas:

Tabla 4

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.391,15	16/03/2023	18/01/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial con Fecha de Firma Inicial de Contrato de Obra.

Póliza de Seguro Cumplimiento

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	20/05/2023	30/06/2024
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	20/05/2023	30/06/2024
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	20/05/2023	31/12/2026
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2023	31/12/2028

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial Correspondiente a la Actualización con Fecha del Acta de Inicio.

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Prorroga No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.392,00	20/05/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 5

Póliza de Seguro Cumplimiento – Prorroga No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	22/12/2023	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	22/12/2023	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	22/12/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificación No. 3.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	20/05/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 6

Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificación No. 3

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	22/12/2023	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	22/12/2023	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	22/12/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

4 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Relación de flujo de inversión ajustado al acta de prorroga No.1 celebrada el 22 de diciembre de 2023 por un periodo de 12 meses.

4.1 Programación de Obra del Proyecto.

Tabla 7

Flujo de Inversión Programado Por Mes

Mes	Avance Programado Mensual ($)	% Programado Mensual	Avance Programado Acumulado ($)	% Programado Acumulado
MAYO-23	$ 6.722.962,44	0,03%	$ 6.722.962,44	0,03%
JUNIO-23	$ 96.472.126,60	0,38%	$ 103.195.089,04	0,41%
JULIO-23	$ 389.467.266,96	1,55%	$ 492.662.356,00	1,96%
AGOSTO-23	$ 248.331.968,82	0,99%	$ 740.994.324,82	2,95%
SEPTIEMBRE-23	$ 111.181.244,68	0,44%	$ 852.175.569,50	3,40%
OCTUBRE-23	$ 330.640.484,57	1,32%	$ 1.182.816.054,07	4,71%
NOVIEMBRE-23	$ 601.344.832,07	2,40%	$ 1.784.160.886,14	7,11%
DICIEMBRE-23	$ 2.087.908.351,04	8,32%	$ 3.872.069.237,18	15,43%
ENERO-24	$ 1.786.740.909,16	7,12%	$ 5.658.810.146,34	22,55%
FEBRERO-24	$ 1.280.687.387,99	5,10%	$ 6.939.497.534,33	27,65%
MARZO-24	$ 1.271.873.141,55	5,07%	$ 8.211.370.675,88	32,72%
ABRIL-24	$ 1.156.983.425,18	4,61%	$ 9.368.354.101,06	37,33%
MAYO-24	$ 1.221.649.401,08	4,87%	$ 10.590.003.502,14	42,20%
JUNIO-24	$ 1.319.559.686,37	5,26%	$ 11.909.563.188,51	47,46%
JULIO-24	$ 2.587.876.156,43	10,31%	$ 14.497.439.344,94	57,77%
AGOSTO-24	$ 1.830.844.236,09	7,30%	$ 16.328.283.581,03	65,07%
SEPTIEMBRE-24	$ 1.850.427.545,22	7,37%	$ 18.178.711.126,25	72,44%
OCTUBRE-24	$ 1.131.537.157,42	4,51%	$ 19.310.248.283,67	76,95%
NOVIEMBRE-24	$ 2.252.680.817,27	8,98%	$ 21.562.929.100,94	85,93%
DICIEMBRE-24	$ 3.531.678.720,94	14,07%	$ 25.094.607.821,88	100,00%

4.2 Análisis Programado Acumulado vs Ejecutado Acumulado.

Las actividades ejecutadas vs programadas según el acta de prorroga No.1 celebrada el 22 de diciembre de 2023 por un periodo de 12 meses.

Logrando mediante tablas y gráficos los indicadores de avances y que a continuación se detallan:

Tabla 8

Relación Avance Programado Acumulado vs Avance Físico Acumulado

Mes	Avance Programado		Avance Ejecutado	
	Acumulado ($)	%Acumulado	Acumulado ($)	%Acum.
MAYO-23	$ 6.722.962,44	0,03%	$ 0,00	0,00%
JUNIO-23	$ 103.195.089,04	0,41%	$ 52.698.676,43	0,21%
JULIO-23	$ 492.662.356,00	1,96%	$ 486.835.391,74	1,94%
AGOS-23	$ 740.994.324,82	2,95%	$ 742.800.391,53	2,96%
SEP.-23	$ 852.175.569,50	3,40%	$ 1.036.407.303,04	4,13%
OCT.-23	$ 1.182.816.054,07	4,71%	$ 1.372.675.047,86	5,47%
NOV.-23	$ 1.784.160.886,14	7,11%	$ 2.198.287.645,20	8,76%
DIC. -23	$ 3.872.069.237,18	15,43%	$ 3.754.153.330,15	14,96%
ENE-24	$ 5.658.810.146,34	22,55%	$ 4.429.198.280,56	17,65%
FEB-24	$ 6.939.497.534,33	27,65%	$ 5.736.627.348,08	22,86%
MAR-24	$ 8.211.370.675,88	32,72%	$ 6.574.787.249,33	26,20%
26 -ABRIL - 24	$ 9.152.890.208,83	36,47%	$ 7.315.078.180,08	29,15%

El porcentaje de obra ejecutado a la fecha del presente informe es de 29.15%, vs programado del 36.47% como lo indica la gráfica de control de programación.

4.3 Grafica de Avance Físico vs Programado.

Ilustración 3. *Curva S Análisis de Avance Físico vs Programado*



	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	26-abr
PRO. ACUMULADO	0,03%	0,41%	1,96%	2,95%	3,40%	4,71%	7,11%	15,43%	22,55%	27,65%	32,72%	36,47%
EJECUT. ACUMULADO	0,00%	0,21%	1,94%	2,96%	4,13%	5,47%	8,76%	14,96%	17,65%	22,86%	26,20%	29,15%

5 COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA.

5.1 Actividades Realizadas.

5.1.1 Capítulo 2. Acondicionamiento del terreno

Con la finalidad de conformar espacios que no requieren el uso de maquinaria especializadas, la excavación manual consiste en remover tierra en zonas específicas de los proyectos o por la naturaleza de la actividad a ejecutar como lo es las vigas de cimentación del módulo C educativo.

Tabla 9

Capítulo 2. Cantidad ejecutadas

Ítem	Descripción	Cantidad
2.3.4	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. INCL. RETIRO 5 KMS	- M3

Ilustración 4. *Excavación manual en conglomerado seco.*



5.1.2 Capítulo 3. Cimentaciones (base - solados).

5.1.2.1 Concreto 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie

Poder realizar las operaciones en una zona nivelada y limpia es fundamental para el Consorcio Educación C&G-MH, es por ello, el concreto de limpieza se aplicó al fondo de las excavaciones correspondientes a las vigas de cimentación del módulo C Educativo, con el objetivo de proteger el piso de cimentación y el acero de refuerzo de cualquier tipo de contaminación.

Tabla 10

Cimentación Concreto de Limpieza

Ítem	Descripción	Cantidad
3.1.1	Concreto 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	- m^3

Ilustración 5

Concreto de Limpieza



5.1.3 Capítulo 3. Cimentaciones - (Acero de Refuerzo).

El Consorcio Educación C&G-MH, realizará el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos respetando los recubrimiento y espaciado y direcciones entre ellas, actividad desarrollada en los anillos de los caisson del módulo C educativo (donde se proyectan las escaleras) y fustes de los caisson de los módulos auditorio, asi mismo en las vigas de cimentación del módulo C educativo.

Tabla 11

Acero de Refuerzo Cimentación

Ítem	Descripción	Cantidad
3.4.1	Acero Refuerzo Figurado 412Mpa, (4200 kg/cm2,G60)	Kg

Ilustración 6

Acero de Refuerzo Cimentación



5.1.4 Capítulo 4. Acero de Refuerzo Estructural.

El acero de refuerzo son barras que se proporcionan en combinación con el hormigón simple para convertirse el hormigón armado el Consorcio Educación C&G-MH; realizará el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos respetando los recubrimiento y espaciado y direcciones entre ellas, esta actividad se desarrolló en el módulo educativo en las columnas.

Tabla 12

Acero de Refuerzo

Ítem	Descripción	Cantidad	
4.9.1	Acero Refuerzo Figurado 412Mpa, (4200 kg/cm2,G60)	-	Kg

Ilustración 7

Acero de Refuerzo Estructural



5.1.5 Capítulo 22. Sobre Acarreo y Transporte de Material

5.1.5.1 Disposición Final de RCD.

El Consorcio Educación C&G-MH, durante el periodo del presente informe conto con el servicio de transporte los residuos excedentes de excavaciones realizadas en los módulos C educativo, B Administrativo y A auditorio. se realiza la disposición final en Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P. autorizada para recibir y acopiar el material de forma definitiva.

Tabla 13

Disposición final de residuos

Ítem	Descripción	Cantidad
22.1	Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición en Bioagricola (RCD)	- Ton
22.2	Sobreacarreo Material, 20% compacta.	- m^3/kg







5.1.6 ITEMS NO PREVISTOS.

Estos ítems corresponden a las actividades complementarias a las inicialmente contratadas, que surgen durante la etapa de ejecución y son indispensables para cumplir con el objeto contratado.

5.1.6.1 EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON INCLUYE CARGUE Y RETIRO 5KM

Esta actividad comprende la excavación manual para Caisson (excavación para cimentación profunda) incluyendo equipos y materiales; se realizaron excavaciones hasta obtener las cotas de requeridas según el estudio de suelos y la recomendación del especialista con el nivel de fundación en la cimentación profunda de la obra, incluye cargue, manejo de aguas y transporte de los sobrantes hasta la zona de disposición autorizada (Bioagrícola del llano S.A E.S.P). en el módulo A Auditorio Y modulo C Educativo.

Tabla 14

Excavacion humeda conglomerado

Ítem	Descripción	Cantidad
NP-05	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON INCLUYE CARGUE Y RETIRO 5KM	- m3

Ilustración 8 *Excavación Húmeda Conglomerado Manual Para Caisson Incluye Cargue Y Retiro 5km*



5.1.6.2 ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)

Se refiere a la construcción de anillo para caisson de concreto vaciados con concreto premezclado de 4000 PSI cuya ejecución se efectúa excavando previamente el terreno e instalando formaleta formando los anillo para su posterior vaciado con concreto fresco y las correspondientes armaduras, con los diámetros, longitudes y profundidades indicados en los planos del proyecto.

La localización de los ejes de las estructuras deberá hacerse con equipos de topografía de precisión, debidamente calibrados y certificados. El sistema de referencia debe quedar estable y localizado de tal manera que permita la ejecución de las excavaciones y la disposición de los materiales de excavación sin que se generen interferencias, actividad desarrollada en el módulo A Auditorio Y modulo C Educativo.

Ítem	Descripción	Cantidad
NP-6	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10M - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)	- m3

Ilustración 9 *Anillo De Recubrimiento Para Caisson En Concreto De 4000 Psi - Profundidad 0-10m - Sin Refuerzo (Incluye Bombeo)*



5.1.6.3 CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE GRUA Y BOMBEO)


Se realizo el vaciado de concreto tipo tremie premezclado de 4000 PSI para la construcción de caisson, cumplimiento de las especificaciones para la mezcla de concreto, además de la manera de vaciarse con bomba, vibrarse y curarse; según la norma NSR-10. Esta actividad se desarrolló en los caisson de los en el módulo A Auditorio Y modulo C Educativo.

Tabla 15

Ítem	Descripción	Cantidad
NP-07	CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE GRUA Y BOMBEO)	1.132,52 m3

Ilustración 10

concreto de 4000 psi tipo tremie para caisson - profundidad 0-10m - sin refuerzo (incluye grua y bombeo))

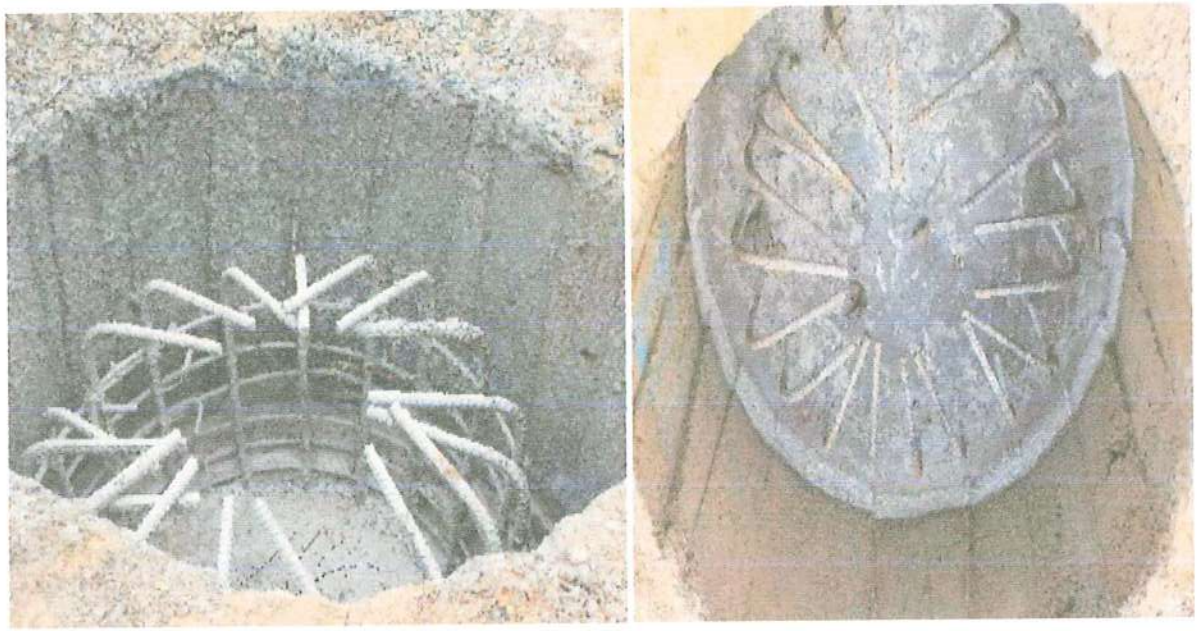

5.1.6.4 DEMOLICIÓN CON QUIMICO EXPANSIVO

Esta actividad comprende el suministro de mano de obra, equipos, materiales y todo trabajo necesario para llevar a cabo las fracturas con químicos expansivos (cloruro potásico – KCL03) en roca, necesarios para fracturar las rocas que se encuentren en la excavación de los caisson, de tal forma que se puedan extraer y continuar con los trabajos de excavación.

Ítem	Descripción	Cantidad
	DEMOLICIÓN CON QUIMICO EXPANSIVO	- UND

Ilustración 11 *Demolición con químico Expansivo*



5.1.7 Plan de Manejo de Transito (PMT).

El propósito principal del manejo de tránsito que se aplicara en la construcción del colegio Alfonso López Pumarejo, es mitigar el impacto en la movilidad ocasionado por la obra mediante alternativas seguras y controladas para los actores viales. (Peatones, transporte público, vehículos privados, transporte de cargas, etc.). Ver anexo. Oficio de aprobación de Movilidad al Plan de manejo de Tránsito.

El uso de controladores viales es fundamental, ya que serán los encargados de controlar y regular la aplicación del PMT, la utilización de señalización informativa, preventiva, reglamentaria y de dispositivos para la canalización como conos, delineadores tabulares y maletines instalados en los puntos críticos estarán encaminados para la prevención de accidentes en incidentes de tráfico.

Ilustración 12 *Plano Plan de Manejo de Transito*



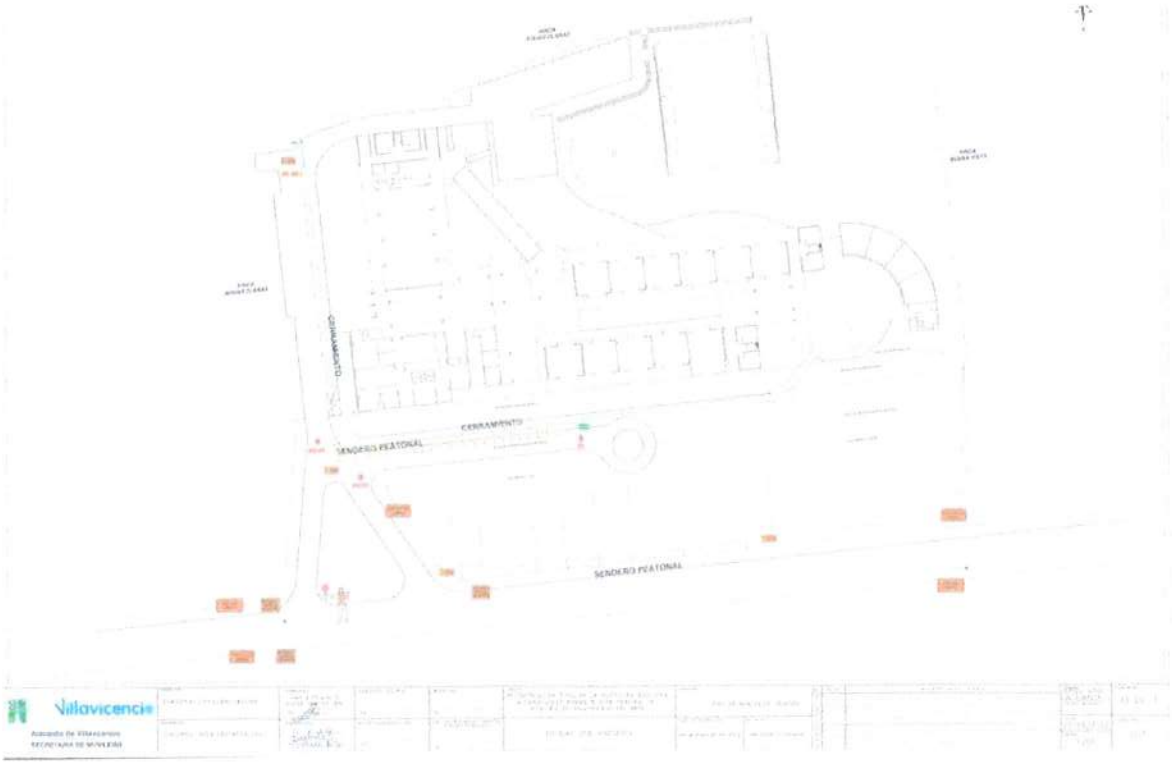


Ilustración 13 *Plan de Manejo de Transito*



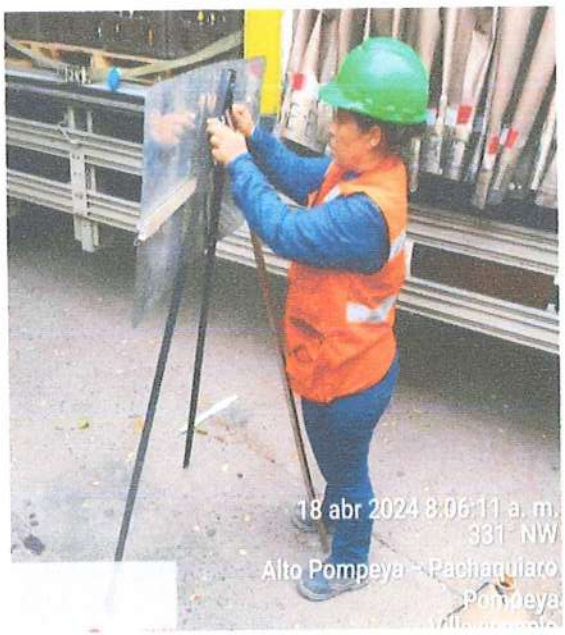

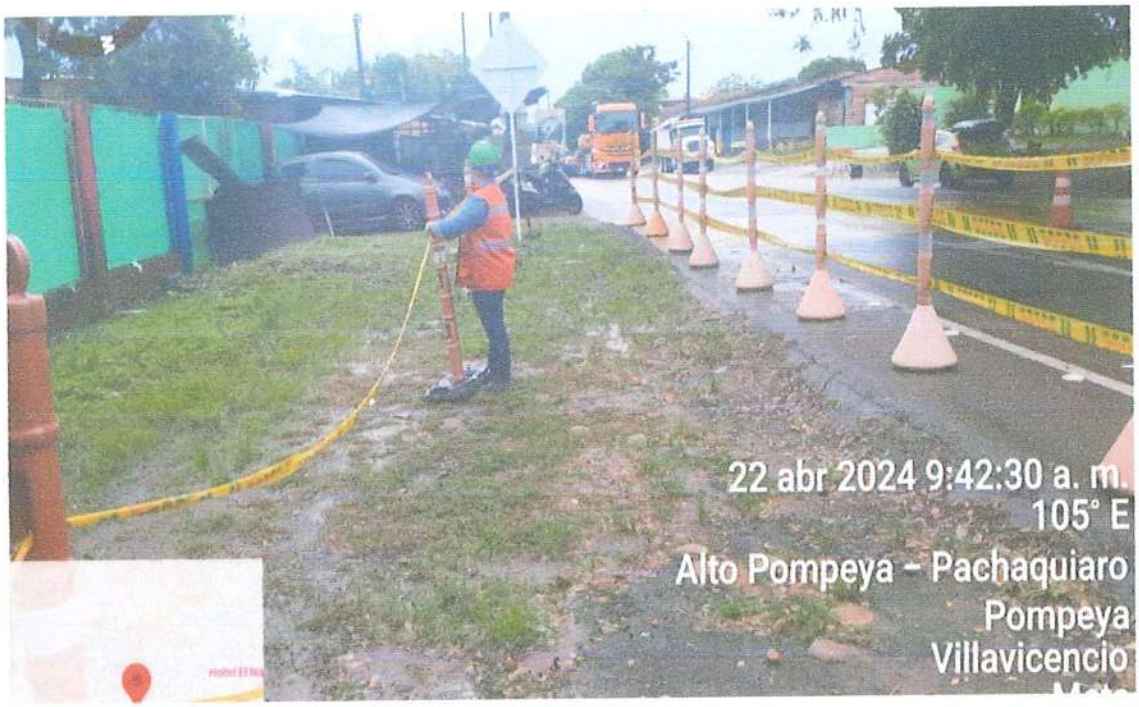

5.1.8 Uso de Maquinarias y Equipos.

Para la operación de los procesos Consorcio Educación C&G-MH, dispone en obra los equipos y maquinarias necesarios, que han permitido ejecutar las obras oportunamente. En el siguiente cuadro el listado y control de maquinaria y equipos se demostrará la maquinaria utilizada con su respectivo estatus y dedicación.

Tabla 16

Relación de Maquinarias Usadas en el Periodo

Maquinaria	Placa	Marca	Modelo	Estatus	Dedicación
Excavadora Hidráulica	-	KOBELCO	SK210LC	Operativa	100%
Retroexcavadora	-	CATERPILLAR	-	Operativa	100%
Planta de Concreto	-	DOMAT	DM SERIES	Operativa	100%
Bomba Estacionaria	-	SCHWING	WP 1000X	Operativa	100%
Mezcladora	-	-	1,5 Bultos	Operativa	100%
Vibrador de Concreto	-	-	-	Operativa	100%
Bomba Sumergible	-	-	-	Operativa	100%
Compresor sullair 210H	-	M. Caterpillar	3044 CT/2600RPM	Operativa	100%
Minicargador	-	BOBCAT	-	Operativa	100%

Ilustración 14: *Maquinaria en Obra*





5.2 Bitácora o Libro de Obra

Se adjunta al presente informe copias de las anotaciones diarias sobre las actividades realizadas en la bitácora de obra firmadas tanto por la interventoría como por el constructor el Consorcio Educación C&G-MH. Ver anexo. Bitácora de obra

5.3 Estado del Tiempo.

A continuación, en el siguiente grafico se observará las condiciones climatológicas en el presente periodo de ejecución del proyecto. Las anotaciones del estado del tiempo se encuentran registradas en la bitácora de obra para su posterior análisis, en las siguientes ilustraciones se podrá observar el comportamiento del clima en el periodo comprendido del 01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024.

Ilustración 15

Registro Diario del Clima abril 2024

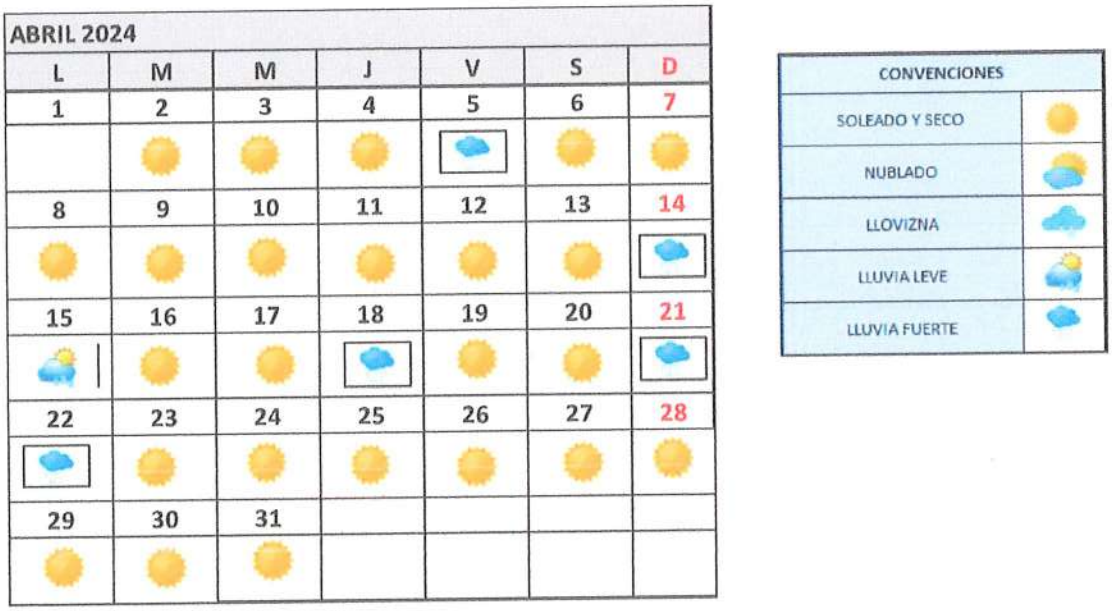


Ilustración 16

Influencia del Clima abril 2024



Como se puede evidenciar en las ilustraciones y graficas anteriores, durante el mes de abril del 2024 hubo presencia de lluvias un 0.19%. El clima durante este mes fue mayormente soleado.

6 GESTIÓN DE CALIDAD ACORDE AL PLAN DE CALIDAD.

El presente plan de calidad es elaborado por el Consorcio Educación C&G-MH, cumpliendo con los requisitos en el desarrollo específico del contrato. El contenido del plan de calidad se encuentra alineado con las directrices establecidas por la norma ISO 9001:2015, GTC-ISO 10005:2019 y el Sistema de Gestión de Calidad aplicado por CYG Ingeniería y Construcciones SAS, como administrador y ejecutor del contrato 1279 de 2023.

6.1 Certificado de Calidad de Materiales y Equipos.

Con el objeto de asegurar los resultados de seguimiento y medición durante este periodo se llevan a cabo el control de los equipos que garanticen la validez y fiabilidad de los resultados y se mencionan a continuación

6.1.1 Equipos de Topografía.

Durante este periodo se contó con una comisión propia del Consorcio Educación C&G-MH, con el fin de viabilizar, liberar y cuantificar las actividades ejecutadas.

Tabla 17

Relación de Equipos Topográficos

Equipos	Marca	Modelo	Serie	Fecha Calibración	Vencimiento Calibración
Estación Total	TOPCON	GTS-235W	274383	01/03/2024	01/09/2024
Nivel	POWER GEO	PG424	05761	01/03/2024	01/09/2024

6.1.2 Certificado de laboratorio.

El consorcio Educación C&G-MH, realiza la contratación del laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S., mediante el cual certificará la calidad de los diseños de mezclas y materiales utilizados en los ensayos requeridos con el objetivo de certificar la idoneidad de los materiales utilizados. Con el fin de garantizar la funcionalidad de los equipos utilizado por el laboratorio para las funciones que fue contratado, a continuación, se mencionan los diferentes equipos utilizados con los cuales se realizaron los ensayo en el laboratorio.

Tabla 18

Equipos de Laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S

Maquinaria	Marca	Modelo	Estatus	Dedicación
Tamizadora 8 IN	PINZUAR	Granotest	Operativa	100%
Balanza 20 kg	OHAUS	CD-11	Operativa	100%
Balanza 3 kg	TRUMAX	MIX-A	Operativa	100%
Prensa Doble Rango 1000 KN	PINZUAR	PC-42D	Operativa	100%

Maquinaria	Marca	Modelo	Estatus	Dedicación
Prensa Doble Rango 200 KN	PINZUAR	PC-42D	Operativa	100%

6.2 **Ensayos de Laboratorio**

Para asegurar la correcta ejecución de las actividades de obra el Consorcio Educación C&G-MH, efectuará los ensayos correspondientes para el control y seguimientos de las características de los materiales empleados de acuerdo a las normas establecidas con el objeto de obtener resultados confiables que aseguren la calidad y confiabilidad de los proyectos.

La calidad nace desde la planeación, es por ello que Consorcio Educación C&G-MH, establecerá la forma y medios idóneos para el control de calidad en la producción de concreto cumpliendo el plan de inspección de ensayos, se presentan los ensayos a compresión de los cilindros de concreto. Ver anexo. Ensayos de cilindros de concreto.

Basándonos en la norma NSR-10, capítulo C.5, sub capítulo C.5.6.2.1, "para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 40 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 200 m2 de superficie de losas o muros. De igual manera, como mínimo, debe tomarse una muestra por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de concreto".

"Cuando en un proyecto dado el volumen total de concreto sea tal que la frecuencia de ensayos requerida por C.5.6.2.1 proporcione menos de cinco ensayos de resistencia para cada clase dada de concreto, los ensayos deben hacerse por lo menos en cinco tandas de mezclado seleccionadas al azar, o en cada tanda cuando se empleen menos de cinco".

En el presente mes se tomaron *Ensayos de Resistencia* en los elementos correspondientes a los anillos de recubrimiento para Caisson anillos del módulo A auditorio y C educativo y de los fustes en el modulo A Auditorio.

Tabla 19

Ensayo de Resistencia de Cilindros de Concreto 4000 PSI / Concreto tipo Tremie 4000 PSI

Elemento	Resistencia de Diseño (PSI)	Fecha Toma de Muestra	Fecha Rotura	EDAD CURADO (DÍAS)	Resistencia a la Rotura (PSI)	% de Resistencia con Respecto a f`c
FUSTE CAISSON M13 Y O6 MODULO EDUCATIVO	4000PSI	06-03-2024	03-04-2024	28	4803	120.1 %
FUSTE CAISSON 09 Y P9 MODULO EDUCATIVO	4000PSI	06-03-2024	03-04-2024	28	4896	122.4 %
FUSTE CAISSON BC 8 Y B10 MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	11-03-2024	08-04-2024	28	4896	122.4 %
FUSTE CAISSON C 10 Y C13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	11-03-2024	08-04-2024	28	4181	104.5 %
FUSTE CAISSON C8 Y H 12 MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	12-03-2024	09-04-2024	28	5448	136.2 %
FUSTE CAISSON H 13, I 12 Y I 13	4000PSI	12-03-2024	09-04-2024	28	4811	120.3 %
FUSTE CAISSON D 2 Y D 13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	15-03-2024	01-04-2024	17	5638	140.9 %
FUSTE CAISSON D 2 Y D 13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	15-03-2024	12-04-2024	28	6493	162.3 %
FUSTE CAISSON D8 Y D10 MOSULO ADMINISTATIVO	4000PSI	16-03-2024	13-04-2024	28	4009	100.2 %
FUSTE CAISSON G 10 Y G 12 MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	16-03-2024	13-04-2024	28	4009	100.2 %
FUSTE CAISSON I 10 MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	17-03-2024	14-04-2024	28	4009	100.2 %
FUSTE CAISSON I 7 P Y I 8 MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	19-03-2024	16-04-2024	28	4070	101.8 %
FUSTE CAISSON 6 8 Y 6 B MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	21-03-2024	04-04-2024	14	4759	119.0 %
FUSTE CAISSON H7 Y H 10 MODULO ADMINISTRATIVO	4000PSI	21-03-2024	04-04-2024	14	4255	106.4 %
FUSTE CAISSON F7, E5 Y E7 MODULO AUDITORIO	4000PSI	22-03-2024	12-04-2024	21	4709	117.7 %
FUSTE CAISSON B5, B7 Y A7 MODULO AUDITARIO	4000PSI	22-03-2024	12-04-2024	21	3729	93.2 %
FUSTE CAISSON F1, B1 Y B2 MODULO AUDITARIO	4000PSI	23-03-2024	12-04-2024	20	3812	95.3 %
FUSTE CAISSON A1 Y E4 MODULO AUDITARIO	4000PSI	05-04-2024	12-04-2024	7	4350	108.8 %
FUSTE CAISSON E3 MODULO AUDITORIO	4000PSI	09-04-2024	16-04-2024	7	3423	85.6 %
FUSTE CAISSON B3 Y B4 MODULO AUDITORIO	4000PSI	10-04-2024	17-04-2024	7	3247	81.2 %

Ilustración 17

Análisis Estadístico a 14 días del Hormigón 4000 Psi


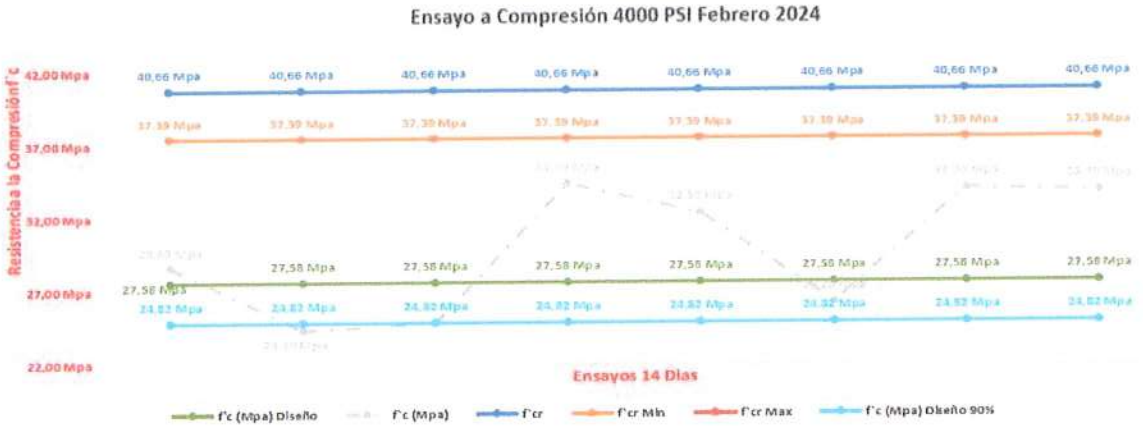


Ilustración 18

Análisis Estadístico a 28 días del Hormigón 4000 Psi

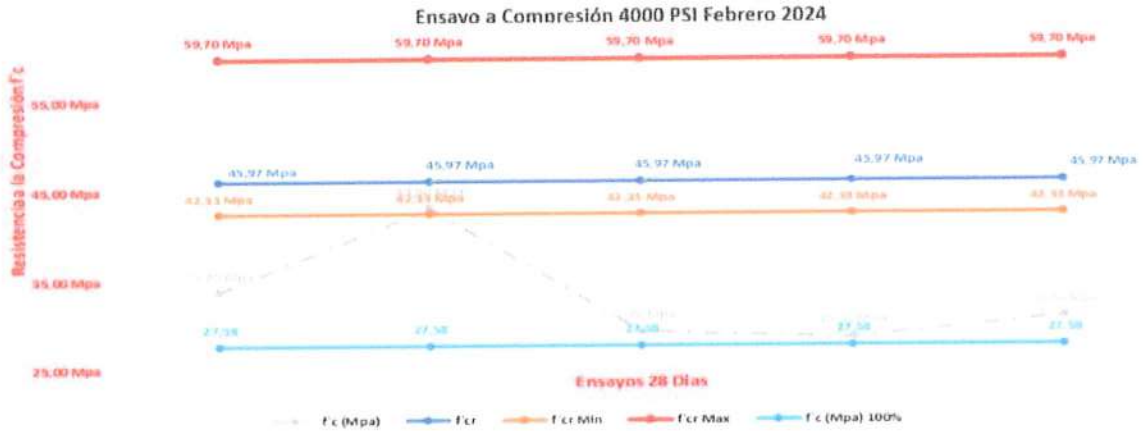

Continuando con la norma NSR-10, capítulo C.5, sub capítulo C.5.6.2.1, "Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m^3, no se requieren ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por el supervisor técnico".

El ensayo de resistencia a la compresión macará la pauta para la calidad del concreto, es por ello, y referenciado en lo descrito en párrafos anteriores en mención a la norma NSR-10, capítulo C.5, las


muestras de concreto deben obtenerse de forma aleatoria, siendo una porción representativa del concreto fresco donde se realizará el vertido en los elementos, es decir, el o los elementos seleccionados aleatoriamente y vaciados con las tandas a las cuales se tomaron la proporciones significativa representarán los elementos que se llenaron con esa tandas de mezclados.

6.3 **Ensayos In Situ.**

Durante el periodo del presente informe el Consorcio Educación C&G-MH, asumiendo con responsabilidad implementar el plan calidad de la obra, ejecutará controles de inspección y ensayos In Situ, que permitan analizar los parámetros sistemáticamente de la información que se recolecte en el lugar donde se captan las muestras.

Ilustración 19

Esquema de Ensayos In Situ para Concretos

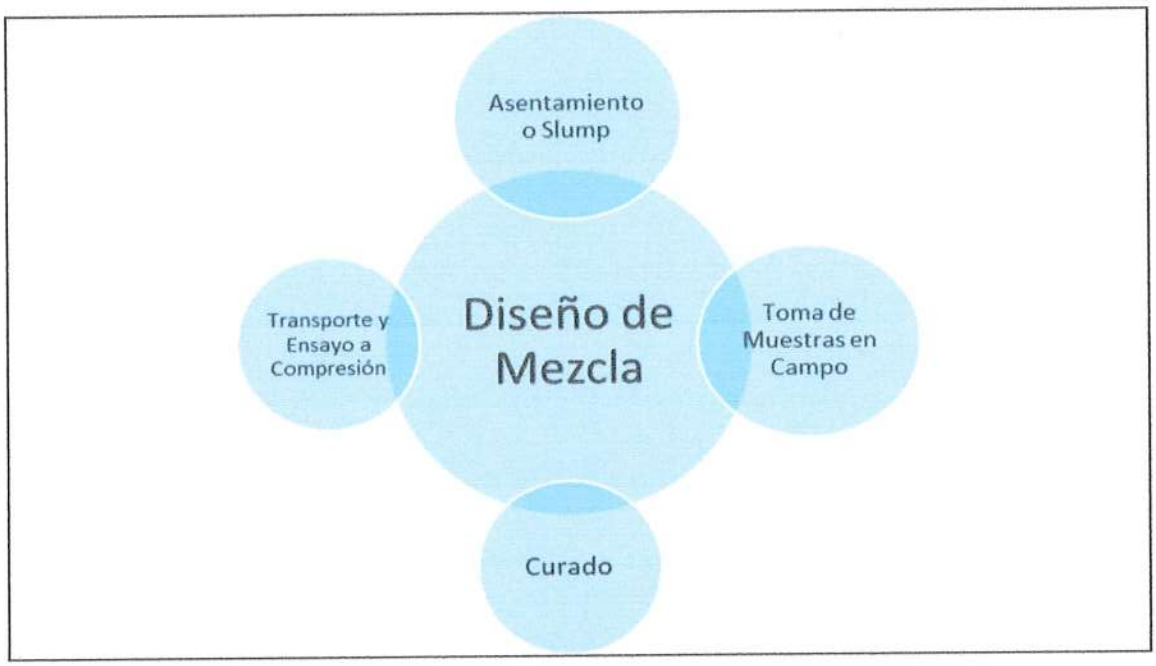

6.3.1 Asentamiento o Slump.

Tabla 20 *Ensayo Asentamiento o Slump*

Elemento	Concreto PSI	Fecha Toma de Muestra	Asentamiento o Slump
FUSTE CAISSON D 2 Y D 13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	**15-03-2024**	7"
FUSTE CAISSON D 2 Y D 13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	**15-03-2024**	7"
FUSTE CAISSON D8 Y D10 MOSULO ADMINISTATIVO	4000	**16-03-2024**	7"

En relación, a la prueba slump los elementos seleccionados en la tabla anterior, son como muestras representativas del lote fabricado para los caisson de los módulos Educativo, Polideportivo, Administrativo y auditorio. Como el tipo de concreto a utilizar es de una gran docilidad por su consistencia o capacidad para adaptarse manteniéndose homogéneo con un mínimo de vacíos, el diseño de mezcla indica un asentamiento entre 5" y 7", se evidencia una diferencia entre el slump del diseño y el tomado en campo al cual tenemos una tolerancia de ± 2,5" para asentamientos oscilan entre 4" y 6", ACI-318.

7 INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El presente informe refleja las actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 de abril de 2024 al 26 de abril de 2024, por el componente de SST del Consorcio Educación C&G-MH, con el objetivo de crear entornos de trabajo saludables y seguros, ejecutando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicando las medidas necesarias para minimizar los riesgos existentes en el proyecto, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente (Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015).

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
Levantamiento y Replanteo Topográfico	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificación condiciones del terreno como desniveles o superficies irregulares y la existencia de líneas energizadas y/o de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, reportar y señalizar). -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos y herramienta menor a utilizar -Utilización de Elementos de Protección Personal-EPP durante la ejecución de actividades. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas. -Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.
	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificar condiciones del terreno y el entorno). -Personal certificado en Alturas y Espacios Confinados (Verificación de cursos en plataforma de Ministerio de Trabajo)

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
Excavación Manual y Construcción de Caisson en Módulo Educativo Y Auditorio.	-Inducción y Charla previa a iniciar actividades -Diligenciamiento y divulgación de Análisis de trabajo seguro (ATS) y Permiso de trabajos -Inspección de Herramienta menor a utilizar -Uso de Elementos de Protección Personal –EPP, durante la ejecución de actividad. -Uso de ventilación dentro de la excavación -Rotación de personal en la excavación durante la ejecución de la actividad. -Pausas activas e higiene postural al manipular cargas y -Ubicar el material extraído mínimo a un metro del borde de la excavación. -Revisión periódica del terreno (paredes) especialmente después de presentarse lluvias. -Disponer de puntos de hidratación para el personal. -Orden y aseo en el área de trabajo.
Demolición y fracturación de roca con agente químico y/o expansivo en Caisson	-Personal Certificado en la ejecución de la tarea (Manejo de Explosivos, Alturas y Espacios Confinados). -Diligenciamiento y divulgación de Análisis de trabajo seguro (ATS) y Permiso de trabajos. -Disponer de ficha de seguridad (FDS), en el área de trabajo. -Almacenar en sitio seguro y ventilado el producto químico y que su manipulación sea realizado por el personal idóneo. - Identificación y notificación de Peligros y Riesgos al personal ejecutor. - Charlas y capacitaciones previas a iniciar labores. Pausas Activas -Inspección de área de trabajo (verificación de condiciones del Caisson y del entorno) -Inspección de equipos y Herramientas a utilizar. -Ventilación dentro de la excavación -Uso correcto de Elementos de Protección Personal-EPP, durante la

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	ejecución de la actividad. -Informar previo a realizar la explosión controlada (solo personal autorizado en el área de trabajo). -Disponer de hidratación para el personal. -Despejar área posterior a la explosión (dispersión del humo emanado)
Armado de Canastas y Fundida de Fustes para Caisson (Cimentación)	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificar condiciones del terreno y el entorno). -Inducción y Charla previa a iniciar actividades -Inspección preoperacional de equipo (Retroexcavadora), planta de concreto y bomba estacionaria. -Inspección de Herramienta menor a utilizar -Uso de Elementos de Protección Personal –EPP, durante la ejecución de actividad. -Pausas activas e higiene postural al manipular, desplazar la carga (herramientas y materiales). -Rotación de personal durante el armado de las canastas (posturas prolongadas). -Antes de introducir la canasta verificar que el área de trabajo esté libre de obstáculos y la excavación este limpia y si exceso de agua. -Al realizar la actividad de ubicación e introducción de la canasta en la excavación (Caisson), verificar que la canasta esté asegurada adecuadamente. -No ubicarse debajo de la canasta levantada, utilizar la manila guía minimizar el efecto péndulo. Tampoco ubicarse en el punto de giro o ciegos o de poca o nula visibilidad de operador de la retroexcavadora. -Revisión periódica del terreno (paredes) especialmente después de presentarse lluvias. -En la fundida de fuste del Caisson acoplar la tubería correctamente verificando que estén aseguradas con las abrazaderas. -Disponer de las Fichas de Seguridad (FDS) de los productos químicos utilizados en la obra. (Cemento, adictivo y ACPM).

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	-Realizar de manera adecuada el levantamiento de cargas y coordinación en la ejecución de labores. -Disponer de puntos de hidratación para el personal. -Orden y aseo en el área de trabajo.
Estructuras de Modulo Preescolar: Fundida de Vigas Aéreas y Placa de Cubierta	-Identificación y notificación de Peligros y Riesgos al personal ejecutor. - Charlas y capacitaciones previas a iniciar labores. -Personal Certificado (trabajo en alturas) y verificación en plataforma de Ministerio de trabajo. -Diligenciamiento y divulgación de Análisis de trabajo seguro (ATS) y Permiso de trabajos -Pausas Activas -Inspección de área de trabajo (superficies y desniveles) -Definir accesos y áreas de tránsito del personal. -Inspección de equipos y Herramientas a utilizar. -Uso correcto de Elementos de Protección Personal-EPP, durante la ejecución de la actividad. -Disponer de hidratación para el personal. -Orden y Aseo (disposición adecuada de residuos generados) y limpieza de herramientas -Almacenamiento de equipos y herramientas -Ubicación y Señalización de Elementos de emergencia existentes en obra.
Cimentación en Modulo Educativo: -Excavación de vigas, -Armado de Acero de Refuerzo de vigas y columnas de cimentación. -Preparación y Aplicación de Concreto para Solados (Vigas de Cimentación).	-Identificación y notificación de Peligros y Riesgos al personal ejecutor. - Charlas y capacitaciones previas a iniciar labores. -Personal Certificado (trabajo en alturas) y verificación en plataforma de Ministerio de trabajo. -Diligenciamiento y divulgación de Análisis de trabajo seguro (ATS) y Permiso de trabajos (en caso de ser requerido). -Pausas Activas -Inspección de área de trabajo Inspección de equipos y Herramientas a utilizar.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	-Uso correcto de Elementos de Protección Personal-EPP, durante la ejecución de la actividad. -Disponer de hidratación para el personal. -Orden y Aseo (disposición adecuada de residuos generados) y limpieza de herramientas -Almacenamiento de equipos y herramientas -Ubicación y Señalización de Elementos de emergencia existentes en obra.

7.1 Relación del Personal Empleado en la Ejecución de la Obra en el Mes.

En el desarrollo del periodo del 01 de abril al 26 de abril de 2024, se cuentan con colaboradores que participan según su formación y conocimiento en las diferentes actividades puestas en prácticas, por consiguiente, se relacionan al presente informe el personal que hace parte del proyecto los que componen el Consorcio Educación C&G-MH, como el de los diferentes subcontratistas que laboran en la obra.

Ilustración 20

Personal Vinculado por Empresas abril 2024



	Altara Ingenieria S.A.S	Consorcio Educación C&G-MH	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	Exvocol S.A.S	Jairo Rojas Morales	Mutual Salud	Luis Alejandro Arce	Constructora de Ingenieria M y F S.A.S	Buenos Aires Servicientro S.A.S.	Raul Alberto Velasco Avila
Ingreso	1	0	12	0	1	1	1	1	1	2
Activos	5	20	28	1	1	1	1	1	1	2
Retiro	2	1	2	0	1	1	1	1	1	0

Además, se lleva una matriz de control del personal directo e indirecto de obra por trabajador y por empresa las que continúan y/o terminen sus labores con el objeto de controlar la autoliquidación de la seguridad social.

Personal Vinculado por Profesión abril 2024



Tabla 21

Nombre	Cédula	Tarjeta Profesional	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Yeison Esneyder Gómez G.	86.051.263	25202-090820 CND	Director de Obra	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	01-03-2024	
Pedro López Ostos	79.949.909	25202-112099	Residente de Obra	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA	COLSUBSIDIO	16-06-2023	-
Lina Fernanda Urrego	1.053.797.649	17202-195361	Residente de Obra	FOSYGA	PORVENIR	COLPATRIA	COLSUBSIDIO	19/07/2023	-
Nohora Juliana Jones Ordoñez	63.532.138	68202-152203 CND	Residente de Obra	SANITAS	COLPENSONES	AXA COLPATRIA	COFREM	05-02-2024	
Jaime Buitrago Nova	79.464.037	25202.133707 CND	Especialista de Estructuras	FAMISANAR	COLPENSIONES	COLPATRIA	COLSUBSIDIO	20-06-2023	-
Edgar Javier Gutiérrez B.	80.122.216	CN205-71295	Ingeniero Eléctrico	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	COMPENSAR	01-01-2024	
Claudia Patricia Rodríguez H.	1.010.165.507	25335-200159 CND	Ingeniero Hidráulico	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA SEGUROS	COMPENSAR	01-01-2024	
Diana	40.217.089	Resolución	Profesional	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	17-07-2023	-

Nombre	Cédula	Tarjeta Profesional	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Carolina Vega		3831	SST						
María del Pilar Sepúlveda Suarez	1.018.427.594	1779151023	Profesional Social	SANITAS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COFREM	20-05-2023	-
Astrid Ruiz González	40.341.812	25238-366217 CND	Ingeniera Ambiental	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	20-05-2023	-
Joel Pineda Sandoval	1.126.246.825	25202-388151CND	Ingeniero	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	COFREM	20-05-2023	-
Arnold Y. Rodríguez S.	1.070.306.746	091037-0592139 CND	Ingeniero Residente	SURA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	04-03-2024	
Leidy Natalia Martínez	1.020.807.368	-	Profesional en finanzas	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	28-06-2023	-
Juan Sebastián Calderón Rodríguez	1.121.945.997	0911037-0581731 CND	Residente Administrativo	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	30-01-2024	

Nota. Ver anexo. Pago de seguridad social.

Tabla 22

Relación del Personal no Profesional del Contratista de Obra

17712

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Sol Lourdes Ramírez	28.589.257	Controladora Vial	Consorcio Educación C&G-MH	CAJACOPI	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	26-02-2024	
Ángela María Silva	1.121.904.972	Controladora Vial	Consorcio Educación C&G-MH	CAJACOPI	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	26-02-2024	30-04-2024
Camilo Gómez Rodríguez	1.006.860.529	Almacenista	Consorcio Educación C&G-MH	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COFREM	16-08-2023	
Miguel Ángel García B.	1.121.904.898	Ayudante	Consorcio Educación C&G-MH	CAJACOPI	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COFREM	19-09-2023	
Brayan Sneider Urquiza Barrera	1.193.089.901	Ayudante de Obra	Consorcio Educación C&G-MH	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	13-12-2023	
Anderson Camilo Urquiza Barrera	1.006.797.237	Ayudante de Obra	Consorcio Educación C&G-MH	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	30-01-2023	

Nota. Ver anexo . Pago de seguridad social.

Tabla 23

Relación del Personal de Contratistas de Obra

17713

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Leider Cardona Barrera	1.00.6516.356	Operador de Minicargador	Altara Ingenieria S.A.S	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	18/11/2023	30-04-2024
Diosnell José Mosqueda Torres	5386773	Auxiliar Planta Concreto	Altara Ingenieria S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	18/11/2023	
Jonathan Murcia Vargas	1.117.529.828	Operador Minicargador	Altara Ingenieria S.A.S.	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	26-02-2024	30-04-2024
Francisco Javier Villalba G.	86.053.821	Operador de Excavadora Hidráulica	Altara Ingeniería S.A.S	SANITAS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COFREM	25-03-2024	
Martin Peña Arias	91.447.961	Operador Bomba Estacionaria	Altara Ingeniería S.A.S	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	02-02-2024	
Iván Tautiva Dueñas	86.048.539	Ingeniero Civil	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	29-08-2023	
Nicolás Ramírez Rodríguez	1.121.938.987	Ingeniero Civil	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	17-10-2023	
Jhon Fredys Bonilla Palacios	1.010.165.547	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COFREM	01-11-2023	
Juan Carlos Moreno Palomeque	1.033.714.256	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	01-11-2023	

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Wilmar Alberto Álvarez Mesa	70.257.108	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	COFREM	01-11-2023	
Diego Fernando Vásquez Tautiva	1.121.946.169	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	11-11-2023	
Jesús Aníbal Reyes Chacón	86.088.695	Maestro de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	25-01-2024	
Héctor Quejada Valoyes	11.791.906	Oficial de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COFREM	25-01-2024	
Ángel Pérez Peña	17.330.024	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COFREM	25-01-2024	
Gilber Medina Villamor	1.006.810.122	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	25-01-2024	
Carlos Ever Fiscal Contreras	1.090.490.686	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	19-02-2024	
Yamid Mozo Cantillo	1.090.490.686	Oficial de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	28-02-2024	
Wilfredo Cuervo Toro	1.006.440.638	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	28-02-2024	
Luis David Estanga	5.765.336	Ayudante de	Jesús Ivan Tautiva	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	28-02-2024	

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Vargas		Obra	Dueñas						
Jonathan Jesús Ortiz Vargas	1.139.837	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	28-02-2024	
Eber Wilinton Palacios Pérez	11.801.617	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA	COFREM	23-03-2024	
Luis Freiman Cárdenas	1.121.842.589	Operador de Retroexcavadora	Jesús Iván Tautiva Dueñas	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	01-04-2024	10-04-2024
Edison Alberto Franco López	14.568.331	Maestro de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COFREM	01-04-2024	
Julián Andrés Cubillos Gómez	1.122.918.439	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	COFREM	01-04-2024	
Carlos Enrique Trujillo Franco	86.041.465	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	CAPITAL SALUD	SKANDIA	POSITIVA	COFREM	01-04-2024	
Marco Aurelio Aracu R.	1.007.702.898	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	01-04-2024	
Jackson D. Apolinar S.	6.134.927	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	COFREM	10-04-2024	
Jhon Estiber	1.121.923.096	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva	CAJACOPI	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	10-04-2024	

19717

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Marco Fidel Suarez Martínez	17.318.652	Conductor de Volqueta	Mutual Salud	NUEVA EPS	COLPENSIONES	EQUIDAD SEGUROS	-	01-04-2024	03-04-2024
Luis Alejandro Arce	17.335.203	Conductor de Volqueta	Luis Alejandro Arce	SANITAS	PORVENIR	SURA	-	01-04-2024	18-04-2024
Carlos Julio Peña O.	17.330.641	Conductor de Volqueta	Constructora de Ingenieria M y F S.A.S.	CAJACOPI	PORVENIR	POSITIVA	COFREM	01-04-2024	03-04-2024
José Ricardo Palmera A.	1.085.041.047	Conductor de Volqueta	Buenos Aires Servicentro	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMFAMA	01-04-2024	03-04-2024

Nota. Ver anexo Pago de seguridad social.

7.2 Registro de Entrega, Reemplazo de EPP´s y Dotación.

El Consorcio Educación C&G-MH, adoptará las medidas necesarias para garantizar a sus trabajadores las condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar. Por ello, dotará de la ropa de protección adecuada para evitar daños a la salud, por consiguiente, es indispensable la entrega de dotación de los equipos de protección personal cuando los trabajadores ingresen por primera vez, el reemplazo o sustitución por cualquier daño que sufran los equipos a causa de las actividades laborales, como el registro sistemático de entrega de forma individual. Ver anexo Entrega **de elementos de protección personal.**

Ilustración 21

Entrega y Reemplazo de Equipos de Protección Personal



7.3 Procesos de Inducción al Ingreso de Obra.

Para el mes de abril de 2024, se presentaron un total de 7 ingresos de personal nuevo y 13 reingresos de trabajadores (incluye personal flotante disposición final de RCD) los cuales ingresaron anteriormente a la obra para las empresas contratistas y el Consorcio Educación C&G-MH, se procede a realizar los exámenes médicos pre empleo con la finalidad de conocer el estado de salud de los trabajadores al inicio de la relación laboral. (Ver anexo). Examen médico de ingreso

El personal recibió previo al inicio de sus actividades la inducción correspondiente para visualizar las condiciones que van a desarrollar en el ambiente laboral, la posibilidad de presencia de sustancias en el área de trabajo, los daños que las mismas puedan causar a su salud y los medios o medidas para prevenirlos, a continuación, se indican las inducciones impartidas. El personal que reingreso se realizó una socialización de las actividades, riesgos y peligros existentes en obra Ver anexo. Formato de inducción de ingreso.

Ilustración 22

Proceso de Inducción






Proceso de Inducción por Empresas

Inducciones de Ingresos	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	Raúl Alberto Velasco
Información General del Proyecto	5	2
Horarios de Trabajos y Zonas Comunes	5	2
Políticas de Seguridad Y Salud en el trabajo	5	2
Cobertura de Seguridad Social, EPS, ARL, AFP, CCF	5	2
Notificación de Riesgos y Protocolos de Seguridad	5	2
Actos y Condiciones Inseguras	5	2
Reportes de Accidentes e Incidentes en el Trabajo	5	2
Normas de Seguridad, Uso de EPPS	5	2
Orden y Aseo en los Lugares de Trabajo	5	2

Nota. Periodo Comprendido del 01 de abril al 26 de abril de 2024

Participación de Inducciones

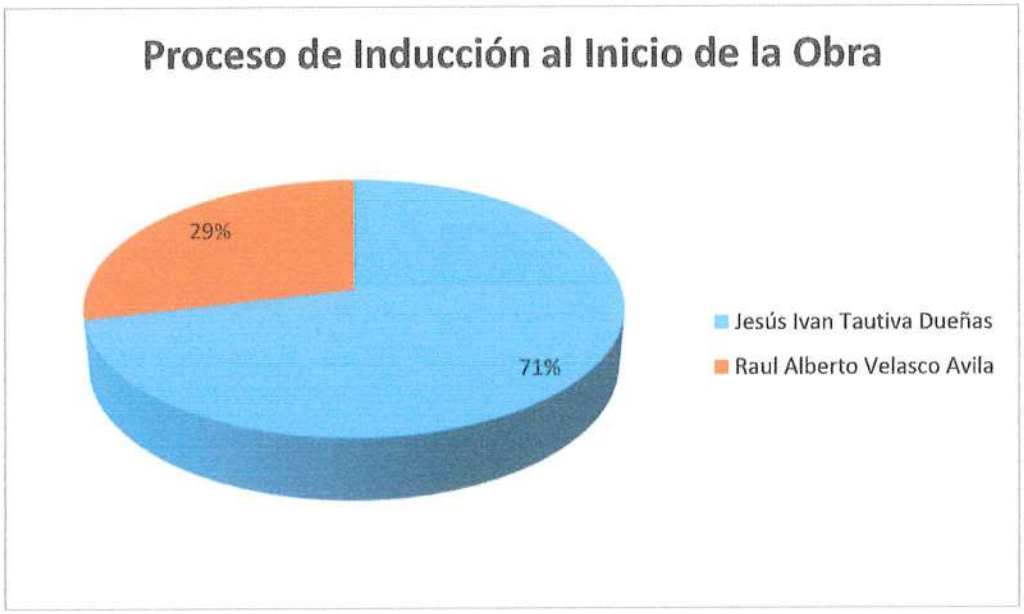

7.4 Charlas de Seguridad y Capacitaciones.

Nuestros colaboradores en el periodo actual reciben información teórica y práctica, adecuada y en forma periódica para las funciones inherentes a su actividad en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ver Anexo Charlas de seguridad y capacitaciones.

En la siguiente tabla se muestran las charlas y capacitaciones programadas para el mes de abril de 2024.


Tabla 24

Charlas de Seguridad y Capacitaciones

Fecha	Tema	Duración (min)	Cobertura de Participación
01/04/2024	Síndrome del Túnel del Carpio	15	25
02/04/2024	Manejo seguro de herramientas manuales	15	27
03/04/2024	Riesgo Químico: Material Partículado	15	25
04/04/2024	Protección Auditiva: Cuidado y recomendaciones	15	29
05/04/2024	Manipulación de Cargas	15	29
06/04/2024	Pausas Activas y Uso de Elementos de Protección Personal	15	09
08/04/2024	La Seguridad No Acepta Bromas Pesadas	15	30
10/04/2024	Cuidado y Protección Visual	15	20
11/04/2024	Uso y mantenimiento de Elementos de Protección Personal	15	20
12/04/2024	Cuidado de las manos: Recomendaciones de Seguridad	15	19
13/04/2024	Importancia de los Análisis de Trabajo Seguro (A.T.S)	20	20
15/04/2024	Uso adecuado de los recursos en obra: Agua y electricidad	15	34
16/04/2024	Riesgo Psicosocial: Salud Mental	15	31
17/04/2024	Riesgo Eléctrico: Verificación de Equipos y conexiones	15	29

Fecha	Tema	Duración (min)	Cobertura de Participación
18/04/2024	Reporte e Investigación de Accidentes Laborales. Causas Inmediatas y Básicas	20	33
19/04/2024	Riesgo Locativo: Recomendaciones para transitar o desplazarse en áreas de trabajo	15	20
20/04/2024	Sistema Globalmente Armonizado- SGA: Etiquetas y Fichas de Seguridad.	15	31
22/04/2024	Riesgo Psicosocial: Manejo de Estrés	15	29
23/04/2024	Riesgo Físico: Ruido y sus Efectos en la Salud	15	34
24/04/2024	Levantamiento mecánico de cargas: Precauciones durante la ejecución de actividades.	15	37
25/04/2024	Tareas de Alto Riesgo: Espacios Confinados	15	38
26/04/2024	Inspecciones en las áreas de trabajo	15	21

Charlas y Capacitación por Contratista

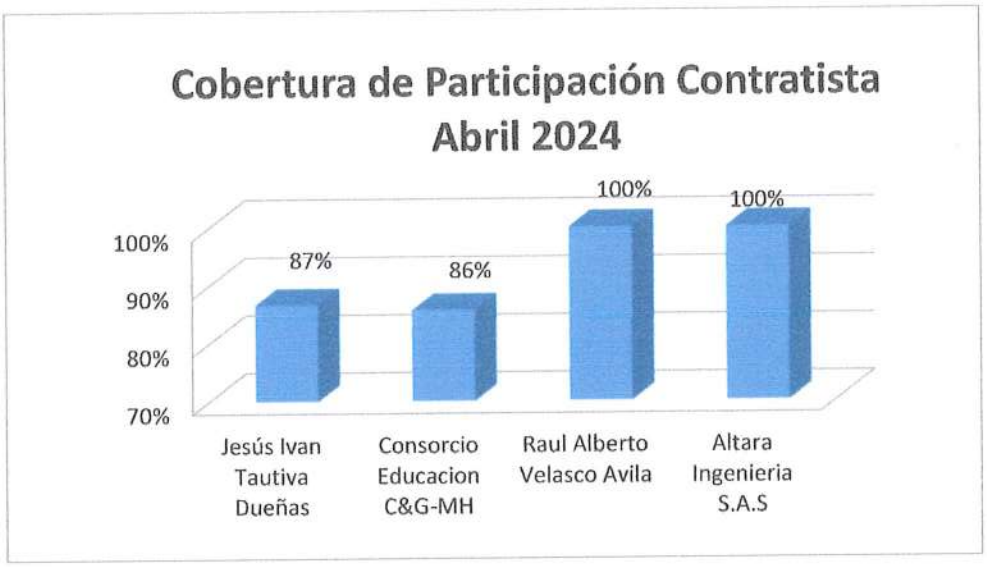

En la siguiente ilustración mostrara los porcentajes de la cobertura de participación por contratistas, indicando que el 100% de nuestros colaboradores participaron en los procesos de charlas y capacitaciones.

Charlas y Capacitación por Contratista













7.5 Control de Actividades de Alto Riesgo.

Para el desarrollo de todas las actividades consideradas de alto riesgo que por sus condiciones generales se ejecutan mediante la interacción de los elementos del proceso de trabajo y el individuo se establecerán parámetros y criterios de seguridad mediante profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo que cuenten con las competencias para validar y firmar los permisos de trabajo seguro como los permisos para trabajos en caliente, trabajos en alturas, trabajo en espacios confinados, excavaciones, izaje de cargas, etc.) y trabajos especiales no rutinarios. Durante el mes de abril de 2024 se realizaron actividades de en las cuales se ejecutaron trabajos en alturas y en espacios confinados (Construcción de Caisson, demolición y fracturación de roca con agente químico y/o expansivo en Caisson). (Ver anexo)

7.6 Inspecciones Planificadas.

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas. El descubrimiento de las condiciones y prácticas inseguras por medio de la inspección y su rápida corrección, son uno de los mejores métodos que pueda emplear el Consorcio Educación C&G-MH, para prevenir accidentes y proteger a sus trabajadores, así La dirección demuestra al personal su interés y sinceridad en la prevención de accidentes laborales.

Tabla 25

Inspecciones Planificadas

Ítem	Equipo a Inspeccionar	Frecuencia
1	Equipos de emergencia (Camilla, botiquín, extintor, etc.)	Mensual
2	Inspección de Kit de Control de derrames	Mensual
3	Pre operacional (Maquinaria : Minicargador, Retroexcavadora Planta de Concreto, Bomba estacionaria de concreto, equipos menores y herramienta menor)	Diario

Ítem	Equipo a Inspeccionar	Frecuencia
4	Inspección Locativa de área: (Orden y Aseo)	Mensual

Ver anexo. Inspecciones planificadas.

Ilustración 23

Inspecciones Planificadas




7.7 Accidentabilidad.

En el mes de abril de 2024, no se presentaron eventos que produjeran una lesión corporal o funcional resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por lo cual se presenta ausentismo laboral. (Ver anexo certificado de accidentalidad emitido por ARL).

Ilustración 24

Indicadores de Accidentabilidad

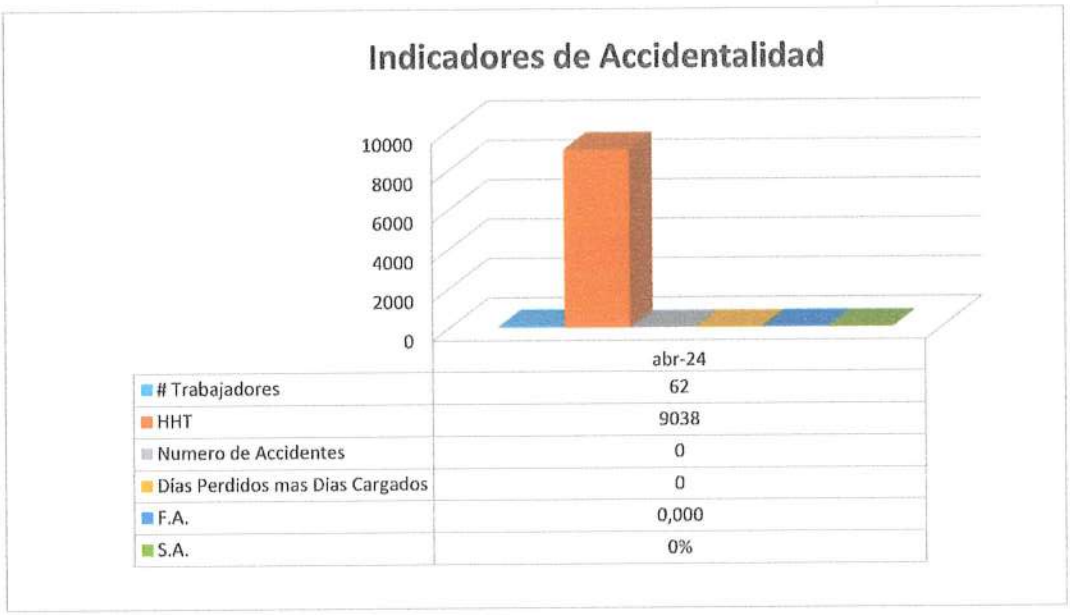

	abr-24
# Trabajadores	62
HHT	9038
Numero de Accidentes	0
Días Perdidos mas Dias Cargados	0
F.A.	0,000
S.A.	0%

7.8 Frecuencia de Accidentalidad.

En relación a la frecuencia de accidentalidad se refiere a la proyección del número de veces que puede ocurrir un accidente de trabajo en el periodo dividido entre el número de trabajadores del periodo, actualmente en Colombia según FASECOLDA la tasa de accidentalidad para el sector de la construcción está entre 7,5%, teniendo en cuenta la tasa a nivel nacional para nuestro proyecto tenemos una proyección de 7,0%.

Frecuencia de accidentalidad = Número de accidentes laborales del periodo/número de trabajadores del mismo periodo X 100.

7.9 **Severidad de Accidentalidad.**

Los días perdidos por accidentes laborales, para el proyecto se establece la meta de 48% para la frecuencia de severidad, teniendo en cuenta el comportamiento a nivel nacional para el gremio de la construcción.

Frecuencia de severidad = Número de días perdidos por AL + días cargados en el periodo / número de trabajadores del periodo X 100.

7.10 **Ausentismo Laboral.**

Durante el mes de abril de 2024 no se presentó ausentismo laboral generado por eventos como accidente laboral o enfermedad común.

8 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.

EL trabajo que a continuación se desarrolla expone los resultados del informe ambiental del proyecto "Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta", del periodo comprendido entre el 01-04-2024 al 26-04-2024, el cual reporta las actividades ambientales del proyecto

EL CONSORCIO EDUCACIÓN C&G MH tiene el compromiso de informar la implementación de las medidas ambientales de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales durante la etapa de ejecución de los trabajos en la obra

De esta manera el presente informe constituye el instrumento mediante el cual se garantiza la ejecución del proyecto. No constituye solo el desarrollo económico y social si no un instrumento fundamental de ordenamiento territorial por tanto la gestión ambiental está considerado como un tema de vital importancia por lo que garantiza en armonía con las normas ambientales y forestales vigentes y a su vez facilita las condiciones que contribuyan con el normal desarrollo de las obras requeridas.

El proyecto se encuentra en etapa constructiva, las actividades expuestas en el informe se desarrollaron en cada uno de los frentes de trabajo activos del proyecto.

8.1 Control y Seguimiento a las Actividades de Gestión Ambiental.

A continuación, se presentan los programas que forman parte del componente abiótico del plan de manejo ambiental en las diferentes etapas de la construcción y todas las a actividades a desarrollar con respecto a lo aplicable de cada ficha de manejo ambiental en el periodo comprendido al presente informe

Estas actividades se ejecutan con el apoyo del equipo de gestión ambiental y se presentan con una breve descripción de las operaciones realizadas en cada programa de manejo ambiental donde se

relaciona el periodo evaluado, su respectivo avance o condición actual, y a su vez, se incluye si aplica, el registro fotográfico

8.2 Actividades del mes

- Excavación húmeda conglomerado manual para caisson del módulo educativo
- anillo de recubrimiento para caisson en concreto de 4000 psi del módulo educativo
- Amarre figurado de acero para caissons del módulo educativo
- demolición con químico expansivo en el módulo educativo
- Excavación mecánica explanación de acuerdo con las cotas de diseño.
- Excavación manual en Vigas del módulo educativo
- vaciado de concreto solado en las vigas de cimentación del módulo Educativo
- replanteo de formaletas metálicas para las vigas de cimentación del módulo Educativo
- vaciado de concreto de 4000 psi de baja permeabilidad para losa aligerada en el módulo preescolar.

Tabla 26

CONTROL DE MANEJO AMBIENTAL

Actividad Propuesta Para el Manejo Ambiental	Avance de la Actividad a la Fecha	Observación / Acción
01/04/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Charlas de seguridad y medio ambiente
01/04/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Control y seguimiento de la maquinaria que se encuentra en obra.
02/04/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Implementación Plan de Manejo de Tránsito
02/04/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Orden y aseo en el campo de trabajo

Actividad Propuesta Para el Manejo Ambiental	Avance de la Actividad a la Fecha	Observación / Acción
12/04/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Pago por taza de aprovechamiento forestal
21 /04/2024	100%	Acompañamiento a la gestión social
25/04/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Demarcación y señalización ambiental

ver anexo: Listado de asistencia charlas de seguridad y capacitaciones.

8.3 MEDIO ABIOTICO

A continuación, se presentan los programas que forman parte del componente abiótico del plan de manejo ambiental en las diferentes etapas de la construcción y todas las a actividades a desarrollar con respecto a lo aplicable de cada ficha de manejo ambiental en el periodo comprendido al presente informe

Estas actividades se ejecutan con el apoyo del equipo de gestión ambiental y se presentan con una breve descripción de las operaciones realizadas en cada programa de manejo ambiental donde se relaciona el periodo evaluado, su respectivo avance o condición actual, y a su vez, se incluye si aplica, el registro fotográfico


8.3.1 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES DE DEMOLICIÓN EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

Se continúa realizando disposición de residuos de excavación en Bioagricola del llano E.S.P sitio autorizado por la corporación para el desarrollo sostenible de manejo especial la macarena CORMACARENA Las volquetas que efectúan el movimiento del material cubren el volco con geotextil para reducir la emisión de material particulado en el trayecto de la obra al sitio de disposición final adecuado para establecer los procedimientos adecuados (la mayoría de los procedimientos son dirigidos

al aprovechamiento de los materiales sobrante de excavación en las obras que implican rellenos y disposición de volúmenes sobrantes en los sitios donde se efectúan las estructuras a construir)

(anexo certificado disposición final RCD).

CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL

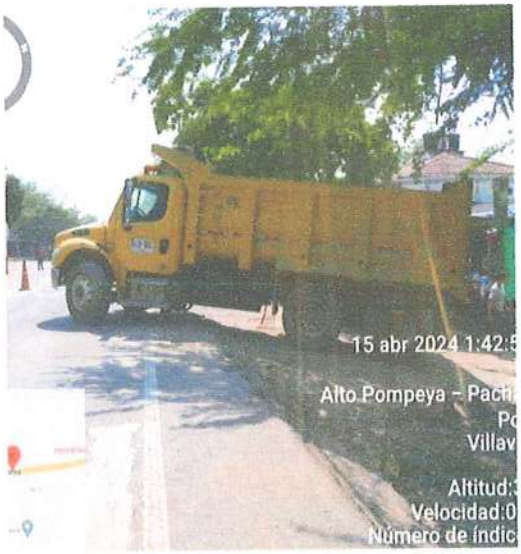





8.3.2 MANEJO ADECUADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales que ingresan la obra son utilizados de manera inmediata, y otros se han dejado acopiados temporalmente para ser utilizados cuando sean requeridos. El material que se deja acopiado en los frentes de trabajo se señaliza con cinta peligro, se cubren con plástico negro para reducir las emisiones de material particulado .la empresa que realiza el suministro de agregados pétreos cumple con los permisos de explotación minera por parte de la autoridad ambiental (CORMACARENA)

Anexo: certificado de explotación minera


8.3.3 PROGRAMA PARA EL MANEJO EFICIENTE DEL AGUA Y VERTIMIENTOS

En el desarrollo de las a actividades de obra en el mes de abril el CONSORCIO EDUCATIVO C&G MH cuenta con puntos de hidratación distribuidos en la obra para que el personal se hidrate en las jornadas de trabajo debido a las altas temperaturas climáticas, es de gran importancia mantener a los colaboradores en buen estado de salud y con ello minimizar un golpe de calor. el agua que se utiliza para descargar las unidades sanitarias se almacena en canecas y es utilizada durante la jornada laboral y al día siguiente se vuelve a llenar para evitar almacenamientos prolongados y frenar la proliferación de vectores

PUNTOS DE HIDRATACIÓN







8.3.4 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS

En el área donde se desarrolla el proyecto no se encuentran cuerpos de agua superficiales los cuales puedan verse contaminados; en lo posible se disminuye al máximo la generación de residuos líquidos para evitar su disposición en areas altamente sensibles en los sitios donde se ubican las estructuras de las diferentes areas del escenario a construir (labores de preparación de materiales)


8.3.5 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES

Se realiza separación en la fuente de los residuos en los diferentes puntos ecológicos que encontramos en la obra. los residuos ordinarios se dejan en la puerta de la obra tres veces por semana para ser recogidos por la empresa de servicios públicos de Villavicencio Bioagricola del llano E.S.P, la cual realiza la disposición final adecuada en el relleno sanitario de Villavicencio dado que cuenta con los permisos ambientales necesarios para la actividad. los residuos aprovechables (plásticos) son almacenados temporalmente para ser entregados a terceros en sitios autorizados para su recolección y tratamiento de estos


Se realiza jornadas de orden y aseo en el área de trabajo para garantizar que las zonas de trabajo se encuentren limpias y ordenadas para garantizar que las zonas de trabajo estén en condiciones adecuadas para realizar las actividades

El consorcio cuenta con una edificación que se conservó para unidades sanitarias la cual se adecuo, se realizaron medidas de higienización adecuadas y elementos de aseo, con servicio de energía e iluminación adecuada para el personal de la obra.

ORDEN Y ASEO EN EL CAMPO DE TRABAJO

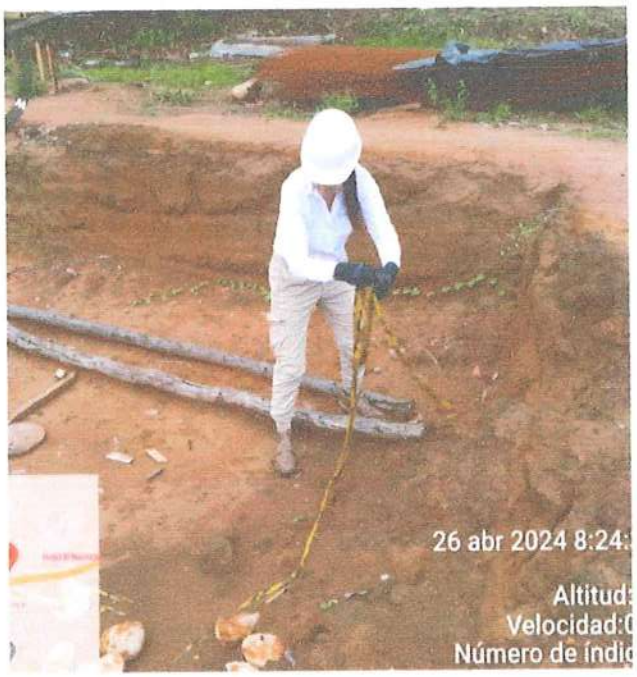



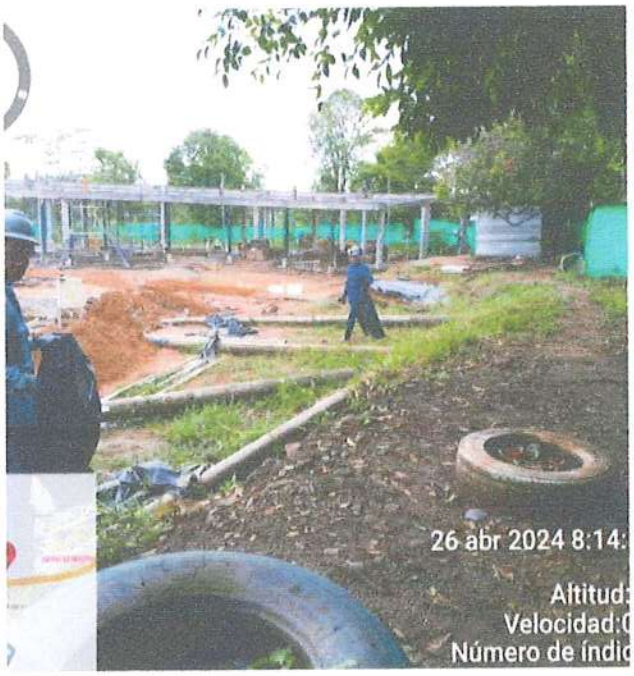



DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS







MANTENIMIENTO DE PUNTOS ECOLÓGICOS Y RETIRO DE RESIDUOS







8.4 MEDIO BIÓTICO

A continuación, se presentan los programas que forman parte del medio biótico del plan de manejo ambiental en la etapa de construcción y la instalación de todos los componentes necesarios para continuar en marcha con todos los procesos. el seguimiento se realiza por el profesional encargado del área ambiental con el apoyo de la brigada ambiental

8.4.1 PROGRAMA DE MANEJO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DESCAPOTE

En el desarrollo de las actividades contempladas para el mes de abril en la obra del Colegio Alfonso López Pumarejo ubicado el corregimiento cuatro altos Pompeya para el mes de abril la obra de acuerdo a la resolución N° PS-GJ .1.2.6.24 expediente N° PM-GA 3.37.9.1023.16 POR MEDIO DE LA CUAL LA CORPORACION OTORGA PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL AISLADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "el director general de la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena CORMACARENA en desarrollo de sus funciones legales y las indicadas en la ley 99 de 1993 y el decreto 1076 de 2015 y con fundamento en los siguientes considerandos resolverá:

ARTICULO 1: Acoger el concepto N° PM-GA 3.44.24.54 del 23 de enero de 2024, emitido por el grupo de bióticos adscrito a la subdirección de gestión ambiental de esta corporación, el cual forma parte integral de presenta acto administrativo.

ARTICULO 2: Otorgar permiso para el aprovechamiento forestal aislado al municipio de Villavicencio identificado con Nit:892.099.324-3(en adelante el titular) a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, de treinta y cuatro (34) ejemplares arbóreos con un total de 15,83m3, a llevarse a cabo en la institución educativa Alfonso López Pumarejo identificado con

cedula catastral N° 500100002000500 y matricula N° 230-73655, ubicada en la vereda altos de Pompeya, jurisdicción del municipio de Villavicencio Meta.

Se pone en conocimiento a esta interventoría que el consorcio educación C&G-HM para dar inicio al aprovechamiento forestal para continuar con el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto Reconstrucción Total De La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. Se realizo publicación en diario de amplia circulación nacional, acta de fijación y desfijacion, solicitud de inicio de actividades a la "Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Área De Manejo Especial La Macarena CORMACARENA"

IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL



8.4.2 MANEJO DE FLORA

los individuos arbóreos presentes en la zona de influencia del proyecto no están siendo afectados por las actividades de obra civil que se llevan a cabo se realizan medidas de manejo ambiental para la ejecución de las actividades de excavación y rellenos previstos en la adecuación del sitio de tal manera que la afectación a la flora sea el más mínimo y mitigable, manteniendo las características naturales del entorno se realiza cerramiento de protección.

8.4.3 MANEJO DE FAUNA

En el mes de ejecución del presente informe no fue necesario realizar ahuyentamiento de especies animales en el proyecto, tampoco fue necesario realizar llamado de las autoridades ambientales para realizar rescate.

8.4.4 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

en el mes de abril se realiza inspección de puntos de emergencia en los cuales se encuentran los siguientes elementos para atender posibles emergencias

1. Kit De Derrames
2. Extintor
3. Botiquín
4. Camilla

En la obra se encuentra punto de almacenamiento de combustible para maquinaria en los cuales se encuentran sus recipientes rotulados y el espacio cuenta con la matriz de compatibilidad de sustancias químicas para saber que tipo de sustancias pueden ser almacenadas en el lugar

PUNTO DE ACOPIO COMBUSTIBLES







8.4.5 MANEJO DE SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA


Para el mes de abril se realizaron actividades de mantenimiento de la señalización en la obra y delimitaciones de zonas de peligro

SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE TRABAJO







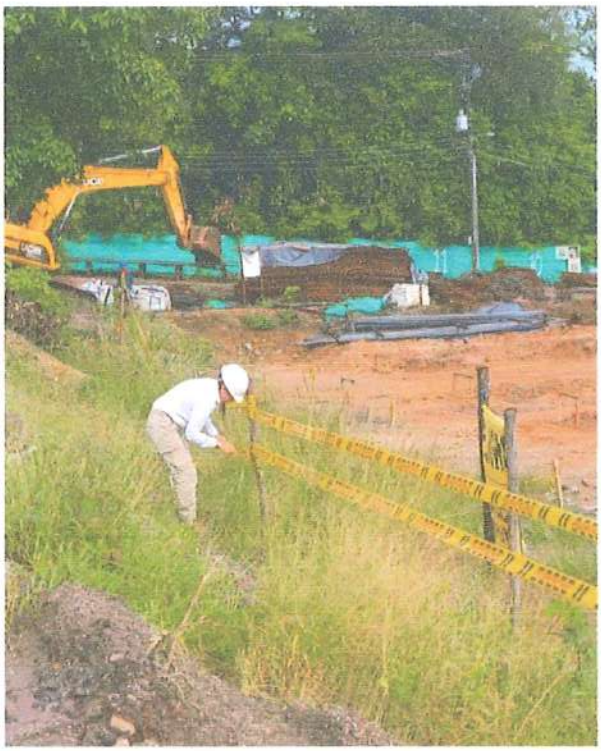


18 abr 2024 1
Alto Pompeya –
Al
Veloci
Número de



8.4.6 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA.

En el mes abril en la obra se encuentran maquinaria retro excavadora con oruga mini cargador, molinetes, planta concretera, mezcladoras de concreto, demoledor realizando actividades dentro del campo de trabajo. La misma cuenta con certificados de mantenimiento de los equipos expedidos en centros debidamente autorizados. Por otra parte, se les solicita a los operarios de cada una de las maquinas la inspección preoperacional diariamente antes de empezar las funciones.

Se verificará toda la documentación de la maquinaria, documentación de los operarios, por el inspector de seguridad, realiza charla pre operacional antes de iniciar labores para que el trabajador tome todas las medidas de protección y autocuidado en la realización de las actividades.

De acuerdo a la maquinaria que se está utilizando en las actividades de construcción, puede decirse que las emisiones de ruido se han mantenido por debajo de los límites permisibles (80 decibeles según Resolución 8321 de 1983) sin generar perjuicios a la comunidad y/o problemas de salud a los trabajadores del proyecto, igualmente los trabajadores deben portar sus elementos de protección individual (protección auditiva), es preciso aclarar que las labores se realizan en jornada diurna.

En el desarrollo de las a actividades de las maquinas mediante observación las cuales cuentan con adecuación del patio para la correcta manipulación del equipo para evitar la contaminación del suelo

8.5 MEDIO SOCIO ECONÓMICO

La educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los colaboradores en la obra sobre temáticas o problemas ambientales. Al hacerlo, les brinda a los trabajadores las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y medidas responsables en el manejo adecuado y la importancia de la protección de nuestro entorno

Intenta reflejar el impacto que las actividades basadas en el conocimiento tienen sobre el desarrollo de la sociedad y la economía

8.5.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO

Socializar con los colaboradores el plan de manejo ambiental y la importancia del cuidado y protección del medio ambiente y el entorno donde nos encontramos, separación en la fuente de los residuos en los puntos ecológicos que se encuentran en la obra, frentes de trabajo limpios y ordenados. En el mes de abril se realizaron charlas preoperacionales ambientales y de seguridad industrial en el que participa todo el personal operativo del proyecto

Se realizan charlas de educación ambiental con los colaboradores antes de iniciar las jornadas de trabajo

8.6 INSPECCIÓN AMBIENTAL.

8.6.1.1 Formato de Inspección Ambiental

Fecha: ABRIL

Responsable: Astrid Ruiz González.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
1. CONSUMO DE ENERGÍA				

	CUMPLIMIENTO			
¿Los monitores que no se están utilizando se encuentran apagados o en suspensión?	x			Los monitores que se están utilizando se mantienen apagados cuando no se necesitan
Los aparatos eléctricos y/o electrónicos que no se están utilizando se encuentran desenchufados y/o apagados?	x			En el desarrollo de las actividades en obra se realiza control adecuado sobre el uso adecuado de los aparatos eléctricos
se reutiliza el papel reciclaje	x			Se realiza un acopio de papel para reutilizar.
¿Las luces de lugares no concurridos o donde no se requiere se encuentran apagadas?	x			Las luces permanecen apagadas cuando no se están realizando actividades en el área
¿Se implementan prácticas para el ahorro de energía?	x			Las instalaciones y equipos electrónicos permanecen desconectados cuando no se están utilizando
¿El área cuenta con sistemas ahorradores de energía en buen estado?	x			Se realizará vigilancia que los sistemas de energía se encuentren en buen estado
2. CONSUMO DE AGUA				
¿Se implementan buenas prácticas de ahorro de agua?	x			En el desarrollo de las actividades se realiza buenas practicas de uso racional de agua
¿La red hidrosanitaria se encuentra en buenas condiciones de tal manera que no se evidencian fugas de agua o condiciones de humedad?	x			Las redes hidro sanitarias s e encuentran en buen estado de tal manera que no presentan perdidas importantes del liquido
3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
punto(s) ecológico(s) para residuos aprovechables y no aprovechables	x			La obra cuenta con puntos ecológicos para la separación en la fuente de los residuos que se generen en la obra, los residuos ordinarios son llevados cada tercer día en la parte de afuera de la obra para ser recogidos por la empresa de servicios públicos Bioagricola del Llano S. A
¿Cumple con la separación en la fuente de acuerdo con el código de colores establecidos?	x			En el desarrollo de las actividades se realiza separación en la fuente d ellos residuos que se generan en el desarrollo de las actividades de la obra
señalización para la clasificación de residuos en canecas en el punto ecológico	x			Se tienen puntos ecológicos conformado por tres canecas de acuerdo al nuevo código de colores El consorcio cuenta con punto de acopio de material peligroso para

	CUMPLIMIENTO			
				realizar disposición final adecuada con empresa certificada
los residuos depositados se encuentran bien clasificados de acuerdo con el código de colores establecido	x			El consorcio comprometido con el manejo adecuado de los residuos cuenta con canecas para la separación en fuente de los residuos
El sitio de acopio evidencia la presencia de vectores como moscas, roedores, cucarachas etc.		X		Los residuos se ordinarios se retiran del punto ecológico cada tercer día para evitar la propagación de plagas
¿los escombros bien almacenados (protegidos del sol y agua) debidamente señalizados	x			Todo el material sobrante de demoliciones, excavación serán acopiados de manera correcta protegidos de la intemperie y señalizados. y llevados a Bioagricola De L Llano S. A
disposición de chatarra con proveedor	x			El material sobrante (chatarra) se entrega a gestores de la comunidad para el aprovechamiento
4. ORDEN Y ASEO				
Área de trabajo limpia y ordenada	x			Se realiza periódicamente orden y aseo en las áreas de trabajo
Área de trabajo demarcada y/o señalizada	x			Se realiza cierre perimetral en los frentes de trabajo donde se están realizando intervenciones
Optimización de recursos en el área (Ahorro de agua, papel, energía)	x			Se realizará un control sobre el uso adecuado de los recursos en la obra.
5. IMPACTOS AMBIENTALES				
¿Existe aspectos ambientales significativos que no puedan ser controlados por la empresa y dependan de un tercero? (Cliente, Proveedor, Comunidad, etc.).	x			identificar los productos o servicios que podrían generar algún cambio positivo o negativo en el ambiente.
Los funcionarios/as de la empresa y los contratistas conocen y han apropiado la política ambiental?	x			Se divulgará con todo el personal administrativo, subcontratistas la política ambiental del consorcio
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				
¿Se encuentran identificadas todas las sustancias químicas utilizadas en el área?	x			El consorcio cuenta con un punto de acopio de sustancias peligrosas dentro del campo de trabajo
¿Se poseen fichas de seguridad de las sustancias químicas que se manejan en el área?	x			Se rotulan las sustancias químicas y se dejarán a la vista las fichas técnicas
Los productos químicos están almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada?	x			Las sustancias químicas se encuentran en el acopio designado
¿Los productos químicos están separados de	x			Los productos químicos se tendrán

	CUMPLIMIENTO			
elementos o equipos que puedan generar chispas?				separados de los equipos
¿Las instalaciones eléctricas de las zonas de almacenamiento de químicos están en buen estado?	x			se realizará revisión de las instalaciones eléctricas en las zonas de almacenamiento de sustancias químicas
7. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS (UNIDADES SANITARIAS)				
Las unidades sanitarias están en buenas condiciones, funcionalidad sin posibles filtraciones y derrames y normas mínimas de higiene	x			En el desarrollo de las actividades se realizará el manejo adecuado de las unidades sanitarias evitando que existan derrames de acuerdo a las normas de higiene
8. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES				
Se evidencian derrames y contaminación del suelo por derrame de aceites		X		Se implementará el paso de acuerdo al PMA del CONSORCIO EDUCACION C&G-MH
El área de almacenamiento de combustible evita contacto directo con el piso, esta señalizada, lejos de fuente de chispa y dentro de un sistema de contención en caso de derrame	x			En el desarrollo del proyecto el tendrá un punto de acopio de combustibles que evita el contacto directo con el piso, debidamente señalizado, lejos de una fuente de chispa
9. COMBUSTIBLES FÓSILES (ACPM. GASOLINA ETC).				
El área de almacenamiento de combustible evita contacto directo con el piso, esta señalizada, lejos de fuente de chispa y dentro de un sistema de contención en caso de derrame	x			En el desarrollo de las actividades del proyecto el punto de acopio de almacenamiento de combustibles se evitará el contacto directo con el piso en una rea lejos de la fuente de chispa y señalizado
Certificado de calidad combustible disponible			x	No aplica
Se mantienen los equipos apagados en el tiempo en el que el personal no se encuentra en el lugar de trabajo.	x			Se mantendrán los equipos apagados en el tiempo en el que en personal no se encuentre en el lugar de trabajo.
10. PLAN DE EMERGENCIA				
¿Cuenta con un plan de emergencia ambiental actualizado?	x			El consorcio cuenta con un plan de acción para cualquier emergencia que se presente en la obra
¿Posee planos con las rutas de evacuaciones de la sede?	x			El consorcio contara con un plano de evacuación en caso de presentarse una emergencia
¿La sede cuenta con una adecuada señalización para una evacuación en caso de una emergencia ambiental?	x			El consorcio tendrá señalización en todo el perímetro para que los colaboradores tengan conocimiento cuando se presente una emergencia ambiental

	CUMPLIMIENTO			
Se identifican riesgos ambientales	x			Los riesgos para el medio ambiente se identifican en el centro de trabajo a partir de la formación específica y del conocimiento de los procesos productivos
¿Las personas que laboran en la sede conocen estos riesgos?	X			Se socializará con todo el personal los riesgos ambientales que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades
Se cuenta con extintores cargados y fecha de vencimiento al día.	x			Se realizará seguimiento a los extintores multifuncional ABC de los extintores que se encuentren en el campo de trabajo
Poseen Kit de emergencia.	x			Se tendrá un kit de derrame en el campo de trabajo
11. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS				
El kit de derrames cuenta como mínimo con bolsas rojas, tela olefilica, pala guantes nitrilo y mono gafas	x			El kit de derrames contiene todos los elementos necesarios para la atención de cualquier emergencia
Se tiene kit de derrames cerca del lugar de almacenamiento temporal de residuos líquidos peligrosos	x			El consorcio cuenta con tres kits de derrames para los dos frentes de obra
Se tiene kit de derrames cerca de equipo estacionario con potencialidad de derrames de derivados de hidrocarburos	x			Los kits de derrames son idóneos para sustancias químicas, anti derrames que se presenten en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Se tiene kit de derrames para vehículo dentro del mismo	x			La máquina que se encuentra en obra cuenta con su kit de derrames
Cuenta con extintor multipropósito de 20 libras cerca del lugar de almacenamiento temporal de residuos peligrosos	x			En el desarrollo de las actividades se tiene instalado dos puntos de emergencia con camilla, extintor multipropósito botiquín de primeros auxilios
Hojas de seguridad de las sustancias químicas disponibles y divulgadas	x			Las hojas de seguridad de las sustancias que químicas se tendrán en un lugar visible para la manipulación adecuada de los colaboradores
Procedimiento operativo para atención de emergencias ambientales (derrames mayores menores, fugas) disponible	x			Se socializará con el personal colaborador el procedimiento operativo para la atención de emergencias ambientales.
Teléfonos de contacto de policía ambiental en caso de encuentro con abejas, serpientes, otros	x			Se divulgará teléfonos de contacto para atención de emergencias.

S: Si Cumple
N: No Cumple
N/A: No Aplica
Responsable de Inspección Ambiental

NOMBRE RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN:	**ASTRID RUIZ GONZÁLEZ** **INGENIERO AMBIENTAL**

8.7 **Seguridad y Salud en el Trabajo.**

Todas las actividades constructivas en el desarrollo de las obras estarán permanentemente acompañadas por parte del equipo de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo del proyecto con el objeto de manejar, controlar mitigar y compensar los impactos negativos que se vayan generan por el Consorcio Educación C&G-MH, comprometidos con la seguridad y salud de los trabajadores en la importancia de uso y manejo adecuado de Los EPP, que son la última alternativa de protección de las personas ante los riesgos presentes en las diferentes tareas y áreas de trabajo donde se pueda que generar un accidente que no impedirá que se pueda ocasionar una lesión la trabajador pero con el uso adecuado de estos ayudara a que esta sea menos grave.

Los Elementos de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.

En el desarrollo de las actividades del mes de abril se encuentran realizando, charlas ambientales al personal operativo de la obra, cerramientos perimetrales en las excavaciones, cerramiento de protección de individuos arbóreos, señalización puntos de acopio de material cubiertos con plástico negro, Señales de obligación, peligro o advertencia, auxilio, Prohibición y Señales de equipos contra incendio.

9 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

El informe de gestión social pretende evidenciar las actividades ejecutas en el periodo comprendido del 1 al 26 de abril del año 2024 de acuerdo al Plan de Gestión Social, donde se evidencia actividades de los diferentes programas como son atención al usuario, educación y capacitación al personal vinculado al proyecto, programa de vinculación de mano de obra, información o participación comunitaria, cultura vial, plan de compensación socioeconómica y demás actividades de acompañamiento.

9.1 Programa de Atención al Usuario.

En este programa se pretende atender quejas peticiones, reclamos Y/o sugerencias que surjan durante la ejecución del proyecto. Este se adelantará de manera virtual haciendo uso de los canales telefónicos y de correo electrónico, atendiendo de manera oportuna todas las PQRS, a las que haya lugar, lo anterior con el fin de generar satisfacción en los usuarios en general del proyecto y mantener una buena imagen institucional en la comunidad.

El punto de atención a la comunidad se estable de manera virtual a través de los canales de comunicación vía telefónica (3138227763) y correo electrónico (social.consorciomh@cyg.com.co).

Durante el mes de abril se realizaron las siguientes atenciones aclarando que no se recibieron oficio o solicitudes por escrito.

Tabla 27

Actividades de Atención al Usuario

Fecha	Objetivo	Descripción de la Actividad
26/04/2024	Atención presencial comunidad	Se realizó atención de manera presencia en compañía de Policía a tres personas que

Fecha	Objetivo	Descripción de la Actividad
		generaron bloqueo al ingreso del personal de obra, quienes manifestaron que supuestamente "se realizó despido indebido del señor Brayan Hernández" por lo cual se procedió a realizar la respectiva reunión para escuchar sus peticiones y exponer que la empresa Altura realizo un adecuado procedimiento ya que el contrato del Señor Brayan Hernández se terminó por cumplimiento de obra labor. Durante la reunión se dejo claridad del proceso y las diferentes llamados de atención que se realizaron al trabajador durante su contrato. Además de que el nuevo operador de la retroexcavadora es residente del Villavicencio y pertenece al Area de Influencia Directa del Proyecto.

Ilustración 25

Atención Al Usuario



9.1.1 Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto.

El 22 de abril de 2024 se desarrolló taller con el personal de obra donde se abordó el tema **"Riesgo Psicosocial y Laboral en obra de construcción"** el cual se llevó a cabo por medio de metodología teórico práctico, iniciando con la presentación audiovisual de video y diapositivas sobre el tema y posteriormente una actividad reflexiva participativa para afianzar los conocimientos adquiridos durante el taller.

Objetivo: Brindar herramientas que permita tener una visión respecto de las diversas condiciones implicadas en el trabajo, que pueden constituirse tanto en factores protectores o de riesgo para la salud física, mental y emocional de los trabajadores.

9.2 **Metodología:**

Teórico- Práctica

Exposición de conceptos básicos:

- De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo que es un riesgo Psicosocial.
- Como identificar el riesgo psicosocial y laboral.
- ¿Qué es el Estres?

Desarrollo de la Actividad:

Se dio inicio con la exposición de los conceptos básicos de los riesgos psicosociales, realizando la proyección del video ESTRÉS EXPLICADO POR DISNEY- https://www.youtube.com/watch?v=v736ggexnVg posteriormente se socializaron los tipos de afectaciones que se presentan a nivel psicosocial en las obras y cómo podemos desde nuestros roles generar un ambiente laboral sano que previene riesgo psicosocial, además de como sobrellevar las diferentes situaciones que pueden afectar al trabajador desde todos los ambientes en los que el trabajador se desarrolla y como puede implementar estrategias y actividades que ayuden a regular estas situaciones generando equilibrio como por ejemplo tener una alimentación saludables, realizar ejercicio, compartir momentos de recreación en familia o amigos.

En cuanto al riesgo laboral la profesional SST del Consorcio C&G MH socializo con los trabajadores la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Enfermedad laboral es aquella contraída

Ilustración

Taller Riego Psicosocial y Laboral en Obra de Construcción.



1.1 Programa de Contratación de Mano de Obra.

En este programa se pretende fomentar la vinculación laboral del personal del Área de Influencia Directa del Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la

población. Especificar los perfiles requeridos concerniente a la mano de obra no calificada de la región, con el fin de divulgar por medio de oficina móvil, las diferentes vacantes laborales en las cuales especifique: caracterización de la población, número de vacantes, perfiles requeridos como (ayudante de obra, oficial de obra, jefe de obra civil, conserje, entre otros a que allá a lugar), aspirantes presentados, seleccionados, seguimiento al contrato, de igual forma como requisito esencial se solicitará certificado de la JAC de residencia en la zona, adicionalmente a eso el certificado si pertenece o no algún grupo población específica, con la finalidad de asegurar la contratación de mínimo un 30% de las personas a intervenir de manera mensual.

Durante el periodo ejecutado, se seleccionó y contrato (7) siete trabajadores de mano de obra no calificada (7) siete en el cargo de ayudante de obra todos del AID del proyecto.

Anexo: Certificados de Residencia

Tabla 28

Mano de Obra no Calificada Contratada al Proyecto


17756

MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATADA DEL 1 AL 30 DE MARZO 2024										
No	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	SEXO	PERTENECE AID	CARGO	MDNC	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EMPRESA
1	SOL LOURDES	RAMIREZ ROCHA	28.589.257	F	SI	CONTROLADORA VIAL	SI	26/02/2024	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G MH
2	ANGELA MARIA	SILVA OSPINA	1.121.904.972	F	SI	CONTROLADORA VIAL	SI	26/02/2024	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G MH
3	MIGUEL ANGEL	GARCIA BUELVAS	1.121.904.981	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	19/09/2023	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G MH
4	BRAYAN SNEIDER	URQUIZA BARRERA	1.013.656.142	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	11/12/2023	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G MH
5	ANDERSON	URQUIZA BARRERA	1.006.797.237	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	30/01/2024	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G
6	CAMILO	GOMEZ RODRIGUEZ	1.006.860.529	M	SI	ALMACENISTA	SI	16/08/2023	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G MH
7	DIOSNELL JÓSE	MOSQUEDA	5.386.773	M	SI	AUXILIAR DE PLANTA DE CONCRETO	SI	18/11/2023	PERMANECE	ALTARA INGENIERIA S.A.S
8	LEIDER	CARDONA BARRERA	1.073.322.160	M	SI	OPERADOR DE MINICARGADOR	SI	18/11/2023	PERMANECE	ALTARA INGENIERIA S.A.S
9	JHONATAN	MURCIA VARGAS	1.117.529.828	M	NO	OP. MINICARGADOR	SI	26/02/2024	PERMANECE	ALTARA INGENIERIA S.A.S
10	FRANCISCO JAVIER	VILLALBA GUAYARA	86.053.821	M	SI	OP. MAQUINARIA RETROESCAVADORA	SI	25/03/2024	PERMANECE	ALTARA INGENIERIA S.A.S
11	DIEGO FERNANDO	VAZQUES TAUTIVA	1.121.946.169	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	11/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA

17757

12	AXON	MURILLO MOSQUERA	8.116.085	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
13	EDWIN	MOSQUERA CORDOBA	1.018.438.040	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
14	JHON FREDYS	BONILLA PALACIOS	1.010.165.547	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
15	JUAN CARLOS	MORENO PALOMEQUE	1.033.714.256	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
16	WILMAR ALBERTO	ALVAREZ MESA	70.257.108	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
17	ANGEL	PEREZ PEÑA	17.330.024	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
18	GILBER	MEDINA VILLAMOR	1.006.810.122	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
19	HECTOR MANUEL	QUEJADA VALOYES	11.791.906	M	SI	OFICIAL	SI	25/01/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
20	CARLOS EVER	FISCAR CONTRERAS	1.090.379.623	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	19/02/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
21	YAMID	MOZO CANTILLO	1.090.490.686	M	SI	OFICIAL	SI	28/02/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
22	WILFREDO	CUERVO TORO	1.006.440.638	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	28/02/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
23	LUIS DAVID	ESTANGA VARGAS	5.765.336	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	28/02/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
24	JONATHAN JESUS	ORTIZ VARGAS	1.139.837	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	28/02/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
25	ANDRES	AREVALO SOSA	1.121.898.278	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	28/02/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
26	CARLOS EVER	ALBERTO ARGUELLO	86.087.034	M	SI	OFICIAL	SI	28/02/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
27	JULIAN ANDRES	CUBILLOS GOMEZ	1.122.918.439	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	7/02/2024	PERMANECE	CONSTRUNAL AGUAS
28	EBER WILINTON	PALACIOS PEREZ	11.801.617	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	23/03/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA

RETIRADOS MES DE MARZO 2024										
No	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	SEXO	PERTENECE AID	CARGO	MDNC	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EMPRESA
1	BRAYAN	HERRERA HERNANDEZ	1.234.788.329	M	SI	OP. MAQUINARIA RETROESCAVADORA	SI	5/08/2023	25/03/2024	ALTARA INGENIERIA S.A.S
2	MARTIN	PEÑA ARIAS	91.447.961	M	NO	OP. BOMBA ESTACIONARIA	SI	23/08/2023	3|/03/2024	ALTARA INGENIERIA S.A.S
3	JUAN EDUARDO	TORRES TRASLAVILLA	1.000.219.013	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	7/12/2023	25/03/2024	ALTARA INGENIERIA S.A.S
4	ORLANDO	HINESTROZA CORDOBA	71.990.028	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	12/01/2024	5/03/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
5	EUGENIO	MENA MEDINA	1.027.940.549	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	12/01/2024	21/03/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
6	IGNACIO CANDELARIO	MURILLO BEDOYA	71.939.286	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	7/03/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
7	JAHSON OLIDER	LEZCANO CUESTA	1.042.732.197	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	7/03/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
8	GONZALO EDUARDO	CALLE PEREA	11.807.151	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	7/03/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
9	EBER WILINTON	PALACIOS PEREZ	11.801.617	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	7/03/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
10	JUAN CARLOS	bcubillos	71.940.541	M	NO	OFICIAL	SI	14/11/2023	21/03/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
11	HARRY	VALENCIA CHAVARRA	1.128.525.438	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/12/2023	6/03/2024	JESUS IVAN TAUTIVA
12	JHON ALEXANDER	GAMBOA BEJARANO	1.077.438.395	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	13/12/2023	6/03/2024	JESUS IVAN TAUTIVA
13	BRAHIAN ESTIVEN	GALLEGO RIAÑO	1.120.380.935	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	19/02/2024	11/03/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S

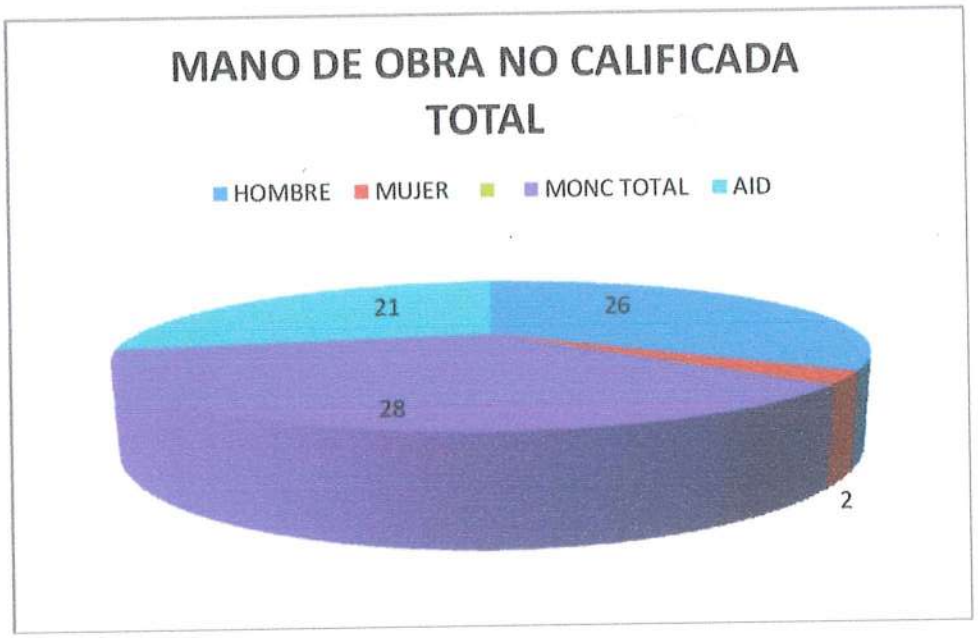

9.3 De acuerdo a la gráfica anterior, podemos concluir que de los 28 trabajadores de MONC, 21 de ellos pertenecen al AID del proyecto, 26 son hombre y 2 son mujeres. Cumpliendo así con el 70% en la contratación de MONC del Área de Influencia Directa del Proyecto.

9.4 **Programa de Información y Participación Comunitaria.**

El programa de información y participación ciudadana consiste en mantener un sistema de comunicación para el proyecto, que integra estrategias de comunicación comunitaria, social masiva, contribuyendo a la generación de una imagen positiva o sólida del Proyecto, al mejoramiento de las relaciones sociales culturales, organizativas, mediáticas. De igual manera, aportar desde la comunicación al fortalecimiento del capital social de la comunidad objeto en los ámbitos de intervención del proyecto, haciendo énfasis en una participación comunitaria. Visibilizar el alcance y los resultados del proyecto que permita el empoderamiento por parte de las comunidades, el posicionamiento del mismo. Fortalecer las organizaciones sociales existentes, generar otros espacios de participación o control social

con las comunidades del área de influencia del proyecto, contribuyendo a la imagen e identidad del proyecto, para su posicionamiento.

9.5 **Comité de Vigilancia y Control.**

En el mes de abril se llevó a cabo el comité mensual de Vigilancia y Control en el cual se contó con la participación de los equipos de trabajo del Consorcio Educación C&G MH e Interventoría, en esta reunión se socializaron los avances del proyecto por cada una de las áreas, técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y Social. Seguido de la socialización de los componentes y sus respectivas actividades ejecutadas en el proyecto, se dio paso para un espacio de preguntas donde se abordaron temas relacionados con los pagos a trabajadores y cortes de subcontratistas y pagos de parafiscales.

Cuál es el porcentaje de obra y el porcentaje ejecutado 29% programado 36%

La comunidad hace sugerencia en relación a la salida de las volquetas que se levantan las llantas al momento de salir lo cual puede generar un

Para corregir esto es que ellos hacían el giro muy rápido entonces se le solicito que salieran derecho y luego hicieran el giro cuando el carro ya está estable en la vía. Adicionalmente la comunidad manifiesta que las volquetas están dejando muchos residuos en la vía generando suciedad por lo cual se solicita hacer aseo a las vías posterior a la salida de las volquetas. La comunidad hace la pregunta sobre la implementación de nuevos frentes de obra, a lo cual el director de obra Ingeniero Yeison Gómez, manifiesta que ya hay unas empresas cotizando, ya hicieron visita de inspección para iniciar nuevos trabajos. La comunidad solicita que las vacantes se hagan de manera pública, por lo cual la profesional Social manifiesta, que el Consorcio realizo la afiliación ante la Agencia Pública de Empleo de la Alcaldía de Villavicencio para hacer las nuevas convocatorias de empleo.

Ilustración 26

Comité de Vigilancia y Control



Ver anexo. Acta de reunión comité de vigilancia y control abril.

9.6 Programas de Compensaciones Socioeconómicas.

El Plan de Compensaciones Socioeconómicas se encuentra definido en la Resolución 545 de 2008 del Instituto Nacional de Concesiones, el cual consiste, mitigar los impactos socioeconómicos específicos, causados por razón de la ejecución de un proyecto.

10 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

10.1 Comité y/o Reuniones de Obra.

A continuación, se relacionan las reuniones y comités de obra en los que se participaron en el periodo comprendido del 01 al 26 de abril de 2024.:

Tabla 29 *Relación de Actas de Reuniones y/o Comité abril 2024.*

Relación de Actas de Reuniones y/o Comité		
Tipo de Acta	Fecha	Descripción
Acta de reunión	01-04-2024	Reunión avance. de actividades social, ambiental, técnico y sst,
Acta de reunión	08-04-2024	Reunión avance. de actividades social, ambiental, técnico y sst,
Acta de reunión	15-04-2024	Reunión avance. de actividades social, ambiental, técnico y sst,

Tabla 30 *Relación de Actas Tramitadas.*

Relación de Actas Tramitadas		
Tipo de Acta	Fecha	Descripción
ACTA DE INICIO	20/05/2023	
ACTA DE ENTREGA DEL LOTE	21/06/2023	
ACTA MODIFICACION No. 3	18/12/2023	Modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos.
PRORROGA No.1	22/12/2023	Prorroga por 12 meses, nueva fecha de terminación 31/12/25
SUSPENSION No. 1	26/04/2024	Suspensión por un plazo de 1 mes hasta el 26 de mayo de 2024

10.2 **Correspondencia Enviada.**

El motivo para desarrollar un control documental de las correspondencias enviadas

Tabla 31

Relación de Correspondencia Enviada abril 2024

CE	N° sub carpeta	N°	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Asunto
201	125	254	4/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Acta de recibo parcial No 1.
201	125	263	8/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Documentación de Ingreso Personal de Obra.
201	125	264	11/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Documentación de Ingreso Personal de Obra Topografía Raul Velasco.
201	125	265	11/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Respuesta Oficio CI-1765-2023-OF-164 Acta de obra parcial No 1.
201	125	266	11/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Documentación de Ingreso Personal de Obra Ayudante de obra Contratista Jesús Ivan Tautiva Dueñas
201	125	268	15/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Seguimiento Contrato Atraso de Obra
201	126	270	16/04/2024	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS Atn Sr. JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	Incumplimiento Contrato CE-201-147-004-Jesús Ivan Tautiva Dueñas-Pólizas 30-45-101015184 y 30-40-101019577-Seguros de Vida del Estado SA.
201	125	271	18/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Documentación de Ingreso Personal de Obra Oficiales y Ayudante de obra Contratista Jesús Ivan Tautiva Dueñas.
201	125	272	19/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Documentación de Ingreso Personal de Obra Oficial de obra Contratista Jesús Ivan Tautiva Dueñas.
201	126	273	23/04/2024	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS Atn Sr. JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	Prorroga Incumplimiento Contrato CE-201-147-004-Jesús Ivan Tautiva Dueñas-Pólizas 30-45-101015184 y 30-40-101019577- Seguros de Vida del Estado SA.
201	125	274	24/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Solicitud Suspensión Contrato.
201	125	275	25/04/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA	Entrega Acta e Informe de Suspensión

CE	N° sub carpeta	N°	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Asunto
				2023	
201	124	276	26/04/2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn. Ing. Juan Pablo Cañón	Rendimientos Financieros Anticipo

11 COMPONENTE FINANCIERO.

11.1 Relación Inversión del Anticipo.

El contrato establece en su cláusula 6 lo siguiente:

"Se pagará al CONTRATISTA de conformidad con lo establecido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en los estudios previos la Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará al contratista la remuneración a su favor de la siguiente manera: Un anticipo del VEINTE (20%) por ciento del valor del contrato previa aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor"

A la fecha se realizó el desembolso total del anticipo por valor de $4.767.975.486.28. A continuación, relacionamos el plan de inversión del anticipo aprobado por Interventoría y el Consorcio:

Tabla 32

Plan de Inversión del Anticipo Versión 3

El 08 de marzo del 2024 por medio de la comunicación N° CE-201-125-250 se presentó a interventoría la modificación del plan de inversión de anticipo ajustando los rubros a las necesidades de obra según la ejecución del contrato así:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO III		
VALOR DEL CONTARTO DE OBRA	$	25.094.607.822,56
ANTICIPO 20%	$	5.018.921.564,51
IMPUESTO DE GUERRA (5%)	$	250.946.078,23
ANTICIPO 20%	$	4.767.975.486,00

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES	$ 2.002.549.704,24	42,00%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 2.527.027.007,73	53,00%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 238.398.774,31	5,00%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 0,00	0,00%
	TOTAL	$ 4.767.975.486	100%

Tabla 33

Datos Fiduciarios

Para garantizar el cumplimiento del contrato de obra 1279 del 2023, y enmarcado en plan de inversión del anticipo los datos fiduciarios se nombran a continuación.

Empresa	NIT	Porcentaje Anticipo	Valor
Alianza Fiduciaria	830053812-2	20%	$ 5.018.921.564,51

11.2 Seguimiento Financiero Control de Actas y Pagos.

A la fecha la entidad realizó el desembolso total del anticipo a la fiducia por valor de $4.767.975.486.28.

Tabla 34

Control y Seguimiento de Anticipo

Actas de Cobro	Fecha	%	Valor Acta Presente	Amortizado	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
Anticipo	14-09-2023	0.159%	76.000.000,00	0	N/A	76.000.000,00
Anticipo	22-09-2023	65.22%	3.109.966.084,95	0	N/A	3.109.966.084,95
Anticipo	22-11-2023	33.18%	1.582.009.400,56	0	N/A	1.582.009.400,56
		Total		-	-	$4.767.975.486.28

Tabla 35

Control y Seguimiento de Pago de Actas Parciales.

Actas de Cobro	Fecha	%	Valor Acta Presente	Amortizado	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
1	11-04-2024	25.31	6.530.645.605	1.270.129.121	5.080.516.484	$0
Total				-	-	$0

Para garantizar el cumplimiento del contrato de obra 1279 del 2023, y enmarcado en plan de inversión del anticipo los datos fiduciarios se nombran a continuación.

Tabla 36

Datos Fiduciarios

Empresa	NIT	Porcentaje Anticipo	Valor
Alianza Fiduciaria	830053812-2	20%	$ 5.018.921.564,51

Tabla 37

Formato de Relación de Inversión Anticipo

17767

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
1	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	167.217.062	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
2	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	58.000.000	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
3	1001	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	506.877	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
4	2263	13/07/2023	901234897-2	ACODEL FERRETERIA DE COLOMBIA SAS	OC 003 -MATERIAL FERRETERIA	7.418.119	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
5	2744	18/07/2023	900539242-5	INVERSIONES ARKA UNION SAS	OC 010 -MATERIAL FERRETERIA	658.042	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
6	1004	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	1.219.275	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
7	8106	1/08/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	TRANSPORTE A ESCOMBRERA	23.943.721	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
8	1021	1/09/2023	17343650	WILSON CARDENAS SABOGAL	CORTE N° 4 CONTRATO 001 DEMOLICIÓN	9.589.983	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
9	TAU-9	30/08/2023	529016550	MARIA DEL	ORDEN DE COMPRA-014		COMPRA DE	Orden de	9/10/2023

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
				ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	MATERIAL FERRETERIA	2.176.426	MATERIALES Y ACCESORIOS	Giro 1	
10	CC049	15/08/2023	900803958-1	ALTARA INGENIERIA SAS	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO OT 007	700.000.000	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
11	CC 003	28/08/2023	1113624886	ALEXANDER GIRALDO DELGADO	COMISION TOPOGRAFICA 19 07 AL 03 08 DE 2023	4.925.250	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
12	321	25/08/2023	901480671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 027 MATERIAL FERRETERIA	6.810.738	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
13	CC 01	8/09/2023	901.455.591-2	INVESTMENT CREARE SAS	ANTICIPO SUMINISTRO MATERIAL PETREO ORDEN DE COMPRA 050	80.021.559	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
14	4970	4/09/2023	900.887.192-7	MADERAS TELLEZ S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 030 MATERIAL FERRETERIA	4.444.550	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
15	No. 1BV 326	1/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 032 MATERIAL FERRETERIA	447.347	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
16	CC	21/09/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE 201 147 004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	33.612.625	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
17	CC 01	11/09/2023	900342509-9	MH CONSULTING SAS	ANTICIPO SUMINISTRO REDES ELECTRICAS	420.768.060	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
18	CC 01	19/09/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISION TOPOGRAFICA 6 07 08 09 10 11 12 y 13 DE SEPTIEMBRE 2023	3.526.280	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
19	NOTA DEBITO N°1	21/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 038 MATERIAL FERRETERIA	2.144.806	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
20	No. 1BV 345	26/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 040 MATERIAL FERRETERIA	4.382.665	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
21	01FE-51445	15/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 041 SUMINISTRO ACERO	3.771.933	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
22	01FE-51650	19/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 045 SUMINISTRO ACERO	38.929.551	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
23	01FE-51756	21/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 046 SUMINISTRO ACERO	11.550.002	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
24	FOS 8321	1/09/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE AGOSTO	35.508.704	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
25	FOS 8576	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE I	5.017.014	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
26	FOS 8577	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE II	5.294.166	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
27	A-380	1/10/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-052 MADERA	2.957.668	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2024
28	No. 1BV 360	9/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA	ORDEN DE COMPRA-056 MATERIAL FERRETERIA	5.685.010	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
				SAS					
29	ALT 285	18/10/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	179.287.996	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2024
30	CC	21/10/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE-201-147-004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	22.249.964	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2024
31	01FE-53555	20/10/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-063 SUMINISTRO ACERO	54.549.598	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2024
32	CC 002	1/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (COBRO 1)	3.967.065	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024
33	CC 03	7/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 13, 14, 15, 16, 17, 18 DE OCTUBRE 2023	2.644.710	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024
34	TAU-19	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 1 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	9.923.581	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024
35	TAU-20	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 2 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	905.008	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024
36	TAU-23	16/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 3 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	7.131.632	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024
37	FOS 8715	2/11/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA	SERVICIO ESCOMBRERA MES		TRANSPORTE DE	Orden de	13/12/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
				DEL LLANO SA	DE OCTUBRE 2023	40.170.822	MATERIALES	Giro 4	
38	No. 1BV 387	25/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-066 MATERIAL FERRETERIA	927.647	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
39	No. 1BV 392	8/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-070 MATERIAL FERRETERIA	535.790	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
40	1BV 416	27/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-083 MATERIAL FERRETERIA	3.399.818	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
41	1BV 420	9/12/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-087 MATERIAL FERRETERIA	4.870.522	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
42	01FE-54325	1/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-068 SUMINISTRO ACERO	169.304	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
43	01FE-54480	3/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-072 SUMINISTRO ACERO	957.252	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
44	01FE-55455	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-074 SUMINISTRO ACERO	52.040.940	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
45	01FE-55453	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-075 SUMINISTRO ACERO	17.072.168	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
46	A-383	1/11/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA	ORDEN DE COMPRA-057 MADERA	398.580	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
				MURILLO					
47	FOS 8915	1/12/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE NOVIEMBRE 2023	4.134.777	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
48	ALT 291	6/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	45.355.552	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
49	292	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	34.690.133	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
50	293	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	40.007.787	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
51	ALT 294	20/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 003 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	41.648.556	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
52	CC 04	1/12/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023 Y DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	6.800.560	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
53	CC 04	1/12/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 8 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023	6.800.560	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
54	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	456.754.810	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 6	2/02/2024
55	FVE 311	22/01/2024	901.556.948-1	COMERCIALIZADORA DE CONCRETOS PREMIUM S.A.S ZOMAC	TRANSPORTE DE AGREGADOS ORDEN DE TRABAJO 027	29.925.014	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 7	10/02/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
56	CC 14176	24/01/2024	891800111-5	DIACO SA	ANTICIPO ACERO	316.540.000	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 7	10/02/2024
57	PROFORMA 45293105756	27/01/2024	860002523-1	CEMEX COLOMBIA SA	ANTICIPO CEMENTO GRIS	299.499.200	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 7	10/02/2024
58	SAE 3381	5/12/2023	901.174.550-4	SAE TABLEROS DE CONTROL Y ENERGIA S.A.S.	ORDEN DE COMPRA-076 MATERIAL FERRETERIA PROVISIONAL DE OBRA (CABLE)	4.365.454	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
59	DAFE 6	24/11/2023	901.753.376-3	GNC CONSTRUCCIONES SAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUB BASE ORDEN DE COMPRA 069	5.422.144	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
60	DAFE-13	24/01/2024	901.753.376-3	GNC CONSTRUCCIONES SAS	ORDEN DE COMPRA-088 MATERIAL AGREGADO	3.098.368	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
61	A-384	1/11/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	OC 065 COMPRA MADERA	1.181.432	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
62	A-430	23/01/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	OC 079 COMPRA MADERA	833.952	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
63	ALT-296	23/01/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	TRANSPORTE DE MATERIALES	13.338.000	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
64	ALT 301	8/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 003 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	20.927.198	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
65	ALT 302	8/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 004 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	22.545.238	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
66	FECV 189	26/01/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 3 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	13.067.860	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
67	FECV 190	7/02/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 4 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	32.023.394	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
68	TAU-32	7/02/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 6 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	59.980.201	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
69	CC 06	2/02/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 20 DÍAS MES DE DICIEMBRE	8.549.700	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
70	ALT 285	18/10/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	15.794.897	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
71	ALT 304	20/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 004 CONTRATO CE-201-146-002 EXCAVACIÓN	176.133.378	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
72	ALT 305	20/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 005 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	32.919.472	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
73	TAU-35	20/02/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 7 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	27.557.188	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
74	FECV 191	19/02/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 5 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	39.517.236	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
75	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 3	71.631.753	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
76	1191	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	574.770,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
77	1193	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	47.649.147,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
78	1194	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	1.165.962,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
79	1195	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	25.488.372,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
80	1241	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	53.530.960,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
81	1242	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	20.200.726,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
82	1248	4/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	32.905.404,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
83	1249	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	32.172.840,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
84	1253	5/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	75.179.797,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
85	A-450	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA103 MADERA	3.985.800,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
86	A-451	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-103 MADERA	1.303.050,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
87	2448	29/02/2024	901.100.411-1	SOLUINTECO SAS	ORDEN DE COMPRA-103 SUMINISTRO ACERO	8.259.384,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
88	CC 07	1/03/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 09 AL 26 DE ENERO DEL 2023	7.704.130,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
89	ALT 308	6/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 006 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	85.059.771,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
90	TAU-36	6/03/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 8 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	38.803.958,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
91	FECV 192	7/03/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 6 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	34.981.301,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
92	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 4	45.895.714,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
93	1192	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	24.555.531,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
94	1255	7/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	70.939.946,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
95	1258	3/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	1.185.954,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
96	1259	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	65.054.920,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
97	1261	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	7.901.540,50	COMPRA DE MATERIALES Y	Orden de Giro 11	17/04/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
							ACCESORIOS		
98	1262	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	3.738.619,23	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
99	FECV 196	21/03/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 7 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	42.746.131,98	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
100	CC 09	3/04/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 02AL 04 DE MARZO DEL 2024	856.014,44	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
101	CC 08	3/04/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 02AL 04 DE MARZO DEL 2024	10.272.173,33	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
102				ANULADO					17/04/2024
103	TAU-39	6/04/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N°98 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	35.323.429,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
104	310	21/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N 006 CE 201 146 007 CONCRETO	90.650.204,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
105	9817	3/04/2024	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE MARZO 2024	14.546.044,40	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 11	17/04/2024

CLASIFICACIÓN ANTICIPO	VALOR GIRADO OCTUBRE 2023	VALOR GIRADO NOVIEMBRE 2023	VALOR GIRADO DICIEMBRE 2023	VALOR GIRADO ENERO 2024	VALOR GIRADO FEBRERO 2024
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 1.285.249.950,00	$ 63.192.276,00	$ 0,00	$ 80.372.021,00	$ 622.420.038,00
MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	$ 218.871.200,00	$ 201.537.960,42	$ 24.571.996,00	$ 632.057.957,50	$ 520.647.515
TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 127.763.604,58	$ 0,00	$ 40.170.822,00	$ 4.134.777,33	$ 51.783.526
COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	$ 1.631.884.754,58	$ 264.730.236,42	$ 64.742.818,00	$ 716.564.755,83	1.194.851.079

CLASIFICACIÓN ANTICIPO	VALOR GIRADO MARZO 2024	VALOR GIRADO ABRIL 2024	ACUMULADO TOTAL
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$302.416.212	173.376.511	2.527.027.008
MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	$ 212.444.874	179.847.953	1.989.979.456
TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 0,00	14.546.044	238.398.774
COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 0,00	-	-
TOTAL	$514.861.086	367.770.508	4.755.405.238

En el periodo del 01 al 26 de abril del 2024 se ha girado por medio de la fiducia el valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($367.770.508).**

12 CONCLUSIÓN.

El Consorcio Educación C&G-MH, Continua la implantación de Plan de Manejo de Transito (PMT), igualmente con el Plan de manejo Ambiental.

En referencia al avance de obra que se evidencia una ejecución de 29.15% vs 36.47% programado.

Lo correspondiente a los ensayos de laboratorio se evidencia que todos se encuentran en los parámetros de las normas correspondientes.

El consorcio Educación C&G-MH solicito el trámite de suspensión del contrato de referencia en la que debe quedar claro el compromiso de atender los temas solicitados en nuestra comunicación CE-201-125-268 "Solicitud atención temas críticos desarrollo contrato"

13 TABLAS

Tabla 1 *Datos Generales del Proyecto* 9

Tabla 2 *Ubicación Geográfica Centro poblado Altos de Pompeya* 10

Tabla 3 *Áreas a Construir por Edificaciones* 13

Tabla 4 *Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual* 14

Tabla 5 *Póliza de Seguro Cumplimiento – Prorroga No. 1* 15

Tabla 6 *Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificación No. 3* 15

Tabla 7 *Flujo de Inversión Programado Por Mes* 16

Tabla 8 *Relación Avance Programado Acumulado vs Avance Físico Acumulado* 17

Tabla 9 *Capítulo 2. Cantidad ejecutadas* 19

Tabla 15 *Cimentación Concreto de Limpieza* 20

Tabla 9 *Acero de Refuerzo Cimentación* 21

Tabla 19 *Acero de Refuerzo* 22

Tabla 20 *Disposición final de residuos* 23

Tabla 10 24

Tabla 14 26

Tabla 15 *Relación de Maquinarias Usadas en el Periodo* 30

Tabla 16 *Relación de Equipos Topográficos* 34

Tabla 17 *Equipos de Laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S* 34

Tabla 18 36

Tabla 19 *Ensayo Asentamiento o Slump* 39

Tabla 21 46

Tabla 21 ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 23 *Relación del Personal no Profesional del Contratista de Obra* 48

Tabla 24 *Relación del Personal de Contratistas de Obra* 49

Tabla 25 *Charlas de Seguridad y Capacitaciones* 57

Tabla 26 *Inspecciones Planificadas* 60

Tabla 27 65

Tabla 25 *Actividades de Atención al Usuario* 86

Tabla 27 92

Tabla 30 *Relación de Actas de Reuniones y/o Comité abril 2024.* 98

Tabla 31 *Relación de Actas Tramitadas.* 98

Tabla 32 *Relación de Correspondencia Enviada abril 2024* 99

Tabla 33 100

Tabla 34 101

Tabla 35 *Control y Seguimiento de Anticipo* 101

Tabla 36 102

Tabla 37 *Datos Fiduciarios* 102

Tabla 38 *Formato de Relación de Inversión Anticipo* 103

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 *Localización Geográfica del Proyecto* 11

Ilustración 2 *Implantación y Localización General* 12

Ilustración 3. *Curva S Análisis de Avance Físico vs Programado* 18

Ilustración 4. *Excavación manual en conglomerado seco.* 19

Ilustración 5 *Concreto de Limpieza* 20

Ilustración 5 *Acero de Refuerzo Cimentación* 21

Ilustración 6 *Acero de Refuerzo Estructural* 22

Ilustración 8 *Excavación Húmeda Conglomerado Manual Para Caisson Incluye Cargue Y Retiro 5km* 24

Ilustración 9 *Anillo De Recubrimiento Para Caisson En Concreto De 4000 Psi - Profundidad 0-10m - Sin Refuerzo (Incluye Bombeo)* 25

Ilustración 10 26

Ilustración 8 *Demolición con químico Expansivo* 27

Ilustración 12 *Plano Plan de Manejo de Transito* 28

Ilustración 13 *Plan de Manejo de Transito* 29

Ilustración 11: *Maquinaria en Obra* 31

Ilustración 14 *Registro Diario del Clima abril 2024* 32

Ilustración 16 *Influencia del Clima abril 2024* 33

Ilustración 17 *Análisis Estadístico a 14 días del Hormigón 4000 Psi* 37

Ilustración 18 *Análisis Estadístico a 28 días del Hormigón 4000 Psi* 37

Ilustración 19 *Esquema de Ensayos In Situ para Concretos* 38

Ilustración 21 44

Ilustración 21 *Entrega y Reemplazo de Equipos de Protección Personal* 54

Ilustración 22 *Proceso de Inducción* 55

Ilustración 24 *Inspecciones Planificadas* 61

Ilustración25 *Indicadores de Accidentabilidad* ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 27 88

Ilustración 28 *Comité de Vigilancia y Control* 97

12784

ANEXO OFICIO DE APROBACIÓN DE MOVILIDAD AL

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

1278

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
NIT: 901.687.301

Villavicencio, 28 de Diciembre de 2023
CE-201-127-190

SECRETARIA DE MOVILIDAD
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
No Radicado: 0-10-4-12
Fecha y Hora: 29 DIC 2023
Recibido por: 153 F
ERIKA

Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD
Atn **Sr. DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B.**
Representante Legal de Interventoría
Calle 19 No. 31 – 19
Barrio Villa María
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 1279 de 2023 *"Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta".*

ASUNTO: Contestación Oficio 1703-19.18/1504 Informes PMT meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.

Cordial saludo,

Nos permitimos enviar los informes de PMT de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre debidamente firmados por el Consorcio e Interventoría y atendiendo las observaciones realizadas por ustedes mediante el oficio 1703-19.18/1504.

Lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACIÓN CYG - MH
MAURICIO MEJIA HOYOS
Representante Legal

Powered by CamScanner

ANEXO. BITÁCORA DE OBRA.

FORMATO BITÁCORA DE OBRA		N° 1
consorciomh@cyg.com.co	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	NIT. 901687301-9
DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE DE LA OBRA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
N° DE CONTRATO	1279	
GATOS GENERALES		
FECHA	PERIODO COMPRENDIDO DEL 1-04-2024 AL 07-04-2024	
CLIMA	SOLEADO	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	PLANTA DE CONCRETO DOMAT, SILO, GRUA CANASTA	
No. TRABAJADORES	28	

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1		**Modulo A. Auditorio**
2	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON INCLUYE CARGUE Y RETIRO 5KM	Excav. Manual caisson en: campana de E4, A1 Excav. Manual caisson en: campana A1, campana E3 Excav. Manual caisson en: anillo 8 de B4, anillo 9 de E1
3	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	Se instalan canastas en caisson E1, E3, B3, B4
4	DEMOLICIÓN CON QUIMICO EXPANSIVO PARA ROCA	explosivo en anillo 8 de B4
5	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)	Fundida de anillo: 7 de B4, 7 de A1
6	CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE GRUA Y BOMBEO)	Fundida de caisson E4, A1
7		**Modulo B. Administrativo**
8	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	Se continua perfilado del terrreno a cota 306.15m, 15cm por debajo de VC excavacion manual de vigas de cimentacion ejes J-K, 6-13 excavacion manual de vigas de cimentacion ejes J11-J13, K11-K13
9	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)	Retiro de material sobrante de excavacion y disposicion en bioagricola
10		**Modulo C. Educativo**
11	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	excavacion manual de vigas de cimentacion ejes J6-J11, K6-K11, J6-L6
12	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	Se funden concreto solados de VC tramos: 9-6 entre J-L, 9-11 viguetas 105, 106 entre J-L
13		**Modulo D. Pre-escolar**
14	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	Ajuste de formaleta y parales vigas inclinadas
15		
16		

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
RESIDENTE DE OBRA	
FIRMA	

17988

FORMATO BITÁCORA DE OBRA		N° 2
consorciomh@cyg.com.co	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	NIT. 901687301-9

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE DE LA OBRA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
N° DE CONTRATO	1279

GATOS GENERALES	
FECHA	PERIODO COMPRENDIDO DEL 8-04-2024 AL 14-04-2024
CLIMA	SOLEADO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	PLANTA DE CONCRETO DOMAT, SILO, GRUA CANASTA
No. TRABAJADORES	31

N°	ITEM	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1		**Modulo A. Auditorio**
2	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	Se instalan canastas en caisson: E2
3	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)	Se fundio: anillo 1 de PQ3, PQ4,PQ2 Se fundio: anillo 1 de PQ10, PQ1, anillo 2 de PQ3 y PQ4
4	CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE GRUA Y BOMBEO)	Fundida de caisson: E3 Fundida de caisson: E2
5		**Modulo B. Administrativo**
6	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	excavacion manual de vigas de cimentacion ejes: V109 entre 11-9 del eje N incompleta, V110 entre 11-9 del eje P, dos V106 entre 11-9 del N-P
7	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN	Retiro de material sobrante de excavacion
8		**Modulo C. Educativo**
9	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)	Se fundio: anillo 1 de PQ3, PQ4,PQ2
10	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	Se replantea caisson de escaleras y centros de columnas
11	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	excavacion manual de vigas de cimentacion ejes J11-J13, K11-K13 excavacion manual de vigas de cimentacion ejes: J-L entre 13-13', 9-11 entre L-M vigueta 105, 11 entre L-M viga 104, vigueta 103 en 11-13 entre L-M excavacion manual de vigas de cimentacion ejes: V109 entre 11-9 del eje N incompleta, V110 entre 11-9 del eje P, dos V106 entre 11-9 del N-P
12	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	Se funden concreto solados ejes de vigas modulo c Solados: viga V101C eje 13' entre L-M, V102C eje 13 entre L-M, V105C entre 11-9 entre N-P, V105-V106-V109C-V110C entre ejes 11-9 y N-P
13		**Modulo D. Pre-escolar**
14	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa,	Instalacion de acero para vigas y placa de cubierta
15	PLACA DE CONCRETO DE 27,6MPa, (4000psi), Impermeab	Se funde primera fase de placa de cubierta de pre escolar 32m3 aprox.
16		

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

FORMATO BITÁCORA DE OBRA			N° 3
consorciomh@cyg.com.co		CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	NIT. 901687301-9
DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA		RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
N° DE CONTRATO		1279	
GATOS GENERALES			
FECHA		PERIODO COMPRENDIDO DEL 15-04-2024 AL 21-04-2024	
CLIMA		LLOVIZNA	
MAQUINARIA Y EQUIPOS		PLANTA DE CONCRETO DOMAT, SILO, GRUA CANASTA Y RETROEXCAVADORA	
No. TRABAJADORES		34	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**ACTIVIDADES A DESARROLLAR**	
1		**Modulo B. Administrativo**	
2	DISPOSICIÓN FINAL DE	Retiro de material sobrante de excavacion	
3		**Modulo C. Educativo**	
4	CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE GRUA Y BOMBEO)	Fundida de caisson: PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQ5, PQ6, PQ10 , PQ11	
5	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	Se corrigen niveletas con topografia para explanacion Se levantan cotas terreno para excavacion de vigas de cimentacion	
6	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	excavacion manual de vigas de cimentacion ejes: V103-V104-V105 entre ejes 9-6 entre N-P	
7	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	Solados: viga V101C eje 13' entre L-M, V102C eje 13 entre L-M, V105C entre 11-9 entre N-P, V105-V106-V109C-V110C entre ejes 11-9 y N-P Solados: V102 a V106 entre 13-9 y M-N Solados: V101 eje 13 entre M-N, V105-V104-V103-V102 entre 9-6 y M-N, V104 eje 9 entre N-O Solados: V103-V102 entre 9-6 y N-P, V108 entre 11-9 y O-P	
8	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	Amarre de hierro: arranque de columna K13 Amarre de hierro: arranque columna J11, L11, L13 excavacion manual de vigas de cimentacion ejes: V102 eje 6 entre M-N, V101 entre M-P, V108 entre 11-9 y J-K Amarre de hierro: arranque de columna L11 Amarre de hierro: V107 eje J entre 6-9, V109 eje K entre 6-9	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
RESIDENTE DE OBRA			
FIRMA			

17789

FORMATO BITÁCORA DE OBRA		N° 4
consorciomh@cyg.com.co	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	NIT. 901687301-9
	DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE DE LA OBRA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	
N° DE CONTRATO	1279	
	GATOS GENERALES	
FECHA	PERIODO COMPRENDIDO DEL 22-04-2024 AL 26-04-2024	
CLIMA	LLOVIZNA	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	PLANTA DE CONCRETO DOMAT, SILO, GRUA CANASTA	
No. TRABAJADORES	37	

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1		**Modulo C. Educativo**
2	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	Replanteo de ejes caidos en modulo educativo
3	CONCRET013,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	Solados: V108C entre 9-11 y J-K Solados: V101C perimetral 5' entre M-P
4	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	Amarre de hierro: V104 1/3 eje 9 entre L-M, V101-V102 y V103 1/3 entre L-M, V105 1/3 entre 9-11 y L-M, V106c 1/3 entre L-M eje 9, V109C 2/3 9-11 eje L Amarre de hierro: V103C entre 11-13 y J-L, V102C entre 11-13 y J-K, columna M6 y M9 Amarre de hierro: V104 eje 9 entre K-L, V101-V102 y V103 entre K-L, V105 entre 9-11 y J-K
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

ANEXO. ENSAYOS DE CILINDROS DE CONCRETO.

17 de Abril de 2024

Señores:

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Villavicencio

Asunto: **Informe Preliminar RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Estimado Cliente,

El presente informe tiene como objetivo proporcionarle una revisión oportuna de los resultados de las muestras de concreto, permitiéndole tomar decisiones informadas en relación con su proyecto.

Es importante destacar que los resultados presentados en este informe corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo en nuestro laboratorio. No obstante, es necesario enfatizar que NHSQ INGENIERIA S.A.S. no es responsable del proceso de muestreo, ni del transporte de las muestras.

Por otra parte, le recordamos que este informe no puede ser reproducido en su totalidad, ni parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio.

Para que este informe sea válido, requerimos la firma original del coordinador de ingeniería y el sello original del laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S.

Por favor, revise el informe y no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita más información.

Atentamente,

Haiver David Olivo
Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
NHSQ INGENEIRIA S.A.S


NHSQ SAS INGENIERIA
901047361

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CODIGO
INV. E 410 - 2013	09 ENERO 2024	F-LAB-011-V10

PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.				
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**NIT**	901687301	**TIPO DE FALLA**	
MUNICIPIO	Villavicencio	**CORREO**	consorciomh@cyg.com.co		
DEPARTAMENTO	META	**CELULAR**			
FECHA DE RECEPCIÓN	VER REMISIÓN	**CONTACTO**	JOSE MARX REYES		
DESCRIPCIÓN	CONCRETO ELABORADO EN EL SITIO DE LA OBRA			**FECHA DE EMISIÓN**	Miércoles, 17 de Abril de 2024



EQUIPOS UTILIZADOS — PRENSA DOBLE RANGO N°: EQ-100 - EQ-101 | BALANZA N°: EQ-029 | FLEXOMETRO: EQ-161 | PIE D REY N°: EQ-158

ID MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO f'c		ASENT. (cm)	HORA DE TOMA	FECHA DE TOMA	DÍAS DE CURADO	FECHA DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (g)	DEFECTOS	AREA (mm2)	DENSIDAD (Kg/m3)	CARGA MAXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		% CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA	OBSERVACIONES
		(PSI)	(MPa)												(PSI)	(MPa)				
GT-67-C	FUSTE CAISSON M13, N6 Y O6 MODULO EDUCATIVO	4000	28.0	15.00	00:00	06-03-2024	28	03-04-2024	101.67	3705	NO	8118.50	2237.1	268.9	4803	33.1	120.1 %	4	--	
GT-68-C	FUSTE CAISSON 09 P6 Y P9 MODULO EDUCATIVO	4000	28.0	15.00	00:00	06-03-2024	28	03-04-2024	102.00	3845	NO	8171.28	2306.6	275.9	4896	33.8	122.4 %	3	--	
GT-69-C	FUSTE CAISSON BC 8 Y B10 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	15.00	00:00	11-03-2024	28	08-04-2024	101.33	3575	NO	8064.29	2198.2	199.2	3583	24.7	89.6 %	4	--	
GT-70-C	FUSTE CAISSON C 10 Y C13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	15.00	00:00	11-03-2024	28	08-04-2024	104.00	3835	NO	8494.87	2213.0	244.9	4181	28.8	104.5 %	4	--	
GT-71-C	FUSTE CAISSON C8 Y H 12 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	14.00	10:30	12-03-2024	28	09-04-2024	101.00	3705	NO	8011.85	2263.2	301.0	5448	37.6	136.2 %	4	--	
GT-72-C	FUSTE CAISSON H 13, I 12 Y I 13	4000	28.0	15.00	10:00	12-03-2024	28	09-04-2024	100.67	3680	NO	7959.56	2273.8	264.0	4811	33.2	120.3 %	4	--	
GT-73-B	FUSTE CAISSON D12 Y D 13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	16.00	11:00	15-03-2024	17	01-04-2024	102.00	3765	NO	8171.28	2281.0	317.6	5636	38.9	140.9 %	4	--	
GT-73-C	FUSTE CAISSON D12 Y D 13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	16.00	11:00	15-03-2024	28	12-04-2024	102.00	3750	NO	8171.28	2271.0	365.8	6493	44.8	162.3 %	3	--	
GT-74-C	FUSTE CAISSON D8 Y D10 MOSULO ADMINISTATIVO	4000	28.0	14.00	11:30	16-03-2024	28	13-04-2024	100.67	3720	NO	7959.56	2298.5	220.0	4009	27.6	100.2 %	5	--	
GT-75-C	FUSTE CAISSON G 10 Y G 12 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	15.00	13:00	16-03-2024	28	13-04-2024	100.00	3625	NO	7853.98	2284.9	182.6	3372	23.3	84.3 %	5	--	
GT-76-C	FUSTE CAISSON I 10 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	16.00	10:00	16-03-2024	28	13-04-2024	103.00	3745	NO	8332.29	2214.1	208.0	3821	25.0	90.5 %	5	--	
GT-77-C	FUSTE CAISSON I 7 Y I 8 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	14.00	11:00	19-03-2024	28	16-04-2024	100.67	3665	NO	7959.56	2268.2	223.4	4070	28.1	101.8 %	5	--	
GT-78-B	FUSTE CAISSON G 8 Y G13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	15.00	14:40	21-03-2024	14	04-04-2024	101.67	3710	NO	8118.50	2243.7	266.4	4759	32.8	119.0 %	4	--	
GT-79-B	FUSTE CAISSON H7 Y H 10 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	16.00	15:30	21-03-2024	14	04-04-2024	102.33	3910	NO	8224.24	2319.1	241.3	4255	29.3	106.4 %	4	--	
GT-80-A	FUSTE CAISSON F7, E5 Y E7 MODULO AUDITORIO	4000	28.0	14.00	10:30	22-03-2024	21	12-04-2024	100.00	3590	NO	7853.98	2274.1	255.0	4709	32.5	117.7 %	3	--	
GT-81-A	FUSTE CAISSON B5, B7 Y A7 MODULO AUDITARIO	4000	28.0	15.00	13:30	22-03-2024	21	12-04-2024	100.00	3650	NO	7853.98	2323.7	202.0	3729	25.7	93.2 %	5	--	
GT-82-A	FUSTE CAISSON F1, B1 Y B2 MODULO AUDITARIO	4000	28.0	16.00	11:00	23-03-2024	20	12-04-2024	102.00	3690	NO	8171.28	2235.6	214.8	3812	26.3	95.3 %	5	--	
GT-83-A	FUSTE CAISSON A1 Y E4 MODULO AUDITARIO	4000	28.0	14.00	10:30	05-04-2024	7	12-04-2024	103.00	3800	NO	8332.29	2254.0	249.9	4350	30.0	108.8 %	5	--	
GT-84-A	FUSTE CAISSON E3 MODULO AUDITORIO	4000	28.0	15.00	15:40	09-04-2024	7	16-04-2024	103.67	3835	NO	8441.04	2241.7	199.2	3423	23.6	85.6 %	5	--	

ESTE INFORME SE EXPIDE DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2017

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.

ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.

ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.

LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

PROCESÓ

Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO
Analista de Ingeniería

REVISÓ Y APROBÓ

COPIA NO ORIGINAL

Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

17793


NHSQ S.A.S INGENIERIA
901047361

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CODIGO
INV. E 410 - 2013	09 ENERO 2024	F-LAB-011-V10

PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.				
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**NIT**	901687301	**TIPO DE FALLA**	
MUNICIPIO	Villavicencio	**CORREO**	consorciomh@cyg.com.co		
DEPARTAMENTO	META	**CELULAR**			
FECHA DERECEPCIÓN	VER REMISIÓN	**CONTACTO**	JOSE MARX REYES		
DESCRIPCIÓN	CONCRETO ELABORADO EN EL SITIO DE LA OBRA			**FECHA DE EMISIÓN**	Miércoles, 17 de Abril de 2024



EQUIPOS UTILIZADOS	PRENSA DOBLE RANGO N°:	EQ-100 - EQ-101	BALANZA N°:	EQ-029	FLEXOMETRO:	EQ-161	PIE D REY N°:	EQ-158

ID MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO f'c		ASENT. (cm)	HORA DE TOMA	FECHA DE TOMA	DÍAS DE CURADO	FECHA DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (g)	DEFECTOS	AREA (mm2)	DENSIDAD (Kg/m3)	CARGA MAXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		% CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA	OBSERVACIONES
		(PSI)	(MPa)												(PSI)	(MPa)				
GT-85-A	FUSTE CAISSON B3 Y B4 MODULO AUDITORIO	4000	28.0	14.00	09:00	10-04-2024	7	17-04-2024	100.33	3670	NO	7905.90	2298.1	177.0	3247	22.4	81.2 %	2	--	

ESTE INFORME SE EXPIDE DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2017

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.

ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.

ESTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.

LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

PROCESÓ

Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO
Analista de Ingeniería

REVISÓ Y APROBÓ

COPIA NO ORIGINAL

Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

19794

17 de Abril de 2024

Señores:

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH
Villavicencio

Asunto: **Informe Preliminar RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Estimado Cliente,

El presente informe tiene como objetivo proporcionarle una revisión oportuna de los resultados de las muestras de concreto, permitiéndole tomar decisiones informadas en relación con su proyecto.

Es importante destacar que los resultados presentados en este informe corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo en nuestro laboratorio. No obstante, es necesario enfatizar que NHSQ INGENIERIA S.A.S. no es responsable del proceso de muestreo, ni del transporte de las muestras.

Por otra parte, le recordamos que este informe no puede ser reproducido en su totalidad, ni parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio.

Para que este informe sea válido, requerimos la firma original del coordinador de ingeniería y el sello original del laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S.

Por favor, revise el informe y no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o necesita más información.

Atentamente,

Haiver David Olivo
Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
NHSQ INGENEIRIA S.A.S


NHSQ C&G INGENIERIA
901047301

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CODIGO
INV. E 410 - 2013	09/ENERO/2024	F-LAB-011-V10

PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.			
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**NIT**	901687301	**TIPO DE FALLA**
MUNICIPIO	Villavicencio	**CORREO**	consorcio mh@cyg.com.co	
DEPARTAMENTO	META	**CELULAR**		
FECHA DE RECEPCIÓN	VER REMISIÓN	**CONTACTO**	JOSE MARX REYES	



DESCRIPCIÓN	CONCRETO ELABORADO EN EL SITIO DE LA OBRA	**FECHA DE EMISIÓN**	Miércoles, 17 de Abril de 2024

EQUIPOS UTILIZADOS — PRENSA DOBLE RANGO N°: EQ-100 - EQ-101 | BALANZA N°: EQ-029 | FLEXOMETRO: EQ-161 | PIE D REY N°: EQ-158

ID MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO f'c (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO f'c (MPa)	ASENT. (cm)	HORA DE TOMA	FECHA DE TOMA	DÍAS DE CURADO	FECHA DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (g)	DEFECTOS	AREA (mm2)	DENSIDAD (Kg/m3)	CARGA MAXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (MPa)	% CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA	OBSERVACIONES
GT-67-C	FUSTE CAISSON M13 Y O6 MODULO EDUCATIVO	4000	28.0	15.00	00:00	06-03-2024	28	03-04-2024	101.67	3705	NO	8118.50	2237.1	268.9	4803	33.1	120.1 %	4	--	
GT-68-C	FUSTE CAISSON 09 Y P9 MODULO EDUCATIVO	4000	28.0	15.00	00:00	06-03-2024	28	03-04-2024	102.00	3845	NO	8171.28	2306.6	275.9	4896	33.8	122.4 %	3	--	
GT-70-C	FUSTE CAISSON C 10 Y C13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	15.00	00:00	11-03-2024	28	08-04-2024	104.00	3835	NO	8494.87	2213.0	241.9	4181	28.8	104.5 %	4	--	
GT-71-C	FUSTE CAISSON C8 Y H 12 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	14.00	10:30	12-03-2024	28	09-04-2024	101.00	3705	NO	8011.85	2263.2	301.0	5448	37.6	136.2 %	4	--	
GT-72-C	FUSTE CAISSON H 13, I 12 Y I 13	4000	28.0	15.00	10:00	12-03-2024	28	09-04-2024	100.67	3680	NO	7959.58	2273.8	264.0	4811	33.2	120.3 %	4	--	
GT-73-B	FUSTE CAISSON D 2 Y D 13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	16.00	11:00	15-03-2024	17	01-04-2024	102.00	3765	NO	8171.28	2281.0	317.6	5638	38.9	140.9 %	4	--	
GT-73-C	FUSTE CAISSON D 2 Y D 13 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	16.00	11:00	15-03-2024	28	12-04-2024	102.00	3750	NO	8171.28	2271.9	365.8	6493	44.8	162.3 %	3	--	
GT-74-C	FUSTE CAISSON D8 Y D10 MOSULO ADMINISTATIVO	4000	28.0	14.00	11:30	16-03-2024	28	13-04-2024	100.67	3720	NO	7959.58	2298.5	220.0	4009	27.6	100.2 %	5	--	
GT-77-C	FUSTE CAISSON I 7 P Y I 8 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	14.00	11:00	19-03-2024	28	16-04-2024	100.67	3665	NO	7959.58	2268.2	223.4	4070	28.1	101.8 %	5	--	
GT-78-B	FUSTE CAISSON 6 8 Y 6 B MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	15.00	14:40	21-03-2024	14	04-04-2024	101.67	3710	NO	8118.50	2243.7	266.4	4759	32.8	119.0 %	4	--	
GT-79-B	FUSTE CAISSON H7 Y H 10 MODULO ADMINISTRATIVO	4000	28.0	16.00	15:30	21-03-2024	14	04-04-2024	102.33	3910	NO	8224.24	2319.1	241.3	4255	29.3	106.4 %	4	--	
GT-80-A	FUSTE CAISSON F7, E5 Y E7 MODULO AUDITORIO	4000	28.0	14.00	10:30	22-03-2024	21	12-04-2024	100.00	3590	NO	7853.98	2274.1	255.0	4709	32.5	117.7 %	3	--	
GT-81-A	FUSTE CAISSON B5, B7 Y A7 MODULO AUDITARIO	4000	28.0	15.00	13:30	22-03-2024	21	12-04-2024	100.00	3650	NO	7853.98	2323.7	202.0	3729	25.7	93.2 %	5	--	
GT-82-A	FUSTE CAISSON F1, B1 Y B2 MODULO AUDITARIO	4000	28.0	16.00	11:00	23-03-2024	20	12-04-2024	102.00	3690	NO	8171.28	2235.6	214.8	3812	26.3	95.3 %	5	--	
GT-83-A	FUSTE CAISSON A1 Y E4 MODULO AUDITARIO	4000	28.0	14.00	10:30	05-04-2024	7	12-04-2024	103.00	3800	NO	8332.29	2254.0	249.9	4350	30.0	108.8 %	5	--	
GT-84-A	FUSTE CAISSON E3 MODULO AUDITORIO	4000	28.0	15.00	15:40	09-04-2024	7	16-04-2024	103.67	3835	NO	8441.04	2241.7	199.2	3423	23.6	85.6 %	5	--	

ESTE INFORME SE EXPIDE DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2017

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.

ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.

ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.

LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

PROCESÓ

Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO
Analista de Ingeniería

REVISÓ Y APROBÓ

Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Coordinador de Ingeniería y Laboratorio


NHSQ SAS INGENIERIA
901047361

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410 - 2013	09/ENERO/2024	F-LAB-011-V10

PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.			
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**NIT**	901667301	**TIPO DE FALLA**
MUNICIPIO	Villavicencio	**CORREO**	consorcomh@cyg.com.co	
DEPARTAMENTO	META	**CELULAR**		
FECHA DERECEPCIÓN	VER REMISIÓN	**CONTACTO**	JOSE MARX REYES	



DESCRIPCIÓN	CONCRETO ELABORADO EN EL SITIO DE LA OBRA			**FECHA DE EMISIÓN**	Miércoles, 17 de Abril de 2024
EQUIPOS UTILIZADOS	**PRENSA DOBLE RANGO N°:** EQ-100 - EQ-101	**BALANZA N°:** EQ-029	**FLEXOMETRO:** EQ-161	**PIE D REY N°:**	EQ-158

ID MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO f'c		ASENT. (cm)	HORA DE TOMA	FECHA DE TOMA	DÍAS DE CURADO	FECHA DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (g)	DEFECTOS	AREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MAXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		% CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA	OBSERVACIONES
		(PSI)	(MPa)												(PSI)	(MPa)				
GT-85-A	FUSTE CAISSON B3 Y B4 MODULO AUDITORIO	4000	28.0	14.00	09:00	10-04-2024	7	17-04-2024	100.33	3670	NO	7905.90	2298.1	177.0	3247	22.4	81.2 %	2	–	

ESTE INFORME SE EXPIDE DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2017

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.

EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.

ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE. SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.

ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERÍA S.A.S.

LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

PROCESÓ

Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO
Analista de Ingeniería

REVISÓ Y APROBÓ

Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

ANEXO. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

17798

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	616688637	9466723601	E	2024/05/03	2024/05/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,630,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO EDUCACION (15 Afiliados)																						$44,288,703	$7,186,700			$44,288,703	$1,772,000			$44,406,063	$1,776,600			$44,288,703		$2,895,400		$0	$0		$13,630,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$2,912,000	$466,000			$2,912,000	$116,500			$2,912,000	$116,500			$2,912,000		$15,300		$0	$0		$714,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$2,912,000	$466,000			$2,912,000	$116,500			$2,912,000	$116,500			$2,912,000		$15,300		$0	$0		$714,300
1	CC	1020807368	MARTINEZ LEIDY																		23030 1	30	$2,912,000	$466,000	EPS005	30	$2,912,000	$116,500	CCF34	30	$2,912,000	$116,500	14-4	30	$2,912,000	0.522%	$15,300	30	$0	$0	SI	$714,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (14 Afiliados)																						$41,376,703	$6,720,700			$41,376,703	$1,655,500			$41,494,063	$1,660,100			$41,376,703		$2,880,100		$0	$0		$12,916,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (14 Afiliados)																						$41,376,703	$6,720,700			$41,376,703	$1,655,500			$41,494,063	$1,660,100			$41,376,703		$2,880,100		$0	$0		$12,916,400
2	CC	1121945797	CALDERON JUAN																		23030 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
3	CC	1121904981	GARCIA MIGUEL									X									25-14	30	$1,548,245	$247,800	CCFC55	30	$1,548,245	$62,000	CCF34	30	$1,548,245	$62,000	14-4	30	$1,548,245	6.960%	$107,800	30	$0	$0	SI	$479,600
4	CC	1006860529	GOMEZ CAMILO									X									25-14	30	$2,412,767	$386,100	EPS002	30	$2,412,767	$96,600	CCF34	30	$2,412,767	$96,600	14-4	30	$2,412,767	6.960%	$168,000	30	$0	$0	SI	$747,300
5	CC	86051263	GOMEZ YEISON																		23030 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF34	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$0	$0	SI	$3,196,000
6	CC	63532138	JONES NOHORA																		25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
7	CC	1126246825	PINEDA JOEL																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
8	CC	28589257	RAMIREZ SOL									X									23030 1	30	$1,386,436	$221,900	CCFC55	30	$1,386,436	$55,500	CCF34	30	$1,386,436	$55,500	14-4	30	$1,386,436	6.960%	$96,500	30	$0	$0	SI	$429,400
9	CC	1070306746	RODRIGUEZ ARNOLD																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
10	CC	40341812	RUIZ ASTRID																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
11	CC	1018427594	SEPULVEDA MARIA																		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
12	CC	1121904972	SILVA ANGELA		X							X									23030 1	30	$1,372,606	$219,700	CCFC55	30	$1,372,606	$55,000	CCF34	30	$1,489,966	$59,600	14-4	30	$1,372,606	6.960%	$95,600	30	$0	$0	SI	$429,900
13	CC	1006796237	URQUIZA ANDERSON									X									23030 1	30	$1,505,372	$240,900	EPS002	30	$1,505,372	$60,300	CCF34	30	$1,505,372	$60,300	14-4	30	$1,505,372	6.960%	$104,800	30	$0	$0	SI	$466,300
14	CC	1193089901	URQUIZA BRAYAN									X									23030 1	30	$1,651,277	$264,300	EPS002	30	$1,651,277	$66,100	CCF34	30	$1,651,277	$66,100	14-4	30	$1,651,277	6.960%	$115,000	30	$0	$0	SI	$511,500
15	CC	40217089	VEGA DIANA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Total			**Afiliados(15)**																				$44,288,703	$7,186,700			$44,288,703	$1,772,000			$44,406,063	$1,776,600			$44,288,703		$2,895,400		$0	$0		$13,630,700

2024/05/06 10:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

17799

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	616688637	9466723601	E	2024/05/03	2024/05/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$13,630,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$7,186,700	$0	$0	$7,186,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,353,900	$0	$0	$1,353,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$4,792,800	$0	$0	$4,792,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,895,400	$0	$0	$2,895,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	15	$2,895,400	$0	$0	$2,895,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,776,600	$0	$0	$1,776,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	15	$1,776,600	$0	$0	$1,776,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,772,000	$0	$0	$1,772,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$172,500	$0	$0	$172,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$403,000	$0	$0	$403,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$996,500	$0	$0	$996,500
TOTAL				15	$13,630,700	$0	$0	$13,630,700

2024/05/06 10:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

17800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900803958	1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	EQUIPOS	cra7 No. 51-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6401500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	650568602	9466693077	E	2024/05/16	2024/05/20	BANCOLOMBIA	4	$2,466,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EQUIPOS (5 Afiliados)																						$7,747,667	$1,239,700			$7,747,667	$310,000			$9,212,000	$368,700			$7,747,667		$539,400		$0	$0		$2,457,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																						$7,747,667	$1,239,700			$7,747,667	$310,000			$9,212,000	$368,700			$7,747,667		$539,400		$0	$0		$2,457,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																						$7,747,667	$1,239,700			$7,747,667	$310,000			$9,212,000	$368,700			$7,747,667		$539,400		$0	$0		$2,457,800
1	CC	1006516356	CARDONA LEIDER	X																230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,844,000	$73,800	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$478,200
2	CE	5386773	MOSQUEDA DIOSNELL									X								230301	30	$1,611,000	$257,800	EPS037	30	$1,611,000	$64,500	CCF34	30	$1,611,000	$64,500	14-4	30	$1,611,000	6.960%	$112,200	30	$0	$0	SI	$499,000
3	CC	1117529828	MURCIA JONATHAN	X																230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$2,209,000	$88,400	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$492,800
4	CC	91447961	PEÑA MARTIN	X																230301	29	$1,546,667	$247,500	EPS005	29	$1,546,667	$61,900	CCF34	29	$1,958,000	$78,400	14-4	29	$1,546,667	6.960%	$107,700	29	$0	$0	SI	$495,500
5	CC	86053821	VILLALBA FRANCISCO									X								230201	30	$1,590,000	$254,400	EPS005	30	$1,590,000	$63,600	CCF34	30	$1,590,000	$63,600	14-4	30	$1,590,000	6.960%	$110,700	30	$0	$0	SI	$492,300
Total			Afiliados(5)																			$7,747,667	$1,239,700			$7,747,667	$310,000			$9,212,000	$368,700			$7,747,667		$539,400		$0	$0		$2,457,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900803958	1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	EQUIPOS	cra7 No. 51-75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6401500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	650568602	9466693077	E	2024/05/16	2024/05/20	BANCOLOMBIA	4	$2,466,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,239,700	$4,100	$0	$1,243,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$985,300	$3,200	$0	$988,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$254,400	$900	$0	$255,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$539,400	$1,800	$0	$541,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$539,400	$1,800	$0	$541,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$368,700	$1,200	$0	$369,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$368,700	$1,200	$0	$369,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$310,000	$1,200	$0	$311,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$60,000	$200	$0	$60,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$64,500	$300	$0	$64,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$200	$0	$60,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$125,500	$500	$0	$126,000
TOTAL				5	$2,457,800	$8,300	$0	$2,466,100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

19801

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	86048539-8	jesus ivan tautiva dueñas	calle39 c 25-36	6646919	jtautivad@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E		76967452	$9.554.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	128.400	0		0		0	0	0	0	128.400	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	185.600	0		0		0	0	0	0	185.600	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.300	0		0		0	0	0	0	180.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	66.000	0		0		0	0	0	0	66.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	414.400	0		0		0	0	0	0	414.400	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	527.000	0	0	0	0	0	0		527.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	3.578.100	0	0	0	0	0	0		3.578.100	21
230901	Old Mutual	800253055-2	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.148.300				2.148.300	0	0	2.148.300			21.483	2.148.300	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.234.700	0	0	1.234.700	28

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

17802

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	86048539-8	jesus ivan tautiva dueñas		calle39 c 25-36	6646919	jtautivad@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E		76967452	$9.554.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.234.700	1.234.700
Pensión	5	4.937.100	4.937.100
Riesgos Laborales	1	2.148.300	2.148.300
CCF	1	1.234.700	1.234.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	9.554.800	9.554.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

17803

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	86048539-8	jesus ivan tautiva dueñas	calle39 c 25-36	6646919	jtautivad@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E		76967452	$9.554.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Estrato	Extranjero	Colom. exterior	Suspendido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006810122	MEDINA VILLAMOR GILBER DUBEY	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1090378623	FISCAL CONTRERAS CARLOS EVER	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	11791906	QUEJADA VALOYES HECTOR MANUEL	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	14568331	FRANCO LOPEZ EDISON ALBERTO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	17330024	PEREZ PEÑA ANGEL LIBARDO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	86088695	REYES CHACON JESUS ANIBAL	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1033714256	MORENO PALOMEQUE JUAN CARLOS	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	70257108	ALVAREZ MESA WILMAR ALBERTO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1121946169	VASQUEZ TAUTIVA DIEGO FERNANDO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1090490036	MOZO CANTILLO YAMID	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	1006440638	CUERVO TORO WILFREDO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	11801917	PALACIOS PEREZ EBER WILINTON	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	1122918439	CUBILLOS GOMEZ JULIAN ANDRES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	86041465	TRUJILLO FRANCO CARLOS ENRIQUE	1	0			S																230901	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	1121938887	RAMIREZ RODRIGUEZ NICOLAS	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	1010166547	BONILLA PALACIOS JHON FREDYS	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	1007702898	ARACU RODRIGUEZ MARCO AURELIO	1	0			S	X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS037	1.213.334	48.600	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF34	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
18	CC	1121923096	CHISCO GUTIERREZ JHON ESTIBER	1	0			S	X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	CCFC55	1.213.334	48.600	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF34	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
19	PT	6134927	APOLINAR SANDIA JACKSON DANIEL	1	0			S	X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS017	1.213.334	48.600	14-23	1.213.334	5	84.500	CCF34	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
20	CC	1073322160	JIMENEZ BUITRAGO HENRY ELLISES	1	0			S	X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	27.800	14-23	693.334	5	48.300	CCF34	693.334	27.800	0	0	0	0	0
21	PT	1139837	PERAZA VARGAS JONATHAN JESUS	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	PT	5765336	ESTANGA VARGAS LUIS DAVID	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
23	CC	86012683	FANDIÑO BEDOYA ANGEL ALBERTO	1	0			S	X															230201	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	27.800	14-23	693.334	5	48.300	CCF34	693.334	27.800	0	0	0	0	0
24	CC	93335916	PEÑALOZA GARCIA JOSE DANIEL	1	0			S	X															230301	693.334	111.000	0	0	0	0	CCFC55	693.334	27.800	14-23	693.334	5	48.300	CCF34	693.334	27.800	0	0	0	0	0
25	CC	77156378	DAZA LIZARAZO RAFAEL ENRIQUE	1	0			S	X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS002	650.000	26.000	14-23	650.000	5	45.300	CCF34	650.000	26.000	0	0	0	0	0
26	CC	1069844826	CUERVO TORO WILFRAN	1	0			S	X															230301	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS005	606.667	24.300	14-23	606.667	5	42.300	CCF34	606.667	24.300	0	0	0	0	0
27	PT	5302146	PEROSA SERRANO JESUS MARCIAL	1	0			S		X														230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF34	43.334	1.800	0	0	0	0	0
28	CC	1121842589	CARDENAS GAVIRIA LUIS FREIMAN	1	0			S		X														230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS017	433.334	17.400	14-23	433.334	5	30.200	CCF34	433.334	17.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

17804

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901208583	5	EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	Cll 161A8B17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2326448	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	655832388	9467516484	E	2024/05/22	2024/05/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,296,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (14 Afiliados)																							$13,873,336	$2,220,000			$13,873,336	$555,200			$13,873,336	$555,200			$13,873,336	$966,100			$0	$0		$4,296,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (8 Afiliados)																							$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800			$0	$0		$2,053,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																							$6,630,002	$1,061,000			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$265,400			$6,630,002	$461,800			$0	$0		$2,053,600
1	CC	1003889275	BENITEZ STIVEN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1129485438	GONZALEZ SIXTO		X																23020 1	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
3	CC	1075021983	MENA BREINER																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1076819835	MOSQUERA JHON		X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
5	CC	1003889271	MOSQUERA YASER																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	1032366062	PLATA CARLOS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	11804996	RAMIREZ WILLINTON																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	16161824	TABARES PEDRO	X	X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																							$7,243,334	$1,159,000			$7,243,334	$289,800			$7,243,334	$289,800			$7,243,334	$504,300			$0	$0		$2,242,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$7,243,334	$1,159,000			$7,243,334	$289,800			$7,243,334	$289,800			$7,243,334	$504,300			$0	$0		$2,242,900
9	CC	1003912623	GIL MARLON		X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
10	CC	80091312	RIAÑO JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	CC	80872810	RIVERA JULIAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
12	CC	80087162	TORRES DANIEL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	1001218821	TORRES JOSE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	1005701154	URREGO LEIDY																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
Total			**Afiliados(14)**																				$13,873,336	$2,220,000			$13,873,336	$555,200			$13,873,336	$555,200			$13,873,336	$966,100			$0	$0		$4,296,500

aportes en línea

Planilla Resumen

17805

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901208583	5	EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CIL 161A8B17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2326448	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	655832388	9467516484	E	2024/05/22	2024/05/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,296,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$2,220,000	$0	$0	$2,220,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,005,000	$0	$0	$2,005,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$215,000	$0	$0	$215,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$966,100	$0	$0	$966,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$966,100	$0	$0	$966,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$555,200	$0	$0	$555,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$555,200	$0	$0	$555,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$555,200	$0	$0	$555,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$187,600	$0	$0	$187,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$53,800	$0	$0	$53,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$53,800	$0	$0	$53,800
TOTAL				14	$4,296,500	$0	$0	$4,296,500

2024/05/22 04:02 PM

17806

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-17, 11:09:49 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1063521789

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 17/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCTORA DE INGENIERIA MYF SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901656321	**Dirección**	CL 34A SUR #07 - 52 BARRIO LA MACARENA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6667556		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal	LUIS EVELIO GUTIERREZ BOHORQUEZ	**Identificación**	CC 7232502		
Total Afiliados	2	**ARP**	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 17339841	CARLO JULIO OVIEDO PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) CAJA COPI EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF34) COFREM	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 2.600.000	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500	$ 0	$ 402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

17 807

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-13, 08:38:48 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1062407368

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 13/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRARAS		
Documento	CC17335203	**Dirección**	CL 40A #20 - 23
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3142869567
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 17335203	LUIS ALEJANDRO ARCE CONTRERAS	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000	$ 0	$ 461.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

17808

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17330776		MORALES ROJAS JAIRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JAIRO MORALES ROJAS	CALLE 4 # 34B-27 BARRIO LAS ACACIAS	VILLAVICENCIO-META	6831896	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	624680486	9466765361	E	2024/05/21	2024/05/07	BANCO DE BOGOTA	0	$2,739,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121926086	ARANGO JOHAN	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF34	25	$833,334	$33,400	14-23	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
2	CC	1007812648	CARDENAS MARIO	230301	5	$216,667	$34,700	CCFC55	5	$216,667	$8,700	CCF34	5	$151,421	$6,100	14-23	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
3	CC	1006875349	FIGUEREDO CRISTIAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS017	8	$346,667	$13,900	CCF34	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
4	CC	40368587	LINCE ITALIA	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF34	8	$346,667	$13,900	14-23	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
5	CC	1121824731	MORALES JAIRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1125548853	PEÑA ALEXIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	1122653715	RAMIREZ JOAN	230201	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF34	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
8	CC	17331765	RINCON PEDRO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	17315144	SANCHEZ JESUS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	5654221	SANCHEZ LEONIDAS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$8,276,669	$1,324,500			$9,576,669	$383,300			$9,121,423	$365,100			$9,576,669	$667,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,324,500	$0	$0	$1,324,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$263,500	$0	$0	$263,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$887,600	$0	$0	$887,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$173,400	$0	$0	$173,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$667,000	$0	$0	$667,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$667,000	$0	$0	$667,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$365,100	$0	$0	$365,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	$365,100	$0	$0	$365,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$383,300	$0	$0	$383,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$8,700	$0	$0	$8,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$13,900	$0	$0	$13,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$95,400	$0	$0	$95,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$43,400	$0	$0	$43,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$169,900	$0	$0	$169,900
TOTAL				10	$2,739,900	$0	$0	$2,739,900

2024/05/24 09:12 AM

17809

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-03, 10:27:36 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70505117

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 03/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BUENOS AIRES SERVICENTRO		
Documento	NI901156904	**Dirección**	DIAGONAL 74D # 32 bb 25
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5088824
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CELIS BEDOYA LILIANA DELSOCORRO	**Identificación**	CC 42679338
Total Afiliados	15	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDF	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001762669	CAROLINA RUEDA OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1007508145	CRISTIAN BENITEZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1013342228	ANDRES ESTEBAN OQUENDO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	2,436	$ 2.000.000	$ 48.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.800
CC 1045047153	EDILSON ALBERTO GONZALEZ CEBALLOS	01	00	X																0	19	19	19	19	(231001) COLFONDOS	$ 924.667	$ 148.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 924.667	$ 37.000	6,960	$ 924.667	$ 64.400	(CCF04) COMFAMA	$ 924.667	$ 37.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.400
CC 1048033715	RODRIGO ALEJANDRO CANO BERMUDEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 632.667	$ 101.300	(EPS010) EPS SURA	$ 632.667	$ 25.400	6,960	$ 632.667	$ 44.100	(CCF04) COMFAMA	$ 632.667	$ 25.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200
CC 1048017694	DIEGO ALBERTO URREGO GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1048019789	JHONATAN MONTOYA MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1085041847	RICARDO JOSE PALMERA ARRIETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 15455699	OSCAR DE JESUS DEOSSA TORRES	01	00	X	X															0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.667	$ 77.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 466.667	$ 19.500	6,960	$ 466.667	$ 33.900	(CCF04) COMFAMA	$ 466.667	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.800
CC 19483699	ALQUIVAR MONTOYA NAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 43340808	BEATRIZ ELENA ARIAS LORA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 43345757	CLAUDIA ANDREA LAYOS LAVERDE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 71393560	JHON ROBERT DE JESUS ROJAS GUTIERREZ	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 97.334	$ 15.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 97.334	$ 3.900	6,960	$ 97.334	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 97.334	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.200
CC 8397944	JHON JAIRO LONDOÑO JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
PT 6627639	JOSE EMMANUEL CUAITA GONZALEZ	01	00		X															0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 535.334	$ 85.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 535.334	$ 21.500	6,960	$ 535.334	$ 37.300	(CCF04) COMFAMA	$ 535.334	$ 21.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1A810

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.076.669	$ 17.076.669	$ 17.076.669	$ 17.076.669	$ 2.732.500	$ 683.300	$ 720.800	$ 683.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.819.900	$ 0	$ 4.819.900

13811

ANEXO. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 04-04-2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Martin Peña Arias

CARGO: Operador de Planta

Marque con una X los elementos de dotación entregados.

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
☐	Casco de Seguridad		☐	Protectores auditivos	
☐	Botas de Seguridad de material		☐	Guantes de carnaza	
☐	Botas de caucho		☐	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
☐	Traje impermeable		☐	Tapabocas	
☐	Monogafas		☐	Guantes de Caucho	
☑	Pantalón	01	☐	Máscara de doble filtro	
☑	Camisa	01	☐	Delantal de caucho	
☐	Guantes de Punto de PVC, una cara		☐	Overol de dos piezas	
☐	Otros, Cuales?				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

MARTIN PEÑA
Firma del trabajador
N° CC. 91447961

Camilo Gomez
Firma quien entrega:
Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

1363

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 04-04/2024 PROYECTO: EE-201 Colegio Alfonso L.

EMPLEADO: Jeider Cardona Barrera.

CARGO: Operador Minicargador.

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
	Casco de Seguridad			Protectores auditivos	
	Botas de Seguridad de material			Guantes de carnaza	
	Botas de caucho			Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
	Traje impermeable			Tapabocas	
	Monogafas			Guantes de Caucho	
X	Pantalón	01		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	01		Delantal de caucho	
	Guantes de Punto de PVC, una car	1		Overol de dos piezas	
	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 1006516356

Camilo Gomez

Firma quién entrega:

Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCACIÓN CCGMVH

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 04-04/2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Brayan Snaider Urquiza Barrera

CARGO: Ayudante de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
X	Casco de Seguridad	1		Protectores auditivos	
	Botas de Seguridad de material			Guantes de carnaza	
	Botas de caucho			Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
	Traje impermeable			Tapabocas	
	Monogafas			Guantes de Caucho	
X	Pantalón	01		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	01		Delantal de caucho	
	Guantes de Punto de PVC, una cara	1		Overol de dos piezas	
	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Brayan U. B.
Firma del trabajador
N° CC. 1193089901

Camilo Gomez
Firma quién entrega:
Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 15-04/2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Diana C Vega C

CARGO: Profesional SST

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[ ]	Casco de Seguridad		[ ]	Protectores auditivos	
[X]	Botas de Seguridad de material	01	[ ]	Guantes de carnaza	
[ ]	Botas de caucho		[ ]	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
[ ]	Traje impermeable		[ ]	Tapabocas	
[ ]	Monogafas		[ ]	Guantes de Caucho	
[ ]	Pantalón		[ ]	Máscara de doble filtro	
[ ]	Camisa		[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 1017089.

Camilo Gomez

Firma quién entrega:

Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCACIÓN CGGMH

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 18 Abril - 2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Yeison Esneyder Gomez Guerrero

CARGO: Director de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[ ]	Casco de Seguridad		[ ]	Protectores auditivos	
[ ]	Botas de Seguridad de material		[ ]	Guantes de carnaza	
[ ]	Botas de caucho		[ ]	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
[ ]	Traje impermeable		[ ]	Tapabocas	
[ ]	Monogafas		[ ]	Guantes de Caucho	
[ ]	Pantalón		[ ]	Máscara de doble filtro	
[X]	Camisa	02	[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador
N° CC. 86051263V1610

Camilo Gomez
Firma quien entrega:
Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCACIÓN CSGMH

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 18-Abril-2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Arnold Rodriguez Sierra

CARGO: Ing. Residente

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[ ]	Casco de Seguridad		[ ]	Protectores auditivos	
[ ]	Botas de Seguridad de material		[ ]	Guantes de carnaza	
[X]	Botas de caucho	1	[ ]	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
[ ]	Traje impermeable		[ ]	Tapabocas	
[ ]	Monogafas		[ ]	Guantes de Caucho	
[ ]	Pantalón		[ ]	Máscara de doble filtro	
[ ]	Camisa		[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador
N° CC. 1070506746

Camilo Gomez
Firma quién entrega:
Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCACIÓN CSG MH

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 23-04-2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Bryan S. Urquiza

CARGO: Ay de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
☐	Casco de Seguridad	1	☐	Protectores auditivos	
☐	Botas de Seguridad de material		☐	Guantes de carnaza	
☐	Botas de caucho		☐	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
☐	Traje impermeable		☐	Tapabocas	
☐	Monogafas		☐	Guantes de Caucho	
☑	Pantalón	01	☐	Máscara de doble filtro	
☐	Camisa		☐	Delantal de caucho	
☐	Guantes de Punto de PVC, una cara		☐	Overol de dos piezas	
☐	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Bryan U B.
Firma del trabajador
N° CC. 1193087791.

Camilo Gomez
Firma quién entrega:
Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

ANEXO. EXAMEN MÉDICO DE INGRESO

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-16

Nombres y apellidos: ANGEL ALBERTO FANDIÑO BEDOYA **CC:** 86012883
Fecha de nacimiento: 10/04/1982 **Edad:** 42 **Sexo:** MASCULINO
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN **Fecha ingreso:** 2024-04-16 / 07:04:10
Empresa usuaria: **Fecha salida:** 2024-04-16 / 10:08:48
Cargo: OFICIAL



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
- VISIOMETRIA
- PERFIL LIPIDICO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CONDICIÓN VISUAL:
CONDICIÓN AUDITIVA:
CARDIOVASCULAR:

RECOMENDACIONES:
ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: MEDICINA GENERAL
VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: REQUIERE CORRECCIÓN ÓPTICA DE USO OCASIONAL, CUANDO REALICE ACTIVIDADES EN VISIÓN PRÓXIMA.

OTRAS:: -USO OBLIGATORIO DE EPP AUDITIVO.
-REALIZAR REPOSO AUDITIVO DESPUÉS DEL TRABAJO MÍNIMO 8 HORAS.
-REALIZAR EXÁMEN AUDITIVO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL POR MEDIO DE SU EPS.

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

RICARDO MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

ANGEL ALBERTO FANDIÑO
BEDOYA
CC: 86012883
Firma del paciente

Sedes Bogotá

Principal - Centro - Connecta 26 - Norte 106 - Norte 83 - Norte 86 - Occidente 1 - Occidente 2 - Sur 1 - Sur 2 - Zona Franca Fontibón

Sedes Nacionales

Barranquilla - Bello - Bucaramanga - Buenaventura - Cajicá - Cali Éxito San Fernando - Cali La Flora - Cali Versalles - Cartagena - Ibagué - Manizales - Medellín Aguacatala - Medellín Alpujarra - Medellín La América - Montería - Pereira - Santa Marta - Villavicencio

1982

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-16

Nombres y apellidos: ANGEL ALBERTO FANDIÑO BEDOYA **CC:** 86012883
Fecha de nacimiento: 10/04/1982 **Edad:** 42 **Sexo:** MASCULINO
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN **Fecha ingreso:** 2024-04-16 / 10:09:27
Empresa usuaria: **Fecha salida:** 2024-04-16 / 10:09:27
Cargo: OFICIAL



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
- VISIOMETRIA
- PERFIL LIPIDICO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES

:

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

RICARDO MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

Angel F B.

ANGEL ALBERTO FANDIÑO BEDOYA
CC: 86012883
Firma del paciente

Cendiatra

17823

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-16

Nombres y apellidos: ANGEL ALBERTO FANDIÑO BEDOYA **CC:** 86012883
Fecha de nacimiento: 10/04/1982
Edad: 42 **Sexo:** MASCULINO
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Fecha ingreso: 2024-04-16 / 07:04:10
Empresa usuaria:
Fecha salida: 2024-04-16 / 10:08:48
Cargo: OFICIAL



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: MEDICINA GENERAL
2. VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: REQUIERE CORRECCIÓN ÓPTICA DE USO OCASIONAL, CUANDO REALICE ACTIVIDADES EN VISIÓN PRÓXIMA.
3. OTRAS:: -USO OBLIGATORIO DE EPP AUDITIVO. -REALIZAR REPOSO AUDITIVO DESPUÉS DEL TRABAJO MÍNIMO 8 HORAS. -REALIZAR EXÁMEN AUDITIVO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ANUAL POR MEDIO DE SU EPS.

RICARDO MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

ANGEL ALBERTO FANDIÑO
BEDOYA
CC: 86012883
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

17824

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-03-18

Nombres y apellidos: CARLOS ENRIQUE TRUJILLO FRANCO
Fecha de nacimiento: 26/11/1972
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

CC: 86041465
Edad: 51 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-03-18 / 08:50:44
Fecha salida: 2024-03-18 / 10:56:47



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
- VISIOMETRIA
- PERFIL LIPIDICO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CONDICIÓN VISUAL:
CONDICIÓN AUDITIVA:

RECOMENDACIONES:
VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: CONTROLES ANUALES.
OTRAS:: CONTROLES ANUALES POR AUDIOMETRIA.

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

Dra. Johana Diaz
Medico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo
Resolucion 3462 / 2016

JOHANA MARCELA DIAZ GARZON
RM: 81286-2010
Firma y sello del médico

CARLOS ENRIQUE TRUJILLO FRANCO
CC: 86041465
Firma del paciente

Cendiatra

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-03-18

Nombres y apellidos: CARLOS ENRIQUE TRUJILLO FRANCO
Fecha de nacimiento: 26/11/1972
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

CC: 86041465
Edad: 51 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-03-18 / 08:50:44
Fecha salida: 2024-03-18 / 10:56:47



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: CONTROLES ANUALES.
2. OTRAS:: CONTROLES ANUALES POR AUDIOMETRIA.

Dra. Johana Díaz
Médico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo
Resolución 3482 - 2016

JOHANA MARCELA DIAZ GARZON
RM: 81286-2010
Firma y sello del médico

CARLOS ENRIQUE TRUJILLO FRANCO
CC: 86041465
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

19826

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-02

Nombres y apellidos: JESUS MARCIAL PEROSA SERRANO
PE: 5302346
Fecha de nacimiento: 16/04/1970
Edad: 54 **Sexo:** MASCULINO
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Fecha ingreso: 2024-04-02 / 12:10:30
Empresa usuaria:
Fecha salida: 2024-04-02 / 12:10:40
Cargo: OBRERO



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

RECOMENDACIONES:
NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

Dra. Johana Diaz
Medico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo
Resolución 3492 - 2016

JOHANA MARCELA DIAZ GARZON
RM: 81286-2010
Firma y sello del médico

JESUS MARCIAL PEROSA SERRANO
PE: 5302346
Firma del paciente

Cendiatra

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-02

Nombres y apellidos: JESUS MARCIAL PEROSA SERRANO
PE: 5302346
Fecha de nacimiento: 16/04/1970
Edad: 54 **Sexo:** MASCULINO
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Fecha ingreso: 2024-04-02 / 12:10:30
Empresa usuaria:
Fecha salida: 2024-04-02 / 12:10:40
Cargo: OBRERO



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

Dra. Johana Diaz
Medico especialista en pericia en seguridad y salud en el trabajo
Resolucion 3482 : 2016

JOHANA MARCELA DIAZ GARZON
RM: 81286-2010
Firma y sello del médico

JESUS MARCIAL PEROSA SERRANO
PE: 5302346
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO | **DIRECCIÓN:**Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto | **CIUDAD DE LA SEDE:** VILLAVICENCIO

TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915 | **EMAIL:** citas.villavicencio@cendiatra.com | **FECHA EXAMEN:** 2024-04-15

Nombres y apellidos: JOSE DANIEL PEÑALOZA GARCIA
Fecha de nacimiento: 13/03/1964
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo:OFICIAL

CC: 93335916
Edad: 60 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-04-15 / 09:46:02
Fecha salida: 2024-04-15 / 09:46:02



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
- VISIOMETRIA
- PERFIL LIPIDICO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APLAZADO

:

RESTRICCIONES:
TIPO RESTRICCIÓN: VISUAL Y AUDITIVA
DURACIÓN DE RESTRICCIÓN: RESTRICCIÓN TEMPORAL
ASISTIR A CONTROL CON CORRECCIÓN VISUAL ACTUALIZADA PARA EVALUAR RETIRO DE APLAZAMIENTO
ASISTIR A CONTROL CON CONCEPTO DE MEDICINA GENERAL EPS (RESTRICCION AUDITIVA)

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

RICARDO MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

JOSE DANIEL PEÑALOZA GARCIA
CC: 93335916
Firma del paciente

Cendiatra

13829

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-15

Nombres y apellidos: JOSE DANIEL PEÑALOZA GARCIA
Fecha de nacimiento: 13/03/1964
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo: OFICIAL

CC: 93335916
Edad: 60 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-04-15 / 07:50:05
Fecha salida: 2024-04-15 / 09:44:31



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- VISIOMETRIA
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
- PERFIL LIPIDICO
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: CON RESTRICCIONES TEMPORALES PARA EL CARGO

:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CONDICIÓN VISUAL:
CONDICIÓN AUDITIVA:
CARDIOVASCULAR:

RESTRICCIONES:
TIPO RESTRICCIÓN: VISUAL
DURACIÓN DE RESTRICCIÓN: RESTRICCIÓN TEMPORAL
ASISTIR A CONTROL CON CORRECCIÓN VISUAL ACTUALIZADA PARA EVALUAR RETIRO DE APLAZAMIENTO

RECOMENDACIONES:
ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: MEDICINA GENERAL
NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:
VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: REQUIERE USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PERMANENTE
OTRAS:: -USO OBLIGATORIO DE EPP AUDITIVO.
-REALIZAR REPOSO AUDITIVO DESPUÉS DEL TRABAJO MÍNIMO 8 HORAS.
-SE SUGIERE, ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR MEDICINA GENERAL (OTORRINOLARINGOLOGÍA / AUDIOLOGÍA).
-SE SUGIERE, EXÁMENES AUDIOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS COMO MEDIDA DIAGNÓSTICO/PREVENTIVO.

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

RICARDO MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

JOSE DANIEL PEÑALOZA GARCIA
CC: 93335916
Firma del paciente

17830

17831

Cendiatra

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-15

Nombres y apellidos: JOSE DANIEL PEÑALOZA GARCIA
Fecha de nacimiento: 13/03/1964
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo: MAESTRO

CC: 93335916
Edad: 60 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-04-15 / 07:50:05
Fecha salida: 2024-04-15 / 09:44:31



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR:: MEDICINA GENERAL
2. NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:
3. VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: REQUIERE USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PERMANENTE
4. OTRAS:: -USO OBLIGATORIO DE EPP AUDITIVO. -REALIZAR REPOSO AUDITIVO DESPUÉS DEL TRABAJO MÍNIMO 8 HORAS. -SE SUGIERE, ACUDIR A CONSULTA MÉDICA EN SU EPS PARA MANEJO Y CONTROL POR MEDICINA GENERAL (OTORRINOLARINGOLOGÍA / AUDIOLOGÍA). -SE SUGIERE, EXÁMENES AUDIOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS COMO MEDIDA DIAGNÓSTICO/PREVENTIVO.

RICARDO MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

JOSE DANIEL PEÑALOZA GARCIA
CC: 93335916
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Cendiatra

12832

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-03-26

Nombres y apellidos: LUIS FREIMAN CARDENAS GAVIRIA **CC:** 1121842589
Fecha de nacimiento: 04/12/1987 **Edad:** 36 **Sexo:** MASCULINO
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN **Fecha ingreso:** 2024-03-26 / 02:32:17
Empresa usuaria: **Fecha salida:** 2024-03-26 / 02:36:04
Cargo: OPERADOR DE RETROESCAVADORA



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

RECOMENDACIONES:
NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

Dra. Johana Diaz
Médico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo
Resolución 3462 - 2016

JOHANA MARCELA DIAZ GARZON
RM: 81286-2010
Firma y sello del médico

LUIS FREIMAN CARDENAS GAVIRIA
CC: 1121842589
Firma del paciente

Cendiatra

12833

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-03-26

Nombres y apellidos: LUIS FREIMAN CARDENAS GAVIRIA
CC: 1121842589
Fecha de nacimiento: 04/12/1987
Edad: 36 **Sexo:** MASCULINO
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Fecha ingreso: 2024-03-26 / 02:32:17
Empresa usuaria:
Fecha salida: 2024-03-26 / 02:36:04
Cargo: OPERADOR DE RETROESCAVADORA



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. NUTRICIONALES - CAMBIOS DE ESTILOS DE VIDA:

Dra. Johana Diaz
Medico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo
Resolucion 3482 - 2010

JOHANA MARCELA DIAZ GARZON
RM: 81286-2010
Firma y sello del médico

LUIS FREIMAN CARDENAS GAVIRIA
CC: 1121842589
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Cendiatra

1834

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-05

Nombres y apellidos: MARCO AURELIO ARACU RODRIGUEZ
Fecha de nacimiento: 04/01/2001
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

CC: 1007702898
Edad: 23 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-04-05 / 08:55:47
Fecha salida: 2024-04-06 / 09:55:13



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- VISIOMETRIA
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
- PERFIL LIPIDICO
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CONDICIÓN VISUAL:
CONDICIÓN AUDITIVA:

RECOMENDACIONES:
VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: EN SU EPS.
OTRAS:: CONTROLES ANUALES POR AUDIOMETRIA.

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

Dra. Johana Diaz
Medico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo
Resolución 3482 - 2016

JOHANA MARCELA DIAZ GARZON
RM: 81286-2010
Firma y sello del médico

MARCO AURELIO ARACU RODRIGUEZ
CC: 1007702898
Firma del paciente

Cendiatra

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-05

Nombres y apellidos: MARCO AURELIO ARACU RODRIGUEZ
Fecha de nacimiento: 04/01/2001
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

CC: 1007702898
Edad: 23 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-04-05 / 08:55:47
Fecha salida: 2024-04-06 / 09:55:13



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: EN SU EPS.
2. OTRAS:: CONTROLES ANUALES POR AUDIOMETRIA.

Dra. Johana Diaz
Médico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo
Resolución 3462 - 2016

JOHANA MARCELA DIAZ GARZON
RM: 81286-2010
Firma y sello del médico

MARCO AURELIO ARACU RODRIGUEZ
CC: 1007702898
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

Cendiatra

17836

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-13

Nombres y apellidos: WILFRAN CUERVO TORO
Fecha de nacimiento: 29/11/1982
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo: OFICIAL

CC: 1058844826
Edad: 41 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-04-13 / 07:59:52
Fecha salida: 2024-04-13 / 10:23:50



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
- VISIOMETRIA
- PERFIL LIPIDICO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

:

SE SUGIERE CONTROL PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:
CONDICIÓN VISUAL:

RECOMENDACIONES:
VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: REQUIERE CORRECCIÓN ÓPTICA DE USO OCASIONAL, CUANDO REALICE ACTIVIDADES EN VISIÓN PRÓXIMA.

La presente certificación se expide en base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009. Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización del contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

RICARDO MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

WILFRAN CUERVO TORO
CC: 1058844826
Firma del paciente

17837

Cendiatra

CERTIFICADO EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-13

Nombres y apellidos: WILFRAN CUERVO TORO
Fecha de nacimiento: 29/11/1982
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo: OFICIAL

CC: 1058844826
Edad: 41 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-04-13 / 10:24:14
Fecha salida: 2024-04-13 / 10:24:14



EXÁMENES REALIZADOS

- EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
- GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
- VISIOMETRIA
- PERFIL LIPIDICO
- AUDIOMETRIA OCUPACIONAL
- EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO

CONCEPTO DE APTITUD: APTO Y SIN RESTRICCIONES

:

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST. La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constatar quien presento la valoración.

RICARDO MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

WILFRAN CUERVO TORO
CC: 1058844826
Firma del paciente

Cendiatra

19838

RECOMENDACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

SEDE: CENDIATRA VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN: Avenida 40 # 27-63, 7 de Agosto
CIUDAD DE LA SEDE: VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 6086740689 - 6086740915
EMAIL: citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA EXAMEN: 2024-04-13

Nombres y apellidos: WILFRAN CUERVO TORO
Fecha de nacimiento: 29/11/1982
Empresa: TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN
Empresa usuaria:
Cargo: OFICIAL

CC: 1058844826
Edad: 41 **Sexo:** MASCULINO
Fecha ingreso: 2024-04-13 / 07:59:52
Fecha salida: 2024-04-13 / 10:23:50



Las presentes recomendaciones se expiden con base a su historial clínico ocupacional.
Recomendaciones generales, laborales y extralaborales:

1. VALORACIÓN OPTOMÉTRICA: REQUIERE CORRECCIÓN ÓPTICA DE USO OCASIONAL, CUANDO REALICE ACTIVIDADES EN VISIÓN PRÓXIMA.

RICARDO MENDOZA PATERNINA
RM: 73188203
Firma y sello del médico

Wilfran Cuervo

WILFRAN CUERVO TORO
CC: 1058844826
Firma del paciente

Firma responsable del SG-SST de la empresa.

INTEGRAR SALUD Y SEGURIDAD S.A.S.

No. Identificación	901200839-9
Dirección:	CALLE 15 N° 37L 10 ET 8 B. ESPERANZA
Telefono:	6668018-3176678051
Email:	gerencia@integrarips.com

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL con enfasis en ANEXO OSTEOMUSCULAR

Información General



Fecha Impresión:	VILLAVICENCIO - 2024/04/08	Nro Ingreso:	20240408020110
Paciente:	PABLO JOSE WILCHES CRUZ	CC:	1121894458
Edad:	31 años	Nombre Cliente:	PARTICULAR
Género:	Masculino	Tipo Evaluación:	Ingreso
Cargo:	TOPOGRAFO		
Orígen:	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA	Destino:	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA
Fecha Salida:	2024-04-08 14:13:28	Fecha Atención:	2024-04-08 14:11:29

Pruebas de Apoyo Diagnóstico

PARACLINICOS **LABORATORIO CLINICO** **COMPLEMENTARIOS** **VACUNAS**

Certificacion de Aptitud

CONCEPTO - EXAMEN INGRESO:	APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
OBSERVACIONES AL CONCEPTO:	SIN OBSERVACIÓN
ENFASIS - ANEXO OSTEOMUSCULAR:	Definicion de caso para el SVE desordenes Osteomusculares **CASO DESCARTADO**

Recomendaciones Generales

Examen Periodico Ocupacional	Realizacion Pruebas Complementarias	Continuar Manejo Medico
Pausas Activas	Uso de E.P.I.	
Higiene Postural	Remitir a EPS	

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

Recomendaciones Específicas

Tipo Limitación: ninguna

Observación: HABITOS DE VIDA SALUDABLE, CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA BAJAR DE PESO. EVITAR CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN GRASA, HARINAS Y AZUCARES. REALIZAR ACTIVIDAD FISICA MINIMO 1 HORA DIARIA TRES VECES POR SEMANA.

Autorizo la realización de exámenes ocupacionales según consentimiento informado y política de protección de datos diligenciadas en el autoreporte de condiciones de salud que previamente firme. La firma del paciente referida en este documento es imagen extraída del consentimiento informado y política de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos y paraclínicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presento y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de INTEGRAR SALUD Y SEGURIDAD S.A.S..

Profesional Ocupacional: RUBEN IVAN MARTINEZ LOBO 0
Registro M.D: 688591999
Licencia S.O: 7407-21

Firma del Paciente: PABLO JOSE WILCHES CRUZ
Identificacion: CC. - 1121894458

Todos los derechos reservados - www.innovasoftcol.com

INTEGRAR SALUD Y SEGURIDAD S.A.S.

No. Identificación	901200839-9
Dirección:	CALLE 15 N° 37L 10 ET 8 B. ESPERANZA
Telefono:	6668018-3176678051
Email:	gerencia@integrarips.com

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL con enfasis en ANEXO PARA TRABAJO EN ALTURAS,ANEXO OSTEOMUSCULAR

17840

Información General



Fecha impresión:	VILLAVICENCIO - 2024/04/09	Nro Ingreso:	20240408020111
Paciente:	FABER ANDRES RODRIGUEZ NUÑEZ	CC:	1121860237
Edad:	34 años	Nombre Cliente:	PARTICULAR
Género:	Masculino	Tipo Evaluación:	Ingreso
Cargo:	CADENERO		
Orígen:	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA	Destino:	RAUL ALBERTO VELASCO AVILA
Fecha Salida:	2024-04-09 14:45:27	Fecha Atención:	2024-04-08 14:15:32

Pruebas de Apoyo Diagnóstico

PARACLINICOS	LABORATORIO CLINICO	COMPLEMENTARIOS	VACUNAS
AUDIOMETRIA OPTOMETRIA	GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA PERFIL LIPIDICO		

Certificacion de Aptitud

CONCEPTO - EXAMEN INGRESO:	APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
OBSERVACIONES AL CONCEPTO:	SIN OBSERVACIÓN
ENFASIS - ANEXO PARA TRABAJO EN ALTURAS:	Apto para trabajar en alturas **Nota:** Segun RESOLUCION 4272 DE 2021 expedida por el Ministerio de trabajo, en la cual se establece los requisitos minimos seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.
ENFASIS - ANEXO OSTEOMUSCULAR:	Definicion de caso para el SVE desordenes Osteomusculares **CASO DESCARTADO**

Recomendaciones Generales

Examen Periodico Ocupacional	Realizacion Pruebas Complementarias	Continuar Manejo Medico
Pausas Activas	Uso de E.P.I.	
Higiene Postural	Remitir a EPS	

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

Recomendaciones Específicas

Tipo Limitación: ninguna

Observación: VALORACION MEDICA EN EPS PARA MANEJO DE DISLIPIDEMIA. HABITOS DE VIDA SALUDABLE, CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA BAJAR DE PESO. EVITAR CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN GRASA, HARINAS Y AZUCARES. REALIZAR ACTIVIDAD FISICA MINIMO 1 HORA DIARIA TRES VECES POR SEMANA. REQUIERE USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PARA FIJACIÓN PROLONGADA (USO DE PC, CELULAR, LECTURA)

Autorizo la realización de exámenes ocupacionales según consentimiento informado y política de protección de datos diligenciadas en el autoreporte de condiciones de salud que previamente firme. La firma del paciente referida en este documento es imagen extraída del consentimiento informado y política de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos y paraclinicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presento y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de INTEGRAR SALUD Y SEGURIDAD S.A.S..

Faber Andres Rodriguez

Profesional Ocupacional: RUBEN IVAN MARTINEZ LOBO 0

Registro M.D: 688591999
Licencia S.O: 7407-21

Firma del Paciente: FABER ANDRES RODRIGUEZ NUÑEZ
Identificacion: CC. - 1121860237

Todos los derechos reservados - www.innovasoftcol.com

17842

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA CHARLAS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES.

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pamplona, 01/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Entrada del Tunel del Carpio DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega C	Consorcio Educacion C&G-MH	Profesional SST	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo. Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo G Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Brayan U.B	
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Martin Peña Arias	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Bomba Estacionaria	MARTIN PEÑA	
6	Brayan Stiven Herrera Hernandez	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
7	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingeniería S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Juan Eduardo Torres Traslaviña	Altara Ingeniería S.A.S	Ayudante de Bomba Estacionaria		
9	Carlos Islen Plata G.	Exvocol S.A.S	Operario de Explosivos	Carlos Plata G	
10	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
11	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	ANGELA O.	
12	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan M.	
13	Jose E Moreno	Fautsa	Pilero		
14	Edgar Palacio	Fautsa	Pilero		
15	Juan Cubillos	Fautsa	Ay Obra		
16	Bilba Medina	Fautsa	Ay Obra	- Cindy	
17	Jhon F Bonilla	Fautsa	Pilero		
18	Diego Vazquez	Fautsa	Ay Obra	Diego Vasquez T	
19	Hector Quesada	Fautsa	Oficial	HECTOR QUESADA	
20	Libardo Perez	Fautsa	Ay Obra	Angel P.	
21	Anibal Reyes	Fautsa	Maestro	Anibal Reyes	
22	Edison Franco	Fautsa	Maestro	Edison Franco	

* TOTAL PARTICIPANTES: 20

OBSERVACIONES:

* La calificación es diligenciada solamente para el personal capacitado presencialmente

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pompeya 01/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Sindrome del Tunel del Carpio DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCIÓN	☐	CHARLA/DIVULGACIÓN	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega C	Conforeo Educación C46-HH	Profesional SST	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Carlos E Fiscal	Fautus	Ay Obra.	Carlos Fiscal.	
2	Carlos E Trujillo	Fautus	Ay Obra		
3	Luis D Estruga	Fautus	Ay Obra	-Luis	
4	Jonathan Ortiz	Fautus	Ay Obra		
5	Wilmar Alvarez	Fautus	Fiero	Wilmar	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES: 05

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Tauramena, 02 Abril 2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Manejo Seguro de Herramientas manuales. DURACIÓN: 45 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐
CAPACITACIÓN	☐	REUNION	☐

OTRO/ CUAL? _____

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
22	Juana C Vega C	Consorcio Educación	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo. Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Martin Peña Arias	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Bomba Estacionaria	Martin Pena	
6	Brayan Stiven Herrera Hernandez	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
7	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingeniería S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Juan Eduardo Torres Traslaviña	Altara Ingeniería S.A.S	Ayudante de Bomba Estacionaria		
9	Carlos Islen Plata G.	Exvocol S.A.S	Operario de Explosivos	Carlos plata	
10	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
11	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Angela	
12	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Minicargador	Jonatan Murcia	
13	Jhon F Bonilla	Fautiz.	Pilero		
14	Nicolas Ramirez			Nicolas Ramirez	
15	Elar Palacios	Fautiz	Pilero		
16	Wilmar Alvarez	Fautiz	Pilero	Wilmar	
17	Juan C Moreno	Fautiz	Pilero		
18	Felizn Cabillos	Fautiz	Ay Obra	Julian.	
19	Hector Quesada	Fautiz	Oficial	Hector R Quesada	
20	Diego Vazquez	Fautiz	Ay Obra	Diego Vasquez T	
21	Edison Franco	Fautiz	Maestro	Edison Franco	
22	Gilbert Medina	Fautiz	Ayudante		

TOTAL PARTICIPANTES: 20

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pampa, 04 Abril 2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Manejo Seguro de Herramientas Manuales DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
2	Diana C Vega C	Contratación Educación CyG MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Luis D Estruga	Fautus	Ay Obra	Luis	
2	Jonathan Ortiz	Fautus	Ay Obra		
3	Luis F Coaduas	Fautus	Operario		
4	Carlos E Trujillo	Fautus	Ay Obra		
5	David Mozo	Fautus	Oficial	David	
6	Carlos E Fiscal	Fautus	Ay Obra	Carlos F	
7	Jesus Anibal Reyes	Fautus	Operario	Anibal Reyes	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES: 07

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Ramireza 03/Abril/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Riesgo Quimico: Material Particulado DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO ¿CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega C	Consorcio Educación C&G-MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
6	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial		
7	Martin Peña Arias	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Planta de Concreto	MARTIN PEÑA	
7	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingenieria S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Leider Cardona Barrera	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador		
9	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador	Thanolan Murcio.	
10	Francisco Javier Villalba Guayara	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
11	Carlos Islen Plata G.	Altara S.A.S	Operario de Explosivos		
12	Julian Cubillos	Tartus	Ay. Obra	Julian G.	
13	Jonathan Ortiz	Tartus	Ay Obra		
14	Luis D'Esteuga	Tartus	Ay Obra	Luis	
15	Carlos E Trujillo	Tartus	Ay Obra		
16	Gilbert Medina	Tartus	Ay Obra	Carl	
17	Diego Vazquez	Tartus	Ay Obra	Diego Vazquez	
18	Luis F Cardenas	Tartus	Op Retro		
19	Edison Franco	Tartus	Maestro	Edison Franco	
20	Yamid Moreno	Tartus	Oficial		
21	Eduardo Lopez	Tartus	Ay Obra	Angel Perez	

TOTAL PARTICIPANTES: 20

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pamplona 03/Abril/20 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Riesgo Químico: Material Particulado DURACIÓN: 45 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO ¿CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
2	Diana C Vega	Consorcio Educación C46-MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Hector Quezada	Fautrs	Oficial		
2	Wilfredo Cuervo	Fautrs	Ay Dor		
3	Anibal Reyes	Fautrs	Maestro		
4	Juan C Moreno	Fautrs	Fiero		
5	Nicolas Barrera	Fautrs	Ing Civil		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES: 05

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Tauramena, 04/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Protección Auditiva: Cuidado y Recomendaciones DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐

OTRO/ CUAL? _____

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
2	Diana C Vega C	Consorcio Educación C&G-MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo. Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Martin Peña Arias	Altara Ingeniera S.A.S	Operador de Bomba Estacionaria		
6	Brayan Stiven Herrera Hernandez	Altara Ingeniera S.A.S	Operador de Retroexcavadora	—	
7	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingeniera S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Juan Eduardo Torres Traslaviña	Altara Ingeniera S.A.S	Ayudante de Bomba Estacionaria	—	
9	Carlos Islen Plata G.	Exvocol S.A.S	Operario de Explosivos	Ya Está Registrado Ver Pagina 2.	
10	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
11	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Angela S	
12	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingeniera S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan Murcia	
13	Elisa Franco	Tautiva	Maestro		
14	Julian andres camilo gomez	Tautiva	Ayudante	Julian G	
15	Anapaola Paez	Tautiva	oficial	Ana	
16	Anibal Reyes	Tautiva	maestro	Anibal Reyes	
17	Wilfredo Gomez	tautiva	Ay Obra	Wilfredo Gomez	
18	aber wperez	contratista	piloto		
19	Jhon Fredy Bonilla	tautiva	Piloto	JFBP	
20	yilver medina	tautiva	Mandato	Cmy	
21	Carla E Fiscal C	Tautiva	Auxiliar	Carla Efi.	
22	Juan carlos ch	Tautiva	Ayudante		

TOTAL PARTICIPANTES: _____

OBSERVACIONES: _____

* ... calificación sobre el desempeño ... de la actividad ...

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pompeya, 04/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Protección Auditiva: Cuidado y Recomendaciones DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐

OTRO/ CUAL? _____

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
	Diana C Vega	Consorcio Educacion SYS-HH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Carlos Trujillo	Ituitiva	obrero		
2	Diego Fdo Vasquez Tautiva	Ing-Ivan Tautiva	ayudante	Diego Vasquez T	
3	Yauris MOZO C.	Ing Ivan tautiva	OFICIAL	Yauris	
4	carlos plata G.	ex vocal	polvorero	carlos plata G.	
5	HECTOR Ramirez	Tautiva	OFICIAL	HECTOR Ramirez	
6	Nicolas Ramirez R	tautiva	Ing Civil	Nicolas Ramirez R	
7	Angela O				
8	Francisco Villalba	Altura	Profesional	-	
9	Luis D. Estruga	Tautiva	Ay Obra	- Luis	
10	Jonathan Ortiz	Tautiva	Ay Obra	-	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES: 10

OBSERVACIONES: _____

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pamplona, 05/Abril/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Manipulacion de Cargas. DURACIÓN: 15 Minutos.

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACION	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNION	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
	Diana C Vega C.	Consorcio Educacion C&G-MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	B.S.U.B.	
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
6	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial		
7	Martin Peña Arias	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Planta de Concreto		
7	Diosnell Jose Mosqueda T	Altara Ingeniería S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Leider Cardona Barrera	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador		
9	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingeniaria S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan Murcia	
10	Francisco Javier Villalba Guayara	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
11	Carlos Islen Plata G.	Exxcol S.A.S	Operario de Explosivos		
12	Carlos E Fiscal	I Tactus	Ay Obra	Carlos Fiscal	
13	Carlos Trujillo	I Tactus	Ay Obra		
14	Eduardo Flores	I Tactus	Ay Obra		
15	Jonathan Ortiz	I Tactus	Ay Obra		
16	Luis D Estupiñan	I Tactus	Ay Obra	Luis	
17	Edgar Medina	I Tactus	Ay Obra		
18	Jeiman Caballos	I Tactus	Ay Obra		
19	Daniel Mora	I Tactus	Oficial		
20	Wilfredo Cervo	I Tactus	Ay Obra		
21	Nicolas Ramirez	I Tactus	Ing Civil	Nicolas Ramirez	
22					

Powered by CamScanner

1952

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pompeya 05/Abril/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Manipulacion de Cargas. DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
	Diana C Vega C	Coforge Educacion SAS-HH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Elbar W Palacios	I Tautiva	Pilero		
2	Jhon F Bonilla	I Tautiva	Pilero		
3	Edison Forero	I Tautiva	Maestro	Edison Forero	
4	Anibal Reyes	I Tautiva	Maestro	Anibal Reyes	
5	Hector Rueda	I Tautiva	Oficial	-	
6	Hector Ramirez	I Tautiva	Oficial	Hector R	
7	Diego Fdo Vasquez Tautiva	I Tautiva	Ay. obra	Diego Vasquez T	
8	Wilmar Juarez	I Tautiva	Pilero	Wilmar	
9	Juan C Moreno	I Tautiva	Pilero		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES: 09

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

Powered by CamScanner

1383

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Paipa 06/04/2021 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Pausas Activas Uso Elementos Proteccion Personal, DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCIÓN	☐	CHARLA OBLIGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACION	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO? CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
2	Diana C Vega	Consorcio Educación Profesional SST		

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo E. Gomez R.	Consorcio	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Brayan Snaider Vega	Consorcio	Ayudante		
3	Leider Cardenas D.	Altara	Operario		
4	Miguel Angel	[illegible]	Ayudante	Miguel Angel	
5	Daniel Vanegas	Altara	Aux. D Planta		
6	Andres Camilo Urquiza B.	Consorcio	Ayudante de obra		
7	Jhonatan Murcia V.	Altara	Of. mantenimiento	Jhonatan Murcia.	
8	Francisco Javier Villalba	Altara.	operador.		
9	MARTIN PEÑA A.	ALTARA	OP PLANTA.	MARTIN P.	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES:

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducc[illegible]reinducción, capacitación o entre[illegible]

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Popayan, Abril 08, 2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: La Seguridad No Acepta Bromas pesadas DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/VULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNION	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oriana C Vega	Consorcio Educacion C&G-MH	Profesional SST	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
6	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial		
7	Martin Peña Arias	Altara Ingeniena S.A.S	Operador de Planta de Concreto	MARTIN PEÑA	
7	Diosnell Jose Mosqueda T	Altara Ingeniena S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Leider Cardona Barrera	Altara Ingeniena S.A.S	Operador de Minicargador		
9	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingeniena S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan Murcia	
10	Francisco Javier Villalba Guayara	Altara Ingeniena S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
11	Carlos Isien Plata G	Explosivos S.A.S	Operario de Explosivos	Carlos plata G	
12	Jonathan Ortiz	ITactiva	Ay Obra		
13	Luis D Estruga	ITactiva	Ay Obra	Luis	
14	Gilbert Medina	ITactiva	Ay Obra		
15	Julian Cubillos	ITactiva	Ay Obra		
16	Jesus A Reyes	ITactiva	Maestro		
17	Ilbardo Perez	ITactiva	Ay Obra		
18	Edison Franco	ITactiva	Maestro	Edison Franco	
19	Carlos Trujillo	ITactiva	Ay Obra		
20	Yamid Moro	ITactiva	Oficial		
21	Hector Quezada	ITactiva	Oficial		
22	Nicolas Ramirez	ITactiva	Oficial	Nicolas Ramirez R	

Powered by CamScanner

1785

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pasquia Abril 08/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: La Seguridad No Acepta Bromas Pesadas DURACIÓN: 45 Minutos

INDUCCION		CHARLA/DIVULGACION	X
REINDUCCIÓN		NOTIFICACIÓN	
CAPACITACIÓN		REUNIÓN	

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
2	Diana C Vega	Consorcio Educacion C46-HH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Wilfredo Cueto	Tactis	Ay Obr		
2	Luis F Cardona	Tactis	Oficio		
3	Elder W Blanco	Tactis	Pilero		
4	Wilmer Alvarez	Tactis	Pilero		
5	Juan C Moreno	Tactis	Pilero		
6	Jhon F Bonilla	Tactis	Pilero		
7	Diego Vasquez	Tactis	Ay Obr	Diego Vasquez T	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES: 30

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

REV.01- 24/06/2014

SC-003-023

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Paipa, 10/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Cuidado y Protección Visual. DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNION	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega	Consorcio Educación C&G-MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
6	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial		
7	Martin Peña Arias	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Planta de Concreto		
7	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingeniería S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Leider Cardona Barrera	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Minicargador		
9	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan Murcia	
10	Francisco Javier Villalba Guayara	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Retroexcavador		
11	Carlos Islen Plata G.	Exvocol S.A.S	Operario de Explosivos		
12	Edison Franco	Tautus	Maestro	Edison Franco	
13	Diego Vasquez	Tautus	Ay Obra	Diego Vasquez T	
14	Anibal Reyes	Tautus	Maestro	Anibal	
15	Gilberto Medina	Tautus	Ay Obra		
16	Nicolas Ramirez	Tautus	Ing Civil	Nicolas Ramirez	
17	Libardo Perez	Tautus		Perez	
18	Hector Delgado	Tautus	Oficial	Hector A Delgado	
19	Luis D Estupiñan	Tautus	Ay Obra	Luis	
20	Jonathan Ortiz	Tautus	Ay Obra		
21	Luis F Cordenas	Tautus	Op Retro		

TOTAL PARTICIPANTES: 20

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pompeya, 11 | Abril | 2024 LUGAR: Co...o Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Uso y mantenimiento de Elementos de Protección personal DURACIÓN: 15 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA - DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNION	☐	OTRO CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
	Diana C Vega C	Consorcio Educación C&G-MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	[illegible] U.B	
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
6	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Angela O.	
7	Martin Peña Arias	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Planta de Concreto	MARTIN PEÑA	
8	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingenieria S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
9	Leider Cardona Barrera	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador		
10	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan Murcia	
11	Francisco Javier Villalba Guayara	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
12	Carlos Islen Plata G.	Exvocol S.A.S	Operario de Explosivos	carlos plata G	
13	Marco Arce	Tractivo	Ay Obra	Marco Arce	
14	Jhon Chisco	Tractivo	Oficial		
15	Jhon Chisco	Tractivo	Ay Obra	Jhon Chisco	
16	Yaned Mozo	Tractivo	Oficial		
17	Wilfran Cuervo	Tractivo	Oficial		
18	Eduardo Perez	Tractivo	Ay Obra		
19	Wilmar Alvarez	Tractivo	Fierro		
20	Jonathan Ortiz	Tractivo	Ay Obra		
21	Wilfredo Cuervo	Tractivo	Ay Obra		

TOTAL PARTICIPANTES: 20

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pamplona, 12 Abril 2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Cuidado de las Manos: Recomendaciones de seguridad DURACIÓN: 15 Minutos.

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega	Consorcio Educacion C&C-MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo Gomez R.	Consorcio Educacion C&C-MH	Almacenista	Camilo G	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&C-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&C-MH	Ayudante de Obra	Brayan U.B.	
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&C-MH	Ayudante de Obra		
5	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&C-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez. R	
6	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&C-MH	Controladora Vial	Angela S	
7	Martin Peña Arias	Altara Ingeniena S.A.S	Operador de Planta de Concreto	MARTIN PEÑA	
7	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingeniena S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Leider Cardona Barrera	Altara Ingeniena S.A.S	Operador de Minicargador		
9	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingeniena S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan Murcia.	
10	Francisco Javier Villalba Guayara	Altara Ingeniena S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
11	Carlos Islen Plata G.	Exvicci S.A.S	Operario de Explosivos		
12	Nicolás Ramirez	I Tastiva	Ing Residente	Nicolas Ramirez R	
13	Aníbal Reyes	I Tastiva	Maestro	Anibal Reyes	
14	Edwin Franco.	I Tastiva	Maestro	Edwin Franco	
15	Julian Cobillos	I Tastiva	Ay Obra.	Julian.	
16	Carlos Fiscal	I Tastiva.	Ay Obra.	Ya se registro	
17	Jhon Chisco	I Tastiva	Ay Obra	Jhon Chisco	
18	Marco Arrieta Arzu	—	—	Ya se registro	—
19	Gilbert Medina	I Tastiva	Ay Obra.	Gilbert	
20	Hector Quezada	I Tastiva	Oficial	Hector Quezada	
21	Libardo Perez	I Tastiva	Ay Obra.		

TOTAL PARTICIPANTES: 19

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pompeya, 13/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Importancia de los Analisis de Trabajo Seguro. (A.T.S) DURACIÓN: 20 Minutos

INDUCCIÓN	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega.	Consorcio Educacion C4G-MH	Profesional SST	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
6	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Angela O.	
7	Martin Peña Arias	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Planta de Concreto	MARTIN PEÑA	
7	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingenieria S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Leider Cardona Barrera	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador		
9	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan Murcia	
10	Francisco Javier Villalba Guayara	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
11	Carlos Islen Plata G.	Exvocol S.A.	Operario de Explosivos		
15	Jonathan Ortiz	ITastur.	Ay Obra		
13	Luis D Estruga	ITastur	Ay Obra	- Luis	
14	Wilfredo Guerrero	ITastur	Ay Obra	-	
15	Yamid Moro	ITastur.	Oficial	-	
16	Carlos E Trujillo	ITastur	Ay Obra		
17	Carlos E Fiscal	ITastur	Ay Obra	Carlos E Fiscal -	
18	Julian A Cubillos	ITastur	Ay Obra.	- J. Julian.	
19	Jhon E Chisco	ITastur	Ay Obra.	- Jhon Ch	
20	Marco A. Arcu	ITastur	Ay Obra	- Marco A	
21	Gilbert Medina	ITastur	Ay Obra	- Gilb	
22	Hector Quejada	ITastur.	Oficial	Hector	

Total: 22.

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Paipa 16/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Uso adecuado de los Recursos en Obra Agua y Electricidad DURACIÓN: 45 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACIÓN	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNION	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
2	Diana Ojeda C	Consorcio Educación C4G-MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo. Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Martin Peña Arias	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Bomba Estacionaria	Martin Peña	
6	Brayan Stiven Herrera Hernandez	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
7	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingenieria S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Juan Eduardo Torres Traslaviña	Altara Ingenieria S.A.S	Ayudante de Bomba Estacionaria		
9	Carlos Islen Plata G.	Exvecol S.A.S	Operario de Explosivos		
10	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
11	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial		
12	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan Murcia	
13	Pablo Wilches	Raul Vivas	Topografia		
14	Luis D Estruga	Fuzy Bustos	Ay Obra	Luis	
15	Jonathan Ortiz	Fuzy Bustos	Ay Obra		
16	Jackson Aguilar	Fuzy Bustos	Ay Obra	Jackson	
17	Carlos Trujillo	Fuzy Bustos	Ay Obra		
18	Anibal Reyes	Fuzy Bustos	Maestro	Anibal	
19	Luis F Cardenas	Fuzy Bustos	Operador		
20	Wilson Alvarez	Fuzy Bustos	Pilero		
21	Marco Arco	Fuzy Bustos	Ay Obra		
22	Juan F Bonilla	Fuzy Bustos	Pilero		

TOTAL PARTICIPANTES 18

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Paipeya 15/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Uso Adecuado de los Recursos en Obra Agua y Electricidad DURACIÓN: 45 Minutos

* INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒
* REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐

OTRO/ CUAL? _____

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega	Consorcio Educamos C46-HH	Profesional SST	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Edison Franco	Ing Futura	Maestro	Edison Franco	
2	Eduardo Perez	Ing Futura	Ay Obra		
3	Elber W Palacios	Ing Futura	Fiero		
4	Ivan C Moreno	Ing Futura	Fiero		
5	Diego Vasquez	Ing Futura	Ay Obra	Diego Vasquez T	
6	Gilberto Medina	Ing Futura	Ay Obra		
7	Yamid Mozo	Ing Futura	Oficial		
8	Wilfredo Cerro	Ing Futura	Ay Obra		
9	Edwin Cubillos	Ing Futura	Ay Obra		
10	Heider Cardona	Altra	Op Mini		
11	Francisco J Vilalba	Altura	Op Retro		
12	Jhon Chisco	Ing Futura	Ay Obra	Jhon Chisco	
13	Nicolas Ramirez	Ing Futura	Ing Civil	Nicolas Ramirez R	
14	Faber Rodriguez	Rapi Pelaez	Aux Topogr	Faber Andres Rodriguez	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES: 14

OBSERVACIONES: _____

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

Powered by CamScanner

1382

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Popayán, 16/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Riesgo psicosocial, Salud y fertil DURACIÓN: 1 Hora

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACIÓN	☒		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNION	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega C	Consorcio Educación C&G - MH	Profesional SST	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista		
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Brayan U. B.	
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
6	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Angela S.	
7	Martin Peña Arias	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Planta de Concreto	MARTIN PEÑA	
7	Diosnell Jose Mosqueda T	Altara Ingeniería S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Leider Cardona Barrera	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Minicargador		
9	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan Murcia	
10	Francisco Javier Villalba Guayara	Altara Ingeniería S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
11	Carlos Islen Plata G.	Excel S.A.S	Operario de Explosivos		
12	Jonathan Ortiz	Fyzy Fautiz	Ay Obr		
13	Luis D. Estrada	Fyzy Fautiz	Ay Obr	Luis	
14	Carlos E. Trujillo	Fyzy Fautiz	Ay Obr		
15	Marco A. Arce	Fautiz	Ay Obr		
16	Luis F Carbajal	Fautiz	Op Retro		
17	Gilber Medina	Fautiz	Ay Obr		
18	Wilfredo Cerro	Fautiz	Ay Obr		
19	Diego Vasquez	Fautiz	Ay Obr	Diego Vasquez T	
20	Anibal Reyes	Fautiz	Maestro	Anibal Reyes	
21	Hector Quepada	Fautiz	Oficial	Hector Quepada	

TOTAL PARTICIPANTES: 20

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

1983

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Popayán, 16/04/2024 LUGAR: Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Riesgo Psicosocial, Salud Mental

DURACIÓN: 45 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☑		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐		
CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐	OTRO/ CUAL?	

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega	Consorcio Educacion Y6HH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Jackson Apolinar	Factus	Ay Obra	Jackson	
2	Libardo Perez	Factus	Ay Obra		
3	Julian Cubillos	Factus	Ay Obra		
4	Pablo Wilches	Particular	Topografo		
5	Faber Rodriguez	Particular	Auxiliar	Faber Andres Rodriguez	
6	Pablo Jair wilches C.	—	—	—	
7	Jhon E Chisco	Factus	Ay Obra	Jhon E Chisco	
8	Edgar W. Blanco S	Factus	Piloto		
9	Nicolas Ramirez	Factus	Tug Civil	Nicolas Ramirez	
10	Wilmer Alegria	Factus	Piloto	Ultima	
11	Jhonf Bonilla	Factus	Piloto		
12	Juan C Moreno	Factus	Piloto		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES: 11

OBSERVACIONES:

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Roupuya 17/07/2024 LUGAR: Corregimiento Alfonso Lopez Pumarejo

TEMAS TRATADOS: Riesgo Electrico, Verificacion de Equipos y Conexiones. DURACIÓN: 45 Minutos

INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐
CAPACITACIÓN	☐	REUNION	☐

OTRO/ CUAL? _____

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Diana C Vega C	Consorcio Educacion C&G-MH	Profesional SST	

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Camilo Eduardo Gomez R.	Consorcio Educacion C&G-MH	Almacenista	Camilo Gomez	
2	Miguel Angel Garcia Buelvas	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra	Miguel Angel	
3	Brayan Sneider Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
4	Anderson Camilo Urquiza Barrera	Consorcio Educacion C&G-MH	Ayudante de Obra		
5	Sol Lourdes Ramirez Rocha	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Sol Ramirez	
6	Angela Maria Silva Ospina	Consorcio Educacion C&G-MH	Controladora Vial	Angela Ospina	
7	Martin Peña Arias	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Planta de Concreto	Martin Peña	
7	Diosnell Jose Mosqueda T.	Altara Ingenieria S.A.S	Auxiliar de Planta Concreto		
8	Leider Cardona Barrera	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador		
9	Jonathan Murcia Vargas	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Minicargador	Jhonatan M.	
10	Francisco Javier Villalba Guayara	Altara Ingenieria S.A.S	Operador de Retroexcavadora		
11	Carlos Islen Plata G.	Exvecol S.A.S	Operario de Explosivos		
12	Marco A Arce	Ivru Tuticz	Ay Obr	Marco A.	
13	Carlos E Trujillo	Ivru Tuticz	Ay Obr		
14	Jhon E. Chisco	Ivru Tuticz	Ay Obr	Jhon Chisco	
15	Juan F Bonilla	Ivru Tuticz	Pilero		
16	Jonathan Ortiz	Ivru Tuticz	Ay Obr		
17	Luis D Estupiñan	Ivru Tuticz	Ay Obr	Luis	
18	Juan C Morelo	Ivru Tuticz	Pilero		
19	Wilmer Alvarez	Ivru Tuticz	Pilero	Wilmer	
20	Anibal Reyes	Ivru Tuticz	Puestero	Anibal	
21	Edgar W Palacios	Ivru Tuticz	Pilero		

TOTAL PARTICIPANTES: 19

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner
