ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

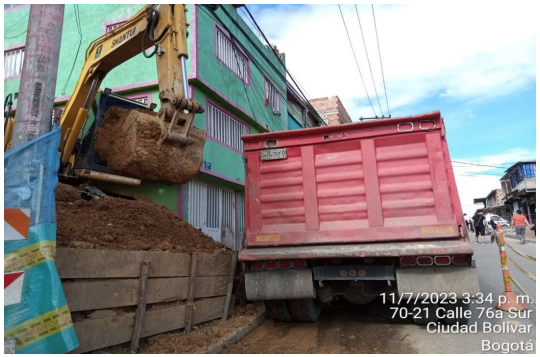
ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)					Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ALTO	AREA	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN EXPANSION		
	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MANUAL				36,60	47,58		47,58
	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MECANICA				23,08	30,00		30,00
	TRANSPORTE DEMOLICION DE PISOS ITEM 1,05 MES MAYO		0,10	93,57	9,36	12,16		12,16
	TRANSPORTE DEMOLICION DE MUROS ITEM 1,06 ME JUNIO		0,10	117,68	11,77	15,30		15,30
	TRANSPORTE DEMOLICION DE ESCALERAS ITEM 1,08 MES MAYO		0,10	93,34	9,33	12,13		12,13
	TRANSPORTE MANUEL MES MAYO				28,15	36,60		36,60
	Excavación Manual				140,36	182,46		182,46
	Excavación Mecanica				11,54	15,00		15,00
	Excavación Manual				11,25	14,63		14,63
	Excavación Mecanica				11,54	15,00		15,00
	DEMOLICIO MURO 19				7,50	9,75		9,75
	EXCAVACIÓN MECANICA, DESCAPOTE Y ZARPAS				11,54	15,00		15,00
	EXCAVACIÓN MANUAL ZARPAS				11,25	14,63		14,63
	DEMOLICIO MURO 24				9,75	12,68		12,68
	DEMOLICION MURO CASA 1		0,10	8,00	0,80	1,04		1,04
	Excavación Mecanica				7,73	10,05		10,05
	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MANUAL				22,13	28,76		28,76
	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MANUAL				28,35	36,86		36,86
	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MANUAL				10,31	13,40		13,40
	TRANSPORTE EXCAVACIÓN MANUAL				10,58	13,76		13,76
	DEMOLICIÓN ROCAS				21,00	27,30		27,30
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)				46,16	60,01		60,01



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)					Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ALTO	AREA	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN EXPANSION		
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.				61,51	79,96		79,96
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)				131,38	170,79		170,79
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.				34,68	45,08		45,08
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)				73,14	95,08		95,08
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.				4,40	5,72		5,72
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.				30,02	39,03		39,03
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.				21,88	28,44		28,44
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)				86,98	113,07		113,07
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.				20,96	27,25		27,25
	EXCAVACION MANUAL TUBERIAS				8,82	11,47		11,47
	EXCAVACION MANUAL TUBERIAS				14,57	18,95		18,95
	EXCAVACION MANUAL TUBERIAS				6,83	8,87		8,87
	EXCAVACION MANUAL CAJAS DE INSPECCION				9,36	12,17		12,17
	EXCAVACION MANUAL TUBERIAS				7,14	9,28		9,28
	EXCAVACION POZO INICIAL ZRA				11,13	14,47		14,47
	EXCAVACION TUBERIA DE 6"				9,93	12,91		12,91
	EXCAVACION TUBERIA DE 6"				3,85	5,01		5,01
	EXCAVACION TUBERIAS				20,49	26,63		26,63

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)					Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ALTO	AREA	VOLUMEN COMPACTO	VOLUMEN EXPANSION		
	EXCAVACION CAJAS DE INSPECCIÓN				16,50	21,45		21,45
	EXCAVACION CAJAS DE INSPECCIÓN				3,00	3,90		3,90
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ANDEN PARTE BAJA				13,32	17,31		17,31
	TOTAL						**M3**	**1390,92**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES						**M3**	**1373,61**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10						**M3**	**17,31**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,01	M3	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

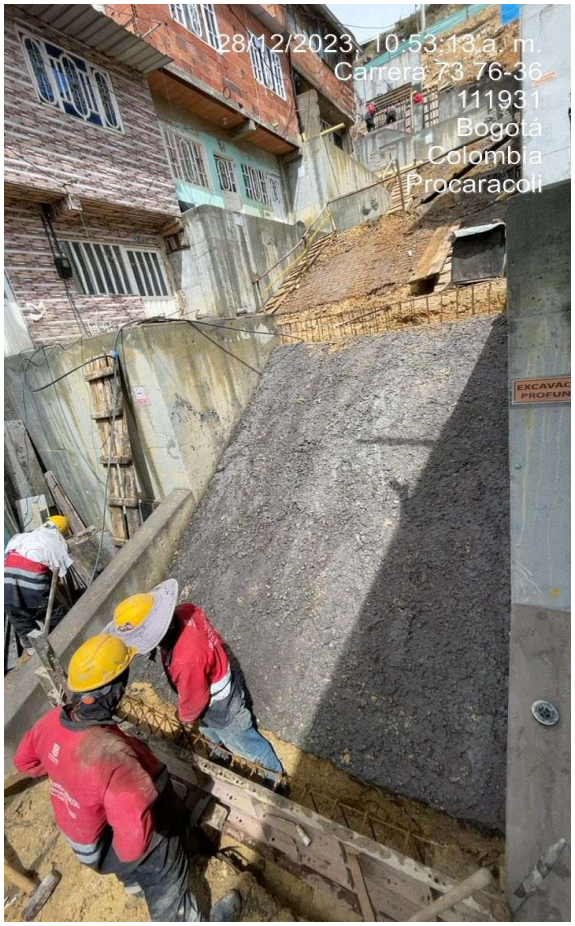
ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO



LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
MURO 19	2,60	1,90	0,05	1,00	0,25
MURO 20	3,20	3,90	0,05	1,00	0,62
DESCUENTO MURO 20	0,80	1,00	0,05	-1,00	-0,04
MURO 6	5,60	2,88	0,05	1,00	0,81
MURO 7	2,90	1,60	0,05	1,00	0,23
MURO 8	6,00	2,30	0,05	1,00	0,69
MURO 24	3,60	2,80	0,05	1,00	0,50
MURO 23	2,60	2,40	0,05	1,00	0,31
MURO 25	1,90	1,80	0,05	1,00	0,17
MURO 26	3,20	2,80	0,05	1,00	0,45
MURO 9	5,00	5,80	0,05	1,00	1,45
MURO 28	3,60	2,40	0,05	1,00	0,43
MURO 11	2,80	5,00	0,05	1,00	0,70
MURO 14	4,40	3,50	0,05	1,00	0,77
MURO 30	4,50	2,40	0,05	1,00	0,54
MURO 17	3,70	3,00	0,05	1,00	0,56
MURO 3	3,80	2,20	0,05	1,00	0,42
MURO 5	2,40	2,20	0,05	1,00	0,26
MURO 29	2,20	2,20	0,05	1,00	0,24
MURO 33	3,80	2,70	0,05	1,00	0,51
MURO 12	1,90	1,60	0,05	1,00	0,15
MURO 2	4,00	3,30	0,05	1,00	0,66
MURO 16	2,50	2,20	0,05	1,00	0,28
MURO 18	1,00	1,00	0,05	1,00	0,05
MURO EMPALEME PARTE BAJA COSTADO IZQUIERDO	4,00	1,80	0,05	1,00	0,36
MURO 27	1,70	1,15	0,05	1,00	0,10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,01	M3	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	MURO 4	4,50	2,00	0,05	1,00	0,45
	SOLADO PARA POZO INICIAL SANITARIO	2,00	2,00	0,05	1,00	0,20
	MURO 1 EN L	2,40	1,10	0,05	1,00	0,13
	MURO 1 EN L	2,10	1,10	0,05	1,00	0,12
	ENTRE MURO 2 Y MURO 4	1,50	0,80	0,05	1,00	0,06
	ENTRE MURO2 Y MURO 4	1,70	0,90	0,05	1,00	0,08
	ENTRE MURO 2 Y MURO 4	1,80	0,90	0,05	1,00	0,08
	MURO 15 EN T	3,10	1,10	0,05	1,00	0,17
	MURO 15 EN T	2,15	1,10	0,05	1,00	0,12
	MURO 13A	3,10	1,50	0,05	1,00	0,23
	MURO 10	2,70	1,60	0,05	1,00	0,22
	ENTRE MURO 1 Y MURO 2	1,30	0,50	0,05	2,00	0,07
	ENTRE MURO 5 Y MURO 3	1,80	0,80	0,05	2,00	0,14
	ENTRE MURO 5 Y MURO 6	1,20	1,10	0,05	2,00	0,13
	ENTRE MURO 5 Y MURO 16	1,90	0,90	0,05	2,00	0,17
	MURO EMPALME ZRA	8,90	3,10	0,05	1,00	1,38
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 14 Y MURO 33	3,15	2,36	0,05	1,00	0,37
	ESCALERA ENTRE MURO 10-9 Y MURO 25-26-27	5,30	2,70	0,05	1,00	0,72
	ESCALERA ENTRE MURO 13 Y MURO 30	1,00	4,30	0,05	1,00	0,22
	ESCALERA ENTRE MURO 29A Y MURO 30	2,40	2,10	0,05	1,00	0,25
	ESCALERA ENTRE MURO 8 Y MURO 23-24	5,06	4,90	0,05	1,00	1,24
	ESCALERA ENTRE MURO 6 Y MURO 19	2,80	4,90	0,05	1,00	0,69
	ESCALERA ENTRE MURO 7 Y MURO 20	1,70	3,45	0,05	1,00	0,29
	ESCALERA ENTRE MURO 20	1,00	1,35	0,05	1,00	0,07
	ESCALERA ENTRE MURO 11 Y MURO 28	1,70	4,70	0,05	1,00	0,40
	ESCALERA ENTRE MURO 12 Y MURO 29	1,91	1,80	0,05	1,00	0,17
	ESCALERA ENTRE MURO 11 Y MURO 29	1,80	3,10	0,05	1,00	0,28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,01	M3	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO



LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
ESCALERA ENTRE MURO PZ SANITARIO Y CASA 5	2,65	3,10	0,05	1,00	0,41
ESCALERA ENTRE MURO PZ SANITARIO Y CASA 11 SECCION 1	2,40	1,95	0,05	1,00	0,23
ESCALERA ENTRE MURO PZ SANITARIO Y CASA 12 SECCION 2	0,60	1,65	0,05	1,00	0,05
ESCALERA ENTRE CASA 5 Y CASA 11	0,65	3,80	0,05	1,00	0,12
ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 1	2,40	1,00	0,05	1,00	0,12
ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 2	2,70	1,00	0,05	1,00	0,14
ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 4	3,50	0,90	0,05	1,00	0,16
ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 3	3,20	0,90	0,05	1,00	0,14
TOTAL				**M3**	**21,30**
TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**16,32**
TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**4,98**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,02	M3	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. CON ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL 4 MÓDULOS AUTOESTABLES (2 TORRES CON PASARELA DE 3 METROS DE 1.40 m x 5.80 m) (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	VASTAGO MURO 6 TIPO E	4,70	0,40	3,40	1,00	6,39
	VASTAGO MURO 6 TIPO E	1,25	0,40	3,40	1,00	1,70
	VASTAGO MURO 19 TIPO C	2,40	0,30	2,10	1,00	1,51
	VASTAGO MURO 20 TIPO D	2,80	0,35	2,50	1,00	2,45
	VASTAGO MURO 20 TIPO D	1,90	0,35	2,50	1,00	1,66
	VASTAGO MURO 24 TIPO E	2,15	0,40	3,60	1,00	3,10
	VASTAGO MURO 24 TIPO E	1,60	0,40	3,60	1,00	2,30
	VASTAGO MURO 8 TIPO D	4,75	0,35	3,10	1,00	5,15
	VASTAGO MURO 8 TIPO D	1,25	0,35	3,10	1,00	1,36
	VASTAGO MURO 7 TIPO B	1,70	0,25	1,60	1,00	0,68
	VASTAGO MURO 7 TIPO B	1,45	0,25	1,60	1,00	0,58
	VASTAGO MURO 23 TIPO D	2,40	0,35	2,70	1,00	2,27
	VASTAGO MURO 25 TIPO B	1,90	0,25	1,52	1,00	0,72
	VASTAGO MURO 28 TIPO D	1,40	0,35	2,50	1,00	1,23
	VASTAGO MURO 28 TIPO D EN L	3,50	0,35	2,50	1,00	3,06
	VASTAGO MURO 26 TIPO E EN EL	1,70	0,40	3,63	1,00	2,47
	VASTAGO MURO 26 TIPO E EN EL	1,60	0,40	3,63	1,00	2,32
	VASTAGO MURO 11 TIPO E	1,55	0,40	3,55	1,00	2,20
	VASTAGO MURO 11 TIPO E EN L	3,00	0,40	3,55	1,00	4,26
	VASTAGO MURO 9 TIPO E EN Z	2,42	0,40	3,63	1,00	3,51
	VASTAGO MURO 9 TIPO E EN Z	2,54	0,40	3,63	1,00	3,69
	VASTAGO MURO 9 TIPO E EN Z	0,90	0,40	3,63	1,00	1,31
	VASTAGO MURO 9 TIPO E EN Z	0,80	0,40	3,63	1,00	1,16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,02	M3	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. CON ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL 4 MÓDULOS AUTOESTABLES (2 TORRES CON PASARELA DE 3 METROS DE 1.40 m x 5.80 m) (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	VASTAGO MURO 14TIPO E	3,30	0,40	3,60	1,00	4,75
	VASTAGO MURO 14 TIPO E EN L	2,20	0,40	3,60	1,00	3,17
	VASTAGO MURO 30 TIPO C	3,20	0,30	2,05	1,00	1,97
	VASTAGO MURO 30 TIPO C EN L	1,55	0,30	2,05	1,00	0,95
	VASTAGO MURO 17 TIPO E EN L	2,70	0,40	3,88	1,00	4,19
	VASTAGO MURO 17 TIPO E EN L	1,70	0,40	3,88	1,00	2,64
	VASTAGO MURO 3 TIPO C EN L	2,55	0,25	1,30	1,00	0,83
	VASTAGO MURO 3 TIPO C EN L	3,45	0,25	1,30	1,00	1,12
	VASTAGO MURO 5 TIPO C	4,10	0,30	2,16	1,00	2,66
	VASTAGO MURO 29 TIPO D EN L	1,20	0,35	1,30	1,00	0,55
	VASTAGO MURO 29 TIPO D EN L	2,00	0,35	2,60	1,00	1,82
	VASTAGO MURO 29 TIPO D EN L	1,50	0,35	2,60	1,00	1,37
	VASTAGO MURO 33 TIPO C EN L	2,70	0,30	1,60	1,00	1,30
	VASTAGO MURO 33 TIPO C EN L	2,00	0,30	1,60	1,00	0,96
	VASTAGO MURO 16 TIPO D EN L	0,80	0,35	3,4	1,00	0,95
	VASTAGO MURO 16 TIPO D EN L	2,50	0,35	2,16	1,00	1,89
	VASTAGO MURO 2 TIPO D EN L	2,87	0,35	2,50	1,00	2,51
	VASTAGO MURO 2 TIPO D EN L	2,72	0,35	2,10	1,00	2,00
	VASTAGO MURO 18 TIPO A ESCALONADO	0,80	0,25	1,30	1,00	0,26
	VASTAGO MURO 18 TIPO A ESCALONADO	0,60	0,25	1,05	1,00	0,16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR		PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS		
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022	ACTA PARCIAL 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,02	M3	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. CON ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL 4 MÓDULOS AUTOESTABLES (2 TORRES CON PASARELA DE 3 METROS DE 1.40 m x 5.80 m) (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	VASTAGO MURO EMPALME TIPO B ESCALONADO	2,80	0,30	1,35	1,00	1,13
	VASTAGO MURO EMPALME TIPO B ESCALONADO	1,00	0,30	1,80	1,00	0,54
	VASTAGO MURO 12 TIPO B	1,90	0,25	0,95	1,00	0,45
	VASTAGO MURO 4 TIPO C ESCALONADO	2,15	0,30	1,75	1,00	1,13
	VASTAGO MURO 4 TIPO C ESCALONADO	1,50	0,30	1,20	2,00	1,08
	VASTAGO MURO 1 TIPO A EN L	2,45	0,25	1,25	1,00	0,77
	VASTAGO MURO 1 TIPO A EN L	2,43	0,25	1,25	1,00	0,76
	VASTAGO MURO 27 TIPO A	1,60	0,25	0,80	1,00	0,32
	VASTAGO MURO 15 TIPO A EN L	3,50	0,25	1,20	1,00	1,05
	VASTAGO MURO 15 TIPO A EN L	2,30	0,25	1,20	1,00	0,69
	VASTAGO MURO 10 TIPO B	2,60	0,25	1,00	1,00	0,65
	VASTAGO MURO 13A	3,00	0,30	1,70	1,00	1,53
	MURO EMPALME ZRA SECCION 1	2,40	0,35	2,00	1,00	1,68
	MURO EMPALME ZRA SECCION 2	5,10	0,35	2,10	1,00	3,75
	MURO EMPALME ZRA SECCION 3	3,40	0,35	2,10	1,00	2,50
	MURO EMPALME ZRA SECCION 4	2,25	0,35	2,25	1,00	1,77
	MURO EMPALME ZRA SECCION 5	1,00	0,35	1,70	1,00	0,60
	MURO EMPALME ZRA SECCION 6	1,85	0,35	2,60	1,00	1,68
	MURO EMPALME ZRA SECCION 7	1,25	0,35	2,80	1,00	1,23
	MURO EMPALME ZRA SECCION 8	1,35	0,35	2,80	1,00	1,32
	MURO 29 A	2,15	0,35	0,95	1,00	0,71

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,02	M3	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. CON ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL 4 MÓDULOS AUTOESTABLES (2 TORRES CON PASARELA DE 3 METROS DE 1.40 m x 5.80 m) (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	VASTO MUROS JUNTO A POZO SANITARIO FINAL	1,85	0,45	2,00	3,00	5,00
	VASTAGO MURO 23A	1,10	0,30	1,20	1,00	0,40
	VASTAGO MURO CASA 11 EN CHAFLAN	0,90	0,30	1,10	1,00	0,30
	VASTAGO MURO CASA 11 EN CHAFLAN	1,10	0,30	0,80	1,00	0,26
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 1	1,50	0,40	3,50	1,00	2,10
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 2	1,25	0,40	3,50	1,00	1,75
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 3	2,00	0,40	2,80	1,00	2,24
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 4	1,20	0,40	1,95	1,00	0,94
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 5	2,60	0,40	1,20	1,00	1,26
	TOTAL				**M3**	**130,69**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**116,46**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**14,23**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO - CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,03	KG	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			PESO KG	Medida Total
		LARGO	ANCHO	No. Elementos		
	ZARPA MURO 19 TIPO C				94,03	94,03
	ZARPA MURO 20 TIPO D				230,76	230,76
	ZARPA MURO 7 TIPO B				74,52	74,52
	ZARPA MURO 6 TIPO E				433,32	433,32
	VASTAGO MURO 6 TIPO D				562,69	562,69
	ZARPA MURO 8 TIPO D				389,10	389,10
	VASTAGO MURO 19 TIPO C				118,06	118,06
	VASTAGO MURO 20 TIPO D				286,13	286,13
	REFUERZO POSTE MURO 9				29,18	29,18
	VASTAGO MURO 8 TIPO D				473,71	473,71
	ZARPA MURO 24 TIPO E				272,35	272,35
	VASTAGO MURO 24 TIPO E				361,65	361,65
	ZARPA MURO 23 TIPO D				130,02	130,02
	ZARPA MURO 25 TIPO B				55,01	55,01
	ZARPA MURO 26 TIPO E				227,26	227,26
	VASTAGO MURO 7 TIPO E				110,78	110,78
	ZARPA MURO 28 TIPO D				315,49	315,49
	ZARPA MURO 11 TIPO E				290,95	290,95
	ZARPA MURO 9 TIPO E				368,44	368,44
	VASTAGO MURO 25 TIPO B				62,37	62,37
	VASTAGO MURO 23 TIPO D				214,31	214,31
	VASTAGO MURO 9 TIPO E				702,55	702,55
	VASTAGO MURO 11 TIPO E				432,57	432,57
	VASTAGO MURO 26 TIPO E				266,98	266,98
	VASTAGO MURO 28 TIPO D				278,37	278,37
	ZARPA MURO 14 TIPO E				373,61	373,61
	VASTAGO MURO 14 TIPO E				514,45	514,45
	ZARPA MURO 30 TIPO C				160,14	160,14
	VASTAGO MURO 30 TIPO C				131,16	131,16
	ZARPA MURO 17 TIPO E				315,42	315,42
	ZARPA MURO 5 TIPO C				282,23	282,23



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,03	KG	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			PESO KG	Medida Total
		LARGO	ANCHO	No. Elementos		
	ZARPA MURO 3 TIPO B				111,18	111,18
	ZARPA MURO 29 TIPO D				103,92	103,92
	VASTAGO MURO 17 TIPO E				471,28	471,28
	VASTAGO MURO 5 TIPO C				255,95	255,95
	VASTAGO MURO 3 TIPO B				172,05	172,05
	ZARPA MURO 33 TIPO C				175,41	175,41
	VASTAGO MURO 33 TIPO C				219,45	219,45
	ZARPA MURO 2 TIPO D				278,50	278,50
	ZARPA MURO 16 TIPO D				150,65	150,65
	ZARPA MURO 12 TIPO B				84,51	84,51
	VASTAGO MURO 29 TIPO D				363,70	363,70
	ZARPA MURO 27 TIPO A				32,34	32,34
	ZARPA MURO 18 TIPO C				23,75	23,75
	ZARPA MURO EMPALME PARTE BAJA COSTADO IZQUIERO TIPO B				134,37	134,37
	VASTAGO MURO 18 TIPO E				29,55	29,55
	VASTAGO MURO 2 TIPO C				354,19	354,19
	VASTAGO MURO 16 TIPO B				157,20	157,20
	VASTAGO MURO 12 TIPO B				47,29	47,29
	VASTAGO MURO EMPALME TIPO B				203,34	203,34
	ZARPA MURO 4 TIPO C				163,84	163,84
	VASTAGO MURO 4 TIPO C				182,93	182,93
	ZARPA MURO 1 TIPO A				93,04	93,04
	VASTAGO MURO 1 TIPO A				107,08	107,08
	VASTAGO MURO 27 TIPO A				41,73	41,73
	ZARPA MURO 15 TIPO A				124,40	124,40
	VASTAGO MURO 15 TIPO A				105,53	105,53
	ZARPA MURO 13A TIPO B				83,57	83,57
	ZARPA MURO 10 TIPO B				93,45	93,45
	VASTAGO MURO 10 TIPO B				49,84	49,84
	VASTAGO MURO 13A				86,99	86,99
	ZARPA MUR EMPALME ZRA	435,91		1,00		435,91
	VASTAGO MURO EMPALME ZRA TUPO D	459,46		1,00		459,46

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,03	KG	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024




ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			PESO KG	Medida Total
		LARGO	ANCHO	No. Elementos		
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 4 Y MURO 1, MURO 15	16,43		2,00		32,85
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 4 Y MURO 2, MURO 16	21,05		2,00		42,09
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 5 Y MURO 2, MURO 15	23,20		2,00		46,41
	VIGA ENTRE MURO 5 Y MURO 18	14,37		2,00		28,75
	VIGA CASA 11	56,47		1,00		56,47
	VASTAGO MURO EMPALME ZRA SECCION 2 TUPO D	318,69		1,00		318,69
	VASTAGO MURO 29A	54,91		1		54,91
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 14 Y MURO 33	24,23		2		48,46
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 9, MURO 10 Y MURO 26-MURO 27	27,72		2		55,44
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 13 Y MURO 30	44,15		1,00		44,15
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 29A Y MURO 30	21,56		1,00		21,56
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 8 Y MURO 23-24	51,95		2,00		103,90
	vastago muro escalera modulo 12	654,21		1,00		654,21
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 7 Y MURO 23	39,94		1,00		39,94
	VIGA MATERA ENTRE MURO 10 Y MURO 9	23,61		1,00		23,61
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 6 Y MURO 19	50,31		2,00		100,61
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 7 Y MURO 20	35,42		2,00		70,84
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 20	13,86		2,00		27,72
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 11 Y MURO 28	48,25		2,00		96,51
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 12 Y MURO 29	18,48		2,00		36,96
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 11 Y MURO 29	31,83		2,00		63,65
	VASTAGO JUNTO A PZ SANITARIO PARTE BAJA	113,97		1,00		113,97
	VASTAGO MURO 23A	40,09		1,00		40,09
	VIGA CASA 10	12,32		1,00		12,32
	VIGA PARA ESCALERA ENTRE MURO PZ SANITARIO Y CASA 5	31,83		2,00		63,65
	MURO CASA 11	79,25		1,00		79,25
	VIGA PARA ESCALERA ENTRE MURO PZ SANITARIO Y CASA 11 SECCION 1	20,02		2,00		40,04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,03	KG	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			PESO KG	Medida Total
		LARGO	ANCHO	No. Elementos		
	VIGA PARA ESCALERA ENTRE MURO PZ SANITARIO Y CASA 11 SECCION 2	16,94		2,00		33,88
	VIGA PARA ESCALERA ENTRE CASA 5 Y CASA 11	39,01		2,00		78,02
	VIGA ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 1	10,27		2,00		20,53
	VIGA ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 2	10,27		2,00		20,53
	VIGA ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 4	9,24		2,00		18,48
	VIGA ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 3	9,24		2,00		18,48
	TOTAL				**KG**	**16460,99**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**KG**	**14638,07**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**KG**	**1822,92**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,06	M3	CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRAVA COMÚN PARA PLACA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE FORMALETA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CURADO). NO INCLUYE REFUERZO	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 4 Y MURO 1, MURO 15	1,60	0,30	0,50	2,00	0,48
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 4 Y MURO 2, MURO 16	2,05	0,30	0,50	2,00	0,62
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 5 Y MURO 2, MURO 15	2,26	0,30	0,50	2,00	0,68
	VIGA ENTRE MURO 5 Y MURO 18	1,40	0,30	0,30	2,00	0,25
	VIGA CASA 5	5,50	0,30	0,50	1,00	0,83
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 14 Y MURO 33	2,36	0,30	0,30	2,00	0,42
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 9, MURO 10 Y MURO 26- MURO 27	2,70	0,30	0,30	2,00	0,49
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 13 Y MURO 30	4,30	0,30	0,50	1,00	0,65
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 29A Y MURO 30	2,10	0,30	0,50	1,00	0,32
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 8 Y MURO 23-24	5,06	0,30	0,50	2,00	1,52
	VIGA DESCANSO ENTRE MURO 7 Y MURO 23	3,89	0,30	0,50	1,00	0,58
	VIGA MATERA ENTRE MURO 10 Y MURO 9	2,30	0,20	0,40	1,00	0,18
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 6 Y MURO 19	4,90	0,30	0,30	2,00	0,88
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 7 Y MURO 20	3,45	0,30	0,30	2,00	0,62
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 20	1,35	0,30	0,30	2,00	0,24
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 11 Y MURO 28	4,70	0,30	0,30	2,00	0,85
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 12 Y MURO 29	1,80	0,30	0,30	2,00	0,32
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO 11 Y MURO 29	3,10	0,30	0,30	2,00	0,56
	VIGA CASA 10	1,20	0,30	0,50	1,00	0,18
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO PZ SANITARIO Y CASA 5	3,10	0,30	0,30	2,00	0,56
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO PZ SANITARIO Y CASA 11 SECCION 1	1,95	0,30	0,30	2,00	0,35
	VIGA ESCALERA ENTRE MURO PZ SANITARIO Y CASA 11 SECCION 2	1,65	0,30	0,30	2,00	0,30
	VIGA ESCALERA ENTRE CASA 5 Y CASA 11	3,80	0,30	0,30	2,00	0,68

VIGA ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 1	1,00	0,30	0,30	2,00	0,18
VIGA ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 2	1,00	0,30	0,30	2,00	0,18
VIGA ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 4	0,90	0,30	0,30	2,00	0,16
VIGA ESCALERA ENTRE MUROS EMPALME ZRA SECCION 3	0,90	0,30	0,30	2,00	0,16
TOTAL				**M3**	**13,23**
TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**3,76**
TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**9,47**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	**RESIDENTE DE OBRA**	**TOPOGRAFÍA**	**INTERVENTORIA**
		**N/A**	
FECHA: 02-03-2024	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022	ACTA PARCIAL 10

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,09	M2	GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	Muro 6 EN L	4,40		4,70	1,00	20,68
	Muro 6 EN L	1,05		4,70	1,00	4,94
	Muro 7 EN L	1,45		1,90	1,00	2,76
	Muro 7 EN L	1,60		1,90	1,00	3,04
	Muro 19	2,45		2,30	1,00	5,64
	Muro 20 EN L	2,35		3,40	1,00	7,99
	Muro 20 EN L	1,55		3,40	1,00	5,27
	Muro 23	2,70		3,26	1,00	8,80
	Muro 24 EN L	2,10		4,75	1,00	9,98
	Muro 24 EN L	1,00		4,75	1,00	4,75
	Muro 8 EN L	5,15		3,40	1,00	17,51
	Muro 8 EN L	1,00		3,40	1,00	3,40
	Muro 25	1,90		1,90	1,00	3,61
	Muro 26 EN L	1,70		4,83	1,00	8,21
	Muro 26 EN L	1,60		4,83	1,00	7,73
	Muro 28 EN L	3,50		3,30	1,00	11,55
	Muro 28 EN L	1,40		3,30	1,00	4,62
	Muro 9 EN Z	2,42		4,83	1,00	11,69
	Muro 9 EN Z	2,54		4,83	1,00	12,27
	Muro 9 EN Z	0,90		4,83	1,00	4,35
	Muro 9 EN LZ	0,80		4,83	1,00	3,86
	Muro 11 EN L	1,27		4,83	1,00	6,13
	Muro 11 EN L	3,30		4,83	1,00	15,94
	VASTAGO MURO 1 TIPO A EN L	2,70	1,15		1,00	3,11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,09	M2	GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO



LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
VASTAGO MURO 1 TIPO A EN L	2,50	1,15		1,00	2,88
VASTAGO MURO 27TIPO A EN L	1,50	0,80		1,00	1,20
VASTAGO MURO 16 TIPO D EN L	0,80	3,4		1,00	2,72
VASTAGO MURO 16 TIPO D EN L	2,50	2,16		1,00	5,39
VASTAGO MURO 2 TIPO D EN L	2,87	2,50		1,00	7,18
VASTAGO MURO 2 TIPO D EN L	2,72	2,10		1,00	5,71
VASTAGO MURO 18 TIPO A ESCALONADO	0,80	1,30		1,00	1,04
VASTAGO MURO 18 TIPO A ESCALONADO	0,60	1,05		1,00	0,63
VASTAGO MURO EMPALME TIPO B ESCALONADO	2,80	1,35		1,00	3,78
VASTAGO MURO EMPALME TIPO B ESCALONADO	1,00	1,80		1,00	1,80
VASTAGO MURO 12 TIPO B	1,90	0,95		1,00	1,81
VASTAGO MURO 4 TIPO C ESCALONADO	2,15	1,75		1,00	3,76
VASTAGO MURO 4 TIPO C ESCALONADO	1,50	1,20		1,00	1,80
VASTAGO MURO 14TIPO E	3,30	3,60		1,00	11,88
VASTAGO MURO 14 TIPO E EN L	2,20	3,60		1,00	7,92
VASTAGO MURO 30 TIPO C	3,20	2,05		1,00	6,56
VASTAGO MURO 30 TIPO C EN L	1,55	2,05		1,00	3,18
VASTAGO MURO 17 TIPO E EN L	2,70	3,88		1,00	10,48
VASTAGO MURO 17 TIPO E EN L	1,70	3,88		1,00	6,60
VASTAGO MURO 3 TIPO C EN L	2,55	1,30		1,00	3,32
VASTAGO MURO 3 TIPO C EN L	3,45	1,30		1,00	4,49
VASTAGO MURO 5 TIPO C	4,10	2,16		1,00	8,86
VASTAGO MURO 29 TIPO D EN L	1,20	1,30		1,00	1,56

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,09	M2	GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024




ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	VASTAGO MURO 29 TIPO D EN L	2,00	2,60		1,00	5,20
	VASTAGO MURO 29 TIPO D EN L	1,50	2,60		1,00	3,90
	VASTAGO MURO 33 TIPO C EN L	2,70	1,60		1,00	4,32
	VASTAGO MURO 33 TIPO C EN L	2,00	1,60		1,00	3,20
	VASTAGO MURO 15 TIPO A EN L	3,50	1,20		1,00	4,20
	VASTAGO MURO 15 TIPO A EN L	1,50	1,20		1,00	1,80
	VASTAGO MURO 10 TIPO B	2,60	1,00		1,00	2,60
	MURO EMPALME ZRA SECCION 1	2,40		3,00	1,00	7,20
	MURO EMPALME ZRA SECCION 2	5,10		3,10	1,00	15,81
	MURO EMPALME ZRA SECCION 3	3,40		3,10	1,00	10,54
	MURO EMPALME ZRA SECCION 4	2,25		3,25	1,00	7,31
	MURO EMPALME ZRA SECCION 5	1,00		2,30	1,00	2,30
	MURO EMPALME ZRA SECCION 6	1,85		3,60	1,00	6,66
	MURO EMPALME ZRA SECCION 7	1,25		3,80	1,00	4,75
	MURO EMPALME ZRA SECCION 8	1,35		3,80	1,00	5,13
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 1	1,50		4,80	1,00	7,20
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 2	1,25		4,80	1,00	6,00
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 3	2,00		3,80	1,00	7,60
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 4	1,20		2,45	1,00	2,94

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,09	M2	GEODREN PLANAR H=1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	VASTAGO SOBRE MODULO 12 SECCION 5	2,60		1,70	1,00	4,42
	TOTAL				**M2**	**405,40**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M2**	**317,54**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M2**	**87,86**

OBSERVACIONES




VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
4,15	UNI	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA).	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	CARGUE POZO INICIAL SANITARIO				1,00	1,00
	CARGUE POZO FINALSANITARIO				1,00	1,00
	TOTAL				**UNI**	**2,00**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**UNI**	**1,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**UNI**	**1,00**

OBSERVACIONES



VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		**N/A**	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
4,19	ML	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		CANTIDAD	ANCHO	ALTO		
 	CAÑUELA CASA 4	2,42			1,00	2,42
	TOTAL				**ML**	**2,42**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**ML**	**0,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**ML**	**2,42**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		**N/A**	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
4,27	UNI	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		CANTIDAD	ANCHO	ALTO		
	RENIVELACION POZO SANITARIO PARTE BAJA				1,00	1,00
	TOTAL				UNI	1,00
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				UNI	0,00
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				UNI	1,00

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
6,06	M2	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024



LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	AREA	ANCHO	ALTO		
Nivelacion y compactacion de subrasante mes de junio	38,99			1,00	38,99
Nivelacion y compactacion de subrasante mes de julio	160,52			1,00	160,52
Nivelacion y compactacion de subrasante mes de agosto	26,20			1,00	26,20
Nivelacion y compactacion de subrasante mes de septiembre	62,57			1,00	62,57
PZ parte a PZ inicial	2,20	2,20		1,00	4,84
MURO 18	1,00	1,00		1,00	1,00
MURO EMPALEME PARTE BAJA COSTADO IZQUIERDO	4,00	1,80		1,00	7,20
MURO 27	1,70	1,15		1,00	1,96
MURO 4	3,70	2,00		1,00	7,40
MURO 15 EN T	3,15	1,10		1,00	3,47
MURO 15 EN T	2,15	1,10		1,00	2,37
SOLADO PARA POZO INICIAL SANITARIO	4,50	2,00		1,00	9,00
MURO 1 EN L	2,40	1,10		1,00	2,64
MURO 1 EN L	2,10	1,10		1,00	2,31
FALTANTE MURO 4	0,80	2,00		1,00	1,60
MURO 10	2,60	1,80		1,00	4,68
MURO EMPALME ZRA	8,70	2,90		1,00	25,23
parte central civ	40,00	3,50		1,00	140,00
TOTAL				**M2**	**501,97**
TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M2**	**336,74**
TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M2**	**165,23**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 | ACTA PARCIAL | 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
7,08	m2	CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO Y FUNDIDO EN SITIO E= 0,10 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO





LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
ENTRE MURO 4Y MURO 1, MURO 15	1,60	0,65		2,00	2,08
ENTRE MURO 5 Y MURO 2, MURO 15	0,60	0,80		2,00	0,96
ENTRE MURO 5 Y MURO 18	1,30	0,50		1,00	0,65
Cra 72 # 76-24	5,40	1,30		1,00	7,02
MATERA ENTRE MURO 10 Y MUROI 9	2,30	0,90		1,00	2,07
ANDEN ENTRE MURO 2 Y MURO 3	0,70	1,60		1,00	1,12
ANDEN ENTRE MURO 18 Y MURO 16	0,55	1,30		1,00	0,72
ANDEN ENTRE MURO 15 Y MURO 16	0,50	1,60		1,00	0,80
ANDEN PARTE BAJA FRENTE CASA 11	0,70	0,80		1,00	0,56
ANDEN PARTE BAJA FRENTE CASA 5	1,50	0,70		1,00	1,05
ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 1	1,30	1,20		1,00	1,56
ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 2	1,00	0,70		1,00	0,70
ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 3	2,30	0,70		1,00	1,61
ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 4	0,90	0,70		1,00	0,63
ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 5	0,90	0,40		1,00	0,36
TOTAL				**m2**	**21,89**
TOTAL ACTAS ANTERIORES				**m2**	**3,69**
TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**m2**	**18,20**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
7,11	ML	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	terraza casa 6 Cra 72 # 76A - 10	15,25			1,00	15,25
	terraza casa 1 Cra 72 # 76A - 27	8,75			1,00	8,75
	terraza casa 2 Cra 72 # 76A - 31	12,40			1,00	12,40
	terraza casa 10 Cra 72 # 76A - 30	13,85			1,00	13,85
	terraza casa 4 Cra 72 # 76A - 41	12,15			1,00	12,15
	terraza casa 11 seccion 1	12,70			1,00	12,70
	terraza casa 11 seccion 2	11,50			1,00	11,50
	terraza casa 9 Cra 72 # 76A - 24	6,70			1,00	6,70
	terraza casa 5	6,30			1,00	6,30
	terraza casa 8 Cra 72 # 76A - 20	6,70			1,00	6,70
	terraza casa 7 Cra 72 # 76A - 14	6,70			1,00	6,70
	terraza casa 1 Cra 72 # 76A - 27	6,70			1,00	6,70
	descanso entre muro 13 y muro 29	2,70			1,00	2,70
	descanso casa 5	5,30			1,00	5,30
	descanso entre muro 1 y casa 6	8,40			1,00	8,40
	descanso entre muro 3 y muro 18	1,90			1,00	1,90
	descanso entre muro 15 y muro 16	1,60			1,00	1,60
	TOTAL				**ML**	**139,60**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**ML**	**129,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**ML**	**10,60**

OBSERVACIONES

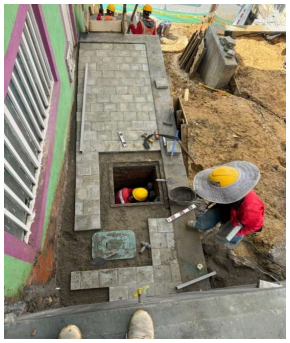
VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
7,12	M2	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR GRIS NATURAL O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO





LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
descanso entre muro 7 y muro 6	1,20	1,85		1,00	2,22
descanso entre muro 6 y muro 20	3,50	0,60		1,00	2,10
descanso entre casa 2 y casa 8 seccion 1	2,70	1,35		1,00	3,65
descanso entre casa 2 y casa 8 seccion 2	1,20	1,66		1,00	1,99
descanso entre casa 3 y casa 9 seccion 1	2,12	3,30		1,00	7,00
descanso entre casa 3 y casa 9 seccion 2	3,00	4,46		1,00	13,38
descanso entre casa 3 y casa 9 seccion 3	0,95	0,60		1,00	0,57
descanso entre casa 4 y casa 10 seccion 1	2,42	1,65		1,00	3,99
descanso entre casa 4 y casa 10 seccion 2	2,75	1,40		1,00	3,85
descanso entre muro 13 y muro 29	2,70	1,85		1,00	5,00
descanso entre casa 5 y casa 11	2,75	1,10		1,00	3,03
descanso entre casa 29A y casa 30	2,15	1,72		1,00	3,70
descanso entre casa 11 y casa 28	1,60	1,70		1,00	2,72
descuento toperol	45,77	0,20		-1,00	-9,15
descanso entre muro 1 y casa 6 seccion 1	6,40	3,15		1,00	20,16
descanso entre muro 1 y casa 6 seccion 2	1,70	0,75		1,00	1,28
descanso entre muro 3 y muro 18 seccion 1	4,80	1,25		1,00	6,00
descanso entre muro 3 y muro 18 seccion 2	2,90	0,60		1,00	1,74
descanso entre muro 3 y muro 18 seccion 3	2,40	1,30		1,00	3,12
descanso entre muro casa 11 y muro casa 5 parte baja seccion 1	6,90	0,60		1,00	4,14
descanso entre muro casa 11 y muro casa 5 parte baja seccion 2	3,00	0,55		1,00	1,65
descuento toperol	45,77	0,20		-1,00	-9,15
descuento pozo sanitario inicial	0,79			-1,00	-0,79
desceuento caja de inspeccio	0,80	0,80		-1,00	-0,64
descanso anden empalme vía	6,40	1,70		1,00	10,88
TOTAL				**M2**	**82,42**
TOTAL ACTAS ANTERIORES				**ML**	**0,00**
TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**ML**	**82,42**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
Miguel A Gutierrez	Sofia Pinzon	N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
7,13	ML	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	INSTALACIÓN SARDINE PARTE BAJA	6,40			1,00	6,40
	TOTAL				**ML**	**6,40**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**ML**	**0,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**ML**	**6,40**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
7,14	M2	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR OCRE O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO





LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
terraza casa 6 Cra 72 # 76A - 10	5,65	1,45		1,00	8,19
terraza casa 7 Cra 72 # 76A - 14	5,60	1,40		1,00	7,84
terraza casa 1 Cra 72 # 76A - 27	5,80	1,05		1,00	6,09
terraza casa 8 Cra 72 # 76A - 20	5,40	1,40		1,00	7,56
terraza casa 2 Cra 72 # 76A - 31	5,70	0,90		1,00	5,13
terraza casa 9 Cra 72 # 76A - 24	5,40	2,75		1,00	14,85
terraza casa 3 Cra 72 # 76A - 35 SECCION	3,25	4,40		1,00	14,30
terraza casa 3 Cra 72 # 76A - 35 SECCION	1,00	0,90		1,00	0,90
terraza casa 10 Cra 72 # 76A - 30	5,70	1,54		1,00	8,78
terraza casa 4 Cra 72 # 76A - 41	5,45	1,20		1,00	6,54
terraza casa 11 seccion 1	4,70	1,30		1,00	6,11
terraza casa 11 seccion 2	3,60	1,20		1,00	4,32
descuento cajillas	0,30	0,50		-10,00	-1,50
descuento cajas de inspeccion	0,80	0,80		-9,00	-5,76
terraza casa 5	5,40	1,00		1,00	5,40
TOTAL				**M2**	**88,75**
TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M2**	**83,35**
TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M2**	**5,40**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

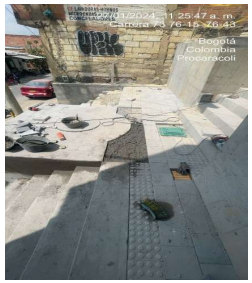
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 | ACTA PARCIAL | 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
7,16	ML	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 20CM X 20CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO, ACERO DE REFUERZO Y NIVELACIÓN EN ARENA)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO





LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CASA 4 CR 72 # 76 - 41	2,90			4,00	11,60
CASA 9 CR 72 # 76 - 24	2,20			2,00	4,40
CAS 2 CR 72 # 76 - 31	1,40			4,00	5,60
terraza casa 7 Cra 72 # 76A - 14	1,00			1,50	1,50
terraza casa 1 Cra 72 # 76A - 27	1,60			4,00	6,40
terraza casa 8 Cra 72 # 76A - 20	1,25			6,00	7,50
terraza casa 3 Cra 72 # 76A - 35 SECCION	2,20			1,00	2,20
terraza casa 10 Cra 72 # 76A - 30	0,90			3,50	3,15
terraza casa 11 seccion 1	1,70			3,00	5,10
terraza casa 11 seccion 2	1,20			1,50	1,80
Descanso entre muro 2 y muro 3	2,60	.		2,00	5,20
TOTAL				**ML**	**54,45**
TOTAL ACTAS ANTERIORES				**ML**	**49,25**
TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**ML**	**5,20**

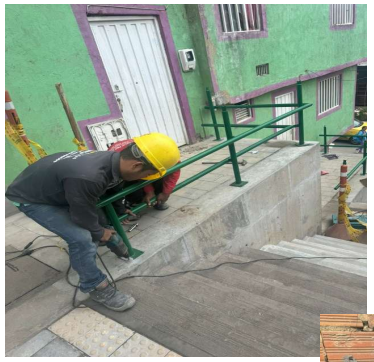
OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
8,01	ML	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	CASA 1	5,40				5,40
	CASA 1	2,60				2,60
	CASA 2	4,90				4,90
	CASA 3	7,10				7,10
	CASA 4	4,30				4,30
	CASA 5	2,40				2,40
	CASA 5	5,14				5,14
	CASA 6	6,50				6,50
	CASA 6	1,80				1,80
	CASA 7	6,30				6,30
	CASA 8	5,65				5,65
	CASA 9	4,30				4,30
	CASA 10	5,00				5,00
	CASA 10	4,50				4,50
	CASA 11	4,30				4,30
	CASA 11	4,00				4,00
	MURO 2	3,20				3,20
	MURO 16	2,60				2,60
	MURO 5	4,00				4,00
	MURO 3	1,70				1,70
	MURO JUNTO PZ SANITARIO PARTE BAJA	5,50				5,50
	MURO 15	2,10				2,10
	MURO 15	2,30				2,30
	MURO 4	4,60				4,60
	MURO 23A	1,60				1,60
	MURO 10	2,66				2,66
	MURO 27	1,43				1,43




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
8,01	ML	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	MURO 12	2,10				2,10
	MURO 29 A	2,40				2,40
	MURO EMPALME ZRA	20,48				20,48
	TOTAL				**ML**	**130,86**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				***ML***	**0,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				***ML***	**130,86**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		**N/A**	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP-16	M2	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO








LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
ENTRE MURO 4Y MURO 1, MURO 15	1,60	0,20		1,00	0,32
ENTRE MURO 4 Y MURO 2. MURO 16	4,10	0,20		1,00	0,82
ENTRE MURO 5 Y MURO 2, MURO 15	3,30	0,20		1,00	0,66
ENTRE MURO 5 Y MURO 18	1,51	0,20		1,00	0,30
ENTRE MURO 5 Y MURO 3	2,00	0,20		1,00	0,40
DESCANSO ENTRE MURO 6 Y MURO 20	7,80			1,00	7,80
DESCANSO ENTRE CASA 2 Y CASA 8	7,80			1,00	7,80
DESCANSO ENTRE CASA 3 Y CASA 9	6,52			1,00	6,52
DESCANSO ENTRE CASA 4 Y CASA 10	7,10			1,00	7,10
DESCANSO ENTRE MURO 13 Y MURO 29	3,60			1,00	3,60
DESCANSO ENTRE CASA 5 Y CASA 11 SECCION 1	7,00			1,00	7,00
DESCANSO ENTRE CASA 5 Y CASA 11 SECCION 2	2,75			1,00	2,75
DESCANSO ENTRE MURO 11 Y MURO 28	6,20			1,00	6,20
DESCANSO ENTRE MURO 1 Y CASA 6	1,60			1,00	1,60
DESCANSO ENTRE MURO 3 Y MURO 18	6,60			1,00	6,60
DESCANSO ENTRE MURO CASA 11 Y MURO CASA 5 PARTE BAJA	9,15			1,00	9,15
DESCANSO ENTRE MURO 2 Y CASA 3	2,60			1,00	2,60
DESCANSO ENTRE MURO 16 Y MURO 18	2,80			1,00	2,80
DESCANSO ENTRE MURO 5 Y MURO 4	4,12			1,00	4,12
DESCANSO ENTRE MURO 1 Y MURO 2	3,20			1,00	3,20
ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 1	1,10	0,20		1,00	0,22
ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 2	2,00	0,20		1,00	0,40
ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 3	2,30	0,20		1,00	0,46
ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 4	0,90	0,20		2,00	0,36

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP-16	M2	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	ANDÉN DESCANSO ENTRE MURO EMPALME ZRA SECCIÓN 5	0,90	0,20		1,00	0,18
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	TOTAL				**M2**	**82,96**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M2**	**2,50**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M2**	**80,46**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		**N/A**	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP-18	M3	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	LLENO APOYO MURO 13A	4,00	1,60	1,40	1,00	8,96
	CICLOPEO DETRÁS DE MURO 33	2,45	1,60	0,30	1,00	1,18
	CONCRETO CICLOPEO	0,50	0,30	2,80	1,00	0,42
	TOTAL				M3	10,56
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				M3	0,00
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				M3	10,56

OBSERVACIONES

En el Acta Parcial No. 9 se adjuntó la memoria de ejecución correspondiente al ítem en cuestión, con el fin de soportar el respectivo cobro para el CIV 5. Sin embargo, debido a observaciones y aclaraciones técnicas realizadas durante la revisión de obra, no se consideró la cantidad ejecutada evidenciada en dicha memoria.

Por lo anterior, y una vez verificada en campo la correcta ejecución del ítem, se adjunta nuevamente la memoria correspondiente para su reconocimiento en el marco del Acta Parcial No. 10, toda vez que se comprobó que la cantidad indicada sí fue efectivamente ejecutada, conforme a lo registrado en la memoria técnica.

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP 21	UND	Caja de inspeccion .60x.60 h=1 **.	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO





LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
CAJAS DE INSPECCION CR 72 # 76-41				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCION CR 72 # 76-30				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCION CR 72 # 76-24				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCION CR 72 # 76-35				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCION CR 72 # 76-27				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCION DE PASO PARTE ALTA CIV				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCION CR 72 # 76-31				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCION CR 72 # 76-20				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCION CR 72 # 76-14				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCION DE PASO PARTE BAJA CIV				1,00	1,00
CAJA DE INSPECCION CR 72 # 76A - 14	1,00	0,00		1,00	1,00
TOTAL				**UND**	**11,00**
TOTAL ACTAS ANTERIORES				**UND**	**10,00**
TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**UND**	**1,00**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
Miguel A Gutierrez	Sofia Pinzon	N/A	M. E-F
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP-24	UND	PELDAÑO- ESCALERA POZO EN POLIPROPILENO NP-074	19003909	CIV cra 72	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		CANTIDAD	ANCHO	ALTO		
 	POZO INICIAL SANITARIO				4,00	4,00
	TOTAL				UND	4,00
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				UND	-
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				UND	4,00

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN



DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
1,01	M2	REPLANTEO GENERAL	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
	MARZO	Area intervención No. 1 (Avance 5 de marzo)	4,50	1,44		2,00	13,00
	MARZO	Area intervención No. 2 (Avance 12 de marzo)	40,00	5,89		1,00	235,75
	ENE	Replanteo general para planos record	2,594	6,65		1,00	17,25
		TOTAL				**M2**	**266,00**
		TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M2**	**248,75**
		TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M2**	**17,25**

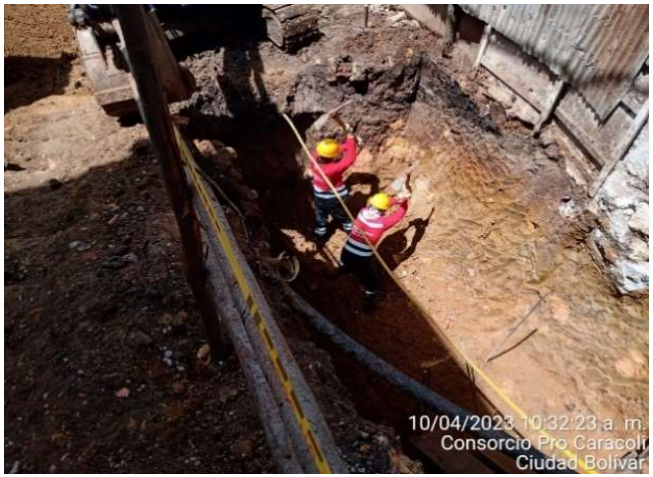
OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
			
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO





LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos / VOLUMEN	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
GAS NATURAL COSTADO IZQUIERDO	42,00	0,30	0,50		6,30
AGUA POTABLE PRIMER TRAMO	25,00	0,75	0,90		16,88
CIV Car 73A - Terraza Casa 2	3,42	0,50	1,53	0,50	1,31
CIV Car 73A - Terraza Casa 6	3,50	1,20	2,00	0,50	4,20
CIV Car 73A - Terraza Casa 7	3,70	0,20	1,00	0,50	0,37
CIV Car 73A - Terraza Casa 8	1,43	0,44	1,00	1,00	0,63
MURO 3 ZARPA Y DENTELLON				8,48	8,48
MURO 4 ZARPA Y DENTELLON				4,64	4,64
MURO 18 Y 19 ZARPA Y DENTELLON				17,71	17,71
MURO 20 Y 21 ZARPA Y DENTELLON				18,80	18,80
EXCAVACION ZARPAS DE MURO, DENTELLONES Y TUBERIA.				45,00	34,62
EXCAVACION ZARPAS DE MURO, DENTELLONES Y TUBERIA.				15,00	11,54
EXCAVACION ZARPAS DE MURO, DENTELLONES Y TUBERIA.				36,88	24,01
ZARPA Y DENTELLONES		1,00		15,00	11,54
ZARPA Y DENTELLONES		1,00		15,00	5,34
Excavación Manual de Zarpas 12	4,00	4,00	1,70	1,00	27,20
Instalacion de tuberia de 8" PZ inicial al PZ final	32,00	0,70	0,35	1,00	7,84
CRA 73a No. 76-45	4,47	0,60	0,35	1,00	0,94
CRA 73a No. 76- LOTE	3,43	0,60	0,25	1,00	0,51
CRA 73a No. 76-48	3,40	0,60	0,30	1,00	0,61
CRA 73a No. 76-54	3,10	0,60	0,30	1,00	0,56
CRA 73a No. 76-58	3,50	0,60	0,28	1,00	0,59
CRA 73a No. 76-63	3,50	0,60	0,30	1,00	0,63

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO









LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos / VOLUMEN	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
CRA 73a No. 76-57	3,20	0,60	0,20	1,00	0,38
CRA 73a No. 76-51	3,60	0,60	0,35	1,00	0,76
Excavación cajas de inspeccion de 60x60	0,90	0,90	1,00	2,00	1,62
Excavación cajas de inspeccion de 80x80	1,20	1,20	1,50	2,00	4,32
Excavacion pozo	2,00	2,00	0,90	1,00	3,60
excavación cajas de inspeccion de 80x80	1,20	1,20	1,00	3,00	4,32
excavación cajas de inspeccion de 60x60	0,90	0,90	0,80	1,00	0,65
Excavación Zarpas M-11	1,00	1,00	1,30	1,00	1,30
Excavación Zarpas M-13	1,00	1,00	1,80	1,00	1,80
Excavación Zarpas M-14	1,00	1,50	1,50	1,00	2,25
Excavación Zarpas M-15	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Excavación Zarpas M-26	4,00	1,20	1,30	1,00	6,24
Excavación Zarpas M-5	4,00	3,00	2,50	1,00	30,00
Excavación Zarpas M-1	5,00	2,50	1,00	1,00	12,50
Excavación Zarpas M-16	5,00	3,00	0,85	1,00	12,75
Excavacion red nueva de vanti	120,00	0,30	0,40	1,00	14,40
Excavacion instalacion red 1/2" agua potable	78,00	0,30	0,40	1,0	9,36
Excavación Zarpas M-1	4,00	1,50	2,50	1,00	15,00
ESCALERA ENTRE MURO 15 - MURO 26	6,15	0,40	0,30	1,00	0,74
ESCALERA ENTRE MURO 1 - MURO 16	4,76	0,40	0,30	1,00	0,57
ESCALERA ENTRE MURO 7 - MURO 22	1,30	0,40	0,30	1,00	0,16
ESCALERA Muro 12- 26	2,70	0,40	0,30	1,00	0,32
ESCALERA Muro 10- 25	4,10	0,40	0,30	1,00	0,49
ESCALERA Muro 5-6- 20-21	4,30	0,40	0,30	1,00	0,52
ESCALERA Muro 9- 24	3,90	0,40	0,30	1,00	0,47
ESCALERA Muro 4- 19	2,60	0,40	0,30	1,00	0,31

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos / VOLUMEN	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	ESCALERA Muro 3-18	4,00	0,40	0,30	1,00	0,48
	ESCALERA Muro 19- 2	2,80	0,40	0,30	1,00	0,34
	ESCALERA muro 11	3,40	0,40	0,30	1,00	0,41
	ESCALERA muro 12A y muro 26	6,10	0,40	0,30	1,00	0,73
	ESCALERA muro 21-7	3,50	0,40	0,30	1,00	0,42
	ESCALERA Muro 7- 22	4,20	0,40	0,30	1,00	0,50
	ESCALERA Muro 8- 23	2,55	0,40	0,30	1,00	0,31
	ESCALERA Muro 1 - Muro 16	4,4	0,40	0,30	1,00	0,53
	EXCAVACION ANDÉN PARTE BAJA	7,05	1,90	0,80	1,00	10,72
	TOTAL				**M3**	**346,50**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**328,48**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**18,02**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	**RESIDENTE DE OBRA**	**TOPOGRAFÍA**	**INTERVENTORIA**
			
FECHA: 02-03-2024	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos / VOLUMEN	Medida Total
		LARGO	AREA	ALTO		
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL					36,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN					23,18
	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO		55,66	0,15		8,35
	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO		35,68	0,12		4,28
	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M		36,14	0,15		5,42
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL					36,13
	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO		24,09	0,12		2,89
	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M		31,80	0,15		4,77
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN					56,14
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL					18,00
	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO		18,85	0,12		2,26
	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M		18,27	0,15		2,74
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL	11,54		3,46	30%	15,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	34,62		10,38	30%	45,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	11,54		3,46	30%	15,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	24,01		7,20	30%	31,21
	EXCAVACION DEL MES MARZO DE EXCAVACION MECANICA Y MANUAL	200,15		60,05	30%	60,05
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL	11,54		3,46	30%	15,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	11,54		3,46	30%	15,00
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL	11,54		3,46	30%	15,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	46,15		13,85	30%	60,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN DE ZARPAS M-12		21,00	27,30		27,30
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		22,36	29,07		29,07

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos / VOLUMEN	Medida Total
		LARGO	AREA	ALTO		
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		4,97	6,46		6,46
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		7,35	9,56		9,56
	Excavación Zarpas M-26		6,24	8,11		8,11
	Excavación Zarpas M-26		30,00	39,00		39,00
	Excavación Zarpas M-1		12,50	16,25		16,25
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		36,51	47,46		47,46
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN		15,00	19,50		19,50
	EXCAVACION ANDÉN PARTE BAJA	10,72	13,93		1,00	13,93
	TOTAL				**M3**	**688,05**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**674,12**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**13,93**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	**RESIDENTE DE OBRA**	**TOPOGRAFÍA**	**INTERVENTORIA**
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
4,05	M3	Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	Instalacion de tuberia de 8" PZ inicial al PZ final	18,00	0,70	0,30		3,78
	CRA 73a No. 76-45	4,47	0,60	0,30		0,80
	CRA 73a No. 76- LOTE	3,43	0,60	0,30		0,62
	CRA 73a No. 76-48	3,40	0,60	0,30		0,61
	CRA 73a No. 76-54	3,10	0,60	0,30		0,56
	descuento diametro Instalacion de tuberia de 8" PZ inicial al PZ final				-0,16	-0,16
	descuento diametro CRA 73a No. 76-45				-0,04	-0,04
	descuento diametro CRA 73a No. 76- LOTE				-0,03	-0,03
	descuento diametro CRA 73a No. 76-48				-0,03	-0,03
	descuento diametro CRA 73a No. 76-54				-0,03	-0,03
	CRA 73a No. 76-58	3,50	0,60	0,30		0,63
	CRA 73a No. 76-57	3,20	0,60	0,30		0,58
	CRA 73a No. 76-51	3,60	0,60	0,30		0,65
	CRA 73a No. 76-44	3,43	0,60	0,30		0,62
	descuento diametro CRA 73a No. 76-58				-0,03	-0,03
	descuento diametro CRA 73a No. 76-57				-0,03	-0,03
	descuento diametro CRA 73a No. 76-51				-0,03	-0,03
	descuento diametro CRA 73a No. 76-44				-0,03	-0,03
	Instalacion de tuberia de 8" PZ inicial al PZ final	14,00	0,70	0,30		2,94

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
4,05	M3	Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	CRA 73a No. 76-63	3,00	1,00	0,30		0,90
	Tuberia conexión sumidera oa pozo ALL	2,40	0,70	0,30		0,50
	TOTAL				M3	12,76
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				M3	12,26
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				M3	0,50


VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
4,11	M3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

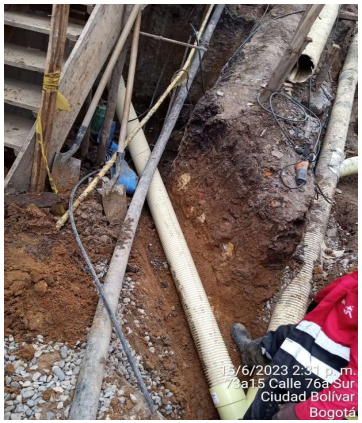
ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	excavacion tuberia sanitaria	4,00	0,70	1,50	1,00	4,20
	Excavacion valvula	2,00	4,00	0,70	1,00	5,60
	EXCAVACION CONEXIÓN CANAL POZO ALL	2,40	0,70	1,58	1,00	2,65
	TOTAL				**M3**	**12,45**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**9,80**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**2,65**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		**N/A**	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
4,32	ML	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	Instalacion de tuberia de 8" PZ inicial al PZ eje	18,00			1,00	18,00
	Instalacion de tuberia de 8" PZ inicial al PZ eje	14,00			1,00	14,00
	CONEXIÓN POZO ALL	2,40			1,00	2,40
	TOTAL				**ML**	**34,40**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**ML**	**32,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**ML**	**2,40**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
8,01	m2	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	muro 3	2,00			1,00	2,00
	muro 17	3,60			1,00	3,60
	muro 5	4,70			1,00	4,70
	muro 21	1,40			1,00	1,40
	muro 19	2,90			1,00	2,90
	muro 22	4,10			1,00	4,10
	muro 7	2,30			1,00	2,30
	muro 24	4,20			1,00	4,20
	muro 9	5,50			1,00	5,50
	muro 12	5,00			1,00	5,00
	muro 25	3,00			1,00	3,00
	MURO 12A	1,30			1,00	1,30
	MURO 23	1,80			1,00	1,80
	MURO 6	2,30			1,00	2,30
	MURO 20	3,30			1,00	3,30
	MURO 4	2,10			1,00	2,10
	AJUSTE MEDIDAS POR PASAMANOS	10,15			1,00	10,15
	***TOTAL***				**m2**	**59,65**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**m2**	**38,70**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**m2**	**20,95**

OBSERVACIONES



VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP-10	UNI	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1 V4 EAAB	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	PARTE BAJA CIV				1,00	1,00
	TOTAL				UNI	1,00
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				UNI	0,00
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				UNI	1,00

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP 18	M3	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024



ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	MURO 5	2,00	3,00	0,30	1,00	1,80
	MURO 17	2,20	2,00	0,30	1,00	1,32
	MURO 11 TIPO	3,40	1,35	0,30	1,00	1,38
	MURO 13 TIPO	1,00	1,00	0,30	1,00	0,30
	MURO 14 TIPO	1,35	1,20	0,30	1,00	0,49
	MURO 15 TIPO	0,90	0,70	0,30	1,00	0,19
	MURO 26	4,70	1,45	0,30	1,00	2,04
	atrás de muro 26	4,78	0,25	1,10	1,00	1,31
	TOTAL				**M3**	**8,83**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**0,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**8,83**

OBSERVACIONES

En el Acta Parcial No. 9 se adjuntó la memoria de ejecución correspondiente al ítem en cuestión, con el fin de soportar el respectivo cobro para el CIV 7. Sin embargo, debido a observaciones y aclaraciones técnicas realizadas durante la revisión de obra, no se consideró la cantidad ejecutada evidenciada en dicha memoria.

Por lo anterior, y una vez verificada en campo la correcta ejecución del ítem, se adjunta nuevamente la memoria correspondiente para su reconocimiento en el marco del Acta Parcial No. 10, toda vez que se comprobó que la cantidad indicada sí fue efectivamente ejecutada, conforme a lo registrado en la memoria técnica.

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		**N/A**	
FECHA: 02-03-2024	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP-24	UND	PELDAÑO- ESCALERA POZO EN POLIPROPILENO NP-074	19003890	CIV cra 73A	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		CANTIDAD	ANCHO	ALTO		
 	POZO INICIAL SANITARIO				3,00	3,00
	TOTAL				**UND**	**3,00**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**UND**	**-**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**UND**	**3,00**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		**N/A**	
FECHA: 02-03-2024	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-3-24**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
1,01	M2	REPLANTEO GENERAL	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
	MARZO	Area Intervencion No.1 (Avance 5 de marzo)	1,65	8,50		1,00	14,00
	MARZO	Area Intervencion No.2 (Avance 12 de marzo)	42,00	6,38		1,00	268,00
	ENE	Replanteo en parte baja de CIV -8	6,75	6,52		1,00	44,00
		TOTAL				**M2**	**326,00**
		TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M2**	**282,00**
		TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M2**	**44,00**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	**RESIDENTE DE OBRA**	**TOPOGRAFÍA**	**INTERVENTORIA**
FECHA: 02-03-2024	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA:**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024





ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	GAS NATURAL	42,00	0,30	0,52	2,00	13,10
	AGUA POTABLE TRAMO 1	19,00	0,75	0,90	1,00	12,83
	EXCAVACION AGUA POTABLE TRAMO 2	23,00	0,75	0,90	1,00	15,53
	EXCAVACION TUBERIA 8"	21,00	0,80	0,30	1,00	5,04
	EXCAVACION TUBERIA 6"	3,00	0,80	0,30	6,00	4,32
	RED DE GAS NATURAL 1/2"	1,50	0,50	0,30	6,00	1,35
	CIV Car 73B - Terraza Casa 1	3,76	0,96	1,50	0,50	2,71
	CIV Car 73B - Terraza Casa 2	5,70	0,60	1,60	0,50	2,74
	CIV Car 73B - Terraza Casa 3	4,60	0,70	2,60	0,50	4,19
	CIV Car 73B - Terraza Casa 4	5,90	1,00	1,70	0,50	5,02
	CIV Car 73B - Terraza Casa 5	5,90	0,82	1,60	0,50	3,87
	CIV Car 73B - Terraza Casa 6	2,90	1,18	0,42	0,50	0,72
	CIV Car 73B - Terraza Casa 7	2,60	0,55	1,26	0,50	0,90
	CIV Car 73B - Terraza Casa 8	3,64	0,48	1,62	0,50	1,42
	CIV Car 73B - Terraza Casa 9	3,54	0,30	1,17	0,50	0,62
	CIV Car 73B - Terraza Casa 10	4,63	1,00	1,60	0,50	3,70
	CIV Car 73B - Terraza Casa 11	5,73	0,70	2,49	0,50	4,99
	EXCAVACION ZARPA Y DENTELLON MURO 2 Y 3				20,85	20,85
	EXCAVACION ZARPA Y DENTELLON MURO 6				20,65	20,65
	EXCAVACION ZARPA Y DENTELLON MURO 4				29,51	29,51
	EXCAVACION DE ZARPAS, DENTELLON Y TUBERIAS			15,00	1,00	15,00
	EXCAVACION DE ZARPAS, DENTELLON Y TUBERIAS			45,00	1,00	45,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	EXCAVACION DE ZARPAS				29,38	29,38
	EXCAVACION DENTELLON				10,50	10,50
	EXCAVACION TUBERIA A.N.	12,00	0,60	0,90	6,502	6,50
	Excavacion manual de zarpa	2,00	3,21	1,80	1,00	11,54
	Excavación caja de inspeccion 80X80 Carrera 73B No. 76-78 Sur	1,00	1,00	1,60	1,00	1,60
	Excavación caja de inspeccion 60X60 Carrera 73B No. 76-45 Sur	0,80	0,80	1,00	1,00	0,64
	Excavación caja de inspeccion 80X80 Carrera 73B No. 76-52 Sur	1,00	1,00	1,60	1,00	1,60
	Excavación caja de inspeccion 60X60 Carrera 73B No. 76-51 Sur	0,80	0,80	1,20	1,00	0,77
	Excavación caja de inspeccion 60X60 Carrera 73B No. 76-39 Sur	0,80	0,80	1,10	1,00	0,70
	Excavación caja de inspeccion 80X80 Carrera 73B No. 76-35 Sur	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50
	Excavación de Zarpas 24	1,80	2,50	1,35	1,00	6,08
	Excavación de Zarpas 23	2,20	2,95	1,65	1,00	10,71
	Excavacion manual tubería de 12"	18,00	0,80	0,80	1,00	11,52
	CRA 73 No. 76-45	3,88	0,60	0,80	1,00	1,86
	CRA 73 No. 76-51	5,80	0,60	0,85	1,00	2,96
	CRA 73 No. 76-48	3,75	0,60	0,65	1,00	1,46
	CRA 73 No. 76-52	3,85	0,60	0,75	1,00	1,73
	CRA 73 No. 76-39	5,59	0,60	0,80	1,00	2,68
	CRA 73 No. 76-40	3,80	0,60	0,45	1,00	1,03
	Excavación de Zarpa muro 9	2,10	2,90	1,43	1,00	8,71
	Excavación de Zarpa muro 8	3,10	3,00	2,50	1,00	23,25
						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	Excavación caja de inspeccion 80X80 Carrera 73B No. 76-42 Sur	1,20	1,20	1,50	1,00	2,16
	Excavación caja de inspeccion 80X80 Carrera 73B No. 76-48 Sur	1,20	1,20	1,60	1,00	2,30
	Excavacion zarpa muro 1	3,00	2,50	2,00	1,00	15,00
	Excavacion zarpa muro 11	3,00	1,80	2,00	1,00	10,80
	Excavacion zarpa muro 12	4,00	1,60	2,10	1,00	13,44
	Excavacion zarpa muro 14	3,00	1,20	1,00	1,00	3,60
	Excavacion area baja para urbanismo	7,00	5,00	0,82	1,00	28,84
	Excavacion zarpa muro 27	4,20	3,00	1,00	1,00	12,60
	Excavacion zarpa muro 15	2,50	2,00	2,20	1,00	11,00
	Excavacion zarpa muro 27-28	4,00	1,00	2,00	1,00	8,00
	Excavacion manual para tuberia de vanti	128,08	0,40	0,40	1,00	20,49
	Excavacion manual para muro empalme ZRA	3,00	2,00	2,00	1,00	12,00
	Excavacion manual para muro junto a pozo inicial sanitario	4,00	1,50	0,85	1,00	5,10
	Excavacion manual para muro junto a pozo inicial lluvias	6,00	2,00	1,50	1,00	18,00
	EXCAVACION VIGA PARA ESCALERA ENTRE MURO 07 Y MURO 22 EN L	3,20	0,30	0,30	2,00	0,58
	EXCAVACION VIGA PARA ESCALERA ENTRE MURO 07 Y MURO 22 EN L	2,00	0,30	0,30	2,00	0,36
	EXCAVACION VIGAPARA ESCALERA ENTRE CASA 3 Y CASA 10 EN L	3,90	0,30	0,30	2,00	0,70
	EXCAVACION VIGA PARA ESCALERA ENTRE CASA 3 Y CASA 10 EN L	4,40	0,30	0,30	2,00	0,79
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 27 Y PZ SANITARIO PARTE BAJA	2,85	0,30	0,30	2,00	0,51
	EXCAVACION VIGA ESCALERA MURO 27	1,70	0,30	0,30	2,00	0,31

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024




ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 26 Y MURO 13	2,10	0,30	0,30	2,00	0,38
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 25 Y MURO 11	2,10	0,30	0,30	2,00	0,38
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 25A Y MURO 11	2,10	0,30	0,30	2,00	0,38
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 9 Y MURO 24	4,20	0,30	0,30	2,00	0,76
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 23 Y MURO 24	1,80	0,30	0,30	2,00	0,32
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 23 Y MURO 8	2,10	0,30	0,30	2,00	0,38
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 22 Y MURO 8	4,00	0,30	0,30	2,00	0,72
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE M4-M19	3,85	0,30	0,30	2,00	0,69
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE M6-M20	3,00	0,30	0,30	2,00	0,54
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 2 Y MURO 18	2,95	0,30	0,30	2,00	0,53
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 2 Y MURO 17	3,20	0,30	0,30	2,00	0,58
	EXCAVACION VIGA ESCALERA MURO 16	2,00	0,30	0,30	2,00	0,36
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 1 Y MURO 16	4,10	0,30	0,30	2,00	0,74

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 15 Y PZ SANITARIO	1,70	0,30	0,30	2,00	0,31
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 15 Y PZ LLUVIAS	3,00	0,30	0,30	2,00	0,54
	EXCAVACION VIGA ESCALERA ENTRE MURO 1 Y PZ LLUVIAS	1,20	0,30	0,30	2,00	0,22
	TOTAL				**M3**	**525,16**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**514,10**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**11,06**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
			
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,01	M3	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
			LARGO	AREA	ALTO		
	MARZO	SOLADO ZARPA MURO 2 Y 3		13,90	0,05		0,70
	MARZO	SOLADO ZARPA MURO 6		12,15	0,05		0,61
	MARZO	SOLADO ZARPA MURO 4		13,34	0,05		0,67
	ABRIL	SOLADO ZARPA MURO 14	1,50	2,00	0,05		0,15
	ABRIL	SOLADO ZARPA MURO 7	2,55	1,00	0,05	1,00	0,13
	ABRIL	SOLADO ZARPA MURO 18	1,10	1,20	0,05	1,00	0,07
	ABRIL	SOLADO ZARPA MURO 17	3,02	2,25	0,05	1,00	0,34
	ABRIL	SOLADO ZARPA MURO 16	2,00	1,50	0,05	1,00	0,15
	ABRIL	SOLADO ZARPA MURO 19	4,95	2,64	0,05	1,00	0,65
	ABRIL	SOLADO ZARPA MURO 20	3,00	3,50	0,05	1,00	0,53
	MAYO	SOLADO ZARPA MURO 20 TIPO E	3,60	3,00	0,05		0,54
	MAYO	SOLADO ZARPA MURO 23 TIPO E	2,10	3,20	0,05		0,34
	MAYO	SOLADO ZARPA MURO 23-2 TIPO E	1,80	2,75	0,05		0,25
	MAYO	SOLADO ZARPA MURO 24 TIPO E	5,10	3,20	0,05		0,82
	MAYO	SOLADO ZARPA MURO 24 TIPO E EXCEDENTE	0,70	3,20	0,05		0,11
	JUNIO	SOLADO MURO 10	4,60	3,90	0,05	1,00	0,90
	JUNIO	SOLADO MURO 13	3,60	3,90	0,05	1,00	0,70
	JUNIO	SOLADO MURO 22	5,20	2,80	0,05	1,00	0,73
	JUNIO	SOLADO MURO 26	5,30	1,60	0,05	1,00	0,42
	JUNIO	SOLADO MURO 9	4,50	3,90	0,05	1,00	0,88
	AGOSTO	SOLADO MURO 21 TIPO D	2,40	2,40	0,05	1,00	0,29

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,01	M3	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
			LARGO	AREA	ALTO		
	AGOSTO	SOLADO MURO 8 TIPO E EN U	2,70	2,05	0,05	1,00	0,28
	AGOSTO	SOLADO MURO 8 TIPO E EN U	1,00	0,80	0,05	1,00	0,04
	AGOSTO	SOLADO MURO 8 TIPO E EN U	2,06	1,50	0,05	1,00	0,15
	AGOSTO	SOLADO MURO 12 TIPO B	2,70	1,80	0,05	1,00	0,24
	AGOSTO	SOLADO MURO 14 TIPO A	2,70	1,30	0,05	1,00	0,18
	AGOSTO	SOLADO MURO 11 TIPO A	2,10	0,95	0,05	1,00	0,10
	AGOSTO	SOLADO MURO 1 TIPO D ESCALONADO	1,80	2,30	0,05	1,00	0,21
	AGOSTO	SOLADO MURO 1 TIPO D ESCALONADO	1,80	2,30	0,05	1,00	0,21
	AGOSTO	SOLADO MURO 1 TIPO D ESCALONADO	1,40	2,30	0,05	1,00	0,16
	SEPT.	SOLADO MURO 15	2,50	1,20	0,05	1,00	0,15
	SEPT.	SOLADO POZO ALL IV	2,10	2,10	0,05	1,00	0,22
	SEPT.	SOLADO POZO ALL PZ-1	2,10	2,10	0,05	1,00	0,22
	SEPT.	SOLADO POZO AN INICIAL	2,10	2,10	0,05	1,00	0,22
	SEPT.	SOLADO MURO 27-28	2,80	1,00	0,05	1,00	0,14
	OCT.	SOLADO ESCALERA ENTRE M8- M23	3,70	2,35	0,05	1,00	0,43
	OCT.	SOLADO ESCALERA ENTRE M4- M19	2,80	3,85	0,05	1,00	0,54
	OCT.	SOLADO ESCALERA ENTRE M6- M20	3,00	2,30	0,05	1,00	0,35
	OCT.	SOLADO ESCALERA ENTRE M17- 2	3,20	2,30	0,05	1,00	0,37

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,01	M3	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024



ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
			LARGO	AREA	ALTO		
	OCT.	SOLADO ESCALERA ENTRE M8- M23 faltante	2,00	2,40	0,05	1,00	0,24
	OCT.	SOLADO MURO EMPALME ZONA DE RECUPACION	1,80	1,70	0,05	1,00	0,15
	OCT.	SOLADO MURO JUNTO A POZO INICIAL SANITARIO EN L	7,00	1,20	0,05	1,00	0,42
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 1 Y MURO POZO COSTADO DERECHO	3,20	1,10	0,05	1,00	0,18
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 13 Y MURO 26	6,30	2,10	0,05	1,00	0,66
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 9 Y MURO 24	4,20	1,40	0,05	1,00	0,29
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 23Y MURO 24	1,70	1,40	0,05	1,00	0,12
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 25A Y MURO 11	3,00	2,10	0,05	1,00	0,32
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 23 Y MURO 8	2,40	2,10	0,05	1,00	0,25
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 22 Y MURO 8	4,00	1,70	0,05	1,00	0,34
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA MURO 16	1,20	1,00	0,05	1,00	0,06
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 1 Y MURO 16	4,15	1,70	0,05	1,00	0,35
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 15 Y PZ SANITARIO	2,05	1,70	0,05	1,00	0,17
	NOV.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 15 Y PZ LLUVIAS	3,00	1,30	0,05	1,00	0,20
	DIC.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 07 Y MURO 22 EN L	3,20	0,95	0,05	1,00	0,15
	DIC.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE MURO 07 Y MURO 22 EN L	2,00	0,90	0,05	1,00	0,09
	DIC.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE CASA 3 Y CASA 10 EN L	3,90	0,95	0,05	1,00	0,19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,01	M3	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
			LARGO	AREA	ALTO		
	DIC.	SOLADO PARA ESCALERA ENTRE CASA 3 Y CASA 10 EN L	4,40	0,65	0,05	1,00	0,14
	DIC.	ESCALERA ENTRE MURO 27 Y PZ SANITARIO PARTE BAJA	1,70	2,85	0,05	1,00	0,24
	DIC.	SOLADO ESCALERA MURO 27	1,20	1,70	0,05	1,00	0,10
	ENE	SOLADO ESCALERA ENTRE MURO 14 Y PZ PLUVIAL PARTE BAJA	2,15	0,40	0,05	1,00	0,04
		TOTAL				**M3**	**18,86**
		TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**18,82**
		TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**0,04**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		**N/A**	
FECHA: 02-03-2024	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA:**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

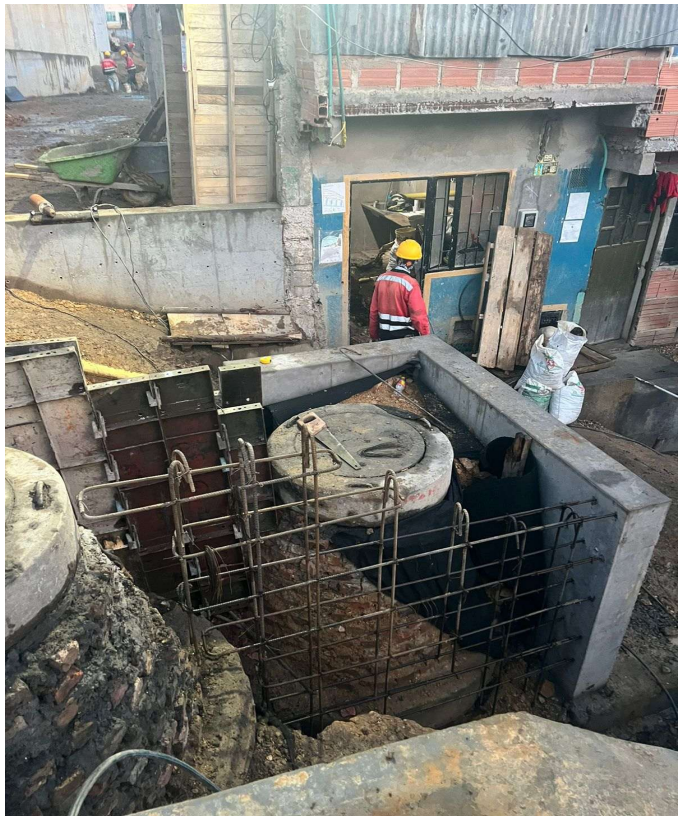
ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,03	KG	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			PESO KG	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
		ZARPA MURO 2				195,11	195,11
		ZARPA MURO 3				161,83	161,83
		ZARPA MURO 4 Y 5				225,28	225,28
		ZARPA MURO 6				348,45	348,45
		VASTAGO MURO 4				402,08	402,08
		VASTAGO MURO 3				173,49	173,49
		VASTAGO MURO 6				440,23	440,23
		ZARPA MURO 7				50,79	50,79
		ZARPA MURO 16				50,44	50,44
		ZARPA MURO 17				164,36	164,36
		ZARPA MURO 18				17,46	17,46
		ZARPA MURO 19				351,24	351,24
		VASTAGO MURO 16 TIPO A				23,79	23,79
		VASTAGO MURO 17 TIPO D				121,50	121,50
		VASTAGO MURO 18 TIPO A				9,72	9,72
		VASTAGO MURO 19 TIPO E				429,58	429,58
		VASTAGO MURO 16 TIPO A				28,68	28,68
		VASTAGO MURO 17 TIPO D				64,89	64,89
		VASTAGO MURO 20 TIPO E				407,26	407,26
		ZARPA MURO 20 TIPO E				222,20	222,20
		VASTAGO MURO 5 TIPO B				47,87	47,87
		VASTAGO MURO 7 TIPO A				56,44	56,44
		ZARPA MURO 23 TIPO E				89,47	89,47

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022	ACTA PARCIAL 10

PRO - CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,03	KG	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			PESO KG	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
		ZARPA MURO 24 TIPO E				389,96	389,96
		ZARPA MURO 23-2 TIPO E				199,82	199,82
		VASTAGO MURO 2 TIPO E				210,08	210,08
		ZARPA MURO 10 TIPO E				442,03	442,03
		VASTAGO MURO 24 TIPO E				543,36	543,36
		VASTAGO MURO 10 TIPO E				618,60	618,60
		ZARPA MURO 13 TIPO E				358,87	358,87
		PASANTE TUBERIA DE 12" EN MURO 13				63,29	63,29
		VASTAGO MURO 13 TIPO E				551,35	551,35
		PASANTE TUBERIA DE 12" EN MURO 10				63,39	63,39
		ZARPA MURO 22 TIPO E				370,39	370,39
		VASTAGO MURO 22 TIPO E				464,70	464,70
		ZARPA MURO 26 TIPO B				97,84	97,84
		VASTAGO MURO 26 TIPO B				201,17	201,17
		ZARPA MURO 9 TIPO E				350,14	350,14
		VASTAGO MURO 9				198,24	198,24
		refuerzo poste muro 8				25,26	25,26
		ZARPA MURO 8 TIPO E				232,21	232,21
		ZARPA MURO 21 TIPO D				109,01	109,01
		VASTAGO MURO 8 TIPO E				431,94	431,94
		VASTAGO MURO 21 TIPO D				145,46	145,46

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,03	KG	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			PESO KG	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
		VASTAGO MURO 25 TIPO B				31,97	31,97
		ZARPA MURO 14				58,25	58,25
		ZARPA MURO 12				104,09	104,09
		ZARPA MURO 11				35,80	35,80
		VASTAGO MURO 14				43,67	43,67
		VASTAGO MURO 12				144,11	144,11
		VASTAGO MURO 11 TIPO A				53,36	53,36
		ZARPA MURO 1 TIPO D				277,04	277,04
		VASTAGO MURO 1 TIPO D				263,91	263,91
		ZARPA MURO 27 TIPO A				61,34	61,34
		ZARPA MURO 15 TIPO A				43,58	43,58
		VASTAGO MURO 15 TIPO A				55,43	55,43
		VASTAGO MURO 27 TIPO A				86,99	86,99
		VASTAGO MURO 18 TIPO A				17,05	17,05
		ZARPA MURO EMPALME ZONA DE RECUPERACION TIPO C JUNTO A CASA KRA 73B #76-39				68,38	68,38
		VASTAGO MURO EMPALME ZONA DE RECUPERACION EN L JUNTO A CASA KRA 73B #76-39				95,34	95,34
		VASTAGO MURO JUNTO A POZO INICIAL SANITARIO DERECHA EN L				105,31	105,31
		ZARPA MURO JUNTO A POZO INICIAL SANITARIO EN L				106,70	106,70
		VASTAGO MURO JUNTO A POZO INICIAL SANITARIO COSTADO IZQUIERDO				55,17	55,17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,03	KG	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			PESO KG	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
		VASTAGO MURO JUNTO A POZO INICIAL LLUVIAS COSTADO DERECHO				51,49	51,49
		VASTAGO MURO 25A	32,74				32,74
		VASTAGO MURO 23	373,39				373,39
		ESCALERA ENTRE MURO 26 Y MURO 13	16,86			2,00	33,71
		ESCALERA ENTRE MURO 25 Y MURO 11	16,86			2,00	33,71
		ESCALERA ENTRE MURO 25A Y MURO 11	16,86			2,00	33,71
		ESCALERA ENTRE MURO 9 Y MURO 24	33,71			2,00	67,42
		ESCALERA ENTRE MURO 23 Y MURO 24	14,45			2,00	28,90
		ESCALERA ENTRE MURO 23 Y MURO 8	16,86			1,00	16,86
		ESCALERA ENTRE MURO 22 Y MURO 8	32,11			1,00	32,11
		ESCALERA ENTRE M4- M19	30,90			2,00	61,81
		ESCALERA ENTRE M6- M20	24,08			2,00	48,16
		ESCALERA ENTRE MURO 2 Y MURO 18	23,68			2,00	47,36
		ESCALERA ENTRE MURO 2 Y MURO 17	25,69			2,00	51,37
		ESCALERA MURO 16	16,05			2,00	32,11
		ESCALERA ENTRE MURO 1 Y MURO 16	32,91			2,00	65,82
		ESCALERA ENTRE MURO 15 Y PZ SANITARIO	13,65			2,00	27,29
		ESCALERA ENTRE MURO 15 Y PZ LLUVIAS	24,08			2,00	48,16
		ESCALERA ENTRE MURO 1 Y PZ LLUVIAS	9,63			2,00	19,26

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,03	KG	ACERO DE REFUERZO 6000 PSI	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			PESO KG	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
		VIGA PARA ESCALERA ENTRE MURO 07 Y MURO 22 EN L	25,69			2,00	51,37
		VIGA PARA ESCALERA ENTRE MURO 07 Y MURO 22 EN L	16,05			2,00	32,11
		VIGA PARA ESCALERA ENTRE CASA 3 Y CASA 10 EN L	31,30			2,00	62,61
		VIGA PARA ESCALERA ENTRE CASA 3 Y CASA 10 EN L	35,32			2,00	70,63
		VASTAGO MURO JUNTO PZ SANITARIO FINAL	64,20			1,00	64,20
		ESCALERA ENTRE MURO 27 Y PZ SANITARIO PARTE BAJA	22,88			2,00	45,75
		ESCALERA MURO 27	13,65			2,00	27,29
		VIGA SILLA ENTRE MURO 14 Y PZ PLUVIAL	17,26			1,00	17,26
		ACERO VIGA PARTE BAJA	20,00			1,00	20,00
		TOTAL				**KG**	**13353,35**
		TOTAL ACTAS ANTERIORES				**KG**	**13316,09**
		TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**KG**	**37,26**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,06	M3	CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRAVA COMÚN PARA PLACA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE FORMALETA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CURADO). NO INCLUYE REFUERZO.	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	ESCALERA ENTRE MURO 26 Y MURO 13	2,10	0,30	0,30	2,00	0,38
	ESCALERA ENTRE MURO 25 Y MURO 11	2,10	0,30	0,30	2,00	0,38
	ESCALERA ENTRE MURO 25A Y MURO 11	2,10	0,30	0,30	2,00	0,38
	ESCALERA ENTRE MURO 9 Y MURO 24	4,20	0,30	0,30	2,00	0,76
	ESCALERA ENTRE MURO 23 Y MURO 24	1,80	0,30	0,30	2,00	0,32
	ESCALERA ENTRE MURO 23 Y MURO 8	2,10	0,30	0,30	1,00	0,19
	ESCALERA ENTRE MURO 22 Y MURO 8	4,00	0,30	0,30	1,00	0,36
	ESCALERA ENTRE M4- M19	3,85	0,30	0,30	2,00	0,69
	ESCALERA ENTRE M6- M20	3,00	0,30	0,30	2,00	0,54
	ESCALERA ENTRE MURO 2 Y MURO 18	2,95	0,30	0,30	2,00	0,53
	ESCALERA ENTRE MURO 2 Y MURO 17	3,20	0,30	0,30	2,00	0,58
	ESCALERA MURO 16	2,00	0,30	0,30	2,00	0,36
	ESCALERA ENTRE MURO 1 Y MURO 16	4,10	0,30	0,30	2,00	0,74
	ESCALERA ENTRE MURO 15 Y PZ SANITARIO	1,70	0,30	0,30	2,00	0,31
	ESCALERA ENTRE MURO 15 Y PZ LLUVIAS	3,00	0,30	0,30	2,00	0,54
	ESCALERA ENTRE MURO 1 Y PZ LLUVIAS	1,20	0,30	0,30	2,00	0,22
	CONCRETO VIGA PARA ESCALERA ENTRE MURO 07 Y MURO 22 EN L	3,20	0,30	0,30	2,00	0,58
	CONCRETO VIGA PARA ESCALERA ENTRE MURO 07 Y MURO 22 EN L	2,00	0,30	0,30	2,00	0,36
	CONCRETO VIGAPARA ESCALERA ENTRE CASA 3 Y CASA 10 EN L	3,90	0,30	0,30	2,00	0,70

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
3,06	M3	CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRAVA COMÚN PARA PLACA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE FORMALETA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CURADO). NO INCLUYE REFUERZO.	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	CONCRETO VIGA PARA ESCALERA ENTRE CASA 3 Y CASA 10 EN L	4,40	0,30	0,30	2,00	0,79
	CONCRETO VIGA ESCALERA ENTRE MURO 27 Y PZ SANITARIO PARTE BAJA	2,85	0,30	0,30	2,00	0,51
	CONCRETO VIGA ESCALERA MURO 27	1,70	0,30	0,30	2,00	0,31
	VIGA SILLA ENTRE MURO 14 Y PZ PLUVIAL	2,15	0,55	0,30	1,00	0,34
	CONCRETO VIGA ANDÈN PARTE BAJA	3,20			1,00	3,20
	TOTAL				**M3**	**14,06**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**10,51**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**3,55**

OBSERVACIONES



VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
4,19	ML	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

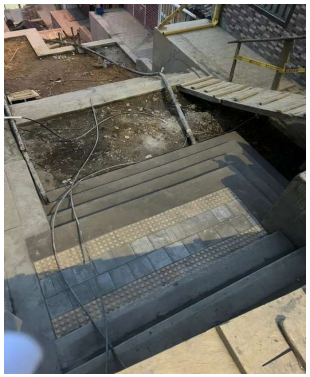
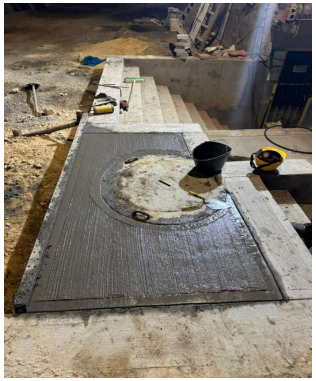
ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
		CAÑUELA CASA 4	2,70			1,00	2,70
		CAÑUELA CASA 9	1,50			1,00	1,50
		CAÑUELA CASA 10	1,80			1,00	1,80
		TOTAL PRESENTE ACTA N° 10				ML	6,00

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
7,08	M2	CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO Y FUNDIDO EN SITIO E= 0,10 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	junto a pozo pluvial	2,20	1,80		1,00	3,96
	junto a pozo sanitario	2,00	0,95		1,00	1,90
	descuento cargue pozo	0,79			-2,00	-1,57
	ANDÈN PARTE BAJA	3,20	1,20		1,00	3,20
	TOTAL				**M2**	**7,49**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				***M2***	**4,29**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				***M2***	**3,20**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
8,01	ML	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO







LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
MURO 13	5,10			1,00	5,10
MURO 11	2,20			1,00	2,20
MURO 26-25	9,00			1,00	9,00
MURO 10	5,70			1,00	5,70
MURO 9	4,40			1,00	4,40
MURO 23	3,60			1,00	3,60
MURO 8	3,55			1,00	3,55
MURO 22	5,60			1,00	5,60
MURO 6	3,90			1,00	3,90
MURO 20	3,40			1,00	3,40
MURO 4	2,90			1,00	2,90
MURO 3-2	5,10			1,00	5,10
MURO 17	2,40			1,00	2,40
MURO 16	2,40			1,00	2,40
MURO 15	2,30			1,00	2,30
MURO PZ	5,00			1,00	5,00
MURO 21	2,00			1,00	2,00
MURO 24	5,65			1,00	5,65
MURO 19	5,95			1,00	5,95
MURO 1	7,00			1,00	7,00
MURO PZ SANITARIO INICIAL	4,00			1,00	4,00
TOTAL				**ML**	**91,15**
TOTAL ACTAS ANTERIORES				**ML**	**59,25**
TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**ML**	**31,90**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP-18	M3	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			N.º Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	MURO 12	1,35	2,40	0,30	1,00	0,97
	MURO 14	1,10	2,70	0,30	1,00	0,89
	MURO 7	2,20	1,60	0,30	1,00	1,06
	MURO 18	2,30	1,80	0,30	1,00	1,24
	TOTAL				**M3**	**4,16**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**0,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**4,16**

OBSERVACIONES

En el Acta Parcial No. 9 se adjuntó la memoria de ejecución correspondiente al ítem en cuestión, con el fin de soportar el respectivo cobro para el CIV 8 . Sin embargo, debido a observaciones y aclaraciones técnicas realizadas durante la revisión de obra, no se consideró la cantidad ejecutada evidenciada en dicha memoria.

Por lo anterior, y una vez verificada en campo la correcta ejecución del ítem, se adjunta nuevamente la memoria correspondiente para su reconocimiento en el marco del Acta Parcial No. 10, toda vez que se comprobó que la cantidad indicada sí fue efectivamente ejecutada, conforme a lo registrado en la memoria técnica.

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CODIGO CIV	ZONA	PERIODO ACTA	
					Fecha inicio	Fecha fin
NP-24	UND	PELDAÑO- ESCALERA POZO EN POLIPROPILENO NP-074	19003888	CIV cra 73B	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	POZO INICIAL SANITARIO				4,00	4,00
	POZO INICIAL PLUVIAL				4,00	4,00
	POZO INICIAL PLUVIAL				3,00	3,00
	TOTAL				**UND**	**11,00**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**UND**	**0,00**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**UND**	**11,00**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
1,01	M2	REPLANTEO GENERAL	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	MES DE REG.	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
			LARGO	ANCHO	ALTO		
	MARZO	Zona de recuperacion ambiental					130,94
	MARZO	Replanteo de Muros, zarpas, terrazas y niveles de excavacion					1926,00
	ABRIL	Zona de recuperacion ambiental					1653,98
	ENE	COSTADO NORORIENTAL					981,51
 		***TOTAL***				**M2**	**4692,43**
		TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M2**	**3710,92**
		TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M2**	**981,51**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
1,03	M2	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO





LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
1. DEMOLICION DE CIMIENTO Y MURO	19,39	0,30	2,30		13,38
2. DEMOLICION DE CIMIENTO Y MURO	21,78	0,30	2,05		13,39
3. DEMOLICION DE CIMIENTO Y MURO	27,53	0,30	1,80		14,87
4. DEMOLICION DE CIMIENTO Y MURO	1,72	0,30	1,50		0,77
5. DEMOLICION DE CIMIENTO Y MURO	30,89	2,35	1,56		113,44
6. DEMOLICION DE CIMIENTO Y MURO	5,54	2,00	1,63		18,06
PILOTE ENCONTADO EN UBICACION MURO 1 MODULO 4	1,50	1,30	1,20		2,34
DEMOLICION DE VIGA EXISTENTE ZAPATA MURO 1 MODULO 5	5,00	0,60	1,00		3,00
DEMOLICION ROCAS CARRETEABLE MURO 3	8,00	3,00	1,50		36,00
DEMOLICION ROCAS CARRETEABLE MURO 3	2,75	2,10	1,80		10,40
DEMOLICIÒN ROCAS DE EXCAVACION CARRETEABLE MURO 3	1,00	1,70	1,20		2,04
	1,90	0,70	1,70		2,26
	1,20	1,80	1,00		2,16
	1,40	1,30	0,90		1,64
	1,00	1,90	0,70		1,33
	1,00	0,60	1,10		0,66
	1,10	0,90	1,00		0,99
	2,00	1,40	0,90		2,52
	0,85	0,50	0,80		0,34
	1,50	5,20	1,50		11,70
CARRETEABLE MURO 3	7,00	4,00	3,00		84,00
Demolicion de rocas en linea de tuberia	8,00	1,00	1,00		8,00
Demolicion de rocas en pozo sanitario	2,50	2,50	1,50		9,38
Demolicion de rocas terraza muro 6	5,00	4,50	1,50		33,75
Zapatas casa pazoleta muro 1 m6-m7	10,00	0,50	0,60		3,00
Zapatas casa pazoleta muro 1 m6-m7	10,00	0,70	0,60		4,20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
1,03	M2	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	demolicion de cimientro en muro 1 modulo 11	3,00	1,50	1,00		4,50
	Demolicion de rocas en linea de tuberia	8,00	1,00	1,00		8,00
	Demolicion de rocas en pozo sanitario	2,50	2,50	1,50		9,38
	Demolicion de rocas terraza muro 6	5,00	4,50	1,50		33,75
	Zapatas casa pazoleta muro 1 m6-m7	10,00	0,50	0,60		3,00
	Zapatas casa pazoleta muro 1 m6-m7	10,00	0,70	0,60		4,20
	DEMOLICIÓN ZAPATAS	1,00	0,80	1,20	4,00	3,84
	DEM OLICION DE ROCAS EN MURO 2 PROTECCION DE CASA	13,00	1,00	0,80	1,00	10,40
	TOTAL				**M2**	**470,67**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M2**	**456,43**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M2**	**14,24**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN

DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
		N/A	
FECHA: 02-03-2024	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**	**FECHA: 02-03-2024**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO - CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	ZARPA MURO 4 MODULO 1	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 4 MODULO 2	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 4 MODULO 3	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 4 MODULO 4	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 4 MODULO 4	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 5 MODULO 1	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 5 MODULO 2	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 5 MODULO 3	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 5 MODULO 4	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 5 MODULO 5	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 3 MODULO 1	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 3 MODULO 2	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 3 MODULO 3	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 2 MODULO 1	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 2 MODULO 2	8,00	3,50	0,50		14,00
	ZARPA MURO 7 MODULO 1	8,00	1,75	0,40		5,60
	ZARPA MURO 7 MODULO 2	8,00	1,75	0,40		5,60
	MURO 1 MODULO 2	8,00	1,75	0,50		7,00
	MURO 1 MODULO 4	8,00	2,70	0,50		10,80
	MURO 1 MODULO 5	8,00	2,70	0,50		10,80
	MURO 1 MODULO 6	8,00	2,70	0,50		10,80
	MURO 2 MODULO 3	8,00	3,50	0,50		14,00
	MURO 3 MODULO 4	8,00	2,70	0,50		10,80
	MURO 3 MODULO 5	8,00	2,70	0,50		10,80
	MURO 3 MODULO 6	8,00	2,70	0,50		10,80
	MURO 2 MODULO 3	8,00	2,70	0,50		10,80
	MURO 2 MODULO 4	8,00	2,70	0,50		10,80
						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO - CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	MURO 2 MODULO 5	8,00	2,70	0,50		10,80
	MURO 2 MODULO 6	8,00	2,70	0,50		10,80
	MURO 2 MODULO 7	8,00	2,70	0,50		10,80
	Zarpa muro 3 Modulo 4	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 3 Modulo 5	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 3 Modulo 6	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 3 Modulo 7	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 3 Modulo 8	4,10	3,50	0,50		7,18
	Zarpa muro 5 Modulo 6	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 7 Modulo 3	8,00	1,75	0,50		7,00
	Zarpa muro 7 Modulo 4	8,00	1,75	0,50		7,00
	Zarpa muro 1 Modulo 2	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 1 Modulo 3	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 3	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 4	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 5	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 6	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 7	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 8	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 3 Modulo 4	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 3 Modulo 5	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 3 Modulo 6	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 6	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 7	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 8	8,00	3,50	0,50		14,00
	Zarpa muro 2 Modulo 9	8,50	4,00	0,50		17,00
	Zarpa muro 2 Modulo 10	8,50	4,00	0,50		17,00





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO







LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	LARGO	ANCHO	ALTO		
Zarpa muro 2 Modulo 11	8,50	4,00	0,50		17,00
Zarpa muro 2 Modulo 12	8,50	4,00	0,50		17,00
Zarpa muro 2 Modulo 13	8,50	4,00	0,50		17,00
Zarpa muro 6 Modulo 1	8,00	3,50	0,50		14,00
Plazoleta muro 7 modulo 1-2-3	24,00	5,00	0,30		36,00
Plazoleta muro 4 modulo 6-7-8	24,00	5,50	1,00		132,00
Plazoleta muro 1 m5 - m6	14,00	5,00	0,30		21,00
Excavacion manual zarpa muro 4 m 9	8,00	3,50	0,50		14,00
Plazoleta muro 1 m1- m2-m3-m4-m7	40,00	5,00	0,30		60,00
Excavacion manual zarpa muro 6 m 1	8,00	3,50	0,50		14,00
EXCAVACION MANUAL TERRAZA 1	30,00	5,00	0,40		60,00
EXCAVACION MANUAL ZARPA MURO 4 M9-M10	8,15	4,00	0,50		16,30
EXCAVACION MANUAL TERRAZA 1	15,00	5,00	0,40		30,00
EXCAVACION MANUAL ZARPA MURO 4 M11	8,15	4,00	0,50		16,30
EXCAVACION MANUAL TERRAZA 1	15,00	5,00	0,40		30,00
EXCAVACION MANUAL ZARPA MURO 6 M 2	8,15	4,00	0,50		16,30
EXCAVACION MANUAL ZARPA MURO 6 M 3	8,15	4,00	0,50		16,30
EXCAVACION MANUAL ZARPA MURO 6 M 4	8,15	4,00	0,50		16,30
EXCAVACION PARA CICLOEO TERRAZA 1	12,00	0,50	0,60	1,00	3,60
EXCAVACION PARA ZARPAS MURO 1 MODULO 8,9 Y 10	9,00	5,00	0,25	3,00	33,75
EXCAVACION PARA DENTELLON MURO 1 MODULO 8,9 Y 10	9,00	0,60	0,50	3,00	8,10
EXCAVACIÓN CARCAMO	38,10	0,50	0,65	1,00	12,38
EXCAVACION PARA ZARPAS MURO 1 MODULO 11.12.13	24,00	3,00	0,10		7,20
EXCAVACION PARA DENTELLON MURO 1 MODULO 11.12.13	24,00	0,50	0,50		6,00
EXCAVACION PARA DENTELLON MURO 1 MODULO 14, MODULO 15	16,00	0,50	0,50		4,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	EXCAVACIÓN MUROS PROTECCION DE FACHADAS ENTRE CIV 5 Y CIV 6	16,00	2,00	1,00		32,00
	EXCAVACIÓN DENTELLON MUROS PROTECCION DE FACHADAS ENTRE CIV 5 Y CIV 7	16,00	0,40	0,40		2,56
	EXCAVACIÓN MUROS PROTECCION DE FACHADAS ENTRE CIV 6 Y CIV 7	20,00	1,80	1,00		36,00
	EXCAVACION PARA DENTELLON MUROPROTECCION DE FACHADAS ENTRE CIV 6 Y CIV 7	27,00	0,40	0,40		4,32
	EXCAVACION PARA DENTELLON MURO 4 MODULO 18	8,00	0,50	0,50		2,00
	EXCAVACIÓN PARA CARCAMO DESDE CIV 5 HASTA CIV 7	63,10	0,50	0,45		14,20
	EXCAVACIÓN PARA CICLOPEO FINALIZACIÓN MURO 2	4,40	1,10	1,30		6,29
	EXCAVACIÓN PARA SUMIDERO CIV 7	1,70	1,30	2,15		4,75
	TOTAL				**M3**	**1402,83**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**1283,51**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**119,32**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,02	M3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos / VOLUMEN	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
 	Semana del 5 de marzo				15,00	15,00
	Semana del 12 de marzo				687,00	687,00
	Semana del 19 de marzo				755,15	755,15
	Semana del 26 de marzo				1395,00	1395,00
	Semana del 31 de marzo				133,35	133,35
	CONFORMACION DE TERRAZAS Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	42,00	15,00			630,00
	CONFORMACION DE TERRAZAS Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	61,00	15,00			915,00
	CONFORMACION DE TERRAZAS Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO				1902,63	1902,63
	DESCUENTO DEMOLICION ACTA No.1 DEL ITEM 1.03 MES DE MARZO				-173,91	-173,91
	DESCUENTO EXCAVACION MANUAL ACTA No.1 DEL ITEM 2.01 MES DE ABRIL				-70,00	-70,00
	CONFORMACION DE TERRAZAS Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	91,00	15,00			1050,00
	CONFORMACION DE TERRAZAS Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	109,00	15,00			1257,69
	CONFORMACION DE TERRAZAS Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	60,00	15,00			692,31
	CONFORMACION DE TERRAZAS Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO				166,27	166,27
	Excavacion de terrazas y replanteo	22,00	15,00			253,85
	Excavacion de terrazas y replanteo	89,00	15,00			1026,92
	Excavacion de terrazas y replanteo	28,00	15,00			323,08
	Excavacion de terrazas y replanteo	3,00	15,00			34,62
	DIFERENCIA DE CONSOLIDADO CON TOPOGRAFIA HASTA EL 30 DE JUNIO				1422,43	1422,43

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,02	M3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos / VOLUMEN	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	DESCUENTO DEMOLICONES ITEM 1,03 DE JUNIO				51,74	-51,74
	DESCUENTO EXCAVACIÓN MANUAL DE ZARPAS ITEM 2,01				139,80	-139,80
	Excavacion de terrazas y replanteo	20,00	240,00			240,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	20,00	240,00			240,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	20,00	240,00			240,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	85,00	1044,75			749,66
	DESCUENTO DEMOLICIÒN DE CIMIENTOS ENTERRADOS				-25,64	-25,64
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.				-245,18	-245,18
	Excavacion de terrazas y replanteo	50,00	750,00			600,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	11,00	165,00			132,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	9,00	135,00			108,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	10,00	150,00			115,38
	Excavacion de terrazas y replanteo				566,73	566,73
	DESCUENTO DE DEMOLICION DE CIMIENTOS ENTERRADOS				-84,00	-84,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	6,00	90,00			72,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	25,00	375,00			300,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	25,00	375,00			300,00
	Excavacion de terrazas (diferencia de topografia restante)				529,75	529,75
	Excavacion de terrazas y replanteo	20,00	300,00			240,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	10,00	150,00			120,00
	Excavacion de terrazas y replanteo	7,00	105,00			80,77
	Excavacion de terrazas y replanteo	5,00	75,00			60,00
	Excavacion de terrazas	2,00	30,00			23,08
	Excavacion de terrazas 1	4,00	60,00			46,15
	Excavacion de terrazas 2	0,00	80,00			80,00






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,02	M3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos / VOLUMEN	Medida Total
		LARGO	ANCHO	ALTO		
	EXCAVACION PARA MURO 1 MODULO 10	3,00	45,00			34,62
	EXCAVACION PARA MURO 1 MODULO 11	23,00	345,00			265,38
	EXCAVACION PARA ZARPAS MURO 1 MODULO 11,12,13	24,00	3,00	1,40		100,80
	EXCAVACION PARA ZARPAS MURO 1 MODULO 14, MODULO 15	18,00	3,70	1,80		119,88
	EXCAVACION PARA ZARPAS MURO 2 MODULO 13	15,00	3,80	2,50		142,50
	Excavacion terrazas 2 y 3				49,15	49,15
	Excavacion terraza 2 y 3	29,00	334,62			334,62
	Excavacion muros estructurales empalmne terraza3	37,00	426,92			426,92
	Excavacion zona empalme	40,00	461,54			461,54
	TOTAL				**M3**	**18648,97**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**17013,56**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**1635,41**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
			
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		VOLUMEN	ANCHO	EXPANSION		
	Zona de recuperacion ambiental	15,00				15,00
	Zona de recuperacion ambiental	687,00				687,00
	Zona de recuperacion ambiental	755,15				755,15
	Zona de recuperacion ambiental	1395,00				1395,00
	Zona de recuperacion ambiental	133,35				133,35
	Zona de recuperacion ambiental exc. Mecanica	42,00	15,00	1,30		819,00
	Zona de recuperacion ambiental exc. Mecanica	61,00	15,00	1,30		1189,50
	Zona de recuperacion ambiental exc. Mecanica	1658,72		1,30		2156,34
	Zona de recuperacion ambiental exc. Manual para solados zarpa	70,00		1,30		91,00
	EXPANSION MES DE MARZO	895,65				895,65
	Transporte demolicion de muros del mes de marzo	173,91		1,30		173,91
	Excavacion manual de zarpas	70,00		1,30		91,00
	Excavacion Mecanica en material comun	1050,00		1,30		1365,00
	Excavacion manual de zarpas	42,00		1,30		54,60
	Excavacion Mecanica en material comun	1257,69		1,30		1635,00
	Excavacion manual de zarpas	39,20		1,30		50,96
	Excavacion Mecanica en material comun	692,31		1,30		900,00
	Excavacion Mecanica en material comun	166,27		1,30		216,15
	Retiro de material proveniente de excavación	253,85		330,00		330,00
	Retiro de material proveniente de excavación	1026,92		1335,00		1335,00
	Retiro de material proveniente de excavación	323,08		420,00		420,00
	DEMOLICION DE ROCAS	41,34				41,34
	Retiro de material proveniente de excavación	34,62		45,00		45,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO





LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	VOLUMEN	ANCHO	EXPANSION		
EXCAVACIO MANUAL ZARPAS	53,40		69,42		69,42
DEMOLICION DE ROCAS	10,40				10,40
EXCAVACIO MANUAL ZARPAS	86,40		112,32		112,32
DIFERENCIA DE TOPOGRAFIA	1230,90		1600,17		1600,17
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	77,18		100,33		100,33
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	240,00		312,00		312,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	42,00		54,60		54,60
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	240,00		312,00		312,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	56,00		72,80		72,80
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	240,00		312,00		312,00
DEMOLICION DE ROCAS	25,64				25,64
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	70,00		91,00		91,00
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	478,85		622,50		622,50
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	14,00		18,20		18,20
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	600,00		780,00		780,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	28,00		36,40		36,40
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	132,00		171,60		171,60
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	51,00		66,30		66,30
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	108,00		140,40		140,40
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	17,00		22,10		22,10
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	115,38		150,00		150,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	17,00		22,10		22,10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		VOLUMEN	ANCHO	EXPANSION		
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	482,73		627,55		627,55
	DEMOLICION	84,00				84,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	14,00		18,20		18,20
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	72,00		93,60		93,60
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	36,00		46,80		46,80
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	300,00		390,00		390,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	132,00		171,60		171,60
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	300,00		390,00		390,00
	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	17,38				17,38
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	529,75		688,68		688,68
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	35,00		45,50		45,50
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	240,00		312,00		312,00
	DEMOLICION PLACA	5,60				5,60
	DEMOLICION CIMIENTOS	36,75				36,75
	DEMOLICION MUROS	5,25				5,25
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	185,30		240,89		240,89
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	120,00		156,00		156,00
	DEMOLICIONES PLACAS	13,80				13,80
	DEMOLICIONES CIMIENTOS	4,20				4,20
	DEMOLICION MUROS	5,00				5,00
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TUBERIAS	24,00		31,20		31,20
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	80,77		105,00		105,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS	
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022 / ACTA PARCIAL / 10	PRO-CARACOLI CONSORCIO

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO









LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
	VOLUMEN	ANCHO	EXPANSION		
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	60,00		78,00		78,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	76,30		99,19		99,19
Excavacion manual para retiro de red de PEAD 8" acueducto	46,40		60,32		60,32
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	23,08		30,00		30,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	46,30		60,19		60,19
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	62,60		81,38		81,38
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	46,15		60,00		60,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	16,30		21,19		21,19
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	80,00		104,00		104,00
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	34,62		45,01		45,01
EXCAVACION MANUAL	3,60		4,68		4,68
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	265,38		344,99		344,99
EXCAVACION MANUAL	41,85		54,41		54,41
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	12,38		16,09		16,09
EXCAVACIÓN MANUAL	13,20		17,16		17,16
EXCAVACIÓN MECANICA	100,80		131,04		131,04
EXCAVACIÓN SUMIDERO PLACA VALOR SOCIAL	1,87		2,43		2,43
Excavacion mecanica CIV 5	2,12		2,76		2,76
Excavacion Manual	74,56		96,93		96,93
Excavacion Mecanica	311,53		404,99		404,99
DEMOLICION DE ROCAS EN MURO 2 PROTECCION DE CASA	10,40				10,40
Excavacion Mecanica	334,62		435,01		435,01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	CAJA DE VIVIENDA POPULAR		PRO-CARACOLI CONSORCIO
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS		
	CONSORCIO PROCARACOLI - CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-720-2022	ACTA PARCIAL 10	

ÍTEM	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ZONA	PERIODO	
				Fecha inicio	Fecha fin
2,04	M3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	ZONA RECUPERACION AMBIENTAL	27/02/2023	02/03/2024

ÁREA PARA FOTOGRAFÍA O GRÁFICO ESQUEMÁTICO	LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN	Dimensiones (m)			Nº Elementos	Medida Total
		VOLUMEN	ANCHO	EXPANSION		
	Excavacion Mecanica	426,92		555,00		555,00
	Excavacion Manual	31,56		41,03		41,03
	Excavacion Mecanica	461,54		600,00		600,00
	Excavacion manual Item 4.11	261,48		339,92		339,92
	TOTAL				**M3**	**27082,31**
	TOTAL ACTAS ANTERIORES				**M3**	**24445,66**
	TOTAL PRESENTE ACTA No.10				**M3**	**2636,65**

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN - ACEPTACIÓN			
DIRECTOR OBRA O PMP	RESIDENTE DE OBRA	TOPOGRAFÍA	INTERVENTORIA
			
FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024	FECHA: 02-03-2024
