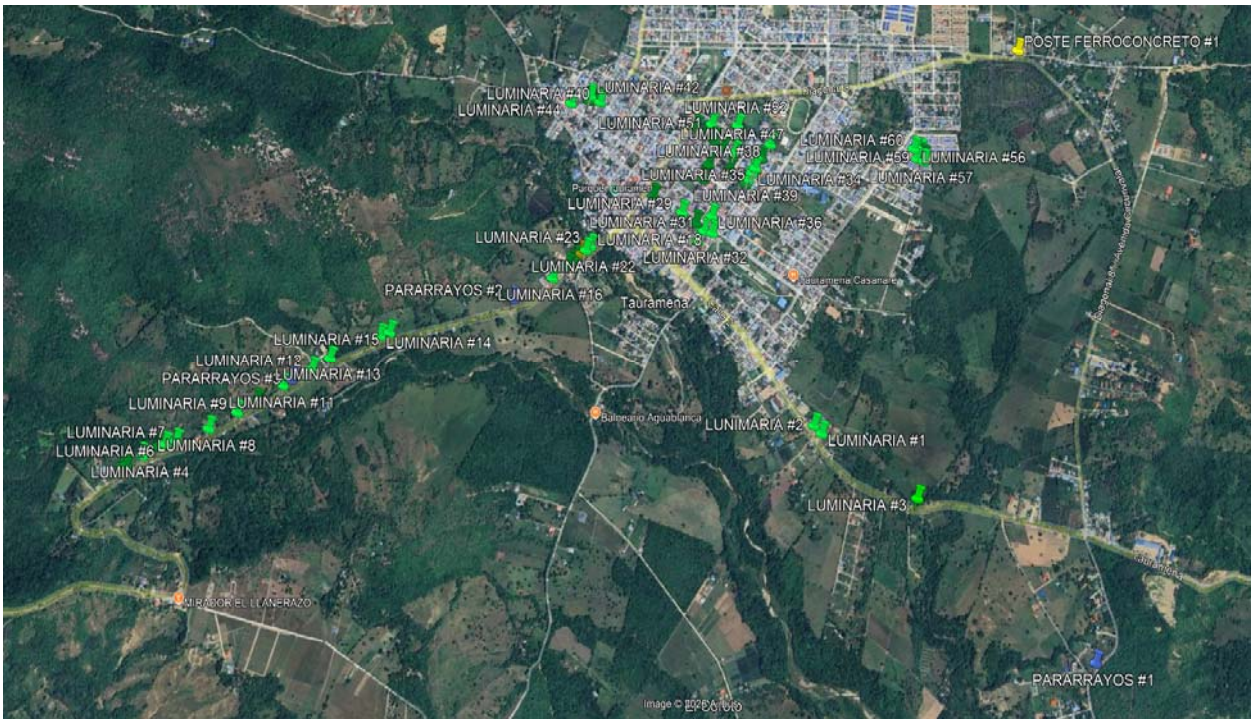
	INFORME ACTA PARCIAL 2	INFORME DE CONSULTORIA *No. 524/2025*		
		8	5	2026
	PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 A MARZO DE 2026	**DD**	**MM**	**AA**

REALIZAR LA INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURíDICA Y AMBIENTAL REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.



MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MAYO 2026

REALIZAR LA INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURíDICA Y AMBIENTAL REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTRATO DE CONSULTORIA

INFORME ACTA PARCIAL 02
Diciembre de 2025 - Mayo de 2026

PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.
Contratista

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Supervisor

MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Mayo 2026

INTRODUCCIÓN

La interventoría tiene por objeto ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental al Contrato de Servicios No. 543 del 03 de diciembre de 2025, cuyo objeto corresponde a: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA”, suscrito entre el Municipio de Tauramena y PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.

El presente informe comprende el periodo de ejecución correspondiente entre el 19 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, durante el cual la interventoría realizó el respectivo seguimiento y control a las actividades desarrolladas por el contratista, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificaciones técnicas, cantidades ejecutadas y condiciones operativas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema de alumbrado público del municipio.

Durante el periodo evaluado, se evidenció la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en diferentes sectores urbanos y rurales del municipio, incluyendo revisión de circuitos, reposición e instalación de luminarias LED, cambio de fotoceldas, instalación de postes de ferroconcreto, adecuación de redes eléctricas y demás componentes asociados al sistema de alumbrado público.

Así mismo, se realizaron actividades complementarias relacionadas con poda y rocería de vegetación que interfería con las redes eléctricas, inspecciones técnicas diurnas y nocturnas, acompañamiento operativo a la empresa ENERCA y apoyo a actividades comunitarias mediante instalación temporal de equipos de iluminación.

Las actividades ejecutadas fueron verificadas por la interventoría conforme a las especificaciones técnicas contractuales, manuales de mantenimiento y lineamientos establecidos para este tipo de infraestructura, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y funcionamiento requeridas para la correcta prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Tauramena.

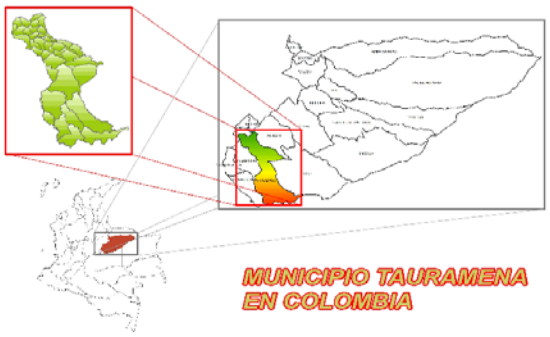
1.0 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS

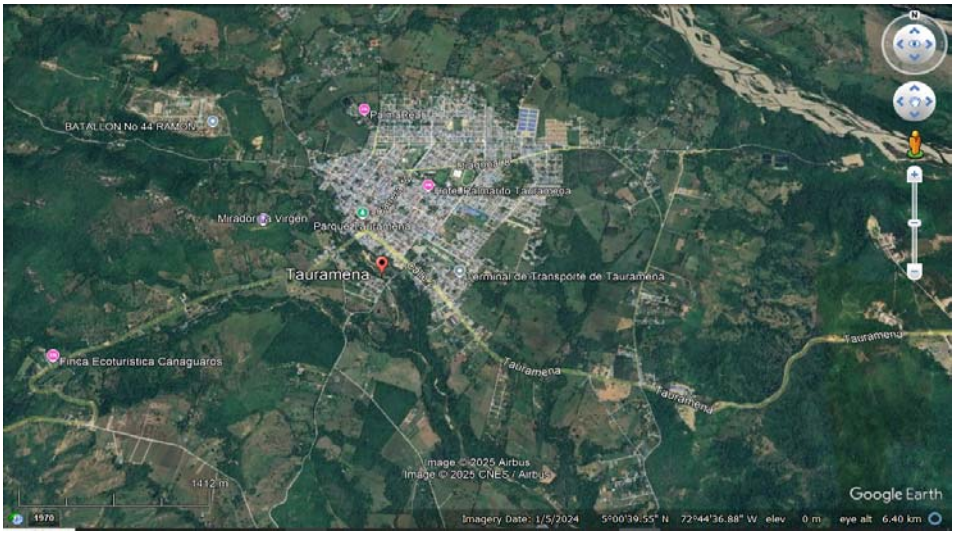
1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El municipio de Tauramena se localiza en la zona suroccidental del Departamento de Casanare; tiene una extensión aproximada de 2607.2 Km2 equivalentes al 5.8 % del total del departamento, cuya extensión es de 44640 Km2.

Ambas entidades territoriales se ubican en la región natural conocida como Orinoquia colombiana que tiene una extensión de 254.445 Km2, equivalentes al 22.3% de la superficie nacional. Su cabecera municipal se localiza a los 5.01'07" de latitud norte y 72.45'19" de longitud Oeste

El presente proyecto se desarrolla en el Area urbana y rural del municipio de tauramena, departamento de Casanare





1.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto contempla la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alumbrado público del municipio de Tauramena, incluyendo la inspección, revisión, diagnóstico, reparación, reposición e instalación de elementos eléctricos y de infraestructura necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema en el casco urbano, zonas rurales y vías principales del municipio.

Dentro del alcance contractual se incluyen actividades relacionadas con la atención de fallas en circuitos de alumbrado público, cambio de luminarias, fotoceldas y accesorios eléctricos, instalación y reposición de postes de ferroconcreto, adecuación de redes eléctricas, montaje de brazos metálicos y demás elementos requeridos para mejorar las condiciones operativas del sistema.

De igual manera, el proyecto contempla la ejecución de actividades complementarias como recorridos técnicos de inspección, poda y rocería en sectores donde la vegetación interfiere con las redes eléctricas, mantenimiento de equipos desmontados y acompañamiento técnico para la verificación de equipos de medida y funcionamiento del sistema de alumbrado público.

Durante el periodo reportado, la interventoría realizó seguimiento permanente a las actividades ejecutadas por el contratista, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades ejecutadas, calidad de los materiales instalados y condiciones de seguridad implementadas durante el desarrollo de los trabajos, conforme a lo establecido en el contrato y en los manuales técnicos aplicables al sistema de alumbrado público.

	INFORME ACTA PARCIAL 2	INFORME DE CONSULTORIA *No. 524/2025*		
		8	5	2026
	PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 A MARZO DE 2026	**DD**	**MM**	**AA**

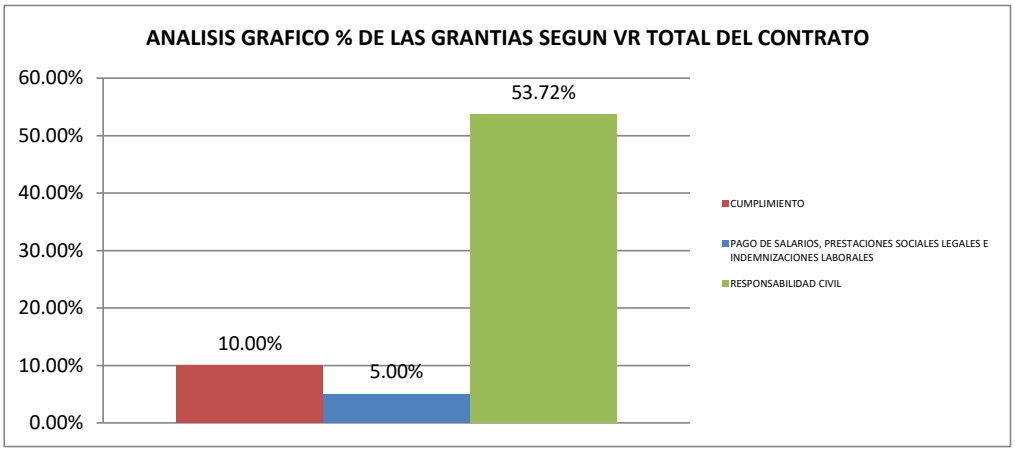
1.2 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
Nombre del Contratante	MUNICIPIO DE TAURAMENA
Nombre del Contratista	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.
Interventor	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S.
Numero del Contrato	No. 543/2025
Fecha del Contrato	DICIEMBRE 03 DE 2025
Plazo Contractual (Meses)	SEIS (6) MESES
Valor Inicial	$530,000,000.00
Valor Anticipo	N.A.
Fecha de Iniciación	DICIEMBRE 19 DE 2025
Fecha de terminación contractual	MAYO 18 DE 2026
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL MUfIICIPIO DE TAURAMENA
PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS	
Prorroga No. 1	N.A.
Plazo final	SEIS (6) MESES
ACTAS	
Acta de inicio	19 de diciembre de 2025
Acta plan inversion de anticipo	N.A.
Fecha de terminación	18 de mayo de 2026
VALORES	
Valor inicial del Contrato	$ 530,000,000.00
Valor Adicional del Contrato	N.A.
Valor final del contrato	$ 530,000,000.00
Valor anticipo (50%)	N.A.
Valor Acta Parcial No. 01	$ 258,370,396.20
	22 de diciembre de 2025
Valor Acta Parcial No. 02	$ 218,465,607.36
	Fecha estimada: 11 de mayo de 2026
PAGOS	
Pago Valor Anticipo	N.A.
Pago Valor Parcial No. 01	$ 258,370,396.20
Pago Valor Parcial No. 02	$ 218,465,607.36
ESTADO ACTUAL CONTRATO	
Valor Contractual	$ 530,000,000.00
Valor Ejecutado presente informe	$ 218,465,607.36
Valor Ejecutado Acumulado	$ 476,836,003.56
Valor por Ejecutar	$ 53,163,996.44
Porcentaje ejecutado presente informe	41.22%
Porcentaje ejecutado acumulado	89.97%
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**$ 476,836,003.56**

1.3 RESUMEN DE GARANTIAS EXIGIDAS ACTUALIZADAS

CONTRATO DE OBRA					
NOMBRE ASEGURADORA		**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**			
POLIZA Nº	**GARANTIAS**	**AMPAROS VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**	**APROBADA**
		DESDE	**HASTA**		
BY- 1000095805 (Anexo 1)	*CUMPLIMIENTO*	3/12/2025	13/09/2026	$ 53,000,000.00	SI
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	3/12/2025	13/05/2025	$ 26,500,000.00	SI
BY- 100009897 (Anexo 1)	*RESPONSABILIDAD CIVIL*	3/12/2025	13/05/2026	$ 284,700,000.00	SI

NOTA: En el cuadro se resumen las garantias actualizadas de acuerdo a las fechas del anexo 1 de la Poliza BY- 1000095805 y 11 de la poliza No.BY- 100009897



2.0 INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS

2.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la interventoría realizó seguimiento técnico y operativo a las actividades ejecutadas por el contratista en desarrollo del Contrato de Servicios No. 543 de 2025, evidenciando la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alumbrado público en diferentes sectores del municipio de Tauramena.

Dentro de las actividades verificadas se encuentran las labores ejecutadas por la cuadrilla eléctrica especializada, las cuales incluyeron inspección de circuitos, revisión de conexiones eléctricas, mantenimiento de luminarias, limpieza de equipos, cambio de luminarias LED y fotoceldas en mal estado, corrección de fallas eléctricas y adecuación de redes de alumbrado público.

Igualmente, se evidenció la instalación de nueva infraestructura eléctrica en sectores priorizados del municipio, incluyendo actividades de excavación, hincado y alineación de postes de ferroconcreto, instalación de brazos metálicos, tendido de cableado eléctrico y montaje de luminarias LED para ampliación y mejoramiento del sistema de alumbrado público.

La interventoría también verificó la utilización del camión grúa hidráulica con canasta para la ejecución de actividades que requerían trabajo en altura, tales como instalación y mantenimiento de luminarias, cambio de fotoceldas, poda técnica y apoyo en labores de instalación de postes y redes eléctricas.

Así mismo, se realizaron recorridos de inspección técnica y seguimiento en diferentes sectores intervenidos, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los circuitos y la adecuada ejecución de las actividades contratadas, evidenciando cumplimiento en las condiciones técnicas y operativas requeridas para el servicio.

Las actividades desarrolladas durante el periodo reportado fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del contrato, lineamientos operativos del sistema de alumbrado público y recomendaciones establecidas en los manuales de mantenimiento de los fabricantes de los equipos instalados.

2.3 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la interventoría verificó la ejecución e instalación de diferentes elementos correspondientes a la bolsa de repuestos y actividades operativas contempladas dentro del Contrato de Servicios No. 543 de 2025.

En desarrollo de las actividades ejecutadas, se evidenció la instalación de seis (6) postes de ferroconcreto de 10 m x 510 kgf tipo línea (mas uno que se encuentra en bodega para solveltar cualquier emergencia), un (1) postes de ferroconcreto de 10 m x 1050 kgf tipo extra reforzado (mas uno que se encuentra en bodega para solveltar cualquier emergencia), se han presentado a la interventoria ciento dieciséis (116) fotoceldas de 208V 7 pines y noventa y siete (97) luminarias LED con las características técnicas requeridas para el sistema de alumbrado público las cuales se han se han venido instalando en los lugares priorizados con un total de 58 luminarias instaladas y las demas lista para la instalacion en los sitios que se prioricen.

De igual manera, se verificó la instalación de siete (7) brazos metálicos de 2” con collarín, ochenta (80) metros de cable encauchetado de cobre THHN/THWN-2 3x No. 12 AWG, tres (3) pararrayos poliméricos de 12KV-10KA y dos (2) proyectores LED de 200W instalados en sectores priorizados del municipio.

Así mismo, la interventoría evidenció la ejecución de actividades correspondientes a cuadrilla eléctrica especializada y utilización de camión grúa hidráulica con canasta, requeridos para la realización de trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de nueva infraestructura de alumbrado público.

Conforme al balance financiero y de cantidades ejecutadas, se presenta un avance acumulado ejecutado correspondiente al 89.97% del valor total del contrato, quedando un saldo pendiente por ejecutar del 10.03%, de acuerdo con la información técnica y financiera verificada durante el periodo del presente informe.

3.0 INFORMACION AVANCE DE CONTRATO

	INFORME ACTA PARCIAL 2	INFORME DE CONSULTORIA *No. 524/2025*	
		8	5	2026
	PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 A MARZO DE 2026	DD	MM	AA

3.1 RELACION AVANCE DE EJECUCION

CTO NO. 543/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$530,000,000.00
VALOR ANTICIPO 0%	$0.00
VALOR ADICIONAL	$0.00
VALOR INICIAL + ADICIONAL	$530,000,000.00

CONTRATISTA	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.
INTERVENTOR	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S.

ACTA DE OBRA No	**FECHA**	**RESUMEN SEGÚN ACTAS**			**RESUMEN DEL CONTRATO ACUMULADO A LA FECHA**					
		VALOR TOTAL EJECUTADO	**VALOR AMORTIZACION ANTICIPO**	**VALOR NETO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**VALOR AMORTIZACION ACUMULADA**	**VALOR NETO PAGADO ACUMULADO**	**ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**VALOR A LIQUIDAR EN ACTAS**	**VALOR FALTANTE POR PAGAR ANTICIPO**
1	22-dic-25	$ 258,370,396.20	$ -	$ 258,370,396.20	$ 258,370,396.20	$ -	$ 258,370,396.20	$ -	$ 271,629,603.80	$ -
2	11-may-26	$ 218,465,607.36	$ -	$ 218,465,607.36	$ 476,836,003.56	$ -	$ 476,836,003.56	$ -	$ 53,163,996.44	$ -
3										
4										
5										
6										

	INFORME ACTA PARCIAL 2	INFORME DE CONSULTORIA No. 524/2025		
		8	5	2026
	PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 A MARZO DE 2026	DD	MM	AA

3.2 AVANCE DE CONTRATO EJECUTADO

CUADRO DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No.2 CTO 543 DE 2025

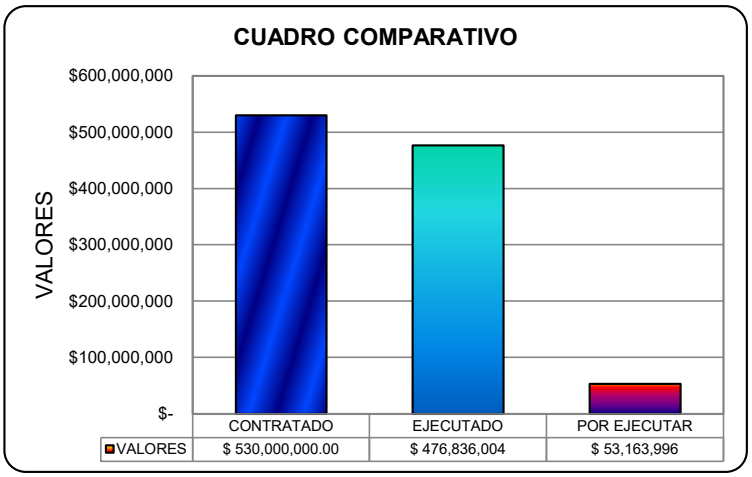
PRESUPUESTO OFICIAL			CANTIDADES CONSTRACTURALES SEGÚN MODIFICCATORIO 01			EJECUTADO ACTA PARCIAL 1		EJECUTADO ACTA PARCIAL 2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	**TRANSPORTE Y MANO DE OBRA**				$263,207,120.00		$ -		$ 111,003,780.00
101	CUADRILLA FF-1 (ELÉCTRICA ESPECIALIZADA)	DÍA	150.00	$ 744,666.00	$111,699,900.00	0.00	$ -	50.00	$ 37,233,300.00
102	ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, CAMIONETA O SIMILAR, CON CILINDRAJE DESDE 2.000 CC HASTA 2.999 CC, INCLUYENDO LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE.	MES	5.00	$ 11,858,824.00	$59,294,120.00	0.00	$ -	0.00	$ -
103	ALQUILER CAMIÓN GRÚA HIDRÁULICA PARA POSTES CON	DÍA	45.00	$ 2,049,180.00	$92,213,100.00	0.00	$ -	36.00	$ 73,770,480.00
2	**BOLSA DE REPUESTOS**						$ 217,117,980.00		$ 72,580,764.00
201	POSTE DE FERROCONCRETO 10 M X 510 KGF,TIPO LINEA	UND		$ 1,111,752.00		0.00	$ -	7.00	$ 7,782,264.00
202	POSTE DE FERROCONCRETO 10 M X 1050 KGF, TIPO	UND		$ 1,571,894.00		0.00	$ -	2.00	$ 3,143,788.00
203	ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN LA 320 SIN CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS.	UND		$ 83,862.00		0.00	$ -	0.00	$ -
204	ESTRUCTURA RETENCIÓN SENCILLA LA 321 SIN CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS.	UND		$ 91,477.00		0.00	$ -	0.00	$ -
205	ESTRUCTURA RETENCIÓN DOBLE LA 327 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS.	UND		$ 163,486.00		0.00	$ -	0.00	$ -
206	CABLE XLPE 2X35MM2+1X335MM2(2X2 + 1X2)	ML		$ 28,387.00		0.00	$ -	0.00	$ -
207	PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSIÓN EN ACERO	UND		$ 665,711.00		0.00	$ -	0.00	$ -
208	FOTOCELDA 208 V 7 PINES	UND		$ 201,600.00		81.00	$ 16,329,600.00	35.00	$ 7,056,000.00
209	LUMINARIA DE 64 LEDS, 60-130W, 2700-15000LM, CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN HASTA 700MA, 5000K INCLUYE FUSIBLE Y DPS, BASE PARA FOTOCELDA.	UND		$ 2,574,210.00		78.00	$ 200,788,380.00	19.00	$ 48,909,990.00
210	BRAZOS METÁLICOS DE 2" DE 1,5 METROS A 3 METROS	UND		$ 279,200.00		0.00	$ -	7.00	$ 1,954,400.00
211	CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600	UND		$ 15,984.00		0.00	$ -	80.00	$ 1,278,720.00
212	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 KVA 480/240V	UND		$ 11,231,718.00		0.00	$ -	0.00	$ -
213	CORTACIRCUITO DE CAÑUELA PARA 15KV 100 A	UND		$ 338,326.00		0.00	$ -	0.00	$ -
214	PARARRAYOS POLIMERICO 12 KV10KA	UND		$ 247,334.00		0.00	$ -	3.00	$ 742,002.00
215	MEDIDOR TRIFÁSICO ELECTRÓNICO DIGITAL 5-6 DÍGITOS, 3X5 440V (120)A CLASE 1	UND		$ 1,905,882.00		0.00	$ -	0.00	$ -
216	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 5 KVA 480/240V	UND		$ 9,667,875.00		0.00	$ -	0.00	$ -
217	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15 KVA 480/240V	UND		$ 13,154,569.00		0.00	$ -	0.00	$ -
218	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO AP 280	UND		$ 309,939.00		0.00	$ -	0.00	$ -
219	BASE PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI PARA POSTE METÁLICO 6 A 10 M DE ALTURA.	UND		$ 4,124,330.00		0.00	$ -	0.00	$ -
220	BREAKER BIPOLAR 2X20A 10KA PARA RIEL	UND		$ 84,228.00		0.00	$ -	0.00	$ -
221	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274	UND		$ 948,968.00		0.00	$ -	0.00	$ -
222	POSTE METÁLICO GALVANIZADO PERFIL REDONDO Y BRAZO DOBLE, CON ALTURA DE MONTAJE DE 8MN, INCLUYE: PERNOS DE ANCLAJE, PUESTA A TIERRA.	UND		$ 2,301,933.00		0.00	$ -	0.00	$ -
223	CABLE DE COBRE 2 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	M		$ 33,501.00		0.00	$ -	0.00	$ -
224	CABLE DE COBRE 4 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	M		$ 22,068.00		0.00	$ -	0.00	$ -
225	CABLE DE COBRE 6 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	M		$ 13,794.00		0.00	$ -	0.00	$ -
226	CABLE DE COBRE 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	M		$ 8,855.00		0.00	$ -	0.00	$ -
227	PROYECTOR LED DE 200W, 5000 K (CW), IP66 / IK08, 24000	UND		$ 856,800.00		0.00	$ -	2.00	$ 1,713,600.00
228	Empalme gel (6 -2 Awg y derivacion de (14-8 Awg)	UND		$ 69,300.00		0.00	$ -	0.00	$ -
					SUBTOTAL		**$ 217,117,980.00**		**$ 183,584,544.00**
					IVA 19%		$ 41,252,416.20		$ 34,881,063.36
					AJUSTE AL PESO		$0.00		$0.00
					TOTAL		**$ 258,370,396.20**		**$ 218,465,607.36**

EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
R/L INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S.

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

	INFORME ACTA PARCIAL 2	INFORME DE CONSULTORIA *No. 524/2025*		
		8	5	2026
	PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 A MARZO DE 2026	DD	MM	AA

3.3 GRAFICO AVANCE DE OBRA EJECUTADA



	INFORME ACTA PARCIAL 2	INFORME DE CONSULTORIA *No. 524/2025*		
		8	5	2026
	PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 A MARZO DE 2026	DD	MM	AA

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El proyecto cuyo objeto corresponde a “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA”, presentó durante el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 un avance satisfactorio en la ejecución de las actividades contempladas dentro del Contrato de Servicios No. 543 de 2025.

Durante el periodo evaluado, la interventoría evidenció la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alumbrado público, así como la instalación y reposición de diferentes elementos eléctricos y de infraestructura requeridos para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema en diferentes sectores del municipio. Igualmente, se verificó la entrega e instalación de materiales conforme a las especificaciones técnicas establecidas contractualmente y a los lineamientos operativos aplicables para este tipo de infraestructura.

La interventoría realizó seguimiento técnico, administrativo, financiero y operativo a las actividades ejecutadas por el contratista, evidenciando cumplimiento en las labores relacionadas con instalación de luminarias LED, fotoceldas, postes de ferroconcreto, cableado eléctrico, brazos metálicos y demás elementos necesarios para el fortalecimiento y mejoramiento del sistema de alumbrado público municipal.

De igual manera, se evidenció que las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo fueron ejecutadas conforme a los manuales técnicos, recomendaciones y procedimientos establecidos por los fabricantes de los equipos y luminarias instaladas en el sistema de alumbrado público, incluyendo los lineamientos técnicos suministrados para los equipos tipo LED y demás componentes eléctricos utilizados en el desarrollo del contrato, garantizando condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, calidad y durabilidad de las intervenciones realizadas.

Conforme a la revisión de las cantidades ejecutadas y soportes presentados por el contratista, la interventoría aprueba y avala la presente Acta Parcial No. 02 del Contrato de Servicios No. 543 de 2025, evidenciándose un avance acumulado ejecutado correspondiente al 89.97% del valor total del contrato, de acuerdo con la información técnica y financiera verificada durante el periodo del presente informe. Así mismo, al presente informe se adjuntan los respectivos soportes técnicos, financieros, administrativos y registros fotográficos que respaldan las actividades ejecutadas y el trámite correspondiente al cobro del acta parcial.

El desarrollo del proyecto se mantuvo dentro de parámetros técnicos y operativos adecuados, evidenciándose una correcta ejecución de las actividades programadas, adecuada utilización de los recursos asignados y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el sistema de alumbrado público. Las actividades ejecutadas contribuirán significativamente al mejoramiento de las condiciones de iluminación, funcionalidad, cobertura y seguridad del sistema de alumbrado público del municipio de Tauramena, beneficiando de manera directa a la comunidad usuaria del servicio.

EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
R./L. INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S

ANEXO

INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		21	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: 1 de 22 Del: 19-dic-25 Al: 21-dic-25

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 3 Días. Tiempo faltante: 148 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 2.0%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	48.9%	48.9%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 259,256,548.74	$ 259,256,548.74
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 259,256,548.74	Avance financiero:	$ 614,917.13
% avance financiero:	48.9%	% avance financiero:	1.7%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizó visita técnica al parque del barrio Mastranto, donde se ejecutó mantenimiento al tablero de distribución del sistema de alumbrado público, incluyendo revisión de conexiones, verificación de protecciones y ajuste de componentes eléctricos. Adicionalmente, se efectuó el cambio de 22 luminarias (bombillas) en farolas existentes, mejorando las condiciones de iluminación del parque y garantizando su adecuado funcionamiento. Ademas se realiza recorrido por diferentes zonas del municipio en el cual se identifica la necesidad de carmbiar 78 luminarias y 81 fotoceldas, las cuales se solicitan a contratista de obra y este realiza la entrega a almacen municipal.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Atención de fallas reportadas en diferentes sectores del municipio.
Realización de visitas técnicas para diagnóstico de redes y equipos de alumbrado público.
Ejecución de mantenimientos correctivos en luminarias, tableros de distribución y redes asociadas.
Apoyo a actividades operativas que requieran intervención con equipos especializados, como camión canasta.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución conforme a lo programado, evidenciándose cumplimiento en las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público. Se destaca la intervención realizada en el parque del barrio Mastranto, donde se mejoraron las condiciones de iluminación mediante mantenimiento al tablero eléctrico y reposición de luminarias.
En términos generales, el contrato mantiene un desarrollo adecuado, con actividades enfocadas en garantizar la prestación eficiente del servicio.

OBSERVACIONES

No se presentaron emergencias eléctricas ni fallas críticas que comprometieran la continuidad del servicio.
Se mantiene la disponibilidad operativa del personal técnico y de los equipos requeridos para la ejecución de las actividades.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		21	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

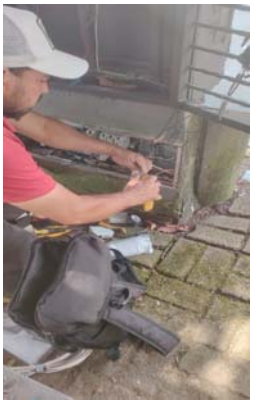
ITEM:
- 101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)
- 208: FOTOCELDA 208 V 7 PINES
- 209: LUMINARIA DE 64 LEDS, 60-130W, 2700-15000LM, CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN HASTA 700MA, 5000K INCLUYE FUSIBLE Y DPS, BASE PARA FOTOCELDA.



Alumbrado Publico Parque Mastranto funcional



Luminarias y Fotoceldas entregadas





Revisión Tablero de distribución AP





Cambio de bolbillas de AP en parque Mastranto

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		28	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **2** de **22** Del: 22-dic-25 Al: 28-dic-25

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 10 Días. Tiempo faltante: 141 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 6.6%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	1.0%	49.9%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 5,096,981.82	$ 264,353,530.56
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 264,353,530.56	Avance financiero:	$ 2,049,723.76
% avance financiero:	49.9%	% avance financiero:	5.5%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado, se desarrollaron actividades orientadas al mantenimiento correctivo del sistema de alumbrado público, acompañamiento técnico interinstitucional y atención de requerimientos específicos del municipio. Se realizó apoyo en la revisión de equipos de medida en conjunto con personal de ENERCA, así como la atención de una falla en la vía doble calzada Paso Cusiana – Tauramena, logrando el restablecimiento del servicio.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento y seguimiento al sistema de alumbrado público, incluyendo recorridos de inspección, atención de fallas reportadas, revisión de redes y equipos, así como el desarrollo de intervenciones correctivas en diferentes sectores del municipio, conforme a la planificación operativa y necesidades identificadas en campo.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público.
En términos generales, se están cumpliendo los objetivos contractuales establecidos, garantizando la prestación del servicio y la atención oportuna de las necesidades operativas.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado no se presentan novedades relevantes que afecten la ejecución del contrato; sin embargo, se requiere reprogramar algunas actividades que no pudieron ser ejecutadas, con el fin de dar continuidad al mantenimiento del sistema de alumbrado público.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		28	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM: **- 101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)**
- 103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA.











MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		4	1	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **3** de **22** Del: 29-dic-25 Al: 04-ene-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 17 Días. Tiempo faltante: 134 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 11.3%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	0.0%	49.9%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ -	$ 264,353,530.56
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 264,353,530.56	Avance financiero:	$ 3,484,530.39
% avance financiero:	49.9%	% avance financiero:	9.4%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado no se registra ejecución de actividades operativas en campo en los días inicialmente programados, debido a condiciones propias de cierre de vigencia y periodo de fin de año.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento correctivo en el sistema de alumbrado público, incluyendo la atención de fallas identificadas, recorridos de inspección en diferentes sectores del municipio, revisión de redes y equipos, así como el desarrollo de intervenciones técnicas orientadas a restablecer y garantizar la correcta prestación del servicio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público.
En términos generales, se están cumpliendo los objetivos contractuales establecidos, garantizando la prestación del servicio y la atención oportuna de las necesidades operativas.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se presenta una baja ejecución de actividades operativas debido a la temporada de fin de año; no obstante, se da inicio a la reactivación de labores, por lo cual se hace necesario dar continuidad a las actividades pendientes en la siguiente semana.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		11	1	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **4** de **22** Del: 05-ene-26 Al: 11-ene-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 24 Días. Tiempo faltante: 127 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 15.9%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	0.5%	50.4%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 2,658,457.62	$ 267,011,988.18
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 267,011,988.18	Avance financiero:	$ 4,919,337.02
% avance financiero:	50.4%	% avance financiero:	13.3%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se retomaron las actividades operativas del sistema de alumbrado público, ejecutando labores de mantenimiento correctivo y actividades de detección de fallas en circuito de carrera 7. Se realizó revisión del sistema en el barrio Santa Isabella, identificando fallas que requieren nuevamente intervención. Así mismo, se realiza detección de fallas en carrera 7 entre diagonal 8 y 19, dejando en funcionamiento el circuito pero pendiente de revisión las conexiónes en luminarias. Las actividades desarrolladas estuvieron enfocadas en diagnóstico, ajuste y organización del sistema.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



Para la siguiente semana se tiene prevista la ejecución de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en el sistema de alumbrado público, incluyendo la atención de fallas identificadas, instalación y reposición de equipos, recorridos de inspección en campo y fortalecimiento de la infraestructura en diferentes sectores del municipio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantienen las condiciones para el cumplimiento de los objetivos contractuales, con la reactivación progresiva de las actividades operativas.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia la reactivación de actividades luego del receso de fin de año, siendo necesario dar continuidad a los procesos de mantenimiento para atender las fallas identificadas en el sistema.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		11	1	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM: - 101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)




Revision circuito Carrera 7, Revision circuito en falla barrio Santa Isabella, se encuentra conexión clandestina y se desmonta



Revision circuito Carrera 7



Revision circuito Carrera 7



Revision circuito Carrera 7

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		18	1	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **5** de **22** Del: 12-ene-26 Al: 18-ene-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31 Días. Tiempo faltante: 120 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 20.5%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	2.8%	53.1%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 14,621,691.84	$ 281,633,680.02
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 281,633,680.02	Avance financiero:	$ 6,354,143.65
% avance financiero:	53.1%	% avance financiero:	17.1%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de mantenimiento correctivo y fortalecimiento de la infraestructura del sistema de alumbrado público en diferentes sectores del municipio. Se realizaron visitas técnicas para inspección y diagnóstico de fallas, así como la corrección de daños en redes. De igual forma, se adelantaron labores de instalación y reposición de postes de concreto con sus respectivos elementos eléctricos en cercanias a zona industrial del municipio de tauramena (Salida a la virgen por via matadero), además de la revision y puesta en funcionamiento de luminarias en carrera 7 entre diagonal 8 y 19. Se desarrollaron recorridos de inspección, incluyendo verificación nocturna, y se dio inicio a la atención de nuevos puntos de iluminación en sectores priorizados. Las actividades se ejecutaron con apoyo de equipo especializado, garantizando condiciones seguras y operativas.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de las actividades de mantenimiento correctivo y expansión del sistema de alumbrado público, incluyendo instalación de luminarias, ajuste de redes, recorridos de inspección y atención de fallas reportadas, así como el fortalecimiento de la cobertura del servicio en diferentes sectores del municipio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantienen las condiciones para el cumplimiento de los objetivos contractuales, con avance en la instalación y mejoramiento de la infraestructura.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia un incremento en la ejecución de actividades operativas, especialmente en instalación y mantenimiento de infraestructura, lo cual contribuye al mejoramiento progresivo del sistema de alumbrado público.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		18	1	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:
- **101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)**
- **103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA**
- **201: POSTE DE FERROCONCRETO 10 M X 510 KGF, TIPO LINEA**




Realizacion de hueco para hincar poste en ferroconcreto




Hincada de poste ferroconcreto, para su posterior vestida




Revision de conexiones en luminarias Carrera 7




Revision de conexiones en luminarias Carrera 7

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		25	1	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **6** de **22** Del: 19-ene-26 Al: 25-ene-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 Días. Tiempo faltante: 113 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 25.2%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	2.5%	55.6%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 13,298,706.96	$ 294,932,386.98
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 294,932,386.98	Avance financiero:	$ 7,788,950.28
% avance financiero:	55.6%	% avance financiero:	21.0%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades de mantenimiento correctivo y optimización del sistema de alumbrado público en diferentes sectores del municipio. Se ejecutaron labores de instalación y reposición de luminarias, corrección de fallas en redes, ajuste de elementos eléctricos (cambio de grapa de retencion en poste instalado 16 de enero) y recorridos de inspección, incluyendo verificación nocturna del servicio. Así mismo, se realizaron trabajos de corrección en infraestructura existente, tales como ajuste de postes y cambio de componentes como fotoceldas, permitiendo mejorar la operatividad del sistema. Las actividades se desarrollaron de manera continua en zonas urbanas y rurales, con apoyo de equipo especializado.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento masivo del sistema de alumbrado público, incluyendo cambio de fotoceldas, revisión de redes, atención de fallas, recorridos de inspección y fortalecimiento de la cobertura del servicio en distintos sectores del municipio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantiene un avance sostenido en las actividades operativas, orientadas a mejorar la calidad y continuidad del servicio.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia una alta ejecución de actividades en campo, especialmente en mantenimiento y reposición de componentes, lo cual contribuye al mejoramiento progresivo del sistema de alumbrado público.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		25	1	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM: **- 101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)**
- 103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA




Cambio de grapa de retencion en poste instalado el 16 de enero, poste con desnivel vertizal barrio libertadores bajo




Nivelacion de postes en barrio libertadores bajo



Relleno en pata de poste nivelado en barrio libertadores bajo




Cambio y repocision de luminarias apagadas en area urbana

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		1	2	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **7** de **22** Del: 26-ene-26 Al: 01-feb-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 Días. Tiempo faltante: 106 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 29.8%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	1.3%	57.0%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 6,943,680.94	$ 301,876,067.92
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 301,876,067.92	Avance financiero:	$ 9,223,756.91
% avance financiero:	56.96%	% avance financiero:	24.9%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de mantenimiento correctivo y mejora del sistema de alumbrado público en diferentes sectores del municipio. Se realizaron labores de cambio masivo de fotoceldas, revisión de redes y luminarias, así como recorridos de inspección en campo para verificación del estado del sistema. Adicionalmente, se adelantaron actividades de poda y limpieza de vegetación que interfería con la red de alumbrado público entrada al municipio por calle 2 y cambio de pararrayos en la vereda chaparral, contribuyendo a la optimización del servicio. Las intervenciones se desarrollaron de manera continua en zonas urbanas y rurales, garantizando el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público, incluyendo revisión de redes, atención de fallas, cambio de componentes eléctricos, inspecciones técnicas y fortalecimiento de la cobertura del servicio en los diferentes sectores del municipio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantiene el cumplimiento de los objetivos contractuales, con avance en actividades de mantenimiento y optimización del sistema.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia continuidad en las actividades operativas, destacándose el mantenimiento masivo de componentes y la intervención sobre factores externos como la vegetación, lo cual favorece la estabilidad del servicio.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		1	2	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:
- **101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)**
- **103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA**
- **214: PARARRAYOS POLIMERICO 12 KV10KA**




Cambio de pararrayos en vereda Chaparral




Poda en entrada a casco urbano por calle 2




Poda en entrada a casco urbano por calle 2




Poda en entrada a casco urbano por calle 2

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		8	2	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **8** de **22** Del: 02-feb-26 Al: 08-feb-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 52 Días. Tiempo faltante: 99 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 34.4%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	0.8%	57.8%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 4,430,762.70	$ 306,306,830.62
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 306,306,830.62	Avance financiero:	$ 10,658,563.54
% avance financiero:	57.8%	% avance financiero:	28.7%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de mantenimiento correctivo, inspección y adecuación de luminarias en bodega bajadas en dias anteriores en diferentes sectores del municipio. De igual forma, se adelantaron labores de inspección en campo, demarcación y excavación para la instalación de nuevos postes de alumbrado público, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura del sistema.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento e instalación en el sistema de alumbrado público, incluyendo la instalación de postes, revisión de redes, atención de fallas, ejecución de trabajos correctivos y desarrollo de inspecciones técnicas en campo para el mejoramiento del servicio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantiene el cumplimiento de los objetivos contractuales, con avance en actividades de mantenimiento e instalación de infraestructura.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia la ejecución de actividades tanto de mantenimiento como de ampliación de infraestructura, lo cual contribuye al fortalecimiento del sistema de alumbrado público en el municipio.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		8	2	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

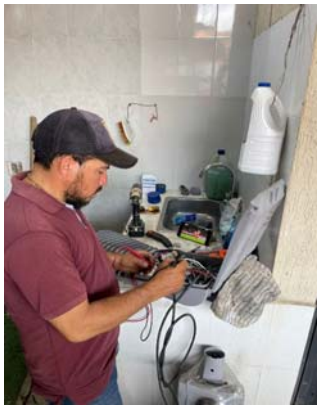
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM: - 101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)




Revision de luminarias desmontadas

Revision de luminarias desmontadas




Alistamiendo de lugar a hincar postes (Roceria)




Realizacion de huecos para hincada de postes

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		15	2	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **9** de **22** Del: 09-feb-26 Al: 15-feb-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 59 Días. Tiempo faltante: 92 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 39.1%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	5.3%	63.1%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 27,865,568.36	$ 334,172,398.98
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 334,172,398.98	Avance financiero:	$ 12,093,370.17
% avance financiero:	63.1%	% avance financiero:	32.6%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, instalación y fortalecimiento del sistema de alumbrado público en diferentes sectores del municipio. Se ejecutaron labores de instalación de postes y luminarias, así como revisión de conexiones, limpieza y/o cambio de fotoceldas y retiro de equipos en mal estado. De igual forma, se realizaron inspecciones técnicas en campo para diagnóstico de fallas y verificación del estado de la infraestructura. Adicionalmente, se adelantaron actividades de pintura de postes y adecuación de elementos eléctricos, contribuyendo al mejoramiento general del sistema.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento correctivo y optimización del sistema de alumbrado público, incluyendo revisión de redes, cambio de componentes, instalación de luminarias, recorridos de inspección y atención de requerimientos en diferentes sectores del municipio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público.
En términos generales, se mantiene el cumplimiento de los objetivos contractuales, con avance en la instalación y mantenimiento de la infraestructura.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia una ejecución continua de actividades en campo, incluyendo instalación y mantenimiento de infraestructura, lo cual contribuye al mejoramiento progresivo del sistema de alumbrado público.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
Maira López		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		15	2	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM: **- 101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)**
- 103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA




Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico




Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico




Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico, pintada de postes instalados.




Hincada de postes en via alterna sector cementerio

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		22	2	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **10** de **22** Del: 16-feb-26 Al: 22-feb-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 66 Días. Tiempo faltante: 85 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 43.7%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	3.1%	66.2%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 16,623,383.70	$ 350,795,782.68
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 350,795,782.68	Avance financiero:	$ 13,528,176.80
% avance financiero:	66.2%	% avance financiero:	36.5%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo y adecuación del sistema de alumbrado público en diferentes sectores del municipio. Se ejecutaron labores de poda y limpieza de redes, desmontaje de luminarias en mal estado, cambio de fotoceldas y mantenimiento de equipos eléctricos. Así mismo, se realizaron visitas técnicas para inspección y diagnóstico en distintos puntos, así como la instalación de cableado y adecuación de redes en espacios públicos.
Adicionalmente, se presentó una novedad durante actividades en campo, donde la comunidad en un sector del municipio no permitió la ejecución del retiro de postes proyectado, lo cual impidió el desarrollo de dicha actividad y requiere ser reprogramada o gestionada nuevamente.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público, incluyendo poda de redes, instalación de cableado, reposición de luminarias, inspecciones técnicas en campo, atención de fallas reportadas y gestión para la ejecución de actividades que presentaron limitaciones durante la semana anterior.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público.
En términos generales, se mantiene el cumplimiento de los objetivos contractuales, con avance en las actividades de mantenimiento y optimización del sistema.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se presentó una limitación operativa asociada a la no autorización por parte de la comunidad para la ejecución de una actividad programada, situación que deberá ser gestionada para garantizar su desarrollo en próximos periodos.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
Maira López		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		22	2	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:
- 101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)
- 103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA




Roceria en via al Rio Caja




Desmonte de luminarias tipo pedestal




Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico




Apoyo a Asojuntas, para instalacion de luminarias de AP

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		1	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **11** de **22** Del: 23-feb-26 Al: 01-mar-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 73 Días. Tiempo faltante: 78 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 48.3%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	0.0%	66.2%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ -	$ 350,795,782.68
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 350,795,782.68	Avance financiero:	$ 14,962,983.43
% avance financiero:	66.2%	% avance financiero:	40.3%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado no se ejecutaron actividades operativas en campo, debido a que no se contaba con el equipo especializado requerido para el desarrollo de las labores programadas, lo cual limitó la intervención del sistema de alumbrado público durante la semana.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



Para la siguiente semana se tiene prevista la reactivación de las actividades operativas del sistema de alumbrado público, incluyendo mantenimiento correctivo, revisión de luminarias, cambio de componentes eléctricos, inspecciones técnicas en campo y atención de fallas reportadas en diferentes sectores del municipio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantienen las condiciones para el cumplimiento de los objetivos contractuales, sujeto a la disponibilidad de los equipos requeridos para la operación.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se presentó una limitación operativa debido a la falta de equipo especializado, lo cual impidió la ejecución de actividades programadas, siendo necesario retomar las labores una vez se cuente con los recursos técnicos requeridos.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		8	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **12** de **22** Del: 02-mar-26 Al: 08-mar-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 80 Días. Tiempo faltante: 71 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 53.0%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	1.6%	67.8%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 8,688,537.48	$ 359,484,320.16
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 359,484,320.16	Avance financiero:	$ 16,397,790.06
% avance financiero:	67.8%	% avance financiero:	44.2%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se reactivaron las actividades operativas del sistema de alumbrado público, ejecutando labores de mantenimiento correctivo en diferentes sectores del municipio. Se realizaron revisiones de luminarias, cambio de fotoceldas y desmontaje de equipos en mal estado, así como inspecciones técnicas en campo para diagnóstico de fallas. Adicionalmente se realizó la instalación de reflectores en espacios públicos y la clasificación de luminarias para su gestión por garantía.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento y optimización del sistema de alumbrado público, incluyendo instalación de luminarias, revisión de redes, atención de fallas, inspecciones técnicas en campo y fortalecimiento de la infraestructura en sectores priorizados.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantiene el cumplimiento de los objetivos contractuales, con la reactivación de las actividades operativas.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia la reactivación de actividades en campo, incluyendo intervenciones de mantenimiento, lo cual contribuye a la continuidad del servicio.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		8	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:
- **101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)**
- **103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA**
- **227: PROYECTOR LED DE 200W, 5000 K (CW), IP66 / IK08, 24000 lm, 100-277 V 50/60Hz**




Instalación de Proyectores LED




Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico




Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico




Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		15	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **13** de **22** Del: 09-mar-26 Al: 15-mar-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 87 Días. Tiempo faltante: 64 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 57.6%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	4.1%	71.9%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 21,811,807.50	$ 381,296,127.66
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 381,296,127.66	Avance financiero:	$ 17,832,596.69
% avance financiero:	71.9%	% avance financiero:	48.1%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades de mantenimiento correctivo, instalación y fortalecimiento del sistema de alumbrado público en diferentes sectores del municipio. Se ejecutaron labores de instalación de redes de baja tensión, tensionado de conductores, instalación de luminarias (se comienza con instalación de luminarias ingresadas a almacen en diferentes zonas del municipio) y adecuación de infraestructura eléctrica en campo. Así mismo recorridos de inspección para identificación de fallas. Las actividades estuvieron orientadas al mejoramiento de la cobertura y la optimización del servicio en zonas priorizadas.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento e instalación en el sistema de alumbrado público, incluyendo instalación de luminarias, revisión de redes, atención de fallas, inspecciones técnicas en campo y fortalecimiento de la infraestructura en diferentes sectores del municipio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantiene el cumplimiento de los objetivos contractuales, con avance en la instalación y mejoramiento de la infraestructura.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia una ejecución continua de actividades de instalación y mantenimiento, lo cual contribuye al fortalecimiento del sistema de alumbrado público en el municipio.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		15	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:

- **101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)**
- **103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA**
- **201: POSTE DE FERROCONCRETO 10 M X 510 KGF,TIPO LINEA**
- **210: BRAZOS METÁLICOS DE 2" DE 1,5 METROS A 3 METROS CON COLLARÍN.**
- **211: CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600 V 3X N° 12 AWG**
- **214: PARARRAYOS POLIMERICO 12 KV10KA**



Instalacion de poste nuevo y luminaria





Instalacion de elementos (luminaria, fotocelda, brazo metalico, cable) en red nueva sector via alterna cementerio





Instalacion de luminarias nuevas



Cambio de pararrayos Via alterna Tramo 2

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		22	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **14** de **22** Del: 16-mar-26 Al: 22-mar-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 94 Días. Tiempo faltante: 57 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 62.3%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	3.3%	75.2%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 17,509,536.24	$ 398,805,663.90
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 398,805,663.90	Avance financiero:	$ 19,267,403.31
% avance financiero:	75.2%	% avance financiero:	51.9%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades de mantenimiento, instalación y adecuación del sistema de alumbrado público, así como apoyo técnico en la infraestructura eléctrica requerida para la realización del festival del rodeo en el municipio. Se ejecutaron labores de instalación de cableado, luminarias y puntos eléctricos en la zona del polifuncional y manga de coleo, así como revisión de voltajes para garantizar el correcto funcionamiento de equipos. Adicionalmente, se realizó instalación de transferencia eléctrica, montaje y posterior retiro de planta eléctrica, así como acompañamiento técnico para el control y verificación del consumo eléctrico durante el evento. Las actividades incluyeron disponibilidad de personal en horario nocturno para garantizar la continuidad del servicio.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



Para la siguiente semana se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público, incluyendo desmontaje de instalaciones temporales, revisión de redes, instalación de luminarias, atención de fallas y ejecución de inspecciones técnicas en diferentes sectores del municipio.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantiene el cumplimiento de los objetivos contractuales, destacándose el apoyo a eventos institucionales y la continuidad en las actividades operativas.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia una alta carga operativa asociada al apoyo de eventos municipales, lo cual requiere disponibilidad adicional de personal y recursos, sin afectar la continuidad del servicio de alumbrado público.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		22	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:
- **101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)**
- **103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA**



Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico



Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico





Instalacion de luminarias nuevas





Instalacion de luminarias nuevas

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FCO09-20
Versión: 4

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		29	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE LA SEMANA DE INFORME

Semana Número: **15** de **22** Del: 23-mar-26 Al: 29-mar-26

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 101 Días. Tiempo faltante: 50 Días

Nombre del Supervisor: LINO RODRIGUEZ OCHOA % Tiempo transcurrido: 66.9%

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	N.A.	N.A.	Obra Ejecutada (%)	14.7%	90.0%
Valor de la Obra programada:	N.A.	N.A.	Valor de la Obra	$ 78,030,339.66	$ 476,836,003.56
Diferencia semanal:		N.A.	**Diferencia acumulada:**		N.A.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO S.A.S.	**Interventor:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Contrato No.	543 DE 2025	Contrato No.	524 DE 2025
Valor Inicial:	$ 530,000,000.00	Valor Inicial:	$ 37,100,000.00
Valor Actualizado:	$ 530,000,000.00	Valor Actualizado:	$ 37,100,000.00
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES	Plazo Actualizado:	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025	Fecha de Iniciación:	19 de diciembre de 2025
Fecha de Términación:	18 de mayo de 2026	Fecha de Términación:	18 de junio de 2026
Estado del contrato:	En ejecución	Estado del contrato:	En ejecución
Avance financiero:	$ 476,836,003.56	Avance financiero:	$ 20,702,209.94
% avance financiero:	90.0%	% avance financiero:	55.8%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades de acompañamiento a personal de enerca a toma de lectura en zona aledaña a polifuncional, se realizan trabajas mantenimiento correctivo. Así mismo, se realizaron actividades de instalación de luminarias y tendido de cableado en sectores como Buenos Aires, Palmarito y Villas, contribuyendo al mejoramiento del servicio. Adicionalmente, se efectuaron labores de desmontaje de luminarias en mal estado en diferentes puntos del municipio, con el fin de avanzar en la optimización del sistema.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Para la siguiente semana no se tiene prevista la continuidad de actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público, debido a que es semana santa.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato continúa en ejecución normal, evidenciando cumplimiento en la atención de requerimientos técnicos del sistema de alumbrado público. En términos generales, se mantiene el cumplimiento de los objetivos contractuales, con avance en actividades de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.

OBSERVACIONES

Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad de actividades operativas, incluyendo desmontaje de instalaciones temporales y mantenimiento del sistema, lo cual contribuye a la estabilidad del servicio de alumbrado público.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**PROFESIONAL DE OBRA**
MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA	N.A.	N.A.
		
Firma	Firma	Firma

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	543 DE 2025
		29	3	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM:

- 101: CUADRILLA FF-1 (ELECTRICA ESPECIALIZADA)
- 103: ALQUILER CAMION GRUA HIDRAULICA PARA POSTES CON CANASTA
- 208: FOTOCELDA 208 V 7 PINES
- 209: LUMINARIA DE 64 LEDS, 60-130W, 2700-15000LM, CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN HASTA 700MA, 5000K INCLUYE FUSIBLE Y DPS, BASE PARA FOTOCELDA.
- 211: CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600 V 3X N° 12 AWG





Elementos presentados para entrega





Mantenimiento preventivo y/o correctivo alumbrado publico





Instalacion de luminarias nuevas





Instalacion de luminarias nuevas

MAIRA JURANY LOPEZ MARTINEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
RESIDENTE DE OBRA
