
Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**01**		**PAVIMENTO VIA 3 CARRERA 4**	**41 días**	**mié 29/04/26**	**vie 19/06/26**
2	**01.01**		**PRELIMINARES**	**3 días**	**mié 29/04/26**	**sáb 2/05/26**
3	01.01.01		Localización, trazado y replanteo del proyecto. Se utilizará equipo de precisión, personal experto. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoria. incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, planos.	3 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26
4	**01.02**		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**18 días**	**lun 4/05/26**	**lun 25/05/26**
5	01.02.01		Excavación mecanica en material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad, medido in situ, no incluye botada.	4 días	lun 4/05/26	jue 7/05/26
6	01.02.02		Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones y demoliciones. Hasta el sitio que indique la interventoria.	2 días	vie 8/05/26	sáb 9/05/26
7	01.02.03		Confomacion de calzada existente despues de cajeo y al final de instalacio estructura pavimento	4 días	lun 11/05/26	jue 14/05/26
8	01.02.04		Confomacion de calzada existente despues de cajeo y al final de instalacio estructura ANDEN	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26
9	01.02.05		Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos, y todo lo necesario para su correcta co	8 días	vie 15/05/26	lun 25/05/26
10	01.02.06		Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo 10 cm , reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% ESTRUCTURA PARA ANDEN	6 días	vie 15/05/26	vie 22/05/26
11	**01.03**		**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**16 días**	**sáb 30/05/26**	**vie 19/06/26**
12	01.03.01		Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y	6 días	sáb 30/05/26	vie 5/06/26
13	01.03.02		Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC - 19. Compactada con medios mecánicos. Según normas para la construcción de pavimentos. Según Normas INVIAS.	10 días	sáb 6/06/26	vie 19/06/26
14	**01.04**		**CONCRETOS**	**10 días**	**mar 26/05/26**	**vie 5/06/26**
15	01.04.01		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - para anden suministro e instalacion de malla electrosoldada y aplicación de antisol	6 días	sáb 30/05/26	vie 5/06/26
16	01.04.02		Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de conc	4 días	mar 26/05/26	vie 29/05/26

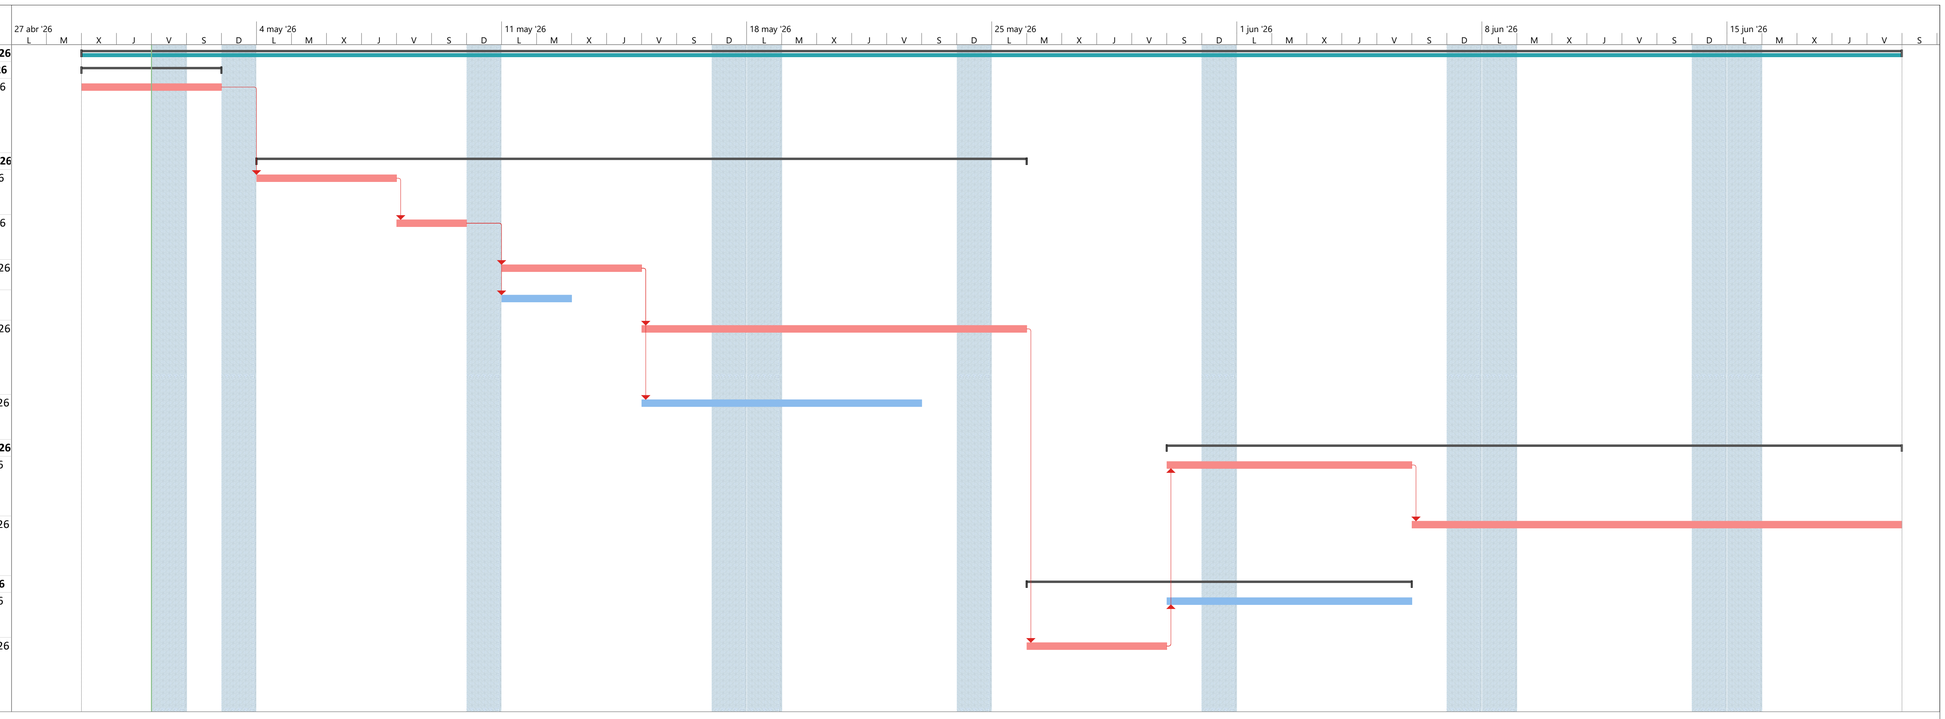

Proyecto: CRONOGRAMA VIA 3
Fecha: vie 1/05/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
