Para garantizar el cumplimiento del contrato de obra 1279 del 2023, y enmarcado en plan de inversión del anticipo los datos fiduciarios se nombran a continuación.

Tabla 55 Datos Fiduciarios

Empresa	NIT	Porcentaje Anticipo	Valor
Alianza Fiduciaria	830053812-2	20%	$ 5.018.921.564,51

10.3 Seguimiento Financiero Control de Actas y Pagos.

A la fecha la entidad realizó el desembolso total del anticipo a la fiducia por valor de $4.767.975.486.28.

*Tabla 56 Control y Seguimiento de Anticipo*Control y Seguimiento de Anticipo

Actas de Cobro	Fecha	%	Valor Acta Presente	Amortizado	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
Anticipo	14-09-2023	0.159%	76.000.000,00	0	N/A	76.000.000,00
Anticipo	22-09-2023	65.22%	3.109.966.084,95	0	N/A	3.109.966.084,95
Anticipo	22-11-2023	33.18%	1.582.009.400,56	0	N/A	1.582.009.400,56
	Total			-	-	$4.767.975.486.28

Tabla 57 Control y Seguimiento de Pago de Actas Parciales.

Actas de Cobro	Fecha	%	Valor Acta Presente	Amortizado	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
						$0
	Total			-	-	$0

Para garantizar el cumplimiento del contrato de obra 1279 del 2023, y enmarcado en plan de inversión del anticipo los datos fiduciarios se nombran a continuación.

Tabla 58 Formato de Relación de Inversión Anticipo

N°	Documento Tercero	Fecha De Documento Tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Neto Pago	Clasificación Anticipo	Orden De Giro	Fecha De Giro
1	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	167,217,062.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
2	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	58,000,000.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
3	1001	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	506,877.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
4	2263	13/07/2023	901234897-2	ACODEL FERRETERIA DE COLOMBIA SAS	OC 003 -MATERIAL FERRETERIA	7,418,119.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
5	2744	18/07/2023	900539242-5	INVERSIONES ARKA UNION SAS	OC 010 -MATERIAL FERRETERIA	658,042.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
6	1004	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	1,219,275.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
7	8106	1/08/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	TRANSPORTE A ESCOMBRERA	23,943,721.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
8	1021	1/09/2023	17343650	WILSON CARDENAS SABOGAL	CORTE N° 4 CONTRATO 001 DEMOLICIÓN	9,589,983.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
9	TAU-9	30/08/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	ORDEN DE COMPRA-014 MATERIAL FERRETERIA	2,176,426.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
10	CC049	15/08/2023	900803958-1	ALTARA INGENIERIA SAS	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO OT 007	700,000,000.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
11	CC 003	28/08/2023	1113624886	ALEXANDER GIRALDO DELGADO	COMISION TOPOGRAFICA 19 07 AL 03 08 DE 2023	4,925,250.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
12	321	25/08/2023	901480671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 027 MATERIAL FERRETERIA	6,810,738.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
13	CC 01	8/09/2023	901.455.591-2	INVESTMENT CREARE SAS	ANTICIPO SUMINISTRO MATERIAL PETREO ORDEN DE COMPRA 050	80,021,559.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
14	4970	4/09/2023	900.887.192-7	MADERAS TELLEZ S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 030 MATERIAL FERRETERIA	4,444,550.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
15	No. 1BV 326	1/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 032 MATERIAL FERRETERIA	447,347.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
16	CC	21/09/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE 201 147 004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	33,612,625.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023

17	CC 01	11/09/2023	900342509-9	MH CONSULTING SAS	ANTICIPO SUMINISTRO REDES ELECTRICAS	420,768,060.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
N°	Documento Tercero	Fecha De Documento Tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Neto Pago	Clasificación Anticipo	Orden De Giro	Fecha De Giro
18	CC 01	19/09/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISION TOPOGRAFICA 6 07 08 09 10 11 12 y 13 DE SEPTIEMBRE 2023	3,526,280.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
19	NOTA DEBITO N°1	21/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 038 MATERIAL FERRETERIA	2,144,806.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
20	No. 1BV 345	26/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 040 MATERIAL FERRETERIA	4,382,665.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
21	01FE-51445	15/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 041 SUMINISTRO ACERO	3,771,933.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
22	01FE-51650	19/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 045 SUMINISTRO ACERO	38,929,551.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
23	01FE-51756	21/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 046 SUMINISTRO ACERO	11,550,002.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
24	FOS 8321	1/09/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE AGOSTO	35,508,704.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
25	FOS 8576	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE I	5,017,014.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
26	FOS 8577	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE II	5,294,165.58	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
27	A-380	1/10/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-052 MADERA	2,957,668.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2023
28	No. 1BV 360	9/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-056 MATERIAL FERRETERIA	5,685,010.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2023
29	ALT 285	18/10/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	179,287,996.42	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2023
30	CC	21/10/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE-201-147-004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	22,249,964.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2023
31	01FE-53555	20/10/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-063 SUMINISTRO ACERO	54,549,598.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2023
32	CC 002	1/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (COBRO 1)	3,967,065.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
33	CC 03	7/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 13, 14, 15, 16, 17, 18 DE OCTUBRE 2023	2,644,710.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
34	TAU-19	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 1 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	9,923,581.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023

N°	Documento Tercero	Fecha De Documento Tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Neto Pago	Clasificación Anticipo	Orden De Giro	Fecha De Giro
35	TAU-20	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 2 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	905,008.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
36	TAU-23	16/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 3 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	7,131,632.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
37	FOS 8715	2/11/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE OCTUBRE 2023	40,170,822.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 4	13/12/2023
38	No. 1BV 387	25/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-066 MATERIAL FERRETERIA	927,647.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
39	No. 1BV 392	8/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-070 MATERIAL FERRETERIA	535,790.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
40	1BV 416	27/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-083 MATERIAL FERRETERIA	3,399,818.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
41	1BV 420	9/12/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-087 MATERIAL FERRETERIA	4,870,522.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
42	01FE-54325	1/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-068 SUMINISTRO ACERO	169,304.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
43	01FE-54480	3/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-072 SUMINISTRO ACERO	957,252.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
44	01FE-55455	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-074 SUMINISTRO ACERO	52,040,940.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
45	01FE-55453	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-075 SUMINISTRO ACERO	17,072,168.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
46	A-383	1/11/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-057 MADERA	398,580.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
47	FOS 8915	1/12/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE NOVIEMBRE 2023	4,134,777.33	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
48	ALT 291	6/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	45,355,552.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
49	292	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	34,690,133.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
50	293	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	40,007,787.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
51	ALT 294	20/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 003 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	41,648,556.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
52	CC 04	1/12/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023 Y DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	6,800,560.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024

N°	Documento Tercero	Fecha De Documento Tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Neto Pago	Clasificación Anticipo	Orden De Giro	Fecha De Giro
53	CC 04	1/12/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 8 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023	6,800,560.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
54	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	456,754,809.50	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 6	31/01/2024
55	FVE 311	22/01/2024	901.556.948-1	COMERCIALIZADORA DE CONCRETOS PREMIUM S.A.S ZOMAC	TRANSPORTE DE AGREGADOS ORDEN DE TRABAJO 027	29,925,014.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 7	10/02/2024
56	CC 14176	24/01/2024	891800111-5	DIACO SA	ANTICIPO ACERO	316,540,000.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 7	10/02/2024
57	PROFORMA 45293105756	27/01/2024	860002523-1	CEMEX COLOMBIA SA	ANTICIPO CEMENTO GRIS	299,499,200.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 7	10/02/2024
58	SAE 3381	5/12/2023	901.174.550-4	SAE TABLEROS DE CONTROL Y ENERGIA S.A.S.	ORDEN DE COMPRA-076 MATERIAL FERRETERIA PROVISIONAL DE OBRA (CABLE)	4,365,454.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
59	DAFE 6	24/11/2023	901.753.376-3	GNC CONSTRUCCIONES SAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUB BASE ORDEN DE COMPRA 069	5,422,144.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
60	DAFE-13	24/01/2024	901.753.376-3	GNC CONSTRUCCIONES SAS	ORDEN DE COMPRA-088 MATERIAL AGREGADO	3,098,368.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
61	A-384	1/11/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	OC 065 COMPRA MADERA	1,181,432.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
62	A-430	23/01/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	OC 079 COMPRA MADERA	833,952.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
63	ALT-296	23/01/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	TRANSPORTE DE MATERIALES	13,338,000.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
64	ALT 301	8/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 003 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	20,927,198.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
65	ALT 302	8/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 004 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	22,545,238.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
66	FECV 189	26/01/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 3 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	13,067,860.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
67	FECV 190	7/02/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 4 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	32,023,394.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
68	TAU-32	7/02/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 6 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	59,980,201.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
69	CC 06	2/02/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 20 DÍAS MES DE DICIEMBRE	8,549,700.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
70	ALT 285	18/10/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	15,794,897.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024

N°	Documento Tercero	Fecha De Documento Tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Neto Pago	Clasificación Anticipo	Orden De Giro	Fecha De Giro
71	ALT 304	20/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 004 CONTRATO CE-201-146-002 EXCAVACIÓN	176,133,378.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
72	ALT 305	20/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 005 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	32,919,472.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
73	TAU-35	20/02/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 7 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	27,557,188.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
74	FECV 191	19/02/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 5 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	39,517,236.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
75	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 3	71,631,753.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
76	1191	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	574,770.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
77	1193	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	47,649,147.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
78	1194	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	1,165,962.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
79	1195	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	25,488,372.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
80	1241	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	53,530,960.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
81	1242	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	20,200,726.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
82	1248	4/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	32,905,404.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
83	1249	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	32,172,840.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
84	1253	5/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	75,179,797.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
85	A-450	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA103 MADERA	3,985,800.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
86	A-451	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-103 MADERA	1,303,050.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
87	2448	29/02/2024	901.100.411-1	SOLUINTECO SAS	ORDEN DE COMPRA-103 SUMINISTRO ACERO	8,259,384.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
88	CC 07	1/03/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 09 AL 26 DE ENERO DEL 2023	7,704,130.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
89	ALT 308	6/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 006 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	85,059,771.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
90	TAU-36	6/03/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 8 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	38,803,958.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024

N°	Documento Tercero	Fecha De Documento Tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Neto Pago	Clasificación Anticipo	Orden De Giro	Fecha De Giro
91	FECV 192	7/03/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 6 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	34,981,301.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
92	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 4	45,895,714.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
93	1192	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	24,555,531.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
94	1255	7/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	70,939,946.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
95	1258	3/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	1,185,954.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
96	1259	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	65,054,920.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
97	1261	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	7,901,540.50	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
98	1262	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	3,738,619.23	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
99	FECV 196	21/03/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 7 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	42,746,131.98	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
100	CC 09	3/04/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 02AL 04 DE MARZO DEL 2024	856,014.44	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
101	CC 08	3/04/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 02AL 04 DE MARZO DEL 2024	10,272,173.33	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
102				ANULADO					17/04/2024
103	TAU-39	6/04/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N°98 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	35,323,429.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
104	310	21/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N 006 CE 201 146 007 CONCRETO	90,650,204.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
105	9817	3/04/2024	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE MARZO 2024	14,546,044.40	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
106	310	21/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N 007 CE 201 146 007 CONCRETO	12,570,248.56	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 12	24/06/2024
TOTAL						4,767,975,486.28			

10.4 Ejecución Financiera del Anticipo

A la fecha del presente informe, se ejecutó el 100% del anticipo aprobado, mediante giros parciales gestionados por la fiduciaria conforme a la planeación contractual.

Tabla 7. Relación de Inversión por Mes y Clasificación

CLASIFICACIÓN ANTICIPO	VALOR GIRADO OCTUBRE 2023	VALOR GIRADO NOVIEMBRE 2023	VALOR GIRADO DICIEMBRE 2023	VALOR GIRADO ENERO 2024	VALOR GIRADO FEBRERO 2024	VALOR GIRADO MARZO 2024	VALOR GIRADO ABRIL 2024	VALOR GIRADO JUNIO 2024	ACUMULADO TOTAL
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$1,285,249,950.00	63,192,276	-	80,372,021	622,420,038	302,416,212	173,376,511	-	$ 2,527,027,007.73
MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	$218,871,200.00	201,537,960	24,571,996	632,057,958	520,647,515	212,444,874	179,847,953	12,570,249	$ 2,002,549,704.24
TRANSPORTE DE MATERIALES	$127,763,604.58	-	40,170,822	4,134,777	51,783,526	-	14,546,044	-	$ 238,398,774.31
COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ -	-	-	-	-	-	-	-	$ -
TOTAL	$1,631,884,754.58	$264,730,236.42	$64,742,818.00	$716,564,755.83	$1,194,851,079.00	$514,861,086.00	$367,770,507.89	$12,570,248.56	$4,767,975,486.28

A la fecha del presente informe, se giró por medio de la fiducia el valor de **CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 4,767,975,486.28).**

10.5 Liquidación Del Encargo Fiduciario

Una vez ejecutado el 100% del plan de inversión aprobado, se procedió a la liquidación del encargo fiduciario administrado por Alianza Fiduciaria S.A., sin saldos pendientes ni observaciones por parte de la interventoría ni de la entidad contratante (Ver anexo 22. Liquidación Encargo Fiduciario).

Adicionalmente, los rendimientos financieros generados por los recursos depositados en el encargo fiduciario fueron debidamente reintegrados al Municipio de Villavicencio el 03 de septiembre del 2024, por un total de 1.133.532,82 discriminados así (Ver anexo 23. Soporte de Giro Rendimientos Financieros), la diferencia en el valor total de $110.94 se debe a la cancelación final de la cuenta:

Fecha	Valor
30/09/2023	$ 80,036.63
31/10/2023	$ 199,125.35
30/11/2023	$ 156,189.68
31/12/2023	$ 240,123.16
31/01/2024	$ 232,901.35
29/02/2024	$ 118,976.98
31/03/2024	$ 61,799.39
30/04/2024	$ 11,904.19
30/04/2025	$ 30,280.99
31/05/2025	$ 875.59
30/06/2024	$ 911.55
31/07/2025	$ 410.96
31/08/2024	$ 99.47
30/09/2025	$ 8.47
TOTAL	**$ 1,133,643.76**

Estado de Liquidación:

- **Valor Total Anticipo Girado:** $4.767.975.486,00
- **Valor Ejecutado:** $4.767.975.486,00
- **Rendimientos Financieros Devueltos a la Alcaldía:** $ 1,133,535.82
- **Saldo:** $0
- **Fecha de Liquidación:** 31-10-2024

CONCLUSIÓN.

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 31 de octubre de 2025, el proyecto se mantuvo en una fase de reinicio controlado y de preparación, orientada principalmente a habilitar el tiempo necesario para la suscripción del Modificatorio No. 4 y ejecutar labores previas esenciales para la reactivación del contrato.

En este lapso, el Consorcio Educación C&G–MH llevó a cabo actividades de limpieza general y adecuación del terreno, la limpieza, organización y resguardo del acero existente, y la verificación y ajuste del sistema de energía provisional de la obra, asegurando su operatividad y condiciones de seguridad. Estas acciones se complementaron con la actualización de los instrumentos de planeación y control, fortaleciendo la gestión técnica y administrativa del proyecto.

De esta manera, se establecieron las condiciones óptimas para el reinicio efectivo de la ejecución de la obra, reafirmando el compromiso del contratista con la planificación, la calidad y el cumplimiento de los lineamientos contractuales en el marco del proyecto de Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, en beneficio de la comunidad educativa y del municipio de Villavicencio, Meta.

TABLAS

Tabla 1 Datos Generales del Proyecto 9

Tabla 2 Ubicación Geográfica Centro Poblado Altos de Pompeya 11

Tabla 3 Áreas a Construir por Edificaciones 14

Tabla 4 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Contrato 15

Tabla 5 Póliza de Seguro Cumplimiento Contrato 15

Tabla 6 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Acta de Inicio 16

Tabla 7 Póliza de Seguro Cumplimiento Acta de Inicio 16

Tabla 8 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Prorroga No. 1 16

Tabla 9 Póliza de Seguro Cumplimiento – Prorroga No. 1 17

Tabla 10 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificación No. 3. 17

Tabla 11 Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificación No. 3 17

Tabla 12 Póliza de Seguro Cumplimiento – Suspensión No. 1 18

Tabla 13 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Suspensión No. 1. 18

Tabla 14 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 1 Suspensión No. 1 18

Tabla 15 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 1 Suspensión No. 1. 19

Tabla 16 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 2 Suspensión No. 1 19

Tabla 17 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 2 Suspensión No. 1. 20

Tabla 18 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 4 Suspensión No. 1 20

Tabla 19 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 4 Suspensión No. 1. 20

Tabla 20 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 5 Suspensión No. 1 21

Tabla 21 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 5 Suspensión No. 1. 21

Tabla 22 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 6 Suspensión No. 1 21

Tabla 23 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 6 Suspensión No. 1. 22

Tabla 24 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1. 22

Tabla 25 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1. 22

Tabla 26 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 10 Suspensión No. 1. 23

Tabla 27 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 10 Suspensión No. 1. 23

Tabla 28 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 11 Suspensión No. 1. 23

Tabla 29 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 11 Suspensión No. 1. 24

Tabla 30 Póliza de Seguro Cumplimiento – Acta Reinicio 24

Tabla 31 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Acta Reinicio 24

Tabla 32 Flujo de Inversión Programado Por Mes 26

Tabla 33 Relación Avance Programado Acumulado vs Avance Físico Acumulado 27

abla 34 *Acero de Refuerzo Cimentación* 31

Tabla 35 Acero de Refuerzo 32

Tabla 36 Relación de Maquinarias Usadas en el Periodo 33

Tabla 37 Análisis Físico-Químico del Agua para Produccion de Concreto 37

Tabla 38 Relación de Equipos Topográficos 37

Tabla 39 Equipos de Laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S 38

Tabla 40 Relación del Personal Profesional del Contratista de Obra 45

Tabla 41 Relación del Personal no Profesional del Contratista de Obra 46

Tabla 42 Relación del Personal de Contratistas de Obra 46

Tabla 43 Proceso de Inducción por Empresas 49

Tabla 44 Charlas de Seguridad y Capacitaciones 50

Tabla 45 Inspecciones Planificadas 53

Tabla 46 Control de Manejo Ambiental 57

Tabla 47 Individuos Evaluados en la Verificación En Campo 66

Tabla 48 Inspección Ambiental 79

Tabla 49 Actividades de Atención al Usuario 83

Tabla 50 Hojas de Vida Recepcionadas octubre 2025 89

Tabla 51 Mano de Obra no Calificada Contratada al Proyecto 91

Tabla 52 Relación de Actas de Reuniones y/o Comité 95

Tabla 53 Relación de Correspondencia Enviada 95

Tabla 54 Plan de Inversión del Anticipo Versión 3 98

Tabla 55 Datos Fiduciarios 99

Tabla 56 Control y Seguimiento de AnticipoControl y Seguimiento de Anticipo 99

Tabla 57 Control y Seguimiento de Pago de Actas Parciales. 99

Tabla 58 Formato de Relación de Inversión Anticipo 100

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del Proyecto 12

Ilustración 2 Implantación y Localización General 13

Ilustración 3 Curva S Análisis de Avance Físico vs Programado 28

Ilustración 4 Acondicionamiento Locativo Redes Eléctricas 29

Ilustración 5 Acondicionamiento Locativo Planta de Concreto 30

Ilustración 6 Acero de Refuerzo Cimentación 31

Ilustración 7 Acero de Refuerzo Estructural 32

Ilustración 8 Plano Plan de Manejo de Tránsito 33

Ilustración 9 Maquinaria en Obra planta de Concreto 34

Ilustración 10 Registro Diario del Clima Octubre 2025 35

Ilustración 11 Influencia del Clima Octubre 2025 35

Ilustración 12 Mantenimiento de Equipos para Produccion de Concreto 39

Ilustración 13 *Personal Vinculado por Empresas octubre 2025* 44

Ilustración 14 *Personal Vinculado por Profesión octubre 2025* 44

Ilustración 15 *Entrega y Reemplazo de Equipos de Protección Personal* 47

Ilustración 16 *Proceso de Inducción* 48

Ilustración 17 *Participación de Inducciones* 49

Ilustración 18 *Cobertura de Participación Contratista* 51

Ilustración 19 *Charlas y Capacitación por Contratista* 52

Ilustración 20 *Inspecciones Planificadas* 53

Ilustración 21 *Indicadores de Accidentalidad* 54

Ilustración 22 *Toma de Muestra Aguas Subterránea Pozo Profundo* 60

Ilustración 23 *Orden y Aseo en el Campo de Trabajo* 62

Ilustración 24 *Organización y Mantenimiento de Puntos Ecológicos* 62

Ilustración 25 *Identificación de Individuos Arbóreos Para Aprovechamiento Forestal* 64

Ilustración 26 ***Motosierra MS 381 MARCA STIHL*** 68

Ilustración 27 ***Actividad de Aprovechamiento Forestal*** 68

Ilustración 28 ***Inspección Elementos Puntos de Emergencia*** 71

Ilustración 29 ***Mantenimiento de la Señalización Frente de Trabajo*** 72

Ilustración 30 *Cierre Perimetral de Excavaciones* 72

Ilustración 31 *Mantenimiento del Cerramiento Perimetral de la Obra* 73

Ilustración 32 *Maquinaria en Obra* 74

Ilustración 33 *Inspección* 75

Ilustración 34 *Educación y Capacitación al Personal de Obra* 76

Ilustración 35 *Elementos de Protección Personal En La Ejecución de las Actividades* 78

Ilustración 36 *Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto.* 84

Ilustración 37 *Taller Derechos y deberes de los Trabajadores en obra* 86

Ilustración 38 *Pieza#1: Publicada 07/10/2025* 87

Ilustración 39 *Pieza#2: Publicada 07/10/2025* 87

Ilustración 40 *Piezza#3: Publicada 24/10/2025* 88

Ilustración 41 *Pieza#4: Publicada 29/10/2025* 89

Ilustración 42 *Reunión comité de vigilancia y control Octubre.* 94

18062

ANEXO 1 BITÁCORA DE OBRA.

18063

FORMATO BITÁCORA DE OBRA		N° 1
consorciomh@cyg.com.co	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	NIT. 901687301-9

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE DE LA OBRA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
N° DE CONTRATO	1279
FECHA INICIO	20/05/2023
FECHA SUSPENSIÓN	26/04/2024
FECHA REINICIO	6/10/2025

GATOS GENERALES	
FECHA	PERIODO COMPRENDIDO DEL 6-10-2025 AL 11-10-2025
CLIMA	SOLEADO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	PLANTA DE CONCRETO DOMAT, SILO, GRUA CANASTA
No. TRABAJADORES	9

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1	MANTENIMIENTO LOCATIVO	ROCERIA Y PODA DE ARBOLES EN LINEAS ELECETRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
2	MANTENIMIENTO LOCATIVO	PRIMERA FASE DE MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA, BAJA Y AREAS INTERNAS
3	MUESTRAS PARA ENSAYO DE ACERO DE REFUERZO	VISITA DE PATOLOGO Y TOMA DE MUESTRAS DE ACERO DE REFUERZO PARA ENSAYO Y DETERMINAR SUS CONCDICIONES
4	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE ACERO DE REFUERZO DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	CONSORCIO EDUCATIVO AR
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA	FIRMA

18654

FORMATO BITÁCORA DE OBRA		N° 2
consorciomh@cyg.com.co	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	NIT. 901687301-9

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE DE LA OBRA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
N° DE CONTRATO	1279
FECHA INICIO	20/05/2023
FECHA SUSPENSIÓN	26/04/2024
FECHA REINICIO	6/10/2025

FECHA, TIEMPO Y CLIMA	
FECHA	PERIODO COMPRENDIDO DEL 13-10-2025 AL 18-10-2025
CLIMA	SOLEADO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	EQUIPOS TOPOGRAFICOS, PLANTA DOMAT, SILO
No. TRABAJADORES	9

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE ACERO DE REFUERZO DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
2	ENSAYO GPR	SE REALIZA PRUEBA DE ENSAYO GPR, POR PARTE DE LA INTERVENTORIA CON EL OBJETO DE DETERMINAR LA CONTINUIDAD Y PROFUNDIDAD DE LOS CAISSON
3	TOPOGRAFIA	INICIO DE ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
4	MANTENIMIENTO ELECTRICO	CONTINUAN LOS TRABAJOS LOCATIVOS ELECTRICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	CONSORCIO EDUCATIVO AR
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA	FIRMA

1806

FORMATO BITÁCORA DE OBRA		N° 3
consorciomh@cyg.com.co	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	NIT. 901687301-9

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE DE LA OBRA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
N° DE CONTRATO	1279
FECHA INICIO	20/05/2023
FECHA SUSPENSIÓN	26/04/2024
FECHA REINICIO	6/10/2025
FECHA, TIEMPO Y CLIMA	
FECHA	PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-10-2025 AL 26-10-2025
CLIMA	SOLEADO 20-21-24-25 Y 26 /LLUVIA FUERTES 22 Y 23
MAQUINARIA Y EQUIPOS	PLANTA DE CONCRETO DOMAT, SILO, GRUA CANASTA, CAMION GRUA
No TRABAJADORES	20

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	DESARMADO Y ETIQUETADO DE ACERO DE REFUERZO PARA POSTERIOR LIMPIEZA EN EL MODULO EDUCATIVO
2	MANTENIMIENTO ELECTRICO	CONTINUAN LOS TRABAJOS LOCATIVOS ELECTRICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES
3	TOPOGRAFIA	CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	CONSORCIO EDUCATIVO AR
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA	FIRMA

18066

FORMATO BITÁCORA DE OBRA		N° 4
consorciomh@cyg.com.co	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	NIT. 901687301-9

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE DE LA OBRA	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
N° DE CONTRATO	1279
FECHA INICIO	20/05/2023
FECHA SUSPENSIÓN	26/04/2024
FECHA REINICIO	6/10/2025
FECHA, TIEMPO Y CLIMA	
FECHA	PERIODO COMPRENDIDO DEL 27-10-2025 AL 01-11-2025
CLIMA	SOLEADO
MAQUINARIA Y EQUIPOS	PLANTA DE CONCRETO DOMAT, SILO, GRUA CANASTA
No TRABAJADORES	15

N°	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS	LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS DE LOS MÓDULOS ADMINISTRATIVO Y POLIDEPORTIVO
2	MANTENIMIENTO LOCATIVO	CULMINAN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO LOCATIVOS EN SILO Y PLANTA DE CONCRETO, IGUALMENTE CONTINUAN LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS DEL PROYECTO
3	TOPOGRAFIA	CONTINUAN LAS ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS PARA DETERMINAR EJES Y, REPLANTEOS Y EXPLANACIONES DE TERRENO
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	CONSORCIO EDUCATIVO AR
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FIRMA	FIRMA

18067

ANEXO 2. INFORME ESTADO ACTUAL DEL ACERO DE REFUERZO EXPUESTO AL A INTEMPERIE.

Docusign Envelope ID: 060E9748-949F-4FCA-9309-FF6466FB5A15

Con-0018-25

Villavicencio, septiembre 2025

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH
Atn. Ing Yeison Gómez
Director de Obra
La ciudad

REF: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.

INFORME TÉCNICO: ESTADO ACTUAL DEL ACERO DE REFUERZO EXPUESTO A LA INTEMPERIE

1. INTRODUCCIÓN

Durante la ejecución del proyecto de reconstrucción de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, el cual comprende estructuras de concreto reforzado, se produjo una suspensión de actividades. Esta pausa dejó parte del acero de refuerzo ya instalado y almacenado expuesto a la intemperie durante varios meses. Ante la preocupación de la comunidad, la interventoría y el consorcio constructor, se realizó una inspección técnica desde la especialidad de patología con el fin de evaluar el estado actual del acero expuesto y determinar su idoneidad para continuar con su utilización estructural.

MUESTRA	MODULO	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	EJES	VARILLA #	LONGITUD
1	EDUCATIVO	VIGA	104-C	M11-N11	6	1,00
2	EDUCATIVO	VIGA	109-C	L9-L11	7	1,00
3	EDUCATIVO	VIGUETA	103-C	J6-H6	5	1,00
4	EDUCATIVO	COLUMNA	J-6	J6	6	1,00
5	EDUCATIVO	COLUMNA	L-13	L-13	5	1,00
6	EDUCATIVO	PATIN	VIGA 101-C	L6-M6	3	1,00
7	EDUCATIVO	ANILLO CAISSON	N9	N9	4	1,00

Tabla de aceros enviados a laboratorio

Carrera 34 #21-30
San Benito-Villavicencio
nestorsuarezespecialista@gmail.com
3115021033

Docusign Envelope ID: 060E9748-949F-4FCA-9309-FF6466FB5A15

1806

Con-0018-25









Carrera 34 #21-30
San Benito-Villavicencio
nestorsuarezespecialista@gmail.com
3115021033

Docusign Envelope ID: 060E9748-949F-4FCA-9309-FF6466FB5A15

18070

Con-0018-25











Carrera 34 #21-30
San Benito-Villavicencio
nestorsuarezespecialista@gmail.com
3115021033

Docusign Envelope ID: 060E9748-949F-4FCA-9309-FF6466FB5A15

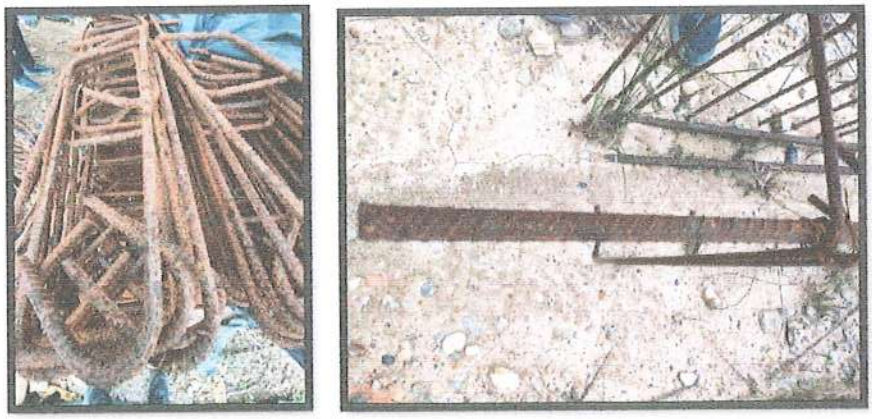

Fotografías del antes y después de cepillado mecánico con Grata

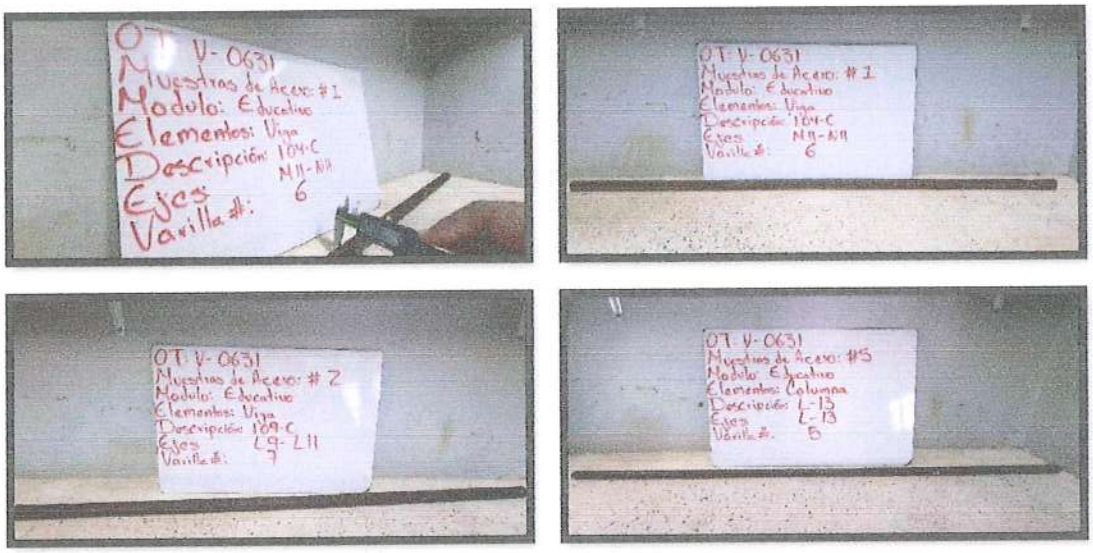

Medición de diámetros en laboratorio

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar el estado de conservación del acero de refuerzo expuesto a la intemperie, evaluando su posible afectación estructural.

Objetivos Específicos

- Verificar si existe pérdida de sección transversal en las barras.
- Evaluar visualmente el estado de corrosión superficial.

Docusign Envelope ID: 060E9748-949F-4FCA-9309-FF6466FB5A15

- Recomendar acciones para limpieza, protección o posible descarte del material.
- Proponer ensayos mecánicos para confirmar la integridad del acero.

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Este informe se fundamenta en las siguientes normas técnicas nacionales e internacionales:

- NSR-10 (Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente): Título F.2.7.3 – Requisitos del acero de refuerzo.
- ACI 318-19 (Building Code Requirements for Structural Concrete): Sección 20.2.2.5 – Requisitos de adherencia en acero oxidado.
- ASTM A615/A706 – Especificación de barras de acero para refuerzo de concreto.

4. MARCO TEÓRICO

El acero de refuerzo para concreto puede sufrir corrosión superficial al estar expuesto a la humedad y el oxígeno del ambiente. No obstante, la adherencia con el concreto no se ve comprometida cuando la corrosión es leve y no hay pérdida de sección ni desprendimiento de partículas. La película superficial de óxido puede incluso mejorar el anclaje, siempre que se mantenga intacta la geometría de las corrugas y el diámetro nominal.

La corrosión se convierte en problemática cuando ocurre en ambientes marinos, contaminados, generando productos expansivos que fracturan el recubrimiento de concreto o afectan la sección útil de las barras.

5. ESTADO ACTUAL DE LOS ACEROS

Inspección Visual:

- Presencia de óxido superficial uniforme.
- No se evidencia corrosión penetrante ni picaduras profundas.
- No hay descascaramientos ni pérdidas visibles de sección.
- Corrugas del acero conservadas.
- Tipo de corrosión: Atmosférica leve, por exposición temporal a intemperie no agresiva.

Docusign Envelope ID: 060E9748-949F-4FCA-9309-FF6466FB5A15

Numero de varilla	Diámetro Nominal (mm)	Diámetro Medido (mm)	Perdida de área por oxidación según ACI 364.1R-07	Cumple Especificación	Observaciones
3	9.5	11.9 mm	<10%	Sí	Óxido leve sin daño
4	12.7	15.8 mm	<10%	Sí	Óxido leve sin daño
5	15.9	19.7 mm	<10%	Sí	Óxido leve sin daño
6	19.1	24.9 mm	<10%	Sí	Óxido leve sin daño
7	22.2	24.9 mm	<10%	Sí	Óxido leve sin daño

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR PÉRDIDA DE SECCIÓN EN BARRAS DE ACERO CORRUGADO

Grado de deterioro	Pérdida estimada de sección transversal del refuerzo	Evaluación estructural	Acción recomendada	Referencia normativa / bibliográfica
Leve	*≤ 10 %*	*No afecta significativamente la capacidad resistente. El acero conserva su adherencia y continuidad estructural.*	*Mantener el refuerzo existente. Aplicar limpieza superficial*	*ACI 364.1R-07, Sección 4.2.2*
Moderado	10 – 25 %	Afecta parcialmente la capacidad resistente. Puede requerir verificación	Evaluar necesidad de refuerzo adicional mediante recubrimiento	ACI 364.1R-07 / FHWA-RD-03-087

		analítica del elemento.	con morteros estructurales o adición de barras suplementarias.	
Severo	> 25 – 40 %	La pérdida de área de acero compromete la capacidad a flexión o tracción del elemento.	Reforzar o sustituir el refuerzo deteriorado. Aplicar técnicas de encamisado, inyección o fibra de carbono según el caso.	ACI 562-19, Cap. 7 / fib Bulletin 80 (2016)
Crítico	> 40 %	Se considera pérdida estructural significativa; la barra ha perdido su función resistente.	Sustituir completamente la barra afectada o el tramo del elemento. No se recomienda reutilización.	fib Bulletin 80 (2016), CEB-FIP Model Code 2010

7. CONCLUSIONES

El acero de refuerzo presenta una corrosión leve superficial compatible con la exposición al ambiente sin protección durante un período moderado.

No se detectó pérdida significativa de sección ni afectación de corrugas (menor a 10%).

El acero es apto para ser utilizado, siempre que se confirme mecánicamente su resistencia.

Las condiciones observadas no comprometen la adherencia al concreto ni la integridad estructural del sistema.

El manejo y almacenamiento posterior deben evitar nuevas exposiciones innecesarias, utilizar plásticos para disminuir el impacto de la lluvia.

Docusign Envelope ID: 060E9748-949F-4FCA-9309-FF6466FB5A15

8. RECOMENDACIONES

Limpieza: Eliminar el polvo de óxido con cepillo de alambre manual o eléctrico. No usar productos químicos agresivos.

Ensayos complementarios: Realizar pruebas mecánicas a muestras aleatorias.

Control de calidad: Registrar fotográficamente el estado del acero antes y después de limpieza.

Validación por interventoría: Todos los resultados deben ser avalados por el laboratorio acreditado y validados por la interventoría técnica del proyecto.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Concrete Institute (ACI). (2007). ACI 364.1R-07: Guide for Evaluation of Concrete Structures Before Rehabilitation.
- American Concrete Institute (ACI). (2019). ACI 562-19: Code Requirements for Assessment, Repair, and Rehabilitation of Existing Concrete Structures.
- fib (Fédération internationale du béton). (2016). Bulletin 80: Partial Factor Methods for Existing Concrete Structures.
- Federal Highway Administration (FHWA). (2003). FHWA-RD-03-087: Corrosion Protection of Steel in Concrete.
- CEB-FIP (2010). Model Code 2010: Design Code for Concrete Structures.

Nota: se adjunta el certificado de calibración del pie de rey
Sin otro particular

DocuSigned by:
3B8E5ADB8AEE423...

Ing. NÉSTOR HERNÁN SUAREZ QUIÑONES
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Especialista en Patología de la Construcción
MP 2520158140 CND

LABORATORIO DE METROLOGÍA PINZUAR S.A.S.
Carrera 104 B No. 18 - 26 Bogotá D.C. - Colombia
(+57 60 1) 745 4555 · Cel.: 316 538 5810 - 317 423 3640
www.pinzuar.com.co

PINZUAR®
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

18076

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

L-33525-001 R2

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	PIE DE REY
Fabricante *Manufacturer*	SATTIYRCH
Modelo *Model*	STAINLESS HARDENED
Número de Serie *Serial Number*	X0026WRSF5T
Identificación Interna *Internal Identification*	EQ-187
Intervalo de Medición *Measurement Range*	0 mm a 150 mm
Solicitante *Customer*	NHSQ INGENIERIA S.A.S
Dirección *Address*	Carrera 34 No. 21 - 34
Ciudad *City*	Villavicencio - Meta
Fecha de Recepción ***Date of reception***	**2024 – 12 – 31**
Fecha de Calibración *Date of calibration*	2025 – 01 – 14
Fecha de Emisión *Date of issue*	2025 – 04 – 04
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	03

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo corresponden al ítem que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad de los resultados reportados a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability of the reported results to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas que Autorizan Certificado ***(Certificado firmado digitalmente)***
Signatures Authorizing the Certificate (Digitally signed certificate)

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Adelfo Durán
Metrólogo Laboratorio de Metrología

Certificado firmado digitalmente.

LABORATORIO DE METROLOGÍA PINZUAR S.A.S.
Carrera 104 B No. 18 - 26 Bogotá D.C. - Colombia
(+57 60 1) 745 4555 · Cel.: 316 538 5810 - 317 423 3640
www.pinzuar.com.co

PINZUAR®
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

18377

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Medición	Exteriores, Interiores y Profundidad
Método Empleado	Comparación Directa
Documento de Referencia	Procedimiento DI-008 Calibración de calibres; Pie de rey del Centro Español de Metrología. Edición digital 1. Rev.2, 2024
Tipo de Indicación	Digital
Resolución	0,01 mm

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Al equipo en referencia se le efectuó una inspección visual con la que se determinó que se encuentra en buen estado, las superficies de medición no presentan sobresaltos, por lo tanto, presenta una buena condición para la medición. Se procede a la realizar la toma de datos respectiva comparando la indicación del equipo con el valor nominal del bloque patrón iniciando la medición con la puesta a cero del equipo.

Tabla 1. Resultados de las Superficies para Medición de Exteriores

Valor Nominal 0 mm a..	Promedio mm	Error µm	Incertidumbre Expandida µm	k (p≈95,45%)
0,5	0,497	-3,3	6,6	2,02
1	0,993	-6,7	6,6	2,02
2	1,997	-3,3	6,6	2,02
3	3,010	10,0	6,6	2,02
4	3,997	-3,3	6,6	2,02
5	5,000	0,0	6,6	2,02
10	10,010	10,0	6,6	2,02
20	20,023	23,3	6,6	2,02
50	50,040	40,0	6,6	2,02
75	75,030	30,0	6,6	2,02
100	100,030	30,0	6,7	2,02
125	125,037	36,7	6,8	2,02
150	150,047	46,7	6,9	2,02

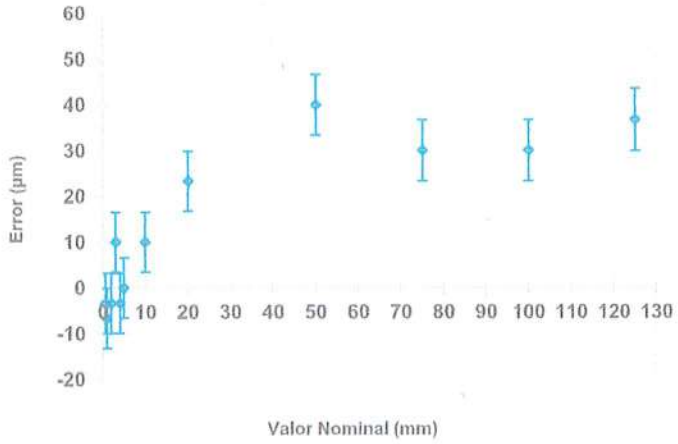


Figura 1. Error vs. valor nominal para la medición de exteriores

Tabla 2. Resultados de las Superficies para Medición de Interiores

Valor Nominal 0 mm a...	Promedio mm	Error µm	Incertidumbre Expandida ± µm	k (p≈95,45%)
10	9,913	-86,7	6,5	2,03



Figura 2. Error vs. valor nominal para la medición de interiores.

Tabla 3. Resultados para Medición de Profundidad

Valor Nominal 0 mm a...	Promedio mm	Error µm	Incertidumbre Expandida ± µm	k (p≈95,45%)
20	19,993	-6,7	6,0	2,01




Figura 3. Error vs. valor nominal para la medición de profundidad

LABORATORIO DE METROLOGÍA PINZUAR S.A.S.
Carrera 104 B No. 18 - 26 Bogotá D.C. - Colombia
(+57 60 1) 745 4555 · Cel.: 316 538 5810 - 317 423 3640
www.pinzuar.com.co

PINZUAR®
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

18078

CONDICIONES AMBIENTALES

La calibración se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar, las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	20,5 °C	**Humedad Relativa Máxima:**	52 %
Temperatura Mínima:	20,3 °C	**Humedad Relativa Mínima:**	50 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura, k, y la probabilidad de cobertura, la cual es aproximada al 95%. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

TRAZABILIDAD

Los resultados reportados en este certificado se obtuvieron utilizando patrones trazables al SI a través de institutos nacionales de metrología y/o laboratorios acreditados y son parte de un programa de aseguramiento metrológico que garantiza la exactitud e incertidumbres requeridas. El/Los certificado(s) de calibración de el/los patrón(es) usado(s) como referencia para la calibración en cuestión que se mencionan a continuación, se pueden descargar accediendo al enlace en el código QR.

Equipo	Fabricante	Certificado de Calibración	Fecha de calibración
Bloques Patrón Longitudinales de Caras Paralelas	MITUTOYO	LMD223515 de Cidesi	2022-11-29

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Tanto el intervalo como los valores de longitud para la ejecución de la calibración reportados en el presente certificado fueron acordados con el cliente.
3. Se adjunta la etiqueta de calibración No. **L-33525-001**
4. El presente certificado reemplaza al certificado No. L- 33525-001 R1, expedido con fecha 2025 – 02 – 17. Se corrige el filtro en la pag. 2. Para ver completa la tabla de resultados, Revisión 2 se registra fecha de recepción.

Fin de Certificado

LM-PC-23-F-01 R11.0

18079

ANEXO 3. INFORME ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.

Docusign Envelope ID: 85A80F62-A066-4BBD-9C64-E2252FA02E80

Anexo 1 Resultados de ensayos al agua de mezclado

Carrera 34 N° 21-34 Barrio San Benito
Villavicencio-Meta
Celular: 3115021033-3112959859-6733005
Email: laboratorio@nhsqingenieria.com
www.nhsqingenieria.com

Docusign Envelope ID: 85A80F62-A066-4BBD-9C64-E2252FA02E80

Villavicencio, octubre de 2025

Señores
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH
Atn. Ing Yeison Gómez
Director de Obra
La ciudad

REF: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
Asunto: Resultados de agua de mezclado.

INFORME TÉCNICO

Análisis de Agua para Concreto según INVIAS 2022 - Artículo 630

1. Introducción

La calidad del agua utilizada en la elaboración del concreto es fundamental para garantizar la durabilidad, resistencia y desempeño estructural de las obras civiles. Por ello, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) establece, en su Artículo 630 del año 2022, los requisitos que debe cumplir el agua para concreto. En este contexto, se tomaron muestras de agua de un pozo ubicado en el área del proyecto de una institución educativa, con el fin de verificar su aptitud para ser utilizada en la mezcla de concreto.

2. Objetivos

- Verificar la calidad del agua del pozo frente a las exigencias del Artículo 630 del INVIAS 2022.
- Evaluar la conformidad de los parámetros químicos y físicos analizados.
- Emitir conclusiones técnicas respecto a la viabilidad de su uso en obras de concreto.
- Proporcionar recomendaciones técnicas según los resultados.

3. Marco Teórico

Según el Artículo 630 del INVIAS 2022, el agua utilizada en la elaboración del concreto debe cumplir con parámetros que aseguren que no afecte negativamente las propiedades del cemento y del concreto endurecido. Entre los valores límite destacan:

- pH: mayor6.5
- Cloruros (como Cl^-): ≤ 1000.
- Sulfatos (como SO_4^{2-}): ≤ 3000.
- Sólidos disueltos totales: ≤ 50000.

El incumplimiento de estos límites puede generar problemas como corrosión en las armaduras, retraso en el fraguado o pérdida de resistencia del concreto.



Docusign Envelope ID: 85A80F62-A066-4BBD-9C64-E2252FA02E80

Parámetro	Resultado del Análisis	Límite INVIAS 2022	Cumple
pH	6,33	≥ 6,5	No
Alcalinidad	27 mg/L	Hasta 600 mg/L	Sí
Sulfatos (SO_4^{2-})	<20 mg/L	Hasta 3000 mg/L	Sí
Cloruros (Cl^-)	<1 mg/L	Hasta 1000 mg/L	Sí
Sólidos disueltos totales	174,75 mg/L	Hasta 50 000 mg/L	Sí

4. Análisis de Resultados

El análisis fisicoquímico del agua proveniente del pozo profundo del Colegio Pompeya muestra que la mayoría de los parámetros evaluados cumplen con los límites establecidos en el Artículo 630 del INVIAS 2022. Sin embargo, se evidencia una no conformidad en el valor del pH, cuyo resultado fue 6,33, inferior al mínimo permitido de 6,5.

Este resultado es importante, ya que el pH del agua influye directamente en la hidratación del cemento y en la durabilidad del concreto. Un pH bajo puede indicar una ligera acidez, que podría:

- Afectar el proceso de fraguado.
- Alterar las reacciones químicas entre los componentes del cemento.
- Incrementar el riesgo de corrosión de las armaduras embebidas en el concreto a largo plazo.

Por otro lado, los valores de sólidos totales (174,75 mg/L), cloruros (<1 mg/L), sulfatos (<20 mg/L) y alcalinidad (27 mg/L) se encuentran ampliamente por debajo de los límites establecidos (500–1000 mg/L para Cl^-, 3000 mg/L para SO_4^{2-}, 600 mg/L para álcalis, y 50,000 mg/L para sólidos totales), lo cual es favorable para el uso del agua en la mezcla de concreto desde el punto de vista químico.

5. Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico del agua del pozo del Colegio Pompeya, se sugiere implementar las siguientes acciones para corregir el valor de pH (6,33) y asegurar su conformidad con la normativa INVIAS 2022 (mínimo pH 6,5).

a. Tratamiento del agua para ajustar el pH

Se recomienda realizar una corrección química del pH mediante el uso controlado de cal hidratada (hidróxido de calcio, $Ca(OH)_2$), una sustancia compatible con el concreto y de fácil manejo en obra.

b. Procedimiento sugerido:

Preparación de la solución alcalina:

- Disolver cal hidratada en agua limpia para formar una solución diluida.



- Se recomienda iniciar con una proporción de aproximadamente 10 g de cal por cada 100 litros de agua como ensayo preliminar.
- Ajustar esta proporción con base en el resultado del pH medido.

Adición al tanque de almacenamiento:

- Verter la solución en el depósito o tanque de almacenamiento de agua del pozo de forma lenta y continua.
- Agitar o recircular el agua para asegurar una distribución homogénea del tratamiento.

Monitoreo del pH:

- Medir el pH con un medidor digital o con tiras indicadoras de pH.
- Detener la adición de cal cuando el pH esté dentro del rango permitido de 6.5 a 8.5.

Verificación final:

- Antes de usar el agua en obra, confirmar que el pH se mantiene dentro del rango especificado.
- Registrar el resultado como parte del control de calidad.

Cuidados especiales durante el tratamiento

- Evitar el exceso de cal: un pH superior a 8.5 también puede afectar la hidratación del cemento.
- Evitar acumulaciones: asegurarse de que la cal esté completamente disuelta para no generar sedimentos.
- No mezclar con otras sustancias: evitar combinaciones con productos que puedan generar reacciones químicas no deseadas.
- Seguridad en la manipulación: usar guantes, gafas y mascarilla al preparar y aplicar la cal hidratada.
- Validación del tratamiento: se recomienda realizar una mezcla de prueba de concreto (ensayo de fraguado y resistencia) si se trata de un uso prolongado del agua tratada.

6. Conclusiones

- El análisis fisicoquímico realizado al agua del pozo profundo del Colegio Pompeya evidencia que cumple con la mayoría de los requisitos establecidos por el Artículo 630 de las Especificaciones Generales del INVIAS 2022, incluyendo los límites para sólidos totales, cloruros, sulfatos y alcalinidad.

- Sin embargo, se detectó una no conformidad en el valor del pH, el cual resultó ser 6,33, cuando el mínimo permitido por la normativa es 6,5. Esta diferencia, aunque leve, invalida el uso directo del agua en la elaboración de concreto estructural, según los criterios técnicos exigidos por INVIAS.

- Esta desviación puede afectar la hidratación del cemento, el fraguado y la durabilidad del concreto, especialmente en obras donde se exige control de calidad normado.



Docusign Envelope ID: 85A80F62-A066-4BBD-9C64-E2252FA02E80

- Se propone como solución práctica y técnicamente válida el uso de cal hidratada (hidróxido de calcio) para realizar un ajuste del pH hasta alcanzar el rango exigido (6.5 a 8.5), mediante un procedimiento de neutralización controlado y verificado en obra.

- Con una correcta aplicación del tratamiento y una verificación posterior del pH, el agua del pozo podrá ser utilizada de manera segura y conforme a la normativa vigente, siempre y cuando se implementen los controles recomendados.

DocuSigned by:

3B8E5ADB8AEE423...

Ing. NÉSTOR HERNÁN SUAREZ QUIÑONES
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Especialista en Patología de la construcción

a. Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo en el laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S.
b. La toma de muestras y los datos correspondientes a la identificación de esta fueron suministrados por el cliente; por lo cual el laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S. no asume ninguna responsabilidad sobre la validez de la información dada por el cliente en este informe y no se responsabiliza por el muestreo y/o daños que se puedan presentar en el transcurso del mismo.
c. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio que lo emite.
d. Este informe no es válido sin la firma original del coordinador de ingeniería y el sello original del laboratorio NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
e. El laboratorio NHSQ INGENIERÍA S.A.S. no brinda opiniones ni interpretaciones en sus informes.

---------- FIN DEL INFORME ----------



ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS
Dra. AMPARO RESTREPO DE ÁVILA

ALFAMPAR S.A.S.
NIT: 900.129.681-6
CRA 38 #35-15 BARZAL,

Informe de Resultados
Nº de Análisis: A / 39905

Identificación del Cliente

Cliente	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	*Dirección*	CL 15 40 01 41 101 ESQ LOBBY 1 OF 901 CC LA PRIMAVI
NIT	901687301-9	*Departamento*	META
Teléfonos	6086833708 6016401500	*Municipio*	VILLAVICENCIO

Identificación de la Muestra

Tipo de muestra	AGUAS POTABLES	*Fecha Toma Muestra*	20/10/2025 10:12:00
Lugar de Toma	COLEGIO POMPEYA	*Fecha Recepción Muestra*	20/10/2025 14:40:00
Punto de Toma	POZO PROFUNDO	*Fecha Inicio Análisis*	20/10/2025 14:45:00
Responsable Toma y Transporte	EMPRESA	*Fecha Dictamen*	27/10/2025 11:03:31

PARÁMETRO	RESULTADO		MÉTODO ANALÍTICO	VALOR ADMISIBLE
GRUPO FÍSICO-QUÍMICO				
pH	* 6,33	udes. pH	SM 4500-B	6.50 - 9.00 Unidades de pH
Alcalinidad	27	mg/l	Anal. SM 2320	Hasta 200 mg/l
Sulfatos	<20	mg/l	Anal. SM 4500-E	Hasta 250 mg/l
Cloruros	<1	mg/l	Anal. SM 4500-G	Hasta 250 mg/l
Sólidos Totales	174,75	mg/l	SM 2540-B	mg/l

Legislación de la Muestra

Res. 2115/2007

Dirección Técnica Microbiología
Dra. AMPARO RESTREPO DE AVILA

Dirección Técnica FQ
Ing. Quimico ALFONSO AVILA CAMPOS

Los valores marcados con el signo * indican que el resultado obtenido no cumple con los rangos admisibles según la normativa.
Los análisis hacen referencia exclusivamente a las muestras recogidas en el dia/hora indicada en este informe ó la muestra tal como se recibió del cliente.
El Laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente asociada a la toma y otras desviaciones que puedan afectar la validez de los resultados.
Este informe no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.
El plazo máximo para cualquier observación sobre los resultados de este informe es de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.
Confirme la validez de este informe a través del código QR ubicado en la parte superior

REGISTRO PICCAP - AUTC ADO POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - SOLUCIÓN 1598 DEL 30 DE JULIO DEL 2025

ANEXO 4. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

1808

482/25

CERTIFICAMOS QUE:

LA ESTACION TOTAL CYGNUS KS-102 No.HV4729

Fue verificada y colimada en nuestro taller de mantenimiento, encontrándose en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante.

Revisión del sistema mecánico

- Conjunto nivelante.....
- Ejes Hz y Ver.....
- Desplazamiento de tornillo de movimiento fino.....
- Desplazamiento del enfoque.....
- Verticalidad .....

Revisión del sistema electrónico

- Procesamiento y calculo.....
- Medición de distancias (fina, intermitente y normal) .....
- Medición de coordenadas.....

Revisión del sistema óptico

- Ausencia de humedad y hongos.....
- Eje óptico.....
- Desplazamiento de plomada optica en 180 Grados..... +1.0mm

Ángulos Horizontales, verticales y mediciones efectuadas con colimador óptico

- Angulo vertical (cierre 360 Grados) ..... + 25seg
- Angulo Horizontal (cierre 180 Grados) ..... + 00seg

Medición en distancia

- En distancias medias y larga (160 mts. 1.850 mts patronados) ..... +1.4mm

Mediciones efectuadas en campo

Ángulo Vertical		Ángulo Horizontal	
Posición 1:	82° 54′ 35″	Posición 1:	90° 28′ 10″
Posición 2:	277° 05′ 00″	Posición 2:	89° 31′ 50″
	359° 59′ 35″		**180° 00′ 00″**

CL.5B No.33B-01 Tel. 3108032568
E-mail topografiapp@hotmail.com
VILLAVICENCIO-META.

18088

Especificaciones

Alcance:	Con un prisma	3.000 Mts
	Con tres prismas	5.000 Mts
Anteojo:	Imagen directa de	30X
Precisión:	En distancia	(+5mm + 5ppm)
	En medición angular	1 seg.

Patrón utilizado: Colimador óptico marca KERN GK-23 No. 265608 con micrómetro óptico y exactitud de 0.7mm

Se expide a solicitud de: **Sr. : EDUARDO CAMARGO.**

Fecha de Calibración: **02 de Octubre 2025**
Recomendamos revisión: **02 de Abril 2026**

Cordialmente,

PEDRO E. GARNICA LOPEZ
Técnico Opto-Mecánico.

CL.5B No.33B-01 Tel. 3108032568
E-mail topografiapp@hotmail.com
VILLAVICENCIO-META.

180881

481/25

CERTIFICAMOS QUE:

EL NIVEL SOKKIA B40 No. 151594

Fue verificado, ajustado y calibrado en nuestro taller de mantenimiento encontrándose actualmente en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante.

Exactitud por kilómetro doble de nivelación..... 2.0mm.
Aumentos del anteojo..... 24X

Nivel de compensación automática
Imagen directa
Constante de multiplicación..... 100

Este instrumento fue ajustado y evaluado utilizando colimador óptico y puntos cuya diferencia de altura fue
previamente verificada: h = 0.426 m

Lectura atrás adelante:	1.557 m	**Lectura adelante atrás:**	1.654 m
	1.131 m		1.228 m
	0.426 m		**0.426 m**

Patrón utilizado: Colimador óptico marca KERN GK23 con micrómetro óptico No de serie 265608 y exactitud de 0.7mm.

Esta certificación se expide a solicitud de: **Sr. EDUARDO CAMARGO.**

Fecha de la última verificación: 02 de Octubre 2025
Recomendamos revisión: 02 de Abril 2026

Cordialmente,

PEDRO E. GARNICA LOPEZ
Técnico Opto-Mecánico.

CL.5B No.33B-01 Tel. 3108032568
E-mail topografiapp@hotmail.com
VILLAVICENCIO - META

ANEXO 5. CERTIFICADOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS.

ONAC ACREDITADO

ONAC ACREDITA A:

NHSQ INGENIERIA SAS

NIT. 901.047.361-5

Carrera 34 #21-34 San Benito, Villavicencio
Meta, Colombia, Colombia

La acreditación de este organismo de Evaluación de la Conformidad se ha realizado con respecto a los requisitos especificados en la norma internacional:

ISO/IEC 17025:2017

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de calibración y de ensayo.

Esta Acreditación es aplicable al alcance establecido en el anexo de este certificado, identificado con el código:

23-LAB-069

Esta Acreditación está cubierta por los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral suscritos por ONAC con:

IAAC

ilac-MRA

18091

ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

Fecha de publicación del Otorgamiento:	2025-01-14
Fecha de Renovación:	
Fecha de publicación última actualización:	
Fecha de vencimiento:	2028-01-13

La vigencia de este certificado puede ser verificada en onac.org.co/directorio-de-acreditados/buscador-por-organismo o escaneando el código QR

Director Ejecutivo (E)

LABORATORIO DE METROLOGÍA PINZUAR S.A.S.
Carrera 104 B No. 18 - 26 Bogotá D.C. - Colombia
(+57 60 1) 745 4555 · Cel.: 316 538 5810 - 317 423 3640
www.pinzuar.com.co

PINZUAR®
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

12093

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

L-34949-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	PIE DE REY
Fabricante *Manufacturer*	STAINLESS HARDENED
Modelo *Model*	GB/T21389-2008
Número de Serie *Serial Number*	K24A161027
Identificación Interna *Internal Identification*	EQ-225
Intervalo de Medición *Measurement Range*	0 mm a 300 mm
Solicitante *Customer*	NHSQ INGENIERIA SAS
Dirección *Address*	CRA 34 #21-34
Ciudad *City*	VILLAVICENCIO - META
Fecha de Calibración *Date of calibration*	2025 – 07 – 24
Fecha de Emisión *Date of issue*	2025 – 07 – 28
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	03

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo corresponden al ítem que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad de los resultados reportados a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability of the reported results to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas que Autorizan Certificado ***(Certificado firmado digitalmente)***

Signatures Authorizing the Certificate (Digitally signed certificate)

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Adelfo Durán
Metrólogo Laboratorio de Metrología

Certificado firmado digitalmente.

LABORATORIO DE METROLOGÍA PINZUAR S.A.S.
Carrera 104 B No. 18 - 26 Bogotá D.C. - Colombia
(+57 60 1) 745 4555 · Cel.: 316 538 5810 - 317 423 3640
www.pinzuar.com.co

PINZUAR®
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

18094

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Medición	Exteriores e Interiores
Método Empleado	Comparación Directa
Documento de Referencia	Procedimiento DI-008 Calibración de Calibres; Pie de rey del Centro Español de Metrología. Edición digital 1. Rev.2, 2024
Tipo de Indicación	Digital
Resolución	0,01 mm

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Al equipo en referencia se le efectuó una inspección visual con la que se determinó que se encuentra en buen estado, las superficies de medición no presentan sobresaltos, por lo tanto, presenta una buena condición para la medición. Se procede a la realizar la toma de datos respectiva comparando la indicación del equipo con el valor nominal del bloque patrón iniciando la medición con la puesta a cero del equipo.

Tabla 1. Resultados de las Superficies para Medición de Exteriores

Longitud Nominal	Promedio Indicación	Error	U	k (p≈95 %)
0 mm a..	mm	µm	µm	
5	5,000	0,0	6,5	2,01
25	25,000	0,0	6,5	2,01
50	50,000	0,0	6,5	2,01
75	75,000	0,0	6,5	2,01
100	100,000	0,0	6,5	2,01
125	125,000	0,0	6,5	2,01
150	150,000	0,0	6,5	2,01
175	175,000	0,0	6,5	2,01
200	200,000	0,0	6,6	2,01
250	249,990	-10,0	7,0	2,01
300	299,990	-10,0	7,4	2,01

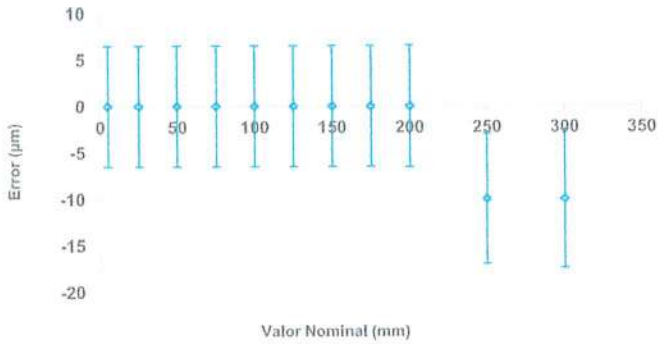


Figura 1. Error vs. Longitud Nominal para la medición de exteriores

Tabla 2. Resultados de las Superficies para Medición de Interiores

Longitud Nominal	Promedio Indicación	Error	U	k (p≈95 %)
0 mm a...	mm	µm	± µm	
25	25,027	27,0	6,5	2,01
150	150,067	67,0	6,5	2,01
250	250,080	80,3	7,0	2,01



Figura 2. Error vs. Longitud Nominal para la medición de interiores.

ALTA TECNOLOGÍA CON CALIDAD HUMANA AL SERVICIO DEL MUNDO
Fuerza | Longitud | Masa | Par Torsional | Presión | Temperatura

LABORATORIO DE METROLOGÍA PINZUAR S.A.S.
Carrera 104 B No. 18 - 26 Bogotá D.C. - Colombia
(+57 60 1) 745 4555 · Cel.: 316 538 5810 - 317 423 3640
www.pinzuar.com.co

PINZUAR®
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

18095

CONDICIONES AMBIENTALES

La calibración se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar, las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	20,3 °C	**Humedad Relativa Máxima:**	52 %
Temperatura Mínima:	20,1 °C	**Humedad Relativa Mínima:**	49 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura, k, y la probabilidad de cobertura, la cual es aproximada al 95%. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

Los resultados reportados en este certificado se obtuvieron utilizando patrones trazables al SI a través de institutos nacionales de metrología y/o laboratorios acreditados y son parte de un programa de aseguramiento metrológico que garantiza la exactitud e incertidumbres requeridas. El/Los certificado(s) de calibración de el/los patrón(es) usado(s) como referencia para la calibración en cuestión que se mencionan a continuación, se pueden descargar accediendo al enlace en el código QR.

Equipo	Fabricante	Certificado de Calibración	Fecha de Calibración
Bloques Patrón Longitudinales de Caras Paralelas	Mitutoyo	LDI250393-1 de Cidesi	2025-03-11
Bloques Patrón Longitudinales de Caras Paralelas	KCP	251173 de C.I.E.	2025-04-16
Bloques Patrón Longitudinales de Caras Paralelas	Mitutoyo	251172 de C.I.E.	2025-04-14

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Tanto el intervalo como los valores de longitud para la ejecución de la calibración reportados en el presente certificado fueron acordados con el
3. Se adjunta la etiqueta de calibración No. **L-34949-001**

Fin de Certificado

ALTA TECNOLOGÍA CON CALIDAD HUMANA AL SERVICIO DEL MUNDO
Fuerza | Longitud | Masa | Par Torsional | Presión | Temperatura

18096

ANEXO 6. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO EDUCACION C&G

CONSORCIO EDUCACION C&G

ACTA DE REALACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

CONTRATO N°	1279-2023	PROYECTO N°	CE-201

18097

OBJETO DEL CONTRATO	
OBJETO DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO,SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION C&G
NIT:	901687301-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851 DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de octubre de 2025	a	30/10/2025													
							AFILIACIÓN									
Nombres y Apellidos	Cargo	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	EPS	%	PENSIÓN	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	Ingreso Base de Cotización
YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO	DIRECTOR DE OBRA	86,051,263	DIRECTA	6/10/2025	N/A	10,500,000	SANITAS	4.00%	PORVENIR	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	8,750,000
NOHORA JULIANA JONES ORDOÑEZ	RESIDENTE DE OBRA	63,532,138	DIRECTA	1/10/2025	N/A	5,000,000	SANITAS	4.00%	COLPENSIONES	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	5,000,000
JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL	RESIDENTE DE OBRA	1,126,246,825	DIRECTA	6/10/2025	N/A	4,500,000	SALUD TOTAL	4.00%	PROTECCION	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	4,500,000
CARLOS ALBERTO HUMOA ACEVEDO	RESIDENTE DE OBRA	1,121,913,852	DIRECTA	6/10/2025	N/A	4,500,000	SALUD TOTAL	4.00%	PORVENIR	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	3,750,000
JAIME BUITRAGO NOVA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	79,464,037	INDIRECTA	6/10/2025	N/A	16,000,000	FAMISANAR	12.50%	COLPENSIONES	16%	COLPATRIA	0.522%	COLSUBSIDIO	4%	16,000,000
DIEGO ALEJANDRO ACOSTA	INGENIERO ELECTRICO	1,010,191,750	INDIRECTA	6/10/2025	N/A	4,660,000	SANITAS	4.00%	PORVENIR	16%	SURA	$ 6.96	COMPENSAR	4%	4,660,000
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ BAYONA	INGENIERO HIDRAULICO	1,010,165,507	INDIRECTA	6/10/2025	N/A	1,600,000	COMPENSAR	12.50%	COLFONDOS	16%	POSITIVA SEGUROS	$ -	COMPENSAR	0%	1,600,000
ASTRID RUIZ GONZALEZ	INGENIERA AMBIENTAL	40,341,812	DIRECTA	6/10/2025	N/A	2,200,000	SANITAS	4.00%	PORVENIR	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	1,833,334
MARIA DEL PILAR SEPULVEDA SUAREZ	RESIDENTE SOCIAL	1,018,427,594	DIRECTA	6/10/2025	N/A	2,200,000	SANITAS	4.00%	PROTECCION	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	1,833,334
LEIDY NATALIA MARTINEZ AREVALO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	1,020,807,368	DIRECTA	28/06/2023	N/A	3,200,000	SANITAS		PORVENIR	16%	AXA COLPATRIA	0.522	COFREM	4%	3,200,000
DIANA CAROLINA VEGA CASTILLO	PROFESIONAL SST	40,217,089	DIRECTA	6/10/2025	N/A	2,600,000	NUEVA EPS	4.00%	PORVENIR	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	2,166,667
LUIS JORGE DUEÑAS ALFONSO	CUIDADOR INMUEBLE	4,131,733	DIRECTA	26/06/2025	N/A	3,255,170	CAJACOPI	4.00%	TIENE ACUERDO PENSIONAL	0%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	3,255,170
DIOSNELL JOSE MOSQUEDA TORRES	AYUDANTE DE OBRA	5,386,773	DIRECTA	4/09/2025	N/A	1,423,500	NUEVA EPS	4.00%	PORVENIR	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	1,423,500
ANDERSON JOSE MOLINA MENDEZ	AYUDANTE DE OBRA	6,843,967	DIRECTA	4/09/2025	N/A	1,423,500	NUEVA EPS	4.00%	PORVENIR	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	1,423,500
JAVIER IVAN BEDOYA MIRANDA	AYUDANTE DE OBRA	80,386,966	DIRECTA	21/102025	N/A	1,423,500	FAMISANAR	4.00%	PORVENIR	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	1,423,500
EDWIN STIVEN FORERO PATIÑO	AYUDANTE DE OBRA	1,006,689,217	DIRECTA	21/10/2025	N/A	1,423,500	SANITAS	4.00%	PORVENIR	16%	AXA COLPATRIA	$ 6.96	COFREM	4%	1,423,500

Nota 1: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.
Nota 2: Se Anexa a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen

Firma:
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA PROFESIONAL 25202-090820 CND

Firma:
Nombre: JOEL ALBERTO PINEDASANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA
MATRICULA PROFESIONAL 25202-388151 CND

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCACION C&G		
	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA	

CONTRATO N°	1279- 2023	PROYECTO N°	CE-201

OBJETO DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,META 13098
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACION C&G
NIT:	901.687.301-9
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2851-2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO EDUCATIVO AR

NUMERO DE PLANILLA:	9494428332-91163675-9494369746-90192150				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:		1 de octubre de 2025		a		30 de octubre de 2025			
Nombre personal	Cargo	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS LABORALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL A PAGAR
					EPS	Valor	Pensión	Valor	ARL	Valor				
Yeison Esneyder Gomez Guerrero	DIRECTOR DE OBRA	86,051,263	$ 8,750,000.00	25	SANITAS	$ 350,000	PORVENIR	$ 1,487,600	AXA COLPATRIA	$ 609,000	$ -	$ -	$ 350,000	$ 2,796,600
Nohora Juliana Jones Ordoñez	RESIDENTE DE OBRA	63,532,138	$ 5,000,000.00	30	SANITAS	$ 200,000	PORVENIR	$ 800,000	AXA COLPATRIA	$ 348,000	$ -	$ -	$ 200,000	$ 1,548,000
Joel Alberto Pineda Sandoval	RESIDENTE DE OBRA	1,126,246,825	$ 4,500,000.00	30	SALUD TOTAL	$ 180,000	PROTECCION	$ 720,000	AXA COLPATRIA	$ 313,200	$ -	$ -	$ 180,000	$ 1,393,200
Carlos Alberto Humoa Acevedo	RESIDENTE DE OBRA	1,121,913,852	$ 3,750,000.00	25	SALUD TOTAL	$ 150,000	PORVENIR	$ 600,000	AXA COLPATRIA	$ 261,000	$ -	$ -	$ 150,000	$ 1,161,000
Jaime Buitrago Nova	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	79,464,037	$ 16,000,000.00	30	FAMISANAR	$ 2,000,000	COLPENSIONES	$ 2,560,000	COLPATRIA	$ 83,600	480,000	320,000	$ 640,000	$ 6,083,600
Diego Alejandro Acosta	INGENIERO ELECTRICO	1,010,191,750	$ 4,660,000.00	30	SANITAS	$ 186,400	PORVENIR	$ 745,600	SURA	$ 324,400	$ -	$ -	$ 186,400	$ 1,442,800
Claudia Patricia Rodriguez Bayona	INGENIERO HIDRAULICO	1,010,165,507	$ 1,600,000.00	30	COMPENSAR	$ 200,000	COLFONDOS	$ 256,000	POSITIVA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 456,000
Astrid Ruiz Gonzalez	INGENIERA AMBIENTAL	40,341,812	$ 1,833,334.00	25	SANITAS	$ 73,400	PORVENIR	$ 293,400	AXA COLPATRIA	$ 127,700	$ -	$ -	$ 73,400	$ 567,900
Maria del Pilar Sepulveda Suarez	RESIDENTE SOCIAL	1,018,427,594	$ 1,833,334.00	25	SANITAS	$ 73,400	COLFONDOS	$ 293,400	AXA COLPATRIA	$ 127,700	$ -	$ -	$ 73,400	$ 567,900
Leidy Natalia Martinez Arevalo	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	1,020,807,368	$ 3,200,000.00	30	SANITAS	$ 128,000	PORVENIR	$ 512,000	AXA COLPATRIA	$ 16,800	$ -	$ -	$ 128,000	$ 784,800
Diana Carolina Vega Castillo	PROFESIONAL SST	40,217,089	$ 2,166,667.00	25	NUEVA EPS	$ 86,700	PORVENIR	$ 346,700	AXA COLPATRIA	$ 150,900	$ -	$ -	$ 86,700	$ 671,000
Luis Jorge Dueñas Alfonso	CUIDADOR INMUEBLE	4,131,733	$ 3,255,170.00	30	CAJACOPI	$ 130,300	NO APLICA TIENE ACUERDO PENSIONAL	$ -	AXA COLPATRIA	$ 226,600	$ -	$ -	$ 130,300	$ 487,200
Diosnell Jose Mosqueda Torres	AYUDANTE DE OBRA	5,386,773	$ 1,423,500.00	30	NUEVA EPS	$ 57,000	PORVENIR	$ 227,800	AXA COLPATRIA	$ 99,100	$ -	$ -	$ 57,000	$ 440,900
Anderson Jose Molina Mendez	AYUDANTE DE OBRA	6,843,967	$ 1,423,500.00	30	NUEVA EPS	$ 57,000	PORVENIR	$ 227,800	AXA COLPATRIA	$ 99,100	$ -	$ -	$ 57,000	$ 440,900
Javier Ivan Bedoya Miranda	AYUDANTE DE OBRA	80,386,966	$ 474,500.00	10	FAMISANAR	$ 19,000	PORVENIR	$ 76,000	AXA COLPATRIA	$ 33,100	$ -	$ -	$ 19,000	$ 147,100
Edwin Stiven Forero Patiño	AYUDANTE DE OBRA	1,006,689,217	$ 474,500.00	10	SANITAS	$ 19,000	PORVENIR	$ 76,000	AXA COLPATRIA	$ 33,100	$ -	$ -	$ 19,000	$ 147,100
					Total									$ 19,136,000

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y se anexan a la presente acta.

OBSERVACIONES GENERALES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 13 de noviembre de 2025

Firma:
Nombre:YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-090820 CND

Firma:
Nombre: JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-388151CND

19099

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906433267	94944283332	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$11,153,600

18100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO EDUCACION (13 Afiliados)																								$34,829,335	$5,660,700			$38,084,505	$1,523,800			$38,084,505	$1,523,800			$38,084,505		$2,445,300		$0	$0		$11,153,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)																								$31,629,335	$5,148,700			$34,884,505	$1,395,800			$34,884,505	$1,395,800			$34,884,505		$2,428,500		$0	$0		$10,368,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (12 Afiliados)																								$31,629,335	$5,148,700			$34,884,505	$1,395,800			$34,884,505	$1,395,800			$34,884,505		$2,428,500		$0	$0		$10,368,800
1	CC	80386966	BEDOYA JAVIER	X																		23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS017	10	$474,500	$19,000	CCF34	10	$474,500	$19,000	14-4	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
2	CC	4131733	DUEÑAS LUIS										X										0	$0	$0	CCFC5	30	$3,255,170	$130,300	CCF34	30	$3,255,170	$130,300	14-4	30	$3,255,170	6.960%	$226,600	30	$0	$0	SI	$487,200
3	CC	1006689217	FORERO EDWIN	X																		23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF34	10	$474,500	$19,000	14-4	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
4	CC	86051263	GOMEZ YEISON	X																		23030 1	25	$8,750,000	$1,487,600	EPS005	25	$8,750,000	$350,000	CCF34	25	$8,750,000	$350,000	14-4	25	$8,750,000	6.960%	$609,000	25	$0	$0	SI	$2,796,600
5	CC	1121913852	HUMOA CARLOS	X																		23030 1	25	$3,750,000	$600,000	EPS002	25	$3,750,000	$150,000	CCF34	25	$3,750,000	$150,000	14-4	25	$3,750,000	6.960%	$261,000	25	$0	$0	SI	$1,161,000
6	CC	62532138	JONES NOHORA																			25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF34	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
7	PT	6843967	MENDEZ ANDERSON																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	PT	5386773	MOSQUEDA DIOSNELL																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1126246825	PINEDA JOEL																			23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
10	CC	40341812	RUIZ ASTRID	X																		23030 1	25	$1,833,334	$293,400	EPS005	25	$1,833,334	$73,400	CCF34	25	$1,833,334	$73,400	14-4	25	$1,833,334	6.960%	$127,700	25	$0	$0	SI	$567,900
11	CC	1018427594	SEPULVEDA MARIA	X																		23100 1	25	$1,833,334	$293,400	EPS005	25	$1,833,334	$73,400	CCF34	25	$1,833,334	$73,400	14-4	25	$1,833,334	6.960%	$127,700	25	$0	$0	SI	$567,900
12	CC	40217089	VEGA DIANA	X																		23030 1	25	$2,166,667	$346,700	EPS041	25	$2,166,667	$86,700	CCF34	25	$2,166,667	$86,700	14-4	25	$2,166,667	6.960%	$150,900	25	$0	$0	SI	$671,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																								$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000		$16,800		$0	$0		$784,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																								$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000	$128,000			$3,200,000		$16,800		$0	$0		$784,800
13	CC	1020807368	MARTINEZ LEIDY																			23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$0	$0	SI	$784,800
Total Afiliados(13)																								$34,829,335	$5,660,700			$38,084,505	$1,523,800			$38,084,505	$1,523,800			$38,084,505		$2,445,300		$0	$0		$11,153,600

2025/11/10 07:48 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

18101

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1906433267	9494428332	E	2025/11/05	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$11,153,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$5,660,700	$0	$0	$5,660,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$293,400	$0	$0	$293,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$800,000	$0	$0	$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,847,300	$0	$0	$3,847,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$2,445,300	$0	$0	$2,445,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$2,445,300	$0	$0	$2,445,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,523,800	$0	$0	$1,523,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$1,523,800	$0	$0	$1,523,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,523,800	$0	$0	$1,523,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$130,300	$0	$0	$130,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$19,000	$0	$0	$19,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$200,700	$0	$0	$200,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$330,000	$0	$0	$330,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$843,800	$0	$0	$843,800
TOTAL				13	$11,153,600	$0	$0	$11,153,600

2025/11/10 07:48 PM

aportes en línea

Comprobante de Pago

18102

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-10	Periodo Salud	2025-11
Fecha limite de pago	2025/11/05	Fecha de pago	2025/11/05
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$11,153,600
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$11,153,600

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9494428332
Clave de pago	1906433267
Banco	BANCOLOMBIA

2025/11/10 07:44 PM

18/03

INGENIERO ESTRUCTURAL

JAIME BUITRAGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

18104

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	coordinacion.administrativa@khypus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 6 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E		91163675	$11.050.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	192.000	0		0		0	0	0	0	192.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.112.000	0		0		0	0	0	0	2.112.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.216.000	0	0	0	0	0	0		1.216.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.480.000	0	0	80.000	80.000	0	0		4.640.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	186.200				186.200	0	0	186.200			1.862	186.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.424.000	0	0	1.424.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
320.000	0	0	320.000	1
ICBF				
480.000	0	0	480.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.784.000	2.784.000
Pensión	2	5.856.000	5.856.000
Riesgos Laborales	1	186.200	186.200
CCF	1	1.424.000	1.424.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	480.000	480.000
MEN	0	0	0
SENA	1	320.000	320.000
TOTALES	10	11.050.200	11.050.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

18105

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	coordinacion.administrativa@khypus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91163675	$11.050.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005339609	CHAVARRIAGA BECERRA SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS010	3.200.000	126.000	14-4	3.200.000	1	16.800	CCF24	3.200.000	126.000	0	0	0	0	0
2	CC	1014282649	RODRIGUEZ BELLO ANGIE TATIANA	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	1	14.700	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019125339	ROMERO BORDA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS009	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	1	20.900	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
4	CC	1020801790	NUÑEZ BUITRAGO DIANA LORENA	1	0			S																	230301	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS010	4.800.000	192.000	14-4	4.800.000	1	25.100	CCF24	4.800.000	192.000	0	0	0	0	0
5	CC	1032476324	BUELVAS CUELLO SEBASTIAN DAVID	1	0			S																	25-14	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS001	4.800.000	192.000	14-4	4.800.000	1	25.100	CCF24	4.800.000	192.000	0	0	0	0	0
6	CC	79464037	BUITRAGO NOVA JAIME ELISEO	1	0			N																	25-14	16.000.000	2.560.000	0	0	80.000	80.000	EPS017	16.000.000	2.000.000	14-4	16.000.000	1	83.600	CCF24	16.000.000	640.000	16.000.000	320.000	480.000	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

18/06

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	**Nit:**	900719112
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Noviembre 2025
Número de radicación:	91163675	**Total a pagar:**	$11,050,200
Fecha de vencimiento:	06/11/2025	**Total de empleados:**	6
Fecha de pago:	05/11/2025	**Número de administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1905373339
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	6		$0.00	$186,200
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$1,216,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$4,640,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	6		$0.00	$1,424,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$192,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$160,000
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0.00	$320,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$2,112,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0.00	$480,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0.00	$320,000
						$11,050,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

18/07

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

2 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara

Acerca de los certificados SSL

Powered by Cenet Edinet

INGENIERO ELECTRICISTA

DIEGO PEREZ ACOSTA

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

(e)09

Se certifica que POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S identificado con NI 900276725 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para DIEGO ALEJANDRO PEREZ ACOSTA identificado con CC 1010191750:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades															Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9494369746	E	2025/10	2025/11/05	1905173778	AFP	230301	PORVENIR																30	16%	$745,600	$0	$0
9494369746	E	2025/10	2025/11/05	1905173778	ARP	14-11	ARL SURA																30	6.96%	$324,400	$0	$0
9494369746	E	2025/10	2025/11/05	1905173778	CCF	CCF24	COMPENSAR																30	4%	$186,400	$0	$0
9494369746	E	2025/11	2025/11/05	1905173778	EPS	EPS005	SANITAS																30	4%	$186,400	$0	$0

Certificado generado el 2025-11-05 a las 11:20

INGENIERA HIDRÁULICA

CLAUDIA RODRIGUEZ HERNANDEZ

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

18111

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010165507	CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	calle 160 73 32	3124260055	cprh2017@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	30/09/2025	90192150	$456.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	456.000	456.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1812

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010165507	CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ		calle 160 73 32	3124260055	cprh2017@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-10	I	30/09/2025	90192150	$456.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Aprendiz	Estudiante	Cotiz. adicional	Suspensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COBRECOACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010165507	RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA	3	0			N																	23001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

TAITECH

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

18114

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070594866	LUIS EDUARDO CAMARGO GARCIA	calle e sur 28b-47	6730052	topoeduardo2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	18/11/2025	91471037	$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

1811 J

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070594866	LUIS EDUARDO CAMARGO GARCIA		calle e sur 28b-47	6730052	topoeduardo2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	18/11/2025	91471037	$405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colcante	Ausilio	Extranjero	Colcante extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COBRECOOPA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070594866	CAMARGO GARCIA LUIS EDUARDO	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901564352	6	TAI TECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43 C 16 24	VILLAVICENCIO-META	6849729	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1930722790	9494756344	Y	2025/11/14	2025/11/18	BANCOLOMBIA	4	$1,282,700

1816

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$3,606,200	$577,100			$3,606,200	$451,000			$0	$0			$251,200		$0	$0		$1,279,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$3,606,200	$577,100			$3,606,200	$451,000			$0	$0			$251,200		$0	$0		$1,279,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)																						$3,606,200	$577,100			$3,606,200	$451,000			$0	$0			$251,200		$0	$0		$1,279,300
1	CC	1006820934	BETANCOURTH LUIS																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
2	CC	1121816287	GUERRERO OSCAR	X	T															23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$89,000		0	$0	$0	14-23	15	$711,750	6.960%	$49,600	0	$0	$0	No	$252,500
3	CC	1121866688	LADINO ANDRES	X	T															23030 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000		0	$0	$0	14-23	1	$47,450	6.960%	$3,400	0	$0	$0	No	$17,000
4	CC	86079772	VALENZUELA JOSE																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total			**Afiliados(4)**																			$3,606,200	$577,100			$3,606,200	$451,000			$0	$0			$251,200		$0	$0		$1,279,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901564352	6	TAI TECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43 C 16 24	VILLAVICENCIO-META	6849729	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1930722790	9494756344	Y	2025/11/14	2025/11/18	BANCOLOMBIA	4	$1,282,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$577,100	$1,500	$0	$578,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$577,100	$1,500	$0	$578,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$251,200	$700	$0	$251,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$251,200	$700	$0	$251,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$451,000	$1,200	$0	$452,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$273,000	$700	$0	$273,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$500	$0	$178,500
TOTAL				4	$1,279,300	$3,400	$0	$1,282,700

ANEXO 7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

18/18

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 06-Oct-2025 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfaro Lopez

EMPLEADO: Luis Jorge Dueñas

CARGO: Custodio de Inmueble

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
X	Casco de Seguridad	01	/	Protectores auditivos	
X	Botas de Seguridad de material	01		Guantes de carnaza	
X	Botas de caucho	01	X	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	01
	Traje impermeable			Tapabocas	
	Monogafas			Guantes de Caucho	
X	Pantalón	02		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	02		Delantal de caucho	
/	Guantes de Punto de PVC, una cara			Overol de dos piezas	
/	Otros, Cuales?: Capuchón o Monja (01)				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 4131733

Firma quién entrega: Diego Vega

Cargo: Profesional SST

Powered by CamScanner

18/19

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 06-10-2025 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso López P.

EMPLEADO: Dionell José Mosqueda Torres.

CARGO: Ayudante de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
X	Casco de Seguridad	01		Protectores auditivos	
X	Botas de Seguridad de material	01		Guantes de carnaza	
X	Botas de caucho	01		Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
	Traje impermeable			Tapabocas	
	Monogafas			Guantes de Caucho	
X	Pantalón	02		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	02		Delantal de caucho	
	Guantes de Punto de PVC, una cara			Overol de dos piezas	
	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 5386723

Firma quién entrega: [illegible]

Cargo: Profesional SST

Powered by CamScanner

18/20

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 06-Oct-2025 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfaguara Part

EMPLEADO: Anderson Méndez

CARGO: Ayudante de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
X	Casco de Seguridad	01		Protectores auditivos	
X	Botas de Seguridad de material	01		Guantes de carnaza	
X	Botas de caucho	01		Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
	Traje impermeable			Tapabocas	
X	Monogafas	01		Guantes de Caucho	
X	Pantalón	02		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	02		Delantal de caucho	
	Guantes de Punto de PVC, una cara			Overol de dos piezas	
	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Anderson José Méndez

Firma del trabajador

N° CC. 6893967

Firma quién entrega: Diana Vega

Cargo: Profesional SST

Powered by CamScanner

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 21-Oct-2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Javier Bedoya Miranda

CARGO: Ayudante de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
X	Casco de Seguridad	01		Protectores auditivos	
X	Botas de Seguridad de material	01		Guantes de carnaza	
X	Botas de caucho	01	X	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	01
	Traje impermeable			Tapabocas	
X	Monogafas	01		Guantes de Caucho	
X	Pantalon	02		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	02		Delantal de caucho	
	Guantes de Punto de PVC, una cara			Overol de dos piezas	
	Otros, Cuales?				

Honga ó Capuchón (01)

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente
2. Los revise y se encuentran en buen estado
3. Conozco su uso adecuado y correcto
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos

Javier Bedoya
Firma del trabajador
N° CC 80386766

Firma quien entrega
Cargo Profesional SST

Powered by CamScanner

18/22

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 21/Oct/2025 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfaviejo

EMPLEADO: Edwin Stiven Forero Patiño

CARGO: Ayudante Obra

Marque con una X los elementos de dotacion entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[X]	Casco de Seguridad	01	[ ]	Protectores auditivos	
[X]	Botas de Seguridad de material	01	[X]	Guantes de carnaza	01
[X]	Botas de caucho	01	[ ]	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
[ ]	Traje impermeable		[ ]	Tapabocas	
[X]	Monogafas	01	[ ]	Guantes de Caucho	
[X]	Pantalón	02	[ ]	Mascara de doble filtro	
[X]	Camisa	02	[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?				

Capuchon ó Honga (01)

Certifico que:

1. Recibí la dotacion de trabajo y los EPP señalados anteriormente
2. Los reviso y se encuentran en buen estado
3. Conozco su uso adecuado y correcto
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC 1006689217

Firma quien entrega: Diana Vega

Cargo: Profesional SST

Powered by CamScanner

1823

CONSORCIO EDUCACIÓN OSORNO

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 30-Oct-2015 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Yeison Esneyder. Gomez Guerrero

CARGO: Director de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
X	Casco de Seguridad	01		Protectores auditivos	
X	Botas de Seguridad de material	01		Guantes de carnaza	
	Botas de caucho			Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
X	Traje impermeable	01		Tapabocas	
	Monogafas			Guantes de Caucho	
X	Pantalón	02		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	02		Delantal de caucho	
	Guantes de Punto de PVC, una cara			Overol de dos piezas	
	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 80851263 Vlavio

Firma quien entrega: Diana Vega

Cargo: Profesional SST

18/24

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 30-Oct-2025 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso López

EMPLEADO: Astrid Ruiz Gonzalez

CARGO: Ingeniera Ambiental

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
X	Casco de Seguridad	01		Protectores auditivos	
X	Botas de Seguridad de material	01		Guantes de carnaza	
	Botas de caucho			Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
X	Traje impermeable	01		Tapabocas	
	Monogafas			Guantes de Caucho	
X	Pantalón	02		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	02		Delantal de caucho	
	Guantes de Punto de PVC, una cara			Overol de dos piezas	
	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 40 324182.

Firma quién entrega:

Cargo: Profesional SST

Powered by CamScanner

18/25

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 30-Oct-2025 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso López

EMPLEADO: Maria del Pilar Saldarriaga

CARGO: Estudiante Social.

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[X]	Casco de Seguridad	01	[ ]	Protectores auditivos	
[X]	Botas de Seguridad de material	01	[ ]	Guantes de carnaza	
[ ]	Botas de caucho		[ ]	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
[ ]	Traje impermeable		[ ]	Tapabocas	
[ ]	Monogafas		[ ]	Guantes de Caucho	
[X]	Pantalón	02	[ ]	Máscara de doble filtro	
[X]	Camisa	02	[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 1.018.427.514

Firma quién entrega: Diana Vega

Cargo: Profesional SST

Powered by CamScanner

18/26

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 30-Oct-2025 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso López

EMPLEADO: Diana C Vega

CARGO: Profesional SST

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
X	Casco de Seguridad	01	X	Protectores auditivos	01
X	Botas de Seguridad de material	01		Guantes de carnaza	
	Botas de caucho			Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
X	Traje impermeable	01		Tapabocas	
X	Monogafas	01		Guantes de Caucho	
X	Pantalón	02		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	02		Delantal de caucho	
	Guantes de Punto de PVC, una cara			Overol de dos piezas	
	Otros, Cuales?:				

1 Capuchón (01).

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 40217089

Firma quien entrega: Diana Vega

Cargo: Profesional SST

Powered by CamScanner

18/27

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 30-Oct-2025 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Joel Alberto Rueda

CARGO: Residente de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[X]	Casco de Seguridad	01	[ ]	Protectores auditivos	
[X]	Botas de Seguridad de material	01	[X]	Guantes de carnaza	
[X]	Botas de caucho	01	[X]	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
[X]	Traje impermeable	01	[X]	Tapabocas	
[ ]	Monogafas		[X]	Guantes de Caucho	
[X]	Pantalón	02	[X]	Máscara de doble filtro	
[X]	Camisa	02	[X]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[X]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?: 1 Capachón o Monja				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 1126246835

Firma quien entrega: Diana Vega C

Cargo: Profesional SST

Powered by CamScanner

ANEXO 8. HOJAS DE VIDA PERSONAL.

HOJA DE VIDA CONSORCIO EDUCACIÓN

DIRECTOR DE OBRA
ING. YEISON GOMEZ

18/31

HOJA DE VIDA



PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil con especialización en Gerencia de Proyectos, con amplia experiencia en obras de construcción e interventorías de obras civiles como: Acueductos, Alcantarillados, Edificaciones y Obras de Urbanismo, Vías, Protección ambiental, entre otras. Conocimiento en procesos de contratación estatal.

Excelentes relaciones interpersonales, recursivas y versátiles para el manejo de situaciones adversas y practico en el logro de objetivos propuestos. Honesto y crítico en el desempeño de las actividades a cargo, las cuales he desempeñado con alta calidad, ética y moral.

Calle 178 No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

HOJA DE VIDA

YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
Ingeniero Civil

DATOS PERSONALES

NOMBRE:	YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
IDENTIFICACION:	C.C No. 86.051.263 de Villavicencio-Meta
LIBRETA MILITAR:	76081350481 DIM No.05 Primera Clase
FECHA DE NACIMIENTO:	13 de Agosto de 1976
LUGAR DE NACIMIENTO:	Guamal-Meta
EDAD:	49 Años
ESTADO CIVIL:	Unión Libre
DIRECCION RESIDENCIAL:	Calle 178 No.3-110 Este, Multifamiliar 6 Casa 11 Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
CONTACTO:	Cel. 301 – 5 46 69 45, Tel. (608) 6 74 42 25
CIUDAD:	Villavicencio-Meta

ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA:	CONC. ESCOLAR 12 DE OCTUBRE PRIMARIA BASICA 1987 Villavicencio - Meta
SECUNDARIA:	INEM "LUIS LOPEZ DE MESA" BACHILLER MODALIDAD ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1993 Villavicencio – Meta
PROFESIONAL:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA INGENIERO CIVIL 2001 Villavicencio – Meta

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
Agosto/2018-Abril/2020, Bogotá D.C.

PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)
PMP Number: 3709765
27-Noviembre/2023

OTROS

CURSO OFICIAL DE PREPARACION PARA EL EXAMEN PROJECT MANAGEMENT PROFESIONAL
BSG INSTITUTE
Marzo – Julio/2023, Virtual.

CURSO DE ACTUALIZACION EN ESTRUCTURAS
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA
Enero – Diciembre/2004, Bogotá D.C.

II CONGRESO INTERNACIONAL Y XIII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL
Marzo/2002, Medellín – Antioquia

SEMINARIO DE LA INGENIERIA DEL PIEDEMONTE LLANERO
2002, Villavicencio – Meta

CURSO DE RESIDENCIA DE OBRAS SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTURA
2001, Bogotá D.C.

CAPACITACION INTEGRAL EN SISTEMAS SYSTEM PLUS DE COLOMBIA
1995, Villavicencio- Meta

Calle 178 No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

LOGROS OBTENIDOS

MEJOR BACHILER MODALIDAD INDUSTRIAL
1993, Villavicencio – Meta

MEJOR PROMEDIO DE LA CARRERA SEGUNDA PROMOCION
2001
Marzo/2003
Ganador de ponencias en la Escuela Colombiana de Ingeniería para el II Congreso Internacional y XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil

Mejor Proyecto De Investigación Universidad
Cooperativa De Colombia Marzo/2003,
Villavicencio – Meta

Publicación del proyecto BIBLIO-PARQUE "Estudios, Diseño y Construcción de Biblioteca Pública para las diferentes instituciones educativas en el Municipio de Puerto Gaitán-Meta"
Septiembre/2014, Revista AXXIS

Premio ICCA-ACESCO 2023 categoría General del proyecto Coliseo Álvaro Mesa Amaya en Villavicencio-Meta y publicación en segunda edición de la revista Construcción con Acero.
Junio/2023, Bogotá D.C.

Calle 178 No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

18/35

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA:	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH
DURACION:	M A R Z O /2024 – ENERO/2025
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	Contrato de obra pública No.1279 de 2023 "Reconstrucción total de la institución educativa Alfonso Lopez Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio-Meta". Valor: $25.094.607.822,56
CONTACTO:	Ing Juliana Jones-Rep. Legal suplente Cel. 301 5524928

EMPRESA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
DURACION:	A B R I L /2023 – DICIEMBRE/2023
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	Contrato de obra No.106 de 2023 "Construcción de escenarios deportivos multipropósito, pista de patinaje y pista de atletismo en la Villa Olímpica del municipio de Villavicencio-Departamento del Meta". Valor: $50.871.940.842
CONTACTO:	Jhon Henry Ortiz García-Rep. Legal Cel. 310 2453562

EMPRESA:	CONSORCIO NUEVO COLISEO
DURACION:	M A Y O /2020 – MARZO/2023
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	Contrato de obra No.914 de 2019 "Construcción del nuevo coliseo Álvaro Mesa Amaya en el municipio de Villavicencio-Departamento del Meta". Valor: $81.363.601.583
CONTACTO:	Tatiana Paola Escalante Ramos-Rep. Legal Cel. 321 4392741

EMPRESA:	CONSORCIO CAÑAVERALEJO 2018
DURACION:	DICIEMBRE/2018 – MARZO/2020
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	CO CVC No.702 de 2018 "Realizar la adecuación paisajística y ambiental del tramo 3 del CAU Cañaveralejo (sector el embalse) correspondiente al resultado 1-Corredores ambientales urbanos, adecuados ambiental y paisajísticamente, del proyecto 7005-"Gestion para la ocupación sostenible del territorio en la zona urbana de Santiago de Cali". Valor: $7.512.324.077
CONTACTO:	Ing. Fernando Romero Cel. 321 9963235

EMPRESA:	CONSORCIO MATAPALO
DURACION:	MARZO/2016 – MARZO/2018
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	CO No.530 de 2015 "Construcción de la Torre Mirador Matapalo En El Municipio De Puerto López-Meta" Valor: $16.568.835.560
CONTACTO:	Ing. Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez Cel. 310-3451876

EMPRESA:	UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVOS DEL META 2015
DURACION:	MARZO/2015 – FEBRERO/2016
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	CO No.030 de 2015 "Construcción del polideportivo ubicado en Villa Cumare municipio de Cumaral, Construcción polideportivo ubicado en Puerto Esperanza municipio de Castillo, Construcción polideportivo ubicado en la institución educativa Pedro Daza municipio de San Martin, Construcción polideportivo ubicado en la vereda El

Diviso municipio de Uribe, Mejoramiento polideportivo ubicado en Aguas Claras municipio de Granada, Mejoramiento del polideportivo ubicado Villa del Sol municipio de Restrepo, Construcción polideportivo ubicado en la escuela Apiay municipio de Villavicencio, Construcción polideportivo ubicado institución Dos Quebradas municipio de Granada, construcción polideportivo ubicado en remolino municipio de puerto López, mejoramiento de parque en San Isidro del Ariari municipio El Dorado, Adecuación del parque de la vida del casco urbano municipio de Puerto Rico y Mejoramiento parque ubicado en la Carrera 44 Con Calle 17c María Paz municipio de Villavicencio, Departamento Del Meta"
Valor: $8.220.057.616

CONTACTO: Ing. Edwin Ríos Robayo Cel. 313-8300577

EMPRESA: CURVA LTDA
DURACION: SEPTIEMBRE/2014 – ENERO/2015
CARGO: DIRECTOR DE OBRA
OBRAS: CO No.271 de 2014 "Construcción de los parques educativos de los municipios de Carmen de Viboral y Argelia en el departamento de Antioquia"
Valor: $3.268.583.777
CONTACTO: Arq. Mauricio Gutiérrez Díaz Cel. 310-3412128

EMPRESA: CORPORACION AMBIENTAL Y DE INGENIERIA COLOMBIANA
DURACION: 15 DICIEMBRE/2013 – 15 SEPTIEMBRE/2014
CARGO: GERENTE TECNICO
OBRAS: CO No.165 de 2013 "Mantenimiento del rio Jiguamiandó mediante el destronque y limpieza de su cauce natural"
Valor: $10.998.838.516,60
CONTACTO: Ana Fuentes Cel. 321-2799920

EMPRESA:	EDMAR INGENIERIA LTDA
DURACION:	MAYO/2013 – NOVIEMBRE/2013
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	UT CONSTRUIR-CO No.500 de 2013 "Construcción Escuela de Formación Artística y plaza especializada para la comercialización de alimentos y servicios complementarios, plaza Siete de Agosto, Villavicencio - Meta" Valor: $3.421.580.716
CONTACTO:	Ing. Edwin Ríos Robayo Cel. 313-8300577

EMPRESA:	CURVA LTDA
DURACION:	01/DICIEMBRE/2010 – 20/DICIEMBRE/2012
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	UT BIBLIOPARQUE 2010 -CO No.249 de 2010 "Estudios, Diseño y Construcción de Biblioteca Pública para las diferentes instituciones educativas en el Municipio de Puerto Gaitán-Meta" 01/Diciembre/2010 – 20/Diciembre/2012 Valor: $14.896.355.987

EMPRESA:	EDMAR INGENIERIA LTDA
DURACION:	3/SEPTIEMBRE/2010 – 30/NOVIEMBRE/2010
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	UT AUDITORIOS DEL META - CO No.003 de 2010 "Estudios, Diseño y Construcción del Auditorio de la Unidad Educativa Cabuyaro en el municipio de Cabuyaro-Meta" Valor: $2.330.251.194
CONTACTO:	Ing. Edwin Ríos Robayo Cel. 313-8300577

EMPRESA:	CONSORCIO CMVE
DURACION:	10/MARZO/2010 – 30/SEPTIEMBRE/2010

18139

HOJA DE VIDA

YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
Ingeniero Civil

CARGO:	ING. RESIDENTE DE MANTENIMIENTO DE VIAS INTERNAS
OBRAS:	CO No.47000000276 de 2008 suscrito con Metapetroleum "Prestación de servicio de movimiento de tierras y mantenimiento de las vías internas y adecuación de áreas en el campo Rubiales"
CONTACTO:	Ing. José Santafé Cel. 317-4410210
EMPRESA:	CONSORCIO VIAL EL TIGRE
DURACION:	05/FEBRERO/2010 – 05/MARZO/2010
CARGO:	COORDINADOR DEL PROYECTO
OBRAS:	CO No.325 de 2009 "Mejoramiento de la vía Puerto Mosco-Puerto Trujillo, Tramo 1 K0+000 al K28+000, zona rural de Puerto Gaitán – Meta.
CONTACTO:	Raúl Gonzalo Ávila Vásquez Tel. (8) 6 714191
EMPRESA:	CURVA LTDA
DURACION:	1/ABRIL/2009 – 15/ENERO/2010
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
OBRAS:	UT ARIMENA - CO No.026 de 2008 "Construcción de Tanques elevados para la inspección de San Pedro de Arimena y Puente Arimena del municipio de Puerto Gaitán- Meta" 01/Abril/2009 – 15/Enero/2010 UT DEPORTES GAITAN – CO No.367 de 2008 "Estudios, Diseño y Construcción de la Casa del Deporte en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, Fase I" 01/Julio/2009 – 15/Octubre/2009
CONTACTO:	Arq. Mauricio Gutiérrez Díaz Cel. 310-3412128
EMPRESA:	EDMAR INGENIERIA LTDA
DURACION:	01/AGOSTO/2008 – 28/FEBRERO/2009
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA

Calle 178 No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

HOJA DE VIDA

YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
Ingeniero Civil

OBRAS:	CO No.748 de 2008 "Mantenimiento redes hidráulicas y sanitarias, planta de tratamiento, planta residual y tanque de almacenamiento para el puesto de mando adelantado de la Biran No.18 en Puerto Jordán – Arauca" Valor: $696.565.025
CONTACTO:	Ing. Edwin Ríos Robayo Cel. 313-8300577
EMPRESA:	CIVILCON LTDA
DURACION:	14/DICIEMBRE/2007 – 07/NOVIEMBRE/2008
CARGO:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA- RESIDENTE DE OBRA
OBRAS:	CI No.107 de 2007 "Interventoría técnica, administrativa, financiera y Ambiental a la Construcción del Puente Vehicular Intersección vial Séptima Brigada Fase I en el municipio de Villavicencio – Meta" Residente de Interventoría 15/Mayo/2008 – 07/Noviembre/2008
OBRAS:	CO No.1595 de 2007 "Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras de la zona centro oriente del país (Grupo 3) Modulo 3 Yopal – Paz de Ariporo – Rio Macaguan PR2+000 al PR6+400 y PR7+500 al PR19+000 Ruta 65 Tramo 6513 y 6514" Residente de Obra 6/Febrero/2008 – 14/Mayo/2008 CO No.020/2007 "Construcción del Puente Vehicular sobre el río Une vereda la Palma y obras complementarias" Residente de Obra 14/Diciembre/2007 – 17/Febrero/2008
CONTACTO:	Ing. Jhon Alexander Salas Barreto Cel. 321-2769871
EMPRESA:	EDMAR INGENIERIA LTDA
DURACION:	22/NOVIEMBRE/2005 – 22/OCTUBRE/2007
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA

HOJA DE VIDA

YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
Ingeniero Civil

OBRAS:

UT INGENIERIA VIAL - CO No.001 de 2006 "Mejoramiento de la vía que comunica la inspección de San Jose con el Municipio de San Juanito – Meta"
Valor: $620.845.440
10/Noviembre/2006 – 17/Agosto/2007

UT E&E ASOCIADOS – CO No.020 de 2006 "Mejoramiento de la vía que comunica al centro poblado de Monfort con la vereda Santa Teresa del K6+300 en el municipio de El Calvario – Meta"
18/Mayo/2006 – 22/Octubre/2007
Valor: $616.214.640

CO No. 342 de 2005 "A) Pavimentación de las carreras 34 y 34ª entre calles 30 y 31 Sur y terminación de la calle 31 Sur entre carreras 34 y 34ª del barrio Álamos – Santa Rosa paradero de buses. B) Pavimentación de la Calle 28B Sur entre carreras 47ª y 47B (manzanas B-D-F-E-I) del barrio Villa Milena, en el municipio de Villavicencio – Meta"
22/Noviembre/2005 – 6/Diciembre/2006

CO No.340 de 2005 "A) Pavimentación de la calle 39 entre carreras 14 y 13ª del Barrio Castilla perfil V-15 B) Pavimentación de la calle 22ª entre carreras 15 Este y 18ª Este del barrio Marco Antonio Pinilla. C) Pavimentación de la calle 11 Sur entre carreras 11 Este y Parque (manzanas D-E) del barrio Villa Mélida, en el municipio de Villavicencio – Meta"
22/Noviembre/2005 – 6/Diciembre/2006

UT ACACIAS – CO No.026 de 2006 "Mejoramiento y Ampliación del sistema de acueducto de Dinamarca y San Isidro de Chichimene en el municipio de Acacias – Meta"

01/Julio/2006 – 30/Diciembre/2006
Valor: $1.418.954.640

UT AULAS INGENIERIA – CO No.007 de 2006 "Construcción de tres aulas en el municipio de Barranca de Upia (3 Institución Educativa Francisco Walter)"
07/Septiembre/2006 – 24/Enero/2007
Valor: $ 145.615.200

UT PORFIA – CO PMAS No.086 de 2005 "Construcción manija de Recolección descarga Porfia-Ocoa tramo MD 01 – MVO 30 (no incluye pozo MVO 30) que hace parte del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Villavicencio – Meta"
01/Enero/2006 – 15/Junio/2006

UT OCOA – CO PMAS No.092 de 2005 "Construcción del Interceptor Ocoa Sur tramo OC 01 – OC 05 (no incluye pozo OC 05) del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Villavicencio – Meta"
02/Enero/2006 – 30/Junio/2006

CONTACTO: Ing. Edwin Ríos Robayo Cel. 313-8300577

EMPRESA: ADMINISTRACION COOPERATIVA DEL SUR DEL META - COSURMETA
DURACION: 01/MAYO/2002 – 30/ABRIL/2005
CARGO: Director del Departamento de Infraestructura
CONTACTO: Efraín Acosta Enciso Cel. 319-3129004

18143

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

CONTRATO No.	1014/2012 (20% PARTICIPACION)
CONTRATANTE:	ELECTRIFICADORA DEL META – EMSA ESP
OBJETO:	Demolición y Construcción de la sede de Atención al Cliente de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. ubicada en la calle 41 No.32/25/29 Barrio Centro de la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.
VALOR:	$1.500.000.000

CONTRATO No.	1014/2007
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL META
OBJETO:	Mejoramiento estabilización con crudo de castilla de la vía que conduce hacia la escuela de caney bajo desde la vía que conduce al municipio de Cumaral, municipio de Restrepo - Meta.
VALOR:	$40.492.441
FECHA DE INICIO:	15/Agosto/2007
FECHA DE TERMINACION:	15/Noviembre/2007

CONTRATO No.	088/2007
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL GUAINIA
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera y Ambiental de la construcción en pavimento rígido de la vía comprendida desde el cruce que conduce a la comunidad del Coco hacia el estadero Caño Bonito K0+000 al K0+685, en el municipio de Inírida, departamento del Guainía.
VALOR:	$89.384.960
FECHA DE INICIO:	02/Mayo/2007
FECHA DE TERMINACION:	10/Diciembre/2007

Calle 178 No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

18/44

CONTRATO No.	260/2007
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL GUAINIA
OBJETO:	Adquisición de neveras solares con paneles, regulador, estructura, caja de paralelaje, batería, caja de batería, termos, termómetros y paquetes fríos con destino a la secretaria de salud y seguridad social, departamento del Guainía.
VALOR:	$311.235.127
FECHA DE INICIO:	23/Julio/2007
FECHA DE TERMINACION:	14/Noviembre/2007

CONTRATO No.	2909/2005
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL META
OBJETO:	Construcción de cunetas en la vía que conduce a la vereda Caney Alto en el barrio el Recreo, iniciando desde el puente Caño Seco hacia Caney Alto en el municipio de Restrepo - Meta.
VALOR:	$17.147.690
FECHA DE INICIO:	17/Abril/2006
FECHA DE TERMINACION:	15/Junio/2006

CONTRATO No.	2908/2005
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL META
OBJETO:	Mejoramiento de la vía (Km 8) vía vereda Carutal del Km 1+250 al Km 9+250 vereda el Vergel Alto- los Piscos, municipio de Cabuyaro-Meta.
VALOR:	$36.836.835
FECHA DE INICIO:	10/Febrero/2006
FECHA DE TERMINACION:	06/Abril/2006

(9147

HOJA DE VIDA

YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
Ingeniero Civil

CONTRATO No.	001/2005
CONTRATANTE:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BRISAS DEL GUEJAR, MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS-META
OBJETO:	Construcción de box coulver en concreto reforzado L=5.00m, ancho=3.50m en el poblado de la vereda Brisas del Guejar, municipio de Puerto Lleras-Meta.
VALOR:	$12.000.000
FECHA DE INICIO:	05/Septiembre/2005
FECHA DE TERMINACION:	27/Septiembre/2005

CONTRATO No.	019/2005
CONTRATANTE:	COSURMETA
OBJETO:	Construcción del alcantarillado de la vereda Brisas del Guejar, municipio de Puerto Lleras-Meta.
VALOR:	$56.895.543
FECHA DE INICIO:	26/Mayo/2005
FECHA DE TERMINACION:	26/Julio/2005

CONTRATO No.	018/2005
CONTRATANTE:	COSURMETA
OBJETO:	Construcción del alcantarillado de la vereda Villa la Paz, municipio de Puerto Lleras-Meta.
VALOR:	$56.746.919
FECHA DE INICIO:	26/Mayo/2005
FECHA DE TERMINACION:	26/Julio/2005

Calle 178 No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

HOJA DE VIDA

YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
Ingeniero Civil

REFERENCIAS PERSONALES

EDWIN JOVAN RIOS ROBAYO	Ingeniero Civil – R/L EDMAR INGENIERIA LTDA Cel. 313 8300577 Villavicencio – Meta
MAURICIO GUTIERREZ DIAZ	Arquitecto Cel. 310 3412128
ANGELICA BUITRAGO AMAYA	Ingeniera Civil Cel. 305 4375493
NELCY ALVIZ LONDOÑO	Contadora Publica Cel. 321 2326346

REFERENCIAS FAMILIARES

JULIA GUERRERO RODRIGUEZ	Diseñadora de Modas Cel. 314 7383096
CONSUELO GOMEZ BARRAGAN	Trabajadora Social – CAIMA Cel. 310 5574082
HENRY BORRERO BENAVIDEZ	Administrador De Empresas Cel. 320 9048304

YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
C.C No. 86.051.263 de Villavicencio – Meta

Calle 178 No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
Ingeniero Civil

CEDULA DE CIUDADANIA





Calle 178 No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

MATRICULA PROFESIONAL



Calle 17B No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

18149

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3909595

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 86051263, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-090820 desde el 21 de Marzo de 2002, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2861.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).


Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

181 TO

DIPLOMA DE GRADO PREGRADO

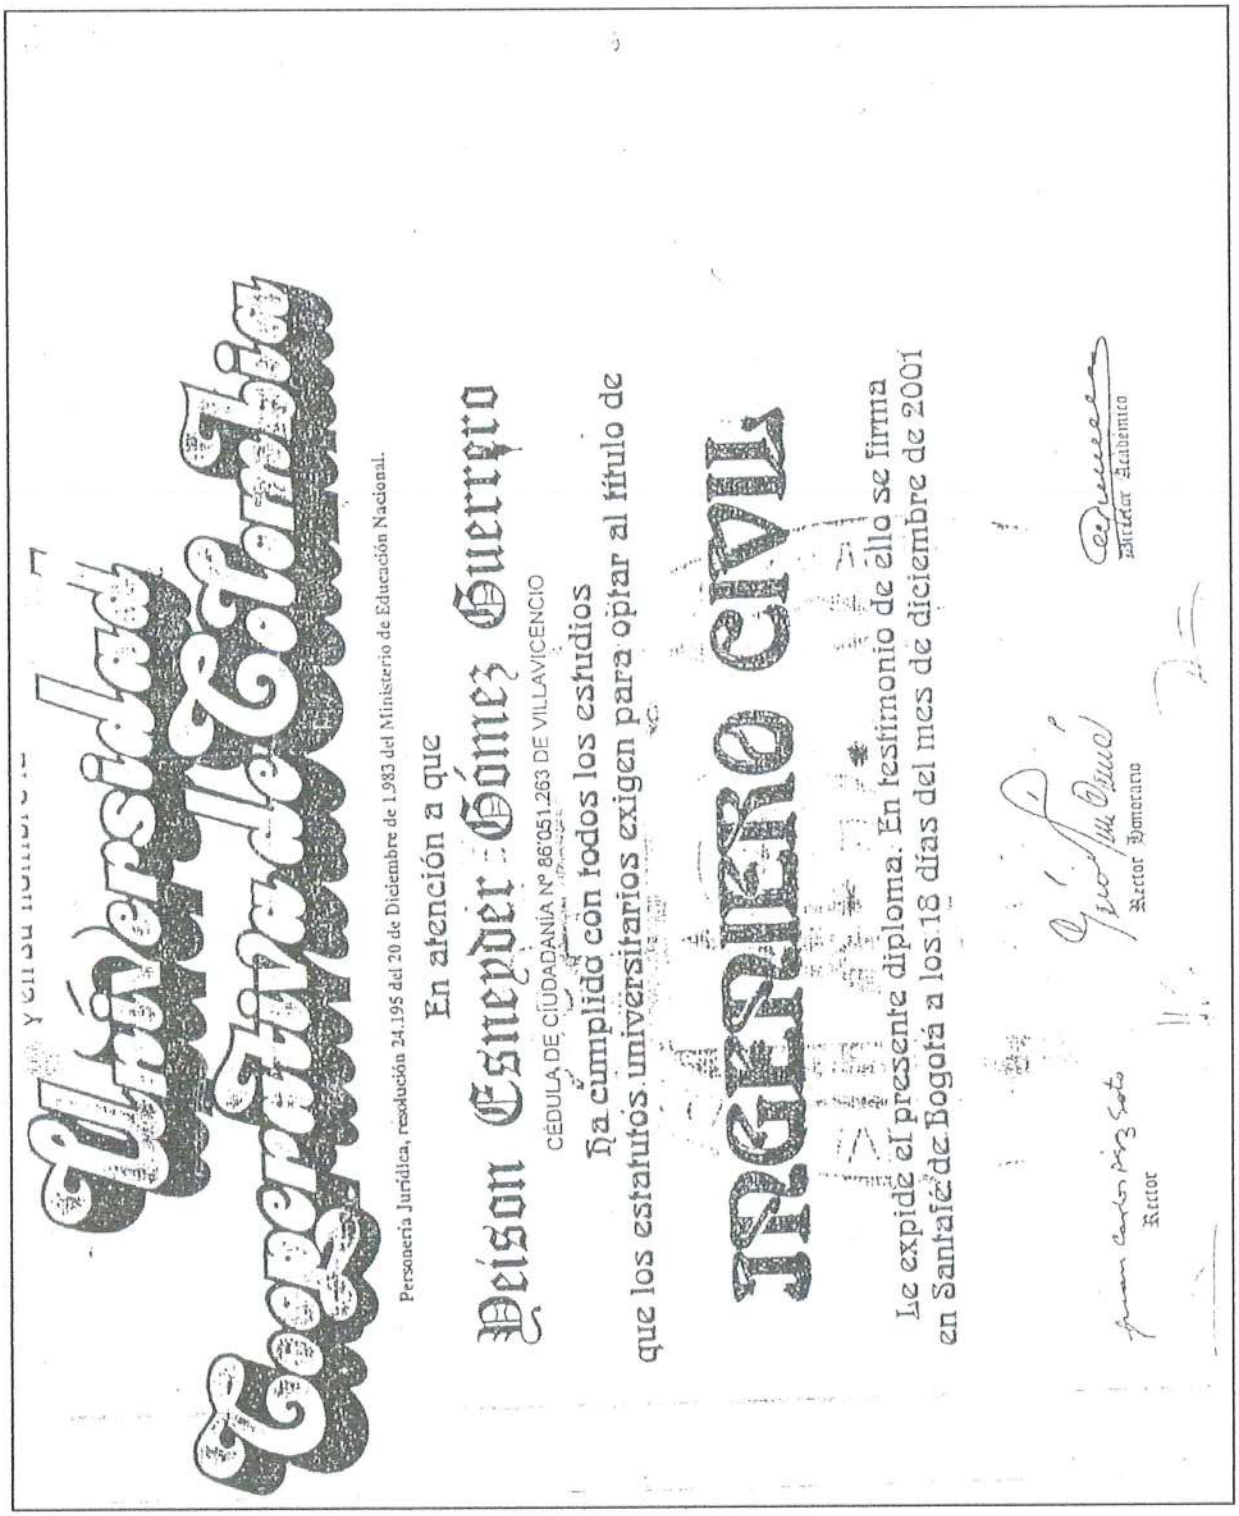

Universidad Cooperativa de Colombia

Personería Jurídica, resolución 24.195 del 20 de Diciembre de 1.983 del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

Yeison Esneyder Gómez Guerrero

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 86'051.263 DE VILLAVICENCIO

ha cumplido con todos los estudios

que los estatutos universitarios exigen para optar al título de

INGENIERO CIVIL

Le expide el presente diploma. En testimonio de ello se firma

en Santafé de Bogotá a los 18 días del mes de diciembre de 2001

Rector

Rector Seccional

Director Académico

Calle 17B No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta

18151

ACTA DE GRADO PREGRADO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Acta Individual de Graduación No. 165

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

APROBACIÓN DEL PROGRAMA: ACTA No. 019 DE MARZO 20 DE 1995

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2001

LUGAR: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

En atención a que YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO con cédula de ciudadanía No. 86,051,263 de VILLAVICENCIO Cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos por las normas legales y estatutarias, le expide el título de INGENIERO CIVIL

Lo anterior, atendiendo la autorización del Consejo Académico mediante acta No. 11 en sesión del día 7 de NOVIEMBRE de 2001

Para constancia se suscribe por:

JUAN CARLOS PEREZ SOTO
Rector

CESAR PEREZ GARCIA
Rector Honorario

ROQUE JULIO MORENO ESTEVEZ
Secretario General

FREDY NELSON OSORIO DONOSO
Director Seccional

Calle 178 No. 3 – 110 Este, Conjunto Cerrado Nueva Esperanza I
Teléfono: (8) 6 74 42 25 Cel. 301-5 46 69 45 Email: yeisongomez76@gmail.com
Villavicencio - Meta
