INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INFORME MENSUAL No. 18
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRACA"

CONTRATO 1447 DE 2024

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

NOVIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal y logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna con tiempo de respuesta casi inmediata ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL LTDA "COOTRACA C.T.A", Lote 5, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS**, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas en el periodo del primero (1) y el treinta y uno (31) de octubre de 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA C.T.A."

El contrato 1447 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA C.T.A."

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACA.

La cooperativa COOTRACA encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ ***COOTRACA***

- 7801 Lorica - Chinú, PR10+0000 (Purísima) – PR52+0000 (Chinú)

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRACA.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la cooperativa "COOTRACA C.T.A.", la cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en el sector 7801 Lorica - Chinú, PR10+0000 (Purísima) – PR52+0000 (Chinú), a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de octubre de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

- ***COOTRACA (CONTRATO 1447 DE 2024)***

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

Semana 1: Miércoles 1 – Domingo 5 de Octubre de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR17+0000 hasta el PR18+0300, desde el PR18+0300 hasta el PR20+0500 y desde el PR43+0300 hasta el PR45+0000, en ambos lados de la vía con un total de 20 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR32+0500 hasta el PR32+0700 y desde el PR49+0400 hasta el PR49+0650, en donde se limpiaron 450 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR26+0650 hasta el PR26+0750 y desde el PR26+0300 hasta el PR26+0750, en donde se limpiaron 550 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Medición anchos de vía, anchos bermas y anchos zonas de retiro desde el PR 10+0000 al PR40+0000, con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR48+0800 y desde el PR36+0300 hasta el PR36+0800, en donde se podaron 6 árboles con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 6 – Domingo 12 de Octubre de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR42+0000 hasta el PR43+0500, desde el PR13+0500 hasta el PR16+0000, desde le PR18+0600 hasta el PR22+0700, desde el PR33+0000 hasta el PR34+0590 y desde el PR21+0000 hasta el PR23+0000, en ambos lados de la vía con un total de 33 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR49+0700 hasta el PR50+0000, desde el PR50+0600 hasta el PR50+0800, desde el PR19+0300 hasta el PR19+0400, desde el PR48+0700 hasta el PR49+0000 y desde el PR42+0000 hasta el PR42+0300, en donde se limpiaron 1200 metros lineales con 15 jornales de trabajo.

- Limpieza de bermas desde el PR33+0600 hasta el PR34+0000, en donde se limpiaron 400 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR49+0000 hasta el PR51+0700 y desde el PR22+0000 hasta el PR23+0000, en donde se limpiaron 18 obras con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR49+0650, con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 13 – Domingo 19 de Octubre de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR20+0000 hasta el PR21+0000 lado derecho de la vía, desde el PR21+0600 hasta el PR22+0400 lado izquierdo de la vía, desde el PR23+0000 hasta el PR25+0000 lado derecho de la vía, desde el PR23+0000 hasta el PR24+0000 lado izquierdo de la vía, desde el PR40+0000 hasta el PR42+0000 en ambos lados de la vía, con un total de 30 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR32+0500 hasta el PR32+0700, en donde se limpiaron 200 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR25+0500 hasta el PR25+0800, en donde se limpiaron 300 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR20+0000 hasta el PR22+0000, en donde se limpiaron 6 obras con 4 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR32+0800, en donde se podaron 2 árboles con 2 jornales de trabajo
- Limpieza de calzada en el PR32+0500 y en el PR19+0000, con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 20 – Domingo 26 de Octubre de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR45+0000 hasta el PR47+0000, desde el PR29+0000 hasta el PR30+0500, desde el PR10+0000 hasta el PR12+0000, desde el PR38+0500 hasta el PR39+0700 y desde el PR46+0000 hasta el PR47+0700, en ambos lados de la vía con un total de 30 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR46+0700 hasta el PR47+0000, desde el PR41+0800 hasta el PR41+0900, desde el PR45+0000 hasta el PR45+0650, desde el PR45+0600 hasta el PR45+0800, desde el PR46+0700 hasta el PR47+0000 y desde el PR38+0500 hasta el PR39+0000, en donde se limpiaron 2050 metros lineales con 18 jornales de trabajo.

- Limpieza de bermas desde el PR29+0400 hasta el PR29+0800 y desde el PR33+0000 hasta el PR33+0500, en donde se limpiaron 900 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR47+0000 hasta el PR48+0000 y desde el PR29+0000 hasta el PR31+0000, en donde se limpiaron 13 obras con 8 jornales de trabajo.
- Parcheo con asfalto reciclado desde el PR48+0800 hasta el PR50+0000, con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 27 – Viernes 31 de Octubre 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR27+0000 hasta el PR29+0000, desde el PR12+0000 hasta el PR14+0000, desde el PR49+0000 hasta el PR52+0000 y desde el PR50+0000 hasta el PR52+0000, en ambos lados de la vía con un total de 30 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0000 hasta el PR28+0300 y desde el PR28+0450 hasta el PR28+0900, en donde se limpiaron 750 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR46+0400 hasta el PR46+0900, desde el PR49+0350 hasta el PR49+0650, desde el PR46+0000 hasta el PR46+0400 y desde el PR13+0000 hasta el PR13+0320, en donde se limpiaron 1142 metros lineales con 12 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR49+0350, con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de señal vertical en el PR48+0850, en donde se despejaron 2 señales con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR41+0350, en donde se podaron 2 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) y el treinta y uno (31) de octubre de 2025. fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento Cacaotal, en el PR47+0000, vía 7801, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOTRACA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5
NÚMERO DEL CONTRATO	1747 de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO	31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$1.324.055.427,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.324.055.427,00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista de la Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

La cooperativa Cootraca informa diariamente por medio del aplicativo WhatsApp publicando las evidencias (fotos) de las actividades desarrolladas durante el día.

En el transcurso del mes de octubre de 2025 se ejecutaron las actividades en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

Se coloco un metro cúbico (1 M3) de asfalto reciclado para la actividad de tapahuecos en puntos críticos de la vía 7801.

Se realizó la actividad de medición anchos de vía, anchos bermas y anchos zonas de retiro sobre la vía 7801 para actualización de inventarios viales

La cooperativa estuvo disponible para atender las emergencias presentadas en sectores varios de la vía a cargo, relacionadas con la caída de árboles producto de las fuertes lluvias y vientos durante la temporada invernal.

Los trabajadores de mantenimiento rutinario asistieron a la capacitación programada por la AMV cuyo tema fue "Practicas sostenibles para la poda de árboles".

ANEXOS

CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
NIT. No. 800.058.218- 0
CONTRATO No. 1447 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR17+0000	PR18+0300	5	6	1,30	1,43	7	0,20	
PR18+0300	PR20+0500	6	7	2,20	2,86	7	0,41	
PR43+0300	PR45+0000	7	9	1,70	2,72	6	0,45	
PR42+0000	PR43+0500	5	6	1,50	1,65	7	0,24	
PR13+0500	PR16+0000	5	5	2,50	2,50	6	0,42	
PR18+0600	PR22+0700	6	6	4,10	4,92	7	0,70	
PR33+0000	PR34+0500	7	6	1,50	1,95	7	0,28	
PR21+0000	PR23+0000	6	6	2,00	2,40	6	0,40	
PR20+0000	PR21+0000		5	1,00	0,50	6	0,08	
PR21+0600	PR22+0400	6		0,80	0,48	6	0,08	
PR23+0000	PR25+0000		7	2,00	1,40	6	0,23	
PR23+0000	PR24+0000	6		1,00	0,60	6	0,10	
PR40+0000	PR42+0000	8	4	2,00	2,40	6	0,40	
PR45+0000	PR47+0000	12	9	2,00	4,20	6	0,70	
PR29+0000	PR30+0500	6	9	1,50	2,25	6	0,38	
PR10+0000	PR12+0000	2	4	2,00	1,20	6	0,20	
PR38+0500	PR39+0700	6	3	1,20	1,08	6	0,18	
PR46+0000	PR47+0700	9	9	1,70	3,06	6	0,51	
PR27+0000	PR29+0000		10	2,00	2,00	6	0,33	
PR27+0000	PR29+0000	7		2,00	1,40	6	0,23	
PR12+0000	PR14+0000	4	4	2,00	1,60	6	0,27	
PR49+0000	PR52+0000	7		3,00	2,10	6	0,35	
PR50+0000	PR52+0000		6	2,00	1,20	6	0,20	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR32+0500	PR32+0700	X		Trigangular	200	3	66,7	
PR49+0400	PR49+0650	X		Trigangular	250	3	83,3	
PR49+0700	PR50+0000	X		Trigangular	300	3	100,0	
PR50+0600	PR50+0800	X		Trigangular	200	3	66,7	
PR19+0300	PR19+0400	X		Trigangular	100	3	33,3	
PR48+0700	PR49+0000	X		Trigangular	300	3	100,0	
PR42+0000	PR42+0300	X		Trigangular	300	3	100,0	
PR32+0500	PR32+0700	X		Trigangular	200	3	66,7	
PR46+0700	PR47+0000	X		Trigangular	300	3	100,0	
PR41+0800	PR41+0900	X		Trigangular	100	3	33,3	
PR45+0000	PR45+0650	X		Trigangular	650	3	216,7	
PR45+0600	PR45+0800	X		Trigangular	200	3	66,7	
PR46+0700	PR47+0000	X		Trigangular	300	3	100,0	
PR38+0500	PR39+0000	X		Trigangular	500	3	166,7	
PR28+0000	PR28+0300	X		Trigangular	300	3	100,0	
PR28+0450	PR28+0900	X		Trigangular	450	3	150,0	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
				0,00			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR26+0650	PR26+0750	X		LD	100	3	33,3	
PR26+0300	PR26+0750	X		LI	450	3	150,0	
PR33+0600	PR34+0000	X		LD	400	3	133,3	
PR25+0500	PR25+0800	X		I-D	300	3	100,0	
PR29+0400	PR29+0800	X		I-D	400	3	133,3	
PR33+0000	PR33+0500	X		I-D	500	3	166,7	
PR46+0400	PR46+0900	X		I-D	500	3	166,7	
PR49+0350	PR49+0650	X		I-D	300	3	100,0	
PR46+0000	PR46+0400	X		I-D	22	3	7,3	
PR13+0000	PR13+0320	X		I-D	320	3	106,7	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
NIT. No. 800.058.218- 0
CONTRATO No. 1447 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR49+0000	PR51+0700	9	9	9	4	2,25	
PR22+0000	PR23+0000	9	9	9	4	2,25	
PR20+0000	PR22+0000	6	6	6	4	1,50	
PR47+0000	PR48+0000	6	6	6	4	1,50	
PR29+0000	PR31+0000	7	7	7	4	1,75	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó la actividad de medición anchos de vía desde el PR 10+0000 al PR52+0000.
- Se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de arboles en el PR48+0800, desde el PR36+0300 hasta el PR36+0800, en el PR32+0800 y en el PR41+0350.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada en el PR49+0650, en el PR32+0500 y en el PR19+0000.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con material de fresado reciclado con ACPM desde el PR48+0800 hasta el PR50+0000.
- Se realizó la actividad de despeje de zona de carretera en el PR49+0350.
- Se realizó la actividad de despeje de señal vertical en el PR48+0850.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	45,9	143	0,32	92%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	4650	48	96,88	94%
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	3292	30	109,73	90%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	37	20	1,85	95%
5	TAPAHUECOS CON MATERIAL DE FRESADO RECICLADO CON ACPM		M3	1	3	0,33	100%
6	DESPEJE DE ZONA CARRETERA		UND	1	2	0,50	95%
7	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES		UND	8	5	2	90%

OBSERVACIONES

- Durante el mes de noviembre se debe continuar priorizando la actividad de rocería para mantenerla en los porcentajes de cumplimiento de INVIAS.
- Se debe verificar el estado de todas las obras de drenaje, puentes y pontones para programar la limpieza de los que la requieran.
- En el mes de noviembre se debe ejecutar la actividad de limpeza y despeje de zona de carretera como parte del ornato y embellecimiento de la vía.
- Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Se debe continuar con la limpieza de calzada en zonas donde se presente acumulación de sedimentos.
- Para el mes de noviembre se debe priorizar la limpieza de bermas.
- Se debe realizar la limpieza de señales verticales de tránsito que se encuentran sucias.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
C.C. No. 6.616.665 de Chinú.
Representante Legal

Nombre: COPEBA S.A.S
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	01 - 05 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 7801; PR32+0550

ANTES



F1 01/10/2025

DESPUES



F2 01/10/2025

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR18+0300

ANTES



F3 01/10/2025

DURANTE



F4 01/10/2025

LIMPIEZA DE BERMA
VÍA 7801; PR26+0650

ANTES



F5 02/10/2025

DESPUES



F6 02/10/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	01 - 05 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR20+0000

ANTES



F7 02/10/2025

DESPUES



F8 02/10/2025

MEDICIÓN DE ANCHOS DE VÍA
VÍA 7801; PR13+0000

DURANTE



F9 03/10/2025

DURANTE



F10 03/10/2025

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR45+0000

ANTES



F11 03/10/2025

DESPUES



F12 03/10/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	01 - 05 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES
VÍA 7801; PR48+0800

ANTES



DURANTE



LIMPIEZA DE CUNETA
VÍA 7801; PR49+0300

ANTES



DURANTE



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES
VÍA 7801; PR39+0570

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	06 - 12 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

ANTES

LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 7801; PR49+0700

DESPUES





ANTES

LIMPIEZA DE CUENTA

VÍA 7801; PR50+0600

DESPUES





ANTES

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR43+0500

DESPUES





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	06 - 12 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
LIMPIEZA DE CUNETA
VÍA 7801; PR48+0700

ANTES



F25 07/10/2025

DESPUES



F26 07/10/2025

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR15+0100

ANTES



F27 07/10/2025

DURANTE



F28 07/10/2025

LIMPIEZA DE CUNETA
VÍA 7801; PR42+0150

DURANTE



F29 08/10/2025

DESPUES



F30 08/10/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	06 - 12 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR19+0000

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 7801; PR33+0650

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR33+0600

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	06 - 12 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR23+0000

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR23+0000

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR12+0000

DURANTE



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	13 - 19 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR20+0056

ANTES



DESPUES



APLOMADO DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 7801; PR23+0500

ANTES



DESPUES



DESCOLE DE AGUAS LLUVIA

VÍA 7801; PR21+0700

ANTES



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	13 - 19 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
LIMPIEZA DE BERMA
VÍA 7801; PR25+0800

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR21+0000

ANTES



DURANTE



LIMPIEZA DE CUNETA
VÍA 7801; PR32+0700

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	13 - 19 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 7801; PR32+0800

ANTES



DESPUES



ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR24+0800

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CALZADA

VÍA 7801; PR32+0500

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA: FECHA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
	20 - 26 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR47+0800

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 7801; PR40+0900

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 7801; PR46+0800

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	20 - 26 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR47+0000

ANTES



F67 20/10/2025

DESPUES



F68 20/10/2025

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR29+0850

DURANTE



F69 21/10/2025

DESPUES



F70 21/10/2025

LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 7801; PR29+0700

ANTES



F71 21/10/2025

DURANTE



F72 21/10/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA: FECHA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
	20 - 26 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 7801; PR28+0800

DURANTE



F73 21/10/2025

DESPUES



F74 21/10/2025

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR29+0800

ANTES



F75 22/10/2025

DURANTE



F76 22/10/2025

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 7801; PR35+0400

ANTES



F77 22/10/2025

DESPUES



F78 22/10/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	20 - 26 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR40+0980

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR40+0200

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CALZADA

VÍA 7801; PR33+0600

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	20 - 26 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR46+0000

ANTES



DESPUES



TAPA HUECO
VÍA 7801; PR49+0360

ANTES



DESPUES



TAPA HUECO
VÍA 7801; PR48+0850

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	27 - 31 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR29+0000

ANTES



DURANTE



LIMPIEZA DE CUNETA
VÍA 7801; PR28+0800

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA
VÍA 7801; PR27+0700

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	27 - 31 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR27+0000

ANTES



F97 28/10/2025

DURANTE



F98 28/10/2025

DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA
VÍA 7801; PR49+0350

ANTES



F99 28/10/2025

DESPUES



F100 28/10/2025

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES
VÍA 7801; PR49+0050

ANTES



F101 28/10/2025

DESPUES



F102 28/10/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	27 - 31 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS


VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR48+0800

ANTES



F103 29/10/2025

DESPUES

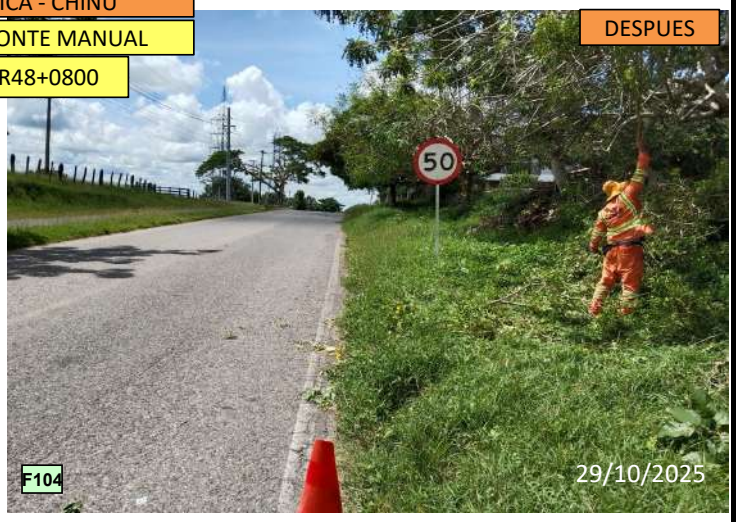

F104 29/10/2025

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR13+0000

ANTES



F105 29/10/2025

DESPUES



F106 29/10/2025

LIMPIEZA DE BERMA
VÍA 7801; PR39+0600

ANTES



F107 29/10/2025

DESPUES



F108 29/10/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACA

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	5
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINU
FECHA:	27 - 31 DE OCTUBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINU
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801; PR41+0350

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA
VÍA 7801; PR46+0300

ANTES



DESPUES



CAPACITACIÓN COOPERATIVAS
TEMA: PRÁCTICA SOSTENIBLE PARA LA PODA DE ÁRBOLES

DURANTE



DURANTE

