INFORME Y FECHA:	INFORME No. 03 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO No Y FECHA:	3339 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025
No. PROCESO EN SECOP II:	AI-SASI-2494-2025
CONTRATISTA:	CONCRE TOLIMA S.A. NIT: 900.180.449-9 RL: CRISTOBAL ANTONIO PARGA ROJAS CC: 14.230.847 DE IBAGUE (T)
SECRETARIA EJECUTORA:	INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OBRA CIVIL, ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000) IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TREI Y UNO DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
PRORROGA No.1:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y SIETE (87) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE ACTA DE INICIO:	5 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA SUSPENSIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE REINICIO:	14 DE ENERO DE 2026

1. DISEÑO DE MEZCLA

En el presente capítulo se relaciona el diseño de mezcla correspondiente al concreto suministrado durante el periodo reportado. Dicho diseño fue elaborado y verificado por el laboratorio de calidad de Concretolima S.A., considerando las especificaciones técnicas del contrato, el tipo de elemento a construir y las condiciones de colocación en obra.

Las proporciones presentadas corresponden al diseño en estado seco por metro cúbico, incluyendo relación agua/cemento, tipo y procedencia de agregados, aditivos químicos y materiales complementarios. El diseño cumple con los parámetros de desempeño exigidos para concretos de pavimento, especialmente en términos de manejabilidad, durabilidad y resistencia a flexión (módulo de ruptura), de acuerdo con las buenas prácticas de producción de concreto premezclado y la normatividad técnica aplicable.

CONCRETOL	DISEÑO SECO POR M³.	
Parámetros Iniciales	Tipo de Concreto	**CRTO. PAVIM. BOMBEABLE. ASENT. 5"+/-1" MR 42 TM 1" A 28D. MICROFIBRA**
	Asentamiento	5" +/- 1"
	Código Interno:	11042100000
	Productor:	CONCRETOLIMA SA
Proporciones del diseño	Relación Agua / Cemento	0.46
	Agregado (lt/m³)	711
	Densidad ponderada de agregados (Tn/m³)	2.606
	Relación fino/agregado	0.54
	RECOVER – Aditivo Plastificante Estabilizador de fraguado (% en peso del cemento)	0.53
	CLARENA – Aditivo super plastificante reductor de agua de alto rango (% en peso del cemento)	0.26
	FIBERSTRAND-150 – Microfibra sintética monofilamento (kg/m³)	0.60
Procedencia de materias primas	Cemento	Argos - Alion (Rio Claro Antioquia)
	Agua	IBAL
	Grava	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
	Arena	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
	Aditivos	GCP - CHRYSO
Resistencias Esperadas	7 (días) - %	70 – 90
	28 (días) - %	100 – 120

CONCRETOL	DISEÑO SECO POR M³.	
Parámetros Iniciales	Tipo de Concreto	**CRTO. PLÁSTICO ASENT. 6"+/-1" 3000 PSI TM 1" A 28D. MICROFIBRA**
	Asentamiento	6" +/- 1"
	Código Interno:	03210100000
	Productor:	CONCRETOLIMA SA
Proporciones del diseño	Relación Agua / Cemento	0.65
	Agregado (lt/m³)	734
	Densidad ponderada de agregados (Tn/m³)	2.605
	Relación fino/agregado	0.56

CONCRETOL	DISEÑO SECO POR M³.	
	RECOVER – Aditivo Plastificante Estabilizador de fraguado (% en peso del cemento)	0.55
	CLARENA – Aditivo super plastificante reductor de agua de alto rango (% en peso del cemento)	0.33
	FIBERSTRAND-150 – Microfibra sintética monofilamento (kg/m³)	0.60
Procedencia de materias primas	Cemento	Argos - Alion (Rio Claro Antioquia)
	Agua	IBAL
	Grava	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
	Arena	Agregados Argos, Rio Saldaña, planta Saldaña (Tolima).
	Aditivos	GCP - CHRYSO
Resistencias Esperadas	3 (días) - %	40 – 60
	7 (días) - %	70 – 90
	14 (días) - %	85 – 105
	28 (días) - %	100 – 120

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico del suministro de concreto realizado en las fechas indicadas en el presente informe. Las imágenes permiten evidenciar el proceso de llegada de los vehículos mezcladores, la colocación del concreto y las condiciones generales de la actividad en obra.

Este registro tiene como finalidad dejar constancia visual del cumplimiento del suministro contratado, así como del acompañamiento técnico realizado durante las actividades de vaciado, sirviendo como soporte documental del desarrollo de las labores ejecutadas.

SECTOR SUMINISTRADO:	RINCON DEL PEDREGAL
FECHA DE SUMINISTRO:	07 Y 09 DE ENERO DE 2026











SECTOR SUMINISTRADO:	RINCON DEL PEDREGAL
FECHA DE SUMINISTRO:	10 Y 11 DE ENERO DE 2026




SECTOR SUMINISTRADO:	RINCON DEL PEDREGAL
FECHA DE SUMINISTRO:	10 Y 11 DE ENERO DE 2026

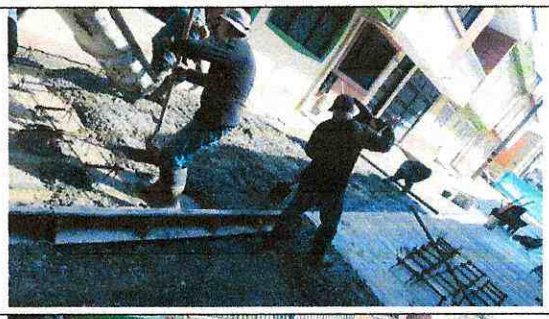

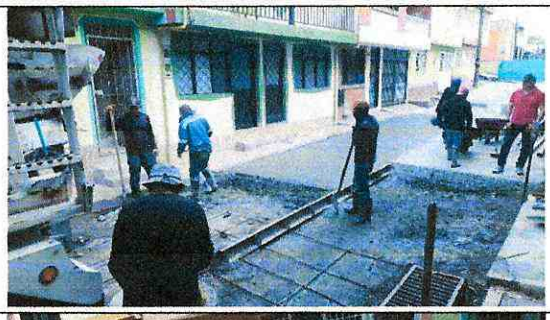

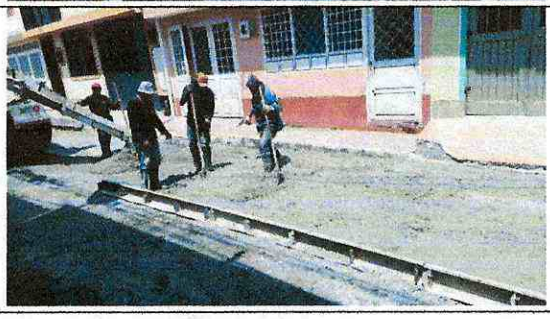SECTOR SUMINISTRADO:	RINCON DEL PEDREGAL
FECHA DE SUMINISTRO:	12, 13 Y 14 DE ENERO DE 2026




SECTOR SUMINISTRADO:	RINCON DEL PEDREGAL
FECHA DE SUMINISTRO:	12, 13 Y 14 DE ENERO DE 2026
	

3. REMISIONES

En este capítulo se anexan las copias de las remisiones correspondientes a cada uno de los despachos efectuados durante el periodo reportado. Estos documentos constituyen el soporte formal del suministro, donde se detallan datos como fecha, número de remisión, volumen transportado, tipo de concreto, asentamiento y horarios de cargue y entrega.

Las remisiones permiten garantizar la trazabilidad del material suministrado desde la planta de producción hasta la obra, verificando que los volúmenes y especificaciones correspondan a lo solicitado dentro del marco del contrato.



CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
REMISIÓN SALIDA DE PLANTA DOS
24713
51000
Fecha 2/01/2026 Hora 9:32 AM
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer SNV943
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor HENRY MORENO
PLANTA Sello de Seguridad No: 43052
Metros 7
Producto 11042100000 - CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5" +/-1
Hora Salida 10:12 Hora Llegada 10:38 Hora Inicio 10 46 Hora Terminada 12:15
Observaciones con adicion de aditivo
IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o sus(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción en asentamiento y diseño.
Despachador MIGUEL ANGEL PEÑALOZA PAQUETO Recibido
CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
REMISIÓN SALIDA DE PLANTA
24713
101101
Fecha 07/02/2026 Hora 07:32 a. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer JVW623
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor HELMUN BARRERA
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 100952
Metros 6
Producto 11042100000 - CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5" +/-1
Hora Salida 7:56 Hora Llegada 08:05 Hora Inicio 08:37 Hora Terminada 09:10
Observaciones con retardante
IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o sus(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción en asentamiento y diseño.
Despachador HECTOR ENEYDER PEDROMO Recibido
CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE



CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT 900.180.449 - 9 - Responsable de IVA
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel 608 268 5061 - Cels. 317 368 69 41 - 314 230 45 93
concretolima@gmail.com Ibague - Tolima

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA — 24713 — 101107

Fecha 07/02/2026 Hora 10:07 a. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer SN0044
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor JHON ORTIZ
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 103953
Metros 35
Producto 11042100000 - CRTO PAVIM PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5"+/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:30	10:50	11:02	11:20

Observaciones Con Adición de Microfibras

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por ubicación y diseño.

Despachador VICTOR ESNEYDER PEDROMO Recibido

CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA DOS — 24713 — 51611

Fecha 2/02/2026 Hora 12:25 PM
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer SN0003
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor ALVARO OLIVEROS
PLANTA Sello de Seguridad No: 53866
Metros 6
Producto 11042100000 - CRTO PAVIM PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5" +/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:58	13:38	13:59	14:22

Observaciones Con Adición de Microfibras

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por ubicación y diseño.

Despachador MIGUEL ANDRES PEÑALOZA BARRETO Recibido

CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA — 24713 — 101123

Fecha 10/02/2026 Hora 08:29 a. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer TGV162
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor JOSE MARROQUIN
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 102978
Metros 6
Producto 11042100000 - CRTO PAVIM PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5"+/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
8:45	9:18	9:19	9:55

Observaciones Con Adición de Microfibras

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por ubicación y diseño.

Despachador VICTOR ESNEYDER PEDROMO Recibido

CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA — 24713 — 101129

Fecha 10/02/2026 Hora 10:35 a. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer TGV162
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor JOSE MARROQUIN
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 102984
Metros 5
Producto 11042100000 - CRTO PAVIM PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5"+/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:55	11:13	11:20	11:50

Observaciones Con Adición de Microfibras

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por ubicación y diseño.

Despachador VICTOR ESNEYDER PEDROMO Recibido

CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA — 24713 — 101149

Fecha 11/02/2026 Hora 07:41 a. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer SN0007
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor JHON ORTIZ
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 103000
Metros 6
Producto 11042100000 - CRTO PAVIM PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5"+/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
08:00	8:12	8:28	9:05

Observaciones Con Adición de Microfibras

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por ubicación y diseño.

Despachador MIGUEL PEÑALOZA Recibido

CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA — 24713 — 101156

Fecha 11/02/2026 Hora 09:54 a. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer SN0007
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor JHON ORTIZ
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 103017
Metros 7
Producto 11042100000 - CRTO PAVIM PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5"+/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
10:05	10:16	10:19	10:37

Observaciones Con Adición de Microfibras

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por ubicación y diseño.

Despachador MIGUEL PEÑALOZA Recibido

CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE



CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Responsable de IVA
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel. 608 268 5061 - Cels. 317 368 69 41 - 314 230 45 93
concretolima@gmail.com Ibagué - Tolima

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA 101161

Publica

Fecha 11/02/2026 Hora 12:24 p. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer TGV160
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor JOSE MARROQUIN
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 109011
Metros 6
Producto 11042100000 - CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 6" +/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:40	13:05	13:05	13:19

Observaciones Con Adición de microfibras. En planta 14:05

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador MIGUEL PEÑALOZA Recibido

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Responsable de IVA
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel. 608 268 5061 - Cels. 317 368 69 41 - 314 230 45 93
concretolima@gmail.com Ibagué - Tolima

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA 101168

Fecha 12/02/2026 Hora 07:56 a. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer PSY842
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor LEONARDO SIERRA
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 109018
Metros 6
Producto 11042100000 - CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5"+/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
08:25	8:36	8:30	9:10

Observaciones Con Adición de microfibras.

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador VICTOR ESNEYDER PERDOMO Recibido

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Responsable de IVA
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel. 608 268 5061 - Cels. 317 368 69 41 - 314 230 45 93
concretolima@gmail.com Ibagué - Tolima

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA 101172

Fecha 12/02/2026 Hora 09:31 a. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer SNO895
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor KEVIN ECHEVERRY
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 109027
Metros 7
Producto 11042100000 - CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5"+/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
09:45	10:09	10:09	10:53

Observaciones Con Adición de microfibras.

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador VICTOR ESNEYDER PERDOMO Recibido

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Responsable de IVA
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel. 608 268 5061 - Cels. 317 368 69 41 - 314 230 45 93
concretolima@gmail.com Ibagué - Tolima

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA 101179

Fecha 12/02/2026 Hora 12:14 p. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer SNO842
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor HENRY MORENO
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 109029
Metros 6
Producto 11042100000 - CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5"+/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
12:25	12:58	01:05	01:30

Observaciones Con Adición de microfibras.

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador VICTOR ESNEYDER PERDOMO Recibido 1A2444476

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Responsable de IVA
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel. 608 268 5061 - Cels. 317 368 69 41 - 314 230 45 93
concretolima@gmail.com Ibagué - Tolima

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA DOS 51055

Fecha 2/13/2026 Hora 11:12 AM
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer PSY842
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor LEONARDO SIERRA
PLANTA Sello de Seguridad No: 53309
Metros 8
Producto 11042100000 - CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 42 TM 1"
Asentamiento 5"+/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:23	11:35	11:37	12:03

Observaciones Con Adición de microfibras

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador OSCAR MAURICIO LUNA MEDINA Recibido

CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Responsable de IVA
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel. 608 268 5061 - Cels. 317 368 69 41 - 314 230 45 93
concretolima@gmail.com Ibagué - Tolima

REMISIÓN SALIDA DE PLANTA 101201

Fecha 13/02/2026 Hora 11:23 a. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer SNO842
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor HENRY MORENO
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No: 109051
Metros 6
Producto 03210100000 - CRTO. PLASTICO 3000 PSI TM 1"
Asentamiento 6" +/-1

Hora Salida	Hora Llegada	Hora Inicio	Hora Terminada
11:36	12:03	12:05	02:00

Observaciones Con Adición de microfibras

IMPORTANTE: No garantizamos la resistencia de la mezcla a la cual se le agregue agua, mortero de cemento o aditivos químicos por parte de la obra. El asentamiento de diseño tiene una tolerancia de una pulgada y el tiempo de manejabilidad es de una hora desde el momento que se llega a obra. La firma de este comprobante por el comprador o su(s) representante(s) indica que ha recibido la mezcla a satisfacción por cubicación y diseño.

Despachador MIGUEL PEÑALOZA Recibido

CONTROL DE CALIDAD REVISADO PLANTA IBAGUE



CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
REMISIÓN SALIDA DE PLANTA
101208
Fecha 13/02/2026 Hora 02:21 p. m.
Cliente MUNICIPIO DE IBAGUE Mixer SN9602
Obra RINCON DEL PEDREGAL Conductor JOSE MARROQUIN
LÍNEA 1 Sello de Seguridad No:
Producto 11M2100000 - CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 42 TM 1"
Hora Salida 14:45 Hora Llegada 15:15 Hora Inicio 15:20
Observaciones
Despachador VICTOR ESNEYDER PERDOMO Recibió

CONCRE TOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
REMISIÓN SALIDA DE PLANTA DOS
Fecha MUNICIPIO DE IBAGUE Hora 7:30 AM
Cliente RINCON DEL PEDREGAL Mixer SN9695
Obra Conductor KEVIN ECHEVERRY
PLANTA Sello de Seguridad No:
Producto 11M2100000 - CRTO. PAVIM. PLASTICO MR 42 TM 1"
Hora Salida 9:30 Hora Llegada 7:42 Hora Inicio 9:06 Hora Terminado 10:10
Observaciones
CONTROL DE CALIDAD REVISADO

4. RESULTADOS DE RESISTENCIAS

Con el fin de realizar seguimiento al comportamiento mecánico del concreto suministrado durante el periodo reportado, Concretolima S.A. ejecuta un plan de inspección y ensayo conforme a los lineamientos de las normas técnicas colombianas aplicables al concreto premezclado, entre ellas la NSR-10 y las NTC vigentes para control de calidad.

Para los concretos destinados a pavimento rígido, el control se realiza mediante ensayos de módulo de ruptura en viguetas, conforme a la NTC 2871, evaluando la resistencia a flexión y su evolución con la edad.

Para los concretos utilizados en otros elementos estructurales, el seguimiento se efectúa mediante ensayos de resistencia a la compresión en especímenes cilíndricos, conforme a la NTC 673, permitiendo verificar el cumplimiento de la resistencia especificada (f'c) a las edades de control establecidas.

Las muestras son elaboradas, curadas y ensayadas en el laboratorio de calidad bajo condiciones controladas y con equipos debidamente calibrados. Los resultados presentados evidencian un comportamiento acorde con el diseño de mezcla aprobado y con los parámetros técnicos exigidos para el suministro ejecutado.

- RINCON DEL PEDREGAL

MTRA No.	CONSECUTIVO INTERNO	FECHA	REMISIÓN No.	DISEÑO	7 DIA (kg/cm²)	7 DIA %	28 DIA (kg/cm²)	28 DIA %
11335	*RMI20260041*	*07/02/2026*	*101101*	CRTO. PAVIM. BOMBEABLE. ASENT. 5"+/-1" MR 42 TM 1" A 28D. MICROFIBRA	*38*	*90%*	-	-
11348	RMI20260046	09/02/2026	51608	CRTO. PAVIM. BOMBEABLE. ASENT. 5"+/-1" MR 42 TM 1" A 28D. MICROFIBRA	36	86%	-	-
11371	RMI20260062	11/02/2026	101149	CRTO. PAVIM. BOMBEABLE. ASENT. 5"+/-1" MR 42 TM 1" A 28D. MICROFIBRA	35	83%	-	-

CONCRETOL
CONSTRUYENDO PAÍS
CONCRE TOLIMA S.A.
900.180.449-9

MTRA No.	CONSECUTIVO INTERNO	FECHA	REMISIÓN No.	DISEÑO	7 DIA (kg/cm²)	7 DIA %	28 DIA (kg/cm²)	28 DIA %
11400	RMI20260084	14/02/2026	51659	CRTO. PAVIM. BOMBEABLE. ASENT. 5"+/-1" MR 42 TM 1" A 28D. MICROFIBRA	42	100%	-	-

MTRA No.	CONSECUTIVO INTERNO	FECHA	REMISIÓN No.	DISEÑO	3 DIA (kg/cm2)	3 DIA %	7 DIA (kg/cm2)	7 DIA %	14 DIA (kg/cm2)	14 DIA %	28 DIA (kg/cm2)	28 DIA %
11389	*RMI20260077*	*13/02/2026*	*101201*	CRTO. PLÁSTICO ASENT. 6"+/-1" 3000 PSI TM 1" A 28D. MICROFIBRA	*157*	*75%*	*208*	*99%*	-	-	-	-

NOTA: Los espacios que se muestran en blanco están pendientes de realizar el ensayo a compresión, teniendo en cuenta la fecha de toma de cada muestra, o corresponden a edades en las que no son fallados algunos diseños.

De acuerdo con la información presentada en el presente informe —diseño de mezcla, registro fotográfico, remisiones y resultados de laboratorio— se evidencia el cumplimiento del suministro de concreto premezclado conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

El material fue producido bajo control de calidad en planta, transportado en equipos especializados y acompañado técnicamente durante su colocación en obra, verificándose un comportamiento adecuado del concreto tanto en estado fresco como endurecido. Concretolima S.A. continúa comprometida con el soporte técnico y la trazabilidad del suministro dentro del marco contractual.

Cordialmente,

GERMAN ANDRES PERDOMO RIVAS
Director de Producción
Concretolima S.A.
Cel. 318-2802695
