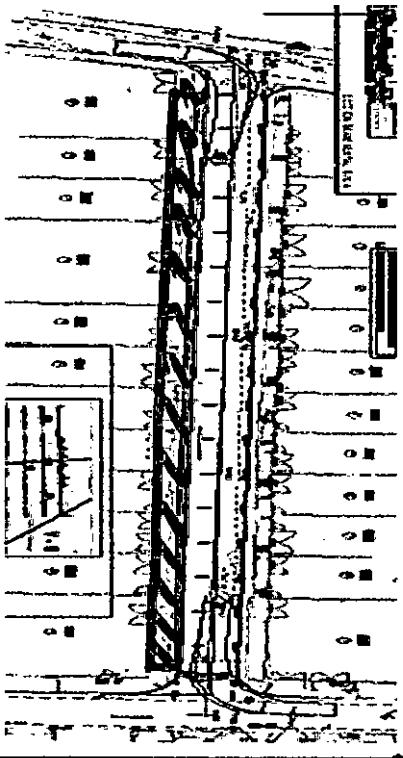
3202 HFS

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4,006 | M2 | GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000204 |  | 62,89 | 6,0 | | | 377,36 | 377,36 |
| | | | | | TOTAL | | 377,36 |

| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

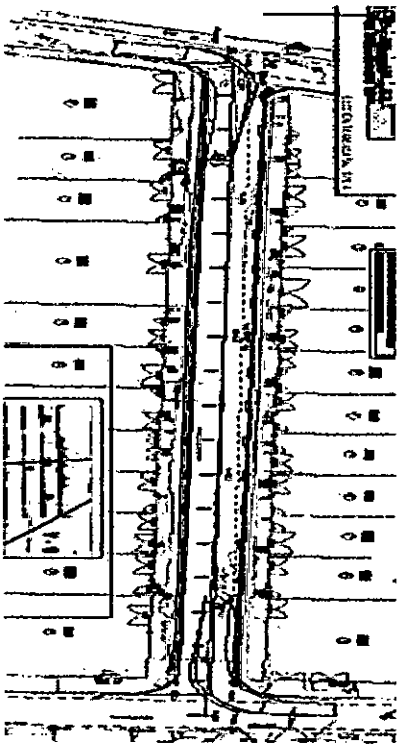
3202

166

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4,007 | ML | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9000204 | | 204,78 | | | | 204,78 | 204,78 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 204,78 |

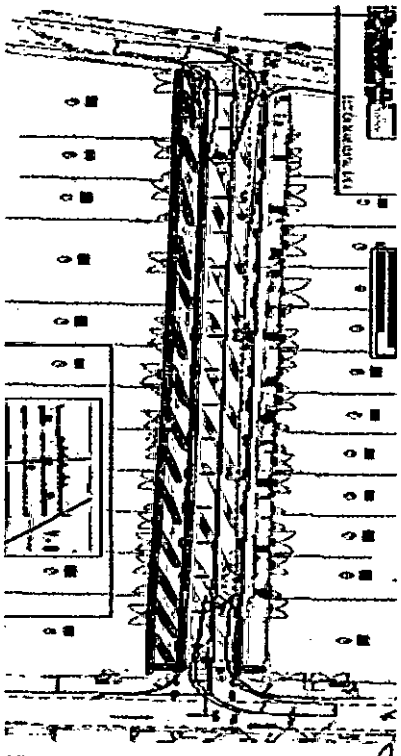
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3203 167

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4,008 | M3 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9000204 | | 54,38 | 6,0 | 0,2 | | 65,26 | 65,26 |
| | | | | | TOTAL | | 65,26 |

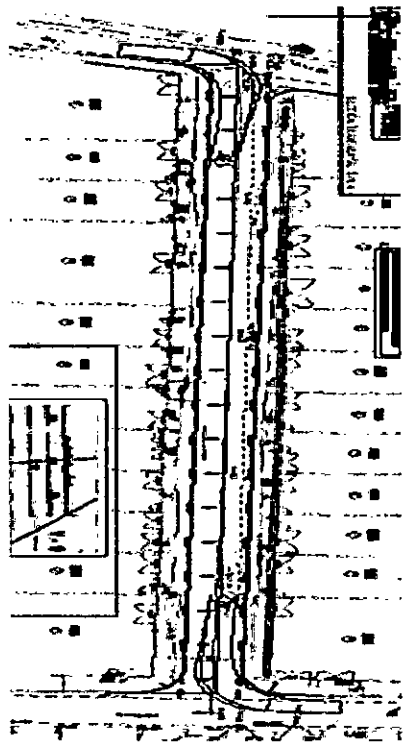
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3204 ~~168~~

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4,012 | ML | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN). |

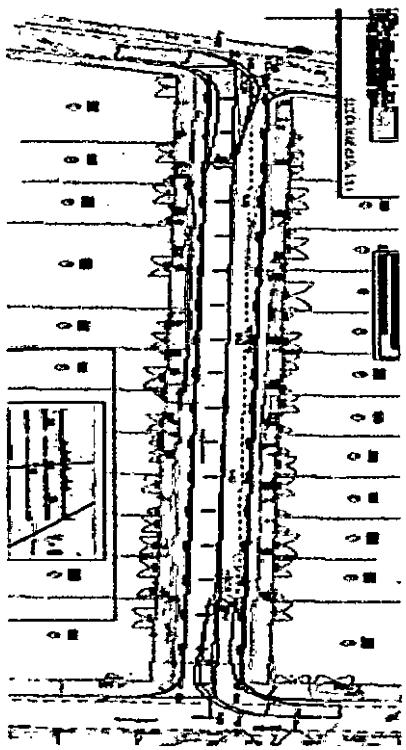
| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9000204 | | 39,23 | | | | 39,23 | 39,23 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

3205 169

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCIÓN: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4,013 | M2 | CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS LARGO | MEDIDAS ANCHO | MEDIDAS ALTO | MEDIDAS AREA | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV | | | | | | | |
| 9000204 |  | 3,88 | 1,8 | | | 6,98 | 6,98 |
| | | | | | TOTAL | | 6,98 |

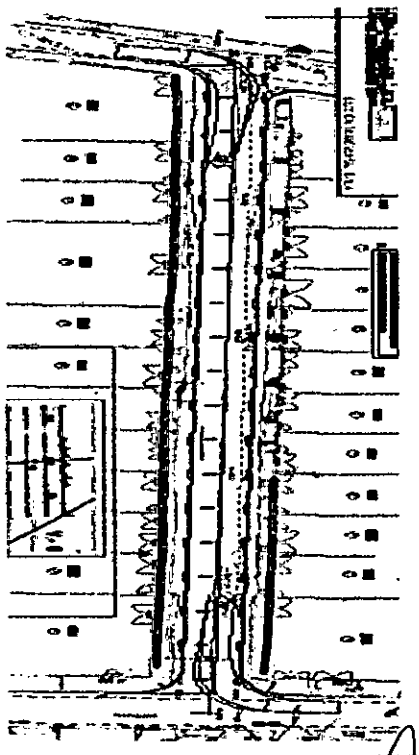
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3206 [illegible]

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4,016 | ML | BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN). |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9000204 | | 147,90 | | | | 147,90 | 147,90 |
| | | | | | | TOTAL | 147,90 |

| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3207 197

# ACTA CIV 9002043 MEMORIAS

3208

**CONSORCIO VIAS FONTIBON**

**CONTRATO DE OBRA VIAS-711-2024**

**CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C**

**INTERVENTORIA: ING INGENIERIA**

**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

**COP-711-2024**

**CVI 9002043 RINCON SANTOS**

| | | | | | | | ACTA No. 2 | | | | 11/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.) | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VR. UNITARIO (OFERTADO) | VALOR TOTAL | VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.) | VALOR PARCIAL |
| | | 1. PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 3007 | 1,001 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 989,25 | $ 1.076,00 | $ 1.064.433,00 | | $ 820 | $ - | $ 1.076 | $ - |
| 3022 | 1,002 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M3 | 57,62 | $ 68.594,00 | $ 3.952.620,68 | | $ 52.266 | $ - | $ 68.594 | $ - |
| 3155 | 1,003 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 3,00 | $ 224.713,00 | $ 674.139,00 | 3 | $ 171.223 | $ 513.669 | $ 224.713 | $ 674.139,00 |
| 4613 | 1,004 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 1.864,99 | $ 68.359,00 | $ 127.488.902,48 | 118,79 | $ 52.087 | $ 6.187.315 | $ 68.359 | $ 8.120.232,13 |
| 4850 | 1,005 | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUEL | M3 | 28,50 | $ 350.521,00 | $ 9.989.501,27 | - | $ 267.084 | $ - | $ 350.521 | $ - |
| | | 2. REDES HÚMEDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) | | | | | | | | | |
| 3045 | 2,001 | TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 192.188,00 | $ - | | $ 146.440 | $ - | $ 192.188 | $ - |
| 3225 | 2,002 | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 113,01 | $ 64.977,00 | $ 7.343.050,77 | | $ 49.510 | $ - | $ 64.977 | $ - |
| 3226 | 2,003 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 82.410,00 | $ - | | $ 62.793 | $ - | $ 82.410 | $ - |
| 3227 | 2,004 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 164.949,00 | $ - | | $ 125.685 | $ - | $ 164.949 | $ - |
| 3252 | 2,005 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | | $ 629.010,00 | $ - | | $ 479.282 | $ - | $ 629.010 | $ - |
| 3253 | 2,006 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | | $ 686.981,00 | $ - | | $ 523.454 | $ - | $ 686.981 | $ - |
| 3293 | 2,007 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | | $ 364.692,00 | $ - | | $ 277.882 | $ - | $ 364.692 | $ - |
| 3471 | 2,008 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.) | ML | 6,90 | $ 874.947,00 | $ 6.037.134,30 | 14,93 | $ 666.677 | $ 9.953.487,61 | $ 874.947 | $ 13.062.957,14 |
| 3478 | 2,009 | RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL) | M3 | 161,72 | $ 183.636,00 | $ 29.697.818,09 | 16,18 | $ 139.924 | $ 2.263.410,62 | $ 183.636 | $ 2.970.500,10 |
| 3708 | 2,010 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 1.568,65 | $ 6.747,00 | $ 10.575.832,47 | 1.568,65 | $ 5.137 | $ 8.058.150,61 | $ 6.742 | $ 10.575.516,26 |
| 3723 | 2,011 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 3,00 | $ 119.612,00 | $ 358.836,00 | | $ 91.140 | $ - | $ 119.612 | $ - |
| 3776 | 2,012 | ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 967,65 | $ 56.004,00 | $ 54.192.360,64 | 80,88 | $ 42.673 | $ 3.451.392,24 | $ 56.004 | $ 4.529 607,18 |
| 3878 | 2,013 | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TAPA) | UN | 3,00 | $ 2.278.900,00 | $ 6.836.700,00 | 3 | $ 1.736.437 | $ 5.209.311,00 | $ 2.278.900 | $ 6.836.699,16 |
| 3879 | 2,014 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) | UN | 3,00 | $ 1.367.165,00 | $ 4.101.495,00 | 3 | $ 1.041.729 | $ 3.125.187,00 | $ 1.367.165 | $ 4.101.495,42 |
| 3882 | 2,015 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA) | UN | 4,00 | $ 3.576.707,00 | $ 14.306.828,00 | | $ 2.725.318 | $ - | $ 3.576.707 | $ - |
| 3919 | 2,016 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 819.239,00 | $ - | | $ 624.230 | $ - | $ 819.239 | $ - |
| 4144 | 2,017 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 103.161,00 | $ - | | $ 78.605 | $ - | $ 103.161 | $ - |
| 4262 | 2,018 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 997,86 | $ 6.693,00 | $ 6.678.662,99 | 283,05 | $ 5.100 | $ 1.443.708,00 | $ 6.693 | $ 1.894.722,18 |
| 4792 | 2,019 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMTDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 572,66 | $ 116.684,00 | $ 66.820.237,64 | 201,22 | $ 88.909 | $ 17.889.913,34 | $ 116.684 | $ 23.478.722,27 |
| 4839 | 2,020 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | | $ 718.716,00 | $ - | | $ 547.635 | $ - | $ 718.716 | $ - |
| 4840 | 2,021 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN, | UN | | $ 222.448,00 | $ - | | $ 169.497 | $ - | $ 222.448 | $ - |
| 4842 | 2,022 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | | $ 504.127,00 | $ - | | $ 384.126 | $ - | $ 504.127 | $ - |
| 4843 | 2,023 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | | $ 374.842,00 | $ - | | $ 285.616 | $ - | $ 374.842 | $ - |
| 4878 | 2,024 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 8,00 | $ 158.209,00 | $ 1.265.672,00 | - | $ 120.549 | $ - | $ 158.209 | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4994 | 2,025 | RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA. NO INCLUYE MEDIDOR.). | UN | 12,00 | $ 474.405,00 | $ 5.692.860,00 | | $ 361.479 | $ - | $ 474.405 | $ - |
| 4986 | 2,026 | CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 19,61 | $ 1.174.615,00 | $ 23.035.425,71 | 12,25 | $ 895.013 | $ 10.966.773,29 | $ 1.174.615 | $ 14.392.799,27 |
| 5015 | 2,027 | CAJA DE INSPECCION O 80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M, INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). | UN | 8,00 | $ 733.507,00 | $ 5.868.056,00 | | $ 558.905 | $ - | $ 733.507 | $ - |
| 5171 | 2,028 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT). | UN | | $ 622.436,00 | $ - | | $ 474.273 | $ - | $ 622.436 | $ - |
| 5173 | 2,029 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT). | UN | | $ 463.848,00 | $ - | | $ 353.435 | $ - | $ 463.848 | $ - |
| 5467 | 2,030 | TUBERIA PVC SANITARIA D="8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | ML | 41,55 | $ 177.325,00 | $ 7.367.853,75 | | $ 135.115 | $ - | $ 177.325 | $ - |
| 6538 | 2,031 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 282.308,00 | $ - | | $ 215.108 | $ - | $ 282.308 | $ - |
| 7830 | 2,032 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | | $ 299.865,00 | $ - | | $ 228.486 | $ - | $ 299.865 | $ - |
| 7831 | 2,033 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 2,00 | $ 409.099,00 | $ 818.198,00 | | $ 311.718 | $ - | $ 409.099 | $ - |
| 8350 | 2,034 | YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN | 8,00 | $ 388.787,00 | $ 3.110.296,00 | | $ 296.241 | $ - | $ 388.787 | $ - |
| 8646 | 2,035 | EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" UNEAL SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE REDUCCIÓN U.M PVC 6"X4" (Suministro e Instalación) | UN | | $ 406.982,00 | $ - | | $ 310.105 | $ - | $ 406.982 | $ - |
| 8792 | 2,036 | TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación) | ML | | $ 265.472,00 | $ - | | $ 202.290 | $ - | $ 265.472 | $ - |
| 9109 | 2,037 | CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN). | M3 | 9,82 | $ 740.468,00 | $ 7.270.815,64 | 9,82 | $ 564.209 | $ 5.540.532,38 | $ 740.468 | $ 7.271.394,70 |
| | | 3 PAVIMENTOS | | | | - | | | | | |
| 3454 | 3,001 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 62,83 | $ 140.668,00 | $ 8.838.301,96 | | $ 107.184 | $ - | $ 140.668 | $ - |
| 3710 | 3,002 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 266,70 | $ 6.693,00 | $ 1.781.673,92 | | $ 5.100 | $ - | $ 6.693 | $ - |
| 4015 | 3,003 | GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 416,09 | $ 15.867,00 | $ 6.602.101,09 | | $ 12.090 | $ - | $ 15.867 | $ - |
| 4159 | 3,004 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 86,12 | $ 187.058,00 | $ 16.110.070,96 | 109,48 | $ 142.531 | $ 15.604.316,68 | $ 187.058 | $ 20.479.105,22 |
| 4394 | 3,005 | ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | | $ 136.869,00 | $ - | | $ 104.289 | $ - | $ 136.869 | $ - |
| 8616 | 3,006 | BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humadecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 93,95 | $ 234.594,00 | | 109,48 | $ 178.752 | $ 19.569.797,56 | $ 234.594 | $ 25.683.402,12 |
| | | 4. ESPACIO PUBLICO | | | | - | | | | | |
| 3394 | 4,001 | LOSA DE CONCRETO MR43 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 17,65 | $ 964.195,00 | $ 17.017.951,75 | | $ 734.681 | $ - | $ 964.195 | $ - |
| 3454 | 4,002 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 120,60 | $ 140.668,00 | $ 16.965.108,94 | | $ 107.184 | $ - | $ 140.668 | $ - |
| 3464 | 4,003 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. | M3 | 324,66 | $ 52.093,00 | $ 16.912.590,31 | | $ 39.693 | $ - | $ 52.093 | $ - |
| 3548 | 4,004 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA) | UN | 59,45 | $ 261.489,00 | $ 15.544.686,07 | | $ 199.345 | $ - | $ 261.489 | $ - |
| 3745 | 4,005 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 128,28 | $ 120.397,00 | $ 15.444.883,86 | | $ 91.738 | $ - | $ 120.397 | $ - |
| 4015 | 4,006 | GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 529,04 | $ 15.867,00 | $ 8.394.278,70 | | $ 12.090 | $ - | $ 15.867 | $ - |
| 4054 | 4,007 | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 282,59 | $ 97.601,00 | $ 27.581.150,35 | 70,9 | $ 74.368 | $ 5.272.691 | $ 97.601 | $ 6.919.879,93 |
| 4159 | 4,008 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 90,45 | $ 187.058,00 | $ 16.919.143,77 | 62,262 | $ 142.531 | $ 8.874.265 | $ 187.058 | $ 11.646.585,55 |
| 4232 | 4,009 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 162,80 | $ 8.846,00 | $ 1.440.148,78 | 162,802 | $ 6.740 | $ 1.097.287 | $ 8.846 | $ 1.440.079,25 |
| 4909 | 4,010 | RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR, E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI. | M2 | 98,55 | $ 223.877,00 | $ 22.063.631,57 | | $ 170.585 | $ - | $ 223.877 | $ - |
| 5047 | 4,011 | ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello) | M2 | 147,58 | $ 148.031,00 | $ 21.846.460,71 | | $ 112.794 | $ - | $ 148.031 | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6475 | 4,012 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN). | ML | 55,86 | $ 89.357,00 | $ 4.991.876,11 | 42,70 | $ 68.087 | $ 2.907.315 | $ 89.357 | $ 3.815.560,07 |
| 8166 | 4,013 | CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) | M2 | 10,98 | $ 132.408,00 | $ 1.454.310,42 | | $ 100.890 | $ - | $ 132.408 | $ - |
| 8169 | 4,014 | CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) | M2 | 65,06 | $ 132.408,00 | $ 8.614.857,02 | | $ 100.890 | $ - | $ 132.408 | $ - |
| 8225 | 4,015 | CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA) | UN | 19,81 | $ 2.103.754,00 | $ 41.668.936,07 | | $ 1.602.982 | $ - | $ 2.103.754 | $ - |
| 8464 | 4,016 | BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 7000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN). | ML | 205,45 | $ 68.430,00 | $ 14.059.726,08 | 80,5 | $ 52.141 | $ 4.197.351 | $ 68.430 | $ 5.508.602,80 |
| | | 5. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | | | | | | | | | |
| 3.431 | 5,001 | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 7,00 | $ 687.759,00 | $ 4.814.313,00 | | $ 524.047 | $ - | $ 687.759 | $ - |
| 4.248 | 5,002 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2,3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INC MICROESFERAS) | M2 | 45,17 | $ 183.979,00 | $ 8.301.133,83 | | $ 140.185 | $ - | $ 183.979 | $ - |
| 7.959 | 5,003 | DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0,12 M (E=2,3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS) | ML | 261,09 | $ 22.079,00 | $ 5.764.662,57 | | $ 16.823 | $ - | $ 22.079 | $ - |
| | | 6. REDES SECAS | | | | | | | | | |
| 4342 | 6,001 | CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA RS1-002. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO. ENTREGADOS. | ML | 221,67 | $ 384.874,00 | $ 85.316.281,15 | | $ 293.260 | $ - | $ 384.874 | $ - |
| | | SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE A.I.U.) (A): | | | | $ 792.995.518,47 | | | 137.125.873 | | 173.401.996 |
| | | | | | | | | | Adminis | 25,24% | 33.348.570 | | |
| | | | | | | | | | Imprevisto | 1,00% | 1.321.259 | | |
| | | | | | | | | | utilidad | 4,20% | 5.551.507 | | |
| | | | | | | | | | | | 172.347.210 | | 173.401.996 |
| | | | | | | | | | IVA | 19% | 1.054.786 | | |
| | | | | | | | | | | | 173.401.996 | | 173.401.996 |
| | | | | | | | | | componente B | 7,0283% | 9.286.203 | componente B | 9.286.203 |
| | | | | | | | | | componente C | 1,6791% | 2.218.526 | componente C | 2.218.526 |
| | | | | | | | | | componente D | 2,3030% | 3.042.859 | componente D | 3.042.859 |
| | | | | | | | | | | | 187.949.583 | | 187.949.583 |

| | PORCENTAJE | PESOS |
|---|---|---|
| COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES Y ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) ( B ) | 7,0283% | |
| PLAN DE MANEJO DE TRASITO OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) ( C ) | 1,6791% | |
| COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) ( D ) | 2,3030% | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARAN LAS OFERTAS ECONOMICAS DE ACUERDO A LAS | [illegible] |
| PROVISION PARA OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (F): | $ 599.411.381,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (E) + F): | $ 8.045.657.306,00 |

| AIU % PROPUESTO | PORCENTAJE | FIRMA DEL PROPONENTE |
|---|---|---|
| Administración (% de los CD) | 25,24% | |
| Imprevistos (%de los CD) | 1,00% | |
| Utilidad (%de los CD) | 5,00% | |
| AIU % | 31,24% | |

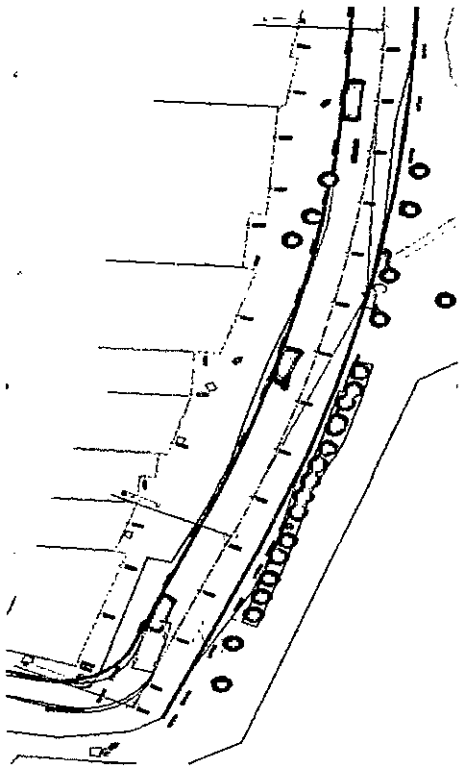
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |


3211 175


**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3155 | UNIDAD | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV | | | | | | | |
| 9002043 |  | | | | | 3,00 | 3 |
| | | | | | total | | 3 |





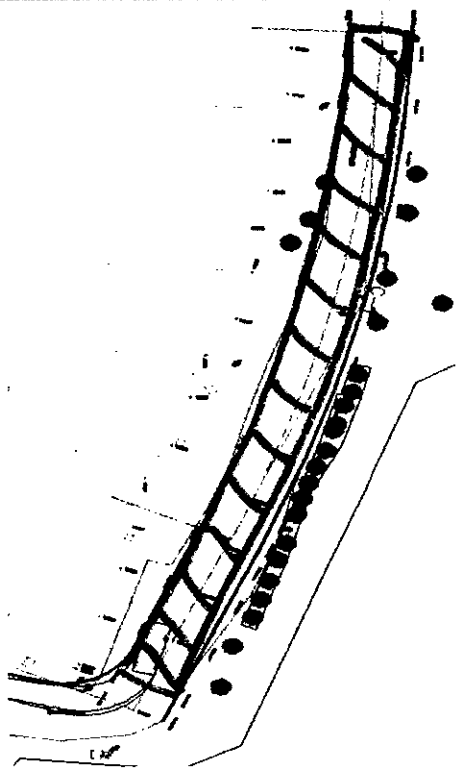
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3212 146


**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2026 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2026 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4613 | m3 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9002043 | | 77,78 | 1,3 | 0,81 | | 1,00 | 81,90 |
| | | 15,78 | 2,75 | 0,85 | | 1,00 | 36,89 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | total | | | | | 118,79 |





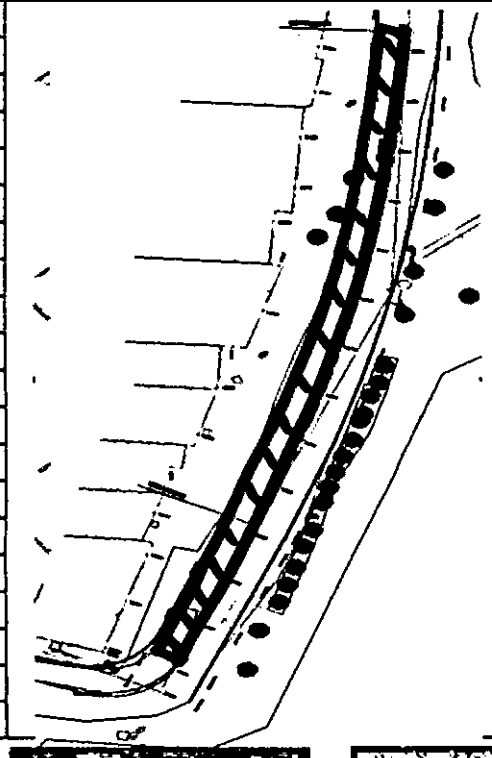

| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3213 ~~179~~

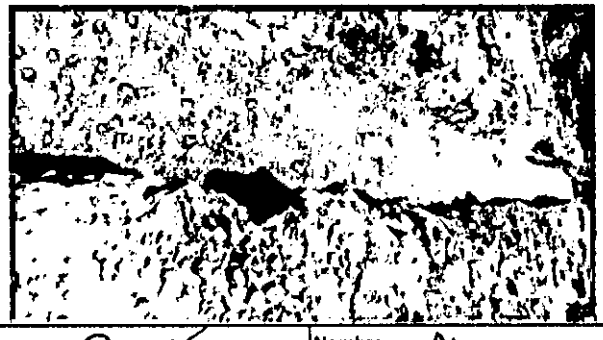
**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3471 | M3 | CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV |  | | | | | | |
| 043 | | 7,40 | | | | 1 | 7,4 |
| | | 7,53 | | | | 1 | 7,53 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 14,93 |





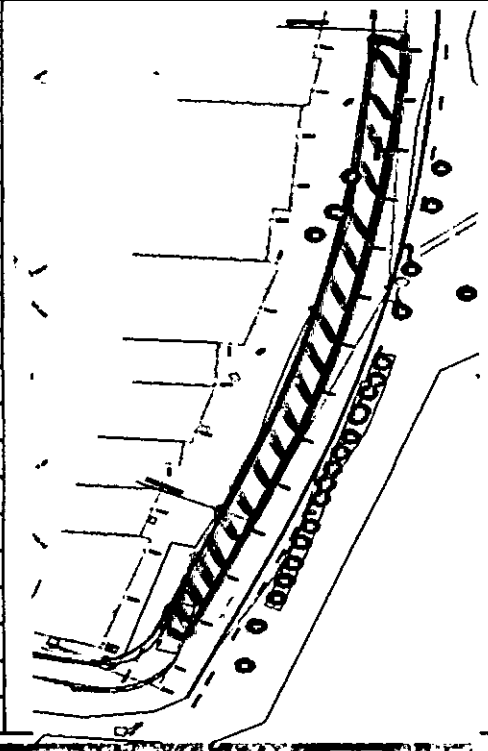
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3214 178

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3478 | M3 | RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICION Y EXTENDIDO MANUAL) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS LARGO | MEDIDAS ANCHO | MEDIDAS ALTO | MEDIDAS AREA | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV | | | | | | | |
| 043 |  | 40,40 | 1,2 | 0,2 | | | 9,696 |
| | | 12,00 | 1,2 | 0,2 | | | 2,88 |
| | | 15,00 | 1,2 | 0,2 | | | 3,6 |
| | | | | TOTAL | | | 16,18 |





| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

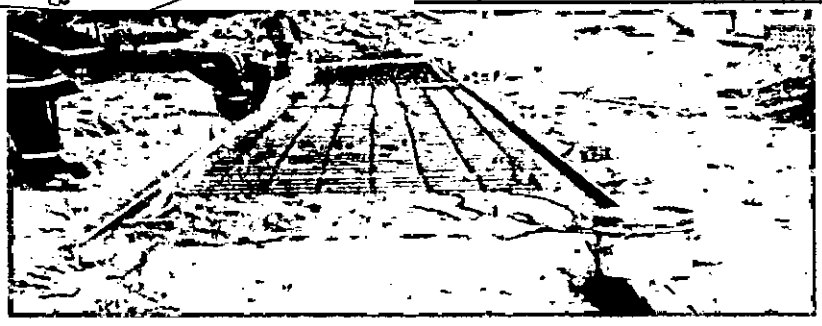
3215 179

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3738 | KG | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 043 | | | | | | | 1.568,65 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 1568,65 |



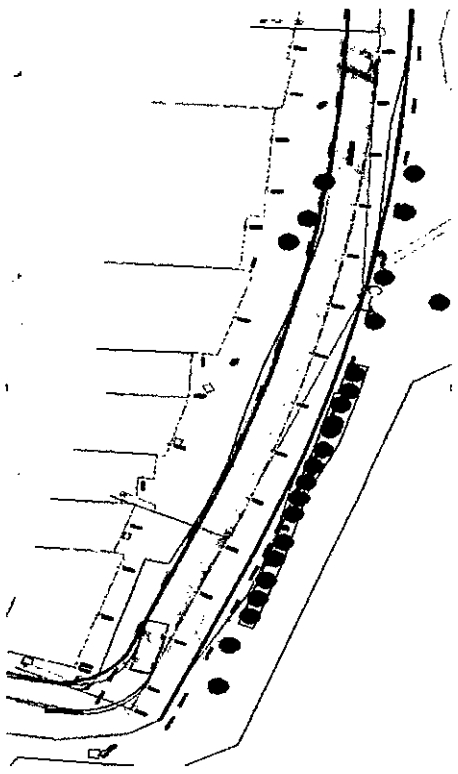
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |


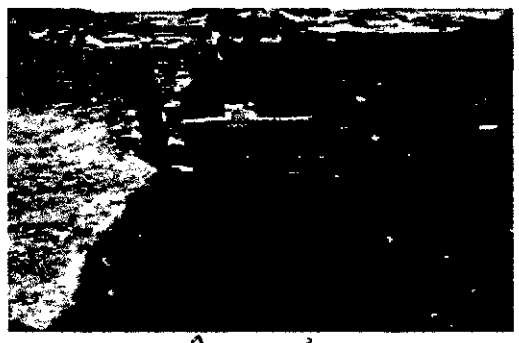
3216 ~~180~~

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3776 | M2 | ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9002043 | | 40,40 | 1,2 | | | 1,00 | 48,48 |
| | | 12,00 | 1,2 | | | 1,00 | 14,4 |
| | | 15,00 | 1,2 | | | 1 | 18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 80,88 |


| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3217

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3878 | UNIDAD | PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9002043 | | | | | | 3,00 | 3 |
| | | | | | | TOTAL | 3 |





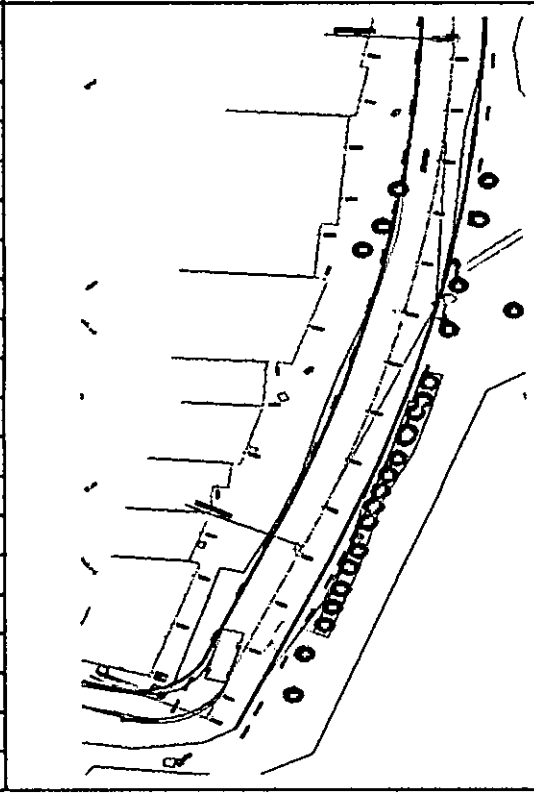
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3218 182

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3879 | UNIDAD | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9002043 |  | | | | | 3,00 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 3 |





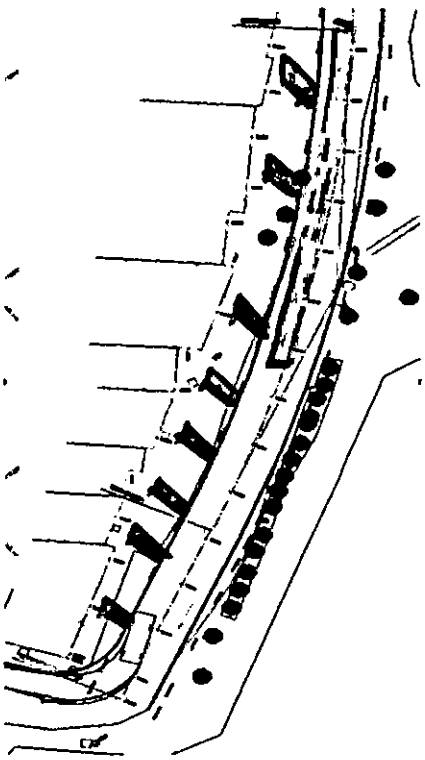
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

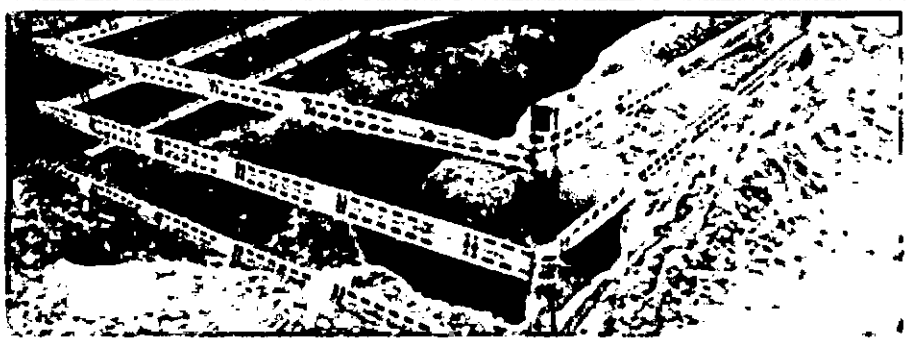
3219 183


**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4262 | m3 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9002043 |  | 40,40 | 1,2 | 3,5 | | | 169,68 |
| | | 12,00 | 1,2 | 3,5 | | | 50,40 |
| | | 15,00 | 1,2 | 3,5 | | | 63,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 283,08 |





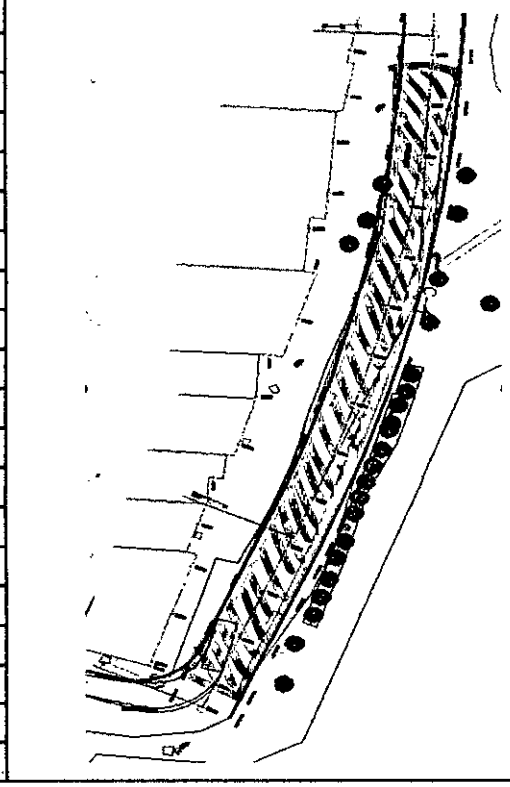

| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3280 184

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4792 | M3 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9002043 | | 40,40 | 1,2 | 3,2 | | | 155,14 |
| | | 12,00 | 1,2 | 3,2 | | | 46,08 |
| | | 15,00 | 1,2 | 3,2 | | | 57,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 201,22 |





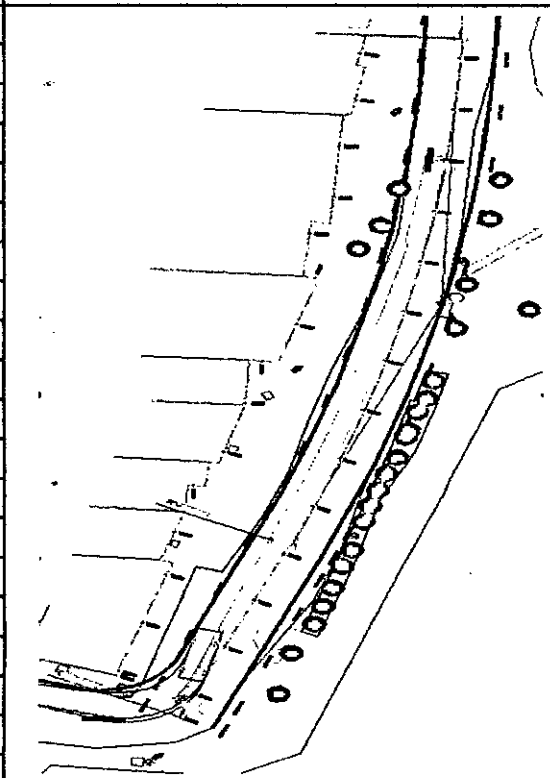
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3221 ~~105~~

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4878 | UNIDAD | CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CAMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9002043 | | 24 | 1,95 | 0,15 | | 7,02 | 7,02 |
| | | 17,8 | 1,96 | 0,15 | | 5,23 | 5,23 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 12,25 |



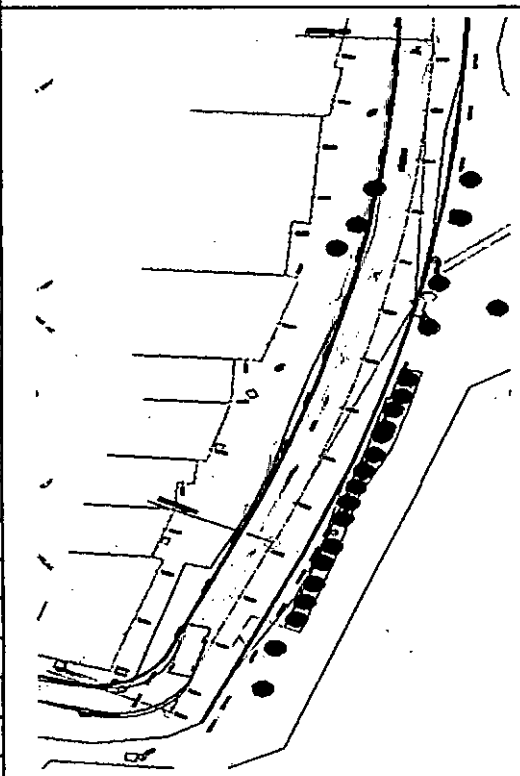
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3222 196

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2026 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2026 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,037 | M3 | CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN). |

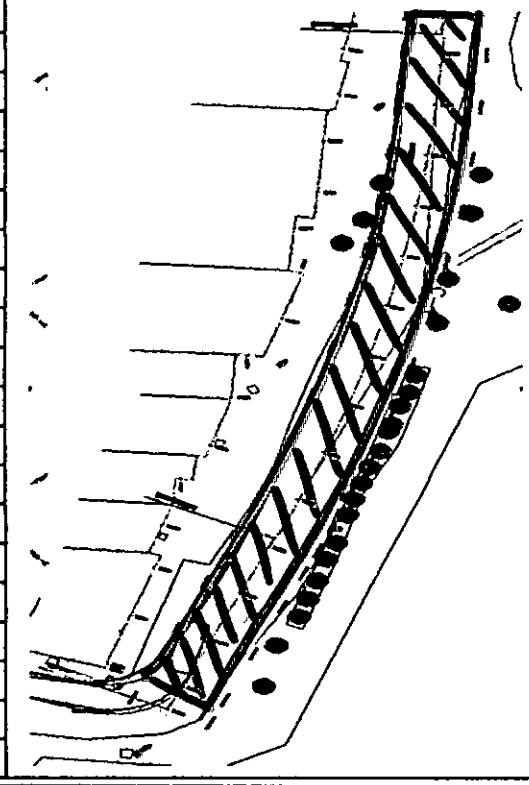
| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9002043 |  | 51,68 | 1,9 | 0,1 | | | 9,82 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |

3223 +187

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

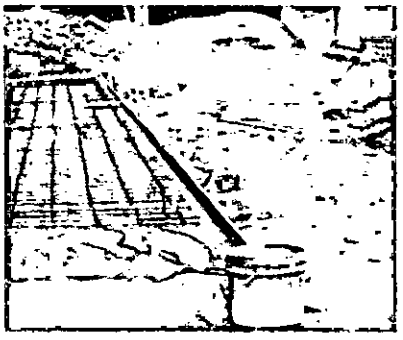
| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3454 | M3 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9002043 |  | 77,8 | 7,036 | 0,2 | | | 109,48 |
| | | | | TOTAL | | | 109,48 |







| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3224 188

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**


| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2026 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2026 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3454 | M3 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9002043 | | 77,8 | 7,036 | 0,2 | | | 109,48 |
| | | | | | TOTAL | | 109,48 |







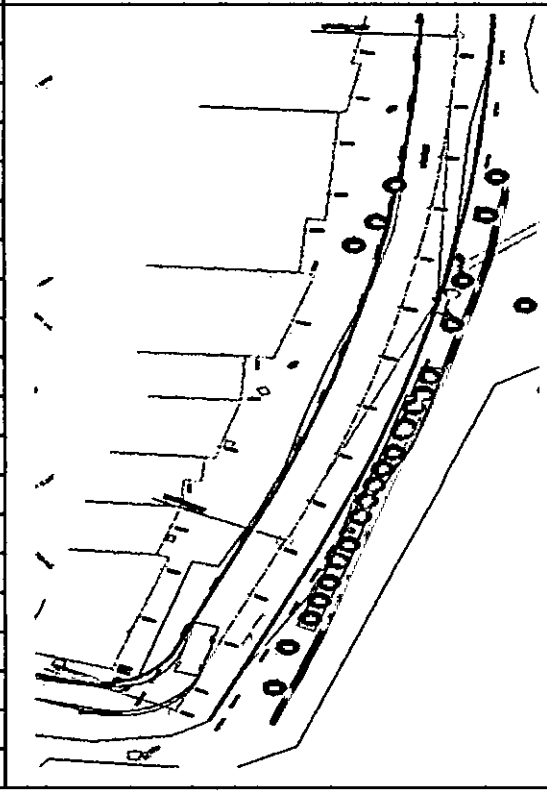
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

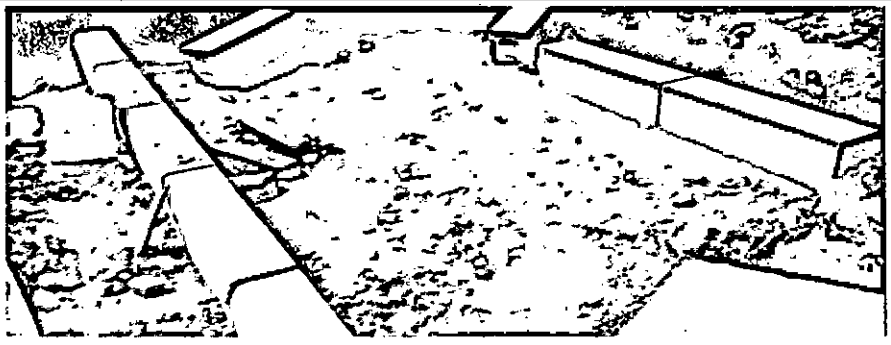
3225 184

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4054 | ML | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9002043 | | 70,9 | | | | 1.00 | 70,9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 70,9 |



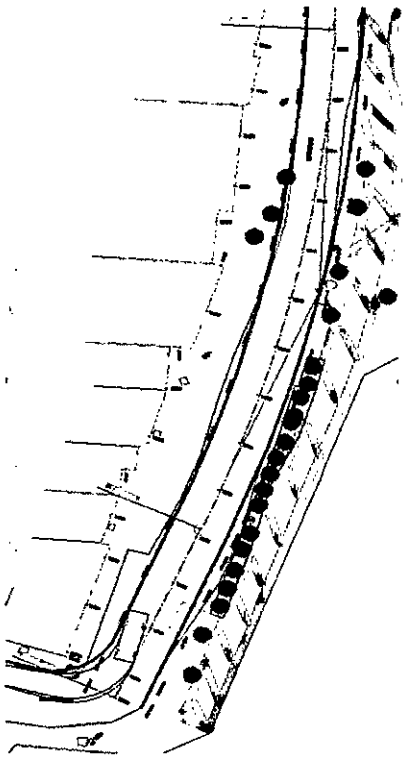
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

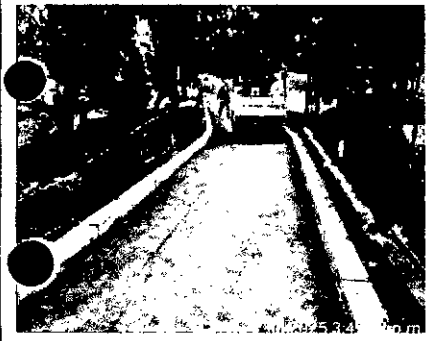
3226 190

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 3454 ✓ | M3 | ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9002043 ✓ | | 69,18 | 4,5 | 0,2 | | 1,00 | 62,262 |
| | | | | | TOTAL | | 62,262 ✓ |





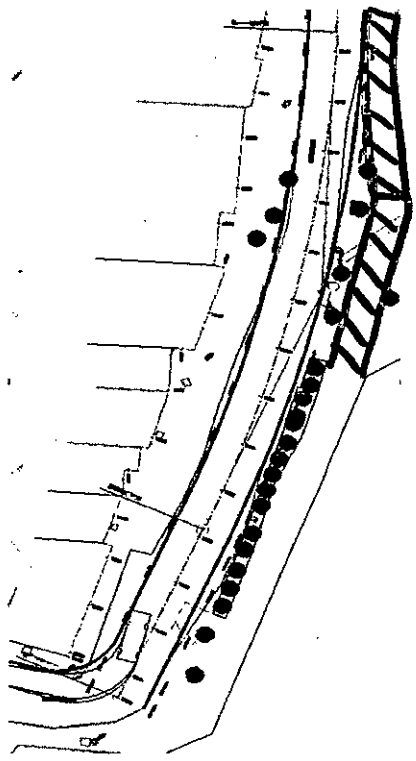
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

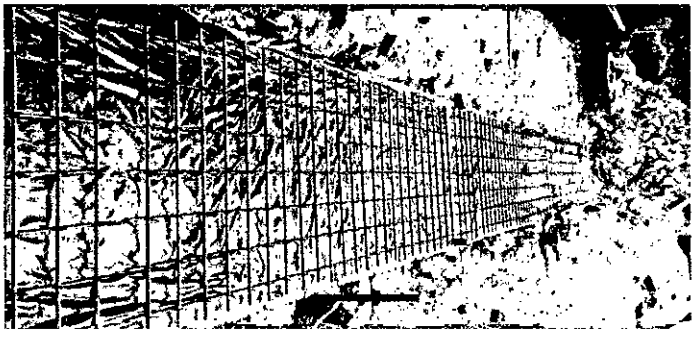
3227 147

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2026 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2026 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4232 | KG | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACIÓN) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9002043 | | | | | | 162,80 | 162,80 |
| | | | | | | TOTAL | 162,8022022 |



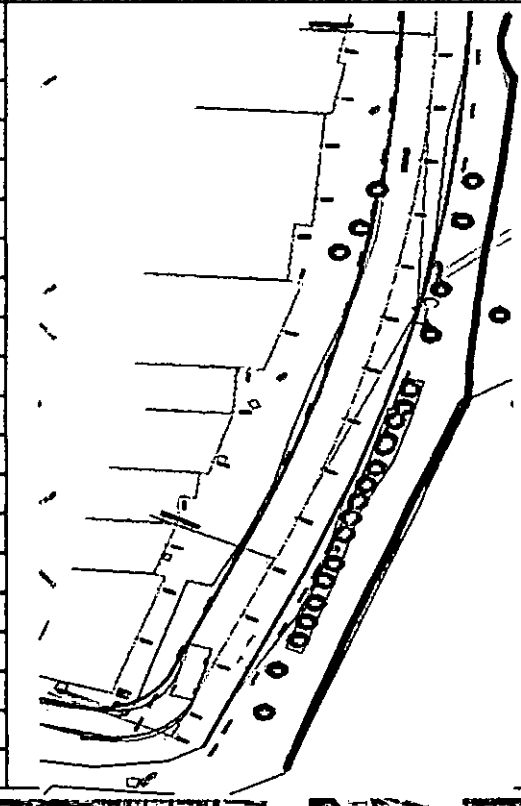
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3288 142

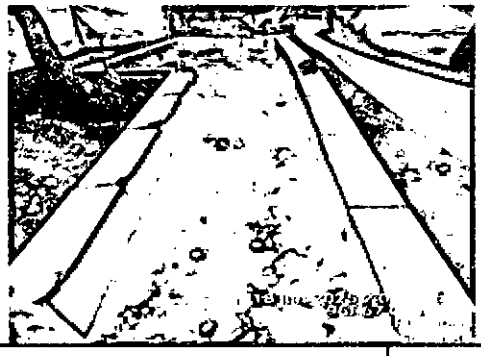
**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

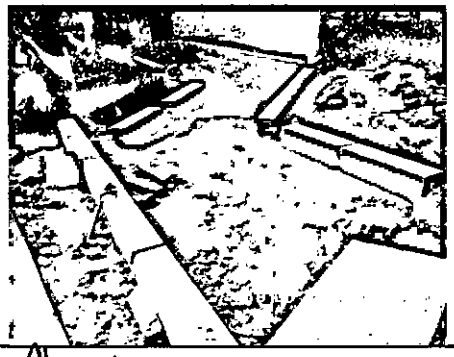
| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 6475 | M3 | BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9002043 |  | 42,7 | | | | 1,00 | 42,7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 42,7 |







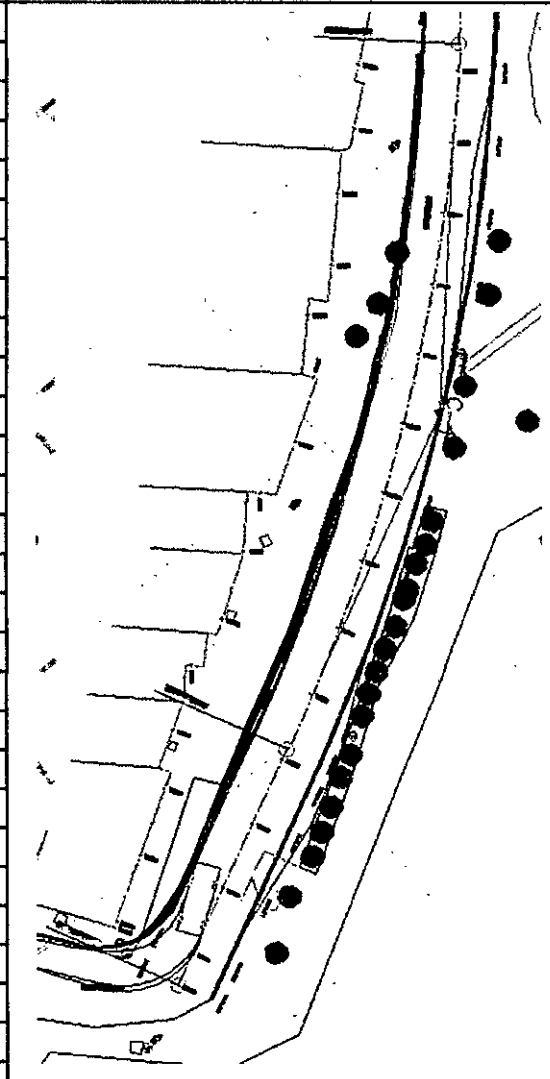
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3229 ~~193~~

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4054 | ML | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9002043 | | 80,5 | | | | 1,00 | 80,5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 80,5 |

| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

**CONSORCIO VIAS FONTIBON**

**CONTRATO DE OBRA VIAS-711-2024**

**CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C**

**INTERVENTORIA: ING INGENIERIA**

**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

**COP-711-2024**

**CVI 9000181 REFUGIO**

| | | | | | | | ACTA No. 2 | | | | 11/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD IDU | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.) | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VR. UNITARIO (OFERTADO) | VALOR TOTAL | VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.) | VALOR PARCIAL |
| | | 1. PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 3007 | 1,001 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 446,08 | $ 1.076,00 | $ 479 930,96 | 445,03 | $ 820 | $ 365.747 | $ 1.076 | $ 480.005,90 |
| 3022 | 1,002 | DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. | M2 | 25,98 | $ 68.594,00 | $ 1.782.155,43 | 25,98 | $ 52.266 | $ 1.357.934 | $ 68.594 | $ 1.782.152,80 |
| 3155 | 1,003 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) | UN | 4,00 | $ 224.713,00 | $ 898.852,00 | 4,00 | $ 171.223 | $ 684.892 | $ 224.713 | $ 898.852,26 |
| 4813 | 1,004 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) | M3 | 840,89 | $ 68.359,00 | $ 57.482.126,30 | 780,78 | $ 52.087 | $ 40.668.488 | $ 68.359 | $ 53.373.323,47 |
| 4850 | 1,005 | DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE). | M3 | 12,65 | $ 350.521,00 | $ 4.504.060,81 | | $ 267.084 | $ - | $ 350.521 | $ - |
| | | 2. REDES HÚMEDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) | | | | | | | | | |
| 9045 | 2,001 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 8722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 8,90 | $ 192.188,00 | $ 1.710.473,20 | 45,40 | $ 146.440 | $ 6.648.376,00 | $ 192.189 | $ 8.725.328,66 |
| 3225 | 2,002 | TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 64.977,00 | $ - | | $ 49.510 | $ - | $ 64.977 | $ - |
| 3226 | 2,003 | TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 82.410,00 | $ - | | $ 62.793 | $ - | $ 82.410 | $ - |
| 3227 | 2,004 | TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 164.949,00 | $ - | | $ 125.685 | $ - | $ 164.949 | $ - |
| 3252 | 2,005 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | | $ 629.010,00 | $ - | | $ 479.282 | $ - | $ 629.010 | $ - |
| 3253 | 2,006 | TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | | $ 686.981,00 | $ - | | $ 523.454 | $ - | $ 686.981 | $ - |
| 3293 | 2,007 | CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | | $ 364.692,00 | $ - | | $ 277.882 | $ - | $ 364.692 | $ - |
| 3471 | 2,008 | CUMPLIMIENTO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0,25M (INC. SUMIN, Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABLE) | ML | 6,90 | $ 874.947,00 | $ 6.037.134,30 | | $ 666.677 | $ - | $ 874.947 | $ - |
| 3478 | 2,009 | RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL) | M3 | 72,92 | $ 183.636,00 | $ 13.390.135,85 | 72,92 | $ 139.924 | $ 10.202.799,94 | $ 183.636 | $ 13.390.154,64 |
| 3708 | 2,010 | ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO POR GD. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GRO) FIGURADO, CORRUGADO. INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | KG | 707,27 | $ 6 742,00 | $ 4.768.425,52 | | $ 5.137 | $ - | $ 6.742 | $ - |
| 3723 | 2,011 | LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES) | UN | 3,00 | $ 119 612,00 | $ 358.836,00 | | $ 91.140 | $ - | $ 119 612 | $ - |
| 3776 | 2,012 | ENTIBADO TIPO ED1. DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 436,29 | $ 56.004,00 | $ 24.434.721,70 | 436,29 | $ 42.673 | $ 18.617.983,41 | $ 56.004 | $ 24.434 741,42 |
| 3878 | 2,013 | PLACA CUBIERTA D=1,70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TAPA) | UN | 3,00 | $ 2.278.900,00 | $ 6.836.700,00 | | $ 1.736.437 | $ - | $ 2.278.900 | $ - |
| 3879 | 2,014 | PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. INST.) | UN | 3,00 | $ 1.367.165,00 | $ 4.101.495,00 | | $ 1.041.729 | $ - | $ 1.367.165 | $ - |
| 3882 | 2,015 | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA) | UN | 2,00 | $ 3.576.707,00 | $ 7 153.414,00 | 4,00 | $ 2.725.318 | $ 10.901.272,00 | $ 3.576.707 | $ 14.306 829,37 |
| 3919 | 2,016 | TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 819.239,00 | $ - | | $ 624.230 | $ - | $ 819.239 | $ - |
| 4144 | 2,017 | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 103 161,00 | $ - | 10,60 | $ 78.605 | $ 833.213,00 | $ 103.161 | $ 1.093.508,74 |
| 4262 | 2,018 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD DM - 3.5M (INCLUYE CARGUE) | M3 | 449,91 | $ 6.693,00 | $ 3.011.271,63 | 449,91 | $ 5.100 | $ 2.294.559,48 | $ 6.693 | $ 3.011.379,87 |
| 4792 | 2,019 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). | M3 | 258,20 | $ 116.684,00 | $ 30.127.873,92 | 258,20 | $ 88.909 | $ 22.956.353,90 | $ 116.684 | $ 30.127.916,23 |
| 4839 | 2,020 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS) | UN | | $ 718.716,00 | $ - | 4,00 | $ 547 635 | $ 2.190.540,00 | $ 718.716 | $ 2.874.864,70 |
| 4840 | 2,021 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 2,00 | $ 222.448,00 | $ 444.896,00 | | $ 169.497 | $ - | $ 222.448 | $ - |
| 4842 | 2,022 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | | $ 504.127,00 | $ - | | $ 384.126 | $ - | $ 504.127 | $ - |
| 4843 | 2,023 | EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). | UN | | $ 374.842,00 | $ - | | $ 285.616 | $ - | $ 374.842 | $ - |
| 4878 | 2,024 | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | 5,00 | $ 158.209,00 | $ 791.045,00 | 4,00 | $ 120.549 | $ 482.196,00 | $ 158.209 | $ 632.834,03 |
| 4984 | 2,025 | RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D=1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.). | UN | 11,00 | $ 474.405,00 | $ 5.218.455,00 | | $ 361.479 | $ - | $ 474.405 | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4936 | 2,029 | CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO). | M3 | 8,84 | $ 1.174.815,00 | $ 10.388.200,05 | | $ 895.013 | $ - | $ 1.174.815 | $ - |
| 5015 | 2,027 | CAJA DE INSPECCION O REGISTRO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (1HO GAL INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA) | UN | 5,00 | $ 733.507,00 | $ 5.667.535,00 | 4,00 | $ 558.905 | $ 2.233.620,00 | $ 733.507 | $ 2.934.027,69 |
| 5171 | 2,028 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PP, REPOSICIÓN DE CAMILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6,54MT) | UN | | $ 622.436,00 | $ - | | $ 474.273 | $ - | $ 622.436 | $ - |
| 5173 | 2,029 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PP REPOSICIÓN DE CAMILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=5 MT) | UN | | $ 463.848,00 | $ - | | $ 353.435 | $ - | $ 463.848 | $ - |
| 5467 | 2,030 | TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 177.375,00 | $ - | | $ 135.215 | $ - | $ 177.375 | $ - |
| 8539 | 2,031 | TUBERIA PVC U M. CXI COMUSADO/ANT USO U M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 282.308,00 | $ - | | $ 215.109 | $ - | $ 282.308 | $ - |
| 7830 | 2,032 | COMEDONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | | $ 299.865,00 | $ - | | $ 228.486 | $ - | $ 299.865 | $ - |
| 7831 | 2,033 | COMEDONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | UN | | $ 409.099,00 | $ - | | $ 311.718 | $ - | $ 409.099 | $ - |
| 8350 | 2,034 | YEE PVC SANITARIA D=8" X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | | $ 588.787,00 | $ - | 4,00 | $ 298.241 | $ 1.184.964,00 | $ 389.787 | $ 1.559.148,75 |
| 8846 | 2,035 | EMPATE DE TUBERÍA (SI PVC A PVC 8"X8" U NI AL SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE REDUCCIÓN U M PVC 8"X4" (Suministro e Instalación) | UN | | $ 408.982,00 | $ - | | $ 310.705 | $ - | $ 408.982 | $ - |
| 8792 | 2,036 | TUBERIA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación) | ML | 45,90 | $ 265.472,00 | $ 12.185.164,80 | 45,90 | $ 202.280 | $ 9.284.652,00 | $ 265.472 | $ 12.185.177,28 |
| 9109 | 2,037 | CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN). | M3 | 4,43 | $ 740.468,00 | $ 3.278.781,24 | | $ 564.209 | $ - | $ 740.468 | $ - |
| | | 3 PAVIMENTOS | | | | | | | | | |
| 3454 | 3,001 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 76,17 | $ 140.668,00 | $ 10.714.295,36 | | $ 107.184 | $ - | $ 140.668 | $ - |
| 8710 | 3,002 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE) | M3 | 170,51 | $ 6.695,00 | $ 1.141.290,12 | | $ 5.100 | $ - | $ 6.695 | $ - |
| 4015 | 3,003 | GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 190,17 | $ 15.867,00 | $ 3.017.349,11 | | $ 12.090 | $ - | $ 15.867 | $ - |
| 4159 | 3,004 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBS_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 45,90 | $ 187.058,00 | $ 8.583.213,92 | | $ 142.551 | $ - | $ 187.058 | $ - |
| 4394 | 3,005 | ADOQUIN DE CONCRETO TX, PISADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | | $ 148.869,00 | $ - | | $ 113.389 | $ - | $ 148.869 | $ - |
| 8616 | 3,006 | BASE GRANULAR CLASE A (BBA_MEST) o (BGA_MGS) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador) | M3 | 39,73 | $ 234.584,00 | | | $ 178.752 | $ - | $ 234.584 | $ - |
| | | 4 ESPACIO PUBLICO | | | | | | | | | |
| 3394 | 4,001 | LOSA DE CONCRETO N041 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS) | M3 | 7,73 | $ 964.195,00 | $ 7.450.022,35 | | $ 734.681 | $ - | $ 964.195 | $ - |
| 3454 | 4,002 | ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO) | M3 | 52,79 | $ 140.668,00 | $ 7.426.197,50 | | $ 107.184 | $ - | $ 140.668 | $ - |
| 3464 | 4,003 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE | M3 | 143,10 | $ 52.095,00 | $ 7.452.516,99 | | $ 39.695 | $ - | $ 52.095 | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3548 | 4,006 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M53 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA) | UN | 25,45 | $ 261.499,00 | $ 6.654.080,07 | | $ 199.245 | $ - | $ 261.499 | $ - | | | |
| 3745 | 4,005 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) | M2 | 55,99 | $ 120.597,00 | $ 6.749.759,53 | | $ 91.723 | $ - | $ 120.597 | $ - | | | |
| 4025 | 4,006 | GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 224,48 | $ 15.867,00 | $ 3.561.783,00 | | $ 12.090 | $ - | $ 15.867 | $ - | | | |
| 4054 | 4,007 | SARDINEL TIPO A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) | ML | 125,13 | $ 97.003,00 | $ 12.212.749,39 | 83,6 | $ 74.358 | $ 8.217.155 | $ 97.003 | $ 8.159.407,09 | | | |
| 4159 | 4,008 | SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) | M3 | 39,59 | $ 187.058,00 | $ 7.405.671,45 | | $ 142.591 | $ - | $ 187.058 | $ - | | | |
| 4232 | 4,009 | MALLA ELECTROSOLDADA D.1500.15MI, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | KG | 48,19 | $ 8.845,00 | $ 426.214,45 | | $ 6.740 | $ - | $ 5.946 | $ - | | | |
| 4909 | 4,010 | RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACARAD E N ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI. | M2 | 43,44 | $ 229.877,00 | $ 9.725.018,56 | | $ 170.586 | $ - | $ 223.877 | $ - | | | |
| 5047 | 4,011 | ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X8cm) (Suministro e instalación, incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello) | M2 | 65,03 | $ 148.051,00 | $ 9.629.098,78 | | $ 112.794 | $ - | $ 148.051 | $ - | | | |
| 6475 | 4,012 | BORDILLO PREFABRICADO A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN) | ML | 72,67 | $ 89.357,00 | $ 2.027.713,96 | | $ 69.087 | $ - | $ 89.357 | $ - | | | |
| 9166 | 4,013 | CUNETA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X8) CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) | M2 | 3,27 | $ 132.408,00 | $ 433.696,11 | | $ 100.890 | $ - | $ 132.408 | $ - | | | |
| 8159 | 4,014 | CUNETA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X8) CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO) | M2 | 27,85 | $ 132.408,00 | $ 3.688.344,23 | | $ 100.890 | $ - | $ 132.408 | $ - | | | |
| 8225 | 4,015 | CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.40X1.20M, INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA) | UN | | $ 2.109.754,00 | $ - | | $ 1.602.992 | $ - | $ 2.109.754 | $ - | | | |
| 8484 | 4,016 | BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 15CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (*INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN) | ML | 89,39 | $ 68.430,00 | $ 6.115.992,91 | | $ 52.141 | $ - | $ 68.430 | $ - | | | |
| | | 5. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| 3.431 | 5,001 | SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | UN | 3,03 | $ 687.799,00 | $ 2.083.777,00 | | $ 524.047 | $ - | $ 687.799 | $ - | | | |
| 4.248 | 5,002 | DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (0.4x2.3MM, TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS) | M2 | 20,34 | $ 183.979,00 | $ 3.742.830,57 | | $ 140.185 | $ - | $ 183.979 | $ - | | | |
| 7.959 | 5,003 | DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2,3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS) | ML | 117,72 | $ 72.079,00 | $ 2.799.167,88 | | $ 16.823 | $ - | $ 22.079 | $ - | | | |
| | | 6. REDES SECAS | | | | | | | | | | | | |
| 6342 | 6,001 | CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-DD (96" EPM NORMA RSI-003, INCLUYE); EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, (ENTRADAS) | ML | 95,75 | $ 384.874,00 | $ 36.858.871,71 | | $ 293.200 | $ - | $ 384.874 | $ - | | | |
| | | SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE A.I.U.) (A) | | | | $ 563.366.513,95 | | | $ 137.136.753 | | $ 179.965.151 | | | |
| | | | | | | | | | | Adminis | 25,74% | 34.610.799 | | |
| | | | | | | | | | | Imprevista | 1,00% | 1.171.268 | | |
| | | | | | | | | | | Utilidad | 4,20% | 5.761.628 | | |
| | | | | | | | | | | | | 178.670.443 | | 179.965.151 |
| | | | | | | | | | | IVA | 19% | 1.094.709 | | |
| | | | | | | | | | | | | 179.965.151 | | 179.965.151 |
| | | | | | | | | | | componente B | 7,0279% | 9.637.680 | componente B | 9.637.680 |
| | | | | | | | | | | componente C | 1,6791% | 2.302.495 | componente C | 2.302.495 |
| | | | | | | | | | | componente D | 1,3070% | 1.158.079 | componente D | 1.158.079 |
| | | | | | | | | | | | | 195.063.355 | | 195.063.355 |

| | PORCENTAJE | PESOS |
|---|---|---|
| COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES Y ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) ( B ) | 7,0279% | |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) ( C ) | 1,6791% | |
| COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) ( D ) | 1,3070% | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARAN LAS OFERTAS ECONOMICAS DE | $ [illegible] |
| PROVISION PARA OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (F): | $ 509.411.381,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (E) + (F): | $ 8.045.557.306,00 |

| A.I.U.S PROPUESTO | PORCENTAJE | FIRMA DEL PROPONENTE |
|---|---|---|
| Administración (% de los CD) | 25,74% | |
| Imprevistos (%de los CD) | 1,00% | |
| Utilidad (%de los CD) | 5,00% | |
| AIU % | 31,74% | |

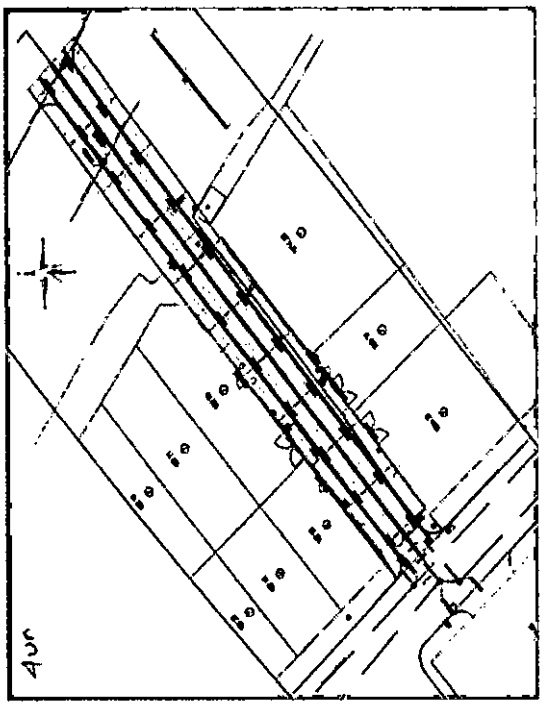
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3233 197

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024. | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 1,001 | M2 | REPLANTEO GENERAL |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | 74,34 | 6,00 | | | 446,03 | 446,03 |
| | | | | | total | | 446,03 |



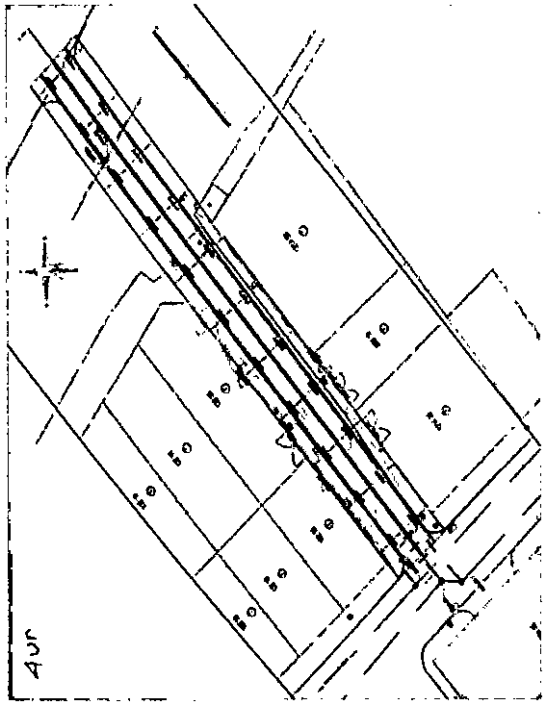
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3234
198

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 1,002 | M3 | DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES. |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV PERIODO DESDE: 12 DE |  | 43,30 | 6,00 | 0,10 | | 25,98 | 25,98 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | total | | | | | 25,98 |



| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

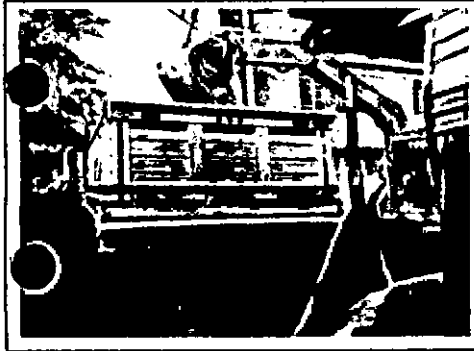
3257 799

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4613 | m3 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 | | 86,75 | 5 | 1,8 | | 1,00 | 780,78 |
| | | | | | total | | 780,78 |







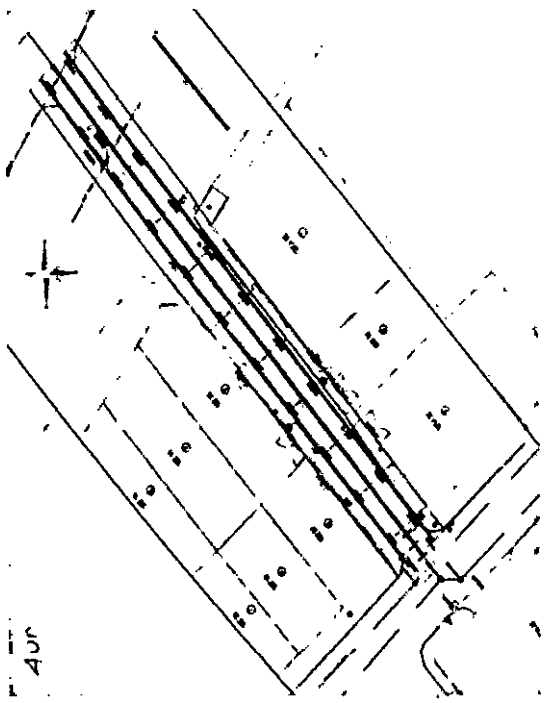
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

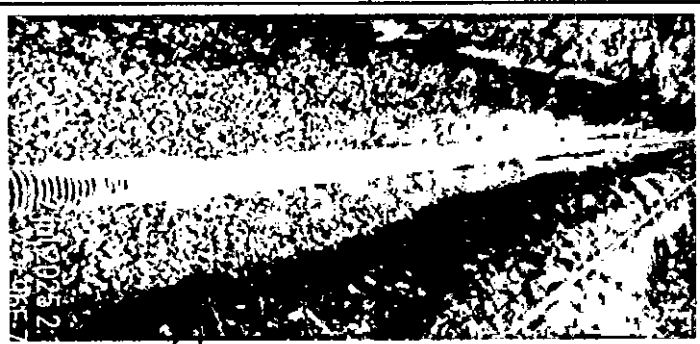
32236 200

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,001 | ML | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | 45,40 | | | | | 45,40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | 45,40 |



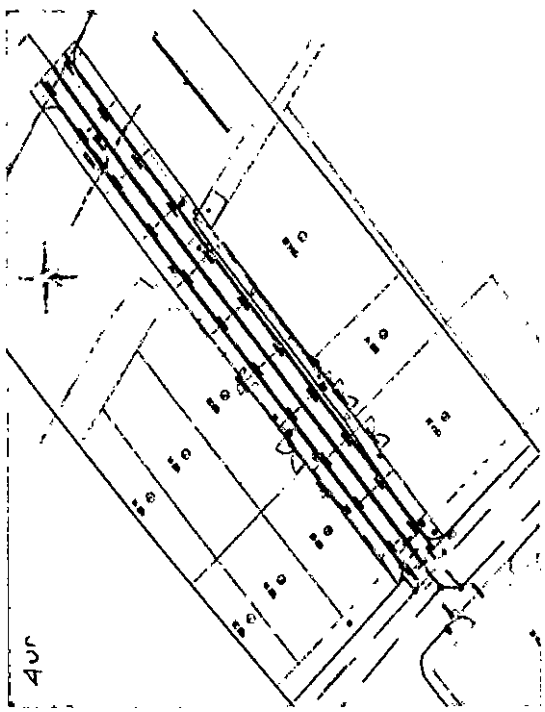
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3237 204

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,009 | M3 | RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | 60,76667 | 1,2 | 1 | | 72,92 | 72,92 |
| | | | | | TOTAL | | 72,92 |

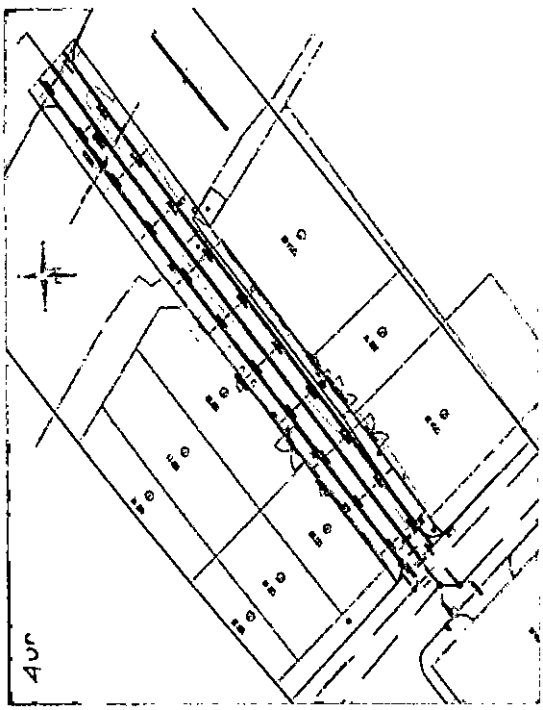
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3238 202

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,012 | M2 | ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | 87,258 | 5 | | 436,29 | | 436,29 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 436,29 |

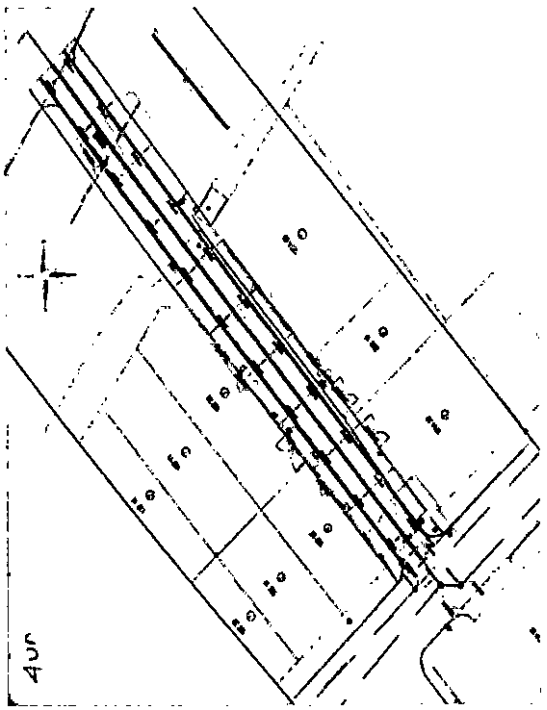
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3239 203

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,015 | UN | SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9000181 | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 4 |

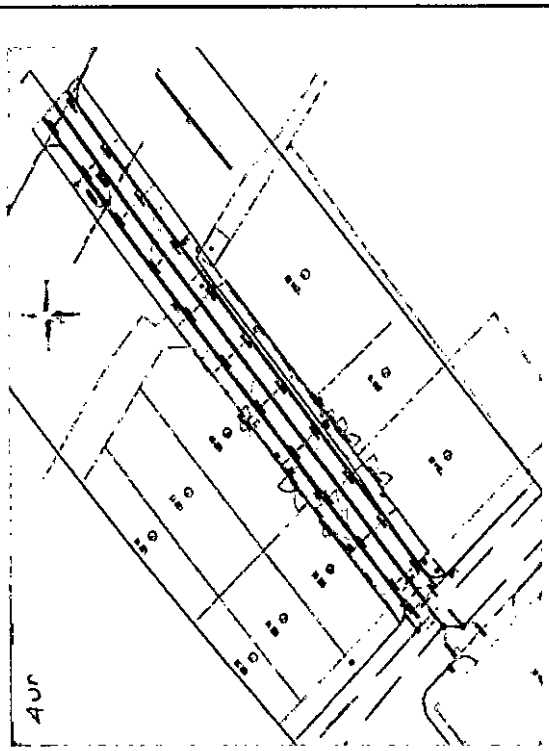
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3240 204

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,017 | ML | TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9000181 | | 10,6 | | | | 10,60 | 10.60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 10.60 |




| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3241 205

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,018 | M3 | EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 | | 195,61 | 1,2 | 1,9 | | | 449,91 |
| | | | | | TOTAL | | 449,91 |



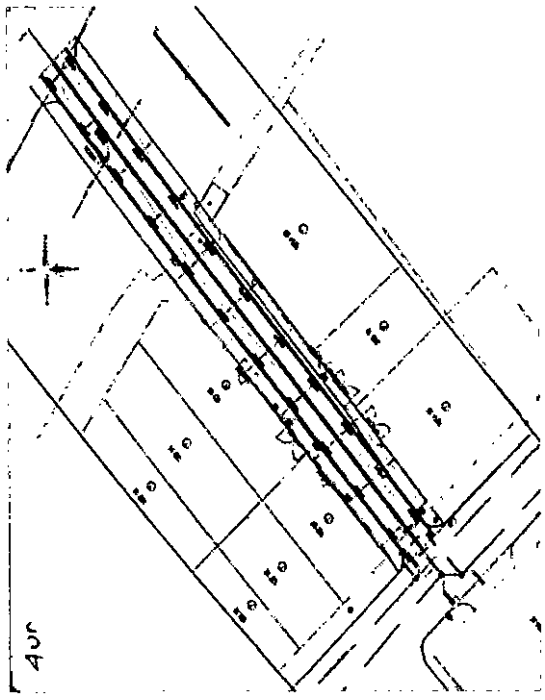
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3242 206

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,019 | M3 | RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM). |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | 112,26 | 1,2 | 1,9 | | | 258,2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 258,20 |



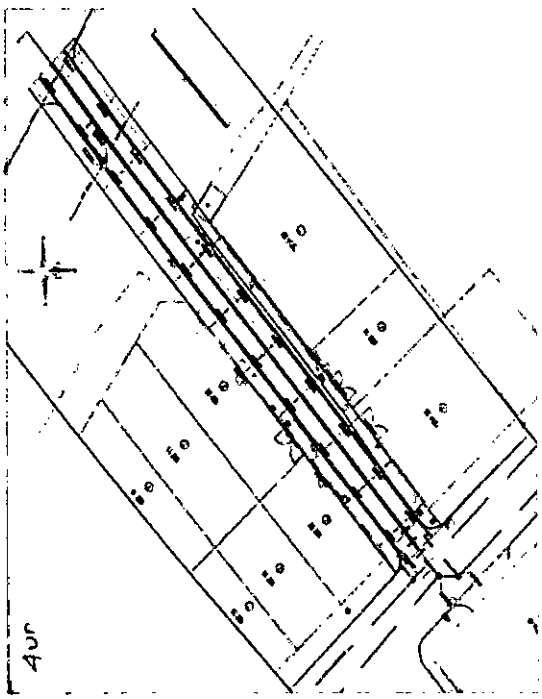
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3243207

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,020 | UN | EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGUN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS). |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | | | | | 4 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 4,00 |



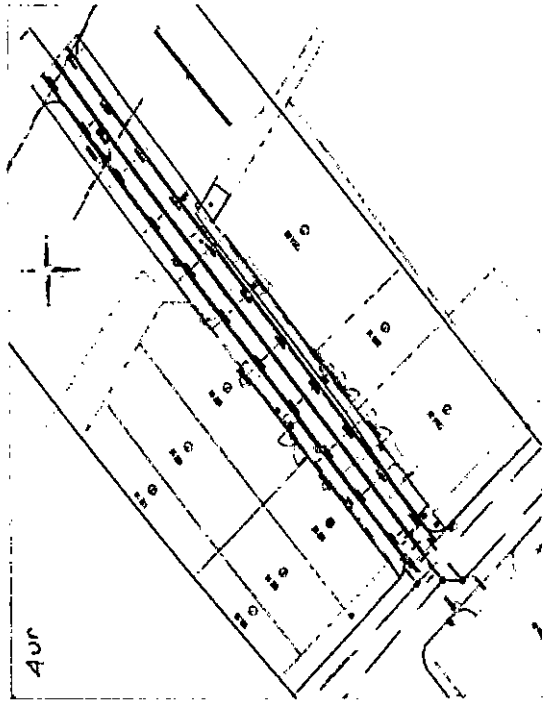
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3244 208

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 1,003 | M3 | DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | | | | | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | total | 4,00 |



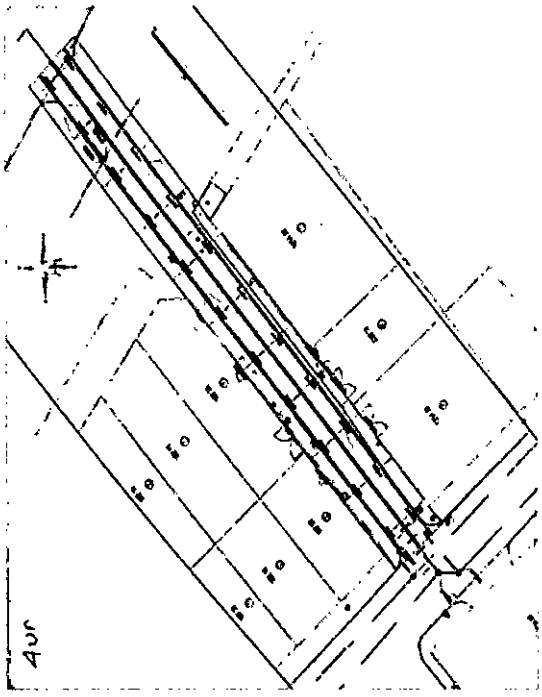
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

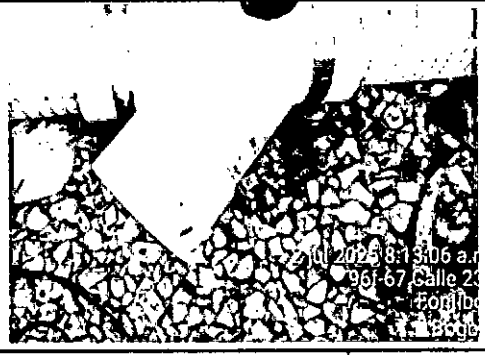
3245 209

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,024 | UN | CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | | | | | 4 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 4,00 |



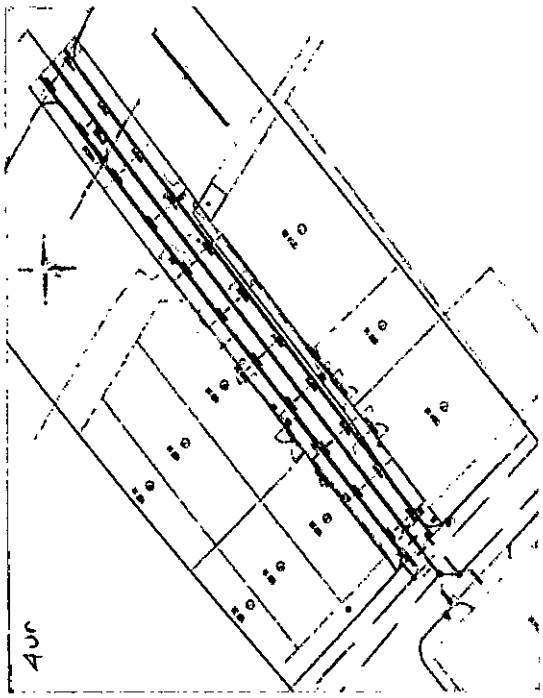

| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3246 270

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,027 | UN | CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA). |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | | | | | 4 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 4,00 |

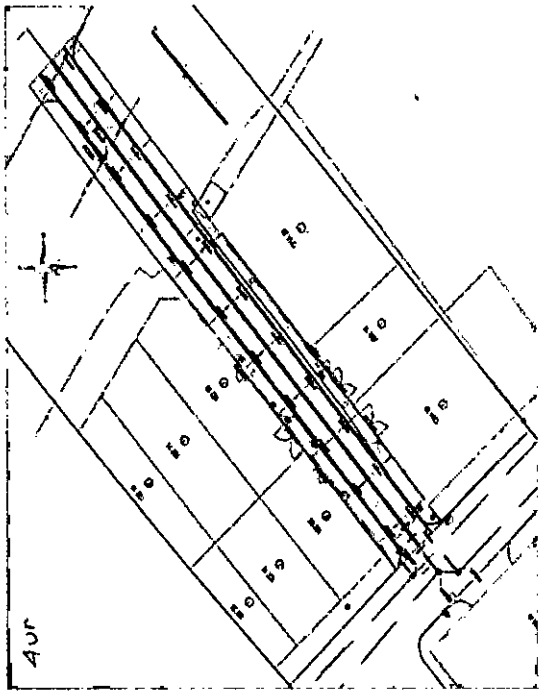
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3247 277

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,034 | UN | YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV | | | | | | | |
| 9000181 |  | | | | | 4 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 4,00 |

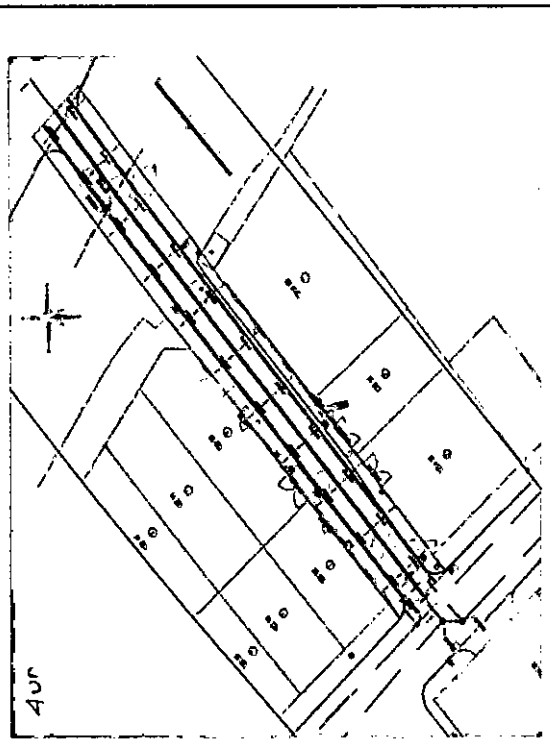
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3248 272

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 2,036 | ML | TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9000181 | | 45,9 | | | | 45,90 | 45,90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 45,90 |

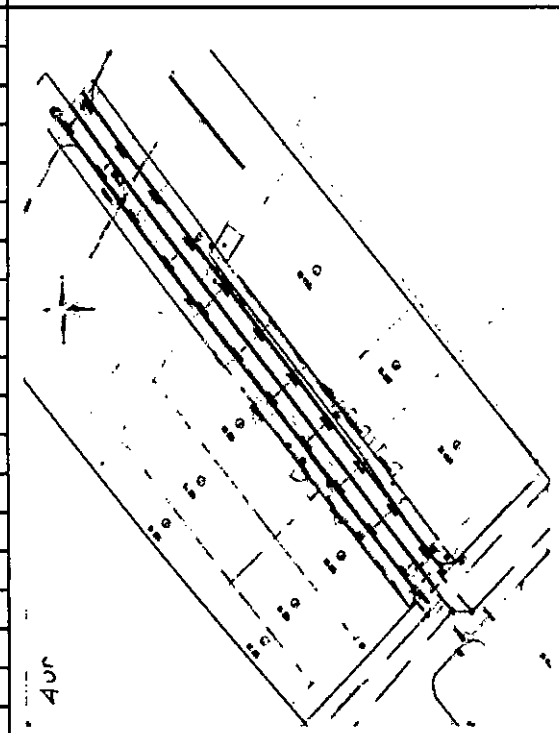
| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |


3249 293

**CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

| CONTRATO 711-2024 | INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS | DIRECCION: | LOCALIDAD DE FONTIBON |
|---|---|---|---|
| PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025 | HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025 | | ACTA DE OBRA N° 2 |

| CODIGO | UNIDAD | ACTIVIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| 4,007 | ML | SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) |

| UBICACIÓN | ESQUEMA | MEDIDAS | | | | ELEMENTOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | | |
| CIV |  | | | | | | |
| 9000181 | | 83,60 | | | | 83,60 | 83,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | 83,60 |



| Nombre | Nombre | Nombre |
|---|---|---|
| VoBo Residente de obra | VoBo Director de obra | VoBo Interventoria |

3250

Info mens

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-127-25**

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2025

Alcaldía Local de Fontibon
R No. 2025-591-009895-2
2025-08-22 16:19 - Folios: 1 Anexos: 933
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: ING INGENIERIA SAS

Señores:
**ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN**
**Att. Dra. ADRIANA YANETH ORTIZ UBAQUE**
Alcaldesa Local de Fontibón
Carrera 99 No. 19 – 43
cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-COP-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024 – REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA NO. 6 – VERSION 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2025.

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de interventoría para el Contrato FDLF-CIV-717-2024, por medio del presente se remite a la Entidad Contratante el Informe Mensual de Interventoría No. 6 V0 de los componentes Técnico, Gestión Social, Ambiental y SST correspondientes al período del 12 de Julio al 11 de Agosto de 2025 de la siguiente manera:

- Informe mensual No. 6 V0 Componente Gestión Social.
- Informe mensual No. 6 V0 Componente Técnico
- Informe mensual No. 6 V0 Componente Ambiental.
- Informe mensual No. 6 V0 SST.

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-127-25**

La documentación soporte puede ser consultada en la información anexa y el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1FX7__Fy6KAkQvFyzpNQohzPG8kFA0ioL?usp=sharing

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1FX7__Fy6KAkQvFyzpNQohzPG8kFA0ioL?usp=sharing
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Daniel Felipe Duitama Vargas– Ingeniero residente
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

933 folios

CONTRATO FDLF-COP-711-2024
Fondo de Desarrollo Local de Fontibón

Ejecutar a precios fijos y a monto agotable las actividades de construcción de la malla vial y espacio público derivados del contrato de consultoría 440 de 2022, de la Localidad de Fontibón

# INFORME DE GESTIÓN SOCIAL No.6

Periodo del 12 de julio al 11 de agosto de 2025




Contratista

CONSORCIO VIAS FONTIBÓN 2024

BOGOTÁ D.C
2025

## Control de revisión

| Versión | Fecha | Descripción Modificación | Folios |
|---|---|---|---|
| V.0 | 14/08/2025 | Entrega Informe de Gestión Social No.6 versión V.0 | 76 |

| Elaboró | Revisó | Revisó Interventoría | Aprobó Interventoría |
|---|---|---|---|
| Firma:  | Firma:  |  |  |
| Nombre: Lida Perdomo | Nombre:Michael Herrera | Nombre: Paola Amaya | Nombre:Alejandro Galindo |
| Cargo: Residente social | Cargo: Director de Obra | Cargo: Residente social | Director de interventoria |

## TABLA DE CONTENIDO


INTRODUCCIÓN ..... 5

1. CONTEXTUALIZACIÓN ..... 6

2.1 INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ..... 8

1.3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA ..... 9

Área de influencia indirecta del proyecto. ..... 9

Área de influencia directa del proyecto. ..... 9

3. OBJETIVOS ..... 11

3.1 Objetivo General ..... 11

3.2 Objetivos específicos ..... 11

4. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL ..... 12

4.1 Programa de Divulgación e información ..... 12

4.1.1 Entrega de volantes y/o afiches informativos ..... 12

4.1.2 Instalación de Puntos Satélites de Información ..... 15

4.1.3 Reuniones de inicio y/o socialización ..... 15

4.1.4 Reuniones extraordinarias, de avance y/o finalización de obras ..... 16

4.2 Programa de acompañamiento a las actividades técnicas ..... 16

4.2.1 Actas de vecindad de inicio ..... 17

4.2.2 Actas de vecindad de cierre ..... 18

4.2.3 Actas de Compromiso ..... 18

4.3 Programa de Atención a la ciudadanía ..... 18

4.4 Programa de Sostenibilidad ..... 20

4.4.1 Plegable de sostenibilidad ..... 20

4.5 Programa de manejo de Impactos en el sector comercial ..... 20

4.6 Programa de Generación de Empleo ..... 20

4.7 Programa de Aseguramiento de la calidad ..... 22

4.7.1 Seguimiento y evaluación ..... 22

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Segmentos viales priorizados para intervención. ....7
Tabla 2. Condiciones generales del Contrato ....8
Tabla 3. Área de Influencia Directa por corredores viales. ....10
Tabla 4. Distribución de volantes y/o afiches generados en el periodo. ....13
Tabla 5. Actas de vecindad de inicio levantadas a la fecha. ....17
Tabla 6. Reporte generación de empleo ....21
Tabla 7. Asuntos sociales tratados en comités. ....22

## LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Aprobación de piezas en el periodo. ....15
Anexo 2. Soportes de entrega de piezas en el periodo. ....15
Anexo 3. Control de Puntos de información. ....15
Anexo 4. Gestión reunión Bahía Solano. ....16
Anexo 5. Soportes reunión acueducto. ....17
Anexo 6. Trazabilidad actas de vecindad ....18
Anexo 7. Soportes de solicitudes ciudadanas ....20
Anexo 8. Registro de Generación de Empleo. ....21
Anexo 9. Trazabilidad Informe Social No. 5. ....22

## INTRODUCCIÓN

Las obras civiles son hechas por y para una comunidad en particular, no podemos desligar las obras del medio social en el que se desarrollan porque son las personas quienes le dan el sentido, la consolidación de la malla vial como parte del desarrollo local es necesaria porque redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes mejorando las condiciones de la movilidad, los tiempos de desplazamiento, la seguridad vial y la conectividad del sector; sin embargo, es inevitable alterar la dinámica social alrededor de las vías durante su proceso de construcción, por consiguiente, con el propósito de mitigar y controlar los efectos negativos de las obras y por otro lado promover los beneficios y el cuidado de las mismas este documento presenta las actividades orientadas a este fin, en las que ha avanzado el área de Gestión Social en el marco del contrato FDLF-COP-711-2024 durante el periodo del 12 de julio a 11 de agosto de 2025.

Empezando por contextualizar el contrato y siguiendo con el reporte de las actividades desarrolladas en este periodo desde el componente social este documento da cuenta del avance del Plan de Gestión Social ideado para responder a las obligaciones definidas para el área desde los estudios previos y la documentación contractual.

## 1. CONTEXTUALIZACIÓN

Desde el Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" y, partiendo de la información proporcionada por el IDU en el año 2023 sobre el estado de la malla vial en Bogotá donde se identifica las necesidades de mantenimiento, rehabilitación y/o reconstrucción vial se tiene los primeros hallazgos sobre la necesidad de construcción en la malla vial local de Fontibón.

Así mismo, considerando que los Fondos de Desarrollo Local son responsables de la construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local, se elaboró el Proyecto 180 "Un nuevo contrato para la movilidad de Fontibón" que, alineado al Programa de movilidad segura, sostenible y accesible, se diseñó para identificar y atender las necesidades locales al respecto. En razón de lo anterior, desde el área de infraestructura de la Alcaldía Local se hizo un diagnóstico de vías donde se determinó el estado de cada uno de los segmentos que conforman los 35.76 KM/Carril[1] pertenecientes a la malla vial local evaluadas bajo el método denominado Índice de Condición de Pavimento que se hace a través de un estudio visual de la condición del pavimento en la que se clasifican de acuerdo a la extensión y la severidad de los daños que presentan[2]

Considerando las inquietudes más frecuentes de la comunidad relacionadas con la construcción de malla vial y espacio público,[3] los perjuicios que trae el estado actual de las vías para la movilidad, para el comercio, para el acceso a los barrios, para la atención oportuna de emergencias y para la circulación vehicular y peatonal en el sector que genera descontento en los habitantes[4] este contrato representa una contribución a la reducción de estas problemáticas.

Por otro lado, el alto índice de renovación urbana que presenta la localidad, trae como consecuencia el deterioro de las vías y el espacio público debido al tránsito constante al que están sometidos y a la exposición ambiente que naturalmente afecta a las vías; la alcaldía local conformó mesas de participación en las que se

[1] Estudios previos de obra. Pág 7
[2] Ibid. Pág.11
[3] Estudios previos, pág.14
[4] Ibid. Pág. 12

determinaron los criterios para priorizar las vías que deben ser intervenidas y determinaron que se debe empezar por aquellas que:

- Cuentan con estudios y diseños vigencia 2022
- Hayan sido requeridas por Acciones populares
- Generen mayor beneficio colectivo por soportar rutas de SITP
- Generen mayor beneficio por conducir a la malla vial intermedia y/o generen conectividad
- Estar ubicadas entre barrios
- Su cercanía con lugares de gran afluencia de personas. Ej. Hospitales y Colegios.

Como resultado de lo anterior, se seleccionaron para intervención los segmentos viales que se describen a continuación, los cuales podrán ser sometidos a cambios de inclusión y/o exclusión por razones técnicas o presupuestales.

Tabla 1. Segmentos viales priorizados para intervención.

| Prioridad | CIV | PK | Eje vial | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001817 | 384775 | Calle 16 H | Carrera 111 A | Carrera 111 A Bis |
| 2 | 9001780 | N.E | Calle 16 H | Carrera 111 A Bis | Carrera 112 |
| 3 | 9000393 | 381037 | Carrera 118 B | Calle 23 | Calle 23 B |
| 4 | 9000368 | 380986 | Carrera 118 B | Calle 23B | Av. Calle 24 |
| 5 | 900181 | 380499 | Carrera 122 | Calle 23B | Av. Calle 24 |
| 6 | 9000379 | 381010 | Carrera 118 B Bis | Calle 23 | Calle 23 B |
| 7 | 9000362 | 380977 | Carrera 119 | Calle 23 | Calle 23 B |
| 8 | 9004860 | S.E | Carrera 134 | Calle 17C | Calle 17 C Bis |
| 9 | 9004864 | S.E | Carrera 134 | Calle 17C Bis | Calle 17 D |
| 10 | 9004866 | S.E | Carrera 134 | Calle 17 D | Calle 17 D Bis |
| 11 | 9004869 | S.E | Carrera 134 | Calle 17 D Bis | Calle 17F |
| 12 | 9004872 | S.E | Carrera 134 | Calle 17 F | NULL |
| 13 | 9004875 | S.E | Carrera 134 | NULL | NULL |

| Prioridad | CIV | PK | Eje vial | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001817 | 384775 | Calle 16 H | Carrera 111 A | Carrera 111 A Bis |
| 14 | 9000204 | 380654 | Calle 15B | Carrera 136 | Carrera 137 |
| 15 | 9002043 | 385377 | Calle 23H | Carrera 96 F Bis | Carrera 96 F |

Elaboración propia.

## 2.1 INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El contrato cumple con las siguientes condiciones:

Tabla 2. Condiciones generales del Contrato

| | |
|---|---|
| **Contrato** | FDLF-COP-711-2024 |
| **Contrato de interventoría** | FDLF- CIV-717-2024 |
| **Objeto del contrato** | Ejecutar a precios fijos y a monto agotable las actividades de construcción de la malla vial y espacio público derivados del contrato de consultoría 440 de 2022, de la localidad de Fontibón |
| **Localización** | Localidad de Fontibón |
| **Contratista** | Consorcio Vías Fontibón 2024 |
| **Interventoría** | ING Ingeniería |
| **Plazo estimado total** | nueve meses |
| **Acta de inicio** | 12 de febrero de 2025 |
| **Fecha de finalización** | 12 de noviembre de 2025 |
| **Valor del Contrato** | $ 8.045.657.306 Ocho mil cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y siete trescientos seis pesos MCTE |
| **Residente Social Obra** | T.S. Lida Perdomo |
| **Profesional Social de Interventoría** | T.S Jessica Paola Amaya Pérez |

Este contrato define tres fases para su desarrollo de acuerdo al momento en el que se encuentre; así, se tiene prevista una fase de planificación (etapa previa), una fase de obra y una fase de liquidación para cada una de ellas desde el anexo técnico se ha definido una serie de actividades y productos que deben resultar de la gestión de cada uno de los componentes que la integran, técnico, social[5], ambiental y SST. Cabe destacar que a lo largo del documento se referencia en la descripción metodológica de los programas la etapa a la cual corresponde.

## 1.3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

### Área de influencia indirecta del proyecto.

Entendiendo el área de influencia indirecta del proyecto como el sector en el que se encuentra inmersa el área de influencia directa y con el cual comparten impactos positivos y negativos generados por las obras; este proyecto considerará como área de influencia indirecta los barrios a los que pertenecen los segmentos viales priorizados, teniendo en cuenta que al ser parte de la malla vial local su principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda por lo cual el alcance e impacto se concentra principalmente a nivel barrial. Los segmentos priorizados para intervención se ubican en tres UPZ de la localidad (75, 76 y 77) y pertenecen a los barrios de Bahía Solano, El Refugio, Villa Andrea, Rincón Santo y Cassandra.

### Área de influencia directa del proyecto.

En cuanto al área de influencia directa del proyecto, entendida como el territorio en el que se manifiesta de manera directa los impactos sociales generados por las actividades del proyecto se considerará como área de influencia directa a los predios inmediatamente colindantes a los quince (15) segmentos viales priorizados los cuales conforman ocho corredores viales como se muestra en las siguientes ilustraciones.

[5] Pág.113-124

Tabla 3. Área de Influencia Directa por corredores viales.

| Prioridad | CIV | PK | Eje vial | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001817 y 9001780 | 384775 | Calle 16 H | Carrera 111 A | Carrera 112 |
| 2 | 9000393 y 9000368 | 381037 y 380986 | Carrera 118 B | Calle 23 | Av. Calle 24 |
| 3 | 9000379 | 381010 | Carrera 118B | calle 23 | calle 23B |
| 4 | 9000362 | 380977 | Carrera 119 | Calle 23 | Calle 23 B |
| 5 | 900181 | 380499 | Carrera 122 | Calle 23B | Av. Calle 24 |
| 6 | 9004860, 9004864, 9004866, 9004869, 9004872 y 9004875 | S.E | Carrera 134 | Calle 17C | Calle 17L |
| 7 | 9000204 | 380654 | Calle 15B | Carrera 136 | Carrera 137 |
| 8 | 9002043 | 385377 | Calle 23H | Carrera 96 F Bis | Carrera 96 F |

Elaboración propia.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1 Objetivo General

Documentar las actividades realizadas desde el área de Gestión Social en el periodo comprendido entre el 12 de julio y el 11 de agosto de 2025 que permitan evidenciar el avance contractual y retroalimentar los procesos y herramientas utilizadas en cada uno de los programas del Plan de Gestión Social.

### 3.2 Objetivos específicos

Describir las actividades realizadas por parte del componente de Gestión Social en el marco del contrato FDLF-COP-711-2024 y en cumplimiento de lo estipulado dentro del Plan de gestión.

Presentar los registros y documentación que soporta las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

Registrar el accionar del componente social de acuerdo a los acontecimientos presentados durante el periodo y el avance del contrato que contribuyan al logro de los objetivos contractuales.

## 4. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL

Retomando las actividades propuestas para el acompañamiento social durante la ejecución del contrato FDLF-COP-711-2024 cuyo objeto es "Ejecutar a precios fijos y a monto agotable las actividades de construcción de la malla vial y espacio público derivados del contrato de consultoría 440 de 2022, de la localidad de Fontibón" El siguiente informe hace un recuento programa por programa de las actividades de este componente durante el cuarto periodo comprendido entre el 12 de julio y el 11 de agosto de 2025 perteneciente a la etapa de ejecución.

1. Programa de Divulgación e información
2. Programa de acompañamiento a las actividades técnicas
3. Programa de Atención ciudadana
4. Programa de Sostenibilidad
5. Programa de manejo de Impactos en el sector comercial
6. Programa de Generación de Empleo
7. Programa de Aseguramiento de la calidad

### 4.1 Programa de Divulgación e información

Para disponer la información clara, veraz, oportuna y suficiente frente a las particularidades y actividades que componen la ejecución del contrato a todos los ciudadanos que prioritariamente vivan, trabajen o se relacionen de alguna forma con las obras a ejecutar (grupos de interés). Los acontecimientos que tuvieron lugar en el desarrollo de este programa son:

#### 4.1.1 Entrega de volantes y/o afiches informativos

En el periodo reportado se generaron piezas de divulgación para adelantar actividades preliminares en los segmentos del barrio Refugio las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 4. Distribución de volantes y/o afiches generados en el periodo.

| Ctvo. No. | Barrio | Contenido de la pieza | Fecha de divulgación | Método de divulgación | Total, entregadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Refugio Calle 23B # 119-03 / Calle 23B # 118b-25 | Afiche de contratación de mano de obra no calificada CIV.9000379 | 25 de julio de 2025 | Publicado en P.S.I | 2 |
| 30 | Refugio | Notificación de primera visita para levantamiento de actas de vecindad CIV 9000379 | 14 de julio de 2025 | Puerta a puerta en área de influencia directa | 14 |
| 31 | Refugio | Notificación de segunda visita para levantamiento de actas de vecindad CIV 9000379 | 22 de julio de 2025 | Predios donde no fue posible ingresar en la primera visita | 4 |
| 32 | Refugio | Notificación de tercera visita para levantamiento de actas de vecindad CIV 9000379 | 25 de julio de 2025 | Predios donde no fue posible ingresar en la segunda visita | 2 |
| 33 | Refugio | Volante inicio de obra CIV. 9000379 | 25 de julio de 2025 | Puerta a puerta en área de influencia directa | 14 |
| 34 | Refugio | Volante aclaración sobre bajantes y canaletas | 31 de julio de 2025 | No ha sido distribuido | 0 |

| Ctvo. No. | Barrio | Contenido de la pieza | Fecha de divulgación | Método de divulgación | Total, entregadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Refugio | Notificación de primera visita para levantamiento de actas de vecindad CIV 9000393 | 02 de agosto de 2025 | Puerta a puerta en área de influencia directa | 16 |
| 36 | Refugio | Notificación de segunda visita para levantamiento de actas de vecindad CIV 9000393 | 08 de agosto de 2025 | Predios donde no fue posible ingresar en la primera visita | 4 |
| 37 | Refugio | Notificación de tercera visita para levantamiento de actas de vecindad CIV 9000393 | 11 de agosto de 2025 | Predios donde no fue posible ingresar en la segunda visita | 3 |
| Total, de piezas distribuidas | | | | | 59 |

Elaboración propia.

Con respecto a la pieza de divulgación No.2, Afiche de contratación de mano de obra no calificada, se hizo la instalación del Punto Satélite de información para el CIV.9000379 donde se inició obra en este periodo y se hizo la renovación del Punto Satélite de información del CIV.9000362 del barrio Refugio debido al deterioro que presentaba por la exposición al ambiente.

En el periodo se generaron ocho piezas de divulgación, que fueron distribuidas tal como se muestra anteriormente, en total fueron entregadas cincuenta y nueve (59) piezas incluyendo las piezas de convocatoria a Mano de Obra No Calificada que fueron publicadas en los PSI.

En cuanto a la pieza No.34, volante de aclaración sobre bajantes y canaletas si bien se generó la pieza y fue aprobada por la interventoría se hará su respectiva distribución en los frentes de obra que se tienen activos en el curso del siguiente periodo.

Anexo 1. Aprobación de piezas en el periodo.

Anexo 2. Soportes de entrega de piezas en el periodo.

### 4.1.2 Instalación de Puntos Satélites de Información

Del 12 de julio al 11 de agosto de 2025 se instaló la cartelera denominada Punto de Información - P.I- para el frente de obra CIV.9000379 donde se inició labores constructivas este periodo y se hizo renovación del punto del CIV.9000362 del barrio Refugio debido al deterioro que presentaba por exposición al ambiente, los dos fueron ubicados en establecimientos comerciales colindantes con las intervenciones donde por su cercanía a las obras se facilita su consulta por parte de la ciudadanía del área de influencia directa.

El Punto Satélite de información del CIV.9000362, ubicado en la carrera 119 entre calle 23 y calle 23B se renovó el día 25 de julio de 2025 y presenta la pieza de inicio de obra en el segmento, así mismo, el Punto Satélite de información del CIV.9000379, ubicado en la carrera 118B Bis entre calle 23 y calle 23B presenta la pieza de inicio de obra en el segmento.

En cuanto a los Puntos Satélites del barrio Rincón Santo, CIV 9002043 y Cassandra, CIV. 9000204 no se tiene novedades puesto que se conservan en buen estado.

Anexo 3. Control de Puntos de información.

### 4.1.3 Reuniones de inicio y/o socialización

Para el periodo entre el 12 de julio y 11 de agosto de 2025 no se presentan actividades para la gestión de reuniones de inicio y/o socialización ya que se

encuentran socializados todos los segmentos viales priorizados por la entidad contratante a la fecha.

### 4.1.4 Reuniones extraordinarias, de avance y/o finalización de obras

Cada vez que se considere necesario, en caso que la interventoría y/o el Fondo de Desarrollo Local – F.D.L.F- lo requieran se realizará reuniones extraordinarias, de avance y/o finalización de obras para dar aviso sobre situaciones imprevistas que tengan incidencia en la obra, que impliquen modificaciones dentro de las actividades técnicas a realizar y/o en los tiempos previstos para la ejecución de las obras.

En el periodo se gestionó una reunión extraordinaria con los interesados del área de influencia directa a los CIV.9001817 y 9001780 del barrio Bahía Solano teniendo en cuenta que, a la fecha no ha sido posible iniciar obra en estos segmentos viales porque durante la reunión de socialización se presentó un ciudadano que se opuso a la obra exigiendo su derecho a la propiedad privada manifestando ser el propietario del terreno que coincide con el CIV.9001780.

Por lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local se dirigió a las entidades distritales para consultar el estado actual de estos terrenos y con su área jurídica para definir la viabilidad de proseguir, sin embargo, a vísperas de la reunión para informar a la comunidad en qué se encontraba el proceso la entidad canceló la actividad con el ánimo de dar un veredicto definitivo frente al tema una vez se obre todos los recursos posibles.

Anexo 4. Gestión reunión Bahía Solano.

## 4.2 Programa de acompañamiento a las actividades técnicas

Entre el 12 de julio y el 11 de agosto, teniendo en cuenta la interferencia identificada en periodos anteriores entre este proceso y un contrato de construcción de redes adelantado por el Acueducto de Bogotá en el barrio Villa Andrea, el Fondo de Desarrollo Local citó a una reunión que contó con la asistencia por parte de funcionarios de la EAAB, funcionarios del FDLF, interventoría y contratistas de

ambos contratos donde el acueducto indicó que las redes sobre la carrera 134 entre calle 17 y calle 17G estarían instaladas para el mes de diciembre sin embargo, aunque se liberaría parcialmente el sector que se requiere para la construcción vial, la vigencia de este proceso se encuentra hasta el mes de noviembre y seguiría habiendo interferencia entre garantías y labores constructivas de los contratistas de ambas entidades en territorio. En conclusión, se programó una nueva reunión para revisar los diseños y seguir evaluando si es posible coordinar actividades para ejecutar la vía en esos segmentos.

Anexo 5. Soportes reunión acueducto.

Por otro lado, en atención al programa de Localidades al Tablero de la Contraloría de Bogotá, la interventoría junto con los funcionarios por parte del Fondo de Desarrollo Local y este contratista estuvieron atentos a la visita mensual de seguimiento sin embargo esta se pospuso para el día martes 12 de agosto de 2025.

### 4.2.1 Actas de vecindad de inicio

Para el periodo se adelantaron actividades para levantamiento de actas de vecindad de inicio en el barrio Refugio teniendo a la fecha los siguientes resultados.

Tabla 5. Actas de vecindad de inicio levantadas a la fecha.

| Barrio | CIV | Dirección | Total, predios | Actas internas y externas | Actas de fachada |
|---|---|---|---|---|---|
| Refugio | 9000379 | Carrera 118B Bis entre calle 23 y calle 23B | 14 | 14 | 0 |
| Refugio | 9000393 | Carrera 118B entre calle 23 y calle 23B | 16 | 15 | 1 |

Elaboración propia.

Como se observa anteriormente, durante este sexto periodo se realizaron las actas de vecindad en el CIV.9000379 y 9000393 del barrio Refugio donde finalmente a 11 de agosto de 2025 se registran veintinueve (29) actas de vecindad internas y

externas, y, una (1) acta de vecindad de fachada debido a que una vez agotadas las tres visitas para el levantamiento no fue posible ingresar a este predio. Estas actas se encuentran en proceso documental para su posterior envío a revisión de interventoría.

Por otro las actas de vecindad de Cassandra, CIV.9000204, Bahía Solano, CIV.9001817, 9001780 y, Refugio, CIV.9000181 y CIV. 9000362 fueron radicadas el día 31 de julio y una vez revisadas por interventoría se devuelven debidamente firmadas y aprobadas como consta en el oficio No. INGI-50260-118-25.

Anexo 6. Trazabilidad actas de vecindad

### 4.2.2 Actas de vecindad de cierre

Entendiendo que el contrato se encuentra iniciando labores técnicas en los primeros frentes de obra para el periodo no fue necesario adelantar actividades para cierre de actas de vecindad.

### 4.2.3 Actas de Compromiso

A la fecha no ha sido necesario adelantar actividades relacionadas con actas de compromiso.

## 4.3 Programa de Atención a la ciudadanía

Durante este periodo por parte del Consorcio Vías Fontibón 2024 continúa disponible para la atención ciudadana la línea telefónica 304 362 1979 en horarios de atención los martes y jueves de 8am a 12m y el correo electrónico viasfontibon2024@gmail.com y, por parte de la interventoría se encuentra a disposición del público la profesional social Jessica Paola Amaya Pérez con el correo electrónico residentesocial1@ingingenieria.com.co y la línea telefónica 310 7644991. Estos datos se han presentado en las piezas de divulgación distribuidas y en las reuniones de socialización realizadas desde el inicio del proceso contractual hasta la fecha.

Para el periodo entre el 12 de julio y el 11 de agosto de 2025 se tiene las siguientes novedades en la atención a la ciudadanía así:

- El día 25 de julio alrededor del mediodía, en recorrido por los frentes de obra se acerca ciudadano del predio ubicado en la carrera 119 # 23-39, CIV. 9000362, quien refiere que hace dos días se encuentra sin servicio de agua por daño de acometida durante excavaciones en este segmento vial, a continuación se envía personal a rectificar y si es el caso reparar la acometida reportada, no se hace evidente daños de acometidas pero al rectificar la reportada se encuentra un tapón que al parecer fue instalado por la EAAB, se realiza la reconexión y se deja la observación para hacer la consulta con la entidad ya que según el propietario del predio funcionarios vinieron en la noche y dejaron ese tapón para que no se saliera el agua pero el daño de la acometida sí fue generado excavaciones de la obra vial.

- El día 5 de agosto, siendo las 15:40 se recibe solicitud telefónica por parte de una ciudadana del barrio Refugio quien requiere se realice la reconexión del servicio de gas natural puesto que este día alrededor de las 10:00 hubo una rotura en la red durante excavaciones en la carrera 118B Bis entre calle 23 y 23B, CIV. 9000379.

  Frente a lo anterior, se le indica a la ciudadana que siguiendo los protocolos establecidos por Vanti se hizo el reporte inmediatamente ocurrió el suceso y la entidad ya hizo presencia en el punto controlando la situación sin embargo son ellos quienes realizan la reconexión de sus redes. A continuación, se estableció contacto con el coordinador de la zona en Vanti quien indicó que en un lapso de tres horas se hacia la reconexión.

  Pasadas tres horas se rectifica que aún no se ha realizado la reconexión por lo que nuevamente se intenta establecer comunicación con el coordinador y al no recibir respuesta se llama a la línea de atención 164 donde se informa que debido a la cantidad de emergencias aún no ha sido posible hacer la reconexión y se espera hacer en el transcurso de unas horas o si no se

alcanza hasta el día de mañana antes de medio día. Finalmente se hizo la reconexión el día 6 de agosto siendo las 10:00.

Anexo 7. Soportes de solicitudes ciudadanas

## 4.4 Programa de Sostenibilidad

### 4.4.1 Plegable de sostenibilidad

Considerando que el contrato se encuentra en su etapa preliminar y apenas se ha iniciado actividades técnicas, para el periodo comprendido entre el 12 de julio y el 11 de agosto no se adelantaron actividades relacionadas con este programa.

## 4.5 Programa de manejo de Impactos en el sector comercial.

De los frentes que han iniciado obra a la fecha, esto es, Rincón Santo, CIV.9002043, Cassandra, CIV.9000204, Refugio CIV. 9000181, 9000362 y 9000379 se encuentran nueve establecimientos comerciales, cuatro en Cassandra, uno en Rincón Santo, uno en Refugio CIV.9000181, uno en Refugio, CIV.9000362 y dos en Refugio CIV.9000379. En el periodo comprendido entre el 12 de julio y el 11 de agosto no ha sido necesario adelantar actividades relacionadas con el manejo de impactos al sector comercial ya que a nivel general se ha garantizado los senderos peatonales para el acceso de clientela y/o no se presenta afectación de los establecimientos por las obras.

## 4.6 Programa de Generación de Empleo

Dando cumplimiento a lo establecido en el decreto Distrital 634 de 2023, del personal total vinculado al contrato correspondiente a cuarenta y cuatro (44) personas, nueve de ellas son mujeres. Teniendo en cuenta que el decreto establece que se debe vincular como mínimo un 18.4% de mujeres en contratos relacionados

con el área de construcción y que, habiendo verificado el personal se tiene un 20% de mujeres vinculadas, a este respecto se tiene un cumplimiento del 100%.

En cuanto a la directiva Distrital 001 de 2011 y la minuta contractual que insta a priorizar la contratación de sujetos de especial protección constitucional y a garantizar la contratación del 10% de mano de obra no calificada local de los cuales por lo menos el 5% sean mujeres. Actualmente se tiene veintidós (22) personas como MONC de las cuales una es mujer y dos son residentes de la localidad.

Tabla 6. Reporte generación de empleo

| | | |
|---|---|---|
| Total | 44 | % 100 |
| Mujeres | 9 | % 20 |
| MONC | 22 | % 54 |
| MONCL | 2 | % 9 |

Elaboración propia.

Anexo 8. Registro de Generación de Empleo.

En este periodo, se mantuvo la publicación de convocatoria a procesos de selección para integrar personal local y se tiene las siguientes novedades:

El día 24 de julio se presenta hoja de vida vía WhatsApp sin embargo al intentar comunicarse desde recursos humanos con la persona no atiende al teléfono reportado.

El 6 de agosto se presenta otra hoja de vida por este mismo medio sin embargo al intentar comunicarse desde recursos humanos con la persona no atiende al teléfono reportado.

El 8 de agosto se comunican tres personas vía WhatsApp sin embargo solo una presenta la hoja de vida y al intentar comunicarse desde recursos humanos con la persona no atiende al teléfono reportado.

En conclusión, durante el periodo no fue posible integrar más personal local en el contrato.

### 4.7 Programa de Aseguramiento de la calidad

Teniendo en cuenta que desde el día 17 de marzo se cuenta con el Plan de Gestión Social PGS debidamente aprobado para garantizar la calidad de la Gestión Social durante la ejecución del contrato, el presente informe presenta las actividades ejecutadas conforme se encuentran contempladas y con los soportes correspondientes.

Además, como parte del aseguramiento de la calidad en la gestión social, el día 16 de junio se presentó el informe No.5 con el reporte mensual de las actividades realizadas entre el 12 de junio y el 12 de julio como consta en el oficio **VIASFONTIBON-711-2024-123**, la interventoría hizo las respectivas observaciones los días 17 y 18 de junio durante mesas de trabajo sostenidas de forma virtual entre las profesionales sociales las cuales siendo subsanadas permitieron su aprobación el día 18 de julio por parte de la interventoría.

Anexo 9. Trazabilidad Informe Social No. 5.

#### 4.7.1 Seguimiento y evaluación

En cuanto al seguimiento y evaluación del componente social del contrato, durante el periodo comprendido entre el 12 de julio y el 11 de agosto se evidencia la participación de la profesional social en los comités de seguimiento al contrato relacionados a continuación donde se reporta lo siguiente.

Tabla 7. Asuntos sociales tratados en comités.

| Comité No. | Fecha | Participantes | Resumen componente social |
|---|---|---|---|
| 18 | 17 de julio de 2025 | FDLF (2)<br>Interventoría (4)<br>Contratista (3) | Respecto al caso de Bahía Solano desde el FDLF se informa que la entidad continúa realizando consultas con las entidades públicas y con su área jurídica por lo tanto |

| Comité No. | Fecha | Participantes | Resumen componente social |
|---|---|---|---|
| | | | se sigue a espera de indicaciones frente a la ejecución o no de estos segmentos viales. Se solicita la radicación de actas de vecindad realizadas a la fecha para revisión de interventoría. |
| 19 | Julio 24 de 2025 | FDLF (1) Interventoría (4) Contratista (3) | Se informa que se recibió una llamada de un ciudadano del barrio Rincón Santos que pregunta si se va modificar el diseño de la vía teniendo en cuenta que en la zona verde frente a los conjuntos residenciales no hay individuos arbóreos. |
| 20 | Agosto 8 de 2025 | FDLF (1) Interventoría (4) Contratista (3) | La entidad informa al área social que sigue en proceso definir la ejecución de Bahía Solano.<br>Se informa del reclamo por la suspensión de gas en una vivienda por rotura de la red durante excavaciones en CIV.9000379 |

Elaboración propia.

# ANEXOS

# Anexo 1.

# Aprobación de piezas en el periodo.

Gmail CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>

# Piezas de divulgación: Notificación de visitas para actas de vecindad CIV. 9000379

4 mensajes

**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024** <viasfontibon2024@gmail.com> 14 de julio de 2025, 1:10 p.m.
Para: residentesocial1@ingingenieria.com.co, residenteinterventoria1@ingingenieria.com.co, Alejandro Galindo <agalindo@ingingenieria.com.co>, Caterine Acosta <asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co>, eruiz@ingingenieria.com.co, Sharith Parra <sparra@ingingenieria.com.co>

Buen día,

Se remite para su revisión y fines correspondientes

Barrio Refugio, CIV. 9000379

1. Volante para notificar las visitas para el levantamiento de actas de vecindad en el segmento ubicado sobre la carrera 118B Bis entre calle 23 y 23B el cual será distribuido puerta a puerta en los predios colindantes con el segmento vial mencionado anteriormente.

Atentos a sus observaciones y/o aprobación.

DIANA MARCELA PACHECO
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**



**30-31-32. Not. Actas Refugio CIV.9000379.pptx.pdf**
239K

**Jessica Paola Amaya Perez** <residentesocial1@ingingenieria.com.co> 15 de julio de 2025, 8:41 a.m.
Para: CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>, residenteinterventoria1@ingingenieria.com.co, Alejandro Galindo <agalindo@ingingenieria.com.co>, Caterine Acosta <asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co>, eruiz@ingingenieria.com.co, Sharith Parra <sparra@ingingenieria.com.co>

Buen día,

Una vez revisada la información de distribución de volante de inicio de obra en el barrio El Refugio CIV 9000379 se solicita **corregir la fecha** en las siguientes piezas:

1. Notificación de primera visita para el levantamiento de actas de vecindad.
2. Notificación de segunda visita para el levantamiento de actas de vecindad.
3. Notificación última visita para el levantamiento de actas de vecindad.

3264 34

Cordialmente,

**JESSICA PAOLA AMAYA PÉREZ**

Residente social

**ING INGENIERIA SAS**

residentesocial1@ingingenieria.com.co

Dirección: Calle 114 A No. 53-94

Tel. 2148025 – 2148460 – 7469364

Celular 310 764 49 91

Bogotá D.C.

[Texto citado oculto]

---

**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024** <viasfontibon2024@gmail.com> 15 de julio de 2025, 4:09 p.m.
Para: Jessica Paola Amaya Perez <residentesocial1@ingingenieria.com.co>

Buen día,

Se remiten volantes corregidos para su revisión.

Atentos a su respuesta.
[Texto citado oculto]

**30-31-32. Not. Actas Refugio CIV.9000379.pptx.pdf**
238K

---

**Jessica Paola Amaya Perez** <residentesocial1@ingingenieria.com.co> 15 de julio de 2025, 4:12 p.m.
Para: CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>

Buen día,

Una vez revisada la información de distribución de volante de inicio de obra en el barrio El Refugio CIV 9000379 se da aprobación desde el componente social.

[Texto citado oculto]

Gmail CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>

# Volante inicio de obra CIV.9000379 barrio Refugio

2 mensajes

**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024** <viasfontibon2024@gmail.com> 23 de julio de 2025, 2:55 p.m.
Para: Jessica Paola Amaya Perez <residentesocial1@ingingenieria.com.co>, residenteinterventoria1@ingingenieria.com.co, Alejandro Galindo <agalindo@ingingenieria.com.co>, Caterine Acosta <asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co>, eruiz@ingingenieria.com.co, Sharith Parra <sparra@ingingenieria.com.co>

Buen día,

Se remite para su revisión y fines correspondientes

Barrio Refugio, CIV. 9000379

1. Volante para informar inicio de obra el cual será distribuido puerta a puerta en los predios colindantes con al segmento vial ubicado en la carrera 118B Bis entre calle 23 y calle 23B.

Atentos a sus observaciones y/o aprobación.

DIANA MARCELA PACHECO
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**

**33. Not. Actas Refugio CIV.9000379.pdf**
269K

**Jessica Paola Amaya Perez** <residentesocial1@ingingenieria.com.co> 23 de julio de 2025, 3:35 p.m.
Para: CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>, residenteinterventoria1@ingingenieria.com.co, Alejandro Galindo <agalindo@ingingenieria.com.co>, Caterine Acosta <asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co>, eruiz@ingingenieria.com.co, Sharith Parra <sparra@ingingenieria.com.co>

Buen día,

Una vez revisada la información de distribución de volante de inicio de obra en el barrio El Refugio CIV 9000379 se da aprobación desde el componente social.

Cordialmente,

**JESSICA PAOLA AMAYA PÉREZ**
Residente social
**ING INGENIERIA SAS**

3265 35

residentesocial1@ingingenieria.com.co

Dirección: Calle 114 A No. 53-94

Tel. 2148025 – 2148460 – 7469364

Celular 310 764 49 91

Bogotá D.C.

[Texto citado oculto]

Gmail CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>

# Piezas de divulgación: Notificación de visitas para actas de vecindad CIV. 9000393

2 mensajes

**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024** <viasfontibon2024@gmail.com> 1 de agosto de 2025, 3:23 p.m.
Para: residenteinterventoria1@ingingenieria.com.co, Jessica Paola Amaya Perez <residentesocial1@ingingenieria.com.co>, Alejandro Galindo <agalindo@ingingenieria.com.co>, Caterine Acosta <asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co>, eruiz@ingingenieria.com.co, Sharith Parra <sparra@ingingenieria.com.co>

Buen día,

Se remite para su revisión y fines correspondientes

Barrio Refugio, CIV. 9000393

1. Volantes notificando las visitas para el levantamiento de actas de vecindad en el segmento ubicado sobre la carrera 118B entre calle 23 y 23B el cual será distribuido puerta a puerta en los predios del área de influencia directa.

Atentos a sus observaciones y/o aprobación.

DIANA MARCELA PACHECO
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**



**35-36-37. Not. Actas Refugio CIV.9000393.pptx.pdf**
237K

**Jessica Paola Amaya Perez** <residentesocial1@ingingenieria.com.co> 1 de agosto de 2025, 3:57 p.m.
Para: CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>, residenteinterventoria1@ingingenieria.com.co, Alejandro Galindo <agalindo@ingingenieria.com.co>, Caterine Acosta <asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co>, eruiz@ingingenieria.com.co, Sharith Parra <sparra@ingingenieria.com.co>

Buen día,

Una vez revisada la información de notificación de visitas para elaboración de actas de vecindad en el barrio El Refugio CIV 9000393 se da aprobación desde el componente social.

Cordialmente,

**JESSICA PAOLA AMAYA PÉREZ**
Residente social
**ING INGENIERIA SAS**

3266 36

residentesocial1@ingingenieria.com.co

**Dirección:** Calle 114 A No. 53-94

**Tel. 2148025 – 2148460 – 7469364**

**Celular 310 764 49 91**

**Bogotá D.C.**

[Texto citado oculto]

Gmail CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>

# Piezas de divulgación: Aclaración sobre bajantes y canaletas

2 mensajes

**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024** <viasfontibon2024@gmail.com> 2 de agosto de 2025, 7:22 a.m.
Para: Jessica Paola Amaya Perez <residentesocial1@ingingenieria.com.co>, residenteinterventoria1@ingingenieria.com.co, Alejandro Galindo <agalindo@ingingenieria.com.co>, Caterine Acosta <asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co>, eruiz@ingingenieria.com.co, Sharith Parra <sparra@ingingenieria.com.co>

Buen día,


Se remite para su revisión y fines correspondientes

Barrio Refugio: CIV. 9000181, 9000362, 9000379, 9000393, 9000368 Cassandra CIV.9000204 y Rincón Santo CIV. 9002043.

Teniendo en cuenta que se ha observado irregularidades en las bajantes y canaletas de los predios contiguos a las áreas de intervención, se remite volante donde se informa el deber de los propietarios de adecuar sus bajantes y canaletas de aguas lluvias de manera que se evite inconvenientes posteriores y se pueda garantizar la estabilidad de las obras. Estos serán distribuidos puerta a puerta en los predios del área de influencia directa de los segmentos viales anteriormente relacionados.

Atentos a sus observaciones y/o aprobación.

DIANA MARCELA PACHECO
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**



**34. Otras inf. Bajantes de agua..pdf**
250K

**Jessica Paola Amaya Perez** <residentesocial1@ingingenieria.com.co> 4 de agosto de 2025, 8:44 a.m.
Para: CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>, residenteinterventoria1@ingingenieria.com.co, Alejandro Galindo <agalindo@ingingenieria.com.co>, Caterine Acosta <asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co>, eruiz@ingingenieria.com.co, Sharith Parra <sparra@ingingenieria.com.co>

Buen día,

Una vez revisada la información de piezas de divulgación: aclaración sobre bajantes en los segmentos viales, Barrio Refugio: CIV. 9000181, 9000362, 9000379, 9000393, 9000368 Cassandra CIV.9000204 y Rincón Santo CIV. 9002043. y canaletas se da aprobación desde el componente social.

Cordialmente,

3267 37

**JESSICA PAOLA AMAYA PÉREZ**

Residente social

**ING INGENIERIA SAS**

residentesocial1@ingingenieria.com.co

Dirección: Calle 114 A No. 53-94

Tel. 2148025 – 2148460 – 7469364

Celular 310 764 49 91

Bogotá D.C.

[Texto citado oculto]

# Anexo 2.

# Soportes de entrega de piezas en el periodo.

3268 38

# Notificación primera visita para el levantamiento de actas de vecindad

## Construcción de malla vial y espacio público

### FDLF-COP-711-2024

Volante: GOB20250146 030 Fecha: 14-07-2025 Localidad: Fontibón.

Del **viernes 18 de julio al jueves 24 de julio de 2025**, entre las 8:00 am y las 4:00 pm el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón a través del contratista encargado de esta obra **CONSORCIO VIAS FONTIBÓN 2024**, realizará el **Levantamiento de Acta de Vecindad** en los predios que rodean el segmento vial ubicado en la **Carrera 118B Bis entre calle 23 y calle 23B.**

Esta actividad consiste en el registro escrito y fotográfico de las condiciones externas e internas de los predios antes del inicio de actividades constructivas; el acta de vecindad le servirá al propietario como soporte en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra determinando la responsabilidad del contratista.

Para realizar esta actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios así como su autorización para el ingreso y acompañamiento durante esta diligencia; esto no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos. En caso de no encontrar una persona que atienda y/o suministre la información necesaria; se programará una **segunda y una última visita.** Una vez cumplida la programación en caso de no tener acceso al predio, se levantará un acta de vecindad de fachada con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

| Profesionales que realizarán la actividad | |
|---|---|
| Residente técnico contratista: | Camilo Carvajal |
| Residente Social contratista: | Lida Perdomo |
| Residente técnico de interventoría | Daniel Duitama |
| Residente social interventoría | Jessica Paola Amaya |

Si desea más información sobre este tema, o coordinar una nueva visita, puede comunicarse con nuestro **Punto de Atención Ciudadana –P.A.C-.**

## Contáctanos:

3043621979

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

BOGOTÁ

| Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | | |
|---|---|---|
| Control de entrega piezas informativas | | |
| Código | Proceso | Versión |
| GS-1 | Gestión Social | 0 |

CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN

Nombre de la pieza informativa: Notif. 1ra visita para levantamiento actas de vecindad

Contrato: FDLF-COP-711-2024 Responsable: Lida Perdomo Fecha: 15/07/2025

Barrio: Refugio

| N° | Nombre y apellidos | Dirección | Teléfono | Firma | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martha Landeros | Cll 23B # 118B - 37 | 3105597916 | | |
| 2 | Carlos Martinez | Cll 23B # 118B-25 | 3209752494 | | |
| 3 | Carlos Barreto | Cra. 118B Bis 23B-20 | 3204180107 | | |
| 4 | Paula Valbuena | Cra. 118B Bis 23B-76 | 3168951047 | | |
| 5 | Luis Beltran. | Cra. 118B Bis 23 27 | 3125855926 | | |
| 6 | Linda La Madrid | Cra. 118B Bis 23 17 | 3007247857 | | |
| 7 | Maria Cristina Patoy | Cra. 118B Bis 23 05 | 3169225565 | | |
| 8 | Maria Julia Rojas | Cra. 118B Bis 23 09 | 3118505850 | | |
| 9 | Sin información | Cra. 118B Bis 23 08 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 10 | Juan Cristancho | Cra. 118B Bis 23 02 | 3167484017 | | Bajo puerta |
| 11 | Sin información | Cra. 118B Bis 23 29 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 12 | Sin información | Cra. 118B Bis 23 28 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 13 | Sin información | Cra. 118B Bis 23 35 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 14 | Sin información | Cra. 118B Bis 23 34 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 15 | | | | | |

Total de piezas entregadas: 14 Afiches 0 Volantes 14

| | Elabpró - Contratista | Revisó - Interventoría |
|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | |
| Firma | | |

3265139

# Notificación segunda visita para el levantamiento de actas de vecindad

## Construcción de malla vial y espacio público

### FDLF-COP-711-2024

Volante: GOB20250146-031 Fecha: 14-07-2025 Localidad: Fontibón.

Debido a que, del **viernes 18 de julio al jueves 24 de julio de 2025** se visito por primera vez este predio sin encontrar quien atendiera el levantamiento de acta de vecindad, se programó **una segunda visita el próximo viernes 25 de julio de 2025** donde, el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón a través del contratista encargado de esta obra **CONSORCIO VIAS FONTIBÓN 2024**, pretende culminar este proceso en los predios que rodean el segmento vial ubicado en la **Carrera 118B Bis entre calle 23 y calle 23B.**

Esta actividad consiste en el registro escrito y fotográfico de las condiciones externas e internas de los predios antes del inicio de actividades constructivas. El acta de vecindad le servirá al propietario como soporte en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.

Para realizar esta actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su autorización para el ingreso y acompañamiento durante esta diligencia; esto no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos; en caso de no encontrar una persona que atienda y/o suministre la información necesaria, se agendará una **última visita**; una vez cumplida la programación en caso de no tener acceso al predio, se levantará acta de vecindad de fachada con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

| Profesionales que realizarán la actividad | |
|---|---|
| Residente técnico contratista: | Camilo Carvajal |
| Residente Social contratista: | Lida Perdomo |
| Residente técnico de interventoría | Daniel Duitama |
| Residente social interventoría | Jessica Paola Amaya |

Si desea más información sobre este tema, o coordinar una nueva visita, puede comunicarse con nuestro **Punto de Atención Ciudadana –P.A.C-.**

**Contáctanos:**

3043621979

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

BOGOTÁ

| | Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | | |
|---|---|---|---|
| | Control de entrega piezas informativas | | |
| | Código | Proceso | Versión |
| | GS-1 | Gestión Social | 0 |

CONSORCIO VIAS FONTIBÓN

Nombre de la pieza informativa: Notif 2da visita actas de vecindad

Contrato: FDLF-COP-711-2024 Responsable: Lida Perdomo Fecha: 22/07/25

Barrio: Refugio

| N° | Nombre y apellidos | Dirección | Teléfono | Firma | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerin Gonzalez | Cra. 118B Bis #23-29 | 3172626233 | Katerin G. | |
| 2 | Jeison Cujia | Cra 118B Bis #23-34 | 3007629722 | | |
| 3 | Carlos Rojas | Calle 23B #118B-25 | 3134225076 | | |
| 4 | Martha Sanchivos | Cra 118B Bis #23-17 | 3105597961 | Martha Sanchivos | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

Total de piezas entregadas: 4

Afiches 0 Volantes 4

| | Elaboró - Contratista | Revisó - Interventoría |
|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | Paola Amaya |
| Firma | | |

3270 40

# Notificación última visita para el levantamiento de actas de vecindad

## Construcción de malla vial y espacio público

### FDLF-COP-711-2024

Volante: GOB20250146 032 Fecha: 14-07-2025 Localidad: Fontibón.

Debido a que, del **viernes 18 de julio al jueves 24 de julio de 2025,** y el día **viernes 25 de julio de 2025** se visitó este predio sin encontrar quien atendiera el levantamiento de acta de vecindad, se programó **una última visita el próximo lunes 28 de julio de 2025** donde, el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón a través del contratista encargado de esta obra, **CONSORCIO VIAS FONTIBÓN 2024,** pretende culminar este proceso en los predios que rodean el segmento vial ubicado en la **Carrera 118B Bis entre calle 23 y calle 23B.**

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita y fotográfica las condiciones actuales de estos antes del inicio de la obra. Este documento le servirá al propietario como soporte en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.

Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta; esta actividad no tiene ningún costo ni requiere la entrega de documentos. Una vez cumplida la programación, en caso de no encontrar a una persona que atienda y/o suministre la información necesaria en esta última oportunidad, se levantará acta de vecindad de fachada con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

| Profesionales que realizarán la actividad | |
|---|---|
| Residente técnico contratista: | Camilo Carvajal |
| Residente Social contratista: | Lida Perdomo |
| Residente técnico de Interventoría | Daniel Duitama |
| Residente social interventoría | Jessica Paola Amaya |

Si desea más información sobre este tema, o coordinar una nueva visita, puede comunicarse con nuestro **Punto de Atención Ciudadana –P.A.C-.**

**Contáctanos:**

3043621979

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

BOGOTÁ

| | Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ | Control de entrega piezas informativas | | |
| | Código | Proceso | Versión |
| | GS-1 | Gestión Social | 0 |

CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN

Nombre de la pieza informativa: Notificación 3ra visita acta de vecindad

Contrato: FDLF-COP-711-2024 Responsable: Lida Perdomo Fecha: 25/07/2025

Barrio: Refugio.

| N° | Nombre y apellidos | Dirección | Teléfono | Firma | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Torres | Cll 23B # 118B-25 | 3204775247 | | |
| 2 | Sin información | Cra 118B Bis #23-34 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

Total de piezas entregadas: 2 . Afiches 0 Volantes 2

| | Elaboró - Contratista | Revisó - Interventoría |
|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | |
| Firma | | |

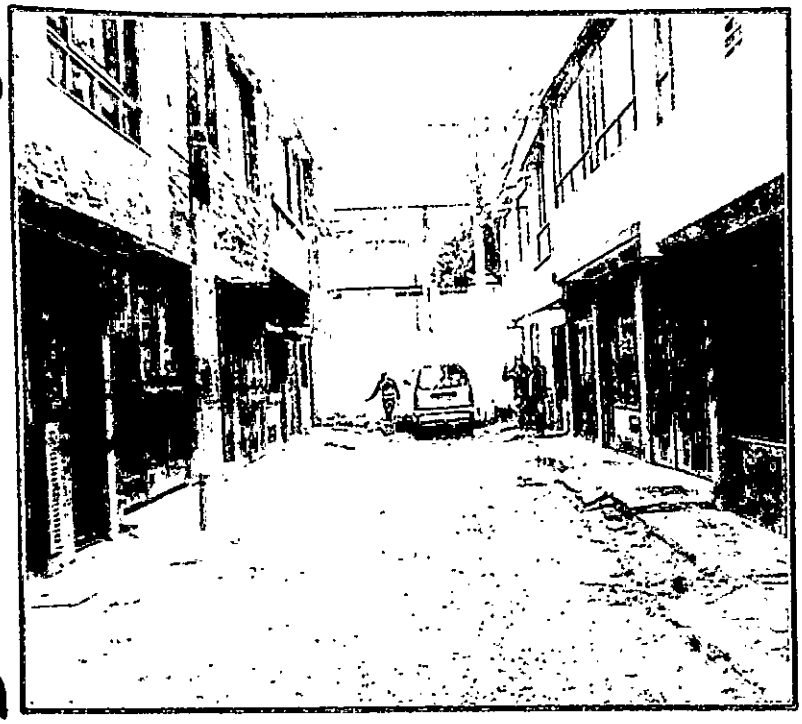
3271
Powered by CamScanner

# Inician las obras de construcción de la malla vial y espacio público

## FDLF-COP-711-2024

Volante: GOB20250146-033 Fecha: 23-07-2025 Localidad: Fontibón.

Estamos trabajando para mejorar la movilidad de los habitantes de la localidad de Fontibón, a partir del **lunes 28 de julio de 2025** y durante aproximadamente **tres meses** se realizarán las obras y actividades necesarias para la construcción de la malla vial y espacio público en el segmento vial ubicado en la **carrera 118B Bis entre calle 23 y calle 23B,** barrio **Refugio.**



Recuerde atender las siguientes recomendaciones para el buen desarrollo del proceso:

**Atienda** la señalización informativa y reglamentaria alrededor de la obra.

Permanezca atento, transite con **precaución** alrededor de la obra, no corra ni juegue, esto puede ser un factor que favorece la accidentalidad.

**Proteja** con mayor empeño el paso cercano a la obra de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y condiciones especiales.

**Absténgase de ingresar** al área en construcción, recuerde que se encuentra maquinaria y manipulación de materiales que pueden ocasionarle lesiones.

Utilice única y **exclusivamente el sendero adecuado** para el tránsito peatonal alrededor de la obra.

**Evite apoyarse en la malla o las cintas de demarcación**, balancearse en ellas y/o romperlas; estas se encuentran dispuestas para su protección.

**Comunique cualquier irregularidad a nuestro Punto de Atención Ciudadana -P.A.C-**

**Contáctanos:**

3043621979

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

BOGOTÁ

| | Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ | Control de entrega piezas informativas | | |
| | Código | Proceso | Versión |
| | GS-1 | Gestión Social | 0 |

CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN

Nombre de la pieza informativa: Volante inicio de obra civ. 9000379

Contrato: FDLF-COP-711-2024 Responsable: Lida Perdomo Fecha: 25/07/2025

Barrio: Refugio

| N° | Nombre y apellidos | Dirección | Teléfono | Firma | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Rivera. | Cll 23B #118B- 25 | 3124056841 | | Supermercado |
| 2 | Sin información. | Cll 23 B#. 118B-37 | — " — | — " — | Bajo pucita |
| 3 | Sandra Lequizamón | Cra 118B Bis#23-29 | 3115564762 | | |
| 4 | Ruben Cuenca. | Cra. 118B Bis#23-17 | 3217167077 | | |
| 5 | Sin información. | Cra. 118B Bis#23-34 | — " — | — " — | Bajo pucito. |
| 6 | Sandra Ruiz. | Cra 118B Bis#23-35 | 3125382693 | | |
| 7 | Miguel Niño. | Cra. 118B Bis#23-05 | 3134257477 | | |
| 8 | María Rojas. | Cra. 118B Bis#23-09 | 3118505850 | | |
| 9 | Carlos Torres | Cra. 118B Bis#23-25 | 3204752474 | | |
| 10 | Sin información | Cra. 118B Bis 23- | — " — | — " — | Bajo pucito |
| 11 | Sin información | Cra. 118B Bis 23- | — " — | — " — | Bajo pucito |
| 12 | Sin información | Cra. 118B Bis 23- | — " — | — " — | Bajo pucito |
| 13 | Sin información | Cra. 118B Bis 23- | — " — | — " — | Bajo pucito |
| 14 | Sin información | Cra. 118B Bis 23- | — " — | — " — | Bajo pucito |
| 15 | | | | | |

Total de piezas entregadas: 14. Afiches 0 Volantes 14

| Elaboró - Contratista | | Revisó - Interventoría |
|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | |
| Firma | | |

Powered by CamScanner

3272

Powered by CamScan

| | | |
|---|---|---|
| BOGOTÁ | Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | |
| | Contrato FDLF-COP-711-2024 | |
| | Gestión Social | |
| | Registro Fotográfico | |

Fecha: Julio 25 de 2025 Lugar: Carrera 118B Bis entre calle 23 y calle 23B

Actividad Notificación inicio de obra

Foto 1

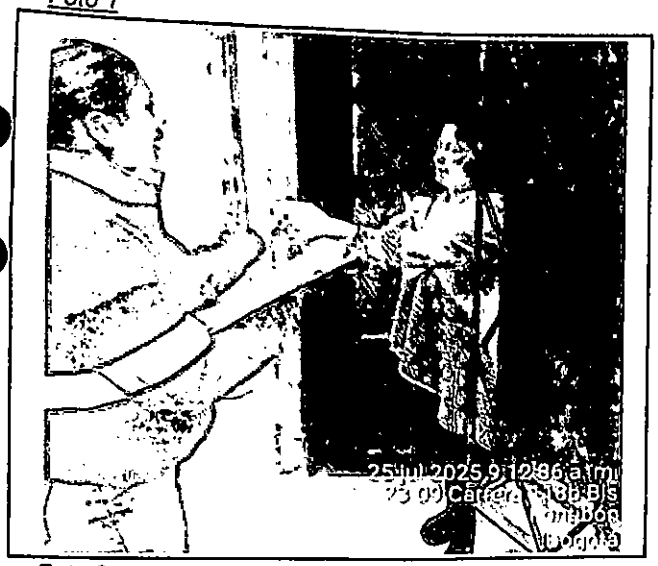



Foto 2

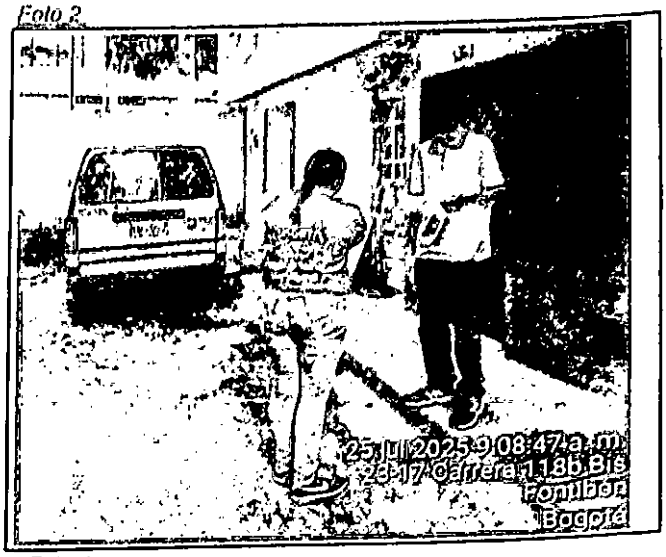



Foto 3

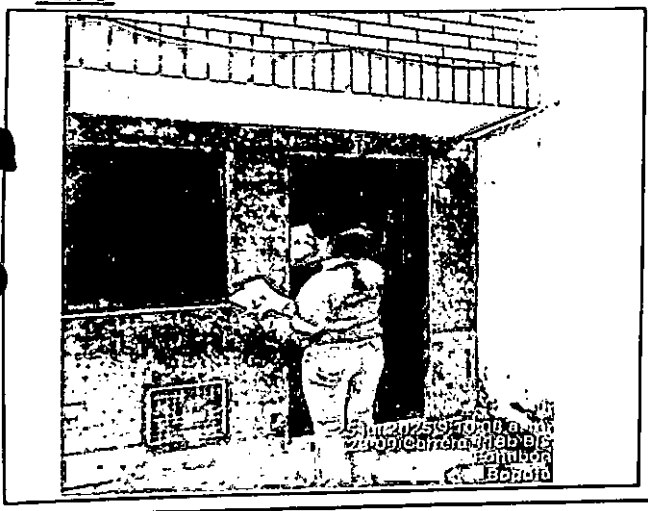


Foto 4



Obvaciones:

Se entrega puerta a puerta volante para notificar el inicio de obra en la carrera 118B Bis entre calle 23 y calle 23B CIV.9000379 del barrio Refugio.


| Código | Versión |
|---|---|
| GS-06 | 0 |

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | Paola Amaya | Paola Amaya |
| Cargo | Residente social | P.S Interventoría | P.S Interventoría |
| Firma | | | |


# Aclaración sobre bajantes y canaletas

## FDLF-COP-711-2024

Volante: GOB20250146-034 Fecha: 31-07-2025 Localidad: Fontibón.



Buscando reducir al máximo los factores que deterioran la malla vial, el espacio público y procurando mantener la garantía de la obra, el fondo de Desarrollo Local y el Consorcio vías Fontibón 2024 informa a la comunidad que:




Es su obligación adecuar y/o instalar las tuberías para desagües de aguas lluvias y canaletas necesarias para evitar el descargue directo sobre la vía ya que esto perjudica la estructura de la obra y por tanto su vida útil.

La evasión de su responsabilidad frente al cuidado de la obra exime al consorcio de hacer efectivas las pólizas de garantía o responder frente alguna reclamación teniendo como precedente que se ha informando frente a su responsabilidad por medio del presente comunicado.



Tenga en cuenta que los tubos de bajantes de aguas lluvias deben descargar al nivel de la vía o el anden, **nunca en las cajas de inspección.**

Los predios que cuenten con cubiertas en tejas que permitan el descargue de agua sobre la obra deben instalar canaleta y tubería que direccione el agua con salida al nivel de la vía o andén.



El o la propietario(a) o encargado(a) del predio cuenta con un plazo máximo de ocho días (8) para la adecuación o instalación de canaletas y/o bajantes según corresponda, de lo contrario el Consorcio reportara los predios ante El Fondo de Desarrollo Local por su incumplimiento.

*Recuerde que de su compromiso depende la estabilidad y durabilidad de la obra realizada para su servicio.*

**Comunique cualquier irregularidad a nuestro Punto de Atención Ciudadana -P.A.C-**

## Contáctanos:

3043621979

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

BOGOTÁ

Powered by CamScanner

327343

# Notificación primera visita para el levantamiento de actas de vecindad

## Construcción de malla vial y espacio público

### FDLF-COP-711-2024

Volante: GOB20250146 035 Fecha: 01 08 2025 Localidad: Fontibón

Del **lunes 4 al viernes 8 de agosto de 2025**, entre las 8:00 am y las 4:00 pm el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón a través del contratista encargado de esta obra **CONSORCIO VIAS FONTIBÓN 2024**, realizará el **Levantamiento de Acta de Vecindad** en los predios que rodean el segmento vial ubicado en la **Carrera 118B entre calle 23 y calle 23B.**

Esta actividad consiste en el registro escrito y fotográfico de las condiciones externas e internas de los predios antes del inicio de actividades constructivas; el acta de vecindad le servirá al propietario como soporte en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra determinando la responsabilidad del contratista.

Para realizar esta actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios así como su autorización para el ingreso y acompañamiento durante esta diligencia; esto no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos. En caso de no encontrar una persona que atienda y/o suministre la información necesaria; se programará una **segunda y una última visita**. Una vez cumplida la programación en caso de no tener acceso al predio, se levantará un acta de vecindad de fachada con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

| Profesionales que realizarán la actividad | |
|---|---|
| Residente técnico contratista: | Camilo Carvajal |
| Residente Social contratista: | Lida Perdomo |
| Residente técnico de interventoría | Daniel Duitama |
| Residente social interventoría | Jessica Paola Amaya |

Si desea más información sobre este tema, o coordinar una nueva visita, puede comunicarse con nuestro **Punto de Atención Ciudadana –P.A.C-.**

**Contáctanos:**

3043621979

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

BOGOTÁ

| BOGOTÁ | Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | | | CONSORCIO VIAS FONTIBON |
|---|---|---|---|---|
| | Control de entrega piezas informativas | | | |
| | Código | Proceso | Versión | |
| | GS-1 | Gestión Social | 0 | |

Nombre de la pieza informativa: Notif. 1ra visita actas de vecindad CIV. 9000393

Contrato: FDLF-COP-711-2024 Responsable: Lida Perdomo Fecha: 02/08/2025

Barrio: Refugio CIV. 9000393.

| N° | Nombre y apellidos | Dirección | Teléfono | Firma | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Perez. | Cra. 118B #23-02 | | Daniel | |
| 2 | Maria Novoa | Cra 118B#23-12 | 3165736917 | Novoa | |
| 3 | Luz Castañeda | Cra. 118B#23-69 | 3112762832 | castañeda | |
| 4 | Sin informacion | Cra. 118B#23-05 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 5 | Sin informacion | Cra. 118B#23-06 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 6 | Sin informacion | Cra. 118B#23-19 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 7 | Sin informacion | Cra 118B#23-16 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 8 | Lucia Polido | Cra. 118B#23-21 | 3125126336 | Polido R. | |
| 9 | Rosalba Velazquez | Cra. 118B#23-30 | 3152257336 | Rosalba Velazquez | |
| 10 | Maria Diaz | Cra. 118B#23-24 | 3123611829 | Maria Diaz | |
| 11 | Silvia Correa | Cra. 118B#23-28 | 3214935040 | Silvia correa | |
| 12 | Yolanda Mesa | Cra. 118B#23-31 | 4216549 | Yolanda Mesa | |
| 13 | Sin informacion | Cra. 118B#23-36 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 14 | Sin informacion | Cra. 118B#23-33 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 15 | Sin informacion | 118A-67 Calle 23B. | — " — | — " — | Bajo puerta |
| | | Cra. 118B#23-03. | — " — | — " — | |

Total de piezas entregadas: 16 Afiches 0 Volantes 16

| Elaboró - Contratista | | Revisó - Interventoría |
|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | Paola Moya |
| Firma | | |

| | |
|---|---|
| | Fondo de Desarrollo Local de Fontibon |
| | Contrato FDLF-COP-711-2024 |
| | Gestión Social |
| | Registro Fotográfico |

Fecha: agosto 2 de 2025 Lugar: Carrera 118B entre calle 23 y calle 23B

Actividad Notificación de primera visita para realizar actas de vecindad

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Obvaciones:

Se entrega puerta a puerta volante para notificar primera visita para levantamiento de actas de vecindad en el CIV.9000393.

| Código | Versión |
|---|---|
| CIS-06 | 0 |

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | Paola Amaya | Paola Amaya |
| Cargo | Residente social | P.S Interventoría | P.S Interventoría |
| Firma | | | |

# Notificación segunda visita para el levantamiento de actas de vecindad

## Construcción de malla vial y espacio público

### FDLF-COP-711-2024

Volante: GOB20250146-036 Fecha: 01-08-2025 Localidad: Fontibón.

Debido a que, del **lunes 4 al viernes 8 de agosto de 2025** se visito por primera vez este predio sin encontrar quien atendiera el levantamiento de acta de vecindad, se programó **una segunda visita el próximo lunes 11 de agosto de 2025** donde, el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón a través del contratista encargado de esta obra **CONSORCIO VIAS FONTIBÓN 2024**, pretende culminar este proceso en los predios que rodean el segmento vial ubicado en la **Carrera 118B entre calle 23 y calle 23B.**

Esta actividad consiste en el registro escrito y fotográfico de las condiciones externas e internas de los predios antes del inicio de actividades constructivas. El acta de vecindad le servirá al propietario como soporte en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.

Para realizar esta actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su autorización para el ingreso y acompañamiento durante esta diligencia; esto no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos; en caso de no encontrar una persona que atienda y/o suministre la información necesaria, se agendará una **última visita**; una vez cumplida la programación en caso de no tener acceso al predio, se levantará acta de vecindad de fachada con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

| Profesionales que realizarán la actividad | |
|---|---|
| Residente técnico contratista: | Camilo Carvajal |
| Residente Social contratista: | Lida Perdomo |
| Residente técnico de interventoría | Daniel Duitama |
| Residente social interventoría | Jessica Paola Amaya |

Si desea más información sobre este tema, o coordinar una nueva visita, puede comunicarse con nuestro **Punto de Atención Ciudadana –P.A.C-.**

**Contáctanos:**

3043621979

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

BOGOTÁ

| | Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ | Control de entrega piezas informativas | | |
| | Código | Proceso | Versión |
| | GS-1 | Gestión Social | 0 |

CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN

Nombre de la pieza informativa: Notificación 2da visita para levantamiento actas de vecindad

Contrato: FDLF-COP-711-2024 Responsable: Lida Perdomo Fecha: 08/08/2025

Barrio: Refugio CIV. 9000393

| N° | Nombre y apellidos | Dirección | Teléfono | Firma | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Fda Patiño | Cra. 118B # 23-76 | 3028372127 | Maria Fernanda | |
| 2 | Fitiven Arellano | Cra. 118B # 23-36 | 3176630472 | Shiven Arellano | |
| 3 | Sin información | Cra. 118B # 23-28 | — " — | — " — | Recibe menor |
| 4 | Sin información | Cll 23B # 118A-69 | — " — | — " — | Bajo puerta |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

Total de piezas entregadas: 4 Afiches 0 Volantes 4

| | Elaboró - Contratista | Revisó - Interventoría |
|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | Paola Amaya |
| Firma | | |

# Notificación última visita para el levantamiento de actas de vecindad

## Construcción de malla vial y espacio público

### FDLF-COP-711-2024

Volante: GOB20250146-037 Fecha: 01-08-2025 Localidad: Fontibón.

Debido a que, del **lunes 4 al viernes 8 de agosto de 2025,** y el día **lunes 11 de agosto de 2025** se visitó este predio sin encontrar quien atendiera el levantamiento de acta de vecindad, se programó **una última visita el próximo martes 12 de agosto de 2025** donde, el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón a través del contratista encargado de esta obra, **CONSORCIO VIAS FONTIBÓN 2024,** pretende culminar este proceso en los predios que rodean el segmento vial ubicado en la **Carrera 118B entre calle 23 y calle 23B.**

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita y fotográfica las condiciones actuales de estos antes del inicio de la obra. Este documento le servirá al propietario como soporte en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista.

Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta; esta actividad no tiene ningún costo ni requiere la entrega de documentos. Una vez cumplida la programación, en caso de no encontrar a una persona que atienda y/o suministre la información necesaria en esta última oportunidad, se levantará acta de vecindad de fachada con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

| Profesionales que realizarán la actividad | |
|---|---|
| Residente técnico contratista: | Camilo Carvajal |
| Residente Social contratista: | Lida Perdomo |
| Residente técnico de interventoría | Daniel Duitama |
| Residente social interventoría | Jessica Paola Amaya |

Si desea más información sobre este tema, o coordinar una nueva visita, puede comunicarse con nuestro **Punto de Atención Ciudadana –P.A.C-.**

## Contáctanos:

3043621979

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

BOGOTÁ

3276

Fondo de Desarrollo Local de Fontibón

Control de entrega piezas informativas

| Código | Proceso | Versión |
|---|---|---|
| GS-1 | Gestión Social | 0 |

CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN

Nombre de la pieza informativa: Notificación 3ra visita para levantamiento de acta de vecindad

Contrato: FDLF-COP-711-2024 Responsable: Lida Perdomo Fecha: 11/08/2025

Barrio: Refugio CIV. 9000393

| N° | Nombre y apellidos | Dirección | Teléfono | Firma | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yguerly Lugo | Cll 23B # 118A-67 | 3114866245 | Yguerly Lugo | |
| 2 | Stiven Arellano | CRA 118B # 23-35 | 3196630472 | Stiven Arellano | |
| 3 | Sin información | Cra. 118B # 23-16 | —"— | —"— | Recibe menor. |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

Total de piezas entregadas: 3. Afiches 0 Volantes 3

| | Elaboró - Contratista | Revisó - Interventoria |
|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | |
| Firma | | |

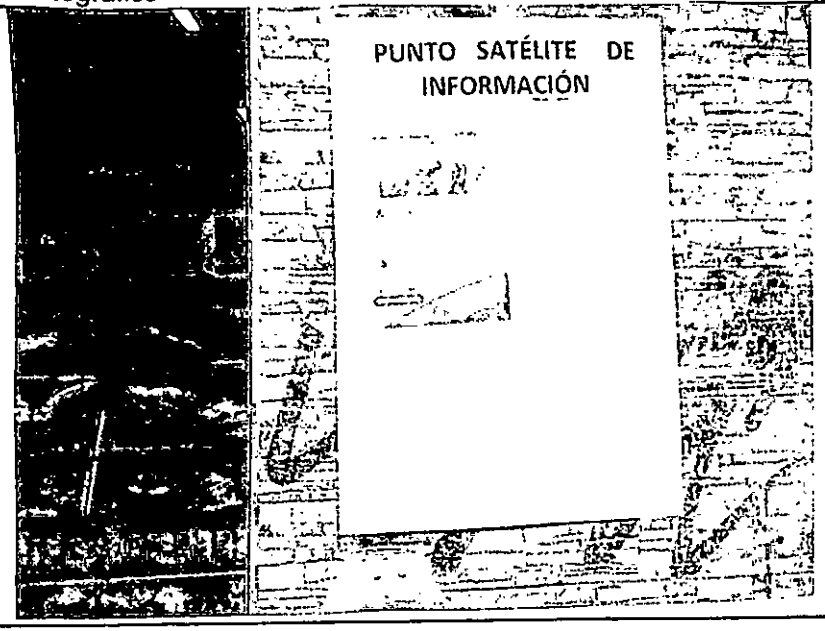
96

# Anexo 3.

# Control de Puntos de información.

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Fontibón | Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | | CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN |
| | Contrato FDLF-COP-711-2024 | | |
| | Control de Puntos de Información -P.I- | | |
| Código | Proceso | Versión | |
| GS-2 | Gestión Social | 0 | |

1. Registro Fotográfico




2. Datos del Punto de Información -P.I-

Nombre del lugar: Bio Pollo
Ubicación: Calle 23B #119-03
Teléfono: 321 272 3935
Persona contacto: Oscar Castillo
Fecha: Julio 25 de 2025

3. Piezas informativas publicadas

| Tipo | | Cantidad |
|---|---|---|
| Afiche | ☐ | |
| Volante | ☒ | 1 |
| Plegable | ☐ | |
| Boletín | ☐ | |
| Otro | ☐ | |

Cúal? _____

Instalación ☐ Actualización ☐ Renovación ☒

4. Observaciones

MONC.

5. Firmas

Propietario /o quien autoriza

Residente social del contratista

Residente Social Interventoría

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOGOTÁ Alcaldía Local de Fontibón | Fondo de Desarrollo Local de Fontibón | | CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN |
| | Contrato FDLF-COP-711-2024 | | |
| | Control de Puntos de Información -P.I- | | |
| Código | Proceso | Versión | |
| GS-2 | Gestión Social | 0 | |

1. Registro Fotográfico



2. Datos del Punto de Información -P.I-

Nombre del lugar: Un centavo menos
Ubicación: Cll 23B # 116B-25
Teléfono: 320 475 2474
Persona contacto: Carlos Alberto Tovar
Fecha: Julio 25 de 2025

3. Piezas informativas publicadas

| Tipo | | Cantidad |
|---|---|---|
| Afiche | ☐ | |
| Volante | ☑ | 7 |
| Plegable | ☐ | |
| Boletín | ☐ | |
| Otro | ☐ | |

Cúal? _____

Instalación [X] Actualización [ ] Renovación [ ]

4. Observaciones

Volante MONC.

5. Firmas

Propietario /o quien autoriza

Residente social del contratista

Residente Social Interventoría

Powered by CamScanner

# Anexo 4.

# Gestión reunión Bahía Solano

# Gestión reunión extraordinaria Bahía Solano

Contrato vías Fontibón
Fredy, Jackeline, Sonia, TÚ

9/7/2025

Fredy Velasco Bahía Solano
si claro 3:07 p.m.

Muchas gracias don Fredy 3:12 p.m.

Entonces allá nos vemos 3:12 p.m.

Fredy Velasco Bahía Solano
ok 3:14 p.m.

Sonia Casa Azul Bahía Solano
*Se eliminó este mensaje.* 3:15 p.m.

15/7/2025

Hola a todos buenos días. Cómo estan? 6:28 a.m.

Les presentamos excusas de antemano pero en vista de que aún se siguen pronunciando desde las entidades distritales frente al caso me solicitaron cancelar nuestra reunión el día de mañana y en cuanto tengamos más luz al respecto volver a citarlos para poder tomar una decisión con buenos fundamentos 6:33 a.m.

Jackeline Bahía Solano
Buen día, gracias a Dios bien por este lado 6:34 a.m.

Ok 6:34 a.m.

Gracias por su comprensión 6:41 a.m.

Buenas tardes de nuevo, por favor me confirman **@Fredy Velasco Bahía Solano. @Sonia Casa Azul Bahía Solano** que hayan quedado informados 3:31 p.m.


Fredy Velasco Bahía Solano
si si 3:47 p.m.

> Fredy Velasco Bahía Solano
> si si

Gracias don Fredy 3:47 p.m.

+ Escribe un mensaje

Sonia Casa Azul Bahía Solano



Gracias 9:24 a.m.


Que pena 9:24 a.m.



Ya llegue 9:42 a.m.

Sume ce está ahí 9:42 a.m.

15/7/2025




Muchas gracias señora Sonia 2:45 p.m.

Apenas tenga razón me vuelvo a comunicar con ustedes 2:45 p.m.

y reprogramamos la reunión 2:45 p.m.

Gracias 2:45 p.m.



Con gusto 2:46 p.m.

Escribe un mensaje

JOSEHF Bahía Solano

4:05 p.m.

26/5/2025

Señorita Lida buen día 12:01 p.m.

Quería preguntarle como les fue con mi correo 12:04 p.m.

[redacted]
2:46 p.m.

8/7/2025

Lida buena tarde me haces un favor me cambias en número de celular ya que este es el personal porfa 4:41 p.m.

Ya te envío el número 4:41 p.m.

[Nombre] Tigo FAMILIA
[Móvil] 305 4769864 4:42 p.m.

Sería incluir este y retirar mi número personal 4:42 p.m.

Buenas tardes profesor, si señor 4:43 p.m.

Gracias 4:43 p.m.

Al fin para cuando queda la reunión. 4:43 p.m.

15/7/2025

Profesor buenas tardes, les presentamos excusas de antemano pero en vista de que aún se siguen pronunciando desde las entidades distritales frente al caso me solicitaron cancelar nuestra reunión el día de mañana y en cuanto tengamos más luz al respecto volver a citarlos para poder tomar una decisión con buenos fundamentos 2:36 p.m.

Por favor que confirma cuando lea el mensaje y de igual manera me estaría comunicando con ustedes más adelante para reprogramar la reunión. Gracias 2:36 p.m.

Hola buena tarde ok 5:09 p.m.

Gracias por confirmar 5:12 p.m.

Escribe un mensaje

# Anexo 5.

# Soportes reunión acueducto

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

# AYUDA DE MEMORIA

Página: de:

Reunión de: Recorrido de obra Alcaldía

Fecha: 01 de agosto 2025 Hora inicio: 9:15 Hora Final:

Lugar: Barrio Villa Andrea

Asistentes:

Ver Lista de Asistencia

**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:**

Se realiza la presentación de los participantes de la reunión para la revisión y avance de la obra para dar inicio a la rehabilitación y construcción de la vía 134, se les informa a la alcaldía local que se terminan obra máximo de Diciembre, después de la entrega por parte de la EAAB, la alcaldía coordina para el inicio de las actividades, comisión topográfica para el diseño de la vía.

El contratista Consorcio Hav zona 3, debe recuperar todo el espacio público, la alcaldía de Fontibón el segmento vial de la carrera 134, Se programa reunión para la revisión de estudios y diseños 14 de agosto 2025 a las 2 PM.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

# LISTA DE ASISTENCIA

Nombre de evento o actividad: Recorrido de obra Alcaldia local

Fecha: 01 de agosto 2025

Hora inicio: 9:15

Nombre del instructor:

Lugar: Barrio Villa andrea

| No | NOMBRE | REGISTRO / CÉDULA | ÁREA / ENTIDAD | E-MAIL | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Florado A | 52.959.013 | Interventoria | —— | 3164628781 | |
| 2 | Jesus A. Ramos M. | 79'411.596 | EAAB-23 | jramos@acueducto.com.co | 3045760919 | |
| 3 | Juan Carlos Garzón S | 79.431.333 | CONSORCIO REDES HAV | RESIDENTE OBRA @gmail | 3102610676 | |
| 4 | Alejandra Castillo C. | 1007560009 | Interventoria. | PROFESST466@gmail.com | 3135530239 | |
| 5 | Jesus Andres Cano S | 1233496905 | Interventoria | —— | 3219399838 | |
| 6 | Paola Diaz | 1016057574 | CONSORCIO REDES HAV | SSThav3@gmail.com | 3102948853 | |
| 7 | Diana Carolina Cortes C | 1013649160 | Consorcio VIAS Fontibon | consoviasfontibon@gmail.com | 3202800398 | |
| 8 | Lida Perdomo | 1023887282 | Consorcio Vias Fontibon | " " | 3043621979 | |
| 9 | Henry Alejandro Galindo Madrigal | 80.779.485 | Ing Ingeniería SAS Interventoría | agalindo@ingingeniería.com.co | 3213146077 | |
| 10 | Adriana Y. Ortiz U. | 20.888.119 | FDL Fontibón | adrianaortiz.trabajo2023@gmail.com | 3102500972 | |
| 11 | Santiago Reyes | 1010240453 | Jor - Fontibon | Santiago.reyes@gct | 3057051586 | |
| 12 | | | | | | |

MPFD0801F04-02

Powered by CamScanner

| BOGOTÁ | Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda |
|---|---|
| | Contrato FDLF-COP-711-2024 |
| | Gestión Social |
| | Registro Fotográfico |

Fecha: Julio 25 de 2025 Lugar: Carrera 134, calle 17D

Actividad Reunión con Acueducto

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Obvaciones:

Se asiste a reunión con el acueducto y contratista de redes en el barrio Villa Andrea para evaluar las posibilidades de coordinar la ejecución de su contrato de manera simultánea con este contrato.

| Código | Version |
|---|---|
| GS-06 | 0 |

| | Elaboro | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre | Lida Perdomo | Paola Amaya | Paola Amaya |
| Cargo | Residente social | P.S Interventoría | P.S Interventoría |
| Firma | | | |

# Anexo 6.

# Trazabilidad de actas de vecindad.

Bogotá D. C. 31 de julio de 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-130***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 – 94
Ciudad. Bogotá D.C

**Ref.** "CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Remisión actas de vecindad.

Respetados señores;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, remite para su revisión y fines consiguientes archivo físico actas de vecindad, caracterización vial e inventario de predios de los CIV. 9000204 del barrio Cassandra, CIV.9001780 y 9001817 del bario Bahía Solano y, los CIV.9000181 y CIV.9000362 del barrio Refugio.

Así mismo, queda a su disposición el siguiente link para la consulta de los registros fotográficos tomados en estos segmentos viales:

https://drive.google.com/drive/folders/1GlgenPjt8Y5boVozbKRURHv86Fz0aYZE?usp=drive_link

Quedamos atentos a sus observaciones y/o aprobación.

Cordialmente,

DIANA MARCELA PACHECO
Representante Legal Consorcio
Contrato de Obra FDLF-COP-711-2024
Anexos: 196 folios.

3283 53

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

INGENIERIA

**INGI-50260-118-25**

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2025

Señores:
**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**Att. Dra. DIANA MARCELA PACHECO**
Representante legal consorcio
Contrato de obra FDLF-COP-711-2024
viasfontibon2024@gmail.com
Kr. 07B Nº 124-39
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-COP-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024 – REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** RESPUESTA AL COMUNICADO VIASFONTIBON-711-2024-130: REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales de esta Interventoría, nos permitimos informar que se dio por recibida, revisada y aprobada la documentación correspondiente a las actas de vecindad, caracterización de espacio público e inventario de actas, presentadas para los siguientes segmentos viales:

- Bahía solano, CIV 9001817 y 9001780.
- Refugio, CIV 900181 y 900362.
- Casandra, 900204.

Por consiguiente se remite la documentación debidamente firmada para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier comentario.

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

INGENIERIA

**INGI-50260-118-25**

Cordialmente,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: N/A
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Jessica Paola Amaya Pérez– Residente social.
Reviso: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3284 54

Gmail

**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 <viasfontibon2024@gmail.com>**

# INGI-50260-118-25: RESPUESTA AL COMUNICADO VIASFONTIBON-711-2024-130: REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD

1 mensaje

**Lina Chaparro** <asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co> 6 de agosto de 2025, 8:45 a.m.
Para: Viasfontibon2024@gmail.com
CC: agalindo@ingingenieria.com.co, sparra@ingingenieria.com.co, residenteinterventoria1@ingingenieria.com.co, residentesocial1@ingingenieria.com.co

Buenas tardes.

Cordial saludo

Por medio del presente la Interventoría ING INGENIERIA S.A.S se permite remitir el comunicado INGI-50260-118-25 con asunto "RESPUESTA AL COMUNICADO VIASFONTIBON-711-2024-130: REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD." para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

**LINA MARIA CHAPARRO LEON**

**ING INGENIERIA**

Asistente Administrativa de Proyectos

asistenteproyecto2@ingingenieria.com.co

Dirección: Calle 114 A No. 53-94

Celular 3144130385

Bogotá D.C.

**INGI-50260-118-25.pdf**
486K

# Anexo 7.

# Soportes de solicitudes ciudadanas.

3285 SS

Fondo de Desarrollo Local de Fontibón

FDLF-COP-711-2024

Atención ciudadana No

| Fecha | 25 | 07 | 25 |
|---|---|---|---|

| Contrato | FDLF-COP-711-2024 |
|---|---|

1. Datos del ciudadano (a)

Nombre y apellidos Luis Villamil

D.I 7720767 Teléfono 320 9997374

Dirección Cra. 119 # 23-30.

Canal de atención Presencial

2. Tipo de requerimiento

| | |
|---|---|
| Pregunta | |
| Queja | |
| Reclamo | ✓ |
| Sugerencia | |

3. Descripción

El ciudadano requiere se repare acometida de agua ya que durante excavación del día miercoles 23 de julio se encuentra sin agua.

4. Sintesis de respuesta o solución dada

Se realiza la reparación mismo día reportado

5. Relación de actividades de seguimiento (Si aplica)

| Responsable | Descripción | Fecha |
|---|---|---|

6. Cierre de la afectación

Los abajo firmantes manifiestan estar conformes con la atención recibida frente al proceso anteriormente descrito y encontrarse a paz y salvo con el contratista sin lugar a futuras reclamaciones.

En constancia de lo anterior se firma a los 25 días del mes de Julio del año 2025 en Bogotá D.C

Ciudadano

Nombre - Luis Villamil

Cédula - 7720767

Residente social

Residente social Interventoria

| Código | Versión | Elaboró | Aprobó | Contrato |
|---|---|---|---|---|
| GS-04 | 0 | Profesional Social contratista | Residente social Interventoria | FDLF-COP-711-2024 |

Powered by CamScanner

Fondo de Desarrollo Local

FDLF-COP-711-2024

Atención ciudadana No

| Fecha | 05 | 08 | 25 |
|---|---|---|---|

| Contrato | FDLF-COP-711-2024 |
|---|---|

**1. Datos del ciudadano (a)**

Nombre y apellidos Nelsy Cardoso

D.I NR Teléfono 3186280407.

Dirección Cra. 118B Bis # 23-08

Canal de atención Telefonica

**2. Tipo de requerimiento**

| | |
|---|---|
| Pregunta | |
| Queja | |
| Reclamo | X |
| Sugerencia | |

**3. Descripción**

Debido a rotura en la red de gas durante excavaciones de la obra se suspendio el servicio en su vivienda por lo cual solicita la reconexion.

**4. Sintesis de respuesta o solución dada**

Se comunica el procedimiento para la reconexion. Se informa al coordinador de Vanti en la zona, pasado el tiempo indicado por el coordinador se llama a la linea 164 y finalmente se verifica la reconexion el dia 6 de agosto

**5. Relación de actividades de seguimiento (Si aplica)**

| Responsable | Descripción | Fecha |
|---|---|---|
| Contratista | Trasladar a Vanti. | Ago-05-2025 |
| Contratista | Verificar reconexion | Ago-06-2025 |

**6. Cierre de la afectación**

Los abajo firmantes manifiestan estar conformes con la atención recibida frente al proceso anteriormente descrito y encontrarse a paz y salvo con el contratista sin lugar a futuras reclamaciones.

En constancia de lo anterior se firma a los ___ días del mes de _____ del año 2025 en Bogotá D.C

Ciudadano

Nombre

Cédula

Residente social

Residente social - Interventoria

| Código | Versión | Elaboró | Aprobó | Contrato |
|---|---|---|---|---|
| GS-04 | 0 | Profesional Social contratista | Residente social Interventoria | FDLF-COP-711-2024 |

# Anexo 8.

# Registro de Generación de Empleo.

Fondo de Desarrollo Local de Fontibón
Contrato FDLF-COP-711-2024
Gestión Social
Registro de Generación de Empleo

Periodo de reporte: Desde el 12 de julio hasta el 11 de agosto de 2025

| No. | Nombre | Cédula | Sujeto de especial protección | Cargo | Fecha de ingreso | Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Javier Herrera Molano | 80725594 | NR | Director de obra | 24/04/2025 | NA |
| 2 | Camilo Andres Carvajal Melo | 1020713746 | NR | Residente de obra | 24/04/2025 | NA |
| 3 | Jair Andres Parra Garzón | 79813449 | NR | Residente de obra | 24/04/2005 | NA |
| 4 | Juan Felipe Pineda Perilla | 1033796332 | NR | Residente ambiental | 3/03/2025 | NA |
| 5 | Miguel Angel Gutierrez Cubillos | 3137389 | NR | Especialista en geotecnia y pavimentos | 24/04/2025 | NA |
| 6 | Julian Andres Puyo Gamboa | 1010200015 | NR | Especialista en transito y transporte | 24/04/2025 | NA |
| 7 | Edwuin German Suarez Ferro | 1101175545 | NR | Especialista en redes secas | 24/04/2025 | NA |
| 8 | Rusbel Bohorquez Diaz | 1022935062 | NR | Topográfo | 24/04/2025 | NA |
| 9 | Edisson Alfredo Barriga Quintero | 80853605 | NR | Especialista en estructuras | 24/04/2025 | 12/06/2025 |
| 10 | Yolanda Patricia Varón Hernandéz | 52088112 | 2 | Especialista en redes hidrosanitarias | 12/02/2025 | NA |
| 11 | Misrley Pilar Perez Ramirez | 35536440 | 2 | Residente SST | 12/02/2025 | NA |
| 12 | Nicole Haneidy Reyes Sierra | 1.049.647.423 | 2 | Ingeniera auxiliar | 12/02/2025 | NA |
| 13 | Diana Carolina Contreras | 1013619160 | 2 | Especialista en Costos y presupuesto | 12/02/2025 | NA |
| 14 | Lida Yuried Perdomo | 1023887282 | 2 | Residente social | 12/02/2025 | NA |
| 15 | Erson Diaz Fontalvo | 1049924070 | NR | Ayudante de obra | 21/05/2025 | NA |
| 16 | Ferley Mosquera Córdoba | 1003928818 | NR | Ayudante de obra | 21/05/2025 | NA |

Fondo Desarrollo Local de Fontibón
Contrato FDLF-COP-711-2024
Gestión Social
Registro de Generación de Empleo

CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN

Periodo de reporte: Desde el 12 de julio hasta el 11 de agosto de 2025

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Juan Andrés Montaño Camacho | 1113515872 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 21/05/2025 | NA |
| 18 | John James Mosquera Córdoba | 1077434177 | NR | | | | | | | | Oficial de obra | 21/05/2025 | NA |
| 19 | Junior Mauricio Angulo Angulo | 1080833567 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 21/05/2025 | NA |
| 20 | Sergio Luis Caraballo Velásquez | 1.044.913.580 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 21/05/2025 | NA |
| 21 | Arnol Enrique Guzman Martinez | 1.063.354.591 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 21/05/2025 | NA |
| 22 | Johan Alexander Pulido Pelaez | 1.073.251.484 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 22/05/2025 | NA |
| 23 | Wilaida Isabel Montiel Pushaina | 1.134.177.654 | 2 | | | | | | | | Boal | 23/05/2025 | NA |
| 24 | Eurípides Albeiro Romero Espitia | 79854591 | NR | | | | | | | | Operario | 27/05/2025 | NA |
| 25 | Héctor Ortiz Gutiérrez | 79517718 | NR | | | | | | | | Operario | 10/06/2025 | NA |
| 26 | Jennifer Lorena Mora Hernández | 1013633916 | 2 | | | | | | | | Residente Técnica | 24/04/2025 | 30/07/2025 |
| 27 | Maribel Murcia Espinoza | 1030668583 | 2 | | | | | | | | Inspectora SST | 28/04/2025 | NA |
| 28 | Enmanuel Stiwar Castro Solis | 1150935222 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 28/05/2025 | NA |
| 29 | Francisco Javier Delgadillo Tafur | 79854591 | 1 | | | | | | | | Ayudante de obra | 28/05/2025 | NA |
| 30 | Jair Emir Mosquera Cordoba | 1077425132 | NR | | | | | | | | Oficial de obra | 4/06/2025 | NA |
| 31 | Darlinton Baloye Sereno | 1077460350 | NR | | | | | | | | Oficial de obra | 4/06/2025 | NA |
| 32 | Rafael Antonio Sanchez Barraza | 1082400218 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 24/06/2025 | NA |
| 33 | Henrry Pachon Bello | 80238533 | NR | | | | | | | | Oficial de obra | 18/06/2025 | 31/07/2025 |
| 34 | Jesus David Hincapie Arango | 1143424001 | NR | | | | | | | | Operario | 16/06/2025 | NA |
| 35 | Wilder Alexander Ortega Hurtado | 101605599 | 1 | | | | | | | | Ayudante de obra | 24/06/2025 | NA |
| 36 | Andres Felipe Camilo Aramendis | 1000933135 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 15/07/2025 | NA |
| 37 | Oscar Alexander Garces | 87942663 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 13/07/2025 | NA |
| 38 | Jose Luis Trujillo Perdomo | 5837198 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 14/07/2025 | NA |

Fondo de Desarrollo Local de Fontibón
Contrato FDLF-COP-711-2024
Gestión Social
Registro de Generación de Empleo

CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN

Periodo de reporte: Desde el 12 de julio hasta el 11 de agosto de 2025

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Yeiner Antonio Rivas Cordoba | 1001846383 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 22/07/2025 | NA |
| 40 | Omar Javier Ravelo Ferreira | 1014279583 | NR | | | | | | | | Oficial de obra | 1/08/2025 | NA |
| 41 | Jhon Jairo Caballero Rodriguez | 1052963121 | NR | | | | | | | | Ayudante de obra | 1/08/2025 | NA |
| 42 | Primitivo Bastida Segura | 16735465 | NR | | | | | | | | Oficial de obra | 1/08/2025 | NA |
| 43 | Jorge Eduardo Supelano Chilatra | 1026557203 | NR | | | | | | | | Operario | 1/08/2025 | NA |
| 44 | Oscar Javier Romero Rojas | 79767343 | NR | | | | | | | | Operario | 1/08/2025 | NA |
| 45 | Juan Sebastian Moreno Barreto | 1018494195 | NR | | | | | | | | Residente Técnico | 6/08/2025 | NA |
| 46 | Diana Carolina Moreno Rubiano | 1030679244 | 2 | | | | | | | | Inspectora Técnica | 6/08/2025 | NA |
| 47 | Diego Andres Miranda Osorio | 1074136633 | NR | | | | | | | | Inspector técnico | 15/07/2025 | NA |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | |

Nota. Los numerales del Sujeto de especial protección corresponden con la codificación presentada en el P.G.S / NR = No registra

| Código | Versión |
|---|---|
| GS-06 | 0 |

| | Elaboró | Revisó | Firma |
|---|---|---|---|
| Nombre: | Lida Perdomo | Michael Herrera | |
| Cargo: | Residente social | Director de obra | |

# Anexo 9.

# Trazabilidad Informe Social No. 5.

Bogotá D. C. 16 de julio de 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-123***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 – 94
Ciudad. Bogotá D.C

**Ref.** "CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Remisión Informe de gestión social No.5 V.0

Respetados señores;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, remite el informe de Gestión Social No.5 V.0 correspondiente al quinto periodo contractual comprendido entre el 12 de junio y el 11 de julio de 2025.

Quedamos atentos a sus observaciones y/o aprobación.

Cordialmente,

DIANA MARCELA PACHECO
Representante Legal Consorcio
Contrato de Obra FDLF-COP-711-2024
Archivo Consorcio
Anexos: Dto. PDF 82 folios

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 711 de 2024 | CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C | INFORME AVANCE 06<br>Julio 2025 \| Versión 1<br>Página 1 |

**INFORME TECNICO 06 DE 12 DE JULIO DE 2025 AL 11 DE AGOSTO DE 2025**

| **DESTINATARIO:** |
|---|
| INTERVENTORÍA: ING INGENIERIA S.A.S |
| ALCALDÍA: ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON |

| **CONTROL DE REVISIONES** | | |
|---|---|---|
| **REVISIÓN** | **FECHA** | **OBSERVACIÓN** |
| 2 | 16-08-2025 | Atención a observaciones emitidas por interventoría |

| **LISTA DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE APROBACIÓN** | | |
|---|---|---|
| **ELABORÓ** | NOMBRE | Ing. Camilo Carvajal<br>Residente obra – CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 |
| | FECHA | 14 DE AGOSTO 2025 |
| | FIRMA | |
| **REVISÓ** | NOMBRE | Ing. Diana Pacheco<br>Representante Legal – CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 |
| | FECHA | 14 DE AGOSTO 2025 |
| | FIRMA | |
| **APROBÓ** | NOMBRE | Ing. Alejandro Galindo y/o Ing. Daniel Duitama<br>director de interventoría y/o Residente de interventoría – ING INGENIERIA S.A.S |
| | FECHA | |
| | FIRMA | |

**TABLA DE CONTENIDO**


1 INTRODUCCIÓN ..... 6
2 GENERALIDADES ..... 7
2.1 ANTECEDENTES ..... 7
2.2 DATOS GENERALES DEL CONTRATO ..... 8
3 ASPECTOS LEGALES ..... 9
3.1 ACTAS SUSCRITAS ..... 9
3.2 PÓLIZAS ..... 9
4 ASPECTOS TÉCNICOS ..... 10
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 10
4.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN ..... 12
5 ETAPA DIAGNÓSTICA ..... 15
5.1 SEGUIMIENTO s contractuales ..... 15
5.1.1 Viabilidad y Zonificación de los segmentos a Intervenir ..... 15
6 COMITES Y REGISTRO DOCUMENTAL ..... 21
6.1 CONTROL DE COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA ..... 21
6.1.1 Correspondencia enviada ..... 21
6.1.2 Correspondencia recibida ..... 25
6.2 REUNIONES Y COMITES ..... 28
7 CONCLUSIONES ..... 29
ANEXOS ..... 30
ANEXO 1. CORRESPONDENCIA ENVIADA ..... 300
ANEXO 2. CORRESPONDENCIA RFECIBIDA ..... 31
ANEXO 3. REUNIONES Y COMITÉS DESARROLLADAS ..... 32

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Datos Generales del Contrato ..... 8
Tabla 2. Actas suscritas ..... 9
Tabla 3. Pólizas legislación del contrato ..... 9
Tabla 4. Listado de CIV objeto de Intervención ..... 11
Tabla 5. Intervención por PK ..... 14
Tabla 6. Correspondencia enviada AR-OP ..... 22
Tabla 7. Correspondencia recibida AR-OP ..... 25
Tabla 8. Reuniones y comités desarrolladas ..... 27

## LISTADO DE IMAGENES


Ilustración 1. Localización Bogotá ..... 12
Ilustración 2. Plano Localización Localidad de Fontibón ..... 13

## LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1. CORRESPONDENCIA ENVIADA ..... 30

ANEXO 2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA ..... 31

ANEXO 3. REUNIONES Y COMITÉS DESARROLLADAS ..... 32

# 1 INTRODUCCIÓN

Mediante el proceso de contratación No. [FDLF-LP-003-2024, en la ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON se adjudicó el proceso cuyo objeto es, "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.", a la empresa contratista CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 bajo el contrato de obra pública No 711 de 2024, el cual contempla las actividades necesarias para el desarrollo de las obras de conservación de la malla vial local intermedia espacio público de la localidad de Fontibón.

En consecuencia, el informe contiene las de actividades ejecutadas en el periodo comprendido del **12 de JULIO de 2025 al 11 de AGOSTO de 2025** las cuales incluyen el listado de segmentos viales a intervenir y programación de obra a ejecutar.

## 2 GENERALIDADES

### 2.1 ANTECEDENTES

El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón plantea el proyecto mediante el cual se pretende "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, ENLA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C." para ejecutar las obras necesarias para la construcción de la malla vial de la localidad, junto con los demás elementos que componen el sistema de espacio público de los segmentos viales a incluidos dentro del alcance del contrato de consultoría No. FDLF-CC-440-2022. Estas obras deben ser supervisadas y avaladas por parte de la interventoría del contrato y la no objeción por parte de la supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón.

Con el contrato que se derive de este proceso de licitación pública, se pretende construir malla vial tanto en pavimento de concreto hidráulico, como concreto asfáltico, que permita ofrecer a los Fontibonenses un servicio de movilidad de calidad, mediante la inversión de los recursos asignados para el desarrollo de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local para el proyecto 1780. "Un nuevo contrato para la movilidad de Fontibón"

El contratista responsable de la ejecución de las obras debe atender y conocer las vías priorizadas para la movilidad de la malla vial de la localidad, garantizando de esta manera, la optimización de los recursos y la calidad de las intervenciones. Así mismo, tendrá la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías para la intervención de pavimentos y la utilización de equipos de última generación que permitan optimizar los recursos y los rendimientos en obra.

## 2.2 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

La tabla número 1 muestra los datos generales del contrato de acuerdo a los lineamientos presentados contrato de consultoría No. FDLF-CC-440-2022. No.1:

Tabla 1. Datos Generales del Contrato

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 |
| **INTERVENTORÍA:** | ING INGENIERIA S.A.S |
| **OBJETO:** | "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C." |
| **CONTRATO:** | 711 de 2024 |
| **NIT:** | 901898112-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | Diana Marcela Pacheco Hernández |
| **PLAZO INICIAL:** | 9 meses |
| **VALOR CONTRACTUAL:** | 8.045.657.306 |
| **FECHA DE INICIO:** | 12 de febrero de 2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** | 11 de noviembre de2025 |

Fuente: Elaboración Propia

# 3 ASPECTOS LEGALES

## 3.1 ACTAS SUSCRITAS

Tabla 2. Actas suscritas

| No. | NOMBRE DEL ACTA | No. CONSECUTIVO | FECHA | No. FOLIOS | ENTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE INICIO | 1 | 12 de febrero 2025 | 1 | ALCALDÍA DE FONTIBON |

## 3.2 PÓLIZAS

Tabla 3. Pólizas Legalización del Contrato

| PÓLIZAS LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA | No. PÓLIZA | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
| SEGUROS MUNDIAL | CSC-100013526 | LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS | 12-02-2025 | 13-11-2025 | $711.750.000 |
| SEGUROS MUNDIAL | CSC-100051365 | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | 12-02-2025 | 13-11-2025 | $5.229.667.248 |

Fuente: Elaboración Propia

# 4 ASPECTOS TÉCNICOS

## 4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para dar cumplimiento del desarrollo de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local para el proyecto 1780. **"Un nuevo contrato para la movilidad de Fontibón"** para ejecutar las obras necesarias para la construcción de la malla vial de la localidad, junto con los demás elementos que componen el sistema de espacio público de los segmentos viales a incluidos dentro del alcance del contrato de consultoría No. FDLF-CC-440-2022. Cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C." El contratista es el único responsable de los procedimientos constructivos que adopte parala ejecución del objeto contractual, siempre y cuando los mismos cumplan como mínimo con las normas vigentes y se ajusten puntualmente a lo previsto en este documento y a todos los demás documentos del contrato. Por otro lado, deberá cumplir con lo previsto en el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental para llevar a cabo las obras de Construcción, como también el Plan de Gestión Social, Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos.

De acuerdo con los estudios y diseños realizados por la consultoría FDLF-CC-440-2022, el Fondo de desarrollo Local de Fontibón, estableció que para dar cumplimiento a las metas de intervención de 6 kilómetros carril de la malla vial urbana local y/o intermedia con acciones de construcción y/o conservación, así como la intervención de 6.652 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación, propuestas para el año 2024, el presente proyecto priorizó la intervención de 15 segmentos viales que hacen parte de la malla vial local, los cuales son factibles desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, toda vez que se cuenta con los estudios y diseños y la aprobación por parte de entidades distritales competentes y empresas de servicios públicos de los mismos.

Las actividades u obras por ejecutar son en la localidad de Fontibón y son las siguientes:

Construcción de 15 segmentos viales locales junto con su espacio público asociado de Fontibón, entendiendo que son obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de infraestructura de transporte (Ley 1682 de 2013. Artículo 12).

El proyecto se compone de dos etapas, que comprenden actividades pertenecientes a la ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN a obra y la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.

El listado de elementos preseleccionados resultante del modelo de priorización y el resultado de la actualización de filtros y reservas adelantadas por la DTE IDU, se presentan a continuación, donde se especifica los CIV que integran el grupo para ejecución.

Tabla 4. Listado de CIV objeto de Intervención

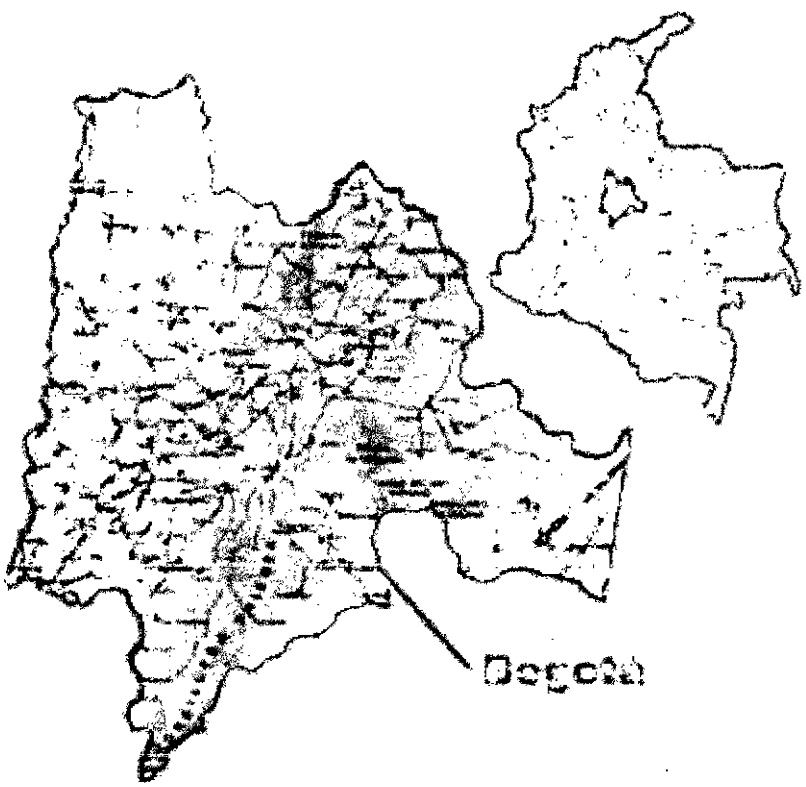
| ITEM | CIV | PK | EJE VIAL | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001817 | 384775 | CALLE 16 H | CARRERA 111 A | CARRERA 111 A BIS |
| 2 | 9001780 | N.E. | CALLE 16 H | CARRERA 111 A BIS | CARRERA 112 |
| 3 | 9000368 | 380986 | CARRERA 118 B | CALLE 23 B | AV. CALLE 24 |
| 4 | 9000393 | 381037 | CARRERA 118 B | CALLE 23 | CALLE 23 B |
| 5 | 9000181 | 380499 | CARRERA 122 | CALLE 23 B | AV. CALLE 24 |
| 6 | 9000379 | 381010 | CARRERA 118 B BIS | CALLE 23 | CALLE 23 B |
| 7 | 9000362 | 380977 | CARRERA 119 | CALLE 23 | CALLE 23 B |
| 8 | 9004860 | S.E. | CARRERA 134 | CALLE 17 C | CALLE 17 C BIS |
| 9 | 9004864 | S.E. | CARRERA 134 | CALLE 17 C BIS | CALLE 17 D |
| 10 | 9004866 | S.E. | CARRERA 134 | CALLE 17 D | CALLE 17 D BIS |
| 11 | 9004869 | S.E. | CARRERA 134 | CALLE 17 D BIS | CALLE 17 F |
| 12 | 9004872 | S.E. | CARRERA 134 | CALLE 17 F | NULL |
| 13 | 9004875 | S.E. | CARRERA 134 | NULL | NULL |
| 14 | 9000204 | 380654 | CALLE 15B | CARRERA 136 | CARRERA 137 |
| 15 | 9002043 | 385377 | CALLE 23 H | CARRERA 96 F BIS | CARRERA 96 F |

Fuente: Elaboración Propia

### 4.1.1 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN

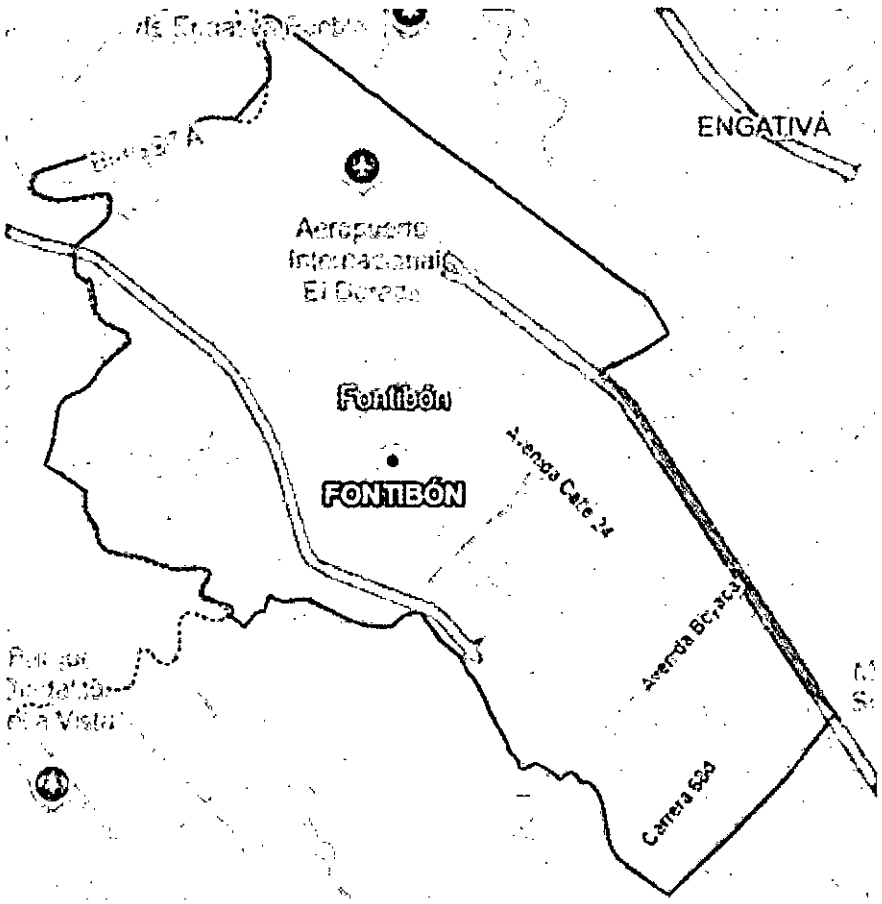
El proyecto se encuentra ubicado en el occidente de la ciudad, en la localidad Fontibón y es número noveno (9) del Distrito Capital de Bogotá. Entre sus residentes predomina el estrato socioeconómico 3 y 4.

Ilustración 1. Localización Bogotá




Fuente: Google Earth y POT

Ilustración 2. Plano Localización Localidad de Fontibón




Fuente: Google Earth y POT

El presente contrato se ejecutará en su totalidad dentro de las 15 PK que conforman la localidad de Fontibón, se relacionan la cantidad de segmentos a intervenir por CIV:

Tabla 5. Intervención por PK

| ITEM | CIV | PK |
|---|---|---|
| 1 | 9001817 | 384775 |
| 2 | 9001780 | N.E. |
| 3 | 9000368 | 380986 |
| 4 | 9000393 | 381037 |
| 5 | 9000181 | 380499 |
| 6 | 9000379 | 381010 |
| 7 | 9000362 | 380977 |
| 8 | 9004860 | S.E. |
| 9 | 9004864 | S.E. |
| 10 | 9004866 | S.E. |
| 11 | 9004869 | S.E. |
| 12 | 9004872 | S.E. |
| 13 | 9004875 | S.E. |
| 14 | 9000204 | 380654 |
| 15 | 9002043 | 385377 |

Fuente: Anexo 1 -Anexo técnico CCE-EICP-IDI-01 licitación

# 5 ETAPA DIAGNÓSTICA

## 5.1 SEGUIMIENTO S CONTRACTUALES

### 5.1.1 Viabilidad y Zonificación de los segmentos a Intervenir:

Mediante el presente documentos se establece los estados actuales de cada de unos de los frentes contractuales que se validan en la ejecución de dicho informe


- **CVI 9001817 – CVI 9001780 Bahía Solano**

En el segmento vial no se han iniciado las actividades, ya que un vecino aledaño manifestó reclamaciones sobre la propiedad de los segmentos viales requeridos para la obra. Esta situación fue reportada en informes anteriores y se encuentra a la espera de las gestiones pertinentes por parte del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, con el fin de avanzar en el proceso de negociación y legalización que permita autorizar el inicio de los trabajos.

- **CVI 9004860 - CVI 9004864 - CVI 9004866 - CVI 9004869 - CVI 9004872 - CVI 9004875 – Villa Andrea**

A la fecha de elaboración del presente informe, los segmentos viales mencionados no presentan actividades de intervención por parte del contratista Consorcio Vías Fontibón. La falta de ejecución se debe a que aún se encuentran pendientes las labores que corresponden al contratista asignado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Actualmente, se está a la espera de la programación y coordinación por parte de dicha entidad, lo cual es necesario para culminar las actividades previas y permitir el inicio de las intervenciones a cargo del Consorcio en estos tramos.

Asimismo, es imperativo mencionar que se llevó a cabo una reunión entre el contratista, la interventoría y la supervisión, junto con los contratistas de la EAAB, con el objetivo de organizar el inicio de actividades y definir el cronograma correspondiente. En dicha reunión, los contratistas de la EAAB indicaron que en un próximo encuentro entregarán las fechas, tiempos de entrega, planos y diseños necesarios para la ejecución de la obra.



**CVI 9004860 - CVI 9004864 - CVI 9004866 - CVI 9004869 - CVI 9004872 - CVI 9004875 – Villa Andrea**

❖ **CVI 9000368- CVI 9000393- CVI 9000181- CVI 9000379- CVI9000362 El Refugio**

**CVI 9000181**

En el segmento vial intervenido se continúa con la instalación de la red de tubería para aguas residuales, incluyendo las respectivas conexiones domiciliarias. Como parte de esta fase, se llevó a cabo la construcción de un pozo en el costado de la calle 23B, con el objetivo de evitar afectaciones a la estructura del pavimento existente en dicha vía. Además, se garantiza la continuidad del flujo de escorrentía, dado que el nuevo pozo construido se encuentra a un nivel superior respecto al pozo de recepción, permitiendo así un adecuado direccionamiento de las aguas.

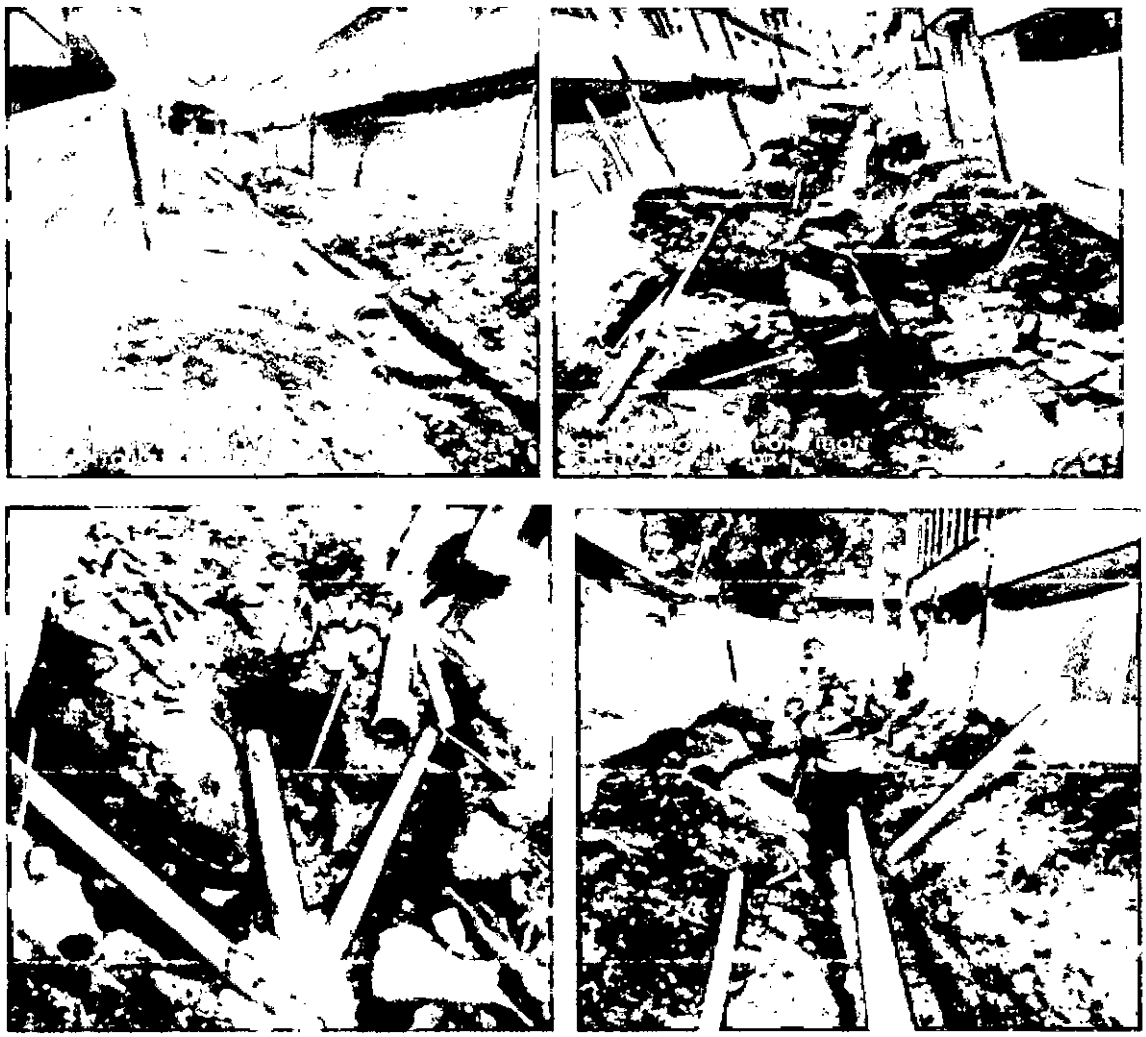



5. CIV 9000181

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 711 de 2024 | CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C | INFORME AVANCE 06.<br>Julio 2025 \| Versión 1<br>Página 17 |

**CIV 9000362**

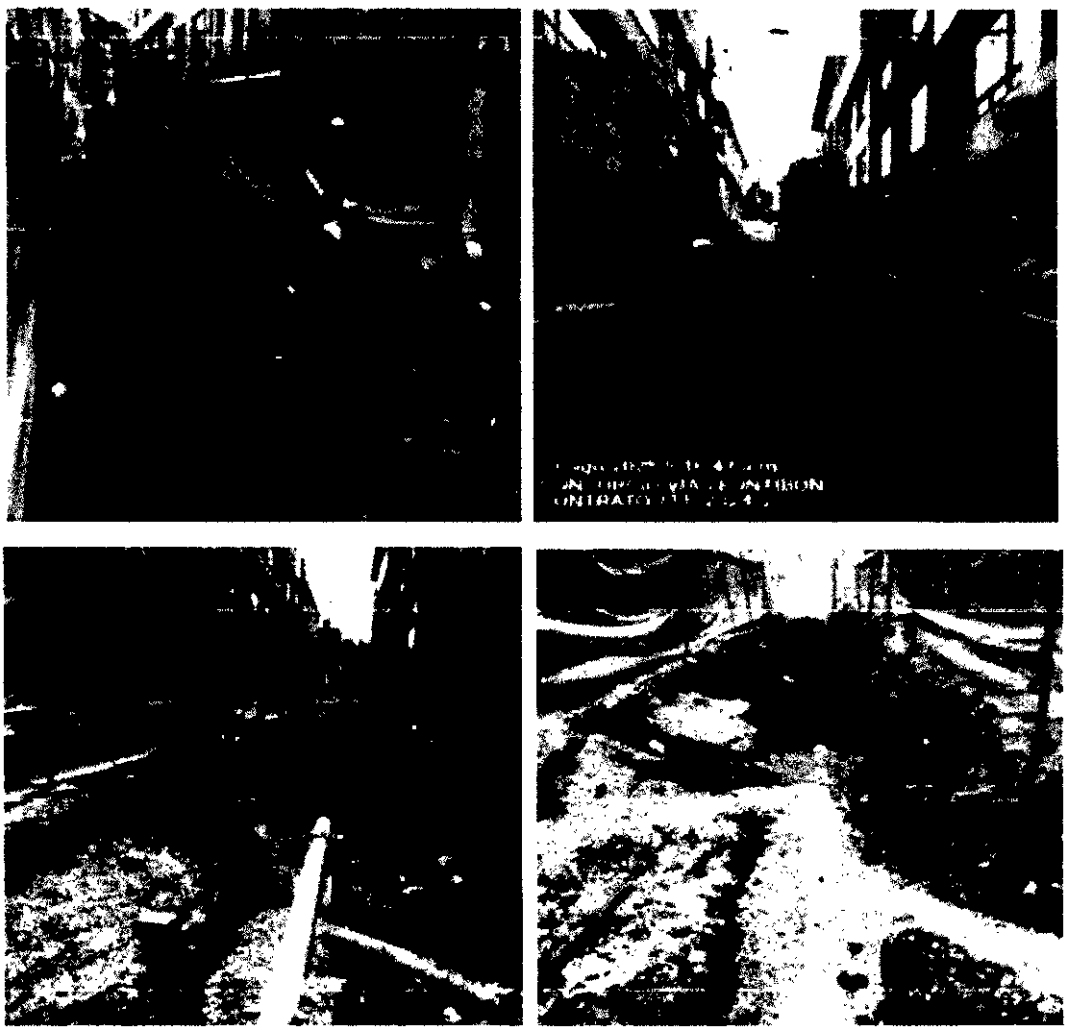
Se da inicio a la obra en el segmento vial intervenido, Se inicia con actividades preliminares de localización, replanteo, cerramiento perimetral donde se lleva a cabo la excavación de la zanja necesaria para la instalación de la tubería de aguas residuales de 8 pulgadas de diámetro, la cual se acompaña de una capa de material filtrante compuesto por triturado de ¾".



7. CIV 9000362

**CIV 9000379**

Se da inicio a la obra en el segmento vial intervenido. Se inicia con actividades preliminares de localización, replanteo, cerramiento perimetral Debido a las dificultades presentadas en el acopio y carga del material de excavación, se ha optado por realizar una excavación por cajeo, con el objetivo de generar un espacio adicional para la excavación de la zanja destinada a la instalación de la tubería de aguas residuales de 8 pulgadas de diámetro.



**6. CIV 9000379**

**CIV 9000393**

En este segmento vial, se concluyen las actividades correspondientes a las actas de vecindad el día 11 de agosto de 2025. Posteriormente, se procederá con el volanteo para notificar a los residentes y propietarios sobre el inicio de las obras en el segmento vial.

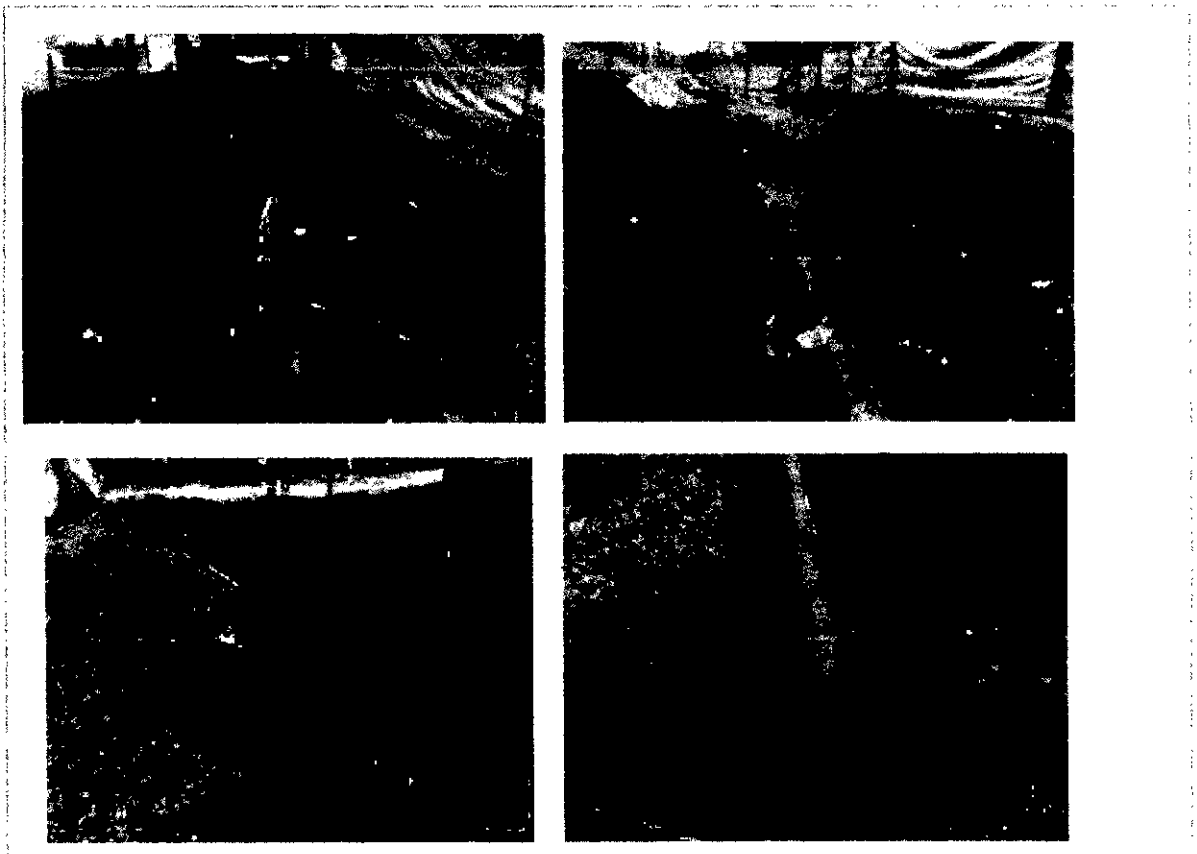



6. CIV 9000393

❖ **CIV 9000204 CASSANDRA**

En el segmento vial intervenido se ejecutan excavaciones manuales con el objetivo de identificar las acometidas existentes. Posteriormente, se procede con la demolición de la tubería sanitaria antigua para permitir su correcta reposición.

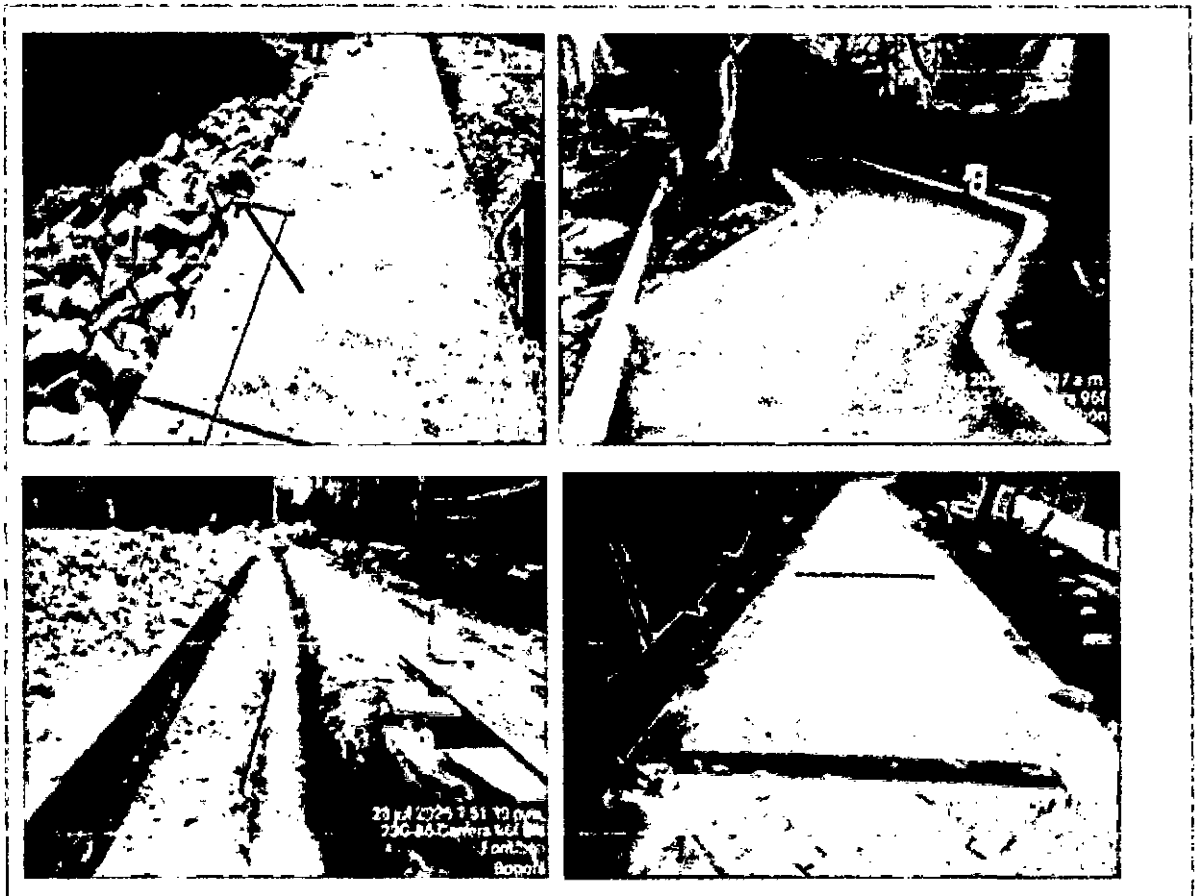
Debido a que el nivel freático supera la generatriz superior del tubo, se realiza el relleno con material triturado y granular hasta nivel de subrasante. Estas labores se llevan a cabo de manera simultánea con la instalación de la nueva tubería, con el propósito de evitar socavaciones y pérdida de la bancada estructural.



**14. CIV 9000204**

❖ **CIV 9002043 Rincón Santos**

Se culmina la conformación de los andenes por el costado norte del segmento vial. De igual forma, se procede con la fundición del cárcamo de protección para la tubería encontrada, según lo solicitado por EAAB. Paralelamente, se realiza la estabilización de la subrasante con rajón, aplicando posteriormente un sello con material granular.



15. CIV 9002043

## 6 . COMITES Y REGISTRO DOCUMENTAL

### 6.1 CONTROL DE COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA

Los medios de comunicación presente durante la ejecución del presente contrato están establecidos de la siguiente manera:

- Correspondencia escrita mediante oficios en físico y digital para la Interventoría, FDLSC, empresas de servicios públicos y demás entidades que se requieran, en caso de que no sea posible radicar en físico la comunicación será por medio magnético.

- Correo electrónico: El e-mail asignado durante la ejecución del contrato es viasfontibon2024@gmail.com

Toda la correspondencia remitida por parte del contratista será enviada a la interventoría para su revisión, evaluación, comentarios y aprobación.

A continuación, se presenta el registro de correspondencia presentado el periodo:

### 6.1.1 Correspondencia enviada

Tabla 6. Correspondencia enviada AR-OP

| REFERENCIA | FECHA DE RECIBO | FECHA DEL DOCUMENTO | DOCUMENTO ENVIADO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| VIASFONTIBON-711-2024-135 | 11-08-2025 | 11-08-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Remisión de documentación del personal |
| VIASFONTIBON-711-2024-134 | 06-08-2025 | 06-08-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Respuesta de modificación acta 2 |
| VIASFONTIBON-711-2024-133 | 5-08-2025 | 5-08-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Remisión reporte mensual de residuos de demolición RCD junio |
| VIASFONTIBON-711-2024-132 | 5-08-2025 | 5-08-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Copia denuncia policía por daños de terceros a arbustos existentes en Rincón Santo CIV 9002043 |
| VIASFONTIBON-711-2024-131 | 4-08-2025 | 4-08-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Respuesta oficio INGI-50260-115-25 Y Oficio INGI-50260-116-25 |
| VIASFONTIBON-711-2024-130 | 31-07-2025 | 31-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Remisión de actas de vecindad inicio CIV 9000304 Cassandra CIV 9001817, 9001718 Bahía Solano |
| VIASFONTIBON-711-2024-129 | 24-07-2025 | 24-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Respuesta a comunicación INGI-50260-111-25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VIASFONTIBON-711-2024-128 | 24-07-2025 | 24-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Respuesta a comunicación INGI-50260-112-25 |
| VIASFONTIBON-711-2024-127 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Remisión documentación Minicargador Caterpillar |
| VIASFONTIBON-711-2024-126 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Remisión de Documentos de maquinarias Hitachi 40. |
| VIASFONTIBON-711-2024-125 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Respuesta a comunicación INGI-50260-104-25 Subsanación de observaciones Informe SST N°5 |
| VIASFONTIBON-711-2024-124 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Respuesta a comunicación INGI-50260-105-25 Subsanación de observaciones Ambiental SST N°5 |
| VIASFONTIBON-711-2024-123 | 16-07-2025 | 16-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Remisión de informe social N°5 |
| VIASFONTIBON-711-2024-122 | 16-07-2025 | 16-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Remisión informe SST y social N°5 |
| VIASFONTIBON-711-2024-121 | 14-07-2025 | 14-07-2025 | Ing. Alejandro Galindo director de Interventoría | Remisión de informe Tecniso N°5 |

Fuente: Elaboración Propio

### 6.1.2 Correspondencia recibida

Tabla 7. Correspondencia recibida AR-OP

| REFERENCIA | FECHA DE RECIBO | FECHA DEL DOCUMENTO | DOCUMENTO FIRMADO POR | | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTIDAD | Nombre y apellido / Cargo | |
| INGI-50260-119-25 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | RESPUESTA COMUNICACIÓN VIASFONTIBON-711-2024-131 "Respuesta a oficio INGI-50260-115-25 y oficio INGI-50260-116-25 (remisión de documentación de Hitachi 40 y minicargador)." OBSERVACIONES A COMUNICADO VIASFONTIBON-711-2024-131 |
| INGI-50260-118-25 | 06-08-2025 | 06-08-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | RESPUESTA AL COMUNICADO VIASFONTIBON-711-2024-130: REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD |
| INGI-50260-117-25 | 28-07-2025 | 28-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | LLAMADO DE ATENCIÓN por el incumplimiento en la entrega de la documentación mínima para ingreso de personal al contrato de obra FDLF 711 de 2024 |
| INGI-50260-116-25 | 28-07-2025 | 28-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | RESPUESTA COMUNICACIÓN VIASFONTIBON-711-2024-128 "Respuesta a comunicación INGI-50260-112-25, documentación minicargador." LLAMADO DE ATENCIÓN REITERACIÓN OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS MINICARGADOR 40 Y |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERADOR |
| INGI-50260-115-25 | 28-07-2025 | 28-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | RESPUESTA COMUNICACIÓN VIASFONTIBON-711-2024-129 "Respuesta a comunicación INGI-50260-111-25, documentación Hitachi 40." LLAMADO DE ATENCIÓN REITERACIÓN OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS HITACHI 40 Y OPERADOR |
| INGI-50260-112-25 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | RESPUESTA COMUNICACIÓN VIASFONTIBON-711-2024-127 "Remisión de documentos minicargador Caterpillar." OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS del contrato FDLF-711-2024. |
| INGI-50260-111-25 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | RESPUESTA COMUNICACIÓN VIASFONTIBON-711-2024-126 "Remisión de documentos de maquinaria Hitachi 40." OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS del contrato FDLF-711-2024 |
| INGI-50260-109-25 | 22-07-2025 | 22-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-125 "Subsanación de observaciones de informes SST Y NO. 5" Aprobación informe N 5 del componente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGI-50260-108-25 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-125 "Subsanación de observaciones de informes SST Y NO. 5" Reiteración de observaciones al informe No. 5 del componente SST V 2." Aprobación informe N 5 del componente AMBIENTAL V 2 |
| INGI-50260-107-25 | 18-07-2025 | 18-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-124 "Respuesta oficio INGI50260-105-25 subsanación observaciones informe ambiental No. 5" Aprobación informe N 5 del componente AMBIENTAL V 2 |
| INGI-50260-106-25 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-120 "SIN ASUNTO". Observaciones y aprobación de personal |
| INGI-50260-105-25 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-124 "Respuesta oficio INGI50260-105-25 subsanación observaciones informe ambiental No. 5" Aprobación informe N 5 del componente AMBIENTAL V 2 |
| INGI-50260-104-25 | 17-07-2025 | 17-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | RESPUESTA COMUNICACIÓN VIASFONTIBON-711-2024-122 "REMISIÓN INFORME SST Y AMBIENTAL NO. 5" OBSERVACIONES AL INFORME No. 5 SST del contrato FDLF-711-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGI-50260-103-25 | 16-07-2025 | 16-07-2025 | INGINGENIERIA | Henry Alejandro Galindo director de interventoría | APROBACIÓN AL INFORME MENSUAL TECNICO N°5 V.1 AJUSTADO SEGÚN MESA DE TRABAJO DEL 15/07/2025, REMITIDO MEDIANTE COMUNICADO VIASFONTIBON-711-2024-121 |

Fuente: Elaboración Propio

## 6.2 REUNIONES Y COMITES

Dentro del periodo transcurrido se desarrollaron las siguientes reuniones y comités de seguimiento para el contrato de obra pública no 711 de 2024. Dentro de los anexos se podrán encontrar las actas de reunión correspondiente.

Tabla 8. Reuniones y comités desarrolladas.

| FECHA DE REUNIÓN | OBJETO DE LA REUNIÓN | LUGAR | NÚMERO DE ACTA | No. de Folios |
|---|---|---|---|---|
| 17-07-2025 | Comité No. 18 | Presencial | No. 18 | 2 |
| 24-07-2025 | Comité No. 19 | Presencial | No. 19 | 2 |
| 28-07-2025 | Comité No. 20 | Presencial | No. 20 | 2 |
| 8-08-2025 | Comité No. 21 | Virtual | No. 21 | 2 |

Fuente: Elaboración Propia

## 7 CONCLUSIONES

Frente CIV 9002043

- Se informa que la tubería correspondiente a la red Sanitaria ya se encuentra instalada a un 100%, dejando pendiente la instalación a las cajas de inspección y en proceso la instalación a los pozos de inspección.
- Se culmina el cárcamo correspondiente la red de 42" encontrada en el frente de ejecución correspondiente a las aguas lluvias, y avalado por el acueducto en la última visita realizada.
- Se realiza la construcción del andén peatonal que se localiza en la zona costado Norte del CIV.

Frente CIV 9000204

- Se realizo todo el proceso de excavación mecánica para garantizar la excavación correspondiente a la conformación del terreno en sus acometidas.
- Igualmente se realiza la excavación para la red de agua sanitarias para las conexiones necesarias.
- la instalación de la red se ejecuta monolíticamente junto con el relleno para evitar socavaciones.

Frente CIV 9000181

- Se realiza todo el proceso de excavación mecánica para garantizar el proceso de conformación del terreno.
- Se realiza igualmente la excavación de la red correspondiente a sanitaria con sus acometidas correspondientes.

Frente CIV 9000362

- Se realiza todo el proceso de excavación mecánica para garantizar el proceso de conformación del terreno.
- Se realiza igualmente la excavación de la red correspondiente a sanitaria con sus acometidas correspondientes.

Frente CIV 9000379

- Se realiza todo el proceso de excavación mecánica para garantizar el proceso de conformación del terreno.
- Se realiza igualmente la excavación de la red correspondiente a sanitaria con sus acometidas correspondientes.

Conclusiones Generales

- Se informa que fue radicada segunda acta de pago con el informe No. 5, en proceso de aprobación a la fecha.

**ANEXOS**

**ANEXO 1. DOCUMENTACION ENVIADA**

3319

[redacted]

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**

**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 14 de julio del 2025

**VIASFONTIBON-711-2024-121**

Señores
ING INGENIERIA
Ing. Alejandro Galindo
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 – 94 Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON

**Asunto:** Remisión Informe técnico no. 5

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, se permite remitir el informe técnico No. 5 para su revisión y aprobación.

Agradezco la atención prestada.

DIANA MARCELA PACHECO

Representante Legal CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón

3530
164

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 16 de julio 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-122***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 – 94
Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** REMISION INFORME SST Y AMBIENTAL NO. 5

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir informe SST y ambiental.

Se adjuntan los documentos soportes para su previa aprobación de cada uno de los perfiles adjuntos, en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1xM8wwOPIUugJ81m0LR326a5Gq-7VzFh3

https://drive.google.com/drive/folders/186MZ_NQF4gM4rmW87BqcTrg5PuC7vHpW

Quedamos atentos a sus comentarios,

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón



**Dirección: Kr. 078 No. 124 – 39 ** Teléfono: 320 2800393**

3321

[redacted]

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 16 de junio de 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-123***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 – 94
Ciudad. Bogotá D.C

**Ref.** "CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Remisión Informe de gestión social No.5 V.0

Respetados señores;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, remite el informe de Gestión Social No.5 V.0 correspondiente al quinto periodo contractual comprendido entre el 12 de junio y el 11 de julio de 2025.

Quedamos atentos a sus observaciones y/o aprobación.

Cordialmente,

DIANA MARCELA PACHECO
Representante Legal Consorcio
Contrato de Obra FDLF-COP-711-2024
Archivo Consorcio
Anexos: Dto. PDF 82 folios

[redacted]

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 18 de julio 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-126***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 – 94
Ciudad.
Bogotá D.C

Ref. CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Remisión de documentos de maquinaria Hitachi 40.

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir documentos de maquinaria Hitachi 40.

Se adjuntan los documentos soportes para su previa aprobación de cada uno de los documentos adjuntos.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón



Dirección: Kr. 97B No. 124 – 39 ** Teléfono: 320 2800393

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 21 de julio 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-127***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 - 94
Ciudad.
Bogotá D.C

Ref. CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Remisión documentación de minicargador Caterpillar.

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir documentación de minicargador Caterpillar.

Se adjuntan los documentos soportes para su previa aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón



Dirección: Kr. 078 No. 124 – 39 ** Teléfono: 320 2800393

3324
168

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 24 de julio 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-128***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 - 94
Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Respuesta a comunicación INGI-50260-112-25, documentación minicargador

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir respuesta a comunicación INGI-50260-112-25 "RESPUESTA COMUNICACIÓN VIASFONTIBON-711-2024-127 "Remisión de documentos minicargador Caterpillar." OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS del contrato FDLF-711-2024."

Se adjuntan los documentos soportes para su previa aprobación junto a el perfil adjunto.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón



Dirección: Kr. 97B No. 124 – 39 ** Teléfono: 320 2800383

3325
169

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 24 de julio 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-129***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 - 94
Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Respuesta a comunicación INGI-50260-111-25, documentación Hitachi 40

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir respuesta a comunicación INGI-50260-111-25 "RESPUESTA COMUNICACIÓN VIASFONTIBON-711-2024-126 "Remisión de documentos de maquinaria Hitachi 40." OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS del contrato FDLF-711-2024"

Se adjuntan los documentos soportes para su previa aprobación junto a el perfil adjunto.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón

169

3326
170

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 04 de agosto 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-131***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 - 94
Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Respuesta a oficio INGI-50260-115-25 y oficio INGI-50260-116-25 (remisión de documentación de Hitachi 40 y minicargador)

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir documentación de Hitachi 40 y minicargador

Se adjuntan los documentos soportes para su previa aprobación de cada uno de los perfiles adjuntos en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1aahs9JTet9u4vrTo3EaJ7ajRli6RBnkV

Quedamos atentos a sus comentarios,

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vias Fontibón

170

3327
171

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 05 de julio 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-132***

Señores
**ING INGENIERIA**
Ing. Alejandro Galindo
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 - 94
Ciudad.
Bogotá D.C

Ref. CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Copia denuncia policía por daños de terceros a arbustos existentes en Rincón Santo CIV 9002043.

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir la copia de la denuncia realizada en la plataforma virtual de la policía de lo sucedido en el CIV 9002043.

El día 17 de julio de 2025 en horas de la noche, aproximadamente a las 10 pm, personal ajeno al contrato COP-711-2024, ingreso al frente de obra CIV 9002043 ubicado en el eje vial calle 23 h entre carrera 96f y carrera 96f bis y afectaron 3 arbustos, de los cuales se llevaron 1 y los otros 2 los dejaron talados y tirados en el frente de obra, por lo anterior el consorcio vías Fontibón 2024 mediante este denuncio deja la salvedad que el daño ocasionado a los mismos no fue producto de la ejecución del proyecto si no fue un daño ocasionado por terceros, por ende no se está en la obligación de hacer una reparación y/o compensación

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

FISCALÍA

La información suministrada por usted se ha registrado de manera exitosa con el número de incidente HC-11-001-2025-50757 En las próximas 24 horas se le informará a su correo electrónico el resultado de la verificación realizada. Si los hechos relatados en este incidente corresponden a un delito, se creará la denuncia y la Fiscalía General de la Nación será la entidad encargada de continuar con el trámite correspondiente de acuerdo a los tiempos establecidos. NOTA: Si transcurridas 24 horas no ha recibido información sobre su incidente, comuníquese con la Policía Nacional al 6015159700 extensión 30547 o al correo electrónico dijin.denunciav@policia.gov.co. Si requiere información sobre una denuncia, comuníquese con la Fiscalía General de la Nación a la línea nacional gratuita 018000919748, Bogotá 6015702000 opción 7 o al centro de contacto línea 122.

Enterado

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal Consorcio Vías Fontibón 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón
Anexos:

3329
173

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 05 de agosto 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-133***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 - 94
Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** REMISIÓN REPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION RCD JUNIO 2025.

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir el reporte correspondientes a la información de residuos de construcción y demolición RCD correspondiente al mes de JUNIO de 2025 y con ello cumplir con lo descrito en el decreto 507 de 2023, se remiten los siguientes formatos para su previa revisión y/o aprobación.

- Anexo V. Informe de aprovechamiento IN SITU
- Anexo VI. Constancia de materiales pétreos y no pétreos valorados de RCD
- Anexo VIII. Reporte de gestores ante la Secretaria Distrital de Ambiente

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal Consorcio Vías Fontibón 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vias Fontibón
Anexos:

- Reporte RCD junio 2025

3330
124

**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**NIT 901.898.112-9**

Bogotá D. C. 11 de agosto 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-135***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 – 94
Ciudad.
Bogotá D.C

Ref. CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Remisión documentación de personal

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir documentación de personal

Se adjuntan los documentos soportes para su previa aprobación de cada uno de los perfiles adjuntos en el siguiente link

https://drive.google.com/drive/folders/1ZHWOm74mHIVKmWvnkARO8il-HaFiibWz

Quedamos atentos a sus comentarios,

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón

3331

# ANEXOS

## ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

3332
176

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-103-25**

Bogotá D.C., 16 de julio de 2025

Señores:
**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**Att. Dra. DIANA MARCELA PACHECO**
Representante legal consorcio
Contrato de obra FDLF-COP-711-2024
viasfontibon2024@gmail.com
Kr. 07B Nº 124-39
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-COP-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024 – REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** APROBACIÓN AL INFORME MENSUAL TECNICO N°5 V.1 AJUSTADO SEGÚN MESA DE TRABAJO DEL 15/07/2025, REMITIDO MEDIANTE COMUNICADO VIASFONTIBON-711-2024-121.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales de esta Interventoría, nos permitimos aprobar el informe mensual N°5 V.1 ajustado según las observaciones dadas en mesa de trabajo del 15 de julio de 2025, teniendo en cuenta que las mismas fueron subsanadas.

Quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

Alejandro Galindo

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: N/A
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Daniel Felipe Duitama Vargas– Residente Técnico.
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

35533
177

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-104-25**

Bogotá D.C., 17 de junio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** RESPUESTA COMUNICACIÓN *VIASFONTIBON-711-2024-122 "REMISIÓN INFORME SST Y AMBIENTAL NO. 5"* OBSERVACIONES AL INFORME No. 5 SST del contrato FDLF-711-2024.

Respetada,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales damos respuesta a la comunicación *VIASFONTIBON-711-2024-122 "REMISIÓN INFORME SST Y AMBIENTAL NO. 5"*, remitimos observaciones al informe No. 5 del componente SST del contrato FDLF-711-2024.

OBSERVACIONES SST No 5 CONTRATO FDLD 711 DE 2025

1. Corregir Tabla 4, PIN ambiental
2. Corregir reporte de personal, Oscar Cortés, Fernando Cadena, no ha sido aprobado para ingreso.
3. La presentación de la documentación de ingreso NO debe hacerse en carpetas comprimidas sino, una carpeta por trabajador con documentación en un solo PDF que no esté con restricción, con el siguiente orden 1. Contrato Laboral 2. Otrosí (si aplica) 3. ARL 4. EPS 5. AFP 6. EMO 7. Entrega de EPP (que debe estar firmada) 8. Inducción y 9. Notificación de riesgos (ten en cuenta que todo debe ser del mes de ingreso, no se puede realizar la validación del anexo 2 por ser carpeta comprimida y tener ruta de acceso muy larga, corregir este ítem.
4. El siguiente personal falta por reporte de planilla de pago en el Anexo 3: Yolanda Patricia Varón, Miguel Ángel Gutiérrez Cubillos, Rusbel Bohórquez Diaz, Edisson Alfredo Barriga

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-104-25**

Quintero, Erson Diaz Fontalvo, Ferley Contreras Córdoba, Juan Andrés Montaño Camacho, John James Mosquera Córdoba, Junior Mauricio Angulo Angulo, Sergio Luis Caraballo Velásquez, Arnol Enrique Guzman Martinez, Johan Alexander Pulido Pelaez, Wilaida Isabel Montiel Pushaina, Héctor Ortiz Gutiérrez

5. Al anexo retirar la carpeta comprimida y anexar notificación de riesgos por trabajador.
6. Corregir apartado 4.2.4 ingreso retiro son los trabajadores que ingresan y el mismo mes de ingreso se van, entonces, allí el análisis debería ser que no se presentaron casos de ingreso-retiro
7. Corregir datos de la tabla 10, habla de otro contrato y la suma tampoco coincide pues son más de 28 trabajadores los reportados, incluidos quienes se retiran.
8. En la tabla 10 se habla de un anexo 13 con seguimiento de personal que no se evidencia en anexos.
9. La tabla 11 no coincide con las fechas de reporte.
10. El anexo 5 entrega de EPP debe ser mensual, es decir, coincidir únicamente con la fecha de reporte del informe y tener la firma de los trabajadores.
11. Anudado a la observación 10, corregir tabla 12.
12. El apartado 4.4 no es posible revisarse debido a la observación No. 3.
13. En el análisis del apartado 4.4 se dice que si se realizaron 13 inducciones, y al final se dice que no se realizaron.
14. La verificación del apartado 4.5 no se puede realizar debido a la observación No. 3.
15. El anexo 12, se evidencia el plan de emergencias más no informe sobre el evento presentado, por favor vincular fecha del evento y acciones tomadas, por otro lado, las actas de cocola no deben ir en el mismo anexo de la emergencia; nuevamente, no presentar carpetas comprimidas.
16. El anexo 6, se presenta en blanco, no hay certificado de mantenimiento de baños.
17. El anexo 7, las fechas de las inspecciones de los extintores y camilla y no coincide con la reportada en la tabla 17.
18. En el anexo 8 se presenta en blanco, no se presentan preoperacionales de maquinaria y herramientas, y por tanto, tampoco coincide la información de anexos con la tabla 17.
19. 4.8.3 por favor indicar cuál fue la condición insegura y cuál fue la acción que se tomó (con fecha y frente).
20. La capacitación de riesgo biológico debe relacionarse en el informe ambiental NO SST, por favor verificar en el SG SST, el cronograma, ejecutar oportunamente y reportar la capacitación correspondiente; por otro lado, la reunión COPASST no es considerada capacitación por lo que no se reporta en el mismo indicador 4.8.4 y tabl 19.
21. El anexo 10 también se presenta en blanco.
22. 4.9.1 La cantidad de días de incapacidad del señor Francisco Javier Delgadillo, no corresponde con la totalización de días perdidos Tabla 20
23. Mencionar en el informe el anexo 16, No se evidencia anexo 16 con investigación del accidente del señor Francisco Delgadillo, formatos de accidentalidad diligenciados (dentro del MAO), FURAT y notificación a EPS.
24. Anudado a la observación 23 en el informe se debe informar: descripción del evento, fecha de la investigación, plan de acción y, factor de riesgo.
25. En los indicadores se habla de 38 trabajadores que no corresponde con los presentados en el informe (tener en cuenta que los retiros del mes también suman), por tanto corregir tabla 22.

3335

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-104-25**

26. En la tabla 22 se habla de 8 inspecciones programadas Vs 6 realizadas, en el item de inspecciones exponer por qué no se realizaron las restantes.
27. En la tabla 22 Se habla de 18 actividades programadas vs 13 ejecutadas, Exponer en el apartado correspondiente el porqué no se da una ejecución del 100%
28. 4.9.4 Nombrar cuáles actividades fueron reprogramadas.
29. Tabla 24 #12 no corresponde con indicador de EPPs
30. 4.9.5 Las reuniones de coppast deben tener el acta, no solo la lista de asistencia, no se evidencia cuál fue el plan de trabajo de la reunión, también está compuesto por más de un trabajador.
31. El COCOLA no sesiona de manera mensual, por favor corregir en el análisis 4.9.5, debe tener el acta, no solo la lista de asistencia, no se evidencia cuál fue el plan de trabajo de la reunión, también está compuesto por más de un trabajador.
32. Tabla 25 conformación de brigadas, se repite un trabajador para 2 cargos de brigada.
33. Anexar a conclusiones el evento del trabajador francisco, mencionando el estado de investigación.
34. Mencionar en el informe el anexo 15, y tener en cuenta observación #2.

En virtud de lo anterior, se solicita al contratista efectuar la atención de las observaciones emitidas, remitiendo en el comunicado de remisión la descripción de la acción ejecutada, así como la ubicación de la evidencia del ajuste implementado, allegando el documento en una nueva versión debidamente ajustado y revisado en un período no mayor a (1) un día hábil contados a partir del recibo de la presente comunicación conforme a lo requerido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/u observación.

Cordialmente,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3336
180

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-105-25**

Bogotá D.C., 17 de junio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** RESPUESTA COMUNICACIÓN *VIASFONTIBON-711-2024-122 "REMISIÓN INFORME SST Y AMBIENTAL NO. 5"* OBSERVACIONES AL INFORME No. 5 AMBIENTAL del contrato FDLF-711-2024.

Respetada,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales damos respuesta a la comunicación *VIASFONTIBON-711-2024-122 "REMISIÓN INFORME SST Y AMBIENTAL NO. 5"*, remitimos observaciones al informe No. 5 del componente ambiental del contrato FDLF-711-2024.

OBSERVACIONES AMBIENTAL No 5 CONTRATO FDLD 711 DE 2025

1. En la carpeta drive se presentan 2 documentos de informe denominados V1 y V2, se debe presentar un solo documento, el documento V2 presenta contraseña, se solicita por favor, verificar que los archivos que se presentan a interventoría NO generen solicitud de acceso o contraseña.
2. Cambiar numeración y fecha de informe en el encabezado, se presenta como V2.
3. Generar corrección de estado Tabla 4. Pin Ambiental
4. 3.7 Tabla 5 sin diligenciar.
5. Actualizar Tabla 6
6. 4.1.1.1 Se habla de 13 inducciones que corresponden al 100% de ingresos, pero luego de 25 trabajadores, no es comprensible el párrafo.

3337

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-105-25**

7. 4.1.1.1 Se habla de 13 sesiones de capacitación, pero, en la tabla 8 solo se relaciona 1 sesión con 1 único asistente, y, el anexo se relaciona en la carpeta que no corresponde y posee información diferente.
8. El anexo 2 no contiene inducciones.
9. 4.1.2.1 Mencionar cuáles son los campamentos.
10. El anexo 4 se presenta como una carpeta comprimida, en anexos presentar documentos en PDF, no comprimidos.
11. No se evidencia en el anexo 4 certificados de la empresa prestadora de aseo a los baños portátiles, ni, seguimiento de aseo a los baños fijos.
12. 4.1.2.2 aparece información resaltada en amarillo, a qué hace referencia?
13. Anexo 5, formato de materiales no presenta fecha.
14. Tabla 11 no se relaciona anexo con certificados, justificar el porqué, dentro del informe
15. La tabla de indicador 13 no corresponde con las tablas 11 y 12.
16. Tabla 15 carece de fecha.
17. Página 16 se habla de la entrega de certificados en el informe 5, el informe de junio corresponde al informe No. 5.
18. Tabla 16, combinar las celdas de "Informe", y ajustar bordes completos
19. Diligenciar item de disposición en tabla 16
20. Tabla 17 Combinar celdas de informe. Diligenciar completamente celdas totalizadoras, o, combinarlas según sea el caso.
21. La cantidad de RCD de la tabla 17 no coincide con el certificado de máquinas amarillas, que a su vez no corresponde (ninguna) con la certificación de recepción de RCD, por tanto, ajustar tablas 15, 16 y 17 a las certificaciones mensuales, agregando nota aclaratoria.
22. Ajustar indicadores Tabla 19 conforme a la observación 21.
23. 4.1.2.3.3 Ajustar párrafo aclaratorio ya que 735m3 no son el 100% de la meta.
24. 4.1.2.3.4 En el párrafo aparece "se presentó/No se presentó" , no genera claridad, todo el texto del ítem en mención.
25. Anexo 8, FOAC 50 las fotos, deben tener fecha, hora y ubicación (aplica para todas las imágenes que se usen en los informes).
26. El anexo 9 se presenta en blanco por tanto no se puede verificar la evidencia del componente C.
27. Las fechas de las fotos de3 la tabla 25 no corresponden a las fechas del periodo de reporte
28. El anexo 7 se presenta como carpeta comprimida, nuevamente, enviar documentación en PDF, no en archivos comprimidos.
29. Ajustar conclusiones a observaciones anteriores.

En virtud de lo anterior, se solicita al contratista efectuar la atención de las observaciones emitidas, remitiendo en el comunicado de remisión la descripción de la acción ejecutada, así como la ubicación de la evidencia del ajuste implementado, allegando el documento en una

3338
Fol

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co



nueva versión debidamente ajustado y revisado en un período no mayor a (1) un día hábil contados a partir del recibo de la presente comunicación conforme a lo requerido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/u observación.

Cordialmente,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3339
185

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-106-25**

Bogotá D.C., 17 de julio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-120 "SIN ASUNTO". Observaciones y aprobación de personal.

Respetada.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos respuesta al comunicado VIASFONTIBON-711-2024-120, donde se solicita aprobación del personal que se mencionará en el presente correo, nos permitimos brindar la siguiente respuesta:

- El personal de la Tabla 1 se relaciona personal presentado que se había aprobado con anterioridad.

***Tabla No. 1 Personal Aprobado con anterioridad***

| NOMBRE | OFICIO DE APROBACIÓN | FECHA |
|---|---|---|
| **Enmanuel Stiwar Castro Solis** | INGI-50260-086-25 | 18/06/2025 |
| **Francisco Javier Delgadillo Tafur** | INGI-50260-086-25 | 18/06/2025 |
| **Jair Emir Mosquera Cordoba** | INGI-50260-086-25 | 18/06/2025 |
| **Darlinton Baloye Sereno** | INGI-50260-086-25 | 18/06/2025 |

- Por otro lado, en la tabla No. 2 se encuentra el personal que se aprueba en el presente oficio.

3340
184

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

INGI-50260-106-25

***Tabla No. 2 Personal con documentación de Ingreso aprobada***

| CONTRATISTA | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | OFICIO DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JHON JAMES MOSQUERA | Rafael Antonio Sánchez Barraza | 1150935222 | Ayudante de obra | VIAS FONTIBON-711-2024-120 |
| CONSORCIO VIAS FONTIBON | Henrry Pachon Bello | 79854591 | Ayudante de obra | VIAS FONTIBON-711-2024-107 |
| ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS | Jennifer Lorena Mora Herrera | 1032385587 | Residente Técnico | VIAS FONTIBON-711-2024-120 |
| ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS | Maribel Murcia Espinosa | 1030668583 | Inspector SST | VIAS FONTIBON-711-2024-120 |
| CONSORCIO VIAS FONTIBON | Wilder Alexander Ortega Hurtado | 1077460350 | Ayudante de obra | VIAS FONTIBON-711-2024-107 |

Conforme a la información anterior, la interventoría solicita al contratista tener control sobre su documentación para evitar cometer errores; y atender el llamado que se hace nuevamente a la forma de presentación de la documentación de ingreso del personal:

1. Toda la documentación por trabajador en un (1) solo PDF que no se encuentre con contraseña.
2. Toda la documentación en PDF, incluidos los documentos de inducción (en el mismo PDF del punto 1.
3. La documentación se debe presentar en el siguiente orden (con el fin de mayor eficiencia en revisión y compilación de informes de contratista e interventoría): 1. Contrato Laboral 2. Otrosí (si aplica) 3. ARL 4. EPS (debe ser certificado) 5. AFP 6. EMO 7. Entrega de EPP (que debe estar firmada) 8. Inducción y 9. Notificación de riesgos (tener en cuenta que todo debe ser del mes de ingreso

Quedamos atentos a cualquier comentario y/u observación.

Cordialmente,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3341

185

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-107-25**

Bogotá D.C., 18 de julio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Director de Obra
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-124 "Respuesta oficio INGI-50260-105-25 subsanación observaciones informe ambiental No. 5" Aprobación informe N 5 del componente AMBIENTAL V 2

Respetada.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos respuesta a la comunicación VIASFONTIBON-711-2024-124, remitiendo el concepto de aprobación del informe N5 del componente AMBIENTAL V2, solicitamos se radique de manera física el informe como lo establece contractualmente el contrato.

Cordialmente,

Alejandro Galindo

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3342
186

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-108-25**

Bogotá D.C., 21 de junio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-125 "Subsanación de observaciones de informes SST Y NO. 5" Reiteración de observaciones al informe No. 5 del componente SST V 2.

Respetada,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales damos respuesta a la comunicación VIASFONTIBON-711-2024-125 "Subsanación de observaciones de informes SST Y NO. 5" Se reiteran las observaciones al informe No. 5 del componente SST V 2 del contrato FDLF-711-2024, ya que no fueron atendidas la totalidad de las observaciones remitidas por la interventoría; a continuación se relacionan los hallazgos persistentes del informe en mención:

OBSERVACIONES SST No 5 versión 2 CONTRATO FDLD 711 DE 2025

1. En el numeral 4.2.2 ANTIGUO en la tabla se describen 24 trabajadores antiguos, pero en la descripción del texto relacionan 25 trabajadores, por favor corregir, estos datos deben coincidir.
2. El índice de tablas no concuerda con la numeración del documento, se solicita ajustar.
3. En el numeral 4.2.3 Retiro, en la tabla se relaciona 1 retiro y en texto describe cero trabajadores, se debe ajustar.
4. El indicador de ausentismo no corresponde a lo propuesto en el MAO y la RES 312 de 2019 se solicita ajustarlo conforme al cálculo propuesto.
5. En la carpeta Edgar Barriga falta registro de retiro - notificación de riesgos
6. En el numeral de maquinaria y equipos 4.6, se debe ajustar la redacción ya que para este período no se presentaron ingresos de equipos, debe relacionar y describir los equipos antiguos.

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-108-25**

7. Ajustar el anexo de ingreso de maquinaria equipos, debe relacionar hoja de no aplica. Ya que para este período no se presentaron ingresos de MEV
8. La documentación de ingreso de personal, debe venir en un solo PDF por trabajador, debido a que las carpetas vienen incompletas, documentos no abren (ya que las extensiones son bastante largas por los nombres) y documentos se evidencia Word.
9. El anexo numero15 el reporte de personal no coincide con el reporte presentado en el documento en word, se debe ajustar.
10. Se debe ajustar la versión del accidente del formato de investigación presentado en el anexo 16, ya que no corresponde con la realidad del evento, también validar el tipo de lesión según el análisis de afectación presentado por el trabajador, ya que presentan tres tipos de lesión que no corresponden con el evento, se debe ajustar las observaciones de la empresa (en esta parte debe agregar la gestión que adelanto la empresa frente al desarrollo del evento: entrenamientos, formación, ATS, reunión COPASST, validación de preoperacionales de la maquinaria, seguridad social del trabajador, entre otros)
11. Validar la condición subestándar del accidente ya que "Resbaloso" no tiene nada que ver con el evento"
12. Los controles presentados no están alineados con el análisis de causa, (adecuación del terreno, no infiere en la prevención de este tipo de eventos; debe aclararse que tipo de capacitación va a realizar la ARL; no se relaciona lección aprendida, debe precisarse el responsable de cada actividad, ya que el área SST no puede ser responsable de todas las actividades
13. Falta firma del representante del COPASST en la investigación, esto es un requisito legal.
14. La Investigación del accidente debe venir en PDF

En virtud de lo anterior, se solicita al contratista efectuar la atención de las observaciones emitidas, remitiendo en el comunicado de remisión la descripción de la acción ejecutada, así como la ubicación de la evidencia del ajuste implementado, allegando el documento en una nueva versión debidamente ajustado y revisado en un período no mayor a (1) un día hábil contados a partir del recibo de la presente comunicación conforme a lo requerido en el Manual
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/u observación.

Cordialmente,

Alejandro Galindo

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3344
188

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-109-25**

Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Director de Obra
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-125 "Subsanación de observaciones de informes SST Y NO. 5" Aprobación informe N 5 del componente SST V 3

Respetada.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos respuesta a la comunicación VIASFONTIBON-711-2024-125, remitiendo el concepto de aprobación del informe N5 del componente SST V3, solicitamos se radique de manera física el informe como lo establece contractualmente el contrato.

Cordialmente,

Alejandro Galindo

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3345
189

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-111-25**

Bogotá D.C., 22 de julio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** RESPUESTA COMUNICACIÓN *VIASFONTIBON-711-2024-126* "Remisión de documentos de maquinaria Hitachi 40." OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS del contrato FDLF-711-2024.

Respetada,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, remitimos observaciones a la documentación enviada para el ingreso de la maquinaria al contrato FDLF-711-2024.

A los documentos de la maquinaria le faltan por ser presentados:

1. Certificado de último mantenimiento.
2. Ficha técnica.
3. Hoja de vida de la máquina.
4. Información del operador que la va a manipular (documentos de ingreso con, carta de idoneidad y certificado de operatividad);

Por tal motivo, la interventoría NO da aprobación para el ingreso de la maquinaria en mención.

En virtud de lo anterior, se solicita al contratista efectuar la atención de las observaciones emitidas, en un período no mayor a (3) tres días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación conforme a lo requerido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-111-25**

de Contratos, en caso de tener alguna inquietud respecto de las observaciones, solicitar mesa de trabajo para la solución de las dudas.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/u observación.

Cordialmente,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3347
191

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-112-25**

Bogotá D.C., 22 de julio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** RESPUESTA COMUNICACIÓN *VIASFONTIBON-711-2024-127* "Remisión de documentos minicargador Caterpillar." OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS ENVIADOS del contrato FDLF-711-2024.

Respetada,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, remitimos observaciones a la documentación enviada para el ingreso del minicargador al contrato FDLF-711-2024.

A los documentos de la maquinaria le faltan por ser presentados:

1. Certificado de último mantenimiento.
2. Ficha técnica.
3. Hoja de vida de la máquina.
4. Información del operador que la va a manipular (documentos de ingreso con, carta de idoneidad y certificado de operatividad);

Por tal motivo, la interventoría NO da aprobación para el ingreso de la maquinaria en mención.

En virtud de lo anterior, se solicita al contratista efectuar la atención de las observaciones emitidas, en un período no mayor a (3) tres días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación conforme a lo requerido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión

3348
192

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-112-25**

de Contratos, en caso de tener alguna inquietud respecto de las observaciones, solicitar mesa de trabajo para la solución de las dudas.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/u observación.

Cordialmente,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3349 HT

Bogotá, Colombia
Calle 114º #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-115-25**

Bogotá D.C., 28 de julio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** RESPUESTA COMUNICACIÓN *VIASFONTIBON-711-2024-129* "Respuesta a comunicación INGI-50260-111-25, documentación Hitachi 40." LLAMADO DE ATENCIÓN REITERACIÓN OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS HITACHI 40 Y OPERADOR.

Respetada,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos respuesta a la comunicación *VIASFONTIBON-711-2024-129*, donde remitimos el siguiente llamado de atención referente a la no atención a las observaciones emitidas en la comunicación INGI-50260-111-25 correspondiente a la documentación de ingreso de la maquinaria Hitachi 40 y el operador Diego Armando Joya Romero.

Se aclara que, la información presentada continúa con los siguientes hallazgos:

MAQUINARIA

1. Se reitera, el Certificado de último mantenimiento no se adjunta.
2. Se reitera, no se adjunta Ficha técnica de la maquinaria.
3. Se aclara que, con base a la primera entrega de la relación de la hoja de vida de la maquinaria esta, no corresponde con documentación de la empresa Consorcio Vías Fontibón 2024, o la empresa contratante del operador y maquinaria; se solicita aclarar por qué se presenta documentación de empresas que no corresponden al contrato.

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-115-25**

OPERADOR

La documentación de ingreso del operador no cumple con especificaciones solicitadas de manera Reiterativa, en diferentes comunicados, mesas de trabajo, entregados por interventoría, a continuación se presentan los hallazgos identificados:

1. La documentación de ingreso NO se encuentra en un solo PDF (se reitera que la documentación debe venir en un solo PDF, que consolide contrato, certificado de ARL, certificado de EPS, certificado de Fondo de Pensiones, examen médico, inducción, notificación de riesgos, entrega de EPPs, y, para el caso de operadores, certificado de idoneidad o certificado de curso de operación de maquinaria pesada, licencia de conducción vigente).
2. Los soportes de ARL, EPS y afiliación Fondo de pensión NO se encuentra actualizada al mes de ingreso, se clara que los documentos mínimos deben corresponder al periodo de ingreso (para este caso, documentación de julio).
3. Se hace nuevamente llamado de atención al contratista ya que el certificado ADRES NO es válido para el ingreso del personal; se reitera que el documento que se debe entregar es el certificado de EPS o formulario de EPS (aclarando, que estos deben corresponder a la fecha de ingreso del personal).
4. El contrato laboral del operador manifiesta operaciones en un contrato IDU, se solicita ajustar contrato o presentar otrosí donde la actividad que desarrolle el trabajador sea directamente relacionada en el contrato de obra del contratista.
5. No se adjunta certificado de idoneidad o, curso de operador de maquinaria pesada del operador.
6. No se adjunta inducción de ingreso, notificación de riesgos, ni entrega de EPPs.

Por tal motivo, la interventoría NO da aprobación para el ingreso de la maquinaria en mención, ni a su operador.

En virtud de lo anterior, se solicita al contratista efectuar los ajustes correspondientes a la documentación de ingreso de maquinaria y personal.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/u observación.

Cordialmente,

Alejandro Galindo

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3351 195

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-116-25**

Bogotá D.C., 28 de julio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** RESPUESTA COMUNICACIÓN *VIASFONTIBON-711-2024-128* "Respuesta a comunicación INGI-50260-112-25, documentación minicargador." LLAMADO DE ATENCIÓN REITERACIÓN OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS MINICARGADOR 40 Y OPERADOR.

Respetada,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos respuesta a la comunicación *VIASFONTIBON-711-2024-128*, donde remitimos el siguiente llamado de atención referente a la no atención a las observaciones emitidas en la comunicación INGI-50260-112-25 correspondiente a la documentación de ingreso de la maquinaria minicargador y el operador Jorge Eduardo Supelano Chilatra.

Se aclara que, la información presentada continúa con los siguientes hallazgos:

MAQUINARIA

1. Se reitera, el Certificado de último mantenimiento no se adjunta.
2. Se reitera, no se adjunta Ficha técnica de la maquinaria.
3. Se aclara que, con base a la primera entrega de la relación de la hoja de vida de la maquinaria esta, no corresponde con documentación de la empresa Consorcio Vías Fontibón 2024, o la empresa contratante del operador y maquinaria; se solicita aclarar por qué se presenta documentación de empresas que no corresponden al contrato.

3352 196

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-116-25**

OPERADOR

La documentación de ingreso del operador no cumple con especificaciones solicitadas de manera Reiterativa, en diferentes comunicados, mesas de trabajo, entregados por interventoría, a continuación, se presentan los hallazgos identificados:

1. La documentación de ingreso NO se encuentra en un solo PDF (se reitera que la documentación debe venir en un solo PDF, que consolide contrato, certificado de ARL, certificado de EPS, certificado de Fondo de Pensiones, examen médico, inducción, notificación de riesgos, entrega de EPPs, y, para el caso de operadores, certificado de idoneidad o certificado de curso de operación de maquinaria pesada, licencia de conducción vigente).
2. Los soportes de ARL, EPS y afiliación Fondo de pensión NO se encuentra actualizada al mes de ingreso, se clara que los documentos mínimos deben corresponder al periodo de ingreso (para este caso, documentación de julio).
3. Se hace nuevamente llamado de atención al contratista ya que el certificado ADRES NO es válido para el ingreso del personal; se reitera que el documento que se debe entregar es el certificado de EPS o formulario de EPS (aclarando, que estos deben corresponder a la fecha de ingreso del personal).
4. El contrato laboral del operador manifiesta operaciones en un contrato IDU, se solicita ajustar contrato o presentar otrosí donde la actividad que desarrolle el trabajador sea directamente relacionada en el contrato de obra del contratista.
5. No se adjunta inducción de ingreso, notificación de riesgos, ni entrega de EPPs.

Por tal motivo, la interventoría NO da aprobación para el ingreso de la maquinaria en mención, ni a su operador.

En virtud de lo anterior, se solicita al contratista efectuar los ajustes correspondientes a la documentación de ingreso de maquinaria y personal

Quedamos atentos a cualquier comentario y/u observación.

Cordialmente,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3353
147

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-117-25**

Bogotá D.C., 28 de julio de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Director de Obra
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** LLAMADO DE ATENCIÓN por el incumplimiento en la entrega de la documentación mínima para ingreso de personal al contrato de obra FDLF 711 de 2024"

Respetada.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, REMITIMOS EL SIGUIENTE LLAMADO DE ATENCIÓN por el incumplimiento en la entrega de la documentación mínima de ingreso de personal que ha efectuado el contratista, ya que, este, no ha cumplido con los estándares mínimos establecidos y comunicados por la interventoría, tal y como se evidenció en los comunicados INGI-50260-106-25, INGI-50260-104-25, INGI-50260-115-25, INGI-50260-111-25, INGI-50260-116-25, INGI-50260-112-25, dirigidos al contrato FDLF 711de 2025.

Se le aclara al contratista que para la presentación de documentación de ingreso del personal debe garantizarse la siguiente información mínima:

1. Toda la documentación debe relacionarse en un solo PDF, sin claves de acceso.
2. Contrato laboral (se debe garantizar la relación del trabajador con el contrato de obra o, la actividad a ejecutar dentro del proyecto).
3. Certificado de ARL, con fecha del mes de ingreso.
4. Certificado de EPS, o, formulario, con fecha del mes de ingreso.
5. Certificado de afiliación de fondo de pensión, con fecha del mes de ingreso.
6. Examen médico ocupacional (no mayor a un año, debe garantizarse el cargo al cual fue contratado, y, debe realizarlo la empresa contratante.
7. Inducción de ingreso.

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-117-25**

8. Notificación de riesgos.
9. Entrega de EPPs.

Para conductores y operadores:

10. Licencia de conducción con B2 vigente.
11. Certificado de idoneidad o, certificado de curso de operador de maquinaria.

Para el ingreso de maquinaria:

1. Hoja de vida de la maquinaria (el formato debe corresponder a la empresa dueña de la maquina o al contratista).
2. Ficha técnica de la maquinaria.
3. Tarjeta de propiedad.
4. Certificado de último mantenimiento realizado.

Para vehículos:

1. Tarjeta de propiedad.
2. SOAT vigente.
3. Tecnomecánica vigente.

Para Volquetas:

4. PIN ambiental de la volqueta.

Lo anterior, se realiza con el fin de que se cumpla con los estándares establecidos contractualmente, y así evitar sanciones y llamados de atención por parte de la interventoría.

Cordialmente,

Alejandro Galindo

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

3355 144

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-118-25**

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2025

Señores:
**CONSORCIO VÍAS FONTIBÓN 2024**
**Att. Dra. DIANA MARCELA PACHECO**
Representante legal consorcio
Contrato de obra FDLF-COP-711-2024
viasfontibon2024@gmail.com
Kr. 07B N° 124-39
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-COP-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024 – REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** RESPUESTA AL COMUNICADO VIASFONTIBON-711-2024-130: REMISIÓN ACTAS DE VECINDAD.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales de esta Interventoría, nos permitimos informar que se dio por recibida, revisada y aprobada la documentación correspondiente a las actas de vecindad, caracterización de espacio público e inventario de actas, presentadas para los siguientes segmentos viales:

- Bahía solano, CIV 9001817 y 9001780.
- Refugio, CIV 900181 y 900362.
- Casandra, 900204.

Por consiguiente se remite la documentación debidamente firmada para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atentos a cualquier comentario.

3356

200

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-118-25**

Cordialmente,

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: N/A
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Jessica Paola Amaya Pérez– Residente social.
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de interventoría

3351
201

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-119-25**

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2025

Señores
**CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**
**Att. Diana Marcela Pacheco**
Dirección Kr. 07B No. 124 - 39
Teléfono: 320 2800393
Bogotá D.C

**REF. 1** CONTRATO DE OBRA No. FDLF-711-2024 – CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN.

**REF. 2** CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLF-CIV-717-2024– REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.

**ASUNTO** RESPUESTA COMUNICACIÓN *VIASFONTIBON-711-2024-131* "Respuesta a oficio INGI-50260-115-25 y oficio INGI-50260-116-25 (remisión de documentación de Hitachi 40 y minicargador)." OBSERVACIONES A COMUNICADO *VIASFONTIBON-711-2024-131.*

Respetada,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, damos respuesta a la comunicación *VIASFONTIBON-711-2024-131*, donde remitimos el siguiente llamado de atención referente a la no atención a las observaciones emitidas en la comunicación INGI-50260-117-25 y la comunicación INGI-50260-115-25.

Se aclara que, la información presentada continúa con los siguientes hallazgos:

MINICARGADOR

1. Se reitera, la documentación debe ser presentada en UN SOLO PDF (únicamente PDF, no otros formatos).
2. La documentación a presentar por maquinaria y trabajador debe ser la que se aclara en el oficio INGI-50260-117-25.

3358

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

**INGI-50260-119-25**

OPERADOR MINICARGADOR

1. 1.Se reitera, la documentación debe ser presentada en UN SOLO PDF (únicamente PDF, no otros formatos).
2. No se presenta licencia de conducción.

HITACHI

1. Se reitera, la documentación debe ser presentada en UN SOLO PDF (únicamente PDF, no otros formatos).
2. Se reitera, presentar certificado (no factura) de último mantenimiento.
3. 2. La documentación a presentar por maquinaria y trabajador debe ser la que se aclara en el oficio INGI-50260-117-25.

OPERADOR HITACHI

1. Se reitera, la documentación debe ser presentada en UN SOLO PDF (únicamente PDF, no otros formatos).

Por tal motivo, la interventoría NO da aprobación para el ingreso de la maquinaria en mención, ni a sus operadores.

En virtud de lo anterior, se solicita al contratista efectuar los ajustes correspondientes a la documentación de ingreso de maquinaria y personal.

Quedamos atentos a cualquier comentario y/u observación.

Cordialmente,

Alejandro Galindo

**HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL**
Director de Interventoría
ING INGENIERÍA S.A.S.

Anexos: NA
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: Ing. Joan Sebastián Díaz González – Residente SST-A
Revisó: Ing. Henry Alejandro Galindo Madrigal – Director de Interventoría

# ANEXOS

## ANEXO 3. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

3360
209

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GFD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Cod HOLA: 70109

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | **Comité de seguimiento N 15 Contratos 711 y 717 de 2025** | | |
| **Fecha:** | **17/07/2025** | **Hora de inicio: 8:00 am** | **Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | **Frentes de obra** | **Hora de finalización: 11:00 am** | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| CC | 80779485 | Henry Alejandro | Interventoria | ING INGENIERIA SAS | | | X | | | | | | X | 3012146076 | Revisar link de asistencia |
| CC | 109868583 | Maribel Murcia | Contratista | Consorcio Vias Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3123754030 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1013833916 | Jennifer Mora | Contratista | Consorcio Vias Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3132147260 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1023587262 | Lida Perdomo | Contratista | Consorcio Vias Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3043621979 | Revisar link de asistencia |
| CC | 74187138 | Oscar Castañeda | Supervisión | FDLF | | | X | | | | | | X | 3173059618 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1090484959 | Paola Amaya | Interventoria | ING INGENIERIA SAS | | | X | | | | | | X | 3107644981 | Revisar link de asistencia |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

CONFIDENCIALIDAD: Datos sujetos a reserva, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, dentro del marco y acorde a la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reservas y ninguna otra condición expresa o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser atendida verbalmente o por medio ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3813000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de esta consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la vía tradición de los datos personales, a revocar este consentimiento o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera autorizo que los datos aquí consignados sean usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el traslado a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

* Ver RAC-SDG Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://www.gobiernobogota.gov.co/content/atencion-integral-de-personas-sdg

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se da inicio al comité al contar con la participación de la Supervisión, Interventoría y Contratista, con la visita en compañía de prensa a los tramos en ejecución para el contrato correspondiente a Malla Vial con la Alcaldía Local de Fontibon, en donde posterior a la terminación de la reunión pactada, se trataron los siguientes tematicas: En primera instancia, tanto la interventoría como la Supervisión, solicita al contratista la revisión correspondiente al espacio publico, especificamente a los andes y su desarrollo, a lo cual el contratista indico que haria la revisión correspondiente. En segunda instancia, se trato la tematica de la revisión del rendimiento con respecto al desarrollo de las actividades de excavación, a lo cual el contratista indico que haria la gestión para la revisión de los rendimientos en la actividad, posteriormente el contratista indico que debido a unos ajustes en los diseños de las redes, citara a una reunión con el delegado, con el fin de definir dichos ajustes, a lo cual indico que la reunión se realizaria en los tramos a ejecutar el dia 21/07/2025. Siguiendo con los temas de interes, se solicita al contratista, presentar la información correspondiente a las señales correspondientes al PMT, que por las distintas razones no han sido instaladas, en donde el contratista indico que trabajaria en el tema. Por ultimo, el contratista indico que haria la solicitud formal con el fin de poder ingresar un nuevo mini cargador a uno de los frentes de obra.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Revisión espacio publico (andenes) | Contratista | 24/07/2025 |
| 2 | Validación del rendimiento de la excavación | Contratista | 24/07/2025 |
| 3 | Programación recorrido con acueducto 21-07-2025 | Contratista-Interventoría | 21/07/2025 |
| 4 | Informe PMT de señales no instaladas | Contratista | 24/07/2025 |
| 5 | Entrega documentación Mini cargador | Contratista | 21/07/2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA 1: En caso de no ser esta reunión virtual se debe anexar el registro de asistencia generado por los participantes en reuniones y plasmarlo que genere trazabilidad.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los compromisos de la reunión.

3362
166

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Comité de seguimeinto N 19 Contratos 711 y 717 de 2025 | | |
| **Fecha:** | 24/07/2025 | **Hora de inicio:** 10:00 AM | **Modalidad:** Presencial / X Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | Frentes de obra | **Hora de finalización:** 11:00 AM | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| CC | 80779485 | Henry Alejandro | Interventoria | ING INGENIERIA SAS | | | X | | | | | | X | 3012145076 | Revisar link de asistencia |
| CC | 109668583 | Maribel Murcia | Contratista | Consorcio Vias Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3123754030 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1013633916 | Jennifer Mora | Contratista | Consorcio Vias Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3132147280 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1023887282 | Lida Perdomo | Contratista | Consorcio Vias Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3043621979 | Revisar link de asistencia |
| CC | 74167138 | Oscar Castañeda | Supervisión | FDLF | | | X | | | | | | X | 3175059818 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1090484859 | Paola Amaya | Interventoria | ING INGENIERIA SAS | | | X | | | | | | X | 3107644991 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1018451468 | Joan Sebastian Diaz | Interventoria | ING INGENIERIA SAS | | | X | | | | | | X | 3012146076 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1033796332 | Juan Felipe Pineda | Contratista | Consorcio Vias Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3123754030 | Revisar link de asistencia |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para tomar estadísticas, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/sistema/sistema-integrado-de-gestion-sig

206

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Reunidas las partes interesadas Entidad, Contratista e Interventoria, se da inicio al comité de seguimiento 19, en donde en primera instancia se procede a la lectura de los compromisos pactados en el comité anterior de la siguiente manera: En primera instancia la revisión de los anclenes en el contrato, a lo cual el contratista indico que esta en la revisión del tema para poder ejecutar la estructura de la mejor forma posible, en segunda instancia, se indico la validación del rendimiento en la excavación, a lo cual el contratista indico que si bien se estaba haciendo el perfilado de manera manual, podia aumentar el rendimiento al usar un avance mecanico que se comenzaria a implementar, Como tercer compromiso, se tenía el recorrido con el acueducto, en donde se llevo a cabo el dia 21/07/2025, con el fin de tomar determinaciones sobre nuevos hallazgos en las redes existentes. Como cuarto punto, se tenia el informe de PMT de señales no instaladas, a lo que el contratista indico que debido a la notificación presetada por la secretaria de movilidad, se esta desarrollando la respuesta para dar la información pertinente con respecto al hurto de las señales en algunos segmentos, por ultimo se tenia la entrega de la documentación del mini cargador, en donde el contratista indico que se presento la información correspondiente, sin embargo que se tenian observaciones por parte de la interventoría los cuales serian subsanadas para esta y futuras entregas. Siendo el caso, se paso a tratar cada uno de los componentes, en primera instancia el componente social, en donde la Interventoria indico que el contratista debe entregar las actas de vecindad realizadas para su respectiva revisión, en donde se acordo la entrega para la siguiente semana, posteriormente se trataron los temas de los componentes SST y Ambiental, a lo cual el profesional de la Interventoria indico que para el area SST era importante la radicación formalmente de la documentación tanto de la Residente Tecnica y la Inspectora SST y como segundo punto, el envio de la información faltante para la maquinaria a la que se le han sacado observaciones, a lo cual el contratista indico que haría estas gestiones la proxima semana, mientras que para el componente ambiental, se indico la necesidad de la presentación del Informe del PIN Ambiental. Por ultimo se trato el tema del componente Tecnico, en donde se indico el desarrollo de actividades en 4 segmentos viales y se iba a aperturar un quinto frente la siguiente semana, igualmente el contratista notifico que en el tramo de Rincon Santos, se presento un acto en donde un tercero en horas de la noche habia realizados daños en el frente de obra, en donde se destaca el daño a especies arboreas presentes en el tramo, a lo cual el contratiste genero la denuncia formal y dio la notificación correspondiente para tratar el tema Igualmente la supervision solicito revisar el diseño debido a la situación de los arboles. Igualmente del area SST, indicaron que era necesario hacer la reposicion correspondiente al baño reportado por hurto, debido a la presencia de personal femenino en la obra. Por ultimo se solicito a la entidad, se diera una notificación a la comunidad de Bahia Solano con respecto al desarrollo de las obras.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Remisión de documentación de maquinaria faltante | Contratista | 31/07/2025 |
| 2 | Remisión documentación Residente e Inspectora SST | Contratista | 30/07/2025 |
| 3 | Dar respuesta al comunicado emitido por la Secretaria de Movilidad | Contratista | 30/07/2025 |
| 4 | Definición de situación en Bahia Solano | FDLF | |
| 5 | Revisión Urbanismo Rincon Santos | Contratista-Interventoria | 31/07/2025 |
| 6 | Reposición baño | Contratista | 31/07/2025 |
| 7 | Radicación informe Pin Ambiental | Contratista | 30/07/2025 |
| 8 | Apertura de nuevo tramo en El refugio | Contratista | 29/07/2025 |
| 9 | Presentación de Actas de Vecindad a la Interventoria | Contratista | 29/07/2025 |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los responsables de la reunión.

3360
106

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GIN-I-029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Clave TRD: A: 2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto de la reunión: | Comité de seguimeinto N 20 Contratos 711 y 717 de 2025 | | |
| Fecha: | 28/07/2025 | Hora de inicio: 08:30 AM | Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |
| Lugar: | Frentes de obra | Hora de finalización: 12:00 AM | |
| Dependencia: | | Nombre del Responsable: | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (nombre o razón social) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 74187138 | Oscar Julian Castañeda B. | | ALF Infraestructura | | | X | | | | | | X | 3174048718 | |
| CC | 1014644541 | Paola Arroyo | | Fig ingenieros | | | X | | | | | | | 3007644999 | |
| CC | 1023882282 | Lida Perdomo | | Consorcio Viasfontibón | | | X | | | | | | | viasfontibon@gmail.com | |
| CC | 1032746332 | Felipe Pineda | | Consorcio Vias Fontibon | | | X | | | | | | | Vias fontibon@gmail.com | |
| CC | 1012229553 | Santiago Vargas | | ALF. Ingeo | | | X | | | | | | X | Santiago.vargas@alfingenieria.co | |
| CC | 1033633916 | Jennifer Mora | | Consorcio Vias fontibon | | | X | | | | | | X | 3132147280 | Jennifer Mora. |
| CC | 1044655865 | Ewel Cultan | | Fig Ingenieros | | | X | | | | | | X | 3214666600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien suscribe este documento, con base a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, a cual la entregamos en la página web de la entidad, y que fue informado(a) de forma clara y comprensible acerca de la finalidad y tratamiento de sus datos personales, así como de los derechos que le asisten como titular, especialmente el de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, y solicitar prueba de este consentimiento, y solicitar información sobre el uso que se ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los mismos. Manifiesta que dicho consentimiento tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, y solicitar prueba de este consentimiento, y solicitar información sobre el uso que se ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar este consentimiento cuando la naturaleza de los datos personales suministrados así lo permita, de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para tomar estadísticas, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SDG-SIG-M02 Manual de Servicio Ciudadano a la Ciudadanía, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/content/protocolos-empresa-de-petroleo

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Reunidos tal Perfil: Entidad, Contratista e Interventoría, se procede a dar inicio en los frentes de Obra del Hogar el Refugio 2: Comité de Seguimiento N°20, en donde en primera instancia se hizo Las inspección de los temas en los cuales se han ejecutado, informando los avances en cada uno de ellos y las circunstancias para la ejecución de las redes De aguas, en la inspección se encontro el defecto de la red principal aledaña a las Torres 9 Interior 1 y 2, Cual se Dalico que se podia reusar el accesorio de la red para la inclusión en el Item de obras complementarias, igualmente se indico que para el pavimento Bahia Solano se citaria a la persona encargada con el fin de exponer lo indicado por Planeación y llegar a acuerdos, siguiendo con la agenda se solicito el cronograma de incorporación de nuevo personal para los frentes del Refugio Luis 2 se tomará por ultimo la Subrogación. Solicito se programe visita técnica junto con los encargados del contrato de cuerdito en Villa Teresa con el fin de revisar el avance del concreto y tomar decisiones en el contrato con la alcaldia.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Revisión de Obras Complementarias | Contratista | 04/08/2025 |
| 2 | Reunión Bahia Solano | FDLE | |
| 3 | Incorporación personal en frentes El Refugio | | 05/08/2025 |
| 4 | Cabrera formatos inclusión NP's | FDLE | 30/07/2025 |
| 5 | Oficio AIU | Contratista | 01/08/2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA 1: En caso de no ser una reunión virtual se deberá anexar el respectivo de asistencia generado por las plataformas que generen formularios

NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los compromisos de la reunión.

3366

210

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | Comité de seguimiento N 21 Contratos 711 y 717 de 2025 | | |
| **Fecha:** | 8/08/2025 | **Hora de inicio:** 11:30 AM | **Modalidad:** Presencial / X Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | Virtual | **Hora de finalización:** 12:30 AM | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| CC | 80779485 | Henry Alejandro Galindo | Interventoría | ING INGENIERIA SAS | | | X | | | | | | X | 3012146076 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1049656865 | Daniel Duitama | Interventoría | ING INGENIERIA SAS | | | X | | | | | | X | 3214666600 | Revisar link de asistencia |
| CC | 109668583 | Maribel Murcia | Contratista | Consorcio Vías Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3123754030 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1018494195 | Juan Sebastián Moreno Barreto | Contratista | Consorcio Vías Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3043621979 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1013619160 | Diana Carolina Contreras | Contratista | Consorcio Vías Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3043621979 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1023887282 | Lida Perdomo | Contratista | Consorcio Vías Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3043621979 | Revisar link de asistencia |
| CC | 74187138 | Oscar Castañeda | Supervisión | FDLF | | | X | | | | | | X | 3175056818 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1090484959 | Paola Amaya | Interventoría | ING INGENIERIA SAS | | | X | | | | | | X | 3107644991 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1018451468 | Joan Sebastian Diaz | Interventoría | ING INGENIERIA SAS | | | X | | | | | | X | 3012146076 | Revisar link de asistencia |
| CC | 1033796332 | Juan Felipe Pineda | Contratista | Consorcio Vías Fontibon 2024 | | | X | | | | | | X | 3123754030 | Revisar link de asistencia |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387500. Manifiesto que los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M02 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sig

3364

2H

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Reunidas las partes interesadas Entidad, Contratista e Interventoría, se da inicio al comité de seguimiento 19, en donde en primera instancia se procede a la lectura de los compromisos pactados en el comité anterior de la siguiente manera: En primera instancia la revisión de las obras complementarias, a lo cual el contratista indico que se encuentra en la evaluación de estas alternativas y que la siguiente semana presentaría formalmente un balance de los rubros asociados al desarrollo de las actividades complementarias, como segundo compromiso, se tenía la reunión para la definición de los tramos en Bahía Solano, a lo cual, la supervisión del contrato notifica que se tendrá una respuesta a la situación la siguiente semana, como tercer compromiso se tenía la vinculacion de personal a los frentes de El Refugio, a lo cual, el contratista indico que hacían falta los documentos de los examenes medicos, sin embargo a lo largo del día, se presentaría dicha documentacion, a lo cual la interventoría solicito celeridad con el tema y la presentación de manera adecuada de la información, como cuarto compromiso, se tenía la entrega de los formatos de presentación de NP´s por parte de la entidad, a lo cual, la Interventoría indico haber recibido estos documentos y haberlos remitido al contratista, quienes ya se encuentran en la verificacion de los mismos para su posterior presentación, por ultimo se tiene la presentación del desgloce del AIU, a lo cual el contratista indico que ya se encuentra trabajando en esto y que se presentara la siguiente semana. Teniendo en cuenta esto, se procedio a la revisión de los componentes, en donde se solicito por parte de la interventoría que los profesionales se pusieran de acuerdo con los temas a cargo de cada uno para no generar reprocesos más que todo en la entrega de documentación tanto de vinculación de personal como de maquinaria, seguido a esto, el componente social por parte de la Interventoría indico que se habían entregado las actas de vecindad correspondientes a los tramos de Cassandra y unos tramos de El Refugio, sin embargo pidio que este proceso fuese más dinamico, igualmente indico que se siguen presentando solicitudes con respecto a la situación en Bahía Solano. Por ultimo se informo que en el componente Tecnico, se estan desarrollando obras en 5 frentes en simultaneo, indicando las actividades que se estan desentrollando y las fechas previstas para la culminación de los tramos en ejecución y las fechas de inicio para los tramos que estan por ejecutar, solicitando tanto por parte de la Interventoría como del Contratista, la revisión de las circunstancias en Villa Andrea, con el fin de definir que actividades se desarrollaran con el rubro inicialmente contemplado para estos CIV´s, a lo cual la supervisión solicito un balance, con el fin de revisar el rubro que quedaría para ejecución y así mismo, tomar determinaciones.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Elaborar diagnosticos de obras complementarias | Contratista | 13/08/2025 |
| 2 | Indicaciones tramos Bahía Solano | FDLF | |
| 3 | Entrega de documentación de vinculación personal El Refugio | Contratista | 8/08/2025 |
| 4 | Entrega desgloce AIU y APU's | Contratista | 12/08/2025 |
| 5 | Terminación actas de vecindad tramos 9000383 | Contratista | 11/08/2025 |
| 6 | Terminación actas de vecindad tramos 9000388 | Contratista | 25/08/2025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTA 1: En caso de no ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregar o ocultar las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

## INFORME AMBIENTAL - 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2025

| | | |
|---|---|---|
| **DESTINATARIO:** | | |
| INTERVENTORÍA: ING INGENIERIA S.A.S. | | |
| ALCALDÍA: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN | | |
| **CONTROL DE APROBACIÓN** | | |
| **ELABORÓ** | NOMBRE | Residente Ambiental Juan Felipe Pineda Perilla Consorcio Vías Fontibón 2024 |
| | FECHA | Julio de 2025 |
| | FIRMA | |
| **REVISÓ** | NOMBRE | Representante legal Diana Marcela Pacheco Hernández Consorcio Vías Fontibón 2024 |
| | FECHA | Julio de 2025 |
| | FIRMA | |
| **APROBÓ** | NOMBRE | Residente SSTMA Joan Sebastián Diaz ING INGENIERIA S.A.S. |
| | FECHA | Julio de 2025 |
| | FIRMA | |

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|
| 01 | 2025-08-14 | Creación del documento | Residente Ambiental |
| | | | |

## ÍNDICE


**1. INTRODUCCIÓN** 4
**2. OBJETIVOS** 5
**3. GENERALIDADES** 6
**3.8.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** 11
**3.8.2. DATOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO** 12
**3.8.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL** 13
3.8.4. Seguimiento a productos ambientales 14
**4. SEGUIMIENTO AL MANUAL DE CONTROL AMBIENTAL** 14
4.1.1. Componente A: Manejo para el cumplimiento de requisitos y A&SST 14
4.1.1.1. Programa A1. Manejo para el cumplimiento de requisitos y A&SST 14
4.1.2. Componente B. Manejo ambiental en la ejecución de las actividades constructivas 16
4.1.2.1. B1. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio: 16
4.1.2.2. B2. Manejo de materiales de construcción: 17
4.1.2.3. B3. Manejo integral de residuos sólidos 19
**4.1.2.3.1 Residuos ordinarios** 19
**4.1.2.3.2 Residuos de Construcción y Demolición** 19
**4.1.2.3.3 Plan de gestión de residuos de construcción y demolición** 20
**4.1.2.3.4 Manejo de residuos peligrosos, aceites usados y sustancias químicas** 21
4.1.2.4. B4. Control de emisiones atmosférica 22
4.1.2.5. B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros 23
4.1.2.6. Componente C. Manejo de la vegetación y paisajismo 24
4.1.2.7. Componente E: Programa de señalización de seguridad 24
**CONCLUSIONES** 25

# ÍNDICE DE TABLAS


Tabla 1 Segmentos viales 7
Tabla 2 Datos contractuales del proyecto 8
Tabla 3 Equipo SST Ambiental 9
Tabla 4 Productos SSTA Contrato 711 de 2024 9
Tabla 5 Correspondencia 10
Tabla 6 Seguimiento a productos ambientales 12
Tabla 7 Equipo Ambiental Contrato Vías Fontibón 711 de 2024 12
Tabla 8 Seguimiento programa de formación 13
Tabla 9 Indicadores componente A. Cumplimiento a las obligaciones Ambientales y SST - Ficha A1 14
Tabla 10 Indicadores Componente B. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio – Ficha B1 15
Tabla 11 Material ingresado durante el periodo de reporte 16
Tabla 12 Trazabilidades materiales de construcción 16
Tabla 13 Indicadores Componente B. Manejo de materiales de construcción – Ficha B2 16
Tabla 14 Puntos ecológicos implementados 17
Tabla 15 RCD generado en el periodo de reporte 17
Tabla 16 Seguimiento certificación manejo de RCD mensual 18
Tabla 17 Seguimiento aprovechamiento de RCD 18
Tabla 18 Indicadores Componente B. Manejo integral de residuos sólidos – Ficha B3 19
Tabla 19 Seguimientos indicadores RCD Resolución 1257 de 2021 19
Tabla 20 Indicadores Componente B. Manejo de residuos peligrosos, aceites usados y sustancias químicas– Ficha B3A 20
Tabla 21 Listado de volquetas aprobadas para el periodo del informe 21
Tabla 22 Indicadores Componente B. Control de emisiones atmosféricas – Ficha B4 21
Tabla 23 Indicadores Componente B. Manejo integral de cuerpos de agua– Ficha B5 22
Tabla 24 Indicadores Componente C. Manejo de la vegetación y paisajismo - Ficha C1 22
Tabla 25 Indicadores Componente C. Manejo de la vegetación y paisajismo - Ficha C1 23

## 1. INTRODUCCIÓN

CONSORCIO VIAS FONTIBÓN 2024, consciente de las posibles alteraciones ambientales ocasionadas por la ejecución del contrato No. 711 DEL 2024 "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.", elaboró el presente Manejo Ambiental de Obra – MAO; mediante el cual se establecen los lineamientos y acciones a implementar durante la gestión ambiental en la ejecución del referido contrato.

Así mismo, se detallan todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, y cumplir con toda la normatividad ambiental aplicable y lo relacionado con el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental, y los documentos contractuales.

En el presente informe se evidencian las actividades realizadas dentro del periodo de ejecución del 12 de julio al 11 de agosto del 2025 en términos de actividades ambientales.

El contratista realiza el MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE OBRA – MAO, documento mediante el cual se establecen lineamientos y acciones a implementar durante la gestión ambiental y SST en la ejecución del COP-711-2024, cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.".

El Manual de seguimiento y control Ambiental de Obra – MAO, se encuentra en su segunda versión, la cual está aprobada por parte de la interventoría.

# 2. OBJETIVOS

## 2.1. OBJETIVO GENERAL

- Garantizar el cumplimiento de las actividades ambientales realizadas para la ejecución del contrato COP-711-2024, dando cumplimiento a los lineamientos legales contractuales.

## 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar la relación de las actividades ejecutadas en materia de gestión ambiental en el periodo comprendido del 12 de julio al 11 de agosto de 2025.
- Evidenciar las actividades realizadas con respecto a cada uno de los componentes ambientales.

## 3. GENERALIDADES

El contrato FDLF No. 711 DEL 2022 "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.".

### 3.1. ALCANCE

El programa de implementación del manual ambiental de obra - MAO, es el plan de acción del contratista de las obras para el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos, con él se busca asegurar y garantizar la ejecución las actividades propuestas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles impactos ambientales.

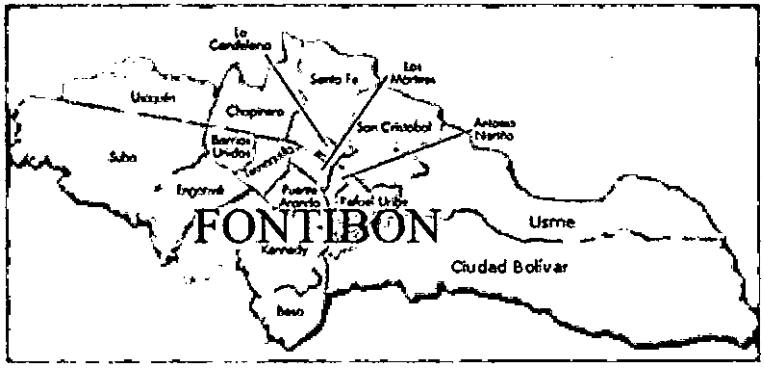
En el presente informe se describen las actividades desarrolladas para el componente E: Seguridad y Salud en el Trabajo

### 3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se llevará a cabo en la localidad de FONTIBÓN. La localidad es el número 9 de la ciudad, Su extensión es de 3.327,2 hectáreas, representando el 3.9% del distrito. Limita al norte con la Autopista El Dorado, al oriente con la carrera 68, al sur con la Avenida Centenario y al occidente con el Río Bogotá.

A continuación, se relacionan los segmentos viales que serán ejecutados durante la ejecución del contrato COP-711-2024.

**Ilustración 1 UPZ localidad de Fontibón**




A continuación, se detallan los límites de la intervención correspondientes al contrato:

***Tabla 1 Segmentos viales***

| No. | CIV | EJE | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001817 | CALLE 16 H | CARRERA 111 A | CARRERA 111 A BIS |
| 2 | 9001780 | CALLE 16 H | CARRERA 111 A BIS | CARRERA 112 |
| 3 | 9000368 | CARRERA 118 B | CALLE 23 B | AV. CALLE 24 |
| 4 | 9000393 | CARRERA 118 B | *CALLE 23* | CALLE 23 B |
| 5 | 9000181 | CARRERA 122 | CALLE 23 B | AV. CALLE 24 |
| 6 | 9000379 | CARRERA 118 B BIS | CALLE 23 | CALLE 23 B |
| 7 | 9000362 | CARRERA 119 | CALLE 23 | CALLE 23 B |
| 8 | 9004860 | CARRERA 134 | CALLE 17 C | CALLE 17 C BIS |
| 9 | 9004864 | CARRERA 134 | CALLE 17 C BIS | CALLE 17 D |
| 10 | 9004866 | CARRERA 134 | CALLE 17 D | CALLE 17 D BIS |
| 11 | 9004869 | CARRERA 134 | CALLE 17 D BIS | CALLE 17 F |
| 12 | 9004872 | CARRERA 134 | CALLE 17 F | NULL |
| 13 | 9004875 | CARRERA 134 | NULL | NULL |
| 14 | 9000204 | CALLE 15B | CARRERA 136 | CARRERA 137 |
| 15 | 9002043 | CALLE 23 H | CARRERA 96 F BIS | CARRERA 96 F |

### 3.3. DATOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

***Tabla 2 Datos contractuales del proyecto***

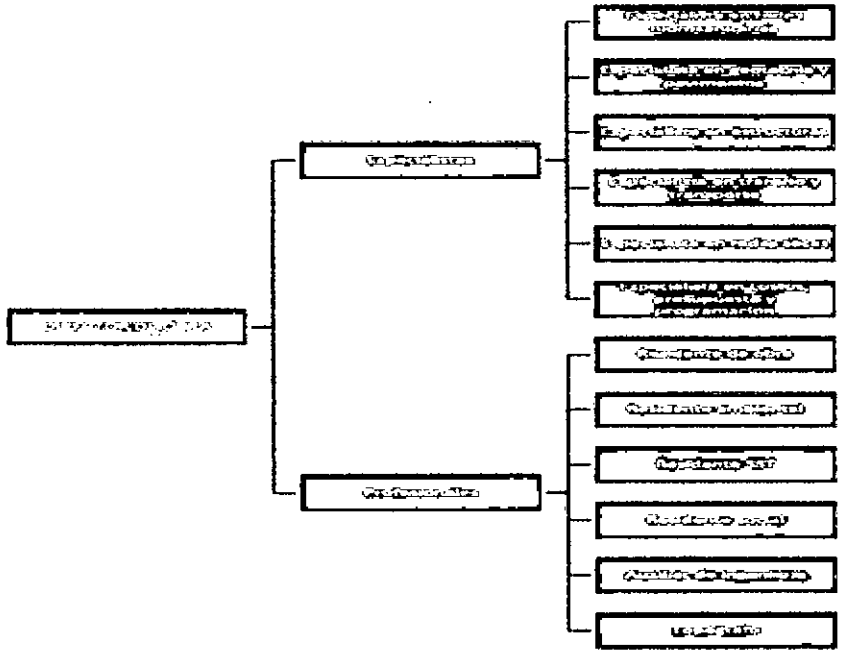
| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | Contrato de Obra Pública No. 711 de 2024 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Fondo de Desarrollo Local de Fontibón FDLF |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C." |
| **CONTRATISTA** | Consorcio Vías Fontibón 2024 |
| **NIT** | 901898112-9 |
| **PLAZO** | 9 meses |
| **FECHA DE INICIO** | 12 de febrero de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 11 de noviembre de 2025 |
| **VALOR** | $ 8.045.657.306 |
| **CIUDAD** | BOGOTÁ D.C |

| | |
|---|---|
| **REPRESENTANTE LEGAL** | Dian Marcela Pacheco Hernández |
| **OFICINA PRINCIPAL** | Carrera 7B #124-39 |
| **TELÉFONO** | 3185473727 |
| **CORREO** | viasfontibon2024@gamil.com |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | FDLF-CMA-001-2024 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | Carlos Alberto Bello Avena |

### 3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A continuación, se presenta el organigrama de la interventoría y contratista del personal mínimo requerido en él proyecto.

**Ilustración 2. Organigrama CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024**



### 3.5. EQUIPO SST AMBIENTAL

***Tabla 3 Equipo SST Ambiental***

| CARGO | NOMBRE | DEDICACIÓN | CÉDULA | APROBACIÓN INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENTE AMBIENTAL | JUAN PINEDA | 40% | 1.033.796.332 | INGI-50260-016-25 |
| RESIDENTE SST | MISRLEY PEREZ | 50% | 35.536.440 | INGI-50260-016-25 |
| RESIDENTE SOCIAL | LIDA PERDOMO | 100% | 1.023.887.282 | INGI-50260-016-25 |

### 3.6. PRODUCTOS SSTA

En la tabla siguiente se puede evidenciar el estado de los productos SSTA del contrato 711 de 2024.

***Tabla 4 Productos SSTA Contrato 711 de 2024***

| PRODUCTO | VERSIÓN | OFICIO DE ENTREGA | FECHA | APROBACIÓN | OFICIO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Ambiental de Obra (MAO) | 2 | VIASFONTIBON-711-2024-010 | 05/03/2025 | Aprobado | INGI-50260-038-25 | 23/04/2025 |
| Plan de Gestión de RCD | 1 | VIASFONTIBON-711-2024-010 | 05/03/2025 | Aprobado | INGI-50260-019-25 | 20/03/2025 |
| Solicitud apertura de PIN ambiental | 1 | Correo Electrónico | 10/03/2025 | Aprobado | INGI-50260-048-25 | 12/05/2025 |
| INFORME AMB 1 | 2 | VIASFONTIBON-711-2024-018 | 17/03/2025 | Aprobado | VIASFONTIBON 711-2024-018 | 17/03/2025 |
| INFORME AMB 2 | 2 | VIASFONTIBON-711-2024-047 | 02/05/2025 | Aprobado | VIASFONTIBON 711-2024-047 | 02/05/2025 |
| INFORME AMB 3 | 1 | VIASFONTIBON-711-2024-066 | 15/05/2025 | Aprobado | INGI-50260-079-25 | 10/06/2025 |
| INFORME AMB 4 | 2 | VIASFONTIBON-711-2024-109 | 13/06/2025 | Aprobado | INGI-50260-102-25 | 07/07/2025 |
| INFORME AMB 4 | 2 | VIASFONTIBON-711-2024-109 | 13/06/2025 | Aprobado | INGI-50260-101-25 | 04/07/2025 |
| INFORME SST 1 | 2 | VIASFONTIBON-717-2024-017 | 17/03/2025 | Aprobado | INGI-50260-039-25 | 23/04/2025 |
| INFORME SST 2 | 2 | VIASFONTIBON-711-2024-048 | 2/05/2025 | Aprobado | INGI-50260-054-25 | 21/05/2025 |
| INFORME SST 3 | 1 | VIASFONTIBON-711-2024-065 | 15/05/2025 | Aprobado | INGI-50260-079-25 | 10/06/2025 |
| INFORME SST 4 | 2 | VIASFONTIBON-711-2024-109 | 13/06/2025 | Aprobado | INGI-50260-101-25 | 04/07/2025 |
| INFORME SST 5 | 2 | VIASFONTIBON-711-2024-125 | 17/07/2025 | Aprobado | INGI-50260-107-25 | 18/07/2025 |

### 3.7. SEGUIMIENTO CORRESPONDENCIA

En la siguiente tabla se relaciona la correspondencia generada en los diferentes organismos interesados en el proyecto sobre el componente SST, durante el periodo entre el 12 de julio al 11 de agosto de 2025.

***Tabla 5 Correspondencia***

| Fecha | Asunto | No. Radicado | Entidad receptora | Entidad emisora |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Remisión informe sst y ambiental no. 5 | Vías Fontibón 711-2024-122 | Ing Ingeniería | Consorcio Vías Fontibón |
| 17/07/2025 | Respuesta oficio INGI-50260-105-25 subsanación observaciones informe ambiental No. 5 | Vías Fontibón 711-2024-124 | Ing Ingeniería | Consorcio Vías Fontibón |
| 17/07/2025 | Respuesta comunicación viasfontibon-711-2024-122 "remisión Informe sst y ambiental no. 5" bservaciones al informe No. 5 SST del contrato FDLF-711-2024 | INGI-50260-104-25 | Consorcio Vías Fontibón | Ing Ingeniería |
| 17/07/2025 | Respuesta comunicación viasfontibon-711-2024-122 "remisión Informe sst y ambiental no. 5" observaciones al informe no. 5 Ambiental del contrato fdlf-711-2024. | INGI-50260-105-25 | Consorcio Vías Fontibón | Ing Ingeniería |
| 18/07/2025 | Respuesta a comunicación VIASFONTIBON-711-2024-124 "Respuesta oficio INGI-50260-105-25 subsanación observaciones informe ambiental No. 5" Aprobación informe N 5 del componente AMBIENTAL V 2 | INGI-50260-107-25 | Consorcio Vías Fontibón | Ing Ingeniería |
| 05/08/2025 | Copia denuncia policía por daños de terceros a arbustos existentes en Rincón Santo CIV 9002043 | Vías Fontibón 711-2024-132 | Ing Ingeniería | Consorcio Vías Fontibón |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Remisión reporte mensual de residuos de construcción y demolición RCD junio 2025 | Vías Fontibón 711-2024-133 | Ing Ingeniería | Consorcio Vías Fontibón |
| 11/08/2025 | Remisión documentación de personal | Vías Fontibón 711-2024-135 | Ing Ingeniería | Consorcio Vías Fontibón |

Ver anexo 1. Correspondencia

### 3.8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO

Las actividades constructivas realizadas en el periodo comprendido entre el 12 de julio al 11 de agosto de 2025 fueron las siguientes:

- Replanteo: cerramiento de segmentos viales
- Señalización: implementación de PMT
- Cerramiento de árboles
- Conformación de la vía
- Apiques
- Excavación manual y excavación mecánica
- Nivelación de la vía
- Conformación de diseño de pavimento
- Instalación de bordillo

#### 3.8.1. Seguimiento a productos ambientales

***Tabla 6 Seguimiento a productos ambientales***

| Producto | Versión | Fecha de reporte | Oficio de radicación | Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Manual de control y Seguimiento ambiental y de SST | Versión 1 | 26/02/2025 | 711-2024-008 | Aprobado |
| Subsanación observaciones PGRCD | Versión 2 | 05/03/2025 | 711-2024-010 | Aprobado |
| Remisión observaciones manual de control y seguimiento Ambiental y de SST | Versión 2 | 17/03/2025 | 711-2024-016 | Aprobado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Remisión informe mensual no.1 componente ambiental | Versión 1 | 17/03/2025 | 711-2024-018 | Aprobado |
| Remisión informe mensual no. 2 componente ambiental | Versión 1 | 02/05/2025 | 711-2024-047 | Aprobado |
| Remisión informe mensual no. 3 componente ambiental | Versión 1 | 15/05/2025 | 711-2024-065 | Aprobado |
| Remisión informe mensual no. 4 componente ambiental | Versión 1 | 13/06/2025 | 711-2024-109 | Aprobado |
| Remisión informe mensual no. 5 componente ambiental | Versión 2 | 17/07/2025 | 711-2024-124 | Aprobado |

## 4. SEGUIMIENTO AL MANUAL DE CONTROL AMBIENTAL

### 4.1. Seguimiento al Componente Ambiental del Proyecto:

Durante el periodo de reporte se presenta la implementación del Manejo Ambiental de Obra del contrato de obra 711 de 2024, a continuación, se remiten las fichas ambientales correspondientes:

#### 4.1.1. Componente A: Manejo para el cumplimiento de requisitos y A&SST

##### 4.1.1.1. Programa A1. Manejo para el cumplimiento de requisitos y A&SST

En las siguientes tablas se relaciona el personal mínimo del Contratista debidamente aprobado por parte de la Interventoría, que participó durante el presente periodo en las actividades de evaluación, control y seguimiento del componente ambiental y SST

***Tabla 7 Equipo Ambiental Contrato Vías Fontibón 711 de 2024***

| CARGO | NOMBRE | DEDICACIÓN | CÉDULA | APROBACIÓN INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENTE AMBIENTAL | JUAN PINEDA | 40% | 1.033.796.332 | INGI-50260-016-25 |
| RESIDENTE SST | MISRLEY PEREZ | 50% | 35.536.440 | INGI-50260-016-25 |
| RESIDENTE SOCIAL | LIDA PERDOMO | 100% | 1.023.887.282 | INGI-50260-016-25 |

Con respecto a las capacitaciones propuestas, el consorcio Vías Fontibón acorde con el cronograma, para el periodo de 12 de julio al 11 de agosto de 2025 las siguientes actividades de formación:

Se realizaron 6 sesiones de inducción con una cobertura del 100% conforme al total de ingresos del mes de julio - agosto correspondiente a 12 trabajadores, las personas a las que se les realizó la inducción corresponden al mismo número de personas que fueron presentadas a la interventoría.

Se realizaron 2 sesiones de capacitación, las cuales incluyeron las programadas en periodo de 12 de julio al 11 de agosto de 2025 de acuerdo con el cronograma lo que corresponde al 100% del cumplimiento.

En el **anexo 2**, se evidencian los registros de las inducciones realizadas y en el **anexo 3**, se presenta el cronograma de capacitaciones debidamente actualizado y verificado por la interventoría.

***Tabla 8 Seguimiento programa de formación***

| Tipo | TEMA | FECHA | COVERTURA | | Sesiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Programados | No asistentes | |
| Inducciones | Inducción y socialización del SGA | 13/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
| | | 14/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
| | | 15/07/2025 | 2 | 2 | 1 |
| | | 22/07/2025 | 1 | 1 | 1 |
| | | 01/08/2025 | 5 | 5 | 1 |
| | | 06/08/2025 | 2 | 2 | 1 |
| **TOTAL** | | | 12 | 12 | 6 |
| Capacitaciones | Funciones de orden y aseo | 29/07/2025 | 10 | 10 | 1 |
| | Recurso del agua | 07/08/2025 | 10 | 10 | 1 |
| **TOTAL** | | | 20 | 20 | 2 |

Los indicadores de gestión de este programa son los siguientes:

***Tabla 9 Indicadores componente A. Cumplimiento a las obligaciones Ambientales y SST - Ficha A1***

| INDICADOR | Programado | Ejecutado | Resultado (%) | Análisis Indicador |
|---|---|---|---|---|
| No. de capacitaciones efectuadas en el mes / No. de capacitaciones programadas * 100 | 2 | 2 | 100% | En cuanto las capacitaciones que se programaron para el personal, se efectuó 2 de 2, cumpliendo con el 100% del programa |
| No. de profesionales A&SST contratados / No. de profesionales A&SST requeridos *100 | 3 | 3 | 100% | Los profesionales contratados son el número de profesionales requeridos para el proyecto |
| No. de inducciones efectuadas en el mes / No. de trabajadores ingresados * 100 | 12 | 12 | 100% | Las inducciones que se programaron para el personal que ingresó fueron efectuadas a su totalidad |

### 4.1.2. Componente B. Manejo ambiental en la ejecución de las actividades constructivas

A continuación, se presenta el seguimiento general de los aspectos que se van evidenciando el cumplimiento por parte del contratista, de acuerdo con la etapa en la que se encuentra el proyecto:

#### 4.1.2.1. B1. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio:

Se identifica que el consorcio Vías Fontibón conto para el periodo de 12 de julio al 11 de agosto de 2025 de reporte con las siguientes zonas de campamento:

Durante el desarrollo del proyecto, se establecieron zonas de campamento destinadas a apoyar las labores operativas, logísticas y administrativas del consorcio. Estos puntos fueron seleccionados estratégicamente para facilitar el acceso a las áreas de intervención y garantizar condiciones adecuadas para el personal. Se tuvo 1 punto en rincon santos, 1 en casandra y 1 refugio.

Cada punto de campamento contó con las siguientes características:

**Ubicación estratégica:** Los campamentos se ubicaron en zonas cercanas a los

frentes de obra, permitiendo optimizar tiempos de traslado y respuesta ante eventualidades. Su localización respondió a criterios de seguridad, accesibilidad y disponibilidad de servicios básicos.

**Apoyo operativo:** Los campamentos contaron con áreas destinadas al almacenamiento de materiales menores, herramientas, equipos y elementos de señalización.

También se habilitaron espacios para el descanso temporal del personal, con condiciones básicas de comodidad y seguridad.

**1 baños fijo:** Unidad sanitaria de estructura sólida, conectada a un sistema de recolección o tanque séptico, destinada a uso prolongado.

**1 baño móvil:** Sanitario portátil fácilmente transportable, utilizado para complementar la demanda según el flujo de personal

Estos campamentos contaron con la instalación de 3 ecológicos y 1 baños fijo, 1 baño móvil los cuales se les realizó mantenimiento 2 veces por semana.

Los indicadores de gestión de este programa son los siguientes:

***Tabla 10 Indicadores Componente B. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio – Ficha B1***

| INDICADOR | Requerido | Utilizados | Resultado (%) | Análisis Indicador |
|---|---|---|---|---|
| No. de puntos ecológicos instalados / No de frentes de trabajo*100 | 3 | 3 | 100% | Implementamos 3 puntos ecológicos en los dos frentes de obra ejecutados en el periodo de 12 de julio a 11 de agosto de 2025 |

En el **anexo 4** se presentan los certificados de mantenimiento y disposición de los baños portátiles instalados.

#### 4.1.2.2. B2. Manejo de materiales de construcción:

El contratista reporta el control de entrada de material mediante el formato CONTROL DE MATERIALES y los certificados de los materiales utilizados (Ver **anexo 5**).
En la siguiente tabla se presenta la relación del material ingresado en el periodo por parte del contratista: Para el periodo de 12 de julio a 11 de agosto de 2025 se ingresó materiales de construcción a obra.

***Tabla 11 Material ingresado durante el periodo de reporte***

| TIPO DE MATERIAL | VOLUMEN SUELTO ($m^3$) | *PESO SUELTO EN (TON) | PROVEEDOR | CANTIDAD CERTIFICADA ($m^3$) |
|---|---|---|---|---|
| **B200** | 150 | 225 | Constriturar | N/A |
| **Triturado** | 60 | 90 | Constriturar | N/A |
| **TOTAL** | 210 | 315 | Constriturar | N/A |
| **Factores de Conversión: Densidad (TON/$m^3$)** | | | | |
| - GRANULARES: 1,5<br>- ASFALTOS: 1,8<br>- CONCRETOS: 2,5 | | - FRESADO: 1,5<br>- HIERRO: 7,84 | | |

En la tabla de arriba se presentan las cantidades de cada tipo de material que ingreso al contrato durante el periodo del 1 de julio al 31 de julio de 2025, en el anexo 5 se presentan los vales correspondientes de cada uno de los viajes, esto con el fin de solicitar la certificación del mes de junio y julio de 2025, ya que la misma la realizan por mes, se está a la espera que la cantera la envié, una vez sea recibida se presentara a la interventoría.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad de ingreso de material del contrato Vías Fontibón 711 de 2024: En el periodo del 1 de julio al 31 de julio de 2025 ingreso de material granular.

***Tabla 12 Trazabilidades materiales de construcción***

| Info | Proveedor | Material | Certificado | Cantidad | | Total, por periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | m3 | Tn | m3 | Tn |
| Feb-Mar | NA | NA | - - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-Abr | NA | NA | - - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abr-May | NA | NA | - - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May-Jun | NA | NA | - - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-Jul | Constriturar | Rajón | N/A | 45 | 67,5 | 105 | 157,5 |
| | Constriturar | B400 | N/A | 30 | 45 | | |
| | Constriturar | B200 | N/A | 15 | 22,5 | | |
| | Constriturar | Triturado | N/A | 15 | 22,5 | | |
| Julio | Constriturar | B200 | N/A | 150 | 225 | 210 | 315 |
| | Constriturar | Triturado | N/A | 60 | 90 | | |
| **TOTAL, proyecto** | | | | **315** | **472,5** | **315** | **472,5** |

Los indicadores de gestión de este programa son los siguientes:

***Tabla 13 Indicadores Componente B. Manejo de materiales de construcción – Ficha B2***

| INDICADOR | No autorizados | No implementados | Resultado (%) | Análisis Indicador |
|---|---|---|---|---|
| No. de quejas y reclamos resueltos por manejo de materiales en el periodo/ N° total de quejas y reclamos recibidos por manejo de material en el periodo *100 | 0 | 0 | 0% | No se presenta quejas en el presente periodo |
| Cantidad de material certificado / Cantidad de material utilizado en obra | 0 | 472,5 ton | 0% | Para el periodo se usaron materiales de construcción provenientes de construturar |

### 4.1.2.3. B3. Manejo integral de residuos sólidos

#### 4.1.2.3.1 Residuos ordinarios

Durante este período de reporte se informa que los residuos domiciliarios generados en los campamentos temporales y en los diferentes de carácter ordinario se dispusieron con el operador asignado por la administración distrital, empresa asignada a esta zona por la alcaldía Mayor de Bogotá para la recolección de estos residuos para la localidad de FONTIBÓN.

***Tabla 14 Puntos ecológicos implementados***

| NÚMERO DE PUNTOS ECOLOGICOS | FRENTE DE OBRA |
|---|---|
| 1 | Rincón Santos |
| 1 | Casandra |
| 1 | Refugio |

#### 4.1.2.3.2 Residuos de Construcción y Demolición

El contratista reporta el control de entrada de material mediante el FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RCD DE LA OBRA, y, PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Ver **anexo 6**) y los certificados de manejo disposición de RCD del periodo de reporte. En la siguiente tabla se presenta la relación del material ingresado en el periodo por parte del contratista:

***Tabla 15 RCD generado en el periodo de reporte***

| CANTIDAD DE RCD DISPUESTO ENTRE EL 1 Y 31 DE JULIO DE 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE MANEJO** | **SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL** | **TIPO DE MATERIAL** | **CANTIDAD SUELTO (m3)** | **CANTIDAD SUELTO (Ton)** | **CANTIDAD CERTIFICADA (m3)** | **TOTAL (m3)** | **TOTAL (Tn)** |
| Centro de aprovechamiento | Ecodesarrollo | Excavación | 45 | 63 | 45 | 480 | 688,53 |
| Sitio de Disposición final | Máquinas Amarillas | Excavación | 285 | 365,57 | 285 | | |
| Centro de aprovechamiento | FYF | Excavación | 120 | 216 | 120 | | |
| Sitio de Disposición final | CEMEX | Excavación | 30 | 43,96 | 30 | | |
| **TOTAL** | | | 480 | 688,53 | 480 | | |

Se presentan en el anexo 6 las certificaciones correspondientes al mes de julio 2025, esto con el fin de solicitar la certificación mensual y no tener inconveniente a la hora de realizar los reportes ante la Secretaria Distrital de Ambiente. Las cantidades correspondientes del 1 al 11 de agosto 2025 se presentarán en el informe 7.

En la siguiente tabla se presenta la trazabilidad de ingreso de material del contrato Vías Fontibón 711 de 2024:

***Tabla 16 Seguimiento certificación manejo de RCD mensual***

| PERIODO | TIPO DE MANEJO | SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD SUELTO (m3) | CANTIDAD SUELTO (Tn) | CANTIDAD CERTIFICADA (m3) | APROV (m3) | APROV (Tn) | DISP.(m3) | DISP.(Tn) | % APROVECHAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 30 JUNIO | Centro de aprovechamiento | Eco desarrollo | Excavación | 195 | 331,5 | 195 | 195 | 331,5 | 0 | 0 | 100% |
| | Centro de aprovechamiento | Maquinas Amarillas | Excavación | 495 | 841,5 | 495 | 495 | 841,5 | 0 | 0 | 100% |
| | Centro de aprovechamiento | FYF | Excavación | 240 | 408 | 240 | 240 | 408 | 0 | 0 | 100% |
| 1 a 31 JULIO | Centro de aprovechamiento | Ecodesarrollo | Excavación | 45 | 63 | 45 | 45 | 63 | 0 | 0 | 100% |
| | Sitio de Disposición final | Máquinas Amarillas | Excavación | 285 | 365,57 | 285 | 285 | 365,57 | 0 | 0 | 100% |
| | Centro de aprovechamiento | FYF | Excavación | 120 | 216 | 120 | 120 | 216 | 0 | 0 | 100% |
| | Sitio de Disposición final | CEMEX | Excavación | 30 | 43,96 | 30 | 30 | 43,96 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | | | | 1.410 | 2.269,53 | 1.410 | 1.410 | 2.269,53 | 0 | 0 | 100% |

#### 4.1.2.3.3 Plan de gestión de residuos de construcción y demolición

Para dar cumplimiento a la resolución 1257 de 2021 y cumplir con el 40% de Material Reciclado y/o Reutilizado instalado en obra, el contratista, reutilizo entre el 1 y 30 de julio de 2025 165 m3 de RCD que fueron entregados a una planta de aprovechamiento, las cuales mediante procesos de clasificación y limpieza generan su reutilización en la nivelación de adecuación y Restauración de Suelos Con fines Agrícolas, generando un cumplimiento en la meta proyectada de aprovechamiento de 40,52%; a continuación, se presenta el seguimiento de aprovechamiento de RCD generado por el contratista en el Contrato Vías Fontibón 711 de 2024.

***Tabla 17 Seguimiento aprovechamiento de RCD***

| PERIODO | TIPO DE MANEJO | SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD SUELTO (m3) | CANTIDAD SUELTO (Tn) | CANTIDAD CERTIFICADA (m3) | CERTIFICADO | TOTAL (m3) | TOTAL (Tn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 30 JUNIO | Centro de aprovechamiento | Eco desarrollo | Excavación | 195 | 331,5 | 195 | 195 | 930 | 1.581 |
| | Centro de aprovechamiento | Maquinas Amarillas | Excavación | 495 | 841,5 | 495 | 495 | | |
| | Centro de aprovechamiento | FYF | Excavación | 240 | 408 | 240 | 240 | | |
| 1 a 31 de JULIO | Centro de aprovechamiento | Ecodesarrollo | Excavación | 45 | 63 | 45 | 45 | 480 | 688,53 |
| | Sitio de Disposición final | Máquinas Amarillas | Excavación | 285 | 365,57 | 285 | 285 | | |
| | Centro de aprovechamiento | FYF | Excavación | 120 | 216 | 120 | 120 | | |
| | Sitio de Disposición final | CEMEX | Excavación | 30 | 43,96 | 30 | 30 | | |
| TOTAL | | | | 1.410 | 2.269,53 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 2.269,53 |

**Nota:** Los certificados del material de aprovechamiento de RCD se adjuntan en el anexo 6

En el **Anexo 6** se presenta el Formato de SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RCD DE LA OBRA, y, PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN y los soportes correspondientes de la gestión adelantada del PIN ambiental del Contrato Vías Fontibón 711 de 2024 del mes de reporte.

Los indicadores de gestión de este programa se presentan a continuación en las tablas 18 y 19

**Tabla 18 Indicadores Componente B. Manejo integral de residuos sólidos – Ficha B3**

| INDICADOR | Cantidad requeridos | Cantidad instalada | Resultado (%) | Análisis Indicador |
|---|---|---|---|---|
| No. de puntos ecológicos instalados / No. de puntos ecológicos requeridos para el proyecto*100 | 3 | 3 | 100% | Los puntos ecológicos implementados son igual a los puntos ecológicos requeridos |

**Tabla 19 Seguimientos indicadores RCD Resolución 1257 de 2021**

| No | NOMBRE DEL INDICADOR | PROYECTADO | | EJECUTADO | | ANÁLISIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TONELADA (t) | INDICADOR / PORCENTAJE | TONELADA (t) | INDICADOR / PORCENTAJE | |
| 1 | Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total) | $\frac{18.235,77}{18.235,77}$ | 100% | $\frac{2.269,53}{18.235,77}$ | 12,44% | Durante la ejecución del proyecto se han reportado 2.269,53 Tn de RCD, generando un cumplimiento del 12,44% correspondiente a las 18.235.77 Tn proyectadas. |
| 2 | Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total) | $\frac{0}{18.235,77}$ | 0% | $\frac{0}{18.235,77}$ | 0% | La cantidad de RCD aprovechada en el proyecto a la fecha fue de 0 Tn (Aprov In Situ) generando un cumplimiento del indicador de 0%. Esto debido a que el material no era susceptible de aprovechamiento durante la obra |
| 3 | Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total) | $\frac{0}{18.235,77}$ | 0% | $\frac{0}{18.235,77}$ | 0% | Durante el periodo de reporte no se realizó entrega de RCD en punto limpio |
| 4 | Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total) | $\frac{7.294,308}{18.235,77}$ | 40% | $\frac{1.860}{18.235,77}$ | 10,20% | Durante la ejecución del proyecto se han reportado 1.860 Tn de RCD los cuales fueron entregados a un centro de aprovechamiento, generando un cumplimiento del 10,20% correspondiente a las 18.235,77 Tn proyectadas. |
| 5 | Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total) | $\frac{0}{18.235,77}$ | 0% | $\frac{0}{18.235,77}$ | 0% | Durante el periodo de reporte se ha presentado el siguiente manejo de 0 Tn de RCD cumpliendo con la meta de entrega a receptor de 0% |
| 6 | Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total) | $\frac{10.941,462}{18.235,77}$ | 60% | $\frac{409,53}{18.235,77}$ | 2,25% | A la fecha de reporte se ha realizo la disposición final de RCD de 409,53 Tn generando un cumplimiento de 2,25% |
| 7 | Meta mínima total de aprovechamiento (40%) | $\frac{7.294,308}{7.294,308}$ | 100% | $\frac{1.860}{7.294,308}$ | 25,50% | El cumplimiento de aprovechamiento de RCD a la fecha de reporte fue de 25,50% (1.860 Tn) |

### 4.1.2.3.4 Manejo de residuos peligrosos, aceites usados y sustancias químicas

Durante el presente periodo del informe no se presentó la generación de residuos tipo RESPEL, producto de las actividades de obra, por lo tanto, no se vio la necesidad de programar la recolección respectiva con el gestor.

Teniendo en cuenta que no se presentó derrame de hidrocarburos para el periodo del informe, no se presentan los formatos ni registro fotográfico de la atención de la emergencia.

Los indicadores de gestión de este programa se presentan a continuación en la tabla 20.

***Tabla 20 Indicadores Componente B. Manejo de residuos peligrosos, aceites usados y sustancias químicas– Ficha B3A***

| INDICADOR | Ocurridos | Atendidos | Resultado (%) | Análisis Indicador |
|---|---|---|---|---|
| (# derrames ocurridos) / (# Derrames atendidos adecuadamente) *100 | 0 | 0 | 0% | En el periodo de 12 de julio a 11 de agosto de 2025 no ocurrió ningún derrame de sustancias químicas |

### 4.1.2.4. B4. Control de emisiones atmosférica

Durante el periodo de reporte se presentan actividades constructivas en los diferentes frentes de trabajo, sin embargo, se implementan medidas de mitigación que generan protección al recurso atmosférico. Las cuales se mencionan a continuación:

- El proyecto no realiza ningún tipo de quemas a cielo abierto.
- La maquinaria utilizada fue sometida a mantenimientos periódicos de acuerdo con las instrucciones del fabricante y a los requerimientos exigidos por al área de maquinaria y equipos.
- Protección de acopios de materiales pétreos.
- Jornadas de orden Aseo y limpieza realizados por el personal de obra.

A continuación, se presenta el listado de volquetas con su correspondiente PIN ambiental utilizado durante el periodo del informe.

***Tabla 21 Listado de volquetas aprobadas para el periodo del informe***

| PLACA | PIN SDA | CAPACIDAD M3 |
|---|---|---|
| SLI200 | 2088 | Doble troque |
| SQW330 | 3027 | Doble troque |
| SRN272 | 5810 | Doble troque |
| SXC230 | 5841 | Doble troque |
| SZZ679 | 3242 | Doble troque |
| VEQ128 | 2104 | Doble troque |

La documentación de validación de PIN de volquetas se presenta en el **Anexo 7.**

Los indicadores de gestión de este programa se presentan a continuación en la tabla 22.

***Tabla 22 Indicadores Componente B. Control de emisiones atmosféricas – Ficha B4***

| INDICADOR | cantidad aprobados | Cantidad utilizada | Resultado (%) | Análisis Indicador |
|---|---|---|---|---|
| No. de vehículos con PIN ambiental transportador utilizados para el periodo / No. de vehículos autorizados por interventoría con PIN *100 | 6 | 6 | 100% | Durante la ejecución del periodo se utilizaron 6 volquetas, las cuales se encuentran dentro del listado de transportadores inscritos en el aplicativo Web de la secretaria distrital de ambiente |

### 4.1.2.5. B5. Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

Durante el periodo de reporte se realizó actividades de protección de sumideros, y pozos por las actividades de construcción.

Los indicadores de gestión de este programa se presentan a continuación en la tabla 5.

***Tabla 23 Indicadores Componente B. Manejo integral de cuerpos de agua– Ficha B5***

| INDICADOR | Identificados | Protegidos | Resultado (%) | Análisis Indicador |
|---|---|---|---|---|
| No. de sumideros p protegidos / No. de sumideros presentes en el proyecto *100 | 2 | 2 | 100% | Los sumideros existentes en el frente de obra fueron protegidos con poli malla |
| No. de pozos protegidos / No. de pozos presentes en la zona | 4 | 4 | 100% | Los pozos existentes en el frente de obra fueron protegidos con poli malla |

En el **Anexo 8** se presenta el formato de manejo de cuerpos de agua.

### 4.1.2.6. Componente C. Manejo de la vegetación y paisajismo

Durante el periodo de reporte se realizaron actividades de protección de individuos

arbóreos, por las actividades de construcción.

Los indicadores de gestión de este programa se presentan a continuación en la tabla 24.

***Tabla 24 Indicadores Componente C. Manejo de la vegetación y paisajismo - Ficha C1***

| INDICADOR | Identificados | Protegidos | Resultado (%) | Análisis Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Número de árboles con cerramiento / Número de árboles en AID | 2 | 2 | 100% | Los árboles existentes dentro de los CIV fueron protegidos en su totalidad con poli malla |

En el **Anexo 9** se presenta el Registro fotográfico donde se evidencia la protección de los distintos individuos arbóreos presentes, y sus correspondientes cerramientos.

### 4.1.2.7. Componente E: Programa de señalización de seguridad

Durante el periodo de reporte el contrato FDLF 711 de 2024, implementó los planes de manejo de tráfico en los siguientes frentes de obra:

***Tabla 25 Indicadores Componente C. Manejo de la vegetación y paisajismo - Ficha C1***

| FRENTE | UBICACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|
| 1 | Rincón Santos |  |
| 2 | Casandra |  |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Refugio |  |

En el **Anexo 9** (registro fotográfico), se presentan distintas evidencias de la señalización en los diferentes frentes de obra; a continuación, se describe el indicador de la ficha:

$$\frac{N° \, de \, frentes \, de \, obra \, señalizados}{N° \, de \, frentes \, de \, obra \, en \, ejecución} * 100$$

$$\frac{3}{3} * 100 = 100\%$$

## CONCLUSIONES

- Para el periodo de 12 de julio a 11 de agosto se mantiene un cumplimiento ambiental satisfactorio, enmarcado en lo dispuesto en el Manual Ambiental de Obra (MAO), los instrumentos de gestión ambiental y la normativa vigente.
- Para el periodo de 12 de julio a 11 de agosto se verificó que las volquetas vinculadas al proyecto cuentan con su respectivo PIN ambiental, cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental y facilitando el seguimiento al transporte de materiales.
- De acuerdo al anexo técnico y a los recorridos realizados a los CIV'S que se van a intervenir no se requiere la necesidad de solicitar permisos adicionales ante la autoridad ambiental, secretaria Distrital de Ambiente.
- Se tiene aprobación al Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición PGRCD, con ella se realizó la solicitud de creación de PIN ante el PIGA de la alcaldía de Fontibón, la cual se asignó el PIN número 26980.
- Se adoptaron medidas efectivas de protección de los árboles y cuerpos de agua presentes en las zonas de intervención, garantizando su integridad durante las actividades constructivas. Estas acciones incluyeron cerramientos, señalización, y control de vertimientos y residuos que pudieran afectar los recursos naturales.

- El contrato FDLF 711 de 2024, en el periodo comprendido del presente informe se generó 688,53 ton de RCD.
- El RCD generado por el contrato, en el mes de julio tiene como disposición final Ecodesarrollo, Máquinas Amarillas, FYF y CEMEX.
- Durante el periodo de reporte se generó un 3,82% sobre la meta del 40% de aprovechamiento de RCD.
- A lo largo del proyecto se ha generado un 25,50% de aprovechamiento sobre la meta del 40% de aprovechamiento de RCD
- A la fecha del presente informe no se generan derrames de RESPEL.
- Se genera cubrimiento de individuos arbóreos, pozos y sumideros presentes en los frentes de obra.

## ANEXOS

- Anexo 1. Correspondencia
- Anexo 2. Registro de formación (Inducción y capacitación)
- Anexo 3. Cronograma de capacitación
- Anexo 4. Mantenimiento de baños
- Anexo 5. Control de materiales y certificados de materiales
- Anexo 6. Formatos y certificados RCD.
- Anexo 7. Pin de Volquetas
- Anexo 8. Formato de manejo de cuerpos de agua
- Anexo 9. Registro fotográfico.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C." | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN BOGOTÁ | |
| | | INFORME AVANCE 06. | |
| CONTRATO FDLF COP-711-2024 | | Julio – Agosto 2025 | Versión 02 |
| | | Página 1 de 1 | |

# ANEXO 1.
# CORRESPONDENCIA

3395 327

Bogotá D. C. 11 de agosto 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-135***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoria
Calle 114 A No 53 – 94
Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Remisión documentación de personal

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024 en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir documentación de personal

Se adjuntan los documentos soportes para su previa aprobación de cada uno de los perfiles adjuntos en el siguiente link

https://drive.google.com/drive/folders/1ZHWOm74mHIVKmWvnkARO8il-HaFiibWz

Quedamos atentos a sus comentarios,

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón

3396 328

Bogotá D. C. 05 de agosto 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-133***

Señores
ING INGENIERIA
**Ing. Alejandro Galindo**
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 – 94
Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** REMISIÓN REPORTE MENSUAL DE RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION RCD JUNIO 2025.

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir el reporte correspondientes a la información de residuos de construcción y demolición RCD correspondiente al mes de JUNIO de 2025 y con ello cumplir con lo descrito en el decreto 507 de 2023, se remiten los siguientes formatos para su previa revisión y/o aprobación.

- Anexo V. Informe de aprovechamiento IN SITU
- Anexo VI. Constancia de materiales pétreos y no pétreos valorados de RCD.
- Anexo VIII. Reporte de gestores ante la Secretaria Distrital de Ambiente

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal Consorcio Vías Fontibón 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón
Anexos:

- Reporte RCD junio 2025

3911 329

Bogotá D. C. 05 de julio 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-132***

Señores
**ING INGENIERIA**
Ing. Alejandro Galindo
Director de Interventoría
Calle 114 A No 53 – 94
Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Copia denuncia policía por daños de terceros a arbustos existentes en Rincón Santo CIV 9002043.

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir la copia de la denuncia realizada en la plataforma virtual de la policía de lo sucedido en el CIV 9002043.

El día 17 de julio de 2025 en horas de la noche, aproximadamente a las 10 pm, personal ajeno al contrato COP-711-2024, ingreso al frente de obra CIV 9002043 ubicado en el eje vial calle 23 h entre carrera 96f y carrera 96f bis y afectaron 3 arbustos, de los cuales se llevaron 1 y los otros 2 los dejaron talados y tirados en el frente de obra, por lo anterior el consorcio vías Fontibón 2024 mediante este denuncio deja la salvedad que el daño ocasionado a los mismos no fue producto de la ejecución del proyecto si no fue un daño ocasionado por terceros, por ende no se está en la obligación de hacer una reparación y/o compensación

3328 330

FISCALÍA

La información suministrada por usted se ha registrado de manera exitosa con el número de incidente HC-11-001-2025-50757 En las próximas 24 horas se le informará a su correo electrónico el resultado de la verificación realizada. Si los hechos relatados en este incidente corresponden a un delito, se creará la denuncia y la Fiscalía General de la Nación será la entidad encargada de continuar con el trámite correspondiente de acuerdo a los tiempos establecidos. NOTA: Si transcurridas 24 horas no ha recibido información sobre su incidente, comuníquese con la Policía Nacional al 6015159700 extensión 30547 o al correo electrónico dijin.denunciav@policia.gov.co. Si requiere información sobre una denuncia, comuníquese con la Fiscalía General de la Nación a la línea nacional gratuita 018000919748, Bogotá 6015702000 opción 7 o al centro de contacto línea 122.

Enterado

Agradezco la atención prestada,

**DIANA MARCELA PACHECO**
Representante Legal Consorcio Vías Fontibón 2024
Contrato de Obra 711 de 2024
Archivo Consorcio Vías Fontibón
Anexos:

3399 331

Bogotá D. C. 17 de junio 2025

***VIASFONTIBON-711-2024-124***



Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**
Subdirección de Planes de Manejo de Transito
Carrera 28 No 18 – 64
Ciudad.
Bogotá D.C

**Ref.** CONTRATO DE OBRA No 711-2024 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD FONTIBON"

**Asunto:** Respuesta oficio INGI-50260-105-25 subsanación observaciones informe ambiental No. 5.

Respetado Ingeniero;

El CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de la referencia se permite remitir la subsanación a las siguientes observaciones realizadas al informe ambiental No. 5:

| OBSERVACION | SUBSANACION |
|---|---|
| En la carpeta drive se presentan 2 documentos de informe denominados V1 y V2, se debe presentar un solo documento, el documento V2 presenta contraseña, se solicita por favor, verificar que los archivos que se presentan a interventoría NO generen solicitud de acceso o contraseña | Se realiza el ajuste pertinente en el drive del informe<br> |
| Cambiar numeración y fecha de informe en el encabezado, se presenta como V2 | Se realiza el ajuste pertinente en el encabezado del presente informe<br> |
| | |

3400

332

| | |
|---|---|
| Generar corrección de estado Tabla 4. Pin Ambiental | Se realiza el ajuste al estado del pin en la tabla 4, esta se encuentra en la página 9 |
| 3.7 Tabla 5 sin diligenciar | Tabla 5 diligenciada en la pagina 10 del presente informe |
| Actualizar Tabla 6 | Se hace la actualización a la tabla 6 dentro del informe en la página 11 |
| 4.1.1.1 Se habla de 13 inducciones que corresponden al 100% de ingresos, pero luego de 25 trabajadores, no es comprensible el párrafo | Se realiza el ajuste pertinente a la tabla 8 en la página 13 |
| 4.1.1.1 Se habla de 13 sesiones de capacitación, pero, en la tabla 8 solo se relaciona 1 sesión con 1 único asistente, y, el anexo se relaciona en la carpeta que no corresponde y posee información diferente | Se realiza el ajuste pertinente a la tabla 8 en la página 13 |

*Tabla 4 Productos SSTA Contrato 711 de 2024*

| PRODUCTO | VERSIÓN | OFICIO DE ENTREGA | FECHA | APROBACIÓN | OFICIO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Ambiental en Obra (MAO) | 2 | VIASFONTIBON-711-2024-010 | 10/03/2025 | Aprobado | INCI-00200-039-25 | 25/04/2025 |
| Plan de Gestión de RCD | 1 | VIASFONTIBON-711-2024-010 | 10/03/2025 | Aprobado | INCI-00200-019-25 | 28/03/2025 |
| Solicitud apertura de PIN ambiental | 1 | Correo electrónico | 10/03/2025 | Aprobado | INCI-00200-049-25 | 12/05/2025 |
| | 2 | | | | VIASFONTI | |

*Tabla 5 Correspondencia*

| Fecha | Asunto | No. Radicado | Entidad emisora | Entidad emisora |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Remisión de consolidación de proveedores de los bienes utilizados en las frentes de obra | Vías Fontibón 711-2024-103 | Ing Ingeniería | Consorcio Vías Fontibón |
| 03/06/2025 | Remisión de informe No 4 SST y Ambiental | Vías Fontibón 711-2024-109 | Consorcio Vías Fontibón | Ing Ingeniería |
| 10/07/2025 | REMISION INFORME SST Y AMBIENTAL NO 5 | Vías Fontibón 711-2024-122 | Consorcio Vías Fontibón | Ing Ingeniería |

*Tabla 8 Seguimiento programa de formación*

| Tipo | TEMA | FECHA | COVERTURA No Programadas | COVERTURA No asistentes | Sesiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Inducciones | Inducción y socialización del SGA | 13/06/2025 | 1 | 1 | 1 |
| | | 14/06/2025 | 1 | 1 | 1 |
| | | 24/06/2025 | 2 | 2 | 1 |
| TOTAL | | | 4 | 4 | 3 |
| Capacitaciones | Funciones de orden y aseo | 01/07/2025 | 7 | 7 | 1 |
| TOTAL | | | 1 | 1 | 1 |

*Tabla 8 Seguimiento programa de formación*

| Tipo | TEMA | FECHA | COVERTURA No Programadas | COVERTURA No asistentes | Sesiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Inducciones | Inducción y socialización del SGA | 13/06/2025 | 1 | 1 | 1 |
| | | 14/06/2025 | 1 | 1 | 1 |
| | | 24/06/2025 | 2 | 2 | 1 |
| TOTAL | | | 4 | 4 | 3 |
| Capacitaciones | Funciones de orden y aseo | 01/07/2025 | 7 | 7 | 1 |
| TOTAL | | | 1 | 1 | 1 |
