ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 01

CONTRATO DE OBRA_X_ CONTRATO DE INTERVENTORÍA __ CONVENIO SOLIDARIO__
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NÚMERO:	**CO1.PCCNTR.8377744**								
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER								
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.448.942.363)								
VALOR ADICIONAL:	N/A								
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE								
PLAZO ADICIONAL:	N/A								
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS – NIT. 902.014.232-5 R/L JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ								
SUPERVISOR:	JUAN PABLO VERA MOGOLLON								
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO								
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS NIT. 901.053.614-8 R/L MIGUEL FERNANDO QUIROS GÓMEZ								
ANTICIPO (XX%)	N/A								
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025								
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1	13/11/2025	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	
ACTA DE REINICIACIÓN	N°1	10/12/2025	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025								
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA								
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA								

En Piedecuesta, a los 19 días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, por parte del Municipio, el Supervisor **JUAN PABLO VERA MOGOLLON**, en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, el Inventor **MIGUEL FERNANDO QUIROS GÓMEZ** en calidad de Representante Legal de **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS**, por parte del contratista **JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ** en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO VIAS URBANAS** y **LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO** como apoyo a la supervisión del Municipio, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial No 01 correspondiente al periodo del 10 de diciembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025 del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo Nº 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. _01_	$ 696.101.318
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	N/A
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	N/A
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$696.101.318
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 696.101.318)	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ
R/L CONSORCIO VIAS URBANAS
CONTRATISTA

MIGUEL FERNANDO QUIROS GÓMEZ
R/L CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS
INTERVENTOR

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
SECRERTARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER								
	ACTA DE COBRO No 1								
	Periodo: 10/12/2025 al 18/12/2025						AVANCE	15,65%	
		CONDICIONES INICIALES DE OBRA				ACTA 1		CANTIDADES	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PIEDECUESTA									
1. PRELIMINARES									
1.1	Localización y replanteo	M2	8.651,38	$ 4.497	$ 38.905.256,00	1.205,10	$ 5.419.335,00	1.205,10	$ 5.419.335,00
1.2	Demolición de pavimento flexible e=15cm (Incluye corte y retiro)	M2	7.269,68	$ 68.690	$ 499.354.319,00	1.205,10	$ 82.778.319,00	1.205,10	$ 82.778.319,00
1.3	Demolición de andenes (Incluye retiro)	m2	310,00	$ 40.058	$ 12.417.980,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.4	Demolición de sardineles existentes (incluye retiro)	ml	329,50	$ 40.058	$ 13.199.111,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal	**$ 563.876.666,00**		**$ 88.197.654,00**	0,00	**$ 88.197.654,00**
2. MOVIMIENTOS DE TIERRA									
2.1	Excavación en material común de profundidad 0.0 a 0.50m Medios mecanicos	M3	4.213,16	$ 46.078	$ 194.133.986,00	734,46	$ 33.842.604,00	734,46	$ 33.842.604,08
2.2	Conformación, adecuación y compactación de la banca o subrasante	M2	9.535,38	$ 19.054	$ 181.687.131,00	1.128,30	$ 21.498.628,00	1.128,30	$ 21.498.628,20
2.3	Cargue, retiro y disposición final	M3	4.213,16	$ 87.658	$ 369.317.179,00	954,80	$ 83.696.069,00	954,80	$ 83.696.069,39
				Subtotal	**$ 745.138.296,00**		**$ 139.037.301,00**	0,00	**$ 139.037.301,68**
3. PAVIMENTO FLEXIBLE									
3.1	Suministro, conformación y compactación de Sub base Granular	M3	2.270,57	$ 245.032	$ 556.362.308,00	508,80	$ 124.673.112,00	508,80	$ 124.673.112,26
3.2	Suministro, conformación y compactación de Base Granular	M3	1.453,94	$ 304.183	$ 442.263.831,00	225,66	$ 68.641.936,00	225,66	$ 68.641.935,78
3.3	Suministro e Instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19	m3	872,36	$ 1.665.686	$ 1.453.077.839,00	144,61	$ 240.878.184,00	144,61	$ 240.878.183,83
3.4	Imprimación con emulsión asfáltica	m2	7.269,68	$ 13.502	$ 98.155.219,00	1.205,10	$ 16.271.260,00	1.205,10	$ 16.271.260,20
				Subtotal	**$ 2.549.859.197,00**		**$ 450.464.492,00**	0,00	**$ 450.464.492,07**
4. OBRAS HIDRAULICAS									
4.1	Excavación manual de zanja material común y/o conglomerado	m3	850,40	$ 75.183	$ 63.935.623,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.2	Berma cuneta en concreto de 3000 PSI reforzado	ml	337,00	$ 220.452	$ 74.292.324,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.3	Filtro o drenaje frances en tuberia PVC perforada de 4 plg	ml	337,00	$ 210.536	$ 70.950.632,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.4	Realce y reconstrucción de corona para pozos de inspección existentes	UND	14,00	$ 619.253	$ 8.669.542,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER								
	ACTA DE COBRO No 1								
	Periodo: 10/12/2025 al 18/12/2025						AVANCE	15,65%	
	CONDICIONES INICIALES DE OBRA					ACTA 1		CANTIDADES	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
				Subtotal	**$ 217.848.121,00**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
5. ESPACIO PUBLICO									
5.1	Suministro e instalación de sardinel prefabricado (incluye preparación de la superficie de apoyo) 0,2 m X0,5 mX0,8m	ML	229,50	$ 139.614	$ 32.041.413,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2	Suministro e instalación de bordillo prefabricado (incluye preparación de la superficie de apoyo) 0,2 m X0,35 mX0,8m	ML	229,50	$ 128.376	$ 29.462.292,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.3	Suministro e instalación de loseta prefabricada para trafico peatonal guía 0.4x0.4x0.06 (toperol, guia, lisa incluye mortero)	M2	749,20	$ 185.939	$ 139.305.499,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal	**$ 200.809.204,00**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
6. OBRAS ELECTRICAS									
6.1	Traslado de postas de energía de baja tensión	UND	6,00	$ 10.023.750	$ 60.142.500,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal	**$ 60.142.500,00**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
7. SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO									
7.1	Pintado de pavimento - Lineas de demarcación, con pintura en frio según especificaciones INVIAS	ML	2.698,50	$ 5.072	$ 13.686.792,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.2	Demarcación de vias, Zebras, Pares y flechas	M2	80,96	$ 68.827	$ 5.572.234,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal	**$ 19.259.026,00**		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
					$ 4.356.933.010,00		**$ 677.699.447,00**		**$ 677.699.447,75**
				COSTO DEL PROYECTO:	**$ 4.356.933.010,00**		**$ 677.699.447,00**		**$ 677.699.447,75**
	COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO:	MES	5		**$ 52.332.620,00**		$ 10.466.524,00		$ 10.466.524,00
	COSTO PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL:	MES	5		**$ 39.676.733,00**		$ 7.935.347,00		$ 7.935.347,00
					$ 4.448.942.363,00		**$ 696.101.318,00**		**$ 696.101.318,75**

Ing. Julian Andres Serrano Gomez	Ing. Miguel Fernando Quirós Gómez	Ing. Juan Pablo Vera Mogollón
Representante Legal Contratista	Representante Legal Interventoria	Supervisión
CONSORCIO VIAS URBANAS	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


CONSORCIO VIAS URBANAS

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA PARCIAL 1

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° CO1. PCCNTR8377744		FRENTE VIA PIEDECUESTA	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS			
INTERVENTORIA: Construingenieria			
SUPERVISIÓN : Linda Palacio	PERIODO	10/12/2025 AL 18/12/2025	
ITEM: 1,1	Localización y replanteo		M2

TRAMO 3: VIA JUNNIN

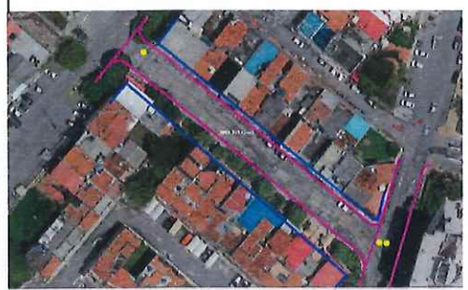



TRAMO 4: VIA CATALUÑA





SECTOR	CANTIDAD				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	V	
TRAMO 3: CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	98,14	9,10			893,10
TRAMO 4: CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	32,50	9,60			312,00
					1205,10
TOTAL			1.205,10		M2

Ing. PERLA OREJUELA
Residente de Obra
CONSORCIO VIAS URBANAS

Ing. Diana Edith Contreras Vargas
Residente de Interventoria
CONSTRUINGENIERIA

CONSORCIO VIAS URBANAS

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA PARCIAL 1

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° CO1. PCCNTR8377744			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS			
INTERVENTORIA: Construingenieria			
SUPERVISIÓN : Linda Palacio		PERIODO	10/12/2025 AL 18/12/2025
ITEM: 1,2	Demolición de pavimento flexible e=15cm (Incluye corte y retiro)		M2

TRAMO 3: VIA JUNNIN





TRAMO 4: VIA CATALUÑA





SECTOR	CANTIDAD				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	V	
TRAMO 3: CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	98,14	9,10			893,10
TRAMO 4: CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	32,50	9,60			312,00
					1205,10
TOTAL			1.205,10	M2	

Ing. PERLA OREJUELA
Residente de Obra
CONSORCIO VIAS URBANAS

Ing. Diana Edith Contreras Vargas
Residente de Interventoria
CONSTRUINGENIERIA

CONSORCIO VIAS URBANAS

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA PARCIAL 1

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° CO1. PCCNTR8377744		FRENTE VIA PIEDECUESTA	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS			
INTERVENTORIA: Construingenieria			
SUPERVISIÓN : Linda Palacio	PERIODO	10/12/2025 AL 18/12/2025	
ITEM: 2,1	Excavación en material común de profundidad 0.0 a 0.50m Medios mecanicos		M3

TRAMO 3: VIA JUNNIN





TRAMO 4: VIA CATALUÑA



SECTOR	CANTIDAD				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	espesor	
TRAMO 3: CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	98,14	9,10		0,45	401,90
TRAMO 3: FALLO DETECTADO CALZADA CON BAJANTES COLINDANTES	98,14	4,55		0,47	209,87
TRAMO 4: CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	24,50	9,60		0,45	105,84
TRAMO 4: FALLO	8,17	4,80		0,43	16,86
					734,46
TOTAL			734,46	M3	

Ing. PERLA OREJUELA
Residente de Obra
CONSORCIO VIAS URBANAS

Ing. Diana Edith Contreras Vargas
Residente de Interventoria
CONSTRUINGENIERIA

CONSORCIO VIAS URBANAS

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA PARCIAL 1

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° CO1. PCCNTR8377744		FRENTE VIA PIEDECUESTA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS		
INTERVENTORIA: Construingenieria		
SUPERVISIÓN : Linda Palacio	PERIODO	10/12/2025 AL 18/12/2025
ITEM: 2,2	Conformación, adecuación y compactación de la banca o subrasante	M2



TRAMO 3: VIA JUNNIN

TRAMO 4: VIA CATALUÑA



SECTOR	CANTIDAD				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	espesor	
TRAMO 3: CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	98,14	9,10			893,10
TRAMO 4: CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	24,50	9,60			235,20
					1128,30
TOTAL			1.128,30		M2

Ing. PERLA OREJUELA
Residente de Obra
CONSORCIO VIAS URBANAS

Ing. Diana Edith Contreras Vargas
Residente de Interventoria
CONSTRUINGENIERIA

CONSORCIO VIAS URBANAS

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA PARCIAL 1

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° CO1. PCCNTR8377744		FRENTE VIA PIEDECUESTA	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS			
INTERVENTORIA: Construingenieria			
SUPERVISIÓN : Linda Palacio		PERIODO	10/12/2025 AL 18/12/2025
ITEM: 2,3	Cargue, retiro y disposición final		M3



TRAMO 3: VIA JUNNIN

TRAMO 4: VIA CATALUÑA



SECTOR	CANTIDAD				TOTAL
	Largo	Ancho	Expansión	espesor	
TRAMO 3: CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	98,14	9,10	1,30	0,45	522,46
TRAMO 3: FALLO DETECTADO CALZADA CON BAJANTES COLINDANTES	98,14	4,55	1,30	0,47	272,83
TRAMO 4: CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	24,50	9,60	1,30	0,45	137,59
TRAMO 4: FALLO	8,17	4,80	1,30	0,43	21,91
					954,80
TOTAL			954,80	M3	

Ing. PERLA OREJUELA
Residente de Obra
CONSORCIO VIAS URBANAS

Ing. Diana Edith Contreras Vargas
Residente de Interventoria
CONSTRUINGENIERIA

CONSORCIO VIAS URBANAS

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA PARCIAL 1

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° CO1. PCCNTR8377744		FRENTE VIA PIEDECUESTA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS		
INTERVENTORIA: Construingenieria		
SUPERVISIÓN : Linda Palacio	PERIODO	10/12/2025 AL 18/12/2025
ITEM: 3,1	Suministro, conformación y compactación de Sub base Granular	M3



TRAMO 3: VIA JUNNIN



TRAMO 4: VIA CATALUÑA

SECTOR	CANTIDAD				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	espesor	
TRAMO 3: CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	98,14	9,10		0,25	223,28
TRAMO 3: FALLO DETECTADO CALZADA CON BAJANTES COLINDANTES	98,14	4,55		0,47	209,87
TRAMO 4: CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	24,50	9,60		0,25	58,80
TRAMO 4: FALLO	8,17	4,80		0,43	16,86
					508,80
TOTAL			508,80	M3	

Ing. PERLA OREJUELA
Residente de Obra
CONSORCIO VIAS URBANAS

Ing. Diana Edith Contreras Vargas
Residente de Interventoria
CONSTRUINGENIERIA

CONSORCIO VIAS URBANAS

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA PARCIAL 1

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° CO1. PCCNTR8377744		FRENTE VIA PIEDECUESTA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS		
INTERVENTORIA: Construingenieria		
SUPERVISIÓN : Linda Palacio	PERIODO	10/12/2025 AL 18/12/2025
ITEM: 3,2	Suministro, conformación y compactación de Base Granular	M3



TRAMO 3: VIA JUNNIN

TRAMO 4: VIA CATALUÑA



SECTOR	CANTIDAD				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	espesor	
TRAMO 3: CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	98,14	9,10		0,20	178,62
TRAMO 4: CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO	24,50	9,60		0,20	47,04
					225,66
TOTAL			225,66	M3	

Ing. PERLA OREJUELA
Residente de Obra
CONSORCIO VIAS URBANAS

Ing. Diana Edith Contreras Vargas
Residente de Interventoria
CONSTRUINGENIERIA

CONSORCIO VIAS URBANAS

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA PARCIAL 1

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° CO1. PCCNTR8377744		FRENTE VIA PIEDECUESTA	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS			
INTERVENTORIA: Construingenieria			
SUPERVISIÓN : Linda Palacio	PERIODO	10/12/2025 AL 18/12/2025	
ITEM: 3,3	Suministro e Instalación de Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19		M3



TRAMO 3: VIA JUNNIN

TRAMO 4: VIA CATALUÑA



SECTOR	CANTIDAD				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	espesor	
TRAMO 3: CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	98,14	9,10		0,12	107,17
TRAMO 4: CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	32,50	9,60		0,12	37,44
					144,61
TOTAL			144,61	M3	

Ing. PERLA OREJUELA
Residente de Obra
CONSORCIO VIAS URBANAS

Ing. Diana Edith Contreras Vargas
Residente de Interventoria
CONSTRUINGENIERIA

CONSORCIO VIAS URBANAS

MEMORIAS DE CALCULO - ANEXO ACTA PARCIAL 1

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER

CONTRATO DE OBRA N° CO1. PCCNTR8377744		FRENTE VIA PIEDECUESTA	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS			
INTERVENTORIA: Construingenieria			
SUPERVISIÓN : Linda Palacio	PERIODO	10/12/2025 AL 18/12/2025	
ITEM: 3,4	Imprimación con emulsión asfáltica		M2

TRAMO 3: VIA JUNNIN





TRAMO 4: VIA CATALUÑA

SECTOR	CANTIDAD				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	espesor	
TRAMO 3: CARRERA 8 ENTRE CALLE 4a NORTE Y CALLE 6a NORTE EN EL BARRIO JUNNIN 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.	98,14	9,10			893,10
TRAMO 4: CARRERA 7 ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 1 NORTE F EN LIMITANTE DEL BARRIO CATALUÑA Y PASEO GALICIA	32,50	9,60			312,00
					1205,10
TOTAL			1.205,10	M2	

Ing. PERLA OREJUELA
Residente de Obra
CONSORCIO VIAS URBANAS

Ing. Diana Edith Contreras Vargas
Residente de Interventoria
CONSTRUINGENIERIA

ACTA 1
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Obra:	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA:	Diciembre de 2025
		MUNICIPIO:	Piedecuesta

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR.TOTAL
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				
	DISPOSITIVOS DE CONTROL (10 AL 18 DE DICIEMBRE 2025)	GLB	1	$ 499.244	$ 499.244
	SEÑALIZACION (10 AL 18 DE DICIEMBRE 2025)	GLB	1	$ 1.118.000	$ 1.118.000
	EQUIPOS VARIOS (10 AL 18 DE DICIEMBRE 2025)	GLB	1	$ 1.649.280	$ 1.649.280
	COSTOS PERSONAL (AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADA) (10 AL 18 DE DICIEMBRE 2025)	GLB	1	$ 4.680.000	$ 4.680.000
	COSTOS PERSONAL PROFESIONAL (10 AL 18 DE DICIEMBRE 2025)	GLB	1	$ 2.520.000	$ 2.520.000
	SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				**$ 10.466.524**

VALOR TOTAL :
$ 10.466.524,00

ACTA 1 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL

OBRA:	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LAS VIAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER	FECHA:	Diciembre del 2025
		MUNICIPIO:	Piedecuesta

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				**$ 7.935.347**
	A1. GESTION AMBIENTAL (PERIODO 10 AL 18 DIC 2025)	GLB	1	$ 3.095.583,37	$ 3.095.583,37
	A2. GESTION SOCIAL (PERIODO 10 AL 18 DIC 2025)	GLB	1	$ 620.000,00	$ 620.000,00
	B1 - INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD (PERIODO 10 AL 18 DIC 2025)	GLB	1	$ 355.000,00	$ 355.000,00
	B2 - DIVULGACIÓN (PERIODO 10 AL 18 DIC 2025)	GLB	1	$ 75.750,00	$ 75.750,00
	B4 - ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PERIODO 10 AL 18 DIC 2025)	GLB	1	$ 374.000,00	$ 374.000,00
	D1 - MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN (PERIODO 10 AL 18 DIC 2025)	GLB	1	$ 302.517,19	$ 302.517,19
	D2 - ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PERIODO 10 AL 18 DIC 2025)	GLB	1	$ 496.000,00	$ 496.000,00
	D3 - MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES (PERIODO 10 AL 18 DIC 2025)	UN	0,8	$ 1.722.160,00	$ 1.377.728,00
	F - PLAN DE CONTINGENCIA (PERIODO 10 AL 18 DIC 2025)	UN	0,8	$ 1.548.460,00	$ 1.238.768,00
				SUBTOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**$ 7.935.347**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO PMA	
$	**7.935.347**
