CONTINUACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA No. 6

3801

DON-009-MONT-048-2022

Montería, 08 de noviembre de 2022

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: 'CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA'

ASUNTO: SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE OBRAS DEL CONTRATISTA.

Cordial saludo.

Es de gran preocupación para esta interventoría los atrasos que se vienen presentando en la ejecución de las actividades de acuerdo al cronograma de obras presentado por el contratista de obras cuya fecha de finalización es el 22 de marzo de 2023, que de acuerdo al informe semanal N°07 de interventoría se tiene un porcentaje acumulado programado del 6.17% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 0.02%, obteniéndose un atraso del (**6.15%.**) en la *tabla 1* se evidencian las cantidades programadas, de acuerdo a la unidad de medida y porcentaje individual de atraso de cada ítems.

	Actividad	Fecha Inicio Actividad	Fecha Final Actividad	Duración (días)	Duración Ejecutada	Unidad	CANT ACTUALIZADA	VR UNITARIO	Valor del Contrato Individual	Cantidad programada	Cantidad ejecutada	Cantidad ejecutada acumulada	Cantidad programada acumulada	Porcentaje individual de actividades	Cantidad ejecutada acumulada	[BL] CONTRATADO $
11	EXCAVACION MANUAL COMUN EN LA EXPLANACION Y CAMINOS					M3										
12	EXCAVACION MANUAL					M3										
14	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ACARREO LIBRE					M3										
21	RECONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)					M3										
22	SUBBASE GRANULAR CLASE C					M3										
23	CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28MPa (3000 psi) PARA PAVIMENTOS					M3										
24	CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14 MPa (2000 psi) PARA PIEDRA PEGADA					M3										
34	CUNETA EN CONCRETO 1500 PSI (f'c=21 MPa)					M3										
35	ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPa					KG										
	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA					GB										
	TOTAL															

Página 1

Tabla 1. Seguimiento de actividades que representan atrasos.

De lo anterior, se le solicita al contratista de obras tomar todas las medidas correctivas para contrarrestar el atraso que se ha venido presentando en la ejecución de las actividades, de

acuerdo al seguimiento y control al cronograma de obras presentado por el contratista de obras.

Agradezco su gestión y pronta solución a los atrasos que se vienen presentando en obra.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia: Alcaldía de Montería- Germán Quintero Mendoza, Secretario de Infraestructura – Supervisor del Contrato

3803

DON-009-MONT-053-2022

Montería, 17 de noviembre de 2022

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: ATRASOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Cordial saludo.

Es de gran preocupación para esta interventoría los atrasos que se vienen presentando en la ejecución de las actividades de acuerdo al cronograma de obras presentado por el contratista de obras cuya fecha de finalización es el 22 de marzo de 2023, dado que hasta la fecha, se tiene un porcentaje acumulado programado del 10.08% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 0.05%, obteniéndose un atraso de! (**10.03%.**) en la *tabla 1* se evidencian las actividades que representan el atraso de las actividades programadas.

	Actividad	Fecha Inicio Reprog	Fecha Final Reprog	Duración Actividad	Unidad de Medida	CANT ACTIVIDAD	VR UNITARIO	Valor del Contrato Actividad	Cantidad programada	Cantidad ejecutada	cantidad ejecutada acumulada	cantidad ejecutada acumulada	Acumulado atraso individual de actividades	Cantidad ejecutada adicionada	(ML) CONTRATO 5
10	EXCAVACION MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	10/08/2022	29/08/2022	13.00	10.71	M3	1,540.00	$ 9,652.00	$ 14,867,080.00	1497.20	150.00		150.00	-1,347.20	-1,347.20	
12	EXCAVACION MANUAL	24/08/2022	6/09/2022	13.00	11.00	M3	231.00	$ 23,571.00	$ 5,443,701.00	43.68			0.00	-43.68	-43.68	
11	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	8/09/22	24/09/22	13.00	1.00	M3	36.08	$ 42,000.00	$ 1,515,360.00	29.82	6.00		6.00	-23.82	-23.82	
14	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ACARREO LIBRE	10/08/2022	13/09/2022	25.00	0.57	M3	1,540.00	$ 9,652.00	$ 14,867,080.00	2855.67		155.00	155.00	-2,700.67	-2,700.67	
2.1	RETIRO DE LA CAPA DE RODADURA EXISTENTE INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS	10/08/2022	6/09/2022	20.00	0.04	M3	1,540.00	$ 9,652.00	$ 14,867,080.00	206.32			0.00	-62.73	-196.37	-196.37
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	10/08/2022	27/08/2022	13.00	11.00	M3	2,695.00	$ 181,976.00	$ 490,497,320.00	307.81			0.00	-31.33	-121.14	-121.14
3.1	CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa 3D	29/08/2022	30/08/2022	13.00	11.00	M3	577.00	$ 899,000.00	$ 518,723,000.00	224.32			0.00	-21.05	-21.05	-21.05
3.2	CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28MPa 3D	8/09/22	8/09/22	13.00	4.00	M3	462.00	$ 974,000.00	$ 450,108,000.00	47.8	6.00		6.00	-9.80	-9.8	
3.3	CONCRETO HIDRAULICO f'c= 35 MPa CLASE G PARA RECIBA PESCADO	6/09/2022	4/09/2022	13.00	13.57	M3	769.00	$ 820,000.00	$ 630,580,000.00	265.28			0.00	-27.99	-279.28	-279.28
3.4	CONCRETO HIDRAULICO 35MPa (f'c 3TOLOG)	29/08/22	8/09/2022	13.00	5.75	M3	80.00	$ 674,000.00	$ 53,920,000.00	43.81			0.00	-8.50	-36.25	
3.5	ACERO DE REFUERZO FY = 420MPa	29/08/2022	30/08/2022	13.00	13.57	KG	30,000.00	$ 9,440.00	$ 283,200,000.00	33083.76			0.00	-30,446.00	-33083.76	
4.1	EXCAVACION MANUAL	29/08/22	9/09/2022	13.00	6.24	M3	70.00	$ 23,571.00	$ 1,649,970.00	38.4			0.00	-3.84	-3.84	
4.2	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE LA SUBRASANTE SOPAS GRANULARES	8/09/2022	9/09/2022	13.00	0.57	M2	750.00	$ 13,000.00	$ 9,750,000.00	419.00			0.00	-2.85	-419.00	
4.3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	8/09/2022	9/09/2022	13.00	0.57	M3	840.00	$ 200,000.00	$ 168,000,000.00	46.82			0.00	-4.85	-46.82	
4.4	ADECUACION FY = 420MPa	29/08/22	9/09/2022	13.00	0.57	KG	5,000.00	$ 4,000.00	$ 20,000,000.00	3499.00			0.00	-3.85	-3499.00	
4.5	CUNETA DE CONCRETO FACHADA ALTA INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUBRASANTE DE APOYO	8/09/2022	8/09/2022	13.00	0.43	M3	1,500.00	$ 39,000.00	$ 58,500,000.00	0.00			0.00	-0.43	-0.24	
4.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ACARREO LIBRE	8/09/2022	9/09/2022	45.00	0.26	M3	270.00	$ 10,000.00	$ 2,700,000.00	0.00			0.00	-0.26	-0.26	
	IMPLEMENTACION DE GESTION DE OBRA	29/08/2022	30/08/2022	357.00	22.00	UND	1.00	$ 151,719,267.00	$ 151,719,267.00	8.33			0.00	-22.00	-8.27	
	EMPAQ	29/08/2022	30/08/2022	357.00	22.00	UND	1.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	8.33			0.00	-22.00	-8.33	

Página 1

Tabla 1. Seguimiento de actividades que representan atrasos.

Como se puede evidenciar en la tabla 1, se identifican atrasos en el ítem *1.1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES*, cuya cantidad programada es de 2765m3, ítem *2.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL (MATERIAL SELECCIONADO), cuya cantidad programada es de 593 m3 equivalentes a 639ml que deberían estar construidos hasta la fecha, 3.1 CONCRETO HIDRAULICO FC=21 MPA, cuya cantidad programada es de 153 m3 equivalentes a 780 ml que deberían estar fundidos hasta la fecha, 3.5. ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa, cuya cantidad programada es de 21 TON.*

De lo anterior, se le solicita al contratista de obras tomar todas las medidas correctivas para contrarrestar el atraso que se ha venido presentando en la ejecución de las actividades, de acuerdo al seguimiento y control realizado por la interventoría al cronograma de actividades presentado por el contratista de obras.

Agradezco su gestión y pronta solución a los atrasos que se vienen presentando en obra.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia: Alcaldía de Montería- Monica Severiche Nuñez, Secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

3805

DON-009-MONT-056-2022

Montería, 23 de noviembre de 2022

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta los atrasos que se han venido presentando en la ejecución de las actividades, evidenciándose un atraso del 10.03%, de acuerdo a lo descrito en el oficio DON-009-MONT-053-202 enviado el día 17 de noviembre de 2022, se le solicita muy respetuosamente al contratista de obras, presentar un plan de contingencia que describa las procedimientos y medidas adoptar para contrarrestar los atrasos, el cual debe ser entregado a más tardar el día **25 de noviembre de 2022.**

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia Alcaldía de Montería– Mónica Severiche Nuñez, Secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

3806

DON-009-MONT-065-2022

Montería, 08 de diciembre de 2022

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OFI: MAR-012-2022-024 cuyo asunto es: Respuesta al oficio DON-009-MONT-056-2022.

Dando respuesta al comunicado relacionado en el asunto, con respecto a la entrega del plan de contingencia y una vez revisada la documentación entregada, se le informa al contratista de obras, que de acuerdo a lo descrito en el plan de contingencia, no se evidencia la manera en que se recuperaran los tiempos perdidos, respecto a lo programado en el cronograma de obras donde se describa de manera cualitativa y cuantitativa las metas de actividades a cumplir para contrarrestar los atrasos.

De lo anterior, se le solicita al contratista de obras entregar un plan de contingencia a mas tardar el dia 09 de diciembre de 2022, donde se reflejen las metas a cumplir en las actividades contractuales para recuperar los atrasos presentados y que se encuentre de acuerdo al cronograma de obras entregado.

Hasta la fecha se evidencia que el porcentaje programado es del 21.98% contra un porcentaje ejecutado acumulado del 0.17%, obteniéndose un **atraso del 21.81%,** para poder realizar un seguimiento y control teniendo en cuenta la manera en que se plantreará recuperar los tiempos perdidos y cumplir así con el plazo contractual de obras.

Sin otro particular,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoria
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia Alcaldía de Montería- Mónica Sevaricha Núñez, secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

2807

CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

DON-009-MONT-085-2022

Montería, 23 de marzo de 2023

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

ASUNTO: SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO CON EL ACTA DE REINCIO N°01 DEL CONTRATO DE OBRAS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se le solicita al contratista de obras presentar el cronograma de actividades y flujo de inversión detallado de cada uno de los ítems contractuales según balance de obras N°01, ajustada con la fecha de suscripción del acta de reinicio N°01, así mismo se solicita incrementar los frentes de obras en los que se pueden ir adelantado otras actividades inherentes al cumplimiento de la meta física contractual, teniendo en cuenta que hasta la fecha solo se cuenta con un solo frente de obra donde se están interviniendo 90ml de placa huella en un solo carril de la vía, sin embargo existen otros tramos que pueden ser intervenidos con placa huella y adicional a ellos se pueden iniciar actividades de box coulvert, el puente y obras de drenajes, aprovechando la temporada de verano que se está presentando en la zona, lo cual facilitaría la ejecución de la misma y que en caso de no ser intervenidos rápidamente se podrían ver afectados por la temporada de invierno que se aproxima, todo esto para cumplir con la fecha de finalización del contrato de obras.

De lo anterior, se deja constancia que la interventoría realizara el seguimiento de las actividades de obras presentadas por el contratista y en caso de existir atraso en la ejecución del mismo solicitara a la entidad contratante los trámites administrativos de incumplimiento que sean necesarios

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia: Alcalde de Montería- Mónica Sevenchi Núñez, secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

Montería, 23 de marzo de 2023

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS DEL PROYECTO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se le solicita al contratista de obras contar con la maquinaria minima requerida para la ejecución de las actividades contractuales, de acuerdo a lo contemplado en el literial b del numeral 7 del anexo técnico del pliego de condiciones, teniendo en cuenta que hasta la fecha solo se evidencia en obra la siguiente maquinaria:

- 1 Minicargador
- 1 Motoniveladora
- 1 Vibricompactador
- 1 vibrador de concreto
- 1 compactador manual vibratorio (tipo Rana)
- 1 motobomba
- Taladro y pulidora.
- 1 sierra circular
- 1 planta electrica
- Rieles metálicos

Cabe mencionar que el rendimientos y las programaciones diarias de trabajo en las actividades de relleno con material de terraplen y sub base, se han visto afectadas por las continuas fallas mecánicas de la maquinaria dispuesta en obra, lo cual afecta en gran medida el avance de las obras sucesoras del relleno, por tanto se le solicita al contratista tomar los correctivos necesarios para cumplir con las obligaciones adquiridos en la ejecución del contrato de la referencia y contar con la maquinaria minima del proyecto, de acuerdo a lo contemplado en el literal b del numeral 7 del anexo técnico del pliego de condiciones, tal y como se evidencia a continuación:

b. Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Minicargador con brazo excavador y martillo demoledor
2. Cortadora de pavimento 13.0 hp
3. Equipo de oxicorte, capacidad de corte 6"
4. Retrocargado pala 95 HP
5. Vehículo para transporte de agua
6. Vibrocompactador potencia 31 HP
7. Fumigadora agrícola
8. VIBRADOR DE CONCRETO 2HP MANGUERA
9. Rieles metálicos
10. Vibrador de concreto 2HP manguera 3m
11. Formaleta metálica
12. Compactador (saltarín) fuerza 12 KN
13. Equipo de soldadura
14. Equipo pintura (compresor)
15. Compresor de aire
16. Taladro de ½, pulidora y lijadora
17. Compactador Manual vibratorio (Tipo Rana – 4.500 VPM)
18. Bulldozer 140 HP, 2200 RPM
19. Motobomba 3"
20. Retroexcavadora de oruga 155 HP;
21. Compresor
22. Mezcladora bulto 1 ⅓

De acuerdo a lo anterior, se le informa que la interventoria realizará el seguimiento del equipo mínimo obligatorio requerido contractualmente y de igual forma realizara el seguimiento de las actividades diarias ejecutadas por el contratista y en caso de existir atraso en la ejecución de las mismas, solicitara a la entidad contratante los trámites administrativos de incumplimiento que sean necesarios.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoria
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia Alcaldía de Montería- Mónica severiche Núñez, secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

3810

CONSULTORES DON ANDRES S.A.S.

DON-009-MONT-088-2022

Montería, 24 de marzo de 2023

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN OBRA.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la fecha de suscripción del acta de reinicio N°01 de fecha 10 de marzo de 2023 del contrato de la referencia, esta interventoria solicita muy respetuosamente se cuente con el personal mínimo requerido en obra, de acuerdo a lo contemplado en el literal a, del numeral 7 del anexo técnico del pliego de condiciones y de igual forma contar con la relación del personal profesional, especialista, técnicos y administrativo contemplado en el desgloce del APIU del presupuesto contractual de obras, donde se relaciona el siguiente personal con los que debe contar para la ejecución de actividades:

Personal Profesional y especialistas			
Cant.	**Descripcion del cargo**	**Dedicacion mes**	**Observaciones**
1	Director de Obra	100%	Cumple
2	Residente de obra	100%	No cuenta con el Residente N°2 en obra
2	Inspector de Obra	100%	No se cuenta en obra con inspectores de obra
1	Especialista en vias	60%	Cumple
1	Especialista Ambiental	60%	Cumple
1	Especialista en Estructura	60%	Cumple
1	Trabajadora social	100%	Cumple
1	Profesional SST	100%	Cumple
Personal Profesional y especialistas			
1	Topografo	100%	Cumple
2	Cadeneros	100%	No cuenta con el Cadenero N° 2
2	Maestro General	100%	Solo se cuenta con (1) Maestro en Obra
1	Almacenista	100%	Cumple
1	Vigilante	100%	Cumple

De acuerdo a lo anterior, esta interventoria manifiesta su preocupación debido a que desde el 16 de marzo de 2023, no se cuenta con los residentes de obras en el frente de trabajo, lo cual dificulta la cordinacoin de todas las actividades en obra y la recepción de las

solicitudes realizadas por la interventoria en campo; por tanto se solicita al contratista de obras contar con todo el personal minimo requerido según lo contemplado en los pliegos de condiciones del contrato LP- SPM-012-2022 y de igual forma se solicita realizar las afiliaciones del personal administrativo, técnico, profesional y especialistas para dar cumplimento a la correcta ejecución de las actividades de acuerdo a las obligaciones contráctuales y especificaciones técnicas del proyecto.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoria
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia: Alcaldía de Montería– Monica severiche Nuñez, Secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

3812

DON-009-MONT-098-2022

Montería, 22 de abril de 2023

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE RELLENO DE MATERIAL DE TERRAPLEN Y SUB BASE.


Dentro de los recorridos técnicos que realiza la interventoria y en virtud de las funciones descritas en el contrato de interventoria, es pertinente informar al contratista que dentro los rellenos que han venido realizando con material de sub base, se continua sin evidenciar el proceso de estacado en la via, previo a la instalación del material del mejoramiento y no se ha evidenciado para el relleno a realizar con material de subbase en el tramo correspondiente entre las abcisas K2+090 hasta K2+440, Cuyo procedimiento es de gran importancia para controlar los espesores, facilitando el trabajo de los operadores de las maquinas al momento de extender el material y para el posterior chequeo de niveles por parte de la comisión topografica de la interventoria, en donde se habia solicitado en su momento por la interventoria el dia 09 de diciembre de 2022, mediante oficio DON-009-MONT-066-2022.

Cabe resaltar, que de acuerdo a los planos del diseño de la placa huella, el ancho total es de 4.00 m para todos los tramos mas los anchos de la berma cuneta, por ende se tendrá en cuenta para efectos de calculo de corte y relleno de material el ancho de la estructura, (Donde se realice excavación hasta nivel de sub rasante, de acuerdo al Diseño), tal y como se evidencia a continuación:


SECCIÓN TIPICA TRAMOS 1 Y 3
(K1+810 – K2+840)



SECCIÓN TIPICA TRAMO 2
(K1+810 - K2+840)

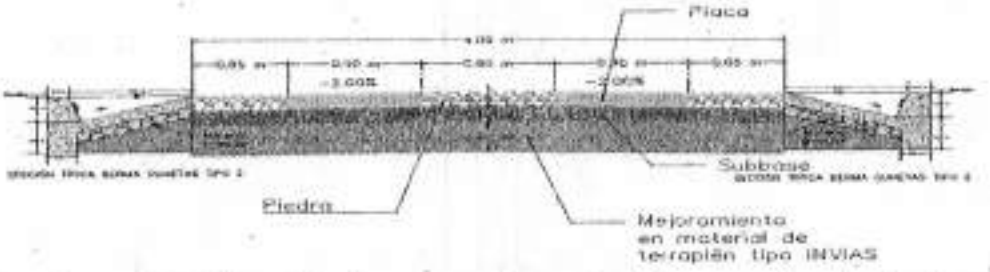

Para la sección típica de la berma cuneta, se tendrá en cuenta solo el relleno con material granular por debajo de la estructura, se resalta que para la construcción de la estructura indicada se tendrá en cuenta en excavacion y relleno la figura geométrica de acuerdo a lo decrito en el diseño, tal y como se evidencia a continuación;



SECCIÓN TÍPICA BERMA CUNETAS TIPO 2

De lo anterior, se le solicita al contratista instalar estacas en el eje y en los bordes máximos de la placa huella, las cuales se deben pintar en la parte superior con un color que no contraste con el material (Preferiblemente Rojo), esto previo al relleno con material de mejoramiento y sub base. En este sentido, a partir de la fecha no se recibirán tramos de vias hasta que no se cumpla con lo descrito anteriormente.

Sin otro particular,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoria
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia: Alcaldia de Montería– Mónica Severiche Núñez, secretaria de infraestructura – Supervisor del Contrato

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES CONSOVIAS S.A.S
ALCALDIA DE MONTERIA

INFORME	1
SEMANA DEL PROYECTO	

FECHA DE INFORME DE AVANCE	lunes, 1 de mayo de 2023		17	DEL	23/04/2023	AL	30/04/2023

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA - CONSULTORES CONSOVIAS S.A.S		CONTRATO DE OBRA - CONSTRUCCIONES JP S.A.S	
CONTRATO No.	CW-CONTRATO-2022	CONTRATO No.	CONTRATO-2022
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MANCAGAN EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"	OBJETO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MANCAGAN EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORTES ORTIZ	REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES ALVAREZ ALVAREZ
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES	PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACION	17/04/2023	FECHA DE INICIACION	17/04/2023
FECHA DE TERMINACION No. 1	17/10/2023	FECHA DE TERMINACION No. 1	17/10/2023
FECHA DE TERMINACION No. 2	17/10/2023	FECHA DE TERMINACION No. 2	17/10/2023
PRORROGA No. 1	N/A	PRORROGA No.	N/A
FECHA DE TERMINACION	17/10/2023	FECHA DE TERMINACION	17/10/2023
PLAZO ACTUALIZADO MESES	SEIS	PLAZO ACTUALIZADO	SEIS
VALOR INICIAL CONTRATO	$0.00	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 3.236.871.000,00
VALOR ADICIONES	$0.00	VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR ACTUAL CONTRATO	$0.00	VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 3.236.871.000,00
ANTICIPO	0%	ANTICIPO	$ 1.227.744.000,00

1.1 EQUIPO DE TRABAJO INTERVENTORIA				1.2 ESTRUCTURA ACTUAL PERSONAL CONTRATISTA			
DESCRIPCION	%	VALOR	PERFIL	DESCRIPCION	%	VALOR	PERFIL
		$ -				$ -	
		$ -				$ -	
		$ -				$ -	
		$ -				$ -	
		$ -				$ -	
TOTAL	0,00%	$ 0,00		TOTAL	0,00%	$ 0,00	
VALOR MENSUAL		$0,00		VALOR MENSUAL		$ 0,00	
ANTICIPO		NO SOLICITO ANTICIPO		ANTICIPO		SE ENTREGA ACTA DE INICIO	

Nota: se hizo se empezo apenas iniciar el seguimiento semanal

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este informe quedaron facturados entregar el contratista un anticipo del 20% sobre el valor total del contrato, hasta la presente entrega no entregaron la carta de entrega de 1° entrega de amortizaciones, de tal cuales las primeras (de 3 (1) cinco) fueron rechazadas por error en el contenido de pago y se reflejan nuevamente mediante la factura con consecutivo (de 3 (1), en este cuarto corte se RECHAZARA las 1°(1) (1) nuevamente nuevamente rechazada este mismo inconveniente las N°5, 6) y 7° respectivamente las cuales fueron aprobadas por estas inconsistencias por medio de calculadora


3. INSPECCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS - ANALISIS DE CURVA

3.1 PROGRAMACION PROGRESIVA DE ACTIVIDADES

INDICADORES

Fecha de Inicio	17-abr-2023	Días Programados	181
Terminación N°01	17-Oct-2023		
Fin. orden N°01	17-Oct-2023	Días Transcurridos	14
Fecha de entrega	17-Oct-2023		
Valor Planeado	$ 1.227.744.000	Tarea del Día	0
Valor Ejecutado	$ 1.250.797.667	Tarea Acumulada	80
% Tarea Programada	12,43%	% Acumulado Programado	14,37%
% Tarea Ejecutada	0,00%	% Acumulado Ejecutado	13,03%
% Atraso	-12,43%	% Adelanto	-1,33%
Horas laboradas del Día	0h(s)	Horas programadas del Día	0h(s)
Horas laboradas Acumulado	0	Horas programadas Acumulado	0

Las imagenes adjuntas, hacen énfasis en cuanto a la reprogramacion aplicada con la Acta de Reinicio N°01 del contrato en referencia

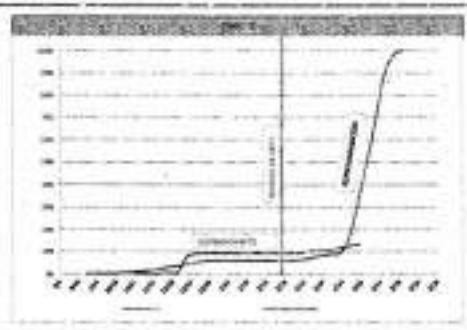



3.2 ANALISIS VALOR GANADO - RESULTADO

Conforme a lo anteriormente indicado, el contratista de obra viene cumpliendo, incluyendo la semana anterior, con el cronograma de obra aprobado, el cual fue presentado dentro de la ejecución del contrato. Actualmente el Contratista ha ejecutado el 13,03% acumulado del valor del contrato, el cual corresponde a $ 421.691.191 (Presentado en el acta anterior 3,03%, el cual corresponde a $ 421.691.191) presentando un atraso del 1,33%, el cual indicamos que nos hemos visto afectados por las lluvias presentadas, de no haber la misma el porcentaje seria mayor de 15,00%.

ITEM	CANTIDAD	VALOR

4. CONTROL DE OBRA

3814


Alcaldía de Montería	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES OSNOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSION	1
		CODIGO DEL PROCESO	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 1 de mayo de 2023	CONTRATO	13	FECHA	04/04/2023	AL	03/05/2023

1. INFORMACION DEL PROYECTO Y/O OBRA CONTRATADA

2. ASPECTOS GENERALES DE LA EJECUCION DE OBRA

3. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE OBRA

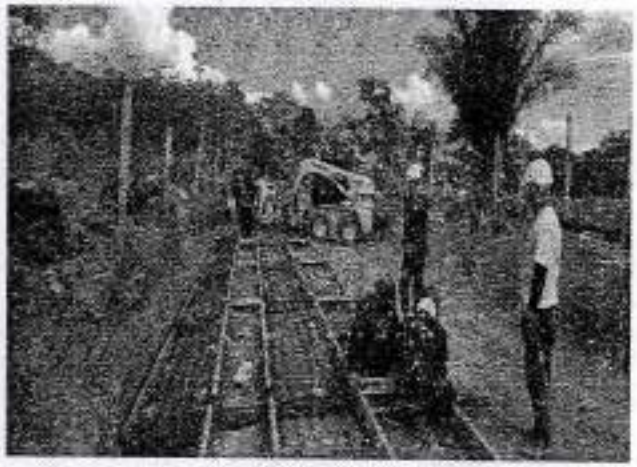

Se evidencia fundida de placas de concreto entre abscisa k2+040



Se evidencia fundido de acera de enfasco para pilotes del puente



Se evidencia conformacion de taludes en frente de via sobre la abscisa k1+480



Se evidencia adecuacion de accesos para la construccion del puente

3815



Se evidencia relleno con material de sub base en abscisa K2+740



Se evidencia excavacion con maquina sobre la abscisa K+780

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA -
NOMBRE:

3846

Alcaldía de Montería

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES CORDOVAN S.A.S
ALCALDIA DE MONTERIA

VERSION	1
CODIGO DEL PROYECTO	

FECHA DE PRESENTACION: Lunes, 8 de mayo de 2023

1. INFORMACION GENERAL

INTERVENTOR		CONTRATISTA	
CONTRATO No.	SIN CRATO 2023	CONTRATO No.	LP-CMA-001-2023
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MANGAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"	OBJETO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MANGAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL	NOHELIA MARIA CORDOVA DIAZ	REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]
CARGO	REPRESENTANTE	CARGO	[illegible]
FECHA DE INICIACION	28/03/2023	FECHA DE INICIACION	[illegible]
FECHA DE SUSPENSION No. 1	N/A	FECHA DE SUSPENSION No. 1	[illegible]
FECHA DE REINICIO No. 1	N/A	FECHA DE REINICIO No. 1	[illegible]
MODIFICACION No.	N/A	MODIFICACION No.	N/A
FECHA DE TERMINACION	27/05/2023	FECHA DE TERMINACION	[illegible]
PLAZO CONTRATADO MESES	2	PLAZO CONTRATADO	0.66
VALOR CONTRATADO	$ 1.406.204.197	VALOR CONTRATADO	$ 1.406.204.197
ANTICIPO	0%	ANTICIPO	30%

RESUMEN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA			
DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
TOTAL	0.00%	$ 0,00	

RESUMEN ACTAS PARCIALES CONTRATISTA			
DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
TOTAL	0.00%	$ 0,00	

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


Para este proyecto la entidad ha pactado otorgar un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato, habiendo presentado amparo de cumplimiento de dicho anticipo por 37 millones de denominación, de los cuales se amortizaron solo 0.0 millones toman evidencias que refleja el incumplimiento manifestado respectivamente el cubrimiento correspondiente del 30%, de los cuales faltarían cubrirse un 11.12 (1) cumplimiento nuevamente requerido para evitar ingresar en las 10%, 15 y 20 respectivamente, las cuales tuvo ejecutadas por esta interventoría por hecho de consecuencia.

3. IDENTIFICACION DEL ESTADO, CAUSAS PROBLEMATICAS Y ANALISIS DE CAUSAS

4. PROGRAMACION DE OBRAS Y CRONOGRAMA

ESPECIFICACIONES			
Fecha de inicio	27-mar-2023	Días Programados	141
Suspensión N°01	29-abr-2023		
Reinicio N°01	30-may-2023	Días Transcurridos	134
Fecha de entrega	22-may-2023		
Valor Planeado	$ 1.062.153.197	Ruta del Día	0
Valor Ejecutado	$ 1.406.204.197	Ruta Acumulado	-46
% Semana Programado	15.00%	% Acumulado Programado	91.33%
% Semana Ejecutado	0.00%	% Acumulado Ejecutado	14.00%
% Avance	-15.00%	% Adelanto	-46.00%
Horas Bloqueos del Día	#¡VALOR!	Horas arqueología del Día	#¡VALOR!
Horas Bloqueos Acumulados	0	Horas arqueología Acumulado	0

Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramación aprobada con la fecha de Acta N°01 del contrato en referencia.

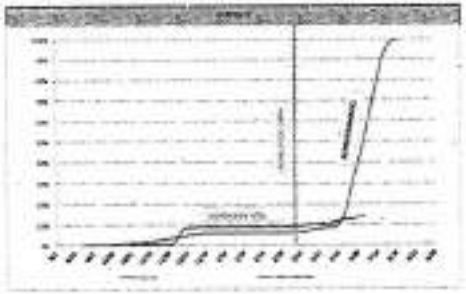



5. ANALISIS FINANCIERO

6. CAUSAS DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CAUSA

384

Alcaldía de Montería	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDÍA DE MONTERÍA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACIÓN	lunes, 6 de febrero de 2023	1. ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Y NO PERMITIDAS REALIZADAS	SEMANA No.	1	DEL	1/02/2023	AL	7/02/2023


En la fecha del presente informe semanal , se evidencia un nuevo inicio actividades , instalacion de malla, arreglo de acera de relleno. Rellano con material de limpieza, nivelaciones con maquinas, relleno con sub base, mejoramiento de sub rasante y fundidas de viga en concreto de placa huella, al igual del presente informe , el Contratista ha ejecutado el 14.93% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $1.488.284.197 lo cual significa un avance programado del 51.23% correspondiente a $ 1.842.131.00 refrigerio un valor de $ 0.0475, se deja constancia que hay items que superan las cantidades contractuales de las cuales se deberá un porcentaje ejecutado del 20.00% de acuerdo a la comprobacion entregada aprobada con informe de cesion N°01 del contrato en referencia.

- El contratista ha dado inicio a nuevas actividades del objeto de obra huella, cunetas en concreto para vigas acuda, fundida de placa de concreto y fundida de cuneta acuda.
- El contratista ha dejado una vía adecuadamente (drenaje de escombros), pasibo para la conexión con las maquinarias, equipos y materiales, la elevación mediante equipamiento y control a distintas actividades.


Durante en cuanto las actividades de hoy, del mismo contratista al lugar adecuado para no generar peligros en diferentes sentidos de la vía.

- En la presente semana


Aquellas Particularidades del Control de Avance y Calidad.

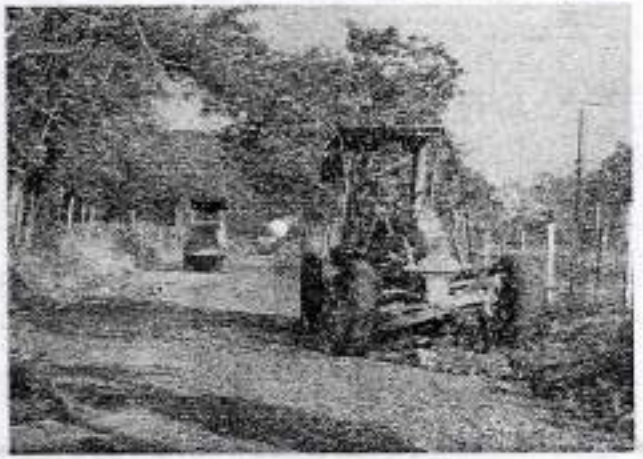


Se evidencia relleno con material de sub base sobre el tramo N°02

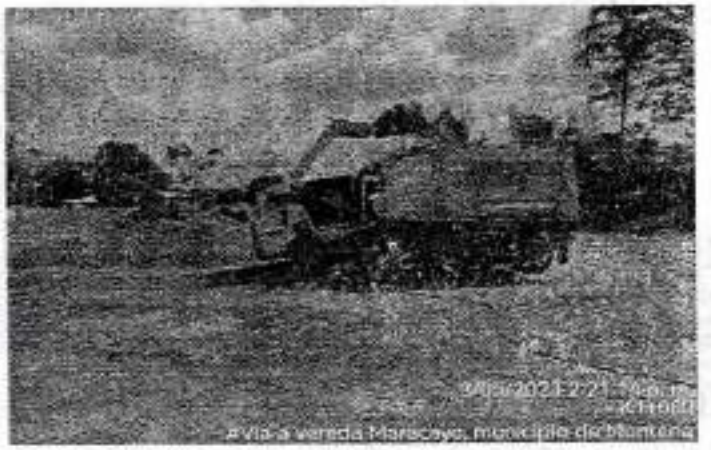

Se evidencia cargue de material de relleno de sub base

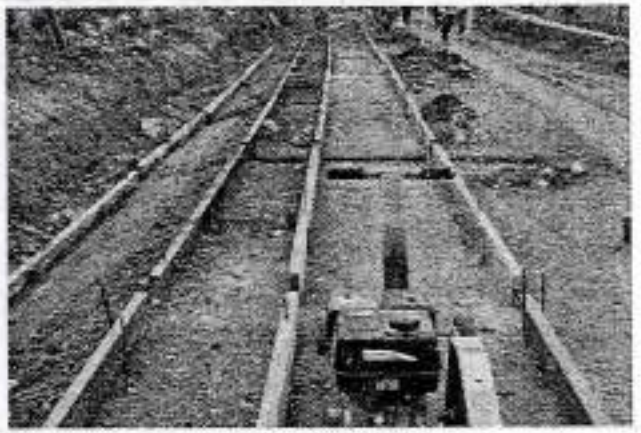

Se evidencia compactacion de terreno para fundida de placas de concreto

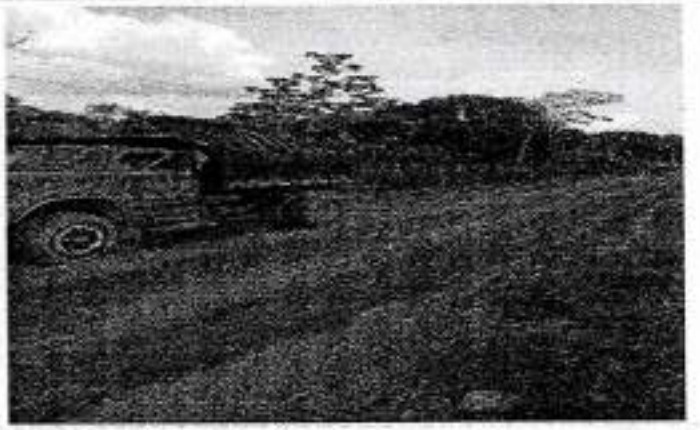

Se evidencia relleno con material de relleno con material de sub base en tramo N°02

3016



Se evidencia relleno con material de sub base en abscisa k2+390



Se evidencia excavacion con maquina sobre la abscisa k2+750

Firma:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ
CC 1941 2222 [illegible] CUN

3819

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**	**141 días**	**jue 13/10/22**	**mié 31/05/23**	
2		**PRELIMINARES**	**135 días**	**jue 13/10/22**	**mié 24/05/23**	
3		EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	117 días	jue 13/10/22	jue 4/05/23	
4		EXCAVACION MANUAL	119 días	lun 24/10/22	mié 17/05/23	3CC+10 días
5		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	15 días	lun 17/04/23	mié 3/05/23	
6		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	135 días	jue 13/10/22	mié 24/05/23	3CC
7		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**97 días**	**mar 15/11/22**	**lun 15/05/23**	
8		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	27 días	vie 14/04/23	sáb 13/05/23	
9		SUBBASE GRANULAR CLASE C	97 días	mar 15/11/22	lun 15/05/23	3CC
10		TERRAPLEN	23 días	mar 18/04/23	sáb 13/05/23	
11		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**32 días**	**lun 17/04/23**	**mar 23/05/23**	
12		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) elaborado en sitio	30 días	mar 18/04/23	lun 22/05/23	8CC+4 días
13		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) para viga riostra	30 días	mar 18/04/23	lun 22/05/23	12CC
14		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14 MPa CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	30 días	mié 19/04/23	mar 23/05/23	13CC+1 día

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 13/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

2820

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
15		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	30 días	lun 17/04/23	sáb 20/05/23	13CC-1 día
16		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	30 días	mar 18/04/23	lun 22/05/23	12CC
17		SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	9 días	sáb 13/05/23	mar 23/05/23	14FC-9 días
18		**OBRAS DE DRENAJE**	**32 días**	**mié 19/04/23**	**jue 25/05/23**	
19		EXCAVACION MANUAL	29 días	mié 19/04/23	lun 22/05/23	12CC+1 día
20		GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	31 días	mié 19/04/23	mié 24/05/23	19CC
21		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	31 días	mié 19/04/23	mié 24/05/23	20CC
22		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	30 días	jue 20/04/23	mié 24/05/23	23CC-1 día
23		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	30 días	vie 21/04/23	jue 25/05/23	21CC+2 días
24		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	29 días	mié 19/04/23	lun 22/05/23	19CC
25		**BOX-COULVERT**	**37 días**	**mié 19/04/23**	**mié 31/05/23**	
26		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	18 días	mié 19/04/23	mar 9/05/23	24CC
27		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	18 días	mar 2/05/23	lun 22/05/23	28CC+1 día
28		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	18 días	lun 1/05/23	sáb 20/05/23	26CC+10 días

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 13/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

3821

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
29		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	18 días	mar 2/05/23	lun 22/05/23	28CC+1 día
30		DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	6 días	sáb 6/05/23	vie 12/05/23	32FC-21 días
31		CONCRETO HIDRAULICO f'c 14MPa (F) (SOLADO)	18 días	mié 3/05/23	mar 23/05/23	29CC+1 día
32		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14 MPa (G) (para piedra pegada)	18 días	mié 10/05/23	mar 30/05/23	33CC+1 día
33		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) (PARA ESTRUCTURAS)	18 días	mar 9/05/23	lun 29/05/23	35CC
34		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	18 días	mié 10/05/23	mar 30/05/23	32CC
35		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	18 días	mar 9/05/23	lun 29/05/23	31CC+5 días
36		PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 1.0 M Y REFUERZO DE ACERO	15 días	vie 21/04/23	lun 8/05/23	26CC+2 días
37		APOYO ELASTOMERICO	3 días	mar 9/05/23	jue 11/05/23	36CC+15 días
38		JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES.	3 días	mar 9/05/23	jue 11/05/23	36CC+15 días
39		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	1 día	mar 30/05/23	mié 31/05/23	30FC+15 días

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 13/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
40		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	25 días	mié 19/04/23	mié 17/05/23	26CC
41		BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	1 día	mar 30/05/23	mié 31/05/23	39CC
42		**SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**lun 29/05/23**	**lun 29/05/23**	
43		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	1 día	lun 29/05/23	lun 29/05/23	
44		IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA	141 días	jue 13/10/22	mié 31/05/23	
45		PAPSO	141 días	jue 13/10/22	mié 31/05/23	44CC

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 13/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


3823

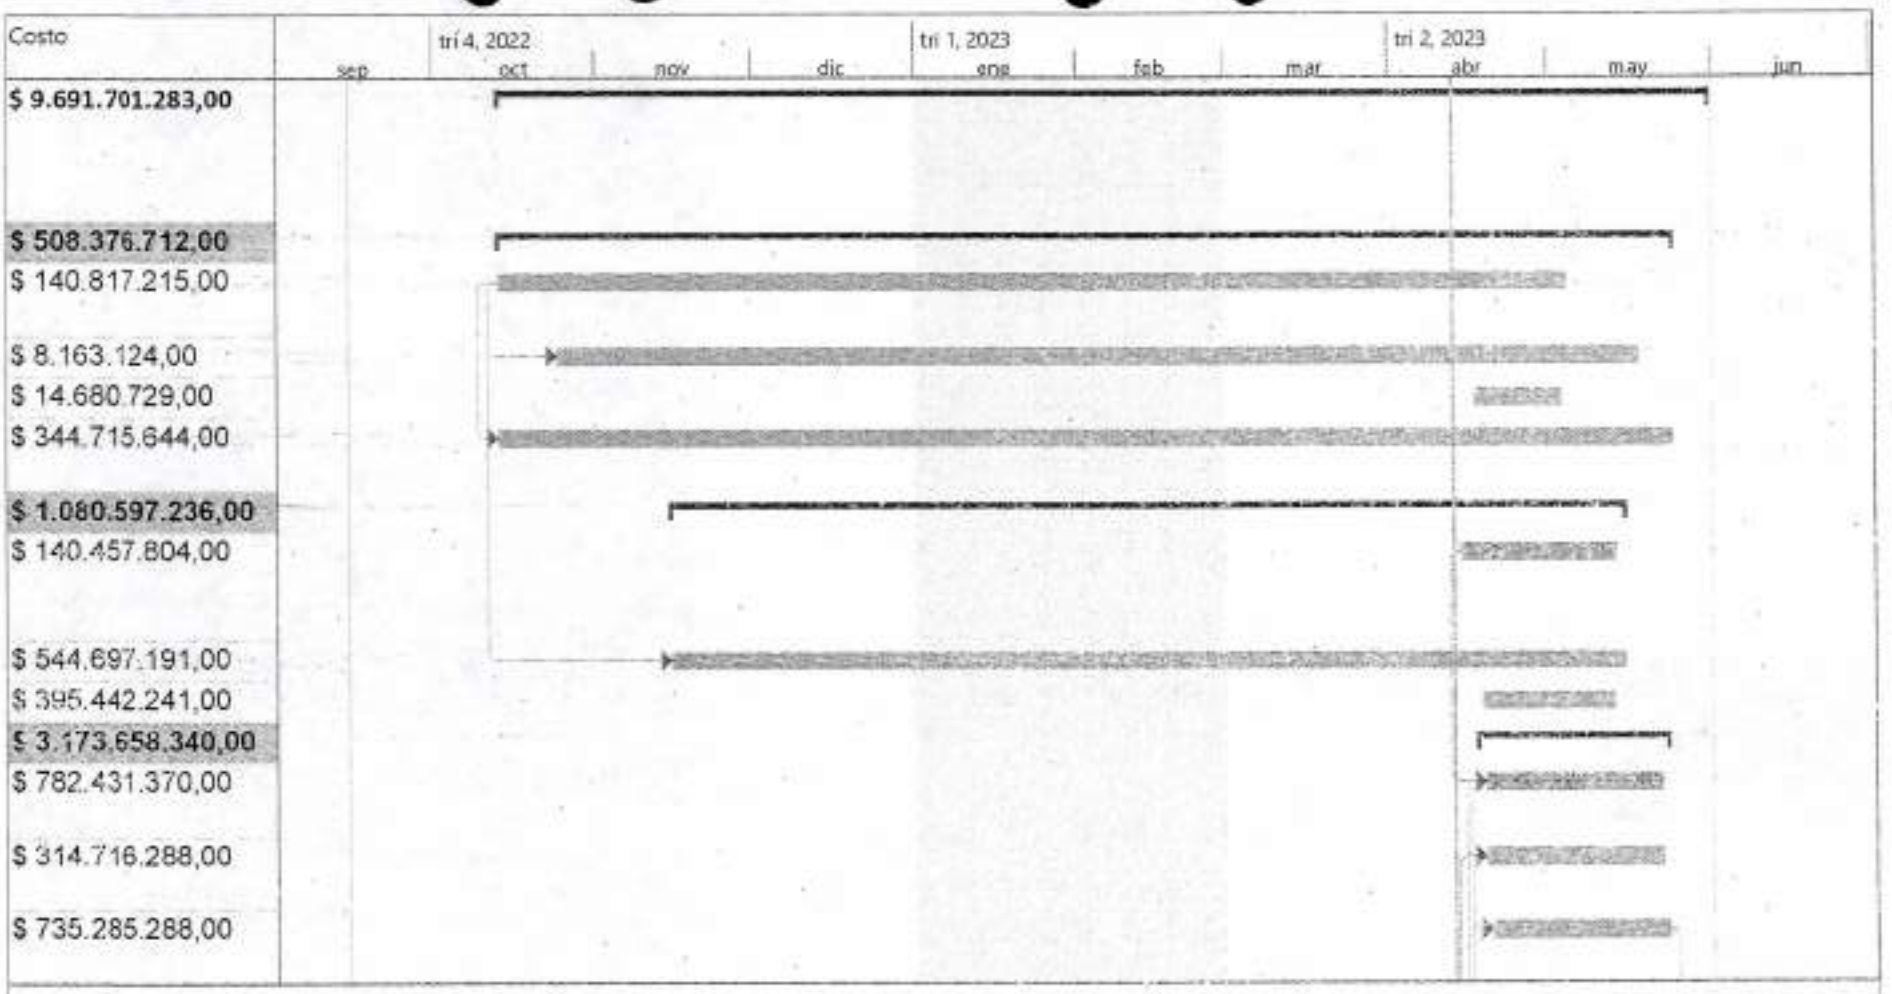

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 13/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Costo
$ 58.056.162,00
$ 969.894.928,00
$ 313.274.304,00
$ 2.621.210.760,00
$ 7.223.808,00
$ 99.682.169,00
$ 140.283.892,00
$ 844.781.760,00
$ 1.523.651.045,00
$ 5.588.086,00
$ 2.121.189.048,00
$ 2.935.327,00
$ 9.930.838,00
$ 24.453.377,00

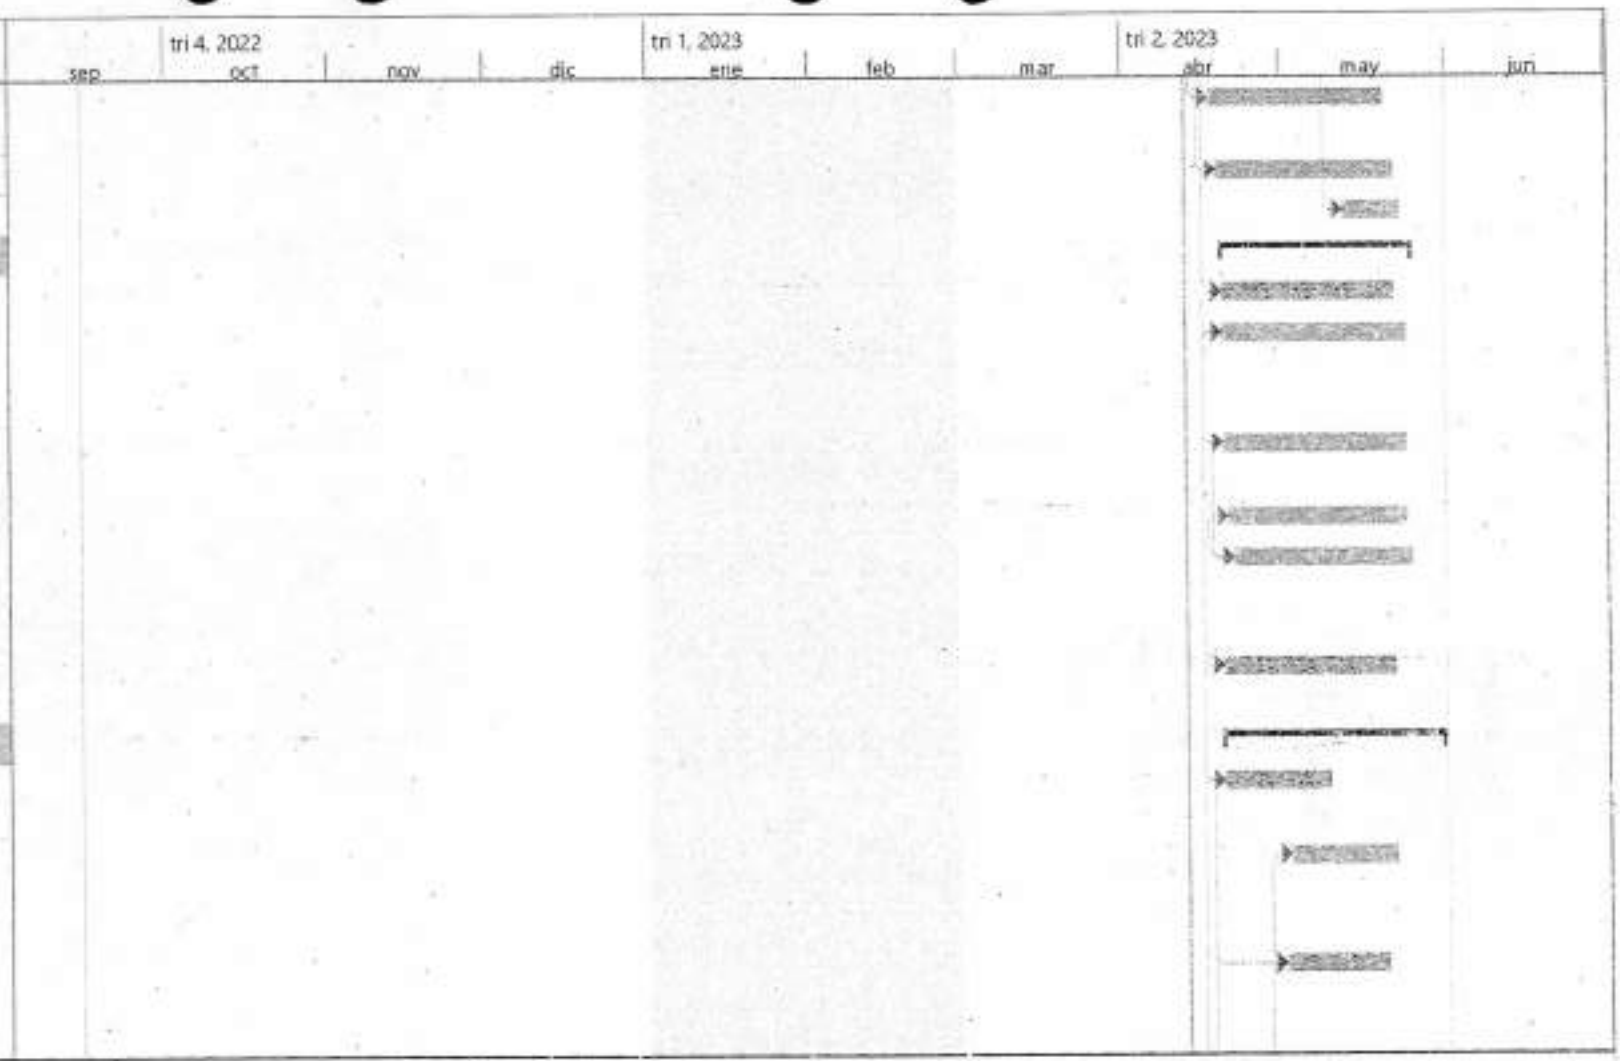

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 13/04/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

3825

Costo	sep	tri 4, 2022 oct	nov	dic	tri 1, 2023 ene	feb	mar	tri 2, 2023 abr	may	jun
$ 40.171.110,00										
$ 164.090.722,00										
$ 8.689.549,00										
$ 174.972.115,00										
$ 263.056.776,00										
$ 346.982.469,00										
$ 377.417.277,00										
$ 566.413.000,00										
$ 3.434.100,00										
$ 22.342.043,00										
$ 86.111.076,00										

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 13/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

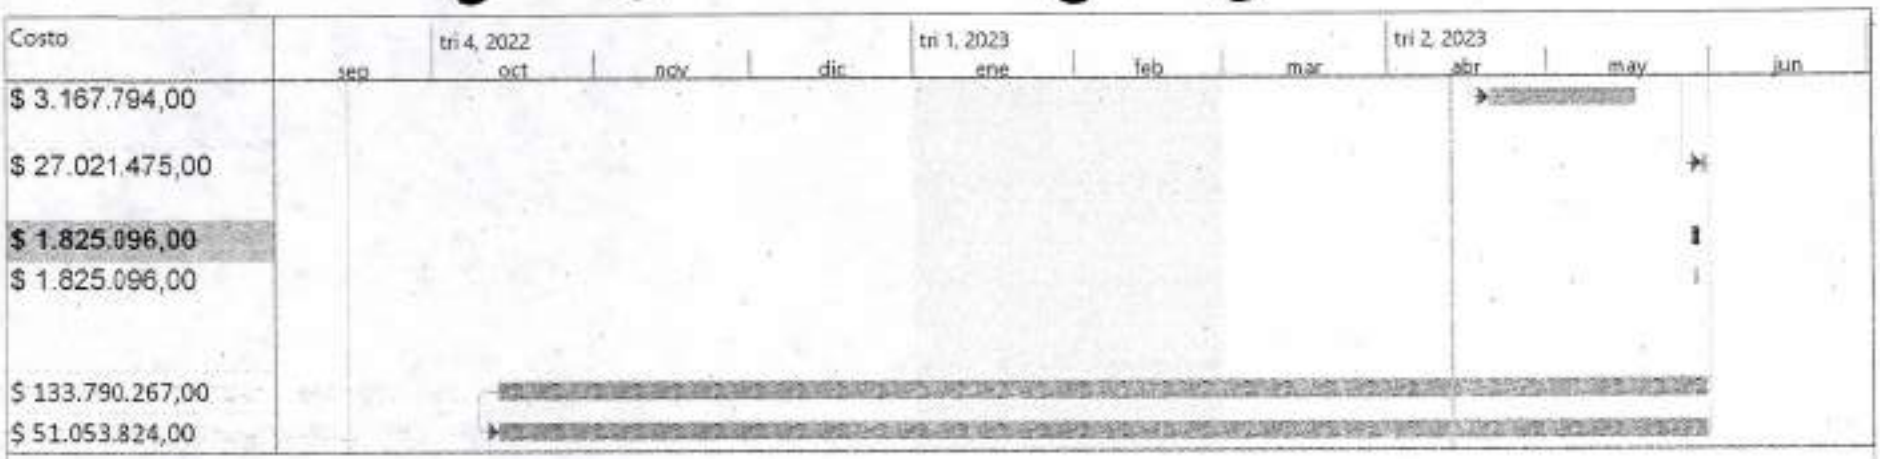

Proyecto: Proyecto1
Fecha: jue 13/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

3817

Montería, 17 de mayo de 2023

Señores
ALCALDIA DE MONTERÍA
Ing. MONICA SEVERICHE NUÑEZ
Secretaria de Infraestructura Municipal
Calle 27 # 3-16,
Montería, Córdoba

REFERENCIA: Contrato de Interventoria N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: Respuesta a Oficio C.E.SIM No.534-2023 cuyo asunto es Solicitud de Informacion.

Dando respuesta al oficio relacionado en el asunto, nos permitimos remitirle nuevamente informe de presunto incumplimiento al contrato de obras No. LP-SPM-012-2022, cuyo objeto es la "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", el cual fue enviado por medio de correo electrónico a través del oficio N° DON-009-MONT-101-2022 el dia 08 de mayo de 2023, donde se describe detalladamente las posibles causas y condiciones que generarían un posible incumplimiento a CONSTRUCCIONES AP S.A.S.

De igual forma nuevamente se anexa el informe de presunto incumplimiento, radicado el día 8 de mayo de 2023.

Relación de anexos

DESCRIPCION	CONTENIDO
Informe presunto Incumplimiento	(47) folios

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoria
CONSULTORES DONOVAN SAS

3829

DON-009-MONT-103-2022

Monteria, 18 de mayo de 2023

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: CORRECTIVOS DE OBRA

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta los recorridos técnicos que realiza la interventoría, se evidencio que el día 12 de mayo de 2023, se llevó a cabo fundida de placas en concreto ciclópeo sobre el carril izquierdo entre abscisas K2+240 hasta k2+270, las cuales previo al inicio de la fundida la interventoría chequeo la geometría, piedra rajón y limpieza de la superficie, por lo cual se encontraba dentro de lo descrito en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, sin embargo en reiteradas oportunidades se le manifestó al residente de obras en campo contar con todos los recursos necesarios para llevar a cabo la fundida, no obstante una vez iniciada lluvia en las horas de la tarde, el contratista de obras no contaba con plástico durante el tiempo de fraguado inicial de las placas de piedra pegada, en el tramo intervenido para cubrirlas y así evitar afectación en el acabado final, alterando la relación agua-cemento y el acabado final de las mismas (*ver fotografía 1 y 2*), cabe mencionar que durante la jornada laboral se realizó la fundida de vigas riostras sobre las abscisas K2+190 hasta K2+202, las cuales no se encuentran perpendicularmente al eje vial, de acuerdo a descrito en los diseños del proyecto, es de resaltar que la riostra es exclusivamente de confinamiento transversal y longitudinal de los elementos del pavimento que se construyen sobre la sub base como son las placas-huella, la piedra pegada, la berma cuneta y bordillo, por lo cual estas deberán quedar perpendicular al eje de la placa huella y así garantizar su funcionabilidad (*ver fotografía 3 y 4*).

De lo anterior, se le solicita al contratista de obras tomar los correctivos necesarios para que en las fundidas de placas de concreto reforzado, vigas riostras y placas en concreto ciclópeo se cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo la fundida de acuerdo a lo descrito en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, realizar la demolición y/o remplazo de las placas en concreto ciclópeo entre las abscisas mencionadas en el presente comunicado y conservar las buenas prácticas de la ingeniería.

Agradezco su gestión y pronta solución.

Se anexa registro fotográfico.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoria
CONSULTORES DONOVAN SAS


Copia Alcaldia de Montaria- Mónica Severiche Nuñez, secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato




Fotografia N°01. Se evidencia Acabado de la piedra pegada.



Fotografia N°02. Se evidencia acabado de la piedra pegada.

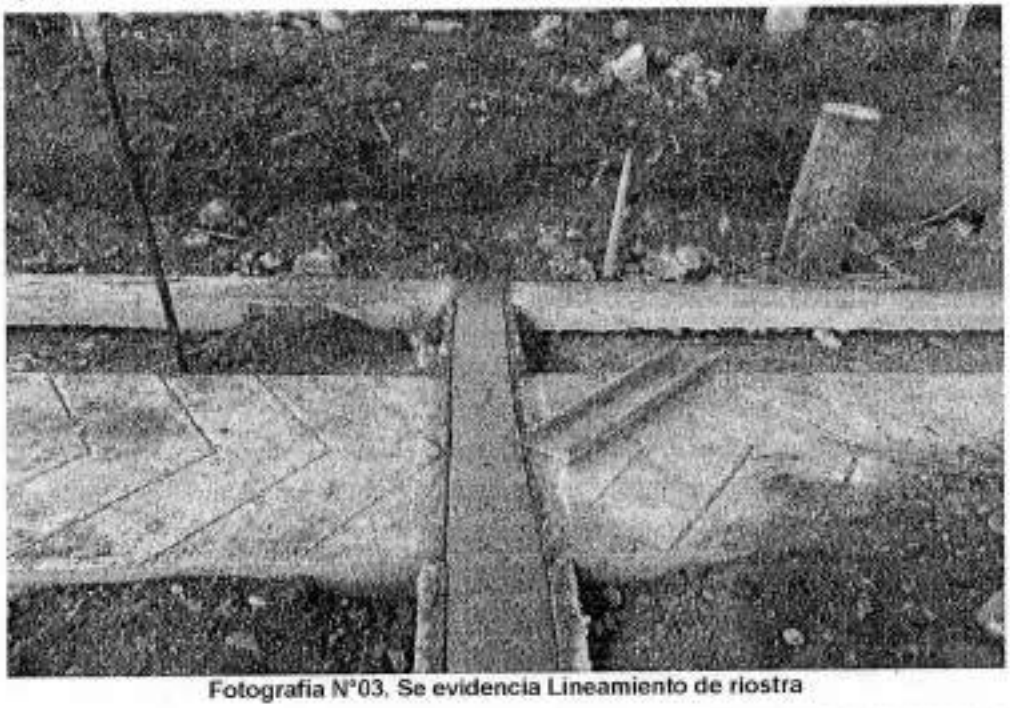

Fotografia N°03. Se evidencia Lineamiento de riostra

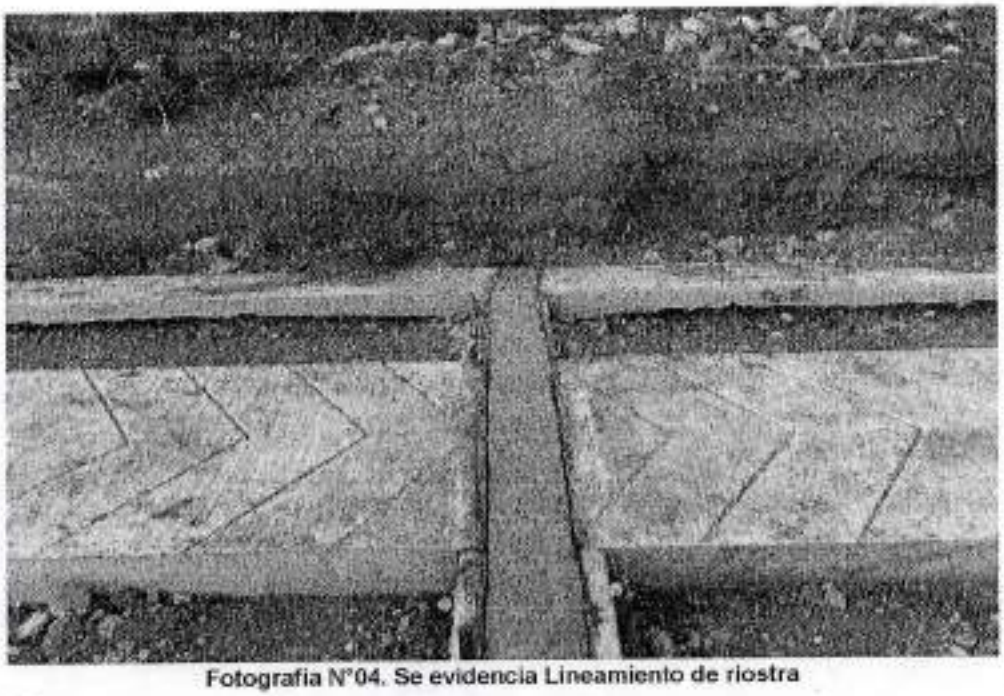

Fotografia N°04. Se evidencia Lineamiento de riostra

3833

DON-009-MONT-104-2022

Montería, 18 de mayo de 2023

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

ASUNTO: SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se le solicita nuevamente al contratista de obras presentar el procedimiento constructivo para la construcción de la placa huella, el cual fue solicitado el día 28 de marzo de 2023 por medio del oficio DON-009-MONT-092-2022, con el fin de cumplir con las especificaciones, planos y normas técnicas establecidas en el contrato de obras para el buen manejo de los conceptos de construcción en la ingeniería, donde se defina la manera en que se van a ejecutar las actividades de construcción de la placa huella, teniendo en cuenta que se ha evidenciado inconvenientes en la programación, logística y coordinación de las actividades diarias tal como se observó el día 27 de marzo de 2023, donde el contratista se encontraba realizando la conformación de las losas la piedra pegada sin fundir previamente las vigas riostras, de acuerdo a lo contemplado en el numeral 2.7.2 de la "Guia de diseño de pavimento con placa huella".

El día 17 de mayo de 2023, se evidencia adecuación de terreno de berma cuneta y encofrado de la misma sin tener en cuenta el bordillo, cabe resaltar que la berma-cuneta y el bordillo se deben fundir monoliticamente para evitar la junta de construcción que se formaria en la frontera entre ambos elementos, dicha junta que con el paso del tiempo se convertiría en una fisura que permitiría la infiltración del agua y por consecuente el deterioro del pavimento, de acuerdo a lo descrito en numeral 1.4.5 de la guía de "diseño de pavimento con placa huella" El cual fue tomado como referencia para el documento "Diseño para la construcción de placa huella en la vía de la vereda de Maracayo en el municipio de Montería", el cual es parte integral del contrato de la referencia.

Cabe mencionar que la placa-huella y la riostra se deberán fundir monoliticamente, dado que es un módulo de construcción que trabajan en conjunto estructuralmente, de acuerdo a lo descrito en el numeral 1.4.3 de la guía de "diseño de pavimento con placa huella" El cual fue tomado como referencia para el documento "Diseño para la construcción de placa huella en la vía de la vereda de Maracayo en el municipio de Montería", el cual es parte integral del contrato de la referencia.

De lo anterior, esta interventoria solicita muy respetuosamente se presente el procedimiento constructivo de la placa huella que garantice el cumplimiento de las especificaciones, planos y normas vigentes con el fin de conservar las buenas prácticas de la ingeniería, garantizando la transpirabilidad de los peatones y vehículos en la zona.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia Alcaldía de Montería- Mónica severiche Núñez, secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

3635

CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

DON-009-MONT-105-2022

Montería, 18 de mayo de 2023

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: SOLICITUD DE FECHA DE REUNION MENSUAL CON EL COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA.

Cordial saludo.

En aras de realizar seguimiento y acompañamiento de las actividades de gestión social esta interventoria solicita al contratista de obra y su área social fecha de la reunión mensual con el comité de veeduría ciudadana correspondiente al mes de mayo del año en curso.

De lo anterior, se le solicita al contratista de obra y su área social, realizar un cronograma de reunión con el comité de veeduria ciudadana, donde se evidencie las fechas estipuladas.

Agradezco su gestión.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoria
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia. Alcaldia de Monteria– Mónica Severiche Núñez, secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

3836

DON-009-MONT-106-2022

Montería, 19 de mayo de 2023

Señores
CONSTRUCCIONES AP SAS
Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO EN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cordial saludo.

Por medio del presente comunicado, se le informa al contratista de obras que se ha evidenciado que sus colaboradores no están utilizando los elementos de protección personal (EPP) adecuados para las actividades que realizan en la obra.

Esta situación constituye una falta grave a la normatividad colombiana sobre seguridad y salud en el trabajo, que establece que todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. Estos se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.

El incumplimiento en el uso de los EPP pone en riesgo la integridad física y la salud de sus trabajadores, así como la calidad y el cumplimiento del contrato. Además, puede generar sanciones administrativas y legales.

Por lo anterior, se solicita que se tomen las medidas correctivas necesarias para garantizar que sus trabajadores utilicen los EPP correspondientes a las labores que desempeñan, de acuerdo con lo establecido en la matriz de elementos de protección personal que usted presentó al inicio del contrato.

Le solicito que me envíe un informe detallado de las acciones realizadas para solucionar esta situación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de este oficio. De lo contrario, se procederá a aplicar las cláusulas penales y las acciones legales pertinentes.


Agradezco su gestión y pronta solución.

Se anexa registro fotográfico.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia: Alcaldía de Montería- Mónica Severiche Núñez, secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

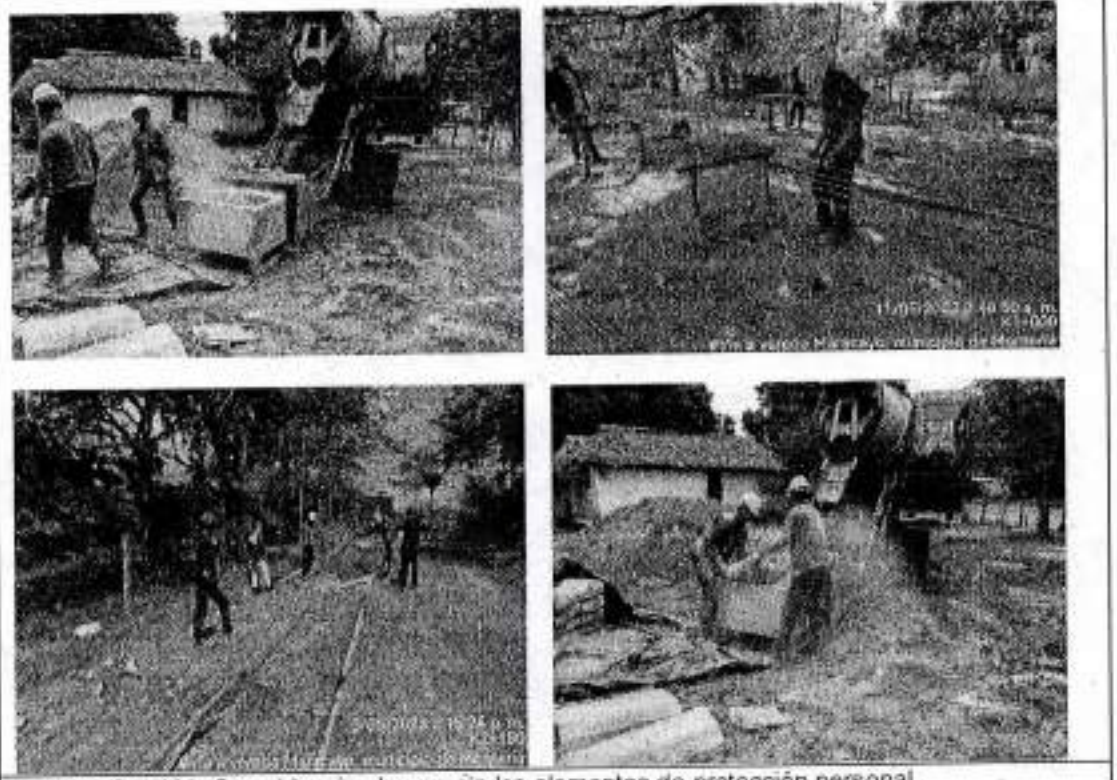

Fotografía N°01. Se evidencia obreros sin los elementos de protección personal correspondiente a la actividad que desempeñan.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	***CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA***						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de**			**Observaciones**
							Impreso	Fax	Mail	
DON-009-MONT-001-2022	18-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Entrega Poliza de Cumplimiento			x	
DON-009-MONT-002-2022	19-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Entrega hojas de vidas profesionales			x	
DON-009-MONT-003-2022	31-ago-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Documentación Para Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-004-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Cesión Contrato de Interventoría			x	
DON-009-MONT-005-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Radicación Hoja de Vida Director de Interventoría			x	
DON-009-MONT-006-2022	2-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Reiteración Entrega de Documentación Para Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-007-2022	6-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida			x	
DON-009-MONT-008-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida V.2			x	
DON-009-MONT-009-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Poliza De Cumplimiento			x	
DON-009-MONT-010-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Plan de Manejo De Tránsito			x	
DON-009-MONT-011-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Inicio Actividades De Obra			x	
DON-009-MONT-012-2022	9-sep-22	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Derecho De Petición. Solicitud Información Perfiles Disponibles			x	
DON-009-MONT-013-2022	12-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas De Vida Recibidas Por Correo Electrónico, 10 de Septiembre De 2022			x	
DON-009-MONT-014-2022	16-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Hojas De Vida Interventoría			x	
DON-009-MONT-016-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			x	

2839

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	***CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.***						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de** Impreso	Fax	Mail	**Observaciones**
DON-009-MONT-017-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Relación Equipo Y Personal Propuesto Interventoria			x	
DON-009-MONT-018-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-019-2022	19-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Respuesta Oficio OFI: MAR-012-2022-001			x	
DON-009-MONT-020-2022	22-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Alcance Comunicación DON-009-MONT-018-2022. Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-021-2022	29-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Cambio Hoja de Vida Residente Interventoria			x	
DON-009-MONT-022-2022										
DON-009-MONT-023-2022	30-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Remisión Pólizas Según Acta De Inicio			x	
DON-009-MONT-024-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Inicio De Obras E Información Domicilio Interventoría			x	
DON-009-MONT-025-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x	
DON-009-MONT-026-2022	5-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud al componente social			x	
DON-009-MONT-027-2022	6-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x	
DON-009-MONT-028-2022	7-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO OFI: MAR-012-2022-004 HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO			x	
DON-009-MONT-029-2022	8-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADA CON FECHA DE ACTA DE INICIO, ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2022.			x	
DON-009-MONT-030-2022	12-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO			x	
DON-009-MONT-031-2022	12-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	SOLICITUD ACLARACION EQUIVALENCIAS PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O DE VIAS Y TRANSPORTE CON POSTGRADO EN VIAS			x	
DON-009-MONT-032-2022	14-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PERSONAL PROFESIONAL CONTRATISTA DE OBRA			x	
DON-009-MONT-033-2022	14-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	SOLICITUD CAMBIO HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORÍA			x	
DON-009-MONT-034-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x	

3640

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	***CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.***						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de**			**Observaciones**
							Impreso	Fax	Mail	
DON-009-MONT-035-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPSO CONTRATADOS			x	
DON-009-MONT-036-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x	
DON-009-MONT-037-2022	24-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.			x	
DON-009-MONT-038-2022	25-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Atrasos en la ejecución de Actividades			x	
DON-009-MONT-039-2022	25-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remisión Documentos Acta de Inicio			x	

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	*CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.*						
Código consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	Medio de			Observaciones
							Impreso	Fax	Mail	
DON-009-MONT-001-2022	18-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Entrega Poliza de Cumplimiento			x	
DON-009-MONT-002-2022	19-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Entrega hojas de vidas profesionales			x	
DON-009-MONT-003-2022	31-ago-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Documentación Para Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-004-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Cesión Contrato de Interventoría			x	
DON-009-MONT-005-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Radicación Hoja de Vida Director de Interventoría			x	
DON-009-MONT-006-2022	2-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Reiteración Entrega de Documentación Para Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-007-2022	6-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida			x	
DON-009-MONT-008-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida V.2			x	
DON-009-MONT-009-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Poliza De Cumplimiento			x	
DON-009-MONT-010-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Plan de Manejo De Tránsito			x	
DON-009-MONT-011-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Inicio Actividades De Obra			x	
DON-009-MONT-012-2022	9-sep-22	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Derecho De Petición. Solicitud Información Perfiles Disponibles			x	
DON-009-MONT-013-2022	12-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas De Vida Recibidas Por Correo Electrónico, 10 de Septiembre De 2022			x	
DON-009-MONT-014-2022	16-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Hojas De Vida Interventoria			x	
DON-009-MONT-016-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-017-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Relación Equipo Y Personal Propuesto Interventoria			x	
DON-009-MONT-018-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-019-2022	19-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Respuesta Oficio OFI: MAR-012-2022-001			x	
DON-009-MONT-020-2022	22-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Alcance Comunicación DON-009-MONT-018-2022. Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-021-2022	29-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Cambio Hoja de Vida Residente Interventoria			x	
DON-009-MONT-022-2022										
DON-009-MONT-023-2022	30-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Remisión Pólizas Según Acta De Inicio			x	
DON-009-MONT-024-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Inicio De Obras E Información Domicilio Interventoría			x	
DON-009-MONT-025-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x	

892

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	*CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA*						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de** Impreso	Fax	Mail	**Observaciones**
DON-009-MONT-026-2022	5-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud al componente social			x	
DON-009-MONT-027-2022	6-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x	
DON-009-MONT-028-2022	7-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO OFI: MAR-012-2022-004 HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO			x	
DON-009-MONT-029-2022	8-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADA CON FECHA DE ACTA DE INICIO, ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2022.			x	
DON-009-MONT-030-2022	12-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO			x	
DON-009-MONT-031-2022	12-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	tario de Infraestructura Mu	Ivan Alviz	SOLICITUD ACLARACION EQUIVALENCIAS PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O DE VIAS Y TRANSPORTE CON POSTGRADO EN VIAS.			x	
DON-009-MONT-032-2022	14-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PERSONAL PROFESIONAL CONTRATISTA DE OBRA			x	
DON-009-MONT-033-2022	14-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	tario de Infraestructura Mu	Ivan Alviz	SOLICITUD CAMBIO HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORÍA			x	
DON-009-MONT-034-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x	
DON-009-MONT-035-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPSO CONTRATADOS.			x	
DON-009-MONT-036-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x	
DON-009-MONT-037-2022	24-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE INFORMACION Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.			x	
DON-009-MONT-038-2022	25-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Atrasos en la ejecución de Actividades			x	
DON-009-MONT-039-2022	25-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	tario de Infraestructura Mu	Ivan Alviz	Remisión Documentos Acta de Inicio			x	

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA			Proyecto:	*CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.*						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de** Impreso	Fax	Mail	**Observaciones**
OFI: MAR-012-2022-001	16-sep-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	Experiencia de profesionales.			x	
OFI: MAR-012-2022-002	22-sep-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	Experiencia de profesionales.			x	
OFI: MAR-012-2022-004	6-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	HOJAS DE VIDA PROPUESTO			x	
OFI: MAR-012-2022-005	10-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	RESPUESTA AL OFICIO DON-009-MONT-027-2022			x	
OFI: MAR-012-2022-008	10-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	RESPUESTA COMUNICADO RECHAZO HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN VIAS			x	
OFI: MAR-012-2022-008	21-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	DOCUMENTOS ACTA DE INCIO			x	

BITÁCORA DE OBRA

Maracayo, 30 de abril del 2023, DOMINGO.
Estado del clima: lluvia moderada.

Personal contratista de obras: No se labora, dia festivo.

Residente de obra

Maracayo, 1 de mayo del 2023, lunes.
Estado del clima: Soleado.

NO se labora, dia festivo.

Residente de obra

Maracayo, 2 de mayo del 2023, Martes.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obras: (1) Director de obras; (1) Residente de obras; (1) Profesional SST; (1) especialista en vias; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Maestro de obra; (1) Almacenista; (9) operadores de maquinaria; (4) Auxiliares de bruno; (11) Ayudantes civiles; (6) oficiales civiles; (1) Ayudante carrus (5) oficios varios.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (inactiva); (1) Vibrocompactador (inactivo); (1) Retroexcavadora - pajarita (inactiva); (2) Mini-cargadores (Activos); (1) Excavadora (Activa); (1) carrus (inactivo); (1) carrotanque (Activo); (1) volqueta doble troque (Activo).

3846

Actividades Realizadas:
- El contratista de obras el dia de hoy fundio placas de concreto reforzado y borma cuneta entre las abscisas Km 225 y Km 250 del carril izquierdo
- El contratista de obras realizo armado y figurado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga riostra y borma cuneta.
- El contratista de obras realizo seleccion de piedra rajon para la conformacion del concreto ciclopeo que hace parte de la calzada vial.

Residente de obra

Mamicayo, 3 de mayo del 2013, miercoles.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obras: (1) Director de obras; (1) Residente de obra; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Maestro de obra; (1) Almacenista; (1) Topogrpo; (1) cadenero; (4) operadores de maquinaria (4) Auxiliares de trafico; (11) Ayudantes civiles; (6) oficiales civiles; (1) Ayudante carrux; (3) oficios varios.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topogrpo; (1) Cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (Activa); (1) Vibro compactador (Activo); (1) Retroexcavadora - pajarita (Activa); (1) Excavadora (Inactiva); (2) Minicargadoras (Activas); (1) carrux (Inactivo); (1) Carrotanque (Activa); (1) volqueta doble troque (Activa).

3897

Actividades Realizadas:
— El contratista el dia de hoy realizo relleno y compactacion de material granular (subbase) entre las abcisas K2+700 y K2+800.
— El contratista el dia de hoy realizo relleno con material de terraplen tipo limos y realizo su compactación entre las abcisas K2+800 y K2+840.
— El contratista de obras realizo instalación de moles y adecuacion del terreno para fundir concreto ciclopeo, concreto reforzado, viga riostra y tercera cuota del carril izquierdo.

Residente de obra

Maracaibo, 4 de mayo del 2023, jueves.
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obras: (1) Director de obras; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Maestro de obra; (1) Topografo; (2) cadeneros; (9) operadores de maquinaria; (4) Auxiliares de limpieza; (1) Almacenista; (9) Ayudante carguix; (11) Ayudantes civiles; (6) oficiales civiles; (3) oficios varios.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (inactiva); (1) Vibro compactador (inactivo); (1) Retroexcavadora-Pajarita (inactiva); (1) carguix (inactivo); (1) Excavadora (inactiva); (2) Mixicargadoras (Activas); (1) carro tanque (Activo); (1) volqueta doble troque (Activa)

3898

Actividades Realizadas:
— El contratista de obras realizo instalacion de rieles y excavacion manual de viga riostra entre las abscisas Km 1+140 y Km 1+235.
— El contratista de obras realizo seleccion de piedras rajas para la conformacion del concreto ciclopeo que hace parte de la calzada vial
— El contratista de obras realizo armado y figurado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga riostra y barrera cuneta.

DRA.

Residente de obra

Maracaye, 5 de mayo del 2023, viernes
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obras: (1) Director de obras; (1) Residente de obras; (9) operadores de maquinaria; (1) Trabajadora social; (1) ayudante carretilla; (3) ejecutores varios; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (2) Auxiliares de transito; (1) Almacenista.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (inactiva); (1) Vibrocompactador (Activo); (2) minicargadores (Activos); (1) Retroexcavadora - pajarita (inactiva); (1) Excavadora (inactiva); (1) camabajo (Activo); (1) volqueta doble troque (Activo). (1) Carretilla (inactiva).

Actividades Realizadas:
— El contratista el dia de hoy realizo Seleccion de piedras rajas para la conformacion del concreto ciclopeo que hace parte de la calzada vial.

3879

— El contratista de obra el dia de hoy realizo mezcla de material granular para la conformación de la sub en sitio de acopio de materiales.
— El contratista de obras realizo compactación de material terraplen tipo INVIAS entre las abscisas K2+720 y K2+810.

Mamcaya, 6 de mayo de 2023, Sabado
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obras: (1) Director de obras; (1) Residente de o (1) Topografo; (1) cadenero; (1) operadores de maquinaria; (1) Almacenista (1) Ayudante general; (3) oficios varios; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (Activo); (1) Vibro compactador (Activo); (2) cargadoras (Activas); (1) Retroexcavadora - pajarita (inactiva); (1) Excavadora (inactiva); (1) carrotanque (Activo); (1) carro (inactivo); (1) volqueta doble troque (Activo)

Actividades Realizadas:
— El contratista el dia de hoy realizo mezcla de material granular para la conformación de Subbase en sitio de acopio de materiales.
— El contratista de obras realizo rellenos y compactación de Subbase granular entre las abscisas K2+720 y K2+800
— El contratista de obras realizo Selección de piedra mayor para la conformación del concreto ciclopeo que hace parte de la calzada vial.

3650

Residente de obra

Marmato, 7 de mayo del 2023, domingo.
Estado del clima: Soleado.

No se labora, día festivo.

Residente de obra

Marmato, 8 de mayo de 2023, lunes.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obras: (1) Director de obras; (1) Residente de obra; (1) trabajadora social; (1) Topógrafo; (2) cadeneros; (9) operadores de maquinaria; (1) ayudante cadenero; (3) oficios varios; (2) Auxiliares de topografía; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Almacenista.
Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) Inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) Cadenero; (1) Conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (activa); (1) vibro compactador (activo); (2) cargador (activo); (1) Retroexcavadora - Pajarita (inactiva); (1) Excavadora (inactiva); (1) camión (inactivo); (1) carro tanque (activo); (1) volqueta doble troque (activa).

Actividades Realizadas:
- El día de hoy el contratista Realizó Actividades de selección de geotextil para la conformación del concreto ciclopeo que hace parte de la calzada vial.

3851

— El contratista de obras realizo mezcla de material granular que conforman la subbase en sitio de acopio de materiales.
— El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga maestra y viga cuneta.
— El contratista de obras el dia de hoy realizo actividades de relleno y compactacion de Subbase granular entre las abscisas K2+720 y K2+800.

Residente de obra

Marmato, 9 de Mayo de 2023, Martes.
Estado del clima: Soleado.
Personal contratista de obras: (1) Director de obras; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Especialista en vias; (1) Trabajadora Social; (9) operadores de maquinaria; (1) ayudante general; (3) oficios varios; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) auxiliares de topografo; (1) Almacenista.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; 0) Conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (Activa); (1) Vibro compactador (Activo); (2) Minicargador (Activo); (1) Retroexcavadora - pajarita; (1) Excavadora (inactiva); (1) camion (inactivo); (1) Carro tanque (Activo); (1) volqueta doble troque (Activo).

Actividades Realizadas:
— El contratista de obras el dia de hoy realizo relleno con Subbase granular y asi mismo realizo compactacion de la Subbase entre las abscisas K2+720 y K2+800.

3852

-El contratista de obra el dia de hoy realizo mezcla de subbase granular en el centro de acopio de materiales ubicado en la abscisa K1+000.
-El contratista de obra realizo seleccion de piedra rajon para la conformacion del concreto ciclopeo que hace parte de la calzada vial.

Residente de obra

Manicaypo, 10 de mayo de 2023, miercoles.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) operadores de maquinarias; (1) Ayudante cannex; (5) oficios varios; (1) Almacenista.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor

Maquinarias y equipos: (1) motoniveladora (inactiva); (1) Vibro compactador (inactivo); (1) retroexcavadora (inactivo); (1) Retroexcavadora - zapata (activa); (1) Excavadora (inactiva); (1) carro tanque (inactivo); (1) cannex (inactivo); (1) volqueta doble troque (inactivo).

Actividades Realizadas:
-El contratista de obra el dia de hoy Realizo figurado y anclado de acero de Refuerzo para pilotes del puente.
-El contratista de obra realizo Seleccion de piedra rajon para la conformacion del concreto ciclopeo que hace parte de la calzada vial.

Residente de obra

Manicayo, 11 de mayo de 2023, jueves.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obras: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Trabajadora social; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Almacenista; (9) Operadores de maquinaria; (1) Ayudante general; (3) oficios varios; (4) Auxiliares de transito; (11) Ayudantes civiles; (6) oficiales civiles.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (Activa); (1) vibro compactador (Activo); (1) excavadora (activa); (1) carro-tanque (activo); (2) cargadores (Activos); (1) Retroexcavadora-pajarita (Activa); (1) cargue (Activo); (1) volqueta doble troque (Activo).

Actividades Realizadas:
— El contratista de obra realizo cortes en los talud ubicados entre las abcisas K1+500 y K1+760
— El contratista de obra realizo cargue y retiro de material entre las abcisas K1+500 y K1+760.
— El contratista de obra realizo rellenos y compactación de material de formación tipo INVIAS entre las abcisas K2+349 y K2+330.
— El contratista de obra realizo excavación de viga riostra en carril izquierdo entre las abcisas K2+200 y K2+215
— El contratista de obra realizo fundida de concreto reforzado, viga riostra y barrera cuneta entre las abcisas K2+160 y K2+215 en carril izquierdo.

Residente de obra

3854

Maracaibo, 12 de mayo de 2023, viernes.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Especialista en vías; (1) Trabajadora social; (1) Almacenista; (2) operadores de maquinaria; (1) ayudante camión; (14) auxiliares de tráfico; (11) ayudantes civiles; (6) oficiales civiles; (3) oficios varios; (1) Topógrafo; (1) cadenero.

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (Activa); (1) vibrocompactador (activo); (2) (Retrocargadores (Activos); (1) camión (activo); (1) Retroexcavadora - pajarita (inactiva); (1) Excavadora (Activa); (1) cargotractor (Activa); (1) volqueta doble troque (Activa).

Actividades Realizadas:
— El contratista de obra realizo cortes en el talud ubicado entre las abscisas K2+500 y K2+760.
— El contratista de obra realizo rellenos y compactacion con material de terraplen tipo INVIAS entre las abscisas K2+860 y K2+890.
— El contratista de obra realizo armado y figurado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga cuatro y barrera cuneta.
— El contratista de obra el dia de hoy realizo seleccion de piedras rajon para la conformacion del concreto ciclopeo que hara parte de la calzada vial.
— El contratista de obra realizo cargue y retiro de material proveniente de los cortes realizados en las abscisas K1+500 y K2+760.
— El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado entre las abscisas K2+890 y K2+950, asi mismo, realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abscisas K2+810 y K2+860.

Residente de obra

3855

Maracayo, 13 de mayo de 2023, Sabado.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obras: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (9) operadores de maquinaria; (1) ayudante carmix; (4) Auxiliares de transito; (1) ayudantes civiles; (1) oficial; (3) oficios varios.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; A) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (activa); (1) vibrocompactador (activo); (2) minicargadores (activos); (1) Retro excavadora - pajarita (activa); (1) Excavadora (fantasma); (1) carmix (inactivo); (1) camotanque (inactivo); (1) volqueta doble troque (activa).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obras realizo instalación de rieles entre las abscisas Km 120 y Km 150 en carril izquierdo.
- El contratista de obras realizo mezcla de subbase granular en sitio de acopio de materiales ubicado en la abscisa Km 000.
- El contratista de obras realizo relleno y compactación de material de terraplen tipo INVIAS entre las abscisas Km 870 y Km 920.
- El contratista de obra realizo figurado y armado de Acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga riostra y barrera cuneta.

Residente de obra

3856

Mamcayo, 14 de mayo de 2023, Domingo.
Estado del clima: Soleado

No se labora, día festivo.

Residente de obra

Mamcayo, 15 de mayo de 2023, Lunes.
Estado del clima: Lluvia moderada.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (4) operadores de maquinaria; (1) ayudante carnicero; (1) almacenista; (6) ayudantes varios; (1) apoyo civil; (4) auxiliares de transito; (3) oficios varios; (1) inspector de obra

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) conductor.

Actividades Realizadas:
- Debido a las fuertes lluvias presentadas el día de hoy, no se dieron las condiciones para realizar actividades contractuales referentes al contrato de obra.

Residente de obra

3857

Maracayo. 16 de mayo de 1923, Martes.
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Especialista en vías; (1) Trabajadora Social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (4) operadores de maquinarias; (4) Ayudantes carreta; (4) Auxiliares de transito; (15) Ayudantes civiles; (3) operarios civiles; (1) Almacenista; (3) oficios varios; (1) inspector de obra

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) conductor

Maquinarias y equipos: (1) motoniveladora (activa); (1) vibro compactador (Activa); (2) Minicargadores (Activos); (1) carreta (inactiva); (1) Retroexcavadora pajarita (Activa); (1) Excavadora (inactiva); (1) carrotanque (Activa); (1) volqueta doble troque (Activa).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo cargue y retiro de material entre las abcisas K2+830 y K2+860.
- El contratista de obra realizo fijando y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga riostra y buena cuneta.
- El contratista de obra realizo nivel y compactacion de material de terraplen entre las abcisas K2+840 y K2+920
- El contratista de obra realizo instalacion de redes y adecuacion del terreno entre las abcisas K2+700 y K2+740 en carril izquierdo

Residente de obra

3858

Maracaibo, 11 de mayo de 2023, Miercoles.
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (2) cadeneros; (9) operadores de maquinaria; (1) Ayudante carguio; (4) Auxiliares de transito; (15) Ayudantes civiles; (3) operarios civiles; (1) Almacenista; (1) inspector de obra.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; a) cadeneros; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (activa); (1) rodillo compactador (activo); (2) Mixer agitador (activo); (1) Retroexcavadora - pajarita (activa); (1) Excavadora (activa); (1) camion (activo); (1) carro tanque (activo); (1) volqueta doble troque (activa).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo pegado y armado de acero de refuerzo para placa de concreto reforzado. viga cuneta y barrera cuneta.
- El contratista de obra realizo relleno y compactacion de subbase granular entre las abcisas KZ+090 y KZ+150.
- El contratista de obra realizo fundida de piedra pegada entre las abcisas KZ+200 y KZ+215, asi mismo, realizo fundida de viga cuneta entre las abcisas KZ+150 y KZ+200; el contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado entre las abcisas KZ+200 y KZ+240, en carril izquierdo.

Residente de obra

Marcayo, 18 de mayo de 2023, jueves.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Especialista en vías; (1) Trabajadora Social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (9) operadores de Maquinaria; (1) ayudante carmix; (14) Auxiliares de transito; (1) Almacenista; (15) ayudantes civiles; (3) operales civiles; (3) oficios varios

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (Activa); (1) vibrocompactador (Activa); (2) Minicargadora (Activa); (1) Retroexcavadora-pajarita (Activa); (1) Excavadora (Activa); (1) carmix (Activa); (1) Camión tanque (Activo); (1) volqueta doble troque (Activa)

Actividades Realizadas
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abscisas K2+150 y K2+225 en carril izquierdo
- El contratista de obra realizo cortes en talud entre las abscisas K2+350 y K1+460
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo para placa de concreto reforzado, viga riostra y buena cinta.
- El contratista de obra realizo cargue y retiro de material entre las abscisas K1+350 y K1+460.

Residente de obra

3860

Manizales, 19 de mayo de 2013, VIERNES.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obras: (1) Director de obras; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) inspector; (9) operadores de maquinaria; (1) Abastecedor carrotanque; (4) auxiliares de tramo; (1) almacenista; (15) Ayudantes civiles; (5) oficiales civiles; (3) oficios varios.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (Activa); (1) retrocargadora (activa); (1) Retroexcavadora-pajarita (activa); (1) excavadora (Activa); (1) vibrocargador (activo); (1) carrotanque (inactivo); (1) carrotanque (Activo); (1) volqueta doble troque (activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo relleno y compactación de subbase granular entre las abscisas Kz+800 y Kz+900.
- Se realizo chequeo de niveles por parte de la comisión topografica de interventoria.
- El contratista de obras realizo perfilado de banca cuneta entre las abscisas Kz+800 y Kz+740 en costado izquierdo.
- Se realizo ensayo de densidades en campo a la subbase granular entre las abscisas Kz+800 y Kz+900.

3861

Marmato, 20 de mayo de 2023, sabado.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (9) operadores de Maquinaria; (1) Ayudante carguio; (4) Auxiliares de tramo; (1) Trabajadora Social; (1) inspectores; (3) otros varios; (15) Ayudantes civiles; (3) oficiales civiles.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (Activa); (1) Vibrocompactadora (Activa); (1) Retroexcavadora-pajarita (Activa); (2) cargadores (Activos); (1) Carrotanque (Inactivo); (1) Excavadora (Activa); (1) Carrotanque (Activo); (1) volqueta doble troque (Activa)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obras realizo mezcla de Subbase granular en sitio de acopio de materiales ubicado en la abscisa K2+000.
- El contratista de obra realizo relleno y compactacion de material de terraplen entre las abscisas K2+900 y K2+940.
- El contratista de obra realizo cargue y retiro de material entre las abscisas K2+900 y K2+960.
- El contratista de obra realizo instalacion de niveles y adecuacion del terreno para pundida de placa huella entre las abscisas K2+149 y K2+190.

Residente de obra

3662

Mamayo, 21 de mayo de 2023, Domingo.
Estado del clima: Lluvia moderada.

No se laboro, dia festivo.

Residente obra

Mamayo, 22 de mayo de 2023, lunes.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora social; (1) inspector; (1) Topografo; (1) cadenero; (9) operadores de maquinaria; (1) ayudante camion; (1) Almacenista; (14) auxiliares de trapeo; (15) Ayudantes civiles; (3) oficiales civiles; (3) oficios varios; (1) operador pistolada; (2) ayudante pistolero.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinarias y equipos: (1) motoniveladora (Activa); (1) vibrocompactador (activo); (1) Retroexcavadora - pajarita (Activa); (1) minicargadora (activa) (1) Excavadora (Activa); (1) camion (inactivo); (1) camion tanque (Activo); (1) volqueta doble troque (inactivo); (1) Pistolada (inactiva)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza rellenos y compactación de material de terraplen entre las abscisas Km 700 y Km 940.
- El contratista de obra realiza instalacion de cunetas y adecuacion del terreno para fundida de piedra pegada entre las abscisas Km 700 y Km 740.

Residente de obra

3863

Maracayo. 23 de mayo de 2023, martes.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) especialista en vias; (1) Trabajadora Social; (1) inspector; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (9) operadores de maquinaria; (1) Ayudante carmix; (4) Auxiliar de trafico; (3) oficios varios; (15) ayudantes civiles; (3) operarios civiles; (1) operador pilotadora; (2) ayudantes pilotadora.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (Activo); (1) vibro compactador (Activo); (2) cargador (activo); (1) carmix (Activo); (1) Retroexcavadora-pajarita (Activo); (1) excavador (Activo); (1) carrotanque (Activo); (1) volqueta doble troque (Activo); (1) pilotadora (Inactivo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo alleno en material de terraplen entre las abcisas Km2+910 y Km2+940, asi mismo, realizo compactacion del material.
- El contratista de obra realizo fundida de concreto reforzado (Placas de concreto, viga riostra y barrera cuneta) entre las abcisas Km2+140 y Km2+190 en carril izquierdo.
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga riostra y barrera cuneta.
- El contratista de obra realizo picada de solados generados en sitio de acopio de materiales ubicado en la abcisa Km2+000

Residente de obra.

Residente de obra

3669

Maracaibo, 24 de ago de 2023, Miercoles.
Estado del clima: Lluvia moderada.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora social; (1) Inspector; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (2) ayudantes de maquinaria; (1) Ayudante camion; (4) auxiliares de trompo; (3) oficios varios; (15) Ayudantes civiles; (3) oficiales civiles.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) retroexcavadora (Activa); (1) Vibro compactador (Activo); (2) cargadores (Activos); (1) cargador (Activo); (1) Retroexcavadora - pajarito (Activo); (1) Excavadora (Activa); (1) carro tanque (Activo); (1) volqueta doble troque (Activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza relleno y compactacion de material de terraplen entre las abcisas Kz+910 y Kz+940.
- El contratista de obra realiza fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y losa en cuneta entre las abcisas Kz+940 y Kz+970 en canal izquierdo.
- El contratista de obra realiza figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga riostra y losa en cuneta.

Residente de Obra.

Contratista de obra

Mamayo, 25 de mayo de 2023. jueves.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora social; (1) inspector; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (9) operadores de maquinaria; (1) Ayudante camion; (4) Auxiliares de trafico; (15) Ayudantes civiles; (3) oficiales civiles; (3) oficios varios.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) Cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (Activo); (1) vibrocompactador (Activo); (1) cargador (Activo); (1) cargador (inactivo); (1) Retroexcavadora - pajarita (Activo); (1) excavadora (Activo); (1) carrotanque (Activo); (1) carrotanque (Activo); (1) volqueta doble troque (Activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo instalacion de acero, figurado y armado de acero de refuerzo entre las abcisas K21+110 y K21+150 en carril izquierdo.
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abcisas K21+110 y K21+140 en carril izquierdo.
- El contratista de obra realizo relleno y compactacion de material de terraplen entre las abcisas K21+910 y K21+960.
- El contratista de obras realizo mezcla de subbase granular en sitio de acopio de materiales ubicado en la abcisa K11+000.

Residente de obra

Manizales, 26 de mayo de 2023, viernes.
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) especialista en vías; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (9) operadores de maquinaria; (1) Ayudante carros; (4) Auxiliares de tráfico; (13) Ayudantes civiles; (3) oficiales civiles; (3) oficios varios; (1) inspector; (1) Almacenista.

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (Activo); (1) vibro compactador (Activo); (1) mini cargador (Activo); (1) mini cargador (Inactivo); (1) Retroexcavadora - pajarel (Activa); (1) Excavadora (Inactiva); (1) carrota (Activo); (1) carro tanque (Activo); (1) volqueta doble troque (Activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abscisas K2+150 y K2+180 en carril izquierdo.
- El contratista de obra realizo relleno y compactacion con material de terraplen entre las abscisas K2+910 y K2+960.
- El dia de hoy se realizo ensayo de densidades en campo para la subbase granular, el ensayo tuvo en cuenta las abscisas K2+660 y K2+890.
- El contratista de obra realizo mezcla de subbase granular en sitio de acopio de materiales, ubicado en la abscisa K1+000.

Residente de interventoría.

Residente de obra

3867

Maracaibo, 27 de mayo de 2023. Sabado.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Inspector; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero; (9) operadores de maquinaria; (4) Auxiliares de topico; (1) Almacenista; (15) Ayudantes civiles; (3) oficios varios; (3) oficiales civiles.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) Cadenero; (1) conductor

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (activa); (1) volco compactador (Activo); (1) minicargador (activo); (1) minicargador (inactivo); (1) Retroexcavadora - pajarita (inactiva); (1) excavadora (activa); (1) camion (inactivo); (1) carro tanque (activo); (1) volqueta doble troque (activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo relleno y compactacion de material de terraplen entre las abcisas Kz+940 y Kz+980.
- El contratista de obra realizo instalacion de rieles, figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga riostra y barras cuadra, en canal izquierdo entre las abcisas Kz+790 y Kz+770.
- El contratista de obra realizo figurado de acero de refuerzo correspondiente a las box culvert 1, 2 y 3.

Residente de interventor.

Contratista de obra

3868

Mamcaya, 28 de mayo de 2023. Domingo.
Estado del clima: Soleado.

No se labora, día festivo.

Residente de interventoría

Residente de obra

Mamcaya, 29 de mayo de 2023, Lunes.
Estado del clima: Lluvia moderada

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (1) inspector; (9) operadores de maquinaria; (4) auxiliares de topico; (1) Ayudante cerrajero; (15) Ayudantes civiles; (3) oficiales civiles; (3) oficios varios.

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) inspector; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (activa); (1) rodillo compactador (activo); (1) cargador (activo); (1) minicargador (inactivo); (1) Retroexcavadora - pajarita (inactiva); (1) excavadora (activa); (1) camión (activo); (1) camión tanque (activo); (1) volqueta doble troque (activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza relleno y compactación de material de terraplen tipo invias entre las abscisas K2+930 y K2+995
- El contratista de obra realiza fundida de concreto con resistencia a la compresión de 3000 PSI (Placas de concreto reforzado, viga cantil y barrera rígida) entre las abscisas K2+580 y K2+820, en zona izquierda.
- El contratista de obra suspende actividades debido a fuertes lluvias que se generaron a partir de la 1:00 P.M
- Se solicita al contratista aumentar los sedimentos

en obra teniendo encuenta el abuso que viene presentado hasta la fecha.

Residente de interventoría.

Residente de obra

Maicao, 30 de mayo de 2023, martes.
estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) Inspector; (1) cadenero; (9) operadores de maquinaria; (4) Auxiliares de trapico; (15) ayudantes civiles; (3) oficiales civiles; (3) oficios varios; (1) Almacenista.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspectora; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (Activo); (1) Vibro compactador (Activo); (1) Minicargador (Activo); (1) Minicargador (Inactivo); (1) Retroexcavadora-pajuela (inactiva); (1) Excavadora (Activa); (1) carro tanque (Activo); (1) carro tanque (Activo); (1) Volqueta doble troque (Activo).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo relleno y compactación de material de terraplen tipo INVIAS entre las abscisas K2+920 y K3+010.
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo (Placas de concreto reforzado, viga riostra y barrera simple) entre las abscisas K2+110 y K2+140 en carril izquierdo.
- El contratista de obra realizo fundida de concreto con resistencia a la compresión de 3000 Psi (Placas de concreto reforzado, viga riostra y barrera simple) entre las abscisas K2+110 y K2+140 en carril izquierdo.

Residente de obra

3870

Marcaya, 31 de mayo de 2023, Miercoles
Estado del clima: Soleado, lluvia moderada

El contratista de obra no realizo actividades debido a las fuertes lluvias presentadas en la madrugada y en la tarde del dia de hoy.

Residente de obra

Supervisor de obra

Marcaya, 1 de junio de 2023, jueves
Estado del clima: lluvias

El contratista de obra no realizo actividades debido a las fuertes lluvias presentadas en la madrugada y en la mañana del dia de hoy.

Res. de interventoria

Supervisor de obra

Marcaya, 2 de junio de 2023, viernes
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) supervisor de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajador social; (1) auxiliar SST; (1) Topografo; (2) cadenero; (1) Almacenista; (2) operadores de maquinaria; (1) oficial civil; (1) ayudantes civiles; (2) oficios varios

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) supervisor de interventoria; (1) Profesional SST; (1) Trabajador social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) conductor.

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (activa); (1) Vibrocompactador (activo) (1) minicargador (activo); (1) minicargador (inactivo); (1) Retrocargador-pajarita (inactiva); (1) excavadora (inactiva); (1) carro tanque (activo); (1) camion (activo) (1) volqueta (activo).

3671

SEGUIMIENTO A PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

PGIO 06

ABRIL 22 DE 2023- MAYO 22 DE 2023

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Contrato de obra N° LP- SPM-012-2022

Montería Córdoba
Mayo de 2023

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA "PGIO 06"

Fecha: Octubre de 2022	Versión: 01	Página: 1

Tabla de contenido

1. ALCANCE 4

2. OBJETIVO 4

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 4

4. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 5

5. SEGUIMIENTO DEL PERSONAL 5

6. SECTOR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 6

7. COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL 6

7.1. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD. 7
7.1.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 7

7.2. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 8
7.2.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 8

7.3. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA 8
7.3.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA 8

8. COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL. 9

8.1. SEGUIMIENTO DE FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 20
8.1.1. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS ASPECTOS FÍSICOS 20
8.1.2. FICHA – B1 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 20
8.1.3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 21
8.1.4. FICHA – B2 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 21
8.1.5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO MANEJO DE DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 22
8.1.6. FICHA - B3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 22
8.1.7. SEGUIMIENTO Y MONITOREO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 23
8.1.8. FICHA – B4 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 23
8.1.9. FICHA – B5 5 Y MANEJO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 24
8.1.10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAELES PARA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 24
8.1.11. FICHA – B6 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 25
8.1.12. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 25

8.1.13. FICHA – B7 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 26
8.1.14. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 26
8.1.15. FICHA – B8 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 27
8.1.16. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 28
8.1.17. FICHA - B9. MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA 28
8.1.18. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA 28
8.1.19. FICHA – B10. MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 29
8.1.20. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AISLAMIENTO DE LA OBRA 29
8.1.21. FICHA – B11. AISLAMIENTO DE LA OBRA 30
8.1.22. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AISLAMIENTO DE LA OBRA 30
8.1.23. FICHA – B12. MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN 31
8.1.24. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN 31
8.1.25. FICHA – B13. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL 32
8.1.26. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN 32
8.1.27. .FICHA – C1. ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES 32
8.1.28. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES 32

9. CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES 33

10. COMPONENTE DE CALIDAD DEL PROYECTO 34

10.1. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 35

11. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 36

11.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 36

11.2. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES. 39

11.3. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE. 39

11.4. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES. 39

11.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 40

11.6. COPASST. 40

11.7. SEGURIDAD SOCIAL 40

11.8. EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. 40

11.9. INSPECCIONES REALIZADAS 40

11.10. INDICADORES SGSST. 40

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO 42

12.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL 42
12.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN DE CALIDAD 45
12.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 48
13. APROBACIONES Y CAMBIOS 50

14. ANEXOS 51

15. Anexo GA1. Requerimientos ambientales preliminares 51
16. Anexo GA2.Manejo y disposición de desechos de construcción 55
17. Anexo GA3. Control de escombros 56
18. Anexo GA5. Manejo de campamentos e instalaciones temporales 57
19. Anexo GA6. Manejo de maquinarias y equipos 58
20. Anexo GA7.Manejo de residuos liquidos,combistibles,aceites y sustancias quimicas 60
21. Anexo GA8.Aseo de la obra 61
22. AnexoA9 .Señalización 62
23. Anexo GA10. Manejo de aguas superficiles 63
24. Anexo GA11. Manejo de la vegetación 64
25. Anexo GA13. Siembras compensatorias 66
26. Anexo GA14. Capacitaciones ambientales 69
27. Anexo SST1. Documentos de maquinarias e inspecciones 70
28. Anexo SST2. Registro de asistencia a capacitaciones 102
29. Anexo SST3. Registro de entrega de EPP 154
30. Anexo SST4. Acta de reunión del COPASST 187
31. Anexo SST5. Certificaciones de afiliaciones a la seguridad social 189

SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA "PGIO" 006

1. ALCANCE

El PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA aplica para las actividades establecidas en el Contrato de obra N° LP- SPM-012-2022, pactado entre el CONSTRUCCIONES AP S.A.S con NIT: 890940910-1 y el Municipio de Montería, para la ejecución del proyecto de obra, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

Este seguimiento relaciona las actividades celebradas entre el 23 de Abril de 2023 y el 22 de Mayo de 2023.

2. OBJETIVO

Evidenciar el cumplimiento de los programas establecidos en el PGIO durante la fase de diseño y construcción de la obra "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"", bajo el compromiso contractual y civil para el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en términos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Contratista	CONSTRUCCIONES AP
NIT	890940910-1
Dirección	Calle 80 Sur # 47D – 163 Bodega 107
Municipio	Sabaneta (Ant.)
Zona de ejecución del proyecto	Vereda Maracayo en el corregimiento de tres piedras en el municipio de monteria
Objeto del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO

4. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

- Desarrollar el Proyecto de obra civil bajo el cumplimiento de todos los requisitos legales, reglamentarios y demás aplicables.
- Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad aledaña al proyecto.
- Fortalecer la inclusión social en el país.
- Realizar las actividades preservando el medio ambiente y previniendo la contaminación.
- Velar por la promoción den una cultura del cuidado, bajo el pilar de la prevención en términos de seguridad y salud de los trabajadores.
- Reducir al mínimo los eventos adversos que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.
- Mejorar continuamente durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.

5. SEGUIMIENTO DEL PERSONAL

Para la ejecución del proyecto se requiere contar con el siguiente Recurso humano para la ejecución de obra:

- ✓ Director de Obra
- ✓ Residente de Obra (2)
- ✓ Ingeniero civil con estudios de posgrado en estructuras
- ✓ Ingeniero civil con estudios de posgrado en vías
- ✓ Ingeniero ambiental o sanitario y ambiental o civil con estudios de postgrado en el área ambiental.
- ✓ Profesional área social/Trabajador social o sociólogo
- ✓ Profesional en SG-SST / Profesional en SG-SST, o Profesionales con estudios de posgrados en SG-SST o QHSE, con licencia en SST vigente, y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.

- ✓ Comisión de Topografía
- ✓ Oficiales
- ✓ Controladores viales
- ✓ Mano de obra no calificada

6. SECTOR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo a la magnitud del proyecto, a la clasificación por su sector e impacto ambiental, se clasifica de la siguiente manera:

Tipo de Proyecto	Placa huella
Proyecto Tipo II	Elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico reforzado, dispuesto en dos placas separadas por piedra pegada (concreto ciclópeo), de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y espesores indicados los diseños
Tipo de impacto ambiental	Impacto Moderado – la afectación ambiental no trasciende el área de influencia directa de la obra. Con la implementación de medidas de manejo incluidas en este Plan de Gestión integral de Obra, se puede prevenir, mitigar, controlar o compensar los impactos identificados.

7. COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL

El Plan de Gestión Social desarrolla un proceso de información y participación comunitaria con la población directamente relacionada con el proyecto de **"CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"**, sobre el inicio, avance de las obras y la operación, lo que permite contribuir a prevenir, mitigar y/o

compensar los impactos negativos y potenciar los positivos, derivados de la ejecución de la obra.

En las comunidades el concepto "intervención y/o gestión social" adquiere múltiples sentidos ya que toda obra que realiza el estado tiene un sentido social, porque busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan y laboran en ella.

De igual forma los planes de gestión social pretenden la creación de empleos, el cooperativismo y empoderamiento de las comunidades, esto implica como primera medida hacer a la población participe directa en los procesos que se llevarán a cabo por la entidad contratista haciendo uso del recurso legal de participación ciudadana; el proceso de comunicación entre diversos actores sociales que buscan transformar mediante acciones concretas una relación socio-ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

7.1. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.

Durante el periodo de 23/04/2023 al 22/05/2023 se realizó la actividad de información y divulgación a la comunidad haciendo entrega de volantes informativos por medio de visitas domiciliarias a cada una de estas familias usuarias del proyecto Construcción de la Placa Huella en el corregimiento de Maracayo de Montería Córdoba, explicando objetivos del proyecto, actividades principales a ejecutar, beneficios, esta actividad se realizó atención a la comunidad despejando dudas, inquietudes por parte de la trabajadora social hacia la comunidad sobre el tema ejecución y evolución de la obra . También se entregó por parte de gestión social capacitación vial a todos los usuarios y peatones del corregimiento de Maracayo haciendo énfasis en una capacitación personalizada a cada uno de estas familias y personas peatonales que se encontraban transitando por la vía, instruyendo a cada una de estas personas para prevenir accidentes viales durante la ejecución del proyecto, se resaltó el tema "debes tener mucha precaución con los niños, evita accidentes, hay máquinas pesadas trabajando en la vía. Ver anexos GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6, GS7, GS8, GS9, GS10, GS11 Y GS12.

7.1.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

% linformación de la población del área de influencia y conocimiento de las estrategias divulgativas	Número de volantes informativos entregados a la comunidad. Reunión informativa toma PARE y SIGA, respeto a estas señales de tránsito dúrante la ejecución de la obra, avance de obra. Solicitudes de permisos para intervenir	51	52%

	en algunos taludes Plazo provisional del puente.		
	Número de personas convocadas	98	
Análisis de indicador: Se realizó entrega de volantes informativos, reunión convocada por parte de la trabajadora social informativa PARE y SIGA avance de obra al cual asistieron aproximadamente el 58 % de la población convocada.			

7.2. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

✓ Durante el período se contó con el acompañamiento de los Veedores y la Comunidad en las reuniones de información PARE y SIGA, solicitud de permiso para intervenir en algunos taludes avance de obra.

7.2.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

% Indicador de cumplimiento de talleres programados	Número de talleres dictados	51	92%
	Número de talleres previstos	55	
Análisis de indicador: Hasta el momento se han realizado entregado 51 volantes informativos. **Ver anexo G5.** Entrega de Volantes.			
% personas participantes de los talleres programados	Número de personas que asisten	98	98%
	Número de personas invitadas a las reuniones	100	
Análisis de indicador: Se contó con una participación activa y positiva por parte de la comunidad **Ver Anexo G5 Y G5.** Actas de reunión con la comunidad. PARE y SIGA avance de obra.			
% Indicador de porcentaje de quejas y reclamos solucionados	Número de quejas y reclamos solucionados	0	0%
	Número de quejas y reclamos recibidos	0	
Análisis de indicador: No se recibieron quejas y reclamos oficiales durante el periodo. Ver anexo G52			

7.3. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

7.3.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

% Indicador de porcentaje de mano de obra no calificada contratada	Número de empleos no calificados locales	53	100%
	Número de empleos no calificados totales		

Análisis de indicador: Toda la mano de obra no calificada contratada es de origen local. Provenientes del área de Maracayo.

8. COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL.

En la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales del proyecto se encuentra detallada cada una de las actividades que podrían producir un impacto, el tipo de impacto, el nivel de importancia y las herramientas que se tienen para identificar y tener control de cada uno de estos aspectos, por lo tanto, se muestra en la siguiente tabla los aspectos más relevantes de la matriz de aspectos e impactos ambientales contenida en los anexos del PGIO inicial.

COMPONENTE AMBIENTAL	ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE A PRODUCIR IMPACTO	TIPO DE IMPACTO	NIVEL DE IMPORTANCIA	CONTROL OPERACIONAL
AGUA	Excavación en material común de la explanación y canales.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (material seleccionado).	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Subbase granular clase C.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

	Terraplén.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Geotextil para estabilización de la subrasante y capas granulares.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
COMPONENTE AMBIENTAL	**ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE A PRODUCIR IMPACTO**	**TIPO DE IMPACTO**	**NIVEL DE IMPORTANCIA**	**CONTROL OPERACIONAL**
	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavación en material común de la explanación y canales.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavaciones varias en material común bajo agua (a máquina).	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (tipo piedra rajón o similar).	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Concreto resistencia 14 Mpa (F) (solado).	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Pilotes en concreto de 28 mpa vaciado	Alteración del nivel freático y	MODERADO	Por medio de los formatos asignados,
COMPONENTE AMBIENTAL	**ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE A PRODUCIR IMPACTO**	**TIPO DE IMPACTO**	**NIVEL DE IMPORTANCIA**	**CONTROL OPERACIONAL**
	in situ incluye perforación diámetro de 1.0 ms y refuerzo de acero.	recarga.		inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavación en material común de la explanación y canales.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavación en material común de la explanación y canales.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavación manual.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (material seleccionado).	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
Subbase granular clase C.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
Terraplén.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
Excavación manual.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

COMPONENTE AMBIENTAL	ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE APRODUCIR IMPACTO	TIPO DE IMPACTO	NIVEL DE IMPORTANCIA	CONTROL OPERACIONAL
	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavación en material común de la explanación y canales.	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

	Excavaciones varias en material común bajo agua (a máquina).	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (tipo piedra rajón o similar).	Alteración del nivel freático y recarga.	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
AIRE	Excavación e nmaterial común de la explanación y canales.	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavación manual.	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Demolición d eestructuras.	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo.	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Mejoramiento de la subrasante co n adición de	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo,
COMPONENTE AMBIENTAL	**ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE APRODUCIR IMPACTO**	**TIPO DE IMPACTO**	**NIVEL DE IMPORTANCIA**	**CONTROL OPERACIONAL**

	materiales (material seleccionado).			verificación de la documentación legal.
	Subbase granular clase C.	Emisión de material particulado	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Terraplén.	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Concreto resistencia 21mpa (D) elaborado en sitio.	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Concreta resistencia 21mpa (D) para viga riostra.	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Concreto resistencia 14 mpa clase G (para piedr apegada).	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Concreto resistencia 14mpa (F) (solado).	Emisión de material particulado.	IRRELEVANTE	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavación e n material común de la explanación y canales.	Generación de ruido por utilización de equipo o maquinaria	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

	Excavación manual	Generación de ruido por utilización de equipo o maquinaria	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Demolición de estructuras.	Generación de ruido por	MODERADO	Por medio de los formatos asignados,
COMPONENTE AMBIENTAL	**ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE APRODUCIR IMPACTO**	**TIPO DE IMPACTO**	**NIVEL DE IMPORTANCIA**	**CONTROL OPERACIONAL**
		utilización de equipo o maquinaria		inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo.	Generación de ruido por utilización de equipo o maquinaria	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (material seleccionado).	Generación de ruido por utilización de equipo o maquinaria	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Subbase granular clase C.	Generación de ruido por utilización de equipo o maquinaria	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Terraplén.	Generación de ruido por utilización de equipo o maquinaria	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA "PGIO 06"

	Concreto resistencia 21mpa (D) elaborado en sitio.	Generación de ruido por utilización de equipo o maquinaria	MODERADO	Por medio de los formatos asignadcs, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
SUELO	Excavación en material común de la explanación y canales.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA (DISMINUCIÓN EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Demolición de estructuras.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
COMPONENTE AMBIENTAL	**ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE APRODUCIR IMPACTO**	**TIPO DE IMPACTO**	**NIVEL DE IMPORTANCIA**	**CONTROL OPERACIONAL**
		(DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO		
	Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (material seleccionado).	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Subbase granular clase C.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Terraplén.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Geotextil para estabilización de la subrasante y capasgranulares.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Rellenos para estructuras con	AFECTACIÓN Y/O	MODERADO	Por medio de los formatos asignados,

COMPONENTE AMBIENTAL	ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE A PRODUCIR IMPACTO	TIPO DE IMPACTO	NIVEL DE IMPORTANCIA	CONTROL OPERACIONAL

	material granular tipo SBG.	DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO		inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavación en material común de la explanación y canales.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavaciones varias en material común bajo agua (a máquina).	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (tipo piedra rajón o similar).	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
COMPONENTE AMBIENTAL	**ACTIVIDAD SUSCEPTIBLE A PRODUCIR IMPACTO**	**TIPO DE IMPACTO**	**NIVEL DE IMPORTANCIA**	**CONTROL OPERACIONAL**
		DEL SUELO		
	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Pilotes en concreto de 28 mpa vaciado in situ incluye perforación diámetro de 1.0 ms y refuerzo de acero.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.
	Excavación en material común de la explanación y canales.	AFECTACIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE LA CAPA ORGANICA (DISMINUCION EN LA CALIDAD DEL SUELO	MODERADO	Por medio de los formatos asignados, inspecciones en campo, verificación de la documentación legal.

Las actividades que son necesarias llevar a cabo implican impactos al medio ambiente por lo cual se define el nivel de importancia, en el resumen de la matriz

de impactos ambientales se quiso resaltar que existen muchas actividades con nivel de importancia moderada lo que implica que se debe tener un estricto control en el momento que se estén realizando las distintas actividades para no afectar los diferentes componentes ambientales presentes en la ejecución del proyecto.

8.1. SEGUIMIENTO DE FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

8.1.1. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS ASPECTOS FÍSICOS

Al momento de realizar el seguimiento ambiental al proyecto es importante resaltar que todos los procesos tienen como base un marco legal existente con el cual se siguen los lineamientos ambientales establecidos por las leyes colombianas, también se utiliza la base científica con la cual se puede por medio de mediciones determinar afectaciones al medio ambiente, el aspecto de seguridad en el trabajo ayuda en gran medida a reforzar los controles ambientales que se deben llevar a cabo ya que contempla distintos tipos de señalizaciones y controles para evitar vertimientos, emisiones o residuos con una mala disposición final, a continuación, se realiza el seguimiento ambiental al contrato "LP- SPM-012-2022, pactado entre el CONSTRUCCIONES AP

S.A.S con NIT: 890940910-1 y el Municipio de Montería, para la ejecución del proyecto de obra, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

8.1.2. FICHA – B1 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

En el proyecto es fundamental el uso de maquinarias y equipos para realizar las actividades contempladas en la construcción de la placahuella tanto en el transporte de materiales, residuos de excavación y escombros, como también en las maquinas utilizadas en cada una de las etapas del proyecto tales como excavaciones, mejoramientos de subrasante, conformación de subbase granular,

construcción de la estructura de placa huella y construcción de boxculverts , en este proceso interviene retroexcavadora, motoniveladora, vibro compactador, mini cargador entre otros, por esta razón se debe tener mucho cuidado con los vertimientos y emisiones que puedan generar cada una de las máquinas y equipos, por lo tanto es importante verificar la papelería vigente y también realizar las respectivas inspecciones para comprobar el estado de la maquinaria. En el corte actual se relacionan los formatos necesarios para verificar el control y estado de la maquinaria y equipos.

Formatos para verificar la ficha: ***formato 6.*** *manejo de maquinaria, equipos y transporte,* ***formato 7.*** *manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.*

8.1.3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

% de vehículos con documentación obligatoria vigente	Número de vehículos con documentación Obligatoria	5	71.42%
	Número total de vehículos	7	
Análisis de indicador: No se ha presentado toda la documentación de los vehículos			

% de mantenimientos realizados	Número de mantenimientos realizados	1	100%
	Número de mantenimientos programados	1	
Análisis de indicador: Se realizaron los mantenimientos programados para este periodo.			

8.1.4. FICHA – B2 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

Una de las actividades más relevantes que se llevara a cabo en la construcción de la placahuella son las excavaciones, en toda la longitud se debe excavar en promedio 0.6 m y en algunos puntos esta profundidad aumentara ya que en la zona por presentar cercanías con la Ciénaga de Betancí presenta suelos lacustres por tal razón se cuentan con niveles freáticos altos y suelos arcillosos por lo cual

se debe garantizar la capacidad portante de la subrasante realizando los diversos tipos de mejoramientos para tal fin, es relevante resaltar que se está haciendo una afectación directa al suelo y que esto podría tener alguna consecuencia ambiental pero al observar el tipo de suelo se puede observar que por ser una vía de más de 50 años ha sido objeto de procesos como compactación y conformación de bancada por lo cual el suelo ya presenta intervención antrópica por lo tanto por esta razón se garantiza que no se va a hacer afectación a fuentes de agua, flora o fauna local. El seguimiento en esta ficha se verificará con los siguientes formatos:

Formatos para verificar la ficha: ***formato 2.*** *manejo y disposición de desechos de construcción,* ***formato 3.*** *control de escombros producidos,* ***formato 4.*** *almacenamiento y manejo de materiales de construcción,* ***formato 5*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 9.*** *señalización.*

8.1.5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO MANEJO DE DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

% de agregado sobrante reutilizado	Metros cúbicos de material de agregado sobrante reutilizado	650	4.94%
	Total volumen de agregado Sobrante	13156	
Análisis de indicador: De acuerdo a las excavaciones realizadas se ha utilizado el material de corte en los desvíos provisionales para la construcción de las obras hidráulicas			

% de material de dispuesto adecuadamente	Metros cúbicos de material dispuesto adecuadamente	1432,79	100%
	Total volumen material generado	1432,79	
Análisis de indicador: Se entrego el material a la comunidad			

8.1.6. FICHA - B3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El manejo y disposición final de los residuos de excavación y demolición es muy importante ya que si estos residuos se disponen de manera inadecuada puede

hacer afectaciones directas al suelo y al agua, es por esta razón que se solicitó a la alcaldía de Montería (ver anexo GA16) indicar en qué lugar se puede dar disposición final a estos residuos, el seguimiento de esta ficha se hace con los formatos:

Formatos para verificar la ficha: ***formato 2.*** *manejo y disposición de desechos de construcción.* ***formato 3.*** *control de escombros producidos.* ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales.* ***formato 8.*** *aseo de la obra.* ***formato 9.*** *señalización.*

8.1.7. SEGUIMIENTO Y MONITOREO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

% de escombros donados	Cantidad de escombros donados a la comunidad	0	0%
	Cantidad de escombros generados en el mes	0	
Análisis de indicador: No se han iniciado actividades que incluyan demolición y generación de escombros			

% de escombros reutilizados	Cantidad de escombro Reutilizados	0	0%
	Cantidad de escombro generados en el mes	0	
Análisis de indicador: Análisis de indicador: No se han iniciado actividades que incluyan demolición y generación de escombros			

8.1.8. FICHA – B4 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

En esta ficha se busca conocer el alcance que va a tener el campamento, el área que se va a utilizar, su ubicación en el proyecto, la maquinaria y materiales que serán almacenados, por lo tanto se recomienda que en el sitio del campamento se cumplan con los estándares de calidad solicitados como limpieza, extintor, verificación que las máquinas y equipos no presentes fugas que puedan causar

vertimientos en el suelo, también es necesario que el campamento cuente con la señalización adecuada , se realizara el seguimiento de acuerdo a :

Formatos para verificar la ficha: *formato 1. requerimientos ambientales preliminares, formato 3. control de escombros producidos, formato 4. almacenamiento y manejo de materiales de construcción, formato 5. manejo de campamentos e instalaciones temporales, formato 8. aseo de la obra, formato 9. señalización.*

8.1.9. FICHA – BS 5 Y MANEJO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En el tiempo proyectado para la ejecución del proyecto se realizara constantemente el ingreso de materiales de construcción como subbase granular, concreto prefabricado, cemento, arena, grava, acero, entre otros para esto es importante cumplir con todos los estándares de calidad para prevenir vertimientos, emisiones o mala disposición final de algún elemento derivado del material de construcción, por esta razón se es muy estricto al momento de realizar las inspecciones correspondientes para verificar si existe alguna anomalía en el proceso, se hará el seguimiento de acuerdo a los siguientes formatos :

Formatos para verificar la ficha: *formato 4. almacenamiento y manejo de materiales de construcción, formato 5. manejo de campamentos e instalaciones temporales, formato 9. señalización.*

8.1.10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAELES PARA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

% de material adquirido en	Metros cúbicos de agregados adquiridos en canteras certificadas	7268	

cateras certificadas	Metros cúbicos de material total utilizado en obra)	4026.35	55.39 %
Análisis de indicador:			

8.1.11. FICHA – B6 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Se debe garantizar que el agua propia de las precipitaciones o en llegados casos la utilizada para la realización de trabajos al momento de formar escorrentia no arrastre consigo partículas o vertimientos que podrían terminar en alguna de las fuentes de aguas que conforman la microcuenca presente en el área del proyecto, para esto se debe garantizar inspecciones diarias a cada uno de los equipos y máquinas y así mismo a los materiales, residuos de construcción y posibles residuos generados por el personal vinculado al proyecto y/o las personas que transitan a diario por el área de influencia, garantizando con esto que se está dando un correcto manejo a las aguas superficiales , los seguimientos se reportan en :

Formatos para verificar la ficha: ***formato 8. aseo de la obra, formato 9. Señalización, formato 10.***
manejo de aguas superficiales.

8.1.12. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

% de sumideros aseados	Número de sumidéros aseados	0	0%
	Número total de sumideros contaminados por acción de la Obra	0	
Análisis de indicador: No existen sumideros en el área del proyecto			

% volumen de agua utilizada en obra	Metros cúbicos de agua potable utilizada en obra mes actual	0	0%
	Metros cúbicos de agua potable utilizada en obra mes anterior	0	

Análisis de indicador: no se ha utilizado agua del acueducto local

8.1.13. FICHA – B7 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se debe tener control diario de las posibles fugas de combustible o aceites provenientes de la maquinaria o equipos presentes en la obra, por otra parte, si se va a almacenar en obra algún tipo de sustancia química, aceite o combustible se debe etiquetar indicando el tipo de sustancia que contiene el recipiente, por otro lado se debe verificar que el recipiente cumple con los estándares de calidad para contener dicha sustancia y por ultimo verificar que no se presenten fugas , hasta el momento para este corte no ha presencia de residuos líquidos en la obra, se realiza la verificación de acuerdo a:

Formatos para verificar la ficha: ***formato 5. manejo de campamentos e instalaciones temporales, formato 6. manejo de maquinaria, equipos y transporte, formato 7. manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas, formato 8. aseo de la obra, formato 9. señalización.***

8.1.14. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

% unidades sanitarias en obra	Número de unidades sanitarias presentes en obra	0	0%
	Número total teórico de unidades sanitarias presentes en obra	0	
Análisis de indicador: Aun no se ha montado el campamento y no hay en obra baños portátiles			

% Indicador de disposición final de residuos sólidos	Cantidad (Kg) de residuos sólidos peligrosos dispuestos a través de ente gestor autorizado	0	0%

peligrosos	Cantidad (Kg) de residuos sólidos peligrosos generados	0	
Análisis de indicador: No se han generado residuos sólidos peligrosos			

% Indicador de disposición final de residuos liquidos peligrosos	Cantidad (Kg) de residuos liquidos peligrosos dispuestos a través de ente gestor autorizado	0	0%
	Cantidad (Kg) de residuos liquidos peligrosos generados	0	
Análisis de indicador: No se han generado residuos liquidos peligrosos			

% Indicador de derrames de residuos liquidos reportados en obra	Numero de derrames reportados con residuos liquidos dentro de la obra	0	0%
		0	
Análisis de indicador: No se han reportado derrames			

8.1.15. FICHA – B8 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Las afectaciones que se pueden presentar directamente al aire pueden provenir de una maquina o equipo por un aumento en las emisiones, el transporte de materiales sin el cubrimiento adecuado,material almacenado sin el recubrimiento, material particulado en el ambiente debido a residuos limosos en la obra por falta de limpieza, por otro lado también se presenta ruido el cual puede ser molesto para las personas que viven en el área de influencia al proyecto es importante medir constantemente la cantidad de decibeles que emiten las máquinas y equipos y determinar si se encuentran en el rango que permite la norma, para este periodo no se han reportado ni evidenciado afectaciones en este aspecto, el seguimiento se realiza de acuerdo a :

Formatos para verificar la ficha: *formato 2. manejo y disposición de desechos de construcción, **formato 3.** control de escombros producidos, **formato 4.** almacenamiento y manejo de materiales de construcción, **formato 5.** manejo de campamentos e instalaciones temporales, **formato 6.** manejo de maquinaria, equipos y transporte, **formato 7.** manejo de residuos liquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas, **formato 8.** aseo de la obra, formato 9. señalización.*

8.1.16. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Indicador de porcentaje gestión de actividades emisoras de gas y ruido	Número de actividades programada gestión de emisión de gases y ruido	0	0%
	Número de actividades ejecutadas relacionadas con emisión de gases y ruido	0	
Análisis de indicador: No se han registrado actividades de este tipo			

8.1.17. FICHA - B9. MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

Se debe garantizar que se va a dar una correcta disposición final a cana uno de los escombros provenientes de las demoliciones de los boxculverts que serán reemplazados por los especificadosen los diseños, para esto se realizó comunicado a la alcaldía pidiendo la ubicación del sitio en donde se va a dar disposición final de estos escombros por lo tanto se está a la espera de la respuesta por parte de la alcaldía de Montería, los seguimientos se realizaran de la siguiente manera:

Formatos para verificar la ficha: ***formato 2.*** *manejo y disposición de desechos de construcción,* ***formato 3.*** *control de escombros producidos,* ***formato 4.*** *almacenamiento y manejo de materiales de construcción,* ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 7.*** *manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas,* ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 9.*** *señalización.*

8.1.18. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

Indicador de puntosecológicos	Número de puntos ecológicos en obra	1	33.33%
	Puntos ecológicos necesarios	3	
Analisis de indicador: Se instalo un punto ecológico			

8.1.19. FICHA – B10. MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

En el área de influencia del proyecto hay presencia de dos redes de acueducto en tubería de 4", una de ellas alimenta el tanque de almacenamiento y la otra distribuye a domiciliarias de fincas y casas colindantes. En algunos tramos a intervenir, dichas redes se encuentran debajo de la banca, por lo que consideramos fundamental el traslado de estas redes a borde de vía, previendo futuras reparaciones que no podrían realizarse o que obligarían a la demolición de la placa huella.

En los otros tramos, no se tiene previsto que alguna red de servicio público sea afectada por el desarrollo de la obra, por esta razón se proyecta ubicar los residuos, materiales, maquinarias, campamentos, entre otros elementos que puedan hacer afectaciones a estas redes, alejados de éstas, para que no tengan contacto con estos elementos. Se debe llevar la verificación y cumplimiento de acuerdo a:

Formatos para verificar la ficha: ***formato 3.*** *control de escombros producidos,* ***formato 4.*** *almacenamiento y manejo de materiales de construcción,* ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 7.*** *manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas,* ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 9.*** *Señalización,* ***formato 10.*** *manejo de aguas superficiales.*

8.1.20. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AISLAMIENTO DE LA OBRA

% porcentaje de intervenciones a redes	Número de daños sobre redes o ductos subterráneos	0	0%
	Número de excavaciones sobre redes y ductos subterráneos	0	
Análisis de indicador: No se presentaron daños sobre redes o ductos subtarreaneos durante este periodo			

% porcentaje de suspensión de servicios públicos	Número de veces que se suspendió el servicio	0	0%
	Número de daños sobre redes o ductos subterráneos	0	
Análisis de indicador: No se presentaron suspensiones de servicios públicos durante este periodo			

8.1.21. FICHA – B11. AISLAMIENTO DE LA OBRA

Se debe recordar que para personas ajenas a la obra se debe garantizar un aislamiento de la obra, ya que por ser una actividad relacionada con la construcción tiene alto riesgos de que se puedan presentar accidentes o incidentes relacionado con las actividades propias del proyecto. por esto es importante garantizar los cerramientos, señalizaciones, pasos peatonales, paleteros y toda la información posible y pertinente para disminuir al máximo el contacto de personas ajenas al proyecto al momento de estar realizando labores especialmente con la maquinaria pesada, el seguimiento se debe realizar verificando:

Formatos para verificar la ficha: ***formato 4.*** *almacenamiento y manejo de materiales de construcción,* ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 9.*** *señalización.*

8.1.22. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AISLAMIENTO DE LA OBRA

Indicador de material para cerramiento perimetral	Metros lineales de tela polipropileno verde, malla fina azul y/o malla naranja instalados en el mes	100	100%
	Metros esperados	100	
Análisis de indicador: No se ha realizado la instalación de este material durante el periodo.			

Indicador de material para delimitación de senderos peatonales	Metros lineales de cinta de seguridad instalados en el mes	450	100%
	Metros esperados	450	
Análisis de indicador: No se reportan la instalación de estos cerramientos.			

8.1.23. FICHA – B12. MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN

En el lugar que se va a realizar la construcción de la placahuella no se reporta patrimonio arqueológico e histórico de la nación, sin embargo, en caso de que se llegara a presentar algún hallazgo, se informara de manera oportuna al ente territorial para que se tomen las medidas necesarias para dar protección al patrimonio. En el momento existe un

Formatos para verificar la ficha: ***formato 3****, control de escombros producidos,* ***formato 5****, manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 6****. manejo de maquinaria, equipos y transporte,* ***formato 7****. manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicos,* ***formato 9****, señalización.*

8.1.24. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN

Indicador de hallazgos arqueológicos	Número de hallazgos arqueológicos encontrados	0	0%
		0	
Análisis de indicador: Actualmente se solicitó a la autoridad competente acerca de la existencia de puntos arqueológicos en el proyecto.			

8.1.25. FICHA – B13. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL

Se debe garantizar una charla relacionada con temas ambientales al personal adscrito al proyecto por cada corte, para este periodo no se realizaron charlas.

Formatos para verificar la ficha: ***formato 3****, control de escombros producidos,* ***formato 5****, manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 8****, aseo de la obra,* ***formato 11****, manejo de lavegetación*

8.1.26. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN

% de trabajadores capacitados	Número de trabajadores del proyecto capacitados.	20	100%
	Número de trabajadores de todo el proyecto	20	
Análisis de indicador: Todos el personal del proyecto fue capacitado en este periodo.			

% de capacitaciones desarrolladas	Número de capacitaciones desarrolladas en el mes	1	100%
	Número de capacitaciones programadas para el mes	1	
Análisis de indicador: Se cumplio con la meta de la capacitación al personal de campo.			

8.1.27. .FICHA – C1. ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES

8.1.28. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES

% de individuos eliminados	Número de individuos eliminados	0	

	Número de individuos a eliminar según diseño	0	0%
Análisis de indicador: No ha sido necesaria la tala de arboles			

% de volumen de material vegetal obtenido	Volumen real de madera obtenido por la actividad	0	0%
	Volumen de madera estimado en inventario para la actividad	0	
Análisis de indicador: No ha sido necesaria la tala de arboles			

% de individuos tratados adecuadamente	Numero de individuos tratados adecuadamente	0	0%
	Número de individuos afectados;	0	
Análisis de indicador: No ha sido necesaria la tala de arboles			

9. CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES

En el tiempo de ejecución del contrato se debe contar con la documentación de regla respecto a los materiales pétreos, botaderos, permisos de ocupación de cauce y la adquisición del agua que se utilizará en las distintas actividades del proyecto:

Agregados pétreos (Cantera)	• Se ha utilizado piedra y material de relleno general.
Escombrera-botadero	• Se concertó con los gestores ambientales doñar el material a la comunidad de la vereda Maracayo para realizar llenos y mejoras en los lugares públicos y vías aledañas
Permiso ocupación de Cauce	• Otorgado por la autoridad ambiental competente CVS (ver anexo)

Adquisición del agua	• Se realizará por medio del acueducto local de la vereda Maracayo, se está en trámite con la comunidad para lograr un acuerdo.

10. COMPONENTE DE CALIDAD DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un Plazo de ejecución de 6 meses a partir del 22 de septiembre de 2022.
El 29 de diciembre de 2022 se levantó Acta de Suspensión 01, debido básicamente a la existencia del acueducto veredal, cuya red se encontró por debajo de la banca a lo largo de la vía objeto del Proyecto y en condiciones muy deterioradas, motivo por el cual no se podia continuar con las actividades y la ejecución de obra, hasta no definir que se haría con dichas redes.
Una vez presentada a la Entidad la solicitud de la construcción de un acueducto nuevo, y una vez presentados los estudios, diseños, presupuesto y reprogramación, se procedió con el Acta de Reinicio con fecha marzo 10 de 2023, quedando así la fecha de entrega para el 3 de junio del año 2023.

Durante el periodo abril 22 a mayo 21 del 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
- CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE RELLENO GENERAL
- COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CLASE C
- FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA PLACA HUELLA
- VACIADO CONCRETOS PLACA HUELLA (PLACA RIGIDA, CONCRETO CICLOPEO, VIGA RIOSTRA Y BERMA CUNETA)
- FIGURACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES PUENTE (20 UN)
- FIGURACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES BOX COULVERT
- CONFORMACION DE PASO PROVISIONAL PARA CONSTRUCCIÓN PUENTE
- CONFORMACION PASOS PROVISIONALES PARA CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT

El material proveniente de las excavaciones fue depositado en los sitios donde se construirán las obras de drenaje – puente y box coulvert, para ser utilizado en los pasos provisionales a conformar mientras se ejecutan las obras.

Las muestras de concreto de los diferentes vaciados, han sido tomadas cuando la interventoria lo ha solicitado y por cada 50 metros lineales de placa se están elaborando 2 cilindros de concreto para envio a laboratorio al ensayo de compresión simple. Los cilindros se desencofran al siguiente dia de vaciado y son trasladados a la alberca para mantenerlos saturados dentro del agua y posteriormente se transportan en guacales en madera hasta entrega al laboratorio.
Para el curado de los concretos, se realiza humectación a los elementos vaciados tres veces al día (mañana, medio dia y finalizando la tarde) para garantizar así que las placas vaciadas adquieran pronto la resistencia de diseño requerida.

A continuación, se relacionan las muestras tomadas durante el periodo:

RESISTENCIA DE CILINDROS DE CONCRETO

CÓDIGO: FO-0143
VERSIÓN: 05
FECHA VIGENCIA: 2020-04-01

Obra: 312 MAGANGUE - MONTELIBA

FECHA DE FABRICACIÓN	CILINDRO No.	FECHA DE FALLADO	EDAD (DIAS)	RESISTENCIA (KG/CM2) Planificada	RESISTENCIA (KG/CM2) Obtenida	ASENTAMIENTO (CM) Especificado	ASENTAMIENTO (CM) Obtenido	ESTRUCTURA Ubicación o Descripción	OBSERVACIONES
11/05/2023	N26			21 Mpa			7,0	Berma Cuneta Izq km 2+295 a 2+315	
12/05/2023	N27			21 Mpa			7,5	Placa reforzada, Berma cuneta y Viga Rodra. Izq	Km 2+230 a Km 2+280
13/05/2023	N28			14 Mpa			7,0	Cunetas km 2+230 a 2+280 Placa media	
17/05/2023	N29			21 Mpa			7,5	Placa reforzada, Berma cuneta y Viga Rodra. Izq	Km 2+720 a Km 2+770

Elaboró: Margarita Mejia Fecha: 24/05/2023

Igualmente, se realizaron ensayos de toma de densidades tanto a terraplenes como a la subbase colocada.

10.1. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Al cierre de este informe no se han presentado NO CONFORMIDADES.

11. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

11.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El proyecto cuenta con una Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que permite identificar todos los peligros asociados a las actividades ejecutadas en cada etapa desarrollada. La valoración de riesgos está basada en la metodología establecida en la Guía Técnica Colombiana 45 – "GTC 45".

Los peligros identificados en las actividades preliminares son los siguientes:

ACTIVIDAD	TAREA	RUTINARIA		PELIGRO	
		SI	NO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
Trabajo de oficina	Elaboración de informes	x		Alta concentración de la tarea	Psicosocial
				Tareas repetitivas	
				Trabajo bajo presión	
				Eléctrico, exposición a baja tención	Condiciones de seguridad
				Trabajo sentado	Biomecánico
				Postura prolongada	
				Esfuerzo visual	Físico

				Radiaciones no ionizantes	
				Deficiencia de iluminación	
	Labores de aseo		x	Bacterias	Biológico
Trabajo de campo	Levantamiento Topográfico			Temperaturas extremas (Calor)	Físico
				Sobrecarga de trabajo, Altos Ritmos de Trabajo	Psicosocial
				Bacterias, picaduras	Biológico
			x	Movimientos repetitivos (Extremidades superiores e inferiores)	Biomecánico
				Caída por superficies de trabajo irregular, orden y aseo	Mecánico
				Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	Fenómenos naturales
				Polvos orgánicos	Químico
	Peligros del sector			Accidentes de tránsito por atropellamiento	Accidente de tránsito
			x	Acumulación de basuras	Ambiental
				Agresividad de personas del sector	

				Robos	Públicos
				Alteración del orden público	
Nivelación del terreno	Manejo de maquinaria pesada	x		Accidente mecánico	Mecánico
				Postura prolongada	Biomecánico
				Exposición a altas temperaturas	Físico
				Caida a distinto nivel	Físico
Instalación De Placa Huella	Colocación de rieles	x		Caído al mismo nivel	Mecánico
				Atrapamiento por aseguramiento de rieles	Mecánico
				Temperaturas extremas (Calor)	Físico
				Sobrecarga de trabajo, Altos Ritmos de Trabajo	Psicosocial
				Bacterias, picaduras	Biológico
	Instalación de Concreto			Contacto con mezclas	Químico
				Caído al mismo nivel	Mecánico
				Atrapamiento por aseguramiento de rieles	Mecánico
				Temperaturas extremas (Calor)	Físico
				Sobrecarga de trabajo Altos	Psicosocial

				Ritmos de Trabajo	
				Bacterias, picaduras	Biológico

11.2. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES.

Durante este período no se levantaron campamentos ni instalaciones temporales.

11.3. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE.

Se registra mantenimiento e inspecciones preoperacionales realizadas a la siguiente maquinaria pesada:

- ✓ MINICARGADOR
- ✓ MOTONIVELADORA
- ✓ VIBRO CAT 7 TON
- ✓ RETROEXCAVADORA
- ✓ EXCAVADORA ORUGA

Ver Anexos SGGST 1. Documentos de máquinas, mantenimientos e inspecciones.

11.4. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES.

Durante este período se realizaron capacitaciones al personal de los siguientes temas:

- Importancia del uso del casco
- Puntualidad en el trabajo
- Incidentes laborales
- Caidad al mismo nivel
- Cuidado al medio ambiente.
- Actos inseguros
- Riesgo químicos.
- Higiene laboral.
- Pausas activas
- Incapacidades laborales.
- Actitud positiva.

Ver Anexos SGGST 2. Registro de capacitaciones

11.5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se realizó entrega de elementos de protección personal al personal operativo.
Ver Anexos SGGST 3. Entrega de EPP

11.6. COPASST.

Se realizó reunión de COPASST No 003.

11.7. SEGURIDAD SOCIAL.

Se relaciona en el anexo, la seguridad social del personal. Anexo SGSST 5. Planilla de seguridad social y registro de personal

11.8. EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES.

Durante este periodo no se relacionan conceptos de aptitud ocupacionales en el anexo SGSST 6. Conceptos ocupacionales, se encuentran relacionados los últimos exámenes ocupacionales reportados.

11.9. INSPECCIONES REALIZADAS

Se anexan inspecciones generales de seguridad y salud en el trabajo. Ver anexo SGSST 7. Inspección de seguridad y salud en el trabajo.

11.10. INDICADORES SGSST.

Indicador de accidentes de trabajo	Número de accidentes laborales	0	0%
	Numero de accidentes	0	
Análisis de indicador: No se registran accidentes laborales. Se registra un accidente de origen común.			

Indicador de dias perdidos por accidentes de trabajo	Número de dias perdidos por accidentes laborales	0	0%
	Numero de accidentes	0	
Análisis de indicador: No se registran accidentes laborales. Se registra un accidente de origen común.			

Indicador de dias perdidos por enfermedad profesional	Número de dias perdidos por enfermedad laboral	0	0%
	Número de dias perdidos de trabajo	0	
Análisis de indicador: No se registran dias perdidos por enfermedad laboral.			

Tasa de Accidentalidad	Número de accidentes laborales	0	0%
	Número total de Trabajadores	30	
Análisis de indicador: no se registraron accidentes laborales en el periodo.			

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

12.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL



Foto GS1. Realización de reunión informativa PARE y SIGA dirigida a la comunidad de Maracayo. Jornada Mañana **GS1**



Foto GS2. Realización de reunión informativa PARE y SIGA dirigida a la comunidad de Maracayo.



Foto GS3. Realización de reunión informativa PARE y SIGA dirigida a la comunidad de Maracayo, Jornada Tarde



Foto GS4 Realización de reunión informativa PARE y SIGA dirigida a la comunidad de Maracayo. Jornada tarde.



Foto GS5. Realización de reunión informativa PARE y SIGA dirigida a la comunidad de Maracayo.



Foto GS6. Realización de reunión informativa PARE y SIGA dirigida a la comunidad de Maracayo.



Foto GS7. Realización de reunión informativa PARE y SIGA dirigida a la comunidad de Pueblo Nuevo y barrio Chino.



Foto GS8. Realización de reunión informativa PARE y SIGA dirigida a la comunidad de Pueblo Nuevo y barrio Chino



Foto GS9. Realización de capacitación personalizada a los



Foto GS10. Realización de capacitación personalizada a los

usuarios y entrega de volante informativo seguridad vial	usuarios y entrega de volante informativo seguridad vial.
	
Foto GS11. Realización de solicitud de permiso a dueño de fincas para intervenir algunos Taludes.	**Foto GS12.** Realización de solicitud de permiso a dueños de fincas para intervenir algunos Taludes.

12.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN DE CALIDAD



Foto GC1. Paso provisional para construcción puente



Foto GC2. Excavación mecánica



Foto GC3. Vaciado concreto ciclópeo



Foto GC4. Figuración acero de refuerzo



Foto GC5. Paso Provisional para construcción puente



Foto GC6. Compactación subbase granular

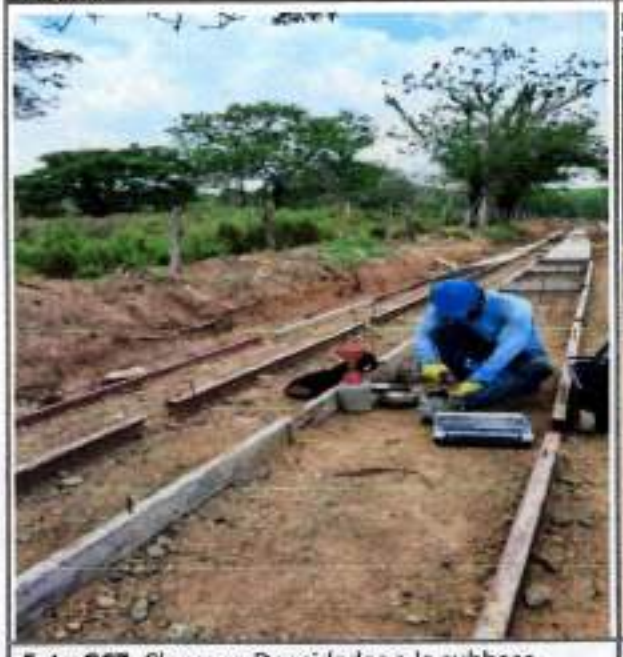


Foto GC7. Chequeo Densidades a la subbase



Foto GC8. Toma Densidades a la subbase

12.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Foto GSST1. Evidencia de barrera en zona restringida por el SGSST



Foto GSST2. Evidencia de instalación de restricciones de acceso en la vía (PMT)



Foto GSST3. Evidencia de instalación de restricciones de acceso en la vía (PMT)



Foto GSST6. Evidencia de socialización SGSST



Foto GSST7. Evidencia de realización de pausas activas



Foto GSST8. Evidencia de realización de pausas activas



Foto GSST9. Evidencia de cerramiento y protección del material.



Foto GSST10. Evidencia de uso de dotación y epps

13. APROBACIONES Y CAMBIOS

VERISÓN: 01 – Elaboración de documento
Fecha de aprobación: Mayo 22 de 2023

Elaboró:

KAREN ANETH MIRANDA ROMERO
INGENIERO AMBIENTAL

Aprobó:
Directora de obra
Contrato de obra N° LP- SPM-012-2022
CONSTRUCCIONES AP

14. ANEXOS

FORMATO 1. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PRELIMINARES

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No. LP.SPM-0.12-2022 Nombre del Contrato: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.
Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Interventor: CONSULTORES DONOVAN SAS

Valor del contrato de construcción: $9.691.701.283,00

Valor del Plan de Manejo Ambiental y de Gestión Social: $ 133.790.267,00

Fecha de inicio: 22-09-23 Fecha de terminación: 03-06-23

Licencia Ambiental: Licencias ambientales de las Canteras donde provienen los materiales pétreos.

Otros permisos: Ocupación de cause para la construcción del puente y box coulverts

Aprobación del diseño paisajistico. Fecha: ____N.A____ Acta No. ___N.A_____

Aprobación del plan de contingencias. Fecha: _____N.A___ Acta No. ____N.A____

Manejo de Escombros:

Escombrera	Localización	Licencia ambiental	Anexo Rutas transporte
Se levanto acta con los gestores ambientales de la vereda Maracayo, con lo cual se acordó entregar a la comunidad los escombros.	Plaza principal vereda maracayo	N/A	N/A

Proveedores de Materiales de Construcción:

Proveedor	Localización	Licencia ambiental	Anexo rutas transporte
Cantera la Fontana	Montería, Cordoba	RESOLUCION N°1-6511	N/A

Anexar Cronograma detallado de obra.

FORMATO 1. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PRELIMINARES

(Continuación)

CAMPAMENTOS

Tipo y número de campamentos: Campamento temporal de 600m2 de área ubicado sobre la margen izquierda de la abscisa K1+650

Direcciones: K1+650

Obtención de agua potable: Acueducto vereda maracayo

Permisos de vertimientos de aguas residuales: N/A

N°. De baños: No se evidencia N°. De baños portátiles en obra: No hay baños portátiles.

Predios a adquirir
Anexar listado, caracteristicas y costos de los predios.

Anexos:

1. Hojas de vida del residente y especialista ambiental y social de obra y de interventoria.
2. Cuadro de costos del Plan de Manejo Ambiental.
3. Plano en planta de la obra.
4. Plano de localización del proyecto.
5. Permiso de escombrera y proveedores ó en su defecto certificación de inscripción al directorio.
6. Plano con las rutas destinadas al transporte de escombros y materiales de construcción.
7. Plano de campamento.
8. Anexo fotográfico.
9. Cronograma de actividades.
10. Plan de Manejo de Tráfico, aprobación del PMT.
11. Plan de desvios, rutas y accesos temporales.
12. Planos de señalización de frentes de trabajo.
13. Diseño paisajístico.

Cargo	Profesión	Nombre	Identificación
DIRECTOR DE OBRA	Ingeniero Civil	Santiago sanchez P.	1067912244
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil	Jaiver Javier Montes Peña	1067898208
ESPECIALISTA VIAS	Ingeniero civil	Margarita mejia B.	42764982
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Ingeniero Ambiental	Karen Aneth Miranda	53139654
ESPECIALISTASG-SST	INGENIERO INDUSTRIAL	Jovana Gonzalez Mendoza	1102813446

TRABAJADORA SOCIAL	Trabajadora social	Eliana Patricia Flores Hernández	50934894
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Ingeniero Civil	Ivan e. Alviz González	92033432
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Ingeniero civil	Jesus Tafur A.	1102856789
INSPECTOR DEOBRA	Ingeniero civil	Pedro Arrieta	1074013639
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA	Ingeniero civil	Martin Rafael Martinez	3880125
ESPECIALISTA EN VIAS INTERVENTORIA	Ingeniero civil	Diego Ignacio MartinezM	79155597
TRABAJADORA SOCIAL INTER	Trabajadora social	Kiara B. Maza Yepez	1102581304
COORDINADOR SG-SST	Ingeniero civil	Mario Alberto Monterrosa	925344968

FORMATO 1. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES PRELIMINARES

(Continuación)

RESUMEN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Dirección punto de atención al ciudadano: Ubicado sobre el margen Izquierdo de la vía en abscisa K1+650
Tel: N/A

No. de reuniones programadas _____N.A_____ Tipo _____N.A_____

No. de volantes de inicio de obra: Se realizo entrega de volantes sobre las viviendas levantadas a lo largo del proyecto (Ver anexo social)

No. de volantes de restricción de tráfico: Se realizo entrega de volantes sobre las viviendas levantadas a lo largo del proyecto (Ver anexo social)

No. de volantes de invitación a reuniones: ___N.a_____

No. de actas de vecindad a levantar: ____0____

Especialista Ambiental Interventoría.

Karen Miranda R.
Especialista Ambiental de la Obra.

FORMATO 2. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN

N° Contrato: LP-SPM-012-2022 Contratista: CONSTRUCCIONES AP S.A.S

Mes: 05 Dirección Sitio de Disposición: Maracayo

Fecha	Placa volqueta	Volumen transportado m^3	Firma responsable de la obra	Firma de recibo	Dirección y/o teléfono
-	-	-	-	-	-

De acuerdo a las actividades realizadas en el presente periodo no se generaron residuos de escombros y tampoco se realizo corte de material a lo largo del proyecto, la empresa contratista realizo actividades de conformación de terreno para fundida de placas sobre el carril izquierdo entre abcisa K2+300 hasta k2+700

Firma Residente Interventoría

Karen Miranda R.
Firma Residente Contratista

FORMATO 3. CONTROL DE ESCOMBROS PRODUCIDOS

N° Contrato: LP-SPM-012-2022 Contratista: CONSTRUCCIONES AP S.A.S Mes: 05

Control de Escombros por ítems contractuales:

Código	Ítem	Volumen generado m³		Escombrera utilizada
		Período evaluado	Acumulado obra	
	NO SE GENERARON RCD, DURANTE EL PERIODO EN MENCION			

Control de escombros por categorías ambientales (m³):

Orgánico		Excavaciones		Demolición concretos		Demolición asfaltos		Demolición edificaciones	
Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado

Total período: ___0___ m³ Total certificado: _____0___ Diferencia m³ ____0___

De acuerdo a las actividades realizadas en el presente periodo no se generaron residuos de escombros y tampoco se realizó corte de material a lo largo del proyecto, la empresa contratista realizo actividades de conformación de terreno para fundida de placas sobre el carril izquierdo entre abscisa K2+300 hasta k2+700

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 5. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Contrato N° LP-SPM-012-202 Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes: ___05____

Tipo de campamento: Fijo: _____X_____ Móvil: _____ Dirección: K1+650

¿Cuenta con cafetería? __NO____ No. de Servicios Sanitarios: ____NO____

No. Extinguidores: ____1_____

¿Cuenta con almacenamiento de materiales de construcción? __SI_____

¿Cuenta con cuneta perimetral? ___SI__ Estado ___BIEN___ Desarenador? __NO__ Estado ____NO CUENTA

¿Trampa de grasas? __NO__ Estado ____NO CUENTA___ Separación de basuras? ___NO____

No. de canecas de basura: Orgánica: ___1____ Metales ___1____ Papel ___1____ Vidrio ____0_____

Residuos Aceitosos: Las maquinas que se encuentran en sitio de obra no presentan fugas.

Disposición de Basuras: las basuras se dispondrán en el sitio de campamento
Frecuencia de recolección: semanal

Destino del material reciclable: El material reciclable será transportado por el camion de la basura y en su lugar de disposición final es colectado por recicladores.

Servicio de Acueducto: No Energía: No Teléfonos: No Gas: No

Las aguas residuales son vertidas en: No se generan aguas residuales

¿Requiere permiso de vertimiento? No Resolución: N/A Fecha vencimiento: N/A

Notas: El campamento se encuentra sobre el margen izquierdo en la abscisa K1+650 de la vía, no se cuentan con baños y el cerramiento con lona verde

Firma Interventor Ambiental.

FORMATO 6. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista CONSTRUCCIONES AP SAS Mes 05

Relación de Vehículos en la obra

Tipo de vehículo	Placa	Modelo	Vencimiento Certificado Emisiones	Estado de llantas	Estado de luces	Estado de frenos	Alarma de reversa	Equipo de carretera
VOLQUETA	SZN 537	2011	05-02-23	BUENO	BUENO	BUENO	NO	BUENO

Mantenimiento de Equipo y Maquinaria

Equipo o maquinaria	Fecha último mantenimiento	Horas trabajadas desde último mantenimiento	Horas de trabajo en el mes	Problemas del equipo en el mes
RETROCARGADOR 555C 95HP FORD 1990	10/04/2023	30	30	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
RETROEXCAVADORA DE ORUGA 320D 155 HP CATERPILLAR 2006	10/04/2023	65	198	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
MOTONIVELADORA 120G CATERPILLAR 1986	10/04/2023	77	212	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
VIBRO COMPACTADOR CS431B/7 Ton CATERPILLAR 1990	10/04/2023	45	120	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
MINICARGADOR S570 CON BRAZO EXCAVADOR Y MARTILLO DEMOLEDOR BOBCAT 2015	10/04/2023	82	160	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
VIBROCOMPACTADOR DV26 POTENCIA 31 HP CASE 2013	10/04/2023	0	0	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE AGUA CHEVROLET 2000	10/04/2023	no	no	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido

3929

BULLDOZER D5 140 HP, 2200 RPM CATERPILLAR 2010	10/04/2023	no	no	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
CORTADORA DE PAVIMENTO 13.0 HP HONDA	10/04/2023	No	no	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
EQUIPO DE OXICORTE, CAPACIDAD DE CORTE 6" VICTOR	10/04/2023	No	no	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
COMPACTADOR (SALTARÍN) FUERZA 12 KN KAMA	10/04/2023	No	no	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
EQUIPO DE SOLDADURA 110/220 V BAUKER	10/04/2023	No	no	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
EQUIPO PINTURA (COMPRESOR) TRUPER	10/04/2023	No	no	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
COMPRESOR DE AIRE TRUPER	10/04/2023	No	no	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (TIPO RANA – 4.500 VPM) FORTE	10/04/2023	No	no	No ha presentado problemas visibles en el periodo transcurrido

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 7. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Contrato N° LP-SPM-012-2022Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes:05

Registro de derrames de sustancias químicas y residuos líquidos

Semana	Fecha	Hora	Tipo de residuo o sustancia derramada	Causa	Acción realizada
1			NO SE HA REPORTADO NI PRESENCIADO DERRAME DE ALGUNA SUSTANCIA O RESIDUOS		
2					
3					
4					
5					

Incluye cualquier sustancia líquida o sólida, acelerantes o cualquier otro aditivo químico, ligas asfálticas y residuos de concretos de las mezcladoras o aguas residuales de cabinas sanitarias.

¿Generó activación del Plan de contingencias? Hasta la fecha no se han presentado derrames

¿Se presentaron reclamaciones por parte de la comunidad? No se han presentado reclamo por parte de la comunidad.

Notas: Hasta la fecha del presente informe, no se han presentado algún tipo de fugas, por las actividades que se han desarrollado.

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 8. ASEO DE LA OBRA

Contrato N° LP-SPM-012-2022Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes:05

¿Se cuenta con una brigada de aseo por cada 1.000 m? __SI_____

¿Se cuenta con una caneca de basura cada 200 m? ___SI____

¿Se han presentado quejas de la comunidad? ___NO_____

Semana	LO 1 (70% 100%)	LO 2 (40% a < 70%)	LO 3 0 < 40%)
1		X	
2		X	
3		X	
4		X	
5		X	

El valor de LO (limpieza de obra) se calcula como sigue:

LO1: La obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

LO-2: En la obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas, colombinas y cintas desechables.

LO-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

En caso de quejas de la comunidad por basuras, se debe anexar el registro.

Firma Interventor Ambiental

2952

FORMATO 9. SEÑALIZACIÓN

Contrato _____ Contratista _____ Mes _____

Control de señalización

Semana	No. señales PMT	Preventivas	Reglamentarias	Informativas	Perímetro frente de obra	Long. cinta o malla de demarcación	Pasos peatonales (mi)	No. vallas institucionales
1	8	8	8	No	No	No	1	1
2	8	8	8	No	No	30m	1	1
3	8	8	8	No	No	no	1	1
4	8	8	8	No	No	40m	1	1
5	8	8	8	No	No	no	1	1

¿Se presentaron quejas de la comunidad? ____no____ En caso positivo, anexar los formatos.

Dificultades presentadas y diferencias con lo programado:

No se llevaron a cabo inconvenientes con relacionados con el trafico.

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 10. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Contrato N° _____ Contratista: _____ Mes: _____

Control de manejo de sumideros del sistema de alcantarillado

Semana	Frente de obra	No. de sumideros presentes	Estado	Protección y limpieza dados
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas: Por ser una via rural no hay presencia de alcantarillado ya que en las casas colindantes manejan sistemas de letrinas.

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 11. MANEJO DE LA VEGETACIÓN

Contrato N°_____ Contratista: _____ Mes: _____

INVENTARIO FORESTAL

Especie			No. Plano ubicación	Altura total (m)	DAP (m)	Volumen (m^3)	Estado fitosanitario			Tratamiento recomendado
N°	Nombre Común	Nombre Científico					B	R	M	
1	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Firma Ingeniero Forestal o Ambiental de obra

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 12. MANEJO DE LA VEGETACIÓN (2)

Contrato N° _____ Contratista: _____ Mes: _____

Control de tala

No.	Especie	Fecha de tala/poda	Productos forestales	Usos de material aprovechable
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Se extrajeron las raíces

Control de bloqueos y traslados

No.	Especie	Fecha de bloqueo	Fecha de traslado	Nueva ubicación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: N° de inventario, tratamiento dado, calidad del suelo donde se trasladó

Control de tratamiento fitosanitario árboles a permanecer

No.	Especie	Fecha	Descripción tratamiento
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: No hay previstos tratamiento fitosanitario para árboles en el proyecto, por ser vía existente no hay árboles, sin embargo, al momento de iniciar la construcción de las obras hidráulicas se debe hacer una compensación contemplada en el permiso de ocupación de cauce dado por la CVS

Karen Miranda R.
Firma Ingeniero Forestal o Ambiental de obra

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 13. SIEMBRAS COMPENSATORIAS

Contrato N° _____ Contratista: _____ Mes: _____

Control de Siembras Compensatorias

Semana	Número de individuos sembrados		Número de riegos	Fertilizaciones
	Primera vez	Por reposición		
1	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A

Problemas fitosanitarios presentados y medidas tomadas: N/A

Ubicación de las Siembras: N/A

Origen del Germoplasma: N/A

Nota: Hasta el momento no ha sido necesaria una compensación forestal ya que es una vía antigua en donde se va a construir la placa huella y no será necesario realizar tala de árboles.

Karen Pineda R.
Firma Ingeniero Forestal o Ambiental de obra

Firma Interventor Ambiental

FORMATO 5. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS Mes: Octubre

Tipo de campamento: Fijo: _X_ Móvil: __Dirección: K3+650

¿Cuenta con cafetería?: No No. de Servicios Sanitarios: 0

No. Extinguidores: 0

¿Cuenta con almacenamiento de materiales de construcción?: No

¿Cuenta con cuneta perimetral?:No Estado: N/A Desarenador?: No Estado: N/A

¿Trampa de grasas?: No Estado N/A Separación de basuras?: No

No. de canecas de basura: Orgánica: 0 Metales :0 Papel: 0 Vidrio: 0

Residuos Aceitosos: las maquinarias que se encuentran en el campamento no ha presentado fuga

Disposición de Basuras: Las basuras se dispondrán en el sitio del campamento Frecuencia de recolección: Semanal

Destino del material reciclable: El material reciclable será transportado por el camión de la basura y en su lugar de disposición final es recolectado por recicladores.

Servicio de Acueducto: No Energía: No Teléfonos: No Gas: No

Las aguas residuales son vertidas en: No se generan aguas residuales.

¿Requiere permiso de vertimiento? : No Resolución: N/A Fecha vencimiento: N/A

Notas:
El campamento se encuentra ubicado en el K1+650, aún falta que instalen el baño, los puntos ecológicos, cerramientos y señalización el estado actual se detalla en las imágenes adjuntas al informe.

_____
Firma Interventor Ambiental.

3938

Lava Costa SERVITECA

NIT: 901285308-4

Montería, 27 de Abril de 2023.

Señores:
CONSTRUCCIONES AP S.A.S.
NIT: 890940910-1

SERVITECA LAVACOSTA SAS
Con NIT: 901285308-4

CERTIFICA:

Que la maquinaria de la empresa MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS Con NIT: 073820235-9, realiza los mantenimientos preventivos con nuestra empresa periódicamente referente a cambios de aceites, cambio de filtros, engrase general, revisión de frenos y baterías, entre otros.

EQUIPOS	TIPO O MARCA	AÑO MODELO
EXCAVADORA LINKBELT 80	LINKBELT	2021
MOTONIVELADORA 120 G#1	CATERPILLAR	1984
MINICARGADOR HSL850-7	HYUNDAI	2017
RETROEXCAVADORA H940C	HYUNDAI	2013
VIBROCOMPACTADOR AMMAN ASC 100	DYNAPAC	1990

JUAN CARLOS RIVAS TORDESILLA
CC 78.689.582
REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° IP-SIN-02 2022 Contratista: CONSTRUCCIONES AP SAS. Mes: Mayo 2023

Titulo de capacitación: PROTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS.

Descripción: Protecaon de los individuos arboreos localizados en obra.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Jose Manuel Pozo T	Ayudante	1067957159	Jose Pozo
Henry Diaz	ayudante	1033366050	Henry Diaz
Arbey Jose	ayudante	1003017379	Gomez Bolivar
Jose Lauro Villalba	conductor	1064199075	
Danny D. Romero	Almacenista	10774682	
Nestor E. Gamero	oficial	78690823	
Jesus Golfo	oficial	1067491230	
Yeison Jimenez	ayudante	1003794422	Yeison Jimenez
Jaime Jose Martinez O	Ayudante	1067858240	Jaime Martinez
Esteban Perez	Ayudante	1003406447	Esteban Perez
Martin Polo Pitre	Ayudante	1067927801	
Raul Mario Montaño	Ayudante	1067953923	Raul Montaño
Hernan Jimenez	ayudante	1062,421,512	Hernan Jimenez
Jose Golfo	ayudante	1133796645	Jose Golfo
Maria Golfo	controladora u	1062955710	Maria Golfo
Yohelis Tuesca	Controladora ii	1073978901	
Francisco Hernandez	SST	1123786400	Francisco H
Jose D. de G	Of.	78702104	
Edgar Benitez	ayudante	1063149466	
Hugo Antonio M.A	ayudante	1003050089	Hugo A.M.A

Firma Contratista

Firma Interventoria

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 18/05/2023 INSPECTOR: Francisco Menendez CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Motoniveladora MODELO: _____ Nº PLACA: _____ Nº MOVIL: _____

AREA ASIGNADA: Nivelación CONDUCTOR: Jadenton

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Técnico mecánica		X			
CARROCERIA					
Latonería	X				
Puertas	X				
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cojinería	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas				X	
Limpiaparabrisas				X	
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios	X				
Pito	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro				X	
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague				X	
Llantas		X			
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Liquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras			X	X	
Direccionales traseras			X		
Luces de reversa	X				
Luces al frenar	X				
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

3991

Llantas o llanta de repuesto			✓		
Juego de herramientas	✓				
Señales de prevención	✓				
Boquilla,Manguera,Válvula, Pintura y Seguro.)	✓				
Linterna		✓			
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	✓				
Brocha para recolección de residuos				✓	
Cinta de demarcación: Peligro				✓	
Material absorbente para contención de derrames (Arena				✓	
Gafas de seguridad	✓				
Guantes de seguridad	✓				
Escoba		✓			
Pala				✓	
Tijeras				✓	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	✓				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	✓				
Micropor x3 Yardas (1 Unidad)	✓				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	✓				
Algodón 15gr (1 Unidad)	✓				
Curas (4 Unidades)	✓				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	✓				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	✓				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	✓				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	✓				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	✓				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				✓	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				✓	
Buen estado del envase o empaque				✓	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	✓				
Adecuada clasificación de residuos	✓				
Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:					

3992

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 18/05/2023 INSPECTOR Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: ORUGA MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: excavación CONDUCTOR: Wilfrido Cortes

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica	X				
CARROCERÍA					
Latonería	X				
Puertas	X				
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cojinería	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas	X				
Limpiaparabrisas	X				
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios	X				
Piso	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro	X				
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague				X	
Llantas				X	
Rines				X	
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Líquido de frenos				X	
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento				X	
Direccionales delanteras				X	
Direccionales traseras				X	
Luces de reversa	X				
Luces al frenar				X	
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

Llantas o llanta de repuesto				X	
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención	X				
Boquilla,Manguera,Válvula, Pintura y Seguro.)	X				
Linterna		X			
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación: Peligro				X	
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micrope x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7.5x7.5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				
Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:					

3997

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 17/05/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Mini Cargador MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: carga CONDUCTOR: Jorge Andres Meza

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	✓				
Seguro Obligatorio (SOAT)	✓				
Licencia de conducción	✓				
Revisión Tecnico mecánica	✓				
CARROCERIA					
Latoneria	✓				
Puertas	✓				
Asientos y apoyacabezas	✓				
Sillas traseras				✓	
Cojineria	✓				
Seguros y/o bloqueos de puertas	✓			✓	
Limpiaparabrisas	✓				
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				✓	
Retrovisores laterales	✓				
Retrovisor central	✓				
Vidrios	✓				
Pito	✓				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocimetro	✓				
Tacómetro	✓				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, gasolina	✓				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	✓				
Sistema de suspensión	✓				
Nivel aceite del motor	✓				
Estado del filtro de aceite	✓				
Nivel liquido refrigerante del radiador	✓				
Estado del filtro de gasolina	✓				
Pedal de embrague				✓	
Llantas	✓				
Rines	✓				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	✓				
Pastillas				✓	
Bandas				✓	
Liquido de frenos	✓				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	✓				
Faroles bajos	✓				
Luces de estacionamiento	✓				
Direccionales delanteras				✓	
Direccionales traseras				✓	
Luces de reversa	✓				
Luces al frenar	✓				
Luces de tablero	✓				
BATERIA					
Bornes de conexión	✓				
Estado de la caja	✓				
Aseguramiento de la caja	✓				
Nivel de agua	✓				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	✓				
Cuñas o tacos				✓	
Gato o elevador mecanico o hidraulico	✓				

Llantas o llants de repuesto			X		
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención	X				
Boquilla,Manguera,Válvula, Pintura y Seguro.)	X				
Linterna		X			
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación Peligro				X	
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micropor x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Isodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Isodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 17/05/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Bibro MODELO: _____ Nº PLACA: _____ Nº MOVIL: _____

ÁREA ASIGNADA: compostaje CONDUCTOR: Andres Suarez

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica	X				
CARROCERÍA					
Latonería	X				
Puertas				X	
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cojinería	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas				X	
Limpiaparabrisas				X	
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios				X	
Piso		X			
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro	X			X	
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague				X	
Llantas	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Líquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras	X				
Direccionales traseras	X				
Luces de reversa	X				
Luces al frenar		X			
Luces de tablero				X	
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico				X	

Llantas o llanta de repuesto					
Juego de herramientas					
Señales de prevención					
Boquilla,Manguera,Válvula, Pintura y Seguro)					
Linterna					
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos					
Brocha para recolección de residuos					
Cinta de demarcación: Peligro					
Material absorbente para contención de derrames (Arena					
Gafas de seguridad					
Guantes de seguridad					
Escoba					
Pala					
Tijeras					
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)					
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)					
Micropo x3 Yardas (1 Unidad)					
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)					
Algodón 15gr (1 Unidad)					
Curas (4 Unidades)					
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)					
Isodopovidona Solución (1 Unidad)					
Alcohol 120ml (1 Unidad)					
Isodopovidona Espuma (1 Unidad)					
Guantes Quirúrgicos (1 par)					
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles					
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de					
Buen estado del envase o empaque					
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado					
Adecuada clasificación de residuos					
Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:					

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 17/5/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: MAXUS MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

AREA ASIGNADA: fundir concreto CONDUCTOR: Arturo Mendoza

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	✓				
Seguro Obligatorio (SOAT)	✓				
Licencia de conducción			✓		
Revisión Tecnico mecánica			✓		
CARROCERIA					
Latonería	✓				
Puertas	✓				
Asientos y apoyacabezas	✓				
Sillas traseras				✓	
Cojineria	✓				
Seguros y/o bloqueos de puertas	✓				
Limpiaparabrisas	✓				
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				✓	
Retrovisores laterales	✓				
Retrovisor central	✓				
Vidrios	✓				
Pito	✓				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocimetro	✓				
Tacómetro	✓				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, gasolina	✓				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	✓				
Sistema de suspensión	✓				
Nivel aceite del motor	✓				
Estado del filtro de aceite	✓				
Nivel liquido refrigerante del radiador	✓				
Estado del filtro de gasolina	✓				
Pedal de embrague				✓	
Llantas	✓				
Rines	✓				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	✓				
Pastillas				✓	
Bandas				✓	
Liquido de frenos	✓				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	✓				
Faroles bajos	✓				
Luces de estacionamiento	✓				
Direccionales delanteras	✓				
Direccionales traseras	✓				
Luces de reversa	✓				
Luces al freno	✓				
Luces de tablero	✓				
BATERÍA					
Bornes de conexión	✓				
Estado de la caja	✓				
Aseguramiento de la caja	✓				
Nivel de agua	✓				
ITEM A INSPECCIONAR	**B**	**R**	**M**	**NA**	**OBSERVACIONES**
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	✓				
Cuñas o tacos				✓	
Gato o elevador mecanico o hidráulico	✓				

Llantas o llanta de repuesto		X			
Juego de herramientas		X			
Señales de prevención	X				
Boquilla,Manguera,Válvula, Pintura y Seguro.)	X				
Linterna			X		
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación: Peligro				X	
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micrope x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Esteril 7.5x7.5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tela)las x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				
Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:					

Llantas o llanta de repuesto		X			
Juego de herramientas		X			
Señales de prevención	X				
Boquilla Manguera Válvula, Pintura y Seguro)	X				
Linterna			X		
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación: Peligro				X	
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Venda 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micrope x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirurgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:

3951

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 2/05/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Motoniveladora MODELO: _____ Nº PLACA: _____ Nº MOVIL: _____

ÁREA ASIGNADA: nivelacion CONDUCTOR: Gabriel Vargas.

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica	X				
CARROCERÍA					
Latonería	X				
Puertas				X	
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cojinería	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas				X	
Limpiaparabrisas				X	
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios	X				
Piso	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro	X				
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de bateria, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel liquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague	X				
Llantas		X			
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Liquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras	X				
Direccionales traseras	X				
Luces de reversa	X				
Luces al frenar	X				
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

Llantas o llanta de repuesto		X			
Juego de herramientas	X		X		
Señales de preventión	X				
Boquilla,Manguera,Valvula, Pintura y Seguro)	X				
Linterna					
KIT AMBIENTAL	X				
Bolsa para residuos				X	
Escoba para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación: Peligro				X	
Material absorbente para contención de derrames (Aserrin	X				
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X			X	
Escoba				X	
Pala					
Tijeras					
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	X				
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micropo x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)				X	
SUBTANCIAS QUÍMICAS				X	
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de					
Buen estado del envase o empaque		X			
MANEJO DE RESIDUOS	X				
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos					

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 2/05/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Patrulla - MODELO: N° PLACA: N° MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: Excavación, carga CONDUCTOR: William Carmona.

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencias de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica		X			
CARROCERÍA					
Latonería	X				
Puertas	X				
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras	X				
Cojinería	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas		X			
Limpiaparabrisas		X			
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios	X				
Pito	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro				X	
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, gasolina.	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague				X	
Llantas	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Líquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Farolas altas	X				
Farolas bajas	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras	X				
Direccionales traseras	X				
Luces de reversa	X				
Luces al frenar	X				
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				
ITEM A INSPECCIONAR	**B**	**R**	**M**	**NA**	**OBSERVACIONES**
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

Llantas o llanta de repuesto		X			
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención		X			
Boquilla Manguera, Válvula, Pintura y Seguro.)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación Peligro	X				
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micrope x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7.5x7.5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razon(es) de inmovilización:

vagoneta inmovilizada por daño en el suspendido.

3955

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 2/05/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Nibro MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

AREA ASIGNADA: Confección CONDUCTOR: Ribeiro Varela.

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)		X			
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica		X			
CARROCERÍA					
Latonería	X				
Puertas				X	
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cojinería	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas				X	
Limpiaparabrisas				X	
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales			X		
Retrovisor central	X				
Vidrios				X	
Pito	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro				X	
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, gasolina.	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague	X			X	
Llantas	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Líquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X		X		
Direccionales delanteras			X		
Direccionales traseras	X		X		
Luces de reversa	X				
Luces al frenar			X		
Luces de tablero			X	X	
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecanico o hidráulico	X			X	

Llantas o llanta de repuesto			X		
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención		X			
Boquilla,Manguera,Válvula, Pintura y Seguro.)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación: Peligro		X			
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Venda 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micropor x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	X				
Algodon 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:

Bibro compactador inmovilizado por daños de balineras del Rodillo.

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 27/04/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Mini cargador MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: Carga CONDUCTOR: Jorge Meza.

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica	X				
CARROCERÍA					
Latonería	X				
Puertas	X				
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cojinería	X				
Seguros y/o bisagras de puertas	X				
Limpiaparabrisas	X				
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios	X				
Pito	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro	X				
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de bateria, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel liquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague				X	
Llantas	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas	X				
Liquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras	X				
Direccionales traseras	X				
Luces de reversa	X				
Luces al frenar	X				
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				
ITEM A INSPECCIONAR	**B**	**R**	**M**	**NA**	**OBSERVACIONES**
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

Llantas o llanta de repuesto	✓				
Juego de herramientas	✓				
Señales de prevención	✓				
Boquilla Manguera,Válvula, Pintura y Seguro)	✓				
Linterna	✓				
KIT AMBIENTAL	✓				
Bolsa para residuos	✓				
Brocha para recolección de residuos				✓	
Cinta de demarcación: Peligro		✓			
Material absorbente para contención de derrames (Arena				✓	
Gafas de seguridad	✓				
Guantes de seguridad	✓				
Escoba	✓				
Pala				✓	
Tijeras				✓	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	✓				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	✓				
Micropo x3 Yardas (1 Unidad)	✓				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	✓				
Algodón 15gr (1 Unidad)	✓				
Curas (4 Unidadesa)	✓				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	✓				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	✓				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	✓				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	✓				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	✓				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				✓	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				✓	
Buen estado del envase o empaque				✓	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	✓				
Adecuada clasificación de residuos	✓				

Si el vehiculo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA: 26/04/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: ORV99 MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: Excavación CONDUCTOR: Wilfido cortez

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica	X				
CARROCERIA					
Latoneria	X				
Puertas	X				
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cojineria	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas	X				
Limpiaparabrisas	X				
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios	X				
Piso	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocimetro	X				
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de bateria, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel liquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague				X	
Llantas	X			X	
Rines	X			X	
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas					
Bandas					
Liquido de frenos					
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras	X				
Direccionales traseras	X				
Luces de reversa	X				
Luces al frenar	X				
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

Llantas o llanta de repuesto				X	
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención	X				
Boquilla,Manguera Válvula, Pintura y Seguro)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación: Peligro	X				
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Venda 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micrope x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7.5x7.5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				
Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:					

3961

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 26/04/2023 INSPECTOR: Francisco Hernandez CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Dataita MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: excavación, carga CONDUCTOR: William Carmona

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica	X				
CARROCERIA					
Latonería	X				
Puertas	X				
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras	X				
Cojinería	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas	X				
Limpiaparabrisas		X			
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios	X				
Pito	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro	X				
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de bateria, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel liquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague	X			X	
Llantas	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Liquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras	X				
Direccionales traseras	X				
Luces de reversa	X				
Luces al frenar	X				
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

Llantas o llanta de repuesto		X			
Juego de herramientas	X		X		
Señales de prevención			X		
Boquilla,Manguera,Válvula, Pintura y Seguro)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Broche para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación. Peligro			X		
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Venda 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micropa x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Isodopovidone Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Isodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				
Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:					

3963

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022 Versión: 01

FECHA 26/04/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Mini cargador MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: Carga CONDUCTOR: Domingo Aguilar

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)			X		
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica			X		
CARROCERIA					
Latoneria	X				
Puertas				X	
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cojineria	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas				X	
Limpiaparabrisas				X	
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales			X		
Retrovisor central				X	
Vidrios				X	
Piso		X			
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocimetro				X	
Tacometro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de bateria, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel liquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague				X	
Llantas	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Liquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	/		X		
Faroles bajos			X		
Luces de estacionamiento					
Direccionales delanteras	X				
Direccionales traseras				X	
Luces de reversa	X				
Luces al freno	X				
Luces de tablero	X				
BATERIA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

3969

Llantas o llanta de repuesto	X				
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención	X				
Bioguía Manguera,Valvula, Pintura y Seguro)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación Peligro		X			
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micropo x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	X				
Algodon 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Isdopovidona Solucion (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Isodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehiculo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razon(es) de inmovilización:

3965

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 26/04/2023 INSPECTOR: Francisco Hunaide CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Mini cargador MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: carga CONDUCTOR: Jorge Meza.

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Segum Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica	X				
CARROCERÍA					
Latoneria	X				
Puertas	X				
Asientos y apoyacabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cornetа	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas	X				
Limpiaparabrisas	X				
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios	X				
Pito	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocimetro	X				
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de bateria, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel liquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague				X	
Llantas	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Liquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras	X				
Direccionales traseras	X				
Luces de reversa	X				
Luces al freno	X				
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				
ITEM A INSPECCIONAR	**B**	**R**	**M**	**NA**	**OBSERVACIONES**
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

Llantas o llanta de repuesto				X	
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención	X				
Boquilla Manguera,Valvula, Pintura y Seguro)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación Peligro	X				
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micropo x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:

3967

Llantas o llanta de repuesto				X	
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención	X				
Boquilla Manguera Valvula, Pintura y Seguro)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación: Peligro	X				
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micropa x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Isodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Isodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUIMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				
Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:					

3968

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022 Versión: 01

FECHA 26/04/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Volco MODELO: Nº PLACA: Nº MOVIL:

ÁREA ASIGNADA: compactar CONDUCTOR: Alberto Jaramillo

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica	X				
CARROCERÍA					
Latonería	X				
Puertas				X	
Asientos y apoyacabezas		X			
Sillas traseras				X	
Cojinería		X			
Seguros y/o bloqueos de puertas				X	
Limpiaparabrisas				X	
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales				X	
Retrovisor central	X				
Vidrios				X	
Pito	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocímetro				X	
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel líquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague				X	
Llantas	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Líquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras			X		
Direccionales traseras			X		
Luces de reversa				X	
Luces al frenar	X				
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico				X	

3969

Llantas o llanta de repuesto				X	
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención		X			
Boquilla,Manguera,Válvula, Pintura y Seguro.)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación: Peligro	X			X	
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Venda 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micropo x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7,5x7,5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razón(es) de inmovilización:

Maquina inmovilizada por daño del Motor.

3970

	INSPECCIÓN A VEHÍCULOS	Noviembre de 2022
		Versión: 01

FECHA 26/04/2023 INSPECTOR: Francisco Hernández CARGO: SST

TIPO DE VEHÍCULO: Motoniveladora MODELO: _____ N° PLACA: _____ N° MOVIL: _____

ÁREA ASIGNADA: nivelación y perfilamiento CONDUCTOR: Jacelin vargas

ITEM A INSPECCIONAR	B	R	M	NA	OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN					
Tarjeta de propiedad	X				
Seguro Obligatorio (SOAT)	X				
Licencia de conducción	X				
Revisión Tecnico mecánica	X				
CARROCERÍA					
Latonería	X				
Puertas			X		
Asientos y apoyocabezas	X				
Sillas traseras				X	
Cojinería	X				
Seguros y/o bloqueos de puertas			X		
Limpiaparabrisas		X			
Tanque y dosificadores de agua para limpiaparabrisas				X	
Retrovisores laterales	X				
Retrovisor central	X				
Vidrios	X				
Piso	X				
INDICADORES O MEDIDORES					
Velocimetro				X	
Tacómetro	X				
Indicadores de temperatura de motor, aceite, carga de batería, freno de mano, gasolina	X				
COMPONENTES DEL SISTEMA DE OPERACIÓN					
Sistema de dirección	X				
Sistema de suspensión	X				
Nivel aceite del motor	X				
Estado del filtro de aceite	X				
Nivel liquido refrigerante del radiador	X				
Estado del filtro de gasolina	X				
Pedal de embrague	X				
Llantas	X				
Rines	X				
SISTEMA DE FRENOS					
Pedal	X				
Pastillas				X	
Bandas				X	
Liquido de frenos	X				
SISTEMA DE ALUMBRADO					
Faroles altos	X				
Faroles bajos	X				
Luces de estacionamiento	X				
Direccionales delanteras	X				
Direccionales traseras	X				
Luces de reversa	X				
Luces al frenar	X				
Luces de tablero	X				
BATERÍA					
Bornes de conexión	X				
Estado de la caja	X				
Aseguramiento de la caja	X				
Nivel de agua	X				
ITEM A INSPECCIONAR	**B**	**R**	**M**	**NA**	**OBSERVACIONES**
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD					
Cinturones de seguridad	X				
Cuñas o tacos				X	
Gato o elevador mecánico o hidráulico	X				

3971

Llantas o llanta de repuesto	X				
Juego de herramientas	X				
Señales de prevención		X			
Boquilla,Manguera,Válvula, Pintura y Seguro)	X				
Linterna	X				
KIT AMBIENTAL					
Bolsa para residuos	X				
Brocha para recolección de residuos				X	
Cinta de demarcación: Peligro	X				
Material absorbente para contención de derrames (Arena				X	
Gafas de seguridad	X				
Guantes de seguridad	X				
Escoba	X				
Pala				X	
Tijeras				X	
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS					
Tijeras (1 Unidad)	X				
Vendaje 2" X 5" (1 Unidad)	X				
Micropor x3 Yardas (1 Unidad)	X				
Gasa Estéril 7.5x7.5 cm (1 Unidad)	X				
Algodón 15gr (1 Unidad)	X				
Curas (4 Unidades)	X				
Inmovilizadores (Tablillas x 2 Unidades)	X				
Iodopovidona Solución (1 Unidad)	X				
Alcohol 120ml (1 Unidad)	X				
Iodopovidona Espuma (1 Unidad)	X				
Guantes Quirúrgicos (1 par)	X				
SUSTANCIAS QUÍMICAS					
Sustancias etiquetadas y legibles				X	
Disponibilidad de Hojas de Seguridad/Tarjetas de				X	
Buen estado del envase o empaque				X	
MANEJO DE RESIDUOS					
Recipiente o bolsa en buen estado	X				
Adecuada clasificación de residuos	X				

Si el vehículo es inmovilizado luego de la inspección escriba en este espacio la(s) razon(es) de inmovilización:

Maquina inmovilizada por pinchada en llanta delantera.

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 22/05/2023.

Titulo de capacitación: importancia de los EPP

Descripción: inspeccionar sitios de trabajo para identificar factores de riesgos, y tener control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Hugo Antonio	Ayudante	1002050089	Hugo
Jorge Morales	ayudante	1007872218	
Eduardo Garcia	ayudante	1073470075	
Jose H. Jimenez	Oficial	78703706	
Luis Patron	Ayudante	1133794762	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Starlin Vargas R	Operador	15488379	
Alejandro Alvarez	TOPO	78673101	
Elian Padilla C.	Inspector	1007675925	Elian Padilla.
Eduardo A Martinez Cuero	Ayudante	1071433184	Eduardo A Martinez
Oresa Mercado	Cadenero	1119816634	Oresa Mercado.
Andres Suarez	Operador	1038138868	
Paula Herrera	Paletera		Paula Herrera.
Francisco Hernandez	SST	1120378569	Francisco-H
Yesica Pastrana	Paletera	1073982472	Yesica Pastrana
Angies Paola Quiñones	Paletera	1003000869	Angies Paola
Johan D. Romero	Almacenista	1073468?	
Elian Padilla	Conductor	2755180	Elian Padilla
	Operario	1067176	William Padilla

Firma Contratista

Firma Interventoria

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 20/05/2023.

Titulo de capacitación: Saludo de la Pel.

Descripción: inspeccionar sitios de trabajo para identificar factores de riesgos, peligros control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Alcardo Torres Graciano	Oficial	8334175	Alcardo T.
Albeiro Varela	Operador de Vibrocompactadora	8415030	
Alejandro Alvarez	Topógrafo	78673101	
Andres Suarez	Operador de vibro AMMAN	1038138868	
Angelino Tuberquia Sepulveda	Oficial	8337021	
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	Angie Paola Guzman M.
Arturo Mendoza Rodríguez	Conductor Mixer	1067915824	
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Carmelo De la Cruz Ochoa Arcia	Ayudante	78705024	
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	Cesar Mercado Cristian
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	Dany Hernandez
Domingo Aguilar	Operador de minicargador	1003588951	
Elian Padilla Carrascal	Inspector de obra	1007675925	
Elian Padilla Carrascal	1007675925	Inspector de obra	Elian Padilla C.
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	Eliecer Agamez B
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco H
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	Hugo Antonio M
Humberto Pérez Reyes	Conductor de volqueta de riego	9100866	Humberto Perez
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Jarlein Vargas S.K

Yesica Paola Rolerteser 1.041.982.412 Yesica Paola

Powered by CamScanner

20/05/2023.

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Jarlinson Jalet Furnieles Padilla	1007367728	Ayudante	
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	Jorge meza-
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	Jorge Morales
Jose Alfredo Hernandez Peñafiel	Ayudante	1067895491	
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	Jose Jimenez
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	Juan David. negrette
Juan Olier Ochoa Martinez	Ayudante	1148436663	
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	
Libardo Antonio Martinez Guerra	Ayudante	1071433184	Libardo A Martinez
Luis Alfredo Arteaga Julio	Oficial	1064981112	
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	Luis Alfredo de Hoyos
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	Luis Miranda
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	Margie GULFO
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	Maria Gulfo Pa
Mario Andres Miranda Llorente	Ayudante	1064314178	
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	MAXIMA
Nilson Enrique Ramos Murillo	78742380	Ayudante	
Oberto José Furnieles Rivera	71976485	Ayudante	
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	Oscar Ayala
Oswaldo Manuel Garcia Sotelo	Ayudante	1073970075	Oswaldo Garcia
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta Nieves
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	Paula Herrera
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	William carmona
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	Yonay Martinez
oscar blandon	71000889	oficial	oscar. Blandon

Dora L. Gonzalez M.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPMI-012-2022 Contratista: Construcciones A° Mec. 19 / octubre 23

Título de capacitación: Auxiliaridad en el trabajo

Descripción: Mejorar el nivel de Seguridad para identificar peligros de riesgos, generar control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No Identificación	Firma
Aricardo Torres Graciano	Oficial	8334175	Aricardo Torres
Albeiro Varela	Operador de Vibrócompactadora	8415030	
Alejandro Alvarez	Topógrafo	78673101	
Andres Suarez	Operador de vibro AMMAN	1036133863	
Angelino Tuberquia Sepulveda	Oficial	3337021	
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1005000369	Angies Paola
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Carmelo De la Cruz Ochoa Arcia	Ayudante	78705024	
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816538	Cesar Mercado
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	Cristian
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	
Domingo Aguilar	Operador de minicargador	1003588951	Domingo Aguilar
Elian Padilla Carrascal	Inspector de obra	1007675925	Elian Padilla
Elian Padilla Carrascal	1007675925	Inspector de obra	
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	Hugo Antonio M
Humberto Pérez Reyes	Conductor de volqueta de riego	9100866	Humberto Perez
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Jarlein Vargas
Yesica Paola	Paletera	1077982472	Yesica Paola

Powered by CamScanner

19/05/2023

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Jarlinson Jalet Furnieles Padilla	1007367728	Ayudante	
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	Jorge Meza
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	
Jose Alfredo Hernandez Peñafiel	Ayudante	1067895491	
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	
Juan Olier Ochoa Martinez	Ayudante	1148436663	
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	
Libardo Antonio Martinez Guerra	Ayudante	1071433184	Libardo A Martinez
Luis Alfredo Arteaga Julio	Oficial	1064981112	
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	Luis Alfredo De Hoyos
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	Margie Gulfo M.
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	Maria Gulfo Pastrana
Mario Andres Miranda Llorente	Ayudante	1064314178	
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	Maximo
Nilson Enrique Ramos Murillo	78742380	Ayudante	
Oberto José Furnieles Rivera	71976485	Ayudante	
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	
Oswaldo Manuel García Sotelo	Ayudante	1073970075	
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta Nieves
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	Paula Herrera
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	Wilfrido Cortes
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	William J Carmona
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	
Oscar Blandón	oficial	7/00089	Oscar Blandón

Diana L González M.

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 18/05/2023

Titulo de capacitación: accidentes laborales.

Descripción: inspeccionar sitios de trabajos para identificar peatones de riesgos. Jueces control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Aicardo Torres Graciano	Oficial	8334175	Aicardo Torres.
Albeiro Varela	Operador de Vibrocompactadora	8415030	
Alejandro Alvarez	Topógrafo	78673101	
Andres Suarez	Operador de vibro AMMAN	1038138868	
Angelino Tuberquia Sepulveda	Oficial	8337021	
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	Angies Paola
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	Arturo Mendoza
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Carmelo De la Cruz Ochoa Arcia	Ayudante	78705024	CARMELO OCHOA
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	Cesar Mercado.
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	Cristian Jose
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	DANIEL GASPAR GARCIA.
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	Denis Hernandez
Domingo Aguilar	Operador de minicargador	1003588951	Domingo Aguilar.
Elian Padilla Carrascal	Inspector de obra	1007675925	
Elian Padilla Carrascal	1007675925	Inspector de obra	Elian Padilla C.
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco H
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	HUGO ANTONIO M
Humberto Pérez Reyes	Conductor de volqueta de riego	9100866	Humberto Perez
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Jarlein Vargas SP

Powered by CamScanner

18/05/2023

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Jarlinson Jalet Furnieles Padilla	1007367728	Ayudante	Jarlinson P
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	
Jose Alfredo Hernandez Peñafiel	Ayudante	1067895491	
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	
Juan Olier Ochoa Martinez	Ayudante	1148436663	
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	
Libardo Antonio Martinez Guerra	Ayudante	1071433184	
Luis Alfredo Arteaga Julio	Oficial	1064981112	
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	
Mario Andres Miranda Llorente	Ayudante	1064314178	
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	
Nilson Enrique Ramos Murillo	78742380	Ayudante	
Oberto José Furnieles Rivera	71976485	Ayudante	
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	
Oswaldo Manuel Garcia Sotelo	Ayudante	1073970075	
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	
Yesica paola	Auletora	1073982478	Yesica Pasttrana

Firma Contratista

Firma Interventoria

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 17/05/2022.

Título de capacitación: Charlas al inicio diario.

Descripción: inspeccionar sitios de trabajo para identificar factores de riesgos, dejar charla sobre ellas.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Aicardo Torres Graciano	Oficial	8334175	Aicardo Torres.
[illegible]	Operador de Vibrocompactadora	8415030	
Alejandro Alvarez	Topógrafo	78673101	
Andres Suarez	Operador de vibro AMMAN	1038138868	
[illegible]	Oficial	8337021	
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	Angie Paola
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	Arturo Mendoza.
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Carmelo De la Cruz Ochoa Arcia	Ayudante	78705024	Carmelo ochoa
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	Cristian José
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	DANIEL GASPAR
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	Denis Hernandez
Domingo Aguilar	Operador de minicargador	1003588951	Domingo Aguilar.
Elian Padilla Carrascal	Inspector de obra	1007675925	Elian Padilla C.
[illegible]	1007675925	Inspector de obra	
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco H
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	Hugo Antonio M
Humberto Pérez Reyes	Conductor de volqueta de riego	9100866	Humberto Perez
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Rafael Bueno.

Powered by CamScanner

17/05/2023

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Jarlinson Jalet Furnieles Padilla	1007367728	Ayudante	Jarlinson K.
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	J. M.
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	
Jose Alfredo Hernandez Peñafiel	Ayudante	1067895491	
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	JOSE A. Jimenez G
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	Juan David Juan Negrette
Juan Olier Ochoa Martinez	Ayudante	1148436663	
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	Leonidas G
Libardo Antonio Martinez Guerra	Ayudante	1071433184	Libardo A Martinez
[illegible]	Oficial	1064981112	
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	Luis Alfredo De Hoyos
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	Luis Miranda
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Margie Gulfo Martinez	Cóntroladora Vial	1067837388	Margie Gulfo M.
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	Maria Gulfo Pastrana
Mario Andres Miranda Llorente	Ayudante	1064314178	
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	Maximo
Nilson Enrique Ramos Murillo	78742380 Oficial	Ayudante	Nilson Ramos
Oberto José Furnieles Rivera	71976485 Maestro	Ayudante	
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	
Oswaldo Manuel García Sotelo	Ayudante	1073970075	
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta Nieves
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	Paula Herrera
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	William J Carmona
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	Yhonny Martinez
Yesica Paola Pastrana	Perfilera	1073982472	Yesica Pastrana

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 16/octubre/23.

Título de capacitación: cuidado al medio Ambiente.

Descripción: inspeccionar sitios de trabajo para donde

Registro de asistencia a capacitación

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Albeiro Varela	Operador de Vibrocompactadora	8415030	
Amaury José Banda	Topógrafo	1067907302	
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	Angie Paola
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	Arturo Mendoza
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	carlos torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	Cesar Mercado
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	Cristian
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	DANIEL Gaspar Garcia
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	Denis Hernandez
Domingo Aguilar	Conductor de minicargador	1003588951	Domingo A
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	Eliecer Agamez B
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	Fernando Padilla
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco H
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	HUGO ANTONIO M
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	Jorge Morales
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	Jose A Jimenez
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	JUANDAVID N G
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	Leonidas G
Libardo Antonio Martinez	Ayudante	1071433184	Libardo M

Powered by CamScanner

16/05/2023.

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Guerra			
Luis Alfredo Arteaga Jullo	Oficial	1064981112	X
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	Luis Alfredo.
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	X
Luis Eduardo Ramos	Oficial	1003758664	X
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	Luis Miranda
Luis Gonzalez Gil	Conductor de volqueta	1073820128	X
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	Luis Miguel
Marco Antonio Mendoza Cordero	Oficial	1003464716	X
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	Margie GULFO
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	Maria GULFO
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	Maximo
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	Oscar Ivan Ayala
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta Nieves
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	Paula Herrera
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	Wilfrido Cortes.
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	William Carmona
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	Jhonny Martinez
Humberto Perez	conductor	9100866	H.P.R
Carmelo ochoa.	ayudante.	78705024.	Carmelo ochoa
OSCAR Vian	OFICIAL	71000889	Oscar Viviana Blanco
Ricardo Torres	Oficial	6334175	
Juan Alfaro	Ayudante	1140436663	
Jose Alfredo Taranda	obrero	1067868491	
Harrinson Barnicis	OFICIAL	1007367728	Harrinson F.
Alejandro Alvarez	TOPO	78673101	
Oswaldo Cortes	Ayudante	1073970075	Oswaldo
Wilson Ramos	oficial.	78774230	Wilson

Firma Contratista

Firma Interventoria

Gobierno de la GENTE

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 15/05/2023

Título de capacitación: Actos Inseguros

Descripción: inspecciones sitios de trabajo para identificar factores de riesgos, efectivas control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Alejandro Alvarez	Topografo	78673101	
Luis Alfredo De Hoyos	paletero	11042064	Luis De Hoyos
Jose Alfredo Hernandez	obrero	1.067895471	
Juan Elier Ochoa	ayudante	Y14B436403	
DANIEL Gaspar Garcia	ayudante	1133796735	
Angiespaola Quiñones	paletera	1003.009.869	Angies Paola
Elvira Bejarano	conductor	2755180	Elvira Bejarano
OBERTO Fernandez	MAESTRO	71976485	
Jarlinson Furnieles	Oficial	1007367728	Jarlinson F.
Wilson Ramos	Oficial	1067423800	Wilson Ramos
Hargie Guifo	Paletera	1067837378	Hargie Guifo
Hadda Guifo	PALETERA	1061955710	Hadda Guifo
Paula Herrera	Paletera	1003011610	Paula Herrera
Omar Arrieta Nieves	Ayudante Mixer	10904586	
Humberto Perez	conductor	9100866	HPR
Cesar Mercado	Cadenero	77816633	
Luis Miguel Herrera	ayudante	1002046763	
Hugo Mario Miranda	ayudante	1003050034	Hugo
Oscar Ayala	ayudante	1067884900	
Carlos Andres Torres	Ayudante	1003001091	
Jorge Morales	ayudante	1007822286	
Osvaldo Cervilla	ayudante	1093470695	Osvaldo
Luis Miranda	Oficial	78718234	
Andres Suarez	Operador	1038138860	
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	
Arturo Mendoza	operador	1067911924	
DANNY D. ROMERO	Almacenista	10174682	
Libardo A Martinez Guerra	Ayudante	1041433184	Libardo A Martinez

Firma Contratista

Firma Interventoria

Powered by CamScanner

MONTERIA
Gobierno de la GENTE

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA ...
EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 14/05/2022

Titulo de capacitación: Evaluación de saberes laborales.

Descripción: Identificar estilos de trabajo para identificar factores de riesgo y aplicar control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Hargie GUIFO H.	palatera	1067837388	Hargie GUIFO
Andrés Suárez	Operador	1038138868	
Cesar Mercado	Cadenero	1117866638	
Elian Padilla	Supervisor	1007675905	Elian Padilla
Alejandra Alvarez	Topografo	78673101	
Rafa. Burgo	operador	1059186414	
María GUIFO	Contratadora Vial	1062900710	María GUIFO
Francisco Acuña	SST	1120378648	
William J Carmona	operario	4481746	

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 13 octubre 22

Título de capacitación: Riesgo Quimicos

Descripción: inspeccionar sitio de trabajo para identificar factores de riesgo, asociados con sobre ellos

Registro de asistencia a capacitación

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Albeiro Varela	Operador de Vibrocompactadora	8415039	
Amaury José Banda	Topógrafo	1067907302	
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	Angie Paola
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	Arturo Mendoza
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	Carlos pastrana
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Cesar Augusto Mercado Pinzón	Cadenero	1119816638	Cesar Mercado
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1072968995	Cristian José
Daniel Alfonso Gasper Garcia	Ayudante	1136796735	
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749207	Denis Hernandez
Domingo Aguilar	Conductor de minicargador	1093586951	
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007761100	Fernando Padilla
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378645	Francisco H
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	Hugo Antonio M
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	
Libardo Antonio Martinez	Ayudante	1071433184	Libardo A Martinez

Powered by CamScanner

13/05/2023.

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Andrés Suarez	Operador	1038138868	
Luis Alfredo Arteaga Julio	Oficial	1064981112	
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	Luis Alfredo De Hoyos
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	
Luis Eduardo Ramos	Oficial	1003758664	
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	Luis Miranda
Luis Gonzalez Gil	Conductor de volqueta	1073820128	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	Luis Miguel.
Marco Antonio Mendoza Cordero	Oficial	1003464716	
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	Margie Gulfo
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	Maria Gulfo
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta Nieves
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	Paula Herrera
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	92615040	
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	Jhonny Martinez

Humberto Peker conductor 9100866 HPR

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 10/05/2022

Título de capacitación: Higiene laboral

Descripción: Realizar inspecciones en sitios de trabajo, para identificar posibles peligros, realizar control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Albeiro Varela	Operador de Vibrocompactadora	8415030	
Amaury José Banda	Topógrafo	1067907302	
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	Angie paola
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	Arturo Mendoza
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	Carlos pastrana
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	Cesar Mercado
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	Cristian
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	DANIEL Gaspar
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774602	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	
Domingo Aguilar	Conductor de minicargador	1003588951	
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	Fernando Padilla
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	Hugo Antonio M
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Jarlein
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	Jorge Morales
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	Jose A. Jimenez
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	Juan David N G
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6883770	Leonidas G.
Libardo Antonio Martinez	Ayudante	1071433184	Libardo A Martinez

Powered by CamScanner

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Guerra			
Luis Alfredo Arteaga Julio	Oficial	1064981112	
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	Luis Alfredo De Hoyo
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	
Luis Eduardo Ramos	Oficial	1063758664	
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	Luis Miranda
Luis Gonzalez Gil	Conductor de volqueta	1073820128	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Marco Antonio Mendoza Cordero	Oficial	1003464716	
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	Margie Gulfo M.
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	Maria Gulfo
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	Maximo
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta Nieves
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	Paula Herrera
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	93615040	Wilfrido Cortes
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	William S Carmona
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	Jhonny Martinez

Humberto Perez Conductor 9100966 HPR

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 11 | 05 | 2022

Título de capacitación: Pausas Activas

Descripción: inspeccionar sitios de trabajos, para identificar factores de riesgos, ejercer control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Albeiro Varela	Operador de Vibrocompactadora	8415030	Albeiro Varelas
Amaury José Banda	Topógrafo	1067907302	Amaury Banda
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	Angies Paola
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	Arturo Mendoza
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	Carlos Pastrana
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	Cesar Mercado
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	Cristian
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	DANIEL GASPAR
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	Denis Hernandez
Domingo Aguilar	Conductor de minicargador	1003588951	
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	Eliecer Agamez B
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	Fernando Padilla
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco A
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	Hugo. ANTONIO. M
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Jarlein Vargas R.
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	Jorge Morales
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	Jose A. Jimenez G
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	Juan David N G
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	Leonidas G
Libardo Antonio Martinez	Ayudante	1071433184	Libardo A Martinez

Powered by CamScanner

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Guerra			
Luis Alfredo Arteaga Julio	Oficial	1064981112	
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	Luis Alfredo De Hoyos
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	
Luis Eduardo Ramos	Oficial	1003758664	
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	Luis M. Miranda
Luis Gonzalez Gil	Conductor de volqueta	1073820128	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Marco Antonio Mendoza Cordero	Oficial	1003464716	
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	Margie Gulfo.
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	Maria Gulfo
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta Meves
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	Paula Herrera
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavedora Pajarita	4471746	
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	Jhonny Martinez
Hamberto Perez	conductor	9100866	
Wilfrido Cotes	operador	98615040	
Danny D. Romero	Almacenista	1037468?	

Firma Contratista

Firma Interventoria

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 10 los / 2023

Título de capacitación: Las incapacidades laborales

Descripción: La Generalidad sitial de trabajo para identificar factores de riesgos, medidas, control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Donny D. Pomeno	Almacenista	10774682	
Humberto Perez	conductor	9100866	HPR
Arturo Acedo	Operador	1067915824	Arturo
Wilfrido Cabo	oficio	98615040	
Over Arrieta Nieves	Ayudante Mixto	10901586	
Carlos Mario Hoyos	Ayudante	1067453923	
Cesar Mendoza	Colocador	1098766373	
Luis Alfredo De Hoyos	Polletero	11092069	Luis De Hoyos
Oscar Ayala	Ayudante	1003954903	
Isaac J. Martinez Cruz	Ayudante	1091 [illegible] 104	
Jacinto Vargas R.	operador	15458579	
Jorge Andres Hoyos	Operador	1108246122	
Alberto Vargas	operador	8415070	
William J. Coronado	operario	1117146	
Francisco Hernandez	SST	1120378648	

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 9/05/2023.

Título de capacitación: Previos Auxiliares.

Descripción: inspección de sitios de trabajo para identificar factores de riesgos, estrategias control sobre ellos

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Luis Alfredo De Hoyos	Palatero	11042069	Luis De Hoyos
Alberto Varelas	operador	8415030	Alberto Varelas
Yacerlin Vargas S R	operador	1548837?	Yacerlin
Cesar Yepes	Cabrero	1119816638	Cesar Yepes
Over Arrieta Nieves	Ayudante Mixel	10.904.586	
William J Campana	operario	1142?746	
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Jesus Ayala	Ayudante	1003641908	J. Ayala
Eduardo A Martinez Guerra	Ayudante	1.071.133.184	Eduardo A Martinez
Humberto Pena	conductor	91008GB	HRR
Arturo Mendoza	operador	1067915824	
Anuar Banda	Topo Cajo	1067707??	
Paola Herrera Cueto	Paletera	1003041676	Paola Herrera
Danny D. Romero	Almacenista	1077468?	
Jorge Mena Arroyo	operador	1100?48172	
Maria Guipo	cocinera	1152955210	Maria Guipo
Wilfrido Cortes	operador	9301540	

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 21 oshao.

Titulo de capacitación: _____

Descripción: Reconocer Sitios de trabajo para identificar factores de riesgos, y difundir conocimiento sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Humberto Perez	conductor	9100806	
Eduardo A Martinez Lucero	Ayudante	1001433484	Eduardo A Martinez
Carlos Mario Montoya	Albañil	1067953923	Carlos Mario M.
Arturo Mendoza	Operador	1067915824	Arturo
Armando Banda	Topografo	1067907502	Armando Banda
Oscar Leal	Ayudante	1067884498	Oscar Leal
Nombre Ilegible	SST	1170378648	Ilegible
Wilfrido Cortés	Operador	93615040	
Martin Vega R.	Operador	15488379	Martin
Cesar Alvarado	Cabrero	1119816618	Cesar Alvarado
Albeiro Varelas	operador	1115030	Albeiro Varelas
Jorge Andres Perez Mora	Operador	1064248127	
William J Carrasco	operario	1143971116	
Danny D. Romero	Ayudante	1071476812	

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP-SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 5/05/2023

Titulo de capacitación: actitud positiva.

Descripción: inspeccionar sitios de trabajo para identificar factores de riesgos, tener control sobre ellos

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Humberto Perez	Conductor	9100866	HPR
Arturo Mendoza	operador	1067415824	Arturo M.
Oscar Ayala	Ayudante	1067864706	Oscar Ayala
Armando Bonilla	Operador	1003588151	Armando Bonilla
Armando Bonilla	Topografo	1067101302	Armando Bonilla
Juan Acosta	Ayudante	1119816633	Juan Acosta
alfredo Cortes	operador	98615040	alfredo Cortes
Albeiro Varelas	operador	8415030	Albeiro Varelas
Jacelin	operador	1546837?	Jacelin
Jorge Andres Hoyos	Operador	1100248127	Jorge Andres Hoyos
Libardo A Martinez Berrio	ayudante	1071933181	Libardo A Martinez
Danny D. Romero	Ayudante	1077146832	
Jorge Andres Hoyos	Operador	1100248127	Jorge Andres Hoyos
Francisco Hdz	SST	1120378648	Francisco H

Firma Contratista

Firma Interventoria

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 6/05/2023

Título de capacitación: Ambiente saludable.

Descripción: Inspeccionar sitio de trabajo; para identificar factores de riesgos, y ataques control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma
Oscar Lyaca	Ayudante	1061 864 908	O. Lyaca
Eduardo A Martinez Garcia	Ayudante	1071153184	Eduardo A Martinez
Jacklin Vargas S.L	operador	15488379	Jacklin
Cesar Mercado	Cadenero	1119216638	Cesar Mercado
Amaury Barda	Topografo	1067907302	Amaury Barda
Alberto Vargas	operador	8415030	Alberto Vargas
William Taborna	operario	4 4 7 7 1 7 1 6	
Eduardo Cantes	Operario	98615040	
Danny D. Romero	Almacenista	1077468 2	
Humberto Perez.	conductor	91008966	HPR.
Arturo Mendoza.	operador	1067915829	Arturo M.
Francisco Hdz	SST	1120376188	Francisco H

Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 4/05/2023.

Título de capacitación: _____

Descripción: Inspeccionar sitios de trabajo para identificar factores de riesgos, ofrecer controles sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Albeiro Varela	Operador de Vibrocompactadora	8415030	Albeiro Varelas
Amaury José Banda	Topógrafo	1067907302	AMAURY Banda
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	Angies Paola
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	Arturo Mendoza
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	Carlos Pastrana
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	DANIEL GASPAR
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	Denis Hernandez
Domingo Aguilar	Conductor de minicargador	1003588951	Domingo A
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	Fernando Padilla
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco.
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	HUGO ANTONIO M
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Jarlin
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	Jorge Meza.
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	Jorge Morales
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	JUAN DAVID NG
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	Leonidas.G.
Libardo Antonio Martinez	Ayudante	1071433184	Libardo A Martinez

Powered by CamScanner

4/05/2022.

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Guerra			
Luis Alfredo Arteaga Julio	Oficial	1064981112	Luis Alfredo Arteaga
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	Luis Alfredo De Hoyos
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	
Luis Eduardo Ramos	Oficial	1003758664	Luis Ramos
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	
Luis Gonzalez Gil	Conductor de volqueta	1073820128	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Marco Antonio Mendoza Cordero	Oficial	1003464716	
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	MARIA GULFO
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	Maximo
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta Nieves
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	Jhonny Martinez
Humberto Perez	conductor	9100866	H P R
Jose Alfredo Mesa	Operador	1100248122	

Firma Contratista

Firma Interventoria

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 3/09/2022.

Titulo de capacitación: La buena comunicación laboral.

Descripción: Realizar sensibilizaciones en sitio de trabajo para identificar factores de riesgos y eliminar contagio.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Albeiro Varela	Operador de Vibrocompactadora	8415030	Albeiro Varela.
Amaury José Banda	Topógrafo	1067907302	Amaury Banda
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	Arturo Mendoza.
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	Carlos Pastrana
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario.
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	Cesar Mercado.
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	Cristian
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	Domingo.A
Domingo Aguilar	Conductor de minicargador	1003588951	Domingo.A.
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	Fernando padilla
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco.H
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Jarlein. Meza.
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	Jorge Meza.
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	Jose A.
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	Juan David NG
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	Julio C Luna
Leonidas Gomez	Celador	6888770	Leonidas Gomez.
Libardo Antonio Martinez	Ayudante	1071433184	Libardo A Martinez

Powered by CamScanner

~~2/05/2023.~~ 31/05/2023

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Guerra			
Luis Alfredo Arteaga Julio	Oficial	1064981112	Luis Alfredo.
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	Luis Alfredo De Hoyos
Luis Alfredo De Hoyos	Controladora Vial	11042069	
Luis Eduardo Ramos	Oficial	1003758664	
Luis Enrique Miranda Viloria	Ayudante	78710341	Luis Miranda
Luis Gonzalez Gil	Conductor de volqueta	1073820128	
Luis Miguel Herrera	Ayudante	1003046763	
Marco Antonio Mendoza Cordero	Oficial	1003464716	
Margie Gulfo Martinez	Controladora Vial	1067837388	
Maria Isabel Gulfo Pastrana	Controladora Vial	1062955710	Maria GULFO
Maximo Carvajal Martinez	Oficial	6843683	
Oscar Ivan Ayala	Ayudante	1067864908	Oscar. AYALA
Over Enrique Arrieta	Ayudante mixer	10904586	Over Arrieta Vacas
Paula Herrera	Controladora Vial	1003046762	
Wilfrido Cortes	Operador de Excavadora oruga	98615040	
William de J. Carmona	Operador de Retroexcavadora Pajarita	4471746	
Yoni José Martinez Miranda	Oficial	78713203	
Humberto PEREZ	Conductor	9100966	HBP

Diana Gonzalez PL.
Firma Contratista

Firma Interventoría

Powered by CamScanner

FORMATO 20. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato N° LP- SPM-012-2022 Contratista: Construcciones AP Mes: 2/05/2022

Titulo de capacitación: Riesgos locativos.

Descripción: inspecciones sitios de trabajo para identificar posibles riesgos, y ofrecer control sobre ellos.

Registro de asistencia a capacitación

Nombre del empleado	Cargo	ID	Firma
Albeiro Varela	Operador de Vibrocompactadora	8415030	Albeiro Varelas
Amaury José Banda	Topógrafo	1067907302	Amaury Banda
Angie Paola Guzman Peña	Controladora Vial	1003000869	
Arturo Mendoza Rodriguez	Conductor Mixer	1067915824	Arturo Mendoza
Carlos Andres Torres Suarez	Ayudante	1003001081	Carlos Torres
Carlos Arturo Pastrana	Ayudante	1133796702	
Carlos Mario Montoya	Ayudante	1067953923	Carlos Mario Montoya
Cesar Augusto Mercado Rincón	Cadenero	1119816638	Cesar Mercado
Cristian Jose Herrera Blanquett	Ayudante	1073969895	Cristian
Daniel Alfonso Gaspar Garcia	Ayudante	1133796735	
Dany Daniel Romero Peralta	Almacenista	10774682	
Denis Hernandez	Ayudante	78749297	
Domingo Aguilar	Conductor de minicargador	1003588951	Domingo Aguilar.
Eliecer Remberto Agamez	Conductor de volqueta	2755180	
Fernando José Padilla Espitia	Oficial	1007781100	Fernando Padilla
Francisco Hernandez	Auxiliar SST	1120378648	Francisco H
Hugo Antonio Miranda Argumedo	Obrero	1003050039	Hugo Antonio M
Jarlein Vargas Rueda	Conductor de motoniveladora	15488379	Jarlein Vargas R
Jorge Andres Meza	Operador de minicargador	1100248122	
Jorge Andres Morales	Ayudante	1007822286	
Jose Alfredo Jimenez Gomez	Oficial	78705306	Jose A. Jimenez G.
Juan David Negrette González	Ayudante	78717301	Juan David N G
Julio Cesar Luna	Maestro	78753670	
Leonidas Gomez	Celador	6888770	Leonidas Gomez
Libardo Antonio Martinez	Ayudante	1071433184	Libardo A Martinez

Powered by CamScanner
