CONTINUACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA No. 12

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644091	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA 1	CALLE 17 kD. 18-55 OFICINA 803	MONTERIA-CORDOBA	3650221	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Cave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	5769032686	94659640O2	E	2024/04/11	2024/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	4	$1,611,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Sln	Lma	Vsp	Avp	Vct	Vst	Sln	Ige	Lma	Vsp	Vct	Irp	Avp	Vst	Sln	Ige	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1074013639	ARRIETA PEDRO	X																		25-14	18	$1,086,000	$117,800	EPS037	18	$1,086,000	$43,500	CCF06	18	$1,086,000	$43,500	14-13	18	$1,086,000	$21,600	18	30	18	SI	$226,400
2	CC	1003439302	HURTADO ELVIS	X																		23-804	30	$780,000	$114,400	EPS040	18	$780,000	$31,200	CCF06	18	$780,000	$31,200	14-13	18	$780,000	$56,000	18	30	18	SI	$234,800
3	CC	1102056788	TAFUR JESUS	X																		23-804	18	$1,998,000	$218,700	EPS040	18	$1,998,000	$80,000	CCF06	18	$1,998,000	$80,000	14-13	18	$1,998,000	$171,100	18	30	18	SI	$409,700
4	CC	1076	VILLAMIZAR	X																		23-804	18	$1,320,000	$211,200	EPS060	18	$1,320,000	$52,800	CCF06	18	$1,320,000	$52,800	14-13	18	$1,320,000	$99,400	18	30	18	SI	$264,400
																								$5,184,000	$569,100			$5,184,000	$207,500			$5,184,000	$207,500			$5,184,000	$384,100					$1,134,900
Total	Afiliados(4)																																										

2024/05/02 09:54 AM

692

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES IGNORANA SAS	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA 1	CALLE 17 NO. 10-55 OFICINA 601	MONTERIA-CORDOBA	3650321	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Cove		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	576852686	9405664302	E	2024/04/11	2024/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	4	$1,611,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$819,500	$3,000	$0	$832,500
COLFONDOS	23-01	800,227,940	6	1	$174,800	$500	$0	$125,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$173,800	$600	$0	$174,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$510,900	$1,900	$0	$532,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$340,900	$1,300	$0	$362,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$340,900	$1,300	$0	$362,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$207,500	$800	$0	$208,300
COMFACOR	CCF16	891,080,085	1	4	$207,500	$800	$0	$208,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$207,500	$800	$0	$208,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	1	1	$80,000	$300	$0	$80,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$43,500	$200	$0	$43,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$84,000	$300	$0	$84,300
TOTAL				4	$1,605,400	$5,900	$0	$1,611,300

6903

	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES ODINOVAN S.A.S INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 13/04/2024 (DD / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: MONTERIA

CONTRATO DE OBRA No: LP-SFM-011-2023 — CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA MR

No. INFORME MENSUAL: AMSTO - ABRIL — PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CMA-EPM-080-2023 — INTERVENTOR: CONSULTORES ODINOVAN S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	2200165T	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2328020080-342	RECURSOS DEL CREDITO	LP-SFM-011-2023	$ 9.681.751.260	
2023		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		RECURSOS DEL CREDITO	LP-SFM-011-2023-ADICIONAL	$ 1.285.152.252	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 10.966.903.512,08

RESUMEN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Incluye pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		dic-23	$ 2.008.337.718	$ 625.140.840	$ 2.285.470.881	$ 888.643.884	$ 2.300.835.065	$ 2.285.257.259							
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del interventor realizar la conciliación del formato con el reporte SIIF o validar las observaciones pertinentes.

Firma
Nombre: JONATHAN C. SANCHEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 23202-271458 CCB

Firma
Nombre: LINA ENRIQUE VLA D ESPINOSA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 23202-121288 CCB

6/09

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**	**352 días**	**jue 22/09/22**	**mar 11/06/24**	
2		**PRELIMINARES**	**325 días**	**jue 13/10/22**	**lun 3/06/24**	
3		EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	325 días	jue 13/10/22	lun 3/06/24	
4		EXCAVACION MANUAL	303 días	vie 4/11/22	vie 31/05/24	3CC+20 días
5		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	55 días	mar 12/03/24	sáb 11/05/24	
6		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	325 días	jue 13/10/22	lun 3/06/24	3CC
7		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**313 días**	**lun 24/10/22**	**vie 31/05/24**	
8		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	45 días	lun 24/10/22	mar 13/12/22	3CC+10 días
9		SUBBASE GRANULAR CLASE C	313 días	lun 24/10/22	vie 31/05/24	3CC+10 días
10		TERRAPLEN	264 días	vie 16/12/22	mié 29/05/24	9CC+25 días
11		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**320 días**	**lun 24/10/22**	**vie 7/06/24**	
12		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) elaborado en sitio	318 días	mar 25/10/22	jue 6/06/24	9CC+1 día
13		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) para viga riostra	318 días	mar 25/10/22	jue 6/06/24	12CC
14		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14 MPa CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	318 días	mié 26/10/22	vie 7/06/24	13CC+1 día

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 19/03/24

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

695

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
15		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	318 días	lun 24/10/22	mié 5/06/24	13CC-1 día
16		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	318 días	mar 25/10/22	jue 6/06/24	12CC
17		SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	10 días	mar 28/05/24	vie 7/06/24	14FC-10 días
18		**OBRAS DE DRENAJE**	**225 días**	**sáb 22/04/23**	**lun 10/06/24**	
19		EXCAVACION MANUAL	202 días	sáb 22/04/23	mié 15/05/24	14CC+95 días
20		GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	220 días	lun 24/04/23	mié 5/06/24	19CC+1 día
21		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	217 días	jue 27/04/23	mié 5/06/24	20CC+3 días
22		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	223 días	lun 24/04/23	sáb 8/06/24	19CC+1 día
23		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	220 días	vie 28/04/23	lun 10/06/24	21CC+1 día
24		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	202 días	sáb 22/04/23	mié 15/05/24	19CC
25		**BOX-COULVERT**	**154,25 días**	**vie 28/07/23**	**sáb 8/06/24**	
26		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	145 días	vie 28/07/23	mié 29/05/24	
27		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	50 días	mar 12/03/24	lun 6/05/24	26CC+1 día

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 19/03/24

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
28		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	60 días	mié 13/03/24	sáb 18/05/24	27CC+1 día
29		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	115 días	mié 6/09/23	mié 5/06/24	33CC+5 días
30		DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	60 días	lun 18/03/24	vie 24/05/24	34CC+6 días
31		CONCRETO HIDRAULICO f'c 14MPa (F) (SOLADO)	102 días	vie 1/09/23	mié 15/05/24	
32		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14 MPa (G) (para piedra pegada)	28 días	mié 8/05/24	sáb 8/06/24	33FC-28 días
33		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) (PARA ESTRUCTURAS)	123 días	vie 1/09/23	sáb 8/06/24	
34		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	70 días	mar 12/03/24	mié 29/05/24	
35		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	129 días	lun 21/08/23	mar 4/06/24	33CC-10 días
36		PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 1.0 M Y REFUERZO DE ACERO				
37		APOYO ELASTOMERICO	5 días	jue 23/05/24	mié 29/05/24	34FF
38		JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES.	15 días	mar 9/04/24	jue 25/04/24	34CC+25 días


Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 19/03/24

Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso manual
Tarea inactiva	solo fin	Margen de demora
Hito inactivo	Tareas externas	
Resumen inactivo	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
39		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	3 días	mié 29/05/24	sáb 1/06/24	34
40		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	145 días	vie 28/07/23	mié 29/05/24	26CC
41		BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	1 día	vie 31/05/24	sáb 1/06/24	39FF
42		**SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**sáb 8/06/24**	**sáb 8/06/24**	
43		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	1 día	sáb 8/06/24	sáb 8/06/24	
44		**NO PREVISTOS**	**150 días**	**vie 28/07/23**	**lun 3/06/24**	
45		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	75 días	mar 12/03/24	lun 3/06/24	46CC
46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	75 días	mar 12/03/24	lun 3/06/24	47CC
47		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	75 días	mar 12/03/24	lun 3/06/24	
48		PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 0.80 M Y ACERO DE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO.	17 días	vie 28/07/23	mié 16/08/23	26CC
49		IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA	352 días	jue 22/09/22	mar 11/06/24	
50		PAPSO	352 días	jue 22/09/22	mar 11/06/24	

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 19/03/24


Tarea	Tarea manual	Fecha límite
División	solo duración	Tareas críticas
Hito	Informe de resumen manual	División crítica
Resumen	Resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso manual
Tarea inactiva	solo fin	Margen de demora
Hito inactivo	Tareas externas	
Resumen inactivo	Hito externo	

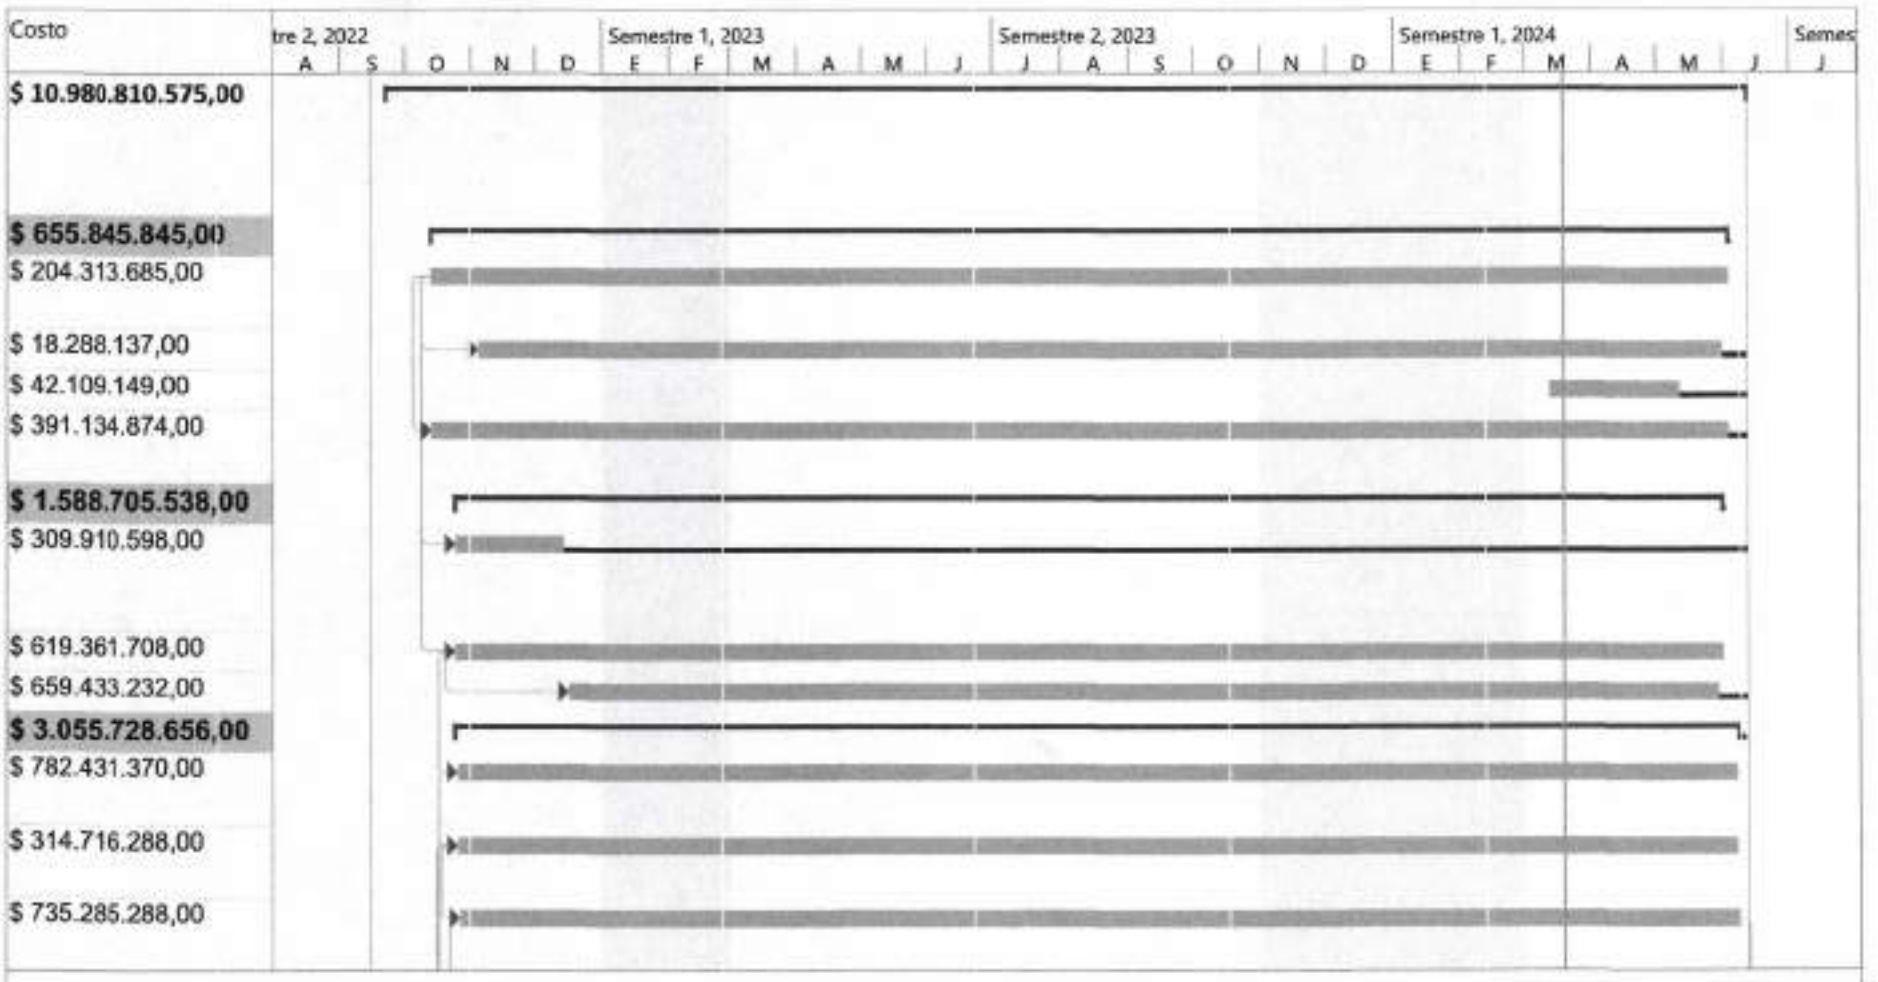

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 19/03/24


Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

6969

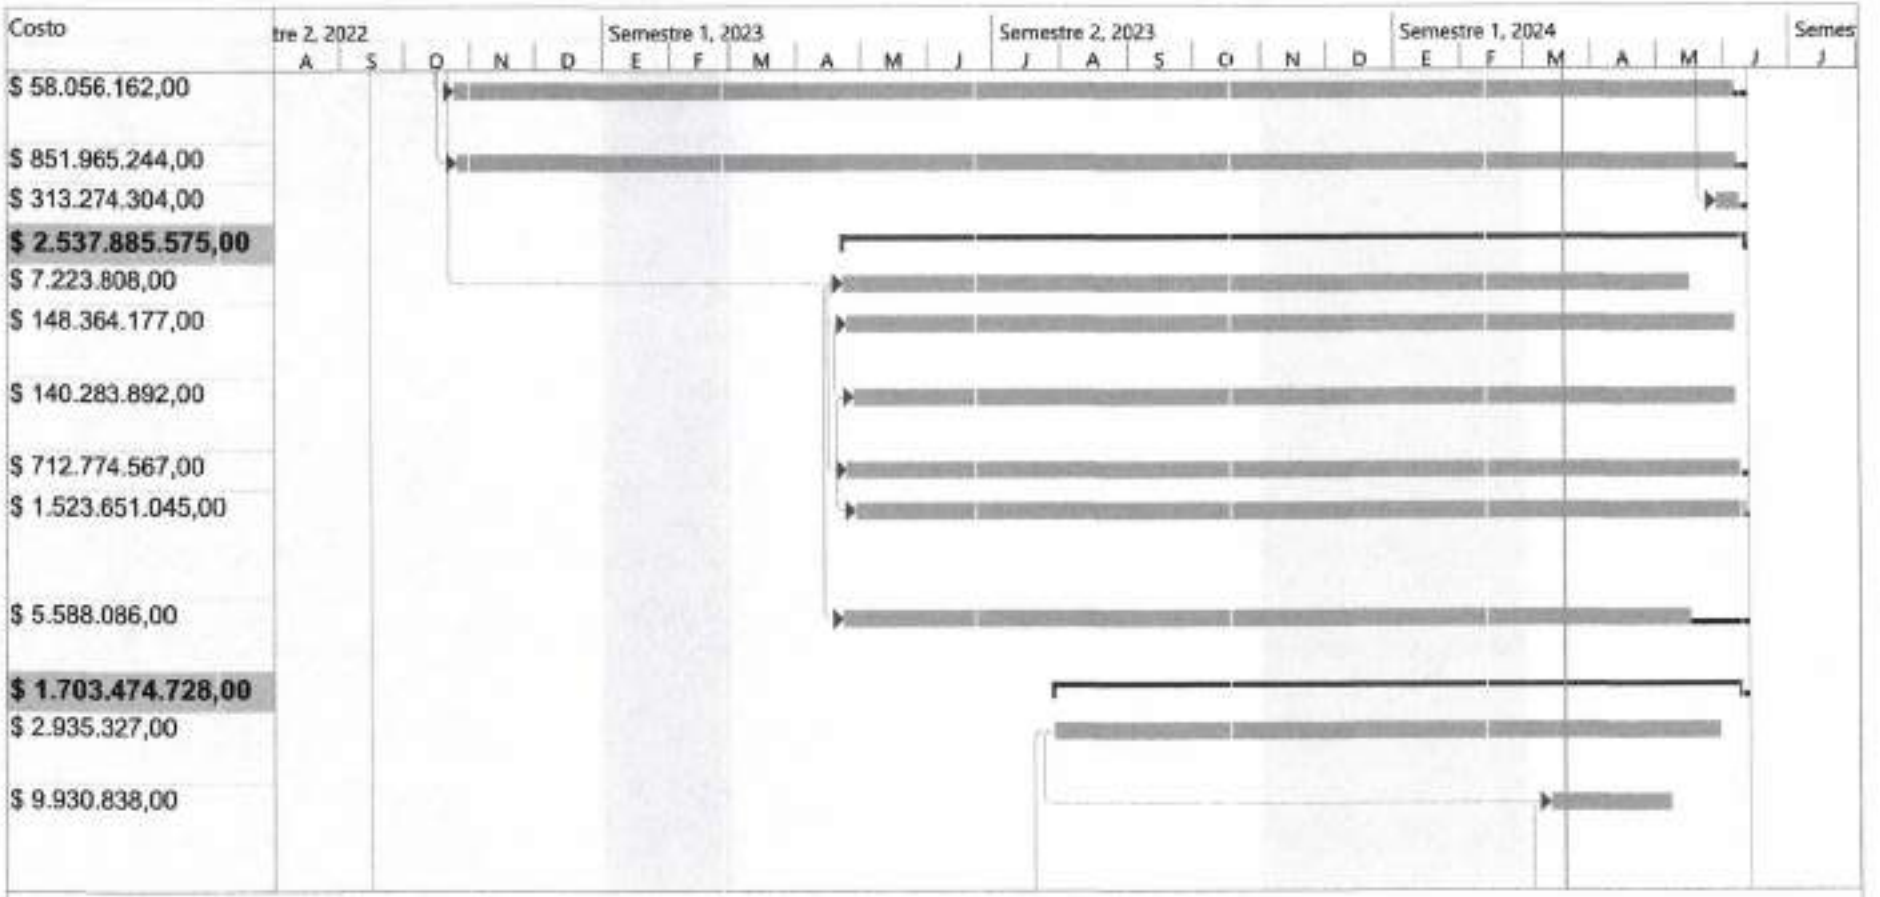

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 19/03/24


Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

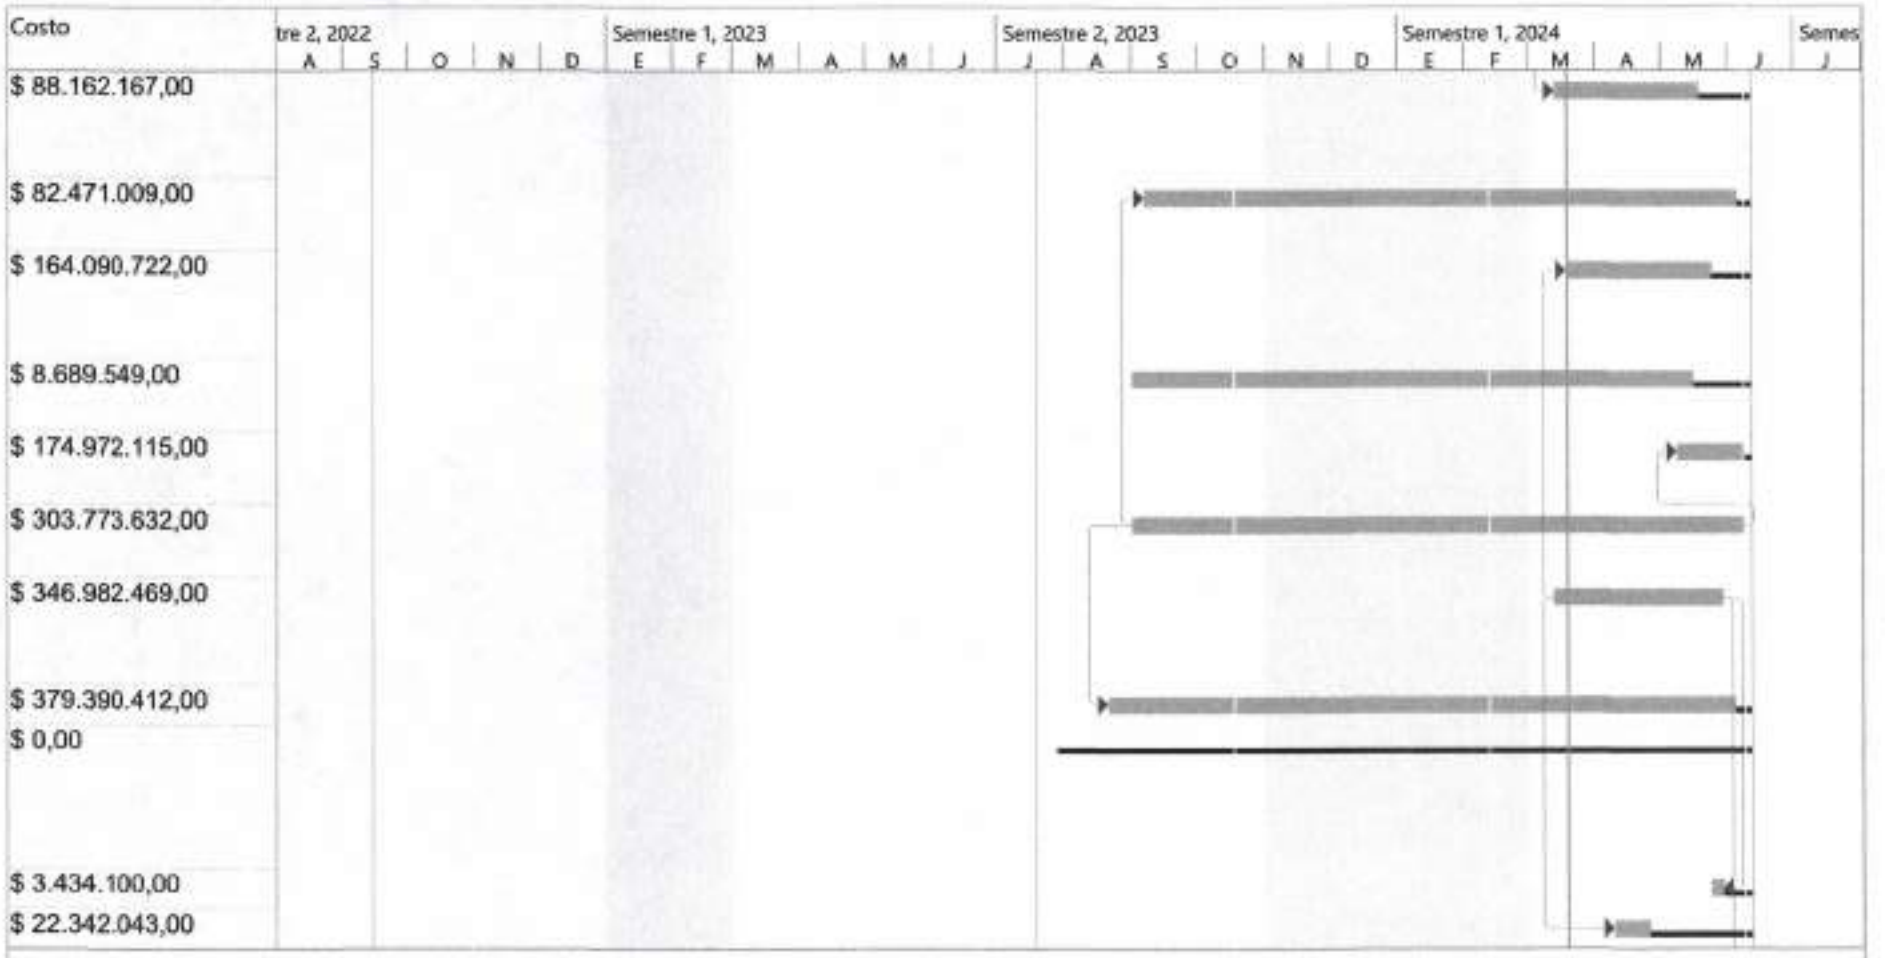

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 19/03/24

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

1169

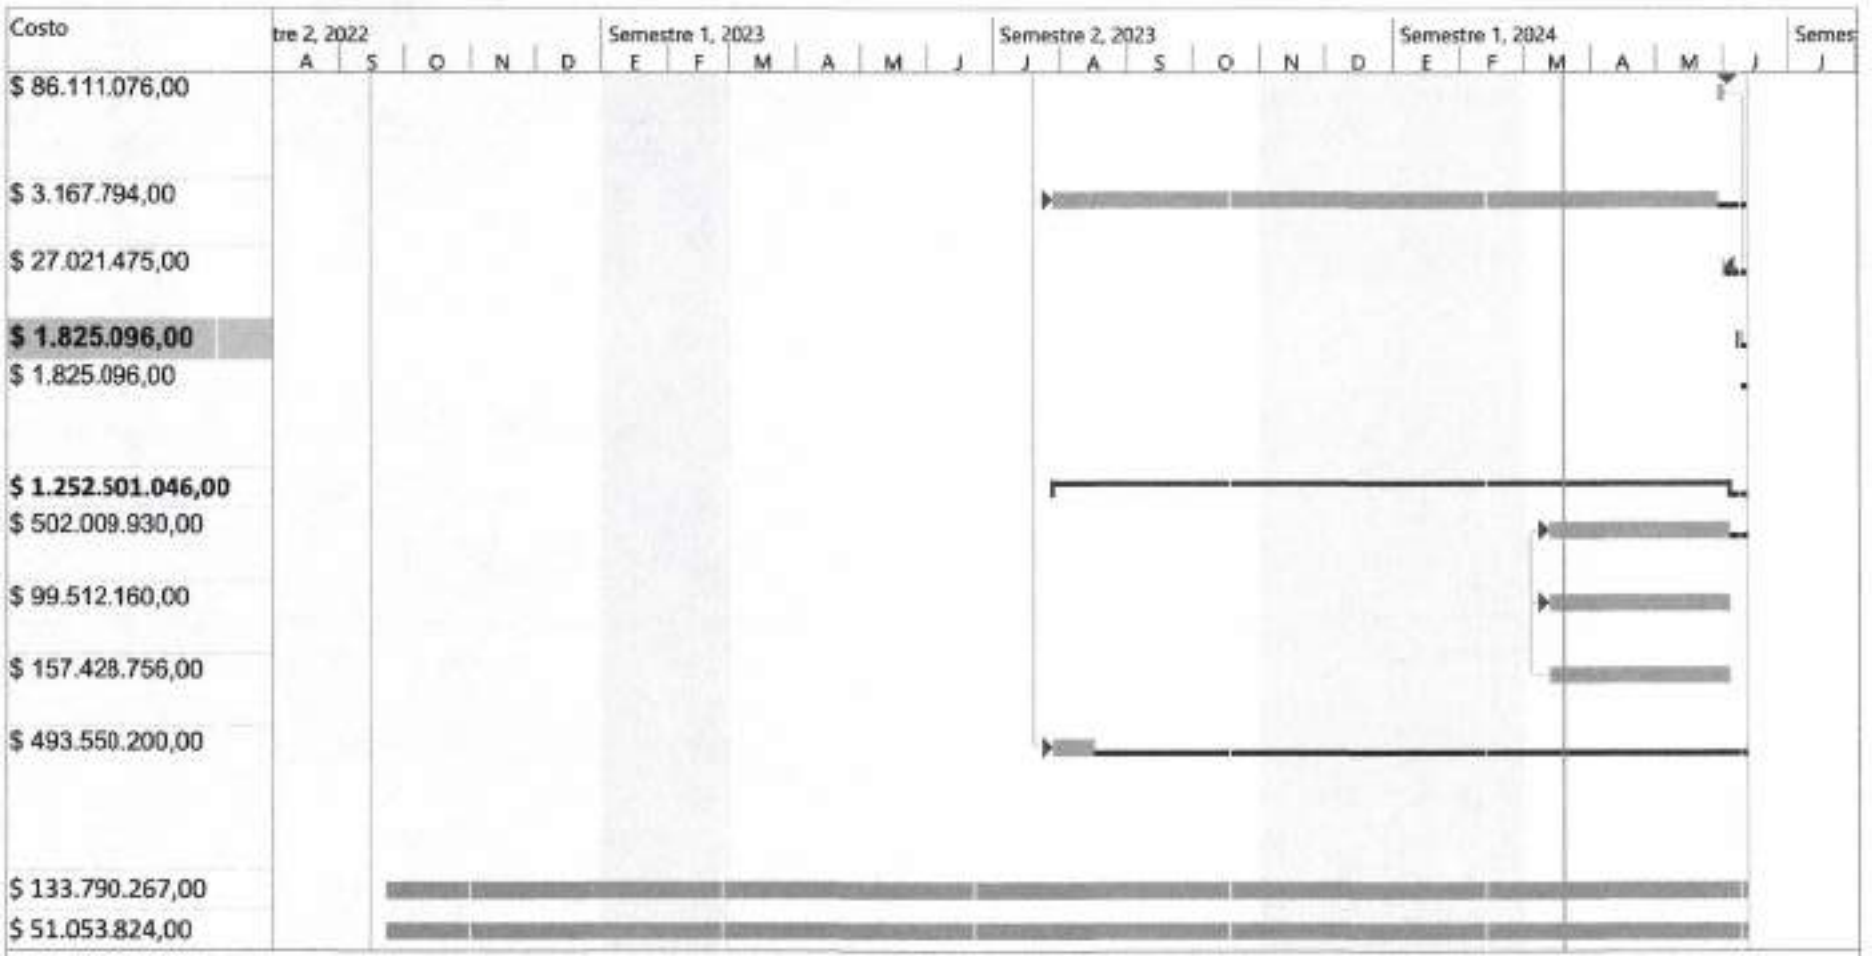

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 19/03/24

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
Hito inactivo		Tareas externas			
Resumen inactivo		Hito externo			

2149

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA: 10 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-SPM-012-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA MR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICPIO DE MONTERIA

SECTOR: K0+000 - K3+586

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco											24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	499
Lluvias moderadas											0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Lluvias intensas											0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total											24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA

OBSERVACIONES: SE RELACIONA EL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME

Nombre: Santiago Sanchez
Director de Obras
Matricula Profesional No.: 22202-273806COR

Nombre: Jesus David Tafur Acosta
Residente de Interventoría Consultoría Bogotana S.A.S.
Matricula No.: 22202-196511 COR

6913

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA: 10 (Día) / 4 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALD A DE MONTERIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-SPV-012-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA MR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

SECTOR: K0+000 - K3+586

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24																						234
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0																						4
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0																						2
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																						

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA

OBSERVACIONES: SE RELACIONA EL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME

Nombre: Santiago Sanchez
Director de Obras
Matricula Profesional No.: 22202-273606COR

Nombre: Jesus David Tafur Acosta
Residente de Interventoria Consultoria Bogotana S.A.S.
Matrícula No.: 22202-195511 COR

6919

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPM-013-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA MR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CMA-SPM-009-2022

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	14/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 1	1	4000 PSI	2893 (7 DIAS)	SI	
2	14/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 1	1	4000 PSI	3865 (14 DIAS)	SI	
3	14/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 1	1	4000 PSI	4093 (28 DIAS)	SI	
4	14/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 2	1	4000 PSI	2915 (7 DIAS)	SI	
5	14/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 2	1	4000 PSI	3629 (14 DIAS)	SI	
6	14/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 2	1	4000 PSI	4032 (28 DIAS)	SI	
7	18/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+110	1		96	SI	
8	18/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+160	1		99	SI	
9	19/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+210	1		97	SI	
10	19/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+260	1		96	SI	
11	19/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+310	1		99	SI	
12	19/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+365	1		98	SI	
13	19/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	ZAPATA PUENTE LADO 1	1	4000 PSI	2878 (7 DIAS)	SI	
14	19/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	ZAPATA PUENTE LADO 1	1	4000 PSI	3871 (14 DIAS)	SI	

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTCRES DONOVAN S.A.S RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	10/04/2024 (Dia / Mes / Año)

15	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	ZAPATA PUENTE LADO 1	1	4000 PSI	4045 (28 DIAS)	SI	
16	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	ZAPATA PUENTE LADO 2	1	4000 PSI	2946 (7 DIAS)	SI	
17	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	ZAPATA PUENTE LADO 2	1	4000 PSI	3711 (14 DIAS)	SI	
18	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	ZAPATA PUENTE LADO 2	1	4000 PSI	4055 (28 DIAS)	SI	
19	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+100 - K0+200	1	2000 PSI	1431 (7 DIAS)	SI	
20	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+100 - K0+200	1	2000 PSI	1806 (14 DIAS)	SI	
21	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+100 - K0+200	1	2000 PSI	2072 (28 DIAS)	SI	
22	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+200 - K0+300	1	2000 PSI	1439 (7 DIAS)	SI	
23	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+200 - K0+300	1	2000 PSI	1815 (14 DIAS)	SI	
24	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+200 - K0+300	1	2000 PSI	2017 (28 DIAS)	SI	
25	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+300 - K0+400	1	2000 PSI	1471 (7 DIAS)	SI	
26	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+300 - K0+400	1	2000 PSI	1915 (14 DIAS)	SI	
27	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+300 - K0+400	1	2000 PSI	2099 (28 DIAS)	SI	
28	21/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 5	1	3000 PSI	2138 (7 DIAS)	SI	
29	21/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 5	1	3000 PSI	2704 (14 DIAS)	SI	
30	21/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 5	1	3000 PSI	3059 (28 DIAS)	SI	
31	23/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGA DERECHA DEL PUENTE	1	4000 PSI	2945 (7 DIAS)	SI	

6916

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	10/04/2024 (Dia / Mes / Año)

32	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGA DERECHA DEL PUENTE	1	4000 PSI	3646 (14 DIAS)	SI	
33	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGA DERECHA DEL PUENTE	1	4000 PSI	4038 (28 DIAS)	SI	
34	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 6	1	3000 PSI	2161 (7 DIAS)	SI	
35	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 6	1	3000 PSI	2722 (14 DIAS)	SI	
36	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 6	1	3000 PSI	3092 (28 DIAS)	SI	
37	25/03/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+410	1		96	SI	
38	25/03/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+460	1		96	SI	
39	25/03/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+505	1		99	SI	
40	25/03/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+560	1		98	SI	
41	26/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGAS DEL PUENTE	1	4000 PSI	2847 (7 DIAS)	SI	
42	26/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGAS DEL PUENTE	1	4000 PSI	3661 (14 DIAS)	SI	
43	26/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGAS DEL PUENTE	1	4000 PSI	4120 (28 DIAS)	SI	
44	27/03/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+645	1		96	SI	
45	27/03/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+660	1		100	SI	
46	27/03/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+710	1		96	SI	
47	27/03/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+770	1		97	SI	
48	2/04/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+840	1		96	SI	
49	2/04/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+890	1		97	SI	
50	2/04/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	KD+950	1		99	SI	
51	5/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGA IZQUIERDA DEL PUENTE	1	4000 PSI	2970 (7 DIAS)	SI	
52	5/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGA IZQUIERDA DEL PUENTE	1	4000 PSI	3606 (14 DIAS)	SI	

6917

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	10/04/2024 (Dia / Mes / Año)

53	5/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGA IZQUIERDA DEL PUENTE	1	4000 PSI	4017 (28 DIAS)	SI	
54	5/04/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+995	1		99	SI	
55	5/04/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K1+040	1		100	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	18/0[illegible]/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+110 a K0+160	2		97	SI	
2	14/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 1	1	4000 PSI	2873 PSI (7 DIAS)	SI	
3	14/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 1	1	4000 PSI	3760 PSI (14 DIAS)	SI	
4	14/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 1	1	4000 PSI	4117 PSI (28 DIAS)	SI	
5	14/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 2	1	4000 PSI	2913 PSI (7 DIAS)	SI	
6	14/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 2	1	4000 PSI	3671 PSI (14 DIAS)	SI	
7	14/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	MURO PUENTE LADO 2	1	4000 PSI	4079 PSI (28 DIAS)	SI	
8	19/0[illegible]/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+210 a K0+365	4	4000 PSI	99	SI	
9	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+100 - K0+200	1	2000 PSI	1461 (7 DIAS)	SI	
10	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+100 - K0+200	1	2000 PSI	1846 PSI (14 DIAS)	SI	
11	19/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+100 - K0+200	1	2000 PSI	2118 PSI (28 DIAS)	SI	
12	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+100 - K0+200	1	3000 PSI	2225 PSI (7 DIAS)	SI	
13	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+100 - K0+200	1	3000 PSI	2790 PSI (14 DIAS)	SI	
14	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+100 - K0+200	1	3000 PSI	3060 PSI (28 DIAS)	SI	
15	20/0[illegible]/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+200 - K0+300	1	2000 PSI	1436 (7 DIAS)	SI	

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	10/04/2024 (Dia / Mes / Año)

16	20/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+200 - K0+300	1	2000 PSI	1815 PSI (14 DIAS)	SI	
17	20/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+200 - K0+300	1	2000 PSI	2060 PSI (28 DIAS)	SI	
18	21/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 5	1	3000 PSI	2141 PSI (7 DIAS)	SI	
19	21/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 5	1	3000 PSI	2792 PSI (14 DIAS)	SI	
20	21/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 5	1	3000 PSI	3063 PSI (28 DIAS)	SI	
21	21/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+400 - K0+500	1	2000 PSI	1491 PSI (7 DIAS)	SI	
22	21/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+400 - K0+500	1	2000 PSI	1841 PSI (14 DIAS)	SI	
23	21/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+400 - K0+500	1	2000 PSI	2028 PSI (28 DIAS)	SI	
24	22/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+200 - K0+300	1	3000 PSI	2136 PSI (7 DIAS)	SI	
25	22/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+200 - K0+300	1	3000 PSI	2718 PSI (14 DIAS)	SI	
26	22/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+200 - K0+300	1	3000 PSI	3026 PSI (28 DIAS)	SI	
27	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 6	1	3000 PSI	2222 PSI (7 DIAS)	SI	
28	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 6	1	3000 PSI	2766 PSI (14 DIAS)	SI	
29	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	LOSA INFERIOR BOX 6	1	3000 PSI	3019 PSI (28 DIAS)	SI	
30	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	BORDILLO K2+740	1	3000 PSI	2301 PSI (7 DIAS)	SI	
31	23/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	BORDILLO K2+740	1	3000 PSI	2252 PSI (7DIAS)	SI	
32	25/03/2024	Densidades en terrenc - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K1+090 a K1+380	7		98	SI	
33	25/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+400 - K0+500	1	3000 PSI	2225 PSI (7 DIAS)	SI	

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	10/04/2024 (Día / Mes / Año)

34	25/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+400 - K0+500	1	3000 PSI	2816 PSI (14 DIAS)	SI	
35	25/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+400 - K0+500	1	3000 PSI	3096 PSI (28 DIAS)	SI	
36	26/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGAS DEL PUENTE	1	4000 PSI	2858 PSI (7 DIAS)	SI	
37	26/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGAS DEL PUENTE	1	4000 PSI	3637 PSI (14 DIAS)	SI	
38	26/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	VIGAS DEL PUENTE	1	4000 PSI	4123 PSI (28 DIAS)	SI	
39	27/03/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+645 a K0+770	4		97	SI	
40	28/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+300 - K0+400	1	3000 PSI	2171 PSI (7 DIAS)	SI	
41	28/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+300 - K0+400	1	3000 PSI	2742 PSI (14 DIAS)	SI	
42	28/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+300 - K0+400	1	3000 PSI	3121 PSI (28 DIAS)	SI	
43	28/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+600 - K0+700	1	3000 PSI	2372 PSI (7 DIAS)	SI	
44	28/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+600 - K0+700	1	3000 PSI	2978 PSI (14 DIAS)	SI	
45	28/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+600 - K0+700	1	3000 PSI	3316 PSI (28 DIAS)	SI	
46	30/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+500 - K0+600	1	3000 PSI	2291 PSI (7 DIAS)	SI	
47	30/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+500 - K0+600	1	3000 PSI	2868 PSI (14 DIAS)	SI	
48	30/03/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+500 - K0+600	1	3000 PSI	3202 PSI (28 DIAS)	SI	
49	2/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+840	1		98	SI	
50	3/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+800 - K0+900	1	3000 PSI	2149 PSI (7 DIAS)	SI	
51	3/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+800 - K0+900	1	3000 PSI	2771 PSI (14 DIAS)	SI	

6920

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

52	3/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+800 - K0+900	1	3000 PSI	2771 PSI (28 DIAS)	SI	
53	3/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+890	1		97	SI	
54	4/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+950	1		96	SI	
55	5/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K1+040	1		97	SI	
56	5/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K0+995	1		96	SI	
57	9/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+700 - K0+800	1	3000 PSI	2149 PSI (7 DIAS)	SI	
58	9/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+700 - K0+800	1	3000 PSI	2771 PSI (14 DIAS)	SI	
59	10/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+900 - K1+000	1	3000 PSI	2225 PSI (7 DIAS)	SI	
60	10/04/2024	Ensayo de resistencia a la compresion de los cilindros de concreto	INV-E-410-13	K0+900 - K1+000	1	3000 PSI	2857 PSI (14 DIAS)	SI	
61	10/04/2024	Densidades en terreno - Método del cono de arena	INV-E-161-13	K1+090	2		96	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencian la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Santiago Sanchez
Director de Obras
Matrícula Profesional No.: 22202-273806COR

Firma

Nombre: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202151384COR

6921

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474-7
LABORATORIO DE ESTUDIOS DE SUELO, CONCRETOS Y ASFALTO

	DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161	**CÓDIGO**	P-FH-CEO-601c
		VERSIÓN	5
		FECHA	20/03/2022
		PÁGINA	1 de 1

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA		
Ordenado por:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
Fecha:	18/03/2024		
Proctor de Referencia - Densidad maxima lab (gr/cm3):	2.279	**% Hum. Opt :**	6.04
Material:			

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	18/03/2024	18/03/2024								
Abscisa	K0+110	K0+160								
Margen	EJE	EJE								
P.frasco+arena inicial (gr)	6825	6812								
P.frasco+arena final (gr)	3425	3398								
Peso arena total usada (gr)	3400	3414								
Constante del Cono (gr)	1624	1624								
P.arena en el hueco (gr)	1776	1790								
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1.427	1.427								
Volumen del Hueco (cm^3)	1245	1254								
P.material extraido humed(gr)	2932	2892								
Humedad (%)	6.8	5.8								
P.material extraido seco(gr)	2745	2733								
Densidad seca (gr/cm^3)	2.206	2.179								
Densidad seca (lb/ft^3)	137.6	136.0								
Densidad max.de labor(gr/cm^3)	2.279	2.279								
%Compactación (%)	97	96								

Observaciones:

Aprobó:

Jorge Luis Gallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Vanda Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 31A 1C-20 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277068 Montería - Córdoba / Correo: jorgesuelos20@gmail.com

JV INGENIERÍA

692

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474-7

LABORATORIO DE ESTUDIOS DE SUELO, CONCRETOS Y ASFALTO

	DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161	**CÓDIGO**	I-FR-CRO-001c
		VERSIÓN	5
		FECHA	20/01/2022
		PÁGINA	1 de 1

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA		
Ordenado por:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
Fecha:	19/03/2024		
Proctor de Referencia - Densidad maxima lab (gr/cm3):	2.279	**% Hum. Opt.:**	6.04
Material:			

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024						
Abscisa	K0+210	K0+280	K0+310	K0+365						
Margen	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO						
P.frasco+arena inicial (gr)	6778	6762	6725	6805						
P.frasco+arena final (gr)	3396	3415	3368	3375						
Peso arena total usada (gr)	3382	3337	3357	3430						
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624						
P.arena en el hueco (gr)	1758	1713	1733	1806						
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1.427	1.427	1.427	1.427						
Volumen del Hueco (cm^3)	1232	1200	1214	1266						
P.material extraido humed(gr)	2853	2839	2845	2874						
Humedad (%)	6.5	6.4	6.9	6.5						
P.material extraido seco(gr)	2668	2668	2661	2699						
Densidad seca (gr/cm^3)	2.182	2.223	2.191	2.257						
Densidad seca (lb/ft^3)	136.2	138.7	136.7	140.9						
Densidad max.de labor(gr/cm^3)	2.279	2.279	2.279	2.279						
%Compactación (%)	96	98	96	99						

Observaciones:

Aprobó:

Jorge Luis Gallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Vanda Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 3A 1C-30 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277088 Monteria - Cordoba / Correo: jorgesuelos20@gmail.com

JV INGENIERÍA

6913

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474-7

LABORATORIO DE ESTUDIOS DE SUELO, CONCRETOS Y ASFALTO

	DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161	CÓDIGO	P-FH-CEO-001c
		VERSIÓN	5
		FECHA	28/03/2022
		PÁGINA	1 de 1

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA		
Ordenado por:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
Fecha:	25/03/2024		
Proctor de Referencia - Densidad maxima lab (gr/cm3):	2.279	**% Hum. Opt.:**	6.04
Material:			

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024						
Abscisa	K0+410	K0+460	K0+505	K0+560						
Margen	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO						
P.frasco+arena inicial (gr)	6592	6571	6582	6528						
P.frasco+arena final (gr)	3256	3246	3245	3267						
Peso arena total usada (gr)	3336	3325	3337	3261						
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624						
P.arena en el hueco (gr)	1712	1701	1693	1637						
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1.427	1.427	1.427	1.427						
Volumen del Hueco (cm^3)	1200	1192	1179	1147						
P.material extraido humed(gr)	2863	2795	2815	2728						
Humedad (%)	6.3	6.8	6.9	6.3						
P.material extraido seco(gr)	2712	2617	2633	2567						
Densidad seca (gr/cm^3)	2.261	2.195	2.233	2.238						
Densidad seca (lb/ft^3)	141.1	137.0	139.3	139.6						
Densidad max.de labor(gr/cm^3)	2.279	2.279	2.279	2.279						
%Compactación (%)	99	96	98	98						

Observaciones:

Aprobó:

Jorge Luis Sallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Varela Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277098 Montería - Cordoba / Correo: jorgesuelos20@gmail.com

JV INGENIERÍA

6924

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474-7

LABORATORIO DE ESTUDIOS DE SUELO, CONCRETOS Y ASFALTO

	DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161	CÓDIGO	P-FH-CEO-001c
		VERSIÓN	5
		FECHA	20/03/2022
		PÁGINA	1 de 1

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA		
Ordenado por:	CONSULTORES CONOVAN SAS		
Fecha	27/03/2024		
Proctor de Referencia - Densidad maxima lab (gr/cm3):	2.279	**% Hum. Opt.:**	6.04
Material:			

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024						
Abscisa	K0+645	K0+680	K0+710	K0+770						
Margen	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO						
P.frasco+arena inicial (gr)	6592	6573	6547	6523						
P.frasco+arena final (gr)	3325	3325	3295	3276						
Peso arena total usada (gr)	3267	3248	3252	3247						
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624						
P.arena en el hueco (gr)	1643	1624	1628	1623						
Densidad de la arena (gr/cm³)	1.427	1.427	1.427	1.427						
Volumen del Hueco (cm³)	1151	1138	1141	1137						
P.material extraido humed(gr)	2725	2665	2652	2649						
Humedad (%)	5.8	6.2	6.8	6.5						
P.material extraido seco(gr)	2576	2509	2483	2487						
Densidad seca (gr/cm³)	2.237	2.205	2.177	2.187						
Densidad seca (lb/ft³)	139.6	137.6	135.8	136.5						
Densidad max.de labor(gr/cm³)	2.279	2.279	2.279	2.279						
%Compactación (%)	98	97	96	96						

Observaciones:

Aprobó:

Jorge Luis Gallejo Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Varela Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277066 Montería - Cordoba / Correo: jorgesuelos20@gmail.com

JV INGENIERÍA

6925

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474-7

LABORATORIO DE ESTUDIOS DE SUELO, CONCRETOS Y ASFALTO

	DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161	CÓDIGO	P-FH-CEO-001c
		VERSIÓN	5
		FECHA	28/03/2022
		PÁGINA	1 de 1

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA		
Ordenado por:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
Fecha:	2/04/2024		
Proctor de Referencia - Densidad maxima lab (gr/cm3):	2.279	% Hum. Opt.:	6.04
Material:			

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	2/04/2024	3/04/2024	4/04/2024							
Abscisa	K0+840	K0+890	K0+950							
Margen	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO							
P.frasco+arena inicial (gr)	6698	6673	6648							
P.frasco+arena final (gr)	3365	3345	3326							
Peso arena total usada (gr)	3333	3328	3322							
Cosetante del Cono (gr)	1624	1624	1624							
P.arena en el hueco (gr)	1709	1704	1698							
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1.427	1.427	1.427							
Volumen del Hueco (cm^3)	1198	1194	1190							
P.material extraido humed(gr)	2865	2709	2775							
Humedad (%)	6.8	6.4	6.1							
P.material extraido seco(gr)	2683	2631	2615							
Densidad seca (gr/cm^3)	2.240	2.203	2.198							
Densidad seca (lb/ft^3)	139.8	137.5	137.2							
Densidad max.de labor(gr/cm^3)	2.279	2.279	2.279							
%Compactación (%)	98	97	96							

Observaciones:

Aprobó:

Jorge Luis Gallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Vanda Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277098 Montería - Córdoba / Correo: jorgesuelos20@gmail.com

JV INGENIERÍA

9926

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474-7

LABORATORIO DE ESTUDIOS DE SUELO, CONCRETOS Y ASFALTO

DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161

CÓDIGO	P-FH-CEO-001c
VERSIÓN	5
FECHA	20/03/2022
PÁGINA	1 de 1

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA		
Ordenado por:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
Fecha:	5/04/2024		
Proctor de Referencia - Densidad maxima lab (gr/cm3):	2.279	% Hum. Opt.:	6.04
Material:			

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	5/04/2024	5/04/2024								
Abscisa	K1+040	K0+995								
Margen	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO								
P.frasco+arena inicial (gr)	6675	6648								
P.frasco+arena final (gr)	3345	3378								
Peso arena total usada (gr)	3330	3270								
Constante del Cono (gr)	1624	1624								
P.arena en el hueco (gr)	1706	1646								
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1.427	1.427								
Volumen del Hueco (cm^3)	1196	1153								
P.material extraido humed(gr)	2815	2683								
Humedad (%)	6.9	6.2								
P.material extraido seco(gr)	2633	2526								
Densidad seca (gr/cm^3)	2.203	2.190								
Densidad seca (lb/ft^3)	137.4	136.7								
Densidad max.de labor(gr/cm^3)	2.279	2.279								
%Compactación (%)	97	96								

Observaciones:

Aprobó:

Jorge Luis Gallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Vanda Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277098 Montería - Córdoba / Correo: jorgesuelos20@gmail.com

JV INGENIERÍA

6927

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474-7

LABORATORIO DE ESTUDIOS DE SUELO, CONCRETOS Y ASFALTO

	DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161	CÓDIGO	P-FH-CEO-001c
		VERSIÓN	5
		FECHA	20/03/2022
		PÁGINA	1 de 1

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA		
Ordenado por:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
Fecha:	10/04/2024		
Proctor de Referencia - Densidad maxima lab (gr/cm3):	2.279	% Hum. Opt.:	6.04
Material:			

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	10/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	13/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	16/04/2024			
Abscisa	K1+090	K1+140	K1+195	K1+240	K1+285	K1+335	K1+380			
Margen	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO			
P.frasco+arena inicial (gr)	6685	6667	6645	6624	6610	6584	6561			
P.frasco+arena final (gr)	3376	3367	3345	3343	3348	3315	3354			
Peso arena total usada (gr)	3309	3260	3300	3281	3262	3269	3207			
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624	1624	1624	1624			
P.arena en el hueco (gr)	1685	1642	1676	1657	1638	1645	1583			
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427			
Volumen del Hueco (cm^3)	1181	1151	1174	1161	1148	1153	1109			
P.material extraido humed(gr)	2745	2723	2723	2695	2678	2685	2632			
Humedad (%)	6.8	6.2	6.3	6.0	5.8	6.2	6.4			
P.material extraido seco(gr)	2570	2561	2562	2542	2531	2528	2474			
Densidad seca (gr/cm^3)	2.177	2.228	2.181	2.190	2.205	2.193	2.230			
Densidad seca (lb/ft^3)	135.8	139.0	136.1	136.6	137.6	136.9	139.1			
Densidad max de labor(gr/cm^3)	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279			
%Compactación (%)	96	98	96	96	97	96	98			

Observaciones:

Aprobó:

Jorge Luis Gallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Varela Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277099 Montería - Cordoba / Correo: jorgesuelos20@gmail.com

JV INGENIERÍA

6976

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474-7

LABORATORIO DE ESTUDIOS DE SUELO, CONCRETOS Y ASFALTO

	DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV E -161	CÓDIGO	P-FH-CEO-001c
		VERSIÓN	5
		FECHA	28/03/2022
		PÁGINA	1 de 1

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA		
Ordenado por:	CONSULTORES DONOVAN SAS		
Fecha:	12/04/2024		
Proctor de Referencia - Densidad maxima lab (gr/cm3):	2.279	% Hum. O.H.:	6.04
Material:			

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	12/04/2024	13/04/2024	14/04/2024	15/04/2024						
Abscisa	K1+440	K1+470	K1+515	K1+575						
Margen	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO						
P.frasco+arena inicial (gr)	6597	6573	6551	6528						
P.frasco+arena final (gr)	3286	3295	3286	3268						
Peso arena total usada (gr)	3311	3278	3265	3260						
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624						
P.arena en el hueco (gr)	1687	1654	1641	1636						
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1.427	1.427	1.427	1.427						
Volumen del Hueco (cm^3)	1182	1159	1150	1146						
P.material extraido humed(gr)	2796	2675	2745	2658						
Humedad (%)	6.3	5.3	6.8	6.4						
P.material extraido seco(gr)	2630	2540	2570	2498						
Densidad seca (gr/cm^3)	2.225	2.192	2.235	2.179						
Densidad seca (lb/ft^3)	138.8	136.8	139.5	136.0						
Densidad max.de labor(gr/cm^3)	2.279	2.279	2.279	2.279						
%Compactación (%)	98	96	98	96						

Observaciones:

Aprobó:

Jorge Luis Gallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Vanda Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277098 Montería - Córdoba / Correo: jorgesuelos20@gmail.com

JV INGENIERÍA


6429

JV INGENIERÍA
NIT. 11765.476-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-28 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098


Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	1c/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1


NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						kl (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CON CRETO CICLOPEO 2000 PSI (K0+100-K0+200	19/03/2024	26/03/2024	7	2000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12885.0	2.368066877					X		180	1461	73%	CUMPLE
2	CON CRETO CICLOPEO 2000 PSI (K0+100-K0+200	19/03/2024	2/04/2024	14	2000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12947.0	2.378218693					X		227	1846	92%	CUMPLE
3	CON CRETO CICLOPEO 2000 PSI (K0+100-K0+200	19/03/2024	16/04/2024	28	2000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12965.0	2.381525891					X		260	2118	106%	CUMPLE


Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6930

	JV INGENIERÍA NIT. 11760 454-7 LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410	Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL.: 3104277898

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	17/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO f'cl	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						hl (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (Kl+200 Kl+300)	20/03/2024	27/03/2024	7	2000	30.4	15.1	179.3	5444.8	12468.0	2.290231766						X	177	1436	72%	CUMPLE
2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (Kl+200 Kl+300)	20/03/2024	3/04/2024	14	2000	30.4	15.1	179.3	5444.8	12389.0	2.332488108					X		225	1815	91%	CUMPLE
3	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (Kl+200 Kl+300)	20/03/2024	17/04/2024	28	2000	30.4	15.1	179.3	5444.8	12745.0	2.341113559					X		253	2040	102%	CUMPLE



Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 35202-40133 DE CND.


JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

	JV INGENIERÍA NIT: 11 [illegible] 7 LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINdros DE CONCRETO I.N.V. - 410	Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL: 3106277098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	01/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO f'cll	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (E0=400-E0+500)	21/03/2024	28/03/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5446.0	12705.0	2.344787336				X			183	1491	75%	CUMPLE
2	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (E0=400-E0+500)	21/03/2024	4/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5446.0	12741.0	2.340578804					X		226	1841	92%	CUMPLE
3	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (E0=400-E0+500)	21/03/2024	18/04/2024	28	3000	30.4	15.1	179.1	5446.0	12069.0	2.216931994					X		249	2028	101%	CUMPLE


Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25302-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6982

	JV INCENIERÍA NIT. 11 760 474-7 LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410	Calle 5A 1C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL: 3106177098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	30/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3-	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO 3000 PSI BORDILLO K2+740	23/04/2024	30/04/2024	7	3000	28.2	10.1	80.1	1638.4	3825.0	2.363455562					X		127	2301	77%	CUMPLE
2	CONCRETO 3000 PSI BORDILLO K2+740	23/04/2024	30/04/2024	7	3000	28.2	10.1	80.1	1638.4	3817.0	2.358512387					X		124	2252	75%	CUMPLE
3																					


Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25302-40122 DE CND.


JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

JV INGENIERÍA
NIT. 11760.474.7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-28 Nuevo Horizonte
MONTERIA - CÓRDOBA
CEL: 3106277098


Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	1°/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORRIGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						kl (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+100 KD+200)	30/03/2024	27/03/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12723.0	2.336785028				X			235	2225	74%	CUMPLE
2	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+100 KD+200)	30/03/2024	3/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12786.0	2.348644799					X		345	2798	93%	CUMPLE
3	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+100 KD+200)	20/03/2024	17/04/2024	28	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12824.0	2.355624973					X		376	3060	102%	CUMPLE



Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6939

JV INGENIERÍA
NIT. 11 765 476-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
UNV. - 410

Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106177098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	19/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO f'SI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+200 - KD+200	22/03/2024	29/03/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12953.0	2.379320826				X			283	2136	71%	CUMPLE
2	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+200 - KD+200	22/03/2024	5/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12894.0	2.368485188					X		334	2318	93%	CUMPLE
3	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+200 - KD+200	22/03/2024	19/04/2024	28	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12916.0	2.371524361						X	372	3026	101%	CUMPLE

Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos

Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

Fractura en una de las esquinas

las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6935

JV INGENIERÍA
NIT. 13 565 474-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106377098


Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	25/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO f'SI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+300 KD+400)	28/03/2024	4/04/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12456.0	2.2880275					X		267	3173	72%	CUMPLE
2	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+300 KD+400)	28/03/2024	11/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12487.0	2.2937218S2					X		337	3742	91%	CUMPLE
3	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+300 KD+400)	28/03/2024	25/04/2024	28	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12509.0	2.297763086						X	384	3121	89%	CUMPLE


Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40121 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6936

JV INGENIERÍA
NIT. 11'565 474-5
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 5A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	22/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO f'cl	DATOS DE DIMENSIÓN											Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						Sl (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+400 - KD+500)	25/03/2024	1/04/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5444.8	12526.9	2.300885715					X		274	2225	74%	CUMPLE
2	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+400 - KD+500)	25/03/2024	8/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5444.8	12594.8	2.313376152					X		346	2816	94%	CUMPLE
3	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+400 - KD+500)	25/03/2024	22/04/2024	28	3000	30.4	15.1	179.1	5444.8	12628.0	2.319621971					X		381	3096	103%	CUMPLE


Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25201-40122 DE CND

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6937

JV INGENIERÍA
NIT. 1176549-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA - CÓRDOBA
CEL: 3106277098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	2/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN											Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI ACELERADO - (K0+500 - K0+600)	30/03/2024	6/04/2024	7	3000	30.4	15.1	178.1	5446.0	12684.0	2.329668563					X		282	2293	76%	CUMPLE
2	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI ACELERADO - (K0+500 - K0+600)	30/03/2024	13/04/2024	14	3000	30.4	15.1	178.1	5446.0	12726.0	2.337623472					X		356	2898	97%	CUMPLE
3	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI ACELERADO - (K0+500 - K0+600)	30/03/2024	27/04/2024	28	3000	30.4	15.1	178.1	5446.0	12769.0	2.34552289					X		394	3202	107%	CUMPLE

Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos

Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

Fractura en una de las esquinas

las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25201-40123 DE CND.

JORGE LUIS VANBA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6136

	JV INGENIERÍA NIT. 11765 474-7 LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410	Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL: 3106277098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	2/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto fleche en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO f'SI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						kl (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO RIGIDO ACELERADO 3000 PSI - (KD+600 - KD+700)	28/03/2024	4/04/2024	7	3000	30.4	15.1	179.3	5448.8	13796.0	2.53048168T					X		292	2372	79%	CUMPLE
2	CONCRETO RIGIDO ACELERADO 3000 PSI - (KD+600 - KD+700)	28/03/2024	11/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.3	5448.8	12774.4	2.346586602						X	388	2978	99%	CUMPLE
3	CONCRETO RIGIDO ACELERADO 3000 PSI - (KD+600 - KD+700)	28/03/2024	25/04/2024	28	3000	30.4	15.1	179.3	5448.0	12812.5	2.353510713					X		408	3316	111%	CUMPLE


Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40133 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6939

JV INGENIERÍA
NIT. 11 765 474-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. – 410

Calle 1A 1C-20 Nueva Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106177890

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	2/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						H (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+700 - (KD+680)	8/04/2024	16/04/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5444.8	12804.4	2.350549316					X		264	2149	72%	CUMPLE
2	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+700 - (KD+680)	8/04/2024	23/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5444.8	12737.3	2.339061008						X	341	2771	92%	CUMPLE
3																					

Fractura diagonal sin quiebres a través de los extremos

Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

Fractura en una de las esquinas

las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25302-40121 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6990


JV INGENIERÍA
NIT. 1) 760.474-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. –418

Calle 3A #C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3104177898

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	2/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1


NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO FSI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						ld (cm)	ld (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+000 - KD+000)	3/04/2024	10/04/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5404.0	12094.4	2.368549316					X		264	2148	72%	CUMPLE
2	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+000 - KD+000)	3/04/2024	17/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5404.0	12737.3	2.358691888						X	341	2771	92%	CUMPLE
3	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+000 - KD+000)	3/04/2024	1/05/2024	28	3000	30.4	15.1	179.1	5404.0	12737.3	2.358691888						X	341	2771	92%	CUMPLE


Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25102-68121 DE CND.

JORGE LUIS VANBA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6661

JV INGENIERÍA
NIT. 13 765 474-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106177098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	24/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO 1SI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+900 - K1+000)	10/04/2024	17/04/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5446.0	12765.0	2.344787335					X		274	2215	74%	CUMPLE
2	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+900 - K1+000)	10/04/2024	24/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5446.0	12806.0	2.352118575					X		351	2857	95%	CUMPLE
3																					

Fractura diagonal sin grietes a través de los extremos

Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

Fractura en una de las esquinas

las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

692

	JV INGENIERÍA NIT. 11760 470-7 LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410	Calle 5A #C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL: 3106277098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	1 /04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DINOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						Li (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	MURO FUENTE LADO 1 CONCRETO 4000 PSI	14/03/2024	31/03/2024	7	4000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12776.0	2.346887811					X		353	2873	72%	CUMPLE
2	MURO FUENTE LADO 1 CONCRETO 4000 PSI	14/03/2024	28/03/2024	14	4000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12825.0	2.355441284					X		462	3760	94%	CUMPLE
3	MURO FUENTE LADO 1 CONCRETO 4000 PSI	14/03/2024	11/04/2024	28	4000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12740.0	2.340195315					X		506	4117	103%	CUMPLE

Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos

Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

Fractura en una de las esquinas

las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-48121 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA


6993


JV INGENIERÍA
NIT. 1176S-034-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277898


Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	1 /04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1


NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO FSI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO 4000 PSI MURO FUENTE - LADO 2	14/03/2024	21/03/2024	7	4000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12843.0	2.35911506					X		358	2913	73%	CUMPLE
2	CONCRETO 4000 PSI MURO FUENTE - LADO 2	14/03/2024	28/03/2024	14	4000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12896.0	2.368850565					X		451	3671	92%	CUMPLE
3	CONCRETO 4000 PSI MURO FUENTE - LADO 2	14/03/2024	11/04/2024	28	4000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12917.0	2.37270803					X		501	4079	102%	CUMPLE


Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

688

JV INGENIERÍA
NIT. 13 765 474-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106237098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	22/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1


NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO f'cl	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						H (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO 4000 PSI VIGAS DEL PUENTE	26/03/2024	2/04/2024	7	4000	30.4	15.1	179.1	5444.8	12659.0	2.325316323						X	351	3858	73%	CUMPLE
2	CONCRETO 4000 PSI VIGAS DEL PUENTE	26/03/2024	9/04/2024	14	4000	30.4	15.1	179.1	5446.0	12305.0	2.333766807					X		447	3437	91%	CUMPLE
3	CONCRETO 4000 PSI VIGAS DEL PUENTE	26/03/2024	23/04/2024	28	4000	30.4	15.1	179.1	5444.8	12688.0	2.330693299						X	507	4123	103%	CUMPLE


Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25102-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

695

JV INGENIERÍA
NIT: 1 1 705 474-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106177898

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	2/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO f'Ci	DATOS Y/O DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						H (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO 3000 PSI CUERPO COMPLETO BOX 5	11/04/2024	18/04/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12845.0	2.359482437					X		236	3246	75%	CUMPLE
2	CONCRETO 3000 PSI CUERPO COMPLETO BOX 5	11/04/2024	25/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12863.0	2.362788835					X		148	3033	94%	CUMPLE
3																					

Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos

Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

Fractura en una de las esquinas

las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 23301-40133 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6996

JV INGENIERÍA
NIT: 11760.474-7
LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA - CÓRDOBA
CEL: 3106277098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	30/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO FSI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO 3000 PSI CUERPO COMPLETO BOX 6	23/04/2024	30/04/2024	7	3000	30.4	15.1	178.1	5404.6	12740.0	2.360185115				X			267	2175	72%	CUMPLE
2	CONCRETO 3000 PSI CUERPO COMPLETO BOX 6	23/04/2024	30/04/2024	7	3000	30.4	15.1	178.1	5404.6	12698.0	2.352401186					X		263	2141	71%	CUMPLE
3																					

Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos

Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

Fractura en una de las esquinas

las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.


JORGE LUIS VANEGA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

64

	JV INGENIERÍA NIT. 11 760 074-7 LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410	Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL: 3106377098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	11/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe Nº:**	1


NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN												Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 5	21/03/2024	28/03/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12841.0	2.577116561				X			203	2161	73%	CUMPLE
2	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 5	21/03/2024	4/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12813.0	2.571973273				X			345	2792	93%	CUMPLE
3	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 5	21/03/2024	18/04/2024	28	3000	30.4	15.1	179.1	5444.0	12976.0	2.603545668					X		377	3063	102%	CUMPLE


Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.


JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA


6 de 8

	JV INGENIERÍA NIT. 1.1765.474-7 LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410	Calle 3A #C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL: 3106177098

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	20/04/2024
Solicitante:	CONSULTORES DONOVAN SAS	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

NUMERO CILINDRO	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN											Resistencia Obtenida			CUMPLIMIENTO
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)	PESO (Kg)	Peso Unitario (Kg/m3)							DISEÑO (KN)	PSI	%	
1	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 6	25/03/2024	30/03/2024	7	3000	30.4	15.1	179.1	5444.8	13647.0	2.32311E+03				X			233	2222	74%	CUMPLE
2	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 6	25/03/2024	6/04/2024	14	3000	30.4	15.1	179.1	5444.8	12695.0	2.33382E+03				X			343	2768	92%	CUMPLE
3	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 6	25/03/2024	20/04/2024	28	3000	30.4	15.1	179.1	5444.8	12714.0	2.33541E+03				X			371	3019	101%	CUMPLE


Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40121 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

6/9

6950


GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	11/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			MURO PUENTE LADO 1 CONRETO 4000 PSI - (#66)	MURO PUENTE LADO 1 CONRETO 4000 PSI - (#66)	MURO PUENTE LADO 1 CONRETO 4000 PSI - (#66)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12883	12732	12758					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.335	2.308	2.313					
Resistencia (KN)			349.22	456.65	509.96					
Resistencia (psi)			2603.5	3865.9	4093.8					
Porcentaje Obtenido (%)			70.1	91.6	102.3					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	B	A					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica H

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6951

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	11/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO 4000 PSI MURO PUENTE - LADO 2	CONCRETO 4000 PSI MURO PUENTE - LADO 2	CONCRETO 4000 PSI MURO PUENTE - LADO 2					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12875	12695	12763					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.334	2.301	2.314					
Resistencia (KN)			363.14	452.05	502.25					
Resistencia (psi)			2915.2	3629.0	4032.0					
Porcentaje Obtenido (%)			72.9	90.7	100.8					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			B	C	B					


Cono (a)


Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica H

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6952

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	23/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			2/04/2024	9/04/2024	23/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO 4000 PSI VIGAS DEL PUENTE	CONCRETO 4000 PSI VIGAS DEL PUENTE	CONCRETO 4000 PSI VIGAS DEL PUENTE					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12745	12898	12852					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.310	2.345	2.330					
Resistencia (KN)			354.75	456.05	513.24					
Resistencia (psi)			2647.9	3881.1	4120.2					
Porcentaje Obtenido (%)			71.2	81.5	103.0					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	B	B					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6953

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	16/11/2023
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			26/10/2023	2/11/2023	16/11/2023					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA PUENTE - LADO 1 (#51)	CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA PUENTE - LADO 1 (#51)	CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA PUENTE - LADO 1 (#51)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12893	12742	12762					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.337	2.310	2.313					
Resistencia (KN)			358.53	457.33	503.89					
Resistencia (psi)			2878.2	3671.4	4045.1					
Porcentaje Obtenido (%)			72.0	91.8	101.1					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			A	C	B					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6959

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	16/11/2023
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			19/10/2023	19/10/2023	19/10/2023					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			26/10/2023	2/11/2023	16/11/2023					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA PUENTE - LADO 2 (#82)	CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA PUENTE - LADO 2 (#82)	CONCRETO 4000 PSI PARA ZAPATA PUENTE - LADO 2 (#82)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	Altura	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12900	12754	12775					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.339	2.312	2.316					
Resistencia (KN)			367.23	462.33	505.23					
Resistencia (psi)			2948.1	3711.5	4055.9					
Porcentaje Obtenido (%)			73.7	92.8	101.4					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	C	B					


Cono (a)



Cono y hendadura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica H

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6955

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	21/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			23/03/2024	24/03/2024	24/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			30/03/2024	7/04/2024	21/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			VIGA DERECHA DE MENOR A MAYOR 4000 PSI (#134)	VIGA DERECHA DE MENOR A MAYOR 4000 PSI (#135)	VIGA DERECHA DE MENOR A MAYOR 4000 PSI (#136)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.2	30.2	30.2					
	Diametro	d	15.1	15.1	15.1					
Volumen (cm^3):			5408	5408	5408					
Area (cm^3):			179.1	179.1	179.1					
Peso (kg):			12842	12892	12868					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.375	2.384	2.379					
Resistencia (KN)			362.16	448.29	496.49					
Resistencia (psi)			2945.9	3646.6	4038.7					
Porcentaje Obtenido (%)			73.6	91.2	101.0					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	B	C					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación: NOTA: Los resultados aquí emitidos corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de representatividad del material, si se altera el mismo, lo invalida completamente.

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6956

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	3/05/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	2

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			5/04/2024	5/04/2024	5/04/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			12/04/2024	19/04/2024	3/05/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			4000 PSI	4000 PSI	4000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			VIGA IZQUIERDA DE MENORES A MAYOR 4000 PSI (#137)	VIGA IZQUIERDA DE MENORES A MAYOR 4000 PSI (#138)	VIGA IZQUIERDA DE MENORES A MAYOR 4000 PSI (#139)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.2	30.2	30.2					
	Diametro	d	15.1	15.1	15.1					
Volumen (cm^3):			5408	5408	5408					
Area (cm^2):			179.1	179.1	179.1					
Peso (kg):			12932	12911	12866					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.391	2.387	2.379					
Resistencia (KN)			365.18	443.39	493.86					
Resistencia (psi)			2970.6	3606.8	4017.5					
Porcentaje Obtenido (%)			74.3	90.2	100.4					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	B	C					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación: NOTA: Los resultados aquí emitidos corresponden estrictamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de representatividad del material, si se altera el mismo, lo invalida completamente.

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6957

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION CEESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	30/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	3

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			16/04/2024	16/04/2024						
Dias De Curado:			7	14						
Fecha De Ensayo:			23/04/2024	30/04/2024						
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"						
Diseño:			4000 PSI	4000 PSI						
Tipo De Elemento Vaciado:			PUENTE LOSA SUPERIOR (#149)	PUENTE LOSA SUPERIOR (#150)						
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.2	30.2						
	Diametro	d	15.1	15.1						
Volumen (cm^3):			5408	5408						
Area (cm^2):			179.1	179.1						
Peso (kg):			12711	12766						
Peso Unitario (kg/m^3):			2.350	2.361						
Resistencia (KN)			348.59	449.06						
Resistencia (psi)			2835.6	3653.0						
Porcentaje Obtenido (%)			70.9	91.3						
Observación			CUMPLE	CUMPLE						
Tipo de falla			E	C						


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

HnAltura
DnDiametro



Observación: NOTA: Los resultados aquí emitidos corresponden exlclusivamente a las muestras proporcionadas por el cliente y no constituyen garantía de representatividad del material, si se altera el mismo, lo invalida completamente.

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6958

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	25/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			11/04/2024	11/04/2024						
Dias De Curado:			7	14						
Fecha De Ensayo:			18/04/2024	25/04/2024						
Asentamiento (pulg):			3.0"	3.5"						
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI						
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO 3000 PSI CUERPO COMPLETO BOX 5	CONCRETO 3000 PSI CUERPO COMPLETO BOX 5						
Dimensiones Del Cilindro (cm)	Altura	h	30.4	30.4						
	Diametro	d	15.2	15.2						
Volumen (cm^3):			5516	5516						
Area (cm^2):			181.46	181.46						
Peso (kg):			12852	12866						
Peso Unitario (kg/m^3):			2.330	2.332						
Resistencia (KN)			270.38	344.16						
Resistencia (psi)			2170.4	2762.9						
Porcentaje Obtenido (%)			72.3	92.1						
Observación			CUMPLE	CUMPLE						
Tipo de falla			B	B						


Cono (a)


Cono y hendadura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

OSCAR BENITEZ RUIZ

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6959

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DESESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	30/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			23/04/2024							
Dias De Curado:			7							
Fecha De Ensayo:			30/04/2024							
Asentamiento (pulg):			3.5"							
Diseño:			3000 PSI							
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO 3000 PSI CUERPO COMPLETO BOX 6							
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4							
	Diametro	d	15.2							
Volumen (cm^3):			5516							
Area (cm^2):			181.48							
Peso (kg):			12910							
Peso Unitario (kg/m^3):			2.340							
Resistencia (KN)			269.35							
Resistencia (psi)			2162.3							
Porcentaje Obtenido (%)			72.1							
Observación			CUMPLE							
Tipo de falla			C							


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica H

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6960

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	18/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1


Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			28/03/2024	4/04/2024	18/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 5	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 5	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 5					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12950	12635	12875					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.348	2.290	2.334					
Resistencia (KN)			268.36	336.84	381.08					
Resistencia (psi)			2138.3	2704.1	3059.2					
Porcentaje Obtenido (%)			71.3	90.1	102.0					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			B	B	A					



Cono (a)



Cono y hendedura (b)



Cono y corte (c)



Corte (d)



Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6961

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	20/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			23/03/2024	23/03/2024	23/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			30/03/2024	6/04/2024	20/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 6	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 6	CONCRETO 3000 PSI LOSA INFERIOR BOX 6					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12745	12588	12710					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.310	2.300	2.304					
Resistencia (KN)			269.28	339.09	365.17					
Resistencia (psi)			2161.7	2722.2	3092.1					
Porcentaje Obtenido (%)			72.1	90.7	103.1					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			B	A	A					


Cono (a)


Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica H

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6962

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA: NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	16/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			26/03/2024	2/04/2024	16/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			2000 PSI	2000 PSI	2000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (KD+100 - KD+200) (#74)	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (KD+100 - KD+200) (#75)	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (KD+100 - KD+200) (#76)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12584	12746	12893					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.281	2.311	2.337					
Resistencia (KN)			178.25	224.98	258.14					
Resistencia (psi)			1431.0	1806.1	2072.3					
Porcentaje Obtenido (%)			71.5	90.3	103.6					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	C	C					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

OSCAR BENITEZ RUIZ

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6963

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	17/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			27/03/2024	3/04/2024	17/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			2000 PSI	2000 PSI	2000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (KD+200 - KD+300) (#82)	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (KD+200 - KD+300) (#83)	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (KD+200 - KD+300) (#84)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12423	12175	12729					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.252	2.207	2.308					
Resistencia (KN)			179.36	226.15	251.32					
Resistencia (psi)			1439.9	1815.5	2017.6					
Porcentaje Obtenido (%)			72.0	90.8	100.9					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			B	C	C					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6969

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	17/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			27/03/2024	3/04/2024	17/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			2000 PSI	2000 PSI	2000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (KD+300 - KD+400) (#94)	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (KD+300 - KD+400) (#95)	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (KD+300 - KD+400) (#95)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12625	12784	12456					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.289	2.317	2.258					
Resistencia (KN)			183.25	238.65	261.48					
Resistencia (psi)			1471.1	1915.8	2099.1					
Porcentaje Obtenido (%)			73.6	95.8	105.0					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			B	C	C					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

OSCAR BENITEZ RUIZ

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

ELIAS CHICA M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6965

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	18/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			28/03/2024	4/04/2024	18/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			2000 PSI	2000 PSI	2000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (K0+400 - K0+500) (#98)	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (K0+400 - K0+500) (#99)	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI (K0+400 - K0+500) (#100)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12726	12745	12785					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.307	2.310	2.318					
Resistencia (KN)			180.25	229.14	251.48					
Resistencia (psi)			1447.0	1839.5	2018.8					
Porcentaje Obtenido (%)			72.4	92.0	100.9					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	C	C					


Cono (a)


Cono y hendadura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

OSCAR BENITEZ RUIZ

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6966

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	30/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			23/04/2024	23/04/2024						
Dias De Curado:			7	7						
Fecha De Ensayo:			30/04/2024	30/04/2024						
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"						
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI						
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO 3000 PARA BORDILLO K2+740 (#54)	CONCRETO 3000 PARA BORDILLO K2+740 (#54)						
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	20.2	20.2						
	Diametro	d	10.1	10.1						
Volumen (cm^3):			1618	1618						
Area (cm^3):			80.12	80.1						
Peso (kg):			3816	3796						
Peso Unitario (kg/m^3):			2.357	2.346						
Resistencia (KN)			122.56	124.15						
Resistencia (psi)			2228.4	2257.3						
Porcentaje Obtenido (%)			74.3	76.2						
Observación			CUMPLE	CUMPLE						
Tipo de falla			C	C						



Cono (a)



Cono y hendedura (b)



Cono y corte (c)




Corte (d)



Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6967

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	17/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			27/03/2024	3/04/2024	17/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+100 K0+200) (#70)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+100 K0+200) (#71)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+100 K0+200) (#72)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12731	12735	12758					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.308	2.309	2.313					
Resistencia (KN)			280.15	341.82	380.69					
Resistencia (psi)			2249.0	2744.1	3056.1					
Porcentaje Obtenido (%)			75.0	91.5	101.9					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	C	B					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6968

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	19/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			29/03/2024	5/04/2024	19/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO RIGIDO 3000 PSI (K0+200 - K0+300) (#78)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+200 - K0+300) (#78)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+200 - K0+300) (#80)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12914	12836	12741					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.341	2.327	2.310					
Resistencia (KN)			273.38	339.38	384.87					
Resistencia (psi)			2194.6	2724.5	3089.7					
Porcentaje Obtenido (%)			73.2	90.8	103.0					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	C	C					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6969

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	25/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			4/04/2024	11/04/2024	25/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+300 KD+400) (#86)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+300 KD+400) (#87)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+300 KD+400) (#88)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12428	12348	12550					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.253	2.238	2.293					
Resistencia (KN)			269.84	341.29	394.16					
Resistencia (psi)			2166.2	2739.8	3164.2					
Porcentaje Obtenido (%)			72.2	91.3	105.5					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	D	E					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6970


GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	22/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			1/04/2024	8/04/2024	22/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+400 - K0+500) (Ø90)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+400 - K0+500) (Ø91)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+400 - K0+500) (Ø92)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12587	12698	12743					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.282	2.302	2.310					
Resistencia (KN)			271.39	342.59	380.15					
Resistencia (psi)			2178.7	2750.2	3051.8					
Porcentaje Obtenido (%)			72.6	91.7	101.7					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			D	C	D					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica H

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6971


GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	27/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			30/03/2024	30/03/2024	30/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			6/04/2024	13/04/2024	27/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO RIGIDO 3000 PSI ACELERADO - (K0+500 - K0+600) (#102)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI ACELERADO - (K0+500 - K0+600) (#103)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI ACELERADO - (K0+500 - K0+600) (#104)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12659	12756	12830					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.295	2.312	2.326					
Resistencia (KN)			296.15	368.24	416.15					
Resistencia (psi)			2377.4	2956.2	3340.6					
Porcentaje Obtenido (%)			79.2	98.5	111.4					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	B	C					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica H

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6972

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	25/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			4/04/2024	11/04/2024	25/04/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO RIGIDO ACELERADO 3000 PSI - (K0+600 - K0+700) (#106)	CONCRETO RIGIDO ACELERADO 3000 PSI - (K0+600 - K0+700) (#107)	CONCRETO RIGIDO ACELERADO 3000 PSI - (K0+600 - K0+700) (#108)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	Altura	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12736	12720	12765					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.309	2.306	2.314					
Resistencia (KN)			288.14	361.29	402.85					
Resistencia (psi)			2313.1	2900.4	3232.4					
Porcentaje Obtenido (%)			77.1	96.7	107.7					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	B	B					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6973

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	23/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1


Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			9/04/2024	9/04/2024						
Dias De Curado:			7	14						
Fecha De Ensayo:			16/04/2024	23/04/2024						
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"						
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI						
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+700 - KD+800) (#110)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+700 - KD+800) (#110)						
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4						
	Diametro	d	15.2	15.2						
Volumen (cm^3):			5516	5516						
Area (cm^2):			181.46	181.46						
Peso (kg):			12850	12703						
Peso Unitario (kg/m^3):			2.329	2.303						
Resistencia (KN)			262.31	338.95						
Resistencia (psi)			2105.8	2721.0						
Porcentaje Obtenido (%)			70.2	90.7						
Observación			CUMPLE	CUMPLE						
Tipo de falla			C	B						


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica M

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6979

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	1/05/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1

Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			3/04/2024	3/04/2024	3/04/2024					
Dias De Curado:			7	14	28					
Fecha De Ensayo:			10/04/2024	17/04/2024	1/05/2024					
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"	3.5"					
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI	3000 PSI					
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+800 - KD+900) (#114)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+800 - KD+900) (#115)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (KD+800 - KD+900) (#116)					
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4	30.4					
	Diametro	d	15.2	15.2	15.2					
Volumen (cm^3):			5516	5516	5516					
Area (cm^2):			181.46	181.46	181.46					
Peso (kg):			12860	12695	12842					
Peso Unitario (kg/m^3):			2.331	2.301	2.292					
Resistencia (KN)			275.33	345.03	383.45					
Resistencia (psi)			2210.3	2769.8	3078.3					
Porcentaje Obtenido (%)			73.7	92.3	102.6					
Observación			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
Tipo de falla			C	D	E					


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

h=Altura
D=Diametro



Observación:

Oscar Benitez Ruiz

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Elias Chica H

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

6975

GEOLABCON
GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEESPECIMENES CILINDRICOS DE CONCRETO (NORMA - NTC 673)

Proyecto:	PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Fecha:**	24/04/2024
Solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	**Concreto Hecho en:**	OBRA
Localización:	CORREGIMIENTO MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA	**Informe N°:**	1


Cilindro N°:			1	2	3	4	5	6	7	8
Fecha De Toma:			10/04/2024	10/04/2024						
Dias De Curado:			7	14						
Fecha De Ensayo:			17/04/2024	24/04/2024						
Asentamiento (pulg):			3.5"	3.5"						
Diseño:			3000 PSI	3000 PSI						
Tipo De Elemento Vaciado:			CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+900 - K1+000) (#112)	CONCRETO RIGIDO 3000 PSI - (K0+900 - K1+000) (#112)						
Dimensiones Del Cilindro (cm)	**Altura**	h	30.4	30.4						
	Diametro	d	15.2	15.2						
Volumen (cm^3):			5516	5516						
Area (cm^2):			181.46	181.46						
Peso (kg):			12875	12728						
Peso Unitario (kg/m^3):			2.334	2.307						
Resistencia (KN)			283.28	358.23						
Resistencia (psi)			2274.1	2875.8						
Porcentaje Obtenido (%)			75.8	95.9						
Observación			CUMPLE	CUMPLE						
Tipo de falla			C	A						


Cono (a)



Cono y hendedura (b)


Cono y corte (c)


Corte (d)


Columnar (e)

H=Altura
D=Diametro



Observación:

OSCAR BENITEZ RUIZ

ING. OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

ING. ELIAS JOSE CHICA MACHADO
INGENIERO ENCARGADO

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA

DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV E - 161 - 13

Proyecto:	PLACA HUELLA EN E.. CORREGIMIENTO DE MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. - CÓRDOBA				
Entidad solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR				
Fecha Ensayo Inicio:	18 de marzo de 2024	**Fecha Ensayo Final:**	18 de marzo de 2024	**Norma:**	INV E 161-13
Ubicación:	CORREGIMIENTO DE MARACAYO, MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Material:	CANTERA GALLO CRUDO				

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	18/03/2024	18/3/2024								
Abscisa	KD+110	KD+160								
Margen	EJE	EJE								
P.frasco+arena inicial (gr)	6675	6852								
P.frasco+arena final (gr)	3383	3416								
Peso arena total usada (gr)	3486	3436								
Constante del Cono (gr)	1624	1624								
P.arena en el hueco (gr)	1862	1812								
Densidad de la arena (gr/cm³)	1,427	1,427								
Volumen del Hueco (cm³)	1305	1270								
P.material extraido humedo (gr)	3065	3089								
Humedad (%)	4,8	5,2								
P.material extraido seco(gr)	2925	2936								
Densidad seca (gr/cm³)	2,241	2,312								
Densidad seca (lb/ft³)	139,9	144,3								
Densidad max.de labor(gr/cm³)	2,333	2,333								
%Compactación (%)	96	99								

Especificaciones	
Densidad maxima lab (gr/cm³)	2,333
Humedad optima laborator (%)	7,1%

Observaciones:
LOS RESULTADOS CORRESPONDEN A LOS ENSAYOS TOMADOS EN CAMPO, LO CUALES PUEDEN VARIAR EN LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES POR LAS CORRELACIONES DE LAS HUMEDADES EN EL LABORATORIO

Elias Chica H

ELIAS JOSE CHICA MACHADO
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Oscar Benitez Ruiz

OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

6946

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA

DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV E - 161 - 13

Proyecto:	PLACA HUELLA EN E.. CORREGIMIENTO DE MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Entidad solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR				
Fecha Ensayo Inicio:	19 de marzo de 2024	**Fecha Ensayo Final:**	19 de marzo de 2024	**Norma:**	INV E 161-13
Ubicación:	CORREGIMIENTO DE MARACAYO, MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Material:	CANTERA GALLO CRUDO				

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024						
Abscisa	KD+210	KD+260	KD+310	KD+360						
Margen	EJE	EJE	EJE	EJE						
P.frasco+arena inicial (gr)	6785	5761	6743	6719						
P.frasco+arena final (gr)	3265	1194	3239	3128						
Peso arena total usada (gr)	3520	3567	3504	3591						
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624						
P.arena en el hueco (gr)	1896	1943	1910	1967						
Densidad de la arena (gr/cm³)	1,427	1,427	1,427	1,427						
Volumen del Hueco (cm³)	1329	1362	1338	1378						
P.material extraido humedo(gr)	3166	3216	3264	3324						
Humedad (%)	5,6	5,8	6,0	5,2						
P.material extraido seco(gr)	2997	3040	3079	3160						
Densidad seca (gr/cm³)	2,256	2,232	2,301	2,292						
Densidad seca (lb/ft³)	140,8	139,3	143,6	143,0						
Densidad max.de labor(gr/cm³)	2,333	2,333	2,333	2,333						
%Compactación (%)	97	96	99	98						

Especificaciones		**Observaciones:**
Densidad maxima lab (gr/cm³)	2,333	LOS RESULTADOS CORRESPONDEN A LOS ENSAYOS TOMADOS EN CAMPO, LO CUALES PUEDEN VARIAR EN LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES
Humedad optima laborator (%)	7,1%	POR LAS CORRELACIONES DE LAS HUMEDADES EN EL LABORATORIO

Elias Chica M

ELIAS JOSE CHICA MACHADO
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Oscar Benitez Ruiz

OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Valido con firma original

6944

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA

DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV E - 161 - 13

Proyecto:	PLACA HUELLA EN E.. CORREGIMIENTO DE MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. - CÓRDOBA				
Entidad solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR				
Fecha Ensayo Inicio:	25 de marzo de 2024	**Fecha Ensayo Final:**	5 de febrero de 2024	**Norma:**	INV E 161-13
Ubicación:	CORREGIMIENTO DE MARACAYO, MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Material:	CANTERA GALLO CRUDO				

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024						
Abscisa	KD+410	KD+460	KD+605	KD+560						
Margen	EJE	EJE	EJE	EJE						
P.frasco+arena inicial (gr)	6958	6876	6852	6835						
P.frasco+arena final (gr)	3428	3366	3458	3429						
Peso arena total usada (gr)	3270	3310	3194	3206						
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624						
P.arena en el hueco (gr)	1646	1686	1570	1582						
Densidad de la arena (gr/cm³)	1,427	1,427	1,427	1,427						
Volumen del Hueco (cm³)	1153	1181	1100	1109						
P.material extraido humedo(gr)	2656	2765	2884	2871						
Humedad (%)	4,2	4,6	5,2	5,4						
P.material extraido seco(gr)	2569	2643	2551	2534						
Densidad seca (gr/cm³)	2,245	2,237	2,319	2,286						
Densidad seca (lb/ft³)	140,1	139,6	144,7	142,6						
Densidad max.de labor(gr/cm³)	2,333	2,333	2,333	2,333						
%Compactación (%)	96	96	99	98						

Especificaciones		**Observaciones:**
Densidad maxima lab (gr/cm³)	2,333	LOS RESULTADOS CORRESPONDEN A LOS ENSAYOS TOMADOS EN CAMPO, LO CUALES PUEDEN VARIAR EN LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES
Humedad optima laborator (%)	7,1%	POR LAS CORRELACIONES DE LAS HUMEDADES EN EL LABORATORIO

ELIAS JOSE CHICA MACHADO
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Tabla con firma original

0470

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA

DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV E - 161 - 13

Proyecto:	PLACA HUELLA EN E., CORREGIMIENTO DE MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Entidad solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR				
Fecha Ensayo Inicio:	27 de marzo de 2024	**Fecha Ensayo Final:**	10 de febrero de 2024	**Norma:**	INV E 161-13
Ubicación:	CORREGIMIENTO DE MARACAYO, MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Material:	CANTERA GALLO CRUDO				

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024						
Abscisa	KD+645	KD+660	KD+710	KD+770						
Margen	EJE	EJE	EJE	EJE						
P.frasco+arena inicial (gr)	6585	6571	6590	6534						
P.frasco+arena final (gr)	3274	3316	3285	3260						
Peso arena total usado (gr)	3321	3255	3305	3274						
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624						
P.arena en el hueco (gr)	1697	1631	1641	1650						
Densidad de la arena (gr/cm³)	1,427	1,427	1,427	1,427						
Volumen del Hueco (cm³)	1189	1143	1150	1156						
P.material extraido humedo(gr)	2795	2614	2695	2756						
Humedad (%)	4,8	5,2	4,6	4,8						
P.material extraido seco(gr)	2667	2675	2576	2630						
Densidad seca (gr/cm³)	2,243	2,340	2,240	2,274						
Densidad seca (lb/ft³)	139,9	146,0	139,8	141,9						
Densidad max.de labor(gr/cm³)	2,333	2,333	2,333	2,333						
%Compactación (%)	96	100	96	97						

Especificaciones	
Densidad maxima lab (gr/cm³)	2,333
Humedad optima laborator (%)	7,1%

Observaciones:
LOS RESULTADOS CORRESPONDEN A LOS ENSAYOS TOMADOS EN CAMPO, LO CUALES PUEDEN VARIAR EN LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES POR LAS CORRELACIONES DE LAS HUMEDADES EN EL LABORATORIO

ELIAS JOSE CHICA MACHADO
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

Validar con firma digital

679

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO CEL CONO Y ARENA

DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV E - 161 - 13

Proyecto:	PLACA HUELLA EN E., CORREGIMIENTO DE MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. - CÓRDOBA				
Entidad solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR				
Fecha Ensayo Inicio:	21 de febrero de 2024	**Fecha Ensayo Final:**	21 de febrero de 2024	**Norma:**	INV E 161-13
Ubicación:	CORREGIMIENTO DE MARACAYO, MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Material:	CANTERA GALLO CRUDO				

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	2/04/2024	2/04/2024	2/04/2024							
Abscisa	K0+840	K0+880	K0+950							
Margen	EJE	EJE	EJE							
P.frasco+arena inicial (gr)	6875	6858	6824							
P.frasco+arena final (gr)	3475	3462	3516							
Peso arena total usada (gr)	3400	3394	3308							
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624							
P.arena en el hueco (gr)	1776	1770	1684							
Densidad de la arena (gr/cm³)	1,427	1,427	1,427							
Volumen del Hueco (cm³)	1245	1240	1180							
P.material extraido humed(gr)	2914	2954	2865							
Humedad (%)	4,2	4,8	4,6							
P.material extraido seco(gr)	2797	2819	2739							
Densidad seca (gr/cm³)	2,247	2,272	2,321							
Densidad seca (lb/ft³)	140,2	141,8	144,8							
Densidad max de labor(gr/cm³)	2,333	2,333	2,333							
%Compactación (%)	96	97	99							

Especificaciones	
Densidad maxima lab (gr/cm³)	2,333
Humedad optima laborator (%)	7,1%

Observaciones:
LOS RESULTADOS CORRESPONDEN A LOS ENSAYOS TOMADOS EN CAMPO, LO CUALES PUEDEN VARIAR EN LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES POR LAS CORRELACIONES DE LAS HUMEDADES EN EL LABORATORIO

Elias Chica H

ELIAS JOSE CHICA MACHADO
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Oscar Benitez Ruiz

OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

8960

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA

DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV E - 161 - 13

Proyecto:	PLACA HUELLA EN E.. CORREGIMIENTO DE MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. - CÓRDOBA				
Entidad solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR				
Fecha Ensayo Inicio:	18 de marzo de 2024	**Fecha Ensayo Final:**	19 de marzo de 2024	**Norma:**	INV E 161-13
Ubicación:	CORREGIMIENTO DE MARACAYO, MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Material:	CANTERA GALLO CRUDO				

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	05/04/204	05/04/204								
Abscisa	K0+666	K1+040								
Margen	EJE	EJE								
P.frasco+arena inicial (gr)	6154	5125								
P.frasco+arena final (gr)	3016	2984								
Peso arena total usada (gr)	3138	3141								
Constante del Cono (gr)	1624	1624								
P.arena en el hueco (gr)	1514	1517								
Densidad de la arena (gr/cm³)	1,427	1,427								
Volumen del Hueco (cm³)	1061	1063								
P.material extraido humed(gr)	2561	2568								
Humedad (%)	4,2	4,8								
P.material extraido seco(gr)	2458	2449								
Densidad seca (gr/cm³)	2,317	2,323								
Densidad seca (lb/ft³)	144,6	145,0								
Densidad max.de labor(gr/cm³)	2,333	2,333								
%Compactación (%)	99	100								

Especificaciones	
Densidad maxima lab (gr/cm³)	2,333
Humedad optima laborator (%)	7,1%

Observaciones:
LOS RESULTADOS CORRESPONDEN A LOS ENSAYOS TOMADOS EN CAMPO, LO CUALES PUEDEN VARIAR EN LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES POR LAS CORRELACIONES DE LAS HUMEDADES EN EL LABORATORIO

ELIAS JOSE CHICA MACHADO
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

6981

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA

DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV E 161 - 13

Proyecto:	PLACA HUELLA EN E.. CORREGIMIENTO DE MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. - CÓRDOBA				
Entidad solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR				
Fecha Ensayo Inicio:	17 de abril de 2024	**Fecha Ensayo Final:**	17 de abril de 2024	**Norma:**	INV E 161-13
Ubicación:	CORREGIMIENTO DE MARACAYO, MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Material:	CANTERA GALLO CRUDO				

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024			
Abscisa	K1+090	K1+140	K1+195	K1+240	K1+285	K1+335	K1+380			
Margen	EJE	EJE	EJE	EJE	EJE	EJE	EJE			
P.frasco+arena inicial (gr)	6488	6461	6432	6411	6395	6370	6348			
P.frasco+arena final (gr)	3265	3164	3229	3260	3188	3212	3174			
Peso arena total usada (gr)	3223	3297	3203	3151	3207	3158	3174			
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624	1624	1624	1624			
P.arena en el hueco (gr)	1599	1673	1579	1527	1583	1534	1550			
Densidad de la arena (gr/cm³)	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427	1,427			
Volumen del Haeco (cm³)	1121	1172	1107	1070	1109	1075	1086			
P.material extraido humed(gr)	2716	2755	2614	2584	2535	2539	2610			
Humedad (%)	5,6	5,2	4,6	4,2	4,0	4,8	4,4			
P.material extraido seco(gr)	2572	2628	2499	2480	2534	2423	2500			
Densidad seca (gr/cm³)	2,295	2,242	2,258	2,317	2,284	2,254	2,302			
Densidad seca (lb/ft³)	143,2	139,9	140,9	144,6	142,5	140,6	143,6			
Densidad max.de labor(gr/cm³)	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333	2,333			
%Compactación (%)	98	96	97	99	98	97	99			

Especificaciones	
Densidad maxima lab (gr/cm³)	2,333
Humedad optima laborator (%)	7,1%

Observaciones:
LOS RESULTADOS CORRESPONDEN A LOS ENSAYOS TOMADOS EN CAMPO, LO CUALES PUEDEN VARIAR EN LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES POR LAS CORRELACIONES DE LAS HUMEDADES EN EL LABORATORIO

ELIAS JOSE CHICA MACHADO
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

6982

GEOLABCON

GEOTECNIA - LABORATORIO - CONSULTORIA

ENSAYO DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA

DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV E - 161 - 13

Proyecto:	PLACA HUELLA EN E.. CORREGIMIENTO DE MARACAYO, DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. - CÓRDOBA				
Entidad solicitante:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR				
Fecha Ensayo Inicio:	17 de abril de 2024	**Fecha Ensayo Final:**	17 de abril de 2024	**Norma:**	INV E 161-13
Ubicación:	CORREGIMIENTO DE MARACAYO, MUNICIPIO DE MONTERIA - CÓRDOBA				
Material:	CANTERA GALLO CRUDO				

PRUEBA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024						
Abscisa	K1+440	K1+470	K1+515	K1+575						
Margen	EJE	EJE	EJE	EJE						
P.frasco+arena inicial (gr)	6285	6259	6233	6210						
P.frasco+arena final (gr)	3016	2988	2935	3012						
Peso arena total usada (gr)	3269	3271	3298	3198						
Constante del Cono (gr)	1624	1624	1624	1624						
P.arena en el hueco (gr)	1645	1647	1674	1574						
Densidad de la arena (gr/cm³)	1,427	1,427	1,427	1,427						
Volumen del Hueco (cm³)	1153	1154	1173	1103						
P.material extraido humo(gr)	2796	2695	2784	2608						
Humedad (%)	4,2	3,6	3,8	4,8						
P.material extraido seco(gr)	2645	2601	2682	2489						
Densidad seca (gr/cm³)	2,294	2,254	2,286	2,256						
Densidad seca (lb/ft³)	143,2	140,8	142,7	140,8						
Densidad max de labor(gr/cm³)	2,333	2,333	2,333	2,333						
%Compactación (%)	98	97	98	97						

Especificaciones	
Densidad maxima lab (gr/cm³)	2,333
Humedad optima laborator (%)	7,1%

Observaciones:
LOS RESULTADOS CORRESPONDEN A LOS ENSAYOS TOMADOS EN CAMPO, LO CUALES PUEDEN VARIAR EN LOS RESULTADOS DE LAS DENSIDADES POR LAS CORRELACIONES DE LAS HUMEDADES EN EL LABORATORIO

ELIAS JOSE CHICA MACHADO
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

OSCAR NEY BENITEZ RUIZ
LABORATORISTA

6983

6989

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) | 4 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-012-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA MR

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MANGLATO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

FECHA DE INICIO: 22/09/2022

PLAZO INICIAL: 6 (SEIS) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/06/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 9.691.701.283,00

VALOR ACUMULADO: $ 10.980.810.575,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-009-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10	$ 1.098.081.057,50	11 / 3 / 2023	11 / 12 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	$ 3.294.243.172,50	11 / 3 / 2023	11 / 12 / 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 2.196.162.115,00	11 / 3 / 2023	11 / 6 / 2027
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 3.294.243.172,50	11 / 6 / 2024	11 / 6 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100171905

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5	$ 549.040.528,75	22 / 9 / 2022	11 / 6 / 2024
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100034726 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

6985

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S SEGUINIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A. **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10	$ 1.098.081.057,50	11 / 3 / 2023	11 / 12 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30	$ 3.294.243.172,50	11 / 3 / 2023	11 / 12 / 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 2.196.162.115,00	11 / 3 / 2023	11 / 6 / 2027
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 3.294.243.172,50	11 / 6 / 2024	11 / 6 / 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N.A. **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N.A. **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:
AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME, EL CONTRATISTA DE OBRA HIZO ENTREGADO LAS POLIZAS ACTUALIZADAS A FECHA DEL ACTA DE INICIO, QUEDANDO PENDIENTE LAS APROBACIONES DE LAS MISMAS POR PARTE DEL ENTE CONTRATANTE.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____
Nombre: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2220215136ACOR

6486

	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CODIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-012-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA NARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA MB

FECHA DE INICIO: 21/09/2022 (Indicar día - mes y año) — PLAZO INICIAL: 9 (MESES MESES) — FECHA DE VENCIMIENTO: 11/06/2024 (Incluye suspensión y prorrogas)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CMA-SPM-008-2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI .....X..... NO ..... APROBADO: SI ....x.... NO ..... VERSIÓN No. ....1.... FECHA DE VERSIÓN: 1/09/2022

OBSERVACIONES:
A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HECHO ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PLAN DE CALIDAD PRESENTADO.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ..... NO .....X..... No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ULTIMA AUDITORÍA: _____
No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:
A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA HECHO ENTREGA DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS POR TAL MOTIVO NO SE EVIDENCIAN FECHAS DE AUDITORIAS POR REALIZAR

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ..... NO .....X..... APROBADO: SI ..... NO ..... X FECHA DE APROBACION: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ..... NO .....

OBSERVACIONES:
A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA HECHO ENTREGA DEL PLAN DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYOS.

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO PRESENTA NO CONFORMIDADES

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:
A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA RECIBIDO QUEJAS NI RECLAMOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD NI NINGUN OTRO USUARIO DEL PROYECTO.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6987

	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DOMOAN S.A.S SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

EL CONTRATISTA AUN NO HA INICIADO ACTIVIDADES CONTRACTUALES EN LA OBRA, POR LO QUE AUN NO CUENTA CON INDICES DE GESTION

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CERTIFICADO N°1196 DEL [illegible]	[illegible]	
2	NIVEL	SANCE	0954797	3/09/2023	CERTIFICADO N°1126 DEL 3/09/2023	2023/2024	

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: ENRIQUE ANDRES HERRERA ALVAREZ
Representante Legal/Contratista de Obra

Firma NA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: IVAN ENRIQUE MUÑOZ GONZALEZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2220215135400R

Firma NA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Alcaldía de Montería	ALCALDIA DE MONTERIA CONSULTORES DONOVAN S.A.S PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA	18	4	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA ALCALDIA DE MONTERIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No LP-SPM-012-2022 **DE** 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACA HUELLA MR

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-009-2022 **DE** 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1

(Indicar en forma consecutiva el número de la revisión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de Salarios y Jornales	$ 38.138.396,0	$ 147.279.717,0	$ 312.326.155,0		$ 497.749.268,0	16,8%
2	Movimiento de Tierra y Alquiler de Maquinaria	$ 75.109.316,0	$ 231.691.717,0	$ 353.548.795,0		$ 660.349.830,0	22,7%
3	Compra de Materiales	$ 45.582.661,0	$ 489.706.868,0	$ 1.224.124.757,9		$ 1.759.414.286,9	60,5%
						$ -	
						$ -	
						$ -	
						$ -	
	TOTAL	**$ 148.830.375,0**	**$ 868.678.302,0**	**$ 1.890.001.707,9**	**$ -**	**$ 2.987.510.384,9**	**100%**
						$ 872.253.115,5	
						$ 2.035.257.269,4	

Nombre: Santiago Sanchez
Director de Obras
Matrícula Profesional No.: 22202-273806COR

Iván Ariz González
Director de Interventoría
Interventor
Matrícula No.: 22202-151364COR

8188

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		
Fecha: octubre de 2022	Versión: 01	Página: 1

SEGUIMIENTO A PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

MARZO 11 AL 10 DE ABRIL DE 2024

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Contrato de obra N° LP- SPM-012-2022

Montería Córdoba

2024

INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Social desarrolla un proceso de información y participación comunitaria con la población directamente relacionada con el proyecto de **"Construcción De Placa Huella en la Vía de la Vereda Maracayo en el Corregimiento de Tres Piedras En El Municipio de Montería"**, sobre el inicio, avance de las obras y la operación, lo que permite contribuir a prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos, derivados de la ejecución de la obra. Se realizo reunión con el grupo de veeduría ciudadana, cabildos de la zona y trabajadores del consorcio.

En las comunidades el concepto "intervención y/o gestión social" adquiere múltiples sentidos ya que toda obra que realiza el estado tiene un sentido social, porque busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan y laboran en ella.

De igual forma los planes de gestión social pretenden la creación de empleos, el cooperativismo y empoderamiento de las comunidades, esto implica como primera medida hacer a la población participe directa en los procesos que se llevarán a cabo por la entidad contratista haciendo uso del recurso legal de participación ciudadana; el proceso de comunicación entre diversos actores sociales que buscan transformar mediante acciones concretas una relación socio-ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

1. INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.

El contratista de obra y su área sociai realizó atención a los usuarios de la comunidad de Maracayo, se recibieron dos (2) P.Q.R.S a usuarios que manifestaban tener inquietudes, quejas y reclamos acerca del avance y ejecución del proyecto.

Así mismo, se realizaron dos campañas de seguridad vial denominadas Importancia de respetar las señales de tránsito PARE Y SIGA y prevención de accidentes viales durante la ejecución de la obra, esta actividad es realizada mediante visitas domiciliarias y entrega de volantes a los beneficiarios del proyecto Construcción de la Placa Huella en el corregimiento de Maracayo de Montería Córdoba, se realizaron como estrategia de prevenir accidentes viales, además, que los usuarios respetaran las señales de tránsito.

Se llevo a cabo reunión con los miembros del comité de veeduría ciudadana, cabildos de la zona y trabajadores del consorcio, con el objetivo de dar a conocer los avances de la obra, en el área técnica, social del proyecto aclarando dudas e inquietudes y a su vez que compartieran la informacion de manera veras y clara con el resto de la comunidad.

1.1.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

% informacion de la población del área de influencia y conocimiento de las estrategias divulgativas	Número de volantes informativos entregados a la comunidad.	34	82%
	Número de personas convocadas		
Análisis de indicador: Se realizó entrega de volantes informativos a usuarios, familias, peatones que circulan por la zona, tema: Importancia de respetar las normas de tránsito PARE Y SIGA, para evitar accidentes viales y prevención de accidentes viales desde el tramo K3+080 (Pueblo Nuevo) hasta K3+595 (Placa			

Huella Vieja). En general, se sensibiliza y/o crea conciencia de la importancia de respetar las normas de tránsito teniendo en cuenta, que se viene trabajando con maquinarias pesadas durante la ejecución de la obra. Con el objetivo de instruir a cada una de estas personas sobre el buen manejo que le debemos dar a los procesos que se llevan a cabo durante la ejecución de la obra y así poder obtener resultados positivos con el buen comportamiento de toda la población.

1.2. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- ✓ Durante el período se contó con el acompañamiento de los Veedores y la Comunidad en la reunión informativa avance de obra, Restructuración temporal de vehículos pesados desde el tramo K3+080 (Pueblo Nuevo) hasta K3+595 (Placa Huella Vieja).

1.2.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

% Indicador de cumplimiento de talleres programados	Número de talleres dictados	0	0%
	Número de talleres previstos	0	
Análisis de indicador: Hasta el momento se han realizado entregado 34 volantes informativos. **Ver anexo GS.** Entrega de Volantes.			
% personas participantes de los talleres programados	Número de personas que asisten	7	70%
	Número de personas invitadas a las reuniones	10	
Análisis de indicador: Se contó con una participación activa y positiva por parte de la comunidad Ver **Anexo.** Actas de reunión con la comunidad tema: Avance de obra.			
% Indicador de porcentaje de quejas y reclamos solucionados	Número de quejas y reclamos solucionados	2	100%
	Número de quejas y reclamos Recibidos.	2	

Análisis de indicador: Se recibieron 2 quejas y reclamos por parte de la comunidad oficiales durante el período. Ver anexo, se entregaron 34 volantes informativos a la comunidad de Maracayo. Tema: Información y divulgación a la comunidad, campaña educativa hacia el respeto por las normas de tránsito.

1.3. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

1.3.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

% Indicador de porcentaje de mano de obra no calificada contratada	Número de empleos no calificados locales	60	36%
	Número de empleos no calificados totales	60	
Análisis de indicador: Toda la mano de obra no calificada contratada es de origen local. Provenientes del área de Maracayo, padres de cabeza de hogar y madres cabeza de hogar.			

1.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL



Foto GS1. Atención a la comunidad, entrega de volantes informativo, respeto a las normas de tránsito Pare y Siga



Foto GS2. Atención a la comunidad, entrega de volantes informativo, respeto a las normas de tránsito Pare y Siga.



Foto GS3. Atención a la comunidad, entrega de volantes informativo, respeto a las normas de transito Pare y Siga.



Foto GS3. Atención a la comunidad, entrega de volantes informativo, respeto a las normas de tránsito Pare y Siga.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		
Fecha: octubre de 2022	Versión: 01	Página: 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL



Foto GS6. Atención reclamos de afectaciones en la comunidad por causa de trabajos con maquinarias pesadas



Foto GS7. Atención reclamos de afectaciones en la comunidad



Foto GS8. Atención reclamos de afectaciones en la comunidad



Foto GS9. Atención reclamos de afectaciones en la comunidad



Foto GS12. Solicitud de permiso para realizar desvió provisional para el paso de vehículos.



Foto GS13. Solicitud de permiso para realizar desvió provisional para el paso de vehículos.



Foto GS14. Acta de reunión con la comunidad comité técnico social.



Foto GS15. Acta de reunión con la comunidad comité técnico social.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

Fecha: octubre de 2022	Versión: 01	Página: 9

FORMATO 17. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD - CONTROL DE VOLANTES INFORMATIVOS

CONTRATO: 012-2022 CONTRATISTA: Consorcio placa huella FECHA: marzo 7-24

DESCRIPCIÓN DEL VOLANTE: Informativo; prevención de accidentes Viales Así podemos evitar accidentes; respetar la vía y Siga.

ANEXAR

N° DE VOLANTES A REPARTIR: 17.

N° de volantes	Nombre	Dirección	Teléfono	Firma
1	Anderson Acosta	Maracayo	320 531 00 39	
1	Gilberto Soto	Maracayo	323 342 11 05	
1	Sol Vertel	Maracayo	311 939 4129	
1	Emilio Salas		315 932 21 20	
1	Claudia Ortiz		300 421 12 82	
1	Domingo Cuma	Bodegas	321 190 0122	
1	Mario Osorio	Barrio Cielo	314 324 21 22	
1	Olga Salas	pueblo nuevo	300 321 19 41	
1	Manuel Cuma	Pueblo N-	315 921 21 22	
1	Elvira Miranda	Pueblo nu	— o —	
1	Sebastian Pons	pueblo nu	— o —	
1	Mario Lopez		300 241 21 25	
1	Rosa Jaraba	/	310 891 0124	No quiso P.
1	Carlos Arango	/	— o —	No quiso P.
1	Robert Elias	/	— o —	No quiso P.
1	Daniel Pons	/	— o —	No quiso P.
1	Yadis Ortiz	/	— o —	— o —

Observaciones: Se instruyo a la comunidad sobre la importancia que tiene este volante informativo para poner en practica y realizar mejor el avance de nuestra obra.

Firma Residente Social Obra

Firma Residente Social o Ambiental Interventoría

6998

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA		
Fecha: octubre de 2022	Versión: 01	Página: 1

El consorcio MR le informa a la comunidad de Maracayo que se encuentra restringido el tránsito por el puente grande el cual tiene cerramiento total.

Es importante respetar las señalizaciones y tomar el desvío habilitado , ya que el puente representa un peligro , por la intervención que se le empezó hacer.

¡Gracias!

6999

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

DON-009-MONT-175-2024

Montería, 03 de mayo de 2024

Señores
CONSORCIO PLACA HUELLA MR
MARCOS GOMEZ MENDOZA
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA INFORMES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Cordial saludo.

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación respecto al incumplimiento por parte de **CONSORCIO PLACA HUELLA MR** en la entrega de los informes N°11 correspondiente al mes de octubre de 2023 y N°12 correspondiente al mes de Marzo- abril, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a lo establecido en el contrato suscrito, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".
El no cumplimiento de esta obligación pone en riesgo la integridad y la salud de los trabajadores, así como el adecuado desarrollo de las labores en el lugar de trabajo. Es por ello que le instamos a tomar las medidas necesarias para subsanar esta situación a la brevedad posible.
En caso de persistir este incumplimiento, nos veremos en la necesidad de aplicar las medidas contractuales correspondientes.
Esperamos que esta comunicación sea tomada con la seriedad y urgencia que amerita, y que se tomen las acciones correctivas pertinentes para evitar futuras situaciones similares.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y a la subsanación de esta situación.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia. Alcaldía de Montería– Iris Spath camaño, secretaria de Infraestructura – Supervisor del Contrato

ECOVÍAS LTDA. Sistema de gestión de la calidad

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Formato 054 / Versión 05 / Página 1 de 1

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL						
Código consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	Medio de			Observaciones
							Impreso	Fax	Mail	
DON-009-MONT-167-2022	9-abr-24	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	MARCO GOMEZ MENDOZA	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PROXIRAMA DE OBRAS Y FLUJO DE CAJA SEGUN PRORROGRA N°03			X	
DON-009-MONT-168-2022	3-abr-24	ALCALDIA DE MONTERIA	IRIS SPATH CAMAÑO	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	RESPUESTA A COMUNICADO N° CE.SIM-716-2024 CUYO ASUNTO ES SEGUIMIENTO DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRAS			X	
DON-009-MONT-169-2022	10-abr-24	ALCALDIA DE MONTERIA	IRIS SPATH CAMAÑO	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	NOTIFICACION DE POSTES DE ENERGIA QUE IMPLANTA EN LINEAMIENTO DE VIA.			X	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	***CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MAIRACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.***					

Código consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	Medio de: Impreso	Fax	Mail	Observaciones
DON-009-MONT-167-2022	9-abr-24	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	MARCO GOMEZ MENDOZA	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PROGRAMA DE OBRAS Y FLUJO DE CAJA SEGÚN PRORROGRA N°03			x	
DON-009-MONT-168-2022	8-abr-24	ALCALDIA DE MONTERIA	IRIS SPATH CAMAÑO	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	RESPUESTA A COMUNICADO N° CE.SIM-716-2024 CUYO ASUNTO ES SEGUIMIENTO DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRAS			x	
DON-009-MONT-169-2022	10-abr-24	ALCALDIA DE MONTERIA	IRIS SPATH CAMAÑO	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	NOTIFICACION DE POSTES DE ENERGIA QUE IMPLANTA EN LINEAMIENTO DE VIA.			x	

6501

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
Código consecutivo de	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
DON-009-MONT-002-2022	19-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Entrega hojas de vidas profesionales
DON-009-MONT-003-2022	31-ago-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Documentación Para Acta de Inicio
DON-009-MONT-004-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Cesión Contrato de Interventoria
DON-009-MONT-005-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Radicación Hoja de Vida Director de Interventoria
DON-009-MONT-006-2022	2-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Reiteración Entrega de Documentación Para Acta de Inicio
DON-009-MONT-007-2022	6-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida
DON-009-MONT-008-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida V.2
DON-009-MONT-009-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Poliza De Cumplimiento
DON-009-MONT-010-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Plan de Manejo De Tránsito
DON-009-MONT-011-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Inicio Actividades De Obra
DON-009-MONT-012-2022	9-sep-22	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Derecho De Petición. Solicitud Información Perfiles Disponibles
DON-009-MONT-013-2022	12-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas De Vida Recibidas Por Correo Electrónico, 10 de Septiembre De 2022
DON-009-MONT-014-2022	16-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Hojas De Vida Interventoría
DON-009-MONT-016-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio
DON-009-MONT-016-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA
DON-009-MONT-017-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Relación Equipo Y Personal Propuesto Interventoria
DON-009-MONT-018-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio
DON-009-MONT-019-2022	19-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Respuesta Oficio OFI: MAR-012-2022-001
DON-009-MONT-020-2022	22-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Alcance Comunicación DON-009-MONT-018-2022. Remisión Acta de Inicio
DON-009-MONT-021-2022	29-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Cambio Hoja de Vida Residente Interventoria

6502

DON-009-MONT-023-2022	30-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Remisión Pólizas Según Acta De Inicio
DON-009-MONT-024-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Inicio De Obras E Información Domicilio Interventoría
DON-009-MONT-025-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO
DON-009-MONT-026-2022	5-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud al componente social
DON-009-MONT-027-2022	6-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
DON-009-MONT-028-2022	7-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO OFI: MAR-012-2022-004 HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
DON-009-MONT-029-2022	8-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADA CON FECHA DE ACTA DE INICIO, ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2022.
DON-009-MONT-030-2022	12-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO
DON-009-MONT-031-2022	12-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	SOLICITUD ACLARACION EQUIVALENCIAS PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O DE VIAS Y TRANSPORTE CON POSTGRADO EN VIAS.
DON-009-MONT-032-2022	14-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PERSONAL PROFESIONAL CONTRATISTA DE OBRA
DON-009-MONT-033-2022	14-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	retario de Infraestructura Munic	Ivan Alviz	SOLICITUD CAMBIO HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORÍA
DON-009-MONT-034-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO
DON-009-MONT-035-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPSO CONTRATADOS.
DON-009-MONT-036-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
DON-009-MONT-037-2022	24-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
DON-009-MONT-038-2022	25-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Atrasos en la ejecución de Actividades
DON-009-MONT-039-2022	25-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remisión Documentos Acta de Inicio
DON-009-MONT-040-2022	27-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN VIAS
DON-009-MONT-041-2022	27-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO MAR-012-2022-011: SEGUIMIENTO MENSUAL PGIO 01
DON-009-MONT-042-2022	27-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	AUSENCIA DE PERSONAL EN OBRA
DON-009-MONT-043-2022	27-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE OBRAS CONTRATISTA
DON-009-MONT-045-2022	1-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REQUERIMIENTO AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PGIO

DON-009-MONT-046-2022	1-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE OBRAS CONTRATISTA
DON-009-MONT-047-2022	1-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE IMPLEMETACION SST
DON-009-MONT-048-2022	8-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CRONOGRAMA DE OBRAS DEL CONTRATISTA.
DON-009-MONT-049-2022	8-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA A OFICIO MAR-012-2022-015: Seguimiento PGIO (Componente Ambiental)
DON-009-MONT-050-2022	10-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	ATRASOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.
DON-009-MONT-050-2022	10-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	ATRASOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES V2.
DON-009-MONT-051-2022	10-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE PROGRAMACION DE TRABAJOS LOS DIAS 12,13 Y 14 DE
DON-009-MONT-052-2022	11-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA A OFICIO MAR-012-2022-013: Entrega documentos cantera y
DON-009-MONT-053-2022	17-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	ATRASOS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.
DON-009-MONT-054-2022	17-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA A OFICIO: MAR-012-2022-020 – REVISION Y APROBACION INFORME MENSUAL DE LA IMPLEMENTACION PGIO COMPONENTE AMBIENTAL
DON-009-MONT-055-2022	18-nov-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remisión de concepto estructural de interventoría.
DON-009-MONT-055-2022	18-nov-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remisión de concepto estructural de interventoría.
DON-009-MONT-056-2022	23-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud de Plan de Contingencia
DON-009-MONT-057-2022	24-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Respuesta a oficios **MAR-012-2022-016** "Justificacion y solicitud aprovacion de obras no previstas" y **MAR-012-2022-021** "Justificacion y solicitud de aprobacion de obras no contempladas-envio archivo digital con la informacion de la tuberia de la red de acueducto a trasladar".
DON-009-MONT-058-2022	28-nov-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Respuesta a entrega de respuesta del oficio **DON-009-MONT-057-2022** "Respuesta a oficios MAR-012-2022-016 "Justificacion y solicituc aprovacion de obras no previstas" y MAR-012-2022-021 "Justificacion y solicitud de aprobacion de obras no contempladas-envio archivo digital con la informacion de la tuberia de la red de acueducto a trasladar".
DON-009-MONT-059-2022	1-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Respuesta a comunicado cuyo asunto es "**P.A ANTICIPO CONSTRUCCIONES AP SAS 2022 - ORDEN REEMBOLSO N°1**"
DON-009-MONT-060-2022	2-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Respuesta a oficio MAR-012-2022-013: Documentos cantera La Fontana y caracterización del material

DON-009-MONT-061-2022	3-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Respuesta a comunicado cuyo asunto es "**15629 P.A ANTICIPO CONSTRUCCIONES AP SAS 2022 - ORDENES SDE OPERACIÓN**"
DON-009-MONT-062-2022	6-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de ordenes de operaciones enviados por correo electronico cuyo asunto es "**15629 P.A ANTICIPO CONSTRUCCIONES AP SAS 2022 - ORDENES DE OPERACIONES**"
DON-009-MONT-063-2022	6-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de orden de operación N°1 por concepto de alquiler de maquinarias enviado por correo electronico cuyo asunto es "**15629 P.A ANTICIPO CONSTRUCCIONES AP SAS 202 - ORDENES DE OPERACIÓN**"
DON-009-MONT-064-2022	7-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Respuesta oficio OFI: MAR-012-2022-022 - Revisión informe mensual de la implementacion PGIO componente ambiental mes dos
DON-009-MONT-065-2022	8-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Respuesta oficio OFI: MAR-012-2022-024 cuyo asunto es : Respuesta al oficio DON-009-MONT-056-2022
DON-009-MONT-066-2022	9-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Observaciones al proceso constructivo de relleno de material de terraplen y subbase
DON-009-MONT-067-2022	9-dic-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remision de informe presunto incumplimiento al contrato de obra N° LP-SIM-012-2022
DON-009-MONT-068-2022	9-dic-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Entrega de informe mensual de interventoria N°02
DON-009-MONT-069-2022	9-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de ordenes de operaciones enviados por correo electronico cuto asunto es "**ORDEN DE OPERACIÓN**"
DON-009-MONT-070-2022	10-dic-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remision plan de calidad de interventoria
DON-009-MONT-071-2022	13-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de ordenes de operaciones enviados popr correo electronico cuyo asunto es "**ordenes de operaciones fiducia**"
DON-009-MONT-072-2022	13-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de orden de operación N°13 enviado por correo electronico cuyo asunto es "**ORDENES DE OPERACIÓN FIDUCIA**"
DON-009-MONT-073-2022	16-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación de ordenes de operaciones N°15, 16 y 17 enviado por correo electronico cuyo asunto es "**RV: 15629 P.A ANT CONSTRUCCIONES A.P. S.A.S 2022 - RECHAZO DE ORDEN**"
DON-009-MONT-074-2022	21-dic-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Aprobación a los analsis de precios unitarios contractuales
DON-009-MONT-085-202	23-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO CON EL ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE OBRA
DON-009-MONT-086-2022	24-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PGPSO CONTRATADOS.

6808

DON-009-MONT-087-2022	23-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS DEL PROYECTO.
DON-009-MONT-088-2022	24-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN OBRA.
DON-009-MONT-090-2022	28-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN OBRA.
DON-009-MONT-091-2022	28-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS DEL PROYECTO.
DON-009-MONT-092-2022	28-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
DON-009-MONT-093-2022	28-mar-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO CON EL ACTA DE REINCIO N°01 DEL CONTRATO DE OBRAS
DON-009-MONT-094-2022	13-abr-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION DE HOJA DE VIDA INGENIERA AMBIENTAL
DON-009-MONT-095-2022	14-abr-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO REQUERIDO EN OBRA.
DON-009-MONT-096-2022	13-abr-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPSO CONTRATADOS.
DON-009-MONT-098-2022	22-abr-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE RELLENO DE MATERIAL DE TERRAPLEN Y SUB BASE
DON-009-MONT-099-2022	4-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Atrasos en la ejecucion de actividades.
DON-009-MONT-100-2022	5-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud de plan de contingencia
DON-009-MONT-101-2022	8-may-23	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	REMISIÓN DE INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM-012-2022
DON-009-MONT-102-2022	18-may-23	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Respuesta a Oficio C.E.SIM No.534-2023 cuyo asunto es Solicitud de Información.
DON-009-MONT-103-2022	18-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Correctivos de obra.
DON-009-MONT-104-2022	18-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
DON-009-MONT-105-2022	18-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE FECHA DE REUNIÓN MENSUAL CON EL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA
DON-009-MONT-106-2022	19-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	INCUMPLIMIENTO EN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
DON-009-MONT-107-2022	29-may-23	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	REMISION DE ENTREGA DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRAS
DON-009-MONT-108-2022	29-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA A OFICIO MAR-012-2022-038 CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE PRORROGA

6506

DON-009-MONT-109-2022	30-may-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REQUERIMIENTO AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL DOCUEMNTO PGIO – RESOLUCION PERMISO OCUPACION DE CAUCE N° 2-9038 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022
DON-009-MONT-112-2022	7-jun-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE OBRAS AJUSTADO CON LA PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRAS
DON-009-MONT-113-2022	8-jun-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE POLIZAS SEGÚN PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRAS
DON-009-MONT-114-2022	13-jun-23	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA A COMUNICADO MAR-012-2022-041 CUYO ASUNTO ES RESPUESTA A OFICIO DON-009-MONT-112-2022 DEL DÍA 07/06/2023
DON-009-MONT-116-2022	23-jun-23	ALCALDIA DE MONTERIA	MONICA SEVERICHE NUÑEZ	Secretaria de Infraestructura Municipal	Iván Alviz	Entrega de informe mensual de interventoria N°06

6807

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	***CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.***						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de** Impreso	Fax	Mail	**Observaciones**
DON-009-MONT-001-2022	18-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Entrega Poliza de Cumplimiento			x	
DON-009-MONT-002-2022	19-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Entrega hojas de vidas profesionales			x	
DON-009-MONT-003-2022	31-ago-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Documentación Para Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-004-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Cesión Contrato de Interventoría			x	
DON-009-MONT-005-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Radicación Hoja de Vida Director de Interventoría			x	
DON-009-MONT-006-2022	2-sep-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Reiteración Entrega de Documentación Para Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-007-2022	6-sep-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida			x	
DON-009-MONT-008-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida V.2			x	
DON-009-MONT-009-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Poliza De Cumplimiento			x	
DON-009-MONT-010-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Plan de Manejo De Tránsito			x	
DON-009-MONT-011-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Inicio Actividades De Obra			x	
DON-009-MONT-012-2022	9-sep-22	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Derecho De Petición. Solicitud Información Perfiles Disponibles			x	
DON-009-MONT-013-2022	12-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas De Vida Recibidas Por Correo Electrónico, 10 de Septiembre De 2022			x	
DON-009-MONT-014-2022	16-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Hojas De Vida Interventoría			x	

6508

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	***CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.***						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de**			**Observaciones**
							Impreso	Fax	Mail	
DON-009-MONT-016-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-017-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Relación Equipo Y Personal Propuesto Interventoria			x	
DON-009-MONT-018-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-019-2022	19-sep-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Respuesta Oficio OFI: MAR-012-2022-001			x	
DON-009-MONT-020-2022	22-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Alcance Comunicación DON-009-MONT-018-2022. Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-021-2022	29-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Cambio Hoja de Vida Residente Interventoria			x	
DON-009-MONT-022-2022										
DON-009-MONT-023-2022	30-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Remisión Pólizas Según Acta De Inicio			x	
DON-009-MONT-024-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Inicio De Obras E Información Domicilio Interventoría			x	
DON-009-MONT-025-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x	
DON-009-MONT-026-2022	5-oct-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud al componente social			x	
DON-009-MONT-027-2022	6-oct-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x	
DON-009-MONT-028-2022	7-oct-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO OFI: MAR-012-2022-004 HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO			x	
DON-009-MONT-029-2022	8-oct-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADA CON FECHA DE ACTA DE INICIO, ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2022.			x	
DON-009-MONT-030-2022	12-oct-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO			x	
DON-009-MONT-031-2022	12-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Germian Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	SOLICITUD ACLARACION EQUIVALENCIAS PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O DE VIAS Y TRANSPORTE CON POSTGRADO EN VIAS.			x	
DON-009-MONT-032-2022	14-oct-22	CONSTRUCCIONES AP S/S	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PERSONAL PROFESIONAL CONTRATISTA DE OBRA			x	

6509

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	***CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.***						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de** Impreso	Fax	Mail	**Observaciones**
DON-009-MONT-033-2022	14-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	SOLICITUD CAMBIO HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORÍA			x	
DON-009-MONT-034-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x	
DON-009-MONT-035-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPSO CONTRATADOS.			x	
DON-009-MONT-036-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x	
DON-009-MONT-037-2022	24-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL			x	
DON-009-MONT-038-2022	25-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Atrasos en la ejecución de Actividades			x	
DON-009-MONT-039-2022	25-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	Secretario de Infraestructura Municipal	Ivan Alviz	Remisión Documentos Acta de Inicio			x	

659

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA			Proyecto:	*CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.*						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de** Impreso	Fax	Mail	**Observaciones**
DON-009-MONT-001-2022	18-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Entrega Poliza de Cumplimiento			x	
DON-009-MONT-002-2022	19-ago-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Entrega hojas de vidas profesionales			x	
DON-009-MONT-003-2022	31-ago-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Documentación Para Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-004-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Solicitud de Cesión Contrato de Interventoria			x	
DON-009-MONT-005-2022	2-sep-22	MUNICIPIO DE MONTERÍA	MUNICIPIO DE MONTERÍA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Radicación Hoja de Vida Director de Interventoria			x	
DON-009-MONT-006-2022	2-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Reiteración Entrega de Documentación Para Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-007-2022	6-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida			x	
DON-009-MONT-008-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas de Vida V.2			x	
DON-009-MONT-009-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Poliza De Cumplimiento			x	
DON-009-MONT-010-2022	9-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Plan de Manejo De Tránsito			x	
DON-009-MONT-011-2022	8-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Inicio Actividades De Obra			x	
DON-009-MONT-012-2022	9-sep-22	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN DE PERSONAS Y NORMALIZACIÓN	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Derecho De Petición. Solicitud Información Perfiles Disponibles			x	
DON-009-MONT-013-2022	12-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Revisión Hojas De Vida Recibidas Por Correo Electrónico, 10 de Septiembre De 2022			x	
DON-009-MONT-014-2022	16-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Hojas De Vida Interventoría			x	
DON-009-MONT-016-2022	16-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-017-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Relación Equipo Y Personal Propuesto Interventoria			x	
DON-009-MONT-018-2022	19-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-019-2022	19-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Juan Diego Arenas De La Hoz	Respuesta Oficio OFI: MAR-012-2022-001			x	
DON-009-MONT-020-2022	22-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Alcance Comunicación DON-009-MONT-018-2022. Remisión Acta de Inicio			x	
DON-009-MONT-021-2022	29-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	Victor Manuel Hernandez	Supervisor de Obra	Juan Diego Arenas De La Hoz	Cambio Hoja de Vida Residente Interventoria			x	
DON-009-MONT-022-2022										
DON-009-MONT-023-2022	30-sep-22	ALCALDIA DE MONTERIA	MUNICIPIO DE MONTERIA	Representante Legal	Ivan Alviz	Remisión Pólizas Según Acta De Inicio			x	
DON-009-MONT-024-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Inicio De Obras E Información Domicilio Interventoría			x	
DON-009-MONT-025-2022	30-sep-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x	

DON-009-MONT-026-2022	5-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Solicitud al componente social			x	
DON-009-MONT-027-2022	6-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x	
DON-009-MONT-028-2022	7-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	RESPUESTA COMUNICADO OFI: MAR-012-2022-004 HOJA DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO			x	
DON-009-MONT-029-2022	8-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	OBSERVACIONES PROGRAMACION DE OBRA ACTUALIZADA CON FECHA DE ACTA DE INICIO, ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2022.			x	
DON-009-MONT-030-2022	12-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS DE LABCIRATORIO			x	
DON-009-MONT-031-2022	12-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	tario de Infraestructura Mu	Ivan Alviz	SOLICITUD ACLARACION EQUIVALENCIAS PROFESIONAL INGENIERO CIVIL O DE VIAS Y TRANSPORTE CON POSTGRADO EN VIAS.			x	
DON-009-MONT-032-2022	14-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PERSONAL PROFESIONAL CONTRATISTA DE OBRA			x	
DON-009-MONT-033-2022	14-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	tario de Infraestructura Mu	Ivan Alviz	SOLICITUD CAMBIO HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORÍA			x	
DON-009-MONT-034-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	REITERACION SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION INICIO DE CONTRATO			x	
DON-009-MONT-035-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO, PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD,SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PAPSO CONTRATADOS.			x	
DON-009-MONT-036-2022	20-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	APROBACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO			x	
DON-009-MONT-037-2022	24-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.			x	
DON-009-MONT-038-2022	25-oct-22	CONSTRUCCIONES AP SAS	Sergio Andres Acero Alvarez	Representante Legal	Ivan Alviz	Atrasos en la ejecución de Actividades			x	
DON-009-MONT-039-2022	25-oct-22	ALCALDIA DE MONTERIA	German Quintero Mendoza	tario de Infraestructura Mu	Ivan Alviz	Remisión Documentos Acta de Inicio			x	

RELACIOn DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA			Proyecto:	*CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.*						
Código consecutivo de enviado	**Fecha de documento**	**Entidad destinataria**	**Persona destinataria**	**Cargo de persona destinataria**	**Persona que firma el documento**	**Asunto tratado** (Breve descripción del tema tratado en el oficio)	**Medio de**			**Observaciones**
							Impreso	Fax	Mail	
OFI: MAR-012-2022-001	16-sep-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	Experiencia de profesionales.			x	
OFI: MAR-012-2022-002	22-sep-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	Experiencia de profesionales.			x	
OFI: MAR-012-2022-004	6-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	HOJAS DE VIDA PROPUESTO			x	
OFI: MAR-012-2022-005	10-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	RESPUESTA AL OFICIO DON-009-MONT-027-2022			x	
OFI: MAR-012-2022-006	10-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	RESPUESTA COMUNICADO RECHAZO HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN VIAS			x	
OFI: MAR-012-2022-008	21-oct-22	CONSULTORES DONOVAN SAS	CONSULTORES DONOVAN SAS	Representante Legal	Sergio Acero	DOCUMENTOS ACTA DE INCIO			x	

6313

-Se le solicita al contratista de obra mejorar los rendimientos en las actividades contractuales. 6519



Manicaya, 12 de octubre de 2013, martes
estado del clima: soleado


Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Trabajadora Social; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (1) maestro de obra; (1) operario civil; (18) ayudantes civiles; (3) oficios varios; (6) op de maquinaria

Personal interventoria: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de interventoria; (1) profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero.

Maquinaria y equipos: (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora pajarita (A); (1) vibro compactador (T); (1) cargo luque (A); (1) camion (A); (1) volqueta (A)

Actividades Realizadas:
-El contratista de obra realizo pundida de piedra pegada entre las abscisas K3+270 y K3+330, en canal izquierdo.
-El contratista de obra realiza ingreso de volquetas para descargar en sitio de acopio de materiales.





6515

Maracaya, 11 de octubre de 2023, Miercoles.
Estado del clima: Lluvia leve.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Trabajadora Social; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) almacenista; (1) Maestro de obra; (1) oficial civil; (18) ayudantes civiles; (3) oficios varios; (6) operadores de maquinaria

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) Trabajadora social; (1) profesional SST; (1) Topografo; (1) cadenero.

Maquinaria y equipos: (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora pajarita (A); (1) vibro compactador (I); (1) carro tanque (A); (1) carmix (I); (1) volqueta (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo excavacion de la subrasante y cargue y retiro de material entre las abcisas K3+450 y K3+500
- El contratista de obra realizo figuracion de acero de refuerzo para placa huella e instalacion de rieles entre las abcisas K2+650 y K2+720 en carril derecho
- Se le solicita al contratista de obra mejorar los rendimientos de las actividades contractuales.

Hg Schl

6516

Manaure, 12 de octubre de 2023, guarda
dado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (1) Maestro de obra; (1) oficial civil; (1) ayudante civiles; (3) oficios varios; (6) op. de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Profesional SST; (1) Topografo; (1) cadenero.

Maquinaria y equipos: (1) compactador (A); (1) Retroexcavadora pajarita (A); (1) vibrocompactador (A); (1) retroexcavador (A); (1) camion (I); (1) volqueta (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista realizo conformación manual de viga nueva y berma cunita entre las abscisas K2+440 y K2+480, en canal derecho.
- El contratista de obra realizo relleno con sublase granular y compactación entre las abscisas K3+400 y K3+450
- se le solicita al contratista de obra mejorar los rendimientos en las actividades contractuales y dar cumplimiento al PGIO, PMT y papeleo entregados.

H3 Sub

6517

Marmato, 13 de octubre de 2023, viernes.
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) almacenista; (1) Maestro de obra; (1) oficial civil; (1) ayudantes civiles; (3) Operarios varios; (6) op. de maquinaria

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) profesional SST.

maquinaria y equipos: (1) mini cargador (A); (1) Retroexcavadora pajarita (A); (1) vibrocompactador (I); (1) carrotanque (A); (1) carrote (I); (1) volqueta (A).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo mezcla de subbase granular en sitio de acopio de marmato
- El contratista de obra realizo relleno en subbase granular entre las abscisas K3+430 y K3+450.
- Se le solicita al contratista de obra mejorar los rendimientos de las actividades contratadas
- El contratista de obra realizo figurado de acero de refuerzo para estribos del puente.

6518

Marcaya, 14 de octubre de 2023, sabado.
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista (1) maestro de obra; (1) oficial civil; (18) ayudantes civiles; (6) operadores de maquinaria

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria (1) profesional SST; (1) Topografo; (1) cadenero.

Maquinaria y equipos: (1) Minicargador (A); (1) Retroexcavadora pajarita (A); (1) vibro compactador (I); (1) carrotanque (A); (1) camion ( ); (1) volqueta (A)

Actividades Realizadas:
- el contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo sobre los abscisas K2+680 y K2+720, en carril derecho
- el contratista de obra realizo seleccion y recolección de piedra roja para la conformación de la placa huella.
- el contratista de obra realizo mezcla de subbase granular en sitio de apoyo de materiales.
- Se le solicita al contratista de obra dar cumplimiento al plan, PESO y PMT contratados.

6519

Maracaya, 15 de octubre de 2022, domingo
Estado del dia: soleado.

No se labora, dia festivo.



Maracaya, 16 de octubre de 2022, lunes
Estado del dia: lluvia leve

No se labora, dia festivo.



Maracaya, 17 de octubre de 2022, martes.
Estado del dia: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (4) cadeneros; (1) almacenista; (1) residente de obra; (1) apoyo civil; (12) ayudantes civiles; (3) oficios varios; (4) controladores viales; (7) operadores de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Topografo; (1) cadenero.

Maquinaria y equipos: (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora pajarita (A); (1) vibro compactador (A); (1) carrotanque (A); (1) camion (I); (2) volquetas (A)

6520

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra rellena en ambos de subbase granular entre las abscisas K3+450 y K3+500 y realiza su debida compactación.
- El contratista de obra retira mezcla de subbase granular en sitio de acopio de materiales.
- Se le solicita al contratista de obra mejorar los rendimientos en la ejecución de las actividades contractuales.

Firma

Manizales, 19 de Oct. de 2023

Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) cadenera; (1) Almacenista; (4) controladores viales; (1) Maestro de obra; (1) oficial civil; (12) ayudantes civiles; (3) operarios varios; (7) op. de maquinaria.

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) inspector de interventoría; (1) Topógrafo; (1) profesional SST; (1) cadenera

Maquinaria y equipos: (1) Minicargador (A); (1) Retroexcavadora pajarita (A); (1) vibro compactador (A); (1) carrotanque (A); (1) excavadora (I); (1) camión (I); (1) volquetas (activos).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza mezcla de subbase granular en sitio de acopio de materiales.

6529

— El contratista de obra realizo traslado de tuberia para proceder a excavación manual de bombeo cuneta entre las abcisas Km 1+700 y Km 1+720 en carril derecho.
— El contratista de obra realizo encofrado de estribos del puente, en la abcisa Km 1+780.

Maracaibo, 19 de octubre de 2023, jueves, estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) prepersonal SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) almacenista; (7) contratadores varios; (1) maestro de obra; (1) Oficial civil; (16) ayudantes civiles; (3) oficios varios; (2) operadores de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero.

Maquinaria y equipos: (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora pajarita (A); (1) vibrocompactador (A); (1) Excavadora (A); (1) cargotractor (A); (1) camion (I); (2) volquetes (A).

Actividades Realizadas:
— El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo entre las abcisas Km 1+700 y Km 1+740, en carril derecho

6522

- el contratista de obra realizo excavacion de la subrasante y cargue y retiro de material entre las abscisas K3+500 y K3+520
- se realizo fundida de estribos del puente, en la abscisa K1+100.

Manizales, 20 de octubre de 2023, viernes
estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (4) contratistas viales; (1) maestro de obra; (1) operario civil; (10) ayudantes civiles; (3) ofios varios; (6) op. de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) profesional SST.

Maquinarias y equipos: (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora pyaruta (A); (1) rodillo compactador (I); (1) excavadora (A); (1) cargotuqueo (A); (1) carmix (I); (2) volquetas (A)

Actividades Realizadas:
- el contratista de obra realizo Mezcla de Subbase granular en sitio de acopio de materiales.
- el contratista de obra realizo excavacion de la subrasante y cargue y retiro de material entre las abscisas K3+450 y K3+500
- el contratista de obra realizo seleccion y recoleccion de piedras rajas para placa huella.

6523

— Se le solicita al contratista de obra mejorar los rendimientos en las actividades contratadas y se le solicita dar cumplimiento al PGRSO, PGIO y PMT contratadas.
— El contratista de obra realiza figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reparado, viga riostra y bordillo cuneta.
— El contratista de obra realiza figurado y armado de acero de refuerzo para el pivote, ubicado en la abscisa K1+780.
—

Maracaya, 11 de marzo de 2024, lunes
Estado del clima; Soleado.

Actividades Realizadas:
— El presente día, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía de Maracaya. Se revisaron los ítems involucrados en el proyecto, (representante legal del proyecto (contratista de obra, interventoría) y la secretaria de infraestructura. Se suscribió acta de reunión N°03 y prórroga N°03.
.

6529

Manaure, 12 de marzo de 2024, martes
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Inspector de obra; (1) Residente de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) Almacenista; (1) cadenero; (4) cantineladores viales; (5) maestros de obra; (42) Ayudantes civiles; (7) oficios varios; (9) Operadores de maquinaria

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) inspector de interventoría; (1) Topógrafo; (1) cadenero.

Maquinaria y equipos: (1) Motoniveladora (A); (1) rodillo compactador (A); (1) cargadora (A); (1) Excavadora (A); (4) Volquetas (A); (1) camión (A); (1) Retroexcavadora-pajarito (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo para box culvert N°6, en la abcisa K1+975,7
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo para las vigas del puente, en la abcisa K1+781
- Se realizo excavación de la subrasante entre la abcisa K1+260 y K1+310
- se realizo fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y bermas cuneta, entre las abcisas K3+[illegible] y K3+110, en carril derecho

Hs Sol

6525

Manizayo, 13 de marzo de 2024, miercoles
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Topografo; (1) Auxiliar SST; (1) cadenero; (1) Almacenista; (4) controladores viales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (4) oficios varios; (7) operadores de maquinaria

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) profesional SST

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (A); (1) vibro compactador (A); (1) minicargador (A); (1) excavadora (A); (3) volquetas (A); (1) carro tanque (A); (1) carrux (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo relleno con subbase granular entre las abcisas K1+260 y K1+310
- Se realizo fundida de barrera cuneta y placas de concreto reforzado, entre las abcisas K0+900 y K0+920 en carril derecho; y entre las abcisas K1+200 y K1+220 en carril derecho.
- Se realizo excavación para filtros y relleno con material granular mayor a 3" entre las abcisas K1+650 y K1+700.
- Se realizo fundida de placas de concreto ciclopeo entre las abcisas K3+090 y K3+110, en carril derecho.
- El contratista de obra realizo fundida de muros y aletas del puente, en la abcisa K1+780.

Sin O.

6526

Mamacaya, 14 de marzo de 2024, Jueves
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Trabajadora social; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Almacenero; (4) contratadores viales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (1) oficios varios; (9) operadores de maquinaria

Personal supervisión: (1) Director de supervisión; (1) Residente de supervisión; (1) inspector de supervisión; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Profesional SST

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (A); (1) vibro compactador (A); (1) mezcladora (A); (1) Excavadora (E); (1) Payarita (A); (3) volqueta (A); (1) carro tanque (A); (1) camión (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo fundido de bordillos entre las abscisas K1+095 y K1+180 en carril izquierda
- Se realizo figurado y armado de refuerzo para vigas del puente en la abscisa K1+781
- Se realizo instalación de rieles en carril izquierda entre las abscisas K0+950 y K0+950
- Se tomaron muestra y se realizo el ensayo de densidades en campo entre las abscisas K2+100 y K3+586
- Se realizo fundida de placas de concreto reforzado, vigas muestra y barras cuneta entre las abscisas K3+110 y K3+260 en carril derecha

Ing. Civil

6527

Maracaya, 15 de marzo de 2024, viernes.
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Trabajador social; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) Almacenista; (1) cadenero; (4) Auxiliares viales; (5) maestros de obra; (42) Auxiliares civiles; (1) oficios varios; (9) operadores de maquinaria.

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) inspector de interventoría; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Profesional SST.

Maquinaria y equipo: (1) Motoniveladora (T); (1) Vibro compactador (T); (1) Mezclador (T); (1) Excavadora (A); (1) Retroexcavadora - pajarita (A); (3) Volquetes; (1) carrotanque (A); (1) Cargador (A)

Actividades Realizadas:

— El contratista de obra realiza fijación y anclaje de acero de refuerzo para viga riostra y viga del puente en la abscisa K1+760.

— El contratista de obra realiza excavación y relleno de filtros entre las abscisas K1+600 y K1+740.

— El contratista de obra realiza fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y pantalla, entre las abscisas K0+620 y K0+978, en carril derecho.

— Se realiza chequeo de niveles de subrasante por parte de consorcio topografía de interventoría.

— El contratista de obra realiza fundida de concreto ciclopeo entre las abscisas K2+100 y K2+760, en carril derecho.

6528

Manizales, 16 de marzo de 2024, sabado.
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Trabajadora social; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadeneros; (1) Almacenista; (4) controladores viales; (3) maestros de obra; (42) Ayudantes civiles; (7) oficios varios; (9) operadores viales.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Profesional SST

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (A); (1) vibro compactador (A); (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora - pajarita (A); (3) volquetes (A); (1) carrotanque (A); (1) cargador (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo para placa de concreto, viga riostra y barrera cuneta, entre las abscisas K1+250 y K1+300, en carril derecho.
- El contratista de obra realizo instalación de curles para placa huella y nivelación del terreno, entre las abscisas K1+300 y K1+350, en carril derecho.
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abscisas K0+665 a K0+545, en carril izquierdo.
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y barrera cuneta, entre las abscisas K2+700 y K2+760, en carril derecho.

Ing. S. y P.

[illegible]

6529

Maracaya, 11 de mayo de 2024, domingo.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Trabajador Social; (1) Profesional SST; (1) Topografo; (1) Auxiliar SST; (1) cadenero; (4) contenedores viales; (3) maestros de obras; (42) ayudantes civiles; (2) oficios varios; (9) operadores de Maquinaria.

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) profesional SST

Maquinaria y equipo: (1) motoniveladora (I); (1) Vibro compactador (I); (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora-pajarita (A); (3) volquetas (I); (1) carrotanque (A); (1) carmix (A); (1) excavadora (I)

Actividades Realizadas:
— El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reportado entre las abcisas K1+000 y K1+300, en canal derecho
— El contratista de obra realizo instalacion de formaleta para losa inferior de box culvert No (4 x 2), en la abcisa K1+975
— El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abcisas K3+400 y K3+460, en canal izquierdo
— Se realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abcisas K3+420 y K3+460, en canal derecho
— Se realizaron cunetas de coronacion en concreto entre las abcisas K0+000 y K0+685

6530

Manizaya, 18 de marzo de 2024, lunes
Estado de clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (4) contratadores viales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (2) oficios varios; (9) operadores de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Profesional SST.

Maquinaria y equipo: (1) retroexcavadora (A); (1) vibro compactador (A); (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora - pajarita (A); (1) carrotanque (A); (3) volquetas (A); (1) camioneta (A).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y berma cuneta, entre las abscisas K1+300 y K1+360, en carril derecho.
- El contratista de obra realiza instalación de niveles y nivelación de terreno entre las abscisas K0+700 y K0+820, en carril izquierdo.
- El contratista de obra realiza figurado y acerado de acero de refuerzo para vigas del puente y armado de formaletas.
- El contratista de obra realiza fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y berma cuneta, entre las abscisas K3+400 y K3+460.

Firma.

6531

Manizales 19 de marzo de 2024, martes
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (4) contratadores viales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (7) oficios varios; (9) operadores de maquinaria

Personal interventoria: (1) Residente de obra; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Profesional SST;

Maquinaria y equipos: (1) motoniveladora (A); (1) vibro compactador (A); (1) Cargador (A); (1) Retroexcavadora - pajarita (1) Excavadora (I); (1) cargatrompo (A); (3) Volquetas (A); (1) carrota (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo excavacion de la Subrasante entre las abcisas K9+550 y K9+630.
- El contratista de obra realizo armado de parantelas para fundida de vigas del puente en la abcisa K1+190
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado entre las abcisas K1+350 y K1+400, en carril derecho.
- El contratista de obra fundio placas de concreto ciclopeo entre las abcisas K0+700 y K0+740, en carril izquierdo.
- El dia de hoy se realizo cosecha de cesantidades en campo a la Subbase granular, entre las abcisas K1+250 y K1+450.
- El contratista de obra realizo fundida de concreto reforzado, entre las abcisas K3+170 y K3+160, carril derecho

6532

Manizales, 20 de marzo de 2024, Municipio.
Estado del clima: llovia moderado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (4) contratadores viales; (5) Maestros de obra; (42) Ayudantes civiles; (7) oficios varios; (8) operadores de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Profesional SST.

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (I); (1) Mini-cargador (A); (1) Retroexcavadora-pajarita (A); (1) Excavadora (A); (1) Formaleta (A); (3) volquetas (A); (1) Camion (A).

Actividades Realizadas.
- El contratista de obra realizo instalacion de rieles para placa huella, entre las abscisas K0+740 y K0+820, en carril izquierdo.
- El contratista de obra realizo Excavacion manual de viga riostra y berma cuneta entre las abscisas K0+700 y K0+740, en carril derecha.
- El contratista de obra realizo excavacion de la subrasante entre las abscisas K1+550 y K1+630.
- El contratista de obra realizo instalacion de formaletas para fundida de losa inferior de box coulvert N° 6 (4x2) en la abscisa K1+975.
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto ciclopeo entre las abscisa K2+760 y K2+830, en carril derecho y K3+460 a K3+520, en carril izquierdo.

Hay Sol P

DIA

6533

Manizales, 21 de marzo de 2024, jueves
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) cadenera; (1) almacenista; (4) controladores viales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (3) oficiales varios; (6) operadores de maquinaria.

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) Inspector de interventoría; (1) Topógrafo; (1) cadenera; (1) profesional SST.

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (A); (1) minicargador (A); (1) Retroexcavador - pajarita (A); (1) Excavadora (T); (1) carrotanque (A); (3) volquetas (A); (1) carmix (A).

Actividades realizadas:
- El contratista de obra realizo fundida de losa inferior de box coulvert N= (4x2), en la abscisa K1+915
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abscisas K1+400 y K1+450, en canal derecho
- El contratista de obra realizo excavacion manual de viga riostra y berma cuneta entre las abscisa K0+6 y K0+120, en canal izquierda.
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado viga riostra y berma cuneta, entre las abscisas K2+160 y K2+230, en canal derecho, y K3+460 a K3+520, canal izquierda

6534

Maracaibo, 21 de enero de 2024, viernes
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Trabajadora social; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) almacenista; (4) controladores viales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (7) oficios varios; (6) operadores de maquinaria.

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) inspector de interventoría; (1) Profesional SST; (1) Topógrafo; (1) cadenero

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (I); (1) minicargador (I); (1) Retroexcavadora sobre llanta (I); (1) excavadora (I); (1) camión aljibe (A); (3) volquetas (A); (1) camión (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo para box culvert N°7, (3x2), en la abscisa K2+046, y realizo armado de formaletas para losa inferior.
- El contratista de obra realizo excavación manual de viga riostra y berma cuneta entre las abscisas K1+400 y K1+450, en carril derecho.
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo, entre las abscisas K1+400 y K1+450, en carril derecho.
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abscisas K3+512 a K3+586, en carril izquierda.

6535

Macanaya, 28 de marzo de 2014, sabado
estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Trabajadora social; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (2) Almacenista; (4) controladoras viales; (9) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (7) oficios varios; (8) operadores de maquinaria;

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Profesional SST

Maquinaria y equipos: (1) retro compactador (I); (1) mezclador (2); (1) Retroexcavadora-pajarita (I); (1) excavadora (1) camioneta (2); (1) carrotanque (2); (1) carrota (2); (3) volquetas (2).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo fundida de losa inferior de boxcoulvert N°1 (3x2), en la abcisa K2+048.
- El contratista de obra realizo fundida de viga central del puente entre abcisas K1+760 y K1+600
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abcisas K0+680 y K0+200, en carril izquierdo.
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y barrera rigida entre las abcisas K3+760 y K3+350, en carril derecho.

Hoscol

Ing. A.

6536

Maracaya, 24 de marzo de 2024, domingo
Estado del clima: soleado.

No se realizaron actividades, día festivo.

Maracaya, 25 de marzo de 2024, lunes
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Instructor de obra; (1) Trabajadora social; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Almacenista; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (4) contratadores viales; (3) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (4) oficios varios; (2) operadores de maquinaria.

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) inspectora de interventoría; (1) Profesional SST; (1) Topógrafo; (1) cadenero

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (T); (1) motoniveladora (A); (1) Retroexcavadora-pajarita (T); (1) Excavadora (T); (1) carro tanque (A); (1) cisterna (T); (3) volquetas (A).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza armado de acero de refuerzo para vigas del puente, en la abscisa K1+230.
- El contratista de obra realiza instalación de redes sobre las abscisas K0+320 y K0+900.
- Se realiza ensayo de densidades en campo sobre las abscisas K1+060 y K1+230.

6537

Manizales, 26 de marzo de 2014, Martes.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Trabajadora social; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Almacenista; (1) Topógrafo; (2) cadeneros; (4) controladores viales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (1) oficios varios; (3) operadores de maquinaria.

Personal interventoría: (1) Residente de interventoría; (1) Inspector de interventoría; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Profesional SST.

Maquinaria y equipos: (1) Vibro compactador (A); (1) Mini cargador (A); (1) Retroexcavadora - pajarita (T); (1) Excavadora (A); (1) carrotanque (A); (1) Formaleta (A); (3) volquetas (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo fundida de Segunda viga del puente, en la abscisa K1+280
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto, repartido, entre la abscisa K1+300 y K1+320 en carril derecho.
- El contratista de obra realizo mezcla de subbase granular en Sitio de acopio de materiales.
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abscisa K3+260 y K3+332 en carril derecho.

6538

Manicaya, 22 de marzo de 2024, miercoles
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Residente de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (4) contratadores viales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (7) oficios varios; (6) operadores de maquinaria

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Profesional SST; (1) Topografo; (1) cadenero

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (I); (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora - Pajarita (I); (1) excavadora (A); (1) cacrotanque (A); (1) carmix (I)

Actividades Realizadas:
- el contratista de obra realiza armado de acero de refuerzo para vigas del puente en la abscisa K5+280
- el contratista de obra realiza mezcla de subbase granular en sitio de acopio de materiales.
- el contratista de obra realiza figurado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga cabezal y barrera rigida.
- Se realiza fundida de placas de concreto reforzado entre las abscisas K0+100 y K0+220, en carril derecha; y K3+350 a K3+460, en carril derecha

6539

Maracaya, 28 de marzo de 2024, Jueves.
Estado del clima: Soleado

No se realizaron actividades, dia festivo.

DIA Hs Sch

Maracaya, 29 de marzo de 2024, Viernes.
Estado del clima: Soleado

No se realizaron actividades, dia festivo.

DIA Hs Sch

Maracaya, 30 de marzo de 2024, Sabado.
Estado del clima: Soleado

No se realizaron actividades, dia festivo

DIA Hs Sch

Maracaya, 31 de marzo de 2024, domingo.
Estado del clima: Soleado.

No se realizaron actividades, dia festivo.

DIA Hs Sch

6590

Manizales 1 de abril de 2014. Lunes.
Estado del clima: Soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Cadenero; (4) cerrajeros viales; (3) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (1) oficial varios; (1) ayudantes viales

(Personal interventoria: (1) Director de interventoria; (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Profesional SST

Maquinaria y equipos: (1) gibia compactadora (I); (1) mezclador (A); (1) Retroexcavadora-pajarita (I); (1) excavadora (I); (1) carro tanque (A); (2) volquetas (A); (1) camioneta (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo armado de acero de refuerzo para box culvert N°4 (3x2) en la abcisa K2+048.
- El contratista de obra realizo instalacion de redes y adecuacion del terreno entre las abcisas K1+220 y K1+350.
- Se realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abcisas K0+100 y K0+220, y entre K3+350 y K3+460, carril derecho.

6591

Maracaya, 2 de abril de 2024, martes
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra, (1) Residente de obra, (1) Inspector de obra, (1) Profesional SST, (1) Topógrafo, (1) Auxiliar SST, (1) cadeneros, (1) Almacenero, (4) controladores viales, (3) maestros de obra, (42) oficiales civiles, (1) oficios varios, (1) operadores de maquinaria

Personal interventoría: (1) Director de interventoría, (1) Residente de interventoría, (1) Inspector de interventoría, (1) Topógrafo, (1) Profesional SST, (1) cadenero.

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (A), (1) motoniveladora (A), (1) Retroexcavadora oruga (E), (1) excavadora (A), (1) cargotractor (A), (2) volquetas (A), (1) carro (E).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abcisas Km 230 y Km 250, en canal derecha
- El contratista de obra realizo excavacion de la subrasante y cargue y retiro de material entre las abcisas Km 600 y Km 680
- El contratista de obra realiza instalacion de formaletas en box N°6 (4x2), para fundida de muros laterales y losa superior de este
- El contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo entre las abcisas Km 060 y Km 110, en canal izquierdo

6592

Managua, 3 de abril de 2014, miercoles.
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) Cadenero; (1) Almacenista; (4) controladores viales; (3) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (7) oficiales varios; (4) operadores de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) Inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) Cadenero; (1) Profesional SST

Maquinarias y equipos: (1) vibro compactador (A); (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora-payarita (T); (1) Excavadora (A); (1) Cargatractor (A); (2) volquetes (A); (1) camion (T)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga riostra y berma cuneta, entre las abcisas Km 4+230 y Km 5+00, en carril derecho.
- El contratista de obra realizo perfilado de cuneta cuneta, entre las abcisas Km 4+230 y Km 4+260, en carril derecho.

Ing Sahyl

6593

Barranca, 4 de abril de 2024, jueves.
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografía; (1) cadenero; (1) Almacenista; (4) controladores viales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes varios; (7) oficios varios; (1) operadores de maquinaria.

Personal interventoría: (1) Director de interventoría; (1) Residente de interventoría; (1) Inspector de interventoría; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Profesional SST

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (A); (1) motoniveladora (A); (1) Retroexcavadora - pajarita (I); (1) Excavadora (A); (1) cargador (A); (2) volquetas (A); (1) carmix (A).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza instalación de formaletas para fundida de vigas del puente, en la abscisa K1+740
- El contratista de obra realiza fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y berma izquierda, entre las abscisas K1+720 y K1+800, en canal derecho
- El contratista de obra realiza excavación con maquinaria para la instalación del filtro, entre las abscisas K1+740 y K1+760
- El contratista de obra realiza figurado y armado de acero de refuerzo entre las abscisas K0+840 y K0+880.

Hg Sub l

6599

Macuyo, 9 de abril de 2024, viernes.
Estado del clima: soleado.

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Inspector de obra; (1) Prevencionista SST; (1) Auxiliar SST; (1) cadenero; (1) Almacenista; (4) controladores viales; (9) Maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (1) oficiales varios; (1) operadores de maquinaria.

Personal interventoría: (1) Residente de interventoría; (1) Inspector de interventoría; (1) Topógrafo; (1) cadenero; (1) Trabajadora social.

Maquinaria y equipo: (1) vibro compactador (I); (1) Minicargador (A); (1) Retroexcavador sobre llanta (I); (1) excavadora (A); (1) carrotanque (A); (2) volquetas (A); (1) camión (A).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo excavación con maquina y relleno de filtros, entre las abscisas K1+740 y K1+760.
- El contratista de obra realizo fundida de vigas del puente, entre las abscisas K1+770 y K1+790.
- El contratista de obra, realizo excavación manual y figurado de acero de viga riostra, y barras cuneta, entre las abscisas K1+500 y K1+550.
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y barras cuneta, entre las abscisas K1+050 y K1+230, en carril izquierdo.

Hay Sol

6595

Maracaya, 6 de abril de 2024, Sabado.
estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) almacenista; (4) controladores reales; (5) maestros de obra; (42) ayudantes civiles; (7) oficios varios; (7) operadores de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) Cadenero; (1) especialista ambiental.

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (I); (1) Miniscargador (A); (1) Retroexcavadora - pajarita (I); (1) excavadora (A); (1) cargotrasgeo (A); (1) camion (A); (2) volquetas (A).

Actividades Realizadas:
— el contratista de obra realizo mezcla de subbase granular en sitio de apoyo de materiales.
— el contratista de obra realiza figurado de acero de refuerzo para las vías (1/2), e instalacion de formaletas para fundida de placas de muro laterales y losa superior.
— el contratista de obra realizo fundida de concreto ciclopeo, entre las abscisas K4+200 y K4+250, en canal izquierdo.
— El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto ciclopeo, entre las abscisa K4+150 y K4+170, en canal izquierdo.

6596

Maracaya, 7 de abril de 2024. domingo
Estado del clima: soleado

NO se realizaron Actividades, dia festivo.

Maracaya, 8 de abril de 2024. Lunes

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) almacenista; (4) controladores viales; (6) maestros de obra; (43) ayudantes civiles; (1) oficios varios; (1) operadores de maquinaria

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social.

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (I); (1) minicargador (A); (1) Retroexcavadora-pajarita (I); (1) Excavadora (A); (1) carrotanque (A); (2) volquetas (A); (1) cisterna (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza fundida de placa de concreto reforzado, viga contra y lengua cuneta, entre las abscisas K0+870 y K0+880.
- El contratista de obra realiza excavacion a maquina y relleno de filtros entre las abscisa K0+170 y K0+180.

6597

- El contratista de obra realizo instacion de formaletas para fundida de muros laterales y losa superior de box N°6 (4x2), en la abscisa Km+975.
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y berma concreta, entre las abscisas Km+230 y Km+250.

Manizales, 9 de abril de 2024, martes.
Estado del clima: Soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) almacenista; (4) contratistas viales; (5) maestros de obra; (42) ay. de L. civiles; (1) oficiales viales; (8) operadores de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) especialista ambiental.

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (A); (1) mini-cargador (A); (1) Excavadora (A); (1) Retroexcavadora Pajarita (I); (1) carrotanque (A); (2) volquetas (A); (1) camion (A).

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza fundida de piedra pegada entre las abscisa Km+500 y Km+550 en canal izquierdo.
- El contratista de obra realiza excavación manual de viga riostra y berma concreta, entre las abscisas Km+400 y Km+450, canal derecho

6598

Managua, 10 de abril de 2024, miercoles
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) inspector de obra; (1) Residente de obra; (1) Supervisor SST; (1) Trabajadora social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) almacenista; (6) maestros de obra; (4) cortadores varios; (42) ayudantes civiles; (8) oficios varios; (6) operadores de maquinaria.

Personal supervision: (1) Director de supervision; (1) Residente de supervision; (1) inspectora de supervision; (1) Topografo; (1) cadenero.

maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (A); (1) mini-cargador (A); (1) Excavadora (A); (1) Retroexcavadora pajarita (T); (1) camabaja (A); (2) volquetes (A); (1) camion (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realizo excavacion de borrow out NO 6 (412), en la abcisa Km 975
- El contratista de obra realizo encofrado para losa del puente, en la abcisa km 780.
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y berma cuneta, entre las abcisas Km 400 y Km 420, en canal izquierda.
- El contratista de obra realizo figurado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, viga riostra y berma cuneta.
- El contratista de obra realizo fundida de placas de concreto reforzado entre las abcisas Km 120 a Km 170, en canal izquierda.

Sch P

6599

Maracaya, 11 de abril de 2024, jueves
Estado del clima: soleado

Personal contratista de obra: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) inspector de obra; (1) Profesional SST; (1) Trabajadora Social; (1) Auxiliar SST; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Almacenista; (4) controladores viales; (5) Maestros de obra; (45) ayudantes civiles; (1) operios varios; (1) operadores de maquinaria.

Personal interventoria: (1) Residente de interventoria; (1) inspector de interventoria; (1) Topografo; (1) cadenero; (1) Trabajadora social.

Maquinaria y equipos: (1) vibro compactador (T); (1) minicargador (A); (1) Excavadora (T); (1) Retroexcavadora pajarita (A) (1) carrotanque (A); (2) volquetas (A); (1) carro (A)

Actividades Realizadas:
- El contratista de obra realiza fundida de muros laterales y losa superior de boxculvert No. 6 (4mx2m); en la abcisa K1+975
- El contratista de obra realiza figurada y armada de acero de refuerzo en sitio para placas de concreto reforzado, viga riostra y berma cuneta, entre las abcisas Kat502 y Kat550, en carril izquierdo.
- El contratista de obra realiza fundida de placas de concreto reforzado, viga riostra y berma cuneta, entre las abcisas Kat420 y Kat600, en carril izquierdo.
- El contratista de obra realiza fundida de placas de concreto ciclopeo entre las abcisas K1+170 a K1+290, en carril izquierdo.

Informe de Supervisión Nº 12

6550

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

ELABORADO POR:
VICTOR MANUEL HERNANDEZ NOVOA
CONTRATISTA SIM

PERIODO DEL INFORME
11/04/2024 al 10/05/2024

2024

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6551

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

GENERALIDADES DEL PROYECTO 4

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 6

2 COMPONENTE TÉCNICO 11

3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 12

4 COMPONENTE JURIDICO 14

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO 16

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 17

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6552

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

INTRODUCCIÓN

De conformidad a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 *"Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*, la Ley 1150 de 2007 *"por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993"* y Ley 1474 de 2011 *"por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*, la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del presente contrato, presenta el siguiente informe ejecutivo relacionando el seguimiento ejercido por la supervisión del contrato No. LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEL MUNICIPIO MONTERÍA"

Al Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 311 de la Constitución Política, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Dentro de las competencias constitucionales le corresponde al Municipio mantener y mejorar la infraestructura vial municipal. La red vial terciaria tiene una importancia relevante en el mejoramiento de la economía de los corregimientos y por ende de los municipios en el logro de mejores niveles de bienestar para sus habitantes. Entre las funciones básicas y primordiales de la red vial están facilitar el acceso de la educación, la salud, el comercio, los centros de trabajo y otros servicios indispensables para la población; además de lo anterior, una red vial adecuada contribuye al desarrollo como estrategia de integración de las regiones. La vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio, debido al mal estado en el que se encuentra por la falta de mantenimiento periódico. Actualmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de las vías, lo que hace que se deteriore más en época de invierno generado aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, perdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos por parte de la población, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros e incremento del riesgo de deserción escolar.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.


	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

GENERALIDADES DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento: Córdoba
Municipio: Montería

Corregimiento: Tres piedras

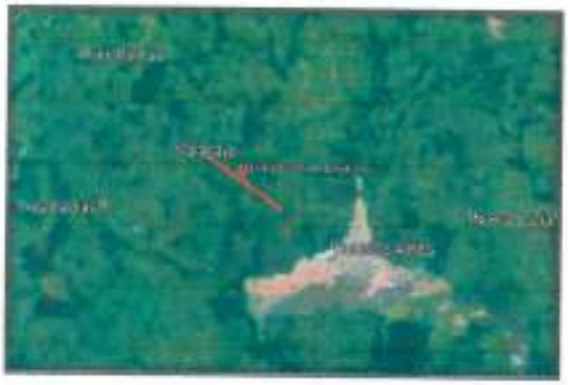

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de 3.58 km de pavimento tipo placa huella, de forma general estos se construirán desde la apartada (carretera en asfalto – hasta la placa huella existente en la vereda Maracayo) dentro de las obras de arte o drenaje se encuentra la construcción de 1 puente y 6 box culvert, distribuidos de la siguiente según lo indica la siguiente tabla, es de anotar que la adición N°1 se contemplo la inclusión de otra estructura hidráulica tipo box culvert sobre la abscisa K3+070.

ID OBRA	ESTRUCTURA	ABSCISA	OBSERVACION
01	Box culvert	k0+379.51	Nueva
02	Box culvert	k0+860.21	Nueva
03	Box culvert	k1+241.12	Nueva
04	Box culvert	k1+506.28	Nueva
05	Puente	k1+781.80	Nueva
06	Box culvert	k1+975.73	Nueva
07	Box culvert	k2+048.39	Nueva


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6559


	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

DISEÑO PLACA HUELLA

Sección típica placa huella

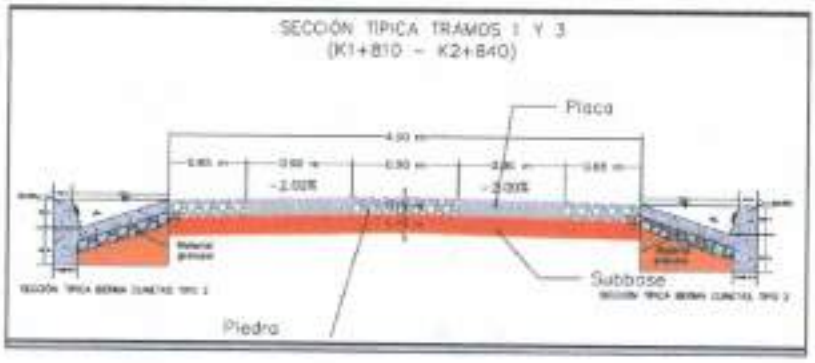

Sección típica Vox Culvert

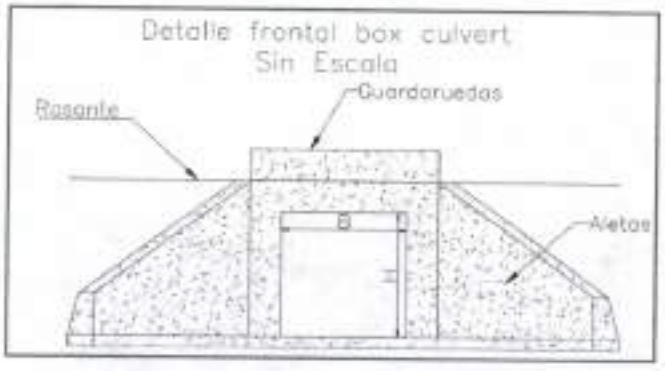

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6555

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024	

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

El proyecto actualmente se encuentra en Ejecución con un con fecha de finalización del 11 de mes de octubre 2024. A continuación, se describe de manera general la información relevante de los contratos derivados del proyecto:

1.1 OBRA:

CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022	FIRMA CONTRATO	VEINTINUEVE (29) JUNIO 2022
		FECHA INICIO	VEINTIDOS (22) SEPTIEMBRE 2022
MODALIDAD DEL CONTRATO:	LICITACION PUBLICA	BPIM:	2021230010215
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	NIT: 890.490.910-1	
REPRESENTANTE LEGAL OBRA:	SERGIO ANDRES ACERO A.	C.C. No. 71.696.543 de Medellín	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLÓNES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($9,691,701,283.00).		
FUENTE DE LOS RECURSOS	RECURSOS PROVENIENTES DE LA SOBRETASA DE LA GASOLINA Y RECURSOS DEL CREDITO.		
ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	DOS MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($2.907.510.384,9) CORRESPONDIENTES AL 30% DEL ANTICIPO DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES		
ACTA DE SUSPENSION No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
MOTIVOS SUSPENSIÓN N°1	*-Tubería del acueducto veredal existente se encuentra dentro del ancho de construcción de la placa huella, continuos inconvenientes debido al mal estado de la tubería encontrándose fugas.* *-Retranqueo de postes en el tramo de vía N°3.* *-Modificación del diseño geométrico y construcción de estructura hidráulica de drenaje.*		
ACTA DE REINICIO No. 1	10 DE MARZO DE 2023		
PRORROGA No. 1	02 DE JUNIO DE 2023 (1 MESES ADICIONAL)		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6556

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
	SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

ACTA DE SUSPENSION No. 2	30 DE JUNIO DE 2023			
MOTIVOS SUSPENSIÓN N°2	*Se esperaba pronunciamiento del Consultor del proyecto sobre:* *Construcción de obra Hidráulica en el K3+030 y modificación del diseño geométrico.* *Lo cual generaría la elaboración de balance de obras el cual incluiría INP para lo cual surgiría la posible necesidad de adición de recursos y prorroga, lo cual conlleva trámites administrativos por parte de la entidad, dentro de los INP se tiene:* *a) construcción de la obra hidráulica y modificación del diseño geométrico sobre tramo N°3 (a la espera de recomendación por parte del consultor).* *b) Construcción de filtro francés sobre 2000 ml.*			
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSIÒN No. 2	14 DE JULIO DE 2023			
MOTIVOS AMPLIACIÓN No. A LA SUSPENSIÓN N°2	*Teniendo en cuenta, que las razones que generaron la suspensión N°2 del contrato de obra LP-SPM-012-2022, dieron lugar a un modificatorio el cual a la fecha se encuentra en proceso de estructuración por parte de la entidad contratante, se hace necesario prorrogar la suspensión N°2 datada de fecha 30 de junio de 2023, con el propósito de finiquitar los procesos administrativos a que den lugar.*			
ACTA DE REINICIO No. 2	18 JULIO DE 2023			
ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 2:	19 DE JULIO DE 2023 (3 MESES ADICIONALES)			
VALOR ADICIÓN No. 1:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.289.109.292,00)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 10.980.810.575,00).			
CESIÓN DEL CONTRATO:	**FECHA DE CESIÓN:**	20 SEPTIEMBRE 2023.	**CEDIDO A:**	CONSORCIO PLACA HUELLA MR – NIT 901.757.238-3
REPRESENTANTE LEGAL:	MARCO ANTONIO GOMEZ		C.C. 10.778.641 de Montería	
ACTA DE SUSPENSION No. 3	20 DE OCTUBRE DE 2023			
MOTIVOS SUSPENSIÓN No. 3	*Escases de Material, "de piedra canto rodado de sobre tamaño requerida para la ejecución del Item no previsto NP-01 suministro e instalación de piedra canto rodado de 4 puig".* *Dificultad con los desvíos provisionales para la construcción de obras hidráulicas, por se predios privados.*			

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6557

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024	

ACTA DE AMPLIACIÓN N°1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	3 DE NOVIEMBRE 2023		
ACTA DE AMPLIACIÓN N°2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	17 DE NOVIEMBRE 2023		
ACTA DE AMPLIACIÓN N°3 DE LA SUSPENSIÓN No.3:	01 DE DICIEMBRE DE 2023		
MOTIVOS AMPLIACIÓNES A LA SUSPENSIÓN N°3:	*Persistían las consideraciones suspensivas*		
ACTA DE REINCIO No. 3:	11 DE MARZO DE 2024		
PRORROGA No. 3:	11 DE MARZO DE 2024		
% DE AVANCE FISICO:	70.99%	**AVANCE FINACIERO:**	30.01%

1.2 INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022	FIRMA CONTRATO	DIECISEIS (16) DE AGOSTO 2022
		FECHA INICIO	VEINTIDOS (22) SEPTIEMBRE 2022
MODALIDAD DEL CONTRATO:	C.M.A.	BPIM:	2021230010215
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	NIT: 900.644351-9	
REPRESENTANTE LEGAL OBRA:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	CC. N° 53.155.174 de BOGOTA	
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($ 696.192.460,00) M/CTE.		
FUENTE DE LOS RECURSOS	RECURSOS PROVENIENTES DE LA SOBRETASA DE LA GASOLINA Y RECURSOS DEL CREDITO.		
ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES		
ACTA DE SUSPENSION No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
ACTA DE REINICIO No. 1	10 DE MARZO DE 2023		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6558

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

PRORROGA No. 1	02 DE JUNIO DE 2023 (1 MESES ADICIONAL)
ACTA DE SUSPENSION No. 2	30 DE JUNIO DE 2023
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	14 DE JULIO DE 2023
ACTA DE REINICIO No. 2	18 JULIO DE 2023
ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 2:	19 DE JULIO DE 2023 (3 MESES ADICIONALES)
VALOR ADICIÓN No. 1:	DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($203.586.836) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($899.779.296) M/CTE.
ACTA DE SUSPENSION No. 3	20 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN N°1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	3 DE NOVIEMBRE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN N°2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	17 DE NOVIEMBRE 2023
ACTA DE AMPLIACIÓN N°3 DE LA SUSPENSIÓN No.3:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINCIO No. 3:	11 DE MARZO DE 2024
PRORROGA No. 3:	11 DE MARZO DE 2024

SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y MODIFICACIONES

Denominación del acta	Fecha de suscripción	
Acta de suspensión No. 1	29/12/2022	
Acta de reinicio No. 1	10/03/2023	
Prórroga No.1	02/06/2023	**(1 mes)**
Acta de suspensión No.2	30/06/2023	
Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 2	14/07/2023	
Acta de reinicio No. 2	18/07/2023	
Adición No. 1 y Prórroga No. 2	19/07/2023	**(3 meses)**
Acta de suspensión No.3	20/10/2023	
Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 3	03/11/2023	
Acta de ampliación No.2 a la suspensión No. 3	17/11/2023	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6559

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

Denominación del acta	Fecha de suscripción	
Acta de ampliación No.3 a la suspensión No. 3	01/12/2023	
Acta de reinicio No. 3	11/03/2024	
Prórroga N°3	11/03/2024	**(3 meses)**

SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA

COMITÉS DE OBRA		
No. COMITE	**FECHA**	**TEMA**
ACTA DE COMITÉ N°21	03 DE MAYO 2024	REVISIÓN AVANCE DE OBRAS REUBICACION DE POSTES

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2 COMPONENTE TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

Las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe son:

- Instalación de subbase
- Instalación de terraplén
- Excavaciones para filtros
- Instalación de geotextil, piedra para filtro y tubería
- Construcción de placa huella
- Construcción de box culvert
- Construcción de puente

INDICADORES			
AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
% PROGRAMADO	70.99%	VALOR PROGRAMADO	$ 7.795.277.427,00
% EJECUTADO	73.92 %	VALOR EJECUTADO	$ 8.117.015.177,00
% ADELANTO	2.93 %	Lluvias EN LA ZONA:	SI
TIEMPO CONTRATO	390 DIAS	TIEMPO TRANSCURRIDO	360 DIAS

No se presentan retrasos según la reprogramación presentada, por el contratista de obra, en la ejecución al cierre del presente periodo, se evidencia que el contratista cuenta con recurso humano, maquinaria y equipos en la ejecución de las actividades.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.D.P.	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
OBRA - VIG. 2022	22000927	11 de marzo de 2022	$ 10.206.292.719,00
OBRA - VIG. 2023	22000927-R	08 de febrero 2023	$ 6.784.190.898,00
OBRA - ADICION N°1	23001332	12 de julio de 2024	$ 1.289.109.292,00
OBRA – ADICION N°1 VIG 2024	24000835	29 de febrero de 2024	$ 1.289.109.292,00
INTER – VIG. 2022	22000926	11 de marzo de 222	$ 714.463.563,00
INTER - VIG. 2023	22000926-R	08 de febrero de 2023	$ 696.192.460,00
INTER - ADICION N°1	23001333	12 de julio de 2023	$ 203.586.836,00
INTER – ADICION N°1 VIG 2024	24000832	29 de febrero de 2024	$ 203.586.836,00

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO			
C.R.P.	NÚMERO	FECHA EXPEDICIÓN	VALOR
OBRA - VIG. 2022	22001857	05 de agosto de 2022	$ 9.691.701.283,00
OBRA - VIG. 2023	22001857	08 de febrero 2023	$ 6.784.190.898,00
OBRA - ADICION N°1	23001380	19 de julio de 2023	$ 1.289.109.292,00
OBRA – ADICION N°1 VIG 2024	24000641	29 de febrero de 2024	$ 1.289.109.292,00
INTER – VIG. 2022	22002010	25 de agosto de 2022	$ 696.192.460,00
INTER - VIG. 2023	22002010-R	08 de febrero de 2023	$ 696.192.460,00
INTER - ADICION N°1	23001379	19 de julio de 2023	$ 203.586.836,00
INTER – ADICION N°1 VIG 2024	24000638	29 de febrero de 2024	$ 203.586.836,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Con respecto al contrato de obra a la fecha se han pagado un anticipo y 01 actas parciales, en la tabla a continuación se muestra el detalle de cada acta pagada, quedando como saldo del contrato un valor de $ 5.766.465.124,93.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024	

ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO				
DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	NO. ORDEN DE PAGO / FECHA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 9.691.701.283,00			
VALOR ADICIÓN No.1	$ 1.289.109.292,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 10.980.810.575,00**			
VALOR ANTICIPO		$ 2.907.510.384,90		OP 22005489 08 / NOV / 2022
ACTA PARCIAL 1		$ 2.306.835.065,17	$ 988.643.599,23	OP 23007095 21 / DIC / 2023
SALDO POR PAGAR		$ 5.766.465.124,93		
TOTAL	**$ 10.980.810.575,00**	**$ 10.980.810.575,00**	$ 988.643.599,23	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Con respecto al contrato de interventoría, a la fecha se ha cancelado 01 actas parciales, en la tabla a continuación se muestra el detalle de cada acta pagada, quedando como saldo del contrato un valor de $ 629.755.529,00

DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	PAGADO	NO. ORDEN DE PAGO / FECHA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 696.192.460,00		
VALOR ADICIÓN No.1	$ 203.586.836,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 899.779.296,00		
VALOR ANTICIPO	N/A		
ACTA PARCIAL 1		$ 270.023.767,00	
SALDO POR PAGAR		$ 629.755.529,00	OP 23007084 de fecha 21-12-2023.
TOTAL	**$ 899.779.296,00**	**$ 899.779.296,00**	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

4 COMPONENTE JURIDICO

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

En el periodo no se han realizado modificaciones

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA		
PRORROGAS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	PLAZO/FECHA	
PRORROGA No.1	1 MES (02/06/2023)	
ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 2	3 MESES (19/07/2023)	
PRÓRROGA No. 3	3 MESES (11/03/2024)	
ADICIONES		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	VALOR	
ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 2	$ 1.289.109.292,00	
SUSPENSIONES / REINICIOS		
TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO	PLAZO/FECHA	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 DE DICIMBRE DE 2022	
ACTA DE REINICIO No. 1	10 DE MARZO DE 2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	30 DE JUNIO DE 2023	
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	14 DE JULIO DE 2023	
ACTA DE REINICIO No. 2	18 DE JULIO DE 2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.3	20 DE OCTUBRE DE 2023	
ACTA DE AMPLIACIÓN N°1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	3 DE NOVIEMBRE 2023	
ACTA DE AMPLIACIÓN N°2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	17 DE NOVIEMBRE 2023	
ACTA DE AMPLIACIÓN N°3 DE LA SUSPENSIÓN No.3:	01 DE DICIEMBRE DE 2023	
ACTA DE REINICIO No. 3	11 DE MARZO DE 2024	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SI)		
NUMERO DE MODIFICACIONES	CLAUSULA NO.	DESCRIPCION
N.A.	N.A.	N.A.
CESIONES		
CEDENTE	CESIONARIO	
CONSTRUCCIONES AP S.A.S	CONSORCIO PLACA HUELLA MR	
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
CAUSAL	ACTO ADMINISTRATIVO	(CLASE DE SANCIÓN)
N.A.	N.A.	N.A.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6569

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024	

PÓLIZAS

- Pólizas Contrato de obra

POLIZA N° 100171905	ASEGURADORA: SEGUROS MUNIDAL		
1. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA APROBACION	PROCESO
	0151-2022	7 JULIO DE 2022	SEGÚN CONTRATO
2. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA APROBACION	PROCESO
	0270-2022	20 DE OCTUBRE DE 2022	ACTA DE INICIO
3. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	N° APROBACION	FECHA APROBACION	PROCESO
	0237 -2023	13 SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE REINICIO N°1 Y N°2 Y PRORROGA N°1

- Póliza contrato Interventoría

POLIZA N° 3413175-4	ASEGURADORA: SURAMERICANA		
4. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA	PROCESO
	0198-2022	22/08/2022	SEGÚN CONTRATO
5. RES. APROBACIÓN DE POLIZA	NUMERO	FECHA	PROCESO
	0252-2023	21/09/2023	ACTA DE INICIO, REINICIO N°1 Y N°2, PRORROGA N°1, ADICION N°1 Y PRORROGA N°2

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

4 REGISTRO FOTOGRÁFICO













La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6566

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-040	01	23/01/2024

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Al cierre del presente informe, la interventoría en cumplimiento de sus funciones reporta un avance ejecutado del 73.92% contra un avance programado del 70.99% indicando un adelanto sobre la programación de 2.93%.

Desde la supervisión se solicita a la interventoría continuar con el seguimiento integral del contrato e informe si existen novedades que impidan la ejecución del contrato.

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Víctor Manuel Hernández – Contratista SIM

Acta de Suspensión Nº4

6367

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-024	01	23/01/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4

CONTRATO No.	CMA-SPM-009-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($696.192.460,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL N°1	DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 203.586.836,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($899.779.296,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES
PRÓROGA No. 1	UN (1) MES
PRÓRROGA No. 2	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE PRÓRROGA N°1	02 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N°2	18 DE JULIO DE 2023
ADICIÓN N°1 Y PRORROGA N°02	19 DE JULIO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°3	20 DE OCTUBRE DE 2023

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-024	01	23/01/2024

FECHA AMPLIACIÓN N°1 SUSPENSIÓN N°3	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACION N°2 SUSPENSION N°3	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN N°3 SUSPENSIÓN N°3	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA REINICIO N°3	11 DE MARZO DE 2024
FECHA FINAL SEGÚN EL REINICIO No. 3	11 DE JUNIO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	07 DE JUNIO DE 2024

En la ciudad de Montería a los siete (07) días del mes junio del año 2024, se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSULTORES DONOVAN SAS,** Representado por ROSA MARIA CORDERO CELIS, la secretaria de Infraestructura **IRIS M. SPATH CAMAÑO** y el profesional apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura **VICTOR MANUEL HERNANDEZ**, con el propósito de suscribir la presente acta de suspensión No. 4 del contrato de interventoría No. CMA-SPM-009-2022, de acuerdo con lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1. Que, mediante comité de obra No. 22 de fecha 4 de junio de 2024, la interventoría CONSULTORES DONOVAN SAS dio viabilidad de suspensión del contrato de obra No. LP-SPM-012-2022, al tiempo de solicitar que, de aprobarse dicha suspensión, se suspendiera el contrato de interventoría No. CMA-SPM-009-2022.

2. Que, el día siete (07) de junio de 2024, las partes acordaron suspender el contrato de obra No. LP-SPM-012-2022, respecto del cual, el contratista ejerce labores de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable, a través del contrato de interventoría No. CMA-SPM-009-2022. Por lo anterior, se considera pertinente suspender la ejecución del contrato en mención, hasta tanto se superen las situaciones que dieron lugar a la presente suspensión.

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender la ejecución del contrato de Interventoria No. CMA-SPM-009-2022, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL*

6569

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-024	01	23/01/2024

MUNICIPIO DE MONTERÍA" hasta que sean superadas las situaciones que dieron lugar a la presente suspensión.

SEGUNDO: El contratista se obliga a mantener actualizadas las garantías que amparan el contrato, conforme a la normatividad vigente y aplicable y, notificar de la presente actuación a la aseguradora.

TERCERO: Una vez superados los motivos que sustentan la presente suspensión, el contratista deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato de interventoria y actualizar las garantías manteniendo las condiciones indicadas en el contrato y/o sus modificatorios.

CUARTO: La presente suspensión del Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-009-2022, no implicara mayores costos ni reclamaciones por parte de la firma contratista CONSULTORES DONOVAN SAS.

QUINTO: La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSULTORES DONOVAN SAS
ROSA CORDERO CELIS
CONTRATISTA

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERÍA

VICTOR MANUEL HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Revisó: Angie Diaz Diaz – Contratista SIM

Acta parcial Nº 2

6570

Factura Electrónica De Venta No

CD No. 163

CONSULTORES DONOVAN SAS	
Nit:	900644351
Dirección:	Calle 17 No. 10 - 16 Ofi 803 Ed Tecvivienda
Teléfono:	2650221
Ciudad:	Bogotá, D.C., Colombia
Actividad Económica	7112
Tipo de contribuyente	Juridica
Responsable de IVA	
Correo Electronico	lmartinez@arenasingenieros.com

CLIENTE	MUNICIPIO DE MONTERIA			
NIT	800096734 1			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE	
Calle 27 Carrera 3 Esquina	Monteria	7924545	Acta No. 2	
Correo Electronico		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
contabilidad@monteria.gov.co		09/07/2024	19/07/2024	Abono en cuenta

Item	Descripción		IVA	Total
1	Contrato de Interventoria CMA-SPM-009-2022	Acta No. 2 del Contrato CMA-SPM-009-2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA" , Correspondiente al 25,36% del valor del contrato. Del periodo: Del 11 de octubre de 2023 al 20 de octubre de 2023; Del 11 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2024	0	191751285,00
Total lineas o items: 1				

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Nota: Favor consignar a la cuenta corriente No. 250846730 Banco de Occidente

SUBTOTAL	191.751.285,00
ANTICIPO	0,00
IVA	36.432.744,00
TOTAL	228.184.029,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Numero Autorización 18764052317922 aprobado en 2023-07-25 preifjo CD desde la 121 a la 200 vigencia: 12 meses. Régimen responsable de ELABORADA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 9005343

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534095-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d0e97f9f02f0705511ac145a7719d930f7a0c3689f61b4db1841239d5084d2fef562ea9b70c69878e6b1739d8595537bf0e --Fecha y Hora de Expedición : 09/07/2024 11:55:35 a. m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644251	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA I	CALLE 17 NO. 10-16 OFICINA 503	MONTERIA-CORDOBA	3050221	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	315703515	94599520268	E	2023/11/15	2023/11/04	BANCOLOMBIA	19	$2,325,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Nr.	Identificación		Nombre	Tip	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Sup	Configuracion	Dias	IBC	Aporte	Configuracion	Dias	IBC	Aporte	Configuracion	Dias	IBC	Aporte	Configuracion	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1074013629	ARRIETA PEDRO																			25-14	19	$1,146,334	$183,500	EPS037	19	$1,146,334	$45,900	CCF14	19	$1,146,334	$29,800	14-15	19	$1,146,334	$79,800	19	$0	$0	N	$339,100
2	CC	1074013629	ARRIETA PEDRO											X								25-14	11	$663,667	$79,700	EPS037	11	$663,667	$0	CCF14	11	$663,667	$0	14-15	11	$663,667	$0	11	$0	$0	N	$79,700
3	CC	1080439561	HURTADO ELMIS																			231001	19	$734,667	$117,600	EPS041	19	$734,667	$29,400	CCF14	19	$734,667	$29,400	14-15	19	$734,667	$51,200	19	$0	$0	N	$227,600
4	CC	1080439561	HURTADO ELMIS											X								231001	11	$425,334	$51,100	EPS041	11	$425,334	$0	CCF14	11	$425,334	$0	14-15	11	$425,334	$0	11	$0	$0	N	$51,100
5	CC	1064996391	MENDEZ GERMAN																			230501	19	$1,146,334	$183,500	EPS043	19	$1,146,334	$45,900	CCF14	19	$1,146,334	$29,800	14-15	19	$1,146,334	$79,800	19	$0	$0	N	$339,100
6	CC	1064996391	MENDEZ GERMAN											X								230501	11	$663,667	$79,700	EPS043	11	$663,667	$0	CCF14	11	$663,667	$0	14-15	11	$663,667	$0	11	$0	$0	N	$79,700
7	CC	1102856769	TAFUR JESUS																			230501	19	$1,109,000	$177,500	EPS043	19	$1,109,000	$44,400	CCF14	19	$1,109,000	$28,800	14-15	19	$1,109,000	$146,800	19	$0	$0	N	$403,100
8	CC	1102856769	TAFUR JESUS											X								230501	11	$1,221,000	$146,600	EPS043	11	$1,221,000	$0	CCF14	11	$1,221,000	$0	14-15	11	$1,221,000	$0	11	$0	$0	N	$146,600
9	CC	92549899	VILLAMIZAR ANDRES																			230501	19	$1,385,334	$221,600	EPS043	19	$1,385,334	$55,400	CCF14	19	$1,385,334	$97,000	14-15	19	$1,385,334	$407,000	19	$0	$0	N	$401,400
10	CC	92549899	VILLAMIZAR ANDRES											X								230501	11	$806,667	$96,900	EPS043	11	$806,667	$0	CCF14	11	$806,667	$0	14-15	11	$806,667	$0	11	$0	$0	N	$96,900
Total	Afiliados(5)																							$10,310,004	$1,409,100			$10,310,004	$261,400			$10,310,004	$454,600			$10,310,004	$1,494,300		$0	$0		$1,494,300

659

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES BONOVAR SAS	B - ARENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA 1	CALLE 17 NO.10-16 OFICINA 501	MONTERIA-CORDOBA	3150221	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	3150700515	5459950515	E	2023/11/15	2023/12/04	BANCOLOMBIA	19	$2,523,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,499,900	$28,300	$0	$1,527,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$168,700	$3,200	$0	$171,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$263,200	$5,000	$0	$268,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,067,200	$20,100	$0	$1,087,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$454,600	$8,600	$0	$463,200
COLMENA	14-25	800,226,175	5	5	$454,600	$8,600	$0	$463,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$261,400	$5,000	$0	$266,400
COMFACOR	CCF16	891,080,009	1	5	$261,400	$5,000	$0	$266,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$261,400	$5,000	$0	$266,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$84,400	$1,600	$0	$86,000
MUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$45,900	$900	$0	$46,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$131,100	$2,500	$0	$133,600
TOTAL				5	$2,476,500	$46,900	$0	$2,523,400

2024/03/13 02:58 PM

652

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644251	9	CONSULTORES BONOVAN SAS	B - APORTANTES DEPENDIENTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	2676228640	94587904[illegible]	Y	2023/11/09	2023/11/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,399,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. (12 Afiliados)							$8,454,669	$1,351,000			$8,454,669	$1,057,000			$0	$0			$11,771,669		$959,200		$0	$0		$3,399,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$1,760,667	$281,800			$1,760,667	$220,900			$0	$0			$1,760,667		$122,600		$0	$0		$624,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,760,667	$281,800			$1,760,667	$220,900			$0	$0			$1,760,667		$122,600		$0	$0		$624,900
1	CC	91251401	ALVIZ [illegible]	X	23/30	19	$1,760,667	$281,800	P5010	19	$1,760,667	$220,900		0	$0	$0	14-23	19	$1,760,667	6.960%	$122,600	0	$0	$0	No	$624,900
Centro de Trabajo: PROFESIONAL (11 Afiliados)							$6,694,002	$1,071,200			$6,694,002	$836,900			$0	$0			$10,010,338		$836,600		$0	$0		$2,744,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)							$6,694,002	$1,071,200			$6,694,002	$836,900			$0	$0			$10,010,338		$836,600		$0	$0		$2,744,700
1	CC	52142933	ALVAREZ JORGE	X	23/30	30	$773,334	$123,800	P5010	30	$773,334	$96,700		0	$0	$0	14-23	30	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$274,400
3	CC	79554501	CAMARGO MAURICIO	X	23/30	30	$1,300,000	$208,000	P5010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
4	CC	1015695179	CRUZ TARBA	X	23/30	30	$2,860,000	$457,600	P5010	30	$2,860,000	$357,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,860,000	6.960%	$199,100	0	$0	$0	No	$1,014,200
5	CC	46377990	GARCIA ANDREA	X		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-13	30	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$53,900
6	CC	1015748325	GIL ALAN	X		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$53,900
7	CC	52947426	RODRIGUEZ YULI	X		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$53,900
8	CC	3882125	MARTINEZ MARTIN	X		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	19	$1,419,000	6.960%	$99,200	0	$0	$0	No	$99,200
9	CC	1102581634	MOSA MARIA	X	23-14	19	$880,334	$140,900	S0224	19	$880,334	$110,100		0	$0	$0	14-23	19	$880,334	6.960%	$61,300	0	$0	$0	No	$312,300
10	CC	9253464	MONTERROSA MARIO	X	23/30	19	$880,334	$140,900	P5010	19	$880,334	$110,100		0	$0	$0	14-23	19	$880,334	6.960%	$61,300	0	$0	$0	No	$312,300
11	CC	9031431	PEREZ FRANCISCO	X		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$800,000	6.960%	$55,700	0	$0	$0	No	$55,700
12	CC	1015486455	PRIETO CINDY	X		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	19	$773,334	6.960%	$53,900	0	$0	$0	No	$53,900
Total Afiliados(12)							$8,454,669	$1,351,000			$8,454,669	$1,057,000			$0	$0			$11,771,669		$959,200		$0	$0		$3,399,200

2023/11/09 10:58 AM

653

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES BONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7460535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	265028640	5458709475	Y	2023/11/15	2023/11/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,369,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,353,000	$0	$0	$1,353,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,900	$0	$0	$140,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$630,700	$0	$0	$630,700
PROTECCION	230301	800,229,739	0	2	$581,400	$0	$0	$581,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$959,200	$0	$0	$959,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$53,900	$0	$0	$53,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$905,300	$0	$0	$905,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,057,000	$0	$0	$1,057,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$110,100	$0	$0	$110,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$577,600	$0	$0	$577,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$206,800	$0	$0	$206,800
TOTAL				12	$3,369,200	$0	$0	$3,369,200

2023/11/09 10:58 AM

6574

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 801	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7440505	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	277302111	94565269	E	2023/11/13	2023/11/15	BANCOLOMBIA	0	$5,589,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. (6 Afiliados)							$18,352,184	$2,940,700			$18,352,184	$734,200			$18,352,184	$734,200			$18,352,184		$1,528,300					$5,589,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$18,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$18,200		$0	$0		$569,000
1	CC	1020934851	DIEGO ABDUL ABDUL		13/03/1	30	$1,160,000	$185,600	ESP001	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.5231	$6,100	30	$0	$0	N	$280,500
2	CC	80756487	PALACIOS FREDY		13/03/1	30	$1,160,000	$185,600	ESP001	30	$1,160,000	$46,400	CCF14	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.5231	$6,100	30	$0	$0	N	$284,100
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)							$1,820,184	$291,200			$1,820,184	$72,800			$1,820,184	$72,800			$1,820,184		$127,300		$0	$0		$564,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,820,184	$291,200			$1,820,184	$72,800			$1,820,184	$72,800			$1,820,184		$127,300		$0	$0		$564,300
3	CC	1072724113	SANDRA SAAVAR	X	13/03/1	30	$1,820,184	$291,200	ESP001	30	$1,820,184	$72,800	CCF14	30	$1,820,184	$72,800	14-25	30	$1,820,184	0.5231	$127,300	30	$0	$0	N	$564,300
Centro de Trabajo: PROFESIONAL (3 Afiliados)							$14,204,000	$2,328,900			$14,204,000	$568,300			$14,204,000	$568,300			$14,204,000		$1,382,700		$0	$0		$4,454,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							$14,204,000	$2,328,900			$14,204,000	$568,300			$14,204,000	$568,300			$14,204,000		$1,382,700		$0	$0		$4,454,800
4	CC	79151557	ABDNAS DIEGO	X	13/03/1	30	$4,600,000	$736,000	ESP001	30	$4,600,000	$184,000	CCF14	30	$4,600,000	$184,000	14-25	30	$4,600,000	0.5231	$24,100	30	$0	$0	N	$1,464,100
5	CC	1070547758	ABDNAS MARIA		13/03/1	30	$4,000,000	$640,000	ESP001	30	$4,000,000	$160,000	CCF14	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.5231	$20,900	30	$0	$0	N	$1,280,900
6	CC	52151174	CORDERO ROSA	X	25-14	30	$5,604,000	$952,700	ESP001	30	$5,604,000	$224,200	CCF14	30	$5,604,000	$224,200	14-25	30	$5,604,000	0.5231	$29,300	30	$0	$0	N	$1,791,400
Total Afiliados(6)							$18,352,184	$2,940,700			$18,352,184	$734,200			$18,352,184	$734,200			$18,352,184		$1,528,300		$0	$0		$5,589,300

655

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900640351	9	CONSULTORES BONOVIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDAR DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17No. 10-16 oficina 803	BOGOTA BOGOTA D.E.	7440559	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	2775503111	94868231429	E	2023/11/15	2023/11/15	BANCOLOMBIA	0	$5,589,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$2,992,700	$0	$0	$2,992,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$952,900	$0	$0	$952,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,303,800	$0	$0	$1,303,800
PROTECCION	230301	800,229,739	0	1	$736,000	$0	$0	$736,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,128,200	$0	$0	$1,128,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	6	$1,128,200	$0	$0	$1,128,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$734,200	$0	$0	$734,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$734,200	$0	$0	$734,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$734,200	$0	$0	$734,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$224,200	$0	$0	$224,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$119,600	$0	$0	$119,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$390,400	$0	$0	$390,400
TOTAL				6	$5,589,300	$0	$0	$5,589,300

2023/11/15 10:03 AM

656

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CLAVE DE SUCURSAL:	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	2999120
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SANDRA PAMELA MARTINEZ MORGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARCELONA	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	BARRIO ANDRES CLL 29 A 19 BC 48	TELÉFONO:	2028850
TIPO APORTANTE:		CLASE APORTANTE:	MICROEMPLEADOR
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades agropecuarias y habilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	RAZÓN SOCIAL / DEPENDENCIA:	9601 - CONSTRUCCIO
APORTANTE GENERADO PAGO APORTES SALUD, SCHA Y ICBF (FOOTPAK TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7601240851	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN LITIGIO	NO	mm/aaaa AÑO	2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mm/aaaa AÑO	2023
GRADO DE RIESGO:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/16	NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN:			229940074

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			DEPENDIENTE	CORTESANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 405.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.000	$ 0	$ 405.000
SUBTOTALES										**$ 405.000**	**$ 0**	**$ 405.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	SUBSIDIADO	VALOR PAGADO
EPS046	EPS SURA EPS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 310.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.000	$ 0	$ 0	$ 310.000
SUBTOTALES													**$ 310.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 310.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	SUBSIDIADO	VALOR PAGADO
14-01	14-01-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 61.000	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 61.000
SUBTOTALES									**$ 61.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 61.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES BONOVAN SAS	B - ANIMOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA 1	CALLE 17 NO. 10-16 OFICINA 803	MONTERIA-CORDOBA	2650321	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	M3803761	94677351638	N	2024/04/11	2024/05/27	BANCOLOMBIA	46	$93,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MONTERIA 1 (4 Afiliados)						$288,002	$46,300			$288,002	$11,600			$288,002	$11,600			$288,002	$20,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)						$288,002	$46,300			$288,002	$11,600			$288,002	$11,600			$288,002	$20,100		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)						$288,002	$46,300			$288,002	$11,600			$288,002	$11,600			$288,002	$20,100		$0	$0
1	CC	1074611639	ARRIETA PEDRO	23-14	18	($1,066,000)	($171,600)	SFS023	18	($1,066,000)	($43,500)	COF14	18	($1,066,002)	($43,500)	14-25	18	($1,066,000)	($75,600)	18	$0	$0
2	CC	1074611639	ARRIETA PEDRO	23-14	19	$1,146,334	$185,600	SFS023	19	$1,146,334	$46,900	COF14	19	$1,146,334	$46,900	14-25	19	$1,146,334	$79,896	19	$0	$0
3	CC	1002439582	BURITAGO OLIVO	231001	18	($780,000)	($126,000)	SFS062	18	($780,000)	($31,200)	COF14	18	($780,002)	($31,200)	14-25	18	($780,000)	($54,900)	18	$0	$0
4	CC	1002439582	BURITAGO OLIVO	231001	19	$823,334	$133,000	SFS062	19	$823,334	$33,000	COF14	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
5	CC	1102552788	TAFUR JESUS	230301	19	$2,109,000	$337,500	SFS043	19	$2,109,000	$84,400	COF14	19	$2,109,000	$84,400	14-25	19	$2,109,000	$146,900	19	$0	$0
6	CC	1102552788	TAFUR JESUS	230301	18	($1,998,000)	($319,700)	SFS043	18	($1,998,000)	($80,000)	COF14	18	($1,998,002)	($80,000)	14-25	18	($1,998,000)	($139,100)	18	$0	$0
7	CC	91544698	VILLAMIZAR MEDINA	230301	18	($1,330,000)	($212,800)	SFS062	18	($1,330,000)	($53,200)	COF14	18	($1,330,002)	($53,200)	14-25	18	($1,330,000)	($92,600)	18	$0	$0
8	CC	91541698	VILLAMIZAR MEDINA	230301	19	$1,393,334	$222,900	SFS062	19	$1,393,334	$55,800	COF14	19	$1,393,334	$55,800	14-25	19	$1,393,334	$97,000	19	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$288,002	$46,300			$288,002	$11,600			$288,002	$11,600			$288,002	$20,100		$0	$0

658

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900441051	9	CONSULTORES GIONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MONTERIA 1	CALLE 17 NO. 1D-16 OFICINA 803	MONTERIA-CORDOBA	2650221	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	46383796	98673516	N	2024/04/11	2024/05/27	BANCOLOMBIA	46	$93,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$46,300	$1,900	$0	$48,200
COLFONDOS	230301	800,227,940	6	1	$7,000	$300	$0	$7,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$9,700	$400	$0	$10,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$29,600	$1,200	$0	$30,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$20,100	$800	$0	$20,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$20,100	$800	$0	$20,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$11,600	$500	$0	$12,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$11,600	$500	$0	$12,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$11,600	$500	$0	$12,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$4,400	$200	$0	$4,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$2,400	$100	$0	$2,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$4,800	$200	$0	$5,000
TOTAL				4	$89,600	$3,700	$0	$93,300

2024/05/27 09:53 AM

659

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	0	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460505	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	57686985	9405665900	Y	2024/04/11	2024/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	4	$1,304,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. (4 Afiliados)							$3,407,333	$545,400			$3,407,333	$436,000			$0	$0			$4,707,333		$527,200		$0	$0		$1,299,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$1,760,667	$281,800			$1,760,667	$225,300			$0	$0			$1,760,667		$132,600		$0	$0		$639,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,760,667	$281,800			$1,760,667	$225,300			$0	$0			$1,760,667		$132,600		$0	$0		$639,300
1	CC	9000402	ALVIS SOSA	X	19/20	19	$1,760,667	$281,800	EPS002	19	$1,760,667	$225,300	0	0	$0	$0	14-25	19	$1,760,667	6.960%	$122,600	0	$0	$0	No	$629,300
Centro de Trabajo: PROFESIONAL (3 Afiliados)							$1,646,666	$263,500			$1,646,666	$210,700			$0	$0			$2,946,666		$205,200		$0	$0		$679,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							$1,646,666	$263,500			$1,646,666	$210,700			$0	$0			$2,946,666		$205,200		$0	$0		$679,400
2	CC	3888125	MARTINEZ MARTIN	X		0	$0	$0		0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	1102561304	MEJIA IDARA	X	19-19	19	$823,334	$131,800	ESSC24	19	$823,334	$105,000	0	0	$0	$0	14-25	19	$823,334	6.960%	$57,400	0	$0	$0	No	$294,200
4	CC	9054464	MONTERROSA AMADO	X	19/20	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$105,000	0	0	$0	$0	14-25	19	$823,334	6.960%	$57,400	0	$0	$0	No	$294,200
Total	Afiliados(4)						$3,407,333	$545,400			$3,407,333	$436,000			$0	$0			$4,707,333		$327,700		$0	$0		$1,299,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	0	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460505	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	57686985	9405665900	Y	2024/04/11	2024/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	4	$1,304,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$545,400	$2,000	$0	$547,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$131,800	$500	$0	$132,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$413,600	$1,500	$0	$415,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$327,900	$1,200	$0	$329,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$327,900	$1,200	$0	$329,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$426,100	$1,600	$0	$427,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$103,000	$400	$0	$103,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$220,100	$800	$0	$220,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,000	$400	$0	$103,400
TOTAL				4	$1,299,400	$4,800	$0	$1,304,200

6580

2024/05/02 09:58 AM

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	3880125
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MARTIN RAFAEL MARTINEZ MURGADO
CLASE/NATURALEZA	ORDELLO	DEPARTAMENTO	GUAJIRA
DIRECCIÓN	BARRIO PONIENTE CLL 35 A 5 BIS 48	TELÉFONO	2626858
TIPO APORTANTE	03-INDEPENDIENTES	CLASE APORTANTE	LINDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades rigidatrice y facilitadora (9 0 a0
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	00019 - CONTRATOS
APORTANTE: LIQUIDACIÓN PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (FUTORMA TRIBUTARIA)			90

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7917922997	TIPO DE PLANILLA				LINDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mes AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mes AÑO		2026
DÍAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN				924864656

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			DIFERENCIA	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
2514	25-14 COLPENSIONES	1	$ 454.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.300	$ 0	$ 454.300
SUBTOTALES										$ 454.300	$ 0	$ 454.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR CONTINGENCIA		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	(DESCUENTO)	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS E.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 554.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.900	$ 0	$ 0	$ 554.900
SUBTOTALES													$ 554.900	$ 0	$ 0	$ 554.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A CTAS RESOLUCIÓN	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	(DESCUENTO)	VALOR PAGADO
14-20	14-20-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 69.200	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 69.200
SUBTOTALES									$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 69.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES											
N°	TIPO DE COTIZANTE	NUMERO	TIPO	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE TRIBUTARIA	IBC	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP																																									
																										ADMIN	EXACTO	IBC	COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIO	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PAGADO TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	EXACTO	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	EXACTO	IBC	DÍAS/CONTRATO TRABAJO	TOTAL APORTE	EXACTO	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MEN
1	01	1065...	CONTRATO INTEGRADO MARTIN RAFAEL	DEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.656.200				NO															25-14 COLPENSIONES	N	$ 2.650.200	$ 454.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.300	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	N	$ 2.650.200	$ 554.900	$ 0	$ 554.900	14-20 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	N	$ 2.650.200	30	$ 69.200	N	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 878.400

Planilla Pagada

6582

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSULTORES DONOVAN SAS** identificada con el número de documento **9006443519** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 31 de marzo de 2023 con la Cuenta Corriente 250-846730 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSULTORES DONOVAN SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **19 de enero de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-042	01	23/01/2024

ACTA PARCIAL No. 02

CONTRATO No.	CMA-SPM-009-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSULTORES DONOVAN SAS,
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($696.192.460,00).
ADICION N° 01	DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 203.586.836,00)
VALOR ACTUALIZADO	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($899.779.296,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL DE INICIAL	22 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1:	10 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°01:	2 DE JUNIO DE 2023 (1 MES ADICIONAL)
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	30 JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N°2	18 JULIO DE 2023
ADICION N1 Y PRORROGA N°02:	19 DE JULIO DE 2023 (3 MESES ADICIONALES)
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN PRORROGA N° 2:	20 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA SUSPENSION N° 3:	20 DE OCTUBRE 2023
FECHA AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 3	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACION N° 2 A LA	17 DE NOVIEMBRE DE 2023

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6589

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-042	01	23/01/2024

SUSPENSION N° 3	
FECHA AMPLIACION N° 3 A LA SUSPENSION N° 3	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 3	11 DE MARZO DE 2024
PRORROGA N° 03	11 DE MARZO DE 2024 (03 MESES ADICIONALES)
FECHA FINAL	11 DE JUNIO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION ACUMULADO	TRECE (13) MESES
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO A COBRAR	DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023; DEL 11 DE MARZO DE 2024 AL 10 DE ABRIL DE 2024.

En la ciudad de Monteria a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 2024 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSULTORES DONOVAN**, representado legalmente por **ROSA CORDERO CELIS**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad del supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR HERNANDEZ NOVOA**, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. Las actividades ejecutadas en el contrato de Obra No. LP-SPM-012-2022 objeto de la interventoría, en el periodo del 11 de octubre de 2023 al 20 de octubre de 2023; del 11 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2024, representan un avance de 25,36%, y, en consecuencia, el presente contrato presenta el mismo porcentaje de avance correspondiente a DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS ($228.184.029,00), tal como se evidencia en los informes de avance semanal presentados.

2. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No. 02** es de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS ($228.184.029,00).**

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-042	01	23/01/2024

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato	$ 696.192.460,00		
Valor Adición 1	$ 203.586.836,00		
Valor final del contrato	$ 899.779.296,00		
Acta parcial 1		$ 270.023.767,00	OP 23007084 de fecha 21-12-2023
Acta parcial 2		$ 228.184.029,00	
Saldo por ejecutar		$ 401.571.500,00	
BALANCE	$ 899.779.296,00	$ 899.779.296,00	

3. Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago de la presente acta parcial.

4. Con la suscripción del acta parcial N°2, el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los porcentajes y costos relacionados en sus informes corresponden a los ejecutados en el periodo a cobrar en la presente acta.

5. El contratista declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

6. El supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

ID	Cargo y/o oficio	Cédula	Dedicación %	N° Planilla
PERSONAL PROFESIONAL				
1	IVAN ALVIZ GONZALEZ	92.033.432	50	9458799475 – 9465665930
2	MARTIN MARTINEZ	3.880.125	30	9458799475 – 7901240951 – 9465665930 – 7917022997
3	JESUS TAFUR	1.102.856.789	100	9459952018 – 9467781638
4	KIARA MAZA	1.102.561.304	30	9458799475 – 9465665930
5	MARIO MONTERROZA	92.534.968	30	9458799475 – 9465665930
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				
6	ANDERSON VILLAMIZAR	92.549.890	100	9459952018 – 9467781638

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-042	**01**	**23/01/2024**

ID	Cargo y/o oficio	Cédula	Dedicación	N° Planilla
			%	
7	PEDRO ARRIETA	1.074.013.639	100	9459952018 – 9467781638
8	GERMAN NOVOA	1.103.094.694	100	9459952018
9	ELVIS HURTADO	1.102.439.502	100	9459952018 – 9467781638
10	AIDA OJEDA	1.023.934.055	100	9458921639

Para el periodo de cobro se realizaron los siguientes cambios de personal:

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL						
Nombre y Apellidos propuesto inicialmente	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Nombre y Apellidos reemplazo	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Fecha y periodo del cambio
N.A.						

7. La suscripción de la presente acta, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

ROSA CORDERO CELIS
Nombre Rep. Legal

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

VICTOR HERNANDEZ NOVOA
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Iván Alviz González – Director de Interventoría
Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM
Diana Murillo – Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	CONTRATO Nº CMA-GPM-012-2022	FECHA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ACTA PARCIAL Nº 02
	OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	SEIS (6) MESES	VALOR PRESENTE ACTA: $228.184.039,00
		ACTA DE SUSPENSION Nº1:	29 DE DICIEMBRE DE 2022	PERIODO DE COBRO
		FECHA DE REINICIO Nº1:	10 DE MARZO DE 2023	
		PRORROGA No. 1	UN (1) MES (3 DE JUNIO DE 2023)	
		ACTA DE SUSPENSION Nº2	30 DE JUNIO DE 2023	
		ACTA DE REINICIO Nº2	19 DE JULIO DE 2023	
		ADICIÓN Nº1 Y PRORROGA Nº2	$ 203.586.936,00 Y TRES (3) Meses	
		ACTA DE SUSPENSION Nº3	20 DE OCTUBRE DE 2023	
		FECHA DE REINICIO Nº3	11 DE MARZO DE 2024	PERIODO DE COBRO: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023; DEL 11 DE MARZO DE 2024 AL 10 DE ABRIL DE 2024
		PRÓRROGA No. 3	TRES (3) MESES	
		FECHA DE FINALIZACION	11 DE JUNIO DE 2024	
		% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - EN EL PERIODO	35,98%	
		% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - ACUMULADO	55,37%	
		VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 606.192.403,00	
		VALOR ADICION Nº1	$ 203.586.936,00	
	CONTRATISTA: CONSULTORES DONOVAN SAS	VALOR CONTRACTUAL ACUMULADO INTERVENTORIA	$ 809.779.339,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL: ROSA CORDERO CELIS	VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:	$ 466.337.795,00	
CÓDIGO: SI-SUP-043	FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:	$ 278.023.757,00	FECHA PRESENTE ACTA:
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA Nº 02	FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN PRORROGA Nº3: 11 DE JUNIO DE 2024	VALOR PRESENTE ACTA No. 2 DE INTERVENTORIA:	$ 228.184.039,00	27 DE MAYO DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No. 1	ACTA ANTERIOR Nº1 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022; DEL 10 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023; DEL 19 DE JULIO DE 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023	PRESENTE ACTA Nº 2 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023; DEL 11 DE MARZO DE 2024 AL 10 DE ABRIL DE 2024.	ACUMULADO

CANT. (#)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (h-mes)	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE OBRA	VALOR
	PERSONAL PROFESIONAL				$ 152.316.000,00			$ 177.864.240,00	30,01%	$ 53.376.046,00	25,36%	$ 40.103.958,00	55,37%	$ 56.477.971,00
1	Director de Interventoria	$ 5.500.000,00	100%	6,00	$ 33.180.000,00	1	6,87	$ 47.883.208,00	30,01%	$ 14.130.468,00	25,36%	$ 11.942.836,00	55,37%	$ 26.073.305,00
1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 3.750.000,00	60%	3,60	$ 13.500.000,00	1	1,60	$ 6.750.000,00	30,01%	$ 2.026.575,00	25,36%	$ 1.711.800,00	55,37%	$ 3.737.475,00
1	Ingeniero Especialista en Vias	$ 3.750.000,00	60%	3,60	$ 13.500.000,00	1	4,22	$ 16.200.000,00	30,01%	$ 4.861.620,00	25,36%	$ 4.106.320,00	55,37%	$ 8.966.940,00
1	Ingeniero Especialista Ambiental	$ 3.750.000,00	60%	3,60	$ 13.500.000,00	1	4,70	$ 17.850.000,00	30,01%	$ 5.356.785,00	25,36%	$ 4.526.760,00	55,37%	$ 9.883.545,00
1	Profesional Residente de Interventoria 1	$ 3.330.000,00	100%	6,00	$ 19.980.000,00	1	8,66	$ 31.601.520,00	30,01%	$ 9.483.656,00	25,36%	$ 8.004.960,00	55,37%	$ 17.008.480,00
1	Profesional Residente de Interventoria 2	$ 3.330.000,00	100%	6,00	$ 19.980.000,00	1	8,17	$ 29.546.100,00	30,01%	$ 8.868.885,00	25,36%	$ 7.510.491,00	55,37%	$ 15.970.376,00
1	Trabajadora Social	$ 2.780.000,00	100%	6,00	$ 16.680.000,00	1	6,63	$ 25.431.480,00	30,01%	$ 5.531.283,00	25,36%	$ 4.674.200,00	55,37%	$ 10.205.866,00
1	Coordinador SG-SST	$ 2.780.000,00	100%	6,00	$ 16.680.000,00	1	5,10	$ 15.848.280,00	30,01%	$ 4.755.383,00	25,36%	$ 4.018.548,00	55,37%	$ 8.773.931,00
1	Contador	$ 2.780.000,00	10%	0,60	$ 1.668.000,00	1	0,60	$ 1.668.000,00	30,01%	$ 500.567,00	25,36%	$ 423.065,00	55,37%	$ 923.572,00
1	Abogado	$ 2.780.000,00	10%	0,60	$ 1.668.000,00	1	0,60	$ 1.668.000,00	30,01%	$ 500.567,00	25,36%	$ 423.065,00	55,37%	$ 923.572,00
	PERSONAL TÉCNICO				$ 34.020.000,00			$ 54.096.000,00	30,01%	$ 16.231.389,00	25,36%	$ 13.716.270,00	55,37%	$ 29.947.659,00
1	Topografo	$ 2.200.000,00	100%	6,00	$ 13.200.000,00	1	9,64	$ 21.208.800,00	30,01%	$ 6.363.347,00	25,36%	$ 5.376.725,00	55,37%	$ 11.738.513,00
1	Inspector 1	$ 1.613.000,00	100%	6,00	$ 10.900.000,00	1	6,60	$ 17.319.600,00	30,01%	$ 5.214.539,00	25,36%	$ 4.406.554,00	55,37%	$ 9.621.093,00
1	Inspector 2	$ 1.613.000,00	100%	6,00	$ 10.900.000,00	1	6,23	$ 14.642.900,00	30,01%	$ 4.453.054,00	25,36%	$ 3.783.631,00	55,37%	$ 8.258.015,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				$ 14.400.000,00			$ 17.772.000,00	30,01%	$ 5.333.277,00	25,36%	$ 4.506.879,00	55,37%	$ 9.840.350,00
1	Secretaria	$ 1.200.000,00	100%	6,00	$ 7.200.000,00	1	7,47	$ 9.964.800,00	30,01%	$ 2.990.640,00	25,36%	$ 2.527.272,00	55,37%	$ 5.517.912,00
1	Contador	$ 1.200.000,00	100%	6,00	$ 7.200.000,00	1	7,34	$ 9.808.200,00	30,01%	$ 2.942.637,00	25,36%	$ 2.233.726,00	55,37%	$ 4.876.590,00
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				$ 13.200.000,00			$ 18.931.000,00	30,01%	$ 5.681.393,00	25,36%	$ 4.800.932,00	55,37%	$ 10.482.095,00
1	Cadenero 1	$ 1.100.000,00	100%	6,00	$ 6.600.000,00	1	8,84	$ 10.814.200,00	30,01%	$ 3.245.200,00	25,36%	$ 2.777.892,00	55,37%	$ 6.064.155,00
1	Cadenero 2	$1.100.000,00	100%	6,00	$ 6.600.000,00	1	7,27	$ 7.967.300,00	30,01%	$ 2.390.800,00	25,36%	$ 2.039.039,00	55,37%	$ 4.427.939,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 213.036.000,00			$ 268.643.200,00	30,01%	$ 80.619.825,00	25,36%	$ 68.127.916,00	55,37%	$ 148.747.741,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,14			2,14		2,14		2,14		2,14
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 455.997.040,00			$ 574.895.448,00	30,01%	$ 172.526.426,00	25,36%	$ 145.760.739,00	55,37%	$ 318.320.165,00

CANT.	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (h-mes)	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR
3	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				$ 69.600.000,00			$ 127.560.000,00	30,01%	$ 38.287.956,00	25,36%	$ 32.355.048,00	55,37%	$ 70.643.796,00
1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 o 2010	$4.500.000,00	100%	6,00	$ 27.000.000,00	1	0,07	$ 44.865.000,00	30,01%	$ 13.463.287,00	25,36%	$ 11.377.764,00	55,37%	$ 24.841.751,00
1	Equipo completo de topografia	$2.600.000,00	100%	6,00	$ 17.400.000,00	1	9,97	$ 26.913.000,00	30,01%	$ 8.078.781,00	25,36%	$ 7.202.337,00	55,37%	$ 16.009.128,00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$5.000.000,00	100%	6,00	$ 30.000.000,00	1	7,77	$ 35.650.000,00	30,01%	$ 11.658.885,00	25,36%	$ 9.662.388,00	55,37%	$ 21.511.245,00
1	Oficina/Campamento (Incluye dotacion y servicios públicos)	$1.500.000,00	100%	6,00	$ 9.000.000,00	1	9,97	$ 14.982.000,00	30,01%	$ 4.467.996,00	25,36%	$ 3.703.584,00	55,37%	$ 8.260.584,00
4	OTROS COSTOS	COSTO UNITARIO			$9.000.000,00			$ 14.998.187,00	30,01%	$ 1.797.215,00	25,36%	$ 1.523.976,00	55,37%	$ 3.320.891,00
1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax ,correo, internet, etc)	$200.000,00	100%	6,00	$ 1.776.000,00	1	7,57	$ 2.349.720,00	30,01%	$ 672.440,00	25,36%	$ 568.347,00	55,37%	$ 1.240.887,00
1	Edición de informes, Videos, reproducción de documentos, planos, fotografias,etc	$400.000,00	100%	6,00	$ 2.400.000,00	1	8,37	$ 3.744.800,00	30,01%	$ 1.124.775,00	25,36%	$ 950.493,00	55,37%	$ 2.075.268,00
1	Elementos e Insumos Implementacion Protocolo de Bioseguridad	$765.000,00	100%	6,00	$ 4.719.000,00	1	0,30	$ 19.467,00	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -

658

	CONTRATO N° CMA-6PM-612-2022		FECHA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 20...	ACTA PARCIAL N° 02
	OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	2000 (D) MIRRA	VALOR PRESENTE ACTA: $339.194.039,00
			ACTA DE SUSPENSION N°1:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	PERIODO DE COBRO
			FECHA DE REINICIO N°1:	10 DE MARZO DE 2023	
			PRORROGA No. 1	UNO (1) MES (1) DE JUNIO DE 2023	
			ACTA DE SUSPENSION N°3	30 DE JUNIO DE 2023	
			ACTA DE REINICIO N°2	16 DE JULIO DE 2023	
			ADICION N°1 Y PRORROGA N°2	$ 303.586.834,00 Y TRES (3) MESES	
			ACTA DE SUSPENSION N°3	20 DE OCTUBRE DE 2023	
			FECHA DE REINICIO N°3	11 DE MARZO DE 2024	PERIODO DE COBRO: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023; DEL 11 DE MARZO DE 2024 AL 10 DE ABRIL DE 2024
			PRÓRROGA No. 3	TRES (3) MESES	
			FECHA DE FINALIZACION	11 DE JUNIO DE 2024	
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - EN EL PERIODO	36,98%	
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA - ACUMULADO	55,37%	
			VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	$ 696.192.460,00	
			VALOR ADICION N°1	$ 303.586.834,00	
	CONTRATISTA: CONSULTORES DONOVAN SAS		VALOR CONTRACTUAL ACUMULADO INTERVENTORIA:	$ 999.779.294,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL: ROSA CORDERO CELIS		VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE	$ 499.297.796,00	
CODIGO: SI-SUP-043	FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022		VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA	$ 270.025.767,00	FECHA PRESENTE ACTA:
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 02	FECHA FINALIZACIÓN SEGÚN PRORROGA N°3: 11 DE JUNIO DE 2024		VALOR PRESENTE ACTA No. 2 DE INTERVENTORIA:	$ 229.194.039,00	27 DE MAYO DE 2024

		CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No. 1			ACTA ANTERIOR N°1 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022; DEL 10 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023; DEL 16 DE JULIO DE 2023 AL 10 DE OCTUBRE DE 2023.		PRESENTE ACTA N° 2 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023; DEL 11 DE MARZO DE 2024 AL 10 DE ABRIL DE 2024.		ACUMULADO	
1	Alquiler el peso y/o valor Herramienta												
	b) TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (CD)			$ 92.286.000,00			$ 103.991.187,00	30,01%	$ 46.092.715,00	25,36%	$ 33.870.725,00	55,37%	$ 73.969.440,00
	SUBTOTAL CP+CE			$ 348.553.040,00			$ 706.487.035,00	30,01%	$ 312.617.139,00	25,36%	$ 1.523.676,00	55,37%	$ 214.140.815,00
5	COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES			$ 43.854.640,00			454.679.810,00	30,01%	$ 17.008.371,00	25,36%	$14.373.767,00	55,37%	$ 31.383.138,00
	Impuestos PROCOMUNA 1%		1,0%	$ 5.481.830,00		1,00%	$ 7.094.676,00	30,01%	$ 2.126.171,00	25,36%	$ 1.799.725,00	55,37%	$ 3.922.896,00
	Impuestos PRO ANCIANIDAD 3%		2,0%	$ 10.963.661,00		2,00%	$ 14.189.753,00	30,01%	$ 4.253.343,00	25,36%	$ 3.599.449,00	55,37%	$ 7.845.792,00
	Impuestos PROCULTURA 1%		1,0%	$ 5.481.830,00		1,00%	$ 7.094.676,00	30,01%	$ 2.126.171,00	25,36%	$ 1.799.725,00	55,37%	$ 3.922.896,00
	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 3% (si el valor supera 5.000 UVT $150.765.000)		3,0%	$ 15.445.481,00		3,00%	$ 21.284.528,00	30,01%	$ 6.379.514,00	25,36%	$ 5.399.174,00	55,37%	$ 11.766.688,00
	Impuestos PRODEPORTE 1%		1,0%	$ 5.481.830,00		1,00%	$ 7.094.676,00	30,01%	$ 2.126.171,00	25,36%	$ 1.799.725,00	55,37%	$ 3.922.896,00
6	COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE			$ 392.537.682,00			$ 705.166.848,00	30,01%	$ 329.626.510,00	25,36%	$194.046.201,00	55,37%	$ 420.672.771,00
	IVA		19,0%	$ 104.154.776,00		19,0%	$ 134.612.681,00	30,01%	$ 40.567.257,00	25,36%	$ 34.137.788,93	55,37%	$ 74.535.025,00
	VALOR TOTAL			$ 696.192.460,00			$ 999.779.294,00	30,01%	$ 370.025.767,00	25,36%	$339.194.039,00	55,37%	$ 499.297.796,00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 229.194.039,00

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por Consultores Donovan S.A.S.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, a los 27 días del mes de Mayo del año 2024

TOTAL NETO A PAGAR: $ 229.194.039,00

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE., COL

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
R.L. ROSA CORDERO CELIS
CONTRATISTA

Revisó:
Ing. Victor Hernández Martínez - Contratista SIM
Ing. Hugo Martínez - Contratista SIM

6588

6589

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902136051

(415)7707212489984(8020) 000014902136051

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 4 3 5 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES DONOVAN S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 10 16 OF 803

42. Correo electrónico lmartinez@arenasingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 6 5 0 2 2 1	3 1 0 7 9 0 1 2 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 8 1 3	7 1 2 0	2 0 1 3 0 8 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 03 - 13 / 10 : 32: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORDERO CELIS ROSA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-06-2024 09:06:00AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

6390

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902136051

[415]7707212489984[8020] 000001490213605 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 4 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 7 2 7 0 4 5 4		1 5 0 8 9 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GAMEZ	DE LEON	DALIANA	PATRICIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 5 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

6591

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902136051

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 4 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 5 5 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORDERO	CELIS	ROSA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-06-2024 09:06:00AM

6592

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902136051

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 4 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizada	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		0
73. Fecha	2 0 1 3 0 8 0 8	2 0 1 7 0 9 2 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 8 1 3	2 0 1 7 0 9 2 7
77. No. Matrícula mercantil	0 2 3 5 2 6 9 4	2 2 6 2 7 9 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 0 8 0 8	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 2 8		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 27-06-2024 09:06:00AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

6593

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, 08 de julio de 2024 **C.I SIM-607-2024**

Respetado
HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA
Alcalde municipio de Montería E.S.D.

Asunto: Justificación técnica y económica para tramite de pago por concepto de *"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas"*

Cordial saludo,

Por medio del presente, de manera atenta, se expone la justificación técnica y económica para tramite de pago por concepto de *"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas"*, con ocasión del contrato de interventoría No. CMA-SPM-009-2022, en los siguientes términos:

Que, en la vigencia 2022, el Municipio de Montería celebró con la empresa CONSULTORES DONOVAN S.A.S., identificado con NIT 900.644.351-9, el contrato de interventoría No. CMA-SPM-009-2022 el cual tiene por objeto la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.", por un valor total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($899.779.296,00), incluido IVA, y plazo de ejecución total de 13 meses.

Que, el Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-009-2022, inició su ejecución en fecha 22 de septiembre de 2022, de acuerdo al Acta de Inicio suscrita por el representante legal de la firma CONSULTORES DONOVAN S.A.S y, el Secretario de Infraestructura del Municipio, Ingeniero GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA.

Que, por medio de Acta N°23 de fecha 28 de febrero de 2023 suscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la asamblea de accionista designa como Representa Legal del Consorcio DONOVAN S.A.S a la señora Rosa María Cordero Celis, identificada con cedula de ciudadanía N° 53.155.174.

Que, durante la ejecución del contrato, se han presentado las siguientes modificaciones, suspensiones y reinicios:

Denominación del Acta	Fecha de Suscripción	Valor Adición
Acta de suspensión No. 1	29/12/2022	
Acta de reinicio No. 1	10/03/2023	
Prórroga No.1 **(1 mes)**	02/06/2023	
Acta de suspensión No.2	30/06/2023	
Acta de reinicio No. 2	18/07/2023	
Adición No. 1 y Prórroga No. 2 **(3meses)**	19/07/2023	$ 203.586.836,00

Alcaldía de
MONTERÍA

Denominación del Acta	Fecha de Suscripción	Valor Adición
Acta de suspensión No.3	20/10/2023	
Acta de reinicio No. 3	11/03/2024	
Prórroga N°3 **(3 meses)**	11/03/2024	

En consideración a lo anterior se tiene; que el valor inicial del contrato ascendía a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($696.192.460,00), en fecha 19 de julio de 2023 se celebra modificatorio mediante el cual se adicionan recursos por valor de DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 203.586.836,00), obteniéndose como valor final del contrato la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($899.779.296,00).

Qué, el plazo inicialmente pactado fue de SEIS (6) MESES y que, dicho plazo se ha prorrogado en tres ocasiones, así: por UN (1) MES, TRES (3) MESES y TRES (3) MESES, respectivamente, quedando el plazo total en TRECE (13) MESES.

Que, en relación al contrato mencionado es pertinente indicar que este se encuentra vigente, por lo tanto fue suscrita Acta parcial No.2 de fecha 27 de mayo de 2024, entre el contratista de interventoría Consultores Donovan S.A.S., y la secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, en cabeza de la ingeniera IRIS SPATH CAMAÑO, quien, verificó y certifico el cumplimiento parcial del objeto contractual. Así las cosas, se consignó en dicha Acta, que el valor del Acta parcial equivale a la suma de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTI NUEVE PESOS M/CTE. ($ 228.184.029,00)**, de estos, resulta permitente manifestar que dicho monto corresponde a *"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas"*, tal como se observa en la siguiente tabla:

Valor Acta parcial No. 2	**$ 228,184,029.00**	Vigencias Expiradas

Por lo anterior y debido al trámite correspondiente para el pago de dicha cuenta, se ha revisado la cláusula 8 del contrato, **FORMA DE PAGO**, en la que se cita, lo siguiente: ***"...El valor del contrato resultante de este proceso, se cancelará mediante pagos parciales, en la misma proporción de la ejecución de la obra objeto de vigilancia, para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Los porcentajes de pagos mensuales no podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la obra objeto de 17 vigilancia. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte del Municipio de Montería – Secretaría de Planeación, el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato***

Alcaldía de
MONTERÍA

de interventoría. En este último pago deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica y acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO TERCERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual..."

De igual forma en consecuencia de lo expuesto, se tiene que a la fecha el balance financiero del contrato de obra es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato	$ 696.192.460,00		
Valor Adición N° 1	$ 203.586.836,00		
Valor final del contrato	$ 899.779.296,00		
Acta parcial 1		$ 270.023.767,00	OP 23007084 de fecha 21-12-2023
Acta parcial 2		$ 228.184.029,00	(En trámite)
Saldo por pagar		$ 401.571.500,00	
BALANCE	**$ 899.779.296,00**	**$ 899.779.296,00**	

Así la cosas, se puede determinar de la tabla anterior que hay un saldo disponible de **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 629.755.529,00),** de los cuales CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE **($ 426.168.693,00)** provienen de la vigencia 2022 y el restante, es decir DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 203.586.836,00) son producto de la Adición realizada al contrato en el año 2023, tal como ya se ha manifestado. Ahora bien, conforme a los lineamientos impartidos por la Oficina de Presupuesto del Municipio de Montería, los recursos provenientes de la vigencia 2022 se constituyen como una vigencia expirada.

Por lo tanto, en mérito de lo expuesto, se considera procedente que a través del gasto *"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", se* expida el CDP correspondiente al valor del Acta parcial N°2 mencionada por valor de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 228.184.029,00).**

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Víctor Manuel Hernández – Contratista SIM
Revisó: Kelly Arteaga – Contratista – Contratista SIM

6596

Alcaldía de
MONTERÍA

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que el artículo 49 de la Ley 2159 de 2021 establece los lineamientos y los eventos en los que es viable realizar el pago de obligaciones adquiridas en las vigencias anteriores a través del concepto "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", estableciendo que para su pago es necesario, entre otras, que el jefe del órgano certifique previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en dicho artículo.

Que el Alcalde, delegó la función de expedir la certificación de que trata el artículo 49 de la Ley 2159 de 2021 o la norma que la modifique, la reemplace o la sustituya, con el fin de tramitar los pagos por concepto de *"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas"* en los funcionarios del nivel directivo y asesor del municipio de Montería.

Que, en la vigencia 2022, el Municipio de Montería celebró con la empresa CONSULTORES DONOVAN S.A.S., identificado con NIT 900.644.351-9, el contrato de interventoría No. CMA-SPM-009-2022 el cual tiene por objeto la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.", por un valor total de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($696.192.460,00), incluido IVA, equivalentes a 696.192 SMLMV, plazo de ejecución inicial de 6 meses y se suscribió acta de inicio de 22 de septiembre de 2022.

Que, el Contrato de Interventoria No. CMA-SPM-009-2022, inició su ejecución en fecha 22 de septiembre de 2022, de acuerdo al Acta de Inicio suscrita por el representante legal de la firma CONSULTORES DONOVAN S.A.S y, el Secretario de Infraestructura del Municipio, ingeniero GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA.

Que, por medio de acta N°23 de fecha 28 de febrero de 2023 suscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la asamblea de accionista designa a la señora Rosa María Cordero Celis, identificada con cedula de ciudadanía N° 53.155.174.

Que, durante la ejecución del contrato, se han presentado las siguientes modificaciones, suspensiones y reinicios:

Denominación del Acta	Fecha de Suscripción	Valor Adición
Acta de suspensión No. 1	29/12/2022	
Acta de reinicio No. 1	10/03/2023	
Prórroga No.1 (**1 mes**)	02/06/2023	
Acta de suspensión No.2	30/06/2023	
Acta de reinicio No. 2	18/07/2023	
Adición No. 1 y Prórroga No. 2 (**3meses**)	19/07/2023	$ 203.586.836,00
Acta de suspensión No.3	20/10/2023	
Acta de reinicio No. 3	11/03/2024	
Prórroga N°3 (**3 meses**)	11/03/2024	

Alcaldía de
MONTERÍA

En consideración a lo anterior se tiene: que el valor inicial del contrato ascendía a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($696.192.460,00), en fecha 19 de julio de 2023 se celebra modificatorio mediante el cual se adicionan recursos por valor de DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 203.586.836,00), obteniéndose como valor final del contrato la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($899.779.296,00).

Qué, el plazo inicialmente pactado fue de SEIS (6) MESES y que, dicho plazo se ha prorrogado en tres ocasiones, así: por UN (1) MES, TRES (3) MESES y TRES (3) MESES, respectivamente, quedando el plazo total en TRECE (13) MESES.

Que, en relación al contrato mencionado es pertinente indicar que este se encuentra vigente, por la tanto fue suscrita Acta parcial No.2 de fecha 27 de mayo de 2024, entre el contratista de interventoría Consultores Donovan S.A.S., y la secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, en cabeza de la ingeniera IRIS SPATH CAMAÑO, quien, verificó y certifico el cumplimiento parcial del objeto contractual. Así las cosas, se consignó en dicha Acta, que el valor del Acta parcial equivale a la suma de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTI NUEVE PESOS M/CTE. ($ 228,184,029.00)**, de estos, resulta permitente manifestar que dicho monto corresponde a *"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas"*, tal como se observa en la siguiente tabla:

Valor Acta parcial No. 2	**$ 228,184,029.00**	Vigencias Expiradas

Por lo anterior y debido al trámite correspondiente para el pago de dicha cuenta, se ha revisado la cláusula **8** del contrato, **FORMA DE PAGO**, en la que se cita, lo siguiente: ***"...El valor del contrato resultante de este proceso, se cancelará mediante pagos parciales, en la misma proporción de la ejecución de la obra objeto de vigilancia, para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: Los porcentajes de pagos mensuales no podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la obra objeto de 17 vigilancia. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte del Municipio de Montería – Secretaría de Planeación, el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoría. En este último pago deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica y acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO TERCERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual..."***

Alcaldía de
MONTERÍA

De igual forma en consecuencia de lo expuesto, se tiene que a la fecha el balance financiero del contrato de obra es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato	$ 696.192.460,00		
Valor Adición N° 1	$ 203.586.836,00		
Valor final del contrato	$ 899.779.296,00		
Acta parcial 1		$ 270.023.767,00	OP 23007084 de fecha 21-12-2023
Acta parcial 2		$ 228.184.029,00	(En trámite)
Saldo por pagar		$ 401.571.500,00	
BALANCE	**$ 899.779.296,00**	**$ 899.779.296,00**	

Así la cosas, se puede determinar de la tabla anterior que hay un saldo disponible de **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 629.755.529,00),** de los cuales CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE **($ 426.168.693,00)** provienen de la vigencia 2022 y el restante, es decir DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 203.586.836,00) son producto de la Adición realizada al contrato en el año 2023, tal como ya se ha manifestado. Ahora bien, conforme a los lineamientos impartidos por la Oficina de Presupuesto del Municipio de Montería, los recursos provenientes de la vigencia 2022 se constituyen como una vigencia expirada.

Por lo tanto, en mérito de lo expuesto, se considera procedente que a través del gasto *"Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", se* expida el CDP correspondiente al valor del Acta parcial N°2 mencionada por valor de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 228.184.029,00).**

Se expide la presente certificación a los ocho (08) días del mes de julio de 2024.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Víctor Manuel Hernández – Contratista SIM
Revisó: Kelly Arteaga – Contratista SIM

6599

FORMATO DECLARACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN Y DEMANDAS PARA TRAMITE DE "PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS"

Señores
MUNICIPIO DE MONTERÌA
Ciudad

Referencia: Contrato No. CMA-SPM-009-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Cordial saludo,

ROSA MARIA CORDERO CELIS, identificado con cedula de ciudadanía No. 53.155.174 en mi condición de representante legal CONSULTORES DONOVAN SAS declaro bajo la gravedad de juramento que la sociedad NO ha presentado solicitudes de conciliación ni demandas judiciales de cualquier índole con ocasión a la ejecución del contrato de la referencia.

Se expide la presente constancia con el fin de tramitar el pago por concepto de "Pago de Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas".

Atentamente,

ROSA MARIA CORDERO CELIS
CC. No. 53.155.174

6600

Alcaldia de
MONTERÍA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud N°	24002067
CDP No.	24001701
miércoles 10 julio 2024	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2024 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de	Producto	CPC	Valor C.D.P.	Valor Disponible.
2.3.7.06.02.12	Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas	1.3.3.11.05 - R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	2402104		$ 228.184.029,00	$ 3.730.891.027,20
				Totales...	$ 228.184.029,00	$ 3.730.891.027,20

CON SITUACION DE FONDO

Total CDP en letras: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA y CUATRO MIL VEINTINUEVE Pesos

El certificado No. 24001701 se emite en Monteria el dia miércoles 10 de julio de 2024 como requisito previo a:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Dairo Hoyos Bedoya

Profesional Especializado

Solicito : HUGO F. KERGUELÉN GARCÍA		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250, 10.0.0.246

Alcaldía de
MONTERÍA

Resolución No 0632 de 12 de Julio de 2024

"Por la cual se ordena un pago a CONSULTORES DONOVAN SAS con cargo al gasto "pagos pasivos exigibles - vigencias expiradas"

EL ALCALDE DE MONTERÍA

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, y

CONSIDERANDO:

Que, en la vigencia 2022, el Municipio de Montería celebró con la empresa CONSULTORES DONOVAN S.A.S., identificado con NIT 900.644.351-9, el contrato de interventoría No. CMA-SPM-009-2022 el cual tiene por objeto la "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.", por un valor total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($899.779.296,00), incluido IVA, y plazo de ejecución total de 13 meses.

Que, el Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-009-2022, inició su ejecución en fecha 22 de septiembre de 2022, de acuerdo al Acta de Inicio suscrita por el representante legal de la firma CONSULTORES DONOVAN S.A.S y, el secretario de Infraestructura del Municipio, ingeniero GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA.

Que, por medio de acta N°23 de fecha 28 de febrero de 2023 suscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la asamblea de accionista designa a la señora Rosa María Cordero Celis, identificada con cedula de ciudadanía N° 53.155.174.

Que, durante la ejecución del contrato, se han presentado las siguientes modificaciones, suspensiones y reinicios:

Denominación del Acta	Fecha de Suscripción	Valor Adición
Acta de suspensión No. 1	29/12/2022	
Acta de reinicio No. 1	10/03/2023	
Prórroga No.1 **(1 mes)**	02/06/2023	
Acta de suspensión No.2	30/06/2023	
Acta de reinicio No. 2	18/07/2023	
Adición No. 1 y Prórroga No. 2 **(3meses)**	19/07/2023	$ 203.586.836,00
Acta de suspensión No.3	20/10/2023	
Acta de reinicio No. 3	11/03/2024	
Prórroga N°3 **(3 meses)**	11/03/2024	
