CONTINUACIÓN INFORME DE INTERVENTORIA FINAL

1.1.1.8. FICHA – B5 5 Y MANEJO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Durante este periodo se presentó el ingreso de los siguientes materiales:

Sub base granular 66,83 m3
Terraplen 83,73 m3

Se realizo el seguimiento de acuerdo a los siguientes formatos:

Formatos para verificar la ficha: ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales, formato* ***9. señalización.***

1.1.1.9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Durante este periodo se recibió 150,56 m3 material proveniente de la cantera el banquito, la cual cuenta con la documentación legal vigente.

VER ANEXO 4 DOCUMENTACION LEGAL CANTERA

% de material adquirido en cateras certificadas	Metros cúbicos de agregados adquiridos en canteras certificadas	150,56	100%
	Metros cúbicos de material total utilizado en obra)	150,56	
Análisis de indicador:			

1.1.1.10. FICHA – B6 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

El agua usada corresponde al acueducto de la zona y el volumen utilizado en el periodo fue de 160 m3, cabe recalcar que el agua utilizada en el periodo no es agua apta para el consumo humano.

VER ANEXO 5 CERTIFICADO DOTACION DE AGUA

Formatos para verificar la ficha: ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 9****. Señalización,* ***formato 10.*** *manejo de aguas superficiales.*

1.1.1.11. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

% de sumideros aseados	Número de sumideros aseados	0	0%
	Número total de sumideros contaminados por acción de la Obra	0	
Análisis de indicador: No existen sumideros en el área del proyecto			

% volumen de agua utilizada en obra	Metros cúbicos de agua potable utilizada en obra mes actual	0	0%
	Metros cúbicos de agua potable utilizada en obra mes anterior	0	
Análisis de indicador: no se ha utilizado agua del acueducto local			

1.1.1.12. FICHA – B7 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se tiene el control diario de las posibles fugas de combustible o aceites provenientes de la maquinaria o equipos presentes en la obra, y se realiza un mantenimiento mensual a las mismas; Durante este periodo se realizaron los mantenimientos de la maquinaria con empresas certificadas, con el fin de prevenir el derrame de aceites o materiales fluidos y a su vez evitar la contaminación en el suelo.

VER ANEXO 6 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Formatos para verificar la ficha: ***formato 5****. manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 6.*** *manejo de maquinaria, equipos y transporte,* ***formato 7.*** *manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas,* ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 9.*** *señalización.*

1.1.1.13. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Durante este periodo se realizo el alquiler de baño a una persona de la comunidad para uso de los trabajadores del proyecto.

VER ANEXO 7 DOCUMENTO ALQUILER DE BAÑO

% unidades sanitarias en obra	Número de unidades sanitarias presentes en obra	1	100%
	Número total teórico de unidades sanitarias presentes en obra	1	
Análisis de indicador: unidad sanitaria adecuada			

6809

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA "PGIO 14"

Fecha: Junio de 2024	Versión: 02	Página: 1

% Indicador de disposición final de residuos sólidos	Cantidad (Kg) de residuos sólidos peligrosos dispuestos a través de ente gestor autorizado	0	0%

peligrosos	Cantidad (Kg) de residuos sólidos peligrosos generados	0	
Análisis de indicador: No se han generado residuos sólidos peligrosos			

% Indicador de disposición final de residuos líquidos peligrosos	Cantidad (Kg) de residuos líquidos peligrosos dispuestos a través de ente gestor autorizado	0	0%
	Cantidad (Kg) de residuos líquidos peligrosos generados	0	
Análisis de indicador: No se han generado residuos líquidos peligrosos			

% Indicador de derrames de residuos líquidos reportados en obra	Numero de derrames reportados con residuos líquidos dentro de la obra	0	0%
		0	
Análisis de indicador: No se han reportado derrames			

1.1.1.14. FICHA – B8 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Para el transporte de material durante este periodo, los vehículos dispuestos para el transporte de material, contaron con cubierta para evitar la contaminación de material particulado a su vez se realizó mensualmente el mantenimiento a los vehículos en empresas certificadas, con lo cual se busca mitigar las posibles contaminaciones auditivas que se presenten en la obra; para este periodo no se han reportado ni evidenciado afectaciones en este aspecto, el seguimiento se realiza de acuerdo a :

Formatos para verificar la ficha: ***formato 2.*** *manejo y disposición de desechos de construcción,* ***formato 3.*** *control de escombros producidos,* ***formato 4.*** *almacenamiento y manejo de materiales de construcción,* ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 6.*** *manejo de maquinaria, equipos y transporte,* ***formato 7.*** *manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas,* ***formato 8.*** *aseo de la obra, formato 9. señalización.*

1.1.1.15. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Indicador de porcentaje gestión de actividades emisoras de gas y ruido	Número de actividades programada gestión de emisión de gases y ruido	0	0%

	Número de actividades ejecutadas relacionadas con emisión de gases y ruido	0	
Análisis de indicador: No se han registrado actividades de este tipo			

1.1.1.16. FICHA - B9. MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

Se garantiza la correcta disposición final a cada uno de los escombros provenientes de las demoliciones de los boxculverts que serán reemplazados por los especificados en los diseños.

Durante este periodo se generaron 1,231 m3 de residuos de construcción y demolición, los cuales fueron entregados a la comunidad y se evidencia mediante las actas anexadas.

Se le informa al personal de obra que se debe mantener el área de trabajo libre de obstáculos y residuos solidos.

VER ANEXO 3 ACTAS DE ENTREGA DE MATERIAL

Formatos para verificar la ficha: ***formato 2.*** *manejo y disposición de desechos de construcción,* ***formato 3.*** *control de escombros producidos* ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 7.*** *manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas,* ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 9.*** *señalización.*

1.1.1.17. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

Indicador de puntos ecológicos	Número de puntos ecológicos en obra	1	33.33%
	Puntos ecológicos necesarios	3	
Análisis de indicador: Se instalo un punto ecológico			

1.1.1.18. FICHA – B10. MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Durante este periodo no se presentaron daños a tuberías de servicios públicos que pudieran afectar a los usuarios de la zona.

Formatos para verificar la ficha: ***formato 3.*** *control de escombros producidos,* ***formato 4.*** *almacenamiento y manejo de materiales de construcción,* ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 7.*** *manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas,* ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 9.*** *Señalización,* ***formato 10.*** *manejo de aguas superficiales.*

1.1.1.19. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AISLAMIENTO DE LA OBRA

% porcentaje de intervenciones a redes	Número de daños sobre redes o ductos subterráneos	0	0%
	Número de excavaciones sobre redes y ductos subterráneos	0	
Análisis de indicador: No se presentaron daños sobre redes o ductos subtarrenaneos durante este periodo			

% porcentaje de suspensión de servicios públicos	Número de veces que se suspendió el servicio	0	0%
	Número de daños sobre redes o ductos subterráneos	0	
Análisis de indicador: No se presentaron suspensiones de servicios públicos durante este periodo			

1.1.1.20. FICHA – B11. AISLAMIENTO DE LA OBRA

Durante periodo se realizaron cerramientos con tela polipropileno (100 m) y cinta de seguridad (190 m) **Ver registro fotográfico** en distintas zonas de la obra señalizaciones, con el fin de evitar accidentes y mantener el aseo y el orden en la misma.

Formatos para verificar la ficha: ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 9.*** *señalización.*

1.1.1.21. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AISLAMIENTO DE LA OBRA

Indicador de material para cerramiento perimetral	Metros lineales de tela polipropileno verde, malla fina azul y/o malla naranja instalados en el mes	100	100%
	Metros esperados	100	
Análisis de indicador: No se ha realizado la instalación de este material durante el periodo.			

Indicador de material para delimitación de senderos peatonales	Metros lineales de cinta de seguridad instalados en el mes	190	100%
	Metros esperados	190	
Análisis de indicador: No se reportan la instalación de estos cerramientos.			

1.1.1.22. FICHA – B12. MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN

En el lugar que se va a realizar la construcción de la placahuella no se reporta patrimonio arqueológico e histórico de la nación, sin embargo, en caso de que se llegara a presentar algún hallazgo, se informara de manera oportuna al ente territorial para que se tomen las medidas necesarias para dar protección al patrimonio. En el momento existe un

Formatos para verificar la ficha: ***formato 3.*** *control de escombros producidos,* ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 6.*** *manejo de maquinaria, equipos y transporte,* ***formato 7.*** *manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas,* ***formato 9.*** *señalización.*

1.1.1.23. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN

Indicador de hallazgos arqueológicos	Número de hallazgos arqueológicos encontrados	0	0%
		0	
Análisis de indicador: Actualmente se solicitó a la autoridad competente acerca de la existencia de puntos arqueológicos en el proyecto.			

1.1.1.24. FICHA – B13. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL

Durante este periodo se realizo una capacitación con todo el personal de la obra la cual tuvo una duración de 10 minutos.

La capacitación de este periodo consistió en PROTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS

Formatos para verificar la ficha: ***formato 3****. control de escombros producidos,* ***formato 5.*** *manejo de campamentos e instalaciones temporales,* ***formato 8.*** *aseo de la obra,* ***formato 11.*** *manejo de la vegetación*

1.1.1.25. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN

% de trabajadores capacitados	Número de trabajadores del proyecto capacitados.	20	100%
	Número de trabajadores de todo el proyecto	20	
Análisis de indicador: Todos el personal del proyecto fue capacitado en este periodo.			

% de capacitaciones desarrolladas	Número de capacitaciones desarrolladas en el mes	1	100%
	Número de capacitaciones programadas para el mes	1	
Análisis de indicador: Se cumplio con la meta de la capacitación al personal de campo.			

1.1.1.26. .FICHA – C1. ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES

1.1.1.27. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES

% de individuos eliminados	Número de individuos eliminados	0	0%
	Número de individuos a eliminar según diseño	0	
Análisis de indicador: No ha sido necesaria la tala de arboles			

% de volumen de material vegetal obtenido	Volumen real de madera obtenido por la actividad	0	0%
	Volumen de madera estimado en inventario para la actividad	0	
Análisis de indicador: No ha sido necesaria la tala de arboles			

% de individuos tratados adecuadamente	Número de individuos tratados adecuadamente	0	0%
	Número de individuos afectados)	0	
Análisis de indicador: No ha sido necesaria la tala de arboles			

1. CONTROL DE GESTORES AMBIENTALES

En el tiempo de ejecución del contrato se debe contar con la documentación de regla respecto a los materiales pétreos, botaderos, permisos de ocupación de cauce y la adquisición del agua que se utilizará en las distintas actividades del proyecto:

Agregados pétreos (Cantera)	• Se ha utilizado piedra y material de relleno general.
Escombrera-botadero	• Se concertó con los gestores ambientales donar el material a la comunidad de la vereda Maracayo para realizar llenos y mejoras en los lugares públicos y vías aledañas
Permiso ocupación de Cauce	• Otorgado por la autoridad ambiental competente CVS **(ver anexo)**

Adquisición del agua	• Se realizará por medio del acueducto local de la vereda Maracayo, se está en trámite con la comunidad para lograr un acuerdo.

3.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL



Foto GC1. Punto ecológico ubicado en obra



Foto GC2. Acopio de material

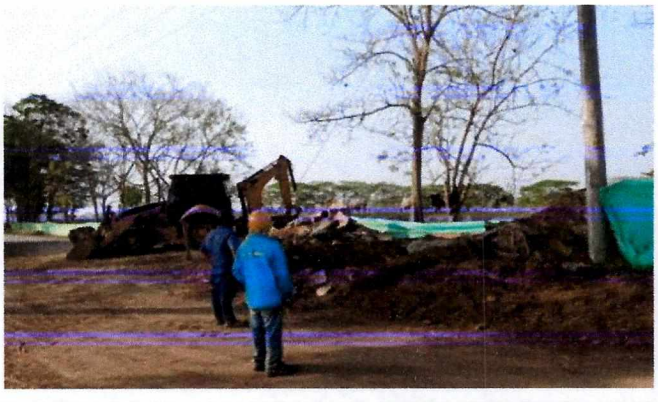


Foto GC3. Actividades de excavación en obra



Foto GC4. Actividades de excavación en obra

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA "PGIO 14"		
Fecha: Junio de 2024	Versión: 02	Página: 2









Foto GC5 Y 6. Acopio de material

Foto G7 Y 8. Uso de malla fina azul y cinta de seguridad

6814

1. APROBACIONES Y CAMBIOS

VERISÓN: 01 – Elaboración de documento
Fecha de aprobación:

Elaboró:

ANA MARIA
PATERNINA
INGENIERO AMBIENTAL

Aprobó:
Directora de obra
Contrato de obra N° LP- SPM-012-2022
CONSTRUCCIONES AP

6815

Alcaldia de Monteria
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S
ALCALDIA DE MONTERIA

VERSIÓN	1
CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 20 de mayo de 2024	SEMANA No.	56	DEL	13/05/2024	AL	19/05/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSORCIO PLACA HUELLA MR			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS			REPRESENTANTE LEGAL:	MARCO ANTONIO GOMEZ MENDOZA		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACION:	22/09/2022			FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022			*FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023			*FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023		
FECHA DE SUSPENSION No. 2:	30/06/2023			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	30/06/2023		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	18/07/2023			FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	18/07/2023		
FECHA DE SUSPENSION No. 3:	20/10/2023			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3:	20/10/2023		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	11/03/2024			FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	11/03/2024		
PRORROGA Nº 1	02 DE JUNIO DE 2023 30 dias adicioneles			PRORROGA Nº 1	02 DE JUNIO DE 2023 30 dias adicioneles		
PRORROGA Nº 2	19 DE JULIO DE 2023 90 dias Adicionales			PRORROGA Nº 2	19 DE JULIO DE 2023 90 dias Adicionales		
PRORROGA Nº 3	11 DE MARZO DE 2023 90 dias Adicionales			PRORROGA Nº 3	11 DE MARZO DE 2023 90 dias Adicionales		
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/06/2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	11/06/2024		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	13.00			PLAZO ACTUALIZADO:	13.00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	369.00	EQUIVALE AL	94.6%	PLAZO TRANSCURRIDO:	369.00	EQUIVALE AL	94.6%
VALOR INICIAL :			$ 696,192,460.00	VALOR INICIAL :			$ 9,691,701,283.00
VALOR ADICION(ES):			$ 203,566,836.00	VALOR ADICION(ES):			$ 1,289,109,292.00
VALOR ACTUALIZADO:			$ 899,779,296.00	VALOR ACTUALIZADO:			$ 10,980,810,575.00
ANTICIPO 0%			$ 0.00	ANTICIPO 30%			$ 2,907,510,384.90

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	%	VALOR	FECHA
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°01	30.01%	$ 208,927,356	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	30.01%	$ 208,927,356.00	
VALOR POR PAGAR:			$ 690,851,940.00

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	%	VALOR	FECHA
ACTA PARCIAL DE OBRA N°01	30.01%	$ 3,295,478,664	10 octubre de 2023
TOTAL:	30.01%		$ 3,295,478,664.10
VALOR POR PAGAR:			$ 7,685,331,910.90

SUPERVISOR:	ING. IRIS SPATH CAMANO	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato.

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

INDICADORES

Fecha de Inicio	22-sep-2022
Suspension N°01	29-dic-2022
Reinicio N°01	10-mar-2023
Suspension N°02	30-jun-2023
Reinicio N°02	18-jul-2023
Suspension N°03	20-oct-2023
Reinicio N°03	11-mar-2024
Fecha de entrega	11-jun-2024

Valor Planeado	$ 8,525,501,330
Valor Ejecutado	$ 8,177,409,635

% Semana Programado	6.65%
% Semana Ejecutado	0.55%
% Atraso/Adelanto	-6.10%


Horas bloqueos del Día	0
Horas bloqueos Acumulado	0

Días Programados	390
Días Transcurridos	369
Días Faltantes	21

% Acumulado Programado	77.64%
% Acumulado Ejecutado	74.47%
% ATRASO	-3.17%

Horas arqueología del Día	0
Horas arqueología Acumulado	0

Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la prorroga n°03

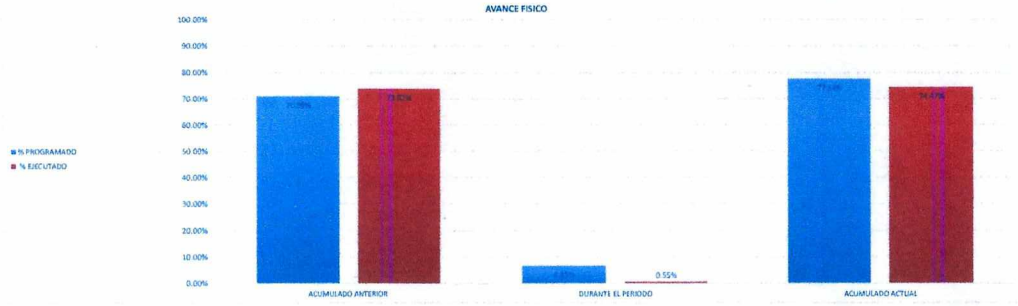

1141340891

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

*A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Fundida de concreto ciclopeo para proteccion de taludes, Instalacion de Sub base, Terrapien, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 74.47% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $8.177.409.635 Vs un porcentaje acumulado programado del 77.64% correspondiente a $8.525.501.330 reflejando un Atraso del 3.17%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

6816

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 20 de mayo de 2024	SEMANA No.	56	DEL	13/05/2024	AL	19/05/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Fundida de concreto ciclopeo para proteccion de taludes, Instalacion de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 74.47% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $8.177.409.635 Va un porcentaje acumulado programado del 77.64% correspondiente a $8.525.501.330 reflejando un Atraso del 3.17%, de acuerdo a la reprogramacion entregada con la fecha de finalizacion 11 de junio de 2024.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de relleno con material de terraplen y sub base para placa huella, construccion de construccion de taludes y construccion de placa huella.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoria realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia relleno con material de terraplen en abcisa k1+970



Se evidencia instalacion de rieles para fundida de placa huella entre abcisa k1+580



Se evidencia fundida en concreto para losas de placa entre abcisas k1+390




Se evidencia fundida de proteccion de taludes en piedra pegada en abcisa k1+240

6817

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 20 de mayo de 2024	SEMANA No.	56	DEL	13/05/2024	AL	19/05/2024

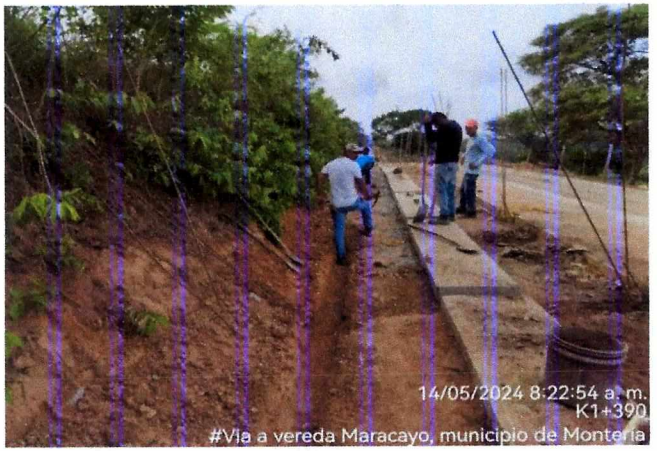

Se eviedencia excavacion manual para bordillo de placa huella entre abcisa k1+390



se evidencia fundida de placa huella entre abcisa k1+460

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 22202151364 COR

68/18

Alcaldia de Monteria SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 27 de mayo de 2024	SEMANA No.	57	DEL	20/05/2024	AL	26/05/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSORCIO PLACA HUELLA MR			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS			REPRESENTANTE LEGAL:	MARCO ANTONIO GOMEZ MENDOZA		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACION:	22/09/2022			FECHA DE INICIACION:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022			*FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023			*FECHA DE REINICIACION No. 1:	10/03/2023		
FECHA DE SUSPENSION No. 2:	30/06/2023			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	30/06/2023		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	18/07/2023			FECHA DE REINICIACIÓN No. 2:	18/07/2023		
FECHA DE SUSPENSION No. 3:	20/10/2023			FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3:	20/10/2023		
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	11/03/2024			FECHA DE REINICIACIÓN No. 3:	11/03/2024		
PRORROGA Nº 1	02 DE JUNIO DE 2023 30 dias adicioneles			PRORROGA Nº 1	02 DE JUNIO DE 2023 30 dias adicioneles		
PRORROGA Nº 2	19 DE JULIO DE 2023 90 dias Adicionales			PRORROGA Nº 2	19 DE JULIO DE 2023 90 dias Adicionales		
PRORROGA Nº 3	11 DE MARZO DE 2023 90 dias Adicionales			PRORROGA Nº 3	11 DE MARZO DE 2023 90 dias Adicionales		
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/06/2024			*FECHA DE TERMINACIÓN:	11/06/2024		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	13.00			PLAZO ACTUALIZADO:	13.00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	376.00	EQUIVALE AL	96.4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	376.00	EQUIVALE AL	96.4%
VALOR INICIAL :	$ 696,192,460.00			VALOR INICIAL :	$ 9,691,701,283.00		
VALOR ADICION(ES):	$ 203,586,836.00			VALOR ADICION(ES):	$ 1,289,109,292.00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 899,779,296.00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 10,980,810,575.00		
ANTICIPO 0%	$ 0.00			ANTICIPO 30%	$ 2,907,610,384.90		

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA				RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA			
DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA	DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°01	30.01%	$ 208,927,356		ACTA PARCIAL DE OBRA N°01	30.01%	$ 3,296,478,864	10 octubre de 2023
		$ -					
		$ -					
		$ -					
		$ -					
TOTAL:	30.01%	$ 208,927,356.00		TOTAL:	30.01%		$ 3,295,478,864.10
VALOR POR PAGAR:			$ 690,851,940.00	VALOR POR PAGAR:			$ 7,685,331,910.90
SUPERVISOR:	ING. IRIS SPATH CAMAÑO			DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato.


3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

INDICADORES

Fecha de inicio	22 sep 2022	Días Programados	390
Suspension N°01	29-dic-2022	Días Transcurridos	376
Reinicio N°01	10-mar-2023	Días Faltantes	14
Suspension N°02	30 jun 2023		
Reinicio N°02	18 jul 2023		
Suspension N°03	20 oct 2023		
Reinicio N°03	11 mar 2024		
Fecha de entrega	11 jun 2024		
		% Acumulado Programado	84.50%
Valor Planeado	$ 9,278,784,936	% Acumulado Ejecutado	80.05%
Valor Ejecutado	$ 8,790,138,865	% ATRASO	-4.45%
% Semana Programado	5.86%	Horas arqueología del Día	0
% Semana Ejecutado	5.58%	Horas arqueología Acumulado	0
% Atraso/Adelanto	-1.28%		
Horas bloqueos del Día	0		
Horas bloqueos Acumulado	0		

Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la prorroga n°03

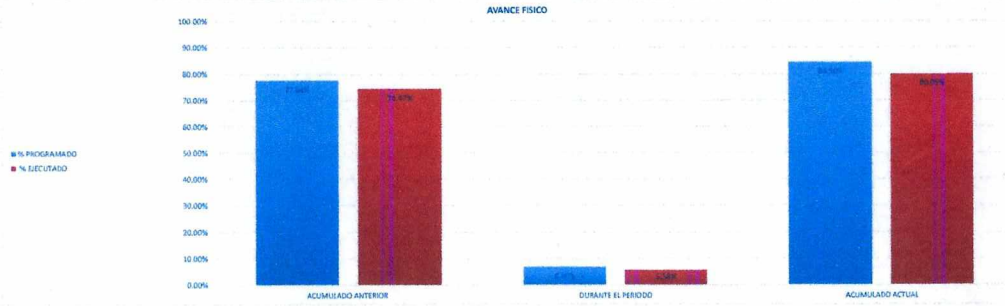

1141340881

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Fundida de concreto ciclopeo para proteccion de taludes, Instalacion de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 80.05% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $8,790,138,865 Vs un porcentaje acumulado programado del 84.50% correspondiente a $9,278,784,936 reflejando un Atraso del 4.45%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

6819

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 27 de mayo de 2024	SEMANA No.	57	DEL	20/05/2024	AL	26/05/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Fundida de concreto ciclopeo para proteccion de taludes, Instalacion de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 80.05% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $8.790.138.865 Vs un porcentaje acumulado programado del 84.50% correspondiente a $9.278.784.936 reflejando un Atraso del 4.45%, de acuerdo a la reprogramacion entregada con la fecha de finalizacion 11 de junio de 2024.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de relleno con material de terraplen y sub base para placa huella, construccion de construccion de taludes y construccion de placa huella.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoria realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la vía.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia relleno con material de terraplen en abcisa k1+780



Se evidencia excavacion manual para bordillo y viga riostra en placa huella sobre abcisa K1+610



Se evidencia fundida en concreto para bordillos de placa huella en abcisa k1+520



Se evidencia fundida de proteccion de taludes en piedra pegada en abcisa k1+240

6820

Alcaldía de Monteria SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 27 de mayo de 2024	SEMANA No.	57	DEL	20/05/2024	AL	26/05/2024



Se eviedencia relleno con material de terraplen en abcisa k1+780



se evidencia armado de acero de refuerzo en placa huella entre abcisa k1+570

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 22202151364 COR

6821

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S
ALCALDIA DE MONTERIA

VERSIÓN	1
CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 3 de junio de 2024	SEMANA No.	58	DEL	27/05/2024	AL	2/06/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S		CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S	
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022	CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	REPRESENTANTE LEGAL:	MARCO ANTONIO GOMEZ MENDOZA
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACION:	22/09/2022	FECHA DE INICIACION:	22/09/2022
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022	FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022
FECHA DE REINICIACION No. 1:	10/03/2023	FECHA DE REINICIACION No. 1:	10/03/2023
FECHA DE SUSPENSION No. 2:	30/06/2023	FECHA DE SUSPENSION No. 2:	30/06/2023
FECHA DE REINICIACION No. 2:	18/07/2023	FECHA DE REINICIACION No. 2:	18/07/2023
FECHA DE SUSPENSION No. 3:	20/10/2023	FECHA DE SUSPENSION No. 3:	20/10/2023
FECHA DE REINICIACION No. 3:	11/03/2024	FECHA DE REINICIACION No. 3:	11/03/2024
PRORROGA N° 1	02 DE JUNIO DE 2023 30 dias adicionales	PRORROGA No. 1	02 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA N° 2	3 DE JUNIO DE 2023 90 dias adicionales	PRORROGA No. 2	19 DE JULIO DE 2023
PRORROGA N° 3	11 DE MARZO DE 2024 90 dias adicionales	PRORROGA No. 3	11 DE MARZO DE 2024 90 dias adicionales
FECHA DE TERMINACION:	11/09/2024	FECHA DE TERMINACION:	11/06/2024
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	13,00	PLAZO ACTUALIZADO:	13,00
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	381,00 EQUIVALE AL 97,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	381,00 EQUIVALE AL 97,7%
VALOR INICIAL :	$ 696.192.460,00	VALOR INICIAL :	$ 9.691.701.285,00
VALOR ADICION(ES):	$ 203.586.836,00	VALOR ADICION(ES):	$ 1.289.109.292,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 899.779.296,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 10.980.810.575,00
ANTICIPO 0%	$ 0,00	ANTICIPO 30%	$ 2.907.510.384,90

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
Acta parcial de interventoria N°01	30,01%	$ 208.927.356,000	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	30,01%	$ 208.927.356,00	
VALOR POR PAGAR:			$ 690.851.940,00

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
Acta parcial de obra N°01	30,01%	$ 3.295.478.664	10 de Octubre de 2023
TOTAL:	30,01%		$ 3.295.478.664,00
VALOR POR PAGAR:			$ 7.685.331.911,00

SUPERVISOR:	ING. IRIS SPATH CAMANO	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


" Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato.

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

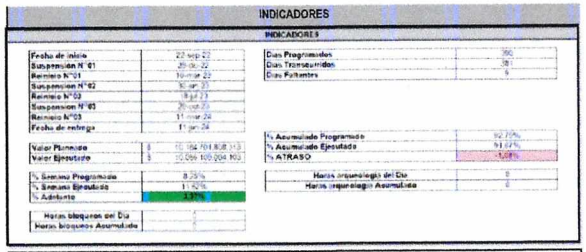

Los siguientes Indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la fecha de Reinicio N°03 del contrato en referencia.

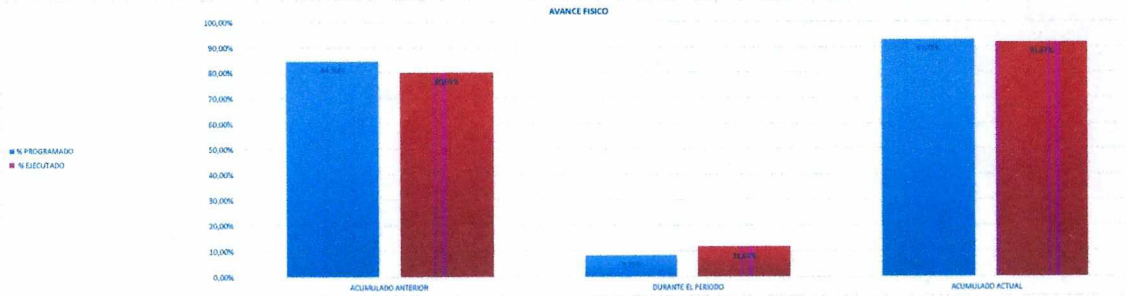

1141340891

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Instalacion de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 91,67% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $10.066.109.054 Vs un porcentaje acumulado programado del 92,75% correspondiente a $10.184.701.808 reflejando un atraso del 1,08%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

6822

Alcaldia de Monteria SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 3 de junio de 2024	SEMANA No.	58	DEL	27/05/2024	AL	2/06/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

• A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Instalacion de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 91,67% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $10.065.109.054 Vs un porcentaje acumulado programado del 92,75% correspondiente a $10.184.701.808 reflejando un atraso del 1,08%. Con respecto al valor contractual el contratista de Obras ha ejecutado 91,67% de acuerdo a la reprogramacion entregada ajustada con la fecha de finalizacion 11 de junio de 2024.
• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de relleno con material de sub base para placa huella, construccion de mejoramiento de taludes de obras hidraulicas con concreto ciclopeo y construccion de placa huella.
• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoria realiza seguimiento y control a dichas actividades.
• En la presente semana, el contratista de obra realizo actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia fundida de placa huella



Se evidencia fundida de placa huella



Se evidencia figurado y armado de acero de refuerzo para construccion de placa huella



Se evidencia cargue y retiro de material sobrante

6823

Alcaldia de Monteria	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	lunes, 3 de junio de 2024	SEMANA No.	58	DEL	27/05/2024	AL	2/06/2024



Se evidencia instalacion de rieles para construccion de placa huella



Se evidencia excavacion manual para construccion de placa huella

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 22202151364 COR

6824

Alcaldia de Monteria SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	sábado, 8 de junio de 2024	SEMANA No.	59	DEL	2/06/2024	AL	7/06/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S				CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S			
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022			CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".			OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS			REPRESENTANTE LEGAL:	MARCO ANTONIO GOMEZ MENDOZA		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES			PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIACION:	22/06/2022			FECHA DE INICIACION:	22/09/2022		
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022			FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022		
FECHA DE REINICIACION No. 1	10/03/2023			FECHA DE REINICIACION No. 1	10/03/2023		
FECHA DE SUSPENSION No. 2:	30/06/2023			FECHA DE SUSPENSION No. 2:	30/06/2023		
FECHA DE REINICIACION No. 2:	18/07/2023			FECHA DE REINICIACION No. 2:	18/07/2023		
FECHA DE SUSPENSION No. 3:	20/10/2023			FECHA DE SUSPENSION No. 3:	20/10/2023		
FECHA DE REINICIACION No. 3:	11/03/2024			FECHA DE REINICIACION No. 3:	11/03/2024		
PRORROGA N° 1	02 DE JUNIO DE 2023 30 dias adicionales			PRORROGA No. 1	02 DE JUNIO DE 2023		
PRORROGA N° 2	3 DE JUNIO DE 2023 90 dias adicionales			PRORROGA No. 2:	19 DE JULIO DE 2023		
PRORROGA N° 3	11 DE MARZO DE 2024 90 dias adicionales			PRORROGA No. 3:	11 DE MARZO DE 2024 90 dias adicionales		
FECHA DE TERMINACION:	11/06/2024			FECHA DE TERMINACION:	11/08/2024		
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	13,00			PLAZO ACTUALIZADO:	13,00		
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	381,00	EQUIVALE AL	97,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	381,00	EQUIVALE AL	97,7%
VALOR INICIAL :	$ 696.192.460,00			VALOR INICIAL :	$ 9.691.701.263,00		
VALOR ADICION(ES):	$ 203.586.836,00			VALOR ADICION(ES):	$ 1.289.109.292,00		
VALOR ACTUALIZADO	$ 899.779.296,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 10.980.810.575,00		
ANTICIPO 0%	$ 0,00			ANTICIPO 30%	$ 2.907.510.384,90		

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
Acta parcial de interventoria N°01	30,01%	$ 208.927.356,000	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	30,01%	$ 208.927.356,00	
VALOR POR PAGAR:		$ 690.851.940,00	

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
Acta parcial de obra N°01	30,01%	$ 3.295.478.664	10 de Octubre de 2023
TOTAL:	30,01%		$ 3.295.478.664,00
VALOR POR PAGAR:			$ 7.685.331.911,00

SUPERVISOR: ING. IRIS SPATH CAMAÑO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato.

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)



Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la fecha de Reinicio N°03 del contrato en referencia.

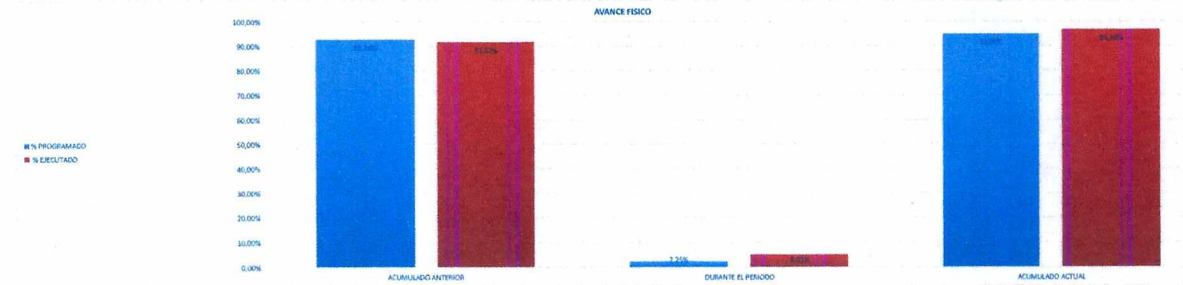

$ 10.431.770.046,25

1141340881

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Instalacion de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 98,70% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $10.618.443.826 Ve un porcentaje acumulado programado del 95% correspondiente a $10.431.770.046 reflejando un adelanto del 1,7%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

6825

Alcaldía de Monteria SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	sábado, 8 de junio de 2024	SEMANA No.	59	DEL	2/06/2024	AL	7/06/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

- A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Instalacion de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 96,7% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $10.618.443.826 Vs un porcentaje acumulado programado del 95% correspondiente a $10.431.770.046 reflejando un adelanto del 1,7%. Con respecto al valor contractual el contratista de Obras ha ejecutado 95,7% de acuerdo a la reprogramacion entregada ajustada con la fecha de finalizacion 11 de junio de 2024.
- El contratista de obras en la presente semana realizo actividades de relleno con material de sub base para placa huella, construccion de mejoramiento de taludes de obras hidraulicas con concreto ciclopeo y construccion de placa huella.
- El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoria realiza seguimiento y control a dichas actividades.
- En la presente semana, el contratista de obra realizo actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia fundida de placa huella



Se evidencia fundida de placa huella



Se evidencia fundida de placa huella



Se evidencia fundida de placa huella

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT.: 22202151354 COR

6826

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	domingo, 1 de septiembre de 2024	SEMANA No	60	DEL	27/08/2024	AL	31/08/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S		CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S	
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022	CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	REPRESENTANTE LEGAL:	MARCO ANTONIO GOMEZ MENDOZA
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACION:	22/09/2022	FECHA DE INICIACION:	22/09/2022
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022	FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022
FECHA DE REINICIACION No. 1:	10/03/2023	FECHA DE REINICIACION No. 1:	10/03/2023
FECHA DE SUSPENSION No. 2	30/06/2023	FECHA DE SUSPENSION No. 2	30/06/2023
FECHA DE REINICIACION No. 2:	18/07/2023	FECHA DE REINICIACION No. 2:	18/07/2023
FECHA DE SUSPENSION No. 3:	20/10/2023	FECHA DE SUSPENSION No. 3:	20/10/2023
FECHA DE REINICIACION No. 3:	11/03/2024	FECHA DE REINICIACION No. 3:	11/03/2024
FECHA DE SUSPENSION No. 4:	7/06/2024	FECHA DE SUSPENSION No. 4:	7/06/2024
FECHA DE REINICIACION No. 4:	27/08/2024	FECHA DE REINICIACION No. 4:	27/08/2024
PRORROGA N° 1	02 DE JUNIO DE 2023 30 dias adicionales	PRORROGA No. 1	02 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA N°2	3 DE JUNIO DE 2023 90 dias adicionales	PRORROGA No. 2	19 DE JULIO DE 2023
PRORROGA N°3	11 DE MARZO DE 2024 90 dias adicionales	PRORROGA No. 3	11 DE MARZO DE 2024 90 diss adicionales
FECHA DE TERMINACION:	31/08/2024	FECHA DE TERMINACION:	31/08/2024
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	13,00	PLAZO ACTUALIZADO	13,00
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	381,00 EQUIVALE AL 97,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	381,00 EQUIVALE AL 97,7%
VALOR INICIAL :	$ 696.192.460,00	VALOR INICIAL :	$ 9.691.701.263,00
VALOR ADICION(ES):	$ 203.586.836,00	VALOR ADICION(ES):	$ 1.289.109.292,00
VALOR ACTUALIZADO	$ 899.779.296,00	VALOR ACTUALIZADO	$ 10.980.810.575,00
ANTICIPO 0%	$ 0,00	ANTICIPO 30%	$ 2.907.510.384,90

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
Acta parcial de interventoria N°01	30,01%	$ 208.927.356,000	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	30,01%	$ 208.927.356,00	
VALOR POR PAGAR:			$ 690.851.940,00

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCION	%	VALOR	FECHA
Acta parcial de obra N°01	30,01%	$ 3.295.478.664	10 de Octubre de 2023
TOTAL:	30,01%		$ 3.295.478.664,00
VALOR POR PAGAR:			$ 7.685.331.911,00

SUPERVISOR: ING. IRIS SPATH CAMANO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato.

3. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACION (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)



Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la fecha de Reinicio N°04 del contrato en referencia.

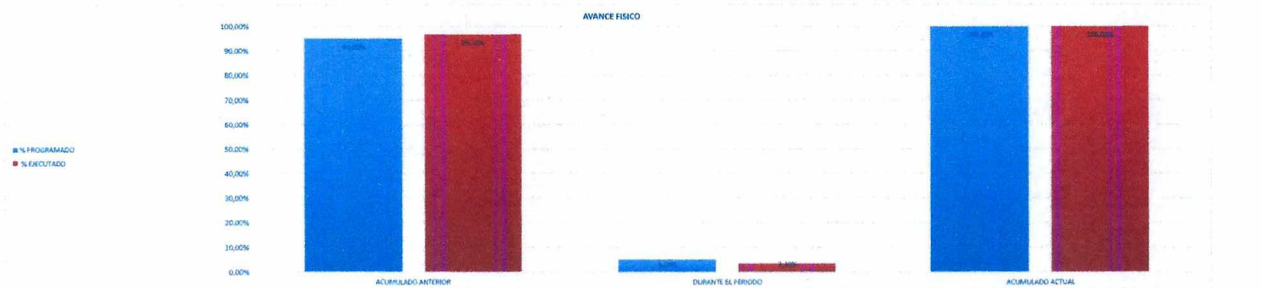

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

*A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Instalacion de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 100% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $10.980.810.575 Vs un porcentaje acumulado programado del 100% correspondiente a $10.980.810.575 reflejando un adelanto del 0%.

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITE No	LUGAR

6825

Alcaldia de Monteria SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDIA DE MONTERIA	VERSIÓN	1
		CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	domingo, 1 de septiembre de 2024	SEMANA No.	60	DEL	27/08/2024	AL	31/08/2024

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

- A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades de construccion de placa huella, Instalacion de Sub base, Terraplen, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 100% acumulado del valor total Actualizado, el cual equivale a $$10.980.810.575 Va un porcentaje acumulado programado del 100% correspondiente a $10.980.810.575 reflejando un adelanto del 0%. Con respecto al valor contractual el contratista de Obras ha ejecutado 100% de acuerdo a la reprogramacion entregada ajustada con la fecha de finalizacion 31 de agosto de 2024.
- El contralista de obras en la presente semana realizo actividades de relleno con material de sub base para placa huella, construccion de mejoramiento de taludes de obras hidraulicas con concreto ciclopeo y construccion de placa huella.
- El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoria realiza seguimiento y control a dichas actividades.
- En la presente semana, el contratista de obra realizo actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia fundida de placa huella



Se evidencia fundida de placa huella



Se evidencia fundida de placa huella



Se evidencia fundida de placa huella

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT.: 22202151964 COR

ACTA FINAL

6828

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-032	02	02/07/2024

ACTA FINAL

CONTRATO No.	CMA-SPM-009-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSULTORES DONOVAN SAS
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($696.192.460,00).
ADICION N° 01	DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 203.586.836,00)
VALOR ACTUALIZADO	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($899.779.296,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL DE INICIAL	22 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1:	10 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°01:	2 DE JUNIO DE 2023 (1 MES ADICIONAL)
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	30 JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N°2	18 JULIO DE 2023
ADICION N1 Y PRORROGA N°02:	19 DE JULIO DE 2023 (3 MESES ADICIONALES)
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN PRORROGA N° 2:	20 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA SUSPENSION N° 3:	20 DE OCTUBRE 2023
FECHA AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 3	03 DE NOVIEMBRE DE 2023

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6829

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-032	02	02/07/2024

FECHA AMPLIACION N° 2 A LA SUSPENSION N° 3	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACION N° 3 A LA SUSPENSION N° 3	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 3	11 DE MARZO DE 2024
PRORROGA N° 03	11 DE MARZO DE 2024 (03 MESES ADICIONALES)
FECHA DE SUSESPENSION N°4	7 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE REINCIO N°4	27 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA FINAL	31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DEL ACTA FINAL	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Montería, a los dos (2) días de septiembre del año 2024, se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSULTORES DONOVAN SAS**, representado legalmente por **ROSA CORDERO CELIS**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad de supervisor y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR HERNANDEZ NOVOA**, con el propósito de dejar constancia del recibo final de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. Que mediante la suscripción de la presente Acta Final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. Que, una vez revisado el informe final por parte del supervisor, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-032	02	02/07/2024

3. Con la suscripción de la presente acta el contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por la firma **CONSULTORES DONOVAN SAS**.

4. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cuales debe presentar para aprobación.

5. El valor de restante por cobrar corresponde a la suma de $ 90.794.455,00 de conformidad al siguiente Balance financiero:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato	$ 696.192.460,00		
Valor Adición 1	$ 203.586.836,00		
Acta parcial 1		$ 270.023.767,00	OP 23007084 de fecha 21-12-2023
Acta parcial 2		$ 228.184.029,00	OP 24003481 de fecha 25-07-2024
Acta parcial 3		$ 310.777.045,00	EN TRAMITE
Saldo por ejecutar		$ 90.794.455,00	
BALANCE	$ 899.779.296,00	$ 899.779.296,00	

6. El interventor CONSULTORES DONOVAN SAS manifiesta que, dado que en el acta final del contrato de obra LP-SPM-012-2022, el cual es objeto de interventoría, se estableció un listado de faltantes, reparaciones y observaciones a cargo del contratista de obra, razón por la cual la interventoría realizará el seguimiento respectivo a la subsanación de los pendientes que se encuentran relacionados en el acta de inspección de obra de fecha 30 de agosto de 2024, con el objetivo de hacer cumplir a cabalidad el objeto contractual y así recibir a satisfacción total el proyecto.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6631

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-032	02	02/07/2024

Nota: Se suscribe la presente acta en fecha dos (02) de septiembre de 2024, por ser el día hábil posterior a la fecha de finalización del contrato.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

ROSA CORDERO CELIS
Nombre Rep. Legal

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

VICTOR MANUEL HERNANDEZ
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Iván Alviz G.

Revisó: Raúl Doval – Abogado SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

PÓLIZA Y APROBACIÓN

- Acta Final

6832

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3413175-4		15982716
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LUAL SEGUROS LTDA.	34493	2615	01215982716

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9006443519	CONSULTORES DONOVAN S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
TV 27 # 57 19		BOGOTA D.C.	3516772

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9006443519	CONSULTORES DONOVAN S.A.S

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8000967341	MUNICIPIO DE MONTERIA

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	02-SEP-2024	02-SEP-2029	89.977.929,60	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-SEP-2022	03-MAR-2025	89.977.929,60	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22-SEP-2022	02-SEP-2027	89.977.929,60	-1,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A DEVOLVER
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
22-SEP-2022	02-SEP-2029	1816	12-SEP-2024	02-SEP-2029	$-1	$-0	$1

VALOR A DEVOLVER EN LETRAS
UN PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON DEVOLUCION DE PRIMA	$0	$620.391	$179.955.859,20

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2615	1001390	16	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
34493	LUAL SEGUROS LTDA.	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	-1

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO CMA-SPM-009-2022.
SEGÃ□N CONTRATO DE INTERVENTORÃ□A NO. CMA-SPM-009-2022. REALIZAR LA INTERVENTORIA
TÃ□CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÃ□N DE PLACA HUELLA EN LA VÃ□A DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÃ□A.
LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRÃ□ UNA VIGENCIA DE 5 AÃ□OS, A PARTIRDEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE PROCEDE A ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS DE LAS COBERTURAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6833

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3413175-4		15982716
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LUAL SEGUROS LTDA.	34493	2615	01215982716

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9006443519	CONSULTORES DONOVAN S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
TV 27 # 57 19		BOGOTA D.C.	3516772

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA LA POLIZA, SEDA CONOCIMIENTO AL ACTA DE SUSPENSION CON FECHA 29/12/2022 Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A ACTA DE REINICIO CON FECHA 10/03/2023 .LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGENCIA.

****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y DE ACUERDO A LA PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 1 MES Y ASI MISMO SE AJUSTAN LAS GARANTIAS TAL COMO SE DETALLA EN LA SECCION DE AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGENCIA.

**********POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE I NTEGRAL DE LA POLIZA Y DE ACUERDO A ACTA DE REINICIO NO. 2 SE AJUSTAN LAS GARANT IAS, TAL COMO SE DETALLA EN LA SECCION DE AMPAROS.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICION ES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGENCIA.

****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y DE ACUERDO A LA ADICION NO. 1 Y PRORROGA NO. 2 AL CONTRATO, SE AUMENTA EL VALORDEL CONTRATO A $ 899.779.296,00, SE PRORROGA LA VIGENCIA CONTRACTUAL HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2023 Y ASI MISMO SE AJUSTAN LAS GARANTIAS, TAL COMO SE DETALLA ENLA SECCION DE AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGENCIA.

****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA, SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO CORRESPONDE A 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

**********POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PART E INTEGRAL DE LA POLIZA Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION NO. 3 SUSCRITA ENTREL AS PARTE CON FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2023, SE AJUSTAN LAS GARANTIAS, TAL COMO SE DETALLA EN LA SECCION DE AMPAROS.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN ENVIGENCIA.

****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y DE ACUERDO AL ACTA DE AMPLIACIÓN NO. 1 DEL ACTA DE SUSPENSION NO. 3 SUSCRITA ENTRE LAS PARTE CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MISMA.

****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y DE ACUERDO AL ACTA DE AMPLIACIÓN NO. 2 DEL ACTA DE SUSPENSION NO. 3 SUSCRITA ENTRE LAS PARTE CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MISMA.

****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y DEDE ACUERDO A ACTA DE REINICIO NO 3 FIRMADA EL 11 DE MARZO DEL 2024 Y OTRO SI NO 3, SE PRORROGA EL TERMINO DE LA VIGENCIA POR 3 MESES, QUEDANDO HASTA EL 11 DE JUNIO
DEL 2024 Y ASI MISMI SE AJUSTAN LAS GARANTIAS, TAL COMO SE DETALLA EN LA SECCION
DE AMPAROS
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGENCIA.

****

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y DE

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

6834

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
BOGOTA D.C., 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3413175-4		15982716
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
LUAL SEGUROS LTDA.	34493	2615	01215982716

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9006443519	CONSULTORES DONOVAN S.A.S		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
TV 27 # 57 19		BOGOTA D.C.	3516772

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

ACUERDO A ACTA DE SUSPENSION NO 4 FIRMADA EL 07 DE JUNIO DEL 2024 SE DEJA CONTANCIA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONCIMIENTO DE LA MISMA Y DE LA SUSPENSION DELAS ACTIVIDADES HASTA QUE SEA SUSCRITA EL ACTA DE REINICIO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGENCIA.

****


POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA Y DE ACUERDO A ACTA DE REINICIO NO 4 FIRMADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS, TAL COMO SE DETALLA EN LA SECCION DE AMPAROS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGENCIA.

****

SEGUN ACTA FINAL DE OBRA DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE DEJA CONSTANCIADE LA TERMINACION DEL CONTRATO Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6835

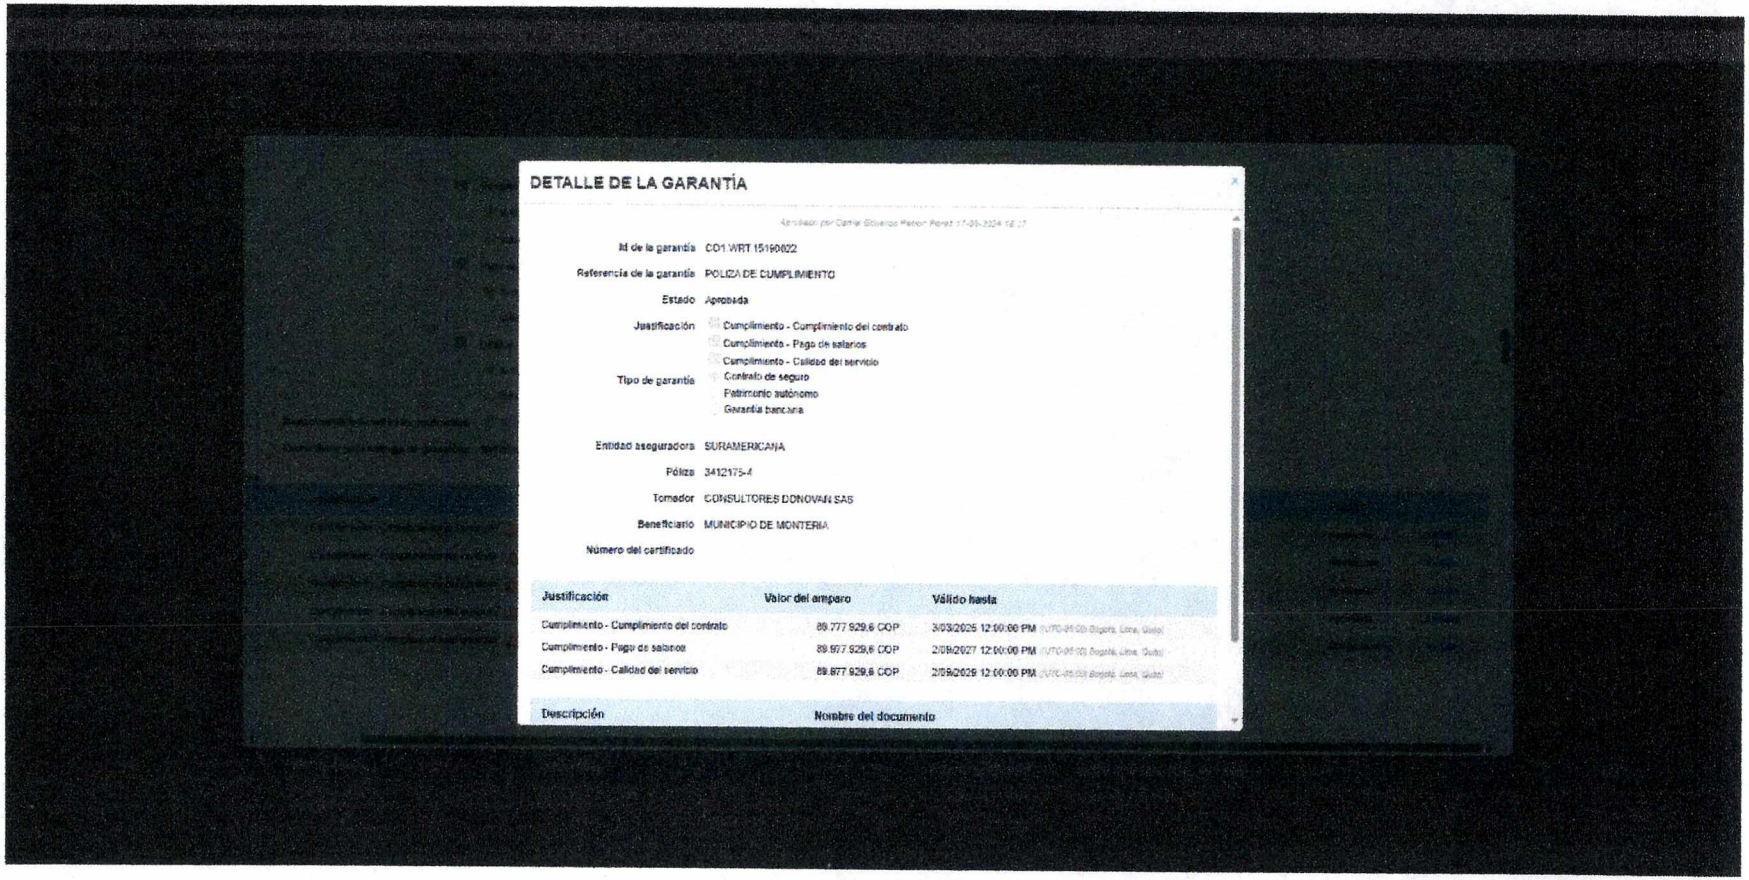

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Carrie Silveros Peter Perez 17-09-2024 16:17

Id de la garantía	CO1.WRT.15190802
Referencia de la garantía	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
Estado	Aprobada
Justificación	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Calidad del servicio
Tipo de garantía	Contrato de seguro Patrimonio autónomo Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SURAMERICANA
Póliza	3412175-4
Tomador	CONSULTORES DONOVAN SAS
Beneficiario	MUNICIPIO DE MONTERIA
Número del certificado	

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	89.877.929,6 COP	3/03/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Cumplimiento - Pago de salarios	89.877.929,6 COP	2/09/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Cumplimiento - Calidad del servicio	89.877.929,6 COP	2/09/2029 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Descripción	Nombre del documento
