ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

ACTA DE SOCIALIZACIÓN No 3

CONTRATO: 098 de 2025	
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".	
FECHA: 06/02/2026	OBJETO DEL ACTA: Socializar con actores sociales, entes municipales, líderes y comunidad el avance actual del proyecto.

DESARROLLO:

Se realizó la socialización del contrato 098-2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" en el salón social del barrio cristal bajo, entre la comunidad, ediles de comuna, presidente de la junta de acción comunal, el contratista de obra civil, el contratista de interventoría y personal de la supervisión; en donde se realizó una presentación del avance actual del proyecto, las obras realizadas a la fecha, los ajustes realizados a los diseños y se mencionó la proyección de un posible adicional teniendo en cuenta lo necesario para garantizar la estabilidad de las obras realizadas y los recursos invertidos, esto, debido a las emergencias generadas por lluvias y socavación.













ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

CONSORCIO ASESORÍA LEWIS ROJAS

ASISTENTES:

NOMBRE	ÁREA / CARGO	CEDULA	FIRMA
Mauricia Garcia		27936409	
Benjamin Cohog		19419920	
Heliberto Murillo T		91756764	
Elio Rincón		13842226	
Martha Navarro		63503382	
enoxa tulio Carvajal		57[illegible]696	enoxa tulio Carvajal
Nancy Palacedo M.		63151710 4.	Nancy Palacedo M
Mirian Bohorquez		27931713.	Mirian Bohorquez
Rosalbina Bohorquez		28072548.	Rosalbina Bohorquez
Hery Molina.		52159132	Hery Molina
Luz Marina Martinez		63'359522	Luz M Martinez
Cenaida Avila		37807373	Cenaida
Maria del Carmen Diaz		37813277.	.
Nicole yorley Martinez S.		1005260941	Nicole M S.
Nuri Ruiz		8279476	
Eva Romero		63306263	Eva Romero
Kellyn Gonzalez		1098721600	Kellyn Gonzalez.
Avelino Blanco		91239031	Avelino Blanco
Maria del Carmen Rueda		37813277	

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

CONSORCIO GESTIÓN LEWIS ROJAS

ASISTENTES:

NOMBRE	ÁREA / CARGO	CEDULA	FIRMA
MARIA LUDY GOMEZ		63.319.432	MARIA LUDY GOMEZ
HELENA SUELTA MARTINEZ		28.608.955	HELENA SUELTA MARTINEZ
MERCEDES ROMERO R		63.485.038	MERCEDES ROMERO R
Vale Rojas		2848770	Vale Rojas
Maria A. Pico.		63 284 255	Maria Antonia
Carlos L. Trejos.	Consorcio Lewis Rojas	13.460.411	
Dayana C. Arenas Bayona	Apoyo Supervisión Sec. Infra Alc Bga.	1007402713	Dayana A.
OSCAR JULIAN CARRILLO.	UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	1095828196.	
Laura Ortegui	Trabajadora Social - contratista obra	1098775093	Laura Ortegui S.
Fernando Mau	Apoyo Sup - Alc Bga	91.536.951	
Andres Pulido	Supervisor Lewis	91133754	
Horacio Sanabria		1115732809	Horacio Sanabria
Ines Quintero		37831965	Ines Quintero
Leidy Johanna R.		37.513.643	Leidy Johana R.
Lizeth nayibe E.		37.843.873	
sergio Andres		1094238809	Sergio Andres
Lukas Sára Lastián	Residente de Interventoria	1095816002	
Nicolas Quintero	Residente de obra	1095835076	

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

CONSORCIO GAVIONES
LEWIS ROJAS

ACTA N°: 12

CONTRATO: 098 de 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN EL BARRIO CRISTAL BAJO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

FECHA: 27/11/2026	**OBJETO DE REUNIÓN:** Visita de obra.

DESARROLLO:

Se reúnen el consorcio INTER GAVIONES FZ (Interventoría), CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS (Contratista de obra), y el Ing Wilson Motta Rodríguez (supervisión), cada uno con sus equipos de profesionales y de apoyo, con el fin de realizar el presente comité técnico de obra en donde se realiza recorrido de obra con el fin de evidenciar el avance de la obra, las actividades en ejecución y actividades próximas a iniciar, revisión de los diferentes componentes como Seguridad y salud en el trabajo, actividades de componente estructural y de componente geotécnico y mesa de trabajo para presentar el avance financiero a la fecha y un recuento de las actividades realizadas en el periodo.

Una vez realizada la visita de campo y la mesa de trabajo se evidencia lo siguiente.

- El contratista de obra presenta a la supervisión la necesidad de realizar obras adicionales a las contratadas contractualmente, con el fin de proteger en su totalidad la obra realizada y los recursos invertidos, debido a las diferentes emergencias ocasionadas por las lluvias que dejan expuestas las obras existentes.
- Por parte de la supervisión solicita al contratista de obra realizar una socialización con la comunidad para informar acerca del avance de la obra a la fecha y la proyección del adicional que se pretende solicitar.
- Realizar un concepto técnico por parte del contratista para entregar a la interventoría y así mismo a la supervisión del estado actual de los gaviones existentes en la parte final del proyecto, para así sustentar la necesidad de demolición de los mismos o apoyar la conservación de estos.
- Por parte de la supervisión se solicita toda la información del componente ambiental, requerida para los trámites con la alcaldía de Floridablanca y posteriormente con la autoridad ambiental competente (CDMB).

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	CONSORCIO VIALES LEWIS ROJAS

COMPROMISOS

- Realizar el balance adicional de las obras requeridas junto con sus planos de diseño, memorias de cantidades, ítems no previstos y análisis de precios unitarios para ser entregados a la interventoría y posteriormente a la supervisión para validar la viabilidad del adicional y corroborar la información entregada por el contratista de obra.
- Realizar la socialización con la comunidad el día viernes 6 de febrero. (Contratista de obra).
- Realizar concepto técnico para validar el estado de los gaviones existentes en la parte final del proyecto. (Contratista de obra).
- Entregar el inventario forestal, coordenadas, mapa y demás información ambiental para los trámites con las entidades mencionadas.

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

CONSORCIO GOBIERNO LEWIS ROJAS

ASISTENTES:

NOMBRE	ÁREA / CARGO	CEDULA	FIRMA
Wilson Botta R	Supervisor de Inf	8.[illegible]498	
Fernando Mila M	Apoyo Sup Alcaldía	91503951	
Alejandra Saavedra	Infraestructura	1096951560	
Luis Fernando Quintero F	Apoyo Supervisión Alcaldía	13.862.036	
Wendy Poveda	Seguridad y Salud en	1095781913	
Nubes Dulce	Supervisor Obra	91337217	
Carlos Trejos B	Salud Ocupacional	13.410.411	
Germán Martínez G	Geotecnista.	13'510.452	
Hugo Sinisterra Cairo	Apoyo al Ing Mutta Sec. Infraestructura	91.230.784	
Néstor Jaime O.	Director interventoría	Interventoría	
Oscar Mauricio Ayala	Director obra	13'727.007	
Jeyson A. Vera Ucan.	Geotécnista - Interv.	1.098.700.183	
Neira María Sandoval	Esp Estructuras - Interv.	1.102.379.674	
Laura Juliana Ocstegui	Trabajadora Social - obra	1098775095	
Rafael M Senegal A	Estructural Obra	13882165	
Nicolas Quintero	Residente de obra	1095835076	
Lukas Gómez Laytón	Residente de Interv	1095816002	

"INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

INFORME QUINCENAL NO. 9

PERIODO DE INFORME: del 20 de diciembre del 2025 al 23 de enero de 2026

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA



Información General del Contrato de Interventoría

Contrato de Interventoría:	No. 132 – 25 de Junio del 2025
Fecha de Inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación :	27 de febrero de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTER FZ-AGLV
Valor Inicial :	$ 485.158.855,00
Plazo Inicial :	07 meses
Plazo transcurrido a la fecha:	179 días
Plazo restante	35 días
Valor anticipo:	No aplica.



Información General del Contrato de Obra

Contrato de obra:	098 – 10 de junio del 2025
Fecha de Inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación :	27 de febrero de 2026
Contratista:	CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS
Valor Inicial :	$ 5.277.464.143,00
Plazo Inicial :	07 meses
Plazo transcurrido a la fecha:	179 días
Plazo restante	35 días
Valor anticipo:	$ 1.583.239.242,90

EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025

EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025					
No.	PERIODO	Vr. EJECUTADO	% EJECUTADO	Vr. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1	28 JUL 25 – 10 AGO 25	$ 45.153.184	0,86%	$ 45.153.184	0,86%
2	11 AGO 25 – 31 AGO 25	$ 436.739.494	8,27%	$ 481.892.678	9,13%
3	01 SEP 25 – 14 SEP 25	$ 498.032.407	9,44%	$ 979.925.085	18,57%
4	15 SEP 25 – 05 OC 25	$ 862.989.410	16,35%	$1.842.914.495,00	34,92%
5	06 OC 25 - 26 OC 25	$ 575.467.036,00	10,90%	$ 2.418.381.531	45,82%
6	27 OC 25 – 09 NOV 25	$ 244.207.197,00	4,63%	$ 2.662.588.728	50,45%
7	10 NOV 25 – 23 NOV 25	$ 908.677.258	17,22%	$3.571.259.986	67,67
8	24 NOV 25 – 20 DIC 25	$ 712.457.659	13,5%	$ 4.283.717.645	81,17%
9	21 DIC 25 – 23 ENE 25	$ 473.916.280	8,98%	$ 4.757.633.925	90,15%

VALOR POR EJECUTAR	**$ 519.830.218**
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**9,85%**


Flujo de inversión mensual- Contrato de obra No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO
AGO	$ 395.235.066,59	$ 481.892.678,00
SEP	$ 1.168.100.181,00	$ 1.653.863.929,00
OCT	$ 2.279.084.888,16	$ 2.533.466.724,00
NOV	$ 3.601.890.812,16	$ 4.000.317.820,31
DIC	$ 4.198.641.966,16	$ 4.283.717.644,87
ACTUAL	$ 4.821.842.077,16	$ 4.757.633.925,25
ENE	$ 4.962.239.605,16	
FEB	$ 5.277.464.143,00	

Contratista presenta la re programación de obra el día 15 de septiembre del 2025.

Flujo de inversión semanal- Contrato de obra No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025

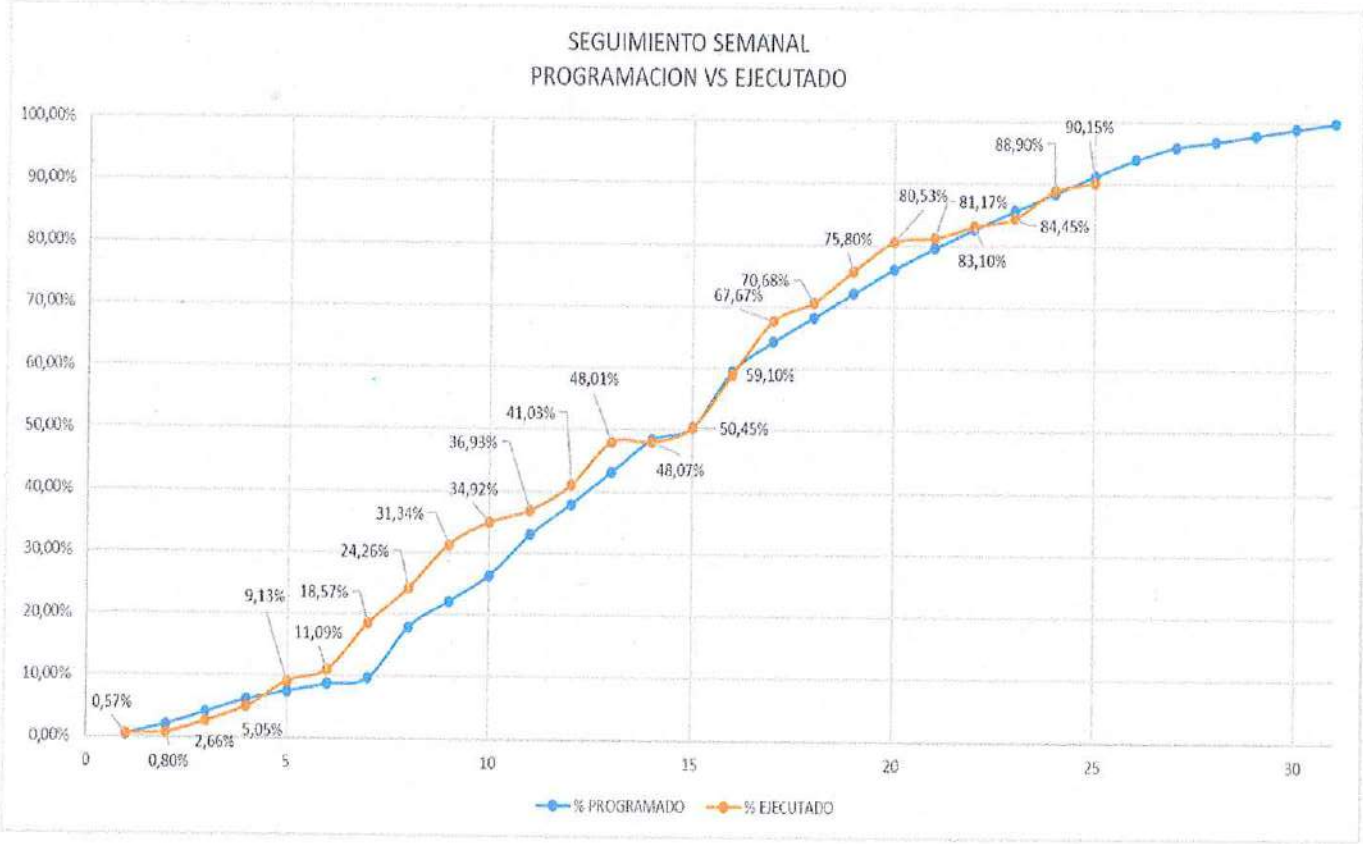

SEMANA	% EJECUTADO	SEMANA	% EJECUTADO
SEMANA 1	0,57%	SEMANA 17	67,67%
SEMANA 2	0,80%	SEMANA 18	70,68%
SEMANA 3	2,66%	SEMANA 19	75,80%
SEMANA 4	5,05%	SEMANA 20	80,53%
SEMANA 5	9,13%	SEMANA 21	81,17%
SEMANA 6	11,09%	SEMANA 22	83,10%
SEMANA 7	18,57%	SEMANA 23	84,45%
SEMANA 8	24,26%	SEMANA 24	88,90%
SEMANA 9	31,34%	SEMANA 25	90,15%
SEMANA 10	34,92%	SEMANA 26	
SEMANA 11	36,93%	SEMANA 27	
SEMANA 12	41,03%	SEMANA 28	
SEMANA 13	48,01%	SEMANA 29	
SEMANA 14	48,07%	SEMANA 30	
SEMANA 15	50,45%	SEMANA 31	
SEMANA 16	59,10%		

PERSONAL VINCULADO Contrato de Contratista No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Oscar Mauricio Rojas Camargo	13.722.077	Director de Obra	28/07/2025	-
Deibys Nicolas Quintero Gómez	1.095.835.076	Residente de Obra	28/07/2025	-
Rafael Matías Senegal Alemán.	13.887.165	Especialista Estructural	28/07/2025	-
German Augusto Martínez Gómez	13.510.452	Especialista en Geotecnia	28/07/2025	-
Carlos Alberto Trenjo Betancur	13.460.411	Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	28/07/2025	-
Lyda Yaritza Quintana Quintana	1.098.751.290	Profesional Social	28/07/2025	26/08/2025
Laura Orostegui Sastoque	1.098.755.095	Profesional Social	27/08/25	

PERSONAL VINCULADO Contrato de Contratista No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025

CARGO	CANTIDAD
AYUDANTE	22
OFICIAL	4
AUXILIAR DE TRANSITO	1
MAESTRO	1
OPERADOR	1
TOPOGRAFO	1
TOTAL	30

PERSONAL VINCULADO Contrato de Interventoría No. 132-25 DE JUNIO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ	1.095.816.909	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	28/07/2025	
LUKAS GOMEZ LAYTON	1.095.816.002	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	28/07/2025	
NEIRA MARIA SANDOVAL GUERRERO	1.102.379.674	PROFESIONAL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	28/07/2025	
JORGE ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ	91.480.796	PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	28/07/2025	26/08/25
JEISON ANDRES VERA VIANA	1.098.700.183	PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	27/08/2025	
WENDY KATHERINE POVEDA BERBEO	1.095.787.913	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	28/07/2025	
YEIMY NATHALIA FONSECA CABRERA	1.102.381.897	PROFESIONAL SOCIAL	28/07/2025	26/08/25
ANGELLA PAOLA ROA URIBE	1.098.677.485	PROFESIONAL SOCIAL	27/08/2025	
FABIO ENRIQUE PINZON HERNANDEZ	1.098.697.723	TOPOGRAFO	28/07/2025	
DIEGO EDINSON QUINTANA QUINTANA	1.098.772.771	CADENERO	28/07/2025	

ACTIVIDADES TECNICAS

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PERIODO	
1.1	REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA OBRA.
2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO.
2.2	EXCAVACIONES EN MATERIAL GRANULAR A CUALQUIER PROFUNDIDAD.
2.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG (INCLUYE ACARREO).
2.4	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) (INCLUYE CONFORMACION DE BOTADERO).
2,5	CONFORMACION ESTRUCTURA DE JARILLON.
3.2.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa.
4.2	CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI (35% RAJON, 65% CONCRETO 3500 PSI).
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA GEOTEXTIL NT-2500.
5.1	GAVIONES CON MALLA TRIPLE TORSIÓN C12.
5.2	DENTELLÓN TRANSVERSAL
5.3	DEMOLICIÓN DE GAVION EXISTENTE.

ACTIVIDADES HSEQ

- Se realizó la inducción a los trabajadores nuevos.
- Se ha realizado la entrega de dotación y reposición de elementos de protección personal
- Se realizaron capacitaciones por parte de la ARL.
- El personal de obra se encuentra correspondiente afiliado a seguridad social y parafiscales.
- Se realizan pre operacionales de maquinaria en obra.
- Se implementaron medidas de orden y aseo en áreas de trabajo y campamentos, con disposición de puntos ecológicos, baños y zonas de descanso.
- Se han realizado diferentes charlas con el personal por parte de los profesionales.

ACTIVIDADES HSEQ





ACTIVIDADES AMBIENTALES

- Se realizan trabajos de reposición de cerramiento en lona verde, así como asegurado de parales en madera.
- Se evidencia que el contratista de obra cuenta con punto ecológico, así como con baño portátil.
- Se cuenta con señalética interna preventiva como informativa.
- Se ha revisado evitar vertimientos a la quebrada de líquidos como residuos de concreto, aceites o combustibles.
- El contratista de obra cuenta con correcto almacenamiento de combustible para la maquinaria.
- Retiro de volquetas con materiales provenientes de la obra completamente carpadas.
- Se realizó visita por parte de la unidad de gestión de riesgo del municipio de Floridablanca.
- Por parte del contratista realizaron levantamiento de especies arbóreas en el sector de caracolíes la cual se radicara ante la CDMB para su respectivo tramite.

ACTIVIDADES AMBIENTALES



Limpieza de Baño portátil.



Llegada de materiales.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Lluvias presentadas.



Lluvias presentadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Lluvias presentadas.



Lluvias presentadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Recubrimiento en concreto.



Recubrimiento en concreto.

REGISTRO FOTOGRAFICO




Rellenos.



Instalación de manto geotextil.

REGISTRO FOTOGRAFICO

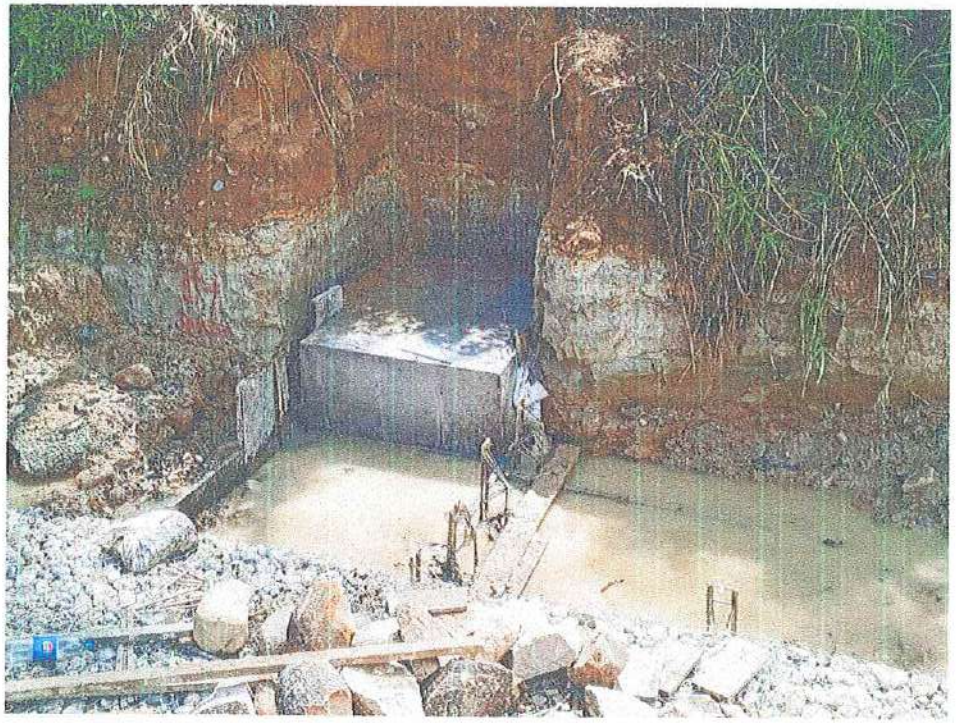

Fundida de dentellón transversal.



Fundida de dentellón transversal.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción de gaviones.



Construcción de gaviones.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Enrocado.



Lluvias presentadas.

CONCLUSIONES

- Por parte de los profesionales de obra e interventoría, se han realizado visitas al sitio de obra, con el fin de dar seguimiento a las actividades realizadas.
- La presente interventoría ha llevado seguimiento al personal de obra con el uso de elementos de protección personal.
- El contratista de obra ha realizado trabajos de armado de gaviones e instalación de geotextil y fundida de recubrimiento.
- Se han presentado lluvias que han provocado crecimiento en el nivel de la quebrada Cuellar, afectando los trabajos realizados.
- Se adelantaron trabajos de relleno de material en sector posterior de gaviones.
- Se han presentado bajos rendimientos con respecto a meses anteriores, esto debido a las festividades de fin de año, sumado a las constantes lluvias presentadas a inicio del presente año.
- Se mantiene una cultura preventiva activa, con seguimiento continuo al uso de EPP, manejo ambiental responsable y disposición adecuada de residuos y servicios básicos en obra.
- Por parte del contratista se realizó visita de forestal, con el fin de realizar el inventario forestal de especies y de esta manera continuar con el tramite ante la entidad.
- Se ha consultado con DTTB la necesidad de realizar reuniones de socialización de la ejecución del PMT, pero estas no han sido solicitadas por la entidad.

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

Gracias

"INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN EL BARRIO CRISTAL BAJO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER".

INFORME QUINCENAL NO. 10

PERIODO DE INFORME: del 27 de enero del 2026 al 06 de febrero de 2026

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA



Información General del Contrato de Interventoría

Contrato de Interventoría:	No. 132 – 25 de Junio del 2025
Fecha de Inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación :	27 de febrero de 2026
Contratista:	CONSORCIO INTER FZ-AGLV
Valor Inicial :	$ 485.158.855,00
Plazo Inicial :	07 meses
Plazo transcurrido a la fecha:	194 días
Plazo restante	20 días
Valor anticipo:	No aplica.



Información General del Contrato de Obra


Contrato de obra:	098 – 10 de junio del 2025
Fecha de Inicio:	28 de julio de 2025
Fecha de terminación :	27 de febrero de 2026
Contratista:	CONSORCIO GAVIONES LEWIS ROJAS
Valor Inicial :	$ 5.277.464.143,00
Plazo Inicial :	07 meses
Plazo transcurrido a la fecha:	194 días
Plazo restante	20 días
Valor anticipo:	$ 1.583.239.242,90

EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025

EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025					
No.	PERIODO	Vr. EJECUTADO	% EJECUTADO	Vr. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1	28 JUL 25 – 10 AGO 25	$ 45.153.184	0,86%	$ 45.153.184	0,86%
2	11 AGO 25 – 31 AGO 25	$ 436.739.494	8,27%	$ 481.892.678	9,13%
3	01 SEP 25 – 14 SEP 25	$ 498.032.407	9,44%	$ 979.925.085	18,57%
4	15 SEP 25 – 05 OC 25	$ 862.989.410	16,35%	$1.842.914.495,00	34,92%
5	06 OC 25 - 26 OC 25	$ 575.467.036,00	10,90%	$ 2.418.381.531	45,82%
6	27 OC 25 – 09 NOV 25	$ 244.207.197,00	4,63%	$ 2.662.588.728	50,45%
7	10 NOV 25 – 23 NOV 25	$ 908.677.258	17,22%	$3.571.259.986	67,67
8	24 NOV 25 – 20 DIC 25	$ 712.457.659	13,5%	$ 4.283.717.645	81,17%
9	21 DIC 25 – 23 ENE 26	$ 473.916.280	8,98%	$ 4.757.633.925	90,15%
10	23 ENE 26 – 07 FEB 26	$ 177.850.542	3,37%	$ 4.935.484.467	93,52%

VALOR POR EJECUTAR	**$ 341.979.677**
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**6,48%**


Flujo de inversión mensual- Contrato de obra No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025

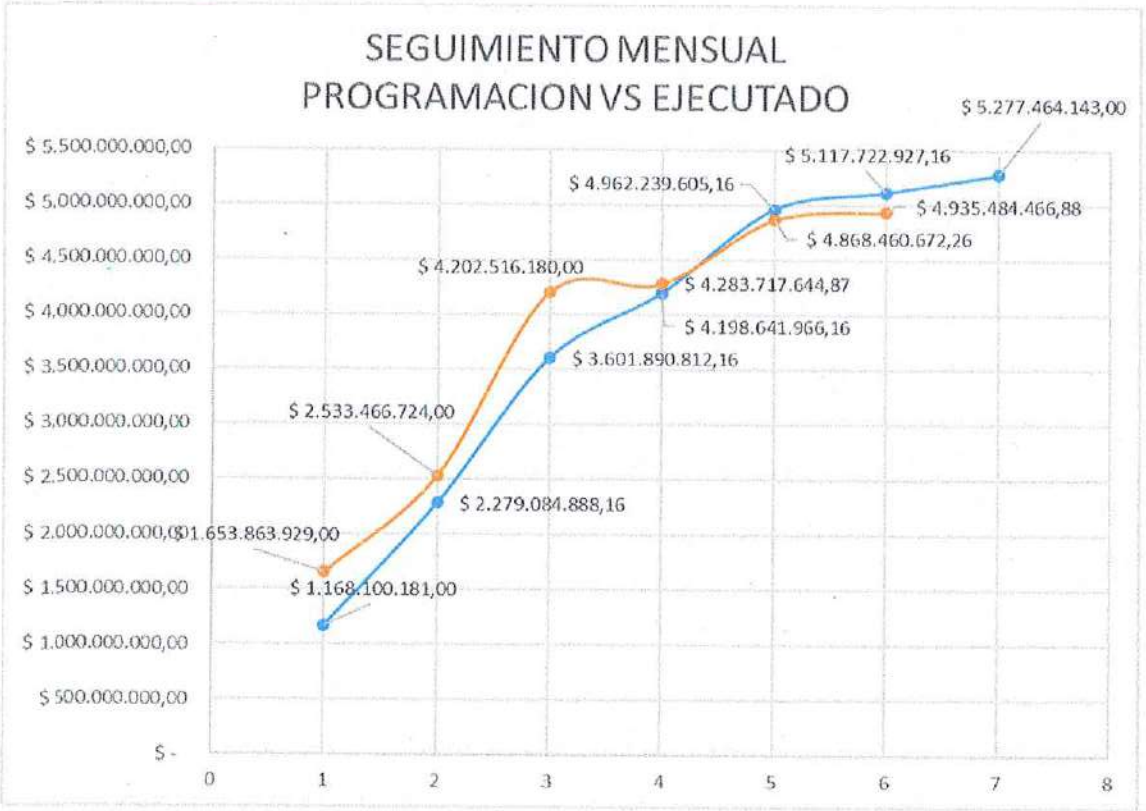

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO
AGO	$ 395.235.066,59	$ 481.892.678,00
SEP	$ 1.168.100.181,00	$ 1.653.863.929,00
OCT	$ 2.279.084.888,16	$ 2.533.466.724,00
NOV	$ 3.601.890.812,16	$ 4.202.516.180,00
DIC	$ 4.198.641.966,16	$ 4.283.717.644,87
ENE	$ 4.962.239.605,16	$ 4.868.460.672,26
ACTUAL	$ 5.117.722.927,16	$ 4.935.484.466,88
FEB	$ 5.277.464.143,00	

Contratista presenta la re programación de obra el día 15 de septiembre del 2025.

Flujo de inversión semanal- Contrato de obra No. 098-10 DE JUNIO DEL 2025

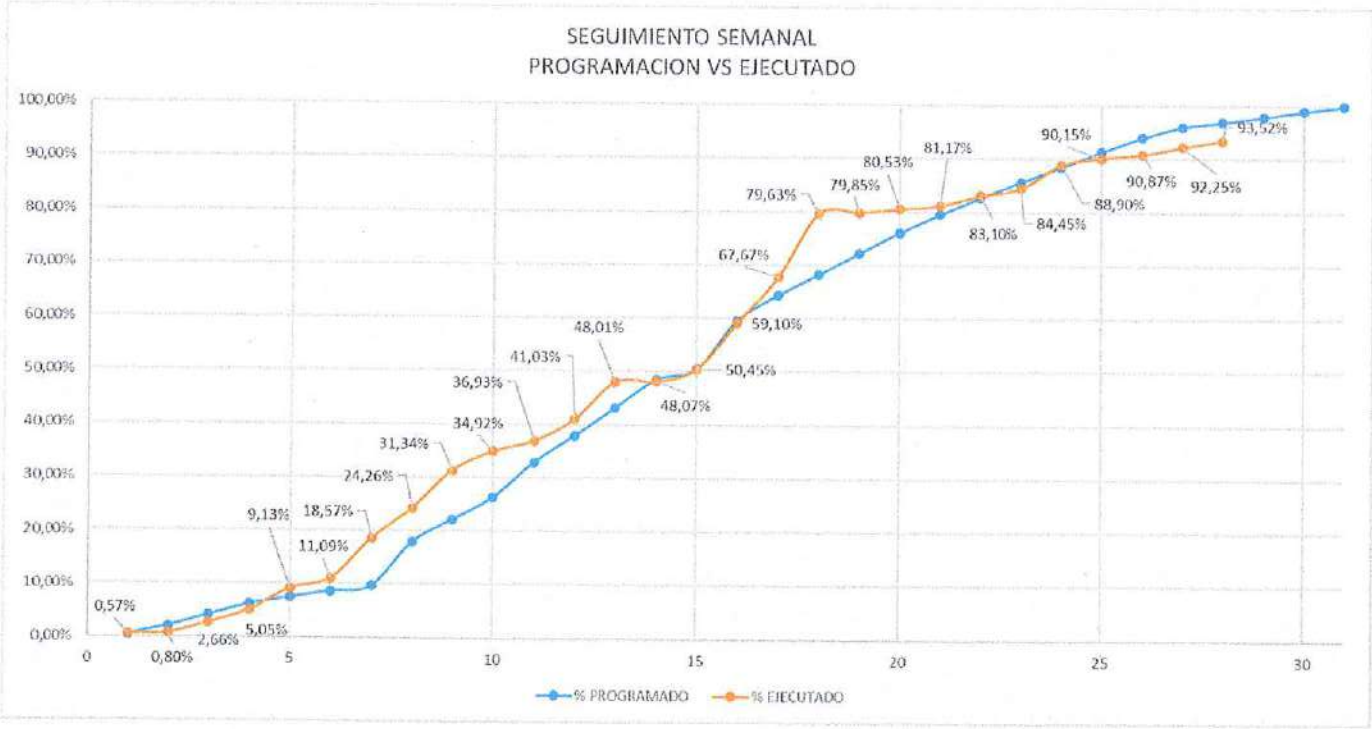

SEMANA	% EJECUTADO	SEMANA	% EJECUTADO
SEMANA 1	0,57%	SEMANA 17	67,67%
SEMANA 2	0,80%	SEMANA 18	79,63%
SEMANA 3	2,66%	SEMANA 19	79,85%
SEMANA 4	5,05%	SEMANA 20	80,53%
SEMANA 5	9,13%	SEMANA 21	81,17%
SEMANA 6	11,09%	SEMANA 22	83,10%
SEMANA 7	18,57%	SEMANA 23	84,45%
SEMANA 8	24,26%	SEMANA 24	88,90%
SEMANA 9	31,34%	SEMANA 25	90,15%
SEMANA 10	34,92%	SEMANA 26	90,87%
SEMANA 11	36,93%	SEMANA 27	92,25%
SEMANA 12	41,03%	SEMANA 28	93,52%
SEMANA 13	48,01%	SEMANA 29	
SEMANA 14	48,07%	SEMANA 30	
SEMANA 15	50,45%	SEMANA 31	
SEMANA 16	59,10%		
