Lunes 2 de Marzo 2026
Se inicia instalacion de Parales en Guaduas
Con el Replanteo y Perforacion de Muro
Sobre Calle 10. Se continua Con la
instalacion de Teja en el ala sobre
Carrera 3 y Al interior de Patio Fuga

Lunes 02 de marzo 2026
Total personal en obra (10) 6 Trabajadores de
instalación de cubierta, 4 Trabajadores del area adminis-
trativa, Se realiza charla de seguridad, pausas Activas,
Se Firman permisos de trabajo, ATS, inspecciones Preopera-
cionales, Se vigilan actividades de alto riesgo, se realiza
orden y Aseo // Paolacabatuz
Res 5554

Martes 03 de Marzo 2026
Se inicia instalacion de Parales sobre Calle 10 y sello de Huecos en Cubierta Bajo Plastico.
Se Continua con la Construccion de Estructura de Cubierta y Correas.
Se Continua instalacion de Teja en sector Carrera 3 y patio Interior

03 de marzo 2026
Total personal en obra (11) 7 Trabajadores del área de Instalación de Cubierta, 4 Trabajadores del área administrativa Se realiza Charla de seguridad, pausas-activas, Se Firman ATS, Inspecciones preoperacionales, permisos de trabajo, se vigilan actividades de alturas, no se presenten novedades, se vigilar Orden y Aseo, se realiza orden y Aseo, // Paolac

Paola Cabrera
Res SST

Miercoles 04 de Marzo 2026
Se inicia instalacion de Piede Amigos Pasarela sector Calle 10°
Estructura Cubierta en Cumbrera, Ala Camera 3 y instalacion de Teja.

04 de marzo 2026
Total personal en obra (11) 7 Trabajadores del área de instalacion de cubierta, 4 Trabajadores del área administrativa, Se realiza charla de seguridad, Pausas Activas, se Firman permisos de trabajo, ATS, Inspecciones Preoperacionales // Paolac

Residente SST

05 DE MARZO DE 2026

SE SOLICITA A LA SUPERVISORA DE LA FUGA ANDREA CASAS (VERBAL) EL TRASLADO DE DOS CAMARAS DE VIGILANCIA UBICADAS EN LA ESQUINA DEL BALCON UBICADO (calle 10 Hon 3). y EL BALCON OCCIDENTAL SOBRE LA CALLE 10. - SE LE INFORMA QUE PUEDEN SER REINSTALADAS BAJO LA GUADUA HORIZONTAL DE LA PASARELA

LA SUPERVISORA NOS INFORMA QUE REALIZA LA SOLICITUD

05/03/26

05de Marzo de 2026


SSTA: Total personal en obra (10) 6 Trabajadores del area de Instalacion de Cubierta, 4 Trabajadores del Area administrativa, Se realiza Charla de seguridad, pausas Activas, Se Firman Permisos de trabajo para tareas de alto riesgo, Inspecciones preoperacionales, ATS, Se Vigilan actividades de alto riesgo, se instala señalizacion PMT (por calle y por carrera), Se realiza Orden y Aseo en Area Interna y externa de la obra, No se presento novedad, no se presentan lluvias, 11 Paolaga

Paola Cabrera
Residente SSTA

06- de marzo 2026

-Durante el recorrido realizado en campo en donde se encuentran con interferencias para generar los parhos en los ejes D y G hacia la fachada en donde los puntos de apoyo se encuentran sobre puertas, lo que no se puede generar el apoyo sobre el muro. Por lo cual, se define con el Esp. en Estructuras el Ing. Andres Felipe Granados en el eje D desplazar el punto de apoyo hacia el vano de la puerta y redistribuir el apoyo siguiente hacia el eje E 80 cm lo que no repercute en el diseño propuesto lo que se genera un nuevo pie de amigo para la plataforma y garantizar la seguridad. En el eje G se mantiene el eje sobre la puerta, se propone generar un apoyo en Celosia generando apoyos en celosia. se debe tener cuidado con las redes electricas realizando una regata para

para no cruzar con redes.

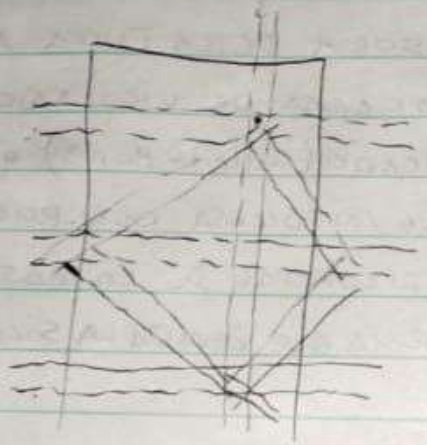

Andres L Granados M
Ing. Civil Especialista en Estructuras

Conformacion interna de Parales eje 7, 8, 9, 10, Carrera 10 en instalacion de Pie de AMIGOS.

Sabado 7 de Marzo 2026
se realiza instalacion de Correa de Pasarela en esquina balcon Calle 10 y 3 Aun nose Trasladan Camara por parte Fuga se deja el Vano. Para la el Retiro.

Sabado 7 de Marzo 2026
SSTA: Total Personal en obra (10) 6 Trabajadores del área de Instalacion de Cubierta, 4 Trabajadores del area administrativa, Se realiza pausas activas, Charla de Seguridad, se Firman permisos de trabajo en alturas, caliente, ATS, Inspecciones preoperacionales, se Ubica Senalizacion PMT, en Calle 10 y Cra 3, Se vigilan actividade de alto riesgo Se realiza Inspección Constante de epp y de spcc, se realiza orden y Aseo en obra y exterio de obra, no Se Presentan novedades, // Paolace

Paola Cabrera Ruge
Residente SSTA
Paolace

Lunes 9 de Marzo 2026
SSTA: Total personal en obra (9) 5 Trabajadores del área de instalación de cubierta, 4 Trabajadores del área administrativa, se realiza pausas activas, Charla de Seguridad, Se Firman pausas Activas, Charla de seguridad, se Firman Permisos de trabajo de tareas de alto riesgo, ATS, Inspecciones preoperacionales, se Ubica Señalización PMT; sobre calle 10 - Cr 3, Se vigilan actividades de alto riesgo, Se vigilan uso de EPP, orden y Aseo.
→ Clima: Se presenta precipitaciones fuertes de 10:00 - 12:00 se suspenden actividades en alturas por seguridad del personal // Paola CL

Paola Cabaleiro Rivera
Residente SSTA //

- Se Continua con la instalacion de Teja en el area Carrera 3 Realizando ajuste General de Tejas y limpieza con viruta y inmunizacion de Guaduas. Ajuste de Estructura y instalacion de Esterilla en el sector Pasarela Esquinera

-

Martes 10 de Marzo 2026
SSTA: Total personal en obra (9) 5 Trabajadores del area de instalacion de Sobrecubierta de guadua, 4 Trabajadores administrativa, se realiza pausas activas, charla de seguridad, se Firman permisos de trabajo en alturas, Caliente, Actividades de alto riesgo, Inspecciones preoperacionales, ATS, se instala (Reinos) señalizacion PMT sobre calle 10 - Cr 3, Se vigilan actividades de alto riesgo.
→ Clima: Se presenta lluvias, se suspende actividades de trabajo en altura por Seguridad del personal, llovio de 8:00am - 10:00am // Paola CL

Paola Cabaleiro Rivera

No se ha Realizado Traslado de Camaras de Seguridad No se ha realizado el dia de hoy, Se Continua Con Instalacion de esterilla, Se Continua la instalacion de estructura de Cubierta.
Se Continua con la limpieza de Guadua y Viruta e inmunizacion de Guadua.

Miercoles 11 de Marzo 2026
SSTA: Total personal en obra (9) 5 Trabajadores, de instaladores de guadua, cubierta, 4 Trabajadores del area administrativa, se realiza Charla de seguridad, pausas activas, se Firman permisos de trabajo de actividades de alto riesgo, ATS, inspecciones preoperacionales, Se Instala senalizacion PMT, se vigilan actividades de alto riesgo Se revisa Planilla de seguridad social del visitante "tecnico de camaras" se autoriza Ingreso, el visitante no realiza actividades de alto riesgo, se le realiza acompanamiento SST, se vigila la orden y Aseo, y actividades de alto riesgo
Clima: Se suspenden Actividades de trabajo en altura por seguridad de los trabajadores, debido a que precipita de 7:00 am - 10:00 am // Paolace

Paola Cabrera Rivera
Residente SSTA //

Se Continua la instalacion de Pie de Amigo En la Calle 10, Se Proyecta instalacion de Estructura de Guadua Para el dia Viernes zona Alta Calle 10 y el desmonte de Andamio Para Organizacion de Guadua Faltante, se Continua con la inmunizacion de Guadua y limpieza con Viruta.

Jueves 12 de marzo 2026
SSTA Total personal en obra (9) 5 Trabajadores del area de instalacion de Sobrecubierta, 4 Trabajadores administrativos, Se realiza Charla de seguridad, pausas Activas, Se Firman permisos de trabajo de actividades de alto riesgo, ATS, Inspecciones preoperacionales, se instala Señalizacion PMT, Se vigila Desarme de andamio, se vigila Organizacion en obra///
→ Clima: Se Suspenden actividades de trabajo en altos y alturas por Motivo de Clima, Se presenta lluvia constante de 2pm-03 a6pm, Por motivo de seguridad del personal///

Paola Cabrativa Rivera
Residente SSTA

Viernes 13 de marzo 2026
Se Realizan actividades de estructuracion de guadua en el Patio Central en los ejes E, F, G Con replanteo de Canecas y Posicionando Piedeamigos Fachada Plaz Calle 10a Armado de Andamios en Patio Central y acomodacion de Guadua existente y Pulida de Guadua Con Virutex en Humectacion de la misma.

Viernes 13 de marzo 2026
SSTA: Total personal en obra (9) 5 Trabajadores del área de instalación de Sobrecubierta, 4 Trabajadores del área de Administrativa, Se realiza Charla de seguridad, Pausas Activas, Se Firman Permisos de trabajo de Alturas y Caliente; Inspecciones Preoperacionales, ATS, Se instala señalización PMT, se vigilan actividades de alto riesgo, se vigila Orden y Aseo, Se realiza Inspección de EPP y SPCC Todo sin novedad,

Paola Cabrativa
Residente SSTA

Sabado 14-03-2026
Se termina la Tratamiento de Viruta y inmunizacion de la Guadua. el se continua con la estructuracion de los ejes E, F, G en el Patio Central e interior d sala de exposicion.

Sabado 14 de Marzo 2026
SSTA: Total personal en obra (9) 5 Trabajadores del área de Instalacion de sobrecubierta 4 Trabajadores del área de administrativa, Se realiza Charla de seguridad, Pausas Activas, se Firman permisos de trabajo en altura y Caliente, y demolición, ATS, Inspecciones Preoperacionales, se instala Señalizacion PMT, se vigilan actividades de alto riesgo, Se inspecciona epp-3pec // Paolace
Paola Cabiativa Rivera
Residente SSTA

Lunes 16
Instalacion de estructura Vertical de en los ejes E, F, G Dentro de salon de exposicion y
Se inicia el Relleno de Cantos Pasantes de la Guadua en intersecion, Se Continua con la Esterilla en la Pasarella sobre Calle 10

Lunes 16 de marzo 2026
SSTA: Total Persona en obra (9) 5 Trabajadores del área de Instalación de Sobrecubierta 4 Trabajadores del área administrativa, se realiza charla de seguridad, pausas Activas, Se Firman permisos de Trabajo de tareas de alto riesgo, Alturas, Caliente y demolición, ATS, Inspecciones preoperacionales, se instala señalizacion PMT en C1180-C13, Se realiza Induccion SSTA a personal nuevo //
Paola Cabiativa
Residente SSTA

Martes 17

Armado de Cerchar en ejes B, C, D, E. sobre ala sur Calle 10 Para Conformacion de estructura y Parte de las Correas internas del mismo sector en el eje B, C, D, E, Se Continua Con el Relleno de Canutos intervenidos Para Estructuracion de uniones.

Martes 17 de marzo 2026
SSTA. Total personal en obra (9) 5 Trabajadores del área de Instalacion de estructura enguadua para Sobrecubierta, 4 Trabajadores del área administrativa, Se realiza charla, Pausas Activas, Se instala PMT, Inspeccion de Andamios Residente SST

Miercoles 18 de Marzo 2026
Instalacion y Estructuracion de Guadua Sobre Cubierta y Pasarela,
Apertura de Orificios Cubierta Para Cruce de Guaduas en eje G.
Se Continua con la Rellenado de Canutos Para Conformacion de Uniones

Miercoles 18 de marzo 2026
SSTA. Total personal en obra (9) 5 Trabajadores del area de Instalacion de Sobrecubierta, 4 Trabajadores del area administrativa, Se realiza charla de seguridad, Pausas Activas, se Firman permisos de trabajo de tareas de alto riesgo ATS, Inspecciones preoperacionales, Se instala Señalizacion PMT en C11 $0-C13. Se realiza reunion con el comite de convivencia laboral (CCL) y COPASSST, Se realiza Simulacro de evacuacion hacia el punto de encuentro, se evacua con 11 Trabajadores, se incluye a 2 Trabajadores de interventoria.
→ Clima. Se presentan lluvias de 8:00am - 12:00pm y de 04:00 pm - 05:00 pm se suspenden actividades por seguridad

Jueves 19 de Marzo 2026
Se Continua Con la Conformacion de Estructura Pasarela y Cerchos sobre Calle 10, Se continua el llenado de Canutos en guadua Para estructuracion de Unionet, se Realizan Apturas dude de Asao General

Jueves 19 de Marzo 2026
SSTA: Total personal en obra (9) 5 Trabajadores del área de Instalación de Sobrecubierta, 4 Trabajadores del área de Administrativa, Se realiza charla de seguridad, pausa Activas, Se Firman permisos de trabajo de actividades de alto riesgo, Inspecciones preoperacionales, se instala Senalizacion PMT, se vigila orden y Aseo, Se vigilan actividades, se inspecciona uso de EPP y spec, no se presentan novedades // Paola Cabiativa
Residente SSTA

Viernes 20 de marzo 2026
SSTA: Total personal en obra, (9) 5 Trabajadores del área de instalacion de sobrecubierta, 4 Administrativos, se Realiza Charla de seguridad, Pausas Activas, se Firman permisos de trabajo de actividades de alto riesgo, Inspecciones preoperacionales, ATS, se instala Senalizacion PMT, Se vigilan EPP, SPEC, orden y Aseo, Se arregla Senalizacion, Se abrea camilla FEL, no se presenta novedades // Paola Cabiativa
Residente SSTA

Se Realiza instalacion de Estructura de Cubierta Sobre el ala Norte Calle 10 Se Realiza Arreglo de Piede aMigas eje F y G. se Realizo aseo General de Obra y zonificacion de Material.

Sabado 21 de Marzo 2026
SSTA Total personal en obra (9) 5 Trabajadores del Área de Instalación de Sobrecubierta 4 Administrativos, se Instala señalización PMT, se Realiza Charla de seguridad, se realizan pausas Activas, calistenia, se Firman permisos de trabajo ATS, Inspecciones preoperacionales, se vigilan Actividades de alto riesgo se visila uso de SSPCC y EPP. No se presenta Novedades // Paola

Paola Cabrera
Presidente SSTA

Lunes 23 de Marzo 2026 → Día Festivo

Martes 24 de Marzo 2026
SSTA: Total personal en obra (9) 5 personal en obra del area de estructera instaladores de estructura en guadua, 4 Trabajadores del área administrativos, Se realiza instalación de PMT, se realiza Charla de seguridad, pausas activas, Se Firman ATS, Inspecciones preoperacionales, se Firman permisos de trabajo de tareas de alto riesgo, se vigila uso correcto de EPP, y SPCC, se vigilan actividades de alto riesgo.
→ Clima Se presentan lluvias, de 2:00 pm - 05:00 pm, se suspenden actividades en altura pa motivos de seguridad //

Paola Cabrera Rivera
Presidente SSTA.

Se Realiza Impermeabilizacion de las bases de la Guadua con Brea, Posteriormente se Plasma la Estructura del Ala Sur En el patio Interior y se realiza el Vaciado de las Canoas en Concreto; Se continua Con la inmunizacion y virroteado de las Guaduas, Aseo General de Obra

Miercoles 25 de marzo 2026: Total personal en obra, (10) 6 Trabajadores del area de instalacion de estructura de guadua, 4 Trabajadores del area administrativa, Se realiza Charla de seguridad, Pausas Activas, Se Firma permisos de trabajo de tareas de alto riesgo, ATS, Inspecciones de Preoperacionales, Se instala senalizacion PMT por calle y por carrera, Se vigilan Actividades de alto riesgo uso de EPP y de SPCC, Se vigila orden y Aseo.

→ Clima: Se presentan lluvias de 1:00 pm - 03:00 - 03:40 - 05:00 pm se suspenden actividades de trabajo en alturas, por seguridad del personal

Se realiza la instalacion de Canales en la Parte Exterior y Se instalacion de Sobres, se continuan con el Armado de Estructura en Cerchas Calle 10 ala sur
Aseo General de Obra.
Perforacion y Vaciado de Canuto en interseccion de Guaduas

Jueves 26 de marzo 2026:
SST Total personal en obra (10) 6 Trabajadores del Área de Estructura de Guadua, 4 Trabajadores del area administrativa, Se realiza Charla de seguridad, Pausas Activas, Se Firman permiso de trabajo en alturas y Tareas de alto riesgo, ATS, Inspecciones Preoperacionales, Se insta Senalizacion PMT por calle y por carrera, Se vigilan actividades de alto riesgo, Uso de EPP y SPCC, Se vigila orden y Aseo.

→ Clima: Se presentan lluvias de 02:00 pm - 05:00 pm, se suspenden actividades en trabajo en alturas, por motivos de seguridad

Paola Cabrera
Presidente SSTA

-Instalacion de Canales en Calle 10 e instalacion de Soportes en el sitio Sugerido instalacion en Guadua de correas de Sector Ala sur Calle 10 Con su Respectivo Nivelacion y RePlanteo Ase General de Obra
Se inicia el Retane de Perforaciones en Cielo Rasos

Viernes 27 de marzo 2026
SSTA. Total Personal en obra (10) 6 Trabajadores del área de instalacion de sobrecubierta, 4 Trabajadores del area administrativa, se realiza charla de seguridad, Pausa Activa, se Firman Permiso de trabajo en altura, y Tareas de alto riesgo, ATS inspeccion preoperacionales, se instala senalizacion PMT por callejo, se vigilan actividades de alto riesgo, uso de epp, spcc se vigila orden y aseo.
Toda Cuadrilla
Residente SSTA

Se Continua con la instalacion de Correas sobre Ala sur Calle 10, se Inicia instalacion de Teja Sobre la Cubierta Terminada en la esquina sobre Carrera 3, se Raliza un Ajuste sobre las Columnas de la esquina en calle 10 con Carrera 3.
Aseo General de Obra.
Se Contina Reparacion en Cielo Raso

Sabado 28 de marzo 2026
SSTA: Total personal de obra (10) 6 Trabajadores del area de instalación de guadua, 4 Trabajadores del area de Administrativa, se Firman permiso de trabajo en altura, ATS, Inspeccion preoperacionales, se realiza, charla pausa Activa, se visita Tareas de alto riesgo, 11
Clima. 07:00 am - 09:00am y de 14:00 pm

se realiza la instalacion de una Correa Faltante sobre calle 10 Parcial Posterior instalacion de Teja en el Ala sur. quedando Pendiente el Remate de la Parte Contra el Auditorio Fuga el Cual se Programo Para dia Lunes, Para evitar el flujo de Personal en la Biblioteca

Lunes 30 de marzo - 2026
SSTA: Total Personal en obra (10) 6 Trabajadores del area de Instalación de guadua, 4 Trabajadores del area administrativa Se realiza Charla de seguridad, Pausas Activas, Se Firman permisos de trabajo en altura, Caliente, ATS, Inspecciones Preoperacionales, se instala Señalización PMT por calle 10.
→ Clima: Se presentan lluvias de 07:00 am - 9:00 am por tal motivo no se realizan actividades laborales en alturas durante ese tiempo por motivos de seguridad
→ del personal. Se presenta lluvias a la 04:00 pm - 00:00

Paola Cabrera Residente SSTA

El dia de hoy Se Continua con la instalacion de Estructura de Cubierta Sobre Calle 10 y Remate Pasarela Contra el auditorio de la Fuga, Donde se Raliza la instalacion de la Teja del ala sur Calle 10, se Continua con la Reparacion de Pases de la Guada en la Cubierta y Cielo Rasos Calle 10.

Martes 31 de marzo 2026
SSTA: Total personal en obra (10) 6 Trabajadores del area de Instalación de guadua, 4 Trabajadores del area administrativa Se realiza Charla de seguridad, Pausas Activas, se Firma Permisos de PMT, se instala Señalización se Firma ATS Inspecciones, Paola C Residente SSTA.
