	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO NOTA REMISORIA	Código: GDM-06 Versión: 01 Fecha: 28/05/2025 Página 1 de 1

FECHA:	11 de Mayo del 2026		
PARA:	Despacho - Jhonny Ojeda		
DE:	ING. MARISTELLA SANTANA TORRES		
DATOS DEL RADICADO:	Fecha de radicado: 08 MAY 2026	Radicado No.: 1967	
	Remitente: Caja de Compensación Hector Armando Gomez Jaimes		
INDICACIONES:			
FIRMA REMITENTE	RECIBIDO DESTINATARIO		
	FIRMA	FECHA	HORA
TRAMITE:			
FIRMA DE QUIEN REASIGNA:	RECIBIDO DE LA REASIGNACIÓN		
	NOMBRE:	FECHA DE RECIBIDO	HORA
NOMBRE DE QUIEN REASIGNA:	FIRMA:		

23284

	CONSORCIO EDUCATIVO AR	Código: GES-FO-12
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 01/09/2025
	OFICIO	Versión: 01

CER-122-2026

INFRAESTRUCTURA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 08 MAY 2026 Hora: 11:47
Radicado No. 1967
No. Folio: 1 6 folios
Recibido por:

Villavicencio, 08 de Mayo de 2026

Señora

MARISTELLA SANTANA TORRES
Secretaria de infraestructura
Villavicencio- Meta

REF: RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META. CONTRATO 1279 DE 2023

Asunto: Envío del informe mensual de obra e interventoría correspondiente al mes de febrero.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la Interventoría del contrato referido en el asunto se permite remitir para su conocimiento, revisión y fines pertinentes, el informe mensual de obra e informe mensual de interventoría correspondientes al mes de febrero de 2026, relacionados con la ejecución del proyecto denominado "Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo – Sede Principal del Municipio de Villavicencio, Meta".

Los informes anexos contienen el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de avance físico de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, así como el respectivo control y verificación adelantados por la interventoría, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.

De igual manera, se incluyen las observaciones, recomendaciones y registros correspondientes al desarrollo de las actividades ejecutadas en obra durante el periodo mencionado, con el propósito de mantener un adecuado control y trazabilidad del proyecto.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación, requerimiento o información adicional que considere pertinente.

Cordialmente,

HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO AR
NIT: 901.983.071-9

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 17

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

CONTRATO 1279 de 2023



"RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO 2026

VERSION 0

Carrera 35 # 34A - 46 Barrio Barzal - Piso 2

Consorciomh@cyg.com.co

Control de Aprobaciones y Versiones

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	FOLIOS
0	28-12-2025	DOCUMENTO ORIGINAL	169

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL DIANA CAROLINA VEGA CASTILLO ASTRID RUÍZ GONZÁLEZ MARIA DEL PILAR SEPULVÉDA SUÁREZ	
ING. APOYO TÉCNICO PROFESIONAL SST	NOMBRE: ING. YEISON GOMEZ GUERRERO DIRECTOR DE OBRA

3

INTRODUCCIÓN 8

OBJETIVOS 9

Objetivo General 9

Objetivos Específicos 9

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 10

1.1 Descripción General del Proyecto 10

1.2 Localización de Obra 12

1.3 Implantación del Proyecto 14

1.4 Alcance del Proyecto 15

1.5 Control de Garantías 17

2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 39

2.1 Programación de Obra del Proyecto 39

2.2 Análisis Programado Acumulado vs Ejecutado Acumulado 39

2.3 Grafica de Avance Físico vs Programado 40

3 COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA 42

3.1 Actividades Realizadas 42

3.2 Trazado y Replanteo Arquitectónico 43

3.3 Capítulo 2. Rellenos y Explanaciones 44

3.4 Capítulo 2. Relleno con Material de Excavación 45

3.5 Capítulo 3. Cimentaciones (base solado). Concreto 13,8 Mpa, (2000 psi), solado, conc limpieza ... 46

Capítulo 4. Columnas Concreto 28 Mpa-4000 Psi 47

Capítulo 4. Acero de Refuerzo Estructural 48

Items No Previstos 49

Plan de Manejo de Transito (PMT) 53
3.6 Uso de Maquinarias y Equipos. 54
3.7 Bitácora o Libro de Obra 56
3.8 Estado del Tiempo 56
4 GESTIÓN DE CALIDAD ACORDE AL PLAN DE CALIDAD. 57
4.1 Certificados de Calidad y Limpieza del Acero de Refuerzo 58
4.2 Certificado de Laboratorio 58
4.3 Ensayos de Laboratorios 59
4.4 Ensayos de Muestras de Concreto 59
4.5 Ensayos In Situ 69
4.6 Ensayo de Asentamiento o Slump 69
4.7 Resultados Densidad o Masa Unitaria en el Terreno Método Cono de Arena 70
4.8 Certificado de Calidad de Materiales y Equipos. 71
4.9 Equipos de Topografía. 71
5 INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 73
5.1 Relación del Personal Empleado en la Ejecución de la Obra en el Mes. 80
5.2 Registro de Entrega, Reemplazo de EPP´s y Dotación. 97
5.3 Procesos de Inducción al Ingreso de Obra. 98
5.4 Retiros de Personal 100
5.5 Charlas de Seguridad y Capacitaciones. 101
5.6 Control de Actividades de Alto Riesgo. 102
5.7 Inspecciones Planificadas. 102
5.8 Visitas y Comités en Obra 103

5.9 Accidentabilidad 104
5.10 Frecuencia de Accidentalidad. 106
5.11 Severidad de Accidentalidad 106
5.12 Ausentismo Laboral. 107
6 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL. 108
6.1 Actividades del Mes 109
7 MEDIO ABIÓTICO 110
7.1 Manejo y Disposición de Materiales Sobrantes de Demolición Excavación y Construcción 110
7.2 Clasificación de Material Aprovechable y No Aprovechable 111
7.3 Manejo Adecuado de los Materiales de Construcción 111
7.4 Programa para el Manejo Eficiente del Agua y Vertimientos 113
7.5 Manejo de Residuos Líquidos Domésticos 114
7.6 Manejo de Residuos Sólidos y Especiales 115
8 MEDIO BIÓTICO 118
8.1 Programa de Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote 118
8.2 Manejo de Flora 119
8.3 Manejo de Fauna 120
8.4 Manejo de Sustancias Químicas 121
8.5 Manejo de Señalización en la Obra 122
8.6 Manejo de Maquinaria y Equipos en Obra. 123
8.7 Anexo 23: Inspección Ambiental a Contratistas 125
8.8 Anexo: 24 Inspección Maquinaria y Equipo Menor 125

8.9 Anexo 25 Circular Ambiental Informativa 125
8.10 Anexo 26 Acta Entrega De Chatarra 125
8.11 Programa de Educación y Capacitación al Personal del Proyecto 126
8.12 Seguridad y Salud en el Trabajo. 127
8.13 Programa de Información y Participación Comunitaria 128
9 INSPECCIÓN AMBIENTAL. 130
10 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL. 138
10.1 Programa de Atención al Usuario. 138
10.2 Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto. 140
10.3 Taller Manejo de Conflictos en Obra 140
10.4 Programa de Contratación de Mano de Obra. 142
10.5 Programa de Información y Participación Comunitaria 152
10.6 Comité de Vigilancia y Control. 152
11 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 155
11.1 Comité y/o Reuniones de Obra 155
11.2 Gestión de Comunicaciones 155
12 COMPONENTE FINANCIERO 158
12.1 Relación Inversión del Anticipo 158
12.2 Plan de Inversión del Anticipo Versión 3 158
12.3 Ejecución Financiera del Anticipo 170
12.4 Liquidación Del Encargo Fiduciario 172
12.1 Relación Actas de Pago Parcial 173

7

CONCLUSIÓN.....174

ILUSTRACIONES.....179

INTRODUCCIÓN.

El presente Informe Mensual de Obra correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero del 2026 tiene como propósito presentar de manera detallada, verificable y objetiva el avance físico, técnico, administrativo y financiero del proyecto de construcción. Este documento consolida la información necesaria para garantizar el adecuado seguimiento y control.

En este informe se describen las actividades ejecutadas en cada uno de los frentes de trabajo, el uso de recursos, así como la evidencia fotográfica que soporta el progreso alcanzado durante el mes. Asimismo, se integran las novedades y gestiones adelantadas en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), gestión ambiental y gestión social, incluyendo las acciones preventivas y correctivas implementadas.

De igual manera, se presenta el estado contractual, administrativo y financiero actualizado, con reporte de actas parciales, valores ejecutados, pagos tramitados y el cumplimiento documental exigido

OBJETIVOS.

Objetivo General.

Presentar de manera detallada y verificable el avance físico, administrativo, técnico y financiero correspondiente al periodo evaluado, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento, control y toma de decisiones del proyecto de construcción.

Objetivos Específicos

- Describir el avance físico y técnico del proyecto, detallando las actividades ejecutadas, los frentes de trabajo activos, las cantidades desarrolladas, el uso de recursos y la evidencia fotográfica que soporte la ejecución mensual.
- Consolidar la gestión y novedades identificados durante el periodo, así como el reporte integral de la gestión en SST, ambiental y social, incluyendo las acciones implementadas.
- Presentar el estado contractual, administrativo y financiero, reportando actas parciales, valores ejecutados, pagos tramitados, cumplimiento documental.

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

1.1 Descripción General del Proyecto.

A continuación, se aportarán datos generales del proyecto los cuales permitirán la comprensión del objeto del contrato 1279 de 2023, para su seguimiento y control, los cuales se describen a continuación:

Tabla 1 Datos Generales del Proyecto

Condiciones Generales	
Entidad Contratante	Municipio de Villavicencio
Contratista	Consorcio Educación C&G-MH
Objeto del Contrato	Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta
Representante Legal	Carlos Alberto Ferreira Sandino
Contrato N°	1279 de 2023
BIPN	2021-50001-0023 BPPIM 2021-050001-0021
NIT	901687301-9
Valor del Contrato	$25.094.607.822,56
Anticipo	20%
Valor Anticipo	$5.018.921.564,51
Plazo Inicial	10 meses
Plazo Modificado	7 meses y Once Días
Fecha Contrato	16 de marzo de 2023
Fecha Modificación 1	15 de mayo de 2023
Fecha Acta de Inicio	20 de mayo de 2023

Condiciones Generales	
Fecha Modificación 2	02 de junio de 2023
Fecha Entrega del lote	21 de junio de 2023
Fecha Prorroga No. 1	22 de diciembre de 2023
Plazo Prorroga No. 1	12 meses
Fecha Modificación 3	22 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	26 de abril de 2024
Plazo suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.1 suspensión No. 1	25 de mayo de 2024
Plazo ampliación No.1 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.2 suspensión No. 1	25 de junio de 2024
Plazo ampliación No.2 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.3 suspensión No. 1	25 de julio de 2024
Plazo ampliación No.3 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.4 suspensión No. 1	25 de agosto de 2024
Plazo ampliación No.4 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.5 suspensión No. 1	25 de septiembre de 2024
Plazo ampliación No.5 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.6 suspensión No. 1	25 de octubre de 2024
Plazo ampliación No.6 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.7 suspensión No. 1	25 de noviembre de 2024
plazo ampliación No.7 suspensión No. 1	2 meses

Condiciones Generales	
Fecha ampliación No.8 suspensión No. 1	24 de enero de 2025
plazo ampliación No.8 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.9 suspensión No. 1	24 de febrero de 2025
Plazo ampliación No.9 suspensión No. 1	2 meses
Fecha ampliación No.10 suspensión No. 1	24 de abril de 2025
Plazo ampliación No.10 suspensión No. 1	2 meses y 10 días
Fecha ampliación No.11 suspensión No. 1	04 de julio de 2025
Plazo ampliación No.11 suspensión No. 1	3 meses
Acta Reinicio	06 de octubre de 2025
Fecha Modificación 4	31 de octubre de 2025
Fecha de Culminación del Contrato	**05 de junio de 2026**

1.2 Localización de Obra.

EL proyecto está ubicado en el corregimiento 4, del centro poblado Altos de Pompeya calle 6 # 19-36, Villavicencio capital del departamento del Meta, en un terreno de 1.8 Ha, destinado para la construcción del nuevo colegio Alfonso López Pumarejo, con una superficie de 0,3392 Km^2.

En la siguiente tabla se adjuntaron los diferentes tipos de coordenadas de ubicación geográfica del centro poblado Altos de Pompeya, información que nos permitirá realizar la ubicación de coordenadas reales para la posterior georreferenciación del proyecto.

Tabla 2 Ubicación Geográfica Centro Poblado Altos de Pompeya

Ubicación Geográfica	
Coordenadas Geográficas	Norte 4°03´48" Oeste 73°23´48"
Coordenada Decimales	Norte 4,063333° Oeste -73,396667°
UTM	449304 677989 18N

Para obtener una mejor comprensión y asimilación de la ubicación geográfica del centro poblado de Altos de Pompeya en la siguiente ilustración se demostrará como el valor informativo de una imagen nos ayuda a entender lo plasmado en los párrafos antes mencionados.

Ilustración 1 Localización del Proyecto



1.3 Implantación del Proyecto.

Implica la distribución y ordenamiento de los espacios para los diferentes fines previstos, correspondería a los diferentes módulos que componen la estructura física y obras de urbanismo del nuevo Colegio Alfonso López Pumarejo.

Ilustración 2 Implantación y Localización General



1.4 Alcance del Proyecto.

El Consorcio Educación C&G-MH, enmarcado en el alcance del contrato llevará a cabo la construcción del Colegio Alfonso López Pumarejo hasta la terminación de las edificaciones y demás construcciones en funcionamiento para ser entregada a la entidad para sus operaciones principales las cuales se describen a continuación:

Tabla 3 Áreas a Construir por Edificaciones

Cuadro de Áreas y Niveles					
Módulo	Piso	Espacios	Nivel	Área (m^2)	Área (m^2) Construida
Auditorio	1	Auditorio	0,00	781,00	2389,00
	2	Restaurante	4,24	804,00	
	3	Laboratorios/Talleres	8,00	804,00	
Administración	1	Rectoría, Recepción, secretarias	3,60	1009,00	2980,00
	2	Sistemas, Salas de Profesores	8,00	1028,00	
	3	Biblioteca	11,65	943,00	
Educativo	1	Aulas Primarias	3,00	1784,00	5206,00
	2	Aulas Secundaria	8,00	1784,00	
	3	Talleres	11,75	1638,00	
Pre Escolar	1	Aulas Preescolar	5,30	425,00	425,00
Polideportivo	1	Polideportivo	0,99	1088,58	1088,58
Portería	1	Portería	4,45	8,89	8,89
Cuarto Residuos	1	Cuarto Residuos	0,40	15,12	15,12
TOTAL					12.112,59

Como parte de la ejecución del Consorcio Educación C&G-MH, para la construcción del proyecto se aplicarán las directrices establecidas en los planes y programas determinados que se implementaran y a continuación se mencionan: Plan de Manejo Ambiental Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-, Plan de Gestión Social, PDT Programa Detallado de Trabajo, Programa de subcontratos y compras, Plan de manejo e inversión de anticipo y plan de calidad.

1.5 Control de Garantías.

Para garantizar la atención de posibles daños ocasionados de manera involuntaria a terceros durante la ejecución de la obra, y en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Obra 1279 de 2023, el Consorcio Educación C&G-MH, mantiene un control sobre las garantías exigidas contractualmente.

En este sentido, se presentan a continuación las tablas de seguimiento y verificación de las pólizas, las cuales respaldan la adecuada cobertura y vigencia de los amparos requeridos para el desarrollo del proyecto:

Tabla 4 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Contrato

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.391,15	16/03/2023	17/01/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	16/03/2023	17/01/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.117,00	16/03/2023	17/01/2024

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	16/03/2023	17/01/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial con Fecha de Firma Inicial de Contrato de Obra.

Tabla 5 Póliza de Seguro Cumplimiento Contrato

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	20/05/2023	30/06/2024
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	20/05/2023	30/06/2024
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	20/05/2023	31/12/2026
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2023	31/12/2028

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial Correspondiente a la Actualización con Fecha del Acta de Inicio.

Tabla 6 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Acta de Inicio

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.391,15	16/03/2023	18/01/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial con Fecha de Firma Inicial de Contrato de Obra.

Tabla 7 Póliza de Seguro Cumplimiento Acta de Inicio

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	20/05/2023	30/06/2024
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	20/05/2023	30/06/2024

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	20/05/2023	31/12/2026
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2023	31/12/2028

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Correspondiente a la Actualización con Fecha del Acta de Inicio.

Tabla 8 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Prorroga No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.392,00	20/05/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 9 Póliza de Seguro Cumplimiento – Prorroga No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	22/12/2023	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	22/12/2023	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	22/12/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 10 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificación No. 3.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	20/05/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024
	Responsabilidad	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Civil patronal			
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 11 Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificación No. 3

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	22/12/2023	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	22/12/2023	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	22/12/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 12 Póliza de Seguro Cumplimiento – Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	26/04/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	26/04/2023	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	26/04/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 13 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Civil patronal			
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 14 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 1 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/05/2024	30/07/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/05/2023	30/07/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/05/2023	31/01/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	28/02/2025	28/02/2030

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 15 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 1 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	28/02/2025
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	28/02/2025
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	28/02/2025
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	28/02/2025

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 16 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 2 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/06/2024	30/08/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/06/2023	30/08/2025

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/06/2023	31/02/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	28/03/2025	28/03/2030

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 17 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 2 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/04/2023	28/03/2025
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/04/2023	28/03/2025
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/04/2023	28/03/2025
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/04/2023	28/03/2025

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 18 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 4 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	23/08/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	23/08/2024	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	23/08/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 19 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 4 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Civil patronal			
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 20 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 5 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/09/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/09/2024	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/09/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 21 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 5 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 22 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 6 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/10/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/10/2024	30/06/2025

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/10/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 23 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 6 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 24 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/11/2024	30/03/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/11/2024	30/03/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/11/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 25 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Civil patronal			
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 26 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 10 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/11/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/11/2024	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/11/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 27 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 10 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Sub Contratistas			
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 28 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 11 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	26/04/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	26/04/2024	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	26/04/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 29 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 11 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 30 Póliza de Seguro Cumplimiento – Acta Reinicio

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	20/05/2023	06/12/2026
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	20/05/2023	06/12/2026

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	20/05/2023	06/06/2029
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	20/05/2023	06/06/2031

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 31 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Acta Reinicio

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	06/06/2026
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 32 Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificatoria N° 4

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	30/10/2025	06/12/2026
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	30/10/2025	06/12/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	30/10/2025	06/06/2029
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	06/06/2026	06/06/2031

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880 Anexo N° 20 Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 33 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificatoria N° 4

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	06/06/2026
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026

	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026

Nota. Póliza de RCE N° 100008195.Anexo 22 Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 34 Póliza de Seguro Cumplimiento – Cesión de Posición Contractual

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	09/12/2025	06/12/2026
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	09/12/2025	06/12/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	09/12/2025	06/06/2029
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	06/06/2026	06/06/2031

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880 Anexo N° 21 y 22 Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 35 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Cesión de Posición Contractual

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	06/06/2026
	Contratistas y	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026

	Sub Contratistas			
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026

Nota. Póliza de RCE N° 100008195.Anexo 23 y 24 Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

El avance en el cumplimiento de las metas se evalúa a partir de la relación del flujo de inversión ajustado conforme a la Modificatoria N.º 4 del 31 de octubre de 2025, evidenciando la correspondencia entre los recursos financieros ejecutados y la programación actualizada del proyecto.

2.1 Programación de Obra del Proyecto.

Tabla 36 Flujo de Inversión Programado Por Mes

Mes	Avance Programado Mensual ($)	% Programado Mensual	Avance Programado Acumulado ($)	% Programado Acumulado
abr-24			$ 5,953,148,568	23.72%
DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 AL 05 OCTUBRE DEL 2025 EL CONTRATO SE ENCONTRABA SUSPENDIDO				
oct-25	$ 642,530,600	2.6%	$6,595,679,167.56	26.3%
nov-25	$ 973,796,537.57	3.9%	$7,569,475,705.13	30.2%
dic-25	$ 1,405,510,239.58	5.6%	$8,974,985,944.71	35.8%
ene-26	$ 1,810,794,424.87	7.2%	$10,785,780,369.58	43.0%
feb-26	$ 1,244,916,756.15	5.0%	$12,030,697,125.73	47.9%
mar-26	$ 1,349,680,916.88	5.4%	$13,380,378,042.61	53.3%
abr-26	$ 2,227,396,129.23	8.9%	$15,607,774,171.84	62.2%
may-26	$ 7,581,610,548.69	30.2%	$23,189,384,720.53	92.4%
jun-26	$ 1,905,222,981.65	7.6%	$25,094,607,702.18	100.0%

2.2 Análisis Programado Acumulado vs Ejecutado Acumulado.

El análisis del programado acumulado frente al ejecutado acumulado se desarrolla a partir de la relación del flujo de inversión ajustado conforme a la Modificatoria N.º 4, del 31 de octubre de 2025, lo cual permite evaluar el comportamiento real de la ejecución del proyecto del colegio respecto a la programación vigente.


Este análisis se soporta en tablas y representaciones gráficas que facilitan la identificación de indicadores de avance del proyecto.

Tabla 37 Relación Avance Programado Acumulado vs Avance Físico Acumulado

Mes	Avance Programado Acumulado ($)	% Programado Acumulado	Avance Ejecutado Acumulado ($)	% Ejecutado Acumulado
abr-24	$ 5,953,148,568	23.72%	$ 6,572,277,757.15	26.20%
DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 AL 05 OCTUBRE DEL 2025 EL CONTRATO SE ENCONTRABA SUSPENDIDO				
oct-25	$6,595,679,167.56	26.3%	$6,797,308,381.50	27.1%
nov-25	$7,569,475,705.13	30.2%	$7,569,475,710.00	30.2%
dic-25	$8,974,985,944.71	35.8%	$8,272,365,057.04	33.0%
ene-26	$10,785,780,369.58	43.0%	$8,928,951,315.60	35.6%
feb-26	$12,030,697,125.73	47.9%	$ 10,655,385,456	42.4%
mar-26	$13,380,378,042.61	53.3%		
abr-26	$15,607,774,171.84	62.2%		
may-26	$23,189,384,720.53	92.4%		
jun-26	$25,094,607,702.18	100.0%		

2.3 Grafica de Avance Físico vs Programado.

Ilustración 3 Curva S Análisis de Avance Físico vs Programado

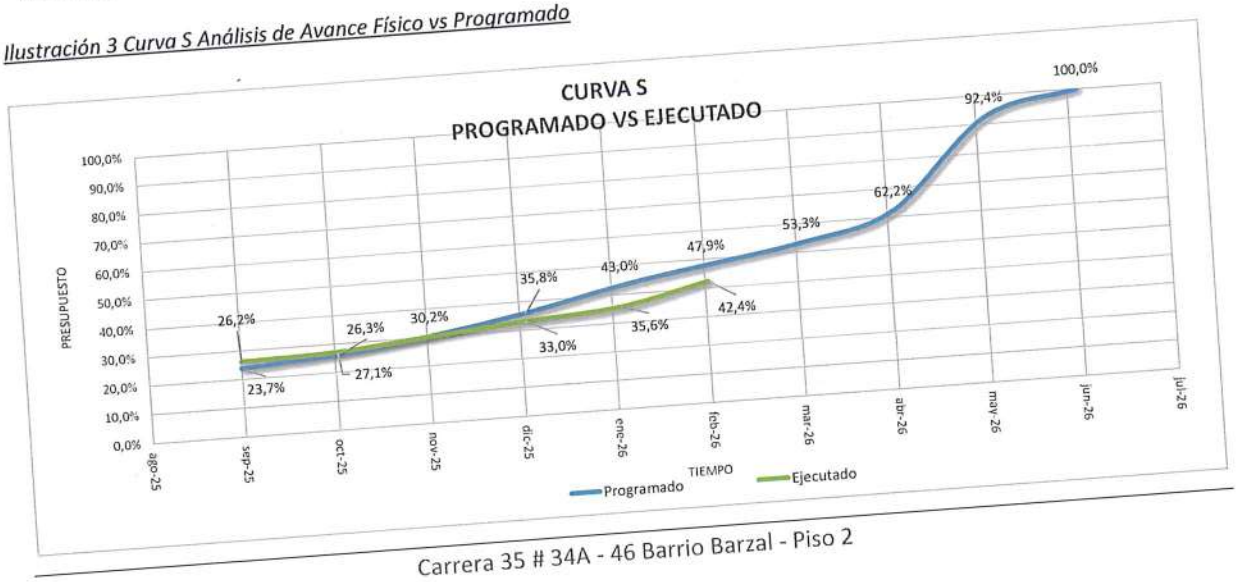

El porcentaje de obra ejecutado a la fecha del presente informe corresponde al 42,4 %, frente a un 47,9 % programado, conforme a lo evidenciado en la gráfica de control de programación, lo cual indica una diferencia entre la ejecución real y la planificación establecida para el corte evaluado. Ver anexo 1. Acta de avance mensual.

3 COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA.

El Componente Técnico del Contrato de Obra comprende el conjunto de lineamientos, especificaciones y criterios constructivos que regulan la ejecución de las actividades propias del proyecto Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta

3.1 Actividades Realizadas

Cumpliendo con los lineamientos, especificaciones y criterios constructivos que regulan la ejecución de las actividades del proyecto, la limpieza del acero expuesto a la intemperie es la actividad de importancia que permitirá realizar el armado de las estructuras que componen los diferentes módulos de la Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta.

Actualmente, en el caso de los módulos educativo y administrativo los refuerzos de barras de acero se realiza su limpieza por medios químicos con la aplicación de un preparador químico de superficies ferrosa. Ver anexo 2. Ficha técnica desoxidante pintoxido.

Ilustración 4 Limpieza de Acero de Refuerzo por Medios Químicos





3.2 Trazado y Replanteo Arquitectónico

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las actividades correspondientes al ítem de trazado y replanteo arquitectónico, las cuales consistieron en la verificación, localización y materialización en campo de ejes, alineamientos, cotas y niveles establecidos en los planos arquitectónicos aprobados, estas labores se desarrollaron tomando como referencia los puntos de control topográfico previamente definidos, garantizando la correcta correspondencia entre el diseño y su implantación física en la obra.

Tabla 38 Trazado y Replanteo Arquitectónico

Capítulo	Ítem	Descripción	Cantidad
2	2.1.3.	Trazado y Replanteo Arquit	3144,31 M^2

Ilustración 5 Trazado y Replanteo Arquitectónico



El trazado permitió establecer con precisión la ubicación de los elementos arquitectónicos proyectados, constituyéndose en una actividad fundamental para el adecuado desarrollo de las etapas constructivas posteriores y para el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos del proyecto.

3.3 Capítulo 2. Rellenos y Explanaciones

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de relleno en las áreas utilizando material seleccionado de río TM 2", el cual cumple con las condiciones granulométricas y de calidad requeridas para este tipo de trabajos, los rellenos fueron colocados en capas controladas, garantizando una adecuada conformación, nivelación y estabilidad del terreno.

Tabla 39 Relleno con Material Seleccionado de Río TM 2

Capítulo	Ítem	Descripción	Cantidad
2	2.4.1	Relleno Material T. Max. 2" Comp.Mecan.selecc rio	20,10 M3

En particular, se realizaron rellenos en el módulo administrativo, donde el material fue extendido, humedecido y compactado de manera uniforme, asegurando las condiciones necesarias para la continuidad de las actividades constructivas posteriores, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a los lineamientos de calidad establecidos.

Ilustración 6 Relleno con Material Seleccionado de Río TM 2



3.4 Capítulo 2. Relleno con Material de Excavación

Durante el periodo objeto de análisis se adelantaron trabajos de relleno y conformación de terreno empleando material producto de las excavaciones realizadas en el proyecto, el cual fue previamente seleccionado y acondicionado para su reutilización, material que fue dispuesto en las zonas requeridas, cumpliendo con los niveles de diseño establecidos en los módulos educativo y administrativo.

El relleno se ejecutó mediante la colocación controlada del material, asegurando su correcta distribución, humectación y compactación, con el fin de lograr una adecuada estabilidad y capacidad de soporte del terreno, que permitieron optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles en obra y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las etapas constructivas siguientes

Tabla 40 Relleno con Material de Excavación

Capítulo	Ítem	Descripción	Cantidad
2	2.4.2	Rellenos Material Excava (Relleno exten mecánico)	22,15 M^3

Ilustración 7 Relleno con Material de Excavación



3.5 Capítulo 3. Cimentaciones (base solado). Concreto 13,8 Mpa, (2000 psi), solado, conc limpieza

La correcta ejecución de las actividades constructivas exige disponer de superficies niveladas, limpias y libres de contaminación; por esta razón, el Consorcio Educación C&G-MH, establece la utilización de concreto de limpieza en el fondo de las excavaciones, garantizando las condiciones adecuadas para la posterior instalación de los aceros de refuerzo de los elementos estructurales.

En el módulo educativo, durante el presente periodo se ejecutaron los solados correspondientes a las vigas de cimentación y dados de apoyos de muros portantes de concreto, como actividad previa a las fundidas de los elementos estructurales, y así regularizar la superficie de apoyo, garantizar las cotas de diseño y mejorar las condiciones de limpieza y nivelación del terreno del módulo educativo.

Tabla 41 Cimentación Concreto de Limpieza

Capítulo	Ítem	Descripción	Cantidad
3	3.1.1	Concreto 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	0,72 m^3

Ilustración 8 Concreto de Limpieza en Cimentación



Capítulo 4. Columnas Concreto 28 Mpa-4000 Psi

Las columnas de concreto constituyen un elemento estructural fundamental cumpliendo la función de transmitir de manera segura las cargas verticales y horizontales hacia la cimentación, garantizando la estabilidad y resistencia del sistema estructural. Asimismo, contribuyen al adecuado comportamiento sísmico de la estructura, asegurando la continuidad estructural y la correcta interacción con vigas y losas.

Ilustración 9 Columnas de Concreto 28 Mpa-4000 Psi





Durante el periodo correspondiente a febrero de 2026, se ejecutaron las actividades asociadas a la construcción de columnas en los módulos administrativo y educativo conforme a los diseños estructurales aprobados, especificaciones técnicas y normativa vigente, mediante el armado de formaletas aplomadas y posterior vaciado de concreto.

Tabla 42 Columnas de Concreto 28 Mpa-4000 Psi

Capítulo	Ítem	Descripción	Cantidad
4	4.1.1	Columna Concreto 28 Mpa - 4000 psi (m3)	26,47 m^3

Capítulo 4. Acero de Refuerzo Estructural.

El acero de refuerzo consiste en barras que, al combinarse con el concreto, conforman el concreto reforzado y permiten mejorar su capacidad resistente y su desempeño estructural, para el Consorcio Educación C&G-MH desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y preparación del acero de refuerzo de 60.000 PSI, incluyendo su figuración y disposición conforme a las especificaciones establecidas en los planos estructurales, bajo criterios de control técnico, asegurando la correcta identificación, manipulación y organización del material que garanticen la adecuada integración del refuerzo dentro del sistema estructural proyectado

Ilustración 10 Acero de Refuerzo Estructural



En esta fase del proyecto se avanza en la instalación del acero de refuerzo correspondiente a los elementos estructurales de las columnas y vigas de entrepiso de los módulos administrativo y educativo, muros del módulo educativo, garantizando el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos para las estructuras.

Tabla 43 Acero de Refuerzo Estructural

Capítulo	Ítem	Descripción	Cantidad
4	4.9.1	Acero Refuerzo Figurado 412Mpa, (4200 kg/cm2, G60)	66138,17 kg

Items No Previstos

Estos ítems corresponden a actividades complementarias a las inicialmente contratadas para la construcción del Colegio Alfonso López Pumarejo, labores que emergen en la etapa de ejecución como consecuencia de condiciones no previstas en los estudios y diseños preliminares, y resultan indispensables para garantizar la adecuada materialización del objeto contractual, su incorporación permite asegurar la continuidad técnica del proyecto.

NP 4.4.2 Losa Aligeradas de Concreto

El sistema constructivo de losas aligeradas con casetón de poliestireno expandido permite reducir cargas muertas sobre la estructura, garantizando al mismo tiempo la rigidez y capacidad portante requeridas, esta actividad se desarrolla en los módulos administrativo y educativo durante el mes de febrero de 2026.

Ilustración 11 Losa Aligerada de Concreto



Esta actividad se ejecuta bajo control técnico y geodésico permanente, verificando el adecuado armado del refuerzo, la correcta disposición de los aligerantes y el cumplimiento de los niveles y espesores establecidos en los planos estructurales.

Tabla 44 Losa Aligerada de Concreto

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 4.4.2	Losa Aligerada en Concreto a la Vista de 4000 Psi Premezclado, Altura de Losa Entre 0,75 a 0,90 m, Vigas y Riostras Descolgadas Altura Libre Entre 0,63 a 0,78 m, Torta Superior e= 0,12 m.	1.787,33 kg

NP 4.9.2. Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada

La malla electrosoldada es un elemento de refuerzo ampliamente utilizado en elementos de concreto para controlar la fisuración, mejorar la distribución de esfuerzos y aumentar la durabilidad del sistema constructivo. En el periodo correspondiente a febrero de 2026, su utilización fue fundamental en las losas aligerada de los módulos educativo y administrativo.

Tabla 45 Malla Electrosoldada Losa Contrapiso

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 4.9.2	Suministro e Instalación de malla Electrosoldada	10.639,73 kg

Ilustración 12 Malla Electrosoldada Losa Contrapiso



La correcta colocación de la malla, con recubrimientos adecuados y alineación uniforme, permite garantizar un comportamiento estructural eficiente del contrapiso, optimizando la resistencia ante cargas de servicio y reduciendo la aparición de fisuras por retracción o asentamiento diferencial.

NP 11-01 Concreto Zapata-Dados de Cimentación 28 Mpa-4000 Psi

Se ejecutaron las actividades correspondientes al ítem de concreto para zapatas de cimentación, cuales cumplen la función estructural de recibir, distribuir y transmitir de manera uniforme las cargas provenientes de la superestructura hacia el terreno de fundación, garantizando la estabilidad y capacidad portante del sistema.

Tabla 46 Concreto en Dados de Cimentación

Ítem	Descripción	Cantidad
NP-11-01	Concreto Zapata 28 MPa (4000 psi) No inc hierro.	6,50 M^3

Ilustración 13 Concreto en Dados de Cimentación



El desarrollo de estos trabajos se realizó durante el mes de febrero de 2026, e incluyó el vaciado, colocación, compactación y curado del concreto estructural, previa verificación de dimensiones, niveles y

alineamientos, así como del correcto armado del acero de refuerzo y la adecuada disposición de las formaletas.

NP 12-01 Concreto Vigas de Cimentación 28 Mpa-4000 Psi

Son elementos estructurales fundamentales que permiten la correcta distribución y transmisión de las cargas de la edificación hacia el suelo, además de proporcionar amarre y rigidez al sistema de fundación. En el periodo correspondiente a febrero de 2026, la ejecución de las vigas de cimentación se desarrolló en el módulo educativo, cumpliendo con los diseños estructurales, especificaciones técnicas y criterios de calidad establecidos para el proyecto, estos elementos contribuyen a controlar asentamientos diferenciales y a garantizar la estabilidad de la estructura.

Tabla 47 Concreto 4000 PSI en Vigas y Dados de Cimentación

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 12-01	Concreto Viga Cimentación 28 MPa, (4000 PSI)	60,93 M^3


Ilustración 14 Concreto Vigas y Dados de Cimentación



La ejecución de las labores anteriormente descritas refleja el seguimiento de las disposiciones técnicas y parámetros constructivos definidos para el proyecto de Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta, permitiendo verificar la adecuada implementación de los procedimientos y el control técnico de las intervenciones realizadas. Ver anexo 3. Formato de registro fotográfico.

Plan de Manejo de Transito (PMT)

Ilustración 15 Plan de Manejo de Transito febrero 2026

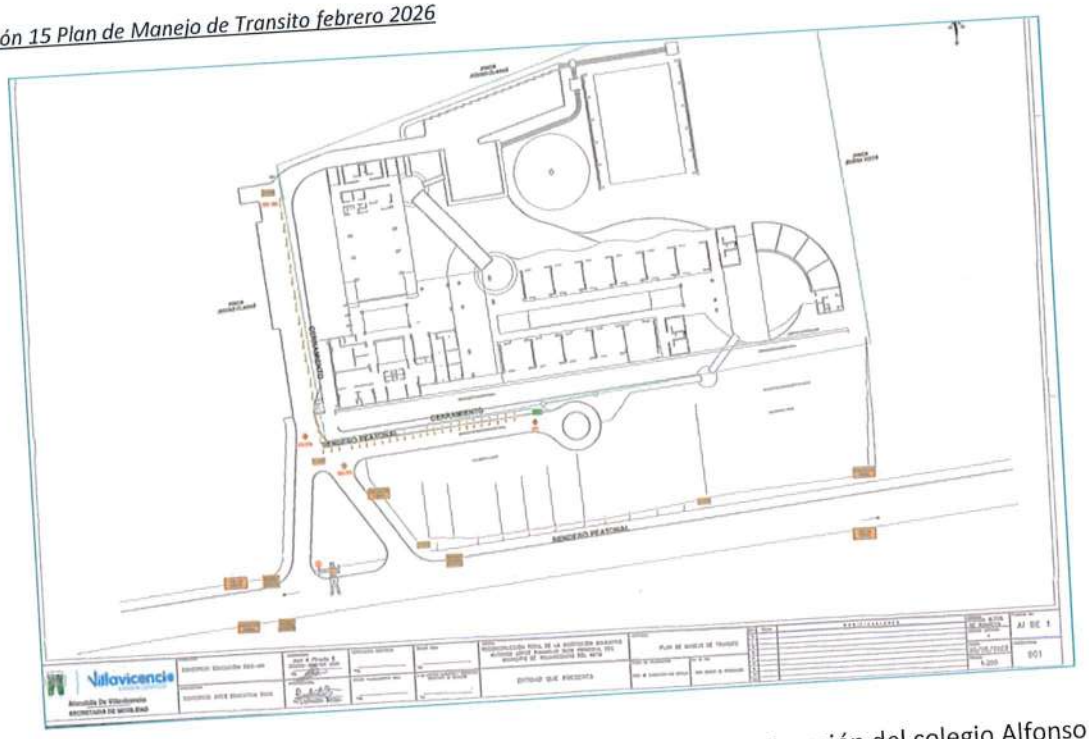

El propósito principal del manejo de tránsito que se aplicara en la construcción del colegio Alfonso López Pumarejo, es mitigar el impacto en la movilidad ocasionado por la obra mediante alternativas seguras y controladas para los actores viales. (Peatones, transporte público, vehículos privados, transporte de cargas, etc. Ver anexo 4. Informe Aprobación PMT.

Es una herramienta técnica orientada a la formulación de estrategias, alternativas y actividades específicas destinadas a prevenir, minimizar y mitigar los impactos generados sobre las condiciones

normales de movilización y desplazamiento de los usuarios de las vías, garantizando la seguridad vial, la continuidad del tránsito y la adecuada gestión de la circulación durante la ejecución de las actividades previstas.

Ilustración 16 Implementación del Plan de Manejo de Transito febrero 2026



El uso de controladores viales resulta fundamental, son los responsables de dirigir, regular y supervisar la correcta aplicación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Asimismo, la implementación adecuada de señalización informativa, preventiva y reglamentaria, junto con dispositivos de canalización debidamente instalados en los puntos críticos, se orienta a garantizar el orden del tránsito, mejorar la visibilidad de las intervenciones y reducir de manera significativa el riesgo de accidentes de tráfico.


Adicionalmente, estas acciones permiten mantener condiciones seguras para peatones, conductores y personal de obra durante la ejecución de las actividades constructivas, el seguimiento permanente del PMT asegura el cumplimiento de la normativa vigente y fortalece la gestión integral de la seguridad vial.

3.6 Uso de Maquinarias y Equipos.

Para el desarrollo de las actividades constructivas, el Consorcio Educación C&G-MH dispone en obra de la maquinaria y los equipos necesarios, garantizando la ejecución oportuna y eficiente de los procesos. La

disponibilidad y operatividad de estos recursos constituye un componente fundamental para asegurar la continuidad de las labores y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Ilustración 17 Maquinaria en Obra febrero 2026

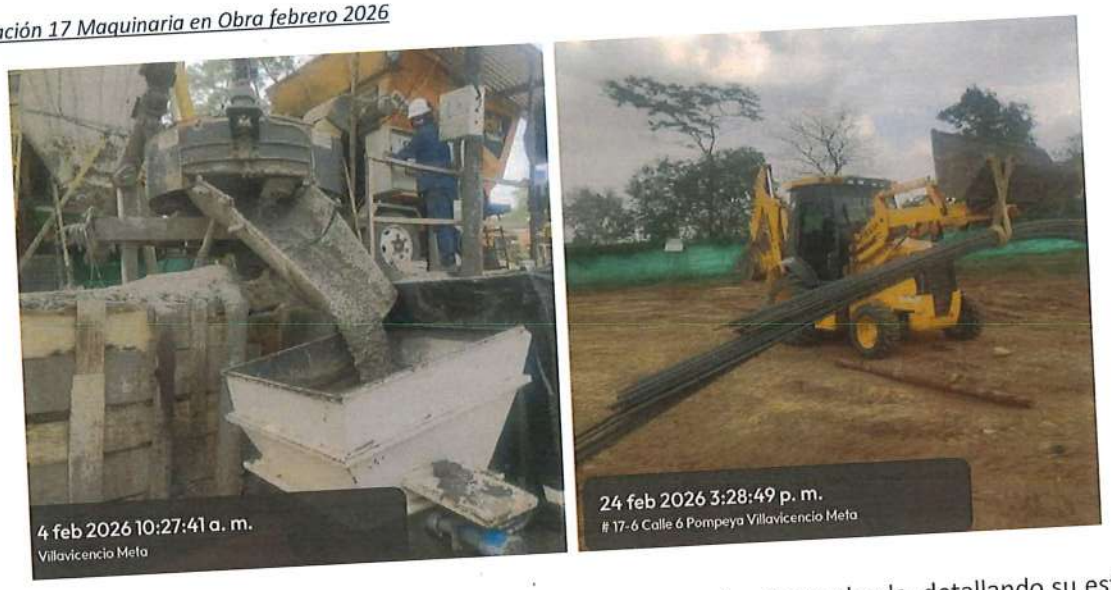

En el cuadro siguiente se presenta el listado y control de la maquinaria empleada, detallando su estatus operativo y la dedicación asignada al proyecto, permitiendo evidenciar la adecuada gestión, asignación y seguimiento de los equipos vinculados a cada una de las actividades constructivas. Ver anexo 5. Certificados de Maquinarias y Equipos.

Tabla 48 Relación de Maquinarias Usadas en el Periodo febrero 2026

Maquinaria	Placa	Marca	Modelo	Estatus	Dedicación
Planta de Concreto	-	DOMAT	DM SERIES	Operativa	100%
Bomba de Concreto	-	HAMAC	DHBT50-10-82	Operativa	100%
Retroexcavadora	-	SINOMACH	630A	Operativa	100%
Minicargador	-	EARTTHFORCE	S18	Operativa	100%

3.7 Bitácora o Libro de Obra

Se adjuntan al presente informe copias de las anotaciones diarias registradas en la bitácora de obra, documento en el cual se consignan de manera detallada las actividades ejecutadas, las condiciones de operación y los aspectos técnicos relevantes para el seguimiento del proyecto, debidamente firmado por la interventoría y por el constructor, el Consorcio Educación C&G-MH, garantizando la validez y trazabilidad de la información consignada. Ver Anexo 6. Bitácora de Obra."

3.8 Estado del Tiempo.


En el gráfico siguiente se presentan las condiciones climatológicas registradas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, correspondiente a la ejecución de las actividades del proyecto. Esta información permite identificar las variaciones atmosféricas que pudieron incidir en el desarrollo normal de los procesos constructivos.

Ilustración 18 Registro Diario del Clima febrero 2026



Las observaciones relacionadas con el estado del tiempo fueron consignadas diariamente en la bitácora de obra, con el propósito de facilitar su análisis, seguimiento y correlación con el avance de las actividades ejecutadas, permitiendo evaluar su incidencia en los rendimientos, la programación y la continuidad de los trabajos.

Ilustración 19 Influencia del Clima febrero 2026

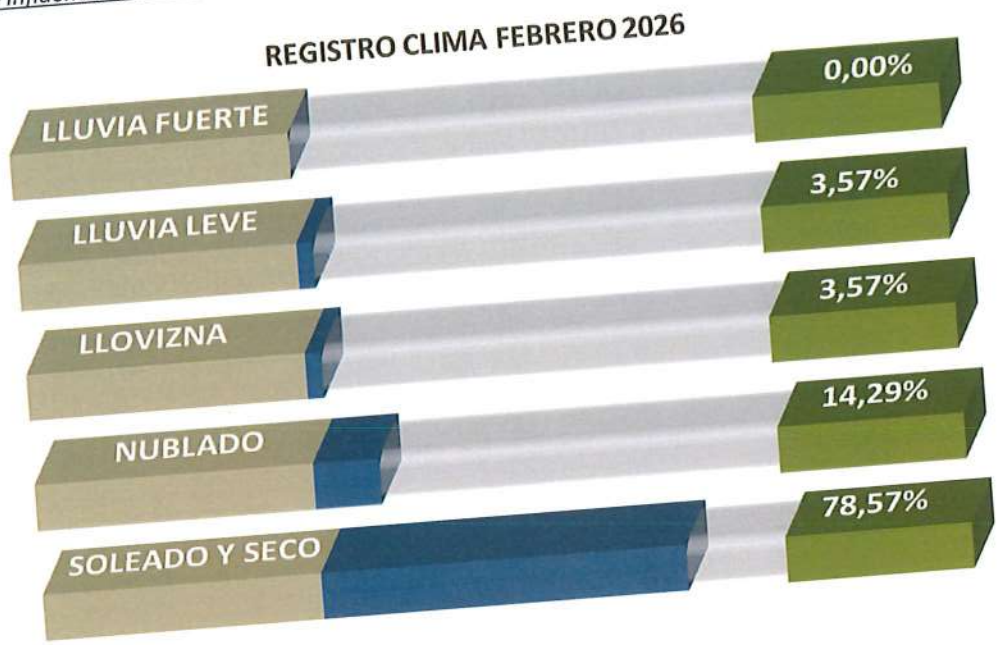

El análisis de las condiciones climatológicas registradas durante febrero de 2026, evidencia un predominio de tiempo soleado y seco correspondiente al 78,57 % del periodo, seguido de condiciones nubladas con un 14,29 %. Las precipitaciones se presentaron de manera aislada en forma de llovizna y lluvia leve, representando en conjunto el 7,14 %, sin registrarse eventos de lluvia fuerte. Estas condiciones resultaron favorables para la ejecución de las actividades constructivas, minimizando afectaciones en los rendimientos, la programación y la estabilidad de los procesos desarrollados en obra.

4 GESTIÓN DE CALIDAD ACORDE AL PLAN DE CALIDAD.

El presente Plan de Calidad ha sido elaborado por el Consorcio Educación C&G-MH, en cumplimiento de los requisitos establecidos para el desarrollo específico del contrato. Su contenido se encuentra estructurado de acuerdo con las directrices definidas en las normas ISO 9001:2015 y GTC-ISO 10005:2019, asegurando la coherencia con el Sistema de Gestión de Calidad implementado por C&G Ingeniería y Construcciones S.A.S., responsable de la administración y ejecución del Contrato No. 1279 de 2023.

4.1 Certificados de Calidad y Limpieza del Acero de Refuerzo

Actualmente el Consorcio Educación C&G-MH, en consonancia con los estándares establecidos en el plan de calidad del proyecto, presenta los certificados de calidad del acero de refuerzo obtenidos en esta etapa del proyecto. Ver anexo 7. Reporte de Ensayos Diaco.

Ilustración 20 Limpieza por Medios Mecánicos del Acero de Refuerzo



Del mismo modo, continua la limpieza del acero de refuerzo expuesto a la intemperie por recomendación del Especialista en Patología de la Construcción como se expresa en el informe del periodo correspondiente al 01 al 28 de febrero de 2026.

4.2 Certificado de Laboratorio

El Consorcio Educación C&G-MH realiza la contratación del laboratorio NHSQ Ingeniería S.A.S., acreditado por el ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, registro 23-LAB-069, mediante el cual se certifica la calidad de los diseños de mezcla y de los materiales utilizados en los ensayos requeridos, con el propósito de garantizar la idoneidad de los insumos empleados en el proyecto.

La intervención del laboratorio contribuye a la trazabilidad y confiabilidad de los ensayos realizados durante el desarrollo de la obra. Ver anexo 8. Certificado de Laboratorio.

4.3 Ensayos de Laboratorios

Para asegurar la correcta ejecución de las actividades de obra el Consorcio Educación C&G-MH, efectuará los ensayos correspondientes para el control y seguimientos de las características de los materiales empleados de acuerdo a las normas establecidas con el objeto de obtener resultados confiables que aseguren la calidad y confiabilidad de los proyectos.

4.4 Ensayos de Muestras de Concreto

Para garantizar la correcta ejecución de las actividades constructivas, el Consorcio Educación C&G-MH, implementa los ensayos necesarios para el control y seguimiento de las características de los materiales utilizados, en estricto cumplimiento de las normas vigentes. Este proceso permite obtener resultados confiables que respaldan la calidad y la seguridad del proyecto, asegurando que cada elemento cumpla con los parámetros técnicos establecidos.

Tabla 49 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 5-6-7-8 y 10 Días


ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-143A	MÓDULO POLIDEPORTIVO CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 3	4000	23-01-2026	30-01-2026	7	27,6	100,1
GT-144A	MODULO C EDUCATIVO DADO EJE 13	4000	24-01-2026	31-01-2026	7	31,3	113,4
GT-145A	MODULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 4	4000	26-01-2026	02/02/2026	7	28,9	104,7
GT-146A	POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 4-1	4000	27-01-2026	03/02/2026	7	28,6	103,7
GT-147A	MODULO C EDUCATIVO PLACA CONTRAPISO EJE N A 2/3	4000	27-01-2026	03/02/2026	7	30,3	109,9
GT-150A	MODULOC EDUCATIVO DADO EJE 9	4000	02-02-2026	09-02-2026	7	32,1	116,4

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-151A	MODULO ADMINISTRATIVO LOSA Y VIGAS N+6,55 EJE B-C ENTRE 8-13 VIGAS 201B-204B-208B-210B-211B-227B-212B-226B-213B-214B-215B FUNDIDA 1	4000	04/02/2026	10/02/2026	6	31,7	114,9
GT-152A	MODULO C EDUCTAIVO PLACA CONTRAPISO VOLADO NORTE EJE M-N + 2/3	4000	06/02/2026	13/02/2026	7	28,5	103,2
GT-153A	MODULO C EDUCATIVO DADO EJE -6	4000	06/02/2026	13/02/2026	7	26,4	95,9
GT-154A	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTREPISO EJE J Y K + 1/3 DE 6 Y 9	4000	07/02/2026	13/02/2026	6	26,0	24,2
GT-155A	MODULO C EDUCATIVO PLACA VOLADO SUR EJE M-Y N+2/3	4000	09/02/2026	16/02/2026	7	24,2	87,6
GT-156A	MODULO C EDUCATIVO PLACA DE ENTREPISO EJES JY K 1/3 DEL 11,13	4000	11/02/2026	18/02/2026	7	26,0	94,2
GT-157A	MODULO ADMINISTRATIVO LOSA Y VIGA N+6,55 EJE B-C ENTRE C 8 -13 FUNDIDA 1	4000	12/02/2026	19/02/2026	7	31,3	113,4
GT-158A	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNA EJE B12-C12-B13-C13	4000	12/02/2026	19/02/2026	7	26,8	97,1
GT-160A	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNA H10	4000	14/02/2026	21/02/2026	7	15,2	55,0
GT-161A	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTREPISO EJE K-L ENTRE 11-13	4000	19/02/2026	25/02/2026	6	27,1	98,4

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-162A	MODULO C EDUCATIVO PLACA ENTREPISO EJE K-L ENTRE 6-9	4000	20/02/2026	25/02/2026	5	26,1	94,6
GT-163A	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNAS D10-D13	4000	20/02/2026	27/02/2026	7	24,5	88,8
GT-164A	MODULO ADMINISTRATIVO LOSA Y VIGAS TRAMO 2 N+6.55 201B-202B-204B-207B-208B-209B-210B-211B-218B-229B-EJES C-D 2/3 EJE 8-13	4000	16/02/2026	26/02/2026	10	29,1	105,7
GT-164A	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNAS N+6.55 B10-C-10	4000	18/02/2026	26/02/2026	8	26,5	95,9

Ver anexo 9. Informe Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto.

Ilustración 21 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 5-6-7-8-10 Días

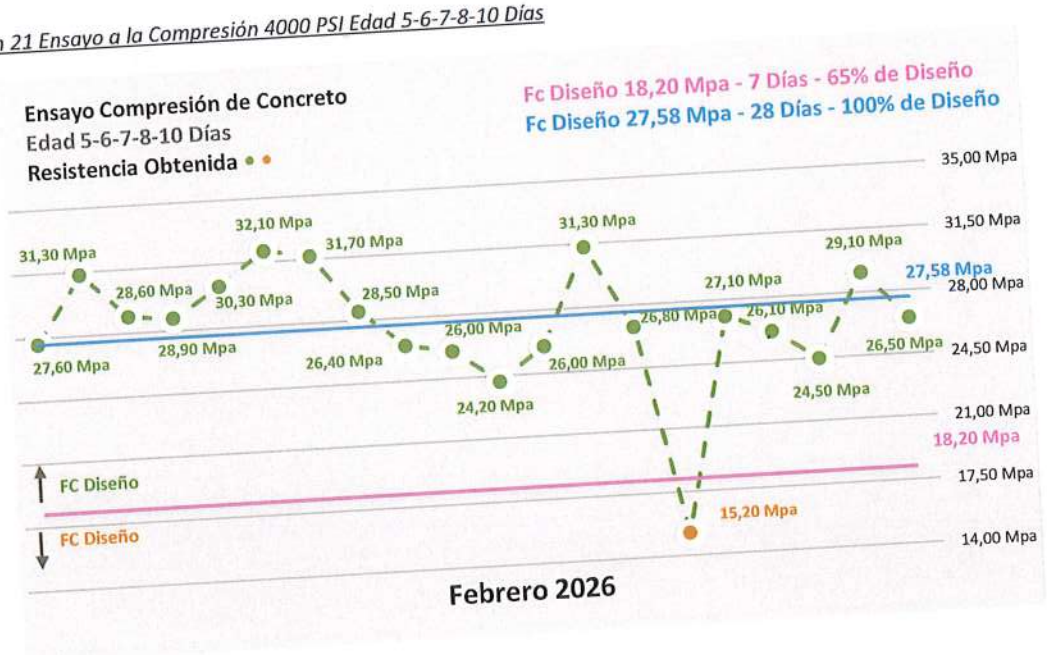

En relación con los resultados del ensayo de compresión del concreto a los 7 días, presentados en la gráfica correspondiente al mes de febrero de 2026, se observa que la mayoría de las resistencias obtenidas se sitúan entre 26,0 MPa y 32,1 MPa, superando ampliamente el valor de referencia de 18,20 MPa, equivalente al 65 % de la resistencia de diseño.

Este comportamiento evidencia un adecuado desarrollo inicial de resistencia y un desempeño favorable del concreto en edades tempranas, no obstante, se identifica un valor atípico de 15,20 MPa, el cual se encuentra por debajo del umbral mínimo establecido, lo que sugiere la posible incidencia de factores como deficiencias en el proceso de curado, errores en la elaboración de probetas o condiciones inadecuadas durante el ensayo, quedan sometidos a verificación mediante los ensayos de resistencia a los 28 días, los cuales permitirán confirmar el cumplimiento definitivo de la resistencia de diseño y la idoneidad estructural del concreto empleado.

Tabla 50 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 14 Días


ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-139B	MÓDULO EDUCATIVO PLACA CONTRAPISO VOLADO SUR EJES J-K-L 1/3	4000	19/01/2026	02/02/2026	14	31,9	115,5
GT-140B	MÓDULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 1	4000	20/01/2026	03/02/2026	14	30,6	111,1
GT-141B	MÓDULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 2	4000	22/01/2026	05/02/2026	14	34,2	124,1
GT-142B	MÓDULO EDUCATIVO PLACA CONTRAPISO VOLADO NORTE EJE J-K- 1/3	4000	22/01/2026	05/02/2026	14	33,6	121,7
GT-143B	MÓDULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 3	4000	23/01/2026	06/02/2026	14	32,1	116,4
GT-144B	MODULO EDUCATIVO DADO EJE 13	4000	24/01/2026	07/02/2026	14	31,3	113,4

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-145B	MODULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 4	4000	26/01/2026	09/02/2026	14	30,4	110,3
GT-146B	MODULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 4-1	4000	27/01/2026	10/02/2026	14	35,9	130,0
GT-147B	MODULO EDUCATIVO PLACA CONTRAPISO EJES N-A 2/3	4000	27/01/2026	10/02/2026	14	35,8	129,9
GT-148A	MODULO EDUCATIVO DADO EJE 11	4000	29/01/2026	12/02/2026	14	31,2	113,2
GT-149B	MODULO EDUCATIVO COLUMNAS EJE DE EL 9-9-11-13	4000	30/01/2026	13/02/2026	14	33,5	121,3
GT-150B	MODULO EDUCATIVO DADO EJE 9	4000	02/02/2026	16/02/2026	14	33,0	119,7
GT-151B	MODULO ADMINISTRATIVO LOSA Y VIGAS N+6,55 EJE B-C ENTRE 8-13 VIGAS 201B-204B-208B-210B-211B-227B-212B-226B-213B-214B-215B FUNDIDA 1	4000	04/02/2026	18/02/2026	14	33,4	121,1
GT-152B	MODULO EDUCTAIVO PLACA CONTRAPISO VOLADO NORTE EJE M-N + 2/3	4000	06/02/2026	20/02/2026	14	30,3	110,0
GT-153B	MODULO EDUCATIVO DADO EJE -6	4000	06/02/2026	20/02/2026	14	29,6	107,4
GT-154B	MODULO EDUCATIVO PLACA ENTREPISO EJE J Y K +1/3 DE 6 Y 9	4000	07/02/2026	21/02/2026	14	26,5	96,1
GT-155B	MODULO EDUCATIVO PLACA VOLADO SUR EJE MY N +2/3	4000	09/02/2026	23/02/2026	14	27,2	98,6
GT-156B	MODULO EDUCATIVO LOSA ENTREPISO EJES J-K 1/3 EJES 11-13	4000	11/02/2026	25/02/2026	14	27,3	98,9

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-157B	MODULO ADMINISTRATIVO LOSA Y VIGA N+6,55 EJE B-CEJES 8-13 FUNDIDA 1	4000	12/02/2026	22/02/2026	14	33,3	120,7
GT-158B	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNAS B12- C12- B13-C13	4000	12/02/2026	22/02/2026	14	29,4	106,5
GT-160B	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNA H10	4000	14/02/2026	28/02/2026	14	27,1	

Ver anexo 9. Informe Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto.

Ilustración 22 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 14 Días

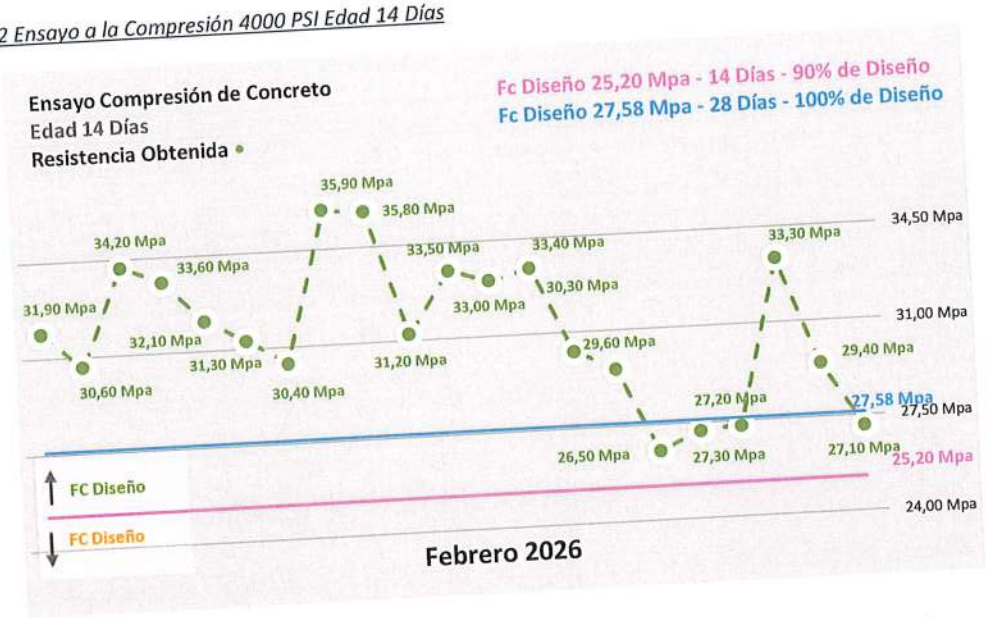

Los resultados de los ensayos de compresión de concreto a los 14 días, correspondientes al mes de febrero de 2026, evidencian resistencias comprendidas entre 26,50 MPa y 35,90 MPa, superando en su totalidad el valor de referencia de 25,20 MPa, equivalente al 90 % de la resistencia de diseño, y, en su mayoría, la resistencia de diseño de 28,00 MPa a 28 días. Este comportamiento refleja un adecuado desarrollo de resistencia temprana, asociado a condiciones favorables de dosificación, colocación y curado del concreto.

La variabilidad observada se encuentra dentro de rangos aceptables, sin evidenciar valores críticos que comprometan el comportamiento estructural del concreto empleado, es decir, cumple con los requisitos de calidad y resistencia establecidos para el proyecto.


Tabla 51 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 28 Días

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-127C	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNAS 13C-13D-13E	4000	06/01/2025	03/02/2026	28	29,7	107,7
GT-128C	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNAS BC8-D8	4000	07/01/2025	04/02/2026	28	28,6	103,7
GT-129C	MODULO EDUCATIVO COLUMNAS EJE L EJES 6 Y 11	4000	07/01/2025	04/02/2026	28	27,9	101,3
GT-130C	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNAS EJE I8-G8	4000	08/01/2025	05/02/2026	28	27,7	100,6
GT-131C	MÓDULO C EDUCATIVO COLMNA L EJE 9-13	4000	09/01/2025	06/02/2026	28	27,8	100,7
GT-132C	MODULO C EDUCATIVO PLACA CONTRAPISO EJE L-M 2/3 EJE 6,9,11,13	4000	10/01/2025	07/02/2026	28	31,2	113,0
GT-133C	MODULO EDUCATIVO PLACA CONTRAPISO EJE L-M A 2/3 EJE 6-9	4000	13/01/2025	10/02/2026	28	35,5	128,6
GT-134C	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNA H8´H8''	4000	13/01/2025	10/02/2026	28	34,5	125,1
GT-135C	MODULO EDUCATIVO VIGAS EJE 9,11 Y 13 DE EL O	4000	14/01/2025	11/02/2026	28	33,5	121,6
GT-136C	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNA I8´I8''	4000	15/01/2025	12/02/2026	28	34,2	124,1
GT-137C	MÓDULO EDUCATIVO VIGAS EJE 6 DEL O	4000	16/01/2025	13/02/2026	28	39,5	143,1
GT-138C	MÓDULO EDUCATIVO COLUMNAS EJE M DEL 6,9,11,13	4000	16/01/2025	13/02/2026	28	40,9	148,2

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-139C	MÓDULO EDUCATIVO PLACA CONTRAPISO VOLADO SUR EJES 1/3 J-K-L	4000	19/01/2025	16/02/2026	28	37,2	135,0
GT-140C	MÓDULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 1	4000	20/01/2025	17/02/2026	28	36,2	131,1
GT-141C	MÓDULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 2	4000	22/01/2025	19/02/2026	28	38,8	140,6
GT-142C	MÓDULO EDUCATIVO PLACA CONTRAPISO VOLADO NORTE EJE J-K- 1/3	4000	22/01/2025	19/02/2026	28	36,8	133,2
GT-143C	MÓDULO POLIDEPORTIVO CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 3	4000	23/01/2025	20/02/2026	28	33,0	119,6
GT-144C	MODULO EDUCATIVO DADO EJE 13	4000	24/01/2025	21/02/2026	28	34,7	125,9
GT-145C	MODULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 4	4000	26/01/2025	23/02/2026	28	32,3	117,3
GT-146C	POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO FUNDIDA TRAMO 4-1	4000	27/01/2025	24/02/2026	28	36,9	133,7
GT-147C	MODULO EDUCATIVO PLACA CONTRAPISO EJE N A 2/3	4000	27/01/2025	24/02/2026	28	41,2	149,4
GT-148C	MODULO EDUCATIVO DADO EJE 11	4000	27/01/2025	24/02/2026	28	34,2	124,0

Ver anexo 9. Informe Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto.

Ilustración 23 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 28 Días

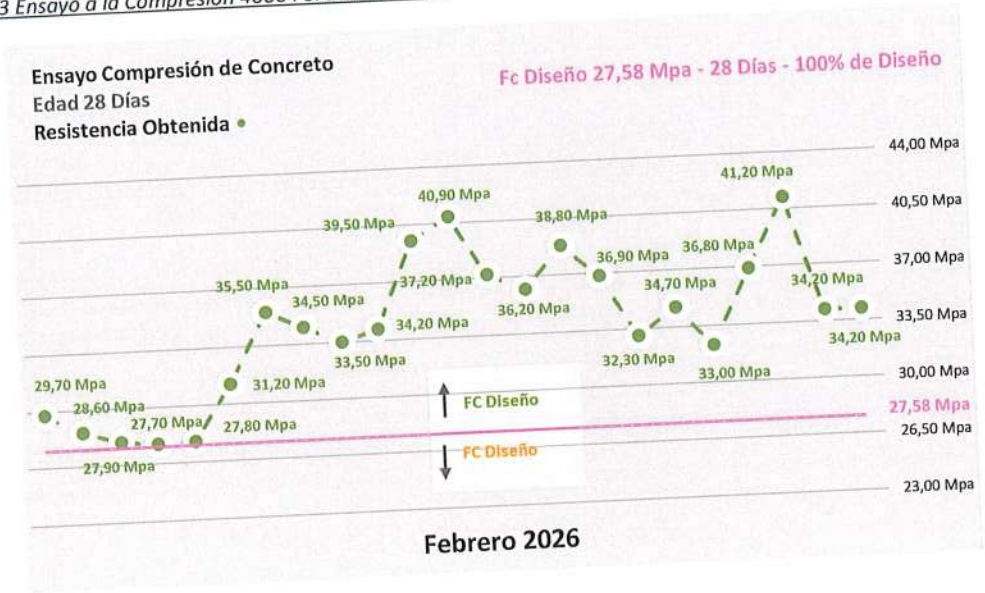

El análisis de los resultados de los ensayos de compresión de concreto a la edad de 28 días evidencia un comportamiento estructural satisfactorio y plenamente conforme con la resistencia de diseño especificada de 27,52 MPa. La totalidad de las muestras ensayadas presentan valores superiores al límite de diseño, registrándose resistencias que oscilan aproximadamente entre 27,70 MPa y 41,20 MPa, lo cual confirma el adecuado desarrollo mecánico del concreto colocado.

La evolución de los resultados de los ensayos a compresión de las muestras de concreto, evidencia un desarrollo progresivo y consistente de la resistencia mecánica del material desde edades tempranas hasta su madurez a 28 días. En las muestras ensayadas entre 7 y 9 días se registraron resistencias mayoritariamente superiores al 65 % de la resistencia de diseño, lo cual indicó desde una etapa inicial un adecuado proceso de hidratación del cemento y condiciones favorables de fabricación y curado del concreto.

Posteriormente, los ensayos realizados a edades comprendidas entre 14 días mostraron un incremento significativo de la resistencia, alcanzando y superando el 90 % de la resistencia de diseño, con numerosos valores que sobrepasaron incluso la resistencia especificada a 28 días. Es por ello, los resultados obtenidos

a los 28 días consolidaron la tendencia observada en las etapas previas, evidenciando que la totalidad de las muestras superaron la resistencia de diseño de 27,58 MPa, con valores que alcanzaron resistencias considerablemente mayores.

Vale mencionar, la muestra GT-160A, registra 15,20 MPa a 7 días, valor inferior al diseño parcial; sin embargo, a 14 días como la muestra GT-160B, alcanzó 27,10 MPa, evidenciando recuperación resistente y evolución mecánica favorable propias de los concretos a mediana edad de 98,3%.

Ilustración 24 Toma y Curado de Muestras Concreto



Basándonos en la norma NSR-10, capítulo C.5, sub capítulo C.5.6.2.1, "para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 40 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 200 m2 de superficie de losas o muros. De igual manera, como mínimo, debe tomarse una muestra por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de concreto".

"Cuando en un proyecto dado el volumen total de concreto sea tal que la frecuencia de ensayos requerida por C.5.6.2.1 proporcione menos de cinco ensayos de resistencia para cada clase dada de concreto, los ensayos deben hacerse por lo menos en cinco tandas de mezclado seleccionadas al azar, o en cada tanda cuando se empleen menos de cinco".

4.5 Ensayos In Situ

Los ensayos in situ corresponden al conjunto de pruebas y verificaciones técnicas realizadas directamente en el lugar de la obra, con el propósito de evaluar las condiciones reales de los materiales, del suelo y de las diferentes mezclas de concreto a utilizar, sin alterar su estado natural ni su función dentro del proyecto Reconstrucción Total del Colegio Alfonso López Pumarejo Sede principal del municipio Villavicencio Meta.

El Consorcio Educación C&G-MH ejecuta dichos ensayos como parte integral del control de calidad, garantizando que las actividades constructivas se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas y parámetros de diseños establecidos.

4.6 Ensayo de Asentamiento o Slump

El ensayo de asentamiento slump constituye un control fundamental para evaluar la consistencia del concreto fresco y verificar su idoneidad antes de la colocación en obra. Conforme a lo establecido en la NSR-10, específicamente en el numeral C.5.3.3.2, las mezclas de prueba deben presentar un asentamiento dentro del rango definido para la obra, garantizando así la trabajabilidad requerida y la uniformidad del material.

Ilustración 25 Ensayo Asentamiento o Slump



Este parámetro permite identificar variaciones en la dosificación, el contenido de agua o la calidad de los materiales, asegurando que el concreto cumpla con las condiciones necesarias para su adecuado desempeño estructural.

Tabla 52 Ensayo Asentamiento o Slump

Elemento	Concreto PSI	Fecha Toma de Muestra	Asentamiento o Slump
Modulo Administrativo Losa y Vigas N+6,55 Eje B-C Ejes 8-13 Fundida 1	4000	12-02-2026	71/4"
Modulo C Educativo Placa Entrepiso Eje K-L Entre 6-9	4000	20-12-2025	7"
Modulo Administrativo Columna H10	4000	16-12-2025	7"

4.7 Resultados Densidad o Masa Unitaria en el Terreno Método Cono de Arena

El método del cono de arena se basa en la excavación controlada de un volumen conocido en el terreno, el cual es posteriormente llenado con arena calibrada, permitiendo calcular el volumen del hueco y, a partir del peso del material extraído y su contenido de humedad, determinar la densidad o masa unitaria del material compactado in situ.

Este procedimiento se ejecuta conforme a las normas INV E-161 y la NTC 164, determinación de la densidad en el terreno por el método del cono de arena con el objeto de verificar que los rellenos y capas de soporte cumplan con los niveles de compactación exigidos en el proyecto, garantizando la estabilidad, capacidad portante y durabilidad de las estructuras que se apoyan sobre dichos materiales, proceso que se realiza en el módulo administrativo en el periodo analizado del 01 al 28 de febrero de 2026.

Los resultados obtenidos se comparan con la densidad máxima determinada en laboratorio (Proctor modificado), estableciendo el porcentaje de compactación alcanzado. Ver anexo 10. Informe densidad o masa unitaria en el terreno método cono de arena.

Ilustración 26 Ensayo Densidad o Masa Unitaria en el Terreno Método Cono de Arena



4.8 Certificado de Calidad de Materiales y Equipos.

Con el objeto de asegurar la confiabilidad de los resultados de seguimiento y medición durante este periodo, se lleva a cabo el control de los equipos que garantizan la validez y fiabilidad de los procedimientos ejecutados. Este proceso incluye la verificación del estado operativo, la calibración vigente y la trazabilidad metrológica de los instrumentos utilizados en obra y de los laboratorios aliados.

4.9 Equipos de Topografía.

Durante este periodo se contó con una comisión del Consorcio Educación C&G-MH, con el fin de viabilizar, liberar y cuantificar las actividades ejecutadas. Esta comisión efectuó recorridos técnicos periódicos en frente de obra como respaldo técnico de las actividades de obra.

Tabla 53 Relación de Equipos Topográficos

Equipos	Marca	Modelo	Serie	Fecha Calibración	Vencimiento Calibración
Estación Total	LEIKA	TCR	703	11/10/2025	10/04/2026

Equipos	Marca	Modelo	Serie	Fecha Calibración	Vencimiento Calibración
Nivel	TOPCON	AT-G4	B38539	16/07/2025	15/01/2026

Ver anexo 11. Certificados de Calibración de Equipos Topográficos

Tabla 54 Equipos de Laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S

Maquinaria	Marca	Modelo	Estatus	intervalo
Pie de Rey	PINZUAR	STAINLESS HARDENED	Operativa	0 mm a 300 mm
Cinta Métrica	STANLEY	N/A	Operativa	0 m 3 m
Instrumento de Pesaje no Automático	OHAUS	CD-11	Operativa	20.000 gr
Máquina Para Ensayos De Compresión De Cilindros	OHAUS	PC-42D	Operativa	200 kn
Máquina Para Ensayos De Compresión De Cilindros	OHAUS	PC-42D	Operativa	1000 kn

Ver anexo 12. Certificados de Equipos de Laboratorio.

5 INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El presente informe refleja las actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, por el componente de SST del Consorcio Educación C&G-MH, con el objetivo de crear entornos de trabajo saludables y seguros, ejecutando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicando las medidas necesarias para minimizar los riesgos existentes en el proyecto, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente (Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015).

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
Levantamiento y Replanteo Topográfico	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificación condiciones del terreno como desniveles o superficies irregulares y la existencia de líneas energizadas y/o de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, en caso de alguna eventualidad reportar). -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos y herramienta menor a utilizar -Utilización de Elementos de Protección Personal-EPP durante la ejecución de actividades. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas. -Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
Limpieza de Acero de Vigas de Cimentación y Pedestales de columnas de los Módulos Administrativo y Educativo por Medio Mecánico y Químico	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificación condiciones del terreno como desniveles o superficies irregulares, excavaciones, almacenamiento de elementos (acero), accesos al área y la existencia de líneas energizadas y/o de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y gas domiciliario). Siempre estar atento y alerta en caso que se presente alguna condición inusual, reportar inmediatamente. -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Uso, Inspección de elementos de protección personal (E.P.P) como casco, gafas, dotación de trabajo, botas de seguridad, mascarilla media cara con filtros y reposición en caso de deterioro. -Al manipular el acero, extraerlo de manera cuidadosa y Verificando puntos de atrapamiento o que ocasionen golpes, machucones, cortes y fractura -Inspección Preoperacional de herramienta menor y equipo (pulidora) a utilizar. -Verificar y asegurar el disco de la pulidora -Mantener y divulgación de Ficha de Seguridad de Pintoxido para consulta. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo. -Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
Relleno y compactación con Material Seleccionado de Rio en Modulo Administrativo y con Material Proveniente de Excavación en el Modulo Educativo	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificación condiciones del terreno como desniveles o superficies irregulares y la existencia de líneas energizadas y/o de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y gas domiciliario enterrada en subsuelo, en caso de alguna eventualidad reportar). Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos a utilizar. Verificación de condiciones de los mismos antes y durante el desarrollo de la actividad. En caso de alguna anomalía presentada, revisar y reportar para hacer mantenimiento. -Al momento de manipular equipos Utilizar los Elementos de Protección Personal básicos-EPP (casco, gafas, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad) durante la ejecución de actividades. En caso de equipos con niveles de ruido altos, uso de protección auditiva como tapaoídos de inserción o de copa, Realizar Pausas Activas periódicas y rotación de personal. -No ubicarse cerca de los puntos de giro y/o puntos ciegos de la retroexcavadora o minicargador. Coordinar el transito del personal o de equipos. -Disponer de hidratación en el área de trabajo. -Realizar Pausas activas - Al realizar el tanqueo de combustible, minimizar el impacto de derrames en el suelo. Utilizar los elementos de protección básicos (casco, gafas, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad).Disponer la ficha de

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	seguridad (FDS) en el área de almacenamiento y los recipientes en los cuales se encuentre los productos químicos rotulados.
Armado, Encofrado y Desencofrado de Acero de Refuerzo para Vigas de Cimentación en los Módulos Administrativo y Educativo.	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificación condiciones del terreno como desniveles o superficies irregulares y la existencia de líneas energizadas y/o de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, en caso de alguna eventualidad reportar). -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos y herramienta menor a utilizar -Identificar puntos de atrapamiento, bordes filosos y puntas expuestas de herramientas, equipos, elementos u objetos utilizados durante la actividad (acero de refuerzo al realizarse el armado de la viga e instalación y remoción de la formaleta). -Utilización de Elementos de Protección Personal básicos-EPP (casco, gafas, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad) durante la ejecución de actividades -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas. -Realizar Pausas Activas.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	- En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.
Armado, Encofrado y Desencofrado de Acero de Refuerzo para Vigas Aéreas de cimentación y Columnas en los Módulos Administrativo y Educativo.	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e Inspección (verificación condiciones del terreno como desniveles o superficies irregulares y la existencia de líneas energizadas y/o de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, en caso de alguna eventualidad reportar). -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos, herramienta menor y elementos a utilizar. -Personal Certificado (trabajo en alturas) y verificación en plataforma de Ministerio de trabajo. -Diligenciamiento y divulgación de Análisis de trabajo seguro (ATS) y Permiso de trabajos. -Utilización de Elementos de Protección Personal básicos-EPP (casco, gafas, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad) y de protección contra caídas (arnés y eslingas) durante la ejecución de actividades. -Identificar puntos de atrapamiento, bordes filosos y puntas expuestas de herramientas, equipos, elementos u objetos utilizados durante la actividad. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	.-Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.
Fundida con Concreto de Solados, Vigas aéreas de Cimentación, placa de entrepiso y Columnas en Módulo Educativo.	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificar condiciones del terreno y el entorno). - Charla previa a iniciar actividades -Inspección de equipos planta de concreto y bomba estacionaria. -Revisión de tablero o móvil eléctrico, conexiones o cables se encuentren en condiciones adecuadas. -Inspección de Herramienta menor a utilizar (martillos, macetas, barras y llaves) -Uso de Elementos de Protección Personal –EPP (casco, gafas, protección auditiva, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad), durante la ejecución de actividad. -Pausas activas e higiene postural al manipular, desplazar la carga (herramientas, tubería y materiales). -Acoplar la tubería asegurando las abrazaderas y empaques utilizando guantes e identificando puntos de atrapamiento o pellizco y teniendo precaución al manipular. Verificación de los parámetros de presión durante el bombeo de concreto.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	-Disponer de las Fichas de Seguridad (FDS) de los productos químicos utilizados en la obra. (Cemento, adictivo y ACPM). -Disponer de puntos de hidratación para el personal. -Orden y aseo en el área de trabajo.
Instalación y Desencofrado de Losa Aligerada (Casetón) en los Módulos Administrativo y Educativo.	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificar condiciones del terreno y el entorno). -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos, herramienta menor y elementos a utilizar. -Personal Certificado (trabajo en alturas) y verificación en plataforma de Ministerio de trabajo. -Diligenciamiento y divulgación de Análisis de trabajo seguro (ATS) y Permiso de trabajos. -Utilización de Elementos de Protección Personal básicos-EPP (casco, gafas, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad) y de protección contra caídas (arnés y eslingas) durante la ejecución de actividades. -Colocar líneas de vida y mantenerse anclado cerca a bordes -No ubicar elementos, implementos o herramientas cerca a los bordes para evitar caída de objetos.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	-Identificar puntos de atrapamiento, bordes filosos y puntas expuestas de herramientas, equipos, elementos u objetos utilizados durante la actividad. Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas. .-Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.


Nota. Periodo Comprendido del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026.

5.1 Relación del Personal Empleado en la Ejecución de la Obra en el Mes.

En el desarrollo del periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026, se cuentan con colaboradores que participan según su formación y conocimiento en las diferentes actividades puestas en prácticas, por consiguiente, se relacionan al presente informe el personal que hace parte del proyecto los que componen el Consorcio Educación C&G, como el de los diferentes subcontratistas que laboran en la obra.

23367


Ilustración 27 Personal Vinculado por Empresas febrero 2026

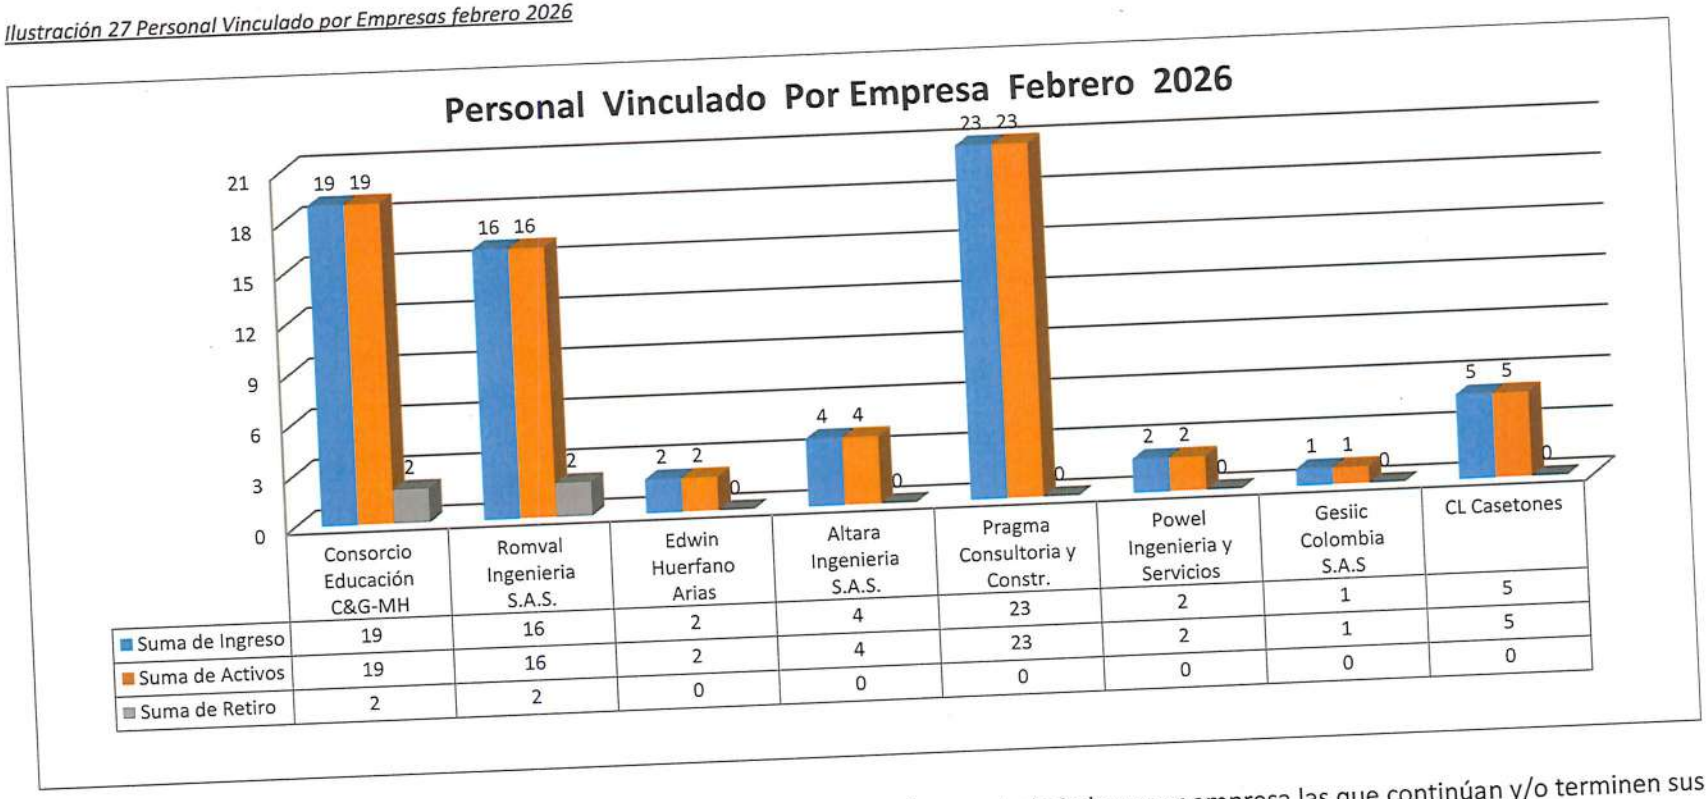

	Consorcio Educación C&G-MH	Romval Ingenieria S.A.S.	Edwin Huerfano Arias	Altara Ingenieria S.A.S.	Pragma Consultoria y Constr.	Powel Ingenieria y Servicios	Gesiic Colombia S.A.S	CL Casetones
Suma de Ingreso	19	16	2	4	23	2	1	5
Suma de Activos	19	16	2	4	23	2	1	5
Suma de Retiro	2	2	0	0	0	0	0	0

Además, se lleva una matriz de control del personal directo e indirecto de obra por trabajador y por empresa las que continúan y/o terminen sus labores con el objeto de controlar la autoliquidación de la seguridad social.

Ilustración 28 Personal Vinculado por Profesión febrero 2026

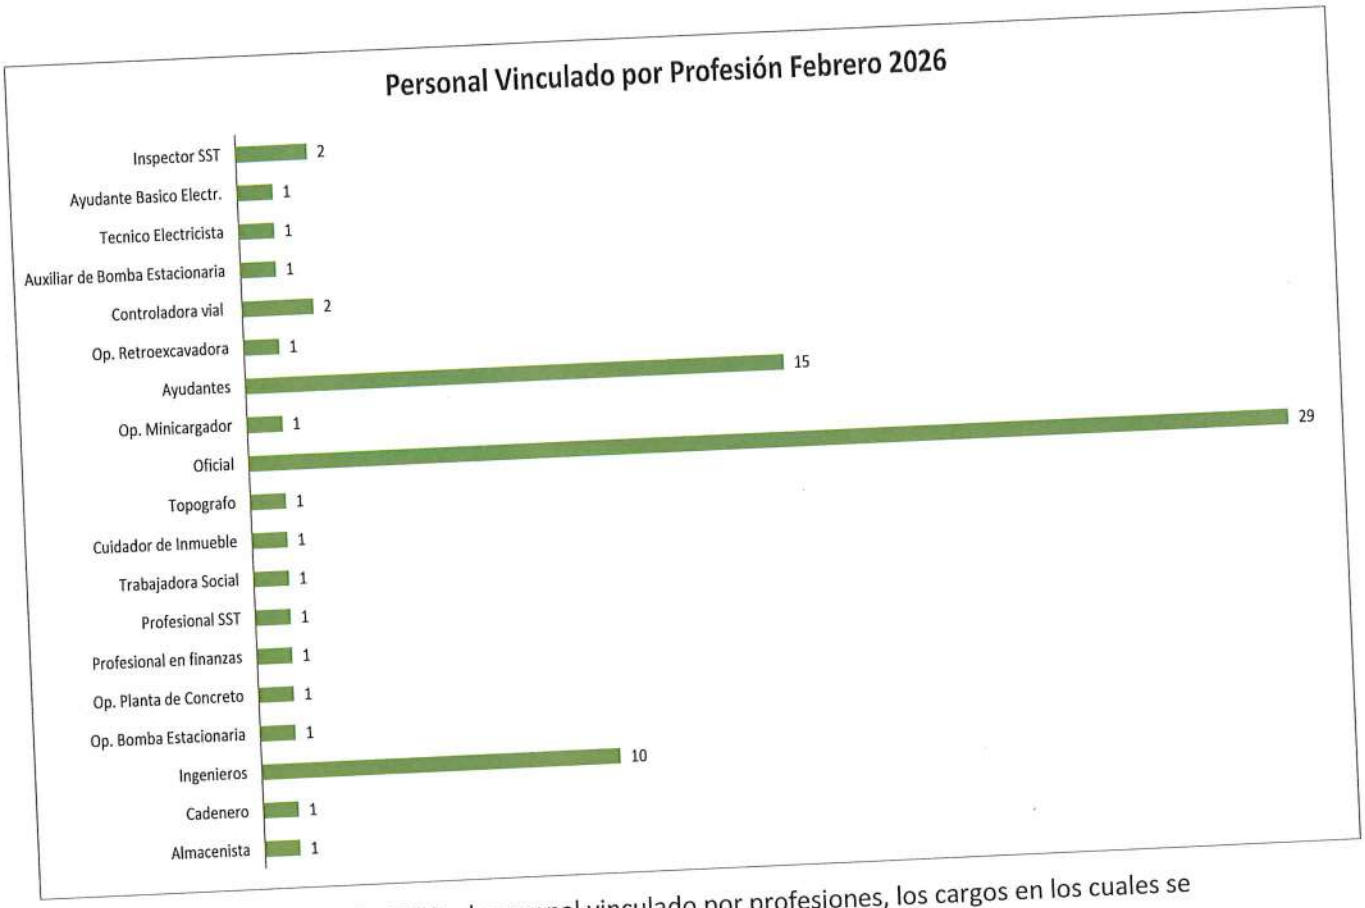

Durante el mes de febrero de 2026, el personal vinculado por profesiones, los cargos en los cuales se presentó aumento correspondió a oficiales y ayudantes.

Tabla 55 Relación del Personal Profesional en Obra

Nombre	Cédula	Tarjeta Profesional	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Yeison Esneyder Gómez G.	86.051.263	25202-090820 CND	Director de Obra	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
Nohora Juliana Jones Ordoñez	63.532.138	68202-152203 CND	Residente de Obra	SANITAS	COLPENSONES	AXA COLPATRIA	COFREM	05/02/2024	-
Joel Pineda Sandoval	1.126.246.825	25202-388151 CND	Residente de Obra	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COFREM	1/10/2025	-
Carlos Alberto Humoa Acevedo	1.121.913.852	091037-0518607 CND	Residente de Obra	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
Jaime Buitrago Nova	79.464.037	25202.133707 CND	Especialista de Estructuras	FAMISANAR	COLPENSIONES	COLPATRIA	COLSUBSIDIO	6/10/2025	

Diego Alejandro Acosta	1.010.191.750	CN 205-142219	Ingeniero Electricista	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	6/10/2025	-
Claudia Patricia Rodríguez H.	1.010.165.507	25335-200159 CND	Ingeniero Hidráulico	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA SEGUROS	COMPENSAR	6/10/2025	-
Astrid Ruiz González	40.341.812	25238-366217 CND	Ingeniera Ambiental	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
Diana Carolina Vega C.	40.217.089	Resolución 3831	Profesional SST	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
María del Pilar Sepúlveda Suarez	1.018.427.594	1779151023	Profesional Social	SANITAS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
Leidy Natalia Martínez Arévalo	1.020.807.368	-	Coordinadora Administrativa	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	20/06/2023	-

Tabla 56 Relación del Personal no Profesional del Contratista de Obra

Nombre	Cédula	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Luis Jorge Dueñas A.	4.131.733	Cuidador de Inmueble	CAJACOPI	NO APLICA TIENE ACUERDO PENSIONAL	AXA COLPATRIA	COFREM	26/06/2025	
Diosnell José Mosqueda Torres	5.386.773	Ayudante de Obra	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	4/09/2025	-
Anderson José Méndez M.	6.843.967	Ayudante de Obra	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	4/09/2025	-
Javier Ivan Bedoya Miranda	80.386.966	Ayudante de Obra	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	21/10/2025	20/02/2026

Edwin Stiven Forero Patiño	1.006.689.217	Ayudante de Obra	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	21/10/2025	20/02/2026
Deiver Fernando Fonseca	86.063.011	Almacenista	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COFREM	04/11/2025	-
María Andrea Monsalve Mejía	20.499.919	Controladora Vial	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRA	COFREM	13/11/2025	-
Ana Mayerly Parada Salgado	1.006.821.856	Controladora Vial	CAJACOPI	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COFREM	13/11/2025	-

Tabla 57 Relación del Personal de Contratistas de Obra

Edwin Huérfano

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Edwin Armando Huérfano	1.057.587.959	Topógrafo	Edwin Huérfano	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	-	06/11/2025	-
Jhonnier Andrés Bohórquez	1.006.655.813	Cadenero	Edwin Huérfano	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	-	12/12/2025	-

Romval Ingenieria S.A.S.

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Ariel Enrrique Martínez	78.675.490	Oficial	Romval Ingenieria	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	4/11/2025	-
Mamerto Córdoba Rentería	71.675.984	Oficial	Romval Ingenieria	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	4/11/2025	28/02/2026

Agustín Landázuri	12.831.649	Oficial	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	6/11/2025	
José Ernesto Cetina	4.102.432	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	COMPENSAR	6/11/2025	
Fernando Berrio	1.003.931.983	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	6/11/2025	
Manuel David Gómez H.	1.002.319.651	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	13/11/2025	24/01/2026
Rufino Mercado Castro	9.251.604	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	13/11/2025	
Over Manuel Ríos Gutiérrez	1.067.852.238	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA	COMPENSAR	13/11/2025	
Teobaldo Martínez R.	11.798.455	Oficial	Romval Ingenieria	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	1/12/2025	-
Jhon Estiber Chisco G.	1.121.923.096	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	3/12/2025	28/02/2026

Jonathan Enrique Gutiérrez	1.221.973.762	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	3/12/2025	
Jhon J. Terán R.	1.053.122.484	Oficial	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	6/12/2025	-
Ángela P. García Morales	1.108.928.812	Inspector SST	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	29/12/2025	-
Néstor Rodríguez R.	9.154.867	Oficial	Romval Ingenieria	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	13/01/2026	-
Diego Fernando Rodríguez M.	1.121.906.899	Ingeniero Residente	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	23/01/2026	-
Francisco José Vásquez	1.065.841.379	Oficial	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	13/02/2026	-
Jheisson Stick Pérez	84.459.874	Oficial	Romval Ingenieria	MUTUALSER	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	13/02/2026	-

Altara Ingenieria S.A.S.

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Freddy Hinestroza P.	1.105.057.864	Operador de Planta de Concreto	Altara Ingenieria	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	10/11/2025	-
Oscar Guerrero	1.121.816.287	Auxiliar Bomba de Concreto	Altara Ingeniera	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	19/11/2025	-
Bernardo Carmona A.	1.125.184.075	Operador Bomba de Concreto	Altara Ingenieria	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COLSUBSIDIO	24/01/2026	-
Josvitervy Mensa Castro	80.033.326	Operador de Minicargador	Altara Ingenieria	CAPITAL SALUD	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COFREM	02/02/2026	

Pragma Consultoría y Construcciones S.A.S.

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Daniel Humberto Parra Montaña	1.121.959.816	Ingeniero Residente	Pragma	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	21/11/2025	
Jamer Moreno	1.042.733.984	Oficial	Pragma	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	20/11/2025	-
Cesar Villalobos	6.688.582	Oficial	Pragma	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	20/11/2025	-
Víctor Manuel Guerra	1.065.839.522	Ayudante de Obra	Pragma	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	20/11/2025	-
Carlos Luis Estanga	5.765.564	Ayudante de Obra	Pragma	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	22/11/2025	-
Jhon Jairo Basto	1.121.836.450	Ayudante de Obra	Pragma	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	22/11/2025	-
Arley Barrientos Saldarriaga	17.360.268	Ayudante de Obra	Pragma	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	24/11/2025	-

José del Carmen Bautista	79.787.480	Oficial	Pragma	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	24/11/2025	-
Jhon Javer Moreno Lucumi	86.073.337	Ayudante de Obra	Pragma	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	26/11/2025	-
Rogelio Santamaría Téllez	5.790.070	Oficial	Pragma	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	27/11/2025	-
Yamith Pedrozo Mora	12.402.255	Oficial	Pragma	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	28/12/2025	-
Fernando Guarnizo Zabala	86.061.844	Ayudante de Obra	Pragma	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	13/01/2026	-
Miguel Olarte Ospina	1.007.159.335	Ayudante de Obra	Pragma	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	13/01/2026	-
Jhonatan Rincón Sánchez	1.007.246.829	Oficial	Pragma	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COFREM	29/01/2026	-
José Carlos Baute	85.271.710	Oficial	Pragma	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	29/01/2026	-

Nicolás Valderrama S.	1.121.957.876	Inspector SST	Pragma	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COFREM	30/01/2026	-
Yersón Andrés Cárdenas	1.003.316.722	Oficial	Pragma	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COFREM	02/02/2026	-
Hernando Sánchez Robles	1.216.973.225	Oficial	Pragma	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COFREM	02/02/2026	-
Tiodoberto Ávila Osorio	80.068.655	Oficial	Pragma	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	COFREM	03/02/2026	-
Gustavo Parra Aguirre	1.121.941.624	Ayudante de Obra	Pragma	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	12/02/2026	-
Rafael Pérez Nieto	1.050.460.376	Oficial	Pragma	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COFREM	12/02/2026	
Marcial José Narváez	1.103.096.462	Oficial	Pragma	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COFREM	17/02/2026	-
Samuel Eduardo Marcelo T.	1.003.293.834	Ayudante de Obra	Pragma	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COFREM	17/02/2026	-

Oromar Moreno Lucumi	1.121.862.773	Ayudante de Obra	Pragma	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	COFREM	17/02/2026	-

Powel Ingenieria y Servicios

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Luis Fernando Rodríguez M.	79.637.101	Técnico Electricista	Powel	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	26/11/2025	-
Cesar Luis Rodríguez	1.006.700.623	Ayudante Básico Elec.	Powel	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	26/11/2025	-

Gesiic Colombia S.A.S.

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Camilo Andrés Castañeda	1.019.008.320	Operador Retroexcavadora	Gesiic	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	6/11/2025	-

CL Casetones

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Yorman Chaverra Palomeque	1.001.846.684	Oficial	CL Casetones	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA SEGUROS	-	02/02/2026	-
Leonel López F.	1.121.816.287	Oficial	CL Casetones	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA SEGUROS	-	02/02/2026	-
Leonel de Jesús Álvarez	1.043.606.303	Ayudante de Obra	CL Casetones	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	-	06/02/2026	-

Gregorio Doria López	1.073.816.074	Oficial	CL Casetones	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFANDI	06/02/2026	-
Orinson López Fuentes	1.063.160.288	Oficial	CL Casetones	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COMFANDI	06/02/2026	-

Ver Anexo 13. Seguridad Social Consorcio y Contratistas

5.2 Registro de Entrega, Reemplazo de EPP´s y Dotación.

El Consorcio Educación C&G-MH, adoptará las medidas necesarias para garantizar a sus trabajadores las condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar. Por ello, dotará de la ropa de protección adecuada para evitar daños a la salud, por consiguiente, es indispensable la entrega de dotación de los equipos de protección personal cuando los trabajadores ingresen por primera vez, el reemplazo o sustitución por cualquier daño que sufran los equipos a causa de las actividades laborales, como el registro sistemático de entrega de forma individual. Ver anexo 14. Entrega de elementos de protección personal.

Ilustración 29 Entrega y Reemplazo de Equipos de Protección Personal



5.3 Procesos de Inducción al Ingreso de Obra.

Para el mes de febrero de 2026, se presentaron un total de diecinueve (16) ingresos de personal nuevo, los cuales se generaron para los contratistas del proyecto, se procede a realizar los exámenes médicos pre empleo con la finalidad de conocer el estado de salud de los trabajadores al inicio de la relación laboral. (Ver anexo 15. Hojas de Vida Personal).

El personal recibió previo al inicio de sus actividades la inducción correspondiente para visualizar las condiciones que van a desarrollar en el ambiente laboral, los daños que las mismas puedan causar a su salud y los medios o medidas para prevenirlos, a continuación, se indican las inducciones impartidas. El personal flotante se realizó una socialización de las actividades, riesgos y peligros existentes en obra Ver anexo 16. Formato de inducción de ingreso.

Ilustración 30 Proceso de Inducción




Tabla 58 Proceso de Inducción por Empresas

Inducciones de Ingresos	Altara Ingenieria S.A.S.	Romval Ingenieria S.A.S.	Pragma Consultoría y Constr.	CL Casetones S.A.S.
Información General del Proyecto y presentación de la empresa.	1	2	8	5
Horarios de Trabajos y Zonas Comunes	1	2	8	5
Política Integral de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Salud en el trabajo	1	2	8	5
Cobertura de Seguridad Social, EPS, ARL, AFP, CCF	1	2	8	5
Notificación de Peligros, Riesgos y Aspectos Ambientales para trabajadores	1	2	8	5
Actos y Condiciones Inseguras	1	2	8	5
Reportes de Accidentes e Incidentes en el Trabajo	1	2	8	5

Inducciones de Ingresos	Altara Ingenieria S.A.S.	Romval Ingenieria S.A.S.	Pragma Consultoría y Constr.	CL Casetones S.A.S.
Normas de Seguridad, Uso de EPPS	1	2	8	5
Orden y Aseo en los Lugares de Trabajo	1	2	8	5

Nota. Periodo Comprendido del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026

Ilustración 31 Participación de Inducciones

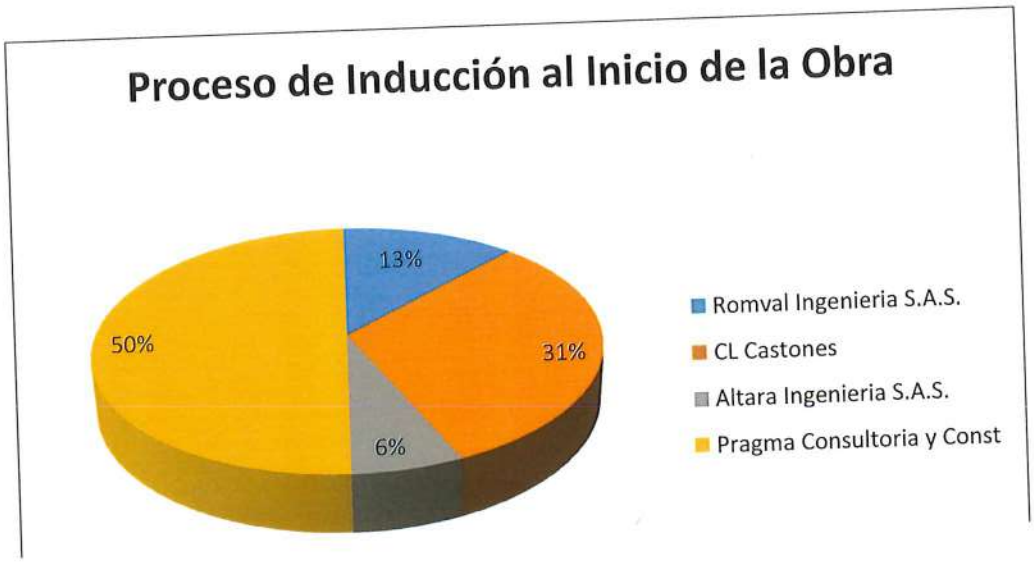

5.4 Retiros de Personal


En el mes de febrero de 2026 se generaron cuatro (4) retiros de personal directo y de los contratistas activos en el proyecto. Para tal fin se solicita la entrega de la documentación que garantice que las empresas contratistas realizaron los respectivos procesos de liquidación, notificación de examen de

egreso y/o realización por parte del ex colaborador en tiempo establecido, paz y salvo, documentos firmados por el personal saliente. Ver anexo 17. Documentos de Retiro de Personal. Nota: En caso que los documentos del personal no se entreguen oportunamente por parte de los contratistas se generan oficio y/o correspondencia por correo para solicitar la documentación.

5.5 Charlas de Seguridad y Capacitaciones.

Nuestros colaboradores en el periodo actual reciben información teórica y práctica, adecuada y en forma periódica para las funciones inherentes a su actividad en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ver Anexo 18. Cronograma de Capacitaciones. Ver Anexo 19. Listado de Asistencia.

Ilustración 32 Cobertura de Participación Contratista

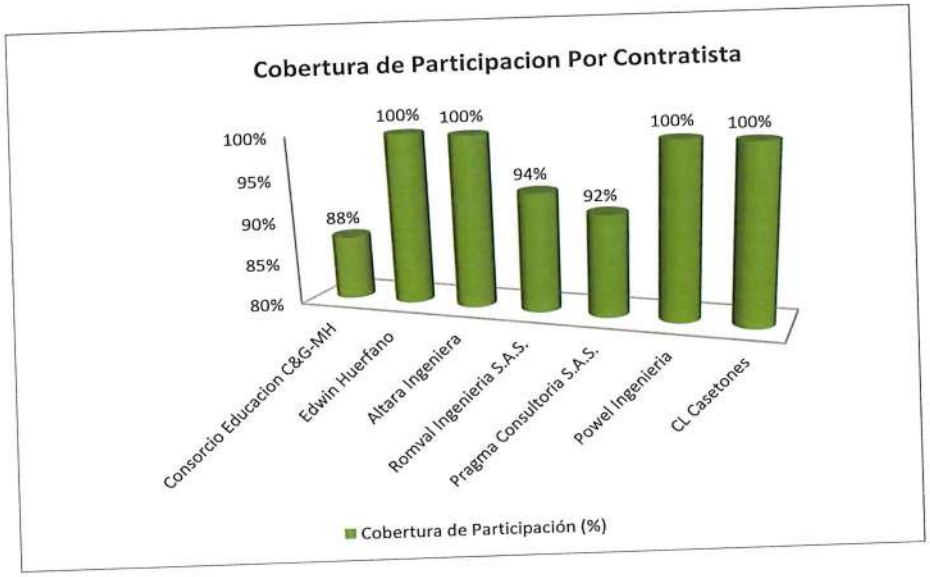

En la anterior ilustración se describen los porcentajes de la cobertura de participación por contratistas, indicando que el compromiso de nuestros colaboradores en los procesos de charlas y capacitaciones.

Ilustración 33 Cobertura de Participación Contratista



5.6 Control de Actividades de Alto Riesgo.

Para el desarrollo de todas las actividades consideradas de alto riesgo que por sus condiciones generales se ejecutan mediante la interacción de los elementos del proceso de trabajo y el individuo se establecerán parámetros y criterios de seguridad mediante profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo que cuenten con las competencias para validar y firmar los permisos de trabajo seguro como los permisos para trabajos en caliente, trabajos en alturas, trabajo en espacios confinados, excavaciones, izaje de cargas, etc.) y trabajos especiales no rutinarios. Durante el mes de febrero de 2026 se realizaron actividades relacionadas con trabajos en altura desarrolladas por los contratistas. Ver Anexo 20 Permisos de trabajo en alturas e informes de contratistas.

5.7 Inspecciones Planificadas.

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas. El descubrimiento de las condiciones y prácticas

inseguras por medio de la inspección y su rápida corrección, son uno de los mejores métodos que pueda emplear el Consorcio Educación C&G-MH, para prevenir accidentes y proteger a sus trabajadores, así La dirección demuestra al personal su interés y sinceridad en la prevención de accidentes laborales. Ver Anexo 21 Cronograma General de Inspecciones y Formatos Inspecciones y Preoperacionales en informes de contratistas.

Ilustración 34 Inspecciones Planificadas



5.8 Visitas y Comités en Obra

Durante el mes de febrero de 2026 se llevaron a cabo visitas semanales a la obra por parte de las entidades participantes del proyecto, entre ellas la Alcaldía de Villavicencio, Ecopetrol S.A., la Interventoría y personal directivo del Consorcio Educación.

De igual manera, el 26 de febrero de 2026 se realizó la reunión mensual con los integrantes de la veeduría ciudadana.

Estos espacios tuvieron como finalidad efectuar seguimiento al avance físico y administrativo del proyecto, verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y técnicos establecidos, y fortalecer los canales de comunicación y articulación entre las partes interesadas.

Ilustración 35 Comités de Obra



5.9 Accidentabilidad.

En el mes de febrero de 2026, se presentó 01 evento que produjo una lesión corporal o funcional resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por lo cual se presentó ausentismo laboral. (Ver anexo 22 certificado de accidentalidad emitido por ARL).

Descripción del evento: El día 04 de febrero de 2026, en el área contigua al módulo E (polideportivo), se desarrollaba la actividad de cargue y descargue de varillas de acero para su respectiva ubicación en el frente de trabajo.

Durante el desplazamiento del material, uno de los trabajadores sufrió un punzamiento en la planta del pie izquierdo al pisar un objeto metálico que se encontraba parcialmente enterrado en el suelo.

El *colaborador* informó de manera inmediata el incidente al personal responsable. Posteriormente, se realizó el respectivo reporte ante la ARL y se efectuó el traslado al centro asistencial más cercano para valoración y atención médica.

Como resultado del evento, el trabajador recibió incapacidad médica por dos (2) días.


Adicional se presentó ausentismo por enfermedad común:

- Ausentismo de colaborador de contratista Pragma Consultoría por 07 días de incapacidad por caída generada durante actividades de recreación.
- Ausentismo de colaborador de Consorcio Educacion C&G por cuadro clínico de virosis con 02 días de incapacidad.

Tabla 59 Descripción de Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES SST			
Total de HHTT Mes:	11817	Total HHTT Acumuladas	44066
Número de Accidentes:	1	Días de Ausentismo por Incapacidad	6
Porcentaje de Ausentismo Mes:	0,35%	Días Programados en el mes:	24

Ilustración 36 Indicadores de Accidentalidad

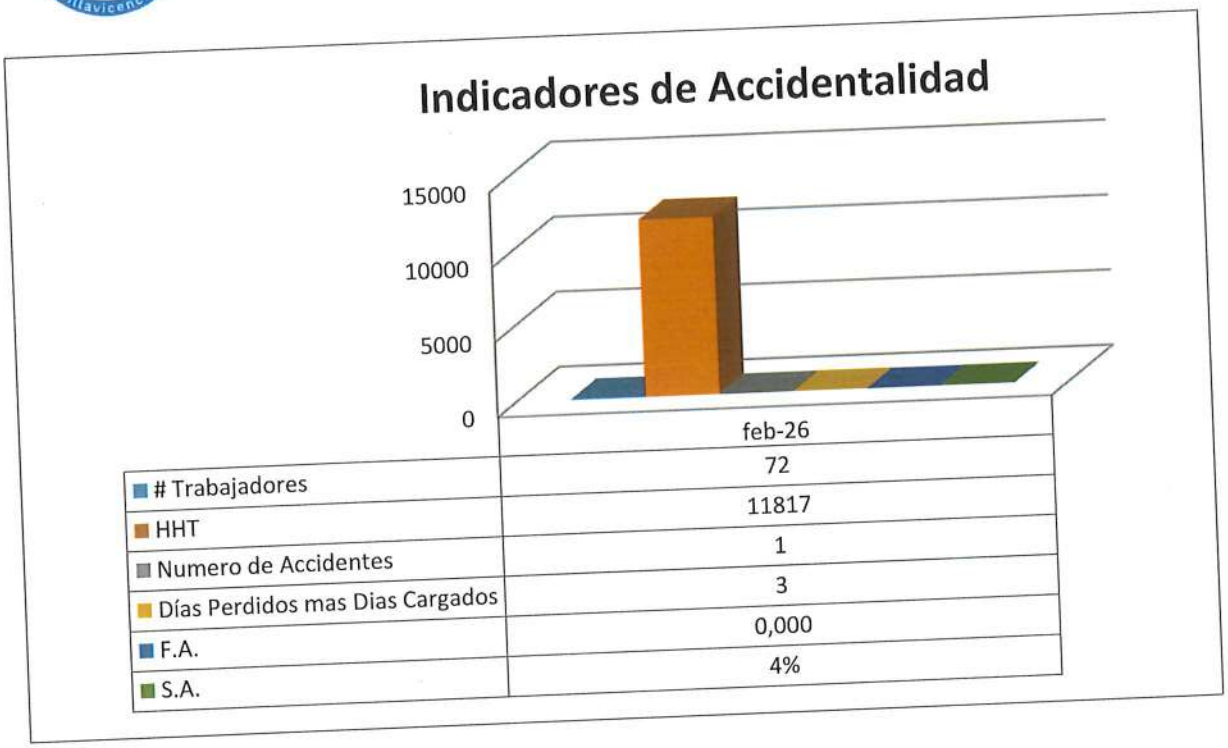

5.10 Frecuencia de Accidentalidad.

Frecuencia de accidentalidad = Número de accidentes laborales del periodo/número de trabajadores del mismo periodo X 100.

5.11 Severidad de Accidentalidad.

Los días perdidos por accidentes laborales, para el proyecto se establece la meta de 48% para la frecuencia de severidad, teniendo en cuenta el comportamiento a nivel nacional para el gremio de la construcción.

Frecuencia de severidad = Número de días perdidos por AL + días cargados en el periodo / número de trabajadores del periodo X 100.

5.12 Ausentismo Laboral.

Ausentismo=No de días de ausencia/No de días de trabajo programados en el mes X100.

6 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades desarrolladas en el marco de la gestión ambiental de la obra denominada "Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo – Sede Principal del Municipio de Villavicencio, Meta", alto Pompeya correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026.

Durante el periodo reportado, se implementaron las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado, con el propósito de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales derivados de las actividades constructivas ejecutadas en la etapa de obra.

El Consorcio Educación C&G ratifica su compromiso con la adecuada gestión ambiental del proyecto, mediante el seguimiento y reporte continuo de la aplicación de las medidas de prevención, mitigación y corrección, orientadas a minimizar los impactos generados durante la ejecución de las obras, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la protección de los recursos naturales en el área de intervención.

Durante el periodo evaluado, se desarrollaron actividades de control, seguimiento y mejora continua en la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante las autoridades ambientales competentes.

El proyecto se encuentra actualmente en etapa constructiva; por lo tanto, las actividades descritas en el presente informe fueron ejecutadas en los diferentes frentes de trabajo activos, de acuerdo con el avance físico de la obra y conforme a los lineamientos técnicos y ambientales establecidos en el PMA.

Así mismo, se realizó el control y seguimiento en campo de las medidas ambientales implementadas, verificando el cumplimiento de las fichas de manejo ambiental y la correcta aplicación de los procedimientos definidos para la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales asociados a las actividades constructivas.

A continuación, se presentan los programas que conforman el componente Abiótico del Plan de Manejo Ambiental, implementados durante las diferentes etapas de la construcción. En este apartado se describen las actividades ejecutadas de acuerdo con la aplicabilidad de cada ficha de manejo ambiental y el periodo evaluado en el presente informe.

Las actividades fueron desarrolladas con el apoyo del equipo de gestión ambiental del proyecto y se presentan con una descripción general de las operaciones realizadas en cada programa de manejo ambiental. Para cada caso, se detalla el periodo evaluado, el estado de avance o condición actual de las actividades y, cuando aplica, se incorpora el respectivo registro fotográfico como evidencia de las acciones implementadas.

6.1 Actividades del Mes

Las acciones de supervisión se enfocaron principalmente en:

- ✓ Ingreso de maquinaria
- ✓ Mantenimiento de la señalización en la obra
- ✓ Inspección de puntos de emergencia
- ✓ Inspección de puntos ecológicos
- ✓ seguimiento de acopio de combustibles
- ✓ seguimiento de orden y aseo en los frentes de obra
- ✓ seguimiento desinfección unidades sanitarias
- ✓ Se continúa realizando actividades de organización y limpieza del acero, adecuaciones locativas, fabricación de concreto, en la obra del Colegio Alfonso López Pumarejo En el Corregimiento Cuatro Alto de Pompeya.

Tabla 60 Control De Manejo Ambiental

Actividad Para El Manejo Ambiental	Avance Actividad A La Fecha	Observación / Acción
MAQUINARIA Y EQUIPO	100%	Control y seguimiento ingreso maquinaria y equipo en la obra
MANEJO DE RCD	100%	Control de rutas y registro de transporte de residuos (RCD — escombreras autorizadas).
ORDEN Y ASEO	100%	Mantenimiento de áreas de trabajo en campo
CONTROL Y SEGUIMIENTO	100%	Mantenimiento, Demarcación y señalización ambiental
CONSORCIO EDUCACION C&G	100%	Manejo de residuos en las obras de construcción separación en la fuente (22-01-2026)

7 MEDIO ABIÓTICO

A continuación, se presentan los programas que integran el Componente Abiótico del Plan de Manejo Ambiental (PMA), aplicables a las diferentes fases del proceso constructivo. En este apartado se describen las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado, de acuerdo con la aplicabilidad de cada ficha de manejo ambiental y en cumplimiento de los lineamientos establecidos para su adecuada implementación.

Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento del equipo de gestión ambiental del proyecto y se documentan mediante una descripción clara y precisa de las operaciones realizadas en cada programa de manejo. Para cada uno de ellos se indica el periodo evaluado, el estado de avance o condición actual de las acciones implementadas y, cuando corresponde, se incorpora el respectivo registro fotográfico como evidencia del cumplimiento y ejecución de las medidas ambientales previstas.

7.1 Manejo y Disposición de Materiales Sobrantes de Demolición Excavación y Construcción

En el desarrollo de las actividades del mes de FEBRERO del 2026 no se ha realizado la disposición de los materiales sobrantes de excavación en la empresa Bioagrícola del Llano E.S.P., sitio autorizado por la

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA.) Las volquetas encargadas del transporte del material cubren el volcó con lonas o geotextil, con el fin de minimizar la emisión de material particulado durante el trayecto desde la obra hasta el sitio de disposición final autorizado

7.2 Clasificación de Material Aprovechable y No Aprovechable

Con respecto al manejo de los materiales sobrantes de excavación y demolición, se informa que durante el periodo evaluado no se dispuso de material en la empresa de servicios públicos **Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.**, conforme a los registros de transporte y manifiestos de disposición final.

Adicionalmente, se implementaron las siguientes medidas de manejo:

- Reutilización de material pétreo en rellenos y nivelaciones internas de la obra.
- Control y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) en escombrera autorizada (**Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.**).

Tabla 61 Disposición Final De Los Residuos De Construcción Y Demolición RCD

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	
EXCAVACION	0
DEMOLICION	0
APROVECHAMIENTO Rellenos Material Excavación (Relleno Exten Mecanico)	0

7.3 Manejo Adecuado de los Materiales de Construcción

Los materiales que ingresan a la obra son utilizados de manera progresiva, de acuerdo con los requerimientos del proceso constructivo; no obstante, algunos son acopiados de forma temporal para su uso posterior.

Los acopios ubicados en los diferentes frentes de trabajo se encuentran debidamente señalizados mediante cinta de seguridad y, cuando se requiere, son cubiertos con plástico negro o material similar, con el fin de minimizar la dispersión de material particulado, prevenir el arrastre de material por acción del viento o la lluvia y mantener condiciones seguras en las áreas de almacenamiento.

Ilustración 37 Acopio Temporal De Material



Asimismo, la empresa encargada del suministro de agregados pétreos cuenta con los permisos de explotación minera otorgados por la autoridad ambiental competente (CORMACARENA), garantizando que el material proviene de fuentes legalmente autorizadas y ambientalmente responsables.

Durante el mes de FEBRERO de 2026, ingresó a la obra un volumen aproximado de 390 m^3 de material pétreo, el cual fue utilizado en las actividades programadas para el desarrollo de las obras, de acuerdo con los requerimientos constructivos del proyecto.

Tabla 62 Cantidad de Material

CANTIDAD DE MATERIAL	
GRAVA 3/4	300M3
GRAVA 1/2	0
CRUDO DE RIO (RELLENO DE 6")	0
ARENA DE PLANTA	435M3
SUB-BASE	0
MATERIAL SELECCIONADO RIO 2"	
TOTAL	735 m^3

7.4 Programa para el Manejo Eficiente del Agua y Vertimientos

El **Consorcio Educativo C&G** dispone de unidades sanitarias exclusivas para el personal de obra, las cuales cuentan con condiciones adecuadas de higienización y mantenimiento, garantizando su correcto uso y contribuyendo al cumplimiento de las condiciones de salud ocupacional y salubridad en el área de trabajo.

El agua empleada para las descargas sanitarias se almacena en canecas y es utilizada durante la jornada laboral; posteriormente, estas son nuevamente abastecidas al día siguiente, evitando almacenamientos prolongados que puedan favorecer la proliferación de vectores y generar afectaciones a las condiciones de higiene y salubridad del proyecto.

Adicionalmente, se realiza seguimiento periódico al estado de las unidades sanitarias, con el fin de verificar su adecuado funcionamiento y asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

El consorcio dispone de una edificación que fue conservada y adaptada para el funcionamiento de las unidades sanitarias, las cuales cuentan con medidas de higienización adecuadas, suministro permanente de elementos de aseo, servicio de energía eléctrica e iluminación apropiada para el uso del personal de obra.

Ilustración 38 Desinfección de Unidades Sanitarias



7.5 Manejo de Residuos Líquidos Domésticos

En el área de desarrollo del proyecto no se identifican cuerpos de agua superficiales que puedan verse afectados o contaminados por las actividades constructivas. No obstante, se implementan medidas orientadas a minimizar la generación de residuos líquidos, evitando su disposición en zonas ambientalmente sensibles.

Estas acciones se aplican especialmente en los sitios donde se ubican las estructuras y durante las labores de preparación de materiales, con el fin de prevenir posibles afectaciones al suelo y al entorno inmediato del proyecto.

En la obra se cuenta con canecas destinadas a la recolección y almacenamiento de agua, las cuales se utilizan para apoyar el desarrollo de las actividades en los diferentes frentes de trabajo, garantizando un

uso controlado del recurso hídrico y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

7.6 Manejo de Residuos Sólidos y Especiales

Se realiza mantenimiento periódico a los **puntos ecológicos** ubicados en sitios estratégicos de la obra, con el fin de garantizar la correcta separación en la fuente de los residuos generados, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Durante el periodo reportado se realizó mantenimiento y fortalecimiento de los puntos ecológicos del proyecto, con el fin de mejorar la correcta separación en la fuente y dar cumplimiento al código de colores vigente.

Las actividades ejecutadas fueron:

- Mantenimiento de puntos ecológicos mediante pintura de canecas, ajustándolas al nuevo código de colores para la adecuada clasificación de residuos.
- Reposición y cambio de la lona de cerramiento del área de almacenamiento de residuos, garantizando la protección de las canecas frente a la exposición solar y la lluvia, evitando así el deterioro de los recipientes, la contaminación cruzada y la posible proliferación de vectores.
- Rotulación técnica de las canecas conforme al tipo de residuo.
- Entrega de una caneca a cada contratista para promover la correcta gestión y separación de residuos en las áreas de trabajo.

Estas acciones permiten fortalecer el manejo integral de residuos sólidos en obra, prevenir impactos ambientales negativos y mejorar las condiciones de orden y aseo en el frente de trabajo.

Los residuos ordinarios son dispuestos en la entrada de la obra tres (3) veces por semana para su recolección por parte de la empresa de servicios públicos de Villavicencio, **Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.**, la cual cuenta con los permisos ambientales requeridos para realizar la disposición final en el relleno sanitario autorizado del municipio.

por su parte, los residuos aprovechables son almacenadas en la caneca del rotulo blanco para material aprovechable tales como plásticos, son almacenados temporalmente en áreas designadas dentro de la obra y posteriormente entregados a terceros autorizados para su recolección y adecuado aprovechamiento y tratamiento.

Adicionalmente, se realizan jornadas periódicas de **orden y aseo** en las áreas de trabajo, con el objetivo de mantener las zonas limpias y organizadas, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo seguro y eficiente de las actividades constructivas.

Ilustración 39 Mantenimiento Puntos Ecológicos



Ilustración 40 Capacitación manejo adecuado de Puntos Ecológicos y Separación en la Fuente



8 MEDIO BIÓTICO

A continuación, se presentan los programas que conforman el componente Biótico del Plan de Manejo Ambiental durante la etapa de construcción y la instalación de los componentes necesarios para garantizar la continuidad de los procesos.

El seguimiento y control de estas actividades es realizado por el profesional responsable del área ambiental, con el apoyo de la brigada ambiental, asegurando el cumplimiento de las medidas de manejo establecidas.

8.1 Programa de Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote

Durante el desarrollo de las actividades correspondientes al mes de **FEBRERO de 2026**, se continuó con el **aprovechamiento del material proveniente de excavación** para el desarrollo de las diferentes actividades constructivas dentro de la obra del **Colegio Alfonso López Pumarejo**, ubicado en el corregimiento de **Cuatro Altos – Pompeya**. Este aprovechamiento se realizó principalmente en actividades de relleno, conformación y nivelación de áreas internas del proyecto, en cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), contribuyendo a la reducción de volúmenes dispuestos externamente y a la optimización del uso de los recursos generados en obra.

Durante el período evaluado, no se realizó la disposición de materiales sobrantes de excavación en la empresa **Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.**, sitio autorizado por la **Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA**.

No obstante, como medida preventiva y de control, las volquetas encargadas del transporte de material implementaron el cubrimiento del volco mediante lonas o geotextil, con el fin de minimizar la emisión de material particulado durante el trayecto desde la obra hasta el sitio de disposición final autorizado, en cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA.

8.2 Manejo de Flora

En el marco de las actividades de manejo ambiental del proyecto, se continúa con la implementación de medidas de protección a la flora existente dentro del área de intervención.

Se está realizando el cerramiento individual de los individuos arbóreos presentes en el proyecto, con el fin de prevenir afectaciones mecánicas derivadas de las actividades constructivas, tránsito de maquinaria, acopio de materiales y circulación de personal.

Estos cerramientos de protección permiten:

- Evitar daños en fuste, raíces y copa.
- Prevenir compactación del suelo en la zona radicular.
- Minimizar riesgos de afectación durante el proceso constructivo.
- Dar cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

La implementación de esta medida contribuye a la conservación de la cobertura vegetal existente y al control de impactos ambientales asociados a la ejecución de la obra.

Ilustración 41 Cerramiento de Protección Individual



8.3 Manejo de Fauna

Durante el periodo reportado se realizó monitoreo de fauna mediante observación directa en el área de influencia del proyecto, con el fin de verificar posibles afectaciones a especies de fauna silvestre asociadas al desarrollo de las actividades constructivas.

Como resultado del seguimiento realizado, no se evidenció afectación, desplazamiento forzado ni eventos de atropellamiento o perturbación significativa de fauna silvestre en el área intervenida.

Durante las jornadas de observación se registró la presencia de las siguientes especies:

- Tórtola común (conocida localmente como tórtola abuelita).
- Canario amarillo.

La presencia de estas especies indica que, a la fecha, las actividades del proyecto no están generando impactos negativos significativos sobre la fauna aviar del sector.

Se continuará con el monitoreo periódico como medida preventiva dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

8.4 Manejo de Sustancias Químicas

Durante el mes de FEBRERO se realizó la inspección del punto de acopio principal de combustibles, verificando el adecuado estado y funcionamiento de los elementos dispuestos para la atención de posibles emergencias, el manejo adecuado de las sustancias químicas en obras civiles es fundamental para proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente, las áreas de almacenamiento se encuentran frescas, secas y bien ventiladas lejos de fuentes de calor.

El consorcio cuenta con tres puntos de emergencia distribuidos estratégicamente dentro del proyecto, destinados al manejo de posibles contingencias que puedan presentarse durante las labores diarias en la obra.

Durante el mes de FEBRERO se realizó la revisión y verificación de los elementos que conforman dichos puntos, con el fin de asegurar que se encuentren en buen estado y dentro de su fecha de vigencia. Se repusieron los suministros caducados o agotados, garantizando la disponibilidad de los equipos y materiales necesarios para una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se verificó que los botiquines de emergencia y los kits de control de derrames permanezcan ubicados en lugares frescos, secos y de fácil acceso, y se programaron las acciones correspondientes.

En este punto se encuentran disponibles los equipos y materiales necesarios que permiten garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el desarrollo de las actividades del proyecto..

- ✓ Botiquín primeros auxilios
- ✓ Extintor multipropósito
- ✓ Camilla de emergencia
- ✓ Kit control de derrames

Ilustración 42 Inspección Puntos de Emergencia



8.5 Manejo de Señalización en la Obra

Durante el mes de FEBRERO se realizaron actividades de mantenimiento y reposición de la señalización instalada en la obra, así como la delimitación de las zonas de peligro, con el fin de garantizar la seguridad del personal y el adecuado desarrollo de las labores constructivas

Ilustración 43 Mantenimiento de la Señalización



8.6 Manejo de Maquinaria y Equipos en Obra.

Durante el mes de **FEBRERO de 2026**, en la obra se contó con la siguiente maquinaria y equipos: **planta de cemento DOMAT, silo y sistema de alimentación de concreto, retroexcavadora SINOMACH y minicargador BOBCAT EARTHFORCE S18.**

Ilustración 44 Maquinaria en la Obra



Se realizó la inspección general de la maquinaria que se encuentra operando en las diferentes actividades programadas dentro del proyecto, verificando que cada equipo cuente con los elementos requeridos para la atención de emergencias, tales como extintor multipropósito, así como con los dispositivos de seguridad y operación en condiciones adecuadas.

Previo al inicio de las actividades, se desarrollan charlas preoperacionales y se realiza la firma de permisos de trabajo, con el fin de reforzar las medidas de seguridad industrial y ambiental, y garantizar la correcta operación de los equipos.

Durante la inspección de cada máquina se constató que los elementos de seguridad y operación se encontraban en regla, permitiendo su uso seguro dentro del proyecto.

De acuerdo con la maquinaria utilizada en las actividades de construcción, se puede indicar que los niveles de emisión de ruido se han mantenido por debajo de los límites permisibles establecidos (80 decibeles,

según la Resolución 8321 de 1983), sin generar afectaciones a la comunidad ni a la salud de los trabajadores del proyecto. No obstante, se exige el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP), especialmente protección auditiva. Cabe resaltar que las labores se desarrollan exclusivamente en jornada diurna.

Finalmente, mediante observación directa durante la operación de la maquinaria, se evidenció que el proyecto cuenta con la adecuada conformación del patio de maniobras, lo cual permite la correcta manipulación de los equipos y contribuye a la prevención de la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustibles, aceites o lubricantes.


8.7 Anexo 23: Inspección Ambiental a Contratistas

8.8 Anexo: 24 Inspección Maquinaria y Equipo Menor

8.9 Anexo 25 Circular Ambiental Informativa

8.10 Anexo 26 Acta Entrega De Chatarra

Ilustración 45 Puesto de Control Silo Para Concreto

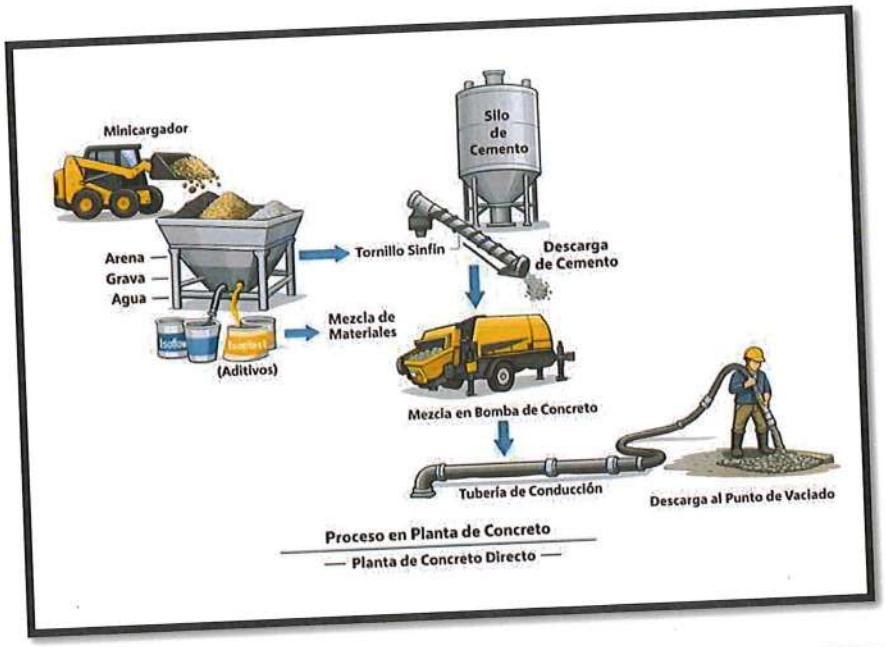

En el desarrollo de las actividades del proyecto, se busca fortalecer la concienciación ambiental de los colaboradores mediante la realización de charlas ambientales orientadas a la importancia del cuidado y el manejo adecuado de los recursos naturales y del entorno.

La educación ambiental permite fortalecer el conocimiento y la sensibilización del personal de obra frente a las principales problemáticas y temáticas ambientales. Al promover la comprensión de estos aspectos, se brindan a los trabajadores las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y adoptar acciones responsables, orientadas al uso eficiente de los recursos naturales y a la protección del entorno, contribuyendo así al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a la sostenibilidad del proyecto

8.11 Programa de Educación y Capacitación al Personal del Proyecto

Durante el periodo reportado se desarrollaron jornadas de educación y sensibilización ambiental dirigidas al personal operativo del proyecto, con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Las charlas abordaron temas relacionados con:

- Importancia del cuidado y protección del medio ambiente durante la ejecución de la obra.
- Correcta separación y disposición de residuos.
- Orden y aseo en las áreas de trabajo.
- Prevención de impactos ambientales derivados de malas prácticas operativas.
- Importancia de mantener condiciones seguras para evitar accidentes laborales asociados al desorden y acumulación de residuos.

Estas actividades permitieron generar conciencia en el personal sobre su responsabilidad individual y colectiva en la gestión ambiental del proyecto, promoviendo buenas prácticas ambientales y fortaleciendo el compromiso con la sostenibilidad y la seguridad en obra.

Ilustración 46 Capacitación al Personal en la Obra



8.12 Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todas las actividades constructivas desarrolladas en la obra cuentan con el acompañamiento permanente del equipo de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de manejar, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos que puedan generarse durante la ejecución del proyecto por parte del Consorcio Educación C&G.

La entidad se encuentra comprometida con la seguridad y salud de los trabajadores, promoviendo el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), los cuales constituyen la última barrera de defensa frente a los riesgos presentes en las diferentes labores y áreas de trabajo. Si bien el uso de los EPP no evita completamente la ocurrencia de accidentes, su correcta utilización reduce significativamente la gravedad de las lesiones que puedan presentarse.

Los Elementos de Protección Personal (EPP) son equipos o dispositivos destinados a ser utilizados por los trabajadores para protegerse de los riesgos laborales y garantizar su seguridad y salud en el entorno de trabajo.

- ✓ Realización de charlas ambientales dirigidas al personal operativo.
- ✓ Instalación de cerramientos perimetrales en las zonas de excavación.
- ✓ Señalización de puntos de acopio de materiales, los cuales se mantienen cubiertos con plástico negro.
- ✓ Implementación de señales de obligación, peligro o advertencia, auxilio, prohibición y de equipos contra incendio, garantizando una adecuada comunicación visual en los frentes de trabajo.

Ilustración 47 Actividades Sst Medio Ambiente



8.13 Programa de Información y Participación Comunitaria

Es importante resaltar que la comunidad se verá directamente beneficiada con la construcción del nuevo Colegio Alfonso López Pumarejo, el cual contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio.

Con el propósito de mantener informada a la comunidad sobre el avance y las actividades desarrolladas durante el proceso constructivo, durante el mes de febrero se contó con el acompañamiento de la

profesional social del Consorcio, quien participó activamente en las jornadas de socialización y seguimiento en campo.

Ilustración 48 Socialización Avance Del Proyecto Comunidad Alto Pompeya



9 INSPECCIÓN AMBIENTAL.

FECHA: 01 DE FEBRERO AL 28 de FEBRERO DE 2026

RESPONSABLE: ASTRID RUIZ GONZÁLEZ.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
1. CONSUMO DE ENERGÍA				
¿Los monitores que no se están utilizando se encuentran apagados o en suspensión?	x			Los monitores permanecen apagados o en modo suspensión cuando no se encuentran en uso.
Los aparatos eléctricos y/o electrónicos que no se están utilizando se encuentran desenchufados y/o apagados?	x			Durante la ejecución de las actividades se realiza control sobre el uso eficiente de los equipos eléctricos y electrónicos, manteniéndolos apagados cuando no se requieren.
se reutiliza el papel reciclaje	x			Se realiza acopio de papel reutilizable promoviendo prácticas de reciclaje interno.
¿Las luces de lugares no concurridos o donde no se requiere se encuentran apagados?	x			Las luminarias permanecen apagadas en zonas donde no se desarrollan actividades.
¿Se implementan prácticas para el ahorro de energía?	x			Se implementan prácticas orientadas al uso eficiente de la energía mediante la desconexión de equipos inactivos
¿El área cuenta con sistemas ahorradores de energía en buen estado?	x			Se realiza seguimiento periódico al estado y funcionamiento de los sistemas de ahorro energético.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
2. CONSUMO DE AGUA				
¿Se implementan buenas prácticas de ahorro de agua?	x			Se aplican buenas prácticas para el uso racional del recurso hídrico durante las actividades constructivas.
¿La red hidrosanitaria se encuentra en buenas condiciones de tal manera que no se evidencian fugas de agua o condiciones de humedad?	x			Las redes hidrosanitarias se encuentran en buen estado, sin evidencias de fugas o pérdidas significativas de agua.
3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
punto(s) ecológico(s) para residuos aprovechables y no aprovechables	x			La obra cuenta con puntos ecológicos para la separación en la fuente de residuos aprovechables y no aprovechables.
¿Cumple con la separación en la fuente de acuerdo con el código de colores establecidos?	x			Se realiza adecuada separación de residuos conforme al código de colores establecido por la normativa vigente.
señalización para la clasificación de residuos en canecas en el punto ecológico	x			Los puntos ecológicos se encuentran señalizados y conformados por canecas según el código de colores
los residuos depositados se encuentran bien clasificados de acuerdo con el código de colores establecido	x			Los residuos ordinarios son evacuados cada tercer día para recolección por la empresa Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
El sitio de acopio evidencia la presencia de vectores como moscas, roedores, cucarachas etc.		X		No se evidencia presencia de vectores debido al manejo oportuno y retiro periódico de residuos.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
¿los escombros bien almacenados (protegidos del sol y agua) debidamente señalizados	x			Los materiales provenientes de demolición y excavación se almacenan protegidos de la intemperie, señalizados y dispuestos con gestor autorizado.
disposición de chatarra con proveedor	x			La chatarra generada es entregada a gestores autorizados para su aprovechamiento.
4. ORDEN Y ASEO				
Área de trabajo limpia y ordenada	x			Se realiza periódicamente orden y aseo en las áreas de trabajo
Área de trabajo demarcada y/o señalizada	x			Las áreas intervenidas cuentan con cierre perimetral y señalización preventiva.
Optimización de recursos en el área (Ahorro de agua, papel, energía)	x			Se efectúa control permanente para el uso eficiente de agua, energía y papel.
5. IMPACTOS AMBIENTALES				
¿Existe aspectos ambientales significativos que no puedan ser controlados por la empresa y dependan de un tercero? (Cliente, Proveedor, Comunidad, etc.).	x			Se identifican actividades o servicios que pueden generar impactos ambientales asociados a terceros.
Los funcionarios/as de la empresa y los contratistas conocen y han apropiado la política ambiental?	x			La política ambiental del consorcio es divulgada al personal administrativo, operativo y subcontratistas.
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
¿Se encuentran identificadas todas las sustancias químicas utilizadas en el área?	x			Las sustancias químicas utilizadas se encuentran debidamente identificadas y almacenadas en área designada.
¿Se poseen fichas de seguridad de las sustancias químicas que se manejan en el área?	x			Las fichas de datos de seguridad se mantienen disponibles y visibles para consulta del personal.
Los productos químicos están almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada?	x			Los productos químicos se almacenan en zonas ventiladas y seguras.
¿Los productos químicos están separados de elementos o equipos que puedan generar chispas?	x			Las sustancias químicas permanecen alejadas de equipos generadores de chispas.
¿Las instalaciones eléctricas de las zonas de almacenamiento de químicos están en buen estado?	x			Se realizan inspecciones periódicas a las instalaciones eléctricas del área de almacenamiento.
7. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS (UNIDADES SANITARIAS)				
Las unidades sanitarias están en buenas condiciones, funcionalidad sin posibles filtraciones y derrames y normas mínimas de higiene	x			Las unidades sanitarias se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento, higiene y sin evidencias de filtraciones o derrames.
8. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES				
Se evidencian derrames y contaminación del suelo por derrame de aceites		X		

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
				No se evidencian derrames ni contaminación del suelo; se aplican medidas establecidas en el PMA.
El área de almacenamiento de combustible evita contacto directo con el piso, está señalizada, lejos de fuente de chispa y dentro de un sistema de contención en caso de derrame	x			El almacenamiento se realiza en zonas señalizadas, con sistema de contención y evitando contacto directo con el suelo.
9. COMBUSTIBLES FÓSILES (ACPM. GASOLINA ETC).				
El área de almacenamiento de combustible evita contacto directo con el piso, está señalizada, lejos de fuente de chispa y dentro de un sistema de contención en caso de derrame	x			El combustible se almacena en áreas seguras, señalizadas y alejadas de fuentes de ignición.
Certificado de calidad combustible disponible			x	No aplica
Se mantienen los equipos apagados en el tiempo en el que el personal no se encuentra en el lugar de trabajo.	x			Los equipos permanecen apagados cuando no se encuentran en operación.
10. PLAN DE EMERGENCIA				
¿Cuenta con un plan de emergencia ambiental actualizado?	x			El consorcio cuenta con plan de emergencia ambiental actualizado, rutas de evacuación señalizadas, identificación de riesgos ambientales y socialización permanente con el personal.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
				Se realiza seguimiento al estado de extintores y disponibilidad de kits de emergencia.
¿Posee planos con las rutas de evacuaciones de la sede?	x			El consorcio contara con un plano de evacuación en caso de presentarse una emergencia
¿La sede cuenta con una adecuada señalización para una evacuación en caso de una emergencia ambiental?	x			El consorcio tendrá señalización en todo el perímetro para que los colaboradores tengan conocimiento cuando se presente una emergencia ambiental
Se identifican riesgos ambientales	x			Los riesgos para el medio ambiente se identifican en el centro de trabajo a partir de la formación específica y del conocimiento de los procesos productivos
¿Las personas que laboran en la sede conocen estos riesgos?	X			Se socializará con todo el personal los riesgos ambientales que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades
Se cuenta con extintores cargados y fecha de vencimiento al día.	x			Se realizará seguimiento a los extintores multifuncional ABC de los extintores que se encuentren en el campo de trabajo
Poseen Kit de emergencia.	x			Se tendrá un kit de derrame en el campo de trabajo
11. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS				

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
El kit de derrames cuenta como mínimo con bolsas rojas, tela olefilica, pala guantes nitrilo y mono gafas	x			El kit de derrames contiene todos los elementos necesarios para la atención de cualquier emergencia
Se tiene kit de derrames cerca del lugar de almacenamiento temporal de residuos líquidos peligrosos	x			El consorcio cuenta con tres kits de derrames para los dos frentes de obra
Se tiene kit de derrames cerca de equipo estacionario con potencialidad de derrames de derivados de hidrocarburos	x			Los kits de derrames son idóneos para sustancias químicas, anti derrames que se presenten en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Se tiene kit de derrames para vehículo dentro del mismo	x			La máquina que se encuentra en obra cuenta con su kit de derrames
Cuenta con extintor multipropósito de 20 libras cerca del lugar de almacenamiento temporal de residuos peligrosos	x			En el desarrollo de las actividades se tiene instalado dos puntos de emergencia con camilla, extintor multipropósito botiquín de primeros auxilios
Hojas de seguridad de las sustancias químicas disponibles y divulgadas	x			Las hojas de seguridad de las sustancias que químicas se tendrán en un lugar visible para la manipulación adecuada de los colaboradores
Procedimiento operativo para atención de emergencias ambientales (derrames mayores menores, fugas) disponible	x			Se socializará con el personal colaborador el procedimiento operativo para la atención de emergencias ambientales.
Teléfonos de contacto de policía ambiental en caso de encuentro con abejas, serpientes, otros	x			Se divulgará teléfonos de contacto para atención de emergencias.

S: Si Cumple

N: No Cumple

N/A: No Aplica

Responsable de Inspección Ambiental **NOMBRE RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN:**	**ASTRID RUIZ GONZÁLEZ** **INGENIERO AMBIENTAL**

10 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

El informe de gestión social pretende evidenciar las actividades ejecutas en el periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero del año 2026 de acuerdo al Plan de Gestión Social, donde se evidencia actividades de los diferentes programas como son atención al usuario, educación y capacitación al personal vinculado al proyecto, programa de vinculación de mano de obra, información o participación comunitaria, plan de compensación socioeconómica y demás actividades de acompañamiento.

10.1 Programa de Atención al Usuario.

En este programa se pretende atender quejas peticiones, reclamos Y/o sugerencias que surjan durante la ejecución del proyecto. Este se adelantará de manera virtual haciendo uso de los canales telefónicos y de correo electrónico, atendiendo de manera oportuna todas las PQRS, a las que haya lugar, lo anterior con el fin de generar satisfacción en los usuarios en general del proyecto y mantener una buena imagen institucional en la comunidad.

El punto de atención a la comunidad se estable de manera virtual a través de los canales de comunicación vía telefónica (3138227763) y correo electrónico (social.consorciomh@cyg.com.co).

Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes atenciones aclarando que no se recibieron oficio o solicitudes por escrito.

Tabla 63 Tramite De PQRS

FORMATO DE PQRS

NIT: 901.687.301

N°	FECHA DE RECIBIDO	REQUERIMINETO	QUIEN FIRMA	CELULAR	EMAIL	TRAMITE	FECHA DE CIERRE
1	30/11/2023	El día 30 de noviembre se comunicó la Señora MARIA GLORIA HERNANDEZ manifestando lo siguiente: "Tengo una inquietud y me gustaría que revisen y midan mi predio ya que siento que están invadiendo propiedad privada con las adecuaciones que están haciendo en el colegio, también quiero resaltar que me di cuenta que el árbol que yo tenía de zapote me lo secaron y debido a esto yo tengo que pagar 150.000 mil pesos para que lo tumben ya que el árbol se secó completamente, por lo anterior solicito se hagan las mediciones y verifiquen que están invadiendo propiedad privada y hagan las correcciones pertinentes quedo atenta muchas gracias"	MARIA GLORIA HERNANDEZ CC 21231842	3133968728	ingricita_91@hotmail.com	Se realizó visita de inspección en fecha 30/12/2023 el área social, topografia de obra y profesional social de interventoria, al predio ubicado en la direccion • Calle 6#17a 16 Alto De Pompeya. a fin de corroborar la información que se reporta en la solicitud. En esta visita se determinó realizar un levantamiento topográfico de acuerdo a los planos suministrados por la Alcaldia de Villavicencio. Adicional se hizo nuevamente la medición con equipos de topografía y replanteo del cual resulto un informe: **Reporte de la comparación de los linderos** el cual llego a las siguientes conclusiones: • El lindero del lote del colegio, en el sitio de su predio se encuentra actualmente tal como lo indican los planos catastrales, no se intercepta o se mete en el lindero del predio ubicado en la dirección Calle 6#17a 16 Alto De Pompeya. • La cerca viva se encuentra en el lote de propiedad de la Alcaldia para la construcción del colegio. • El descapote o excavación del lote no toca el lindero del predio en mención. 2. Se realizó visita por el área Ambiental evidenciando que la intervención en obra se encuentra retirado del predio dirección Calle 6#17a 16 Alto De Pompeya, por tanto no pudo haber afectado el individuo arbóreo que menciona el propietario. Las actividades en ejecución de excavación manual y mecánica están retiradas del predio donde se encuentra el individuo arbóreo, el cual se evidencia que en el suelo del predio Calle 6#17a 16 se realizó un relleno en material de escombro que no es el adecuado para la capa vegetal generando contaminación y posteriormente la muerte del individuo. Desde el area social se realizo oficio de respuesta adjuntando el informe de topografia y enviado al correo suministrado por la peticionaria.	11 de Diciembre de 2023
2	20/11/2025	La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALTOS DE POMPEYA Y EL COMITÉ NAVIDEÑO POMPEYA comprendiendo el sentido de pertenencia y su responsabilidad social con las comunidades de las cuales ustedes hacen parte y donde desarrollan sus actividades económicas, les agradecemos de antemano por la colaboración y el apoyo que nos han brindado hasta la fecha. Queremos solicitarles de manera muy cordial su aporte con 25 REGALOS para las niñas de edades entre 8 a 10 años y 25 REGALOS para niños de edades entre 8 a 10 años de nuestra comunidad. Debido a que en la actualidad no contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo este evento, esperamos como siempre contar con su apoyo incondicional y con su valiosa colaboración para permitirnos hacer realidad este sueño de todos los niños y niñas de nuestra comunidad.	MARISOL CALVO Presidenta J.A.C Alto Pompeya. Y ARTURO HERRERA Veedor colegio ALP	3214901466 3167538525	jacaltopompeya@gmail.com	El 15/12/2025 C&G Ingeniería y Construcciones en atención a la comunicación radicada el 20 de noviembre de 2025, mediante la cual solicitan el apoyo para la donación de regalos navideños destinados a los niños y niñas de la comunidad de Altos de Pompeya, como muestra de nuestro compromiso social y el deseo de contribuir al bienestar de la niñez del sector, C&G Ingeniería y Construcciones realizaro la entrega total de 40 regalos, distribuidos 20 para niñas y 20 para niños en las edades solicitadas , con el fin de aportar a la celebración navideña y generar un espacio de alegría y unión.	15/12/2025
3	5/02/2026	La Junta De Accion Comunal del Alto de Pompeya solicito realizar la poda de un árbol bastante alto que está en el predio donde se ejecuta el Proyecto del COLEGIO ALP; que genera peligro en las redes eléctricas y a las casas vecinas, por tal motivo solicitamos se tomen pronto las medidas pertinentes para mitigar dicho riesgo.	MARISOL CALVO Presidenta J.A.C Alto Pompeya. Y ANA DELIA GUTIERREZ EDIL Corregimiento N° 4.	3214901466- 313291754	jacaltopompeya@gmail.com, anapresidente2009@hotmail.com	Se d'o respuesta la solicitud via correo electronico, informando que ante la solicitud el consorcio Educacion cyg ha realizado los respectivos tramites ante la empresa de servicios publicos Electrificado del Meta Emsa desde el año 2025, para que procesa a realizar la actividad de poda, teniendo en cuenta que por el riesgo electrico qué genera la poda debe ser el personal idoneo y capacitado que solo cuenta la empresa Emsa. A la solicitud se adjuntan los respectivos enviados desde el año 2025, y ante la nueva solicitud por parte de la comunidad se reitera la solicitud con un nuevo oficio.	23/02/2026

Anexo 27: Oficio solicitud de poda Junta Acción Comunal Altos de Pompeya

Anexo 28: Oficio Respuesta a solicitud poda de árbol por la JAC Altos de Pompeya

10.2 Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto.

En este programa se pretende capacitar al personal vinculado al proyecto en todas las áreas, tiene como propósito fortalecer las habilidades humanas, sociales y éticas del personal vinculado al proyecto, promoviendo conductas responsables, respetuosas y acordes con el entorno comunitario donde se desarrolla la obra.

10.3 Taller Manejo de Conflictos en Obra

Objetivo: Fortalecer las competencias del personal en la identificación, gestión y resolución constructiva de conflictos laborales, mediante el desarrollo de habilidades en comunicación asertiva, escucha activa y aplicación de estrategias prácticas que contribuyan al mejoramiento del clima laboral y al fortalecimiento del trabajo en equipo.

Descripción de la actividad:

Dentro de la dinámica del taller se realizó una actividad inicial de sensibilización, en la cual se explicó a los puntos básicos del conflicto y todas las formas en que se pueden presentar en el área laboral, el manejo de emociones, comunicación asertiva y todas las herramientas que se deben emplear para manejar y solucionar un conflicto de manera positiva.

Tipos de conflicto

1. Conflicto intrapersonal

Definición: Ocurre dentro de la misma persona, cuando hay dilemas, emociones o valores en choque.

2. Conflicto interpersonal

- **Definición:** Surge entre dos personas debido a diferencias de opinión, intereses, valores o personalidad.

3. Conflicto intragrupal

- **Definición:** Aparece dentro de un grupo, equipo o familia.

Posteriormente, se llevó a cabo una actividad lúdica

Durante el desarrollo del taller de resolución de conflictos con los trabajadores, se implementó una dinámica basada en la lectura, dramatización y análisis de casos prácticos de situaciones comunes en la obra. Inicialmente, se presentaron los casos a los participantes, quienes tuvieron unos minutos para leer individualmente y familiarizarse con la situación planteada. Posteriormente, se conformaron grupos pequeños y se asignaron roles a cada integrante, incluyendo el de maestro de obra, trabajador y compañeros observadores, de manera que cada grupo pudiera representar de manera realista la situación. Cada subgrupo dramatizó su caso frente a los demás, poniendo especial atención a la comunicación verbal y no verbal, así como a las emociones manifestadas durante el conflicto. Una vez finalizadas las dramatizaciones, se realizó una discusión guiada en la que los participantes respondieron a las preguntas planteadas en cada caso, identificando el tipo de conflicto, las emociones presentes, los errores de comunicación y las posibles soluciones. En el caso del malentendido en la obra, los trabajadores reconocieron la importancia de la comunicación asertiva y propusieron diálogos de resolución respetuosa; en el caso del uso inadecuado de herramientas compartidas, los participantes identificaron la necesidad de normas claras y elaboraron un acuerdo grupal de compromiso con estrategias de seguimiento. La actividad permitió a los trabajadores reflexionar sobre la importancia de manejar los conflictos de manera constructiva, mejorar la comunicación y fortalecer el trabajo en equipo, promoviendo un ambiente laboral más armonioso y colaborativo.

Anexo 29: Listado de asistencia Taller Resolución de Conflictos

Ilustración 49 Actividad Taller Resolución de Conflictos



10.4 Programa de Contratación de Mano de Obra.

En este programa se pretende fomentar la vinculación laboral del personal del Área de Influencia Directa del Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Especificar los perfiles requeridos concerniente a la mano de obra no calificada de la región, con el fin de divulgar por

medio de oficina móvil, las diferentes vacantes laborales en las cuales especifique: caracterización de la población, número de vacantes, perfiles requeridos como (ayudante de obra, oficial de obra, jefe de obra civil, conserje, entre otros a que allá a lugar), aspirantes presentados, seleccionados, seguimiento al contrato, de igual forma como requisito esencial se solicitará certificado de la JAC de residencia en la zona, adicionalmente a eso el certificado si pertenece o no algún grupo población específica, con la finalidad de asegurar la contratación de mínimo un 30% de las personas a intervenir de manera mensual.

Durante el mes de febrero de 2026 ingresaron 19 trabajadores a la obra, distribuidos por cargo de la siguiente manera:

Los ingresos fueron así: trece (13) Oficiales, lo que equivale al 68,4 % del total del personal vinculado en el periodo. En el cargo de Ayudantes de obra ingresaron cuatro (4) trabajadores, representando el 21 % del total. En el nivel profesional se vinculó 1 Ingeniero, correspondiente al 5,3 % del total de ingresos. Finalmente, ingresó 1 trabajador en el cargo de Operador de Minicargador, equivalente al 5,3 %.

Tabla 64 Mano de Obra no Calificada Contratada al Proyecto

MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATADA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2026										
No	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	SEXO	PERTENECE AID	CARGO	MDNC	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EMPRESA
1	LUIS JORGE	DUEÑAS ALFONSO	4.131.733	M	SI	CUIDADOR DE INMUEBLE	SI	26/06/2025	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
2	DIOSNELL JOSE	MOSQUERA TORRES	5.386.773	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	4/09/2025	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
3	ANDERSON JOSE	MENDEZ MOLINA	6.843.967	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	4/09/2025	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
4	OSCAR ANDRES	GUERRERO	1.121.816.287	M	SI	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	SI	15/10/2025	PERMANECE	TAN TECH S.A.S
5	JAVIER IVAN	BEDOYA MIRANDA	80.386.966	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	21/10/2025	20/02/2025	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
6	EDWIN STIVEN	FORERO PATIÑO	1.006.689.217	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	21/10/2025	20/02/2025	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
7	DEIVER FERNANDO	FONSECA	86.063.011	M	SI	ALMACENISTA	NO	4/11/2025	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
8	FRAIS LUIS	BANDA DORIA	1.063.142.661	M	NO	OFICIAL	NO	4/11/2025	6/11/2025	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
9	ARIEL ENRRIQUE	MARTINEZ	78.675.490	M	NO	OFICIAL	NO	4/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
10	MAMERTO	CORDOBA RENTERIA	71.942.984	M	NO	OFICIAL	NO	4/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
11	AGUSTIN	LANDAZURI CUERO	12.831.649	M	NO	OFICIAL	NO	6/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
12	JOSE ERNESTO	CETINA	4.104.432	M	NO	OFICIAL	NO	6/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
13	FERNANDO	BERRIO	1.003.931.983	M	NO	OFICIAL	NO	6/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.

14	EDWIN ARMANDO	HUERFANO ARIAS	1.057.587.959	M	NO	TOPOGRAFO	NO	6/11/2025	PERMANECE	EDWIN HUERFANO ARIAS
15	CARLOS EDUARDO	CASTRO ARDILA	1.010.112.452	M	NO	CADENERO	NO	6/11/2025	PERMANECE	EDWIN HUERFANO ARIAS
16	FREDDY	HINESTROZA PERDOMO	1.105.057.864	M	NO	OP. PLANTA DE CONCRETO	NO	10/11/2025	PERMANECE	ALTARA INGENIERIA S.A.S.
17	JORGE ANDRES	MURILLO PALACIOS	1.077.452.526	M	NO	OP. MINICARGADOR	NO	11/10/2025	26/01/2026	ALTARA INGENIERIA S.A.S.
18	YANDRI JOHANA	ROA	36.347.690	F	SI	SST OPERATIVO	NO	11/11/2025	5/12/2025	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
19	DANIEL ELIVTH	FRANCO B.	1.193.546.934	M	NO	INGENIEROS	NO	10/11/2025	13/01/2026	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
20	JEAN CARLOS	COCHERO SUAREZ	1.005.675.751	M	NO	OFICIAL	NO	12/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
21	MARIA ANDREA	MONSALVE MEJIA	20.499.919	F	SI	CONTROLADORA VIAL	SI	13/11/2025	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
22	ANA MAYERLY	PARADA SALGADO	1.006.821.856	F	SI	CONTROLADORA VIAL	SI	13/11/2025	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH
23	DAYBER MANUEL	SALAS TUNDENO	73.592.066	M	NO	OFICIAL	NO	13/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
24	MANUEL DAVID	GOMEZ HERNANDEZ	1.002.319.651	M	NO	OFICIAL	NO	13/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
	JESUS ALBERTO	BAQUERO CASTRO	78.079.566	M	NO	OFICIAL	NO	13/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
25										
26	RUFINO JOSE	MERCADO CASTRO	92.512.604	M	NO	OFICIAL	NO	13/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.

27	OVER MANUEL	RIOS GUTIERREZ	1.067.852.238	M	NO	OFICIAL	NO	13/11/2025	PERMANECE	ROMVAL INGENIERIA S.A.S.
28	DANIEL MAURICIO	CARRILLO	79.867.455	M	NO	CONDUCTOR DE VOLQUETA	NO	13/11/2025	PERMANECE	MONICA VIVIANA GARCIA
29	JAIME EFRAIN	MONTOYA LAVERDE	80.436.661	M	NO	CONDUCTOR DE VOLQUETA	NO	13/11/2025	PERMANECE	SOLUCIONES INTEGRALES AH S.A.S
30	MARCO ANTONIO	RINCON ORTIZ	17.304.198	M	NO	CONDUCTOR DE VOLQUETA	NO	13/11/2025	PERMANECE	GRUPO VIARQ LTDA
31	CRISTIAN FABIAN	CANO RUIZ	1.121.941.269	M	NO	CONDUCTOR DE VOLQUETA	NO	13/11/2025	PERMANECE	TRANSPORTES GUADALUPE
32	JEISSON MIGUEL	CAICEDO SARMIENTO	1.075.303.780	M	NO	CONDUCTOR DE VOLQUETA	NO	13/11/2025	PERMANECE	WILSON ROGER RAMIREZ R.
33	HAROLD DAVID	PARADA CARDENAS	1.020.718.908	M	NO	CONDUCTOR DE VOLQUETA	NO	13/11/2025	PERMANECE	MONICA VIVIANA GARCIA
34	OSCAR	GUERRERO PATIÑO	1.121.816.287	M	NO	Auxiliar de Bomba Estacionaria	SI	19/11/2025	PERMANECE	Altara Ingenieria S.A.S.
35	CESAR	VILLALOBOS	6.688.582	M	NO	Oficial	NO	20/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
36	ENER JOSE	RIOS	1.085.098.423	M	NO	Oficial	NO	20/11/2025	20/12/2025	Pragma Consultoria y Constr.
37	VICTOR	GUERRA	1.065.839.522	M	NO	Oficial	NO	20/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
38	JAMER	MORENO	1.042.733.984	M	NO	Oficial	NO	20/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
39	JUAN FRANCISCO	HERNANDEZ VILLA	1.124.068.642	M	NO	Op. Bomba Estacionaria	NO	21/11/2025	PERMANECE	Altara Ingenieria S.A.S.

40	DANIEL HUMBERTO	PARRA	1.121.959.816	M	NO	Ingenieros	NO	21/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
41	GEOVANNY SEBASTIAN	MENESES	1.049.894.941	M	NO	Ayudantes	SI	21/11/2025	13/12/2025	Pragma Consultoria y Constr.
42	CARLOS LUIS	ESTANGA	5.765.564	M	NO	Ayudantes	SI	22/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
43	JHON JAIRO	BASTO	1.121.836.450	M	NO	Ayudantes	SI	22/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
44	MOISES DAVID	DE LA ROSA	19.603.698	M	NO	Oficial	NO	22/11/2025	6/12/2025	Pragma Consultoria y Constr.
45	IGNACIO	BELEÑO GUTIERREZ	1.049.894.941	M	NO	Oficial	NO	24/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
46	ARLEY	BARRIENTOS GUTIERREZ	17.360.268	M	NO	Ayudantes	SI	24/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
47	JOSE DEL VCARMEN	BAUTISTA	79.787.480	M	NO	Oficial	NO	24/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
48	JHON JAVIER	MORENO LUCUMI	86.073.337	M	NO	Ayudantes	SI	26/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
49	JOSE DOMINGO	MORENO	12.021.006	M	NO	Oficial	NO	26/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
50	LUIS FERNANDO	RODRIGEZ MENDEZ	79.637.101	M	NO	Tecnico Electricista	NO	26/11/2025	PERMANECE	Powel Ingenieria y Servicios
51	CASAR LUIS	LOPEZ RODRIGUEZ	1.006.700.623	M	NO	Ayudante Basico Electr.	NO	26/11/2025	PERMANECE	Powel Ingenieria y Servicios
52	ROGELIO	SANTAMARIA TELLEZ	5.790.070	M	NO	Oficial	NO	27/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
53	JORGE LUIS	YEPES	73.434.326	M	NO	Oficial	NO	29/11/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.

54	TEOBALDO	MARTINEZ RENTERIA	11.798.455	M	NO	Oficial	NO	1/12/2025	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
55	JHON ESTIBER	CHISCO GUTIERREZ	1.121.923.096	M	SI	Ayudantes	SI	3/12/2025	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
56	YEISON	ACHURY LEYTON	1.120.873.574	M	SI	Ayudantes	SI	3/12/2025	24/01/2026	Romval Ingenieria S.A.S.
57	JONATHAN	GUTIERREZ	1.121.973.762	M	NO	Ayudantes	SI	3/12/2025	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
58	CARLOS JOSE	PIMIENTA	1.100.083.522	M	NO	Oficial	NO	3/12/2025	23/12/2025	Romval Ingenieria S.A.S.
59	JAN CARLOS	DIAZ BOHORQUEZ	1.233.515.100	M	NO	Oficial	NO	4/12/2025	17/01/2026	Pragma Consultoria y Constr.
60	ROBINSON	RICARDO DIAZ	1.192.792.538	M	NO	Oficial	NO	4/12/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
61	JORGE LUIS	BLANCO RODRIGUEZ	19.955.237	M	NO	Oficial	NO	6/12/2025	23/12/2025	Romval Ingenieria S.A.S.
62	HECTOR LUIS	VILLAREAL VALENCIA	1.049.937.262	M	NO	Oficial	NO	6/12/2025	23/12/2025	Romval Ingenieria S.A.S.
63	YACSON ANDRES	GARCES IBARGUEN	1.079.359.292	M	NO	Oficial	NO	6/12/2025	24/01/2025	Romval Ingenieria S.A.S.
64	JHON	TERAN RODRIGUEZ	1.053.122.484	M	NO	Oficial	NO	6/12/2025	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
	YANDRI JOHANA	ROA	36.347.690	F	SI	Inspector SST	NO	9/12/2025	28/01/2026	Pragma Consultoria y Constr.
65										
66	FERNANADO	GUARNIZO ZABALA	86.061.844	M	SI	Ayudantes	SI	11/12/2025	30/12/2025	Pragma Consultoria y Constr.

67	FREIDER	AYALA PICHINA	1.007.164.009	M	SI	Ayudantes	SI	11/12/2025	29/12/2025	Pragma Consultoria y Constr.
68	MIGUEL ANDRES	OLARTE	1.007.159.335	M	SI	Ayudantes	SI	11/12/2025	30/12/2025	Pragma Consultoria y Constr.
69	DAVID RICARDO	AREVALO	1.121.941.648	M	SI	Ayudantes	SI	11/12/2025	8/01/2026	Pragma Consultoria y Constr.
70	JHONNIER ANDRES	BOHORQUEZ	1.006.655.813	M	NO	Cadenero	SI	12/12/2025	PERMANECE	Edwin Huerfano Arias
71	YAMITH	PEDROZO MORA	12.402.255	M	NO	Oficial	NO	29/12/2025	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
72	PABLO CESAR	SANCHEZ COLO	1.121.820.591	M	NO	Oficial	NO	29/12/2025	17/01/2026	Pragma Consultoria y Constr.
73	ANGELA PATRICIA	GARCIA	1.108.928.812	M	NO	Inspector SST	NO	29/12/2025	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
74	BREIDER JORFRAN	BEJARANO	1.122.510.709	M	NO	Oficial	NO	30/12/2025	30/12/2025	Pragma Consultoria y Constr.
75	FERNANDO GUARNIZO	ZABALA	86.061.844	M	NO	Ayudantes	SI	11/01/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
76	MIGUEL ANDRES	OLARTE	1.007.159.335	M	NO	Ayudantes	SI	11/01/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
77	JHONNY ALEXIS	HERNANDEZ	1.120.864.735	M	NO	Oficial	NO	5/01/2026	24/01/2026	Pragma Consultoria y Constr.
78	JHON FERNEY	LOPEZ	1.102.715.913	M	NO	Oficial	NO	5/01/2026	10/01/2026	Pragma Consultoria y Constr.
79	JHEISON	HENAO LEITON	1.006.773.114	M	NO	Oficial	NO	6/01/2026	23/01/2026	Pragma Consultoria y Constr.

80	NESTOR	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	9.154.867	M	NO	Oficial	NO	12/01/2026	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
81	DIEGO FERNANDO	RODRIGUEZ M.	1.121.906.899	M	NO	Ingenieros	NO	23/01/2026	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
82	BERNARDO	CARMONA AVENDAÑO	11.125.184.075	M	NO	Op. Bomba Estacionaria	NO	24/01/2026	PERMANECE	Altara Ingenieria S.A.S.
83	JHONATAN JOSE	RINCON	1.007.246.829	M	NO	OFICIAL	NO	29/01/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
84	JOSE CARRLOS	BAUTE MEJIA	85.271.710	M	NO	OFICIAL	NO	29/01/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
85	NICOLAS	VALDERRAMA SOTO	1.121.957.876	M	NO	Inspector SST	NO	30/01/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
86	JOSVITERVY	MENSA CASTRO	80.033.326	M	NO	Op. Minicargador	NO	2/02/2026	PERMANECE	Altara Ingenieria S.A.S.
87	YORMAN JAIR	CHAVERRA PALOMEQUE	1.001.846.684	M	NO	Oficial	NO	2/02/2026	PERMANECE	CL Casetones
88	LEONEL	LOPEZ FUENTES	1.063.156.310	M	NO	Oficial	NO	2/02/2026	PERMANECE	CL Casetones
89	YERSON ANDRES	CARDENAS	1.003.316.722	M	NO	Oficial	NO	2/02/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
90	HERNANDO SANCHEZ	SANCHEZ	1.216.973.225	M	NO	Oficial	NO	2/02/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
91	TIODOBERTO	AVILA OSORIO	80.068.655	M	NO	Oficial	NO	3/02/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
92	LEONEL DE JESUS	ALVAREZ	1.043.606.303	M	NO	Ayudantes	NO	6/02/2026	PERMANECE	CL Casetones
93	GREGORIO	DORIA LOPEZ	1.073.816.074	M	NO	Oficial	NO	6/02/2026	PERMANECE	CL Casetones

94	ORINSON	LOPEZ FUENTES	1.063.160.288	M	NO	Oficial	NO	6/02/2026	PERMANECE	CL Casetones
95	YENSY LORENA	TIQUE MADRIGAL	1.007.789.749	M	NO	Ingenieros	NO	11/02/2026	PERMANECE	Powel Ingenieria y Servicios
96	GUSTAVO ALFONSO	PARRA AGUIRRE	1.121.941.624	M	SI	Ayudantes	NO	12/02/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
97	RAFAEL	PEREZ NIETO	1.050.460.376	M	NO	Oficial	NO	12/02/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
98	FRANCISCO JOSE	VASQUEZ	1.065.841.379	M	NO	Oficial	NO	13/02/2026	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
99	JUAN CARLOS DE LEON	MIRANDA	7.601.530	M	NO	Oficial	NO	13/02/2026	14/02/2026	Romval Ingenieria S.A.S.
100	JHEISON STICK	PEREZ BARRANCO	84.459.875	M	NO	Oficial	NO	13/02/2026	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
101	OSCAR	HINESTROZA	12.797.446	M	NO	Oficial	NO	13/02/2026	PERMANECE	Romval Ingenieria S.A.S.
102	MARCIAL JOSE	NARVAEZ VERGARA	1.103.096.462	M	NO	Oficial	NO	17/02/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
103	SAMUEL EDUARDO	MARCELO TAPIAS	1.003.293.834	M	SI	Ayudantes	NO	17/02/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.
104	OROMAR	MORENO LUCUMI	1.121.862.773	M	SI	Ayudantes	NO	17/02/2026	PERMANECE	Pragma Consultoria y Constr.

10.5 Programa de Información y Participación Comunitaria.

El programa de información y participación ciudadana consiste en mantener un sistema de comunicación para el proyecto, que integra estrategias de comunicación comunitaria, social masiva, contribuyendo a la generación de una imagen positiva o sólida del Proyecto, al mejoramiento de las relaciones sociales culturales, organizativas, mediáticas. De igual manera, aportar desde la comunicación al fortalecimiento del capital social de la comunidad objeto en los ámbitos de intervención del proyecto, haciendo énfasis en una participación comunitaria. Visibilizar el alcance y los resultados del proyecto que permita el empoderamiento por parte de las comunidades, el posicionamiento del mismo. Fortalecer las organizaciones sociales existentes, generar otros espacios de participación o control social con las comunidades del área de influencia del proyecto, contribuyendo a la imagen e identidad del proyecto, para su posicionamiento.

10.6 Comité de Vigilancia y Control.

El 26 de Febrero del año 2026 se llevó a cabo el comité de vigilancia y control, la reunión tuvo como objetivo socializar el avance del proyecto en sus componentes **técnico, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo (SST) y social**, así como atender inquietudes de la veeduría y la comunidad. El Consorcio presentó las principales actividades técnicas ejecutadas, destacando trabajos de excavación y cimentación, instalación y limpieza de acero de refuerzo, fundidas de concreto, ejecución de losas, rellenos, ensayos de calidad y adecuación de áreas, evidenciando el cumplimiento de los procedimientos técnicos y de almacenamiento del material.

En el componente ambiental, se informó sobre la implementación y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), incluyendo el control de maquinaria, manejo de residuos, aprovechamiento de material de excavación, aplicación del Plan de Manejo de Tránsito y cumplimiento normativo para la protección de los recursos naturales durante la ejecución de la obra.

En cuanto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, se socializaron las acciones orientadas a garantizar condiciones seguras en la obra, tales como inducciones al personal, entrega de dotación y

elementos de protección personal, capacitaciones, inspecciones permanentes, señalización preventiva e instalación de puntos de hidratación.

Desde el componente social, se presentó el Plan de Gestión Social, resaltando el Programa de Atención al Usuario, la priorización de la mano de obra local, la realización de actividades de bienestar y capacitaciones al personal de obra, así como la entrega de apoyos comunitarios solicitados por la Junta de Acción Comunal, fortaleciendo el relacionamiento con la comunidad y la participación ciudadana en el seguimiento del proyecto.

Durante el espacio de preguntas, la Interventoría informó que el avance físico del proyecto es del 33 % ejecutado, frente a un 38 % programado, aclarando que el desfase es mínimo y se encuentra dentro de los rangos normales de ejecución. Se indicó que se han tramitado actas parciales de obra y que el primer desembolso se encuentra en proceso. Asimismo, se socializó que el incremento del personal se realizará de manera progresiva según las necesidades técnicas y que se han ampliado jornadas laborales como medida preventiva frente a la temporada invernal.

La comunidad expresó satisfacción con el avance del proyecto y destacó el compromiso del Consorcio y la nueva Interventoría. Por su parte, el Consorcio C&G reiteró su compromiso con la ejecución del proyecto, resaltando el esfuerzo financiero asumido para garantizar la continuidad de la obra, mientras que la Alcaldía de Villavicencio manifestó su disposición permanente para acompañar y apoyar las gestiones necesarias.

Ilustración 50 Actividad Comité de Vigilancia y Control Febrero



Anexo 30: Acta Comité Vigilancia y Control

11 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

11.1 Comité y/o Reuniones de Obra.

A continuación, se relacionan las reuniones y comités de obra en los que se participaron en el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2026:

Tabla 65 Relación de Actas de Reuniones y/o Comité

Relación de Actas de Reuniones y/o Comité		
Tipo de Acta	Fecha	Descripción
Acta Reunión	11-02-2026	Comité de Obra
Acta Reunión	17-02-2026	Comité de Obra
Acta Reunión	26-02-2026	Comité Veeduría

11.2 Gestión de Comunicaciones

El control documental de las comunicaciones tiene como objeto garantizar la trazabilidad y registro formal de la información generada durante la ejecución del proyecto de construcción del Colegio Alfonso López Pumarejo.

Tabla 66 Relación de Correspondencia Enviada

CE	N° sub carpeta	N°	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Asunto
201	125	509	2/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Respuesta a observaciones Informe Mensual No. 15 – diciembre de 2025. Oficio CER-067-2025 del 26 de enero de 2026
201	125	510	2/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Reporte de redes existentes EDESA
201	125	511	2/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Solicitud de ajuste en Programación de obra

201	125	512	6/02/2026	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Ing. JHONNY OJEDA CARDENAS CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Solicitud de atención y resolución de controversias contractuales
201	125	513	6/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Entrega Memorias de Calculo para Solicitud de Adición N°1.
201	125	514	6/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Radicación Informe Mensual de Obra No. 16 correspondiente al mes de enero 2026
201	126	515	6/02/2026	PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS JUAN DAVID RODRIGUEZ CESPEDES	Documentos de Retiro del Personal de Diciembre 2025 y Enero de 2026
201	126	516	6/02/2026	ROMVAL INGENIERIA S.A.S. Ing. EDWIN FERNEY ROMERO VALENCIA	Documentos de Retiro del Personal Enero 2026
201	125	517	10/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Respuesta Oficio CER-069-2025 – Señalización Proyecto
201	125	518	10/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Entrega memorias de cantidades de obra – Modificación No. 5
201	126	519	13/02/2026	PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS JUAN DAVID RODRIGUEZ CESPEDES	Asignación urgente de reemplazo SST en obra y otros temas relacionados.
201	127	520	23/02/2026	Electrificadora Del Meta EMSA S.A	Reiteración solicitud de intervención para poda urgente de árbol en contacto con red de media y baja tensión.
201	127	521	23/02/2026	COMITÉS DE VIGILANCIA Y CONTROL Integrantes	Invitación Comité Social 26-02-2026
201	127	522	23/02/2026	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL – VEREDA ALTOS DE POMPEYA	Respuesta a solicitud de poda / tala de árbol
201	126	523	23/02/2026	ROMVAL INGENIERIA S.A.S. Ing. EDWIN FERNEY ROMERO VALENCIA	Pago de Liquidación Señor Daniel Franco (Residente de Obra Saliente) y documentos de retiro de personal.
201	125	524	24/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Trámite de disponibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado
201	125	525	24/02/2026	SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO ING. Laura Madelin Urrea	Informe PMT diciembre 2025
201	125	526	25/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Radicación Acta Parcial de Obra N° 3
201	125	527	25/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Entrega memorias de cálculo y análisis de precios unitarios (APU) – Redes eléctricas ajustadas – Modificación No. 5
201	125	528	27/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Balance cantidades de obra – Modificación No. 5

201	125	529	27/02/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Entrega memorias de cálculo – Modificación No. 5

12 COMPONENTE FINANCIERO.

12.1 Relación Inversión del Anticipo.

El contrato establece en su cláusula 6 lo siguiente:

"Se pagará al CONTRATISTA de conformidad con lo establecido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en los estudios previos la Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará al contratista la remuneración a su favor de la siguiente manera: Un anticipo del VEINTE (20%) por ciento del valor del contrato previa aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor"

A la fecha se realizó el desembolso total del anticipo por valor de $4.767.975.486.28. A continuación, relacionamos el plan de inversión del anticipo aprobado por Interventoría y el Consorcio:

12.2 Plan de Inversión del Anticipo Versión 3

El 08 de marzo del 2024 por medio de la comunicación N° CE-201-125-250 se presentó a interventoría la modificación del plan de inversión de anticipo ajustando los rubros a las necesidades de obra según la ejecución del contrato así:

Tabla 67 Plan de Inversión del Anticipo Versión 3

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO III			
VALOR DEL CONTARTO DE OBRA		$	25.094.607.822,56
ANTICIPO 20%		$	5.018.921.564,51
IMPUESTO DE GUERRA (5%)		$	250.946.078,23
ANTICIPO 20%		$	4.767.975.486,00
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES	$ 2.002.549.704,24	42,00%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 2.527.027.007,73	53,00%

3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 238.398.774,31	5,00%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 0,00	0,00%
	TOTAL	**$ 4.767.975.486**	100%

Para garantizar el cumplimiento del contrato de obra 1279 del 2023, y enmarcado en plan de inversión del anticipo los datos fiduciarios se nombran a continuación.

Tabla 68 Datos Fiduciarios

Empresa	NIT	Porcentaje Anticipo	Valor
Alianza Fiduciaria	830053812-2	20%	$ 5.018.921.564,51

Tabla 69 Formato de Relación de Inversión Anticipo

N°	Document o Tercero	Fecha De Documento Tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Neto Pago	Clasificación Anticipo	Orden De Giro	Fecha De Giro
1	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	167,217,062.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
2	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	58,000,000.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
3	1001	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	506,877.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
4	2263	13/07/2023	901234897-2	ACODEL FERRETERIA DE COLOMBIA SAS	OC 003 -MATERIAL FERRETERIA	7,418,119.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
5	2744	18/07/2023	900539242-5	INVERSIONES ARKA UNION SAS	OC 010 -MATERIAL FERRETERIA	658,042.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
6	1004	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	1,219,275.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
7	8106	1/08/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	TRANSPORTE A ESCOMBRERA	23,943,721.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
8	1021	1/09/2023	17343650	WILSON CARDENAS SABOGAL	CORTE N° 4 CONTRATO 001 DEMOLICIÓN	9,589,983.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
9	TAU-9	30/08/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	ORDEN DE COMPRA-014 MATERIAL FERRETERIA	2,176,426.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023

10	CC049	15/08/2023	900803958-1	ALTARA INGENIERIA SAS	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO OT 007	700,000,000.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
11	CC 003	28/08/2023	1113624886	ALEXANDER GIRALDO DELGADO	COMISION TOPOGRAFICA 19 07 AL 03 08 DE 2023	4,925,250.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
12	321	25/08/2023	901480671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 027 MATERIAL FERRETERIA	6,810,738.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
13	CC 01	8/09/2023	901.455.591-2	INVESTMENT CREARE SAS	ANTICIPO SUMINISTRO MATERIAL PETREO ORDEN DE COMPRA 050	80,021,559.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
14	4970	4/09/2023	900.887.192-7	MADERAS TELLEZ S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 030 MATERIAL FERRETERIA	4,444,550.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
15	No. 1BV 326	1/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 032 MATERIAL FERRETERIA	447,347.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
16	CC	21/09/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE 201 147 004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	33,612,625.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
17	CC 01	11/09/2023	900342509-9	MH CONSULTING SAS	ANTICIPO SUMINISTRO REDES ELECTRICAS	420,768,060.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
18	CC 01	19/09/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISION TOPOGRAFICA 6 07 08 09 10 11 12 y 13 DE SEPTIEMBRE 2023	3,526,280.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
19	NOTA DEBITO N°1	21/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 038 MATERIAL FERRETERIA	2,144,806.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023

20	No. 1BV 345	26/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 040 MATERIAL FERRETERIA	4,382,665.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
21	01FE-51445	15/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 041 SUMINISTRO ACERO	3,771,933.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
22	01FE-51650	19/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 045 SUMINISTRO ACERO	38,929,551.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
23	01FE-51756	21/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 046 SUMINISTRO ACERO	11,550,002.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
24	FOS 8321	1/09/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE AGOSTO	35,508,704.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
25	FOS 8576	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE I	5,017,014.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
26	FOS 8577	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE II	5,294,165.58	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
27	A-380	1/10/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-052 MADERA	2,957,668.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2023
28	No. 1BV 360	9/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-056 MATERIAL FERRETERIA	5,685,010.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2023
29	ALT 285	18/10/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	179,287,996.42	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2023
30	CC	21/10/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE-201-147-004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO	22,249,964.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2023

					DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO				
31	01FE-53555	20/10/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-063 SUMINISTRO ACERO	54,549,598.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2023
32	CC 002	1/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (COBRO 1)	3,967,065.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
33	CC 03	7/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 13, 14, 15, 16, 17, 18 DE OCTUBRE 2023	2,644,710.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
34	TAU-19	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 1 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	9,923,581.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
35	TAU-20	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 2 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	905,008.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
36	TAU-23	16/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 3 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	7,131,632.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
37	FOS 8715	2/11/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE OCTUBRE 2023	40,170,822.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 4	13/12/2023
38	No. 1BV 387	25/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-066 MATERIAL FERRETERIA	927,647.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
39	No. 1BV 392	8/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-070 MATERIAL FERRETERIA	535,790.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024

40	1BV 416	27/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-083 MATERIAL FERRETERIA	3,399,818.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
41	1BV 420	9/12/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-087 MATERIAL FERRETERIA	4,870,522.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
42	01FE-54325	1/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-068 SUMINISTRO ACERO	169,304.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
43	01FE-54480	3/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-072 SUMINISTRO ACERO	957,252.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
44	01FE-55455	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-074 SUMINISTRO ACERO	52,040,940.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
45	01FE-55453	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-075 SUMINISTRO ACERO	17,072,168.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
46	A-383	1/11/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-057 MADERA	398,580.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
47	FOS 8915	1/12/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE NOVIEMBRE 2023	4,134,777.33	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
48	ALT 291	6/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	45,355,552.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
49	292	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	34,690,133.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024

50	293	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	40,007,787.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
51	ALT 294	20/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 003 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	41,648,556.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
52	CC 04	1/12/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023 Y DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	6,800,560.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
53	CC 04	1/12/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 8 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023	6,800,560.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
54	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	456,754,809.50	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 6	31/01/2024
55	FVE 311	22/01/2024	901.556.948-1	COMERCIALIZADORA DE CONCRETOS PREMIUM S.A.S ZOMAC	TRANSPORTE DE AGREGADOS ORDEN DE TRABAJO 027	29,925,014.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 7	10/02/2024
56	CC 14176	24/01/2024	891800111-5	DIACO SA	ANTICIPO ACERO	316,540,000.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 7	10/02/2024
57	PROFORMA 4529310575 6	27/01/2024	860002523-1	CEMEX COLOMBIA SA	ANTICIPO CEMENTO GRIS	299,499,200.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 7	10/02/2024
58	SAE 3381	5/12/2023	901.174.550-4	SAE TABLEROS DE CONTROL Y ENERGIA S.A.S.	ORDEN DE COMPRA-076 MATERIAL FERRETERIA PROVISIONAL DE OBRA (CABLE)	4,365,454.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
59	DAFE 6	24/11/2023	901.753.376-3	GNC CONSTRUCCIONES SAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUB BASE ORDEN DE COMPRA 069	5,422,144.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
60	DAFE-13	24/01/2024	901.753.376-3	GNC CONSTRUCCIONES SAS	ORDEN DE COMPRA-088 MATERIAL AGREGADO	3,098,368.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024

61	A-384	1/11/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	OC 065 COMPRA MADERA	1,181,432.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
62	A-430	23/01/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	OC 079 COMPRA MADERA	833,952.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
63	ALT-296	23/01/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	TRANSPORTE DE MATERIALES	13,338,000.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
64	ALT 301	8/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 003 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	20,927,198.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
65	ALT 302	8/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 004 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	22,545,238.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
66	FECV 189	26/01/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 3 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	13,067,860.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
67	FECV 190	7/02/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 4 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	32,023,394.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
68	TAU-32	7/02/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 6 CE-201-147-004 DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO	59,980,201.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
69	CC 06	2/02/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 20 DÍAS MES DE DICIEMBRE	8,549,700.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
70	ALT 285	18/10/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	15,794,897.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
71	ALT 304	20/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 004 CONTRATO CE-201-146-002 EXCAVACIÓN	176,133,378.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
72	ALT 305	20/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 005 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	32,919,472.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024

73	TAU-35	20/02/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 7 CE-201-147-004 DE OBRA PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	27,557,188.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
74	FECV 191	19/02/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 5 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	39,517,236.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
75	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 3	71,631,753.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
76	1191	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	574,770.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
77	1193	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	47,649,147.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
78	1194	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	1,165,962.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
79	1195	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	25,488,372.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
80	1241	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	53,530,960.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
81	1242	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	20,200,726.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
82	1248	4/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	32,905,404.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024

83	1249	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	32,172,840.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
84	1253	5/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	75,179,797.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
85	A-450	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA103 MADERA	3,985,800.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
86	A-451	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-103 MADERA	1,303,050.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
87	2448	29/02/2024	901.100.411-1	SOLUINTECO SAS	ORDEN DE COMPRA-103 SUMINISTRO ACERO	8,259,384.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
88	CC 07	1/03/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 09 AL 26 DE ENERO DEL 2023	7,704,130.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
89	ALT 308	6/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 006 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	85,059,771.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
90	TAU-36	6/03/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 8 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	38,803,958.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
91	FECV 192	7/03/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 6 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	34,981,301.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
92	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 4	45,895,714.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024

93	1192	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	24,555,531.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
94	1255	7/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	70,939,946.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
95	1258	3/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	1,185,954.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
96	1259	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	65,054,920.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
97	1261	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	7,901,540.50	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
98	1262	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	3,738,619.23	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
99	FECV 196	21/03/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 7 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	42,746,131.98	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
100	CC 09	3/04/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 02AL 04 DE MARZO DEL 2024	856,014.44	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
101	CC 08	3/04/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 02AL 04 DE MARZO DEL 2024	10,272,173.33	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
102				ANULADO					17/04/2024
103	TAU-39	6/04/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N°98 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	35,323,429.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024

104	310	21/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N 006 CE 201 146 007 CONCRETO	90,650,204.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
105	9817	3/04/2024	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE MARZO 2024	14,546,044.40	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
106	310	21/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N 007 CE 201 146 007 CONCRETO	12,570,248.56	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 12	24/06/2024
TOTAL						**4,767,975,486.28**			

12.3 Ejecución Financiera del Anticipo

A la fecha del presente informe, se ejecutó el 100% del anticipo aprobado, mediante giros parciales gestionados por la fiduciaria conforme a la planeación contractual.

Tabla 70. Relación de Inversión por Mes y Clasificación

CLASIFICACIÓN ANTICIPO	VALOR GIRADO OCTUBRE 2023	VALOR GIRADO NOVIEMBRE 2023	VALOR GIRADO DICIEMBRE 2023	VALOR GIRADO ENERO 2024	VALOR GIRADO FEBRERO 2024	VALOR GIRADO MARZO 2024	VALOR GIRADO ABRIL 2024	VALOR GIRADO JUNIO 2024	ACUMULADO TOTAL
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$1,285,249,950.00	63,192,276	-	80,372,021	622,420,038	302,416,212	173,376,511	-	$ 2,527,027,007.73
MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	$218,871,200.00	201,537,960	24,571,996	632,057,958	520,647,515	212,444,874	179,847,953	12,570,249	$ 2,002,549,704.24
TRANSPORTE DE MATERIALES	$127,763,604.58	-	40,170,822	4,134,777	51,783,526	-	14,546,044	-	$ 238,398,774.31
COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ -	-	-	-	-	-	-	-	$ -

TOTAL	$1,631,884,754.58	$264,730,236.42	$64,742,818.00	$716,564,755.83	$1,194,851,079.00	$514,861,086.00	$367,770,507.89	$12,570,248.56	$4,767,975,486.28

A la fecha del presente informe, se giraron por medio de la fiducia el valor de **CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 4,767,975,486.28)**.

12.4 Liquidación Del Encargo Fiduciario

Una vez ejecutado el 100% del plan de inversión aprobado, se procedió a la liquidación del encargo fiduciario administrado por Alianza Fiduciaria S.A., sin saldos pendientes ni observaciones por parte de la interventoría ni de la entidad contratante.

Adicionalmente, los rendimientos financieros generados por los recursos depositados en el encargo fiduciario fueron debidamente reintegrados al Municipio de Villavicencio el 03 de septiembre del 2024, por un total de 1.133.532,82 discriminados así, la diferencia en el valor total de $110.94 se debe a la cancelación final de la cuenta:

Tabla 71 Giros Rendimientos Financieros

Fecha	Valor
30/09/2023	$ 80,036.63
31/10/2023	$ 199,125.35
30/11/2023	$ 156,189.68
31/12/2023	$ 240,123.16
31/01/2024	$ 232,901.35
29/02/2024	$ 118,976.98
31/03/2024	$ 61,799.39
30/04/2024	$ 11,904.19
30/04/2025	$ 30,280.99
31/05/2025	$ 875.59
30/06/2024	$ 911.55
31/07/2025	$ 410.96
31/08/2024	$ 99.47
30/09/2025	$ 8.47
TOTAL	**$ 1,133,643.76**

Estado de Liquidación:

- **Valor Total Anticipo Girado:** $4.767.975.486,00
- **Valor Ejecutado:** $4.767.975.486,00
- **Rendimientos Financieros Devueltos a la Alcaldía:** $ 1,133,535.82
- **Saldo:** $0
- **Fecha de Liquidación:** 31-10-2024Seguimiento Financiero Control de Actas y Pagos.

A la fecha la entidad realizó el desembolso total del anticipo a la fiducia por valor de $4.767.975.486.28.

Tabla 72 Control y Seguimiento de Anticipo

RP	Detalle	Fecha de pago	%	Valor	Descuentos	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
2929	Anticipo N° 1	14/09/2023	0.16%	$ 80,000,000.00	5%	$ 76,000,000.00	$ 76,000,000.00
2929		22/09/2023	65.22%	$ 3,273,648,510.95	5%	$ 3,109,966,084.95	$ 3,109,966,084.95
2929		22/11/2023	33.18%	$ 1,665,273,053.56	5%	$ 1,582,009,400.56	$ 1,582,009,400.56
Total				**$ 5,018,921,564.51**		**$ 4,767,975,485.51**	**$ 4,767,975,485.51**

12.1 Relación Actas de Pago Parcial

Tabla 73 Control y Seguimiento de Pago de Actas Parciales.

RP	Detalle	Fecha de pago	%	Valor Acta Presente	Amortizado	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
2994	Acta Parcial 1	2/01/2026	20%	$5,019,015,322.68	$1,003,803,065.00	$4,015,212,257.68	$ 178,626,235.00
		26/01/2026					$ 3,033,543,648.00
2994	Acta Parcial 2	N/A	10%	$ 2,509,475,598.89	$ 501,895,120.00	$ 2,007,580,478.89	$ 0.00
Total				**$ 7,528,490,921.57**	**$ 1,505,698,185.00**	**$ 6,022,792,736.57**	**$ 3,212,169,883.00**

CONCLUSIÓN.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre, el proyecto evidenció avances significativos en sus componentes físicos, técnicos, administrativos y financieros, los cuales se presentan de manera consolidada en este informe. La información recopilada permite verificar el cumplimiento de las actividades programadas, la correcta utilización de los recursos y la ejecución de acciones orientadas a asegurar el desarrollo eficiente y seguro de la obra.

La gestión realizada en SST, medio ambiente y componente social contribuyó al fortalecimiento de las condiciones de trabajo, al control de impactos y a la atención oportuna de las novedades surgidas durante el mes. En cuanto al ámbito contractual y financiero, se registró el avance correspondiente a los trámites administrativos, pagos y documentación requerida, garantizando la continuidad del proyecto conforme a los lineamientos establecidos.

En conclusión, el informe mensual de noviembre proporciona una visión integral y actualizada del estado del proyecto, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento adecuado para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del contrato.

TABLAS

Tabla 1 Datos Generales del Proyecto 10

Tabla 2 Ubicación Geográfica Centro Poblado Altos de Pompeya 13

Tabla 3 Áreas a Construir por Edificaciones 16

Tabla 4 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Contrato 17

Tabla 5 Póliza de Seguro Cumplimiento Contrato 18

Tabla 6 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Acta de Inicio 19

Tabla 7 Póliza de Seguro Cumplimiento Acta de Inicio 19

Tabla 8 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Prorroga No. 1 20

Tabla 9 Póliza de Seguro Cumplimiento – Prorroga No. 1 21

Tabla 10 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificación No. 3. 21

Tabla 11 Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificación No. 3 22

Tabla 12 Póliza de Seguro Cumplimiento – Suspensión No. 1 23

Tabla 13 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Suspensión No. 1. 23

Tabla 14 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 1 Suspensión No. 1 24

Tabla 15 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 1 Suspensión No. 1 25

Tabla 16 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 2 Suspensión No. 1 25

Tabla 17 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 2 Suspensión No. 1 26

Tabla 18 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 4 Suspensión No. 1 27

Tabla 19 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 4 Suspensión No. 1..... 27

Tabla 20 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 5 Suspensión No. 1 28

Tabla 21 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 5 Suspensión No. 1..... 29

Tabla 22 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 6 Suspensión No. 1 29

Tabla 23 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 6 Suspensión No. 1..... 30

Tabla 24 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1..... 31

Tabla 25 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1. ... 31

Tabla 26 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 10 Suspensión No. 1. 32

Tabla 27 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 10 Suspensión No. 1..... 32

Tabla 28 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 11 Suspensión No. 1. 33

Tabla 29 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 11 Suspensión No. 1..... 34

Tabla 30 Póliza de Seguro Cumplimiento – Acta Reinicio 34

Tabla 31 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Acta Reinicio 35

Tabla 32 Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificatoria N° 4..... 36

Tabla 33 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificatoria N° 4 36

Tabla 34 Póliza de Seguro Cumplimiento – Cesión de Posición Contractual 37

Tabla 35 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Cesión de Posición Contractual 37

Tabla 36 Flujo de Inversión Programado Por Mes 39

Tabla 37 Relación Avance Programado Acumulado vs Avance Físico Acumulado 40

Tabla 38 Trazado y Replanteo Arquitectónico 43

Tabla 39 Relleno con Material Seleccionado de Río TM 2 44

Tabla 40 Relleno con Material de Excavación 45

Tabla 41 Cimentación Concreto de Limpieza 46

Tabla 42 Columnas de Concreto 28 Mpa-4000 Psi 47

Tabla 43 Acero de Refuerzo Estructural 48

Tabla 44 Losa Aligerada de Concreto 50

Tabla 45 Malla Electrosoldada Losa Contrapiso 50

Tabla 46 Concreto en Dados de Cimentación 51

Tabla 47 Concreto 4000 PSI en Vigas y Dados de Cimentación 52

Tabla 48 Relación de Maquinarias Usadas en el Periodo febrero 2026 55

Tabla 49 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 5-6-7-8 y 10 Días 59

Tabla 50 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 14 Días 62

Tabla 51 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 28 Días 65

Tabla 52 Ensayo Asentamiento o Slump 70

Tabla 53 Relación de Equipos Topográficos 71

Tabla 54 Equipos de Laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S 72

Tabla 55 Relación del Personal Profesional en Obra 83

Tabla 56 Relación del Personal no Profesional del Contratista de Obra 85

Tabla 57 Relación del Personal de Contratistas de Obra 87

Tabla 58 Proceso de Inducción por Empresas 99

Tabla 59 Descripción de Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo 105

Tabla 60 Control De Manejo Ambiental 110

Tabla 61 Disposición Final De Los Residuos De Construcción Y Demolición RCD 111

Tabla 62 Cantidad de Material 113

Tabla 63 Tramite De PQRS 139

Tabla 64 Mano de Obra no Calificada Contratada al Proyecto 144

Tabla 65 Relación de Actas de Reuniones y/o Comité 155

Tabla 66 Relación de Correspondencia Enviada 155

Tabla 67 Plan de Inversión del Anticipo Versión 3 158

Tabla 68 Datos Fiduciarios 159

Tabla 69 Formato de Relación de Inversión Anticipo 160

Tabla 70. Relación de Inversión por Mes y Clasificación 170

Tabla 71 Giros Rendimientos Financieros 172

Tabla 72 Control y Seguimiento de Anticipo 173

Tabla 73 Control y Seguimiento de Pago de Actas Parciales. 173

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del Proyecto 14

Ilustración 2 Implantación y Localización General 15

Ilustración 3 Curva S Análisis de Avance Físico vs Programado 40

Ilustración 4 Limpieza de Acero de Refuerzo por Medios Químicos 42

Ilustración 5 Trazado y Replanteo Arquitectónico 43

Ilustración 6 Relleno con Material Seleccionado de Río TM 2 44

Ilustración 7 Relleno con Material de Excavación 45

Ilustración 8 Concreto de Limpieza en Cimentación 46

Ilustración 9 Columnas de Concreto 28 Mpa-4000 Psi 47

Ilustración 10 Acero de Refuerzo Estructural 48

Ilustración 11 Losa Aligerada de Concreto 49

Ilustración 12 Malla Electrosoldada Losa Contrapiso 50

Ilustración 13 Concreto en Dados de Cimentación 51

Ilustración 14 Concreto Vigas y Dados de Cimentación 52

Ilustración 15 Plan de Manejo de Transito febrero 2026 53

Ilustración 16 Implementación del Plan de Manejo de Transito febrero 2026 54

Ilustración 17 Maquinaria en Obra febrero 2026 55

Ilustración 18 Registro Diario del Clima febrero 2026 56

Ilustración 19 Influencia del Clima febrero 2026 57

Ilustración 20 Limpieza por Medios Mecánicos del Acero de Refuerzo 58

Ilustración 21 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 5-6-7-8-10 Días 61

Ilustración 22 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 14 Días 64

Ilustración 23 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 28 Días 67

Ilustración 24 Toma y Curado de Muestras Concreto 68

Ilustración 25 Ensayo Asentamiento o Slump 69

Ilustración 26 Ensayo Densidad o Masa Unitaria en el Terreno Método Cono de Arena 71

Ilustración 27 Personal Vinculado por Empresas febrero 2026 81

Ilustración 28 Personal Vinculado por Profesión febrero 2026 82

Ilustración 29 Entrega y Reemplazo de Equipos de Protección Personal 97

Ilustración 30 Proceso de Inducción 98

Ilustración 31 Participación de Inducciones 100

Ilustración 32 Cobertura de Participación Contratista 101

Ilustración 33 Cobertura de Participación Contratista 101

Ilustración 34 Inspecciones Planificadas 103

Ilustración 35 Comités de Obra 104

Ilustración 36 Indicadores de Accidentalidad 105

Ilustración 37 Acopio Temporal De Material 112

Ilustración 38 Desinfección de Unidades Sanitarias 114

Ilustración 39 Mantenimiento Puntos Ecológicos 117

Ilustración 40 Capacitación manejo adecuado de Puntos Ecológicos y Separación en la Fuente 117

Ilustración 41 Cerramiento de Protección Individual 120

Ilustración 42 Inspección Puntos de Emergencia 121

Ilustración 43 Mantenimiento de la Señalización 122

Ilustración 44 Maquinaria en la Obra 124

Ilustración 45 Puesto de Control Silo Para Concreto 125

Ilustración 46 Capacitación al Personal en la Obra 127

Ilustración 47 Actividades Sst Medio Ambiente 128

Ilustración 48 Socialización Avance Del Proyecto Comunidad Alto Pompeya 129

Ilustración 49 Actividad Taller Resolución de Conflictos 142

Ilustración 50 Actividad Comité de Vigilancia y Control Febrero 154
