ANEXO 1: BITACORA

Miercoles. 01 Abril de 2026 - Dia lluvioso

Personal de obra

Director de obra = 1
Residente Arquitecto = 1
Residente ing. civil = 1
Profesional SST = 1
Aux. administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 8
Ayudantes = 27
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

Se realiza la instalación de los postes para el cerramiento perimetral de zona 10, se empieza con la pintura de la cancha de Badminton y con la cancha de futbol (Multiple), se realiza el replanteo y cortada de bordillos para la escalera de acceso de zona 10 a el descanso de zona 5 (Palestina) se realizan pañetes (revoque) en los muros interiores del baño, se hace instalación de la red electrica de los baños de zona 4, se hace localizacion de la zona 6, se continua con la vaciada de los pedestales de la zapata de zona 6, se realiza la instalación de la sub-base en los espejos de agua de zona 1, se continua con la excavación mecanica del parqueadero de zona 2, se continua con la instalación de la estructura metalica y de superboard en las casetas de ventas de zona 1. se continua con la instalación de los morteros de nivelacion en zona 1 para los casetas

Ing Obra

Ing Interventoria

Jueves 02 Abril de 2026.
Viernes 03 Abril de 2026.
(NO SE TRABAJÓ - POR SER DIA FESTIVO).

Sabado 04 Abril de 2026 NO se TRABAJÓ

Lunes 06 de Abril de 2026

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto residente = 1
ing civil residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 10
Ayudantes = 30
controlador vial = 1

Actividades de obra.

se realiza la excavación de la Tierra excavada de zona 2, se hace la instalación de la formaleta para el vaciado de columnas, o pedestales de la zapata de zona 6, se realiza la instalación de las platinas de la viga perimetral de zona 9. (Multiple) se continua con la instalación acta subbase compactada en el parqueadero de zona 2. se continua con la excavación manual de los pilotes para la cubierta del Teatrino, se hace la instalación del superboard en las casetas de zona 1, se realiza la pintura en acrilex en las canchas de zona 7 y 9 (Badminton) - (Multiple), se realiza limpieza en Senderos

Ing obra

Ing interventoria.

Powered by CamScanner

Martes 07 de Abril de 2026.

Personal de Obra

Director de obra: 1
Arquitecto Residente: 1
Ing civil Residente: 1
Profesional SST: 1
Aux administrativa: 1
Maestro de obra: 1
Oficiales: 10
Ayudantes: 32
Controlador vial: 1

Actividades de obra

se realiza la instalación de los postes de iluminacion en la concha Multiple, se realiza fundido en rampa de zona 1 - circulación parte baja, se realiza el vaciado de las boleras de las Terrazas de zona 11-D, Se realiza el fundido de los senderos de zona 5, se continua con la instalación de la subbase compactada en los parqueaderos de zona 2.
se realiza la instalación de sub-base en la circulación del Teatrino, se instala la Malla electrosoldada en la rampa perimetral de la plazoleta de zona 1, se realizan movimiento de tierra de forma mecanica en zona 2.
se empieza a replantear y a instalar el afirmado compactado en zona 6 (acceso).
se formaleteo la zapata derecha del portico de la zona 6.

Ing Residente de obra

Ing Interventoria

Miercoles 08 de Abril de 2026.

Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 33
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

se realiza la instalación del afirmado compactado en el sendero de runing cerca a la zona 13, se realiza el vaciado de los descansos del sendero de zona 5, (costado sur de la cancha de Badminton) se realiza vaciado de la viga de cerramiento en la mampostería de los Baños de zona 4. se hace instalación de Barandas en la placa de zona 10-B, se continua con el cerramiento perimetral (instalación elementos prefabricados en taller), se realiza limpieza de cancha de Badminton. zona 7. se realiza. perfilado de Talud de forma mecanica. en el sendero. de cicloamantanismo, se continua con la instalación de las losetas de zona 11-B. se realiza excavación de rampa. de zona 1. se hace vaciado del muro posterio en las Terrazas de zona 5 (Miradores).

Ing Residente de Obra

Ing Residente Interventoria

Powered by CamScanner

Jueves 09 de Abril de 2026 - Dia lluvioso

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil - Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 33
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

se presentan Fuertes lluvias - se cancelan actividades.-
Se realiza sellado en rampa de zona 6 (acceso).-
y se hace la instalación del afirmado compactado en la placa de zona 6, se hace la conformación de forma manual y compactación del material en la rampa. longitudinal de zona 5. aprox (70m) se realiza la instalación de la Tubería de presión en las casetas de zona 1. (camara de aire), se continua con la instalación de la Subbase. en zona 2. se continua con la instalación de Bordillos perimetrales. en zona 2. se hace instalación de formaleta en rampa perimetral de zona 7. se continua con la instalación de placas de Superboard. en las casetas de ventas, se hace la vaciada del Muro patio de la Terraza o Mirador de zona 5 y se continua con la vaciada de postes perimetrales para el cerramiento en el costado Norte. del proyecto. el contratista inicia realiza instalación de postes de iluminación

Residente de obra.

Ing. Interventoria.

Viernes 10 de Abril de 2026.

Personal en obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 32
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

Se continua con el relleno compactado con material de prestamo en los senderos de zona 5 (70 m), se continua con la instalación de subbase en el parqueadero de zona 2, se realizan cortes Mecanicos de las Terrazas de zona 5, cerca a la zona 6, se realiza resanado de forma manual para las Miradores del costado norte. de la zona 1 se realiza el vaciado de placas de paso en la Terraza de zona 11-D, se continua evacuando material de corte de zona 2 (Tierra) se hace la instalacion de Bordillo perimetral en el parqueadero de zona 2 se continua con la vaciada del descanso de acceso alas escaleras de zona 5, costado sur de color arena, se realiza instalación del cerramiento perimetral de Parque en zona 10A, se realizan Soldaduras en cosamanos en la zona 10-B.

Ingrado esteban Hoyos C.
A-19312021-1053841731
Residente obra

Ing interventoria -

Powered by CamScanner

Sabado 11 de Abril de 2026.

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 31
controladora vial = 1

Actividades de obra.

Se realiza corte (modelación) de la teja de las cubetas de ventas de zona 1, se realiza instalación de canal en PVC en modulo de ventas de zona 1, se realiza la instalación de la Subbase compactada en el parqueadero de zona 2, se continua colocando Bordillos perimetrales en parqueadero. se realizan Toma de densidades en la circulación baja del Teatrino en zona 1., se continua con la instalación de los Postes de cerramiento de zona 10 y zona 12 y 13, se realiza revoque de muro de zona 11-B, se continua con la instalación de las placas de Piso en la Terraza 11-B, se realiza vaciado de escalera que comunica zona 10-A con descanso Nevia de zona 5, se realiza retiro de escombros y material de corte en zona 3, se realiza fundida de la viga perimetral de zona 9 (Multiple) se continua con la nivelación manual de Miradores de zona 1, se continua instalando Superboard

Didier Flórez C.
ING. RESIDENTE.
DE OBRA.

ING INTERVENTORIA

lunes 13 de abril de 2026 - Dia lluvioso -

Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto residente = 1
Ing civil residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 10
Ayudantes = 31
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

Se realiza vaciado de la zapata de zona 6, se realiza limpieza en cancha MULTIPLE, se realiza replanteo de Juegos infantiles, y de Maquinas de calistenia en zona 10-B, se realizan los dados para anchaje de Maquinas de calistenia, se continua instalando y compactando la subbase en el parqueadero de zona 2. Se realizan cortes mecanicos en las Terrazas verdes de zona 5 cerca al acceso de zona 6, se realiza el Traslado de campamentos y almacen para placa de zona 4, se continua formaleteando Placas de Piso de zona 11-D, se continua el sellado manual de la Terraza de zona 1 cerca a zona 6, se realiza instalación de formaleta en rampas de acceso a zona 6. y senderos de zona 5, se continua con el llenó con material de prestamo en el sendero longitudinal (70 m) y compactación, rampa que comunica zona 6 con zona 11-D. se realiza pegylado de Tubos en zona 14 y empradización

ING. RESIDENTE DE OBRA.

ING. INTERVENTORIA.

Martes 14 de Abril de 2026 - Dia lluvioso -

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
ing civil Residente = 1
Aux administrativa = 1
Profesional SST = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 11
Ayudantes = 32
controlador vial = 1

Actividades de obra

se continua con la instalación de la Sobbase y compactacion en el parqueadero de zona 2, se continua con la instalación perimetral de Bordillos. en parqueadero de zona 2. se realiza instalación de formaleta y vaciado de pedestales de zapata de zona 6, se realiza vaciado con concreto premezclado (mixer) en las placas de piso de zona 1. se realiza vaciado de los pedestales para el anclaje de los juegos infantiles y para las maquinas de calistenia en la zona 10-B, se realiza compactación con vibrocompactadora Tipo (Rana) en el sendero longitudinal de zona 5 (70m) long, se realiza el Transporte y Suministro de la arena Silice. para la cancha de voleibol arena, se hace el ensamble de juegos infantiles (Torres de vigilancia grandes-pequeños) columpios, sube y bajas, Muros de escalar de cuerdas - se continua con la instalación de Barandas en la Rampas de zona 5, cerca a la zona 10-A y zona 11-B.

ING. RESIDENTE DE OBRA.

ING INTERVENTORIA.

Miercoles 15 de Abril de 2026. (Dia lluvioso)

Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil residente. = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 31
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

Se realiza instalación de Bordillos perimetrales en el parqueadero de zona 2, (se presentan Fuertes lluvias en horas de la mañana, se reanudan actividades a las 9:30am), se continua instalando Tejas y canaletas de PVC en los modulos de venta de zona 1, se realiza instalación de formaleta metalica para pedestales de zona 6 (zapata), se realiza el replanteo en las escaleras en zona 6, se continua con la instalación de Bordillo perimetral en el parqueadero de zona 2, se realiza instalación de arena Silica en cancha de voleiball arena, se continua con la instalación de ejercios Biosaludables se continua con la instalación de la baranda. metalica entre. zona 9 y zona 10-A, se realiza la instalación de los parques infantiles, y columpios en zona 10-A, se realiza nivelación en zona 12. para Traslado de almacen de obra, se realiza Traslado de campamento y comedor de obra a zona 11-A, se realiza formaleteado de placas de piso para la Terraza de zona 11-D, se continua haciendo cortes mecanicos en Sendero de zona 5 y 4.

Yuli P. H
ING INTERVENTORIA.

Julian Hoyos C.
ING INTERVENTORIA - RESIDENTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

Jueves 16 de Abril de 2026 (Dia lluvioso)

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 11
Ayudantes = 30
Controladae vial = 1

Actividades de obra

se realizan cortes de forma mecanica en el sendero peatonal de zona 4. que conecta con la Terraza de zona 6, se continua realizando. el Traslado del campamento y el almacen de obra, se realiza la instalación de alcorques en la Terraza de zona 11-D, se continua con la instalación de maquinas de calistenia y de juegos infantiles en zona 10-A y 10-B respectivamente, se continua instalando. Bordillo perimetral en parqueadero de zona 2, se continua con la instalacion de los baranda metalicas en zona 5 entre zona 9 y zona 10-A, se hacen cortes mecanicos en el sendero de zona 5 long (70 mL) 4 se realizan corte perimetrales al Baño de zona para hacer instalación de revoque en paredes exteriores, se realiza descargue de mobiliario en concreto para zona 11-A. se realiza vaciado de postes para el cerramiento perimetral sobre zona 10-B. se presentan FUERTES lluvias en las horas de la Tarde (3:50 pm) se cancelan actividades

Arquitecto Residente de obra
A-193/2021-053841731.

ING INTERVENTORIA

Viernes 17. de Abril de 2026.

Personal de obra.

Director de obra = 1.
Arquitecto Residente. = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 30
Controladora vial = 1

Actividades de obra

Se realizan cortes mecanicos en el sendero de zona 5. Longitudinal (70m) se realiza el vaciado de los pedestales de la zapata de zona 6, se realizan cortes mecanicos en el camino peatonal de zona 14. que comunica el descanso de Manizales con los miradores de zona 1, se realizan encaretas de zona 1 aplicación de Pintura, se continua con la instalación de Superboard en caretas 4-5 de zona 1. se continua con la instalación de Teja en caretas de zona 1, se hace instalación de arena silice. en concha de voleiball arena, se continua con el Traslado de campamento y almacen de obra, se finaliza con la instalación de los juegos infantiles y de las maquinas de calistenia. en zona 10-A y 10-B, se realiza limpieza de la placa de zona 10-A y 10-B para la instalación de la grama sintetica, se empieza con la instalación de alcorques en zona 11-D y zona 11-B, se realiza llero compactado en rampa de acceso de la cll 48 al 21

Arquitecto Residente de obra.

ING INTERVENTORIA.

Sabado 18 de Abril de 2026. (Dia lluvioso)

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1
Ing. civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 11
Ayudantes = 30
Controlador vial = 1

Actividades de obra.

se continua con la instalación de la arena Silice en la cancha de voleiball arena, se continua con la instalación de la formaleta para los gradas del Teatrino en zona 1, se realiza instalación de formaleta en los pedestales de zapata de zona 6, se continua con la instalación de la canaleta PVC en las cajetas de centros, se continua instalando afirmado para rampa de acceso desde la calle 48 a zona 1 - (circulación parte baja), se continua con la instalación de bordillos perimetrales en zona 2. (parqueadero). se realiza el armado de juegos infantiles de cuerdas en zona 10-A para su posterior instalación, se realiza limpieza en zona 3 para inicio actividades mecanicos, se realiza el resane de los muros exteriores de los Baños de zona 4, se continua con cortes manuales en zona K1 y se realiza siembra de arboles y especies ornamentales en la zona K1, se realiza el Traslado de el cerramiento provisional de obra cerca a la calle 48.

RESIDENTE DE OBRA

ING INTERVENTORIA

Lunes 20 de Abril de 2026. (Dia lluvioso)

Personal en obra.

Director de obra = 1.
Arquitecto Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra. = 1
Oficiales = 8
Ayudantes = 30
Comisionada vial = 1

Actividades de Obra


Se realiza vaciado de grada en el teatrino de zona 1, se continua con la instalación de Bordillo perimetral en zona 2 (parqueadero de zona sur). Se continua con el recaqué exterior de los baños de zona 4. se realiza instalación de juegos de cuerdas en zona 10=A, se continua con la siembra de arboles en zona 14, se realizan cortes mecanicos en zona 4. para rampas y estructura de parqueadero. se realiza limpieza en la zona 4 (recolección de Basuras, y madera), se realiza traslado de Material Petreo de zona 4 para la zona 1= para realizar cortes mecanicos en zona 4. para instalación de la subbase, se continua con la instalación de postes metalicos para el cerramiento perimetral cerca a la calle 48, se establece con autorización de interventoria el detalle del sendero longitudinal de (70m) continuación. Segun NTC-4143

Pdt.

Jhoan
Arquitecto
Residente de Obra.

ING INTERVENTORIA

SEGUN NTC 4143 - (Tercera actualización).

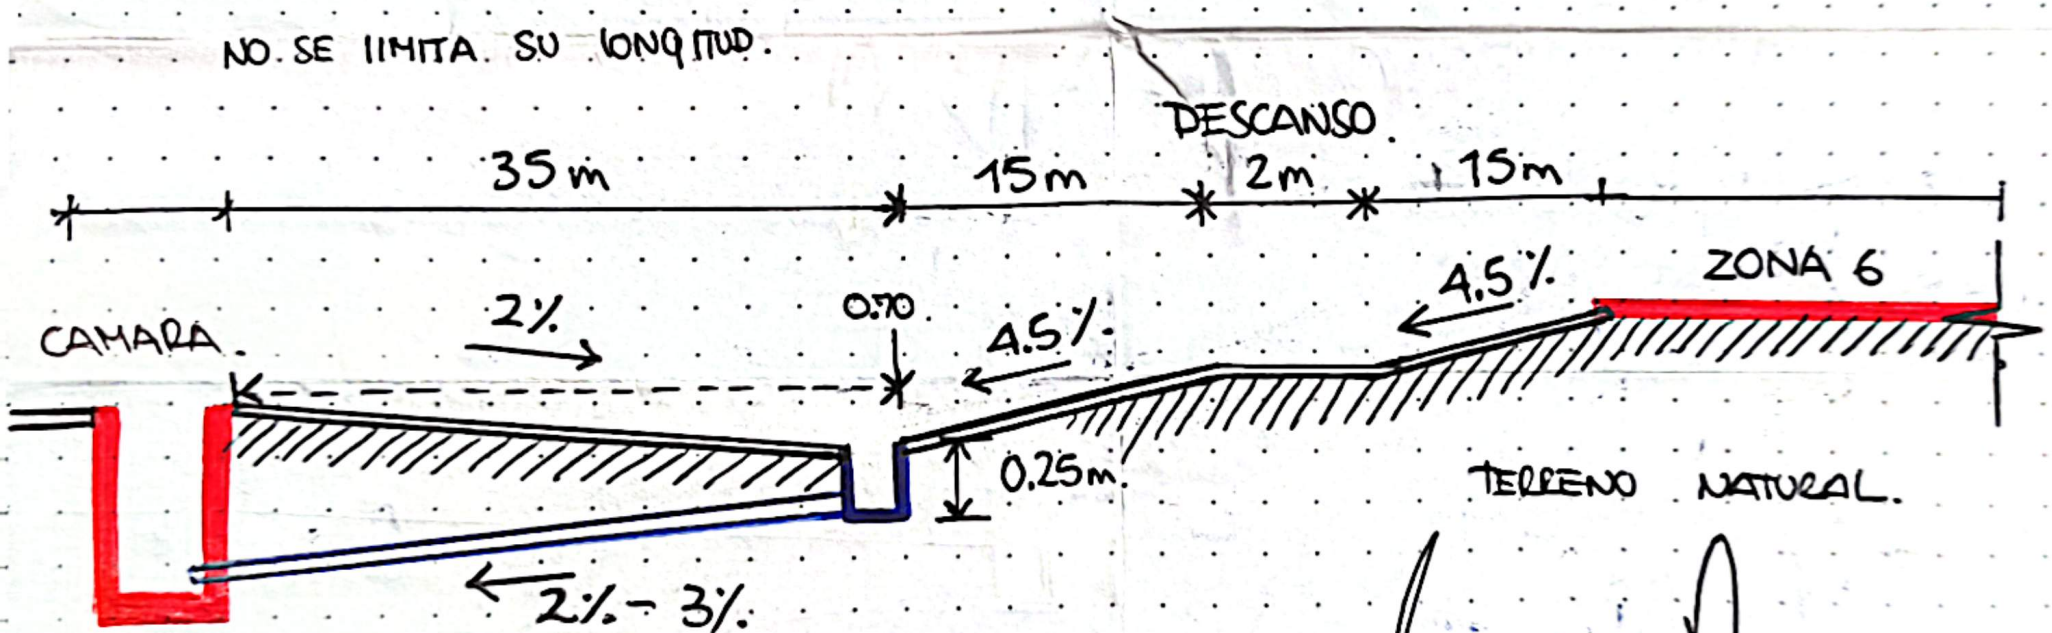

Powered by CamScanner

Martes 21 de abril de 2026. (Dia lluvioso)

Personal de obra.

Director de obra. = 1
Arquitecto Residente de obra = 1
Ing civil Residente de obra = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 8
Ayudantes = 29.
Controlador vial = 1
Topografo = 1

Actividades de obra.

Se realiza localizacion y replanteo del parqueadero de zona 3. con ayuda de Topografia, Se continua con la instalación de bordillo en el parqueadero de zona 2, se realiza vaciado de la batea de los canales de los espejos de agua de zona 1, se continua con el revoque exterior de los baños de zona 4, se realizan cortes mecanicos en el parqueadero de zona 3. para estructura de parqueadero, se realiza limpieza de zona 14 para Terminar la siembra de arboles, se realizan cortes mecanicos en el parqueadero de zona 3, se realiza localizacion de rampa peatonal en zona 4 costado Sur de los Baños, se realiza instalacion de pañaleta para gradas en Teatrino, Se realiza vaciado de pasos de escaleras de zona 1, Se empieza con instalación de placas de Piso en zona 11-C, se continua con la siembra de arboles, e instalación de Baranda, se realiza instalación de Postes de luminaria, se realiza instalación de cerramiento de zona 9.

Jhon F.
ING Residente
DE obra

Director
ING DE OBRA - INTERVENTORIA

Miercoles 22 de abril de 2026. - (Dia lluvioso)

Personal de obra

Director de obra = 1
Arquitecto diseñador Residente = 1
Ing civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro = 1
Oficiales = 8
Ayudantes = 29
Controlador vial = 1

Actividades de obra

Se realiza concreto de forma manual para el vaciado de las escaleras de acceso a zona 1 desde zona 6, se realiza vaciado de gradas de Teatrino de zona 1. Se realiza el vaciado del pedestal de la zapata de zona 6, se realizan instalaciones electricas en casetas de ventas de zona 1, se realiza instalación de superboard en las casetas de ventas, se continua con la instalación de Bodillos en zona 2, se continua con la instalación de la subbase en el parqueadero de zona 2, se realiza la instalación del cerramiento perimetral a cada 2m en el costado Este del parqueadero de zona 2. se realiza instalación de Malla eslabonada en la concha Multiple se realiza instalación de plaqueta en las terrazas de zona II-C, se continua con la instalación de baranda metalicas en el perimetro de zona 13, se realiza siembra de arboles en la zona K, se realiza la instalación de carcamos en el costado oeste de la concha Multiple. y se realiza limpieza de borde de carcamos

Yuli B.H
Director.

Residente de obra

Ing. de interventoria.

Powered by CamScanner

Jueves 23 de Abril de 2026 (Dia lluvioso)

Personal de Obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente de obra = 1
Ing Civil Residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 8
Ayudantes = 26
Controlador Vial = 1

Actividades de Obra.

Se realiza limpieza de baldas de los carcamos de la cancha Multiple, zona 9. se realiza la instalación de los carcamos en todo el proyecto Tipo A-Tipo B.
se realizan cortes mecanicos en el parqueadero de zona 3, se realizan instalación de los muros con malla eslavonada en la cancha multiple de zona 9, se continua con la siembra de arboles en zona 14 y con la siembra de cinaro en senderos de zona 5.
se realiza vaciado de forma manual de las gradas del Teatrino en zona 1, se realiza compactación en instalación de afirmado en el parqueadero de zona 3
se realiza limpieza general de obra, recogiendo madera, y desechos de construcción como tambien escombros en zona 10, se realiza instalación de subbase compactada en la rampa de acceso a la zona 1. que conecta con la calle 48, se continua con la instalación de baranda metálica en zona 13 todos.

Residente de obra.

Director.
Ing. INTERVENTORIA

Viernes 24 de Abril de 2026. (Dia lluvioso)

Personal de obra.

Directa de obra = 1
Residente arquitecto = 1
Residente ing civil = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
oficiales = 8
Ayudantes = 27
Controlador vial = 0

- Actividades de obra -

Se continuan con los cortes mecanicos en el parqueader de zona 3, se continua cona la instalación de Bordillos ón el parqueadero de zona 2, se continua con la instalación de carcamos en el proyecto zona 1. zona 5 - zona 10-A y zona 14, se realizan cortes mecanican en rampas peatonales de zona 4. se continua con la instalación de los paños con malla eslaborada en cancha multiple de zona 9, se continua instalando postes de iluminación, se hacen llenos con material de prestamo compactado en las zapatas de zona 6 se realizan corte mecanicos en el acceso a los baños de zona 4, se realiza limpieza en bateas de carcamos, se realiza compactación de subbase en la rampa de acceso de la calle 48 a zona 1 parte baja, se realiza instalación de subbase en los espejos circulares de agua para vaciado de bateas, se realiza llenos con material de prestamo y piedra en las graderias de zona 1, se continua con la instalación de subbase en zona 2.

Residente de obra

Ing. INTERVENTORIA
Director interventoria.

Sábado 25 de Abril de 2026.

Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente = 1.
Ing. Civil Residente. 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa: 1
Maestro de obra = 1
Oficiales -
Ayudantes =
Contratados vial: 0

Actividades de Obra.

- desde del punto de vista Tecnico. las lluvias continuas han generado restricciones significativas en la ejecución de actividades de obra civil. especialmente aquellas relacionadas con movimientos de Tierra, conformación de Taludes, rellenos y compactaciones. la saturación de los suelos disminuye su capacidad portante, e incrementa el riesgo de inestabilidad en Taludes y obliga a suspender labores por razones de seguridad industrial y control de calidad, -

Se continuan con el vaciado de los postes para el cerramiento perimetral en zona 1, se realizan movimientos de Tierra mecanicos en el parqueadero de zona 3 se realiza compactación de subbase en el parqueadero de zona 2, se continuan con los Trabajos de Soldaduras en la cancha Multiple - (techos con malla eslabonada), se realiza el figurado de los pilotes y fleyes para los pilotes de la vivienda del Teatrino. se realiza vaciado de escaleras de zona 6 Se realiza traslado de cerramento de Guadua para el ingreso de la 48. se continua con la instalación de Bordillo

Residente de obra
Arquitecto.

Ing. Interventoria
Director interventoria

lunes 27 de Abril de 2026 (Dia lluvioso).

Se realiza revision de vaciado de espejos de agua zona 1 evidenciandose que tras reunion realizada con planos en fisico el dia viernes 24 abril donde se le manifiesta al contratista que se deben cumplir los niveles segun diseños donde se evidencia que no es lo mismo el nivel de los espejos al de las canales como se ve en el detalle anexo, sin embargo el dia sabado proceden a vaciar y lo realizan al mismo nivel lo cual no comple con los diseños establecidos, Por lo tanto se solicita al contratista de manera urgente realizar las correcciones necesarias y cumplir estrictamente el diseño.

Atte. Yuli P. H.
Director interventoria

Personal de obra

Director de obra: 1
Residente de obra Arquitecto: 1
Residente de obra ing civil: 1
Profesional SST: 1
Aux administrativa: 1
Maestro de obra:
oficiales: 8
Ayudantes: 26
Controladue vial: 0

Actividades de obra

se presentan Fuertes lluvias se cancelan actividades en horas 9:30a.m.
Se realiza instalación de carcamos en zona 1, Teatrino cerca de los parqueaderos de zona 2. Se realiza vaciado de graderia en la plazoleta de zona 1.

Teatrino, se continua con los trabajos de soldadura en la cancha Multiple (cerramiento). Se autoriza por parte de interventoría el distanciamiento entre postes de 1.5m para los astas de banderas y a la misma distancia con respecto al poste de iluminación de Incama, se establecio con la arquitecta Monica Velazquez que la altura del pedestal es de 0.5m con respecto a la placa de la plazoleta de 21 y se deben realizar ochaves en las esquinas y al rededor de toda el perimetro del pedestal, dicho pedestal queda de 7m y el detalle se muestra al final de la hoja.

se realiza el pulido de las placas de paso de zona 10-A- y 10-B para la instalación de la espuma de la vial se pega la grama sintetica, se realiza aseo en los baños y recolección de madera y cosecha de toda la obra. se realizan cortes de forma manual en el acceso a los baños de zona 4. se continua con la pintura de las casetas o modulos de ventas de plazoleta de zona 1. se continua con la instalación de la subbase en el parqueadero de zona 2 y compactación con vibrocompactador "Rana", se continua con la instalación de postes perimetrales en el costado sur-este cerca al parqueadero de zona 2 para cerramiento. se continua con la instalación de Bordillo para parq-

= DISEÑO PEDESTAL ASTAS DE BANDERAS DE ZONA 1.

Arquitecto
Residente de obra


Ing. INTERVENTORIA.


lunes 27 de abril de 2026.

Manzales:

EJE DE POSTES

Iluminación - Astas de Banderas

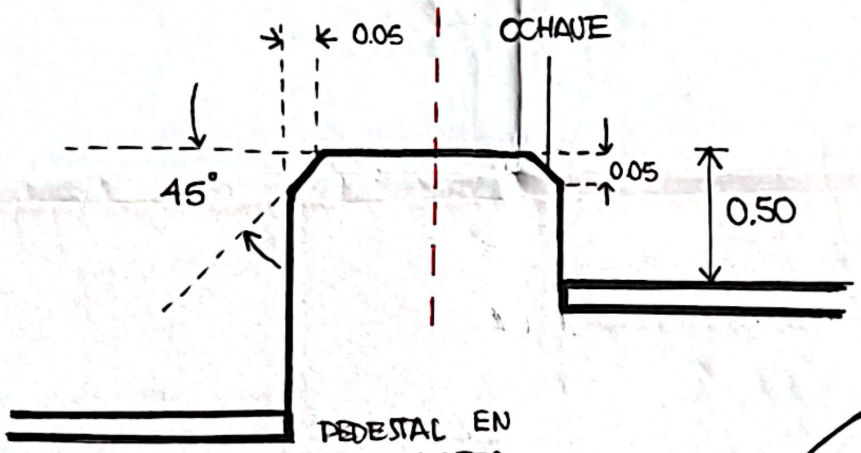

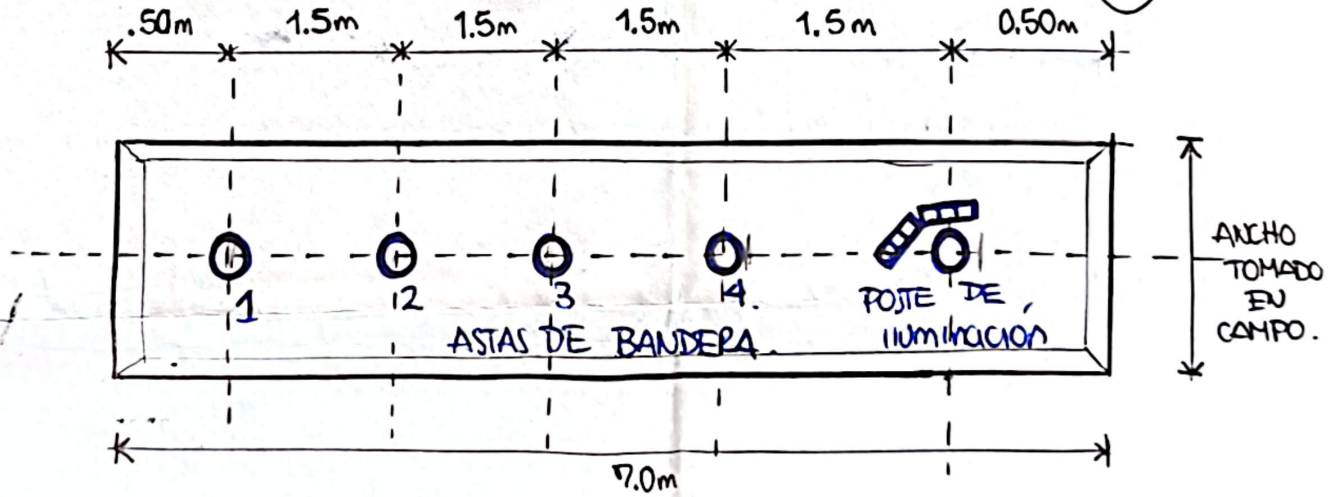

Martes 28 de Abril de 2026. (Día lluvioso).

Director de obra = 1 - Personal de obra -
Residente Arquitecto : 1
Residente ing civil = 1
Profesional SST = 1
Apoyo administrativo = 1
Maestro = 1
Oficiales = 8
Ayudantes = 26
Controlador vial = 0

Actividades de Obra.

Se realiza Reunion con la arquitecta monica Velazquez y la Directora de Obra de Interventoria, Paulina. Henao en donde se establece que los fondos de los espejos de agua cárcamos de la zona 1, quedan al mismo nivel de la batea de los canales. Se anexa el detalle de encuentro de los espejos cárcamos - y canales. se presentan lluvias en horas de la mañana, se reanudan actividades a las 10:50 am, (Se presenta saturación de agua lluvia en suelos, retrasando conformación de rampas de zona 5, se realiza excavación de forma mecanica para remplazar el "lodo" por material de prestamo y compactado en zona 5.
Se realiza instalación de revoque en los Muros exteriores en los baños de zona 4, se realiza nivelación de rampa de zona 1 costado (NORTE) se realiza Nivelación manual en material conglomerado para las gradas de zona 1 de Teatrino, se realiza pulido de placa de zona 10-A y 10-B para instalación de grama sintetica, se realiza empradización en zona 14

Ing Residente obra

Ing interventoria.


Miercoles 29 de Abril de 2026. (Dia lluvioso - suave)

Personal de obra.

Director de obra = 1
Arquitecto Residente de obra = 1
Ing Civil Residente de obra = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 8
Ayudantes = 26
Controlador vial = 0

Actividades de Obra.

Se anexa el detalle DE la revision de la arquitecta Monica Velazquez y Yoli paulina Heros sobre los fondos de los espejos de agua circulares y los canales, que quedan al mismo nivel, se presentan suaves lluvias en horas de la Mañana.
-Se realiza excavacion manual a cielo abierto en material conglomerado en los pilotes para la cubierta del Teatrino de zona 1, se realiza excavacion para conformación en Tierra. de las graderias para el Teatrino de zona 1, se continua con la instalación y compactación de la Sobbase del parqueadero de zona 2, se continua con la instalación perimetral para parqueadero de zona 2, se continua con la instalación de baranda Metalica en el costado Este de la zona 10-B (calistenia). Se realiza demolición de piedras en canales de agua para su posterior fundido

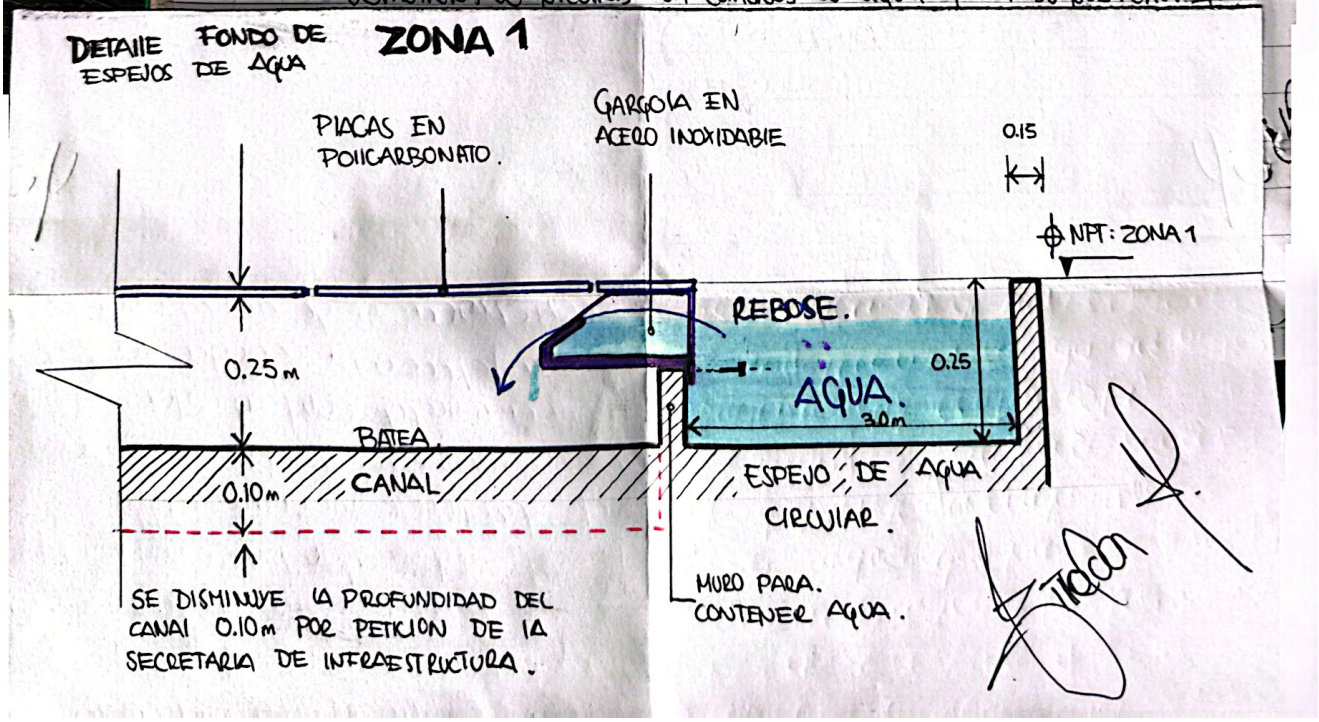

Jueves 30 de Abril de 2026.

Personal de obra:

Director de obra = 1
Arquitecto residente = 1
Ing civil residente = 1
Profesional SST = 1
Aux administrativa = 1
Maestro de obra = 1
Oficiales = 8
Ayudantes = 27

Actividades de Obra.

se realiza el vaciado de los canales en la zona 1 para los espejos de agua, se realizan cortes mecanicos en zona 3, se realiza conformación manual para las gradas de teatrino de la zona 1, se continua con la Sobbase compactada en el parqueadero de zona 2 se realiza instalación de sardinel perimetral para parqueadero de zona 2, se continua pulendo las placas de piso de zona 10AB, para la instalación de la grama sintetica. se realiza instalación del acero (malla electrosoldada) en rampas de zona 5, se realiza instalación de solado de limpieza para pilotes de la cubierta del teatrino, se instala el acero de Refuerzo para pilotes de zona 1, (cubierta teatrino) e instalación de formaleta, se continua con la instalación de la baranda metalica en senderos de zona 5. se continua con el revoque perimetral en paredes exteriores del foro de zona 4, se continua con la instalación de los postes perimetrales para cerramiento definitivo en el costado Este del parqueadero de zona 2.

Ing residente de obra

Ing interventoria.
