PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, .		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	FECHA DE APLICACIÓN: 27/04/2026	27/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	INSTALACION MANUAL DE TUBERIA Y ACCESORIOS , CORTE, FIGURADO Y ARMADO DE HIERRO PARA PLACA Y/O ESTRUCTURA EN CONCRETO.ENCOFRADO Y DESENCOFRAD DE LA ESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANHOLES, INSTALACIÓN DE CONCRETOS, ACOPLE Y DESACOPLE DE TUBERIA. CONSTRUCCIÓN DE POZOS, SUMIDEROS Y CAJAS, REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS(GAS,ACUEDUCTO), TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE, TOMA DE MUESTRAS, DENSIDADES Y TRANSPORTE.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre). Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador), Equipos de rescate.		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE

DIFUNDIDO A:

Nombre	Cédula	Cargo	Firma
Leidy Cruz A.	1098646801	Sup HSE	
Luz Dary Lizarazo	63471681	Controladora Ind	Luz Dary Lizarazo
Helmer Perez	1096227281	Obrero	
EDER HENDEZ	13854843	OBRERO	
Franklin.	1143141475	OFICIO	
Brayan Arguello	1005321226	Cadenero	Brian A.
[illegible]	1096 194 560	Operador	
Jefferson Lopez pico	1005602257	conductor	

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: HSE-F-132
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Versión: 1
		Vigente a partir de: 01/07/2023

DIFUNDIDO EL 27/04/2026 A:

Nombre	Cédula	Cargo	Firma
NESTOR C.	0988646992	TOPOGRAFO	
LUBIN J. LEON	91 292.024	Laboratorista	
GELMER PEÑA	1091181548	obrero	
JOHN J. GONZALEZ	0914497347	conductor	

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		20/04/2026	20/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, LIMPIEZA Y DESMONTE ZONA DE TRABAJO, APIQUES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		
AUTO EVALUACIÓN PREVIA DE TAREA (APT)			
EVALUAR EL RIESGO:	Riesgo locativo (Caidas a distinto nivel), Riesgo quimico (proyección de particulas), accidentes de transito (Movilización de maquinaria y vehiculos), Riesgo fisico (Vibraciones, Ruido, Exposición a altas temperaturas), Virus, presencia de ofidios insectos bacterias, microorganismos, animales domésticos , biomecámico (manipulación manual de cargas).		
ANALIZAR/REDUCIR RIESGO:	Se debe realizar una inspección preliminar al inicio de las actividades con el objetivo de evaluar los riesgos asociados en las areas a intervenir, se debe efectuar la charla preoperacional asegurando el uso adecuado de EPP, inspección de herramientas, maquinarias, equipos y vehículos.		
ACTUAR PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN SEGURA	Realizar las actividades de forma segura, teniendo en cuanto la precaución durante los desplazamientos en obra, seguir los lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo correctamente, contar con los elementos de emergencia en obra, vehículos disponibles, primeros auxilios (personal capacitado), informar al jefe inmediato sobre el desarrollo de las labores, e implementar el plan de emergencias en caso de alguna eventualidad.		

AUTO EVALUACIÓN PREVIA DE TAREA (APT)

ALREDEDORES

- [X] Nivel de Ruido
- [ ] Iluminación
- [ ] Ventilación
- [ ] Trabajos encima
- [ ] Areas Punteadas
- [X] Pisos resbalosos
- [X] Agua
- [X] Linea Alto Voltaje
- [X] Cables Enterrados
- [ ] Químicos
- [ ] Material cortopunzante
- [X] Congestión
- [ ] Caminos
- [ ] Guayas / Cables
- [X] Clima
- [ ] Combustibles
- [X] Tuberías enterradas
- [ ] Otros

Cuales ? _____

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- [X] Herram . de Mano
- [ ] Opera con aire
- [X] Generador
- [X] Escaleras
- [ ] Herram Especial
- [X] Retroexcavadora
- [ ] Circuito Interrruptor
- [ ] Otros
- [ ] Bombas
- [ ] Mangueras
- [ ] Andamios
- [X] Extintor
- [ ] Extensiones Eléctricas
- [ ] Equipo Movil
- [ ] Ventiladores

Cuales ? PULIDORA, SALTARIN, RETROLLANTA VOLQUETA, RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA

EPI REQUERIDO

- [X] Gafas de Seguridad
- [X] Casco
- [X] Respirador
- [ ] Equipo Lava Ojos
- [X] Calzado de Seguridad
- [ ] Ropa Resistente a Prueba de Fuego
- [ ] Ropa Protectora para Sandblasting
- [ ] Otros
- [ ] Careta
- [X] Guantes
- [ ] Arnés de Seguridad
- [X] Protección Auditiva
- [ ] Chaleco Salvavidas

Cuales ? OVEROL Y CAMISA MANGA LARGA, TABABOCAS

PRUEBAS

- [ ] Hidráulicas
- [ ] Gases
- [ ] Otras

Cuales ? _____

NOTIFICACIONES

- [ ] Usuarios
- [ ] Otros

Cuales ? _____

RIESGOS IDENTIFICADOS

- [X] Corto Eléctrico
- [X] Caida desde distinto nivel
- [X] Lesiones Oculares
- [X] Espacio Confinado

Cuales ? _____

PRODUCTO/MATERIAL

- [ ] Corrosivo
- [ ] Tóxico
- [X] Liquido
- [X] Partículas en el Ambiente
- [ ] Caliente
- [X] Frío
- [ ] Gas / Vapor
- [ ] Otros

Cuales ? _____

REQUERIMIENTOS ESPECIALIZADOS/PERSONAL

- [ ] Soldador
- [X] Operador de Equipos
- [ ] Personal para manejo especializado de Equipos
- [ ] Otros

Cuales ? _____

OTROS

- [X] Procedimientos
- [ ] Consideraciones Ambientales
- [X] Inspección de Equipos
- [ ] Desactivación Equipo Critico de Seguridad

Cuales ? _____

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		20/04/2026	20/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, LIMPIEZA Y DESMONTE ZONA DE TRABAJO, APIQUES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarín, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (puldora, taladro, extensiones, generador).		

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
B	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	1	LOCATIVO (Área en desorden, pisos resbalosos, inestabilidad del terreno a trabajar y obstrucción en vias de evacuación).	1.1	Caidas al mismo y diferente nivel, golpes, lesiones menores, cortaduras, resbalones.	1.1.1	Asegurar orden y aseo del área y verificar que el piso no presente derrames de sustancias que puedan generar caidas.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.2	Inspeccionar el área de trabajo, adecuar el terreno, retirar obstáculos de las áreas y vías de acceso.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.3	Demarcar y señalizar el área donde se ubicará el equipo topográfico	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1,1,4	Uso permanente de los EPP (casco, guantes, botas, ropa de trabajo, gafas y protección auditiva). Realizar la respectiva desinfección de los EPP antes y después de realizar la actividad	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.5	Socializar ATS y todos los procedimientos constructivos seguros establecidos y dejar evidencia de la divulgación.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		2	BIOMECANICO (Posturas inadecuadas o disergonómicas, sobre esfuerzos, movimientos repetitivos,)	2.1	Dolores de espalda , desviación de columna, exposición a lesiones osteomusculares, disconfort laboral.	2.1.1	Realizar charlas sobre higiene postural	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.2	Adoptar posiciones ergonómicas, no doble la espalda manténgala erguida, flexione las rodillas al levantar o recoger las estacas	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.3	No cargar pesos superiores a 25 kg por persona y aplicar fuerzas ergonómicamente	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.4	Tomar descansos activos que permitan contrarrestar posiciones repetitivas y de larga exposición.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		3	MECANICO Manipulación y uso de herramientas manuales de forma inadecuada.	3.1	Golpes por objetos en movimiento, machucones, heridas, lesiones permanentes, cortaduras, aprisionamiento, atrapamiento.	3.1.1	Realizar desinfección e inspección pre operacional de las herramientas a emplear, seleccionando y demarcando las herramientas que se encuentren defectuosas y sacarlas de servicio.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.2	Uso permanente de los guantes proteger y cuidar sus manos, vigilar que se ejecuten las actividades con las técnicas apropiadas; también el uso permanente del tapabocas	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.3	En caso de accidente se activa el plan medico de emergencia.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		4	FISICOS Exposición a rayos solares y altas temperaturas	4.1	Episodios de insolación y deshidratación, golpe de calor	4.1.1	Realizar charlas pre operacionales advirtiendo sobre radiaciones no ionizantes y los efectos en la salud del ser humano.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.2	Mantener el punto de hidratación personal surtido de liquido en la zona de trabajo, además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP's.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.3	Usar un parasol para las altas temperaturas y los EPP s correspondientes, realizar descansos periódicos y pausas activas.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.4	Contar con su termo de uso personal, realizar el lavado de manos.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO					5.1.4	Realizar inspección y verificación del Área para detectar la presencia de animales.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Version: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		20/04/2026	20/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, LIMPIEZA Y DESMONTE ZONA DE TRABAJO, 'APIQUES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
		5				5.1.5	Divulgar al personal sobre la ubicación del suero antiofidico en el entorno e incluir en el medevac. En caso de mordedura activar el plan de emergencia.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		6	QUIMICO Polvos, Gases, Vapores y aerosoles, Uso, manipulación de aerosoles (Pintura en aerosol para marcación de mojones y estacas)	6.1	Inhalación, absorción cutánea, irritación, intoxicación	6.1.1	Conocer y socializar las hojas de seguridad de cada producto y dejar evidencia de socialización del mismo, tener en cuenta las caracteristicas de los productos y sus incompatibilidades.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						6.1.2	Uso obligatorio de EPP y dotación para la actividad (guantes, tapabocas, camisa manga larga, botas, pantalón.)	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						6.1.3	Realizar lavado de manos constante antes durante y después de la actividad.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
	DEMOLICION Y CORTE DE PLACAS Y/O ESTRUCTURAS DE CONCRETO O PAVIMENTO FLEXIBLE DE FORMA MECANICA O MANUAL	1	MECANICO Manipulación de equipos o herramientas manuales	1.1	Amputaciones, contusiones, cortes, laceraciones, golpes, fracturas, atrapamientos y/o aplastamientos, proyección de objetos y particulas cortante o punzante	1.1.1	Inspeccionar equipos antes de iniciar cualquier labor percatándose que el dispositivo tenga guarda y el disco seleccionado sea el adecuado para la actividad y diligenciar permiso de trabajo en caliente.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.2	Divulgar al personal los diferentes riesgos al momento de manipular una pulidora o cortadora. Recordar las lesiones aprendidas en los diferentes accidentes del entorno que se han generado por falta de capacitación o descuido. instruir a los trabajadores en cuidado de manos.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.3	Señalizar el área de trabajo uso adecuado de los EPP (Casco, guantes, botas, ropa de trabajo, gafas, protección auditiva, uso de careta siempre y cuando sea necesario).	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.4	En caso de presentarse incidente o accidente, disponer del kit de primeros auxilios, medios de transporte, comunicación, activar el plan de emergencias.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.5	Diligenciar inspección pre operacional diariamente a las herramientas a utilizar, equipo en buen estado y de manera adecuada, divulgar lecciones por aprender de accidentes de trabajo en actividades similares, ser prudentes y guardar distancia cuando se realice demolición, antes de su inspección desinfectar las herramientas antes de manipularlas, para darle cumplimiento al protocolo de bioseguridad.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.6	Uso de los EPP requeridos en buen estado, acordonar y señalizar el sitio de almacenamiento de material escombro y residuos sólidos.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.7	Activar el plan de emergencias y reportar de inmediato cualquier evento negativo, delimitar la zona afectada.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.8	Realizar el lavado de manos mínimo cada 3 horas o cuando se requiera llevar el debido seguimiento y control en el proceso de limpieza y desinfección.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.9	Preventivo: realizar desinfección e inspección pre operacional de las herramientas a emplear. Se debe realizar un estudio previo al área a laborar, para determinar si hay lineas de agua, alcantarillas, red de voz y datos, eléctricos, etc. Cuando se comprueba la existencia de estas y se ubican dentro del área de trabajo se debe extremar las precauciones para evitar daños.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.1	Mantener los equipos en óptimas condiciones para evitar excesos de nivel de vibración de los equipos.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		20/04/2026	20/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, LIMPIEZA Y DESMONTE ZONA DE TRABAJO, APIQUES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehículo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
C	DEMOLICION Y CORTE DE PLACAS Y/O ESTRUCTURAS DE CONCRETO O PAVIMENTO FLEXIBLE DE FORMA MECANICA O MANUAL	2	FISICO Vibraciones, Ruido, Exposición a altas temperaturas	2.1	Golpes de calor, dolores musculares, dolor de cabeza, estrés, hipoacusia, irritación cutanea.	2.1.2	Rotación de trabajos, los periodos de descanso y la duración de la intensidad y duración de la exposición maquinaria y/o equipos, mantener el distanciamiento entre los trabajadores.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.3	Sensibilización en el uso de los EPP y uso de doble protección auditiva para el personal que opere las herramientas o equipos mecanicos	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.4	Los trabajadores deberán contar con un termo personal para realizar la hidratación, y el debido uso de proector solar. Además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP's.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		3	ELÉCTRICO Equipos energizados (baja tensión), uso de extensiones o conexiones a circuitos temporales,.	3.1	Quemaduras, electrocución, contacto directo o indirecto, corto circuito, fibrilación cardiaca	3.1.1	Diligenciar la inspección de equipos eléctricos antes de iniciar la actividad. Realizar la debida desinfección de equipos según indica el protocolo de Bioseguridad.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.2	Verificar que los equipos eléctricos se encuentren certificados por un profesional, y uso de los EPP's.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.3	Verificar que las Herramientas eléctricas, enchufes y conexiones, estén en perfecto estado evitando contacto con conductores energizados. Cada extensión eléctrica, debe estar protegida por un toma corriente.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		4	QUIMICO Polvos, material particulado, Humos metálicos	4.1	Inhalacion, irritación, intoxicación	4.1.1	Uso obligatorio de EPP para la actividad (guantes, tapabocas, mascarilla de ser necesario, entre otros)	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.2	Realizar lavado de manos constante, antes durante y después de la actividad.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		5	BIOMECANICO (Posturas inadecuadas o disergonómicas, sobre esfuerzos, movimientos repetitivos)	5.1	Dolores de espalda , desviación de columna, exposición a lesiones osteomusculares, disconfort laboral.	5.1.1	Realizar charlas sobre higiene postural / realizar pausas activas durante la jornada laboral	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						5.1.2	No realizar levantamiento manual de cargas mayores de 25 Kg	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						5.1.3	Adoptar posiciones ergonómicas, no doble la espalda y manténgala erguida.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						5.1.4	Tomar descansos activos que permitan contrarrestar posiciones repetitivas y de larga exposición.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		6	LOCATIVO Tubería, ductos, cables enterrados, generación de escombros, obstáculos en el área	6.1	Explosión daños a instalación y equipos, caídas al mismo y diferente nivel, golpes y lesiones	6.1.1	Antes de iniciar las actividades, inspeccionar areas de trabajo señalizando y demarcando las áreas y los peligros identificados.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						6.1.2	Reportar inmediatamente al personal de aguas de Barrancabermeja SA E S.P, si se hace algún hallazgo de tubería distinta a la que se va a intervenir.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						6.1.3	No transitar por los bordes de los andenes, bordes de cajas, y no transitar sobre tuberías.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						6.1.4	Mantener áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo. Dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						6.1.5	Socializar ATS y todos los procedimientos constructivos seguros establecidos y dejar evidencia de la divulgación.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Version: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	**FECHA DE APLICACIÓN:**	
		20/04/2026	20/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, LIMPIEZA Y DESMONTE ZONA DE TRABAJO, APIQUES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
D	TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS- OPERACIÓN DE EQUIPOS	1	MECÁNICO: Parqueo del vehiculo: Volqueta, retroexcavadora, Camioneta	1.1	Daño a infraestructura: tubería superficial o enterrada, bordillos, etc. Contacto con lineas de alta, media o baja tensión, cables, guayas. Etc Electrecusión	1.1.1	Verificar la documentacion del vehiculo en particular el certificado de revision tecnico mecanica vigente.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.2	Evaluar las condiciones del area,Verificar lineas y cables alrededor de la zona intervenida., Señalizar las areas con colombinas, avisos, señales preventivas y de aviso. Dar previo aviso al operador durante los movimientos realizados dentro del area de ejecución para evitar posibles daños, incidentes o accidentes.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.3	Informar al encargado del area, el numero y tipo de vehiculos que se emplearan y las posibles areas de parqueo, para descartar daño a infraestructura no visible (tuberia o ductos enterrados). Implementar guia permanente para esta labor.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.4	Inspeccionar el area de parqueo con el operador o conductor, definiendo el recorrido y señalizando obstaculos irremobibles: bordillos, tuberia superficial, postes, ect., lineas de media y alta tensión, cables, guayas. etc. Comprobar estabilidad del terreno y señalizar baches en todo el recorrido.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		2	MECÁNICO: Conducción de vehiculos pesados y/o livianos Operación de Equipos y/o maquinaria pesada	2.1	Atrapamiento o atropellamiento de personas	2.1.1	verificar la documentacion del vehiculo, en particular lista de chequeo diaria.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.2	Disponer de un guia para el accionar en reversa del vehiculo, el cual tendra la precaución de no ubicarse ni adelante ni atrás del mismo.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.3	Informar y coordinar con el personal presente en el area la actividad de posicionamiento del vehiculo.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.4	Divulgar lesiones aprendidas respecto al tema.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		1	MECANICO Partes a en movimiento, herramientas manuales, equipos de proyección de elementos, manejo y levantamiento mecánico de cargas, generación de escombros	1.1	Golpes por objetos en movimiento, atrapamientos, aprisionamiento, laceraciones, cortaduras.	1.1.1	Realizar desinfección e inspeccionar las herramientas antes de iniciar las actividades realizando el pre operacional, e inspeccionar el área antes del inicio de las actividades.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.2	Diligenciar el formato de inspección de retro llanta antes de iniciar la actividad, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la máquina. Realizar desinfección previa de la máquina de acuerdo al protocolo de bioseguridad.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.3	Coordinar el trabajo con el personal ubicándose a 2 metros de distancia como mínimo, entre ellos, en caso de accidente activar plan de emergencias.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.4	Coordinar los trabajos con el operador que opera la retro llanta, y mantener un guia de apoyo para la excavación.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.5	Para excavaciones mayores 1,50 mts verificar la disposición de medios seguros de salida para la ubicacion del trabajador, realizando plan de rescate cuando requiera, y uso de EPP, equipos de protección contra caida y diligenciar el permiso de trabajo en excavaciones.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.6	Implementación de sistemas de control de taludes (entibado o perfilado) de acuerdo al tipo de suelo y dimensiones de la excavación.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.7	Asegurar el diligenciamiento e implementación del formato de permiso de trabajo para excavaciones.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-122 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		20/04/2026	20/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, LIMPIEZA Y DESMONTE ZONA DE TRABAJO, APIQUES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehículo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
E	APIQUES Y EXCAVACIÓN MANUAL Y MECANICA					1.1.8	Señalizar y demarcar las excavaciones que permanezcan abiertas durante y después de la jornada de trabajo.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		2	BIOMECANICO Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	2.1	Fatiga física por dolor en la espalda por extensión prolongada de miembros superiores, posición prolongada de pie, deshidratación.	2.1.1	Capacitar en higiene postural.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.2	No realizar levantamiento manual de cargas mayores de 25 Kg.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.3	Establecer periodos de descanso y pausas activas de máximo 3 minutos en la jornada, y el lavado constante de manos. Dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad establecidos por la empresa.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		3	LOCATIVO Tubería, ductos, cables enterrados, generación de escombros, obstáculos en el área	3.1	Explosión daños a instalación y equipos, caidas al mismo y diferente nivel, golpes y lesiones	3.1.1	Antes de iniciar las actividades, inspeccionar superficies de trabajo señalizando y demarcando las áreas y los peligros identificados.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.2	Reportar inmediatamente al personal de aguas de Barrancabermeja SA E.S.P, si se hace algún hallazgo de tubería distinta a la que se va a intervenir.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.3	No transitar por los bordes de los andenes, bordes de cajas, y no transitar sobre tuberías.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.4	Mantener áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo. Dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.5	Material extraído se ubicara de tal forma que no afecte a la comunidad y delimitar las rutas seguras y pasos peatonales	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.6	Verificar durante la ejecución de las actividades, que no se realicen modificaciones, sin previa autorización.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.7	Socializar ATS y todos los procedimientos constructivos seguros establecidos y dejar evidencia de la divulgación.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		4	FISICO Ruido, Exposición a altas temperaturas	4.1	Episodios de insolación y deshidratación, golpe de calor	4.1.1	Aplicar la toma de temperatura al ingreso y a la salida de la jornada laboral por cada trabajador con el debido registro. Diligenciar el reporte diario de estado de salud.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.2	Realizar inspección y verificación del Área para detectar la presencia de animales.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.3	Divulgar al personal sobre la ubicación del suero antiofídico en el entorno e incluir en el medevac. En caso de mordedura activar el plan de emergencia.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.4	Mantener los equipos en óptimas condiciones para evitar excesos de nivel de vibración de los equipos.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.5	Rotación de trabajos, los periodos de descanso y la duración de la intensidad y duración de la exposición maquinaria y/o equipos, mantener el distanciamiento entre los trabajadores.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.6	Los trabajadores deberán contar con un termo personal para realizar la hidratación, uso de protector solar. Además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP s.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
	APIQUES Y EXCAVACIÓN MANUAL Y MECANICA						Contar con la certificación de Trabajo Seguro en Alturas vigente, Certificado de aptitud medica Diligenciar permisos de trabajo y certificados de apoyo. Contar con vigía en espacio confinado en caso de aplicar. Contar con un Coordinador de trabajo en altura. Socializar ATS a todo el personal. Inspección pre operacional de equipos para trabajo en alturas. Verificar condiciones de salud del personal antes de ingresar. Socializar programa de prevención y protección contra	

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	**FECHA DE APLICACIÓN:** 20/04/2026	20/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, LIMPIEZA Y DESMONTE ZONA DE TRABAJO, APIQUES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pico, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
		5	TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS Excavacion a mas de 2 mts de profundidad con 1,20 de ancho,espacio reducido, con poca ventilación, vacio o borde desprotegido o sin protección adecuada	5.1	Politraumatismos, fractura,muerte,asfixia.	5.1.1	Socializar Programa de rescate en alturas (Brigada-Formación). Inspeccionar de manera periódica las paredes, bordes, accesos, y entibaciones. Evitar acercarse al borde sin la protección necesariq (elementos de protección contracaidas). Contar con planos de redes de servicio publico,realizar los apiques e identicar las lineas de servicio. Instalar sistemas de entibados en las paredes de la excavación, realizar terraceados. Inspeccionar que las paredes se encuentren libres de piedras grandes, masas duras de tierra, escombros u otros objetos que puedan caer al interior. Realizar medición de atmosferas. Instalar cierre perimetral para demarcar y asegurar area de la excavación. Instalar señalización preventiva e informativa. Ubicar el material excavado a 2 mts de distancia del borde de la excavación. Habilitar las salidas de emergencia en caso de un evento a menos de 7 mts de distancia de la excavación, escaleras o rampas. Mantener el area despejada cuando los equipos esten funcionando. Garantizar que las volquetas y vehiculos conduzcan a una velocidad segura.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores.
F	ACHIQUE DE NIVEL DE AGUA EN EXCAVACIONES Y/O MANHOLES CON MOTOBOMBA	1	FISICO Ruido, Exposición a altas temperaturas	1.1	Temperaturas extremas / radiación solar dentro y fuera del Manhol exposición a rayos solares y altas temperaturas (calor), golpe de calor, deshidratación, fatiga, cansancio	1.1.1	Contar con bebidas hidratantes y suministrar al personal de forma permanente, evitar el uso de ropa ajustada y realizar descansos periódicos en lugares frescos y ventilados, evitar la exposición prolongada a los rayos solares. Realizar pausas activas y/o rotación de personal que este expuesto constantemente al sol. Si se detecta deshidratación o afectación de la persona, hidratar con suero oral y realizar valoración medica inicial, remitir a centro médicos si es necesario	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		2	BIOLÓGICO Presencia de ofidios insectos bacterias, microorganismos, animales domésticos.	2.1	Animales venenosos y ponzoñosos, Picadura o mordedura de animal o ente biológico	2.1.1	Utilizar rastrillos o palancas para mover el lodo del fondo de las excavaciones, las paredes internas y Alrededor de las áreas de trabajo, para verificar la ausencia de estos animales. Uso de los EPP adecuados (Guantes, Gafas, casco, protector auditivo).	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		1	FISICO Ruido, Exposición a altas temperaturas, vibraciones	1.1	Episodios de insolación y deshidratación, golpe de calor, Estrés, hipoacusia, Alteraciones osteomusculares y agotamiento, lesiones en la piel	1.1.1	Sensibilización en uso de EPP's Mantenimiento a la máquina o equipo, establecer un tiempo no prolongado con periodos de descanso.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.2	Los trabajadores deberán contar con un termo personal para realizar la hidratación. Además de utilizar ropa de dotación adecuada, EPP s.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						1.1.3	Uso de protector solar y evitar la exposición a altas temperaturas, y usos de dotación (camisa manga larga, guantes, casco, gafas oscuras, etc.)	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.1	Realizar desinfección e Inspeccionar las herramientas antes de iniciar las actividades realizando el pre operacional, e inspeccionar el área antes del inicio de las actividades.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.2	Coordinar el trabajo con el personal ubicándose a 2 metros de distancia como mínimo, entre ellos, en caso de accidente activar plan de emergencias.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	FECHA DE APLICACIÓN:	
		20/04/2026	20/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, LIMPIEZA Y DESMONTE ZONA DE TRABAJO, APIQUES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motoniveladora, Vehículo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayas, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)		CARGO RESPONSABLE
H	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL O MECANICA	2	MECANICO Partes a en movimiento, herramientas manuales, equipos de proyección de elementos, manejo y levantamiento mecánico de cargas.	2.1	Lesiones en manos o cualquier parte del cuerpo por golpes con herramientas. Golpes por objetos en movimiento, atrapamientos, aprisionamiento, laceraciones, cortaduras.	2.1.1	Realizar desinfección e Inspeccionar las herramientas antes de iniciar las actividades realizando el pre operacional, e inspeccionar el área antes del inicio de las actividades.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.2	Coordinar el trabajo con el personal ubicándose a 2 metros de distancia como mínimo, entre ellos, en caso de accidente activar plan de emergencias.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.3	Rotación de trabajos, los periodos de descanso y la duración de la intensidad y duración de la exposición maquinaria y/o equipos, mantener el distanciamiento entre los trabajadores.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.4	Capacitación y sensibilización de los riesgos presentes y la importancia del uso de los EPP's.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						2.1.5	Uso de protector solar y evitar la exposición a altas temperaturas, usos de dotación (camisa manga larga, guantes, casco, gafas oscuras, protección auditivos, etc.)	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		3	BIOMECANICO Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	3.1	Lesiones osteomusculares, Fatiga física por dolor en la espalda, por extensión prolongada de miembros superiores, posición prolongada de pie.	3.1.1	Capacitación en higiene postural Pausas activas.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.2	No realizar levantamiento manual de cargas mayores de 25 Kg.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						3.1.3	Capacitación en el manejo adecuado de herramientas. Periodos de descanso.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		4	LOCATIVO (Área en desorden, pisos resbalosos, inestabilidad del terreno a trabajar y obstrucción en vias de evacuación).	6.1	Caidas al mismo y diferente nivel, golpes, lesiones menores, cortaduras, resbalones.	4.1.1	Antes de iniciar las actividades, inspeccionar areas de trabajo señalizando y demarcando las áreas y los peligros identificados.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.2	Reportar inmediatamente al personal de aguas de Barrancabermeja SA E.S.P, si se hace algun hallazgo de tuberia distinta a la que se va a intervenir.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.3	No transitar por los bordes de los andenes, bordes de cajas, y no transitar sobre tuberias.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.4	Mantener áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo. Dar cumplimiento a los protocolos de Bioseguridad	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						4.1.5	Socializar ATS y todos los procedimientos constructivos seguros establecidos y dejar evidencia de la divulgación.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
		5	QUIMICO Material articulado Gases, Vapores, manipulación de combustible (ACPM)	5.1	Dermatitis, Irritación del tracto respiratorio y ocular, Material particulado	5.1.1	Etiquetas y rotulado de envases, Hoja de datos de seguridad de los productos químicos, Capacitación en riesgo químico, Autorización para uso solo a personal avalado por la empresa.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						5.1.2	Hacer uso de los EPP's requeridos.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores
						5.1.3	Se realizará encerramiento con mallas de aislamiento (tela verde) en la zona a intervenir, con el fin de eliminar el riesgo en peatones o personal ajeno a la obra.	Ing. Residente,supervisores , capataz, HSE, ejecutores

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	Codigo: HSE-F-132 Versión: 1 Fecha: 01/07/2023

SITIO/LUGAR:	COMUNA 2, 3,,5, 6 y 7, (BARRIOS OLAYA HERRERA, TORCOROMA, LAS GRANJAS, EL CAMPIN, DIVINO NIÑO, EUGENIA, URBANIZACIÓN CAMPESTRE,) DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.		
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2026	FECHA DE APLICACIÓN: 20/04/2026	20/05/2026
EMPRESA EJECUTORA	PAVIGAS S.A.S		
TRABAJO A REALIZAR:	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO, LIMPIEZA Y DESMONTE ZONA DE TRABAJO. APIQUES, DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, TRANSPORTE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL.		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	Herramienta menor (pica, pala, barra, paladraga, carretilla, porra, segueta, cizalla, martillo, palustre), Escalera, mezcladora, Rana,Saltarin, Martillo neumático, martillo hidraulico, Retroexcavadora ,pajarita, Minicargador Vibrocompactador, Motonivelaodra, Vehiculo liviano, Carrotanque, Camión Grua , Cama Alta, Cama baja, Camión Turbo, Volquetas, Mixer, eslingas sinteticas, grilletes, eslingas de guayes, ganchos, cadenas. Equipos eléctricos (pulidora, taladro, extensiones, generador).		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos y Reactivos)	CARGO RESPONSABLE

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

Nombre	Registro o CC	Cargo	Firma
Oscar Julian Castellanos	1098791556	Ing Residente	
María Fda Jiménez F.	1193137986	VIGIA HSE	María. Jiménez F.

APROBACIÓN — Fecha Aprobación (dd/mm/aa):

Nombre	Cédula	Cargo	Firma
Oscar Julian Castellanos	1098791556	Ing Residente	
María Fda Jiménez F.	1193137986.	VIGIA SSO	María Jiménez F.

DIFUNDIDO A:

Nombre	Cédula	Cargo	Firma
NESTOR CEDIEL	1098646992	TOPOGRAFO	
Brayan Arguello	1005327726	Cadenero	Brian A.

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 05-03-2023 VERSIÓN: 1

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 28 Abril 2026 | DÍA: 28 | MES: 04 | AÑO: 2026 | PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA | MES | AÑO

No CERTIFICADO DE APOYO: # 01

EMPRESA EJECUTORA: Pavigas S.A.S.

ÁREA O LUGAR: Tramo 11 - Divino Niño | Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para instalación de tubería pvc alcantarillado, cajeo, instalación de bordillos, cajas domiciliarias

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Herramientas manual menores, Retrollanta, Pulidora, Volqueta, vibrocompactada doble tandem

Los ejecutantes han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de oxígeno), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos durante la ejecución de la tarea.	SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones	Modo de Excavación
Largo - 35 Mt. Profundidad - 1,60 Mt. Ancho - 90 cm	Manual ☑ Mecánica ☑ Equipo a utilizar Retrollanta

3 Requerimientos adicionales	SI	NO	NA
Se debe contar con los planos de la cimentación	✓		
Se debe elaborar un diagrama de estructura de protección (entibado, escalonado inclinación 45°)			✓
Por la condición de la excavación se considera espacio confinado			
Por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2 metros)			✓
Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?			
¿Cuales?			

4 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Antes de iniciar la excavación se hicieron estudios de todas las estructuras adyacentes para poder determinar los posibles riesgos que ofrezcan los trabajos.	✓		
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas y son aptas para la ejecución y continuación del trabajo	✓		
El personal conoce los procedimientos requeridos y métodos empleados para trabajar en excavaciones (zanjas, hoyos, pilas, entre otros)	✓		
Se cuenta con la debida delimitación y separación del área de trabajo	✓		
Se encuentran los accesos y salidas en buenas condiciones de uso y ubicación	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP requeridos para la tarea (Casco, Botas, Lentes de seguridad, Guantes, Dotación)	✓		
Se ha verificado la competencia física y técnica de la (s) persona (s) que desarrolla la tarea	✓		

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 05-03-2023 VERSIÓN: 1

Se ha verificado la manera en que el personal hace uso de los elementos de protección personal	✓		
Si se usan productos químicos se tiene conocimiento de la hoja de seguridad MSDS	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia Camilla botiquin, extintor	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado	✓		
Se cuenta con los elementos y materiales necesarios para realizar entibados o apuntalamientos donde sea requerido.			✓
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, hoyo o pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

5 Cierre del anexo de excavación

El Líder ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

¿Se termino el trabajo? **SI** ☐ **NO** ☐ **Cancelado** ☒

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a: Inconvenientes con la comunidad.

6 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO	NA
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓		
Se han revisado losl Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓		
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ?	✓		

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — **Marque con "X" según aplique**

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? Si ☐ No ☒

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? Si ☐ No ☒

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

8. Firmas Emisión y Revalidaciones

EJECUTOR: He verificado y evaluado los peligros latentes en el area de trabajo y se determinaron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la actividad

SUPERVISOR HSE: He verificado en campo con los trabajadores la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

9. Cierre (Indique "SÍ" "NO" "NA" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- SI ✓ El trabajo ha sido terminado
- SI ✓ El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- SI ✓ Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 05-03-2023 VERSIÓN: 1

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (Fecha - Fecha)		EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	SUPERVISOR HSE FIRMA Y REGISTRO O C.C.
28-Abril-26	Fecha inicio	28-Abril-2026	1096236339	Leidy Cruz A. 1098646801
	Fecha fin	27-Mayo-2026		

1096236339
Jeison Galces
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

SUPERVISOR HSE: Personalmente he verificado que:

- [x] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [x] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

María Jiménez F. CC 1193137948
NOMBRE, FIRMA Y C.C.

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):
Jueves, 28/04/26. 5:00 p.m.

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 05-03-2023 VERSIÓN: 1

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 20 DE ABRIL DEL 2026. (DÍA: 20 | MES: ABRIL | AÑO: 2026)

PERMISO VÁLIDO HASTA: (DÍA: 20 | MES: MAYO | AÑO: 2026.)

No CERTIFICADO DE APOYO: 001

EMPRESA EJECUTORA: PAVIGAS. S.A.S

ÁREA O LUGAR: Barrio Campin – Tramo 116.

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 11

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual y mecanica

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Herramienta menor, retrocargador

Los ejecutantes han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de oxigeno), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos durante la ejecución de la tarea.	SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho Aprox: 3 mts -> {instalación de bordillos, cajeo} Ancho: 4 mts aprox.
Profundidad Aprox: 50 cm. -> {instalación de bordillos, cajeo} Profundidad: 90 cm.

Modo de Excavación

Manual ☑
Mecánica ☑
Equipo a utilizar: Retrocargador.

3 Requerimientos adicionales	SI	NO	NA
Se debe contar con los planos de la cimentación			X
Se debe elaborar un diagrama de estructura de protección (entibado, escalonado inclinación 45°)			X
Por la condición de la excavación se considera espacio confinado		X	
Por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2 metros)		X	
Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?		X	

¿Cuales?

4 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Antes de iniciar la excavación se hicieron estudios de todas las estructuras adyacentes para poder determinar los posibles riesgos que ofrezcan los trabajos.	✓		
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas y son aptas para la ejecución y continuación del trabajo	✓		
El personal conoce los procedimientos requeridos y métodos empleados para trabajar en excavaciones (zanjas, hoyos, pilas, entre otros)	✓		
Se cuenta con la debida delimitación y separación del área de trabajo	✓		
Se encuentran los accesos y salidas en buenas condiciones de uso y ubicación	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP requeridos para la tarea (Casco, Botas, Lentes de seguridad, Guantes, Dotación)	✓		
Se ha verificado la competencia física y técnica de la (s) persona (s) que desarrolla la tarea	✓		

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 05-03-2023 VERSIÓN: 1

Se ha verificado la manera en que el personal hace uso de los elementos de protección personal	✓		
Si se usan productos químicos se tiene conocimiento de la hoja de seguridad MSDS			X
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia			X
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y lineas principales de alcantarillado	✓		
Se cuenta con los elementos y materiales necesarios para realizar entibados o apuntalamientos donde sea requerido.			X
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, hoyo o pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

5 Cierre del anexo de excavación

El Líder ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

¿Se termino el trabajo? **SI** ☐ **NO** ☐ **Cancelado** ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: _____

El trabajo fue cancelado debido a: _____

6 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO	NA
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	✓		
Se han revisado losl Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓		
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	✓		
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ?			X

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — **Marque con "X" según aplique**

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? Si ☐ No ☐ No ✓

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? Si ☐ No ☐ No ✓

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

8. Firmas Emisión y Revalidaciones

EJECUTOR: He verificado y evaluado los peligros latentes en el area de trabajo y se determinaron las medidas de control necesarias para la ejecución segura de la actividad.

SUPERVISOR HSE: He verificado en campo con los trabajadores la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

9. Cierre (Indique **"SÍ" "NO" "NA"** en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- ☐ El trabajo ha sido terminado
- ☐ El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- ☐ Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

Scanned with CamScanner

PAVIGAS	CERTIFICADO DE APOYO PARA EXCAVACIONES	CODIGO: HSE-GG-002 FECHA: 05-03-2023 VERSIÓN: 1

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (Fecha - Fecha)		EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	SUPERVISOR HSE FIRMA Y REGISTRO O C.C.
20/04/26	Fecha inicio	20 DE ABRIL 2026	Ing Oscar C. CC 1098771586	María Jiménez F. CC 1143137986.
	Fecha fin	20 DE MAYO 2026		

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

SUPERVISOR HSE: Personalmente he verificado que:

- ☐ El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- ☐ Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- ☐ El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Codigo: FR-HSE-028 | Página: 1 | Versión: 4 | Vigente a partir de: 2021-11-11

1 Generalidades

PERMISO EN FRIO: X | PERMISO EN CALIENTE: | PERMISO ELÉCTRICO:

FECHA Y HORA DE DILIGENCIAMIENTO: 20 (Día) 04 (Mes) 2026 (Año) 7:30 am (Hora) | VALORACIÓN DE RIESGOS: | M | NÚMERO PERMISO DE TRABAJO: 001

EMPRESA Y/O DEPENDENCIA EJECUTORA: PAVIGAS SAS | ÁREA O LUGAR: Camino tramo 116 | Nº CONTRATO: Mto DE 3.028

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR (Incluya EPP): Planta generadora, Pulidora, taladro, Herramienta menor, retro cargador, vibro compactador

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavaciones manual y mecanica, instalación de bordillos, instalaciones de tuberia, concreto

2 PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO (Marque con "X" cuando aplique y fecha de apertura del documento) Indique el codigo según el tipo certificado de apoyo

X	TIPO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO		DOC. APOYO TRABAJO EN ALTURA
N	DOC. APOYO ESPACIO CONFINADO	N	DOC. APOYO TRABAJO MATERIALES PELIGROSOS Y CARGAS
N	DOC. APOYO TRABAJO EN EXCAVACIONES		

Marcar con una X las opciones con las que cuenta para la apertura del permiso de trabajo

X	PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO		PLAN DE IZAJE DE CARGA
	PROCEDIMIENTO DE RESCATE		INTERFERENCIAS CON OTROS TRABAJOS O AFECTACIÓN A OTRAS ÁREAS
	SE CUENTA CON BRIGADA DE EMERGENCIAS CAPACITADA Y ENTRENADA		PRUEBA DE GASES
	LINEAS VIVAS (ENERGIZADAS) ADYACENTES	X	SEÑALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	AFECTACIÓN AMBIENTAL POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	X	PRE-OPERACIONAL
	ATERRIZAJE DE EQUIPOS O ESTRUCTURAS		OTROS: Charla diaria inspecciones. (Ej: Listas de chequeo o inspecciones, charlas, socialización de procedimientos y análisis de riesgos, fichas de

3 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES EN CALIENTE (Marque con "X" cuando no aplique) N.A | NA

	SE INSTALARON BARRERAS PARA RETENER ESCORIAS O CHISPAS		SE CUENTA CON EXTINTORES
	SE CUBRIERON ADECUADAMENTE TODAS LAS ALCANTARILLAS		EJECUTORES ENTRENADOS EN LA TAREA
	SE INSTALO PUESTA A TIERRA AL EQUIPO QUE GENERA ELECTRICIDAD ESTÁTICA		INSPECCIÓN DIARIA DE CILINDROS
	EL EQUIPO DE OXICORTE TIENE VÁLVULAS CHEQUE Y DOBLE ATRAPA-LLAMAS		
	SE RETIRARON LOS MATERIALES Y QUÍMICOS COMBUSTIBLES DEL ÁREA		

4 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES ELECTRICAS (Marque con "X" cuando no aplique) N.A

EL NIVEL DE TENSIÓN DE OPERACIÓN NORMAL DEL EQUIPO O SISTEMA A INTERVENIR ES:

TENSIÓN DC >= 120 Vdc		Tensión _____ Vdc	MUY BAJA TENSIÓN (MBT < 25 Vac)		Tensión _____ Vac
TENSIÓN DC < 120 Vdc		Tensión _____ Vdc	BAJA TENSIÓN (25Vac < BT <= 1000 Vac)		Tensión _____ Vac
			MEDIA TENSIÓN (1 KVac < MT <= 57.5 KVac)		Tensión _____ Vac
			ALTA TENSIÓN (57.5 KVac < AT <= 230 KVac)		Tensión _____ Vac

COMO REPRESENTANTE DEL ÁREA ELÉCTRICA: HE VERIFICADO CON EL EMISOR Y EL EJECUTOR QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO HAYAN SIDO CONTEMPLADOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGO Y EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO

FECHA DESDE	FECHA HASTA	FIRMA REPRESENTANTE DEL ÁREA ELÉCTRICA: NOMBRE	FIRMA	REGISTRO No. MATRICULA PROF. - RADIO/TELÉFONO

5 PRUEBA DE GASES N.A | NA

FECHA DE PRUEBA (D) (M) (A)	HORA PRUEBA (hh, min)	TIEMPO DE VALIDEZ	LEL, %	SH2	O2, %	19.5 a 23	CO, ppm	H2S	NOx, ppm	S1	OTRO:	FECHA CALIBRACION VIGENTE DEL EQUIPO	FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA PRUEBA	CÉDULA

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Código: PAV-HSE-026
Página: 1
Versión: 4
Vigente a partir de: 2021-11-11

6 FIRMAS VALIDACIONES

7 CIERRE (Coloque "SI", "NO" o "NA" en cada casilla)

EJECUTOR: DECLARO QUE

- ☐ EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO
- ☐ EL SITIO Y EL EQUIPO QUEDAN EN CONDICIONES SEGURAS
- ☐ ENTREGO EL ÁREA LIMPIA Y LIBRE DE DESECHOS Y MATERIALES

Nombre: _____

Teléfono: _____

_____

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EJECUTOR: HE VERIFICADO LA APLICACIÓN DEL LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y ME COMPROMETO A COMUNICARLOS AL GRUPO EJECUTOR. CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EJECUTOR FIRMA Y C.C	No DE PERSONAS EJECUTORAS
20-04 2026	7:30 am - 12. Pm		10
	1:00 Pm - 5 Pm		10
21-04 2026	7:30 am - 12 Pm		10
	1:00 pm - 5 Pm		10
22-04 2026	7:30 am - 12 Pm		10
	1:00 Pm - 5 Pm		10
23-04 2026	7:30 am - 12 PM		10
	1:00 PM - 5 PM		10
24-04 2026	7:30 am - 12 Pm		10
	1:00 PM - 4:30 Pm		10
27-04 2026	7:30 am - 12 Pm		10
	1:00 Pm - 5:00 Pm		10
28-04 2026	7:30 am - 12 Pm		10
	1:00 Pm - 5:00 Pm		10
29-04 2026	7:30 am - 12. Pm		12
	1:00 Pm - 5:00 Pm		12
30-04 2026	7:30 a.m - 12:00 p.m		16
	1:00 Pm - 5:00 Pm		16
04-05 2026	7:30 am - 12:00 Pm		12
	1:00 Pm - 5:00 Pm		12
	7:30 am		14
	5:00 Pm		14

OBSERVACIONES: _____

Scanned with CamScanner

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Código: PAV-HSE-018 | Página: 1 | Versión: 3 | Vigente a partir de: 2021-11-11

1 Generalidades

PERMISO EN FRIO: | PERMISO EN CALIENTE: | PERMISO ELÉCTRICO:

FECHA Y HORA DE DILIGENCIAMIENTO: 27 (Día) | 04 (Mes) | 2026 (Año) | (Hora)

VALORACIÓN DE RIESGOS: M

NÚMERO PERMISO DE TRABAJO: 1

EMPRESA Y/O DEPENDENCIA EJECUTORA: PAVIGAS SAS

ÁREA O LUGAR: Divino Niño

Nº CONTRATO: 1503 DE 2023

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR (incluya EPP): Herramientas manuales, menores, retrollanta, Pulidora, Vdqueta

ACTIVIDAD A REALIZAR: Instalación de tuberías, Replanteo, instalación de Subbase, instalación bordillo, instalación concreto

2 PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO (Marque con "X" cuando aplique y fecha de apertura del documento) (indique el código según el tipo certificado de apoyo)

X	TIPO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO		DOC. APOYO TRABAJO EN ALTURA
	DOC. APOYO ESPACIO CONFINADO		DOC. APOYO TRABAJO MATERIALES PELIGROSOS Y CARGAS
X	DOC. APOYO TRABAJO EN EXCAVACIONES		

Marcar con una X las opciones con las que cuenta para la apertura del permiso de trabajo

	PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO		PLAN DE IZAJE DE CARGA
	PROCEDIMIENTO DE RESCATE		INTERFERENCIAS CON OTROS TRABAJOS O AFECTACIÓN A OTRAS ÁREAS
	SE CUENTA CON BRIGADA DE EMERGENCIAS CAPACITADA Y ENTRENADA		PRUEBA DE GASES
	LINEAS VIVAS (ENERGIZADAS) ADYACENTES	X	RESALIZACIÓN Y/O DEMARCACIÓN DE ÁREAS
	AFECTACIÓN AMBIENTAL POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO	X	PRECPERACIONAL
	ATERRIZAJE DE EQUIPOS O ESTRUCTURAS	X	OTROS: Charla diaria inspecciones

1) Listas de chequeo e inspecciones, charlas, socialización de procedimientos y análisis de riesgos, entre otros

3 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES EN CALIENTE (Marque con "X" cuando se aplique) N.A: X

	SE INSTALARON BARRERAS PARA RETENER ESCORIAS O CHISPAS		SE CUENTA CON EXTINTORES
	SE CUBRIERON ADECUADAMENTE TODAS LAS ALCANTARILLAS		EJECUTORES ENTRENADOS EN LA TAREA
	SE INSTALO PUESTA A TIERRA AL EQUIPO QUE GENERA ELECTRICIDAD ESTÁTICA		INSPECCIÓN DIARIA DE CILINDROS
	EL EQUIPO DE OXICORTE TIENE VÁLVULAS CHEQUE Y DOBLE ATRAPA-LLAMAS		
	SE RETIRARON LOS MATERIALES Y QUIMICOS COMBUSTIBLES DEL ÁREA		

4 REQUISITOS ADICIONALES PARA ACTIVIDADES ELÉCTRICAS (Marque con "X" cuando se aplique) N.A:

EL NIVEL DE TENSIÓN DE OPERACIÓN NOMINAL DEL EQUIPO O SISTEMA A INTERVENIR ES:

TENSIÓN DC => 120 Vdc		Tensión: ____ Vdc	MUY BAJA TENSIÓN (MBT < 25 Vac)		Tensión: ____ Vac
TENSIÓN DC < 120 Vdc		Tensión: ____ Vdc	BAJA TENSIÓN (25Vac < BT <= 1000 Vac)		Tensión: ____ Vac
			MEDIA TENSIÓN (1 KVac < MT <= 57.5 KVac)		Tensión: ____ Vac
			ALTA TENSIÓN (57.5 KVac < AT <= 230 KVac)		Tensión: ____ Vac

COMO REPRESENTANTE DEL ÁREA ELÉCTRICA: HE VERIFICADO CON EL EMISOR Y EL EJECUTOR QUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO HAYAN SIDO CONTEMPLADOS EN EL ANÁLISIS DE RIESGO Y SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO DE TRABAJO.

FECHA DESDE	FECHA HASTA	FIRMA REPRESENTANTE DEL ÁREA ELÉCTRICA: NOMBRE	FIRMA	REGISTRO No. MATRICULA PROF. - RADIO/TELÉFONO

5 PRUEBA DE GASES N.A: | N.A:

FECHA DE PRUEBA (D) (M) (A)	HORA PRUEBA (am, pm)	TIEMPO DE VALIDEZ	LEL, %	pH	O1, %	19.5 a 23	CO, ppm	H2S	H2S, ppm	ST	OTRO:	FECHA CALIBRACION VIGENTE DEL EQUIPO	FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZA LA PRUEBA	CEDULA

PAVIGAS

SISTEMA DE GESTION

PERMISO DE TRABAJO

Código: PAV-HSE-IDR
Página: 1
Versión: 4
Vigente a partir de: 2021-10-11

6 FIRMAS VALIDACIONES

EJECUTOR: HE VERIFICADO LA APLICACIÓN DEL LOS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y ME COMPROMETO A COMUNICARLOS AL GRUPO EJECUTOR CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EJECUTOR FIRMA Y C.C	No DE PERSONAS EJECUTORAS
27-04-26	7:30 am - 12:00 m		10
	1:00 pm - 5:00 pm		10
28-04-2026	7:30 am - 12:00 m		10
	1:00 pm - 5:00 pm		10
29-04-2026	7:30 AM - 12:00 PM		10
	1:00 PM - 5:00 PM		10

7 CIERRE (Coloque "SI", "NO" o "NA" en cada casilla)

EJECUTOR: DECLARO QUE

- [ ] EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO
- [SI] EL SITIO Y EL EQUIPO QUEDAN EN CONDICIONES SEGURAS
- [SI] ENTREGO EL ÁREA LIMPIA Y LIBRE DE DESECHOS Y MATERIALES

Nombre: Jeison Ariel Garces

Teléfono: 3186381870

1096236339

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

OBSERVACIONES:

El trabajo no se logró terminar por problemas con la comunidad.

Scanned with CamScanner

12.4. INFORME SOCIOAMBIENTAL

INFORME SOCIO AMBIENTAL 01

PERIODO: 6 DE ABRIL DEL 2026 AL 5 DE MAYO DEL 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA 5037-25 CON OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.”

UT INTERPAVIMENTOS BCA

BARRANCABERMEJA

Elaboró:



Ing. Veronica Gamarra Acosta
Profesional siso de interventoría

Revisó y Aprobó:



Ing. Fernando Zúñiga Vásquez
Representante Legal Interventoría

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades de implementación del PAGA durante este periodo; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus evidencias

Esta interventoría realizó el continuo seguimiento técnico al PAGA para el contratista de obra 1593 del 23 con el fin de verificar la implementación de dicho componente. Durante este corte de ejecución del proyecto, se ha dado cumplimiento a la implementación del mismo, realizando diferentes actividades.

Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el punto ecológico en el área y dando cumplimiento a la nueva normatividad colombiana y cumplen con el nuevo código de colores, además cuentan con el kit de emergencia como camillas rígidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de 10 libras e inspección ambiental, además se capacitó al personal en temas ambientales.

EXCAVACIÓN

Se realizaron actividades con referencia a este programa, se continúa haciendo uso del material sobrante de la excavación ya que es óptimo para su reutilización, sin afectar la zonas aledañas ni vegetación del área intervenida por la obra.

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

No se presentaron quejas por ruido, material particulado, ni emisión de gases combustibles de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = N0 quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$

$Quejas\ de\ ruido$ = 0

COMPONENTE SOCIAL

Durante el periodo se recibe informe mensual del contratista donde se realiza la verificación de las actividades ejecutadas, adjuntando el registro fotográfico y lo establecido en el PAGA.

A la fecha no se evidencian quejas presentadas por la comunidad, para el informe ambiental no se han recibido PQR, por las entidades ambientales o la comunidad.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Durante la ejecución del periodo, no se recibieron solicitudes de pqrs por parte de los habitantes de la comunidad de los tramos intervenidos en la comuna 7, barrio el Campin, Divino niño y María Eugenia.

Sistema de atención de quejas y reclamos. A continuación, se relacionan las PQRS recibidas en el presente corte desde cada canal de atención ofrecido por el contratista durante la ejecución del proyecto y se describen las medidas correctivas adelantadas a la fecha del presente corte.

SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS.

CANAL DE ATENCION	DESCRIPCION GENERAL
1. Correo electrónico disponible. pqrspavigas@gmail.com	Durante el presente corte no se recibió un comunicado oficial por este medio electrónico.
2. Formato en físico de PQRS	Durante el presente periodo abril no se enlazaron PQRS en formato físico.

- **Reuniones con las comunidades**

Reuniones de inicio:	A la fecha del presente corte, se programaron 2 reuniones de inicio de obra Para el presente periodo tramo 128 y barrio María Eugenia.
Reunión de avance de obra.	A la fecha no se han programado reuniones de avance de obra.

Reunión de finalización de obra:	A la fecha no se han programado reuniones finales.

Reuniones de inicio y avance

ITEM	BARRIO	FECHA	HORARIO	ASUNTO
1	El campin	10/04/2026	2:00pm	Reunión de inicio.
2	María Eugenia	28/04/2025	4:00pm	Reunión de inicio

Las reuniones antes mencionadas se realizaron en el sector de intervención, teniendo en cuenta la consideración a la comunidad de cada barrio, quienes manifestaron como sugerencia que estas reuniones sean ejecutadas lo más cerca posible sin necesidad de ser un auditorio, como lo son andenes, parques o canchas. Previamente, se extendió la invitación a participar a esta reunión a la comunidad como se hace normalmente, puerta a puerta y/o por medio de los líderes del sector y sus grupos internos como comunidad.

A fin de adecuar el espacio se buscó la silletería correspondiente y se entregó circulares de avance de obra como apoyo visual. Lo anterior, aumentó la participación de la comunidad, permitiendo espacios de conversación entre contratistas y personas del sector.

Barrio Maria eugenia



Barrio el campin



Actas de Vecindad

.

Hasta la fecha se han realizado actas de vecindad en el siguiente orden: 19 actas de vecindad del barrio María Eugenia, 14 actas de vecindad levantadas en el barrio el Campin y 5 actas de vecindad del barrio Divino niño

Actas de compromiso
Durante el presente corte, no se registraron actas de compromiso.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Durante la evaluación realizada por la Interventoría, se constató la existencia de una oficina dedicada a la gestión de quejas y reclamaciones dentro del área administrativa del proyecto, donde se abordan las quejas relacionadas con las actividades de mejora del tramo y se proporciona información básica sobre las entidades e instituciones pertinentes. Dado que diversas partes interesadas locales se ven directamente afectadas por el proyecto, el objetivo principal de la gestión social es mitigar los conflictos con las comunidades del área de influencia, así como satisfacer sus necesidades de información, escuchar sus opiniones, quejas y reclamaciones, y ofrecer respuestas oportunas.

Para fortalecer la trazabilidad de las distintas actividades sociales durante el desarrollo de las obras, se lleva a cabo una sesión de socialización con los ingenieros residentes y los supervisores de obra. Durante esta sesión, se detalla el proceso de completar cada formato relacionado con la gestión

social. Además, se proporciona un libro específico en cada sitio de trabajo, el cual contiene impresiones disponibles para su uso en caso de ser necesario. Esta medida se implementa considerando la operación simultánea de varios frentes de obra y la posibilidad de situaciones inesperadas que requieran un seguimiento detallado de las actividades.

Instalación de servicios de atención al usuario

Sistema de atención de quejas y reclamos

Dando cumplimiento por parte del Contratista se conforma este sistema de atención de quejas y reclamos con tres canales de atención diferentes que son: Correo electrónico, enlace drive a formato PQRS los cuales no han recibido solicitudes hasta la fecha, el tercer método de radicación de quejas y reclamos es por medio del formato físico de PQRS por medio del cual se recibieron dos para este período.

Volantes informativos

Durante el presente periodo de ejecución se elaboraron 2 formatos sobre las implicaciones ambientales, técnicas y económicas que conlleva el proyecto.

Vallas informativas

Las vallas informativas del proyecto se encuentran instaladas en la Glorieta Fertilizantes y en el barrio Jerusalén. Se reitera la importancia de estas ya que estas son herramientas de divulgación masiva que contiene información general para garantizar la correcta difusión del proyecto.

Los parámetros establecidos para las vallas informativas son los siguientes:

- Medidas: 2,24 m x 1,25 m.
- Material: lámina galvanizada con vinilo en ambas caras y tubos de ½ x ½.

A la fecha, no se encuentran instaladas vallas fijas, se estableció una (1) valla móvil en el punto de intervención del campin, la cual cuenta con información de índole social del proyecto.



Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión social.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Atender a la comunidad	No. De quejas y reclamos atendidos (0)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente corte no se atendió ninguna solicitud por parte de la comunidad de los tramos intervenidos de la comuna 7.	
Informar y divulgar el proyecto con la comunidad	No. de reuniones realizadas (2) _____*100=100% No. de reuniones programadas (2)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente periodo se programaron 2 reuniones con comunidades implicadas en el proyecto de pavimentación, las cuales fueron ejecutadas a cabalidad.	

- **Contratación de mano de obra**

Durante el presente corte, se ha incrementado la contratación del personal en los diferentes frentes de la siguiente manera:

Tabla 1 Contratación mano de obra

PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO
Dentro del personal administrativo se encuentran 8 contratados, de los cuales 5 fueron contratados en el mes de abril, quienes realizan tanto trabajos operativos como administrativos.
PERSONAL OPERATIVO
Dentro del personal operativo se encuentran 18 contratados, de los cuales 4 fueron contratados en el mes de abril

En este punto, cabe resaltar que la contratación del personal se realiza teniendo en cuenta el sector a intervenir por lo cual el contratado reside en una de las comunas de intervención. Sin embargo, cuando en el barrio no existen personas que cumplan con los requisitos de contratación se tienen en cuenta postulantes de barrios que se encuentran dentro del proyecto de pavimentación. Como última medida en caso tal de no contar tampoco con disponibilidad de personal se tomarán en cuenta barrios que estén dentro de las comunas a intervenir, aunque éste no sea directamente intervenido.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Generar empleos	No. de empleos generados (26)
En el presente corte se mantiene 26 puesto de trabajos en el sector de intervención.	
Generar empleo de personal del área de influencia	No. de trabajadores vinculados (26) / No. de trabajadores de la región (26) *100 =100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha, se ha contratado personal proveniente de los sectores de intervención, siendo actualmente la participación del 100%. Por lo cual, se cumple a cabalidad el presente indicador.	

CONCLUSIONES

La empresa UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTOS BCA realiza las actividades de interventoría sobre el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1593-23, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, ejecutado por le empresa PAVIGAS, verificando el cumplimiento de lineamientos ambientales y sociales del proyecto. Durante el periodo del presente informe no se presentaron accidentes ambiental ni quejas por parte de la comunidad.

ANEXOS

ANEXO INFORME SOCIO-AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA EL PLAN DE ADAPTACIÓN GUÍA AMBIENTAL PAGA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 1593-23: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER."

PAVIGAS S.A.S.
BARRANCABERMEJA
DESDE EL 6 DE ABRIL DE 2.026 HASTA 30 DE ABRIL DE 2.026.

TABLA DE CONTENIDO

1 CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS. 6
1.1 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN. 6
2 INTRODUCCCIÓN. 7
3 OBJETIVO GENERAL. 7
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 7
4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 8
5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 9
5.1 MAQUINARIA A EMPLEAR. 10
6 OBJETO DEL CONTRATO DE LA OBRA. 11
7 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 11
8 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 12
9 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 13
9.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL.. 13
9.2 CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA. 15
9.3 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES. 16
10 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 18
10.1 MANEJO DE OBRAS EN CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 18
10.2 MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO. 20
10.3 MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL DE RECICLAJE Y BASURAS……22
10.4 DEMOLICIONES ESTRUCTURALES DE CONCRETO. 24
11 GESTIÓN HÍDRICA. 24
11.1 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y RESIDUOS LÍQUIDOS. 24
11.2 MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES. 25
12 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 26
12.1 MANEJO DE LA VEGETACIÓN. 26

12.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS Y ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. 27
13 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS. 28
13.1 MANEJO DE CAMPAMENTO Y SITIOS DE ACOPIO. 28
13.2 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 30
14 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. 32
14.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. 32
14.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 33
14.2.1 Vallas informativas. 33
14.2.2 Volantes de información 34
14.2.3 Actas de vecindad 34
14.2.4 Actas de compromiso 34
14.3 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 35
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 37
ANEXOS 38

LISTA DE CUADROS.

CUADRO 1. ACTIVIDADES A EJECUTAR. 9
CUADRO 2. MATRIZ DE ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALES. 12
CUADRO 3. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL. 14
CUADRO 4. CAPACITACIONES AMBIENTALES. 16
CUADRO 5. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. 16
CUADRO 6. SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS. 32
CUADRO 7. PERSONAL VINCULADO. 35


LISTA DE FIGURAS.

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LOS TRAMOS VIALES A INTERVENIR. 8
FIGURA 2. LOCALIZACIÓN POR COMUNAS ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. 9
FIGURA 3. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL. 11
FIGURA 4. CAPACITACIONES AMBIENTALES AL PERSONAL DE OBRA. 15
FIGURA 5. ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN. 19
FIGURA 6. DELIMITACIÓN, ENCERRAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ÁREAS. 21
FIGURA 7. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN..... 22
FIGURA 8. SEPARACIÓN EN LA FUENTE..... 23
FIGURA 9. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. 24
FIGURA 10. LIMPIEZA Y RETIRO DE CAMPAMENTO EN EL ÁREA POR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN. 28
FIGURA 11. PREOPERACIONALES DE MAQUINARIAS PESADA, Y EQUIPOS DE OPERACIÓN..... 30
FIGURA 12. DISTRIBUCCIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS. 34

1 CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN	**VERSIÓN**	**REVISIÓN**	**FECHA DE EMISIÓN**
Emitido para comentarios del cliente	1	1	30/04/26

1.1 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.

Control de Distribuciones				
Copia N°	**Entregado a**	**Cargo**	**Firma**	**Fecha Emisión**
Original	Luzmery Torres Castro	Profesional socioambiental		30/04/26

2 INTRODUCCCIÓN.

El presente documento establece una descripción detalla de las actividades realizadas en materia ambiental necesarias para el óptimo desarrollo del proyecto para la minimización de los efectos negativos que genera el mismo en el área de influencia directa teniendo en cuenta el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

3 OBJETIVO GENERAL.

Elaborar el informe mensual de plan de manejo ambiental del proyecto “construcción de vías de pavimento rígido en diferentes sectores del distrito de Barrancabermeja-Santander.” con el fin de establecer los programas que permitan, prevenir, mitigar, corregir y compensar el impacto ambiental negativo que se genere en el área de influencia directa de las obras a ejecutar durante el periodo comprendido entre 6 al 30 de abril de 2.026.


3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Desarrollar actividades de capacitación y educación integral, dirigido al personal operativo, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto y la seguridad de los participantes del proyecto.
- Mitigar los impactos ambientales asociados al manejo de sustancias químicas y la generación de residuos peligrosos y no peligrosos.
- Promocionar el uso racional de los recursos naturales (agua, aire y suelo).
- Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia ambiental y otros. suscritos por el PAGA.

4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.


El distrito de Barrancabermeja se encuentra al occidente del Departamento de Santander, forma parte de la provincia de Yariguies, la cabecera municipal se encuentra localizada geográficamente a 7°3.92´ latitud norte y 73°51.3´ de longitud al oeste con respecto al meridiano Greenwich. El distrito limita al norte con el municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al Occidente con el Río Magdalena y el municipio de Yondó, departamento de Antioquia.

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LOS TRAMOS VIALES A INTERVENIR.

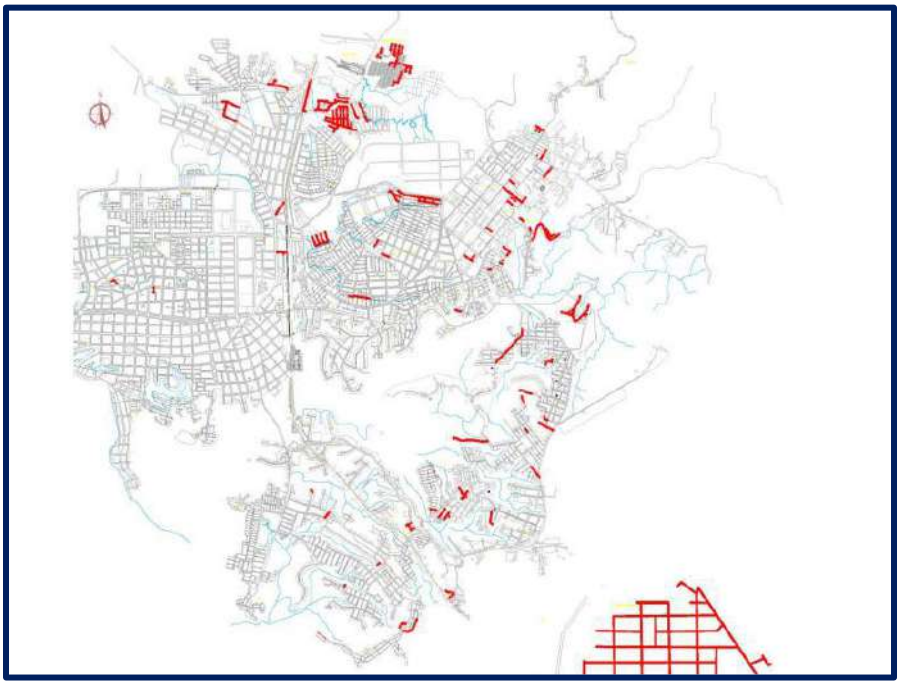

Fuente tomada POT 2022-2035.

FIGURA 2. LOCALIZACIÓN POR COMUNAS ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

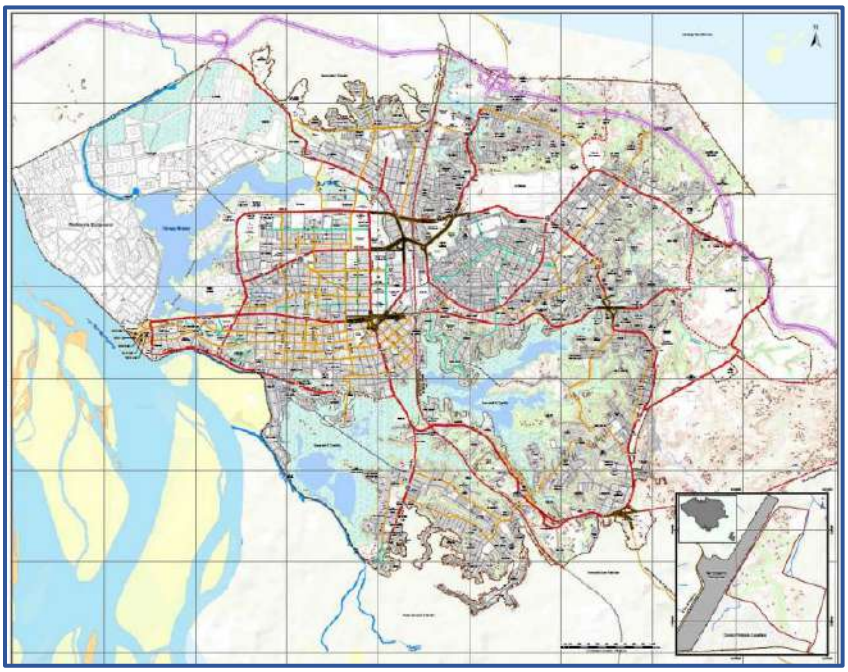

Fuente tomada POT 2022-2035.

5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El alcance del proyecto se compone de un total de 57 tramos viales, en 6 diferentes comunas del Distrito de Barrancabermeja, atendiendo 26 barrios. con un total de 4.99 [Km] lineales en calles con un metraje cuadrado de 25,481.4 [M2], 3,670.52 [m] de alcantarillado sanitario, 143.49 [m] de alcantarillado pluvial y 561.2 [m] de acueducto.

CUADRO 1. ACTIVIDADES A EJECUTAR.

ITEM	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
1.1	Preliminares y adecuación del terreno
1.2	Demoliciones
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1	Excavaciones
2,2	Rellenos
3	OBRAS DE DRENAJE

3.1	Tuberías
3.2	Pozos de Inspección
3.3	Sumideros
3.4	Concretos
4	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
5	URBANISMO

- **Preliminares y Demoliciones:** Actividades de adecuación del terreno, localización y replanteo, limpieza y desmonte de la zona de trabajo, tala de árboles, corte con disco y demoliciones de estructuras en concreto, sardineles, andenes, pavimento rígido y flexible.
- **Excavaciones y Rellenos:** Excavación a máquina en material común o manual, rellenos con material seleccionado del sitio, con material de préstamo o material granular y cargue y transporte de materiales provenientes de la excavación.
- **Obras de drenaje**: Se encuentran las tuberías, pozos de Inspección, concretos, cajas y sumideros.
- **Estructura de pavimento:** Consiste en la conformación y compactación de la subrasante, la colocación de la capa granular y placa en concreto y construcción de juntas.
- **Urbanismo:** Está conformado por los sardineles, ajuste de andenes y empradizar.

5.1 MAQUINARIA A EMPLEAR.

A continuación, se relaciona maquinara y equipos para la ejecución del proyecto**.**

- 2 vibro compactador de rodillo.
- 1 mini excavadora.
- 1 camioneta turbo.
- 1 camioneta.
- 1 volqueta.
- 2 retro excavadora.

6 OBJETO DEL CONTRATO DE LA OBRA.


CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1593-23: "CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER."

- **Valor:** Quince mil quinientos treinta millones doscientos sesenta y dos mil trescientos setenta y tres mil, ochenta pesos. M/CTE $ 15.530.262.373,80
- **Plazo:** 10 meses
- **Contratista:** Pavigas S.A.S
- **Supervisor:** Enildo Jiménez Gonzales
- **Empresa contratante**: Alcaldía Distrital De Barrancabermeja.

7 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa PAVIGAS S.A.S mediante el cual se da a conocer la estructura para la coordinación de las diferentes áreas durante el desarrollo del proyecto.

FIGURA 3. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL.

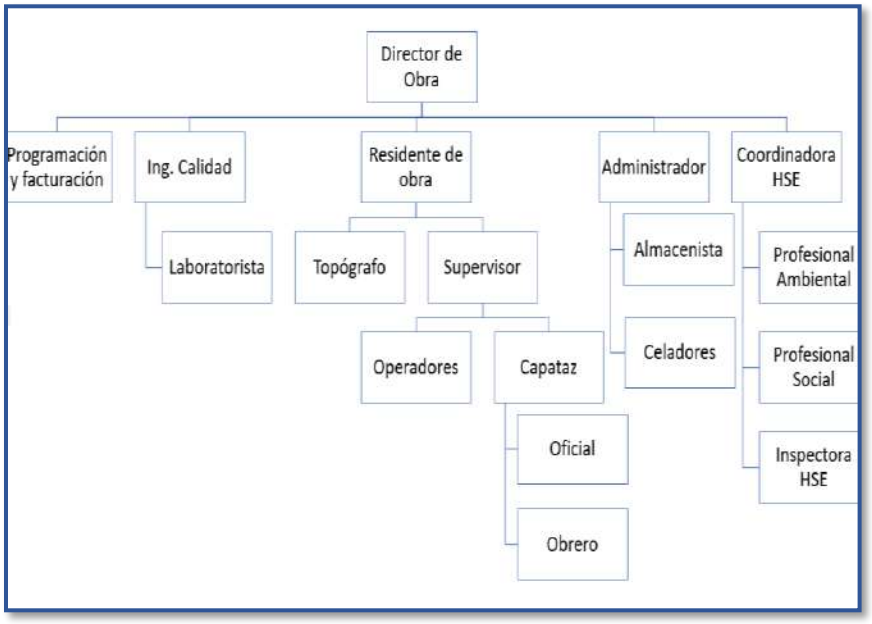

8 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

En la matriz de aspectos e impactos ambientales se encuentra relacionada la normatividad que la empresa debe cumplir legalmente para garantizar mediante las evidencias, el cumplimiento de la normatividad aplicada para la protección del medio ambiente.

Por su parte se encuentran relacionadas también las actividades realizadas durante el proyecto, los aspectos ambientales, la entrada, el impacto ambiental, la salida, la normatividad, el criterio legal, criterio de impacto ambiental, criterio de grupos de interés, la valoración y los programas y/o controles. Entre los aspectos e impactos más relevantes encontramos:

CUADRO 2. MATRIZ DE ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALES.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL PROYECTO, OBRA Y/O ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES (MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS)	Alteración movilidad peatonal/vehicular	Emisión de ruido
	Emisión de gases a la atmosfera	Contaminación del aire
	Accidente de transito	Daños a vida humana y propiedad de terceros.
CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO	Generación de material particulado	Contaminación atmosférica
	Generación de ruido	Contaminación auditiva
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y ZONAS DURAS	Generación de material particulado	Contaminación atmosférica
	Generación de ruido	Contaminación auditiva
	Generación de residuos de construcción y demolición	Contaminación del suelo
EXCAVACIÓN MANUAL	Producción de material particulado	Contaminación atmosférica
	Generación de residuos sólidos y de construcción y demolición	Contaminación del suelo
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE AGUA Y SANITARIA	Generación de residuos sólidos y de construcción y demolición	Contaminación del suelo
	Suspensión del servicio de agua	Molestias a la comunidad

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS	Generación de residuos sólidos y líquidos	Contaminación del suelo
RELLENO MANUAL Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO	Generación de ruido por uso del equipo	Molestias a trabajadores y a la Comunidad
	Consumo de Arena, Agregados Pétreos	Disminución de recursos naturales
	Liberación de Material particulado, polvo	Contaminación atmosférica
APLICACIÓN Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO Y ZONAS DURAS	Liberación de Material particulado, polvo	Contaminación atmosférica, afectación a los trabajadores.
CERRAMIENTOS PROVISONALES	Alteración movilidad peatonal/vehicular	Cierres parciales en la vía
DISPOSICIÓN DE MATERIAL ESTÉRIL	Generación de emisiones y material particulado	Contaminación atmosférica
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACÉN Y ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE LA OBRA (CAMPAMENTO)	Generación de residuos sólidos.	Aumento de los residuos a disponer
	Generación de vertimiento	Contaminación de los cuerpos hídricos

De acuerdo con el alcance del proyecto, las actividades realizadas en este periodo se enfocan en la comuna 7, en los barrios el campin, divino niño y maría eugenia. A continuación, se desglosan el desarrollo de los componentes de plan de adaptación de la guía ambiental.

9 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

9.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL.

El programa de gestión ambiental buscará garantizar el cumplimiento y desarrollo eficiente de todas las medidas que permitan controlar y manejar los impactos generados por el proyecto**.** Así como, efectuar acciones que permitan la gestión socio ambiental ante los efectos secundarios del mismo. Por lo anterior, con el fin de garantizar los lineamientos ambientales establecidos en el plan de adaptación de la guía ambiental para el desarrollo del proyecto, se estipula que la creación del grupo de gestión socio ambiental estará conformado por un profesional ambiental

y un profesional social, el cual seguirá conformado durante el tiempo de ejecución del proyecto.

CUADRO 3. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.

PROFESIONALES	FUNCIÓN
Profesional Socioambiental	Garantizar el cumplimiento y desarrollo de las medidas necesarias para manejar los impactos generados por el proyecto, de manera eficaz y eficiente. Comunicar a la comunidad el objetivo de la obra como sus beneficios y posibles dificultades. Así como atender PQRS.
Vigía SISO	Aplicar las normativas, prevenir accidentes, evaluar riesgos y fomentar la cultura preventiva.

Durante este periodo no se atendieron solicitudes por parte de la comunidad, la cual será explicada en el ítem correspondiente del presente informe.

- Indicador de cumplimiento componente gestión-social ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Recibir dar respuestas a todas las PQRS de la obra	No. Quejas y reclamos atendidos (0) / No. PQR recibidas (0) *100 =0%
CUMPLIEMIENTO DEL PROGRAMA - AVANCE 0%. Dentro de las actividades realizadas en el presente periodo se han atendido las solicitudes de la comunidad, de manera presencial o por medio de llamadas telefónicas.	
Garantizar el cumplimiento del PAGA	No de profesionales contratados (2) / No. profesionales propuestos (2) *100 = 100%
CUMPLIEMIENTO DEL PROGRAMA -AVANCE 100% A la fecha del presente informe continúa el 100% del presente indicador.	

9.2 CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.

A la fecha del presente periodo se realizaron 2 capacitaciones ambientales al personal operativo en los frentes de obra con el objetivo de crear conciencia en relación con el plan de manejo ambiental del proyecto.

FIGURA 4. CAPACITACIONES AMBIENTALES AL PERSONAL DE OBRA.



CUADRO 4. CAPACITACIONES AMBIENTALES.

CAPACITACIONES AMBIENTALES			
ITEM	**TEMA**	**INSTRUCTOR**	**FIRMA**
1	Manejo y protección de los recursos naturales	Profesional socioambiental	27 de abril de 2026
2	Contaminación atmosférica	Profesional socioambiental	29 de abril de 2026

- indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Realizar capacitación a todo el personal que ingresa al proyecto.	No. de personas capacitadas (17) / No. de personas laborando (26) *100 = 65,38 %
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 100% Se realizaron capacitaciones a todo el personal operativo que se encuentra en los diferentes frentes de obra, de acuerdo con el cronograma socioambiental.	

9.3 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.

En aras de garantizar el cumplimiento de este programa se ha solicitado a todos los proveedores de servicios que competen las licencias y permisos otorgados por la autoridad ambiental correspondiente con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos legales. La documentación requerida se encuentra adjunta en el primer informe del plan de adaptación de la guía ambiental.

CUADRO 5. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.

PROVEEDORES	OBJETO	RESOLUCION	DOCUMENTOS
PG ambiental.	Disposición de residuos.	RESOLUCIÓN 0877 21 de julio 2015 /RESOLUCIÓN 1741 26 dic 2018.	Licencia ambiental.
Santa lucia.	Escombrera.	RESOLUCIÓN SPDT NO.071 del 23 noviembre de 2021.	Permiso de funcionamiento.

Asa construcciones SAS.	Extracción de materiales.	RESOLUCIÓN DGL NO.00000260 ,13 marzo 2017 RESOLUCIÓN DGL.NO.00000589 14 julio 2017 RESOLUCIÓN.NO.001927 18 septiembre 2017. RESOLUCION DGL No. 000509 del 06 de julio de 2023.	Licencia ambiental y registro minero.
Gestión de riesgo.	Tala, árboles en situación de riesgo.	N.A, se cuenta con autorización otorgada por la corporación autónoma regional de Santander, CAS mediante la circular 000001del 12 de marzo de 2015 para que los consejos municipales de gestión del riesgo autoricen podas y talas en cuanto a situación de emergencia.	AT-SGRD-132-2023. Autorización de tala, árboles en situación de riesgo AT-SGRD-136-2023. Autorización de tala, árboles en situación de riesgo AT-SGRD-166-2023.Autorización de tala, árboles en situación de riesgo AT-SGRD-191-2023.Autorización de tala, árboles en situación de riesgo. AT-SGRD-192-2023.Autorización de tala, árboles en situación de riesgo

- indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Cumplimiento de los requisitos legales.	No. de permisos aprobados (8) / No. de permisos requeridos (8) *100 = 100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 100% A la fecha del presente corte de este informe se ha entregado toda la información técnica y legal requerida para la gestión de los permisos ambientales.	

10 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

10.1 MANEJO DE OBRAS EN CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 6 al 30 de abril de 2026 se enfocan en la comuna 7, en los barrios campin, divino niño y maría eugenia, en los cuales se hicieron actividades relacionadas con:

- localización y replanteo topográfico, apiques para localización de tubería de agua y gas, demolición de sardineles, demarcación corte y demolición de pavimento rígido, excavación manual y mecánica, instalación de tubería PVC, instalación de sardineles, acarreo de materiales, manejo de material de excavación y demolición, extensión, conformación y compactación de subbase, toma de prueba de densidades, arreglo de cajas domiciliarias y andenes, aplicación de concreto rígido, corte de pavimento rígido y flexible , excavación e instalación de tubería, construcción de sumideros y pozos, nivelación ,arme y fundida de placa coronas, corte y sellado de juntas , demarcación y señalización temporal de áreas intervenidas.

FIGURA 5. ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN.

EXCAVACIÓN MECÁNICA. 	**INSTALACIÓN DE SARDINELES.** 
CONFORMACIÓN DE SUB BASE. 	**COMPACTACIÓN.** 
VACIADO DE CONCRETO. 	**NIVELACIÓN Y LOCALIZACIÓN.** 

- En cuanto al manejo de materiales de construcción y excavación se sigue implementado cubrimiento en los materiales y residuos en la obra, de tal manera que se evite el aporte de sedimentos por dispersión o escorrentía al sistema de alcantarillado o que afecte fuentes hídricas. Todas las fuentes de materiales seleccionadas para este proyecto cuentan sus respectivas licencias y permisos ambientales pertinentes.

- indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Prevención de contaminación atmosférica.	Parámetros de monitoreo.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA -N. A El indicador de cumplimiento para este programa no se encuentra establecido entre los componentes del PMA. Sin embargo, se realizan cubrimientos de materiales con el fin evitar dispersión de material que afecte a comunidad y recursos naturales dentro de las áreas de intervención. El material granular usado en las vías se conforma y se compacta, y el material resultante de excavación o demolición es llevado a la escombrera santa lucia dejando las áreas limpias y organizadas. Los equipos y maquinarias empleados en el área del proyecto se le realizan inspecciones periódicas a fin de evitar afectaciones en las zonas de intervención.	
Prevención de contaminación hídrica.	Parámetros de monitoreo.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA N.A En cuanto a parámetros de monitoreo en el recurso hídrico, no se encuentra establecido entre los componentes PMA, sin embargo, en aras de cumplimiento de este programa y evitar afectación en el recurso hídrico se dejan áreas limpias de material, con el fin evitar afectación en este recurso.	

10.2 MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO.

Con el objetivo de cumplir con el presente indicador se ha efectuado las señalizaciones y señalizador vial correspondiente en el frente de obra en la comuna 7 de acuerdo con las actividades ejecutadas del proyecto. La implementación de señalización se relaciona a, avisos preventivos e informativos entre los cuales encontramos, inicio de obra, desvío, vías cerradas, maquinaria en la vía, reduzca la velocidad, hombres trabajando, entrada y salida de volquetas, sendero peatonal, parqueo de vehículos, ruta de evacuación, peligro excavación, acopio temporal de materiales esto se hace a fin de:

- Delimitar y aislar claramente las áreas de trabajo.
- Delimitar las áreas de circulación peatonal y vehicular.
- Prevenir el ingreso de vehículos y personal ajeno a la obra.
- Proteger a los trabajadores de posibles accidentes.
- Señalizar materiales acopiados dentro de las áreas de intervención.

De igual manera se ha implementado en campamento las señales de obligación, prohibición, prevención y se ha delimitado con maletines, conos viales, delineadores tubulares, lona de encerramiento, malla de encerramiento y cinta de seguridad cada área de intervención del proyecto.

FIGURA 6. DELIMITACIÓN, ENCERRAMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE ÁREAS.



- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Delimitar y marcar mediante avisos los diferentes frentes de obra.	No. de medidas implementadas (1) / No. de medidas propuestas (1) *100 =100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 100% A la fecha del presente informe se ha señalizado las áreas de intervención, así mismo se ha instalado señalización temporal para controlar el tránsito vía adyacente al proyecto Se aumentará el número de señalización en la medida que se abran más frentes de obra.	

10.3 MANEJO DE ESCOMBROS, MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL DE RECICLAJE Y BASURAS.

- **MANEJO DE ESCOMBRO.**

En cumplimiento de los lineamientos de este programa se han retirado y dispuesto el material obrante de excavación, desmantelamiento y demolición de estructuras existente en la escombrera santa lucia.

FIGURA 7. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN.



- **MATERIAL REUTILIZABLE, MATERIAL DE RECICLAJE Y BASURAS.**

Con el objetivo de cumplir con la gestión de los residuos sólidos de este programa se realizó separación en la fuente de los diferentes residuos generado en los frentes de obra para ser llevados por la empresa PG AMBIENTAL E.S.P SAS, quienes

realizan la entrega a la empresa Veolia en periodo semanales para su disposición final o proceso de reciclajes.

FIGURA 8. SEPARACIÓN EN LA FUENTE.



- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO INDICADOR
Cumplimiento de normas en cuanto de manejo de escombros.	No. de requerimientos o sanciones emitidas por autoridades ambientales (1) _____*100 =100% No. requerimientos de autoridad ambiental (1)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 100% En materia de disposición final se ha retirado material de excavación y demolición de estructuras existentes a la escombrera santa lucia cumpliendo así con el presente indicador en cuanto a manejo de escombro de la obra.	
Control de medidas.	No. de medidas implementadas (2) _____*100 =100% No. de medidas propuestas (2)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % AVANCE 100% Se han dispuesto correctamente todos los residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos generados por la obra con la empresa PG ambiental, quien se encarga de entregar a la empresa Veolia en periodo semanales. Así mismo en cumplimiento de este programa se realiza inspecciones ambientales mensuales en los frentes de trabajo con el propósito de recolectar todo material aprovechable y contribuir a reducir el impacto negativo de los residuos en el medio ambiente, cumpliendo así con el presente indicador.	

10.4 DEMOLICIONES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Las actividades relacionadas con el presente indicador se encuentran establecidas en el programa de actividades constructivas, y en cumplimiento de este programa se mantiene los sitios de obra limpios, libres de acumulación de material de demolición especialmente en las cunetas o sumideros en las zonas de influencia de la obra; las zonas de trabajo se mantienen demarcada y señalizadas.

FIGURA 9. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.



11 GESTIÓN HÍDRICA

11.1 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y RESIDUOS LÍQUIDOS.

Conforme a los requerimientos contractuales para la ejecución de la Gestión Ambiental, en este programa se han establecido los siguientes controles a fin de evitar contaminación de suelos, corrientes de aguas superficiales, subterráneas y sistemas de drenaje:

- Los frentes de obras se mantienen limpios a fin de evitar arrastre de material en las áreas de intervención.
- Los residuos sólidos, material obrante de excavación y demolición de los frentes de obras son retirados a fin de evitar contaminación por arrastre por lluvia, viento o aguas de escurrimiento superficial.
- Los materiales acopiados son cubiertos para evitar la dispersión

- Para evitar fugas o derrames en la planta eléctrica y equipos de operación, se utilizan diques o plástico como barrera de protección para evitar afectación en suelo y por ende en el recurso agua por escurrimiento superficial o por lluvias.
- Para el uso de grasas se implementa barreras plásticas que impida el contacto directo con el suelo y por ende dispersión de dichas sustancias por lluvias o escorrentía superficial.
- Se usas estructuras metálicas como bateas, carretillas, baldes y plástico para las mezclas de concreto.
- Se realizan limpiezas en sumideros y pozos para evitar taponamiento y colapso del sistema pluvial y sanitario.
- Se implementa el uso de dique en el almacenamiento de las sustancias químicas.
- Se implementa barreras con sacos para evitar la dispersión de material.
- Se realiza limpieza y retiro de escombro en las áreas de intervención.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
prevenir contaminación hídrica	Parámetros de monitoreo =N. A
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA N.A En cuanto el indicador de seguimiento y monitoreo de calidad de agua de este programa no se encuentra establecido entre los componentes del PMA, Sin embargo, con el propósito de prevenir afectaciones en la parte hídrica se dejan la áreas limpias y organizadas con el fin evitar dispersión de material que a afecte a la comunidad y recursos naturales implicados.	

11.2 MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES.

Con el objetivo de llevar un manejo adecuado de este programa se lleva a cabo los controles establecidos en plan de adaptación de la guía ambiental. Los cuales establecen lo siguiente:

- Las cantidades llevadas de grasas y aceites; son mínimas y de consumo diario, estos se encuentran debidamente rotulado.
- Se implementan programas de orden y aseo en los frentes de trabajo.
- El lavado, reparación y mantenimiento correctivo vehículos y maquinaria en las zonas de obra están prohibidos.
- En los frentes de obra se cuenta con extintores y sus respectivas bases

- Se realizan pre- operaciones a fin de evitar fugas y derrames en las áreas de intervención.
- Se implementa hojas de seguridad y se realizan charlas al personal operativo sobre el manejo y almacenamiento de las sustancias químicas.
- Se implementa señalizaciones en las áreas de almacenamiento.
- Se cuenta con kit derrame en cada frente de obra para atender eventualidades de emergencia, por derrames o fugas en los campamentos y sobre las vías de intervención por actividades de operación de las maquinarias.
- Se hacen inspecciones y rotulaciones de sustancias químicas empleadas dentro de los campamentos.
- Se implementa estibas o diques para contención de las sustancias químicas.

- indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
prevenir contaminación hídrica.	Parámetros de monitoreo= N.A
prevenir contaminación del suelo.	Parámetros de monitoreo= N.A
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA –N. A En cuanto el indicador de seguimiento y monitoreo de calidad de agua y calidad del suelo de este programa no se encuentra establecido entre los componentes del PMA. De igual manera se llevan a cabo controles para evitar la afectación en los recursos de las áreas de ejecución. (ver programa de gestión hídrica).	

12 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

12.1 MANEJO DE LA VEGETACIÓN.

Para el presente corte del mes de abril no se llevaron a cabo actividades de tala, estas fueron efectuadas en el término de vigencia el 25 de diciembre de la resolución RMS 53-2024.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
compensación del material vegetal talado.	No. de árboles sembrados (0) / No. de árboles a compensar (343) *100%= 0 %
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA N.A Entre los componentes del plan de manejo ambiental no se encuentra establecido el plan de compensación forestal, por consiguiente, no hace Parte de alcance del objeto contractual del proyecto. Esta actividad será realizada a través de la alcaldía distrital de barranca en coordinación con secretaria de medio ambiente de acuerdo con el radicado **No:EE-20240416-0180-000006806** remitido por secretaria de infraestructura el 16 de abril de 2024 y el cual fue relacionado en el informe del mes de mayo de 2024.	
Seguimiento al crecimiento de las plantas.	No. de árboles vivos (0) / No. de árboles sembrados (0) *100= 0%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA N.A No se realizan actividades de seguimientos de especies.	

12.2 RESTAURACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS Y ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

Para el presente periodo, se llevaron a cabo limpiezas en vías intervenidas, reparaciones de zonas duras, desmonte y retiro de campamento por suspensión de actividades constructivas.

FIGURA 10. LIMPIEZA Y RETIRO DE CAMPAMENTO EN EL ÁREA POR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN.



- indicador de cumplimiento componente gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Restablecimiento de áreas verdes.	Registro línea base inicial
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA %avance -0% En relación con el presente indicador a la fecha del presente periodo no se han intervenido áreas verdes, de tipo de empradización o revegetalización arbustiva, sin embargo, se llevaron a cabo jornada de limpieza general en vías y en áreas donde se ha efectuado trabajos de construcción.	

13 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS.

13.1 MANEJO DE CAMPAMENTO Y SITIOS DE ACOPIO.

De acuerdo con los lineamientos de este programa del presente periodo de 6 al 30 de abril se llevaron las siguientes medidas:

- Jordanas de orden y aseo en los frentes de obra.

- Retiro residuos sólidos de los frentes de obra.
- Retiro de baños portátiles.
- Retiros de campamentos.
- Retiro de materiales de acopio y de excavación.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Reducir y controlar los impactos generados por el establecimiento de campamentos temporales.	No. de medidas ambientales ejecutadas (5) / No. de medidas ambientales programadas (5) *100=100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente informe se han implementado las medidas necesarias para controlar los cambios temporales de las áreas de intervención del proyecto, cumpliendo así con el presente indicador.	

13.2 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

se han realizado inspecciones preoperacionales, de vehículos y maquinarias existentes en cada frente de obra, de manera que se minimicen los riesgos de accidentes tanto para los empleados que laboran en el proyecto como para los peatones y conductores que transitan en las áreas, así mismo evitar afectaciones en los recursos (agua, aire, suelo fauna y flora), por fugas o derrames en las áreas de intervención. la documentación y las inspecciones preoperacionales se encuentra relacionadas en el informe SG SST. Para el presente periodo no se reportan fugas ni derrames dentro las áreas de ejecución.

FIGURA 11. PREOPERACIONALES DE MAQUINARIAS PESADA, Y EQUIPOS DE OPERACIÓN.



- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión ambiental.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Prevenir accidentes por fallas mecánicas en vehículos y maquinarias.	No. de vehículos en operación (3) / No. de vehículos con revisión técnico-mecánica (3) *100=100%
Prevenir accidentes por manejo inadecuado.	No. de conductores trabajando (3) / No. de conductores con licencia (3) *100 =100%
Prevenir sanciones por ausencia de permiso.	No. de vehículos trabajando (3) / No. de vehículos con documentación mecánica (seguro soat) (3) *100 =100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente informe en los frentes obras tanto los vehículos como maquinarias pesadas se les realizan sus respectivos preoperacional con el fin de identificar los peligros y controlar los riesgos antes de que ocasionen daños en los trabajadores, transeúntes o afectación de zonas de intervención.	

- **MANEJO DE RUIDO Y MATERIAL PARTICULADO.**

Para el control del ruido y material particulado en las áreas de operación de equipos y maquinarias pesadas, se implementaron los siguientes controles:

- Uso de protectores de copa o tapa oídos de inserción de acuerdo con la actividad de ejecución y el nivel de exposición.
- Charlas relacionadas al uso de los EPP.
- Uso de mascarillas o respiradores media cara con filtros P100 de acuerdo con la actividad de ejecución y el nivel de exposición del material particulado.
- preoperacionales de vehículos, maquinarias y equipos empleados en la obra.
- limpiezas en las áreas de intervención con el fin de disminuir la concentración de material particulado.
- Se implementa el uso mascarilla o respiradores de protección a vapores, humos y partículas.
- Se emplea corte en húmedo para dilatación en placas de concreto para reducir la concentración de material particulado.
- Se realiza medición de ruido de maquinarias y equipos de operación anual.
- Se emplea carro tanque de riego para reducir la concentración de material. Particulado en áreas de intervención.

- Encerramiento con lona para aislar las zonas de trabajo.
- Los materiales de construcción en los frentes de obra se encuentran cubiertos y señalizados.
- Los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de la obra están acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.

14 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

14.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Durante la ejecución del periodo, no se recibieron solicitudes de pqrs por parte de los habitantes de la comunidad de los tramos intervenidos en la comuna 7, barrios el campin, divino niño y maría eugenia.

Sistema de atención de quejas y reclamos.

A continuación, se relacionan las PQRS recibidas en el presente corte desde cada canal de atención ofrecido por el contratista durante la ejecución del proyecto y se describen las medidas correctivas adelantadas a la fecha del presente corte.

CUADRO 6. SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS.

CANAL DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN GENERAL
1. Correo electrónico disponible. pqrspavigas@gmail.com	Durante el presente corte no se recibió un comunicado oficial por este medio electrónico.
2. Formato en físico de PQRS	Durante el presente periodo abril no se enlazaron PQRS en formato físico.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión social.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Atender a la comunidad	No. De quejas y reclamos atendidos (0)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente corte no se atendió ninguna solicitud por parte de la comunidad de los tramos intervenidos de la comuna 7.	
Informar y divulgar el proyecto con la comunidad	No. de reuniones realizadas (2) _____*100=100% No. de reuniones programadas (2)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente periodo se programaron 2 reuniones con comunidades implicadas en el proyecto de pavimentación, las cuales fueron ejecutadas a cabalidad.	

14.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Para el presente periodo se realizaron 2 reuniones programadas con la comunidad del tramo 128, barrio maría eugenia.

14.2.1 Vallas informativas.

A la fecha, no se encuentran instaladas vallas fijas, se estableció una (1) valla móvil en el punto de intervención del campin, la cual cuenta con información de índole social del proyecto.

FIGURA 12. DISTRIBUCCIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS.



14.2.2 Volantes de información

Durante el presente periodo de ejecución se elaboraron 2 formatos sobre las implicaciones ambientales, técnicas y económicas que conlleva el proyecto.

14.2.3 Actas de vecindad

Durante el presente periodo de ejecución se llevaron a cabo actividades de levantamiento de actas de vecindad.

14.2.4 Actas de compromiso

Durante el presente corte, no se registraron actas de compromiso.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión social.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Informar los aspectos generales más relevantes del proyecto	No. de vallas instaladas (1) _____*100 =100% No. de vallas programadas (1)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente informe no se encuentra instaladas vallas fijas y se estableció 1 valla móvil que contiene información referente al proyecto.	
Brindar información veraz y oportuna a las autoridades municipales y a la comunidad	No. de reuniones realizadas (2) _____*100=100% No. de reuniones programadas (2)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha del presente periodo se programaron 2 reuniones con comunidades implicadas en el proyecto de pavimentación, para explicarle a la comunidad las generalidades del proyecto.	

14.3 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Durante el presente corte, se ha incrementado la contratación del personal en diferentes frentes

CUADRO 7. PERSONAL VINCULADO.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Dentro del personal administrativo se encuentran 8 contratados, de los cuales 5 fueron contratados en el mes de abril, quienes realizan tanto trabajos operativos como administrativos.
PERSONAL OPERATIVO
Dentro del personal operativo se encuentran 18 contratados, de los cuales 4 fueron contratados en el mes de abril.

En este punto, cabe resaltar que la contratación del personal se realiza teniendo en cuenta el sector a intervenir por lo cual el contratado reside en una de las comunas de intervención. Sin embargo, cuando en el barrio no existen personas que cumplan con los requisitos de contratación se tienen en cuenta postulantes de barrios que se encuentran dentro del proyecto de pavimentación. Como última medida en caso tal de no contar tampoco con disponibilidad de personal se tomarán en cuenta barrios que estén dentro de las comunas a intervenir, aunque éste no sea directamente intervenido.

- Indicador de cumplimiento para el desarrollo de la gestión social.

META	CALCULO DEL INDICADOR
Generar empleos	No. de empleos generados (26)
En el presente corte se mantiene 26 puesto de trabajos en el sector de intervención.	
Generar empleo de personal del área de influencia	No. de trabajadores vinculados (26) / No. de trabajadores de la región (26) *100 =100%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA % avance 100% A la fecha, se ha contratado personal proveniente de los sectores de intervención, siendo actualmente la participación del 100%. Por lo cual, se cumple a cabalidad el presente indicador.	

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Los programas que comprenden el desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental se encuentran claramente definidos, pues abarcan los aspectos de importancia a tratar del proyecto de infraestructura vial, el cual genera impactos que se deben llevar a detalle con el avance de protocolos particulares para su manejo, en los ámbitos preventivos y correctivos. Así mismo, el planteamiento de los indicadores de gestión para cada actividad definida en los programas establecidos, dando cumplimiento en relación con el plan de adaptación de la guía ambiental.

Se evidencia recepción por parte de la comunidad durante las reuniones de socialización planificadas sobre las actividades que se realizan y las implicaciones ambientales en el área del proyecto pese a los diferentes escenarios de duda que se generaron durante el presente mes. Se busca en lo posible de escuchar y atender las peticiones, quejas y/o reclamos de los habitantes de los sectores intervenidos, generando lo más pronto posible las medidas correctivas o estrategias pertinentes para promover el bienestar en la comunidad y mitigar los impactos negativos que pueda ocasionar las actividades de obra o el retraso en la terminación de los tramos actualmente abiertos.

El personal de la obra muestra interés frente a las capacitaciones realizadas en temas ambientales y comportamientos con las comunidades.

Se cuenta con un plan de manejo de tránsito en el cual se implementa la delimitación, cerramiento y aislamiento de las áreas de trabajo a intervenir durante la ejecución del proyecto, se definen áreas de especial comportamiento en términos de movilización de vehículos y peatones.

Se tienen establecidas acciones para cumplir con el transporte y disposición final de los escombros provenientes de la ruptura de pavimentos y materiales inertes provenientes de las excavaciones. Las áreas de trabajo se encuentran debidamente señalizadas.

Es necesario realizar campañas y charlas periódicas en los frentes de obra, con el objetivo de capacitar sobre la conservación de condiciones de orden y aseo adecuadas en los sitios de trabajo.

Se lleva a cabo controles de las actividades de la obra y se toman medidas preventivas en las fuentes de emisión en cuanto a material particulado y ruido. Se realizan capacitaciones con la administradora de riesgo labores (ARL) con el fin de brindar asistencias técnicas para el desarrollo de los programas de prevención de riesgos.

ANEXOS.

SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD.

PAVIGAS	SOCIALIZACIONES - ACTAS DE VECINDAD Y OBRAS	CÓDIGO: GG-F-08 FECHA: 05/04/2017 VERSION: 1 PAGINA: 1__ DE _1_

Fecha	Hora de inicio	Hora de terminación	Lugar
29-Abril-2026	8:00am	5:30pm.	Barrio: María eugenia Comuna: 7

TEMA:

Participantes	Barrio	Telefono	Firma
Zoraida Nicolas	María Eugenia	3124459021	
Vitolia Acevedo	María Eugenia	3223948090	
ANA ARIAS V	MARIA EUGENIA	3219756383	
María Carrascal	María eugenia	3128537663	
Johany Sanabria	María eugenia	3168928531	
Jackeline Sanabria	Maria Eugenia	3153987025	
Yard ortiz c.	Maria Eugenia	3507135868	
Yulmo Landinez	Maria Eugenia	3204878873	
Elbatrujillo Gom	maria EUGENIA	3118957480	Elbatrujillo1106
Veronica Suarez	Maria Eugenia	3209310260	Veronica Su.
Fernando Jimenez Mena	Mariaeugenia.	3133937683	

9.2 CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa.	El Campin - Tramo 1/6	27/ABRIL/26	7:30 a.m

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Manejo y protección de los recursos naturales.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Oscar Julian Castellanos A	Ing Civil Residente	
Hector Alonso Pello	Oficial	
[illegible]	obrero	
Yonis Gonzalez	conductor	
Omar Rueda	Oficial.	
Yulyon [illegible]	ob	
[illegible]	Controladora. Vial	
[illegible]	obrero	
Jerson Garcia	Supervisor civil	
Jhon N [illegible]	operador	
JESUS [illegible]	oficial	
LUDIN JESUS LEON REINO	Laboratorista	
Franklin Reales	Oficial.	
Gerner Contreras	Obrero	
NESTOR CEDIEL	TOPOGRAFO	
Brayan Arguello	Cadenero	Brian A.
Jefferson Leon Pino	conductor	Jefferson Leon

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Director HSEQ
Luzmery Torres C.	

PAVIGAS

DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativo.	Lugar: El Campin - Tramo 116.	Fecha: 29/ABRIL/26	Hora: 7:30 a.m

Dirigido: Personal de Obra.

Temas: Contaminación atmosférica.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Oscar Julian Castellanos	Ing Cons Residente	
[illegible]	Conductor U-1	
Hector Jacio Bello	Oficial	
[illegible]	Obrero	
[illegible]	Oficial	
[illegible]	Ob	
[illegible]	[illegible]	
Darwin Esneider Quintaya A.	Obrero	
Yonis Gonzalez	conductor	
Jhon Alexander Villa	operador	
Jesus Alvear C	Oficial	
Jason Garces Arteaga	supervisor civil	
Franklin Reales	Oficial.	
Gelner Contreras	Obrero	
[illegible] CEDEL	TOPOGRAFO	
Brayan Arquello	Cadenero	Brian A.
[illegible]	Conductor	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Luzmery Torres C.	Firma Director HSEQ

13.MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

PAVIGAS	INSPECCION AMBIENTALES	CODIGO:HSE-F-12 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

Periodo de Inspección:	16/04/26 al 26/06/26	Area:	Campin.	Contrato	1593-23
Responsable de Inspección:	Luzmery Torres Castro				

	Fechas de Inspeccion																		
ASPECTOS A EVALUAR	16/04/26			30/04/26			15/05/26			29/05/26			12/06/26			26/06/26			Requisito legal Asociado
1. IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Aspectos e Ambientales Identificados en su totalidad	✓			✓															4.3.1 ISO 14001:2004
Aspectos Ambientales Controlados en su totalidad	✓			✓															4.3.1 ISO 14001:2004
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Zona de almacenamiento de residuos solidos lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			✓															Articulo 9., Ley 9 de 1979
Residuos han sido separados y clasificados correctamente.	✓			✓															Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 2013
Canecas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			✓															Articulo 9 de Decreto 4741 de 2005. Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Se aplica una adecuada separacion en la fuente en el area.	✓			✓															Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
El personal conoce el manejo de residuos	✓			✓															4.4.2 ISO 14001:2004
3. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y PREVENCION DE VERTIMIENTOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			✓															Articulo 12 Decreto 4741 de 2005. Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			✓															Articulos 10, Ley 9 de 1979
Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			✓															Articulos 10, Ley 9 de 1979
El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			✓															4.4.2 ISO 14001
La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias. O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			✓															Articulo 14, Ley 9 de 1979
Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan grietas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓			✓															Decreto 4741 de 2005
No se presenta Vertimientos a cuerpos de agua naturales de residuos liquidos de las obras	✓			✓															Articulo 60 y 62 Decreto 1594 de 1984
4. MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se poseen Hojas de Seguridad de todos los productos quimicos que se manejan en el area	✓			✓															Ley 55 de 1993
El personal conoce las Hojas de Seguridad y estan concientes de la importancia de las mismas	✓			✓															Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada	✓			✓															Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan separados de elementos o equipos que puedan generar chispas	✓			✓															Ley 55 de 1993
Las instalaciones electricas de las zonas de almacenamiento de quimicos estan en buen estado	✓			✓															Ley 55 de 1993
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.															

OBSERVACIONES

PAVIGAS	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	CODIGO: HSE-F-07 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASO O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐ Tecnico ☐

PERIODO DE INSPECCION: 16/04/16 al 26/06/26 AREA: campin. PROYECTO: 1593 - 23

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS	FECHAS DE INSPECCION																		Requisitos Legal Asociado
	16/04/26			30/04/26			15/05/26			29/05/26			17/06/26			26/06/26			
GUIA PARA LA INSPECCION	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			✓															Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	✓			✓															Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Ruta de Evacuación	✓			✓															Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Herramientas almacenadas correctamente	✓			✓															Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Estantes en buen estado	✓			✓															Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Recipientes suficentes para manejo de residuos	✓			✓															Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Residuos correctamente separados	✓			✓															
Lamparas limpias y en buen estado	✓			✓															Articulo 7 Resolución 2400 de 1979
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo	✓			✓															Articulo 29 Resolución 2400 de 1979
Separación correcta de productos no Conformes	✓			✓															8.3 ISO 9001
Material bien apilado o almacenado	✓			✓															Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			✓															Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Paredes limpias	✓			✓															Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Pisos limpios, en buen estado, y secos	✓			✓															Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	✓			✓															24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Rincones sin basura	✓			✓															Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	✓			✓															24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Sitios señalizados adecuadamente	✓			✓															Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla			✓			✓													Articulo 18 y 19 Resolucion 2400 de 1979
Suficiente iluminación	✓			✓															Articulo 16 Ratia 2009, Articulo 7 Resol 2400 de 1979
Se proporciona agua potable en un sistema higiénico			✓			✓													Articulo 23 Resolución 2400 de 1979
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.															
Vo Bo Inspector/Supervisor HSE																			

Convenciones: N.A. No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS	CODIGO: HSE-IN-80 VERSION: 01 FECHA: 01/04/2021

Proyecto/Contrato 1593-23 Semana del 16 al 23 mes Abril año 2026

Inspeccionado por: Luzmery Torres Castro Cargo Profesional Socioambiental Ubicación Tramo 116 el cumbre

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se cuenta con punto ecológico en el área de trabajo	✓		
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓		
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓		
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)	✓		
El punto ecológico dispone de 4 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son blanca, verde y negra.	✓		
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓		
El punto ecológico se encuentra demarcado y señalizado	✓		
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓		
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓		
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓		

Elaboró	Nombre: Luzmery Torres Castro.	Supervisor	Nombre: Jhon Guerra
	Cargo: Profesional socio-ambiental		Cargo: Coord. HSE
	Firma: Luzmery Torres C.		Firma:

Versión 1, 19 Enero 2016

PAVIGAS

INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS

CODIGO: HSE-IN-80
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/04/2021

Proyecto/Contrato: 1593-23 Semana del 24 al 30 mes Abril año 2026

Inspeccionado por: Luzmery Torres castro Cargo: Profesional Socioambiental Ubicación: Tramo 116 al campin

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se cuenta con punto ecológico en el área de trabajo	✓		
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓		
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓		
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)	✓		
El punto ecológico dispone de 4 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son blanca, verde y negra.	✓		
Las canecas o bolsas plásticas están roluladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓		
El punto ecológico se encuentra demarcado y señalizado	✓		
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓		
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓		
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓		

Elaboró	Nombre: Luzmery Torres castro.	Supervisor	Nombre: Jhon Alexander Guerra
	Cargo: Profesional Socioambiental.		Cargo: coord. HSEQ.
	Firma: Luzmery Torres C.		Firma:

Versión 1. 19 Enero 2016

PAVIGAS	INSPECCION AMBIENTALES	CODIGO:HSE-F-12 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

Periodo de Inspección:	27/04/26 al 10/07/26	Area:	Divino Niño	Contrato	1593-23
Responsable de Inspección:	Luzmery Torres Castro				

	Fechas de Inspeccion																		
ASPECTOS A EVALUAR	27/04/26			12/05/26			27/05/26			11/06/26			26/06/26			10/07/26			Requisito legal Asociado
1. IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Aspectos e Ambientales Identificados en su totalidad	✓																		4.3.1 ISO 14001:2004
Aspectos Ambientales Controlados en su totalidad	✓																		4.3.1 ISO 14001:2004
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Zona de almacenamiento de residuos solidos lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓																		Articulo 9., Ley 9 de 1979
Residuos han sido separados y clasificados correctamente	✓																		Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 2013
Canecas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno	✓																		Articulo 9 de Decreto 4741 de 2005 Articulo 14, 15, 16, 17 y 18 Decreto 1713 de 2002
Se aplica una adecuada separacion en la fuente en el area.	✓																		Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
El personal conoce el manejo de residuos	✓																		4.4.2 ISO 14001:2004
3. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y PREVENCION DE VERTIMIENTOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓																		Articulo 12 Decreto 4741 de 2005, Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓																		Articulos 10, Ley 9 de 1979
Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓																		Articulos 10, Ley 9 de 1979
El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓																		4.4.2 ISO 14001
La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓																		Articulo 14, Ley 9 de 1979
Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan grietas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓																		Decreto 4741 de 2005
No se presenta Vertimientos a cuerpos de agua naturales de residuos liquidos de las obras	✓																		Articulo 60 y 62 Decreto 1594 de 1984
4. MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se poseen Hojas de Seguridad de todos los productos quimicos que se manejan en el area	✓																		Ley 55 de 1993
El personal conoce las Hojas de Seguridad y estan conscientes de la importancia de las mismas	✓																		Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada	✓																		Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan separados de elementos o equipos que puedan generar chispas	✓																		Ley 55 de 1993
Las instalaciones electricas de las zonas de almacenamiento de quimicos estan en buen estado	✓																		Ley 55 de 1993
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luz Mary Torres C.																		

OBSERVACIONES

PAVIGAS

INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS

CODIGO: HSE-IN-60
VERSION: 01
FECHA: 01/04/2021

Proyecto Contrato 1593-23 Semana del 22 al 29 mes Abril año 2026

Inspeccionado por luzmery torres castro Cargo Profesional Socioambiental Ubicación Tramo 117 Puno Niño

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se cuenta con punto ecológico en el área de trabajo	✓		
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓		
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓		
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)	✓		
El punto ecológico dispone de 4 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son blanca, verde y negra	✓		
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓		
El punto ecológico se encuentra demarcado y señalizado	✓		
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓		
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓		
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓		

Elaboró	Nombre: luzmery torres castro	Supervisor	Nombre:
	Cargo: Profesional Socio-ambiental		Cargo:
	Firma: luzmerytorres c.		Firma:

Versión 1, 19 Enero 2018

14.2 INFORMACIÓN A LA DIVULGACIÓN.

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-018 Página: 1 de 1
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 3 Vigente a partir de: 15-01-2019

ACTA No. 1 DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

LUGAR:	Tramo 128 Maria Eugenia
FECHA:	21/Abril/2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO N° 1593-23 OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	COSNTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT Interpavimento BCA

REPRESENTANTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Johanna P. Santos Roy	Sec. Infraestructura	
Luzmery Torres Castro	Ing. socio-ambiental	Luzmery Torres C.
Oscar Julian Castellanos	Ing Residente	

REPRESENTANTES INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Mauin Mayin	Ing. Civil.	Carlos Mayin

USUARIO Y/O COMUNIDAD

NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Ilmar Gonzalez	3103290328	
Antolova Lagos	3189914520	Antolova Vargas
Fernando Jaimes Mesa	3133037685	
Carlos Rodrigo Sanchez	3744888467	Carlos Rodrigo Sanchez
Edwin Nuñez Barbosa	3017298727.	Edwin Nuñez Barbosa

Nota: De requerirse más campos para firmas de la comunidad se anexará el acta de asistencia.

TEMA A TRATAR

Socalización tramo 128 Maria Eugenia, se explico a la Comunidad las dimensiones contratadas, se pacta fecha de inicio para el 19 de Mayo, se explica a la comunidad la participación del personal de la comunidad

CIERRE DE ACCIONES

Se pacta fecha de inicio para el 19 de Mayo.

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-018 Página: 1 de 1
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 3 Vigente a partir de: 15-01-2019

ACTA No. 2 DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

LUGAR:	Tramo 128 Barrio Maria Eugenia
FECHA:	28-Abril-2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO N° 1593-23 OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	COSNTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERPAVIMENTO BCA

REPRESENTANTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Oscar Julian Castellanos Alvarado	Ing Residente	
Luzmery Torres Castro	Profesional socioambiental	Luzmery Torres C.

REPRESENTANTES INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Mario Marin	Ing Civil	Carlos Mario
Kevin Andres Jimenez C.	Prof. Social	Kevin A Jimenez C.

USUARIO Y/O COMUNIDAD

NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Elba Tovar Gomez	3118457480	Elba Tovar Gomez
Jhon Guerra	310 3290280	
[illegible]	304 3927744	
Ariel Hernandez Meriño	3143305631	
[illegible]	3133037683	
Maria Carrascal Atencia	3128537663	Maria Carrascal
[illegible]	3143877425	
Gloria Nuñez Barbosa	3017747729	
[illegible]	3223940991	

Nota De requerirse más campos para firmas de la comunidad se anexará el acta de asistencia.

TEMA A TRATAR

Se socializo sobre especificaciones técnicas del tramo 128 maria eugenia, se entrego chapolas a la comunidad se manifiesta por parte de la comunidad problematica del sistema de agua potable y sanitarias y pluvial tiempo de ejecución e inicio de obra, contratación de personal y sobre el acta de vecindad.

CIERRE DE ACCIONES

Se van a iniciar actividades antes del 19 de mayo se va a realizar revisión en campo de los sistemas de acueducto, sanitarios y pluviales, se queda a la espera de recibir el personal de la comunidad.

14.2.2 VOLANTES INFORMATIVOS.

PAVIGAS

Gobierno de Obras · SGR · ecopetrol

Volante N°01

CIRCULAR INFORMATIVA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER.

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD - PRIMERA VISITA

Señores

Propietarios de los predios del área de influencia del proyecto

Al iniciar/avanzar las actividades constructivas, **UT Interpavimento BCA.** A través del contratista **PAVIGAS S.A.S**, realizarán el **Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios del área de influencia del proyecto**.

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

Para adelantar la actividad de levantamiento de actas se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

Las visitas se realizarán en el horario de 7:30 am a 11:30 am – 1:30 pm a 4:30 pm

El personal autorizado para el ingreso a los predios es:

- ✓ Luzmery Torres Castro - Profesional Socioambiental – Cel: 322 377 4400
- ✓ Kevin Jiménez-Profesional social INTERVENTORÍA. - Cel: 300 762 3087

Correos de recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias:

- ✓ pqrspavigas@gmail.com

Más información sobre el Contrato de obra pública N° 1593-23.

Diagonal 56 # 18ª – 88 Centro Empresarial San Silvestre piso
Teléfono: 6010110
Email: pqrspavigas@gmail.com

Volante N°02

CIRCULAR INFORMATIVA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER.

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD - SEGUNDA VISITA

Señores

Propietarios de los predios del área de influencia del proyecto.

Por medio de la presente nos permitimos informar que de acuerdo a la ejecución del proyecto próximo a llevarse a cabo, se realizaron 2 visitas en diferentes oportunidades con el fin de evaluar el estado del inmueble, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales del predio antes del inicio de las obras, dado que no se ha podido encontrar en ninguna de las dos visitas se procederá a hacer el levantamiento únicamente de la fachada exterior sin petición, queja, solicitud o reclamos a futuro en relación a afectaciones que se puedan presentar por el desarrollo de la obra.

Nota: Estamos atentos a cualquier información que se pueda suministrar.

Atentamente,

- ✓ Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental – Cel: 322 377 4400
- ✓ Kevin Jiménez-Profesional social INTERVENTORÍA. - Cel: 300 762 3087

Más información sobre el Contrato de obra pública N° 1593-23.

Diagonal 56 # 18ª – 88 Centro Empresarial San Silvestre piso
Teléfono: 6010110
Email: pqrspavigas@gmail.com

14.2.3 ACTAS DE VECINDAD.

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1593-22).
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA: 12 04 22

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental | REVISÓ: Oscar castellanos-Ing residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Alexandra Trejos
DIRECCION: calle 47A #52-30 el campin.
TELÉFONO: 3134773407
FRENTE (en metros): 3 metros
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	SI
ALCANTARILLADO	SI
ENERGÍA	SI
TELÉFONO	NO
GAS	SI
OTRO (cual)	

OBSERVACIONES: Recargable

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden es, fachas, puertas, ventanas, muros, esqueletos, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden: Piso semi pulido. Presenta resana por tubería de gas / desgaste y partido en una esquina / muro de contención en obra negra sin terminación y construido a casi dos metros / se evidencia deterioro (desgaste) del muro / vivienda construida en zinc / piso rústico con desgaste de tránsito / techo en buen estado, escalón de acceso rústico con grietas..

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cuál)		OTRO (Cuál)	

Firma: Alexandra Trejos
Nombre: Alexandra Trejos
CC 63 472 902
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Oscar Castellanos
CC 1098 791 576
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando Jaimes
CC 91.291.604
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:
UT Interpavimento BCA

FECHA: 22 04 26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Oscar cardenas Ingeniero residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Elizabeth Aguirre Bolivar
DIRECCIÓN: Calle 45 #48-26 campin
TELEFONO: 3233207196
No PISOS: 1
ESTRATO: 1
FRENTE (en metros): 8 (Ochentres)

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden es, fachas, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén: Rustico, presenta fisuras por tuberia de gas y dilatacion en varios puntos, muro de contencion en doble hilera en buen estado escaleras de acceso en piso rustico en buen estado. Fachada: en obra gris, presenta dilatacion en la pega del marco de la ventana con vidrios en buen estado, en la parte superior se ve dilatacion al lado de la cerchas del techo.
Sala-comedor-cocina: Piso semi esmaltado en buen estado Paredes en obra gris, Pared frente fisuras en la pega del marco de la puerta, Pared lateral derecho fisura en la pega del marco en la puerta, el resto en buen estado, Pared lateral izquierda presenta fisuras en la pega del marco de la ventana con dilatacion en la ceramica el resto en buen estado, Habitacion: Piso semiesmaltado con una dilatacion en la entrada, el resto en buen estado, Paredes en obra gris, Pared lateral izquierda presenta fisuras en las pegas del marco de la ventana, el resto en buen estado, techo en drywall en buen estado. Baño: Piso rustico y semi esmaltado, Presentan fisuras y desnivel, Paredes en obra gris, Pared externa derecha presenta separacion y dilatacion en la junta del muro del piso al techo y techo de eternit con del baño presenta fisura desde el marco de la ventana hacia el techo, techo de eternit con estructura metalica y dilatacion cerca al marco de la ventana, ventana sin vidrio.

TIPO DE PREDIO			USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL			RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X		OFICIAL	
LOTE BALDIO			COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO			INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)			OTRO (Cual)	

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELEFONO	NO	
GAS	SI	
OTRO (Cual)		

Firma
Nombre: Elizabeth Aguirre Bolivar
cc 37 932 043
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre: Oscar Castellanos
cc 1.094.879.556
CONTRATISTA

Firma
Nombre: Fernando Zúñiga.
cc 91.291.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA: 12/04/26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro Profesional Socio-ambiental
REVISÓ: Oscar castellanos PE residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Ruth Carmen Diaz
DIRECCIÓN: Calle 45A # 58 - 15 el Campin.
TELEFONO: 3115493942
FRENTE (en metros): 3 metros
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1
REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	Si
ALCANTARILLADO	Si
ENERGIA	Si
TELEFONO	no
GAS	Si
OTRO (cual)	internet

OBSERVACIONES: Recoyable.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anderes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Fachada con piso de cerámica con 3 baldosas partidas y 2 desgastadas/baldosa de la esquina partida/Pared estucada y pintada, ventanas de metal metálica en buen estado.

Sala comedor: Piso semiesmaltado presenta desgaste por tránsito/paredes en ladrillo dos ladrillos partidos en la pared lateral izquierda, agrietamiento en la parte superior del marco de la Puerta/techo de eternit con estructuras de madera.

Habitación 1=piso semi esmaltado con grietas/paredes en ladrillo, techo de eternit con estructuras de madera. Puerta con grietas en la parte superior del marco tanto externo como interno de madera. Puerta con grietas en el marco y la pared/marco entre sala y cocina presenta fisuras y una separación entre el marco y la pared izquierda presenta grietas, paredes metálicas, presenta grietas con grietas en cerámica. gran parte de cocina con piso semiesmaltado con puntos/mesón en cerámica. gran parte con grietas, techo de lateral derecha en ladrillo sin puntos/mesón en cerámica. gran parte con grietas, techo de eternit con estructuras de madera.

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (Cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL: X; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (Cual)

Firma: Ruth Carmen Diaz C
Nombre: Ruth Carmen Diaz C
CC 63.432.421 Bga/Bjo
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma: Oscar Castellanos
Nombre: Oscar Castellanos
CC 1098791576
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando Zuñiga
CC 91.291.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GGI-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA 27 04 26
ELABORÓ: LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ: Oscar castellanos-Residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Leonardo Diaz Silva
DIRECCIÓN: Calle 45A #58C-04 el campin.
TELÉFONO: 3178889064
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1
FRENTE (en metros): 4.20

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Rampa en cemento con agrietas en la parte superior fachada en piso de cemento desgastado por transito y grietas rayando de concreto que esta muy desgastada con grietas, con la escalera de la parte superior de 1,8m, puerta metalica y reja sin vidrio, en el marco hay grietas en la parte superior. Sala: piso semi pulido con desgaste por transito, paredes en ladrillo sin pintar, techo de eternit con estructuras de madera, ventana con vidrios, lado derecho con vidrio suelto al marco. Cocina: piso semi esmaltado desgastado, mesón semi esmaltado, paredes en ladrillo, con ventana pequeña en cemento con grietas. Habitación: piso semi esmaltado desgastado, paredes en ladrillo, techo en eternit con estructura de madera y metal. Baño: piso en obra gris, paredes en obra gris con humedad. Cuarto lavado: piso en cemento, paredes en ladrillo, lavadero en granito. con humedad, techo en eternit con estructura de metal, con ventana pequeño en cemento.

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (Cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL: X; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (Cual)

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	Si
ALCANTARILLADO	Si
ENERGÍA	Si
TELÉFONO	NO
GAS	Si
OTRO (cual)	Internet

OBSERVACIONES

Firma: Ludmar Diaz Silva
Nombre: Leonardo Diaz Silva
CC: 1095128862
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma: Jhon Jairo C
Nombre: Jhon Jairo Castellanos
CC: 1.098.791.776
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando Zafra
CC: 91.291.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-03
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:
UT Interpavimento BCA

FECHA: 21 | 04 | 2026

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro-Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
OKAY centralmag.net/ver

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Antonio Celso Gallón
DIRECCIÓN: Cll 45A # 58-03 B. El Campín
TELÉFONO: 3008881816 No. PISOS: 1
FRENTE (en metros): 7.1 mts - 9.90 mts. ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden en piso semiesma todo, presenta fundimientos y grietas Alax, techo en eternit en soporte en hierro en buen estado.
Fachada esticada y pintada.
Ventanas y puertas con vidrio en buen estado, costado izquierdo presenta dilatacion desde el marco de la ventana hasta el techo
Sala: piso enchapado, presenta desgaste y fisuras en varias partes, paredes estucadas, pared frontal presenta una lamina con dilatacion desde la puerta de habitacion hasta cielorraso, cielorraso en estiropor presenta dilatacion desde el techo y a lo ancho en buen estado
Habitacion 1: Puerta metalica en buen estado, estico del techo del marco presenta cortes pequeños, piso con ceramica presenta tableta despicadas, paredes en obra gris y pintadas, pared lateral derecha tiene estuco direchado
marco de la puerta izquierda la mitad de la pared y presenta daños por corrosion en la parte inferior del marco de la puerta, cielorraso en drywall presenta daños en la unión del techo con la pared
Baño interno: piso con tableta de ceramica en buen estado, paredes en obra gris-el dintel del marco en lodillo es uniforme, ventana en buen estado, puerta presenta sisura parte esquinera hacia la placa, placa en concreto no uniforme, desnivel, resanes y desgaste por transito
Estado.
Habitacion 2: piso semi enchapado presenta pileta de cemento a extremo, desnivel, resanes y desgaste por transito, paredes estucadas, pared frontal presenta dilatacion entre los muros desde el marco de la puerta hacia el cielorraso
Pared frontal: presenta humedad levantamiento del estuco parte inferior, pared lateral derecha presenta dilatacion desde el marco-piso del lavamanos hacia el cielorraso, cielorraso en estiropor presenta dilatacion hacia el techo, 1 sello, 1 ventilador

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONSTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cuál)		OTRO (Cuál)	

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGÍA	S
TELÉFONO	
GAS	
OTRO (Cuál)	S

OBSERVACIONES: Reacyable

Firma
Nombre Christian Valderrama
CC 13.882.840
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Jose Castellanos
CC 1098 [illegible]
CONTRATISTA

Firma
Nombre Fernando [illegible]
CC 91.291.841
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimenta BCA
FECHA: 21 | 04 | 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio ambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Yolanda Uribe Gaitan
DIRECCION: Calle 45 #239 Barrio Campin
TELEFONO: 3162332573
FRENTE (en metros): 5m
No PISOS: 1
ESTRATO: 1

SERVICIOS PUBLICOS

	Y/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	NO	Pozo septico
ENERGÍA	SI	
TELEFONO	NO	
GAS	SI	
OTRO (cual)	Ninguno	

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas,ventanas, muros,cielo raso, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden: Piso en tierra, Norte costado izquierdo en muro de contención, con ladrillos antiguos fundido y pared lateral en doble friso, ven ventana con vidrios en buen estado.
Alcoba con dormit sobre el muro, presenta separación de la mezcla con el techo, Norte interior de la pared Lateral interior presenta huecos para la centinuación de la viga de amarre cercador: Piso rustico no uniforme
Puertas: sin vidrios en buen estado.
Habitación-cocina: Piso rustico, en la entrada presenta un resane, el resto en buen estado, paredes en doble friso, pared Pin ciral se evidencia humedad Norte esquinero, Pared lateral izquierda presenta filtración desde el techo de contante lluvia el techo, sobre la regada de la Parte electrica.
Baño interno: Piso rustico presenta desajuste y orificios, paredes en doble friso en buen estado.
Cocina: Paredes en doble friso en buen estado, mesón rustico faltante un pedazo en la parte frontal y techo en eternit, sobre estructura metalica en buen estado, la parte de afuera se observa dos paredes construidas, muro en concreto abiertas con madera

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL: X; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (cual)

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

Firma: Yolanda U G.
Nombre: Yolanda Uribe Gaitan
CC 1048637531
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Oscar Castellanos
CC 1098771552
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando Uribe
CC 91 291 804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GSS-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT interventoría BCA

FECHA: 12/04/26 | ELABORÓ: Luz Mery Torres Castro- Profesional Socio ambiental | REVISÓ: | Nombre y cargo

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Robinson Pinto Castro
DIRECCIÓN: Calle 45 #52-60 B/ Campin
TELEFONO: 3182224110
FRENTE (en metros): 4.80m
ESTRATO: 1
No. PISOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Rampa de acceso con piso rústico, presenta dilataciones de la entrada de la rampa, pared lateral muro de contención en doble ladrillo pintada, presenta fisuras en varios puntos y fachada, presenta pintada. Techado: estructura en madera y teja de zinc en buen estado. Parte interior de la fachada, ventanas y puerta con vidrios vencidos y rasgadas, paredes estucadas en buen estado, cielo raso en icopor, costado derecho una lamina vencida. Sala comedor: Piso en cerámica, presenta 5 tabletas cerámica piso con icopor, costado derecho una lamina vencida. Cocina: Piso en cerámica, presenta tabletas despegadas y vencidas, paredes en cerámica piso con cerámica. Presenta tabletas despegadas y vencidas, paredes en cerámica piso con cerámica. Presenta fisura en parte interior del mesón en buen estado, muro de la parte posterior presenta humedad en la base del mesón de la cocina presenta daño en la parte superior y faltante de tabletas, cielo raso en icopor en buen estado.
Habitación 1: Piso con cerámica en tabletas despegadas, paredes estucadas, pared lateral izquierda presenta humedad y levantamiento del estuco parte interior, cielo raso en icopor en buen estado, paredes estucadas, pared lateral izquierda presenta fisura desde el muro de la Habitación 2: Piso con cerámica en buen estado, paredes estucadas, pared lateral derecha presenta fisura desde el muro de la puerta hasta el cielo raso y pared externa, cielo raso en icopor en buen estado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	Si	
ALCANTARILLADO	no	
ENERGÍA	Si	Recargable.
TELÉFONO	no	
GAS	Si	
OTRO (cual)		

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONSTRUIDO	
OTRO (Cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)	

Firma: Robinson Pinto Castro
Nombre: Robinson Pinto Castellanos
CC: 1095797782
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Oscar Castellanos
CC: 1098 [illegible]
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando [illegible]
CC 91.291.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: HSE-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA 27/04/26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio ambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Wilson Sarmiento Plata
DIRECCIÓN: Calle 45a #52-114 Piedecuesta
TELEFONO: 3122533318
FRENTE (en metros): 6m
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1

SERVICIOS PUBLICOS

ACUEDUCTO	S/N
ALCANTARILLADO	SI
ENERGÍA	SI
TELEFONO	NO
GAS	SI
OTRO (cual)	Internet

OBSERVACIONES: Yreay gabie

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Rampa de acceso en piso rústico en buen estado, anden piso semi pulido presenta fisuras y resanes alrededor, fachada Frente intervenida con cerámica, estado regular presenta un tableta rasgada, marco de la puerta en buen estado, el resto de fachada con graniplas y pintadas y ventanas con vidrios en buen estado en la reja, el resto de fachada con cerámica presenta tabletas despicadas y rayadas, con dos postes sala-comedor: presenta piso con cerámica presenta tabletas despicadas y rayadas, con dos postes de transito, paredes estucadas y pintadas, pared lateral izquierda presenta fisuras desde el marco de la puerta hasta el ciclorraso en regular estado, parte superior presenta fisuras desde el marco de la puerta hasta el ciclorraso en regular estado habitación 1: piso en cerámica en buen estado, paredes estucadas y pintadas, pared lateral con ventana, en regular estado, parte superior del muro presenta humedad en regular estado, el resto en buen estado. habitación 2: piso en cerámica presenta tabletas rotas en regular estado, paredes estucadas y pintadas, pared lateral izquierda presenta humedad en regular estado, el resto en buen estado. Pared frontal y pared derecha con fisuras desde el marco de la puerta hasta el ciclorraso en regular estado, pared lateral izquierda presenta humedad en regular estado, el resto en buen estado. Baño: piso en cerámica presenta tabletas rotas en regular estado, paredes estucadas y pintadas, pared lateral izquierda presenta humedad en regular estado, el resto en buen estado. Pared frontal y pared derecha con fisuras desde el marco de la puerta hasta el ciclorraso en regular estado, pared lateral izquierda presenta humedad en regular estado, el resto en buen estado. Cocina: piso en cerámica presenta tabletas rotas en regular estado, paredes estucadas y pintadas, pared lateral izquierda presenta humedad en regular estado, el resto en buen estado. Pared frontal y pared derecha con fisuras desde el marco de la puerta hasta el ciclorraso en regular estado, pared lateral izquierda presenta humedad en regular estado, el resto en buen estado. Patio: piso en cerámica presenta tabletas rotas en regular estado, paredes estucadas y pintadas, pared lateral izquierda presenta humedad en regular estado, el resto en buen estado. Pared frontal y pared derecha con fisuras desde el marco de la puerta hasta el ciclorraso en regular estado, pared lateral izquierda presenta humedad en regular estado, el resto en buen estado.

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL: X; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (cual)

	Firma	Nombre	cc
PROPIETARIO Y/O TESTIGO		Yeimi Alejandra Plata Gamboa	1095135522
CONTRATISTA		Oscar Castellanos C.	1098741552
INTERVENTORIA		Fernando Rodriguez	cc 91.191.804

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GCA-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1591-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT interpavimento BCA
FECHA: 22 | 04 | 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ: Oscar castellanos hoy residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Luz Adrea Sierro
DIRECCION: Calle 45A #58-32 B. Campin.
TELÉFONO: 322-7208496
FRENTE (en metros): 4 metros
No PISOS: 1
ESTRATO: 1
REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	no
ALCANTARILLADO	no
ENERGÍA	si
TELEFONO	no
GAS	si
OTRO (cual)	

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden=Piso rústico, presenta 30 cabas, muro de contención lateral hacia el sifón. Fachada= estucada y pintada, presenta buen estado. Puerta= metálica con marco de madera, presenta una lamina recortada. Piso= piso rústico en cemento. Ventanas= cuenta con 2 ventanas, una de ellas presenta una lamina recortada.

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONSTRUIDO	
OTRO (cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cual)	

OBSERVACIONES

Fachada= estucada y pintada, presenta buen estado. Puerta= metálica con marco de madera, presenta una lamina recortada. Piso= piso rústico en cemento. Ventanas= cuenta con 2 ventanas, una de ellas presenta una lamina recortada. Cubierta= teja de barro, presenta buen estado. Paredes= pintadas, presenta buen estado. Puerta principal= metálica con marco de madera, presenta buen estado. Puerta lateral= metálica con marco de madera, presenta buen estado. Habitaciones= piso rústico, presenta buen estado, cuenta con 2 habitaciones en buen estado. Baños= piso rústico, presenta buen estado, cuenta con 1 baño en buen estado. Cocina= piso rústico, presenta buen estado, cuenta con 1 cocina en buen estado. Patio= piso rústico, presenta buen estado, cuenta con 1 patio en buen estado. Garaje= piso rústico, presenta buen estado, cuenta con 1 garaje en buen estado. Escaleras= piso rústico, presenta buen estado, cuenta con 1 escalera en buen estado. Pasillos= piso rústico, presenta buen estado, cuenta con 1 pasillo en buen estado. Techos= teja de barro, presenta buen estado. Paredes= pintadas, presenta buen estado. Puertas= metálicas con marco de madera, presenta buen estado

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GES-F-018
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO- 1593-13
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA: 22 04 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio ambiental
REVISÓ:
Observaciones/Recomendaciones

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Ana Esther Hornier Ibañez.
DIRECCIÓN: Calle 45 #58-25 comun
TELÉFONO: 3223565050
FRENTE (en metros): 7 metros. No. PISOS: 1 ESTRATO: 1
REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO:

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	Recargado.
TELÉFONO	NO	
GAS	SI	
OTRO (cual)		

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachada, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (Cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (Cual)

Ante = Piso rústico, costado izquierdo presenta separación con el muro de caramento, costado derecho presenta desprende y fisura en la rampa, muro de la fachada del sopolite de rejas (Partes esquineras) Fachada= Parte inferior con cerámica, con dos (2) ventanas con rejas, costado izquierdo presenta fisura desde el techo hasta el marco de la ventana hacia el marco de la puerta, costado derecho presenta fisura desde el techo hasta el marco de la ventana con ubicación cerca a la puerta, ventana con vidrios en buen estado y costado izquierdo presenta fisura desde el techo hasta el marco de la puerta en buen estado y costado derecho presenta fisura desde el techo hasta el marco de la puerta en buen estado y costado izquierdo

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GC-F-08
VERSION: 1
FECHA: 02-08-2021
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento RCA

FECHA: 25 04 26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISO: Oscar Leonardo Ruiz Gutierrez


DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Yaneth Rodriguez
DIRECCIÓN: Calle 45 #58-45 Ocampo
TELÉFONO: 3183701439
FRENTE (en metros): 8 metros
No PISOS: 1
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN IMAGINERO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, techo, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Rampa de acceso: Piso rústico presenta daño en la terminación, Muro de cerramiento: en obra negra, presenta un ladrillo caido parte superior, Alar: techo en eternit con estructura de madera en buen estado, Pared: fachada = estucada y pintada en buen estado, Ventana: Metalica con vidrio, Puertas: Metalica en buen estado, Piso del corredor semipulido presenta una lamina rayada ventana de la misma forma en la mitad y desgaste del terminado, Piso del desmaltado presenta rasgue la entrada hasta el fondo de la vivienda sala-comedor: Piso desmaltado presenta rasgue desde la entrada hasta el fondo de la vivienda, Paredes estucadas pared lateral derecha presenta cuarteamiento y humedad debajo de la ventana, Paredes de bloque de la nevera del resto en buen estado, cuarto de baño en buen estado desmaltado en buen estado Paredes estucadas y pintadas, pared lateral derecha presenta humedad y cuarteamiento en la parte inferior, Habitacion 1: Piso desmaltado en buen estado Paredes estucadas y pintadas, pared lateral derecha presenta humedad y cuarteamiento en la parte inferior, 2 habitacion: Piso desmaltado en buen estado Paredes estucadas y pintadas, pared lateral derecha presenta humedad y cuarteamiento en la parte inferior, Observaciones: Se evidencia rasgue de una vez tapada en PVC buen estado, Patio: Piso rustico presenta rasgue en la mitad de la vivienda hacia el fondo, Pared lateral izquierda presenta cuarteamiento y humedad en la parte inferior, Pared fondo presenta cuarteamiento y humedad en la parte inferior, Pared lateral derecha presenta cuarteamiento y humedad en la parte inferior, Cubierta: Teja de barro en buen estado

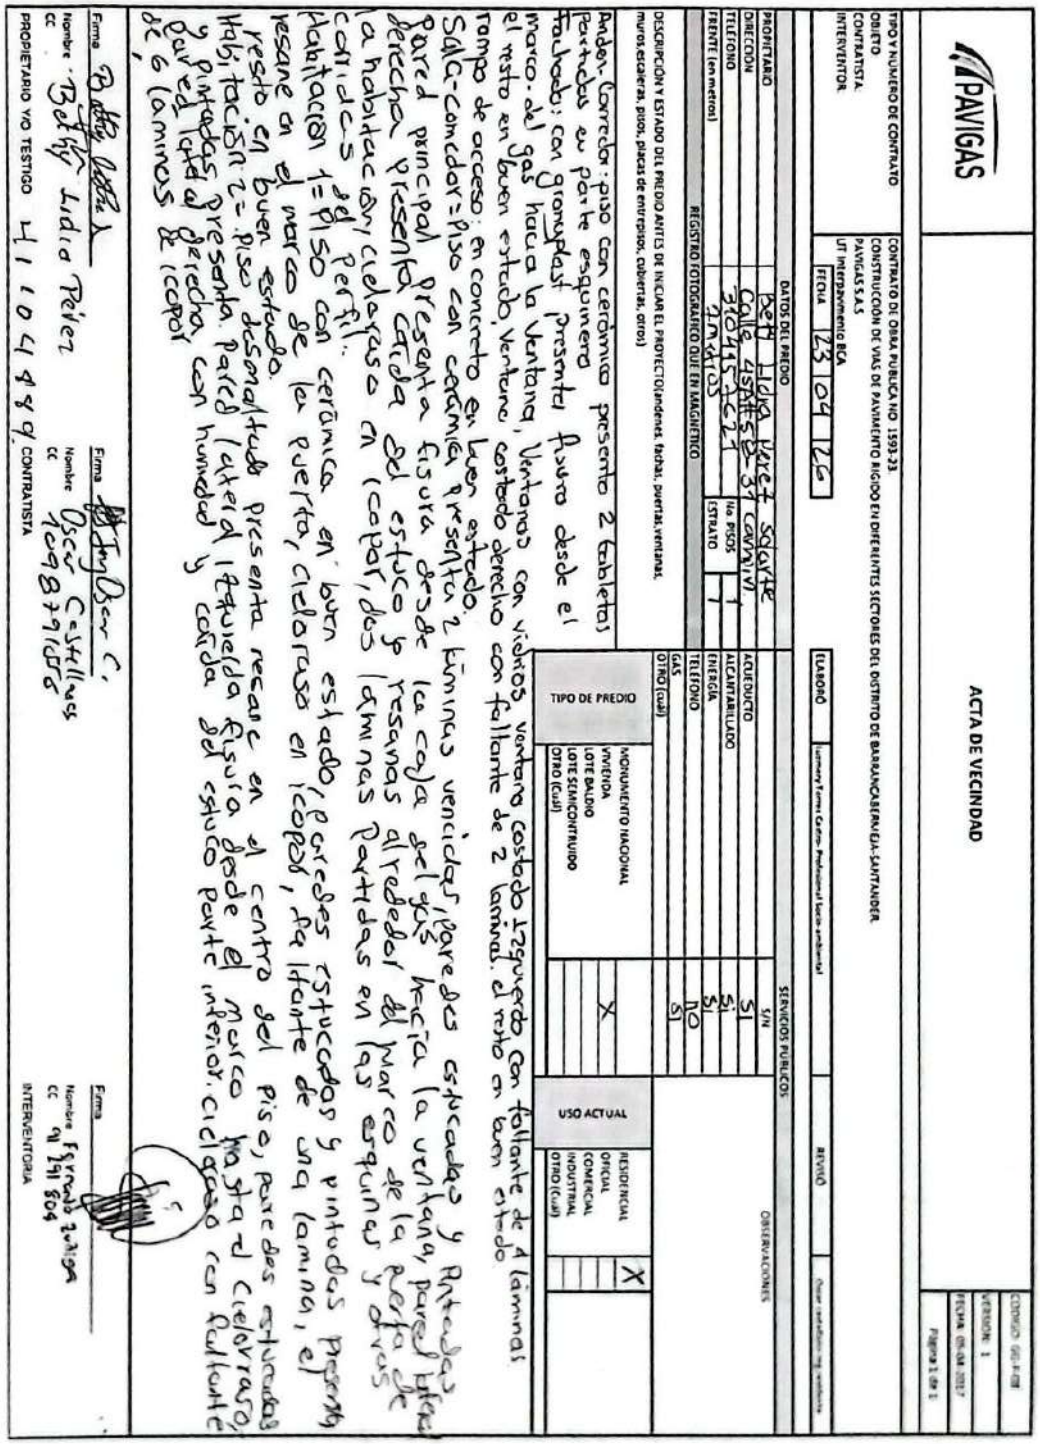

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1591-23
CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
PAVIGAS S.A.S
UT INTERVENTORIA BCA

FECHA 23 04 26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro. Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO
PROPIETARIO: Beth Lidia Pérez Salgado
DIRECCIÓN: Calle 45#15-37 Campiv
TELEFONO: 3104152627
FRENTE (en metros): 7 No PISOS: 1 ESTRATO: 1
REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	SI
ALCANTARILLADO	SI
ENERGIA	SI
TELEFONO	NO
GAS	SI
OTRO (cual)	

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(pendientes, fachadas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden Correcto: piso con cerámica presento 2 tabletas Perfectas en parte esquinera Fachada; con granoplast presenta fisura desde el marco del gas hacia la Ventana, el resto en buen estado Ventana con vidrios en buen estado Ventana costado derecho con fallante de 2 laminas. el resto en buen estado Rampa de acceso: en concreto en buen estado. Sala-Comedor: Piso con cerámica presenta 2 baldosas con fallante de 4 laminas Pared principal presenta fisura desde la caja del gas hacia la ventana, pared lateral derecha presenta grieta del estuco y resanas alrededor del marco de la puerta de la habitación, cielorraso en icopor, dos laminas partidas en las esquinas y otras con daños del Perfil.. Habitación 1= Piso con cerámica en buen estado, presenta estucados y pintados pero presenta en el marco de la puerta, cielorraso en icopor, fallante de una lamina, el resto en buen estado desnivel tubo presenta en el centro del piso, pared estucada Habitación 2= piso desnivelado presenta fisura desde el marco hasta el cielorraso, y pintadas presenta. pared lateral izquierda fisura desde el marco hasta el cielorraso pared lateral derecha con humedad y caída de 6 laminas de icopor

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONTRUIDO	
OTRO (cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cual)	

Firma: [signature]
Nombre: Beth Lidia Pérez
CC 1104484894
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma: [signature]
Nombre: Oscar Castellanos
CC 1098791056
CONTRATISTA

Firma: [signature]
Nombre: Fernando Zuñiga
CC 91 791 804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GSA-F-08
VERSION: 1
FECHA: 03-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA 17-3-2024 | ELABORÓ Luzmery Torres Castro Profesional Socioambiental | REVISÓ Oscar candamil Ing residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Luis Ernesto Gonzalez
DIRECCIÓN: Calle 45 #58-33 el campin
TELEFONO: 312 356 3303
FRENTE (en metros): 12 metros | No. PISOS: 1 | ESTRATO: 1

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELEFONO	no	
GAS	no	
OTRO (cual)		

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(pendientes, fachas, puertas,ventanas; muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = piso en trocha, la fachada en obra negra, presenta fisura en la pega del marco de la ventana, no tiene viga de amarre.
La parte interna = piso rustico en buen estado el resto no se pudo observar la habitacion es obra negra sin viga de amarre y paredes externas de la habitacion en ladrillo, no se pudo ingresar a la parte de atras sin terminacion, techo en eternit se observa regular en el marco de la puerta, no se pudo ingresar a la habitacion, resto esta con piso en trocha sin terminacion, techo en eternit estructuras metalicas en buen estado.
Labor en habitacion y la entrada, con estructuras metalicas en buen estado.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONSTRUIDO	X	INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

Firma
Nombre: Luis Ernesto Gonzalez
cc.. 10 323 604
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Oscar Castellanos
cc 1098 791 526
CONTRATISTA

Firma
Nombre Fernando Ruiz
cc 91.241.904
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1591-22
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento RCA
FECHA: 17 | 04 | 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ: Oscar castellanos residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Guido Rafael Florez.
DIRECCIÓN: Cra 54 #45-03 Campin
TELÉFONO: 3176881496
FRENTE (en metros): 7m
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNÉTICO

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
OTRO (cuál)	Internet	

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachadas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Segundo piso = Sala comedor y baño = piso en cerámica en buen estado, Pared lateral izquierda y piso en cerámica, se evidencia un buen estado, Pared lateral derecha en buen estado y el resto en buen estado, Pared lateral izquierda y derecha con pvc en buen estado. Cocina = Paredes en pvc en buen estado y piso en cerámica en buen estado, Pared lateral derecha de las puertas estucada, habitación 3 se encuentra en buen estado, habitaciones 1, 2 y 3 = piso con cerámica en buen estado, pared las mismas estucadas, habitación 3 se encuentra en buen estado con pvc en buen estado, paredes estucadas, la pared lateral derecha se evidencia en buen estado, pared lateral izquierda estucada, la puerta hacia el otro marco de la puerta hacia el baño = piso con cerámica en buen estado, estructuras de acceso en cerámica desde el marco en buen estado, que a derecha se encuentra en buen estado, que a derecha se encuentra en buen estado, la puerta hacia el otro marco de la puerta hacia el baño = piso con cerámica en buen estado, estructuras de acceso en cerámica desde el marco

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GGC-F-038
VERSION: 1
FECHA: 05-Oct-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA 12/04/26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro. Profesional Socio ambiental
REVISÓ: Cargo: apellidos y nombres completos

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Nagly Segundo Hayderdo
DIRECCION: Cra 54 #44A-155-01 Divino Niño
TELÉFONO: 3102730773
FRENTE (en metros): 4,50 mts
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andan = en cemento pulido con golpes y grietas
Rejas = chapa en mal estado, partes finales de la reja con oxido e incompletas, por el momento no esta en uso.
Puerta = presenta oxidación en la parte final, llegando al piso, vidrios de la puerta en buen estado
Sala = Piso en cemento y pulido con grietas al ingresar a la vivienda y del lado izquierdo también, viga canal con humedad, cielorraso en PVC en buen estado, muros revocados, muro del lado izquierdo presenta grietas y el muro esta Pintado.
Cocina = Piso en cemento pulido en desgaste, muro sin revoques, parte superior de meson y barra enchapadas, tubería del gas a la vista, cielorraso hasta mitad de pasillo.
Habitación 1 = Piso en cemento pulido con varios golpes, paredes con humedad, grieta arriba del marco de la ventana, golpes en el dintel del marco.
Baño = humedad en la placa del baño, piso y paredes enchapados en buen estado
Habitación 2 = Piso cemento pulido, no tiene cielorraso, paredes Pintadas
Habitación 3 = Piso enchapado, grietas en pared lateral, sin cielorraso, vidrios en buen estado, pasillos con ladrillos a la vista, piso cemento pulido, la propietaria manifiesta que se encuentra un apartamento en construcción, el cual tiene

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELEFONO	no	
GAS	Si	
OTRO (Cual)		

Firma: Nagly Olarte
Nombre: Nagly
CC 1.098.291.556
PROPIETARIO Y/O TESTIGO 1.098.291.556

Firma: Jhon Osmer
Nombre: Jhon Osmer Castellanos
CC 1.098.291.556
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Felipe Bayona
CC 1.098.254.[illegible]
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT interventoría BCA

FECHA: 12/04/26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Cargo contratista: Ing residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Nagly Campos Izquierdo
DIRECCIÓN: Cra 52#47A-01-Apto 101
TELEFONO: 3102130425
FRENTE (en metros): 10 mts
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N
ACUEDUCTO	no
ALCANTARILLADO	no
ENERGÍA	SI
TELÉFONO	NO
GAS	NO
OTRO (cual)	SI

OBSERVACIONES: Recargable con Patricia con la Primera quincena

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden=Piso rústico incompleto en mal estado.
Jardines=en ladrillos con faltante, en mal estado/ el otro Jardinel presenta fisuras en todas/ las esquinas, en regular estado/los dos con moho.
Fachada=en obra negra, presenta fisura gruesa a lado izquierdo en la pega de los muros/ventanas con dilatación en la pega del marco con la ventana, alar en eternit en buen estado ventanas con vidrio en buen estado, puerta oxidada y con perforación en la parte inferior
Sala-comedor-cocina=Piso semipulido presenta desgaste y hundimiento en el centro de la vivienda, paredes en obras negras/se evidencia resane sobre las tuberías de los servicios públicos y con dilataciones en las mismas/techo en eternit sobre estructura metálica en buen estado.
Habitación=Piso semi esmaltado presenta desgaste por tránsito pluviales estructuras principal presenta humedad y levantamiento del estuco, techo en eternit con estructura metálica en buen estado.
Baño=Piso semi esmaltado en buen estado, pared estuco y laberal estucada con caída del estuco en la parte inferior cerca a la ducha

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONSTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

Firma		Firma	
Nombre	Nagly Campos	Nombre	Oscar Castellanos
CC	1098791576	CC	1098791576
PROPIETARIO Y/O TESTIGO	37876037	CONTRATISTA	

Firma
Nombre: Yesid Rincón Fonseca
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:
UT Interventoría ECA
FECHA: 12/4/04/26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro. Profesional Socio ambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Yaris Vanessa Celis Ayala
DIRECCIÓN: Cra 39 Diana Nino
TELEFONO: 3118547775
FRENTE (en metros): 7
No PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden peatonal = Asoc con ceramica con 3 bolardos vencidos cerca al bordillo, Rampa peatonal de acceso al conjunto evidencia inclinacion en la terminacion de la rampa.
ceramica: con rajas y columnas parte interna del estuco
interna bolardo parte frontal con ceramica en buen estado, parte interna de la marquesina: parte interior estucada en buen estado, parte interior estucada, presenta humedad y cuarteamiento, viga lateral de la marquesina con ceramica en buen estado y cuarteamiento, presenta humedad y cuarteamiento en la parte interna de la fachada, viga lateral de la marquesina por parte interna se observa rajas en la junta de la fachada con la pared, puertas y ventanas en ceramica desde la fachada: Parte interior al rededor de las puertas y ventanas en ceramica desde la fachada el resto estucado, costado derecho presenta filtraciones y humedad y hacia el cederaso, costado derecho en buen estado, costado izquierdo en buen estado esquinero, ventanas con vidrios en buen estado, puertas en buen estado, Paredes estucadas, Pared Principal sala-comedor: piso con ceramica. en buen estado, Pared lateral derecha del estuco en buen estado, Pared lateral izquierda del estuco en buen estado, se observa humedad en la parte inferior de la pared, se observa cuarteamiento en la parte inferior de la pared, se observa escalon de la puerta de la habitacion principal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELEFONO	NO	
GAS	SI	
OTRO (cual)		


TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL, VIVIENDA (X), LOTE BALDIO, LOTE SEMICONTRUIDO, OTRO (cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL (X), OFICINAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, OTRO (cual)

Firma: Andres Zuñiga
Nombre: Andres Zuñiga
CC: 5 913 0 Zuñiga
PROPIETARIO Y/O TESTIGO 1096246892

Firma:
Nombre: Oscar Castellanos
CC: 1098795576
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando Bohorquez
CC: 91 291 869
INTERVENTORIA

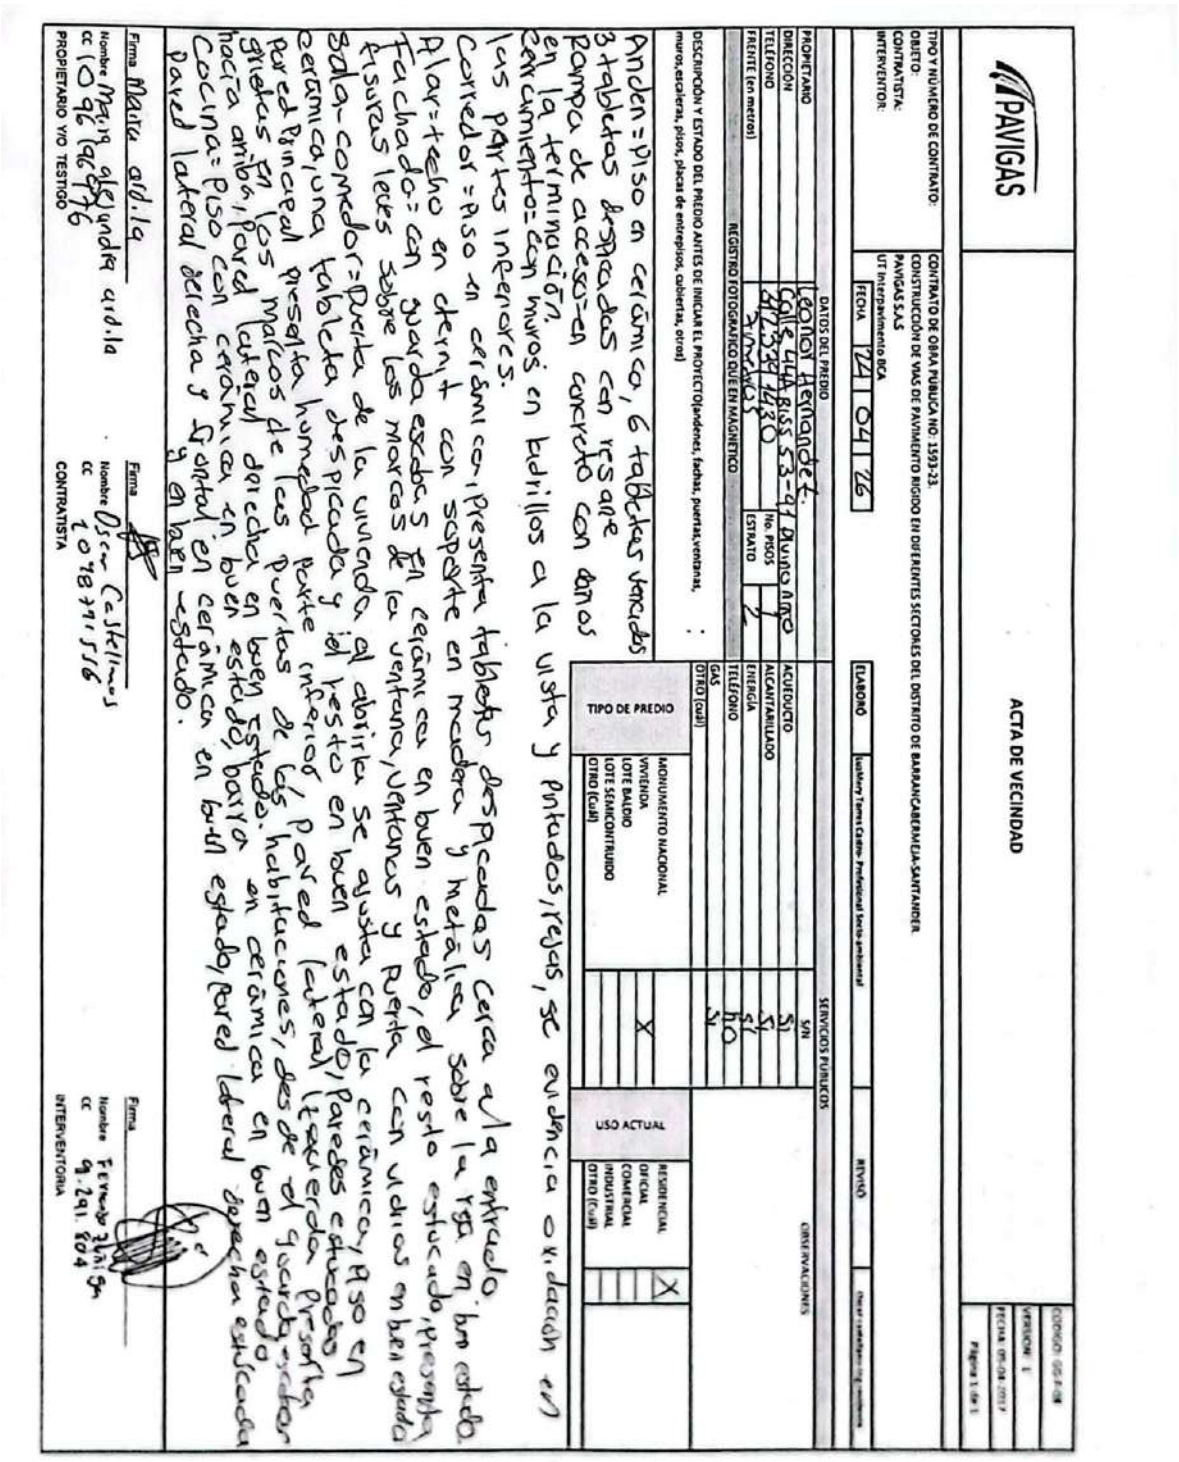

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: HSE-FOR-[illegible]
VERSION: 1
FECHA: 09-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento RCA
FECHA: 22 | 04 | 26
ELABORÓ: Luz Mery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Leonor Hernandez
DIRECCIÓN: Calle 44A Bis 53-41 Avenida 60
TELÉFONO: 3173914430
FRENTE (en metros): 3 metros
No. PISOS: 2
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNÉTICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden es, fachadas, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso en ceramico, 6 tableras vacias 3 tableras ocupadas con resane Rampa de acceso en concreto con daños en la terminación. Cerramiento= con muros en ladrillos a la vista y pintados, rejas, se evidencia oxidacion en las partes inferiores.
Corredor = Piso en ceramico, presenta tableros despicadas cerca a la entrada. Plafon= techo en drywall con soporte en madera y metalica sobre la cual esta pegado el cielo falso en icopor. Fachada= con guarda escobas en ceramica en buen estado, el resto estucado, presenta fisuras leves sobre los marcos de la ventana, ventanas y Puerta con vidrios en buen estado.
Sala-comedor= Puerta de la vivienda al abrirla se ajusta con la ceramica, Piso en ceramica, una tableta despicada y el resto en buen estado, Paredes estucadas pintadas humedad presente interiores (lateral derecha) Pared Principal presenta humedad Puente inferiores de los Pared (lateral izquierda Pared Posterior) Puertas de los habitaciones, desde del ingreso estado ventanas en buen estado, Techo en icopor en buen estado, Pared lateral derecha y frontal en ceramica en buen estado, Pared lateral derecha en buen estado.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICINAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	Si
ALCANTARILLADO	Si
ENERGÍA	Si
TELÉFONO	No
GAS	No
OTRO (Cual)	

OBSERVACIONES

Firma: Maritza alvarado
Nombre: Maritza alexandra alvarado
CC 1096196976
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Oscar Castellanos
CC 1098791516
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando Jhoi Gr
CC 91.291.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GUIA-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-JUL-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento PCA
FECHA 12/1 07/12/23

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro. Profesional Socio-ambiental
REVISÓ: Jhon Guerra

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO
DIRECCIÓN
TELEFONO
FRENTE (en metros) | No. PISOS | ESTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Lote desocupado, se observa muro hacia la vía de intervención negra, sin viga de amarre, se observa que esta debilitado y en parte de ingreso hacia el lote se observa faltante de ladrillos (5 hileras) el resto se encuentra en buen estado, se deja registro fotografico en el que se encuentra el muro del lote

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	
ALCANTARILLADO	
ENERGÍA	
TELÉFONO	
GAS	
OTRO (cual)	

OBSERVACIONES: MW Guerra

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	
VIVIENDA		OFICIAL	
LOTE BALDIO	X	COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

Firma
Nombre Jhon Castellanos
CC 1098x91556
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Jhon Castellanos
CC 1098x91556
CONTRATISTA

Firma
Nombre Fernando Ruiz
CC 91.291.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: HSE-F-08
VERSION: 1
FECHA: 09-08-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interparvimento BCA

FECHA: 30 04 2026

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental
REVISÓ: Cargo y profesión del revisor

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: YOSELINA ACUÑA
DIRECCIÓN: CALLE 43B #66-33 M. Escuela.
TELÉFONO: 3209441884
FRENTE (en metros): 6 metros
No. PISOS: 2
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubertas, otros)

Segundo Piso.
Fachada= frente a la intervención del proyecto en dos pisos, se observa fisuras leves y humedad parte inferior en la junta de los muros con el techo, ventana pequeña sin marco, dos ventanas con vidrio en buen estado.
Escaleras de acceso = Piso rústico en buen estado/pared lateral derecha presenta humedad desde el techo hasta el piso del corredor
Corredor = Piso rústico con diferencias en los pegas.
Alcoba= Techo en drywall con soporte de metal en buen estado
Fachada= puertas estructuradas y pintadas, todo derecho presenta humedad parte inferior del marco de la ventana. con separación de la pega del mismo, ventana con vidrios en buen estado con algunas tabletas despegadas /pared lateral derecha presenta humedad con carácter de presencia humedad/ Pared frontal presenta fisuras con separación de la pega del marco

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO GG-F-08
VERSION: 1
FECHA 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA: 20 04 26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio ambiental | REVISÓ | Observaciones ing residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Lanmali Vargas Acevedo
DIRECCIÓN: Calle 58A Golfo Tib 2 M. Bogotá
TELÉFONO: 3185345363
FRENTE (en metros): 6 metros
No. PISOS: 2
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anotenes, fechas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = piso en ceramica en buen estado
Muro = techo en drywall en regular estado
Fachada = parte interior del resto estucada y pintada, presenta buen estado de la pintura
Marco de la ventana derecha, Ventanas con vidrio en buen estado, las dos ventanas con rejas
Sala = piso con ceramica, presenta tableras despicadas, Paredes estucadas en buen estado, cielorraso en PVC. en buen estado; ceramica en buen estado, Paredes estucadas en buen estado, ventilador hacia la sala sin ventilador
Habitacion 1 = piso en ceramica en buen estado, presenta tableras despicadas, paredes estucadas en buen estado
Habitacion 2 = piso con tableras, presenta tableras despicadas, paredes estucadas en buen estado
Baño, Interno = piso con tableras, presenta tableras despicadas, paredes estucadas en buen estado
Techo en eternit con base metalica.
Cocina = barra piso con ceramica, con presencia de tableras despicadas, paredes estucadas en buen estado
Ceramica, el resto estucada y pintada

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGIA	S	
TELÉFONO	S	
GAS		
OTRO (cual)	Internet	

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONTRUIDO	
OTRO (cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	X
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cual)	

Firma: [signature]
Nombre: Lanmali Vargas Acevedo
CC 1.136.980.803
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma: [signature]
Nombre: Hector Mauricio Castellanos
CC 1.098.791.556
CONTRATISTA

Firma: [signature]
Nombre: Fernando Ramos
CC 91.291.904
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO GCI-F-08
VERSION 1
FECHA 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BEA

FECHA: 30 04 26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro. Profesional Socioambiental
REVISÓ:
Cargo y profesión/oficio del residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Arturo Vargas.
DIRECCIÓN: Cll 4 #60-33 Maria Eugenia
TELEFONO: 317 656 1407
No. PISOS: 1
ESTRATO: 2
FRENTE (en metros): 5mts

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGÍA	S
TELEFONO	S
GAS	N
OTRO (cual)	Internet

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden es, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)


Antejardin= Piso rustico con desgastes. Anden= piso con cerámica en mal estado. Muro= 40cm de altura. con 4 tabletas en la parte superior de estilo presenta tabletas partidas en las Losa= bodega cuenta con un espacio en piso rustico con algunas tabletas partidas en la Cubierta= el resto con piso en cerámica se observa tabletas partidas en la entrada, en varios puntos los pisos están desprendidos y se observa pared con humedad. Ventanas= se encuentran con Marcos, rejas y vidrios en buen estado. Puertas= se encuentra en buen estado. Paredes= estucadas y pintadas en buen estado. Techos= se encuentra en buen estado con cielo raso en láminas de madera, en la bodega cielo raso con láminas de madera con algunas tablas partidas y desprendidas. Observaciones= se observan tabletas desprendidas, paredes con humedad, pintura desprendida. Por ahora es todo lo que se observa.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	X
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

Firma
Nombre: LUZMERY TORRES CASTELLANOS
CC: 1.098.730.634
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre: OSCAR CASTELLANOS
CC: 7.098.791.556
CONTRATISTA

Firma
Nombre: FERNANDO GUERRA
CC: 91.291.804
INTERVENTORIA

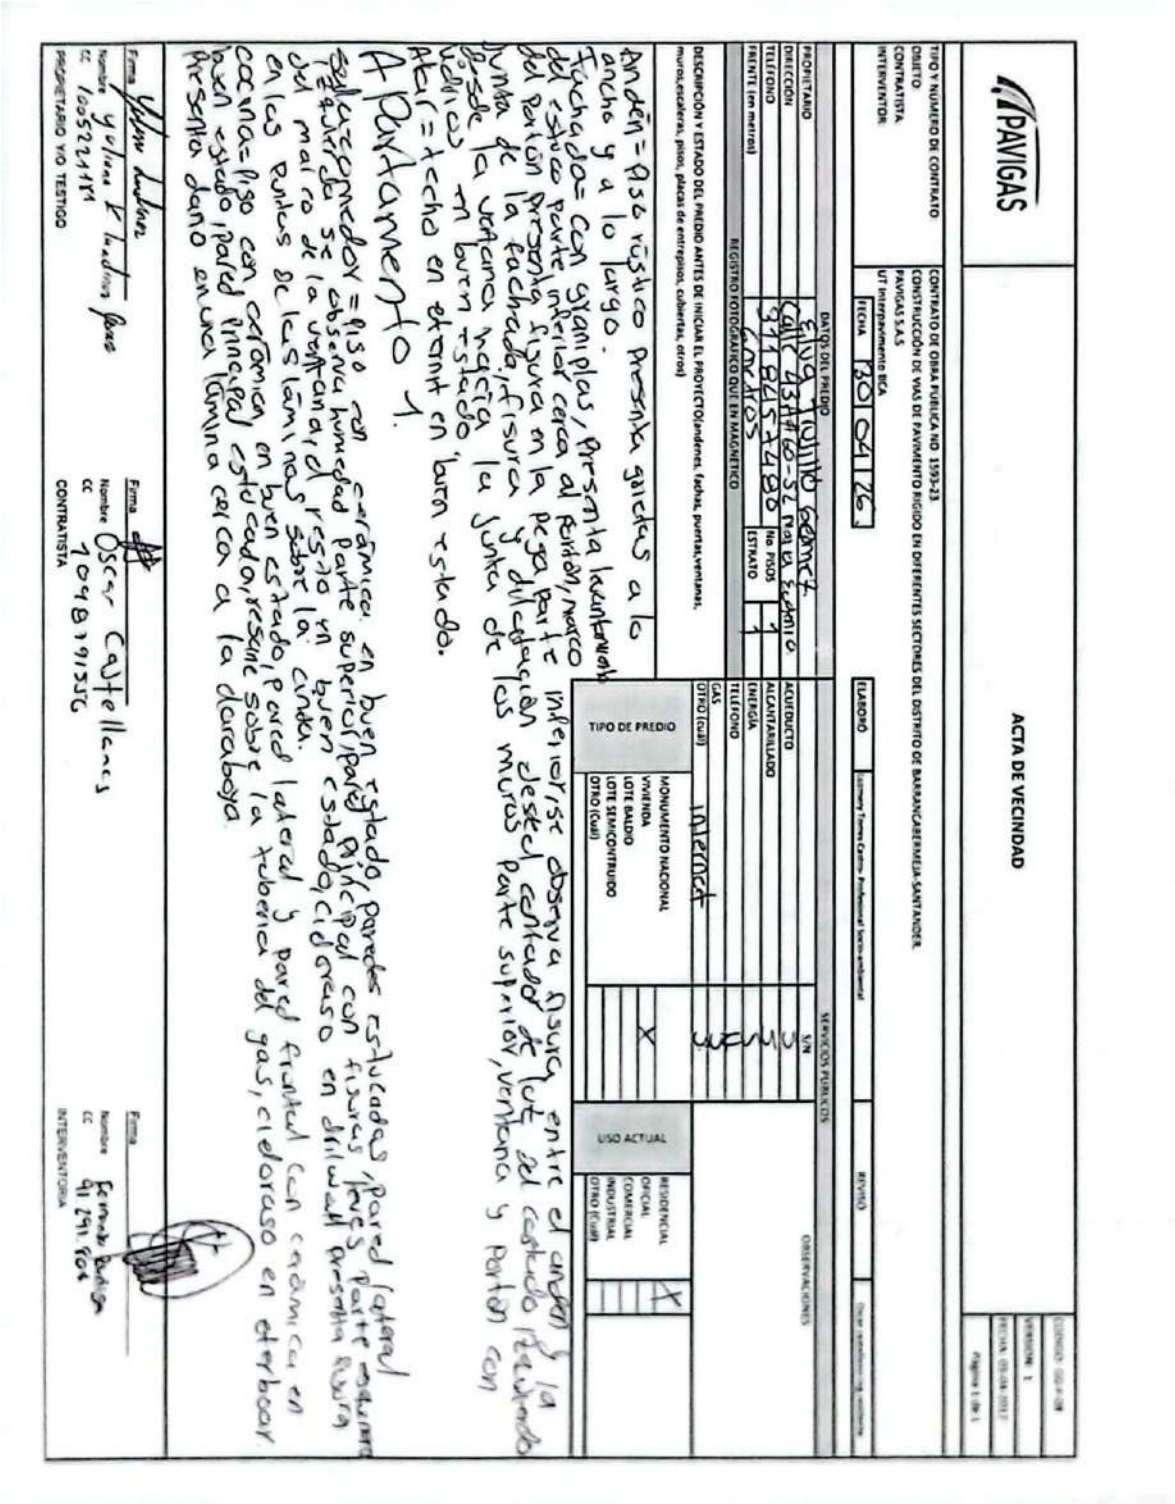

ACTA DE VECINDAD

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:
UT Interventoría IDCA
FECHA: 30/04/26
ELABORÓ:
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Edgar Trujillo Gomez
DIRECCIÓN: Calle 43#60-32 Mata Sumito
TELEFONO: 3118645288
No PISOS: 1
ESTRATO: 1
FRENTE (en metros): 6.00 metros

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELEFONO	N	
GAS	N	
OTRO (cual)	Internet	

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachada, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso rustico presenta grietas a lo ancho y a lo largo.
Fachada= Con graniplas, presenta laceraciones del estuco pinte interior cerca al techo, marco del porton presenta fisura en la pega, parte inferior presenta fisura en la pega, filtraciones entre el dintel y la fachada, fisura en la pega de la jardinera y junta de dilatacion entre el castillo y la pared, presenta fisuras en la pega de la jardinera y junta de dilatacion los muros parte superior y porton con desprendimiento de pintura.
Ventanas = Hacho en aluminio en buen estado.
Techos = En eternit en buen estado.
Puertas = En madera.
Piso = En ceramica en buen estado, presenta fisuras y desprendimiento de ceramica en la parte superior del porton.
Paredes = Se observa humedad en la parte superior de la ventana, del marco de la misma, presenta fisuras y desprendimiento de ceramica en la parte inferior del porton en buen estado, presenta fisuras en la parte superior del porton en buen estado, presenta fisuras en la parte superior del porton en buen estado, presenta fisuras en la parte super

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO GG-F-08 | VERSION: 1 | FECHA 05-04-2017 | Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S.
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA 30 04 25 | ELABORÓ Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental | REVISÓ | Diego castellanos-Ingeniero

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Carlos Enrique Sanchez.
DIRECCION: Calle 43 #12-11 B. Eduardo Galvis.
TELEFONO: 3013662844
FRENTE (en metros): [ ] No. PISOS: [ ] ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén lateral vía intervención= Aso en regular estado, pared fachada en mal estado, presenta agrietamiento y manchas de moho, ventana de madera con hierro y en buen estado, puerta principal en madera con 4 laminas y 2 laminas de vidrio, presenta daños en la parte superior, techo en zinc con soporte de madera, sobre el techo se encuentra antena de internet. Piso en tierra y concreto. Fachada en obra gris y pintada. Presenta fisura desde el techo hasta la mitad de la fachada en forma diagonal. Puerta principal en madera en buen estado. Ventana con barrotes y rejas en buen estado. Presenta tuberías expuestas en la parte superior de la fachada. Piso en concreto. Presenta daños en el piso y grietas en la parte inferior de la pared. Cocina= piso con baldosas y pared en buen estado. Presenta tuberías expuestas en la parte superior de la pared. Presenta filtración en la cocina desde el techo, la entrada, pared y piso con humedad.

SERVICIOS PUBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGIA	S	Prepago.
TELEFONO	S	
GAS	N	
OTRO (cual)	Internet	

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

Firma [signature] | Nombre Carlos Enrique Sanchez | cc 97.070.716 | PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma [signature] | Nombre Oscar Castellanos | cc 1098.715.56 | CONTRATISTA

Firma [signature] | Nombre Fernando Ramirez | cc 91.291.404 | INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA: 04 05 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio ambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Jackson Valencia
DIRECCIÓN: Cra 33B #60-65 Brisas H. Esmeralda
TELEFONO: 311 562 2332
FRENTE (en metros): 11 metros
No. PISOS: 2
ESTRATO: 1

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS		
OTRO (Cuál)		

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso en cemento rústico, con muchas fisuras y algunos partido y con desgaste en regular estado.
Corredor = Piso en baldosas, en regular estado.
Sala = Piso en baldosas, en regular estado.
Comedor = Piso en baldosas, en regular estado.
Cocina = Piso en baldosas, en regular estado.
Habitación 1 = Piso en tabletas, en regular estado.
Habitación 2 = Piso en tabletas, en regular estado.
Habitación 3 = Piso en tabletas, en regular estado.
Baño = Piso en baldosas, en regular estado.
Lavadero = Piso en baldosas, en regular estado.
Fachada = Estucada y pintada en buen estado.
Techo = Teja de zinc en regular estado.
Paredes = Estucadas y pintadas en buen estado.

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONSTRUIDO; OTRO (Cuál)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL: X; OTRO (Cuál)

Firma: Jhon Osorio
Nombre: Jhon Osorio Castellanos
CC 1098791576
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Jhonny Plata Ussa
CC 37960598
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Fernando Pabón
CC 91291.984
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: HSE-INF-PR-01
VERSION: 1
FECHA: 30-09-2019
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT interpavimento BCA
FECHA: 04 | 05 | 24

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Cargo y profesión del encuestador

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Verónica Andrea Suárez Alvarez
DIRECCIÓN: Calle 43 #60-40 Mata Eugenio
TELÉFONO: 3209310260
FRENTE (en metros): Cinco (5)
No. PISOS: 2
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden=Mixto Piso rústico en regular estado y piso en tierra.
Primer PISO=Local.
Fachada= Fachada en obra negra,con columnas y vanillas solidas,con pegas separados a la otra casa, Puerta en tablas en regular estado. Dentro del local= piso rústico,con una escalera de acceso a segundo piso con columnas y vigas que presentan vanillas saldas en algunas partes,techo en laminas metalicas, tiene otro local mas pequeño en el mismo estado,Presenta grietas en las columnas Segundo PISO.
Fachada=en obra negra,Pueda de acceso presenta fisuras en la pega de la ventana, escaleras de acceso en cemento rústico en buen estado.
acceso en cemento rústico en buen estado.
sala-cocina= piso rústico con dos gradas de ladrillo,paredes en laminas de zinc con estructura de madera, cocina en concreto,cubierta en laminas de zinc con estructura de madera, piso rústico en baldosin estado, paredes en bloque negro con columnas en piso rústico en buen estado, techo de zinc con estructura de madera.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	Redes
GAS	S	
OTRO (cual)	Internet	

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (Cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL: X; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (Cual)

Firma: Veronica Su
Nombre: Veronica Andrea Suarez Alvarez
CC 1005182605
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Oscar Castellanos
CC 1098791556
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando Reniga
CC 91.291.904
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO GGF-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT INTERVENTORIA RKA
FECHA: 04 / 05 / 26

ELABORÓ: Ludwey Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ: Oscar castellanos-residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Jefferson Valencia Cortes
DIRECCIÓN: Cra 43 #65 Luis M. Cuenca
TELÉFONO: 317 3906270
FRENTE (en metros): Vanda 05
No. PISOS: 2.
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PUBLICOS

ACUEDUCTO	S/N	GAS	
ALCANTARILLADO	SI	OTRO (Cual)	Inforet
ENERGÍA	SI		
TELÉFONO	NO		

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubierta, otros)

Anden = piso en cemento rustico presenta desgaste y grietas.
Corredor = piso en baldosas, 6 ventanas y tablitas paredes en la union con el anden. fachada = paredes estucadas/pared lateral derecha que une con la otra casa, presenta humedad, caido del estucado/pared frontal presenta muchas fisuras y algunas grietas, pisos y techos, puerta de vidrio en buen estado. (lateral izquierda pintada y estucada, los demas solo estucados, lo demas no se puede observar por las viviendas y enchapes cubiertos en PVC en buen estado.

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDIO	
LOTE SEMICONTRUIDO	
OTRO (Cual)	

USO ACTUAL

RESIDENCIAL	
OFICIAL	
COMERCIAL	X
INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)	

Firma: Jefferson Valencia
Nombre: Jefferson Valencia
CC 1.096.209.828
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Oscar Castellanos
CC 1.096.911.026
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando Zuñiga
CC 91.291.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-03
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-33.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA: 04 05 17

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro-Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Observaciones/Recomendaciones

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Jesus Vergel
DIRECCIÓN: Calle 43A #62-64 B. Esperanza
TELÉFONO: 317 2906210 No. PISOS: 2
FRENTE (en metros): 6 metros. ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGIA	S	
TELEFONO	S	
GAS	N	
OTRO (cual)		

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

ANDEN = Piso en cerámica con 13 tableteas rotadas, los muros en buen estado.
Fachada = Muros en ladrillos rajos, marco de las ventanas presentan leve separación con la pared, puerta principal en madera en buen estado, bajo el contador de la electricidad, marco de la puerta presenta algunas fisuras, se presenta fisura bajo el contador y lateral derecho, puerta metálica, ventanas metálicas, con vidrios en buen estado.
Techo = techo en placa, presenta humedad y varias fisuras placa estucada con agrietamiento.
Sala-comedor = Piso de cerámica con piezas y tres tableteas rotadas, pared lateral izquierda de la sala pintada y estucada, pared frontal y lateral derecha estucada, pared lateral izquierda del comedor estucada con una lámina rajada y caída de estuco a la vista pintada, cielo raso de placa estucado con láminas rajadas, pared lateral derecha y frontal de cerámica en cocina= Piso en cerámica, pres enta tableta picada y un ciclo raso en placa estucado con una lámina rajada y un hueco, pared lateral derecha y frontal de cerámica en baño= Piso en cerámica con una tableta picada y un hueco, cielo raso en placa estucado con separación de la pega entre los anillos tiene tres baldosas rotas y la pared lateral derecha y frontal en cerámica.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONSTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

Firma
Nombre Fernando Ramirez Muñoz
CC 13'889.223
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Oscar Castellanos J
CC 1.094.879.576
CONTRATISTA

Firma
Nombre Fernando Ramirez
CC 91.291.604
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-01-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-21.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA 12/1/2021 | ELABORÓ Luzmery Torres Castro Profesional Socio-ambiental | REVISÓ | Oscar castellanos/residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Gloria Nuñez Bordosa
DIRECCIÓN: Calle 45A #60-89 Maria Eugenia
TELEFONO: 3017196729
FRENTE (en metros): 6 metros
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	SI
ALCANTARILLADO	SI
ENERGÍA	SI
TELEFONO	SI
GAS	
OTRO (cual)	

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubierta, otros)

Anden = Piso en concreto rústico, presenta humedad, con muchas dilataciones, en regular estado.
Fachada = Paredes en dos gus, presenta dilataciones y grietas en el marco de la puerta de este ubicada en el lado izquierdo, dilatación desde el marco de la ventana, en la ventana derecha presenta muchas dilataciones presentan dilataciones al rededor del marco del contador de luz, hacia el techo, en la ventana izquierda se al rededor del marco, puertas metalicas en buen estado, ventanas metalicas con vidrios en buen estado, la parte inferior de la pared presenta humedad, techo en placa en concreto presenta desgaste por humedad, presenta hongos.
Sala-cocina = Piso en ceramica, dos tableros vencidos, las demas en buen estado, guarda escobas presenta humedad, Pared principal presenta caida del estuco por humedad en la parte inferior, Pared frontal, mas de la mitad en ceramica en buen estado, lo demas es con estuco, pared lateral izquierda, estucada y pintada, presenta caida de la pintura parte superior derecha. en buen estado, pared lateral derecha, estucada y pintada, presenta caida de la pintura parte inferior, ventana en buen estado, falta un pedazo de la cuña del lado izquierdo, es de baldosas en buen estado, enchapado en baldosas del borde de la cocina inferior, 3 baldosas del borde de la estantería de la cocina inferior, 3 baldosas enteras y 2 partidas, Techo, en placa en concreto presenta humedad, Puerta principal en buen estado, en la parte inferior presenta humedad, el lado derecho de la puerta presenta humedad, en la parte inferior.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cual)		OTRO (Cual)	

Firma
Nombre Oscar Castellanos
CC 1098871556
CONTRATISTA

Firma
Nombre Fernando Zuñiga
CC 91.241.804
INTERVENTORIA

Firma
Nombre Gloria Nuñez B.
CC 37.938.948
PROPIETARIO YO TESTIGO

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION 1
FECHA 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT interpavimento RCA
FECHA 29 | 04 | 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ: Oscar castellanos reg residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Nydia Acevedo Beltran
DIRECCIÓN: Calle 43#60-22 Barrio Esmeralda
TELÉFONO: 3224148044
FRENTE (en metros): 6 metros.
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO		
GAS	SI	
OTRO (Cuál)		

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas, ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden=Liso semi esmaltado y una parte con baldosas/la parte semi esmaltada presenta A di blaciones de en torno a externo, presenta resane en concreto rústico/la parte de la baldosa presenta gasta el resto en buen estado

Fachada: Paredes estucadas y pintadas, Pared lateral izquierda se nal estucado, presenta Caida de pintura y esto es humedad pared frontal presenta resane alrededor del mar o de la puerta presenta pequeñas caidas del estuco por humedad, marco de ventana metálicas alrededor del contador del gas, Presenta fisuras, pared lateral derecha en buen estado, ventanas metálicas en buen estado deber en eternit, Puerta metálica con vidrios en buen estado

Sala-comedor-cocina=Piso en cerámica, con baldosa picada, las demás en buen estado, paredes pintadas y una parte; como de 40 centimetros en la parte superior en obra negra, paredes en buen estado, techo en eternit en buen estado, cocina con mesón en concreto con 4 tableros unicos lo demás pintado, pared frontal y lateral requiere cerámica en baldosa con una altura de medio y medio, lo demás pintado y en estado piso en cerámica en buen estado, escalera escaleras en peldaños estucadas y pintadas, Habitación 1=Piso en cerámica desgastado en pequeños por trasito, paredes estucadas y pintadas, pared frontal con resane en la parte inferior, ventana con vidrios en buen estado, Presenta separación entre el marco de la ventana y la pared, cielorraso en drywall en regular estado

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cuál)		OTRO (Cuál)	

Firma: Nydia Acevedo
Nombre: Nydia Acevedo Castellanos
CC 1098971556
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Oscar Castellanos
CC 63549577
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Fernando Ruiz
CC 91.291.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO GG-F-08
VERSION 1
FECHA 05-01-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA 29/04/26
ELABORÓ Luzmery Torres Castro-Profesional Socio-ambiental
REVISÓ
Clara.castellano@ingconsultores.co

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Vladimir Arenas
DIRECCIÓN: Calle 23A #60-05 Mara Estrella
TELÉFONO: 3155946279
FRENTE (en metros): 6 mts aprox.
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1
REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGIA	S
TELEFONO	N
GAS	
OTRO (cual)	

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (Cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL: X; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (Cual)

Anden = Piso semiestrallado con fisuras y fichas por desgaste, resane cerca al contador del agua.
Fachada = estucado y pintado en buen estado.
Alay = techo en eternit y estructura de metal en buen estado, hay 11 resane, paredes estucadas, pared lateral derecha Sala-Piso esmaltado con algunas picadas, hay 11 grietas en buen estado, puerta metálica sin Presenta grietas resanadas, ventana metálica con 11 vidrios en buen estado, pared frontal presenta resane arriba del marco de la puerta, cielorraso en yeso en buen estado
Habitación 1 = piso esmaltado con desgaste en la entrada, paredes estucadas con fisuras y grietas, cielorraso en yeso en buen estado, marco de la puerta presenta desgaste en la parte superior de la puerta, la puerta presenta oxido y rayones en buen estado, pared lateral derecha con ventana metálica sin vidrios en buen estado, cielorraso en yeso en buen estado.
Habitación 2 = piso esmaltado con desgaste y caída de pedazos, paredes estucadas con fisuras y grietas, pared frontal con ventana metálica sin vidrios en buen estado, pared lateral derecha con puerta metálica en buen estado, cielorraso en yeso en buen estado.
Baño = piso en cerámica con dos fichas, las demás en buen estado, paredes en cerámica en buen estado, cielorraso en yeso en buen estado
Patio = piso en cemento con dos fichas, las demás en buen estado, pared frontal presenta resane, pared lateral izquierda presenta grietas resanadas, pared lateral derecha en ladrillo expuesto

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA: 24 | 04 | 26
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio ambiental
REVISÓ: Oscar cesar perez rodriguez

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: LINCY Montalvo
DIRECCION: Calle 43 #60-46 Nueva Granada
TELÉFONO: 3043385791
FRENTE (en metros): 6metros
No. PISOS: 1
ESTRATO: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

En dem= Piso en cerámica. con una tableta rajada, las demás en buen estado. Fachada= en la parte inferior a pita altura de 70cm tiene cerámica en buen estado, lo demás de la pared esta estucada. en buen estado con vidrios en buen estado, Puerta metalica, con una tableta de vidrio partida. Alar= techo en eternit con base metalica.
Sala-comedor-cocina= Piso en cerámica, Presenta algunas tabletas picadas, en buen estado, Paredes en buen estado, hecho en cerámica. Paredes estucadas, Pared Principal en una fuerza arriba del marco de la ventana, Pared lateral derecha, presenta humedad del suelo hasta los dos habitaciones y dos pies de la segunda habitación también en la parte anterior, pared derecha en buen estado. Pared frontal en buen estado, en la parte inferior, cocina con barra base de metal y la parte superior de marmol en buen estado. Pared lateral izquierda en buen estado, en la parte superior de marmol en buen estado, en buen estado, algunas bombillas presentan oxidación, presenta picadas, columna a la entrada, presenta oxidación en la parte inferior. Piso en cerámica en buen estado, Paredes en buen estado, algunas picadas en la parte inferior. Techo en estructura metalica, presenta oxidación en la parte inferior. Piso en cerámica en buen estado, Paredes estucadas en buen estado, presenta fisura en la parte superior a los lados del marco de la puerta, pared frontal presenta estado, presenta fisura en la columna hay una fisura a los lados de la ventana lateral derecha

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO GGF-08
VERSION 1
FECHA 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA
FECHA 19/04/26
ELABORÓ Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ Oscar castañeda-Ing residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Escuela Pisco León
DIRECCION: Calle 49#26-71 Barrio Eugenio
TELÉFONO: 3177415902
FRENTE (en metros): 2 metros
No. PISOS: 2
ESTRATO: 1

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGIA	S
TELEFONO	S
GAS	
OTRO (cual)	

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN IMAGINERICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(prdenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

ANDEN = Piso en cerámica en buen estado.
Fachada = Paredes en cerámica en buen estado, portón con vidrios en buen estado.
Cerramiento = muros con altura de 80cm. en buen estado, en buen estado, ventana metálica. con vidrios en buen estado / colorado en buen estado en PVC.
SCALA = Piso en cerámica en buen estado, paredes pintadas y estucadas en buen estado, donde esta el tablero, la pared tiene una altura del piso hasta el cabezal, colocado en PVC en buen estado, ventanas y puertas con vidrios en buen estado, metálicas, Baranje = Piso en cerámica en buen estado, con dos bolsas pisadas y paredes en buen estado, donde es cocina en cerámica en buen estado, paredes enchapadas en cerámica en buen estado, Baños con baldosas en la parte inferior y marmol en la parte superior en buen estado, meson con marmol en la parte superior en buen estado, y cerámica en buen estado, una parte del techo tiene cielo raso en PVC. Patio = Piso y paredes en cerámica en buen estado, una parte del techo tiene cielo raso en PVC. La manguera es abierto.

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTO NACIONAL		RESIDENCIAL	X
VIVIENDA	X	OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (cual)		OTRO (cual)	

Firma
Nombre Yaneth Rico León
CC 1095[illegible]
PROPIETARIO YAT TESTIGO

Firma
Nombre Oscar Castañeda
CC 1098791556
CONTRATISTA

Firma
Nombre Fernando [illegible]
CC 91.291.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GSH-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT INTERVENTORIA BCA

FECHA: 30 04 2024

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro Profesional Socio ambiental
REVISÓ:
Nombre y cargo del residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Nohemi Pinto
DIRECCIÓN: Cle 48A #68-28 B Pinto Segundo
TELÉFONO: 3167995243
FRENTE (en metros): 6,90 mts
No PISOS: 1
ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, pilazas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = piso con cerámica, lado derecho en mal estado y en el lado izquierdo dos tablones rajados en la parte esquinera.
Fachada = parte interior con cerámica con dos habitaciones y parqueadero, el resto de la pared (se observa manchado de las tabletas, presenta dilatación en la pega de la cerámica con la pared del mismo, marco de la ventana en vidrios en la parte posterior presenta fisuras y dilataciones en la pega del mismo, marco de la ventana en buen estado, costados derecho de la entrada observa resane al rededor, sin estuco, ventana con vidrios en buen estado, techo en el porton se observa humedad en la parte de los muros y parte interna en buen estado. techo en la parte interna, alar pequeño en teja de eternit en buen estado.
Sala- comedor = piso con cerámica, se observa tabletas despegadas en varios puntos, paredes estucadas, pintadas de color blanco, techo en el porton se observa humedad en los bordes de la entrada, derecha presenta humedad en los bordes de la pega del marco de la puerta, al rededor del mismo estucado en buen estado, cielo raso en machimbre en buen estado pero con algo de desgaste, paredes estucadas y pintadas en buen estado pero con algo de humedad hacia el techo.
Habitación 1 = piso con cerámica en buen estado, paredes estucadas y pintadas en buen estado, cielo raso en machimbre en buen estado pero con algo de desgaste, puerta principal en madera en buen estado, ventana en vidrios en buen estado, cielo raso en machimbre en buen estado, paredes estucadas y pintadas en buen estado.
Baño = piso con cerámica, lado derecho en mal estado y en el lado izquierdo dos tablones rajados en la parte esquinera. Fachada = parte interior con cerámica con dos habitaciones y parqueadero, el resto de la pared (se observa manchado de las tabletas, presenta dilatación en la pega de la cerámica con la pared del mismo, marco de la ventana en vidrios en la parte posterior presenta fisuras y dilataciones en la pega del mismo, marco de la ventana en buen estado, costados derecho de la entrada observa resane al rededor, sin estuco, ventana con vidrios en buen estado, techo en el porton se observa humedad en los muros y parte interna en buen estado. techo en la parte interna, alar pequeño en teja de eternit en buen estado.
Sala- comedor = piso con cerámica, se observa tabletas despegadas en varios puntos, paredes estucadas, pintadas de color blanco, techo en el porton se observa humedad en los bordes de la entrada, derecha presenta humedad en los bordes de la pega del marco de la puerta, al rededor del mismo estucado en buen estado, cielo raso en machimbre en buen estado pero con algo de desgaste, paredes estucadas y pintadas en buen estado pero con algo de humedad hacia el techo.
Habitación 1 = piso con cerámica en buen estado, paredes estucadas y pintadas en buen estado, cielo raso en machimbre en buen estado pero con algo de desgaste, puerta principal en madera en buen estado, ventana en vidrios en buen estado, cielo raso en machimbre en buen estado, paredes estucadas y pintadas en buen estado.
Baño = piso con cerámica, lado derecho en mal estado y en el lado izquierdo dos tablones rajados en la parte esquinera.

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGÍA	S
TELÉFONO	N
GAS	S
OTRO (cual)	Internet

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO

- MONUMENTO NACIONAL
- VIVIENDA: X
- LOTE BALDO
- LOTE SEMICONSTRUIDO
- OTRO (cual)

USO ACTUAL

- RESIDENCIAL: X
- OFICIAL
- COMERCIAL
- INDUSTRIAL
- OTRO (cual)

Firma
Hombre: Ana Arias
CC 63471606
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Hombre: Oscar Castellanos
CC 1098791576
CONTRATISTA

Firma
Hombre: Fernando Bolaños
CC 91.281.804
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: 1593-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA: 28 04 26 | ELABORÓ: Nombre y Cargo- Profesional Socio-ambiental | REVISÓ: Cargo- coordinador HSE o residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Yoselina acevedo beltran
DIRECCION: Calle 43 Cra 89 Barrio 1 de Enero
TELEFONO: 320 4448804 | No. PISOS: 1 | ESTRATO: 1
FRENTE (en metros): 6 metros

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

1er Piso
Antejardin=Piso rustico, se observa habitacion en la junta de los pisos.
Anden=Piso rustico, se observa humedecimiento, fachada=pared estucada y pintada/ventana de metal con vidrio en buen estado, puerta de metal en buen estado, placa en concreto y ladrillo H10, se observa humedad y daño de la pintura en el rodeador del ladrillo H10, el marco de la puerta recostado le quitaron la chapa, la reja de la puerta se cruza a la mitad de la apertura.
Sala-habitacion.= Piso con tableteo presenta desgaste por transito y baldosas, paredes estucadas, columna de la pared principal presenta daño del revoque parte inferior y parte superior con pintura y daño del revoque cerca a la placa, pared principal con faltante de estuco, pared frontal con presencia de humedad parte central, se observa ondulaciones cerca al marco de la ventana, presenta fisuras en el estuco, pared lateral derecha con presencia de humedad parte central, se observa desgaste de transito y tableteo y baldosas vencidas, paredes de la puerta, cerca a la placa con faltante de estuco parte inferior, pared lateral izquierda con presencia de humedad parte central, se observa desgaste de transito y tableteo y baldosas vencidas, paredes estucadas, pared lateral derecha se observa humedad desde el marco de la puerta hacia el techo, techo en madera se observa leve suciedad presenta unas tablitas vencidas en la entrada, el resto en buen estado, pared lateral izquierda

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS SAS
INTERVENTOR: UT Interventoría BCA
FECHA: 30 / 04 / 26

ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental | REVISÓ: | Cargo contratista-Ing residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: JOHAN SANABRIA
DIRECCION: CALLE 49B#60-15 Malla Española
TELEFONO: 3168912853 | No. PISOS: 2
FRENTE (en metros): 6 metros | ESTRATO: 2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso en ceramica, presenta una fisura parcial cerca al contador del agua, y una vencida. Fachada = Pega en buen estado, columnas en concreto, y muro interior estucados en buen estado, pintura en buen estado. Techo = Con teja de eternit en buen estado, se observa algunas goteras en la parte posterior. Piso = con ceramica en buen estado, pero se observa algunas rajas de la ceramica, Balcon, cerramiento en estructura de acero con vidrios en buen estado. Corredor y garaje = Piso con ceramica en buen estado. Primer Piso = estucado en buen estado, ventanas y puerta con rejas en buen estado, Placa con fisura leve desde la lampara hacia la columna. Segundo Piso = estucado en buen estado, presenta tableteos despicados en la entrada y una vencida, Paredes estucadas, en la cocina hay tableteos despicados, Paredes en buen estado, placa en buen estado, cocina, pared lateral con ceramica en buen estado.

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELEFONO	S	
GAS	S	
OTRO (cual)	Vecinal	

TIPO DE PREDIO: MONUMENTO NACIONAL; VIVIENDA: X; LOTE BALDIO; LOTE SEMICONTRUIDO; OTRO (cual)

USO ACTUAL: RESIDENCIAL: X; OFICIAL; COMERCIAL; INDUSTRIAL; OTRO (cual)

Firma
Nombre: Johan Sanabria M
CC 1.152.240
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Oscar Castellanos
CC 1098391556
CONTRATISTA

Firma
Nombre Fernando Zuñiga
CC 91.281.604
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento RCA
FECHA: 30/04/26

ELABORÓ: luzmery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ:
Observaciones (si/no) explicar:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO: Dario Mora Ospina
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FRENTE (en metros):
No. PISOS:
ESTRATO:

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén = piso en tierra.
Habitación en obra negra con reja, de ventana en regular estado, sin vidrio. Viga de amarre con presencia de hierro, techo en eternit en buen estado, puerta se observa resane y pintura, en la parte del resto en lote enmontado

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO		
ALCANTARILLADO		
ENERGÍA		
TELÉFONO		
GAS		
OTRO (cuál)		

TIPO DE PREDIO

MONUMENTO NACIONAL	
VIVIENDA	X
LOTE BALDO	
LOTE SEMICONTRUIDO	
OTRO (cuál)	


USO ACTUAL

RESIDENCIAL	
OFICIAL	
COMERCIAL	
INDUSTRIAL	
OTRO (cuál)	

Firma
Nombre: Oscar Castellanos
CC: 1098791556
CONTRATISTA

Firma
Nombre:
CC:
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre: Fernando Ruiz Gil
CC: 91.291.608
INTERVENTORIA

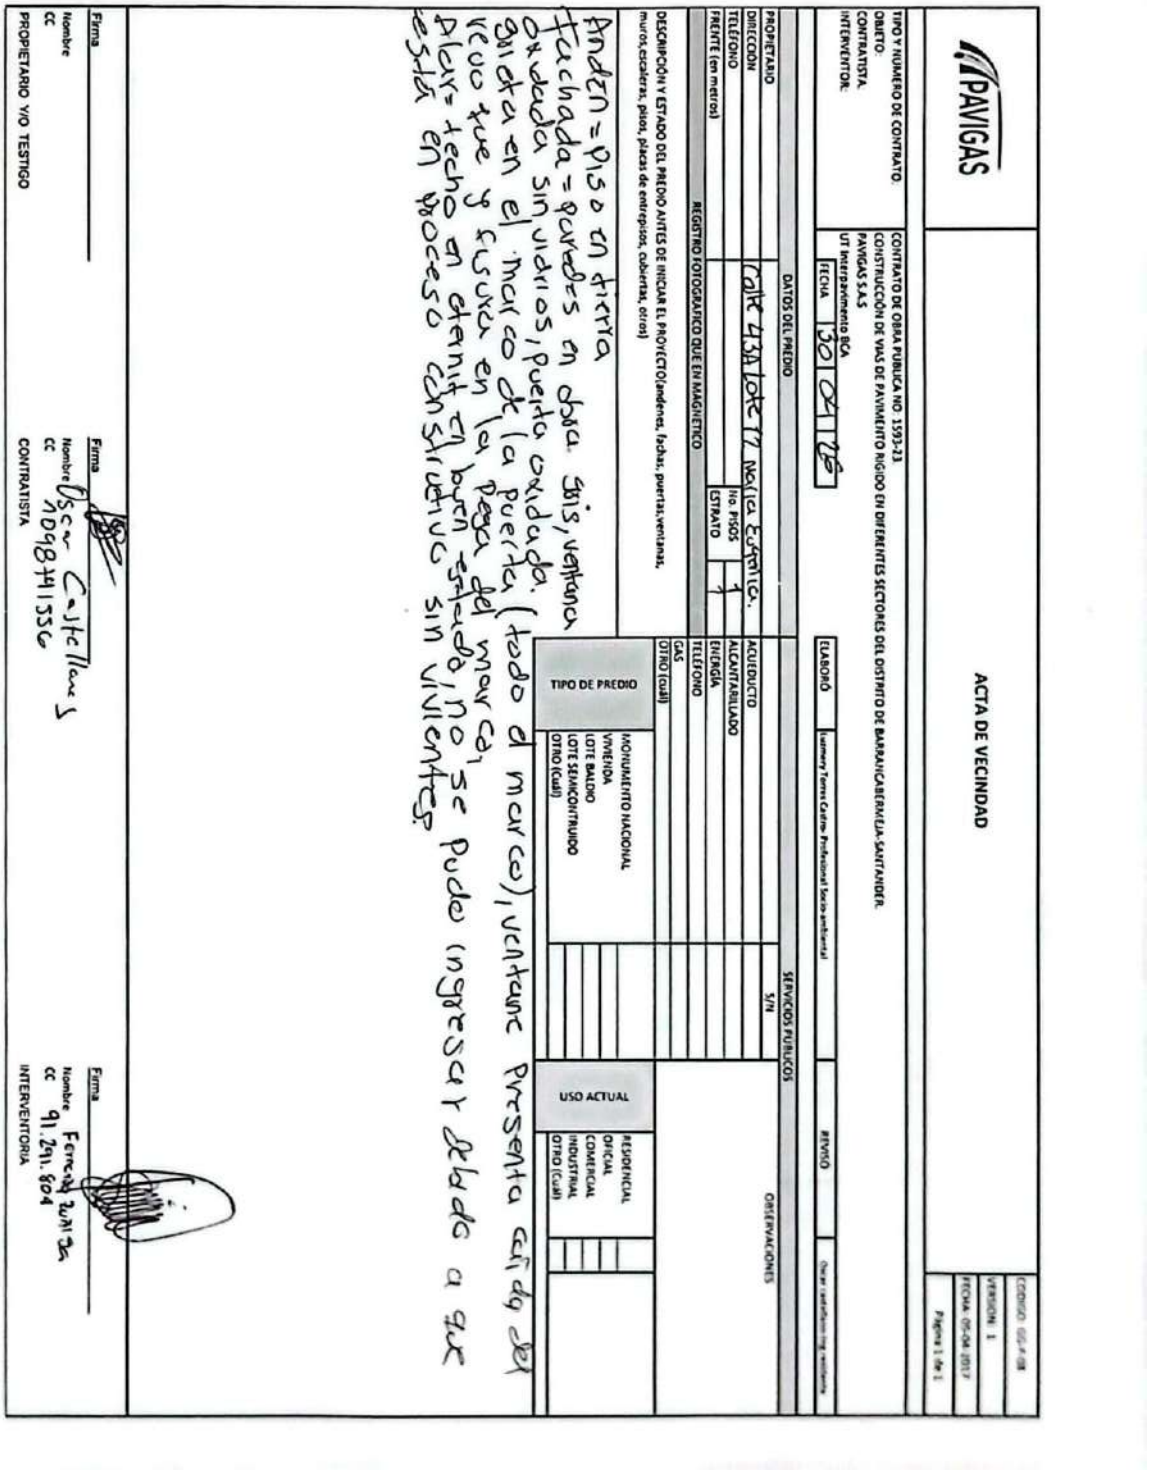

ACTA DE VECINDAD

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 1592-23
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT INTERVENTORIA BCA
FECHA: 30 OCT 23
ELABORÓ: Luzmery Torres Castro- Profesional Socio ambiental
REVISÓ:

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO:
DIRECCION: Calle 43A Lote 17 Nueva Esperanza
TELÉFONO:
FRENTE (en metros):
No PISOS: 1
ESTRATO: 1

SERVICIOS PUBLICOS
S/N
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ENERGÍA
TELÉFONO
GAS
OTRO (Cuál)

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(anden-es, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso en tierra
fachada = Paredes en obra gris, ventana
cubierta = Paredes en obra gris, puerta cerrada.
Sin vidrios, puerta cerrada. Marco de la puerta (todo el marco), ventana presenta cerrado
Pero fue forzada en la pega del marco, se pudo ingresar y dado a que
Plaza techo en estado, no se pudo ingresar y dado a que
Esta en proceso de construcción sin viviendas

TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
MONUMENTITO NACIONAL		RESIDENCIAL	
VIVIENDA		OFICIAL	
LOTE BALDIO		COMERCIAL	
LOTE SEMICONSTRUIDO		INDUSTRIAL	
OTRO (Cuál)		OTRO (Cuál)	

Firma
Nombre: Oscar Castellanos
CC 1.098.741.556
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre
CC
CONTRATISTA

Firma
Nombre Fernando Zuñiga
CC 91.291.604
INTERVENTORIA

14.5. POLIZA DE INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	**AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA**	**56**	**56-44-101012132**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**04**	**2026**	**06**	**04**	**2026**	**00:00**	**05**	**07**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA	**NIT: 902.020.820-0**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 50 NRO. 10 A - 48 OF 304	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3176679736

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	**NIT: 890.201.900-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 #27-25 BARRIO GALAN PISO 2	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO N. 5037-25 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**06/04/2026**	**05/01/2027**	**$37,142,280.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**06/04/2026**	**05/07/2029**	**$9,285,570.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**05/07/2026**	**05/07/2031**	**$18,571,140.00**	

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ACTA DE INICIO DE FECHA DE FIRMA 06/04/2026 AL CONTRATO N. 5037-25. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 06/04/2026.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****385,765.00	$ *******8,000.00	$ ******74,815.00	$ **********468,581.00	$ *******64,998,990.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

56-44-101012132

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101012132	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	04	2026	06	04	2026	00:00	05	07	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA			**NIT: 902.020.820-0**
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OF 304	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3176679736

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA			**NIT: 890.201.900-6**
DIRECCIÓN: CL 52 #27-25 BARRIO GALAN PISO 2	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101012132

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14.6. ACTAS DE REUNION

14.7. CORRESPONDENCIA ENVIADA

UNIÓN TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA

NIT. 902.020.820-0

Barrancabermeja, 7 de enero de 2026

UT5037-25-001

Señores
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Diagonal 60 Km 1, Vía al Llanito Barrancabermeja

Referencia: CONTRATO 5037-25 con objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."


Asunto: Entrega de garantías contractuales.

Estimados Señores:

Por medio de la presente hacemos entrega de las garantías contractuales según lo establecido en la cláusula 10.1 GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato de la referencia.

Lo anterior para revisión y aprobación en su calidad de supervisores.

Atentamente,



FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
Representante legal
C.C. No. 91.291.804 de Bucaramanga

Anexo. Póliza de seguro de cumplimiento No. 56-44-101012132 Anexo 0

Barrancabermeja 22 de abril del 2026.

Señores
PAVIGAS S.A.S
Centro Empresarial San Silvestre Piso 6
Ciudad

Referencia: CONTRATO 5037-25 CON OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Asunto: Rogativa de cumplimiento de aportar documentación de suma importancia como lo es actualización de pólizas del contrato 1593-23 “CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitidos rogar a usted el cumplimiento por parte de la contratista de las actualizaciones de las diferentes pólizas que garantizan el cumplimiento de lo contratado, ya que el contrato tuvo como acta de reinicio el 6 de abril del 2026 y a la fecha no se ha hecho entrega de la actualizacion de polizas.

Lo anterior debido a que, es deber del contratista contar con toda la documentación pertinente y necesaria como lo es: Anexo Modificatorio de Pólizas, para confirmar la vigencia, los montos asegurados y el alcance de las pólizas, ajustados al nuevo plazo contractual y al valor actualizado de los riesgos asociados al proyecto, para ante la respectiva Aseguradora.

Esta obligación constituye un deber contractual esencial habilitante para la continuación de las actividades del proyecto. La falta de garantías vigentes constituye un riesgo legal inminente y una transgresión a las condiciones mínimas para la ejecución de las actividades contractuales.

En ese sentido, le rogamos realizar las diligencias necesarias y pertinentes, a la mayor brevedad posible

Atentamente,



_____

FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Barrancabermeja, 7 de mayo del 2026

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UT5037-25-003
ENILDO JIMENEZ GONZALEZ
Supervisor contrato
Ciudad

Referencia: CONTRATO 5037-25 CON OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Asunto: Radicación de análisis de precios unitarios (APU) para creación de nuevo ítem 7.18. SUM. E INST. TUBERIA DE PRESIÓN ORIENTADA 200PSI Ø 14"

Cordial saludo


Por medio del presente, la Interventoría se permite radicar ante la Supervisión la solicitud de creación del ítem no previsto correspondiente a:
Ítem 7.18. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN ORIENTADA 200 PSI Ø 14”

Lo anterior, con el fin de que sea revisado, analizado y aprobado conforme a las necesidades técnicas identificadas durante la ejecución del proyecto.

Para soporte de la presente solicitud, se adjunta la siguiente documentación:

- Análisis de Precios Unitarios (APU) del ítem propuesto.
- Cotizaciones correspondientes para la validación de precios de mercado.

Atentamente



FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIGAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U)

Contrato No.: 1593-23

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**

Ítem: **7,18** Unidad: **ml**

Descripción: **SUM. E INST. TUBERIA DE PRESIÓN ORIENTADA 200PSI Ø 14"**

1.0. COSTOS DIRECTOS:

1.1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Referencia	Descripción	Marca Tipo	Tarifa/Día ($/Día)	Rendimiento (Unidad/Día)	Vr. Unitario ($)
	Diferencial 5.o Ton		$ 45.515,00	18,00	$ 2.529,00
	Grua de extensión para postes		$ 1.820.605,00	200,00	$ 9.103,00
E-135	Herramienta menor (10%MO)			10%	$ 2.360,00
Subtotal 1.1.					**13.992,00**

1.2. MATERIALES EN LA OBRA

Referencia	Descripción	Unidad	Precio Unitario ($)	Cantidad	Vr. Unitario ($)
	SUM. E INST. TUBERIA DE PRESIÓN ORIENTADA 200PSI Ø 14"	ml	$ 496.474,00	1,05	521.298,00
	Lubricante 500 g	un	$ 28.166,00	0,17	4.647,00
Subtotal 1.2.					**525.945,00**

1.3. TRANSPORTE

Referencia	Descripción	Volumen ó Peso (Unidad)	Distancia (Km)	Volumen ó Peso - Km	Tarifa ($/Km-Unidad)	Vr. Unitario ($)
	Transporte (viaje)	1,00	1	0,00	$ 6.377.133,00	12.754,00
Subtotal 1.3.						**12.754,00**

1.4. MANO DE OBRA

Referencia	Descripción	Cantidad	Jornal ($/Día)	Prestaciones (%)	Total jornal ($/Día)	Rendimiento (Unidad/Día)	Vr. Unitario ($)
	Oficial de Cuadrilla	1,00	90.000,00	180,00%	$ 162.000,00	18,00	$ 9.000,00
	Ayudante de Obra	3,00	48.667,00	180,00%	$ 262.802,00	18,00	$ 14.600,00
Subtotal 1.4.							**23.600,00**

TOTAL COSTOS DIRECTOS (C.D.)	**$ 576.291,00**

2.0. COSTOS INDIRECTOS:

Ítem	Descripción	Porcentaje del C.D.	Vr. Unitario ($)
2.1.	Administración	31,50%	181.532,00
2.2.	Imprevistos	0,50%	2.881,00
2.3.	Utilidad	4,00%	23.052,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C.I.)	**$ 207.465,00**
3.0. TOTAL ANTES DE IVA	**$ 783.756,00**
4.0. VALOR UNITARIOS TOTAL:	**$ 783.756,00**



Ò .z94")JÍ9ÍÓ

00129025200209429

COTIZACION 290-252-209429

Cota, 05 de MAYO de 2,026

Señor(es):

PAVIGAS SAS

80400244-0 - 690
JAVIER FLOREZ
DG 56 18 A 88 P 6 CC SAN SILVESTRE Santander De Quilichao Cauca

Tel : 3125556772 Cel :
Email: quinteroyvalencia@gmail.com

Atendiendo su solicitud, tenemos el gusto de cotizar los siguientes artículos:

--Referencia--	------Descripción Articulo------	--Ext.1--	Unid	-$Lista Unit.-	%Desc	**$Neto Unit (*)**	-Cantidad-	-----$SubTotal-----
36100276	TUBO PRESI ORIENTA 200 PSI 14" GERF		UN	$ 2,503,232.06	0.00	2,503,232.06	26.00	65,084,033.61

(*) Valor neto por unidad antes de Iva.

Valor Ítems	$	65,084,033.61
Valor Servicios	$	
Valor Descuentos	$	0.00
Subtotal Neto	$	65,084,033.61
Iva	$	12,365,966.39
TOTAL COTIZACION	**$**	77,450,000.00

CONDICIONES:

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO , TIEMPO DE ENTREGAR A CONVENIR SEGUN OFERTA Y DISPONIBILIDAD DE LA FABRICA, VENTA PUNTUAL NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES, CAMBIOS O CANCELACIONES

PLAZO DE ENTREGA : 0 Dias
VALIDEZ DE LA OFERTA : 05 de MAYO de 2,026
CONDICION DE PAGO : C CONTADO - CTR

OBSERVACIONES : MATERIAL ENTREGADO EN BARRO GRANJAS B/ BERMEJA SIN COSTO ADICIONAL

Cordialmente,

GARZON BRAVO ANGELA ANDREA

Elb. andrea.garzon

Apr. andrea.garzon

Información Tributaria:
Grandes Contribuyentes:
Autoretenedores : Resolucion 6833 De 25 De AGOSTO De 2,000
Iva : Régimen Común
Términos de Venta : Consulte https://coval.com.co/terminosventa

MUNDO AGUAS S.A.S
NIT : 901.303.886- 8
CRA 14 N° 49 68 BARRIO COLOMBIA
6076211468 - 3152507658
BARRANCABERMEJA - COLOMBIA

Barrancabermeja, 5 de mayo de 2026

Señores

PAVIGAS SAS

804,003,244 - 0

Atn:
CR 31 51 74 ED TORREMARDEL OF 907
3153788513
Bucaramanga-Santander . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 2497

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0030001002218	TUBO UNION MECANICA ORIENTADO 14" 200 PSI		26.00	2,985,000.00	77,610,000.00

Total Bruto	77,610,000.00
IVA	14,745,900.00
IMPOCONSUMO 0.00	
Total a Pagar	$92,355,900.00

Entrega: días despues de recibir su orden de compra o pedido
Forma de Pago :
Validez de la oferta: 7 días a partir de la fecha, mayo 5 2026

Cordialmente,

Principal

MUNDO AGUAS S.A.S

Elaborado e Impreso por Siigo

Barrancabermeja, 8 de mayo del 2026

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UT5037-25-004
ENILDO JIMENEZ GONZALEZ
Supervisor contrato
Ciudad

Referencia: CONTRATO 5037-25 CON OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA”

Asunto: REMISIÓN Y AVAL DEL PDT PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Cordial saludo


En atención al asunto de la referencia, la Interventoría del contrato No. 5037-25***, cuyo objeto corresponde a*** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, se permite remitir para su conocimiento y trámite correspondiente el PDT presentado por el contratista de obra.

Una vez efectuada la revisión técnica y contractual del documento allegado, esta Interventoría considera que el PDT cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para su implementación dentro de la ejecución del proyecto, razón por la cual se emite aval al mismo.

En consecuencia, se remite a la Supervisión para lo de su competencia y fines pertinentes.

Se anexan los documentos soporte correspondientes.


Atentamente



FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

PDT_REPROG_6_06ABRIL_2026_TRAMOS PENDIENTES


Id	Nombre de tarea	% trabajo completado	Duración	Comienzo	Fin
1	**CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	**0%**	**93 días**	**lun 6/04/26**	**mié 5/08/26**
2	**COMUNA 6**	**0%**	**93 días**	**lun 6/04/26**	**mié 5/08/26**
3	REINICIO DE OBRA 06 DE ABRIL DE 2026	0%	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26
4	Alistamiento, Socializaciones, Actas de Vecinda	0%	6 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26
5	**Barrio Las Granjas**	**0%**	**60 días**	**mar 19/05/26**	**mié 5/08/26**
6	**Tramos 91**	**0%**	**60 días**	**mar 19/05/26**	**mié 5/08/26**
7	T-91 Preliminares y Demoliciones	0%	18 días	mar 19/05/26	mié 10/06/26
8	T-91 Excavaciones y Rellenos	0%	30 días	jue 11/06/26	lun 20/07/26
9	T-91 Obras Hidrosanitarias	0%	30 días	vie 12/06/26	mar 21/07/26
10	T-91 Estructura de Pavimento rigido	0%	24 días	jue 25/06/26	lun 27/07/26
11	T-91 Sardineles y Andenes	0%	29 días	lun 29/06/26	mié 5/08/26
12	**Tramos 92**	**0%**	**41 días**	**vie 12/06/26**	**mié 5/08/26**
13	T-92 Preliminares y Demoliciones	0%	5 días	vie 12/06/26	jue 18/06/26
14	T-92 Excavaciones y Rellenos	0%	20 días	vie 19/06/26	jue 16/07/26
15	T-92 Obras Hidrosanitarias	0%	20 días	vie 19/06/26	jue 16/07/26
16	T-92 Estructura de Pavimento rigido	0%	15 días	jue 16/07/26	mié 5/08/26
17	T-92 Sardineles y Andenes	0%	15 días	jue 16/07/26	mié 5/08/26
18	FINALIZACION COMUNA 6	0%	0 días	mié 5/08/26	mié 5/08/26
19	**COMUNA 3**	**0%**	**40 días**	**lun 15/06/26**	**mié 5/08/26**
20	**Barrio Colinas del Norte**	**0%**	**40 días**	**lun 15/06/26**	**mié 5/08/26**
21	**Cabezales de entrega (Adicional)**	**0%**	**40 días**	**lun 15/06/26**	**mié 5/08/26**
22	T-205 Cabezal de entrega	0%	14 días	lun 15/06/26	jue 2/07/26
23	T-204 Cabezal de entrega	0%	14 días	jue 2/07/26	mar 21/07/26
24	T-203 Cabezal de entrega	0%	12 días	mar 21/07/26	mié 5/08/26
25	FINALIZACION COMUNA 3	0%	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26
26	**COMUNA 7**	**0%**	**88 días**	**lun 13/04/26**	**mié 5/08/26**
27	**Barrio El Campin**	**0%**	**29 días**	**lun 13/04/26**	**mié 20/05/26**
28	**Tramo 116 (Adicional)**	**0%**	**29 días**	**lun 13/04/26**	**mié 20/05/26**
29	T-116 Preliminares y Demoliciones	0%	20 días	lun 13/04/26	jue 7/05/26
30	T-116 Excavaciones y Rellenos	0%	20 días	mar 14/04/26	vie 8/05/26
31	T-116 Obras Hidrosanitarias	0%	22 días	mar 14/04/26	mar 12/05/26
32	T-116 Estructura de Pavimento rigido	0%	22 días	lun 20/04/26	mar 19/05/26
33	T-116 Sardineles y Andenes	0%	22 días	mar 21/04/26	mié 20/05/26
34	**Barrio Maria Eugenia**	**0%**	**32 días**	**lun 4/05/26**	**sáb 13/06/26**
35	**Tramo 128**	**0%**	**32 días**	**lun 4/05/26**	**sáb 13/06/26**
36	T-117 Preliminares y Demoliciones	0%	15 días	lun 4/05/26	vie 22/05/26
37	T-117 Excavaciones y Rellenos	0%	15 días	mié 6/05/26	lun 25/05/26
38	T-117 Obras Hidrosanitarias	0%	20 días	jue 7/05/26	mar 2/06/26
39	T-117 Estructura de Pavimento rigido	0%	20 días	jue 14/05/26	mié 10/06/26
40	T-117 Sardineles y Andenes	0%	20 días	mar 19/05/26	sáb 13/06/26
41	**Barrio Divino Niño**	**0%**	**24 días**	**lun 6/07/26**	**mié 5/08/26**
42	**Tramo 117**	**0%**	**24 días**	**lun 6/07/26**	**mié 5/08/26**
43	T-128 Preliminares y Demoliciones	0%	17 días	lun 6/07/26	lun 27/07/26
44	T-128 Excavaciones y Rellenos	0%	19 días	mar 7/07/26	jue 30/07/26
45	T-128 Obras Hidrosanitarias	0%	10 días	mié 8/07/26	mar 21/07/26
46	T-128 Estructura de Pavimento rigido	0%	20 días	mié 8/07/26	lun 3/08/26
47	T-128 Sardineles y Andenes	0%	20 días	vie 10/07/26	mié 5/08/26
48	FINALIZACION COMUNA 7	0%	0 días	mié 5/08/26	mié 5/08/26
49	**COMUNA 2**	**0%**	**58 días**	**mié 20/05/26**	**mar 4/08/26**
50	**Barrio Torcoroma**	**0%**	**30 días**	**mié 20/05/26**	**lun 29/06/26**
51	**Tramo 2**	**0%**	**30 días**	**mié 20/05/26**	**lun 29/06/26**
52	T-1 Preliminares y Demoliciones	0%	7 días	mié 20/05/26	jue 28/05/26

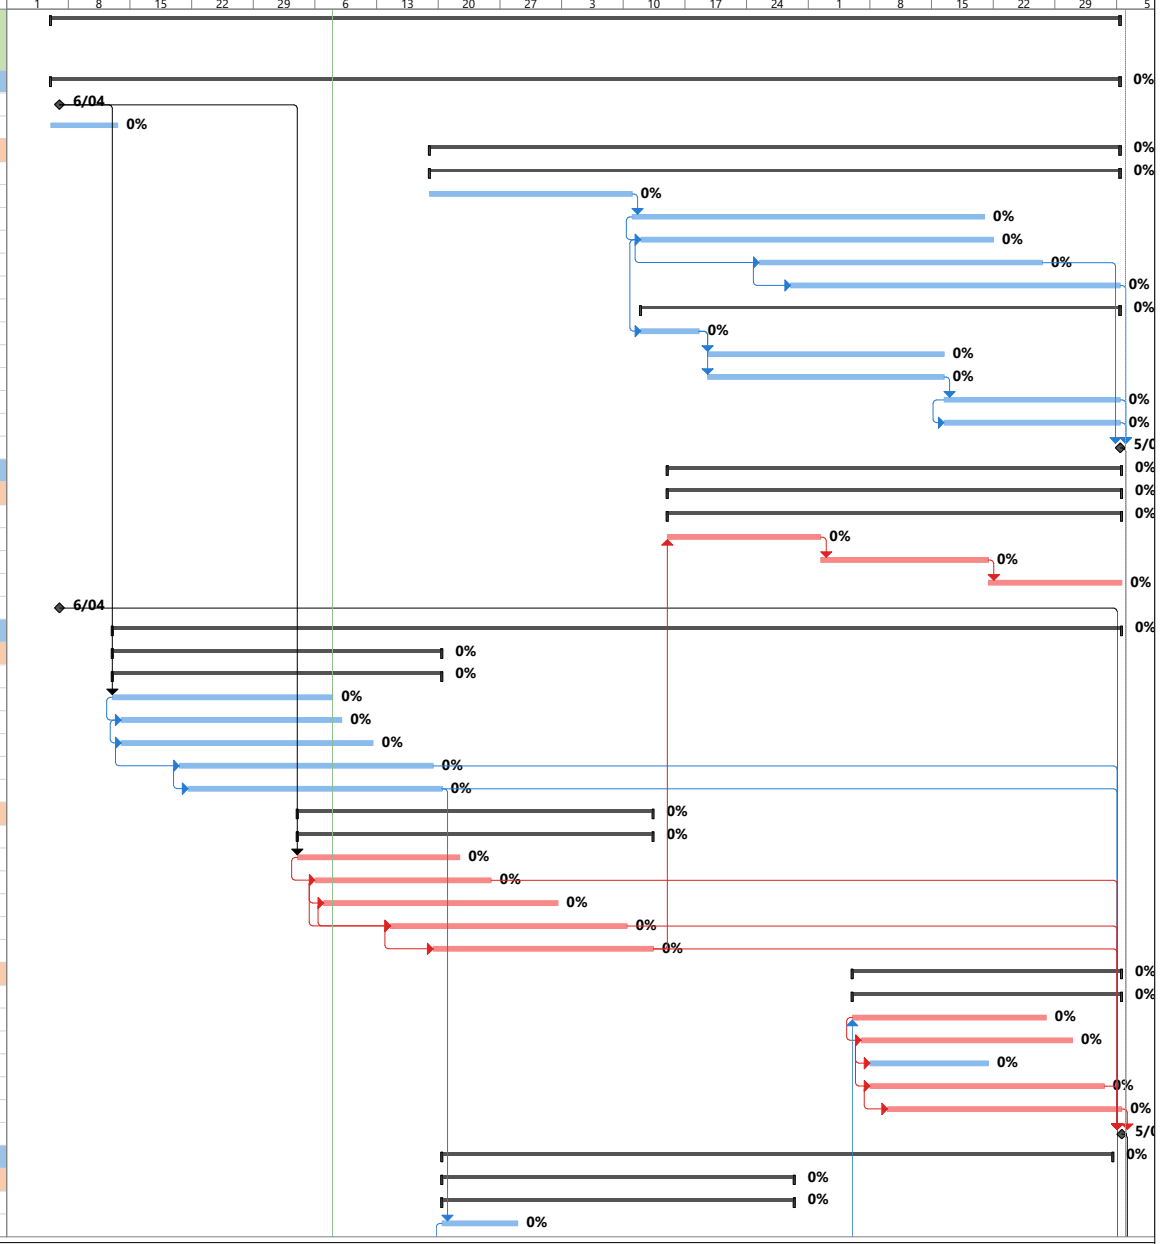


Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

PDT_REPROG_6_06ABRIL_2026_TRAMOS PENDIENTES


Id	Nombre de tarea	% trabajo completado	Duración	Comienzo	Fin
53	T-1 Excavaciones y Rellenos	0%	20 días	vie 22/05/26	mié 17/06/26
54	T-1 Obras hidrosanitarias	0%	20 días	lun 25/05/26	jue 18/06/26
55	T-1 Estructura de Pavimento rigido	0%	20 días	mar 2/06/26	lun 29/06/26
56	T-1 Sardineles y Andenes	0%	18 días	jue 4/06/26	lun 29/06/26
57	**Barrio Olaya Herrera**	**0%**	**28 días**	**lun 29/06/26**	**mar 4/08/26**
58	**Tramo 1**	**0%**	**28 días**	**lun 29/06/26**	**mar 4/08/26**
59	T-2 Preliminares y Demoliciones	0%	10 días	lun 29/06/26	vie 10/07/26
60	T-2 Excavaciones y Rellenos	0%	20 días	mié 1/07/26	lun 27/07/26
61	T-2 Obras Hidrosanitarias	0%	16 días	jue 2/07/26	jue 23/07/26
62	T-2 Estructura de Pavimento rigido	0%	16 días	sáb 11/07/26	vie 31/07/26
63	T-2 Sardineles y Andenes	0%	16 días	mar 14/07/26	mar 4/08/26
64	FINALIZACION COMUNA 2	0%	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26
65	**SEÑALIZACION**	**0%**	**60 días**	**mar 19/05/26**	**mié 5/08/26**
66	Inicio de la señalizacion	100%	0 días	mar 19/05/26	mar 19/05/26
67	Señalización Horizontal y Vertical Tramos Pendientes	0%	60 días	mar 19/05/26	mié 5/08/26
68	FINALIZACION PAVIMENTACION	0%	0 días	mié 5/08/26	mié 5/08/26

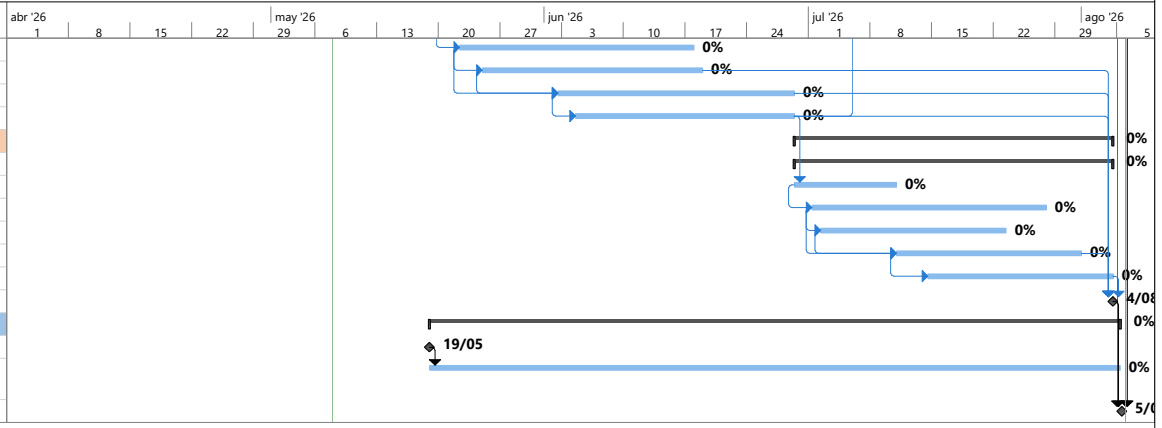

Progreso de tarea crítica	Tarea manual	Tareas críticas	Hito de línea base	Resumen manual	Tarea inactiva
Tarea	solo el comienzo	División crítica	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo
División	solo fin	Línea base	Progreso del resumen	Tareas externas	Resumen inactivo
Progreso de tarea	solo duración	División de la línea base	Resumen	Hito externo	Fecha límite

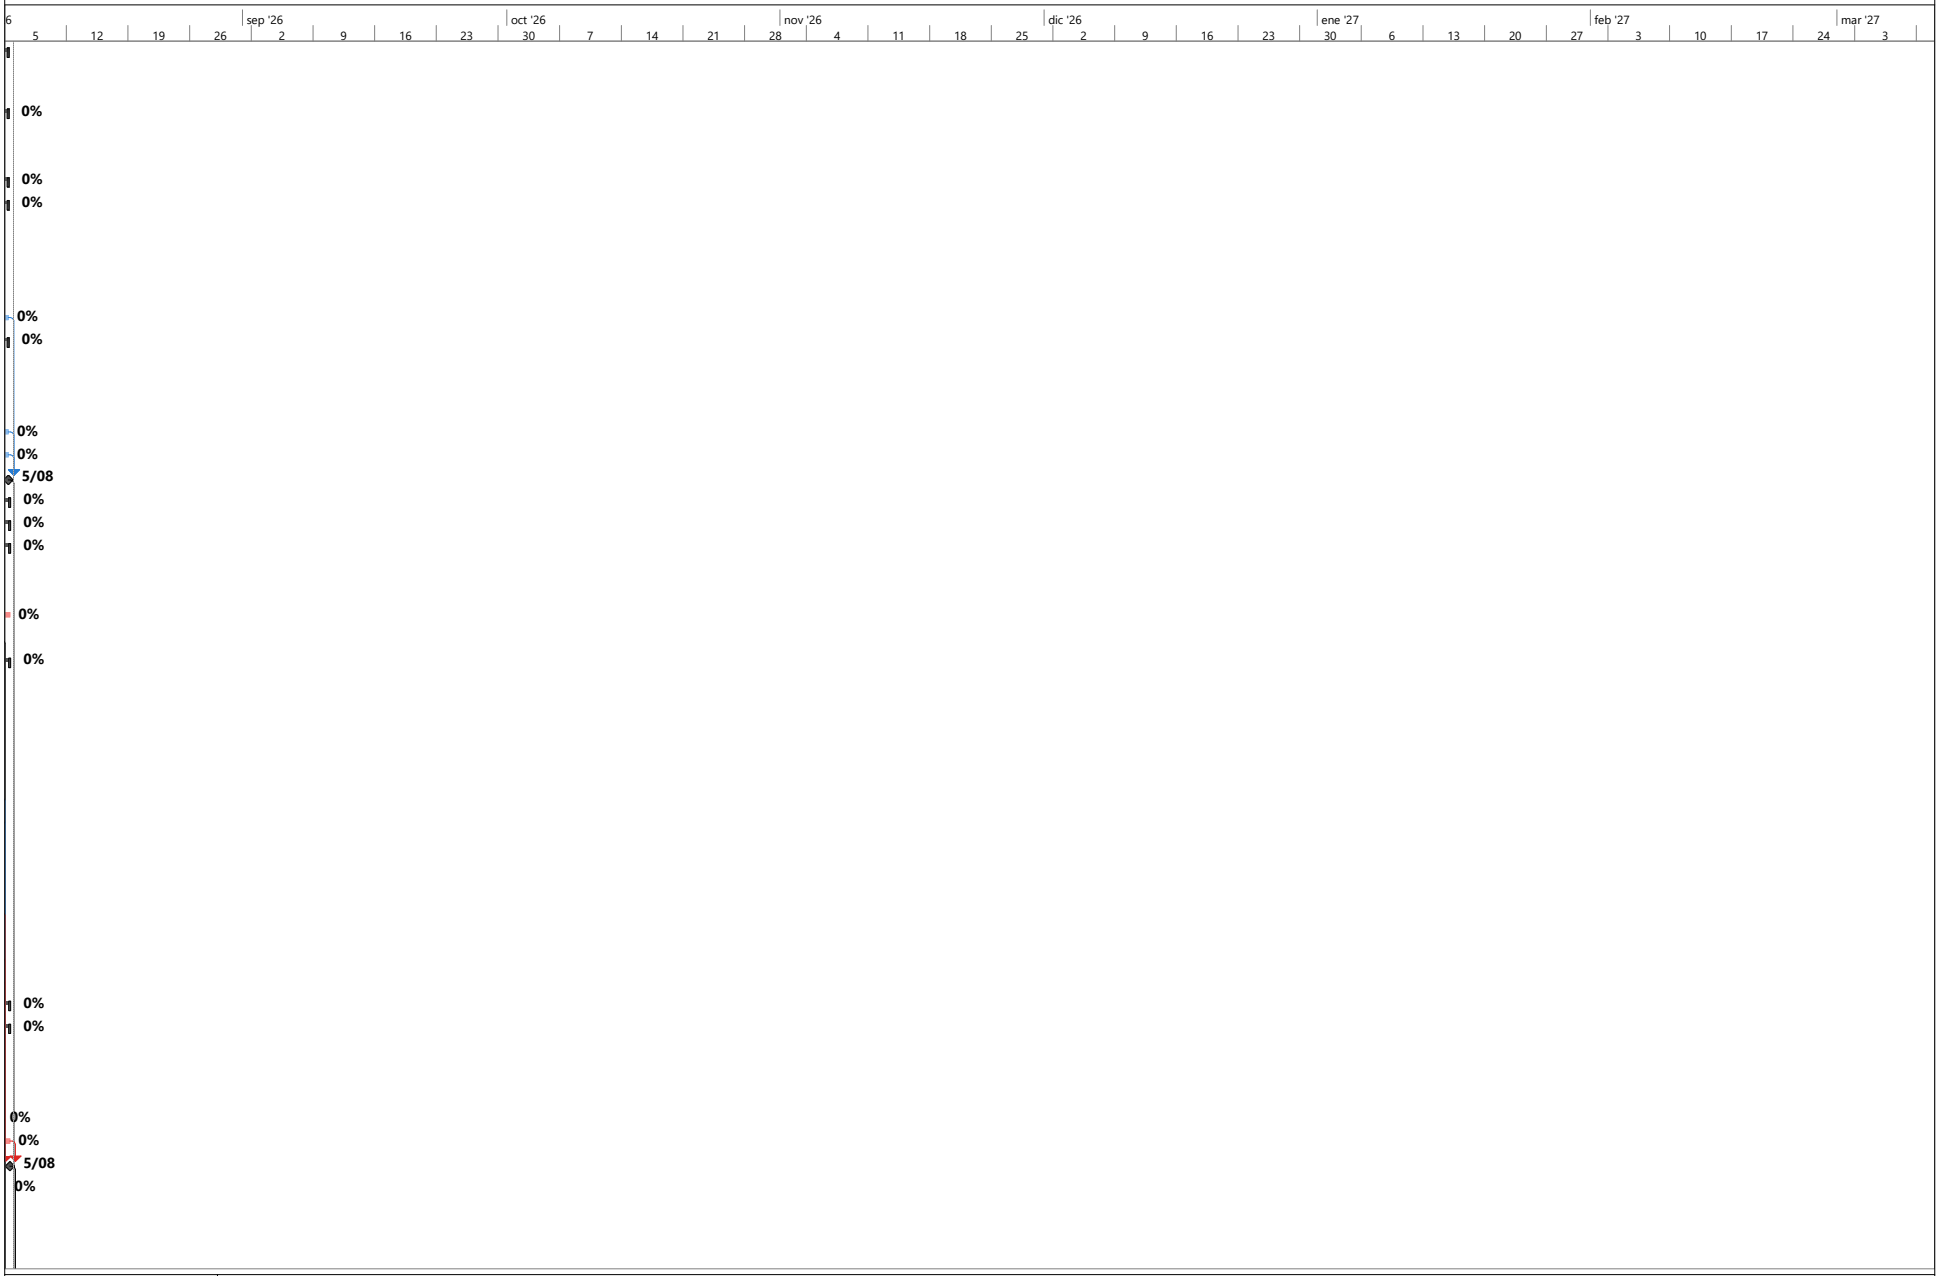

Progreso de tarea crítica		Tarea manual		Tareas críticas		Hito de línea base		Resumen manual		Tarea inactiva	
Tarea		solo el comienzo		División crítica		Hito		Resumen del proyecto		Hito inactivo	
División		solo fin		Línea base		Progreso del resumen		Tareas externas		Resumen inactivo	
Progreso de tarea		solo duración		División de la línea base		Resumen		Hito externo		Fecha límite	

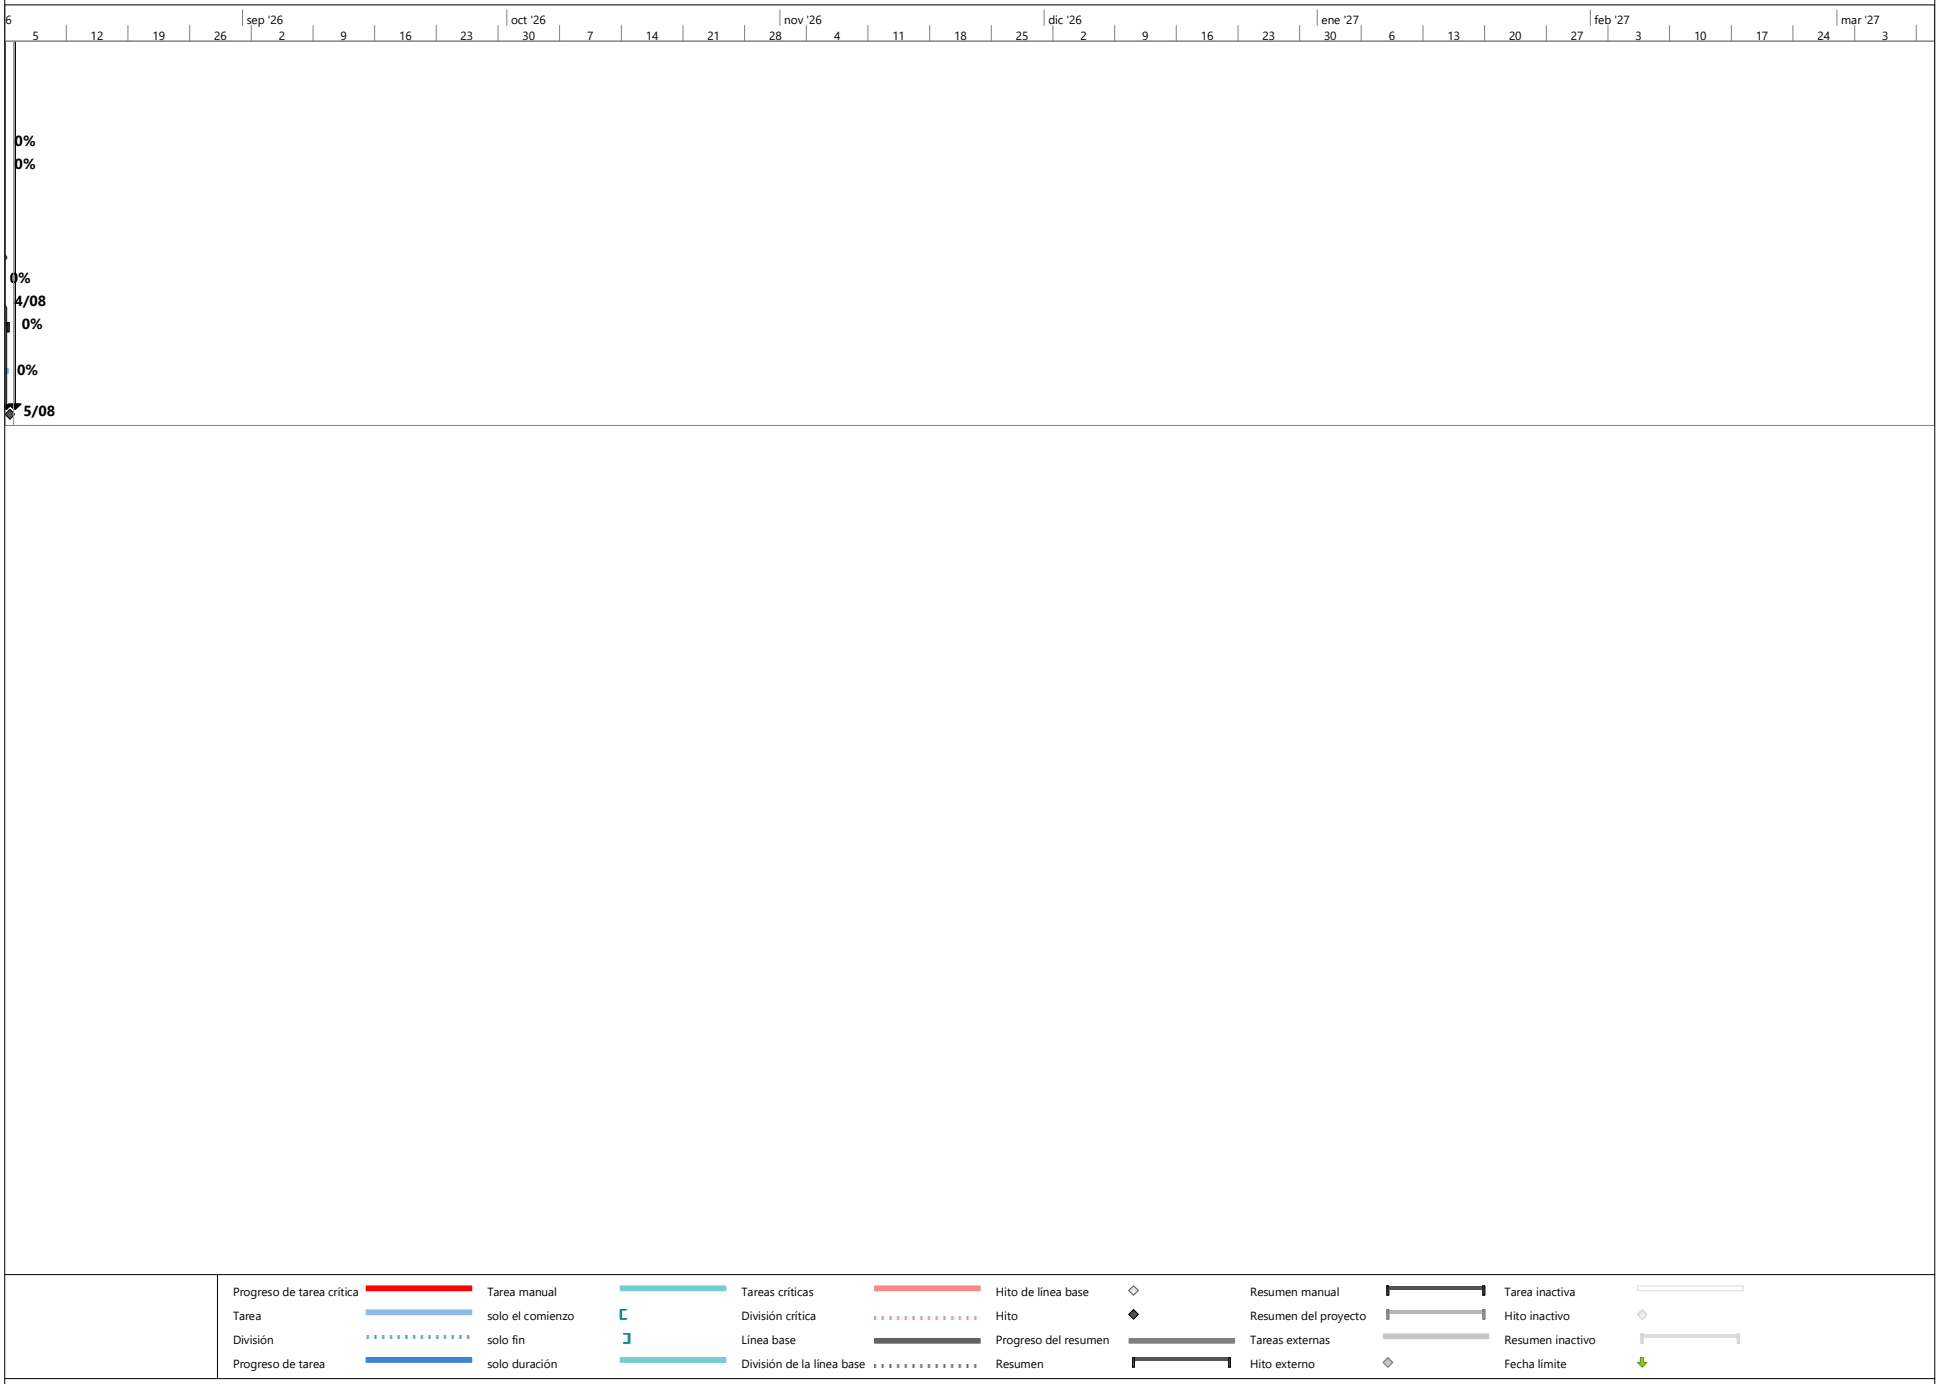
6
sep '26
oct '26
nov '26
dic '26
ene '27
feb '27
mar '27
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3
0%
0%
0%
4/08
0%
0%
5/08
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Tareas críticas
División crítica
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

14.8. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Barrancabermeja, 5 de mayo de 2026

PAVIGAS-1593-23-2026-276

Señores.
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Atn. **ING**. **SANDRA FONSECA**
Profesional III - Distribución

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1593-23 "CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

Asunto: **SOLICITUD DE APROBACIÓN CAMBIO DE MATERIAL DE TUBERÍA PARA EL BARRIO LAS GRANJAS - TRAMO 91 Y TRAMO 92.**

Saludo Cordial,

Teniendo en cuenta las dificultades que actualmente se presentan para la compra de la tubería PVC RDE21 de 14", requerida para la reposición o cambio de la red principal del sistema de agua potable en los tramos 91 y 92 del barrio Las Granjas, lo cual viene afectando de forma negativa la programación y ejecución de las actividades; nos permitimos solicitar muy respetuosamente la aprobación para realizar el cambio del material por tubería de PVC Orientada como alternativa de solución, siendo ésta, de fácil acceso y compra en el mercado.

Es importante señalar que la tubería de PVC Orientada cumple con las características técnicas y equivalentes, a la tubería PVC RDE21", garantizando su funcionalidad, resistencia y durabilidad para las condiciones del proyecto, por lo cual no se vería afectada la calidad ni el desempeño de la red.

Anexamos las especificaciones técnicas del producto propuesto, con el fin de respaldar nuestra solicitud y facilitar su respectiva evaluación.

Atentamente,

JAVIER LEONARDO FLÓREZ GÓMEZ
Director de Obra
PAVIGAS SAS

Diagonal 56 # 18ª – 88 Centro Empresarial San Silvestre piso 6
Teléfono: 6010110-Ext.112
Email: *viaspavigasbca@gmail.com*
Barrancabermeja, Santander

Barrancabermeja, 8 de mayo de 2026

PAVIGAS-1593-23-2026-0277

Señores:
UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTO BCA.
Atn. **ING. FERNANDO ZÚÑIGA VÁSQUEZ**
Representante Legal
Interventoría de Obra

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1593-23 "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

Asunto: **ENTREGA DE INFORME MENSUAL No 22 ABRIL 2026**

Saludo cordial,

De acuerdo con lo establecido, nos permitimos enviar el informe mensual del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"** Contrato N°1593-23 correspondiente al periodo del 06 al 30 de abril 2026 de las áreas SST, Socioambiental, y Técnica.

Agradeciendo su atención,

Atentamente,

JAVIER LEONARDO FLÓREZ GÓMEZ
Director de Obra
PAVIGAS SAS

Diagonal 56 # 18ª – 88 Centro Empresarial San Silvestre piso 6
Teléfono: 6010110-Ext.112
Email: viaspavigasbca@gmail.com
Barrancabermeja, Santander

14.9. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

14.10. INFORME MENSUAL DE OBRA

INFORME TÉCNICO MENSUAL No.22

CONTRATO DE OBRA No. 1593-23: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

ABIRL DE 2026

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 3
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
3 LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO 3
4 PRESUPUESTO DEL CONTRATO 6
5 CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO Y ANALISIS DE DESEMPEÑO 14
6 DESCRIPCIÓN DE ATRASOS Y ADELANTOS 16
7 CUADRO SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO Y AFECTACIONES 17
8 REPORTE DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 18
9 PLANES DE CONTINGENCIA 18
10 MEDIDAS CORRECTIVAS EXIGIDAS POR LA INTERVENTORIA 18
11 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES 18
12 REGISTRO FOTOGRAFICO 22
13 FACTURACIÓN CONTRATO 27
14 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 27

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo principal reportar los aspectos técnicos registrados durante el periodo del 6 al 30 de abril de 2026 del Contrato de Obra No. 1593-23, con objeto "CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona la información general del contrato:

Contratista	PAVIGAS S.A.S.
Contratante	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Numero de contrato	1593-23
Alcance	CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Plazo inicial	10 meses
Fecha de acta de inicio	26 de junio de 2023
Fin previsto	5 de agosto de 2026
Plazo Actual	26 meses
Fin Actual	5 de agosto de 2026
Valor inicial CD+AIU	$ 15.173.386.367,80
Valor adicional	$ 434.000.000
Plan de manejo ambiental	$ 142.104.172,00
Plan de manejo de transito	$ 193.196.447,00
Protocolos COVID	$ 21.575.387,00
Valor total de la obra	$15.964.262.373,80

3 LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO

El proyecto está localizado en el Distrito de Barrancabermeja, en el cual se intervendrán las vías de los tramos relacionados a continuación:

ID	CODIGO	COMUNA	BARRIO	CODIGO CONSULTORIA	DIRECCIONES - TRAMOS DE VIAS	Longitud (m)	Ancho Típico (m)	Área (m2)
1	1	2	OLAYA HERRERA	001-02-OH-01	Carrera 15 A con Calle 54 A al fondo - Callejón	54,03	2,20	120,01
2	2		TORCOROMA	002-02-TO-01	Carrera 18 A con Calle 54 al fondo	33,32	3,60	120,39
3	200	3	COLINAS DEL NORTE	200-03-CN-01	Calle 1 (Calle 77 A)	190,05	4,89	973,00
4	201			201-03-CN-01	Calle 2 (Calle 77)	231,10	5,00	1187,60
5	202			202-03-CN-02	Carrera 1	41,24	5,00	211,14
6	206			206-03-CN-06	Carrera 5	31,39	2,80	91,52
7	16		JERUSALEN	016-03-JE-01	Calle 75 desde la entrada "Vía al Llanito" hasta la carrera 75 A	219,73	5,00	1084,30
8	17			017-03-JE-04	callejón 2 entre Calles 75 y 76	31,00	5,00	158,00
9	19			019-03-JE-06	CRA 75 A desde la Calle 75 hasta empalmar con la Calle 75 B	89,15	5,00	507,93
10	21			021-03-JE-08	Desde la bahía hasta la diagonal 60 "Vía Llanito"	238,07	6,60	1826,00
11	22			022-03-JE-07	Calle 75 B desde Box hasta la bahía	169,22	6,00	1018,91
12	24		CAMINOS DE SAN SILVESTRE	024-03-SS-17	Carrera 36A entre Calles 83 y 82 A	30,71	4,40	138,99
13	26			026-03-SS-12	Carrera 39 entre Calles 84 y 85	64,98	4,20	277,25
14	48		SANTA ISABEL	048-03-SI-03	Calle 77 entre Carrera 30 y línea Férrea	171,91	6,00	1034,69
15	52		BRISAS DE LA LIBERTAD	052-03-BL-03	Calle 76 entre carreras 21A y 24	198,24	6,20	1246,96
16	60	4	BUENAVISTA I ETAPA	060-04-BU-01	Calle 29A entre CRA 58 y 60	90,97	5,40	514,99
17	61			061-04-BU-02	CRA 60 entre calle 29A, 29B y 31	135,39	7,10	955,17
18	300		LOS LAGOS	300-04-LL-04	Calle 37 entre Carrera 50 y Carrera 51 a	48,00	4,00	203,01
19	209		BUENAVISTA	209-04-BU-01	Sector Gorgona, Diagonal 58 Manzana 34, al fondo	105,71	4,00	423,15
20	80	5	LAS CAMELIAS	080-05-LC-01	Calle 58 entre Avenida 36 y Carrera 37	73,91	6,60	493,22
21	81			081-05-LC-02	Carrera 37 con Calle 58	28,48	6,00	176,53
22	86	6	BOSTON	086-06-BS-02	Diagonal 62 con Transversal 54 al fondo	34,34	1,70	71,11
23	87			087-06-BS-03	Diagonal 61 con Transversal 54 al fondo	25,45	2,30	59,93
24	89		SAN PEDRO	089-06-SP-01	Diag. 58 entre transv 47B, 47C y 48	118,68	6,00	729,28
25	211			211-06-SP-05	Detrás del Puesto de salud desde la Diagonal 57 hasta empalmar con la Transversal 47	97,36	3,20	334,43
26	90		LAS GRANJAS	090-06-GR-01	Transversal 44A con Diagonal 59 al fondo-Peatonal	51,28	1,80	92,30
27	91			091-06-GR-02	Transversal 44 entre Diagonal 57 y entrada al Barrio Manzanares	107,45	6,00	655,47
28	92			092-06-GR-03	Diagonal 56 entre Transversal 43C y Transversal 44	54,14	6,00	352,58
29	93			093-06-GR-04	Transversal 42A entre Diagonales 58, 58A y 59	103,52	4,90	510,66
30	94			094-06-GR-05	Diagonal 58A con Transversal 42A al fondo	51,58	4,90	256,59
31	210			210-06-GR-06	Transversal 46B con Diagonal 64 al fondo	51,32	2,80	143,70
32	95		20 DE JULIO	095-06-VJ-01	Transversal 46 entre Diagonales 58, 59 y 60	214,25	6,10	1318,41
33	96			096-06-VJ-02	Transversal 45C con Diagonal 59 al fondo	51,34	1,80	93,38
34	97			097-06-VJ-03	Transversal 45D con Diagonal 59 al fondo	52,01	1,80	94,59

35	99		LOS ALPES	099-06-AL-01	Transv 46B con Diag. 60 costado Escuela Manuela Beltrán	53,13	1,80	95,63
36	100		BRISAS DEL ORIENTE	100-06-BO-01	Diag. 55A entre entrada principal hasta calle 72	172,22	5,00	949,61
37	101			101-06-BO-02	Calle 72 con Diag. 55A al fondo	193,30	5,00	1005,71
38	102			102-06-BO-03	Callejón 1 con calle 72 al fondo (Peatonal)	75,36	5,00	390,45
39	103			103-06-BO-04	Callejón 2 con calle 72 al fondo (Peatonal)	37,78	2,30	89,58
40	105			105-06-BO-06	Callejón 4 con calle 72 al fondo (Peatonal)	34,80	2,50	97,75
41	106			106-06-BO-07	Calle 72A entre callejones 2 y 4	101,23	3,30	336,16
42	108		CORINTO	108-06-CO-02	Transversal 57 A con diagonal 56 A al fondo	35,69	4,00	142,76
43	111		EL PROGRESO	111-06-PR-03	Transversal 43 A con Av. Pozo Siete al Fondo - Callejón 3ro	25,69	3,30	86,63
44	113	7	EL CAMPIN	113-07-CP-02	Carrera 58 A con Calle 45 A	26,73	3,90	108,39
45	114			114-07-CP-03	Calle 45 A entre Carreras 58 A y 59	34,35	6,00	215,46
46	115			115-07-CP-04	Calle 45 entre CRA 61 vía principal y CRA 59	95,77	5,00	489,94
47	117		DIVINO NIÑO	117-07-DN-01	Calle 44A entre Carreras 53 y 54	33,68	5,80	200,79
48	123		VILLALELYS II	123-07-VY-01	Carrera 54 entre Calle 50 y Calle 49 A	57,62	6,00	377,10
49	125			125-07-VY-03	Carrera 56B entre Calles 48 A y 48 B	30,92	2,30	71,85
50	127			127-07-VY-05	Carrera 56A con Calle 48A al fondo	38,02	2,40	93,50
51	128		MARIA EUGENIA	128-07-ME-01	Calle 43A entre CRA 60 y 64 "Vía Principal"	71,63	5,00	375,39
52	130		URBANIZACION CAMPESTRE	130-07-UC-01	Carrera 58 con Calle 40 al fondo	114,22	4,00	458,67
53	132		ALTOS DEL CAMPESTRE	132-07-AC-01	Carrera 52 con Calle 38 al fondo	96,11	5,00	490,49
54	133			133-07-AC-02	Carrera 52A con Calle 38 al fondo	53,97	5,00	276,72
55	134			134-07-AC-03	Calle 37C con Carrera 52A al fondo	25,56	2,00	52,11
56	223		EL POBLADO	223-07-EP-01	Carrera 54 Bis	245,70	4,67	1469,14
57	224			224-07-EP-02	Calle 50 A	49,20	2,50	132,38
						4992,00		**25481,40**

4 PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto del contrato se encuentra desglosados en los ítems relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
1.1	**Preliminares y adecuación del terreno**				
1.1.1	Localización y replanteo (Vía)	m2	5.815,40	$ 4.918,88	$ 126.982.854,75
1.1.2	Localización y replanteo (Hidrosanitario)	ml	4.382,71	$ 3.274,74	$ 14.352.235,75
1.1.3	Limpieza y desmonte zona de trabajo (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m2	478,14	$ 14.904,14	$ 7.126.265,50
1.1.4	Tala de árboles < 8 m (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	und	18,00	$ 320.142,76	$ 5.762.569,68
1.1.5	Bombeo y manejo de aguas	día	312,00	$ 114.965,17	$ 35.869.133,04
1.1.6	Apiques L= 1.0, 1.0, H=1.5-2.0 (Incluye corte, demolición pavimento, excavación, señalización)	und	122,00	$ 305.802,90	$ 37.307.953,80
1.1.7	Barrera con cinta plástica (incluye base en madera)	ml	3.122,40	$ 8.592,82	$ 26.830.221,17
1.2	**Demoliciones y Retiros**		-		
1.2.1	Corte con disco	ml	.556,69	$ 21.816,29	$ 121.226.360,48
1.2.2	Demolición de estructuras en concreto (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	93,25	$ 429.662,65	$ 40.066.042,11
1.2.3	Demolición de sardineles (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	ml	2.983,69	$ 30.838,07	$ 92.011.241,08
1.2.4	Demolición de andenes, morteros o adoquines, e ≤10 cm (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m2	2.529,60	$ 44.171,15	$ 111.735.341,04
1.2.5	Demolición de pavimento rígido, e ≤ 20 cm (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m2	359,29	$ 88.087,91	$ 31.649.105,18
1.2.6	Demolición de pavimento flexible, e ≤ 5 cm (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m2	8.638,68	$ 17.851,41	$ 154.212.618,54
1.2.7	Demolición de tubería existente (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	ml	3.818,53	$ 25.415,80	$ 97.050.994,77
1.2.8	Demolición de cajas de inspección (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	und	245,00	$ 69.452,99	$ 17.015.982,55
1.2.9	Demolición de pozos de inspección, h > 2 m (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	und	24,00	$ 827.173,27	$ 19.852.158,48

1.2.10	Demolición de pozos de inspección, h < =2 m (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	und	12,00	$	414.612,36	$	4.975.348,32
1.2.11	Reubicación de poste de 8 metros (incluye Desmonte, Desinstalación e Instalación con facilidades desmontadas)	und	15,00	$	2.340.865,50	$	35.112.982,50
1.2.12	Desinstalación de poste de 8 metros	und	11,00	$	599.409,41	$	6.593.503,51
1.2.13	Desinstalación de poste de 12 metros	und	4,00	$	792.906,19	$	3.171.624,76
1.2.14	Desinstalación de cable de acero 1/4 estructura Poste a Poste	ml	150,00	$	2.456,06	$	368.409,00
1.2.15	Desinstalación de bayoneta sencilla	und	15,00	$	49.428,34	$	741.425,10
1.2.16	Desinstalación e instalación de líneas telefónicas	ml	75,00	$	74.152,65	$	5.561.448,75
1.2.17	Desinstalación de aislador de pin 15 kv	und	15,00	$	149.022,50	$	2.235.337,50
1.2.18	Desinstalación e instalación de acometida de A.P.	und	15,00	$	103.607,76	$	1.554.116,40
1.2.19	Desinstalación e instalación de luminaria de A.P.	und	15,00	$	103.607,76	$	1.554.116,40
1.2.20	Suministro e instalación de poste de 8 MTS 750 KG	und	11,00	$	3.409.053,16	$	37.499.584,76
1.2.21	Suministro e instalación de poste de 12 MTS 1050 KG	und	4,00	$	4.085.653,16	$	16.342.612,64
1.2.22	Suministro e instalación de estructura de paso en circuito 7	und	15,00	$	949.612,16	$	14.244.182,40
1.2.23	Desinstalación e instalación de acometida trifásica	und	15,00	$	296.693,16	$	4.450.397,40
1.2.24	Desinstalación e instalación de ramal de baja tensión en la estructura de B.T.	und	15,00	$	74.172,95	$	1.112.594,25
1.2.25	Desinstalación de líneas telefónicas y herrajes, accesorios de comunicación	und	15,00	$	74.172,95	$	1.112.594,25
1.2.26	Trabajos a realizar con línea viva y grupo de redes Grúa	und	30,00	$	1.285.540,00	$	38.566.200,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		-				
2.1	**Excavaciones**		-				
2.1.1	Excavación a máquina en material común	m3	10.913,00	$	35.413,24	$	386.464.688,12
2.1.2	Excavación con máquina para alcantarillado	m3	6.531,51	$	41.359,20	$	270.138.028,39
2.1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, en material común	m3	4.998,81	$	77.082,33	$	385.319.922,03
2.1.4	Excavación manual de 2 a 4 m, en material común	m3	221,95	$	112.220,88	$	24.907.424,32

2.1.5	Entibado temporal <4m	m2	7.254,36	$ 43.663,70	$ 316.752.198,73
2.1.6	Entibado temporal >4m	m2	2.697,00	$ 59.082,07	$ 159.344.342,79
2,2	**Rellenos**		-		
2.2.1	Relleno compactado con material seleccionado de sitio	m3	5.624,64	$ 49.535,24	$ 278.617.892,31
2.2.2	Relleno compactado con material de préstamo	m3	3.204,22	$ 94.599,51	$ 303.117.641,93
2.2.3	Relleno con material granular (Arena)	m3	739,25	$ 104.200,46	$ 77.030.190,06
2.2.4	Relleno manual con material granular (Subbase)	m3	228,58	$ 267.422,09	$ 61.127.341,33
2.2.5	Relleno con bolo	m3	52,00	$ 282.116,49	$ 14.670.057,48
2.2.6	Cargue y disposición final de materiales provenientes de la excavación	m3	16.705,44	$ 42.556,79	$ 710.929.901,94
2.2.7	Transporte de materiales provenientes de la excavación	m3-km	397.517,61	$ 2.193,34	$ 871.976.778,24
3	**OBRAS HIDROSANITARIAS**		-		
3,1	**ACUEDUCTO**		-		
3.1.1	**Concretos**		-		
3.1.1.1	Concreto (3000 psi) para atraque de accesorios 3" y 4" y válvulas con Sikaset L y Plastocrete DM	und	42,00	$ 295.196,52	$ 12.398.253,84
3.1.2	**Suministro e instalación tubería acueducto**		-		
3.1.2.1	Sum. E Inst. Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3"	ml	561,20	$ 66.825,08	$ 37.502.234,90
3.1.3	**Suministro e instalación accesorios acueducto**		-		
3.1.3.1	Sum. E Inst. TEE HD 3"X3" J.H.	und	6,00	$ 353.223,09	$ 2.119.338,54
3.1.3.2	Sum. E Inst. de codo PVC 45X3"	und	22,00	$ 210.672,94	$ 4.634.804,68
3.1.3.3	SUM. E INST. REDUCCION HD 3" X 2" J.H.	und	1,00	$ 260.739,99	$ 260.739,99
3.1.3.4	Sum. E Inst. de codo PVC 11.25X3"	und	6,00	$ 152.711,33	$ 916.267,98
3.1.3.5	Sum. E Inst. de codo PVC 22.50X3"	und	2,00	$ 160.335,26	$ 320.670,52
3.1.3.6	Sum. E Inst. de codo PVC 90X3"	und	2,00	$ 217.440,30	$ 434.880,60

3.1.3.7	Sum. E Inst. CRUZ HD 3"X3"	und	1,00	$ 349.144,54	$ 349.144,54
3.1.3.8	Sum. E Inst. Tapón PVC 3"	und	1,00	$ 111.808,15	$ 111.808,15
3.1.4	**Elementos hidráulicos acueducto**		-		
3.1.4.1	SUM. E INST. VALVULA C.E. 3" J.H O E. L	und	1,00	$ 725.669,74	$ 725.669,74
3.1.5	**Actividades complementarias acueducto**		-		
3.1.5.1	Empalme a tubería PVC 2"	und	1,00	$ 323.632,67	$ 323.632,67
3.1.5.2	Empalme a tubería PVC 3"	und	6,00	$ 487.862,43	$ 2.927.174,58
3.1.5.3	Empalme a tubería AC 3"	und	1,00	$ 487.862,43	$ 487.862,43
3.1.5.4	Rehabilitación acometida domiciliaria tipo flexible y rígida 3" x 1/2", 3/4", 1" (Incluye Tubería)	und	65,00	$ 202.653,88	$ 13.172.502,20
3.1.6	**Estructuras acueducto**		-		
3.1.6.1	CAJA DE 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO REFORZADO CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS (Incluye Tapa Válvula HD Tráfico Pesado)	und	1,00	$ 2.511.380,88	$ 2.511.380,88
3,2	**ALCANTARILLADO**		-		
3.2.1	**Concretos**		-		
3.2.1.1	Concreto ciclópeo de 2500 PSI	m3	64,48	$ 810.606,04	$ 52.267.726,54
3.2.1.2	Concreto reforzado Clase D 3000 PSI	m3	9,53	$ 1.044.405,17	$ 9.953.181,27
3.2.1.3	Concreto pobre o solado 2000 PSI	m3	5,68	$ 663.538,91	$ 3.768.901,01
3.2.1.4	Acero de refuerzo	kg	1.065,00	$ 11.917,63	$ 12.692.275,95
3.2.2	**Tuberías**		-		
3.2.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC (160 mm) 06", incluye accesorios, hidrosellos y lubricante	ml	1.902,40	$ 77.975,44	$ 148.340.477,06
3.2.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC (200 mm) 08", incluye accesorios, hidrosellos y lubricante	ml	1.745,99	$ 102.734,94	$ 179.374.177,89
3.2.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC (250 mm) 10", incluye accesorios, hidrosellos y lubricante	ml	109,85	$ 132.639,31	$ 14.570.428,20
3.2.2.4	Tubería PVC Ø 315 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 12"	ml	148,95	$ 198.713,36	$ 29.598.354,97

3.2.2.5	Tubería PVC Ø 355 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 14"	ml	136,13	$	261.734,59	$	35.629.929,74
3.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC (500 mm) 20", incluye accesorios, hidrosellos y lubricante	ml	23,69	$	519.963,04	$	12.317.924,42
3.2.2.7	Accesorio PVC KIT SILLA YEE Ø 8" x Ø 6" (Incluye hidrosellos, acondicionador, adhesivo, abrazadera inoxidable y lubricante)	und	351,00	$	326.274,11	$	114.522.212,61
3.2.2.8	Empalmes colectores	und	9,00	$	167.328,59	$	1.505.957,31
3.2.3	**Pozos de Inspección**		-				
3.2.3.1	Placa corona para pozo en concreto reforzado de 4000 PSI (Incluye Acelerante) para pozo de Descarga pluvial (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo), incluye tapa en concreto	und	13,00	$	931.710,68	$	12.112.238,84
3.2.3.2	Placa en concreto reforzado de 4000 PSI (Incluye Acelerante) para pozo de inspección Tipo I (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo), sin reducción, incluye Tapa Aro en HF 63 CM Tipo Pesado.	und	54,00	$	1.307.767,66	$	70.619.453,64
3.2.3.3	Placa en concreto reforzado de 4000 PSI (Incluye Acelerante) para pozo de inspección Tipo 2 (Ø= 1.20 m interno / 1.80 m Externo), sin reducción, incluye Tapa Aro en HF 63 CM Tipo Pesado.	und	6,00	$	1.760.599,80	$	10.563.598,80
3.2.3.4	Base y cañuela en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de inspección Tipo I (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo)	und	54,00	$	949.959,93	$	51.297.836,22
3.2.3.5	Base y cañuela en concreto reforzado de 4000 PSI Impermeabilizado para pozo de Descarga pluvial (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo)	und	13,00	$	973.239,03	$	12.652.107,39
3.2.3.6	Base y cañuela en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de inspección Tipo 2 (Ø= 1.20 m interno / 1.80 m Externo)	und	6,00	$	1.798.651,79	$	10.791.910,74
3.2.3.7	Cilindro en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de inspección Tipo I (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo)	ml	111,24	$	1.888.222,80	$	210.045.904,27
3.2.3.8	Cilindro en concreto reforzado de 4000 PSI Impermeabilizado para pozo de Descarga pluvial (Ø= 1.20 m interno), con pantallas internas de disipación	ml	34,58	$	2.352.378,52	$	81.345.249,22
3.2.3.9	Cilindro en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de inspección Tipo 2 (Ø= 1.20 m interno / 1.80 m Externo)	ml	32,76	$	3.229.283,25	$	105.791.319,27
3.2.3.10	Nivelación de pozo de inspección	und	85,00	$	[illegible]	$	[illegible]
3.2.4	**Sumideros y Cajas**		-				
3.2.4.1	Sumidero Lateral SLR-200 en concreto reforzado de 3000 PSI y rejilla en hierro fundido	und	30,00	$	4.205.086,59	$	126.152.597,70

3.2.4.2	Sumidero Transversal STR-60 en concreto reforzado de 3000 PSI y rejilla en hierro fundido	ml	72,00	$	2.361.794,09	$	170.049.174,48
3.2.4.3	Nivelación de Sumidero	ml	88,90	$	588.248,22	$	52.295.266,76
3.2.4.4	Caja de 0.80 X 0.80 m con tapa en concreto y hierros	und	225,00	$	860.549,95	$	193.623.738,75
3.2.4.5	Caja de 0.60 X 0.60 m con tapa en concreto y hierros	und	126,00	$	592.497,27	$	74.654.656,02
3.2.6	**Obras varias - Reparaciones**		-				
3.2.6.1	Reparaciones domiciliarias de acueducto tipo flexible y rígida 3" x 1/2", 3/4", 1" (Incluye Tubería)	und	233,00	$	78.884,79	$	18.380.156,07
3.2.6.2	Reparaciones domiciliarias de gas (Con acompañamiento de Empresa de servicios públicos)	und	213,00	$	262.380,07	$	55.886.954,91
4	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**		-				
4.1	Conformación y compactación de la subrasante	m2	25.481,40	$	2.837,66	$	72.307.549,52
4.2	Subbase granular	m3	4.474,79	$	230.835,62	$	1.032.940.924,02
4.3	Concreto MR 3.5 MPa	m3	3.178,46	$	1.024.178,89	$	3.255.311.634,71
4.4	Concreto MR 4.2 MPa	m3	997,60	$	1.108.092,18	$	1.105.432.758,77
4.5	Canastilla en acero de refuerzo (Barra lisa de 3/4", L=30 cm, c/30 cm), conformada en grafil de 6 mm	ml	7.511,31	$	59.310,76	$	445.501.504,70
4.6	Canastilla en acero de refuerzo (Barra lisa de 7/8", L=35 cm, c/30 cm), conformada en grafil de 6 mm	ml	1.871,43	$	71.235,15	$	133.311.596,76
4.7	Canastilla en acero de refuerzo (Barra lisa de 1", L=40 cm, c/30 cm), conformada en grafil de 6 mm	ml	125,70	$	87.251,63	$	10.967.529,89
4.8	Acero de refuerzo	kg	11.289,27	$	11.917,63	$	134.541.342,83
4.9	Corte y sellado de juntas	ml	21.497,60	$	32.946,36	$	708.267.668,74
5	**SARDINELES**		-				
5.1	Sardinel Prefabricado en concreto de 3000 PSI (80 x 20 x 50 cm)	ml	8.423,00	$	88.029,72	$	741.474.331,56
5.2	Sardinel Prefabricado en concreto de 3000 PSI (80 x 15 x 45 cm)	ml	1.772,00	$	88.745,56	$	157.257.132,32
5.3	Concreto de 3000 psi para ajuste andenes (e=10 cm) por reparación	m2	1.174,62	$	115.268,28	$	135.396.427,05
5.4	Empradización por reparación	m2	251,25	$	39.447,13	$	9.911.091,41

5.5	Reparación de zonas duras (incluye zonas verdes, andenes, antejardín, bordillos, tierra negra, empradización)	m2	166,00	$	261.445,01	$	43.399.871,66
6	**SEÑALIZACION VIAL**		-				
6,1	Suministro y Aplicación de Imprimante para marcas viales.	m2	727,81	$	23.779,78	$	17.307.161,68
6,2	Suministro y Aplicación de pintura acrílica para marca vial (Incluye microesfera y antideslizante)	m2	727,81	$	59.375,71	$	43.214.235,50
6,3	Suministro y Aplicación de Imprimante para línea de demarcación. Ancho=15 cms	ml	12.571,68	$	3.040,64	$	38.225.953,08
6,4	Suministro y aplicación de pintura de tráfico, línea de demarcación con microesfera de vidrio, Ancho=12cms.	ml	12.571,68	$	5.125,92	$	64.441.425,95
6,5	Suministro e instalación de tachas reflectivas	und	570,00	$	18.122,05	$	10.329.568,50
6,6	Suministro e instalación de Señal Vertical Sencilla Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 3.5m en lámina galvanizada cal. 16 Dúplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	und	85,00	$	876.788,35	$	74.527.009,75
6,7	Suministro e instalación de señal Vertical Doble Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 4,0 m en lámina galvanizada cal. 16 Dúplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	und	40,00	$	946.248,10	$	37.849.924,00
6,8	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto en concreto reforzado de 4,000 PSI, incluye pintura	ml	107,70	$	1.604.586,67	$	172.813.984,36
6,9	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura y ancho de 50 cm	m2	25,68	$	270.181,27	$	6.938.255,01
7	**ITEM NO PREVISTOS**						
7.2	Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 400 mm (incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 16"	ml	112,00		$ 282.240,46	$	31.610.931,52
7.3	Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 24 " (incluye accesorios, hidrosellos y lubricante)	ml	22,00		$ 600.015,74	$	13.200.346,28
7.4	Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 27" (incluye accesorios, hidrosellos y lubricante)	ml	71,00		$ 725.167,81	$	51.486.914,51
7.5	Cilindro en concreto de 3000 PSI para pozos de inspección Tipo I (Ø= 1.20 m)	ml	14,83		$ 1.506.390,00	$	22.339.763,70
7.6	Placa Corona en concreto de 3000 PSI reforzado para pozos inspección tipo I (Ø= 1.20 m), sin reducción, incluye para Aro en HF 63 cm tipo pesado	und	13,00		$ 928.025,00	$	12.064.325,00
7.7	Base y Cañuela en concreto de 3000 PSI para pozos inspección tipo I (Ø= 1.20 m) con cilindro en concreto	ml	13,00		$ 839.156,00	$	10.909.028,00

COSTO DIRECTO + AUI		$	15.607.386.367,80
ADMINISTRACION	**31,5%**	$	3.614.946.107,25
IMPREVISTO	**0,5%**	$	57.380.096,94
UTILIDAD	**4,0%**	$	459.040.775,52
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$	142.104.172,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		$	193.196.447,00
PROTOCOLOS COVID		$	21.575.387,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA		$	15.964.262.373,80

5 CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO Y ANALISIS DE DESEMPEÑO


En el siguiente cuadro se describe el cronograma detallado actualizado del contrato, acorde la reprogramación No. 6 en el cual se puede observar el desempeño, de acuerdo con la desviación actual en cada uno de los tramos viales del contrato. El anexo No.1 contiene el PDT actualizado a la fecha de corte del presente informe.

1	**1**		**CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	**0%**	**93 días**	**lun 6/04/26**	**mié 5/08/26**	
2	**1.1**	**6**	**COMUNA 6**	**0%**	**93.67 días**	**lun 6/04/26**	**mié 5/08/26**	
3	1.1.1		REINICIO DE OBRA 06 DE ABRIL DE 2026	0%	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	
4	1.1.2		Alistamiento, Socializaciones, Actas de Vec	0%	6 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26	
5	**1.1.3**	**6**	**Barrio Las Granjas**	**0%**	**82 días**	**mar 21/04/26**	**mié 5/08/26**	
6	**1.1.3.1**		**Tramos 91**	**0%**	**73 días**	**mar 21/04/26**	**vie 24/07/26**	
7	1.1.3.1	6	T-91 Preliminares y Demoliciones	0%	25 días	mar 21/04/26	vie 22/05/26	
8	1.1.3.1	6	T-91 Excavaciones y Rellenos	0%	40 días	vie 22/05/26	mar 14/07/26	7
9	1.1.3.1	6	T-91 Obras Hidrosanitarias	0%	40 días	lun 25/05/26	mié 15/07/26	8CC+1 día
10	1.1.3.1	6	T-91 Estructura de Pavimento rigido	0%	30 días	sáb 6/06/26	mié 15/07/26	9CC+10 días
11	1.1.3.1	6	T-91 Sardineles y Andenes	0%	35 días	mar 9/06/26	vie 24/07/26	10CC+2 días
12	**1.1.3.2**		**Tramos 92**	**0%**	**56 días**	**lun 25/05/26**	**mié 5/08/26**	
13	1.1.3.2	6	T-92 Preliminares y Demoliciones	0%	10 días	lun 25/05/26	vie 5/06/26	9CC
14	1.1.3.2	6	T-92 Excavaciones y Rellenos	0%	25 días	lun 8/06/26	vie 10/07/26	13FC+1 día
15	1.1.3.2	6	T-92 Obras Hidrosanitarias	0%	25 días	lun 8/06/26	vie 10/07/26	13FC+1 día
16	1.1.3.2	6	T-92 Estructura de Pavimento rigido	0%	20 días	vie 10/07/26	mié 5/08/26	15
17	1.1.3.2	6	T-92 Sardineles y Andenes	0%	20 días	vie 10/07/26	mié 5/08/26	16CC
18	1.2	6	FINALIZACION COMUNA 6	0%	0 días	mié 5/08/26	mié 5/08/26	10;11;16;17
19	**1.3**	**3**	**COMUNA 3**	**0%**	**38 días**	**mié 17/06/26**	**mié 5/08/26**	
20	**1.3.1**	**3**	**Barrio Colinas del Norte**	**0%**	**38 días**	**mié 17/06/26**	**mié 5/08/26**	
21	**1.3.1.1**	**3**	**Cabezales de entrega (Adicional)**	**0%**	**38 días**	**mié 17/06/26**	**mié 5/08/26**	
22	1.3.1.1	3	T-205 Cabezal de entrega	0%	13 días	mié 17/06/26	vie 3/07/26	46
23	1.3.1.1	3	T-204 Cabezal de entrega	0%	13 días	vie 3/07/26	mar 21/07/26	22
24	1.3.1.1		T-203 Cabezal de entrega	0%	12 días	mar 21/07/26	mié 5/08/26	23
25	1.4	3	FINALIZACION COMUNA 3	0%	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	
26	**1.5**	**7**	**COMUNA 7**	**0%**	**52 días**	**lun 13/04/26**	**jue 18/06/26**	
27	**1.5.1**	**7**	**Barrio El Campin**	**0%**	**29 días**	**lun 13/04/26**	**mié 20/05/26**	
28	**1.5.1.1**		**Tramo 116 (Adicional)**	**0%**	**29 días**	**lun 13/04/26**	**mié 20/05/26**	
29	1.5.1.1	7	T-116 Preliminares y Demoliciones	0%	20 días	lun 13/04/26	jue 7/05/26	3
30	1.5.1.1	7	T-116 Excavaciones y Rellenos	0%	20 días	mar 14/04/26	vie 8/05/26	29CC+1 día
31	1.5.1.1	7	T-116 Obras Hidrosanitarias	0%	22 días	mar 14/04/26	mar 12/05/26	30CC
32	1.5.1.1	7	T-116 Estructura de Pavimento rigido	0%	22 días	lun 20/04/26	mar 19/05/26	31CC+5 días
33	1.5.1.1	7	T-116 Sardineles y Andenes	0%	22 días	mar 21/04/26	mié 20/05/26	32CC+1 día
34	**1.5.2**	**7**	**Barrio Divino Niño**	**0%**	**32 días**	**lun 13/04/26**	**sáb 23/05/26**	

35	**1.5.2.1**		**Tramo 117**	**0%**	**32 días**	**lun 13/04/26**	**sáb 23/05/26**	
36	1.5.2.1	7	T-117 Preliminares y Demoliciones	0%	15 días	lun 13/04/26	vie 1/05/26	3
37	1.5.2.1	7	T-117 Excavaciones y Rellenos	0%	15 días	mié 15/04/26	lun 4/05/26	36CC+2 días
38	1.5.2.1	7	T-117 Obras Hidrosanitarias	0%	20 días	jue 16/04/26	mar 12/05/26	37CC+1 día
39	1.5.2.1	7	T-117 Estructura de Pavimento rigido	0%	20 días	jue 23/04/26	mié 20/05/26	37CC+6 días;38CC+6
40	1.5.2.1	7	T-117 Sardineles y Andenes	0%	20 días	mar 28/04/26	sáb 23/05/26	39CC+3 días
41	**1.5.3**	**7**	**Barrio Maria Eugenia**	**0%**	**24 días**	**mar 19/05/26**	**jue 18/06/26**	
42	**1.5.3.1**		**Tramo 128**	**0%**	**24 días**	**mar 19/05/26**	**jue 18/06/26**	
43	1.5.3.1	7	T-128 Preliminares y Demoliciones	0%	17 días	mar 19/05/26	mié 10/06/26	32
44	1.5.3.1	7	T-128 Excavaciones y Rellenos	0%	19 días	mié 20/05/26	sáb 13/06/26	43CC+1 día
45	1.5.3.1		T-128 Obras Hidrosanitarias	0%	10 días	jue 21/05/26	mié 3/06/26	44CC+1 día
46	1.5.3.1	7	T-128 Estructura de Pavimento rigido	0%	20 días	jue 21/05/26	mar 16/06/26	44CC+1 día
47	1.5.3.1	7	T-128 Sardineles y Andenes	0%	20 días	lun 25/05/26	jue 18/06/26	46CC+2 días
48	1.6	7	FINALIZACION COMUNA 7	0%	0 días	jue 18/06/26	jue 18/06/26	40;47;37;39;46;32;3
49	**1.7**	**2**	**COMUNA 2**	**0%**	**56 días**	**lun 25/05/26**	**mié 5/08/26**	
50	**1.7.1**	**2**	**Barrio Olaya Herrera**	**0%**	**27 días**	**lun 25/05/26**	**lun 29/06/26**	
51	**1.7.1.1**		**Tramo 1**	**0%**	**27 días**	**lun 25/05/26**	**lun 29/06/26**	
52	1.7.1.1	2	T-1 Preliminares y Demoliciones	0%	7 días	lun 25/05/26	mar 2/06/26	40
53	1.7.1.1	2	T-1 Excavaciones y Rellenos	0%	20 días	mar 26/05/26	vie 19/06/26	52CC+1 día
54	1.7.1.1		T-1 Obras hidrosanitarias	0%	20 días	mié 27/05/26	lun 22/06/26	53CC+1 día
55	1.7.1.1	2	T-1 Estructura de Pavimento rigido	0%	22 días	jue 28/05/26	jue 25/06/26	53CC+2 días
56	1.7.1.1	2	T-1 Sardineles y Andenes	0%	22 días	sáb 30/05/26	lun 29/06/26	55CC+2 días
57	**1.7.2**	**2**	**Barrio Torcoroma**	**0%**	**28 días**	**mar 30/06/26**	**mié 5/08/26**	
58	**1.7.2.1**		**Tramo 2**	**0%**	**28 días**	**mar 30/06/26**	**mié 5/08/26**	
59	1.7.2.1	2	T-2 Preliminares y Demoliciones	0%	10 días	mar 30/06/26	lun 13/07/26	56FC+1 día;55FC+1 d
60	1.7.2.1	2	T-2 Excavaciones y Rellenos	0%	20 días	jue 2/07/26	mar 28/07/26	59CC+2 días
61	1.7.2.1	2	T-2 Obras Hidrosanitarias	0%	16 días	vie 3/07/26	vie 24/07/26	60CC+1 día
62	1.7.2.1	2	T-2 Estructura de Pavimento rigido	0%	16 días	lun 13/07/26	lun 3/08/26	60CC+7 días;61CC+7
63	1.7.2.1	2	T-2 Sardineles y Andenes	0%	16 días	mié 15/07/26	mié 5/08/26	62CC+2 días
64	1.8	2	FINALIZACION COMUNA 2	0%	0 días	mié 5/08/26	mié 5/08/26	56;63;54;55;62
65	**1.9**		**SEÑALIZACION**	**0%**	**92 días**	**lun 6/04/26**	**mar 4/08/26**	
66	1.9.1		Inicio de la señalizacion	100%	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	
67	1.9.2	6	Señalización Horizontal y Vertical Tramos Pendientes	0%	91 días	mar 7/04/26	mar 4/08/26	3
68	2		FINALIZACION PAVIMENTACION	0%	0 días	mié 5/08/26	mié 5/08/26	18;25;64;48

6 DESCRIPCIÓN DE ATRASOS Y ADELANTOS

A la fecha de corte el proyecto presenta una desviación del -0.91%, tal como se puede visualizar en la Curva S de avance.

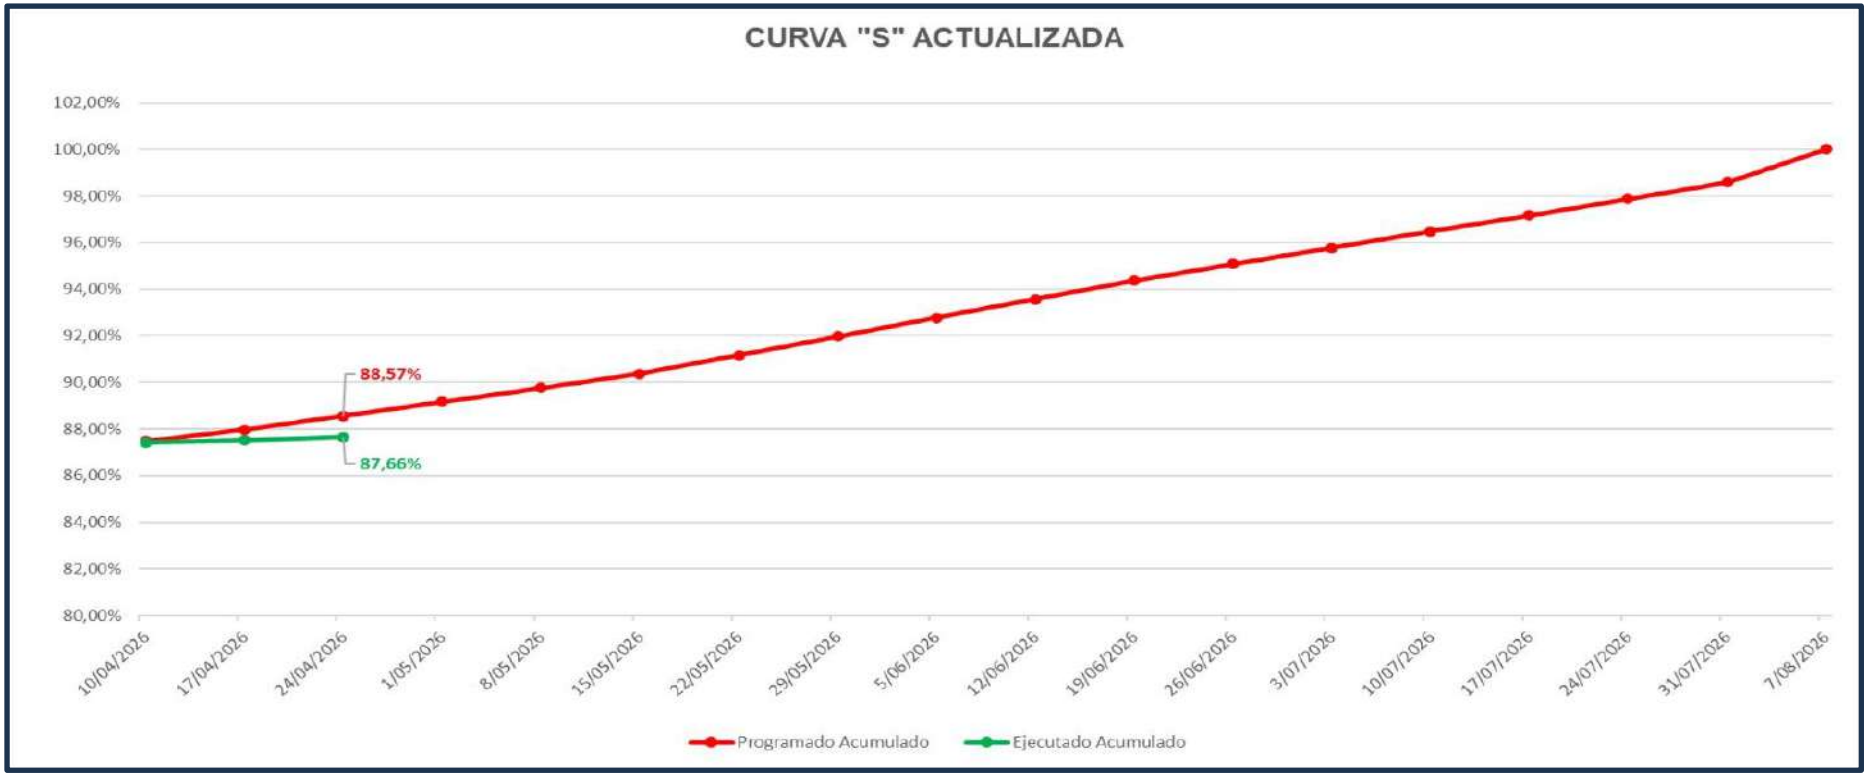

Las alertas y riesgos identificados en el proyecto han sido los siguientes:

Se encuentra pendiente la formalización por parte de la Entidad Contratante de la suspensión del Tramo 117 (Divino Niño), considerando que el día 28 de abril de 2026 se presentó la señora Mirley acompañada de la policía nacional " alegando " ser la propietaria de la vía intervenida y evitando el avance de las obras en ese sector; adicionalmente el día 24 de abril del presente año los miembros de la comunidad del Barrio El Campín Tramo 116 manifestaron inconformidades respecto a los parámetros en los diseños, el ing. Carlos Arguello de Ecopetrol se presentó y se reanudaron las actividades conciliando las diferencias.

7 CUADRO SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO Y AFECTACIONES

A continuación, se relaciona el cuadro de afectaciones presentadas durante el periodo.

AFECTACIÓN	DÍA	PERIODO	OBSERVACIÓN / UBICACIÓN
Lluvia	28/04/2026	7:30am - 10:30am	Divino Niño
Suspensión comunidad	28/04/2026	1:00pm - 3:40pm	Divino Niño
Suspensión comunidad	24/04/2026	8:00am - 9:30am	El Campín

8 REPORTE DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

A la fecha de corte del presente informe no se encuentra pendiente la reparación de daños a la infraestructura de servicios públicos.

9 PLANES DE CONTINGENCIA

A la fecha de corte del presente informe no son necesarios los planes de contingencia.

10 MEDIDAS CORRECTIVAS EXIGIDAS POR LA INTERVENTORIA

A la fecha de corte del presente informe no existieron medidas correctivas por parte de la interventoría.

11 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES

En el transcurso del mes se realizaron las siguientes actividades en el mes en cada uno de los tramos:

Del 6 al 30 de abril de 2026:

(ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO DEL 6 AL 12 DE ABRIL DE 2026)

COMUNA 7 – DIVINO NIÑO

TRAMO 117:
-Reconocimiento tramo
-Identificación de redes
-Socialización con la comunidad y presidente de la JAC
-Actas de vecindad

COMUNA 7 – EL CAMPÍN

TRAMO 116:
-Reconocimiento tramo
-Identificación de redes
-Socialización con la comunidad y presidente de la JAC
-Actas de vecindad

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (13 al 19 de abril de 2026)

COMUNA 7 – DIVINO NIÑO

TRAMO 117:
-Afiliaciones
-Exámenes de ingreso
-Capacitaciones
-Apiques
-Señalización en campo

COMUNA 7 - EL CAMPIN

TRAMO 116:
-Afiliaciones
-Exámenes de ingreso
-Capacitaciones
-Apiques
-Señalización en campo

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (20 al 26 de abril de 2026)

COMUNA 7 – DIVINO NIÑO

TRAMO 117:
-Excavación manual
-Figurado de hierro
-Excavación mecánica
-Suministro e instalación de subbase
-Suministro e instalación de sardineles
-Rehabilitación de acometidas de agua potable
-Demolición de zonas duras

COMUNA 7 – EL CAMPÍN

TRAMO 116:

-Excavación manual
-Figurado de hierro
-Excavación mecánica
-Suministro e instalación de subbase
-Suministro e instalación de sardineles
-Rehabilitación de acometidas de agua potable
-Demolición de zonas duras

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (27 al 30 abril de 2026)

COMUNA 7 – DIVINO NIÑO

TRAMO 117:


-Localización y replanteo
-Demolición pavimento rígido
-Relleno con material granular (arena)
-Instalación tubería Novafort
-Relleno material seleccionado
-Empalme colector aguas negras
-Suministro e instalación de subbase granular
-Suministro e instalación de concreto Mr 3.5Mpa
-Instalación de acero
-Cargue material de excavación

COMUNA 7 – EL CAMPÍN

TRAMO 116:

- Demolición muro en mampostería
-Suministro subbase cama sardinel
-Instalación sardinel
-Excavación manual para sardinel
-Demolición cajas de inspección aguas negras
-Reparación domiciliaria de acueducto
-Demolición estructura en concreto (muro)
-Reparación domiciliaria de gas

12 REGISTRO FOTOGRAFICO

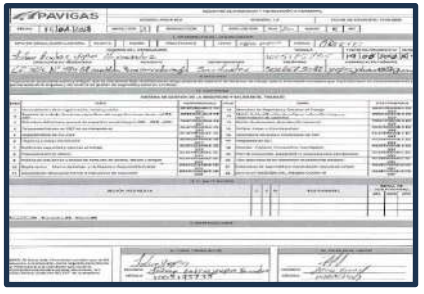			
Socialización **COMUNA 7 – DIVINO NIÑO** **TRAMO**	Actas de vecindad **COMUNA 7 – DIVINO NIÑO** **TRAMO**	Socialización **COMUNA 7 – EL CAMPÍN** **TRAMO**	Reunión Aguas de Barrancabermeja **PLANTA AGUAS DE BARRANCABERMEJA**
			
Registro inducción/ capacitación **OFICINA PAVIGAS S.A.S.**	Revisión materiales en patio **PATIO PAVIGAS S.A.S.**	Entrega dotación y EPPS. **OFICINA PAVIGAS S.A.S.**	Señalización en campo **COMUNA 7 - EL CAMPÍN**
			
Apiques **COMUNA 7 – EL CAM´PÍN** **TRAMO 116**	Apiques **COMUNA 7 – DIVINO NIÑO** **TRAMO 117**	Entrega botiquín personal **COMUNA 7 – DIVINO NIÑO/ EL CAMPÍN** **TRAMO 116-117**	Entrega turbo HINO para el proyecto **COMUNA 7 – EL CAMPÍN/DIVINO NIÑO** **TRAMO 116-117**

			
Excavación manual	Demolición y retiro de andén	Charla HSE diaria	Excavación manual para domiciliaria
COMUNA 7 - EL CAMPIN	**COMUNA 7 - EL CAMPIN**	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**	**COMUNA 7 - EL CAMPIN**
TRAMO 116	**TRAMO 116**	**TRAMO 116**	**TRAMO 116**
			
Cargue de materisl	Levantamiento topográfico	Suministro e instalación subbase granular	Rehabilitación de agua potable
COMUNA 7 - EL CAMPÍN	**COMUNA 7 – ELCAMPÍN**	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**
TRAMO 116	**TRAMO 116**	**TRAMO 116**	**TRAMO 116**
			
Cargue de material	Rehabilitación agua potable	Descargue sardinel	Conformación subbase granular
COMUNA 7 – EL CAMPÍN	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**
TRAMO 116	**TRAMO 116**	**TRAMO**	**TRAMO 116**

			
Excavación manual para sardinel	Instalación sardinel	Demolición pavimento rígido	Limpieza y desmonte zona de trabajo
COMUNA 7 – EL CAMPÍN	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**
TRAMO 116	**TRAMO 116**	**TRAMO 117**	**TRAMO 117**
			
Cargue de material	Excavación manual	Achique manual de agua empozada	Excavación mecánica
COMUNA 7 - EL CAMPIN	**COMUNA 7 - EL CAMPIN**	**COMUNA 7 – DIVINO**	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**
TRAMO 116	**TRAMO 116**	**TRAMO 117**	**TRAMO 117**
			
Suspensión por predio privado	Excavación manual	Suministro e instalación tubo novafort	Cama subbase de tubería novafot
COMUNA 7 – DIVINO NIÑO	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**
TRAMO 117	**TRAMO 116**	**TRAMO 117**	**TRAMO 117**

			
Compactación material de préstamo	Reparación domiciliarias	Suministro e instalación sardineles	Excavación manual para sardinel
COMUNA 7 – DIVINO NIÑO	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**
TRAMO 117	**TRAMO 117**	**TRAMO 116**	**TRAMO 116**
			
Fundida de losas de pavimento rígido	Recibo mixer concreto	Fundida losa de pavimento rígido	Fundida losa de pavimento rígido
COMUNA 7 – DIVINO NIÑO	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**	**COMUNA 7 DIVINO NIÑO**
TRAMO 117	**TRAMO 117**	**TRAMO 117**	**TRAMO 117**
			
Suministro e instalación canastilla	Limpieza, orden y aseo	Limpieza, orden y aseo	Nivelación y cajeo
COMUNA 7 – DIVINO NIÑO	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**	**COMUNA 7 – DIVINO NIÑO**	**COMUNA 7 – EL CAMPÍN**
TRAMO 117	**TRAMO 117**	**TRAMO 115**	**TRAMO 116**

			
Armado y fundida de sumidero SR200	Armado y fundida sumidero SR200	Armado y figurado hierro	Céreo y compactación de subrasante
COMUNA 7 – EL CAMPÍN	COMUNA 7 – EL CAMPÍN	COMUNA 7 – EL CAMPÍN	COMUNA 7 – EL CAMPÍN
TRAMO 116	TRAMO 116	TRAMO 116	TRAMO 116

13 FACTURACIÓN CONTRATO

Presentadas en las actas:

DESCRIPCIÓN	FECHA	COSTO DIRECTO + AIU	PMA-PMT-COVID	VALOR TOTAL DEL ACTA	% AVANCE
ACTA 1	26/JUN/2023 al 4/NOV/2023	$ 1.536.224.622,08	$ 36.131.911,23	$ 1.572.356.533,31	10,12%
ACTA 2	15/NOV/2023 al 13/DIC/2023	$ 738.745.638,55	$ 17.375.222,11	$ 756.120.860,66	4,87%
ACTA 3	14/DIC/2023 al 12/ABR/2024	$ 2.279.288.414,63	$ 53.608.486,11	$ 2.332.896.900,74	15,02%
ACTA 4	13/ABR/2024 al 29/MAY/2024	$ 770.479.518,88	$ 17.617.540,90	$ 788.097.059,78	4,94%
ACTA 5	13/AGO/2024 al 07/SEP/2024	$ 2.477.465.487,05	$ 56.649.426,57	$ 2.534.114.913,62	15,87%
ACTA 6	08/SEP/2024 al 30/NOV/2024	$ 1.032.806.181,84	$ -	$ 1.032.806.181,84	6,47%
ACTA 7	01/DIC/2024 al 30/DIC/2024	$ 365.785.392,13	$ -	$ 365.785.392,13	2,29%
ACTA 8	31/DIC/2024 AL 15/FEB/2025	$ 1.483.046.861,27	$ -	$ 1.483.046.861,27	9,29%
ACTA 9	16/FEB/2025 al 15/MAR/2025	$ 422.724.705,71	$ -	$ 422.724.705,71	2,65%
ACTA 10	16/MAR/2025 al 31/MAR/2025	$ 200.713.238,97	$ -	$ 200.713.238,97	1,26%
ACTA 11	PAGOS PENDIENTES ACTAS 5-6-7-8-9-10	$ 357.023.230,41	$ -	$ 339.932.912,56	2,13%
ACTA 12	31/MAR/2025 al 09/MAY/2025	$ 901.611.683,39	$ -	$ 901.611.683,89	5,65%
			TOTAL	**$ 12.730.207.244,48**	79,74%

14 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Se inicia alistamiento para la actividad de aseguramiento de calidad en el proyecto:

- Se envía material al laboratorio para realizar ensayos de Proctor y granulometría.
- Se anexa en este informe los certificados de calibración del equipo para la toma de densidades en campo.

15 LISTADO DE ANEXOS.

15.1 Anexo 1: PDT vigente.
15.2 Anexo 2: Afectaciones del tiempo según Estación Meteorológica del Aeropuerto Yariguies.
15.3 Anexo 3: Certificados de calibración equipo de densidades.

Elaboró	Elaboró	Aprobó
Malory Quintero Muñoz **PROFESIONAL DE FACTURACION** **PAVIGAS S.A.S.**	**PROFESIONAL DE CALIDAD** Anamaría Villamizar Duran **PAVIGAS S.A.S.**	Javier Leonardo Florez Gomez **DIRECTOR DE OBRA** **PAVIGAS S.A.S.**

14.11. BITACORA

Bitacora

Barrio campin tramo 116

Contrato 1593-23

Scanned with CamScanner

El campin tramo 116 001

20-abril 2026 tramo 116	Se inicia bitacora del barrio el campin tramo 116. 20/04/2026 Se realiza translado de maquinaria y armado de campamento se realiza localización y replanteo de via, Excabación manual Para sumidero rosetta y limpieza. Personal: oficial 2 - obrero 4 - conductor 1 - Supervisor 1 HSE 1, ingeniero residente 1 Ing Oscar C.
21-abril 2026 tramo 116	Se inicia actividades 7:30 am Con las siguientes actividades Excabación con maquinaria del Kot00 - Kot36 = 36ML * 3.7MA * 0. Demolición de andenes Kot15 - Kot20 lado derecho 5ml * 1MA Excabacion manual Para Piofundisación de linea de agua Kot36 y Kot15 Renavilitación de agua Potable Kot36 - Kot15 = 2 und Ing Oscar C
22 - abril 2026 tramo 116	Se inicia actividades 7:30 am con las siguientes actividades cargue y transporte Proveniente de excabación = 4 viajes Conformación y compactación de Subbrasante Kot00 - Kot36 Excabación Manual y instalación de tubería de agua Potable Kot10 Personal: Oficial 02 - obrero 4 - conductor 1 - Supervisor civil 1 - HSE 1 Ing Oscar C
23 - abril 2026 tramo 116	Se inicia actividades 7:30 am con las siguientes actividades Se realiza instalación de Subbase Kot00 - Kot36 Se realiza fundida de losa inferior de sumidero Kot36 Ing Oscar C
24 - abril 2026 tramo 116	Se inicia actividades 7:30 am con las siguientes actividades "Se Presento una situación de incoformidad entre mienbros de la comunidad devido a diferencias de entendimiento. la intervención se realizo en campo entre las 8.40 am y 9:30 am, lo cual causo suspención de actividades se llega un acuerdo con temas de alineamiento y se continuan actividades. Excabación manua, cama de subbase, instalación de Sardinel del Kot08 - Kot28 lado izquierdo. Ing Oscar C

27- abril 2026 tramo 116	Se inicia labores 7:30 am con las siguientes actividades se realiza demolición de muro caido Km0+15 - Km0+21 = 6ml * .70 mA Reparación de muro con sardinel Km0+15 - Km0+21 = 6ml * .50 = 3m² lleno de espaldar con material de sitio 6ml * .50 * .10 Ing Oscar C
28- abril 2026 tramo 116	Se inicia labores 7:30 am con las siguientes actividades se realiza excabación manual de Km0+28 - Km0+36 Ldo con cama de subbase y instalación de sardinel. 8 ml Lado derecho Ing Oscar C
29- abril 2026 tramo 116	Se inicia labores 7:30 am con las siguientes actividades se realiza excabación manual del Km0+08 - Km0+28 lado derecho, cama de subbase y instalación de sardinel con una longitud de 20ml Ing Oscar C
30- abril 2026 tramo 116	Se inicia labores 7:30 am con las siguientes actividades demolición de caja aguas negras Km0+05 Izqd, demolición y reparación de muro en anden Km0+05 1.50 * 1.20, Reubicación de tubería de Gas Km0+3 lo cual obliga ala suspención de labores de 2 Pm - 4 Pm Ing Oscar C
04- mayo 2026 tramo 116	Se inicia labores 7:30 am con las siguientes actividades excabación manual, cama de subbase y instalación de sardinel en el Km0+28 - Km0+52 lado izquierdo, fundida de sumidero Km0+00 S1200, excabación con maquinaria Km0+36 - Km0+52 conformación de subrasante, subbase granular se terminan actividades 5:30 Pm Ing Oscar C
06- Abril 2026 al 19- Abril 2026	Se realizo Alistamiento de Equipos, Personal, Materiales y se realizo Socialización en los tramos Campin y Divino Niño Ing Oscar C.

Scanned with CamScanner

25-mayo 2026 Tramo 116	Se inicia labores 7:30 am con las siguientes actividades se realiza excavación manual, cama de sobbase, e instalación de Sardinel en el K0+36 - K0+52) (K0+08 - K0+00) lado derecho y del K0+00 - K0+08 lado izquierdo = 32 ml Cerco de sobbase del K-K0+00 - K0+40 Ing Oscar C
26- MAYO 2026 Tramo 116.	Se inicia labores a las 7:30 a.m. con las siguientes actividades, se realiza el cereo de la sobbase en el área programada, se trabaja en la rehabilitación de la red de agua potable de 1/2" en el tramo K0+02, se aplica concreto MR-35 entre K0+15 y K0+40.5, colocando canastilla de refuerzo de 3/4".
	Definiciones en reunión con Interventoría e Infraestructura: se acordó la ampliación de la vía para mejorar el acondicionamiento, se definió la construcción de un pozo en el K0+14, Se programó la demolición y construcción de un sumidero en el K0+50, se aprobó la construcción de un sumidero en el K0+00. Ing Oscar C.
07- MAYO 2026. Tramo 116.	Se inicia labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: instalación de concreto MR 35 en el tramo comprendido entre K0+41 y K0+55, con un volumen calculado de 11.2 m³, colocación de canastillas de 3/4" en 4 unidades con un promedio de 5 m cada una, para un total de 20 ml, instalación de acero de refuerzo 3/8" equivalente a 47.04 kg (84 ml x 0.56 kg/ml), instalación de acero de refuerzo 5/8" equivalente a 9.11 kg (6 unidades x 1 ml x 152 kg/m
	Ing Oscar C
11- MAYO 2026 TRAMO 116.	Se inicia labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: excavación manual de pozo con diametro de 1.80 metros y profundidad de 1.40 metros, controlando estabilidad y seguridad en el área. Se ejecutó figurado de acero según medida de planos, dejando material preparado para armado. Se inicia demolición de pozo de aguas negras, con retiro progresivo de material, se realiza demolición de andenes en el tramo intervenido. Ing Oscar C

Scanned with CamScanner

004

12 DE MAYO 2026 TRAMO 116.	Se inicia labores a las 7:30 am con las siguientes actividades: reparación de zonas duras en tramos K0+40 - K0+25, K0+20 - K0+15 y K0+15 - K0+3 con un área total de 21 m², excavación con maquinaria para tubería de alivio, volumen ejecutado: 2.88 m³, instalación de tubería sanitaria Novafor de 8" Para alivio de poto, longitud 6 ml, empalme de tubería de alivio 8" al poto de inspección en parte baja cantidad: 1 und, Base de cañuela en K0+10, cantidad: 1 und, cilindro de poto tipo 1 en K0+10, longitud: 1.1 ml, demolición de tuberías existentes Novafor: 12" = 1 ml, 6" = 1.6 ml, Fundida de placa de cañuelas de poto, Fundida de cilindro de poto de 1.20 ml en K0+15, Fundida de andenes en tramo intervenido. Ing Oscar C.

BITACORA

BARRIO DIVINO NIÑO

CONTRATO 1843 - 23

27 de abril 2026	Se da inicio a bitacora el dia 27 de abril de 2026:
tramo 117	Se inician Labores 9:30 am se realiza traslado de maquinaria asia el tramo, Se realiza armado de martillo demoledor y instalación de campamento, se realiza las siguientes actividades: limpieza, rocería, delimitación de area demolición de Placa en concreto K0+00 - K0-03 Para empalme con el manjol de entrega aguas negras 5.80 * 3 * .15 Personal 1 oficial, 3 obreros, 1 operador, 1 supervisor civil 1 HSE Ing Oscar C
28 de abril 2026 tramo 117	Se inician labores 7:30 am tramo 117 con el siguiente Personal 1 oficial, 3 obreros, 1 topografo, 1 HSE, 1 Supervisor civil Se Presento lluvia de 7:30 am - 10.00 am se inician actividades de excabación Para la instalación de tuberia 10" sanitaria, Ya realizado un avance de 18 ml de excabación, Se Presenta una mujer acompañada de la Policia nacional la cual alega ser Propietaria de la via que se esta interviniendo. Se detienen actividades de 1:00 PM - 3.40 Pm. dado que a esa hora hace Presencia el ing enildo de infraestructura, a dialogar con la comunidad, ala cual nose llega a una conclución del tema a tratar, se realiza la sugerencia de Parte del ing enildo de llenar la excabación y dejar la via habilitada.
	Se Prosede ala intalación de arena Para la Proteccion de la tuberia y el lleno de la excabación con las siguientes actividades: Excabación con maquinaria (K0+00 - K0+15)(K0+00 - K0-03) Para un total de 18 ml * 1.60 de Profundidad * .90 de ancho instalación de tuberia 10" 18 m lineales cama de arena 18 ml * .90 m de ancho * .50 m de Profundidad - 18 ml * 0.15² * π = 1.272 m³, Para un total de = 6.83 m³ lleno con material de sitio 1m * 18 ml * .90 = 16.2 m³ Ing Oscar

002

29- de abril 2026 tramo 11.4	se suspenden actividades en el tramo por inconvenientes con la comunidad, Por la reclamacion de una Propietaria que manifiesta ser la dueña del tramo una parte, se espera respuesta de planeacion y de infraestructura Ing Oscar Castellanos
