ACTA FINAL DE OBRA.

FECHA Y LUGAR DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA	LA LLANADA (NAR.), SIETE (7) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
CONTRATO	OBRA PUBLICA SAMC 005-2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO NIT: 800.149.894 – 0 DIRECCION: CALLE 6 No. 4-09 BARRIO SAN JUAN BOSCO CORREO: alcaldia@lallanada-narino.gov.co REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS TAPIA AYALA IDENTIFICACION: C.C. No. 13.069.278 DE PASTO (NAR) ACTA DE POSESIÓN: No. 02/2023 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 NOTARIA UNICA DEL CIRCUITO DE LOS ANDES
CONTRATISTA DE OBRA	INGEARQ SOLUCIONES SAS. NIT: 901311695-1 REP. LEGAL. ING. GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO IDENTIFICACION: C.C. No. 87.513.028 DE CUMBAL (NAR) MATRICULA PROFESIONAL: 52202-089024 CONTACTO: 3122567214 CORREO: sasingearq@gmail.com
SUPERVISOR	ARQ. HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO. IDENTIFICACIÓN: CC No. 98.348.392 DE LOS ANDES (NAR.) CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL CORREO: planeacionyobrasmpal@lallanada-narino.gov.co
OBJETO	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 99.149.841)
CDP	CDP No. 2025000760 DE FECHA 04/11/2025 VALOR $ 99.842.392,00
COMPROMISO PRESUPUESTAL	No. 2025000969 DE FECHA 22/12/2025 VALOR $ 99.149.841,00
PAGO DE ANTICIPO 40%	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 39.659.936)
PÓLIZA	COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.– NIT 860.009.578-6 ✓ PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N° 41-44-101300817 ANEXO 0

	✓ PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE N° 41-40-101058716 ANEXO 0
FECHA DE INICIO	VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE REINICIO N.º 01:	CATORCE (14) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO Nº 01:	NUEVE (09) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
OTRO SI MODIFICATORIO N° 01:	FECHA: NUEVE (09) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
	ADICIÓN EN TIEMPO EN UN TERMINO DE DOS (02) MESES
	PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO (04) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN OTRO SI MODIFICATORIO N° 01	NUEVE (09) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)

GARANTÍAS VIGENTES A LA FECHA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
SEGUROS DEL ESTADO	**PÓLIZA No. 41-44-101300817**	
Anexo 02 (Otro Si Modificatorio N° 01)	**Fecha de expedición: 13/03/2026**	
Amparos	***Valor asegurado***	***Vigencia***
Cumplimiento del contrato	*$ 9.914.984,10*	*22/12/2025 -09/09/2026*
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	*$ 39.659.936,40*	*22/12/2025 -09/09/2026*
Salarios Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	*$ 4.957.942,05*	*22/12/2025 -09/05/2029*
Estabilidad y Calidad de la Obra	*$9.914.984,10*	*5 Años Después del Acta de Recibo Final*
Aprobada mediante Resolución 051A de trece (13) de Marzo de dos mil veintiséis (2026)		

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
SEGUROS DEL ESTADO	**PÓLIZA No. 41-40-101058716**	
Anexo 02 (Otro Si Modificatorio N° 01)	**Fecha de expedición: 13/03/2026**	
Amparos	***Valor asegurado***	***Vigencia***
Responsabilidad civil extracontractual	*$ 284.700.000*	*22/12/2025 -09/05/2026*
Aprobada mediante Resolución 051A de trece (13) de Marzo de dos mil veintiséis (2026)		

En la alcaldía Municipal de La Llanada, el día siete (7) de mayo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Secretaría de Planeación y obras del Municipio de La Llanada Nariño, **JUAN CARLOS TAPIA AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.069.278 expedida en el municipio de Pasto (Nar), obrando a nombre y en representación del **MUNICIPIO DE LA LLANADA** de **NIT. 800.149.894 – 0**, y posesionado con acta No. 02/2023 del 27 de diciembre de 2023 de la Notaria Única del circuito de Los Andes (Nar.), en su condición de Alcalde del Municipio, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**; de otra parte el arquitecto **FERNANDO MUÑOZ JURADO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 98.348.392 expedida en el municipio de Los Andes (Nar.), quien se desempeña como Secretario de Planeación y Obras Municipal, nombramiento realizado mediante Decreto N° 030B de 1 de marzo de 2024 y Acta de posesión de 1 de marzo de 2024 y en este caso en su condición de **SUPERVISOR** del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA SAMC-005-2025**; actuando de conformidad al acta de delegación suscrita por el señor alcalde municipal, y por otra, el Ingeniero **GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.513.028, quien figura como Representante Legal de **INGEARQ SOLUCIONES SAS** de **NIT 901311695-1,** firma Contratista de la Obra Pública No. **SAMC-005-2025**, con el objeto de suscribir la presente **ACTA FINAL DE OBRA** del contrato en referencia, cuyo objetivo es **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO."** previa revisión física en el sitio de ejecución de las obras el día siete (7) de mayo del año dos mil veintiséis (2026), en donde el contratista entregó al Municipio, quien recibe a satisfacción los trabajos valorados en la presente acta según especificaciones y cantidades establecidas en el contrato del proceso contractual.

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	$ 99.149.841,00	$0
VALOR ANTICIPO 40%		$ 39.659.936,00
VALOR ADICIONES	$0	$0
VALOR PAGADO	$0	$0
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	$0	$ 50.863.169,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA FINAL	$0	$ 8.626.736,00
VALOR POR EJECUTAR	$0	$0
SALDO A LIBERAR (Si aplica)	$0	$0
SUMAS IGUALES	**$ 99.149.841,00**	**$ 99.149.841,00**

SON (NETO A PAGAR): OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. ($8.626.736,00).

METAS FÍSICAS ALCANZADAS CON LA PRESENTE ACTA

Las metas físicas del proyecto y sus actividades complementarias se describen a continuación:

ÍTEM 5. RELLENOS VARIOS.

5.1. MATERIAL DE COLCHÓN Y ATRAQUE CON TRITURADO: Este ítem se refiere a la colocación, extendido, nivelación y compactación de material triturado fino, destinado a la conformación de un colchón de apoyo y atraque lateral de tuberías. Se ejecuto 19.20 M^3.

ÍTEM 6. DESALOJO.

6.1. DESALOJO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES: Este ítem comprende el desalojo del material sobrante de la excavación, el cual debe ser reubicado. Se ejecuto 125,55 M^3.

ÍTEM 7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

7.1. DEMOLICIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES: Comprende el conjunto de actividades, materiales y equipos necesarios para realizar la demolición de un pozo de inspección existente. Se ejecuto 1 Und.

La presente se firma por quienes en ella intervienen, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

POR EL MUNICIPIO DE LA LLANADA:	
JUAN CARLOS TAPIA AYALA Alcalde Municipio La Llanada C.C. No.13.069.278	**HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO** Secretaria de Planeación y Obras La Llanada C.C. No. 98.348.392

POR EL CONTRATISTA
GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO Rep. Legal INGEARQ SOLUCIONES SAS C.C. No. 87.513.028

Revisó: Arq. Hugo Fernando Muñoz Jurado - secretara de Planeación y Obras La Llana-da
Aprobó: Juan Carlos Tapia - alcalde Municipal.
Archivo: Expediente físico del contrato SAMC 005-2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SAMC 005 2025

FECHA	7/05/2026		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: SAMC 005-2025 (Indique número y año)

ACTA Nº 2 **ACTA FINAL** SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)

VALOR ACTA + (AIU): $ 14.377.992 **VALOR NETO DE PAGO:** $ 8.626.736

MES Mayo **PERIODO ACTA:** 10/04/2026 -07/05/2026

OBJETO: AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

CONTRATISTA INGEARQ SOLUCIONES S.A.S.
NIT: 901311695-1

LOCALIZACIÓN B/SAN FRANCISCO - LA LLANADA (NAR.) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATANTE MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO
NIT: 800.149.894 – 0

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2025 - 13/01/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 14/01/2026 (Indique día/mes/año)

SUPERVISOR: ARQ. HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL

FECHA DE OTRO SI MODIFICATORIO No. 1: 9/03/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL: $ 99.149.841,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES:

VALOR ANTICIPO: $ 39.659.936,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO: $ 99.149.841

ITEM	DETALLE	UNIDAD	VALORES CONTRACTUALES INICIALES			EJECUTADO ACUMULADO		EJECUTADO PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR	
			CANT	VR UNITARIO	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL	CANT	TOTAL
C	INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO												
1	LOCALIZACIÓN												
1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	192,00	$ 4.199,48	$ 806.300,00	192,00	$ 806.300,00		$ -	192,00	$ 806.300,00		
				Sub Total	$ 806.300,00								
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.01	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL MIXTO	M3	313,88	$ 8.300,00	$ 2.605.163,00	313,88	$ 2.605.163,00		$ -	313,88	$ 2.605.163,00		
1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO	M3	109,86	$ 13.456,00	$ 1.478.226,00	109,86	$ 1.478.226,00		$ -	109,86	$ 1.478.226,00		
				Sub Total	$ 4.083.389,00								
2	ESTRUCTURA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES												
2.01	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	576,00	$ 23.414,05	$ 13.486.493,00	576,00	$ 13.486.493,00		$ -	576,00	$ 13.486.493,00		
				Sub Total	$ 13.486.493,00								
3	TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES												
3.01	INSTALACION ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	10,00	$ 162.312,05	$ 1.623.121,00	10,00	$ 1.623.121,00		$ -	10,00	$ 1.623.121,00		
3.02	SUM. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC CORRUGADA DIM. 10 IN.	M	96,00	$ 143.313,75	$ 13.758.120,00	96,00	$ 13.758.120,00		$ -	96,00	$ 13.758.120,00		
				Sub Total	$ 15.381.241,00								
4	CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS SANITARIAS												
4.01	CAMARA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, H=(1.0-2.0)M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1.20M, E=20CM	UND	2,00	$ 3.221.112,42	$ 6.442.225,00	2,00	$ 6.442.225,00		$ -	2,00	$ 6.442.225,00		
4.02	CAMARA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, H=(2.0-3.0)M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1.20M, E=20CM	UND	1,00	$ 4.301.112,42	$ 4.301.112,00	1,00	$ 4.301.112,00		$ -	1,00	$ 4.301.112,00		
4.03	CAMARA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA, H=(2.5-3.5)M, (REDONDA), DIM. INTERNO= 1.20M, E=20CM, INCLUYE ADITAMENTO DE CAIDA	UND	1,00	$ 5.064.591,48	$ 5.064.591,00	1,00	$ 5.064.591,00		$ -	1,00	$ 5.064.591,00		
				Sub Total	$ 15.807.928,00								

5	RELLENOS VARIOS												
5.01	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3	529,66	$ 29.535,40	$ 15.643.840,00	529,66	$ 15.643.840,00		$ -	529,66	$ 15.643.840,00		
5.02	MATERIAL DE COLCHON Y ATRAQUE CON TRITURADO	M3	19,20	$ 181.357,36	$ 3.482.061,00		$ -	19,20	$ 3.482.061,00	19,20	$ 3.482.061,00		
				Sub Total	$ 19.125.901,00								
6	DESALOJO												
6.01	DESALOJO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	M3	125,55	$ 59.225,00	$ 7.435.699,00		$ -	125,55	$ 7.435.699,00	125,55	$ 7.435.699,00		
				Sub Total	$ 7.435.699,00								
7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS												
7.01	DEMOLICIÓN CAMARAS DE INSPECCION EXISTENTES	UND	1,00	$ 142.157,68	$ 142.158,00		$ -	1,00	$ 142.158,00	1,00	$ 142.158,00		
				Sub Total	$ 142.158,00								
	COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				**$ 76.269.109,00**		**$ 65.209.191,00**		**$ 11.059.918,00**		**$ 76.269.109,00**		
	I. ADMINISTRACIO	**25,00%**			$ 19.067.277,25		$ 16.302.297,75		$ 2.764.979,50		$ 19.067.277,25		
	II. IMPREVISTOS	**2,00%**			$ 1.525.382,00		$ 1.304.184,00		$ 221.198,00		$ 1.525.382,00		
	III. UTILIDAD	**3,00%**			$ 2.288.073,00		$ 1.956.276,00		$ 331.797,00		$ 2.288.073,00		
	COSTOS TOTAL OBRA CIVIL				**$ 99.149.841,00**		**$ 84.771.949,00**		**$ 14.377.892,00**		**99.149.841,00**		

VALOR DE ANTICIPO	**40%**	**$ 39.659.936,00**	**VALOR EJECUTADO**	**$ 14.377.892,00**	**$ 99.149.841,00**
			AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%)	**$ 5.751.156,00**	**$ 39.659.936,00**
			VALOR NETO A PAGAR	**$ 8.626.736,00**	**$ 59.489.905,00**

EL VALOR NETO DE PAGO APLICANDO LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL 40% SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. ($8.626.736,00)

Se firma en el Municipio de La Llanada, a los siete (07) días del mes de mayo del año 2026, por los que en esta diligencia intervinieron.

MUNICIPIO DE LA LLANADA

JUAN CARLOS TAPIA AYALA
C.C. No. 13.069.278
Alcalde Municipio de La Llanada
Contratante

INGEARQ SOLUCIONES SAS.

GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO
C.C. No. 87.513.029
Representante Legal.
Contratista

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS MUNICIPAL

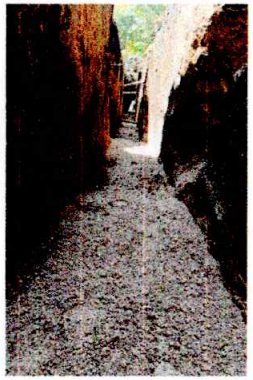
HUGO FERNANDO MONTENEGRO
C.C. No. 98.348.392
Secretario de Planeación y Obras Municipal.
Supervisor

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA (NAR)
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SAMC 005 2025

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL

AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONTRATO: SAMC 005- 2025	**FECHA ACTA INICIO: 22/12/2025**	**FECHA TERMINACIÓN (Prorroga 1): 9/05/2026**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($): 99.149.841	**DEPARTAMENTO: NARIÑO**	**SUPERVISOR: ARQ. HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA: ING. GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO	**MUNICIPIOS DE LA LLANADA**	**PERIODO ACTA: 10/04/2026 - 07/05/2026**

DESCRIPCION GRAFICA	ÍTEM	ABSCISA Inicial	ABSCISA Final	LONGITUD	ANCHO. M	ALT. M	VOLUMEN TOTAL M3	OBSERVACIONES
	**MATERIAL DE COLCHON Y ATRAQUE CON TRITURADO.**							
	5,02	K0+000,00	K0+080,00		1,00	0,20	16,00	
		K0+000,00	K0+016,00		1,00	0,20	3,20	
		VIENE ACTAS ANTERIORES					**0,00**	
		PRESENTE ACTA					**19,20**	
		TOTAL					**19,00**	

Nota: Las medidas consignadas en la presente preacta son responsabilidad estricta del Contratista y el Supervisor del proyecto.

INGEARQ SOLUCIONES SAS.

Firma
Nombre: GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO
Representante Legal
CC. 87.513.028 DE CUMBAL (NAR)

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL

Firma
Nombre: HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO.
Secretario de Planeación y Obras Municipal.
C.C. 98.348.392 DE LOS ANDES (NAR.)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA (NAR)
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SAMC 005 2025

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL

AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR BISAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONTRATO: SAMC 005 - 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($): 99.149.841
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA: ING. GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO
FECHA ACTA INICIO: 22/12/2025
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIOS DE LA LLANADA
FECHA TERMINACIÓN (Prorroga 1): 9/05/2026
SUPERVISOR: ARQ. HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL
PERIODO ACTA: 10/04/2026 - 07/05/2026

DESCRIPCION GRAFICA	ITEM	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO. M	ALT. M	VOLUMEN M3	UNIDADES	TOTAL VOLUMEN EN M3	OBSERVACIONES
		Inicial	Final							
	6,01	**DESALOJO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES**								
		TRAMO 1		80	1	1,2	96,00	1,00	96,00	
		TRAMO 2		16	1	0,8	12,80	1,00	12,80	
		CAMARAS DE INSPECCION 1.		1,9	1,9	1,3	4,69	1,00	4,69	
		CAMARAS DE INSPECCION 2.		1,9	1,9	1,34	4,84	1,00	4,84	
		CAMARAS DE INSPECCION 3.		1,9	1,9	1,00	3,61	1,00	3,61	
		CAMARAS DE INSPECCION 4.		1,9	1,9	1,00	3,61	1,00	3,61	
		VIENE ACTAS ANTERIORES								
		PRESENTE ACTA							125,55	
		TOTAL							125,55	

Nota: Las medidas consignadas en la presente preacta son responsabilidad estricta del Contratista y el Supervisor del proyecto.

INGEARQ SOLUCIONES SAS

Firma

Nombre: GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO
Representante Legal
CC. 87.513.028 DE CUMBAL (NAR)

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL

Firma

Nombre: HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO.
Secretario de Planeación y Obras Municipal.
C.C. 98.348.392 DE LOS ANDES (NAR.)

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LLANADA (NAR)
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SAMC 005 2025

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA - ACTA FINAL

AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO SECTOR B/SAN FRANCISCO - MUNICIPIO DE LA LLANADA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

CONTRATO: SAMC 005- 2025	**FECHA ACTA INICIO: 22/12/2025**	**FECHA TERMINACIÓN (Prorroga 1): 9/05/2026**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($): 99.149.841	**DEPARTAMENTO: NARIÑO**	**SUPERVISOR: ARQ. HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA: ING. GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO	**MUNICIPIOS DE LA LLANADA**	**PERIODO ACTA: 10/04/2026 - 07/05/2026**

DESCRIPCION GRAFICA	ÍTEM	ABSCISA		UNIDADES	OBSERVACIONES
		Inicial	Final		
	**DEMOLICIÓN CAMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES**				
	7,01	CAMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTE		1,00	
		VIENE ACTAS ANTERIORES		**0,00**	
		PRESENTE ACTA		**1,00**	
		TOTAL		**1,00**	

Nota: Las medidas consignadas en la presente preacta son responsabilidad estricta del Contratista y el Supervisor del proyecto.

INGEARQ SOLUCIONES SAS

Firma
Nombre: GIOVANI ALEXANDER LOZA ROSERO
Representante Legal.
CC. 87.513.028 DE CUMBAL (NAR)

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL

Firma
Nombre: HUGO FERNANDO MUÑOZ JURADO.
Secretario de Planeación y Obras Municipal.
C.C. 98.348.392 DE LOS ANDES (NAR.)
