INFORME MENSUAL

CONVENIO No. 2452 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

IBAGUÉ– TOLIMA

Febrero del 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
   2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 4
      2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
      2.1.2 CONDICIONES INICIALES 4
      2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 4
3. CONTRATO DE OBRA 5
   3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO 5
      3.1.1 GENERALIDADES 5
      3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 5
   3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
      3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS 10
   3.3 PLAZO CONTRACTUAL 12
   3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO 12
4. CONCLUSIONES 15
5. ANEXOS 15

ANEXOS 16

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual tiene como finalidad documentar y evaluar el desarrollo de las actividades ejecutadas del 1 al 28 de Febrero en el marco del contrato suscrito para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada en el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Durante el periodo reportado, se han llevado a cabo diversas actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos contractuales, garantizando el adecuado mantenimiento, rehabilitación y optimización de la red vial urbana. Adicionalmente, se han ejecutado actividades complementarias externas a la rehabilitación de la malla vial, relacionadas con el apoyo a otras labores operativas y logísticas que contribuyen al desarrollo integral de los frentes de trabajo y al buen avance del proyecto.

Asimismo, se incluyen registros fotográficos, cantidades ejecutadas asegurando la transparencia y trazabilidad de las actividades ejecutadas.


Con este informe, se busca proporcionar una visión clara y detallada de la gestión realizada, en cumplimiento de las condiciones contractuales y los lineamientos establecidos por la entidad competente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Ibagué se encuentra ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los andes entre el cañón del Combeima y el valle del Magdalena en cercanías del nevado del Tolima, con coordenadas: Longitud75°12'02''-Latitud4°26'16''N. K4+850aK5+750

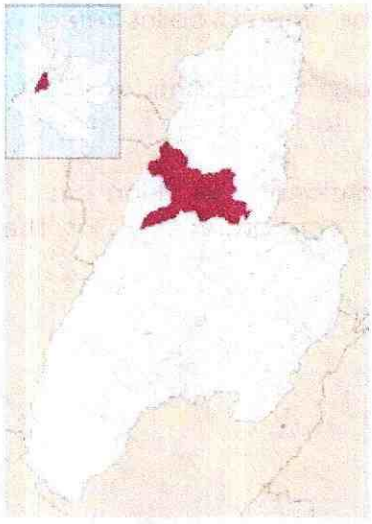

2.1.2 CONDICIONES INICIALES

En vista del crecimiento urbano y considerando las necesidades de mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de Ibagué, se identifican sectores que requieren intervención para garantizar una movilidad segura y eficiente. Actualmente, algunas vías presentan deterioro significativo, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico de la región.

Por lo anterior, la Administración Municipal contempla la contratación de una entidad sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada, con el propósito de ejecutar actividades orientadas al mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la conectividad del municipio.

2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla todas las intervenciones necesarias pára la ejecución de las distintas fases del proyecto que involucran las actividades

relacionadas con el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.
Se hace necesaria la intervención en las diferentes fases o frentes del proyecto para dar mejor calidad de vida a cada uno de los transeúntes de la ciudad de Ibagué

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
VALOR	NNOVECIENTOS MILLONES MCTE ($900.000.000) IVA INCLUIDO SOBRE COSTOS INDIRECTOS
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
MODIFICACION 1	NOVENTA Y DOS (92) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	NOVENTA Y DOS (92) DIAS CALENDARIO

DOCUMENTOS GENERADOS DENTRO DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO	1 DE OCTUBE DE 2025
SUSPENSION No.1	29 DE DICIEMBRE DE 205
REINICIO No.1	14 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No.1	15 DE ENERO DE 2025

3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Un (1) director del Proyecto.
- Un (1) residente de obra.
- Un (1) inspector de obra.
- Un (1) topógrafo.
- Un (1) profesional SST.
- Tres (3) cuadrillas: Conformadas por un (1) oficial, seis (6) y/o siete (7) ayudantes de obra y una cuarta (4) cuadrilla conformada por un (1) maestro y tres (3) ayudantes de obra.

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista ejecuto la intervención de diferentes puntos de la ciudad de acuerdo a las directrices del Ingeniero asignado por la secretaria de infraestructura, realizando el cajeo, re parcheo y nivelaciones en las siguientes ubicaciones:

A continuación, se presenta la relación semanal de lo ejecutado:

- Semana del 02 al 08 de febrero

Área cajeo: 494.79 m2
Área nivelaciones: 286.45 m2
Volumen asfalta suelto: 70,83 m3
Viajes de escombros: 3 viajes

- Semana del 09 al 14 de febrero

Área cajeo: 0 m2
Área nivelaciones: 0 m2
Volumen asfalto suelto: 0 m3
Viajes de escombros: 0 viajes

- Semana del 16 al 21 de febrero

Área cajeo: 452.84m2
Área nivelaciones: 116.24 m2
Volumen asfalta suelto: 60.74 m3
Viajes de escombros: 3 viajes

- Semana del 23 al 28 de febrero

Área cajeo: 473.31 m2
Área nivelaciones: 123.14 m2
Volumen asfalta suelto: 56.13 m3
Viajes de escombros: 10 viajes


Se anexa Excel con las áreas, volúmenes y cantidades ejecutas (Ver anexo III).

Alcaldía de IBAGUÉ

También se realizaron actividades de apoyo en este periodo:

- Instalación de concreto para hechura de Vía, Barrio Brisas del Pedregal



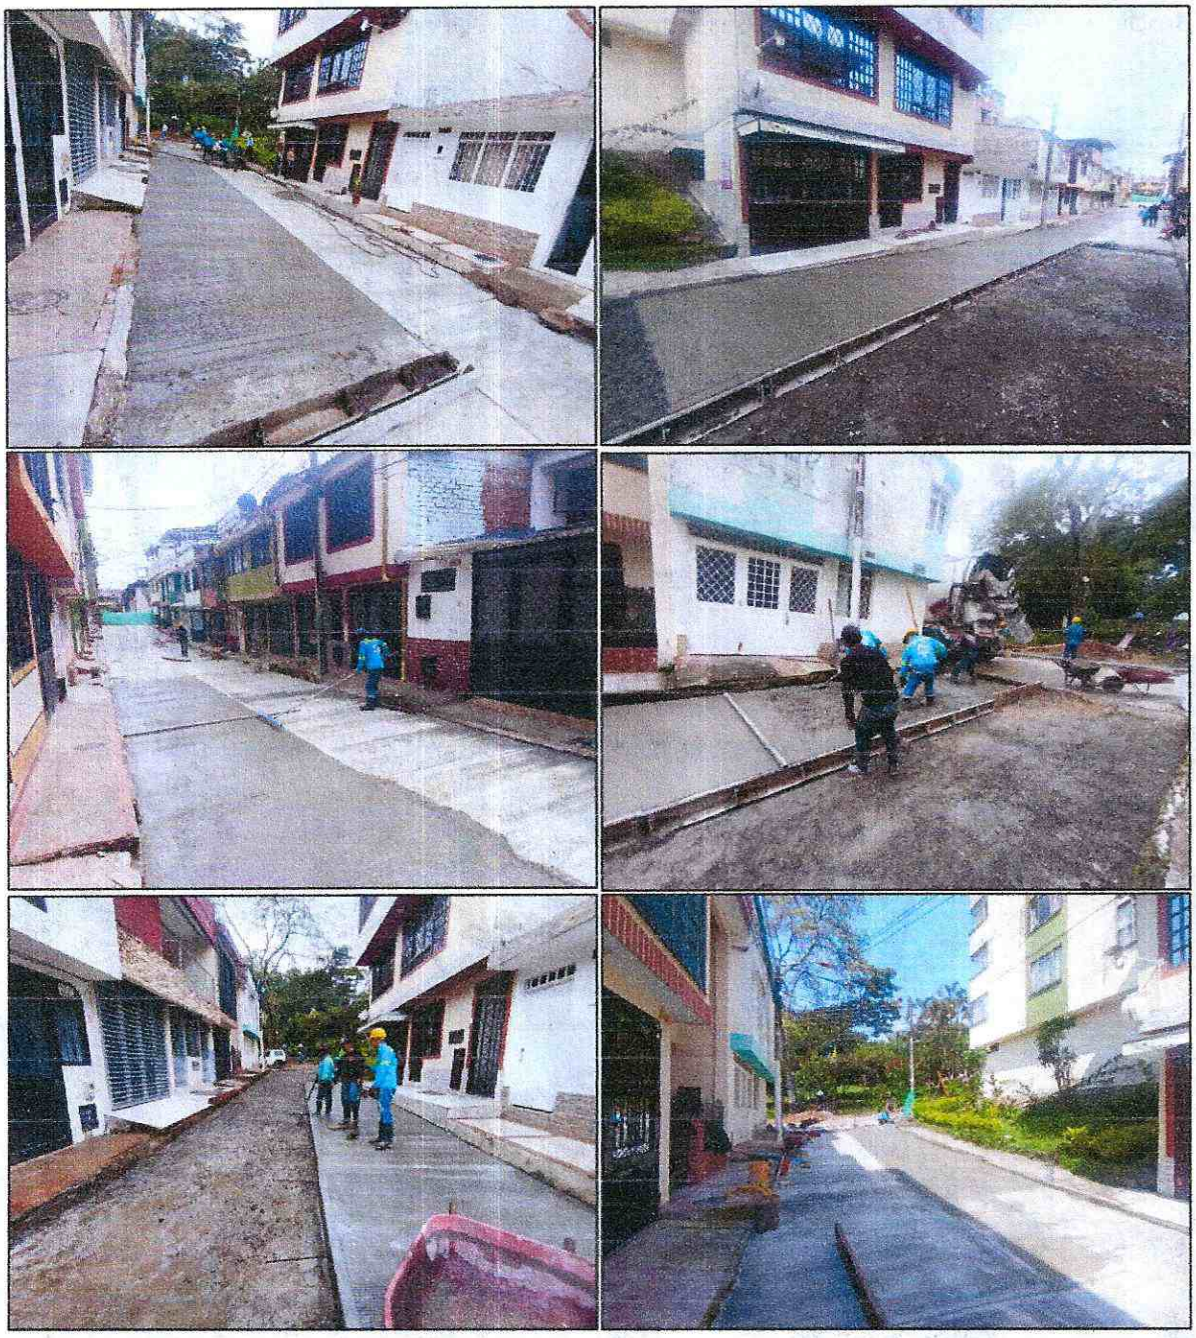

- Alistamiento para demarcación, Bahia de taxis glorieta de Mirolindo



- Hechura de andenes en concreto, Barrio Brisas del Pedregal






- Recolección de escombros de anden, Barrio Balcázar




3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS


En cumplimiento de la ejecución del contrato, la Secretaría de Infraestructura pone a disposición del contratista, en la obra, los equipos necesarios para la ejecución de las actividades que requiere el proyecto, tales como:

- Una (1) retroexcavadora.
- tres (3) volquetas.
- Dos (2) vibrocompactador.

Por su parte, el contratista pone a disposición en la obra la siguiente herramienta:


- Herramienta menor.
- Un (1) benetin.



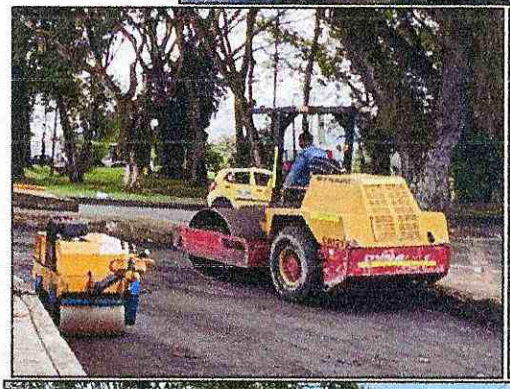





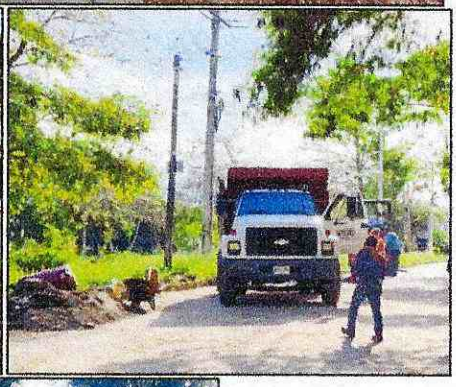



3.3 PLAZO CONTRACTUAL

PLAZO		DÍAS
INICIAL		
PLAZO TOTAL		92
ACTA	**FECHA**	**DÍAS EJECUTADOS**
ACTA DE INICIO	1/10/2025	
SUSPENSION	29/12/2025	90
REINICIO	14/01/2026	90
PRORROGA No.1	17/01/2026	93
FECHA ACTUAL	28/02/2026	139
TOTAL		**139**

3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS				
AMPAROS	**No. PÓLIZA**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	**ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	1-100048259	$90,000,000.00	17/01/2026-17/10/2026	SEGUROS MUNDIAL
PRESTACIONES SOCIALES	1-100048259	$135,000,000.00	17/01/2026-17/03/2029	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	1-100048259	$90,000,000.00	17/01/2026-17/10/2026	SEGUROS MUNDIAL
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	1-100012375	$350.181.000	18/09/2025-17/03/2026	SEGUROS MUNDIAL


3.5 PERSONAL EN OBRA


	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Cuadrilla 1	Luis Alberto Bobadilla	Oficial Rastrillero
	Andrés Fabian Garzón	Oficial Rastrillero
	Guillermo León Hernández	Auxiliar de Obra
	Luis Eduardo Salcedo	Auxiliar de Obra
	Junior Rafael Perdomo	Auxiliar de Obra
	Eduard Fabian Leal	Auxiliar de Obra
	Oscar Naranjo Ruiz	Auxiliar de Obra
	Cesar Augusto Pérez	Auxiliar de Obra
	Deivi Alejandro Martínez	Auxiliar de Obra
	Domingo Olmos	Auxiliar de Obra
	Juan David Londono	Auxiliar de Obra
	Jose Saul Nutes	Auxiliar de Obra
Cuadrilla 2	Alexander Vargas Peña	Oficial Rastrillero
	Victor Astudillo	Auxiliar de Obra
	Andrea Jellinek Quintana	Auxiliar de Obra
	Luis Carlos Guio	Auxiliar de Obra
	Gabriel Quijano	Auxiliar de Obra
	Daniel Correa	Auxiliar de Obra
	Alonso Murillo	Auxiliar de Obra
	Jairo García	Auxiliar de Obra
Cuadrilla de Apoyo	Ramiro Varón Cabiedes	Auxiliar de Obra
	Jesús Emilio Figueroa Garzón	Oficial
	Jhobany Alba	Auxiliar de Obra

3.6 GRÁFICOS DE AVANCE





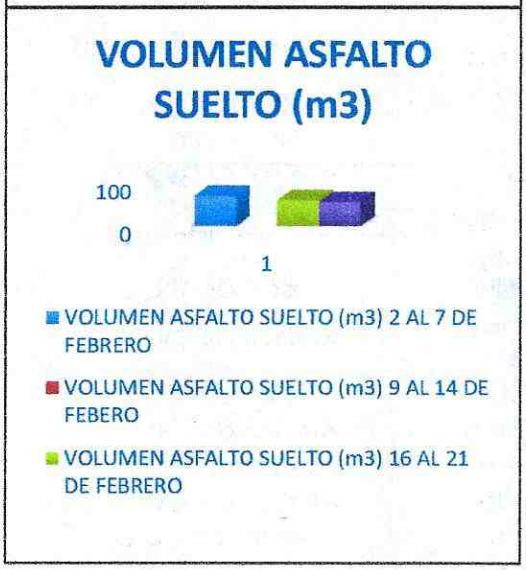

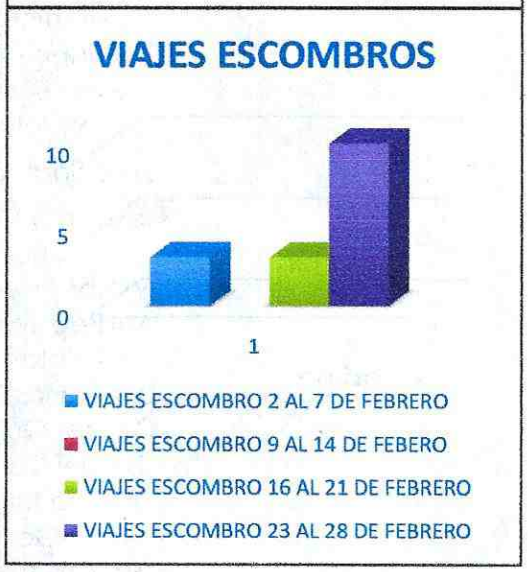

4. CONCLUSIONES

- El contratista, contrato el personal profesional, técnico y operativo y administrativo requerido para dar cumplimiento al proyecto.
- EL contratista da cumplimiento a las instrucciones impartidas por la alcaldía por medio de la supervisión del ingeniero asignado por secretaria de infraestructura.
- El contratista cuenta con una oficina administrativa y campamentos móviles en sitio.

5. ANEXOS

I. Estado del tiempo.
II. Informe SST.
III. Excel de cantidades mensuales.

ING. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Director De Obra

ANEXOS

I. Estado del tiempo
II. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL SST FEBRERO"
III. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL FEBRERO"

Alcaldía de IBAGUÉ

I. Estado del tiempo

REGISTRO CLIMÁTICO DIARIO FEBRERO							
Obra:	CUADRILLAS 2026						
Fecha	Estado Climático	Hora		Intensidad			Observaciones
		AM	PM	Baja	Media	Alta	
1/02/2026	SOLEADO						
2/02/2026	LLUVIA	X				X	
3/02/2026	LLUVIA	X				X	
4/02/2026	SOLEADO						
5/02/2026	SOLEADO						
6/02/2026	LLUVIA		X			X	
7/02/2026	SOLEADO						
8/02/2026	SOLEADO						
9/02/2026	SOLEADO						
10/02/2026	SOLEADO						
11/02/2026	SOLEADO						
12/02/2026	LLUVIA		X			X	
13/02/2026	SOLEADO						
14/02/2026	SOLEADO						
15/02/2026	SOLEADO						
16/02/2026	SOLEADO						
17/02/2026	SOLEADO						
18/02/2026	SOLEADO						
19/02/2026	SOLEADO						
20/02/2026	SOLEADO						
21/02/2026	SOLEADO						
22/02/2026	LLUVIA		X			X	
23/02/2026	LLUVIA		X			X	
24/02/2026	LLUVIA		X			X	
25/02/2026	SOLEADO						
26/02/2026	SOLEADO						
27/02/2026	LLUVIA		X			X	
28/02/2026	SOLEADO						

	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	FECHA MENSUAL :	INFORME MENSUAL FEBRERO
			FRENTE 1 y 2

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

PROYECTO: A UNAR ESFUERZOS Y RECURSOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MARCO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE – TOLIMA	**ELABORADO POR: Lina Marcela Camargo Conde**
PERIODO: 1	**FECHA ELABORACION: INFORME MENSUAL FEBRERO**

1. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

PROMEDIO TRABAJADORES	HORAS HOMBRE	No ACCIDENTES		DIAS PERDIDOS POR AT		INDICE DE FRECUENCIA		INDICE DE SEVERIDAD		INDICE DE LESION INCAPACITANTE
		JUNIO	ACUMULADO	OCTUBRE	ACUMULADO	JUNIO	ACUMULADO	JUNIO	ACUMULADO	
28	2.400	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. PERSONAL EN OBRA.

FRENTE 1

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA
Luis Alberto Bobadilla	Oficial	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Andres Fabian Garzon	Oficial	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Guillermo Leon Hernandez	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Luis Eduardo Salcedo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Junior Rafael Perdomo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Eduard Fabian Leal	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Oscar Naranjo Ruiz	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Cesar Augusto Perez	Auxiliar de Obra	sociedad Tolimense de Ingenieros
Deivi Alejandro Martinez	Auxiliar de Obra	sociedad Tolimense de Ingenieros
Domingo Olmos	Auxiliar de Obra	sociedad Tolimense de Ingenieros
Jairo Garcia	Auxiliar de Obra	sociedad Tolimense de Ingenieros
Jose Saul Ñustes	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Alonso Murillo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
FRENTE 2		
Alexander Vargas Peña	Oficial	Sociedad Tolimense de ingenieros
Juan David Londoño	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Daniel Correa	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Victor Astudillo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Andreal Jelineck Quintana	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Gabriel Quijano	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Oscar Alejandro Echavarria	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros

Jesus Moreno	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
CUADRILLA DE APOYO		
Jesús Emilio Figueroa Garzon	Oficial	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Ramiro Varon Cabiedes	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Jhobany Alba	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO OPERATIVO		
Llano Gomez Jorge Alberto	Ingeniero Residente	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Jose Policarpo Quintero	Operario	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Aroca Laguna Laura Juliana	Inspectora de obra	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Calderón Andrés Mauricio	Inspector Topógrafo	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Camargo Conde Lina Marcela	Profesional SST	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Sanchez Cardozo Fernando	Director de Obra	*Sociedad Tolimense de ingenieros*

INGRESO DE PERSONAL

INGRESO DE PERSONAL A OBRA DE DANIEL CORREA, CRISTIAN CAMILO ORTIZ, VICTOR ESTUDILLO, JUAN DAVID LONDOÑO Y JOSE SAUL RONCANCIO 25 DE FEBRERO DEL 2026

RETIROS EN EL PERIODO

FECHA DE RETIRO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA
15/02/26	JAIRO GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	

AUSENTISMOS

NOMBRES	CARGO	AREA	CAUSAS Y/O DUAGNOSTICO	TIEMPO		ACUMULADO
				DIAS	FECHA INCAPACIDAD	
CESAR AGUSTO PEREZ	AUXILIAR DE OBRA	OPERATIVO	ENFERMADAD COMUN	**8**	23-02-2026 AL 02-03-2026	NO

LLAMADOS DE ATENCION

NOMBRES	CARGO	AREA	OBSERVACION	NUMERO DE LLAMADOS DE ATENCION	ACUMULADO
No se presentaron llamados de atención					

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO			
ACTIVIDAD	**TEMA**	**CONTRATISTA**	**Controles para Eliminar Reducir los Riesgos**
INSPECCIONES DE SEGURIDAD	HERRAMIENTAS MANUALES	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE VERIFICAN LAS HERRAMIENTAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO(BARRAS, PICAS, PALAS, CEPILLOS, RASTRILLOS,NIVELETES, CARRETILLAS EN LAS ACTIVIDADES A DESAROLLAR DURANTE LA SEMANA. SE LES HACE LA OBSERVACIÓN A LA CUADRILLAS CONFORMADAS QUE SON RESPONSABLES DE LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS CON LA QUE CUENTAN A DIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES DE IGUAL MANERA REPORTAR DAÑOS PARA SU RESPECTIVO CAMBIO O
	SEÑALIZACION	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA LA UBICACIÓN PERTINENTE EN LOS FRENTES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INTERVENCIÓN (B/ ARKANIZA B ARKAMONICA 16 CON SEGUNDA 19 CON SEGUNDA)
ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJADORES QUE PRESENTAN DETERIORO COMO LO SON: GUANTES CON PALMA DE NITRILO, GUANTES DE VAQUETA, MASCARILLAS.
HIDRATACCION	ENTREGA DE HIDRATACIÓN PERSONAL DE OBRA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE HACE ENTREGA TODOS LOS DIAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO 1 VEZ AL DÍA PARA SU RESPECTIVA HIDRATACIÓN DURANTE SU JORNADA LABORAL , SE LES INDICA A TODO EL PERSONAL LA IMPORTANCIA DE HACERLO PARA EVITAR ENFERMEDADES RELACIONADAS A GOLPES DE CALOR , PREVENCIÓN DE CALAMBRES MUSCULARES ENTRE OTROS

8. ENTREGA DE DOTACION			
TRABAJADORES QUE INGRESARON EN EL PERIODO	**TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACION**		**COBERTURA %**
	NUEVOS	**ANTIGUOS**	
5	5	27	**80%**

CONTROL PROGRAMACIÓN DEL PERIODO			
ACTIVIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**EJECUTADO**	**FECHA DD/MM/AA**
INGRESO DE OBRA: SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN COMFORMACION DE LAS CUADRILLAS. SE INDICA PASOS A SEGUIR EN TEMAS SST.	LLEVAR CONTROL DE ASISTENCIA EN OBRA	SI	23 AL 31 DE FEBRERO DE 2026

VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS FRENTES DE TRABAJO	VERIFICACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS	SI	23 AL 31 DE FEBRERO DE 2026
SE ORGANIZA LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION.	SE HACE SEÑALIZACION DEL AREA EN OBRA.	SI	23 AL 31 DE FEBRERO 2026
SE REALIZA ORDEN Y ASEO, CARGUE DE SEÑALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS EN CADA FRENTE DE TRABAJO.	SE REALIZA JORNADA DE ASEO SE RECOGE EL ESCOMBRO, SE LLEVA AL CENTRO DE ACOPIO	SI	23 AL 31 DE FEBRERO DE 2026

10. ACTIVIDADES Y/O PROPUESTAS PARA EJECUTAR PROXIMO PERIODO

ACCIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PERIODO SIGUIENTE (En este espacio se deben plasmar las acciones de mejora de acuerdo a su frente de trabajo.)	REVISION
ORGANIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR TALES COMO: SEÑALIZACION Y HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADAS AL INICIO Y FINAL DE LA JORNADA LABORAL	DIARIO
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CHARLAS DE SEGURIDAD EN CADA FRENTE DE TRABAJO CON LOS LIDERES DE CUADRILLA Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA ASIGNADA DENTRO DEL PROCESO SST	DIARIO



FRENTE 2



ELABORADO POR:

Lina Marcela Camargo Conde
PROFESIONAL SST
Sociedad Tolimense de ingenieros

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL FEBRERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
2/02/2026	CRA 6 CON CLL 20	1	3,25	6,7	21,78	0,08	1,74
			2,54	2,52	6,40	0,08	0,51
			3,02	2,45	7,40	0,08	0,59
		SUB TOTAL			**35,57**		**2,85**
		2	1,91	2,15	4,11	0,1	0,41
			1,46	1,3	1,90	0,1	0,19
		SUB TOTAL			**6,00**		**0,60**
		3	2,2	5,12	11,26	0,07	0,79
			0,92	1,38	1,27	0,07	0,09
		SUB TOTAL			**12,53**		**0,88**
		4	1,49	1,23	1,83	0,06	0,11
		SUB TOTAL			**1,83**		**0,11**
		5	0,7	1,05	0,74	0,07	0,05
			1,70	1,35	2,30	0,07	0,16
			1,05	0,35	0,37	0,07	0,03
		SUB TOTAL			**3,40**		**0,24**
		6	1,95	3,55	6,92	0,06	0,42
			2,8	2,7	7,56	0,07	0,53
		SUB TOTAL			**14,48**		**0,94**
	CAR 4 CLL 80	7	1,8	3,16	5,69	0,10	0,57
			2,15	1,16	2,49	0,10	0,25
			1,6	3,4	5,44	0,10	0,54
			1,96	1,12	2,20	0,10	0,22
			1,37	3,7	5,07	0,10	0,51
			1,93	2,76	5,33	0,10	0,53
			3,65	6,6	24,09	0,10	2,41
			0,4	5,5	2,20	0,10	0,22
			1,28	0,79	1,01	0,10	0,10
		SUB TOTAL			**53,51**		**5,35**
		8	3,54	4,25	15,05	0,12	1,81
			4,4	5,7	25,08	0,12	3,01
			0,8	2,75	2,20	0,12	0,26
		SUB TOTAL			**42,33**		**5,08**
5/02/2025	CRA 6 CLL 25	9	1,3	2	2,60	0,15	0,39
		SUB TOTAL			**2,60**		**0,39**
		10	1,43	2	2,86	0,15	0,43
		SUB TOTAL			**2,86**		**0,43**
	CRA 6 CLL 29	11	0,98	1,71	1,68	0,08	0,13
		SUB TOTAL			**1,68**		**0,13**
	CRA 4 ENTRE CLL 80 Y CLL 79	12	3,75	6,65	24,94	0,08	2,00
			5,65	3,2	18,08	0,08	1,45
			9,07	3,88	35,19	0,08	2,82
			1,3	2,45	3,19	0,08	0,25
			6,2	2,02	12,52	0,08	1,00
		SUB TOTAL			**93,92**		**7,51**
		13	3,35	3,25	10,89	0,15	1,63
		SUB TOTAL			**10,89**		**1,63**
6/02/2026	CRA 8 CON CLL 19	14	1,5	5,4	8,10	0,06	0,49
			0,6	0,62	0,37	0,06	0,02
		SUB TOTAL			**8,47**		**0,51**
		15	2,85	3,35	9,55	0,07	0,67
		SUB TOTAL			**9,55**		**0,67**
		16	1,2	0,86	1,03	0,07	0,07
			1,9	2,5	4,75	0,07	0,33
		SUB TOTAL			**5,78**		**0,40**
		17	0,5	0,48	0,24	0,07	0,02
			1,47	0,97	1,43	0,07	0,10
		SUB TOTAL			**1,67**		**0,12**
	CRA 4 ENTRE CLL 80 Y CLL 79	18	1,85	1,05	1,94	0,06	0,12
			3,6	5,6	20,16	0,06	1,21
			3	11,2	33,60	0,06	2,02
			1,1	15	16,50	0,06	0,99
		SUB TOTAL			**72,20**		4,33

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS ~~MENSUAL~~ FEBRERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
7/02/2026	CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL77	19	1,2	5,9	7,08	0,10	0,71
			5,5	7,7	42,35	0,10	4,24
			4,6	1,15	5,29	0,10	0,53
			2,9	2,6	7,54	0,09	0,68
			1,25	2,05	2,56		0,00
		SUB TOTAL			**64,82**		**6,15**
		20	4,3	10,05	43,22	0,10	4,32
			3,05	2,45	7,47	0,09	0,67
		SUB TOTAL			**50,69**		**4,99**
SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO							
16/02/2026	CRA 4 CON CLL 78	1	4,2	7,12	29,90	0,1	2,99
		SUBTOTAL			**29,90**		**2,99**
		2	4,35	4,03	17,53	0,1	1,75
			3,03	1,25	3,79	0,1	0,38
		SUBTOTAL			**21,32**		**2,13**
		3	6	11,4	68,40	0,1	6,84
		SUBTOTAL			**68,40**		**6,84**
	PARQUE DEPORTIVO	4	2,51	1,54	3,87	0,12	0,46
			2,73	1,5	4,10	0,12	0,49
		SUBTOTAL			**7,96**		**0,96**
	AV GUABINAL CON CLL 50	5	1,8	3,2	5,76	0,12	0,69
		SUBTOTAL			**5,76**		**0,69**
		6	1,6	1	1,60	0,15	0,24
		SUBTOTAL			**1,60**		**0,24**
17/02/2026	CRA 4 ENTRE CLL 78 Y 77	7	4,1	5,7	23,37	0,09	2,10
			2,47	2,05	5,06	0,09	0,46
		SUBTOTAL			**28,43**		**2,56**
		8	2,2	7,2	15,84	0,12	1,90
		SUBTOTAL			**15,84**		**1,90**
		9	4,3	4,6	19,78	0,08	1,58
		SUBTOTAL			**19,78**		**1,58**
	AV. FERROCARIL CON CRA 2A	10	3,2	4,4	14,08	0,12	1,69
			1,35	7,2	9,72	0,07	0,68
			2,25	3,6	8,10	0,07	0,57
		SUBTOTAL			**31,90**		**2,94**
		11	2,83	6,85	19,39	0,13	2,52
			2	3,1	6,20	0,07	0,43
		SUBTOTAL			**25,59**		**2,95**
19/02/2026	CRA 4 CON CLL 79	12	2,4	0,85	2,04	0,08	0,16
			1,82	1,2	2,18	0,08	0,17
			1,3	1,85	2,41	0,08	0,19
			0,6	4,85	2,91	0,08	0,23
			2,5	2	5,00	0,08	0,40
			1,7	3,5	5,95	0,08	0,48
		SUBTOTAL			**20,49**		**1,64**
	AV. FERROCARIL CON CRA 2A	13	3,35	9,3	31,16	0,08	2,49
			5,05	4	20,20	0,08	1,62
			3,54	7,4	26,20	0,08	2,10
		SUBTOTAL			**77,55**		**6,20**

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL FDBRERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
20/02/2026	AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 20 Y CLL 22	14	1,05	0,97	1,02	0,10	0,10
			1,5	1,52	2,28	0,13	0,30
			3,3	2,34	7,72	0,13	1,00
			0,66	0,9	0,59	0,13	0,08
			1,3	2,3	2,99	0,13	0,39
		SUBTOTAL			**14,60**		**1,87**
		15	1,04	1,24	1,29	0,10	0,13
			0,4	1,65	0,66	0,10	0,07
			0,5	1,77	0,89	0,10	0,09
			0,9	1,35	1,22	0,10	0,12
			2,65	1,65	4,37	0,10	0,44
		SUBTOTAL			**8,42**		**0,84**
		16	2,36	1,65	3,89	0,10	0,39
			2,82	8,7	24,53	0,10	2,45
		SUBTOTAL			**28,43**		**2,84**
	CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 77	17	1,7	3,5	5,95	0,08	0,48
		SUBTOTAL			**5,95**		**0,48**
		18	1,6	3,6	5,76	0,07	0,40
		SUBTOTAL			**5,76**		**0,40**
		19	1,8	0,8	1,44	0,07	0,10
			3,2	3,6	11,52	0,07	0,81
		SUBTOTAL			**12,96**		**0,91**
		20	1,9	1,7	3,23	0,07	0,23
		SUBTOTAL			**3,23**		**0,23**
		21	2	3,9	7,80	0,07	0,55
			1,3	1,2	1,56	0,07	0,11
			3	3,2	9,60	0,07	0,67
		SUBTOTAL			**18,96**		**1,33**
SEMANA DEL 23 AL 26 DE FEBRERO							
23/02/2026	CRA 2 CON CLL19	1	2,35	2,47	5,80	0,08	0,46
			1,9	1,27	2,41	0,08	0,19
		SUB TOTAL			**8,22**		**0,66**
		2	1,96	1,4	2,74	0,09	0,25
		SUB TOTAL			**2,74**		**0,25**
		3	2,82	1,7	4,79	0,12	0,58
			4,55	6	27,30	0,12	3,28
			0,8	1,15	0,92	0,12	0,11
		SUB TOTAL			**33,01**		**3,96**
	CRA 4 ENTRE CLL 78 Y CLL77	4	4,5	7,8	35,10	0,12	4,21
		SUB TOTAL			**35,10**		**4,21**
		5	1,7	3,9	6,63	0,10	0,66
		SUB TOTAL			**6,63**		**0,66**
24/02/2026	CRA 4 ENTRE CLL 78 Y CLL77	6	2,41	2	2,41	0,09	0,22
			3,55	1,7	6,04	0,09	0,54
			4,37	6,35	27,75	0,09	2,50
		SUB TOTAL			**36,19**		**3,26**
		5	2,63	3,9	10,26	0,10	1,03
			2,63	8	21,04	0,10	2,10
			1,61	8	12,88	0,10	1,29
			2,06	2	4,12	0,10	0,41
		SUB TOTAL			**48,30**		**4,83**
	CRA 2 CON CLL 19	7	1,25	2,22	2,78	0,12	0,33
			1,8	1,3	2,34	0,12	0,28
			3,72	0,7	2,60	0,12	0,31
			4,19	0,6	2,51	0,12	0,30
			3,69	1,19	4,39	0,12	0,53
			3,09	1,9	5,87	0,12	0,70
			1,27	1,73	2,20	0,12	0,26
		SUB TOTAL			**22,69**		**2,72**

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MEDICIÓN FEBRERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
25/02/2026	CRA 4 CON CLL 77 Y CLL 76	8	2,3	6	13,80	0,09	1,24
			4	3,35	13,40	0,09	1,21
			3,2	3,4	10,88	0,09	0,98
			SUB TOTAL		38,08		3,43
		9	1,6	2,25	3,60	0,06	0,22
			0,7	1,8	1,26	0,06	0,08
			SUB TOTAL		4,86		0,29
		10	2,4	1,9	4,56	0,06	0,27
			SUB TOTAL		4,56		0,27
		11	1,65	6,5	10,73	0,10	1,07
			1,37	1,93	2,64	0,10	0,26
			6	16	96,00	0,10	9,60
			1,24	2,26	2,80	0,10	0,28
			1,48	2,92	4,32	0,10	0,43
			SUB TOTAL		116,49		11,65
	CRA 2 ENTRE CLL 18 Y 17	12	1,82	2,9	5,28	0,16	0,84
			SUB TOTAL		5,28		0,84
		13	2,7	2,3	6,21	0,06	0,37
			1,65	2,8	4,62	0,06	0,28
			SUB TOTAL		10,83		0,65
		14	1	2,75	2,75	0,07	0,19
			SUB TOTAL		2,75		0,19
		15	0,75	2,25	1,69	0,07	0,12
			SUB TOTAL		1,69		0,12
		16	0,43	0,65	0,28	0,13	0,04
			1,1	1,55	1,71	0,13	0,22
			2,42	1	2,42	0,13	0,31
			SUB TOTAL		4,40		0,57
		17	2,45	1,8	4,41	0,07	0,31
			SUB TOTAL		4,41		0,31
26/02/2026	AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20	18	0,7	0,5	0,35	0,04	0,01
			SUB TOTAL		0,35		0,01
		19	2,12	1,1	2,33	0,04	0,09
			0,75	0,85	0,64	0,04	0,03
			SUB TOTAL		2,97		0,03
		20	1,3	1	1,30	0,04	0,05
			SUB TOTAL		1,30		0,05
		21	1	1	1,00	0,04	0,10
			SUB TOTAL		1,00		0,10
		22	0,76	0,95	0,72	0,04	0,03
			SUB TOTAL		0,72		0,03
	CRA 2 CON CLL 16	23	1,75	1,9	3,33	0,10	0,33
			4,3	18	77,40	0,10	7,74
			SUB TOTAL		80,73		8,07
TOTAL					1420,9309 m2		

TOTAL SEMANA 4 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026(M2)	473,3088 m2
TOTAL SEMANA 3 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026(M2)	452,836 m2
TOTAL SEMANA 1 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026(M2)	494,7861 m2
TOTAL MES DE ENERO DEL 2026(M2)	981,0538 m2
TOTAL MES DE DICIEMBRE (M2)	1771,8975 m2
TOTAL MES DE NOVIEMBRE (M2)	1133,3985 m2
TOTAL MES DE OCTUBRE (M2)	5411,6404 m2
Total Acumulado	**10718,9211 m2**

FERNANDO SÁNCHEZ CARDOZO


Presidente STI

	INFORME DE OBRA	FECHA:		
		1	FEBRERO	2026
		28	FEBRERO	2026
		VERSIÓN: 01		
		PAGINA: 1 DE		

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	
CONTRATO Nº:	2452
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	FREDY RINCON
MES:	FEBRERO

1. CRA 6 CON CLL 20

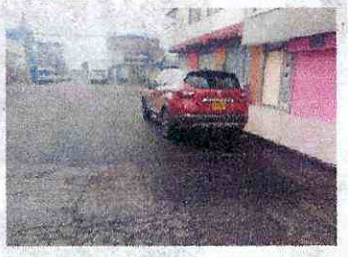

2. CRA 6 CON CLL 20





3. CRA 6 CON CLL 20





0


4. CRA 6 CON CLL 20





5. CRA 6 CON CLL 20



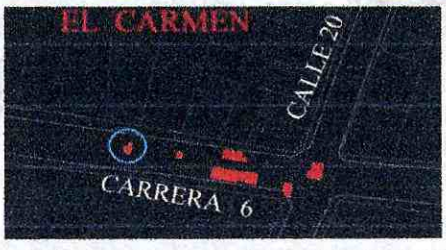

6. CRA 6 CON CLL 20






7. CAR 4 CLL 80





8. CAR 4 CLL 80

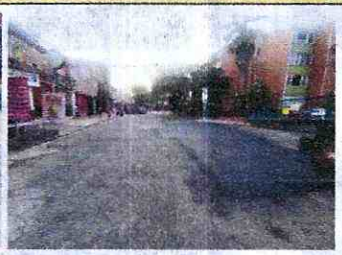

9. CRA 6 CLL 25





10. CRA 6 CLL 25



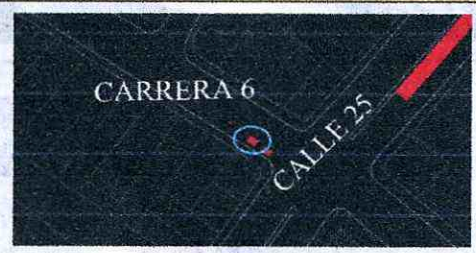

11. CRA 6 CLL 29

CRA 8 CLL 19





12. CRA 4 ENTRE CLL 80 Y CLL 79






13. CRA 4 ENTRE CLL 80 Y CLL 79





14. CRA 8 CON CLL 19



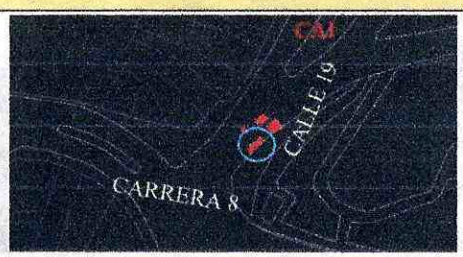


15. CRA 8 CON CLL 19






16. CRA 8 CON CLL 19



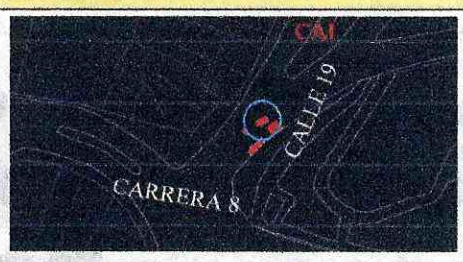

17. CRA 8 CON CLL 19



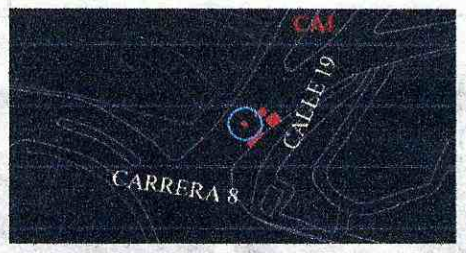

18. CRA 4 ENTRE CLL 80 Y CLL 79





19. CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL77







20. CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL77








SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO


1. CRA 4 CON CLL 78





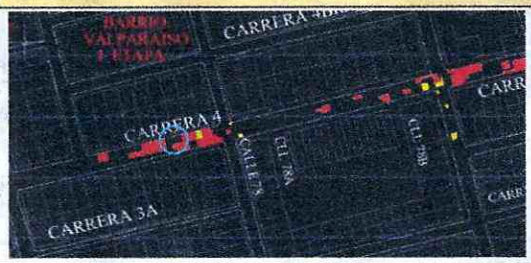

2. CRA 4 CON CLL 78

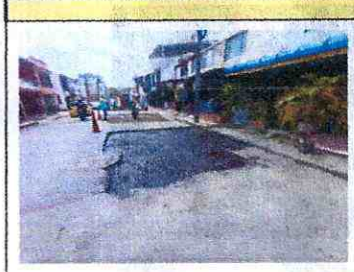





3. CRA 4 CON CLL 78








4. PARQUE DEPORTIVO



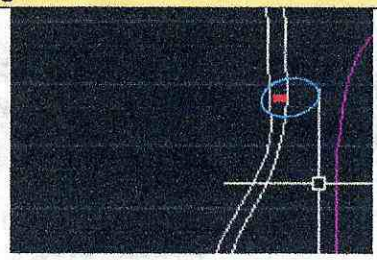

5. AV GUABINAL CON CLL 50





6. AV GUABINAL CON CLL 50




7. AV. FERROCARRIL CON CRA 2A



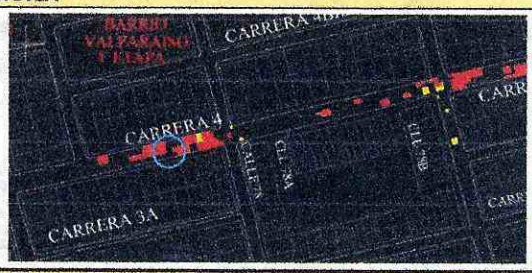


8. CRA 4 ENTRE CLL 78 Y 77





9. CRA 4 ENTRE CLL 78 Y 77



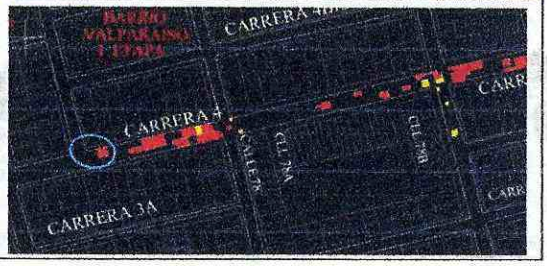

10. AV. FERROCARIL CON CRA 2A






11. AV. FERROCARIL CON CRA 2A




12. CRA 4 CON CLL 79

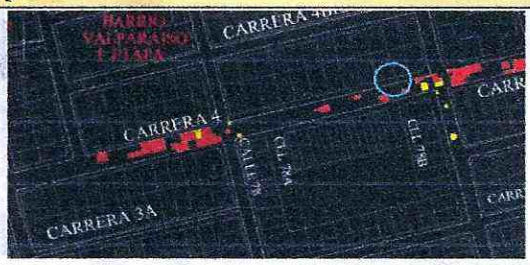13. AV. FERROCARIL CON CRA 2A





14. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 20 Y CLL 22





15. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 20 Y CLL 22





16. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 20 Y CLL 22






17. CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 77




18. CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 77





19. CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 77

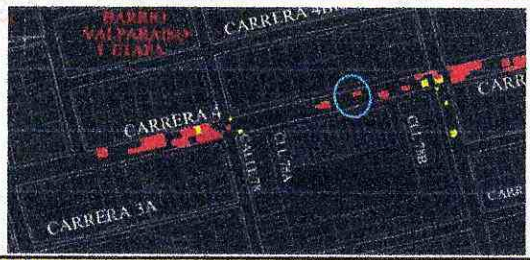20. CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 77





20. CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 77

23 AL 27 DE FEBRERO

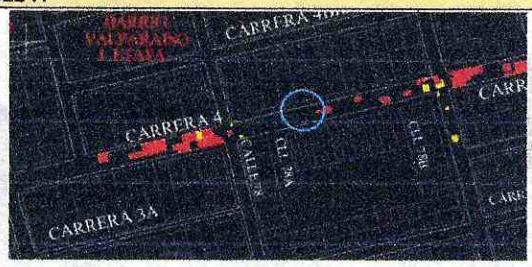
1. CRA 2 CON CLL19



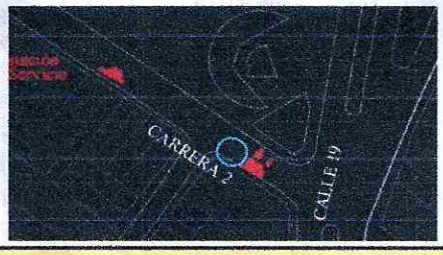


2. CRA 2 CON CLL19



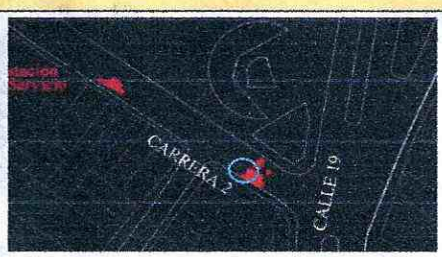

3. CRA 2 CON CLL19




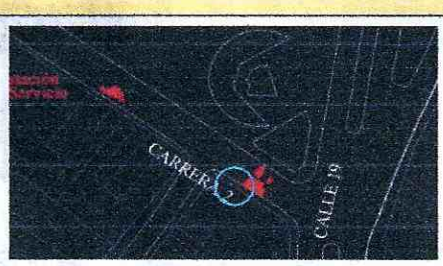

4. CRA 4 ENTRE CLL 78 Y CLL77





5. CRA 4 ENTRE CLL 78 Y CLL77

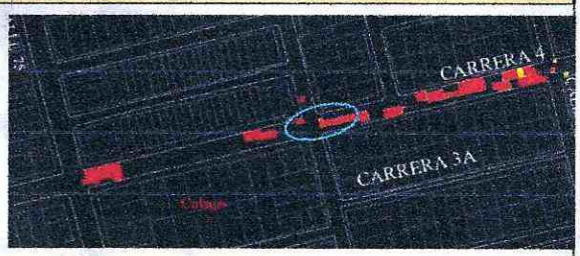
6. CRA 4 ENTRE CLL 78 Y CLL77



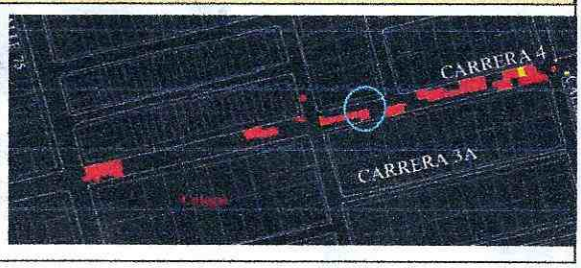

7. CRA 2 CON CLL 19





8. CRA 4 CON CLL 77 Y CLL 76








9. CRA 4 CON CLL 77 Y CLL 76






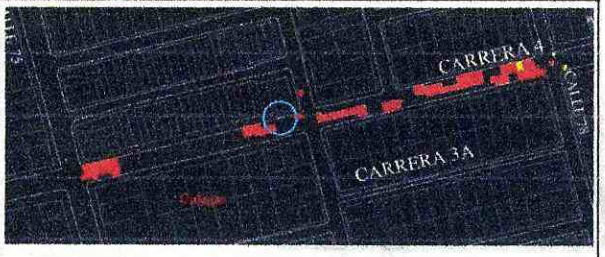

10. CRA 4 CON CLL 77 Y CLL 76









11. CRA 4 CON CLL 77 Y CLL 76






12. CRA 2 ENTRE CLL 18 Y 17



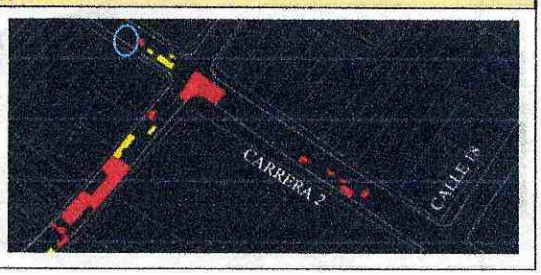


13. CRA 2 ENTRE CLL 18 Y 17






14. CRA 2 ENTRE CLL 18 Y 17







15. CRA 2 ENTRE CLL 18 Y 17



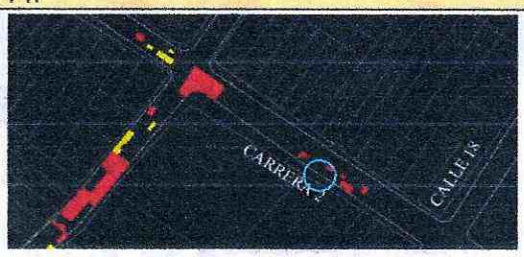


16. CRA 2 ENTRE CLL 18 Y 17

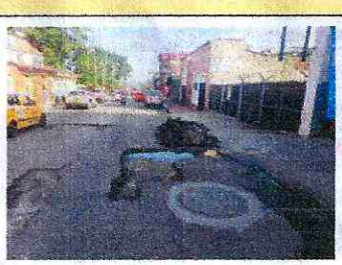



17. CRA 2 ENTRE CLL 18 Y 17



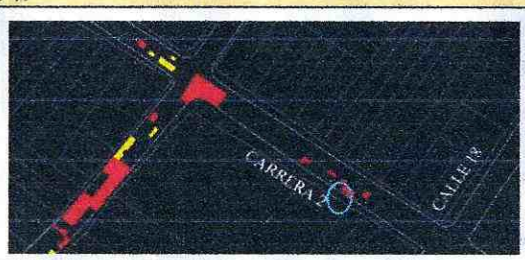

18. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20









19. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20



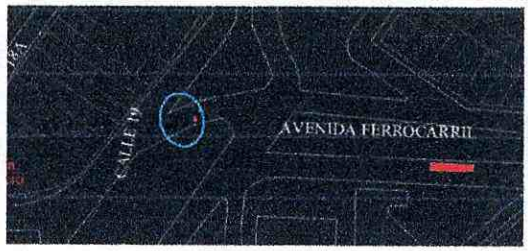


20. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20



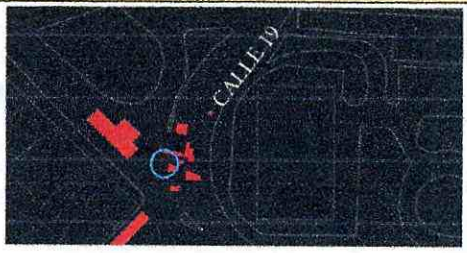


21. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20



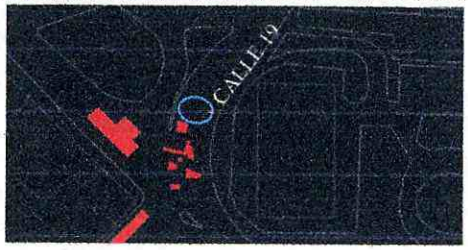

22. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20

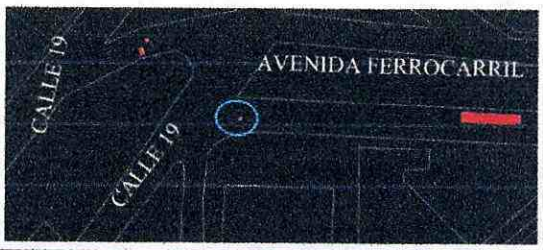

23. CRA 2 CON CLL 16




SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE NIVELACION MENSUAL FEBRERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA	PROFUNDIDAD	VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL SUELTO
4/02/2026	CRA 4 CLL 80	1	3,12	4,74	14,79	0,05	0,74	0,92
			5,85	10,30	60,26	0,05	3,01	3,77
5/02/2026	CRA 6 CLL 29	2	0,69	0,67	0,46	0,07	0,03	0,04
			1,62	1,45	2,35	0,07	0,16	0,21
			0,82	0,65	0,53	0,07	0,04	0,05
		3	1,16	1,65	1,91	0,07	0,13	0,17
			0,63	0,87	0,55	0,07	0,04	0,05
		4	0,89	1,02	0,91	0,07	0,06	0,08
			0,68	1,30	0,88	0,07	0,06	0,08
	CLL 19 CON AV. GUABINAL	5	3,2	6,50	20,80	0,10	2,08	2,60
			1	2,50	2,50	0,10	0,25	0,31
	CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 80	1	10,7	5,85	62,60	0,05	3,13	3,91
6/02/2026	CRA 8 CLL 19	6	2,05	8,00	16,40	0,04	0,66	0,82
			2	2,20	4,40	0,04	0,18	0,22
		7	1,75	1,35	2,36	0,04	0,09	0,12
			1,38	2,76	3,81	0,04	0,15	0,19
		8	3	9,60	28,80	0,04	1,15	1,44
		9	3,2	7,80	24,96	0,04	1,00	1,25
			2,9	1,20	3,48	0,04	0,14	0,17
		10	3,1	1,02	3,16	0,04	0,13	0,16
	CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 80	1	5,85	1,89	11,06	0,04	0,44	0,55
			2,9	4,10	11,89	0,04	0,48	0,59
			1,55	4,90	7,60	0,04	0,30	0,38
SEMANA DEL 13 AL 20								
16/02/2026	AV GUABINAL CON CLL 81	1	3,65	5,90	21,54	0,04	0,86	1,08
			1,22	3,04	3,71	0,04	0,15	0,19
		2	1,55	2,15	3,33	0,04	0,13	0,17
		3	1,15	1,13	1,30	0,04	0,05	0,06
	AV GUABINAL CON CLL 60	4	2,03	3,20	6,50	0,04	0,26	0,32
		5	1,8	1,70	3,06	0,04	0,12	0,15
	CLL 44 CON CRA 11	6	3,2	4,30	13,76	0,04	0,55	0,69
			2,8	2,70	7,56	0,04	0,30	0,38
			1,5	2,00	3,00	0,04	0,12	0,15
18/02/2026	AV. FERROCARRIL CON CRA 2A	7	1,7	3,50	5,95	0,04	0,24	0,30
19/02/2026	CRA 4 CON CLL 79	8	2,1	3,50	7,35	0,05	0,37	0,46
			3,8	0,40	1,52	0,05	0,08	0,10
		9	1,35	1,52	2,05	0,05	0,10	0,13
		10	0,97	1,24	1,20	0,05	0,06	0,08
		11	1,85	0,70	1,30	0,05	0,06	0,08
			2,85	2,45	6,98	0,05	0,35	0,44
		12	3,5	3,05	10,68	0,05	0,53	0,67
	CRA 4 CON CLL 78	13	2,76	4,25	11,73	0,05	0,59	0,73
20/02/2026	CRA 4 CLL 77	14	1,4	1,80	2,52	0,05	0,13	0,16
		15	1,1	1,10	1,21	0,05	0,06	0,08
SEMANA DEL 23 al 27								
24/02/2026	CRA 2 CON CLL 19	1	1,8	1,85	3,33	0,05	0,17	0,21
26/02/2026	CRA 4 CON CLL 77	2	3,8	7,20	27,36	0,03	0,82	1,03
		3	2,37	5,32	12,61	0,03	0,38	0,47
		4	1,09	3,65	3,98	0,03	0,12	0,15
			1,95	5,50	10,73	0,03	0,32	0,40
			2,45	2,00	4,90	0,03	0,15	0,18
			1,77	2,85	5,04	0,03	0,15	0,19
	AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20	5	2,05	8,10	16,61	0,05	0,83	1,04
		6	1,35	1,82	2,46	0,05	0,12	0,15
		7	1,42	0,82	1,16	0,05	0,06	0,07
		8	1,15	1,75	2,01	0,05	0,10	0,13
		9	1,5	2,65	3,98	0,05	0,20	0,25
		10	1,15	0,77	0,89	0,05	0,04	0,06
		11	0,89	1,38	1,23	0,05	0,06	0,08
		12	1,1	1,82	2,00	0,05	0,10	0,13
		pl	1	1,30	1,30	0,05	0,07	0,08
		pl	1,5	2,06	3,09	0,05	0,15	0,19
		15	1,15	1,40	1,61	0,05	0,08	0,10
		16	0,76	3,15	2,39	0,05	0,12	0,15
			2,35	1,60	3,76	0,05	0,19	0,24
	CRA 2 CON CLL 19	17	1,96	1,86	3,65	0,05	0,18	0,23
		18	2,45	3,70	9,07	0,05	0,45	0,57
TOTAL							625,83	30,55005625 m3

TOTAL RENIVELACION SEMANA 4 DE FEBRERO 2026 (M2)	123,1406 m2
TOTAL RENIVELACION SEMANA 3 DE FEBRERO 2026 (M2)	116,2391 m2
TOTAL RENIVELACION SEMANA 1 DE FEBRERO 2026 (M2)	286,4518 m2
TOTAL RENIVELACIN MESDE ENERO 2026(M2)	231,4248 m2
TOTAL RENIVELACION MES DE DICIEMBRE (M2)	445,7414 m2
TOTAL RENIVELACION MES DE NOVIEMBRE (M2)	603 m2
TOTAL RENIVELACION MES DE OCTUBRE (M2)	215,655 m2
Total Acumulado	2021,65

	INFORME DE OBRA	FECHA:		
		2	FEBRERO	2026
		28	FEBRERO	2026
		VERSIÓN: 01		
		PAGINA: 1 DE		

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
CONTRATO Nº:	2452
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	FREDY RINCON
MES:	FEBRERO

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. CRA 4 CLL 80





2. CRA 6 CLL 29






3. CRA 6 CLL 29








4. CRA 6 CLL 29



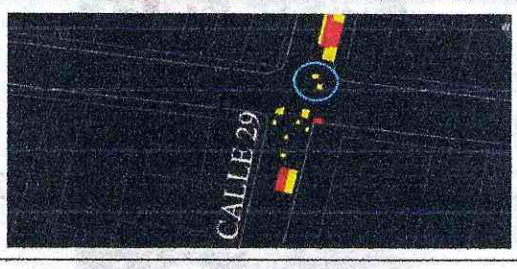


5. CLL 19 CON AV. GUABINAL	
	
6. CRA 8 CLL 19	
	
7. CRA 8 CLL 19	
	
8. CRA 8 CLL 19	
	
9. CRA 8 CLL 19	
	
10. CRA 8 CLL 19	
	

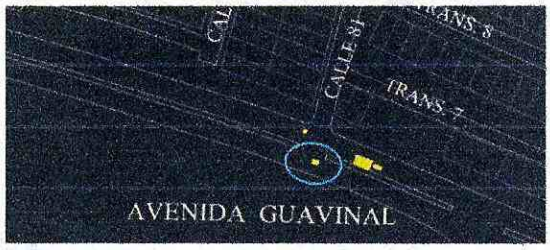SEMANA DEL 13 AL 20	
1. AV GUABINAL CON CLL 81	
	
2. AV GUABINAL CON CLL 81	
	
3. AV GUABINAL CON CLL 81	
	
4. AV GUABINAL CON CLL 50	
	
5. AV GUABINAL CON CLL 50	
	

6. CLL 44 CON CRA 11





7. CRA 4 CON CLL 79





8. CRA 4 CON CLL 79





9. CRA 4 CON CLL 79






10. CRA 4 CON CLL 79





11. CRA 4 CON CLL 79



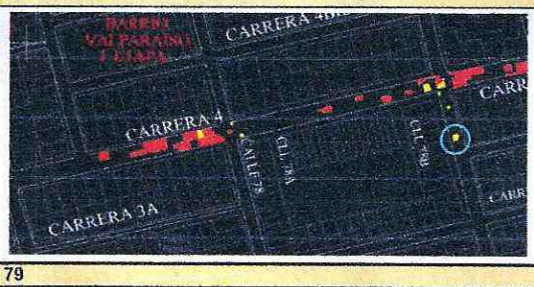

12. CRA 4 CON CLL 79










13. CRA 4 CON CLL 78



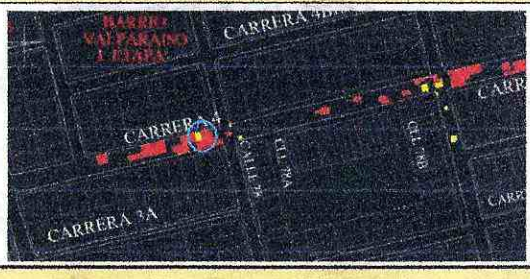

14. CRA 4 CLL 77





15. CRA 4 CLL 77






SEMANA DEL 23 AL 27

1. CRA 2 CON CLL 19



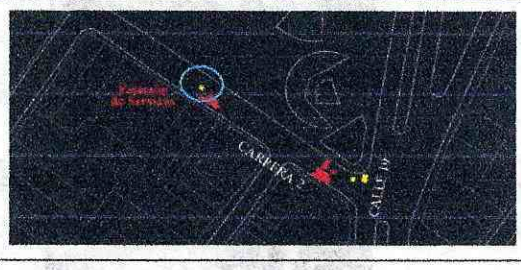


2. CRA 4 CON CLL 77






3. CRA 4 CON CLL 77



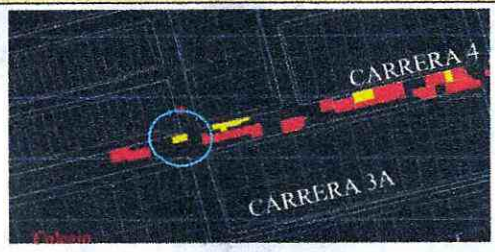


4. CRA 4 CON CLL 77






5. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20






6. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20





7. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20





8. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20










9. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20





10. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20



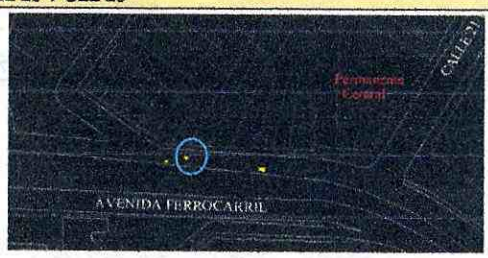


11. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20





12. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20



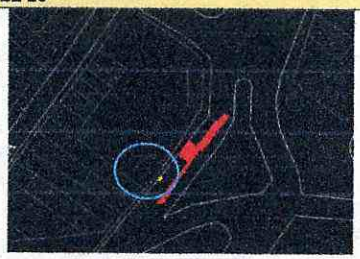


13. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20





14. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20





15. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20










16. AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20




17. CRA 2 CON CLL 19



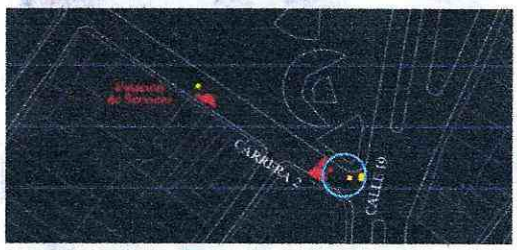

18. CRA 2 CON CLL 19





SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

CANTIDAD ASFALTO MENSUAL FEBRERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	UBICACIÓN	PLACA	EMULSION	CANTIDAD	TOTAL
4/02/2026	CRA 6 CLL 20	OTD 875		6,69	21,42
	CRA 4 CLL 80	OTD 916		7,11	
		USC 112		7,62	
5/02/2026	CRA 6 CLL 25	OTD 875		6,93	21,87
	CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 80	USC 112	1	7,94	
		OTD 916		7	
6/02/2026	CRA8 CLL 19	OTD 916		6,53	13,62
	CRA 4 ENTRE CLL 79 Y CLL 80	USC 112		7,09	
7/02/2026	CRA 4 CLL 79	USC 112		6,92	13,92
		OTD 916		7	
16/02/2026	CRA 4 CLL 78	OTD 875		6,03	11,55
	PARQUE DEPORTIVO	OTD 916		5,52	
18/02/2026	CRA 4 CLL 78	OTD 916	1	6,84	13,83
	AV FERROCARRIL CRA 2A	OTD 875	1	6,99	
19/02/2026	CRA 4 CPN CLL 79	TGN 781		15,09	21,36
	AV FERROCARRIL CRA 2A	OTD 875		6,27	
20/02/2026	AV FERROCARRIL ENTRE CLL 20 Y CLL 21	OTD 875	1	6,97	14
	CRA 4 ENTRE CLL 78 Y CLL 77	OTD 916	1	7,03	
24/02/2026	CRA 2 CON CLL 19	OTD 916		6,84	13,37
	CRA 4 ENTRE CLL 78 Y CLL 77	OTD 875		6,53	
26/02/2026	CRA 4 ENTRE CLL 78 Y CLL 76	OTD 916		7,12	21,9
		TBL 046		7,79	
	AV. FERROCARRIL ENTRE CLL 23 Y CLL 20	OTD 875		6,99	
27/02/2026	CRA 2 CON CLL 16	OTD 875		7,04	20,86
	CRA 4 CON CLL 76	OTD 916		6,71	
		TBL 046	1	7,11	
TOTAL M3			**6**		**187,7**

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 2452 ALCALDIA DE IBAGUE

RECOLECCION ESCOMBRO MENSUAL FEBRERO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 2452

FECHA	VEHICULO	CANTIDAD
6/02/2026	OTD 916	2
7/02/2026	OTD 875	1
17/02/2026	OTD 916	3
23/02/2026	OTD 875	1
	OTD 916	2
24/02/2026	OTD 875	1
	OTD 916	2
26/02/2026	OTD 916	1
27/02/2026	OTD 875	1
	OTD 916	1
28/02/2026	OTD 916	1
TOTAL VIAJES		**16**
