ACTA DE OBRA			VERSIÓN 00	
CONTRATO DE OBRA N° CD-01-2025	**OBJETO**: CONTRATO DE OBRA PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO LO QUE INCLUYE LA REPOSICIÓN Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO ACTUAL Y LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DE JERUSALÉN - MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE SONSON.			
VR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($180.527.394) INCLUIDO AU + GMSSAST + PMT + PÓLIZAS			
ADICIÓN	OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 87.399.854)			
VR INICIAL DEL CONTRATO + ADICIÓN	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 267.927.248)			
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI		**NIT:**	901.956.792-6
CONTRATISTA:	GRUPO DANEK S.A.S		**NIT:**	901705985-4
SUPERVISIÓN:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			
PLAZO DEL CONTRATO:	3 MESES			
FECHA DE INICIACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
FECHA DE FINALIZACION	10 DE DICIEMBRE DE 2025			

ITEMS	Descripcion	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	BALANCE PRESUPUESTAL			ACTA No.1		SALDO	
						CANT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Excavación manual en material comun de 0-2 m de profundidad. No incluye transporte	m3	33,00	$ 60.000	$ 1.980.000	22,42	$ 60.000	$ 1.345.200	55,42	$ 3.325.200,00	0,00	$ -
2	Demolicion de concreto de cajas de inspeccion. No incluye el material producto de la demolicion.	un	3,00	$ 201.000	$ 603.000	-3,00	$ 201.000	-$ 603.000		$ -	0,00	$ -
3	S.T.I de vigas en concreto simple de 0,4 X 0.4 en concreto de 21 Mpa para anclaje de tuberia de 160mm a 250 mm.Incluye desalojo del tubo	m3	44,00	$ 1.080.000	$ 47.520.000	1,87	$ 1.080.000	$ 2.019.600	45,87	$ 49.539.600,00	0,00	$ -
4	S.T.I de columnas en concreto de 21 Mpa de 0,20 X 0,20 para apoyo de viga de empotramiento	ml	91,00	$ 78.000	$ 7.098.000	7,81	$ 78.000	$ 609.180	98,81	$ 7.707.180,00	0,00	$ -
5	Construcción de cajas de empalme de 0,8 X 0,8 y hasta 1 m en concreto de 21 Mpa. Inclye marco y tapa.	un	3,00	$ 731.000	$ 2.193.000	0,00	$ 731.000	$ -	3,00	$ 2.193.000,00	0,00	$ -
6	Siministro transporte y colocación de concreto simple de 21 Mpa para recinte de obras existente.	m3	8,00	$ 1.080.000	$ 8.640.000	20,22	$ 1.080.000	$ 21.837.600	28,22	$ 30.477.600,00	0,00	$ -
7	Transporte manual del concreto desde la via hasta el sitio de colocacion con grado de dificultado mayor	m3	56,00	$ 310.000	$ 17.360.000	26,05	$ 310.000	$ 8.075.500	82,05	$ 25.435.500,00	0,00	$ -
8	STI de acero de refuerzo Fy 42 Mpa	kg	2.277,00	$ 10.570	$ 24.067.890	634,15	$ 10.570	$ 6.702.966	2911,15	$ 30.770.855,50	0,00	$ -

9	Suministro , transporte e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 4"	ml	90,00	$ 73.226	$ 6.590.340	61,06	$ 73.226	$ 4.471.383	151,06	$ 11.061.723,16	0,00	$ -
10	Suministro , transporte e instalacion de tuberia PVC novafort de 6"	ml	36,00	$ 101.000	$ 3.636.000	28,45	$ 101.000	$ 2.873.450	64,45	$ 6.509.450,00	0,00	$ -
11	Suministro , transporte e instalacion de tuberia PVC novafort de 8"	ml	24,00	$ 123.152	$ 2.955.648	18,68	$ 123.152	$ 2.300.479	42,68	$ 5.256.127,36	0,00	$ -
12	Suministro , transporte e instalacion de tuberia PVC novafort de 10"	ml	12,00	$ 167.277	$ 2.007.324	30,68	$ 167.277	$ 5.132.058	42,68	$ 7.139.382,36	0,00	$ -
13	Suministro, transporte e instalacion de accesorios sanitarios PVC de 4"(codos , semicodos, uniones)	un	30,00	$ 58.475	$ 1.754.250	74,00	$ 58.475	$ 4.327.150	104,00	$ 6.081.400,00	0,00	$ -
14	Suministro, transporte e instalacion de accesorios sanitarios PVC de 6"(codos , semicodos, uniones)	un	16,00	$ 118.171	$ 1.890.736	15,00	$ 118.171	$ 1.772.565	31,00	$ 3.663.301,00	0,00	$ -
15	Suministro e instalacion de silla T " PVC de 4x6".	ml	12,00	$ 190.225	$ 2.282.700	7,00	$ 190.225	$ 1.331.575	19,00	$ 3.614.275,00	0,00	$ -
16	Suministro e instalacion de silla T " PVC de 4x8".	ml	8,00	$ 220.616	$ 1.764.928	2,00	$ 220.616	$ 441.232	10,00	$ 2.206.160,00	0,00	$ -
17	Suministro e instalacion de silla T " PVC de 4x10".	ml	2,00	$ 247.055	$ 494.110	3,00	$ 247.055	$ 741.165	5,00	$ 1.235.275,00	0,00	$ -
18	Suministro e instalacion de hidrosello de 6"	un	10,00	$ 15.000	$ 150.000	6,00	$ 15.000	$ 90.000	16,00	$ 240.000,00	0,00	$ -
19	Suministro e instalacion de hidrosello de 8".	un	16,00	$ 23.480	$ 375.680	0,00	$ 23.480	$ -	16,00	$ 375.680,00	0,00	$ -
20	Suministro e instalacion de hidrosello de 10".	un	6,00	$ 32.236	$ 193.416	13,00	$ 32.236	$ 419.068	19,00	$ 612.484,00	0,00	$ -
21	Suministro e instalacion de malla Metal Huecos 2-1/4 x 2-1/4 2,77mm Eslabonada para cercamiento de la PTAR	m2	150,00	$ 25.200	$ 3.780.000	-150,00	$ 25.200	-$ 3.780.000	0,00	$ -	0,00	$ -
22	Suministro e instalacion Válvula bola Material:Bronce Presión:150 PSI Conexión:Rosca tipo NPT Diámetro:4" (pulgadas) Marca:HL-CDC	Und	2,00	$ 765.102	$ 1.530.204	-2,00	$ 765.102	-$ 1.530.204	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRAS EXTRAS										0,00	$ -
OE 1	Suministro e instalacion Válvula bola Material:PVC Presión:150 PSI Conexión: LISA Diámetro:4" (pulgadas)	Und	2,00	$ 595.700		2,00	$ 595.700	$ 1.191.400		$ 1.191.400		$ -
OE 2	Demolición de estructuras en concreto	m3	4,29	$ 201.000		4,29	$ 201.000	$ 862.290		$ 862.290		$ -
OE 3	Suministro transporte e instalación de perfileria para soporte de tuberia existente	ml	30,00	$ 220.000		30,00	$ 220.000	$ 6.600.000		$ 6.600.000		$ -
							VALOR COSTO DIRECTO	$ 67.230.657	**VALOR COSTO DIRECTO**	**$ 206.097.883**		
	COSTO DIRECTO APORTE MUNICIPIO				**$ 138.867.226**							
	ADMINISTRACION			**30%**	**$ 41.860.168**		**AU 30%**	$ 20.169.197	**AU 30%**	**$ 61.829.365**		
	SUB TOTAL APORTES MUNICIPIO				**$ 180.527.394**		**TOTAL OBRA**	$ 87.399.854	**TOTAL OBRA**	**$ 267.927.248**	**VALOR TOTAL SALDO**	$ 0,00

Daniela Alexandra Lopez Sanchez
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Elkin Dario Correa Puerta
ING. RESIDENTE DE OBRA

Jorge Espinosa Vanegas
DIRECTOR DE VIVIENDA – SUPERVISIÓN

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	**CONTRATO: CD-01-2025**	**ACTA No :**	**1**
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
1	Excavación manual en material comun de 0-2 m de profundidad. No incluye transporte	m3	0,00		**0,00**

		UBICACIÓN			Dimensiones						
ACTIVIDAD	**LOCALIZACIÓN**	**K INICIO**	**K FINAL**	**Caracteristicas**	**Cantidad**	**Longitud**	**Ancho**	**Espesor o alto**	**UND**	**Total**	**IMAGEN Y/O GRÁFICO**
Excavación Cajas											
Zapatas Caja 1	Altura Hotel Claudia				1	1,00	0,90	0,90		0,81	
Zapatas Caja 2	Ultimo Mh				1	1,00	0,90	0,90		0,81	
Zapatas Caja 3	Reemplazo caja existente - Puente				1	1,00	0,90	0,90		0,81	
EXCAVACION VIGAS											
SECTOR 1	**COSTADO IZQUIERDO**										
VIGA 1					1	9,50	1,00	1,00		9,50	
VIGA 2					1	1,90	0,90	0,90		1,54	
VIGA 4	Limpieza para formaleta				1	0,95	0,60	0,60		0,34	
VIGA 5	Limpieza para formaleta				1	1,20	0,60	0,60		0,43	
VIGA 6					1	0,55	0,60	0,60		0,20	
VIGA 7					1	0,54	0,55	0,60		0,18	
VIGA 8					1	0,93	0,45	0,60		0,25	
VIGA 9					1	0,28	0,30	0,60		0,05	
VIGA 10					1	3,00	0,60	0,60		1,08	
VIGA 11					1	4,82	0,30	0,30		0,43	
SECTOR 2											
VIGA 18					1	20,00	0,30	0,30		1,80	
VIGA 20					1	15,42	0,40	0,40		2,47	





CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	**CONTRATO: CD-01-2025**	**ACTA No :**	**1**
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
1	Excavación manual en material comun de 0-2 m de profundidad. No incluye transporte	m3	0,00		**0,00**

		UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	**LOCALIZACIÓN**	**K INICIO**	**K FINAL**	**Caracteristicas**	**Cantidad**	**Longitud**	**Ancho**	**Espesor o alto**	**UND**	**Total**
VIGA 22					1	14,48	0,60	0,60		5,21
VIGA 23	Anclaje en caja existente				1	3,30	0,60	0,60		1,19
COLUMNAS										
Columna 1					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 2					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 3					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 4					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 5					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 6					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 7					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 8					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 9					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 10					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 11					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 12					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 13					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 14					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 15					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 16					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 17					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 18					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 19					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 20					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 21					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 22					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 23					1	1,00	0,20	0,20		0,04
Columna 24					1	1,00	0,20	0,20		0,04

IMAGEN Y/O GRÁFICO



	CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA	GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	**CONTRATO: CD-01-2025**	**ACTA No :**	**1**
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
1	Excavación manual en material comun de 0-2 m de profundidad. No incluye transporte	m3	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones						
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
Columna 25					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 26					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 27					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 28					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 29					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 30					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 31					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 32					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 33					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 34					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 35					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 36					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 37					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 38					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 39					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 40					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 41					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 42					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 43					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 44					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 45					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 46					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 47					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 48					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 49					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 50					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 51					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 52					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 53					1	1,00	0,20	0,20		0,04	

	CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA	GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	**CONTRATO: CD-01-2025**	**ACTA No :**	**1**
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
1	Excavación manual en material comun de 0-2 m de profundidad. No incluye transporte	m3	0,00		**0,00**

		UBICACIÓN			Dimensiones						
ACTIVIDAD	**LOCALIZACIÓN**	**K INICIO**	**K FINAL**	**Caracteristicas**	**Cantidad**	**Longitud**	**Ancho**	**Espesor o alto**	**UND**	**Total**	**IMAGEN Y/O GRÁFICO**
Columna 54					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 55					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 56					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 57					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 58					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 59					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 60					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 61					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 62					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
Columna 63					1	1,00	0,20	0,20		0,04	
RECINTES											
RECINTE 1					1	11,30	0,50	0,20		1,13	
RECINTE 2					1	23,55	0,50	0,20		2,36	
RECINTE 3					1	8,55	0,50	0,20		0,86	
RECINTE 4					1	22,74	0,50	0,20		2,27	
RECINTE 5					2	15,30	0,50	0,20		3,06	
RECINTE 6					2	2,16	0,52	0,20		0,45	
RECINTE 7					1	8,30	0,60	0,20		1,00	
RECINTE 8					1	8,33	0,56	0,20		0,93	
RECINTE 9					1	8,80	0,54	0,20		0,95	

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	**CONTRATO: CD-01-2025**	**ACTA No :**	**1**
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
1	Excavación manual en material comun de 0-2 m de profundidad. No incluye transporte	m3	0,00		**0,00**

		UBICACIÓN			Dimensiones						
ACTIVIDAD	**LOCALIZACIÓN**	**K INICIO**	**K FINAL**	**Caracteristicas**	**Cantidad**	**Longitud**	**Ancho**	**Espesor o alto**	**UND**	**Total**	**IMAGEN Y/O GRÁFICO**
Manholes											
Mh 1					1	2,51				2,51	
Mh 2					1	1,78				1,78	
Mh 3					1	1,08				1,08	
Mh 4					1	2,71				2,71	
Mh 5					1	1,88				1,88	
Mh 6					1	1,41				1,41	
Mh 7					1	1,41				1,41	
									TOTAL	**55,42**	
									COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	**0,00**	
									PRESENTE ACTA	**55,42**	

ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	**CONTRATO: CD-01-2025**	**ACTA No :**	**1**
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
3	S.T.I de vigas en concreto simple de 0,4 X 0.4 en concreto de 21 Mpa para anclaje de tuberia de 160mm a 250 mm.Incluye desalojo del tubo	m3	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones						
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Características	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
SECTOR 1	**Margen izquierda**										
VIGA 1					1	9,50	0,5	0,55		2,61	
VIGA 2					1	1,90	0,5	0,5		0,48	
VIGA 3					1	7,00	0,55	0,52		2,00	
VIGA 4					1	0,95	0,6	0,5		0,29	
VIGA 5					1	1,20	0,67	0,5		0,40	
VIGA 6					1	0,55	0,5	0,5		0,14	
VIGA 7					1	0,54	0,5	0,5		0,14	
VIGA 8					1	0,93	0,42	0,5		0,20	
VIGA 9					1	0,28	0,5	0,55		0,08	
VIGA 10					1	3,00	0,54	0,54		0,87	
VIGA 11					1	4,82	0,54	0,5		1,30	
VIGA 12					1	5,18	0,5	0,65		1,68	
VIGA 13					1	6,83	0,5	0,5		1,71	
VIGA 14					1	7,10	0,5	0,52		1,85	
SECTOR 2	**Margen derecha**										
VIGA 15					1	14,30	0,43	0,40		2,46	
VIGA 16					1	6,00	0,40	0,40		0,96	
VIGA 17					1	24,15	0,40	0,40		3,86	
VIGA 18					1	20,00	0,51	0,50		5,10	
VIGA 19					1	8,24	0,50	0,53		2,18	
VIGA 20					1	15,42	0,50	0,50		3,86	
VIGA 21					1	14,48	0,51	0,52		3,84	
VIGA 22					1	36,17	0,50	0,50		9,04	
VIGA 23					1	3,30	0,50	0,50		0,83	
									TOTAL	45,87	
									COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00	
									PRESENTE ACTA	45,87	





ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
4	S.T.I de columnas en concreto de 21 Mpa de 0,20 X 0,20 para apoyo de viga de empotramiento	ml	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN K INICIO	UBICACIÓN K FINAL	Caracteristicas	Dimensiones Cantidad	Dimensiones Longitud	Dimensiones Ancho	Dimensiones Espesor o alto	Dimensiones UND	Total
Columna 1					1	1,51				1,51
Columna 2					1	1,51				1,51
Columna 3					1	1,51				1,51
Columna 4					1	1,61				1,61
Columna 5					1	1,48				1,48
Columna 6					1	1,37				1,37
Columna 7					1	1,39				1,39
Columna 8					1	2,07				2,07
Columna 9					1	1,85				1,85
Columna 10					1	2,03				2,03
Columna 11					1	1,94				1,94
Columna 12					1	1,62				1,62
Columna 13					1	1,13				1,13
Columna 14					1	1,98				1,98
Columna 15					1	1,98				1,98
Columna 16					1	2,17				2,17
Columna 17					1	2,07				2,07
Columna 18					1	2,30				2,30
Columna 19					1	1,95				1,95
Columna 20					1	1,78				1,78
Columna 21					1	1,56				1,56
Columna 22					1	1,49				1,49
Columna 23					1	1,38				1,38
Columna 24					1	1,28				1,28
Columna 25					1	1,29				1,29
Columna 26					1	1,38				1,38
Columna 27					1	1,33				1,33
Columna 28					1	1,98				1,98
Columna 29					1	1,93				1,93
Columna 30					1	2,03				2,03
Columna 31					1	2,03				2,03
Columna 32					1	2,01				2,01
Columna 33					1	1,83				1,83
Columna 34					1	1,89				1,89
Columna 35					1	1,47				1,47
Columna 36					1	1,48				1,48
Columna 37					1	1,47				1,47
Columna 38					1	1,31				1,31
Columna 39					1	1,35				1,35
Columna 40					1	1,35				1,35
Columna 41					1	1,35				1,35
Columna 42					1	1,35				1,35

IMAGEN Y/O GRÁFICO





CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
4	S.T.I de columnas en concreto de 21 Mpa de 0,20 X 0,20 para apoyo de viga de empotramiento	ml	0,00		0,00

ACTIVIDAD	UBICACIÓN			Caracteristicas	Dimensiones					Total
	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	
Columna 43					1	1,35				1,35
Columna 44					1	1,35				1,35
Columna 45					1	1,35				1,35
Columna 46					1	1,30				1,30
Columna 47					1	2,00				2,00
Columna 48					1	0,95				0,95
Columna 49					1	2,08				2,08
Columna 50					1	1,43				1,43
Columna 51					1	1,50				1,50
Columna 52					1	1,45				1,45
Columna 53					1	1,42				1,42
Columna 54					1	1,37				1,37
Columna 55					1	1,35				1,35
Columna 56					1	1,33				1,33
Columna 57					1	1,39				1,39
Columna 58					1	1,35				1,35
Columna 59					1	1,25				1,25
Columna 60					1	1,25				1,25
Columna 61					1	1,15				1,15
Columna 62					1	1,25				1,25
Columna 63					1	1,15				1,15
									TOTAL	98,81
									COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
									PRESENTE ACTA	98,81

IMAGEN Y/O GRÁFICO



ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

CONTRATISTA: GRUPO DANEK | **CONTRATO: CD-01-2025** | **ACTA No :** 1

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
5	Construccion de cajas de empalme de 0,8 X 0,8 y hasta 1 m en concreto de 21 Mpa. Inclye marco y tapa.	m3	0,00		0,00

ACTIVIDAD	UBICACIÓN		Caracteristicas	Dimensiones					Total
	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	
Caja 1					1					1,00
Caja 2					1					1,00
Caja 3					1					1,00
									TOTAL	3,00
									COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
									PRESENTE ACTA	3,00

IMAGEN Y/O GRÁFICO



ING. ELKIN DARIO CORREA P.
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

	CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA	GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			


ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
6	Siminstro transporte y colocacion de concreto simple de 21 Mpa para resinte de obras existente.	m3	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
RECINTES										
RECINTE 1					1	11,30	0,50	0,20		1,13
RECINTE 2					1	23,55	0,50	0,20		2,36
RECINTE 3					1	8,55	0,50	0,20		0,86
RECINTE 4					1	22,74	0,50	0,20		2,27
RECINTE 5					2	15,30	0,50	0,20		3,06
RECINTE 6					2	2,16	0,52	0,20		0,45
RECINTE 7					1	8,30	0,60	0,20		1,00
RECINTE 8					1	8,33	0,56	0,20		0,93
RECINTE 9					1	8,80	0,54	0,20		0,95
Mh 1					1	2,51				2,51
Mh 2					1	1,78				1,78
Mh 3					1	1,08				1,08
Mh 4					1	2,71				2,71
Mh 5					1	1,88				1,88
Mh 6					1	1,41				1,41
Mh 7					1	1,41				1,41
Zapata para anclaje Caja 1	Altura Hotel Claudia				1	1,00	0,90	0,90		0,81
Zapata para anclaje Caja 2	Ultimo Mh				1	1,00	0,90	0,90		0,81
Zapata para anclaje Caja 3	Reemplazo caja existente - Puente				1	1,00	0,90	0,90		0,81

TOTAL	28,22
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	28,22

IMAGEN Y/O GRÁFICO



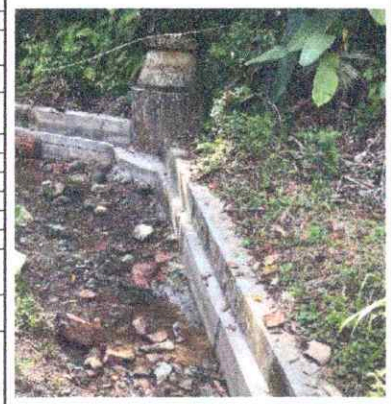

ING. ELKIN DARIO CORREA P.
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK | CONTRATO: CD-01-2025 | ACTA No : 1 | FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
7	Transporte manual del concreto desde la via hasta el sitio de colocacion con grado de dificultado mayor	m3	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
Transporte concreto										
Concreto Vigas	Item 3									45,87
Concreto columnas	Item 4					98,81	0,2	0,2		3,95
Concreto Cajas de empalme	Item 5									4,00
Concreto Recintes	Item 6									28,22
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
								TOTAL		82,05
								COBRADO EN ACTAS ANTERIORES		0,00
								PRESENTE ACTA		82,05



ING. ELKIN DARIO CORREA P.
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

	CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA	GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
8	STI de acero de refuerzo Fy 42 Mpa	Kg	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN K INICIO	UBICACIÓN K FINAL	Características	Dimensiones Cantidad	Longitud	Ancho	Peso	UND	Total
SECTOR 1	Margen izquierda									
VIGA 1 Longitudinal					4	9,50		0,994		37,77
VIGA 1 Transversal					48	9,50	2,00	0,56		53,20
VIGA 2 Longitudinal					4	1,90		0,994		7,55
VIGA 2 Transversal					10	1,90	2,00	0,56		10,64
VIGA 3 Longitudinal					4	7,00		0,994		27,83
VIGA 3 Transversal					35	7,00	2,00	0,56		39,20
VIGA 4 Longitudinal					4	0,95		0,994		3,78
VIGA 4 Transversal					5	0,95	2,00	0,56		5,32
VIGA 5 Longitudinal					4	1,20		0,994		4,77
VIGA 5 Transversal					6	1,20	2,00	0,56		6,72
VIGA 6 Longitudinal					4	0,55		0,994		2,19
VIGA 6 Transversal					3	0,55	2,00	0,56		3,08
VIGA 7 Longitudinal					4	0,54		0,994		2,15
VIGA 7 Transversal					3	0,54	2,00	0,56		3,02
VIGA 8 Longitudinal					4	0,93		0,994		3,70
VIGA 8 Transversal					5	0,93	2,00	0,56		5,21
VIGA 9 Longitudinal					4	0,28		0,994		1,11
VIGA 9 Transversal					1	0,28	2,00	0,56		1,57
VIGA 10 Longitudinal					4	3,00		0,994		11,93
VIGA 10 Transversal					15	3,00	2,00	0,56		16,80
VIGA 11 Longitudinal					4	4,82		0,994		19,16
VIGA 11 Transversal					24	4,82	2,00	0,56		26,99
VIGA 12 Longitudinal					4	5,18		0,994		20,60
VIGA 12 Transversal					26	5,18	2,00	0,56		29,01
VIGA 13 Longitudinal					4	6,83		0,994		27,16
VIGA 13 Transversal					34	6,83	2,00	0,56		38,25
VIGA 14 Longitudinal					4	7,10		0,994		28,23
VIGA 14 Transversal					36	7,10	2,00	0,56		39,76

IMAGEN Y/O GRÁFICO





	CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA	GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
8	STI de acero de refuerzo Fy 42 Mpa	Kg	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN K INICIO	UBICACIÓN K FINAL	Características	Dimensiones Cantidad	Dimensiones Longitud	Dimensiones Ancho	Dimensiones Peso	Dimensiones UND	Total
SECTOR 2	Margen derecha									
VIGA 15 Longitudinal					4	14,30		0,994		56,86
VIGA 15 Transversal					72	14,30	2,00	0,56		80,08
VIGA 16 Longitudinal					4	6,00		0,994		23,86
VIGA 16 Transversal					30	6,00	2,00	0,56		33,60
VIGA 17 Longitudinal					4	24,15		0,994		96,02
VIGA 17 Transversal					121	24,15	2,00	0,56		135,24
VIGA 18 Longitudinal					4	20,00		0,994		79,52
VIGA 18 Transversal					100	20,00	2,00	0,56		112,00
VIGA 19 Longitudinal					4	8,24		0,994		32,76
VIGA 19 Transversal					41	8,24	2,00	0,56		46,14
VIGA 20 Longitudinal					4	15,42		0,994		61,31
VIGA 20 Transversal					77	15,42	2,00	0,56		86,35
VIGA 21 Longitudinal					4	14,48		0,994		57,57
VIGA 21 Transversal					72	14,48	2,00	0,56		81,09
VIGA 22 Longitudinal					4	36,17		0,994		143,81
VIGA 22 Transversal					181	36,17	2,00	0,56		202,55
VIGA 23 Longitudinal					4	3,30		0,994		13,12
VIGA 23 Transversal					17	3,30	2,00	0,56		18,48
VIGA 24 Longitudinal										
VIGA 24 Transversal										
COLUMNAS LONGITUDINAL										
Columna 1					4	1,66		0,994		6,60
Columna 2					4	1,66		0,994		6,60
Columna 3					4	1,66		0,994		6,60
Columna 4					4	1,76		0,994		7,00
Columna 5					4	1,63		0,994		6,48
Columna 6					4	1,52		0,994		6,04
Columna 7					4	1,54		0,994		6,12
Columna 8					4	2,22		0,994		8,83
Columna 9					4	2,00		0,994		7,95
Columna 10					4	2,18		0,994		8,67
Columna 11					4	2,09		0,994		8,31
Columna 12					4	1,77		0,994		7,04
Columna 13					4	1,28		0,994		5,09
Columna 14					4	2,13		0,994		8,47
Columna 15					4	2,13		0,994		8,47
Columna 16					4	2,32		0,994		9,22
Columna 17					4	2,22		0,994		8,83
Columna 18					4	2,45		0,994		9,74
Columna 19					4	2,10		0,994		8,35

IMAGEN Y/O GRÁFICO



	CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA	GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
8	STI de acero de refuerzo Fy 42 Mpa	Kg	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
		K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Peso	UND		
Columna 20					4	1,93		0,994		7,67	
Columna 21					4	1,71		0,994		6,80	
Columna 22					4	1,64		0,994		6,52	
Columna 23					4	1,53		0,994		6,08	
Columna 24					4	1,43		0,994		5,69	

	CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA	GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
8	STI de acero de refuerzo Fy 42 Mpa	Kg	0,00		0,00

		UBICACIÓN		Características	Dimensiones					Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Peso	UND		
Columna 25					4	1,44		0,994		5,73	
Columna 26					4	1,53		0,994		6,08	
Columna 27					4	1,48		0,994		5,88	
Columna 28					4	2,13		0,994		8,47	
Columna 29					4	2,08		0,994		8,27	
Columna 30					4	2,18		0,994		8,67	
Columna 31					4	2,18		0,994		8,67	
Columna 32					4	2,16		0,994		8,59	
Columna 33					4	1,98		0,994		7,87	
Columna 34					4	2,04		0,994		8,11	
Columna 35					4	1,62		0,994		6,44	
Columna 36					4	1,63		0,994		6,48	
Columna 37					4	1,62		0,994		6,44	
Columna 38					4	1,46		0,994		5,80	
Columna 39					4	1,50		0,994		5,96	
Columna 40					4	1,50		0,994		5,96	
Columna 41					4	1,50		0,994		5,96	
Columna 42					4	1,50		0,994		5,96	
Columna 43					4	1,50		0,994		5,96	
Columna 44					4	1,50		0,994		5,96	
Columna 45					4	1,50		0,994		5,96	
Columna 46					4	1,45		0,994		5,77	
Columna 47					4	2,15		0,994		8,55	
Columna 48					4	1,10		0,994		4,37	
Columna 49					4	2,23		0,994		8,87	
Columna 50					4	1,58		0,994		6,28	
Columna 51					4	1,65		0,994		6,56	
Columna 52					4	1,60		0,994		6,36	
Columna 53					4	1,57		0,994		6,24	
Columna 54					4	1,52		0,994		6,04	
Columna 55					4	1,50		0,994		5,96	
Columna 56					4	1,48		0,994		5,88	
Columna 57					4	1,54		0,994		6,12	
Columna 58					4	1,50		0,994		5,96	
Columna 59					4	1,40		0,994		5,57	
Columna 60					4	1,40		0,994		5,57	
Columna 61					4	1,30		0,994		5,17	
Columna 62					4	1,40		0,994		5,57	
Columna 63					4	1,30		0,994		5,17	
ESTRIBOS COLUMNAS					ESTRIBOS		LONGITUD	PESO			
COLUMNA 1 - 63					1083	108,26	0,80	0,56		485,00	
CAJAS DE EMPALME					Cantidad	Longitud	Ancho	Peso	UND		
CAJA 1 LONGITUDINAL					15	0,80		0,994		11,93	
CAJA 1 TRANSVERSAL					4	2,80		0,994		11,13	
PISO					2	10,00		0,994		19,88	
TAPA					1	10,00		0,994		9,94	
CAJA 2 LONGITUDINAL					15	0,80		0,994		11,93	
CAJA 2 TRANSVERSAL					4	2,80		0,994		11,13	
PISO					2	10,00		0,994		19,88	
TAPA					1	10,00		0,994		9,94	

	CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA	GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
8	STI de acero de refuerzo Fy 42 Mpa	Kg	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN K INICIO	UBICACIÓN K FINAL	Características	Dimensiones Cantidad	Dimensiones Longitud	Dimensiones Ancho	Dimensiones Peso	Dimensiones UND	Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
CAJA 3 LONGITUDINAL					15	0,80		0,994		11,93	
CAJA 3 TRANSVERSAL					4	2,80		0,994		11,13	
PISO					2	10,00		0,994		19,88	
TAPA					1	10,00		0,994		9,94	

TOTAL	2911,15
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	2911,15

ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	**CONTRATO: CD-01-2025**	**ACTA No :**	**1**
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
9	Suministro , transporte e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 4"	ml	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
Acometidas										
Casa 1	Hotel Claudia				1	7,00				7,00
Casa 2	Hotel Claudia				1	8,00				
Casa 3	Hotel Rosa				1	6,50				6,50
Casa 4	Hotel Rosa				1	6,00				
Casa 5	Sector Guaduas				1	6,00				6,00
Casa 6	Sector Iglesia				1	13,00				13,00
Casa 7	Sector Iglesia				1	2,00				2,00
Casa 8	Sector Iglesia				1	3,70				3,70
Casa 9	Sector Iglesia				1	2,60				2,60
Casa 10	Sector Gymnasio				1	10,00				10,00
Casa 11	Sector Gymnasio				1	4,00				4,00
Casa 12	Sector Gymnasio				1	3,00				3,00
Casa 13	Sector Gymnasio				1	2,00				2,00
Casa 14	Sector Gymnasio				1	1,50				1,50
Casa 15	Gallinero				1	6,00				6,00
Casa 16	Gallinero				1	8,00				8,00
Casa 17	Gallinero				1	3,00				3,00
Casa 18	Inicio				1	6,20				6,20
Casa 19	Inicio				1	5,50				5,50
										0,00
Tramo 2 Puente aguas abajo					1	61,06				61,06

TOTAL	**151,06**
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	**0,00**
PRESENTE ACTA	**151,06**

IMAGEN Y/O GRÁFICO





ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA


GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL –			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
10	Suministro , transporte e instalacion de tuberia PVC novafort de 6"	ml	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	OCALIZACIÓ	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
VIGA 15					1	14,30				14,30
VIGA 16					1	6,00				6,00
VIGA 17					1	24,15				24,15
VIGA 18					1	20,00				20,00
								TOTAL		64,45
								COBRADO EN ACTAS ANTERIORES		0,00
								PRESENTE ACTA		64,45

IMAGEN Y/O GRÁFICO

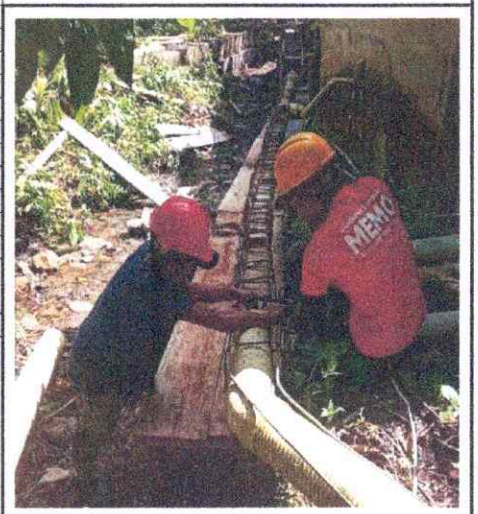

ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK | CONTRATO: CD-01-2025 | ACTA No : 1

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
11	Suministro , transporte e instalacion de tuberia PVC novafort de 8"	ml	0,00		0,00

		UBICACIÓN		Caracteristicas	Dimensiones					
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
SECTOR 1	Margen izquierda									
VIGA 1					1	9,50				9,50
VIGA 2					1	1,90				1,90
VIGA 3					1	7,00				7,00
VIGA 4					1	0,95				0,95
VIGA 5					1	1,20				1,20
VIGA 6					1	0,55				0,55
VIGA 7					1	0,54				0,54
VIGA 8					1	0,93				0,93
VIGA 9					1	0,28				0,28
VIGA 10					1	3,00				3,00
VIGA 11					1	4,82				4,82
VIGA 12					1	5,18				5,18
VIGA 13					1	6,83				6,83
									TOTAL	42,68
									COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
									PRESENTE ACTA	42,68

IMAGEN Y/O GRÁFICO



ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
12	Suministro , transporte e instalacion de tuberia PVC novafort de 10"	ml	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
SECTOR 2	Margen derecha									
VIGA 11					1	4,82				4,82
VIGA 12					1	5,18				5,18
VIGA 13					1	6,83				6,83
VIGA 14					1	7,10				7,10
VIGA 22					1	36,17				36,17
VIGA 23					1	3,30				3,30
										0,00
										0,00
Tramo 2 Puente aguas abajo					1	30,00				30,00
										0,00

TOTAL	93,40
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	93,40

IMAGEN Y/O GRÁFICO





ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
13	Suministro, transporte e instalacion de accesorios sanitarios PVC de 4"(codos , semicodos, uniones)	ml	0,00		0,00

ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	UBICACIÓN K INICIO	UBICACIÓN K FINAL	Caracteristicas	Dimensiones Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
Codos	Sector Hoteles				6					6,00	
Uniones	Sector Hoteles				7					7,00	
Tee	Sector Hoteles				3					3,00	
Codos	Secctor Guaduas				12					12,00	
Semicodo	Secctor Guaduas				2					2,00	
Tee	Secctor Guaduas				5					5,00	
Uniones	Sector Gymnasio				12					12,00	
Codos	Sector Gallinero				8					8,00	
Tee	Sector Gallinero				3					3,00	
Tee	Sector Gallinero				7					7,00	
Reducciones					14					14,00	
										0,00	
Tramo 2 Puente aguas abajo					25					25,00	





TOTAL	104,00
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	104,00

ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
14	Suministro, transporte e instalacion de accesorios sanitarios PVC de 6"(codos , semicodos, uniones)	ml	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones						
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
Codos					6					6,00	
Semicodos					4					4,00	
Uniones					6					6,00	
										0,00	
										0,00	
Tramo 2 Puente aguas abajo					15					15,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
								TOTAL		31,00	
								COBRADO EN ACTAS ANTERIORES		0,00	
								PRESENTE ACTA		31,00	





ING. ELKIN DARIO CORREA P.
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
15	Suministro e instalacion de silla T " PVC de 4x6".	UNIDAD	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones						
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
Sillas T					15					15,00	
Tramo 2 Puente aguas abajo					4					4,00	

TOTAL	19,00
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	19,00



ING. ELKIN DARIO CORREA P.
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
16	Suministro e instalacion de silla T " PVC de 4x8".	UNIDAD	0,00		0,00

		UBICACIÓN		Caracteristicas	Dimensiones					
ACTIVIDAD	OCALIZACIÓ	K INICIO	K FINAL		Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
Sillas T					10					10,00

TOTAL	10,00
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	10,00

IMAGEN Y/O GRÁFICO



ING. ELKIN DARIO CORREA P.
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
17	Suministro e instalacion de silla T " PVC de 4x10".	UNIDAD	0,00		0,00

	UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
Sillas T					5					5,00

TOTAL	5,00
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	5,00

IMAGEN Y/O GRÁFICO



ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
18	Suministro e instalacion de hidrosello de 6"	m3	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones						
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total	IMAGEN Y/O GRÁFICO
Hidrosellos					10					10,00	
Tramo 2 Puente aguas abajo					6					6,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	

TOTAL	16,00
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	16,00



ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

	CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA	GRUPO DANEK


CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
19	Suministro e instalacion de hidrosello de 8".	m3	0,00		0,00

		UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	OCALIZACIÓ	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
Hidrosellos					16					16,00

TOTAL	16,00
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	16,00

IMAGEN Y/O GRÁFICO

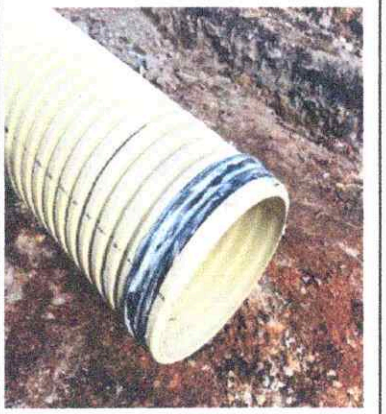

ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
			FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
20	Suministro e instalacion de hidrosello de 10".	m3	0,00		0,00

	UBICACIÓN		Caracteristicas	Dimensiones					
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
Hidrosellos				10					10,00
Tramo 2 Puente aguas abajo				9					9,00
							TOTAL		19,00
							COBRADO EN ACTAS ANTERIORES		0,00
							PRESENTE ACTA		19,00

IMAGEN Y/O GRÁFICO



ING. ELKIN DARIO CORREA P.
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	**CONTRATO: CD-01-2025**	**ACTA No :**	**1**
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	D E S C R I P C I Ó N	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
OE1	Suministro e instalacion Válvula bola Material:PVC Presión:150 PSI Conexión: LISA Diámetro:4" (pulgadas)	UNIDAD	0,00		**0,00**

		UBICACIÓN			Dimensiones						
ACTIVIDAD	**LOCALIZACIÓN**	**K INICIO**	**K FINAL**	**Caracteristicas**	**Cantidad**	**Longitud**	**Ancho**	**Espesor o alto**	**UND**	**Total**	**IMAGEN Y/O GRÁFICO**
Instalación válvulas de bola	PTARD				2					2,00	

TOTAL	**2,00**
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	**0,00**
PRESENTE ACTA	**2,00**



ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK


CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
OE2	Demolición de estructuras en concreto	m3	0,00		0,00

	UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Características	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
Demolición caja 1	Paredes				2	2,80	0,9	0,20		1,01
Demolición caja 1	Piso y tapa				2	0,90	0,9	0,20		0,32
Demolición caja 2	Paredes				2	2,80	0,9	0,20		1,01
Demolición caja 2	Piso y tapa				2	0,90	0,9	0,20		0,32
Demolición caja 3	Paredes				2	2,80	0,9	0,20		1,01
Demolición caja 3	Piso y tapa				2	0,90	0,9	0,20		0,32
Emboquillada tuberia					16	0,30	0,3	0,2		0,29
								TOTAL		4,29
								COBRADO EN ACTAS ANTERIORES		0,00
								PRESENTE ACTA		4,29

IMAGEN Y/O GRÁFICO



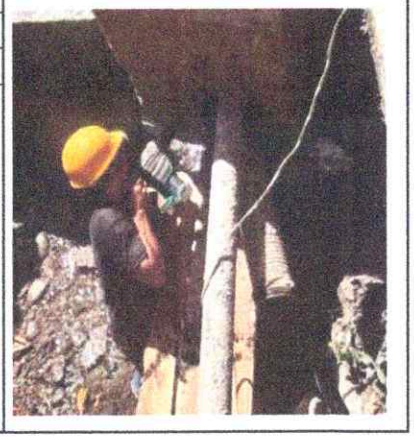

ING. ELKIN DARIO CORREA P
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervision

CANTIDADES EJECUTADAS EN OBRA

GRUPO DANEK

CONTRATISTA: GRUPO DANEK	CONTRATO: CD-01-2025	ACTA No :	1
		FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL INTEGRAL – EDURI			

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
OE3	Suministro transporte e instalación de perfileria para soporte de tuberia existente	ml	0,00		0,00

	UBICACIÓN			Dimensiones					
ACTIVIDAD	LOCALIZACIÓN	K INICIO	K FINAL	Caracteristicas	Cantidad	Longitud	Ancho	Espesor o alto	UND	Total
	Tramo 2				1	30,00				30,00

TOTAL	30,00
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES	0,00
PRESENTE ACTA	30,00

IMAGEN Y/O GRÁFICO





ING. ELKIN DARIO CORREA P.
Ing. Director de obra

JORGE ESPINOSA VANEGAS
Director de Vivienda – Supervisión
