	CUENTA No. 2	
	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE	**VERSIÓN 1**
RELACIÓN DE DOCUMENTOS		
No. ORDEN	**ARCHIVO 1 COP 938 DE 2025 - CUENTA No. 2 - INFORME No. 3 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026**	**UBICACIÓN PAGINA**
1	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	1
2	ACTA DE INICIO	2
3	INFORME DE ACTIVIDADES	3 - 26
4	CERTIFICACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	27 - 70
5	CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	71
6	DOCUMENTOS DEL CONTADOR	72 - 75
7	FACTURA	76
8	ACTA DE FIJACIÓN No.1	77-80
9	ACTA No. 2 CON ANEXOS DE DISEÑOS Y APROBACIONES	81 - 654
10	CUADRO CONTROL FINANCIERO	655
11	CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA	656 - 657
12	CERTIFICADO CONSORCIAL, OTRO SI Y DOCUMENTOS DE CONSORCIADOS	658 - 694
13	RUT, RIT Y RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN	695 - 703
14	INFORME DE SUPERVISIÓN	704 - 718
	ANEXOS COP 938 DE 2025 - CUENTA No. 2 - INFORME No. 3 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026	
1	INFORMES MENSUALES	https://n9.cl/p47cqp
2	MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST	
3	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	
4	HOJAS DE VIDA	
5	DISEÑOS APROBADOS	
6	PLAN DE CALIDAD	
7	APUS CONTRACTUALES, ITEMS DE INCLUSION Y NO PREVISTOS	

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025,** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el **1 de marzo de 2026 al 31 de marzo del 2026.**

Contrato:	COP-938-2025
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra publica
Contratista Cedente:	Consorcio Vial KD E&C 2025
Fecha Cesión:	26 de noviembre del 2025
Contratista Cesionario:	Consorcio VIAL KENNEDY 2025
NIT:	902.012.883-0
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTA D.C ATRAVES DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MOTO AGOTABLE".
Plazo de Ejecución inicial:	Catorce (14) meses
Fecha Iniciación:	15 de diciembre de 2025
Fecha de Terminación:	14 de febrero de 2027
Prorroga(s):	N/A
Valor inicial Pactado:	$ 19.645.886.208 M/CTE
Valor adicional:	N/A
Valor a Pagar:	**$ 2.054.549.671,00 M/CTE (PAGO 3 - ACTA No. 2)**
Valor amortizado Anticipo:	**$ 880.521.287,00 M/CTE**
valor total:	**$ 2.935.070.958,00 M/CTE**

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los (19) diecinueve días del mes de mayo del dos mil veintiseis (2026).

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
C.C. 79.518.952 de Bogotá
Representante Legal Interventoría
SAVIMAC SAS

JAVIER PRIETO TRISTANCHO
C.C. 1.057.579.523 de Sogamoso
Alcalde Local de Kennedy (E)
Revisión técnica documental - Magda Lorena Davila

ALCALDÍA DE KENNEDY

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No 938 de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

VALOR: $ 19.645.886.208,00

PLAZO: 14 mes(es)

El día 15 de DIC de 2025 se reunieron CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025, con NIT. No 902012883, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE OBRA No 938 de 2025, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
NIT. No 902012883

Por la ALCALDÍA DE KENNEDY,

KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACIÓN: 19-MAYO-2026 **NÚMERO INFORME: 2** **PERÍODO: MARZO 1 DE 2026 – MARZO 31 DE 2026**	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	COP-938-2025, 2 DE OCTUBRE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN (CEDENTE CUANDO APLIQUE)	NIT: 901.994.772-0(CONSORCIO VIAL E&C 2025)
NOMBRE DEL CONTRATISTA (CESIONARIO CUANDO APLIQUE)	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 902.012.883-0
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	(14) CATORCE MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.645.886.208,00 M/Cte
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	3259
VALOR A PAGAR	$ 2.054.549.671,00 M/Cte
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO (30%)	$ 880.521.287,00 M/Cte
VALOR TOTAL	$ 2.935.070.958,00 M/Cte
FECHA ACTA DE INICIO	15 -12- 2025
PRÓRROGA[1]	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
CESIÓN (CUANDO APLIQUE)	26-11-2025
DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO APLIQUE)	N/A
REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO APLIQUE)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 19.645.886.208,00 M/Cte
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	(14) CATORCE MESES
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O DISMINUCIÓN DE PLAZO)	14-02-2027
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL		
EPS	**ARL**	**PENSION**
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL SANITAS/COMPENSAR/SALUD TOTAL/EPS SURA/FAMISANAR/NUEVA EPS	ARL SURA, COLPATRIA	SGSSI COLFONDOS/COLPENSIONES/PORVENIR »

NÚMERO DE PLANILLA	**PERIODO COTIZADO**
67755601	2026 - 03

DESARROLLO DEL INFORME	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1	
EJECUTAR EL CONTRATO DE OBRA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES Y PROPIAS DEL CONTRATO. LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA, CELERIDAD Y CALIDAD.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE A ESTE COBRO, SE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES Y A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE, GARANTIZANDO EFICIENCIA, CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2	
ELABORAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT) POR TRAMO DEL CONTRATO, EL PMT PARA INVENTARIO DE REDES, DESVÍOS, TRATAMIENTOS SILVICULTURALES CUANDO SE REQUIERA, PRESENTARLO A LA INTERVENTORÍA Y GESTIONAR SU APROBACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM). LA APROBACIÓN DEL PMT POR PARTE DE LA SDM ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) DE OBRAS. PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TRÁMITE DE LOS MISMOS NUNCA DEBE SOBREPASAR EL PLAZO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL), DETERMINADO EN TRES MESES Y QUINCE DÍAS.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE ESTE PERIODO SE ELABORAN Y GESTIONAN LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT) REQUERIDOS POR TRAMO DEL CONTRATO, INCLUYENDO LOS CORRESPONDIENTES A INVENTARIO DE REDES, DESVÍOS Y TRATAMIENTOS SILVICULTURALES CUANDO APLICA, PARA SU REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA Y POSTERIOR TRÁMITE DE APROBACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 3	
REALIZAR EL REPLANTEO DE LA OBRA, DE TAL FORMA QUE PERMITA LOCALIZAR ADECUADAMENTE EL PROYECTO SOBRE EL TERRENO Y ASEGURAR LA PERMANENCIA DE LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS ESTABLECIDAS, SU PROTECCIÓN, TRASLADO O REPOSICIÓN CUANDO SEA NECESARIO.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
SE REALIZA EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON EL FIN DE UBICAR CORRECTAMENTE LAS OBRAS EN TERRENO, GARANTIZANDO LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS PARA EL PROYECTO. ESTA ACTIVIDAD SE HA DESARROLLADO CON REGISTRO FOTOGRÁFICO, EN COMPAÑÍA DEL INGENIERO TOPOGRÁFICO DEL CONTRATISTA Y DEL PROFESIONAL DE TOPOGRAFÍA DE LA INTERVENTORÍA, DEJANDO EVIDENCIA DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN EN CAMPO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 4
GENERAR Y ENTREGAR ANTES Y DESPUÉS DE LAS INTERVENCIONES, REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE SEAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
EN ESTE PERIODO SE GENERAN Y ORGANIZAN LOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS CORRESPONDIENTES AL ESTADO PREVIO Y POSTERIOR DE LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS, LOS CUALES SE INTEGRAN COMO SOPORTE DOCUMENTAL DEL CONTRATO. EN LOS CIV APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA SE CUENTA CON EL DEBIDO REGISTRO FOTOGRÁFICO, Y EN LOS INFORMES MENSUALES SE INCLUYEN IMÁGENES QUE EVIDENCIAN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. AL FINALIZAR LAS INTERVENCIONES, SE ENTREGARÁN LAS HOJAS DE VIDA DE LOS SEGMENTOS INTERVENIDOS COMO PARTE DE LOS SOPORTES DEL CONTRATO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\5. DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS APROBADOS.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5
ELABORAR Y PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN Y POSTERIOR ENVÍO AL FDLK, EL ALCANCE, LA METODOLOGÍA, EL ENFOQUE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO; EL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) PROGRAMADO, CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA LA REVISIÓN (ESTOS TIEMPOS SE ACORDARÁN EN EL PRIMER COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y SERÁ DETERMINADO POR LAS FECHAS DE PAGOS DEL FONDO), LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, CRONOGRAMA DE CIERRES POR FRENTE DE OBRA (SABIENDO LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CIV, LOS CIERRES DE FRENTES SE DETERMINARÁN COMO HITO DE INICIO A OTROS CIV), EL ACTA SUSCRITA DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS. LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU), SERÁ LA BASE PARA NUEVOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SE REQUIERAN EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO CON PRECIOS TOPE IDU VIGENTES AL MOMENTO DE EXPEDIR EL ACTA DE FIJACIÓN DE NO PREVISTOS.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
SE ELABORA Y PRESENTA A LA INTERVENTORÍA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE AL ALCANCE, METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, EL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) Y LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 2. PROGRAMACIÓN. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 3. BALANCE.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 6	
REALIZAR EL REPLANTEO DE LA OBRA, DE TAL FORMA QUE PERMITA LOCALIZAR ADECUADAMENTE EL CONTRATO SOBRE EL TERRENO. ASEGURAR LA PERMANENCIA DE LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS ESTABLECIDAS, SU PROTECCIÓN, TRASLADO O REPOSICIÓN CUANDO SEA NECESARIO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE EJECUTAN NUEVAMENTE LAS LABORES DE REPLANTEO NECESARIAS PARA VERIFICAR LA CORRECTA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EN EL TERRENO, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y ADECUADA PROTECCIÓN DE LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 7	
EJECUTAR LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y VISITAS JUNTAMENTE CON LA INTERVENTORÍA Y SUS ESPECIALISTAS O EL FDLK O ENTIDADES DISTRITALES COMPETENTES, PROPONIENDO ALTERNATIVAS, GENERANDO SOLUCIONES Y DEMÁS ACCIONES PARA EL BUEN DESARROLLO DEL CONTRATO Y SUSCRIBIR EL ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE ESTE PERIODO SE DESARROLLAN REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y VISITAS TÉCNICAS CON LA INTERVENTORÍA Y LAS ENTIDADES DISTRITALES COMPETENTES, EN LAS CUALES SE REVISA EL AVANCE DEL CONTRATO, SE PLANTEAN SOLUCIONES Y SE SUSCRIBEN LAS RESPECTIVAS ACTAS DE SEGUIMIENTO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 8. ACTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y RECORRIDOS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 8	
CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE OBRA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL PROGRAMA DE INVERSIONES REVISADO Y APROBADO POR LA INTERVENTORA, ASEGURANDO EL USO ADECUADO Y OPORTUNO DE LOS RECURSOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS EFECTUAR DE MANERA INMEDIATA LOS CORRECTIVOS NECESARIOS Y/O PLAN DE CONTINGENCIA PARA CONTRARRESTAR EL ATRASO DE ACTIVIDADES EN CASO DE QUE EXISTAN VARIACIONES POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN PREVISTA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AL CRONOGRAMA APROBADO, REALIZANDO EL CONTROL PERMANENTE DEL AVANCE DE OBRA Y ADOPTANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS EN CASO DE PRESENTARSE DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 2. PROGRAMACIÓN.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 9	
SOPORTAR TÉCNICAMENTE LA GESTIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD Y DAR RESPUESTA POR ESCRITO DE MANERA OPORTUNA, CLARA Y DE FONDO A LOS PQRS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SE BRINDA SOPORTE TÉCNICO AL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO Y SE ATIENDEN DE MANERA OPORTUNA LAS PQRS PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 10	
IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO APROBADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE IMPLEMENTA EN CAMPO EL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO APROBADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, GARANTIZANDO LA ADECUADA SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS FRENTES DE OBRA.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 11	
IMPLEMENTAR EL PLAN DE CALIDAD.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EN ESTE PERIODO SE APLICAN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS DEFINIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	• ACTA DE COBRO NO. 2\6. PLAN DE CALIDAD.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 12	
AJUSTAR EL CRONOGRAMA DEL CONTRATO CUANDO EL FDLK O LA INTERVENTORÍA LO SOLICITE, PARA EL BUEN DESARROLLO DE ESTE O CUMPLIMIENTO DE METAS.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
CUANDO ES REQUERIDO, SE REALIZAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES AL CRONOGRAMA DEL CONTRATO, EN COORDINACIÓN CON LA INTERVENTORÍA Y EL FDLK, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 2. PROGRAMACIÓN.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 13	
PRESENTAR PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO INICIALMENTE PREVISTO. DE LO CONTRARIO DEBE ENTREGAR LA NUEVA PROGRAMACIÓN CON LAS JUSTIFICACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE ESTO IMPLIQUE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS AL CONTRATISTA.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
SE ELABORAN Y PRESENTAN A LA INTERVENTORÍA LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 2. PROGRAMACIÓN. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 3. BALANCE.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 14

REMITIR OPORTUNAMENTE A LA INTERVENTORÍA LOS REPORTES SEMANALES DE EJECUCIÓN, INFORMES MENSUALES EN DONDE SE HAGA UN DETALLE DEL DESARROLLO DE LAS LABORES DE OBRA, INFORME FINAL Y EJECUTIVO DE OBRA. O CUANDO LA INTERVENTORÍA O EL FDLK LO REQUIERAN.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
DURANTE ESTE PERIODO SE REMITEN A LA INTERVENTORÍA LOS REPORTES SEMANALES Y LOS INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE OBRA, DETALLANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 15

EN CASO DE REQUERIRSE ÍTEMS NO PREVISTOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ENTREGAR PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN A LA INTERVENTORÍA LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU IDENTIFICACIÓN Y PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. TENIENDO EN CUENTA EL PRECIO TOPE IDU VIGENTE AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
EN CASO DE IDENTIFICARSE ÍTEMS NO PREVISTOS, SE ELABORAN Y PRESENTAN LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.	• ACTA DE COBRO NO. 2\7. APUS CONTRACTUALES.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 16

REALIZAR LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS CON EL FIN DE CORROBORAR LA CALIDAD LOS MATERIALES Y DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS PARA EL CONTRATO. ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN (COMO REFERENTE EL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO), CON LOS REQUISITOS QUE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN EXIJAN, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE REQUERIDA.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
SE REALIZAN LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.	• EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA NO SE PRESENTAN ENSAYOS DE LABORATORIO, DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HICIERON PARTE DE LA ETAPA PRELIMINAR DEL CONTRATO, DURANTE LA CUAL AÚN NO SE HABÍAN INICIADO LAS INTERVENCIONES DE OBRA QUE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE DICHOS ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 17	
EFECTUAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO CUANDO LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS PARA EL CONTRATO. DICHO LO ANTERIOR, REALIZAR NUEVOS ENSAYOS DE LABORATORIO QUE PRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
CUANDO LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS, SE IMPLEMENTAN LOS CORRECTIVOS CORRESPONDIENTES Y SE REALIZAN NUEVOS ENSAYOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS.	• EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA NO SE PRESENTAN ENSAYOS DE LABORATORIO, DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HICIERON PARTE DE LA ETAPA PRELIMINAR DEL CONTRATO, DURANTE LA CUAL AÚN NO SE HABÍAN INICIADO LAS INTERVENCIONES DE OBRA QUE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE DICHOS ENSAYOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 18	
DILIGENCIAR Y REALIZAR EL REPORTE DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS CIV INTERVENIDOS EN EL FORMATO IDU, CON EL FIN DE SER AVALADO POR LA INTERVENTORÍA Y REMITIDO AL FDLK PARA SU POSTERIOR ENTREGA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA DEL IDU Y MANTENER LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL IDU (SIGIDU).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE EL PERIODO SE DILIGENCIAN Y REPORTAN LOS FORMATOS IDU RELACIONADOS CON EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS CIV INTERVENIDOS, CON EL FIN DE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN EN EL SIGIDU.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 19	
ENTREGAR A LA INTERVENTORÍA LOS PLANOS RÉCORD DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) EN FORMA FÍSICA Y MAGNÉTICA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS ACORDE AL TIPO DE INTERVENCIÓN.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE ELABORAN Y ENTREGAN A LA INTERVENTORÍA LOS PLANOS RÉCORD DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS POR CADA CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL.	• UNA VEZ FINALIZADA LA FASE DE EJECUCIÓN EN CADA SEGMENTO INTERVENIDO, SE INICIA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS RÉCORD CORRESPONDIENTES A CADA CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV), LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LA INTERVENTORÍA COMO SOPORTE TÉCNICO PARA EL PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 20	
ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR A LA INTERVENTORÍA PARA SU APROBACIÓN EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA, INFORME MENSUAL ELABORADO POR EL CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRE ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN (COMO REFERENTE EL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO), CON LOS REQUISITOS QUE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN EXIJAN, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE REQUERIDA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EN ESTE PERIODO SE ELABORAN Y PRESENTAN LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA JUNTO CON LOS INFORMES CORRESPONDIENTES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 21	
SUSCRIBIR JUNTO CON LA INTERVENTORÍA EL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA A MÁS TARDAR EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA FASE DE OBRA. EN LA TERMINACIÓN SE DEBEN RELACIONAR LAS OBRAS EJECUTADAS, EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERAMENTE.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
AL FINALIZAR LA FASE DE OBRA SE SUSCRIBE JUNTO CON LA INTERVENTORÍA EL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA, EN LA CUAL SE RELACIONAN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EL ESTADO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 22	
REALIZAR DE MANERA CONJUNTA CON LAS ESP, ENTIDADES COMPETENTES Y LA INTERVENTORÍA LA VISITA DE INSPECCIÓN DETALLADA, PARA VERIFICAR EL ESTADO FINAL DE LAS OBRAS. DEBEN ESTAR PRESENTES TODOS LOS ESPECIALISTAS RESPECTIVOS.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
SE REALIZAN VISITAS DE INSPECCIÓN FINAL CON LAS ENTIDADES COMPETENTES Y LA INTERVENTORÍA CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 8. ACTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y RECORRIDOS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 23	
SUSCRIBIR JUNTO CON LA INTERVENTORÍA, EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA UNA VEZ SE HAYAN ATENDIDO LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS A MÁS TARDAR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE FINALIZADO EL PLAZO DEL CONTRATO O SEGÚN LA FECHA QUE SEA ACORDADA POR LAS PARTES.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
POSTERIORMENTE SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA UNA VEZ SE HAN ATENDIDO LAS OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS.	• A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA NO SE HA ALCANZADO LA TERMINACIÓN DE LA FASE DE OBRA, POR LO CUAL NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 24	
EN EL EVENTO EN QUE EL FDLK DEBA TOMAR POSESIÓN DE LAS OBRAS, POR INCUMPLIMIENTO O ABANDONO DE LAS MISMAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, O POR RENUENCIA DE ÉSTE PARA SU ENTREGA, SIN NECESIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ORDENE SE CITARÁ CON LA DEBIDA ANTELACIÓN AL CONTRATISTA, PARA QUE JUNTO CON LA INTERVENTORÍA, LOS PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN LOCAL DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA, EL GARANTE Y EL COASEGURADOR, SI LO HAY, PROCEDA A EFECTUAR UNA VISITA DE VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS, DE LA CUAL SE LEVANTARÁ UN ACTA EN EL FORMATO DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, DONDE SE PLASMARÁ ÉSTA CIRCUNSTANCIA, EL ESTADO DE LAS OBRAS, LAS ANOTACIONES Y SALVEDADES A QUE HAYA LUGAR, ANEXANDO LOS SOPORTES RESPECTIVOS. SI EL CONTRATISTA NO COMPARECE, O SE NIEGA A SUSCRIBIR LA CITADA ACTA, EL FDLK TOMARÁ POSESIÓN DE LAS OBRAS, DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN LA MISMA ACTA, LA CUAL SE TENDRÁ PARA TODOS LOS EFECTOS COMO EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EN CASO DE PRESENTARSE SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO O ABANDONO DE OBRA, SE PARTICIPA EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE JUNTO CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA DEJAR CONSTANCIA DEL ESTADO DE LAS OBRAS.	• NO APLICA PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME, TODA VEZ QUE NO SE HAN PRESENTADO SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO O ABANDONO DE OBRA QUE REQUIERAN LA TOMA DE POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL FDLK NI LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL EN ESTAS CONDICIONES.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 25	
ENTREGAR A LA INTERVENTORÍA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GARANTÍA ÚNICA, PARA SU POSTERIOR TRÁMITE DE APROBACIÓN POR EL FDLK.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO SE SUMINISTRAN A LA INTERVENTORÍA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GARANTÍA ÚNICA.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 1. PÓLIZAS CONTRACTUALES.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 26	
ENTREGAR A LA INTERVENTORÍA LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DE IGUAL MANERA SE ENTREGAN LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3 • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 27	
RETIRAR LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL UTILIZADA TANTO EN LA OBRA COMO EN LOS DESVÍOS E IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS DEFINITIVA PARA EL CIV Y PARA LAS VÍAS UTILIZADAS COMO DESVÍOS.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN, SE PRESENTAN ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN. POSTERIORMENTE, Y UNA VEZ OBTENIDA DICHA APROBACIÓN, SE PROCEDE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA DEL SEGMENTO INTERVENIDO.	• PARA EL PRESENTE PERIODO NO APLICA EL RETIRO DE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL, DEBIDO A QUE LOS FRENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 28	
DISPONER DE SEIS (06) FRENTES DE OBRA SIMULTÁNEOS COMO MÍNIMO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO SE DISPONEN SIMULTÁNEAMENTE LOS FRENTES DE OBRA REQUERIDOS, GARANTIZANDO LA EJECUCIÓN PARALELA DE LAS ACTIVIDADES.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3 • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 29	
UBICAR POR CADA FRENTE DE OBRA LOS EQUIPOS, PERSONAL, MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO CON LAS FECHAS PREVISTAS EN EL CRONOGRAMA APROBADO POR LA INTERVENTORÍA E INICIAR LAS ACTIVIDADES DE CADA FRENTE.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EN CADA FRENTE DE OBRA SE UBICAN LOS EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 30	
EFECTUAR LOS CORRECTIVOS DE OBRAS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORÍA O EL FDLK, EN UN PLAZO NO MAYOR A OCHO (8) DÍAS CALENDARIO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE ATIENDEN OPORTUNAMENTE LOS CORRECTIVOS SOLICITADOS POR LA INTERVENTORÍA O EL FDLK CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	• UNA VEZ LA INTERVENTORÍA REALIZA LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE Y EMITE LAS OBSERVACIONES O CORRECTIVOS A QUE HAYA LUGAR, ESTOS SERÁN ATENDIDOS Y SUBSANADOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 31	
EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER Y GENERAR ACCIONES DE MITIGACIÓN EN OBRA CUYO FIN SEA EVITAR POSIBLES RETRASOS Y DAÑOS A OBRAS EJECUTADAS Y POR EJECUTAR, SEMANALMENTE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES QUE REPORTE EL IDEAM.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE EL PERIODO SE IMPLEMENTAN ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN EN OBRA CON BASE EN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS REPORTADAS POR EL IDEAM.	• EN CASO DE QUE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA SE VEAN AFECTADAS POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL PERIODO, SE ELABORARÁN Y PRESENTARÁN PLANES DE CONTINGENCIA Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 32	
DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL CONTRATO Y LA VINCULACIÓN CON EL DESARROLLO DE ESTE, PARA LOS TEMAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A IMPLEMENTAR LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS EN: - ANEXO TÉCNICO PARTICULAR, - ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE APLICAN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO PARTICULAR Y LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3.

	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 33	
REALIZAR JUNTO CON EL SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DESIGNADO POR EL FDLK Y LA INTERVENTORÍA, COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL Y PRESENTAR LOS RESPECTIVOS INFORMES SEMANALES Y/O MENSUALES SEGÚN SEA REQUERIDO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE REALIZAN COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL JUNTO CON LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PRESENTANDO LOS INFORMES REQUERIDOS PARA EL CONTROL DE AVANCE.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 34	
IMPLEMENTAR LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE IMPLEMENTAN LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL CONTRATO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 35	
REMITIR A LA INTERVENTORÍA UN INFORME AL CORTE DEL PERIODO CALENDARIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR, (MENSUAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO) SOBRE EL COMPONENTE SOCIAL, DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES (3) DÍAS CALENDARIO, PERIODO DE FACTURACIÓN. DEBE CONTENER TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL COMPONENTE SOCIAL.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE ELABORAN Y REMITEN A LA INTERVENTORÍA LOS INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3.

	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 36	
DAR CUMPLIMIENTO A LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: • PROGRAMA DE INFORMACIÓN: REUNIÓN DE AVANCE, EXTRAORDINARIO Y FINALIZACIÓN. • PROGRAMA DE DIVULGACIÓN: DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES DE INFORMACIÓN CIUDADANA O COMUNICADOS Y VOLANTES PMT. • PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: CUMPLIR EN EL PUNTO DE ATENCIÓN EN OBRA CON LOS HORARIOS APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y EL FDLK. • PROGRAMA DE TALLERES DE SOSTENIBILIDAD: REUNIONES INFORMATIVAS AL COMITÉ DEL PUNTO DE ATENCIÓN EN OBRA. • SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL EMPLEADO PARA LA OBRA. • PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL: REUNIONES CON COMERCIANTES. • ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD, GARAJES Y RAMPAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CONTRATO; ELABORACIÓN DE ACTAS DE COMPROMISO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS VÍAS UTILIZADAS COMO DESVÍOS. • PROGRAMA DE APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO, GESTIÓN, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EN ESTE PERIODO SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN, ATENCIÓN AL CIUDADANO, SOSTENIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DEL PROYECTO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 37	
ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD, GARAJES Y RAMPAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE ELABORAN LAS ACTAS DE VECINDAD CORRESPONDIENTES A LOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CONTRATO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 38	
ELABORACIÓN DE ACTAS DE COMPROMISO Y REGISTRO FÍLMICOS Y FOTOGRÁFICOS A LAS VÍAS UTILIZADAS COMO DESVÍOS.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE REALIZAN REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y FÍLMICOS DE LAS VÍAS UTILIZADAS COMO DESVÍOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 39	
REALIZAR LAS VISITAS A TERRENO NECESARIAS EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA, EL FDLK Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL CUANDO SE REQUIERA, PARA ACTUALIZAR O ELABORAR EL INVENTARIO FORESTAL, CUANDO APLIQUE Y POSTERIORMENTE REMITIRLO A LA INTERVENTORÍA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
CUANDO APLICA, SE REALIZAN VISITAS TÉCNICAS PARA ACTUALIZAR O ELABORAR EL INVENTARIO FORESTAL EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COMPETENTES.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 40	
IMPLEMENTAR LOS COMPROMISOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO APROBADOS EN EL PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES Y DEMÁS NORMAS VIGENTES PARA LA MATERIA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE IMPLEMENTAN LOS COMPROMISOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTABLECIDOS EN LOS INSTRUMENTOS DE MANEJO APROBADOS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3/3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 41	
REMITIR A LA INTERVENTORÍA UN INFORME AL CORTE DEL PERIODO DE OBRA INMEDIATAMENTE ANTERIOR, DENTRO DE LOS PRIMEROS DÍAS DE ACUERDO CON LOS CRONOGRAMAS DE ENTREGA PREVIAMENTE ACORDADOS, REPORTE MENSUAL EL CUAL DEBE CONTENER TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES Y DEMÁS NORMAS.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE REMITEN A LA INTERVENTORÍA LOS INFORMES PERIÓDICOS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 42	
INFORMAR A LA INTERVENTORÍA DE TODOS LOS ACONTECIMIENTOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD DE SALUD EN EL TRABAJO QUE OCURRAN DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE INFORMA OPORTUNAMENTE A LA INTERVENTORÍA SOBRE CUALQUIER ACONTECIMIENTO RELACIONADO CON SEGURIDAD, SALUD O ASPECTOS AMBIENTALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 43	
ASISTIR Y ASUMIR LOS COMPROMISOS DE LAS REUNIONES COMITÉS E INSPECCIONES PROGRAMADAS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y DE SALUD DE SALUD EN EL TRABAJO SST Y SUSCRIBIR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS GENERADAS DE DICHAS VISITAS.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE PARTICIPA EN LAS REUNIONES, COMITÉS E INSPECCIONES PROGRAMADAS POR LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 44	
EFECTUAR Y EVIDENCIAR DOCUMENTALMENTE LOS PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES, CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (FIC) Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE OBRA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY Y LO EXIGIDO EN EL CONTRATO. ELABORAR Y PRESENTAR DEBIDAMENTE FIRMADA A LA INTERVENTORÍA, LA CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SST, PARAFISCALES, CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (FIC) Y PRESTACIONES SOCIALES.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE EL PERIODO SE EFECTÚAN Y DOCUMENTAN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 45	
APLICAR Y EVIDENCIAR DOCUMENTALMENTE, LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO-AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN EL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN NO. 1115 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA), RESOLUCIÓN 472 DE 2017 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, O LA QUE LO SUSTITUYA O MODIFIQUE.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE IMPLEMENTAN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 4\5. INFORME DE RCD NO. 4.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 46	
EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DE LA OBRA, DEBERÁ ENTREGARSE DE ACUERDO CON LOS CRONOGRAMAS DE ENTREGA PREVIAMENTE ACORDADOS CON LA INTERVENTORÍA, UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
SE ELABORA Y PRESENTA EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA CONFORME A LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\2. MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 47
ENTREGAR MENSUALMENTE A LA INTERVENTORÍA LOS CERTIFICADOS DE MATERIALES DE PROVEEDORES Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EN ORIGINAL, EXPEDIDOS POR LOS PROVEEDORES Y ESCOMBRERAS UTILIZADOS EN LA OBRA. ADICIONALMENTE, LA INTERVENTORÍA VERIFICARÁ EN OBRA LOS RECIBOS DE ESCOMBROS Y MATERIALES CONTRA CERTIFICADOS. EN CASO DE PRESENTARSE OBSERVACIONES, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LAS ACLARACIONES Y CORRECCIONES EN EL PLAZO QUE DETERMINE LA INTERVENTORÍA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, ESTE HECHO PODRÁ CONSTITUIRSE PRUEBA DEL USO DE PROVEEDORES O SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS NO AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE Y LA INTERVENTORÍA PODRÁ INICIAR LAS ACCIONES LEGALES Y CONTRACTUALES APLICABLES CON EL FIN DE SANCIONAR AL CONTRATISTA. LA INTERVENTORÍA DEBERÁ ENTREGAR LOS RESPECTIVOS REPORTES DE ESCOMBRERAS Y RCD, CON UNA PERIODICIDAD MENSUAL AL FDLK.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
MENSUALMENTE SE ENTREGAN A LA INTERVENTORÍA LOS CERTIFICADOS DE MATERIALES Y DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 48
APLICAR Y DOCUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES NORMATIVAS FRENTE A GRANULO DE CAUCHO RECICLADO SEGÚN LO VERSADO EN EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 265 DE 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO DISTRITAL 442 DE 2015 Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES” O LA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
SE APLICAN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS RELACIONADAS CON EL USO DE GRÁNULO DE CAUCHO RECICLADO EN LAS ACTIVIDADES QUE ASÍ LO REQUIERAN.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 49
APLICAR Y ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LOS ASPECTOS SST Y SGA PARA LA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO A LA VEGETACIÓN (EN CASO DE QUE APLIQUE) SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS LINEAMIENTO DEL DECRETO 531 DE DICIEMBRE DE 2010, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA SILVICULTURA URBANA, ZONAS VERDES Y LA JARDINERÍA EN BOGOTÁ Y SE DEFINEN LAS RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DISTRITALES EN RELACIÓN CON EL TEMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.", EXPEDIDO POR LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DE IGUAL MANERA SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL ACUERDO № 327 SEPTIEMBRE 24 DE 2008, "POR MEDIO CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA PLANEACIÓN, GENERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DENOMINADAS "PULMONES VERDES" EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", ESTE ACUERDO FUE EXPEDIDO POR EL CONSEJO DE BOGOTÁ D.C.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
CUANDO APLICA, SE EJECUTAN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN CONFORME A LA NORMATIVA DISTRITAL VIGENTE.	• NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO, DEBIDO A QUE NO SE HA EVIDENCIADO PRESENCIA DIRECTA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS CIV QUE SE ESTÁN INTERVINIENDO. ADICIONALMENTE, AL INICIO DEL CONTRATO SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN CONJUNTO CON LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA, DURANTE EL CUAL NO SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE SOLICITAR TRATAMIENTO SILVICULTURAL, TENIENDO EN CUENTA LOS ALCANCES ESTABLECIDOS PARA CADA SEGMENTO VIAL CONTRATADO.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 50	
EJECUTAR LOS TRATAMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO EMITIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS POR EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS, Y CON LAS INDICACIONES DEL COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MANEJO DE VEGETACIÓN SEÑALADAS EN EL PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE EJECUTAN LOS TRATAMIENTOS DE MANEJO DE VEGETACIÓN AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	• NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO, DEBIDO A QUE NO SE HA EVIDENCIADO PRESENCIA DIRECTA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS CIV QUE SE ESTÁN INTERVINIENDO. ADICIONALMENTE, AL INICIO DEL CONTRATO SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN CONJUNTO CON LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA, DURANTE EL CUAL NO SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE SOLICITAR TRATAMIENTO SILVICULTURAL, TENIENDO EN CUENTA LOS ALCANCES ESTABLECIDOS PARA CADA SEGMENTO VIAL CONTRATADO.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 51	
DILIGENCIAR LOS FORMATOS A LAS GESTIONES SST Y SGA QUE EN COMITÉS SEAN DEFINIDOS Y QUE PUEDAN SERVIR COMO HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE LA LABOR A LA INTERVENTORÍA. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PERMITIR EL ACCESO EN TODO MOMENTO DE ESTOS FORMATOS A LA INTERVENTORÍA Y AL FDLK.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO SE DILIGENCIAN LOS FORMATOS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 52	
REALIZAR EL PAGO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, POR CONCEPTO DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVICIOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y DE COMPENSACIÓN GENERADOS PARA EL CONTRATO, SEGÚN LO CONSIGNADO EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
SE REALIZAN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES REQUERIDAS ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	• NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO, DEBIDO A QUE NO SE HAN PRESENTANDO ACTIVIDADES QUE REQUIERAN DE PERMISOS O LICENCIAS AMBIENTALES.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 53	
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LA VEGETACIÓN QUE SE RELACIONA EN EL INVENTARIO FORESTAL Y EN EL ÁREA CIRCUNDANTE A LOS FRENTES DE OBRA Y DEBERÁ TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y SUPERVIVENCIA DE LOS INDIVIDUOS VEGETALES DURANTE LA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO. EN CASO DE QUE OCURRA UN DAÑO OCASIONADO POR LA EJECUCIÓN DE OBRA A TERCEROS Y/O A ALGÚN INDIVIDUO VEGETAL, Y SE DEMUESTRE NEGLIGENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA QUE EL HECHO OCURRIERA, EL CONTRATISTA CUMPLIRÁ CON LAS COMPENSACIONES EXIGIDAS EN LA GUÍA VERDE DE SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO DE MANEJO AMBIENTAL VIGENTE EN EL MOMENTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SIN QUE ESTO LO EXIMA DE LA RESPONSABILIDAD ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE ADOPTAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS INDIVIDUOS VEGETALES PRESENTES EN LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 54	
EJECUTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ÁRBOLES, A PARTIR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ARBOLADO URBANO, SI ES REQUERIDO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
CUANDO ES REQUERIDO SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE ÁRBOLES MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.	• NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO, DEBIDO A QUE NO SE HA SOLICITADO NINGÚN TRÁMITE SILVICULTURAL ANTE SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Y JARDIN BOTANICO.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 55	
VERIFICAR QUE LAS OBRAS NO SE EJECUTEN EN SECTORES UBICADOS DENTRO DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE VERIFICA QUE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO NO SE DESARROLLEN DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL.	• NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO, DEBIDO A QUE LOS SEGMENTOS VIALES ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN NO SE ENCUENTRAN CATALOGADOS COMO ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO. ADICIONALMENTE, DURANTE LA ETAPA PRELIMINAR DEL CONTRATO SE REALIZÓ UNA REVISIÓN DE LOS SEGMENTOS VIALES OBJETO DE INTERVENCIÓN, EVIDENCIANDO QUE ESTOS NO SE LOCALIZAN DENTRO DE ZONAS DECLARADAS COMO ÁREAS PROTEGIDAS.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 56	
VERIFICAR LOS SITIOS DONDE SE INSTALAN CAMPAMENTOS (PERMANENTES O TEMPORALES) LOS CUALES DEBEN CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA NORMATIVIDAD SST Y SGA VIGENTE.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE VERIFICA QUE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO NO SE DESARROLLEN DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\3. INFORME AMBIENTAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3/4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 57	
GARANTIZAR LA EVACUACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA DE MATERIALES, RESIDUOS, MAQUINARIA, EQUIPO, VEHÍCULOS, SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTES DE LA FINAL DE OBRA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
AL FINALIZAR LAS OBRAS SE REALIZA LA EVACUACIÓN TOTAL DE MATERIALES, RESIDUOS, EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	• NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO, SIN EMBARGO, EL CONSORCIO ESTÁ COMPROMETIDO A REALIZAR LA RESPECTIVA EVACUACIÓN DE MATERIAL Y GARANTIZAR ZONAS LIMPIAS Y SEGURAS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 58	
REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO POR EL FABRICANTE EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 59	
EL DECRETO 332 DE 2020 ESTABLECE MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO CAPITAL, ORIENTADAS A FORTALECER SU ACCESO A OPORTUNIDADES LABORALES Y A LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN CONDICIONES DE EQUIDAD. EN ESTE SENTIDO, LAS ENTIDADES DISTRITALES SUJETAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEBEN EXIGIR A LOS CONTRATISTAS LA VINCULACIÓN Y PERMANENCIA DE UN PORCENTAJE MÍNIMO DE MUJERES DENTRO DEL PERSONAL DE OBRA, CONFORME A LOS PORCENTAJES DEFINIDOS EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO. ASIMISMO, DESDE EL 1 DE JULIO DE 2021, LOS CONTRATOS DEBEN INCORPORAR CLÁUSULAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y LA ELIMINACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA NORMA. ESTAS DISPOSICIONES BUSCAN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES Y PROMOVER ENTORNOS LABORALES MÁS EQUITATIVOS E INCLUSIVOS.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
EN EL MARCO DEL CONTRATO SE PROMUEVE LA VINCULACIÓN DE MUJERES EN EL PERSONAL DE OBRA Y SE IMPLEMENTAN ACCIONES ORIENTADAS A PREVENIR LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\2. INFORME SOCIAL NO. 3. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\4. INFORME SST NO. 3.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 60	
REALIZAR LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INSPECCIONES DE CAMPO PROGRAMADAS JUNTAMENTE CON LA INTERVENTORÍA Y LOS DELEGADOS DE LAS DIFERENTES ESP.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE REALIZAN REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INSPECCIONES DE CAMPO JUNTO CON LA INTERVENTORÍA Y LOS DELEGADOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 8. ACTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y RECORRIDOS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 61	
ENVIAR A LA INTERVENTORÍA LA SOLICITUD DE LAS MANIOBRAS REQUERIDAS CON LAS ESP PREVIA VERIFICACIÓN EN TERRENO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
CUANDO SE REQUIERE, SE TRAMITAN ANTE LA INTERVENTORÍA LAS SOLICITUDES DE MANIOBRAS NECESARIAS CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 8. ACTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y RECORRIDOS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 62	
SUSCRIBIR CON LOS DELEGADOS DE LAS ESP Y LA INTERVENTORÍA, LA CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE MANIOBRA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE SUSCRIBEN LAS CONSTANCIAS DE EJECUCIÓN DE MANIOBRAS REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA INTERVENTORÍA.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 8. ACTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y RECORRIDOS.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 63	
SUSCRIBIR EL DOCUMENTO DE AVANCE DE OBRA, DE REDES DE SERVIDOS PÚBLICOS, PARA EFECTUAR RECIBOS PARCIALES DE OBRA CON LAS ESP.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE SUSCRIBEN LOS DOCUMENTOS DE AVANCE DE OBRA RELACIONADOS CON REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EFECTOS DE RECIBOS PARCIALES.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 8. ACTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y RECORRIDOS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 64	
INFORMAR A LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS DAÑOS O HURTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESP Y SUSCRIBIR EL ACTA RESPECTIVA, MÁXIMO DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA OCURRENCIA DEL SUCESO.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS O HURTO A INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SE INFORMA OPORTUNAMENTE A LA INTERVENTORÍA Y SE SUSCRIBE EL ACTA CORRESPONDIENTE.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 8. ACTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y RECORRIDOS.
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 65	
CUSTODIAR Y ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE PROPIEDAD DE LAS ESP Y DEMÁS ENTES DISTRITALES COMPETENTES Y SUSCRIBIR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
SE CUSTODIAN Y POSTERIORMENTE SE ENTREGAN A LAS ENTIDADES COMPETENTES LOS ELEMENTOS DE SU PROPIEDAD UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 8. ACTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y RECORRIDOS.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 66	
REALIZAR LOS TRÁMITES Y GESTIONES PERTINENTES PARA OBTENER LAS APROBACIONES REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS POR PARTES EPS Y OTRA ENTIDADES DISTRITALES.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
FINALMENTE, SE REALIZAN LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER LAS APROBACIONES REQUERIDAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEMÁS ENTIDADES DISTRITALES.	• ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 7. ACTAS DE COMITÉ. • ACTA DE COBRO NO. 2\1. INFORMES MENSUALES NO. 3\1. INFORME TÉCNICO NO. 3\ANEXO 8. ACTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y RECORRIDOS.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. Adicionalmente, conforme a lo establecido se presenta las planillas al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago.	**CONTRATISTA** **Firma:** **Nombre: JOTAM MAESTRE DIAB** **Cargo: Representante legal Consorcio vial Kennedy C.C. 1.065.825.668**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe señalar que, tratándose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Firma:** **Nombre: SANTIAGO CARRILLO VARGAS** **Cargo: Representante legal Savimac S.A.S. C.C.79.518.952** **SUPERVISIÓN** **Firma:** **Nombre: JAVIER PRIETO TRISTANCHO** **Cargo: Alcalde local de Kennedy (E) C.C. 1.057.579.523** **Apoyo a la supervisión: Magda Lorena Davila**

CERTIFICACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 CONTRATISTA DEL CONTRATO DE OBRA NO. DFLK- COP- 938-2025

CERTIFICA

Que el Consorcio vial Kennedy 2025, representado legalmente por Jotam Maestre Diab, contratista de obra No. FDLK- 938-2025 que tiene por objeto REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTA D.C ATRAVES DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MOTO AGOTABLE se encuentra a la fecha de este documento y durante los últimos seis (6) meses a paz y salvo con los pagos de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales derivadas del contrato en mención.

Esta certificación se expide para el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy-Bogotá D.C.

Dado en la ciudad de Bogotá a los (24) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

Ing. JOTAM MAESTRE
C.C 1.065.825.668
Representante Legal
Consorcio Vial Kennedy 2025
NIT. 902012883-0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901983554-4	CONSORCIO SUBA VIAL	KR 15 93 A 84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67750720	13/03/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$20,001,654	$8.874.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	353.700	0		0		0	1	300	0	354.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	750.300	0		0		0	1	500	0	750.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	306.600	0		0		0	1	200	0	306.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	249.400	0		0		0	1	200	0	249.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	268.800	0		0		0	1	200	0	269.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	562.500	0		0		0	1	400	0	562.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	319.200	0	0	0	0	1	300	0	319.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.691.100	0	0	0	0	1	1.100	0	1.692.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.178.200	0	0	0	0	1	800	0	1.179.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.387.300				1.387.300	1	900	1.388.200			13.873	1.388.200	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	800.300	1	600	800.900	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
400.400	1	300	400.700	9
ICBF				
600.400	1	400	600.800	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.491.300	2.493.100
Pensión	3	3.188.500	3.190.700
Riesgos Laborales	1	1.387.300	1.388.200
CCF	1	800.300	800.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	600.400	600.800
MEN	0	0	0
SENA	1	400.400	400.700
TOTALES	13	8.868.200	8.874.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901983554-4	CONSORCIO SUBA VIAL	KR 15 93 A 84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67750720	13/03/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$20,001,654	$8.874.400	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901983554-4	CONSORCIO SUBA VIAL	KR 15 93 A 84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67750720	13/03/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$20,001,654	$8.874.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79243286	SOLANO OSORIO RAFAEL GUSTAVO	1	0			N																	25-14	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	30	687.500	14-11	5.500.000	30	5	382.800	CCF24	5.500.000	30	220.000	5.500.000	110.000	165.000	0	0
2	CC 51855638	OROZCO ROJAS TERESA	1	0			N																	230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS037	2.150.000	30	268.800	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	2.150.000	43.000	64.500	0	0
3	CC 1233338150	CAICEDO CARVAJAL OMAR	1	0			N																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	ESSC07	4.500.000	30	562.500	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF24	4.500.000	30	180.000	4.500.000	90.000	135.000	0	0
4	CC 52254239	MURCIA ANDRADE MONICA PATRICIA	1	0			N	X																25-14	501.667	7	80.300	0	0	0	0	EPS005	501.667	7	62.800	14-11	501.667	7	5	35.000	CCF24	576.200	7	23.100	576.200	11.600	17.300	0	0
5	CC 1018494383	GARZON RAMIREZ DALIA VANESSA	1	0			N	X																25-14	1.361.667	19	217.900	0	0	0	0	EPS002	1.361.667	19	170.300	14-11	1.361.667	19	5	94.800	CCF24	1.361.667	19	54.500	1.361.667	27.300	40.900	0	0
6	CC 1102584473	PALACIO MUÑOZ MARIA MERCEDES	1	0			N	X																230301	1.466.667	22	234.700	0	0	0	0	EPS002	1.466.667	22	183.400	14-11	1.466.667	22	5	102.100	CCF24	1.466.667	22	58.700	1.466.667	29.400	44.100	0	0
7	CC 1052410822	CASTELLANOS MORA DIANA PAOLA	1	0			N	X																230301	1.576.667	22	252.300	0	0	0	0	EPS010	1.576.667	22	197.100	14-11	1.576.667	22	5	109.800	CCF24	1.576.667	22	63.100	1.576.667	31.600	47.400	0	0
8	CC 1024571771	NIVIA RODRIGUEZ LAURA BRIYITH	1	0			N	X																230201	1.995.000	21	319.200	0	0	0	0	EPS017	1.995.000	21	249.400	14-11	1.995.000	21	5	138.900	CCF24	1.995.000	21	79.800	1.995.000	39.900	59.900	0	0
9	CC 1057590267	CAMARGO MORENO ALVARO SALVADOR	1	0			N	X																230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS010	875.453	15	109.500	14-11	875.453	15	5	61.000	CCF24	875.453	15	35.100	875.453	17.600	26.300	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	902010258-8	CONSORCIO COCO	carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67723724	13/04/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$31,459,546	$14.211.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.207.100	0		0		0	31	24.600	0	1.231.700	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	473.100	0		0		0	31	9.700	0	482.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.130.700	0		0		0	31	23.100	0	1.153.800	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.100.100	0		0		0	31	22.400	0	1.122.500	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	229.400	0	0	0	0	31	4.700	0	234.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.688.200	0	0	0	0	31	54.800	0	2.743.000	10
231001	Colfondos	800227940-6	344.000	0	0	0	0	31	7.100	0	351.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.744.000	0	0	0	0	31	35.600	0	1.779.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.177.900				2.177.900	31	44.400	2.222.300			21.779	2.222.300	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.258.800	31	25.700	1.284.500	15

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
629.600	31	12.900	642.500	15
ICBF				
944.200	31	19.300	963.500	15
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	3.911.000	3.990.800
Pensión	4	5.005.600	5.107.800
Riesgos Laborales	1	2.177.900	2.222.300
CCF	1	1.258.800	1.284.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	944.200	963.500
MEN	0	0	0
SENA	1	629.600	642.500
TOTALES	12	13.927.100	14.211.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	902010258-8	CONSORCIO COCO		carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67723724	13/04/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$31,459,546	$14.211.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1002995875	ARAUJO MOLINA MARIA VICENTA	1	0			N	X																230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS037	2.150.000	30	268.800	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	2.150.000	43.000	64.500	0	0
2	PT 1004495	MORENO ALVARADO LEONAR GREGORIO	1	0			N	X							X									230301	1.955.011	28	312.900	0	0	0	0	EPS002	1.955.011	28	244.400	14-11	1.955.011	28	5	136.100	CCF24	1.955.011	28	78.300	1.955.011	39.200	58.700	0	0
3	CC 1022985289	NIETO TRIVIÑO JOHANA MARCELA	1	0			N																	230301	2.850.000	30	456.000	0	0	0	0	EPS002	2.850.000	30	356.300	14-11	2.850.000	30	5	198.400	CCF24	2.850.000	30	114.000	2.850.000	57.000	85.500	0	0
4	CC 1033729101	DUSSAN DUSSAN MAYRA ALEJANDRA	1	0			N		X															230201	1.433.333	20	229.400	0	0	0	0	EPS008	1.433.333	20	179.200	14-11	1.433.333	20	5	99.800	CCF24	1.507.866	20	60.400	1.507.866	30.200	45.300	0	0
5	CC 1033780860	GAMEZ TABIMBA WENDY JULIET	1	0			N																	230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS008	2.150.000	30	268.800	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	2.150.000	43.000	64.500	0	0
6	CC 1061816007	GUZMAN ÑAÑEZ EDGAR DANIEL	1	0			N																	25-14	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS037	4.500.000	30	562.500	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF24	4.500.000	30	180.000	4.500.000	90.000	135.000	0	0
7	CC 1067816960	SIERRA OÑATE SARAIMA PATRICIA	1	0			N																	230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS002	2.150.000	30	268.800	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	2.150.000	43.000	64.500	0	0
8	CC 1076669398	PULGA HERRERA GUILLERMO ANDRES	1	0			N		X															25-14	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS037	2.150.000	30	268.800	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.251.767	30	90.100	2.251.767	45.100	67.600	0	0
9	CC 1085226564	ORTEGA MARTINEZ EDUAR JOSE	1	0			N	X																230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS008	700.362	12	87.600	14-11	700.362	12	5	48.800	CCF24	700.362	12	28.100	700.362	14.100	21.100	0	0
10	CC 1085227822	GARCIA MATUTE SERGIO JOSE	1	0			N	X																230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS002	700.362	12	87.600	14-11	700.362	12	5	48.800	CCF24	700.362	12	28.100	700.362	14.100	21.100	0	0
11	CC 1127917495	DELGADO CORONADO CESAR AUGUSTO	1	0			N	X																230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	204.300	14-11	1.634.178	28	5	113.800	CCF24	1.634.178	28	65.400	1.634.178	32.700	49.100	0	0
12	CC 19705889	MAESTRE FAREDES GEOVANNY	1	0			N																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	250.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF24	2.000.000	30	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
13	CC 3022659	BAQUERO RIVEROS JOAQUIN EMILIO	1	0			N	X																230301	510.000	6	81.600	0	0	0	0	EPS008	510.000	6	63.800	14-11	510.000	6	5	35.500	CCF24	510.000	6	20.400	510.000	10.200	15.300	0	0
14	CC 53134703	VANEGAS RODRIGUEZ MARITZA MAYERLY	1	0			N																	231001	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS005	2.150.000	30	268.800	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	2.150.000	43.000	64.500	0	0
15	CC 98388497	CASTRO GUERRERO JAVIER HERNANDO	1	0			N																	25-14	4.250.000	30	680.000	0	0	0	0	EPS008	4.250.000	30	531.300	14-11	4.250.000	30	5	295.800	CCF24	4.250.000	30	170.000	4.250.000	85.000	127.500	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901846534-0	CONSORCIOVIASCB2024	Cra15 #93a84	6014770190	Rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67751789	13/03/2026	50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$128,300,669	$39.271.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	97.700	0		0		0	4	300	0	98.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.668.600	0		0		0	4	4.300	0	1.672.900	18
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.389.200	0		0		0	4	3.600	0	1.392.800	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	257.200	0		0		0	4	700	0	257.900	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	375.900	0		0		0	4	1.000	0	376.900	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	336.800	0		0		0	4	900	0	337.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	813.600	0		0		0	4	2.100	0	815.700	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	97.000	0		0		0	4	300	0	97.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.710.800	0	0	50.000	50.000	4	12.200	400	4.823.400	9
230301	Porvenir	800224808-8	9.528.800	0	0	0	0	4	24.500	0	9.553.300	26
231001	Colfondos	800227940-6	1.408.600	0	0	0	0	4	3.700	0	1.412.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.490.700	0	0	0	0	4	11.600	0	4.502.300	12

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.761.600				8.761.600	4	22.600	8.784.200			87.616	8.784.200	50

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.133.900	4	13.200	5.147.100	50

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901846534-0	CONSORCIOVIASCB2024	Cra15 #93a84	6014770190	Rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67751789	13/03/2026	50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$128,300,669	$39.271.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.036.000	5.049.200
Pensión	4	20.238.900	20.291.300
Riesgos Laborales	1	8.761.600	8.784.200
CCF	1	5.133.900	5.147.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	39.170.400	39.271.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901846534-0	CONSORCIOVIASCB2024	Cra15 #93a84	6014770190	Rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67751789	13/03/2026	50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$128,300,669	$39.271.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80820454	HERNANDEZ NIÑO NELSON ALBERTO	1	0			S																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS017	4.500.000	30	180.000	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF24	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
2	CC 1031145002	BERMUDEZ MONCADA HERNAN DAVID	1	0			S																	230201	4.300.000	30	688.000	0	0	0	0	EPS005	4.300.000	30	172.000	14-11	4.300.000	30	5	299.300	CCF24	4.300.000	30	172.000	0	0	0	0	0
3	CC 80132029	RODRIGUEZ RINCON JOHN ALEJANDRO	1	0			S																	230201	10.000.000	30	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS005	10.000.000	30	400.000	14-11	10.000.000	30	5	696.000	CCF24	10.000.000	30	400.000	0	0	0	0	0
4	CC 1023926407	BARRETO DELGADO JESSICA PAOLA	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS010	4.000.000	30	160.000	14-11	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
5	CC 80229640	GUTIERREZ SANCHEZ ERICSON HERNAN	1	0			S																	230301	4.300.000	30	688.000	0	0	0	0	EPS002	4.300.000	30	172.000	14-11	4.300.000	30	5	299.300	CCF24	4.300.000	30	172.000	0	0	0	0	0
6	CC 1033780457	CRUZ RINCON MARIA FERNANDA	1	0			S																	25-14	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS005	2.150.000	30	86.000	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
7	CC 75074775	CASTRO GOMEZ ANDRES MAURICIO	1	0			S								X									230301	3.240.909	30	518.600	0	0	0	0	EPS010	3.240.909	30	129.700	14-11	3.240.909	30	5	225.600	CCF24	3.240.909	30	129.700	0	0	0	0	0
8	CC 52328935	TRIANA CARRERO MARTHA LILIANA	1	0			S	X																25-14	4.300.000	30	688.000	0	0	0	0	EPS005	4.300.000	30	172.000	14-11	4.300.000	30	5	299.300	CCF24	5.858.033	30	234.400	0	0	0	0	0
9	CC 1067031269	CAMPUSANO VALLE DEINER	1	0			S								X									230301	2.327.908	30	372.500	0	0	0	0	EPS005	2.327.908	30	93.200	14-11	2.327.908	30	5	162.100	CCF24	2.327.908	30	93.200	0	0	0	0	0
10	CC 80245298	RESTREPO IZQUIERDO OSCAR LEONARDO	1	0			S																	25-14	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS002	2.550.000	30	102.000	14-11	2.550.000	30	5	177.500	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
11	CC 1012346153	BORBON BRIÑEZ BRALLAN ESTIVEN	1	0			S								X									25-14	1.900.130	30	304.100	0	0	0	0	EPS002	1.900.130	30	76.100	14-11	1.900.130	30	5	132.300	CCF24	1.900.130	30	76.100	0	0	0	0	0
12	CC 1049621328	PIRACHICAN PARRA JOHN EDISSON	1	0			S								X									230301	2.392.572	30	382.900	0	0	0	0	EPS005	2.392.572	30	95.800	14-11	2.392.572	30	5	166.600	CCF24	2.392.572	30	95.800	0	0	0	0	0
13	CC 1010218800	MONTENEGRO RAMIREZ EDWIN	1	0			S								X									230301	2.424.904	30	388.000	0	0	0	0	EPS002	2.424.904	30	97.000	14-11	2.424.904	30	5	168.800	CCF24	2.424.904	30	97.000	0	0	0	0	0
14	CC 1001279393	SALAZAR CARDENAS YORMAIRA YARINSA	1	0			S								X									230201	2.273.192	30	363.800	0	0	0	0	EPS008	2.273.192	30	91.000	14-11	2.273.192	30	5	158.300	CCF24	2.273.192	30	91.000	0	0	0	0	0
15	CC 5969575	TRIANA GUTIERREZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS037	2.550.000	30	102.000	14-11	2.550.000	30	5	177.500	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
16	CC 1014231344	PERDOMO TRUJILLO ANYI KATERIN	1	0			S																	231001	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS005	2.150.000	30	86.000	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
17	CC 1106309176	URREGO URREGO FLAMINIO	1	0			S								X									230301	2.370.188	30	379.300	0	0	0	0	EPS037	2.370.188	30	94.900	14-11	2.370.188	30	5	165.000	CCF24	2.370.188	30	94.900	0	0	0	0	0
18	CC 1022949674	GONZALEZ CARRION FABIAN LEONARDO	1	0			S								X									230301	2.153.409	30	344.600	0	0	0	0	EPS017	2.153.409	30	86.200	14-11	2.153.409	30	5	149.900	CCF24	2.153.409	30	86.200	0	0	0	0	0
19	CC 80855128	RUSSI GUSTAVO	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
20	CC 1033761151	MARIN PERDOMO YUBARCID	1	0			S								X									230301	2.387.598	30	382.100	0	0	0	0	EPS037	2.387.598	30	95.600	14-11	2.387.598	30	5	166.200	CCF24	2.387.598	30	95.600	0	0	0	0	0
21	CC 1005206217	NOVA GRANDAS DANIELA	1	0			S																	230201	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS037	2.150.000	30	86.000	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
22	CC 52133869	CARDENAS CARO ELVIA CECILIA	1	0			S								X									230301	2.275.679	30	364.200	0	0	0	0	EPS008	2.275.679	30	91.100	14-11	2.275.679	30	5	158.400	CCF24	2.275.679	30	91.100	0	0	0	0	0
23	CC 1024523401	AVILA QUIROGA JEISSON ANDRES	1	0			S								X									230201	2.253.295	30	360.600	0	0	0	0	EPS002	2.253.295	30	90.200	14-11	2.253.295	30	5	156.900	CCF24	2.253.295	30	90.200	0	0	0	0	0
24	CC 1065578614	ROJAS MOLINA DUVAL ARTURO	1	0			S								X									230301	2.170.455	30	347.300	0	0	0	0	EPS002	2.170.455	30	86.900	14-11	2.170.455	30	5	151.100	CCF24	2.170.455	30	86.900	0	0	0	0	0
25	CC 1022931809	CORREDOR GARCIA OSCAR ANDRES	1	0			S								X									231001	2.153.409	30	344.600	0	0	0	0	EPS010	2.153.409	30	86.200	14-11	2.153.409	30	5	149.900	CCF24	2.153.409	30	86.200	0	0	0	0	0
26	CC 1001032434	GONZALEZ USUGA BRAYAN STEVEN	1	0			S								X									230301	2.337.856	30	374.100	0	0	0	0	EPS037	2.337.856	30	93.600	14-11	2.337.856	30	5	162.800	CCF24	2.337.856	30	93.600	0	0	0	0	0
27	CC 1022950657	SANCHEZ PADILLA SANDRA MILENA	1	0			S								X									230301	2.367.701	30	378.900	0	0	0	0	EPS002	2.367.701	30	94.800	14-11	2.367.701	30	5	164.800	CCF24	2.367.701	30	94.800	0	0	0	0	0
28	CC 1000516593	PAZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	1	0			S								X									230301	2.526.874	30	404.300	0	0	0	0	EPS002	2.526.874	30	101.100	14-11	2.526.874	30	5	175.900	CCF24	2.526.874	30	101.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901846534-0	CONSORCIOVIASCB2024		Cra15 #93a84	6014770190	Rhprocom@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67751789	13/03/2026	50	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$128,300,669	$39.271.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
29	CC 1006826004	SARAY FUENTES HAIDER STIVEN	1	0			S								X									230201	2.362.294	30	378.000	0	0	0	0	EPS002	2.362.294	30	94.500	14-11	2.362.294	30	5	164.500	CCF24	2.362.294	30	94.500	0	0	0	0	0
30	CC 1023903329	ARDILA VIZCAINO JUAN DAVID	1	0			S																	25-14	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS002	2.550.000	30	102.000	14-11	2.550.000	30	5	177.500	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
31	CC 1073675138	REYES TOVAR PAULA ANDREA	1	0			S																	230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS002	2.150.000	30	86.000	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
32	CC 80425250	TIQUE PRADA JOSE LISANDRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
33	CC 1007114716	MUÑOZ TORRES EDWIN ANTONIO	1	0			S								X									230201	2.402.736	30	384.500	0	0	0	0	EPS005	2.402.736	30	96.200	14-11	2.402.736	30	5	167.300	CCF24	2.402.736	30	96.200	0	0	0	0	0
34	CC 1053772794	GUARNIZO VALDES HUMBERTO	1	0			S		X															230301	333.333	5	53.400	0	0	0	0	EPS037	333.333	5	13.400	14-11	333.333	5	5	23.200	CCF24	528.000	5	21.200	0	0	0	0	0
35	CC 1118572593	LEAL CAMARGO CARMEN KARINA	1	0			S																	230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS005	2.150.000	30	86.000	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
36	CC 1014180856	BERNAL FLOREZ CESAR AUGUSTO	1	0			S		X						X									230201	1.833.534	22	293.400	0	0	0	0	EPS002	1.833.534	22	73.400	14-11	1.833.534	22	5	127.700	CCF24	2.059.984	22	82.400	0	0	0	0	0
37	CC 92530811	PEREZ MERCADO ROBERT LUIS	1	0			S								X									25-14	2.440.800	30	390.600	0	0	0	0	CCFC33	2.440.800	30	97.700	14-11	2.440.800	30	5	169.900	CCF24	2.440.800	30	97.700	0	0	0	0	0
38	CC 1073678314	ROJAS FIGUEROA SHAIEL	1	0			S								X									25-14	1.876.989	30	300.400	0	0	0	0	EPS008	1.876.989	30	75.100	14-11	1.876.989	30	5	130.700	CCF24	1.876.989	30	75.100	0	0	0	0	0
39	CC 1073700745	SANCHEZ AREVALO AURA CRISTINA	1	0			S								X									230201	1.865.094	30	298.500	0	0	0	0	EPS037	1.865.094	30	74.700	14-11	1.865.094	30	5	129.900	CCF24	1.865.094	30	74.700	0	0	0	0	0
40	CC 1030604788	OSPINA GARCIA DAVID ALBEIRO	1	0			S		X						X									230301	1.344.581	21	215.200	0	0	0	0	EPS037	1.344.581	21	53.800	14-11	1.344.581	21	5	93.600	CCF24	1.553.522	21	62.200	0	0	0	0	0
41	CC 1110553605	RIVERA RIVERA DAIRO ALEJANDRO	1	0			S																	231001	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS002	4.500.000	30	180.000	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF24	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
42	CC 79574426	GIL NARVAEZ NELSON	1	0			S																	25-14	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS005	2.550.000	30	102.000	14-11	2.550.000	30	5	177.500	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
43	CC 79851357	MASMELA CASTAÑO HECTOR MANUEL	1	0			S		X															230301	765.000	9	122.400	0	0	0	0	EPS017	765.000	9	30.600	14-11	765.000	9	5	53.300	CCF24	977.500	9	39.100	0	0	0	0	0
44	CC 1193449453	BOTONERO SANTOS FRANCISCO JOSE	1	0			S								X									25-14	2.472.158	30	395.600	0	0	0	0	EPS037	2.472.158	30	98.900	14-11	2.472.158	30	5	172.100	CCF24	2.472.158	30	98.900	0	0	0	0	0
45	CC 1005485071	ROJAS VELASCO MAURA FERNANDA	1	0			S								X									25-14	2.424.904	30	388.000	0	0	0	0	EPS041	2.424.904	30	97.000	14-11	2.424.904	30	5	168.800	CCF24	2.424.904	30	97.000	0	0	0	0	0
46	CC 1024540508	MONROY JUAN GABRIEL	1	0			S								X									230301	2.516.926	30	402.800	0	0	0	0	EPS037	2.516.926	30	100.700	14-11	2.516.926	30	5	175.200	CCF24	2.516.926	30	100.700	0	0	0	0	0
47	CC 1000615574	SABOGAL FRANCO BRANDON STIV	1	0			S								X									230301	2.282.145	30	365.200	0	0	0	0	EPS002	2.282.145	30	91.300	14-11	2.282.145	30	5	158.900	CCF24	2.282.145	30	91.300	0	0	0	0	0
48	CC 80100449	PEÑA MARTA LUIS MARTIN	1	0			S		X															25-14	300.000	5	48.000	0	0	0	0	EPS002	300.000	5	12.000	14-11	300.000	5	5	20.900	CCF24	342.600	5	13.800	0	0	0	0	0
49	CC 1233507924	ROJAS RINCON JOHAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	1.000.000	15	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	15	40.000	14-11	1.000.000	15	5	69.600	CCF24	1.000.000	15	40.000	0	0	0	0	0
50	PT 1281523	ALVAREZ GONZALEZ GABRIEL RICARDO	1	0			S	X																230301	480.000	8	76.800	0	0	0	0	EPS002	480.000	8	19.200	14-11	480.000	8	5	33.500	CCF24	480.000	8	19.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024547185	DIEGO CABALLERO ROJAS	Carrera 86 # 17-96 Apartamento 3607	3194614792	caballerodr93@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	10/02/2026	49398258	$2.091.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	845.000	0		0		0	0	0	0	845.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.081.600	0	0	0	0	0	0		1.081.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	164.700				164.700	0	0	164.700			1.647	164.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	845.000	845.000
Pensión	1	1.081.600	1.081.600
Riesgos Laborales	1	164.700	164.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.091.300	2.091.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024547185	DIEGO CABALLERO ROJAS	Carrera 86 # 17-96 Apartamento 3607	3194614792	caballerodr93@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	10/02/2026	49398258	$2.091.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024547185	CABALLERO ROJAS DIEGO	59	0			N																	230901	6.760.000	1.081.600	0	0	0	0	EPS002	6.760.000	845.000	14-23	6.760.000	3	164.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63488595	04/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$912.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	912.000	912.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015416017	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	CALLE 11A 79A 28	3156123657	fdavid.martinez90@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63488595	04/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$912.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1015416017	MARTINEZ PENAGOS FERNEY DAVID	3	0			N																	230301	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	30	400.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PAOLO ANDRES BIANCHI GANEM identificado(a) con CC 1020799464 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BIANCHI GANEM PAOLO ANDRES CC 1020799464																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9501134428	118252324	I	2026-03-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501134428	118252324	I	2026-03-06	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501134428	118252324	I	2026-03-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501134428	118252324	I	2026-03-06	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	

Este certificado se expide el día 2026-03-25 a las 12:03.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80026555	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	CL 70A 57B 34	3206185	juanricardotroncoso@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65065305	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$499.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499.100	499.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80026555	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	CL 70A 57B 34	3206185	juanricardotroncoso@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65065305	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$499.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80026555	TRONCOSO RIVERA JUAN RICARDO	3	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79691429
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIO MERCK RAMIREZ POVEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 116 B 77-33 IN 1 AP 503	TELÉFONO:	7578947
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6004408578**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	86269277

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										**$ 640.000**	**$ 0**	**$ 640.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:													**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.500	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 97.500
SUBTOTALES:									**$ 97.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 97.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:			**$ 80.000**	**$ 0**	**$ 80.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79691429	RAMIREZ POVEDA FABIO MERCK	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000	79691429	$ 97.500	30	$ 4.000.000	CCF21-CAFAM	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.317.500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901855498-1	CONSORCIO CONKENNEDY	carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67727392	14/04/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$49,176,826	$11.554.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	310.700	0		0		0	21	4.400	0	315.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.600	0		0		0	21	2.500	0	178.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	421.900	0		0		0	21	5.900	0	427.800	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	172.000	0		0		0	21	2.500	0	174.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	186.800	0		0		0	21	2.700	0	189.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	74.900	0		0		0	21	1.100	0	76.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	81.200	0		0		0	21	1.200	0	82.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	21	4.500	0	324.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.076.100	0	0	0	0	21	43.000	0	3.119.100	10
231001	Colfondos	800227940-6	302.400	0	0	0	0	21	4.300	0	306.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.828.800	0	0	0	0	21	25.600	0	1.854.400	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.476.100				2.476.100	21	34.600	2.510.700			24.761	2.510.700	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.967.800	21	27.500	1.995.300	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901855498-1	CONSORCIO CONKENNEDY	carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67727392	14/04/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$49,176,826	$11.554.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.423.100	1.443.400
Pensión	4	5.527.300	5.604.700
Riesgos Laborales	1	2.476.100	2.510.700
CCF	1	1.967.800	1.995.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	11.394.300	11.554.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901855498-1	CONSORCIO CONKENNEDY	carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67727392	14/04/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$49,176,826	$11.554.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1013636724	OVALLE PEÑA MARCY ALEJANDRA	1	0			S																	230301	4.300.000	30	688.000	0	0	0	0	EPS010	4.300.000	30	172.000	14-11	4.300.000	30	5	299.300	CCF24	4.300.000	30	172.000	0	0	0	0	0
2	CC 1014476490	OVALLE PEÑA TATIANA VALENTINA	1	0			S																	230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS005	2.150.000	30	86.000	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
3	CC 1022931877	TAPIAS MAYOR MAICOL DUVAN	1	0			S		X						X									231001	1.889.836	27	302.400	0	0	0	0	EPS002	1.889.836	27	75.600	14-11	1.889.836	27	5	131.600	CCF24	2.052.670	27	82.200	0	0	0	0	0
4	CC 1030588638	SANDOVAL HERRERA ANGI VIVIANA	1	0			S		X															25-14	1.075.000	15	172.000	0	0	0	0	EPS005	1.075.000	15	43.000	14-11	1.075.000	15	5	74.900	CCF24	1.666.250	15	66.700	0	0	0	0	0
5	CC 1030612556	SALCEDO COMBITA JAVIER MAURICIO	1	0			S		X															230201	2.000.000	15	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	15	80.000	14-11	2.000.000	15	5	139.200	CCF24	4.044.000	15	161.800	0	0	0	0	0
6	CC 1030651862	GARZON CASTRO CRISTIAN DAVID	1	0			S		X															230301	1.000.000	15	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	15	40.000	14-11	1.000.000	15	5	69.600	CCF24	2.255.333	15	90.300	0	0	0	0	0
7	CC 1030673225	ARIZA CELIS FABER ANDRES	1	0			S		X						X									230301	1.033.299	16	165.400	0	0	0	0	EPS017	1.033.299	16	41.400	14-11	1.033.299	16	5	72.000	CCF24	2.120.611	16	84.900	0	0	0	0	0
8	CC 1076658452	PAEZ MARCELO CRISTIAN CAMILO	1	0			S		X															230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	30	180.000	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF24	5.106.000	30	204.300	0	0	0	0	0
9	CC 1143236628	PUENTES CANTILLO PEDRO ALEJANDRO	1	0			S		X															230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	61.000	CCF24	2.003.619	15	80.200	0	0	0	0	0
10	CC 1193286404	GOMEZ CANTILLO GEINER ANDRES	1	0			S		X						X									230301	1.183.851	15	189.500	0	0	0	0	EPS017	1.183.851	15	47.400	14-11	1.183.851	15	5	82.400	CCF24	1.514.772	15	60.600	0	0	0	0	0
11	CC 4269011	AREVALO AVILA GONZALO	1	5			S		X						X										0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.022.727	15	41.000	14-11	1.022.727	15	5	71.200	CCF24	1.584.927	15	63.400	0	0	0	0	0
12	CC 52457900	CADENA BELTRAN SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	30	200.000	14-11	5.000.000	30	5	348.000	CCF24	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
13	CC 52851338	CARDENAS VELA ANA PATRICIA	1	0			S		X															230301	1.146.667	16	183.500	0	0	0	0	EPS008	1.146.667	16	45.900	14-11	1.146.667	16	5	79.900	CCF24	2.063.284	16	82.600	0	0	0	0	0
14	CC 73242298	GALVIS BARBA POMPEYO DE JESUS	1	0			S		X						X									230301	1.163.954	15	186.300	0	0	0	0	EPS005	1.163.954	15	46.600	14-11	1.163.954	15	5	81.100	CCF24	1.614.135	15	64.600	0	0	0	0	0
15	CC 79398418	ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS	1	0			S		X															25-14	1.425.000	15	228.000	0	0	0	0	EPS017	1.425.000	15	57.000	14-11	1.425.000	15	5	99.200	CCF24	2.833.850	15	113.400	0	0	0	0	0
16	CC 79547138	CASTELLANOS GARCIA HECTOR ALFONSO	1	0			S		X						X									25-14	2.029.458	30	324.800	0	0	0	0	EPSC34	2.029.458	30	81.200	14-11	2.029.458	30	5	141.300	CCF24	2.863.472	30	114.600	0	0	0	0	0
17	CC 79891792	MARTINEZ CASTRO CESAR JEFFERSON	1	0			S		X															25-14	1.900.000	15	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	15	76.000	14-11	1.900.000	15	5	132.300	CCF24	3.841.800	15	153.700	0	0	0	0	0
18	CC 8051102	VARGAS DIOSA ISAIC	1	0			S		X						X									230301	1.870.285	30	299.300	0	0	0	0	EPS037	1.870.285	30	74.900	14-11	1.870.285	30	5	130.200	CCF24	2.162.103	30	86.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901845086-8	CONSORCIO KAPATIVA	carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67728690	13/03/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$48,026,119	$12.562.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	280.100	0		0		0	0	0	0	280.100	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	486.800	0		0		0	0	0	0	486.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	227.000	0		0		0	0	0	0	227.000	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	246.000	0		0		0	0	0	0	246.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	202.000	0		0		0	0	0	0	202.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	93.200	0		0		0	0	0	0	93.200	2
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	92.600	0		0		0	0	0	0	92.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	304.000	0	0	0	0	0	0		304.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.947.100	0	0	0	0	0	0		2.947.100	15
231001	Colfondos	800227940-6	312.000	0	0	0	0	0	0		312.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.537.600	0	0	40.000	40.000	0	0		2.617.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.832.100				2.832.100	0	0	2.832.100			28.321	2.832.100	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.922.100	0	0	1.922.100	23

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901845086-8	CONSORCIO KAPATIVA		carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67728690	13/03/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$48,026,119	$12.562.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.627.700	1.627.700
Pensión	4	6.180.700	6.180.700
Riesgos Laborales	1	2.832.100	2.832.100
CCF	1	1.922.100	1.922.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	12.562.600	12.562.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901845086-8	CONSORCIO KAPATIVA		carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67728690	13/03/2026	23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$48,026,119	$12.562.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80127979	ACOSTA MENDEZ PEDRO ANTONIO	1	0			S																	230301	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS008	2.550.000	30	102.000	14-4	2.550.000	30	5	177.500	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
2	CC 19342269	GARZON RINCON LUIS ALBERTO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	2.550.000	30	102.000	14-4	2.550.000	30	5	177.500	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
3	CC 1022431501	GALINDO CASALLAS SERGIO ANDRES	1	0			S	X																230301	340.000	4	54.400	0	0	0	0	EPS017	340.000	4	13.600	14-4	340.000	4	5	23.700	CCF24	1.728.050	4	69.200	0	0	0	0	0
4	CC 52205814	TORRES BEDOYA MARIA DEL PILAR	1	0			S	X							X									230301	434.908	4	69.600	0	0	0	0	EPS017	434.908	4	17.400	14-4	434.908	4	5	30.300	CCF24	1.385.649	4	55.500	0	0	0	0	0
5	CC 1007639630	CAÑATE DIAZ LUIS ENRIQUE	1	0			S								X									230301	2.312.985	30	370.100	0	0	0	0	EPS042	2.312.985	30	92.600	14-4	2.312.985	30	5	161.000	CCF24	2.312.985	30	92.600	0	0	0	0	0
6	CC 1014184775	AGUILAR GARCIA CAROL TATIANA	1	0			S								X									25-14	2.372.675	30	379.700	0	0	0	0	EPS002	2.372.675	30	95.000	14-4	2.372.675	30	5	165.200	CCF24	2.372.675	30	95.000	0	0	0	0	0
7	CC 14234554	RICO HECTOR FABIO	1	0			S																	231001	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.950.000	30	78.000	14-4	1.950.000	30	5	135.800	CCF24	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
8	CC 1097990613	BARRERA RUIZ KAREN LIZETH	1	0			S	X																230301	286.667	4	45.900	0	0	0	0	EPS017	286.667	4	11.500	14-4	286.667	4	5	20.000	CCF24	1.012.650	4	40.600	0	0	0	0	0
9	CC 1000623530	LOPEZ GUTIERREZ CRISTIAN DAVID	1	0			S	X																25-14	286.667	4	45.900	0	0	0	0	EPS008	286.667	4	11.500	14-4	286.667	4	5	20.000	CCF24	815.567	4	32.700	0	0	0	0	0
10	CC 1073328106	LOZANO FRANCO LUZ ANGELA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 22736315	MEJIA ARROYO KARINA PAOLA	1	0			S	X																25-14	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS005	8.000.000	30	320.000	14-4	8.000.000	30	5	556.800	CCF24	10.488.000	30	419.600	0	0	0	0	0
12	CC 1073669016	CAMARGO MARTINEZ DAVID	1	0			S								X									230301	2.085.227	30	333.700	0	0	0	0	EPS017	2.085.227	30	83.500	14-4	2.085.227	30	5	145.200	CCF24	2.085.227	30	83.500	0	0	0	0	0
13	CC 79965422	MENDEZ JAVIER ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.845.414	30	295.300	0	0	0	0	EPS037	1.845.414	30	73.900	14-4	1.845.414	30	5	128.500	CCF24	1.845.414	30	73.900	0	0	0	0	0
14	CC 1000353922	SALINAS RAMIREZ LUZ ANGIE	1	0			S																	230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS005	2.150.000	30	86.000	14-4	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
15	CC 1033770907	ORTIZ PARADA SERGIO LEONARDO	1	0			S																	230301	2.850.000	30	456.000	0	0	0	0	EPS010	2.850.000	30	114.000	14-4	2.850.000	30	5	198.400	CCF24	2.850.000	30	114.000	0	0	0	0	0
16	CC 1003825740	BUELVAS PEÑA LUIS MIGUEL	1	0			S																	25-14	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS010	3.300.000	30	132.000	14-4	3.300.000	30	5	229.700	CCF24	3.300.000	30	132.000	0	0	0	0	0
17	CC 1072422125	CAVIEDES CORTES DANIEL FELIPE	1	0			S	X							X									230301	482.162	4	77.200	0	0	0	0	EPS037	482.162	4	19.300	14-4	482.162	4	5	33.600	CCF24	691.103	4	27.700	0	0	0	0	0
18	CC 1030674433	MOREA RAMOS CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	266.667	4	42.700	0	0	0	0	EPS005	266.667	4	10.700	14-4	266.667	4	5	18.600	CCF24	555.334	4	22.300	0	0	0	0	0
19	CC 80419491	BARRETO LOZANO ALEXANDER	1	0			S	X							X									230301	541.667	4	86.700	0	0	0	0	EPS002	541.667	4	21.700	14-4	541.667	4	5	37.800	CCF24	988.634	4	39.600	0	0	0	0	0
20	CC 1031182293	REYES ZAMBRANO HENRY ISAIAS	1	0			S																	230201	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS002	1.900.000	30	76.000	14-4	1.900.000	30	5	132.300	CCF24	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
21	CC 1012363203	TRUJILLO SUAREZ YESID ALEXANDER	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-4	233.454	4	5	16.300	CCF24	372.359	4	14.900	0	0	0	0	0
22	CC 1023945283	SANCHEZ SANTANA ASTRID YOLANDA	1	0			S	X																230301	286.667	4	45.900	0	0	0	0	EPS008	286.667	4	11.500	14-4	286.667	4	5	20.000	CCF24	471.567	4	18.900	0	0	0	0	0
23	CC 1031124324	REYES ZAMBRANO OSCAR ANDRES	1	0			S																	25-14	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	30	76.000	14-4	1.900.000	30	5	132.300	CCF24	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901851633-1	CONSORCIO SANPROTO	carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67750289	13/03/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$48,632,197	$14.716.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	325.600	0		0		0	4	900	0	326.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	536.000	0		0		0	4	1.400	0	537.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	102.000	0		0		0	4	300	0	102.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	452.600	0		0		0	4	1.200	0	453.800	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	102.000	0		0		0	4	300	0	102.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	86.000	0		0		0	4	300	0	86.300	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	97.500	0		0		0	4	300	0	97.800	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	85.000	0		0		0	4	300	0	85.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	97.900	0		0		0	4	300	0	98.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.170.500	0	0	0	0	4	3.100	0	1.173.600	4
230301	Porvenir	800224808-8	4.885.800	0	0	40.000	40.000	4	12.600	400	4.978.800	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.481.000	0	0	0	0	4	3.900	0	1.484.900	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.229.500				3.229.500	4	8.400	3.237.900			32.295	3.237.900	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.945.800	4	5.100	1.950.900	18

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901851633-1	CONSORCIO SANPROTO	carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67750289	13/03/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$48,632,197	$14.716.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.884.600	1.889.900
Pensión	3	7.617.300	7.637.300
Riesgos Laborales	1	3.229.500	3.237.900
CCF	1	1.945.800	1.950.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	14.677.200	14.716.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901851633-1	CONSORCIO SANPROTO		carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67750289	13/03/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$48,632,197	$14.716.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1033750244	RODRIGUEZ CRUZ KRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS037	2.550.000	30	102.000	14-11	2.550.000	30	5	177.500	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
2	CC 1103713767	ACERO HERNANDEZ DIDIER ANDREY	1	0			S																	230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS041	2.150.000	30	86.000	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
3	CC 1193601990	ORTEGA MATUTE LUIS FERNANDO	1	0			S								X									25-14	2.437.339	30	390.000	0	0	0	0	EPS048	2.437.339	30	97.500	14-11	2.437.339	30	5	169.700	CCF24	2.437.339	30	97.500	0	0	0	0	0
4	CC 1052042571	ORTEGA MATUTE MANUEL FAUSTINO	1	0			S								X									230301	2.447.288	30	391.600	0	0	0	0	ESSC07	2.447.288	30	97.900	14-11	2.447.288	30	5	170.400	CCF24	2.447.288	30	97.900	0	0	0	0	0
5	CC 1019101939	RODRIGUEZ FERNANDEZ CRISTIAN ANDRES	1	0			S																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS002	4.500.000	30	180.000	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF24	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
6	CC 1032443367	RODRIGUEZ PINTO DAVID ENRIQUE	1	0			S																	230201	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS005	2.550.000	30	102.000	14-11	2.550.000	30	5	177.500	CCF24	2.550.000	30	102.000	0	0	0	0	0
7	CC 1092393528	MARTINEZ BERMUDEZ JIMMY	1	0			S								X									230301	3.106.960	30	497.200	0	0	0	0	EPS017	3.106.960	30	124.300	14-11	3.106.960	30	5	216.300	CCF24	3.106.960	30	124.300	0	0	0	0	0
8	CC 1000462901	RIVERA AVILA MARIA FERNANDA	1	0			S	X																230301	1.218.333	17	195.000	0	0	0	0	EPS002	1.218.333	17	48.800	14-11	1.218.333	17	5	84.800	CCF24	1.735.050	17	69.500	0	0	0	0	0
9	CC 1026568860	GONZALEZ SILVA CRISTIAN GUSTAVO	1	0			S																	230301	2.850.000	30	456.000	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	30	114.000	14-11	2.850.000	30	5	198.400	CCF24	2.850.000	30	114.000	0	0	0	0	0
10	PT 5836385	BERNAL RIVAS RAMON ISIDRO	1	0			S								X									25-14	2.419.930	30	387.200	0	0	0	0	EPS002	2.419.930	30	96.800	14-11	2.419.930	30	5	168.500	CCF24	2.419.930	30	96.800	0	0	0	0	0
11	CC 1022950246	MENJURA CARO LAURA ALEJANDRA	1	0			S								X									25-14	2.248.321	30	359.800	0	0	0	0	EPS017	2.248.321	30	90.000	14-11	2.248.321	30	5	156.500	CCF24	2.248.321	30	90.000	0	0	0	0	0
12	CC 1001048025	SANTAMARIA GONZALEZ ESTEBAN	1	0			S								X									230301	2.122.727	30	339.700	0	0	0	0	EPSC34	2.122.727	30	85.000	14-11	2.122.727	30	5	147.800	CCF24	2.122.727	30	85.000	0	0	0	0	0
13	CC 1004361762	CASTAÑEDA MEJIA FERNANDO JOSE	1	0			S								X									230301	1.273.778	19	203.900	0	0	0	0	EPS017	1.273.778	19	51.000	14-11	1.273.778	19	5	88.700	CCF24	1.273.778	19	51.000	0	0	0	0	0
14	CC 1004361762	CASTAÑEDA MEJIA FERNANDO JOSE	1	0			S												X					230301	715.000	11	114.400	0	0	0	0	EPS017	715.000	11	28.600	14-11	715.000	11	5	0	CCF24	715.000	11	28.600	0	0	0	0	0
15	CC 1018460808	DIAZ CERCHIARO DUVAN JOSE	1	0			S	X																230301	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS005	8.000.000	30	320.000	14-11	8.000.000	30	5	556.800	CCF24	8.810.667	30	352.500	0	0	0	0	0
16	CC 1000007707	SOTTO YATE OVER STICK	1	0			S																	230301	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS017	2.150.000	30	86.000	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
17	CC 1007423483	BUSTOS BUSTOS MAICOL ANDRES	1	0			S								X									230201	1.815.137	30	290.500	0	0	0	0	EPS017	1.815.137	30	72.700	14-11	1.815.137	30	5	126.400	CCF24	1.815.137	30	72.700	0	0	0	0	0
18	CC 1030685386	VASQUEZ ROJAS LAURA DANIELA	1	0			S																	25-14	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS008	2.150.000	30	86.000	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
19	CC 1022341629	VEGA HERRERA ABEL SADIR	1	0			S	X																230201	400.000	6	64.000	0	0	0	0	EPS008	400.000	6	16.000	14-11	400.000	6	5	27.900	CCF24	600.000	6	24.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá DC, 25 de marzo del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-03-09, el aportante YULI PAOLIN JARAMILLO con documento de identificación CC 32907266 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a YULY PAULIN JARAMILLO BOLAÑO con CC 32907266, bajo la tarifa ARL de 6.960% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800229739	230201	PROTECCION	202602	1079391414
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA	202602	1079391414
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202602	1079391414
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA	202602	1079391414

Gestionamos tu planilla de seguridad social
www.pagosimple.com
Simple

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79117772	HENRY DURAN CAÑON	calle 58C sur # 22H 11	3112833895	heduca123@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62969022	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$230.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	14	2.000	0	220.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	14	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	220.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	228.100	230.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79117772	HENRY DURAN CAÑON	calle 58C sur # 22H 11	3112833895	heduca123@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62969022	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$230.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79117772	DURAN CAÑON HENRY	57	2			N																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79747388	JHON WILSON GALVIS LAVERDE	calle 1c # 38c - 21	8101738	jwgalvis@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65306586	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$584.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	24	3.500	0	222.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	24	4.500	0	284.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	76.200				76.200	24	1.300	77.500			762	77.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	24	0	0	0
ICBF				
0	24	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	222.400
Pensión	1	280.200	284.700
Riesgos Laborales	1	76.200	77.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	575.300	584.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79747388	JHON WILSON GALVIS LAVERDE	calle 1c # 38c - 21	8101738	jwgalvis@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65306586	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$584.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79747388	GALVIS LAVERDE JHON WILSON	57	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	4	76.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	902012883-0	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67755601	15/04/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$38,077,168	$17.051.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	240.100	0		0		0	27	4.300	0	244.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	838.400	0		0		0	27	15.000	0	853.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	833.300	0		0		0	27	14.900	0	848.200	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	883.900	0		0		0	27	15.800	0	899.700	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	239.100	0		0		0	27	4.300	0	243.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	914.200	0		0		0	27	16.400	0	930.600	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	235.600	0		0		0	27	4.300	0	239.900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	562.500	0		0		0	27	10.100	0	572.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.209.500	0	0	0	0	27	39.500	0	2.249.000	6
230301	Porvenir	800224808-8	1.728.600	0	0	0	0	27	30.900	0	1.759.500	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.993.700	0	0	0	0	27	35.700	0	2.029.400	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.643.600				2.643.600	27	47.300	2.690.900			26.436	2.690.900	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.523.800	27	27.300	1.551.100	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	902012883-0	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67755601	15/04/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$38,077,168	$17.051.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
762.200	27	13.700	775.900	20
ICBF				
1.143.100	27	20.500	1.163.600	20
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	4.747.100	4.832.200
Pensión	3	5.931.800	6.037.900
Riesgos Laborales	1	2.643.600	2.690.900
CCF	1	1.523.800	1.551.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.143.100	1.163.600
MEN	0	0	0
SENA	1	762.200	775.900
TOTALES	15	16.751.600	17.051.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	902012883-0	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025		carrea 15 #93a-84	6014770190	rhprocom@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67755601	15/04/2026	20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$38,077,168	$17.051.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000775159	ANGARITA OLARTE YEIMY ALEJANDRA	1	0			N																	230201	2.150.000	30	344.000	0	0	0	0	EPS005	2.150.000	30	268.800	14-11	2.150.000	30	5	149.700	CCF24	2.150.000	30	86.000	2.150.000	43.000	64.500	0	0
2	CC 1003404397	RAMOS HOYOS NEIBYS MARIA	1	0			N								X									230201	1.912.673	30	306.100	0	0	0	0	EPS010	1.912.673	30	239.100	14-11	1.912.673	30	5	133.200	CCF24	1.912.673	30	76.600	1.912.673	38.300	57.400	0	0
3	CC 1012329700	SANDOVAL HERRERA KAREN LORENA	1	0			N	X																25-14	2.078.333	29	332.600	0	0	0	0	EPS005	2.078.333	29	259.800	14-11	2.078.333	29	5	144.700	CCF24	2.078.333	29	83.200	2.078.333	41.600	62.400	0	0
4	CC 1014241034	SALOM PARRA JOHN SEBASTIAN	1	0			N																	230301	2.550.000	30	408.000	0	0	0	0	EPS017	2.550.000	30	318.800	14-11	2.550.000	30	5	177.500	CCF24	2.550.000	30	102.000	2.550.000	51.000	76.500	0	0
5	CC 1030588638	SANDOVAL HERRERA ANGI VIVIANA	1	0			N	X																25-14	1.075.000	15	172.000	0	0	0	0	EPS005	1.075.000	15	134.400	14-11	1.075.000	15	5	74.900	CCF24	1.075.000	15	43.000	1.075.000	21.500	32.300	0	0
6	CC 1030612556	SALCEDO COMBITA JAVIER MAURICIO	1	0			N	X																230201	2.000.000	15	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	15	250.000	14-11	2.000.000	15	5	139.200	CCF24	2.000.000	15	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
7	CC 1030651862	GARZON CASTRO CRISTIAN DAVID	1	0			N	X																230301	1.000.000	15	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	15	125.000	14-11	1.000.000	15	5	69.600	CCF24	1.000.000	15	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
8	CC 1043980895	OLIVO PEÑA MOISES JOAQUIN	1	0			N								X									230301	1.920.027	30	307.300	0	0	0	0	CCFC55	1.920.027	30	240.100	14-11	1.920.027	30	5	133.700	CCF24	1.920.027	30	76.900	1.920.027	38.500	57.700	0	0
9	CC 1073811664	CAUSIL MONTALVO LUIS FERNANDO	1	0			N								X									230201	1.884.126	30	301.500	0	0	0	0	EPS037	1.884.126	30	235.600	14-11	1.884.126	30	5	131.200	CCF24	1.884.126	30	75.400	1.884.126	37.700	56.600	0	0
10	CC 1118579454	PEÑA AMAYA JOHELVIS ENRIQUE	1	0			N								X									230301	2.019.510	30	323.200	0	0	0	0	EPS002	2.019.510	30	252.500	14-11	2.019.510	30	5	140.600	CCF24	2.019.510	30	80.800	2.019.510	40.400	60.600	0	0
11	CC 1120750763	VEGA BRAVO JORGE ANDRES	1	0			N																	230201	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS041	4.500.000	30	562.500	14-11	4.500.000	30	5	313.200	CCF24	4.500.000	30	180.000	4.500.000	90.000	135.000	0	0
12	CC 1143236628	PUENTES CANTILLO PEDRO ALEJANDRO	1	0			N	X																230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS002	875.453	15	109.500	14-11	875.453	15	5	61.000	CCF24	875.453	15	35.100	875.453	17.600	26.300	0	0
13	CC 4148422	LEGUIZAMON PERILLA LUIS ALEJANDRO	1	0			N								X									25-14	1.900.130	30	304.100	0	0	0	0	EPS002	1.900.130	30	237.600	14-11	1.900.130	30	5	132.300	CCF24	1.900.130	30	76.100	1.900.130	38.100	57.100	0	0
14	CC 4269011	AREVALO AVILA GONZALO	1	5			N	X																	0	0	0	0	0	0	0	EPS017	900.000	15	112.500	14-11	900.000	15	5	62.700	CCF24	900.000	15	36.000	900.000	18.000	27.000	0	0
15	CC 53141064	OVALLE PEÑA LUZ MERY	1	0			N		X															230201	1.361.667	19	217.900	0	0	0	0	EPS005	1.361.667	19	170.300	14-11	1.361.667	19	5	94.800	CCF24	1.469.167	19	58.800	1.469.167	29.400	44.100	0	0
16	CC 79398418	ARIZA ROJAS JOSE DE LOS SANTOS	1	0			N	X																25-14	1.425.000	15	228.000	0	0	0	0	EPS017	1.425.000	15	178.200	14-11	1.425.000	15	5	99.200	CCF24	1.425.000	15	57.000	1.425.000	28.500	42.800	0	0
17	CC 79701011	QUINTANILLA CAMACHO ARIEL	1	0			N								X									25-14	2.170.455	30	347.300	0	0	0	0	EPS008	2.170.455	30	271.400	14-11	2.170.455	30	5	151.100	CCF24	2.170.455	30	86.900	2.170.455	43.500	65.200	0	0
18	CC 79891792	MARTINEZ CASTRO CESAR JEFFERSON	1	0			N	X																25-14	1.900.000	15	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	15	237.500	14-11	1.900.000	15	5	132.300	CCF24	1.900.000	15	76.000	1.900.000	38.000	57.000	0	0
19	CC 79973228	ARAGON MARIO ANDRES	1	0			N								X									230301	2.437.216	30	390.000	0	0	0	0	EPS017	2.437.216	30	304.700	14-11	2.437.216	30	5	169.700	CCF24	2.437.216	30	97.500	2.437.216	48.800	73.200	0	0
20	CC 92188878	AVILES ACOSTA OMAR ANTONIO	1	0			N								X									25-14	1.910.078	30	305.700	0	0	0	0	EPS002	1.910.078	30	238.800	14-11	1.910.078	30	5	133.000	CCF24	1.910.078	30	76.500	1.910.078	38.300	57.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900868163	2	INGEINCOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ZONA SUR	ZONA SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6619803	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	138837157	9501437233	E	2026/03/13	2026/03/16	BANCO POPULAR	3	$5,977,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1024555933	ARIAS MUÑOZ ERIK STEVEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1059703868	BUENO TAPASCO YUDIER ANTONIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	80366669	CARRILLO RINCON RICARDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	4085787	CUEVAS MISAEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	5571903	DIAZ FINO RAFAEL ANTONIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	74333180	FONSECA RODRIGUEZ LAZARO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	4731820	IPIA VARGAS JOSE POLICARPO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	84083565	PINTO BLANCO REMI ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1065667734	RUBIO CONTRERAS VICTOR MANUEL	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	79604809	SIERRA ARMEL	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	7938508	VILLADIEGO PEREZ JONATHAN DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			**$19,259,955**	**$3,082,200**			**$19,259,955**	**$771,100**			**$19,259,955**	**$771,100**			**$19,259,955**	**$1,340,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$3,082,200	$6,200	$0	$3,088,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,120,800	$2,200	$0	$1,123,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$1,700	$0	$842,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$1,700	$0	$842,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$600	$0	$280,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,340,900	$2,600	$0	$1,343,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,340,900	$2,600	$0	$1,343,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$771,100	$1,500	$0	$772,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	$771,100	$1,500	$0	$772,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$771,100	$1,700	$0	$772,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$200	$0	$70,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$210,300	$500	$0	$210,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$300	$0	$140,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$350,500	$700	$0	$351,200
TOTAL				**11**	**$5,965,300**	**$12,000**	**$0**	**$5,977,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901850515-6	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SIGLO XXI SAS	CR 82 J NO. 64 64	3033164	CONSTRUCCIONESYTRANSPORTES21@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65029085	16/03/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$21,536,135	$4.723.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	203.600	0		0		0	11	1.500	0	205.100	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	42.100	0		0		0	11	300	0	42.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	280.600	0		0		0	11	2.000	0	282.600	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	105.100	0		0		0	11	800	0	105.900	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	11.700	0		0		0	11	100	0	11.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	364.400	0	0	0	0	11	2.600	0	367.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.219.100	0	0	0	0	11	8.700	0	1.227.800	5
231001	Colfondos	800227940-6	514.000	0	0	0	0	11	3.700	0	517.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	607.300	0	0	0	0	11	4.300	0	611.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	698.700				698.700	11	5.000	703.700			6.987	703.700	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	643.100	11	4.600	647.700	17

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	11	0	0	0
ICBF				
0	11	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	643.100	647.800
Pensión	4	2.704.800	2.724.100
Riesgos Laborales	1	698.700	703.700
CCF	1	643.100	647.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.689.700	4.723.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901850515-6	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SIGLO XXI SAS	CR 82 J NO. 64 64	3033164	CONSTRUCCIONESYTRANSPORTES21@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65029085	16/03/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$21,536,135	$4.723.300	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901850515-6	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SIGLO XXI SAS		CR 82 J NO. 64 64	3033164	CONSTRUCCIONESYTRANSPORTES21@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65029085	16/03/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$21,536,135	$4.723.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1053684048	OJEDA SILVA WILSON JIOVANY	1	0			S																	230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS002	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	4	30.500	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
2	CC 1053684048	OJEDA SILVA WILSON JIOVANY	1	0			S									X								230201	1.050.543	18	126.100	0	0	0	0	EPS002	1.050.543	18	0	14-11	1.050.543	18	4	0	CCF24	1.050.543	18	0	0	0	0	0	0
3	CC 1053684054	OJEDA SILVA BLANCA IDALY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1233490149	MALAMBO AROCA EDWIN STIVEN	1	0			S																	230301	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS037	1.342.361	23	53.700	14-11	1.342.361	23	4	58.400	CCF24	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0
5	CC 1233490149	MALAMBO AROCA EDWIN STIVEN	1	0			S									X								230301	408.545	7	49.100	0	0	0	0	EPS037	408.545	7	0	14-11	408.545	7	4	0	CCF24	408.545	7	0	0	0	0	0	0
6	CC 13526015	PARDO NIÑO ARISTIRES	1	0			S																	231001	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS017	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	4	55.900	CCF24	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
7	CC 13526015	PARDO NIÑO ARISTIRES	1	0			S									X								231001	466.908	8	56.100	0	0	0	0	EPS017	466.908	8	0	14-11	466.908	8	4	0	CCF24	466.908	8	0	0	0	0	0	0
8	CC 3102662	AREVALO MONTERO GERMAN	1	0			S	X																25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	4	7.700	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
9	CC 3102662	AREVALO MONTERO GERMAN	1	0			S									X								25-14	233.454	4	28.100	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	0	14-11	233.454	4	4	0	CCF24	233.454	4	0	0	0	0	0	0
10	CC 4226939	OJEDA SILVA JOSE SILVERIO	1	0			S	X																230201	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS017	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	4	30.500	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
11	CC 4226939	OJEDA SILVA JOSE SILVERIO	1	0			S									X								230201	116.727	2	14.100	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	0	14-11	116.727	2	4	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
12	CC 4226984	SILVA PARRA JOSE ANDRES	1	0			S	X																230301	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS002	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	4	30.500	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
13	CC 4226984	SILVA PARRA JOSE ANDRES	1	0			S									X								230301	116.727	2	14.100	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	0	14-11	116.727	2	4	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
14	CC 4248728	ORTIZ GALINDO LUIS ALFONSO	1	0			S																	25-14	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS017	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	4	45.700	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
15	CC 4248728	ORTIZ GALINDO LUIS ALFONSO	1	0			S									X								25-14	700.362	12	84.100	0	0	0	0	EPS017	700.362	12	0	14-11	700.362	12	4	0	CCF24	700.362	12	0	0	0	0	0	0
16	CC 7330452	LOPEZ GONZALEZ PEDRO ANTONIO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	4	55.900	CCF24	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
17	CC 7330452	LOPEZ GONZALEZ PEDRO ANTONIO	1	5			S									X									0	0	0	0	0	0	0	EPS037	466.908	8	0	14-11	466.908	8	4	0	CCF24	466.908	8	0	0	0	0	0	0
18	CC 7330633	GAMEZ DIAZ JOSE GUILLERMO	1	3			S		X																0	0	0	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	4	2.600	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
19	CC 79189121	DIAZ RISCANEVO LUIS ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS008	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	4	45.700	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
20	CC 79189121	DIAZ RISCANEVO LUIS ALBERTO	1	0			S									X								25-14	700.362	12	84.100	0	0	0	0	EPS008	700.362	12	0	14-11	700.362	12	4	0	CCF24	700.362	12	0	0	0	0	0	0
21	CC 79210190	CABALLERO LUIS CARLOS	1	0			S	X																231001	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS002	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	4	30.500	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
22	CC 79210190	CABALLERO LUIS CARLOS	1	0			S									X								231001	116.727	2	14.100	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	0	14-11	116.727	2	4	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
23	CC 80132078	SANCHEZ LESMES OSCAR	1	0			S	X																25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPSC34	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	4	12.700	CCF24	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
24	CC 80231144	POVEDA GONZALEZ JOSE HUMBERTO	1	0			S	X																231001	700.362	12	112.100	0	0	0	0	EPS017	700.362	12	28.100	14-11	700.362	12	4	30.500	CCF24	700.362	12	28.100	0	0	0	0	0
25	CC 80231144	POVEDA GONZALEZ JOSE HUMBERTO	1	0			S									X								231001	116.727	2	14.100	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	0	14-11	116.727	2	4	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
26	CC 80246263	SANTANA JIMENEZ CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 83085354	GARRIDO WALLES ALFONSO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	4	45.700	CCF24	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
28	CC 83085354	GARRIDO WALLES ALFONSO	1	5			S									X									0	0	0	0	0	0	0	EPS002	700.362	12	0	14-11	700.362	12	4	0	CCF24	700.362	12	0	0	0	0	0	0
29	CC 4226971	REYES SOLER NESTOR ALBERTO	1	0			S																	230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS017	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	4	63.500	CCF24	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
30	CC 4226971	REYES SOLER NESTOR ALBERTO	1	0			S									X								230301	291.818	5	35.100	0	0	0	0	EPS017	291.818	5	0	14-11	291.818	5	4	0	CCF24	291.818	5	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340744-8	VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	DG 146 128 70 CASA 10	3204229888	body.esbelto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61732221	10/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$15,215,249	$4.378.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	202.400	0		0		0	0	0	0	202.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	56.100	0		0		0	0	0	0	56.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	504.400	0	0	0	0	0	0		504.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.089.800	0	0	0	0	0	0		1.089.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	725.500				725.500	0	0	725.500			7.255	725.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	609.000	0	0	609.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	609.000	609.000
Pensión	3	2.434.800	2.434.800
Riesgos Laborales	1	725.500	725.500
CCF	1	609.000	609.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.378.300	4.378.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340744-8	VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	DG 146 128 70 CASA 10	3204229888	body.esbelto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61732221	10/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$15,215,249	$4.378.300	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340744-8	VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	DG 146 128 70 CASA 10	3204229888	body.esbelto@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61732221	10/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$15,215,249	$4.378.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000129227	GUIZA DIAZ KEVIN ARLEY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1000129228	GUIZA DIAZ YEISON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1012357989	GUIZA ARIZA JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	65.400	14-11	1.634.178	28	5	113.800	CCF22	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
4	CC 1012357989	GUIZA ARIZA JUAN CARLOS	1	0			S												X					230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	5	0	CCF22	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
5	CC 1025528289	GUIZA CRUZ LEYNER ALEXIS	1	0			S	X																230201	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPSC34	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	5	97.500	CCF22	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
6	CC 1032383432	CADENA JARA CARLOS ARTURO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 17588752	PLAZAS GUERRERO JHON JAIRO	1	0			S																	25-14	2.530.000	30	404.800	0	0	0	0	EPS008	2.530.000	30	101.200	14-11	2.530.000	30	1	13.300	CCF22	2.530.000	30	101.200	0	0	0	0	0
8	CC 52266033	GUIZA PINZON ADRIANA ELVIRA	1	0			S																	25-14	2.530.000	30	404.800	0	0	0	0	EPS008	2.530.000	30	101.200	14-11	2.530.000	30	1	13.300	CCF22	2.530.000	30	101.200	0	0	0	0	0
9	CC 80127447	GUIZA PINZON VICENTE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

EL SUSCRITO CONTADOR DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
CON NIT: 902.012.883-0

CERTIFICA

De conformidad con las normas legales vigentes el CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025, identificado con NIT 902.012.883-0, se encuentra a paz y salvo con el pago de los impuestos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá.

La presente certificación se expide con destino a Bogotá DISTRITO CAPITAL, para efectos del contrato de obra No. 938-2025 el día diecinueve (19) del mes de abril de 2026.

En constancia firma,



CARLOS GUILLLERMO HOLGUIN GIRALDO
T.P. 39734-T
Contador Publico

DOCUMENTOS CONTADOR





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-DIC-1962**

BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-JUN-1981 BUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



R-1500150-00157040-M-0014884753-20090520 **00115**98707A 1 7000008911



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
38734-T
CARLOS GUILLERMO
HOLGUIN ARBOLEDA
C.C. 14.894.753
RESOLUCION INSCRIPCION 851
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FECHA 11-VIII-84
Presidente
00047008



FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
EN CASO DE PERDIDA TEL EN BOGOTA 5263470

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BB90914482AF1A8F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS GUILLERMO HOLGUIN GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14884753 de GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 39734-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
NIT 902.012.883-0
CR 1 # 62 - 41
Tel: 3176682956
Montería - Colombia
cop938kennedy@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVVK 2

Señores	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	Carrera 30 Nº 25-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2026, 11:24
Expedición	12/05/2026, 11:25
Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OBRA CIVIL CORTE DE OBRA 2 REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE	1.00	1,998,735,385.00
2	ADMININISTRACIÓN 28,47%	1.00	569,039,964.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	19,987,354.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	99,936,769.00
5	COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES.	1.00	247,371,486.00

Total items: 5

Total Bruto	2,935,070,958.00
Total a Pagar	2,935,070,958.00

Valor en Letras:
Dos mil novecientos treinta y cinco millones setenta mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 2,935,070,958.00

Observaciones:
TOTAL PRESENTE ACTA ---------- $ 2.935.070.958
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30 % ---------- $ 880.521.287
==========
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA ---------- $ 2.054.549.671

PORCENTAJE DE EJECUCION EN EL PERIODO DE CORTE 14.94%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104306395 aprobado en 20260105 prefijo FVVK desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 7b1cd5129a4bd14bd5faf4d14f5ed5f64cab881410ce3427a004b698b6b6336c5b26ed8cbce61ed82a5d1a38091030ac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE FIJACIÓN No. 1

Fecha		
2	3	2026
Dia	Mes	Año

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

CONTRATO No. 938-2025

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.1

CONTRATO No **938** **DE** **2025**

OBJETO DEL CONTRATO

Objeto: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTA D.C ATRAVES DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MOTO AGOTABLE "

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

PROFESIONAL DEL FDLK

En Bogotá D.C ; a los Dos (2) días del mes Marzo de 2026

se reunieron JOTAM MAESTRE DIAB Representante Legal

del contratista SANTIAGO CARRILLO VARGAS Representante Legal de la Interventoria

Con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoría. A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados de acuerdo con el listado de insumos IDU y/o cotizaciones anexas entregadas por parte del Contratista CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025, indicando los ítems correspondientes y cantidades de obra de los mismos.

Ítem	Codigo IDRD o IDU	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Precio Unitario	Precio Unitario con AIU
		ITEMS DE INCLUSIÓN				
7,001	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,00	$ 65.583,00	$ 88.189,00
7,002	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,00	$ 90.827,00	$ 122.135,00
7,003	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,00	$ 128.010,00	$ 172.135,00
7,004	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,00	$ 261.494,00	$ 351.631,00
7,005	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	1,00	$ 1.785,00	$ 2.400,00
7,006	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2	1,00	$ 2.781,00	$ 3.740,00
7,007	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1,00	$ 68.808,00	$ 92.526,00
7,008	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,	M3	1,00	$ 1.371.234,00	$ 1.843.898,00
7,009	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1,00	$ 8.040,00	$ 10.811,00
7,010	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1,00	$ 8.040,00	$ 10.811,00
7,011	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN	UN	1,00	$ 487.892,00	$ 656.068,00
7,012	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF,	UN	1,00	$ 468.675,00	$ 630.227,00
7,013	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E	UN	1,00	$ 35.369,00	$ 47.561,00
7,014	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 421.286,00	$ 566.503,00
7,015	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1,00	$ 85.050,00	$ 114.367,00
7,016	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO,	M3	1,00	$ 1.556.717,00	$ 2.093.317,00
7,017	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1,00	$ 3.630,00	$ 4.881,00
7,018	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE	UN	1,00	$ 634.048,00	$ 852.604,00
7,019	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	1,00	$ 218.962,00	$ 294.438,00
7,020	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	1,00	$ 74.368,00	$ 100.003,00
7,021	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,00	$ 75.728,00	$ 101.831,00
7,022	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	$ 118.357,00	$ 159.155,00
7,023	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 222.745,00	$ 299.525,00
7,024	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 86.585,00	$ 116.431,00
7,025	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	1,00	$ 1.128.464,00	$ 1.517.446,00
7,026	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 219.130,00	$ 294.664,00
7,027	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	1,00	$ 1.725.500,00	$ 2.320.280,00
7,028	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	1,00	$ 1.892.100,00	$ 2.544.307,00
7,029	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	1,00	$ 2.082.500,00	$ 2.800.338,00
7,030	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 14". ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	1,00	$ 2.475.200,00	$ 3.328.401,00

Ítem	Codigo IDRD o IDU	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Precio Unitario	Precio Unitario con AIU
7,031	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS,	ML	1,00	$ 2.826.250,00	$ 3.800.458,00
7,032	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,00	$ 58.299,00	$ 78.395,00
7,033	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	1,00	$ 3.532,00	$ 4.749,00
7,034	3735	TUBERÍA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,00	$ 2.637,00	$ 3.546,00
7,035	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 7.480,00	$ 10.058,00
7,036	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 7.827,00	$ 10.525,00
7,037	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y	M3	1,00	$ 147.640,00	$ 198.532,00
7,038	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	1,00	$ 732.374,00	$ 984.823,00
7,039	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 5.547.512,00	$ 7.459.739,00
7,040	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN	1,00	$ 202.339,00	$ 272.085,00
7,041	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA	VIAJE	1,00	$ 1.840.000,00	$ 2.474.248,00
7,042	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24". ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	M3	1,00	$ 4.237.152,00	$ 5.697.698,00
7,043	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con	M3	1,00	$ 191.532,00	$ 257.553,00
7,044	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	1,00	$ 172.045,00	$ 231.349,00
7,045	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	1,00	$ 7.517,00	$ 10.108,00
7,046	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION	M2	1,00	$ 25.096,00	$ 33.747,00
7,047	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS,	ML	1,00	$ 3.088.050,00	$ 4.152.501,00
7,048	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	1,00	$ 4.608,00	$ 6.196,00
7,049	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR	ML	1,00	$ 19.113,00	$ 25.701,00
7,050	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	1,00	$ 26.586,00	$ 35.750,00
7,051	10257 o 6573	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA	M2	1,00	$ 142.562,00	$ 191.703,00
7,052	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 6.583,00	$ 8.852,00
7,053	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1,00	$ 92.358,00	$ 124.194,00
7,054	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 19.717,00	$ 26.513,00
7,055	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	UN	1,00	$ 231.838,00	$ 311.753,00
7,056	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML	1,00	$ 3.790.150,00	$ 5.096.615,00
7,057	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,00	$ 523.216,00	$ 703.569,00
7,058	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,00	$ 316.439,00	$ 425.516,00
7,059	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML	1,00	$ 20.205,00	$ 27.170,00
7,060	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	1,00	$ 21.734,00	$ 29.226,00
7,061	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML	1,00	$ 13.090,00	$ 17.602,00
		ITEMS NO PREVISTOS				
8,001	NP-1	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 14 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO.	M3	1,00	$ 1.030.096,00	$ 1.385.170,00
8,002	NP-2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2	1,00	$ 209.954,00	$ 282.325,00
8,003	NP-3	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1,00	$ 57.871,00	$ 77.819,00
8,004	NP-4	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	M3	1,00	$ 354.536,00	$ 476.745,00
8,005	NP-5	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	M3	1,00	$ 14.444,00	$ 19.423,00
8,006	NP-6	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	UN	1,00	$ 79.774,00	$ 107.272,00
8,007	NP-7	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML	1,00	$ 331.964,00	$ 446.392,00
8,008	NP-8	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacion)	UN	1,00	$ 267.765,00	$ 360.064,00
8,009	NP-9	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN	1,00	$ 120.694,00	$ 162.297,00
8,010	NP-10	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 489.196,00	$ 657.822,00
8,011	NP-11	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 14 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 553.400,00	$ 744.157,00
8,012	NP-12	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 16 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 591.456,00	$ 795.331,00
8,013	NP-13	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 666.608,00	$ 896.388,00
8,014	NP-14	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 724.900,00	$ 974.773,00
8,015	NP-15	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	UN	1,00	$ 200.263,00	$ 269.294,00
8,016	NP-16	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye taladro rotopercutor 3/4", planta eléctrica 4Kw).	UN	1,00	$ 56.610,00	$ 76.124,00
8,017	NP-17	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO	UN	1,00	$ 133.863,00	$ 180.006,00
8,018	NP-18	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)	UN	1,00	$ 3.608.680,00	$ 4.852.592,00
8,019	NP-19	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML	1,00	$ 419.360,00	$ 563.913,00
8,020	NP-20	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalacion)	UN	1,00	$ 362.082,00	$ 486.892,00

Ítem	Codigo IDRD o IDU	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Precio Unitario	Precio Unitario con AIU
8,021	NP-21	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80.	UN	1,00	$ 154.930,00	$ 208.334,00
8,022	NP-22	CONEXIONES KIT SILLA YEE 355 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 345.557,00	$ 464.671,00
8,023	NP-23	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIÓN, CON COLMATACIÓN SUPERIOR AL 30% Y DIÁMETROS DE 8" A 36" INCLUYE AGUA	ML	1,00	$ 492.100,00	$ 661.727,00
8,024	NP-24	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 297.607,00	$ 400.192,00
8,025	NP-25	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 166.316,00	$ 223.645,00
8,026	NP-26	PISO EN CONCRETO MR41 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2	1,00	$ 257.449,00	$ 346.192,00
8,027	NP-27	PISO EN CONCRETO 3000 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE,	M2	1,00	$ 237.212,00	$ 318.979,00
8,028	NP-28	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1,00	$ 195.225,00	$ 262.519,00

Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de reversión de precios de acuerdo con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios.

526 folios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Dos (2) días del mes de Marzo de 2026

CONSORCIO VIAL KENNEDY
JOTAM MAESTRE DIAB
Representante legal Contratista

SAVIMAC SAS
SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Representante legal Interventoria

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
MIGUEL NUÑEZ
Profesional de apoyo a la supervisión

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Supervisor del contrato

Nota: Respecto al seguimiento y control de los contratos de obra pública del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, la SUPERVISIÓN a cargo de la interventoría, exige conocimientos especializados y una capacidad operativa y organizacional instalada en el sitio de ejecución y en tiempo real, acorde con la dimensión del objeto a vigilar. Por ende, se aclara que si bien desde la supervisión y apoyo a la supervisión al contrato de interventoría, en cabeza del FDLK se realiza una revisión de la documentación entregada, es la interventoría la facultada para generar la aprobación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica respecto al cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la ley 1474 del 2011.

Original: Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
1. Copia Interventor.
2, Copia Contratista.
3. Copia Dependencia responsable del contrato.

ACTA No. 2
CON MEMORIAS Y CARTERAS

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** **1/3/2026** (Día/Mes/Año) **A** **31/3/2026** (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

JA**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el numero de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

CONSOLIDADO

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES									
											ACTA 1			PRESENTE ACTA		ACUMULADAS			SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	+ -	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
			1. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE																	
1	1,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8195,34	$ 1.142,00	$ 9.359.080,00	10212,16	$ 1.142,00	$ 11.662.287,00				2789,06	$ 3.185.107,00		2789,06	$ 3.185.107,00	7423,10	$ 8.477.180,00
2	1,002	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1375,79	$ 48.679,00	$ 66.972.081,00	1359,01	$ 48.679,00	$ 66.155.248,00				166,75	$ 8.117.223,00		166,75	$ 8.117.223,00	1192,26	$ 58.038.025,00
3	1,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5859,32	$ 7.206,00	$ 42.222.260,00	4763,20	$ 7.206,00	$ 34.323.619,00				1521,93	$ 10.967.028,00		1521,93	$ 10.967.028,00	3241,27	$ 23.356.592,00
4	1,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1100,00	$ 57.240,00	$ 62.964.000,00	6192,47	$ 57.240,00	$ 354.456.983,00				2951,79	$ 168.960.460,00		2951,79	$ 168.960.460,00	3240,68	$ 185.496.523,00
5	1,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4566,07	$ 73.056,00	$ 333.578.810,00	0,00	$ 73.056,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
6	1,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9171,92	$ 16.517,00	$ 151.492.603,00	0,00	$ 16.517,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
7	1,007	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4141,23	$ 235.794,00	$ 976.477.187,00	0,00	$ 235.794,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
8	1,008	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1200,00	$ 220.890,00	$ 265.068.000,00	0,00	$ 220.890,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
9	1,009	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 213.572,00	$ 616.219.292,00	0,00	$ 213.572,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
10	1,010	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 205.221,00	$ 592.124.151,00	0,00	$ 205.221,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
11	1,011	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	545,12	$ 1.757.344,00	$ 957.963.361,00	0,00	$ 1.757.344,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
12	1,012	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	545,12	$ 1.953.442,00	$ 1.064.860.303,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
13	1,013	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.003,00	$ 38.316.276,00	0,00	$ 4.003,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
14	1,014	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.877,00	$ 46.682.108,00	0,00	$ 4.877,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
15	1,015	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3930,17	$ 22.817,00	$ 89.674.689,00	0,00	$ 22.817,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
16	1,016	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	66,00	$ 228.161,00	$ 15.058.626,00	0,00	$ 228.161,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
17	1,017	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	1420,00	$ 190.133,00	$ 269.988.860,00	0,00	$ 190.133,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
18	1,018	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1095,38	$ 1.712.945,00	$ 1.876.325.694,00	442,61	$ 1.712.945,00	$ 758.166.586,00				64,09	$ 109.782.645,00		64,09	$ 109.782.645,00	378,52	$ 648.383.941,00
														0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			2. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO																	
										$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
19	2,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6603,57	$ 1.142,00	$ 7.541.277,00	0,00	$ 1.142,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
20	2,002	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	1320,71	$ 234.955,00	$ 310.307.418,00	148,00	$ 234.955,00	$ 34.773.340,00				145,58	$ 34.204.749,00		145,58	$ 34.204.749,00	2,42	$ 568.591,00
21	2,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4406,02	$ 7.206,00	$ 31.749.780,00	0,00	$ 7.206,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
22	2,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	6603,57	$ 57.240,00	$ 377.988.347,00	0,00	$ 57.240,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
23	2,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	600,00	$ 73.056,00	$ 43.833.600,00	0,00	$ 73.056,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
24	2,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2200,00	$ 16.517,00	$ 36.337.400,00	0,00	$ 16.517,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
25	2,007	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2203,01	$ 220.757,00	$ 486.329.879,00	0,00	$ 220.757,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
26	2,008	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	700,00	$ 208.805,00	$ 146.163.500,00	0,00	$ 208.805,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
27	2,009	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 240.902,00	$ 264.992.200,00	0,00	$ 240.902,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
28	2,010	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 242.117,00	$ 266.328.700,00	0,00	$ 242.117,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
29	2,011	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	1234,31	$ 488.707,00	$ 603.215.937,00	0,00	$ 488.707,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
30	2,012	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	1320,71	$ 7.018,00	$ 9.268.743,00	0,00	$ 7.018,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
31	2,013	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2311,25	$ 13.278,00	$ 30.688.778,00	0,00	$ 13.278,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
32	2,014	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	23772,85	$ 10.549,00	$ 250.779.795,00	0,00	$ 10.549,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
33	2,015	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	330,18	$ 9.221,00	$ 3.044.590,00	0,00	$ 9.221,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
34	2,016	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	6603,57	$ 3.206,00	$ 21.171.045,00	0,00	$ 3.206,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
35	2,017	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	2905,57	$ 17.296,00	$ 50.254.739,00	0,00	$ 17.296,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
36	2,018	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2905,57	$ 3.338,00	$ 9.698.793,00	248,00	$ 3.338,00	$ 827.824,00				246,38	$ 822.416,00		246,38	$ 822.416,00	1,62	$ 5.408,00
37	2,019	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	2829,63	$ 22.817,00	$ 64.563.668,00	0,00	$ 22.817,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
38	2,020	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	19,00	$ 228.161,00	$ 4.335.059,00	0,00	$ 228.161,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
39	2,021	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	180,00	$ 190.133,00	$ 34.223.940,00	0,00	$ 190.133,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			3. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO FLEXIBLE																	
										$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
40	3,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3253,08	$ 1.142,00	$ 3.715.017,00	0,00	$ 1.142,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
41	3,002	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	8,13	$ 371.818,00	$ 3.022.880,00	0,00	$ 371.818,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
42	3,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	162,65	$ 7.206,00	$ 1.172.056,00	0,00	$ 7.206,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
43	3,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	275,97	$ 57.240,00	$ 15.796.523,00	0,00	$ 57.240,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
44	3,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	81,33	$ 73.056,00	$ 5.941.644,00	0,00	$ 73.056,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
45	3,006	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	1382,56	$ 9.347,00	$ 12.922.788,00	0,00	$ 9.347,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
46	3,007	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	162,65	$ 248.800,00	$ 40.467.320,00	0,00	$ 248.800,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
47	3,008	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	80,00	$ 213.572,00	$ 17.085.760,00	0,00	$ 213.572,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
48	3,009	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	195,18	$ 1.712.945,00	$ 334.332.605,00	0,00	$ 1.712.945,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
49	3,010	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	81,33	$ 1.953.442,00	$ 158.873.438,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
50	3,011	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.003,00	$ 5.534.388,00	0,00	$ 4.003,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
51	3,012	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.877,00	$ 6.742.745,00	0,00	$ 4.877,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
52	3,013	4758	SELLO DE FISURAS	ML	800,00	$ 11.144,00	$ 8.915.200,00	0,00	$ 11.144,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
53	3,014	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	487,96	$ 13.037,00	$ 6.361.535,00	0,00	$ 13.037,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
54	3,015	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	25,00	$ 131.419,00	$ 3.285.475,00	2,00	$ 131.419,00	$ 262.838,00				2,00	$ 262.838,00		2,00	$ 262.838,00	0,00	$ -
55	3,016	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	140,00	$ 131.419,00	$ 18.398.660,00	0,00	$ 131.419,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			4. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO RIGIDO																	
										$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
56	4,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3672,96	$ 1.142,00	$ 4.194.520,00	0,00	$ 1.142,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
57	4,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	459,12	$ 58.217,00	$ 26.728.589,00	0,00	$ 58.217,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
58	4,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	619,81	$ 57.240,00	$ 35.477.924,00	0,00	$ 57.240,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
59	4,004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	252,52	$ 73.056,00	$ 18.447.809,00	0,00	$ 73.056,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
60	4,005	3486	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	550,94	$ 234.955,00	$ 129.447.048,00	0,00	$ 234.955,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
61	4,006	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	206,60	$ 248.800,00	$ 51.402.080,00	0,00	$ 248.800,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
62	4,007	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	68,87	$ 242.117,00	$ 16.674.598,00	0,00	$ 242.117,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
63	4,008	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m	M2	550,94	$ 464.229,00	$ 255.764.182,00	0,00	$ 464.229,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
64	4,009	3708	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	9182,40	$ 7.018,00	$ 64.442.083,00	0,00	$ 7.018,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
65	4,010	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	4591,20	$ 13.278,00	$ 60.961.954,00	0,00	$ 13.278,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
66	4,011	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1836,48	$ 10.549,00	$ 19.373.028,00	0,00	$ 10.549,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
67	4,012	4758	SELLO DE FISURAS	ML	100,00	$ 11.144,00	$ 1.114.400,00	0,00	$ 11.144,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
68	4,013	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1616,10	$ 17.296,00	$ 27.952.107,00	0,00	$ 17.296,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
69	4,014	3723	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	10,65	$ 131.419,00	$ 1.399.612,00	0,00	$ 131.419,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
70	4,015	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	20,94	$ 131.419,00	$ 2.751.914,00	0,00	$ 131.419,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
71	4,016	3434	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	20,00	$ 97.222,00	$ 1.944.440,00	0,00	$ 97.222,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
72	4,017	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	20,00	$ 90.021,00	$ 1.800.420,00	0,00	$ 90.021,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
														0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			5. MANTENIMIENTO PERIODICO EN ANDEN DE CONCRETO																	
73	5,001	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	2683,78	$ 10.370,00	$ 27.830.799,00	3088,81	$ 10.370,00	$ 32.030.960,00				72,30	$ 749.751,00		72,30	$ 749.751,00	3016,51	$ 31.281.209,00
74	5,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	268,38	$ 58.217,00	$ 15.624.278,00	542,24	$ 58.217,00	$ 31.567.586,00				5,00	$ 291.085,00		5,00	$ 291.085,00	537,24	$ 31.276.501,00
75	5,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	536,76	$ 57.240,00	$ 30.724.142,00	2260,66	$ 57.240,00	$ 129.400.178,00				0,00	$ -		0,00	$ -	2260,66	$ 129.400.178,00
76	5,004	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	268,38	$ 392.394,00	$ 105.310.702,00	0,00	$ 392.394,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
77	5,005	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	2683,78	$ 105.225,00	$ 282.400.751,00	73,00	$ 105.225,00	$ 7.681.425,00				72,30	$ 7.607.768,00		72,30	$ 7.607.768,00	0,70	$ 73.657,00
78	5,006	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	89,46	$ 1.212.741,00	$ 108.491.810,00	0,00	$ 1.212.741,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
79	5,007	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO), INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS	M2	2236,48	$ 165.385,00	$ 369.880.245,00	0,00	$ 165.385,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
80	5,008	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO.	UN	20,00	$ 2.082.959,00	$ 41.659.180,00	0,00	$ 2.082.959,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
81	5,009	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	M2	2236,48	$ 145.068,00	$ 324.441.681,00	0,00	$ 145.068,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
82	5,010	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).	ML	4472,97	$ 78.310,00	$ 350.278.281,00	10,00	$ 78.310,00	$ 783.100,00				9,60	$ 751.776,00		9,60	$ 751.776,00	0,40	$ 31.324,00
83	5,011	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	4472,97	$ 102.949,00	$ 460.487.789,00	1533,10	$ 102.949,00	$ 157.831.112,00				97,30	$ 10.016.938,00		97,30	$ 10.016.938,00	1435,80	$ 147.814.174,00
84	5,012	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	6262,15	$ 86.663,00	$ 542.696.705,00	529,68	$ 86.663,00	$ 45.903.658,00				0,00	$ -		0,00	$ -	529,68	$ 45.903.658,00
														0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			6. REDES																	
85	6,001	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5808,47	$ 58.217,00	$ 338.151.698,00	3657,45	$ 58.217,00	$ 212.925.767,00				407,90	$ 23.746.714,00		407,90	$ 23.746.714,00	3249,55	$ 189.179.052,00
86	6,002	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1452,12	$ 73.056,00	$ 106.086.079,00	4754,66	$ 73.056,00	$ 347.356.441,00				0,00	$ -		0,00	$ -	4754,66	$ 347.356.441,00
87	6,003	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4356,35	$ 49.220,00	$ 214.419.547,00	37,00	$ 49.220,00	$ 1.821.140,00				31,57	$ 1.553.875,00		31,57	$ 1.553.875,00	5,43	$ 267.265,00
88	6,004	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	217,82	$ 209.827,00	$ 45.704.517,00	886,54	$ 209.827,00	$ 186.020.029,00				135,71	$ 28.475.622,00		135,71	$ 28.475.622,00	750,83	$ 157.544.406,00
89	6,005	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	653,45	$ 125.986,00	$ 82.325.552,00	0,00	$ 125.986,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
90	6,006	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	72,61	$ 268.758,00	$ 19.514.518,00	0,00	$ 268.758,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
91	6,007	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	435,64	$ 195.195,00	$ 85.034.750,00	43,00	$ 195.195,00	$ 8.393.385,00				40,44	$ 7.893.686,00		40,44	$ 7.893.686,00	2,56	$ 499.699,00
92	6,008	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	40,00	$ 2.379.851,00	$ 95.194.040,00	56,00	$ 2.379.851,00	$ 133.271.656,00				9,00	$ 21.418.659,00		9,00	$ 21.418.659,00	47,00	$ 111.852.997,00
93	6,009	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	280,00	$ 928.646,00	$ 260.020.880,00	82,00	$ 928.646,00	$ 76.148.972,00				10,42	$ 9.676.491,00		10,42	$ 9.676.491,00	71,58	$ 66.472.481,00
94	6,010	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	40,00	$ 170.695,00	$ 6.827.800,00	65,00	$ 170.695,00	$ 11.095.175,00				1,00	$ 170.695,00		1,00	$ 170.695,00	64,00	$ 10.924.480,00
95	6,011	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	295,20	$ 180.628,00	$ 53.321.386,00	0,00	$ 180.628,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
96	6,012	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190,41	$ 528.764,00	$ 100.681.953,00	23,35	$ 528.764,00	$ 12.346.639,00				0,00	$ -		0,00	$ -	23,35	$ 12.346.639,00
97	6,013	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3310,80	$ 46.883,00	$ 155.220.236,00	0,00	$ 46.883,00	$ -				0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
98	6,014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1744,93	$ 221.771,00	$ 386.974.871,00	378,50	$ 221.771,00	$ 83.940.324,00				131,30	$ 29.118.532,00		131,30	$ 29.118.532,00	247,20	$ 54.821.791,00
99	6,015	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	60,00	$ 535.886,00	$ 32.153.160,00	165,50	$ 535.886,00	$ 88.689.133,00				74,45	$ 39.896.713,00		74,45	$ 39.896.713,00	91,05	$ 48.792.420,00
														0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			7. ITEMS DE INCLUSION																	
100	7,001	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 88.189,00		727,96	$ 88.189,00	$ 64.198.064,00				356,12	$ 31.405.867,00		356,12	$ 31.405.867,00	371,84	$ 32.792.198,00
101	7,002	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 122.135,00		792,57	$ 122.135,00	$ 96.800.537,00				328,40	$ 40.109.134,00		328,40	$ 40.109.134,00	464,17	$ 56.691.403,00
102	7,003	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 172.135,00		33,60	$ 172.135,00	$ 5.783.736,00				0,00	$ -		0,00	$ -	33,60	$ 5.783.736,00
103	7,004	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 351.631,00		88,70	$ 351.631,00	$ 31.189.670,00				0,00	$ -		0,00	$ -	88,70	$ 31.189.670,00
104	7,005	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$ 2.400,00		9059,81	$ 2.400,00	$ 21.743.544,00				2274,51	$ 5.458.824,00		2274,51	$ 5.458.824,00	6785,30	$ 16.284.720,00
105	7,006	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2		$ 3.740,00		1936,46	$ 3.740,00	$ 7.242.360,00				0,00	$ -		0,00	$ -	1936,46	$ 7.242.360,00
106	7,007	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 92.526,00		500,20	$ 92.526,00	$ 46.281.505,00				58,30	$ 5.394.266,00		58,30	$ 5.394.266,00	441,90	$ 40.887.239,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** **1/3/2026** **A** **31/3/2026**

Día/Mes/Año — Día/Mes/Año

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

JA**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO del Contrato N° COP 938 DE 2025

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) (Escriba el numero de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

0

CONSOLIDADO

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES									
											ACTA 1			PRESENTE ACTA		ACUMULADAS			SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	+ -	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
107	7,008	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3		$ 1.843.898,00		10,41	$ 1.843.898,00	$ 19.194.978,00				0,00	$ -		0,00	$ -	10,41	$ 19.194.978,00
108	7,009	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG		$ 10.811,00		165,20	$ 10.811,00	$ 1.785.977,00				0,00	$ -		0,00	$ -	165,20	$ 1.785.977,00
109	7,010	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG		$ 10.811,00		1,00	$ 10.811,00	$ 10.811,00				0,00	$ -		0,00	$ -	1,00	$ 10.811,00
110	7,011	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	UN		$ 656.068,00		341,00	$ 656.068,00	$ 223.719.188,00				0,00	$ -		0,00	$ -	341,00	$ 223.719.188,00
111	7,012	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$ 630.227,00		33,00	$ 630.227,00	$ 20.797.491,00				0,00	$ -		0,00	$ -	33,00	$ 20.797.491,00
112	7,013	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA).	UN		$ 47.561,00		14,00	$ 47.561,00	$ 665.854,00				0,00	$ -		0,00	$ -	14,00	$ 665.854,00
113	7,014	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 566.503,00		341,00	$ 566.503,00	$ 193.177.523,00				0,00	$ -		0,00	$ -	341,00	$ 193.177.523,00
114	7,015	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 114.367,00		451,00	$ 114.367,00	$ 51.579.517,00				0,00	$ -		0,00	$ -	451,00	$ 51.579.517,00
115	7,016	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3		$ 2.093.317,00		634,19	$ 2.093.317,00	$ 1.327.560.708,00				89,73	$ 187.833.334,00		89,73	$ 187.833.334,00	544,46	$ 1.139.727.374,00
116	7,017	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.881,00		8744,61	$ 4.881,00	$ 42.682.441,00				1281,73	$ 6.256.124,00		1281,73	$ 6.256.124,00	7462,88	$ 36.426.317,00
117	7,018	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN		$ 852.604,00		6,00	$ 852.604,00	$ 5.115.624,00				6,00	$ 5.115.624,00		6,00	$ 5.115.624,00	0,00	$ -
118	7,019	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN		$ 294.438,00		28,00	$ 294.438,00	$ 8.244.264,00				12,00	$ 3.533.256,00		12,00	$ 3.533.256,00	16,00	$ 4.711.008,00
119	7,020	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 100.003,00		9059,81	$ 100.003,00	$ 906.008.179,00				2272,24	$ 227.230.817,00		2272,24	$ 227.230.817,00	6787,57	$ 678.777.363,00
120	7,021	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 101.831,00		306,00	$ 101.831,00	$ 31.160.286,00				300,90	$ 30.640.948,00		300,90	$ 30.640.948,00	5,10	$ 519.338,00
121	7,022	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 159.155,00		2619,76	$ 159.155,00	$ 416.947.903,00				748,32	$ 119.098.870,00		748,32	$ 119.098.870,00	1871,44	$ 297.849.033,00
122	7,023	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.525,00		341,00	$ 299.525,00	$ 102.138.025,00				68,00	$ 20.367.700,00		68,00	$ 20.367.700,00	273,00	$ 81.770.325,00
123	7,024	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 116.431,00		38,00	$ 116.431,00	$ 4.424.378,00				34,00	$ 3.958.654,00		34,00	$ 3.958.654,00	4,00	$ 465.724,00
124	7,025	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN		$ 1.517.446,00		23,00	$ 1.517.446,00	$ 34.901.258,00				5,00	$ 7.587.230,00		5,00	$ 7.587.230,00	18,00	$ 27.314.028,00
125	7,026	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 294.664,00		2,00	$ 294.664,00	$ 589.328,00				0,00	$ -		0,00	$ -	2,00	$ 589.328,00
126	7,027	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.320.280,00		149,30	$ 2.320.280,00	$ 346.417.804,00				0,00	$ -		0,00	$ -	149,30	$ 346.417.804,00
127	7,028	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.544.307,00		2,00	$ 2.544.307,00	$ 5.088.614,00				0,00	$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.088.614,00
128	7,029	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.800.338,00		2,00	$ 2.800.338,00	$ 5.600.676,00				0,00	$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.600.676,00
129	7,030	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 14". ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.328.401,00		1,00	$ 3.328.401,00	$ 3.328.401,00				0,00	$ -		0,00	$ -	1,00	$ 3.328.401,00
130	7,031	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 16". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.800.458,00		34,50	$ 3.800.458,00	$ 131.115.801,00				0,00	$ -		0,00	$ -	34,50	$ 131.115.801,00
131	7,032	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 78.395,00		4593,68	$ 78.395,00	$ 360.121.544,00				496,76	$ 38.943.500,00		496,76	$ 38.943.500,00	4096,92	$ 321.178.043,00
132	7,033	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2		$ 4.749,00		9059,81	$ 4.749,00	$ 43.025.038,00				1281,73	$ 6.086.936,00		1281,73	$ 6.086.936,00	7778,08	$ 36.938.102,00
133	7,034	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 3.546,00		48,20	$ 3.546,00	$ 170.917,00				0,00	$ -		0,00	$ -	48,20	$ 170.917,00
134	7,035	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 10.058,00		14,00	$ 10.058,00	$ 140.812,00				0,00	$ -		0,00	$ -	14,00	$ 140.812,00
135	7,036	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML		$ 10.525,00		3979,34	$ 10.525,00	$ 41.882.554,00				422,80	$ 4.449.970,00		422,80	$ 4.449.970,00	3556,54	$ 37.432.584,00
136	7,037	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3		$ 198.532,00		64,08	$ 198.532,00	$ 12.721.931,00				0,00	$ -		0,00	$ -	64,08	$ 12.721.931,00
137	7,038	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 984.823,00		16,00	$ 984.823,00	$ 15.757.168,00				1,49	$ 1.467.386,00		1,49	$ 1.467.386,00	14,51	$ 14.289.782,00
138	7,039	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 7.459.739,00		5,00	$ 7.459.739,00	$ 37.298.695,00				0,00	$ -		0,00	$ -	5,00	$ 37.298.695,00
139	7,040	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN		$ 272.085,00		14,00	$ 272.085,00	$ 3.809.190,00				0,00	$ -		0,00	$ -	14,00	$ 3.809.190,00
140	7,041	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE		$ 2.474.248,00		14,00	$ 2.474.248,00	$ 34.639.472,00				10,00	$ 24.742.480,00		10,00	$ 24.742.480,00	4,00	$ 9.896.992,00
141	7,042	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24". ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.697.698,00		100,70	$ 5.697.698,00	$ 573.758.189,00				0,00	$ -		0,00	$ -	100,70	$ 573.758.189,00
142	7,043	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 257.553,00		1875,14	$ 257.553,00	$ 482.947.932,00				518,04	$ 133.422.756,00		518,04	$ 133.422.756,00	1357,10	$ 349.525.176,00
143	7,044	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3		$ 231.349,00		348,56	$ 231.349,00	$ 80.639.007,00				0,00	$ -		0,00	$ -	348,56	$ 80.639.007,00
144	7,045	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$ 10.108,00		2258,60	$ 10.108,00	$ 22.829.929,00				0,00	$ -		0,00	$ -	2258,60	$ 22.829.929,00
145	7,046	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2		$ 33.747,00		12148,62	$ 33.747,00	$ 409.979.479,00				2471,99	$ 83.422.247,00		2471,99	$ 83.422.247,00	9676,63	$ 326.557.233,00
146	7,047	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 4.152.501,00		4,00	$ 4.152.501,00	$ 16.610.004,00				0,00	$ -		0,00	$ -	4,00	$ 16.610.004,00
147	7,048	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.196,00		7958,68	$ 6.196,00	$ 49.311.981,00				0,00	$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 49.311.981,00
148	7,049	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 25.701,00		7958,68	$ 25.701,00	$ 204.546.035,00				0,00	$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 204.546.035,00
149	7,050	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 35.750,00		408,47	$ 35.750,00	$ 14.602.803,00				0,00	$ -		0,00	$ -	408,47	$ 14.602.803,00
150	7,051	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2		$ 191.703,00		510,64	$ 191.703,00	$ 97.891.220,00				0,00	$ -		0,00	$ -	510,64	$ 97.891.220,00
151	7,052	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 8.852,00		2830,00	$ 8.852,00	$ 25.051.160,00				0,00	$ -		0,00	$ -	2830,00	$ 25.051.160,00
152	7,053	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		$ 124.194,00		19,00	$ 124.194,00	$ 2.359.686,00				0,00	$ -		0,00	$ -	19,00	$ 2.359.686,00
153	7,054	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 26.513,00		54,00	$ 26.513,00	$ 1.431.702,00				0,00	$ -		0,00	$ -	54,00	$ 1.431.702,00
154	7,055	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	UN		$ 311.753,00		19,00	$ 311.753,00	$ 5.923.307,00				0,00	$ -		0,00	$ -	19,00	$ 5.923.307,00
155	7,056	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.096.615,00		1,00	$ 5.096.615,00	$ 5.096.615,00				0,00	$ -		0,00	$ -	1,00	$ 5.096.615,00
156	7,057	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 703.569,00		62,50	$ 703.569,00	$ 43.973.063,00				0,00	$ -		0,00	$ -	62,50	$ 43.973.063,00
157	7,058	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 425.516,00		35,50	$ 425.516,00	$ 15.105.818,00				0,00	$ -		0,00	$ -	35,50	$ 15.105.818,00
158	7,059	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		$ 27.170,00		1569,67	$ 27.170,00	$ 42.647.934,00				0,00	$ -		0,00	$ -	1569,67	$ 42.647.934,00
159	7,060	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIAMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML		$ 29.226,00		340,50	$ 29.226,00	$ 9.951.453,00				0,00	$ -		0,00	$ -	340,50	$ 9.951.453,00
160	7,061	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		$ 17.602,00		1910,17	$ 17.602,00	$ 33.622.812,00				0,00	$ -		0,00	$ -	1910,17	$ 33.622.812,00
														0,00	$ -		0,00	$ -		
			8. NO PREVISTOS																	
161	8,001	NP-01	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 14 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO.	M3		$ 1.385.170,00		5,00	$ 1.385.170,00	$ 6.925.850,00				0,00	$ -		0,00	$ -	5,00	$ 6.925.850,00
162	8,002	NP-02	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 282.325,00		1355,52	$ 282.325,00	$ 382.697.184,00				0,00	$ -		0,00	$ -	1355,52	$ 382.697.184,00
163	8,003	NP-03	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 77.819,00		9059,81	$ 77.819,00	$ 705.025.354,00				2272,24	$ 176.823.445,00		2272,24	$ 176.823.445,00	6787,57	$ 528.201.910,00
164	8,004	NP-04	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	M3		$ 476.745,00		2281,25	$ 476.745,00	$ 1.087.574.531,00				486,46	$ 231.917.373,00		486,46	$ 231.917.373,00	1794,79	$ 855.657.159,00
165	8,005	NP-05	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	M3		$ 19.423,00		94,00	$ 19.423,00	$ 1.825.762,00				0,00	$ -		0,00	$ -	94,00	$ 1.825.762,00
166	8,006	NP-06	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).	UN		$ 107.272,00		9059,81	$ 107.272,00	$ 971.863.938,00				1941,00	$ 208.214.952,00		1941,00	$ 208.214.952,00	7118,81	$ 763.648.986,00
167	8,007	NP-07	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML		$ 446.392,00		341,00	$ 446.392,00	$ 152.219.672,00				1,00	$ 446.392,00		1,00	$ 446.392,00	340,00	$ 151.773.280,00
168	8,008	NP-08	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacion)	UN		$ 360.064,00		341,00	$ 360.064,00	$ 122.781.824,00				1,00	$ 360.064,00		1,00	$ 360.064,00	340,00	$ 122.421.760,00
169	8,009	NP-09	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN		$ 162.297,00		341,00	$ 162.297,00	$ 55.343.277,00				6,00	$ 973.782,00		6,00	$ 973.782,00	335,00	$ 54.369.495,00
170	8,010	NP-10	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 657.822,00		137,00	$ 657.822,00	$ 90.121.614,00				76,90	$ 50.586.512,00		76,90	$ 50.586.512,00	60,10	$ 39.535.102,00
171	8,011	NP-11	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 14 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 744.157,00		4,00	$ 744.157,00	$ 2.976.628,00				0,00	$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.976.628,00
172	8,012	NP-12	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 16 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 795.331,00		1,00	$ 795.331,00	$ 795.331,00				0,00	$ -		0,00	$ -	1,00	$ 795.331,00
173	8,013	NP-13	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 896.388,00		49,75	$ 896.388,00	$ 44.595.303,00				0,00	$ -		0,00	$ -	49,75	$ 44.595.303,00
174	8,014	NP-14	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 974.773,00		62,50	$ 974.773,00	$ 60.923.313,00				0,00	$ -		0,00	$ -	62,50	$ 60.923.313,00
175	8,015	NP-15	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	UN		$ 269.294,00		24,00	$ 269.294,00	$ 6.463.056,00				7,00	$ 1.885.058,00		7,00	$ 1.885.058,00	17,00	$ 4.577.998,00
176	8,016	NP-16	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye taladro rotopercutor 3/4", planta eléctrica 4Kw).	UN		$ 76.124,00		11,00	$ 76.124,00	$ 837.364,00				0,00	$ -		0,00	$ -	11,00	$ 837.364,00
177	8,017	NP-17	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	UN		$ 180.006,00		9059,81	$ 180.006,00	$ 1.630.820.159,00				1941,00	$ 349.391.646,00		1941,00	$ 349.391.646,00	7118,81	$ 1.281.428.513,00
178	8,018	NP-18	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)	UN		$ 4.852.592,00		124,00	$ 4.852.592,00	$ 601.721.408,00				12,00	$ 58.231.104,00		12,00	$ 58.231.104,00	112,00	$ 543.490.304,00
179	8,019	NP-19	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML		$ 563.913,00		4,00	$ 563.913,00	$ 2.255.652,00				0,00	$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.255.652,00
180	8,020	NP-20	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalacion)	UN		$ 486.892,00		4,00	$ 486.892,00	$ 1.947.568,00				0,00	$ -		0,00	$ -	4,00	$ 1.947.568,00
181	8,021	NP-21	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80.	UN		$ 208.334,00		4,00	$ 208.334,00	$ 833.336,00				0,00	$ -		0,00	$ -	4,00	$ 833.334,00
182	8,022	NP-22	CONEXIONES KIT SILLA YEE 355 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 464.671,00		15,00	$ 464.671,00	$ 6.970.065,00				0,00	$ -		0,00	$ -	15,00	$ 6.970.065,00
183	8,023	NP-23	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIÓN, CON COLMATACIÓN SUPERIOR AL 30% Y DIÁMETROS DE 8" A 36" INCLUYE AGUA	ML		$ 661.727,00		86,80	$ 661.727,00	$ 57.437.904,00				0,00	$ -		0,00	$ -	86,80	$ 57.437.904,00
184	8,024	NP-24	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 400.192,00		170,75	$ 400.192,00	$ 68.332.784,00				16,10	$ 6.443.091,00		16,10	$ 6.443.091,00	154,65	$ 61.889.693,00
185	8,025	NP-25	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 223.645,00		2,00	$ 223.645,00	$ 447.290,00				0,00	$ -		0,00	$ -	2,00	$ 447.290,00
186	8,026	NP-26	PISO EN CONCRETO MR41 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 346.192,00		172,86	$ 346.192,00	$ 59.842.749,00				0,00	$ -		0,00	$ -	172,86	$ 59.842.749,00
187	8,027	NP-27	PISO EN CONCRETO 3000 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 318.979,00		580,92	$ 318.979,00	$ 185.301.281,00				0,00	$ -		0,00	$ -	580,92	$ 185.301.281,00
188	8,028	NP-28	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 262.519,00		1815,49	$ 262.519,00	$ 476.600.619,00				374,18	$ 98.229.359,00		374,18	$ 98.229.359,00	1441,31	$ 378.371.260,00
						TOTALES	**$ 16.532.066.661,00**			**$ 16.456.658.116,00**			**$ -**		**$ 2.687.699.472,00**			**$ 2.687.699.472,00**		**$ 13.768.958.644,00**

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CONTRATO No. CDP 998

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 **A** 31/3/2026

OBRA PUBLICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.896.208,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO del Contrato Nº CDP 998 DE 2025

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

CONSOLIDADO

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO DRO O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES									
											ACTA 1			PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES	ACTA No. 1	OBRA EJECUTADA		
					PRESENTE ACTA	ACUMULADOS	SALDOS
OBRA EJECUTADA							
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 12.264.241.580,23	$ 12.238.163.245,32		$ 1.998.735.365,00	$ 1.998.735.365,00	$ 10.239.427.880,32
ADMINISTRACIÓN	28,47%	$ 3.500.170.576,60	$ 3.484.205.075,95		$ 569.039.964,00	$ 569.039.964,00	$ 2.915.165.111,95
IMPREVISTO	1,00%	$ 122.342.416,80	$ 121.381.632,45		$ 19.987.354,00	$ 19.987.354,00	$ 101.394.278,45
UTILIDAD	5,00%	$ 614.712.079,37	$ 611.908.162,27		$ 99.936.769,00	$ 99.936.769,00	$ 511.971.393,27
SUBTOTAL A.I.U	34,47%	$ 4.237.225.074,77	$ 4.218.494.870,67		$ 688.964.087,00	$ 688.964.087,00	$ 3.528.530.783,67
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=34,47%)		**$ 16.532.066.661,00**	**$ 16.456.658.116,00**		**$ 2.687.699.472,00**	**$ 2.687.699.472,00**	**$ 13.768.958.664,00**
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL – SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES. SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (B) =	**12,3754%**	**$ 1.521.504.516,00**	**$ 1.521.504.516,00**		**$ 247.371.466,00**	**$ 247.371.466,00**	**$ 1.274.213.030,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA). SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (C) =	**2,3218%**	**$ 285.447.701,00**	**$ 285.447.701,00**	**$ 285.447.701,00**		**$ 285.447.701,00**	**$ -**
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES) (E) = (A) + (B) + (C) =		**$ 18.339.099.878,00**	**$ 18.263.690.333,00**				
OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS		**$ 1.306.787.330,00**	**$ 1.382.195.875,00**			**$ -**	**$ 1.382.195.875,00**
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**30,000%**	**$ 5.893.765.862,00**	**$ 5.893.765.862,00**	**$ 85.634.310,00**	**$ 880.521.207,00**	**$ 966.155.597,00**	**$ 4.927.610.265,00**
(K) COSTO TOTAL MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (F)+(G)		**$ 19.645.896.208,00**	**$ 19.645.896.208,00**	**$ 285.447.701,00**	**$ 2.935.070.966,00**	**$ 3.220.518.659,00**	**$ 16.425.367.549,00**
VALOR PAGAR AMORTIZANDO ANTICIPO				**$ 199.813.391,00**	**$ 2.054.549.471,00**	**$ 2.254.363.862,00**	**$ 16.425.367.549,00**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El Interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UNO (31) días del mes de MARZO de 2026

JOTAM MAESTRE DIAS
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** **1/3/2026** (Día/Mes/Año) **A** **31/3/2026** (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8009556 - CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
			1. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
1	1,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8195.34	$ 1.142.00	$ 9.359.080.00	10212.16	$ 1.142.00	$ 11.662.287.00	504.60	$ 576.253.00		504.60	$ 576.253.00	9707.56	$ 11.086.034.00
2	1,002	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1375,79	$ 48.679,00	$ 66.972.081,00	1359,01	$ 48.679,00	$ 66.155.248,00		$ -		0,00	$ -	1359,01	$ 66.155.248,00
3	1,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5859.32	$ 7.206.00	$ 42.222.260.00	4763.20	$ 7.206.00	$ 34.323.619.00	330.33	$ 2.380.358.00		330.33	$ 2.380.358.00	4432.87	$ 31.943.261.00
4	1,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1100,00	$ 57.240,00	$ 62.964.000,00	6192,47	$ 57.240,00	$ 354.456.983,00	636,86	$ 36.453.866,00		636,86	$ 36.453.866,00	5555,61	$ 318.003.116,00
5	1,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4566,07	$ 73.056,00	$ 333.578.810,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
6	1,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9171,92	$ 16.517,00	$ 151.492.603,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
7	1,007	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4141,23	$ 235.794,00	$ 976.477.187,00	0,00	$ 235.794,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
8	1,008	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1200,00	$ 220.890,00	$ 265.068.000,00	0,00	$ 220.890,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
9	1,009	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 213.572,00	$ 616.219.292,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
10	1,010	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 205.221,00	$ 592.124.151,00	0,00	$ 205.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
11	1,011	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	545,12	$ 1.757.344,00	$ 957.963.361,00	0,00	$ 1.757.344,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
12	1,012	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	545,12	$ 1.953.442,00	$ 1.064.860.303,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
13	1,013	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.003,00	$ 38.316.276,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
14	1,014	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.877,00	$ 46.682.108,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
15	1,015	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3930,17	$ 22.817,00	$ 89.674.689,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
16	1,016	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	66,00	$ 228.161,00	$ 15.058.626,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
17	1,017	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	1420,00	$ 190.133,00	$ 269.988.860,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
18	1,018	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1095,38	$ 1.712.945,00	$ 1.876.325.694,00	442,61	$ 1.712.945,00	$ 758.166.586,00		$ -		0,00	$ -	442,61	$ 758.166.586,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			2. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
19	2,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6603.57	$ 1.142.00	$ 7.541.277.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
20	2,002	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1320,71	$ 234.955,00	$ 310.307.418,00	148,00	$ 234.955,00	$ 34.773.340,00	73,46	$ 17.259.794,00		73,46	$ 17.259.794,00	74,54	$ 17.513.546,00
21	2,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4406.02	$ 7.206.00	$ 31.749.780.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
22	2,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	6603,57	$ 57.240,00	$ 377.988.347,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
23	2,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	600,00	$ 73.056,00	$ 43.833.600,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
24	2,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2200,00	$ 16.517,00	$ 36.337.400,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
25	2,007	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2203,01	$ 220.757,00	$ 486.329.879,00	0,00	$ 220.757,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
26	2,008	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	700,00	$ 208.805,00	$ 146.163.500,00	0,00	$ 208.805,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
27	2,009	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 240.902,00	$ 264.992.200,00	0,00	$ 240.902,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
28	2,010	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 242.117,00	$ 266.328.700,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
29	2,011	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	1234,31	$ 488.707,00	$ 603.215.937,00	0,00	$ 488.707,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
30	2,012	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	1320,71	$ 7.018,00	$ 9.268.743,00	0,00	$ 7.018,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
31	2,013	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2311.25	$ 13.278.00	$ 30.688.778.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
32	2,014	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	23772,85	$ 10.549,00	$ 250.779.795,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
33	2,015	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	330,18	$ 9.221,00	$ 3.044.590,00	0,00	$ 9.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
34	2,016	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	6603.57	$ 3.206.00	$ 21.171.045.00	0.00	$ 3.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
35	2,017	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	2905,57	$ 17.296,00	$ 50.254.739,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
36	2,018	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2905,57	$ 3.338,00	$ 9.698.793,00	248,00	$ 3.338,00	$ 827.824,00		$ -		0,00	$ -	248,00	$ 827.824,00
37	2,019	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	2829,63	$ 22.817,00	$ 64.563.668,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
38	2,020	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	19,00	$ 228.161,00	$ 4.335.059,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
39	2,021	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	180,00	$ 190.133,00	$ 34.223.940,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			3. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
40	3,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3253.08	$ 1.142.00	$ 3.715.017.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
41	3,002	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	8,13	$ 371.818,00	$ 3.022.880,00	0,00	$ 371.818,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
42	3,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	162.65	$ 7.206.00	$ 1.172.056.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
43	3,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	275,97	$ 57.240,00	$ 15.796.523,00	0,00	$ 57.240,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
44	3,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	81,33	$ 73.056,00	$ 5.941.644,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
45	3,006	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	1382,56	$ 9.347,00	$ 12.922.788,00	0,00	$ 9.347,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
46	3,007	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	162,65	$ 248.800,00	$ 40.467.320,00	0,00	$ 248.800,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
47	3,008	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	80,00	$ 213.572,00	$ 17.085.760,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
48	3,009	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	195,18	$ 1.712.945,00	$ 334.332.605,00	0,00	$ 1.712.945,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
49	3,010	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	81,33	$ 1.953.442,00	$ 158.873.438,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
50	3,011	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.003,00	$ 5.534.388,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
51	3,012	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.877,00	$ 6.742.745,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
52	3,013	4758	SELLO DE FISURAS	ML	800.00	$ 11.144.00	$ 8.915.200.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
53	3,014	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	487.96	$ 13.037.00	$ 6.361.535.00	0.00	$ 13.037.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
54	3,015	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	25,00	$ 131.419,00	$ 3.285.475,00	2,00	$ 131.419,00	$ 262.838,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 262.838,00
55	3,016	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	140,00	$ 131.419,00	$ 18.398.660,00	0,00	$ 131.419,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			4. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
56	4,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3672.96	$ 1.142.00	$ 4.194.520.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
57	4,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	459.12	$ 58.217.00	$ 26.728.589.00	0.00	$ 58.217.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
58	4,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	619,81	$ 57.240,00	$ 35.477.924,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
59	4,004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	252,52	$ 73.056,00	$ 18.447.809,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
60	4,005	3486	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	550,94	$ 234.955,00	$ 129.447.048,00	0,00	$ 234.955,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
61	4,006	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	206.60	$ 248.800.00	$ 51.402.080.00	0.00	$ 248.800.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
62	4,007	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	68,87	$ 242.117,00	$ 16.674.598,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
63	4,008	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m	M2	550,94	$ 464.229,00	$ 255.764.182,00	0,00	$ 464.229,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
64	4,009	3708	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	9182.40	$ 7.018.00	$ 64.442.083.00	0.00	$ 7.018.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
65	4,010	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	4591.20	$ 13.278.00	$ 60.961.954.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
66	4,011	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1836,48	$ 10.549,00	$ 19.373.028,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
67	4,012	4758	SELLO DE FISURAS	ML	100.00	$ 11.144.00	$ 1.114.400.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
68	4,013	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1616,10	$ 17.296,00	$ 27.952.107,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
69	4,014	3723	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	10.65	$ 131.419.00	$ 1.399.612.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
70	4,015	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	20.94	$ 131.419.00	$ 2.751.914.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
71	4,016	3434	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	20,00	$ 97.222,00	$ 1.944.440,00	0,00	$ 97.222,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
72	4,017	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	20,00	$ 90.021,00	$ 1.800.420,00	0,00	$ 90.021,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			5. MANTENIMIENTO PERIODICO EN ANDEN DE CONCRETO														
73	5,001	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	2683,78	$ 10.370,00	$ 27.830.799,00	3088,81	$ 10.370,00	$ 32.030.960,00		$ -		0,00	$ -	3088,81	$ 32.030.960,00
74	5,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	268.38	$ 58.217.00	$ 15.624.278.00	542.24	$ 58.217.00	$ 31.567.586.00		$ -		0.00	$ -	542.24	$ 31.567.586.00
75	5,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	536,76	$ 57.240,00	$ 30.724.142,00	2260,66	$ 57.240,00	$ 129.400.178,00		$ -		0,00	$ -	2260,66	$ 129.400.178,00
76	5,004	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	268,38	$ 392.394,00	$ 105.310.702,00	0,00	$ 392.394,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
77	5,005	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	2683,78	$ 105.225,00	$ 282.400.751,00	73,00	$ 105.225,00	$ 7.681.425,00		$ -		0,00	$ -	73,00	$ 7.681.425,00
78	5,006	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	89.46	$ 1.212.741.00	$ 108.491.810.00	0.00	$ 1.212.741.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
79	5,007	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO). INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS	M2	2236,48	$ 165.385,00	$ 369.880.245,00	0,00	$ 165.385,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
80	5,008	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO	UN	20,00	$ 2.082.959,00	$ 41.659.180,00	0,00	$ 2.082.959,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
81	5,009	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	2236,48	$ 145.068,00	$ 324.441.681,00	0,00	$ 145.068,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
82	5,010	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO)	ML	4472,97	$ 78.310,00	$ 350.278.281,00	10,00	$ 78.310,00	$ 783.100,00		$ -		0,00	$ -	10,00	$ 783.100,00
83	5,011	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	4472,97	$ 102.949,00	$ 460.487.789,00	1533,10	$ 102.949,00	$ 157.831.112,00		$ -		0,00	$ -	1533,10	$ 157.831.112,00
84	5,012	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	6262,15	$ 86.663,00	$ 542.696.705,00	529,68	$ 86.663,00	$ 45.903.658,00		$ -		0,00	$ -	529,68	$ 45.903.658,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			6. REDES														
85	6,001	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5808,47	$ 58.217,00	$ 338.151.698,00	3657,45	$ 58.217,00	$ 212.925.767,00	83,28	$ 4.848.312,00		83,28	$ 4.848.312,00	3574,17	$ 208.077.455,00
86	6,002	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1452,12	$ 73.056,00	$ 106.086.079,00	4754,66	$ 73.056,00	$ 347.356.441,00		$ -		0,00	$ -	4754,66	$ 347.356.441,00
87	6,003	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4356,35	$ 49.220,00	$ 214.419.547,00	37,00	$ 49.220,00	$ 1.821.140,00	31,57	$ 1.553.875,00		31,57	$ 1.553.875,00	5,43	$ 267.265,00
88	6,004	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	217,82	$ 209.827,00	$ 45.704.517,00	886,54	$ 209.827,00	$ 186.020.029,00	37,72	$ 7.914.674,00		37,72	$ 7.914.674,00	848,82	$ 178.105.354,00
89	6,005	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	653,45	$ 125.986,00	$ 82.325.552,00	0,00	$ 125.986,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
90	6,006	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	72,61	$ 268.758,00	$ 19.514.518,00	0,00	$ 268.758,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
91	6,007	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	435,64	$ 195.195,00	$ 85.034.750,00	43,00	$ 195.195,00	$ 8.393.385,00	11,66	$ 2.275.974,00		11,66	$ 2.275.974,00	31,34	$ 6.117.411,00
92	6,008	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	40,00	$ 2.379.851,00	$ 95.194.040,00	56,00	$ 2.379.851,00	$ 133.271.656,00	2,00	$ 4.759.702,00		2,00	$ 4.759.702,00	54,00	$ 128.511.954,00
93	6,009	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	280,00	$ 928.646,00	$ 260.020.880,00	82,00	$ 928.646,00	$ 76.148.972,00	2,47	$ 2.293.756,00		2,47	$ 2.293.756,00	79,53	$ 73.855.216,00
94	6,010	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	40,00	$ 170.695,00	$ 6.827.800,00	65,00	$ 170.695,00	$ 11.095.175,00		$ -		0,00	$ -	65,00	$ 11.095.175,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/3/2026 (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8009556 - CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
95	6,011	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	295,20	$ 180.628,00	$ 53.321.386,00	0,00	$ 180.628,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
96	6,012	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190,41	$ 528.764,00	$ 100.681.953,00	23,35	$ 528.764,00	$ 12.346.639,00		$ -		0,00	$ -	23,35	$ 12.346.639,00
97	6,013	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3310,80	$ 46.883,00	$ 155.220.236,00	0,00	$ 46.883,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
98	6,014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1744,93	$ 221.771,00	$ 386.974.871,00	378,50	$ 221.771,00	$ 83.940.324,00	84,10	$ 18.650.941,00		84,10	$ 18.650.941,00	294,40	$ 65.289.382,00
99	6,015	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	60,00	$ 535.886,00	$ 32.153.160,00	165,50	$ 535.886,00	$ 88.689.133,00		$ -		0,00	$ -	165,50	$ 88.689.133,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			7. ITEMS DE INCLUSION														
100	7,001	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 88.189,00		727,96	$ 88.189,00	$ 64.198.064,00	57,15	$ 5.040.001,00		57,15	$ 5.040.001,00	670,81	$ 59.158.063,00
101	7,002	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 122.135,00		792,57	$ 122.135,00	$ 96.800.537,00	85,50	$ 10.442.543,00		85,50	$ 10.442.543,00	707,07	$ 86.357.994,00
102	7,003	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 172.135,00		33,60	$ 172.135,00	$ 5.783.736,00		$ -		0,00	$ -	33,60	$ 5.783.736,00
103	7,004	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 351.631,00		88,70	$ 351.631,00	$ 31.189.670,00		$ -		0,00	$ -	88,70	$ 31.189.670,00
104	7,005	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$ 2.400.00		9059.81	$ 2.400.00	$ 21.743.544.00	363.34	$ 872.016.00		363.34	$ 872.016.00	8696.47	$ 20.871.528.00
105	7,006	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2		$ 3.740.00		1936.46	$ 3.740.00	$ 7.242.360.00		$ -		0.00	$ -	1936.46	$ 7.242.360.00
106	7,007	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 92.526,00		500,20	$ 92.526,00	$ 46.281.505,00		$ -		0,00	$ -	500,20	$ 46.281.505,00
107	7,008	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3		$ 1.843.898,00		10,41	$ 1.843.898,00	$ 19.194.978,00		$ -		0,00	$ -	10,41	$ 19.194.978,00
108	7,009	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		165,20	$ 10.811,00	$ 1.785.977,00		$ -		0,00	$ -	165,20	$ 1.785.977,00
109	7,010	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		1,00	$ 10.811,00	$ 10.811,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 10.811,00
110	7,011	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	UN		$ 656.068,00		341,00	$ 656.068,00	$ 223.719.188,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 223.719.188,00
111	7,012	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$ 630.227,00		33,00	$ 630.227,00	$ 20.797.491,00		$ -		0,00	$ -	33,00	$ 20.797.491,00
112	7,013	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA)	UN		$ 47.561,00		14,00	$ 47.561,00	$ 665.854,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 665.854,00
113	7,014	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 566.503.00		341.00	$ 566.503.00	$ 193.177.523.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 193.177.523.00
114	7,015	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 114.367.00		451.00	$ 114.367.00	$ 51.579.517.00		$ -		0.00	$ -	451.00	$ 51.579.517.00
115	7,016	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3		$ 2.093.317,00		634,19	$ 2.093.317,00	$ 1.327.560.708,00		$ -		0,00	$ -	634,19	$ 1.327.560.708,00
116	7,017	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.881,00		8744,61	$ 4.881,00	$ 42.682.441,00		$ -		0,00	$ -	8744,61	$ 42.682.441,00
117	7,018	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN		$ 852.604,00		6,00	$ 852.604,00	$ 5.115.624,00	1,00	$ 852.604,00		1,00	$ 852.604,00	5,00	$ 4.263.020,00
118	7,019	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN		$ 294.438.00		28.00	$ 294.438.00	$ 8.244.264.00	2.00	$ 588.876.00		2.00	$ 588.876.00	26.00	$ 7.655.388.00
119	7,020	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 100.003,00		9059,81	$ 100.003,00	$ 906.008.179,00	363,34	$ 36.335.090,00		363,34	$ 36.335.090,00	8696,47	$ 869.673.089,00
120	7,021	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 101.831.00		306.00	$ 101.831.00	$ 31.160.286.00	86.80	$ 8.838.931.00		86.80	$ 8.838.931.00	219.20	$ 22.321.355.00
121	7,022	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 159.155,00		2619,76	$ 159.155,00	$ 416.947.903,00	222,96	$ 35.485.199,00		222,96	$ 35.485.199,00	2396,80	$ 381.462.704,00
122	7,023	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.525,00		341,00	$ 299.525,00	$ 102.138.025,00	12,00	$ 3.594.300,00		12,00	$ 3.594.300,00	329,00	$ 98.543.725,00
123	7,024	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 116.431,00		38,00	$ 116.431,00	$ 4.424.378,00	5,00	$ 582.155,00		5,00	$ 582.155,00	33,00	$ 3.842.223,00
124	7,025	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN		$ 1.517.446,00		23,00	$ 1.517.446,00	$ 34.901.258,00	2,00	$ 3.034.892,00		2,00	$ 3.034.892,00	21,00	$ 31.866.366,00
125	7,026	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 294.664,00		2,00	$ 294.664,00	$ 589.328,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 589.328,00
126	7,027	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.320.280,00		149,30	$ 2.320.280,00	$ 346.417.804,00		$ -		0,00	$ -	149,30	$ 346.417.804,00
127	7,028	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.544.307,00		2,00	$ 2.544.307,00	$ 5.088.614,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.088.614,00
128	7,029	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.800.338,00		2,00	$ 2.800.338,00	$ 5.600.676,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.600.676,00
129	7,030	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 14". ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.328.401,00		1,00	$ 3.328.401,00	$ 3.328.401,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 3.328.401,00
130	7,031	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 16". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.800.458,00		34,50	$ 3.800.458,00	$ 131.115.801,00		$ -		0,00	$ -	34,50	$ 131.115.801,00
131	7,032	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 78.395,00		4593,68	$ 78.395,00	$ 360.121.544,00	279,33	$ 21.898.075,00		279,33	$ 21.898.075,00	4314,35	$ 338.223.468,00
132	7,033	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.749,00		9059,81	$ 4.749,00	$ 43.025.038,00		$ -		0,00	$ -	9059,81	$ 43.025.038,00
133	7,034	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 3.546.00		48.20	$ 3.546.00	$ 170.917.00		$ -		0.00	$ -	48.20	$ 170.917.00
134	7,035	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 10.058.00		14.00	$ 10.058.00	$ 140.812.00		$ -		0.00	$ -	14.00	$ 140.812.00
135	7,036	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	ML		$ 10.525,00		3979,34	$ 10.525,00	$ 41.882.554,00		$ -		0,00	$ -	3979,34	$ 41.882.554,00
136	7,037	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3		$ 198.532,00		64,08	$ 198.532,00	$ 12.721.931,00		$ -		0,00	$ -	64,08	$ 12.721.931,00
137	7,038	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 984.823.00		16.00	$ 984.823.00	$ 15.757.168.00		$ -		0.00	$ -	16.00	$ 15.757.168.00
138	7,039	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 7.459.739,00		5,00	$ 7.459.739,00	$ 37.298.695,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 37.298.695,00
139	7,040	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN		$ 272.085,00		14,00	$ 272.085,00	$ 3.809.190,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 3.809.190,00
140	7,041	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE		$ 2.474.248,00		14,00	$ 2.474.248,00	$ 34.639.472,00	2,00	$ 4.948.496,00		2,00	$ 4.948.496,00	12,00	$ 29.690.976,00
141	7,042	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24". ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.697.698,00		100,70	$ 5.697.698,00	$ 573.758.189,00		$ -		0,00	$ -	100,70	$ 573.758.189,00
142	7,043	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 257.553,00		1875,14	$ 257.553,00	$ 482.947.932,00	72,67	$ 18.716.377,00		72,67	$ 18.716.377,00	1802,47	$ 464.231.556,00
143	7,044	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3		$ 231.349,00		348,56	$ 231.349,00	$ 80.639.007,00		$ -		0,00	$ -	348,56	$ 80.639.007,00
144	7,045	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$ 10.108,00		2258,60	$ 10.108,00	$ 22.829.929,00		$ -		0,00	$ -	2258,60	$ 22.829.929,00
145	7,046	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 33.747,00		12148,62	$ 33.747,00	$ 409.979.479,00	405,39	$ 13.680.696,00		405,39	$ 13.680.696,00	11743,23	$ 396.298.783,00
146	7,047	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 4.152.501,00		4,00	$ 4.152.501,00	$ 16.610.004,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 16.610.004,00
147	7,048	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.196.00		7958.68	$ 6.196.00	$ 49.311.981.00		$ -		0.00	$ -	7958.68	$ 49.311.981.00
148	7,049	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML		$ 25.701,00		7958,68	$ 25.701,00	$ 204.546.035,00		$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 204.546.035,00
149	7,050	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 35.750.00		408.47	$ 35.750.00	$ 14.602.803.00		$ -		0.00	$ -	408.47	$ 14.602.803.00
150	7,051	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2		$ 191.703,00		510,64	$ 191.703,00	$ 97.891.220,00		$ -		0,00	$ -	510,64	$ 97.891.220,00
151	7,052	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 8.852.00		2830.00	$ 8.852.00	$ 25.051.160.00		$ -		0.00	$ -	2830.00	$ 25.051.160.00
152	7,053	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 124.194,00		19,00	$ 124.194,00	$ 2.359.686,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 2.359.686,00
153	7,054	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 26.513.00		54.00	$ 26.513.00	$ 1.431.702.00		$ -		0.00	$ -	54.00	$ 1.431.702.00
154	7,055	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	UN		$ 311.753,00		19,00	$ 311.753,00	$ 5.923.307,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 5.923.307,00
155	7,056	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.096.615,00		1,00	$ 5.096.615,00	$ 5.096.615,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 5.096.615,00
156	7,057	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 703.569,00		62,50	$ 703.569,00	$ 43.973.063,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 43.973.063,00
157	7,058	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 425.516,00		35,50	$ 425.516,00	$ 15.105.818,00		$ -		0,00	$ -	35,50	$ 15.105.818,00
158	7,059	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		$ 27.170,00		1569,67	$ 27.170,00	$ 42.647.934,00		$ -		0,00	$ -	1569,67	$ 42.647.934,00
159	7,060	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML		$ 29.226,00		340,50	$ 29.226,00	$ 9.951.453,00		$ -		0,00	$ -	340,50	$ 9.951.453,00
160	7,061	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		$ 17.602,00		1910,17	$ 17.602,00	$ 33.622.812,00		$ -		0,00	$ -	1910,17	$ 33.622.812,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			8. NO PREVISTOS														
161	8,001	NP-1	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 14 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO)	M3		$ 1.385.170,00		5,00	$ 1.385.170,00	$ 6.925.850,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 6.925.850,00
162	8,002	NP-2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 282.325,00		1355,52	$ 282.325,00	$ 382.697.184,00		$ -		0,00	$ -	1355,52	$ 382.697.184,00
163	8,003	NP-3	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 77.819.00		9059.81	$ 77.819.00	$ 705.025.354.00	363.34	$ 28.274.755.00		363.34	$ 28.274.755.00	8696.47	$ 676.750.599.00
164	8,004	NP-4	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	M3		$ 476.745,00		2281,25	$ 476.745,00	$ 1.087.574.531,00	72,08	$ 34.363.780,00		72,08	$ 34.363.780,00	2209,17	$ 1.053.210.752,00
165	8,005	NP-5	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	M3		$ 19.423,00		94,00	$ 19.423,00	$ 1.825.762,00		$ -		0,00	$ -	94,00	$ 1.825.762,00
166	8,006	NP-6	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%)	UN		$ 107.272,00		9059,81	$ 107.272,00	$ 971.863.938,00	338,00	$ 36.257.936,00		338,00	$ 36.257.936,00	8721,81	$ 935.606.002,00
167	8,007	NP-7	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	ML		$ 446.392,00		341,00	$ 446.392,00	$ 152.219.672,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 152.219.672,00
168	8,008	NP-8	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacíon)	UN		$ 360.064.00		341.00	$ 360.064.00	$ 122.781.824.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 122.781.824.00
169	8,009	NP-9	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN		$ 162.297.00		341.00	$ 162.297.00	$ 55.343.277.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 55.343.277.00
170	8,010	NP-10	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 657.822,00		137,00	$ 657.822,00	$ 90.121.614,00	37,80	$ 24.865.672,00		37,80	$ 24.865.672,00	99,20	$ 65.255.942,00
171	8,011	NP-11	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 14 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 744.157,00		4,00	$ 744.157,00	$ 2.976.628,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.976.628,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 338

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Fecha Inicio) **A** 31/3/2026 (Fecha Fin)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Indique el objeto del contrato de la operación suscrita)

VALOR ACTUAL DEL $ 19.645.886.208,00 (Escriba el número y cada cifra del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS (Escriba el número y cada cifra del interventor, y el nombre de la entidad de interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRETANCHO (Escriba el nombre del supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS (Escriba del representante legal de la firma interventora)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 338 DE 2025 (Escriba el número del contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8059556 - CARRERA 77V ENTRE CALLE 49B SUR Y CALLE 47A SUR

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES							
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO		
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
172	8,012	NP-12	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 16 PULGADAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 795.331,00		1,00	$ 795.331,00	$ 795.331,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 795.331,00
173	8,013	NP-13	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 896.388,00		49,75	$ 896.388,00	$ 44.595.303,00		$ -		0,00	$ -	49,75	$ 44.595.303,00
174	8,014	NP-14	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 974.773,00		62,50	$ 974.773,00	$ 60.923.313,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 60.923.313,00
175	8,015	NP-15	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	UN		$ 269.294,00		24,00	$ 269.294,00	$ 6.463.056,00	2,00	$ 538.588,00		2,00	$ 538.588,00	22,00	$ 5.924.468,00
176	8,016	NP-16	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye taladro rotopercutor 3/4", planta electrica 6Kw)	UN		$ 76.124,00		11,00	$ 76.124,00	$ 837.364,00		$ -		0,00	$ -	11,00	$ 837.364,00
177	8,017	NP-17	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, EJECUTIVE BROCAS, PREBARRO Y COMBUSTIBLE)	UN		$ 180.006,00		9059,81	$ 180.006,00	$ 1.630.820.159,00	338,00	$ 60.842.028,00		338,00	$ 60.842.028,00	8721,81	$ 1.569.978.131,00
178	8,018	NP-18	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO,INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)	UN		$ 4.852.592,00		124,00	$ 4.852.592,00	$ 601.721.408,00	2,00	$ 9.705.184,00		2,00	$ 9.705.184,00	122,00	$ 592.016.224,00
179	8,019	NP-19	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML		$ 563.913,00		4,00	$ 563.913,00	$ 2.255.652,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.255.652,00
180	8,020	NP-20	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalación)	UN		$ 486.892,00		4,00	$ 486.892,00	$ 1.947.568,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 1.947.568,00
181	8,021	NP-21	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X80	UN		$ 208.334,00		4,00	$ 208.334,00	$ 833.336,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 833.336,00
182	8,022	NP-22	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 464.671,00		15,00	$ 464.671,00	$ 6.970.065,00		$ -		0,00	$ -	15,00	$ 6.970.065,00
183	8,023	NP-23	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIÓN, CON COLMATACIÓN SUPERIOR AL 30% Y DIÁMETROS DE 8" A 36" INCLUYE ACCIÓ	ML		$ 661.727,00		86,80	$ 661.727,00	$ 57.437.904,00		$ -		0,00	$ -	86,80	$ 57.437.904,00
184	8,024	NP-24	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN.	ML		$ 400.192,00		170,75	$ 400.192,00	$ 68.332.784,00	4,50	$ 1.800.864,00		4,50	$ 1.800.864,00	166,25	$ 66.531.920,00
185	8,025	NP-25	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 223.645,00		2,00	$ 223.645,00	$ 447.290,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 447.290,00
186	8,026	NP-26	PISO EN CONCRETO MR45 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR,BASE,CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 346.192,00		172,86	$ 346.192,00	$ 59.842.749,00		$ -		0,00	$ -	172,86	$ 59.842.749,00
187	8,027	NP-27	PISO EN CONCRETO 3000 ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR,BASE,CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 318.979,00		580,92	$ 318.979,00	$ 185.301.281,00		$ -		0,00	$ -	580,92	$ 185.301.281,00
188	8,028	NP-28	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (A6 , IE(38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 262.519,00		1815,49	$ 262.519,00	$ 476.600.619,00	55,44	$ 14.554.053,00		55,44	$ 14.554.053,00	1760,05	$ 462.046.566,00
				TOTALES			$ 16.832.066.661,00			$ 16.456.656.116,00		$ 475.080.616,00			$ 475.080.616,00		$ 15.981.577.499,00

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES	OBRA EJECUTADA		
				PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
OBRA EJECUTADA						
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 12.294.241.586,25	$ 12.238.163.245,35	$ 353.298.591,51		$ 353.298.591,51
ADMINISTRACIÓN	28,47%	$ 3.500.170.579,60	$ 3.484.205.075,95	$ 100.584.109,00		$ 100.584.109,00
IMPREVISTO	1,00%	$ 122.942.415,86	$ 122.381.632,45	$ 3.532.985,92		$ 3.532.985,92
UTILIDAD	5,00%	$ 614.712.079,31	$ 611.908.162,27	$ 17.664.929,58		$ 17.664.929,58
SUBTOTAL A.I.U	34,47%	$ 4.237.825.074,77	$ 4.218.494.870,67	$ 121.782.024,50		$ 121.782.024,50
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=34,47%)		**$ 16.532.066.661,00**	**$ 16.456.658.116,00**	**$ 475.080.616,00**		**$ 475.080.616,00**
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES. SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (B) =	**12,3764%**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 43.725.647,00**		**$ 43.725.647,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA). SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (C) =	**2,3210%**	**$ 285.447.701,00**	**$ 285.447.701,00**	$ -	$ -	
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES) (E) = (A) + (B) + (C) =		**$ 18.339.098.878,00**	**$ 18.339.098.878,00**		$ -	
OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS		**$ 1.306.787.330,00**	**$ 1.302.195.875,00**			
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**30,000%**	**$ 5.893.765.862,00**		$ -	$ -	
(K) COSTO TOTAL MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (F)+(G)		**$ 19.645.886.208,00**	**$ 19.645.886.208,00**		$ -	
VALOR A PAGAR CIV				$ 518.806.263,00		$ 518.806.263,00

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de MARZO (Mes en (para los Textos en letras) de 2026 (año en Texto en letras)

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
replanteo de segmento vial			84,10	6,00					504,60
	planimetria y altimetria inicial								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									504,60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									504,60
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

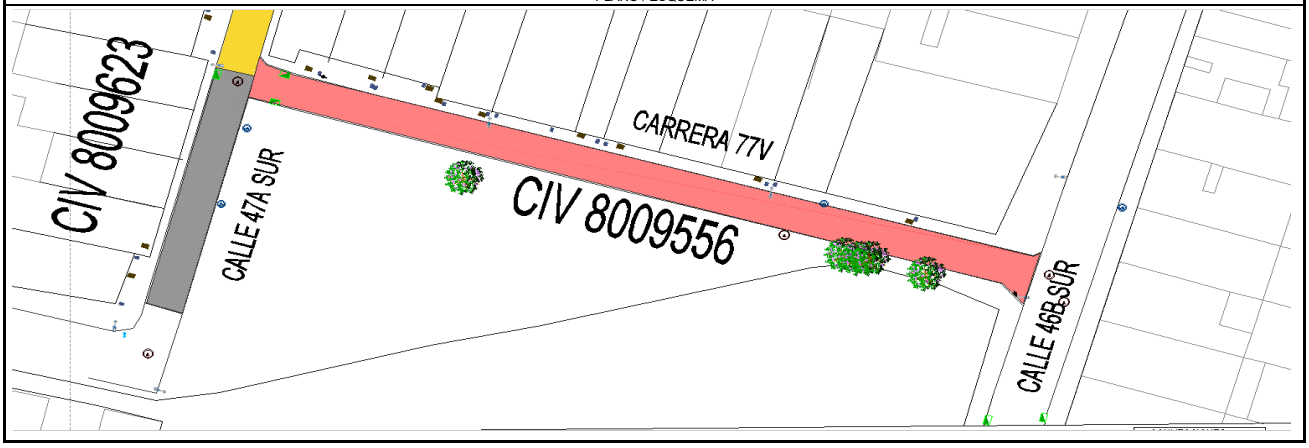

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
excavacion mecanica estructura de via									
	caja de via		84,10	4,40	0,290				107,17
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,291			-1,00	-0,66
	sumideros existentes	area	0,25		0,291			-2,00	-0,14
excavacion mecanica REDES - SANITARIA									
	NC6 - SANITARIO		85,00	1,00	1,59				135,47
	se anexa cartera topografica								
excavacion mecanica REDES - PLUVIAL									
	NC6 - PLUVIAL TR 1		5,30	1,00	1,70				9,02
	se anexa cartera topografica								
	NC6 - PLUVIAL TR 2		33,65	0,90	2,30				69,51
	se anexa cartera topografica								
excavacion mecanica para pozos PLUVIAL									
	NC6 - PLUVIAL TR 1	cota subrasante	cota clave	cota fondo	alt corte	diametro excva	area excavac		
	PMP38096-A	2538,26	2537,39	2536,74	1,52	2,25	3,98		6,06
	NC6 - PLUVIAL TR 2								
	PMP38096-B	2538,10	2537,77	2537,12	0,98	2,25	3,98		3,91
	se anexa cartera topografica								

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	330,33
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	330,33
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

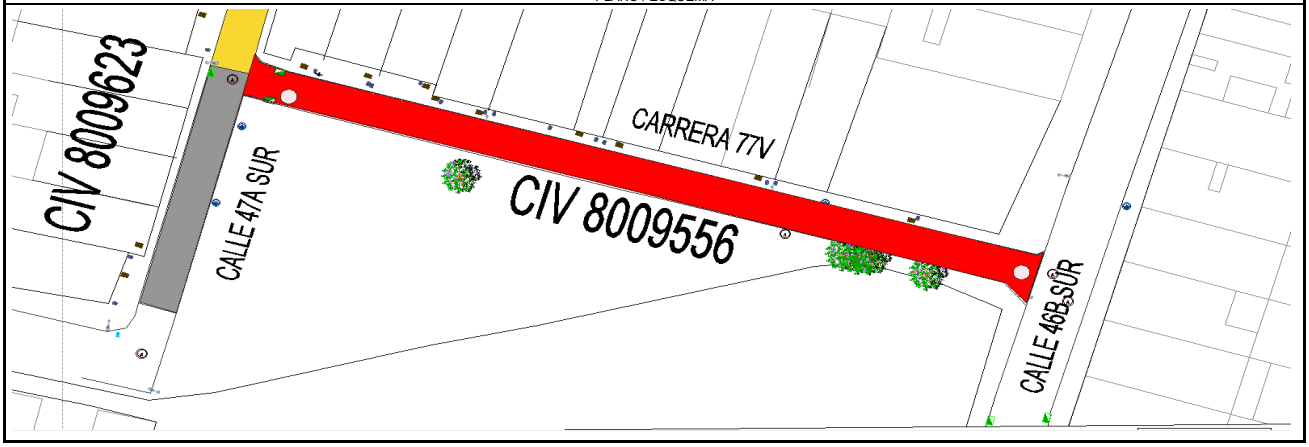

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	15/03/2026	CIV	8009556		ESTRUCTURA DE VIA	0,480
				PRIORIDAD:	NC	6		

CARTERA DE:	EXCAVACION MECANICA DE VIA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,40

ABSCISA (m)	DEMOLICION					SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,505	2538,508	2538,510	2538,508	2538,505	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	4,400	0,345	0,340	0,334	0,324	0,313	0,331		
K0+005,00	2538,405	2538,415	2538,425	2538,403	2538,380	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	4,400	0,340	0,322	0,305	0,310	0,315	0,319	22,000	7,145
K0+010,00	2538,435	2538,433	2538,430	2538,403	2538,375	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	4,400	0,345	0,322	0,300	0,293	0,285	0,309	22,000	6,902
K0+015,00	2538,435	2538,438	2538,440	2538,420	2538,400	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	4,400	0,320	0,303	0,285	0,285	0,285	0,296	22,000	6,650
K0+020,00	2538,440	2538,445	2538,450	2538,430	2538,410	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	4,400	0,300	0,285	0,270	0,270	0,270	0,279	22,000	6,320
K0+025,00	2538,450	2538,458	2538,465	2538,443	2538,420	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	4,400	0,285	0,273	0,260	0,258	0,255	0,266	22,000	5,995
K0+030,00	2538,490	2538,505	2538,520	2538,490	2538,460	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	4,400	0,300	0,295	0,290	0,280	0,270	0,287	22,000	6,083
K0+035,00	2538,495	2538,518	2538,540	2538,518	2538,495	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	4,400	0,280	0,282	0,285	0,282	0,280	0,282	22,000	6,259
K0+040,00	2538,500	2538,518	2538,535	2538,530	2538,525	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	4,400	0,260	0,258	0,255	0,270	0,285	0,266	22,000	6,023
K0+045,00	2538,530	2538,548	2538,565	2538,553	2538,540	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	4,400	0,265	0,263	0,260	0,267	0,275	0,266	22,000	5,847
K0+050,00	2538,540	2538,580	2538,620	2538,595	2538,570	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	4,400	0,250	0,270	0,290	0,285	0,280	0,275	22,000	5,951
K0+055,00	2538,620	2538,613	2538,605	2538,603	2538,600	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	4,400	0,305	0,278	0,250	0,267	0,285	0,277	22,000	6,072
K0+060,00	2538,665	2538,650	2538,635	2538,615	2538,595	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	4,400	0,325	0,290	0,255	0,255	0,255	0,276	22,000	6,083
K0+065,00	2538,655	2538,670	2538,685	2538,673	2538,660	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	4,400	0,290	0,285	0,280	0,288	0,295	0,288	22,000	6,199
K0+070,00	2538,665	2538,680	2538,695	2538,675	2538,655	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	4,400	0,275	0,270	0,265	0,265	0,265	0,268	22,000	6,111
K0+075,00	2538,635	2538,648	2538,660	2538,650	2538,640	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	4,400	0,296	0,313	0,329	0,323	0,316	0,315	22,000	6,415
K0+080,00	2538,610	2538,628	2538,645	2538,628	2538,610	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	4,400	0,323	0,347	0,372	0,362	0,352	0,351	22,000	7,332
K0+084,10	2538,535	2538,528	2538,520	2538,508	2538,495	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	4,400	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	18,040	5,785
																TOTAL	0,291	370,04	107,17
														area	2,27	POZOS	-1	-2,27	-0,66
														sumidero	0,245	SUMIDEROS	-2	-0,49	-0,14
																	TOTAL	367,28	106,36

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			VOLUMEN COMPACTO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Transporte y disposicion de escombros		item							
	excavacion mecanica de estructura de via	1,003	330,33				1,30		429,43
	Demolicion de concreto estructural	2,002	73,46				1,35		99,17
	excavacion manual para redes	6,001	83,28				1,30		108,26
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									636,86
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									636,86
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

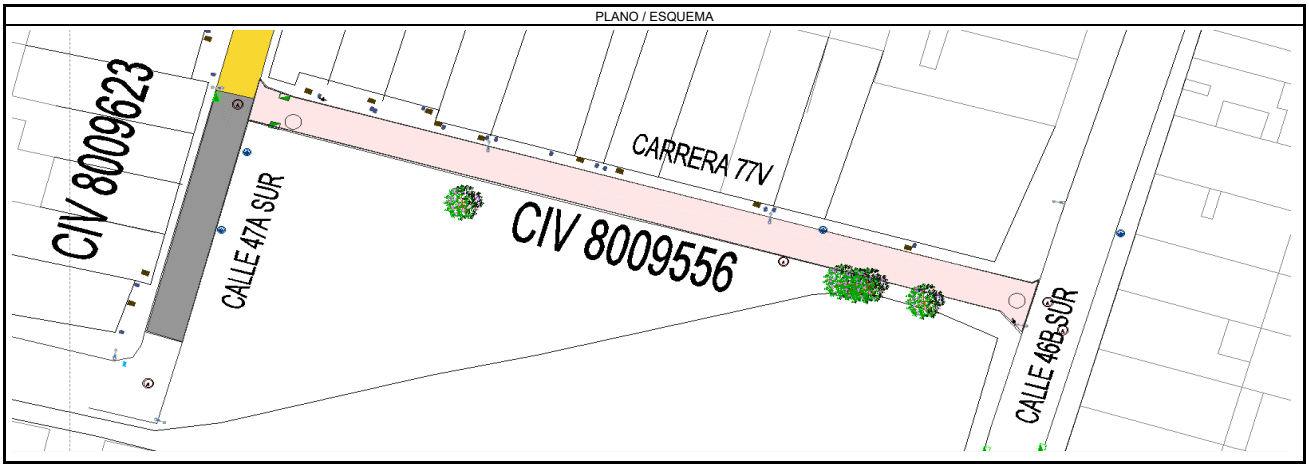

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
demolicion de carpeta asfaltica existente									
	asfalto existente		84,10	4,40	0,20				74,01
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,20			-1,00	-0,45
	sumideros existentes	area	0,25		0,20			-2,00	-0,10
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									73,46
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									73,46
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

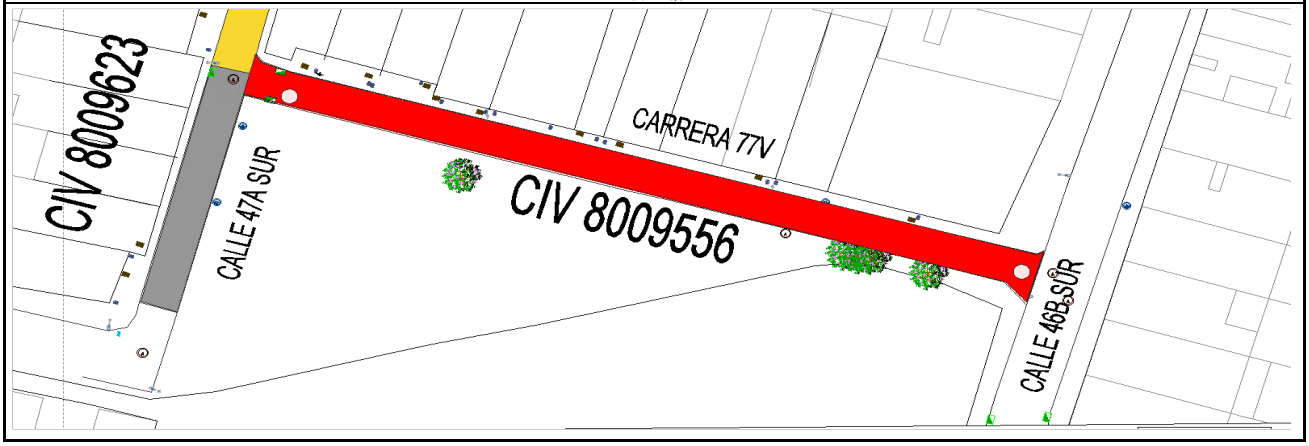

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009556	
PRIORIDAD:	NC	6

ESPESOR MEDIO ENCONTRADO 0,200

CARTERA DE:	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE - PLACA EN CONCRETO	ANCHO DE VIA DEMOLIDA	4,40

ABSCISA (m)	PLACA EN CONCRETO EXISTENTE					DEMOLICION					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,705	2538,708	2538,710	2538,708	2538,705	2538,505	2538,508	2538,510	2538,508	2538,505	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
K0+005,00	2538,605	2538,615	2538,625	2538,603	2538,580	2538,405	2538,415	2538,425	2538,403	2538,380	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+010,00	2538,635	2538,633	2538,630	2538,603	2538,575	2538,435	2538,433	2538,430	2538,403	2538,375	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+015,00	2538,635	2538,638	2538,640	2538,620	2538,600	2538,435	2538,438	2538,440	2538,420	2538,400	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+020,00	2538,640	2538,645	2538,650	2538,630	2538,610	2538,440	2538,445	2538,450	2538,430	2538,410	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+025,50	2538,650	2538,658	2538,665	2538,643	2538,620	2538,450	2538,458	2538,465	2538,443	2538,420	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	24,200	4,840
K0+030,00	2538,690	2538,705	2538,720	2538,690	2538,660	2538,490	2538,505	2538,520	2538,490	2538,460	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	19,800	3,960
K0+035,00	2538,695	2538,718	2538,740	2538,718	2538,695	2538,495	2538,518	2538,540	2538,518	2538,495	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+040,00	2538,700	2538,718	2538,735	2538,730	2538,725	2538,500	2538,518	2538,535	2538,530	2538,525	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+045,00	2538,730	2538,748	2538,765	2538,753	2538,740	2538,530	2538,548	2538,565	2538,553	2538,540	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+050,00	2538,740	2538,780	2538,820	2538,795	2538,770	2538,540	2538,580	2538,620	2538,595	2538,570	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+055,00	2538,820	2538,813	2538,805	2538,803	2538,800	2538,620	2538,613	2538,605	2538,603	2538,600	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+060,00	2538,865	2538,850	2538,835	2538,815	2538,795	2538,665	2538,650	2538,635	2538,615	2538,595	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+065,00	2538,855	2538,870	2538,885	2538,873	2538,860	2538,655	2538,670	2538,685	2538,673	2538,660	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+070,00	2538,865	2538,880	2538,895	2538,875	2538,855	2538,665	2538,680	2538,695	2538,675	2538,655	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+075,00	2538,835	2538,848	2538,860	2538,850	2538,840	2538,635	2538,648	2538,660	2538,650	2538,640	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+080,00	2538,810	2538,828	2538,845	2538,828	2538,810	2538,610	2538,628	2538,645	2538,628	2538,610	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+084,10	2538,735	2538,728	2538,720	2538,708	2538,695	2538,535	2538,528	2538,520	2538,508	2538,495	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	18,040	3,608

TOTAL	0,200	370,04	**74,01**	
POZOS	-1	-2,27	**-0,45**	area 2,27
SUMIDEROS	-2	-0,49	**-0,10**	sumidero 0,245
	TOTAL	**367,28**	**73,46**	

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
excavacion para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC6 - SANITARIO	77V-07	3,90	0,60	1,41				3,30
		46B-23	4,60	0,60	1,39				3,85
		46B-29	4,50	0,60	1,38				3,74
		46B-35	5,00	0,60	1,33				3,99
		46B-45	4,50	0,60	1,30				3,50
		46B-49	4,40	0,60	1,27				3,36
		46B-49	4,70	0,60	1,28				3,62
		46B-53	4,15	0,60	1,24				3,09
		46B-61	4,10	0,60	1,16				2,86
		46B-63	5,25	0,60	1,09				3,42
		46B-71	7,15	0,60	1,08				4,64
		46B-77	4,90	0,60	1,01				2,97
excavacion para construccion de sumideros									
	costado norte								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+004,00	1,40	1,10	0,92				1,42
	costado sur								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+004,00	1,40	1,10	0,92				1,42
excavacion para instalacion tuberia de sumideros									
	costado norte								
	Excavacion tub de sumidero	K0+004,00	3,70	1,10	0,77				3,13
	costado sur								
	Excavacion tub de sumidero	K0+004,00	2,00	1,10	0,79				1,74
excavacion para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	franja por anden - zona verde parque	K0+000,00							
	costado sur	K0+082,00	82,00	0,50	0,77				31,57
	cruce N-S - carcamo - costado oriental segm	K0+082,50	4,80	0,70	0,50				1,68

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	83,28
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	83,28
TOTAL POR EJECUTAR	

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01


DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

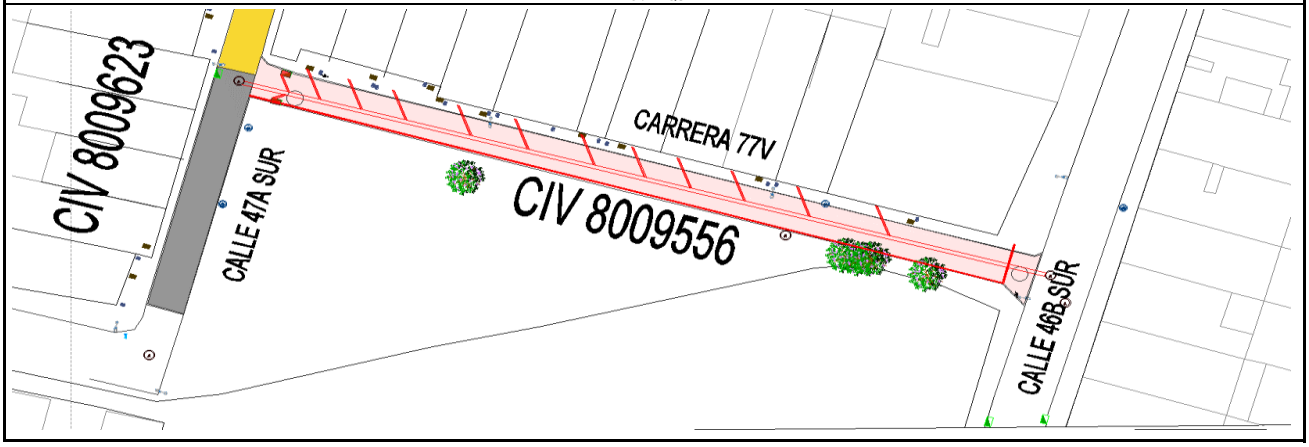

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
					altura media				
relleno para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+082,00	82,00	0,50	0,77				31,57
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									31,57
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									31,57
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

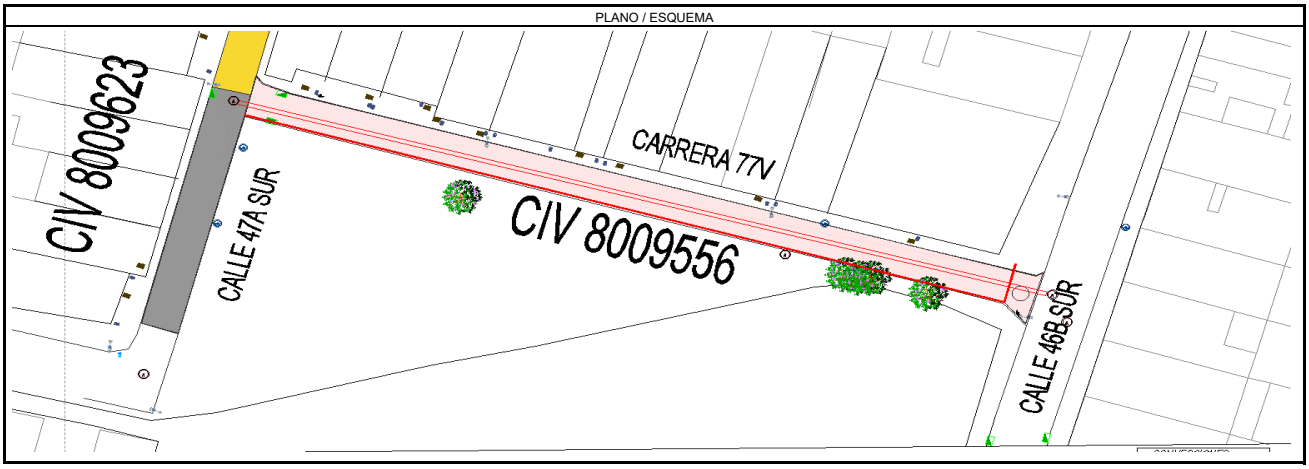

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Relleno para redes - tramos SANITARIOS					area seccion				
	NC6 - SANITARIO		85,00	1,00	0,185				15,72
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - tramos PLUVIAL					area seccion				
	NC6 - PLUVIAL TR 1		5,30	1,00	0,216				1,14
	se anexa cartera topografica								
	NC6 - PLUVIAL TR 2		71,50	0,90	0,191				13,64
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de domiciliarias					area seccion				
	NC6 - SANITARIO		57,15	0,60	0,097				5,52
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de pozos									
	NC6 - PLUVIAL TR 1		diametro excav	area excavacion					
	PMP38096-A		2,20	3,80	0,10				0,38
	NC6 - PLUVIAL TR 2								
	PMP38096-B		2,20	3,80	0,10				0,38
	se anexa cartera topografica								
relleno base instalacion de sumideros									
	costado norte								
	Triturado para instal de sumidero	K0+004,00	1,40	1,10	0,10				0,15
	costado sur								
	Triturado para instal de sumidero	K0+004,00	1,40	1,10	0,10				0,15
relleno para instalacion tuberia de sumideros - base carcamo									
	NC6 - PLUVIAL TR 2								
	Triturado para tub de sumidero	K0+004,00	3,70	1,10	0,100				0,41
	NC6 - PLUVIAL TR 2								
	Triturado para tub de sumidero	K0+004,00	2,00	1,10	0,100				0,22
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									37,72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									37,72
TOTAL POR EJECUTAR									

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

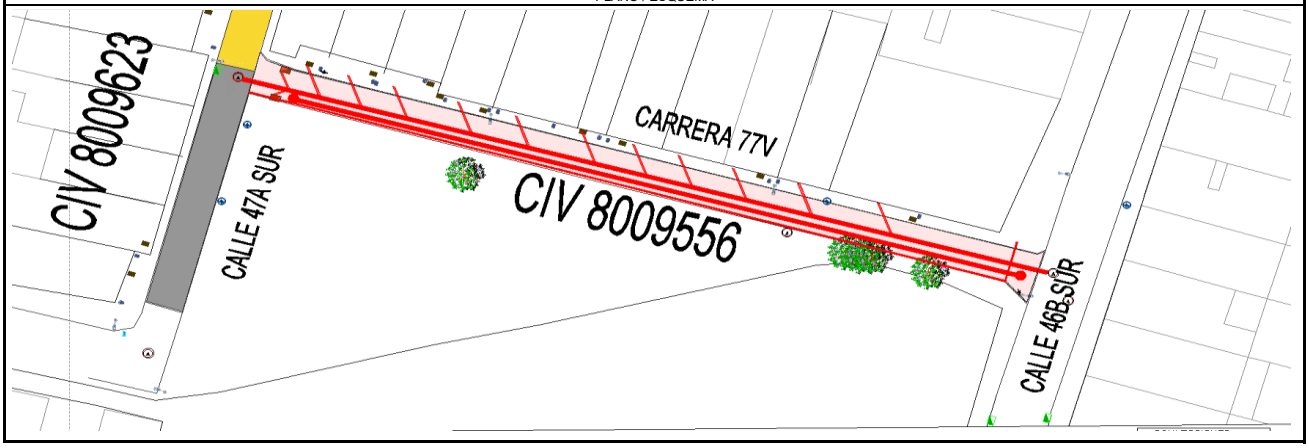

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Relleno para red de acueducto 4"									
	tubo acueducto 4"								
	Costado sur	K0+000,00							
		K0+082,00	82,00	0,50	0,30				12,30
	volumen tubo 4"		82,00	area	-0,0079				-0,64
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									11,66
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									11,66
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

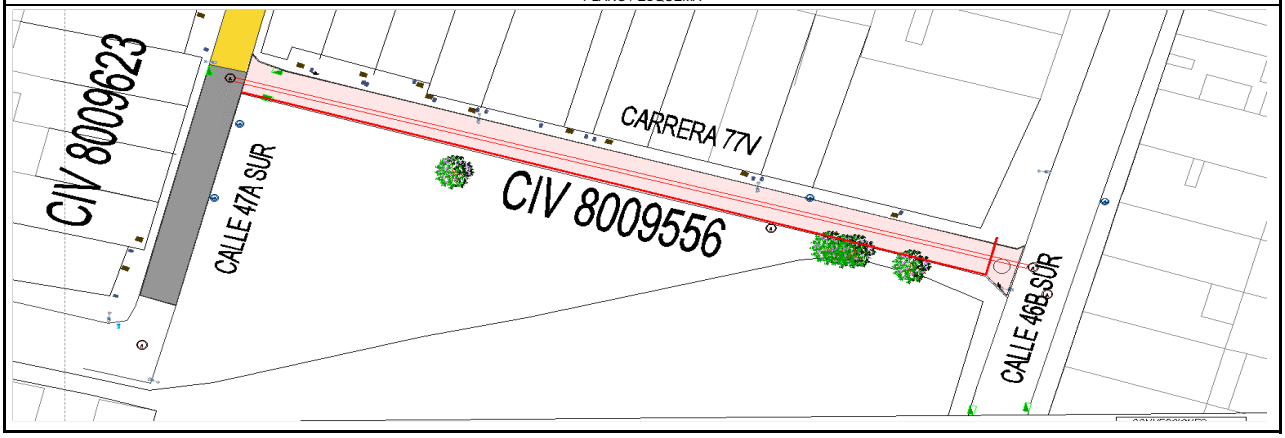

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
placa de cubierta - construccion de pozos PLUVIALES									
	NC6 - PLUVIAL TR 1								
	PMP38096-A							1,00	1,00
	NC6 - PLUVIAL TR 2								
	PMP38096-B							1,00	1,00
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

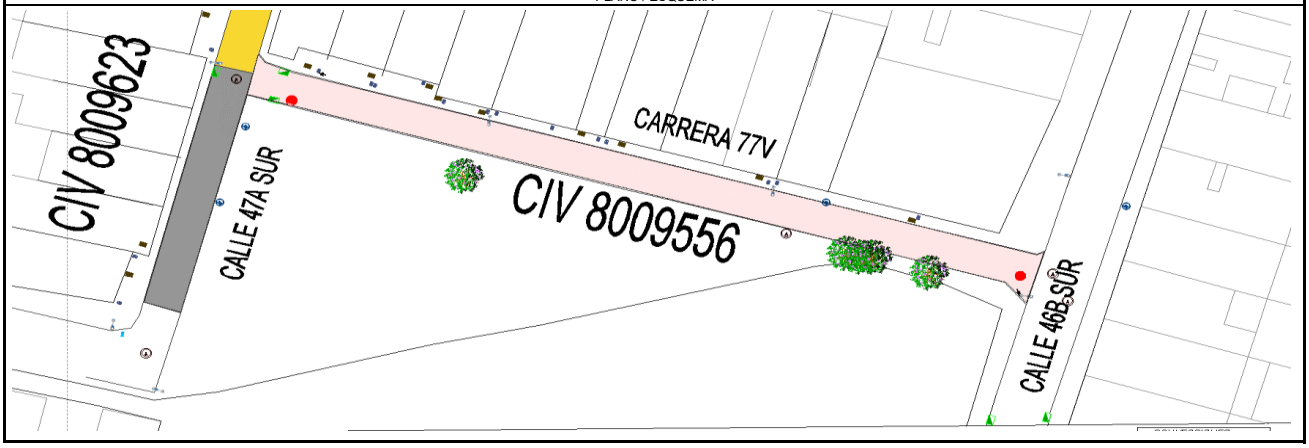

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
mamposteria - construccion de pozos PLUVIAL									
	NC6 - PLUVIAL TR 1		a	b	a-b=c	d			c-d
	PMP38096-A		2538,74	2536,99	1,75	0,25			1,50
	NC6 - PLUVIAL TR 2								
	PMP38096-B		2538,58	2537,37	1,21	0,25			0,96
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,47
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,47
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

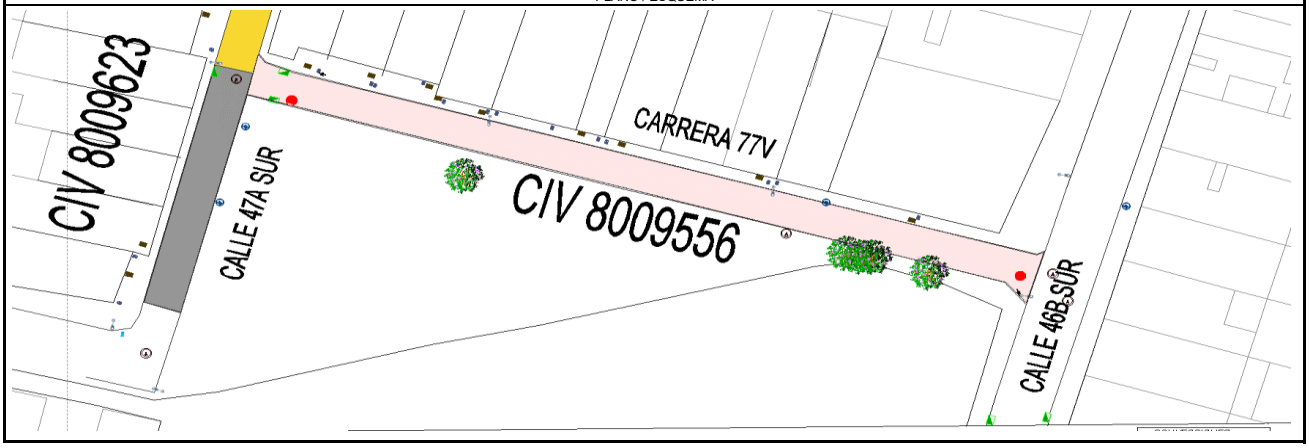

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Tuberia para redes - tramos PLUVIAL									
	NC6 - PLUVIAL TR 1		7,00			-1,20			5,80
	se anexa cartera topografica								
	NC6 - PLUVIAL TR 2		73,20			-1,20			72,00
	se anexa cartera topografica								
tuberia para conexcion de sumideros									
norte	NC6 - PLUVIAL TR 2	K0+004,00	3,90						3,90
sur	NC6 - PLUVIAL TR 2	K0+004,00	2,40						2,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									84,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									84,10
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

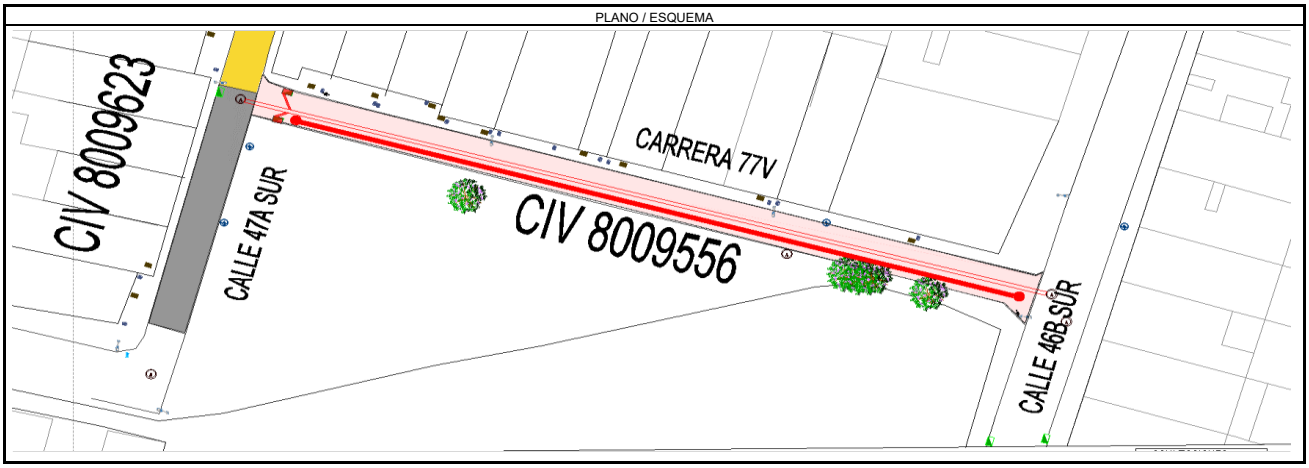

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Tuberia para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC6 - SANITARIO	77V-07	3,90						3,90
		46B-23	4,60						4,60
		46B-29	4,50						4,50
		46B-35	5,00						5,00
		46B-45	4,50						4,50
		46B-49	4,40						4,40
		46B-49	4,70						4,70
		46B-53	4,15						4,15
		46B-61	4,10						4,10
		46B-63	5,25						5,25
		46B-71	7,15						7,15
		46B-77	4,90						4,90

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	57,15
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	57,15
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

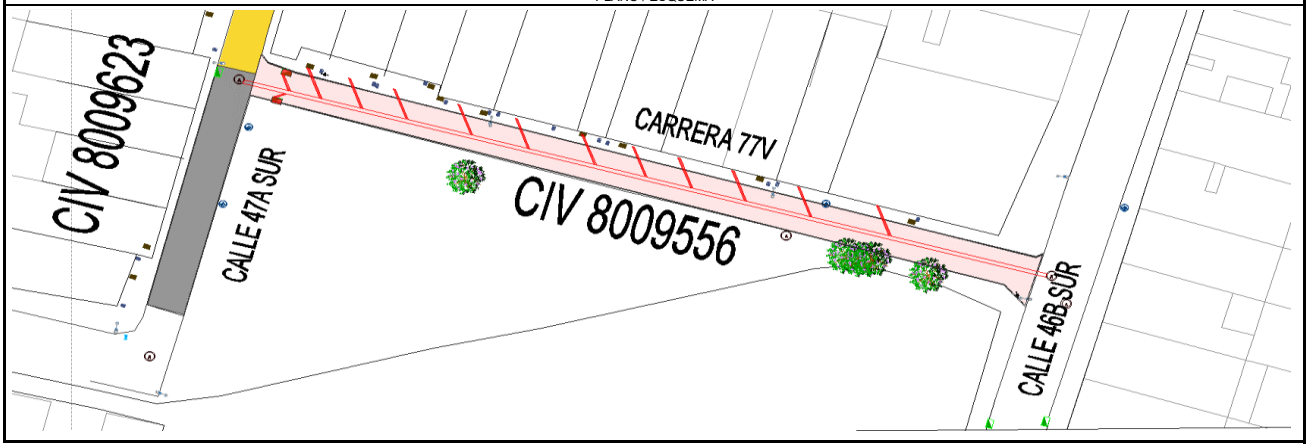

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LONG ENTRE EJES POZO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Tuberia para redes - tramos SANITARIOS									
	NC6 - SANITARIO		86,70			-1,20			85,50
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									85,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									85,50
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

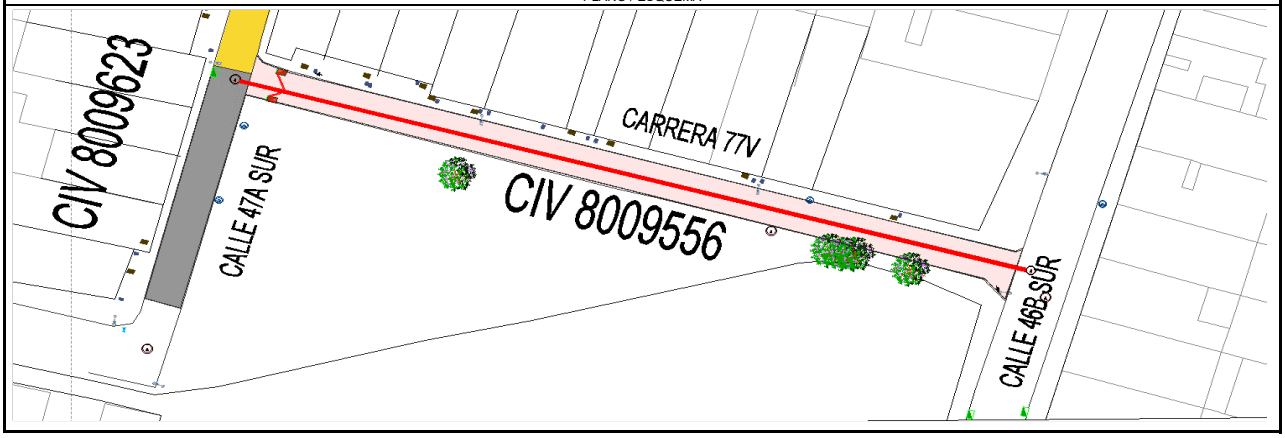

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
nivelacion y compactacion de subrasante de via									
	subrasante de diseño		84,10	4,400					370,04
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-2,00	-4,54
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	363,34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	363,34
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

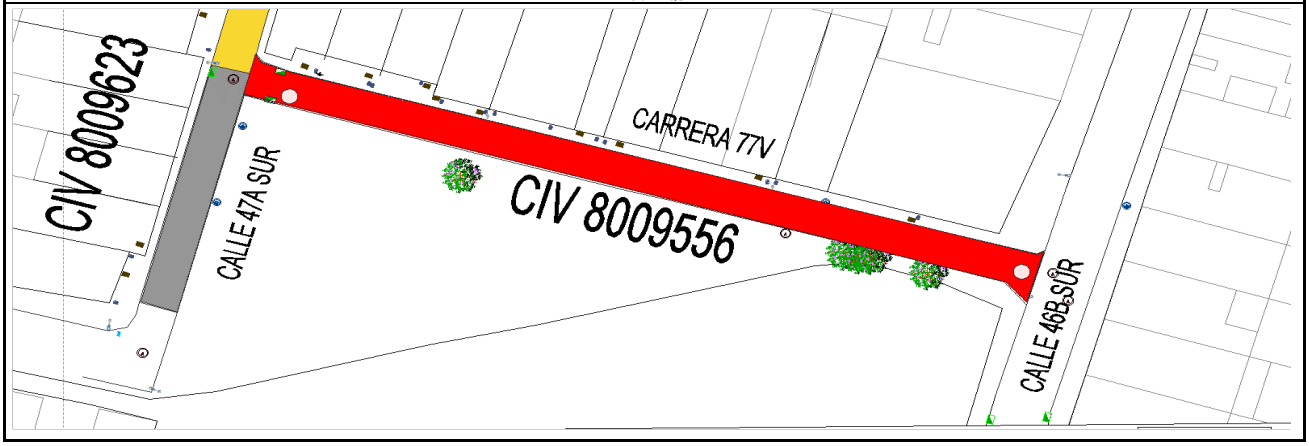

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	15/03/2026	CIV	8009556		ESTRUCTURA DE VIA	0,480
				PRIORIDAD:	NC	6		

CARTERA DE:	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,40

ABSCISA (m)	SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+010,00	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+015,00	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+020,00	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+025,00	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+030,00	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+035,00	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+040,00	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+045,00	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+050,00	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+055,00	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+060,00	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+065,00	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+070,00	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+075,00	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+080,00	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+084,10	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,040	0,000

																TOTAL	0,000	370,04	0,00
															area	2,27	POZOS	-2	-4,54	0,00
															sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL		363,34	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Demolicion de pozo existente									
	pozo desabilitado	K0+032,00						1,00	1,00
	PLUVIAL								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

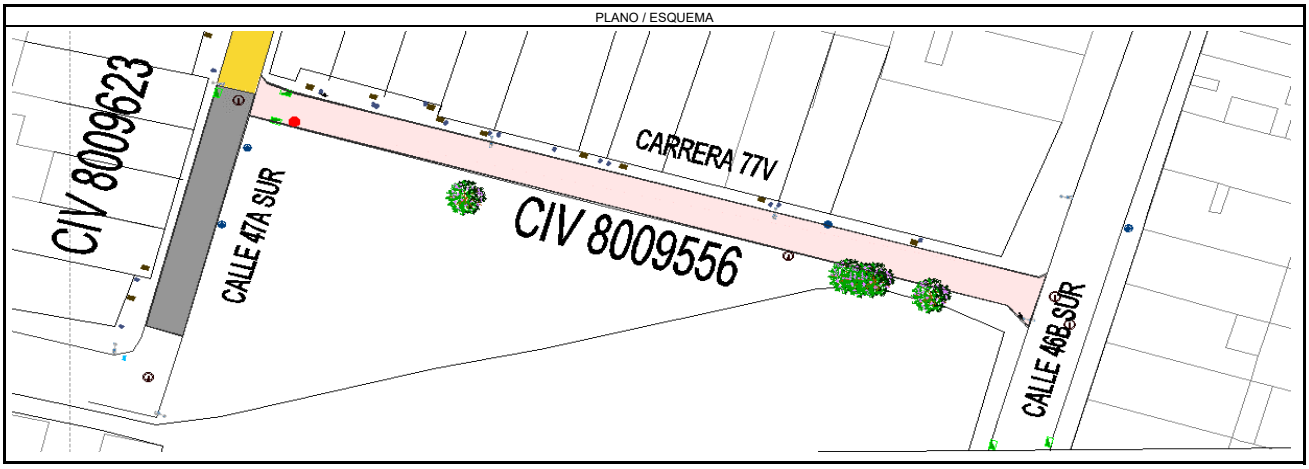

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Demolicion de sumidero existente									
	sumidero existente		K0+005,00	norte				1,00	1,00
	sumidero existente		K0+005,00	sur				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

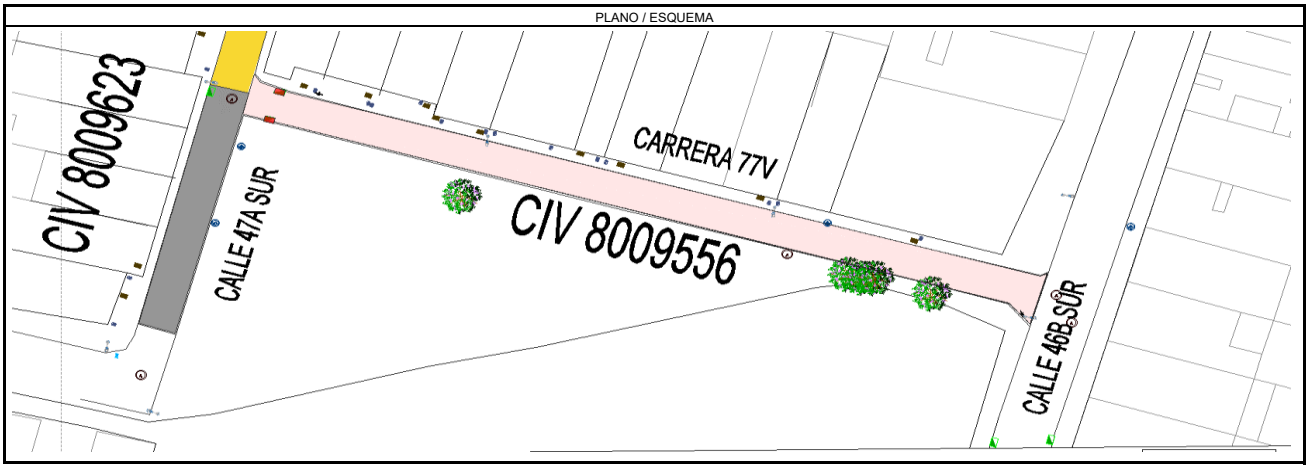

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Geocelda para estructura de via									
	estructura de via		84,10	4,40					370,04
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-2,00	-4,54
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									363,34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									363,34
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

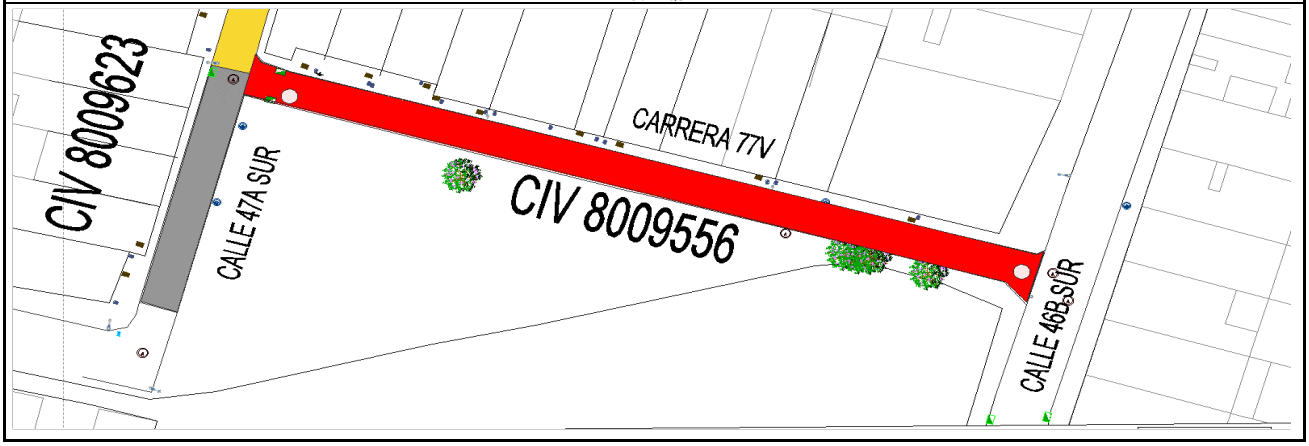

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009556	
PRIORIDAD:	NC	6

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	GEOCELDA h=15cm	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,40

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					GEOCELDA h=15cm					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+010,00	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+015,00	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+020,00	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+025,00	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+030,00	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+035,00	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+040,00	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+045,00	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+050,00	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+055,00	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+060,00	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+065,00	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+070,00	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+075,00	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+080,00	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+084,10	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,040	0,000

			TOTAL	0,000	370,04	0,00
area	2,27		POZOS	-2	-4,54	0,00
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
			TOTAL		363,34	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
tuberia de acueducto 4"									
	costado sur	K0+000,00							
		K0+082,00	82,00						82,00
	cruce N-S - carcamo - costado oriental segm	K0+082,50	4,80						4,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									86,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									86,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

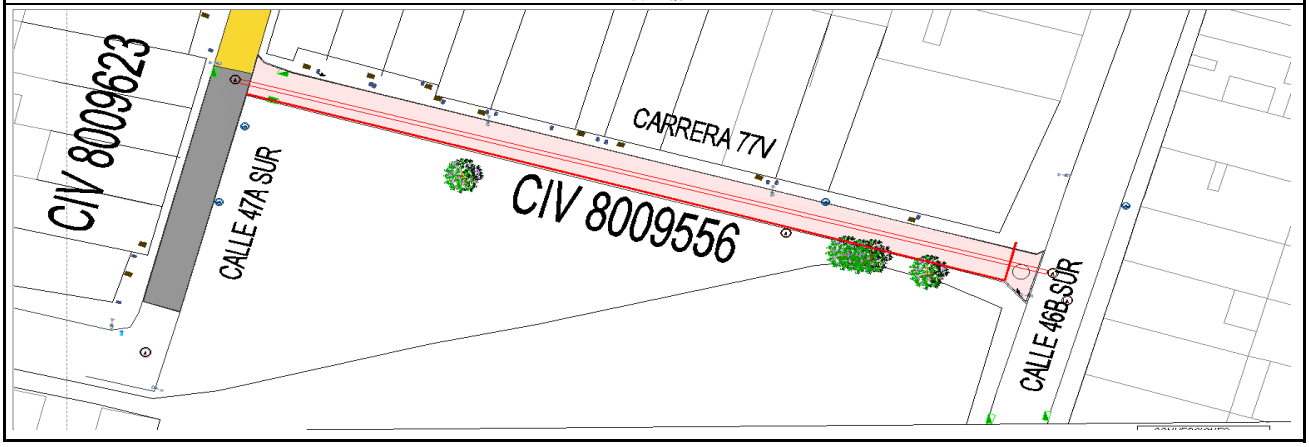

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
					altura media				
Relleno para redes - tramos SANITARIOS									
	NC6 - SANITARIO		85,00	1,00	1,377				117,02
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - tramos PLUVIALES									
	NC6 - PLUVIAL TR 1		5,30	1,00	1,413				7,49
	se anexa cartera topografica								
	NC6 - PLUVIAL TR 2		33,65	0,90	1,672				50,65
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion domiciliarias									
	NC6 - SANITARIO		57,15	0,60	1,043				35,76
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de pozos									
	NC6 - PLUVIAL TR 1	cota subrasante	cota clave	cota fondo	alt relleno	diametro excva	diametro pozo	diferencia areas	
	PMP38096-A	2538,26	2537,39	2536,74	1,52	2,20	1,70	1,53	2,33
	NC6 - PLUVIAL TR 2								
	PMP38096-B	2538,10	2537,77	2537,12	0,98	2,20	1,70	1,53	1,51
	se anexa cartera topografica								
relleno para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+082,00	82,00	0,50	0,20				8,20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	222,96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	222,96
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

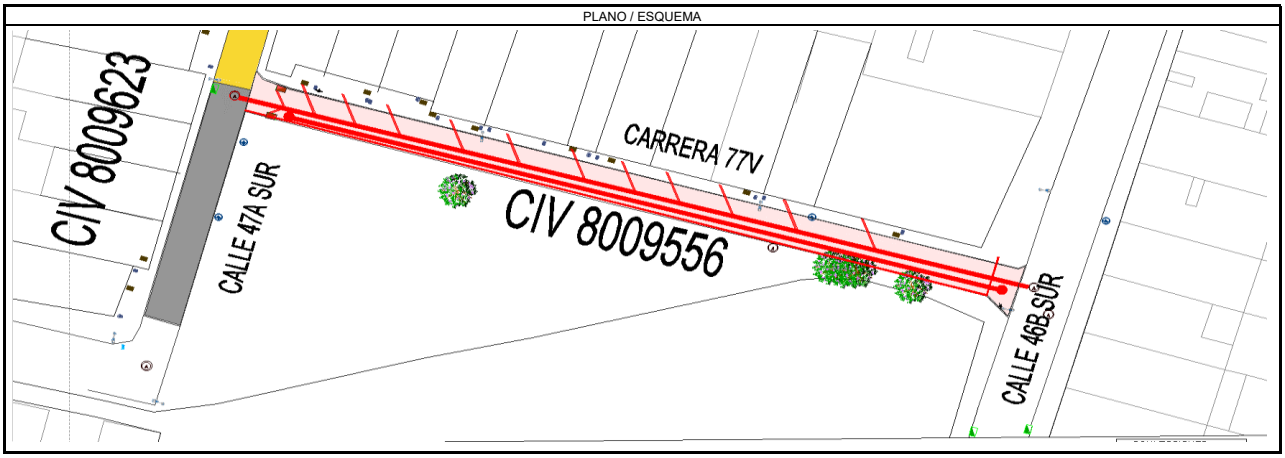

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Silla Y para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC6 - SANITARIO	77V-07						1,00	1,00
		46B-23						1,00	1,00
		46B-29						1,00	1,00
		46B-35						1,00	1,00
		46B-45						1,00	1,00
		46B-49						1,00	1,00
		46B-49						1,00	1,00
		46B-53						1,00	1,00
		46B-61						1,00	1,00
		46B-63						1,00	1,00
		46B-71						1,00	1,00
		46B-77						1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	12,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	12,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

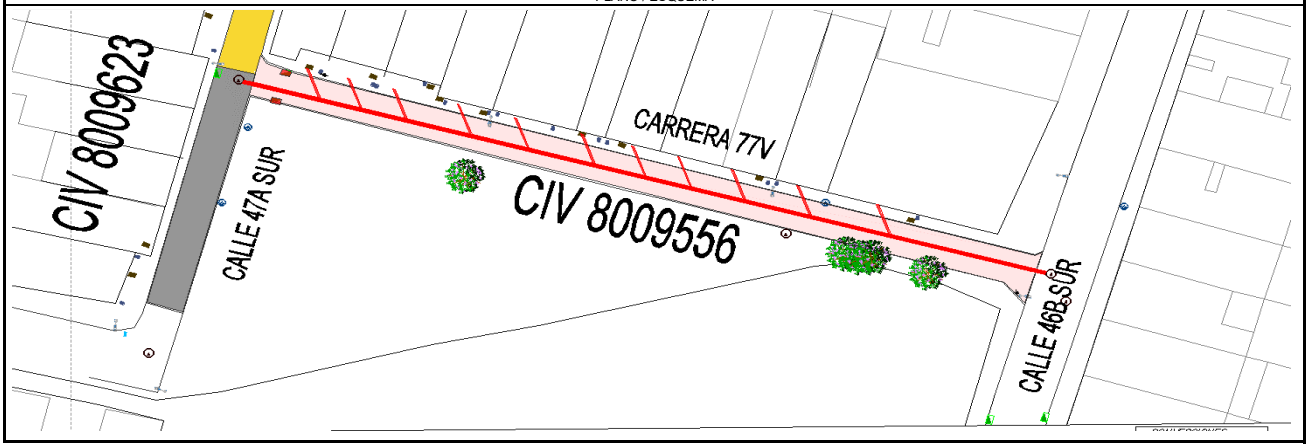

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Codo para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC6 - SANITARIO	77V-07							
		46B-23						1,00	1,00
		46B-29						1,00	1,00
		46B-35						1,00	1,00
		46B-45							
		46B-49							
		46B-49							
		46B-53							
		46B-61						1,00	1,00
		46B-63						1,00	1,00
		46B-71							
		46B-77							

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	5,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

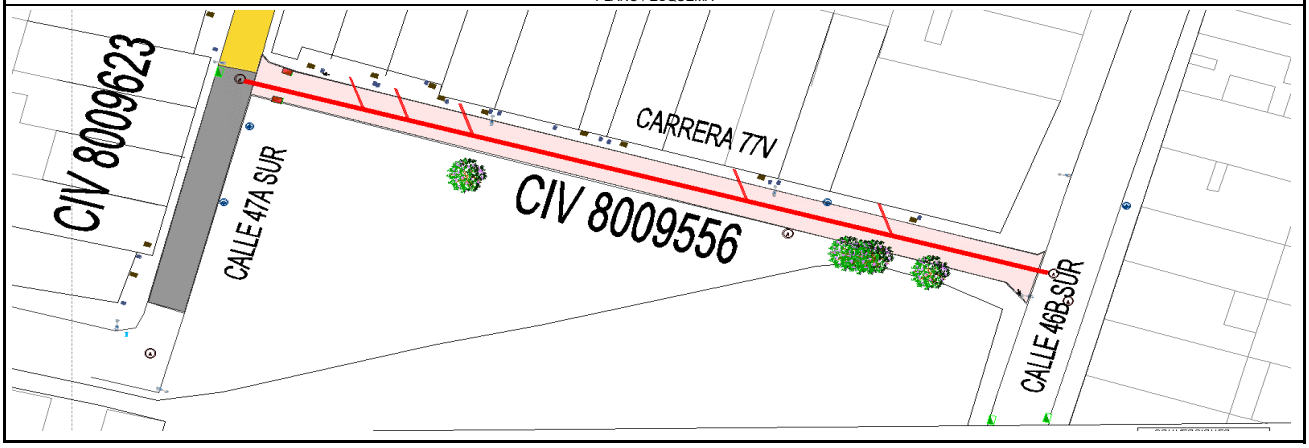

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,025 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
placa de fondo - construccion de pozos PLUVIAL									
	NC6 - PLUVIAL TR 1								
	PMP38096-A							1,00	1,00
	NC6 - PLUVIAL TR 2								
	PMP38096-B							1,00	1,00
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

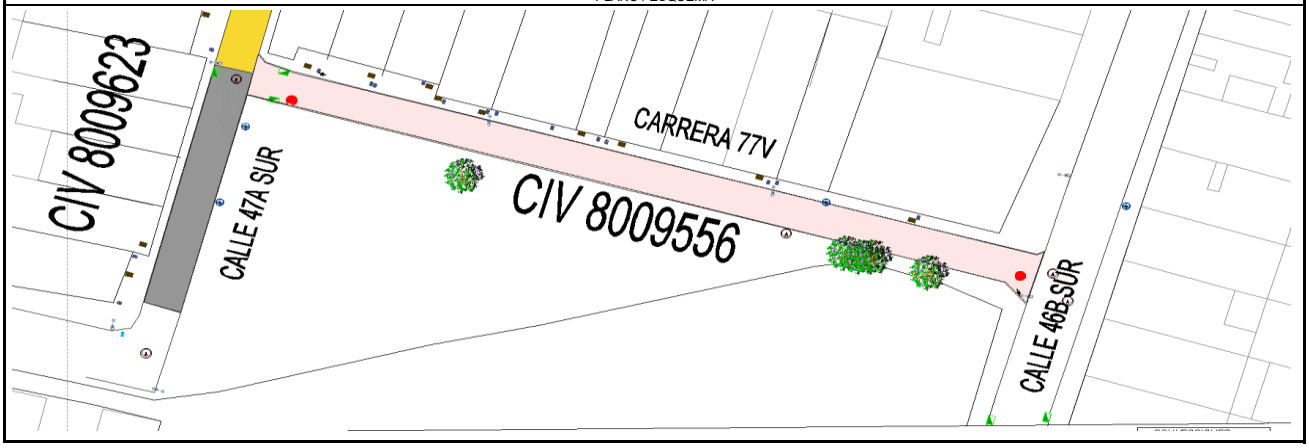

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,025 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,032 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD CARAS	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Entibado para redes - tramos sanitarios									
	NC6 - SANITARIO		85,00	1,00	1,643			2,00	279,33
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									279,33
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									279,33
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

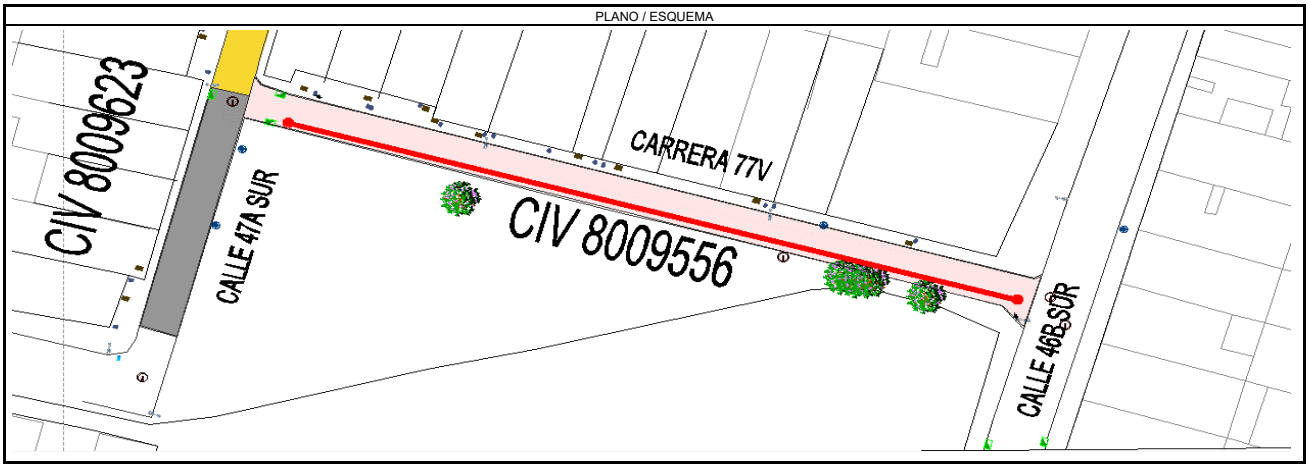

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,032 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Movilizacion de equipo para construccion de segmento vial									
	equipo de demolicion y excavacion							1,00	1,00
	equipo para rellen - perfilado - compactacion							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

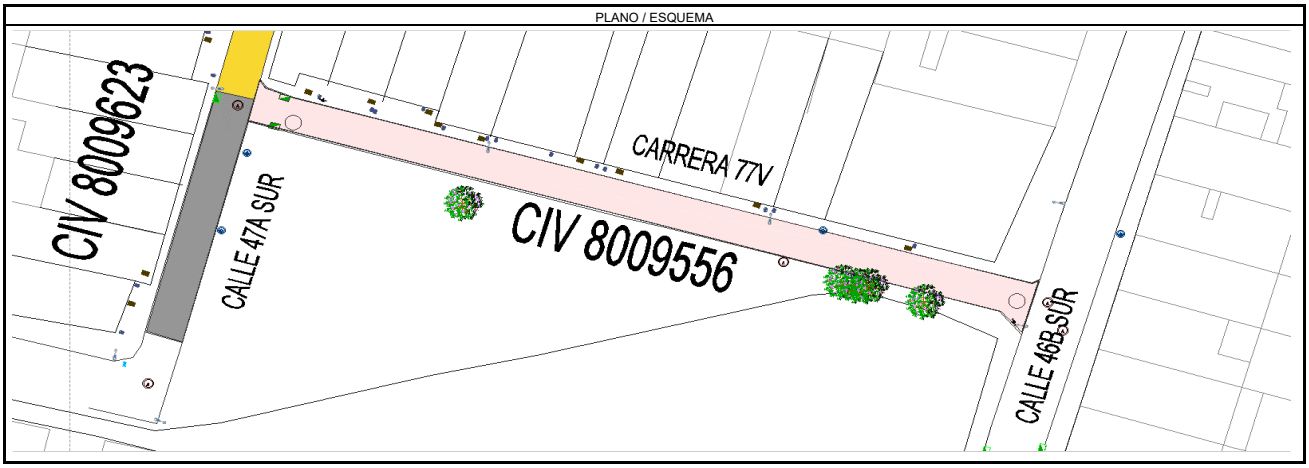

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
relleno con subbase granular AR_SBG50 para estructura de via									
	estructura de via		84,10	4,40	0,200				74,01
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,200			-2,00	-0,91
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,200			-2,00	-0,43

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	72,67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	72,67
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

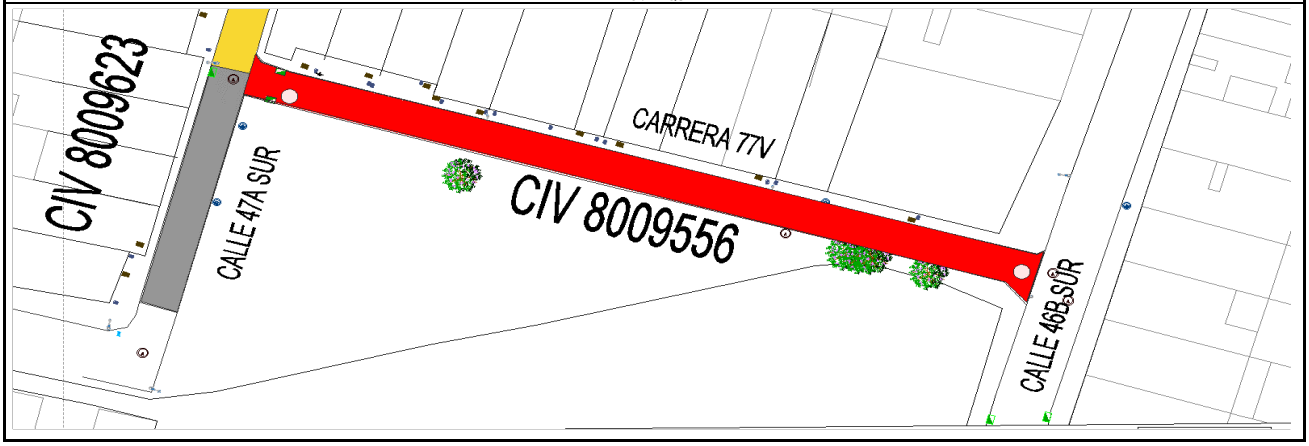

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009556	
PRIORIDAD:	NC	6

JB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG 0,200

CARTERA DE:	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,40

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	2538,360	2538,368	2538,376	2538,384	2538,392	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
K0+005,00	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	2538,265	2538,293	2538,320	2538,293	2538,265	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+010,00	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+015,00	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+020,00	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+025,00	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+030,00	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+035,00	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	2538,415	2538,435	2538,455	2538,435	2538,415	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+040,00	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	2538,440	2538,460	2538,480	2538,460	2538,440	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+045,00	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	2538,465	2538,485	2538,505	2538,485	2538,465	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+050,00	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	2538,490	2538,510	2538,530	2538,510	2538,490	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+055,00	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	2538,515	2538,535	2538,555	2538,535	2538,515	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+060,00	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	2538,540	2538,560	2538,580	2538,560	2538,540	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+065,00	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	2538,565	2538,585	2538,605	2538,585	2538,565	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+070,00	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	2538,590	2538,610	2538,630	2538,610	2538,590	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+075,00	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	2538,539	2538,535	2538,531	2538,528	2538,524	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+080,00	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	2538,487	2538,480	2538,473	2538,466	2538,458	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,000	4,400
K0+084,10	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	2538,445	2538,438	2538,430	2538,418	2538,405	4,400	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	18,040	3,608
																TOTAL	0,200	370,04	74,01
														area	2,27	POZOS	-2	-4,54	-0,91
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,43
																	TOTAL	363,34	72,67

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Geotextil para estructura de via									
	subrasante de diseño		84,10	4,90					412,09
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-2,00	-4,54
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									405,39
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									405,39
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

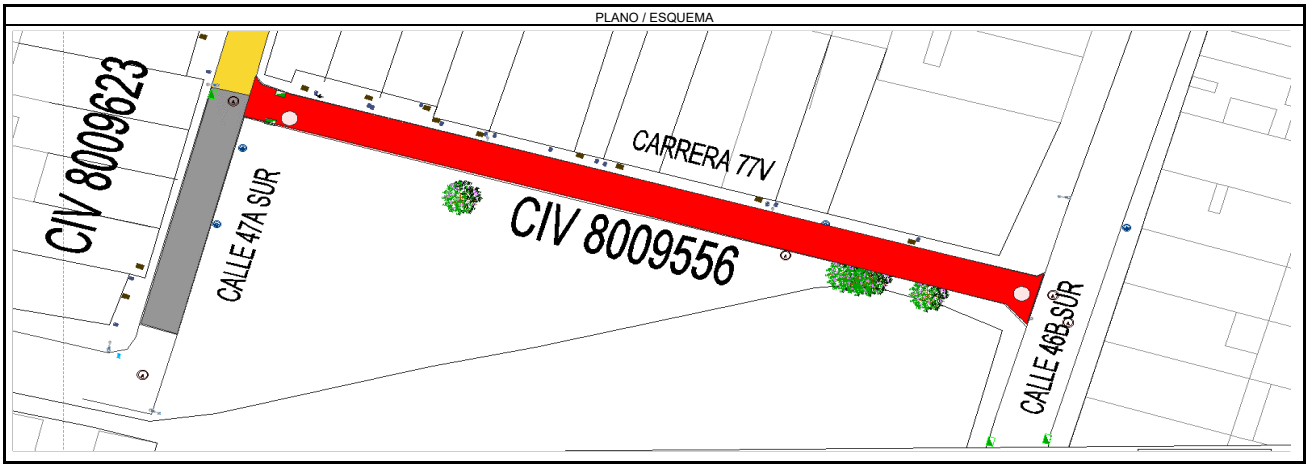

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009556	
PRIORIDAD:	NC	6

GEOTEXTIL	0,480

CARTERA DE:	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,90

ABSCISA (m)	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+010,00	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+015,00	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+020,00	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+025,00	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+030,00	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+035,00	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+040,00	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+045,00	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+050,00	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+055,00	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+060,00	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+065,00	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+070,00	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+075,00	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+080,00	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,500	0,000
K0+084,10	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	4,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,090	0,000
																TOTAL	0,000	412,09	0,00
														area	2,27	POZOS	-2	-4,54	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	405,39	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Geomalla para estructura de via									
	estructura de via		84,10	4,40					370,04
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-2,00	-4,54
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									363,34
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									363,34
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

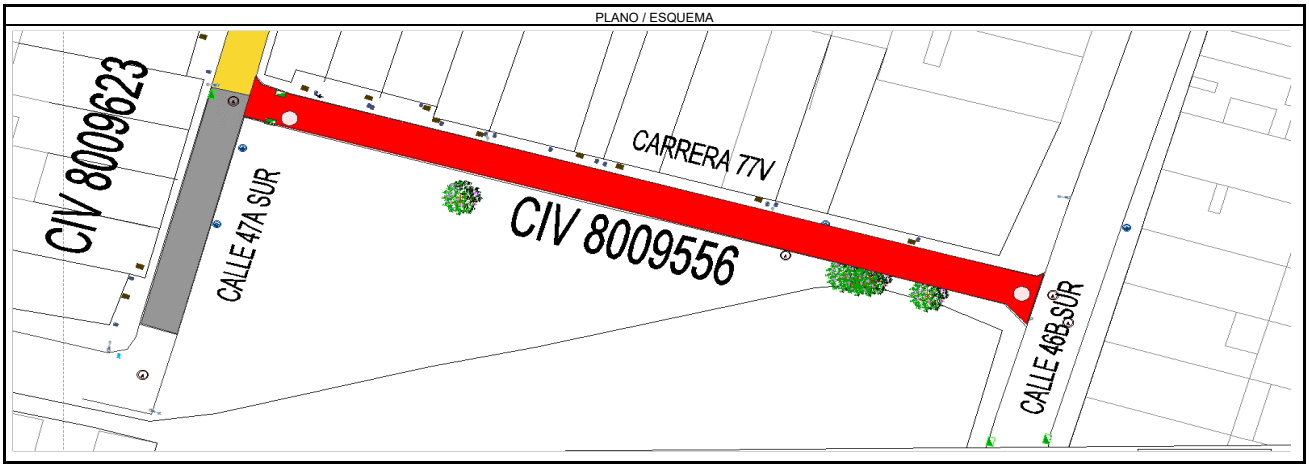

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009556	
PRIORIDAD:	NC	6

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	GEOMALLA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,40

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					GEOMALLA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	2538,160	2538,168	2538,176	2538,184	2538,192	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	2538,065	2538,093	2538,120	2538,093	2538,065	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+010,00	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	2538,090	2538,110	2538,130	2538,110	2538,090	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+015,00	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	2538,115	2538,135	2538,155	2538,135	2538,115	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+020,00	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	2538,140	2538,160	2538,180	2538,160	2538,140	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+025,00	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	2538,165	2538,185	2538,205	2538,185	2538,165	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+030,00	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	2538,190	2538,210	2538,230	2538,210	2538,190	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+035,00	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	2538,215	2538,235	2538,255	2538,235	2538,215	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+040,00	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	2538,240	2538,260	2538,280	2538,260	2538,240	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+045,00	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	2538,265	2538,285	2538,305	2538,285	2538,265	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+050,00	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+055,00	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+060,00	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+065,00	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+070,00	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+075,00	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	2538,339	2538,335	2538,331	2538,328	2538,324	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+080,00	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	2538,287	2538,280	2538,273	2538,266	2538,258	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000
K0+084,10	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	2538,245	2538,238	2538,230	2538,218	2538,205	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,040	0,000

			TOTAL	0,000	370,04	0,00
area	2,27		POZOS	-2	-4,54	0,00
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
				TOTAL	363,34	0,00

ENTREGA:	
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	
	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Estabilizacion de material granular									
	estructura de via Base granular	BG38	84,10	4,20	0,160		1,30		73,47
	pozos existentes	area	2,27		0,160		1,30	-2,00	-0,94
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,160		1,30	-2,00	-0,45

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	72,08
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	72,08
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

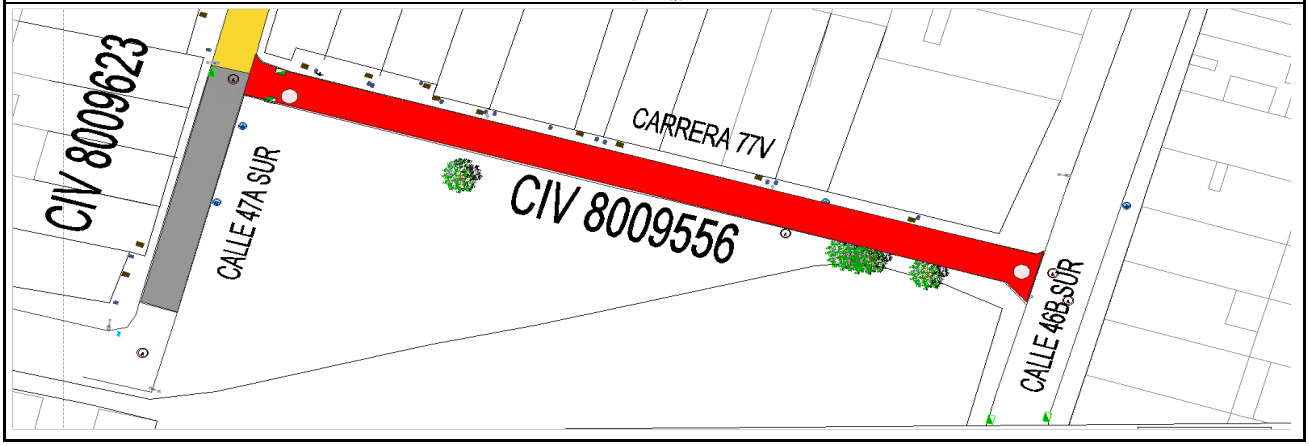

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA





FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Inyeccion de Cal a perforaciones									
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+001,50	A		B				
		K0+083,00	81,5000	4,4000	4,2000				
corredor tuberia pluvial	numero de lineas transversales	-1,00	(B/0.70)+1(-1)	C	6,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	58,2143				
	cantidad de barrenos		C*D	6,0000	58,0000				348,00
	pozos existentes - construidos		-2,00					3,00	-6,00
	sumideros construidos		-2,00					2,00	-4,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
			C		D				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									338,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									338,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

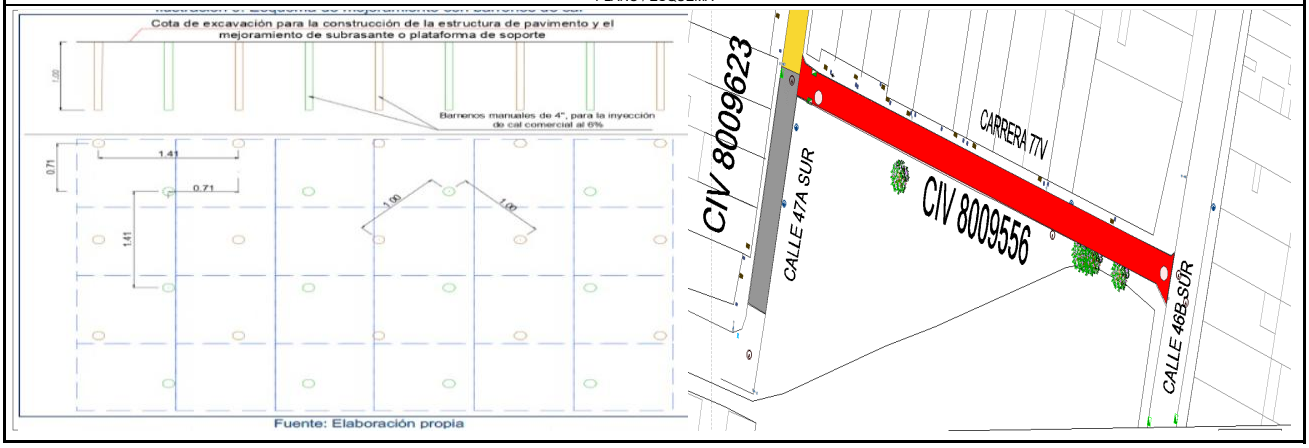

Fuente: Elaboración propia

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
carcamo para tuberia red pluvial									
		K0+040,25							
	costado sur	K0+072,35	32,10						32,10
carcamo para tuberia sumideros									
	costado norte	K0+005,00	3,70						3,70
	costado sur	K0+005,00	2,00						2,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									37,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									37,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

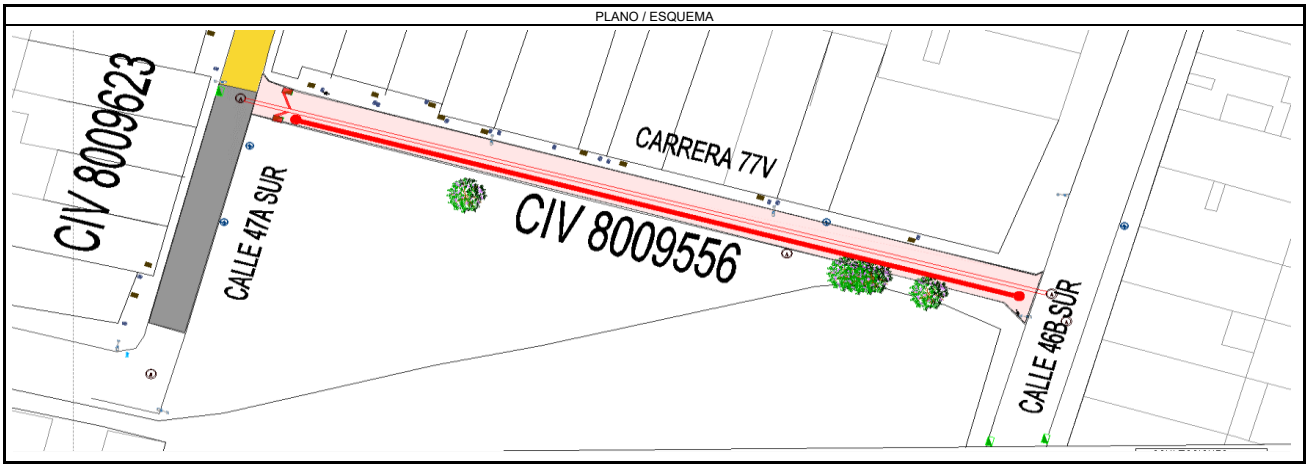

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Cañuela para pozo - construccion de pozos PLUVIAL									
	NC6 - PLUVIAL TR 1								
	PMP38096-A							1,00	1,00
	NC6 - PLUVIAL TR 2								
	PMP38096-B							1,00	1,00
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

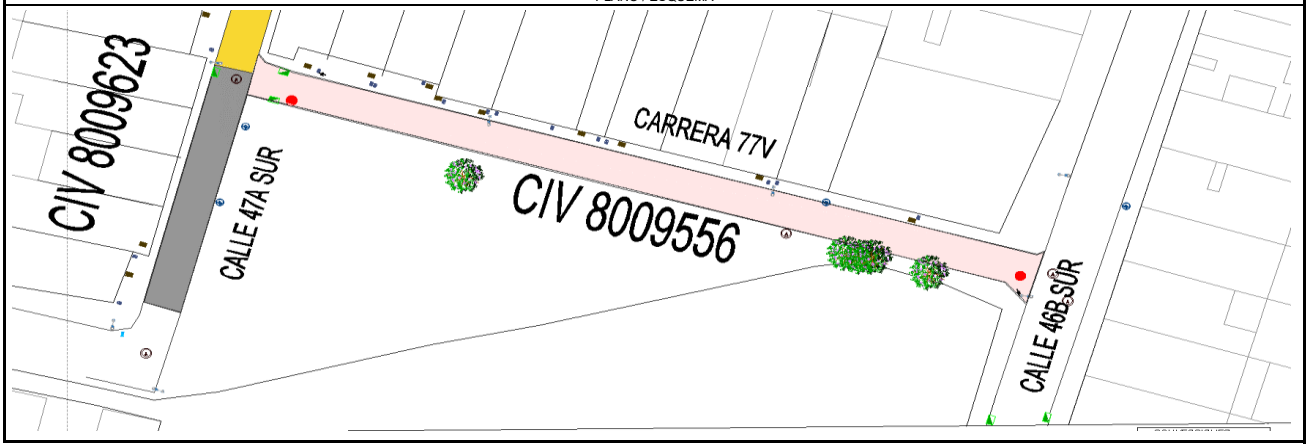

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
	perforaciones de 4"								
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+001,50	A		B				
		K0+083,00	81,5000	4,4000	4,2000				
corredor tuberia pluvial	numero de lineas transversales	-1,00	(B/0.70)+1(-1)	C	6,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	58,2143				
	cantidad de barrenos		C*D	6,0000	58,0000				348,00
	pozos existentes - construidos		-2,00					3,00	-6,00
	sumideros construidos		-2,00					2,00	-4,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
			C		D				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									338,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									338,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

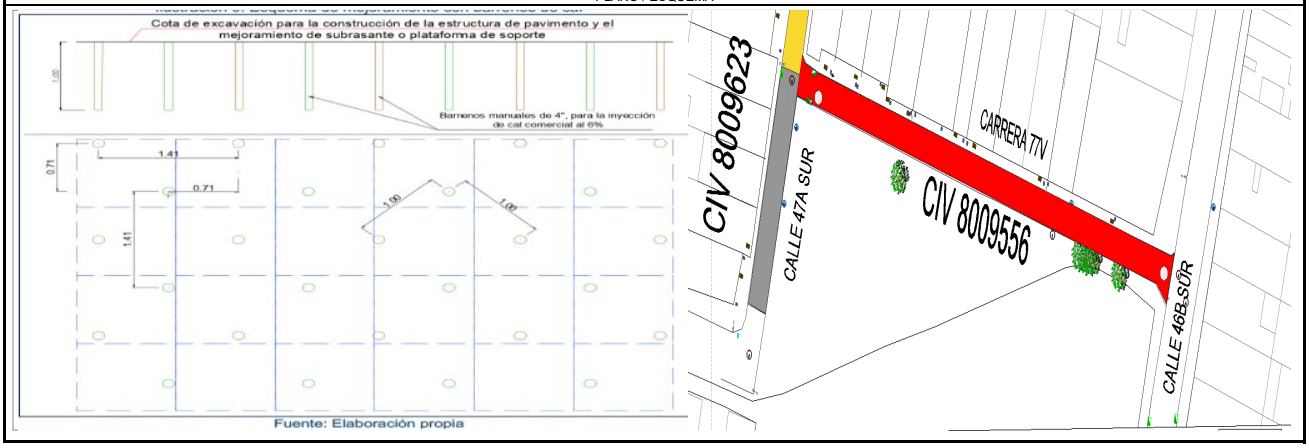

Fuente: Elaboración propia

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
Construccion de sumideros									
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+004,00	norte				1,00	1,00
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+004,00	sur				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

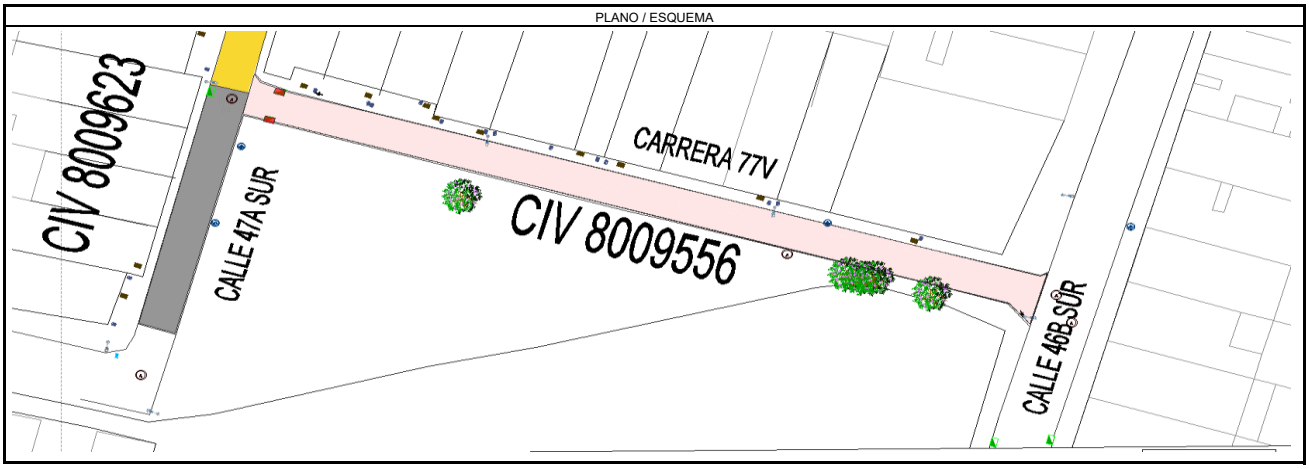

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,024 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
carcamo para tuberia acueducto 4"									
	cruce N-S - carcamo	K0+082,50	4,50	0,55					4,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									4,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									4,50
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

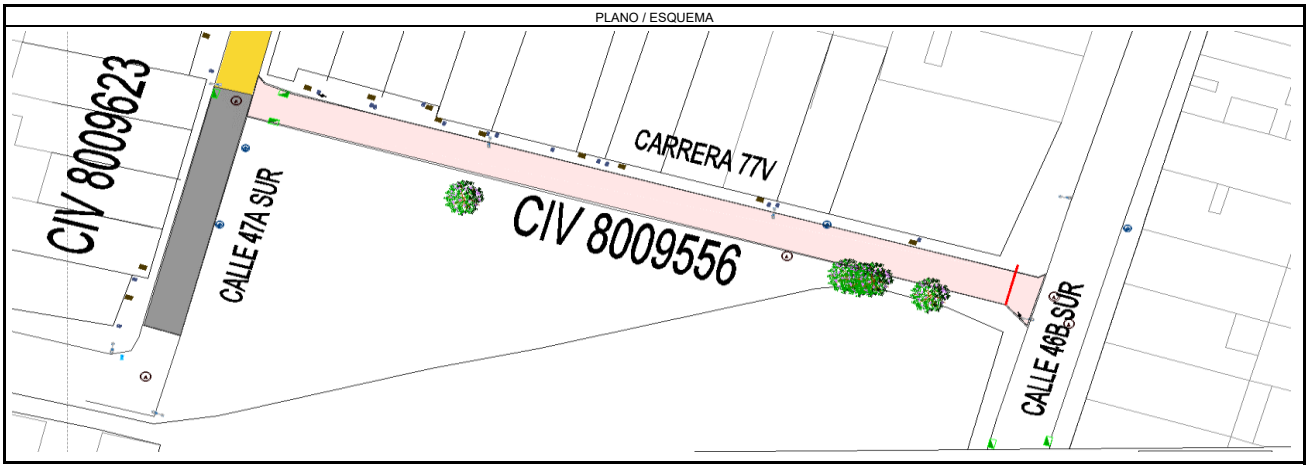

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,024 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009556	CARRERA 77V ENTRE CALLE 46B SUR Y CALLE 47A SUR								
relleno con base granular AR_BG38 para estructura de via									
	estructura de via		84,10	4,20	0,160				56,52
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,160			-2,00	-0,73
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,160			-2,00	-0,35
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									55,44
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									55,44
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

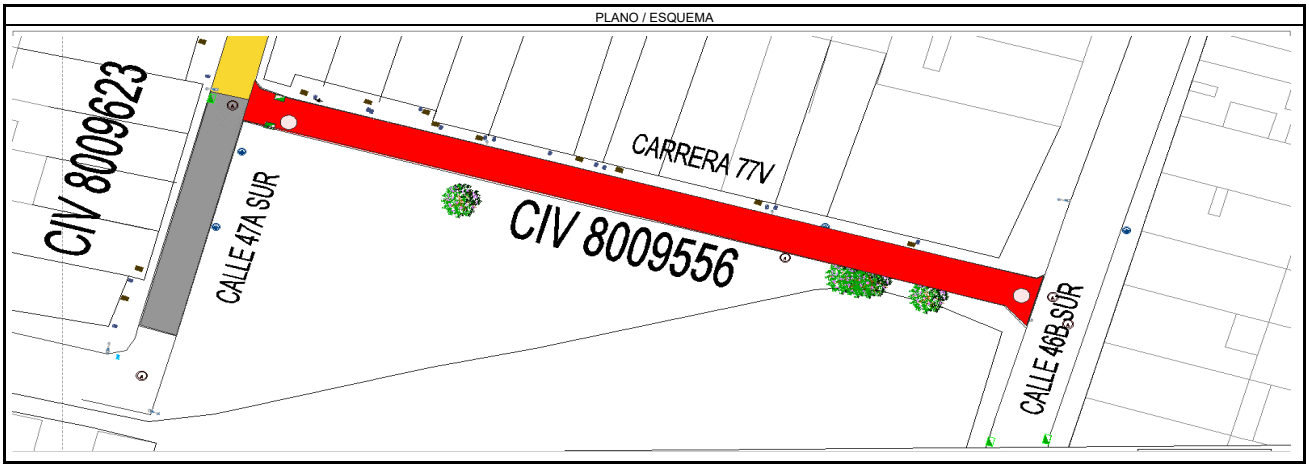

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	15/03/2026

CIV	8009556	
PRIORIDAD:	NC	6

BASE GRANULAR AR_BG38 0,160

CARTERA DE:	BASE GRANULAR AR_BG38	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,20

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					BASE GRANULAR AR_BG38					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO	AREA (m2)	VOLUMEN
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,360	2538,368	2538,376	2538,384	2538,392	2538,520	2538,528	2538,536	2538,544	2538,552	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
K0+005,00	2538,265	2538,293	2538,320	2538,293	2538,265	2538,425	2538,453	2538,480	2538,453	2538,425	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+010,00	2538,290	2538,310	2538,330	2538,310	2538,290	2538,450	2538,470	2538,490	2538,470	2538,450	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+015,00	2538,315	2538,335	2538,355	2538,335	2538,315	2538,475	2538,495	2538,515	2538,495	2538,475	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+020,00	2538,340	2538,360	2538,380	2538,360	2538,340	2538,500	2538,520	2538,540	2538,520	2538,500	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+025,00	2538,365	2538,385	2538,405	2538,385	2538,365	2538,525	2538,545	2538,565	2538,545	2538,525	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+030,00	2538,390	2538,410	2538,430	2538,410	2538,390	2538,550	2538,570	2538,590	2538,570	2538,550	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+035,00	2538,415	2538,435	2538,455	2538,435	2538,415	2538,575	2538,595	2538,615	2538,595	2538,575	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+040,00	2538,440	2538,460	2538,480	2538,460	2538,440	2538,600	2538,620	2538,640	2538,620	2538,600	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+045,00	2538,465	2538,485	2538,505	2538,485	2538,465	2538,625	2538,645	2538,665	2538,645	2538,625	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+050,00	2538,490	2538,510	2538,530	2538,510	2538,490	2538,650	2538,670	2538,690	2538,670	2538,650	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+055,00	2538,515	2538,535	2538,555	2538,535	2538,515	2538,675	2538,695	2538,715	2538,695	2538,675	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+060,00	2538,540	2538,560	2538,580	2538,560	2538,540	2538,700	2538,720	2538,740	2538,720	2538,700	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+065,00	2538,565	2538,585	2538,605	2538,585	2538,565	2538,725	2538,745	2538,765	2538,745	2538,725	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+070,00	2538,590	2538,610	2538,630	2538,610	2538,590	2538,750	2538,770	2538,790	2538,770	2538,750	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+075,00	2538,539	2538,535	2538,531	2538,528	2538,524	2538,699	2538,695	2538,691	2538,688	2538,684	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+080,00	2538,487	2538,480	2538,473	2538,466	2538,458	2538,647	2538,640	2538,633	2538,626	2538,618	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,000	3,360
K0+084,10	2538,445	2538,438	2538,430	2538,418	2538,405	2538,605	2538,598	2538,590	2538,578	2538,565	4,200	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	17,220	2,755
																TOTAL	0,160	353,22	56,52
														area	2,27	POZOS	-2	-4,54	-0,73
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,35
																	TOTAL	346,52	55,44

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: **REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE**

HOJA 1 DE 1

CIV 8009556
BARRIO JACQUELINE Alcantarillado: PLUVIAL Diámetro: 0,305 Rasante: PAV FLEXIBLE Longitud entre ejes: 7,00
estructura 0,48
Tramo: NC6 - PLUVIAL TR 1 Clase de tubería: PVC Pendiente: 0,500% Ancho excavación: 1,00 Corte promedio: 1,587
Base Triturado 0,1

POZO	ABS	COTAS RASANTE	COTAS SUBRASANTE	COTAS CLAVE	COTAS FONDO	CORTE A FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS GRAVA	AREA RELLENOS B-200	VOL RELLENOS GRAVA	VOL RELLENOS B-200	RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	ENTIBADO 2 CARAS	DEMOLICION PAVIMENTO	OBSERVACIONES
PMP38096	K0+000,00	2538,760	2538,280	2537,360	2536,955	1,805	1,00	alt subra			alt subra							
1	K0+000,85	2538,760	2538,280	2537,364	2536,959	1,801	1,00			0,216								excav y relleno hasta rasante
1	K0+004,80	2538,750	2538,270	2537,384	2536,979	1,771	1,00	1,786	7,054	0,216	1,497	0,85	5,91	9,17			1,584	asfalto espesro 33 cm
1	K0+005,75	2538,750	2538,270	2537,389	2536,984	1,286	1,00	1,529	1,452	0,216	1,240	0,21	1,18	1,89				
PMP38096-A	K0+006,15	2538,740	2538,260	2537,391	2536,986	1,274	1,00	1,280	0,512	0,216	0,991	0,09	0,40	0,67				
							SUMAS		**9,02**			**1,14**	**7,49**	**11,72**	**0,00**	**0,00**	**1,58**	**0,00**

TUBERIA DIAM	
12"	5,80

Observaciones:

ENTREGA:	**CESAR JEFFERSON MARTINEZ**	**RECIBE:**
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA	**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
		TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: **REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE**

HOJA 1 DE 1

CIV 8009556
BARRIO JACQUELINE Alcantarillado: PLUVIAL Diámetro: 0,305 Rasante: PAV FLEXIBLE Longitud entre ejes: 73,20
estructura 0,48
Tramo: NC6 - PLUVIAL TR 2 Clase de tubería: PVC Pendiente: 0,500% Ancho excavación: 0,90 Corte promedio: 1,079
Base Triturado 0,1

POZO	ABS	COTAS RASANTE	COTAS SUBRASANTE	COTAS CLAVE	COTAS FONDO	FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS GRAVA	AREA RELLENOS B-200	VOL RELLENOS GRAVA	VOL RELLENOS B-200	RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	ENTIBADO 2 CARAS
PMP38096-A	K0+000,00	2538,740	2538,260	2537,410	2537,005	1,255	0,90	alt subra			alt subra					
1	K0+000,85	2538,740	2538,260	2537,414	2537,009	1,251	0,90			0,191						
1	K0+005,75	2538,746	2538,266	2537,439	2537,034	1,232	0,90	1,117	5,475	0,191	0,854	0,93	4,18	7,12		
2	K0+011,50	2538,808	2538,328	2537,468	2537,063	1,265	0,90	1,124	6,463	0,191	0,860	1,10	4,95	8,40		
3	K0+017,25	2538,890	2538,410	2537,496	2537,091	1,319	0,90	1,163	6,687	0,191	0,899	1,10	5,17	8,69		
4	K0+023,00	2538,865	2538,385	2537,525	2537,120	1,265	0,90	1,163	6,685	0,191	0,899	1,10	5,17	8,69		
5	K0+028,75	2538,800	2538,320	2537,554	2537,149	1,171	0,90	1,096	6,304	0,191	0,833	1,10	4,79	8,19		
6	K0+034,50	2538,770	2538,290	2537,583	2537,178	1,112	0,90	1,028	5,909	0,191	0,764	1,10	4,39	7,68		
7	K0+040,25	2538,680	2538,200	2537,611	2537,206	0,994	0,90	0,948	5,450	0,191	0,684	1,10	3,93	7,08		
8	K0+046,00	2538,690	2538,210	2537,640	2537,235	0,975	0,90	0,886	5,094	0,191	0,622	1,10	3,58	6,62		
9	K0+051,75	2538,710	2538,230	2537,669	2537,264	0,966	0,90	0,874	5,023	0,191	0,610	1,10	3,51	6,53		
10	K0+057,50	2538,700	2538,220	2537,698	2537,293	0,927	0,90	0,852	4,900	0,191	0,588	1,10	3,38	6,37		
11	K0+063,25	2538,690	2538,210	2537,726	2537,321	0,889	0,90	0,817	4,700	0,191	0,554	1,10	3,18	6,11		
12	K0+069,00	2538,665	2538,185	2537,755	2537,350	0,835	0,90	0,776	4,460	0,191	0,512	1,10	2,94	5,80		
PMP38096-B	K0+072,35	2538,580	2538,100	2537,772	2537,367	0,733	0,90	0,706	2,364	0,191	0,442	0,64	1,48	3,07		
							SUMAS		**69,51**			**13,64**	**50,65**	**90,37**	**0,00**	**0,00**

TUBERIA DIAM	
12"	72,00

Observaciones:

ENTREGA:		**RECIBE:**
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ	**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: **REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE**

HOJA 1 DE 1

CIV 8009556
BARRIO JACQUELINE Alcantarillado: SANITARIO Diámetro: 0,202 Rasante: PAV FLEXIBLE Longitud entre ejes: 86,70
estructura 0,48
Tramo: NC6 - SANITARIO Clase de tubería: PVC Pendiente: 0,570% Ancho excavación: 1,00 Corte promedio: 1,602
Base Triturado 0,1

POZO	ABS	COTAS				FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS		VOL RELLENOS		RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	ENTIBADO 2 CARAS
		RASANTE	SUBRASANTE	CLAVE	FONDO					GRAVA	B-200	GRAVA	B-200			
PZ CMP102290	K0+000,00	2538,710	2538,230	2536,750	2536,448	1,782	1,00	alt subra			alt subra					rasante demolida
1	K0+000,85	2538,710	2538,230	2536,755	2536,453	1,777	1,00			0,185						
1	K0+005,75	2538,750	2538,270	2536,783	2536,481	1,789	1,00	1,783	8,738	0,185	1,566	0,91	7,67	11,36		18,035
2	K0+011,50	2538,810	2538,330	2536,816	2536,514	1,816	1,00	1,803	10,366	0,185	1,586	1,06	9,12	13,48		21,293
3	K0+017,25	2538,910	2538,430	2536,848	2536,546	1,884	1,00	1,850	10,638	0,185	1,633	1,06	9,39	13,83		21,836
4	K0+023,00	2538,885	2538,405	2536,881	2536,579	1,826	1,00	1,855	10,665	0,185	1,638	1,06	9,42	13,86		21,890
5	K0+028,75	2538,860	2538,380	2536,914	2536,612	1,768	1,00	1,797	10,333	0,185	1,580	1,06	9,08	13,43		21,226
6	K0+034,50	2538,835	2538,355	2536,947	2536,645	1,710	1,00	1,739	10,001	0,185	1,522	1,06	8,75	13,00		20,561
7	K0+040,25	2538,840	2538,360	2536,979	2536,677	1,683	1,00	1,696	9,755	0,185	1,479	1,06	8,51	12,68		20,069
8	K0+046,00	2538,785	2538,305	2537,012	2536,710	1,595	1,00	1,639	9,422	0,185	1,422	1,06	8,17	12,25		19,405
9	K0+051,75	2538,760	2538,280	2537,045	2536,743	1,537	1,00	1,566	9,004	0,185	1,349	1,06	7,76	11,71		18,568
10	K0+057,50	2538,735	2538,255	2537,078	2536,776	1,479	1,00	1,508	8,672	0,185	1,291	1,06	7,42	11,27		17,904
11	K0+063,25	2538,710	2538,230	2537,111	2536,809	1,421	1,00	1,450	8,340	0,185	1,233	1,06	7,09	10,84		17,239
12	K0+069,00	2538,685	2538,205	2537,143	2536,841	1,364	1,00	1,393	8,007	0,185	1,176	1,06	6,76	10,41		16,575
13	K0+074,75	2538,635	2538,155	2537,176	2536,874	1,281	1,00	1,322	7,603	0,185	1,105	1,06	6,36	9,88		15,767
14	K0+080,50	2538,610	2538,130	2537,209	2536,907	1,223	1,00	1,252	7,199	0,185	1,035	1,06	5,95	9,36		14,958
PZ CMI66609	K0+085,85	2538,708	2538,228	2537,239	2536,937	1,291	1,00	1,257	6,724	0,185	1,040	0,99	5,56	8,74		14,009
							SUMAS		**135,47**			**15,72**	**117,02**	**176,11**	**0,00**	**279,33**

TUBERIA DIAM	
8"	85,50

Observaciones:

ENTREGA:		**RECIBE:**
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ	**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

PLANILLA DOMICILIARÍAS

CÓDIGO: 003
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/09/2024

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATO No.: 938-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 **CIV** 8009556 **FECHA:** 31/03/2026

TRAMO TUBERIA NC6 - SANITARIO **Diametro** 0,152 **base** 0,10

BARRIO: JACQUELINE **TRAMO:** NC 6 **ALCANTARILLADO:** SANITARIO **H ESTRU VIA:** 0,48 **HOJA:** 1 **DE** 1

Abscisa de tubería	Nomenclatura	Costado	Diámetro Tubería (m)	Longitud Tubería	Longitud Excavacion	Ancho Excavación	Cota subrasante de tubería	Cota cimentacion de tubería	Diferencia cotas de tubería a excavación	Cota rasante de caja	Cota lomo entrada a caja	Diferencia cotas de caja	Altura promedio	Volumen excavación	Concreto de anclaje	Area Rellenos		Rellenos		Volumen retiro de sobrantes	Accesorios Yee	semicodo
																Triturado 3/4"	Recebo B200	Triturado 3/4"	Recebo B200			
K0+013,30	77V-07	DER	6"	3,90	3,70	0,60	2538,330	2536,714	1,62	2537,992	2536,792	1,20	1,41	3,30		0,0966	0,730	0,377	2,847	4,28	1,0	
K0+027,60	46B-23	DER	6"	4,60	4,40	0,60	2538,380	2536,812	1,57	2538,124	2536,904	1,22	1,39	3,85		0,0966	0,722	0,444	3,319	5,00	1,0	1,0
K0+030,75	46B-29	DER	6"	4,50	4,30	0,60	2538,380	2536,812	1,57	2538,102	2536,902	1,20	1,38	3,74		0,0966	0,716	0,435	3,220	4,86	1,0	1,0
K0+036,60	46B-35	DER	6"	5,00	4,80	0,60	2538,355	2536,845	1,51	2538,095	2536,945	1,15	1,33	3,99		0,0966	0,683	0,483	3,416	5,19	1,0	1,0
K0+044,50	46B-45	DER	6"	4,50	4,30	0,60	2538,305	2536,910	1,39	2538,200	2537,000	1,20	1,30	3,50		0,0966	0,664	0,435	2,986	4,55	1,0	
K0+047,80	46B-49	DER	6"	4,40	4,20	0,60	2538,305	2536,910	1,39	2538,148	2536,998	1,15	1,27	3,36		0,0966	0,649	0,425	2,854	4,37	1,0	
K0+048,20	46B-49	DER	6"	4,70	4,50	0,60	2538,305	2536,910	1,39	2538,174	2537,004	1,17	1,28	3,62		0,0966	0,655	0,454	3,077	4,70	1,0	
K0+056,10	46B-53	DER	6"	4,15	3,95	0,60	2538,255	2536,976	1,28	2538,259	2537,059	1,20	1,24	3,09		0,0966	0,629	0,401	2,610	4,01	1,0	
K0+060,30	46B-61	DER	6"	4,10	3,90	0,60	2538,230	2537,009	1,22	2538,191	2537,091	1,10	1,16	2,86		0,0966	0,582	0,396	2,385	3,71	1,0	1,0
K0+065,90	46B-63	DER	6"	5,25	5,05	0,60	2538,230	2537,009	1,22	2538,064	2537,114	0,95	1,09	3,42		0,0966	0,537	0,507	2,817	4,45	1,0	1,0
K0+069,20	46B-71	DER	6"	7,15	6,95	0,60	2538,205	2537,041	1,16	2538,184	2537,184	1,00	1,08	4,64		0,0966	0,534	0,691	3,820	6,03	1,0	
K0+077,20	46B-77	DER	6"	4,90	4,70	0,60	2538,130	2537,107	1,02	2538,205	2537,205	1,00	1,01	2,97		0,0966	0,492	0,473	2,411	3,87	1,0	
Totales				57,15										42,33				5,52	35,76	55,02	12,00	5,00

6,001

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** **1/3/2026** **A** **31/3/2026**

Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO del Contrato N° COP 938 DE 2025

(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8009456 - CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
			1. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
1	1,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8195.34	$ 1.142.00	$ 9.359.080.00	10212.16	$ 1.142.00	$ 11.662.287.00	421.48	$ 481.330.00		421.48	$ 481.330.00	9790.68	$ 11.180.957.00
2	1,002	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1375,79	$ 48.679,00	$ 66.972.081,00	1359,01	$ 48.679,00	$ 66.155.248,00	29,54	$ 1.437.978,00		29,54	$ 1.437.978,00	1329,47	$ 64.717.270,00
3	1,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5859.32	$ 7.206.00	$ 42.222.260.00	4763.20	$ 7.206.00	$ 34.323.619.00	213.52	$ 1.538.625.00		213.52	$ 1.538.625.00	4549.68	$ 32.784.994.00
4	1,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1100,00	$ 57.240,00	$ 62.964.000,00	6192,47	$ 57.240,00	$ 354.456.983,00	444,30	$ 25.431.732,00		444,30	$ 25.431.732,00	5748,17	$ 329.025.251,00
5	1,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4566,07	$ 73.056,00	$ 333.578.810,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
6	1,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9171,92	$ 16.517,00	$ 151.492.603,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
7	1,007	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4141,23	$ 235.794,00	$ 976.477.187,00	0,00	$ 235.794,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
8	1,008	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1200,00	$ 220.890,00	$ 265.068.000,00	0,00	$ 220.890,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
9	1,009	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 213.572,00	$ 616.219.292,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
10	1,010	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 205.221,00	$ 592.124.151,00	0,00	$ 205.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
11	1,011	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	545,12	$ 1.757.344,00	$ 957.963.361,00	0,00	$ 1.757.344,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
12	1,012	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	545,12	$ 1.953.442,00	$ 1.064.860.303,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
13	1,013	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.003,00	$ 38.316.276,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
14	1,014	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.877,00	$ 46.682.108,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
15	1,015	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3930,17	$ 22.817,00	$ 89.674.689,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
16	1,016	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	66,00	$ 228.161,00	$ 15.058.626,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
17	1,017	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	1420,00	$ 190.133,00	$ 269.988.860,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
18	1,018	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1095,38	$ 1.712.945,00	$ 1.876.325.694,00	442,61	$ 1.712.945,00	$ 758.166.586,00		$ -		0,00	$ -	442,61	$ 758.166.586,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			2. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
19	2,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6603.57	$ 1.142.00	$ 7.541.277.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
20	2,002	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1320,71	$ 234.955,00	$ 310.307.418,00	148,00	$ 234.955,00	$ 34.773.340,00		$ -		0,00	$ -	148,00	$ 34.773.340,00
21	2,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4406.02	$ 7.206.00	$ 31.749.780.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
22	2,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	6603,57	$ 57.240,00	$ 377.988.347,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
23	2,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	600,00	$ 73.056,00	$ 43.833.600,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
24	2,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2200,00	$ 16.517,00	$ 36.337.400,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
25	2,007	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2203,01	$ 220.757,00	$ 486.329.879,00	0,00	$ 220.757,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
26	2,008	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	700,00	$ 208.805,00	$ 146.163.500,00	0,00	$ 208.805,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
27	2,009	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 240.902,00	$ 264.992.200,00	0,00	$ 240.902,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
28	2,010	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 242.117,00	$ 266.328.700,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
29	2,011	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	1234,31	$ 488.707,00	$ 603.215.937,00	0,00	$ 488.707,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
30	2,012	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	1320,71	$ 7.018,00	$ 9.268.743,00	0,00	$ 7.018,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
31	2,013	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2311.25	$ 13.278.00	$ 30.688.778.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
32	2,014	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	23772,85	$ 10.549,00	$ 250.779.795,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
33	2,015	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	330,18	$ 9.221,00	$ 3.044.590,00	0,00	$ 9.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
34	2,016	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	6603.57	$ 3.206.00	$ 21.171.045.00	0.00	$ 3.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
35	2,017	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	2905,57	$ 17.296,00	$ 50.254.739,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
36	2,018	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2905,57	$ 3.338,00	$ 9.698.793,00	248,00	$ 3.338,00	$ 827.824,00		$ -		0,00	$ -	248,00	$ 827.824,00
37	2,019	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	2829,63	$ 22.817,00	$ 64.563.668,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
38	2,020	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	19,00	$ 228.161,00	$ 4.335.059,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
39	2,021	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	180,00	$ 190.133,00	$ 34.223.940,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			3. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
40	3,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3253.08	$ 1.142.00	$ 3.715.017.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
41	3,002	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	8,13	$ 371.818,00	$ 3.022.880,00	0,00	$ 371.818,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
42	3,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	162.65	$ 7.206.00	$ 1.172.056.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
43	3,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	275,97	$ 57.240,00	$ 15.796.523,00	0,00	$ 57.240,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
44	3,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	81,33	$ 73.056,00	$ 5.941.644,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
45	3,006	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	1382,56	$ 9.347,00	$ 12.922.788,00	0,00	$ 9.347,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
46	3,007	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	162,65	$ 248.800,00	$ 40.467.320,00	0,00	$ 248.800,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
47	3,008	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	80,00	$ 213.572,00	$ 17.085.760,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
48	3,009	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	195,18	$ 1.712.945,00	$ 334.332.605,00	0,00	$ 1.712.945,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
49	3,010	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	81,33	$ 1.953.442,00	$ 158.873.438,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
50	3,011	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.003,00	$ 5.534.388,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
51	3,012	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.877,00	$ 6.742.745,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
52	3,013	4758	SELLO DE FISURAS	ML	800.00	$ 11.144.00	$ 8.915.200.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
53	3,014	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	487.96	$ 13.037.00	$ 6.361.535.00	0.00	$ 13.037.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
54	3,015	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	25,00	$ 131.419,00	$ 3.285.475,00	2,00	$ 131.419,00	$ 262.838,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 262.838,00
55	3,016	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	140,00	$ 131.419,00	$ 18.398.660,00	0,00	$ 131.419,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			4. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
56	4,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3672.96	$ 1.142.00	$ 4.194.520.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
57	4,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	459.12	$ 58.217.00	$ 26.728.589.00	0.00	$ 58.217.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
58	4,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	619,81	$ 57.240,00	$ 35.477.924,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
59	4,004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	252,52	$ 73.056,00	$ 18.447.809,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
60	4,005	3486	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	550,94	$ 234.955,00	$ 129.447.048,00	0,00	$ 234.955,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
61	4,006	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	206.60	$ 248.800.00	$ 51.402.080.00	0.00	$ 248.800.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
62	4,007	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	68,87	$ 242.117,00	$ 16.674.598,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
63	4,008	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m	M2	550,94	$ 464.229,00	$ 255.764.182,00	0,00	$ 464.229,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
64	4,009	3708	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	9182.40	$ 7.018.00	$ 64.442.083.00	0.00	$ 7.018.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
65	4,010	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	4591.20	$ 13.278.00	$ 60.961.954.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
66	4,011	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1836,48	$ 10.549,00	$ 19.373.028,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
67	4,012	4758	SELLO DE FISURAS	ML	100.00	$ 11.144.00	$ 1.114.400.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
68	4,013	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1616,10	$ 17.296,00	$ 27.952.107,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
69	4,014	3723	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	10.65	$ 131.419.00	$ 1.399.612.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
70	4,015	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	20.94	$ 131.419.00	$ 2.751.914.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
71	4,016	3434	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	20,00	$ 97.222,00	$ 1.944.440,00	0,00	$ 97.222,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
72	4,017	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	20,00	$ 90.021,00	$ 1.800.420,00	0,00	$ 90.021,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			5. MANTENIMIENTO PERIODICO EN ANDEN DE CONCRETO														
73	5,001	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	2683,78	$ 10.370,00	$ 27.830.799,00	3088,81	$ 10.370,00	$ 32.030.960,00		$ -		0,00	$ -	3088,81	$ 32.030.960,00
74	5,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	268.38	$ 58.217.00	$ 15.624.278.00	542.24	$ 58.217.00	$ 31.567.586.00		$ -		0.00	$ -	542.24	$ 31.567.586.00
75	5,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	536,76	$ 57.240,00	$ 30.724.142,00	2260,66	$ 57.240,00	$ 129.400.178,00		$ -		0,00	$ -	2260,66	$ 129.400.178,00
76	5,004	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	268,38	$ 392.394,00	$ 105.310.702,00	0,00	$ 392.394,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
77	5,005	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	2683,78	$ 105.225,00	$ 282.400.751,00	73,00	$ 105.225,00	$ 7.681.425,00		$ -		0,00	$ -	73,00	$ 7.681.425,00
78	5,006	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	89.46	$ 1.212.741.00	$ 108.491.810.00	0.00	$ 1.212.741.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
79	5,007	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO). INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS	M2	2236,48	$ 165.385,00	$ 369.880.245,00	0,00	$ 165.385,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
80	5,008	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO	UN	20,00	$ 2.082.959,00	$ 41.659.180,00	0,00	$ 2.082.959,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
81	5,009	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	2236,48	$ 145.068,00	$ 324.441.681,00	0,00	$ 145.068,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
82	5,010	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO)	ML	4472,97	$ 78.310,00	$ 350.278.281,00	10,00	$ 78.310,00	$ 783.100,00		$ -		0,00	$ -	10,00	$ 783.100,00
83	5,011	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	4472,97	$ 102.949,00	$ 460.487.789,00	1533,10	$ 102.949,00	$ 157.831.112,00		$ -		0,00	$ -	1533,10	$ 157.831.112,00
84	5,012	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	6262,15	$ 86.663,00	$ 542.696.705,00	529,68	$ 86.663,00	$ 45.903.658,00		$ -		0,00	$ -	529,68	$ 45.903.658,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			6. REDES														
85	6,001	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5808,47	$ 58.217,00	$ 338.151.698,00	3657,45	$ 58.217,00	$ 212.925.767,00	92,83	$ 5.404.284,00		92,83	$ 5.404.284,00	3564,62	$ 207.521.483,00
86	6,002	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1452,12	$ 73.056,00	$ 106.086.079,00	4754,66	$ 73.056,00	$ 347.356.441,00		$ -		0,00	$ -	4754,66	$ 347.356.441,00
87	6,003	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4356,35	$ 49.220,00	$ 214.419.547,00	37,00	$ 49.220,00	$ 1.821.140,00		$ -		0,00	$ -	37,00	$ 1.821.140,00
88	6,004	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	217,82	$ 209.827,00	$ 45.704.517,00	886,54	$ 209.827,00	$ 186.020.029,00	17,66	$ 3.705.545,00		17,66	$ 3.705.545,00	868,88	$ 182.314.484,00
89	6,005	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	653,45	$ 125.986,00	$ 82.325.552,00	0,00	$ 125.986,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
90	6,006	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	72,61	$ 268.758,00	$ 19.514.518,00	0,00	$ 268.758,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
91	6,007	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	435,64	$ 195.195,00	$ 85.034.750,00	43,00	$ 195.195,00	$ 8.393.385,00	7,31	$ 1.426.875,00		7,31	$ 1.426.875,00	35,69	$ 6.966.510,00
92	6,008	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	40,00	$ 2.379.851,00	$ 95.194.040,00	56,00	$ 2.379.851,00	$ 133.271.656,00	1,00	$ 2.379.851,00		1,00	$ 2.379.851,00	55,00	$ 130.891.805,00
93	6,009	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	280,00	$ 928.646,00	$ 260.020.880,00	82,00	$ 928.646,00	$ 76.148.972,00	1,89	$ 1.755.141,00		1,89	$ 1.755.141,00	80,11	$ 74.393.831,00
94	6,010	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	40,00	$ 170.695,00	$ 6.827.800,00	65,00	$ 170.695,00	$ 11.095.175,00		$ -		0,00	$ -	65,00	$ 11.095.175,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/3/2026 (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8009456 - CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
95	6,011	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	295,20	$ 180.628,00	$ 53.321.386,00	0,00	$ 180.628,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
96	6,012	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190,41	$ 528.764,00	$ 100.681.953,00	23,35	$ 528.764,00	$ 12.346.639,00		$ -		0,00	$ -	23,35	$ 12.346.639,00
97	6,013	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3310,80	$ 46.883,00	$ 155.220.236,00	0,00	$ 46.883,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
98	6,014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1744,93	$ 221.771,00	$ 386.974.871,00	378,50	$ 221.771,00	$ 83.940.324,00		$ -		0,00	$ -	378,50	$ 83.940.324,00
99	6,015	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	60,00	$ 535.886,00	$ 32.153.160,00	165,50	$ 535.886,00	$ 88.689.133,00		$ -		0,00	$ -	165,50	$ 88.689.133,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	
			7. ITEMS DE INCLUSION														
100	7,001	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 88.189,00		727,96	$ 88.189,00	$ 64.198.064,00	80,07	$ 7.061.293,00		80,07	$ 7.061.293,00	647,89	
101	7,002	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 122.135,00		792,57	$ 122.135,00	$ 96.800.537,00	48,90	$ 5.972.402,00		48,90	$ 5.972.402,00	743,67	
102	7,003	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 172.135,00		33,60	$ 172.135,00	$ 5.783.736,00		$ -		0,00	$ -	33,60	
103	7,004	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 351.631,00		88,70	$ 351.631,00	$ 31.189.670,00		$ -		0,00	$ -	88,70	
104	7,005	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$ 2.400.00		9059.81	$ 2.400.00	$ 21.743.544.00	293.69	$ 704.856.00		293.69	$ 704.856.00	8766.12	
105	7,006	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2		$ 3.740.00		1936.46	$ 3.740.00	$ 7.242.360.00		$ -		0.00	$ -	1936.46	
106	7,007	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 92.526,00		500,20	$ 92.526,00	$ 46.281.505,00		$ -		0,00	$ -	500,20	
107	7,008	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3		$ 1.843.898,00		10,41	$ 1.843.898,00	$ 19.194.978,00		$ -		0,00	$ -	10,41	
108	7,009	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		165,20	$ 10.811,00	$ 1.785.977,00		$ -		0,00	$ -	165,20	
109	7,010	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		1,00	$ 10.811,00	$ 10.811,00		$ -		0,00	$ -	1,00	
110	7,011	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	UN		$ 656.068,00		341,00	$ 656.068,00	$ 223.719.188,00		$ -		0,00	$ -	341,00	
111	7,012	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$ 630.227,00		33,00	$ 630.227,00	$ 20.797.491,00		$ -		0,00	$ -	33,00	
112	7,013	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA)	UN		$ 47.561,00		14,00	$ 47.561,00	$ 665.854,00		$ -		0,00	$ -	14,00	
113	7,014	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 566.503.00		341.00	$ 566.503.00	$ 193.177.523.00		$ -		0.00	$ -	341.00	
114	7,015	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 114.367.00		451.00	$ 114.367.00	$ 51.579.517.00		$ -		0.00	$ -	451.00	
115	7,016	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3		$ 2.093.317,00		634,19	$ 2.093.317,00	$ 1.327.560.708,00		$ -		0,00	$ -	634,19	
116	7,017	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.881,00		8744,61	$ 4.881,00	$ 42.682.441,00		$ -		0,00	$ -	8744,61	
117	7,018	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN		$ 852.604,00		6,00	$ 852.604,00	$ 5.115.624,00	1,00	$ 852.604,00		1,00	$ 852.604,00	5,00	
118	7,019	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN		$ 294.438.00		28.00	$ 294.438.00	$ 8.244.264.00	2.00	$ 588.876.00		2.00	$ 588.876.00	26.00	
119	7,020	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 100.003,00		9059,81	$ 100.003,00	$ 906.008.179,00	293,69	$ 29.369.881,00		293,69	$ 29.369.881,00	8766,12	
120	7,021	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 101.831.00		306.00	$ 101.831.00	$ 31.160.286.00	51.40	$ 5.234.113.00		51.40	$ 5.234.113.00	254.60	
121	7,022	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 159.155,00		2619,76	$ 159.155,00	$ 416.947.903,00	162,18	$ 25.811.758,00		162,18	$ 25.811.758,00	2457,58	
122	7,023	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.525,00		341,00	$ 299.525,00	$ 102.138.025,00	16,00	$ 4.792.400,00		16,00	$ 4.792.400,00	325,00	
123	7,024	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 116.431,00		38,00	$ 116.431,00	$ 4.424.378,00	4,00	$ 465.724,00		4,00	$ 465.724,00	34,00	
124	7,025	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN		$ 1.517.446,00		23,00	$ 1.517.446,00	$ 34.901.258,00		$ -		0,00	$ -	23,00	
125	7,026	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 294.664,00		2,00	$ 294.664,00	$ 589.328,00		$ -		0,00	$ -	2,00	
126	7,027	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.320.280,00		149,30	$ 2.320.280,00	$ 346.417.804,00		$ -		0,00	$ -	149,30	
127	7,028	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.544.307,00		2,00	$ 2.544.307,00	$ 5.088.614,00		$ -		0,00	$ -	2,00	
128	7,029	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.800.338,00		2,00	$ 2.800.338,00	$ 5.600.676,00		$ -		0,00	$ -	2,00	
129	7,030	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 14". ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.328.401,00		1,00	$ 3.328.401,00	$ 3.328.401,00		$ -		0,00	$ -	1,00	
130	7,031	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 16". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.800.458,00		34,50	$ 3.800.458,00	$ 131.115.801,00		$ -		0,00	$ -	34,50	
131	7,032	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 78.395,00		4593,68	$ 78.395,00	$ 360.121.544,00	182,60	$ 14.314.927,00		182,60	$ 14.314.927,00	4411,08	
132	7,033	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.749,00		9059,81	$ 4.749,00	$ 43.025.038,00		$ -		0,00	$ -	9059,81	
133	7,034	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 3.546.00		48.20	$ 3.546.00	$ 170.917.00		$ -		0.00	$ -	48.20	
134	7,035	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 10.058.00		14.00	$ 10.058.00	$ 140.812.00		$ -		0.00	$ -	14.00	
135	7,036	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	ML		$ 10.525,00		3979,34	$ 10.525,00	$ 41.882.554,00	102,80	$ 1.081.970,00		102,80	$ 1.081.970,00	3876,54	
136	7,037	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3		$ 198.532,00		64,08	$ 198.532,00	$ 12.721.931,00		$ -		0,00	$ -	64,08	
137	7,038	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 984.823.00		16.00	$ 984.823.00	$ 15.757.168.00		$ -		0.00	$ -	16.00	
138	7,039	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 7.459.739,00		5,00	$ 7.459.739,00	$ 37.298.695,00		$ -		0,00	$ -	5,00	
139	7,040	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN		$ 272.085,00		14,00	$ 272.085,00	$ 3.809.190,00		$ -		0,00	$ -	14,00	
140	7,041	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE		$ 2.474.248,00		14,00	$ 2.474.248,00	$ 34.639.472,00	2,00	$ 4.948.496,00		2,00	$ 4.948.496,00	12,00	
141	7,042	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24". ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.697.698,00		100,70	$ 5.697.698,00	$ 573.758.189,00		$ -		0,00	$ -	100,70	
142	7,043	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 257.553,00		1875,14	$ 257.553,00	$ 482.947.932,00	58,74	$ 15.128.663,00		58,74	$ 15.128.663,00	1816,40	
143	7,044	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3		$ 231.349,00		348,56	$ 231.349,00	$ 80.639.007,00		$ -		0,00	$ -	348,56	
144	7,045	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$ 10.108,00		2258,60	$ 10.108,00	$ 22.829.929,00		$ -		0,00	$ -	2258,60	
145	7,046	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 33.747,00		12148,62	$ 33.747,00	$ 409.979.479,00	319,39	$ 10.778.454,00		319,39	$ 10.778.454,00	11829,23	
146	7,047	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 4.152.501,00		4,00	$ 4.152.501,00	$ 16.610.004,00		$ -		0,00	$ -	4,00	
147	7,048	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.196.00		7958.68	$ 6.196.00	$ 49.311.981.00		$ -		0.00	$ -	7958.68	
148	7,049	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 25.701,00		7958,68	$ 25.701,00	$ 204.546.035,00		$ -		0,00	$ -	7958,68	
149	7,050	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 35.750.00		408.47	$ 35.750.00	$ 14.602.803.00		$ -		0.00	$ -	408.47	
150	7,051	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2		$ 191.703,00		510,64	$ 191.703,00	$ 97.891.220,00		$ -		0,00	$ -	510,64	
151	7,052	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 8.852.00		2830.00	$ 8.852.00	$ 25.051.160.00		$ -		0.00	$ -	2830.00	
152	7,053	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 124.194,00		19,00	$ 124.194,00	$ 2.359.686,00		$ -		0,00	$ -	19,00	
153	7,054	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 26.513.00		54.00	$ 26.513.00	$ 1.431.702.00		$ -		0.00	$ -	54.00	
154	7,055	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	UN		$ 311.753,00		19,00	$ 311.753,00	$ 5.923.307,00		$ -		0,00	$ -	19,00	
155	7,056	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.096.615,00		1,00	$ 5.096.615,00	$ 5.096.615,00		$ -		0,00	$ -	1,00	
156	7,057	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 703.569,00		62,50	$ 703.569,00	$ 43.973.063,00		$ -		0,00	$ -	62,50	
157	7,058	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 425.516,00		35,50	$ 425.516,00	$ 15.105.818,00		$ -		0,00	$ -	35,50	
158	7,059	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		$ 27.170,00		1569,67	$ 27.170,00	$ 42.647.934,00		$ -		0,00	$ -	1569,67	
159	7,060	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML		$ 29.226,00		340,50	$ 29.226,00	$ 9.951.453,00		$ -		0,00	$ -	340,50	
160	7,061	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		$ 17.602,00		1910,17	$ 17.602,00	$ 33.622.812,00		$ -		0,00	$ -	1910,17	
												$ -		0.00	$ -	0.00	
			8. NO PREVISTOS														
161	8,001	NP-1	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 14 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO)	M3		$ 1.385.170,00		5,00	$ 1.385.170,00	$ 6.925.850,00		$ -		0,00	$ -	5,00	
162	8,002	NP-2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 282.325,00		1355,52	$ 282.325,00	$ 382.697.184,00		$ -		0,00	$ -	1355,52	
163	8,003	NP-3	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 77.819.00		9059.81	$ 77.819.00	$ 705.025.354.00	293.69	$ 22.854.662.00		293.69	$ 22.854.662.00	8766.12	
164	8,004	NP-4	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	M3		$ 476.745,00		2281,25	$ 476.745,00	$ 1.087.574.531,00	64,91	$ 30.945.518,00		64,91	$ 30.945.518,00	2216,34	
165	8,005	NP-5	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	M3		$ 19.423,00		94,00	$ 19.423,00	$ 1.825.762,00		$ -		0,00	$ -	94,00	
166	8,006	NP-6	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%)	UN		$ 107.272,00		9059,81	$ 107.272,00	$ 971.863.938,00	281,00	$ 30.143.432,00		281,00	$ 30.143.432,00	8778,81	
167	8,007	NP-7	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	ML		$ 446.392,00		341,00	$ 446.392,00	$ 152.219.672,00		$ -		0,00	$ -	341,00	
168	8,008	NP-8	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacíon)	UN		$ 360.064.00		341.00	$ 360.064.00	$ 122.781.824.00		$ -		0.00	$ -	341.00	
169	8,009	NP-9	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN		$ 162.297.00		341.00	$ 162.297.00	$ 55.343.277.00		$ -		0.00	$ -	341.00	
170	8,010	NP-10	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 657.822,00		137,00	$ 657.822,00	$ 90.121.614,00		$ -		0,00	$ -	137,00	
171	8,011	NP-11	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 14 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 744.157,00		4,00	$ 744.157,00	$ 2.976.628,00		$ -		0,00	$ -	4,00	

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Fecha Inicio) **A** 31/3/2026 (Fecha Fin)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR ACTUAL PAGO $ 19.645.886.208,00 (Escriba el valor total del pago que se solicita)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVMAC SAS (Escriba el número y razón social del interventor - y en todos los números de cifras escriba $ y separe)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO (Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS (Escriba el nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número del contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8005456 - CARRERA 77V BIS S ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES							
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS			SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
172	8,012	NP-12	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 16 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 795.331,00		1,00	$ 795.331,00	$ 795.331,00		$ -		0,00	$ -	1,00	
173	8,013	NP-13	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 896.388,00		49,75	$ 896.388,00	$ 44.595.303,00		$ -		0,00	$ -	49,75	
174	8,014	NP-14	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 974.773,00		62,50	$ 974.773,00	$ 60.923.313,00		$ -		0,00	$ -	62,50	
175	8,015	NP-15	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	UN		$ 269.294,00		24,00	$ 269.294,00	$ 6.463.056,00	1,00	$ 269.294,00		1,00	$ 269.294,00	23,00	
176	8,016	NP-16	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye taladro rotopercutor 3/4", planta electrica 65hp)	UN		$ 76.124,00		11,00	$ 76.124,00	$ 837.364,00		$ -		0,00	$ -	11,00	
177	8,017	NP-17	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, EJECUTIVE BROCAS, CINCEARRO, Y COMBUSTIBLE)	UN		$ 180.006,00		9059,81	$ 180.006,00	$ 1.630.820.159,00	281,00	$ 50.581.686,00		281,00	$ 50.581.686,00	8778,81	
178	8,018	NP-18	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)	UN		$ 4.852.592,00		124,00	$ 4.852.592,00	$ 601.721.408,00		$ -		0,00	$ -	124,00	
179	8,019	NP-19	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML		$ 563.913,00		4,00	$ 563.913,00	$ 2.255.652,00		$ -		0,00	$ -	4,00	
180	8,020	NP-20	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalación)	UN		$ 486.892,00		4,00	$ 486.892,00	$ 1.947.568,00		$ -		0,00	$ -	4,00	
181	8,021	NP-21	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN		$ 208.334,00		4,00	$ 208.334,00	$ 833.336,00		$ -		0,00	$ -	4,00	
182	8,022	NP-22	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 464.671,00		15,00	$ 464.671,00	$ 6.970.065,00		$ -		0,00	$ -	15,00	
183	8,023	NP-23	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIÓN, CON COLMATACIÓN SUPERIOR AL 30% Y DIÁMETROS DE 8" A 36" INCLUYE ACCIÓ	ML		$ 661.727,00		86,80	$ 661.727,00	$ 57.437.904,00		$ -		0,00	$ -	86,80	
184	8,024	NP-24	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 400.192,00		170,75	$ 400.192,00	$ 68.332.784,00		$ -		0,00	$ -	170,75	
185	8,025	NP-25	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 223.645,00		2,00	$ 223.645,00	$ 447.290,00		$ -		0,00	$ -	2,00	
186	8,026	NP-26	PISO EN CONCRETO MR45 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 346.192,00		172,86	$ 346.192,00	$ 59.842.749,00		$ -		0,00	$ -	172,86	
187	8,027	NP-27	PISO EN CONCRETO 3000 ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 318.979,00		580,92	$ 318.979,00	$ 185.301.281,00		$ -		0,00	$ -	580,92	
188	8,028	NP-28	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_RCB) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 262.519,00		1815,49	$ 262.519,00	$ 476.600.619,00	49,93	$ 13.107.574,00		49,93	$ 13.107.574,00	1765,56	
				TOTALES			$ 16.832.066.661,00			$ 16.456.658.116,00		$ 318.569.344,00			$ 318.569.344,00		$ 2.784.274.044,00

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES	OBRA EJECUTADA		
				PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
OBRA EJECUTADA						
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 12.294.241.586,25	$ 12.238.163.245,35	$ 236.907.818,64		$ 236.907.818,64
ADMINISTRACIÓN	28,47%	$ 3.500.170.579,60	$ 3.484.205.075,95	$ 67.447.656,02		$ 67.447.656,02
IMPREVISTO	1,00%	$ 122.942.415,86	$ 122.381.632,45	$ 2.369.078,19		$ 2.369.078,19
UTILIDAD	5,00%	$ 614.712.079,31	$ 611.908.162,27	$ 11.845.390,94		$ 11.845.390,94
SUBTOTAL A.I.U	34,47%	$ 4.237.825.074,77	$ 4.218.494.870,67	$ 81.662.125,15		$ 81.662.125,15
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=34,47%)		**$ 16.532.066.661,00**	**$ 16.456.658.116,00**	**$ 318.569.344,00**		**$ 318.569.344,00**
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES. SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (B) =	**12,3764%**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 29.320.659,00**		**$ 29.320.659,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA). SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (C) =	**2,3210%**	**$ 285.447.701,00**	**$ 285.447.701,00**	**$ -**	**$ -**	
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES) (E) = (A) + (B) + (C) =		**$ 18.339.098.878,00**	**$ 18.339.098.878,00**		**$ -**	
OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS		**$ 1.306.787.330,00**	**$ 1.302.195.875,00**			
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**30,000%**	**$ 5.893.765.862,00**		**$ -**	**$ -**	
(K) COSTO TOTAL MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (F)+(G)		**$ 19.645.886.208,00**	**$ 19.645.886.208,00**		**$ -**	
VALOR NETO A PAGAR				**$ 347.890.603,00**		**$ 347.890.603,00**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN (En letras) (31) (En número) días del mes de MARZO (Mes en que se Firma el acta) de 2026 (Año de Firma del acta)

(Firma)
SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista

(Firma)
SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
replanteo de segmento vial			51,40	8,20					421,48
	planimetria y altimetria inicial								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									421,48
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									421,48
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

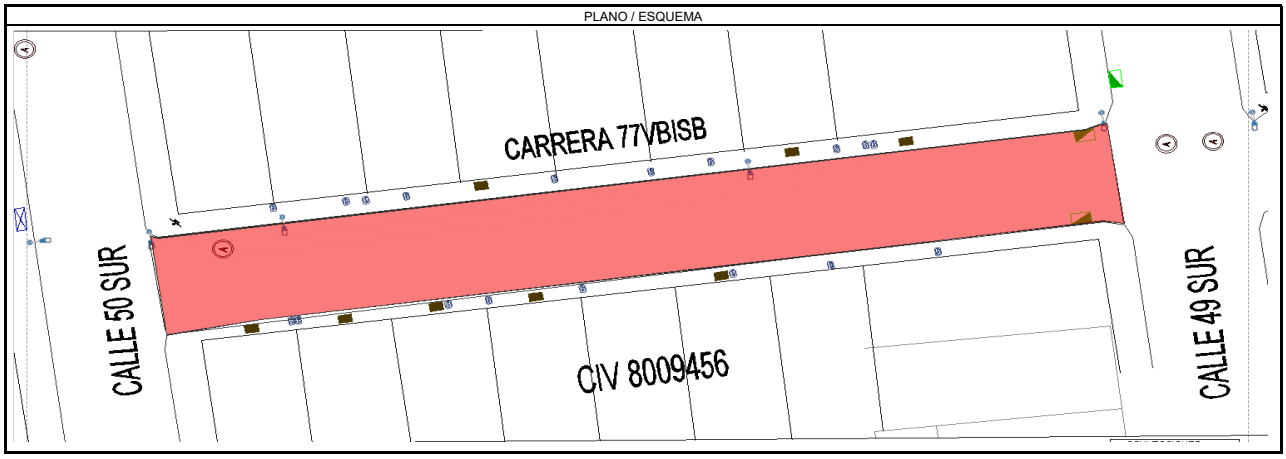

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
demolicion de carpeta asfaltica existente									
	asfalto existente		51,40	5,80	0,10				29,81
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,10			-1,00	-0,23
	sumideros existentes	area	0,25		0,10			-2,00	-0,05
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									29,54
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									29,54
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

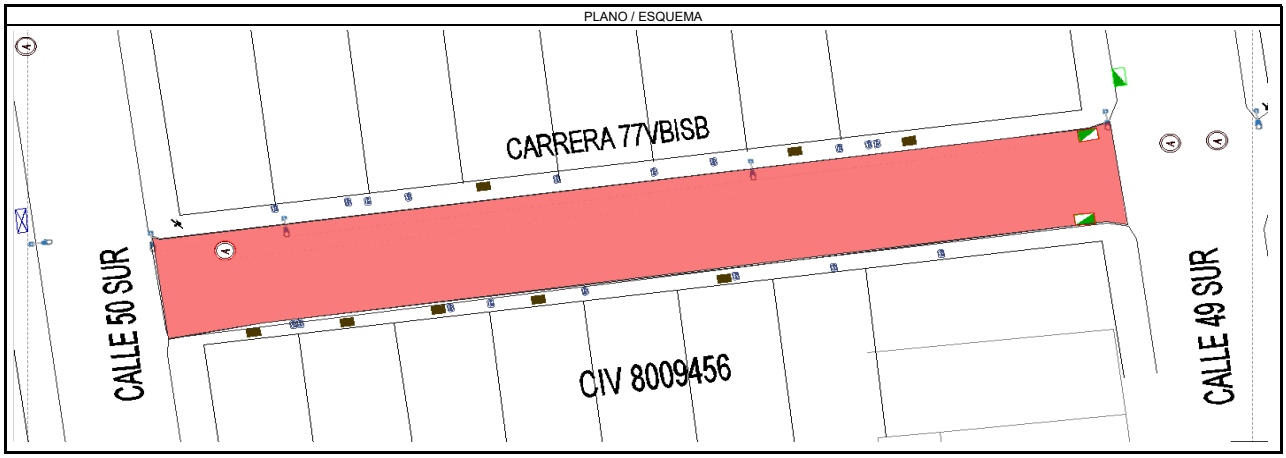

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	10/03/2026

CIV	8009456	
PRIORIDAD:	NC	11

ESPESOR MEDIO ENCONTRADO 0,100

CARTERA DE:	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE - PLACA EN CONCRETO	ANCHO DE VIA DEMOLIDA	5,80

ABSCISA (m)	ASFALTO EXISTENTE					DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2539,080	2539,073	2539,065	2539,088	2539,110	2538,980	2538,973	2538,965	2538,988	2539,010	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
K0+005,00	2539,085	2539,105	2539,125	2539,115	2539,105	2538,985	2539,005	2539,025	2539,015	2539,005	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	29,000	2,900
K0+010,00	2539,185	2539,178	2539,170	2539,158	2539,145	2539,085	2539,078	2539,070	2539,058	2539,045	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	29,000	2,900
K0+015,00	2539,175	2539,168	2539,160	2539,155	2539,150	2539,075	2539,068	2539,060	2539,055	2539,050	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	29,000	2,900
K0+020,00	2539,225	2539,218	2539,210	2539,213	2539,215	2539,125	2539,118	2539,110	2539,113	2539,115	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	29,000	2,900
K0+025,50	2539,225	2539,233	2539,240	2539,228	2539,215	2539,125	2539,133	2539,140	2539,128	2539,115	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	31,900	3,190
K0+030,00	2539,220	2539,233	2539,245	2539,248	2539,250	2539,120	2539,133	2539,145	2539,148	2539,150	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	26,100	2,610
K0+035,00	2539,225	2539,238	2539,250	2539,240	2539,230	2539,125	2539,138	2539,150	2539,140	2539,130	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	29,000	2,900
K0+040,00	2539,230	2539,253	2539,275	2539,258	2539,240	2539,130	2539,153	2539,175	2539,158	2539,140	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	29,000	2,900
K0+045,00	2539,260	2539,265	2539,270	2539,260	2539,250	2539,160	2539,165	2539,170	2539,160	2539,150	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	29,000	2,900
K0+051,40	2539,170	2539,180	2539,190	2539,180	2539,170	2539,070	2539,080	2539,090	2539,080	2539,070	5,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	37,120	3,712
																TOTAL	0,100	298,12	29,81
														area	2,27	POZOS	-1	-2,27	-0,23
														sumidero	0,245	SUMIDEROS	-2	-0,49	-0,05
																	TOTAL	295,36	29,54

ENTREGA:	
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	
	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
excavacion mecanica estructura de via									
	caja de via		51,40	5,80	0,383				114,14
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,383			-1,00	-0,87
	sumideros existentes	area	0,25		0,383			-2,00	-0,19
excavacion mecanica REDES - SANITARIA									
	NC11 - SANITARIO		48,40	1,10	1,89				100,43
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									213,52
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									213,52
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

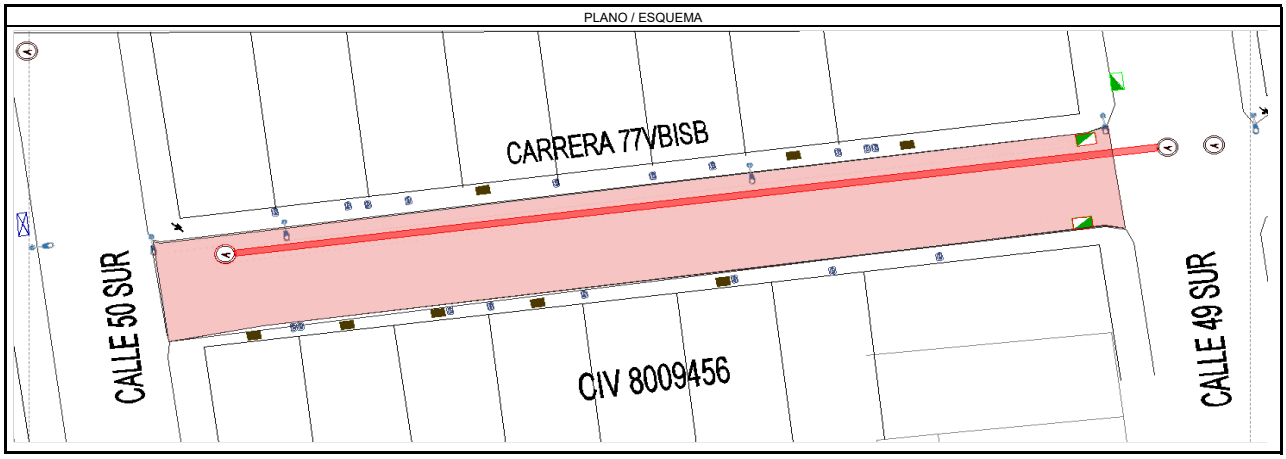

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	10/03/2026

CIV	8009456	
PRIORIDAD:	NC	11

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	EXCAVACION MECANICA DE VIA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	5,80

ABSCISA (m)	DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE					SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,980	2538,973	2538,965	2538,988	2539,010	2538,572	2538,569	2538,565	2538,588	2538,610	5,800	0,408	0,404	0,400	0,400	0,400	0,402		
K0+005,00	2538,985	2539,005	2539,025	2539,015	2539,005	2538,605	2538,645	2538,685	2538,663	2538,640	5,800	0,380	0,360	0,340	0,352	0,365	0,360	29,000	11,048
K0+010,00	2539,085	2539,078	2539,070	2539,058	2539,045	2538,638	2538,675	2538,711	2538,689	2538,666	5,800	0,447	0,403	0,359	0,369	0,379	0,391	29,000	10,888
K0+015,00	2539,075	2539,068	2539,060	2539,055	2539,050	2538,671	2538,701	2538,731	2538,712	2538,692	5,800	0,404	0,367	0,329	0,343	0,358	0,360	29,000	10,898
K0+020,00	2539,125	2539,118	2539,110	2539,113	2539,115	2538,704	2538,734	2538,764	2538,741	2538,718	5,800	0,421	0,383	0,346	0,372	0,397	0,384	29,000	10,788
K0+025,00	2539,125	2539,133	2539,140	2539,128	2539,115	2538,737	2538,767	2538,797	2538,771	2538,744	5,800	0,388	0,365	0,343	0,357	0,371	0,365	29,000	10,856
K0+030,00	2539,120	2539,133	2539,145	2539,148	2539,150	2538,780	2538,805	2538,830	2538,800	2538,770	5,800	0,340	0,328	0,315	0,348	0,380	0,342	29,000	10,250
K0+035,00	2539,125	2539,138	2539,150	2539,140	2539,130	2538,755	2538,780	2538,805	2538,773	2538,740	5,800	0,370	0,358	0,345	0,368	0,390	0,366	29,000	10,266
K0+040,00	2539,130	2539,153	2539,175	2539,158	2539,140	2538,730	2538,755	2538,780	2538,745	2538,710	5,800	0,400	0,398	0,395	0,412	0,430	0,407	29,000	11,209
K0+045,00	2539,160	2539,165	2539,170	2539,160	2539,150	2538,705	2538,730	2538,755	2538,718	2538,680	5,800	0,455	0,435	0,415	0,443	0,470	0,444	29,000	12,332
K0+051,40	2539,070	2539,080	2539,090	2539,080	2539,070	2538,680	2538,700	2538,720	2538,685	2538,650	5,800	0,390	0,380	0,370	0,395	0,420	0,391	37,120	15,488
																TOTAL	0,383	298,12	114,02
														area	2,27	POZOS	-1	-2,27	-0,87
														sumidero	0,245	SUMIDEROS	-2	-0,49	-0,19
																	TOTAL	295,36	112,97

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			VOLUMEN COMPACTO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Transporte y disposicion de escombros		item							
	Demolicion de asfalto carpeta existente	1,002	29,54				1,35		39,88
	excavacion mecanica de estructura de via	1,003	213,52				1,30		277,58
				area					
	excavacion manual para redes	6,001	92,83				1,30		120,68
	demolicion manual de sardinel - longitud	7,036	102,80	0,20	0,300		1,35		6,17
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									444,30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									444,30
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

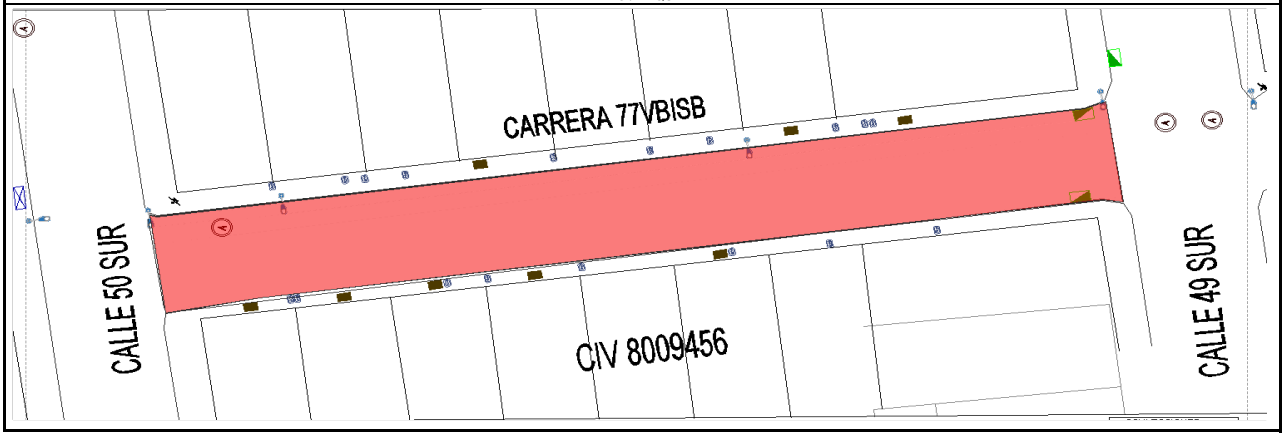

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
excavacion para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC11 - SANITARIO	49-43	2,40	0,60	1,81				2,60
		49-42	7,40	0,60	1,56				6,92
		49-39	3,50	0,60	1,75				3,68
		49-40	7,35	0,60	1,56				6,89
		49-35	2,90	0,60	1,78				3,11
		49-31	3,10	0,60	1,78				3,30
		49-34	7,95	0,60	1,53				7,31
		49-30	7,30	0,60	1,57				6,86
		49-25	3,05	0,60	1,72				3,14
		49-24	7,17	0,60	1,45				6,25
		49-21	2,80	0,60	1,67				2,81
		49-20	7,60	0,60	1,43				6,53
		49-15	2,90	0,60	1,61				2,80
		49-14	6,80	0,60	1,41				5,77
		40-09	2,70	0,60	1,57				2,54
		77V-53	5,15	0,60	1,40				4,33
excavacion para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+051,40	51,40	0,50	0,70				17,99
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									92,83
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									92,83
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

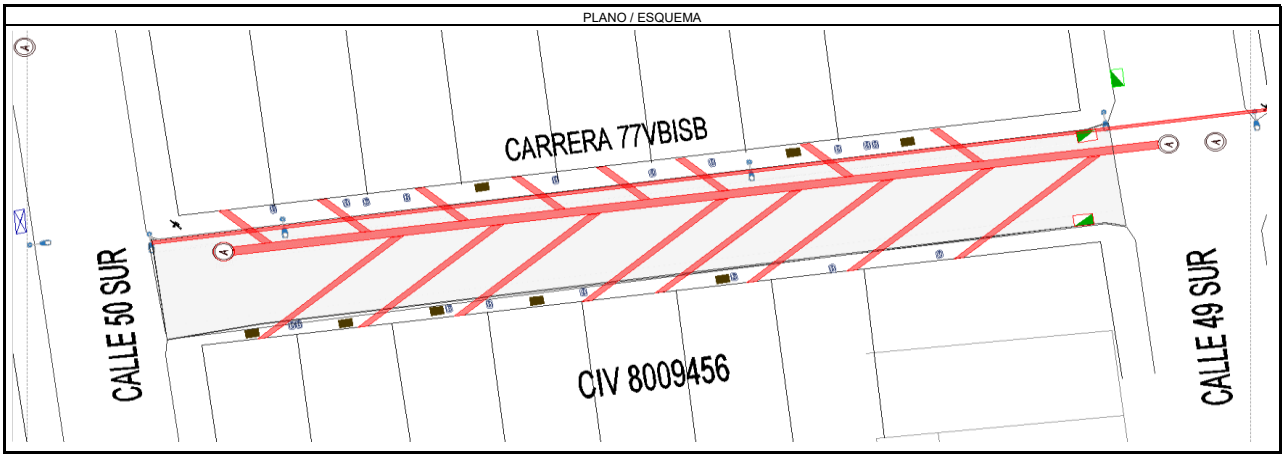

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Relleno para redes - tramos SANITARIOS					area seccion				
	NC11 - SANITARIO		48,40	1,10	0,205				9,93
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de domiciliarias					area seccion				
	NC11 - SANITARIO		80,07	0,60	0,097				7,74
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									17,66
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									17,66
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

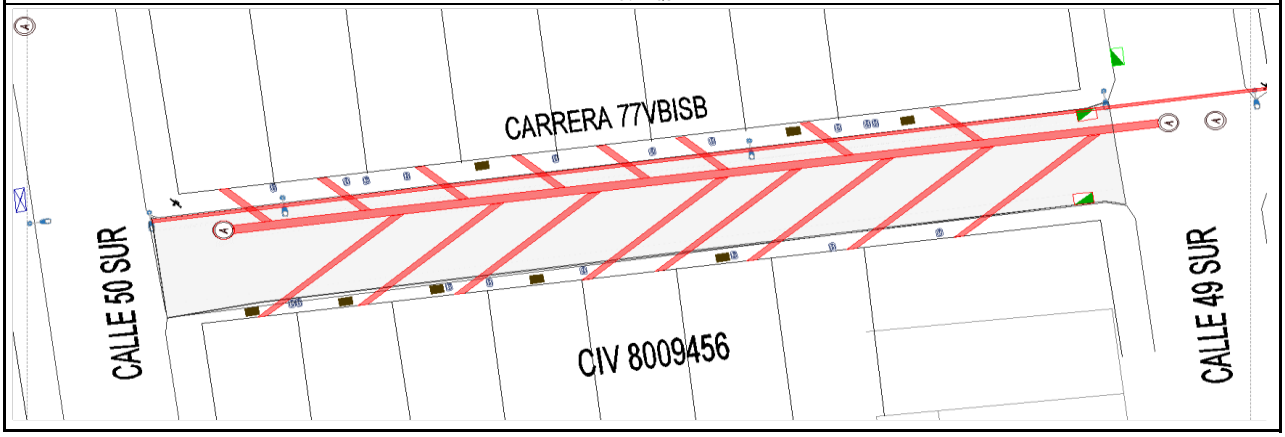

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Relleno en arena para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+051,40	51,40	0,50	0,30				7,71
	volumen tubo 4"		51,40	area	-0,0079				-0,40

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	7,31
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	7,31
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

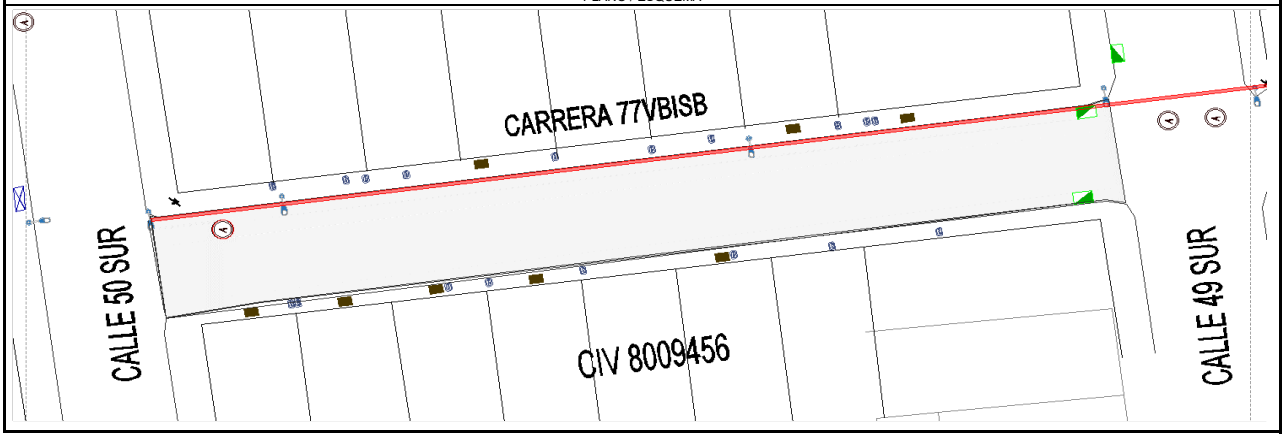

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
placa de cubierta - Reconstruccion de pozos SANITARIO									
	PZ CMI66577							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

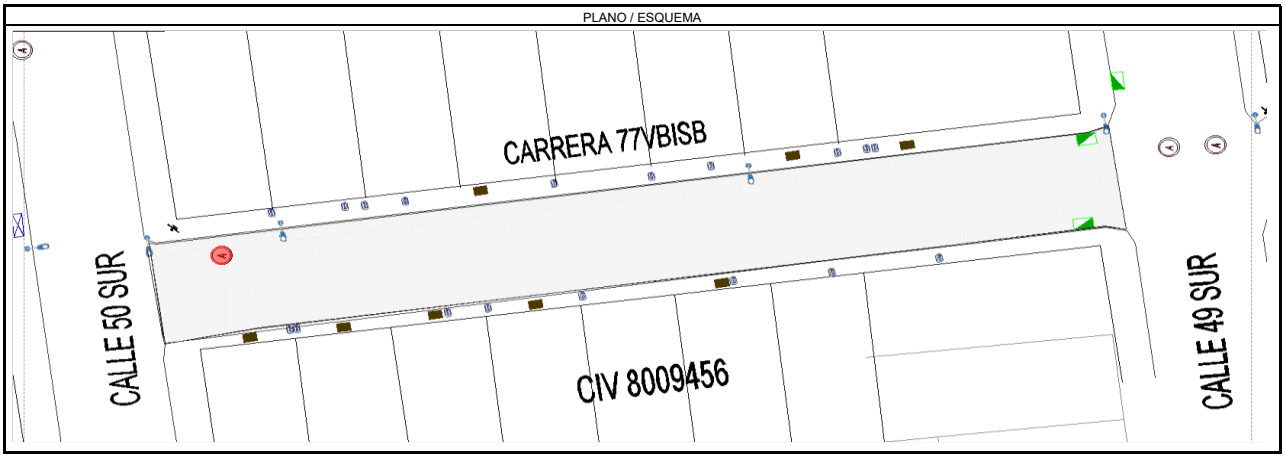

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
mamposteria - Reconstruccion de pozos SANITARIO									
	NC11 - SANITARIO		a	b	a-b=c	d			c-d
	PZ CMI66577		2539,13	2536,98	2,14	0,25			1,89
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,89
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,89
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

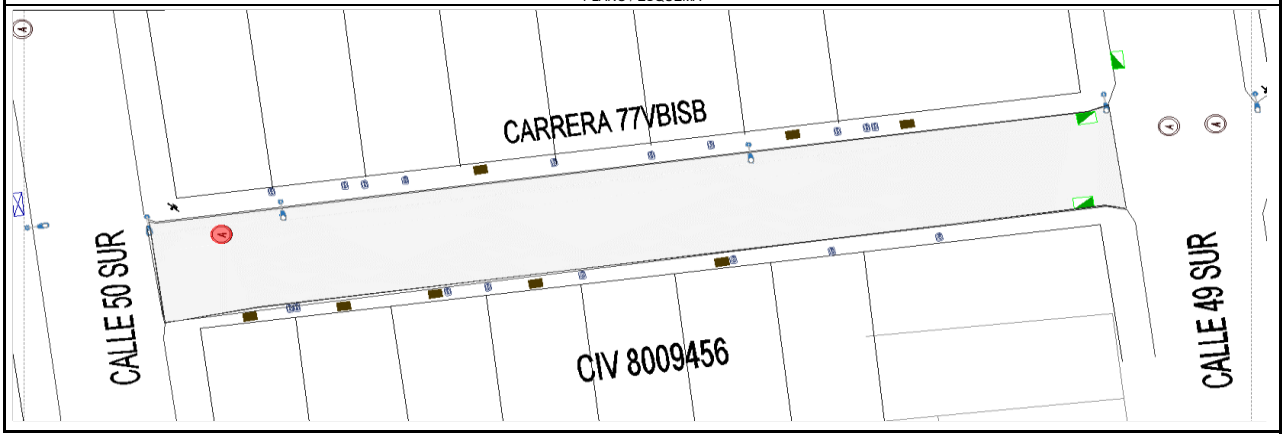

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Tuberia para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC11 - SANITARIO	49-43	2,40						2,40
		49-42	7,40						7,40
		49-39	3,50						3,50
		49-40	7,35						7,35
		49-35	2,90						2,90
		49-31	3,10						3,10
		49-34	7,95						7,95
		49-30	7,30						7,30
		49-25	3,05						3,05
		49-24	7,17						7,17
		49-21	2,80						2,80
		49-20	7,60						7,60
		49-15	2,90						2,90
		49-14	6,80						6,80
		40-09	2,70						2,70
		77V-53	5,15						5,15

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	80,07
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	80,07
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

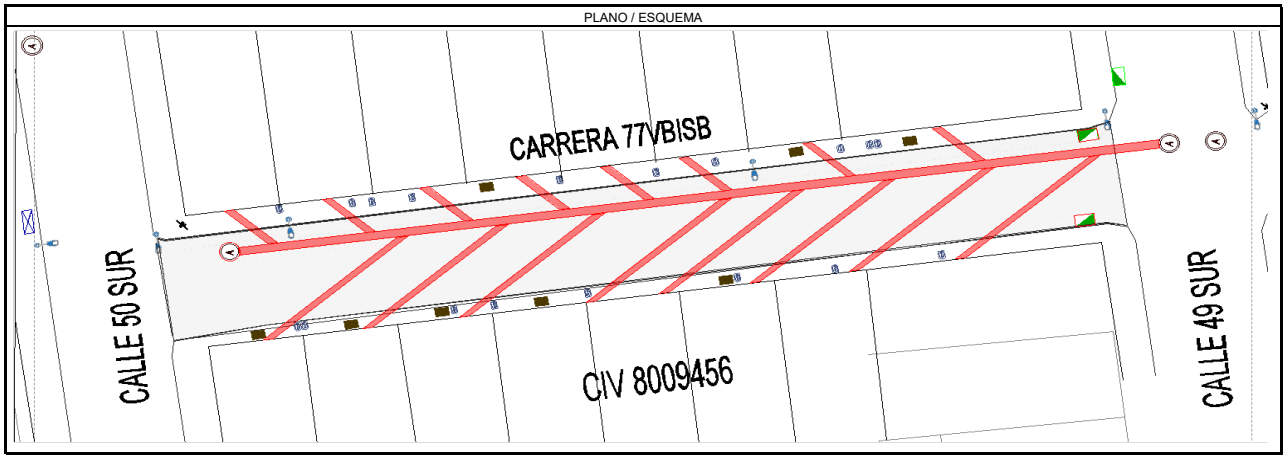

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LONG ENTRE EJES POZO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Tuberia para redes - tramos SANITARIOS									
	NC11 - SANITARIO		50,10			-1,20			48,90
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									48,90
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									48,90
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

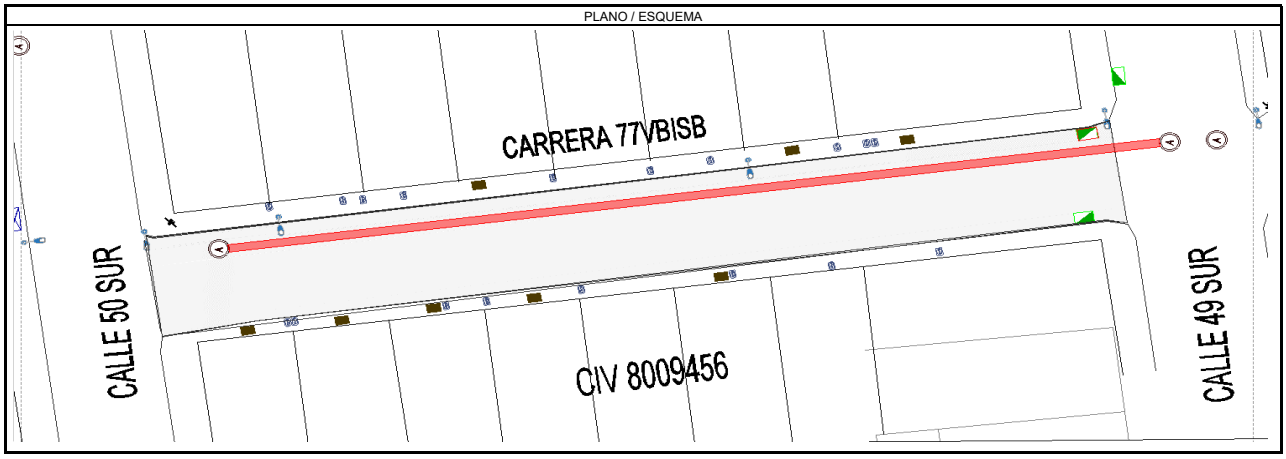

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original y 1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
nivelacion y compactacion de subrasante de via									
	subrasante de diseño		51,40	5,800					298,12
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-1,00	-2,27
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									293,69
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									293,69
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

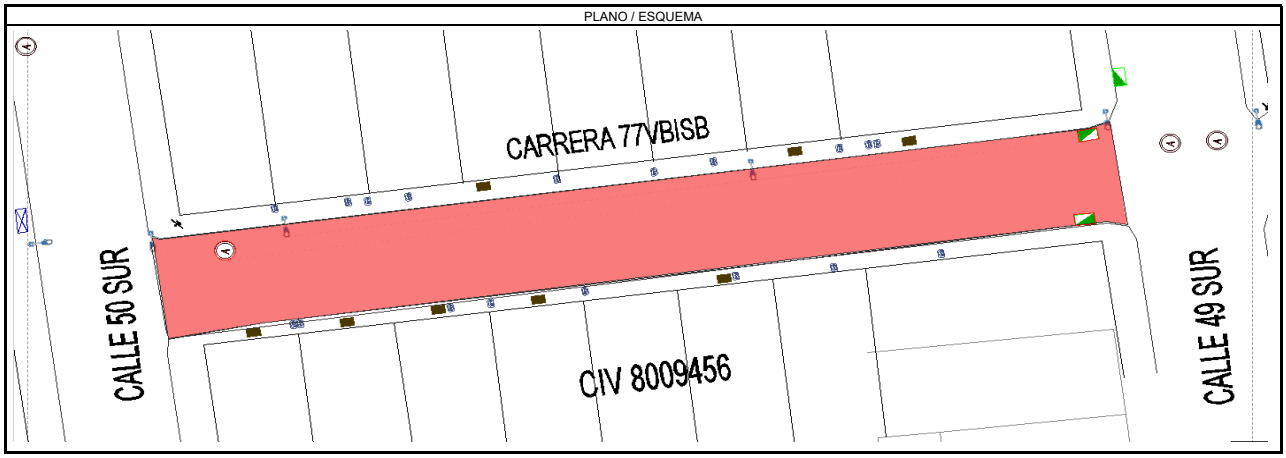

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original 1ra : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	10/03/2026

CIV	8009456	
PRIORIDAD:	NC	11

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE	ANCHO DE VIA EXCAVADA	5,80

ABSCISA (m)	SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,572	2538,569	2538,565	2538,588	2538,610	2538,572	2538,569	2538,565	2538,588	2538,610	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,605	2538,645	2538,685	2538,663	2538,640	2538,605	2538,645	2538,685	2538,663	2538,640	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+010,00	2538,638	2538,675	2538,711	2538,689	2538,666	2538,638	2538,675	2538,711	2538,689	2538,666	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+015,00	2538,671	2538,701	2538,731	2538,712	2538,692	2538,671	2538,701	2538,731	2538,712	2538,692	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+020,00	2538,704	2538,734	2538,764	2538,741	2538,718	2538,704	2538,734	2538,764	2538,741	2538,718	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+025,00	2538,737	2538,767	2538,797	2538,771	2538,744	2538,737	2538,767	2538,797	2538,771	2538,744	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+030,00	2538,780	2538,805	2538,830	2538,800	2538,770	2538,780	2538,805	2538,830	2538,800	2538,770	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+035,00	2538,755	2538,780	2538,805	2538,773	2538,740	2538,755	2538,780	2538,805	2538,773	2538,740	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+040,00	2538,730	2538,755	2538,780	2538,745	2538,710	2538,730	2538,755	2538,780	2538,745	2538,710	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+045,00	2538,705	2538,730	2538,755	2538,718	2538,680	2538,705	2538,730	2538,755	2538,718	2538,680	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+051,40	2538,680	2538,700	2538,720	2538,685	2538,650	2538,680	2538,700	2538,720	2538,685	2538,650	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,120	0,000
																TOTAL	0,000	298,12	0,00
														area	2,27	POZOS	-1	-2,27	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	293,69	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Demolicion - Reconstruccion de pozos									
	NC11 - SANITARIO								
	PZ CMI66577	SANITARIO						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

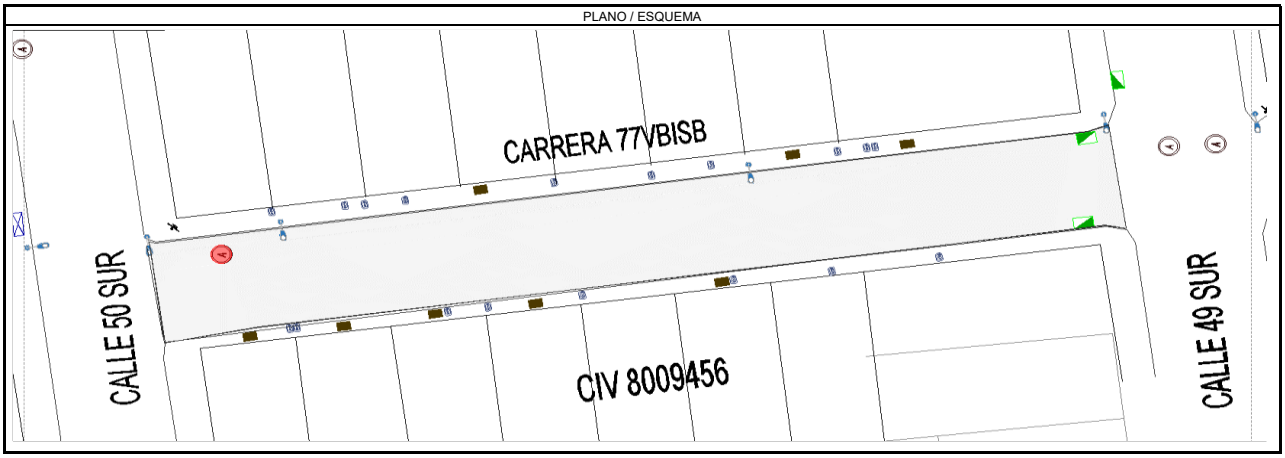

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Demolicion de sumidero existente									
	sumidero existente		K0+050,00	norte				1,00	1,00
	sumidero existente		K0+050,20	sur				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

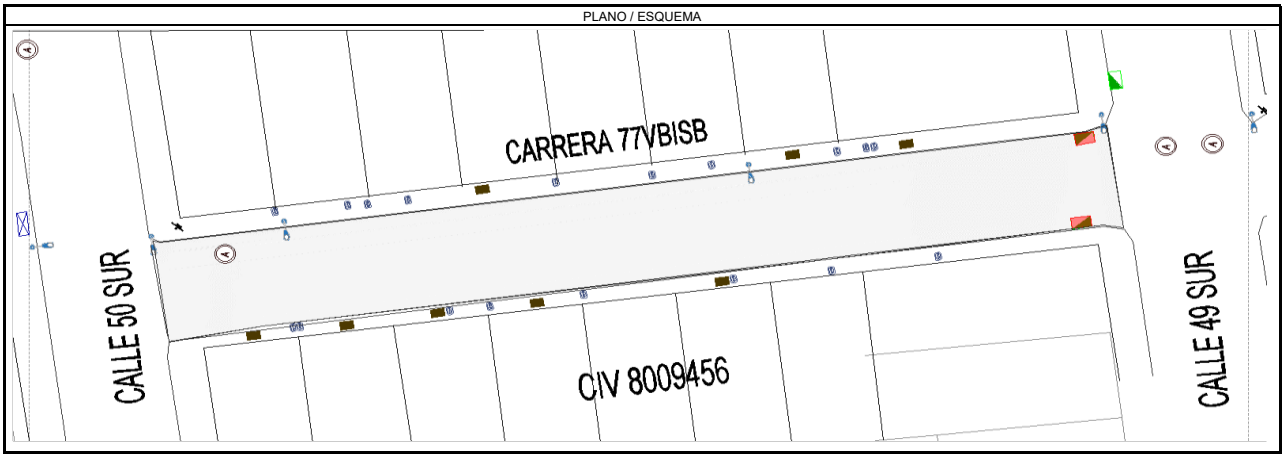

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Geocelda para estructura de via									
	estructura de via		51,40	5,80					298,12
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-1,00	-2,27
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									293,69
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									293,69
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

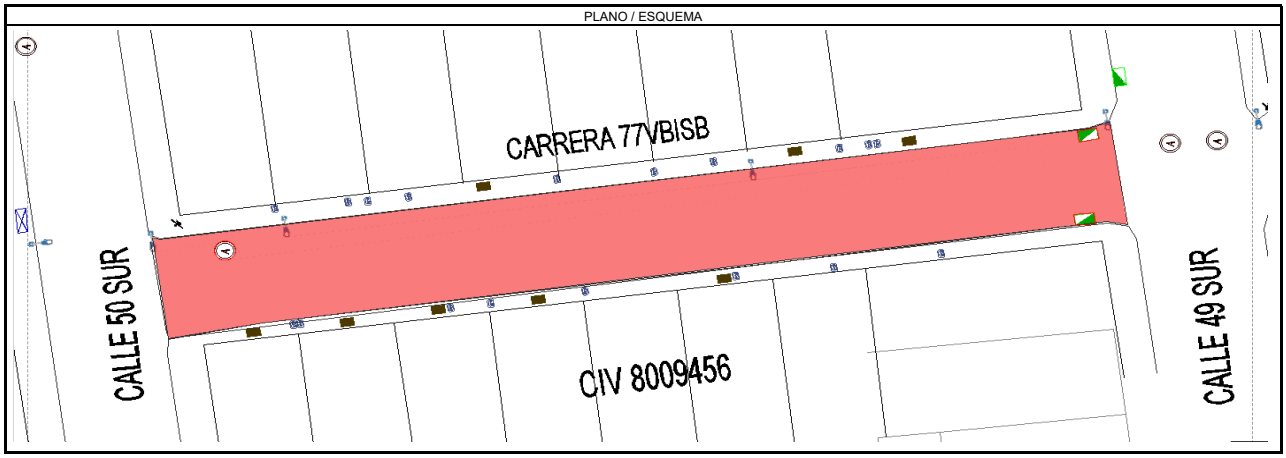

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	10/03/2026

CIV	8009456	
PRIORIDAD:	NC	11

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	GEOCELDA h=15cm	ANCHO DE VIA EXCAVADA	5,80

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					GEOCELDA h=15cm					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,572	2538,569	2538,565	2538,588	2538,610	2538,572	2538,569	2538,565	2538,588	2538,610	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,605	2538,645	2538,685	2538,663	2538,640	2538,605	2538,645	2538,685	2538,663	2538,640	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+010,00	2538,638	2538,675	2538,711	2538,689	2538,666	2538,638	2538,675	2538,711	2538,689	2538,666	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+015,00	2538,671	2538,701	2538,731	2538,712	2538,692	2538,671	2538,701	2538,731	2538,712	2538,692	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+020,00	2538,704	2538,734	2538,764	2538,741	2538,718	2538,704	2538,734	2538,764	2538,741	2538,718	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+025,00	2538,737	2538,767	2538,797	2538,771	2538,744	2538,737	2538,767	2538,797	2538,771	2538,744	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+030,00	2538,780	2538,805	2538,830	2538,800	2538,770	2538,780	2538,805	2538,830	2538,800	2538,770	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+035,00	2538,755	2538,780	2538,805	2538,773	2538,740	2538,755	2538,780	2538,805	2538,773	2538,740	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+040,00	2538,730	2538,755	2538,780	2538,745	2538,710	2538,730	2538,755	2538,780	2538,745	2538,710	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+045,00	2538,705	2538,730	2538,755	2538,718	2538,680	2538,705	2538,730	2538,755	2538,718	2538,680	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+051,40	2538,680	2538,700	2538,720	2538,685	2538,650	2538,680	2538,700	2538,720	2538,685	2538,650	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,120	0,000
																TOTAL	0,000	298,12	0,00
														area	2,27	POZOS	-1	-2,27	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	293,69	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+051,40	51,40						51,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									51,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									51,40
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

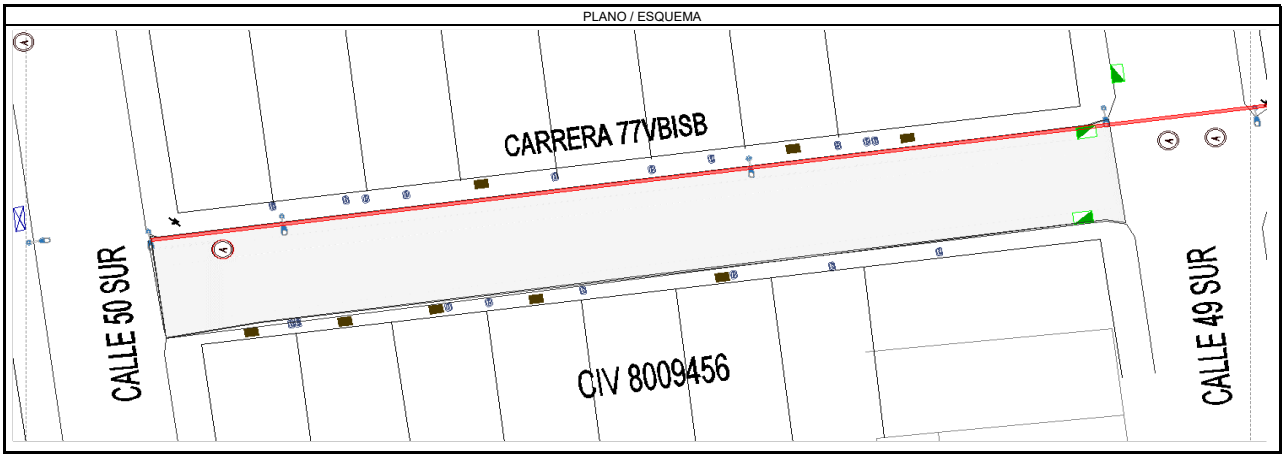

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
					altura media				
Relleno para redes - tramos SANITARIOS									
	NC11 - SANITARIO		48,40	1,10	1,671				88,96
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion domiciliarias									
	NC11 - SANITARIO		80,07	0,60	1,310				62,94
	se anexa cartera topografica								
relleno para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+051,40	51,40	0,50	0,40				10,28

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	162,18
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	162,18
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

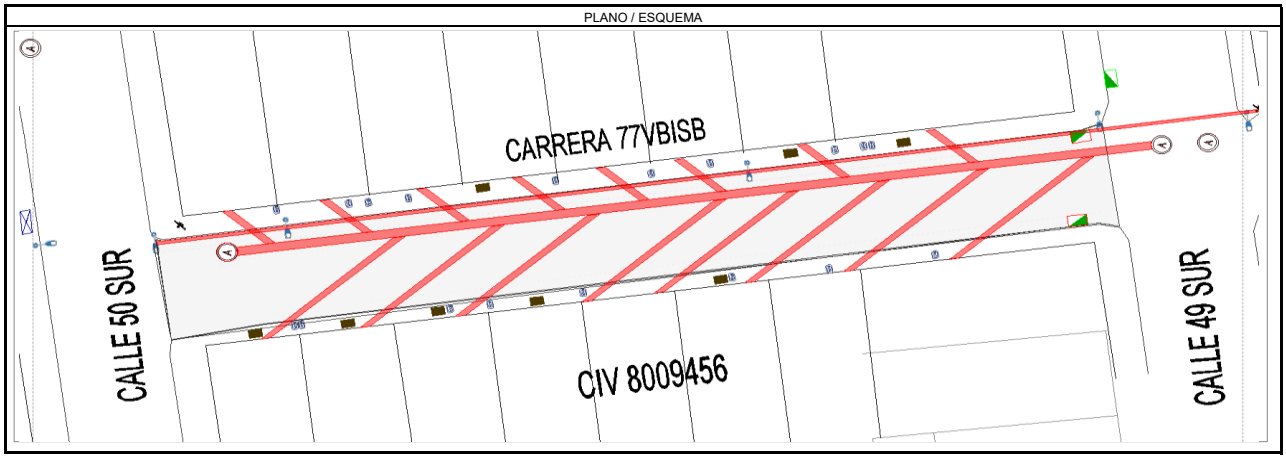

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Silla Y para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC11 - SANITARIO	49-43						1,00	1,00
		49-42						1,00	1,00
		49-39						1,00	1,00
		49-40						1,00	1,00
		49-35						1,00	1,00
		49-31						1,00	1,00
		49-34						1,00	1,00
		49-30						1,00	1,00
		49-25						1,00	1,00
		49-24						1,00	1,00
		49-21						1,00	1,00
		49-20						1,00	1,00
		49-15						1,00	1,00
		49-14						1,00	1,00
		40-09						1,00	1,00
		77V-53						1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	16,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	16,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

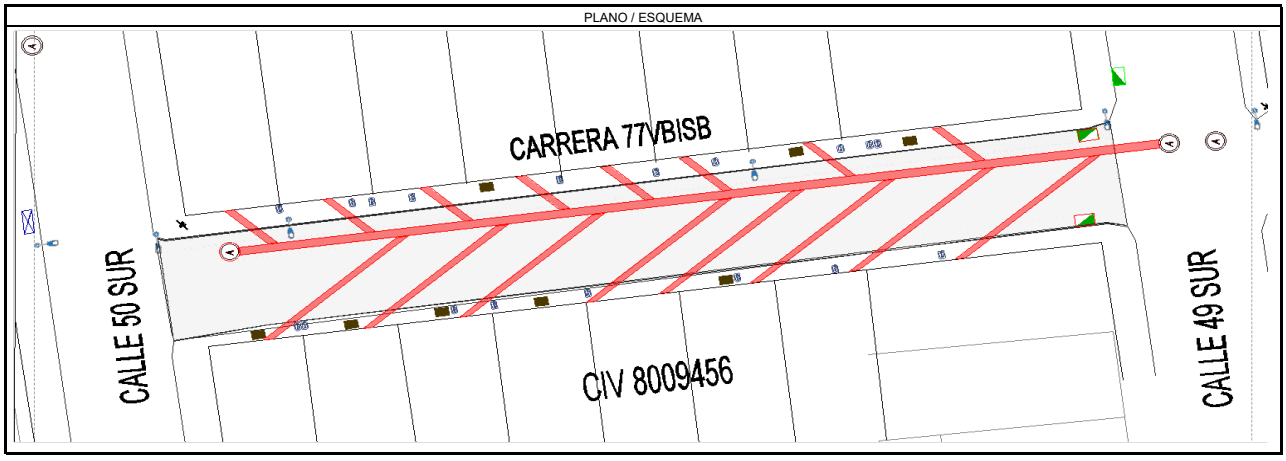

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Codo para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC11 - SANITARIO	49-43						1,00	1,00
		49-42							
		49-39							
		49-40							
		49-35						1,00	1,00
		49-31						1,00	1,00
		49-34							
		49-30							
		49-25							
		49-24							
		49-21							
		49-20							
		49-15							
		49-14							
		40-09							
		77V-53						1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

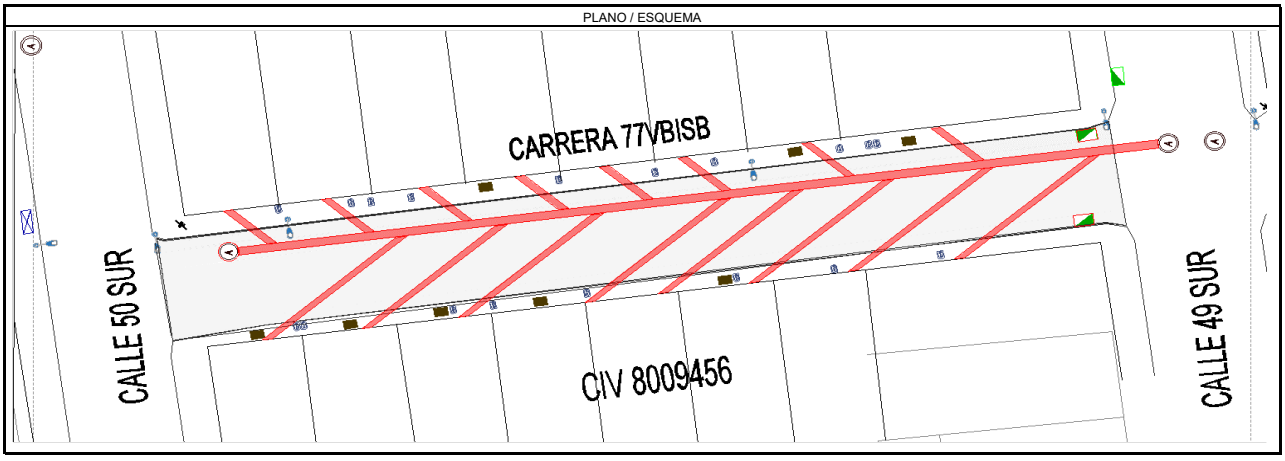

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,032 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO MEDIA	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD CARAS	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Entibado para redes - tramos sanitarios									
	NC11 - SANITARIO		48,40	1,10	1,886			2,00	182,60
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									182,60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									182,60
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

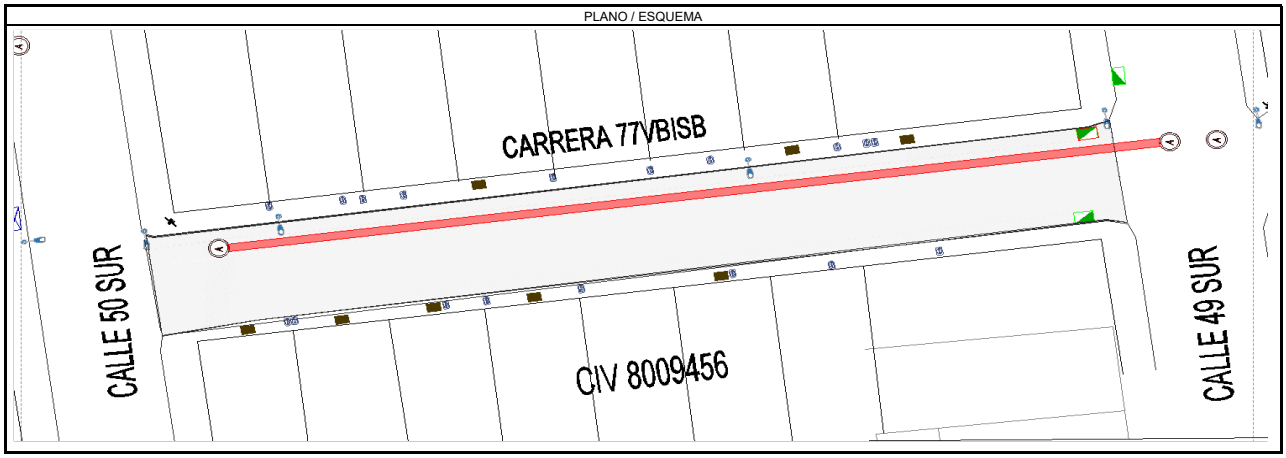

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,032 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,036 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
demolicion de Sardinel existente									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+051,40	51,40	0,20	0,30				51,40
	costado sur	K0+000,00							
		K0+051,40	51,40	0,20	0,30				51,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									102,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									102,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

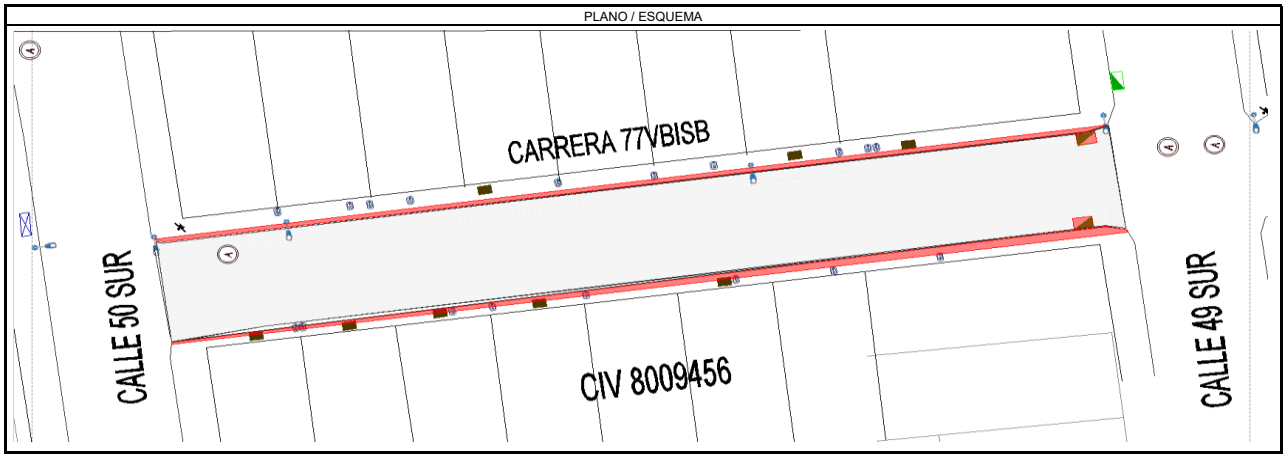

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,036 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Movilizacion de equipo para construccion de segmento vial									
	equipo de demolicion y excavacion							1,00	1,00
	equipo para rellen - perfilado - compactacion							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

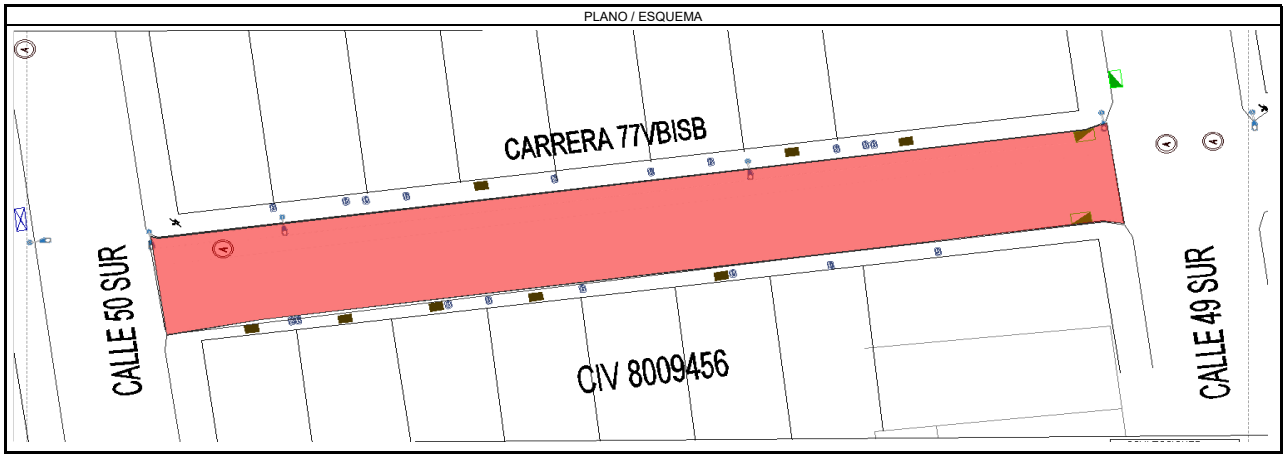

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
relleno con subbase granular AR_SBG50 para estructura de via									
	estructura de via		51,40	5,80	0,200				59,62
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,200			-1,00	-0,45
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,200			-2,00	-0,43
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									58,74
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									58,74
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

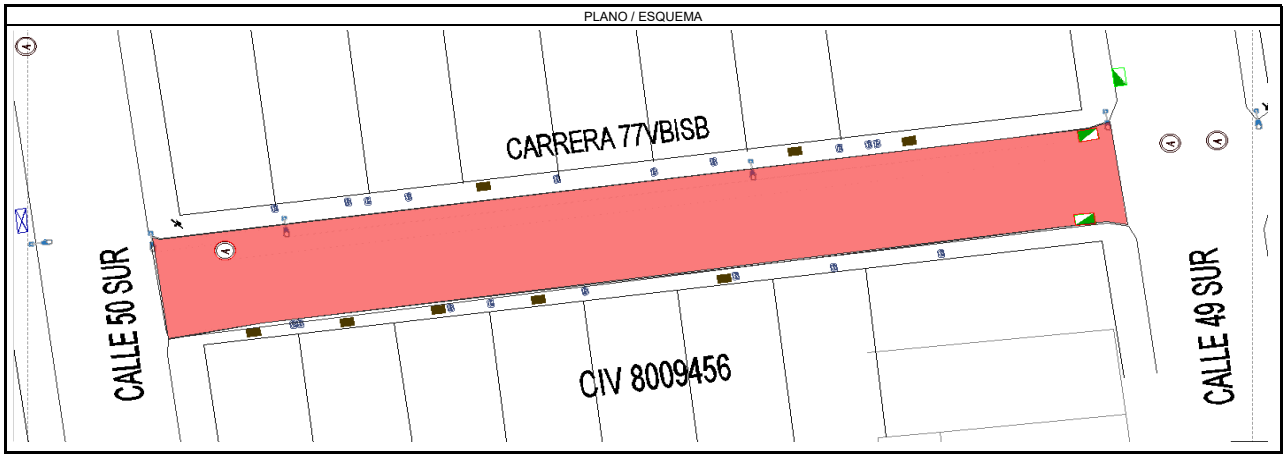

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	10/03/2026

CIV	8009456	
PRIORIDAD:	NC	11

JB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG 0,200

CARTERA DE:	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50	ANCHO DE VIA EXCAVADA	5,80

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,572	2538,569	2538,565	2538,588	2538,610	2538,772	2538,769	2538,765	2538,788	2538,810	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
K0+005,00	2538,605	2538,645	2538,685	2538,663	2538,640	2538,805	2538,845	2538,885	2538,863	2538,840	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	29,000	5,800
K0+010,00	2538,638	2538,675	2538,711	2538,689	2538,666	2538,838	2538,875	2538,911	2538,889	2538,866	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	29,000	5,800
K0+015,00	2538,671	2538,701	2538,731	2538,712	2538,692	2538,871	2538,901	2538,931	2538,912	2538,892	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	29,000	5,800
K0+020,00	2538,704	2538,734	2538,764	2538,741	2538,718	2538,904	2538,934	2538,964	2538,941	2538,918	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	29,000	5,800
K0+025,00	2538,737	2538,767	2538,797	2538,771	2538,744	2538,937	2538,967	2538,997	2538,971	2538,944	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	29,000	5,800
K0+030,00	2538,780	2538,805	2538,830	2538,800	2538,770	2538,980	2539,005	2539,030	2539,000	2538,970	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	29,000	5,800
K0+035,00	2538,755	2538,780	2538,805	2538,773	2538,740	2538,955	2538,980	2539,005	2538,973	2538,940	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	29,000	5,800
K0+040,00	2538,730	2538,755	2538,780	2538,745	2538,710	2538,930	2538,955	2538,980	2538,945	2538,910	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	29,000	5,800
K0+045,00	2538,705	2538,730	2538,755	2538,718	2538,680	2538,905	2538,930	2538,955	2538,918	2538,880	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	29,000	5,800
K0+051,40	2538,680	2538,700	2538,720	2538,685	2538,650	2538,880	2538,900	2538,920	2538,885	2538,850	5,800	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	37,120	7,424
																TOTAL	0,200	298,12	59,62
														area	2,27	POZOS	-1	-2,27	-0,45
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,43
																	TOTAL	293,69	58,74

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Geotextil para estructura de via									
	subrasante de diseño		51,40	6,30					323,82
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-1,00	-2,27
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									319,39
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									319,39
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

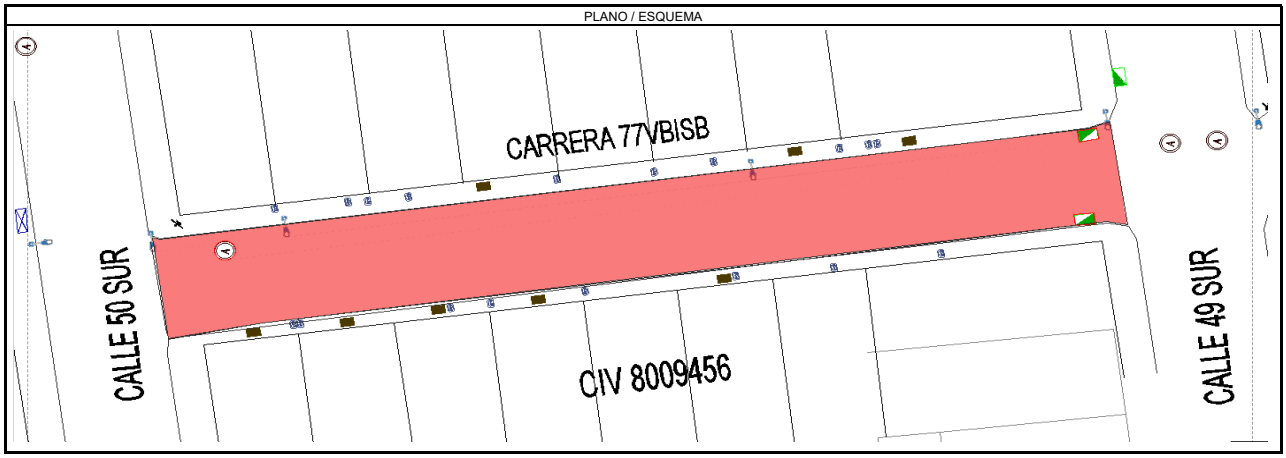

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	10/03/2026

CIV	8009456	
PRIORIDAD:	NC	11

GEOTEXTIL 0,480

CARTERA DE:	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m	ANCHO DE VIA EXCAVADA	6,30

ABSCISA (m)	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,572	2538,569	2538,565	2538,588	2538,610	2538,572	2538,569	2538,565	2538,588	2538,610	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,605	2538,645	2538,685	2538,663	2538,640	2538,605	2538,645	2538,685	2538,663	2538,640	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000
K0+010,00	2538,638	2538,675	2538,711	2538,689	2538,666	2538,638	2538,675	2538,711	2538,689	2538,666	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000
K0+015,00	2538,671	2538,701	2538,731	2538,712	2538,692	2538,671	2538,701	2538,731	2538,712	2538,692	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000
K0+020,00	2538,704	2538,734	2538,764	2538,741	2538,718	2538,704	2538,734	2538,764	2538,741	2538,718	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000
K0+025,00	2538,737	2538,767	2538,797	2538,771	2538,744	2538,737	2538,767	2538,797	2538,771	2538,744	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000
K0+030,00	2538,780	2538,805	2538,830	2538,800	2538,770	2538,780	2538,805	2538,830	2538,800	2538,770	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000
K0+035,00	2538,755	2538,780	2538,805	2538,773	2538,740	2538,755	2538,780	2538,805	2538,773	2538,740	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000
K0+040,00	2538,730	2538,755	2538,780	2538,745	2538,710	2538,730	2538,755	2538,780	2538,745	2538,710	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000
K0+045,00	2538,705	2538,730	2538,755	2538,718	2538,680	2538,705	2538,730	2538,755	2538,718	2538,680	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,500	0,000
K0+051,40	2538,680	2538,700	2538,720	2538,685	2538,650	2538,680	2538,700	2538,720	2538,685	2538,650	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,320	0,000

			TOTAL	0,000	323,82	0,00
area	2,27		POZOS	-1	-2,27	0,00
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
				TOTAL	319,39	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Geomalla para estructura de via									
	subrasante de diseño		51,40	5,80					298,12
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-1,00	-2,27
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									293,69
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									293,69
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

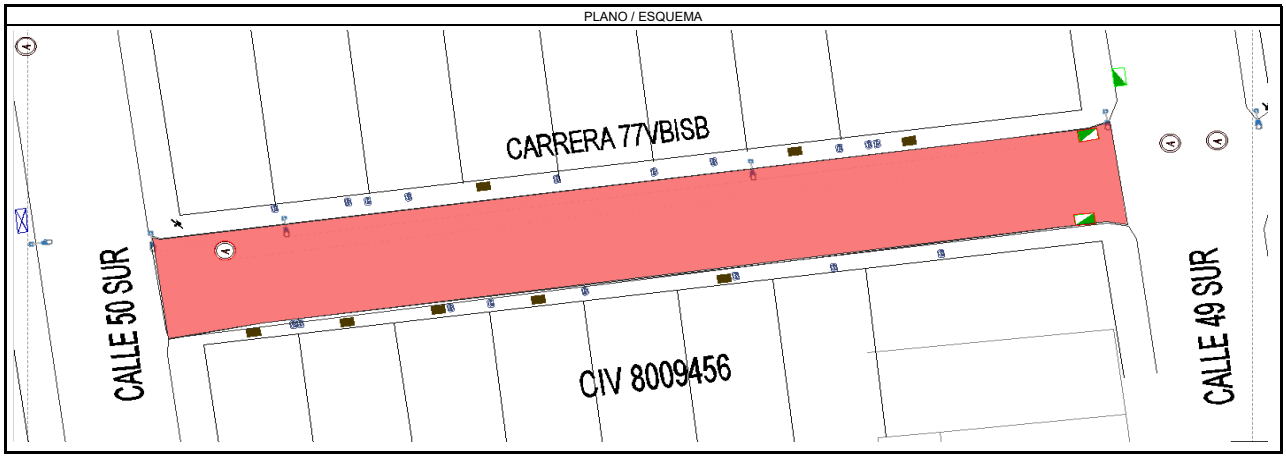

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	10/03/2026

CIV	8009456	
PRIORIDAD:	NC	11

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	GEOMALLA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	5,80

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					GEOMALLA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,772	2538,769	2538,765	2538,788	2538,810	2538,772	2538,769	2538,765	2538,788	2538,810	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,805	2538,845	2538,885	2538,863	2538,840	2538,805	2538,845	2538,885	2538,863	2538,840	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+010,00	2538,838	2538,875	2538,911	2538,889	2538,866	2538,838	2538,875	2538,911	2538,889	2538,866	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+015,00	2538,871	2538,901	2538,931	2538,912	2538,892	2538,871	2538,901	2538,931	2538,912	2538,892	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+020,00	2538,904	2538,934	2538,964	2538,941	2538,918	2538,904	2538,934	2538,964	2538,941	2538,918	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+025,00	2538,937	2538,967	2538,997	2538,971	2538,944	2538,937	2538,967	2538,997	2538,971	2538,944	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+030,00	2538,980	2539,005	2539,030	2539,000	2538,970	2538,980	2539,005	2539,030	2539,000	2538,970	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+035,00	2538,955	2538,980	2539,005	2538,973	2538,940	2538,955	2538,980	2539,005	2538,973	2538,940	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+040,00	2538,930	2538,955	2538,980	2538,945	2538,910	2538,930	2538,955	2538,980	2538,945	2538,910	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+045,00	2538,905	2538,930	2538,955	2538,918	2538,880	2538,905	2538,930	2538,955	2538,918	2538,880	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,000	0,000
K0+051,40	2538,880	2538,900	2538,920	2538,885	2538,850	2538,880	2538,900	2538,920	2538,885	2538,850	5,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,120	0,000

			TOTAL	0,000	298,12	0,00
area	2,27		POZOS	-1	-2,27	0,00
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
				TOTAL	293,69	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Estabilizacion de material granular									
	estructura de via Base granular	BG38	51,40	5,80	0,170		1,30		65,88
	pozos existentes	area	2,27		0,170		1,30	-1,00	-0,50
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,170		1,30	-2,00	-0,48
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									64,91
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									64,91
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

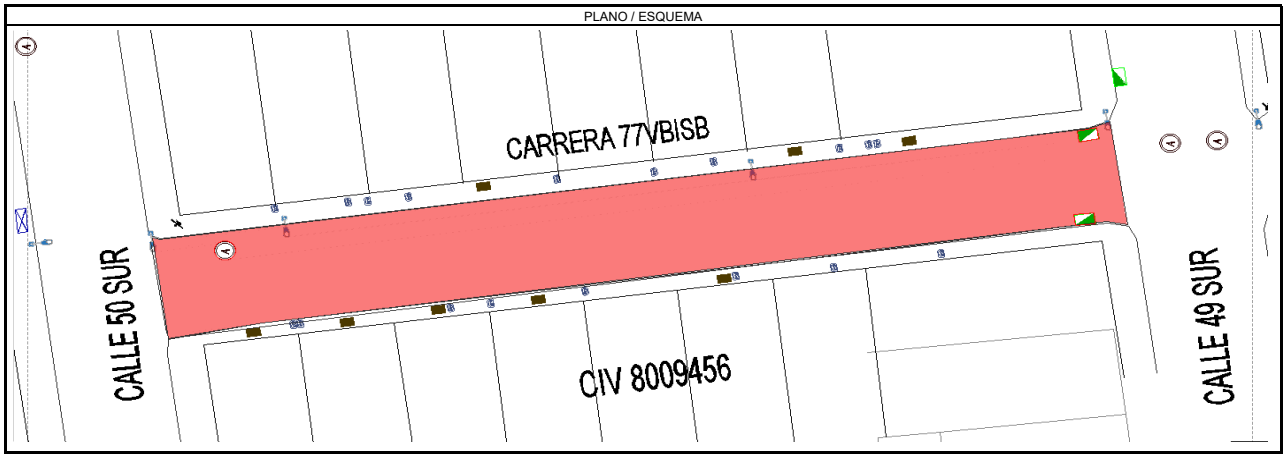

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Inyeccion de Cal a perforaciones									
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+000,50	A		B				
		K0+050,50	50,0000	5,8000	5,6000				
corredor tuberia sanitaria	numero de lineas transversales	-1,00	(B/0.70)+1(-1)	C	8,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	35,7143				
	cantidad de barrenos		C*D	8,0000	36,0000				288,00
	pozos existentes - construidos		-1,00					3,00	-3,00
	sumideros construidos		-2,00					2,00	-4,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
C					D				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									281,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									281,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

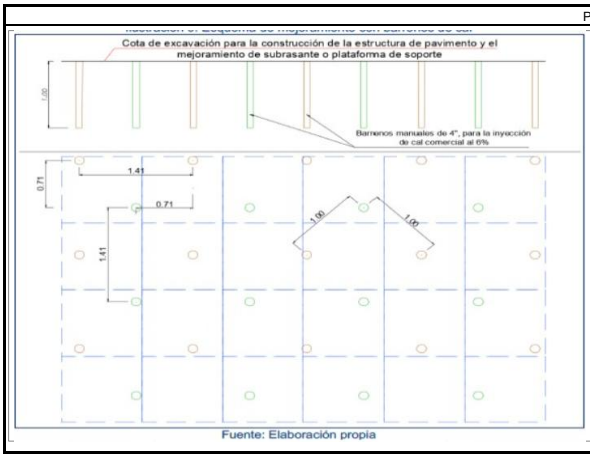

Fuente: Elaboración propia

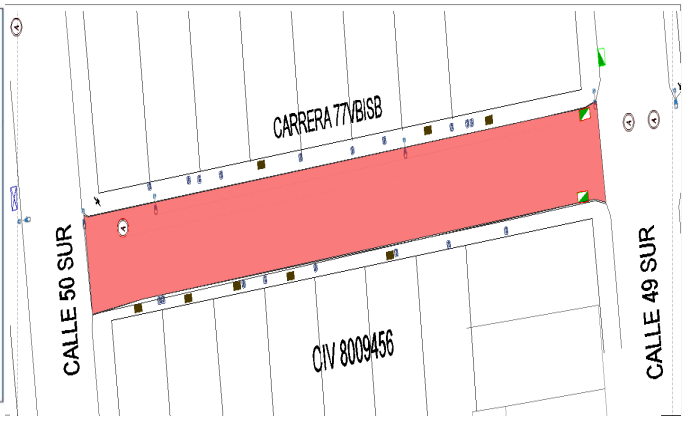

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
Cañuela para pozo - Reconstruccion de pozos SANITARIO									
	NC11 - SANITARIO								
	PZ CMI66577							1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

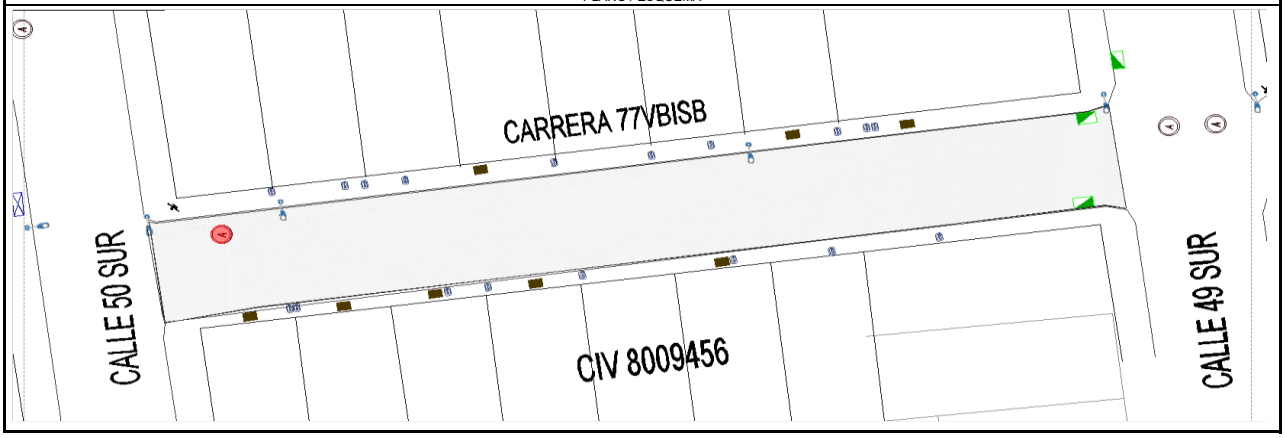

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
	perforaciones de 4"								
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+000,50	A		B				
		K0+050,50	50,0000	5,8000	5,6000				
corredor tuberia sanitaria	numero de lineas transversales	-1,00	(B/0.70)+1(-1)	C	8,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	35,7143				
	cantidad de barrenos		C*D	8,0000	36,0000				288,00
	pozos existentes - construidos		-1,00					3,00	-3,00
	sumideros construidos		-2,00					2,00	-4,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
C					D				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									281,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									281,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

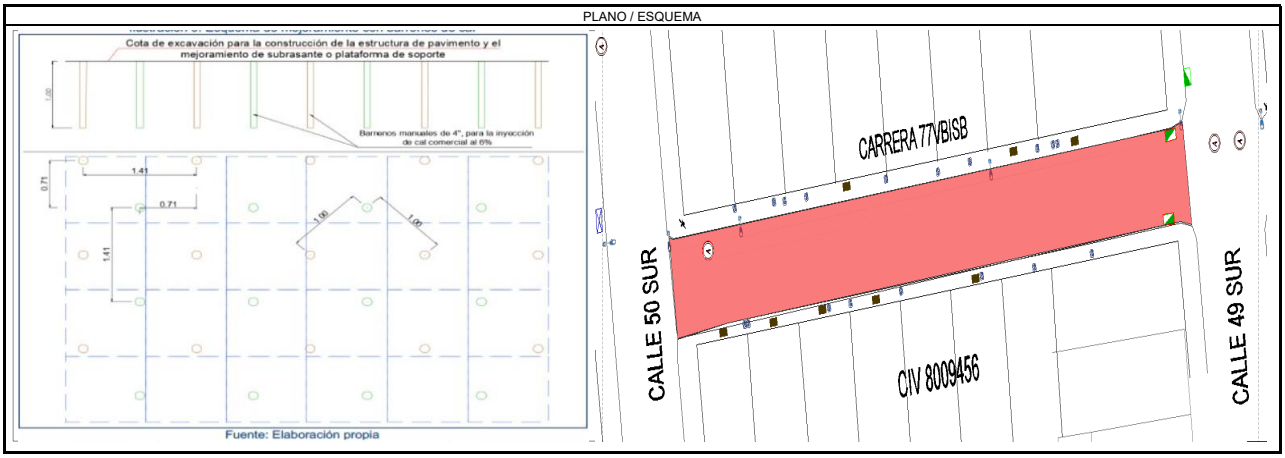

Fuente: Elaboración propia

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009456	CARRERA 77V BIS B ENTRE CALLE 49 SUR Y CALLE 50 SUR								
relleno con base granular AR_BG38 para estructura de via									
	estructura de via		51,40	5,80	0,170				50,68
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,170			-1,00	-0,39
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,170			-2,00	-0,37
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									49,93
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									49,93
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

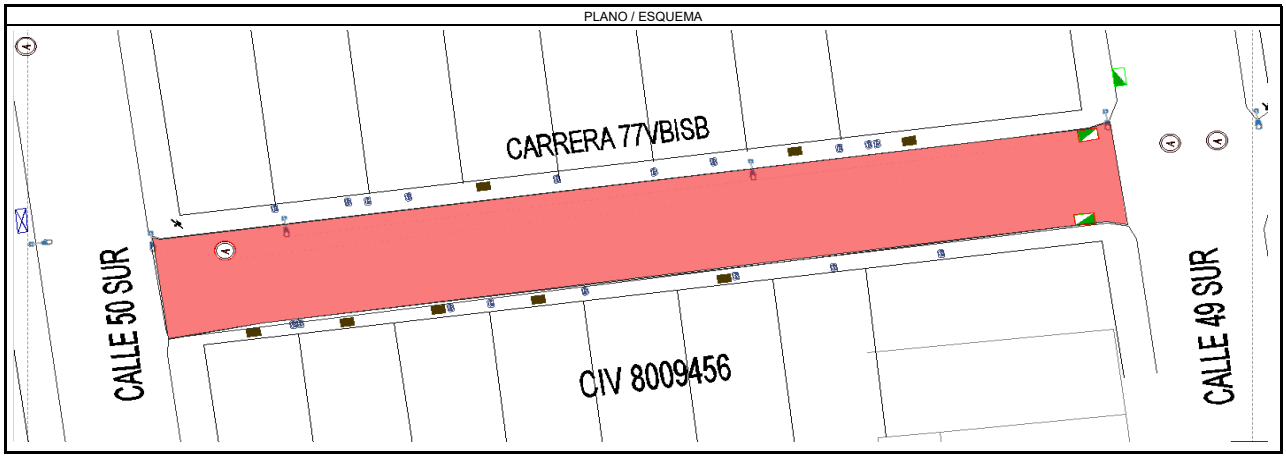

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	10/03/2026

CIV	8009456	
PRIORIDAD:	NC	11

BASE GRANULAR AR_BG38 0,160

CARTERA DE:	BASE GRANULAR AR_BG38	ANCHO DE VIA EXCAVADA	5,80

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					BASE GRANULAR AR_BG38					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,772	2538,769	2538,765	2538,788	2538,810	2538,932	2538,929	2538,925	2538,948	2538,970	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
K0+005,00	2538,805	2538,845	2538,885	2538,863	2538,840	2538,965	2539,005	2539,045	2539,023	2539,000	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	29,000	4,640
K0+010,00	2538,838	2538,875	2538,911	2538,889	2538,866	2538,998	2539,035	2539,071	2539,049	2539,026	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	29,000	4,640
K0+015,00	2538,871	2538,901	2538,931	2538,912	2538,892	2539,031	2539,061	2539,091	2539,072	2539,052	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	29,000	4,640
K0+020,00	2538,904	2538,934	2538,964	2538,941	2538,918	2539,064	2539,094	2539,124	2539,101	2539,078	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	29,000	4,640
K0+025,00	2538,937	2538,967	2538,997	2538,971	2538,944	2539,097	2539,127	2539,157	2539,131	2539,104	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	29,000	4,640
K0+030,00	2538,980	2539,005	2539,030	2539,000	2538,970	2539,140	2539,165	2539,190	2539,160	2539,130	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	29,000	4,640
K0+035,00	2538,955	2538,980	2539,005	2538,973	2538,940	2539,115	2539,140	2539,165	2539,133	2539,100	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	29,000	4,640
K0+040,00	2538,930	2538,955	2538,980	2538,945	2538,910	2539,090	2539,115	2539,140	2539,105	2539,070	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	29,000	4,640
K0+045,00	2538,905	2538,930	2538,955	2538,918	2538,880	2539,065	2539,090	2539,115	2539,078	2539,040	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	29,000	4,640
K0+051,40	2538,880	2538,900	2538,920	2538,885	2538,850	2539,040	2539,060	2539,080	2539,045	2539,010	5,800	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	37,120	5,939
																TOTAL	0,160	298,12	47,70
														area	2,27	POZOS	-1	-2,27	-0,36
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,35
																	TOTAL	293,69	46,99

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: **REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE**

HOJA 1 DE 1

CIV 8009456
BARRIO JACQUELINE Alcantarillado: SANITARIO Diámetro: 0,202 Rasante: PAV FLEXIBLE Longitud entre ejes: 50,10
estructura 0,48
Tramo: NC11 - SANITARIO Clase de tubería: PVC Pendiente: 0,420% Ancho excavación: 1,10 Corte promedio: 1,972
Base Triturado 0,1

POZO	ABS	COTAS				CORTE A FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS		VOL RELLENOS		RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	ENTIBADO 2 CARAS	DEMOLICION PAVIMENTO	OBSERVACIONES
		RASANTE	SUBRASANTE	CLAVE	FONDO					GRAVA	B-200	GRAVA	B-200					
PZ PMP 38149	K0+000,00	2539,160	2538,680	2537,080	2536,778	2,382	1,10	alt subra			alt subra							
1	K0+000,85	2539,160	2538,680	2537,084	2536,782	2,378	1,10			0,205								excav y relleno hasta rasante
1	K0+002,10	2539,180	2538,700	2537,089	2536,787	2,393	1,10	2,624	3,280	0,205	2,387	0,26	2,98	4,26		5,965	0,531	asfalto espesro 23 cm
1	K0+005,75	2539,210	2538,730	2537,104	2536,802	1,928	1,10	2,377	8,674	0,205	2,139	0,75	7,81	11,28		15,772		
2	K0+011,50	2539,235	2538,755	2537,128	2536,826	1,929	1,10	2,121	12,196	0,205	1,884	1,18	10,83	15,86		22,175		
3	K0+017,25	2539,260	2538,780	2537,152	2536,850	1,930	1,10	2,122	12,202	0,205	1,885	1,18	10,84	15,86		22,185		
4	K0+023,00	2539,285	2538,805	2537,177	2536,875	1,930	1,10	2,123	12,207	0,205	1,886	1,18	10,84	15,87		22,195		
5	K0+028,75	2539,247	2538,767	2537,201	2536,899	1,868	1,10	2,089	12,013	0,205	1,852	1,18	10,65	15,62		21,842		
6	K0+034,50	2539,214	2538,734	2537,225	2536,923	1,811	1,10	2,024	11,636	0,205	1,787	1,18	10,27	15,13		21,156		
7	K0+040,25	2539,181	2538,701	2537,249	2536,947	1,754	1,10	1,961	11,274	0,205	1,724	1,18	9,91	14,66		20,499		
8	K0+046,00	2539,155	2538,675	2537,273	2536,971	1,704	1,10	1,902	10,935	0,205	1,665	1,18	9,57	14,22		19,882		
PZ CMI66577	K0+049,25	2539,125	2538,645	2537,287	2536,985	1,660	1,10	1,850	6,013	0,205	1,613	0,67	5,24	7,82		10,933		
							SUMAS		100,43			9,93	88,96	130,56	0,00	182,60	0,53	

TUBERIA DIAM	
8"	48,90

Observaciones:

ENTREGA:		**RECIBE:**
CESAR JEFFERSON MARTINEZ		**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
TOPOGRAFIA CONTRATISTA		TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

PLANILLA DOMICILIARÍAS

CÓDIGO: 003
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/09/2024

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATO No.: 938-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 **CIV** 8009456 **FECHA:** 31/03/2026

TRAMO TUBERIA NC11 - SANITARIO **Diametro** 0,152 **base** 0,10

BARRIO: LA CAMPINA NC-11 **ALCANTARILLADO:** SANITARIO **H ESTRU VIA:** 0,48 **HOJA:** 1 **DE** 1

Abscisa de tuberia	Nomenclatura	Costado	Diámetro Tubería (m)	Longitud Tubería	Ancho Excavación	Cota subrasante de tuberia	Cota cimentacion de tuberia	Diferencia cotas de tuberia a excavación	Cota rasante de caja	Cota lomo entrada a caja	Diferencia cotas de caja	Altura promedio	Volumen excavación	Concreto de anclaje MANO DE OBRA	Area Rellenos		Rellenos		Volumen retiro de sobrantes	Accesorios Yee	semicodo
															Triturado 3/4"	Recebo B200	Triturado 3/4"	Recebo B200			
K0+011,10	49-43	DER	6"	2,40	0,60	2538,755	2536,826	1,93	2538,755	2537,066	1,69	1,81	2,60		0,0966	0,970	0,232	2,135	3,39	1,0	1,0
K0+011,50	49-42	IZQ	6"	7,40	0,60	2538,755	2536,826	1,93	2538,755	2537,566	1,19	1,56	6,92		0,0966	0,820	0,715	5,907	9,00	1,0	
K0+014,40	49-39	DER	6"	3,50	0,60	2538,780	2536,850	1,93	2538,780	2537,200	1,58	1,75	3,68		0,0966	0,938	0,338	3,095	4,79	1,0	
K0+017,60	49-40	IZQ	6"	7,35	0,60	2538,780	2536,850	1,93	2538,780	2537,585	1,19	1,56	6,89		0,0966	0,822	0,710	5,880	8,96	1,0	
K0+019,10	49-35	DER	6"	2,90	0,60	2538,780	2536,850	1,93	2538,780	2537,140	1,64	1,78	3,11		0,0966	0,956	0,280	2,581	4,04	1,0	1,0
K0+023,10	49-31	DER	6"	3,10	0,60	2538,805	2536,875	1,93	2538,805	2537,185	1,62	1,78	3,30		0,0966	0,950	0,299	2,756	4,29	1,0	1,0
K0+024,60	49-34	IZQ	6"	7,95	0,60	2538,805	2536,875	1,93	2538,805	2537,670	1,14	1,53	7,31		0,0966	0,805	0,768	6,238	9,51	1,0	
K0+025,10	49-30	IZQ	6"	7,30	0,60	2538,805	2536,875	1,93	2538,805	2537,605	1,20	1,57	6,86		0,0966	0,824	0,705	5,853	8,91	1,0	
K0+029,20	49-25	DER	6"	3,05	0,60	2538,767	2536,899	1,87	2538,767	2537,204	1,56	1,72	3,14		0,0966	0,915	0,295	2,607	4,08	1,0	
K0+034,00	49-24	IZQ	6"	7,17	0,60	2538,734	2536,923	1,81	2538,734	2537,640	1,09	1,45	6,25		0,0966	0,757	0,693	5,274	8,12	1,0	
K0+035,70	49-21	DER	6"	2,80	0,60	2538,734	2536,923	1,81	2538,734	2537,203	1,53	1,67	2,81		0,0966	0,888	0,270	2,308	3,65	1,0	
K0+038,60	49-20	IZQ	6"	7,60	0,60	2538,734	2536,923	1,81	2538,734	2537,683	1,05	1,43	6,53		0,0966	0,744	0,734	5,504	8,48	1,0	
K0+039,00	49-15	DER	6"	2,90	0,60	2538,701	2536,947	1,75	2538,701	2537,237	1,46	1,61	2,80		0,0966	0,851	0,280	2,296	3,64	1,0	
K0+042,45	49-14	IZQ	6"	6,80	0,60	2538,701	2536,947	1,75	2538,701	2537,627	1,07	1,41	5,77		0,0966	0,734	0,657	4,841	7,50	1,0	
K0+044,00	40-09	DER	6"	2,70	0,60	2538,675	2536,971	1,70	2538,675	2537,241	1,43	1,57	2,54		0,0966	0,826	0,261	2,066	3,30	1,0	
K0+048,10	77V-53	IZQ	6"	5,15	0,60	2538,645	2536,985	1,66	2538,645	2537,500	1,15	1,40	4,33		0,0966	0,727	0,498	3,597	5,63	1,0	1,0
Totales				80,07									74,84	0,00			7,74	62,94	97,29	16,00	4,00
ITEM				7,001									6,001	7,038			6,004	7,022	1,004	7,023	7,024

1,44

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** **1/3/2026** (Día/Mes/Año) **A** **31/3/2026** (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010914 - CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
			1. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
1	1,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8195.34	$ 1.142.00	$ 9.359.080.00	10212.16	$ 1.142.00	$ 11.662.287.00	560.00	$ 639.520.00		560.00	$ 639.520.00	9652.16	$ 11.022.767.00
2	1,002	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1375,79	$ 48.679,00	$ 66.972.081,00	1359,01	$ 48.679,00	$ 66.155.248,00	54,69	$ 2.662.255,00		54,69	$ 2.662.255,00	1304,32	$ 63.492.993,00
3	1,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5859.32	$ 7.206.00	$ 42.222.260.00	4763.20	$ 7.206.00	$ 34.323.619.00	426.79	$ 3.075.449.00		426.79	$ 3.075.449.00	4336.41	$ 31.248.170.00
4	1,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1100,00	$ 57.240,00	$ 62.964.000,00	6192,47	$ 57.240,00	$ 354.456.983,00	776,80	$ 44.464.032,00		776,80	$ 44.464.032,00	5415,67	$ 309.992.951,00
5	1,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4566,07	$ 73.056,00	$ 333.578.810,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
6	1,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9171,92	$ 16.517,00	$ 151.492.603,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
7	1,007	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4141,23	$ 235.794,00	$ 976.477.187,00	0,00	$ 235.794,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
8	1,008	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1200,00	$ 220.890,00	$ 265.068.000,00	0,00	$ 220.890,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
9	1,009	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 213.572,00	$ 616.219.292,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
10	1,010	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 205.221,00	$ 592.124.151,00	0,00	$ 205.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
11	1,011	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	545,12	$ 1.757.344,00	$ 957.963.361,00	0,00	$ 1.757.344,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
12	1,012	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	545,12	$ 1.953.442,00	$ 1.064.860.303,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
13	1,013	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.003,00	$ 38.316.276,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
14	1,014	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.877,00	$ 46.682.108,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
15	1,015	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3930,17	$ 22.817,00	$ 89.674.689,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
16	1,016	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	66,00	$ 228.161,00	$ 15.058.626,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
17	1,017	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	1420,00	$ 190.133,00	$ 269.988.860,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
18	1,018	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1095,38	$ 1.712.945,00	$ 1.876.325.694,00	442,61	$ 1.712.945,00	$ 758.166.586,00	27,22	$ 46.626.363,00		27,22	$ 46.626.363,00	415,39	$ 711.540.224,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			2. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
19	2,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6603.57	$ 1.142.00	$ 7.541.277.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
20	2,002	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1320,71	$ 234.955,00	$ 310.307.418,00	148,00	$ 234.955,00	$ 34.773.340,00		$ -		0,00	$ -	148,00	$ 34.773.340,00
21	2,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4406.02	$ 7.206.00	$ 31.749.780.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
22	2,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	6603,57	$ 57.240,00	$ 377.988.347,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
23	2,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	600,00	$ 73.056,00	$ 43.833.600,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
24	2,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2200,00	$ 16.517,00	$ 36.337.400,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
25	2,007	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2203,01	$ 220.757,00	$ 486.329.879,00	0,00	$ 220.757,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
26	2,008	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	700,00	$ 208.805,00	$ 146.163.500,00	0,00	$ 208.805,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
27	2,009	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 240.902,00	$ 264.992.200,00	0,00	$ 240.902,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
28	2,010	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 242.117,00	$ 266.328.700,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
29	2,011	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	1234,31	$ 488.707,00	$ 603.215.937,00	0,00	$ 488.707,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
30	2,012	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	1320,71	$ 7.018,00	$ 9.268.743,00	0,00	$ 7.018,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
31	2,013	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2311.25	$ 13.278.00	$ 30.688.778.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
32	2,014	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	23772,85	$ 10.549,00	$ 250.779.795,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
33	2,015	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	330,18	$ 9.221,00	$ 3.044.590,00	0,00	$ 9.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
34	2,016	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	6603.57	$ 3.206.00	$ 21.171.045.00	0.00	$ 3.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
35	2,017	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	2905,57	$ 17.296,00	$ 50.254.739,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
36	2,018	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2905,57	$ 3.338,00	$ 9.698.793,00	248,00	$ 3.338,00	$ 827.824,00	198,78	$ 663.528,00		198,78	$ 663.528,00	49,22	$ 164.296,00
37	2,019	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	2829,63	$ 22.817,00	$ 64.563.668,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
38	2,020	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	19,00	$ 228.161,00	$ 4.335.059,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
39	2,021	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	180,00	$ 190.133,00	$ 34.223.940,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			3. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
40	3,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3253.08	$ 1.142.00	$ 3.715.017.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
41	3,002	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	8,13	$ 371.818,00	$ 3.022.880,00	0,00	$ 371.818,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
42	3,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	162.65	$ 7.206.00	$ 1.172.056.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
43	3,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	275,97	$ 57.240,00	$ 15.796.523,00	0,00	$ 57.240,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
44	3,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	81,33	$ 73.056,00	$ 5.941.644,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
45	3,006	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	1382,56	$ 9.347,00	$ 12.922.788,00	0,00	$ 9.347,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
46	3,007	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	162,65	$ 248.800,00	$ 40.467.320,00	0,00	$ 248.800,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
47	3,008	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	80,00	$ 213.572,00	$ 17.085.760,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
48	3,009	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	195,18	$ 1.712.945,00	$ 334.332.605,00	0,00	$ 1.712.945,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
49	3,010	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	81,33	$ 1.953.442,00	$ 158.873.438,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
50	3,011	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.003,00	$ 5.534.388,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
51	3,012	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.877,00	$ 6.742.745,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
52	3,013	4758	SELLO DE FISURAS	ML	800.00	$ 11.144.00	$ 8.915.200.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
53	3,014	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	487.96	$ 13.037.00	$ 6.361.535.00	0.00	$ 13.037.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
54	3,015	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	25,00	$ 131.419,00	$ 3.285.475,00	2,00	$ 131.419,00	$ 262.838,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 262.838,00
55	3,016	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	140,00	$ 131.419,00	$ 18.398.660,00	0,00	$ 131.419,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			4. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
56	4,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3672.96	$ 1.142.00	$ 4.194.520.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
57	4,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	459.12	$ 58.217.00	$ 26.728.589.00	0.00	$ 58.217.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
58	4,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3	619,81	$ 57.240,00	$ 35.477.924,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
59	4,004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	252,52	$ 73.056,00	$ 18.447.809,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
60	4,005	3486	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	550,94	$ 234.955,00	$ 129.447.048,00	0,00	$ 234.955,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
61	4,006	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	206.60	$ 248.800.00	$ 51.402.080.00	0.00	$ 248.800.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
62	4,007	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	68,87	$ 242.117,00	$ 16.674.598,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
63	4,008	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m	M2	550,94	$ 464.229,00	$ 255.764.182,00	0,00	$ 464.229,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
64	4,009	3708	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	9182.40	$ 7.018.00	$ 64.442.083.00	0.00	$ 7.018.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
65	4,010	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	4591.20	$ 13.278.00	$ 60.961.954.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
66	4,011	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1836,48	$ 10.549,00	$ 19.373.028,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
67	4,012	4758	SELLO DE FISURAS	ML	100.00	$ 11.144.00	$ 1.114.400.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
68	4,013	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1616,10	$ 17.296,00	$ 27.952.107,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
69	4,014	3723	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	10.65	$ 131.419.00	$ 1.399.612.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
70	4,015	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	20.94	$ 131.419.00	$ 2.751.914.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
71	4,016	3434	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	20,00	$ 97.222,00	$ 1.944.440,00	0,00	$ 97.222,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
72	4,017	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	20,00	$ 90.021,00	$ 1.800.420,00	0,00	$ 90.021,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			5. MANTENIMIENTO PERIODICO EN ANDEN DE CONCRETO														
73	5,001	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	2683,78	$ 10.370,00	$ 27.830.799,00	3088,81	$ 10.370,00	$ 32.030.960,00	69,90	$ 724.863,00		69,90	$ 724.863,00	3018,91	$ 31.306.097,00
74	5,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	268.38	$ 58.217.00	$ 15.624.278.00	542.24	$ 58.217.00	$ 31.567.586.00	5.00	$ 291.085.00		5.00	$ 291.085.00	537.24	$ 31.276.501.00
75	5,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	536,76	$ 57.240,00	$ 30.724.142,00	2260,66	$ 57.240,00	$ 129.400.178,00		$ -		0,00	$ -	2260,66	$ 129.400.178,00
76	5,004	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	268,38	$ 392.394,00	$ 105.310.702,00	0,00	$ 392.394,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
77	5,005	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	2683,78	$ 105.225,00	$ 282.400.751,00	73,00	$ 105.225,00	$ 7.681.425,00	69,90	$ 7.355.228,00		69,90	$ 7.355.228,00	3,10	$ 326.197,00
78	5,006	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	89.46	$ 1.212.741.00	$ 108.491.810.00	0.00	$ 1.212.741.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
79	5,007	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO). INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS	M2	2236,48	$ 165.385,00	$ 369.880.245,00	0,00	$ 165.385,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
80	5,008	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO	UN	20,00	$ 2.082.959,00	$ 41.659.180,00	0,00	$ 2.082.959,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
81	5,009	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	2236,48	$ 145.068,00	$ 324.441.681,00	0,00	$ 145.068,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
82	5,010	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO)	ML	4472,97	$ 78.310,00	$ 350.278.281,00	10,00	$ 78.310,00	$ 783.100,00	9,60	$ 751.776,00		9,60	$ 751.776,00	0,40	$ 31.324,00
83	5,011	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	4472,97	$ 102.949,00	$ 460.487.789,00	1533,10	$ 102.949,00	$ 157.831.112,00	97,30	$ 10.016.938,00		97,30	$ 10.016.938,00	1435,80	$ 147.814.174,00
84	5,012	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	6262,15	$ 86.663,00	$ 542.696.705,00	529,68	$ 86.663,00	$ 45.903.658,00		$ -		0,00	$ -	529,68	$ 45.903.658,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			6. REDES														
85	6,001	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5808,47	$ 58.217,00	$ 338.151.698,00	3657,45	$ 58.217,00	$ 212.925.767,00	96,16	$ 5.598.147,00		96,16	$ 5.598.147,00	3561,29	$ 207.327.620,00
86	6,002	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1452,12	$ 73.056,00	$ 106.086.079,00	4754,66	$ 73.056,00	$ 347.356.441,00		$ -		0,00	$ -	4754,66	$ 347.356.441,00
87	6,003	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4356,35	$ 49.220,00	$ 214.419.547,00	37,00	$ 49.220,00	$ 1.821.140,00		$ -		0,00	$ -	37,00	$ 1.821.140,00
88	6,004	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	217,82	$ 209.827,00	$ 45.704.517,00	886,54	$ 209.827,00	$ 186.020.029,00	43,55	$ 9.137.966,00		43,55	$ 9.137.966,00	842,99	$ 176.882.063,00
89	6,005	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	653,45	$ 125.986,00	$ 82.325.552,00	0,00	$ 125.986,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
90	6,006	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	72,61	$ 268.758,00	$ 19.514.518,00	0,00	$ 268.758,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
91	6,007	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	435,64	$ 195.195,00	$ 85.034.750,00	43,00	$ 195.195,00	$ 8.393.385,00	11,37	$ 2.219.367,00		11,37	$ 2.219.367,00	31,63	$ 6.174.018,00
92	6,008	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	40,00	$ 2.379.851,00	$ 95.194.040,00	56,00	$ 2.379.851,00	$ 133.271.656,00	3,00	$ 7.139.553,00		3,00	$ 7.139.553,00	53,00	$ 126.132.103,00
93	6,009	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	280,00	$ 928.646,00	$ 260.020.880,00	82,00	$ 928.646,00	$ 76.148.972,00	2,50	$ 2.321.615,00		2,50	$ 2.321.615,00	79,50	$ 73.827.357,00
94	6,010	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	40,00	$ 170.695,00	$ 6.827.800,00	65,00	$ 170.695,00	$ 11.095.175,00		$ -		0,00	$ -	65,00	$ 11.095.175,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/3/2026 (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00 (Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoria)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO (Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS (Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010914 - CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
95	6,011	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	295,20	$ 180.628,00	$ 53.321.386,00	0,00	$ 180.628,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
96	6,012	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190,41	$ 528.764,00	$ 100.681.953,00	23,35	$ 528.764,00	$ 12.346.639,00		$ -		0,00	$ -	23,35	$ 12.346.639,00
97	6,013	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3310,80	$ 46.883,00	$ 155.220.236,00	0,00	$ 46.883,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
98	6,014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1744,93	$ 221.771,00	$ 386.974.871,00	378,50	$ 221.771,00	$ 83.940.324,00	6,20	$ 1.374.980,00		6,20	$ 1.374.980,00	372,30	$ 82.565.343,00
99	6,015	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	60,00	$ 535.886,00	$ 32.153.160,00	165,50	$ 535.886,00	$ 88.689.133,00	74,45	$ 39.896.713,00		74,45	$ 39.896.713,00	91,05	$ 48.792.420,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			7. ITEMS DE INCLUSION														
100	7,001	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 88.189,00		727,96	$ 88.189,00	$ 64.198.064,00	86,65	$ 7.641.577,00		86,65	$ 7.641.577,00	641,31	$ 56.556.488,00
101	7,002	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 122.135,00		792,57	$ 122.135,00	$ 96.800.537,00	85,80	$ 10.479.183,00		85,80	$ 10.479.183,00	706,77	$ 86.321.354,00
102	7,003	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 172.135,00		33,60	$ 172.135,00	$ 5.783.736,00		$ -		0,00	$ -	33,60	$ 5.783.736,00
103	7,004	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 351.631,00		88,70	$ 351.631,00	$ 31.189.670,00		$ -		0,00	$ -	88,70	$ 31.189.670,00
104	7,005	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$ 2.400.00		9059.81	$ 2.400.00	$ 21.743.544.00	544.37	$ 1.306.488.00		544.37	$ 1.306.488.00	8515.44	$ 20.437.056.00
105	7,006	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2		$ 3.740.00		1936.46	$ 3.740.00	$ 7.242.360.00		$ -		0.00	$ -	1936.46	$ 7.242.360.00
106	7,007	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 92.526,00		500,20	$ 92.526,00	$ 46.281.505,00	54,00	$ 4.996.404,00		54,00	$ 4.996.404,00	446,20	$ 41.285.101,00
107	7,008	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3		$ 1.843.898,00		10,41	$ 1.843.898,00	$ 19.194.978,00		$ -		0,00	$ -	10,41	$ 19.194.978,00
108	7,009	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		165,20	$ 10.811,00	$ 1.785.977,00		$ -		0,00	$ -	165,20	$ 1.785.977,00
109	7,010	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		1,00	$ 10.811,00	$ 10.811,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 10.811,00
110	7,011	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	UN		$ 656.068,00		341,00	$ 656.068,00	$ 223.719.188,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 223.719.188,00
111	7,012	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$ 630.227,00		33,00	$ 630.227,00	$ 20.797.491,00		$ -		0,00	$ -	33,00	$ 20.797.491,00
112	7,013	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA)	UN		$ 47.561,00		14,00	$ 47.561,00	$ 665.854,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 665.854,00
113	7,014	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 566.503.00		341.00	$ 566.503.00	$ 193.177.523.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 193.177.523.00
114	7,015	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 114.367.00		451.00	$ 114.367.00	$ 51.579.517.00		$ -		0.00	$ -	451.00	$ 51.579.517.00
115	7,016	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3		$ 2.093.317,00		634,19	$ 2.093.317,00	$ 1.327.560.708,00	38,11	$ 79.776.311,00		38,11	$ 79.776.311,00	596,08	$ 1.247.784.397,00
116	7,017	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.881,00		8744,61	$ 4.881,00	$ 42.682.441,00	544,37	$ 2.657.070,00		544,37	$ 2.657.070,00	8200,24	$ 40.025.371,00
117	7,018	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN		$ 852.604,00		6,00	$ 852.604,00	$ 5.115.624,00	2,00	$ 1.705.208,00		2,00	$ 1.705.208,00	4,00	$ 3.410.416,00
118	7,019	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN		$ 294.438.00		28.00	$ 294.438.00	$ 8.244.264.00	4.00	$ 1.177.752.00		4.00	$ 1.177.752.00	24.00	$ 7.066.512.00
119	7,020	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 100.003,00		9059,81	$ 100.003,00	$ 906.008.179,00	544,37	$ 54.438.633,00		544,37	$ 54.438.633,00	8515,44	$ 851.569.546,00
120	7,021	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 101.831.00		306.00	$ 101.831.00	$ 31.160.286.00	80.00	$ 8.146.480.00		80.00	$ 8.146.480.00	226.00	$ 23.013.806.00
121	7,022	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 159.155,00		2619,76	$ 159.155,00	$ 416.947.903,00	189,36	$ 30.137.591,00		189,36	$ 30.137.591,00	2430,40	$ 386.810.312,00
122	7,023	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.525,00		341,00	$ 299.525,00	$ 102.138.025,00	16,00	$ 4.792.400,00		16,00	$ 4.792.400,00	325,00	$ 97.345.625,00
123	7,024	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 116.431,00		38,00	$ 116.431,00	$ 4.424.378,00	11,00	$ 1.280.741,00		11,00	$ 1.280.741,00	27,00	$ 3.143.637,00
124	7,025	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN		$ 1.517.446,00		23,00	$ 1.517.446,00	$ 34.901.258,00	1,00	$ 1.517.446,00		1,00	$ 1.517.446,00	22,00	$ 33.383.812,00
125	7,026	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 294.664,00		2,00	$ 294.664,00	$ 589.328,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 589.328,00
126	7,027	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.320.280,00		149,30	$ 2.320.280,00	$ 346.417.804,00		$ -		0,00	$ -	149,30	$ 346.417.804,00
127	7,028	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.544.307,00		2,00	$ 2.544.307,00	$ 5.088.614,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.088.614,00
128	7,029	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.800.338,00		2,00	$ 2.800.338,00	$ 5.600.676,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.600.676,00
129	7,030	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 14". ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.328.401,00		1,00	$ 3.328.401,00	$ 3.328.401,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 3.328.401,00
130	7,031	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 16". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.800.458,00		34,50	$ 3.800.458,00	$ 131.115.801,00		$ -		0,00	$ -	34,50	$ 131.115.801,00
131	7,032	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 78.395,00		4593,68	$ 78.395,00	$ 360.121.544,00		$ -		0,00	$ -	4593,68	$ 360.121.544,00
132	7,033	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.749,00		9059,81	$ 4.749,00	$ 43.025.038,00	544,37	$ 2.585.213,00		544,37	$ 2.585.213,00	8515,44	$ 40.439.825,00
133	7,034	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 3.546.00		48.20	$ 3.546.00	$ 170.917.00		$ -		0.00	$ -	48.20	$ 170.917.00
134	7,035	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 10.058.00		14.00	$ 10.058.00	$ 140.812.00		$ -		0.00	$ -	14.00	$ 140.812.00
135	7,036	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	ML		$ 10.525,00		3979,34	$ 10.525,00	$ 41.882.554,00	160,00	$ 1.684.000,00		160,00	$ 1.684.000,00	3819,34	$ 40.198.554,00
136	7,037	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3		$ 198.532,00		64,08	$ 198.532,00	$ 12.721.931,00		$ -		0,00	$ -	64,08	$ 12.721.931,00
137	7,038	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 984.823.00		16.00	$ 984.823.00	$ 15.757.168.00	0.77	$ 758.314.00		0.77	$ 758.314.00	15.23	$ 14.998.854.00
138	7,039	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 7.459.739,00		5,00	$ 7.459.739,00	$ 37.298.695,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 37.298.695,00
139	7,040	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN		$ 272.085,00		14,00	$ 272.085,00	$ 3.809.190,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 3.809.190,00
140	7,041	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE		$ 2.474.248,00		14,00	$ 2.474.248,00	$ 34.639.472,00	2,00	$ 4.948.496,00		2,00	$ 4.948.496,00	12,00	$ 29.690.976,00
141	7,042	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24". ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.697.698,00		100,70	$ 5.697.698,00	$ 573.758.189,00		$ -		0,00	$ -	100,70	$ 573.758.189,00
142	7,043	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 257.553,00		1875,14	$ 257.553,00	$ 482.947.932,00	136,09	$ 35.050.388,00		136,09	$ 35.050.388,00	1739,05	$ 447.897.545,00
143	7,044	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3		$ 231.349,00		348,56	$ 231.349,00	$ 80.639.007,00		$ -		0,00	$ -	348,56	$ 80.639.007,00
144	7,045	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$ 10.108,00		2258,60	$ 10.108,00	$ 22.829.929,00		$ -		0,00	$ -	2258,60	$ 22.829.929,00
145	7,046	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 33.747,00		12148,62	$ 33.747,00	$ 409.979.479,00	584,37	$ 19.720.734,00		584,37	$ 19.720.734,00	11564,25	$ 390.258.745,00
146	7,047	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 4.152.501,00		4,00	$ 4.152.501,00	$ 16.610.004,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 16.610.004,00
147	7,048	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.196.00		7958.68	$ 6.196.00	$ 49.311.981.00		$ -		0.00	$ -	7958.68	$ 49.311.981.00
148	7,049	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML		$ 25.701,00		7958,68	$ 25.701,00	$ 204.546.035,00		$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 204.546.035,00
149	7,050	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 35.750.00		408.47	$ 35.750.00	$ 14.602.803.00		$ -		0.00	$ -	408.47	$ 14.602.803.00
150	7,051	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2		$ 191.703,00		510,64	$ 191.703,00	$ 97.891.220,00		$ -		0,00	$ -	510,64	$ 97.891.220,00
151	7,052	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 8.852.00		2830.00	$ 8.852.00	$ 25.051.160.00		$ -		0.00	$ -	2830.00	$ 25.051.160.00
152	7,053	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 124.194,00		19,00	$ 124.194,00	$ 2.359.686,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 2.359.686,00
153	7,054	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 26.513.00		54.00	$ 26.513.00	$ 1.431.702.00		$ -		0.00	$ -	54.00	$ 1.431.702.00
154	7,055	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	UN		$ 311.753,00		19,00	$ 311.753,00	$ 5.923.307,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 5.923.307,00
155	7,056	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.096.615,00		1,00	$ 5.096.615,00	$ 5.096.615,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 5.096.615,00
156	7,057	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 703.569,00		62,50	$ 703.569,00	$ 43.973.063,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 43.973.063,00
157	7,058	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 425.516,00		35,50	$ 425.516,00	$ 15.105.818,00		$ -		0,00	$ -	35,50	$ 15.105.818,00
158	7,059	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		$ 27.170,00		1569,67	$ 27.170,00	$ 42.647.934,00		$ -		0,00	$ -	1569,67	$ 42.647.934,00
159	7,060	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML		$ 29.226,00		340,50	$ 29.226,00	$ 9.951.453,00		$ -		0,00	$ -	340,50	$ 9.951.453,00
160	7,061	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		$ 17.602,00		1910,17	$ 17.602,00	$ 33.622.812,00		$ -		0,00	$ -	1910,17	$ 33.622.812,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			8. NO PREVISTOS														
161	8,001	NP-1	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 14 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO)	M3		$ 1.385.170,00		5,00	$ 1.385.170,00	$ 6.925.850,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 6.925.850,00
162	8,002	NP-2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 282.325,00		1355,52	$ 282.325,00	$ 382.697.184,00		$ -		0,00	$ -	1355,52	$ 382.697.184,00
163	8,003	NP-3	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 77.819.00		9059.81	$ 77.819.00	$ 705.025.354.00	544.37	$ 42.362.329.00		544.37	$ 42.362.329.00	8515.44	$ 662.663.025.00
164	8,004	NP-4	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	M3		$ 476.745,00		2281,25	$ 476.745,00	$ 1.087.574.531,00	120,31	$ 57.357.191,00		120,31	$ 57.357.191,00	2160,94	$ 1.030.217.340,00
165	8,005	NP-5	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	M3		$ 19.423,00		94,00	$ 19.423,00	$ 1.825.762,00		$ -		0,00	$ -	94,00	$ 1.825.762,00
166	8,006	NP-6	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%)	UN		$ 107.272,00		9059,81	$ 107.272,00	$ 971.863.938,00	401,00	$ 43.016.072,00		401,00	$ 43.016.072,00	8658,81	$ 928.847.866,00
167	8,007	NP-7	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	ML		$ 446.392,00		341,00	$ 446.392,00	$ 152.219.672,00	1,00	$ 446.392,00		1,00	$ 446.392,00	340,00	$ 151.773.280,00
168	8,008	NP-8	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacíon)	UN		$ 360.064.00		341.00	$ 360.064.00	$ 122.781.824.00	1.00	$ 360.064.00		1.00	$ 360.064.00	340.00	$ 122.421.760.00
169	8,009	NP-9	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN		$ 162.297.00		341.00	$ 162.297.00	$ 55.343.277.00	6.00	$ 973.782.00		6.00	$ 973.782.00	335.00	$ 54.369.495.00
170	8,010	NP-10	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 657.822,00		137,00	$ 657.822,00	$ 90.121.614,00		$ -		0,00	$ -	137,00	$ 90.121.614,00
171	8,011	NP-11	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 14 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 744.157,00		4,00	$ 744.157,00	$ 2.976.628,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.976.628,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (mm/dd/aaaa) **A** 31/3/2026 (mm/dd/aaaa)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR ACTUAL DAPO $ 19.645.886.208,00 (escriba el valor total del contrato de ejecución)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVMAC SAS (escriba el número y fecha suscrito entre ellos y el nombre de la entidad de interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO (escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS (escriba el nombre del representante legal de la interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (escriba el número del contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010914 - CALLE 38I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES							
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO		
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
172	8,012	NP-12	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 16 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 795.331,00		1,00	$ 795.331,00	$ 795.331,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 795.331,00
173	8,013	NP-13	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 896.388,00		49,75	$ 896.388,00	$ 44.595.303,00		$ -		0,00	$ -	49,75	$ 44.595.303,00
174	8,014	NP-14	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 974.773,00		62,50	$ 974.773,00	$ 60.923.313,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 60.923.313,00
175	8,015	NP-15	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	UN		$ 269.294,00		24,00	$ 269.294,00	$ 6.463.056,00	1,00	$ 269.294,00		1,00	$ 269.294,00	23,00	$ 6.193.762,00
176	8,016	NP-16	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye taladro rotopercutor 3/4", planta electrica 6Kw)	UN		$ 76.124,00		11,00	$ 76.124,00	$ 837.364,00		$ -		0,00	$ -	11,00	$ 837.364,00
177	8,017	NP-17	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, EJECUTIVE BROCAS, CINCEARRO, Y COMBUSTIBLE)	UN		$ 180.006,00		9059,81	$ 180.006,00	$ 1.630.820.159,00	401,00	$ 72.182.406,00		401,00	$ 72.182.406,00	8658,81	$ 1.558.637.753,00
178	8,018	NP-18	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO,INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)	UN		$ 4.852.592,00		124,00	$ 4.852.592,00	$ 601.721.408,00	4,00	$ 19.410.368,00		4,00	$ 19.410.368,00	120,00	$ 582.311.040,00
179	8,019	NP-19	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML		$ 563.913,00		4,00	$ 563.913,00	$ 2.255.652,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.255.652,00
180	8,020	NP-20	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalación)	UN		$ 486.892,00		4,00	$ 486.892,00	$ 1.947.568,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 1.947.568,00
181	8,021	NP-21	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X80	UN		$ 208.334,00		4,00	$ 208.334,00	$ 833.336,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 833.336,00
182	8,022	NP-22	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 464.671,00		15,00	$ 464.671,00	$ 6.970.065,00		$ -		0,00	$ -	15,00	$ 6.970.065,00
183	8,023	NP-23	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIÓN, CON COLMATACIÓN SUPERIOR AL 30% Y DIÁMETROS DE 8" A 36" INCLUYE ACCIÓ	ML		$ 661.727,00		86,80	$ 661.727,00	$ 57.437.904,00		$ -		0,00	$ -	86,80	$ 57.437.904,00
184	8,024	NP-24	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 400.192,00		170,75	$ 400.192,00	$ 68.332.784,00		$ -		0,00	$ -	170,75	$ 68.332.784,00
185	8,025	NP-25	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 223.645,00		2,00	$ 223.645,00	$ 447.290,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 447.290,00
186	8,026	NP-26	PISO EN CONCRETO MR45 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 346.192,00		172,86	$ 346.192,00	$ 59.842.749,00		$ -		0,00	$ -	172,86	$ 59.842.749,00
187	8,027	NP-27	PISO EN CONCRETO 3000 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 318.979,00		580,92	$ 318.979,00	$ 185.301.281,00		$ -		0,00	$ -	580,92	$ 185.301.281,00
188	8,028	NP-28	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (A6 , IG:30) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 262.519,00		1815,49	$ 262.519,00	$ 476.600.619,00	92,54	$ 24.293.508,00		92,54	$ 24.293.508,00	1722,95	$ 452.307.111,00
			TOTALES				**$ 16.832.066.661,00**			**$ 16.456.658.116,00**		**$ 720.431.213,00**			**$ 720.431.213,00**		**$ 15.736.226.905,00**

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES	OBRA EJECUTADA		
				PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
OBRA EJECUTADA						
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 12.294.241.586,25	$ 12.238.163.245,35	$ 535.756.089,09		$ 535.756.089,09
ADMINISTRACIÓN	28,47%	$ 3.500.170.579,60	$ 3.484.205.075,95	$ 152.529.758,56		$ 152.529.758,56
IMPREVISTO	1,00%	$ 122.942.415,86	$ 122.381.632,45	$ 5.357.560,89		$ 5.357.560,89
UTILIDAD	5,00%	$ 614.712.079,31	$ 611.906.162,27	$ 26.787.804,45		$ 26.787.804,45
SUBTOTAL A.I.U	34,47%	$ 4.237.825.074,77	$ 4.218.494.870,67	$ 184.675.123,90		$ 184.675.123,90
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU+34,47%)		**$ 16.532.066.661,00**	**$ 16.456.658.116,00**	**$ 720.431.213,00**		**$ 720.431.213,00**
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES. SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (B) =	**12,3764%**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 66.307.317,00**		**$ 66.307.317,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA). SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (C) =	**2,3210%**	**285.447.701,00**	**285.447.701,00**	$ -	$ -	
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES) (E) = (A) + (B) + (C) =		**$ 18.339.098.878,00**	**$ 18.339.098.878,00**		$ -	
OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS		**$ 1.306.787.330,00**	**$ 1.302.195.875,00**			
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**30,000%**	**$ 5.893.765.862,00**		$ -	$ -	
(K) COSTO TOTAL MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (F)+(G)		**$ 19.645.886.208,00**	**$ 19.645.886.208,00**		$ -	
VALOR NETO A PAGAR				**$ 786.738.530,00**		**$ 786.738.530,00**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN (31) días del mes de MARZO de 2026

(En letras) (En números) (Mes en palabras) (En letras del año)

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
	replanteo de segmento vial		80,00	7,00					560,00
	planimetria y altimetria inicial								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									560,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									560,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

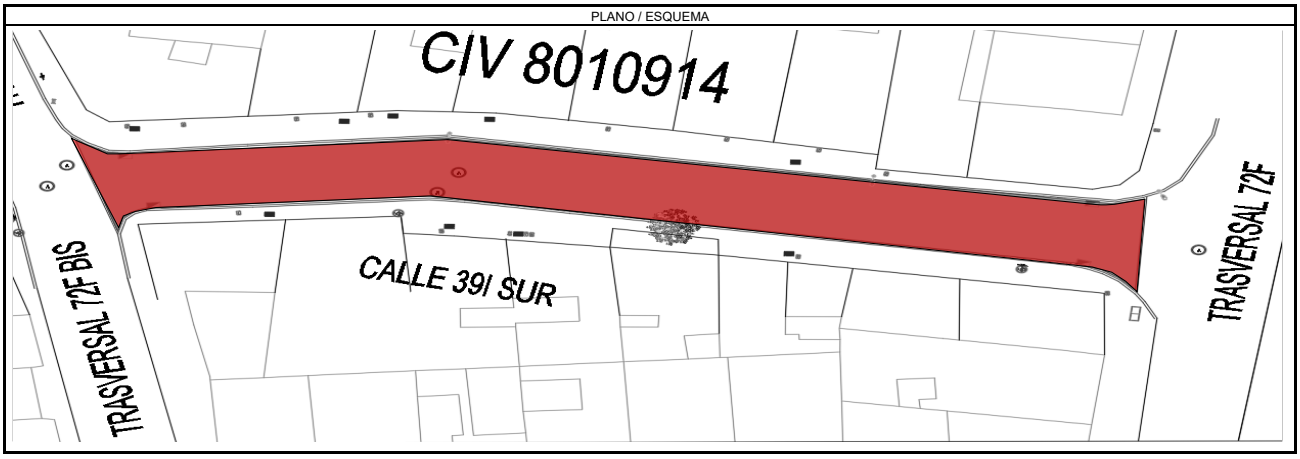

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
demolicion de carpeta asfaltica existente									
	asfalto existente		20,00	6,78	0,10				13,56
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00	0,10				42,00
	pozos existentes	area	2,27		0,10			-3,00	-0,68
	sumideros existentes	area	0,48		0,10			-4,00	-0,19
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									54,69
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									54,69
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

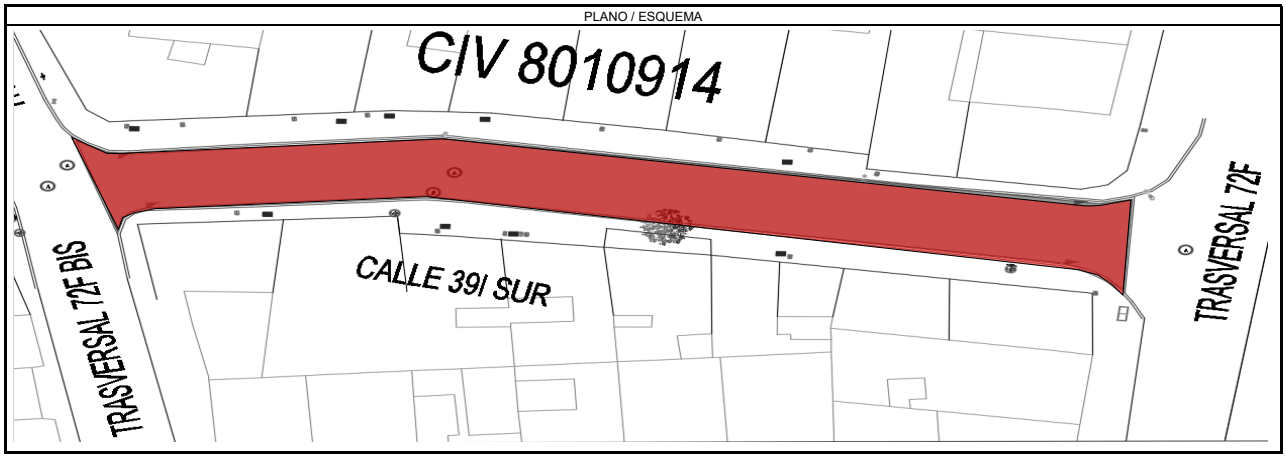

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

ESPESOR MEDIO ENCONTRADO 0,100

CARTERA DE:	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE - PLACA EN CONCRETO	ANCHO DE VIA DEMOLIDA	7,00

ABSCISA (m)	PLACA EN CONCRETO EXISTENTE					DEMOLICION					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,420	2543,445	2543,470	2543,483	2543,495	2543,320	2543,345	2543,370	2543,383	2543,395	6,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
K0+005,00	2543,430	2543,458	2543,485	2543,478	2543,470	2543,330	2543,358	2543,385	2543,378	2543,370	6,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	34,000	3,400
K0+010,00	2543,480	2543,508	2543,535	2543,513	2543,490	2543,380	2543,408	2543,435	2543,413	2543,390	6,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	34,000	3,400
K0+015,00	2543,520	2543,553	2543,585	2543,560	2543,535	2543,420	2543,453	2543,485	2543,460	2543,435	6,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	34,000	3,400
K0+020,00	2543,555	2543,580	2543,605	2543,595	2543,585	2543,455	2543,480	2543,505	2543,495	2543,485	6,800	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	34,000	3,400
K0+025,00	2543,575	2543,598	2543,620	2543,593	2543,565	2543,475	2543,498	2543,520	2543,493	2543,465	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	34,500	3,450
K0+030,00	2543,620	2543,623	2543,625	2543,625	2543,625	2543,520	2543,523	2543,525	2543,525	2543,525	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+035,00	2543,660	2543,673	2543,685	2543,670	2543,655	2543,560	2543,573	2543,585	2543,570	2543,555	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+040,00	2543,700	2543,713	2543,725	2543,695	2543,665	2543,600	2543,613	2543,625	2543,595	2543,565	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+045,00	2543,700	2543,725	2543,750	2543,725	2543,700	2543,600	2543,625	2543,650	2543,625	2543,600	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+050,00	2543,750	2543,748	2543,745	2543,730	2543,715	2543,650	2543,648	2543,645	2543,630	2543,615	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+055,00	2543,785	2543,780	2543,775	2543,765	2543,755	2543,685	2543,680	2543,675	2543,665	2543,655	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+060,00	2543,805	2543,820	2543,835	2543,840	2543,845	2543,705	2543,720	2543,735	2543,740	2543,745	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+065,00	2543,810	2543,840	2543,870	2543,838	2543,805	2543,710	2543,740	2543,770	2543,738	2543,705	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+070,00	2543,850	2543,863	2543,875	2543,865	2543,855	2543,750	2543,763	2543,775	2543,765	2543,755	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+075,00	2543,865	2543,865	2543,865	2543,853	2543,840	2543,765	2543,765	2543,765	2543,753	2543,740	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+080,00	2543,925	2543,920	2543,915	2543,905	2543,895	2543,825	2543,820	2543,815	2543,805	2543,795	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
																TOTAL	0,100	555,50	55,55
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	-0,68
														sumidero	0,48	SUMIDEROS	-4	-1,92	-0,19
																	TOTAL	546,77	54,68

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
excavacion mecanica estructura de via									
	caja de via		80,00	7,00	0,436				244,29
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,444			-3,00	-3,02
	sumideros existentes	area	0,48		0,444			-4,00	-0,85
excavacion mecanica REDES - SANITARIA									
	NC26 - TRAMO 1		28,30	0,90	1,21				30,89
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		56,50	0,90	1,33				67,59
	se anexa cartera topografica								
excavacion mecanica REDES - PLUVIAL									
	NC26 - TRAMO 1		28,15	1,05	1,11				32,79
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		45,30	1,05	1,06				50,30
	se anexa cartera topografica								
excavacion mecanica para pozos PLUVIAL									
	NC26 - TRAMO 2	cota subrasante	cota clave	cota fondo	alt corte	diametro excva	area excavac		
	PZ PLT816533	2543,31	2542,85	2542,05	1,26	2,20	3,80		4,80
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									426,79
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									426,79
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

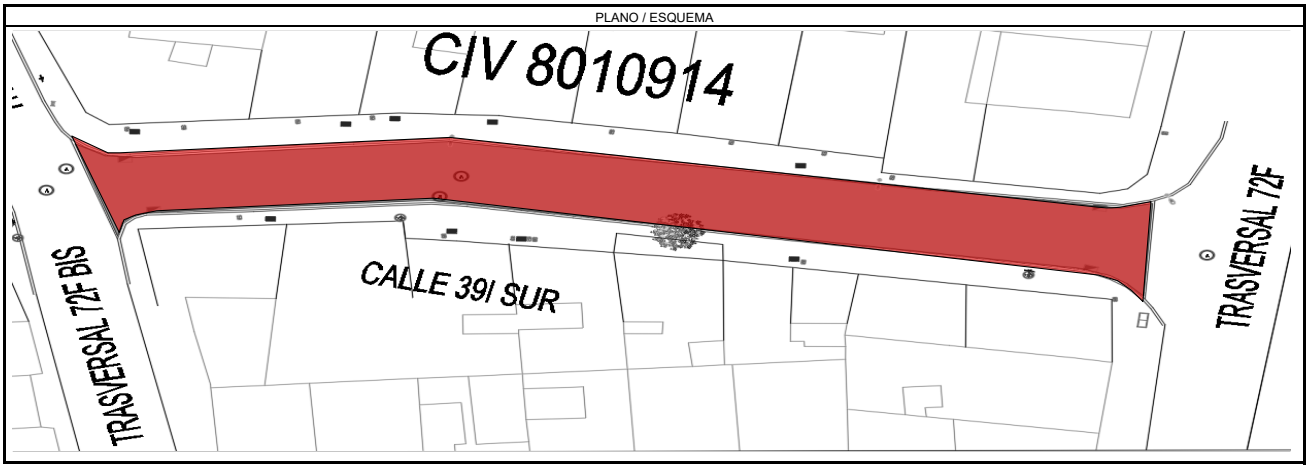

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	27/03/2026	CIV	8010914		ESTRUCTURA DE VIA	0,540
				PRIORIDAD:	NC	26		

CARTERA DE:	EXCAVACION MECANICA DE VIA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	DEMOLICION					SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,320	2543,345	2543,370	2543,383	2543,395	2542,860	2542,885	2542,910	2542,923	2542,935	6,800	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460		
K0+005,00	2543,330	2543,358	2543,385	2543,378	2543,370	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	6,800	0,420	0,412	0,405	0,433	0,460	0,426	34,000	15,062
K0+010,00	2543,380	2543,408	2543,435	2543,413	2543,390	2542,940	2542,975	2543,010	2542,975	2542,940	6,800	0,440	0,432	0,425	0,437	0,450	0,437	34,000	14,671
K0+015,00	2543,420	2543,453	2543,485	2543,460	2543,435	2542,970	2543,005	2543,040	2543,005	2542,970	6,800	0,450	0,447	0,445	0,455	0,465	0,452	34,000	15,121
K0+020,00	2543,455	2543,480	2543,505	2543,495	2543,485	2543,000	2543,035	2543,070	2543,035	2543,000	6,800	0,455	0,445	0,435	0,460	0,485	0,456	34,000	15,444
K0+025,00	2543,475	2543,498	2543,520	2543,493	2543,465	2543,030	2543,065	2543,100	2543,065	2543,030	7,000	0,445	0,432	0,420	0,427	0,435	0,432	34,500	15,318
K0+030,00	2543,520	2543,523	2543,525	2543,525	2543,525	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	7,000	0,460	0,427	0,395	0,430	0,465	0,435	35,000	15,181
K0+035,00	2543,560	2543,573	2543,585	2543,570	2543,555	2543,090	2543,125	2543,160	2543,125	2543,090	7,000	0,470	0,447	0,425	0,445	0,465	0,450	35,000	15,505
K0+040,00	2543,600	2543,613	2543,625	2543,595	2543,565	2543,120	2543,155	2543,190	2543,155	2543,120	7,000	0,480	0,457	0,435	0,440	0,445	0,452	35,000	15,785
K0+045,00	2543,600	2543,625	2543,650	2543,625	2543,600	2543,150	2543,185	2543,220	2543,185	2543,150	7,000	0,450	0,440	0,430	0,440	0,450	0,442	35,000	15,636
K0+050,00	2543,650	2543,648	2543,645	2543,630	2543,615	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	7,000	0,470	0,432	0,395	0,415	0,435	0,429	35,000	15,251
K0+055,00	2543,685	2543,680	2543,675	2543,665	2543,655	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	7,000	0,475	0,435	0,395	0,420	0,445	0,434	35,000	15,111
K0+060,00	2543,705	2543,720	2543,735	2543,740	2543,745	2543,240	2543,275	2543,310	2543,275	2543,240	7,000	0,465	0,445	0,425	0,465	0,505	0,461	35,000	15,662
K0+065,00	2543,710	2543,740	2543,770	2543,738	2543,705	2543,270	2543,305	2543,340	2543,305	2543,270	7,000	0,440	0,435	0,430	0,432	0,435	0,434	35,000	15,671
K0+070,00	2543,750	2543,763	2543,775	2543,765	2543,755	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	7,000	0,450	0,428	0,405	0,430	0,455	0,434	35,000	15,190
K0+075,00	2543,765	2543,765	2543,765	2543,753	2543,740	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	7,000	0,435	0,400	0,365	0,388	0,410	0,399	35,000	14,577
K0+080,00	2543,825	2543,820	2543,815	2543,805	2543,795	2543,360	2543,355	2543,350	2543,343	2543,335	7,000	0,465	0,465	0,465	0,463	0,460	0,464	35,000	15,103

					TOTAL	0,444	555,50	244,29
area	2,27				POZOS	-3	-6,81	-3,02
sumidero	0,48				SUMIDEROS	-4	-1,92	-0,85
						TOTAL	546,77	240,42

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			VOLUMEN COMPACTO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Transporte y disposicion de escombros		item							
	Demolicion de asfalto carpeta existente	1,002	54,69				1,35		73,83
	excavacion mecanica de estructura de via	1,003	426,79				1,30		554,83
				area					
	demolicion manual andenes	5,001	6,99	69,90	0,10		1,35		9,44
	excavacion manual andenes	5,002	5,00				1,30		6,50
	excavacion manual para redes	6,001	96,16				1,30		125,01
	demolicion manual de sardinel - longitud	7,036	160,00	0,15	0,300		1,35		7,20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									776,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									776,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

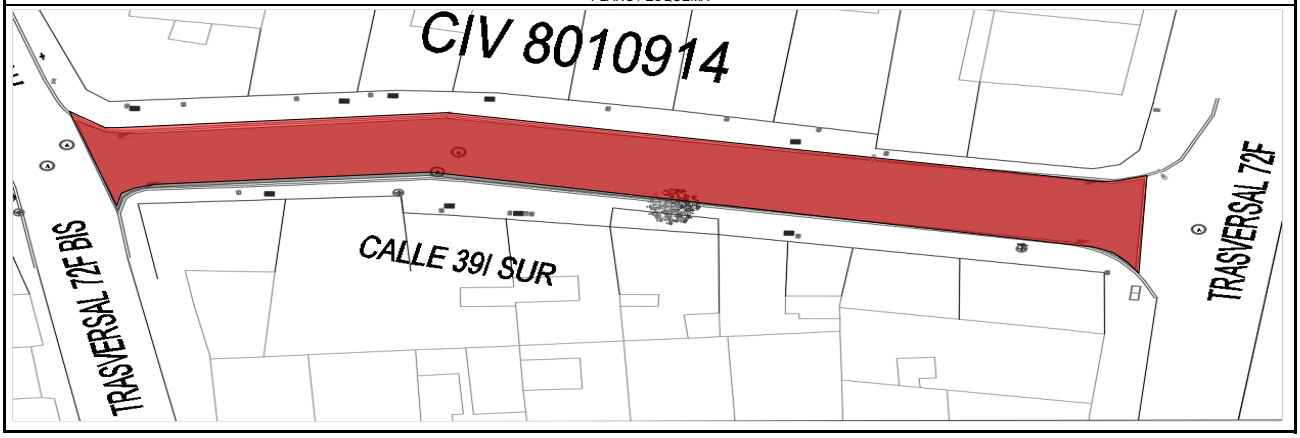

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,018 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
	Asfalto MD 19								
	estructura de via		20,00	6,78	0,05				6,78
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00	0,05				21,00
	pozos existentes	area	2,27		0,050			-3,00	-0,34
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,050			-4,00	-0,22
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									27,22
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									27,22
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

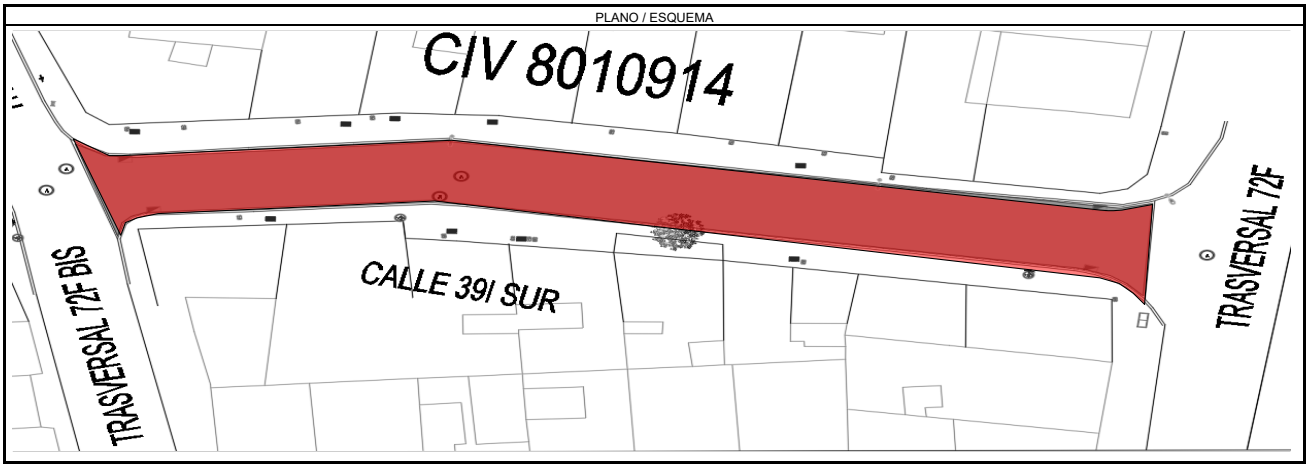

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,018 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,018 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
cortes para empalme en vias anexas									
	empalme con calle 39I sur - Cra 72F Bis		7,00						7,00
	empalme con calle 39I sur - TRV 72F		7,00						7,00
Corte en andenes para adecuacion de sardinel prefabricado									
	costado norte	K0+005,00							
		K0+080,00	75,00						75,00
	costado sur	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00						80,00
		Predio							
	adecuacion de rampa de acceso	72F-32	3,40						3,40
	demolicion para conexiones sanitarias	72F-29	2,80						2,80
	tramo 1 - sanitario								0,00
		72F-32	2,28						2,28
		72F-26	3,40						3,40
									0,00
	demolicion para conexiones sanitarias	72F-22	2,20						2,20
	tramo 2 - sanitario	72F-08	1,00						1,00
		72F-06	0,20						0,20
									0,00
		72F-19	1,00						1,00
		72F-15	3,10						3,10
		72F-23	4,60						4,60
		72F-27	5,80						5,80

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	198,78
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	198,78
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

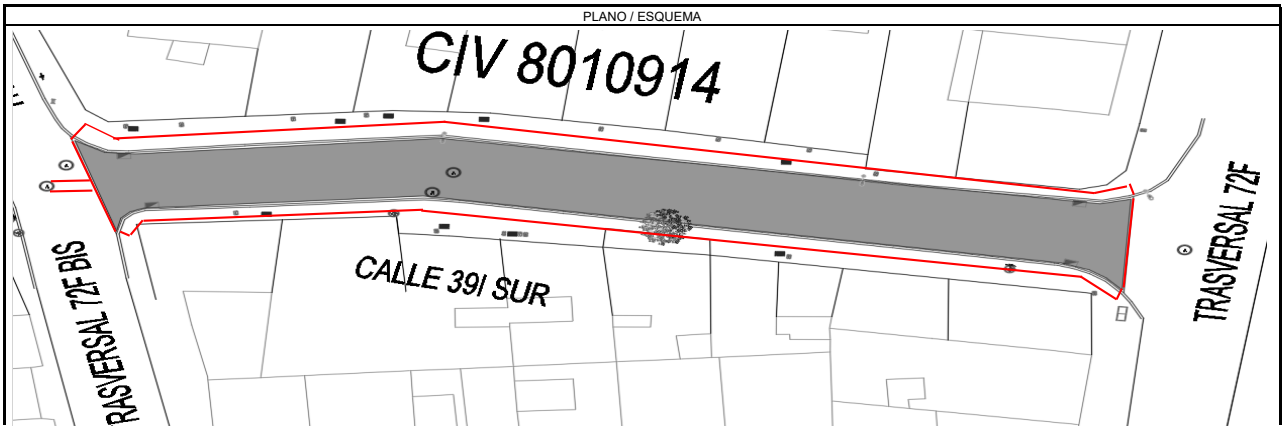

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,018 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

RIEGO DE LIGA CRR-1 0,050

CARTERA DE:	MEZCLA ASFALTICA MD 19	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	RIEGO DE LIGA CRR-1					MEZCLA ASFALTICA MD 19					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,350	2543,375	2543,400	2543,413	2543,425	2543,400	2543,425	2543,450	2543,463	2543,475	6,800	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
K0+005,00	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	6,800	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	34,000	1,700
K0+010,00	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	2543,480	2543,515	2543,550	2543,515	2543,480	6,800	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	34,000	1,700
K0+015,00	2543,460	2543,495	2543,530	2543,495	2543,460	2543,510	2543,545	2543,580	2543,545	2543,510	6,800	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	34,000	1,700
K0+020,00	2543,490	2543,525	2543,560	2543,525	2543,490	2543,540	2543,575	2543,610	2543,575	2543,540	6,800	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	34,000	1,700
K0+025,00	2543,520	2543,555	2543,590	2543,555	2543,520	2543,570	2543,605	2543,640	2543,605	2543,570	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	34,500	1,725
K0+030,00	2543,550	2543,585	2543,620	2543,585	2543,550	2543,600	2543,635	2543,670	2543,635	2543,600	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+035,00	2543,580	2543,615	2543,650	2543,615	2543,580	2543,630	2543,665	2543,700	2543,665	2543,630	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+040,00	2543,610	2543,645	2543,680	2543,645	2543,610	2543,660	2543,695	2543,730	2543,695	2543,660	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+045,00	2543,640	2543,675	2543,710	2543,675	2543,640	2543,690	2543,725	2543,760	2543,725	2543,690	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+050,00	2543,670	2543,705	2543,740	2543,705	2543,670	2543,720	2543,755	2543,790	2543,755	2543,720	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+055,00	2543,700	2543,735	2543,770	2543,735	2543,700	2543,750	2543,785	2543,820	2543,785	2543,750	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+060,00	2543,730	2543,765	2543,800	2543,765	2543,730	2543,780	2543,815	2543,850	2543,815	2543,780	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+065,00	2543,760	2543,795	2543,830	2543,795	2543,760	2543,810	2543,845	2543,880	2543,845	2543,810	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+070,00	2543,790	2543,825	2543,860	2543,825	2543,790	2543,840	2543,875	2543,910	2543,875	2543,840	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+075,00	2543,820	2543,855	2543,890	2543,855	2543,820	2543,870	2543,905	2543,940	2543,905	2543,870	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+080,00	2543,850	2543,845	2543,840	2543,833	2543,825	2543,900	2543,895	2543,890	2543,883	2543,875	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
																TOTAL	0,050	555,50	27,78
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	-0,34
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-4	-4,32	-0,22
																	TOTAL	544,37	27,22

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
demolicion de andenes para adecuacion de sardinel prefabricado									
	costado norte	K0+005,00							
		K0+080,00	75,00	0,40					30,00
	costado sur	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00	0,40					32,00
		Predio							
	adecuacion de rampa de acceso	72F-32	2,50	0,45					1,13
	demolicion para conexiones sanitarias	72F-29	1,40	0,50					0,70
	tramo 1 - sanitario								
		72F-32	1,14	0,40					0,46
		72F-26	1,70	0,45					0,77
	demolicion para conexiones sanitarias	72F-22	1,10	0,80					0,88
	tramo 2 - sanitario	72F-08	0,50	0,80					0,40
		72F-06	0,10	0,50					0,05
		72F-19	0,50	0,45					0,23
		72F-15	1,55	0,45					0,70
		72F-23	2,30	0,50					1,15
		72F-27	2,90	0,50					1,45

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	69,90
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	69,90
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

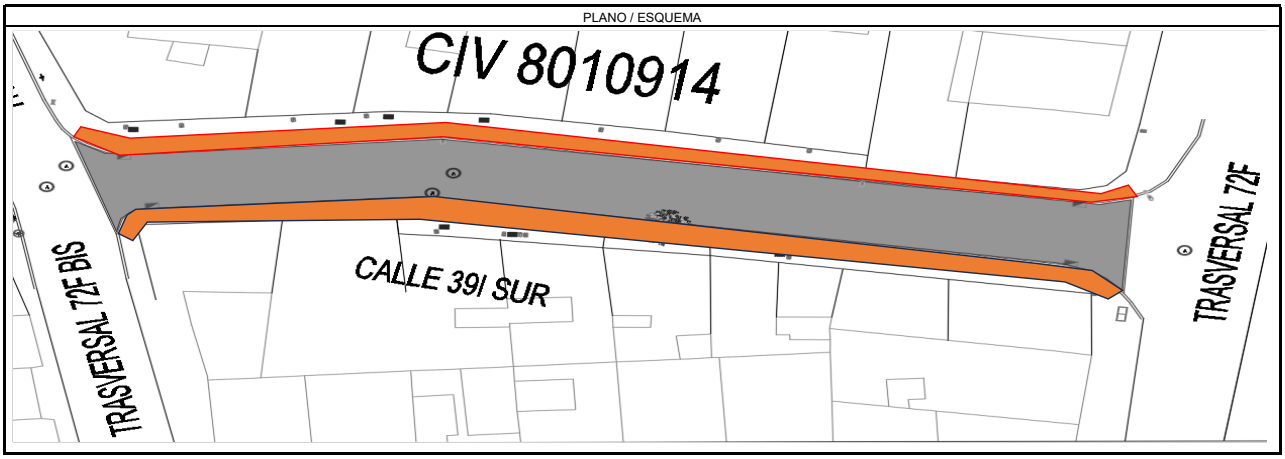

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
excavacion para para adecuacion de sardinel prefabricado									
	costado sur	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00	0,25	0,25				5,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									5,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									5,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

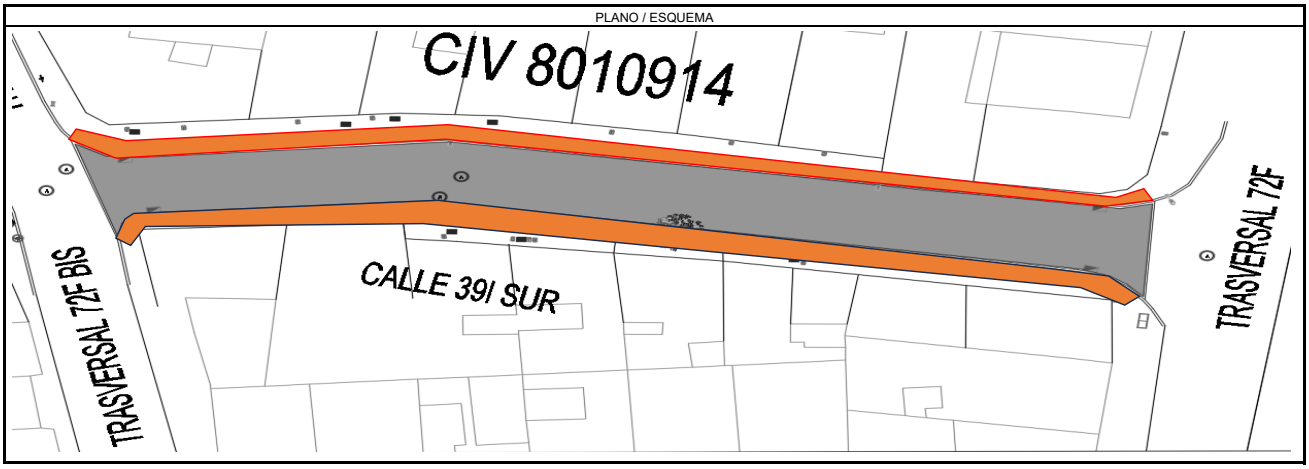

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
reconstruccion de andenes para adecuacion de rasante cosntruida									
	costado norte	K0+005,00							
		K0+080,00	75,00	0,40					30,00
	costado sur	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00	0,40					32,00
		Predio							
	adecuacion de rampa de acceso	72F-32	2,50	0,45					1,13
	demolicion para conexiones sanitarias	72F-29	1,40	0,50					0,70
	tramo 1 - sanitario								
		72F-32	1,14	0,40					0,46
		72F-26	1,70	0,45					0,77
	demolicion para conexiones sanitarias	72F-22	1,10	0,80					0,88
	tramo 2 - sanitario	72F-08	0,50	0,80					0,40
		72F-06	0,10	0,50					0,05
		72F-19	0,50	0,45					0,23
		72F-15	1,55	0,45					0,70
		72F-23	2,30	0,50					1,15
		72F-27	2,90	0,50					1,45

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	69,90
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	69,90
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

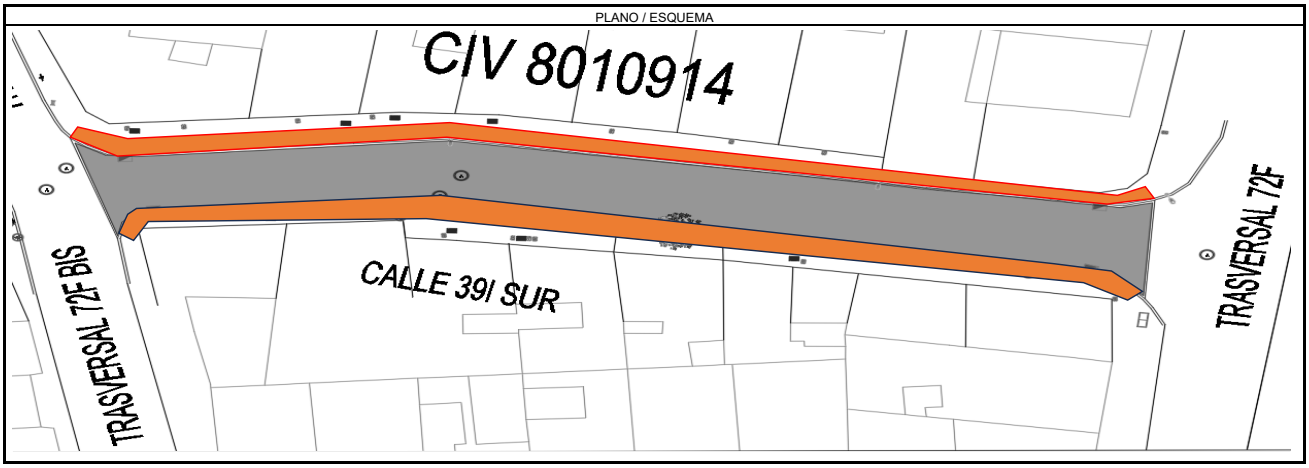

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Sardinel fundido - hombros de rampas de accesos									
	costado norte	-K0+000,20							
	Abscisado de occidente a oriente	K0+011,40	11,60	A-10					
		K0+011,40							
		K0+011,80	0,40	FUND					0,40
		K0+011,80							
		K0+014,25	2,45	A-85					
		K0+014,25							
		K0+014,65	0,40	FUND					0,40
		K0+014,65							
		K0+015,75	1,10	A-10					
		K0+015,75							
		K0+016,15	0,40	FUND					0,40
		K0+016,15							
		K0+022,63	6,48	A-85					
		K0+022,63							
		K0+023,03	0,40	FUND					0,40
		K0+023,03							
		K0+026,18	3,15	A-10					
		K0+026,18							
		K0+026,58	0,40	FUND					0,40
		K0+026,58							
		K0+029,50	2,92	A-85					
		K0+029,50							
		K0+029,90	0,40	FUND					0,40
		K0+029,90							
		K0+043,30	13,40	A-10					
		K0+043,30							
		K0+043,70	0,40	FUND					0,40
		K0+043,70							
		K0+046,35	2,65	A-85					
		K0+046,35							
		K0+046,75	0,40	FUND					0,40

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

		K0+046,75							
		K0+051,10	4,35	A-10					
		K0+051,10							
		K0+051,50	0,40	FUND					0,40
		K0+051,50							
		K0+057,45	5,95	A-85					
		K0+057,45							
		K0+057,85	0,40	FUND					0,40
		K0+057,85							
		K0+060,15	2,30	A-10					
		K0+060,15							
		K0+060,55	0,40	FUND					0,40
		K0+060,55							
		K0+063,05	2,50	A-85					
		K0+063,05							
		K0+063,45	0,40	FUND					0,40
		K0+063,45							
		K0+071,45	8,00	A-10					
		K0+071,45							
		K0+071,85	0,40	FUND					0,40
		K0+071,85							
		K0+074,75	2,90	A-85					
		K0+074,75							
		K0+075,15	0,40	FUND					0,40
		K0+075,15							
		K0+077,50	2,35	A-10					
		K0+077,50							
		K0+077,90	0,40	FUND					0,40
		K0+077,50							
		K0+080,80	3,30	A-85					
		K0+080,80							
		K0+081,20	0,40	FUND					0,40
	costado sur	K0+000,00							
	Abscisado de occidente a oriente	K0+009,95	9,95	A-10					
		K0+009,95							

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

		K0+010,35	0,40	FUND					0,40
		K0+010,35							
		K0+016,75	6,40	A-85					
		K0+016,75							
		K0+017,15	0,40	FUND					0,40
		K0+017,15							
		K0+032,95	15,80	A-10					
		K0+032,95							
		K0+033,35	0,40	FUND					0,40
		K0+033,35							
		K0+038,95	5,60	A-85					
		K0+038,95							
		K0+039,35	0,40	FUND					0,40
		K0+039,35							
		K0+043,85	4,50	A-10					
		K0+043,85							
		K0+044,25	0,40	FUND					0,40
		K0+044,25							
		K0+050,80	6,55	A-85					
		K0+050,80							
		K0+051,20	0,40	FUND					0,40
		K0+051,20							
		K0+057,80	6,60	A-10					
		K0+057,80							
		K0+058,20	0,40	FUND					0,40
		K0+058,20							
		K0+064,50	6,30	A-85					
		K0+064,50							
		K0+064,90	0,40	FUND					0,40
		K0+064,90							
		K0+079,30	14,40	A-10					

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	9,60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	9,60
TOTAL POR EJECUTAR	

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

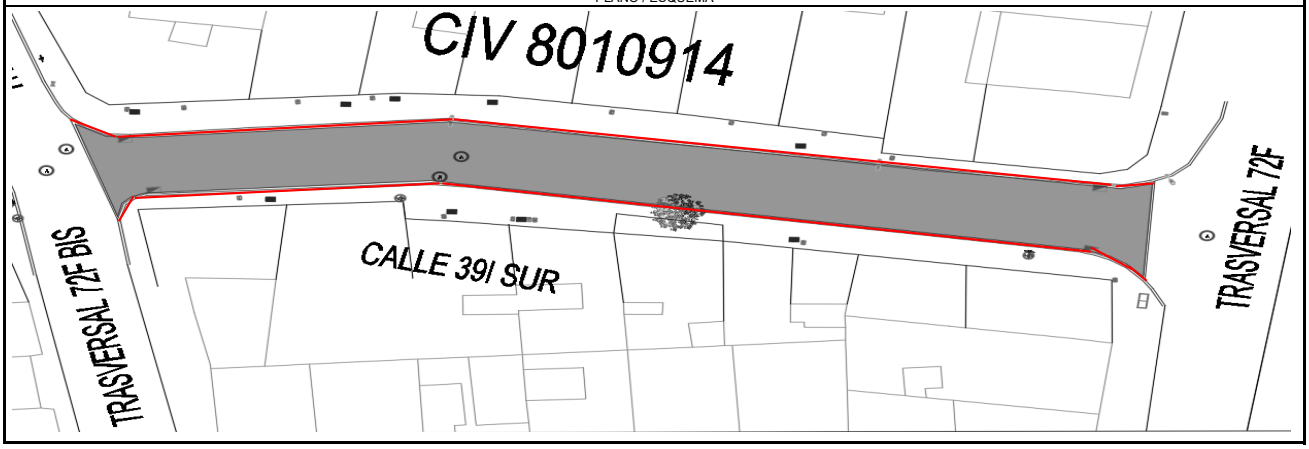

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,011 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
	Sardinel A-10								
	costado norte	-K0+000,20							
	Abscisado de occidente a oriente	K0+011,20	11,40	A-10					11,40
		K0+011,20							
		K0+011,60	0,40	FUND					
		K0+011,60							
		K0+014,05	2,45	A-85					
		K0+014,05							
		K0+014,45	0,40	FUND					
		K0+014,45							
		K0+015,55	1,10	A-10					1,10
		K0+015,55							
		K0+015,95	0,40	FUND					
		K0+015,95							
		K0+022,43	6,48	A-85					
		K0+022,43							
		K0+022,83	0,40	FUND					
		K0+022,83							
		K0+025,98	3,15	A-10					3,15
		K0+025,98							
		K0+026,38	0,40	FUND					
		K0+026,38							
		K0+029,30	2,92	A-85					
		K0+029,30							
		K0+029,70	0,40	FUND					
		K0+029,70							
		K0+043,10	13,40	A-10					13,40
		K0+043,10							
		K0+043,50	0,40	FUND					
		K0+043,50							
		K0+046,15	2,65	A-85					
		K0+046,15							
		K0+046,55	0,40	FUND					

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,011 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

		K0+046,55							
		K0+050,90	4,35	A-10					4,35
		K0+050,90							
		K0+051,30	0,40	FUND					
		K0+051,30							
		K0+057,25	5,95	A-85					
		K0+057,25							
		K0+057,65	0,40	FUND					
		K0+057,65							
		K0+059,95	2,30	A-10					2,30
		K0+059,95							
		K0+060,35	0,40	FUND					
		K0+060,35							
		K0+062,85	2,50	A-85					
		K0+062,85							
		K0+063,25	0,40	FUND					
		K0+063,25							
		K0+071,25	8,00	A-10					8,00
		K0+071,25							
		K0+071,65	0,40	FUND					
		K0+071,65							
		K0+074,55	2,90	A-85					
		K0+074,55							
		K0+074,95	0,40	FUND					
		K0+074,95							
		K0+077,30	2,35	A-10					2,35
		K0+077,30							
		K0+077,70	0,40	FUND					
		K0+077,30							
		K0+080,60	3,30	A-85					
		K0+080,60							
		K0+081,00	0,40	FUND					
	costado sur	K0+000,00							
	Abscisado de occidente a oriente	K0+009,95	9,95	A-10					9,95
		K0+009,95							

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,011 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

		K0+010,35	0,40	FUND					
		K0+010,35							
		K0+016,75	6,40	A-85					
		K0+016,75							
		K0+017,15	0,40	FUND					
		K0+017,15							
		K0+032,95	15,80	A-10					15,80
		K0+032,95							
		K0+033,35	0,40	FUND					
		K0+033,35							
		K0+038,95	5,60	A-85					
		K0+038,95							
		K0+039,35	0,40	FUND					
		K0+039,35							
		K0+043,85	4,50	A-10					4,50
		K0+043,85							
		K0+044,25	0,40	FUND					
		K0+044,25							
		K0+050,80	6,55	A-85					
		K0+050,80							
		K0+051,20	0,40	FUND					
		K0+051,20							
		K0+057,80	6,60	A-10					6,60
		K0+057,80							
		K0+058,20	0,40	FUND					
		K0+058,20							
		K0+064,50	6,30	A-85					
		K0+064,50							
		K0+064,90	0,40	FUND					
		K0+064,90							
		K0+079,30	14,40	A-10					14,40

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	97,30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	97,30
TOTAL POR EJECUTAR	

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,011 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

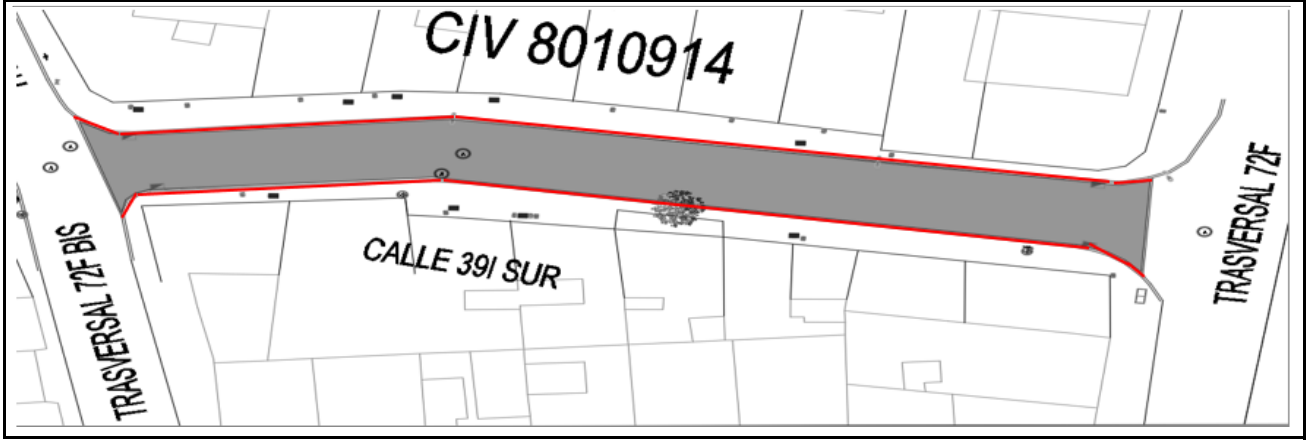

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
excavacion para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC26 - TRAMO 1	72F-36	4,60	0,60	0,75				2,07
		72F-37	2,50	0,60	0,73				1,10
		72F-29	3,60	0,60	0,73				1,57
		72F-32	7,40	0,60	0,68				3,01
		72F-26	8,10	0,60	0,64				3,13
	NC26 - TRAMO 2	72F-27	4,50	0,60	1,17				3,16
		72F-22	8,50	0,60	1,07				5,45
		72F-23	4,00	0,60	1,16				2,79
		72F-20	8,50	0,60	0,99				5,07
		72F-19	2,70	0,60	1,08				1,75
		72F-14	7,00	0,60	0,92				3,85
		72F-15	3,95	0,60	0,94				2,22
		72F-08	6,40	0,60	0,87				3,36
		72F-09	2,90	0,60	0,85				1,47
		72F-06	5,80	0,60	0,77				2,69
		72F-02	6,20	0,60	0,71				2,63
excavacion para construccion de sumideros									
	costado norte								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+001,50	1,40	1,10	0,86				1,32
	costado sur								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+003,50	1,40	1,10	0,86				1,32
	costado norte								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+071,00	1,40	1,10	0,86				1,32
	costado sur								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+071,00	1,40	1,10	0,86				1,32
excavacion para instalacion tuberia de sumideros									
	costado norte								
	Excavacion tub de sumidero	K0+071,00	2,20	0,80	0,82				1,44
	costado sur								
	Excavacion tub de sumidero	K0+071,00	3,20	0,80	0,82				2,10
excavacion para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00	0,50	1,05				42,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	96,16
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	96,16
TOTAL POR EJECUTAR	

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

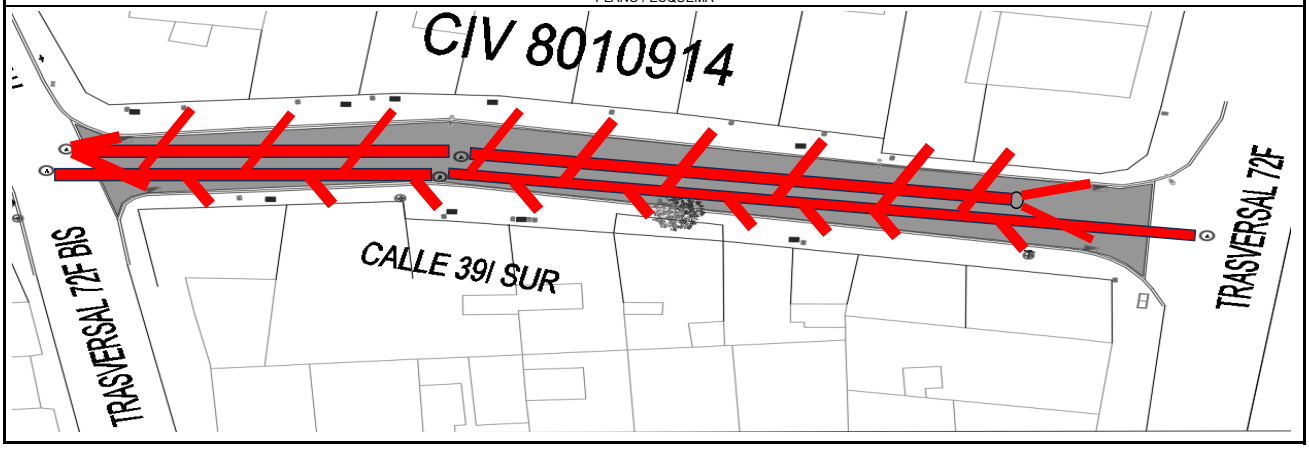

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Relleno para redes - tramos SANITARIOS					area seccion				
	NC26 - TRAMO 1		28,30	0,90	0,165				4,67
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		56,50	0,90	0,165				9,32
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - tramos PLUVIAL					area seccion				
	NC26 - TRAMO 1		28,15	1,05	0,263				7,40
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		45,30	1,05	0,263				11,91
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de domiciliarias					area seccion				
	NC26 - TRAMO 1		26,20	0,60	0,097				2,53
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		60,45	0,60	0,097				5,84
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de pozos									
	NC26 - TRAMO 2		diametro excav	area excavacion					
	PZ PLT816533		2,20	3,80	0,10				0,38
	se anexa cartera topografica								
relleno base instalacion de sumideros									
	costado norte								
	Triturado para instal de sumidero	K0+001,50	1,40	1,10	0,10				0,15
	costado sur								
	Triturado para instal de sumidero	K0+003,50	1,40	1,10	0,10				0,15
	costado norte								
	Triturado para instal de sumidero	K0+071,00	1,40	1,10	0,10				0,15
	costado sur								
	Triturado para instal de sumidero	K0+071,00	1,40	1,10	0,10				0,15
relleno para instalacion tuberia de sumideros - base carcamo									
	costado norte				area seccion				
	Triturado para tub de sumidero	K0+071,00	2,20	0,80	0,165				0,36
	costado sur								
	Triturado para tub de sumidero	K0+071,00	3,20	0,80	0,165				0,53
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									43,55
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									43,55

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

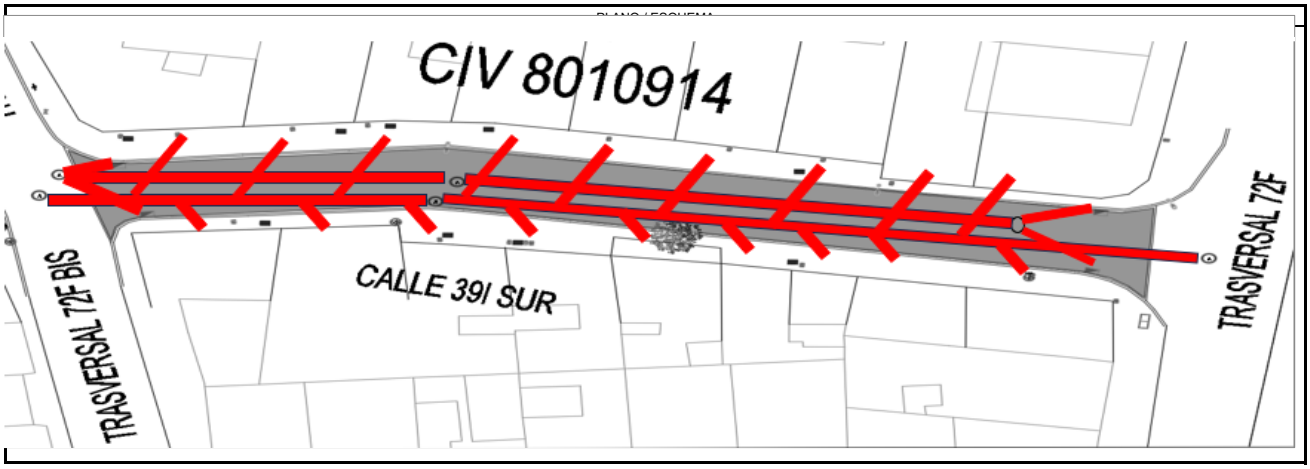

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Relleno en arena para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00	0,50	0,30				12,00
	volumen tubo 4"		80,00	area	-0,0079				-0,63

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	11,37
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11,37
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

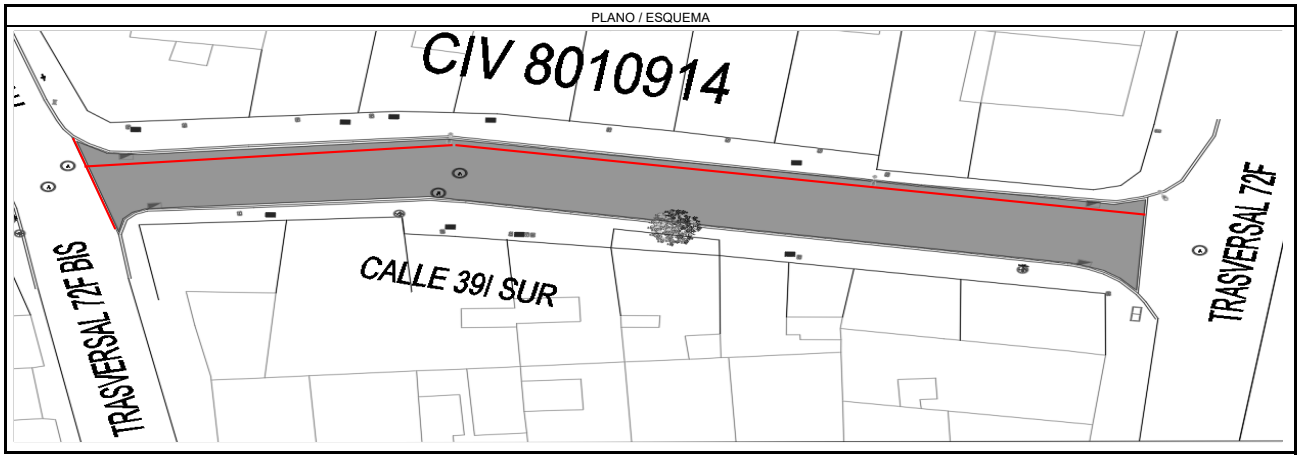

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
placa de cubierta - construccion de pozos PLUVIALES									
	NC26 - TRAMO 2								
	PZ PLT816533							1,00	1,00
	se anexa cartera topografica								
placa de cubierta - Reconstruccion de pozos PLUVIAL									
	PZ PMP116380							1,00	1,00
placa de cubierta - Reconstruccion de pozos SANITARIO									
	PZ CMP121500							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									3,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									3,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

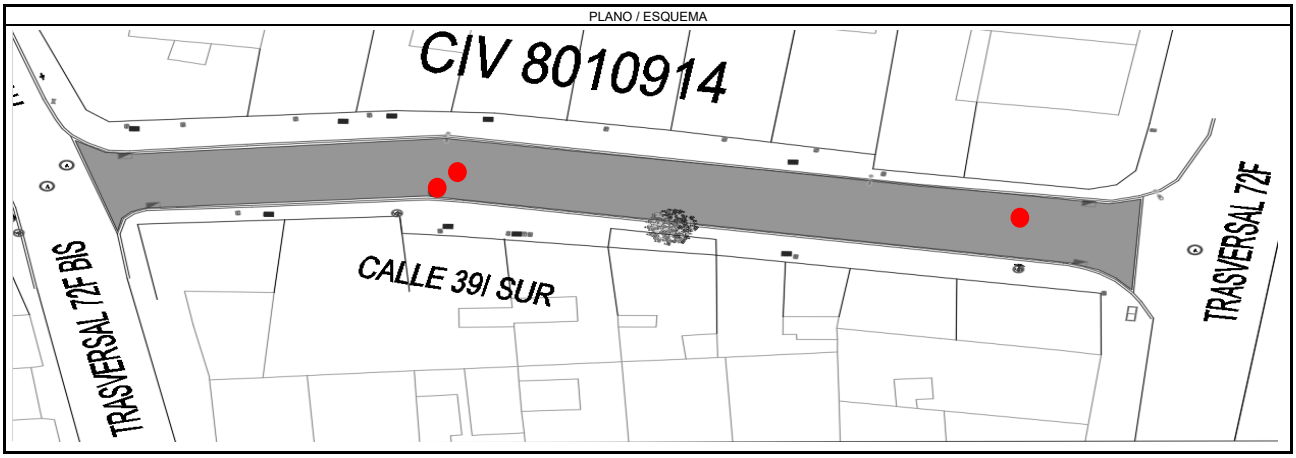

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
mamposteria - construccion de pozos PLUVIAL					c				
	NC26 - TRAMO 2		a	b	a-b=c	d			c-d
	PZ PLT816533		2543,85	2542,30	1,55	0,25			1,30
	se anexa cartera topografica								
mamposteria - Reconstruccion de pozos PLUVIAL									
	NC26 - TRAMO 1				0,60				0,60
	PZ PMP116380								
mamposteria - Reconstruccion de pozos SANITARIO									
	NC26 - TRAMO 1				0,60				0,60
	PZ CMP121500								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,50
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

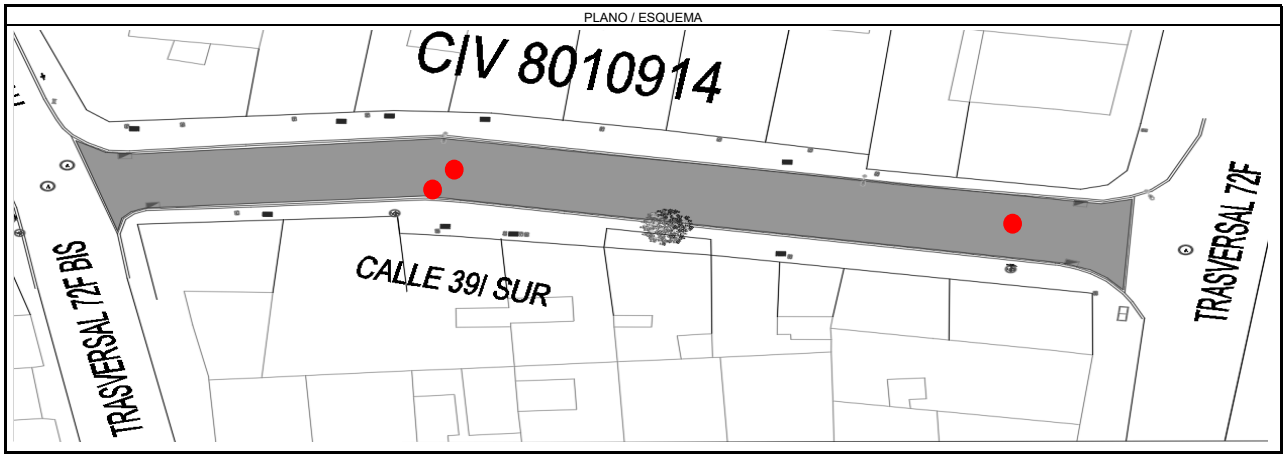

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
tuberia para conexcion de sumideros									
	costado norte	K0+071,00	2,60						2,60
	costado sur	K0+071,00	3,60						3,60

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6,20
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

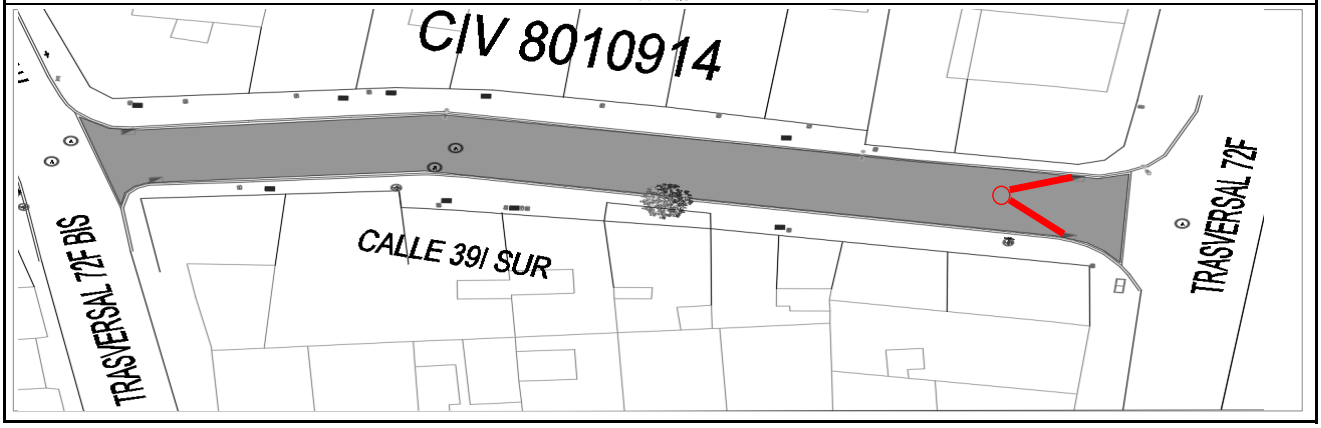

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,015 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LONG ENTRE EJES POZO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Tuberia para redes - tramos PLUVIALES									
	NC26 - TRAMO 1		29,85			-1,20			28,65
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		47,00			-1,20			45,80
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									74,45
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									74,45
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

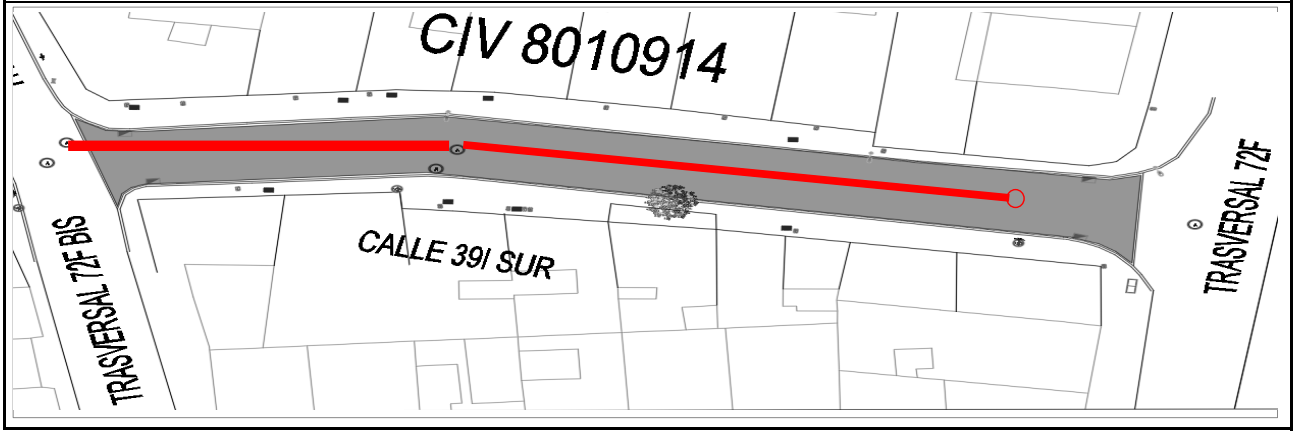

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,015 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Tuberia para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC26 - TRAMO 1	72F-36	4,60						4,60
		72F-37	2,50						2,50
		72F-29	3,60						3,60
		72F-32	7,40						7,40
		72F-26	8,10						8,10
	NC26 - TRAMO 2	72F-27	4,50						4,50
		72F-22	8,50						8,50
		72F-23	4,00						4,00
		72F-20	8,50						8,50
		72F-19	2,70						2,70
		72F-14	7,00						7,00
		72F-15	3,95						3,95
		72F-08	6,40						6,40
		72F-09	2,90						2,90
		72F-06	5,80						5,80
		72F-02	6,20						6,20

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	86,65
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	86,65
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

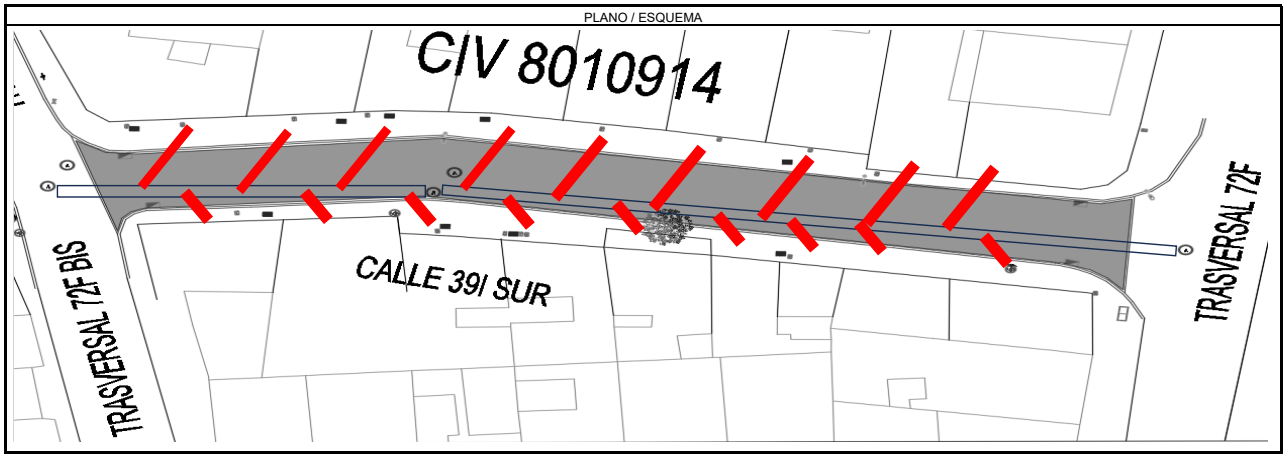

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LONG ENTRE EJES POZO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Tuberia para redes - tramos SANITARIOS									
	NC26 - TRAMO 1		30,00			-1,20			28,80
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		58,20			-1,20			57,00
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									85,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									85,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

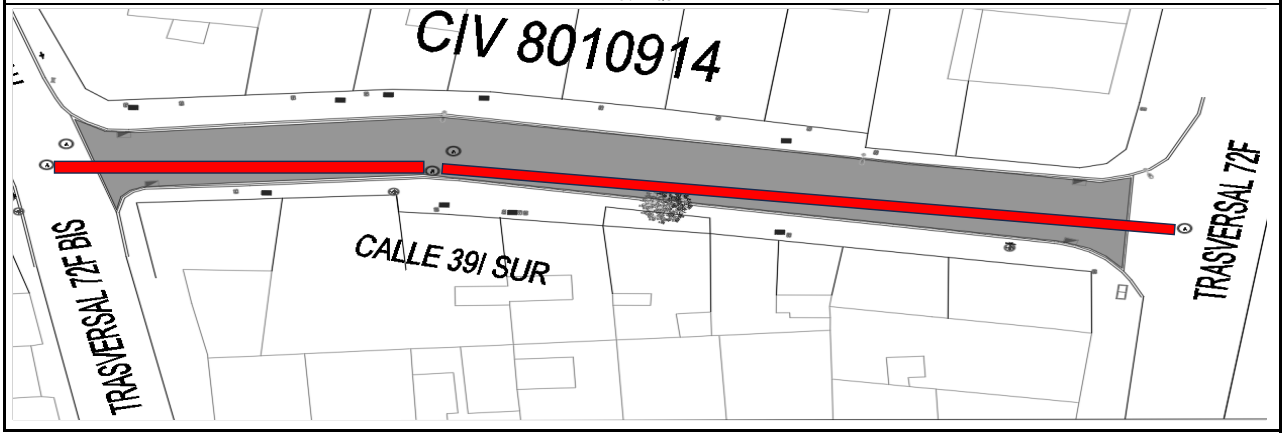

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
nivelacion y compactacion de subrasante de via									
	subrasante de diseño		20,00	6,775					135,50
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00					420,00
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-4,00	-4,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									544,37
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									544,37
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

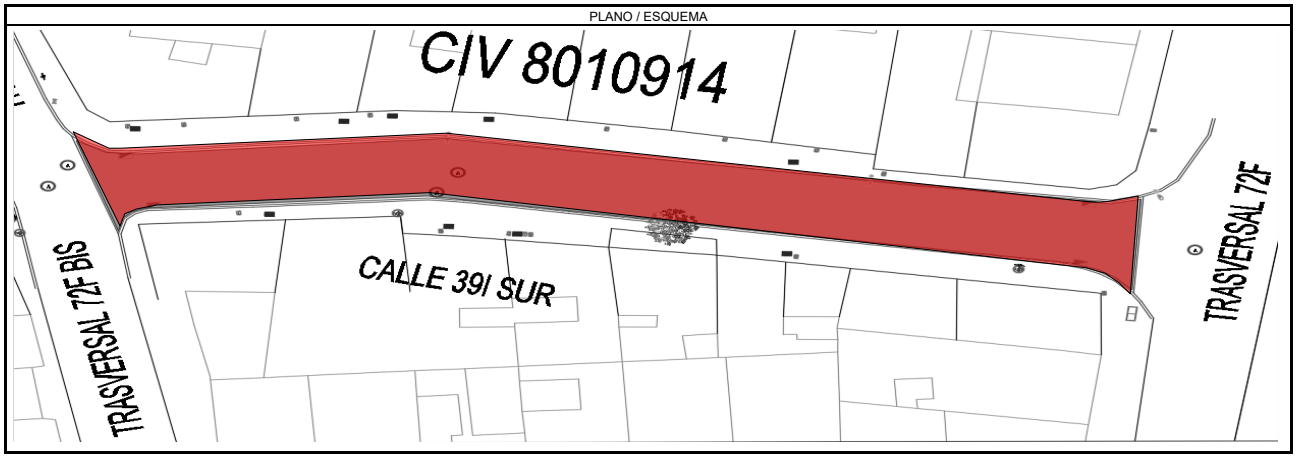

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

ESTRUCTURA DE VIA 0,540

CARTERA DE:	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2542,860	2542,885	2542,910	2542,923	2542,935	2542,860	2542,885	2542,910	2542,923	2542,935	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+010,00	2542,940	2542,975	2543,010	2542,975	2542,940	2542,940	2542,975	2543,010	2542,975	2542,940	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+015,00	2542,970	2543,005	2543,040	2543,005	2542,970	2542,970	2543,005	2543,040	2543,005	2542,970	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+020,00	2543,000	2543,035	2543,070	2543,035	2543,000	2543,000	2543,035	2543,070	2543,035	2543,000	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+025,00	2543,030	2543,065	2543,100	2543,065	2543,030	2543,030	2543,065	2543,100	2543,065	2543,030	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,500	0,000
K0+030,00	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,090	2543,125	2543,160	2543,125	2543,090	2543,090	2543,125	2543,160	2543,125	2543,090	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2543,120	2543,155	2543,190	2543,155	2543,120	2543,120	2543,155	2543,190	2543,155	2543,120	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2543,150	2543,185	2543,220	2543,185	2543,150	2543,150	2543,185	2543,220	2543,185	2543,150	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2543,240	2543,275	2543,310	2543,275	2543,240	2543,240	2543,275	2543,310	2543,275	2543,240	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2543,270	2543,305	2543,340	2543,305	2543,270	2543,270	2543,305	2543,340	2543,305	2543,270	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+070,00	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+075,00	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+080,00	2543,360	2543,355	2543,350	2543,343	2543,335	2543,360	2543,355	2543,350	2543,343	2543,335	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000

		TOTAL	0,000	555,50	0,00
area	2,27	POZOS	-3	-6,81	0,00
sumidero	1,08	SUMIDEROS	-4	-4,32	0,00
		TOTAL		544,37	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,007 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Instalacion de A-85 en rampa bocaccalle 39 SUR									
	costado norte	-K0+000,20							
	Abscisado de occidente a oriente	K0+011,40	11,60	A-10					
		K0+011,40							
		K0+011,80	0,40	FUND					
		K0+011,80							
		K0+014,25	2,45	A-85					2,45
		K0+014,25							
		K0+014,65	0,40	FUND					
		K0+014,65							
		K0+015,75	1,10	A-10					
		K0+015,75							
		K0+016,15	0,40	FUND					
		K0+016,15							
		K0+022,63	6,48	A-85					6,48
		K0+022,63							
		K0+023,03	0,40	FUND					
		K0+023,03							
		K0+026,18	3,15	A-10					
		K0+026,18							
		K0+026,58	0,40	FUND					
		K0+026,58							
		K0+029,50	2,92	A-85					2,92
		K0+029,50							
		K0+029,90	0,40	FUND					
		K0+029,90							
		K0+043,30	13,40	A-10					
		K0+043,30							
		K0+043,70	0,40	FUND					
		K0+043,70							
		K0+046,35	2,65	A-85					2,65
		K0+046,35							
		K0+046,75	0,40	FUND					

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,007 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

		K0+046,75							
		K0+051,10	4,35	A-10					
		K0+051,10							
		K0+051,50	0,40	FUND					
		K0+051,50							
		K0+057,45	5,95	A-85					5,95
		K0+057,45							
		K0+057,85	0,40	FUND					
		K0+057,85							
		K0+060,15	2,30	A-10					
		K0+060,15							
		K0+060,55	0,40	FUND					
		K0+060,55							
		K0+063,05	2,50	A-85					2,50
		K0+063,05							
		K0+063,45	0,40	FUND					
		K0+063,45							
		K0+071,45	8,00	A-10					
		K0+071,45							
		K0+071,85	0,40	FUND					
		K0+071,85							
		K0+074,75	2,90	A-85					2,90
		K0+074,75							
		K0+075,15	0,40	FUND					
		K0+075,15							
		K0+077,50	2,35	A-10					
		K0+077,50							
		K0+077,90	0,40	FUND					
		K0+077,50							
		K0+080,80	3,30	A-85					3,30
		K0+080,80							
		K0+081,20	0,40	FUND					
	costado sur	K0+000,00							
	Abscisado de occidente a oriente	K0+009,95	9,95	A-10					
		K0+009,95							

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,007 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

		K0+010,35	0,40	FUND					
		K0+010,35							
		K0+016,75	6,40	A-85					6,40
		K0+016,75							
		K0+017,15	0,40	FUND					
		K0+017,15							
		K0+032,95	15,80	A-10					
		K0+032,95							
		K0+033,35	0,40	FUND					
		K0+033,35							
		K0+038,95	5,60	A-85					5,60
		K0+038,95							
		K0+039,35	0,40	FUND					
		K0+039,35							
		K0+043,85	4,50	A-10					
		K0+043,85							
		K0+044,25	0,40	FUND					
		K0+044,25							
		K0+050,80	6,55	A-85					6,55
		K0+050,80							
		K0+051,20	0,40	FUND					
		K0+051,20							
		K0+057,80	6,60	A-10					
		K0+057,80							
		K0+058,20	0,40	FUND					
		K0+058,20							
		K0+064,50	6,30	A-85					6,30
		K0+064,50							
		K0+064,90	0,40	FUND					
		K0+064,90							
		K0+079,30	14,40	A-10					

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	54,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	54,00
TOTAL POR EJECUTAR	

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,007 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01


DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

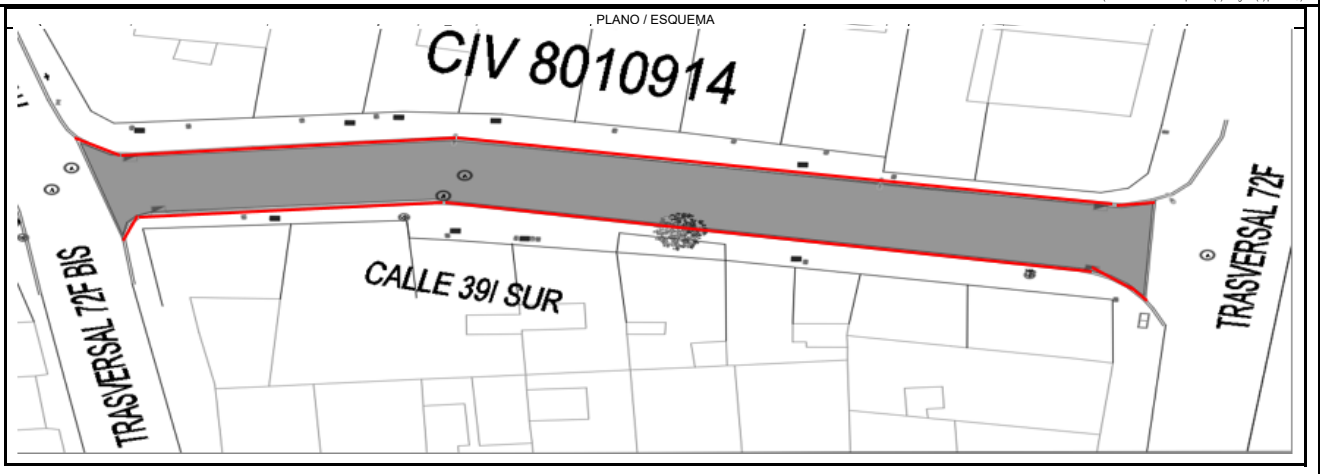

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,016 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
	Asfalto Caucho								
	estructura de via		20,00	6,78	0,070				9,49
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00	0,070				29,40
	pozos existentes	area	2,27		0,070			-3,00	-0,48
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,070			-4,00	-0,30
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									38,11
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									38,11
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

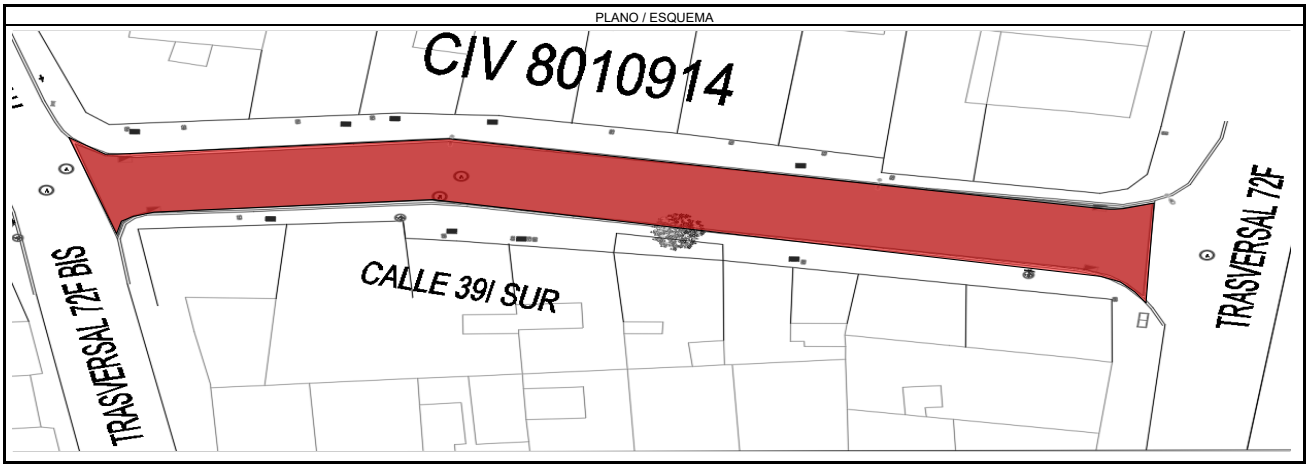

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,016 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

MEZCLA ASFALTICA MCCH25 0,070

CARTERA DE:	MEZCLA ASFALTICA MCCH25	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	IMPRIMACION CRL-1					MEZCLA ASFALTICA MCCH25					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,280	2543,305	2543,330	2543,343	2543,355	2543,350	2543,375	2543,400	2543,413	2543,425	6,800	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
K0+005,00	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	6,800	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	34,000	2,380
K0+010,00	2543,360	2543,395	2543,430	2543,395	2543,360	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	6,800	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	34,000	2,380
K0+015,00	2543,390	2543,425	2543,460	2543,425	2543,390	2543,460	2543,495	2543,530	2543,495	2543,460	6,800	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	34,000	2,380
K0+020,00	2543,420	2543,455	2543,490	2543,455	2543,420	2543,490	2543,525	2543,560	2543,525	2543,490	6,800	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	34,000	2,380
K0+025,00	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	2543,520	2543,555	2543,590	2543,555	2543,520	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	34,500	2,415
K0+030,00	2543,480	2543,515	2543,550	2543,515	2543,480	2543,550	2543,585	2543,620	2543,585	2543,550	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+035,00	2543,510	2543,545	2543,580	2543,545	2543,510	2543,580	2543,615	2543,650	2543,615	2543,580	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+040,00	2543,540	2543,575	2543,610	2543,575	2543,540	2543,610	2543,645	2543,680	2543,645	2543,610	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+045,00	2543,570	2543,605	2543,640	2543,605	2543,570	2543,640	2543,675	2543,710	2543,675	2543,640	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+050,00	2543,600	2543,635	2543,670	2543,635	2543,600	2543,670	2543,705	2543,740	2543,705	2543,670	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+055,00	2543,630	2543,665	2543,700	2543,665	2543,630	2543,700	2543,735	2543,770	2543,735	2543,700	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+060,00	2543,660	2543,695	2543,730	2543,695	2543,660	2543,730	2543,765	2543,800	2543,765	2543,730	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+065,00	2543,690	2543,725	2543,760	2543,725	2543,690	2543,760	2543,795	2543,830	2543,795	2543,760	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+070,00	2543,720	2543,755	2543,790	2543,755	2543,720	2543,790	2543,825	2543,860	2543,825	2543,790	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+075,00	2543,750	2543,785	2543,820	2543,785	2543,750	2543,820	2543,855	2543,890	2543,855	2543,820	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+080,00	2543,780	2543,775	2543,770	2543,763	2543,755	2543,850	2543,845	2543,840	2543,833	2543,825	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
																TOTAL	0,070	555,50	38,89
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	-0,48
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-4	-4,32	-0,30
																	TOTAL	544,37	38,11

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,017 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Riego de liga sobre Asfalto McCh25									
	estructura de via		20,00	6,78					135,50
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00					420,00
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-4,00	-4,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									544,37
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									544,37
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

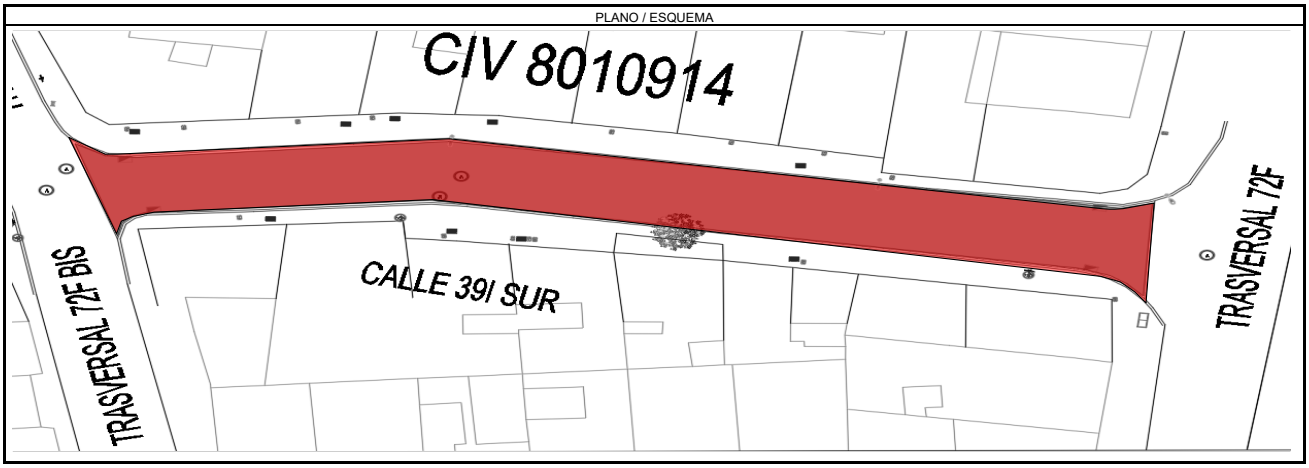

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,017 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

RIEGO DE LIGA CRR-1 0,000

CARTERA DE:	RIEGO DE LIGA CRR-1	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	MEZCLA ASFALTICA MCCH25					RIEGO DE LIGA CRR-1					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,350	2543,375	2543,400	2543,413	2543,425	2543,350	2543,375	2543,400	2543,413	2543,425	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+010,00	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+015,00	2543,460	2543,495	2543,530	2543,495	2543,460	2543,460	2543,495	2543,530	2543,495	2543,460	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+020,00	2543,490	2543,525	2543,560	2543,525	2543,490	2543,490	2543,525	2543,560	2543,525	2543,490	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+025,00	2543,520	2543,555	2543,590	2543,555	2543,520	2543,520	2543,555	2543,590	2543,555	2543,520	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,500	0,000
K0+030,00	2543,550	2543,585	2543,620	2543,585	2543,550	2543,550	2543,585	2543,620	2543,585	2543,550	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,580	2543,615	2543,650	2543,615	2543,580	2543,580	2543,615	2543,650	2543,615	2543,580	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2543,610	2543,645	2543,680	2543,645	2543,610	2543,610	2543,645	2543,680	2543,645	2543,610	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2543,640	2543,675	2543,710	2543,675	2543,640	2543,640	2543,675	2543,710	2543,675	2543,640	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2543,670	2543,705	2543,740	2543,705	2543,670	2543,670	2543,705	2543,740	2543,705	2543,670	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2543,700	2543,735	2543,770	2543,735	2543,700	2543,700	2543,735	2543,770	2543,735	2543,700	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2543,730	2543,765	2543,800	2543,765	2543,730	2543,730	2543,765	2543,800	2543,765	2543,730	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2543,760	2543,795	2543,830	2543,795	2543,760	2543,760	2543,795	2543,830	2543,795	2543,760	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+070,00	2543,790	2543,825	2543,860	2543,825	2543,790	2543,790	2543,825	2543,860	2543,825	2543,790	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+075,00	2543,820	2543,855	2543,890	2543,855	2543,820	2543,820	2543,855	2543,890	2543,855	2543,820	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+080,00	2543,850	2543,845	2543,840	2543,833	2543,825	2543,850	2543,845	2543,840	2543,833	2543,825	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
																TOTAL	0,000	555,50	0,00
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-4	-4,32	0,00
																	TOTAL	544,37	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Demolicion - Reconstruccion de pozos									
	PZ PMP116380	PLUVIAL						1,00	1,00
	PZ CMP121500	SANITARIO						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

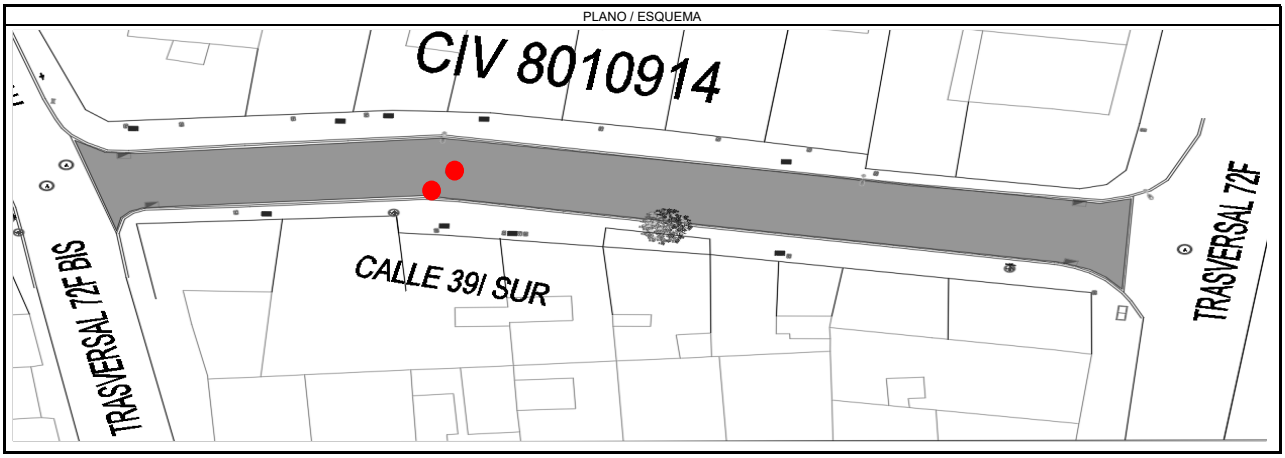

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Demolicion de sumidero existente									
	sumidero existente		K0+001,50	norte				1,00	1,00
	sumidero existente		K0+071,00	norte				1,00	1,00
	sumidero existente		K0+003,50	sur				1,00	1,00
	sumidero existente		K0+071,00	sur				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

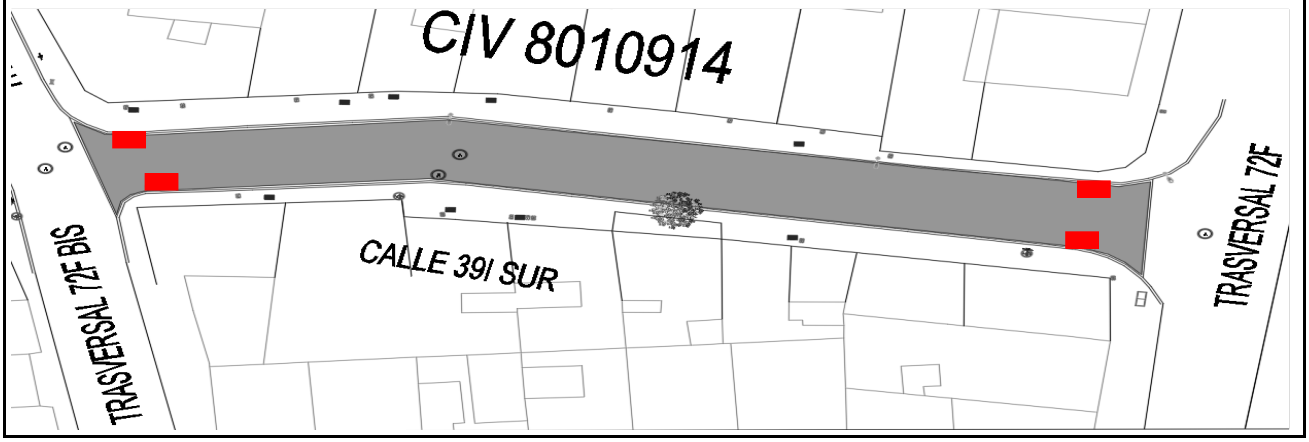

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Geocelda para estructura de via									
	estructura de via		20,00	6,78					135,50
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00					420,00
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-4,00	-4,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									544,37
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									544,37
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

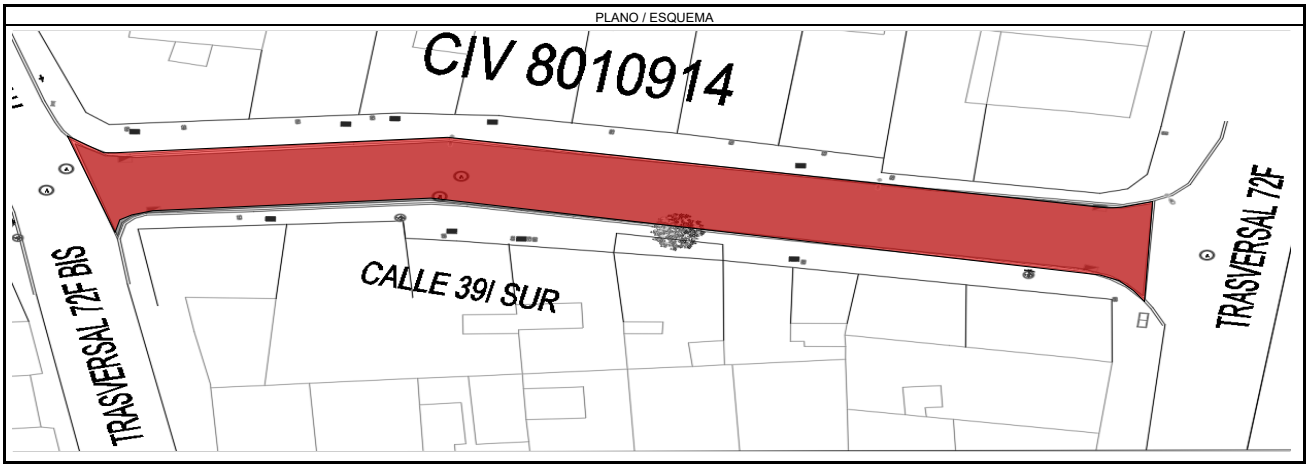

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01


DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA

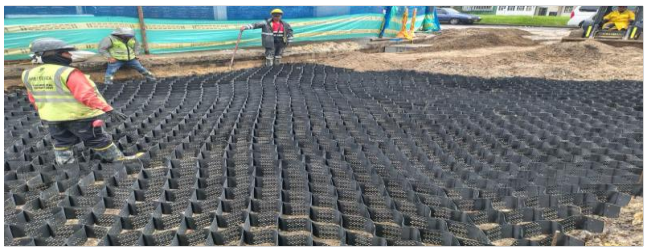

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

ESTRUCTURA DE VIA 0,540

CARTERA DE:	GEOCELDA h=15cm	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					GEOCELDA h=15cm					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2542,860	2542,885	2542,910	2542,923	2542,935	2542,860	2542,885	2542,910	2542,923	2542,935	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+010,00	2542,940	2542,975	2543,010	2542,975	2542,940	2542,940	2542,975	2543,010	2542,975	2542,940	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+015,00	2542,970	2543,005	2543,040	2543,005	2542,970	2542,970	2543,005	2543,040	2543,005	2542,970	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+020,00	2543,000	2543,035	2543,070	2543,035	2543,000	2543,000	2543,035	2543,070	2543,035	2543,000	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+025,00	2543,030	2543,065	2543,100	2543,065	2543,030	2543,030	2543,065	2543,100	2543,065	2543,030	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,500	0,000
K0+030,00	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,090	2543,125	2543,160	2543,125	2543,090	2543,090	2543,125	2543,160	2543,125	2543,090	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2543,120	2543,155	2543,190	2543,155	2543,120	2543,120	2543,155	2543,190	2543,155	2543,120	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2543,150	2543,185	2543,220	2543,185	2543,150	2543,150	2543,185	2543,220	2543,185	2543,150	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2543,240	2543,275	2543,310	2543,275	2543,240	2543,240	2543,275	2543,310	2543,275	2543,240	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2543,270	2543,305	2543,340	2543,305	2543,270	2543,270	2543,305	2543,340	2543,305	2543,270	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+070,00	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+075,00	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+080,00	2543,360	2543,355	2543,350	2543,343	2543,335	2543,360	2543,355	2543,350	2543,343	2543,335	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000

			TOTAL	0,000	555,50	0,00
area	2,27		POZOS	-3	-6,81	0,00
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-4	-4,32	0,00
			TOTAL		544,37	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00						80,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									80,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									80,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

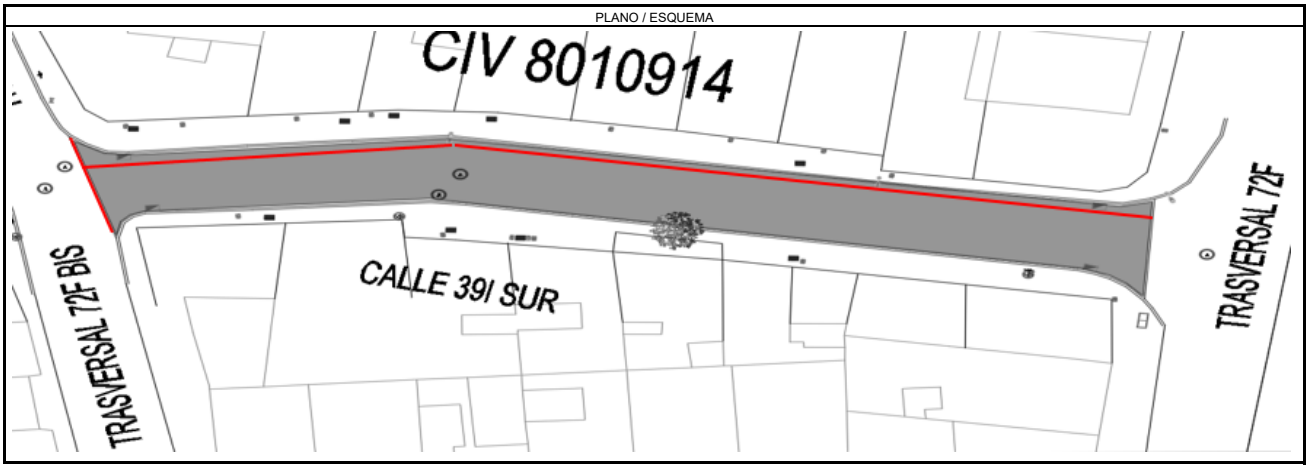

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
					altura media				
Relleno para redes - tramos SANITARIOS									
	NC26 - TRAMO 1		28,30	0,90	0,994				25,31
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		56,50	0,90	1,111				56,47
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - tramos PLUVIALES									
	NC26 - TRAMO 1		28,15	1,05	0,702				20,76
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		45,30	1,05	0,651				30,95
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion domiciliarias									
	NC26 - TRAMO 1		26,20	0,60	0,472				7,42
	se anexa cartera topografica								
	NC26 - TRAMO 2		60,45	0,60	0,724				26,24
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de pozos									
	NC26 - TRAMO 2	cota subrasante	cota clave	cota fondo	alt relleno	diametro excva	diametro pozo	diferencia areas	
	PZ PLT816533	2543,31	2542,85	2542,05	1,26	2,20	1,70	1,53	1,93
	se anexa cartera topografica								
relleno para instalacion tuberia de sumideros									
diam tub 12"			a			a	b	a-b-c	
0,30	costado norte - 1 - Tub 12"	K0+071,00	2,200	0,800	0,820	0,656	0,165	0,421	0,93
	Area tubo - c	0,071							
diam tub 12"			a			a	b	a-b-c	
0,30	costado norte - 1 - Tub 12"	K0+071,00	3,200	0,800	0,820	0,656	0,165	0,421	1,35
	Area tubo - c	0,071							
relleno para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00	0,50	0,45				18,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									189,36
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									189,36
TOTAL POR EJECUTAR									

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01


DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

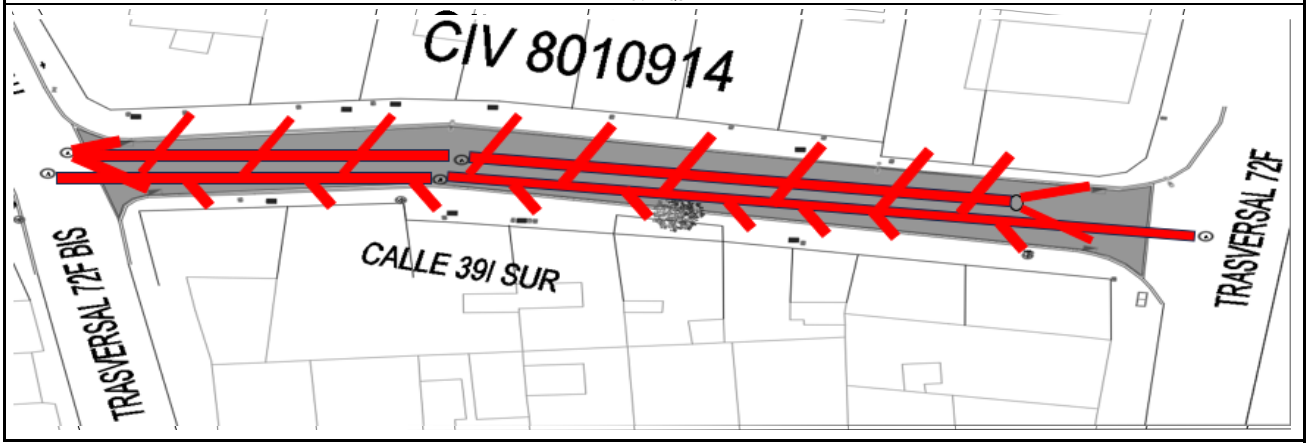

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Silla Y para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC26 - TRAMO 1	72F-36						1,00	1,00
		72F-37						1,00	1,00
		72F-29						1,00	1,00
		72F-32						1,00	1,00
		72F-26						1,00	1,00
	NC26 - TRAMO 2	72F-27						1,00	1,00
		72F-22						1,00	1,00
		72F-23						1,00	1,00
		72F-20						1,00	1,00
		72F-19						1,00	1,00
		72F-14						1,00	1,00
		72F-15						1,00	1,00
		72F-08						1,00	1,00
		72F-09						1,00	1,00
		72F-06						1,00	1,00
		72F-02						1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	16,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	16,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

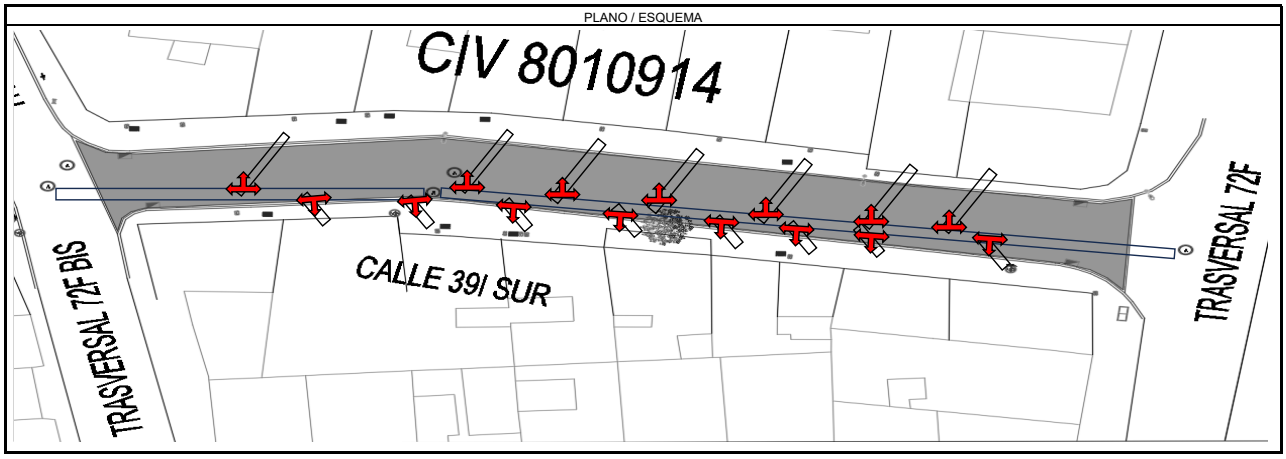

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Codo para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC26 - TRAMO 1	72F-36						1,00	1,00
		72F-37							
		72F-29							
		72F-32						2,00	2,00
		72F-26						1,00	1,00
	NC26 - TRAMO 2	72F-27							
		72F-22						1,00	1,00
		72F-23							
		72F-20						1,00	1,00
		72F-19							
		72F-14						2,00	2,00
		72F-15							
		72F-08						1,00	1,00
		72F-09							
		72F-06						1,00	1,00
		72F-02						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									11,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									11,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

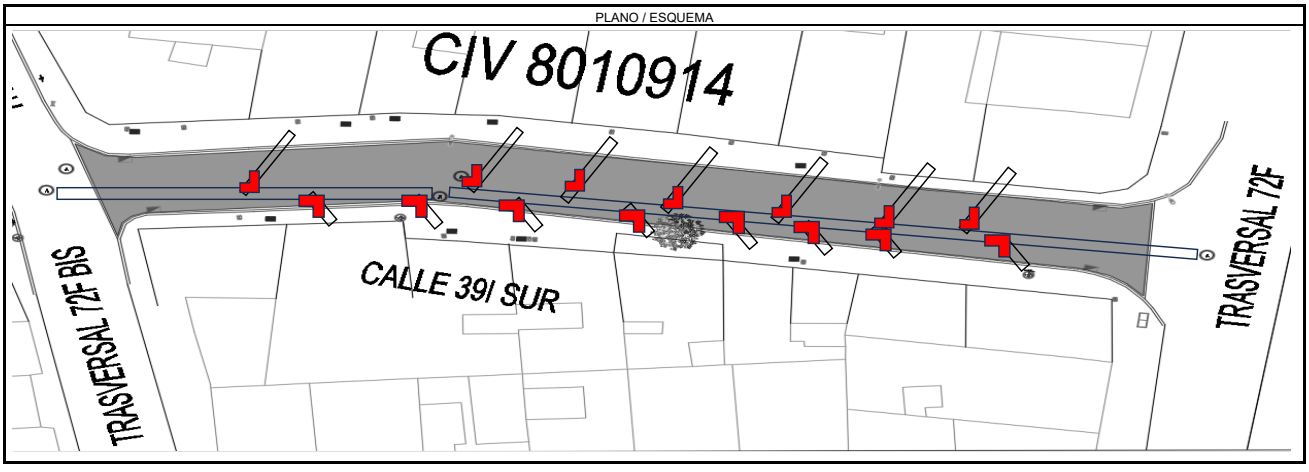

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,025 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
placa de fondo - construccion de pozos PLUVIAL									
	NC26 - TRAMO 2								
	PZ PLT816533							1,00	1,00
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

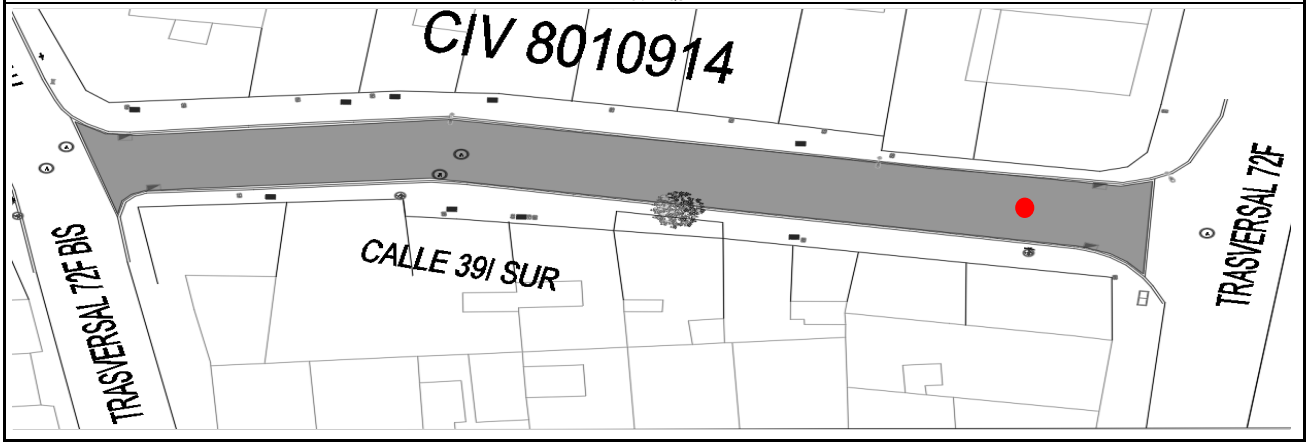

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,025 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,033 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Imprimacion sobre base granular para pavimento									
	estructura de via		20,00	6,78					135,50
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00					420,00
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-4,00	-4,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									544,37
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									544,37
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

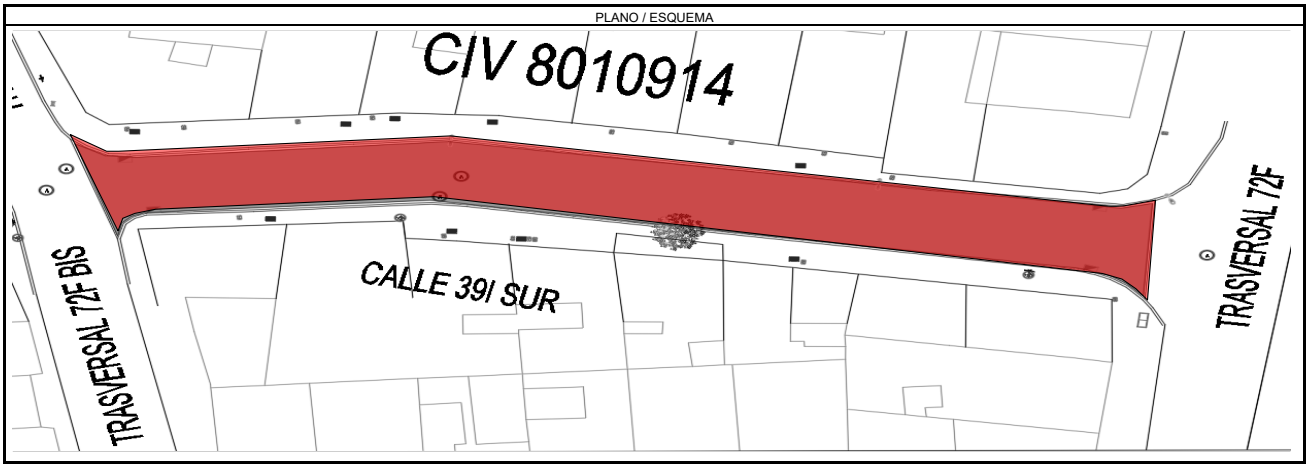

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,033 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

IMPRIMACION CRL-1 0,000

CARTERA DE:	IMPRIMACION CRL-1	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	BASE GRANULAR AR_BG38					IMPRIMACION CRL-1					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,280	2543,305	2543,330	2543,343	2543,355	2543,280	2543,305	2543,330	2543,343	2543,355	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+010,00	2543,360	2543,395	2543,430	2543,395	2543,360	2543,360	2543,395	2543,430	2543,395	2543,360	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+015,00	2543,390	2543,425	2543,460	2543,425	2543,390	2543,390	2543,425	2543,460	2543,425	2543,390	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+020,00	2543,420	2543,455	2543,490	2543,455	2543,420	2543,420	2543,455	2543,490	2543,455	2543,420	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+025,00	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,500	0,000
K0+030,00	2543,480	2543,515	2543,550	2543,515	2543,480	2543,480	2543,515	2543,550	2543,515	2543,480	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,510	2543,545	2543,580	2543,545	2543,510	2543,510	2543,545	2543,580	2543,545	2543,510	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2543,540	2543,575	2543,610	2543,575	2543,540	2543,540	2543,575	2543,610	2543,575	2543,540	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2543,570	2543,605	2543,640	2543,605	2543,570	2543,570	2543,605	2543,640	2543,605	2543,570	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2543,600	2543,635	2543,670	2543,635	2543,600	2543,600	2543,635	2543,670	2543,635	2543,600	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2543,630	2543,665	2543,700	2543,665	2543,630	2543,630	2543,665	2543,700	2543,665	2543,630	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2543,660	2543,695	2543,730	2543,695	2543,660	2543,660	2543,695	2543,730	2543,695	2543,660	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2543,690	2543,725	2543,760	2543,725	2543,690	2543,690	2543,725	2543,760	2543,725	2543,690	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+070,00	2543,720	2543,755	2543,790	2543,755	2543,720	2543,720	2543,755	2543,790	2543,755	2543,720	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+075,00	2543,750	2543,785	2543,820	2543,785	2543,750	2543,750	2543,785	2543,820	2543,785	2543,750	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+080,00	2543,780	2543,775	2543,770	2543,763	2543,755	2543,780	2543,775	2543,770	2543,763	2543,755	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
																TOTAL	0,000	555,50	0,00
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-4	-4,32	0,00
																	TOTAL	544,37	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,036 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
demolicion de Sardinel existente									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00	0,15	0,30				80,00
	costado sur	K0+000,00							
		K0+080,00	80,00	0,15	0,30				80,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									160,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									160,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

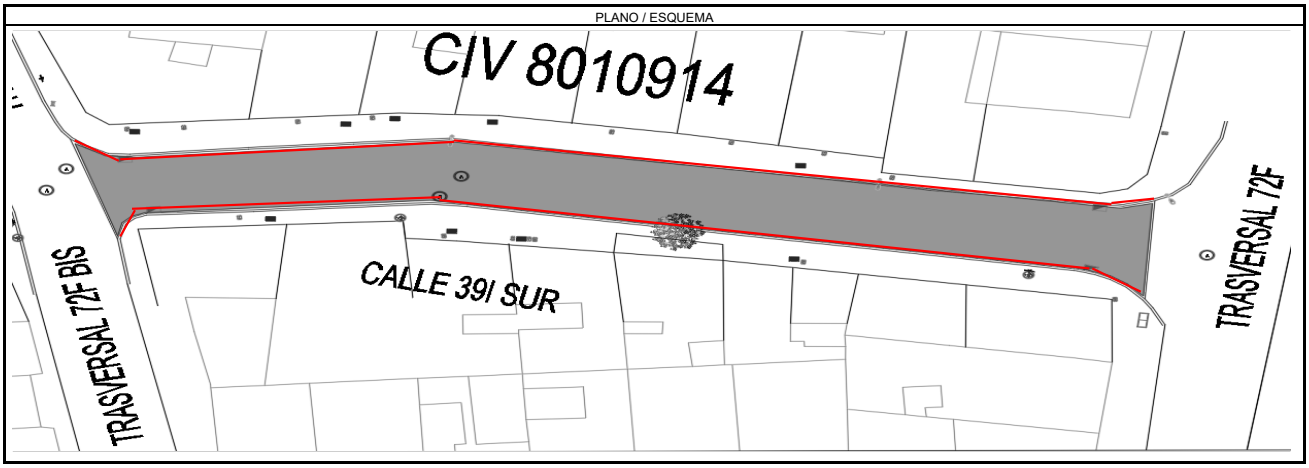

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,036 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,038 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
dado en concreto para empalme de domiciliarias a redes existentes		predio							
	NC26 - TRAMO 1	72F-36	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-37	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-29	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-32	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-26	0,30	0,40	0,40				0,048
	NC26 - TRAMO 2	72F-27	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-22	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-23	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-20	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-19	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-14	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-15	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-08	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-09	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-06	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-02	0,30	0,40	0,40				0,048
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									0,77
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									0,77
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

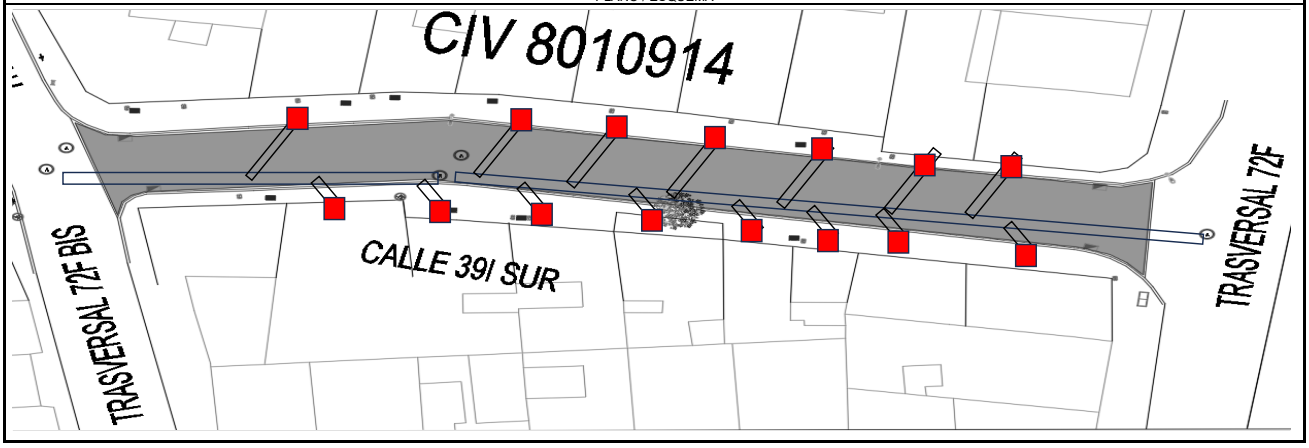

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,038 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Movilizacion de equipo para construccion de segmento vial									
	equipo de demolicion y excavacion							1,00	1,00
	equipo para rellen - perfilado - compactacion							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

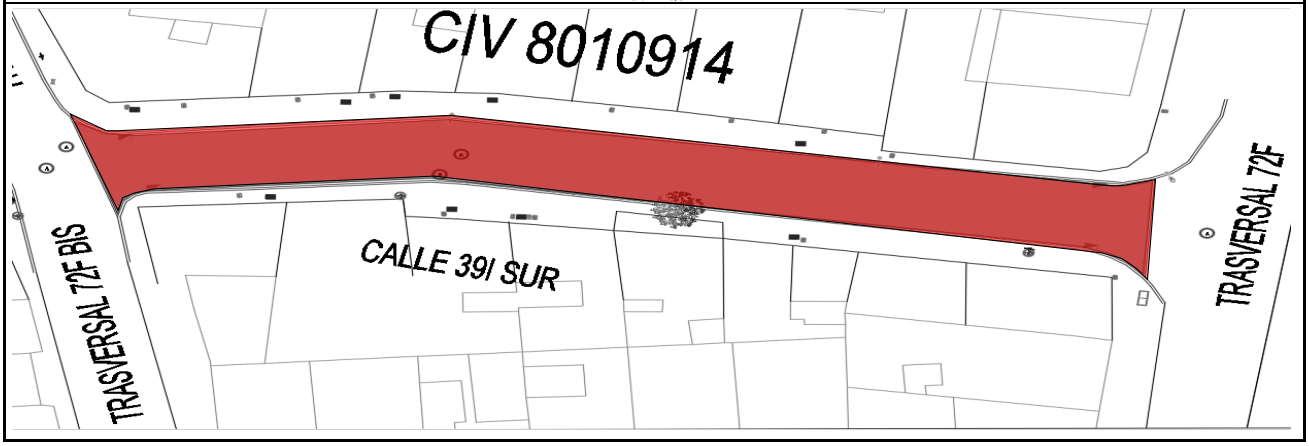

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
relleno con subbase granular AR_SBG50 para estructura de via									
	estructura de via		20,00	6,78	0,250				33,88
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00	0,250				105,00
	pozos existentes	area	2,27		0,250			-3,00	-1,70
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,250			-4,00	-1,08
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									136,09
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									136,09
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

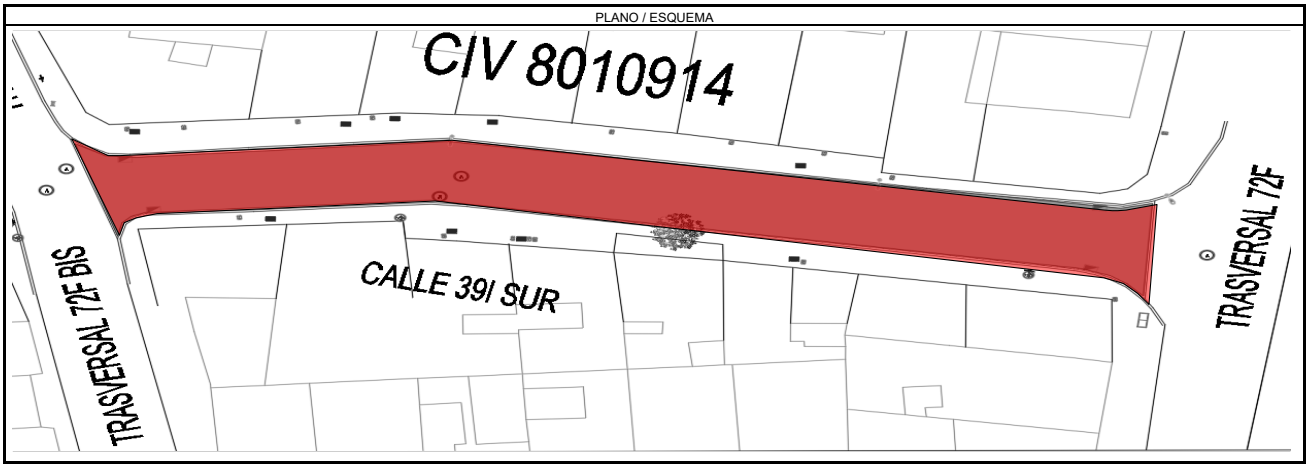

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	27/03/2026	CIV	8010914
				PRIORIDAD:	NC 26

JB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG 0,250

CARTERA DE:	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2542,860	2542,885	2542,910	2542,923	2542,935	2543,110	2543,135	2543,160	2543,173	2543,185	6,800	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
K0+005,00	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	2543,160	2543,195	2543,230	2543,195	2543,160	6,800	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	34,000	8,500
K0+010,00	2542,940	2542,975	2543,010	2542,975	2542,940	2543,190	2543,225	2543,260	2543,225	2543,190	6,800	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	34,000	8,500
K0+015,00	2542,970	2543,005	2543,040	2543,005	2542,970	2543,220	2543,255	2543,290	2543,255	2543,220	6,800	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	34,000	8,500
K0+020,00	2543,000	2543,035	2543,070	2543,035	2543,000	2543,250	2543,285	2543,320	2543,285	2543,250	6,800	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	34,000	8,500
K0+025,00	2543,030	2543,065	2543,100	2543,065	2543,030	2543,280	2543,315	2543,350	2543,315	2543,280	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	34,500	8,625
K0+030,00	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	2543,310	2543,345	2543,380	2543,345	2543,310	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+035,00	2543,090	2543,125	2543,160	2543,125	2543,090	2543,340	2543,375	2543,410	2543,375	2543,340	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+040,00	2543,120	2543,155	2543,190	2543,155	2543,120	2543,370	2543,405	2543,440	2543,405	2543,370	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+045,00	2543,150	2543,185	2543,220	2543,185	2543,150	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+050,00	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+055,00	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	2543,460	2543,495	2543,530	2543,495	2543,460	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+060,00	2543,240	2543,275	2543,310	2543,275	2543,240	2543,490	2543,525	2543,560	2543,525	2543,490	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+065,00	2543,270	2543,305	2543,340	2543,305	2543,270	2543,520	2543,555	2543,590	2543,555	2543,520	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+070,00	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	2543,550	2543,585	2543,620	2543,585	2543,550	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+075,00	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	2543,580	2543,615	2543,650	2543,615	2543,580	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+080,00	2543,360	2543,355	2543,350	2543,343	2543,335	2543,610	2543,605	2543,600	2543,593	2543,585	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
																TOTAL	0,250	555,50	138,88
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	-1,70
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-4	-4,32	-1,08
																	TOTAL	544,37	136,09

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Geotextil para estructura de via									
	subrasante de diseño		20,00	7,28					145,50
	se anexa cartera topografica		60,00	7,50					450,00
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-4,00	-4,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									584,37
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									584,37
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

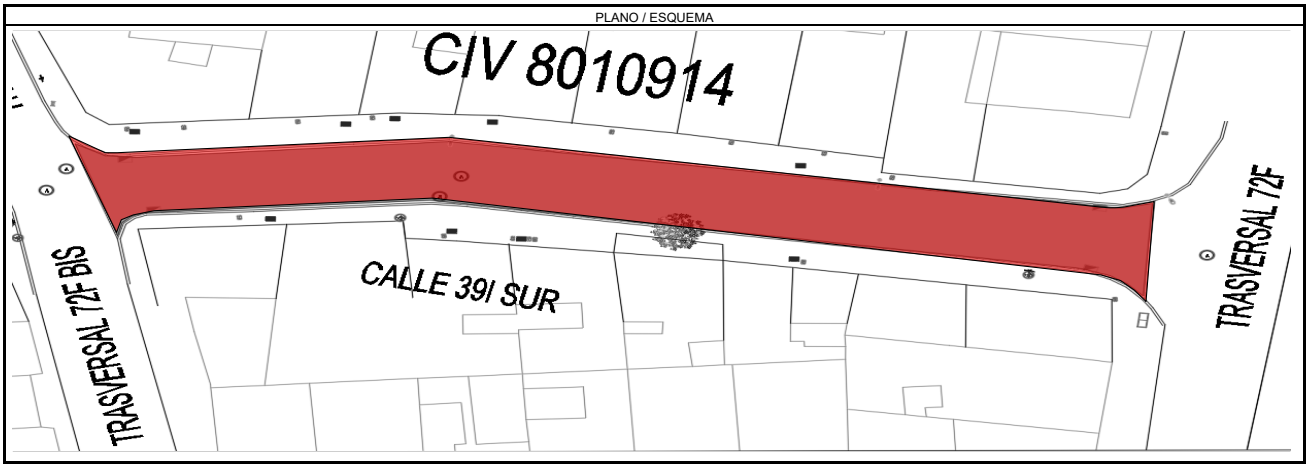

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

GEOTEXTIL 0,540

CARTERA DE:	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,50

ABSCISA (m)	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2542,860	2542,885	2542,910	2542,923	2542,935	2542,860	2542,885	2542,910	2542,923	2542,935	7,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	7,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,500	0,000
K0+010,00	2542,940	2542,975	2543,010	2542,975	2542,940	2542,940	2542,975	2543,010	2542,975	2542,940	7,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,500	0,000
K0+015,00	2542,970	2543,005	2543,040	2543,005	2542,970	2542,970	2543,005	2543,040	2543,005	2542,970	7,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,500	0,000
K0+020,00	2543,000	2543,035	2543,070	2543,035	2543,000	2543,000	2543,035	2543,070	2543,035	2543,000	7,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,500	0,000
K0+025,00	2543,030	2543,065	2543,100	2543,065	2543,030	2543,030	2543,065	2543,100	2543,065	2543,030	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,000	0,000
K0+030,00	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+035,00	2543,090	2543,125	2543,160	2543,125	2543,090	2543,090	2543,125	2543,160	2543,125	2543,090	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+040,00	2543,120	2543,155	2543,190	2543,155	2543,120	2543,120	2543,155	2543,190	2543,155	2543,120	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+045,00	2543,150	2543,185	2543,220	2543,185	2543,150	2543,150	2543,185	2543,220	2543,185	2543,150	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+050,00	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+055,00	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+060,00	2543,240	2543,275	2543,310	2543,275	2543,240	2543,240	2543,275	2543,310	2543,275	2543,240	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+065,00	2543,270	2543,305	2543,340	2543,305	2543,270	2543,270	2543,305	2543,340	2543,305	2543,270	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+070,00	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+075,00	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+080,00	2543,360	2543,355	2543,350	2543,343	2543,335	2543,360	2543,355	2543,350	2543,343	2543,335	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
																TOTAL	0,000	595,50	0,00
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-4	-4,32	0,00
																	TOTAL	584,37	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Geomalla para estructura de via									
	estructura de via		20,00	6,78					135,50
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00					420,00
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-4,00	-4,32
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									544,37
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									544,37
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

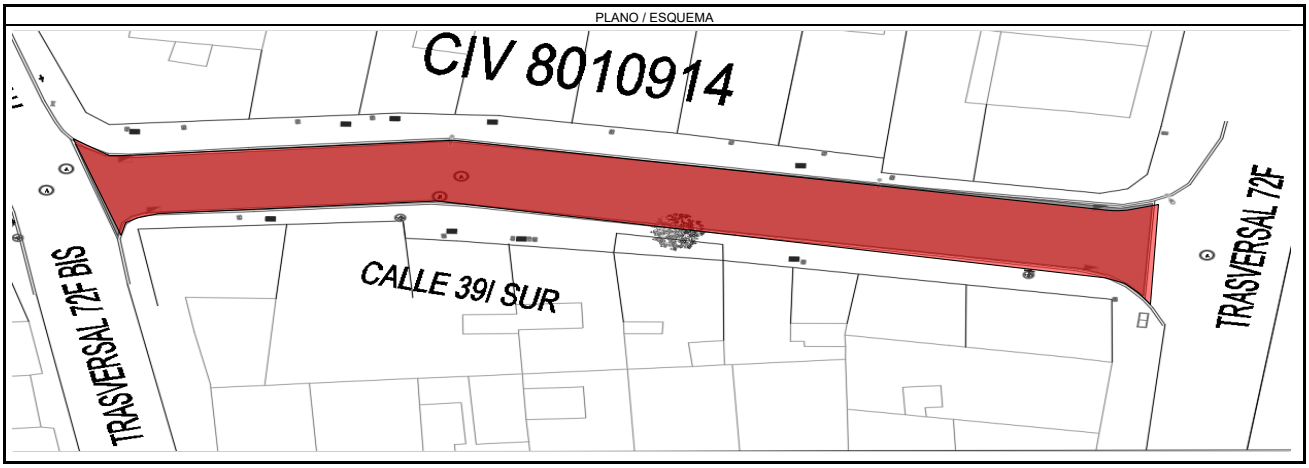

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

ESTRUCTURA DE VIA 0,540

CARTERA DE:	GEOMALLA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					GEOMALLA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,110	2543,135	2543,160	2543,173	2543,185	2543,110	2543,135	2543,160	2543,173	2543,185	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2543,160	2543,195	2543,230	2543,195	2543,160	2543,160	2543,195	2543,230	2543,195	2543,160	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+010,00	2543,190	2543,225	2543,260	2543,225	2543,190	2543,190	2543,225	2543,260	2543,225	2543,190	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+015,00	2543,220	2543,255	2543,290	2543,255	2543,220	2543,220	2543,255	2543,290	2543,255	2543,220	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+020,00	2543,250	2543,285	2543,320	2543,285	2543,250	2543,250	2543,285	2543,320	2543,285	2543,250	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000
K0+025,00	2543,280	2543,315	2543,350	2543,315	2543,280	2543,280	2543,315	2543,350	2543,315	2543,280	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,500	0,000
K0+030,00	2543,310	2543,345	2543,380	2543,345	2543,310	2543,310	2543,345	2543,380	2543,345	2543,310	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,340	2543,375	2543,410	2543,375	2543,340	2543,340	2543,375	2543,410	2543,375	2543,340	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2543,370	2543,405	2543,440	2543,405	2543,370	2543,370	2543,405	2543,440	2543,405	2543,370	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2543,460	2543,495	2543,530	2543,495	2543,460	2543,460	2543,495	2543,530	2543,495	2543,460	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2543,490	2543,525	2543,560	2543,525	2543,490	2543,490	2543,525	2543,560	2543,525	2543,490	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2543,520	2543,555	2543,590	2543,555	2543,520	2543,520	2543,555	2543,590	2543,555	2543,520	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+070,00	2543,550	2543,585	2543,620	2543,585	2543,550	2543,550	2543,585	2543,620	2543,585	2543,550	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+075,00	2543,580	2543,615	2543,650	2543,615	2543,580	2543,580	2543,615	2543,650	2543,615	2543,580	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+080,00	2543,610	2543,605	2543,600	2543,593	2543,585	2543,610	2543,605	2543,600	2543,593	2543,585	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
																TOTAL	0,000	555,50	0,00
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-4	-4,32	0,00
																	TOTAL	544,37	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Estabilizacion de material granular									
	estructura de via Base granular	BG38	20,00	6,78	0,170		1,30		29,95
			60,00	7,00	0,170		1,30		92,82
	pozos existentes	area	2,27		0,170		1,30	-3,00	-1,51
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,170		1,30	-4,00	-0,95
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									120,31
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									120,31
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

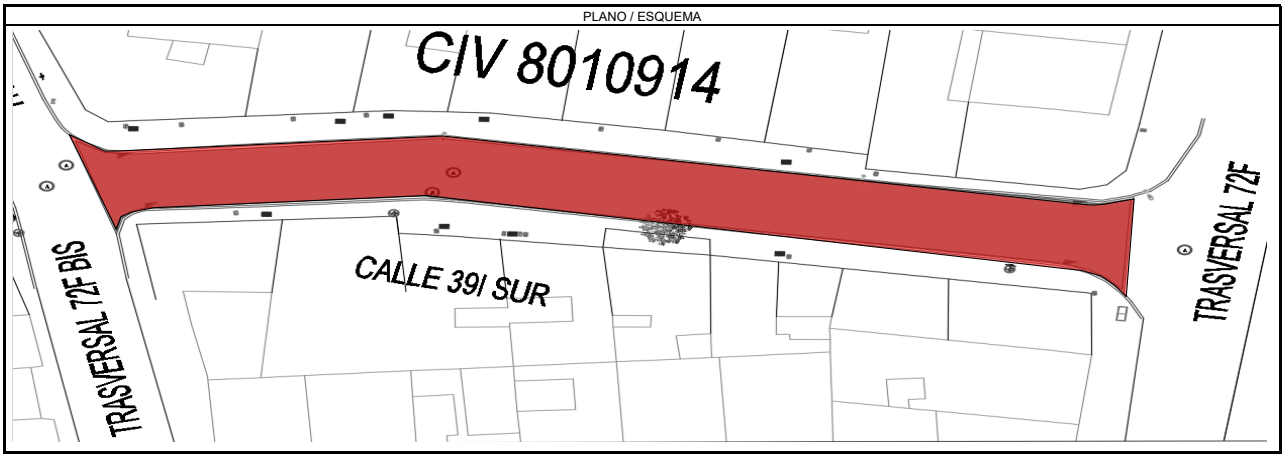

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY


(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Inyeccion de Cal a perforaciones									
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+002,50	A		B				
		K0+078,50	76,0000	7,0000	6,3000				
corredor tuberia sanitaria	numero de lineas transversales	-2,00	(B/0.70)+1(-3)	C	8,0000				
corredor tuberia pluvial									
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	54,2857				
	cantidad de barrenos		C*D	8,0000	54,0000				432,00
	pozos existentes - construidos		-3,00					5,00	-15,00
	sumideros construidos		-4,00					4,00	-16,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									401,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									401,00
TOTAL POR EJECUTAR									

NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)

C D

PLANO / ESQUEMA

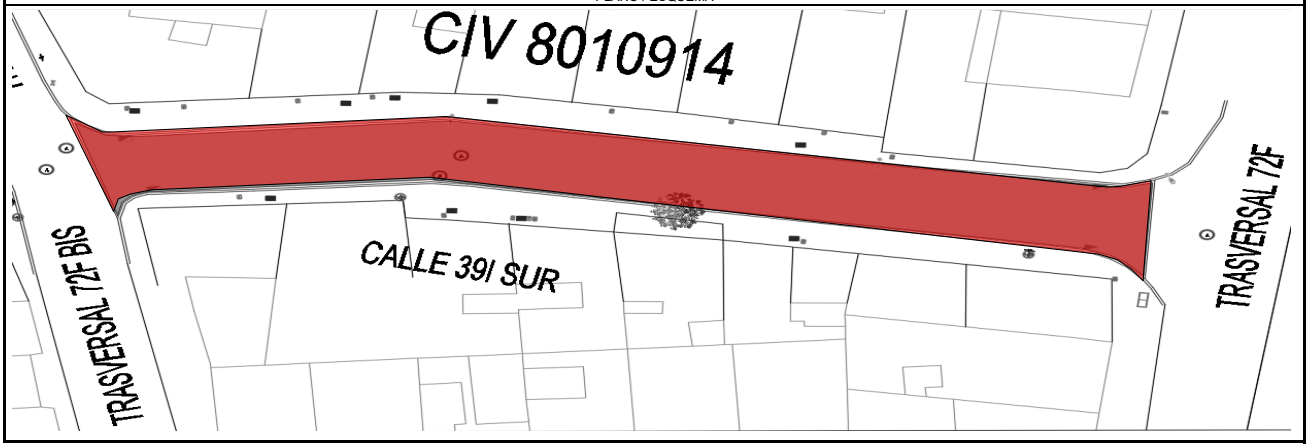

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,007 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Construccion de caja sanitaria		predio							
	NC26 - TRAMO 2	72F-02						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

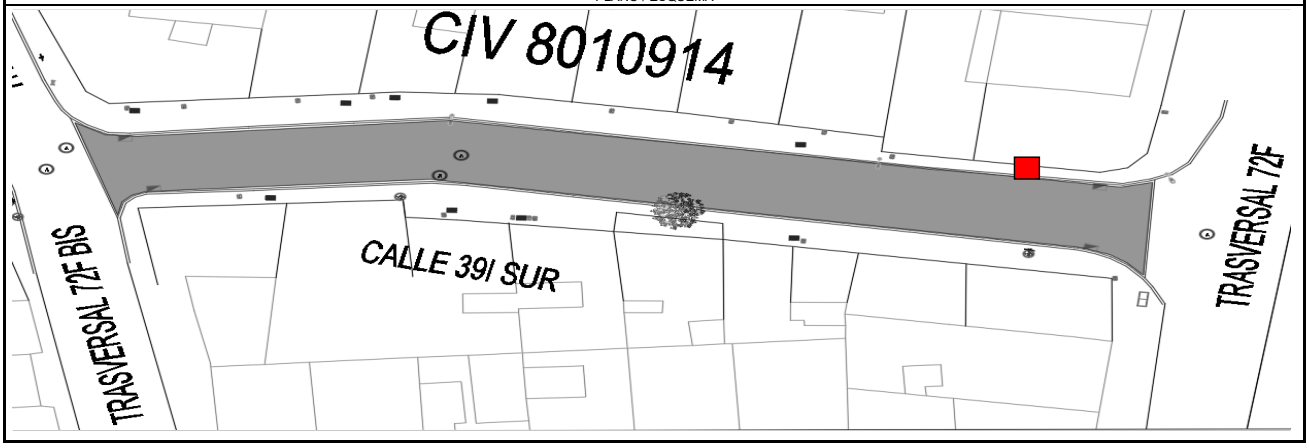

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,007 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacíon)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Marco y tapa de caja sanitaria		predio							
	NC26 - TRAMO 2	72F-02						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

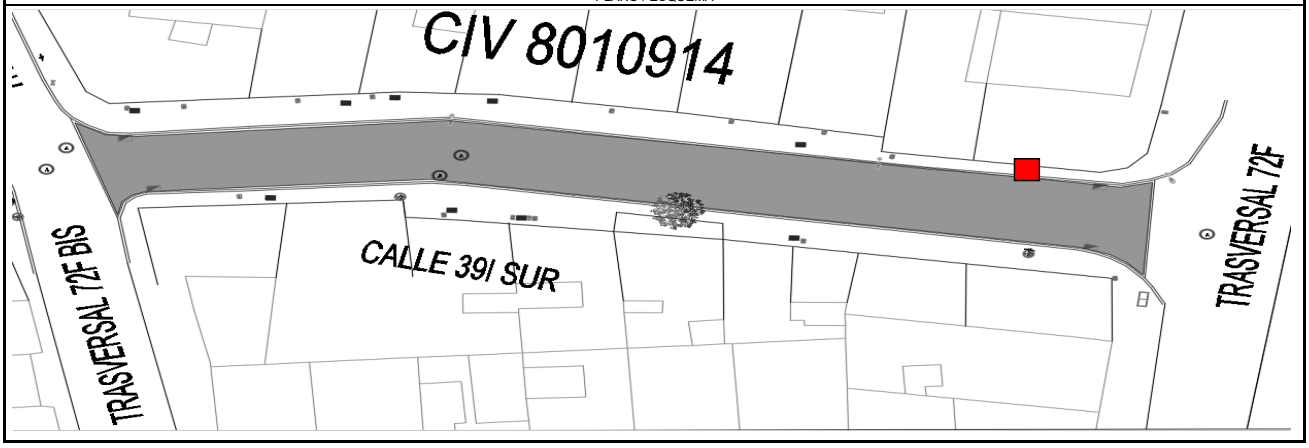

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacíon)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,009 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Construccion de Base y Cañuela para adecuacion de cajas sanitarias		predio							
	NC26 - TRAMO 2	72F-02						1,00	1,00
		72F-08						1,00	1,00
		72F-22						1,00	1,00
		72F-09						1,00	1,00
		72F-15						1,00	1,00
		72F-23						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									6,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									6,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

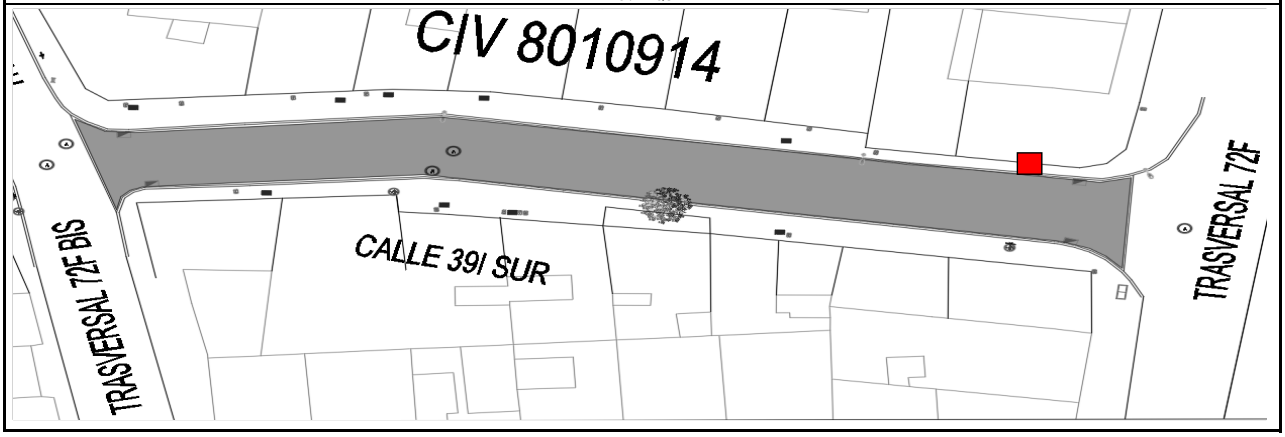

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,009 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original 1ra : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Cañuela para pozo - construccion de pozos PLUVIAL									
	NC26 - TRAMO 2								
	PZ PLT816533							1,00	1,00
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

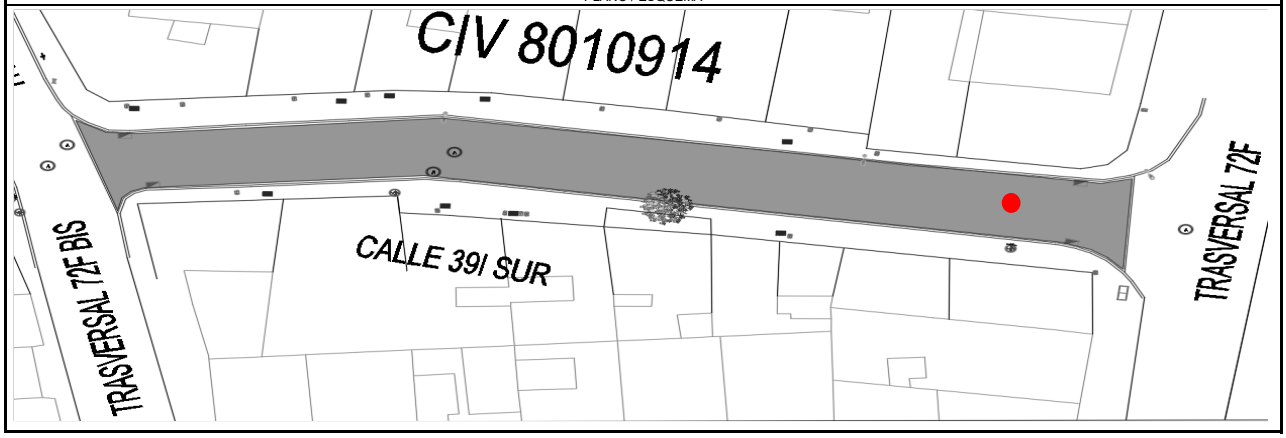

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
	perforaciones de 4"								
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+002,50	A		B				
		K0+078,50	76,0000	7,0000	6,3000				
corredor tuberia sanitaria	numero de lineas transversales	-2,00	(B/0.70)+1(-3)	C	8,0000				
corredor tuberia pluvial									
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	54,2857				
	cantidad de barrenos		C*D	8,0000	54,0000				432,00
	pozos existentes - construidos		-3,00					5,00	-15,00
	sumideros construidos		-4,00					4,00	-16,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									401,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									401,00
TOTAL POR EJECUTAR									

NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)

C D

PLANO / ESQUEMA

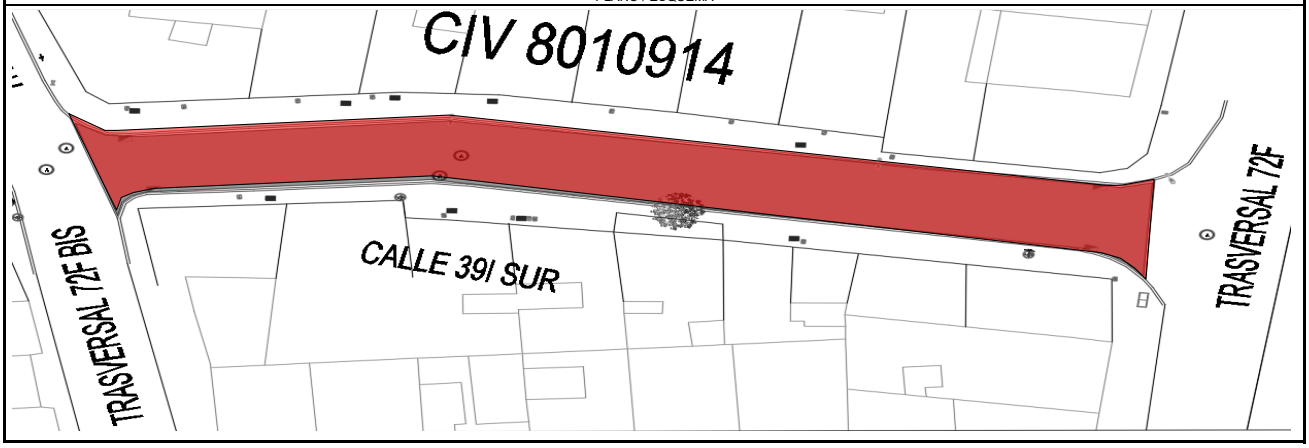

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA

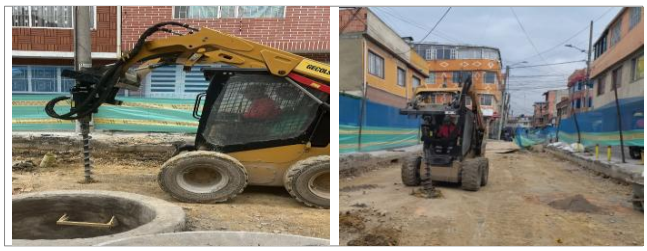

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
Construccion de sumideros									
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+001,50	norte				1,00	1,00
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+071,00	norte				1,00	1,00
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+003,50	sur				1,00	1,00
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+071,00	sur				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

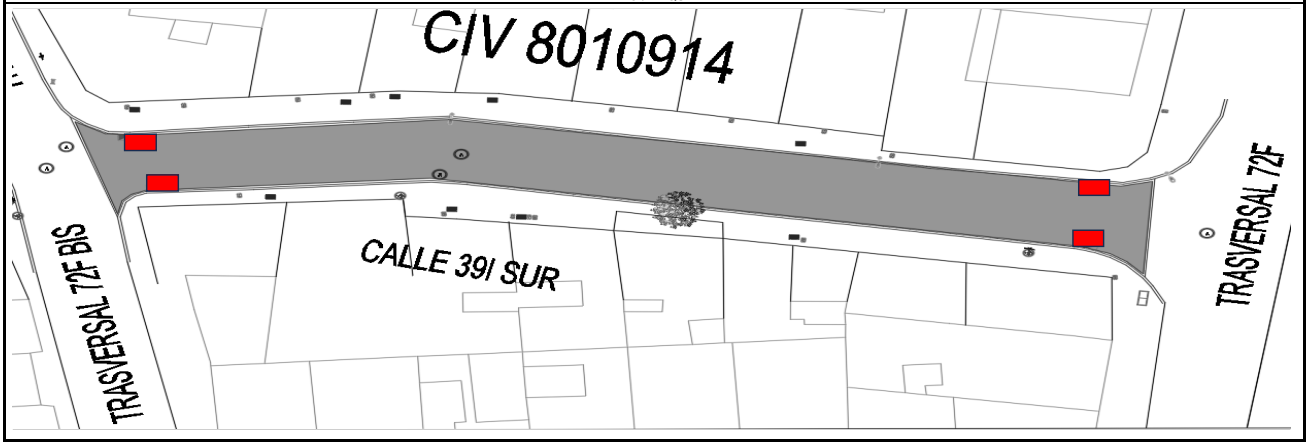

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010914	CALLE 39I SUR ENTRE TRANSVERSAL 72F Y CARRERA 72F BIS								
relleno con base granular AR_BG38 para estructura de via									
	estructura de via		20,00	6,78	0,170				23,04
	se anexa cartera topografica		60,00	7,00	0,170				71,40
	pozos existentes	area	2,27		0,170			-3,00	-1,16
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,170			-4,00	-0,73
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									92,54
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									92,54
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

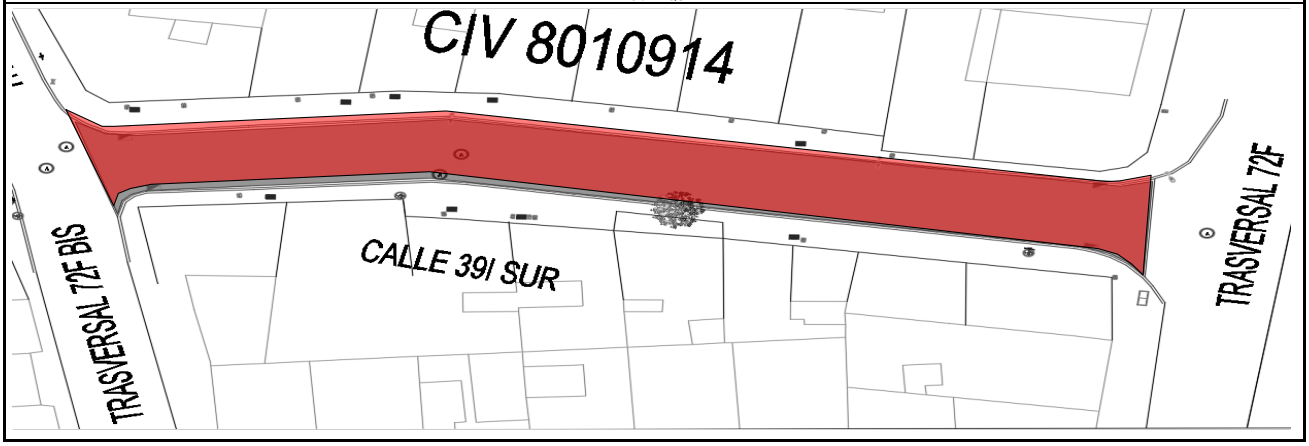

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	27/03/2026

CIV	8010914	
PRIORIDAD:	NC	26

BASE GRANULAR AR_BG38 0,170

CARTERA DE:	BASE GRANULAR AR_BG38	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					BASE GRANULAR AR_BG38					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,110	2543,135	2543,160	2543,173	2543,185	2543,280	2543,305	2543,330	2543,343	2543,355	6,800	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170		
K0+005,00	2543,160	2543,195	2543,230	2543,195	2543,160	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	6,800	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	34,000	5,780
K0+010,00	2543,190	2543,225	2543,260	2543,225	2543,190	2543,360	2543,395	2543,430	2543,395	2543,360	6,800	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	34,000	5,780
K0+015,00	2543,220	2543,255	2543,290	2543,255	2543,220	2543,390	2543,425	2543,460	2543,425	2543,390	6,800	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	34,000	5,780
K0+020,00	2543,250	2543,285	2543,320	2543,285	2543,250	2543,420	2543,455	2543,490	2543,455	2543,420	6,800	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	34,000	5,780
K0+025,00	2543,280	2543,315	2543,350	2543,315	2543,280	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	34,500	5,865
K0+030,00	2543,310	2543,345	2543,380	2543,345	2543,310	2543,480	2543,515	2543,550	2543,515	2543,480	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+035,00	2543,340	2543,375	2543,410	2543,375	2543,340	2543,510	2543,545	2543,580	2543,545	2543,510	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+040,00	2543,370	2543,405	2543,440	2543,405	2543,370	2543,540	2543,575	2543,610	2543,575	2543,540	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+045,00	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	2543,570	2543,605	2543,640	2543,605	2543,570	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+050,00	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	2543,600	2543,635	2543,670	2543,635	2543,600	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+055,00	2543,460	2543,495	2543,530	2543,495	2543,460	2543,630	2543,665	2543,700	2543,665	2543,630	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+060,00	2543,490	2543,525	2543,560	2543,525	2543,490	2543,660	2543,695	2543,730	2543,695	2543,660	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+065,00	2543,520	2543,555	2543,590	2543,555	2543,520	2543,690	2543,725	2543,760	2543,725	2543,690	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+070,00	2543,550	2543,585	2543,620	2543,585	2543,550	2543,720	2543,755	2543,790	2543,755	2543,720	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+075,00	2543,580	2543,615	2543,650	2543,615	2543,580	2543,750	2543,785	2543,820	2543,785	2543,750	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+080,00	2543,610	2543,605	2543,600	2543,593	2543,585	2543,780	2543,775	2543,770	2543,763	2543,755	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
																TOTAL	0,170	555,50	94,44
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	-1,16
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-4	-4,32	-0,73
																	TOTAL	544,37	92,54

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

HOJA 1 DE

CIV 8010914
BARRIO LA CAMPINA Alcantarillado: PLUVIAL Diámetro: 0,457 Rasante: PAV FLEXIBLE Longitud entre ejes: 29,85
estructura 0,54
Tramo: NC26 - TRAMO 1 Clase de tubería: PVC Pendiente: 0,630% Ancho excavación: 1,05 Corte promedio: 1,107
Base Triturado 0,1

POZO	ABS	COTAS				CORTE A FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS		VOL RELLENOS		RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	DEMOLICION 0,00	ENTIBADO 2 CARAS	OBSERVACIONES
		RASANTE	SUBRASANTE	CLAVE	FONDO					GRAVA	B-200	GRAVA	B-200					
PZ PMI73676	K0+000,00	2543,450	2542,910	2542,378	2541,821	1,089	1,05	alt subra			alt subra							
1	K0+000,85	2543,450	2542,910	2542,383	2541,826	1,084	1,05			0,263								
1	K0+005,75	2543,520	2542,980	2542,414	2541,857	1,123	1,05	1,159	5,677	0,263	0,731	1,29	3,58	7,38				
2	K0+011,50	2543,550	2543,010	2542,450	2541,893	1,117	1,05	1,176	6,761	0,263	0,749	1,51	4,31	8,79				
3	K0+017,25	2543,580	2543,040	2542,487	2541,929	1,111	1,05	1,169	6,724	0,263	0,742	1,51	4,27	8,74				
4	K0+023,00	2543,610	2543,070	2542,523	2541,966	1,104	1,05	1,163	6,686	0,263	0,736	1,51	4,23	8,69				
5	K0+028,75	2543,640	2543,100	2542,559	2542,002	1,098	1,05	1,156	6,648	0,263	0,729	1,51	4,19	8,64				
PZ PMP116380	K0+029,00	2543,670	2543,130	2542,561	2542,004	1,127	1,05	1,168	0,292	0,263	0,741	0,07	0,19	0,38				
							SUMAS		**32,79**			**7,40**	**20,76**	**42,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TUBERIA DIAM	
18"	28,65

Observaciones:

ENTREGA:		**RECIBE:**
CESAR JEFFERSON MARTINEZ		**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
TOPOGRAFIA CONTRATISTA		TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

HOJA 1 DE

CIV 8010914
BARRIO LA CAMPINA | Alcantarillado: PLUVIAL | Diámetro: 0,457 | Rasante: PAV FLEXIBLE | Longitud entre ejes: 47,00 | estructura 0,54
Tramo: NC26 - TRAMO 2 | Clase de tubería: PVC | Pendiente: 0,500% | Ancho excavación: 1,05 | Base Triturado 0,1 | Corte promedio: 1,060

POZO	ABS	COTAS				CORTE A FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS		VOL RELLENOS		RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	DEMOLICION 0,00	ENTIBADO 2 CARAS	OBSERVACIONES
		RASANTE	SUBRASANTE	CLAVE	FONDO					GRAVA	B-200	GRAVA	B-200					
PZ PMP116380	K0+000,00	2543,670	2543,130	2542,623	2542,066	1,064	1,05	alt subra			alt subra							
1	K0+000,85	2543,670	2543,130	2542,627	2542,070	1,060	1,05			0,263								
1	K0+005,75	2543,700	2543,160	2542,652	2542,095	1,065	1,05	1,116	5,468	0,263	0,689	1,29	3,37	7,11				
2	K0+011,50	2543,730	2543,190	2542,681	2542,123	1,067	1,05	1,119	6,436	0,263	0,692	1,51	3,98	8,37				
3	K0+017,25	2543,760	2543,220	2542,709	2542,152	1,068	1,05	1,121	6,444	0,263	0,694	1,51	3,99	8,38				
4	K0+023,00	2543,790	2543,250	2542,738	2542,181	1,069	1,05	1,122	6,452	0,263	0,695	1,51	4,00	8,39				
5	K0+028,75	2543,820	2543,280	2542,767	2542,210	1,070	1,05	1,123	6,459	0,263	0,696	1,51	4,00	8,40				
PZ PLT816533	K0+046,15	2543,850	2543,310	2542,854	2542,297	1,013	1,05	1,094	19,036	0,263	0,667	4,58	11,60	24,75				
							SUMAS		**50,30**			**11,91**	**30,95**	**65,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TUBERIA DIAM	
18"	45,80

Observaciones:

ENTREGA:		**RECIBE:**	
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ		**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA		TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: **REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE**

HOJA 1 DE

CIV 8010914
BARRIO LA CAMPINA Alcantarillado: SANITARIO Diámetro: 0,202 Rasante: PAV FLEXIBLE Longitud entre ejes: 30,00
estructura 0,54
Tramo: NC26 - TRAMO 1 Clase de tubería: PVC Pendiente: 1,560% Ancho excavación: 0,90 Corte promedio: 1,220
Base Triturado 0,1

POZO	ABS	COTAS				CORTE A FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS		VOL RELLENOS		RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	DEMOLICION 0,00	ENTIBADO 2 CARAS	OBSERVACIONES
		RASANTE	SUBRASANTE	CLAVE	FONDO					GRAVA	B-200	GRAVA	B-200					
PZ CMP119809	K0+000,00	2543,450	2542,910	2541,848	2541,546	1,364	0,90	alt subra			alt subra							
1	K0+000,85	2543,450	2542,910	2541,861	2541,559	1,351	0,90			0,165								
1	K0+005,75	2543,485	2542,945	2541,938	2541,636	1,309	0,90	1,197	5,865	0,165	1,000	0,81	4,90	7,63				
2	K0+011,50	2543,515	2542,975	2542,027	2541,725	1,250	0,90	1,152	6,621	0,165	0,955	0,95	5,49	8,61				
3	K0+017,25	2543,545	2543,005	2542,117	2541,815	1,190	0,90	1,098	6,312	0,165	0,901	0,95	5,18	8,21				
4	K0+023,00	2543,575	2543,035	2542,207	2541,905	1,130	0,90	1,044	6,003	0,165	0,847	0,95	4,87	7,80				
5	K0+028,75	2543,605	2543,065	2542,297	2541,995	1,071	0,90	0,990	5,694	0,165	0,793	0,95	4,56	7,40				
PZ CMP121500	K0+029,15	2543,635	2543,095	2542,303	2542,001	1,094	0,90	0,974	0,390	0,165	0,777	0,07	0,31	0,51				
							SUMAS		**30,89**			**4,67**	**25,31**	**40,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TUBERIA DIAM	
8"	28,80

Observaciones:

ENTREGA:		**RECIBE:**
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ	**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: **REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE**

HOJA 1 DE

CIV 8010914
BARRIO LA CAMPINA | Alcantarillado: SANITARIO | Diámetro: 0,202 | Rasante: PAV FLEXIBLE | Longitud entre ejes: 58,20 | estructura 0,54
Tramo: NC26 - TRAMO 2 | Clase de tubería: PVC | Pendiente: 0,480% | Ancho excavación: 0,90 | Base Triturado 0,1 | Corte promedio: 1,460

POZO	ABS	COTAS				CORTE A FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS		VOL RELLENOS		RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	DEMOLICION 0,00	ENTIBADO 2 CARAS	OBSERVACIONES
		RASANTE	SUBRASANTE	CLAVE	FONDO					GRAVA	B-200	GRAVA	B-200					
PZ CMP119874	K0+000,00	2543,875	2543,335	2542,058	2541,756	2,119	0,90	alt subra			alt subra							
1	K0+000,85	2543,875	2543,335	2542,062	2541,760	2,115	0,90			0,165								
1	K0+004,20	2543,850	2543,310	2542,078	2541,776	2,074	0,90	1,885	6,315	0,165	1,688	0,55	5,65	8,21				EXCAVACION Y RELLENOS HASTA RASANTE K0+4.20
1	K0+005,75	2543,840	2543,300	2542,086	2541,784	1,516	0,90	1,616	2,504	0,165	1,419	0,26	2,20	3,26				
2	K0+011,50	2543,810	2543,270	2542,113	2541,811	1,459	0,90	1,339	7,698	0,165	1,142	0,95	6,57	10,01				
3	K0+017,25	2543,780	2543,240	2542,141	2541,839	1,401	0,90	1,287	7,400	0,165	1,090	0,95	6,27	9,62				
4	K0+023,00	2543,750	2543,210	2542,168	2541,866	1,344	0,90	1,235	7,102	0,165	1,038	0,95	5,97	9,23				
5	K0+028,75	2543,720	2543,180	2542,196	2541,894	1,286	0,90	1,183	6,804	0,165	0,986	0,95	5,67	8,85				
6	K0+034,50	2543,690	2543,150	2542,224	2541,922	1,228	0,90	1,131	6,506	0,165	0,935	0,95	5,37	8,46				
7	K0+040,25	2543,660	2543,120	2542,251	2541,949	1,171	0,90	1,080	6,208	0,165	0,883	0,95	5,08	8,07				
8	K0+046,00	2543,630	2543,090	2542,279	2541,977	1,113	0,90	1,028	5,910	0,165	0,831	0,95	4,78	7,68				
9	K0+051,75	2543,635	2543,095	2542,306	2542,004	1,091	0,90	0,992	5,702	0,165	0,795	0,95	4,57	7,41				
PZ CMP121500	K0+057,35	2543,640	2543,100	2542,333	2542,031	1,069	0,90	0,972	5,441	0,165	0,775	0,92	4,34	7,07				
							SUMAS		**67,59**			**9,32**	**56,47**	**87,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TUBERIA DIAM	
8"	57,00

Observaciones:

ENTREGA:		**RECIBE:**
CESAR JEFFERSON MARTINEZ		**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
TOPOGRAFIA CONTRATISTA		TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

PLANILLA DOMICILIARÍAS

CÓDIGO: 003
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/09/2024

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATO No.: 938-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 **CIV** 8010914 **FECHA:** 31/03/2026

TRAMO TUBERIA NC26 - TRAMO 1 **Diametro** 0,152 **base** 0,10

BARRIO: LA CAMPINA **NC-26** **ALCANTARILLADO:** SANITARIO **H ESTRU VIA:** 0,54 **HOJA:** 1 **DE** 1

Abscisa de tuberia	Nomenclatura	Costado	Diámetro Tubería (m)	Longitud Tubería	Ancho Excavación	Cota subrasante de tuberia	Cota cimentacion de tuberia	Diferencia cotas de tuberia a excavación	Cota rasante de caja	Cota lomo entrada a caja	Diferencia cotas de caja	Altura promedio	Volumen excavación	Concreto de anclaje MANO DE OBRA	Area Rellenos		Rellenos		Volumen retiro de sobrantes	Accesorios Yee	semicodo
															Triturado 3/4"	Recebo B200	Triturado 3/4"	Recebo B200			
K0+011,80	72F-36	IZQ	6"	4,60	0,60	2542,975	2542,027	0,95	2542,627	2542,073	0,55	0,75	2,07	0,048	0,0966	0,336	0,444	1,410	2,69	1,0	1,0
K0+017,00	72F-37	DER	6"	2,50	0,60	2543,005	2542,117	0,89	2542,717	2542,142	0,57	0,73	1,10	0,048	0,0966	0,324	0,242	0,680	1,43	1,0	
K0+018,50	72F-29	DER	6"	3,60	0,60	2543,005	2542,117	0,89	2542,717	2542,153	0,56	0,73	1,57	0,048	0,0966	0,321	0,348	1,090	2,04	1,0	
K0+022,70	72F-32	IZQ	6"	7,40	0,60	2543,035	2542,207	0,83	2542,807	2542,281	0,53	0,68	3,01	0,048	0,0966	0,291	0,715	2,098	3,91	1,0	2,0
K0+025,00	72F-26	IZQ	6"	8,10	0,60	2543,065	2542,297	0,77	2542,897	2542,378	0,52	0,64	3,13	0,048	0,0966	0,271	0,782	2,144	4,07	1,0	1,0
Totales				26,20									10,87	0,24			2,53	7,42	14,13	5,00	4,00
ITEM				7,001									6,001	7,038			6,004	7,022	1,004	7,023	7,024

PLANILLA DOMICILIARÍAS

CÓDIGO: 003
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/09/2024

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATO No.: 938-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 **CIV** 8010914 **FECHA:** 31/03/2026

TRAMO TUBERIA NC26 - TRAMO 2 **Diametro** 0,152 **base** 0,10

BARRIO: LA CAMPINA NC-26 **ALCANTARILLADO:** SANITARIO **H ESTRU VIA:** 0,54 **HOJA:** 1 **DE** 1

Abscisa de tuberia	Nomenclatura	Costado	Diámetro Tubería (m)	Longitud Tubería	Ancho Excavación	Cota subrasante de tuberia	Cota cimentacion de tuberia	Diferencia cotas de tuberia a excavación	Cota rasante de caja	Cota lomo entrada a caja	Diferencia cotas de caja	Altura promedio	Volumen excavación	Concreto de anclaje MANO DE OBRA	Area Rellenos		Rellenos		Volumen retiro de sobrantes	Accesorios Yee	semicodo
															Triturado 3/4"	Recebo B200	Triturado 3/4"	Recebo B200			
K0+003,50	72F-27	DER	6"	4,50	0,60	2543,310	2542,078	1,23	2543,410	2542,303	1,11	1,17	3,16	0,048	0,0966	0,587	0,435	2,464	4,10	1,0	
K0+004,70	72F-22	IZQ	6"	8,50	0,60	2543,310	2542,078	1,23	2543,410	2542,503	0,91	1,07	5,45	0,048	0,0966	0,527	0,821	4,372	7,09	1,0	1,0
K0+007,00	72F-23	DER	6"	4,00	0,60	2543,300	2542,086	1,21	2543,400	2542,286	1,11	1,16	2,79	0,048	0,0966	0,584	0,386	2,102	3,63	1,0	
K0+011,50	72F-20	IZQ	6"	8,50	0,60	2543,270	2542,113	1,16	2543,370	2542,538	0,83	0,99	5,07	0,048	0,0966	0,482	0,821	3,998	6,59	1,0	1,0
K0+017,50	72F-19	DER	6"	2,70	0,60	2543,240	2542,141	1,10	2543,340	2542,276	1,06	1,08	1,75	0,048	0,0966	0,534	0,261	1,335	2,28	1,0	
K0+024,00	72F-14	IZQ	6"	7,00	0,60	2543,210	2542,168	1,04	2543,310	2542,518	0,79	0,92	3,85	0,048	0,0966	0,435	0,676	2,959	5,00	1,0	2,0
K0+029,00	72F-15	DER	6"	3,95	0,60	2543,180	2542,196	0,98	2543,280	2542,394	0,89	0,94	2,22	0,048	0,0966	0,446	0,382	1,651	2,88	1,0	
K0+029,50	72F-08	IZQ	6"	6,40	0,60	2543,180	2542,196	0,98	2543,280	2542,516	0,76	0,87	3,36	0,048	0,0966	0,410	0,618	2,539	4,36	1,0	1,0
K0+041,00	72F-09	DER	6"	2,90	0,60	2543,120	2542,251	0,87	2543,220	2542,396	0,82	0,85	1,47	0,048	0,0966	0,393	0,280	1,061	1,91	1,0	
K0+043,00	72F-06	IZQ	6"	5,80	0,60	2543,120	2542,251	0,87	2543,220	2542,541	0,68	0,77	2,69	0,048	0,0966	0,349	0,560	1,922	3,50	1,0	1,0
K0+044,50	72F-02	IZQ	6"	6,20	0,60	2543,090	2542,279	0,81	2543,190	2542,589	0,60	0,71	2,63	0,048	0,0966	0,309	0,599	1,838	3,42	1,0	1,0
Totales				60,45									34,44	0,53			5,84	26,24	44,78	11,00	7,00
ITEM				7,001									6,001	7,038			6,004	7,022	1,004	7,023	7,024

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/3/2026 (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010695 - CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
			1. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
1	1,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8195.34	$ 1.142.00	$ 9.359.080.00	10212.16	$ 1.142.00	$ 11.662.287.00	471.80	$ 538.796.00		471.80	$ 538.796.00	9740.36	$ 11.123.491.00
2	1,002	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1375,79	$ 48.679,00	$ 66.972.081,00	1359,01	$ 48.679,00	$ 66.155.248,00	46,85	$ 2.280.611,00		46,85	$ 2.280.611,00	1312,16	$ 63.874.637,00
3	1,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5859.32	$ 7.206.00	$ 42.222.260.00	4763.20	$ 7.206.00	$ 34.323.619.00	290.52	$ 2.093.487.00		290.52	$ 2.093.487.00	4472.68	$ 32.230.132.00
4	1,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1100,00	$ 57.240,00	$ 62.964.000,00	6192,47	$ 57.240,00	$ 354.456.983,00	518,48	$ 29.677.795,00		518,48	$ 29.677.795,00	5673,99	$ 324.779.188,00
5	1,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4566,07	$ 73.056,00	$ 333.578.810,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
6	1,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9171,92	$ 16.517,00	$ 151.492.603,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
7	1,007	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4141,23	$ 235.794,00	$ 976.477.187,00	0,00	$ 235.794,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
8	1,008	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1200,00	$ 220.890,00	$ 265.068.000,00	0,00	$ 220.890,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
9	1,009	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 213.572,00	$ 616.219.292,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
10	1,010	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 205.221,00	$ 592.124.151,00	0,00	$ 205.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
11	1,011	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	545,12	$ 1.757.344,00	$ 957.963.361,00	0,00	$ 1.757.344,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
12	1,012	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	545,12	$ 1.953.442,00	$ 1.064.860.303,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
13	1,013	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.003,00	$ 38.316.276,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
14	1,014	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.877,00	$ 46.682.108,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
15	1,015	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3930,17	$ 22.817,00	$ 89.674.689,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
16	1,016	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	66,00	$ 228.161,00	$ 15.058.626,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
17	1,017	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	1420,00	$ 190.133,00	$ 269.988.860,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
18	1,018	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1095,38	$ 1.712.945,00	$ 1.876.325.694,00	442,61	$ 1.712.945,00	$ 758.166.586,00	23,26	$ 39.843.101,00		23,26	$ 39.843.101,00	419,35	$ 718.323.486,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			2. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
19	2,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6603.57	$ 1.142.00	$ 7.541.277.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
20	2,002	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1320,71	$ 234.955,00	$ 310.307.418,00	148,00	$ 234.955,00	$ 34.773.340,00		$ -		0,00	$ -	148,00	$ 34.773.340,00
21	2,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4406.02	$ 7.206.00	$ 31.749.780.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
22	2,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	6603,57	$ 57.240,00	$ 377.988.347,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
23	2,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	600,00	$ 73.056,00	$ 43.833.600,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
24	2,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2200,00	$ 16.517,00	$ 36.337.400,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
25	2,007	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2203,01	$ 220.757,00	$ 486.329.879,00	0,00	$ 220.757,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
26	2,008	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	700,00	$ 208.805,00	$ 146.163.500,00	0,00	$ 208.805,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
27	2,009	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 240.902,00	$ 264.992.200,00	0,00	$ 240.902,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
28	2,010	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 242.117,00	$ 266.328.700,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
29	2,011	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	1234,31	$ 488.707,00	$ 603.215.937,00	0,00	$ 488.707,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
30	2,012	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	1320,71	$ 7.018,00	$ 9.268.743,00	0,00	$ 7.018,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
31	2,013	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2311.25	$ 13.278.00	$ 30.688.778.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
32	2,014	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	23772,85	$ 10.549,00	$ 250.779.795,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
33	2,015	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	330,18	$ 9.221,00	$ 3.044.590,00	0,00	$ 9.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
34	2,016	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	6603.57	$ 3.206.00	$ 21.171.045.00	0.00	$ 3.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
35	2,017	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	2905,57	$ 17.296,00	$ 50.254.739,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
36	2,018	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2905,57	$ 3.338,00	$ 9.698.793,00	248,00	$ 3.338,00	$ 827.824,00	24,80	$ 82.782,00		24,80	$ 82.782,00	223,20	$ 745.042,00
37	2,019	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	2829,63	$ 22.817,00	$ 64.563.668,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
38	2,020	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	19,00	$ 228.161,00	$ 4.335.059,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
39	2,021	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	180,00	$ 190.133,00	$ 34.223.940,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			3. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
40	3,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3253.08	$ 1.142.00	$ 3.715.017.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
41	3,002	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	8,13	$ 371.818,00	$ 3.022.880,00	0,00	$ 371.818,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
42	3,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	162.65	$ 7.206.00	$ 1.172.056.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
43	3,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	275,97	$ 57.240,00	$ 15.796.523,00	0,00	$ 57.240,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
44	3,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	81,33	$ 73.056,00	$ 5.941.644,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
45	3,006	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	1382,56	$ 9.347,00	$ 12.922.788,00	0,00	$ 9.347,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
46	3,007	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	162,65	$ 248.800,00	$ 40.467.320,00	0,00	$ 248.800,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
47	3,008	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	80,00	$ 213.572,00	$ 17.085.760,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
48	3,009	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	195,18	$ 1.712.945,00	$ 334.332.605,00	0,00	$ 1.712.945,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
49	3,010	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	81,33	$ 1.953.442,00	$ 158.873.438,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
50	3,011	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.003,00	$ 5.534.388,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
51	3,012	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.877,00	$ 6.742.745,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
52	3,013	4758	SELLO DE FISURAS	ML	800.00	$ 11.144.00	$ 8.915.200.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
53	3,014	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	487.96	$ 13.037.00	$ 6.361.535.00	0.00	$ 13.037.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
54	3,015	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	25,00	$ 131.419,00	$ 3.285.475,00	2,00	$ 131.419,00	$ 262.838,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 262.838,00
55	3,016	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	140,00	$ 131.419,00	$ 18.398.660,00	0,00	$ 131.419,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			4. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
56	4,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3672.96	$ 1.142.00	$ 4.194.520.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
57	4,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	459.12	$ 58.217.00	$ 26.728.589.00	0.00	$ 58.217.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
58	4,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3	619,81	$ 57.240,00	$ 35.477.924,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
59	4,004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	252,52	$ 73.056,00	$ 18.447.809,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
60	4,005	3486	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	550,94	$ 234.955,00	$ 129.447.048,00	0,00	$ 234.955,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
61	4,006	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	206.60	$ 248.800.00	$ 51.402.080.00	0.00	$ 248.800.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
62	4,007	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	68,87	$ 242.117,00	$ 16.674.598,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
63	4,008	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m	M2	550,94	$ 464.229,00	$ 255.764.182,00	0,00	$ 464.229,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
64	4,009	3708	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	9182.40	$ 7.018.00	$ 64.442.083.00	0.00	$ 7.018.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
65	4,010	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	4591.20	$ 13.278.00	$ 60.961.954.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
66	4,011	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1836,48	$ 10.549,00	$ 19.373.028,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
67	4,012	4758	SELLO DE FISURAS	ML	100.00	$ 11.144.00	$ 1.114.400.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
68	4,013	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1616,10	$ 17.296,00	$ 27.952.107,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
69	4,014	3723	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	10.65	$ 131.419.00	$ 1.399.612.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
70	4,015	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	20.94	$ 131.419.00	$ 2.751.914.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
71	4,016	3434	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	20,00	$ 97.222,00	$ 1.944.440,00	0,00	$ 97.222,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
72	4,017	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	20,00	$ 90.021,00	$ 1.800.420,00	0,00	$ 90.021,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			5. MANTENIMIENTO PERIODICO EN ANDEN DE CONCRETO														
73	5,001	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	2683,78	$ 10.370,00	$ 27.830.799,00	3088,81	$ 10.370,00	$ 32.030.960,00		$ -		0,00	$ -	3088,81	$ 32.030.960,00
74	5,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	268.38	$ 58.217.00	$ 15.624.278.00	542.24	$ 58.217.00	$ 31.567.586.00		$ -		0.00	$ -	542.24	$ 31.567.586.00
75	5,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	536,76	$ 57.240,00	$ 30.724.142,00	2260,66	$ 57.240,00	$ 129.400.178,00		$ -		0,00	$ -	2260,66	$ 129.400.178,00
76	5,004	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	268,38	$ 392.394,00	$ 105.310.702,00	0,00	$ 392.394,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
77	5,005	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	2683,78	$ 105.225,00	$ 282.400.751,00	73,00	$ 105.225,00	$ 7.681.425,00		$ -		0,00	$ -	73,00	$ 7.681.425,00
78	5,006	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	89.46	$ 1.212.741.00	$ 108.491.810.00	0.00	$ 1.212.741.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
79	5,007	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO). INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS	M2	2236,48	$ 165.385,00	$ 369.880.245,00	0,00	$ 165.385,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
80	5,008	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO	UN	20,00	$ 2.082.959,00	$ 41.659.180,00	0,00	$ 2.082.959,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
81	5,009	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	2236,48	$ 145.068,00	$ 324.441.681,00	0,00	$ 145.068,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
82	5,010	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO)	ML	4472,97	$ 78.310,00	$ 350.278.281,00	10,00	$ 78.310,00	$ 783.100,00		$ -		0,00	$ -	10,00	$ 783.100,00
83	5,011	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	4472,97	$ 102.949,00	$ 460.487.789,00	1533,10	$ 102.949,00	$ 157.831.112,00		$ -		0,00	$ -	1533,10	$ 157.831.112,00
84	5,012	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	6262,15	$ 86.663,00	$ 542.696.705,00	529,68	$ 86.663,00	$ 45.903.658,00		$ -		0,00	$ -	529,68	$ 45.903.658,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			6. REDES														
85	6,001	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5808,47	$ 58.217,00	$ 338.151.698,00	3657,45	$ 58.217,00	$ 212.925.767,00	59,66	$ 3.473.226,00		59,66	$ 3.473.226,00	3597,79	$ 209.452.540,00
86	6,002	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1452,12	$ 73.056,00	$ 106.086.079,00	4754,66	$ 73.056,00	$ 347.356.441,00		$ -		0,00	$ -	4754,66	$ 347.356.441,00
87	6,003	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4356,35	$ 49.220,00	$ 214.419.547,00	37,00	$ 49.220,00	$ 1.821.140,00		$ -		0,00	$ -	37,00	$ 1.821.140,00
88	6,004	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	217,82	$ 209.827,00	$ 45.704.517,00	886,54	$ 209.827,00	$ 186.020.029,00	21,37	$ 4.484.003,00		21,37	$ 4.484.003,00	865,17	$ 181.536.026,00
89	6,005	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	653,45	$ 125.986,00	$ 82.325.552,00	0,00	$ 125.986,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
90	6,006	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	72,61	$ 268.758,00	$ 19.514.518,00	0,00	$ 268.758,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
91	6,007	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	435,64	$ 195.195,00	$ 85.034.750,00	43,00	$ 195.195,00	$ 8.393.385,00		$ -		0,00	$ -	43,00	$ 8.393.385,00
92	6,008	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	40,00	$ 2.379.851,00	$ 95.194.040,00	56,00	$ 2.379.851,00	$ 133.271.656,00	2,00	$ 4.759.702,00		2,00	$ 4.759.702,00	54,00	$ 128.511.954,00
93	6,009	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	280,00	$ 928.646,00	$ 260.020.880,00	82,00	$ 928.646,00	$ 76.148.972,00	2,14	$ 1.987.302,00		2,14	$ 1.987.302,00	79,86	$ 74.161.670,00
94	6,010	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	40,00	$ 170.695,00	$ 6.827.800,00	65,00	$ 170.695,00	$ 11.095.175,00		$ -		0,00	$ -	65,00	$ 11.095.175,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No 2 **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/3/2026 (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010695 - CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
95	6,011	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	295,20	$ 180.628,00	$ 53.321.386,00	0,00	$ 180.628,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
96	6,012	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190,41	$ 528.764,00	$ 100.681.953,00	23,35	$ 528.764,00	$ 12.346.639,00		$ -		0,00	$ -	23,35	$ 12.346.639,00
97	6,013	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3310,80	$ 46.883,00	$ 155.220.236,00	0,00	$ 46.883,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
98	6,014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1744,93	$ 221.771,00	$ 386.974.871,00	378,50	$ 221.771,00	$ 83.940.324,00	20,40	$ 4.524.128,00		20,40	$ 4.524.128,00	358,10	$ 79.416.195,00
99	6,015	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	60,00	$ 535.886,00	$ 32.153.160,00	165,50	$ 535.886,00	$ 88.689.133,00		$ -		0,00	$ -	165,50	$ 88.689.133,00
												$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			7. ITEMS DE INCLUSION														
100	7,001	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 88.189,00		727,96	$ 88.189,00	$ 64.198.064,00	77,95	$ 6.874.333,00		77,95	$ 6.874.333,00	650,01	$ 57.323.732,00
101	7,002	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 122.135,00		792,57	$ 122.135,00	$ 96.800.537,00	62,00	$ 7.572.370,00		62,00	$ 7.572.370,00	730,57	$ 89.228.167,00
102	7,003	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 172.135,00		33,60	$ 172.135,00	$ 5.783.736,00		$ -		0,00	$ -	33,60	$ 5.783.736,00
103	7,004	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 351.631,00		88,70	$ 351.631,00	$ 31.189.670,00		$ -		0,00	$ -	88,70	$ 31.189.670,00
104	7,005	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$ 2.400,00		9059,81	$ 2.400,00	$ 21.743.544,00	467,37	$ 1.121.688,00		467,37	$ 1.121.688,00	8592,44	$ 20.621.856,00
105	7,006	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2		$ 3.740,00		1936,46	$ 3.740,00	$ 7.242.360,00		$ -		0,00	$ -	1936,46	$ 7.242.360,00
106	7,007	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 92.526,00		500,20	$ 92.526,00	$ 46.281.505,00		$ -		0,00	$ -	500,20	$ 46.281.505,00
107	7,008	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3		$ 1.843.898,00		10,41	$ 1.843.898,00	$ 19.194.978,00		$ -		0,00	$ -	10,41	$ 19.194.978,00
108	7,009	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		165,20	$ 10.811,00	$ 1.785.977,00		$ -		0,00	$ -	165,20	$ 1.785.977,00
109	7,010	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		1,00	$ 10.811,00	$ 10.811,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 10.811,00
110	7,011	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	UN		$ 656.068,00		341,00	$ 656.068,00	$ 223.719.188,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 223.719.188,00
111	7,012	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$ 630.227,00		33,00	$ 630.227,00	$ 20.797.491,00		$ -		0,00	$ -	33,00	$ 20.797.491,00
112	7,013	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA)	UN		$ 47.561,00		14,00	$ 47.561,00	$ 665.854,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 665.854,00
113	7,014	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 566.503,00		341,00	$ 566.503,00	$ 193.177.523,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 193.177.523,00
114	7,015	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 114.367,00		451,00	$ 114.367,00	$ 51.579.517,00		$ -		0,00	$ -	451,00	$ 51.579.517,00
115	7,016	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3		$ 2.093.317,00		634,19	$ 2.093.317,00	$ 1.327.560.708,00	32,56	$ 68.158.402,00		32,56	$ 68.158.402,00	601,63	$ 1.259.402.307,00
116	7,017	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.881,00		8744,61	$ 4.881,00	$ 42.682.441,00	465,10	$ 2.270.153,00		465,10	$ 2.270.153,00	8279,51	$ 40.412.288,00
117	7,018	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN		$ 852.604,00		6,00	$ 852.604,00	$ 5.115.624,00	1,00	$ 852.604,00		1,00	$ 852.604,00	5,00	$ 4.263.020,00
118	7,019	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN		$ 294.438,00		28,00	$ 294.438,00	$ 8.244.264,00	2,00	$ 588.876,00		2,00	$ 588.876,00	26,00	$ 7.655.388,00
119	7,020	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 100.003,00		9059,81	$ 100.003,00	$ 906.008.179,00	465,10	$ 46.511.395,00		465,10	$ 46.511.395,00	8594,71	$ 859.496.784,00
120	7,021	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 101.831,00		306,00	$ 101.831,00	$ 31.160.286,00		$ -		0,00	$ -	306,00	$ 31.160.286,00
121	7,022	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 159.155,00		2619,76	$ 159.155,00	$ 416.947.903,00	104,46	$ 16.625.331,00		104,46	$ 16.625.331,00	2515,30	$ 400.322.572,00
122	7,023	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.525,00		341,00	$ 299.525,00	$ 102.138.025,00	14,00	$ 4.193.350,00		14,00	$ 4.193.350,00	327,00	$ 97.944.675,00
123	7,024	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 116.431,00		38,00	$ 116.431,00	$ 4.424.378,00	11,00	$ 1.280.741,00		11,00	$ 1.280.741,00	27,00	$ 3.143.637,00
124	7,025	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN		$ 1.517.446,00		23,00	$ 1.517.446,00	$ 34.901.258,00	1,00	$ 1.517.446,00		1,00	$ 1.517.446,00	22,00	$ 33.383.812,00
125	7,026	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 294.664,00		2,00	$ 294.664,00	$ 589.328,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 589.328,00
126	7,027	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.320.280,00		149,30	$ 2.320.280,00	$ 346.417.804,00		$ -		0,00	$ -	149,30	$ 346.417.804,00
127	7,028	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.544.307,00		2,00	$ 2.544.307,00	$ 5.088.614,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.088.614,00
128	7,029	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.800.338,00		2,00	$ 2.800.338,00	$ 5.600.676,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.600.676,00
129	7,030	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 14". ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.328.401,00		1,00	$ 3.328.401,00	$ 3.328.401,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 3.328.401,00
130	7,031	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 16". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.800.458,00		34,50	$ 3.800.458,00	$ 131.115.801,00		$ -		0,00	$ -	34,50	$ 131.115.801,00
131	7,032	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 78.395,00		4593,68	$ 78.395,00	$ 360.121.544,00	34,83	$ 2.730.498,00		34,83	$ 2.730.498,00	4558,85	$ 357.391.046,00
132	7,033	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.749,00		9059,81	$ 4.749,00	$ 43.025.038,00	465,10	$ 2.208.760,00		465,10	$ 2.208.760,00	8594,71	$ 40.816.278,00
133	7,034	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 3.546,00		48,20	$ 3.546,00	$ 170.917,00		$ -		0,00	$ -	48,20	$ 170.917,00
134	7,035	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 10.058,00		14,00	$ 10.058,00	$ 140.812,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 140.812,00
135	7,036	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	ML		$ 10.525,00		3979,34	$ 10.525,00	$ 41.882.554,00		$ -		0,00	$ -	3979,34	$ 41.882.554,00
136	7,037	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3		$ 198.532,00		64,08	$ 198.532,00	$ 12.721.931,00		$ -		0,00	$ -	64,08	$ 12.721.931,00
137	7,038	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 984.823,00		16,00	$ 984.823,00	$ 15.757.168,00	0,67	$ 659.831,00		0,67	$ 659.831,00	15,33	$ 15.097.337,00
138	7,039	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 7.459.739,00		5,00	$ 7.459.739,00	$ 37.298.695,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 37.298.695,00
139	7,040	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN		$ 272.085,00		14,00	$ 272.085,00	$ 3.809.190,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 3.809.190,00
140	7,041	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE		$ 2.474.248,00		14,00	$ 2.474.248,00	$ 34.639.472,00	2,00	$ 4.948.496,00		2,00	$ 4.948.496,00	12,00	$ 29.690.976,00
141	7,042	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24". ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.697.698,00		100,70	$ 5.697.698,00	$ 573.758.189,00		$ -		0,00	$ -	100,70	$ 573.758.189,00
142	7,043	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 257.553,00		1875,14	$ 257.553,00	$ 482.947.932,00	116,28	$ 29.948.263,00		116,28	$ 29.948.263,00	1758,86	$ 452.999.670,00
143	7,044	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3		$ 231.349,00		348,56	$ 231.349,00	$ 80.639.007,00		$ -		0,00	$ -	348,56	$ 80.639.007,00
144	7,045	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$ 10.108,00		2258,60	$ 10.108,00	$ 22.829.929,00		$ -		0,00	$ -	2258,60	$ 22.829.929,00
145	7,046	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 33.747,00		12148,62	$ 33.747,00	$ 409.979.479,00	498,80	$ 16.833.004,00		498,80	$ 16.833.004,00	11649,82	$ 393.146.476,00
146	7,047	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 4.152.501,00		4,00	$ 4.152.501,00	$ 16.610.004,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 16.610.004,00
147	7,048	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.196,00		7958,68	$ 6.196,00	$ 49.311.981,00		$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 49.311.981,00
148	7,049	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML		$ 25.701,00		7958,68	$ 25.701,00	$ 204.546.035,00		$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 204.546.035,00
149	7,050	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 35.750,00		408,47	$ 35.750,00	$ 14.602.803,00		$ -		0,00	$ -	408,47	$ 14.602.803,00
150	7,051	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2		$ 191.703,00		510,64	$ 191.703,00	$ 97.891.220,00		$ -		0,00	$ -	510,64	$ 97.891.220,00
151	7,052	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 8.852,00		2830,00	$ 8.852,00	$ 25.051.160,00		$ -		0,00	$ -	2830,00	$ 25.051.160,00
152	7,053	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 124.194,00		19,00	$ 124.194,00	$ 2.359.686,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 2.359.686,00
153	7,054	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 26.513,00		54,00	$ 26.513,00	$ 1.431.702,00		$ -		0,00	$ -	54,00	$ 1.431.702,00
154	7,055	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	UN		$ 311.753,00		19,00	$ 311.753,00	$ 5.923.307,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 5.923.307,00
155	7,056	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.096.615,00		1,00	$ 5.096.615,00	$ 5.096.615,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 5.096.615,00
156	7,057	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 703.569,00		62,50	$ 703.569,00	$ 43.973.063,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 43.973.063,00
157	7,058	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 425.516,00		35,50	$ 425.516,00	$ 15.105.818,00		$ -		0,00	$ -	35,50	$ 15.105.818,00
158	7,059	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		$ 27.170,00		1569,67	$ 27.170,00	$ 42.647.934,00		$ -		0,00	$ -	1569,67	$ 42.647.934,00
159	7,060	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML		$ 29.226,00		340,50	$ 29.226,00	$ 9.951.453,00		$ -		0,00	$ -	340,50	$ 9.951.453,00
160	7,061	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		$ 17.602,00		1910,17	$ 17.602,00	$ 33.622.812,00		$ -		0,00	$ -	1910,17	$ 33.622.812,00
												$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			8. NO PREVISTOS														
161	8,001	NP-1	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 14 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO)	M3		$ 1.385.170,00		5,00	$ 1.385.170,00	$ 6.925.850,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 6.925.850,00
162	8,002	NP-2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 282.325,00		1355,52	$ 282.325,00	$ 382.697.184,00		$ -		0,00	$ -	1355,52	$ 382.697.184,00
163	8,003	NP-3	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 77.819,00		9059,81	$ 77.819,00	$ 705.025.354,00	465,10	$ 36.193.617,00		465,10	$ 36.193.617,00	8594,71	$ 668.831.737,00
164	8,004	NP-4	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	M3		$ 476.745,00		2281,25	$ 476.745,00	$ 1.087.574.531,00	102,79	$ 49.004.619,00		102,79	$ 49.004.619,00	2178,46	$ 1.038.569.913,00
165	8,005	NP-5	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	M3		$ 19.423,00		94,00	$ 19.423,00	$ 1.825.762,00		$ -		0,00	$ -	94,00	$ 1.825.762,00
166	8,006	NP-6	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%)	UN		$ 107.272,00		9059,81	$ 107.272,00	$ 971.863.938,00	396,00	$ 42.479.712,00		396,00	$ 42.479.712,00	8663,81	$ 929.384.226,00
167	8,007	NP-7	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	ML		$ 446.392,00		341,00	$ 446.392,00	$ 152.219.672,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 152.219.672,00
168	8,008	NP-8	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacíon)	UN		$ 360.064,00		341,00	$ 360.064,00	$ 122.781.824,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 122.781.824,00
169	8,009	NP-9	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN		$ 162.297,00		341,00	$ 162.297,00	$ 55.343.277,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 55.343.277,00
170	8,010	NP-10	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 657.822,00		137,00	$ 657.822,00	$ 90.121.614,00	19,60	$ 12.893.311,00		19,60	$ 12.893.311,00	117,40	$ 77.228.303,00
171	8,011	NP-11	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 14 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 744.157,00		4,00	$ 744.157,00	$ 2.976.628,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.976.628,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Fecha Inicio) **A** 31/3/2026 (Fecha Fin)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR ACTUAL PAGO $ 19.645.886.208,00 (Escriba el valor total del acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVMAC SAS (Escriba el número y razón social del interventor y en el caso de Consorcio de Unión temporal, el nombre de cada uno de los integrantes)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO (Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS (Escriba el nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número del contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8610035 - CALLE 38 SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES							
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO		
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
172	8,012	NP-12	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 16 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 795.331,00		1,00	$ 795.331,00	$ 795.331,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 795.331,00
173	8,013	NP-13	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 896.388,00		49,75	$ 896.388,00	$ 44.595.303,00		$ -		0,00	$ -	49,75	$ 44.595.303,00
174	8,014	NP-14	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 974.773,00		62,50	$ 974.773,00	$ 60.923.313,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 60.923.313,00
175	8,015	NP-15	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	UN		$ 269.294,00		24,00	$ 269.294,00	$ 6.463.056,00	2,00	$ 538.588,00		2,00	$ 538.588,00	22,00	$ 5.924.468,00
176	8,016	NP-16	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye taladro rotopercutor 3/4", planta electrica 6Kw)	UN		$ 76.124,00		11,00	$ 76.124,00	$ 837.364,00		$ -		0,00	$ -	11,00	$ 837.364,00
177	8,017	NP-17	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, EXCLUYE BROCAS, PREBARRO Y COMBUSTIBLE)	UN		$ 180.006,00		9059,81	$ 180.006,00	$ 1.630.820.159,00	396,00	$ 71.282.376,00		396,00	$ 71.282.376,00	8663,81	$ 1.559.537.783,00
178	8,018	NP-18	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO,INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)	UN		$ 4.852.592,00		124,00	$ 4.852.592,00	$ 601.721.408,00	2,00	$ 9.705.184,00		2,00	$ 9.705.184,00	122,00	$ 592.016.224,00
179	8,019	NP-19	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML		$ 563.913,00		4,00	$ 563.913,00	$ 2.255.652,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.255.652,00
180	8,020	NP-20	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalación)	UN		$ 486.892,00		4,00	$ 486.892,00	$ 1.947.568,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 1.947.568,00
181	8,021	NP-21	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X80	UN		$ 208.334,00		4,00	$ 208.334,00	$ 833.336,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 833.336,00
182	8,022	NP-22	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 464.671,00		15,00	$ 464.671,00	$ 6.970.065,00		$ -		0,00	$ -	15,00	$ 6.970.065,00
183	8,023	NP-23	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIÓN, CON COLMATACIÓN SUPERIOR AL 30% Y DIÁMETROS DE 8" A 36" INCLUYE ACCIÓ	ML		$ 661.727,00		86,80	$ 661.727,00	$ 57.437.904,00		$ -		0,00	$ -	86,80	$ 57.437.904,00
184	8,024	NP-24	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 400.192,00		170,75	$ 400.192,00	$ 68.332.784,00		$ -		0,00	$ -	170,75	$ 68.332.784,00
185	8,025	NP-25	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 223.645,00		2,00	$ 223.645,00	$ 447.290,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 447.290,00
186	8,026	NP-26	PISO EN CONCRETO MR45 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 346.192,00		172,86	$ 346.192,00	$ 59.842.749,00		$ -		0,00	$ -	172,86	$ 59.842.749,00
187	8,027	NP-27	PISO EN CONCRETO 3000 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 318.979,00		580,92	$ 318.979,00	$ 185.301.281,00		$ -		0,00	$ -	580,92	$ 185.301.281,00
188	8,028	NP-28	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_ RCB) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 262.519,00		1815,49	$ 262.519,00	$ 476.600.619,00	79,07	$ 20.757.377,00		79,07	$ 20.757.377,00	1736,42	$ 455.843.242,00
				TOTALES			$ 16.832.066.661,00			$ 16.456.656.116,00		$ 551.495.258,00			$ 551.495.258,00		$ 15.905.162.862,00

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES	OBRA EJECUTADA		
				PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
OBRA EJECUTADA						
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 12.294.241.586,25	$ 12.238.163.245,35	$ 410.125.126,79		$ 410.125.126,79
ADMINISTRACIÓN	28,47%	$ 3.500.170.579,60	$ 3.484.205.075,95	$ 116.762.623,60		$ 116.762.623,60
IMPREVISTO	1,00%	$ 122.942.415,86	$ 122.381.632,45	$ 4.101.251,27		$ 4.101.251,27
UTILIDAD	5,00%	$ 614.712.079,31	$ 611.906.162,27	$ 20.506.256,34		$ 20.506.256,34
SUBTOTAL A.I.U	34,47%	$ 4.237.825.074,77	$ 4.218.494.870,67	$ 141.370.131,21		$ 141.370.131,21
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=34,47%)		**$ 16.532.066.661,00**	**$ 16.456.656.116,00**	**$ 551.495.258,00**		**$ 551.495.258,00**
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES. SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (B) =	**12,3764%**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 50.758.726,00**		**$ 50.758.726,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA). SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (C) =	**2,3210%**	**285.447.701,00**	**285.447.701,00**	$ -	$ -	
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES) (E) = (A) + (B) + (C) =		**$ 18.339.098.878,00**	**$ 18.339.098.878,00**		$ -	
OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS		**$ 1.306.787.330,00**	**$ 1.302.195.875,00**			
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**30,000%**	**$ 5.893.765.862,00**		$ -	$ -	
(K) COSTO TOTAL MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (F)+(G)		**$ 19.645.886.208,00**	**19.645.886.208,00**		$ -	
VALOR NETO A PAGAR				**$ 602.253.384,00**		**$ 602.253.384,00**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de MARZO (Mes en (para en Todos en el acta) de 2026 (Año del Fecha del acta)

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista

(Firma)
Cesar Maldonado
Director de Interventoría
Interventor

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
replanteo de segmento vial			67,40	7,00					471,80
	planimetria y altimetria inicial								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									471,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									471,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

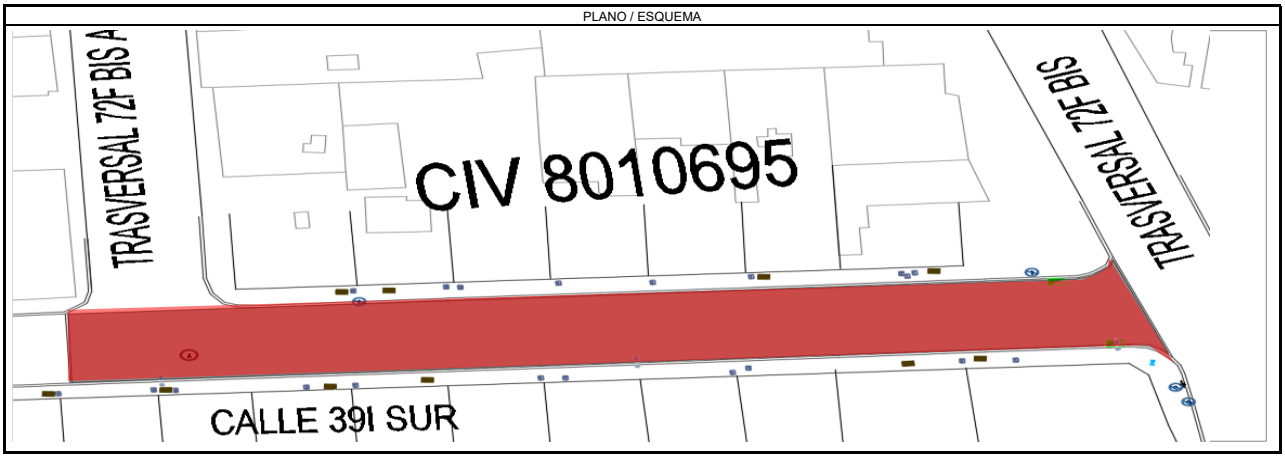

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
demolicion de carpeta asfaltica existente									
	asfalto existente		67,40	7,00	0,10				47,18
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,10			-1,00	-0,23
	sumideros existentes	area	0,50		0,10			-2,00	-0,10
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									46,85
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									46,85
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

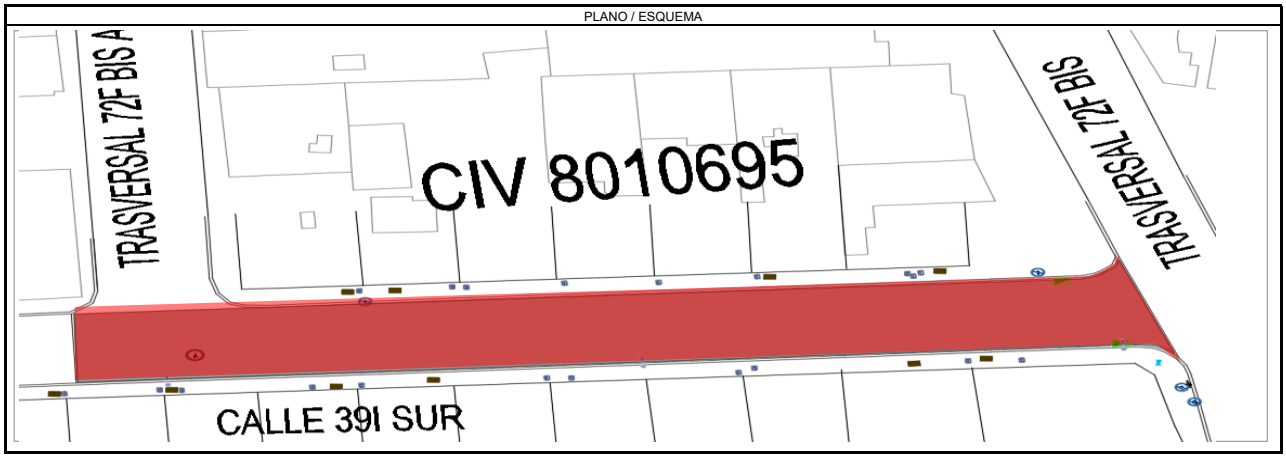

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8010695	
PRIORIDAD:	NC	27

ESPESOR MEDIO ENCONTRADO 0,100

CARTERA DE:	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE - PLACA EN CONCRETO	ANCHO DE VIA DEMOLIDA	7,00

ABSCISA (m)	ASFALTO EXISTENTE					DEMOLICION					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,529	2543,552	2543,575	2543,559	2543,542	2543,429	2543,452	2543,475	2543,459	2543,442	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
K0+005,00	2543,525	2543,545	2543,565	2543,545	2543,525	2543,425	2543,445	2543,465	2543,445	2543,425	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+010,00	2543,510	2543,540	2543,570	2543,550	2543,530	2543,410	2543,440	2543,470	2543,450	2543,430	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+015,00	2543,525	2543,543	2543,560	2543,533	2543,505	2543,425	2543,443	2543,460	2543,433	2543,405	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+020,00	2543,505	2543,523	2543,540	2543,520	2543,500	2543,405	2543,423	2543,440	2543,420	2543,400	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+025,00	2543,485	2543,495	2543,505	2543,493	2543,480	2543,385	2543,395	2543,405	2543,393	2543,380	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+030,00	2543,485	2543,498	2543,510	2543,488	2543,465	2543,385	2543,398	2543,410	2543,388	2543,365	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+035,00	2543,440	2543,465	2543,490	2543,478	2543,465	2543,340	2543,365	2543,390	2543,378	2543,365	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+040,00	2543,440	2543,458	2543,475	2543,458	2543,440	2543,340	2543,358	2543,375	2543,358	2543,340	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+045,00	2543,425	2543,443	2543,460	2543,440	2543,420	2543,325	2543,343	2543,360	2543,340	2543,320	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+050,00	2543,420	2543,440	2543,460	2543,440	2543,420	2543,320	2543,340	2543,360	2543,340	2543,320	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+055,00	2543,405	2543,423	2543,440	2543,420	2543,400	2543,305	2543,323	2543,340	2543,320	2543,300	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+060,00	2543,385	2543,375	2543,365	2543,360	2543,355	2543,285	2543,275	2543,265	2543,260	2543,255	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+065,00	2543,300	2543,338	2543,375	2543,395	2543,415	2543,200	2543,238	2543,275	2543,295	2543,315	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	35,000	3,500
K0+067,40	2543,290	2543,325	2543,360	2543,385	2543,410	2543,190	2543,225	2543,260	2543,285	2543,310	7,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	16,800	1,680
																TOTAL	0,100	471,80	47,18
														area	2,27	POZOS	-1	-2,27	-0,23
														sumidero	0,5	SUMIDEROS	-2	-1,00	-0,10
																	TOTAL	468,53	46,85

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
excavacion mecanica estructura de via									
	caja de via		67,40	7,00	0,454				214,13
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,454			-1,00	-1,03
	sumideros existentes	area	0,50		0,454			-2,00	-0,45
excavacion mecanica REDES									
	NC27 - TRAMO 1		6,60	1,00	1,37				9,01
	se anexa cartera topografica								
	NC27 - TRAMO 2		53,90	1,00	1,17				63,18
	se anexa cartera topografica								
excavacion mecanica para pozos sanitario									
	NC27 - TRAMO 1	cota subrasante	cota clave	cota fondo	alt corte	diametro excva	area excavac		
	PZ CMP119809-A	2542,79	2541,85	2541,29	1,50	2,20	3,80		5,69
	se anexa cartera topografica								

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	290,52
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	290,52
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

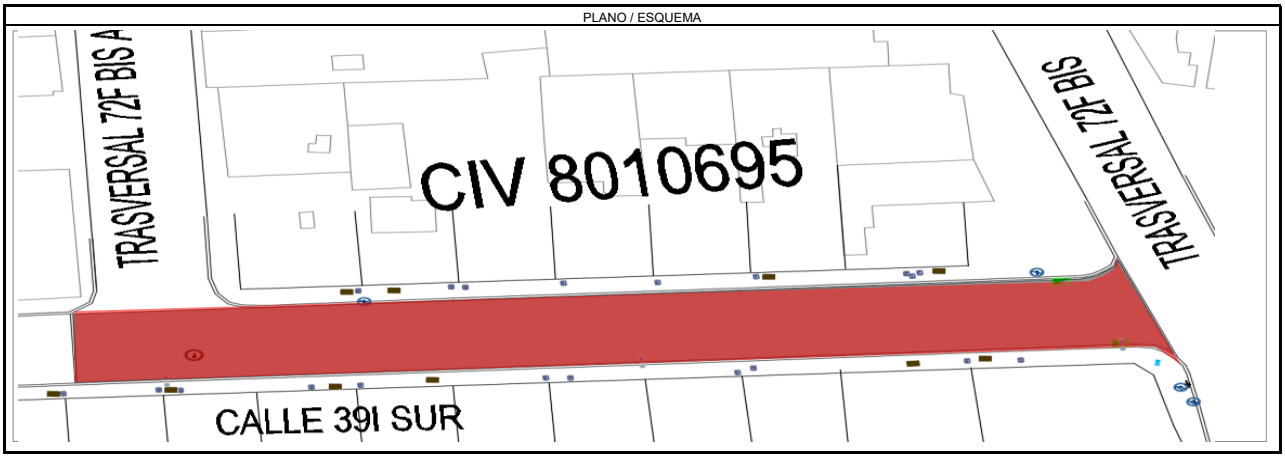

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	20/03/2026	CIV	8010695		ESTRUCTURA DE VIA	0,540
				PRIORIDAD:	NC	27		

CARTERA DE:	EXCAVACION MECANICA DE VIA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	DEMOLICION					SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,429	2543,452	2543,475	2543,459	2543,442	2542,964	2542,999	2543,034	2543,006	2542,977	7,000	0,465	0,453	0,441	0,453	0,465	0,455		
K0+005,00	2543,425	2543,445	2543,465	2543,445	2543,425	2542,980	2543,015	2543,050	2543,015	2542,980	7,000	0,445	0,430	0,415	0,430	0,445	0,433	35,000	15,547
K0+010,00	2543,410	2543,440	2543,470	2543,450	2543,430	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	7,000	0,400	0,395	0,390	0,405	0,420	0,402	35,000	14,612
K0+015,00	2543,425	2543,443	2543,460	2543,433	2543,405	2542,985	2543,020	2543,055	2543,020	2542,985	7,000	0,440	0,422	0,405	0,412	0,420	0,420	35,000	14,385
K0+020,00	2543,405	2543,423	2543,440	2543,420	2543,400	2542,960	2542,995	2543,030	2542,995	2542,960	7,000	0,445	0,427	0,410	0,425	0,440	0,429	35,000	14,866
K0+025,00	2543,385	2543,395	2543,405	2543,393	2543,380	2542,935	2542,970	2543,005	2542,970	2542,935	7,000	0,450	0,425	0,400	0,422	0,445	0,428	35,000	15,015
K0+030,00	2543,385	2543,398	2543,410	2543,388	2543,365	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	7,000	0,475	0,452	0,430	0,443	0,455	0,451	35,000	15,391
K0+035,00	2543,340	2543,365	2543,390	2543,378	2543,365	2542,885	2542,920	2542,955	2542,920	2542,885	7,000	0,455	0,445	0,435	0,457	0,480	0,454	35,000	15,846
K0+040,00	2543,340	2543,358	2543,375	2543,358	2543,340	2542,860	2542,895	2542,930	2542,895	2542,860	7,000	0,480	0,462	0,445	0,462	0,480	0,466	35,000	16,109
K0+045,00	2543,325	2543,343	2543,360	2543,340	2543,320	2542,835	2542,870	2542,905	2542,870	2542,835	7,000	0,490	0,472	0,455	0,470	0,485	0,474	35,000	16,459
K0+050,00	2543,320	2543,340	2543,360	2543,340	2543,320	2542,810	2542,845	2542,880	2542,845	2542,810	7,000	0,510	0,495	0,480	0,495	0,510	0,498	35,000	17,019
K0+055,00	2543,305	2543,323	2543,340	2543,320	2543,300	2542,785	2542,820	2542,855	2542,820	2542,785	7,000	0,520	0,503	0,485	0,500	0,515	0,504	35,000	17,544
K0+060,00	2543,285	2543,275	2543,265	2543,260	2543,255	2542,760	2542,795	2542,830	2542,795	2542,760	7,000	0,525	0,480	0,435	0,465	0,495	0,480	35,000	17,229
K0+065,00	2543,200	2543,238	2543,275	2543,295	2543,315	2542,740	2542,775	2542,810	2542,830	2542,850	7,000	0,460	0,462	0,465	0,465	0,465	0,463	35,000	16,511
K0+067,40	2543,190	2543,225	2543,260	2543,285	2543,310	2542,730	2542,785	2542,840	2542,850	2542,860	7,000	0,460	0,440	0,420	0,435	0,450	0,441	16,800	7,598
																TOTAL	0,453	471,80	214,13
														area	2,27	POZOS	-1	-2,27	-1,03
														sumidero	0,5	SUMIDEROS	-2	-1,00	-0,45
																	TOTAL	468,53	212,65

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			VOLUMEN COMPACTO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Transporte y disposicion de escombros		item							
	Demolicion de asfalto carpeta existente	1,002	46,85				1,35		63,25
	excavacion mecanica de estructura de via	1,003	290,52				1,30		377,68
	excavacion manual para redes	6,001	59,66				1,30		77,56
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									518,48
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									518,48
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

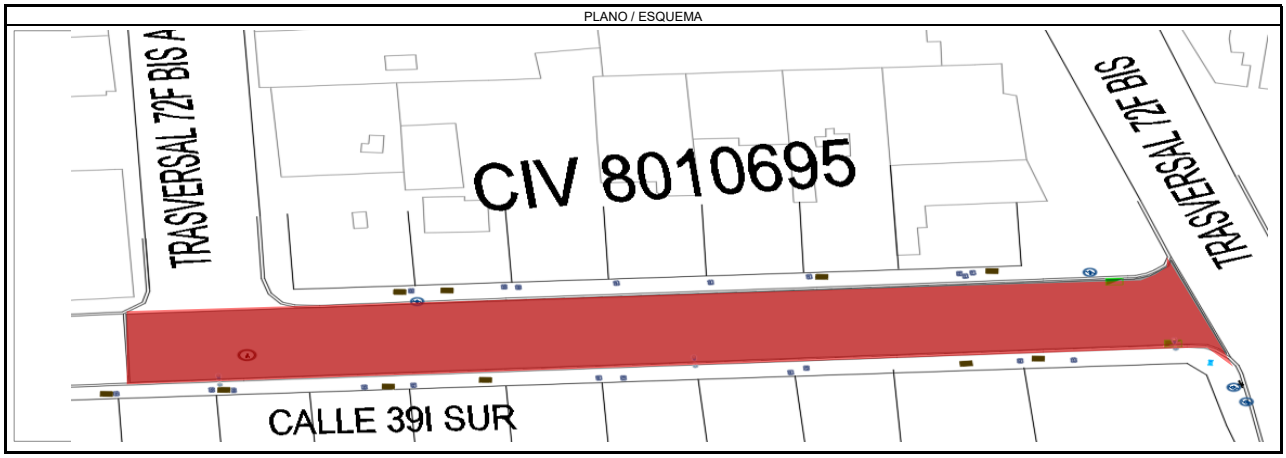

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,018 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
	Asfalto MD 19								
	estructura de via		67,40	7,00	0,050				23,59
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,050			-2,00	-0,23
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,050			-2,00	-0,11
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									23,26
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									23,26
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

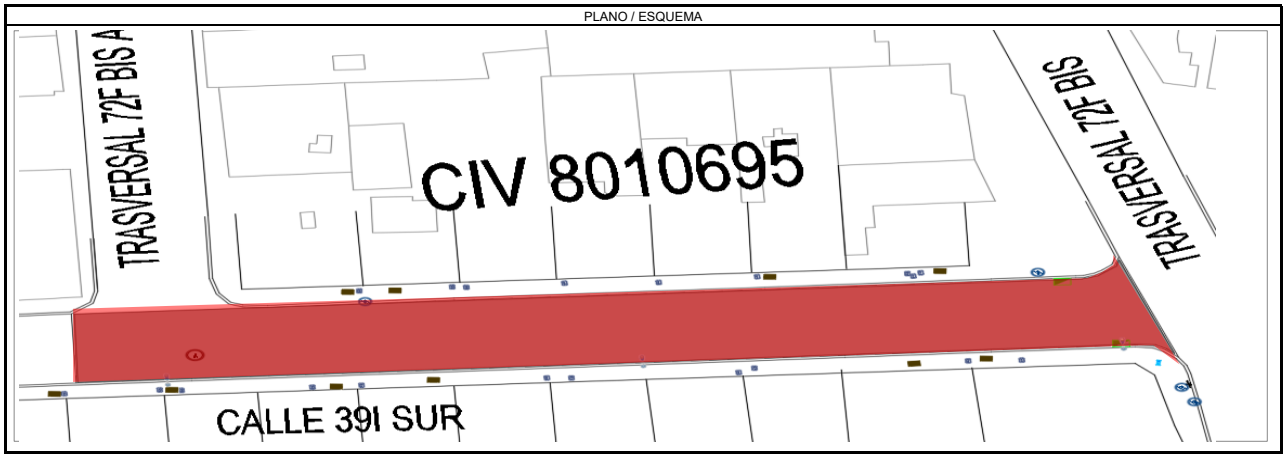

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,018 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	20/03/2026	CIV	8010695		RIEGO DE LIGA CRR-1	0,050
				PRIORIDAD:	NC	27		

CARTERA DE:	MEZCLA ASFALTICA MD 19	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	RIEGO DE LIGA CRR-1					MEZCLA ASFALTICA MD 19					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,454	2543,489	2543,524	2543,496	2543,467	2543,504	2543,539	2543,574	2543,546	2543,517	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
K0+005,00	2543,470	2543,505	2543,540	2543,505	2543,470	2543,520	2543,555	2543,590	2543,555	2543,520	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+010,00	2543,500	2543,535	2543,570	2543,535	2543,500	2543,550	2543,585	2543,620	2543,585	2543,550	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+015,00	2543,475	2543,510	2543,545	2543,510	2543,475	2543,525	2543,560	2543,595	2543,560	2543,525	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+020,00	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	2543,500	2543,535	2543,570	2543,535	2543,500	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+025,00	2543,425	2543,460	2543,495	2543,460	2543,425	2543,475	2543,510	2543,545	2543,510	2543,475	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+030,00	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+035,00	2543,375	2543,410	2543,445	2543,410	2543,375	2543,425	2543,460	2543,495	2543,460	2543,425	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+040,00	2543,350	2543,385	2543,420	2543,385	2543,350	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+045,00	2543,325	2543,360	2543,395	2543,360	2543,325	2543,375	2543,410	2543,445	2543,410	2543,375	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+050,00	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	2543,350	2543,385	2543,420	2543,385	2543,350	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+055,00	2543,275	2543,310	2543,345	2543,310	2543,275	2543,325	2543,360	2543,395	2543,360	2543,325	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+060,00	2543,250	2543,285	2543,320	2543,285	2543,250	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+065,00	2543,230	2543,265	2543,300	2543,320	2543,340	2543,280	2543,315	2543,350	2543,370	2543,390	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+067,40	2543,220	2543,275	2543,330	2543,340	2543,350	2543,270	2543,325	2543,380	2543,390	2543,400	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	16,800	0,840
																TOTAL	0,050	471,80	23,59
														area	2,27	POZOS	-2	-4,54	-0,23
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,11
																	TOTAL	465,10	23,26

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,018 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
cortes para empalme en vias anexas									
	empalme con calle 39I sur - Cra 72F Bis A		7,00						7,00
	empalme con calle 39I sur - Cra 72F Bis		7,00						7,00
	empalme con cCra 72F Bis A		10,80						10,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									24,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									24,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

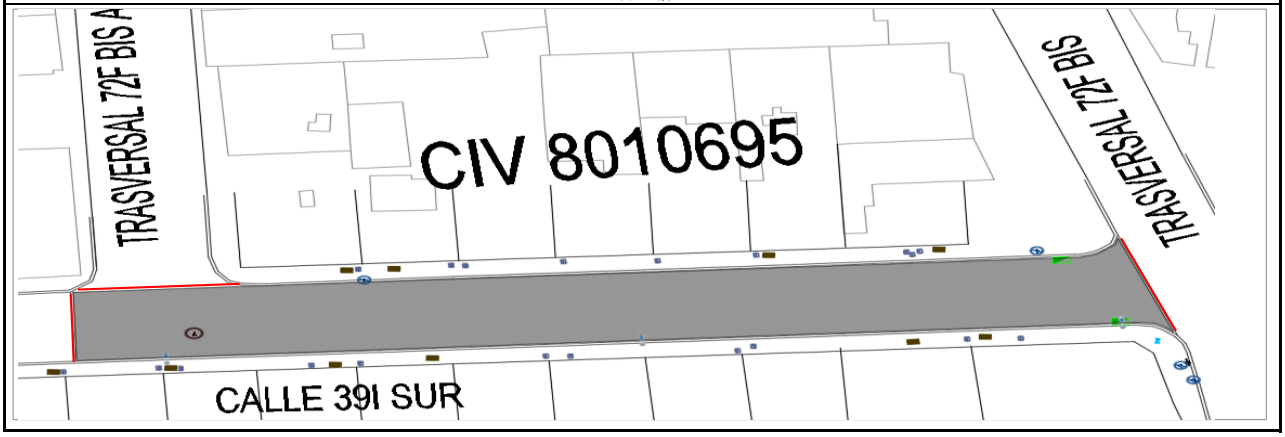

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,018 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39f SUR ENTRE CARRERA 72P BIS Y CARRERA 72P BIS A								
excavacion para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
		72F-50	7,50	0,60	1,00				4,51
		72F-43	4,90	0,60	0,99				2,92
		72F-53	5,00	0,60	0,99				2,98
		72F-57	5,40	0,60	0,98				3,17
		72F-54	7,20	0,60	0,96				4,14
		72F-61	4,85	0,60	0,97				2,83
		72F-58	6,50	0,60	0,96				3,73
		72F-62	6,10	0,60	0,95				3,49
		72F-65	4,70	0,60	0,96				2,72
		72F-66	6,10	0,60	0,95				3,47
		72F-70	6,20	0,60	0,95				3,53
		72F-73	3,90	0,60	0,97				2,27
		72F-72	5,20	0,60	0,95				2,97
		72F-77	4,40	0,60	0,96				2,52
excavacion para construccion de sumideros									
	costado norte								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+060,80	1,40	1,10	0,86				1,32
	costado sur								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+062,80	1,40	1,10	0,86				1,32
excavacion para instalacion tuberia de sumideros									
	costado norte								
	Excavacion tub de sumidero	K0+060,80	11,40	1,00	0,60				6,84
	costado sur								
	Excavacion tub de sumidero	K0+062,80	8,20	1,00	0,60				4,92
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									59,66
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									59,66
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

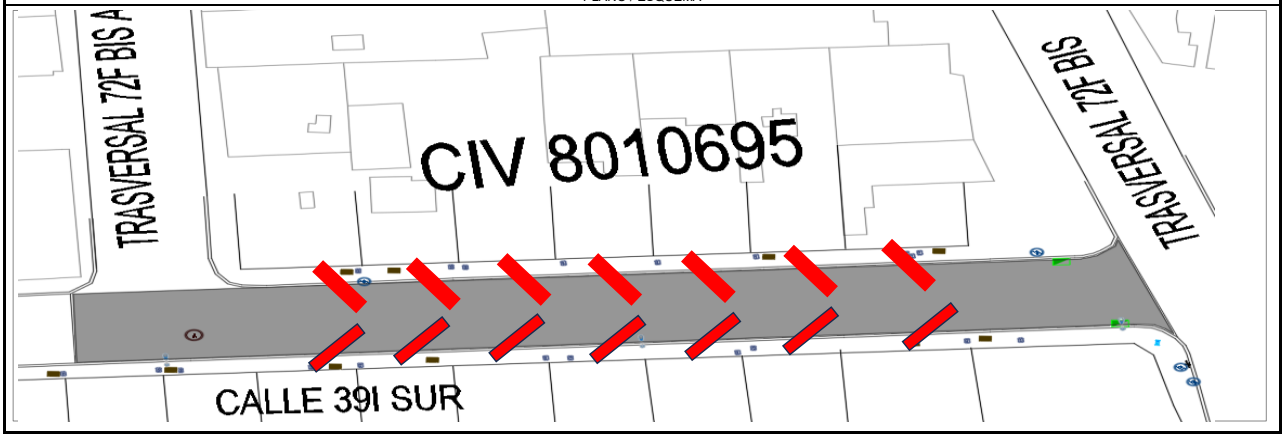

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1/8 : Contratista.
2da : Dependencia responsable del contrato.
copia

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72P BIS Y CARRERA 72P BIS A								
Relleno para redes - tramos sanitarios					area seccion				
	NC27 - TRAMO 1		6,60	1,00	0,185				1,22
	se anexa cartera topografica								
	NC27 - TRAMO 2		53,90	1,00	0,185				9,97
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de domiciliarias					area seccion				
	NC27 - TRAMO 1		77,95	0,60	0,097				7,53
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 1		diametro excav	area excavacion					
	PZ CMP119809-A		2,20	3,80	0,10				0,38
	se anexa cartera topografica								
relleno base instalacion de sumideros									
	costado norte								
	Triturado para instal de sumidero	K0+060,80	1,40	1,10	0,10				0,15
	costado sur								
	Triturado para instal de sumidero	K0+062,80	1,40	1,10	0,10				0,15
relleno para instalacion tuberia de sumideros - base carcamo									
	costado norte								
	Triturado para tub de sumidero	K0+060,80	11,40	1,00	0,10				1,14
	costado sur								
	Triturado para tub de sumidero	K0+062,80	8,20	1,00	0,10				0,82
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									21,37
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									21,37
TOTAL POR EJECUTAR									

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

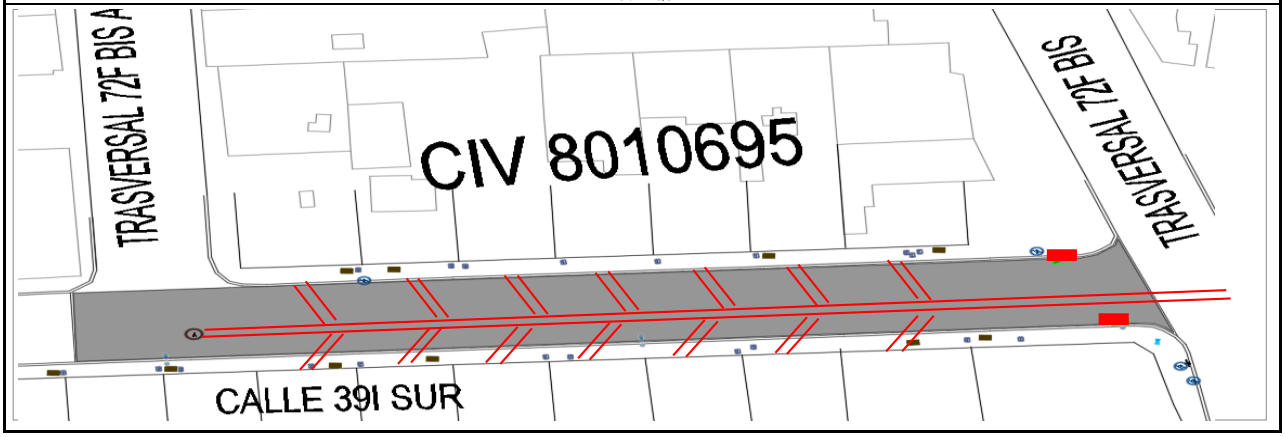

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
placa de cubierta - construccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 1								
	PZ CMP119809-A							1,00	1,00
	se anexa cartera topografica								
placa de cubierta - Reconstruccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 2								
	PZ CMP107278							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

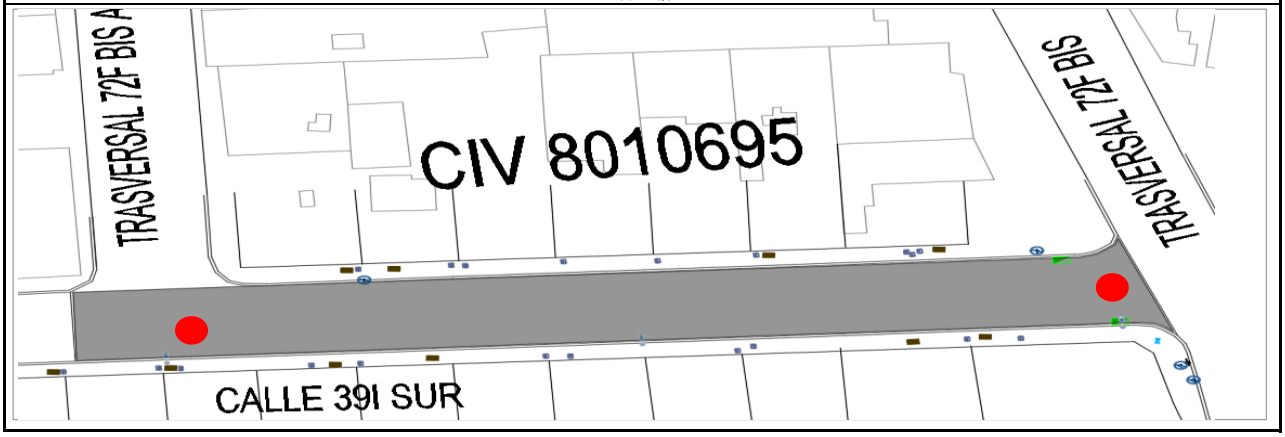

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original y 1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
mamposteria - construccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 1		a	b	a-b=c	d			c-d
	PZ CMP119809-A		2543,33	2541,54	1,79	0,25			1,54
	se anexa cartera topografica								
mamposteria - Reconstruccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 2				0,60				0,60
	PZ CMP107278								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,14
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,14
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

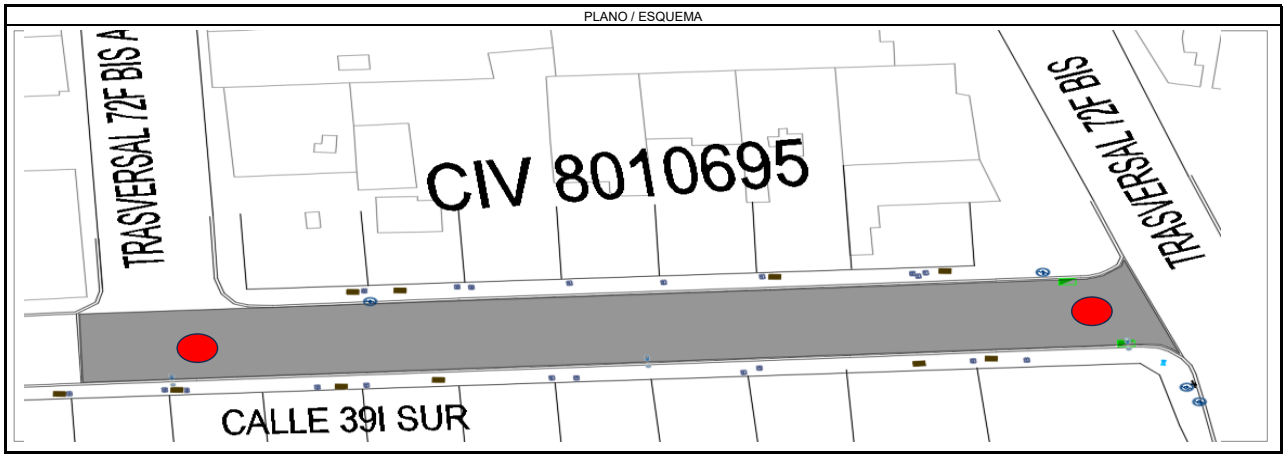

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
tuberia para conexcion de sumideros									
	costado norte	K0+060,80	11,80						11,80
	costado sur	K0+062,80	8,60						8,60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									20,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									20,40
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

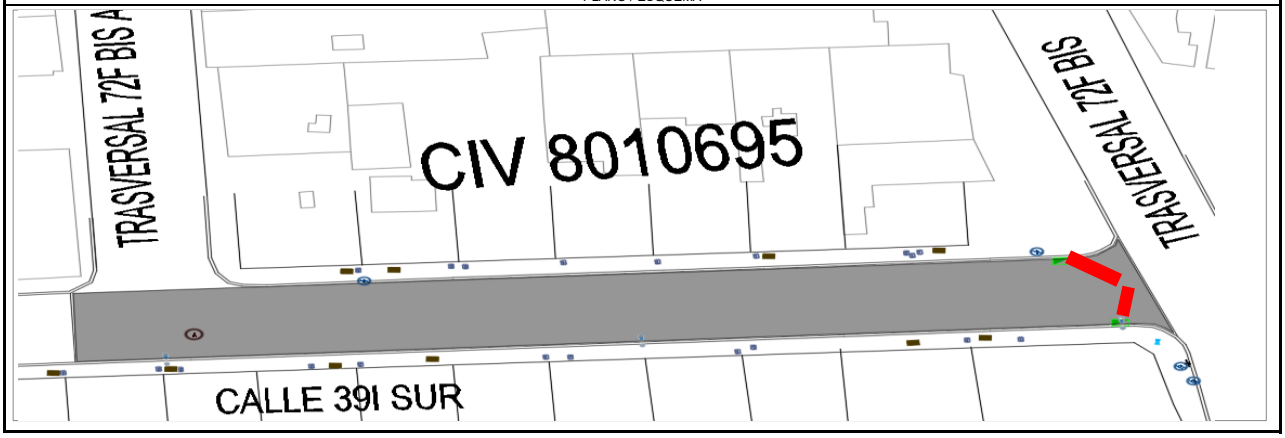

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Tuberia para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
		72F-50	7,50						7,50
		72F-43	4,90						4,90
		72F-53	5,00						5,00
		72F-57	5,40						5,40
		72F-54	7,20						7,20
		72F-61	4,85						4,85
		72F-58	6,50						6,50
		72F-62	6,10						6,10
		72F-65	4,70						4,70
		72F-66	6,10						6,10
		72F-70	6,20						6,20
		72F-73	3,90						3,90
		72F-72	5,20						5,20
		72F-77	4,40						4,40

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	77,95
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	77,95
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

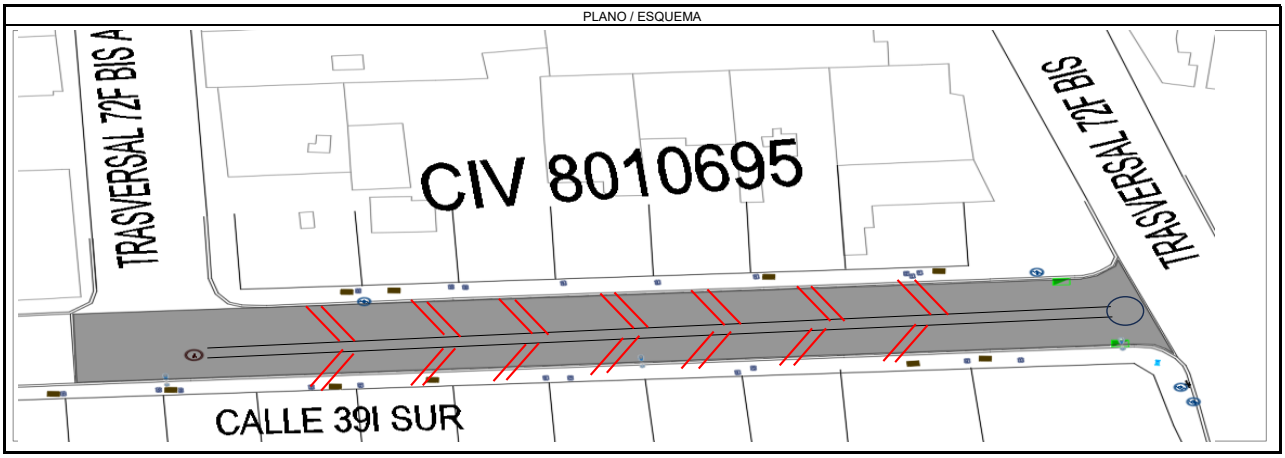

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LONG ENTRE EJES POZO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Tuberia para redes - tramos sanitarios									
	NC27 - TRAMO 1		8,55			-1,20			7,35
	se anexa cartera topografica								
	NC27 - TRAMO 2		55,85			-1,20			54,65
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									62,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									62,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

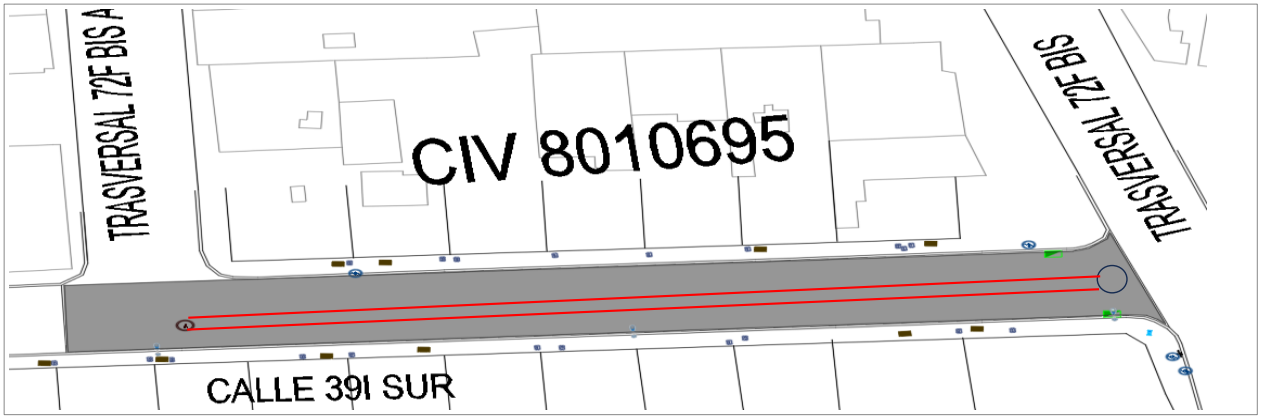

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original 1ra : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
nivelacion y compactacion de subrasante de via									
	subrasante de diseño		67,40	7,00					471,80
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-1,00	-2,27
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									467,37
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									467,37
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

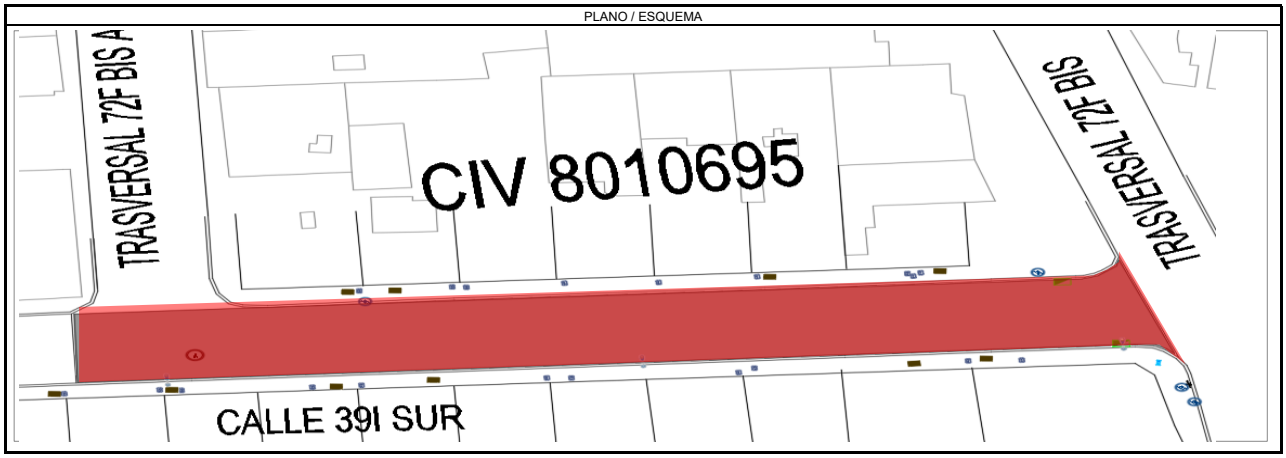

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original 1ra : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	20/03/2026	CIV	8010695		ESTRUCTURA DE VIA	0,540
				PRIORIDAD:	NC	27		

CARTERA DE:	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2542,964	2542,999	2543,034	2543,006	2542,977	2542,964	2542,999	2543,034	2543,006	2542,977	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2542,980	2543,015	2543,050	2543,015	2542,980	2542,980	2543,015	2543,050	2543,015	2542,980	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2542,985	2543,020	2543,055	2543,020	2542,985	2542,985	2543,020	2543,055	2543,020	2542,985	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2542,960	2542,995	2543,030	2542,995	2542,960	2542,960	2542,995	2543,030	2542,995	2542,960	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2542,935	2542,970	2543,005	2542,970	2542,935	2542,935	2542,970	2543,005	2542,970	2542,935	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2542,885	2542,920	2542,955	2542,920	2542,885	2542,885	2542,920	2542,955	2542,920	2542,885	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2542,860	2542,895	2542,930	2542,895	2542,860	2542,860	2542,895	2542,930	2542,895	2542,860	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2542,835	2542,870	2542,905	2542,870	2542,835	2542,835	2542,870	2542,905	2542,870	2542,835	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2542,810	2542,845	2542,880	2542,845	2542,810	2542,810	2542,845	2542,880	2542,845	2542,810	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2542,785	2542,820	2542,855	2542,820	2542,785	2542,785	2542,820	2542,855	2542,820	2542,785	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2542,760	2542,795	2542,830	2542,795	2542,760	2542,760	2542,795	2542,830	2542,795	2542,760	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2542,740	2542,775	2542,810	2542,830	2542,850	2542,740	2542,775	2542,810	2542,830	2542,850	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+067,40	2542,730	2542,785	2542,840	2542,850	2542,860	2542,730	2542,785	2542,840	2542,850	2542,860	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,800	0,000

			TOTAL	0,000	471,80	0,00
area	2,27		POZOS	-1	-2,27	0,00
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
				TOTAL	467,37	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,016 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
	Asfalto Caucho								
	estructura de via		67,40	7,00	0,070				33,03
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,070			-2,00	-0,32
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,070			-2,00	-0,15
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									32,56
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									32,56
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

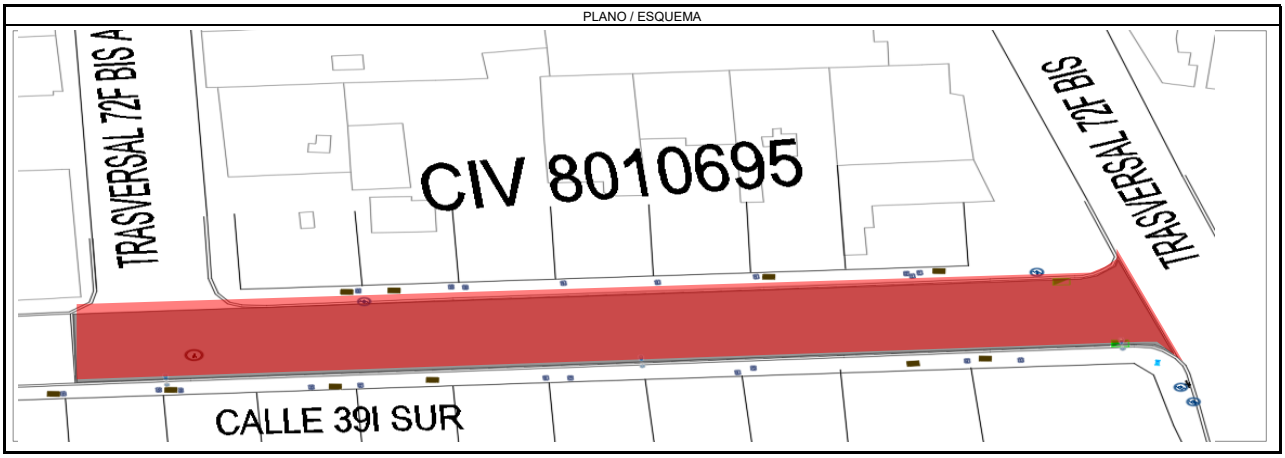

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,016 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8010695	
PRIORIDAD:	NC	27

MEZCLA ASFALTICA MCCH25 0,070

CARTERA DE:	MEZCLA ASFALTICA MCCH25	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	IMPRIMACION CRL-1					MEZCLA ASFALTICA MCCH25					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,384	2543,419	2543,454	2543,426	2543,397	2543,454	2543,489	2543,524	2543,496	2543,467	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
K0+005,00	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	2543,470	2543,505	2543,540	2543,505	2543,470	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+010,00	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	2543,500	2543,535	2543,570	2543,535	2543,500	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+015,00	2543,405	2543,440	2543,475	2543,440	2543,405	2543,475	2543,510	2543,545	2543,510	2543,475	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+020,00	2543,380	2543,415	2543,450	2543,415	2543,380	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+025,00	2543,355	2543,390	2543,425	2543,390	2543,355	2543,425	2543,460	2543,495	2543,460	2543,425	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+030,00	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+035,00	2543,305	2543,340	2543,375	2543,340	2543,305	2543,375	2543,410	2543,445	2543,410	2543,375	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+040,00	2543,280	2543,315	2543,350	2543,315	2543,280	2543,350	2543,385	2543,420	2543,385	2543,350	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+045,00	2543,255	2543,290	2543,325	2543,290	2543,255	2543,325	2543,360	2543,395	2543,360	2543,325	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+050,00	2543,230	2543,265	2543,300	2543,265	2543,230	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+055,00	2543,205	2543,240	2543,275	2543,240	2543,205	2543,275	2543,310	2543,345	2543,310	2543,275	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+060,00	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	2543,250	2543,285	2543,320	2543,285	2543,250	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+065,00	2543,160	2543,195	2543,230	2543,250	2543,270	2543,230	2543,265	2543,300	2543,320	2543,340	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+067,40	2543,150	2543,205	2543,260	2543,270	2543,280	2543,220	2543,275	2543,330	2543,340	2543,350	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	16,800	1,176
																TOTAL	0,070	471,80	33,03
														area	2,27	POZOS	-2	-4,54	-0,32
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,15
																	TOTAL	465,10	32,56

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,017 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Riego de liga sobre Asfalto McCh25									
	estructura de via		67,40	7,00					471,80
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-2,00	-4,54
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									465,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									465,10
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

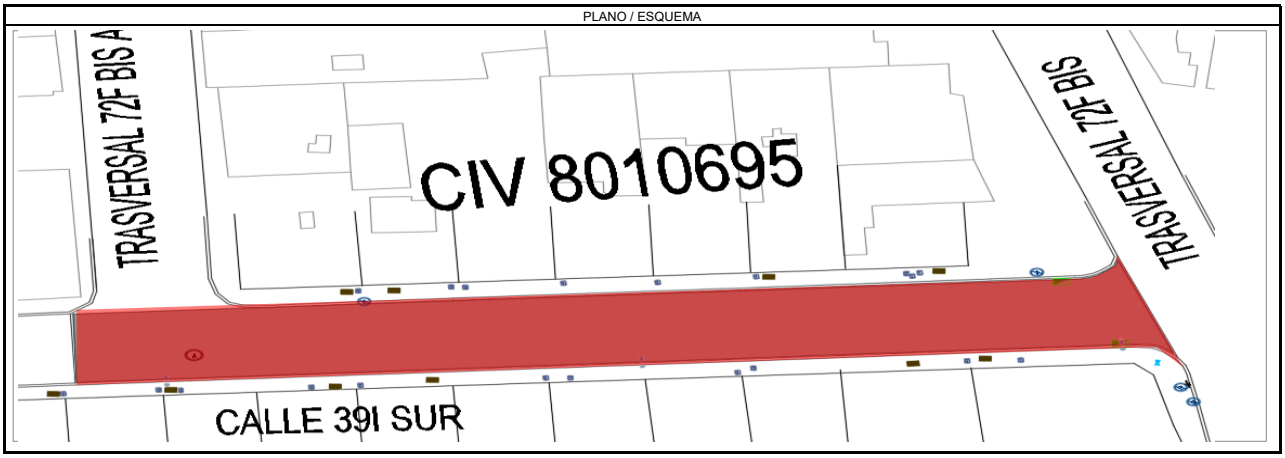

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,017 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original y 1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	20/03/2026	CIV	8010695		RIEGO DE LIGA CRR-1	0,000
				PRIORIDAD:	NC	27		

CARTERA DE:	RIEGO DE LIGA CRR-1	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	MEZCLA ASFALTICA MCCH2S					RIEGO DE LIGA CRR-1					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,454	2543,489	2543,524	2543,496	2543,467	2543,454	2543,489	2543,524	2543,496	2543,467	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2543,470	2543,505	2543,540	2543,505	2543,470	2543,470	2543,505	2543,540	2543,505	2543,470	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2543,500	2543,535	2543,570	2543,535	2543,500	2543,500	2543,535	2543,570	2543,535	2543,500	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2543,475	2543,510	2543,545	2543,510	2543,475	2543,475	2543,510	2543,545	2543,510	2543,475	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	2543,450	2543,485	2543,520	2543,485	2543,450	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2543,425	2543,460	2543,495	2543,460	2543,425	2543,425	2543,460	2543,495	2543,460	2543,425	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,375	2543,410	2543,445	2543,410	2543,375	2543,375	2543,410	2543,445	2543,410	2543,375	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2543,350	2543,385	2543,420	2543,385	2543,350	2543,350	2543,385	2543,420	2543,385	2543,350	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2543,325	2543,360	2543,395	2543,360	2543,325	2543,325	2543,360	2543,395	2543,360	2543,325	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	2543,300	2543,335	2543,370	2543,335	2543,300	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2543,275	2543,310	2543,345	2543,310	2543,275	2543,275	2543,310	2543,345	2543,310	2543,275	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2543,250	2543,285	2543,320	2543,285	2543,250	2543,250	2543,285	2543,320	2543,285	2543,250	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2543,230	2543,265	2543,300	2543,320	2543,340	2543,230	2543,265	2543,300	2543,320	2543,340	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+067,40	2543,220	2543,275	2543,330	2543,340	2543,350	2543,220	2543,275	2543,330	2543,340	2543,350	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,800	0,000

			TOTAL	0,000	471,80	0,00
area	2,27		POZOS	-2	-4,54	0,00
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
				TOTAL	465,10	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Demolicion - Reconstruccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 2							1,00	1,00
	PZ CMP107278								

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

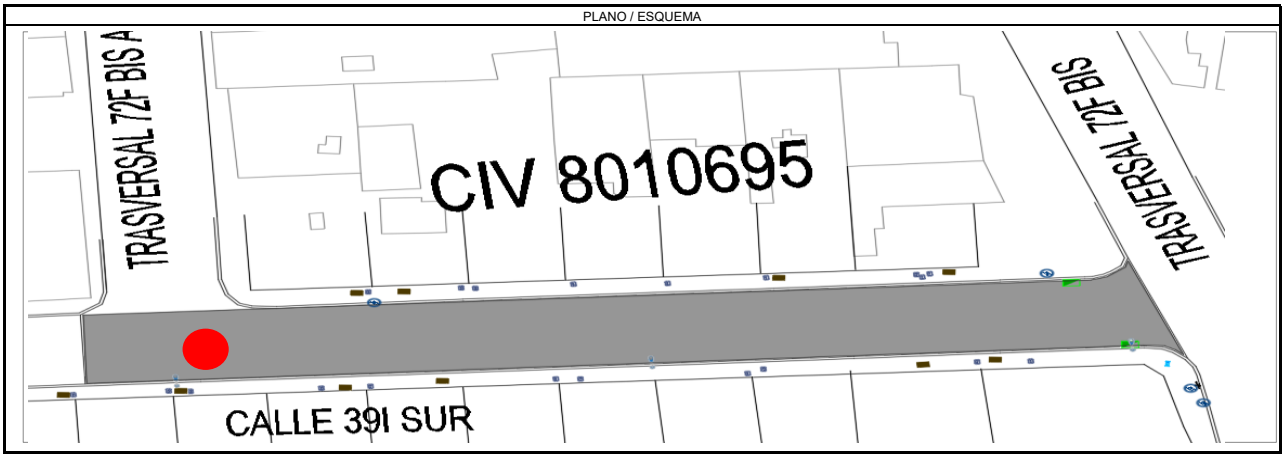

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Demolicion de sumidero existente									
	sumidero existente		K0+060,00	norte				1,00	1,00
	sumidero existente		K0+060,50	sur				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

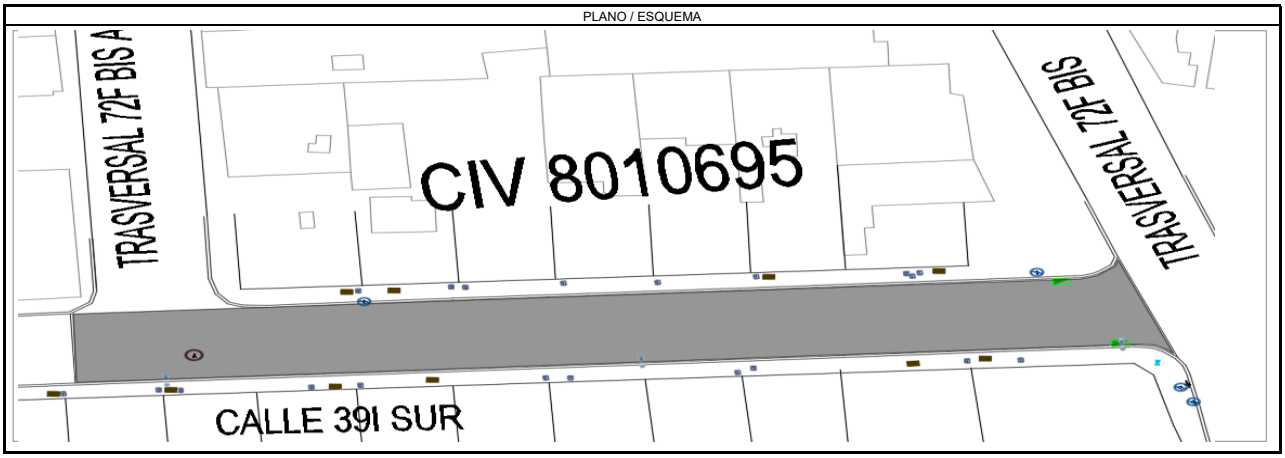

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Geocelda para estructura de via									
	estructura de via		67,40	7,00					471,80
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-2,00	-4,54
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	465,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	465,10
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

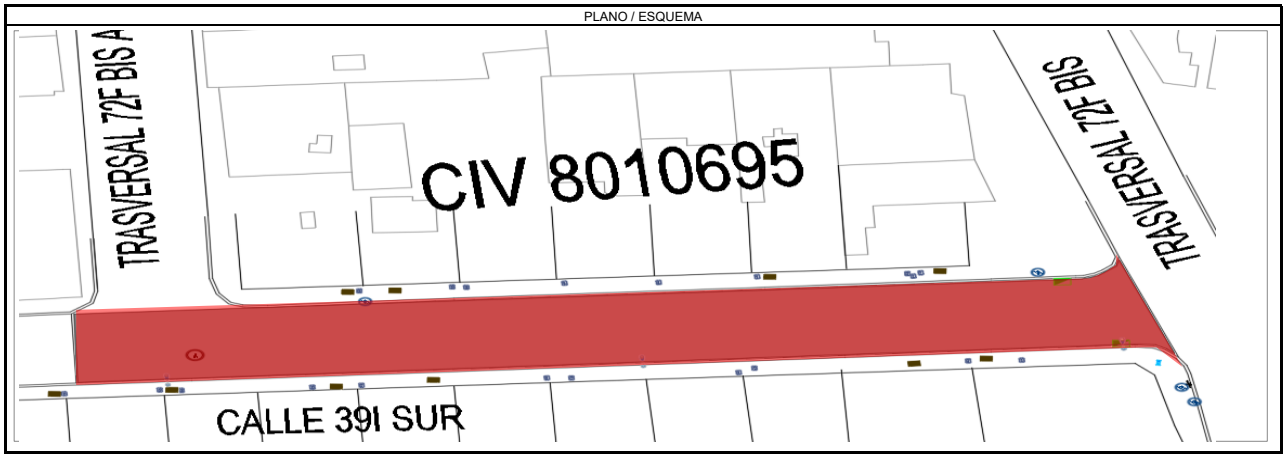

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original 1ra : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8010695	
PRIORIDAD:	NC	27

ESTRUCTURA DE VIA 0,540

CARTERA DE:	GEOCELDA h=15cm	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					GEOCELDA h=15cm					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2542,964	2542,999	2543,034	2543,006	2542,977	2542,964	2542,999	2543,034	2543,006	2542,977	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2542,980	2543,015	2543,050	2543,015	2542,980	2542,980	2543,015	2543,050	2543,015	2542,980	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2542,985	2543,020	2543,055	2543,020	2542,985	2542,985	2543,020	2543,055	2543,020	2542,985	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2542,960	2542,995	2543,030	2542,995	2542,960	2542,960	2542,995	2543,030	2542,995	2542,960	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2542,935	2542,970	2543,005	2542,970	2542,935	2542,935	2542,970	2543,005	2542,970	2542,935	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2542,885	2542,920	2542,955	2542,920	2542,885	2542,885	2542,920	2542,955	2542,920	2542,885	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2542,860	2542,895	2542,930	2542,895	2542,860	2542,860	2542,895	2542,930	2542,895	2542,860	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2542,835	2542,870	2542,905	2542,870	2542,835	2542,835	2542,870	2542,905	2542,870	2542,835	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2542,810	2542,845	2542,880	2542,845	2542,810	2542,810	2542,845	2542,880	2542,845	2542,810	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2542,785	2542,820	2542,855	2542,820	2542,785	2542,785	2542,820	2542,855	2542,820	2542,785	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2542,760	2542,795	2542,830	2542,795	2542,760	2542,760	2542,795	2542,830	2542,795	2542,760	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2542,740	2542,775	2542,810	2542,830	2542,850	2542,740	2542,775	2542,810	2542,830	2542,850	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+067,40	2542,730	2542,785	2542,840	2542,850	2542,860	2542,730	2542,785	2542,840	2542,850	2542,860	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,800	0,000

				TOTAL	0,000	471,80	0,00
				POZOS	-2	-4,54	0,00
area	2,27			SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
sumidero	1,08				TOTAL	465,10	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
					altura media				
Relleno para redes - tramos sanitarios									
	NC27 - TRAMO 1		6,60	1,00	1,430				9,44
	se anexa cartera topografica								
	NC27 - TRAMO 2		53,90	1,00	0,955				51,48
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion domiciliarias									
	NC27 - TRAMO 2		77,95	0,60	0,776				36,30
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 1	cota subrasante	cota clave	cota fondo	alt relleno	diametro excva	diametro pozo	diferencia areas	
	PZ CMP119809-A	2542,79	2541,85	2541,29	1,50	2,20	1,70	1,53	2,29
	se anexa cartera topografica								
relleno para instalacion tuberia de sumideros - base carcamo									
	costado norte								
	B200 para tub de sumidero - cruce calle 39I	K0+060,80	7,10	1,00	0,42				2,98
	costado sur								
	B200 para tub de sumidero - cruce calle 39I	K0+062,80	4,70	1,00	0,42				1,97
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									104,46
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									104,46
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

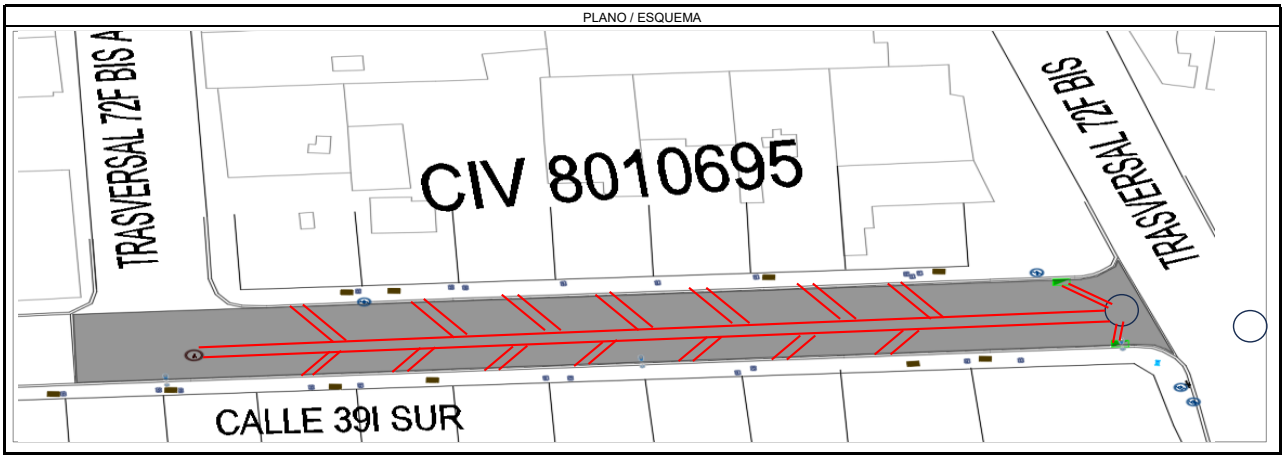

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Silla Y para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
		72F-50						1,00	1,00
		72F-43						1,00	1,00
		72F-53						1,00	1,00
		72F-57						1,00	1,00
		72F-54						1,00	1,00
		72F-61						1,00	1,00
		72F-58						1,00	1,00
		72F-62						1,00	1,00
		72F-65						1,00	1,00
		72F-66						1,00	1,00
		72F-70						1,00	1,00
		72F-73						1,00	1,00
		72F-72						1,00	1,00
		72F-77						1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	14,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	14,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

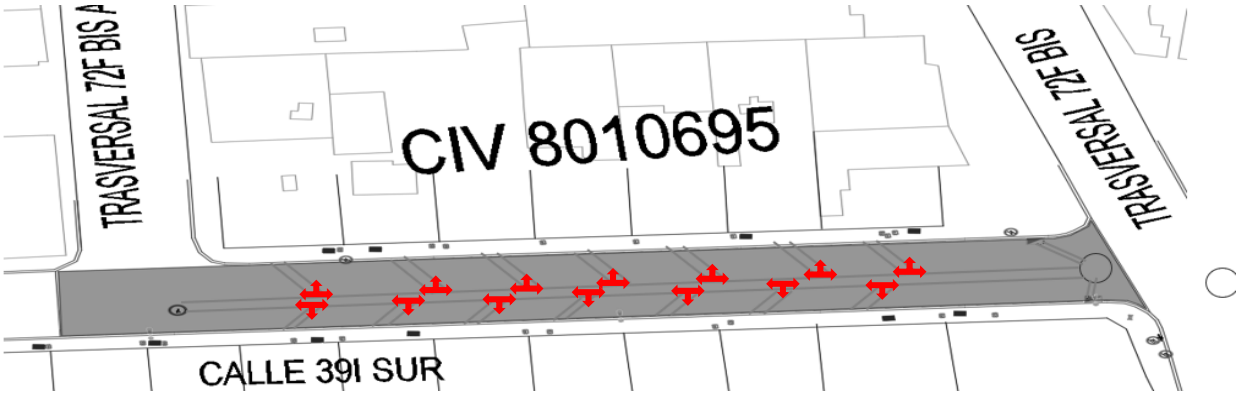

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Codo para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
		72F-50						1,00	1,00
		72F-43							
		72F-53							
		72F-57						1,00	1,00
		72F-54							
		72F-61						1,00	1,00
		72F-58						1,00	1,00
		72F-62						1,00	1,00
		72F-65						1,00	1,00
		72F-66						1,00	1,00
		72F-70						1,00	1,00
		72F-73						1,00	1,00
		72F-72						1,00	1,00
		72F-77						1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	11,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

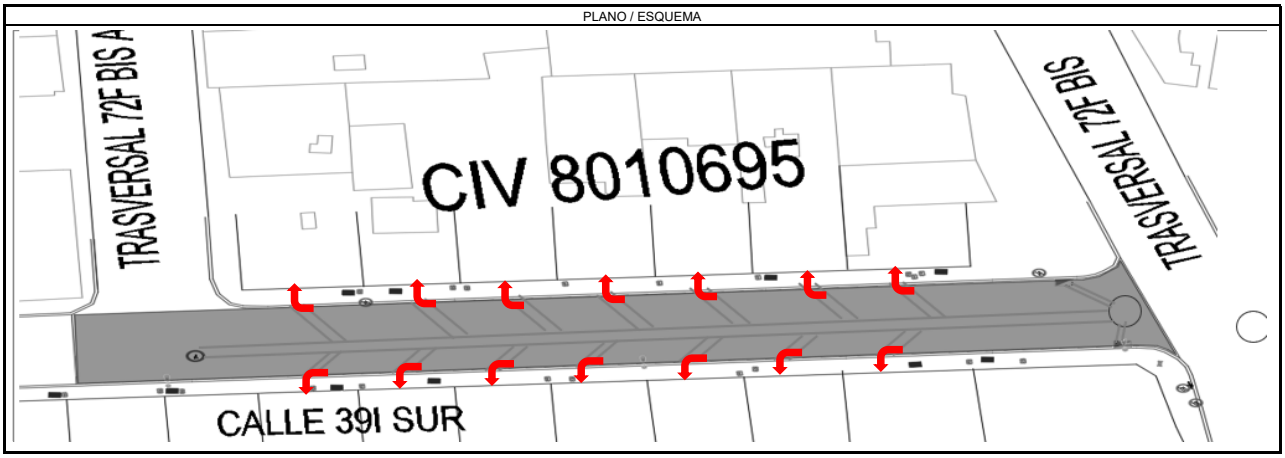

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original 1ra : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,025 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
placa de fondo - construccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 1								
	PZ CMP119809-A							1,00	1,00
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

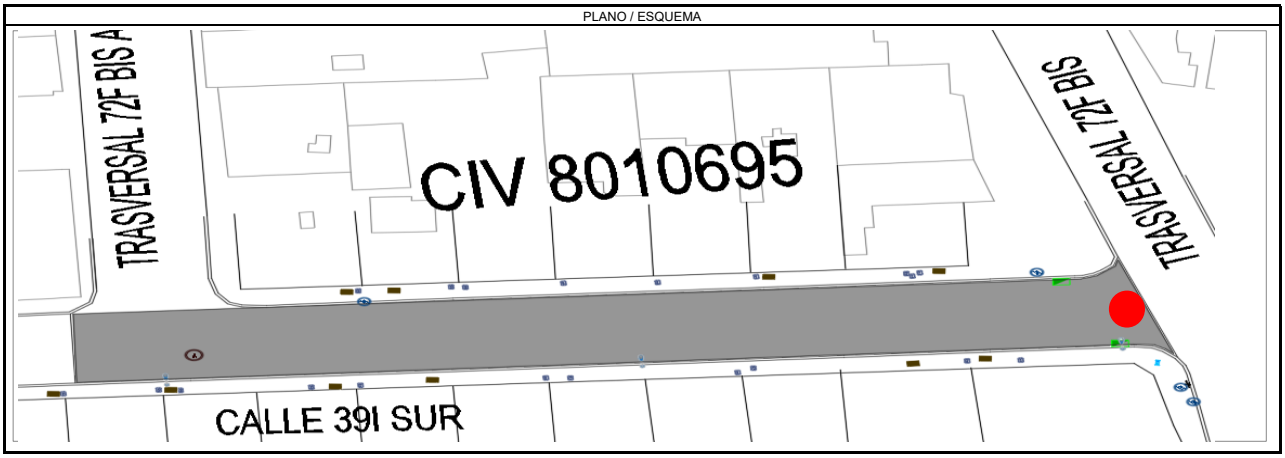

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,025 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,032 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD CARAS	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Entibado para redes - tramos sanitarios									
	NC27 - TRAMO 1		6,60	1,00	1,979			2,00	26,12
	se anexa cartera topografica								
Entibado para redes - construccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 1		2,20		1,979			2,00	8,71
	PZ CMP119809-A								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									34,83
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									34,83
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

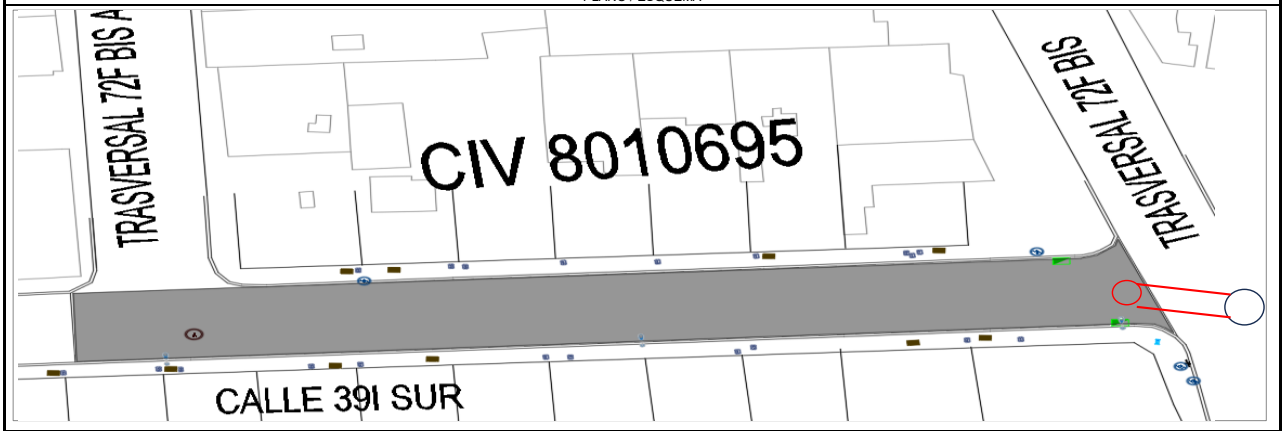

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,032 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original 1ra : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,033 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Imprimacion sobre base granular para pavimento									
	estructura de via		67,40	7,00					471,80
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-2,00	-4,54
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									465,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									465,10
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

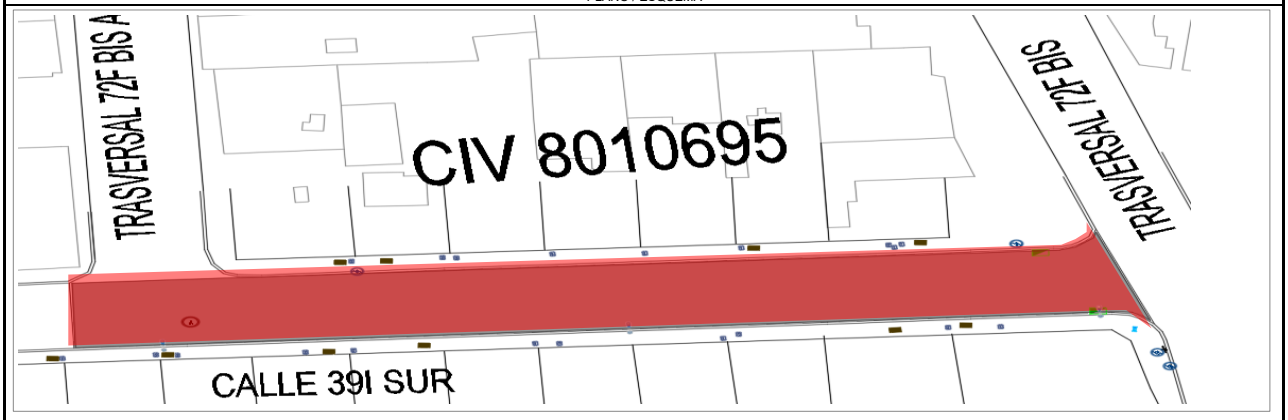

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,033 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	20/03/2026	CIV	8010695		IMPRIMACION CRL-1	0,000
				PRIORIDAD:	NC	27		

CARTERA DE:	IMPRIMACION CRL-1	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	BASE GRANULAR AR_BG38					IMPRIMACION CRL-1					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,384	2543,419	2543,454	2543,426	2543,397	2543,384	2543,419	2543,454	2543,426	2543,397	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2543,405	2543,440	2543,475	2543,440	2543,405	2543,405	2543,440	2543,475	2543,440	2543,405	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2543,380	2543,415	2543,450	2543,415	2543,380	2543,380	2543,415	2543,450	2543,415	2543,380	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2543,355	2543,390	2543,425	2543,390	2543,355	2543,355	2543,390	2543,425	2543,390	2543,355	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,305	2543,340	2543,375	2543,340	2543,305	2543,305	2543,340	2543,375	2543,340	2543,305	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2543,280	2543,315	2543,350	2543,315	2543,280	2543,280	2543,315	2543,350	2543,315	2543,280	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2543,255	2543,290	2543,325	2543,290	2543,255	2543,255	2543,290	2543,325	2543,290	2543,255	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2543,230	2543,265	2543,300	2543,265	2543,230	2543,230	2543,265	2543,300	2543,265	2543,230	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2543,205	2543,240	2543,275	2543,240	2543,205	2543,205	2543,240	2543,275	2543,240	2543,205	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2543,160	2543,195	2543,230	2543,250	2543,270	2543,160	2543,195	2543,230	2543,250	2543,270	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+067,40	2543,150	2543,205	2543,260	2543,270	2543,280	2543,150	2543,205	2543,260	2543,270	2543,280	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,800	0,000

				TOTAL	0,000	471,80	0,00
area	2,27			POZOS	-2	-4,54	0,00
sumidero	1,08			SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
				TOTAL		465,10	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,038 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
dado en concreto para empalme de domiciliarias a redes existentes		predio							
		72F-50	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-43	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-53	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-57	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-54	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-61	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-58	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-62	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-65	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-66	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-70	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-73	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-72	0,30	0,40	0,40				0,048
		72F-77	0,30	0,40	0,40				0,048

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	0,67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	0,67
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

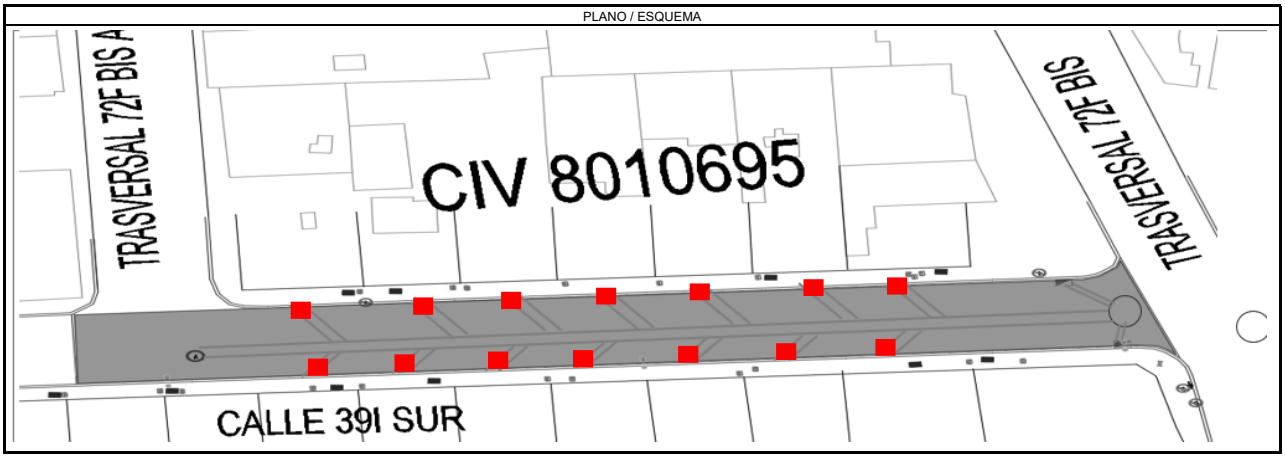

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,038 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Movilizacion de equipo para construccion de segmento vial									
	equipo de demolicion y excavacion							1,00	1,00
	equipo para rellen - perfilado - compactacion							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

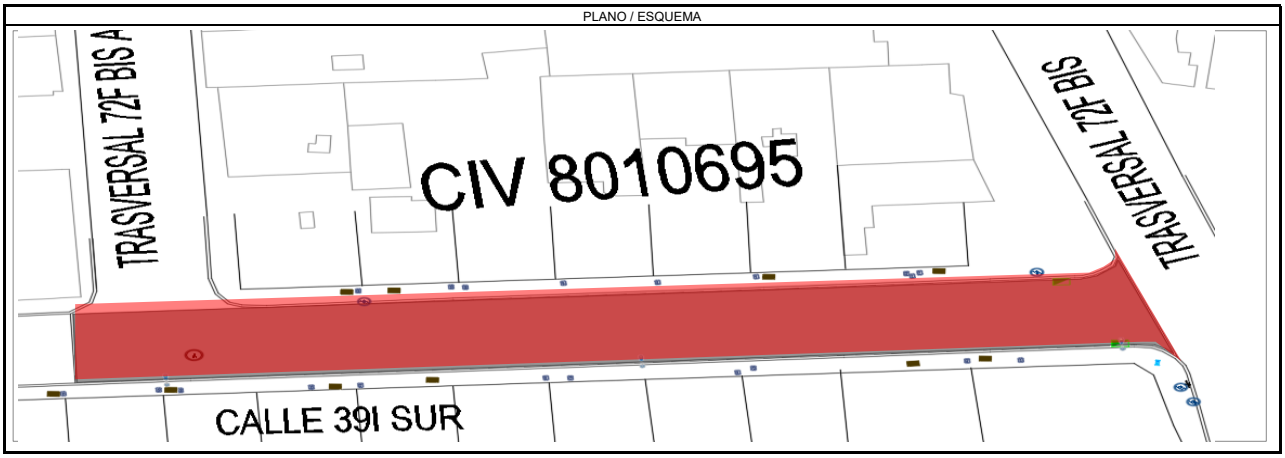

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
relleno con subbase granular AR_SBG50 para estructura de via									
	estructura de via		67,40	7,00	0,250				117,95
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,250			-2,00	-1,14
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,250			-2,00	-0,54

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	116,28
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	116,28
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

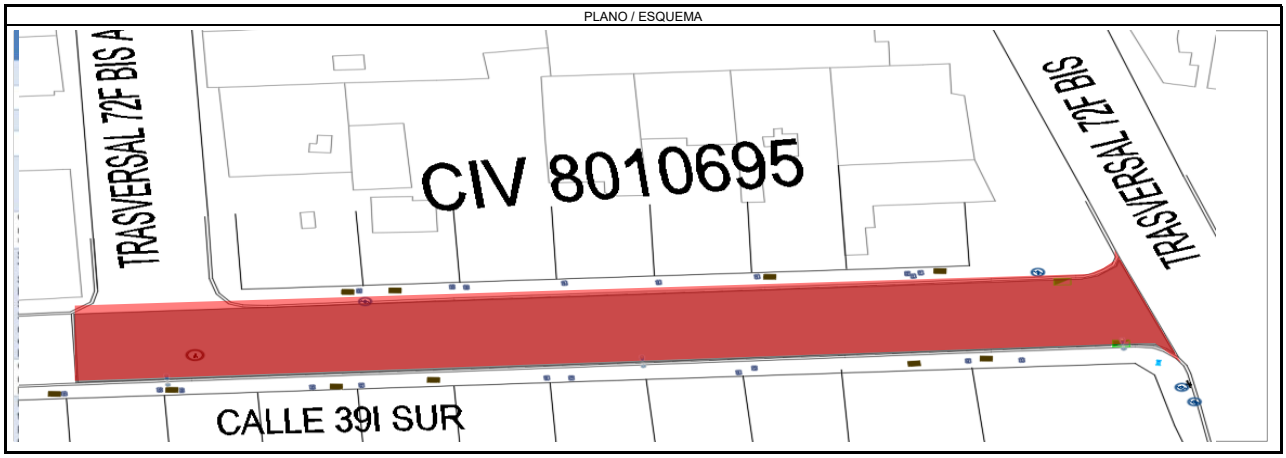

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original y 1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8010695	
PRIORIDAD:	NC	27

JB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG 0,250

CARTERA DE:	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2542,964	2542,999	2543,034	2543,006	2542,977	2543,214	2543,249	2543,284	2543,256	2543,227	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
K0+005,00	2542,980	2543,015	2543,050	2543,015	2542,980	2543,230	2543,265	2543,300	2543,265	2543,230	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+010,00	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	2543,260	2543,295	2543,330	2543,295	2543,260	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+015,00	2542,985	2543,020	2543,055	2543,020	2542,985	2543,235	2543,270	2543,305	2543,270	2543,235	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+020,00	2542,960	2542,995	2543,030	2542,995	2542,960	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+025,00	2542,935	2542,970	2543,005	2542,970	2542,935	2543,185	2543,220	2543,255	2543,220	2543,185	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+030,00	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	2543,160	2543,195	2543,230	2543,195	2543,160	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+035,00	2542,885	2542,920	2542,955	2542,920	2542,885	2543,135	2543,170	2543,205	2543,170	2543,135	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+040,00	2542,860	2542,895	2542,930	2542,895	2542,860	2543,110	2543,145	2543,180	2543,145	2543,110	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+045,00	2542,835	2542,870	2542,905	2542,870	2542,835	2543,085	2543,120	2543,155	2543,120	2543,085	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+050,00	2542,810	2542,845	2542,880	2542,845	2542,810	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+055,00	2542,785	2542,820	2542,855	2542,820	2542,785	2543,035	2543,070	2543,105	2543,070	2543,035	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+060,00	2542,760	2542,795	2542,830	2542,795	2542,760	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+065,00	2542,740	2542,775	2542,810	2542,830	2542,850	2542,990	2543,025	2543,060	2543,080	2543,100	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+067,40	2542,730	2542,785	2542,840	2542,850	2542,860	2542,980	2543,035	2543,090	2543,100	2543,110	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	16,800	4,200

			TOTAL	0,250	471,80	117,95
area	2,27		POZOS	-2	-4,54	-1,14
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,54
			TOTAL		465,10	116,28

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN ÍTEM **DEL** GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Geotextil para estructura de via									
	subrasante de diseño		67,40	7,50					505,50
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-2,00	-4,54
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									498,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									498,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

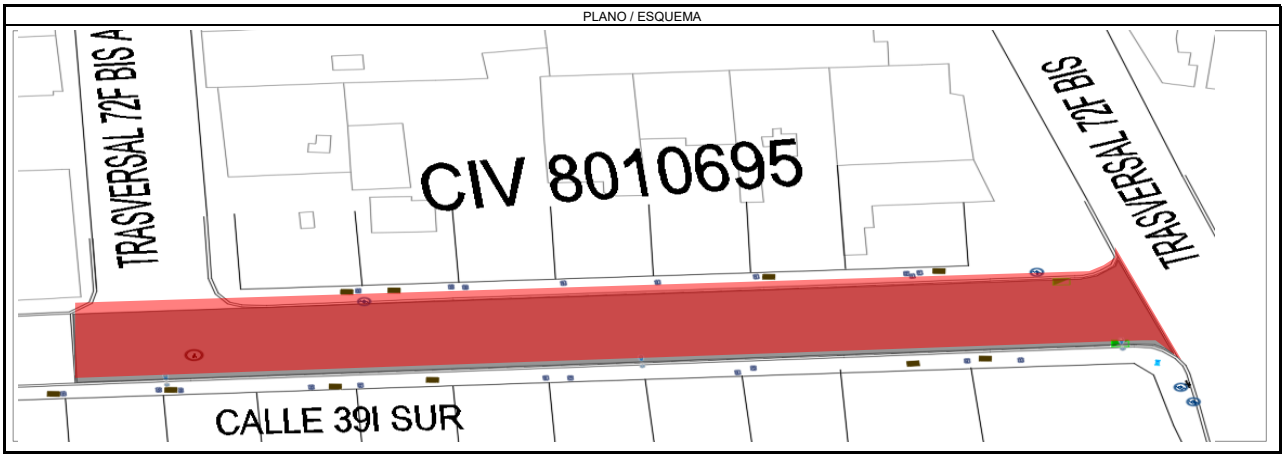

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	20/03/2026	CIV	8010695
				PRIORIDAD:	NC 27

GEOTEXTIL 0,540

CARTERA DE:	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,50

ABSCISA (m)	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2542,964	2542,999	2543,034	2543,006	2542,977	2542,964	2542,999	2543,034	2543,006	2542,977	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2542,980	2543,015	2543,050	2543,015	2542,980	2542,980	2543,015	2543,050	2543,015	2542,980	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+010,00	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+015,00	2542,985	2543,020	2543,055	2543,020	2542,985	2542,985	2543,020	2543,055	2543,020	2542,985	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+020,00	2542,960	2542,995	2543,030	2542,995	2542,960	2542,960	2542,995	2543,030	2542,995	2542,960	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+025,00	2542,935	2542,970	2543,005	2542,970	2542,935	2542,935	2542,970	2543,005	2542,970	2542,935	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+030,00	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	2542,910	2542,945	2542,980	2542,945	2542,910	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+035,00	2542,885	2542,920	2542,955	2542,920	2542,885	2542,885	2542,920	2542,955	2542,920	2542,885	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+040,00	2542,860	2542,895	2542,930	2542,895	2542,860	2542,860	2542,895	2542,930	2542,895	2542,860	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+045,00	2542,835	2542,870	2542,905	2542,870	2542,835	2542,835	2542,870	2542,905	2542,870	2542,835	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+050,00	2542,810	2542,845	2542,880	2542,845	2542,810	2542,810	2542,845	2542,880	2542,845	2542,810	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+055,00	2542,785	2542,820	2542,855	2542,820	2542,785	2542,785	2542,820	2542,855	2542,820	2542,785	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+060,00	2542,760	2542,795	2542,830	2542,795	2542,760	2542,760	2542,795	2542,830	2542,795	2542,760	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+065,00	2542,740	2542,775	2542,810	2542,830	2542,850	2542,740	2542,775	2542,810	2542,830	2542,850	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+067,40	2542,730	2542,785	2542,840	2542,850	2542,860	2542,730	2542,785	2542,840	2542,850	2542,860	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	0,000
																TOTAL	0,000	505,50	0,00
																POZOS	-2	-4,54	0,00
																SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	498,80	0,00

area	2,27
sumidero	1,08

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Geomalla para estructura de via									
	estructura de via		67,40	7,00					471,80
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-2,00	-4,54
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									465,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									465,10
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

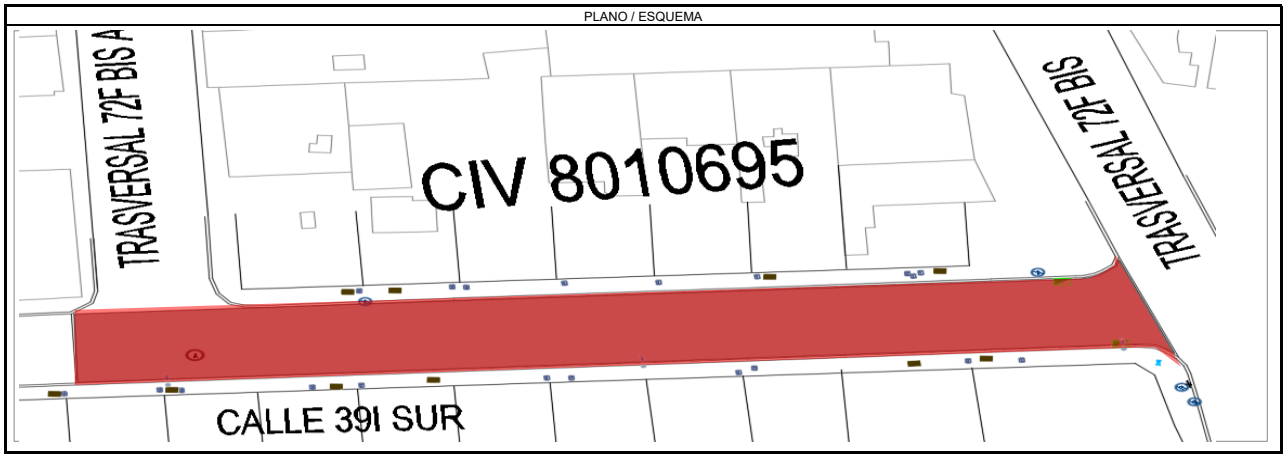

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8010695	
PRIORIDAD:	NC	27

ESTRUCTURA DE VIA 0,540

CARTERA DE:	GEOMALLA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					GEOMALLA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,214	2543,249	2543,284	2543,256	2543,227	2543,214	2543,249	2543,284	2543,256	2543,227	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2543,230	2543,265	2543,300	2543,265	2543,230	2543,230	2543,265	2543,300	2543,265	2543,230	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2543,260	2543,295	2543,330	2543,295	2543,260	2543,260	2543,295	2543,330	2543,295	2543,260	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2543,235	2543,270	2543,305	2543,270	2543,235	2543,235	2543,270	2543,305	2543,270	2543,235	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2543,185	2543,220	2543,255	2543,220	2543,185	2543,185	2543,220	2543,255	2543,220	2543,185	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2543,160	2543,195	2543,230	2543,195	2543,160	2543,160	2543,195	2543,230	2543,195	2543,160	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,135	2543,170	2543,205	2543,170	2543,135	2543,135	2543,170	2543,205	2543,170	2543,135	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,00	2543,110	2543,145	2543,180	2543,145	2543,110	2543,110	2543,145	2543,180	2543,145	2543,110	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+045,00	2543,085	2543,120	2543,155	2543,120	2543,085	2543,085	2543,120	2543,155	2543,120	2543,085	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+050,00	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+055,00	2543,035	2543,070	2543,105	2543,070	2543,035	2543,035	2543,070	2543,105	2543,070	2543,035	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+060,00	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+065,00	2542,990	2543,025	2543,060	2543,080	2543,100	2542,990	2543,025	2543,060	2543,080	2543,100	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+067,40	2542,980	2543,035	2543,090	2543,100	2543,110	2542,980	2543,035	2543,090	2543,100	2543,110	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,800	0,000

			TOTAL	0,000	471,80	0,00
area	2,27		POZOS	-2	-4,54	0,00
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
				TOTAL	465,10	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Estabilizacion de material granular									
	estructura de via Base granular	BG38	67,40	7,00	0,170		1,30		104,27
	pozos existentes	area	2,27		0,170		1,30	-2,00	-1,00
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,170		1,30	-2,00	-0,48

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	102,79
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	102,79
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

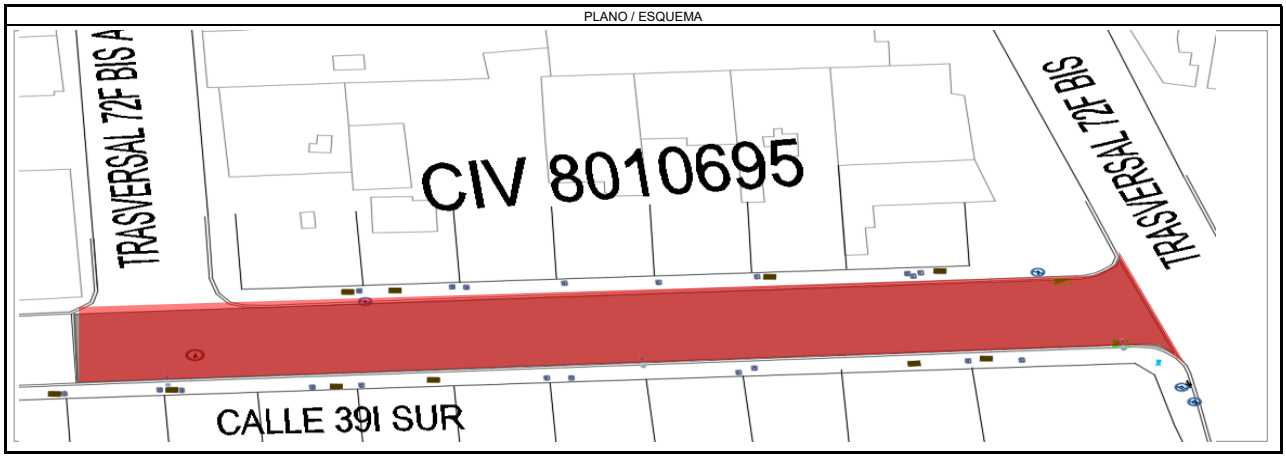

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Inyeccion de Cal a perforaciones									
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+001,50	A		B				
		K0+066,00	64,5000	7,0000	6,3000				
corredor tuberia sanitaria	numero de lineas transversales	-1,00	(B/0.70)+1(-1)	C	9,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	46,0714				
	cantidad de barrenos		C*D	9,0000	46,0000				414,00
	pozos existentes - construidos		-2,00					5,00	-10,00
	sumideros construidos		-2,00					4,00	-8,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
C					D				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									396,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									396,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

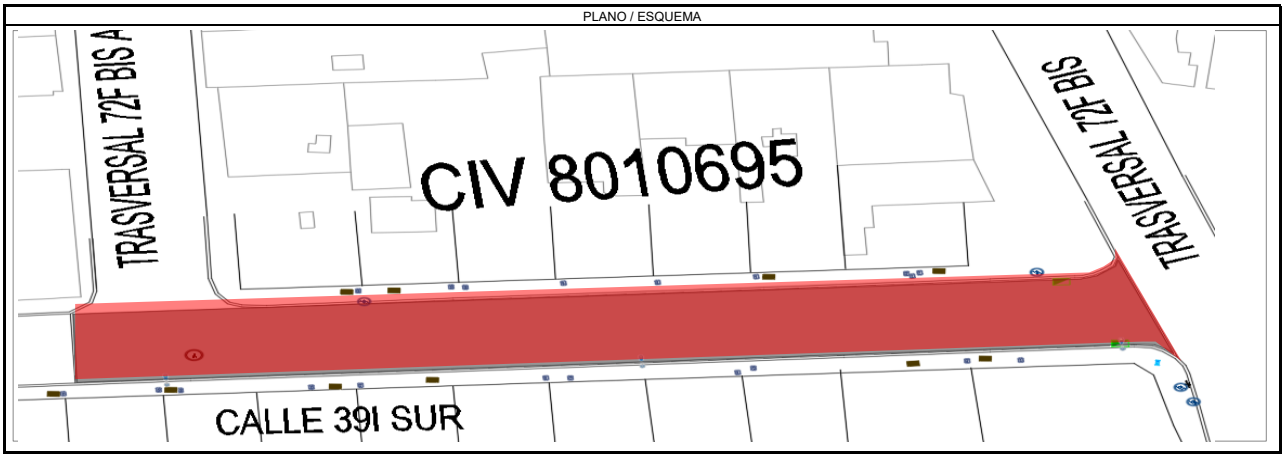

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
carcamo para proteccion tuberia conexión de sumideros									
	costado norte	K0+060,80	11,40						11,40
	costado sur	K0+062,80	8,20						8,20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									19,60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									19,60
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

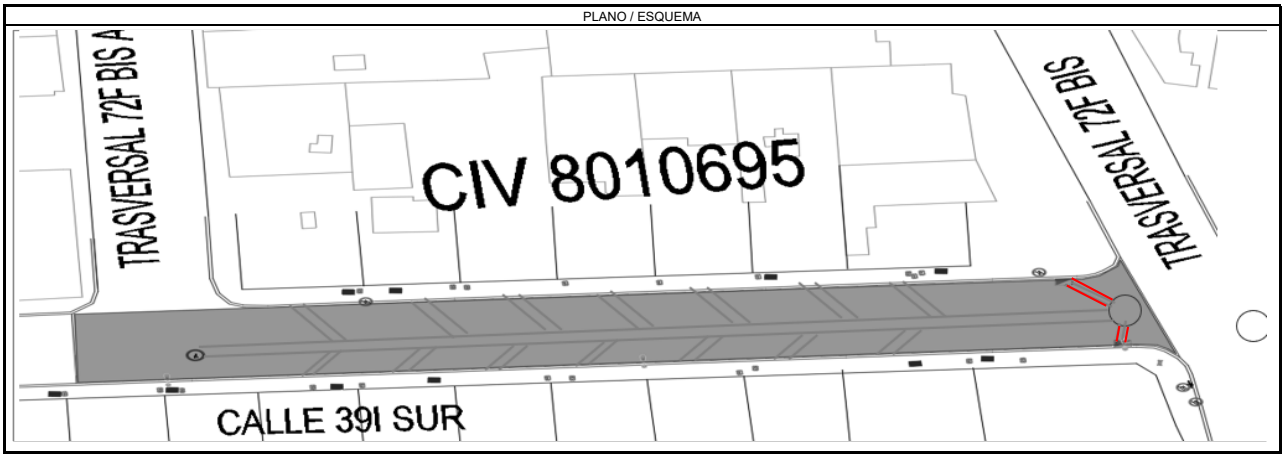

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original 1ra : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
placa de cubierta - construccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 1								
	PZ CMP119809-A							1,00	1,00
	se anexa cartera topografica								
placa de cubierta - Reconstruccion de pozos									
	NC27 - TRAMO 2								
	PZ CMP107278							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

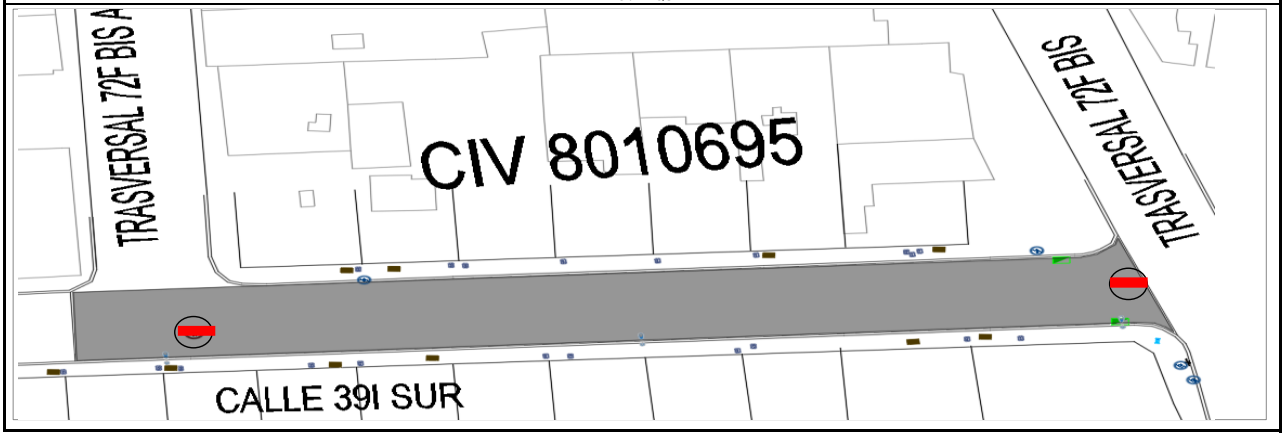

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
	perforaciones de 4"								
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+001,50	A		B				
		K0+066,00	64,5000	7,0000	6,3000				
corredor tuberia sanitaria	numero de lineas transversales	-1,00	(B/0.70)+1(-1)	C	9,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	46,0714				
	cantidad de barrenos		C*D	9,0000	46,0000				414,00
	pozos existentes - construidos		-2,00					5,00	-10,00
	sumideros construidos		-2,00					4,00	-8,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
			C		D				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									396,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									396,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

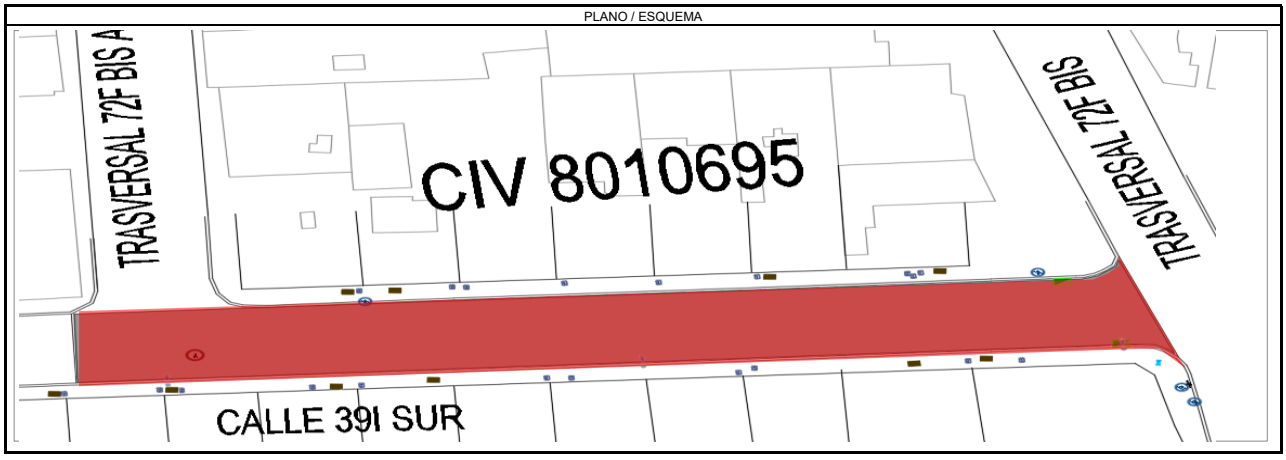

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
Construccion de sumideros									
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+060,80	norte				1,00	1,00
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+062,80	sur				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

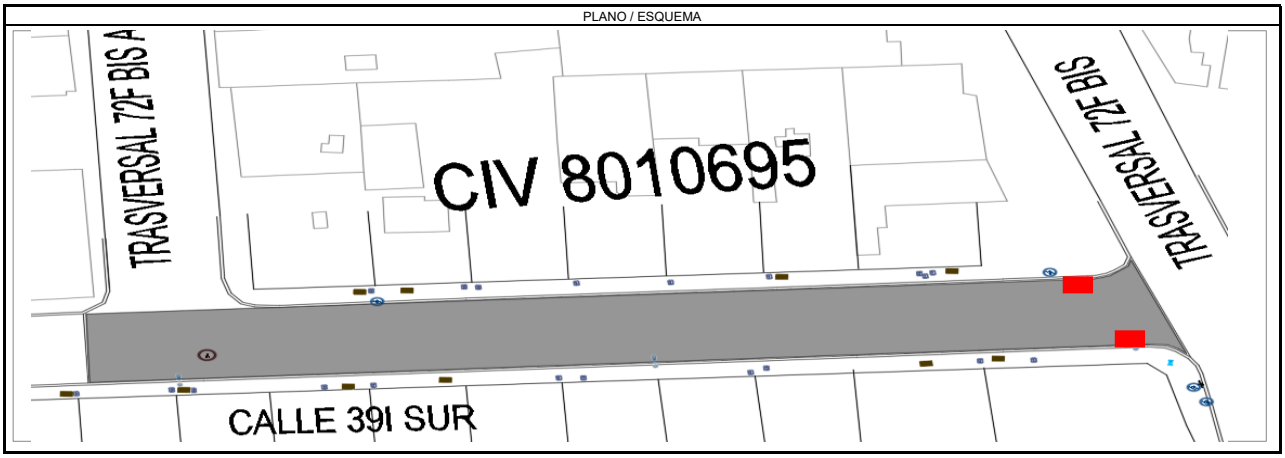

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010695	CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A								
relleno con base granular AR_BG38 para estructura de via									
	estructura de via		67,40	7,00	0,170				80,21
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,170			-2,00	-0,77
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,170			-2,00	-0,37
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									79,07
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									79,07
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

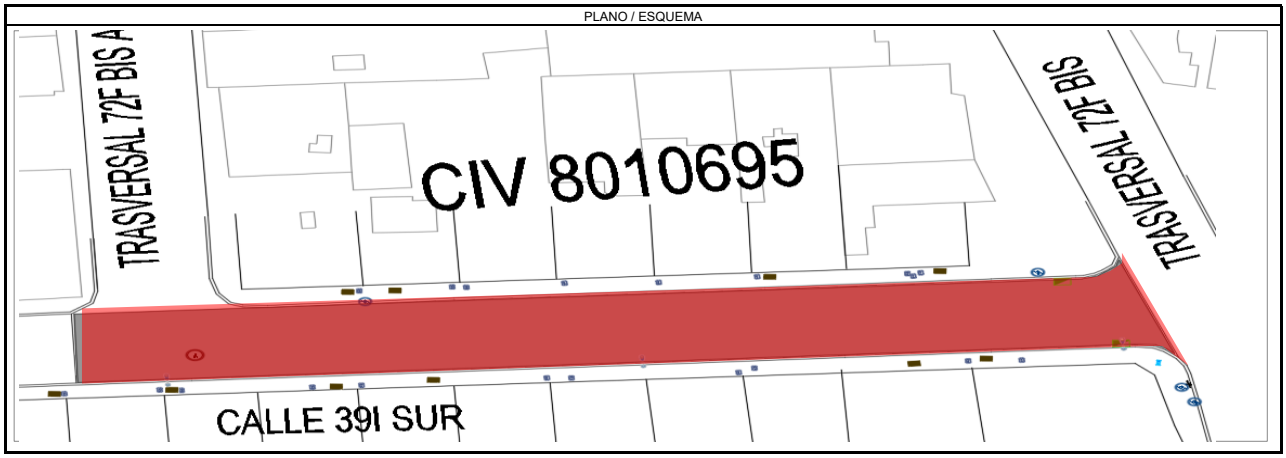

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original y 1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.
: Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	20/03/2026	CIV	8010695		BASE GRANULAR AR_BG38	0,170
				PRIORIDAD:	NC	27		

CARTERA DE:	BASE GRANULAR AR_BG38	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					BASE GRANULAR AR_BG38					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,214	2543,249	2543,284	2543,256	2543,227	2543,384	2543,419	2543,454	2543,426	2543,397	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170		
K0+005,00	2543,230	2543,265	2543,300	2543,265	2543,230	2543,400	2543,435	2543,470	2543,435	2543,400	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+010,00	2543,260	2543,295	2543,330	2543,295	2543,260	2543,430	2543,465	2543,500	2543,465	2543,430	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+015,00	2543,235	2543,270	2543,305	2543,270	2543,235	2543,405	2543,440	2543,475	2543,440	2543,405	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+020,00	2543,210	2543,245	2543,280	2543,245	2543,210	2543,380	2543,415	2543,450	2543,415	2543,380	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+025,00	2543,185	2543,220	2543,255	2543,220	2543,185	2543,355	2543,390	2543,425	2543,390	2543,355	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+030,00	2543,160	2543,195	2543,230	2543,195	2543,160	2543,330	2543,365	2543,400	2543,365	2543,330	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+035,00	2543,135	2543,170	2543,205	2543,170	2543,135	2543,305	2543,340	2543,375	2543,340	2543,305	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+040,00	2543,110	2543,145	2543,180	2543,145	2543,110	2543,280	2543,315	2543,350	2543,315	2543,280	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+045,00	2543,085	2543,120	2543,155	2543,120	2543,085	2543,255	2543,290	2543,325	2543,290	2543,255	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+050,00	2543,060	2543,095	2543,130	2543,095	2543,060	2543,230	2543,265	2543,300	2543,265	2543,230	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+055,00	2543,035	2543,070	2543,105	2543,070	2543,035	2543,205	2543,240	2543,275	2543,240	2543,205	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+060,00	2543,010	2543,045	2543,080	2543,045	2543,010	2543,180	2543,215	2543,250	2543,215	2543,180	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+065,00	2542,990	2543,025	2543,060	2543,080	2543,100	2543,160	2543,195	2543,230	2543,250	2543,270	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+067,40	2542,980	2543,035	2543,090	2543,100	2543,110	2543,150	2543,205	2543,260	2543,270	2543,280	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	16,800	2,856
																TOTAL	0,170	471,80	80,21
														area	2,27	POZOS	-2	-4,54	-0,77
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,37
																	TOTAL	465,10	79,07

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: **REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE**

HOJA 1 DE

CIV 8010695
BARRIO LA CAMPINA | Alcantarillado: SANITARIO | Diámetro: 0,202 | Rasante: PAV FLEXIBLE | Longitud entre ejes: 8,55 | estructura 0,54
Tramo: NC27 - TRAMO 1 | Clase de tubería: PVC | Pendiente: 0,380% | Ancho excavación: 1,00 | Corte promedio: 1,646 | Base Triturado 0,1

POZO	ABS	COTAS				CORTE A FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS		VOL RELLENOS		RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	DEMOLICION 0,10	ENTIBADO 2 CARAS	OBSERVACIONES
		RASANTE	SUBRASANTE	CLAVE	FONDO					GRAVA	B-200	GRAVA	B-200					
PZ CMP119809	K0+000,00	2543,520	2542,980	2541,818	2541,516	1,904	1,00	alt subra			alt subra							LOS PRIMEROS 4 MTS LA EXCAVACION Y RELLENOS DE RASANTE
1	K0+000,85	2543,520	2542,980	2541,821	2541,519	1,901	1,00			0,185								
1	K0+004,00	2543,470	2542,930	2541,833	2541,531	1,839	1,00	1,870	5,890	0,185	1,653	0,58	5,21	7,66			11,780	
1	K0+005,75	2543,420	2542,880	2541,840	2541,538	1,342	1,00	1,050	1,838	0,185	1,373	0,32	2,40	2,39			6,647	
PZ CMP119809-A	K0+007,45	2543,330	2542,790	2541,846	2541,544	1,246	1,00	0,754	1,282	0,185	1,077	0,31	1,83	1,67			7,692	
TUBERIA DIAM							**SUMAS**		**9,01**			**1,22**	**9,44**	**11,71**	**0,00**	**0,00**	**26,12**	**0,00**
8"	7,35																	

Observaciones: _____

ENTREGA:		
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ	
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA	

RECIBE:		
	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS	
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA	

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

HOJA 1 DE

CIV 8010695
BARRIO LA CAMPINA | Alcantarillado: SANITARIO | Diámetro: 0,202 | Rasante: PAV FLEXIBLE | Longitud entre ejes: 55,85 | estructura 0,54

Tramo: NC27 - TRAMO 2 | Clase de tubería: PVC | Pendiente: 0,440% | Ancho excavación: 1,00 | Base Triturado 0,1 | Corte promedio: 1,180

POZO	ABS	COTAS				FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS		VOL RELLENOS		RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	DEMOLICION 0,00	ENTIBADO 2 CARAS	OBSERVACIONES
		RASANTE	SUBRASANTE	CLAVE	FONDO					GRAVA	B-200	GRAVA	B-200					
PZ CMP119809-A	K0+000,00	2543,330	2542,790	2541,858	2541,556	1,234	1,00	alt subra			alt subra							
1	K0+001,10	2543,330	2542,790	2541,863	2541,561	1,229	1,00			0,185								
1	K0+005,75	2543,315	2542,775	2541,883	2541,581	1,194	1,00	1,211	5,633	0,185	0,994	0,86	4,62	7,32				
2	K0+011,50	2543,335	2542,795	2541,909	2541,607	1,188	1,00	1,191	6,849	0,185	0,974	1,06	5,60	8,90				
3	K0+017,25	2543,355	2542,815	2541,934	2541,632	1,183	1,00	1,186	6,818	0,185	0,969	1,06	5,57	8,86				
4	K0+023,00	2543,370	2542,830	2541,959	2541,657	1,173	1,00	1,178	6,773	0,185	0,961	1,06	5,53	8,81				
5	K0+028,75	2543,390	2542,850	2541,985	2541,683	1,168	1,00	1,170	6,728	0,185	0,953	1,06	5,48	8,75				
6	K0+034,50	2543,410	2542,870	2542,010	2541,708	1,162	1,00	1,165	6,698	0,185	0,948	1,06	5,45	8,71				
7	K0+040,25	2543,430	2542,890	2542,035	2541,733	1,157	1,00	1,160	6,667	0,185	0,943	1,06	5,42	8,67				
8	K0+046,00	2543,450	2542,910	2542,060	2541,758	1,152	1,00	1,154	6,637	0,185	0,937	1,06	5,39	8,63				
9	K0+051,75	2543,470	2542,930	2542,086	2541,784	1,146	1,00	1,149	6,606	0,185	0,932	1,06	5,36	8,59				
PZ CMP107278	K0+055,00	2543,510	2542,970	2542,100	2541,798	1,172	1,00	1,159	3,767	0,185	0,942	0,60	3,06	4,90				
							SUMAS		**63,18**			**9,97**	**51,48**	**82,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TUBERIA DIAM	
8"	54,65

Observaciones:

ENTREGA:		**RECIBE:**
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ	**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

PLANILLA DOMICILIARÍAS

CÓDIGO: 003
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/09/2024

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATO No.: 938-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 | **CIV** 8009549 | **FECHA:** 31/03/2026

TRAMO TUBERIA NC27 - TRAMO 2 | **Diametro** 0,152 | **base** 0,10

BARRIO: LA CAMPINA | NC-27 | **ALCANTARILLADO:** SANITARIO | **H ESTRU VIA:** 0,54 | **HOJA:** 1 | **DE** 1

Abscisa de tuberia	Nomenclatura	Costado	Diámetro Tuberia (m)	Longitud Tuberia	Ancho Excavación	Cota subrasante de tuberia	Cota cimentacion de tuberia	Diferencia cotas de tuberia a excavación	Cota rasante de caja	Cota lomo entrada a caja	Diferencia cotas de caja	Altura promedio	Volumen excavación	Concreto de anclaje MANO DE OBRA	Area Rellenos		Rellenos		Volumen retiro de sobrantes	Accesorios Yee	semicodo
															Triturado 3/4"	Recebo B200	Triturado 3/4"	Recebo B200			
K0+002,60	72F-50	DER	6"	7,50	0,60	2542,790	2541,863	0,93	2543,090	2542,013	1,08	1,00	4,51	0,048	0,0966	0,486	0,725	3,648	5,86	1,0	1,0
K0+003,50	72F-43	IZQ	6"	4,90	0,60	2542,775	2541,883	0,89	2543,075	2541,981	1,09	0,99	2,92	0,048	0,0966	0,481	0,473	2,356	3,79	1,0	
K0+007,00	72F-53	IZQ	6"	5,00	0,60	2542,775	2541,883	0,89	2543,075	2541,983	1,09	0,99	2,98	0,048	0,0966	0,480	0,483	2,401	3,87	1,0	
K0+015,00	72F-57	IZQ	6"	5,40	0,60	2542,815	2541,934	0,88	2543,115	2542,042	1,07	0,98	3,17	0,048	0,0966	0,471	0,522	2,546	4,12	1,0	1,0
K0+016,00	72F-54	DER	6"	7,20	0,60	2542,815	2541,934	0,88	2543,115	2542,078	1,04	0,96	4,14	0,048	0,0966	0,461	0,696	3,316	5,39	1,0	
K0+020,00	72F-61	IZQ	6"	4,85	0,60	2542,830	2541,959	0,87	2543,130	2542,056	1,07	0,97	2,83	0,048	0,0966	0,469	0,469	2,272	3,68	1,0	1,0
K0+022,00	72F-58	DER	6"	6,50	0,60	2542,830	2541,959	0,87	2543,130	2542,089	1,04	0,96	3,73	0,048	0,0966	0,459	0,628	2,981	4,85	1,0	1,0
K0+027,50	72F-62	DER	6"	6,10	0,60	2542,850	2541,985	0,87	2543,150	2542,107	1,04	0,95	3,49	0,048	0,0966	0,458	0,589	2,793	4,54	1,0	1,0
K0+031,00	72F-65	IZQ	6"	4,70	0,60	2542,870	2542,010	0,86	2543,170	2542,104	1,07	0,96	2,72	0,048	0,0966	0,463	0,454	2,176	3,53	1,0	1,0
K0+031,50	72F-66	DER	6"	6,10	0,60	2542,870	2542,010	0,86	2543,170	2542,132	1,04	0,95	3,47	0,048	0,0966	0,455	0,589	2,774	4,52	1,0	1,0
K0+036,00	72F-70	DER	6"	6,20	0,60	2542,870	2542,010	0,86	2543,170	2542,134	1,04	0,95	3,53	0,048	0,0966	0,454	0,599	2,815	4,59	1,0	1,0
K0+037,50	72F-73	IZQ	6"	3,90	0,60	2542,870	2542,010	0,86	2543,170	2542,088	1,08	0,97	2,27	0,048	0,0966	0,468	0,377	1,825	2,95	1,0	1,0
K0+041,00	72F-72	DER	6"	5,20	0,60	2542,890	2542,035	0,85	2543,190	2542,139	1,05	0,95	2,97	0,048	0,0966	0,457	0,502	2,376	3,86	1,0	1,0
K0+044,00	72F-77	IZQ	6"	4,40	0,60	2542,910	2542,060	0,85	2543,210	2542,148	1,06	0,96	2,52	0,048	0,0966	0,459	0,425	2,018	3,28	1,0	1,0
Totales				77,95									45,25	0,67			7,53	36,30	58,82	14,00	11,00
ITEM				7,001									6,001	7,038			6,004	7,022	1,004	7,023	7,024

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** **1/3/2026** (Día/Mes/Año) **A** **31/3/2026** (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010695 - CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
			1. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
1	1,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8195.34	$ 1.142.00	$ 9.359.080.00	10212.16	$ 1.142.00	$ 11.662.287.00	471.80	$ 538.796.00		471.80	$ 538.796.00	9740.36	$ 11.123.491.00
2	1,002	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1375,79	$ 48.679,00	$ 66.972.081,00	1359,01	$ 48.679,00	$ 66.155.248,00	46,85	$ 2.280.611,00		46,85	$ 2.280.611,00	1312,16	$ 63.874.637,00
3	1,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5859.32	$ 7.206.00	$ 42.222.260.00	4763.20	$ 7.206.00	$ 34.323.619.00	290.52	$ 2.093.487.00		290.52	$ 2.093.487.00	4472.68	$ 32.230.132.00
4	1,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1100,00	$ 57.240,00	$ 62.964.000,00	6192,47	$ 57.240,00	$ 354.456.983,00	518,48	$ 29.677.795,00		518,48	$ 29.677.795,00	5673,99	$ 324.779.188,00
5	1,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4566,07	$ 73.056,00	$ 333.578.810,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
6	1,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9171,92	$ 16.517,00	$ 151.492.603,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
7	1,007	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4141,23	$ 235.794,00	$ 976.477.187,00	0,00	$ 235.794,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
8	1,008	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1200,00	$ 220.890,00	$ 265.068.000,00	0,00	$ 220.890,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
9	1,009	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 213.572,00	$ 616.219.292,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
10	1,010	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 205.221,00	$ 592.124.151,00	0,00	$ 205.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
11	1,011	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	545,12	$ 1.757.344,00	$ 957.963.361,00	0,00	$ 1.757.344,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
12	1,012	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	545,12	$ 1.953.442,00	$ 1.064.860.303,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
13	1,013	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.003,00	$ 38.316.276,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
14	1,014	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.877,00	$ 46.682.108,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
15	1,015	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3930,17	$ 22.817,00	$ 89.674.689,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
16	1,016	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	66,00	$ 228.161,00	$ 15.058.626,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
17	1,017	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	1420,00	$ 190.133,00	$ 269.988.860,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
18	1,018	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1095,38	$ 1.712.945,00	$ 1.876.325.694,00	442,61	$ 1.712.945,00	$ 758.166.586,00	23,26	$ 39.843.101,00		23,26	$ 39.843.101,00	419,35	$ 718.323.486,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			2. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
19	2,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6603.57	$ 1.142.00	$ 7.541.277.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
20	2,002	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1320,71	$ 234.955,00	$ 310.307.418,00	148,00	$ 234.955,00	$ 34.773.340,00		$ -		0,00	$ -	148,00	$ 34.773.340,00
21	2,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4406.02	$ 7.206.00	$ 31.749.780.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
22	2,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	6603,57	$ 57.240,00	$ 377.988.347,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
23	2,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	600,00	$ 73.056,00	$ 43.833.600,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
24	2,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2200,00	$ 16.517,00	$ 36.337.400,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
25	2,007	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2203,01	$ 220.757,00	$ 486.329.879,00	0,00	$ 220.757,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
26	2,008	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	700,00	$ 208.805,00	$ 146.163.500,00	0,00	$ 208.805,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
27	2,009	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 240.902,00	$ 264.992.200,00	0,00	$ 240.902,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
28	2,010	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 242.117,00	$ 266.328.700,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
29	2,011	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	1234,31	$ 488.707,00	$ 603.215.937,00	0,00	$ 488.707,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
30	2,012	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	1320,71	$ 7.018,00	$ 9.268.743,00	0,00	$ 7.018,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
31	2,013	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2311.25	$ 13.278.00	$ 30.688.778.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
32	2,014	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	23772,85	$ 10.549,00	$ 250.779.795,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
33	2,015	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	330,18	$ 9.221,00	$ 3.044.590,00	0,00	$ 9.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
34	2,016	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	6603.57	$ 3.206.00	$ 21.171.045.00	0.00	$ 3.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
35	2,017	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	2905,57	$ 17.296,00	$ 50.254.739,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
36	2,018	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2905,57	$ 3.338,00	$ 9.698.793,00	248,00	$ 3.338,00	$ 827.824,00	24,80	$ 82.782,00		24,80	$ 82.782,00	223,20	$ 745.042,00
37	2,019	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	2829,63	$ 22.817,00	$ 64.563.668,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
38	2,020	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	19,00	$ 228.161,00	$ 4.335.059,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
39	2,021	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	180,00	$ 190.133,00	$ 34.223.940,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			3. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
40	3,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3253.08	$ 1.142.00	$ 3.715.017.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
41	3,002	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	8,13	$ 371.818,00	$ 3.022.880,00	0,00	$ 371.818,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
42	3,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	162.65	$ 7.206.00	$ 1.172.056.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
43	3,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	275,97	$ 57.240,00	$ 15.796.523,00	0,00	$ 57.240,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
44	3,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	81,33	$ 73.056,00	$ 5.941.644,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
45	3,006	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	1382,56	$ 9.347,00	$ 12.922.788,00	0,00	$ 9.347,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
46	3,007	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	162,65	$ 248.800,00	$ 40.467.320,00	0,00	$ 248.800,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
47	3,008	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	80,00	$ 213.572,00	$ 17.085.760,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
48	3,009	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	195,18	$ 1.712.945,00	$ 334.332.605,00	0,00	$ 1.712.945,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
49	3,010	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	81,33	$ 1.953.442,00	$ 158.873.438,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
50	3,011	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.003,00	$ 5.534.388,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
51	3,012	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.877,00	$ 6.742.745,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
52	3,013	4758	SELLO DE FISURAS	ML	800.00	$ 11.144.00	$ 8.915.200.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
53	3,014	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	487.96	$ 13.037.00	$ 6.361.535.00	0.00	$ 13.037.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
54	3,015	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	25,00	$ 131.419,00	$ 3.285.475,00	2,00	$ 131.419,00	$ 262.838,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 262.838,00
55	3,016	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	140,00	$ 131.419,00	$ 18.398.660,00	0,00	$ 131.419,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			4. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
56	4,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3672.96	$ 1.142.00	$ 4.194.520.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
57	4,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	459.12	$ 58.217.00	$ 26.728.589.00	0.00	$ 58.217.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
58	4,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3	619,81	$ 57.240,00	$ 35.477.924,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
59	4,004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	252,52	$ 73.056,00	$ 18.447.809,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
60	4,005	3486	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	550,94	$ 234.955,00	$ 129.447.048,00	0,00	$ 234.955,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
61	4,006	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	206.60	$ 248.800.00	$ 51.402.080.00	0.00	$ 248.800.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
62	4,007	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	68,87	$ 242.117,00	$ 16.674.598,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
63	4,008	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m	M2	550,94	$ 464.229,00	$ 255.764.182,00	0,00	$ 464.229,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
64	4,009	3708	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	9182.40	$ 7.018.00	$ 64.442.083.00	0.00	$ 7.018.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
65	4,010	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	4591.20	$ 13.278.00	$ 60.961.954.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
66	4,011	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1836,48	$ 10.549,00	$ 19.373.028,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
67	4,012	4758	SELLO DE FISURAS	ML	100.00	$ 11.144.00	$ 1.114.400.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
68	4,013	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1616,10	$ 17.296,00	$ 27.952.107,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
69	4,014	3723	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	10.65	$ 131.419.00	$ 1.399.612.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
70	4,015	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	20.94	$ 131.419.00	$ 2.751.914.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
71	4,016	3434	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	20,00	$ 97.222,00	$ 1.944.440,00	0,00	$ 97.222,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
72	4,017	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	20,00	$ 90.021,00	$ 1.800.420,00	0,00	$ 90.021,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			5. MANTENIMIENTO PERIODICO EN ANDEN DE CONCRETO														
73	5,001	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	2683,78	$ 10.370,00	$ 27.830.799,00	3088,81	$ 10.370,00	$ 32.030.960,00		$ -		0,00	$ -	3088,81	$ 32.030.960,00
74	5,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	268.38	$ 58.217.00	$ 15.624.278.00	542.24	$ 58.217.00	$ 31.567.586.00		$ -		0.00	$ -	542.24	$ 31.567.586.00
75	5,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	536,76	$ 57.240,00	$ 30.724.142,00	2260,66	$ 57.240,00	$ 129.400.178,00		$ -		0,00	$ -	2260,66	$ 129.400.178,00
76	5,004	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	268,38	$ 392.394,00	$ 105.310.702,00	0,00	$ 392.394,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
77	5,005	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	2683,78	$ 105.225,00	$ 282.400.751,00	73,00	$ 105.225,00	$ 7.681.425,00		$ -		0,00	$ -	73,00	$ 7.681.425,00
78	5,006	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	89.46	$ 1.212.741.00	$ 108.491.810.00	0.00	$ 1.212.741.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
79	5,007	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO). INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS	M2	2236,48	$ 165.385,00	$ 369.880.245,00	0,00	$ 165.385,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
80	5,008	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO	UN	20,00	$ 2.082.959,00	$ 41.659.180,00	0,00	$ 2.082.959,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
81	5,009	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	2236,48	$ 145.068,00	$ 324.441.681,00	0,00	$ 145.068,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
82	5,010	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO)	ML	4472,97	$ 78.310,00	$ 350.278.281,00	10,00	$ 78.310,00	$ 783.100,00		$ -		0,00	$ -	10,00	$ 783.100,00
83	5,011	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	4472,97	$ 102.949,00	$ 460.487.789,00	1533,10	$ 102.949,00	$ 157.831.112,00		$ -		0,00	$ -	1533,10	$ 157.831.112,00
84	5,012	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	6262,15	$ 86.663,00	$ 542.696.705,00	529,68	$ 86.663,00	$ 45.903.658,00		$ -		0,00	$ -	529,68	$ 45.903.658,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			6. REDES														
85	6,001	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5808,47	$ 58.217,00	$ 338.151.698,00	3657,45	$ 58.217,00	$ 212.925.767,00	59,66	$ 3.473.226,00		59,66	$ 3.473.226,00	3597,79	$ 209.452.540,00
86	6,002	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1452,12	$ 73.056,00	$ 106.086.079,00	4754,66	$ 73.056,00	$ 347.356.441,00		$ -		0,00	$ -	4754,66	$ 347.356.441,00
87	6,003	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4356,35	$ 49.220,00	$ 214.419.547,00	37,00	$ 49.220,00	$ 1.821.140,00		$ -		0,00	$ -	37,00	$ 1.821.140,00
88	6,004	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	217,82	$ 209.827,00	$ 45.704.517,00	886,54	$ 209.827,00	$ 186.020.029,00	21,37	$ 4.484.003,00		21,37	$ 4.484.003,00	865,17	$ 181.536.026,00
89	6,005	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	653,45	$ 125.986,00	$ 82.325.552,00	0,00	$ 125.986,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
90	6,006	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	72,61	$ 268.758,00	$ 19.514.518,00	0,00	$ 268.758,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
91	6,007	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	435,64	$ 195.195,00	$ 85.034.750,00	43,00	$ 195.195,00	$ 8.393.385,00		$ -		0,00	$ -	43,00	$ 8.393.385,00
92	6,008	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	40,00	$ 2.379.851,00	$ 95.194.040,00	56,00	$ 2.379.851,00	$ 133.271.656,00	2,00	$ 4.759.702,00		2,00	$ 4.759.702,00	54,00	$ 128.511.954,00
93	6,009	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	280,00	$ 928.646,00	$ 260.020.880,00	82,00	$ 928.646,00	$ 76.148.972,00	2,14	$ 1.987.302,00		2,14	$ 1.987.302,00	79,86	$ 74.161.670,00
94	6,010	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	40,00	$ 170.695,00	$ 6.827.800,00	65,00	$ 170.695,00	$ 11.095.175,00		$ -		0,00	$ -	65,00	$ 11.095.175,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** **1/3/2026** (Día/Mes/Año) **A** **31/3/2026** (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010695 - CALLE 39I SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
95	6,011	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	295,20	$ 180.628,00	$ 53.321.386,00	0,00	$ 180.628,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
96	6,012	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190,41	$ 528.764,00	$ 100.681.953,00	23,35	$ 528.764,00	$ 12.346.639,00		$ -		0,00	$ -	23,35	$ 12.346.639,00
97	6,013	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3310,80	$ 46.883,00	$ 155.220.236,00	0,00	$ 46.883,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
98	6,014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1744,93	$ 221.771,00	$ 386.974.871,00	378,50	$ 221.771,00	$ 83.940.324,00	20,40	$ 4.524.128,00		20,40	$ 4.524.128,00	358,10	$ 79.416.195,00
99	6,015	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	60,00	$ 535.886,00	$ 32.153.160,00	165,50	$ 535.886,00	$ 88.689.133,00		$ -		0,00	$ -	165,50	$ 88.689.133,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			7. ITEMS DE INCLUSION														
100	7,001	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 88.189,00		727,96	$ 88.189,00	$ 64.198.064,00	77,95	$ 6.874.333,00		77,95	$ 6.874.333,00	650,01	$ 57.323.732,00
101	7,002	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 122.135,00		792,57	$ 122.135,00	$ 96.800.537,00	62,00	$ 7.572.370,00		62,00	$ 7.572.370,00	730,57	$ 89.228.167,00
102	7,003	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 172.135,00		33,60	$ 172.135,00	$ 5.783.736,00		$ -		0,00	$ -	33,60	$ 5.783.736,00
103	7,004	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 351.631,00		88,70	$ 351.631,00	$ 31.189.670,00		$ -		0,00	$ -	88,70	$ 31.189.670,00
104	7,005	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$ 2.400.00		9059.81	$ 2.400.00	$ 21.743.544.00	467.37	$ 1.121.688.00		467.37	$ 1.121.688.00	8592.44	$ 20.621.856.00
105	7,006	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2		$ 3.740.00		1936.46	$ 3.740.00	$ 7.242.360.00		$ -		0.00	$ -	1936.46	$ 7.242.360.00
106	7,007	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 92.526,00		500,20	$ 92.526,00	$ 46.281.505,00		$ -		0,00	$ -	500,20	$ 46.281.505,00
107	7,008	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3		$ 1.843.898,00		10,41	$ 1.843.898,00	$ 19.194.978,00		$ -		0,00	$ -	10,41	$ 19.194.978,00
108	7,009	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		165,20	$ 10.811,00	$ 1.785.977,00		$ -		0,00	$ -	165,20	$ 1.785.977,00
109	7,010	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		1,00	$ 10.811,00	$ 10.811,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 10.811,00
110	7,011	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	UN		$ 656.068,00		341,00	$ 656.068,00	$ 223.719.188,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 223.719.188,00
111	7,012	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$ 630.227,00		33,00	$ 630.227,00	$ 20.797.491,00		$ -		0,00	$ -	33,00	$ 20.797.491,00
112	7,013	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA)	UN		$ 47.561,00		14,00	$ 47.561,00	$ 665.854,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 665.854,00
113	7,014	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 566.503.00		341.00	$ 566.503.00	$ 193.177.523.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 193.177.523.00
114	7,015	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 114.367.00		451.00	$ 114.367.00	$ 51.579.517.00		$ -		0.00	$ -	451.00	$ 51.579.517.00
115	7,016	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3		$ 2.093.317,00		634,19	$ 2.093.317,00	$ 1.327.560.708,00	32,56	$ 68.158.402,00		32,56	$ 68.158.402,00	601,63	$ 1.259.402.307,00
116	7,017	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.881,00		8744,61	$ 4.881,00	$ 42.682.441,00	465,10	$ 2.270.153,00		465,10	$ 2.270.153,00	8279,51	$ 40.412.288,00
117	7,018	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN		$ 852.604,00		6,00	$ 852.604,00	$ 5.115.624,00	1,00	$ 852.604,00		1,00	$ 852.604,00	5,00	$ 4.263.020,00
118	7,019	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN		$ 294.438.00		28.00	$ 294.438.00	$ 8.244.264.00	2.00	$ 588.876.00		2.00	$ 588.876.00	26.00	$ 7.655.388.00
119	7,020	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 100.003,00		9059,81	$ 100.003,00	$ 906.008.179,00	465,10	$ 46.511.395,00		465,10	$ 46.511.395,00	8594,71	$ 859.496.784,00
120	7,021	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 101.831.00		306.00	$ 101.831.00	$ 31.160.286.00		$ -		0.00	$ -	306.00	$ 31.160.286.00
121	7,022	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 159.155,00		2619,76	$ 159.155,00	$ 416.947.903,00	104,46	$ 16.625.331,00		104,46	$ 16.625.331,00	2515,30	$ 400.322.572,00
122	7,023	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.525,00		341,00	$ 299.525,00	$ 102.138.025,00	14,00	$ 4.193.350,00		14,00	$ 4.193.350,00	327,00	$ 97.944.675,00
123	7,024	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 116.431,00		38,00	$ 116.431,00	$ 4.424.378,00	11,00	$ 1.280.741,00		11,00	$ 1.280.741,00	27,00	$ 3.143.637,00
124	7,025	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN		$ 1.517.446,00		23,00	$ 1.517.446,00	$ 34.901.258,00	1,00	$ 1.517.446,00		1,00	$ 1.517.446,00	22,00	$ 33.383.812,00
125	7,026	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 294.664,00		2,00	$ 294.664,00	$ 589.328,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 589.328,00
126	7,027	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.320.280,00		149,30	$ 2.320.280,00	$ 346.417.804,00		$ -		0,00	$ -	149,30	$ 346.417.804,00
127	7,028	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10”. ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.544.307,00		2,00	$ 2.544.307,00	$ 5.088.614,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.088.614,00
128	7,029	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12”. ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.800.338,00		2,00	$ 2.800.338,00	$ 5.600.676,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.600.676,00
129	7,030	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 14”. ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.328.401,00		1,00	$ 3.328.401,00	$ 3.328.401,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 3.328.401,00
130	7,031	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 16”. ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.800.458,00		34,50	$ 3.800.458,00	$ 131.115.801,00		$ -		0,00	$ -	34,50	$ 131.115.801,00
131	7,032	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 78.395,00		4593,68	$ 78.395,00	$ 360.121.544,00	34,83	$ 2.730.498,00		34,83	$ 2.730.498,00	4558,85	$ 357.391.046,00
132	7,033	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.749,00		9059,81	$ 4.749,00	$ 43.025.038,00	465,10	$ 2.208.760,00		465,10	$ 2.208.760,00	8594,71	$ 40.816.278,00
133	7,034	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 3.546.00		48.20	$ 3.546.00	$ 170.917.00		$ -		0.00	$ -	48.20	$ 170.917.00
134	7,035	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 10.058.00		14.00	$ 10.058.00	$ 140.812.00		$ -		0.00	$ -	14.00	$ 140.812.00
135	7,036	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	ML		$ 10.525,00		3979,34	$ 10.525,00	$ 41.882.554,00		$ -		0,00	$ -	3979,34	$ 41.882.554,00
136	7,037	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3		$ 198.532,00		64,08	$ 198.532,00	$ 12.721.931,00		$ -		0,00	$ -	64,08	$ 12.721.931,00
137	7,038	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 984.823.00		16.00	$ 984.823.00	$ 15.757.168.00	0.67	$ 659.831.00		0.67	$ 659.831.00	15.33	$ 15.097.337.00
138	7,039	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 7.459.739,00		5,00	$ 7.459.739,00	$ 37.298.695,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 37.298.695,00
139	7,040	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN		$ 272.085,00		14,00	$ 272.085,00	$ 3.809.190,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 3.809.190,00
140	7,041	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE		$ 2.474.248,00		14,00	$ 2.474.248,00	$ 34.639.472,00	2,00	$ 4.948.496,00		2,00	$ 4.948.496,00	12,00	$ 29.690.976,00
141	7,042	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24”. ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.697.698,00		100,70	$ 5.697.698,00	$ 573.758.189,00		$ -		0,00	$ -	100,70	$ 573.758.189,00
142	7,043	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 257.553,00		1875,14	$ 257.553,00	$ 482.947.932,00	116,28	$ 29.948.263,00		116,28	$ 29.948.263,00	1758,86	$ 452.999.670,00
143	7,044	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3		$ 231.349,00		348,56	$ 231.349,00	$ 80.639.007,00		$ -		0,00	$ -	348,56	$ 80.639.007,00
144	7,045	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$ 10.108,00		2258,60	$ 10.108,00	$ 22.829.929,00		$ -		0,00	$ -	2258,60	$ 22.829.929,00
145	7,046	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 33.747,00		12148,62	$ 33.747,00	$ 409.979.479,00	498,80	$ 16.833.004,00		498,80	$ 16.833.004,00	11649,82	$ 393.146.476,00
146	7,047	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18”. ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 4.152.501,00		4,00	$ 4.152.501,00	$ 16.610.004,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 16.610.004,00
147	7,048	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.196.00		7958.68	$ 6.196.00	$ 49.311.981.00		$ -		0.00	$ -	7958.68	$ 49.311.981.00
148	7,049	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 25.701,00		7958,68	$ 25.701,00	$ 204.546.035,00		$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 204.546.035,00
149	7,050	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 35.750.00		408.47	$ 35.750.00	$ 14.602.803.00		$ -		0.00	$ -	408.47	$ 14.602.803.00
150	7,051	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2		$ 191.703,00		510,64	$ 191.703,00	$ 97.891.220,00		$ -		0,00	$ -	510,64	$ 97.891.220,00
151	7,052	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 8.852.00		2830.00	$ 8.852.00	$ 25.051.160.00		$ -		0.00	$ -	2830.00	$ 25.051.160.00
152	7,053	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 124.194,00		19,00	$ 124.194,00	$ 2.359.686,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 2.359.686,00
153	7,054	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 26.513.00		54.00	$ 26.513.00	$ 1.431.702.00		$ -		0.00	$ -	54.00	$ 1.431.702.00
154	7,055	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	UN		$ 311.753,00		19,00	$ 311.753,00	$ 5.923.307,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 5.923.307,00
155	7,056	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20”. ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.096.615,00		1,00	$ 5.096.615,00	$ 5.096.615,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 5.096.615,00
156	7,057	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 703.569,00		62,50	$ 703.569,00	$ 43.973.063,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 43.973.063,00
157	7,058	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 425.516,00		35,50	$ 425.516,00	$ 15.105.818,00		$ -		0,00	$ -	35,50	$ 15.105.818,00
158	7,059	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		$ 27.170,00		1569,67	$ 27.170,00	$ 42.647.934,00		$ -		0,00	$ -	1569,67	$ 42.647.934,00
159	7,060	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML		$ 29.226,00		340,50	$ 29.226,00	$ 9.951.453,00		$ -		0,00	$ -	340,50	$ 9.951.453,00
160	7,061	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		$ 17.602,00		1910,17	$ 17.602,00	$ 33.622.812,00		$ -		0,00	$ -	1910,17	$ 33.622.812,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			8. NO PREVISTOS														
161	8,001	NP-1	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 14 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO	M3		$ 1.385.170,00		5,00	$ 1.385.170,00	$ 6.925.850,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 6.925.850,00
162	8,002	NP-2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 282.325,00		1355,52	$ 282.325,00	$ 382.697.184,00		$ -		0,00	$ -	1355,52	$ 382.697.184,00
163	8,003	NP-3	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 77.819.00		9059.81	$ 77.819.00	$ 705.025.354.00	465.10	$ 36.193.617.00		465.10	$ 36.193.617.00	8594.71	$ 668.831.737.00
164	8,004	NP-4	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	M3		$ 476.745,00		2281,25	$ 476.745,00	$ 1.087.574.531,00	102,79	$ 49.004.619,00		102,79	$ 49.004.619,00	2178,46	$ 1.038.569.913,00
165	8,005	NP-5	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	M3		$ 19.423,00		94,00	$ 19.423,00	$ 1.825.762,00		$ -		0,00	$ -	94,00	$ 1.825.762,00
166	8,006	NP-6	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%)	UN		$ 107.272,00		9059,81	$ 107.272,00	$ 971.863.938,00	396,00	$ 42.479.712,00		396,00	$ 42.479.712,00	8663,81	$ 929.384.226,00
167	8,007	NP-7	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	ML		$ 446.392,00		341,00	$ 446.392,00	$ 152.219.672,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 152.219.672,00
168	8,008	NP-8	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacíon)	UN		$ 360.064.00		341.00	$ 360.064.00	$ 122.781.824.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 122.781.824.00
169	8,009	NP-9	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN		$ 162.297.00		341.00	$ 162.297.00	$ 55.343.277.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 55.343.277.00
170	8,010	NP-10	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 657.822,00		137,00	$ 657.822,00	$ 90.121.614,00	19,60	$ 12.893.311,00		19,60	$ 12.893.311,00	117,40	$ 77.228.303,00
171	8,011	NP-11	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 14 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 744.157,00		4,00	$ 744.157,00	$ 2.976.628,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.976.628,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Fecha Inicio) **A** 31/3/2026 (Fecha Fin)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR ACTUAL PAGO $ 19.645.886.208,00 (Escriba el valor total del acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVMAC SAS (Escriba el número y razón social del interventor y en el caso de Consorcio de Unión temporal, el nombre de cada uno de los integrantes)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO (Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS (Escriba el nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número del contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8610035 - CALLE 38 SUR ENTRE CARRERA 72F BIS Y CARRERA 72F BIS A

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES							
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO		
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
172	8,012	NP-12	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 16 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 795.331,00		1,00	$ 795.331,00	$ 795.331,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 795.331,00
173	8,013	NP-13	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 896.388,00		49,75	$ 896.388,00	$ 44.595.303,00		$ -		0,00	$ -	49,75	$ 44.595.303,00
174	8,014	NP-14	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 974.773,00		62,50	$ 974.773,00	$ 60.923.313,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 60.923.313,00
175	8,015	NP-15	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	UN		$ 269.294,00		24,00	$ 269.294,00	$ 6.463.056,00	2,00	$ 538.588,00		2,00	$ 538.588,00	22,00	$ 5.924.468,00
176	8,016	NP-16	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye taladro rotopercutor 3/4", planta electrica 6Kw)	UN		$ 76.124,00		11,00	$ 76.124,00	$ 837.364,00		$ -		0,00	$ -	11,00	$ 837.364,00
177	8,017	NP-17	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, EXCLUYE BROCAS, PREBARRO Y COMBUSTIBLE)	UN		$ 180.006,00		9059,81	$ 180.006,00	$ 1.630.820.159,00	396,00	$ 71.282.376,00		396,00	$ 71.282.376,00	8663,81	$ 1.559.537.783,00
178	8,018	NP-18	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO,INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)	UN		$ 4.852.592,00		124,00	$ 4.852.592,00	$ 601.721.408,00	2,00	$ 9.705.184,00		2,00	$ 9.705.184,00	122,00	$ 592.016.224,00
179	8,019	NP-19	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML		$ 563.913,00		4,00	$ 563.913,00	$ 2.255.652,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.255.652,00
180	8,020	NP-20	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalación)	UN		$ 486.892,00		4,00	$ 486.892,00	$ 1.947.568,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 1.947.568,00
181	8,021	NP-21	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X80	UN		$ 208.334,00		4,00	$ 208.334,00	$ 833.336,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 833.336,00
182	8,022	NP-22	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 464.671,00		15,00	$ 464.671,00	$ 6.970.065,00		$ -		0,00	$ -	15,00	$ 6.970.065,00
183	8,023	NP-23	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIÓN, CON COLMATACIÓN SUPERIOR AL 30% Y DIÁMETROS DE 8" A 36" INCLUYE ACCIÓ	ML		$ 661.727,00		86,80	$ 661.727,00	$ 57.437.904,00		$ -		0,00	$ -	86,80	$ 57.437.904,00
184	8,024	NP-24	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 400.192,00		170,75	$ 400.192,00	$ 68.332.784,00		$ -		0,00	$ -	170,75	$ 68.332.784,00
185	8,025	NP-25	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 223.645,00		2,00	$ 223.645,00	$ 447.290,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 447.290,00
186	8,026	NP-26	PISO EN CONCRETO MR45 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 346.192,00		172,86	$ 346.192,00	$ 59.842.749,00		$ -		0,00	$ -	172,86	$ 59.842.749,00
187	8,027	NP-27	PISO EN CONCRETO 3000 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 318.979,00		580,92	$ 318.979,00	$ 185.301.281,00		$ -		0,00	$ -	580,92	$ 185.301.281,00
188	8,028	NP-28	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_ RCB) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 262.519,00		1815,49	$ 262.519,00	$ 476.600.619,00	79,07	$ 20.757.377,00		79,07	$ 20.757.377,00	1736,42	$ 455.843.242,00
				TOTALES			$ 16.832.066.661,00			$ 16.456.656.116,00		$ 551.495.258,00			$ 551.495.258,00		$ 15.905.162.862,00

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES	OBRA EJECUTADA		
				PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
OBRA EJECUTADA						
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 12.294.241.586,25	$ 12.238.163.245,35	$ 410.125.126,79		$ 410.125.126,79
ADMINISTRACIÓN	28,47%	$ 3.500.170.579,60	$ 3.484.205.075,95	$ 116.762.623,60		$ 116.762.623,60
IMPREVISTO	1,00%	$ 122.942.415,86	$ 122.381.632,45	$ 4.101.251,27		$ 4.101.251,27
UTILIDAD	5,00%	$ 614.712.079,31	$ 611.906.162,27	$ 20.506.256,34		$ 20.506.256,34
SUBTOTAL A.I.U	34,47%	$ 4.237.825.074,77	$ 4.218.494.870,67	$ 141.370.131,21		$ 141.370.131,21
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=34,47%)		**$ 16.532.066.661,00**	**$ 16.456.656.116,00**	**$ 551.495.258,00**		**$ 551.495.258,00**
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES. SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (B) =	**12,3764%**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 50.758.726,00**		**$ 50.758.726,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA). SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (C) =	**2,3210%**	**285.447.701,00**	**285.447.701,00**	$ -	$ -	
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES) (E) = (A) + (B) + (C) =		**$ 18.339.098.878,00**	**$ 18.339.098.878,00**		$ -	
OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS		**$ 1.306.787.330,00**	**$ 1.302.195.875,00**			
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**30,000%**	**$ 5.893.765.862,00**		$ -	$ -	
(K) COSTO TOTAL MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (F)+(G)		**$ 19.645.886.208,00**	**19.645.886.208,00**		$ -	
VALOR NETO A PAGAR				**$ 602.253.384,00**		**$ 602.253.384,00**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de MARZO (Mes en (para en Todos en el acta) de 2026 (Año del Fecha del acta)

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista

(Firma)
Cesar Maldonado
Director de Interventoría
Interventor

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
replanteo de segmento vial - paramentos			50,60	7,80					394,68
	planimetria y altimetria inicial								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									394,68
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									394,68
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

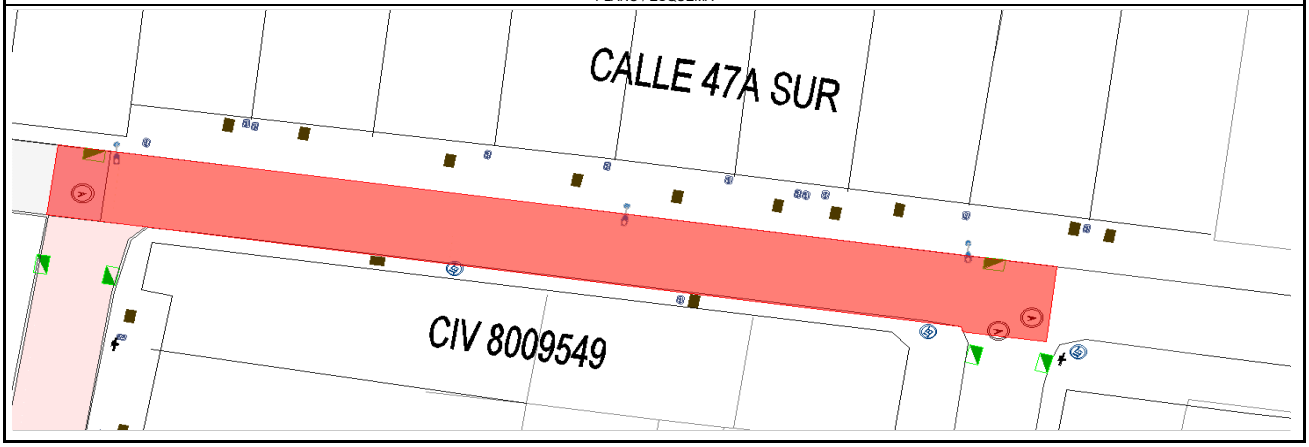

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
excavacion mecanica estructura de via									
	caja de via		50,60	4,50	0,279				63,62
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,282			-3,00	-1,92
	sumideros existentes	area	0,35		0,282			-2,00	-0,20
excavacion mecanica REDES - SANITARIA									
	NC28 - SANITARIA		33,65	0,90	1,42				42,93
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									104,44
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									104,44
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

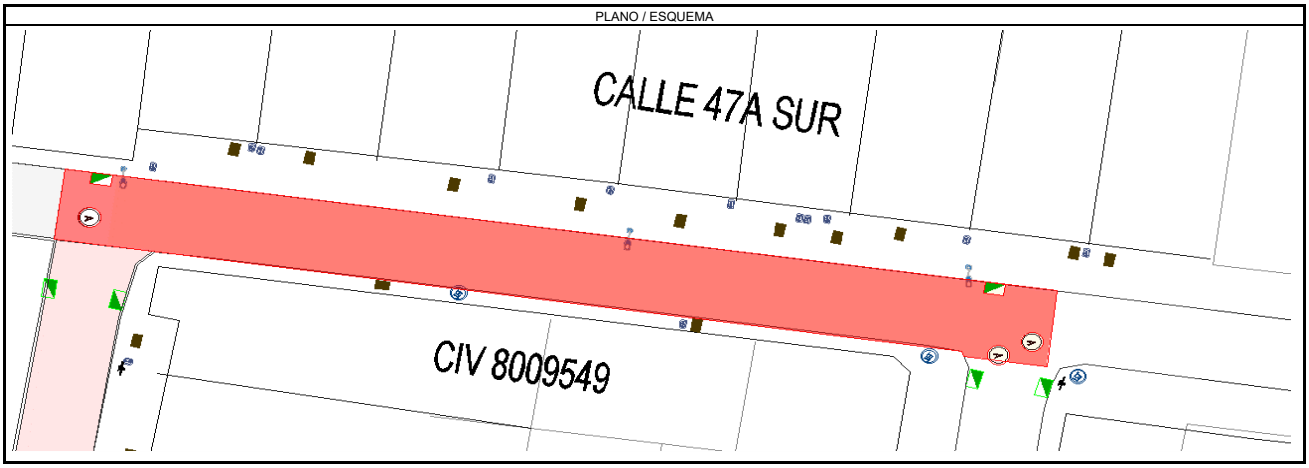

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8009549	
PRIORIDAD:	NC	28

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	EXCAVACION MECANICA DE VIA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,50

ABSCISA (m)	DEMOLICION					SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,420	2538,445	2538,470	2538,458	2538,445	2538,130	2538,155	2538,180	2538,168	2538,155	4,500	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290		
K0+005,00	2538,435	2538,453	2538,470	2538,443	2538,415	2538,155	2538,170	2538,185	2538,158	2538,130	4,500	0,280	0,283	0,285	0,285	0,285	0,284	22,500	6,452
K0+010,00	2538,430	2538,450	2538,470	2538,450	2538,430	2538,180	2538,195	2538,210	2538,183	2538,156	4,500	0,250	0,255	0,260	0,267	0,274	0,261	22,500	6,128
K0+015,00	2538,455	2538,475	2538,495	2538,478	2538,460	2538,205	2538,220	2538,235	2538,209	2538,182	4,500	0,250	0,255	0,260	0,269	0,278	0,262	22,500	5,891
K0+020,00	2538,465	2538,483	2538,500	2538,490	2538,480	2538,230	2538,245	2538,260	2538,234	2538,208	4,500	0,235	0,238	0,240	0,256	0,272	0,248	22,500	5,743
K0+025,00	2538,505	2538,515	2538,525	2538,518	2538,510	2538,255	2538,270	2538,285	2538,260	2538,234	4,500	0,250	0,245	0,240	0,258	0,276	0,254	22,500	5,646
K0+030,00	2538,510	2538,528	2538,545	2538,530	2538,515	2538,280	2538,295	2538,310	2538,285	2538,260	4,500	0,230	0,233	0,235	0,245	0,255	0,240	22,500	5,550
K0+035,00	2538,490	2538,525	2538,560	2538,535	2538,510	2538,240	2538,255	2538,270	2538,249	2538,228	4,500	0,250	0,270	0,290	0,286	0,282	0,276	22,500	5,795
K0+040,00	2538,470	2538,518	2538,565	2538,535	2538,505	2538,200	2538,220	2538,240	2538,218	2538,196	4,500	0,270	0,298	0,325	0,317	0,309	0,304	22,500	6,517
K0+045,00	2538,495	2538,535	2538,575	2538,533	2538,490	2538,160	2538,180	2538,200	2538,182	2538,164	4,500	0,335	0,355	0,375	0,351	0,326	0,348	22,500	7,335
K0+050,60	2538,510	2538,540	2538,570	2538,550	2538,530	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	4,500	0,318	0,328	0,338	0,338	0,337	0,332	25,200	8,568
																TOTAL	0,282	227,70	63,62
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	-1,92
														sumidero	0,35	SUMIDEROS	-2	-0,70	-0,20
																	TOTAL	220,19	61,51

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			VOLUMEN COMPACTO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Transporte y disposicion de escombros		item							
	excavacion mecanica de estructura de via	1,003	104,44				1,30		135,77
	demolicion concreto estructural	2,002	47,64				1,35		64,31
	excavacion manual para redes	6,001	58,76				1,30		76,39
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									276,47
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									276,47
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

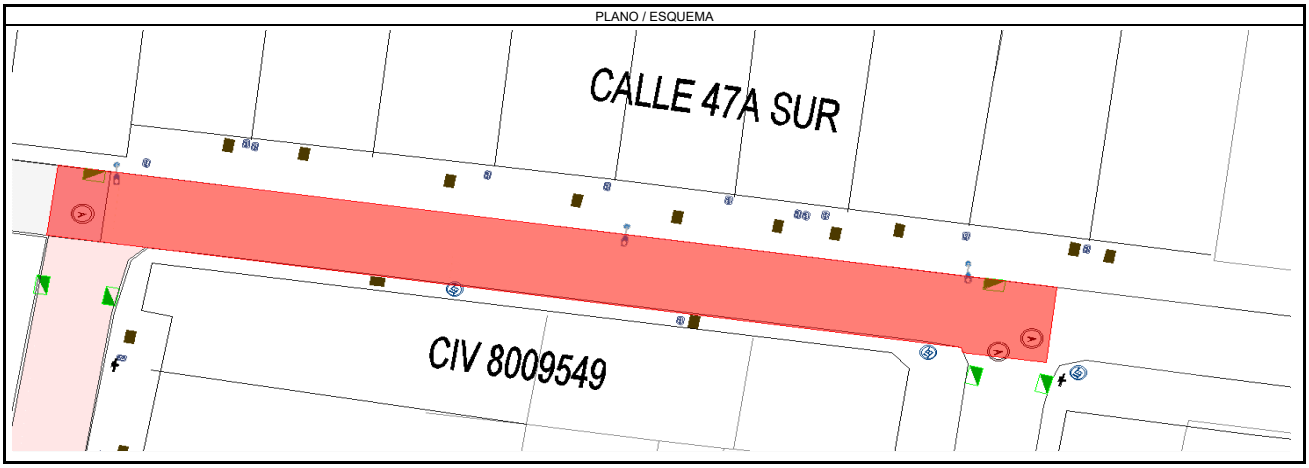

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
demolicion de carpeta asfaltica existente									
	asfalto existente		50,60	4,50	0,20				45,54
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	0,79		0,20			-3,00	-0,47
	sumideros existentes	area	0,35		0,20			-2,00	-0,14
	sardinel adosado a placa en concreto	costado oriental	39,70	0,20	0,15				1,19
		costado occidental	50,60	0,20	0,15				1,52
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									47,64
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									47,64
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

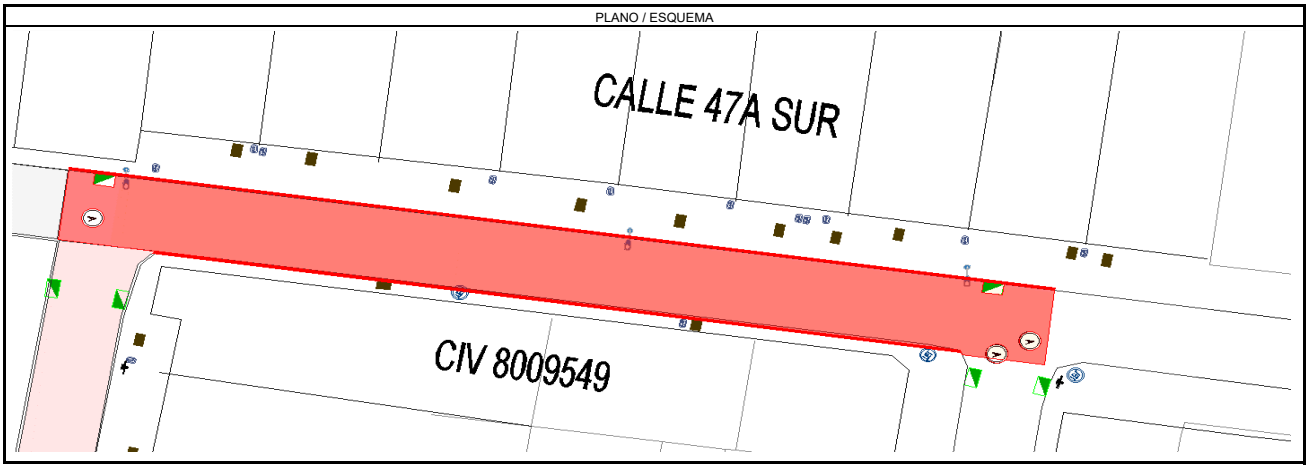

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8009549	
PRIORIDAD:	NC	28

ESPESOR MEDIO ENCONTRADO 0,200

CARTERA DE:	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE - PLACA EN CONCRETO	ANCHO DE VIA DEMOLIDA	4,50

ABSCISA (m)	PLACA EN CONCRETO EXISTENTE					DEMOLICION					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,620	2538,645	2538,670	2538,658	2538,645	2538,420	2538,445	2538,470	2538,458	2538,445	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
K0+005,00	2538,635	2538,653	2538,670	2538,643	2538,615	2538,435	2538,453	2538,470	2538,443	2538,415	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+010,00	2538,630	2538,650	2538,670	2538,650	2538,630	2538,430	2538,450	2538,470	2538,450	2538,430	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+015,00	2538,655	2538,675	2538,695	2538,678	2538,660	2538,455	2538,475	2538,495	2538,478	2538,460	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+020,00	2538,665	2538,683	2538,700	2538,690	2538,680	2538,465	2538,483	2538,500	2538,490	2538,480	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+025,00	2538,705	2538,715	2538,725	2538,718	2538,710	2538,505	2538,515	2538,525	2538,518	2538,510	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+030,00	2538,710	2538,728	2538,745	2538,730	2538,715	2538,510	2538,528	2538,545	2538,530	2538,515	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+035,00	2538,690	2538,725	2538,760	2538,735	2538,710	2538,490	2538,525	2538,560	2538,535	2538,510	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+040,00	2538,670	2538,718	2538,765	2538,735	2538,705	2538,470	2538,518	2538,565	2538,535	2538,505	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+045,00	2538,695	2538,735	2538,775	2538,733	2538,690	2538,495	2538,535	2538,575	2538,533	2538,490	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+050,60	2538,710	2538,740	2538,770	2538,750	2538,730	2538,510	2538,540	2538,570	2538,550	2538,530	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	25,200	5,040
																TOTAL	0,200	227,70	45,54
														area	0,785	POZOS	-3	-2,36	-0,47
														sumidero	0,35	SUMIDEROS	-2	-0,70	-0,14
																	TOTAL	224,65	44,93

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 3,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
limpieza de pozos existentes									
	pozo pluvial - costado oriental	K0+000,00						1,00	1,00
	pozo sanitario - eje via	K0+001,00						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

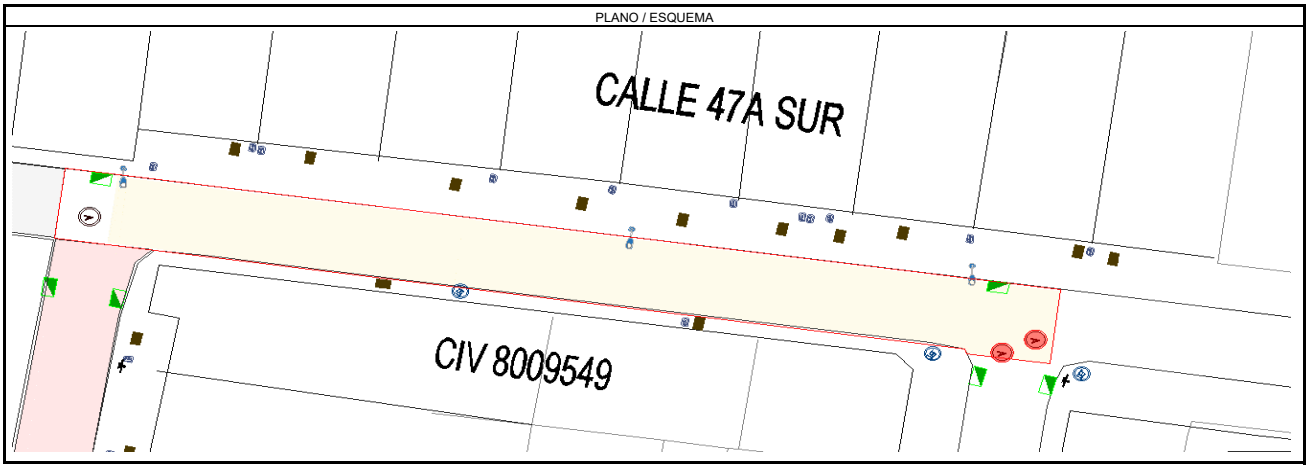

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 3,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
excavacion para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC28 - SANITARIA	77V-05	6,15	0,60	1,06				3,93
		77V-11	8,00	0,60	1,04				4,98
		46B-77	6,60	0,60	1,06				4,19
		77V-17	2,30	0,60	1,12				1,55
		77V-21	6,15	0,60	1,07				3,93
		77V-29	6,15	0,60	1,09				4,03
		77V-24	6,70	0,60	1,08				4,35
		77V-35	2,25	0,60	1,09				1,47
		77V-41	4,70	0,60	1,06				2,98
		77V-43	5,30	0,60	0,99				3,14
excavacion para construccion de sumideros									
	costado occidental								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+002,50	1,40	1,10	0,92				1,42
	costado occidental								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+045,00	1,40	1,10	0,92				1,42
excavacion para instalacion tuberia de sumideros									
	costado occidental								
	Excavacion tub de sumidero	K0+002,50	2,80	1,10	0,25				0,77
	costado occidental								
	Excavacion tub de sumidero	K0+045,00	10,30	1,10	0,68				7,70
excavacion para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	Costado Occidental	K0+005,00							
		K0+050,60	45,60	0,50	0,50				11,40
	cruce E-W	K0+005,00	4,60	0,65	0,50				1,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									58,76
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									58,76
TOTAL POR EJECUTAR									

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

PLANO / ESQUEMA

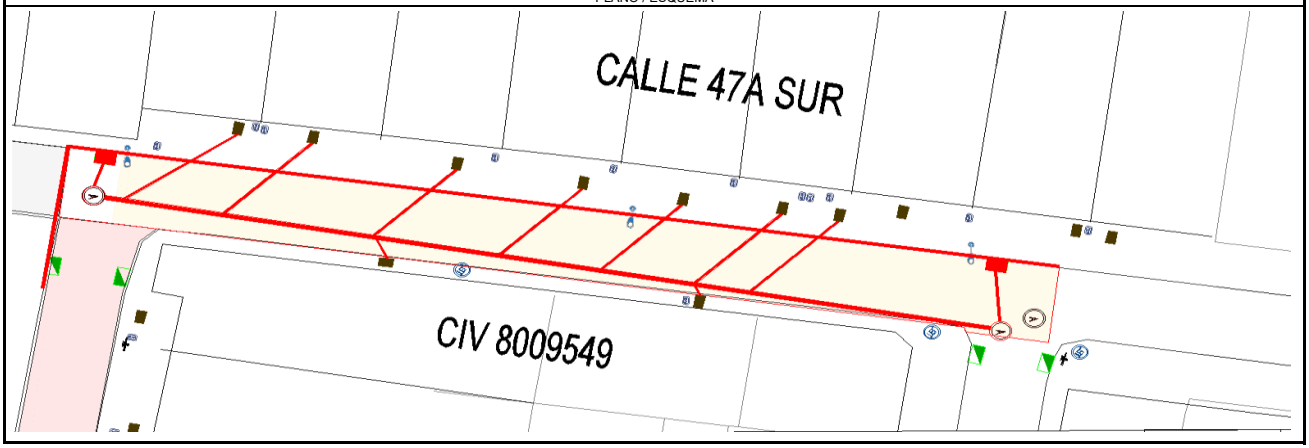

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Relleno para redes - tramos SANITARIOS					area seccion				
	NC28 - SANITARIA		45,70	0,90	0,165				7,53
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion de domiciliarias					area seccion				
	NC28 - SANITARIA		54,30	0,60	0,097				5,25
	se anexa cartera topografica								
relleno base instalacion de sumideros									
	costado occidental								
	Triturado para instal de sumidero	K0+002,50	1,40	1,10	0,10				0,15
	costado occidental								
	Triturado para instal de sumidero	K0+045,00	1,40	1,10	0,10				0,15
relleno para instalacion tuberia de sumideros - base carcamo									
	costado occidental								
	Triturado para tub de sumidero	K0+002,50	2,80	1,10	0,100				0,31
	costado occidental								
	Triturado para tub de sumidero	K0+045,00	10,30	1,10	0,100				1,13

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	14,53
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	14,53
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

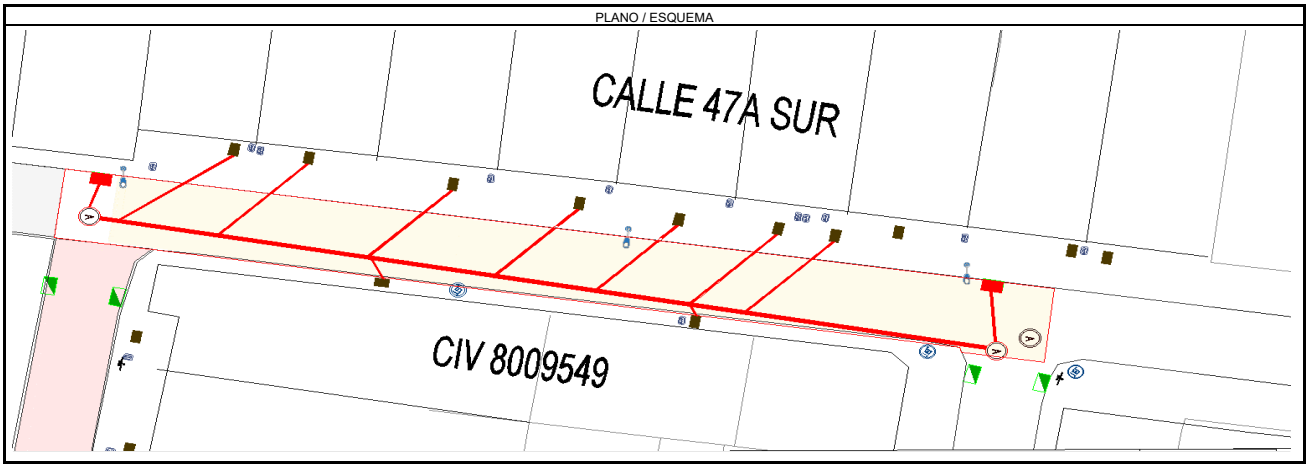

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Relleno en arena para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	tubo acueducto 4"								
	Costado Occidental	K0+005,00							
		K0+050,60	45,60	0,50	0,30				6,84
	volumen tubo 4"		45,60	area	-0,0079				-0,36
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									6,48
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									6,48
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

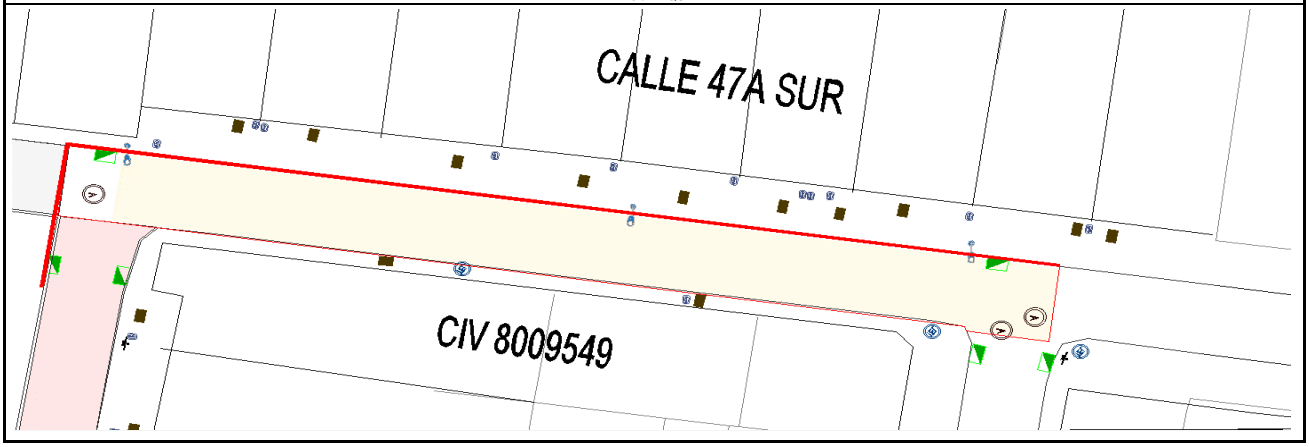

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
placa de cubierta - Reconstruccion de pozos SANITARIO									
	K0+050							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

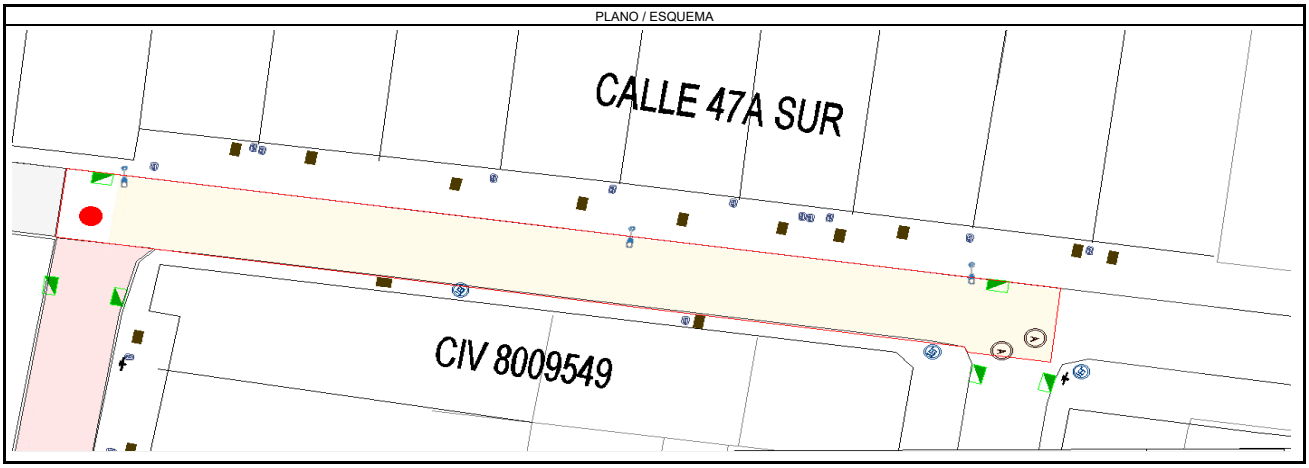

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,008 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
mamposteria - Reconstruccion de pozos SANITARIO									
	NC28 - SANITARIA		a	b	a-b=c	d			c-d
	PZ CMI66609	salida nc6	2538,70	2537,03	1,67	0,25			1,42
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,42
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,42
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

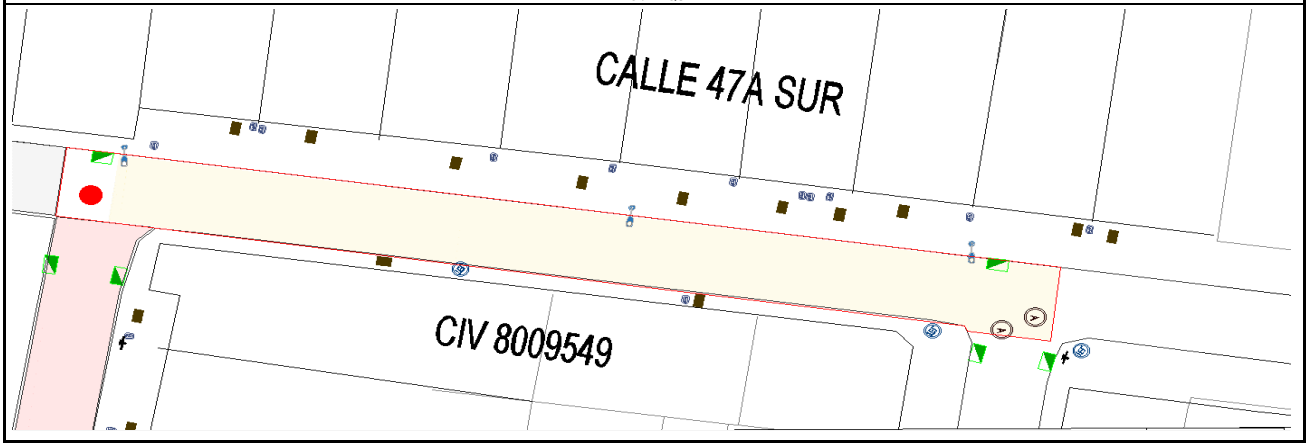

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,009 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
tuberia para conexcion de sumideros									
	costado occidental	K0+002,50	2,80						2,80
	costado occidental	K0+045,00	10,50						10,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									13,30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									13,30
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

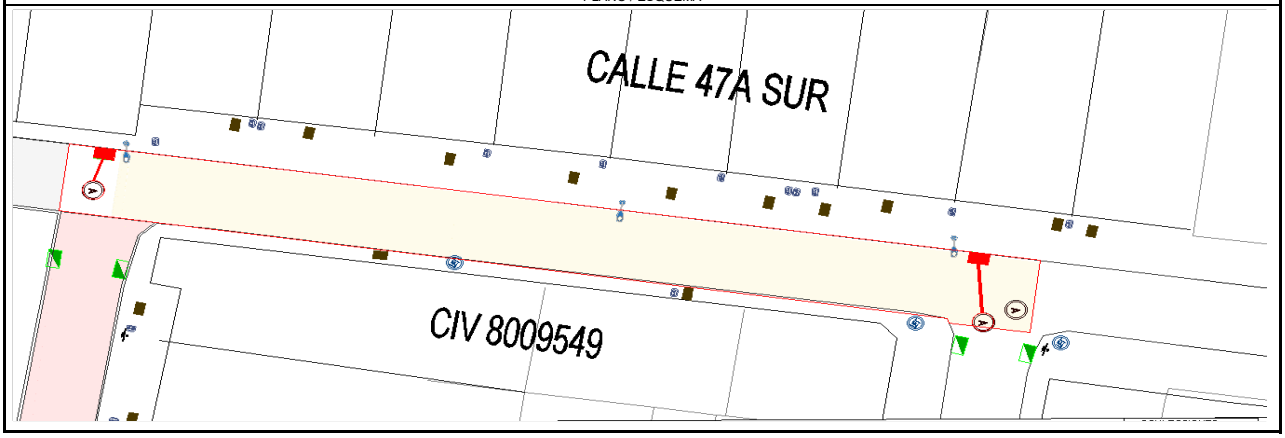

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Tuberia para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC28 - SANITARIA	77V-05	6,15						6,15
		77V-11	8,00						8,00
		46B-77	6,60						6,60
		77V-17	2,30						2,30
		77V-21	6,15						6,15
		77V-29	6,15						6,15
		77V-24	6,70						6,70
		77V-35	2,25						2,25
		77V-41	4,70						4,70
		77V-43	5,30						5,30
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									54,30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									54,30
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

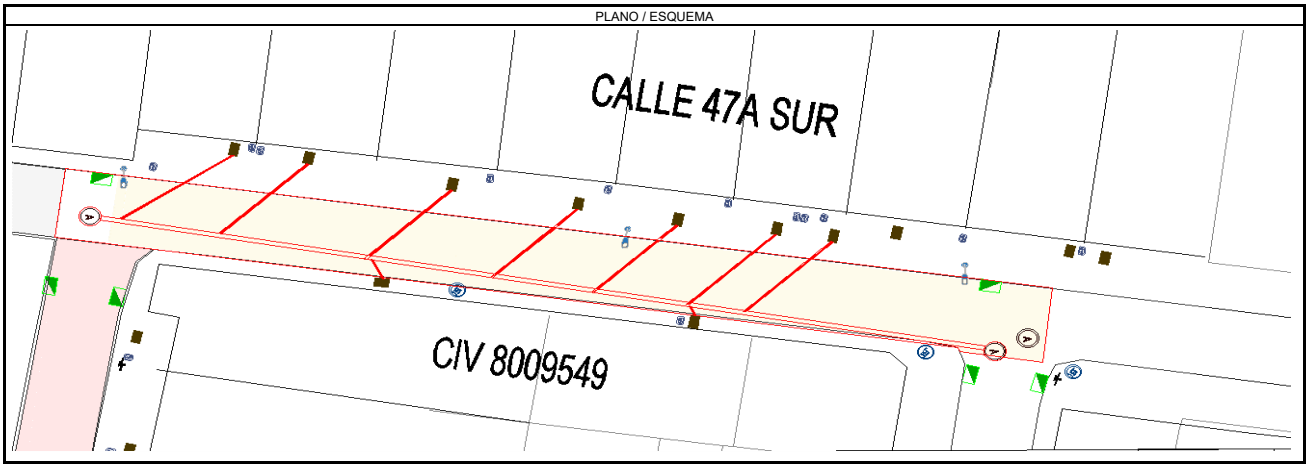

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,001 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LONG ENTRE EJES POZO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Tuberia para redes - tramos SANITARIOS									
	NC28 - SANITARIA		47,40			-1,20			46,20
	se anexa cartera topografica								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									46,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									46,20
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

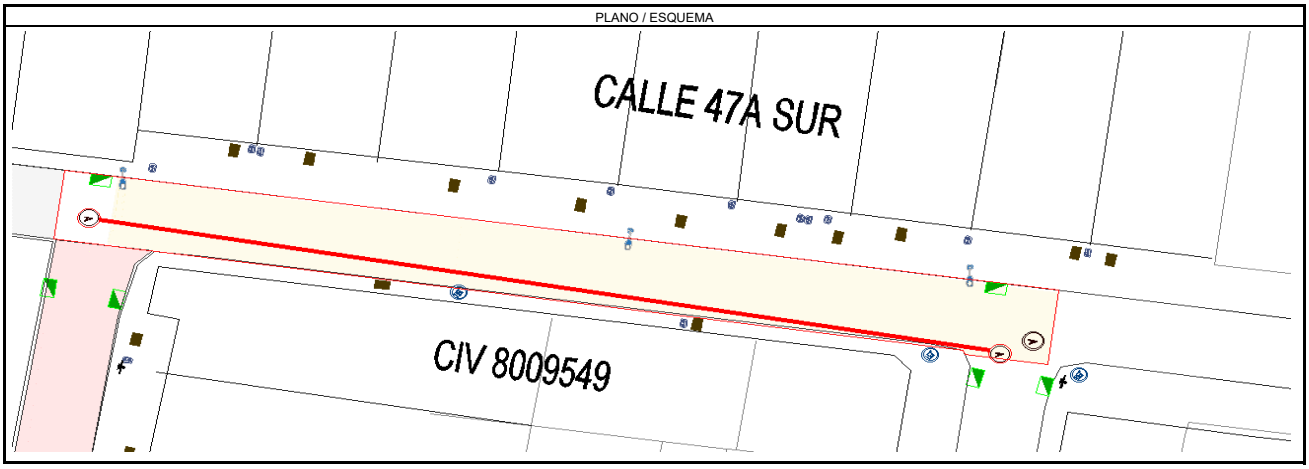

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,002 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
nivelacion y compactacion de subrasante de via									
	subrasante de diseño		50,60	4,500					227,70
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									218,73
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									218,73
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

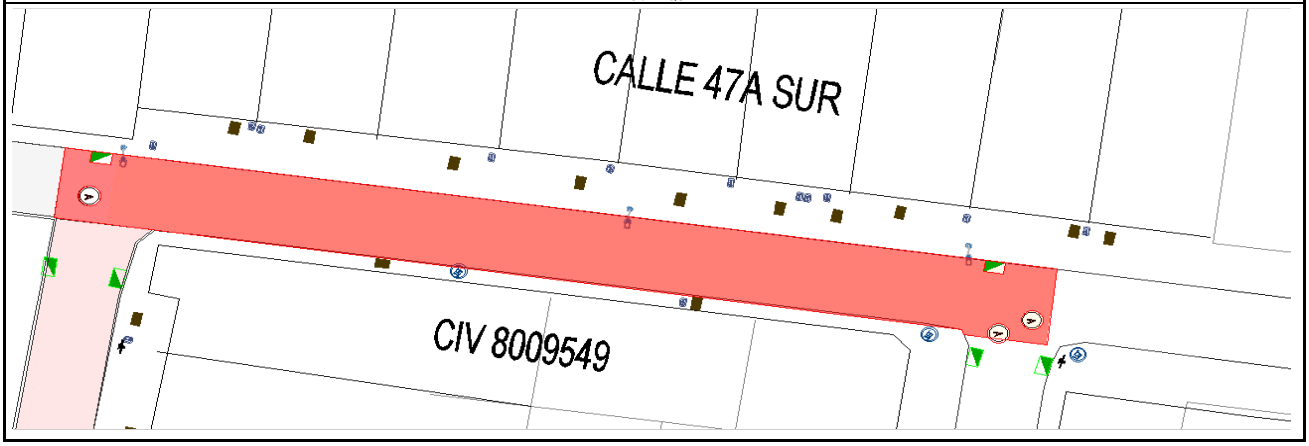

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8009549	
PRIORIDAD:	NC	28

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,50

ABSCISA (m)	SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,130	2538,155	2538,180	2538,168	2538,155	2538,130	2538,155	2538,180	2538,168	2538,155	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,155	2538,170	2538,185	2538,158	2538,130	2538,155	2538,170	2538,185	2538,158	2538,130	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+010,00	2538,180	2538,195	2538,210	2538,183	2538,156	2538,180	2538,195	2538,210	2538,183	2538,156	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+015,00	2538,205	2538,220	2538,235	2538,209	2538,182	2538,205	2538,220	2538,235	2538,209	2538,182	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+020,00	2538,230	2538,245	2538,260	2538,234	2538,208	2538,230	2538,245	2538,260	2538,234	2538,208	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+025,00	2538,255	2538,270	2538,285	2538,260	2538,234	2538,255	2538,270	2538,285	2538,260	2538,234	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+030,00	2538,280	2538,295	2538,310	2538,285	2538,260	2538,280	2538,295	2538,310	2538,285	2538,260	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+035,00	2538,240	2538,255	2538,270	2538,249	2538,228	2538,240	2538,255	2538,270	2538,249	2538,228	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+040,00	2538,200	2538,220	2538,240	2538,218	2538,196	2538,200	2538,220	2538,240	2538,218	2538,196	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+045,00	2538,160	2538,180	2538,200	2538,182	2538,164	2538,160	2538,180	2538,200	2538,182	2538,164	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+050,60	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,200	0,000
																TOTAL	0,000	227,70	0,00
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	218,73	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			COTA RASANTE	COTA FONDO	ALTO	DESCUENTO CARGUE	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Demolicion - Reconstruccion de pozos									
	NC28 - SANITARIA								
	PZ CMI66609	SANITARIO						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

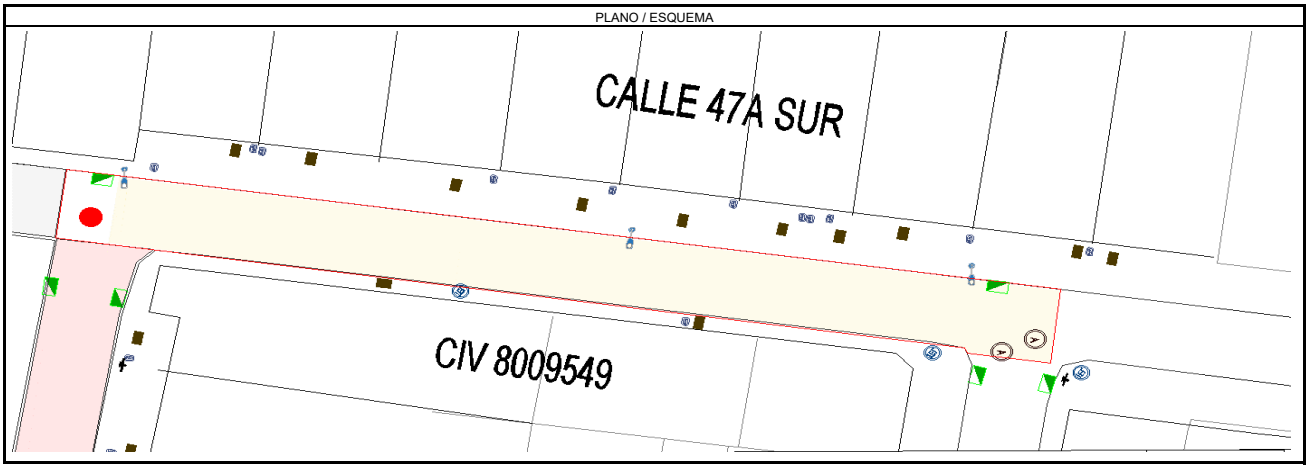

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Demolicion de sumidero existente									
	sumidero existente		K0+002,50	occidental				1,00	1,00
	sumidero existente		K0+045,00	occidental				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

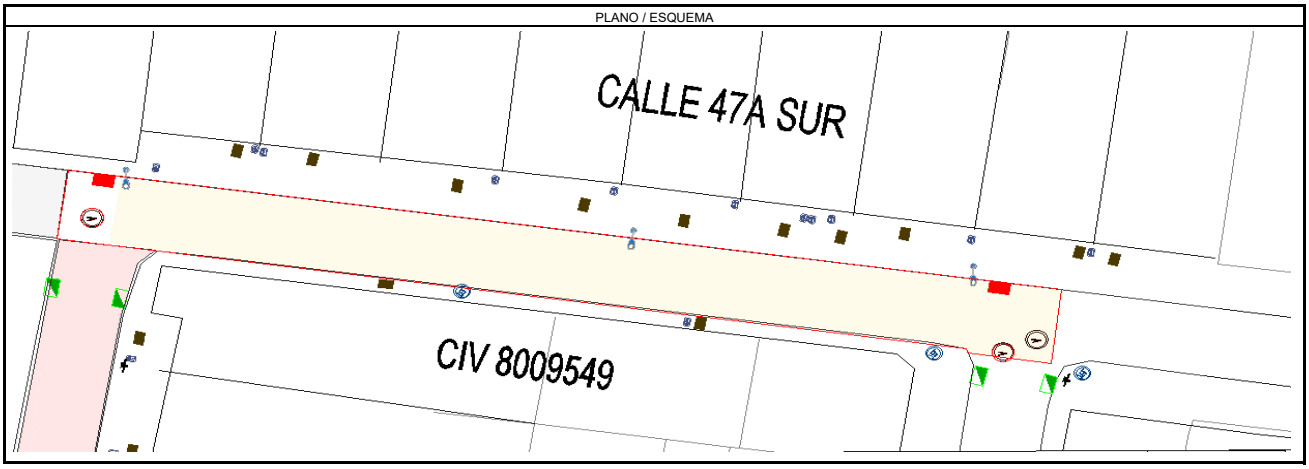

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,019 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Geocelda para estructura de via									
	estructura de via		50,60	4,500					227,70
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									218,73
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									218,73
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

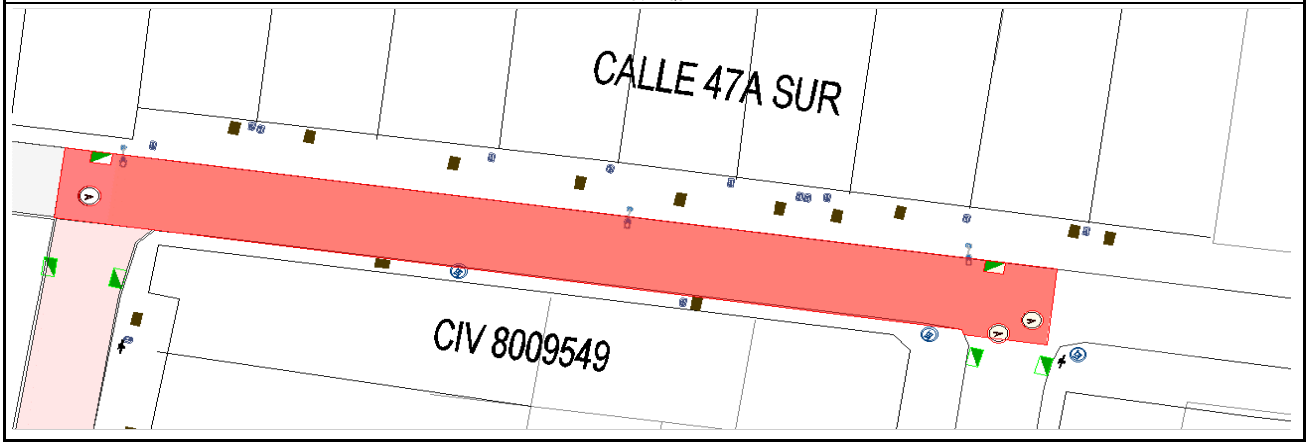

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero

Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez

Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio

Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado

Director de Interventoría

Original : Interventor.

1ra copia : Contratista.

2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8009549	
PRIORIDAD:	NC	28

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	GEOCELDA h=15cm	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,50

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					GEOCELDA h=15cm					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,130	2538,155	2538,180	2538,168	2538,155	2538,130	2538,155	2538,180	2538,168	2538,155	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,155	2538,170	2538,185	2538,158	2538,130	2538,155	2538,170	2538,185	2538,158	2538,130	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+010,00	2538,180	2538,195	2538,210	2538,183	2538,156	2538,180	2538,195	2538,210	2538,183	2538,156	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+015,00	2538,205	2538,220	2538,235	2538,209	2538,182	2538,205	2538,220	2538,235	2538,209	2538,182	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+020,00	2538,230	2538,245	2538,260	2538,234	2538,208	2538,230	2538,245	2538,260	2538,234	2538,208	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+025,00	2538,255	2538,270	2538,285	2538,260	2538,234	2538,255	2538,270	2538,285	2538,260	2538,234	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+030,00	2538,280	2538,295	2538,310	2538,285	2538,260	2538,280	2538,295	2538,310	2538,285	2538,260	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+035,00	2538,240	2538,255	2538,270	2538,249	2538,228	2538,240	2538,255	2538,270	2538,249	2538,228	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+040,00	2538,200	2538,220	2538,240	2538,218	2538,196	2538,200	2538,220	2538,240	2538,218	2538,196	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+045,00	2538,160	2538,180	2538,200	2538,182	2538,164	2538,160	2538,180	2538,200	2538,182	2538,164	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+050,60	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,200	0,000
																TOTAL	0,000	227,70	0,00
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	218,73	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
tuberia de acueducto 4"									
	tubo acueducto 4"								
	Costado Occidental	K0+005,00							
		K0+050,60	45,60						45,60
	cruce E-W	K0+005,00	4,60						4,60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									50,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									50,20
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

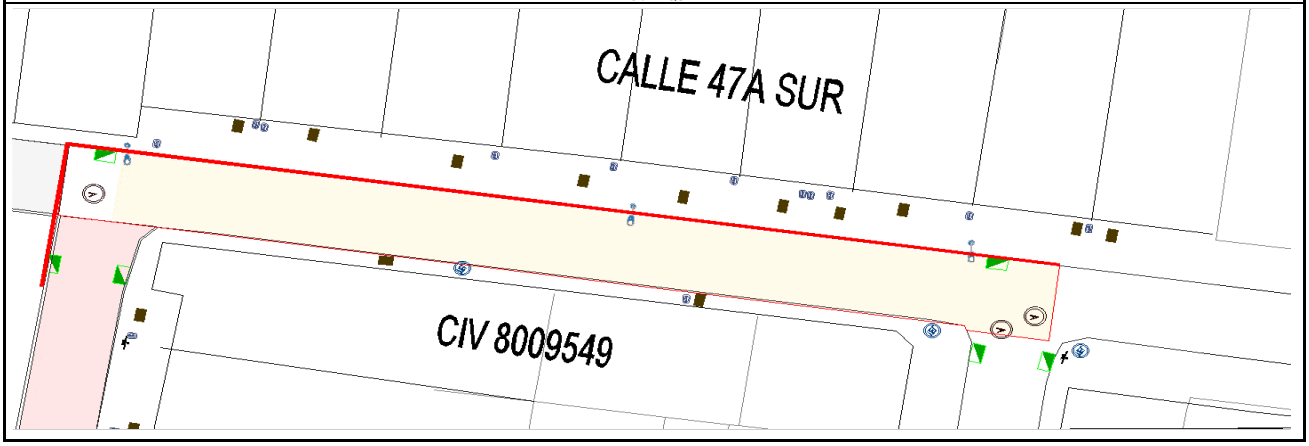

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
					altura media				
Relleno para redes - tramos SANITARIOS									
	NC28 - SANITARIA		45,70	0,90	0,825				33,93
	se anexa cartera topografica								
Relleno para redes - construccion domiciliarias									
	NC28 - SANITARIA		54,30	0,60	0,869				28,32
	se anexa cartera topografica								
relleno para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado occidental	K0+005,00							
		K0+050,60	45,60	0,50	0,20				4,56
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									66,81
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									66,81
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

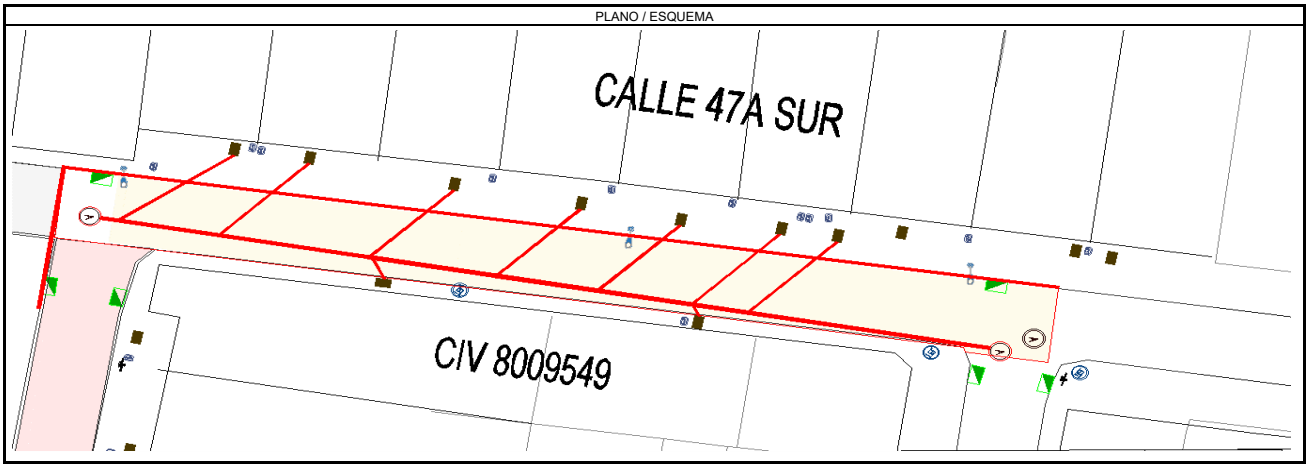

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Silla Y para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC28 - SANITARIA	77V-05						1,00	1,00
		77V-11						1,00	1,00
		46B-77						1,00	1,00
		77V-17						1,00	1,00
		77V-21						1,00	1,00
		77V-29						1,00	1,00
		77V-24						1,00	1,00
		77V-35						1,00	1,00
		77V-41						1,00	1,00
		77V-43						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									10,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									10,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

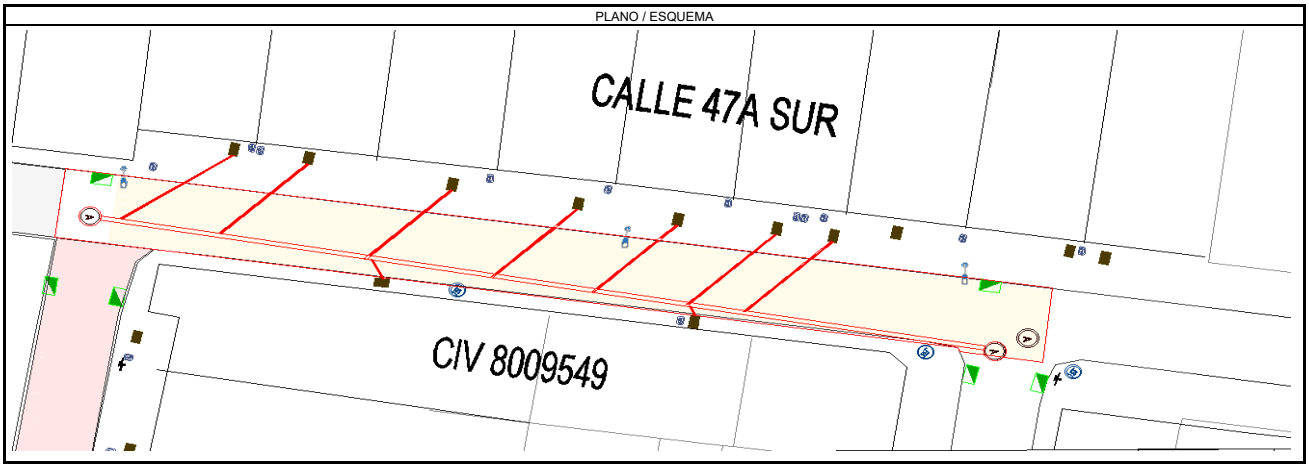

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,023 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Codo para construccion de domiciliarias sanitarias		predio							
	NC28 - SANITARIA	77V-05						1,00	1,00
		77V-11						1,00	1,00
		46B-77							
		77V-17							
		77V-21							
		77V-29							
		77V-24							
		77V-35							
		77V-41							
		77V-43						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									3,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									3,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

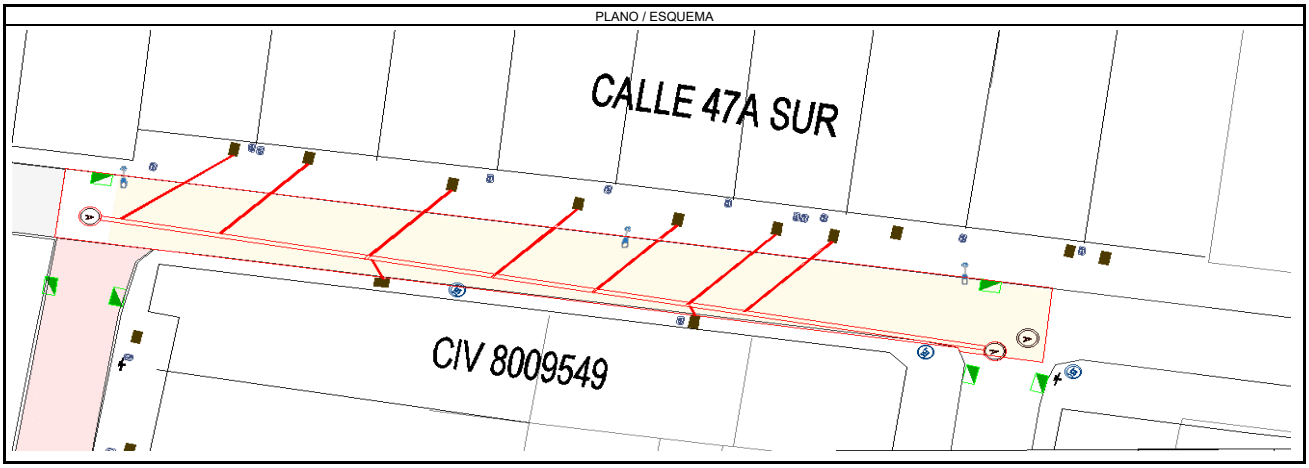

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,024 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,025 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Placa de fondo - Reconstruccion de pozos									
	NC28 - SANITARIA								
	PZ CMI66609	SANITARIO						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

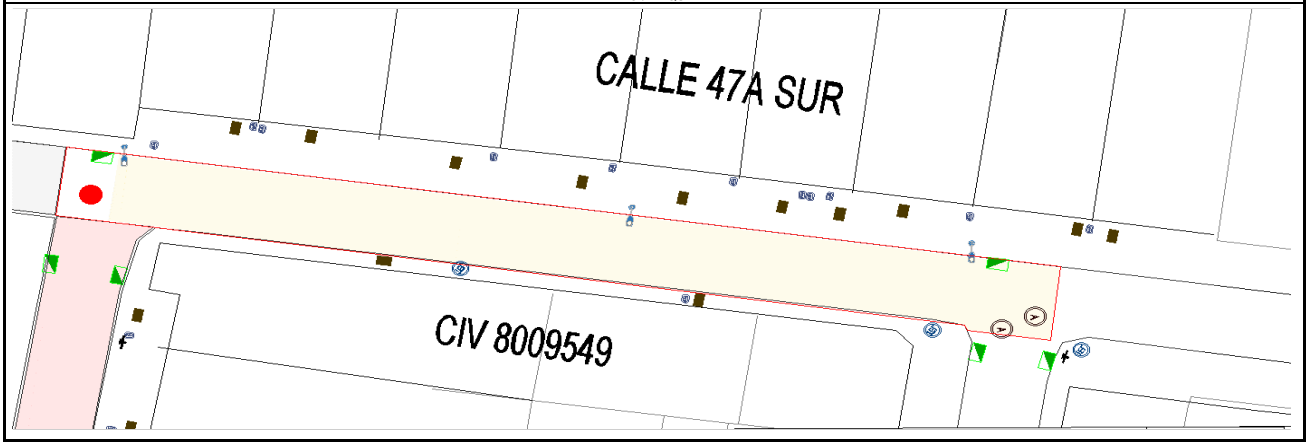

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,025 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
relleno con subbase granular AR_SBG50 para estructura de via									
	estructura de via		50,60	4,50	0,200				45,54
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,200			-3,00	-1,36
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,200			-2,00	-0,43
	carcamo tuberia de sumideros		2,80	0,90	0,200			-1,00	-0,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									43,24
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									43,24
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

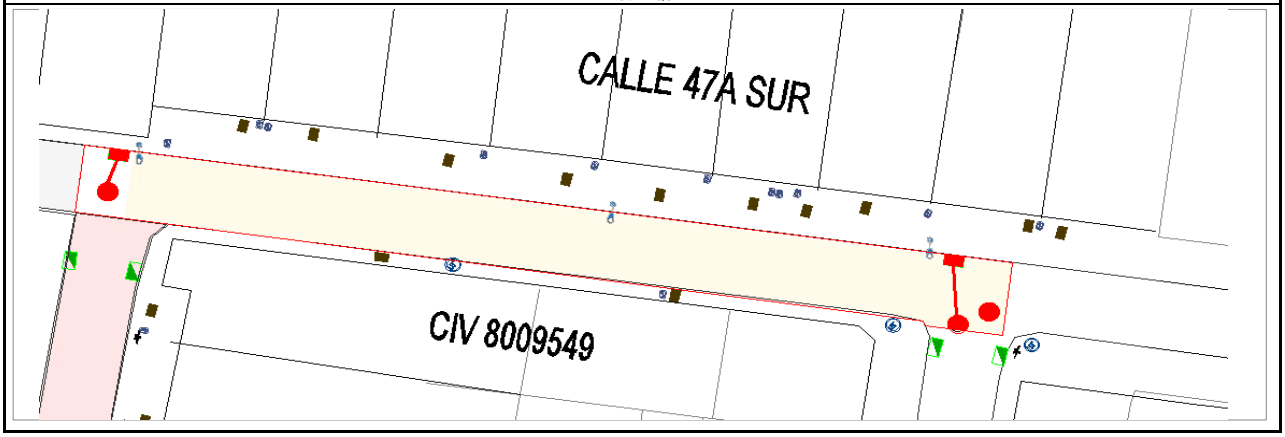

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8009549	
PRIORIDAD:	NC	28

JB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG 0,200

CARTERA DE:	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,50

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,130	2538,155	2538,180	2538,168	2538,155	2538,330	2538,355	2538,380	2538,368	2538,355	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
K0+005,00	2538,155	2538,170	2538,185	2538,158	2538,130	2538,355	2538,370	2538,385	2538,358	2538,330	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+010,00	2538,180	2538,195	2538,210	2538,183	2538,156	2538,380	2538,395	2538,410	2538,383	2538,356	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+015,00	2538,205	2538,220	2538,235	2538,209	2538,182	2538,405	2538,420	2538,435	2538,409	2538,382	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+020,00	2538,230	2538,245	2538,260	2538,234	2538,208	2538,430	2538,445	2538,460	2538,434	2538,408	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+025,00	2538,255	2538,270	2538,285	2538,260	2538,234	2538,455	2538,470	2538,485	2538,460	2538,434	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+030,00	2538,280	2538,295	2538,310	2538,285	2538,260	2538,480	2538,495	2538,510	2538,485	2538,460	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+035,00	2538,240	2538,255	2538,270	2538,249	2538,228	2538,440	2538,455	2538,470	2538,449	2538,428	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+040,00	2538,200	2538,220	2538,240	2538,218	2538,196	2538,400	2538,420	2538,440	2538,418	2538,396	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+045,00	2538,160	2538,180	2538,200	2538,182	2538,164	2538,360	2538,380	2538,400	2538,382	2538,364	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+050,60	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	2538,392	2538,412	2538,432	2538,413	2538,393	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	25,200	5,040
																TOTAL	0,200	227,70	45,54
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	-1,36
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,43
																	TOTAL	218,73	43,75

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Geotextil para estructura de via									
	subrasante de diseño		50,60	5,000					253,00
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									244,03
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									244,03
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

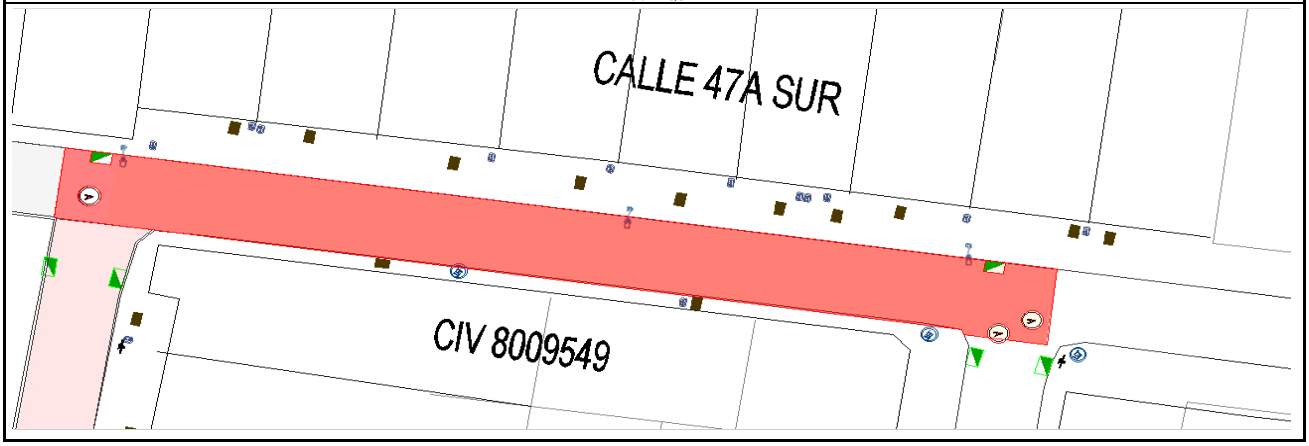

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8009549	
PRIORIDAD:	NC	28

GEOTEXTIL 0,480

CARTERA DE:	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m	ANCHO DE VIA EXCAVADA	5,00

ABSCISA (m)	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,130	2538,155	2538,180	2538,168	2538,155	2538,130	2538,155	2538,180	2538,168	2538,155	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,155	2538,170	2538,185	2538,158	2538,130	2538,155	2538,170	2538,185	2538,158	2538,130	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+010,00	2538,180	2538,195	2538,210	2538,183	2538,156	2538,180	2538,195	2538,210	2538,183	2538,156	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+015,00	2538,205	2538,220	2538,235	2538,209	2538,182	2538,205	2538,220	2538,235	2538,209	2538,182	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+020,00	2538,230	2538,245	2538,260	2538,234	2538,208	2538,230	2538,245	2538,260	2538,234	2538,208	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+025,00	2538,255	2538,270	2538,285	2538,260	2538,234	2538,255	2538,270	2538,285	2538,260	2538,234	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+030,00	2538,280	2538,295	2538,310	2538,285	2538,260	2538,280	2538,295	2538,310	2538,285	2538,260	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+035,00	2538,240	2538,255	2538,270	2538,249	2538,228	2538,240	2538,255	2538,270	2538,249	2538,228	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+040,00	2538,200	2538,220	2538,240	2538,218	2538,196	2538,200	2538,220	2538,240	2538,218	2538,196	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+045,00	2538,160	2538,180	2538,200	2538,182	2538,164	2538,160	2538,180	2538,200	2538,182	2538,164	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+050,60	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,000	0,000
																TOTAL	0,000	253,00	0,00
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	244,03	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Geomalla para estructura de via									
	estructura de via		50,60	4,500					227,70
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-3,00	-6,81
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									218,73
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									218,73
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

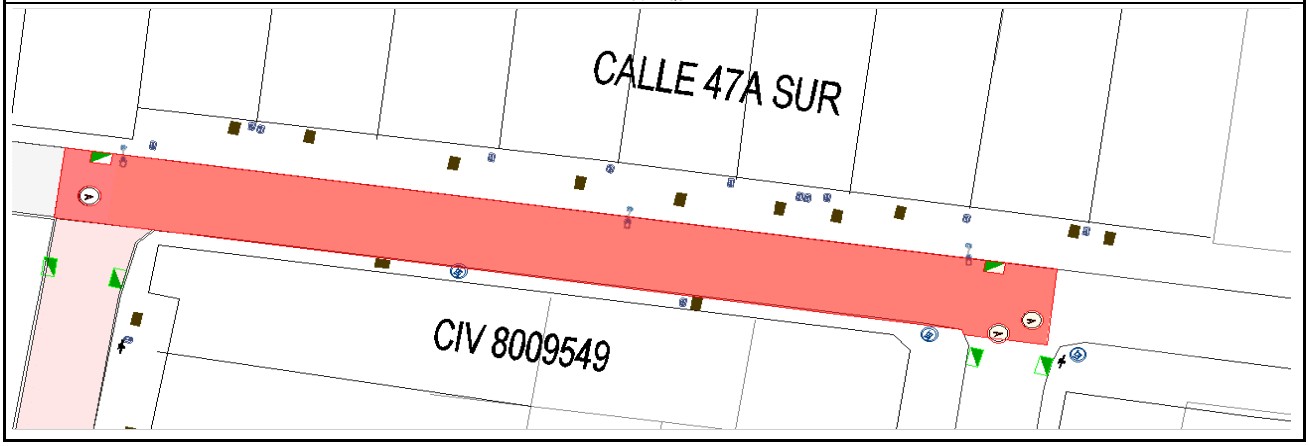

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8009549	
PRIORIDAD:	NC	28

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	GEOMALLA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,50

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					GEOMALLA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,330	2538,355	2538,380	2538,368	2538,355	2538,330	2538,355	2538,380	2538,368	2538,355	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,355	2538,370	2538,385	2538,358	2538,330	2538,355	2538,370	2538,385	2538,358	2538,330	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+010,00	2538,380	2538,395	2538,410	2538,383	2538,356	2538,380	2538,395	2538,410	2538,383	2538,356	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+015,00	2538,405	2538,420	2538,435	2538,409	2538,382	2538,405	2538,420	2538,435	2538,409	2538,382	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+020,00	2538,430	2538,445	2538,460	2538,434	2538,408	2538,430	2538,445	2538,460	2538,434	2538,408	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+025,00	2538,455	2538,470	2538,485	2538,460	2538,434	2538,455	2538,470	2538,485	2538,460	2538,434	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+030,00	2538,480	2538,495	2538,510	2538,485	2538,460	2538,480	2538,495	2538,510	2538,485	2538,460	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+035,00	2538,440	2538,455	2538,470	2538,449	2538,428	2538,440	2538,455	2538,470	2538,449	2538,428	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+040,00	2538,400	2538,420	2538,440	2538,418	2538,396	2538,400	2538,420	2538,440	2538,418	2538,396	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+045,00	2538,360	2538,380	2538,400	2538,382	2538,364	2538,360	2538,380	2538,400	2538,382	2538,364	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+050,60	2538,392	2538,412	2538,432	2538,413	2538,393	2538,392	2538,412	2538,432	2538,413	2538,393	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,200	0,000
																TOTAL	0,000	227,70	0,00
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	218,73	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Estabilizacion de material granular									
	estructura de via Base granular	BG38	50,60	4,30	0,160		1,30		45,26
	pozos existentes	area	2,27		0,160		1,30	-3,00	-1,42
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,160		1,30	-2,00	-0,45
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									43,39
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									43,39
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

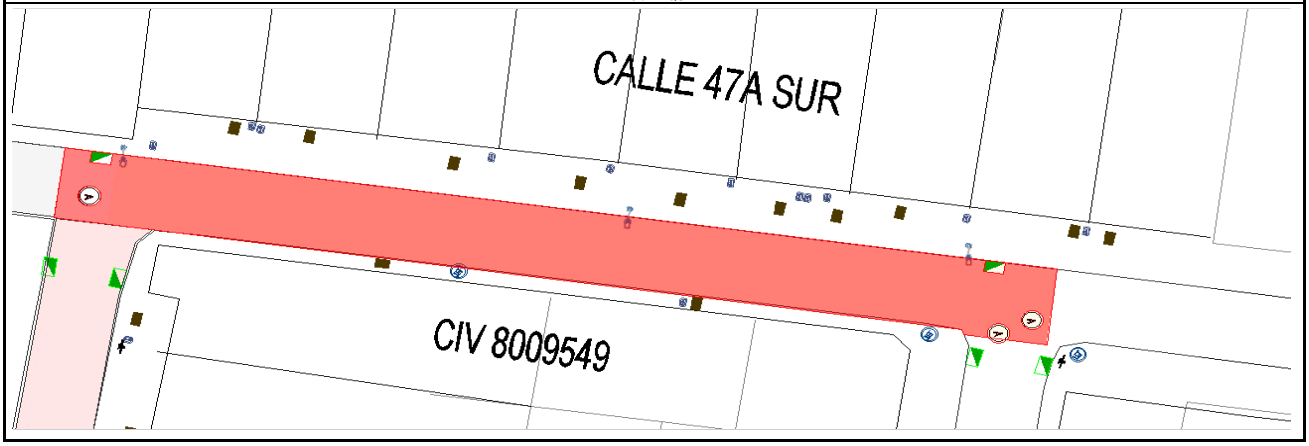

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY


(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Inyeccion de Cal a perforaciones									
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+000,50	A		B				
		K0+050,60	50,1000	4,5000	4,2000				
corredor tuberia sanitaria	numero de lineas transversales	-1,00	(B/0.70)+1(-1)	C	6,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	35,7857				
	cantidad de barrenos		C*D	6,0000	36,0000				216,00
	pozos existentes - construidos		-3,00					3,00	-9,00
	sumideros construidos		-2,00					3,00	-6,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
			C		D				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									201,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									201,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

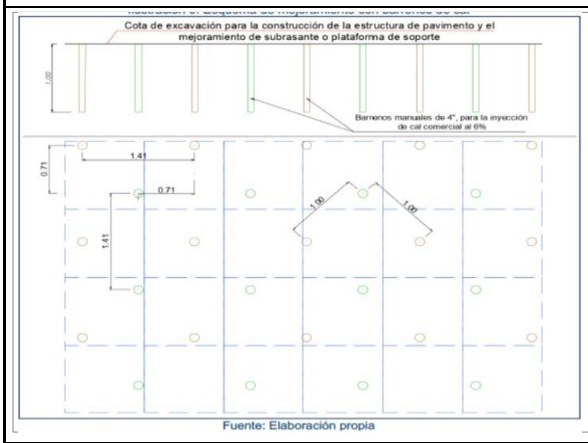

Fuente: Elaboración propia

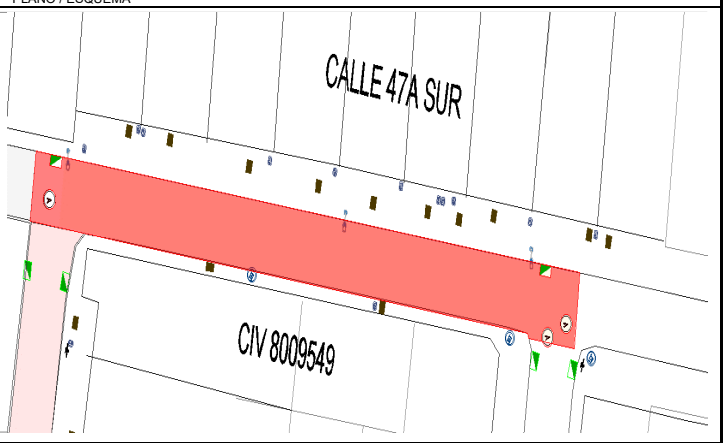

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
carcamo para proteccion tuberia conexión de sumideros									
	costado occidental	K0+002,50	2,80						2,80
	costado occidental	K0+045,00	10,30						10,30
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									13,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									13,10
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

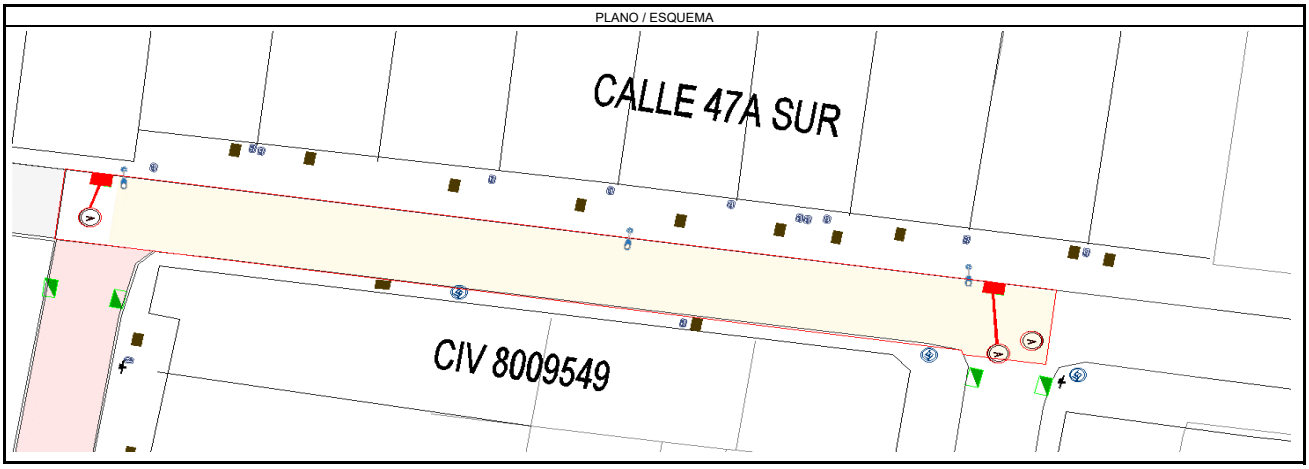

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Cañuela para pozo - Reconstruccion de pozos									
	NC28 - SANITARIA								
	PZ CMI66609							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

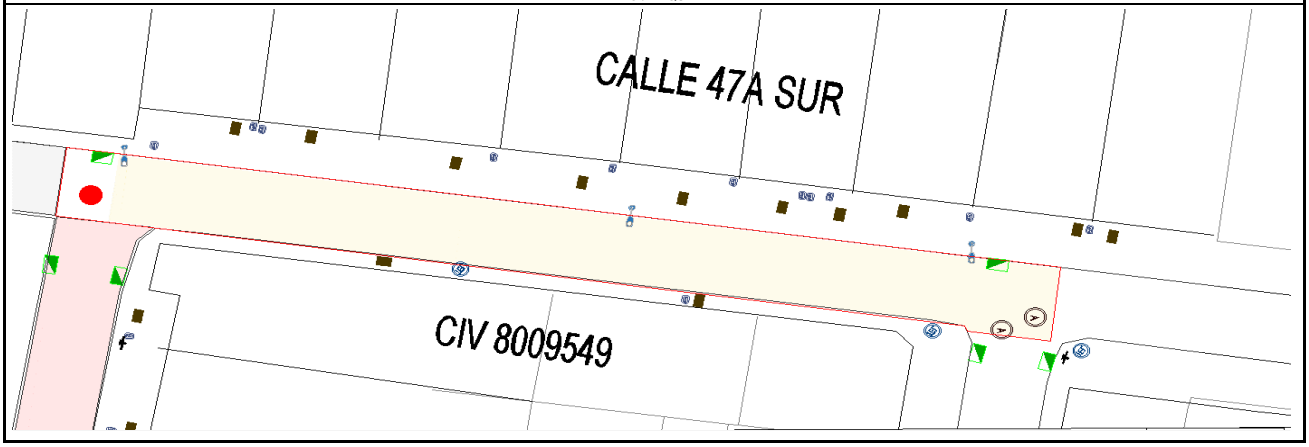

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,015 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY


(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
	perforaciones de 4"								
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+000,50	A		B				
		K0+050,60	50,1000	4,5000	4,2000				
corredor tuberia sanitaria	numero de lineas transversales	-1,00	(B/0.70)+1(-1)	C	6,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	35,7857				
	cantidad de barrenos		C*D	6,0000	36,0000				216,00
	pozos existentes - construidos		-3,00					3,00	-9,00
	sumideros construidos		-2,00					3,00	-6,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
			C		D				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									201,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									201,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

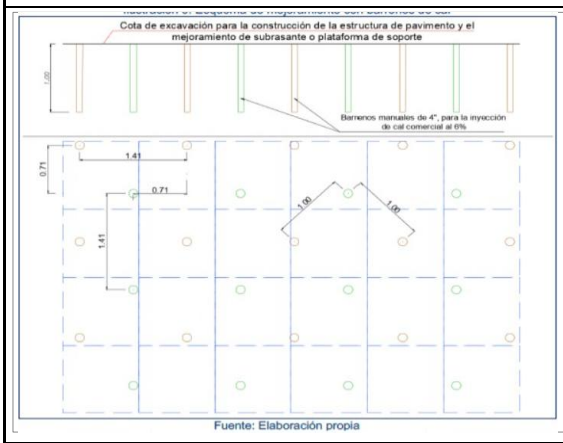

Fuente: Elaboración propia

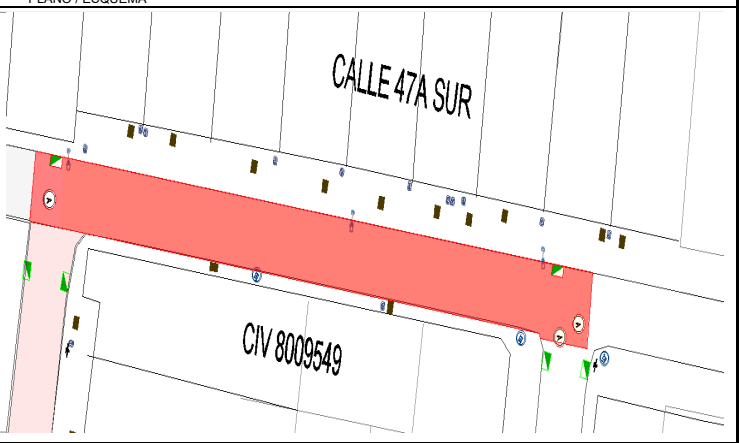

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Construccion de sumideros									
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+002,50	occidental				1,00	1,00
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+045,00	occidental				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

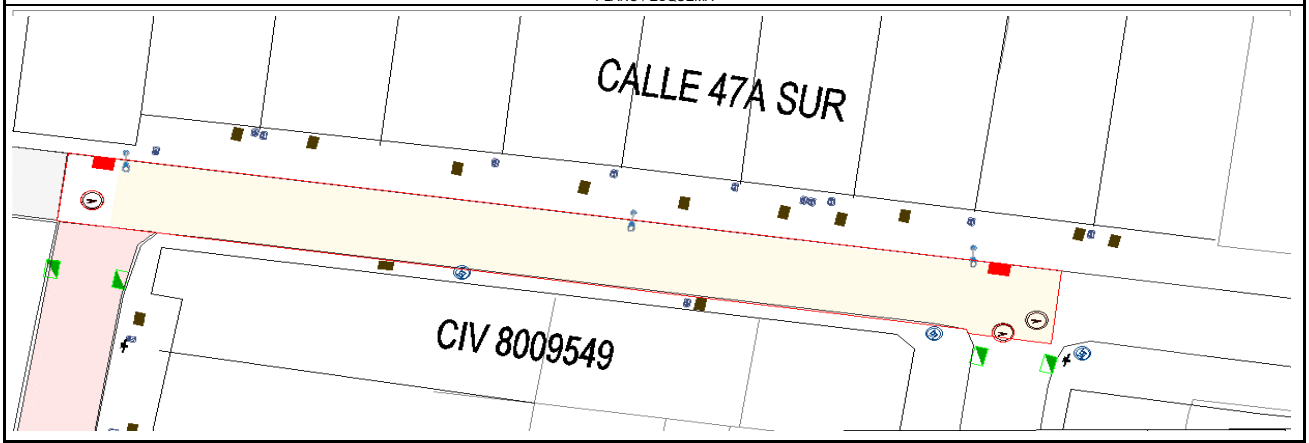

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,024 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
Carcamo proteccion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte segmento								
	tubo acueducto 4"								
	cruce E-W	K0+005,00	4,60	0,55					4,60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									4,60
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									4,60
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

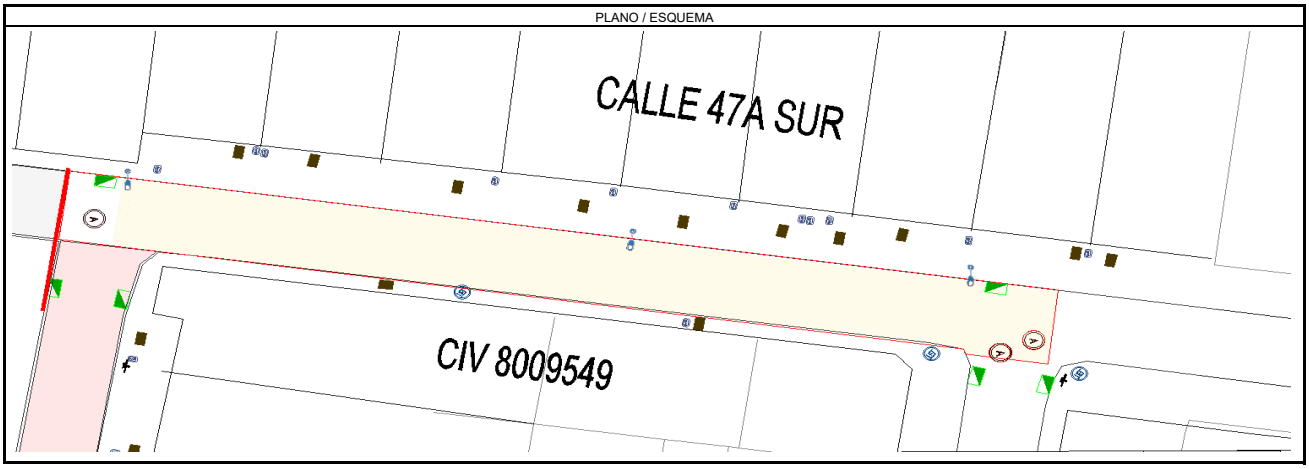

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,024 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

NTIDADES DE OBRA

ARROLLO LOCAL DE KENNEDY

DE INFRAESTRUCTURA

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009549	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77V Y CARRERA 77W								
relleno con base granular AR_BG38 para estructura de via									
	estructura de via		50,60	4,30	0,160				34,81
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,160			-3,00	-1,09
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,160			-2,00	-0,35
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									33,38
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									33,38
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

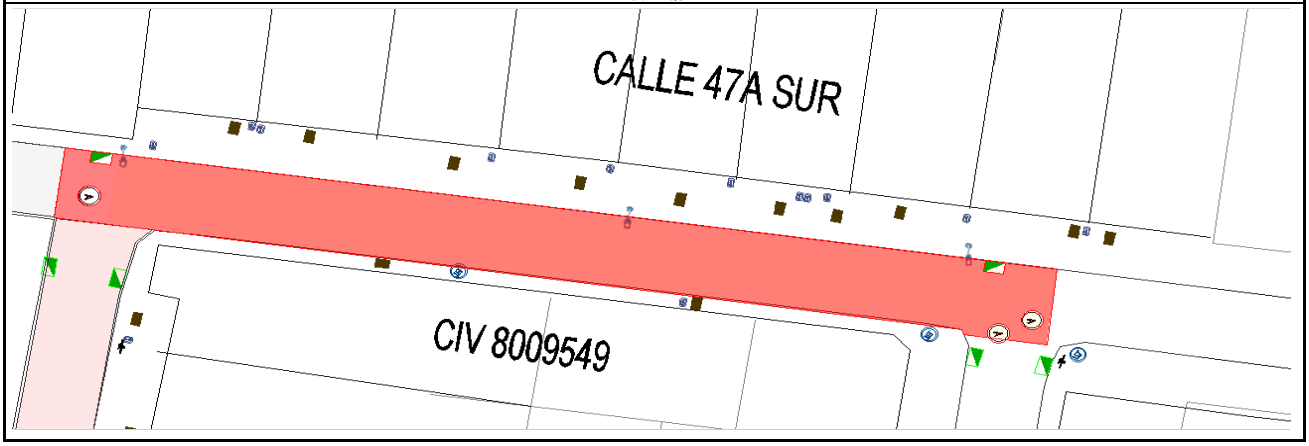

NTIDADES DE OBRA

ARROLLO LOCAL DE KENNEDY

DE INFRAESTRUCTURA

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA





FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	20/03/2026

CIV	8009549	
PRIORIDAD:	NC	28

BASE GRANULAR AR_BG38 0,160

CARTERA DE:	BASE GRANULAR AR_BG38	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,30

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					BASE GRANULAR AR_BG38					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,330	2538,355	2538,380	2538,368	2538,355	2538,490	2538,515	2538,540	2538,528	2538,515	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
K0+005,00	2538,355	2538,370	2538,385	2538,358	2538,330	2538,515	2538,530	2538,545	2538,518	2538,490	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+010,00	2538,380	2538,395	2538,410	2538,383	2538,356	2538,540	2538,555	2538,570	2538,543	2538,516	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+015,00	2538,405	2538,420	2538,435	2538,409	2538,382	2538,565	2538,580	2538,595	2538,569	2538,542	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+020,00	2538,430	2538,445	2538,460	2538,434	2538,408	2538,590	2538,605	2538,620	2538,594	2538,568	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+025,00	2538,455	2538,470	2538,485	2538,460	2538,434	2538,615	2538,630	2538,645	2538,620	2538,594	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+030,00	2538,480	2538,495	2538,510	2538,485	2538,460	2538,640	2538,655	2538,670	2538,645	2538,620	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+035,00	2538,440	2538,455	2538,470	2538,449	2538,428	2538,600	2538,615	2538,630	2538,609	2538,588	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+040,00	2538,400	2538,420	2538,440	2538,418	2538,396	2538,560	2538,580	2538,600	2538,578	2538,556	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+045,00	2538,360	2538,380	2538,400	2538,382	2538,364	2538,520	2538,540	2538,560	2538,542	2538,524	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+050,60	2538,392	2538,412	2538,432	2538,413	2538,393	2538,552	2538,572	2538,592	2538,573	2538,553	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	24,080	3,853
																TOTAL	0,160	217,58	34,81
														area	2,27	POZOS	-3	-6,81	-1,09
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,35
																	TOTAL	208,61	33,38

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
PLANILLA DE TRAMOS INSTALADOS
CONTRATO No. 938 de 2025

CONTRATISTA:

PROYECTO: **REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE**

HOJA 1 DE 1

CIV 8009549
BARRIO JACQUELINE Alcantarillado: SANITARIO Diámetro: 0,202 Rasante: PAV FLEXIBLE Longitud entre ejes: 47,40
estructura 0,48
Tramo: NC28 - SANITARIA Clase de tubería: PVC Pendiente: 0,450% Ancho excavación: 0,90 Corte promedio: 1,050
Base Triturado 0,1

POZO	ABS	COTAS				CORTE A FONDO DE SUBRASNT	ANCHO EXCAV	AREA EXCAV	VOLUMEN EXCAV	AREA RELLENOS		VOL RELLENOS		RETIRO DE SOBR	EXCV ADIC	ENTIBADO 2 CARAS
		RASANTE	SUBRASANTE	CLAVE	FONDO					GRAVA	B-200	GRAVA	B-200			
PZ CMI66609	K0+000,00	2538,635	2538,155	2537,349	2537,047	1,108	0,90	alt subra			alt subra					
1	K0+000,85	2538,635	2538,155	2537,353	2537,051	1,104	0,90			0,165						
1	K0+005,75	2538,610	2538,130	2537,375	2537,073	1,057	0,90	0,973	4,766	0,165	0,776	0,81	3,80	6,20		
2	K0+011,50	2538,636	2538,156	2537,401	2537,099	1,057	0,90	0,951	5,471	0,165	0,755	0,95	4,34	7,11		
3	K0+017,25	2538,662	2538,182	2537,427	2537,125	1,057	0,90	0,952	5,472	0,165	0,755	0,95	4,34	7,11		
4	K0+023,00	2538,714	2538,234	2537,453	2537,151	1,084	0,90	0,963	5,540	0,165	0,766	0,95	4,41	7,20		
5	K0+028,75	2538,740	2538,260	2537,478	2537,176	1,084	0,90	0,975	5,607	0,165	0,778	0,95	4,48	7,29		
6	K0+034,50	2538,708	2538,228	2537,504	2537,202	1,026	0,90	0,949	5,458	0,165	0,752	0,95	4,33	7,10		
7	K0+040,25	2538,676	2538,196	2537,530	2537,228	0,968	0,90	0,897	5,159	0,165	0,700	0,95	4,03	6,71		
PZ CMP102214	K0+046,55	2538,695	2538,215	2537,558	2537,256	0,959	0,90	0,867	5,461	0,165	0,670	1,04	4,22	7,10		
TUBERIA DIAM							**SUMAS**		**42,93**			**7,53**	**33,93**	**55,81**	**0,00**	**0,00**
8"	46,20								1,003			6,004	7,022			

Observaciones:

ENTREGA:		**RECIBE:**
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ	**EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS**
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

PLANILLA DOMICILIARÍAS

CÓDIGO: 003
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/09/2024

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA, D.C. A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATO No.: 938-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 **CIV** 8009549 **FECHA:** 31/03/2026

TRAMO TUBERIA NC28 - SANITARIA **Diametro** 0,152 **base** 0,10

BARRIO: JACQUELINE NC-28 **ALCANTARILLADO:** SANITARIO **H ESTRU VIA:** 0,48 **HOJA:** 1 **DE** 1

Abscisa de tuberia	Nomenclatura	Costado	Diámetro Tubería (m)	Longitud Tubería	Ancho Excavación	Cota subrasante de tuberia	Cota cimentacion de tuberia	Diferencia cotas de tuberia a excavación	Cota rasante de caja	Cota lomo entrada a caja	Diferencia cotas de caja	Altura promedio	Volumen excavación	Concreto de anclaje MANO DE OBRA	Area Rellenos		Rellenos		Volumen retiro de sobrantes	Accesorios Yee	semicodo
															Triturado 3/4"	Recebo B200	Triturado 3/4"	Recebo B200			
K0+005,90	77V-05	IZQ	6"	6,15	0,60	2538,130	2537,073	1,06	2538,330	2537,257	1,07	1,06	3,93		0,0966	0,524	0,594	3,223	5,11	1,0	1,0
K0+008,90	77V-11	IZQ	6"	8,00	0,60	2538,156	2537,099	1,06	2538,356	2537,339	1,02	1,04	4,98		0,0966	0,508	0,773	4,060	6,47	1,0	1,0
K0+013,05	46B-77	DER	6"	6,60	0,60	2538,156	2537,099	1,06	2538,356	2537,297	1,06	1,06	4,19		0,0966	0,520	0,638	3,433	5,45	1,0	
K0+013,55	77V-17	IZQ	6"	2,30	0,60	2538,182	2537,125	1,06	2538,382	2537,194	1,19	1,12	1,55		0,0966	0,559	0,222	1,285	2,01	1,0	
K0+019,40	77V-21	IZQ	6"	6,15	0,60	2538,182	2537,125	1,06	2538,382	2537,309	1,07	1,07	3,93		0,0966	0,524	0,594	3,224	5,11	1,0	
K0+025,50	77V-29	IZQ	6"	6,15	0,60	2538,260	2537,176	1,08	2538,460	2537,361	1,10	1,09	4,03		0,0966	0,540	0,594	3,321	5,24	1,0	
K0+029,35	77V-24	DER	6"	6,70	0,60	2538,260	2537,176	1,08	2538,460	2537,377	1,08	1,08	4,35		0,0966	0,535	0,647	3,585	5,66	1,0	
K0+031,60	77V-35	IZQ	6"	2,25	0,60	2538,228	2537,202	1,03	2538,428	2537,270	1,16	1,09	1,47		0,0966	0,540	0,217	1,216	1,92	1,0	
K0+033,80	77V-41	IZQ	6"	4,70	0,60	2538,228	2537,202	1,03	2538,428	2537,343	1,08	1,06	2,98		0,0966	0,518	0,454	2,436	3,87	1,0	
K0+038,70	77V-43	IZQ	6"	5,30	0,60	2538,196	2537,228	0,97	2538,396	2537,387	1,01	0,99	3,14		0,0966	0,478	0,512	2,534	4,09	1,0	1,0
Totales				54,30									34,55	0,00			5,25	28,32	44,92	10,00	3,00
ITEM				7,001									6,001	7,038			6,004	7,022	1,004	7,023	7,024

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No 2 **DE RECIBO PARCIAL No** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/3/2026 (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010826 - TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES - PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
			1. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
1	1,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8195.34	$ 1.142.00	$ 9.359.080.00	10212.16	$ 1.142.00	$ 11.662.287.00	283.50	$ 323.757.00		283.50	$ 323.757.00	9928.66	$ 11.338.530.00
2	1,002	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1375,79	$ 48.679,00	$ 66.972.081,00	1359,01	$ 48.679,00	$ 66.155.248,00	35,67	$ 1.736.380,00		35,67	$ 1.736.380,00	1323,34	$ 64.418.868,00
3	1,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5859.32	$ 7.206.00	$ 42.222.260.00	4763.20	$ 7.206.00	$ 34.323.619.00	123.75	$ 891.743.00		123.75	$ 891.743.00	4639.45	$ 33.431.877.00
4	1,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1100,00	$ 57.240,00	$ 62.964.000,00	6192,47	$ 57.240,00	$ 354.456.983,00	209,03	$ 11.964.877,00		209,03	$ 11.964.877,00	5983,44	$ 342.492.106,00
5	1,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4566,07	$ 73.056,00	$ 333.578.810,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
6	1,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9171,92	$ 16.517,00	$ 151.492.603,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
7	1,007	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4141,23	$ 235.794,00	$ 976.477.187,00	0,00	$ 235.794,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
8	1,008	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1200,00	$ 220.890,00	$ 265.068.000,00	0,00	$ 220.890,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
9	1,009	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 213.572,00	$ 616.219.292,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
10	1,010	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 205.221,00	$ 592.124.151,00	0,00	$ 205.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
11	1,011	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	545,12	$ 1.757.344,00	$ 957.963.361,00	0,00	$ 1.757.344,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
12	1,012	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	545,12	$ 1.953.442,00	$ 1.064.860.303,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
13	1,013	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.003,00	$ 38.316.276,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
14	1,014	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.877,00	$ 46.682.108,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
15	1,015	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3930,17	$ 22.817,00	$ 89.674.689,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
16	1,016	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	66,00	$ 228.161,00	$ 15.058.626,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
17	1,017	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	1420,00	$ 190.133,00	$ 269.988.860,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
18	1,018	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1095,38	$ 1.712.945,00	$ 1.876.325.694,00	442,61	$ 1.712.945,00	$ 758.166.586,00	13,61	$ 23.313.181,00		13,61	$ 23.313.181,00	429,00	$ 734.853.405,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			2. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
19	2,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6603.57	$ 1.142.00	$ 7.541.277.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
20	2,002	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1320,71	$ 234.955,00	$ 310.307.418,00	148,00	$ 234.955,00	$ 34.773.340,00		$ -		0,00	$ -	148,00	$ 34.773.340,00
21	2,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4406.02	$ 7.206.00	$ 31.749.780.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
22	2,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	6603,57	$ 57.240,00	$ 377.988.347,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
23	2,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	600,00	$ 73.056,00	$ 43.833.600,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
24	2,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2200,00	$ 16.517,00	$ 36.337.400,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
25	2,007	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2203,01	$ 220.757,00	$ 486.329.879,00	0,00	$ 220.757,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
26	2,008	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	700,00	$ 208.805,00	$ 146.163.500,00	0,00	$ 208.805,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
27	2,009	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 240.902,00	$ 264.992.200,00	0,00	$ 240.902,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
28	2,010	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 242.117,00	$ 266.328.700,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
29	2,011	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	1234,31	$ 488.707,00	$ 603.215.937,00	0,00	$ 488.707,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
30	2,012	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	1320,71	$ 7.018,00	$ 9.268.743,00	0,00	$ 7.018,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
31	2,013	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2311.25	$ 13.278.00	$ 30.688.778.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
32	2,014	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	23772,85	$ 10.549,00	$ 250.779.795,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
33	2,015	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	330,18	$ 9.221,00	$ 3.044.590,00	0,00	$ 9.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
34	2,016	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	6603.57	$ 3.206.00	$ 21.171.045.00	0.00	$ 3.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
35	2,017	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	2905,57	$ 17.296,00	$ 50.254.739,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
36	2,018	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2905,57	$ 3.338,00	$ 9.698.793,00	248,00	$ 3.338,00	$ 827.824,00	22,80	$ 76.106,00		22,80	$ 76.106,00	225,20	$ 751.718,00
37	2,019	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	2829,63	$ 22.817,00	$ 64.563.668,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
38	2,020	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	19,00	$ 228.161,00	$ 4.335.059,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
39	2,021	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	180,00	$ 190.133,00	$ 34.223.940,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			3. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
40	3,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3253.08	$ 1.142.00	$ 3.715.017.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
41	3,002	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD10)	M2	8,13	$ 371.818,00	$ 3.022.880,00	0,00	$ 371.818,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
42	3,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	162.65	$ 7.206.00	$ 1.172.056.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
43	3,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	275,97	$ 57.240,00	$ 15.796.523,00	0,00	$ 57.240,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
44	3,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	81,33	$ 73.056,00	$ 5.941.644,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
45	3,006	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	1382,56	$ 9.347,00	$ 12.922.788,00	0,00	$ 9.347,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
46	3,007	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	162,65	$ 248.800,00	$ 40.467.320,00	0,00	$ 248.800,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
47	3,008	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	80,00	$ 213.572,00	$ 17.085.760,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
48	3,009	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	195,18	$ 1.712.945,00	$ 334.332.605,00	0,00	$ 1.712.945,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
49	3,010	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	81,33	$ 1.953.442,00	$ 158.873.438,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
50	3,011	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.003,00	$ 5.534.388,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
51	3,012	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.877,00	$ 6.742.745,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
52	3,013	4758	SELLO DE FISURAS	ML	800.00	$ 11.144.00	$ 8.915.200.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
53	3,014	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	487.96	$ 13.037.00	$ 6.361.535.00	0.00	$ 13.037.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
54	3,015	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	25,00	$ 131.419,00	$ 3.285.475,00	2,00	$ 131.419,00	$ 262.838,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 262.838,00
55	3,016	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	140,00	$ 131.419,00	$ 18.398.660,00	0,00	$ 131.419,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			4. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
56	4,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3672.96	$ 1.142.00	$ 4.194.520.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
57	4,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	459.12	$ 58.217.00	$ 26.728.589.00	0.00	$ 58.217.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
58	4,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	619,81	$ 57.240,00	$ 35.477.924,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
59	4,004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	252,52	$ 73.056,00	$ 18.447.809,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
60	4,005	3486	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	550,94	$ 234.955,00	$ 129.447.048,00	0,00	$ 234.955,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
61	4,006	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	206.60	$ 248.800.00	$ 51.402.080.00	0.00	$ 248.800.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
62	4,007	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	68,87	$ 242.117,00	$ 16.674.598,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
63	4,008	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m	M2	550,94	$ 464.229,00	$ 255.764.182,00	0,00	$ 464.229,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
64	4,009	3708	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	9182.40	$ 7.018.00	$ 64.442.083.00	0.00	$ 7.018.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
65	4,010	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	4591.20	$ 13.278.00	$ 60.961.954.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
66	4,011	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1836,48	$ 10.549,00	$ 19.373.028,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
67	4,012	4758	SELLO DE FISURAS	ML	100.00	$ 11.144.00	$ 1.114.400.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
68	4,013	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1616,10	$ 17.296,00	$ 27.952.107,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
69	4,014	3723	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	10.65	$ 131.419.00	$ 1.399.612.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
70	4,015	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	20.94	$ 131.419.00	$ 2.751.914.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
71	4,016	3434	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	20,00	$ 97.222,00	$ 1.944.440,00	0,00	$ 97.222,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
72	4,017	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	20,00	$ 90.021,00	$ 1.800.420,00	0,00	$ 90.021,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			5. MANTENIMIENTO PERIODICO EN ANDEN DE CONCRETO														
73	5,001	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	2683,78	$ 10.370,00	$ 27.830.799,00	3088,81	$ 10.370,00	$ 32.030.960,00	2,40	$ 24.888,00		2,40	$ 24.888,00	3086,41	$ 32.006.072,00
74	5,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	268.38	$ 58.217.00	$ 15.624.278.00	542.24	$ 58.217.00	$ 31.567.586.00		$ -		0.00	$ -	542.24	$ 31.567.586.00
75	5,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	536,76	$ 57.240,00	$ 30.724.142,00	2260,66	$ 57.240,00	$ 129.400.178,00		$ -		0,00	$ -	2260,66	$ 129.400.178,00
76	5,004	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	268,38	$ 392.394,00	$ 105.310.702,00	0,00	$ 392.394,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
77	5,005	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	2683,78	$ 105.225,00	$ 282.400.751,00	73,00	$ 105.225,00	$ 7.681.425,00	2,40	$ 252.540,00		2,40	$ 252.540,00	70,60	$ 7.428.885,00
78	5,006	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	89.46	$ 1.212.741.00	$ 108.491.810.00	0.00	$ 1.212.741.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
79	5,007	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO). INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS	M2	2236,48	$ 165.385,00	$ 369.880.245,00	0,00	$ 165.385,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
80	5,008	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO	UN	20,00	$ 2.082.959,00	$ 41.659.180,00	0,00	$ 2.082.959,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
81	5,009	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	2236,48	$ 145.068,00	$ 324.441.681,00	0,00	$ 145.068,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
82	5,010	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO)	ML	4472,97	$ 78.310,00	$ 350.278.281,00	10,00	$ 78.310,00	$ 783.100,00		$ -		0,00	$ -	10,00	$ 783.100,00
83	5,011	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	4472,97	$ 102.949,00	$ 460.487.789,00	1533,10	$ 102.949,00	$ 157.831.112,00		$ -		0,00	$ -	1533,10	$ 157.831.112,00
84	5,012	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	6262,15	$ 86.663,00	$ 542.696.705,00	529,68	$ 86.663,00	$ 45.903.658,00		$ -		0,00	$ -	529,68	$ 45.903.658,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			6. REDES														
85	6,001	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5808,47	$ 58.217,00	$ 338.151.698,00	3657,45	$ 58.217,00	$ 212.925.767,00	6,10	$ 355.124,00		6,10	$ 355.124,00	3651,35	$ 212.570.643,00
86	6,002	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1452,12	$ 73.056,00	$ 106.086.079,00	4754,66	$ 73.056,00	$ 347.356.441,00		$ -		0,00	$ -	4754,66	$ 347.356.441,00
87	6,003	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4356,35	$ 49.220,00	$ 214.419.547,00	37,00	$ 49.220,00	$ 1.821.140,00		$ -		0,00	$ -	37,00	$ 1.821.140,00
88	6,004	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	217,82	$ 209.827,00	$ 45.704.517,00	886,54	$ 209.827,00	$ 186.020.029,00	0,88	$ 184.648,00		0,88	$ 184.648,00	885,66	$ 185.835.381,00
89	6,005	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM)	M3	653,45	$ 125.986,00	$ 82.325.552,00	0,00	$ 125.986,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
90	6,006	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	72,61	$ 268.758,00	$ 19.514.518,00	0,00	$ 268.758,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
91	6,007	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	435,64	$ 195.195,00	$ 85.034.750,00	43,00	$ 195.195,00	$ 8.393.385,00		$ -		0,00	$ -	43,00	$ 8.393.385,00
92	6,008	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	40,00	$ 2.379.851,00	$ 95.194.040,00	56,00	$ 2.379.851,00	$ 133.271.656,00		$ -		0,00	$ -	56,00	$ 133.271.656,00
93	6,009	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	280,00	$ 928.646,00	$ 260.020.880,00	82,00	$ 928.646,00	$ 76.148.972,00		$ -		0,00	$ -	82,00	$ 76.148.972,00
94	6,010	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	40,00	$ 170.695,00	$ 6.827.800,00	65,00	$ 170.695,00	$ 11.095.175,00	1,00	$ 170.695,00		1,00	$ 170.695,00	64,00	$ 10.924.480,00
95	6,011	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	295,20	$ 180.628,00	$ 53.321.386,00	0,00	$ 180.628,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
96	6,012	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190,41	$ 528.764,00	$ 100.681.953,00	23,35	$ 528.764,00	$ 12.346.639,00		$ -		0,00	$ -	23,35	$ 12.346.639,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** **1/3/2026** (Día/Mes/Año) **A** **31/3/2026** (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010826 - TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
97	6,013	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3310,80	$ 46.883,00	$ 155.220.236,00	0,00	$ 46.883,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
98	6,014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1744,93	$ 221.771,00	$ 386.974.871,00	378,50	$ 221.771,00	$ 83.940.324,00	7,30	$ 1.618.928,00		7,30	$ 1.618.928,00	371,20	$ 82.321.395,00
99	6,015	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	60,00	$ 535.886,00	$ 32.153.160,00	165,50	$ 535.886,00	$ 88.689.133,00		$ -		0,00	$ -	165,50	$ 88.689.133,00
												$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			7. ITEMS DE INCLUSION														
100	7,001	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 88.189,00		727,96	$ 88.189,00	$ 64.198.064,00		$ -		0,00	$ -	727,96	$ 64.198.064,00
101	7,002	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 122.135,00		792,57	$ 122.135,00	$ 96.800.537,00		$ -		0,00	$ -	792,57	$ 96.800.537,00
102	7,003	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 172.135,00		33,60	$ 172.135,00	$ 5.783.736,00		$ -		0,00	$ -	33,60	$ 5.783.736,00
103	7,004	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 351.631,00		88,70	$ 351.631,00	$ 31.189.670,00		$ -		0,00	$ -	88,70	$ 31.189.670,00
104	7,005	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$ 2.400,00		9059,81	$ 2.400,00	$ 21.743.544,00	272,26	$ 653.424,00		272,26	$ 653.424,00	8787,55	$ 21.090.120,00
105	7,006	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2		$ 3.740,00		1936,46	$ 3.740,00	$ 7.242.360,00		$ -		0,00	$ -	1936,46	$ 7.242.360,00
106	7,007	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 92.526,00		500,20	$ 92.526,00	$ 46.281.505,00	4,30	$ 397.862,00		4,30	$ 397.862,00	495,90	$ 45.883.643,00
107	7,008	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3		$ 1.843.898,00		10,41	$ 1.843.898,00	$ 19.194.978,00		$ -		0,00	$ -	10,41	$ 19.194.978,00
108	7,009	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		165,20	$ 10.811,00	$ 1.785.977,00		$ -		0,00	$ -	165,20	$ 1.785.977,00
109	7,010	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		1,00	$ 10.811,00	$ 10.811,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 10.811,00
110	7,011	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	UN		$ 656.068,00		341,00	$ 656.068,00	$ 223.719.188,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 223.719.188,00
111	7,012	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$ 630.227,00		33,00	$ 630.227,00	$ 20.797.491,00		$ -		0,00	$ -	33,00	$ 20.797.491,00
112	7,013	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA)	UN		$ 47.561,00		14,00	$ 47.561,00	$ 665.854,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 665.854,00
113	7,014	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 566.503,00		341,00	$ 566.503,00	$ 193.177.523,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 193.177.523,00
114	7,015	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 114.367,00		451,00	$ 114.367,00	$ 51.579.517,00		$ -		0,00	$ -	451,00	$ 51.579.517,00
115	7,016	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3		$ 2.093.317,00		634,19	$ 2.093.317,00	$ 1.327.560.708,00	19,06	$ 39.898.622,00		19,06	$ 39.898.622,00	615,13	$ 1.287.662.086,00
116	7,017	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.881,00		8744,61	$ 4.881,00	$ 42.682.441,00	272,26	$ 1.328.901,00		272,26	$ 1.328.901,00	8472,35	$ 41.353.540,00
117	7,018	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN		$ 852.604,00		6,00	$ 852.604,00	$ 5.115.624,00		$ -		0,00	$ -	6,00	$ 5.115.624,00
118	7,019	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN		$ 294.438,00		28,00	$ 294.438,00	$ 8.244.264,00		$ -		0,00	$ -	28,00	$ 8.244.264,00
119	7,020	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 100.003,00		9059,81	$ 100.003,00	$ 906.008.179,00	272,26	$ 27.226.817,00		272,26	$ 27.226.817,00	8787,55	$ 878.781.363,00
120	7,021	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 101.831,00		306,00	$ 101.831,00	$ 31.160.286,00		$ -		0,00	$ -	306,00	$ 31.160.286,00
121	7,022	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 159.155,00		2619,76	$ 159.155,00	$ 416.947.903,00		$ -		0,00	$ -	2619,76	$ 416.947.903,00
122	7,023	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.525,00		341,00	$ 299.525,00	$ 102.138.025,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 102.138.025,00
123	7,024	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 116.431,00		38,00	$ 116.431,00	$ 4.424.378,00		$ -		0,00	$ -	38,00	$ 4.424.378,00
124	7,025	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN		$ 1.517.446,00		23,00	$ 1.517.446,00	$ 34.901.258,00		$ -		0,00	$ -	23,00	$ 34.901.258,00
125	7,026	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 294.664,00		2,00	$ 294.664,00	$ 589.328,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 589.328,00
126	7,027	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.320.280,00		149,30	$ 2.320.280,00	$ 346.417.804,00		$ -		0,00	$ -	149,30	$ 346.417.804,00
127	7,028	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.544.307,00		2,00	$ 2.544.307,00	$ 5.088.614,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.088.614,00
128	7,029	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.800.338,00		2,00	$ 2.800.338,00	$ 5.600.676,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.600.676,00
129	7,030	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 14". ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.328.401,00		1,00	$ 3.328.401,00	$ 3.328.401,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 3.328.401,00
130	7,031	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 16". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.800.458,00		34,50	$ 3.800.458,00	$ 131.115.801,00		$ -		0,00	$ -	34,50	$ 131.115.801,00
131	7,032	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 78.395,00		4593,68	$ 78.395,00	$ 360.121.544,00		$ -		0,00	$ -	4593,68	$ 360.121.544,00
132	7,033	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.749,00		9059,81	$ 4.749,00	$ 43.025.038,00	272,26	$ 1.292.963,00		272,26	$ 1.292.963,00	8787,55	$ 41.732.075,00
133	7,034	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 3.546,00		48,20	$ 3.546,00	$ 170.917,00		$ -		0,00	$ -	48,20	$ 170.917,00
134	7,035	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 10.058,00		14,00	$ 10.058,00	$ 140.812,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 140.812,00
135	7,036	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	ML		$ 10.525,00		3979,34	$ 10.525,00	$ 41.882.554,00		$ -		0,00	$ -	3979,34	$ 41.882.554,00
136	7,037	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3		$ 198.532,00		64,08	$ 198.532,00	$ 12.721.931,00		$ -		0,00	$ -	64,08	$ 12.721.931,00
137	7,038	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 984.823,00		16,00	$ 984.823,00	$ 15.757.168,00		$ -		0,00	$ -	16,00	$ 15.757.168,00
138	7,039	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 7.459.739,00		5,00	$ 7.459.739,00	$ 37.298.695,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 37.298.695,00
139	7,040	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN		$ 272.085,00		14,00	$ 272.085,00	$ 3.809.190,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 3.809.190,00
140	7,041	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE		$ 2.474.248,00		14,00	$ 2.474.248,00	$ 34.639.472,00	2,00	$ 4.948.496,00		2,00	$ 4.948.496,00	12,00	$ 29.690.976,00
141	7,042	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24". ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.697.698,00		100,70	$ 5.697.698,00	$ 573.758.189,00		$ -		0,00	$ -	100,70	$ 573.758.189,00
142	7,043	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 257.553,00		1875,14	$ 257.553,00	$ 482.947.932,00	68,07	$ 17.531.633,00		68,07	$ 17.531.633,00	1807,07	$ 465.416.300,00
143	7,044	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3		$ 231.349,00		348,56	$ 231.349,00	$ 80.639.007,00		$ -		0,00	$ -	348,56	$ 80.639.007,00
144	7,045	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$ 10.108,00		2258,60	$ 10.108,00	$ 22.829.929,00		$ -		0,00	$ -	2258,60	$ 22.829.929,00
145	7,046	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 33.747,00		12148,62	$ 33.747,00	$ 409.979.479,00	292,51	$ 9.871.335,00		292,51	$ 9.871.335,00	11856,11	$ 400.108.144,00
146	7,047	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 4.152.501,00		4,00	$ 4.152.501,00	$ 16.610.004,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 16.610.004,00
147	7,048	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.196,00		7958,68	$ 6.196,00	$ 49.311.981,00		$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 49.311.981,00
148	7,049	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML		$ 25.701,00		7958,68	$ 25.701,00	$ 204.546.035,00		$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 204.546.035,00
149	7,050	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 35.750,00		408,47	$ 35.750,00	$ 14.602.803,00		$ -		0,00	$ -	408,47	$ 14.602.803,00
150	7,051	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2		$ 191.703,00		510,64	$ 191.703,00	$ 97.891.220,00		$ -		0,00	$ -	510,64	$ 97.891.220,00
151	7,052	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 8.852,00		2830,00	$ 8.852,00	$ 25.051.160,00		$ -		0,00	$ -	2830,00	$ 25.051.160,00
152	7,053	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 124.194,00		19,00	$ 124.194,00	$ 2.359.686,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 2.359.686,00
153	7,054	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 26.513,00		54,00	$ 26.513,00	$ 1.431.702,00		$ -		0,00	$ -	54,00	$ 1.431.702,00
154	7,055	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	UN		$ 311.753,00		19,00	$ 311.753,00	$ 5.923.307,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 5.923.307,00
155	7,056	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.096.615,00		1,00	$ 5.096.615,00	$ 5.096.615,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 5.096.615,00
156	7,057	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 703.569,00		62,50	$ 703.569,00	$ 43.973.063,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 43.973.063,00
157	7,058	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 425.516,00		35,50	$ 425.516,00	$ 15.105.818,00		$ -		0,00	$ -	35,50	$ 15.105.818,00
158	7,059	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		$ 27.170,00		1569,67	$ 27.170,00	$ 42.647.934,00		$ -		0,00	$ -	1569,67	$ 42.647.934,00
159	7,060	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML		$ 29.226,00		340,50	$ 29.226,00	$ 9.951.453,00		$ -		0,00	$ -	340,50	$ 9.951.453,00
160	7,061	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		$ 17.602,00		1910,17	$ 17.602,00	$ 33.622.812,00		$ -		0,00	$ -	1910,17	$ 33.622.812,00
												$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
			8. NO PREVISTOS														
161	8,001	NP-1	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 14 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO	M3		$ 1.385.170,00		5,00	$ 1.385.170,00	$ 6.925.850,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 6.925.850,00
162	8,002	NP-2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 282.325,00		1355,52	$ 282.325,00	$ 382.697.184,00		$ -		0,00	$ -	1355,52	$ 382.697.184,00
163	8,003	NP-3	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 77.819,00		9059,81	$ 77.819,00	$ 705.025.354,00	272,26	$ 21.187.001,00		272,26	$ 21.187.001,00	8787,55	$ 683.838.353,00
164	8,004	NP-4	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	M3		$ 476.745,00		2281,25	$ 476.745,00	$ 1.087.574.531,00	60,17	$ 28.685.747,00		60,17	$ 28.685.747,00	2221,08	$ 1.058.888.785,00
165	8,005	NP-5	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	M3		$ 19.423,00		94,00	$ 19.423,00	$ 1.825.762,00		$ -		0,00	$ -	94,00	$ 1.825.762,00
166	8,006	NP-6	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%)	UN		$ 107.272,00		9059,81	$ 107.272,00	$ 971.863.938,00	198,00	$ 21.239.856,00		198,00	$ 21.239.856,00	8861,81	$ 950.624.082,00
167	8,007	NP-7	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	ML		$ 446.392,00		341,00	$ 446.392,00	$ 152.219.672,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 152.219.672,00
168	8,008	NP-8	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacíon)	UN		$ 360.064,00		341,00	$ 360.064,00	$ 122.781.824,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 122.781.824,00
169	8,009	NP-9	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN		$ 162.297,00		341,00	$ 162.297,00	$ 55.343.277,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 55.343.277,00
170	8,010	NP-10	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 657.822,00		137,00	$ 657.822,00	$ 90.121.614,00	6,40	$ 4.210.061,00		6,40	$ 4.210.061,00	130,60	$ 85.911.553,00
171	8,011	NP-11	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 14 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 744.157,00		4,00	$ 744.157,00	$ 2.976.628,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.976.628,00
172	8,012	NP-12	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 16 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 795.331,00		1,00	$ 795.331,00	$ 795.331,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 795.331,00
173	8,013	NP-13	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 896.388,00		49,75	$ 896.388,00	$ 44.595.303,00		$ -		0,00	$ -	49,75	$ 44.595.303,00
174	8,014	NP-14	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 974.773,00		62,50	$ 974.773,00	$ 60.923.313,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 60.923.313,00
175	8,015	NP-15	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	UN		$ 269.294,00		24,00	$ 269.294,00	$ 6.463.056,00		$ -		0,00	$ -	24,00	$ 6.463.056,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** **2** **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (mm/dd/aaaa) **A** 31/3/2026 (mm/dd/aaaa)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR ACTUAL PAGO $ 19.645.886.208,00 (Escriba en números y letras el valor total del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVMAC SAS (Escriba en números y letras el valor total del contrato + y el nombre de la entidad de cada contrato)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO (Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS (Escriba el representante legal de la interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número del contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8010828 - TRANSVERSAL 69J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES							
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO		
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
176	8.016	NP-16	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION (Incluye taladro rotopercutor 3/4", planta eléctrica, 4Hw)	UN		$ 76.124,00		11,00	$ 76.124,00	$ 837.364,00		$ -		0,00	$ -	11,00	$ 837.364,00
177	8.017	NP-17	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGOS DE BROCAS, COMBUSTIBLE)	UN		$ 180.006,00		9059,81	$ 180.006,00	$ 1.630.820.159,00	198,00	$ 35.641.188,00		198,00	$ 35.641.188,00	8861,81	$ 1.595.178.971,00
178	8.018	NP-18	SUMIDERO LATERAL SL- 120, H=1.22m (PREFABRICADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)	UN		$ 4.852.592,00		124,00	$ 4.852.592,00	$ 601.721.408,00	2,00	$ 9.705.184,00		2,00	$ 9.705.184,00	122,00	$ 592.016.224,00
179	8.019	NP-19	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80, N.O INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML		$ 563.913,00		4,00	$ 563.913,00	$ 2.255.652,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.255.652,00
180	8.020	NP-20	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalación)	UN		$ 486.892,00		4,00	$ 486.892,00	$ 1.947.568,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 1.947.568,00
181	8.021	NP-21	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80.	UN		$ 208.334,00		4,00	$ 208.334,00	$ 833.336,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 833.336,00
182	8.022	NP-22	CONEXIONES KIT SILLA YEE 203 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 464.671,00		15,00	$ 464.671,00	$ 6.970.065,00		$ -		0,00	$ -	15,00	$ 6.970.065,00
183	8.023	NP-23	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIÓN, CON COLMATACIÓN SUPERIOR AL 30% Y DIÁMETROS DE 8" A 36" INCLUYE ACOM	ML		$ 661.727,00		86,80	$ 661.727,00	$ 57.437.904,00		$ -		0,00	$ -	86,80	$ 57.437.904,00
184	8.024	NP-24	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETERÍA Y DEMÁS ACTIVI	ML		$ 400.192,00		170,75	$ 400.192,00	$ 68.332.784,00		$ -		0,00	$ -	170,75	$ 68.332.784,00
185	8.025	NP-25	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 223.645,00		2,00	$ 223.645,00	$ 447.290,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 447.290,00
186	8.026	NP-26	PISO EN CONCRETO MR41 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE REMOVIBLE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 346.192,00		172,86	$ 346.192,00	$ 59.842.749,00		$ -		0,00	$ -	172,86	$ 59.842.749,00
187	8.027	NP-27	PISO EN CONCRETO 3000 ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE REMOVIBLE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 318.979,00		580,92	$ 318.979,00	$ 185.301.281,00		$ -		0,00	$ -	580,92	$ 185.301.281,00
188	8.028	NP-28	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (A0_ 8G3B) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 262.519,00		1815,49	$ 262.519,00	$ 476.600.619,00	46,28	$ 12.149.379,00		46,28	$ 12.149.379,00	1769,21	$ 464.451.240,00
			TOTALES				**$ 16.532.066.661,00**			**$ 16.456.658.116,00**		**$ 276.881.336,00**			**$ 276.881.336,00**		**$ 16.179.776.783,00**

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES	OBRA EJECUTADA		
				PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
OBRA EJECUTADA						
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 12.294.241.586,23	$ 12.238.163.245,33	$ 205.905.656,28		$ 205.905.656,28
ADMINISTRACION	28,47%	$ 3.500.170.579,60	$ 3.484.205.075,86	$ 58.621.340,34		$ 58.621.340,34
IMPREVISTO	1,00%	$ 122.942.415,86	$ 122.381.632,45	$ 2.059.056,56		$ 2.059.056,56
UTILIDAD	5,00%	$ 614.712.079,31	$ 611.908.162,27	$ 10.295.282,81		$ 10.295.282,81
SUBTOTAL A.I.U	34,47%	$ 4.237.825.074,77	$ 4.218.494.870,67	$ 70.975.679,71		$ 70.975.679,71
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=34,47%)		**$ 16.532.066.661,00**	**$ 16.456.658.116,00**	**$ 276.881.336,00**		**$ 276.881.336,00**
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES. SE CALCULARA APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (B) =	**12,3764%**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 25.483.708,00**		**$ 25.483.708,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA). SE CALCULARA APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (C) =	**2,3210%**	**$ 285.447.701,00**	**$ 285.447.701,00**	**$ -**	**$ -**	
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES) (E) = (A) + (B) + (C) =		**$ 18.339.098.878,00**	**$ 18.339.098.878,00**		**$ -**	
OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS		**$ 1.306.787.330,00**	**$ 1.302.195.875,00**			
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**30,000%**	**$ 5.893.765.862,00**		**$ -**	**$ -**	
(K) COSTO TOTAL MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (F)+(G)		**$ 19.645.886.208,00**	**$ 19.645.886.208,00**		**$ -**	
VALOR NETO A PAGAR				**$ 302.365.044,00**		**$ 302.365.044,00**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN (31) días del mes de MARZO de 2026

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
	replanteo de segmento vial		40,50	7,00					283,50
	planimetria y altimetria inicial								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									283,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									283,50
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA



FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
demolicion de carpeta asfaltica existente									
	asfalto existente		40,50	7,00	0,13				36,86
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,13			-4,00	-1,18
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									35,67
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									35,67
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

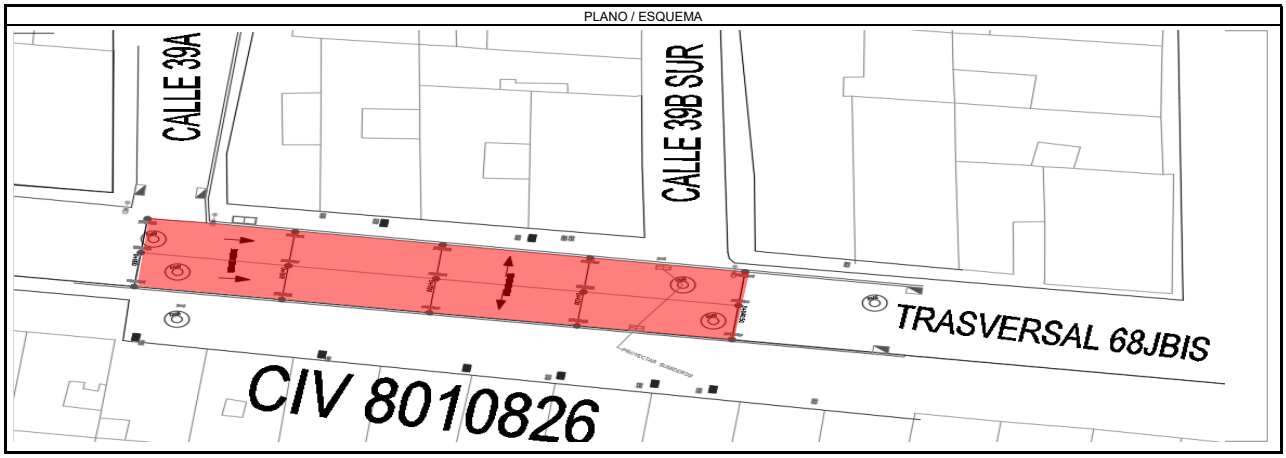

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	NC-29	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

ESPESOR MEDIO ENCONTRADO 0,130

CARTERA DE:	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE - PLACA EN CONCRETO	ANCHO DE VIA DEMOLIDA	7,00

ABSCISA (m)	PLACA EN CONCRETO EXISTENTE					DEMOLICION					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2544,430	2544,470	2544,510	2544,510	2544,510	2544,300	2544,340	2544,380	2544,380	2544,380	7,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
K0+005,00	2544,400	2544,445	2544,490	2544,465	2544,440	2544,270	2544,315	2544,360	2544,335	2544,310	7,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	35,000	4,550
K0+010,00	2544,415	2544,448	2544,480	2544,443	2544,405	2544,285	2544,318	2544,350	2544,313	2544,275	7,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	35,000	4,550
K0+015,00	2544,410	2544,443	2544,475	2544,443	2544,410	2544,280	2544,313	2544,345	2544,313	2544,280	7,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	35,000	4,550
K0+020,00	2544,400	2544,438	2544,475	2544,440	2544,405	2544,270	2544,308	2544,345	2544,310	2544,275	7,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	35,000	4,550
K0+025,50	2544,400	2544,438	2544,475	2544,435	2544,395	2544,270	2544,308	2544,345	2544,305	2544,265	7,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	38,500	5,005
K0+030,00	2544,390	2544,420	2544,450	2544,415	2544,380	2544,260	2544,290	2544,320	2544,285	2544,250	7,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	31,500	4,095
K0+035,00	2544,380	2544,403	2544,425	2544,388	2544,350	2544,250	2544,273	2544,295	2544,258	2544,220	7,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	35,000	4,550
K0+040,50	2544,370	2544,395	2544,420	2544,390	2544,360	2544,240	2544,265	2544,290	2544,260	2544,230	7,000	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	38,500	5,005
																TOTAL	0,130	283,50	36,86
														area	2,27	POZOS	-4	-9,08	-1,18
														sumidero	0,35	SUMIDEROS	0	0,00	0,00
																	TOTAL	274,42	35,67

ENTREGA:	
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	
	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
excavacion mecanica estructura de via									
	caja de via		40,50	7,00	0,451				127,80
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,446			-4,00	-4,05
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									123,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									123,75
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

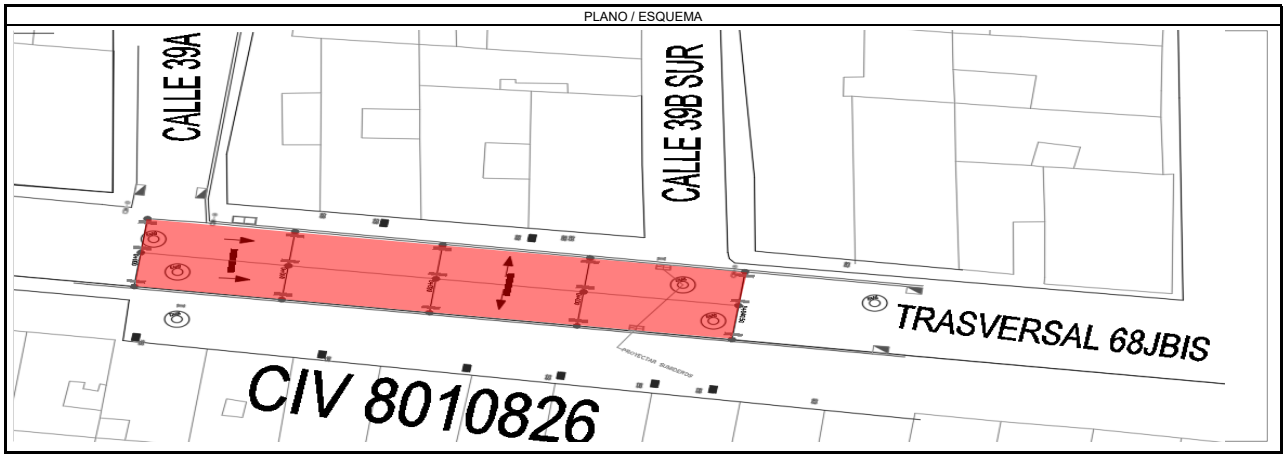

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8010826	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

ESTRUCTURA DE VIA 0,540

CARTERA DE:	EXCAVACION MECANICA DE VIA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	DEMOLICION					SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2544,300	2544,340	2544,380	2544,380	2544,380	2543,890	2543,930	2543,970	2543,970	2543,970	7,000	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410		
K0+005,00	2544,270	2544,315	2544,360	2544,335	2544,310	2543,865	2543,918	2543,970	2543,953	2543,935	7,000	0,405	0,397	0,390	0,382	0,375	0,390	35,000	14,000
K0+010,00	2544,285	2544,318	2544,350	2544,313	2544,275	2543,840	2543,890	2543,940	2543,920	2543,900	7,000	0,445	0,427	0,410	0,392	0,375	0,410	35,000	14,000
K0+015,00	2544,280	2544,313	2544,345	2544,313	2544,280	2543,815	2543,863	2543,910	2543,888	2543,865	7,000	0,465	0,450	0,435	0,425	0,415	0,438	35,000	14,840
K0+020,00	2544,270	2544,308	2544,345	2544,310	2544,275	2543,790	2543,835	2543,880	2543,855	2543,830	7,000	0,480	0,472	0,465	0,455	0,445	0,463	35,000	15,776
K0+025,00	2544,270	2544,308	2544,345	2544,305	2544,265	2543,765	2543,808	2543,850	2543,823	2543,795	7,000	0,505	0,500	0,495	0,482	0,470	0,490	35,000	16,695
K0+030,00	2544,260	2544,290	2544,320	2544,285	2544,250	2543,740	2543,780	2543,820	2543,790	2543,760	7,000	0,520	0,510	0,500	0,495	0,490	0,503	35,000	17,386
K0+035,00	2544,250	2544,273	2544,295	2544,258	2544,220	2543,720	2543,760	2543,800	2543,770	2543,740	7,000	0,530	0,512	0,495	0,487	0,480	0,501	35,000	17,570
K0+040,50	2544,240	2544,265	2544,290	2544,260	2544,230	2543,830	2543,855	2543,880	2543,850	2543,820	7,000	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	38,500	17,537
																TOTAL	0,446	283,50	127,80
														area	2,27	POZOS	-4	-9,08	-4,05
														sumidero	0,35	SUMIDEROS	0	0,00	0,00
																	TOTAL	274,42	123,75

ENTREGA:	
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	
	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			VOLUMEN COMPACTO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Transporte y disposicion de escombros		item							
	Demolicion de asfalto carpeta existente	1,002	35,67				1,35		48,15
	exacvacion mecanica de estructura de via	1,003	123,75				1,30		160,88
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									209,03
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									209,03
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

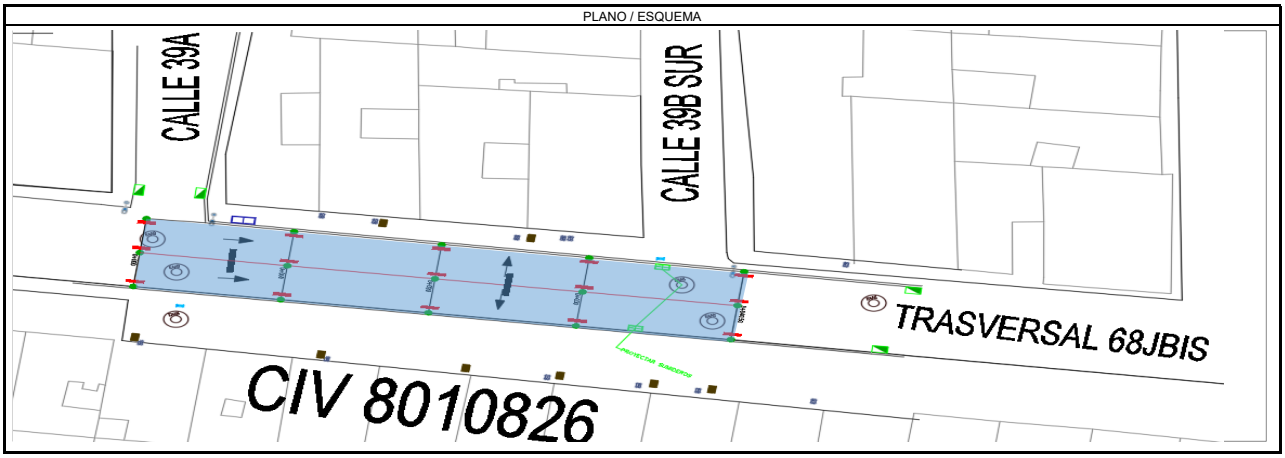

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,018 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
	Asfalto MD 19								
	estructura de via		40,50	7,00	0,050				14,18
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,050			-4,00	-0,45
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,050			-2,00	-0,11
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									13,61
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									13,61
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

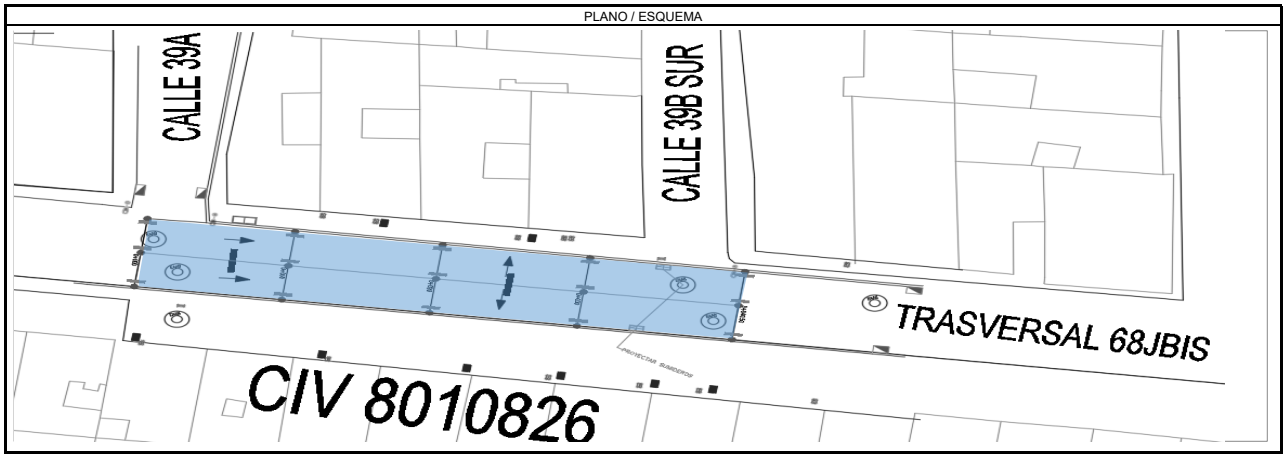

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,018 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	15/03/2026	CIV	NC-29		RIEGO DE LIGA CRR-1	0,050
				PRIORIDAD:	NC	NC-29		

CARTERA DE:	MEZCLA ASFALTICA MD 19	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	RIEGO DE LIGA CRR-1					MEZCLA ASFALTICA MD 19					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2544,380	2544,420	2544,460	2544,460	2544,460	2544,430	2544,470	2544,510	2544,510	2544,510	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
K0+005,00	2544,355	2544,408	2544,460	2544,443	2544,425	2544,405	2544,458	2544,510	2544,493	2544,475	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+010,00	2544,330	2544,380	2544,430	2544,410	2544,390	2544,380	2544,430	2544,480	2544,460	2544,440	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+015,00	2544,305	2544,353	2544,400	2544,378	2544,355	2544,355	2544,403	2544,450	2544,428	2544,405	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+020,00	2544,280	2544,325	2544,370	2544,345	2544,320	2544,330	2544,375	2544,420	2544,395	2544,370	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+025,00	2544,255	2544,298	2544,340	2544,313	2544,285	2544,305	2544,348	2544,390	2544,363	2544,335	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+030,00	2544,230	2544,270	2544,310	2544,280	2544,250	2544,280	2544,320	2544,360	2544,330	2544,300	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+035,00	2544,210	2544,250	2544,290	2544,260	2544,230	2544,260	2544,300	2544,340	2544,310	2544,280	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	35,000	1,750
K0+040,50	2544,320	2544,345	2544,370	2544,340	2544,310	2544,370	2544,395	2544,420	2544,390	2544,360	7,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	38,500	1,925
																TOTAL	0,050	283,50	14,18
																POZOS	-4	-9,08	-0,45
																SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,11
																	TOTAL	272,26	13,61

	area	2,27
	sumidero	1,08

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,018 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
cortes para empalme en vias anexas									
	empalme con calle 39B sur - Trv 68J		7,00						7,00
	empalme con calle 39 sur - Trv 68J		7,00						7,00
	empalme con calle 39 sur		4,50						4,50
	rehabilitacion rampa predio	39A-17	4,30						4,30
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									22,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									22,80
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

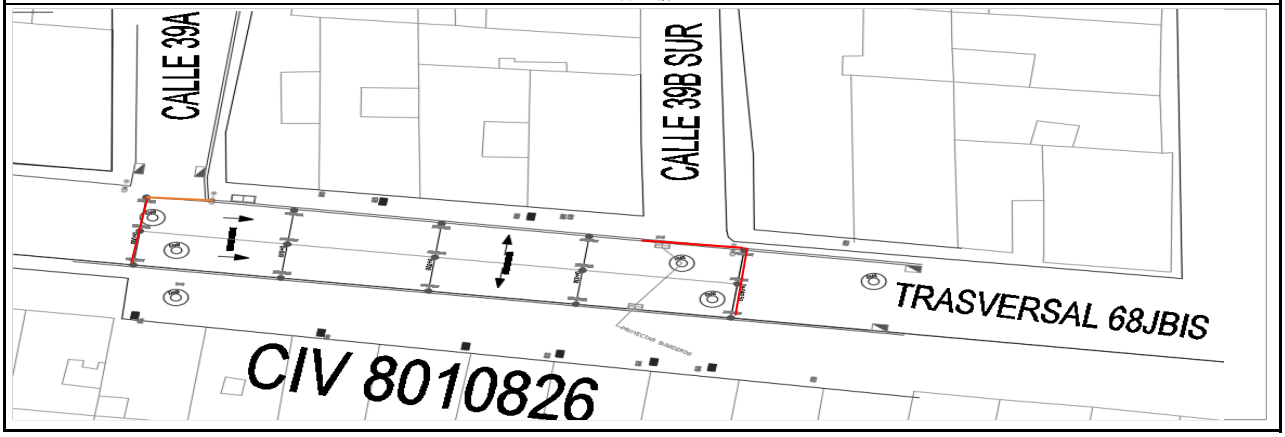

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,018 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
demolicion de andenes para adecuacion de rasante cosntruida									
	rehabilitacion de rampa								
	predio	39A-17	4,00	0,60					2,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,40
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

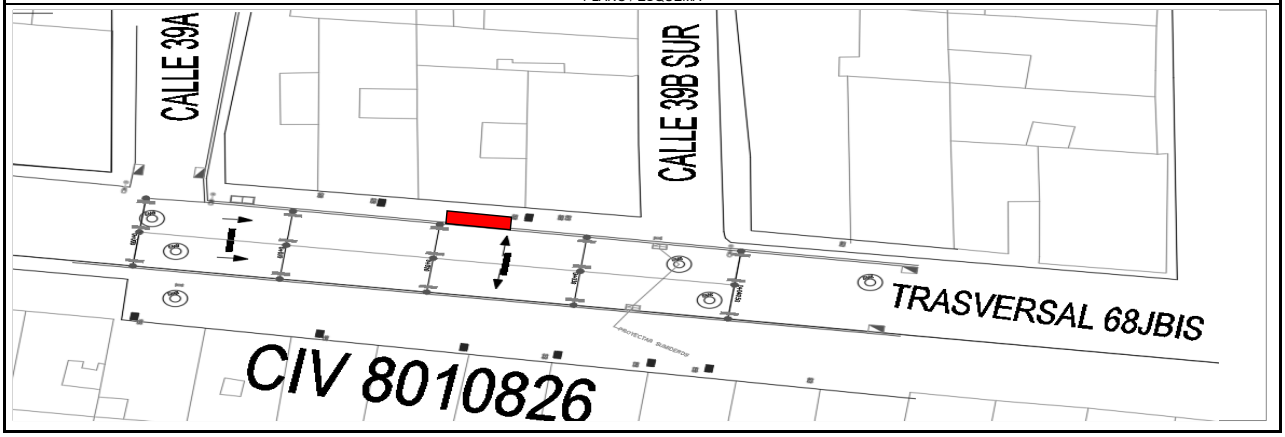

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
reconstruccion de andenes para adecuacion de rasante cosntruida									
	rehabilitacion de rampa								
	predio	39A-17	4,00	0,60					2,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,40
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

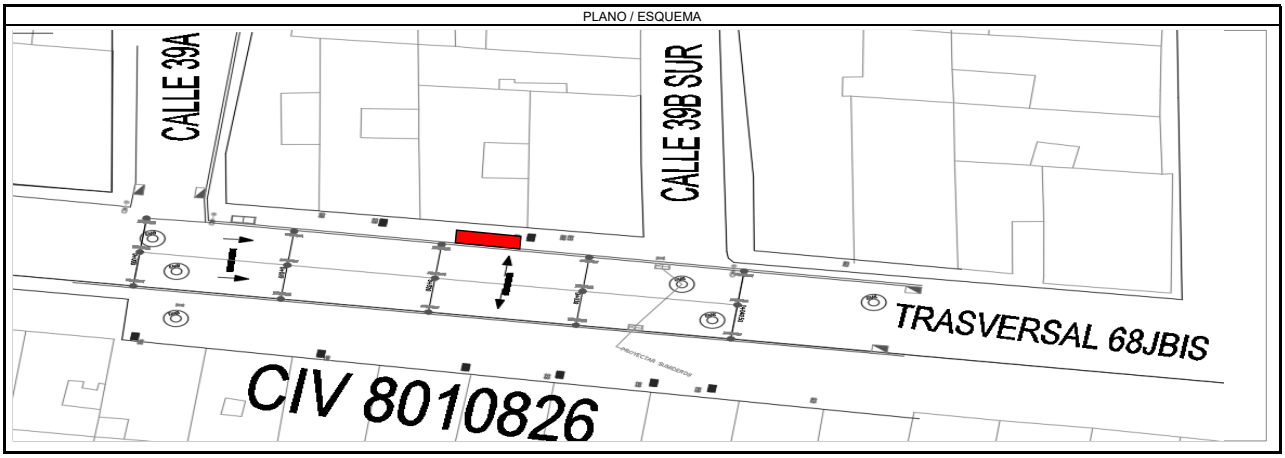

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 5,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
excavacion para construccion de sumideros									
	costado oriental								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+034,00	1,40	1,10	0,86				1,32
	costado occidental								
	Excavacion para instal de sumidero	K0+035,00	1,40	1,10	0,86				1,32
excavacion para instalacion tuberia de sumideros									
	costado oriental								
	Excavacion tub de sumidero	K0+034,00	4,80	0,90	0,60				2,59
	costado occidental								
	Excavacion tub de sumidero	K0+035,00	1,60	0,90	0,60				0,86
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									6,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									6,10
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

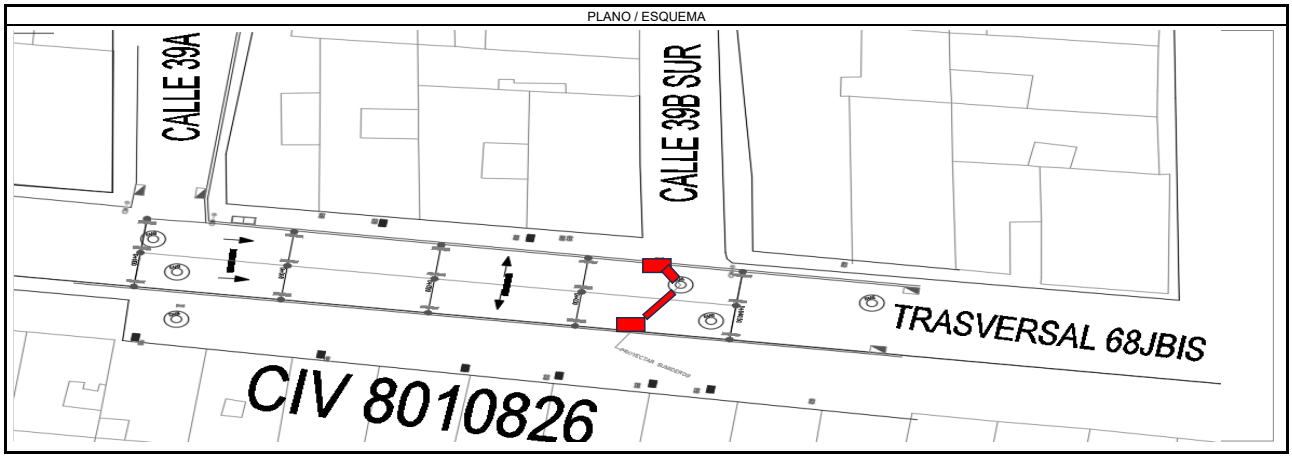

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
relleno base instalacion de sumideros									
	costado oriental								
	tuberia de sumidero	K0+034,00	1,40	1,10	0,10				0,15
	costado occidental								
	tuberia de sumidero	K0+035,00	1,40	1,10	0,10				0,15
relleno para instalacion tuberia de sumideros - base carcamo									
	costado oriental								
	Triturado para tub de sumidero	K0+034,00	4,80	0,90	0,10				0,43
	costado occidental								
	Triturado para tub de sumidero	K0+035,00	1,60	0,90	0,10				0,14

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	0,88
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	0,88
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

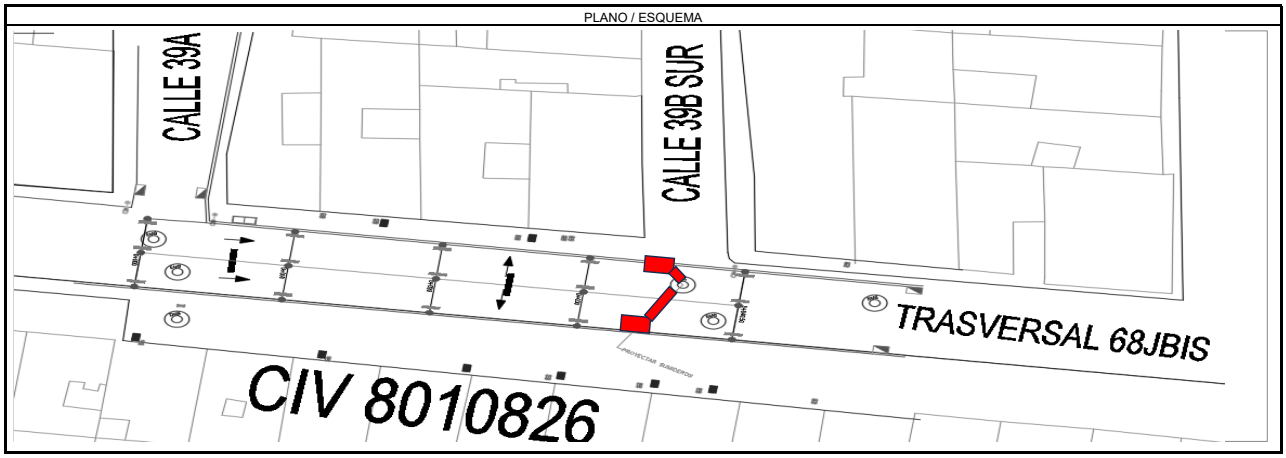

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,010 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
nivelacion de pozo existente									
	pozo pluvial	K0+037,00						1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									1,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

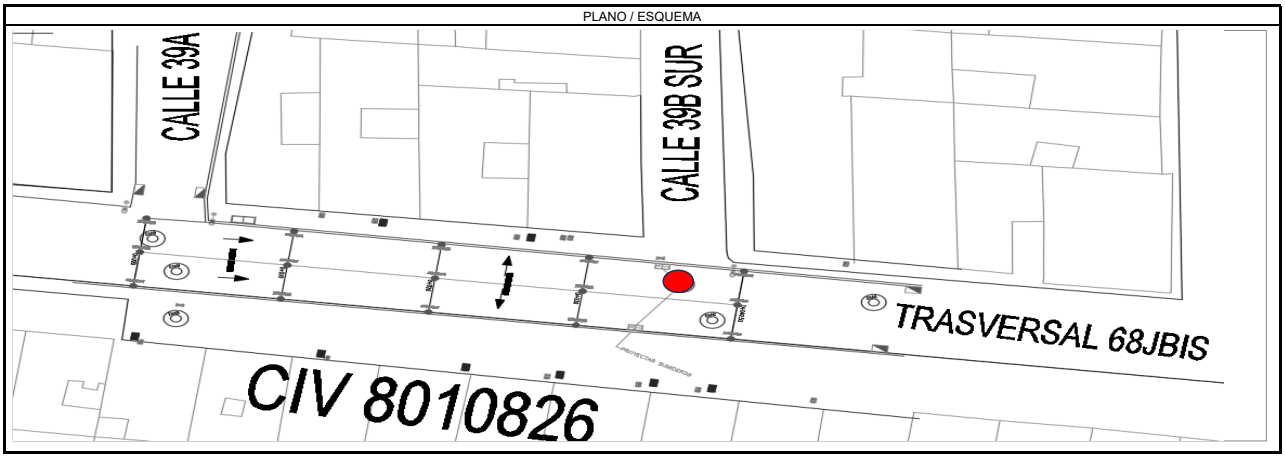

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,010 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
tuberia para conexcion de sumideros									
	costado oriental	K0+034,00	5,20						5,20
	costado occidental	K0+035,00	2,10						2,10
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									7,30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									7,30
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

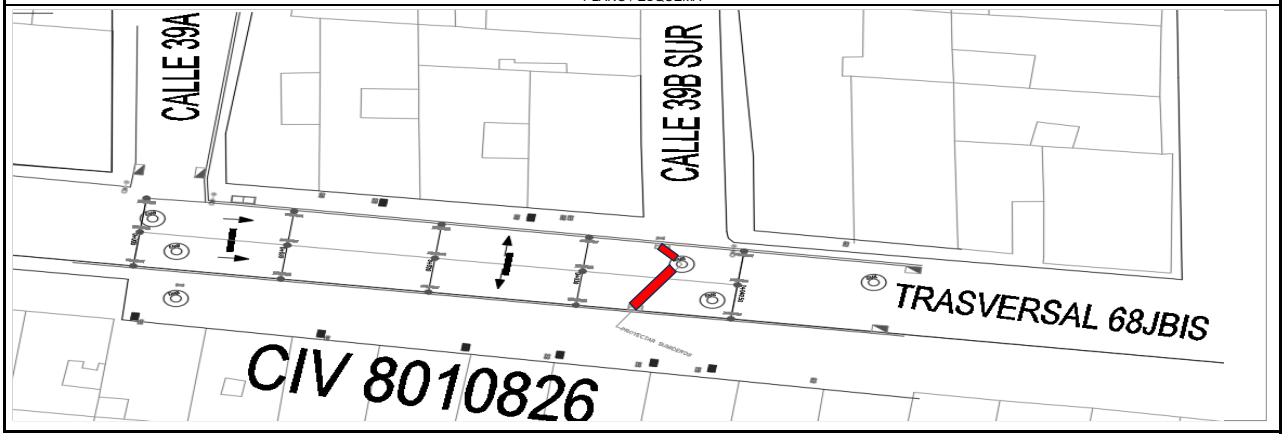

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,014 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
nivelacion y compactacion de subrasante de via									
	subrasante de diseño		40,50	7,00					283,50
	pozos existentes	area	2,27					-4,00	-9,08
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									272,26
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									272,26
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

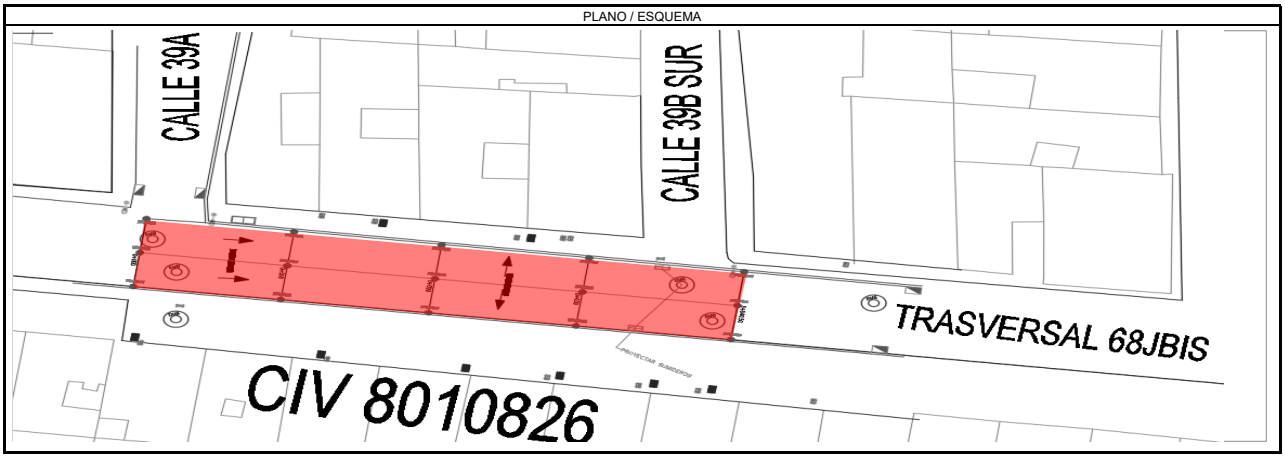

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	NC-29	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

ESTRUCTURA DE VIA 0,540

CARTERA DE:	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,890	2543,930	2543,970	2543,970	2543,970	2543,890	2543,930	2543,970	2543,970	2543,970	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2543,865	2543,918	2543,970	2543,953	2543,935	2543,865	2543,918	2543,970	2543,953	2543,935	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2543,840	2543,890	2543,940	2543,920	2543,900	2543,840	2543,890	2543,940	2543,920	2543,900	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2543,815	2543,863	2543,910	2543,888	2543,865	2543,815	2543,863	2543,910	2543,888	2543,865	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2543,790	2543,835	2543,880	2543,855	2543,830	2543,790	2543,835	2543,880	2543,855	2543,830	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2543,765	2543,808	2543,850	2543,823	2543,795	2543,765	2543,808	2543,850	2543,823	2543,795	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2543,740	2543,780	2543,820	2543,790	2543,760	2543,740	2543,780	2543,820	2543,790	2543,760	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,720	2543,760	2543,800	2543,770	2543,740	2543,720	2543,760	2543,800	2543,770	2543,740	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,50	2543,830	2543,855	2543,880	2543,850	2543,820	2543,830	2543,855	2543,880	2543,850	2543,820	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,500	0,000
																TOTAL	0,000	283,50	0,00
														area	2,27	POZOS	-4	-9,08	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	272,26	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,007 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Instalacion de A-85 en rampa bocaccalle 39 SUR									
	Rampa	K0+037,00	4,30						4,30
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									4,30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									4,30
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

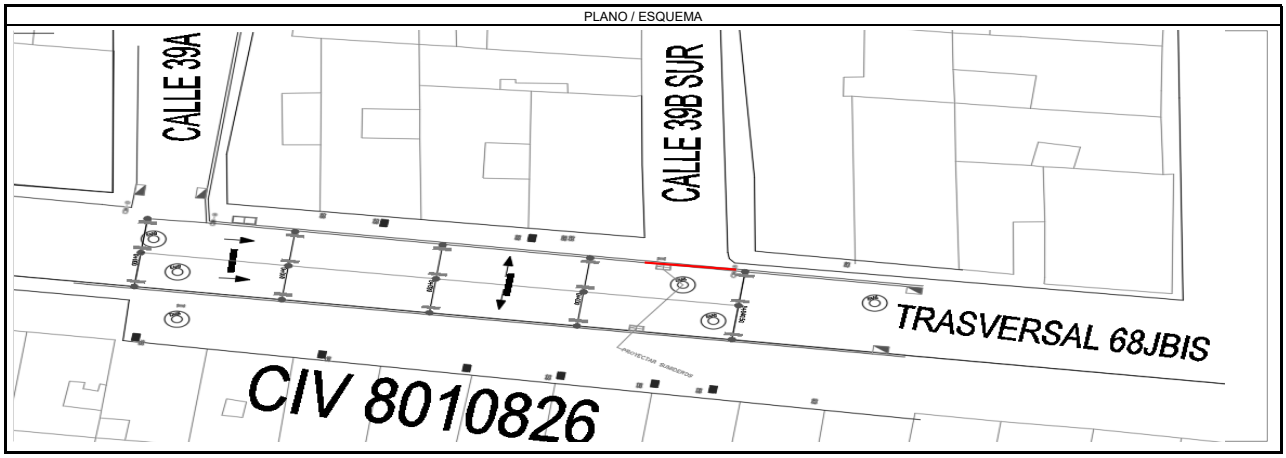

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,007 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,016 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
	Asfalto Caucho								
	estructura de via		40,50	7,00	0,070				19,85
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,070			-4,00	-0,64
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,070			-2,00	-0,15
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									19,06
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									19,06
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

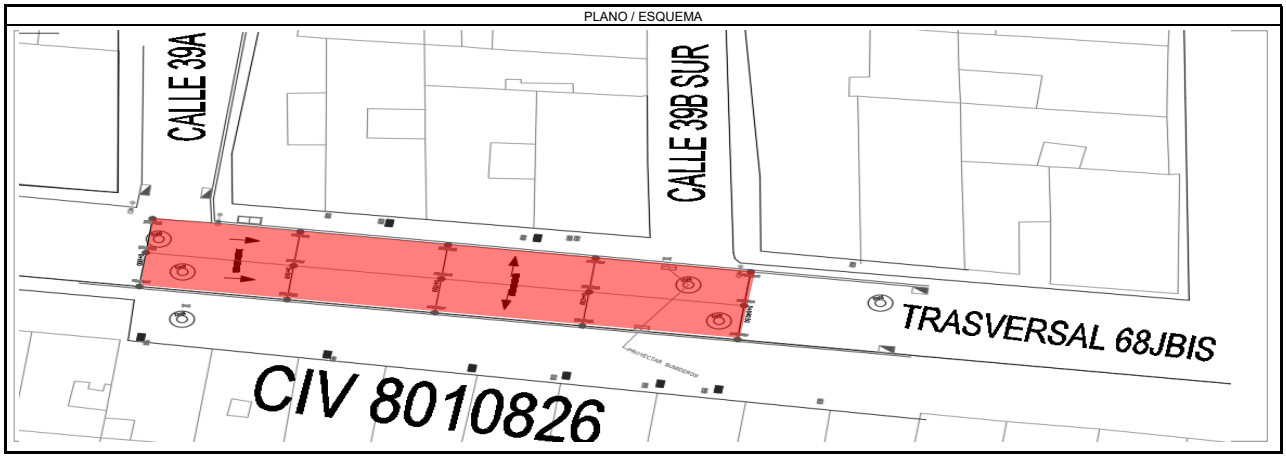

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,016 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	NC-29	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

MEZCLA ASFALTICA MCCH25 0,070

CARTERA DE:	MEZCLA ASFALTICA MCCH25	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	IMPRIMACION CRL-1					MEZCLA ASFALTICA MCCH25					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2544,310	2544,350	2544,390	2544,390	2544,390	2544,380	2544,420	2544,460	2544,460	2544,460	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
K0+005,00	2544,285	2544,338	2544,390	2544,373	2544,355	2544,355	2544,408	2544,460	2544,443	2544,425	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+010,00	2544,260	2544,310	2544,360	2544,340	2544,320	2544,330	2544,380	2544,430	2544,410	2544,390	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+015,00	2544,235	2544,283	2544,330	2544,308	2544,285	2544,305	2544,353	2544,400	2544,378	2544,355	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+020,00	2544,210	2544,255	2544,300	2544,275	2544,250	2544,280	2544,325	2544,370	2544,345	2544,320	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+025,00	2544,185	2544,228	2544,270	2544,243	2544,215	2544,255	2544,298	2544,340	2544,313	2544,285	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+030,00	2544,160	2544,200	2544,240	2544,210	2544,180	2544,230	2544,270	2544,310	2544,280	2544,250	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+035,00	2544,140	2544,180	2544,220	2544,190	2544,160	2544,210	2544,250	2544,290	2544,260	2544,230	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	35,000	2,450
K0+040,50	2544,250	2544,275	2544,300	2544,270	2544,240	2544,320	2544,345	2544,370	2544,340	2544,310	7,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	38,500	2,695
																TOTAL	0,070	283,50	19,85
																POZOS	-4	-9,08	-0,64
																SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,15
																		TOTAL	272,26	19,06

area 2,27
sumidero 1,08

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,017 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Riego de liga sobre Asfalto McCh25									
	estructura de via		40,50	7,00					283,50
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-4,00	-9,08
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									272,26
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									272,26
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

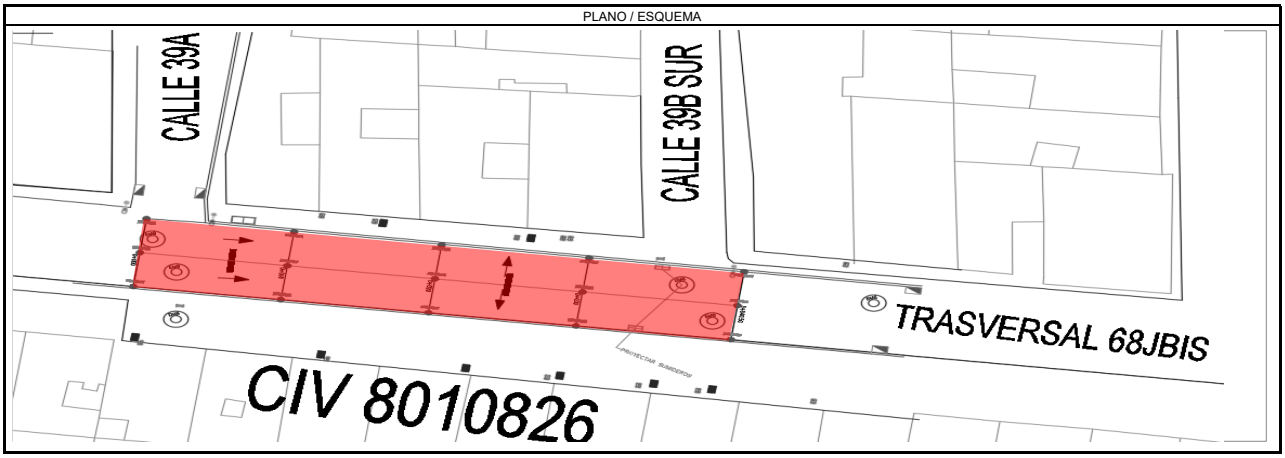

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,017 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	NC-29	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

RIEGO DE LIGA CRR-1 0,000

CARTERA DE:	RIEGO DE LIGA CRR-1	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	MEZCLA ASFALTICA MCCH25					RIEGO DE LIGA CRR-1					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2544,380	2544,420	2544,460	2544,460	2544,460	2544,380	2544,420	2544,460	2544,460	2544,460	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2544,355	2544,408	2544,460	2544,443	2544,425	2544,355	2544,408	2544,460	2544,443	2544,425	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2544,330	2544,380	2544,430	2544,410	2544,390	2544,330	2544,380	2544,430	2544,410	2544,390	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2544,305	2544,353	2544,400	2544,378	2544,355	2544,305	2544,353	2544,400	2544,378	2544,355	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2544,280	2544,325	2544,370	2544,345	2544,320	2544,280	2544,325	2544,370	2544,345	2544,320	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2544,255	2544,298	2544,340	2544,313	2544,285	2544,255	2544,298	2544,340	2544,313	2544,285	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2544,230	2544,270	2544,310	2544,280	2544,250	2544,230	2544,270	2544,310	2544,280	2544,250	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2544,210	2544,250	2544,290	2544,260	2544,230	2544,210	2544,250	2544,290	2544,260	2544,230	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,50	2544,320	2544,345	2544,370	2544,340	2544,310	2544,320	2544,345	2544,370	2544,340	2544,310	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,500	0,000
																TOTAL	0,000	283,50	0,00
																POZOS	-4	-9,08	0,00
																SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																TOTAL		272,26	0,00

area	2,27	
sumidero	1,08	

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Geocelda para estructura de via									
	estructura de via		40,50	7,00					283,50
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-4,00	-9,08
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									272,26
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									272,26
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

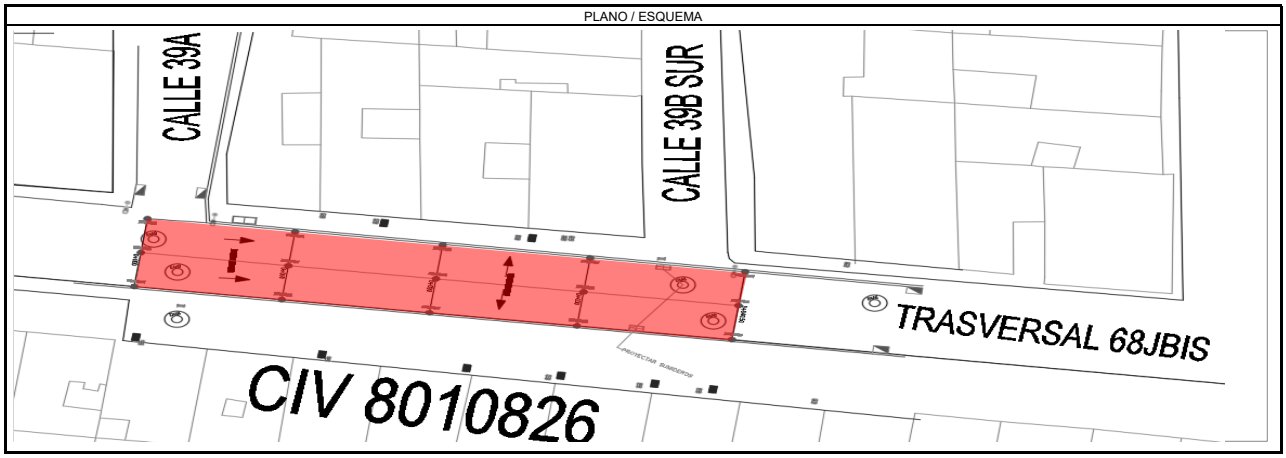

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	NC-29	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

ESTRUCTURA DE VIA 0,540

CARTERA DE:	GEOCELDA h=15cm	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					GEOCELDA h=15cm					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,890	2543,930	2543,970	2543,970	2543,970	2543,890	2543,930	2543,970	2543,970	2543,970	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2543,865	2543,918	2543,970	2543,953	2543,935	2543,865	2543,918	2543,970	2543,953	2543,935	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2543,840	2543,890	2543,940	2543,920	2543,900	2543,840	2543,890	2543,940	2543,920	2543,900	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2543,815	2543,863	2543,910	2543,888	2543,865	2543,815	2543,863	2543,910	2543,888	2543,865	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2543,790	2543,835	2543,880	2543,855	2543,830	2543,790	2543,835	2543,880	2543,855	2543,830	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2543,765	2543,808	2543,850	2543,823	2543,795	2543,765	2543,808	2543,850	2543,823	2543,795	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2543,740	2543,780	2543,820	2543,790	2543,760	2543,740	2543,780	2543,820	2543,790	2543,760	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,720	2543,760	2543,800	2543,770	2543,740	2543,720	2543,760	2543,800	2543,770	2543,740	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,50	2543,830	2543,855	2543,880	2543,850	2543,820	2543,830	2543,855	2543,880	2543,850	2543,820	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,500	0,000

			TOTAL	0,000	283,50	0,00
area	2,27		POZOS	-4	-9,08	0,00
sumidero	1,08		SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
				TOTAL	272,26	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,033 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Imprimacion sobre base granular para pavimento									
	estructura de via		40,50	7,00					283,50
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-4,00	-9,08
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									272,26
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									272,26
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

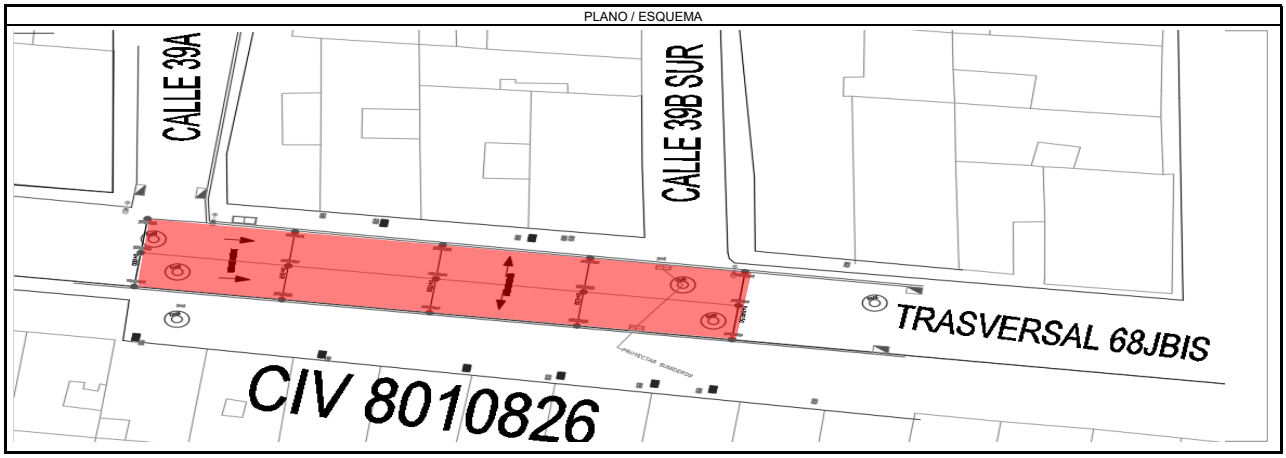

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,033 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	NC-29	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

IMPRIMACION CRL-1 0,000

CARTERA DE:	IMPRIMACION CRL-1	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	BASE GRANULAR AR_BG38					IMPRIMACION CRL-1					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2544,310	2544,350	2544,390	2544,390	2544,390	2544,310	2544,350	2544,390	2544,390	2544,390	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2544,285	2544,338	2544,390	2544,373	2544,355	2544,285	2544,338	2544,390	2544,373	2544,355	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2544,260	2544,310	2544,360	2544,340	2544,320	2544,260	2544,310	2544,360	2544,340	2544,320	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2544,235	2544,283	2544,330	2544,308	2544,285	2544,235	2544,283	2544,330	2544,308	2544,285	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2544,210	2544,255	2544,300	2544,275	2544,250	2544,210	2544,255	2544,300	2544,275	2544,250	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2544,185	2544,228	2544,270	2544,243	2544,215	2544,185	2544,228	2544,270	2544,243	2544,215	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2544,160	2544,200	2544,240	2544,210	2544,180	2544,160	2544,200	2544,240	2544,210	2544,180	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2544,140	2544,180	2544,220	2544,190	2544,160	2544,140	2544,180	2544,220	2544,190	2544,160	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,50	2544,250	2544,275	2544,300	2544,270	2544,240	2544,250	2544,275	2544,300	2544,270	2544,240	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,500	0,000
																TOTAL	0,000	283,50	0,00
														area	2,27	POZOS	-4	-9,08	0,00
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	272,26	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN ÍTEM **DEL** MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Movilizacion de equipo para construccion de segmento vial									
	equipo de demolicion y excavacion							1,00	1,00
	equipo para rellen - perfilado - compactacion							1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

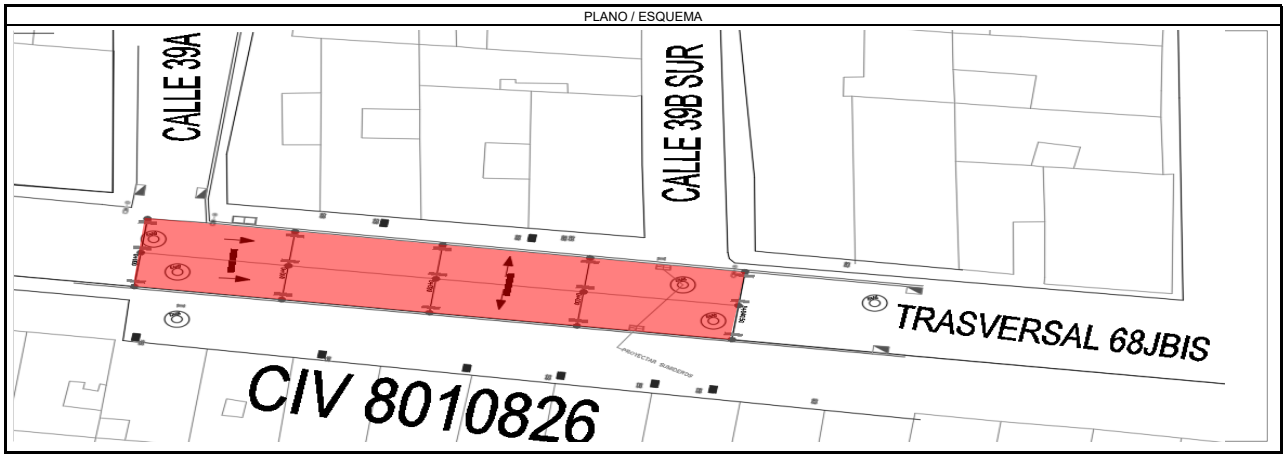

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,041 **UNIDAD** VIAJE **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN ÍTEM **DEL** MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
relleno con subbase granular AR_SBG50 para estructura de via									
	estructura de via		40,50	7,00	0,250				70,88
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,250			-4,00	-2,27
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,250			-2,00	-0,54

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	68,07
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	68,07
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

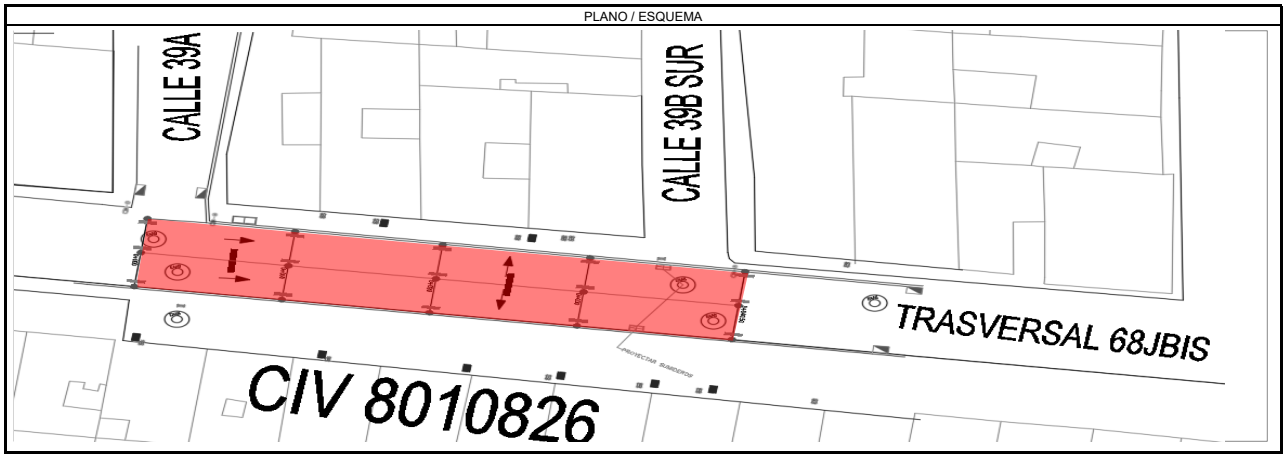

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	NC-29	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50	0,250

CARTERA DE:	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,890	2543,930	2543,970	2543,970	2543,970	2544,140	2544,180	2544,220	2544,220	2544,220	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
K0+005,00	2543,865	2543,918	2543,970	2543,953	2543,935	2544,115	2544,168	2544,220	2544,203	2544,185	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+010,00	2543,840	2543,890	2543,940	2543,920	2543,900	2544,090	2544,140	2544,190	2544,170	2544,150	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+015,00	2543,815	2543,863	2543,910	2543,888	2543,865	2544,065	2544,113	2544,160	2544,138	2544,115	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+020,00	2543,790	2543,835	2543,880	2543,855	2543,830	2544,040	2544,085	2544,130	2544,105	2544,080	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+025,00	2543,765	2543,808	2543,850	2543,823	2543,795	2544,015	2544,058	2544,100	2544,073	2544,045	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+030,00	2543,740	2543,780	2543,820	2543,790	2543,760	2543,990	2544,030	2544,070	2544,040	2544,010	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+035,00	2543,720	2543,760	2543,800	2543,770	2543,740	2543,970	2544,010	2544,050	2544,020	2543,990	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	35,000	8,750
K0+040,50	2543,830	2543,855	2543,880	2543,850	2543,820	2544,080	2544,105	2544,130	2544,100	2544,070	7,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	38,500	9,625
																TOTAL	0,250	283,50	70,88
														area	2,27	POZOS	-4	-9,08	-2,27
														sumidero	1,08	SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,54
																	TOTAL	272,26	68,07

ENTREGA:	
	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	
	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Geotextil para estructura de via									
	subrasante de diseño		40,50	7,50					303,75
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-4,00	-9,08
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									292,51
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									292,51
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

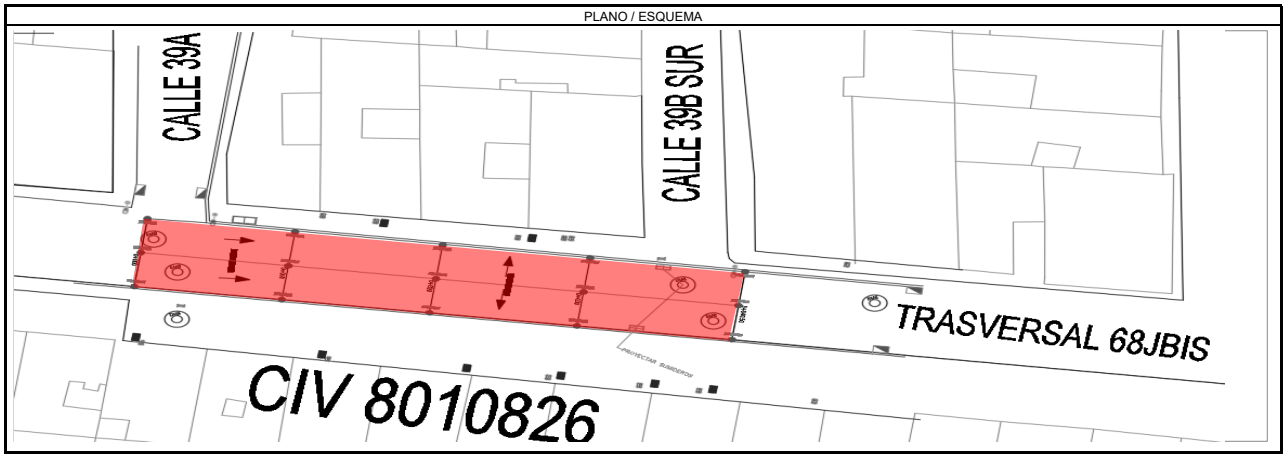

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	15/03/2026	CIV	NC-29		GEOTEXTIL	0,540
				PRIORIDAD:	NC	NC-29		

CARTERA DE:	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,50

ABSCISA (m)	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2543,890	2543,930	2543,970	2543,970	2543,970	2543,890	2543,930	2543,970	2543,970	2543,970	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2543,865	2543,918	2543,970	2543,953	2543,935	2543,865	2543,918	2543,970	2543,953	2543,935	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+010,00	2543,840	2543,890	2543,940	2543,920	2543,900	2543,840	2543,890	2543,940	2543,920	2543,900	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+015,00	2543,815	2543,863	2543,910	2543,888	2543,865	2543,815	2543,863	2543,910	2543,888	2543,865	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+020,00	2543,790	2543,835	2543,880	2543,855	2543,830	2543,790	2543,835	2543,880	2543,855	2543,830	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+025,00	2543,765	2543,808	2543,850	2543,823	2543,795	2543,765	2543,808	2543,850	2543,823	2543,795	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+030,00	2543,740	2543,780	2543,820	2543,790	2543,760	2543,740	2543,780	2543,820	2543,790	2543,760	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+035,00	2543,720	2543,760	2543,800	2543,770	2543,740	2543,720	2543,760	2543,800	2543,770	2543,740	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,500	0,000
K0+040,50	2543,830	2543,855	2543,880	2543,850	2543,820	2543,830	2543,855	2543,880	2543,850	2543,820	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,250	0,000
DO HUMBERTO CRUZ	0	0	0,000																

TOTAL	0,000	303,75	0,00
POZOS	-4	-9,08	0,00
SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
TOTAL		292,51	0,00

area 2,27
sumidero 1,08

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Geomalla para estructura de via									
	estructura de via		40,50	7,00					283,50
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					-4,00	-9,08
	sumideros construidos		1,20	0,90				-2,00	-2,16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									272,26
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									272,26
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

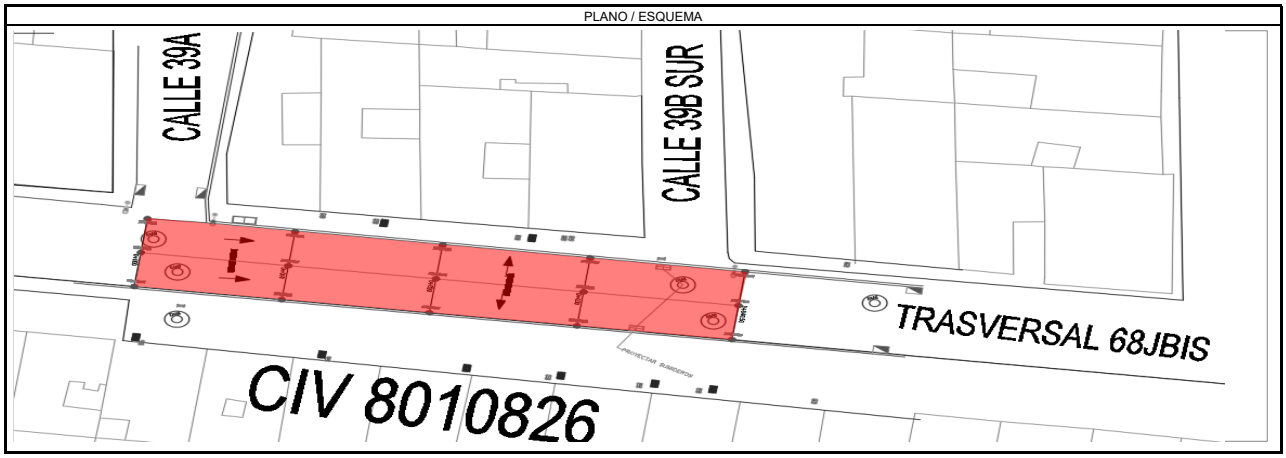

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	NC-29	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

ESTRUCTURA DE VIA 0,540

CARTERA DE:	GEOMALLA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					GEOMALLA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2544,140	2544,180	2544,220	2544,220	2544,220	2544,140	2544,180	2544,220	2544,220	2544,220	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2544,115	2544,168	2544,220	2544,203	2544,185	2544,115	2544,168	2544,220	2544,203	2544,185	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+010,00	2544,090	2544,140	2544,190	2544,170	2544,150	2544,090	2544,140	2544,190	2544,170	2544,150	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+015,00	2544,065	2544,113	2544,160	2544,138	2544,115	2544,065	2544,113	2544,160	2544,138	2544,115	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+020,00	2544,040	2544,085	2544,130	2544,105	2544,080	2544,040	2544,085	2544,130	2544,105	2544,080	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+025,00	2544,015	2544,058	2544,100	2544,073	2544,045	2544,015	2544,058	2544,100	2544,073	2544,045	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+030,00	2543,990	2544,030	2544,070	2544,040	2544,010	2543,990	2544,030	2544,070	2544,040	2544,010	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+035,00	2543,970	2544,010	2544,050	2544,020	2543,990	2543,970	2544,010	2544,050	2544,020	2543,990	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000
K0+040,50	2544,080	2544,105	2544,130	2544,100	2544,070	2544,080	2544,105	2544,130	2544,100	2544,070	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,500	0,000
																TOTAL	0,000	283,50	0,00
																POZOS	-4	-9,08	0,00
																SUMIDEROS	-2	-2,16	0,00
																	TOTAL	272,26	0,00

area	2,27
sumidero	1,08

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Estabilizacion de material granular									
	estructura de via Base granular	BG38	40,50	7,00	0,170		1,30		62,65
	pozos existentes	area	2,27		0,170		1,30	-4,00	-2,01
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,170		1,30	-2,00	-0,48
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									60,17
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									60,17
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

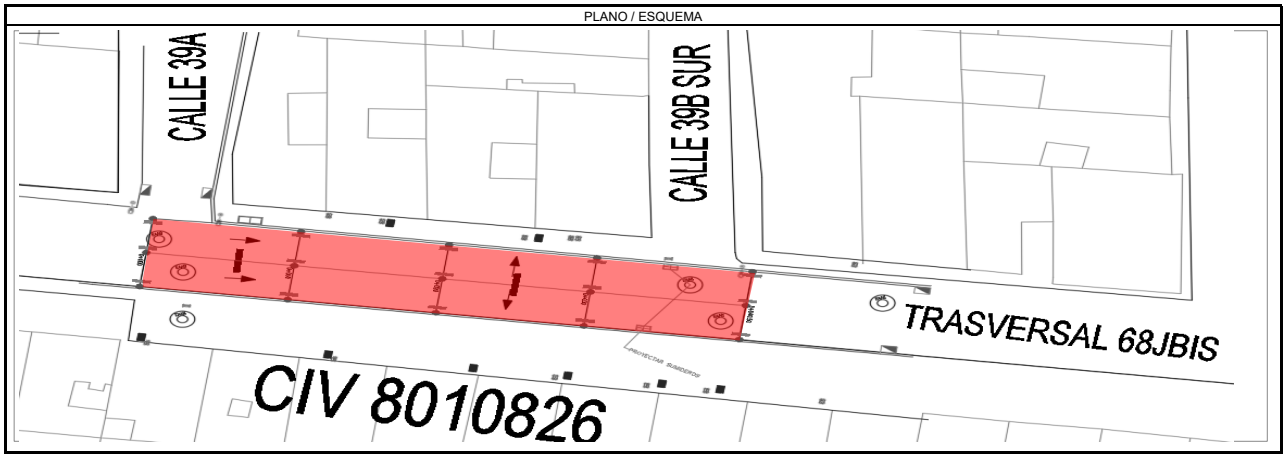

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Inyeccion de Cal a perforaciones									
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+001,00	A		B				
		K0+039,50	38,5000	7,0000	6,3000				
corredor tuberia pluvial	numero de lineas transversales	-2,0000	(B/0.70)+1(-2)	C	8,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	27,5000				
	cantidad de barrenos		C*D	8,0000	28,0000				224,00
	pozos existentes		-4,0000					4,0000	-16,00
	sumideros		-2,0000					5,0000	-10,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
C					D				

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	198,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	198,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

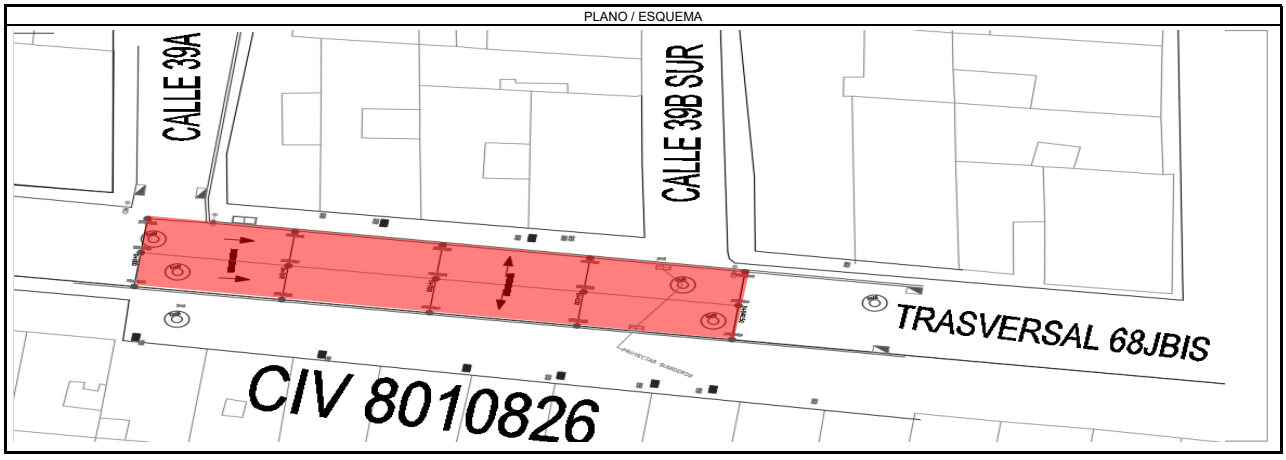

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
carcamo para proteccion tuberia conexión de sumideros									
	costado oriental	K0+034,00	4,80						4,80
	costado occidental	K0+035,00	1,60						1,60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									6,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									6,40
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

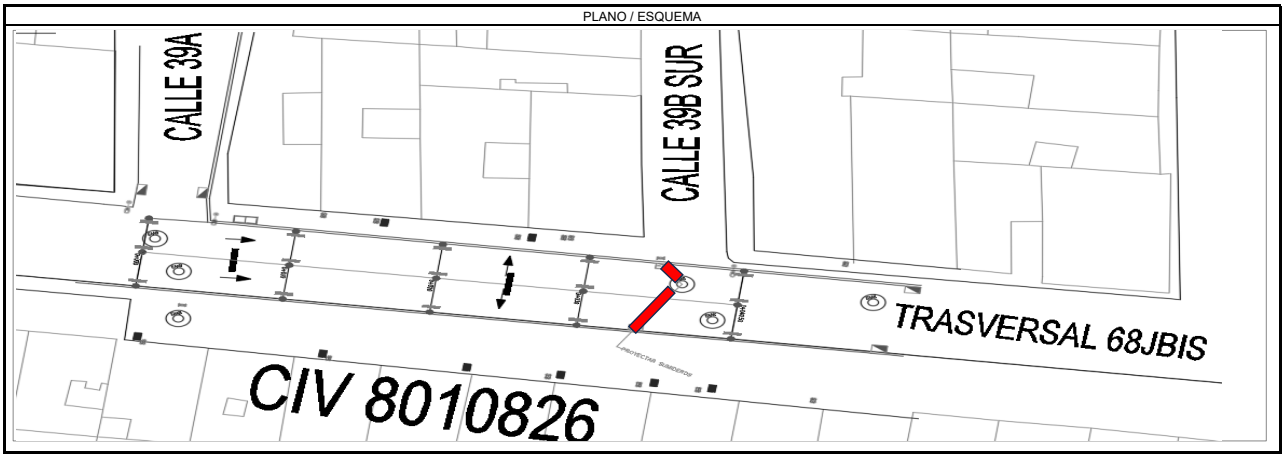

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,010 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)


INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Inyeccion de Cal a perforaciones									
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+001,00	A		B				
		K0+039,50	38,5000	7,0000	6,3000				
corredor tuberia pluvial	numero de lineas transversales	-2,0000	(B/0.70)+1(-2)	C	8,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	27,5000				
	cantidad de barrenos		C*D	8,0000	28,0000				224,00
	pozos existentes		-4,0000					4,0000	-16,00
	sumideros		-2,0000					5,0000	-10,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
C					D				

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	198,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	198,00
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

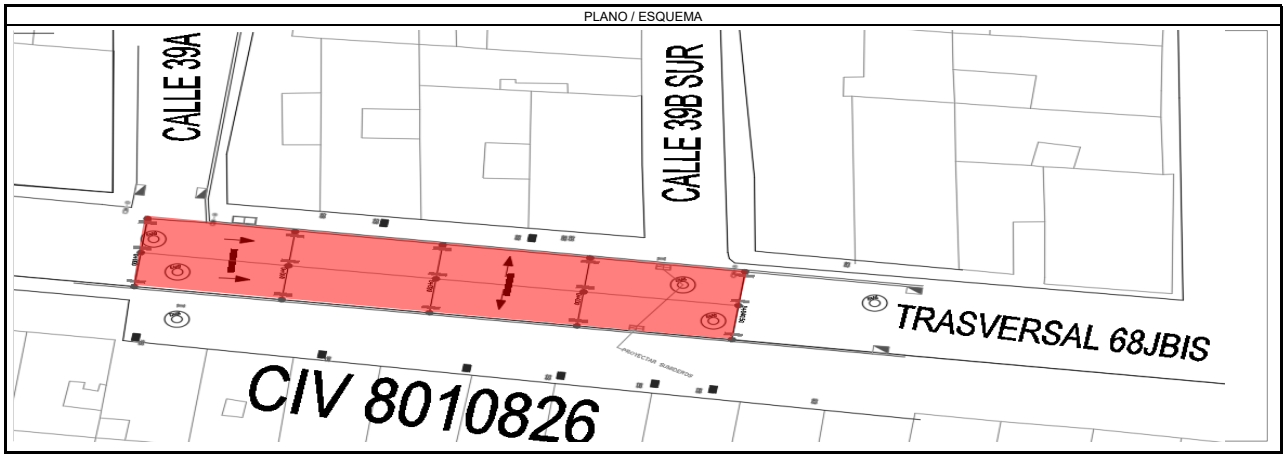

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			ABSCISA	COSTADO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
Construccion de sumideros									
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+034,00	oriental				1,00	1,00
	adecuac de sumideros para escorrentia vial		K0+035,00	occidental				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

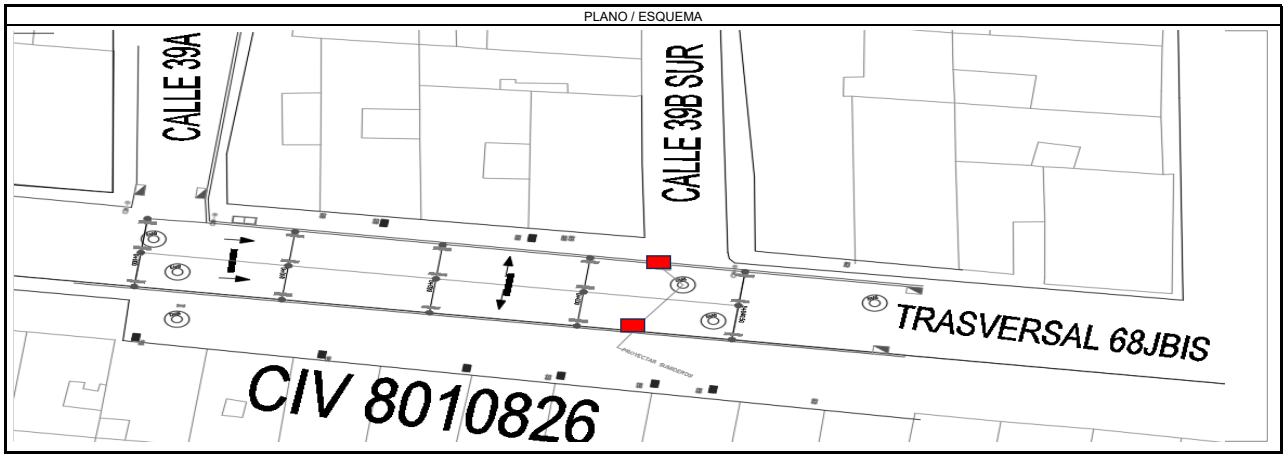

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,018 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO.INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8010826	TRANSVERSAL 68J BIS ENTRE CALLE 39A S Y CALLE 39B SUR								
relleno con base granular AR_BG38 para estructura de via									
	estructura de via		40,50	7,00	0,170				48,20
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,170			-4,00	-1,54
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,170			-2,00	-0,37
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									46,28
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									46,28
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

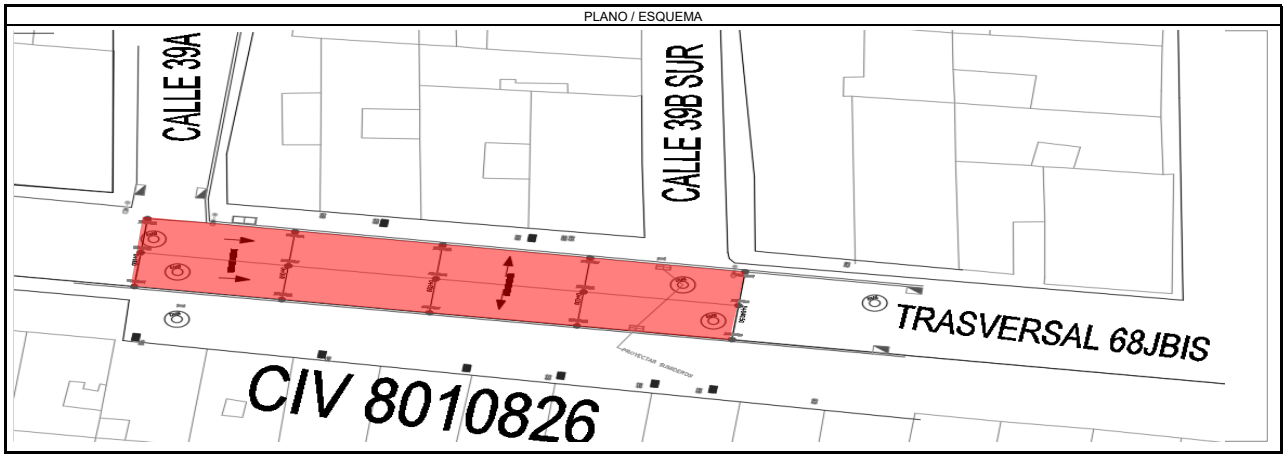

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	15/03/2026

CIV	NC-29	
PRIORIDAD:	NC	NC-29

BASE GRANULAR AR_BG38 0,170

CARTERA DE:	BASE GRANULAR AR_BG38	ANCHO DE VIA EXCAVADA	7,00

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					BASE GRANULAR AR_BG38					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2544,140	2544,180	2544,220	2544,220	2544,220	2544,310	2544,350	2544,390	2544,390	2544,390	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170		
K0+005,00	2544,115	2544,168	2544,220	2544,203	2544,185	2544,285	2544,338	2544,390	2544,373	2544,355	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+010,00	2544,090	2544,140	2544,190	2544,170	2544,150	2544,260	2544,310	2544,360	2544,340	2544,320	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+015,00	2544,065	2544,113	2544,160	2544,138	2544,115	2544,235	2544,283	2544,330	2544,308	2544,285	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+020,00	2544,040	2544,085	2544,130	2544,105	2544,080	2544,210	2544,255	2544,300	2544,275	2544,250	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+025,00	2544,015	2544,058	2544,100	2544,073	2544,045	2544,185	2544,228	2544,270	2544,243	2544,215	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+030,00	2543,990	2544,030	2544,070	2544,040	2544,010	2544,160	2544,200	2544,240	2544,210	2544,180	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+035,00	2543,970	2544,010	2544,050	2544,020	2543,990	2544,140	2544,180	2544,220	2544,190	2544,160	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	35,000	5,950
K0+040,50	2544,080	2544,105	2544,130	2544,100	2544,070	2544,250	2544,275	2544,300	2544,270	2544,240	7,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	38,500	6,545
																TOTAL	0,170	283,50	48,20
																POZOS	-4	-9,08	-1,54
																SUMIDEROS	-2	-2,16	-0,37
																	TOTAL	272,26	46,28

area 2,27
sumidero 1,08

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/3/2026 (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8009623 - CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
			1. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
1	1,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	8195.34	$ 1.142.00	$ 9.359.080.00	10212.16	$ 1.142.00	$ 11.662.287.00	153.00	$ 174.726.00		153.00	$ 174.726.00	10059.16	$ 11.487.561.00
2	1,002	3010	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1375,79	$ 48.679,00	$ 66.972.081,00	1359,01	$ 48.679,00	$ 66.155.248,00		$ -		0,00	$ -	1359,01	$ 66.155.248,00
3	1,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5859.32	$ 7.206.00	$ 42.222.260.00	4763.20	$ 7.206.00	$ 34.323.619.00	32.58	$ 234.771.00		32.58	$ 234.771.00	4730.62	$ 34.088.848.00
4	1,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1100,00	$ 57.240,00	$ 62.964.000,00	6192,47	$ 57.240,00	$ 354.456.983,00	89,85	$ 5.143.014,00		89,85	$ 5.143.014,00	6102,62	$ 349.313.969,00
5	1,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4566,07	$ 73.056,00	$ 333.578.810,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
6	1,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	9171,92	$ 16.517,00	$ 151.492.603,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
7	1,007	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4141,23	$ 235.794,00	$ 976.477.187,00	0,00	$ 235.794,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
8	1,008	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1200,00	$ 220.890,00	$ 265.068.000,00	0,00	$ 220.890,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
9	1,009	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 213.572,00	$ 616.219.292,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
10	1,010	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2885,30	$ 205.221,00	$ 592.124.151,00	0,00	$ 205.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
11	1,011	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	M3	545,12	$ 1.757.344,00	$ 957.963.361,00	0,00	$ 1.757.344,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
12	1,012	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	545,12	$ 1.953.442,00	$ 1.064.860.303,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
13	1,013	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.003,00	$ 38.316.276,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
14	1,014	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	9571,89	$ 4.877,00	$ 46.682.108,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
15	1,015	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	3930,17	$ 22.817,00	$ 89.674.689,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
16	1,016	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	66,00	$ 228.161,00	$ 15.058.626,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
17	1,017	4248	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	1420,00	$ 190.133,00	$ 269.988.860,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
18	1,018	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	1095,38	$ 1.712.945,00	$ 1.876.325.694,00	442,61	$ 1.712.945,00	$ 758.166.586,00		$ -		0,00	$ -	442,61	$ 758.166.586,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			2. RECONSTRUCCION - REHABILITACION VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
19	2,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	6603.57	$ 1.142.00	$ 7.541.277.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
20	2,002	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M3	1320,71	$ 234.955,00	$ 310.307.418,00	148,00	$ 234.955,00	$ 34.773.340,00	24,48	$ 5.751.698,00		24,48	$ 5.751.698,00	123,52	$ 29.021.642,00
21	2,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	4406.02	$ 7.206.00	$ 31.749.780.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
22	2,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	6603,57	$ 57.240,00	$ 377.988.347,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
23	2,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	600,00	$ 73.056,00	$ 43.833.600,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
24	2,006	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	2200,00	$ 16.517,00	$ 36.337.400,00	0,00	$ 16.517,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
25	2,007	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	2203,01	$ 220.757,00	$ 486.329.879,00	0,00	$ 220.757,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
26	2,008	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	700,00	$ 208.805,00	$ 146.163.500,00	0,00	$ 208.805,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
27	2,009	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 240.902,00	$ 264.992.200,00	0,00	$ 240.902,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
28	2,010	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100,00	$ 242.117,00	$ 266.328.700,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
29	2,011	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)	M2	1234,31	$ 488.707,00	$ 603.215.937,00	0,00	$ 488.707,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
30	2,012	3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	KG	1320,71	$ 7.018,00	$ 9.268.743,00	0,00	$ 7.018,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
31	2,013	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACIÓN)	KG	2311.25	$ 13.278.00	$ 30.688.778.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
32	2,014	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	23772,85	$ 10.549,00	$ 250.779.795,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
33	2,015	4238	MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	330,18	$ 9.221,00	$ 3.044.590,00	0,00	$ 9.221,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
34	2,016	3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	6603.57	$ 3.206.00	$ 21.171.045.00	0.00	$ 3.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
35	2,017	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	2905,57	$ 17.296,00	$ 50.254.739,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
36	2,018	3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	2905,57	$ 3.338,00	$ 9.698.793,00	248,00	$ 3.338,00	$ 827.824,00		$ -		0,00	$ -	248,00	$ 827.824,00
37	2,019	4240	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	2829,63	$ 22.817,00	$ 64.563.668,00	0,00	$ 22.817,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
38	2,020	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	19,00	$ 228.161,00	$ 4.335.059,00	0,00	$ 228.161,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
39	2,021	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	M2	180,00	$ 190.133,00	$ 34.223.940,00	0,00	$ 190.133,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			3. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO FLEXIBLE														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
40	3,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3253.08	$ 1.142.00	$ 3.715.017.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
41	3,002	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.14M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) E=0.20M, BASE ASFALTICA MD19)	M2	8,13	$ 371.818,00	$ 3.022.880,00	0,00	$ 371.818,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
42	3,003	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	162.65	$ 7.206.00	$ 1.172.056.00	0.00	$ 7.206.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
43	3,004	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	275,97	$ 57.240,00	$ 15.796.523,00	0,00	$ 57.240,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
44	3,005	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	81,33	$ 73.056,00	$ 5.941.644,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
45	3,006	3021	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	1382,56	$ 9.347,00	$ 12.922.788,00	0,00	$ 9.347,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
46	3,007	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	162,65	$ 248.800,00	$ 40.467.320,00	0,00	$ 248.800,00	0,00		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
47	3,008	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	80,00	$ 213.572,00	$ 17.085.760,00	0,00	$ 213.572,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
48	3,009	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)	M3	195,18	$ 1.712.945,00	$ 334.332.605,00	0,00	$ 1.712.945,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
49	3,010	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	81,33	$ 1.953.442,00	$ 158.873.438,00	0,00	$ 1.953.442,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
50	3,011	3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.003,00	$ 5.534.388,00	0,00	$ 4.003,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
51	3,012	3867	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1382,56	$ 4.877,00	$ 6.742.745,00	0,00	$ 4.877,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
52	3,013	4758	SELLO DE FISURAS	ML	800.00	$ 11.144.00	$ 8.915.200.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
53	3,014	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	487.96	$ 13.037.00	$ 6.361.535.00	0.00	$ 13.037.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
54	3,015	3723	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	25,00	$ 131.419,00	$ 3.285.475,00	2,00	$ 131.419,00	$ 262.838,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 262.838,00
55	3,016	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	140,00	$ 131.419,00	$ 18.398.660,00	0,00	$ 131.419,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			4. MANTENIMIENTO RUTINARIO-PERIODICO DE VIA PAVIMENTO RIGIDO														
										$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
56	4,001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2	3672.96	$ 1.142.00	$ 4.194.520.00	0.00	$ 1.142.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
57	4,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.	M3	459.12	$ 58.217.00	$ 26.728.589.00	0.00	$ 58.217.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
58	4,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3	619,81	$ 57.240,00	$ 35.477.924,00	0,00	$ 57.240,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
59	4,004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)	M3	252,52	$ 73.056,00	$ 18.447.809,00	0,00	$ 73.056,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
60	4,005	3486	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	550,94	$ 234.955,00	$ 129.447.048,00	0,00	$ 234.955,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
61	4,006	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	206.60	$ 248.800.00	$ 51.402.080.00	0.00	$ 248.800.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
62	4,007	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	68,87	$ 242.117,00	$ 16.674.598,00	0,00	$ 242.117,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
63	4,008	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRAULICO MR-45 e=0.18m	M2	550,94	$ 464.229,00	$ 255.764.182,00	0,00	$ 464.229,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
64	4,009	3708	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	9182.40	$ 7.018.00	$ 64.442.083.00	0.00	$ 7.018.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
65	4,010	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	4591.20	$ 13.278.00	$ 60.961.954.00	0.00	$ 13.278.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
66	4,011	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	1836,48	$ 10.549,00	$ 19.373.028,00	0,00	$ 10.549,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
67	4,012	4758	SELLO DE FISURAS	ML	100.00	$ 11.144.00	$ 1.114.400.00	0.00	$ 11.144.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
68	4,013	3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	1616,10	$ 17.296,00	$ 27.952.107,00	0,00	$ 17.296,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
69	4,014	3723	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	10.65	$ 131.419.00	$ 1.399.612.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
70	4,015	3724	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	20.94	$ 131.419.00	$ 2.751.914.00	0.00	$ 131.419.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
71	4,016	3434	TACHON EN CONCRETO L=0.40m Hi=0.15m, Hs=0.08m (Incluye Suminitro e Instalación) INCLUYE PINTURA PARA INSTALAR	UN	20,00	$ 97.222,00	$ 1.944.440,00	0,00	$ 97.222,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
72	4,017	4832	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5cmx15cmx8.5cm). SUMIN. E INSTAL.	UN	20,00	$ 90.021,00	$ 1.800.420,00	0,00	$ 90.021,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			5. MANTENIMIENTO PERIODICO EN ANDEN DE CONCRETO														
73	5,001	3012	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	M2	2683,78	$ 10.370,00	$ 27.830.799,00	3088,81	$ 10.370,00	$ 32.030.960,00		$ -		0,00	$ -	3088,81	$ 32.030.960,00
74	5,002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	268.38	$ 58.217.00	$ 15.624.278.00	542.24	$ 58.217.00	$ 31.567.586.00		$ -		0.00	$ -	542.24	$ 31.567.586.00
75	5,003	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	536,76	$ 57.240,00	$ 30.724.142,00	2260,66	$ 57.240,00	$ 129.400.178,00		$ -		0,00	$ -	2260,66	$ 129.400.178,00
76	5,004	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICO LIVIANO SOBRE MORTERO. RETIRO ADOQUIN E INSTALAR NUEVO, INCLUYE EXCAVACIÓN, SARDINEL, BORDILLO, INCLUYE MOBILIARIO, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A 21KM	M2	268,38	$ 392.394,00	$ 105.310.702,00	0,00	$ 392.394,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
77	5,005	3425	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	2683,78	$ 105.225,00	$ 282.400.751,00	73,00	$ 105.225,00	$ 7.681.425,00		$ -		0,00	$ -	73,00	$ 7.681.425,00
78	5,006	3621	RAMPA TIPO A B10 INCLUYE BASE EN MORTERO 1:5, DESARROLLO: 1M.	UN	89.46	$ 1.212.741.00	$ 108.491.810.00	0.00	$ 1.212.741.00	$ -		$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
79	5,007	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO DE 2000 PSI, NIVELACION Y ARENA DE SELLO). INCLUYE TRANSPORTE DE PÉTREOS	M2	2236,48	$ 165.385,00	$ 369.880.245,00	0,00	$ 165.385,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
80	5,008	5024	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN ANCHO=3.20M, DESARROLLO=2.00M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, EN ESPACIO PUBLICO EXISTENTE. ALTO ESTANDAR DE ANDEN DE 0.20M (INC. BASE ARENA NIVELADA, ARENA SELLO, RELLENO	UN	20,00	$ 2.082.959,00	$ 41.659.180,00	0,00	$ 2.082.959,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
81	5,009	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	2236,48	$ 145.068,00	$ 324.441.681,00	0,00	$ 145.068,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
82	5,010	5181	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000PSI. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (GRAVA COMÚN) E=0.20M H=0.35M (INCLUYE FORMALETA METÁLICA, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE NEGRO)	ML	4472,97	$ 78.310,00	$ 350.278.281,00	10,00	$ 78.310,00	$ 783.100,00		$ -		0,00	$ -	10,00	$ 783.100,00
83	5,011	4054	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	4472,97	$ 102.949,00	$ 460.487.789,00	1533,10	$ 102.949,00	$ 157.831.112,00		$ -		0,00	$ -	1533,10	$ 157.831.112,00
84	5,012	3210	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	6262,15	$ 86.663,00	$ 542.696.705,00	529,68	$ 86.663,00	$ 45.903.658,00		$ -		0,00	$ -	529,68	$ 45.903.658,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			6. REDES														
85	6,001	3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	5808,47	$ 58.217,00	$ 338.151.698,00	3657,45	$ 58.217,00	$ 212.925.767,00	11,11	$ 646.791,00		11,11	$ 646.791,00	3646,34	$ 212.278.976,00
86	6,002	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1452,12	$ 73.056,00	$ 106.086.079,00	4754,66	$ 73.056,00	$ 347.356.441,00		$ -		0,00	$ -	4754,66	$ 347.356.441,00
87	6,003	3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	4356,35	$ 49.220,00	$ 214.419.547,00	37,00	$ 49.220,00	$ 1.821.140,00		$ -		0,00	$ -	37,00	$ 1.821.140,00
88	6,004	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	217,82	$ 209.827,00	$ 45.704.517,00	886,54	$ 209.827,00	$ 186.020.029,00		$ -		0,00	$ -	886,54	$ 186.020.029,00
89	6,005	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	653,45	$ 125.986,00	$ 82.325.552,00	0,00	$ 125.986,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
90	6,006	4837	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	72,61	$ 268.758,00	$ 19.514.518,00	0,00	$ 268.758,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
91	6,007	3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	435,64	$ 195.195,00	$ 85.034.750,00	43,00	$ 195.195,00	$ 8.393.385,00	3,62	$ 706.606,00		3,62	$ 706.606,00	39,38	$ 7.686.779,00
92	6,008	3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	40,00	$ 2.379.851,00	$ 95.194.040,00	56,00	$ 2.379.851,00	$ 133.271.656,00		$ -		0,00	$ -	56,00	$ 133.271.656,00
93	6,009	3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	280,00	$ 928.646,00	$ 260.020.880,00	82,00	$ 928.646,00	$ 76.148.972,00		$ -		0,00	$ -	82,00	$ 76.148.972,00
94	6,010	3722	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	40,00	$ 170.695,00	$ 6.827.800,00	65,00	$ 170.695,00	$ 11.095.175,00		$ -		0,00	$ -	65,00	$ 11.095.175,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY — **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 938

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/3/2026 (Día/Mes/Año)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 19.645.886.208,00

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CIN-994-2025 SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO

(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS

(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 938 DE 2025 (Escriba el número de contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8009623 - CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+ -	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
95	6,011	4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	295,20	$ 180.628,00	$ 53.321.386,00	0,00	$ 180.628,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
96	6,012	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	190,41	$ 528.764,00	$ 100.681.953,00	23,35	$ 528.764,00	$ 12.346.639,00		$ -		0,00	$ -	23,35	$ 12.346.639,00
97	6,013	3041	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	3310,80	$ 46.883,00	$ 155.220.236,00	0,00	$ 46.883,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
98	6,014	3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1744,93	$ 221.771,00	$ 386.974.871,00	378,50	$ 221.771,00	$ 83.940.324,00		$ -		0,00	$ -	378,50	$ 83.940.324,00
99	6,015	3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	60,00	$ 535.886,00	$ 32.153.160,00	165,50	$ 535.886,00	$ 88.689.133,00		$ -		0,00	$ -	165,50	$ 88.689.133,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			7. ITEMS DE INCLUSION														
100	7,001	3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 88.189,00		727,96	$ 88.189,00	$ 64.198.064,00		$ -		0,00	$ -	727,96	$ 64.198.064,00
101	7,002	3043	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 122.135,00		792,57	$ 122.135,00	$ 96.800.537,00		$ -		0,00	$ -	792,57	$ 96.800.537,00
102	7,003	3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 172.135,00		33,60	$ 172.135,00	$ 5.783.736,00		$ -		0,00	$ -	33,60	$ 5.783.736,00
103	7,004	6538	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 351.631,00		88,70	$ 351.631,00	$ 31.189.670,00		$ -		0,00	$ -	88,70	$ 31.189.670,00
104	7,005	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2		$ 2.400.00		9059.81	$ 2.400.00	$ 21.743.544.00	114.75	$ 275.400.00		114.75	$ 275.400.00	8945.06	$ 21.468.144.00
105	7,006	9997	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ESPACIO PÚBLICO	M2		$ 3.740.00		1936.46	$ 3.740.00	$ 7.242.360.00		$ -		0.00	$ -	1936.46	$ 7.242.360.00
106	7,007	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 92.526,00		500,20	$ 92.526,00	$ 46.281.505,00		$ -		0,00	$ -	500,20	$ 46.281.505,00
107	7,008	4203	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3		$ 1.843.898,00		10,41	$ 1.843.898,00	$ 19.194.978,00		$ -		0,00	$ -	10,41	$ 19.194.978,00
108	7,009	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		165,20	$ 10.811,00	$ 1.785.977,00		$ -		0,00	$ -	165,20	$ 1.785.977,00
109	7,010	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG		$ 10.811,00		1,00	$ 10.811,00	$ 10.811,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 10.811,00
110	7,011	5172	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO = 6.5MT).	UN		$ 656.068,00		341,00	$ 656.068,00	$ 223.719.188,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 223.719.188,00
111	7,012	5186	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO DE 6.5M, INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR)	UN		$ 630.227,00		33,00	$ 630.227,00	$ 20.797.491,00		$ -		0,00	$ -	33,00	$ 20.797.491,00
112	7,013	4851	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA)	UN		$ 47.561,00		14,00	$ 47.561,00	$ 665.854,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 665.854,00
113	7,014	8970	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 566.503.00		341.00	$ 566.503.00	$ 193.177.523.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 193.177.523.00
114	7,015	4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 114.367.00		451.00	$ 114.367.00	$ 51.579.517.00		$ -		0.00	$ -	451.00	$ 51.579.517.00
115	7,016	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	M3		$ 2.093.317,00		634,19	$ 2.093.317,00	$ 1.327.560.708,00		$ -		0,00	$ -	634,19	$ 1.327.560.708,00
116	7,017	3866	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.881,00		8744,61	$ 4.881,00	$ 42.682.441,00		$ -		0,00	$ -	8744,61	$ 42.682.441,00
117	7,018	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UN		$ 852.604,00		6,00	$ 852.604,00	$ 5.115.624,00		$ -		0,00	$ -	6,00	$ 5.115.624,00
118	7,019	3155	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN		$ 294.438.00		28.00	$ 294.438.00	$ 8.244.264.00		$ -		0.00	$ -	28.00	$ 8.244.264.00
119	7,020	7900	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 100.003,00		9059,81	$ 100.003,00	$ 906.008.179,00	114,75	$ 11.475.344,00		114,75	$ 11.475.344,00	8945,06	$ 894.532.835,00
120	7,021	3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 101.831.00		306.00	$ 101.831.00	$ 31.160.286.00	32.50	$ 3.309.508.00		32.50	$ 3.309.508.00	273.50	$ 27.850.779.00
121	7,022	3052	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 159.155,00		2619,76	$ 159.155,00	$ 416.947.903,00	2,55	$ 405.845,00		2,55	$ 405.845,00	2617,21	$ 416.542.058,00
122	7,023	4878	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.525,00		341,00	$ 299.525,00	$ 102.138.025,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 102.138.025,00
123	7,024	6542	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 116.431,00		38,00	$ 116.431,00	$ 4.424.378,00		$ -		0,00	$ -	38,00	$ 4.424.378,00
124	7,025	3879	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN		$ 1.517.446,00		23,00	$ 1.517.446,00	$ 34.901.258,00		$ -		0,00	$ -	23,00	$ 34.901.258,00
125	7,026	7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 294.664,00		2,00	$ 294.664,00	$ 589.328,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 589.328,00
126	7,027	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.320.280,00		149,30	$ 2.320.280,00	$ 346.417.804,00		$ -		0,00	$ -	149,30	$ 346.417.804,00
127	7,028	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 10". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.544.307,00		2,00	$ 2.544.307,00	$ 5.088.614,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.088.614,00
128	7,029	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 12". ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 2.800.338,00		2,00	$ 2.800.338,00	$ 5.600.676,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 5.600.676,00
129	7,030	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 14". ESPESOR 3,50 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.328.401,00		1,00	$ 3.328.401,00	$ 3.328.401,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 3.328.401,00
130	7,031	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 16". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 3.800.458,00		34,50	$ 3.800.458,00	$ 131.115.801,00		$ -		0,00	$ -	34,50	$ 131.115.801,00
131	7,032	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 78.395,00		4593,68	$ 78.395,00	$ 360.121.544,00		$ -		0,00	$ -	4593,68	$ 360.121.544,00
132	7,033	4857	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 4.749,00		9059,81	$ 4.749,00	$ 43.025.038,00		$ -		0,00	$ -	9059,81	$ 43.025.038,00
133	7,034	3735	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 3.546.00		48.20	$ 3.546.00	$ 170.917.00		$ -		0.00	$ -	48.20	$ 170.917.00
134	7,035	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 10.058.00		14.00	$ 10.058.00	$ 140.812.00		$ -		0.00	$ -	14.00	$ 140.812.00
135	7,036	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	ML		$ 10.525,00		3979,34	$ 10.525,00	$ 41.882.554,00		$ -		0,00	$ -	3979,34	$ 41.882.554,00
136	7,037	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3		$ 198.532,00		64,08	$ 198.532,00	$ 12.721.931,00		$ -		0,00	$ -	64,08	$ 12.721.931,00
137	7,038	3202	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 984.823.00		16.00	$ 984.823.00	$ 15.757.168.00		$ -		0.00	$ -	16.00	$ 15.757.168.00
138	7,039	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=16" (INCLUYE TUBERÍA).SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 7.459.739,00		5,00	$ 7.459.739,00	$ 37.298.695,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 37.298.695,00
139	7,040	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, PREMEZCLADO)	UN		$ 272.085,00		14,00	$ 272.085,00	$ 3.809.190,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 3.809.190,00
140	7,041	4988	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y VUELTA.	VIAJE		$ 2.474.248,00		14,00	$ 2.474.248,00	$ 34.639.472,00		$ -		0,00	$ -	14,00	$ 34.639.472,00
141	7,042	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 24". ESPESOR 5.60 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.697.698,00		100,70	$ 5.697.698,00	$ 573.758.189,00		$ -		0,00	$ -	100,70	$ 573.758.189,00
142	7,043	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 257.553,00		1875,14	$ 257.553,00	$ 482.947.932,00	22,95	$ 5.910.841,00		22,95	$ 5.910.841,00	1852,19	$ 477.037.091,00
143	7,044	4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3		$ 231.349,00		348,56	$ 231.349,00	$ 80.639.007,00		$ -		0,00	$ -	348,56	$ 80.639.007,00
144	7,045	4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$ 10.108,00		2258,60	$ 10.108,00	$ 22.829.929,00		$ -		0,00	$ -	2258,60	$ 22.829.929,00
145	7,046	4033	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2		$ 33.747,00		12148,62	$ 33.747,00	$ 409.979.479,00	127,50	$ 4.302.743,00		127,50	$ 4.302.743,00	12021,12	$ 405.676.737,00
146	7,047	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 18". ESPESOR 4.20 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 4.152.501,00		4,00	$ 4.152.501,00	$ 16.610.004,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 16.610.004,00
147	7,048	5225	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 6.196.00		7958.68	$ 6.196.00	$ 49.311.981.00		$ -		0.00	$ -	7958.68	$ 49.311.981.00
148	7,049	5220	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML		$ 25.701,00		7958,68	$ 25.701,00	$ 204.546.035,00		$ -		0,00	$ -	7958,68	$ 204.546.035,00
149	7,050	5227	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 35.750.00		408.47	$ 35.750.00	$ 14.602.803.00		$ -		0.00	$ -	408.47	$ 14.602.803.00
150	7,051	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN PARA: CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC)	M2		$ 191.703,00		510,64	$ 191.703,00	$ 97.891.220,00		$ -		0,00	$ -	510,64	$ 97.891.220,00
151	7,052	7881	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 8.852.00		2830.00	$ 8.852.00	$ 25.051.160.00		$ -		0.00	$ -	2830.00	$ 25.051.160.00
152	7,053	5189	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 124.194,00		19,00	$ 124.194,00	$ 2.359.686,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 2.359.686,00
153	7,054	5241	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 26.513.00		54.00	$ 26.513.00	$ 1.431.702.00		$ -		0.00	$ -	54.00	$ 1.431.702.00
154	7,055	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA	UN		$ 311.753,00		19,00	$ 311.753,00	$ 5.923.307,00		$ -		0,00	$ -	19,00	$ 5.923.307,00
155	7,056	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 20". ESPESOR 4.90 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES (LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME POS REHABILITACIÓN E INFORME DE PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN CON NORMA TÉCNICA EAB)).	ML		$ 5.096.615,00		1,00	$ 5.096.615,00	$ 5.096.615,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 5.096.615,00
156	7,057	3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 703.569,00		62,50	$ 703.569,00	$ 43.973.063,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 43.973.063,00
157	7,058	3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 425.516,00		35,50	$ 425.516,00	$ 15.105.818,00		$ -		0,00	$ -	35,50	$ 15.105.818,00
158	7,059	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML		$ 27.170,00		1569,67	$ 27.170,00	$ 42.647.934,00		$ -		0,00	$ -	1569,67	$ 42.647.934,00
159	7,060	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML		$ 29.226,00		340,50	$ 29.226,00	$ 9.951.453,00		$ -		0,00	$ -	340,50	$ 9.951.453,00
160	7,061	6161	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"	ML		$ 17.602,00		1910,17	$ 17.602,00	$ 33.622.812,00		$ -		0,00	$ -	1910,17	$ 33.622.812,00
												$ -		0.00	$ -	0.00	$ -
			8. NO PREVISTOS														
161	8,001	NP-1	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 14 DIAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO	M3		$ 1.385.170,00		5,00	$ 1.385.170,00	$ 6.925.850,00		$ -		0,00	$ -	5,00	$ 6.925.850,00
162	8,002	NP-2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 282.325,00		1355,52	$ 282.325,00	$ 382.697.184,00		$ -		0,00	$ -	1355,52	$ 382.697.184,00
163	8,003	NP-3	GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 77.819.00		9059.81	$ 77.819.00	$ 705.025.354.00	114.75	$ 8.929.730.00		114.75	$ 8.929.730.00	8945.06	$ 696.095.624.00
164	8,004	NP-4	ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%	M3		$ 476.745,00		2281,25	$ 476.745,00	$ 1.087.574.531,00	22,81	$ 10.874.553,00		22,81	$ 10.874.553,00	2258,44	$ 1.076.699.978,00
165	8,005	NP-5	TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN O MATERIAL GRANULAR POR M3 CADA 10 METROS	M3		$ 19.423,00		94,00	$ 19.423,00	$ 1.825.762,00		$ -		0,00	$ -	94,00	$ 1.825.762,00
166	8,006	NP-6	INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%)	UN		$ 107.272,00		9059,81	$ 107.272,00	$ 971.863.938,00	126,00	$ 13.516.272,00		126,00	$ 13.516.272,00	8933,81	$ 958.347.666,00
167	8,007	NP-7	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60X60 H: 1.0 m, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA	ML		$ 446.392,00		341,00	$ 446.392,00	$ 152.219.672,00		$ -		0,00	$ -	341,00	$ 152.219.672,00
168	8,008	NP-8	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 (Suministro e instalacíon)	UN		$ 360.064.00		341.00	$ 360.064.00	$ 122.781.824.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 122.781.824.00
169	8,009	NP-9	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60.	UN		$ 162.297.00		341.00	$ 162.297.00	$ 55.343.277.00		$ -		0.00	$ -	341.00	$ 55.343.277.00
170	8,010	NP-10	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 12 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 657.822,00		137,00	$ 657.822,00	$ 90.121.614,00		$ -		0,00	$ -	137,00	$ 90.121.614,00
171	8,011	NP-11	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 14 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 744.157,00		4,00	$ 744.157,00	$ 2.976.628,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.976.628,00

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. COP 936

ACTA No **DE RECIBO PARCIAL No** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/3/2026 (Fecha inicio) **A** 31/3/2026 (Fecha fin)

OBRA PUBLICA

OBJETO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR ACTUAL DEL $ 19.645.886.208,00 (Escriba en letras el valor total actual del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO CIN-094-2025 SAVIMAC SAS (Escriba el número y nombre asociado del interventor y en el mismo de interventor en ejecución)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO (Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, SANTIAGO CARRILLO VARGAS (Escriba los apellidos/nombre legal de la interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. CLÁUSULA 8. VALOR FORMA DE PAGO (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato N° COP 936 DE 2025 (Escriba el número del contrato)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

8609623 - CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77G Y CARRERA 77V

No.	ITEM DE PAGO	CODIGO IDRD O IDU	CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)					CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES			BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES						
											PRESENTE ACTA			ACUMULADAS		SALDO	
			DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR	CANT.	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
172	8,012	NP-12	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 16 PULGADAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 795.331,00		1,00	$ 795.331,00	$ 795.331,00		$ -		0,00	$ -	1,00	$ 795.331,00
173	8,013	NP-13	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 18 PULGADAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 896.388,00		49,75	$ 896.388,00	$ 44.595.303,00		$ -		0,00	$ -	49,75	$ 44.595.303,00
174	8,014	NP-14	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍA DE 20 PULGADAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN	ML		$ 974.773,00		62,50	$ 974.773,00	$ 60.923.313,00		$ -		0,00	$ -	62,50	$ 60.923.313,00
175	8,015	NP-15	CAÑUELA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO (INCLUYE MATERIALES E INSTALACION)	UN		$ 269.294,00		24,00	$ 269.294,00	$ 6.463.056,00		$ -		0,00	$ -	24,00	$ 6.463.056,00
176	8,016	NP-16	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 6" x 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (Incluye taladro rotopercutor 3/4", planta electrica 6Kw)	UN		$ 76.124,00		11,00	$ 76.124,00	$ 837.364,00		$ -		0,00	$ -	11,00	$ 837.364,00
177	8,017	NP-17	PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, EJECUTAR BROCAS, PREPARAR Y CAMBIAR DE)	UN		$ 180.006,00		9059,81	$ 180.006,00	$ 1.630.820.159,00	126,00	$ 22.680.756,00		126,00	$ 22.680.756,00	8933,81	$ 1.608.139.403,00
178	8,018	NP-18	SUMIDERO LATERAL SL-120, H=1.22m (PREFABRICADO,INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE TAPA Y REJILLA)	UN		$ 4.852.592,00		124,00	$ 4.852.592,00	$ 601.721.408,00		$ -		0,00	$ -	124,00	$ 601.721.408,00
179	8,019	NP-19	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 80X80, NO INCLUYE MARCO, NI TAPA, NI BASE NI CAÑUELA.	ML		$ 563.913,00		4,00	$ 563.913,00	$ 2.255.652,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 2.255.652,00
180	8,020	NP-20	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 (Suministro e instalación)	UN		$ 486.892,00		4,00	$ 486.892,00	$ 1.947.568,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 1.947.568,00
181	8,021	NP-21	BASE Y CAÑUELA PARA CAJA DE INSPECCION DE 80X80	UN		$ 208.334,00		4,00	$ 208.334,00	$ 833.336,00		$ -		0,00	$ -	4,00	$ 833.336,00
182	8,022	NP-22	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 464.671,00		15,00	$ 464.671,00	$ 6.970.065,00		$ -		0,00	$ -	15,00	$ 6.970.065,00
183	8,023	NP-23	LIMPIEZA Y SONDEO DE REDES CON EQUIPO DE SUCCIÓN - PRESIÓN, CON COLMATACIÓN SUPERIOR AL 30% Y DIÁMETROS DE 8" A 36" INCLUYE ACCIÓ	ML		$ 661.727,00		86,80	$ 661.727,00	$ 57.437.904,00		$ -		0,00	$ -	86,80	$ 57.437.904,00
184	8,024	NP-24	CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN.	ML		$ 400.192,00		170,75	$ 400.192,00	$ 68.332.784,00	7,00	$ 2.801.344,00		7,00	$ 2.801.344,00	163,75	$ 65.531.440,00
185	8,025	NP-25	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 223.645,00		2,00	$ 223.645,00	$ 447.290,00		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 447.290,00
186	8,026	NP-26	PISO EN CONCRETO MR45 ESTAMPADO E=0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 346.192,00		172,86	$ 346.192,00	$ 59.842.749,00		$ -		0,00	$ -	172,86	$ 59.842.749,00
187	8,027	NP-27	PISO EN CONCRETO 3000 ESTAMPADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, MOLDE DESMOLDANTE, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2		$ 318.979,00		580,92	$ 318.979,00	$ 185.301.281,00		$ -		0,00	$ -	580,92	$ 185.301.281,00
188	8,028	NP-28	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (A6 , IEC80) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 262.519,00		1815,49	$ 262.519,00	$ 476.630.619,00	17,54	$ 4.604.583,00		17,54	$ 4.604.583,00	1797,95	$ 471.998.036,00
			TOTALES				**$ 16.832.066.661,00**			**$ 16.456.658.116,00**		**$ 101.744.525,00**			**$ 101.744.525,00**		**$ 16.354.913.593,00**

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN		VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES	OBRA EJECUTADA			
				PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL
			OBRA EJECUTADA				
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 12.294.241.586,25	$ 12.239.183.345,33	$ 75.663.363,58			$ 75.663.363,58
ADMINISTRACIÓN	28,47%	$ 3.500.170.579,60	$ 3.484.205.075,95	$ 21.541.359,61			$ 21.541.359,61
IMPREVISTO	1,00%	$ 122.942.415,86	$ 122.381.632,45	$ 756.633,64			$ 756.633,64
UTILIDAD	5,00%	$ 614.712.079,31	$ 611.908.162,27	$ 3.783.168,18			$ 3.783.168,18
SUBTOTAL A.I.U	34,47%	$ 4.237.825.074,77	$ 4.218.494.870,67	$ 26.081.161,43			$ 26.081.161,43
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=34,47%)		**$ 16.532.066.661,00**	**$ 16.456.658.116,00**	**$ 101.744.525,00**			**$ 101.744.525,00**
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES. SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (B) =	**12,3764%**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 1.521.584.516,00**	**$ 9.364.401,00**			**$ 9.364.401,00**
COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYEN ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA). SE CALCULARÁ APLICANDO EL PORCENTAJE FIJO AL COSTO DIRECTO OFERTADO (C) =	**2,3210%**	**285.447.701,00**	**285.447.701,00**	$ -		$ -	
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO A LAS FORMULAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES) (E) = (A) + (B) + (C) =		**$ 18.339.098.878,00**	**$ 18.339.098.878,00**			$ -	
OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS		**$ 1.306.787.330,00**	**$ 1.302.195.675,00**				
AMORTIZACION DE ANTICIPO	**30,000%**	**$ 5.893.765.862,00**		$ -		$ -	
(K) COSTO TOTAL MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (F)+(G)		**$ 19.645.886.208,00**	**$ 19.645.886.208,00**			$ -	
VALOR NETO A PAGAR				$ 111.108.926,00			$ 111.108.926,00

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año en que se firma el acta)

JOTAM MAESTRE DIAB
REPRESENTANTE LEGAL (S)
Contratista

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
replanteo de segmento vial			25,50	6,00					153,00
	planimetria y altimetria inicial								
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									153,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									153,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

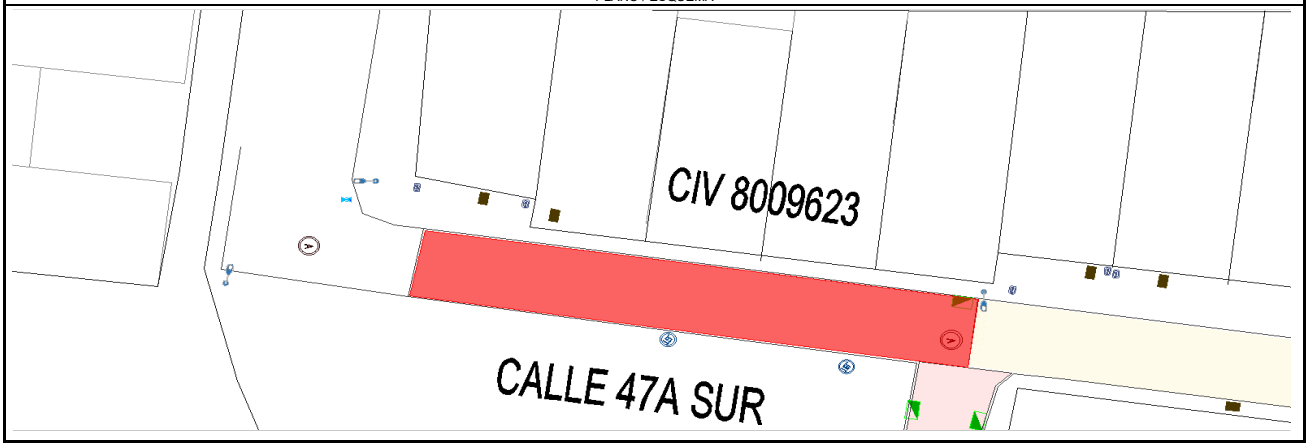

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM REPLANTEO GENERAL

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
excavacion mecanica estructura de via									
	caja de via		25,50	4,50	0,284				32,58
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,000			0,00	0,00
	sumideros existentes	area	0,00		0,000			0,00	0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									32,58
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									32,58
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

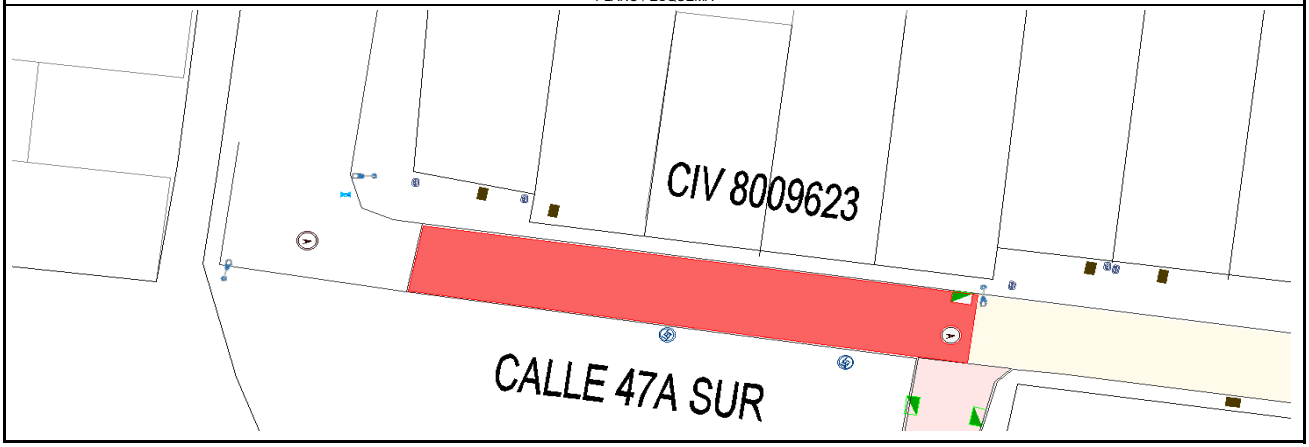

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,003 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONTRATO N.º	938 DE 2025	FECHA:	15/03/2026

CIV	8009623	
PRIORIDAD:	NC	28

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE: EXCAVACION MECANICA DE VIA — **ANCHO DE VIA EXCAVADA** 4,50

ABSCISA (m)	DEMOLICION					SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,497	2538,545	2538,592	2538,650	2538,708	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	4,500	0,305	0,332	0,360	0,437	0,515	0,390		
K0+005,00	2538,507	2538,518	2538,529	2538,531	2538,532	2538,225	2538,243	2538,260	2538,239	2538,218	4,500	0,282	0,276	0,269	0,291	0,314	0,286	22,500	7,608
K0+010,00	2538,512	2538,530	2538,547	2538,517	2538,487	2538,255	2538,270	2538,285	2538,264	2538,243	4,500	0,257	0,260	0,262	0,253	0,244	0,255	22,500	6,092
K0+015,00	2538,515	2538,541	2538,567	2538,570	2538,572	2538,285	2538,300	2538,315	2538,292	2538,268	4,500	0,230	0,241	0,252	0,278	0,304	0,261	22,500	5,806
K0+020,00	2538,592	2538,590	2538,587	2538,602	2538,617	2538,315	2538,330	2538,345	2538,319	2538,293	4,500	0,277	0,260	0,242	0,283	0,324	0,277	22,500	6,054
K0+025,50	2538,652	2538,642	2538,632	2538,615	2538,597	2538,345	2538,345	2538,345	2538,333	2538,320	4,500	0,307	0,297	0,287	0,282	0,277	0,290	24,750	7,018
																TOTAL	0,293	114,75	32,58
														area	0	POZOS	0	0,00	0,00
														sumidero	0	SUMIDEROS	0	0,00	0,00
																	TOTAL	114,75	32,58

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			VOLUMEN COMPACTO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
Transporte y disposicion de escombros		item							
	excavacion mecanica de estructura de via	1,003	32,58				1,30		42,35
	demolicion concreto estructural	2,002	24,48				1,35		33,05
	excavacion manual redes	6,001	11,11				1,30		14,44
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									89,85
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									89,85
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

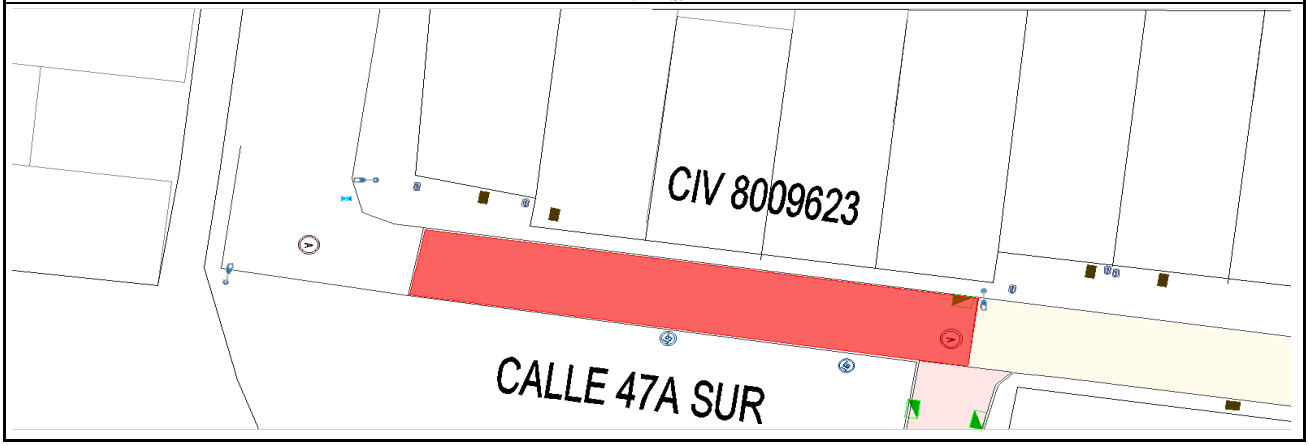

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 1,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
demolicion de concreto estructural									
	concreto existente		25,50	4,50	0,20				22,95
	se anexa cartera topografica								
	sardinel adosado a placa en concreto	costado oriental	25,50	0,20	0,15				0,77
		costado occidental	25,50	0,20	0,15				0,77
	pozos existentes	area	2,27		0,20			0,00	0,00
	sumideros existentes	area	0,00		0,20			0,00	0,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	24,48
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	24,48
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

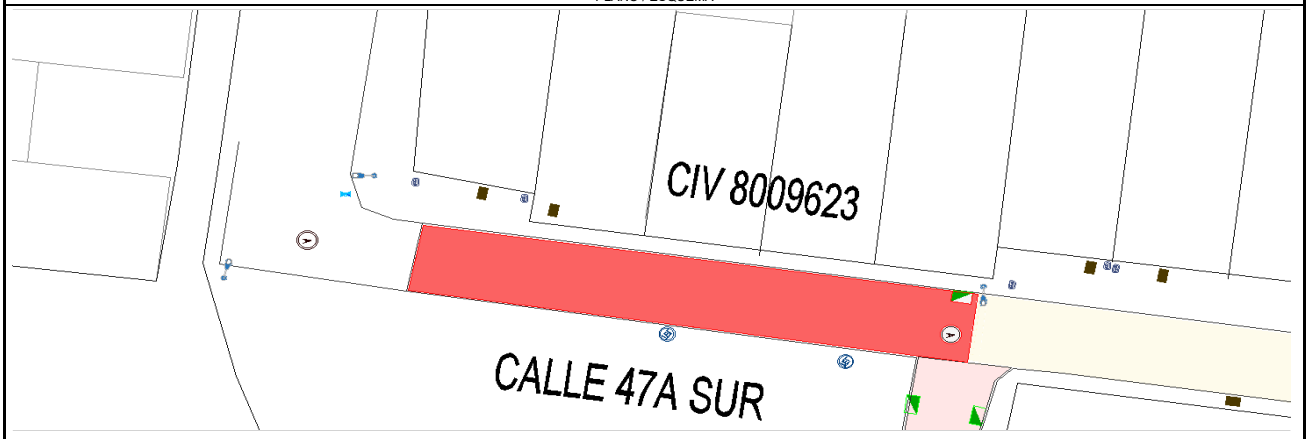

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 2,002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009623	
PRIORIDAD:	NC	28

ESPESOR MEDIO ENCONTRADO 0,200

CARTERA DE:	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE - PLACA EN CONCRETO	ANCHO DE VIA DEMOLIDA	4,50

ABSCISA (m)	PLACA EN CONCRETO EXISTENTE					DEMOLICION					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,697	2538,745	2538,792	2538,850	2538,908	2538,497	2538,545	2538,592	2538,650	2538,708	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
K0+005,00	2538,707	2538,718	2538,729	2538,731	2538,732	2538,507	2538,518	2538,529	2538,531	2538,532	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+010,00	2538,712	2538,730	2538,747	2538,717	2538,687	2538,512	2538,530	2538,547	2538,517	2538,487	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+015,00	2538,715	2538,741	2538,767	2538,770	2538,772	2538,515	2538,541	2538,567	2538,570	2538,572	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+020,00	2538,792	2538,790	2538,787	2538,802	2538,817	2538,592	2538,590	2538,587	2538,602	2538,617	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+025,50	2538,852	2538,842	2538,832	2538,815	2538,797	2538,652	2538,642	2538,632	2538,615	2538,597	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	24,750	4,950

TOTAL	0,200	114,75	22,95
POZOS	0	0,00	0,00
SUMIDEROS	0	0,00	0,00
	TOTAL	114,75	22,95

area 0
sumidero 0

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
excavacion para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado occidental								
	tubo acueducto 4"								
	cruce E-W	K0+000,00	7,00	0,65	0,50				2,28
	tubo acueducto 4"								
	Costado Occidental	K0+000,00							
		K0+025,50	25,50	0,50	0,50				6,38
	anden - empate tuberia	K0+025,50							
	costado sur segmento	K0+028,30	2,80	0,80	1,10				2,46
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									11,11
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									11,11
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

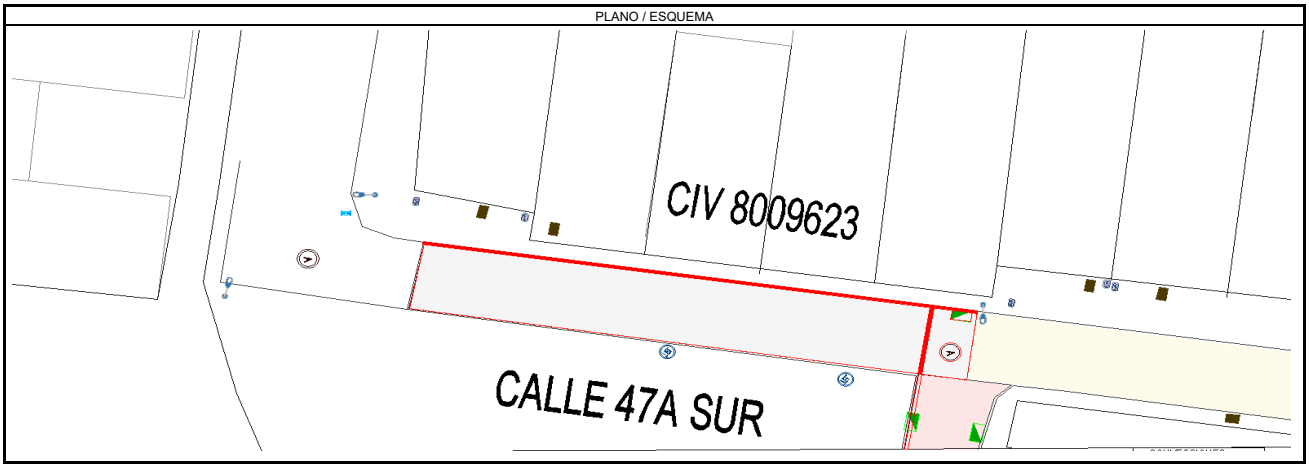

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,001 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
Relleno en arena para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+025,50	25,50	0,50	0,30				3,83
	volumen tubo 4"		25,50	area	-0,0079				-0,20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									3,62
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									3,62
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

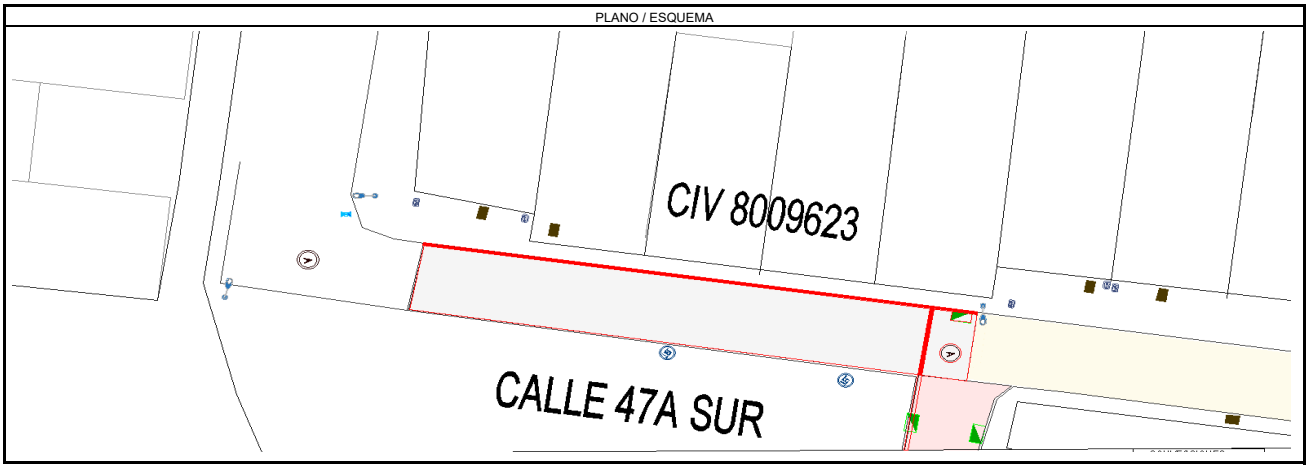

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 6,007 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
nivelacion y compactacion de subrasante de via									
	subrasante de diseño		25,50	4,500					114,75
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					0,00	0,00
	sumideros construidos		1,20	0,90				0,00	0,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	114,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	114,75
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

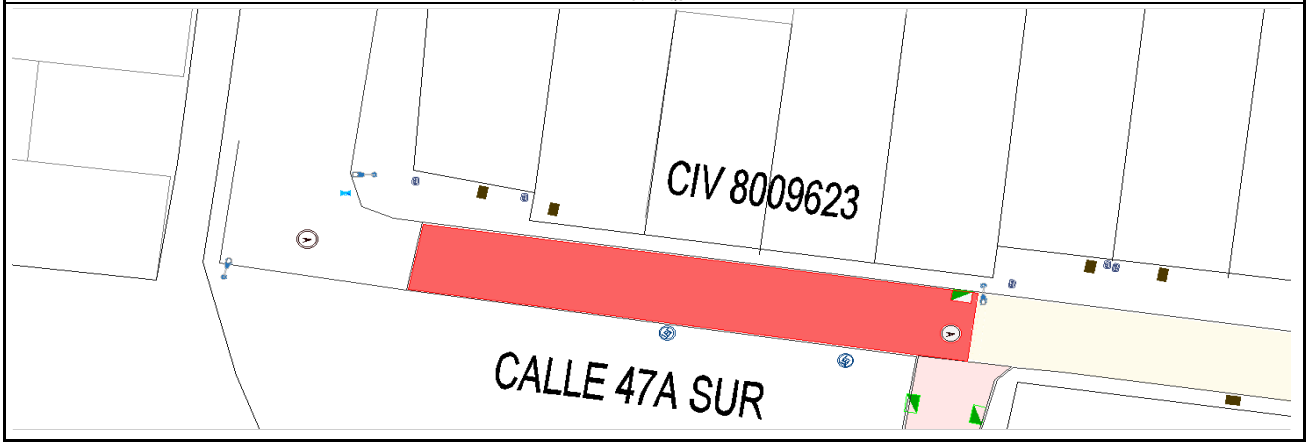

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009623	
PRIORIDAD:	NC	28

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,50

ABSCISA (m)	SUBRASANTE DE DISEÑO EXCAVADA					NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,225	2538,243	2538,260	2538,239	2538,218	2538,225	2538,243	2538,260	2538,239	2538,218	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+010,00	2538,255	2538,270	2538,285	2538,264	2538,243	2538,255	2538,270	2538,285	2538,264	2538,243	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+015,00	2538,285	2538,300	2538,315	2538,292	2538,268	2538,285	2538,300	2538,315	2538,292	2538,268	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+020,00	2538,315	2538,330	2538,345	2538,319	2538,293	2538,315	2538,330	2538,345	2538,319	2538,293	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+025,50	2538,345	2538,345	2538,345	2538,333	2538,320	2538,345	2538,345	2538,345	2538,333	2538,320	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,750	0,000
																TOTAL	0,000	114,75	0,00
														area	0	POZOS	0	0,00	0,00
														sumidero	0	SUMIDEROS	0	0,00	0,00
																	TOTAL	114,75	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
Geocelda para estructura de via									
	estructura de via		25,50	4,50					114,75
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					0,00	0,00
	sumideros construidos		1,20	0,90				0,00	0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									114,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									114,75
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

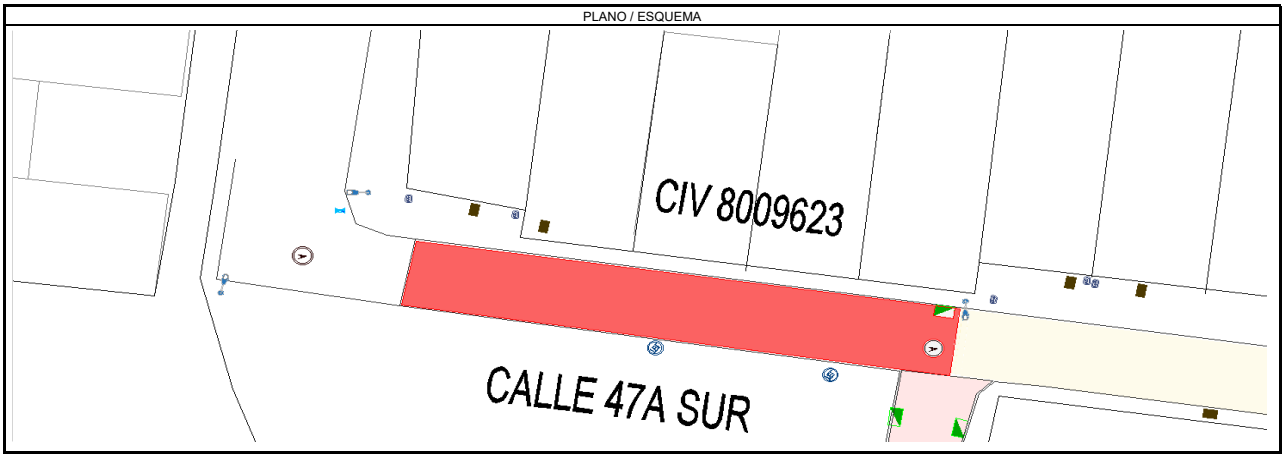

FORMATO	
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,020 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009623	
PRIORIDAD:	NC	28

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	GEOCELDA h=15cm	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,50

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					GEOCELDA h=15cm					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,225	2538,243	2538,260	2538,239	2538,218	2538,225	2538,243	2538,260	2538,239	2538,218	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+010,00	2538,255	2538,270	2538,285	2538,264	2538,243	2538,255	2538,270	2538,285	2538,264	2538,243	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+015,00	2538,285	2538,300	2538,315	2538,292	2538,268	2538,285	2538,300	2538,315	2538,292	2538,268	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+020,00	2538,315	2538,330	2538,345	2538,319	2538,293	2538,315	2538,330	2538,345	2538,319	2538,293	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+025,50	2538,345	2538,345	2538,345	2538,333	2538,320	2538,345	2538,345	2538,345	2538,333	2538,320	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,750	0,000

			TOTAL	0,000	114,75	0,00
area	0		POZOS	0	0,00	0,00
sumidero	0		SUMIDEROS	0	0,00	0,00
			TOTAL	114,75	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+025,50	25,50						25,50
	cruce E-W	K0+000,00	7,00						7,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									32,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									32,50
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

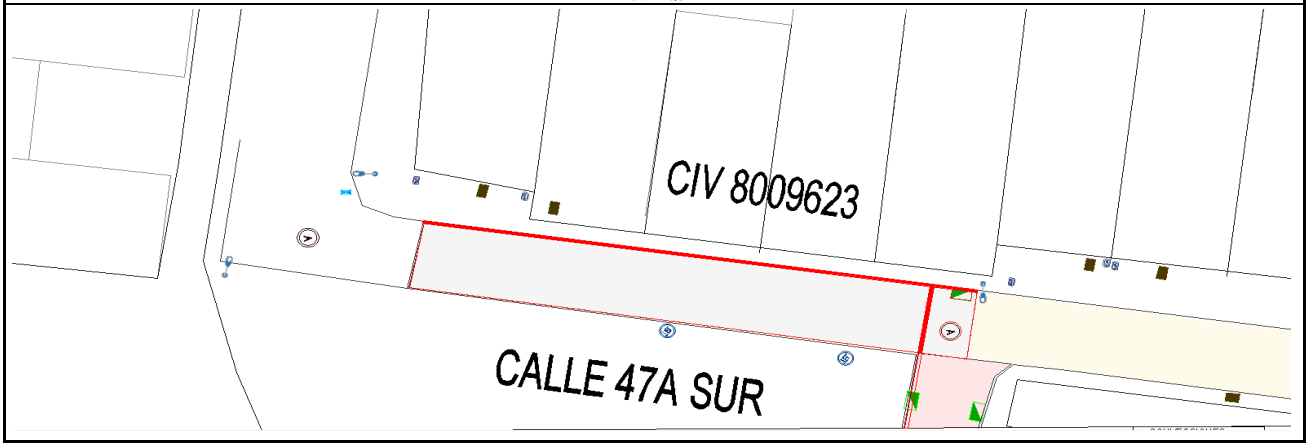

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,021 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
relleno para instalacion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte	K0+000,00							
		K0+025,50	25,50	0,50	0,20				2,55
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									2,55
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									2,55
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

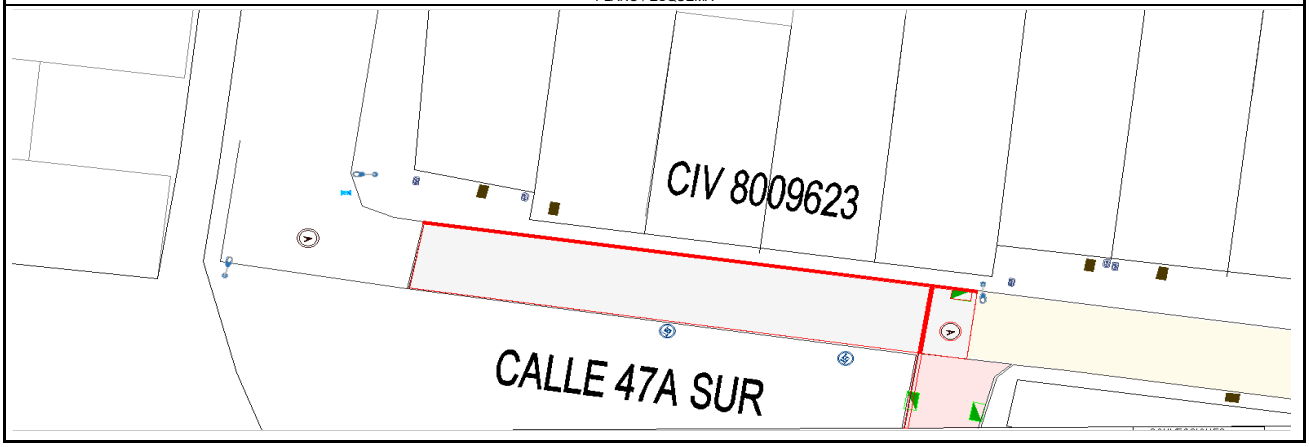

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,022 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
relleno con subbase granular AR_SBG50 para estructura de via									
	estructura de via		25,50	4,50	0,200				22,95
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,200			0,00	0,00
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,200			0,00	0,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	22,95
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	22,95
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

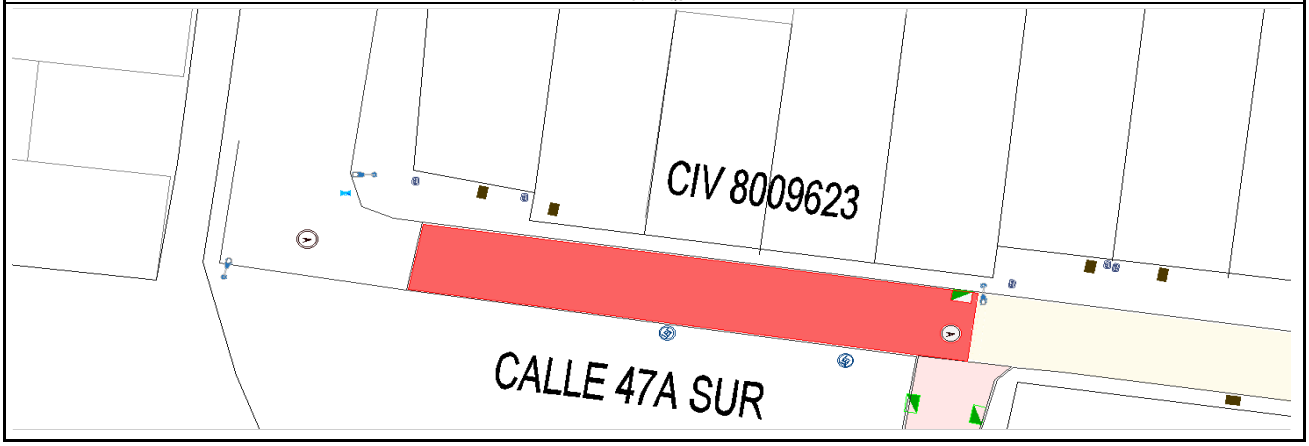

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,043 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009623	
PRIORIDAD:	NC	28

JB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG 0,200

CARTERA DE:	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,50

ABSCISA (m)	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	2538,392	2538,412	2538,432	2538,413	2538,393	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
K0+005,00	2538,225	2538,243	2538,260	2538,239	2538,218	2538,425	2538,443	2538,460	2538,439	2538,418	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+010,00	2538,255	2538,270	2538,285	2538,264	2538,243	2538,455	2538,470	2538,485	2538,464	2538,443	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+015,00	2538,285	2538,300	2538,315	2538,292	2538,268	2538,485	2538,500	2538,515	2538,492	2538,468	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+020,00	2538,315	2538,330	2538,345	2538,319	2538,293	2538,515	2538,530	2538,545	2538,519	2538,493	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	22,500	4,500
K0+025,50	2538,345	2538,345	2538,345	2538,333	2538,320	2538,545	2538,545	2538,545	2538,533	2538,520	4,500	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	24,750	4,950
																	TOTAL	0,200	114,75	22,95
																	POZOS	0	0,00	0,00
																	SUMIDEROS	0	0,00	0,00
																		TOTAL	114,75	22,95

area 0
sumidero 0

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
Geotextil para estructura de via									
	subrasante de diseño		25,50	5,00					127,50
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					0,00	0,00
	sumideros construidos		1,20	0,90				0,00	0,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	127,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	127,50
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

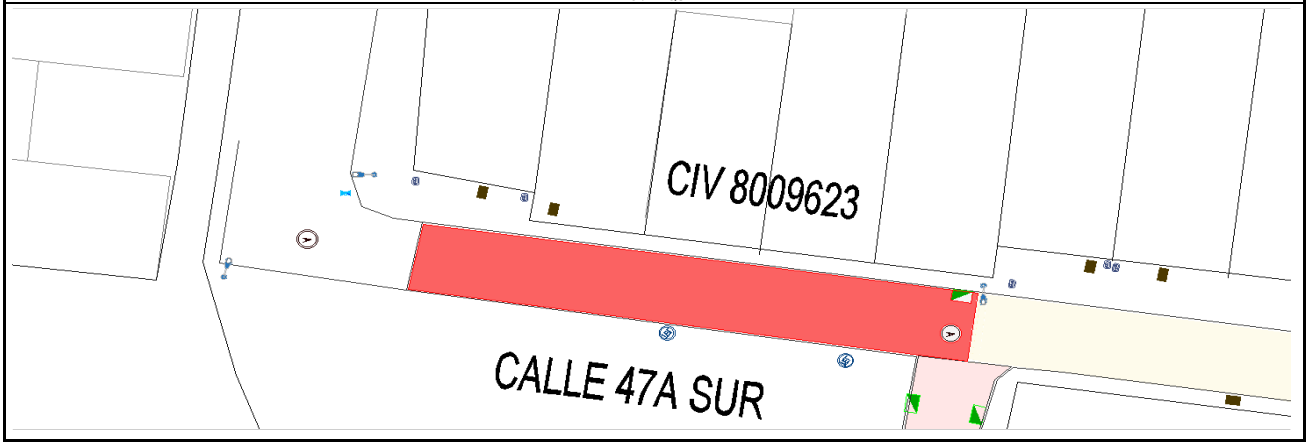

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 7,046 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009623	
PRIORIDAD:	NC	28

GEOTEXTIL 0,480

CARTERA DE:	GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m	ANCHO DE VIA EXCAVADA	5,00

ABSCISA (m)	NIVELACION Y COMPACATACION DE SUBRASANTE					GEOTEXTIL TEJIDO 60KN/m					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	2538,192	2538,212	2538,232	2538,213	2538,193	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,225	2538,243	2538,260	2538,239	2538,218	2538,225	2538,243	2538,260	2538,239	2538,218	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+010,00	2538,255	2538,270	2538,285	2538,264	2538,243	2538,255	2538,270	2538,285	2538,264	2538,243	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+015,00	2538,285	2538,300	2538,315	2538,292	2538,268	2538,285	2538,300	2538,315	2538,292	2538,268	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+020,00	2538,315	2538,330	2538,345	2538,319	2538,293	2538,315	2538,330	2538,345	2538,319	2538,293	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000
K0+025,50	2538,345	2538,345	2538,345	2538,333	2538,320	2538,345	2538,345	2538,345	2538,333	2538,320	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,500	0,000

		TOTAL	0,000	127,50	0,00
area	0	POZOS	0	0,00	0,00
sumidero	0	SUMIDEROS	0	0,00	0,00
			TOTAL	127,50	0,00

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
Geomalla para estructura de via									
	estructura de via		25,50	4,50					114,75
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27					0,00	0,00
	sumideros construidos		1,20	0,90				0,00	0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									114,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									114,75
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

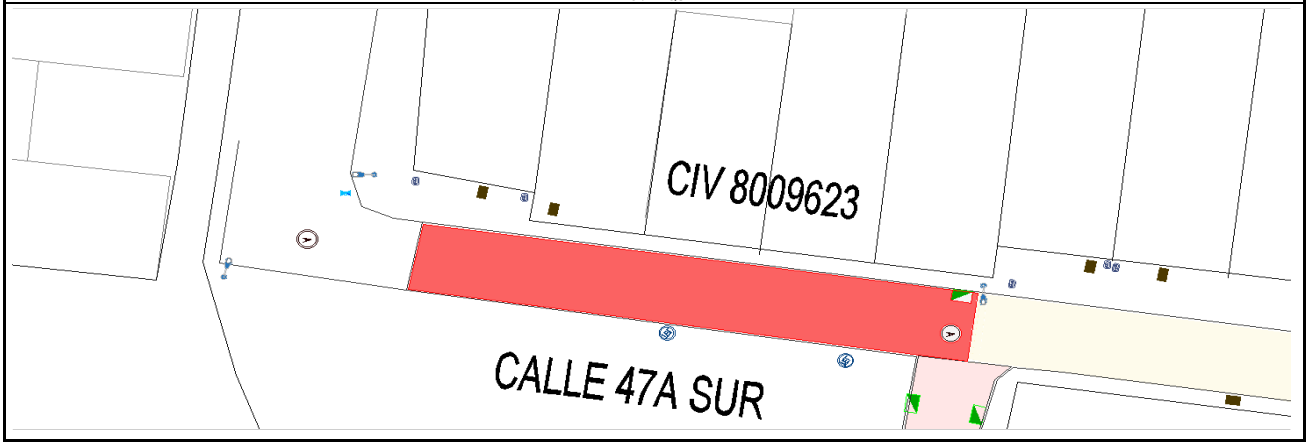

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,003 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009623	
PRIORIDAD:	NC	28

ESTRUCTURA DE VIA 0,480

CARTERA DE:	GEOMALLA	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,50

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					GEOMALLA					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,392	2538,412	2538,432	2538,413	2538,393	2538,392	2538,412	2538,432	2538,413	2538,393	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
K0+005,00	2538,425	2538,443	2538,460	2538,439	2538,418	2538,425	2538,443	2538,460	2538,439	2538,418	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+010,00	2538,455	2538,470	2538,485	2538,464	2538,443	2538,455	2538,470	2538,485	2538,464	2538,443	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+015,00	2538,485	2538,500	2538,515	2538,492	2538,468	2538,485	2538,500	2538,515	2538,492	2538,468	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+020,00	2538,515	2538,530	2538,545	2538,519	2538,493	2538,515	2538,530	2538,545	2538,519	2538,493	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000
K0+025,50	2538,545	2538,545	2538,545	2538,533	2538,520	2538,545	2538,545	2538,545	2538,533	2538,520	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,750	0,000
																TOTAL	0,000	114,75	0,00
																POZOS	0	0,00	0,00
																SUMIDEROS	0	0,00	0,00
																	TOTAL	114,75	0,00

area 0
sumidero 0

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
Estabilizacion de material granular									
	estructura de via Base granular	BG38	25,50	4,30	0,160		1,30		22,81
	pozos existentes	area	2,27		0,160		1,30	0,00	0,00
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,160		1,30	0,00	0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									22,81
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									22,81
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

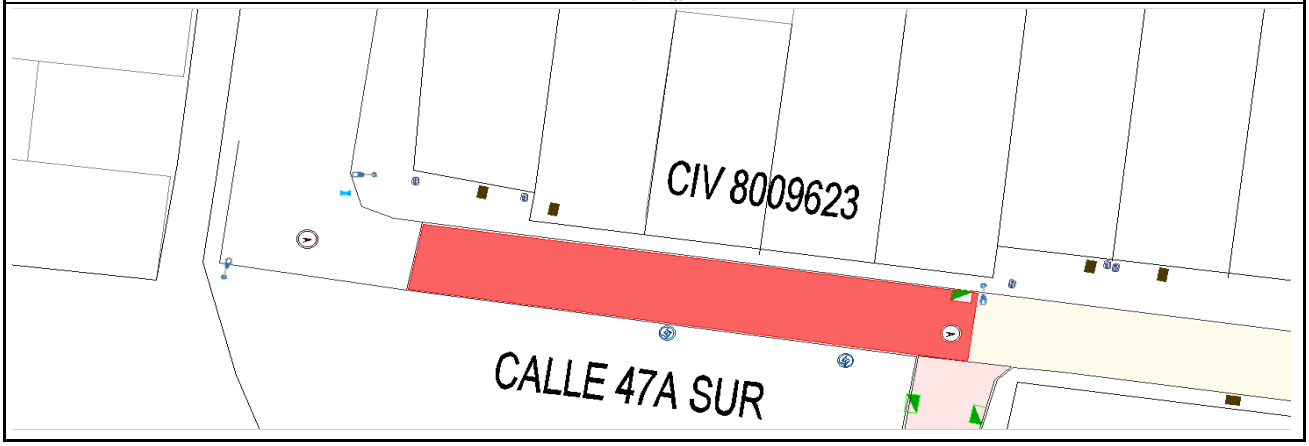

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,004 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTABILIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES CON ADITIVO LIQUIDO IONIZANTE 1.0L/M3 + CEMENTO 5%

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).


CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
Inyeccion de Cal a perforaciones									
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+000,00	A		B				
		K0+024,50	24,5000	4,5000	4,2000				
	numero de lineas transversales		(B/0.70)+1	C	7,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	17,5000				
	cantidad de barrenos		C*D	7,0000	18,0000				126,00
	pozos existentes - construidos		-3,00					0,00	0,00
	sumideros construidos		-4,00					0,00	0,00
NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)									
			C			D			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									126,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									126,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

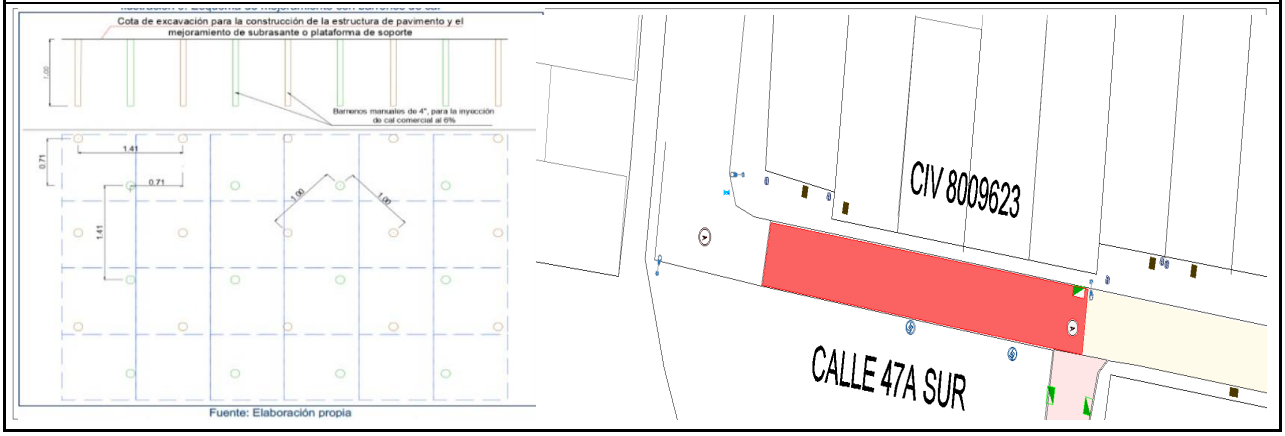

Fuente: Elaboración propia

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,006 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN ÍTEM **DEL** INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON COMPACTACIÓN MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. (INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY


(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
	perforaciones de 4"								
			LONGITUD VIA	ANCHO VIA	ANCHO EFECTIVO				
	perforaciones en subrasante	K0+000,00	A		B				
		K0+024,50	24,5000	4,5000	4,2000				
	numero de lineas transversales		(B/0.70)+1	C	7,0000				
	barrenos longitudinales		A/1.40	D	17,5000				
	cantidad de barrenos		C*D	7,0000	18,0000				126,00
	pozos existentes - construidos		-3,00					0,00	0,00
	sumideros construidos		-4,00					0,00	0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									126,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									126,00
TOTAL POR EJECUTAR									


NUMERO DE BARRENOS= ((ANCHO EFECTIVO/0.70)+1) X (LONGITUD DE VIA/1.40)

C D

PLANO / ESQUEMA

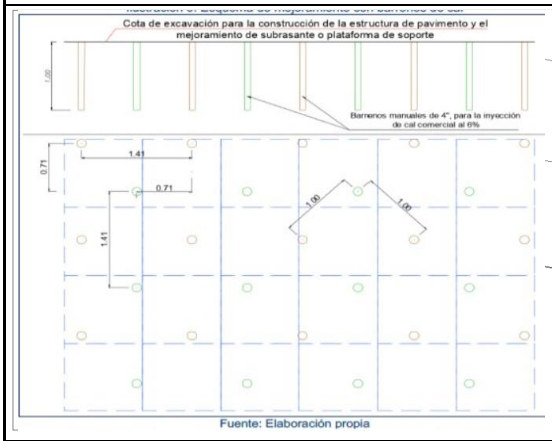

Fuente: Elaboración propia

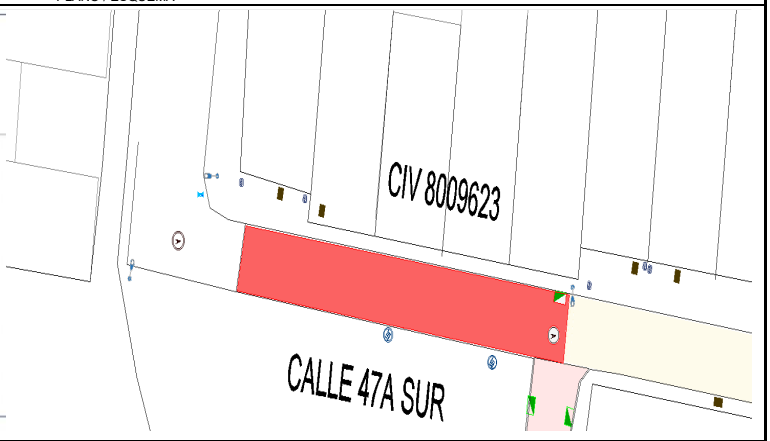

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,017 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PERFORACIONES EN SECO DE 4" CON PROFUNDIDAD DE 1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,024 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS


(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
Carcamo proteccion tuberia de acueducto 4"									
	costado norte segmento								
	tubo acueducto 4"								
	cruce E-W-	K0+000,00	7,00						7,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA									7,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES									0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									7,00
TOTAL POR EJECUTAR									

PLANO / ESQUEMA

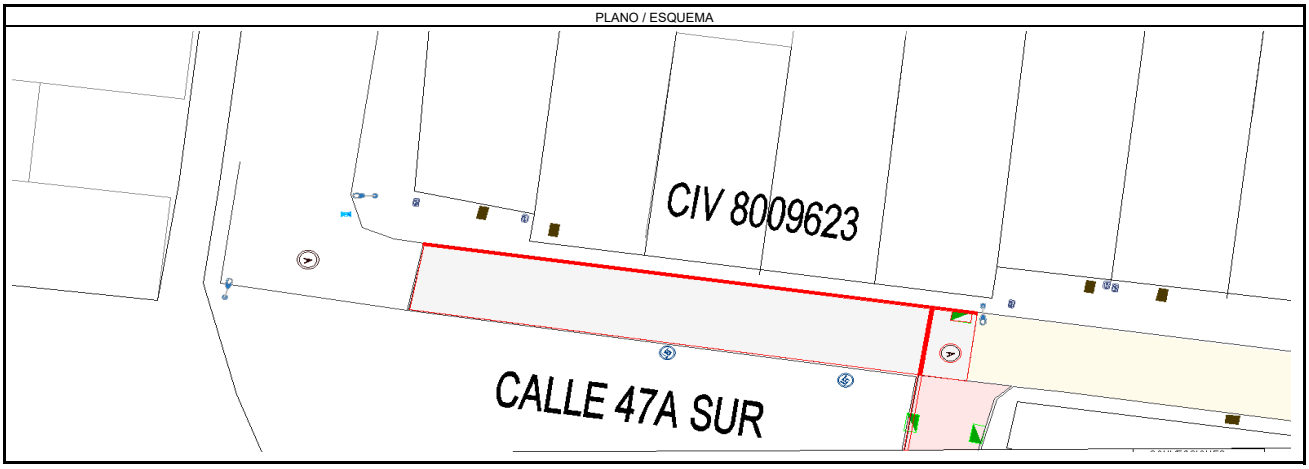

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,024 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CÁRCAMO DE PROTECCIÓN REFORZADO PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA TUBERÍAS ENTRE 4 Y 8 PULGADAS (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETEADO E INSTALACIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)


SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	DESCUENTO	EXPANSIÓN	CANTIDAD	TOTAL
8009623	CALLE 47A SUR ENTRE CARRERA 77U Y CARRERA 77V								
relleno con base granular AR_BG38 para estructura de via									
	estructura de via		25,50	4,30	0,160				17,54
	se anexa cartera topografica								
	pozos existentes	area	2,27		0,160			0,00	0,00
	sumideros construidos		1,20	0,90	0,160			0,00	0,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	17,54
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	17,54
TOTAL POR EJECUTAR	

PLANO / ESQUEMA

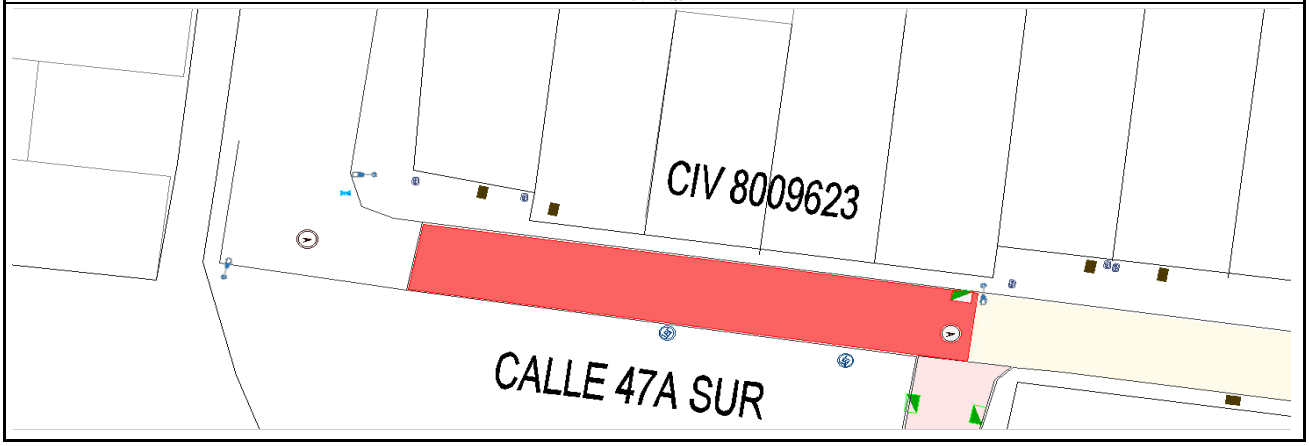

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No COP-938 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/03/2026 **HASTA** 31/03/2026

ÍTEM N° 8,028 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** ET-IC-01

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

FOTOGRAFÍA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Javier Hernando Castro Guerrero
Residente de Obra

(Firma)

(Nombre) Luis Eduardo Acosta Velasquez
Residente de Interventoría

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Rafael Gustavo Solano Osorio
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) Cesar Maldonado
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

CONTRATO N.º	938 DE 2025

FECHA:	15/03/2026

CIV	8009623	
PRIORIDAD:	NC	28

BASE GRANULAR AR_BG38 0,160

CARTERA DE:	BASE GRANULAR AR_BG38	ANCHO DE VIA EXCAVADA	4,30

ABSCISA (m)	SUB BASE GRANULAR RECICLADA ARSBG50					BASE GRANULAR AR_BG38					ANCHO(m)	DIF. IZQ (m)		DIF.EJE (m)		DIF.DER (m)	PROMEDIO ALTURA (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)
	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER	IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER		IZQ	SEMIEJE	EJE	SEMIEJE	DER			
	6	3	0	3	6	6	3	0	3	6		6	3	0	3	6			
K0+000,00	2538,392	2538,412	2538,432	2538,413	2538,393	2538,552	2538,572	2538,592	2538,573	2538,553	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
K0+005,00	2538,425	2538,443	2538,460	2538,439	2538,418	2538,585	2538,603	2538,620	2538,599	2538,578	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+010,00	2538,455	2538,470	2538,485	2538,464	2538,443	2538,615	2538,630	2538,645	2538,624	2538,603	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+015,00	2538,485	2538,500	2538,515	2538,492	2538,468	2538,645	2538,660	2538,675	2538,652	2538,628	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+020,00	2538,515	2538,530	2538,545	2538,519	2538,493	2538,675	2538,690	2538,705	2538,679	2538,653	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	21,500	3,440
K0+025,50	2538,545	2538,545	2538,545	2538,533	2538,520	2538,705	2538,705	2538,705	2538,693	2538,680	4,300	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	23,650	3,784

		TOTAL	0,160	109,65	17,54
area	0	POZOS	0	0,00	0,00
sumidero	0	SUMIDEROS	0	0,00	0,00
			TOTAL	109,65	17,54

ENTREGA:	CESAR JEFFERSON MARTINEZ
	TOPOGRAFIA CONTRATISTA

RECIBE:	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS
	TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

FORMATO

CUADRO CONTROL FINANCIERO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

AREA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 938 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2025 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No. 2 **FECHA** 31/03/2026

A. DATOS BASICOS

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución susctrito)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 994 (Escriba el número del contrato asociado Interventoria u Obra según el caso) **DE** 2025 (Año de suscripción)

INTERVENTORIA SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA JAVIER PRIETO TRISTANCHO (Escriba el nombre del Supervisor)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		ANTICIPO		
No.	Periodo DESDE dd/mm/aaaa	HASTA dd/mm/aaaa	FECHA RAD. dd/mm/aaaa	No. RAD.	EJECUTADO (Valor Bruto)	ACUMULADO	OSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES - OBRAS INICIALES	DIAGNOSTICO Y MODELACIONES	REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA	IVA DE SERVICIOS	CUENTA (VALOR BRUTO)	ACUMULADO	AMORTIZACION	SALDO	VALOR NETO A PAGAR
1	15/12/2025	28/02/2026			$ -	$ -	$ -	$ 285.447.701,00			$ 285.447.701,00		$ 85.634.310,00		$ 199.813.391,00
2	1/03/2026	31/03/2026			$ 2.687.699.472,00	$ 2.687.699.472,00	$ 247.371.486,00				$ 2.935.070.958,00		$ 880.521.287,00		$ 2.054.549.671,00

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO
INICIAL								
VALOR ACTUAL CONTRATO			19.645.886.208,00		TOTAL			

D. RELACIÓN DE PAGOS

FACTURA	CDP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
FVVK-1	2619			$ 199.813.391,00	$ 18.479.917.220,00
FVVK-2	2619			$ 2.054.549.671,00	$ 16.425.367.549,00
TOTAL				$ 2.254.363.062,00	$ 16.425.367.549,00

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES (INCLUYE AIU)	$ 16.532.066.661,00
COSTOS PARA MANEJO AMBIENTAL - SST - GESTIÓN SOCIAL - MANEJO DE TRAFICO CON A.I.U DE COMPONENTES	$ 1.521.584.516,00
VALOR DIAGNOSTICOS - ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE IVA)	$ 285.447.701,00
OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS	$ 1.306.787.330,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 19.645.886.208,00**

Notas:
- ♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo.
- ♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

(Firma)
(Nombre del Representante Legal) SANTIAGO CARRILLO VARGAS
SAVIMAC SAS
INTERVENTORIA

(Firma)
(Nombre) MAGDA LORENA DAVILA
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO A INTERVENTORIA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA
NIT. 860.034.313-7

CERTIFICA QUE:

La empresa **CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025** identificada con NIT **9020128830** se encuentra vinculada a esta entidad con el siguiente producto:

- Cuenta de Ahorros
- Número: **152900062562**
- Fecha de apertura:11/12/2025

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[FDLK – LP – 010 – 2025

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio, unión temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
Transversal 78 k No. 41 A -04 sur
Bogotá, D.C.

REFERENCIA: Proceso de contratación No. FDLK – LP – 010 – 2025, en adelante el "proceso de contratación"

Objeto:

"*REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE*".

Estimados señores:

Los suscritos, JOTAM MAESTRE DIAB, JENNY MARCELA MUSSO HERNANDEZ y DANIEL GONZALEZ ISAZA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS, MINATORE S.A.S y CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [(2)]
ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	35%
MINATORE S.A.S	35%
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S.	30%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025.

3. El objeto del consorcio es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE".

4. La duración del consorcio es el plazo de ejecución del contrato y un año adicional.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es JOTAM MAESTRE DIAB, identificado con C. C. No. 1.065.825.668 de VALLEDUPAR quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es JENNY MARCELA MUSSO HERNANDEZ identificado con C. C. No. 57.290.511 de Santa Marte, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El Señor[a] JOTAM MAESTRE DIAB acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025.


10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 39 # 12 – 24 Interior 403
Dirección electrónica	mlconstrccionesing@gmail.com
Teléfono	3176682956
Telefax	3176682956
Ciudad	Medellín

En constancia, se firma en Medellín, a los 12 días del mes de noviembre de 2025.



JOTAM MAESTRE DIAB
ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT 901.012.697-3




JENNY MARCELA MUSSO HERNANDEZ
MINATORE S.A.S
Nit: 901.450.575-1



DANIEL GONZALEZ ISAZA
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT 901.472.218–1



JOTAM MAESTRE DIAB
R.L. CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025.



JENNY MARCELA MUSSO HERNANDEZ
R.L.Supl CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Kennedy

CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-938-2025

Entre los suscritos, de una parte, **KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.000.002.118 expedida en la ciudad de Bogotá, en su calidad de Alcaldesa Local y Representante Legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**, nombrada mediante Resolución 238 del diecisiete (17) de Julio de 2024 y acta de posesión No 248 del 18 de julio de 2024, con efectividad a partir de la misma fecha, quien suscribe el presente documento en ejercicio de la delegación en materia contractual efectuada mediante el Decreto Distrital No. 374 del 21 de junio de 2019 por medio del cual se delega en los Alcaldes Locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 y el Decreto 1082 de 2015, quien para efectos de este documento se designa como **EL FONDO**, de una parte, por la otra, **IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA** portador de la Cédula de Ciudadanía No. **79.952.890** en representación del **CONSORCIO VIAL KD E&C 2025**, conformado por a). ESTUDIOS E INGENIERIA SAS con el 90% de participación y b). CIVIL GROUP COLOMBIA SAS con el 10% de porcentaje de participación, quien se denomirá **EL CEDENTE**, y de otra parte, **JOTAM MAESTRE DIAB** portador de la C.C. No. **1.065.825.668**, en calidad de Representante del **CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025**, conformado por: **a).** ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS con NIT. 901.012.697-3 y con porcentaje de participación del 35 %, **b).** MINATORE SAS con NIT. 901.450.575-1 y con porcentaje de participación del 35 % y, **c).** CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES SAS con NIT. 901.472.218-1 y con porcentaje de participación del 30 %, quien en adelante se denominará **EL CESIONARIO,** y de conformidad con la Cláusula vigésima primera (21ª) del Contrato de Obra COP-938-2025, hemos acordado suscribir el presente documento de cesión, de acuerdo con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1) Que, mediante la Resolución No. 442 del 29 de septiembre de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato presente Contrato, derivado del proceso de Licitación Pública – Pliego Tipo No. FDLK-LP-010-2025. **2)** Que, en virtud del anterior, el día 02 de octubre de 2025 de forma transaccional en el SECOP II, se firmó el Contrato de Obra COP-938-2025 con el **CONSORCIO VIAL KD E&C 2025**, conformado por a). ESTUDIOS E INGENIERIA SAS con el 90% de participación y b). CIVIL GROUP COLOMBIA SAS con el 10% de porcentaje de participación, cuyo objeto es: "*REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE*" por un valor de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 19.645.886.208,00), de la vigencia fiscal 2025, y un plazo de ejecución de CATORCE (14) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, para lo cual será necesario que se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **3)** Que, mediante radicado No. **2025-581-021793-2** del trece (13) de noviembre de 2025, el representante legal del Contratista, y así como los representantes legales de las personas jurídicas que conforman el CONSORCIO VIAL KD E&C 2025 radicó solicitud de cesión del Contrato de Obra COP-938-2025, argumentando los aspectos inherentes para dar curso al trámite contractual respectivo. **4)** Que, el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 señala que los contratos estatales son "*intuito personae*" y en consecuencia una vez celebrados no pueden cederse sin previa autorización de la Entidad Contratante. **5)** Que, respecto a la cesión del Contrato, la Entidad solicitó concepto favorable a la Interventoría de la misma, mediante Oficio de radicado **20255821177591** del veinte (20) de noviembre de 2025. **6)** Que, con ocasión a lo anterior, el Interventor con comunicación de referencia **DON-994-FDLK-006-2025** de igual fecha, dio aval a la solicitud del Constructor, por lo que, la Administración inició los trámites pertinentes para dar curso a la cesión. **7).** Que, el clausulado complementario al Contrato de Obra COP-938-2025 establece lo siguiente:

CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-938-2025

… (…) "

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

" (…) …

7) Que, en materia de cesión del contrato estatal, el Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto precisando los siguientes requisitos: i) debe recaer en un tercero; ii) el cesionario debe tener capacidad jurídica para continuar con la ejecución del objeto contractual y no estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar; y iii) el cesionario debe contar con capacidad técnica, económica y financiera suficientes para el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato cedido. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha explicado que, en la medida que el tercero cesionario asume la posición contractual del contratista cedente, las disposiciones, los pliegos de condiciones y el contrato mismo serán aplicables a quien asuma la nueva posición contractual. De esta manera, la capacidad jurídica, económica y técnica del contratista cedente se exigirá también al cesionario, ya que "*[…] el proceso cesión del contrato y las exigencias que se le impongan al tercero, no pueden alterar ni burlar los procedimientos de selección del contratista, en otras palabras, la figura de la cesión de contrato no puede servir como instrumento para desviar las obligaciones que tiene la entidad contratante de cumplimiento de los parámetros de la selección objetiva*"[1] **8)** Que, por lo anterior, la Alcaldesa Local de Kennedy procedió a designar un comité técnico, jurídico y financiero a efectos de realizar la evaluación de los documentos aportados por el cesionario para verificar el cumplimiento de cada uno es los requisitos consagrados en el pliego de condiciones definitivo del proceso de Licitación Pública – Pliego Tipo No. FDLK-LP-010-2025. **9)** Que, una vez realizada la evaluación técnica, jurídica y financiera, los funcionarios y contratitas designados para tal efecto, concluyeron que **CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025**, conformado por: **a).** ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS con NIT. 901.012.697-3 y con porcentaje de participación del 35 %, **b).** MINATORE SAS con NIT. 901.450.575-1 y con porcentaje de participación del 35 % y, **c).** CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES SAS con NIT. 901.472.218-1 y con porcentaje de participación del 30 %, cumple con cada uno de los requisitos establecidos por la Entidad en el proceso contractual que dio lugar a la suscripción del Contrato de Obra COP-938-2025, de acuerdo a la recomendación de cada Comité Evaluador, informes que hacen parte integral del presente documento. **10)** Que, en virtud de lo antes expuesto, es procedente realizar la cesión del Contrato de Obra COP-938-2025 ya que se cumplen con los requisitos contemplados en el contrato y en la ley, por lo que las partes acuerdan celebrar la presente cesión, la cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

<u>CLÁUSULA PRIMERA</u>. - AUTORIZACIÓN: Por el presente documento el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** autoriza y acepta expresamente la cesión del **CONTRATO DE OBRA COP-938-2025** a favor del **CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025**, conformado por: **a).** ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS con NIT. 901.012.697-3 y con porcentaje de participación del 35 %, **b).** MINATORE SAS con NIT. 901.450.575-1 y con porcentaje de participación del 35 % y, **c).** CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y OBRAS CIVILES SAS con NIT. 901.472.218-1 y con porcentaje de participación del 30 %**,** quienes declaran que conocen cada uno de los documentos derivados del proceso de Licitación Pública – Pliego Tipo No. FDLK-LP-010-2025.. **<u>CLÁUSULA SEGUNDA</u>. - CESIÓN DEL CONTRATO:** Por medio del presente el **CONSORCIO VIAL KD E&C 2025**, conformado por a). ESTUDIOS E

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de marzo de 2015, Rad. 1999-03028, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-938-2025

INGENIERIA SAS con el 90% de participación y b). CIVIL GROUP COLOMBIA SAS con el 10% de porcentaje de participación cede el **CONTRATO DE OBRA COP-938-2025** con todos los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, a favor del **CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025** representado legalmente por **JOTAM MAESTRE DIAB** portador de la C.C. No. **1.065.825.668**, a partir del día 25 de noviembre de 2025, sin que existan obligaciones pendientes a favor del Cedente, ni tampoco pagos o cualquier clase de reconocimiento por parte del Fondo de Desarrollo Local. La presente Cesión no modifica las condiciones del señalado Contrato de Interventoría, ni su objeto, ni su naturaleza y régimen. **CLÁUSULA TERCERA. -** EL CESIONARIO, acepta esta cesión, asume la ejecución del contrato en el estado en que se encuentra y se obliga a continuar ejecutando la interventoría en lo relacionado con las obligaciones contenidas en el en el clausulado complementario y el anexo técnico, y avala los términos del presente documento, en consideración a que el Cesionario entiende y acepta que el Contrato se desarrollará en el plazo restante de su ejecución. **CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO POR EJECUTAR:** Que, a la fecha de la presente cesión del contrato, restan por ejecutar, el plazo total del mismo, tal como obra en la cláusula cuarta (4ª) del **CONTRATO DE OBRA COP-938-2025**. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Para los efectos del caso, la presente Cesión continuará respaldada con Certificado de Registro Presupuestal No. **3259** del 03 de octubre de 2025. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y el **CEDENTE** se declaran a paz y salvo por todo concepto**. PARÁGRAFO TERCERO:** Como requisitos para el perfeccionamiento y ejecución de la Cesión del Contrato, **se deberá presentar el recibo o certificado de pago del IMPUESTO DE TIMBRE (CONMOSIÓN INTERIOR CATATUMBO)**, en cumplimiento del Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y del Artículo 519 del Estatuto Tributario, el cual es de carácter imperativo, por tratarse de una obligación que entra en vigor al momento de suscribir el contrato. **CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS.** De conformidad con la Cláusula sexta del Contrato, El Cesionario se obliga a otorgar a favor de EL FONDO, como mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales, cualquiera de las garantías, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo a los siguientes amparos:

5.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>Fondo de Desarrollo Local de Kennedy identificado con NIT 899.999.061 – 9

Dirección: Transversal 78 k No 41 a – 04 sur.</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>Por el 30% del valor de contrato.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Por el 10% del valor de contrato.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo</td><td>El cien por ciento (100%) del valor del anticipo.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Cinco (05) años contados a partir de la fecha de</td><td>Por el 30% del valor de contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-938-2025

Característica	Condición
	suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte de la entidad .
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

5.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Fondo de Desarrollo Local de Kennedy identificado con NIT 899.999.061-9, Dirección: Tv. 78 K # 41 A - 04 Sur y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	5% del valor del contrato
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Local de Kennedy identificado con NIT 899.999.061-9, Dirección**: Tv. 78 K # 41 A - 04 Sur**
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Kennedy

CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-938-2025

CLÁUSULA SEXTA: EL CESIONARIO, con la firma de este documento, declara bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** Para los efectos correspondientes, la presente Cesión se entiende perfeccionada con la firma de las partes, debiéndose dar aplicación a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Por EL FONDO

KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
Alcaldesa Local de Kennedy
C.C. No. 1.000.002.118 de Bogotá D.C.

Por EL CEDENTE,

IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
R.L. del CONSORCIO VIAL KD E&C 2025

Por EL CESIONARIO,

JOTAM MAESTRE DIAB
R.L. CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

Aprobó Transaccionalmente: Elkin Leonardo Lopez Guerrero– Professional Universitário FDLK
Proyectó: Harrison Amézquita G. – Abogado Contratista FDLK

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 21/11/2025 - 4:07:11 PM

Recibo No.: 0029128790 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LlpuflLKaankTpdk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

Sigla: No reportó

Nit: 901012697-3

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-571307-12
Fecha de matrícula: 27 de Septiembre de 2016
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 28 de Marzo de 2025
Grupo NIIF: GRUPO III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 39 12 24 Int. 403
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: mlconstruccionesing@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3176682956
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 39 12 24 Int. 403
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: mlconstruccionesing@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3176682956
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado, otorgado por los Accionistas, en agosto 19 de 2016 registrado en esta Entidad en septiembre 27 de 2016, en el libro 9, bajo el número 21924, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

REMOTOS COLOMBIA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No.003 del 20 de febrero de 2018, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2018, con el No.16140 del Libro IX, mediante la cual la sociedad cambia su denominación por MALAMO INFRAESTRUCTURA S.A.S.

Por Acta No.079 del 05 de abril de 2022 de la Asamblea General de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de abril de 2022, con el No.12332 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MALAMO INFRAESTRUCTURA S.A.S. a ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

"NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA"

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades:

A) La realización de obras de construcción de cualquier tipo casas, urbanizaciones, puentes, carreteras, túneles, distritos de riego; estructuras, presas, infraestructuras para centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, bodegas, edificios, centros comerciales y en general

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

todo tipo de obras civiles relacionadas con el ejercicio de las profesiones de ingeniería en todas sus ramas y arquitectura, incluyendo obras vinculadas con la explotación, exploración y comercialización de minerales o de cualquier otro recurso natural.

B) La prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría, interventoría, diseño, programación, gerencia de proyectos de construcción, estudios de factibilidad de inversiones en obras públicas o privadas y cualquier otro servicio relacionado con las ramas de la ingeniería, la arquitectura y el diseño.

C) La explotación de cualquier industria relacionada con el sector de la construcción.

D) La administración de bienes inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal o separada.

E) La comercialización de toda clase de productos, elementos, maquinaria y, equipo relacionados con la construcción y el diseño.

F) La administración, corretaje, compraventa, arriendo, permuta, comodato o cualquier acto o contrato sobre bienes muebles e inmuebles.

G) La adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así como la pignoración e hipoteca de dichos bienes según el caso.

H) La remodelación o restauración de construcciones.

I) organizar y financiar empresas de cualquier naturaleza, que tengan objetos similares o complementarios con los de la sociedad y llevar la representación de personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, dedicadas a la construcción u obras civiles, lo mismo que con la maquinaria dedicada a dicha actividad.

J) Contratar con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, privadas o públicas, en su propio nombre o de terceros la ejecución de obras civiles o asociarse con otras sociedades para la realización de las mismas, bajo cualquiera de las formas de asociación previstas en la ley comercial y administrativa sea bajo el esquema de contratos en participación, consorcios, uniones temporales y otras.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

K) La realización de operaciones de comercio exterior, tales como la importación y exportación de toda clase de bienes y servicios.

L) La promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos, especialmente en los países del grupo andino, mercosur y unasur.

M) Participar en todo tipo de licitaciones privadas o públicas.

N) Todas las actividades relacionadas con el establecimiento, aislamiento, mantenimiento y conservación de plantaciones forestales protectoras, productoras y todas aquellas actividades necesarias para el manejo y control ambiental y forestal; ejecución, intervenitorías y asesorías a todo tipo de proyectos ambientales y forestales y cualquier otro que sea útil para la actividad social.

O) La producción, distribución, importación, exportación, compra, venta, instalación, arrendamiento y/o operación, concesión, mantenimiento y reparación de equipos y materiales de energía eléctrica, mecánica y/o térmica, incluyendo las fuentes de energía alternativas, entre las cuales se pueden considerar: baterías o acumuladores industriales o estacionarios, baterías o acumuladores para fuerza motriz, baterías o acumuladores para radios de comunicaciones, alarmas, computadores, módulos solares fotovoltaicos, sistemas de rectificación y cargadores de baterías, tecnología scrs, ferroresonante y pwm, sistemas ininterrumpidos de potencia u.p.s., Equipos de conversión y transformación eléctrica y electrónica de energía voltaje y corriente, elementos semiconductores para la protección contra sobretensiones transitorias tvs. Sistemas de acondicionamiento ambiental, refrigeración y calefacción; pequeñas centrales hidroeléctricas, redes eléctricas en baja tensión y media tensión, motores diesel y motogeneradores diesel y/o eléctricos para uso en generación de energía eléctrica, además del suministro de materiales, accesorios y servicios de ingeniería para redes eléctricas hvdc, hvac, at, bty mt.

P) Suministro, distribución e instalación de sistemas de iluminación de alumbrado público e interior, alumbrado de emergencia e iluminación de vías y escenarios.

Q) Desarrollar programas de reducción de pérdidas consistentes en la verificación de del funcionamiento, retiro e instalación de medidores de servicio de energía eléctrica, ejecutar el control de morosidad de los

clientes de la empresa de servicio de energía consistente en la verificación de la suspensión, verificación de la suspensión, seguimiento de las suspensiones, reconexión de los servicios de energía en sus diferentes aspectos y modalidades.

R) Diseño, interventoría, supervisión e inspección de redes eléctricas industriales, domiciliarias, comerciales o gubernamentales.

s) Desarrollo, diseño e implementación de proyectos de automatización, gestión y control remoto de equipos de energía y complementarios, así como para sistemas de telecomunicaciones y equipos de control, accionamiento y supervisor. diseño, suministro, construcción, concesión, instalación, remodelación, mantenimiento, reparación y/0 adaptación de elementos y equipos de planta interna y de planta externa, bienes de planta externa, redes de energía y de telefonía alámbrica o inalámbrica, incluyendo el suministro e instalación de torres para comunicaciones, así como el estudia y la prestación de servicios de diseños, asesorías, interventorías, consultoría, construcción, operación de servicios de telecomunicaciones para la prestación de servicios de valor agregado, como socio o aliado estratégico en contratos de asociación y operador de redes y proveedor de equipos relacionados, fabricación de sistemas y equipos de codificación direccionables y servicios complementarios. diseño, fabricación, instalación, concesión, interconexión,

T) Diseño, fabricación, suministro, instalación, concesión, interconexión, prueba y puesta en funcionamiento de las redes, equipos y elementos para la expansión de la red de servicios de banda ancha. Obras civiles para redes de distribución aéreas y subterráneas, canalizaciones y en rutamiento, con el objeto de prestar servicios poblaciones de clientes, usuarios, abonados o suscriptores y en general todo lo relacionado en concesiones de telecomunicaciones. También prestará el servicio público de las telecomunicaciones a través de la explotación, contratación, distribución, concesión, operación, asesoría, auditoria, interventoría y asistencia técnica de los servicios de televisión abierta y por suscripción, radiodifundida, cableada, cerrada y satelital de señales tanto incidentales como codificadas, la prestación del servicio de valor agregado y/0 telemático haciendo uso de la propia re y/o de las redes de telecomunicaciones del estado o privadas; en general la explotación y prestación de servicios de elecomunicaciones básicos, especiales y auxiliares de ayuda, walkout, producción de televisión e ingeniería en general tales como: cableado, diseño de redes, ductos, obras civiles y otros que conlleven o no la comercialización de equipos

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

electrónicos, mantenimientos, transferencia de tecnología, sistemas de comunicación y obras complement arias en: centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y conmutación, el diseño, selección, instalación, operación, concesión y mantenimiento de todo tipo de equipos eiectronicos especializados, líneas/accesorios para comunicaciones, soluciones de vigilancia y seguridad privada, automatización de procesos y el diseño, suministro, integración, instalación, implementación, pruebas, puesta en servicio y mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos de seguridad y blindaje arquitectónico.

U) Actividades de la ingeniería electromecánica tales corro diseñar, seleccionar, instalar, operar, supervisar, dar mantenimiento de sistemas electromecánicos, electroneumáticos y electrohidráulicos, así como los sistemas de protección y control de equipo eléctrico y subestaciones eléctricas, sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, redes y máquinas hidráulicas, maquinaria industrial y equipo. Seleccionar, instalar, controlar y aperar motores de combustión interna, transmisiones mecánicas, turbogeneradores, generadores y turbinas de vapor, cambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y refrigeración y máquinas eléctricas y transformadores. Seleccionar, instalar y operar instrumentos de medición del área electromecánica y todas las labores inherentes al ejercicio de esta ingeniería en todas sus modalidades y aspectos, incluyendo la automatización de servicios industriales, automatización de edificios, sistemas de transporte masivo, equipos de control y, automatización de tráfico y transporte, señalización. Seguridad de instalaciones industriales. La sociedad podrá ser fiadora y garantizar con todo o parte de sus bienes, obligaciones de terceros y por lo tanto, tienen valor para ella las obligaciones que por este concepto lleguen a constituirse por cualquiera de los socios.

En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá realizar actividades que tengan relación directa con el mismo tales como:

a) Tomar o recibir dinero en mutuo con interés o sin él, con garantía o sin ella;

b) Girar, otorgar, aceptar, endosar, avalar, y negociar toda ciase de títulos valores;

c) Celebrar toda clase de contratos y operaciones bancarias y bursátiles

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

con las entidades del sector financiero público o privado, tales como bancos, corporaciones financieras, fondos fiduciarios, bolsas de valores etc.;

d) Intervenir como asociado en todo tipo de sociedades comerciales o civiles y formar parte de personas jurídicas de derecho privado y economía mixta;

e) Celebrar con personas jurídicas o naturales el negocio jurídico de cuentas en participación respecto a operaciones comerciales relacionadas con su objeto social;

f) Importar los bienes muebles y accesorios necesarios para la dotación de los inmuebles de la sociedad o construidos por ella para terceros;

g) Celebrar contratos de compra y venta de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento y demás negocios que versen sobre muebles e inmuebles: h) obtener y explotar concesiones y privilegios de cualquier naturaleza, tales como patentes de invención, marcas de productos o servicios, lemas comerciales y cualquier otro tipo que sea útil para la actividad social. Ejecutar En condición de operador todas las actividades correspondientes al diseño, financiación, operación, gestión, construcción, ampliación, expansión, reposición, rehabilitación, mantenimiento, recuperación y administración de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, recolección y procesamiento de basuras, desechos y escombros y todas las actividades complementarias, afines o análogas acordes con el régimen jurídico vigente y aplicable, así corno la ejecución de obras de ampliación y limpieza de cauces y cuerpos de agua.

Estas actividades podrán desarrollarse en cualquier sitio o región geográfica de la república de Colombia.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Y todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL AUTORIZADO

Valor	:	$400.000.000,00
No. de acciones	:	4.000,00
Valor Nominal	:	$100.000,00

CAPITAL SUSCRITO

Valor	:	$300.000.000,00
No. de acciones	:	3.000,00
Valor Nominal	:	$100.000,00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	$300.000.000,00
No. de acciones	:	3.000,00
Valor Nominal	:	$100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a del representante legal.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad tendrá un gerente de libre nombramiento y remoción de la asamblea de accionistas, el cual tendrá no tendrá suplentes ni restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre funciones: El gerente es el representante legal de la sociedad, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. en especial el gerente tendrá las siguientes funciones:

a) Usar la firma o razón social.

b) Designar al secretario de la compañía, que lo será también de la asamblea de accionistas.

c) Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estatutos deban ser designados por la asamblea de accionistas.

d) Presentar un informe de su gestión a la asamblea de accionistas en

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades.

e) Convocar a la asamblea de accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias.

f) Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de los compromisos, cuando así lo autorice la asamblea de accionistas, y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta; y

g) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales.

Parágrafo 1: el gerente requerirá autorización previa de la asamblea de accionistas para la ejecución de todo acto o contrato que exceda de cien millones de pesos mil ($100.000.000,00).

Parágrafo 2: el gerente suplente es el representante legal suplente de la sociedad, este requiere autorización previa de la asamblea de accionistas para la ejecución de todo acto o contrato que exceda de cincuenta millones de pesos mil ($50.000.000) y tiene las mismas facultades del representante legal (gerente) mencionadas en los estatutos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 080 del 19 de enero de 2023, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de febrero de 2023, con el No. 4197 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JOTAM MAESTRE DIAB	C.C. 1.065.825.668

REVISORES FISCALES

Por Acta No.0087 del 15 de mayo de 2025, de la Asamblea, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de julio de 2025, con el No.30485 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

Recibo No.: 0029128790 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LlpuflLKaankTpdk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	CARLOS GUILLERMO HOLGUIN GIRALDO	C.C. 14.884.753 T.P. 39734-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	JOSE ESNOVER BOGOTA TORRES	C.C. 19.306.380 T.P. 37838-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No.003 del 20/02/2018 Asamblea	16140 del 25/06/2018 del L.IX
Acta No.4 del 09/03/2018 Asamblea	18026 del 18/07/2018 del L.IX
Acta No.079 del 05/04/2022 Asamblea	12332 del 20/04/2022 del L.IX
Acta No.080 del 19/01/2023 Asamblea	4201 del 07/02/2023 del L.IX
Acta No.0087 del 15/05/2025 AsambleaM	30484 del 31/07/2025 del L.IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4210
Actividad secundaria código CIIU: 4290

Recibo No.: 0029128790 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LlpuflLKaankTpdk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Otras actividades código CIIU: 4112, 4923

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $931,955,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Recibo No.: 0029128790 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: LlpuflLKaankTpdk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 14:06:27
Recibo No. AB25766297
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2576629715873

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MINATORE S.A.S
Nit: 901450575 1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03330750
Fecha de matrícula:	1 de febrero de 2021
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	28 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Carrera 15 93 A 84 Oficina 307
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	atencionminatore@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3105141902
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Carrera 15 93 A 84 Oficina 413
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	atencionminatore@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3105141902
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 14:06:27
Recibo No. AB25766297
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2576629715873

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 1 de febrero de 2021 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de febrero de 2021, con el No. 02657424 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MINATORE S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Los fines principales de la sociedad: a.) la explotación de la industria de la construcción en todas sus manifestaciones, tales como el desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios de carácter comercial y/o habitacional, el diseño y construcción de todo tipo de obras civiles de infraestructura urbana; b) la construcción y levantamiento de todo tipo de edificaciones sobre inmuebles, así como la enajenación de las propiedades resultantes; c) el diseño, construcción, planeación y ejecución de todo tipo de obras civiles, eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de protección ambiental, tales como vías, pavimentos, puentes, redes ' tendidos eléctricos, alcantarillados, acueductos, redes de tuberías para transporte y distribución de combustibles líquidos o gaseosos, redes y estaciones para telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, puentes, muelles y obras de pilotaje, dragados, represa .y demás obras hidráulicas, tanques de almacenamiento, hospitales, colegios, parques, casas y edificios, y en general cualquier obra de ingeniería y arquitectura; d) la compra y venta de bienes inmuebles para su explotación a cualquier título; e) la fabricación e instalación de componentes, materiales y partes necesarias para la explotación de la industria de la construcción en todas sus fases; f) la compra, venta, distribución, exportación o importación y alquiler de maquinaria y materiales para la construcción y para la dotación y decoración de todo tipo de inmueble; g) la prestación de servicios técnicos y de asistencia técnica, así como de interventoría en todas aquellas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 14:06:27
Recibo No. AB25766297
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2576629715873

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

actividades que constituyen su objeto; h)la rurales, su administración y explotación, así como la enajenación de los predios, fincas o unidades resultantes de su fraccionamiento; i) la comercialización de toda clase de materiales para la construcción, así como el montaje o inversión en empresas para la fabricación de los mismos; j) la inversión de recursos en la adquisición de cuotas y/o acciones en otras sociedades, cualquier que sea su objeto, con miras a percibir dividendos o participaciones y aumentar así su patrimonio; k) la celebración de todo tipo de contratos de asociación y colaboración empresarial con otras sociedades o personas para efectos de contratar conjuntamente el desarrollo de obras o la prestación de servicios que hagan parte de su objeto; l) la exploración y explotación de minas en general, así como el beneficio y transformación de minerales y todo tipo de recursos naturales no renovables; m) la explotación de la actividad forestal en todas sus manifestaciones, tales como la siembra de bosques maderos, la venta de maderables y afines. Participar de manera individual y/o en sociedad con otras empresas, en proyectos de Asociaciones Público Privadas y contratos de concesión, así como tener facultades expresas dé realizar, alianzas estratégicas en diferentes modalidades, comprar acciones en Sociedades- similares y suscribir cualquier tipo de contratos para su ejecución; o) representar comercialmente empresas nacionales y extranjeras dedicadas a cualquiera de las actividades señaladas en los literales anteriores; p) prestación de servidos de consultoría, asesoría, gestión y acompañamiento en el estudio, diseño implementación, análisis, ejecución, supervisión, control y administración de todo lo referente a la prospección, exploración y explotación de proyectos mineros de cualquier índole extractiva a cielo abierto o subterránea en pequeña y gran escala, por aluvión, cauce beta u otro y el aprovechamiento de los recursos naturales en todas sus formas. q) importación, exportación y comercialización de sustancias químicas necesarias, controladas y requeridas para el desarrollo minero y ambiental. r) procesos de gestión para la adquisición y uso de material explosivo, sustancias químicas controladas y otras, previo cumplimiento de los requisitos de ley al respecto, junto con las demás sustancias químicas necesarias, componentes y clases para la prospección, exploración y explotación minero ambiental en sus diferentes formas. s) actividades de apoyó para otras tareas de prospección, exploración y explotación de minas, canteras, playas y demás depósitos naturales, o yacimientos de materiales para la construcción y la industria. t) construcción de túneles, socavones, pozos, chimeneas, excavaciones, demoliciones y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 14:06:27
Recibo No. AB25766297
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2576629715873

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

otras obras de ingeniería civil, u) actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, v) prestación de servicios de educación y capacitación en seguridad, manipulación de sustancias químicas, explosivos, seguridad laboral, seguridad y salud laboral y otros tipos de educación no formal. prestación de servicios de voladura de rocas, construcciones y demoliciones mediante la utilización técnica de explosivos y sustancias químicas controladas en todo tipo de obras civiles. w) obtención de información geológica, geofísica, geoquímica, procesamiento, análisis e interpretación de resultados de hidrocarburos, minerales y cualquier otro tipo de sustancia explotable, mediante la utilización de técnicas como la sísmica, estudio de síntesis de cuencas magnetometría, gravimetría, fotogeología satelital, sensores remotos, bioestratigrafía y adquisición de información de geología de subsuelo y cartografía. x) perforación de pozos, obtención de fluidos de perforación procesamiento, análisis e interpretación de registros, acorazamiento, cementación, cañoneo, pesca, servicio de pozos diferidos y estimulación de pozos. y) Producción de hidrocarburos, terminación de todo tipo de pozos, automatización de sistemas de levantamiento artificial dé pozos, bombeo mecánico, electro sumergible, gas lift y trabajo realizado a los pozos posteriores a su terminación como mantenimiento, limpieza y reparaciones. z) servicio de ingeniería de yacimientos, estudio análisis, evaluación y control de ingeniería de yacimientos, de hidrocarburos, tasas máximas de producción, análisis petrofísicos de rocas y fluidos. aa) conservación del medio ambiente, desarrollo e implementación de programas, de recuperación ambiental, higiene, salud y seguridad industrial en minería y otras industrias, ab) atención a vertimientos y derrames de hidrocarburos (petróleo y gas), prevención de incendio y contaminación en el medio extractivo, servicio de asesoría, asistencia; acompañamiento y representación de los programas de responsabilidad social empresarial y conservación del medio ambiente en el sector extractivo nacional. Ac) transporte de funcionarios, cargas mercancías, sustancias químicas liquidas, solidas, gaseosas, controladas, dentro y fuera del medio extractivo vía terrestre dentro del territorio nacional. Ad) invertir directamente o por medo de aportes en sociedades de cualquier naturaleza o especie, en actividades de conservación prospección, exploración explotación, industrialización o aprovechamiento, en cualquier forma, de los recursos renovables o no renovables, o en el cultivo, cría, explotación, industrialización o comercialización de especies animales o vegetales de utilización alimentaria, industrial

y recreativa. Ad) prospección exploración o explotación de toda clase de derechos mineros, intervenir en la formación de sociedades mineras y otro tipo de organizaciones, de explotación conjunta de derechos mineros y en general, celebrar toda clase de negocios mineros. Ae) realizar la logística y suministro de cualquier proyecto empresarial en desarrollo de su objeto la sociedad podrá asociarse con otras y otras personas naturales o jurídicas, que desarrollen el mismo o similar objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con este; en general, la sociedad podrá ejecutar los actos y celebrar los contratos convenientes para el logro del objeto social mediante la vinculación directa o indirecta de grupo de profesionales interdisciplinarios que se requiera para la ejecución de dichos proyectos. af) comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra. En desarrollo del objeto social principal antes descrito, la sociedad podrá participar en todo tipo de licitaciones públicas y privadas, y celebrar y ejecutar los correspondientes contratos públicos o privados que le sean adjudicados; ser parte o intervenir en asociación público privadas (APP), tomar interés social como accionista, socio o fundador de empresas; constituir fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro; comprar, vender, importar y exportar todo tipo de bienes y servicios; tomar dinero en préstamo, financiar y garantizar las operaciones comerciales que celebre con terceros relativas al desarrollo de su objeto; celebrar y ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para desarrollar sus operaciones; girar, aceptar, otorgar y protesta todo tipo de títulos valores e instrumentos negociables; comprar, vender y constituir gravámenes sobre bienes muebles e inmuebles, ya sea para garantizar obligaciones propias, de sus socios o de terceros; designar representantes a apoderados en el país y en el exterior y, en general, realizar cualquier acto o negocio que sea necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto social y para la mejor protección de sus intereses corporativos o los de sus socios. Para la realización de su objeto social la sociedad podrá solicitar las concesiones, los permisos y requisitos que se requieran ante las autoridades administrativas públicas de carácter nacional, departamental, municipal, distrital o local. Igualmente podrá celebrar los contratos, actos o negocios que sean necesarios para cumplir el objeto de la sociedad, incluyendo contratos de riesgo compartido con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. La sociedad podrá adquirir o conseguir patentes, nombres comerciales, licencias, marcas, concesiones, permisos en general para celebrar toda clase de contratos bien sean con personas particulares

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 14:06:27
Recibo No. AB25766297
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2576629715873

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

o con entidades del estado a nivel nacional, departamental, municipal, distrital o local, de carácter civil, administrativo, o comercial que guarden relación o sean necesarios para desarrollar el objeto social de la sociedad y ejercer todas aquellas actividades que tengan como finalidad ejercer o solicitar derechos y cumplir obligaciones legales y/o convencionales. Igualmente, la sociedad podrá participar en el capital social de otras sociedades o personas jurídicas de cualquier naturaleza. Intervenir como acreedora o como deudora, en operaciones de crédito, dando o recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a ellas. Así mismo podrá garantizar, respaldar, servir como fiador y/o avalar deudas propias o de terceros. Será necesaria la aprobación previa de la Asamblea General de Accionistas, cuando se trate de deudas de terceros. Celebrar con establecimientos de créditos y compañías aseguradoras, toda clase de operaciones propias de su objeto social principal y complementario. Girar, aceptar, endosar, cobrar, negociar y, en general efectuar operaciones con títulos valores. Transigir, desistir y apelar decisiones de arbitradores, decisiones administrativas o jurisdiccionales en que tenga interés o sea parte la sociedad. Celebrar contratos de cuentas en participación, agencia comercial, mutuo, comodato, contratos con entidades bancarias o financieras. La sociedad podrá realizar cualquier tipo de actividad comercial que no se encuentre prohibida por la ley.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $4.000.000.000,00
No. de acciones : 4.000.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 500.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $500.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 14:06:27
Recibo No. AB25766297
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2576629715873

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 500.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, no existirá un representante legal suplente, el representante legal será designado por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será administrada y representada legalmente ante terceros, por el representante legal, quien de manera especial tendrá a su cargo las siguientes funciones: (1) Representar a la sociedad frente a los accionistas, ante terceros y ante toda suerte de autoridades administrativas o jurisdiccionales (II) Celebrar todos los actos y contratos que, demanden el debido cumplimiento y desarrollo del objeto social, sin restricción para suscribir o celebrar contratos de cualquier monto o cuantía. (III) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad, (IV) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad, (V) Presentar a la asamblea ordinaria de accionistas, el informe de gestión, el balance general dé fin de ejercicio, el detalle del estado de resultados y un proyecto de distribución de utilidades, (VI) Presentar a la asamblea ordinaria de accionistas, un informe sobre la situación económica y financiera de la sociedad con inclusión de todos los datos contables y estadísticos que exige la ley, así como la información sobre la marcha de los negocios sociales y, sobre reformas y ampliaciones que considere convenientes para el desarrollo del objeto social, (VII) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no sea competencia de la asamblea general de accionistas, (VIII) Tomar todas las medidas tendientes a conservar los activos sociales, (IX) Convocar a la asamblea general de accionistas cuando lo juzgue conveniente o necesario y, hacer las convocatorias ordenadas por la ley o de la manera como se prevé en estos Estatutos, (X) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general de accionistas, (XI] Someter a la decisión de árbitros cuando lo crea

conveniente, las diferencias que se susciten entre la sociedad y terceros, concurrir a la designación de los árbitros y nombrar el apoderado que deba representar a la sociedad ante el correspondiente tribunal, (XII) Cumplir y hacer cumplir todas las exigencias que la ley le impone para el desarrollo de la empresa social. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 1 de febrero de 2021, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de febrero de 2021 con el No. 02657424 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Musso Hernandez Jenny Marcela	C.C. No. 57290511

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 14:06:27
Recibo No. AB25766297
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2576629715873

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 0990, 7730

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 731.418.391
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de febrero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 9 de mayo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2025 Hora: 14:06:27
Recibo No. AB25766297
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2576629715873

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Cámara de Comercio de Barranquilla

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

Fecha de expedición: 05/11/2025 - 16:13:22

Recibo No. 13019368, Valor: 11,600

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BJ67BFEBFF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S
Sigla:
Nit: 901.472.218 - 1
Domicilio Principal: Barranquilla

MATRÍCULA

Matrícula No.: 787.074
Fecha de matrícula: 30 de Marzo de 2021
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación de la matrícula: 03 de Abril de 2025
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CR 42 No 84 - 202
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: construdiciviles@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3042489034

Teléfono comercial 2: 3042489034
Teléfono comercial 3: No reportó

Direccion para notificación judicial: CR 42 No 84 - 202
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: construdiciviles@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3042489034
Teléfono para notificación 2: 3042489034
Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA NO AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 30/03/2021, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 30/03/2021 bajo el número 398.669 del libro IX, se constituyó la sociedad:INVERSIONES J.D. DE LA COSTA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES,,

Por Acta número 02-2022 del 26/07/2022, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 29/07/2022 bajo el número 430.210 del libro IX, la sociedad cambio su razón social a CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

Duración.: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida
QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: EI objeto de la sociedad será ejecutar toda clase de obras civiles, infraestructura. y construcción vial, caminos, puentes o túneles, construir, transformar o reparar casas o edificios; el estudio y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de Ingeniería y Construcción, por cuenta propia o ajena; la realización de trabajos de edificación de obras civiles, tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas, túneles, puertos aéreos o marítimos, ferrocarriles y otros; el desarrollo de proyectos inmobiliarios; la compra, venta, enajenación y arriendo de bienes raíces o muebles; la realización de Loteos y obras de urbanización; la construcción, promoción y venta de centros comerciales, locales, oficinas, estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o de subsidios habitacionales; y la implementación y realización, en

general, de todo tipo de proyectos y de obras de Ingeniería y construcción, y cualquier otro acto o negocio ilícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden. EI objeto de la sociedad será la realización, por cuenta propia o ajena, de las siguientes actividades: a) desarrollar proyectos, realizar consultorías y asesorías de ingeniería, hidráulica o transportes; b) importar, exportar, comprar, vender o distribuir toda clase de equipos de ingeniería, materiales de construcción, casas y repuestos; y cualquier otro acto o negocio Lícito que derive de los anteriores, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, u otros que los socios acuerden. Para el cabal desarrollo y cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá adquirir y recibir material primas y otros insumos; construir edificios para bodegas, realizar el montaje de sus plantas y oficinas; adquirir equipos para el transporte de su producción, organizar los establecimientos de comercio necesario para la venta de sus productos; celebrar contratos de agencia, distribución, o concesión, suministro y consignación; formar parte de otras sociedades. Cuyo objeto fuere igual, similar, conexo o complementario; celebrar convenios de colaboración técnica o administrativa con otra u otras personas naturales o jurídicas, comprar bienes muebles o inmuebles para sus actividades o tomarlos por el sistema de arrendamiento, comodato u otro sistema cualquiera realizar las operaciones de crédito necesarias para su normal funcionamiento; ejecutar toda clase de actos con títulos valores u otros representativos de derechos; invertir sus disponibilidades de numerario en bonos, cedulas y otros títulos que emitan entidades privadas o públicas. Además, se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo, así como los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o contractuales, derivados de la existencia y actividad de la compañía. Constituir compañías nacionales, mixtas o extranjeras para el establecimiento y explotación de empresas destinadas a cualquiera de las actividades comprendidas en el objeto social y tomar interés como partícipe asociada o accionista en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, recibir y hacer aportes en dinero, en especie o en servicios a empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ellas, fusionarse con tales empresas, absorberlas, adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su explotación y en general celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones, sobre bienes muebles o inmuebles de carácter civil, comercial, administrativo o financiero que guarden relación de medio a fin con el objeto social y todos aquellos actos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía. Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar operaciones de préstamo, cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o recibir garantías, girar, endosar, adquirir y negociar títulos valores. Se prohíbe a los socios en particular, comprometerse como fiadores en garantía de obligaciones de terceros, como representantes de la Sociedad. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica Lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el Comercio o la industria de la sociedad. Realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet. La prestación de servicios profesionales y la ejecución de obras relacionadas con la arquitectura y la

ingeniería, la explotación de la construcción en todas sus manifestaciones como construcción de viviendas para la venta, bien sean casas de habitación, unifamiliares, conjuntos residenciales o edificios familiares para la venta de pisos o apartamentos; desarrollar planes de urbanizaciones, viviendas populares y planes de propiedad horizontal, la construcción, señalizaci6n, iluminación y arborización de vías; el suministro de redes eléctricas y telefónicas; la construcción y el montaje de muelles terminales de transporte; los montajes mecánicos y eléctricos; el dragado a remoción de sedimentos; la prestación de servicios de consultoría en todas sus manifestaciones; la producción de concretos; la adquisición de inmuebles a titulo oneroso con destino a parcelarlos, urbanizarlos, construirlos, mejorarlos; darlos o recibirlos en arrendamiento, enajenarlos, pignorarlos y/o hipotecarlos; la explotación de minas en general, lo mismo que el beneficio, transformación, importación, exportación y comercialización de minerales; comprar y vender materiales para la construcción y decoración; bienes muebles e inmuebles, dar en venta inmuebles, convertir inmuebles en propiedad horizontal, compra, venta y alquiler de maquinaria y equipos para la construcción y decoración; compra y venta, administración y arrendamiento, importación y exportación de maquinaria y equipos para trabajo pesado y toda clase de vehículos, materiales para la construcción y decoración en general; celebrar toda clase de contratos relativos al transporte aéreo; marítimo, fluvial y terrestre, tales como comprar, vender, dar y recibir en arrendamiento; importar y exportar naves y equipos de transporte, el mismo, de fundición y refinación de metales preciosos, podrá dedicarse a la prestación de servicios de aseo, recolección de basuras, obras sanitarias y en general todo lo relacionado con este ramo, podrá intervenir y/o participar en otras sociedades ya establecidas o que en el futuro se establezcan, pudiéndose fusionar con ellas, sean o no de objeto análogo o complementario; la sociedad podrá diseñar, construir, mejorar; conservar y operar carreteras mediante el sistema de concesión, también podrá intervenir en toda clase de negociaciones de valores bursátiles. Para el cumplimiento de sus actividades podrá adquirir, conservar, enajenar y gravar toda clase de bienes raíces y muebles que sean necesarias para el logro de sus fines sociales, girar, emitir, aceptar, garantizar, negociar, endosar; cobrar, protestar cheques, Letras de cambio, obligaciones, órdenes de pago, libranzas; pagarés, cartas de porte, facturas cambiarias de compraventa, y demás títulos valores y documentos de crédito; tomar y dar dinero a título de préstamo, con garantías específicas o sin ellas, suscribir acciones o adquirir interés social en otras compañías que tengan fines similares, bien sea como accionista fundadora o no, fusionarse con ella o incorporarse en ella, o absorbiéndolas. Adquirir, enajenar y gravar acciones o derechos en, otras empresas, en forma general podrá celebrar y/o ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros, en participación con ellos toda clase de actos y contratos de carácter civil o comercial; ya sea con entidades públicas o particulares nacionales y/o extranjera y llevar a cabo toda clase de negocios que tengan relación directa con el objeto que la sociedad se propone desarrollar, todo con el fin de proporcionarse renta de trabajo. Queda prohibido a la sociedad comprometer su responsabilidad y garantizar con sus bienes el cumplimiento de obligaciones distintas a las suyas propias. Compra, venta y suministro de papelería equipos de oficina, equipos de computación equipos hospitalarios de laboratorios, odontológicos y de cualquier otra clase de mercancías lícitas, en el desarrollo de su objeto social la empresa podrá, adquirir, gravar, enajenar y transformar inmuebles o muebles, tomar y dar bienes según su naturaleza, en arrendamientos; depósitos, comodato, mutuo, prenda, hipoteca, anticresis o en general a cualquier titulo no traslaticio de dominio,

celebrar contratos bancarios, celebrar contratos de sociedades o de cuentas de participación y toda clase de operaciones o contratos con títulos valores y en general todo acto que directamente o indirectamente se relacionen con el objeto social.

CAPITAL

** Capital Autorizado **		
Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	1.000,00
Valor nominal	:	100.000,00
** Capital Suscrito/Social **		
Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	1.000,00
Valor nominal	:	100.000,00
** Capital Pagado **		
Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	1.000,00
Valor nominal	:	100.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad para su dirección y administración contará con los siguientes órganos: A) Asamblea General de Accionistas y B) Gerente. La sociedad tendrá un Gerente. El Gerente será reemplazado en sus faltas temporales, ocasiones o absolutas, por el Subgerente con las mismas facultades que el Gerente. Son funciones del Gerente todas las que correspondan a la naturaleza de su cargo y en especial las siguientes: Hacer uso de la razón social y representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de funcionarios, entidades oficiales y privadas. Celebrar y ejecutar todos los actos y operaciones comprendidas dentro del objeto social, con sujeción a las restricciones o limitaciones previstas en estos estatutos. Constituir designar los mandatarios, árbitros y peritos que debe nombrar la sociedad. El Gerente podrá celebrar actos y negocios jurídicos hasta por cuantía indeterminada. El Gerente y procedió a disponer como opción necesaria el nombramiento de un Subgerente para la compañía, quien ejercerá las funciones y atribuciones correspondientes en caso de ausencia temporal o incapacidad de el.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 14 del 24/09/2025, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 26/09/2025 bajo el número 508.257 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente	
Gonzalez Isaza Daniel	CC 1128471046
Subgerente	
Garcia Castaño Brayan Estiven	CC 1128456626

REVISORÍA FISCAL.

Nombramiento realizado mediante Acta número 12 del 22/04/2025, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 30/04/2025 bajo el número 499.169 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal.	
Benitez Ortega Julio Cesar	CC 8321312

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	02-2022	26/07/2022	Asamblea de Accionista	430.210	29/07/2022	IX
Acta	3	10/08/2022	Asamblea de Accionista	431.049	12/08/2022	IX
Acta	11	25/03/2025	Asamblea de Accionista	494.455	26/03/2025	IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.
Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 6810
Actividad Secundaria Código CIIU: 6820
Otras Actividades 1 Código CIIU: 6499
Otras Actividades 2 Código CIIU: 4290

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

TAMAÑO EMPRESARIAL.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA- RSS

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matrículado en el formualario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria: 26.384.438.761,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

C E R T I F I C A

Que entre los asociados existe pactada cláusula de arbitraje para la solución de controversias.

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

RUT, RIT Y RESOLUCION DE FACTURACION

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141241716241

(415)7707212489984(8020) 000014124171624 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 2 8 8 3	0	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 # 62 - 41

42. Correo electrónico cop938kennedy@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 8 2 9 5 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 5 1 1 1 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-18 / 10:37:42AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MAESTRE DIAB JOTAM

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241716241

(415)7707212489984(8020) 000014124171624 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 2 8 8 3	0	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 1 1 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 1 1 2 6	
81. Hasta	2 0 2 8 0 1 2 6	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241716241

(415)7707212489984(8020) 000014124171624 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 2 8 8 3	0	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 1 1 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 5 8 2 5 6 6 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
MAESTRE	DIAB	JOTAM	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 1 1 1 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	5 7 2 9 0 5 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
MUSSO	HERNANDEZ	JENNY	MARCELA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241716241

(415)7707212489984(8020) 000014124171624 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 2 8 8 3	0	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 1 2 6 9 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 5 1 1 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 5 0 5 7 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MINATORE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 5 1 1 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 7 2 2 1 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 5 1 1 1 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141241716241

(415)7707212489984(8020) 000014124171624 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 2 8 8 3	0	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 5 4 3 2 0		1 3 1 7 0 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HUERTAS	ROJAS	YESID	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:18/03/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 902012883	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 1 # 62 - 41 Teléfonos: 3176682956

Dirección electrónica: cop938kennedy@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 16/12/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 12/11/2025

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 25/11/2025 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
12/11/2025	C.C.	1065825668	JOTAM MAESTRE DIAB	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764104306395

(415)7707212489984(8020) 001876410430639 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 2 0 1 2 8 8 3	0				

11. Razón social
CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería

Cód. 1 2

24. Dirección
CR 1 # 62 - 41

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-01-06 / 12:50:55 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MAESTRE DIAB JOTAM
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1065825668 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

997. Fecha formalización 2026-01-06/12:50:55

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764104306395

(415)7707212489984(8020) 001876410430639 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 2 0 1 2 8 8 3	0				

11. Razón social

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 CR 1 # 62 - 41	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVVK	1	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

INFORME DE SUPERVISIÓN

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	938 de 2025
Periodo y/o No. de Pago	1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026/ (Pago 3)
Nombre Del Contratista	CONSORCIO VIAL KENNEDY
Nit:	902.012.883-0
Objeto Del Contrato	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.
Fecha de Inicio	15 de diciembre de 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	14 de febrero de 2027
Póliza	Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 06-000-28897 con vigencia 13/11/2025 – 13/01/2027. Póliza de cumplimiento No. 05-000-100274 con vigencia 13/11/2025 – 13/01/2032.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
CESIÓN	26/11/2025	CESIÓN ALCONSORCIO VIAL KENNEDY	SI
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.	Durante el periodo correspondiente se adelantan las actividades técnicas asociadas al desarrollo del contrato, conforme a los estudios previos, pliego de condiciones y propuesta aprobada, garantizando el cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior se evidencia mediante el Informe técnico mensual No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
2. Elaborar todos y cada uno de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) por tramo del contrato, el PMT para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo a la Interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría	Durante este periodo se elaboran y gestionan los Planes de Manejo de Tráfico requeridos para los tramos intervenidos, incluyendo inventario de redes, desvíos y tratamientos silviculturales cuando aplica, para revisión de la interventoría y posterior trámite ante la Secretaría

Distrital de Movilidad (SDM). La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Para la respectiva aprobación por la Secretaría de Movilidad, teniendo en cuenta que el trámite de los mismos NUNCA debe sobrepasar el plazo de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL), determinado en tres meses y quince días.	Distrital de Movilidad. La gestión se reporta en el Informe técnico mensual No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
3. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.	Se realiza el replanteo topográfico de las áreas de intervención con el fin de ubicar correctamente las obras en terreno, garantizando la conservación y protección de los puntos de referencia establecidos para el proyecto. Estas actividades se evidencian en los Informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
4. Generar y entregar antes y después de las intervenciones, registros fotográficos que sean parte de los documentos del contrato.	Durante el periodo se generan y organizan los registros fotográficos correspondientes al estado previo y posterior de las intervenciones ejecutadas, integrándose como soporte documental del contrato. En los CIV aprobados por la interventoría se cuenta con el registro fotográfico correspondiente y en los informes mensuales se incluyen imágenes del proceso constructivo. Al finalizar las intervenciones se entregarán las hojas de vida de los segmentos intervenidos. Esta información se encuentra en los Informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
5. Elaborar y presentar a la interventoría para su revisión y aprobación y posterior envío al FDLK, el Alcance, la Metodología, el Enfoque para desarrollar las actividades propias del contrato; el Plan Anual de Caja (PAC) programado, con el tiempo suficiente para la revisión (estos tiempos se acordarán en el primer comité de seguimiento y será determinado por las fechas de pagos del Fondo), la Programación de Obra, Cronograma de cierres por frente de obra (sabiendo la duración de las actividades desarrolladas por CIV, los cierres de frentes se determinarán como hito de inicio a otros CIV), el acta suscrita de los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato con precios tope IDU vigentes al momento de expedir el acta de fijación de no previstos.	Se elabora y presenta a la interventoría la documentación técnica correspondiente al alcance, metodología y enfoque para el desarrollo del contrato, así como la programación de obra, el Plan Anual de Caja (PAC) y los análisis asociados a la ejecución de las actividades. La programación y flujo de caja de obra fueron radicados mediante el oficio CVK-938-086 y el balance de obra fue radicado mediante el oficio CVK-938-077.
6. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el contrato sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias	Se ejecutan nuevamente las labores de replanteo necesarias para verificar la correcta localización de las actividades contractuales en el terreno, garantizando la

topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario.	permanencia y adecuada protección de las referencias topográficas establecidas para el desarrollo del proyecto. Esta información se encuentra consignada en los Informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
7. Ejecutar las reuniones de seguimiento y visitas juntamente con la Interventoría y sus especialistas o el FDLK o Entidades Distritales Competentes, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del contrato y suscribir el Acta de Seguimiento al Contrato.	Durante el periodo reportado se participa en las reuniones de seguimiento y visitas técnicas realizadas con la interventoría y las entidades distritales competentes, en las cuales se revisa el avance de las actividades, se plantean alternativas técnicas y se definen acciones orientadas al adecuado desarrollo del contrato, suscribiendo las respectivas actas de seguimiento. Esta información se encuentra registrada en las actas de seguimiento y comités de obra del contrato, suscritas durante el periodo correspondiente.
8. Cumplir con el cronograma de obra, las especificaciones técnicas y el programa de inversiones revisado y aprobado por la Interventora, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios y/o plan de contingencia para contrarrestar el atraso de actividades en caso de que existan variaciones por retraso en la ejecución prevista.	Se ejecutan las actividades programadas conforme al cronograma aprobado, realizando el control permanente del avance de obra y adoptando las medidas necesarias en caso de presentarse desviaciones en la ejecución, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del programa de inversiones del contrato. Esta información se encuentra consignada en la Programación de obra presentada para seguimiento del contrato, radicada mediante el oficio CVK-938-086.
9. Soportar técnicamente la gestión social en las actividades con la comunidad y dar respuesta por escrito de manera oportuna, clara y de fondo a los PQRS en el desarrollo del contrato.	Durante el desarrollo del contrato se brinda soporte técnico al componente social en las actividades realizadas con la comunidad y se atienden oportunamente las PQRS presentadas por los ciudadanos, garantizando respuestas claras y de fondo. Esta información se encuentra consignada en el Informe social mensual.
10. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).	Durante el periodo se implementa en campo el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, garantizando la adecuada señalización, control del tránsito y seguridad en los frentes de obra durante la ejecución de las actividades. Esta información se encuentra consignada en el Informe ambiental mensual.
11. Implementar el Plan de Calidad.	Durante el periodo se aplican los lineamientos establecidos en el Plan de Calidad del proyecto, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos definidos para la ejecución de las actividades y el adecuado control de los procesos constructivos. Esta información se encuentra consignada en el Plan de Calidad radicado mediante el oficio CVK-938-020.
12. Ajustar el cronograma del contrato cuando el FDLK o la interventoría lo solicite, para el buen desarrollo de este o cumplimiento de metas.	Cuando es requerido, se realizan los ajustes correspondientes al cronograma del contrato en coordinación con la interventoría y el FDLK, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas y la adecuada programación de las actividades del

	proyecto. Esta información se encuentra consignada en la Programación de obra radicada mediante el oficio CVK-938-086.
13. Presentar para revisión y aprobación de la interventoría las medidas de contingencia tendientes al cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo inicialmente previsto. De lo contrario debe entregar la nueva programación con las justificaciones necesarias para la ejecución del contrato, sin que esto implique reconocimientos económicos al Contratista.	Durante el desarrollo del contrato se elaboran y presentan a la interventoría las medidas de contingencia necesarias para garantizar el cumplimiento del cronograma y del objeto contractual, contemplando las acciones correctivas requeridas en caso de presentarse desviaciones en la programación de las actividades. Esta información se encuentra consignada en el Informe técnico mensual No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
14. Remitir oportunamente a la Interventoría los reportes semanales de ejecución, informes mensuales en donde se haga un detalle del desarrollo de las labores de obra, informe final y ejecutivo de obra. O cuando la interventoría o el FDLK lo requieran.	Durante el periodo se elaboran y remiten a la interventoría los informes mensuales en los cuales se presenta el detalle del desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, permitiendo realizar el seguimiento al avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Esta información se encuentra consignada en el Informe técnico mensual No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
15. En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del contrato, entregar para revisión y aprobación a la Interventoría los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a su identificación y previo a la ejecución de las actividades. Teniendo en cuenta el precio tope IDU vigente al momento de la ejecución.	En caso de identificarse ítems no previstos para la adecuada ejecución del contrato, se elaboran y presentan los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU) debidamente sustentados para revisión y aprobación de la interventoría. En este sentido, se remitieron los ítems contractuales correspondientes a la propuesta económica y la subsanación de los APU, los cuales fueron revisados y aprobados por la interventoría y serán utilizados para la elaboración de presupuestos, actas y demás documentos contractuales, mediante los oficios CVK-938-029 y CVK-938-038.
16. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el contrato. Acorde con lo Establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación soporte requerida.	Se realizan los ensayos de laboratorio requeridos para verificar la calidad de los materiales y de las actividades ejecutadas, conforme a las especificaciones técnicas del contrato y a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y Supervisión. No obstante, durante el periodo correspondiente a la presente acta no se efectuaron ensayos de laboratorio, debido a que las actividades desarrolladas hicieron parte de la etapa preliminar del contrato, en la cual aún no se habían iniciado intervenciones de obra que requirieran la ejecución de dichos controles de calidad.
17. Efectuar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las especificaciones contratadas para el contrato. Dicho lo anterior, realizar nuevos ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas.	Cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, se implementan los correctivos correspondientes y se realizan nuevos ensayos con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros exigidos en el contrato.
18. Diligenciar y realizar el reporte del estado de ejecución de los CIV intervenidos en el formato IDU,	Durante el periodo se diligencian y reportan los formatos IDU relacionados con el estado de ejecución de los CIV

con el fin de ser avalado por la Interventoría y remitido al FDLK para su posterior entrega a la Dirección Técnica Estratégica del IDU y mantener la información actualizada en el Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU).	intervenidos, con el fin de mantener actualizada la información correspondiente en el Sistema de Información Geográfica del IDU (SIGIDU). Como soporte se presenta el informe mensual técnico No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
19. Entregar a la Interventoría los planos récord de las actividades desarrolladas por Código de Identificación Vial (CIV) en forma física y magnética de acuerdo con las especificaciones y requerimientos acorde al tipo de intervención.	Se elaborarán y entregarán a la interventoría los planos récord correspondientes a las intervenciones realizadas por cada CIV. Una vez finalizada la fase de ejecución en cada segmento intervenido, se iniciará la elaboración de dichos planos como soporte técnico del proceso de cierre y liquidación del contrato.
20. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de Recibo Parcial de Obra, informe mensual elaborado por el Contratista que se encuentre acorde con lo Establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión (como referente el del Instituto de Desarrollo Urbano), con los requisitos que la Interventoría y Supervisión exijan, adjuntando la documentación soporte requerida.	Durante el periodo se elaboran y presentan a la interventoría las actas de recibo parcial de obra junto con los informes mensuales correspondientes para su revisión y aprobación. Como soporte se radica el Acta de Cobro No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026 mediante oficio CVK-938-112, así como el informe mensual técnico No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
21. Suscribir junto con la interventoría el Acta de Terminación de Obra a más tardar en la fecha de vencimiento del plazo de la fase de obra. En la terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se encuentran técnica, administrativa, legal y financieramente.	Al finalizar la fase de obra se suscribirá junto con la interventoría el Acta de Terminación de Obra, en la cual se relacionarán las actividades ejecutadas y el estado técnico, administrativo, legal y financiero del contrato. A la fecha de la presente acta no se ha alcanzado la terminación de la fase de obra; no obstante, se continúa presentando el informe mensual técnico que permiten realizar seguimiento al estado del contrato No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Deben estar presentes todos los especialistas respectivos.	Una vez finalizadas las intervenciones se realizará la visita de inspección final de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la interventoría, con el fin de verificar el estado final de las obras ejecutadas del contrato, se presenta el informe mensual técnico No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
23. Suscribir junto con la Interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizado el plazo del contrato o según la fecha que sea acordada por las partes.	Posteriormente se suscribirá junto con la interventoría el Acta de Recibo Final de Obra una vez se hayan atendido las observaciones o no conformidades identificadas. A la fecha de la presente acta no se ha alcanzado la terminación de la fase de obra, por lo cual no se ha suscrito el Acta de Recibo Final de Obra.
24. En el evento en que el FDLK deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento o abandono de las mismas por parte del Contratista, o por renuencia de éste para su entrega, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene se citará con la debida antelación al Contratista, para que junto con la Interventoría, los profesionales del área de gestión local del área de Infraestructura, el Garante y el Coasegurador, si lo hay, proceda a efectuar una visita de verificación de	En caso de presentarse situaciones de incumplimiento o abandono de obra, se participará en la visita de verificación correspondiente junto con la interventoría, el FDLK y las demás entidades involucradas, con el fin de dejar constancia del estado de las obras mediante el acta correspondiente. Para el periodo del presente informe no aplica esta actividad, toda vez que no se han presentado situaciones de incumplimiento o abandono

las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el Contratista no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el FDLK tomará posesión de las obras, dejando constancia de ello en la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos como el Acta de Recibo Final de Obra.	de obra que requieran la toma de posesión de las obras por parte del FDLK.
25. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe de seguimiento de la garantía única, para su posterior trámite de aprobación por el FDLK.	Durante el desarrollo del contrato se suministran a la interventoría los insumos necesarios para la elaboración del informe de seguimiento de la garantía única. Como soporte se radican las pólizas correspondientes mediante el oficio CVK-938-023, incluyendo la póliza de cumplimiento del contrato No. 05-000-100274 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 06-000-28897.
26. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de interventoría de obra.	De igual manera se entregan los insumos requeridos para la elaboración del informe final de interventoría de obra. Como soporte se presentan los Informes de actividades mensuales técnicos No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
27. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para el CIV y para las vías utilizadas como desvíos.	Una vez finalizadas las actividades de pavimentación, se presentan ante la Secretaría Distrital de Movilidad los diseños de señalización horizontal y vertical para su revisión y aprobación. Posteriormente, y una vez obtenida dicha aprobación, se procederá con la implementación de la demarcación y señalización definitiva del segmento intervenido. Para el presente periodo no aplica el retiro de señalización temporal, debido a que los frentes de obra se encuentran en ejecución.
28. Disponer de seis (06) frentes de obra simultáneos como mínimo.	Para el desarrollo del contrato se disponen simultáneamente los frentes de obra requeridos, garantizando la ejecución paralela de las actividades. Como soporte se presentan los Informes de actividades mensuales técnicos No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
29. Ubicar por cada frente de obra los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para el buen desarrollo de las obras de construcción de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma aprobado por la interventoría e iniciar las actividades de cada frente.	En cada frente de obra se ubican los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades programadas, conforme al cronograma aprobado por la interventoría. Como soporte se presentan los Informes de actividades mensuales técnicos No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
30. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría o el FDLK, en un plazo no mayor a ocho (8) días calendario.	Se atienden oportunamente los correctivos solicitados por la interventoría o el FDLK con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las obras. Una vez la interventoría realiza la revisión correspondiente y emite las observaciones o correctivos a que haya lugar, estos

	serán atendidos y subsanados dentro del plazo establecido, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las obras.
31. El contratista deberá prever y generar acciones de mitigación en obra cuyo fin sea evitar posibles retrasos y daños a obras ejecutadas y por ejecutar, semanalmente de acuerdo con las condiciones climáticas o ambientales que reporte el IDEAM.	Durante el periodo se implementan acciones preventivas y de mitigación en obra con base en las condiciones climáticas reportadas por el IDEAM, con el fin de evitar posibles retrasos o afectaciones en las actividades ejecutadas y por ejecutar. En caso de que la programación y ejecución de la obra se vean afectadas por condiciones climáticas adversas, se elaborarán y presentarán los respectivos planes de contingencia y medidas de mitigación para garantizar la continuidad de las actividades.
32. De acuerdo con las exigencias técnicas del contrato y la vinculación con el desarrollo de este, para los temas de estudios y diseños, el contratista se obliga a implementar los requerimientos señalados en: - Anexo Técnico Particular, - Especificaciones particulares.	Durante la ejecución del contrato se aplican los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo Técnico Particular y en las especificaciones correspondientes al contrato. Como soporte se presentan los Informes de actividades mensuales No. 1 y 2: informe técnico mensual No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
33. Realizar junto con el Supervisor o apoyo a la supervisión del contrato de interventoría designado por el FDLK y la interventoría, comités de seguimiento semanal y presentar los respectivos informes semanales y/o mensuales según sea requerido de acuerdo con la necesidad del supervisor o apoyo a la supervisión e interventoría.	Se realizan comités de seguimiento semanal junto con la interventoría y el supervisor o apoyo a la supervisión designado por el FDLK, presentando los informes requeridos para el control y seguimiento del avance del contrato. Como soporte se presentan los Informes de actividades mensuales técnicos No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
34. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social.	Durante el desarrollo del proyecto se implementan las acciones contempladas en el Plan de Gestión Social del contrato, conforme a los lineamientos establecidos para el componente social. Como soporte se radica el Plan de Gestión Social mediante oficio CVK-938-035.
35. Remitir a la Interventoría un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, (mensual de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los primeros tres (3) días calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe del componente social.	Se elaboran y remiten a la interventoría los informes mensuales correspondientes al componente social del contrato, dentro de los plazos establecidos. Como soporte se presentan los Informes de actividades mensuales técnicos No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
36. Dar cumplimiento a los siguientes programas: • Programa de información: Reunión de avance, extraordinario y finalización. • Programa de divulgación: Distribución de volantes de información ciudadana o comunicados y volantes PMT. • Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en Obra con los horarios aprobados por la interventoría y el FDLK. • Programa de talleres de sostenibilidad: Reuniones informativas al comité del punto de atención en Obra.	Durante el periodo se desarrollan las actividades contempladas en los programas del componente social del contrato, incluyendo los programas de información, divulgación, atención al ciudadano, sostenibilidad, manejo de impactos en el sector comercial, socialización del contrato, acompañamiento a actividades técnicas de obra y gestión para el cumplimiento de la vinculación de Mano de Obra No Calificada (MONC).

• Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. • Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes. • Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y rampas en los predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas de compromiso y registro fotográfico de las vías utilizadas como desvíos. • Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC).	
37. Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y rampas en los predios ubicados en el área de influencia.	Se elaboran las actas de vecindad correspondientes a los predios ubicados dentro del área de influencia del contrato, incluyendo las relacionadas con garajes y rampas cuando aplica.
38. Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas como desvíos.	Se realizan registros fotográficos y fílmicos de las vías utilizadas como desvíos durante la ejecución de las obras, así como la elaboración de las actas de compromiso correspondientes cuando aplica.
39. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la Interventoría, el FDLK y la autoridad ambiental cuando se requiera, para actualizar o elaborar el inventario forestal, cuando aplique y posteriormente remitirlo a la interventoría.	Cuando aplica, se realizan visitas técnicas en conjunto con la interventoría, el FDLK y la autoridad ambiental correspondiente, con el fin de actualizar o elaborar el inventario forestal en el área de influencia del contrato.
40. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo aprobados en el PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU, durante la ejecución del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas vigentes para la materia.	Durante la ejecución del contrato se implementan los compromisos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo establecidos en los instrumentos de manejo aprobados, tales como el PIPMA, el MAO o el instrumento definido por el IDU, conforme a los requerimientos contractuales y la normativa vigente.
41. Remitir a la interventoría un informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, dentro de los primeros días de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acordados, reporte mensual el cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe mensual SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas.	Se remiten a la interventoría los informes periódicos correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de conformidad con los cronogramas de entrega establecidos, incluyendo los insumos requeridos para la elaboración del informe mensual de SST de interventoría.
42. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud de salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.	Se informa oportunamente a la interventoría sobre los acontecimientos relacionados con los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que se presenten durante la ejecución del contrato, en cumplimiento de los requerimientos contractuales y normativos.
43. Asistir y asumir los compromisos de las reuniones comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud de salud en el trabajo SST y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.	Se participa en las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría relacionadas con el seguimiento ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asumiendo los compromisos derivados de dichas actividades y suscribiendo las actas correspondientes.

44. Efectuar y evidenciar documentalmente los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Elaborar y presentar debidamente firmada a la Interventoría, la certificación de pago al SST, parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales.	Durante el periodo se efectúan y documentan los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y prestaciones sociales del personal vinculado al contrato, conforme a la normatividad vigente y a lo establecido contractualmente. Como soporte se presentan los Informes SST.
45. Aplicar y evidenciar documentalmente, los lineamientos técnico-ambientales de las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el Distrito Capital, de acuerdo con la Resolución No. 1115 del 26 de septiembre de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Resolución 472 de 2017 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generales de las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones”, o la que lo sustituya o modifique.	Se implementan las medidas establecidas para el manejo y disposición de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), conforme a la normativa vigente y a los lineamientos definidos por la autoridad ambiental competente.
46. El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD de la obra, deberá entregarse de acuerdo con los cronogramas de entrega previamente acordados con la interventoría, una vez suscrito el contrato.	Se elabora y presenta el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de la obra conforme a los cronogramas establecidos con la interventoría. Como soporte se radica el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición mediante oficio CVK-938-037.
47. Entregar mensualmente a la interventoría los certificados de materiales de proveedores y disposición final de escombros, en original, expedidos por los proveedores y escombreras utilizados en la obra. Adicionalmente, la interventoría verificará en obra los recibos de escombros y materiales contra certificados. En caso de presentarse observaciones, el contratista se compromete a entregar las aclaraciones y correcciones en el plazo que determine la interventoría y en caso de incumplimiento, este hecho podrá constituirse prueba del uso de proveedores o sitios de disposición final de escombros no autorizados por la autoridad ambiental competente y la interventoría podrá iniciar las acciones legales y contractuales aplicables con el fin de sancionar al contratista. La interventoría deberá entregar los respectivos reportes de escombreras y RCD, con una periodicidad mensual al FDLK.	Mensualmente se entregan a la interventoría los certificados de materiales de proveedores y de disposición final de escombros generados durante la ejecución de las obras, expedidos por los proveedores y escombreras autorizadas. Como soporte se presentan los Informes ambientales mensuales.
48. Aplicar y documentar el cumplimiento de las consideraciones normativas frente a granulo de caucho reciclado según lo versado en el artículo 4 del Decreto	Se aplican las disposiciones normativas relacionadas con el uso de gránulo de caucho reciclado en las actividades que así lo requieran, conforme a lo

265 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones" o la que se encuentre vigente.	establecido en la normativa vigente. Para el presente periodo no se realizó instalación de gránulo de caucho; no obstante, en los informes mensuales se reporta el porcentaje de cumplimiento conforme a lo establecido en el Decreto 265 de 2016. Como soporte se presentan los Informes ambientales mensuales.
49. Aplicar y entregar los documentos que soporten la aplicación del procedimiento en los aspectos SST y SGA para la realización de tratamiento a la vegetación (en caso de que aplique) se deben tener en cuenta los lineamiento del Decreto 531 de diciembre de 2010, "Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones.", expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. De igual manera se deben tener en cuenta las obligaciones consignadas en el Acuerdo № 327 septiembre 24 de 2008, "Por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", este Acuerdo fue expedido por el Consejo de Bogotá D.C.	Cuando aplica, se ejecutan los procedimientos establecidos para el tratamiento de la vegetación conforme a la normativa distrital vigente. Para el presente periodo no aplica, debido a que no se ha evidenciado presencia directa de individuos arbóreos en los CIV intervenidos. Adicionalmente, al inicio del contrato se realizó un recorrido conjunto con la supervisión y la interventoría, durante el cual no se identificó la necesidad de solicitar tratamiento silvicultural, teniendo en cuenta los alcances establecidos para cada segmento vial contratado.
50. Ejecutar los tratamientos para el manejo de la vegetación, conforme a lo estipulado en el acto administrativo aprobatorio emitido por la autoridad ambiental competente, cumpliendo con los procedimientos indicados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, y con las indicaciones del componente correspondiente al manejo de vegetación señaladas en el PIPMA; MAO O EL INSTRUMENTO ESTABLECIDO POR EL IDU.	Se ejecutarán los tratamientos de manejo de vegetación autorizados por la autoridad ambiental competente conforme a los lineamientos establecidos en los instrumentos ambientales del contrato. Para el presente periodo no aplica, debido a que no se ha evidenciado presencia directa de individuos arbóreos en los CIV que se están interviniendo y, según la verificación inicial realizada con la supervisión y la interventoría, no se identificó la necesidad de realizar tratamientos silviculturales.
51. Diligenciar los formatos a las gestiones SST y SGA que en Comités sean definidos y que puedan servir como herramienta de verificación de la labor a la interventoría. El contratista se compromete a permitir el acceso en todo momento de estos formatos a la interventoría y al FDLK.	Durante el desarrollo del contrato se diligencian los formatos requeridos para la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo definidos en comités y utilizados como herramienta de verificación por parte de la interventoría. Se garantiza el acceso permanente a dichos formatos por parte de la interventoría y del FDLK. Soporte en los informes ambientales y SST mensuales.
52. Realizar el pago a la autoridad ambiental competente, por concepto de las licencias, autorizaciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y de compensación generados para el contrato, según lo consignado en la normatividad ambiental vigente.	Se realizan los pagos correspondientes a licencias, permisos o autorizaciones requeridas ante la autoridad ambiental competente, de conformidad con la normatividad ambiental vigente aplicable al contrato. No aplica para el presente periodo, debido a que no se han desarrollado actividades que requieran la obtención de licencias o permisos ambientales.
53. Asumir la responsabilidad de la vegetación que se relaciona en el inventario forestal y en el área	Se implementan medidas de protección y manejo para garantizar la permanencia y conservación de los

circundante a los frentes de obra y deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la permanencia y supervivencia de los individuos vegetales durante la de ejecución de contrato. En caso de que ocurra un daño ocasionado por la ejecución de obra a terceros y/o a algún individuo vegetal, y se demuestre negligencia por parte del contratista para que el hecho ocurriera, el contratista cumplirá con las compensaciones exigidas en la Guía Verde de Secretaría Distrital de Gobierno de Manejo Ambiental vigente en el momento de adjudicación del contrato, sin que esto lo exima de la responsabilidad ante la autoridad ambiental.	individuos vegetales presentes en las áreas de intervención y su entorno, conforme al inventario forestal y a la normatividad ambiental vigente. Durante el periodo se realizó la protección de individuos arbóreos ubicados en las zonas aledañas a los frentes de intervención, según lo consignado en los informes ambientales mensuales.
54. Ejecutar la actualización del censo de árboles, a partir del sistema de información para la gestión de arbolado urbano, si es requerido.	Se realiza la actualización del censo de árboles mediante el sistema de información para la gestión de arbolado urbano cuando es requerido por las autoridades competentes. No aplica para el presente periodo, debido a que no se ha solicitado ningún trámite silvicultural ante la Secretaría Distrital de Ambiente ni ante el Jardín Botánico.
55. Verificar que las obras no se ejecuten en sectores ubicados dentro del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital.	Se verifica que las actividades del contrato no se desarrollen dentro de sectores pertenecientes al sistema de áreas protegidas del Distrito Capital. Durante la etapa preliminar del contrato se realizó la revisión de los segmentos viales objeto de intervención, evidenciando que estos no se localizan dentro de zonas declaradas como áreas protegidas.
56. Verificar los sitios donde se instalan campamentos (permanentes o temporales) los cuales deben cumplir con lo dispuesto en la normatividad SST y SGA vigente.	Se verifica que los sitios destinados para la instalación de campamentos temporales o permanentes cumplan con la normatividad vigente en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Esta verificación se encuentra consignada en los informes ambientales mensuales.
57. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, equipo, vehículos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra antes de la final de obra.	Se garantiza que al finalizar las obras se realice la evacuación total y definitiva de materiales, residuos, maquinaria, equipos, vehículos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución del contrato. No aplica para el presente periodo; sin embargo, el Consorcio se compromete a efectuar la respectiva evacuación de materiales y a entregar las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad al finalizar las actividades.
58. Realizar el mantenimiento a la maquinaria, de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento.	Durante el desarrollo de las actividades del contrato se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria utilizada en obra, de acuerdo con lo establecido por los fabricantes en los respectivos manuales de operación y mantenimiento. Esta gestión se encuentra soportada en los informes SST mensuales.
59. El Decreto 332 de 2020 establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación pública del Distrito Capital,	En cumplimiento del Decreto 332 de 2020 se promueve la vinculación y permanencia de mujeres dentro del personal vinculado al contrato, así como la

orientadas a fortalecer su acceso a oportunidades laborales y a la generación de ingresos en condiciones de equidad. En este sentido, las entidades distritales sujetas al Estatuto General de Contratación deben exigir a los contratistas la vinculación y permanencia de un porcentaje mínimo de mujeres dentro del personal de obra, conforme a los porcentajes definidos en el artículo 3 del decreto. Asimismo, desde el 1 de julio de 2021, los contratos deben incorporar cláusulas relacionadas con la prevención y denuncia de la violencia basada en género y la eliminación del lenguaje sexista, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la norma. Estas disposiciones buscan garantizar el cumplimiento de los lineamientos distritales y promover entornos laborales más equitativos e inclusivos.	implementación de medidas orientadas a la prevención de la violencia basada en género y la eliminación del lenguaje sexista en el entorno laboral. Estas acciones se encuentran consignadas en los informes sociales y SST mensuales.
60. Realizar las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas juntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.	Se realizan reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la interventoría y los delegados de las empresas de servicios públicos, con el fin de verificar el desarrollo de las actividades y coordinar aspectos técnicos relacionados con la ejecución de las obras. Soporte en los informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
61. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en terreno.	Cuando es requerido, se tramitan ante la interventoría las solicitudes de maniobras necesarias con las empresas de servicios públicos, previa verificación en campo de las condiciones de las redes existentes y de las actividades a ejecutar. Esta gestión se encuentra registrada en los informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
62. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de maniobra.	Se suscriben las constancias de ejecución de maniobras realizadas en coordinación con las empresas de servicios públicos y la interventoría, dejando registro de las actividades efectuadas sobre las redes existentes durante el desarrollo del contrato. Soporte en los informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
63. Suscribir el documento de Avance de Obra, de Redes de Servidos Públicos, para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.	Se suscriben los documentos de avance de obra relacionados con las redes de servicios públicos, necesarios para la realización de recibos parciales de obra con las empresas de servicios públicos correspondientes. Esta gestión se encuentra consignada en los informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
64. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.	En caso de presentarse daños o hurto a la infraestructura de las empresas de servicios públicos, se informa oportunamente a la interventoría y se suscribe el acta correspondiente dentro de los plazos establecidos

	contractualmente. Esta situación se reporta en los informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
65. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.	Se realiza la custodia y posterior entrega a las entidades competentes de los elementos de propiedad de las empresas de servicios públicos y demás entes distritales utilizados durante la ejecución del contrato, suscribiendo los documentos correspondientes. Soporte en los informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.
66. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el desarrollo de las obras por partes EPS y otra Entidades Distritales.	Se adelantan los trámites y gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas por parte de las empresas de servicios públicos y demás entidades distritales competentes durante el desarrollo de las obras. Esta gestión se encuentra registrada en los informes técnicos mensuales No. 3 radicado mediante oficio CVK-938-095.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 19.645.886.208,00

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O230117459920242551	Invertir 22 kilómetros – carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Inicial	3259	$ 1.890.277.872,00
O230117459920242574	Invertir 22 kilómetros – carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	Inicial	3259	$ 17.755.608.336,00
Valor total de los CRP				$ 19.645.886.208,00

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
			N/A	N/A	N/A	N/A
Totales				$ 0	$ 0	$ 0

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 19.645.886.208,00
2. Valor Adiciones:	N/A
3. Valor Total:	$ 19.645.886.208,00
4. Valor Total Ejecutado:	$ 3.220.518.659,00
5. Saldo:	$ 16.425.367.549,00

SANTIAGO CARILLO VARGAS
C.C. No. 79.518.952 de Bogotá
Representante legal de Interventoría
SAVIMAC SAS

JAVIER PRIETO TRSTANCHO
C.C. No. 1.057.579.523 de Sogamoso
ALCALDE LOCAL DE KENNEDY (E)
Revisión documental técnica – Magda Lorena Davila
