

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo	Predecesoras
1			**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ**	**127 días**	**mar 10/02/26**	**jue 9/07/26**			**$ 1.500.000.000,00**	
2			**Preeliminares**	**15 días**	**mar 10/02/2**	**jue 26/02/26**			**$ 0,00**	
3			**Parque San Carlos 06-001**	**77 días**	**lun 16/03/26**	**lun 15/06/26**			**$ 417.357.967,00**	
4		1	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mar 24/03/2**	**mar 24/03/2**			**$ 4.858.320,00**	
5		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	mar 24/03/2	mar 24/03/2	ML	120,00	$ 4.858.320,00	
6		2	**DEMOLICIONES**	**6 días**	**jue 26/03/26**	**mié 1/04/26**			**$ 41.518.845,00**	
7		2,01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret	4 días	sáb 28/03/26	mié 1/04/26	M2	95,00	$ 4.006.245,00	8
8		2,03	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)	2 días	jue 26/03/26	vie 27/03/26	M2	600,00	$ 37.512.600,00	5FC+1 día
9		3	**DESMONTES Y RETIROS**	**8 días**	**jue 16/04/26**	**vie 24/04/26**			**$ 15.067.560,00**	
10		3,01	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10event	2 días	jue 16/04/26	vie 17/04/26	JGO	1,00	$ 150.693,00	18
11		3,07	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retir	2 días	sáb 18/04/26	lun 20/04/26	M2	55,00	$ 711.205,00	10
12		3,08	Desmonte Señal (IDG-S)	2 días	mar 21/04/2	mié 22/04/2	UN	2,00	$ 157.662,00	11
13		3,10	Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo M	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26	M2	50,00	$ 14.048.000,00	12
14		4	**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**21 días**	**sáb 28/03/26**	**jue 23/04/26**			**$ 103.630.680,00**	
15		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	4 días	sáb 28/03/26	mié 1/04/26	M3	350,00	$ 21.046.200,00	8
16		4,04	Compactación fondo de excavación con equipos livia	2 días	sáb 4/04/26	lun 6/04/26	M2	600,00	$ 872.400,00	15
17		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	7 días	jue 16/04/26	jue 23/04/26	M3	90,00	$ 28.925.280,00	18
18		4,08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	7 días	mié 8/04/26	mié 15/04/2	M3	120,00	$ 52.786.800,00	28
19		5	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/26**			**$ 19.234.105,00**	
20		5,01	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	4 días	vie 24/04/26	mar 28/04/2	M2	155,00	$ 19.234.105,00	17
21		8	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**22 días**	**sáb 25/04/2**	**mié 20/05/2**			**$ 54.086.186,00**	
22		8,07	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	6 días	sáb 25/04/26	vie 1/05/26	M2	55,00	$ 41.031.210,00	13
23		8,14	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Dem	4 días	lun 11/05/26	jue 14/05/26	UND	14,00	$ 3.396.484,00	25
24		8,15	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO	5 días	vie 15/05/26	mié 20/05/2	UND	7,00	$ 834.582,00	23
25		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	4 días	mié 6/05/26	sáb 9/05/26	M2	190,00	$ 7.420.070,00	26
26		8,22	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	4 días	vie 1/05/26	mar 5/05/26	ML	40,00	$ 1.403.840,00	39
27		9	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**23 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 2/05/26**			**$ 98.975.209,00**	
28		9,05	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	M2	600,00	$ 9.903.600,00	16
29		9,06	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	1 día	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26	M2	600,00	$ 52.315.800,00	30
30		9,07	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	1 día	vie 1/05/26	vie 1/05/26	M2	600,00	$ 2.068.200,00	31
31		9,08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	6 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26	ML	146,97	$ 22.235.529,00	17
32		9,14	Anden Cuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Gec	6 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26	M2	40	$ 12.452.080,00	17
33		10	**MOBILIARIO URBANO**	**7 días**	**jue 21/05/26**	**jue 28/05/26**			**$ 5.905.232,00**	
34		10,01	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	3 días	jue 21/05/26	sáb 23/05/26	UN	2,00	$ 1.544.400,00	24
35		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.du	2 días	lun 25/05/26	mar 26/05/2	UND	4,00	$ 2.823.772,00	34
36		10,41	Señal SC-120 2 caras (Sum + Inst)	1 día	mié 27/05/2	mié 27/05/2	UND	2,00	$ 1.158.152,00	35
37		10,45	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	1 día	jue 28/05/26	jue 28/05/26	UND	1,00	$ 378.908,00	36
38			**ITEMS NO PREVISTOS**	**44 días**	**sáb 25/04/2**	**lun 15/06/26**			**$ 53.739.126,00**	
39		NP-01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x(	5 días	sáb 25/04/26	jue 30/04/26	UND	7,00	$ 2.976.888,00	13
40		NP-04	RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(Su	7 días	lun 8/06/26	lun 15/06/26	M2	600,00	$ 50.762.238,00	29FC+30 días
41			**VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBR**	76 días	lun 16/03/26	sáb 13/06/26			$ 9.830.456,00	
42			**VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS (**	76 días	lun 16/03/26	sáb 13/06/26			$ 3.837.018,00	
43			**VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFIC**	76 días	lun 16/03/26	sáb 13/06/26			$ 6.675.230,00	
44			**Parque San Carlos Norte 06-002**	**104 días**	**lun 9/03/26**	**jue 9/07/26**			**$ 301.964.176,00**	
45		1	**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 9/03/26**	**lun 9/03/26**			**$ 3.238.880,00**	
46		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	lun 9/03/26	lun 9/03/26	ML	80,00	$ 3.238.880,00	
47		3	**DESMONTES Y RETIROS**	**37 días**	**mar 10/03/2**	**jue 23/04/26**			**$ 45.592.299,00**	
48		3,01	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10event	4 días	mar 10/03/2	vie 13/03/26	JGO	1,00	$ 150.693,00	46
49		3,05	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	2 días	mié 22/04/2	jue 23/04/26	UNI	2,00	$ 372.922,00	51
50		3,07	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retir	4 días	sáb 14/03/26	mié 18/03/2	M2	220,00	$ 2.844.820,00	48
51		3,10	Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo M	2 días	lun 20/04/26	mar 21/04/2	M2	150,00	$ 42.144.000,00	61
52		3,12	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM*	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	UN	2,00	$ 79.864,00	50
53		4	**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**4 días**	**vie 24/04/26**	**mar 28/04/2**			**$ 4.810.560,00**	
54		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	4 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	M3	80,00	$ 4.810.560,00	49
55		6	**JUNTAS**	**2 días**	**jue 7/05/26**	**vie 8/05/26**			**$ 1.217.080,00**	
56		6,01	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	2 días	jue 7/05/26	vie 8/05/26	ML	20,00	$ 1.217.080,00	65
57		7	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**3 días**	**mié 29/04/2**	**vie 1/05/26**			**$ 1.459.020,00**	
58		7,02	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	3 días	mié 29/04/2	vie 1/05/26	M2	30,00	$ 1.459.020,00	54
59		8	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**79 días**	**jue 19/03/26**	**sáb 20/06/2**			**$ 170.632.820,00**	
60		8,06	Arreglo de Graderias para Parque***	22 días	jue 19/03/26	mié 15/04/2	ML	80,00	$ 3.753.600,00	46FC+8 días
61		8,07	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	12 días	lun 6/04/26	sáb 18/04/26	M2	220,00	$ 164.124.840,...	63
62		8,15	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO	6 días	lun 15/06/26	sáb 20/06/26	UND	10	$ 1.192.260,00	69
63		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	4 días	lun 30/03/26	sáb 4/04/26	M2	40,00	$ 1.562.120,00	69
64		9	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**4 días**	**sáb 2/05/26**	**mié 6/05/26**			**$ 13.879.194,00**	
65		9,02	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	4 días	sáb 2/05/26	mié 6/05/26	M2	94,00	$ 13.879.194,00	58
66		10	**MOBILIARIO URBANO**	**1 día**	**sáb 9/05/26**	**sáb 9/05/26**			**$ 1.179.778,00**	
67		10,42	Señal SC-80 2 caras (Sum + Inst)	1 día	sáb 9/05/26	sáb 9/05/26	UND	2,00	$ 1.179.778,00	56
68			**ITEMS NO PREVISTOS**	**30 días**	**sáb 21/03/2**	**lun 27/04/26**			**$ 45.236.321,00**	

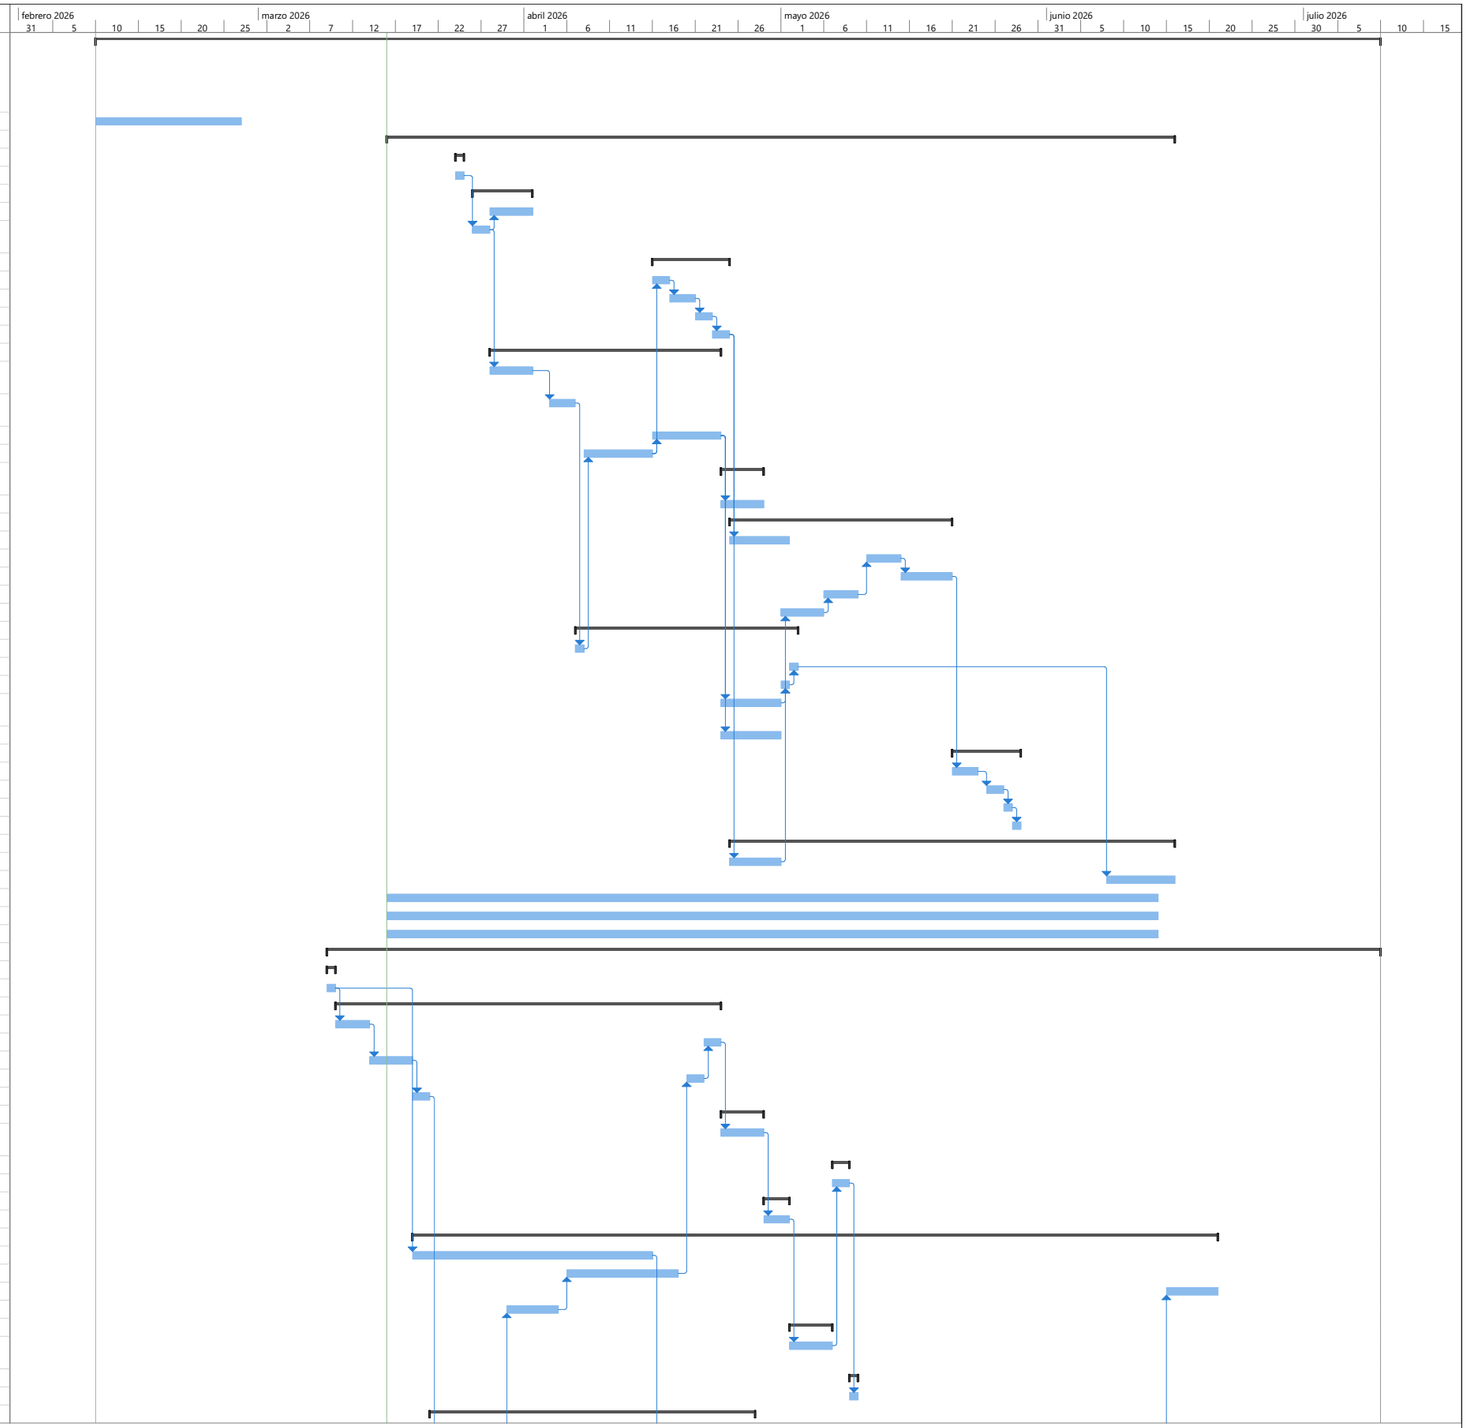

Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: lun 16/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo	Predecesoras
69		NP-01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	7 días	sáb 21/03/26	sáb 28/03/26	UND	15,00	$ 6.379.046,00	52
70		NP-02	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo +	4 días	jue 16/04/26	lun 20/04/26	M2	50,00	$ 785.596,00	60
71		NP-04	RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(SL	6 días	mar 21/04/26	lun 27/04/26	M2	450,00	$ 38.071.679,00	70
72			**VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBRAS (B)**	52 días	lun 11/05/26	jue 9/07/26			**$ 7.112.469,00**	
73			**VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS (**	52 días	lun 11/05/26	jue 9/07/26			**$ 2.776.135,00**	
74			**VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFIC**	52 días	lun 11/05/26	jue 9/07/26			**$ 4.829.620,00**	
75			**Parque Urbanizacion El Tunal II 06-030**	**92 días**	**lun 2/03/26**	**jue 18/06/26**			**$ 429.297.590,00**	
76		**1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**vie 20/03/26**	**vie 20/03/26**			**$ 4.858.320,00**	
77		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	vie 20/03/26	vie 20/03/26	ML	120,00	$ 4.858.320,00	
78		**2**	**DEMOLICIONES**	**3 días**	**sáb 21/03/26**	**mar 24/03/2**			**$ 55.755.456,00**	
79		2,01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret	3 días	sáb 21/03/26	mar 24/03/2	M2	96,00	$ 4.048.416,00	77
80		2,03	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue	3 días	sáb 21/03/26	mar 24/03/2	M2	800,00	$ 50.016.800,00	77
81		2,07	Demolicion Manual Gradas en Concreto +cargue	3 días	sáb 21/03/26	mar 24/03/2	M2	32,00	$ 1.690.240,00	77
82		**4**	**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**20 días**	**mié 25/03/2**	**sáb 18/04/2**			**$ 158.390.401,00**	
83		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-Blan	4 días	mié 25/03/2	sáb 28/03/26	M3	400,00	$ 24.052.800,00	80
84		4,04	Compactación fondo de excavación con equipos	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26	M2	851,60	$ 1.238.226,00	83
85		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	7 días	sáb 11/04/26	sáb 18/04/26	M3	171,60	$ 55.150.867,00	86
86		4,08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	7 días	mié 1/04/26	vie 10/04/26	M3	177,20	$ 77.948.508,00	98
87		**5**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**2 días**	**jue 7/05/26**	**vie 8/05/26**			**$ 17.248.649,00**	
88		5,01	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	2 días	jue 7/05/26	vie 8/05/26	M2	139,00	$ 17.248.649,00	92
89		**6**	**JUNTAS**	**2 días**	**sáb 9/05/26**	**lun 11/05/26**			**$ 2.616.722,00**	
90		6,01	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	2 días	sáb 9/05/26	lun 11/05/26	ML	43,00	$ 2.616.722,00	88
91		**7**	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**7 días**	**mié 29/04/2**	**mié 6/05/26**			**$ 3.890.720,00**	
92		7,02	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	7 días	mié 29/04/2	mié 6/05/26	M2	80,00	$ 3.890.720,00	99
93		**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**62 días**	**mié 25/03/2**	**sáb 6/06/26**			**$ 21.287.574,00**	
94		8,13	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	1 día	mié 25/03/2	mié 25/03/2	UND	2,00	$ 1.294.574,00	80
95		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	6 días	lun 1/06/26	sáb 6/06/26	M2	200,00	$ 7.810.600,00	96FF
96		8,18	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	4 días	mié 3/06/26	sáb 6/06/26	M2	800,00	$ 12.182.400,00	99FC+30 días
97		**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**23 días**	**mar 31/03/2**	**mar 28/04/2**			**$ 129.887.616,00**	
98		9,05	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	1 día	mar 31/03/2	mar 31/03/2	M2	800,00	$ 13.204.800,00	84
99		9,06	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	1 día	mar 28/04/2	mar 28/04/2	M2	800,00	$ 69.754.400,00	100
100		9,07	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	1 día	lun 27/04/26	lun 27/04/26	M2	800,00	$ 2.757.600,00	102
101		9,08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-co	6 días	lun 20/04/26	sáb 25/04/26	ML	206,00	$ 31.166.976,00	85
102		9,12	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 10(	6 días	lun 20/04/26	sáb 25/04/26	ML	80,00	$ 13.003.840,00	85
103		**10**	**MOBILIARIO URBANO**	**3 días**	**lun 8/06/26**	**mié 10/06/2**			**$ 11.295.088,00**	
104		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.du	3 días	lun 8/06/26	mié 10/06/2	UND	16,00	$ 11.295.088,00	96
105			**ITEMS NO PREVISTOS**	**7 días**	**jue 11/06/26**	**jue 18/06/26**			**$ 3.142.384,00**	
106		NP-02	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo +	7 días	jue 11/06/26	jue 18/06/26	M2	200,00	$ 3.142.384,00	104
107			**VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBR**	76 días	lun 2/03/26	sáb 30/05/26			$ 10.111.682,00	
108			**VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS (**	76 días	lun 2/03/26	sáb 30/05/26			$ 3.946.786,00	
109			**VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFIC**	76 días	lun 2/03/26	sáb 30/05/26			$ 6.866.192,00	
110			**Parque Urbanizacion El Tunal II 06-024**	**86 días**	**lun 30/03/26**	**jue 9/07/26**			**$ 351.380.267,00**	
111		**1**	**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 30/03/26**	**lun 30/03/26**			**$ 4.858.320,00**	
112		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	lun 30/03/26	lun 30/03/26	ML	120,00	$ 4.858.320,00	
113		**2**	**DEMOLICIONES**	**4 días**	**mar 31/03/2**	**lun 6/04/26**			**$ 47.813.116,00**	
114		2,01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret	4 días	mar 31/03/2	lun 6/04/26	M2	96,00	$ 4.048.416,00	112
115		2,03	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue	4 días	mar 31/03/2	lun 6/04/26	M2	700,00	$ 43.764.700,00	112
116		**3**	**DESMONTES Y RETIROS**	**1 día**	**mar 7/04/26**	**mar 7/04/26**			**$ 1.864.610,00**	
117		3,05	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	UNI	10,00	$ 1.864.610,00	114
118		**4**	**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**20 días**	**mié 8/04/26**	**jue 30/04/26**			**$ 117.394.760,00**	
119		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	4 días	mié 8/04/26	sáb 11/04/26	M3	350,00	$ 21.046.200,00	117
120		4,04	Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	M2	700,00	$ 1.017.800,00	119
121		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	7 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	M3	105,00	$ 33.746.160,00	122
122		4,08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	7 días	mié 15/04/26	mié 22/04/26	M3	140,00	$ 61.584.600,00	133
123		**5**	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	**2 días**	**sáb 25/04/26**	**lun 27/04/26**			**$ 10.423.644,00**	
124		5,01	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforzado	2 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	M2	84,00	$ 10.423.644,00	126
125		**7**	**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**2 días**	**jue 23/04/26**	**vie 24/04/26**			**$ 4.863.400,00**	
126		7,02	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	2 días	jue 23/04/26	vie 24/04/26	M2	100,00	$ 4.863.400,00	122
127		**8**	**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**60 días**	**lun 13/04/26**	**sáb 20/06/26**			**$ 19.434.234,00**	
128		8,13	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	1 día	lun 13/04/26	lun 13/04/26	UND	2,00	$ 1.294.574,00	119
129		8,15	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS	4 días	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	UND	10,00	$ 1.192.260,00	130FF
130		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	4 días	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	M2	200,00	$ 7.810.600,00	131FF
131		8,18	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	4 días	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	M2	600,00	$ 9.136.800,00	134FC+30 días
132		**9**	**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**25 días**	**mar 14/04/2**	**mar 12/05/2**			**$ 121.953.796,00**	
133		9,05	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	1 día	mar 14/04/2	mar 14/04/2	M2	600,00	$ 9.903.600,00	120
134		9,06	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	1 día	mar 12/05/2	mar 12/05/2	M2	700,00	$ 61.035.100,00	135
135		9,07	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26	M2	700,000	$ 2.412.900,00	137
136		9,08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-co	5 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	ML	260,00	$ 39.336.960,00	121
137		9,12	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 10(	3 días	jue 7/05/26	sáb 9/05/26	ML	57,00	$ 9.265.236,00	136
138		**10**	**MOBILIARIO URBANO**	**1 día**	**sáb 20/06/26**	**sáb 20/06/2**			**$ 5.647.544,00**	
139		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.du	1 día	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	UND	8,00	$ 5.647.544,00	129FF
140			**VALOR COMPONENTE AMBIENTAL TODAS LAS OBR**	70 días	lun 20/04/26	jue 9/07/26			$ 8.276.416,00	

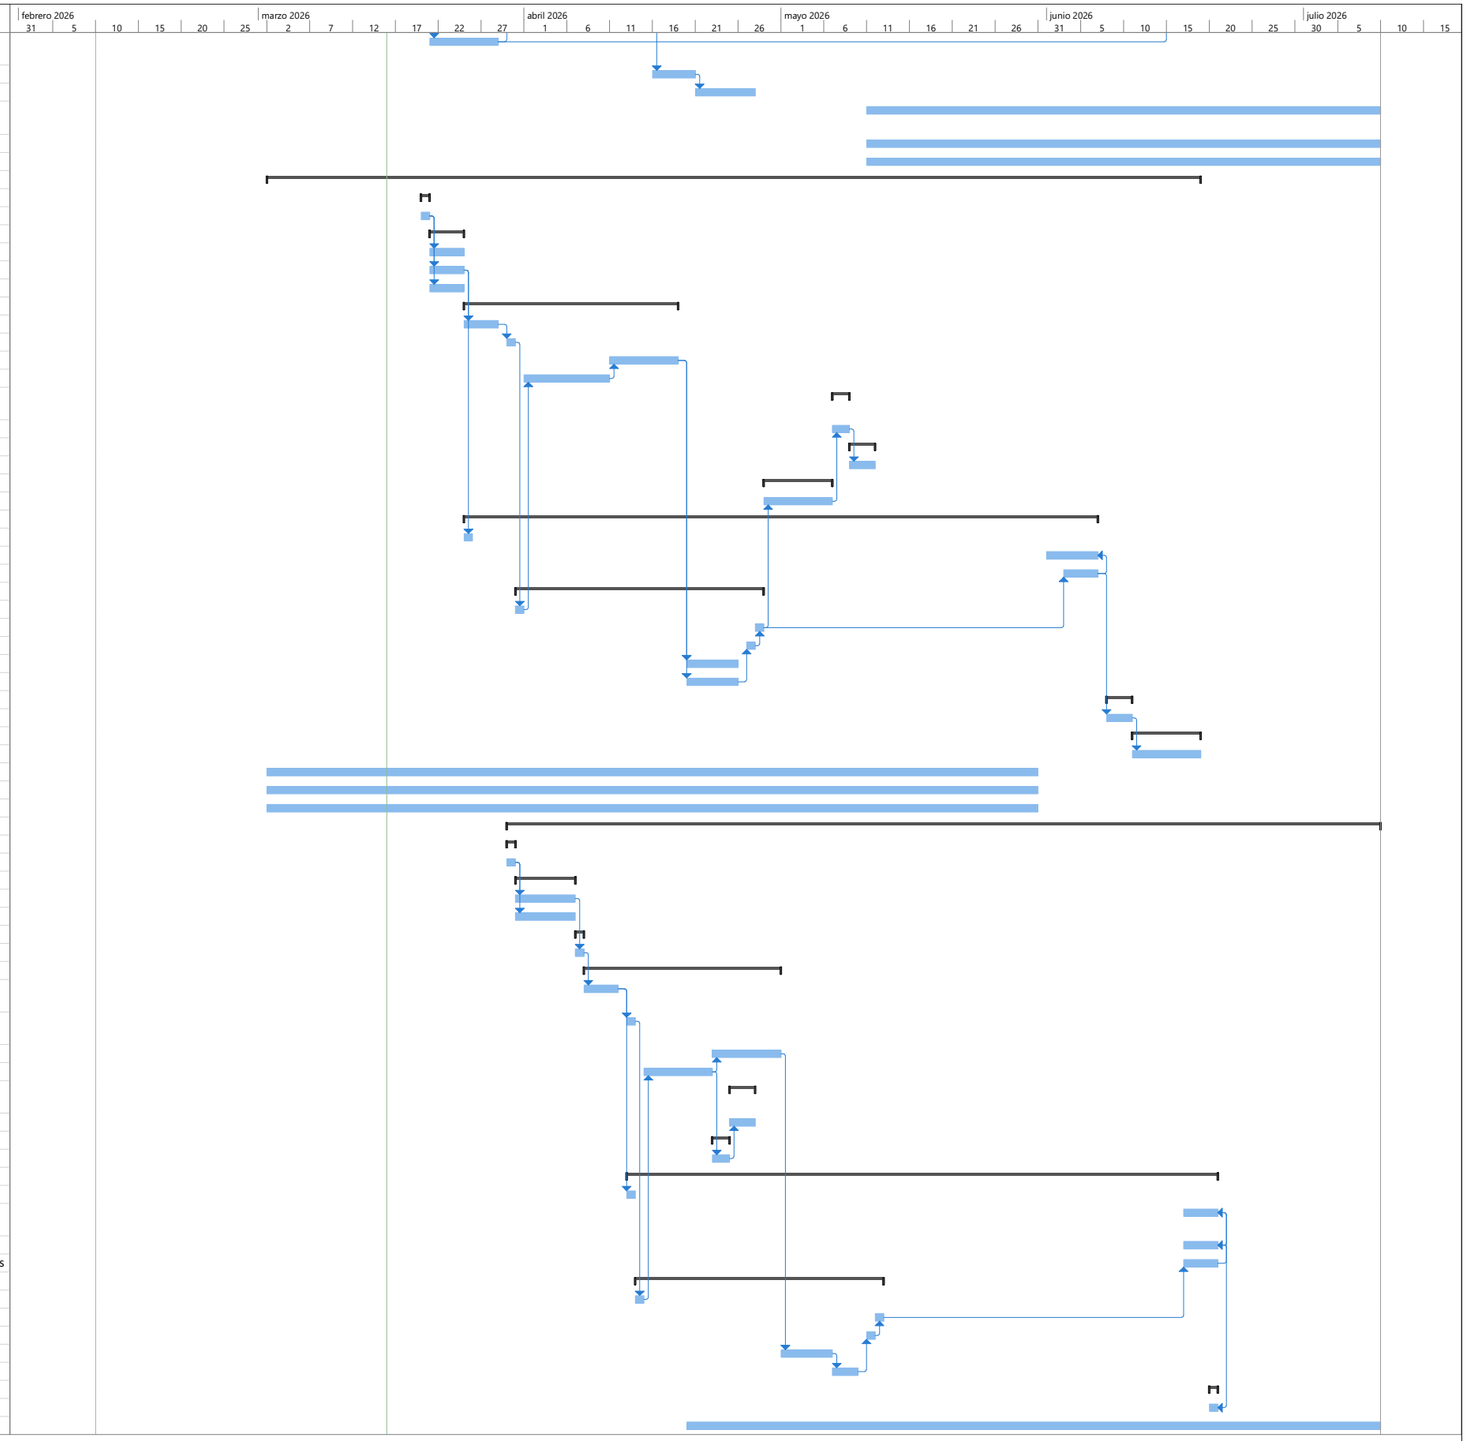

Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: lun 16/03/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo	Predecesoras
141			**VALOR COMPONENTE SOCIAL TODAS LAS OBRAS (**	70 días	lun 20/04/26	jue 9/07/26			$ 3.230.446,00	
142			**VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFIC**	70 días	lun 20/04/26	jue 9/07/26			$ 5.619.981,00	



Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: lun 16/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

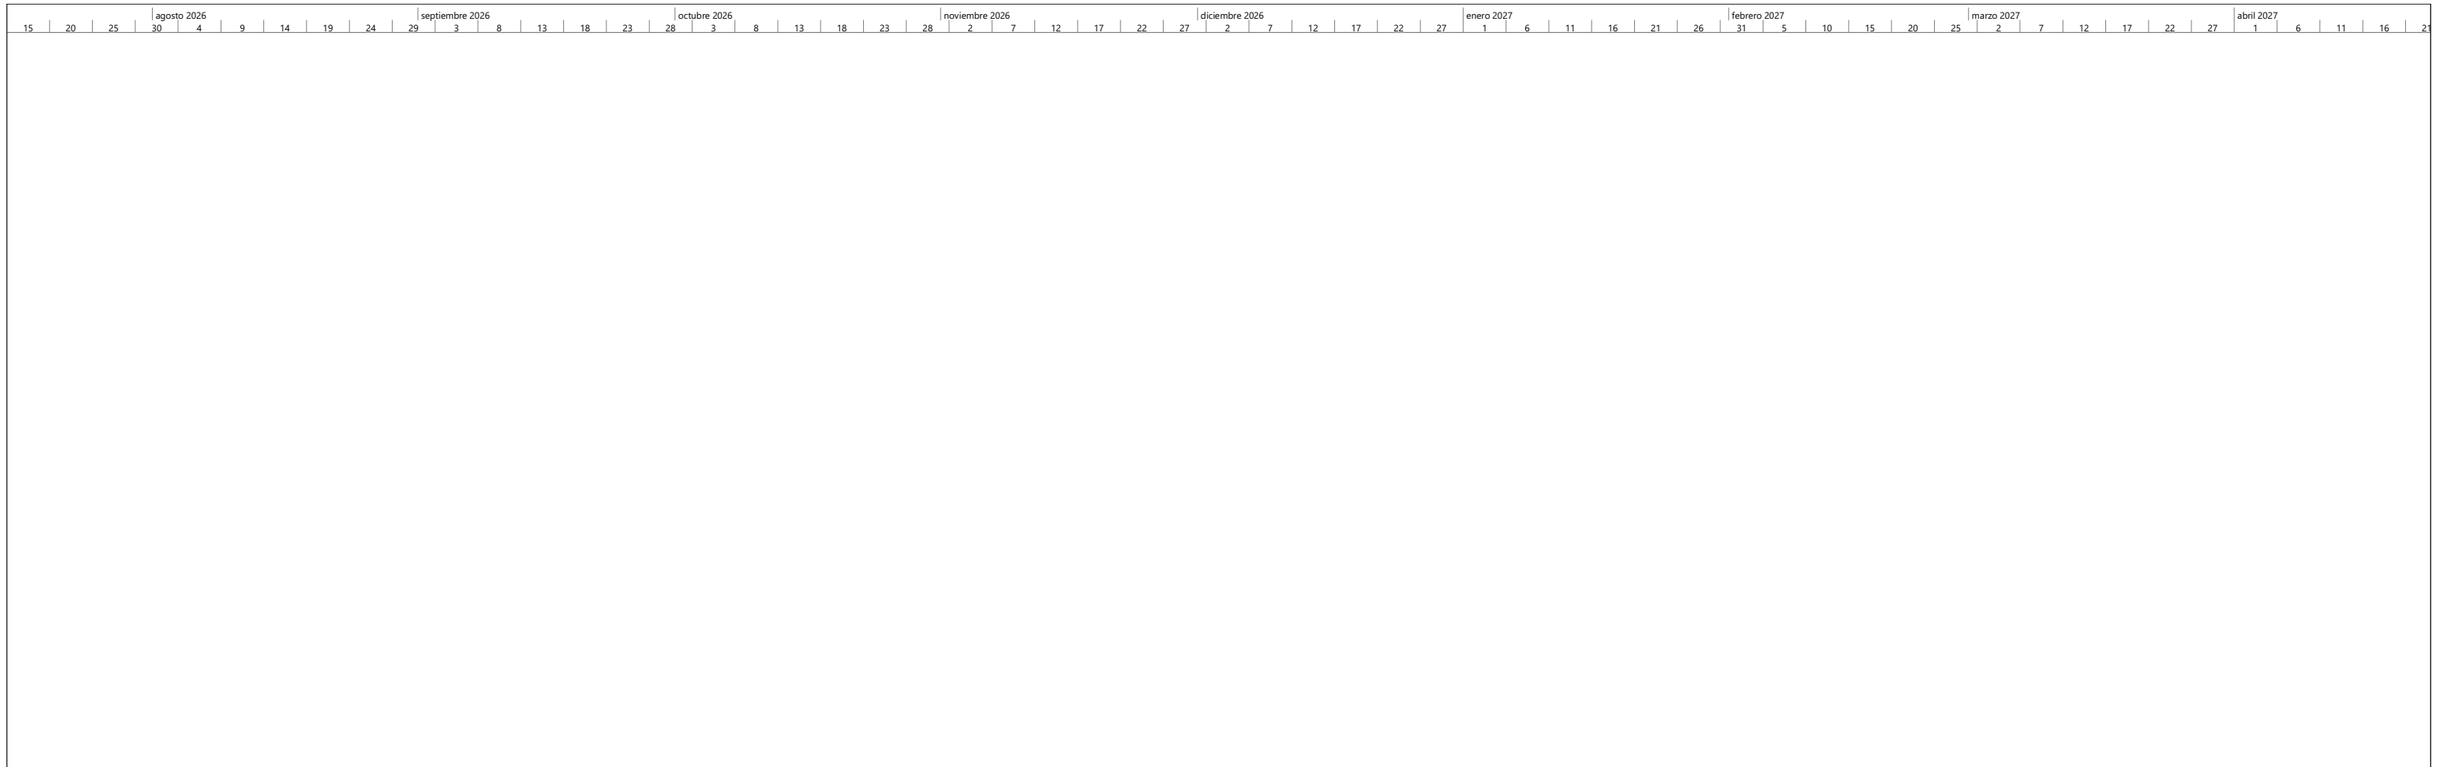

Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: lun 16/03/26


Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual

División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso



Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: lun 16/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

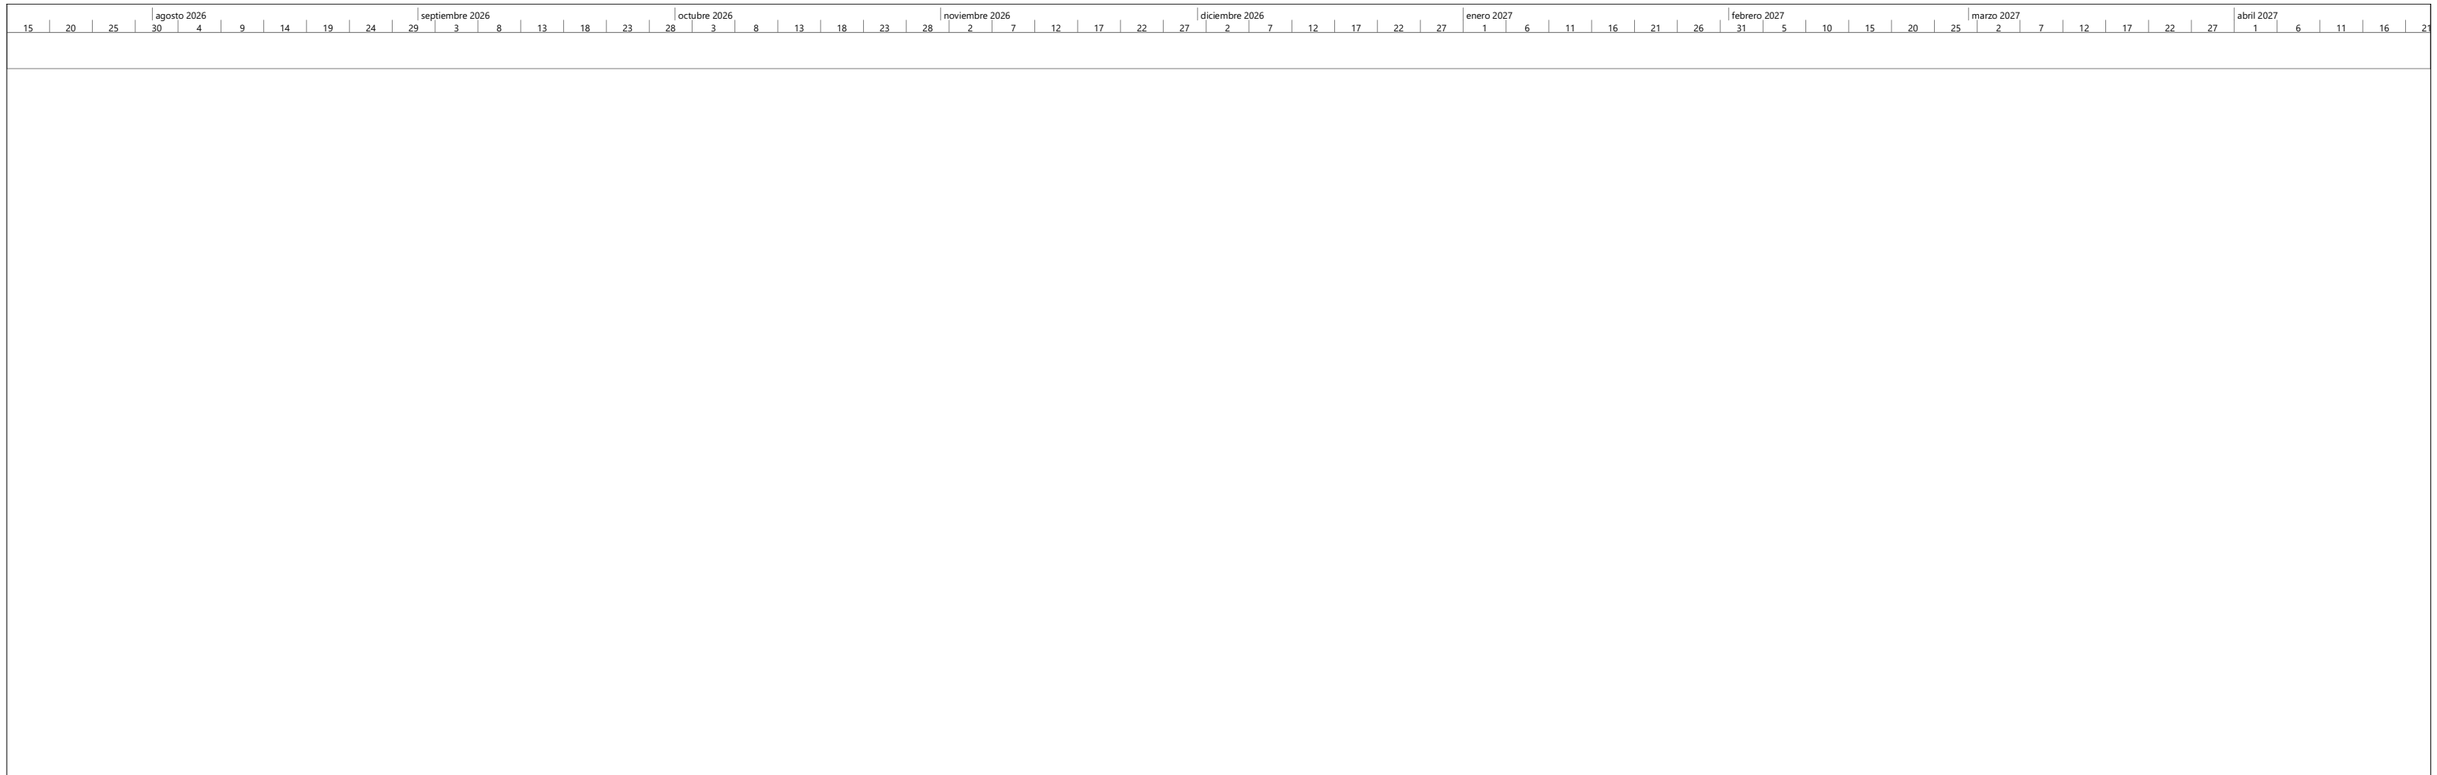

CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO
NIT: 902018023-0
VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ

ING. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
APROBO

Proyecto: Programacion v.2.0 T
Fecha: lun 16/03/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
