REVISIÓN Y ESTADO DE INFORMES

	No. DE REVISIONES	**0**	**1**	**2**	**3**
REVISIÓN	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN: Ing. Diego Fernando López	**24/12/25**			
	RESPONSABLE REVISIÓN: Ing. Diego Fernando López	**24/12/25**			
	RESPONSABLE APROBACIÓN: Ing. Diego Fernando López	**24/12/25**			

CONTROL DE MODIFICACIONES

ÍNDICE REVISIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES	APROBADO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME

DESTINATARIO DEL INFORME	No. DE COPIAS
Alcaldía Municipal de Pesca	1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESCA NIT: 891.856.464-0	**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**	Código:
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Versión:
	INFORME SUPERVISION DE OBRA	Fecha:

Objeto:	**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y ESPACIOS DESTINADOS A LA RECREACIÓN Y PRACTICAS DEPORTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDALECIO VASQUEZ SEDE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE PESCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**
Nombre Contratista:	**LEYDY CAROLINA AGUIRRE AGUIRRE**
Fecha de inicio del contrato	**ABRIL 9 DE 2025**
Duración	**SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**
Fecha finalización	**JUNIO 19 DE 2025**
Porcentaje Total Ejecutado	**100%**

Tabla de contenido

A. GENERALIDADES 4

1. INTRODUCCIÓN 5

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 6

B. INFORME GENERAL 7

1. DESCRIPCIÓN Y AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA 8

A. GENERALIDADES

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del presupuesto de la Alcaldía Municipal, se cuenta con recursos públicos destinados para este fin, lo cual se ha dejado constar en el respectivo Certificado de Disponibilidad presupuestal No.202500040 del 17 de ENERO de 2025 afectando el Rubro Presupuestal 2320202005-02-124303-01-2201052 DENOMINADO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL -PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION – DEP: ALCALDIA – SEC: EDUCACIÓN – PROG: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BASICA Y MEDICA – SUBP: INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN – PROD: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA, por el valor de $ 9.858.000,00; Rubro Presupuestal 2320202005-06-123118-01-4301001 DENOMINADO MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS – FTE: TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN – DEP: ALCALDÍA – SEC: DEPORTE Y RECREACIÓN – PROG: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNO DE CONVIVENCIA Y PAZ – SUBP: RECREACIÓN Y DEPORTE – PROD: SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE, por el valor de $ 30.000.000,00

Es por todo lo anterior que el Municipio requiere suscribir un contrato con una persona natural o jurídica con la capacidad jurídica técnica y financiera para cumplir con el objeto de realizar el objeto “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y ESPACIOS DESTINADOS A LA RECREACIÓN Y PRACTICAS DEPORTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDALECIO VASQUEZ SEDE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE PESCA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

Es por todo lo anterior que el Municipio de Pesca requiere adelantar el proceso contractual con el fin de suscribir un contrato de obra pública, el cual tiene como sustento legal lo consagrado en la ley 80 de 1993, LEY 1150 DE 2007, ley 1474 de 2011, Decreto reglamentario No. 1082 de 2015 y Manuales aplicables al proceso de contratación que para el efecto han expedido Colombia Compra Eficiente demás Decretos reglamentarios y las normas de derecho civil y comercial en ausencia de las normas de derecho público de contratación estatal, y con sujeción a los principios del Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y Artículo 3º de la ley 1437 de 2011 y demás normas que modifican, reglamentan y complementan.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

B. INFORME GENERAL

1. DESCRIPCIÓN Y AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA

El alcance del objeto se encuentra enmarcado por las actividades y desarrollo de los componentes específicos, así como los productos mínimos que recibirá y exigirá la secretaria de planeación de municipio de Pesca , de conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de los estudios previos.

1.2 Objetivo General.

Las actividades generales y específicas a contratar corresponden a:

- CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84
- ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOSC
- BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
- CANCHA MINI FUTBOL INCL. MALLA. TUBO 3" Y 2"
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE 2
- RESBALADEROS, 1 PASAMANOS, PUENTE DE CONEXIÓN ENTRE KIOSKOS, ELABORADO EN ESTRUCTURA METALICA Y ACCESORIOS EN FV

1.1. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

Aseguradora	No. Póliza	Anexo	AMPARO			
			Descripción	Desde	Hasta	Valor
SEGUROS DEL ESTADO S.A	62-40-101012124	2	Cumplimiento del contrato	09/04/2025	19/12/2025	$5.937.876
			Responsabilidad civil cruzada	09/04/2025	19/06/2025	$142.350.000
			Responsabilidad civil patronal	09/04/2025	19/06/2025	$142.350.000
			Estabilidad de Obra	23/12/2021	23/12/2026	$5.937.876

Observaciones: anteriormente Se relacionan las pólizas, finales de contrato

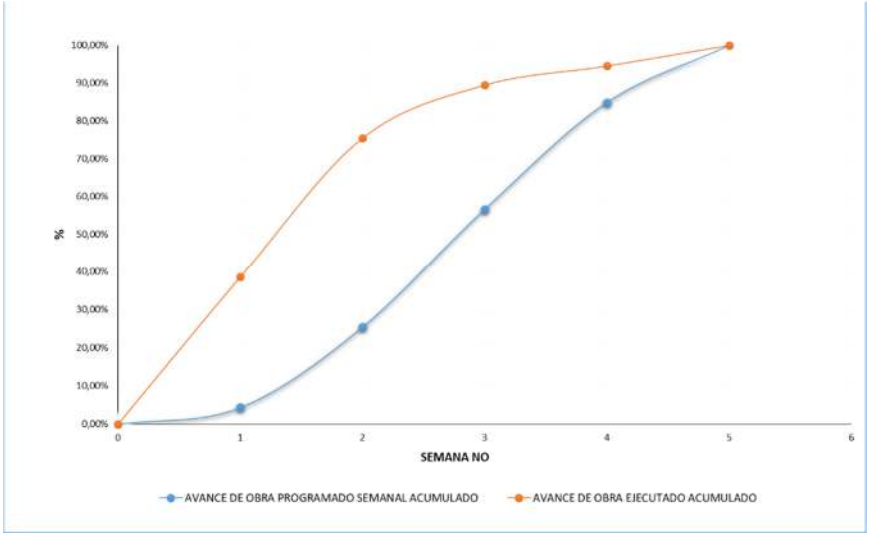
ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

Para el desarrollo del contrato de obra e interventoría se realizan las siguientes actividades:

- Se adelanta por parte de la ALCALDIA MUNICIPAL DE PESCA ., los procesos de contratación para obra "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y ESPACIOS DESTINADOS A LA RECREACIÓN Y PRACTICAS DEPORTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDALECIO VASQUEZ.", quedando adjudicados para obra a LEYDY CAROLINA AGUIRRE AGUIRRE.

INFORME DE AVANCE

El avance del contrato se encuentra en 100% de ejecución de las obras, frente a un avance programado del 100%.



EJECUCION DE OBRA

Durante el desarrollo del contrato de obra No: MP-MC-008-2025se tienen las siguientes cantidades de obra ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta la fecha del presente informe:

ESTADO FINANCIERO

A la fecha se ha ejecutado financieramente el contrato de obra MP-MC-008-2025 de la siguiente manera:

Tabla 8.1 INFORME FINANCIERO OBRA

VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO
$ 39.736.769	$ 19.642.000	$ 59.378.769,00	$ 59.378.769,00
		100%	100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEMOLICION PLACA MACIZA CONCRETO






Galaxy S23


CAT
Galaxy S23


CAT
Galaxy S23

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)






Galaxy S23


Galaxy S23




Galaxy S23


Galaxy S23

BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

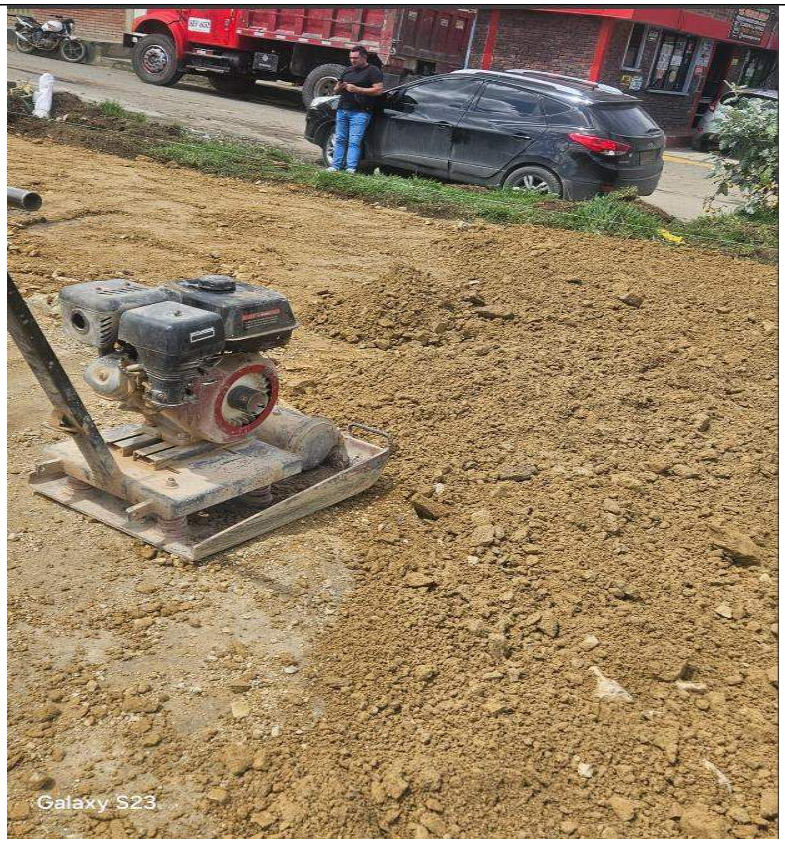





Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84






Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23

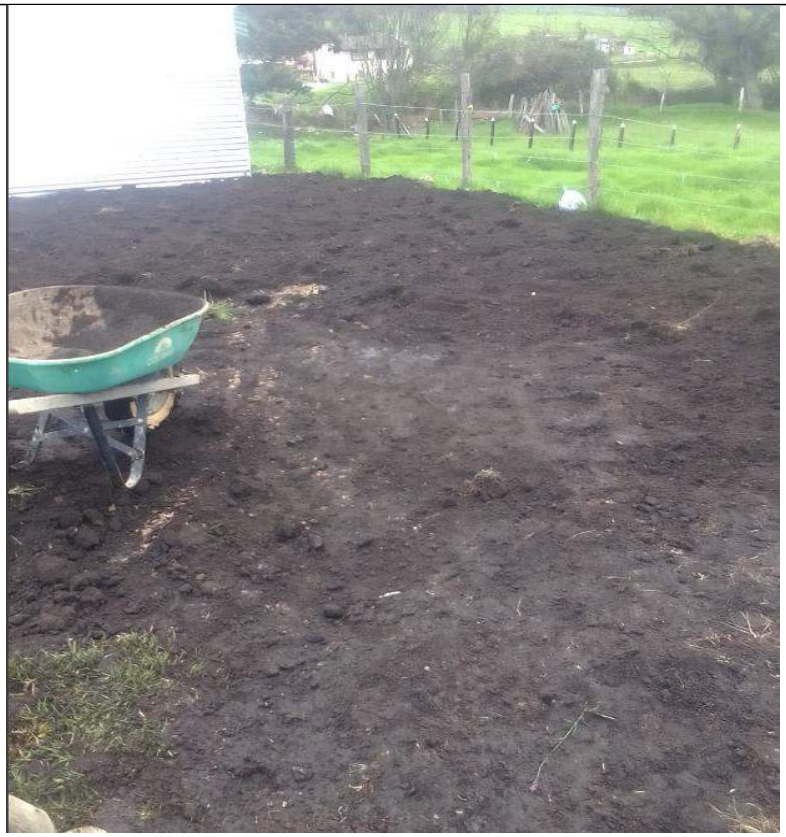

Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION






Galaxy S23


Galaxy S23

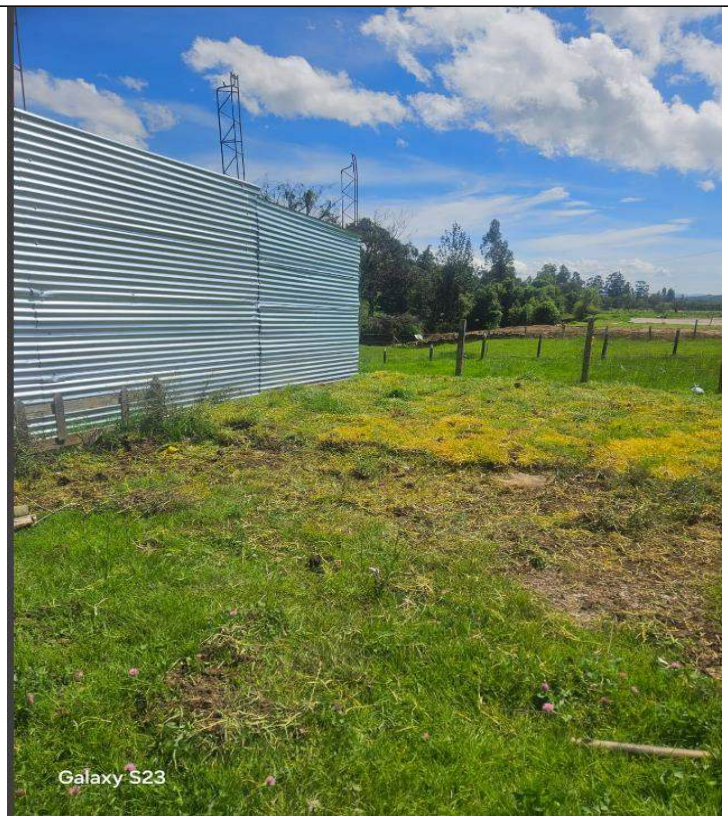
MANTENIMIENTO DE
PRADOS






Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23

CONCRETO CICLOPEO 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P






Galaxy S23


Galaxy S23


terpel
Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA PARA SOLO MINIBALONCESTO DE 2,2 EN TUBO 3" Y 2". INCL. TABLERO ACRILICO

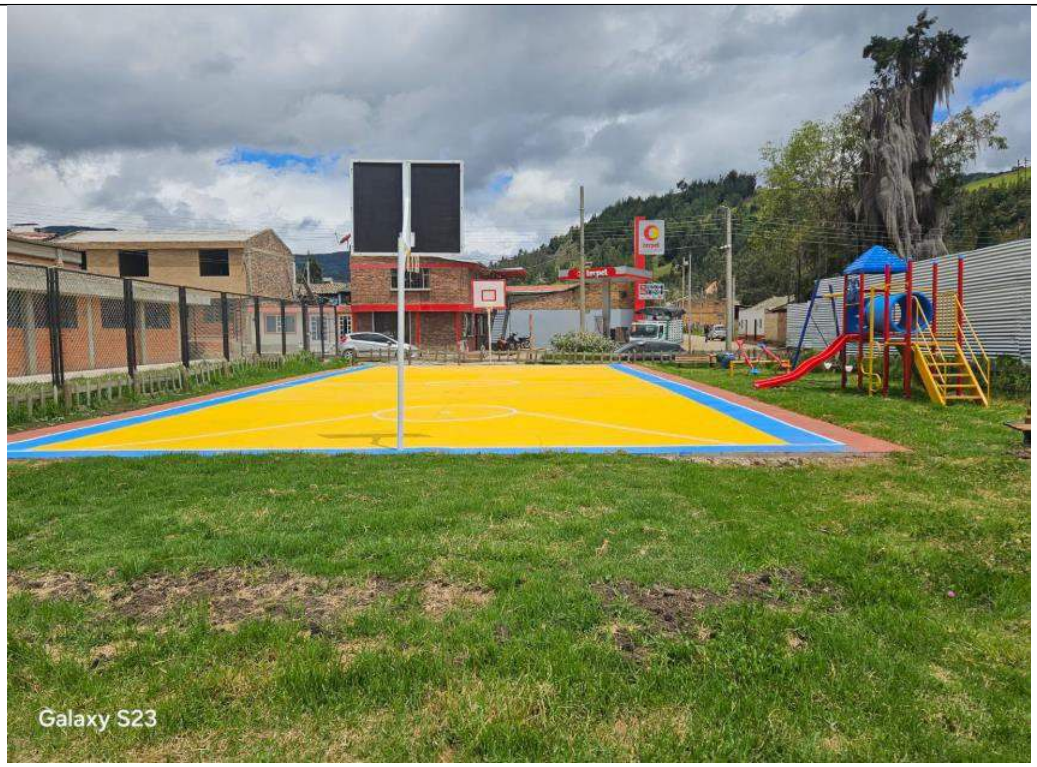





Galaxy S23




Galaxy S23


Galaxy S23

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL (INCLUYE 2 RESBALADEROS, 1

PASAMANOS, PUENTE DE CONEXIÓN ENTRE KIOSKOS, ELABORADO EN ESTRUCTURA METALICA Y ACCESORIOS EN FVP






Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23

ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS








Galaxy S23

MANTENIMIENTO DE PRADOS






Galaxy S23






Galaxy S23


Galaxy S23


Galaxy S23
