LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO				
Supervisor	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				
Número de contrato/vigencia	No. CO1.PCCNTR.8169110 - INTERVENTORIA - LOTE 6				
Informe N°	7	Periodo del informe	6/04/2026	Hasta el	5/05/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría			CUMPLE	133 - 140
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	140 - 148
Informes semanales	SI		CUMPLE	204 - 317
Personal Aprobado	SI		CUMPLE	111- 112
Verificación de licencias y permisos vigentes	N.A.		N.A.	
Pólizas actualizadas con modificaciones	SI		CUMPLE	105 - 106
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	SI		CUMPLE	105 - 106
Directiva distrital N° 1 de 2011	N.A.		N.A.	
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	N.A.		N.A.	
Verificacion de la matriz de riesgos	SI		CUMPLE	113 - 116
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	SI		CUMPLE	30 - 33
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	SI		CUMPLE	318 - 370
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)	SI		CUMPLE	419 - 424
Bitácora	SI		CUMPLE	152 - 203
Reseña fotográfica del periodo por semana	SI		CUMPLE	410 - 418
Actividades no previstas del proyecto	N.A.		N.A.	
Ponderación de elementos de calidad	SI		CUMPLE	113 - 116
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	N.A.		N.A.	
Programación y control de obra	SI		CUMPLE	34 - 35
Aspectos Técnicos				
Control del plan de calidad y ensayos de material	SI		CUMPLE	113 - 116
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	SI		CUMPLE	395 - 399
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato	SI		CUMPLE	113
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	124
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	SI		CUMPLE	116 - 123
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	123 - 133
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	133
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del profesional y de	SI		CUMPLE	111- 112
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	371 - 394
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	402 - 409
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	123 - 133
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	147 - 148
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	N.A.		N.A.	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	N.A.		N.A.	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		CUMPLE	
Garantías	SI		CUMPLE	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	SI		CUMPLE	
Actas parciales	SI		CUMPLE	
Modificaciones	SI		CUMPLE	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110	**Aprobó**	**Revisó.**
JOHN CASTAÑEDA		
Elaboró: Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Apoyo a la Supervisión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR.8169110

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2"

INTERVENTOR:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO PAIS
LOTE: 6

INFORME MENSUAL No. 07
PERIODO REPORTADO 06/04/2026- 05/05/2026

BOGOTA D.C.

ÍNDICE DE REVISIONES INFORME DE INTERVENTORÍA No. 07			
NÚMERO DE REVISIÓN	**CAPÍTULO MODIFICADO**	**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
0	Documento Original	7/05/2026	

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Título Documento		**INFORME MENSUAL 07 DE INTERVENTORÍA**
REVISIÓN		
Responsable Elaboración Componente Técnico	Nombre	Ing. John Freddy Castañeda
	Firma	JOHN CASTAÑEDA
	Fecha	
Responsable de la Elaboración del Componente SST	Nombre	Ana Bermúdez Hernández
	Firma	Ana Mª Bermúdez A
	Fecha	
Responsable de la Elaboración del Componente Ambiental	Nombre	Luis González Camargo
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Revisión del Componente Estructural	Nombre	Juan C Cortés Cortés
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Revisión del Componente de Costos, Presupuestos y Programación	Nombre	Edwin Sierra Hernández
	Firma	
	Fecha	

Título Documento		**INFORME MENSUAL 07 DE INTERVENTORÍA**
Responsable de la Revisión del Componente Hidráulico	Nombre	Luis González Camargo
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Revisión del Informe	Nombre	Arq. Héctor Villazón
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Aprobación del Informe	Nombre	Arq. Santiago Ángel
	Firma	
	Fecha	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

2.1 LOCALIZACIÓN 11

2.2 ESTADO INICIAL 13

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 14

2.3.1 Colegio Arborizadora Baja 14
..... 14
2.3.2 Colegio Buenavista I.E.D Calasanz 15
2.3.3 Colegio Estrella del Sur Sede A 16
2.3.4 Colegio Estrella Del Sur Sede B 17
2.3.5 Colegio Sierra Morena Sede C 18
2.3.6 Colegio Unión Europea Sede B 19
2.3.7 Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede A 20
2.3.8 Colegio Orlando Fals Borda 21
2.3.9 Colegio Santa Librada 22
2.3.10 Colegio Guillermo Cano Izasa Sede A 23
2.3.11 Colegio Tenerife Granda Sur Sede A 24

2.4 EMERGENCIAS 24

3. CONTRATO DE OBRA 25

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 25

3.1.1 GARANTÍAS 26

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 30

3.3 INFORME DE AVANCE 34

3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN 35
3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS 36
3.3.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO 36
3.3.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA 74

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA 74

3.4.1 EQUIPO 74
3.4.2 PERSONAL 74

3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA 76

3.5.1 PRESUPUESTO GENERAL 76
3.5.2 PRESUPUESTO POR SEDES 76
3.5.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS 76
3.5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 77

3.5.5 ESTADO FINANCIERO 83
3.6 ESTADO DEL TIEMPO 84
3.7 RESULTADOS DE LABORATORIO 84
3.8 OBLIGACIONES GENERALES 85
3.9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 93
4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 104
4.1. INFORMACIÓN GENERAL 104
4.1.1. GARANTÍAS 105
4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 106
4.2.1 ADMINISTRATIVAS 106
4.2.2 TÉCNICAS 108
4.2.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 108
4.2.4 LEGAL 109
4.3 RECURSOS DEL INTERVENTOR 110
4.3.1 PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA 110
4.3.2 EQUIPO 112
4.4 INFORMACION FINANCIERA 112
4.4.1 PRESUPUESTO 112
4.4.2 ESTADO FINANCIERO 113
A. PAGOS EFECTUADOS 113
5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 113
6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. 116
7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 123
8. OBLIGACIONES GENERALES 133
9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 140
10. REGISTRO FOTOGRAFICO 148
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 149

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Educativas 13
Tabla 2. Información general contrato de obra 26
Tabla 3. Pólizas contrato de obra - Contratista 30
Tabla 4- Avance Financiero 34
Tabla 5. Porcentajes Acumulados 34
Tabla 6 - Certificado disponibilidad presupuestal 77
Tabla 7 - Listado APU´S 83
Tabla 8 - Pagos Realizados 84
Tabla 9 - Obligaciones Generales Contratista 93
Tabla 10 - Obligaciones Especificas Contratista 104
Tabla 11 - Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110 105
Tabla 12 - Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 106
Tabla 13 - Personal de Interventoría 112
Tabla 14 - Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría 112
Tabla 15. Pagos realizados a la interventoría 113
Tabla 16 - Obligaciones Generales - Interventoría 140
Tabla 17 - Obligaciones Especificas - Interventoría 148
Tabla 18 - Registro fotográfico Colegio Orlando Fals 160
Tabla 19 - Registro fotográfico Colegio sierra morena 161
Tabla 20 - Registro fotográfico Colegio Arborizadora Baja 162
Tabla 21 - Registro fotográfico Colegio Fabio Lozano Simonelli 163
Tabla 22 - Registro fotográfico Colegio Calasanz 164
Tabla 23 - Registro fotográfico Colegio Santa Librada 165
Tabla 24 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza 166
Tabla 25 - Registro fotográfico Colegio Tenerife Granada Sur Sede A 167

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme 11
Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades 12
Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arborizadora Baja 14
Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio Buenavista I.E.D Calasanz 15
Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede A 16
Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede B 17
Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Sierra Morena Sede C 18
Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Unión Europea Sede B 19

Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Fabio Lozano Simonelli sede A 20
Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Orlando Fals Borda 21
Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Santa Librada 22
Ilustración 12 Esquema de Distribución Colegio Guillermo Cano Izasa 23
Ilustración 13 Esquema de Distribución Colegio Tenerife Granda Sur Sede A 24
Ilustración 14 Flujo de Caja Semanal 35
Ilustración 15 Curva s – Programado vs ejecutado 35
Ilustración 16 - Actividades Orlando Fals 38
***Ilustración 17**- Actividades Sierra Morena* 42
***Ilustración 18** - Actividades Unión Europea Sede B* 46
Ilustración 19 - Actividades Arborizadora Baja 53
Ilustración 20 - Actividades Fabio Lozano Simonelli 58
Ilustración 21 - Actividades Estrellas del Sur Sede B 60
Ilustración 22 - Actividades Calasanz (Buenavista) 63
Ilustración 23 - Actividades Santa Librada 66
***Ilustración 24** Actividades Estrella del Sur Sede A* 69
***Ilustración 25** Actividades Guillermo Cano Isaza* 72
Ilustración 26 Actividades Tenerife – Granda Sur 73

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Bitácora de obra 36
Anexo 2. Informe Semanal 36
Anexo 3. Actas de comité 107
Anexo 4. Planillas de pago 112
Anexo 5. Certificado pago Parafiscales 112
Anexo 7. Acta De Interventoría 113
Anexo 8. Registro Capacitaciones 132
Anexo 8. Registro fotográfico 148
Anexo 9. Relación de Correspondencia 151

1. INTRODUCCIÓN

La **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, es un organismo del Sector Central del Distrito Capital con autonomía administrativa y financiera encargada del Sector Educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el decreto 310 de 2022.

Es por esto que la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** a través de la **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (DCCEE)**, es la encargada de liderar, planificar y ejecutar proyectos de construcción, adecuación, ampliación, reparación y mantenimiento de los bienes inmuebles educativos y administrativos del Distrito. En desarrollo de estas funciones y con base en los diagnósticos realizados por los gestores territoriales y especialistas de la DCCEE, se ha determinado la conveniencia de adelantar un programa de **ADECUACIONES, MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS** que permitan garantizar la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las sedes, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

El presente proyecto corresponde al proceso contractual **SED-LP-OP-DCCEE-012-2025**, mediante el cual se seleccionará a los contratistas encargados de ejecutar las obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la **ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OBRAS MENORES PRIORITARIAS**, necesarias para asegurar la prestación continua y eficiente del servicio educativo en Bogotá D.C.

De acuerdo con lo anterior, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, mediante la **LICITACIÓN PUBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025,** cuyo objeto es: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS**" - **LOTE NO. 6** se adjudicó al **CONSORCIO PAIS,** representado legalmente por **Juan Carlos Velásquez Forero** identificado con No. CC 80.217.561 de Bogotá, consorcio integrado por (CONSTRUCUTRA PAIS identificada con NIT. 901.063.647-3 con una participación del 30%, CONSTRUCOL S.A.S identificada con

NIT.1.053.341.203 con una participación del 30%, CONSTRUCCIONES VYP S.A.S identificada con NIT. 901.368.837-6, con una participación del 10%, FAPAIS S.A.S identificada con NIT. 901.762.077-4) por un valor total de la propuesta económica de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($2.232.049.023,00) y un valor de emergencias de CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS ($100.000.000,00), valor que no sobrepasa el presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución de siete (7) meses para la intervención de Nueve (9) instituciones educativas y que para su efectiva supervisión integral se debe de contar con una interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera. Posteriormente, al contrato se le realizó una adición por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($785.001.422,00) y una adición en plazo de un (1) mes y quince (15) días, para un valor total del contrato de TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.117.050.445,00).

Del mismo modo, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** luego de adjudicado el contrato de interventoría **CO1.PCCNTR.8169110** al CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, adelanto el proceso de contratación a través de convocatoria concurso de méritos abierto No. **SED-CM-A-DCCEE-018-2025** y que mediante **RESOLUCIÓN 0073 DE 05 DE AGOSTO DE 2025** por medio de la cual se adjudica el proceso cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – LOTE No. 2** al proponente **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO,** representado legalmente por el señor ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con CC. 79.602.923 de Bogotá D.C., (Consorcio integrado por **SEIING SAS BIC** identificado con Nit. 900.208.425-6, con participación del 50% y **ARQUITECTURA E INGENEIRIA DE CONSULTA ARINCO SAS** identificada con Nit. 901.094.289-2, con un porcentaje de participación del 50%) por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VVEINTIOCHO PESOS M/CTE **($796.278.928,00),** incluido IVA y demás tributos que se causen o se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato por un plazo de SIETE (7) meses.

Mediante el comunicado No. SERINCO-SED-INT-2025-121 del 4 de diciembre de 2025, el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO tramitó y formalizó la Modificación No. 01 del Contrato de Interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110 de 2025**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de uno punto cinco (1.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 20 de junio de 2026, así como adicionar la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00)** IVA incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($924.704.648,00).**

Con este informe, ***CONSORCIO PAIS*** *y* ***CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** presentan el resumen de las actividades realizadas en función de los contratos de obra e interventoría, para el periodo comprendido entre el 06 de abril y el 05 de mayo del año 2026.

La interventoría ***CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** será la encargada de realizar la supervisión a cada una de las actividades de obra, verificando el cumplimento de la normas y especificaciones técnicas, de igual forma el cumplimento de lo estipulado en los pliegos y demás documentos técnicos entregados por la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como propósito adelantar obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO** de las plantas físicas adscritas a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la ejecución de **OBRAS MENORES Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS** que surjan en las instituciones educativas distritales y en las sedes administrativas. Estas intervenciones buscan garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la operatividad y la continuidad en la prestación del servicio educativo, asegurando que la infraestructura física cumpla con las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad requeridas para el desarrollo integral de las actividades pedagógicas y administrativas.

De manera general, el proyecto comprende la ejecución de **ACCIONES CONSTRUCTIVAS, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS** orientadas a conservar, rehabilitar y optimizar los espacios educativos, promoviendo entornos seguros, dignos y funcionales que contribuyan a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad escolar.

Asimismo, el alcance del proyecto se extiende a la **ATENCIÓN OPORTUNA DE SITUACIONES IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR** que puedan afectar la infraestructura institucional, permitiendo una respuesta inmediata y eficiente ante eventos que comprometan la prestación del servicio educativo o la integridad de las instalaciones.

2.1 LOCALIZACIÓN

Las obras objeto del presente proyecto se desarrollarán en la ciudad de **BOGOTÁ D.C**., el proyecto abarca dos (2) de las veinte (20) localidades que conforman el territorio distrital, las cuales se encuentran ubicadas en el sector sur de la ciudad: **CIUDAD BOLÍVAR** y **USME**. Estas localidades presentan una alta densidad poblacional, un número significativo de planteles educativos de gran cobertura y condiciones de infraestructura que requieren acciones inmediatas de mejoramiento y mantenimiento para garantizar la prestación eficiente del servicio educativo.

- En la localidad de **CIUDAD BOLÍVAR**, se intervendrán **siete (7)** instituciones educativas, localizadas en distintos barrios de la zona sur,

- En la localidad de **USME**, se contempla la intervención de **Cuatro (4)** instituciones educativas, solo en el área urbana.

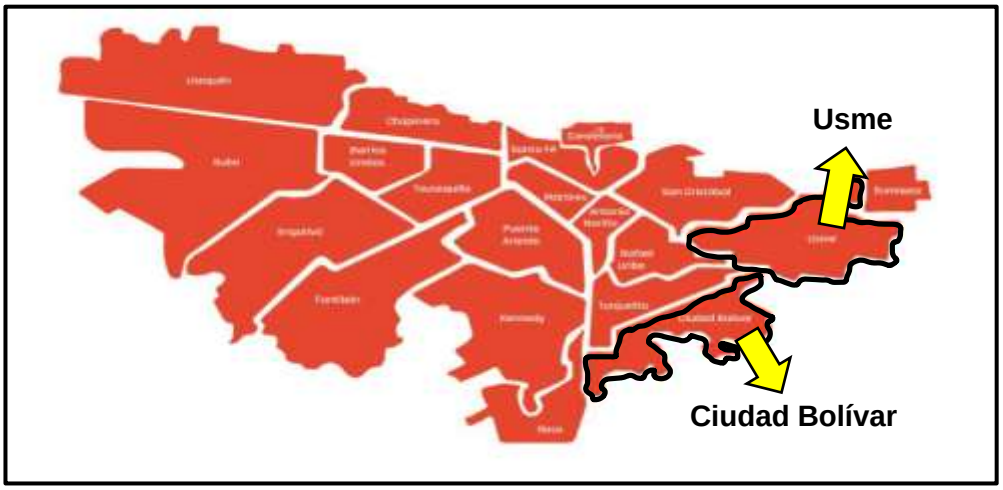


Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme
Fuente: Elaboración propia con base en argis

Adicionalmente, se presenta en la ilustración 2 la localización de cada una de las instituciones educativas a intervenir a través de una imagen satelital extraída de Google Earth.

Se deja claridad que de acuerdo con la adición firmada el día 12 de diciembre de 2025 se añaden dos nuevos colegios uno en la localidad de Ciudad Bolívar y un colegio en la Localidad de Usme.



Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Por otra parte, en la **Tabla No. 1** se consolida la información de las instituciones educativas distritales que serán intervenidas en el marco del presente proyecto, precisando para cada sede su nombre, ubicación, localidad y el tiempo programado para el desarrollo de las actividades contractuales.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN
Colegio Arborizadora Baja	A	Calle 59 a Bis Sur # 45 -16	Ciudad Bolívar	14 Semanas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN
Colegio Buena Vista I.E.D Calasanz	A	Cra. 17f # 77A - 13 Sur	Ciudad Bolívar	15 Semanas
Colegio Estrella del Sur Seda A	A	Cra.7 P No. 72-25 Sur	Ciudad Bolívar	5 Semanas
Colegio Estrella del Sur Seda b	B	Calle 75 sur # 18 B - 45	Ciudad Bolívar	15 Semanas
Colegio Sierra Morena Sede C	C	Carrera 46A No. 79D- 15 Sur	Ciudad Bolívar	23 Semanas
Colegio Unión europea Sede B	B	Calle 69B sur # 17 N 92	Ciudad Bolívar	14 Semanas
Colegio Fabio Lozano Simónelli Sede A	A	Calle 65 Sur # 5-65	Usme	19 Semanas
Colegio Orlando Fals Borda	A	Cra 12 # 72-60 Sur	Usme	15 Semanas
Colegio Santa Librada	A	Calle 75A Sur # 9A-45	Usme	18 Semanas
Colegio Guillermo Cano Izasa	A	Cra. 16ª # 62-35 Sur	Ciudad Bolivar	23 Semanas
Tenerife Granada Sur	A	Cra. 14b Bis # 91 sur 14	Usme	12 Semanas

Tabla 1. Sedes Educativas
Fuente: Propia

2.2 ESTADO INICIAL

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), solicitó realizar visitas de diagnóstico técnico con el acompañamiento de la interventoría y del contratista, con el propósito de exponer y precisar los alcances de intervención de cada uno de los colegios incluidos en el contrato.

Estas visitas permitieron verificar las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones y, al mismo tiempo, clarificar para el contratista los lineamientos, actividades y componentes específicos a intervenir en cada institución educativa. De esta manera, se busca garantizar que el diagnóstico realizado sea coherente con las necesidades reales de cada sede y con los criterios técnicos establecidos por la SED.

Durante las jornadas de campo, se efectuaron recorridos técnicos, levantamientos fotográficos y la identificación de daños o deterioros en los diferentes sistemas constructivos, lo que permitió consolidar información precisa sobre el estado inicial de las edificaciones.

Los resultados de estas visitas constituyen la base técnica para la planeación, programación y ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, asegurando una intervención pertinente, oportuna y ajustada a las condiciones específicas de cada institución educativa.

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto se enmarca en las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), con el objetivo de garantizar la funcionalidad, seguridad y mantenimiento integral de la infraestructura educativa distrital.

Teniendo en cuenta los informes preliminares presentados por el contratista, en los cuales se recopila la información técnica obtenida durante las visitas de diagnóstico, se establecen las características generales y particulares que definirán la intervención de cada uno de los proyectos. Dichas características comprenden aspectos relacionados con la localización, alcance de las obras, componentes constructivos a intervenir, tiempos de ejecución, condiciones técnicas específicas que orientan el desarrollo del contrato.

2.3.1 Colegio Arborizadora Baja



Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arborizadora Baja
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de la cubierta en el Área de preescolar y sus baños adjuntos.
- Reparación de la cancha en la zona de bachillerato, este ítem incluye: Adecuación de la gradería
- Demolición y reconstrucción de una placa
- Remplazo de los marcos de futbol, baloncesto y suministro de los parales y malla para la cancha de voleibol.

2.3.2 Colegio Buenavista I.E.D Calasanz

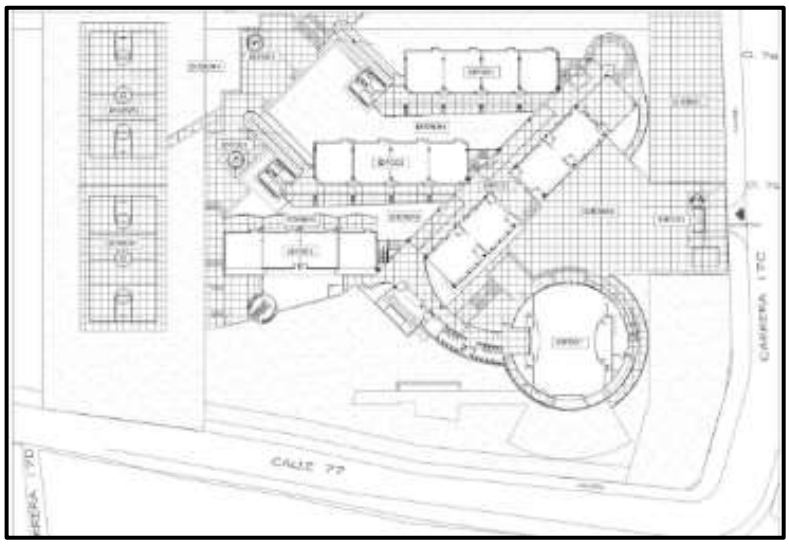


Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio Buenavista I.E.D Calasanz
Fuente: *Propia*

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo por realizar en la sede educativa es el cambio de la cubierta de la zona del comedor
- El contratista deberá contemplar un cerramiento perimetral para mitigar el ingreso de palomas al área.

2.3.3 Colegio Estrella del Sur Sede A.

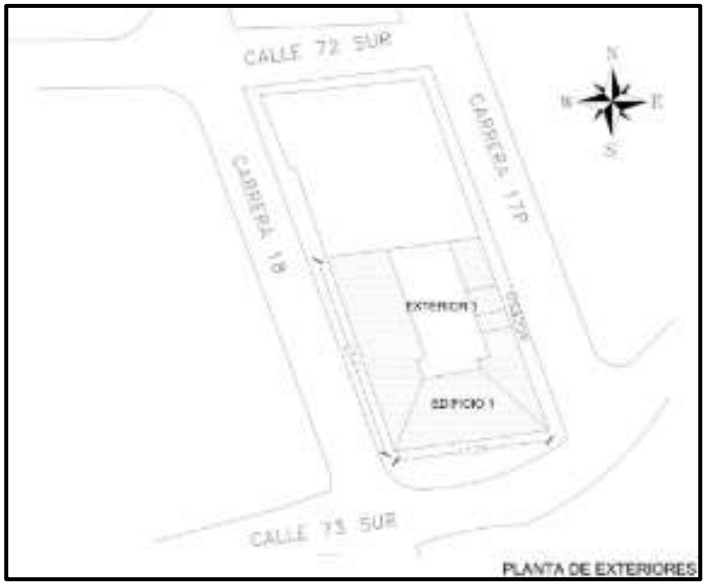


Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de la puerta principal de la entrada
- Cambio total de las dos baterías sanitarias

2.3.4 Colegio Estrella Del Sur Sede B

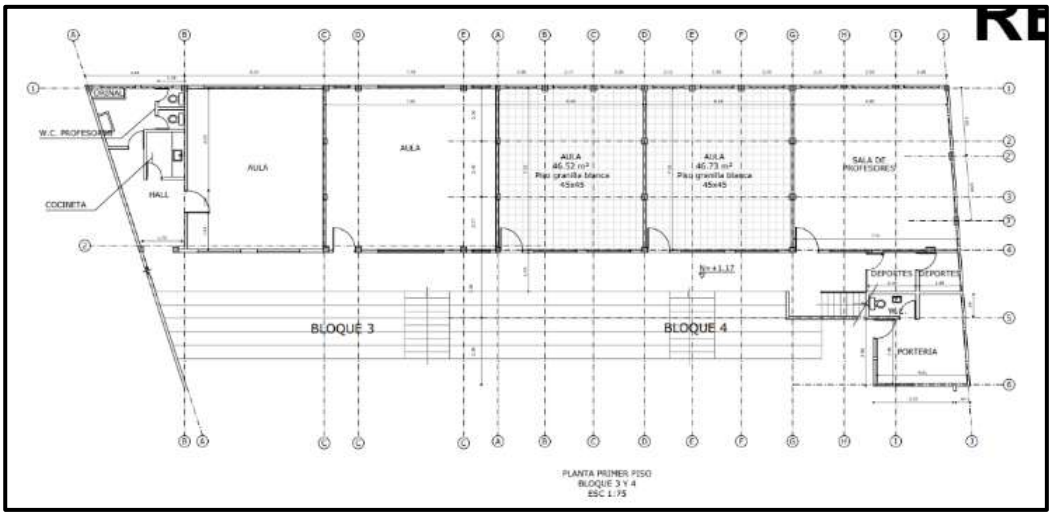


Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede B
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de puertas y ventanas en todas las aulas que allí se encuentran y de igual forma en el área administrativa.
- Cambio de la puerta principal de entrada del colegio.

2.3.5 Colegio Sierra Morena Sede C

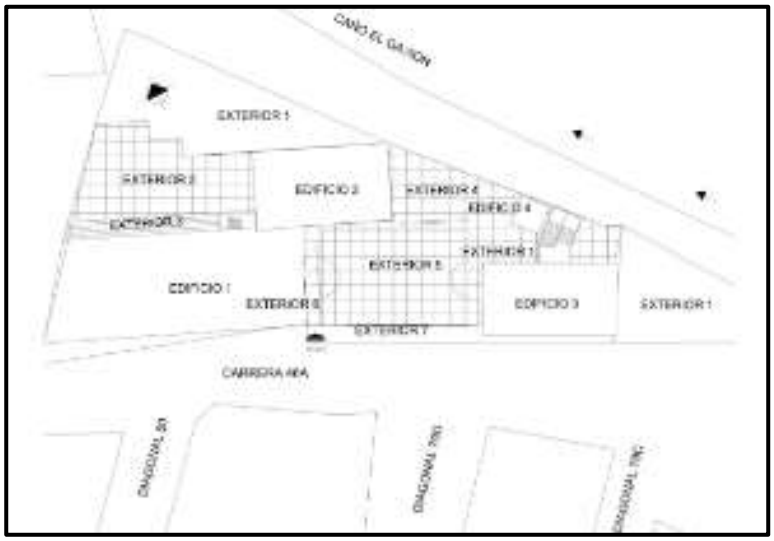


Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Sierra Morena Sede C
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación del cuarto de basuras
- Adecuación de la rampa de acceso, incluyendo de igual forma la instalación de barandas metálicas
- Revisión de la aplicación de pintura para los salones, el contratista tendrá la misión de analizar el estado de esta, ya que de acuerdo con la visita los salones se encuentran en buen estado.

2.3.6 Colegio Unión Europea Sede B

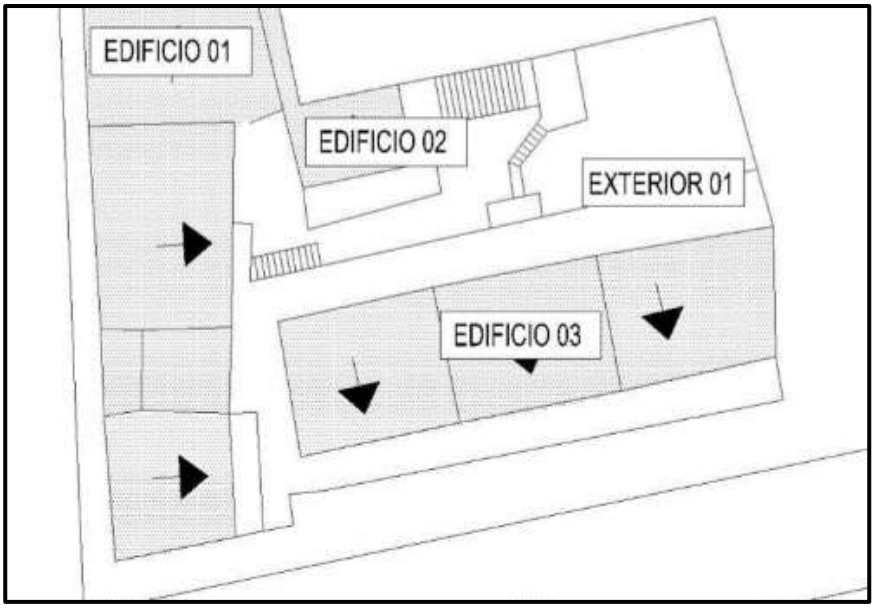


Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Unión Europea Sede B
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo para realizar en la sede educativa es el cambio de cubierta ubicado en tres aulas, para una mejor ubicación es donde se encuentra el aula de informática

2.3.7 Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede A

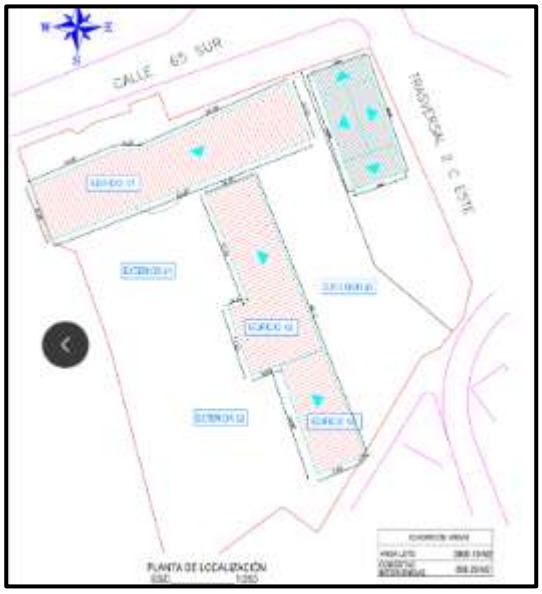


Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Fabio Lozano Simonelli sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Manejo de aguas lluvias en la cancha colindante con el salón de los laboratorios
- Cambio total de las dos baterías sanitarias del tercer piso
- Sustitución de los pisos en todos los salones del tercer piso.

2.3.8 Colegio Orlando Fals Borda

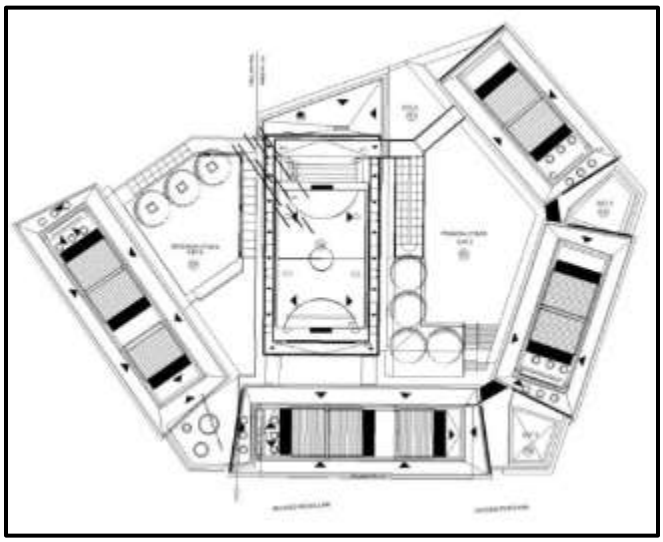


Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Orlando Fals Borda
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo por realizar consiste en la impermeabilización de la placa ubicada en la terraza debido a que se presenta empozamientos en la misma y esta filtra hacia el área de recreación del colegio, además de ello se encuentra afectando los techos de los salones.

2.3.9 Colegio Santa Librada



Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Santa Librada
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Impermeabilización de la terraza del comedor, previa verificación técnica que evidencia filtraciones por la junta de dilatación entre dos estructuras.
- Impermeabilización de la terraza en la zona de las materas.

2.3.10 Colegio Guillermo Cano Izasa Sede A



Ilustración 12 Esquema de Distribución Colegio Guillermo Cano Izasa
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Mejoramiento de Baterías Sanitarias en bloque bachillerato
- Mejoramiento de instalaciones Hidrosanitarias
- Adecuación de la red eléctrica – Baterías Sanitarias.

2.3.11 Colegio Tenerife Granda Sur Sede A

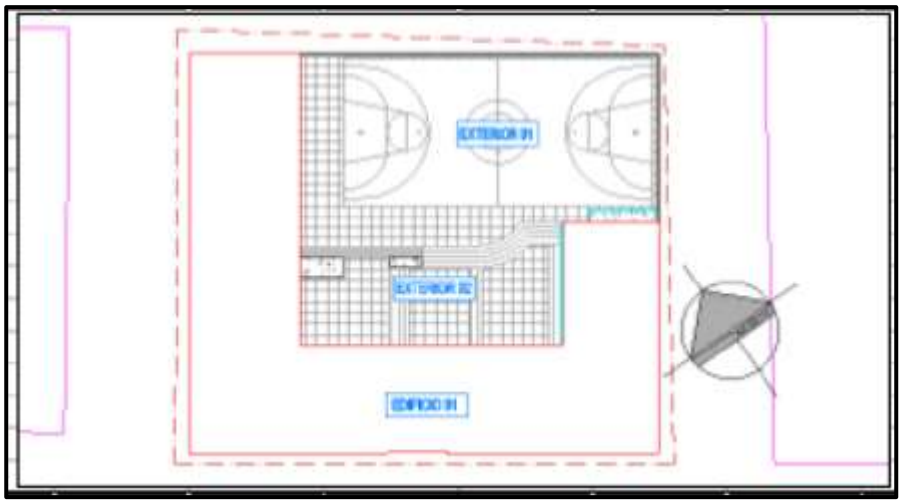


Ilustración 13 Esquema de Distribución Colegio Tenerife Granda Sur Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Impermeabilización Tanque aguas potable
- Mantenimiento correctivo motobombas
- Mejoramiento de barandas

2.4 EMERGENCIAS

En el marco de la ejecución del contrato, la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), contempla la atención de emergencias en la infraestructura educativa distrital, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio educativo.

Estas emergencias corresponden a situaciones imprevistas o de fuerza mayor que afectan las condiciones físicas de las edificaciones como daños estructurales, filtraciones, desprendimientos, fallas en cubiertas o deterioro de redes eléctricas e hidrosanitarias las cuales requieren una intervención inmediata y coordinada.

Para el desarrollo de este componente, el contrato cuenta con un presupuesto asignado de ***CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 416.900.290,00)*** destinado exclusivamente a la atención de emergencias, el cual será utilizado conforme a las necesidades que se presenten y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SED y la interventoría.

Teniendo en cuenta los informes preliminares y reportes institucionales, durante el presente periodo no se han presentado ni ejecutado atenciones por concepto de emergencias en las instituciones educativas a cargo del contrato.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". LOTE No.6
CONTRATISTA	CONSORCIO PAIS - NIT 901.974.049-8
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8154780
VALOR INICIAL	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($2.332.049.023).
VALOR ADICIÓN No.1	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($785.001.422)
VALOR FINAL	TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 3.117.050.445)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES

CONTRATO DE OBRA	
PLAZO ADICIÓN No.1	UN MES (01) Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Tabla 2. Información general contrato de obra
Fuente: Propia

3.1.1 GARANTÍAS

A continuación, se presentan las garantías exigidas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) al contratista, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas, laborales y financieras establecidas en el marco del presente proyecto.

Estas garantías tienen como finalidad respaldar la correcta ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas a cargo de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE).

Para la fecha del presente informe, las garantías se encuentran vigentes y actualizadas, conforme a lo estipulado en el Acta de Inicio del contrato, suscrita el 06 de octubre de 2025, y cumplen con los requerimientos establecidos por la SED en materia de cumplimiento, calidad de los trabajos, manejo de anticipo y responsabilidad civil extracontractual, como se puede evidenciar en la tabla No. 3.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	05/12/2026	$ 466.409.804,60

PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	05/04/2029	$ 233.204.902,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/04/2026	05/04/2028	$ 466.409.804,60

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
AMIT – HMACC	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
MANTENIMIENTO	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/09/2025	10/06/2026	$ 349.807.353,45

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**

PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 6		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	12/01/2027	$ 466.409.804,60
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	13/05/2029	$ 233.204.902,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/05/2026	05/05/2028	$ 466.409.804,60

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 7		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
AMIT – HMACC	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
MANTENIMIENTO	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/09/2025	10/06/2026	$ 349.807.353,45

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 8		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	27/02/2027	$ 623.410.089,00
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	28/06/2029	$ 311.705.044,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/05/2026	05/05/2028	$ 623.410.089,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 10		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 5		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		

	INICIAL	FINAL	VALOR
DAÑOS MATERIALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
AMIT – HMACC	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
MANTENIMIENTO	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	13/07/2026	20/08/2026	$ 349.807.353,45

Tabla 3. Pólizas contrato de obra - Contratista
Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 06 de abril y el 05 de mayo de 2026, se realizaron actividades de visita, además de ello el contratista de obra realizó las siguientes tareas en cada una de las instituciones educativas.

- CPF 1904 – Colegio Arborizadora Baja
- CPF 1913 – Colegio Sierra Morena Sede C
- CPF 1930 – Colegio Unión Europea Sede B
- CPF 581 – Colegio Orlando Fals Borda
- CPF 523 – Colegio Fabio Lozano Simonelli
- CPF 1918 – Colegio Estrella del Sur Sede B
- CPF 1974 – Colegio Calasanz (Buena Vista)
- CPF 546 – Colegio Santa Librada
- CPF 1917 – Colegio Estrella del Sur Sede A
- CPF 1959 – Colegio Guillermo Cano Isaza

Además de ello el contratista de obra CONSORCIO PAIS realizo las siguientes actividades referentes a cada una de las instituciones educativas mencionadas a continuación:

- **CPF 581 – Colegio Orlando Fals Borda**

A la fecha del presente informe, el frente de obra cuenta con las actividades al 100%.
.

- **CPF 1913 – Colegio Sierra Morena Sede C**

Una vez instalada la cubierta tipo sándwich, se procedió a la colocación de los muros en superboard. Terminada esta actividad, se continuó con la aplicación de pintura en la parte exterior de los muros. Posteriormente, se realizó el enchape de los muros interiores del cuarto de depósito de residuos. Luego, se llevó a cabo la nivelación del piso y, finalmente, su enchape.

De manera simultánea, se instaló la puerta tipo persiana para el citado cuarto y se realizo la pintura de la cancha deportiva.

En cuanto al frente de intervención, aún se encuentran pendientes las actividades eléctricas correspondientes al cuarto de depósito de residuos.

- **CPF 1930 – Colegio Unión Europea Sede B**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1904 – Colegio Arborizadora Baja**

A la fecha del presente informe, el contratista ha realizado las subsanaciones correspondientes a los empozamientos detectados en la zona de la cancha deportiva. Asimismo, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, llevó a cabo la adecuación de dos cerramientos contra impacto en la misma área: uno con una altura de 2.5 metros y otro de 5 metros. De igual manera, se realizó una adecuación en forma de andén para facilitar el ingreso del personal de mantenimiento a la zona del cuarto de residuos.

En el bloque de primera infancia ya se culminó la instalación del piso tipo vinilo, y se hizo entrega de esta obra al colegio. Como actividad pendiente, únicamente resta realizar el aseo en la zona de la cancha para proceder con la entrega formal de la adecuación de los cerramientos. Cabe aclarar que, en lo referente a la pintura y demarcación de la cancha, dicha actividad ya fue entregada al personal administrativo del colegio.

- **CPF 523 – Colegio Fabio Lozano Simonelli**

Se completaron los trabajos de instalación de los aparatos sanitarios en los baños ubicados en el tercer piso del colegio. Asimismo, se realizó la instalación de la grifería correspondiente a los lavamanos.

No obstante, para la culminación total de las actividades del frente de obra, aún se encuentran pendientes los siguientes trabajos:

- Terminación del cárcamo ubicado en la zona de la cancha.
- Instalación de los espejos en las baterías sanitarias.

Estas actividades complementarias serán ejecutadas en el transcurso de los próximos días hábiles, a fin de dar por concluido el frente de obra en su totalidad.

- **CPF 1918 – Colegio Estrella del Sur Sede B**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1974 – Colegio Calasanz (Buena Vista)**

A la fecha del presente informe el frente de obra cuenta con el 100% de las actividades.

- **CPF 546 – Colegio Santa Librada**

Una vez culminadas las actividades de impermeabilización con poliurea en la zona de las jardineras, se procedió a intervenir el corredor colindante. En este espacio, se realizó el desmonte del piso deck y de su estructura correspondiente. Luego, se preparó la zona para dar inicio al picado de la membrana y, posteriormente, se ejecutó la impermeabilización total del área con poliurea.

Asimismo, se adecuaron tres rampas para facilitar el acceso a la zona de las jardineras: una primera rampa en la zona del ascensor, y dos rampas adicionales en el corredor colindante a las jardineras, Para dar por terminadas las actividades en este frente de obra, aún faltan ejecutar las siguientes tareas:

- Preparación de la zona de las jardineras, adecuando el área verde en las mismas.
- Aplicación de pintura en la zona del corredor

- **CPF 1917 – Colegio Estrella del Sur Sede A**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1959 – Colegio Guillermo Cano Isaza**

En la zona del tercer piso se reporta un avance significativo: se ha ejecutado en su totalidad el alistado y el pañete, alcanzando un 100% de cumplimiento. En lo que respecta al enchape de pisos y muros, a la fecha se registra igualmente un avance del 100%.

Una vez finalizado el enchape, a la fecha del presente informe se cuenta con la instalación de los mesones de policuarzo, tanto en la zona de los laboratorios (primer piso) como en el área de las aulas (tercer piso). Asimismo, se ha completado el 100% de la instalación de las divisiones en acero inoxidable en cada una de las zonas anteriormente mencionadas.

Para la culminación de las actividades en cada una de las zonas, faltan ejecutarse las siguientes tareas:

- Instalación total de los sanitarios con todos sus elementos.
- Instalación de grifería para lavamanos.
- Instalación de espejos.

Es primordial que se cuente con la terminación completa de al menos una de las baterías sanitarias, a fin de habilitar la intervención en la zona del segundo piso del área de aulas o en la batería sanitaria ubicada en el bloque colindante a las canchas.

- **CPF 548 – Colegio Tenerife Granda Sur Sede A**

A la fecha del presente informe, en el frente de obra se han culminado las actividades de impermeabilización del tanque de agua potable. Asimismo, se inició y finalizó la instalación de barandas en las escaleras de los tres pisos del colegio. De igual manera, se ejecutó en su totalidad la instalación de pasamanos en la zona del patio del frente de obra.

3.3 INFORME DE AVANCE

Durante el presente periodo se desarrollaron las actividades anteriormente mencionadas, con corte al Informe Semanal No. 25. se cuenta con los siguientes porcentajes de la Tabla No.4

% Programado	% Ejecutado
$ 2.031.345.608,91 (86,39%)	$ 2.022.660.446,68 (86.02%)
Atraso de $ 8.685.162,23 (0,37%)	

Tabla 4- *Avance Financiero*
Fuente: Propia

Se cuentan con los siguientes porcentajes por frentes de obra acumulados al cierre del periodo reflejados en la siguiente tabla:

SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL, POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 168.920.087,00	100,00%	$ 168.920.087,00	100,00%	$ 168.920.087,00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 165.727.196,00	100,00%	$ 165.727.196,00	100,00%	$ 165.727.196,00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 113.917.854,00	100,00%	$ 108.648.798,97	95,37%	$ 113.917.854,00	-4,63%
FABIO LOZANO	$ 234.917.032,00	100,00%	$ 231.228.088,35	98,43%	$ 234.917.032,00	-1,57%
ARBORIZADORA BAJA	$ 632.970.974,00	100,00%	$ 623.292.062,12	98,47%	$ 632.970.974,00	-1,53%
BUENAVISTA	$ 186.103.596,00	100,00%	$ 186.103.596,00	100,00%	$ 186.103.596,00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72.206.451,00	100,00%	$ 72.206.450,25	100,00%	$ 72.206.451,00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 219.755.203,00	100,00%	$ 168.977.700,31	76,89%	$ 219.755.203,00	-23,11%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75.074.063,00	100,00%	$ 75.074.063,00	100,00%	$ 75.074.063,00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 21.244.804,06	20,78%	$ 102.227.058,00	100,00%	$ 102.227.058,00	79,22%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 140.508.348,84	37,03%	$ 120.255.346,68	31,69%	$ 379.449.204,00	-5,34%
TOTALES	**$ 2.031.345.608,91**	**86,39%**	**$ 2.022.660.446,68**	**86,02%**	**$ 2.351.268.718,00**	**-0,37%**

Tabla 5. *Porcentajes Acumulados*
Fuente: Propia

3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Para el presente periodo y de acuerdo al flujo de caja del cronograma de obra se cuenta con el siguiente control de acuerdo a la ilustración No.14 e Ilustración No.15

FLUJO DE CAJA SEMANAL	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25
	9-mar-26	16-mar-26	23-mar-26	30-mar-26	6-abr-26	13-abr-26	20-abr-26	27-abr-26
	15-mar-26	22-mar-26	29-mar-26	5-abr-26	12-abr-26	19-abr-26	26-abr-26	3-may-26

FLUJO SEMANAL	$ 58.008.900,37	$ 56.028.312,56	$ 35.940.297,48	$ 70.573.973,65	$ 134.026.404,79	$ 105.231.834,32	$ 47.429.861,06	$ 37.668.653,82
	2,47%	2,38%	1,53%	3,00%	5,70%	4,48%	2,02%	1,60%
FLUJO ACUMULADO	$ 1.544.446.271,23	$ 1.600.474.583,78	$ 1.636.414.881,27	$ 1.706.988.854,92	$ 1.841.015.259,71	$ 1.946.247.094,03	$ 1.993.676.955,09	$ 2.031.345.608,91
	65,69%	68,07%	69,60%	72,60%	78,30%	82,77%	84,79%	86,39%

Ilustración 14 *Flujo de Caja Semanal*
Fuente: Propia



Ilustración 15 Curva s – Programado vs ejecutado
Fuente: Propia

3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS

Para el presente periodo tal y como se mencionó en el punto 3.3 cuenta con ese porcentaje de avance de igual forma en el anexo No.02 se presentarán los informes semanales en donde se evidencian los avances del contratista Consorcio País semana por semana.

Anexo 1. Bitácora de obra
Anexo 2. Informe Semanal

3.3.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO

Para la fecha del presente periodo, y dando alcance al cronograma de obra vigente, el contratista debería llevar en ejecución las siguientes actividades de acuerdo con cada institución educativa, pero como se evidencia en los puntos anteriores se cuenta con un atraso debido a que no ha realizado en su totalidad las actividades programadas.

Se presentarán las Ilustraciones No.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 en donde se evidencias las actividades realizadas y los porcentajes ejecutadas de cada una, a la fecha del presente informe.

CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 25			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO	m2	36,50	225,50	262,00	262,00		$ 4.233,48	$ 1.109.170,66	$ (954.648,79)	717,81%	717,81%
CERRAMIENTO EN LONA	M	91,00	(62,60)	28,40	28,40		$31.110,25	$ 883.530,99	$ 1.947.501,40	100,00%	100,00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,50	211,26	247,76	247,76		$18.044,21	$ 4.470.634,09	$(3.812.020,33)	678,79%	678,79%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301,34	-266,74	34,60	34,60		$33.201,35	$ 1.148.766,74	$ 8.856.128,37	11,48%	11,48%

CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 25			
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79,20	40,80	120,00	120,00		$ 69.099,55	$ 8.291.946,35	$ (2.819.261,76)	151,52%	151,52%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34,00	199,20	233,20	233,20		$ 107.273,69	$ 25.015.880,42	$ (21.368.575,08)	685,87%	685,87%
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16,00	(13,00)	3,00	3,00		$ 166.952,47	$ 500.857,42	$ 2.170.382,16	18,75%	18,75%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1,50			1,50		$ 62.023,52	$ 93.035,29	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34,00			34,00		$ 91.590,40	$ 3.114.073,57	$ -	100,00%	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,30			0,30		$ 135.394,33	$ 40.618,30	$ -	100,00%	100,00%
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,24			0,24		$ 181.045,17	$ 43.450,84	$ -	100,00%	100,00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15,00			15,00		$ 22.829,47	$ 342.442,05	$ -	100,00%	100,00%
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19,00			19,00		$ 19.858,75	$ 377.316,29	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15,36			15,36		$ 177.336,50	$ 2.723.888,59	$ -	100,00%	100,00%
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58,50	136,16	194,66	194,66		$ 27.185,71	$ 5.291.971,11	$ (3.701.606,83)	100,00%	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73,00	189,00	249,56	249,56		$ 45.289,29	$ 11.302.394,46	$ (7.996.276,51)	341,86%	341,86%

CPF	581	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 25			
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127,20	127,20		$ 4.291,49	$ 545.877,16	$ (545.877,16)	100,00%	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344,96			340,58		$ 4.663,84	$ 1.588.397,08	$ 20.440,72	98,73%	98,73%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262,00	20,37	282,37	282,37		$ 361.355,09	$ 102.035.835,61	$ (7.360.803,10)	107,77%	107,77%
	SUBTOTAL I.E.D. SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							$168.920.087,00			

Ilustración 16 - *Actividades Orlando Fals*
Fuente: Propia

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 25			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47,37	223,92	271,29	271,29		$ 7.045,00	$ 1.911.238,10	$ (1.577.516,00)	572,70 %	572,70%
CERRAMIENTO EN LONA	M	60,00	13,00	73,00	73,00		$ 31.110,25	$ 2.271.047,96	$ (404.433,20)	121,67 %	121,67%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1,76	-1,76	0,00	-		$ 274.656,52	$ -	$ 483.395,00	0,00%	0,00%
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20,80	7,20	28,00	28,00		$ 21.488,46	$ 601.677,01	$ (154.716,95)	134,62 %	134,62%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,60			12,60		$ 11.376,96	$ 143.349,70	$ -	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,84			36,84		$ 107.273,69	$ 3.951.962,61	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 25			
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32,64	0,72	31,92	-		$ 93.547,94	$ -	$ 3.053.405,00	0,00%	0,00%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7,20			3,40		$ 15.633,37	$ 53.153,46	$ 59.407,00	47,22%	47,22%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,29			4,00		$ 11.761,45	$ 47.045,82	$ 15.172,00	75,61%	75,61%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1,76	6,86	8,62	4,45		$ 91.988,38	$ 409.348,31	$ (247.448,75)	252,84 %	252,84%
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24,87	-9,60	15,27	15,27		$ 21.702,97	$ 331.382,67	$ 208.370,00	61,40%	61,40%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11,84			11,84		$ 165.931,21	$ 1.964.625,47	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7,00	7,00	14,00	14,00		$ 176.060,25	$ 2.464.579,38	$ (1.232.158,00)	199,98 %	199,98%
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12,60	3,76	16,36	16,36		$ 146.133,16	$ 2.390.738,55	$ (549.461,00)	129,84 %	129,84%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6,00			-		$ 78.726,73	$ -	$ 472.360,38	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8,00			-		$ 28.310,86	$ -	$ 226.487,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2,00			-		$ 129.729,46	$ -	$ 259.458,91	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29,00			-		$ 14.988,50	$ -	$ 434.667,00	0,00%	0,00%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 25			
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42,05	8,55	50,60	50,60		$ 193.996,53	$ 9.816.224,55	$ (1.658.670,00)	120,33 %	120,33%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11,84			11,84		$ 165.931,21	$ 1.964.625,47	$ -	100,00 %	100,00%
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2,96			2,96		$ 592.067,38	$ 1.752.519,43	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420,50	(366,54)	53,96	53,96		$ 7.255,46	$ 391.504,61	$ 2.659.416,00	12,83%	12,83%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91,39			91,39		$ 7.103,01	$ 649.144,22	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	10,00	16,00	16,00		$ 143.600,90	$ 2.297.614,44	$ (1.436.009,00)	266,67 %	266,67%
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4,00	-4,00	0,00	-		$ 1.618.437,02	$ -	$ 6.473.748,09	0,00%	0,00%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3,00			1,00		$ 875.947,70	$ 875.947,70	$ 1.751.895,00	33,33%	33,33%
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15,77	1,25	17,02	17,02		$ 159.158,72	$ 2.708.881,47	$ (198.948,00)	107,93 %	107,93%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33,78			33,78		$ 1.120.163,13	$ 37.839.110,41	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 25			
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172,00	-172,00	0,00	-		$ 65.757,83	$ -	$ 11.310.347,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146,06	146,06		$ 77.589,44	$ 11.332.713,49	$ (11.332.713,00)	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14,08	2,72	16,80	16,80		$ 98.222,57	$ 1.650.139,25	$ (267.165,00)	119,32 %	119,32%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4,08			4,08		$ 45.289,29	$ 184.780,29	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4,84			4,84	4,84	$ 126.224,49	$ 610.926,55	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,08	0,05	5,13	5,13		$ 798.362,30	$ 4.095.598,62	$ (39.918,00)	100,98 %	100,98%
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193,76	-98,31	95,45	95,45		$ 29.785,43	$ 2.843.019,27	$ 2.928.206,00	49,26%	49,26%
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61,76	14,44	76,20	76,20		$ 29.785,43	$ 2.269.649,75	$ (430.102,00)	123,38 %	123,38%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226,80	92,51	319,31	319,31		$ 23.042,63	$ 7.357.741,55	$ (2.131.674,00)	140,79 %	140,79%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36,84	-23,74	13,10	13,10		$ 264.771,67	$ 3.468.508,85	$ 6.285.679,00	35,56%	35,56%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA							$108.648.798,97			

***Ilustración 17**- Actividades Sierra Morena*
Fuente: Propia

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 25			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168,00	10,14	178,14	178,14		$ 4.233,48	$ 754.151,38	$ (42.927,00)	106,04%	106,04%
CERRAMIENTO EN LONA	M	45,00	7,80	52,80	23,83		$ 31.110,25	$ 741.422,37	$ 658.538,70	52,96%	52,96%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136,13	-104,13	32,00	32,00		$ 3.248,63	$ 103.956,25	$ 338.280,13	23,51%	23,51%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,83	0,00	5,83	-		$ 144.722,00	$ -	$ 843.729,29	0,00%	0,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 25			
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36,30			36,30		$ 26.782,33	$ 972.198,70	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5,15	7,35	12,50	12,50		$ 27.938,51	$ 349.231,40	$ (205.348,06)	242,72%	242,72%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168,00	5,63	173,63	173,63		$ 36.752,18	$ 6.381.281,40	$ (206.914,79)	103,35%	103,35%
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18,00	6,00	24,00	24,00		$ 11.967,87	$ 287.228,79	$ (71.807,20)	133,33%	133,33%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18,00	6,00	24,00	24,00		$ 7.469,97	$ 179.279,20	$ (44.819,80)	133,33%	133,33%
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1,00			-		$ 55.922,89	$ -	$ 55.922,89	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7,00	0,00	7,00	-		$ 32.498,47	$ -	$ 227.489,29	0,00%	0,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 25			
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3,90	-3,90	0,00	-		$ 18.687,73	$ -	$ 72.882,16	0,00%	0,00%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19,43			19,43		$ 21.844,63	$ 424.441,11	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00			4,00		$ 126.905,79	$ 507.623,16	$ -	100,00%	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3,90			3,90		$ 89.839,27	$ 350.373,14	$ -	100,00%	100,00%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19,43			19,43		$ 42.469,67	$ 825.185,65	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515,11	-1076,19	2438,92	2.438,92		$ 23.042,63	$ 56.199.126,28	$ (80.997.372,11)	-226,63%	-226,63%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19,43			19,43		$ 42.469,67	$ 825.185,65	$ (825.185,65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0,50			0,50		$ 341.855,19	$ 170.927,60	$ (170.927,60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26,40	18,13	44,53	44,53		$ 91.590,40	$ 4.078.520,47	$ (1.660.533,93)	245,62%	245,62%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1,00	-1,00	0,00			$ 875.947,70	$ -	$ 875.947,70	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213,75	0,29	214,04	214,04		$ 264.771,67	$ 56.671.727,78	$ (76.783,78)	100,14%	100,14%
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,15			18,15		$ 106.267,26	$ 1.928.750,73	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34,90			34,9		$ 91.590,40	$ 3.196.504,93	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42,00			42		$ 23.315,15	$ 979.236,14	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42,00			42		$ 20.790,98	$ 873.221,16	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21,00	3,00	24,00	24		$ 180.330,15	$ 4.327.923,59	$ (540.990,45)	114,29%	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21,00	3,00	24,00	24		$ 238.055,44	$ 5.713.330,57	$ (714.166,32)	114,29%	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22,50	8,50	31,00	31		$ 304.166,74	$ 9.429.168,84	$ (2.585.417,26)	137,78%	137,78%
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32,35	0,75	33,10	33,1		$ 222.048,37	$ 7.349.801,01	$ (166.536,28)	102,32%	102,32%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61,70			61,70		$ 17.207,77	$ 1.061.719,44	$ -	100,00%	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224,21			224,21		$ 4.663,84	$ 1.045.679,27	$ -	100,00%	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA							**$ 165.727.196,00**			

Ilustración 18 *- Actividades Unión Europea Sede B*
Fuente: Propia

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 25			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786,72	463,91	1250,63	1.250,63		$ 7.045,00	$ 8.810.688,60	$ (3.268.246,00)	158,97%	158,97%
CERRAMIENTO EN LONA	M	96,25	73,00	169,25	169,25		$ 31.110,25	$ 5.265.409,14	$ (2.271.047,96)	175,84%	175,84%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466,58	9,42	476,00	476,00		$ 107.273,69	$ 51.062.274,77	$ (1.010.518,00)	102,02%	102,02%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5,25			-		$ 22.300,62	$ -	$ 117.078,27	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145,00	6,23	151,23	151,23		$ 32.594,26	$ 4.929.229,33	$ (203.062,21)	104,30%	104,30%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145,00	123,77	21,23	21,23		$ 42.650,45	$ 905.469,00	$ 5.278.845,87	14,64%	14,64%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130,00			130,00		$ 69.868,54	$ 9.082.910,19	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323,02			323,02		$ 36.752,18	$ 11.871.653,14	$ 37,00	100,00%	100,00%
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35,50			35,50		$ 8.680,11	$ 308.143,88	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 25			
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25,00			25,00		$ 7.469,97	$ 186.749,17	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2,00			2,00		$ 398.950,46	$ 797.900,91	$ -	100,00%	100,00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21,00			-		$ 11.761,45	$ -	$ 246.991,00	0,00%	0,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16,80	5,76	22,56	22,56	5,76	$ 91.988,38	$ 2.075.257,93	$ (529.853,00)	134,29%	134,29%
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258,10	-36,51	221,59	221,59		$ 79.962,51	$ 17.718.891,73	$ 2.919.431,00	85,85%	85,85%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22,83			22,83		$ 135.394,33	$ 3.091.052,48	$ -	100,00%	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15,52			2,22		$ 66.591,58	$ 147.833,30	$ 885.668,00	14,30%	14,30%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103,10	68,26	171,36	171,36		$ 176.060,25	$ 30.169.684,13	$ (12.017.873,00)	166,21%	166,21%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129,05	25,90	154,95	154,95		$ 176.060,25	$ 27.280.535,46	$ (4.559.960,00)	120,07%	120,07%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87,00			87,00		$ 76.033,93	$ 6.614.951,64	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90,00			90,00		$ 97.085,28	$ 8.737.675,50	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 25			
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18,70	5,00	23,70	23,70	5,00	$ 165.931,21	$ 3.932.569,57	$ (829.656,00)	126,74%	126,74%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90,00			90,00		$ 164.788,52	$ 14.830.966,59	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1,52			1,52		$ 358.768,86	$ 545.328,67	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0,90			0,90		$ 156.990,72	$ 141.291,65	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809,76	-142,50	1667,26	1.667,26		$ 23.042,63	$ 38.418.051,96	$ 3.283.574,00	92,13%	92,13%
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2,00					$ 1.088.548,32	$ -	$ 2.177.097,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684,78	-162,78	522,00	522,00		$ 11.730,42	$ 6.123.281,59	$ 1.909.479,00	76,23%	76,23%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3,00			2,00		$ 5.565,04	$ 11.130,08	$ 5.565,00	66,67%	66,67%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323,02			323,02		$ 264.771,67	$ 85.526.544,13	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35,50			35,50		$ 305.515,84	$ 10.845.812,21	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484,50	-43,86	440,64	440,64		$ 225.361,76	$ 99.303.405,31	$ 9.884.367,00	90,95%	90,95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484,50	-484,50	0,00	-		$ 77.589,44	$ -	$ 37.592.083,00	0,00%	0,00%
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714,00			610,00		$ 65.757,83	$ 40.112.277,64	$ 6.838.815,00	85,43%	85,43%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 25			
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66,67			66,67		$ 62.023,52	$ 4.135.108,31	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620,45			620,45		$ 7.255,46	$ 4.501.650,03	$ -	100,00%	100,00%
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353,72			353,72		$ 18.365,30	$ 6.496.173,31	$ -	100,00%	100,00%
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2,00	-1,00	1,00	1,00		$ 12.850.061,48	$ 12.850.061,48	$ 12.850.061,00	50,00%	50,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00			4,00		$ 126.905,79	$ 507.623,16	$ 126.906,00	80,00%	80,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118,00			118,00		$ 15.217,85	$ 1.795.706,06	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118,00			118,00		$ 16.070,48	$ 1.896.316,55	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00			25,00		$ 180.330,15	$ 4.508.253,74	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22,00			22,00		$ 238.055,44	$ 5.237.219,69	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00			3,00		$ 193.810,36	$ 581.431,07	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194,18			194,18		$ 9.167,13	$ 1.780.074,18	$ -	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17,50			17,50		$ 2.042.059,82	$ 35.736.046,83	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 25			
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17,50			17,50		$ 1.257.854,97	$ 22.012.461,99	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130,00			130,00		$ 237.210,90	$ 30.837.417,51	$ -	100,00%	100,00%
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197,54			197,54		$ 5.046,98	$ 996.981,04	$ -	100,00%	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							$ 623.292.062,12			

Ilustración 19 - *Actividades Arborizadora Baja*
Fuente: *Propia*

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 25			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201,02	10,05	1211,07	1.211,07		$ 4.233,48	$ 5.127.035,54	$ (42.546,00)	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51,83	104,17	156,00	156,00		$ 31.110,25	$ 4.853.198,38	$ (3.240.754,33)	300,98%	300,98%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235,29	20,63	255,92	255,92		$ 32.594,26	$ 8.341.522,00	$ (672.419,50)	100,00%	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 25			
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68,70	68,70		$ 107.273,69	$ 7.369.702,26	$ (7.369.702,26)	100,00%	100,00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,64	1,35	29,99	29,99		$ 22.300,62	$ 668.795,68	$ (30.105,84)	100,00%	100,00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55,48	30,02	85,50	85,50		$ 12.649,16	$ 1.081.503,32	$ (379.727,83)	154,11%	154,11%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00			28,00		$ 20.708,69	$ 579.843,18	$ -	100,00%	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15,05			3,93		$ 66.591,58	$ 261.545,07	$ 740.658,14	26,10%	26,10%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,32			17,32		$ 33.174,37	$ 574.580,07	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28,00			28,00		$ 27.281,50	$ 763.882,01	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66,00			66,00		$ 27.938,51	$ 1.843.941,79	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00			8,00		$ 7.469,97	$ 59.759,73	$ -	100,00%	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 25			
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55,30			49,77		$ 32.569,97	$ 1.621.007,52	$ 180.111,95	90,00%	90,00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22,90			22,90		$ 18.687,73	$ 427.949,09	$ -	100,00%	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12,80			12,80		$ 135.394,33	$ 1.733.047,38	$ -	100,00%	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194,67			194,67		$ 135.394,33	$ 26.357.213,62	$ -	100,00%	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49,31			49,31		$ 135.394,33	$ 6.676.294,26	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548,06	-548,06	0,00			$ 69.868,54	$ -	$ 38.292.151,98	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158,76	-24,95	133,81	133,81		$ 7.103,01	$ 950.453,97	$ 177.220,14	84,28%	84,28%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171,60	-44,68	126,92	122,00		$ 140.306,40	$ 17.117.380,80	$ 6.959.197,44	71,10%	71,10%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00%	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8,00			8,00		$ 180.330,15	$ 1.442.641,20	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32,00			32,00		$ 23.315,15	$ 746.084,68	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32,00			32,00		$ 20.790,98	$ 665.311,36	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8,00			8,00		$ 238.055,44	$ 1.904.443,52	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15,00			15,00		$ 361.355,09	$ 5.420.326,29	$ -	100,00%	100,00%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1,00			1,00		$ 875.947,70	$ 875.947,70	$ -	100,00%	100,00%
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55,30			55,30		$ 130.345,99	$ 7.208.133,51	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226,69	12,39	239,08	239,08		$ 126.224,49	$ 30.177.196,69	$ (1.563.366,10)	105,46%	105,46%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,44	76,23	93,67	93,67		$ 33.727,50	$ 3.159.254,93	$ (2.571.047,33)	537,10%	537,10%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 25			
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	0,00	5,40	5,40	5,40		$ 62.023,52	$ 334.927,03	$ (334.927,03)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
WIN DE ALUMINIO	M	18,00			18,00		$ 15.372,99	$ 276.713,90	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131,00			131,00		$ 98.222,57	$ 12.867.157,27	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11,73	-4,73	7,00	7,00		$ 1.128.301,00	$ 7.898.107,00	$ 5.336.863,73	59,68%	59,68%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47,82	-6,22	41,60	41,60		$ 989.338,00	$ 41.156.460,80	$ 6.153.682,36	86,99%	86,99%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80	0,30	1,50	1,50		$ 989.338,00	$ 1.484.007,00	$ 296.801,40	83,33%	83,33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3,00			3,00		$ 772.427,21	$ 2.317.281,62	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11,00			11,00	4,00	$ 1.117.185,66	$ 12.289.042,29	$ -	100,00%	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14,00			14,00		$ 404.611,28	$ 5.664.557,91	$ -	100,00%	100,00%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66,72	216,43	283,15	283,15		$ 20.236,50	$ 5.729.964,98	$ (4.379.785,70)	424,39%	424,39%
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			52,00	45,00		$ 8.484,49	$ 381.802,05	$ (381.802,05)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	0,00		33,77	33,77		$ 32.026,28	$ 1.081.527,64	$ (1.081.527,64)	100,00%	100,00%
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176,38			176,38		$ 6.610,59	$ 1.165.975,86	$ -	100,00%	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI							$ 231.228.088,35			

Ilustración 20 *- Actividades Fabio Lozano Simonelli*
Fuente: *Propia*

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557,28	20,48	577,76	577,76		$ 4.233,48	$2.445.932,98	$ (86.702,00)	103,67%	103,67%
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88,20	-88,20	0,00	-		$154.730,98	$ -	$(13.647.272,19)	0,00%	0,00%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 21			
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54,17			33,24		$ 33.174,37	$1.102.716,03	$ 694.339,54	61,36%	61,36%
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95,99	-32,70	63,29	63,29		$ 29.391,49	$1.860.302,19	$ 960.987,18	65,94%	65,94%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28,37					$707.267,02	$ -	$ 20.065.165,47	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25,81	6,00	31,81	31,81		$829.259,39	$26.378.824,17	$ (4.975.639,28)	123,25%	123,25%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 21			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,43			1,43		$798.362,30	$ 1.145.011,22	$ (3.353,12)	100,29%	100,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87,25			63,29		$467.649,33	$29.597.525,99	$ 11.204.877,91	72,54%	72,54%
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141,20			141,20		$ 9.408,62	$ 1.328.459,99	$ 37,63	100,00%	100,00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141,20			141,20		$ 22.829,47	$ 3.223.429,87	$ 91,32	100,00%	100,00%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141,20			141,20		$ 17.207,77	$ 2.429.668,36	$ 68,83	100,00%	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577,76			577,76		$ 4.663,84	$2.694.579,45	$ -	100,00%	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B							$72.206.450,25			

Ilustración 21 - *Actividades Estrellas del Sur Sede B*
Fuente: *Propia*

CPF	1918	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 25			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538,32	-88,32	450,00	450,00		$ 4.233,48	$ 1.905.064,11	$ 373.901,00	83,59%	83,59%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78,28	11,72	90,00	90,00		$ 31.137,23	$ 2.802.350,52	$ (364.928,00)	114,97%	114,97%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538,32					$ 3.248,63	$ -	$ 1.748.804,00	0,00%	0,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12,00	(1,00)	11,00	11,00		$ 7.469,97	$ 82.169,63	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5,00	5,00		$ 23.315,15	$ 116.575,73	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20,00	20,00		$ 20.790,98	$ 415.819,60	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1,00			1,00		$ 101.214,88	$ 101.214,88	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1918	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 25			
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538,82	-134,52	404,30	404,30		$ 36.752,18	$ 14.858.907,26	$ 4.943.904,00	75,03%	75,03%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841,40	-941,87	899,53	899,53		$ 23.042,63	$ 20.727.535,16	$ 21.703.160,03	48,85%	48,85%
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44,00			44,00		$ 130.345,99	$ 5.735.223,77	$ -	100,00%	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633,15			632,63		$ 4.663,84	$ 2.950.473,25	$ 2.436,22	99,92%	99,92%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30,00			30,00		$ 37.696,55	$ 1.130.896,57	$ -	100,00%	100,00%
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87,00	87,00		$ 106.267,26	$ 9.245.251,44	$ (9.245.251,44)	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538,31	-538,31	0,00	-		$ 264.771,67	$ -	$ 142.529.236,49	0,00%	0,00%

CPF	1918	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0,00	0,00	410,94	410,94		$ 306.692,25	$ 126.032.114,08	$ (126.032.114,08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$ 186.103.596,00**			

Ilustración 22 - *Actividades Calasanz (Buenavista)*
Fuente: *Propia*

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 25			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557,28			557,28		$ 4.233,48	$ 2.359.231,39	$ -	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128,18			25,00		$ 31.110,25	$ 777.756,15	$ 3.209.955,18	19,50%	19,50%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65,03	-39,70	25,33	25,33		$ 15.633,37	$ 395.993,28	$ 620.644,82	38,95%	38,95%

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 25			
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,90			16,47		$ 32.594,26	$ 536.827,40	$ 1.676.322,59	24,26%	24,26%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27,20			13,34		$ 21.844,63	$ 291.407,33	$ 302.766,53	49,04%	49,04%
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372,13			334,28		$ 13.385,77	$ 4.474.588,57	$ 506.658,09	89,83%	89,83%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63,87			63,87		$ 34.724,48	$ 2.217.879,69	$ (26,83)	100,00%	100,00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,47	-16,47	0,00			$ 18.044,21	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194,87			194,87		$ 9.443,70	$ 1.840.293,82	$ 1.840.293,82	100,00%	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59,96			59,96		$ 91.988,38	$ 5.515.765,80	$ 5.515.765,80	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63,33			13,44		$ 91.988,38	$ 1.236.323,87	$ 1.236.323,87	21,22%	21,22%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281,83			218,00		$ 45.289,29	$ 9.873.200,43	$ 9.873.200,43	77,35%	77,35%

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 25			
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			20,36	20,36	20,36	$ 193.996,53	$ 3.949.769,41	$ 3.949.769,41	100,00%	100,00%
PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2			20,36	20,36	20,36	$ 122.272,98	$ 2.489.477,88	$ 2.489.477,88	100,00%	100,00%
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333,93	1,67	335,60	218,00		$ 69.679,67	$ 15.190.376,21	$ 15.190.376,21	65,28%	65,28%
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208,04			118,00		$ 25.122,94	$ 2.964.506,94	$ 2.964.506,94	56,72%	56,72%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19,60			13,44		$ 62.023,52	$ 833.596,15	$ 833.596,15	68,57%	68,57%
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48,00			24,00		$ 16.863,75	$ 404.730,00	$ 404.730,00	50,00%	50,00%
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110,00	69,08	179,08	110,00		$ 16.863,75	$ 1.855.012,50	$ 1.855.012,50	100,00%	100,00%
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356,60	-300,35	56,25	56,25		$ 34.369,67	$ 1.933.294,03	$ 1.933.294,03	15,77%	15,77%
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00	(6,00)	-	-		$ 68.114,71	$ -	$ -	0,00%	0,00%

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 25			
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7,20			7,20		$ 157.817,72	$ 1.136.287,57	$ 1.136.287,57	100,00%	100,00%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67,71			67,71		$ 5.565,04	$ 376.808,69	$ 376.808,69	100,00%	100,00%
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6,00	3,60	9,60	9,60		$ 101.978,47	$ 978.993,30	$ 978.993,30	160,00%	160,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.				19,00	19,00		$ 305.515,84	$ 5.804.800,90	$ 5.804.800,90	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335,60			281,00	93,00	$ 361.355,09	$ 101.540.779,00	$ 101.540.779,00	83,73%	83,73%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA							**$ 168.977.700,31**			

Ilustración 23 - *Actividades Santa Librada*
Fuente: *Propia*

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20,56			20,56		$ 4.233,48	$ 87.040,26	$ -	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40,30	-31,81	8,49	8,49		$ 31.110,25	$ 264.138,88	$ 989.604,00	21,07%	21,07%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-2,22	17,30	17,30		$ 32.594,26	$ 563.880,63	$ 72.359,00	88,63%	88,63%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-5,96	13,56	13,56		$ 22.300,62	$ 302.396,45	$ 132.912,00	69,47%	69,47%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,65	-2,49	38,16	38,16		$ 12.649,16	$ 482.692,01	$ 31.496,00	93,87%	93,87%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-4,52	15,00	15,00		$ 20.708,69	$ 310.630,28	$ 93.603,00	76,84%	76,84%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11,36	-5,02	6,34	6,34		$ 33.174,37	$ 210.325,50	$ 166.535,00	55,81%	55,81%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 21			
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15,00			15,00		$ 27.281,50	$ 409.222,50	$ -	100,00%	100,00%
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15,00			15,00		$182.479,27	$2.737.188,99	$ -	100,00%	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19,52			19,52		$ 42.650,45	$ 832.536,73	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19,52	-1,99	17,53	17,53		$126.224,49	$2.212.715,38	$ 251.187,00	89,81%	89,81%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,80			0,80		$ 67.218,91	$ 53.775,13	$ -	100,00%	100,00%
WIN DE ALUMINIO	M	3,00			3,00		$ 15.372,99	$ 46.118,98	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44,84			40,81		$116.158,86	$4.740.210,72	$ 468.353,00	91,01%	91,01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00			2,00		$ 41.130,01	$ 82.260,02	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,20			5,20		$707.267,02	$3.677.788,50	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2,16	0,12	2,28	2,28		$1.127.967,67	$2.571.766,29	$ (135.356,00)	105,56%	105,56%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 21			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7,00	1,00	8,00	8,00		$873.470,75	$6.987.765,98	$ (873.471,00)	114,29%	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00			2,00		$616.820,66	$1.233.641,32	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00			5,00		$404.611,28	$2.023.056,40	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00			2,00		$ 41.130,01	$ 82.260,02	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28,82	12,82	41,64	41,64		$ 989.338,20	$41.196.042,70	$(12.683.316,00)	144,48%	144,48%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80	-0,80	1,00	1,00		$989.338,20	$ 989.338,20	$ 791.471,00	55,56%	55,56%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44,84			40,81		$ 36.193,65	$1.476.990,67	$ 145.933,00	91,01%	91,01%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35,50			35,50		$ 21.599,09	$ 766.767,73	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2,16			2,16	2,16	$123.260,52	$ 266.242,73	$ -	100,00%	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111,32			100,19		$ 4.663,84	$ 467.270,00	$ 51.909,00	90,00%	90,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A							$75.074.063,00			

Ilustración 24 *Actividades Estrella del Sur Sede A*
Fuente: *Propia*

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 25			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125,48			56,47		$ 4.233,48	$ 239.064,38	$ 292.152,00	45,00%	45,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68,00			27,20		$ 31.110,25	$ 846.198,69	$ 1.269.298,00	40,00%	40,00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129,54			56,06		$ 32.594,26	$ 1.827.233,99	$ 2.395.026,00	43,28%	43,28%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150,00			76,50		$ 11.376,96	$ 870.337,46	$ 836.207,00	51,00%	51,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40,00			25,00		$ 7.469,97	$ 186.749,17	$ 112.050,00	62,50%	62,50%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100,00			55,00		$ 18.687,73	$ 1.027.825,33	$ 840.948,00	55,00%	55,00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364,26			129,31		$ 12.649,16	$ 1.635.663,09	$ 2.971.921,00	35,50%	35,50%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7,20			5,10		$ 65.869,81	$ 335.936,02	$ 138.327,00	70,83%	70,83%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	22,00			8,80		$ 20.708,69	$ 182.236,43	$ 273.355,00	40,00%	40,00%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 25			
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,61			7,56		$ 33.174,37	$ 250.798,23	$ 631.972,00	28,41%	28,41%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78,00			26,00		$ 27.281,50	$ 709.319,01	$ 1.418.638,00	33,33%	33,33%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35,00			18,85		$ 61.099,39	$ 1.151.723,50	$ 986.755,00	53,86%	53,86%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129,54			101,94		$ 126.224,49	$ 12.867.324,94	$ 3.483.796,00	78,69%	78,69%
WIN DE ALUMINIO	M	30,00			18,00		$ 15.372,99	$ 276.713,90	$ 184.476,00	60,00%	60,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M2	7,20			7,12		$ 1.128.300,90	$ 8.033.502,39	$ 90.264,00	98,89%	98,89%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364,26			177,00		$ 36.193,65	$ 6.406.276,90	$ 6.777.624,00	48,59%	48,59%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119,96	(45,93)	74,03	26,10	8,11	$ 21.599,09	$ 563.736,28	$ 2.027.291,00	21,76%	21,76%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135,38			52,69	32,38	$ 989.338,20	$ 52.128.229,82	$ 81.808.376,00	38,92%	38,92%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5,40	-0,60	4,80	1,20	0,93	$ 989.338,20	$ 1.187.205,84	$ 4.155.220,00	22,22%	22,22%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45,00			14,00	5,00	$ 1.117.185,66	$ 15.640.599,28	$ 34.632.756,00	31,11%	31,11%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364,26			141,40		$ 98.222,57	$ 13.888.672,05	$ 21.889.883,00	38,82%	38,82%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA							**$ 120.255.346,68**			

Ilustración 25 *Actividades Guillermo Cano Isaza*
Fuente: *Propia*

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 25			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193,00	41,34	234,34	234,34		$ 4.233,48	$ 992.072,72	$ (175.012,00)	121,42%	121,42%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39,00			26,00		$ 31.110,25	$ 808.866,40	$ 404.433,00	66,67%	66,67%
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24,83	65,79	90,62	90,62		$ 38.696,24	$ 3.506.652,84	$ (2.545.825,00)	364,96%	364,96%

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 25			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44,28	25,88	70,16	70,16		$ 361.355,09	$ 25.352.672,83	$ (9.351.870,00)	158,45%	158,45%
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44,28	25,88	70,16	70,16		$ 65.757,83	$ 4.613.569,51	$ (1.701.813,00)	158,45%	158,45%
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412,00	(366,94)	45,06	45,06		$ 32.026,28	$ 1.443.104,40	$ 11.751.725,00	10,94%	10,94%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43,00	-7,64	35,36	35,36		$ 190.851,78	$ 6.748.518,96	$ 1.458.108,00	82,23%	82,23%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5,50	-0,80	4,70	4,70		$ 1.120.163,13	$ 5.264.766,69	$ 896.131,00	85,45%	85,45%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964,27	(570,86)	393,41	393,41		$ 4.663,84	$ 1.834.783,56	$ 2.662.416,00	40,80%	40,80%
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150,00	(15,20)	134,80	134,80		$ 383.249,63	$ 51.662.050,10	$ 5.825.394,00	89,87%	89,87%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 102.227.058,00**			

Ilustración 26 Actividades Tenerife – Granda Sur
Fuente: *Propia*

3.3.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA

Para el presente periodo se mantiene la atención de la emergencia en la DILE de Usme (Dirección Local de Educación de Usme), correspondiente a las actividades de impermeabilización en la placa de los tanques de almacenamiento de agua. A la fecha, la atención de esta emergencia presenta un porcentaje de ejecución del 100%.

Para este mismo periodo se cuenta con un presupuesto aproximado para la realización de la emergencia en el DILE (Dirección Local de educación de Usme) por un valor de $ 45.000.000), para la fecha del presente informe el contratista CONSORCIO PAIS, presento un balance para la emergencia contando con un presupuesto actualizado de $ 26.605.858.

De igual forma fueron asignadas dos nuevas emergencias al contratista Consorcio País, una en el colegio Arborizadora Baja sede A por un valor aproximado de $ 46.958.658,67, y la segunda para el colegio Calasanz Buena Vista con un valor aproximado para la emergencia de $ 100.413.274, se encuentra a la espera de unos ajustes a la programación para que inicien las emergencias.

De las dos nuevas emergencias asignadas, a la fecha del presente informe se cuenta con una ejecución financieramente del $ 24.268.941, la cual en avance de porcentaje equivale a un 24.17%, dejando claridad que el valor debe ajustarse para la emergencia debido a las actividades realmente ejecutadas.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

El contratista de obra dispone para el presente periodo con los recursos necesarios para la ejecución de las actividades.

3.4.1 EQUIPO

El contratista ha utilizado los equipos necesarios para la realización de las actividades que se encuentran en cada uno de los frentes de obra.

3.4.2 PERSONAL

Teniendo en cuenta el documento Estudios y Documentos previos, en el numeral de personal clave se menciona:

El proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección

El personal clave para el Grupo 2, Ciudad Bolívar y Usme corresponde al siguiente:

- Un (1) Director de obra.
- Un (1) Residente de obra.
- Un (1) Especialista estructural.
- Un (1) Especialista Ambiental.
- Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Un (1) Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendios.
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.
- Dos (2) técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Dos (2) Inspectores técnicos de obra.

Mediante comunicado **SERINCO-SDE-2025-043-L6- REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA - LOTE 6**, enviado a la Secretaría de Educación Distrital SED se dio aprobación a los profesionales del contratista, sin embargo posteriormente, mediante oficio **SERINCO-SDE-2025-330-L6 CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO E INSPECTOR - LOTE 6**, se realizó el cambio de los profesionales correspondientes a residente e inspector; por lo tanto, esta interventoría dio aprobación a las siguientes hojas de vida:

PERSONAL MINIMO DE OBRA		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR	WILSON LEONARDO PARRA ROBLES	100%
RESIDENTE	FABIO ALBEIRO AGREDO FAJARDO	100%
ESTRUCTURAL	JIMMY VERGARA SILVA	10%
AMBIENTAL	JEISSON ARNULFO SIERRA LEÓN	20%
PROF. SST	YONH JAIRO GUARIN PATERNINA	10%
ESP. ELÉCTRICO	CAMILO ANDRES LANCHEROS COY	10%
ESP. HIDROSANITARIO	JEISSON ARNULFO SIERRA LEÓN	10%
PROF. DE COSTOS	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	10%
TÉCNICO SST 1	CINDY LORENA RIVERA	100%
TÉCNICO SST 2	EDINSON FABER FORERO BARRANTE	100%

PERSONAL MINIMO DE OBRA		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
INSPECTOR DE OBRA 1	ALVARO ZAMIR BENITEZ MENDOZA	100%
INSPECTOR DE OBRA 2	IVAN BAUTISTA MACIAS	100%

3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA

3.5.1 PRESUPUESTO GENERAL

La propuesta económica de CONSORCIO PAIS es de: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CINETO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRENITA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.215.148.733)

Y se cuenta con una adición por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($785.001.422) INC.IVA

3.5.2 PRESUPUESTO POR SEDES

los presupuestos de obra correspondientes a cada una de las sedes intervenidas fueron debidamente revisados y aprobados por esta interventoría, verificando su coherencia técnica, financiera y contractual. En consecuencia, los mismos fueron remitidos formalmente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del oficio SERINCO-SDE-L5-2025-074

3.5.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS

Para este mismo periodo se cuenta con un presupuesto aproximado para la realización de la emergencia en el DILE (Dirección Local de educación de Usme) por un valor de $ 45.000.000), para la fecha del presente informe el contratista CONSORCIO PAIS, presento un balance para la emergencia contando con un presupuesto actualizado de $ 26.605.858.

De igual forma fueron asignadas dos nuevas emergencias al contratista Consorcio País, una en el colegio Arborizadora Baja sede A por un valor aproximado de $ 46.958.658,67, y la segunda para el colegio Calasanz Buena Vista con un valor aproximado para la

emergencia de $ 100.413.274, se encuentra a la espera de unos ajustes a la programación para que inicien las emergencias.

De las dos nuevas emergencias asignadas, a la fecha del presente informe se cuenta con una ejecución financieramente del $ 24.268.941, la cual en avance de porcentaje equivale a un 24.17%, dejando claridad que el valor debe ajustarse para la emergencia debido a las actividades realmente ejecutadas.

Para el desarrollo de este componente, el contrato cuenta con un presupuesto total asignado de ***CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($416.900.290,00),*** destinado exclusivamente a la atención de emergencias, el cual será utilizado conforme a las necesidades que se presenten y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SED y la interventoría.

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado disponibilidad presupuestal según como se indica en la Tabla No.6 Certificado disponibilidad presupuestal – Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780.

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1642	20/02/2025	4924	03/09/2025	$2.332.049.023
3697	05/12/2025	7577	22/12/25	$785.001.422
TOTAL				$3.117.050.445

Tabla 6 - *Certificado disponibilidad presupuestal*
Fuente: *Propia*

3.5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista envía Análisis de Precios Unitarios Contractuales por medio de correo electrónico, el cual, una vez recibido, es revisado y mediante oficio enviado mediante correo electrónico se envían las observaciones generales a los Análisis de Precios Unitarios.

Se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoría y el contratista realiza los cambios correspondientes, los cuales de nuevo remite a esta interventoría y una vez recibida la información se verifica las subsanaciones y son avalados los siguientes APUS:

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
1.1.3	Cerramiento en lona (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro no18 -altura del cerramiento 2m). nota: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico.
1.1.6	Suministro e instalación de lona o polisombra (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención)
1.2.4	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.6	Demolición placa maciza h= 0,08 a 0,10 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.8	Demolición de alistado de piso e= 0.04 a 0.06 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.9	Demolición de acabado y alistado de piso e= 0.08 m a 0.12 m y guardaescoba (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.10	Demolición de muro en mampostería con acabados desde e= 0.13 hasta e= 0.17 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.13	Demolición de enchape de muros y pega (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.17	Demolición de encorozado de cubierta (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados y andamios certificados)
1.2.18	Desmonte de puertas existentes con marco de todo tamaño en madera, metal y aluminio metálicas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.19	Desmonte de ventanas todo tamaño metálicas - madera, incluido rejas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.20	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc. (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.21	Desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes de 6", 4", 3", 2" (incluye excavación, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.23	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye andamios certificados y el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes etc (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.24	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (durastic, madera, dry wall, plástico, incluye andamio certificado, retiro de estructura, accesorios, aparatos eléctricos incrustados, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.32	Desmonte de lámparas (incluye andamios certificados)
1.2.33	Desmonte de red eléctrica (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios y andamios autorizados)
1.2.36	Retiro de manto de aluminio sobre cubiertas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
	a sitios autorizados)
1.2.40	Desmonte de griferías existentes incrustadas en muro tipo lavamanos u orinales corridos (incluye retiro de las mismas)
1.2.41	Desmonte y reinstalación de todo tipo de adoquines usados (incluye conformación de nivel)
1.2.47	Demolición de alistado de piso e= 0.01 a 0.05 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.3.1	Mantenimiento cerramiento metálico existente (incluye soldaduras, reposición de elementos en mal estado, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado)
1.4.1	Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <= 15 cm, profundidad <= 10 cm (incluye corte con pulidora, andamio certificado, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, transporte, resane y acabado de la superficie afectada)
1.4.2	Corte y regatas en concreto para instalación tubería hasta 2" de profundidad. incluye corte con pulidora, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados
1.4.4	Picado de membrana y placa en terrazas, para mejoramiento de adherencia con el pendientado nuevo (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.4.7	Descapote manual y/o maquina desde h= 15 cms hasta h= 20 cms (incluye cargue y retiro de residuos a sitios autorizados)
2.1.1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
2.1.2	Excavación manual en recebo compactado (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
2.1.6	Relleno con material seleccionado
2.1.8	Suministro e instalación de subbase granular tipo idu (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación)
2.2.1	Concreto corriente grava común 3000 psi mezclado en sitio (no incluye acero)
2.2.4	Viga de cimentación en concreto 3000 psi de 20 x 15 cm (incluye formaleta, vibrado, no incluye acero)
2.2.7	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm en concreto de 3000 psi. no incluye refuerzo.
2.2.13	Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. incluye corte y dilatación.
2.3.5	Cinta de confinamiento en concreto de 3000 psi de 10 x 12 cm (incluye formaletas y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).
2.4.1	Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi
2.4.2	Suministro e instalación malla electrosoldada 5 mm, de 0.15 x 0.15 m
2.5.1	Suministro e instalación de estructura metálica. incluye izaje, soldadura, anticorrosivo y esmalte de acabado final (aplica para todo tipo de estructura)
3.1.4	Muro ladrillo prensado macizo
3.1.7	Pañete liso 1:3 sobre muros en área de culatas (hasta 30 cm). incluye filos y dilataciones.

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
4.2.3	Suministro e instalación tubería PVCS 4" incluye accesorios
4.2.4	Suministro e instalación accesorios PVC-S 4"
4.2.11	Suministro e instalación sifón de piso 4" incluye accesorios
4.5.1	Suministro e instalación punto agua fría sanitario tanque 1/2"
4.5.2	Suministro e instalación punto agua fría lavamanos 1/2"
4.5.5	Suministro e instalación punto sanitario 4"
4.5.6	Suministro e instalación punto sanitario 2"
4.6.1	Suministro e instalación registro válvula de bola 1-1/2"
4.7.1	Caja de inspección 60 x 60 cm, incluye tapa prefabricada
4.7.3	Caja de inspección 80 x 80 en mampostería. incluye tapa prefabricada
4.7.7	Limpieza de cajas de inspección (incluye retiro de residuos y disposición final de escombros a sitios autorizados)
4.8.1	Suministro e instalación de filtro zanja de 0.3 x 0.3 m incluye geotextil nt-2000, grava 3/4" y pases PVC longitud max 0.3 m cada 3 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
4.8.2	Suministro e instalación geotextil nt 1600
4..9.12	Sondeo y revisión de desagües
5.1.1	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado libre de halógenos calibre n°12 THHN y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.3	Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halógenos y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.5	Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15r, con cable de cobre aislado calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) libre de halógenos y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye aparato, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.10	Suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 12 circuitos con espacio para totalizador puerta y chapa, barrajes de neutro y puesta a tierra
5.1.15	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 1x30a 10 ka
5.1.25	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 1/2". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.26	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 3/4". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.38	Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halógenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye prensa estopa, caja Rawelt, cable encauchetado, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
5.1.40	Suministro e instalación de panel led de sobreponer 120 x 30cm, 40 w. incluye marco, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados
5.1.46	Suministro e instalación cable desnudo #8 en cobre
5.1.47	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x125 a. materiales certificados Retie e instalados según reglamentación ntc 2050.
7.1.1	Alistado de pisos en mortero 1:3 e= 0.04
7.2.1	Suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye pulido y brillado
7.2.10	Suministro e instalación piso en vinilo tráfico pesado espesor 4 mm
7.2.15	Suministro e instalación enchape para piso formato 45 x45, incluye guardaescoba
7.2.17	Suministro e instalación de piso en caucho elaborado con llanta de carro reciclada EPDM Chips fundible de 3 cm para exteriores
7.2.37	Suministro e instalación enchape pared blanca 30x45
9.1.1	Suministro e instalación de reja metálica modelo persiana construida con marco de tubo HRO 2"x5", tubos horizontales cuadrados de 3/4", rigidizador interior cada metro, incluye terminada con anticorrosivo, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.1.2	Suministro e instalación de puerta metálica con marco en lámina Cold Rolled lisa calibre 18, entamborada con refuerzo interno, bisagras, incluye cerradura de seguridad tipo tejo llave exterior y mariposa interna, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura al horno e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.2.2	Suministro e instalación de ventanería en aluminio con cuerpos fijos y corredizos, con cuerpos de rejilla superior o inferior y alfajía, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes. instalada y sellada contra entrada de humedad, verificar en obra medidas, ángulos y de acuerdo a modelos de diseño sed. (aplica color crudo o blanco)
9.3.7	Suministro e instalación cerramiento perimetral reforzado en malla preondulada calibre 8 hueco 2", ángulo 1" x 1/8" pisa malla en ángulo de 3/4" x 1/4", parales de 2 1/2" x 2 1/2" en 3 mm con sujetadores de varilla de 5/8" y refuerzos diagonales en platina de 1-1/2"* 1/8" (incluye todos los insumos, materiales, mano de obra y transporte)
9.3.10	Suministro e instalación de divisiones de orinales en acrílico recuperado de 10 mm diseño de animales, módulos de 40 x 90 x 1 cm, incluye soportes en acero inoxidable de 1-1/2" anclado al piso
10.1.5	Suministro e instalación taza institucional línea adulto color blanco (incluye válvula de control y descarga tipo push, brida de 4" y sellante)
10.1.7	Suministro e instalación orinal línea adulto color blanco (incluye grifería tipo push)
10.1.11	Suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio, faldón frontal de 30 cm, salpicadero de 6 cm, reengruese de 3 c
10.1.12	Suministro e instalación de grifería de lavamanos (incluye grifería tipo push, acople y sifón)
10.1.15	Suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20 plástica

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
10.1.16	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 3"
11.1.4	Suministro e instalación de divisiones para baño institucional compuesta de puertas y paneles en acero inoxidable tipo 304 antiácido, calibre 20, entamborado de 1"
11.1.10	Desinstalación de parque infantil en zona verde.
11.1.10	Desinstalación e instalación de parque infantil en zona verde.
12.1.2	Pañete muro acabado liso 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones (incluye andamio certificado)
12.1.7	Estuco filos sobre pañete (incluye andamios certificados) inferiores a ,60 cm
12.1.9	Pañete carteras muros, culatas, columnas y vigas acabado liso 1:4 hasta 0,60 m de ancho (incluye andamio certificado)
12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados)
12.2.2	Pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos - (hasta 60 cm)
12.2.3	Pintura epóxica a 3 manos, incluye andamio certificado
12.2.4	Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados)
12.2.5	Pintura para exteriores de alta resistencia a tres manos (a = 0.6 m) (incluye andamios certificados)
12.3.1	Esmalte sobre puertas y marcos metálicas dos caras
12.3.2	Esmalte sobre ventanería y rejas de seguridad metálica
14.1.2	Suministro e instalación espejos biselados 1.5 de e= 4 mm
16.1.1	Flanche lámina galvanizada cl. 20 - desarrollo 80 cm incluye andamio certificado
16.1.3	Bajante en PVC blanco (incluye andamios certificados)
16.1.11	Suministro y montaje de estructura metálica en perfil estructural en c para cubierta, incluye andamio certificado, anticorrosivo y pintura esmalte en una cuantía de 11 kg/m2
16.1.13	Tratamiento de fisuras mediante un sellador Elastomérico monocomponente a base de poliuretano (incluye imprimante de alta adherencia con el concreto existente)
16.1.15	Suministro e instalación de lámina policarbonato con protección uv, calibre 8 mm, traslúcido blanco, incluye accesorios necesarios para su correcta instalación
16.1.18	Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich (ancho = 300 a 400 mm) con aislante en poliuretano con un espesor entre 30 mm y 40 mm. panel metálico inferior y superior en aluzinc calibre 26 pintados dos (2) caras con pintura poliéster libre de aceites - fijación con clips invisibles en lámina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. se pagará según los metros cuadrados realmente instalados).
16.1.19	Suministro e instalación de caballetes para cubierta modular tipo sándwich
16.1.20	Suministro e instalación de platina de 2"x1/8" sobre correas para fijación de teja termoacústica
16.1.21	Suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliurea pura de alto desempeño e= 2 mm

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
16.1.22	Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 18 desarrollo (80 a 100 cm). incluye soportes metálicos para fijar la canal en la fachada, anticorrosivo y pintura en esmalte.
16.1.25	Afinado impermeabilizado pendientado mortero 1:3 e= 0.10 m para cubierta no transitable de bloque 11 (cocina)
18.1.1	Aseo general final y limpieza
18.1.4	Protección provisional de elementos y superficies existentes con cartón corrugado, plástico o similar (incluye retiro y disposición).

Tabla 7 - Listado APU´S
Fuente: *Elaboración Propia*

Para las obras programadas, el contratista CONSORCIO PAIS presentó por medio de correo electrónico para la aprobación el informe preliminar de obra, la interventoría realizó el estudio, revisión y observaciones del documento entregado por el contratista que incluye:

El informe contiene un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de obra en cada sede a intervenir.

Una vez recibida y revisada la información, de acuerdo con las observaciones realizadas, el contratista subsana la información y la remite para revisión y a la misma se proporciona aprobación. En consecuencia, los mismos fueron remitidos formalmente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del oficio SERINCO-SDE-L6-2025-040.

3.5.5 ESTADO FINANCIERO

A. EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe lo que el contratista Consorcio País a ejecutado se puede evidenciar en el anexo No.2 Informes Semanales.

B. FORMA DE PAGOS EFECTUADOS

(…) El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a. La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. b. La Entidad efectuará al Contratista pagos

mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. c. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado del Contrato, el cual se hará a la una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. d. Dicha información será verificada por parte del interventor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de pago.

ACTA	%	VALOR	ESTADO
1	11,6%	$ 361.718.611,00	PAGADO
2	13,97%	$ 435.348.486,00	PAGADO
3	25,07%	$ 781.384.254,00	EN TRAMITE
TOTAL	**50,64%**	**$ 1.578.451.351,00**	

Tabla 8 - *Pagos Realizados*
Fuente: *Elaboración Propia*

Para el periodo del presente informe el contratista Consorcio País se encuentra en la elaboración del acta parcial No.3

3.6 ESTADO DEL TIEMPO

Se presentan lluvias durante el presente periodo que han afectado la realización actividades en exterior. Dicho reporte está estipulado en las diferentes bitácoras de cada una de las obras que se han iniciado en los diferentes colegios.

3.7 RESULTADOS DE LABORATORIO

El contratista de obra **CONSORCIO PAÍS**, en el informe técnico, presenta las fichas técnicas de los materiales utilizados en las actividades de obra, los ensayos de laboratorio realizados se evidencian en los informes mensuales anteriores.

3.8 OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones de la licitación Pública. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.	Si cumple, el contratista consorcio País subió las pólizas a la plataforma SECOP II, las cuales fueron aprobadas el día 29/10/2025	
2	Cumplir a cabalidad el contrato, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.	Cumple con lo estipulado en el contrato	
3	Acreditar durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la industria de la Construcción – FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Cumple aplica para el presente periodo	Al momento del presente periodo se ha realizado el pago del acta parcial No.1, y el pago del acta parcial No.2
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar.	No aplica para el presente periodo	
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.		
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.	El contratista a la fecha cumple con lo estipulado en la obligación	
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones	Cumple a la fecha el contratista cuenta con la aprobación de las garantías de acuerdo al contrato y acta de inicio.	
8	Entregar al interventor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	No aplica para el presente periodo	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través de la interventoría del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	a la fecha del presente informe cumple con los requerimientos	
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento	Cumple Parcialmente	De acuerdo a los avances presentados debe presentar un plan de contingencia

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
			para cumplir con la obligación
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que el contratante tenga prueba de que el contratista ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, el contratista indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause al contratante. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.	Cumple	
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia., ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Cumple, a la fecha no se han presentado reportes negativos de acuerdo a la obligación.	
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_ institucional/transparencia-políticas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	A la fecha el contratista cumple con lo estipulado en la obligación	
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los documentos previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén	A la fecha cumple con lo estipulado en la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del Contrato.		
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.	Cumple a la fecha con la obligación	
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental. política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Cumple a la fecha con la obligación	
17	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo mínimo de mujeres, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", modificado por el Decreto 634 de 2023 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.	Cumple	Se presentan en el informe mensual del contratista
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal del contratista, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.	Cumple para el presente periodo del informe	
19	Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico, en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el	No aplica para el presente periodo.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.		
20	El contratista tiene la obligación en relación con sus colaborades, evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	Cumple no se ha reportado nada referente a la obligación	
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Cumple no se ha reportado nada referente a la obligación	
22	El contratista deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Cumple	
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Cumple	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Cumple a la fecha con la obligación	
25	Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante.	Cumple a la fecha con la obligación	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Cumple	
27	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
28	Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Cumple	
29	Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	Cumple	
30	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Cumple a la fecha la obligación	
31	Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. Por el contrario, el contratista se compromete a utilizar elementos y procedimientos que recomienden los fabricantes con el fin de cumplir a cabalidad con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	No aplica.	A la fecha no a realizado la instalación de alguno de los materiales que en la obligación mencionan.
32	Comunicarle a la Interventoría para su respectiva corroboración, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Cumple	
33	Informar trimestralmente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	No aplica	No se ha presentado aun la información que la obligación requiere.
34	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	No aplica para el presente periodo.	
35	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	No aplica para el presente periodo.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
36	Comunicar durante la ejecución del contrato a la interventoría y/o a la Entidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecta su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	No aplica para el presente periodo.	
37	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.	No aplica para el presente periodo.	
38	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.	Cumple	
39	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	A la fecha cumple con el personal, presentado en cada uno de los frentes de obra.	
40	Asumir especial cuidado de la infraestructura y los muebles de la zona a intervenir, comprometiéndose a no afectar ningún elemento o lugar que no corresponda a la ejecución de las actividades. En consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.	Cumple, de haber afectaciones el contratista deberá reparar o restituir lo que llegase a dañar.	
41	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje de personal indicado por la Entidad, consistente en personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con formación para el trabajo en el sector de la construcción, conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del Decreto Distrital 380 de 2015.	No aplica para el presente periodo.	
42	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.		
43	Presentar a la interventoría el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional que se vincule para la ejecución de las obras. El personal del Contratista no podrá ingresar a las instituciones educativas sin que se haya realizado la verificación de estos antecedentes por parte de la Interventoría, por lo tanto, el Contratista deberá remitir los certificados con la antelación suficiente que no afecte las actividades programadas.	Cumple, se presenta cada mes y cada vez que un nuevo personal ingresa a los frentes de obra.	
44	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada, en un porcentaje a convenir con la interventoría dependiendo de las condiciones del mercado laboral y del porcentaje de inclusión de las demás poblaciones específicas, vinculando a la ejecución del contrato jóvenes de la región, entre los 18 y 28 años, priorizando a aquellos que no tienen experiencia con la labor a contratar. El Contratista deberá realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar a su personal en el oficio en cuestión.	Cumple para el periodo del presente informe	
45	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región (Bogotá D.C.) en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	Cumple para el periodo del presente informe	
46	Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.	No aplica para el presente periodo.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
47	Incorporar como mínimo el porcentaje ofertado en el formato "PROMOCION_A_LA_INDUSTRIA_NACIONAL" de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.	Cumple	
48	El contratista deberá responder en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a cualquier requerimiento realizado por la interventoría o la Entidad contratante en relación con la calidad y estabilidad de la obra. En caso de no dar respuesta dentro de dicho plazo, la SED podrá iniciar el correspondiente proceso administrativo sancionatorio contractual, basado en el informe de presunto incumplimiento emitido por la interventoría y conforme a las condiciones estipuladas en el contrato.	A la fecha el contratista no ha requerido de dar respuesta en los días que estipula la obligación	
49	Realizar, a través de sus profesionales, un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas, el plazo establecido en el Anexo Técnico para su intervención y conforme a la programación presentada por el contratista para cada una de las actividades de las IED. Lo anterior con el acompañamiento y supervisión integral de la interventoría.	Se cuenta con el avance semanal que realiza la interventoría	
50	El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 519 del Estatuto Tributario y en el Decreto 175 de 2025.	Cumple	

Tabla 9 - *Obligaciones Generales Contratista*
Fuente: *Elaboración Propia*

3.9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Obligaciones previas para la suscripción del contrato Finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, una vez surtida la notificación de la Resolución de Adjudicación de este, deberá realizar: 1. Suscripción del contrato Deberá realizarse en el término dispuesto por la Entidad, el cual no podrá superar los tres (3) días hábiles Para el caso de uniones temporales o consorcios se podrá ampliar el plazo anteriormente indicado, únicamente si dentro del mismo periodo de suscripción (3 días hábiles) se solicitó atención	Cumple, el contratista realizo la entrega de los documentos estipulados en la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	en el sistema de agendamiento de citas de la DIAN para la obtención del RUT, y esta fue asignada con posterioridad a los tres (3) días hábiles establecidos. Si el adjudicatario injustificadamente no firma el contrato dentro del plazo fijado, la Secretaría de Educación del Distrito podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, en concordancia con el articulo 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993. La no firma del contrato por parte del adjudicatario, dará lugar a que la Secretaría de Educación del Distrito declare el siniestro y haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados no cubiertos por el valor de la garantía. (Art. 30, Numeral 12 Ley 80/93).		
2	Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá radicar en la Oficina de Contratos de la SED y publicar en la plataforma transaccional del SECOP II todas las garantías solicitadas en el presente documento. La Oficina de Contratos de la SED, a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá dos (2) días hábiles para realizar las correcciones a las pólizas y radicarlas nuevamente en la SED. Una vez el contratista entregue a satisfacción de la SED los documentos requeridos, la Entidad tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles para su aprobación. De esta manera, se establece el proceso para la corrección y ajustes a las garantías establecidas el cual no deberá superar los plazos establecidos en el párrafo anterior.	El contratista realizo la entrega de la documentación requerida en la obligación y subió las pólizas a la plataforma SECOP II, las cuales fueron aprobadas el día 29/10/2025	
3	Obligaciones para la suscripción del Acta de inicio: Se suscribirá el acta de inicio una vez que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Aprobación de las garantías por parte de la Entidad. 2. Expedición del Registro Presupuestal. 3. Suscripción Acta de inicio del contrato de Interventoría de obra. 4. El Contratista deberá entregar a la secretaria de Educación del Distrito el comprobante de pago del impuesto	El contratista realizo la entrega de la documentación requerida en la obligación a la entidad y subió el acta de inicio a la	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	de timbre ante la secretaria de Hacienda con ocasión a la suscripción del contrato, teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato a celebrar es superior a 6.000 UVT ($298.794.000). Ahora, ya que la entidad es exenta del pago del impuesto, el porcentaje de dicho impuesto debe ser por el 0,5% del valor del contrato sin IVA de conformidad con lo señalado en el ET. Art. 519 como requisito para la suscripción del acta de inicio.	plataforma SECOP II, el día 09/10/2025	
4	Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio: Al día siguiente de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA recibirá un comunicado por parte de la Interventoría, en el que se enunciará la lista de documentos técnicos a presentar para su validación y aprobación con los respectivos plazos, los cuales deberán ser entregados en su totalidad en máximo diez (10) días hábiles. La Interventoría revisará la documentación entregada por el contratista y realizará las observaciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recepción, en el caso de las hojas de vida del personal mínimo requerido, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción para el resto de los documentos. El contratista deberá realizar las correcciones y/o modificaciones solicitadas por el interventor a más tardar tres (3) días hábiles después de la notificación de las observaciones. El interventor aprobará los documentos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Este proceso establece un plazo total máximo de 21 días hábiles para que el contratista entregue los documentos requeridos para el inicio de la ejecución de actividades, y para que la interventoría los revise y realice las observaciones pertinentes. El contratista deberá atender los requerimientos del interventor, responder a las observaciones y entregar los documentos corregidos en tiempo y forma, con el fin de no superar el plazo establecido.	La interventoría remitió mediante oficio SERINCO-SDE-L6-2025-012 en el cual se le requería al contratista la documentación mencionada en la obligación mencionada.	
5	Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental 1. Ambientales El contratista deberá realizar la obra de conformidad con la legislación vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o distrital) conforme el objeto y alcance del contrato a intervenir en especial en materia ambiental y recursos hídricos.	Cumple	
6	Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 1. Información sobre el	Cumple	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	personal profesional 2. Personal Clave 3. Requisitos del personal del Contratista para cada uno de los lotes 4. Actividades mínimas del personal Clave 5. Verificación de la Experiencia del Personal Clave 6. Otras obligaciones del Contratista frente al Personal Clave.		
7	Maquinaria mínima del proyecto. Para el desarrollo de la obra, el contratista deberá contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución de cada actividad prevista en las sedes a intervenir, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. Además, deberá suministrar estos elementos en las fechas estipuladas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. De igual manera, por proceso, método constructivo, ajuste en insumos o de actividad especifica, el contratista de obra garantizará el suministro de equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, garantizando una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo contractual, sin que esto genere costos adicionales para las partes. De ser necesario, por la magnitud de la obra, condiciones de movilidad y/o avance del proyecto, el contratista podrá plantear la utilización de equipos que permitan optimizar los procesos constructivos, sin que esto genere costos adicionales para las partes.	Cumple con la obligación	
8	Examen del sitio de la obra. Es responsabilidad del Contratista conocer la ubicación y situaciones particulares donde se adelantan las obras e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.	Cumple con la obligación	
9	Señalización De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de		

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. Dar cumplimiento a la Resolución 4474 del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente "Por la cual se modifica la Resolución 5453 de 2009 respecto de las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y pasacalles en el distrito capital".	Cumple con la obligación	
10	Obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El contratista deberá cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral respecto del personal a su cargo (Salud, pensión y riesgos laborales).	Cumple con la obligación	
11	Gestión Social a. El contratista deberá ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas para prevención de accidentes y el plan de emergencia, el cual socializará de forma clara y oportuna a todos los trabajadores vinculados en las obras y a la comunidad de la zona de influencia del proyecto. b. El contratista realizará los levantamientos de las actas de vecindad y las vías aledañas al lote donde se ejecutarán las obras. c. El contratista deberá asegurar y tener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar que la población aledaña ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras. d. El Contratista deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de influencias del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras previa aprobación de la Interventoría y validado por la SED. e. El Contratista deberá tener especial atención con la población estudiantil en condición de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la capacitación de acciones adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades especiales de dicha población. f. El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo, conforme a las Resoluciones 2413 de 1979 emitida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Industria de la Construcción, y la Resolución 2013 de 1986 emitida por la misma cartera ministerial, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Así mismo, el contratista implementará un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y gestión de seguridad y salud en el trabajo. g. El contratista se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Profesional designado para tal fin.		
12	Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. a. Durante la ejecución de las actividades de mejoramiento programado el Contratista deberá mantener la ejecución simultanea de obras programadas, en las sedes asignadas distribuidos entre las sedes educativas y administrativas. Estas sedes deberán contar con personal permanente dedicado al desarrollo de las actividades, y el número de frentes podrá incrementarse según las necesidades de atención de emergencias que requiera la SED. El Contratista deberá asignar el personal operativo conforme a lo indicado en el pliego de condiciones, garantizando la dedicación exclusiva de dicho personal para cada sede en intervención, con el fin de cumplir con el alcance del objeto contractual. b. Con antelación a la ejecución de las obras de mejoramiento programadas, el contratista deberá informar al rector y/o coordinador de la sede, con mínimo cinco días (5) hábiles de antelación, sobre el desarrollo de las mismas. c. El Contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a intervenir, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas, con el fin de proteger el sitio de construcción del acceso de personas ajenas a los trabajos, evitar perturbaciones al tránsito y minimizar las incomodidades para terceros. El cerramiento deberá tener una altura mínima de dos (2) metros y contar con toda la señalización preventiva necesaria para garantizar la circulación segura del personal de obra, los vecinos, terceros y la población estudiantil. Asimismo, el Contratista	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	será responsable del mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecución de la obra. d. Previo al inicio de las obras el contratista hará el registro de los sumideros aledaños a las sedes de obra y los mantendrá en iguales o mejores condiciones a las iniciales, hasta la finalización de las obras. e. Igualmente, previo al inicio de actividades el contratista hará el registro de las vías de acceso aledañas, las cuales serán mantenidas permanentemente libres de residuos de material particulado proveniente de las obras.		
13	Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción. a. El Contratista deberá ejecutar las obras utilizando todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. b. El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas establecidas en su cronograma de obra, para cada sede a intervenir. c. El Contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución de la obra. En este sentido, no se aceptarán saldos de materiales o en condiciones inadecuadas. d. El Contratista será responsable de realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las pruebas necesarias o solicitadas para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.	Cumple	
14	Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar) a. Ejecutar las reparaciones o demoliciones adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal a su cargo ni a las personas de la comunidad educativa. Para ello, deberá aislar el área de trabajo mediante un cerramiento provisional, de manera que se impida el acceso al lugar de la reparación o demolición a personal no autorizado. Esta medida debe estar reflejada en el Plan de Seguridad Industrial y en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. b. Cumplir con la normativa vigente relacionada con el transporte y la disposición adecuada de los escombros generados, conforme a las "Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental" especificadas en el presente estudio previo. c. Gestionar ante las autoridades	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	correspondientes la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de las obras. d. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza, dentro de un plazo no mayor a 5 días. e. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención durante la ejecución de la obra. f. Realizar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas, como consecuencia de defectos de estabilidad, así como en las áreas contiguas que presenten deterioro. g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, cualquier actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por problemas con los insumos o con la mano de obra, dentro del plazo indicado por el interventor o la SED. Igualmente, deberá reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por las intervenciones realizadas. h. Entregar las instalaciones a la interventoría y a la SED en funcionamiento, con todas las conexiones a servicios públicos completas y operativas.		
15	Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	Cumple con la obligación	
16	Obligaciones relacionadas con el Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED. El Contratista de Obra deberá cumplir con los "Lineamientos para proyectos de Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED", elaborados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC). En caso de no cumplir con esta obligación, el contratista asumirá los costos por los posibles daños que puedan generarse como resultado de la falta de coordinación.	Cumple con la obligación	
17	Obligaciones en Materia de Servicios Públicos. a. Realizar cuando sea necesario, las adecuaciones provisionales requeridas para utilizar los servicios públicos de la sede del colegio o la sede administrativa a intervenir, previa autorización de la SED. Dichas adecuaciones no podrán alterar ni modificar el servicio continuo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la edificación. Al finalizar las obras, el contratista deberá retirar las instalaciones provisionales que haya implementado y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes que	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	haya intervenido. Además, deberá solicitar la liquidación de los consumos pagados por la SED y realizar el pago correspondiente como requisito para obtener el Paz y Salvo. b. Estar a Paz y Salvo por concepto del consumo de servicios públicos utilizados durante la ejecución de la obra como requisito previo para la suscripción del acta de liquidación. Para ello, la SED y la interventoría contratada verificarán que se hayan pagado los consumos de los servicios provisionales, que estos hayan sido desconectados y que se haya solicitado la paz y salvo a la empresa respectiva. En caso de no haberse contado con servicios provisionales, se establecerá un sistema de medición de los consumos atribuibles al Contratista, cuyo valor será liquidado por la interventoría y facturado por el área de servicios públicos de la DCCEE para su pago. c. Tramitar todos los permisos necesarios para la realización de las obras que impliquen la obtención de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, deberá notificar oportunamente a la SED sobre los trámites que realice, para que la SED pueda acompañar este proceso.		
18	Obligaciones de información. a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, como mínimo, la siguiente información por cada sede de trabajo: b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como mínimo: c. Llevar una bitácora de obra, que será una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. En ella se deberán registrar las órdenes de la interventoría, los conceptos de los especialistas (si fueran necesarios), las visitas de funcionarios relacionados con el proyecto, etc., de manera que se logre una comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, conforme a la programación detallada. La bitácora deberá estar debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. Los delegados de la SED podrán acceder a ella cuando lo requieran. d. Elaborar durante todo el proceso de la obra un manual de uso y mantenimiento en el que se especifiquen los materiales de obra de uso permanente (pisos, muros, cubiertas, aparatos, etc.), su funcionamiento y	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	mantenimiento. Este manual deberá incluir las especificaciones y garantías de todos los equipos, además de los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales, en una escala reducida pero legible. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría. e. Presentar quincenalmente un registro fotográfico y de video que muestre el avance de la ejecución de la obra, procurando capturar el progreso desde el mismo punto de vista, para facilitar la comparación del avance. f. Elaborar y presentar, junto con la interventoría, las actas de entrega física de obra, y acta de liquidación, las cuales deberán ser radicadas en la SED dentro de los plazos establecidos.		
19	Aprobación de ítems no previstos del Contrato Los ítems o actividades no previstas son aquellas obras que no fueron pactadas al inicio del contrato debido a que resultaban imposibles de prever o contemplar previamente. No obstante, estas actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, debido a su conveniencia y oportunidad técnica.	No aplica para el presente periodo	
20	Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos para la obra. El contratista de obra presentará a la interventoría correspondiente, para su aprobación, los análisis de precios unitarios de su propuesta económica, dentro del plazo establecido en el numeral "g.4.1. Documentos requeridos para el inicio de ejecución de actividades." del presente documento. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte de equipo especial y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad.	Cumple con la obligación	
21	Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato. Teniendo en cuenta que corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito realizar la verificación de la entrega material de la obra, a través de la interventoría contratada para tal fin, y asegurar la entrega a la entidad de los soportes o productos	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	documentales correspondientes, la SED ha establecido un procedimiento para llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de las obras, el cual deberá completarse en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución para cada una de las Sedes.		
22	Documentos mínimos requeridos para la terminación y liquidación del contrato	No aplica para el presente periodo	
23	Advertencia anticipada. El contratista deberá advertir al interventor en un término no mayor tres (3) días hábiles a partir de que tenga conocimiento sobre posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, el cronograma planteado y los demás elementos del contrato, y las estrategias a implementar para ser analizadas por parte del interventor y la SED para reducir el impacto en el desarrollo del proyecto de dicho evento.	No aplica para el presente periodo	
24	Obligaciones especiales El contratista será responsable de todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al Interventor y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión, mediante informe con el levantamiento y conservación de los restos.	No aplica para el presente periodo	
25	Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación. El Contratista deberá participar junto con la SED, el Interventor, y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión y la Dirección de Construcción de Establecimientos Educativos, en tres (3) socializaciones, al inicio de las obras, durante su ejecución y en la entrega a la comunidad y las actividades correspondientes de promoción de la apropiación y sostenibilidad de las obras programadas. El contratista, deberá suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten la obra. Será facultativo marcar los uniformes del personal de obra con identidad visual del Distrito capital, con base en el Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá vigente al momento de suscribir el acta de inicio.	Cumple con la obligación	
26	Obligaciones de trámites y permisos El contratista deberá efectuar los siguientes trámites y permisos ante las	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Entidades correspondientes si aplica en cumplimiento de la normatividad vigente		
27	Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato. El contratista se compromete a realizar las reparaciones necesarias por defectos en los procesos constructivos o por la calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un periodo de dos (2) años a partir de la recepción satisfactoria de la obra por parte de la interventoría y de la SED.	No aplica para el presente periodo	
28	Obligaciones en materia logística del contrato. Para la ejecución de contratos de obras de mejoramiento en varias sedes de colegios distritales, al contratista se le asignará un espacio en cada sede a intervenir, destinado a que sea utilizado para el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas durante la ejecución de las obras. Al finalizar la intervención en la sede respectiva, el contratista deberá entregar el sitio de almacenamiento en iguales o mejores condiciones en las cuales fue entregado al iniciar las obras. La seguridad y vigilancia de los materiales, equipos y herramientas será de su completa responsabilidad, la SED no se hará responsable ni hará pago alguno de reconocimiento de materiales.	Cumple con la obligación	
29	Cumplimiento de los códigos y normativas. Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas.	Cumple con la obligación	

Tabla 10 - *Obligaciones Especificas Contratista*
Fuente: *Elaboración Propia*

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
	MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS "
CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110
VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131.00) INC. IVA
VALOR ADICIÓN	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) INC.IVA
VALOR FINAL	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($924.609.851,00) INC. IVA
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PRORROGA	UN MES (01) Y QUINCE DIAS (15)
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Tabla 11 - *Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110*
Fuente: *Propia.*

4.1.1. GARANTÍAS

A continuación, se encontrarán las garantías que exige la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** al interventor con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen por medio del contrato, para la fecha del presente informe se encuentran actualizadas según el ACTA DE INICIO suscrita el 6 de octubre de 2025.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 0

TIPO DE MODIFICACION	POR SUSCRIPCION DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICION	09/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	04/10/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	04/04/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	04/04/2026	04/04/2031	$ 159.236.827,00
ACTA DE INICIO			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 1 y 2		
TIPO DE MODIFICACION	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICION	08/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	06/10/2025	05/11/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	06/10/2025	06/05/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2026	06/05/2031	$ 159.236.827,00
MODIFICACION No.1 – ADICION Y PRORROGA			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 6		
TIPO DE MODIFICACION	POR MOFICICACION No.1 – ADICION Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICION	31/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEFGURADO**
	INICIO	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	20/12/2026	$ 184.921.970,20
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	20/06/2029	$ 92.460.985,10
CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2026	20/06/2031	$ 184.921.970,20

Tabla 12 - *Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110*
Fuente: *Propia*

4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

4.2.1 ADMINISTRATIVAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades administrativas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Revisión de balances y alcances de actividades para cada IED. Se realizan revisiones, se enuncian las respectivas observaciones y se celebran mesas de trabajo para aterrizar los balances de cada sede. Se presentaron balances ajustados por parte del contratista consorcio País, los cuales se encuentran en revisión.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
- Programación y visitas técnicas para los frentes de obra y de las emergencias asignadas.
- Elaboración de informes semanales de interventoría No.22, No.23, No.24, No.25.
- Seguimiento de actividades realizadas en cada una de las instituciones educativas mencionadas anteriormente.
- Elaboración de comunicaciones referentes a estados de cada frente de obra, solicitudes de planes de contingencia teniendo en cuenta los atrasos en cada frente
- Elaboración de comités de obra.
- Elaboración de informes Mensuales de acuerdo con el periodo de corte.

Anexo 3. Actas de comité

Durante el periodo del presente informe la interventoría realizó las siguientes actividades en el área SST Y ambiental:

- Se valida y se da aprobación del Plan de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista de obra Consorcio País.
- Se valida y se da aprobación del personal de ingreso operativo del contratista de obra Consorcio País.
- Se realiza inducción y notificación de riesgos al personal contractual de la interventoría Consorcio Serinco Educativo.
- Se realizan las afiliaciones al sistema general de riesgos laborales, exámenes médicos de ingreso del personal de interventoría.
- Se valida planilla de Seguridad Social del contratista de obra Consorcio País.
- Se valida el alcance de los documentos de trabajo seguro en alturas emitido por el contratista de obra Consorcio País.
- Solicitud del personal contractual completo del contratista
- Verificación y aprobación de afiliaciones y exámenes de los subcontratistas.
- Organización documental.
- Se realiza seguimiento al plan ambiental con enfoque PIGA.
- Se identifica la adecuación de puntos de acopio para la acumulación de los materiales RCD generados a partir de las demoliciones realizadas.
- Se realiza retiro de material RCD.
- Se identifica ingreso de material pétreo a la obra.

- No se realiza aprovechamiento ni circularidad de RCD por el contratista de obra en el presente periodo.
- El contratista da cumplimiento al cronograma de capacitaciones ambientales y el plan de trabajo de este.

4.2.2 TÉCNICAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Visitas técnicas de verificación de cantidades y avances en cada una de las instituciones educativas, en cuanto a mantenimientos y emergencias.
- Acompañamiento técnico en campo para la verificación de condiciones estructurales y constructivas, con participación de los residentes y director de la interventoría, registrando observaciones que deberán ser atendidas por el contratista.
- Revisión y validación de los APUs técnicos correspondientes a cada sede, verificando la coherencia entre los precios, las cantidades y los recursos propuestos, de igual forma revisión y validación de ítems No previstos.
- Verificación de cumplimiento normativo en materia de seguridad, calidad y medio ambiente, previo al inicio de las actividades constructivas.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista y subcontratistas, verificando cumplimiento en materia de seguridad social y exámenes médicos ocupacionales.
- Revisión de acta de corte de obra y de igual forma revisión de informes mensuales de cada uno de los componentes

4.2.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- La Interventoría efectuó la revisión detallada del alcance técnico y económico del contrato, verificando que las actividades descritas en las especificaciones y planos correspondan con las cantidades de obra incluidas en el presupuesto. Se elaboró registro de observaciones en caso de inconsistencias o diferencias entre el alcance contractual y los documentos de soporte técnico.

- Se llevó a cabo la revisión técnica de la programación presentada por el contratista, verificando su coherencia con el plazo contractual, los hitos definidos y la secuencia lógica de las actividades constructivas. Se realizaron observaciones respecto al orden de ejecución, distribución de recursos y cumplimiento de tiempos previstos, con el fin de garantizar una adecuada planeación del proyecto antes del inicio de las actividades en campo.
- La Interventoría adelantó la revisión técnica y económica de los APU remitidos por el contratista, verificando que los insumos, rendimientos, costos horarios de maquinaria y porcentajes de AIU se encuentren acordes con el mercado y con lo estipulado en los documentos contractuales, y de igual forma se realizó la revisión de los ítems no previstos para ser aprobados por parte de la supervisión
- La Interventoría realizó la revisión técnica y económica de los presupuestos discriminados por institución educativa, de igual forma cada uno de los balances de acuerdo con las actividades que se encuentran en ejecución con el fin de verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las actividades descritas en los diseños y especificaciones técnicas, y los valores unitarios.
- Revisión semana por semana para verificación de actividades realizadas y de avances de obra.
- Revisión de acta parcial de obra, para el respectivo trámite ante la entidad contratante.

4.2.4 LEGAL

Esta interventoría ha revisado según las obligaciones contractuales como lo son:

- La verificación durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra e interventoría, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo, el cual se encuentran aprobadas y en cubrimiento las pólizas actualizadas de los contratos.
- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
- Se realiza la revisión de los informes mensuales de acuerdo al periodo.
- Se realiza la elaboración de los informes mensuales de acuerdo a cada uno de los periodos incluyendo el de mención del 06 de abril de 2026 al 05 de mayo de 2026. En el cual se consolida la información técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental.

4.3 RECURSOS DEL INTERVENTOR

Los recursos con los cuales ha contado CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO para el desarrollo del contrato de Interventoría y la supervisión del contrato de obra son los siguientes:

4.3.1 PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta los estudios previos el cual menciona en el G.7 EQUIPO DE TRABAJO, y en el literal G.7.1 personal Clave, La planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el objeto del contrato será la siguiente:

- Un (1) Director de interventoría
- Un (1) Profesional de Apoyo Técnico
- Tres (3) Residentes de interventoría
- Un (1) Especialista estructural
- Un (1) Especialista ambiental
- Un (1) Especialista en Redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en Redes Hidrosanitarias, Gas y red contra incendio
- Un (1) Profesional en seguridad y salud en el trabajo
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra
- Un (1) Asesor jurídico
- Seis (6) Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Seis (6) Inspectores de interventoría

Mediante comunicados, ***SERINCO-SDE-L6-2025-005-REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-010-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA, SERINCO-SDE-2025-023-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-027-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA*** se radicaron ante la Secretaría de Educación Distrital las hojas de vida de los profesionales que harán parte del contrato de interventoría, la entidad por medio de comunicados No. S-2025-320192_RTA da respuesta mencionando que como resultado al análisis realizado a las hojas de vida presentadas por el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO y de acuerdo con los criterios establecidos en la minuta del contrato en el numeral G.4 en la página No. 19 en la obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio cita lo siguientes: *" El Interventor deberá presentar el día hábil siguiente a la suscripción del Acta de inicio, las hojas de vida y los soportes del personal mínimo requerido, diferente al Director y al profesional de apoyo. La supervisión revisará las hojas de vida, con sus soportes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación de la*

documentación por parte de la interventoría. De presentarse observaciones estás deberán subsanarse por el contratista interventor en el término de tres (3) días hábiles. Recibidas las subsanaciones, la supervisión tendrá un (1) día hábil para la aprobación definitiva del personal mínimo requerido". Posteriormente, mediante el oficio SERINCO-SED-2025-265-INT-RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA, la interventoría solicitó el cambio de seis (6) profesionales, correspondientes a tres (3) Inspectores de Obra y tres (3) Técnicos SST, presentando las respectivas hojas de vida y soportes para su evaluación. En respuesta, la entidad mediante comunicado No. S-2026-55580 emitió concepto favorable y aprobó los profesionales propuestos, al verificar el cumplimiento de los perfiles y requisitos contractuales establecidos. Por tal motivo, se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen con los requisitos exigidos. Por tal motivo se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen.

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	Héctor Villazón Gutiérrez	100%
Profesional de apoyo	Viviana Miranda Cañón	100%
Residentes de Interventoría (3)	Ana Pardo Duarte	100%
	César Carvajal González	
	Jhon Quintero Acevedo	
Especialista Estructural	Juan Cortés Cortés	30%
Especialista Ambiental	Luis González Camargo	60%
Especialista en redes eléctricas, Telefónicas, Voz y datos	Daniel Gómez Sánchez	30%
Especialista en Redes Hidrosanitarias, Gas y red contra incendio	Luis González Camargo	30%
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Ana Bermúdez Hernández	30%
Profesional de costos presupuestos y programación de obra	Edwin Sierra Hernández	30%
Asesor Jurídico	Alejandra Nieto Puentes	15%
Técnicos en Seguridad y salud en el trabajo (6)	Fabian Adolfo Paredes Serrano	100%
	Johanna Henao Cristancho	
	José Vanegas López	
	Marilyn Ospina López	
	Shirley Castillo Curieux	
	Diana Yanneth Reyes Mora	

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Inspectores de interventoría (6)	Julieth Ceballos García	100%
	John Castañeda Mesías	
	Iván Rene Molano Gallo	
	Carlos Santiago Buitrago	
	Humberto Bernal Lozano	
	Camilo Andrés Cardenas	

Tabla 13 - *Personal de Interventoría*
Fuente: *Propia*

Anexo 4. Planillas de pago
Anexo 5. Certificado pago Parafiscales

4.3.2 EQUIPO

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO ha suministrado todos los recursos tecnológicos y de comunicación necesarios para la correcta y oportuna ejecución de las actividades.

4.4 INFORMACION FINANCIERA

4.4.1 PRESUPUESTO

La propuesta económica de la interventoría corresponde a un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131,00).

Y se cuenta con una adición por un valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) INC.IVA

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado de disponibilidad presupuestal detallado en *Tabla 14. Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1984	05/03/2025	5012	05/09/2025	796.184.131
3698	5/12/2025	7587	23/12/2025	128.425.720
TOTAL				924.609.851

Tabla 14 - *Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*
Fuente: *Propia.*

4.4.2 ESTADO FINANCIERO

A. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se encuentra pendiente el pago de costo fijo No. 4 por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($45.496.236), al igual que el acta de costo variables No. 4 por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($33.730.926).

ACTA	%	VALOR	VALOR VARIABLE – LOTE6	PAGO
Costo fijo No. 1	4,92%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo fijo No. 2	4,92%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo fijo No. 3	4,92%	$45.496.236,06	N/A	$45.496.236,06
Costo Variable No. 3	10,39%	$96.091.514,94	$18.180.024,14	$96.091.514,94
Costo fijo No. 4	4,92%	$45.496.236	N/A	$ 45.496.236
Costo Variable No. 4	3,65%	$33.730.926	$8.792.235,88	$ 33.730.926
Costo Fijo No.5	4.92%	$45.496.236	N/A	$ 45.496.236
Costo Variable No.5	7.38%	$68.226.931	N/A	$ 68.226.931
Costo Fijo No.6	9,84%	$90.992.472	N/A	EN TRAMITE
Costo Variable No.6	18,88%	$174.562.766	$112.122.614	EN TRAMITE
TOTAL		**$691.085.790**	**$139.094.874,02**	**$425.530.552**

Tabla 15. *Pagos realizados a la interventoría*
Fuente: *Elaboración Propia*

Anexo 6. Acta De Interventoría

5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

En el plan de calidad el contratista del CONSORCIO PAIS, especifica las compras, almacén, calidad, pruebas, procedimientos, controles, seguimientos, preservación y mejoras de los materiales que usará en la realización del proyecto. El contrato deberá presentar a esta interventoría las fichas técnicas de los materiales además del seguimiento de materiales llevada a cabo por la interventoría que implica tomar medidas para asegurar que los materiales utilizados en el proyecto cumplan con los estándares de calidad

requeridos y se utilicen de manera adecuada. Algunos de los controles y procesos de control de los materiales que se llevará a cabo incluyen:

- Inspección de los materiales a su llegada al sitio del proyecto para verificar que correspondan a los requerimientos especificados en los planos y especificaciones técnicas.
- Realización de pruebas de laboratorio para determinar las propiedades físicas y químicas de los materiales, como resistencia, densidad, durabilidad, etc.
- Verificación de la procedencia de los materiales, asegurando que provengan de proveedores autorizados y cumplan con las normativas legales y de calidad establecidas.
- Supervisión de la correcta manipulación y almacenamiento de los materiales, garantizando que no se dañen o contaminen y que se conserven en condiciones óptimas.
- Registro y control de la cantidad de materiales utilizados en cada etapa del proyecto, asegurando que se utilicen las cantidades adecuadas y evitando desperdicios o malgastos.
- Seguimiento de los procedimientos de instalación o utilización de los materiales, verificando que se sigan las indicaciones del fabricante y las normativas técnicas correspondientes.
- Realización de inspecciones periódicas durante la ejecución del proyecto para asegurar que los materiales se estén utilizando de acuerdo a las especificaciones y que se estén cumpliendo las normas de calidad establecidas.
- Elaboración de informes de avance y control de materiales para documentar el cumplimiento de los requisitos y el estado de los materiales utilizados en el proyecto.

En atención a lo establecido en los documentos contractuales en los cuales, se solicita la presentación de el Plan de Aseguramiento para el desarrollo de las actividades de obra (sub-numerales del a hasta la x) y al requerimiento de entregar Plan de calidad técnico de obra que requiere los ensayos y controles que se realizaran para cada una de las actividades, la interventoría, ha realizado la respectiva revisión de los documentos.

EL contratista presenta el documento ***PLAN DE CALIDAD*** mediante correo electrónico, una vez recibida la información se realiza la respectiva revisión, se envían observaciones las cuales el contratista subsana, por lo cual se encuentra en proceso de ajuste según las últimas observaciones.

A continuación, se presenta cuadro con el resumen de las revisiones realizadas por la interventoría a los lotes designados para la firma.

CONTRATISTA	CONTRATO	LOTE	FECHA DE ENTREGA	VERSIONES	ESTADO
CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CO1.PCCNTR.8155135	4	26 de septiembre de 2025 3 de octubre de 2025 8 de octubre de 2025 23 de octubre de 2025	V0 V1 V2 V3	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO FORTALEZA	CO1.PCCNTR.8154895	5	15 de octubre de 20225 23 de octubre de 2025	V0 V1	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO PAIS	CO1.PCCNTR.8154780	6	22 de septiembre de 2025 22 de octubre de 2025	V0 V1	APROBADO

***Tabla 14**. Plan calidad*
***Fuente:** Propia*

TRAZABILIDAD DE LAS REVISIONES AL LOTE 6

El contratista realiza la entrega de la información mediante un link que comparte la información con: El documento con el aseguramiento a la calidad y anexan los controles y puntos de inspección de las actividades del proyecto, según la siguiente imagen.



El documento entregado presenta el siguiente contenido:

1. Alcance
2. Descripción del proyecto
3. Necesidad
4. Conveniencia
5. Impacto del proyecto
6. Directrices organizacionales
7. Sistema de Gestión de la calidad y enfoque de procesos
8. Liderazgo y compromiso
9. Entradas del Plan de Calidad
10. Roles y autoridades
11. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
12. Planificación de cambios
13. Apoyo
14. Operación

15. Auditorias
16. Ponderación
17. Registros

El contratista entrega un Plan integral con el desarrollo de la mayoría de los contenidos requeridos para el aseguramiento de la calidad. Se solicita complementar el manejo e implementación clara de la propiedad del cliente y la preservación del producto teniendo en cuenta que el objeto del proyecto se desarrolla en edificaciones existentes de la secretaria de educación. Adicionalmente se solicita la revisión del alcance de los controles de los ensayos e inspecciones de las actividades según la normativa. El contratista hace la subsanación y complementación y se aprueba.

6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN.

MANEJO DE DEMOLICIONES.

Para el período comprendido entre el 06 de abril y el 05 de mayo de 2026, el Consorcio País ejecutó actividades de demolición en los diferentes frentes de intervención activos, entre los cuales se destacan los trabajos realizados en:

- El Colegio Santa Librada, donde se llevó a cabo la demolición de placa maciza perteneciente a la conexión de la bajante con la caja de inspección.
- El Colegio Fabio Lozano Simonelli se realizaron excavaciones para conexión de tubería, cajas de inspección y construcción de la caja de 80x80, entre otras actividades de desmonte de cielorrasos.

Los materiales producto de las actividades de demolición y desmonte fueron acopiados temporalmente en los sitios de obra y retirados en un plazo máximo de 24 horas después de su generación, dado que las intervenciones se desarrollan en instituciones educativas en funcionamiento, las cuales exigen condiciones óptimas de orden y limpieza en todo momento.

Se verifica que para el período de reporte el contratista remite los certificados de disposición final de RCD correspondientes al mes de abril de 2026, con gestores CEMEX y GRECO,

con el fin de verificar los reportes en lo solicitado por la normativa vigente y proceder a aprobar la documentación para que el contratista realice el cargue correspondiente a la plataforma web de la Secretaría Distrital de Ambiente.

MANEJO DE ESCOMBRO.

Se contempla un volumen estimado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) según el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – PG-RCD, aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante la asignación del PIN 27846, de acuerdo con el Radicado SDA 2025ER255149 del 27 de octubre de 2025.

El contratista realizó la disposición de 10,84 Toneladas – 7 m³ de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de tipo pétreo (concretos), los cuales fueron trasladados y dispuestos en la planta de aprovechamiento CEMEX – Escombrera Tunjuelo, tal como se evidencia en la Constancia de Recibo de Material con Folio 505118827 del 01 de abril de 2026. La interventoría verifica que el Consorcio País no dispuso residuos de construcción en zonas verdes ni en áreas que no hacen parte de la intervención del proyecto.

Acumulado histórico de disposición de RCD en el proyecto: durante el período octubre 2025 – enero 2026 se dispusieron 0 Toneladas; en el período diciembre 2025 – enero 2026 se dispusieron 352,84 Toneladas con gestores CEMEX, Máquinas Amarillas y GRECO; en enero – febrero 2026 se dispusieron 32,52 Toneladas con gestor CEMEX; en febrero – marzo 2026 se dispusieron 17,92 Toneladas con gestor GRECO; en marzo – abril 2026 se dispusieron 65,88 Toneladas con gestores CEMEX y GRECO; y en el presente período abril – mayo 2026 se dispusieron 10,84 Toneladas con gestor CEMEX.





TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

Durante el período de reporte, el Consorcio País realizó el transporte de 10,84 Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) hasta el sitio de disposición final autorizado (CEMEX – Escombrera Tunjuelo). El transporte se ejecutó mediante volquetas debidamente registradas ante las autoridades competentes, carpadas y sin exceder su capacidad de carga, dando estricto cumplimiento a las normas de tránsito vigentes.

El transporte de los escombros se planificó en horarios que evitaron interferencias con las horas pico del tráfico vehicular, respetando los horarios de descanso de los residentes del sector y los horarios académicos de las instituciones educativas intervenidas. Para el presente período se emplearon siete (7) volquetas con placas ACD905, AEB097, MAH863, VSB607, SBB583, FUC240 y SUJ632, todas con revisión técnico-mecánica vigente al momento del reporte.

PROGRAMA D2. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Para el presente periodo, el contratista Consorcio País, manifiesta no haber hecho ingreso de materiales insumo como pétreos o no pétreos, por tanto, no se presentan cantidades ni certificados de los proveedores.

PROGRAMA D3. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

El contratista Consorcio País, cuenta con varios sitios de almacenamiento temporal para el proyecto, dado que el contrato se desarrolla en varias instituciones educativas, los cuales de igual forma garantizan orden y aseo, y de igual forma están establecidos en espacios que no interrumpa el tráfico peatonal.

MANEJO DE CAMPAMENTO O SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES.

CONSORCIO PAÍS, cuenta con el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos y peligroso – PGIRS Y RESPEL. Allí estará descrito todas las actividades a realizar para la clasificación y separación de los residuos sólidos aprovechable, no aprovechables y peligroso entregado en el PIPMA.

Por otro lado, y mediante Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, los residuos no reciclables, se almacenarán en bolsas adecuadas para posteriormente ser evacuados por los vehículos recolectores de basura de cada uno de los sectores donde se encuentran realizando actividades del contrato.

El área de acopio de materiales en los diferentes frentes de obra mantuvo condiciones de orden y limpieza adecuadas durante el período evaluado. Los residuos ordinarios se clasificaron según lo establecido en el PGIRS y se entregaron a las empresas recolectoras de basuras de la ciudad de Bogotá D.C. Se verifica durante visita de interventoría la correcta instalación de cerramientos en polisombra como medida de delimitación y control de los sitios de acopio temporal, lo cual también contribuye al control de emisiones de material particulado.





DESMANTELAMIENTO.

No aplico en el periodo. Sin embargo, Al finalizar la obra el Consorcio País, estará en el deber de desmontar el campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales, como también de recuperar y restaurar el espacio afectado y el área del campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales de acuerdo con su uso.

PROGRAMA D4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.

Dado que la totalidad de las actividades constructivas se desarrolla al interior de las instituciones educativas intervenidas, no se requirió el uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras ni vibrocompactadores en el presente período, por lo tanto, no se activaron Planes Estratégicos Viales.

Para el retiro de los Residuos de Construcción y Demolición generados, se emplearon únicamente volquetas sencillas, las cuales transportaron los residuos a los sitios de disposición final autorizados, cumpliendo con las condiciones de carpado y sin exceso de carga, dando cumplimiento a las normativas de tránsito vigentes.

No se reportaron eventos de fuga de aceites ni derrames.

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR.

Para el presente período de reporte, el Consorcio País empleó los siguientes vehículos para el transporte y retiro de RCD generados en los diferentes frentes de obra: Volqueta placa ACD905 con vigencia RTM hasta el 27/07/2026; Volqueta placa AEB097 con vigencia RTM hasta el 05/02/2026; Volqueta placa MAH863 con vigencia RTM hasta el 12/02/2026; Volqueta placa VSB607 con vigencia RTM hasta el 20/08/2026; Volqueta placa SBB583 con vigencia RTM hasta el 22/12/2026; Volqueta placa FUC240 con vigencia RTM hasta el 14/07/2026; y Volqueta placa SUJ632 con vigencia RTM hasta el 18/09/2026. La interventoría solicita al contratista gestionar con la mayor brevedad la renovación de la revisión técnico-mecánica de los vehículos cuya vigencia se encuentra vencida o próxima a vencerse.

PROGRAMA D5. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS DERIVADAS.

Durante el presente periodo, dado que no se hizo uso de maquinaria en el contrato, no hubo manejo de combustibles, aceites o sustancias derivadas, de igual forma, las volquetas que

realizan el retiro de RCD, realizan el suministro del combustible en lugares externos a los sitios de trabajo del contrato de obra.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

Durante el presente periodo, no se hizo disposición de aguas residuales, dado que el contrato no hace uso de baterías sanitarias portátiles.

PROGRAMA D6. MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA.

Se ejecutaron capacitaciones ambientales a su personal de obra en cumplimiento del cronograma establecido en el Plan Anual de Trabajo y Cronograma de la Gestión Ambiental. El tema abordado fue Gestión de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos (RESPEL) y Consumo Sostenible y Compras Verdes, realizada el 20 de abril de 2026 en múltiples sedes: Colegio Orlando Fals Borda, Colegio Celeste y Colegio Santa Librada. Las capacitaciones contaron con la participación de trabajadores de diferentes cargos, incluyendo maestros, oficiales y residentes de obra, tal como se evidencia en los formatos de registro de asistencia FT-SST-027, firmados por el responsable de la actividad.

La interventoría revisa y verifica los registros fotográficos y de asistencia suministrados por el contratista, y constata que las capacitaciones se ajustan a los temas programados en el cronograma ambiental del proyecto. Se reitera al contratista la importancia de mantener la cobertura de capacitación a la totalidad del personal activo en los frentes de obra.

MEDIDAS Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS.

Durante el período evaluado, la interventoría identificó y verificó la implementación de actividades de manejo y disposición adecuada de los residuos generados en cada uno de los frentes de trabajo activos, así como el mantenimiento de condiciones de orden, aseo y limpieza en las zonas de intervención. Se verifican instalaciones de cerramientos en polisombra y lonas en las diferentes instituciones educativas, los cuales contribuyen a delimitar las áreas de trabajo, prevenir la dispersión de material particulado y proteger a los estudiantes y demás usuarios de las instituciones de los riesgos propios de la actividad constructiva.

Se evidencia el correcto acopio y manejo de los residuos sólidos generados en los frentes de obra, con separación en la fuente conforme a lo establecido en el PGIRS del contrato y

la normatividad vigente (Resolución 2184 de 2019). Los residuos aprovechables, no aprovechables y peligrosos son clasificados y entregados a los gestores autorizados. Para el período en revisión se reporta el aprovechamiento de 0,430 Toneladas de chatarra entregadas al Depósito San Vicente.

PROGRAMA D8. MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES.

Durante el presente período, el Consorcio País reporta la ejecución de excavaciones puntuales en el Colegio Fabio Lozano Simonelli, específicamente para la conexión de tubería de la caja de inspección nueva con la caja de inspección principal y para la construcción de caja de inspección de 80x80 cm. Los materiales producto de estas excavaciones fueron acopiados temporalmente en sitio y retirados dentro del plazo establecido, con disposición final en los sitios autorizados por las autoridades competentes.

RELLENOS.

Durante el presente periodo, no se realizaron actividades de relleno, de acuerdo con lo reportado por el contratista.

PROGRAMA D9. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

Durante el período de reporte, el Consorcio País implementó medidas de control de emisiones atmosféricas y material particulado en los frentes de obra activos, mediante la instalación de cerramientos en polisombra y lonas, así como labores periódicas de limpieza y mantenimiento en las vías de acceso y salida, con el fin de minimizar la dispersión de polvo y residuos asociados a las actividades constructivas y al retiro de RCD.

La interventoría no evidenció quejas por parte de la comunidad educativa o residentes cercanos relacionadas con emisiones de material particulado. Asimismo, debido a que no se empleó maquinaria pesada durante el período, las emisiones generadas correspondieron únicamente a las volquetas utilizadas para el transporte de RCD, las cuales contaban con la documentación y revisiones técnico-mecánicas vigentes.

PROGRAMA D10. MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO

PRELIMINARES.
No aplico en el periodo.

DURANTE LAS LABORES DE EXCAVACIÓN.

Para este periodo no se presentaron afectaciones a redes

EN CASO DE PRESENTARSE ACCIDENTES

No aplico en el periodo.

Si llegado el caso de que este CONSORCIO realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se avisará de inmediato al Residente Ambiental y al profesional de Seguridad Industrial del mismo, quien avisará a la empresa de servicios correspondiente y pondrá en marcha las acciones previstas en el Plan de Contingencia.

7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El seguimiento al Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, considerando las siguientes actividades y programas:

Actividades Principales

- Evaluación inicial.
- Identificación de riesgos y peligros.
- Definición de la política y los objetivos.
- Elaboración del plan de trabajo anual.
- Programa de capacitación.
- Plan de manejo de emergencias.
- Reporte e investigación de incidentes y accidentes.
- Adquisición de bienes y contratación de servicios relacionados con la seguridad.
- Medición y evaluación de la gestión.
- Implementación de acciones preventivas y/o correctivas.

Seguimiento de Programas

1. Sistema General de Seguridad Social: Verificación de afiliaciones, certificaciones y prestaciones sociales.
2. Programa de Capacitación: Revisión de informes del contratista y seguimiento a la ejecución de las capacitaciones.
3. Programa de Inspecciones: Control de inspecciones periódicas en el lugar de trabajo para identificar riesgos y aplicar medidas preventivas o correctivas.
4. Programa de Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional:

- Verificación del cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales.
- Seguimiento al proceso de gestión de la salud de los trabajadores.
- Control de actividades de alto riesgo mediante:
- Inventario de tareas, equipos y procedimientos de alto riesgo.
- Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Validación de documentación del personal idóneo.
- Permisos de trabajo seguro en alturas.
- Permisos de trabajo de alto riesgo y responsables de las actividades
- Revisión de certificados y documentos de equipos de protección contra caídas.

Actividades de Seguimiento

Durante el presente periodo se realizaron actividades de seguimiento relacionadas con la gestión del SG-SST por parte del contratista y subcontratistas, incluyendo:

- Radicación de documentos.
- Revisiones técnicas.
- Observaciones y correcciones.
- Mejora continua.
- Aprobaciones finales.

Estas acciones garantizaron el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada implementación de los programas de SST.

6	1904	CIUDAD BOLIVAR	ARBORIZADORA BAJA	A – ARBORIZADORA BAJA	CL 59 I SUR No 44 A 02

COLEGIO ARBORIZADORA BAJA





Observación del hallazgo:

Se verificó el adecuado cerramiento, así como la correcta señalización y demarcación del área de construcción. De igual manera, se constató el uso apropiado de los elementos de protección personal por parte del personal en obra.

Así mismo, se requirió al contratista mantener condiciones óptimas de orden y aseo antes, durante y después de la ejecución de las actividades, con el fin de prevenir incidentes y accidentes derivados de condiciones inseguras.

6	546	USME	SANTA LIBRADA	A – SANTA LIBRADA	CL 75 A SUR No 1 B 45 ESTE

COLEGIO SANTA LIBRADA






Observación del hallazgo:
Durante las actividades de lavado de piso en la terraza, se verificó el uso adecuado de los elementos de protección personal (casco, guantes, gafas y botas de seguridad). No se evidenciaron actividades clasificadas como de alto riesgo.

6	581	USME	ORLANDO FALS BORDA	A – BARRANQUILLITA NUEVO	KR 12 No 72 60 SUR

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA



Observación del hallazgo:
Durante la verificación en campo se identificó la ejecución de actividades clasificadas como de alto riesgo sin la implementación de las medidas de prevención y control requeridas. En particular, se evidenciaron escaleras de acceso sin el debido aseguramiento, constituyendo una condición insegura reiterativa y en contravención de la normatividad vigente en materia de trabajo en alturas.

Así mismo, se observó que el área de intervención carecía de señalización y demarcación adecuada, incumpliendo los lineamientos establecidos en la Resolución 4272 de 2021, en lo referente a la delimitación y control de áreas para la ejecución de trabajos en altura.

En cumplimiento de las funciones de interventoría y con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, se dejó constancia en bitácora de la suspensión inmediata de las actividades, hasta tanto el contratista implemente y evidencie el cumplimiento integral de los requisitos normativos aplicables en materia de trabajo seguro en alturas

6	523	USME	FABIO LOZANO SIMONELLI	A – FABIO LOZANO SIMONELLI	KR 4 ESTE No 65 31 SUR

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI









Observación del hallazgo:
Durante los recorridos de interventoría se verificó que el personal contaba con los elementos de protección personal acordes con las actividades ejecutadas y los peligros asociados. Así mismo, se evidenciaron condiciones adecuadas de orden y

aseo, así como el retiro de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en obra; en consecuencia, se solicitó al contratista la presentación de los certificados de disposición final correspondientes.

De igual manera, se verificó el adecuado cerramiento del área intervenida. En los espacios correspondientes a la cancha, se requirió al contratista mantener condiciones óptimas de orden y aseo antes, durante y después de la ejecución de las actividades, con el fin de prevenir incidentes y accidentes asociados a riesgos locativos.

6	1959	CUIDAD BOLIVAR	GUILLERMO CANO ISAZA	A – GUILLERMO CANO	KR 16ª # 62-35 SUR

COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA









Observación del hallazgo:
Se evidencia actos y condiciones inseguras, se informa al contratista con el fin de tomar acciones inmediata.

6	1974	CUIDAD BOLIVAR	CALASANZ BUENA VISTA	A – ARBOLIZADORA BAJA	CL 59 I SUR N 44 A 02

COLEGIO BUENAVISTA IED (CALASANZ) SEDE A





Observación del hallazgo: Durante las actividades de figurado de hierro se evidencia carencia de elementos de protección personal, se solicitó al contratista dotar al personal guantes carnaza para la mitigación y protección en manos.

FRENTES DE OBRA CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, CONFORME A LO PROGRAMADO.

6	1930	CIUDAD BOLIVAR	UNION EUROPEA	B – MARIA CANO (UNION EUROPEA)	CL 69 B SUR No 17 N 92

6	1918	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	B – ESTRELLA II	CL 75 SUR No 18 B 45
6	1917	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	A – ESTRELLA I	KR 17 P No 72 25 SUR

VERIFICACIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA Y GESTIÓN ADELANTADA POR LA INTERVENTORIA













se realizó la entrega de los elementos de protección personal (EPP) conforme a las actividades ejecutadas en obra. Así mismo, se verificó el uso adecuado de dichos elementos por parte del personal.

Adicionalmente, se solicitó al contratista la remisión de las actas de entrega de EPP, con el fin de garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual manera, durante los recorridos de interventoría se efectuó seguimiento al uso correcto de los EPP; en caso de evidenciarse incumplimientos, se procedió a notificar al contratista para la adopción de acciones correctivas inmediatas, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente.

FECHA	TEMA
20/04/2026	Gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos Consumo sostenible
27/04/2026	Postura prolongada, uso de EPP
27/04/2026	Uso adecuado de EPP, Presentación

Anexo 7. Registro Capacitaciones

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista implementar la señalización, delimitación y demarcación de áreas de trabajo, excavaciones y centros de acopio, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Se deberá remitir mensualmente a la interventoría las actas de entrega de elementos de protección personal (EPP), debidamente firmadas por el empleador y el trabajador, con el fin de garantizar la trazabilidad correspondiente.
- Se sugiere la instalación de puntos ecológicos en obra, con el propósito de prevenir la acumulación desordenada de residuos y fomentar una adecuada gestión ambiental.
- Las inspecciones preoperacionales y revisiones a equipos y herramientas deberán ejecutarse de manera periódica (mínimo mensual) durante toda la vigencia del proyecto, dejando los respectivos soportes documentales.
- El personal operativo deberá conocer y aplicar las políticas, procedimientos y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA); en este sentido, se solicita al contratista evidenciar su socialización y cumplimiento.
- Se recomienda al contratista implementar pausas activas, así como desarrollar charlas de autocuidado y promoción de actos seguros, con el fin de fortalecer la cultura preventiva en obra.

REVISIÓN APROBACION UNO A UNO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante el periodo evaluado, el contratista adelantó los procesos de gestión documental requeridos para la aprobación del personal vinculado a las obras, con el fin de autorizar su ingreso y el inicio de actividades. En este sentido, se cuenta con los respectivos registros que soportan la aprobación individual del personal en obra, conforme a los procedimientos establecidos.

miércoles, 8 de abril de 2026	MAURICIO MARTINEZ	79.043.012	INSTALADOR DE PISO
miércoles, 8 de abril de 2026	JOSE DARIO MARTINEZ	19.485.109	INSTALADOR DE PISO

8. OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015.	El Consorcio Serinco Educativo remitió las pólizas a la entidad y subió las mismas a la plataforma SECOP II, el día 27/10/2025	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Estas garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobadas por la Secretaría de Educación de Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones del presente proceso. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.		
2	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas, previo al cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.	Cumple con la obligación	
3	Acreditar, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la Industria de la Construcción - FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda; de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Para el presente periodo se cuenta con el pago de cuatro actas dentro de las cuales se encuentra el pago fijo y el pago variables según el avance de obra. y se encuentra pendiente el pago de una quinta acta.	
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar.	No aplica para el presente periodo	
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista, conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	celebrar el presente contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.		
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, LA INTERVENTORÍA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, incluido el personal de la SED, ocasionados por La Interventoría o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.	Se cumple con la obligación de acuerdo con el presente periodo	
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Interventor debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc, que puedan afectar precisamente su vigencia o monto.	Se cumple con la obligación	
8	Entregar a la SED los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	Se cumple con la obligación de acuerdo al presente periodo	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Se cumple con la obligación	
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.	Se cumple con la obligación	
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a los que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	a terceros, sin la previa autorización escrita de la 1SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que la ENTIDAD tenga prueba de que La Interventoría ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, La Interventoría indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a la ENTIDAD. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.		
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los Documentos Previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento,2 siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del contrato.	Se cumple con la obligación	
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.3	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo –SST–, respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condi5ciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental, política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	
17	Vincular, mantener y garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contrate el porcentaje de mujeres establecido en el Decreto 634 del 28 de diciembre de 2023 y en los estudios previos de acuerdo con cada una de las ramas de actividad económica a la cual corresponda el objeto a contratar, o el indicado en las normas que adicionen, modifiquen, deroguen o sustituyan al referido decreto, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.	Se cumple con la obligación	
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal de la interventoría, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión.	Se cumple con la obligación	
19	Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión o quien esta designe y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico; en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	Se cumple con la obligación	
20	La Interventoría tiene la obligación en relación con sus colaboradores, evitar cualquier acción u omisión, que les cause muerte, daño o sufrimiento (físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos,	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.		
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Se cumple con la obligación	
22	Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Se cumple con la obligación	
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales, presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Se cumple con la obligación	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Se cumple con la obligación	
25	Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Se cumple con la obligación	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Se cumple con la obligación	
27	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	No aplica para el presente periodo	
28	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad.	Se cumple con la obligación	
29	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.6	Se cumple con la obligación	
30	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuan8do sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.		
31	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.	Se cumple con la obligación	
32	Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad, su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios accionistas.	No aplica para el presente periodo	
33	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el estudio previo y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	Se cumple con la obligación	
34	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de que tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes Contratista.	No aplica para el presente periodo	
35	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
36	Comunicar a la Entidad de manera inmediata dentro de las veinticuatro 24 horas siguientes a acaecimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecte su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	No aplica para el presente periodo	
37	Presentar a la Entidad el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional del equipo de interventoría; e igualmente revisar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) del contratista de obra.	Se cumple con la obligación	
38	La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las obligaciones generales, por parte del contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio jurídico referido y sus anexos.	Se cumple con la obligación	

Tabla 16 - *Obligaciones Generales - Interventoría*
Fuente: *Propia.*

9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.	No aplica para el presente periodo	
2	Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de Interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF	Se cumple con la obligación	
3	Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) y cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.		
4	Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.	Se cumple con la obligación	
5	Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.	Se cumple con la obligación	
6	Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.	Se cumple con la obligación	
7	Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.	Se cumple con la obligación	
8	Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
9	Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.	Se cumple con la obligación	
10	Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.	Se cumple con la obligación	
11	Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.	Se cumple con la obligación	
12	Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.	Se cumple con la obligación	
13	Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.	Se cumple con la obligación	
14	Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.	Se cumple con la obligación	
15	El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
16	Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.	Se cumple con la obligación	
17	En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.	Se cumple con la obligación	
18	Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.	No aplica para el presente periodo	
19	Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato, de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.	Se cumple con la obligación	
20	Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.	Se cumple con la obligación	
21	Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.		
22	Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.	Se cumple con la obligación	
23	Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.	Se cumple con la obligación	
24	Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.	Se cumple con la obligación	
25	Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en tal caso el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la Interventoría para este período. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.	Se cumple parcialmente, debido a que se encuentra en verificación el acta parcial de obra.	
26	Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.	Se cumple con la obligación	
27	Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	mes a mes serán requisito para la tramitación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la del informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.		
28	Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.	No aplica para el presente periodo	
29	Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.	No aplica para el presente periodo	
30	Brindar oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.	No aplica para el presente periodo	
31	Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre las medidas a tomar.	No aplica para el presente periodo	
32	Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
33	Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.	Se cumple con la obligación	
34	Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.	Se cumple con la obligación	
35	Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen atrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.	Se cumple con la obligación	
36	Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.	Se cumple con la obligación	
37	Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.	Se cumple con la obligación	
38	Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.	Se cumple con la obligación	
39	Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
40	En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la Interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.	Se cumple con la obligación	
41	Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.	No aplica para el presente periodo	
42	Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.	No aplica para el presente periodo	
43	Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.	No aplica para el presente periodo	
44	En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
45	En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la Interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El Interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.	No aplica para el presente periodo	
46	El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.	Se cumple con la obligación	

Tabla 17 - *Obligaciones Especificas - Interventoría*
Fuente: *Propia.*

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

El registro fotográfico se realizó durante las visitas de seguimiento en la etapa de ejecución de las obras en las diferentes sedes educativas, con el fin de documentar el avance y el estado de las intervenciones. Este material permite respaldar las observaciones técnicas, evidenciar las actividades ejecutadas, identificar situaciones relevantes en campo y servir como soporte visual.

Anexo 8. Registro fotográfico

Se adjunta video mediante el cual se evidencian los avances de obra correspondientes a cada sede intervenida, el cual podrá ser consultado a través del siguiente enlace:

- Link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/16VgyH2Lokx_2KAr3MZ6mwClzTqfbq0Uh?usp=drive_link

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el registro audiovisual del progreso de ejecución.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se solicitó y recalcó al contratista que no se admite el ingreso a personal que no cuente con su Seguridad Social al día así mismo su ARP y respectivas dotaciones en especial en temáticas de trabajó en alturas. No se permitirá el ingreso a obra de personal que no cumpla con este ítem y se recalcó en cuanto al tema de trabajos en alturas que se deben implementar todas las medidas y protocolos de seguridad al respecto.

2. Se sugiere al contratista dar un buen manejo y disposición de los materiales ya que no se recibirán trabajos que no estén en óptimas condiciones en cuanto a su ejecución, terminado y calidad de los materiales y ante todo garantizando el cumplimiento de las respectivas especificaciones técnicas y metodologías de ejecución de cada tarea.

3. Se reporta un avance financiero ejecutado del 86,02% frente a un programado del 86,39%, lo que representa un atraso acumulado del 0,37% (equivalente a $8.685.162,23). Si bien la desviación es porcentualmente baja, evidencia un leve desfase frente a lo programado.

4. Se recomienda al contratista de obra actualizar su cronograma y presentar un plan de contingencia para recuperar el atraso, especialmente en frentes como Santa Librada (-23,11%) y Guillermo Cano Isaza (-5,34%).

5. **Entregados al 100%:** Colegios Orlando Fals Borda, Unión Europea Sede B, Calasanz (Buena Vista), Estrella del Sur Sede A y Sede B, **Con avances parciales significativos:** Sierra Morena (95,37%), Fabio Lozano Simonelli (98,43%), Arborizadora Baja (98,47%), Santa Librada (76,89%), Guillermo Cano Isaza (31,69%) y Tenerife Granada Sur (100% ejecutado sobre un programado del 20,78%, lo que representa un adelanto). **Actividades pendientes recurrentes** en varios frentes incluyen: instalación de aparatos sanitarios, grifería, espejos, terminación de cárcamos, instalaciones eléctricas, adecuación de zonas verdes y pintura de corredores.

6. Se ejecutó el 100% de la atención de la emergencia en el DILE Usme. Se asignaron dos nuevas emergencias (Arborizadora Baja Sede A y Calasanz Buena Vista) con un avance financiero del 24,17%, pendiente de ajuste por cantidades reales ejecutadas. Se recomienda al contratista formalizar la programación y los presupuestos actualizados para estas nuevas emergencias.

7. El contratista de obra ha dispuesto del personal mínimo requerido, previamente aprobado por la interventoría y la SED.

8. Se sugiere actualizar los balances, reprogramaciones y presupuestos de los frentes con atraso y de las nuevas emergencias.

9. Se reitera la necesidad de subsanar oportunamente las observaciones a los Manuales de Mantenimiento y a los APU´s de Ítems No Previstos.

10. Hemos reiterado al contratista de obra la necesidad de actualizar el balance la reprogramación de acuerdo con las cantidades reales a ejecutar para que no se sigan presentando atrasos en el comparativo programado vs ejecutado.

11. Durante este periodo se le solicita a Consorcio País, presentar los alcances, programaciones y presupuestos para atención de las emergencias de ***Arborizadora Baja Sede A, Luis Eduardo Mora Osejo Sede A y Calasanz Buenavista Sede A.***

12. Finalmente, en cuanto a las tareas y/o actividades a ejecutarse en este proyecto las mismas no son definitivas ya que pueden darse situaciones en las que se requieran incorporar nuevas tareas acorde a las necesidades y priorización de estas para cada frente y así mismo enmarcadas dentro del Objeto del Proyecto y su Presupuesto. No se autorizará al Contratista la incorporación y ejecución de tareas que no sean previamente evaluadas y avaladas por parte de SED é Interventoría.

13. Por medio de comunicado ***SERINCO-SED-2025-392-L6-Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 6*** se les sugirió a los contratistas *"… entregar el informe completo antes de la fecha prevista inicialmente (10-abr-2026), de esa forma tendrían un poco más de tiempo para realizar las correcciones si se encuentra alguna observación.*

    Y se les informó, que una vez *"…sean entregados nuevamente a interventoría los informes completos subsanados, a más tardar el 17 de abril, les comunicamos que si*

persiste alguna observación en cualquiera de los componentes del informe, a partir del sábado 18 de abril empezará a contabilizarse los descuentos por concepto de ANS…"

14. Se remiten observaciones a los Manuales de Mantenimiento de las ***IED Estrella del Sur, Sedes A y B***, así como al de ***IED Unión Europea***, las cuales no han sido subsanadas a la fecha.

15. Asimismo, se solicitó al contratista de obra subsanar unas no conformidades en el paquete de APU´s de Ítems No Previstos entregados, las cuales no han sido atendidas al cierre del periodo.

Anexo 9. Relación de Correspondencia

ANEXO No. 1. BITACORA DE OBRA

Colegio Orlando Fals Borda. 01/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el suministro e instalación de la grapilla lavada mona.

JOHN CASTRO
INTERVENTORIA

Colegio Orlando Fals Borda 16/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó la perforación del núcleo de 4 pulgadas, se instaló el tubo de la bajante del núcleo que conecta al cárcamo, se presentaron lluvias moderadas durante todo el día.

JOHN CASTRO
INTERVENTORIA

Colegio Orlando Fals Borda 17/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Para el día de hoy ya se recibió la tubería para la conexión de la bajante; por temas de lluvia no se pudieron adelantar actividades el día de hoy, se presentaron lluvias intensas durante todo el día.

Powered by CamScanner

Colegio Orlando fals Borda. 20/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se inicio la instalación de la bajante faltante y se comenzó a aplicar la pintura de la respectiva tubería.

JOHN OSPINO
INTERVENTOR

Colegio Orlando fals Borda. 21/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación de la bajante faltante, el día de mañana se termina la actividad.

JOHN OSPINO
INTERVENTOR

Colegio Orlando fals Borda. 22/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se termino la instalación de la bajante y se le aplicó su respectiva pintura, se hizo orden y aseo para la entrega.

JOHN OSPINO
INTERVENTOR

Powered by CamScanner

Colegio Orlando Fals Borda. 28/04/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Actividades realizadas:

Se realizó la entrega de las obras ejecutadas al rector del colegio; todo quedo firmado mediante acta para la conformidad de ambas partes.

[redacted]

08/04/2026

Emergencia Dile Usme
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el raspado de las paredes del baño donde se presentaba la humedad retirando todos los residuos, se contempla las cantidades de materiales para la conexión de los tanques, de reserva, se aplico el estuco en las zonas afectadas para dejar secar y el día de mañana aplicar la pintura.

JOHN CASTRUCCI
Interventoría

Obra

Emergencia Colegio Calasanz Buenavista. 08/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se inició la atención de la emergencia número uno que corresponde al tanque de reserva; se inició la excavación del terreno para luego aplicar el mejoramiento y fundir la placa donde reposará el tanque de reserva.

JOHN CASTRUCCI
Interventoría

Obra

Emergencia Dile Usme 09/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se aplicó la pintura tipo 1 en el techo del baño, se aplicó la pintura epóxica en las paredes del baño; se realizó el respectivo aseo y se entregó esa zona ya que no se debe

Norma

Powered by CamScanner

hacer más intervención.

JOHN CASTAÑEDA
RESIDENTE

Emergencia Colegio Calasanz Buenavista. 09/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la excavación del terreno para luego aplicar el mejoramiento y fundir la placa donde reposará el tanque de reserva.

JOHN CASTAÑEDA
RESIDENTE

Emergencia Colegio Calasanz Buenavista. 10/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se sigue la excavación del terreno para luego aplicar el mejoramiento y fundir la placa donde reposará el tanque de reserva.

JOHN CASTAÑEDA
RESIDENTE

Emergencia ~~Dic Usuario~~ Colegio Calasanz Buenavista. 11/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la excavación del terreno para luego aplicar el mejoramiento y fundir la placa donde reposará el tanque

Norma

Powered by CamScanner

de reserva.

Jefe cuadrilla

R.O

Emergencia Dile Usme. 11/04/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se realizó el lavado de las paredes de la oficina administrativa con el ácido nítrico para borrar las manchas de la humedad, se hizo la limpieza de la cubierta donde se tenian los tanques para identificar la intervención a realizar, se recibieron los materiales para la instalación de los tanques de reserva.

Jefe cuadrilla

R.O

Emergencia Dile Usme. 12/04/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se inició la instalación de los tanques de reserva, se presentaron lluvias durante la tarde de 1:00 pm a 5:00 pm.

Jefe cuadrilla

R.O

Emergencia Colegio Cabasanz Buenavista. 13/04/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se Sigue la excavación del terreno para luego aplicar

Norma

Powered by CamScanner

el mejoramiento y fundir la placa donde reposará el tanque de reserva, se presentaron lluvias durante la tarde de 4:00 pm a 5:00 pm.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

R.D

Emergencia Dile Usme. 15/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de la instalación de los tanques de reserva, se presentaron lluvias moderadas durante todo el día.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

E.O

Emergencia Calasanz Buenavista 16/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el figurado del hierro para el muro de contención y poder fundir la placa donde reposará el tanque de reserva, se presentaron lluvias moderadas durante todo el día.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

E.O

Emergencia Calasanz Buenavista 17/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:

Norma

Powered by CamScanner

Se fundió la zarpa y parte del vástago del muro de contención para poder fundir la placa donde reposará el tanque de reserva, Se presentaron lluvias intensas durante todo el día.

JOAN CASTAÑEDA
INGENIERO

L.D

Emergencia Calasanz Buenavista. 18/04/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo

1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades realizadas:

Se realizó el relleno del muro de contención y se sigue perfilando el talud para poder fundir la placa donde reposará el tanque de reserva.

JOAN CASTAÑEDA
INGENIERO

L.D

Emergencia Calasanz Buenavista 20/04/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se terminó de realizar el perfilado y relleno para poder fundir la placa donde reposará el tanque de reserva.

JOAN CASTAÑEDA
INGENIERO

L.D

Emergencia Dile Usme 21/04/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Actividades realizadas:

Se realizó visita en compañía del supervisor arquitecto Santiago Urbe para inspeccionar la posible causa de la falta de

Norma

Powered by CamScanner

agua en los baños planta inferior.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

C.C

Emergencia Calasanz Buenavista. 21/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se amarro el hierro de la placa y se inició a fundir la respectiva placa para instalar después el tanque de reserva.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

C.C

Emergencia Dile Usme. 22/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial.
Actividades realizadas:
Se realizó la aplicación de la pintura bituminosa.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

C.C

Emergencia Calasanz Buenavista. 22/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó de fundir la respectiva placa para la instalación del tanque de reserva.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

C.C

Norma

Powered by CamScanner

23/04/2026

Emergencia Dile Usme
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Actividades realizadas:
Se hizo visita con la persona especialista en encontrar la razón de porque la tubería se encuentra tapada y no se tiene agua en los respectivos baños.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

R.D

Emergencia Calasanz Buenavista. 23/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se afinó la placa fundida el día de ayer y se inició la excavación para las vigas de la rampa.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

R.D

Emergencia Calasanz Buenavista. 24/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó comité en el colegio para finiquitar los temas faltantes de las emergencias con el arquitecto Santiago, Se continua la excavación para la construcción de las vigas de la rampa.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

R.D

Emergencia Calasanz Buenavista. 25/04/2026
Personal administrativo

Norma

Powered by CamScanner

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se recibió el material para fundir la rampa, Se inició a figurar y amarrar el hierro de la viga de la rampa.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO C

E.D

Emergencia Calasanz Buenavista 27/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua figurando y amarrando el hierro de la viga de la rampa.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO C

E.D

Emergencia Dile Usme. 28/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó la reparación de la tubería tapada y ya se tiene en servicio los baños de la planta baja; queda listo para la entrega.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO C

E.D

Emergencia Calasanz Buenavista. 28/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo

Norma

Powered by CamScanner

2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se fundió en su totalidad los muros del descanso y la viga de la rampa a construir, Se presentaron fuertes lluvias de 4:00 pm a 5:00 pm.

Jose castillos
Inspectores

P.D

Emergencia Dic Usme 29/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se profundizo la tubería según lo solicitado por interventoría y Supervisión, se presentaron lluvias moderadas durante la mañana.

Jose castillos
Inspectores

P.D

Emergencia Calasanz Buenavista. 29/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el relleno para fundir la placa, se fundió la placa de la rampa y el descanso, se instaló la división del baño, se presentaron lluvias moderadas durante la mañana.

Jose castillos
Inspectores

P.D

Emergencia Calasanz Buenavista. 30/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo

Norma

Powered by CamScanner

1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se taparon los huecos faltantes por donde ingresaban las palomas, se fundió el muro faltante para contención del talud en la placa donde se va a instalar el tanque de reserva.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

R.O

Emergencia Calasanz Buenavista 01/05/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 Oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se retiro un viaje de material de excavación y se llevo a la escombrera certificada.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

R.O

Emergencia Calasanz Buenavista. 02/05/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se desencofraron los muros de contención de la placa del tanque de reserva, se presentaron lluvias moderadas durante todo el día.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

R.O

Emergencia Calasanz Buenavista. 03/05/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.

Norma

Powered by CamScanner

Actividades realizadas:
Se realizó la instalación de la estructura para poder montar la cubierta en la placa donde reposará el tanque de reserva.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

R.O

Emergencia Calasanz Buenavista. 05/05/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó la instalación del adoquín que se desinstaló para la construcción de la rampa, se pulieron los muros de la rampa y el muro de contención.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

R. O.

Norma

Powered by CamScanner

30/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 maestro, 2 Ayudantes, 1 Ornamentador

ACTIVIDADES. Durante la jornada, se realiza la la nivelación y plomado de la tubería, para los ejes principales de los pilotes; paralelamente se inicia con el encofrado. En horas de la tarde se soldan los tubos a la estructura de los pilotes.

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

01/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL Operativo.

1. maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se realiza la fundición de la viga y los pilotes, paralelamente se seca cilindros de concreto, para los ensayos de resistencia.

JOHN CASTAÑEDA

Residente de Obra. INTERVENTORIA

06/04/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

Scanned with CamScanner

1 maestro, 1 Inspector, 1 siso

ACTIVIDADES: Durente la jornada se realiza el alistado perimetral de la zona de jardin de niños, para Instelar posteriormente el granito lavado. por parte de la estructura del cerramiento. se trae las ~~t~~Modulos con los tubos metalicos para la correspondiente Instalación del cerramiento contra Impacto.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTIBLANCO
INTERVENTORIA

07/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: Se continua y se inicia con la segunda sección de la autonivelación de la cancha. paralelamente se continua con la Instalación de granito lavado, en la sección perimetral del Area de jardin de niños.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTIBLANCO
OBSERVACIONES

08/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 maestro, 1 Inspector, 2 ~~siso~~. Ayudantes.

Scanned with CamScanner

1 Ornamentador, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: Para la zona 0 area de jardin de niños, se realiza un prealistedo del piso del alistado para la Instelación e Instelación del mastico, requerido para la Instalación del Vinisol, paralelamente se realiza la Instelación del cerramiento contra Impacto de 2.50 m de alto, en la sección de la Viga de la parte superior de la cancha, de igual manera se continua con la auto nivelación.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

09/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVOS.

1 Residente, 1 Inspector, 1 Siso

PERSONAL OPERATNO.

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTNIDADES: Durante la jornada, llega el instaladar del piso y revisa la superficie del area de jardin de niños. Para dar comienzo a la aplicación del mastico. Paralelamente se inicia con la demolición de una placa ligera donde se va a realizar la construcción de la Viga del cerramiento de 5m.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

10/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: Durante la jornada, se realiza la autonivelación faltante de la cancha y se verifica que no se presente ningun tipo de aposamiento. Paralelamente se inicia con la excavación de la Viga y los pilotes, para la instalación del cerramiento de 5m.

En el área del jardin se realiza la aplicación del mastico.

Durante la jornada no se presentan lluvias

RESIDENTE DE OBRA

JOHN [illegible]

INTERVENTORIA.

11/04/2026

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Soleado

PERSONA ADMINISTRATIVO:

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO.

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: Se inicia nuevamente con la aplicación de la pintura, en la seccion de la cancha en donde se realizo la Intervención. Paralelamente se continua con la excavación en la sección de la Viga y los pilotes; En el area de Jardin de niños se detalla y se alista la superficie del piso para instalar la baldosa.

Scanned with CamScanner

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

13/04/2026.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: nublado TARDE: Nublado

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 Maestro, 3 Ayudante, 1 Oficial

ACTIVIDADES: Durante la jornada se realiza la demarcación de la cancha, y se comienza con el encofrado de la Viga e Instalación de la estructura metalica de los pilotes

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

14/04/2026

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Soleado TARDE: NUBLADO

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 Maestro, 1 Oficial, 3 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con la demarcación de la cancha, Paralelamente se inicia con el armado y amarrado de la estructura de acero en la Viga En el área del jardin, se da inicio a la instalación de la baldosa de Vinisol

Scanned with CamScanner

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

15/04/2026.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: LLUVIAS; TARDE: Nublado

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO.

1 Maestro, 1 Oficial, 3 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con el armado y amarrado de la estructura de la Viga, paralelamente se deja soldados los tubos en cada una de los pilotes; En el área de jardin de niños se continua con la instalación de la baldosa tipo caucho.

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA.

16/04/2026.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Nublado; TARDE: lluvias

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO.

PERSONAL OPERATIVO.

1 Maestro, 1 OFICIAL, 3 Ayudantes.

ACTIVIDADES: En horas de la mañana se realiza la entrega Formal de la sección de la cancha a la rectora e Interventoria. En el area del jardin de niños se realiza la instalación de la baldose en la seccion del pasillo. Paralelamente se realiza la Fundición de la Viga

Scanned with CamScanner

y los pilotes de 3000 PSI, y se toman los cilindro de muestres, Para dejar un soporte tecnico en los Anexos de los informes.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

17/04/2026

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: lluvias ; TARDE: lluvias

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 3 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se realiza la nivelación y excavación del Area en donde se va a construir el anden al costado lateral de la viga del cerramiento de 5 m. Paralelamente en el área de jardin de niños a la baldosa instalada se aplica un Sellador.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

18/04/2026

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: soleado ; TARDE Nublado

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Durante la jornada, se fundo la instalación del anden al costado lateral

del cerramiento de 5m, paralelamente se realiza la instalación del segundo nivel del cerramiento contra impacto de 5m. ya en la parte administrativa se realiza la entrega formal del Área de jardin de niños a la interventoria y la rectora

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTEJON
INTERVENTORIA

21/04/2026.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Soleado; Nublado; Tarde

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: Se realiza la demolición de la placa superior de la grada y la sección del muro lateral de la tarima.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTEJON
INTERVENTORIA

22/04/2026.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: NUBLADO; TARDE: Nublado

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se inicia con la instalación de granito lavado en la sección de las gradas

Scanned with CamScanner

laterales de la cancha, En la parte de la Ornamentación se finaliza con las uniones de soldadura a nivel general del cerramiento de 5 metros

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

23/04/2026.

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: lluvias moderadas.

TARDE: lluvias. leves.

PERSONA ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se realiza la instalación del alistado en la sección de la tarima; paralelamente en horas de la tarde se finaliza con la aplicación de pintura del cerramiento contra Impacto

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA OBSERVACIONES

24/04/2026

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Soleado

TARDES Nublado

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se finaliza con la actividad e insta-

Scanned with CamScanner

cion de granito de la sección de la gradade del Area de la tarima

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CORTÉS — INTERVENTORIA

27/04/2026

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: lluvias leves

TARDE: Nublado

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: Durante la jornada se realiza la Instalación de granito lavado, en la sección de la tarima y posteriormente; se continuo con la Instalación de granito de las gradarias de la sección Frontal de la tarima

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CORTÉS — INTERVENTORIA

28/04/2026

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Soleado

TARDE: Nublado

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO.

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Durante la jornada se continua con la Instalación del granito en la sección de la tarima de la sección frontal de la tarima

Scanned with CamScanner

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑO — INTERVENTORIA

29/04/2026

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Lluvias leves

TARDE: Nublado

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: En horas de la tarde se finaliza con la instalación de granito lavado, en la Sección de las gradas; Paralelamente se deja Fundido la sección de la placa de concreto el costado Interno dele Viga del cerramiento de 2.5m.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑO — INTERVENTORIA

30/04/2026

ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Soleado

TARDE: Nublado

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONA OPERATIVO

1 Maestro, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se realiza las dilataciones de la placa y se le da inicio, al armado y amarrado de la estructura metalica dela Viga Anta y Columneta.; perelelamente se inicia con la excavación de los pedestales, pare la Instalación

Scanned with CamScanner

de las bacantas del area de la tarima

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

04/05/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: se realiza el encofrado de la sección de la vigueta y la columneta del Area del muro. Paralelamente se realiza el acedo final de la placa de concreto

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

05/05/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 maestro, 2 Ayudantes

Actividades: se realiza la excavacion para los pedostales de la seccion de la baranda de Area de la tarima i paralelamente se realiza la fundicion de la tapa de la Caja de Inspeccion

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Se realizó un apique en la zona donde se va a instalar el tanque de reserva para identificar el tipo de terreno con el que se cuenta, se presentaron lluvias durante la mañana de 7:00 Am a 10:00 Am.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Colegio Calasanz Buenavista 28/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se sigue la actividad de tapar el acceso de las palomas con el respectivo flanche.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Colegio Calasanz Buenavista. 10/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación del flanche para evitar el ingreso de las palomas al comedor.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Colegio Calasanz Buenavista. 11/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.

Scanned with CamScanner

Actividades realizadas:
Se terminó la instalación del flanche para evitar el ingreso de las palomas al comedor.

JOHN CASTAÑEDA
INSPECTOR SST

Colegio Calasanz Buenavista. 14/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se inició el aseo general en el comedor y sus alrededores para la respectiva entrega de está zona, se presentaron lluvias durante la tarde de 1:00 pm a 5:00 pm

JOHN CASTAÑEDA
INSPECTOR SST

Colegio Calasanz Buenavista. 15/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó de realizar el aseo general en el comedor y sus alrededores para la respectiva entrega de está zona, se presentaron lluvias moderadas durante todo el día.

JOHN CASTAÑEDA
INSPECTOR SST

Colegio Calasanz Buenavista 17/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Scanned with CamScanner

Actividades realizadas:
Se realizó la entrega del comedor aula múltiple a la almacenista del colegio de está manera se da por terminada su ejecución, se presentaron lluvias intensas durante todo el día.



TULIA ASTUDILLO
INTERVENTORA

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de Enchape Bateria 4. piso 3. y Bateria 1 - piso 3

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

31/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 SSO

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de Enchape de pared Bateria 4 y 1 - piso 3

JOHN CASTAÑEDA.

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

06/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspecto, 1 SSO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 3 Ayudantes.

ACTIVIDADES: Instalación de Enchape en la sección de la bateria numero 4 de Pared, del piso N° 3.

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

07/04/2026.

PERSONA ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

Scanned with CamScanner

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 3 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se inicia con el emboquillado de las Baterias sanitarias en las paredes de los baños del tercer piso

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTEBLANCO
INTERVENTORIA

08/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

1 Ing Residente, 1 Inspecto, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 3 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se Continua con el emboquillado de de las paredes de las baterias sanitarias dolos Baños del tercer piso

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTEBLANCO
INTERVENTORIA

09/04/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 Maestro, 3 Ayudantes

ACTIVIDADES: Durante la jornada se realizan los remates y emboquillados del piso de la sección de las baterias y el area del pasillo; del tercer piso.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTEBLANCO
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

17/04/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Instalador, 1 Ayudante

ACTIVIDADES: Durante la jornada se realiza la instalación de los tavamanos en policarbonato en las baterias de los baños del primer y tercer piso.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

26/04/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Oficial, 1 Ayudante.

ACTIVIDADES: Se inicia con la aplicación de la pintura epoxica en los costados perimetrales de la parte superior de los baños del primer piso para la cara superior del ta placa se aplica pintura de primera calidad tipo Vinilo

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

29/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Instalador, 1 Ayudante.

ACTIVIDADES: Si inicia con la instalación de las

Scanned with CamScanner

divisiones de baño en las baterias del tercer piso, Paralelamente se da continuidad a la aplicación de pintura epoxica en los costados laterales, en la parte superior de los baños del tercer piso

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

30/04/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Instalador, 1 Ayudante.

ACTIVIDADES: Se continua con la instalación de las divisiones de los baños del tercer piso. Paralelamente se inicia con la aplicación de pintura de vinilo tipo 1, en la cara superior de las baterias.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

05/05/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Ayudante

ACTIVIDADES: Se realiza los acabados internos y externos del cuarto del shut, Paralelamente se inicia con la instalación electrica y los puntos de entra y salida del cuarto del shut

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTOR.

Scanned with CamScanner

Colegio Santa Librada 04/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se aplicó el cemento blanco para evitar el traspaso en el comedor mientras se instala las baldosas de porcelanato.

John castaño
residente

Colegio Santa Librada. 08/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó la prueba de estanquedad para verificar si se presenta algún tipo de filtración en las jardineras o la poliurea quede toda en buen estado.

John castaño
residente

Colegio Santa Librada. 13/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante
Actividades realizadas:
Se hizo el retiro del piso en PUG del respectivo corredor.

John castaño
residente

Colegio Santa Librada. 14/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el retiro de la estructura donde se ~~soportaba~~ soportaba el piso en PUC del respectivo corredor, se hizo la desinstalación de la membrana del corredor, Se presentaron lluvias leves de 1:00 pm a 3:00 pm.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

Colegio Santa Librada 16/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó de realizar la desinstalación de la membrana en el corredor, se presentaron lluvias fuertes durante todo el día.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO CIVIL

Colegio Santa Librada 17/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se aplicó Sicaflex para ir sellando las dilataciones de los tubos para aplicar imprimante y luego poliurea, Se presentaron

Scanned with CamScanner

Lluvias moderadas durante todo el día.

John Cortés
Residente

Colegio Santa Librada 20/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 Oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se recibió el respectivo material para fundir las rampas y el descanso en la cubierta para el corredor.

John Cortés
Residente

Colegio Santa Librada 23/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 Oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se inició a subir el material para fundir las rampas y el descanso en la cubierta para el corredor.

John Cortés
Residente

Colegio Santa Librada 24/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua subiendo el material para fundir las rampas y el descanso en la cubierta para el corredor.

Scanned with CamScanner

JOHN CASTILLOS
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 25/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se Sigue subiendo el material para fundir las rampas y el descanso en la cubierta para el corredor, se pego la tubería de las bajantes que quedan en una rampa, se realizó la construcción de una rampa.

JOHN CASTILLOS
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 27/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó la construcción del descanso y la rampa número dos, se presentaron lluvias leves durante la tarde.

JOHN CASTILLOS
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 28/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó la construcción de la rampa número dos, se hicieron los escalones de la rampa uno y dos para

Scanned with CamScanner

ingresar a las jardineras.

John castillo
residente

Colegio Santa Librada 29/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se fundió la tercer rampa y se da por terminada la actividad, Se arreglaron los filos de la viga del corredor, se presentaron lluvias moderadas durante la mañana.

John castillo
residente

Colegio Santa Librada 30/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó la imprimación del corredor para después aplicar la respectiva poliurea, Se aplicó la poliurea en el corredor.

John castillo
residente

Colegio Santa Librada 01/05/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:

Scanned with CamScanner

Se aplicó el imprimante en la rampa junto al ascensor, Se aplicó un cordon de poliuretano para elitar cualquier filtración por ese sector.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 02/05/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se aplicó la poliurea en la rampa junto al ascensor.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Scanned with CamScanner

27/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL, Operativo

1. Oficial, 2 Ayudantes.

Actividades: Se realiza la Instalación de la estructura metalica de la baranda

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

17/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1. Oficial, 1 Ayudante.

ACTIVIDADES: Se realiza la Instalación de la Cubierta del cuarto de shut.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

10/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se realiza la Instación de los muros de super board en el cuarto del shut

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

11/04/2026.

PERSONAL ADMINISTRATNO

1 Ing Residente, 1 Inspecto, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 Oficial, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: se inicia con la instación de pañete en los muros externos e Internos del cuarto del shut

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA

INTERVENTORIA

15/04/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATNO

1 Oficial, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: se inicia con la instalación del alistado del piso del cuarto del shut; paralelamente se estuce los muros externos.

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

16/04/2026.

PERSONAL ADMINISTRATNO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL Operativo.

1 Oficial, 2 Ayudantes. 1 Ornamentador, 1 Ayudante

ACTIVIDADES: se realizo la instalación de la puerta del cuarto del shut, paralelamente se pinta los muros por la parte Interna

Scanned with CamScanner

de la sección del pasillo y los muros del costado lateral de la cancha.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

17/04/2025

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Oficial, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: Se inicia con la instalación de la baldas de pared y se continua con los acabados de los muros de la sección de la cancha.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

18/04/2025

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO.

1 Oficial, 1 Ayudante.

ACTIVIDADES: Se realiza la instalación de la baldosa de piso.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

22/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se Inicia pintendo la cancha, ya en horas de la tarde se deja completamente terminado los colores base. para realizar el demarcado el dia de mañana

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

23/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL Operativo.

1 Oficial, 2 Ayudantes.

ACTIVIDADES: se finaliza con la demarcación de la Cancha y los acabados correspondientes

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

05/05/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Ing Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Oficial, 2 Ayudante

ACTIVIDADES: Se Finaliza con los acabos y remates faltantes del cuarto de shut; Paralelamente

Se da inicio a las actividades de Instalación Electricas

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Colegio Fabio Lozano Simonelli 04/04/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó la instalación del techo en PUG en la sala de profesores, se terminó el proceso de fundir la cuneta alrededor de las canchas, se instaló la malla electrosoldada faltante para la cuneta y la tubería restante.

Jaime Castro
Inspector

Colegio Fabio Lozano Simonelli 06/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de reconstrucción de la caja de inspección queda faltando únicamente el marco y la tapa.

Jaime Castro
Inspector

Colegio Fabio Lozano Simonelli 07/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el retiro del manto en aluminio sobre la losa que se va a impermeabilizar; se está dejando secar para el día de mañana imprimar.

Scanned with CamScanner

Colegio Fabio Lozano Simonelli 08/04/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se hizo el sellado de las fisuras encontradas con sicaflex y se aplicó el imprimante sobre la zona que se va a impermeabilizar en la parte superior del laboratorio.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 09/04/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 Oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se aplicó la poliurea sobre la zona solicitada para impermeabilizar en la parte superior del laboratorio.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 17/04/2026.

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se recibieron los orinales, sanitarios y grifería tipo push para la instalación en los baños tercer piso, se realizó la instalación de la grifería tipo push, se instalaron los orinales en el baño de hombres, se presentaron lluvias intensas

Scanned with CamScanner

durante todo el día.

JOHN CASTILLOS
INSPECTOR

Colegio Fabio Lozano Simonelli 18/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se inició la instalación de los sanitarios en los respectivos baños.

JOHN CASTILLOS
INSPECTOR

Colegio Fabio Lozano Simonelli 22/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación de los sanitarios en los respectivos baños.

JOHN CASTILLOS
INSPECTOR

Colegio Fabio Lozano Simonelli 23/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se sigue la instalación de los sanitarios en los respectivos baños.

Scanned with CamScanner

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Colegio Fabio Lozano Simonelli 02/05/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se realizó el retiro de un viaje de escombros, se continua la instalación de los sanitarios en los respectivos baños, se presentaron fuertes lluvias durante la mañana.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Colegio Fabio Lozano Simonelli. 04/05/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó la instalación de los orinales y sanitarios, se instaló el marco de la caja de inspección, se presentaron lluvias moderadas durante la mañana.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

Colegio Tenerife Granada Sur. 04/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la impermeabilización en la parte interna del tanque, Se adicó otra mano de pintura impermeabilizante en el techo del tanque.

Obra

Colegio Tenerife Granada Sur. 06/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de la impermeabilización en la parte interna del tanque de reserva.

Obra

Colegio Tenerife Granada Sur. 07/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizaron los dibujos sobre la placa del tanque para generar un espacio recreativo para los niños.

Obra

Colegio Tenerife Granada Sur. 08/04/2026
Personal administrativo.

Scanned with CamScanner

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el retiro del cerramiento que se tenía alrededor del tanque de almacenamiento, el día de mañana se hace la entrega del tanque impermeabilizado y la pintura de la placa exterior mediante la respectiva acta de entrega.

JOHN CASTEÑEDA
INGENIERO

Obra

Colegio Tenerife Granada Sur. 10/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Actividades realizadas:
Se realizó la entrega del acta del tanque de almacenamiento y la pintura de la placa superior del tanque, se entregaron también las respectivas fichas técnicas.

JOHN CASTEÑEDA
INGENIERO

Colegio Tenerife Granada Sur. 23/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se recibió el material para la instalación de la baranda y pasamanos, se inició la instalación de los pasamanos.

JOHN CASTEÑEDA
INGENIERO

Colegio Tenerife Granada Sur. 24/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.

Scanned with CamScanner

1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó la instalación de los pasamanos y la baranda, Ya se tiene terminada la obra y lista para entregar al colegio.

[illegible]
INGENIERO

R. D

Colegio Tenerife Granada Sur. 28/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Actividades realizadas:
Se realizó la entrega de las barandas y pasamanos al rector; todo quedo mediante acta y de está manera se da por finalizada la ejecución de obra en este colegio. "Ya quedo todo debidamente entregado y firmado por parte del rector del colegio".

JOHN [illegible]
INGENIERO CIVIL

R. D

Scanned with CamScanner

ANEXO No. 2. INFORMES SEMANALES

FECHA: 12/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 69 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANENCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS	
12 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCONTR.8169110	CO1.PCONTR.8154760	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRORROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-1000046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028	39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026	jul-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	94.16%	94.16%		100.00%		$ 164,884,421	$ 155,249,499	10/11/2025	28/02/2026																	
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100.00%	100.00%		100.00%		$ 165,727,196	$ 165,727,196	18/11/2025	21/02/2026																	
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	73.91%	75.97%		95.71%		$ 121,299,091	$ 92,156,582	10/11/2025	18/04/2026																	
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	79.80%	82.38%		85.66%		$ 243,945,084	$ 200,964,142	1/12/2025	11/04/2026																	
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	97.62%	79.70%		100.00%		$ 631,551,513	$ 503,373,835	24/11/2025	28/02/2026																	
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	93.67%	93.67%		100.00%		$ 169,818,729	$ 159,064,994	10/12/2025	21/03/2026																	
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%		$ 72,206,451	$ 72,206,450	1/12/2025	14/03/2026																	
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	36.03%	48.06%		50.40%		$ 234,227,860	$ 112,566,445	15/01/2026	2/05/2026																	
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%		$ 75,074,063	$ 75,074,063	15/01/2026	28/02/2026																	
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	46.90%	65.14%		9.24%		$ 130,006,456	$ 84,682,520	9/03/2026	7/06/2026																	
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	10.91%	11.72%		28.87%		$ 364,449,204	$ 42,702,073	13/01/2026	19/06/2026																	
TOTAL FRENTES DE OBRA						70.11%		77.52%		$ 2,373,190,068	$ 1,663,767,799																			
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	81.58%	84.62%		100.00%		$ 26,605,858	$ 22,514,425	26/01/2026	1/03/2026																	
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja						$ 35,000,000																				
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	0.00%	8.28%		11.00%		$ 100,413,274	$ 8,310,638	7/04/2026	22/05/2026																	
TOTAL FRENTES DE OBRA						46.45%		55.50%		$ 162,019,132	$ 30,825,063																			

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ 1,663,767,799
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	2	0	2	$ 30,825,063
TOTAL				
2	9	0	11	$ 1,694,592,862
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2		13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31		$	90,992,472
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$	361,963,041.00	11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	70.11%	11.61%	73.15%
PROGRAMADO	77.52%		
ATRASO	-7.41%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			











OBSERVACIONES:

FECHA:	12/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 94.16%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA
2C 75.97%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	   

FECHA:	12/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

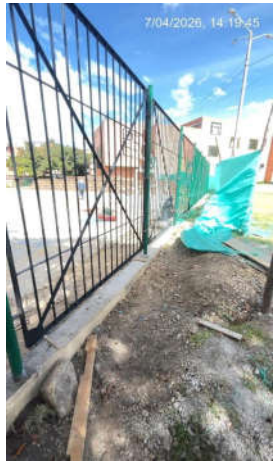TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	FRENTE AL 100%
4A 79.70%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	  



FECHA: 12/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 82.38%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	  
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%



FECHA: 12/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
5/4/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A 93.67%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA
8A 48.06%	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	 

FECHA:	12/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

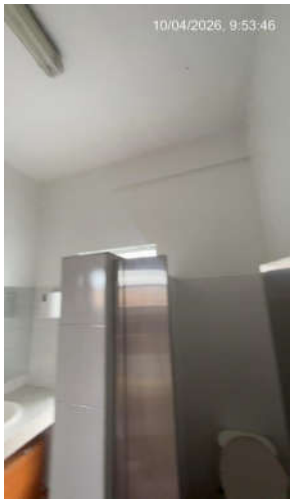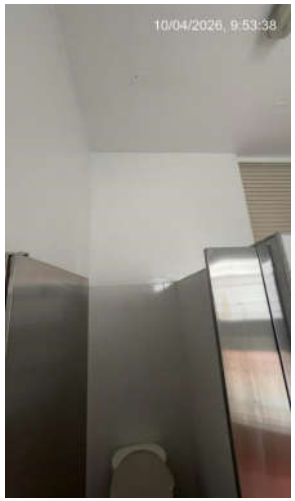TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 81.58%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	  

FECHA:	12/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

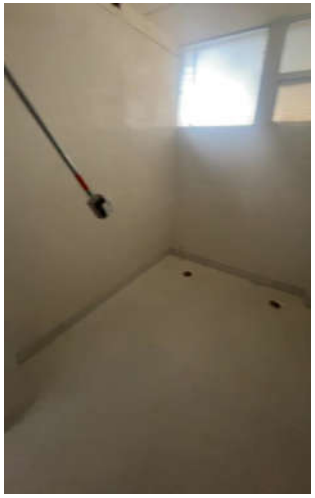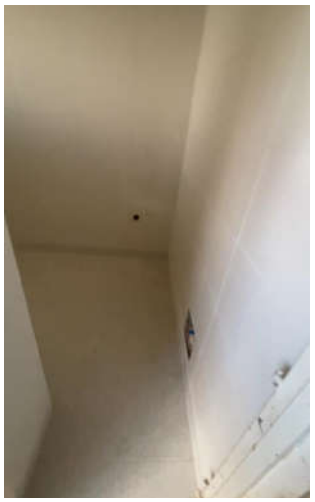TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 11.72%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	  
12A 65.14%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	 

FECHA:	12/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 8.28%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	  

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 22				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 4,233.48	$ 1,275,715.60	$ (1,121,193.73)	825.59%	825.59%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 18,044.21	$ 5,437,442.99	$ (4,778,829.24)	825.59%	825.59%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	-181.34	120.00	120.00		$ 33,201.35	$ 3,984,162.12	$ 6,020,732.99	39.82%	39.82%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20			79.20		$ 69,099.55	$ 5,472,684.59	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00			34.00		$ 107,273.69	$ 3,647,305.34	$ -	100.00%	100.00%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	2.00		$ 166,952.47	$ 333,904.95	$ 2,337,334.64	12.50%	12.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			11.00		$ 91,590.40	$ 1,007,494.39	$ 2,106,579.18	32.35%	32.35%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	44.00	(16.20)	27.80	3.00		$ 91,590.40	$ 274,771.20	$ 3,755,206.36	6.82%	6.82%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	96.00	(72.00)	24.00	2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 523,113.53	2.08%	2.08%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	248.96	248.96		$ 45,289.29	$ 11,275,220.89	$ (7,969,102.94)	341.04%	341.04%	
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	300.00			300.00		$ 34,369.67	$ 10,310,901.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	31.46	293.46	293.46		$ 361,355.09	$ 106,043,263.51	$ (11,368,231.00)	112.01%	112.01%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	**$ 155,249,499.23**				
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 22				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37			47.37		$ 7,045.00	$ 333,721.66	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00			53.10		$ 31,110.25	$ 1,651,954.06	$ 214,660.70	88.50%	88.50%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76			1.76		$ 274,656.52	$ 483,395.48	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	275.63			275.63		$ 23,042.63	$ 6,351,239.56	$ -	100.00%	100.00%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60			2.00		$ 146,133.16	$ 292,266.33	$ 1,549,012.00	15.87%	15.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77			15.77	15.77	$ 159,158.72	$ 2,509,933.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78		$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80			226.80		$ 23,042.63	$ 5,226,068.03	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84			36.84		$ 264,771.67	$ 9,754,188.24	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA							**$ 92,156,581.69**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 22**				
	Unidad de medida		**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**		**Precio unitario ($)**			**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	-104.13	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	0.00	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	173.63		$ 36,752.18	$ 6,381,281.40	$ (206,914.79)	103.35%	103.35%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	

PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,438.92		$ 23,042.63	$ 56,199,126.28	$ (80,997,372.11)	-226.63%	-226.63%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	31		$ 304,166.74	$ 9,429,168.84	$ (2,585,417.26)	137.78%	137.78%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			61.70		$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 165,727,196.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 22**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72			786.72		$ 7,045.00	$ 5,542,442.56	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	26.21	122.46	122.46		$ 31,110.25	$ 3,809,760.73	$ (815,399.55)	127.23%	127.23%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	17.92	484.50	484.50		$ 107,273.69	$ 51,974,101.11	$ (1,922,344.00)	103.84%	103.84%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00			145.00		$ 32,594.26	$ 4,726,167.12	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00			145.00		$ 42,650.45	$ 6,184,314.87	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80			16.80		$ 91,988.38	$ 1,545,404.84	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	-36.51	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83	22.83	$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	

EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10			103.10		$ 176,060.25	$ 18,151,811.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05			129.05		$ 176,060.25	$ 22,720,575.03	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			1.52		$ 156,990.72	$ 238,625.89	$ (97,334.00)	168.89%	168.89%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50			440.64		$ 77,589.44	$ 34,189,010.49	$ 3,403,073.00	90.95%	90.95%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67	66.67	$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			312.00	312.00	$ 7,255.46	$ 2,263,703.46	$ 2,237,947.00	50.29%	50.29%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			3.50	3.50	$ 2,042,059.82	$ 7,147,209.37	$ 28,588,837.00	20.00%	20.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			17.50	17.50	$ 1,257,854.97	$ 22,012,461.99	$ -	100.00%	100.00%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 503,373,835.31**				
CPF	**523**	**IED**				**Fabio Lozano Simonelli**		**SEMANA 22**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	-802.02	399.00	399.00		$ 4,233.48	$ 1,689,156.84	$ 3,395,332.00	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83			42.00		$ 31,110.25	$ 1,306,630.33	$ 305,813.72	81.03%	81.03%	

DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30			49.77		$ 32,569.97	$ 1,621,007.52	$ 180,111.95	90.00%	90.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	-548.06	0.00			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76			123.83		$ 7,103.01	$ 879,565.91	$ 248,108.19	78.00%	78.00%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	-44.68	126.92	122.00		$ 140,306.40	$ 17,117,380.80	$ 6,959,197.44	71.10%	71.10%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00			32.00		$ 23,315.15	$ 746,084.68	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00			32.00		$ 20,790.98	$ 665,311.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00			8.00		$ 238,055.44	$ 1,904,443.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00			15.00	15.00	$ 361,355.09	$ 5,420,326.29	$ -	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00	1.00	$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30			49.77		$ 130,345.99	$ 6,487,320.16	$ 720,813.35	90.00%	90.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			92.03		$ 98,222.57	$ 9,039,423.54	$ 3,827,733.73	70.25%	70.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73			11.73		$ 1,128,301.00	$ 13,238,355.63	$ (3,384.90)	100.03%	100.03%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82			47.82		$ 989,338.00	$ 47,313,111.17	$ (2,968.01)	100.01%	100.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80			1.80		$ 989,338.00	$ 1,780,808.40	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			22.85		$ 6,610.59	$ 151,051.98	$ 1,014,923.88	12.95%	12.95%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 200,964,142.21**				
CPF	**1918**	**IED**				**Estrella del Sur Sede B**		**SEMANA 22**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	

DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			577.76		$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	$ -	100.00%	100.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B			**$ 72,206,450.25**				
CPF	**1918**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 22**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32			538.32		$ 4,233.48	$ 2,278,964.69	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			12.00	12.00		$ 7,469.97	$ 89,639.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-118.82	420.00	420.00		$ 36,749.48	$ 15,434,783.28	$ 4,366,574.00	77.95%	77.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-1486.40	355.00	355.00		$ 23,042.63	$ 8,180,132.94	$ 34,250,562.26	19.28%	19.28%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			44.00		$ 130,345.99	$ 5,735,223.77	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-68.31	470.00	470.00		$ 264,771.67	$ 124,442,683.87	$ 18,086,552.63	87.31%	87.31%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$ 159,064,993.54**				

CPF	**1918**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 22**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			241.34		$ 13,385.77	$ 3,230,454.85	$ 1,750,791.81	64.85%	64.85%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			38.32		$ 34,724.48	$ 1,330,642.26	$ 887,210.59	60.00%	60.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	1.67	335.60	218.00		$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00			110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60			108.00		$ 34,369.67	$ 3,711,924.53	$ 3,711,924.53	30.29%	30.29%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00			6.00		$ 68,114.71	$ 408,688.26	$ 408,688.26	100.00%	100.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20			7.20		$ 157,817.72	$ 1,136,287.57	$ 1,136,287.57	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00			6.00		$ 101,978.47	$ 611,870.81	$ 611,870.81	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60			188.00	78.00	$ 361,355.09	$ 67,934,756.06	$ 67,934,756.06	56.02%	56.02%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA	**$ 112,566,445.19**				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 22				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	-1.99	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.28		$ 1,127,967.67	$ 2,571,766.29	$ (135,356.00)	105.56%	105.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	41.64		$ 989,338.20	$ 41,196,042.70	$ (12,683,316.00)	144.48%	144.48%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	-0.80	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50		$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16	2.16	$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A							**$ 75,074,063.00**				

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 22				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			25.00	15.00	$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ 112,050.00	62.50%	62.50%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			55.00	40.00	$ 18,687.73	$ 1,027,825.33	$ 840,948.00	55.00%	55.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31		$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00			18.85		$ 61,099.39	$ 1,151,723.50	$ 986,755.00	53.86%	53.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			101.94		$ 126,224.49	$ 12,867,324.94	$ 3,483,796.00	78.69%	78.69%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ 184,476.00	60.00%	60.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			177.00		$ 36,193.65	$ 6,406,276.90	$ 6,777,624.00	48.59%	48.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			141.40	21.20	$ 98,222.57	$ 13,888,672.05	$ 21,889,883.00	38.82%	38.82%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA			**$ 42,702,073.07**				


CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 22				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00			193.00		$ 4,294.19	$ 828,777.76	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83			24.83		$ 38,696.24	$ 960,827.52	$ -	100.00%	100.00%	


SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28			44.28		$ 361,355.09	$ 16,000,803.20	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28			44.28		$ 65,757.83	$ 2,911,756.81	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00			12.90	12.90	$ 190,851.78	$ 2,461,987.97	$ 5,744,639.00	30.00%	30.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00			150.00	52.50	$ 404,730.00	$ 60,709,500.00	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 84,682,519.66**				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**70.11%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**1,663,767,799.15**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,373,190,068.00**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Abr 12 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 164,884,421.00	100.00%	$ 155,249,499.23	94.16%	$ 164,884,421.00	-5.84%
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 116,090,226.57	95.71%	$ 92,156,581.69	75.97%	$ 121,299,091.00	-19.73%
FABIO LOZANO	$ 208,962,725.44	85.66%	$ 200,964,142.21	82.38%	$ 243,945,084.00	-3.28%
ARBORIZADORA BAJA	$ 631,551,513.00	100.00%	$ 503,373,835.31	79.70%	$ 631,551,513.00	-20.30%
BUENAVISTA	$ 169,818,729.00	100.00%	$ 159,064,993.54	93.67%	$ 169,818,729.00	-6.33%
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72,206,451.00	100.00%	$ 72,206,450.25	100.00%	$ 72,206,451.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 118,050,515.10	50.40%	$ 112,566,445.19	48.06%	$ 234,227,860.00	-2.34%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 12,013,717.27	9.24%	$ 84,682,519.66	65.14%	$ 130,006,456.00	55.90%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 105,223,836.05	28.87%	$ 42,702,073.07	11.72%	$ 364,449,204.00	-17.16%
TOTALES	$ 1,839,603,393.43	77.52%	$ 1,663,767,799.15	70.11%	$ 2,373,190,068.00	-7.41%

OBSERVACIONES: Para el cierre de la presenta semana, encontramos que de los ocho (8) frentes abiertos, solo uno (1) no presenta atrasos. Las ***IED Fabio Lozano Simonelli, y Santa Librada*** registran atrasos mayores al 2%. ***Orlando Fals Borda y Calasanz Buenavista*** promedian atrasos del 6%. Mientras que en las ***IED Sierra Morena, Arborizadora Baja y Guillermo Cano Isaza*** se registran promedio de atrasos del 19%. El porcentaje de atraso del contrato está cercano al 8%

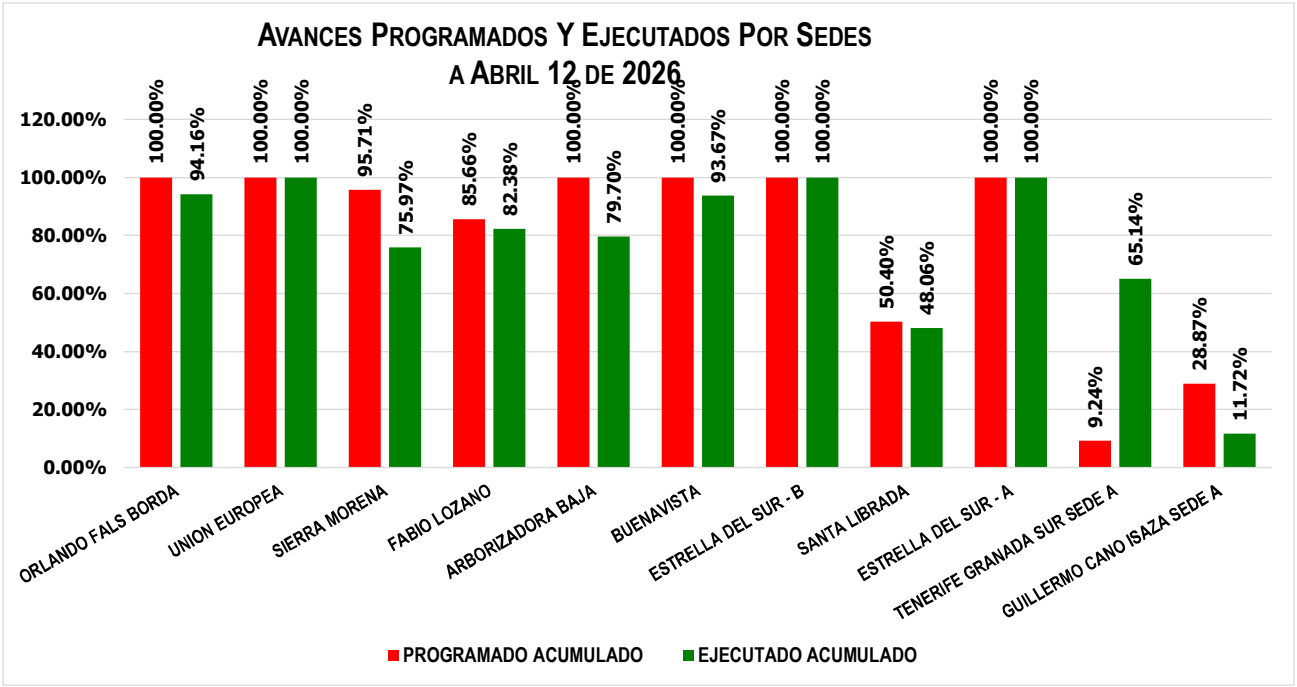

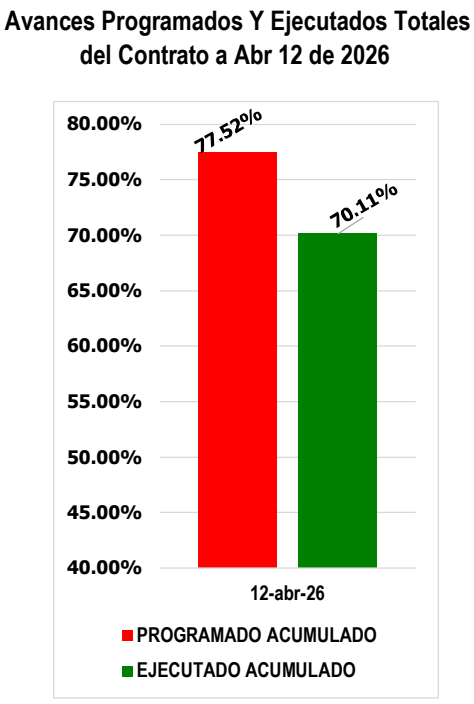

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Abr. 12 2026

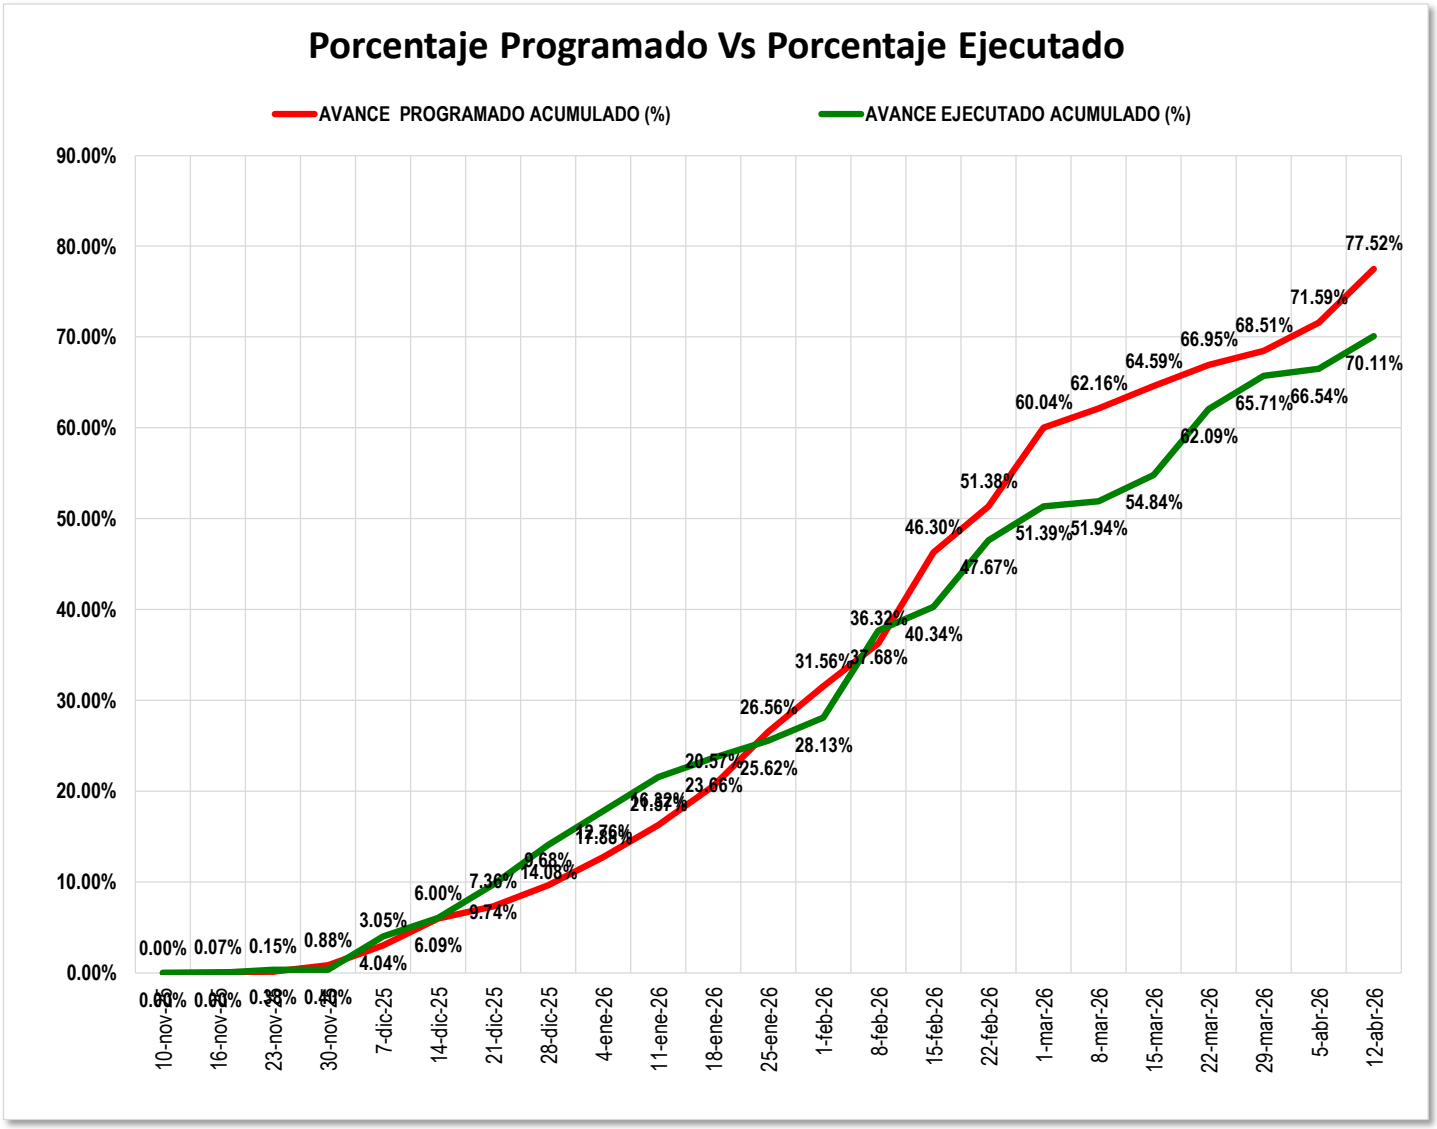

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.07%	0.00%
23-nov-25	0.15%	0.38%
30-nov-25	0.88%	0.40%
7-dic-25	3.05%	4.04%
14-dic-25	6.00%	6.09%
21-dic-25	7.36%	9.74%
28-dic-25	9.68%	14.08%
4-ene-26	12.76%	17.88%
11-ene-26	16.32%	21.57%
18-ene-26	20.57%	23.66%
25-ene-26	26.56%	25.62%
1-feb-26	31.56%	28.13%
8-feb-26	36.32%	37.68%
15-feb-26	46.30%	40.34%
22-feb-26	51.38%	47.67%
1-mar-26	60.04%	51.39%
8-mar-26	62.16%	51.94%
15-mar-26	64.59%	54.84%
22-mar-26	66.95%	62.09%
29-mar-26	68.51%	65.71%
5-abr-26	71.59%	66.54%
12-abr-26	**77.52%**	**70.11%**
19-abr-26	82.19%	
26-abr-26	84.29%	
3-may-26	85.99%	
10-may-26	87.65%	
17-may-26	91.43%	
24-may-26	93.73%	
31-may-26	96.98%	
7-jun-26	98.35%	
14-jun-26	99.16%	
20-jun-26	100.00%	

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780 DE 2025

CONTRATISTA :	CONSORCIO PAIS	**OBJETO:**	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"				
DIRECCION :	CALLE 18 N. 7-28 Centro Chiquinquirá-Boyacá						
C.C. ó NIT :	901.974.049-8	**ESTABLECIMIENTOS :**	LOTE 6	**PLAZO INICIAL**	:	7 MESES	
TELEFONO :	310 259 55 02	**LOCALIZACION :**	CIUDAD BOLIVAR Y USME	**FECHA INICIACION**	:	06 DE OCTUBRE DE 2025	
INTERVENTOR :	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	**VR. INICIAL :**	**$ 2,332,049,023.00**	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	:	05 DE MAYO DE 2026	
DIRECCION :	CALLE 98 No. 70 - 91 Ofic 703	**ANTICIPO**		**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR**	:	1,5 MESES	
C.C. ó NIT :	901.977.271-0	**VR. ADICIONAL :**	**$ 785,001,422.00**	**TIEMPO SUSPENDIDO**	:	N/A	
TELEFONO :	(1) 3688490	**VR. FINAL :**	**$ 3,117,050,445.00**	**PLAZO TOTAL**	:	8.5 MESES	
				FECHA FINAL		20 DE JUNIO DE 2026	

BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NP - ACTUALIZADO HASTA DOM-12-ABR-2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A DOM-12-ABR-2026					
						MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO CON AIU	VR TOTAL CON AIU	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**									
	ORLANDO FALS BORDA										
	REPLANTEO	m2	36.50	$ 4,233.48	$ 154,521.87	264.84	$ 1,121,193.73		$ -	301.34	$ 1,275,715.60
	CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	$ 31,110.25	$ 2,831,032.39		$ -	(62.60)	$ (1,947,501.40)	28.40	$ 883,530.99
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	$ 18,044.21	$ 658,613.76	264.84	$ 4,778,829.24		$ -	301.34	$ 5,437,442.99
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	301.34	$ 33,201.35	$ 10,004,895.11		$ -	(181.34)	$ (6,020,732.99)	120.00	$ 3,984,162.12
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	$ 69,099.55	$ 5,472,684.59	-	$ -	-	$ -	79.20	$ 5,472,684.59
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	34.00	$ 107,273.69	$ 3,647,305.34	-	$ -	-	$ -	34.00	$ 3,647,305.34
	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	$ 166,952.47	$ 2,671,239.59		$ -	(14.00)	$ (2,337,334.64)	2.00	$ 333,904.95
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00	$ 91,590.40	$ 3,114,073.57		$ -	(23.00)	$ (2,106,579.18)	11.00	$ 1,007,494.39
	MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	$ 27,185.71	$ 1,590,364.27	136.16	$ 3,701,606.83		$ -	194.66	$ 5,291,971.11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	44.00	$ 91,590.40	$ 4,029,977.56		$ -	(41.00)	$ (3,755,206.36)	3.00	$ 274,771.20
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	96.00	$ 5,565.04	$ 534,243.60		$ -	(94.00)	$ (523,113.53)	2.00	$ 11,130.08
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	$ 45,289.29	$ 3,306,117.95	175.96	$ 7,969,102.94		$ -	248.96	$ 11,275,220.89
	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE	M	300.00	$ 34,369.67	$ 10,310,901.48	-	$ -	-	$ -	300.00	$ 10,310,901.48
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	$ 361,355.09	$ 94,675,032.51	31.46	$ 11,368,231.00		$ -	293.46	$ 106,043,263.51
	SUBTOTAL ORLANDO FALS BORDA				**$ 143,001,003.57**		**$ 28,938,963.74**		**$ (16,690,468.09)**		**$ 155,249,499.23**
	SIERRA MORENA										
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	$ 7,045.00	$ 333,721.66	-	$ -			47.37	$ 333,721.66
	CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	$ 31,110.25	$ 1,866,614.76		$ -			60.00	$ 1,866,614.76
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y	m3	1.76	$ 274,656.52	$ 483,395.48	-	$ -			1.76	$ 483,395.48
	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	m	20.80	$ 21,488.46	$ 446,960.07	7.20	$ 154,716.95			28.00	$ 601,677.01
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60	$ 11,376.96	$ 143,349.70	-	$ -			12.60	$ 143,349.70
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	36.84	$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	-	$ -			36.84	$ 3,951,962.61

BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NP - ACTUALIZADO HASTA DOM-12-ABR-2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A DOM-12-ABR-2026					
						MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO CON AIU	VR TOTAL CON AIU	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**									
	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE	m2	32.64	$ 93,547.94	$ 3,053,404.86		$ -			32.64	$ 3,053,404.86
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M	7.20	$ 15,633.37	$ 112,560.27		$ -			7.20	$ 112,560.27
	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29	$ 11,761.45	$ 62,218.09		$ -			5.29	$ 62,218.09
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	$ 91,988.38	$ 161,899.55	2.69	$ 247,448.75			4.45	$ 409,348.31
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	$ 21,702.97	$ 539,752.91		$ -			24.87	$ 539,752.91
	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84	$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	-	$ -			11.84	$ 1,964,625.47
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	m3	7.00	$ 176,060.25	$ 1,232,421.74	7.00	$ 1,232,157.65			14.00	$ 2,464,579.38
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA	KG	275.63	$ 23,042.63	$ 6,351,239.56	-	$ -			275.63	$ 6,351,239.56
	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	$ 146,133.16	$ 1,841,277.85		$ -			12.60	$ 1,841,277.85
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00	$ 78,726.73	$ 472,360.38		$ -			6.00	$ 472,360.38
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00	$ 28,310.86	$ 226,486.91		$ -			8.00	$ 226,486.91
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00	$ 129,729.46	$ 259,458.91		$ -			2.00	$ 259,458.91
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00	$ 14,988.50	$ 434,666.53		$ -			29.00	$ 434,666.53
	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y	M2	42.05	$ 193,996.53	$ 8,157,554.20	8.55	$ 1,658,670.35			50.60	$ 9,816,224.55
	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84	$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	-	$ -			11.84	$ 1,964,625.47
	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO)	M	2.96	$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	-	$ -			2.96	$ 1,752,519.43
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	$ 7,255.46	$ 3,050,920.85		$ -			420.50	$ 3,050,920.85
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39	$ 7,103.01	$ 649,144.22	-	$ -			91.39	$ 649,144.22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	$ 143,600.90	$ 861,605.41	10.00	$ 1,436,009.02			16.00	$ 2,297,614.44
	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	$ 1,618,437.02	$ 6,473,748.09		$ -			4.00	$ 6,473,748.09
	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00	$ 875,947.70	$ 2,627,843.09		$ -			3.00	$ 2,627,843.09
	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12	M2	15.77	$ 159,158.72	$ 2,509,933.07	-	$ -			15.77	$ 2,509,933.07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS	M	33.78	$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	-	$ -			33.78	$ 37,839,110.41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA	kg	226.80	$ 23,042.63	$ 5,226,068.03	-	$ -			226.80	$ 5,226,068.03
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR	M2	36.84	$ 264,771.67	$ 9,754,188.24	-	$ -			36.84	$ 9,754,188.24
	SUBTOTAL SIERRA MORENA				**$ 104,805,637.81**		**$ 4,729,002.72**		**$ -**		**$ 109,534,640.54**
	FABIO LOZANO SIMONELLI										
	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias,	m2	1,201.02	$ 4,233.48	$ 5,084,489.11		$ -			1,201.02	$ 5,084,489.11
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	51.83	$ 31,110.25	$ 1,612,444.05		$ -			51.83	$ 1,612,444.05
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	235.29	$ 32,594.26	$ 7,669,102.49	20.63	$ 672,419.50			255.92	$ 8,341,522.00
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	28.64	$ 22,300.62	$ 638,689.84	1.35	$ 30,105.84			29.99	$ 668,795.68
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	$ 12,649.16	$ 701,775.49	30.02	$ 379,727.83			85.50	$ 1,081,503.32
	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	UN	28.00	$ 20,708.69	$ 579,843.18	-	$ -			28.00	$ 579,843.18
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M3	15.05	$ 66,591.58	$ 1,002,203.22		$ -			15.05	$ 1,002,203.22
	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	17.32	$ 33,174.37	$ 574,580.07	-	$ -			17.32	$ 574,580.07

BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NP - ACTUALIZADO HASTA DOM-12-ABR-2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A DOM-12-ABR-2026					
						MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO CON AIU	VR TOTAL CON AIU	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**									
	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y	UN	28.00	$ 27,281.50	$ 763,882.01	-	$ -			28.00	$ 763,882.01
	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M	66.00	$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	-	$ -			66.00	$ 1,843,941.79
	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00	$ 7,469.97	$ 59,759.73	-	$ -			8.00	$ 59,759.73
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE	M2	55.30	$ 32,569.97	$ 1,801,119.46		$ -			55.30	$ 1,801,119.46
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE	M	22.90	$ 18,687.73	$ 427,949.09	-	$ -			22.90	$ 427,949.09
	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80	$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	-	$ -			12.80	$ 1,733,047.38
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67	$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	-	$ -			194.67	$ 26,357,213.62
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31	$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	-	$ -			49.31	$ 6,676,294.26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	$ 69,868.54	$ 38,292,151.98		$ -			548.06	$ 38,292,151.98
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	$ 7,103.01	$ 1,127,674.11		$ -			158.76	$ 1,127,674.11
	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	$ 140,306.40	$ 24,076,578.24		$ -			171.60	$ 24,076,578.24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y	M	1.00	$ 572,567.48	$ 572,567.48	-	$ -			1.00	$ 572,567.48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	8.00	$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	-	$ -			8.00	$ 1,442,641.20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	32.00	$ 23,315.15	$ 746,084.68	-	$ -			32.00	$ 746,084.68
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00	$ 20,790.98	$ 665,311.36	-	$ -			32.00	$ 665,311.36
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	8.00	$ 238,055.44	$ 1,904,443.52	-	$ -			8.00	$ 1,904,443.52
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00	$ 361,355.09	$ 5,420,326.29	-	$ -			15.00	$ 5,420,326.29
	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00	$ 875,947.70	$ 875,947.70	-	$ -			1.00	$ 875,947.70
	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA,	M2	55.30	$ 130,345.99	$ 7,208,133.51		$ -			55.30	$ 7,208,133.51
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	$ 126,224.49	$ 28,613,830.59	12.39	$ 1,563,366.10			239.08	$ 30,177,196.69
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	$ 33,727.50	$ 588,207.60	76.23	$ 2,571,047.33			93.67	$ 3,159,254.93
	WIN DE ALUMINIO	M	18.00	$ 15,372.99	$ 276,713.90	-	$ -			18.00	$ 276,713.90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00	$ 98,222.57	$ 12,867,157.27		$ -			131.00	$ 12,867,157.27
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y	M2	11.73	$ 1,128,301.00	$ 13,234,970.73		$ -			11.73	$ 13,234,970.73
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304	M2	47.82	$ 989,338.00	$ 47,310,143.16		$ -			47.82	$ 47,310,143.16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	$ 989,338.00	$ 1,780,808.40	-	$ -			1.80	$ 1,780,808.40
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	$ 20,236.50	$ 1,350,179.28	216.43	$ 4,379,785.70			283.15	$ 5,729,964.98
	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y	M2	176.38	$ 6,610.59	$ 1,165,975.86		$ -			176.38	$ 1,165,975.86
	SUBTOTAL FABIO LOZANO SIMONELLI				**$ 247,046,181.65**		**$ 9,596,452.29**		**$ -**		**$ 256,642,633.93**
	ARBORIZADORA BAJA										
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	$ 7,045.00	$ 5,542,442.56	-	$ -			786.72	$ 5,542,442.56
	CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	$ 31,110.25	$ 2,994,361.18	26.21	$ 815,399.55			122.46	$ 3,809,760.73
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	m2	466.58	$ 107,273.69	$ 50,051,756.65	17.92	$ 1,922,344.46			484.50	$ 51,974,101.11
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	m2	5.25	$ 22,300.62	$ 117,078.27		$ -			5.25	$ 117,078.27
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	145.00	$ 32,594.26	$ 4,726,167.12	-	$ -			145.00	$ 4,726,167.12

BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NP - ACTUALIZADO HASTA DOM-12-ABR-2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A DOM-12-ABR-2026					
						MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO CON AIU	VR TOTAL CON AIU	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**									
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	$ 42,650.45	$ 6,184,314.87	-	$ -			145.00	$ 6,184,314.87
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE	m2	323.02	$ 36,752.18	$ 11,871,689.89		$ -			323.02	$ 11,871,689.89
	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50	$ 8,680.11	$ 308,143.88	-	$ -			35.50	$ 308,143.88
	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00	$ 7,469.97	$ 186,749.17	-	$ -			25.00	$ 186,749.17
	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	un	2.00	$ 398,950.46	$ 797,900.91	-	$ -			2.00	$ 797,900.91
	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00	$ 11,761.45	$ 246,990.53		$ -			21.00	$ 246,990.53
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	$ 91,988.38	$ 1,545,404.84		$ -			16.80	$ 1,545,404.84
	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	$ 79,962.51	$ 20,638,322.82		$ -			258.10	$ 20,638,322.82
	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83	$ 135,394.33	$ 3,091,052.48		$ -			22.83	$ 3,091,052.48
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	m3	15.52	$ 66,591.58	$ 1,033,501.26		$ -			15.52	$ 1,033,501.26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	m3	103.10	$ 176,060.25	$ 18,151,811.59	-	$ -			103.10	$ 18,151,811.59
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	$ 176,060.25	$ 22,720,575.03	-	$ -			129.05	$ 22,720,575.03
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00	$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	-	$ -			87.00	$ 6,614,951.64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM,	M	1.52	$ 358,768.86	$ 545,328.67	-	$ -			1.52	$ 545,328.67
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA	M	0.90	$ 156,990.72	$ 141,291.65	0.62	$ 97,334.25			1.52	$ 238,625.89
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA	kg	1,809.76	$ 23,042.63	$ 41,701,626.45		$ -			1,809.76	$ 41,701,626.45
	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00	$ 1,088,548.32	$ 2,177,096.63		$ -			2.00	$ 2,177,096.63
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	$ 11,730.42	$ 8,032,760.09		$ -			684.78	$ 8,032,760.09
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00	$ 5,565.04	$ 16,695.11		$ -			3.00	$ 16,695.11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR	m2	323.02	$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	-	$ -			323.02	$ 85,526,544.13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA	m	35.50	$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	-	$ -			35.50	$ 10,845,812.21
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA,	m2	484.50	$ 225,361.76	$ 109,187,772.04		$ -			484.50	$ 109,187,772.04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA	M2	484.50	$ 77,589.44	$ 37,592,083.29		$ -			484.50	$ 37,592,083.29
	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67	$ 62,023.52	$ 4,135,108.31		$ -			66.67	$ 4,135,108.31
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45	$ 7,255.46	$ 4,501,650.03		$ -			620.45	$ 4,501,650.03
	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72	$ 18,365.30	$ 6,496,173.31		$ -			353.72	$ 6,496,173.31
	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL -	UN	2.00	$ 12,850,061.48	$ 25,700,122.95		$ -			2.00	$ 25,700,122.95
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE	UN	5.00	$ 126,905.79	$ 634,528.95		$ -			5.00	$ 634,528.95
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y	UN	1.00	$ 572,567.48	$ 572,567.48	-	$ -			1.00	$ 572,567.48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	118.00	$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	-	$ -			118.00	$ 1,795,706.06
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00	$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	-	$ -			118.00	$ 1,896,316.55
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	UN	25.00	$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	-	$ -			25.00	$ 4,508,253.74
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	22.00	$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	-	$ -			22.00	$ 5,237,219.69
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	UN	3.00	$ 193,810.36	$ 581,431.07	-	$ -			3.00	$ 581,431.07

BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NP - ACTUALIZADO HASTA DOM-12-ABR-2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A DOM-12-ABR-2026					
						MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO CON AIU	VR TOTAL CON AIU	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**									
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA	M	194.18	$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	-	$ -			194.18	$ 1,780,074.18
	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4",	M2	17.50	$ 2,042,059.82	$ 35,736,046.83		$ -			17.50	$ 35,736,046.83
	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4"	M2	17.50	$ 1,257,854.97	$ 22,012,461.99	-	$ -			17.50	$ 22,012,461.99
	LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54	$ 5,046.98	$ 996,981.04	-	$ -			197.54	$ 996,981.04
	SUBTOTAL ARBORIZADORA BAJA				**$ 569,174,867.16**		**$ 2,835,078.26**		**$ -**		**$ 572,009,945.42**
	CALASANZ BUENAVISTA										
	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias,	m2	538.32	$ 4,233.48	$ 2,278,964.69	-	$ -			538.32	$ 2,278,964.69
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	78.28	$ 31,137.23	$ 2,437,422.21	11.72	$ 364,928.31			90.00	$ 2,802,350.52
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en	M2	538.32	$ 3,248.63	$ 1,748,804.01		$ -			538.32	$ 1,748,804.01
	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7,469.97		12.00	$ 89,639.60			12.00	$ 89,639.60
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	1.00	$ 101,214.88	$ 101,214.88	-	$ -			1.00	$ 101,214.88
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE	M2	538.82	$ 36,749.48	$ 19,801,356.97		$ -			538.82	$ 19,801,356.97
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA	KG	1,841.40	$ 23,042.63	$ 42,430,695.20		$ -			1,841.40	$ 42,430,695.20
	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA,	M2	44.00	$ 130,345.99	$ 5,735,223.77	-	$ -			44.00	$ 5,735,223.77
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR	KG	538.31	$ 264,771.67	$ 142,529,236.49		$ -			538.31	$ 142,529,236.49
	SUBTOTAL CALASANZ BUENAVISTA				**$ 217,062,918.22**		**$ 454,567.91**		**$ -**		**$ 217,517,486.13**
	ESTRELLA DEL SUR, SEDE B										
	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias,	m2	557.28	$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	20.48	$ 86,701.58		$ -	577.76	$ 2,445,932.98
	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry	M	88.20	$ 154,730.98	$ 13,647,272.19		$ -	(88.20)	$ (13,647,272.19)	-	$ -
	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	m2	54.17	$ 33,174.37	$ 1,797,055.57		$ -	(20.93)	$ (694,339.54)	33.24	$ 1,102,716.03
	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	m2	95.99	$ 29,391.49	$ 2,821,289.37		$ -	(32.70)	$ (960,987.18)	63.29	$ 1,860,302.19
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO,	M2	28.37	$ 707,267.02	$ 20,065,165.47		$ -	(28.37)	$ (20,065,165.47)	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI	M2	25.81	$ 829,259.39	$ 21,403,184.90	6.00	$ 4,975,639.28		$ -	31.81	$ 26,378,824.17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR.	M2	1.43	$ 798,362.30	$ 1,141,658.09	0.00	$ 3,353.12		$ -	1.43	$ 1,145,011.22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2	87.25	$ 467,649.33	$ 40,802,403.90		$ -	(23.96)	$ (11,204,877.91)	63.29	$ 29,597,525.99
	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20	$ 9,408.62	$ 1,328,497.62		$ -	(0.00)	$ (37.63)	141.20	$ 1,328,459.99
	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20	$ 22,829.47	$ 3,223,521.19		$ -	(0.00)	$ (91.32)	141.20	$ 3,223,429.87
	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20	$ 17,207.77	$ 2,429,737.19		$ -	(0.00)	$ (68.83)	141.20	$ 2,429,668.36
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76	$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	-	$ -	-	$ -	577.76	$ 2,694,579.45
	SUBTOTAL ESTRELLA DEL SUR SEDE B				**$ 113,713,596.35**		**$ 5,065,693.98**		**$ 46,572,840.08**		**$ 72,206,450.25**
	SANTA LIBRADA										
	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias,	m2	557.28	$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	-	$ -			557.28	$ 2,359,231.39

BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NP - ACTUALIZADO HASTA DOM-12-ABR-2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A DOM-12-ABR-2026					
						MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO CON AIU	VR TOTAL CON AIU	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**									
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	128.18	$ 31,110.25	$ 3,987,711.33		$ -			128.18	$ 3,987,711.33
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	m	65.03	$ 15,633.37	$ 1,016,638.10		$ -			65.03	$ 1,016,638.10
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	67.90	$ 32,594.26	$ 2,213,149.98		$ -			67.90	$ 2,213,149.98
	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO	M	27.20	$ 21,844.63	$ 594,173.86		$ -			27.20	$ 594,173.86
	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	372.13	$ 13,385.77	$ 4,981,246.66		$ -			372.13	$ 4,981,246.66
	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20	M3	63.87	$ 34,724.48	$ 2,217,852.85		$ -			63.87	$ 2,217,852.85
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	$ 18,044.21	$ 297,112.39		$ -			16.47	$ 297,112.39
	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87	$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	-	$ -			194.87	$ 1,840,293.82
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96	$ 91,988.38	$ 5,515,623.47	0.00	$ 142.33			59.96	$ 5,515,765.80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33	$ 91,988.38	$ 5,825,624.33		$ -			63.33	$ 5,825,624.33
	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	$ 69,679.67	$ 23,268,130.83		$ -			333.93	$ 23,268,130.83
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04	$ 25,122.94	$ 5,226,576.48		$ -			208.04	$ 5,226,576.48
	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60	$ 62,023.52	$ 1,215,661.06		$ -			19.60	$ 1,215,661.06
	Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00	$ 16,863.75	$ 809,460.00		$ -			48.00	$ 809,460.00
	TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS,	M	110.00	$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	-	$ -			110.00	$ 1,855,012.50
	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE	M	356.60	$ 34,369.67	$ 12,256,224.89		$ -			356.60	$ 12,256,224.89
	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	$ 68,114.71	$ 408,688.26		$ -	-		6.00	$ 408,688.26
	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS	M2	7.20	$ 157,817.72	$ 1,136,287.57		$ -	-		7.20	$ 1,136,287.57
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	6.00	$ 101,978.47	$ 611,870.81		$ -	-		6.00	$ 611,870.81
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60	$ 361,355.09	$ 121,270,766.66		$ -			335.60	$ 121,270,766.66
	SUBTOTAL SANTA LIBRADA				**$ 198,907,337.27**		**$ 142.33**		**$ -**		**$ 198,907,479.60**
	ESTRELLA DEL SUR, SEDE A										
	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias,	M2	20.56	$ 4,233.48	$ 87,040.26	-	$ -	-	$ -	20.56	$ 87,040.26
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	40.30	$ 31,110.25	$ 1,253,742.91		$ -	(31.81)	$ (989,604.04)	8.49	$ 264,138.88
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	19.52	$ 32,594.26	$ 636,239.88		$ -	(2.22)	$ (72,359.25)	17.30	$ 563,880.63
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	19.52	$ 22,300.62	$ 435,308.16		$ -	(5.96)	$ (132,911.71)	13.56	$ 302,396.45
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	$ 12,649.16	$ 514,188.42		$ -	(2.49)	$ (31,496.41)	38.16	$ 482,692.01
	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	19.52	$ 20,708.69	$ 404,233.53		$ -	(4.52)	$ (93,603.26)	15.00	$ 310,630.28
	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	11.36	$ 33,174.37	$ 376,860.83		$ -	(5.02)	$ (166,535.33)	6.34	$ 210,325.50
	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y	UN	15.00	$ 27,281.50	$ 409,222.50	-	$ -	-	$ -	15.00	$ 409,222.50
	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00	$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	-	$ -	-	$ -	15.00	$ 2,737,188.99
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52	$ 42,650.45	$ 832,536.73	-	$ -	-	$ -	19.52	$ 832,536.73
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	$ 126,224.49	$ 2,463,902.13		$ -	(1.99)	$ (251,186.74)	17.53	$ 2,212,715.38

BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NP - ACTUALIZADO HASTA DOM-12-ABR-2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A DOM-12-ABR-2026					
						MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO CON AIU	VR TOTAL CON AIU	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**									
	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80	$ 67,218.91	$ 53,775.13	-	$ -	-	$ -	0.80	$ 53,775.13
	WIN DE ALUMINIO	M	3.00	$ 15,372.99	$ 46,118.98	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 46,118.98
	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84	$ 116,158.86	$ 5,208,563.24		$ -	(4.03)	$ (468,352.52)	40.81	$ 4,740,210.72
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	$ 41,130.01	$ 82,260.02	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 82,260.02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO,	M2	5.20	$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	-	$ -	-	$ -	5.20	$ 3,677,788.50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y	M2	2.16	$ 1,127,967.67	$ 2,436,410.17	0.12	$ 135,356.12		$ -	2.28	$ 2,571,766.29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y	UN	7.00	$ 873,470.75	$ 6,114,295.23	1.00	$ 873,470.75		$ -	8.00	$ 6,987,765.98
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,233,641.32
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00	$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 2,023,056.40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00	$ 41,130.01	$ 82,260.02	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 82,260.02
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304	M2	28.82	$ 989,338.20	$ 28,512,726.96	12.82	$ 12,683,315.74		$ -	41.64	$ 41,196,042.70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	$ 989,338.20	$ 1,780,808.76		$ -	(0.80)	$ (791,470.56)	1.00	$ 989,338.20
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84	$ 36,193.65	$ 1,622,923.48		$ -	(4.03)	$ (145,932.82)	40.81	$ 1,476,990.67
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50	$ 21,599.09	$ 766,767.73	-	$ -	-	$ -	35.50	$ 766,767.73
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16	$ 123,260.52	$ 266,242.73	-	$ -	-	$ -	2.16	$ 266,242.73
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32	$ 4,663.84	$ 519,178.52		$ -	(11.13)	$ (51,908.52)	100.19	$ 467,270.00
	SUBTOTAL ESTRELLA DEL SUR, SEDE A				**$ 64,577,281.56**		**$ 13,692,142.61**		**$ (3,195,361.16)**		**$ 75,074,063.00**
	UNION EUROPEA										
	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	$ 4,233.48	$ 711,223.93	10.14	$ 42,927.44		$ -	178.14	$ 754,151.38
	CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	$ 31,110.25	$ 1,399,961.07		$ -	(21.17)	$ (658,538.70)	23.83	$ 741,422.37
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en	M2	136.13	$ 3,248.63	$ 442,236.38		$ -	(104.13)	$ (338,280.13)	32.00	$ 103,956.25
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	5.83	$ 144,722.00	$ 843,729.29		$ -	(5.83)	$ (843,729.29)	-	$ -
	DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS	M	36.30	$ 26,782.33	$ 972,198.70		$ -	-	$ -	36.30	$ 972,198.70
	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M	5.15	$ 27,938.51	$ 143,883.34	7.35	$ 205,348.06		$ -	12.50	$ 349,231.40
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE	m2	168.00	$ 36,752.18	$ 6,174,366.61	5.63	$ 206,914.79		$ -	173.63	$ 6,381,281.40
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE	un	18.00	$ 11,967.87	$ 215,421.59	6.00	$ 71,807.20		$ -	24.00	$ 287,228.79
	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	$ 7,469.97	$ 134,459.40	6.00	$ 44,819.80		$ -	24.00	$ 179,279.20
	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE	un	1.00	$ 55,922.89	$ 55,922.89		$ -	(1.00)	$ (55,922.89)	-	$ -
	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS	m	7.00	$ 32,498.47	$ 227,489.29		$ -	(7.00)	$ (227,489.29)	-	$ -
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE	m	3.90	$ 18,687.73	$ 72,882.16		$ -	(3.90)	$ (72,882.16)	-	$ -
	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO	M	19.43	$ 21,844.63	$ 424,441.11	-	$ -	-	$ -	19.43	$ 424,441.11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE	UN	4.00	$ 126,905.79	$ 507,623.16	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 507,623.16
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M3	3.90	$ 89,839.27	$ 350,373.14	-	$ -	-	$ -	3.90	$ 350,373.14
	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA	M	19.43	$ 42,469.67	$ 825,185.65	-	$ -	-	$ -	19.43	$ 825,185.65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA	kg	3,515.11	$ 23,042.63	$ 80,997,372.11		$ -	(1,076.19)	$ (24,798,245.83)	2,438.92	$ 56,199,126.28
	CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA	M	19.43	$ 42,469.67	$ 825,185.65	-	$ -	-	$ -	19.43	$ 825,185.65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM,	M	0.50	$ 341,855.19	$ 170,927.60	-	$ -	-	$ -	0.50	$ 170,927.60

BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NP - ACTUALIZADO HASTA DOM-12-ABR-2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A DOM-12-ABR-2026					
						MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO CON AIU	VR TOTAL CON AIU	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**									
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	$ 91,590.40	$ 2,417,986.53	18.13	$ 1,660,533.93		$ -	44.53	$ 4,078,520.47
	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	$ 875,947.70	$ 875,947.70		$ -	(1.00)	$ (875,947.70)	-	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR	kg	213.75	$ 264,771.67	$ 56,594,943.99	0.29	$ 76,783.78		$ -	214.04	$ 56,671,727.78
	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15	$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	-	$ -	-	$ -	18.15	$ 1,928,750.73
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90	$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	-	$ -	-	$ -	34.90	$ 3,196,504.93
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT	M	42.00	$ 23,315.15	$ 979,236.14	-	$ -	-	$ -	42.00	$ 979,236.14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00	$ 20,790.98	$ 873,221.16	-	$ -	-	$ -	42.00	$ 873,221.16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	UN	21.00	$ 180,330.15	$ 3,786,933.14	3.00	$ 540,990.45		$ -	24.00	$ 4,327,923.59
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM,	UN	21.00	$ 238,055.44	$ 4,999,164.25	3.00	$ 714,166.32		$ -	24.00	$ 5,713,330.57
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA	M	22.50	$ 304,166.74	$ 6,843,751.58	8.50	$ 2,585,417.26		$ -	31.00	$ 9,429,168.84
	SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA,	M2	32.35	$ 222,048.37	$ 7,183,264.74	0.75	$ 166,536.28		$ -	33.10	$ 7,349,801.01
	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70	$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	-	$ -	-	$ -	61.70	$ 1,061,719.44
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21	$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	-	$ -	-	$ -	224.21	$ 1,045,679.27
	SUBTOTAL UNION EUROPEA				**$ 187,281,986.67**		**$ 6,316,245.32**		**$ (27,871,035.98)**		**$ 165,727,196.00**
	TENERIFE GRANADA SUR										
	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias,	M2	193.00	$ 4,294.19	$ 828,777.76					193.00	$ 828,777.76
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00	$ 31,110.25	$ 1,213,299.59					39.00	$ 1,213,299.59
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	$ 38,696.24	$ 960,827.52					24.83	$ 960,827.52
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	$ 361,355.09	$ 16,000,803.20					44.28	$ 16,000,803.20
	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	$ 65,757.83	$ 2,911,756.81					44.28	$ 2,911,756.81
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	$ 190,851.78	$ 8,206,626.57					43.00	$ 8,206,626.57
	SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	$ 404,730.00	$ 60,709,500.00					150.00	$ 60,709,500.00
	SUBTOTAL TENERIFE GRANADA SUR				**$ 90,831,591.46**				**$ -**		**$ 90,831,591.46**
	GUILLERMO CANO ISAZA										
	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias,	M2	125.48	$ 4,233.48	$ 531,216.54					125.48	$ 531,216.54
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	68.00	$ 31,110.25	$ 2,115,496.73					68.00	$ 2,115,496.73
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	129.54	$ 32,594.26	$ 4,222,259.92					129.54	$ 4,222,259.92
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00	$ 11,376.96	$ 1,706,544.05					150.00	$ 1,706,544.05
	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00	$ 7,469.97	$ 298,798.67					40.00	$ 298,798.67
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00	$ 18,687.73	$ 1,868,773.32					100.00	$ 1,868,773.32
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26	$ 12,649.16	$ 4,607,583.60					364.26	$ 4,607,583.60
	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20	$ 65,869.81	$ 474,262.61					7.20	$ 474,262.61

BALANCE GENERAL DE CANTIDADES MAYORES, MENORES Y NP - ACTUALIZADO HASTA DOM-12-ABR-2026

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A DOM-12-ABR-2026					
						MAYORES		MENORES			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO CON AIU	VR TOTAL CON AIU	CANTIDADES	VALOR	CANTIDADES	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO**									
	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00	$ 20,708.69	$ 455,591.07					22.00	$ 455,591.07
	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61	$ 33,174.37	$ 882,769.96					26.61	$ 882,769.96
	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y	UN	78.00	$ 27,281.50	$ 2,127,957.02					78.00	$ 2,127,957.02
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00	$ 61,099.39	$ 2,138,478.65					35.00	$ 2,138,478.65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54	$ 126,224.49	$ 16,351,120.98					129.54	$ 16,351,120.98
	WIN DE ALUMINIO	M	30.00	$ 15,372.99	$ 461,189.84					30.00	$ 461,189.84
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26	$ 36,193.65	$ 13,183,900.70					364.26	$ 13,183,900.70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26	$ 98,222.57	$ 35,778,555.02					364.26	$ 35,778,555.02
	SUBTOTAL GUILLERMO CANO ISAZA				**$ 87,204,498.67**						**$ 87,204,498.67**
	COSTOS TOTALES CONTRATO				**$ 2,023,606,900.39**		**$ 71,628,289.16**		**$ (94,329,705.31)**		**$ 2,000,905,484.23**

FECHA:	19/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME
DIAS RESTANTES	62 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			APOYO A LA SUPERVISION
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS			
19 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO			

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154760	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRORROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			CALIDAD DEL SERVICIO DESDE			CALIDAD DEL SERVICIO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA		
BCH-1000046043	6	10	2025	20	12	2026	20	6	2026	20	6	2031	6	10	2025	20	6	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE			CUMPLIMIENTO HASTA			SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE			SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA		
39-44-101175397	6	10	2025	27	2	2027	6	10	2025	28	6	2029	5	5	2026	5	5	2028

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE			RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA		
39-40-101045911	6	10	2025	23	6	2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026	jul-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	94.16%	99.19%		100.00%		$ 168,920,087	$ 167,544,371	10/11/2025	28/02/2026																		
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100.00%	100.00%		100.00%		$ 165,727,196	$ 165,727,196	18/11/2025	21/02/2026																		
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	75.97%	90.37%		100.00%		$ 121,299,091	$ 109,623,451	10/11/2025	18/04/2026																		
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	82.38%	95.05%		100.00%		$ 210,813,697	$ 200,375,361	1/12/2025	11/04/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	79.70%	94.84%		100.00%		$ 631,551,513	$ 598,987,232	24/11/2025	28/02/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	93.67%	100.00%		100.00%		$ 186,103,596	$ 186,103,596	10/12/2025	21/03/2026																		
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%		$ 72,206,451	$ 72,206,450	1/12/2025	14/03/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	48.06%	60.09%		73.37%		$ 212,173,903	$ 127,489,328	15/01/2026	2/05/2026																		
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%		$ 75,074,063	$ 75,074,063	15/01/2026	28/02/2026																		
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	65.14%	65.14%		13.29%		$ 130,006,456	$ 84,682,520	9/03/2026	7/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	11.72%	13.37%		32.04%		$ 379,449,204	$ 50,735,575	13/01/2026	19/06/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						78.13%		81.85%		$ 2,353,325,257	$ 1,838,549,144																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	84.62%	100.00%		100.00%		$ 26,605,858	$ 26,605,858	26/01/2026	1/03/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja						$ 35,000,000																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	8.44%	8.44%		27.00%		$ 100,413,274	$ 8,479,423	7/04/2026	22/05/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						54.22%		63.50%		$ 162,019,132	$ 35,085,281																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
3	6	0	9	$ 1,838,549,144
ACUMULADO EMERGENCIAS				
1	1	0	2	$ 35,085,281
TOTAL				
4	7	0	11	$ 1,873,634,426
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2		13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11	$ 361,963,041.00			11		22		33		$ 90,992,472	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	78.13%	11.61%	75.88%
PROGRAMADO	81.85%		
ATRASO	-3.73%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			










OBSERVACIONES:

FECHA:	15/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 99.19%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	   
2C 90.37%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	   



FECHA: 19/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO	2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	FRENTE AL 100%
4A 94.84%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	    


FECHA:	19/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 95.05%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	  
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 19/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

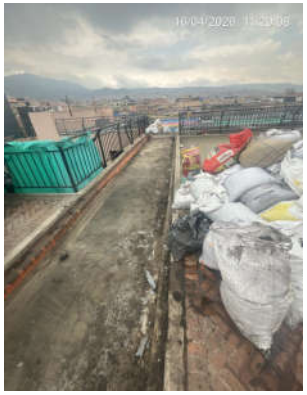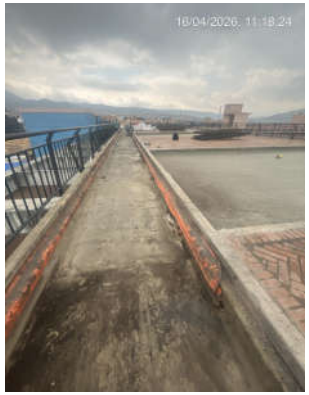TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A 100.00%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	   
8A 60.09%	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	  

FECHA:	19/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

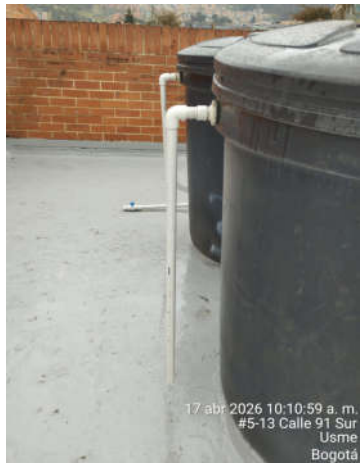TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 81.58%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	 

FECHA:	19/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 13.37%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	 
12A 65.14%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

FECHA:	19/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A **8.44%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA**	*** INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS** ***AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA** ***ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE**	 	 	 

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 23				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	-266.74	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.19	233.19	233.19		$ 107,273.69	$ 25,015,150.95	$ (21,367,845.61)	685.85%	685.85%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00	1.00	$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50	1.50	$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			11.00		$ 91,590.40	$ 1,007,494.39	$ 2,106,579.18	32.35%	32.35%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30	0.30	$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36	15.36						
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	44.00	(16.20)	27.80	3.00		$ 91,590.40	$ 274,771.20	$ 3,755,206.36	6.82%	6.82%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	96.00	(72.00)	24.00	2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 523,113.53	2.08%	2.08%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	248.96	248.96		$ 45,289.29	$ 11,275,220.89	$ (7,969,102.94)	341.04%	341.04%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20	127.20	$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	300.00	(300.00)	-	-		$ 34,369.67	$ -	$ 10,310,901.48	0.00%	0.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			330.40	330.40	$ 4,663.84	$ 1,540,932.31	$ 67,905.49	95.78%	95.78%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	31.46	293.46	293.46		$ 361,355.09	$ 106,043,263.51	$ (11,368,231.00)	112.01%	112.01%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	**$ 167,544,371.42**				
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 23				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37			47.37		$ 7,045.00	$ 333,721.66	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00			53.10		$ 31,110.25	$ 1,651,954.06	$ 214,660.70	88.50%	88.50%	

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76			1.76		$ 274,656.52	$ 483,395.48	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	275.63			275.63		$ 23,042.63	$ 6,351,239.56	$ -	100.00%	100.00%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60			2.00		$ 146,133.16	$ 292,266.33	$ 1,549,012.00	15.87%	15.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	

CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77			15.77		$ 159,158.72	$ 2,509,933.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78		$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00			73.70	73.70	$ 65,757.83	$ 4,846,352.23	$ 6,463,995.00	42.85%	42.85%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08			14.08	14.08	$ 98,222.57	$ 1,382,973.85	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08			5.08	5.08	$ 798,362.30	$ 4,055,680.50	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76			179.36	179.36	$ 29,785.43	$ 5,342,314.69	$ 428,910.00	92.57%	92.57%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76			61.76	61.76	$ 29,785.43	$ 1,839,548.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80			226.80		$ 23,042.63	$ 5,226,068.03	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84			36.84		$ 264,771.67	$ 9,754,188.24	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA	**$ 109,623,451.10**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 23**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	-104.13	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	0.00	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	173.63		$ 36,752.18	$ 6,381,281.40	$ (206,914.79)	103.35%	103.35%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,438.92		$ 23,042.63	$ 56,199,126.28	$ (80,997,372.11)	-226.63%	-226.63%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	31		$ 304,166.74	$ 9,429,168.84	$ (2,585,417.26)	137.78%	137.78%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			61.70		$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 165,727,196.00**				

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 23				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	17.92	484.50	484.50		$ 107,273.69	$ 51,974,101.11	$ (1,922,344.00)	103.84%	103.84%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	

ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80			16.80		$ 91,988.38	$ 1,545,404.84	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	-36.51	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50			440.64		$ 77,589.44	$ 34,189,010.49	$ 3,403,073.00	90.95%	90.95%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45	308.45	$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			17.50	14.00	$ 2,042,059.82	$ 35,736,046.83	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			17.50		$ 1,257,854.97	$ 22,012,461.99	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			130.00	130.00	$ 237,210.90	$ 30,837,417.51	$ -	100.00%	100.00%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							**$ 598,987,232.05**				

CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 23**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	-802.02	399.00	399.00		$ 4,233.48	$ 1,689,156.84	$ 3,395,332.00	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83			42.00		$ 31,110.25	$ 1,306,630.33	$ 305,813.72	81.03%	81.03%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30			49.77		$ 32,569.97	$ 1,621,007.52	$ 180,111.95	90.00%	90.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	-548.06	0.00			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	-24.95	133.81	133.81		$ 7,103.01	$ 950,453.97	$ 177,220.14	84.28%	84.28%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	-44.68	126.92	122.00		$ 140,306.40	$ 17,117,380.80	$ 6,959,197.44	71.10%	71.10%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00			32.00		$ 23,315.15	$ 746,084.68	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00			32.00		$ 20,790.98	$ 665,311.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00			8.00		$ 238,055.44	$ 1,904,443.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00			15.00		$ 361,355.09	$ 5,420,326.29	$ -	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30			55.30		$ 130,345.99	$ 7,208,133.51	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	

SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	0.00	5.40	5.40	5.40		$ 62,023.52	$ 334,927.03	$ (334,927.03)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			92.03		$ 98,222.57	$ 9,039,423.54	$ 3,827,733.73	70.25%	70.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-4.73	7.00	7.00		$ 1,128,301.00	$ 7,898,107.00	$ 5,336,863.73	59.68%	59.68%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-6.22	41.60	41.60		$ 989,338.00	$ 41,156,460.80	$ 6,153,682.36	86.99%	86.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00	3.00	$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00	14.00	$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		33.77	33.77		$ 32,026.28	$ 1,081,527.64	$ (1,081,527.64)	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 200,375,361.28**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 23**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			577.76		$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 72,206,450.25**				
CPF	**1918**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 23**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	404.30		$ 36,752.18	$ 14,858,907.26	$ 4,943,904.00	75.03%	75.03%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	899.53		$ 23,042.63	$ 20,727,535.16	$ 21,703,160.03	48.85%	48.85%	

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			44.00		$ 130,345.99	$ 5,735,223.77	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63	632.63	$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA			**$ 186,103,596.00**				

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 23				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			334.28	92.94	$ 13,385.77	$ 4,474,588.57	$ 506,658.09	89.83%	89.83%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			47.96	9.64	$ 34,724.48	$ 1,665,413.13	$ 552,439.72	75.09%	75.09%	

RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83			218.00		$ 45,289.29	$ 9,873,200.43	$ 9,873,200.43	77.35%	77.35%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	1.67	335.60	218.00		$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	41.30		$ 34,369.67	$ 1,419,467.44	$ 1,419,467.44	11.58%	11.58%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20			7.20		$ 157,817.72	$ 1,136,287.57	$ 1,136,287.57	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	3.60	9.60	9.60		$ 101,978.47	$ 978,993.30	$ 978,993.30	160.00%	160.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.				19.00	19.00		$ 305,515.84	$ 5,804,800.90	$ 5,804,800.90	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60			188.00		$ 361,355.09	$ 67,934,756.06	$ 67,934,756.06	56.02%	56.02%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA	**$ 127,489,328.25**				
CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 23**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	

DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÀLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	-1.99	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.28		$ 1,127,967.67	$ 2,571,766.29	$ (135,356.00)	105.56%	105.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	41.64		$ 989,338.20	$ 41,196,042.70	$ (12,683,316.00)	144.48%	144.48%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	-0.80	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	


PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50		$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A	**$ 75,074,063.00**				
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 23**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ 112,050.00	62.50%	62.50%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			55.00		$ 18,687.73	$ 1,027,825.33	$ 840,948.00	55.00%	55.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31		$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00			18.85		$ 61,099.39	$ 1,151,723.50	$ 986,755.00	53.86%	53.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			101.94		$ 126,224.49	$ 12,867,324.94	$ 3,483,796.00	78.69%	78.69%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ 184,476.00	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M2	7.20			7.12	7.12	$ 1,128,300.90	$ 8,033,502.39	$ 90,264.00	98.89%	98.89%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			177.00		$ 36,193.65	$ 6,406,276.90	$ 6,777,624.00	48.59%	48.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			141.40		$ 98,222.57	$ 13,888,672.05	$ 21,889,883.00	38.82%	38.82%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 50,735,575.46**				


CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 23				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00			193.00		$ 4,294.19	$ 828,777.76	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83			24.83		$ 38,696.24	$ 960,827.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28			44.28		$ 361,355.09	$ 16,000,803.20	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28			44.28		$ 65,757.83	$ 2,911,756.81	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00			12.90		$ 190,851.78	$ 2,461,987.97	$ 5,744,639.00	30.00%	30.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00			150.00		$ 404,730.00	$ 60,709,500.00	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							$ 84,682,519.66				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		78.13%
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	$	1,838,549,144.49
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2,353,325,257.00


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Abr 19 2026					
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 168,920,087.00	100.00%	$ 167,544,371.42	99.19%	$ 168,920,087.00	-0.81%
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 121,299,091.00	100.00%	$ 109,623,451.10	90.37%	$ 121,299,091.00	-9.63%
FABIO LOZANO	$ 210,813,697.00	100.00%	$ 200,375,361.28	95.05%	$ 210,813,697.00	-4.95%
ARBORIZADORA BAJA	$ 631,551,513.00	100.00%	$ 598,987,232.05	94.84%	$ 631,551,513.00	-5.16%
BUENAVISTA	$ 186,103,596.00	100.00%	$ 186,103,596.00	100.00%	$ 186,103,596.00	0.00%
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72,206,451.00	100.00%	$ 72,206,450.25	100.00%	$ 72,206,451.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 155,677,267.52	73.37%	$ 127,489,328.25	60.09%	$ 212,173,903.00	-13.29%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 17,272,882.92	13.29%	$ 84,682,519.66	65.14%	$ 130,006,456.00	51.85%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 121,587,921.23	32.04%	$ 50,735,575.46	13.37%	$ 379,449,204.00	-18.67%
TOTALES	$ 1,926,233,765.67	81.85%	$ 1,838,549,144.49	78.13%	$ 2,353,325,257.00	-3.73%

OBSERVACIONES: Para el cierre de la presenta semana, encontramos que de los ocho (8) frentes abiertos, solo ***Buenavista y Tenerife*** no presentan atrasos. La ***IED Orlando Fals Borda*** registra un atraso inferior al 1%. ***Fabio Lozano Simonelli, y Arborizadora Baja*** registran atrasos cercanos al 5%. Mientras que en las ***IED Sierra Morena, Santa Librada y Guillermo Cano Isaza*** se registran atrasos superiores al 9%. El porcentaje de atraso del contrato está cercano al 4%

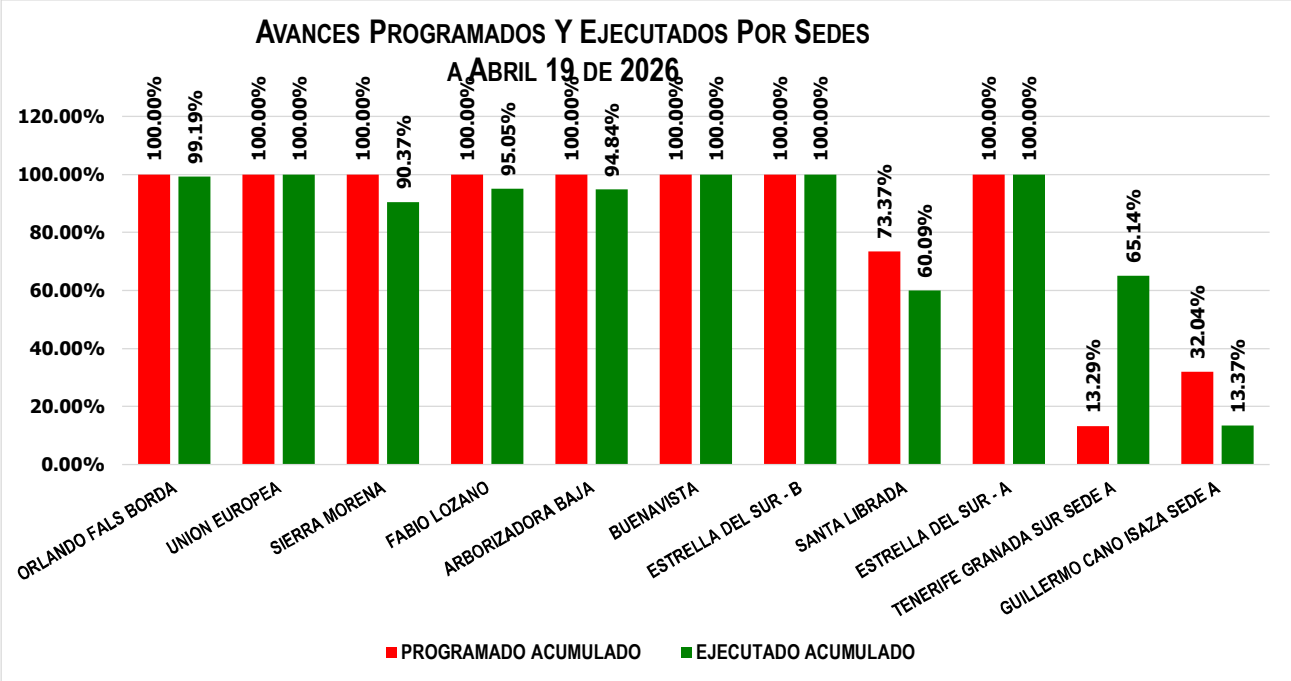

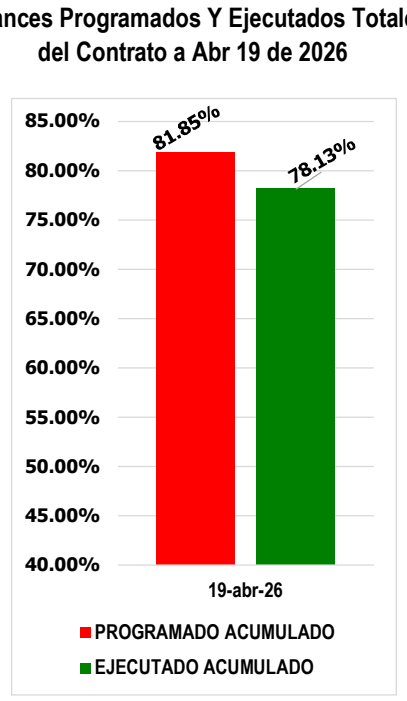

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Abr. 19 2026

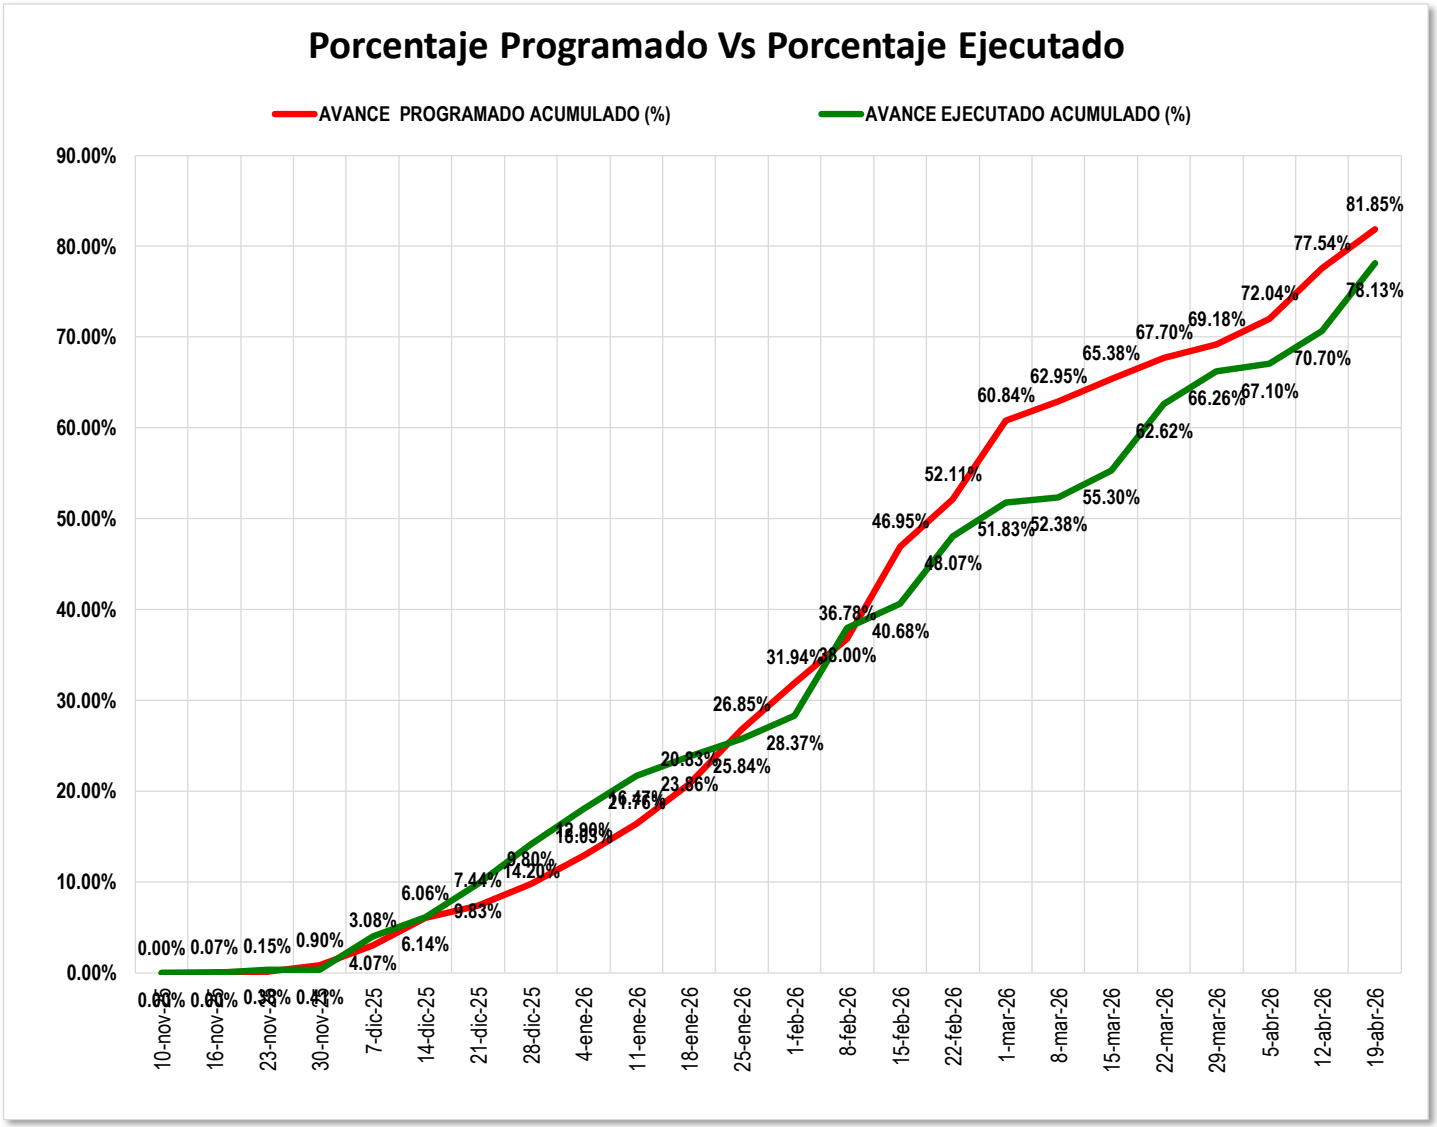

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.07%	0.00%
23-nov-25	0.15%	0.38%
30-nov-25	0.90%	0.41%
7-dic-25	3.08%	4.07%
14-dic-25	6.06%	6.14%
21-dic-25	7.44%	9.83%
28-dic-25	9.80%	14.20%
4-ene-26	12.90%	18.03%
11-ene-26	16.47%	21.76%
18-ene-26	20.83%	23.86%
25-ene-26	26.85%	25.84%
1-feb-26	31.94%	28.37%
8-feb-26	36.78%	38.00%
15-feb-26	46.95%	40.68%
22-feb-26	52.11%	48.07%
1-mar-26	60.84%	51.83%
8-mar-26	62.95%	52.38%
15-mar-26	65.38%	55.30%
22-mar-26	67.70%	62.62%
29-mar-26	69.18%	66.26%
5-abr-26	72.04%	67.10%
12-abr-26	77.54%	70.70%
19-abr-26	**81.85%**	**78.13%**
26-abr-26	83.87%	
3-may-26	85.47%	
10-may-26	87.19%	
17-may-26	91.12%	
24-may-26	93.48%	
31-may-26	96.85%	
7-jun-26	98.26%	
14-jun-26	99.12%	
20-jun-26	100.00%	

FECHA: 26/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 55 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS	
26 de abril de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154760	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRORROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-1000046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028	39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026	jul-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	99.19%	100.00%		100.00%		$ 168,920,087	$ 168,920,087	10/11/2025	28/02/2026																		
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100.00%	100.00%		100.00%		$ 165,727,196	$ 165,727,196	18/11/2025	21/02/2026																		
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	90.37%	96.06%		100.00%		$ 121,299,091	$ 116,516,356	10/11/2025	18/04/2026																		
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	95.05%	98.76%		100.00%		$ 210,813,697	$ 208,195,661	1/12/2025	11/04/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	94.84%	98.48%		100.00%		$ 631,551,513	$ 621,932,553	24/11/2025	28/02/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 186,103,596	$ 186,103,596	10/12/2025	21/03/2026																		
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%		$ 72,206,451	$ 72,206,450	1/12/2025	14/03/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	60.09%	60.35%		86.95%		$ 212,173,903	$ 128,041,795	15/01/2026	2/05/2026																		
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%		$ 75,074,063	$ 75,074,063	15/01/2026	28/02/2026																		
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	65.14%	76.90%		17.51%		$ 130,006,456	$ 99,981,304	9/03/2026	7/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	13.37%	21.49%		35.54%		$ 379,449,204	$ 81,539,394	13/01/2026	19/06/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						81.77%		83.87%		$ 2,353,325,257	$ 1,924,238,456																		
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%		$ 26,605,858	$ 26,605,858	26/01/2026	1/03/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja						$ 35,000,000																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	8.44%	14.51%		27.00%		$ 100,413,274	$ 14,566,494	7/04/2026	22/05/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						57.25%		63.50%		$ 162,019,132	$ 41,172,352																		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
4	5	0	9	$ 1,924,238,456
ACUMULADO EMERGENCIAS				
1	1	0	2	$ 41,172,352
TOTAL				
5	6	0	11	$ 1,965,410,807
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTOR A	VALOR	No ACTA INTERVENTOR A	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
				2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
		14		3		14		25		36	
		15		4		15		26		37	
		16		5		16		27		38	
		17		6		17		28		39	
		18		7		18		29		40	
		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
		20		9		20		31		$ 90,992,472	
		TOTAL OBRA		10		21		32			
	$ 361,963,041.00			11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	81.77%	11.61%	78.60%
PROGRAMADO	83.87%		
ATRASO	-2.11%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			












OBSERVACIONES:

FECHA:	26/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	 
2C 96.06%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	 

FECHA:	26/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

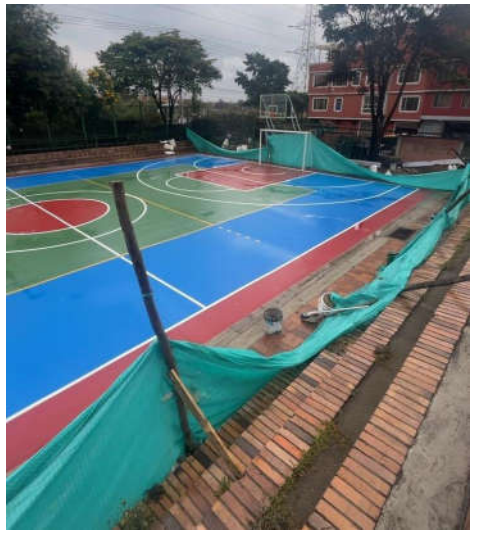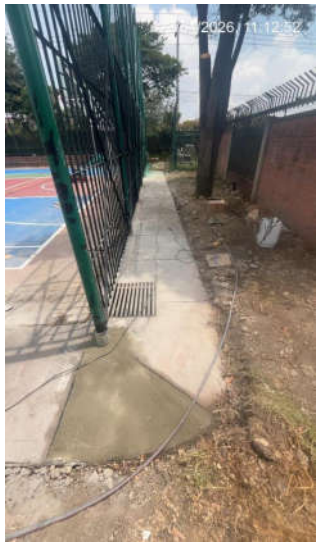TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	**FRENTE AL 100%**
4A 98.48%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	 

FECHA:	26/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 98.76%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	  
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**


FECHA: 26/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	FRENTE AL 100%
8A **60.35%**	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	 

FECHA: 26/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 81.58%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**

FECHA:	26/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 21.49%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	  
12A 76.90%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	   

FECHA: 26/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A 14.51%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA	* INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS *AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA *ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE	 	 	 

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 24				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	-266.74	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	233.20		$ 107,273.69	$ 25,015,880.42	$ (21,368,575.08)	685.87%	685.87%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00	23.00	$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	249.56		$ 45,289.29	$ 11,302,394.46	$ (7,996,276.51)	341.86%	341.86%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58	10.18	$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	282.37	282.37		$ 361,355.09	$ 102,035,835.61	$ (7,360,803.10)	107.77%	107.77%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	**$ 168,920,087.00**				
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 24				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37			47.37		$ 7,045.00	$ 333,721.66	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00			53.10		$ 31,110.25	$ 1,651,954.06	$ 214,660.70	88.50%	88.50%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76			1.76		$ 274,656.52	$ 483,395.48	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	275.63			275.63		$ 23,042.63	$ 6,351,239.56	$ -	100.00%	100.00%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60			2.00		$ 146,133.16	$ 292,266.33	$ 1,549,012.00	15.87%	15.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%	
MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77			15.77		$ 159,158.72	$ 2,509,933.07	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78		$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00			172.00	98.30	$ 65,757.83	$ 11,310,347.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08			14.08		$ 98,222.57	$ 1,382,973.85	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08			5.08		$ 798,362.30	$ 4,055,680.50	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76			193.76	14.40	$ 29,785.43	$ 5,771,224.88	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76			61.76		$ 29,785.43	$ 1,839,548.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80			226.80		$ 23,042.63	$ 5,226,068.03	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84			36.84		$ 264,771.67	$ 9,754,188.24	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA							**$ 116,516,356.20**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 24**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	-104.13	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	0.00	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	173.63		$ 36,752.18	$ 6,381,281.40	$ (206,914.79)	103.35%	103.35%	

DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,438.92		$ 23,042.63	$ 56,199,126.28	$ (80,997,372.11)	-226.63%	-226.63%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	31		$ 304,166.74	$ 9,429,168.84	$ (2,585,417.26)	137.78%	137.78%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			61.70		$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 165,727,196.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 24**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	

DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80			16.80		$ 91,988.38	$ 1,545,404.84	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	-36.51	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70			18.70	18.70	$ 165,931.21	$ 3,102,913.54	$ -	100.00%	100.00%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			610.00		$ 65,757.83	$ 40,112,277.64	$ 6,838,815.00	85.43%	85.43%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			17.50		$ 2,042,059.82	$ 35,736,046.83	$ -	100.00%	100.00%	

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			17.50		$ 1,257,854.97	$ 22,012,461.99	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			130.00		$ 237,210.90	$ 30,837,417.51	$ -	100.00%	100.00%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							**$ 621,932,553.00**				
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 24**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance fisico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	-802.02	399.00	399.00		$ 4,233.48	$ 1,689,156.84	$ 3,395,332.00	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83			42.00		$ 31,110.25	$ 1,306,630.33	$ 305,813.72	81.03%	81.03%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30			49.77		$ 32,569.97	$ 1,621,007.52	$ 180,111.95	90.00%	90.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%	

ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	-548.06	0.00			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	-24.95	133.81	133.81		$ 7,103.01	$ 950,453.97	$ 177,220.14	84.28%	84.28%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	-44.68	126.92	122.00		$ 140,306.40	$ 17,117,380.80	$ 6,959,197.44	71.10%	71.10%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00			32.00		$ 23,315.15	$ 746,084.68	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00			32.00		$ 20,790.98	$ 665,311.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00			8.00		$ 238,055.44	$ 1,904,443.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00			15.00		$ 361,355.09	$ 5,420,326.29	$ -	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30			55.30		$ 130,345.99	$ 7,208,133.51	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	0.00	5.40	5.40	5.40		$ 62,023.52	$ 334,927.03	$ (334,927.03)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			92.03		$ 98,222.57	$ 9,039,423.54	$ 3,827,733.73	70.25%	70.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-4.73	7.00	7.00		$ 1,128,301.00	$ 7,898,107.00	$ 5,336,863.73	59.68%	59.68%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-6.22	41.60	41.60		$ 989,338.00	$ 41,156,460.80	$ 6,153,682.36	86.99%	86.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			7.00	7.00	$ 1,117,185.66	$ 7,820,299.64	$ 4,468,742.65	63.64%	63.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	-		33.77	33.77		$ 32,026.28	$ 1,081,527.64	$ (1,081,527.64)	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 208,195,660.92**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 24**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			577.76		$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 72,206,450.25**				
CPF	**1918**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 24**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	404.30		$ 36,752.18	$ 14,858,907.26	$ 4,943,904.00	75.03%	75.03%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	899.53		$ 23,042.63	$ 20,727,535.16	$ 21,703,160.03	48.85%	48.85%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			44.00		$ 130,345.99	$ 5,735,223.77	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA	**$ 186,103,596.00**				
CPF	**1918**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 24**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			334.28		$ 13,385.77	$ 4,474,588.57	$ 506,658.09	89.83%	89.83%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			63.87	15.91	$ 34,724.48	$ 2,217,879.69	$ (26.83)	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	

ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83			218.00		$ 45,289.29	$ 9,873,200.43	$ 9,873,200.43	77.35%	77.35%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	1.67	335.60	218.00		$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	41.30		$ 34,369.67	$ 1,419,467.44	$ 1,419,467.44	11.58%	11.58%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20			7.20		$ 157,817.72	$ 1,136,287.57	$ 1,136,287.57	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	3.60	9.60	9.60		$ 101,978.47	$ 978,993.30	$ 978,993.30	160.00%	160.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.				19.00	19.00		$ 305,515.84	$ 5,804,800.90	$ 5,804,800.90	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60			188.00		$ 361,355.09	$ 67,934,756.06	$ 67,934,756.06	56.02%	56.02%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA	**$ 128,041,794.81**				

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 24				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance fisico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	-1.99	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.28		$ 1,127,967.67	$ 2,571,766.29	$ (135,356.00)	105.56%	105.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	41.64		$ 989,338.20	$ 41,196,042.70	$ (12,683,316.00)	144.48%	144.48%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	-0.80	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50		$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A							**$ 75,074,063.00**				


CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 24					
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ 112,050.00	62.50%	62.50%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			55.00		$ 18,687.73	$ 1,027,825.33	$ 840,948.00	55.00%	55.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31		$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00			18.85		$ 61,099.39	$ 1,151,723.50	$ 986,755.00	53.86%	53.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			101.94		$ 126,224.49	$ 12,867,324.94	$ 3,483,796.00	78.69%	78.69%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ 184,476.00	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M2	7.20			7.12		$ 1,128,300.90	$ 8,033,502.39	$ 90,264.00	98.89%	98.89%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			177.00		$ 36,193.65	$ 6,406,276.90	$ 6,777,624.00	48.59%	48.59%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96			17.99	17.99	$ 21,599.09	$ 388,567.65	$ 2,202,459.00	15.00%	15.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			20.31	20.31	$ 989,338.20	$ 20,093,458.87	$ 113,843,147.00	15.00%	15.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40			0.27	0.27	$ 989,338.20	$ 267,121.31	$ 5,075,305.00	5.00%	5.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00			9.00	9.00	$ 1,117,185.66	$ 10,054,670.96	$ 40,218,684.00	20.00%	20.00%	


SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			141.40		$ 98,222.57	$ 13,888,672.05	$ 21,889,883.00	38.82%	38.82%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA							$ 81,539,394.26				
CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 24				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00			193.00		$ 4,294.19	$ 828,777.76	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83			24.83		$ 38,696.24	$ 960,827.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28			44.28		$ 361,355.09	$ 16,000,803.20	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28			44.28		$ 65,757.83	$ 2,911,756.81	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00			46.06	46.06	$ 32,026.28	$ 1,475,130.68	$ 11,719,699.00	11.18%	11.18%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00			35.36	22.46	$ 190,851.78	$ 6,748,518.96	$ 1,458,108.00	82.23%	82.23%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	5.50			4.70	4.70	$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27			916.06	916.06	$ 4,663.84	$ 4,272,356.08	$ 224,844.00	95.00%	95.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00			150.00		$ 404,730.00	$ 60,709,500.00	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							$ 99,981,304.11				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	81.77%
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	1,924,238,455.55
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	2,353,325,257.00


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Abr 26 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 168,920,087.00	100.00%	$ 168,920,087.00	100.00%	$ 168,920,087.00	0.00%
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 121,299,091.00	100.00%	$ 116,516,356.20	96.06%	$ 121,299,091.00	-3.94%
FABIO LOZANO	$ 210,813,697.00	100.00%	$ 208,195,660.92	98.76%	$ 210,813,697.00	-1.24%
ARBORIZADORA BAJA	$ 631,551,513.00	100.00%	$ 621,932,553.00	98.48%	$ 631,551,513.00	-1.52%
BUENAVISTA	$ 186,103,596.00	100.00%	$ 186,103,596.00	100.00%	$ 186,103,596.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72,206,451.00	100.00%	$ 72,206,450.25	100.00%	$ 72,206,451.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 184,478,552.57	86.95%	$ 128,041,794.81	60.35%	$ 212,173,903.00	-26.60%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 22,760,491.48	17.51%	$ 99,981,304.11	76.90%	$ 130,006,456.00	59.40%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 134,872,350.55	35.54%	$ 81,539,394.26	21.49%	$ 379,449,204.00	-14.06%
TOTALES	$ 1,973,807,088.60	83.87%	$ 1,924,238,455.55	81.77%	$ 2,353,325,257.00	-2.11%

OBSERVACIONES: Para el cierre de este periodo, encontramos que las ***IED Orlando Fals y Tenerife*** no presentan atrasos. Las ***IED Sierra Morena, Fabio Lozano Simonelli, y Arborizadora Baja*** registran atrasos entre el 1.5 y 4%. Por otro lado que en las ***IED Santa Librada y Guillermo Cano Isaza*** se registran atrasos del 26.60 y 14.06% respectivamente. El porcentaje de atraso del contrato supera el 2%

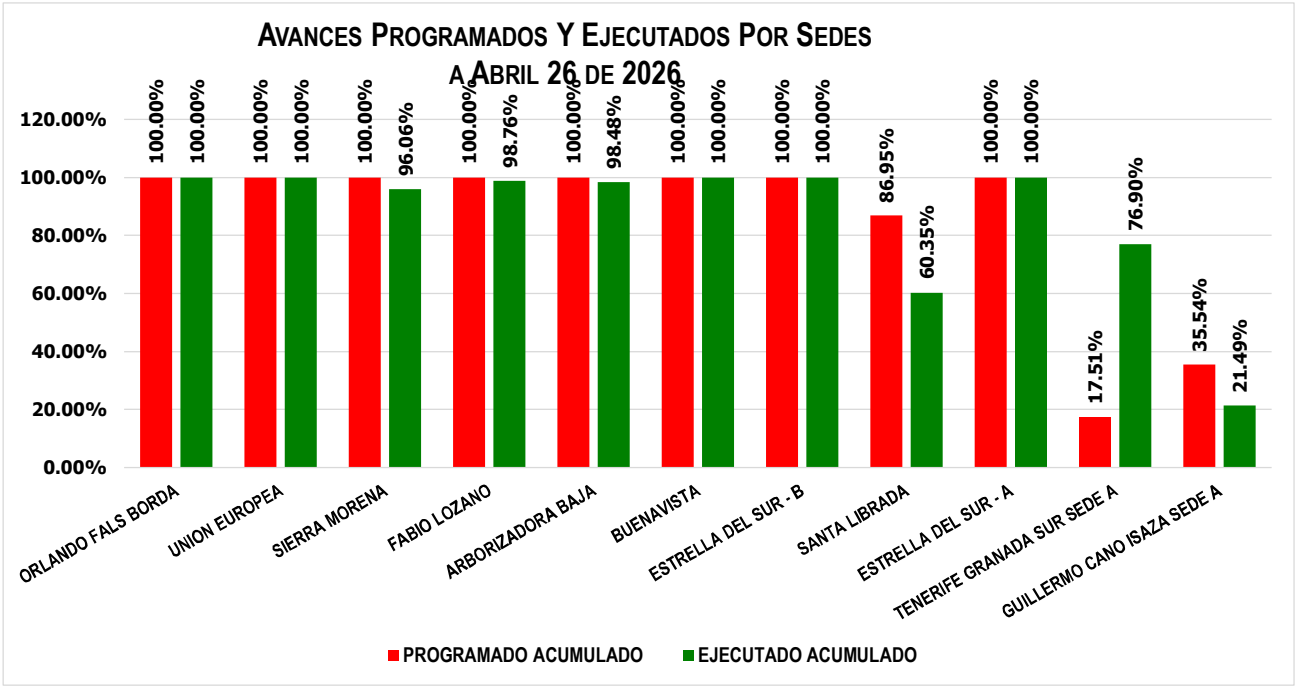

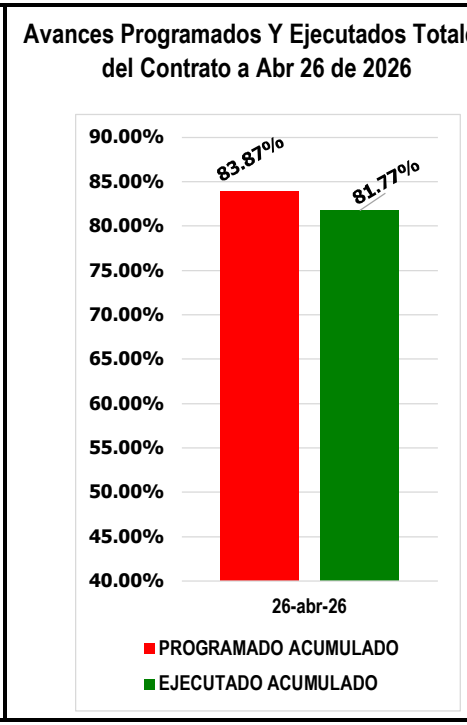

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Abr. 26 2026

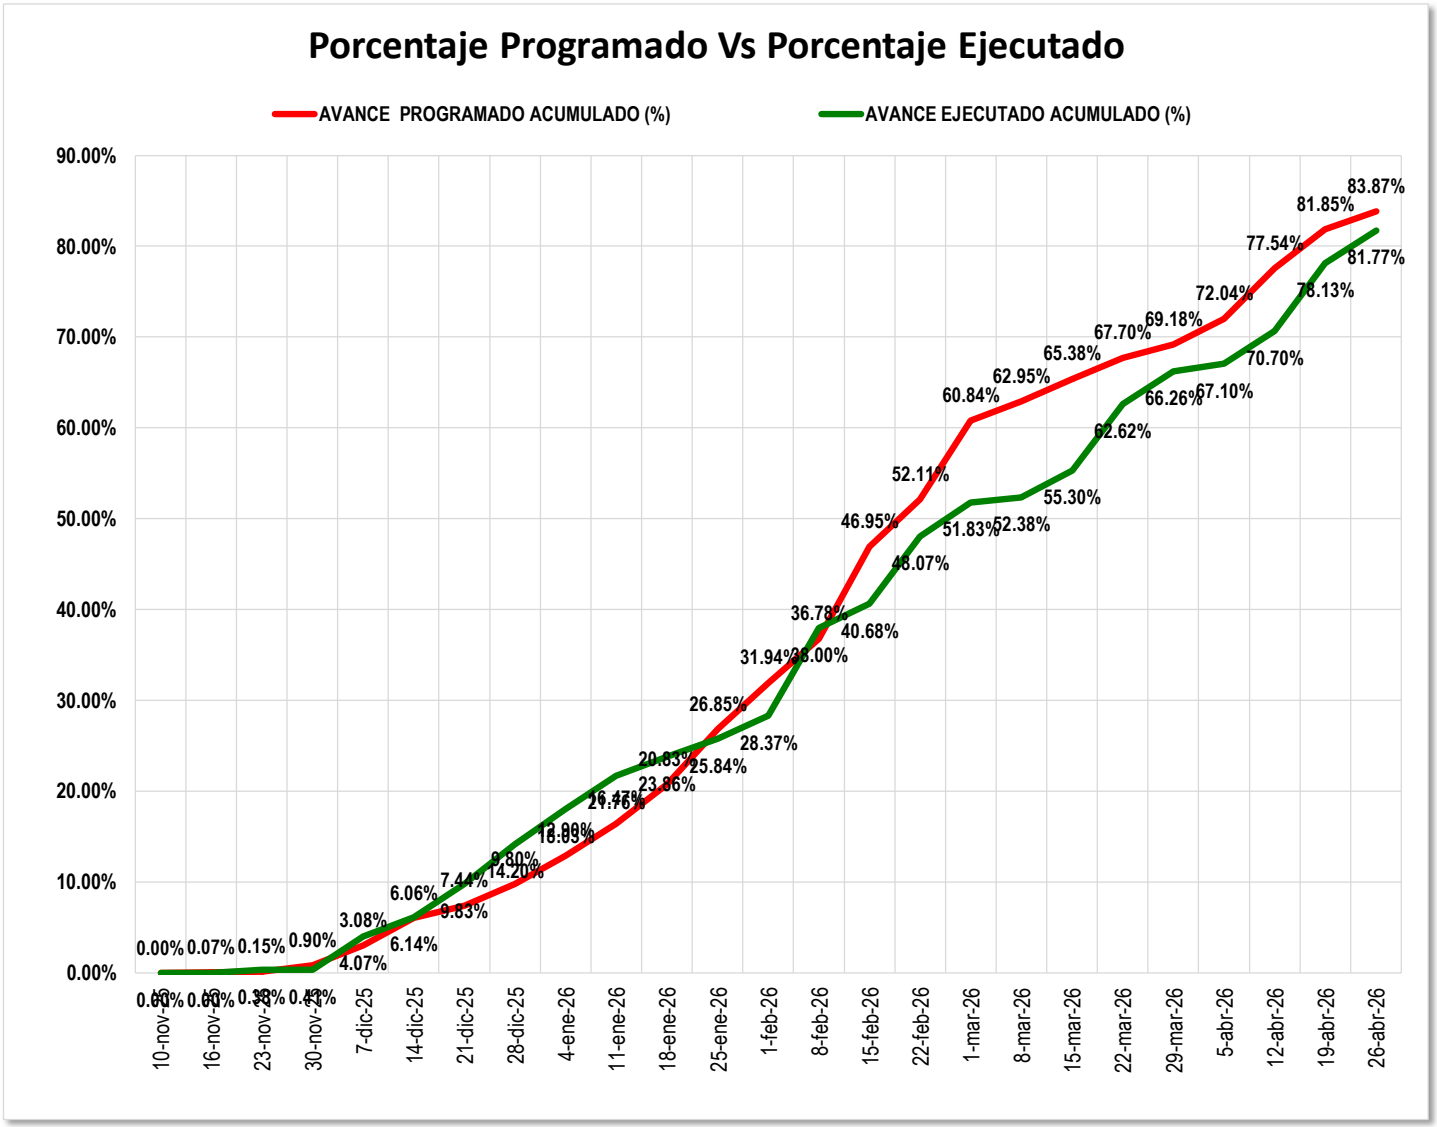

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.07%	0.00%
23-nov-25	0.15%	0.38%
30-nov-25	0.90%	0.41%
7-dic-25	3.08%	4.07%
14-dic-25	6.06%	6.14%
21-dic-25	7.44%	9.83%
28-dic-25	9.80%	14.20%
4-ene-26	12.90%	18.03%
11-ene-26	16.47%	21.76%
18-ene-26	20.83%	23.86%
25-ene-26	26.85%	25.84%
1-feb-26	31.94%	28.37%
8-feb-26	36.78%	38.00%
15-feb-26	46.95%	40.68%
22-feb-26	52.11%	48.07%
1-mar-26	60.84%	51.83%
8-mar-26	62.95%	52.38%
15-mar-26	65.38%	55.30%
22-mar-26	67.70%	62.62%
29-mar-26	69.18%	66.26%
5-abr-26	72.04%	67.10%
12-abr-26	77.54%	70.70%
19-abr-26	81.85%	78.13%
26-abr-26	**83.87%**	**81.77%**
3-may-26	85.47%	
10-may-26	87.19%	
17-may-26	91.12%	
24-may-26	93.48%	
31-may-26	96.85%	
7-jun-26	98.26%	
14-jun-26	99.12%	
20-jun-26	100.00%	

FECHA: 3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 48 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANENCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS	
3 de mayo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154760	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRORROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-1000046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028	39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026	jul-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	100.00%	100.00%		100.00%		$ 168,920,087	$ 168,920,087	10/11/2025	28/02/2026																		
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100.00%	100.00%		100.00%		$ 165,727,196	$ 165,727,196	18/11/2025	21/02/2026																		
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	96.06%	95.37%		100.00%		$ 113,917,854	$ 108,648,799	10/11/2025	18/04/2026																		
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	98.76%	98.43%		100.00%		$ 234,917,032	$ 231,228,088	1/12/2025	11/04/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	98.48%	98.47%		100.00%		$ 632,970,974	$ 623,292,062	24/11/2025	28/02/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100.00%	100.00%		100.00%		$ 186,103,596	$ 186,103,596	10/12/2025	21/03/2026																		
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%		$ 72,206,451	$ 72,206,450	1/12/2025	14/03/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	60.35%	76.89%		100.00%		$ 219,755,203	$ 168,977,700	15/01/2026	2/05/2026																		
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%		$ 75,074,063	$ 75,074,063	15/01/2026	28/02/2026																		
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	76.90%	100.00%		20.78%		$ 102,227,058	$ 102,227,058	9/03/2026	7/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	21.49%	31.69%		37.03%		$ 379,449,204	$ 120,255,347	13/01/2026	19/06/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						86.02%		86.39%		$ 2,351,268,718	$ 2,022,660,447																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																															
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	100.00%	100.00%		100.00%		$ 26,605,858	$ 26,605,858	26/01/2026	1/03/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja						$ 35,000,000																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	14.51%	24.17%		42.00%		$ 100,413,274	$ 24,268,941	7/04/2026	22/05/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						62.08%		71.00%		$ 162,019,132	$ 50,874,799																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
4	5	0	9	$ 2,022,660,447
ACUMULADO EMERGENCIAS				
1	1	0	2	$ 50,874,799
TOTAL				
5	6	0	11	$ 2,073,535,246
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
				2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
		13		3		14		25		36	
		14		4		15		26		37	
		15				16		27		38	
		16		5		16		27		38	
		17		6		17		28		39	
		18		7		18		29		40	
		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
		20		9		20		31			
		TOTAL OBRA		10		21		32			
	$ 361,963,041.00			11		22		33		$ 90,992,472	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	86.02%	11.61%	81.32%
PROGRAMADO	86.39%		
ATRASO	-0.37%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			











OBSERVACIONES:

FECHA: 3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

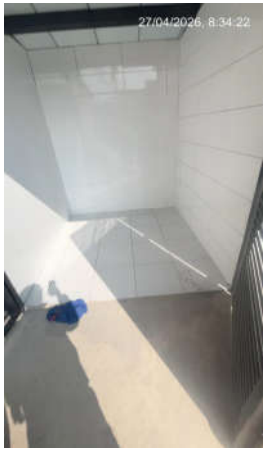TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 100.00%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	FRENTE AL 100%
2C 95.37%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	  

FECHA: 3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	FRENTE AL 100%
4A 98.47%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	 

FECHA: 3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 98.43%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	 
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA:	3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A **100.00%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	**FRENTE AL 100%**
8A **76.89%**	**SANTA LIBRADA (IED)**	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	  

FECHA: 3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 81.58%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**EMERGENCIA AL 100%**

FECHA: 3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 31.69%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	 
12A 100.00%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 3/05/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
13A **24.17%**	**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED) EMERGENCIA**	*** INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS** ***AMPLIACIÓN CAPACIDAD TANQUE DE AGUA** ***ADECUACION RAMPA PARA ENTRADA AULA MULTIPLE**	 	 	 

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	225.50	262.00	262.00		$ 4,233.48	$ 1,109,170.66	$ (954,648.79)	717.81%	717.81%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	211.26	247.76	247.76		$ 18,044.21	$ 4,470,634.09	$ (3,812,020.33)	678.79%	678.79%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	-266.74	34.60	34.60		$ 33,201.35	$ 1,148,766.74	$ 8,856,128.37	11.48%	11.48%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20	40.80	120.00	120.00		$ 69,099.55	$ 8,291,946.35	$ (2,819,261.76)	151.52%	151.52%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00	199.20	233.20	233.20		$ 107,273.69	$ 25,015,880.42	$ (21,368,575.08)	685.87%	685.87%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	3.00		$ 166,952.47	$ 500,857.42	$ 2,170,382.16	18.75%	18.75%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	1.50			1.50		$ 62,023.52	$ 93,035.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			34.00	23.00	$ 91,590.40	$ 3,114,073.57	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0.30			0.30		$ 135,394.33	$ 40,618.30	$ -	100.00%	100.00%	
RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0.24			0.24		$ 181,045.17	$ 43,450.84	$ -	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	15.00			15.00		$ 22,829.47	$ 342,442.05	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	19.00			19.00		$ 19,858.75	$ 377,316.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 3 + 3 DIMENSIONES 1.00 M. X 1.00 M.	M2	15.36			15.36		$ 177,336.50	$ 2,723,888.59	$ -	100.00%	100.00%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	249.56	249.56		$ 45,289.29	$ 11,302,394.46	$ (7,996,276.51)	341.86%	341.86%	
DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M			127.20	127.20		$ 4,291.49	$ 545,877.16	$ (545,877.16)	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	344.96			340.58	10.18	$ 4,663.84	$ 1,588,397.08	$ 20,440.72	98.73%	98.73%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	20.37	282.37	282.37		$ 361,355.09	$ 102,035,835.61	$ (7,360,803.10)	107.77%	107.77%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA			$ 168,920,087.00				
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37	223.92	271.29	271.29		$ 7,045.00	$ 1,911,238.10	$ (1,577,516.00)	572.70%	572.70%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00	13.00	73.00	73.00		$ 31,110.25	$ 2,271,047.96	$ (404,433.20)	121.67%	121.67%	

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76	-1.76	0.00	-		$ 274,656.52	$ -	$ 483,395.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60	3.76	16.36	16.36		$ 146,133.16	$ 2,390,738.55	$ (549,461.00)	129.84%	129.84%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%	

MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2	15.77	1.25	17.02	17.02		$ 159,158.72	$ 2,708,881.47	$ (198,948.00)	107.93%	107.93%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78		$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	172.00	-172.00	0.00	-		$ 65,757.83	$ -	$ 11,310,347.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2			146.06	146.06		$ 77,589.44	$ 11,332,713.49	$ (11,332,713.00)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	14.08	2.72	16.80	16.80		$ 98,222.57	$ 1,650,139.25	$ (267,165.00)	119.32%	119.32%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	4.08			4.08		$ 45,289.29	$ 184,780.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	4.84			4.84	4.84	$ 126,224.49	$ 610,926.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.08	0.05	5.13	5.13		$ 798,362.30	$ 4,095,598.62	$ (39,918.00)	100.98%	100.98%	
PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	193.76	-98.31	95.45	95.45		$ 29,785.43	$ 2,843,019.27	$ 2,928,206.00	49.26%	49.26%	
PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	61.76	14.44	76.20	76.20		$ 29,785.43	$ 2,269,649.75	$ (430,102.00)	123.38%	123.38%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80	92.51	319.31	319.31		$ 23,042.63	$ 7,357,741.55	$ (2,131,674.00)	140.79%	140.79%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84	-23.74	13.10	13.10		$ 264,771.67	$ 3,468,508.85	$ 6,285,679.00	35.56%	35.56%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA	**$ 108,648,798.97**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 25**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	-104.13	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	0.00	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	173.63		$ 36,752.18	$ 6,381,281.40	$ (206,914.79)	103.35%	103.35%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,438.92		$ 23,042.63	$ 56,199,126.28	$ (80,997,372.11)	-226.63%	-226.63%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	31		$ 304,166.74	$ 9,429,168.84	$ (2,585,417.26)	137.78%	137.78%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			61.70		$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 165,727,196.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 25**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72	463.91	1250.63	1,250.63		$ 7,045.00	$ 8,810,688.60	$ (3,268,246.00)	158.97%	158.97%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	73.00	169.25	169.25		$ 31,110.25	$ 5,265,409.14	$ (2,271,047.96)	175.84%	175.84%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	9.42	476.00	476.00		$ 107,273.69	$ 51,062,274.77	$ (1,010,518.00)	102.02%	102.02%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	

DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00	6.23	151.23	151.23		$ 32,594.26	$ 4,929,229.33	$ (203,062.21)	104.30%	104.30%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00	123.77	21.23	21.23		$ 42,650.45	$ 905,469.00	$ 5,278,845.87	14.64%	14.64%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	130.00			130.00		$ 69,868.54	$ 9,082,910.19	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80	5.76	22.56	22.56	5.76	$ 91,988.38	$ 2,075,257.93	$ (529,853.00)	134.29%	134.29%	
EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	-36.51	221.59	221.59		$ 79,962.51	$ 17,718,891.73	$ 2,919,431.00	85.85%	85.85%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	22.83			22.83		$ 135,394.33	$ 3,091,052.48	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10	68.26	171.36	171.36		$ 176,060.25	$ 30,169,684.13	$ (12,017,873.00)	166.21%	166.21%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05	25.90	154.95	154.95		$ 176,060.25	$ 27,280,535.46	$ (4,559,960.00)	120.07%	120.07%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	90.00			90.00		$ 97,085.28	$ 8,737,675.50	$ -	100.00%	100.00%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	18.70	5.00	23.70	23.70	5.00	$ 165,931.21	$ 3,932,569.57	$ (829,656.00)	126.74%	126.74%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	90.00			90.00		$ 164,788.52	$ 14,830,966.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	1.52			1.52		$ 358,768.86	$ 545,328.67	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	0.90			0.90		$ 156,990.72	$ 141,291.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50	-484.50	0.00	-		$ 77,589.44	$ -	$ 37,592,083.00	0.00%	0.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	714.00			610.00		$ 65,757.83	$ 40,112,277.64	$ 6,838,815.00	85.43%	85.43%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	66.67			66.67		$ 62,023.52	$ 4,135,108.31	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	620.45			620.45		$ 7,255.46	$ 4,501,650.03	$ -	100.00%	100.00%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 5.00 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 3" E= 3,81 MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			17.50		$ 2,042,059.82	$ 35,736,046.83	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M2	17.50			17.50		$ 1,257,854.97	$ 22,012,461.99	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2	130.00			130.00		$ 237,210.90	$ 30,837,417.51	$ -	100.00%	100.00%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							**$ 623,292,062.12**				
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 25**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	10.05	1211.07	1,211.07		$ 4,233.48	$ 5,127,035.54	$ (42,546.00)	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83	104.17	156.00	156.00		$ 31,110.25	$ 4,853,198.38	$ (3,240,754.33)	300.98%	300.98%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			68.70	68.70		$ 107,273.69	$ 7,369,702.26	$ (7,369,702.26)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%	

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30			49.77		$ 32,569.97	$ 1,621,007.52	$ 180,111.95	90.00%	90.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	-548.06	0.00			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76	-24.95	133.81	133.81		$ 7,103.01	$ 950,453.97	$ 177,220.14	84.28%	84.28%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	-44.68	126.92	122.00		$ 140,306.40	$ 17,117,380.80	$ 6,959,197.44	71.10%	71.10%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00			32.00		$ 23,315.15	$ 746,084.68	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00			32.00		$ 20,790.98	$ 665,311.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00			8.00		$ 238,055.44	$ 1,904,443.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	15.00			15.00		$ 361,355.09	$ 5,420,326.29	$ -	100.00%	100.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	1.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ -	100.00%	100.00%	

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30			55.30		$ 130,345.99	$ 7,208,133.51	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M2	0.00	5.40	5.40	5.40		$ 62,023.52	$ 334,927.03	$ (334,927.03)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			131.00		$ 98,222.57	$ 12,867,157.27	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73	-4.73	7.00	7.00		$ 1,128,301.00	$ 7,898,107.00	$ 5,336,863.73	59.68%	59.68%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82	-6.22	41.60	41.60		$ 989,338.00	$ 41,156,460.80	$ 6,153,682.36	86.99%	86.99%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	0.30	1.50	1.50		$ 989,338.00	$ 1,484,007.00	$ 296,801.40	83.33%	83.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	3.00			3.00		$ 772,427.21	$ 2,317,281.62	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	11.00			11.00	4.00	$ 1,117,185.66	$ 12,289,042.29	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	14.00			14.00		$ 404,611.28	$ 5,664,557.91	$ -	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0.60 M DE ANCHO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M			52.00	45.00		$ 8,484.49	$ 381,802.05	$ (381,802.05)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	0.00		33.77	33.77		$ 32,026.28	$ 1,081,527.64	$ (1,081,527.64)	100.00%	100.00%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			176.38		$ 6,610.59	$ 1,165,975.86	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI							**$ 231,228,088.35**				

CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 25**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			577.76		$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 72,206,450.25**				
CPF	**1918**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 25**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32	-88.32	450.00	450.00		$ 4,233.48	$ 1,905,064.11	$ 373,901.00	83.59%	83.59%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	12.00	(1.00)	11.00	11.00		$ 7,469.97	$ 82,169.63	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M			5.00	5.00		$ 23,315.15	$ 116,575.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M			20.00	20.00		$ 20,790.98	$ 415,819.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-134.52	404.30	404.30		$ 36,752.18	$ 14,858,907.26	$ 4,943,904.00	75.03%	75.03%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-941.87	899.53	899.53		$ 23,042.63	$ 20,727,535.16	$ 21,703,160.03	48.85%	48.85%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			44.00		$ 130,345.99	$ 5,735,223.77	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	633.15			632.63		$ 4,663.84	$ 2,950,473.25	$ 2,436.22	99.92%	99.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA METÁLICA PARA CERCHA METÁLICA	M2	30.00			30.00		$ 37,696.55	$ 1,130,896.57	$ -	100.00%	100.00%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2			87.00	87.00		$ 106,267.26	$ 9,245,251.44	$ (9,245,251.44)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-538.31	0.00	-		$ 264,771.67	$ -	$ 142,529,236.49	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 50 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR 50 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 24 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA LOS METROS CUADRADOS RALMENTE INSTALADOS)	KG	0.00	0.00	410.94	410.94		$ 306,692.25	$ 126,032,114.08	$ (126,032,114.08)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA	**$ 186,103,596.00**				

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 25				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%	

CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			334.28		$ 13,385.77	$ 4,474,588.57	$ 506,658.09	89.83%	89.83%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			63.87		$ 34,724.48	$ 2,217,879.69	$ (26.83)	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	281.83			218.00		$ 45,289.29	$ 9,873,200.43	$ 9,873,200.43	77.35%	77.35%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2			20.36	20.36	20.36	$ 193,996.53	$ 3,949,769.41	$ 3,949,769.41	100.00%	100.00%	
PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2			20.36	20.36	20.36	$ 122,272.98	$ 2,489,477.88	$ 2,489,477.88	100.00%	100.00%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	1.67	335.60	218.00		$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00	69.08	179.08	110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60	-300.35	56.25	56.25		$ 34,369.67	$ 1,933,294.03	$ 1,933,294.03	15.77%	15.77%	
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00	(6.00)	-	-		$ 68,114.71	$ -	$ -	0.00%	0.00%	

DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20			7.20		$ 157,817.72	$ 1,136,287.57	$ 1,136,287.57	100.00%	100.00%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	67.71			67.71		$ 5,565.04	$ 376,808.69	$ 376,808.69	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00	3.60	9.60	9.60		$ 101,978.47	$ 978,993.30	$ 978,993.30	160.00%	160.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.				19.00	19.00		$ 305,515.84	$ 5,804,800.90	$ 5,804,800.90	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60			281.00	93.00	$ 361,355.09	$ 101,540,779.00	$ 101,540,779.00	83.73%	83.73%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA	**$ 168,977,700.31**				
CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 25**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	-1.99	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.28		$ 1,127,967.67	$ 2,571,766.29	$ (135,356.00)	105.56%	105.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	41.64		$ 989,338.20	$ 41,196,042.70	$ (12,683,316.00)	144.48%	144.48%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	-0.80	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50		$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16		$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A			**$ 75,074,063.00**				
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 25**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ 112,050.00	62.50%	62.50%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			55.00		$ 18,687.73	$ 1,027,825.33	$ 840,948.00	55.00%	55.00%	


DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31		$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00			18.85		$ 61,099.39	$ 1,151,723.50	$ 986,755.00	53.86%	53.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			101.94		$ 126,224.49	$ 12,867,324.94	$ 3,483,796.00	78.69%	78.69%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ 184,476.00	60.00%	60.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M2	7.20			7.12		$ 1,128,300.90	$ 8,033,502.39	$ 90,264.00	98.89%	98.89%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			177.00		$ 36,193.65	$ 6,406,276.90	$ 6,777,624.00	48.59%	48.59%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	119.96	(45.93)	74.03	26.10	8.11	$ 21,599.09	$ 563,736.28	$ 2,027,291.00	21.76%	21.76%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	135.38			52.69	32.38	$ 989,338.20	$ 52,128,229.82	$ 81,808,376.00	38.92%	38.92%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	5.40	-0.60	4.80	1.20	0.93	$ 989,338.20	$ 1,187,205.84	$ 4,155,220.00	22.22%	22.22%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2 PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS	UN	45.00			14.00	5.00	$ 1,117,185.66	$ 15,640,599.28	$ 34,632,756.00	31.11%	31.11%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			141.40		$ 98,222.57	$ 13,888,672.05	$ 21,889,883.00	38.82%	38.82%	
				SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA				**$ 120,255,346.68**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 25**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00	41.34	234.34	234.34		$ 4,233.48	$ 992,072.72	$ (175,012.00)	121.42%	121.42%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83	65.79	90.62	90.62		$ 38,696.24	$ 3,506,652.84	$ (2,545,825.00)	364.96%	364.96%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 361,355.09	$ 25,352,672.83	$ (9,351,870.00)	158.45%	158.45%	


PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28	25.88	70.16	70.16		$ 65,757.83	$ 4,613,569.51	$ (1,701,813.00)	158.45%	158.45%	
PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	412.00	(366.94)	45.06	45.06		$ 32,026.28	$ 1,443,104.40	$ 11,751,725.00	10.94%	10.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1-1/4" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	43.00	-7.64	35.36	35.36		$ 190,851.78	$ 6,748,518.96	$ 1,458,108.00	82.23%	82.23%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS	M	5.50	-0.80	4.70	4.70		$ 1,120,163.13	$ 5,264,766.69	$ 896,131.00	85.45%	85.45%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	964.27	(570.86)	393.41	393.41		$ 4,663.84	$ 1,834,783.56	$ 2,662,416.00	40.80%	40.80%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00	(15.20)	134.80	134.80		$ 383,249.63	$ 51,662,050.10	$ 5,825,394.00	89.87%	89.87%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 102,227,058.00**				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**86.02%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**2,022,660,446.68**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,351,268,718.00**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - May 03 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 168,920,087.00	100.00%	$ 168,920,087.00	100.00%	$ 168,920,087.00	ENTREGADO
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 113,917,854.00	100.00%	$ 108,648,798.97	95.37%	$ 113,917,854.00	-4.63%
FABIO LOZANO	$ 234,917,032.00	100.00%	$ 231,228,088.35	98.43%	$ 234,917,032.00	-1.57%
ARBORIZADORA BAJA	$ 632,970,974.00	100.00%	$ 623,292,062.12	98.47%	$ 632,970,974.00	-1.53%
BUENAVISTA	$ 186,103,596.00	100.00%	$ 186,103,596.00	100.00%	$ 186,103,596.00	ENTREGADO
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72,206,451.00	100.00%	$ 72,206,450.25	100.00%	$ 72,206,451.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 219,755,203.00	100.00%	$ 168,977,700.31	76.89%	$ 219,755,203.00	-23.11%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 21,244,804.06	20.78%	$ 102,227,058.00	100.00%	$ 102,227,058.00	79.22%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 140,508,348.84	37.03%	$ 120,255,346.68	31.69%	$ 379,449,204.00	-5.34%
TOTALES	$ 2,031,345,608.91	86.39%	$ 2,022,660,446.68	86.02%	$ 2,351,268,718.00	-0.37%

OBSERVACIONES: Para el cierre de este periodo, encontramos que cinco (5) de las once (11) entidades educativas han sido entregadas. Las ***IED Sierra Morena y Guillermo Cano*** presentan atrasos cercanos al 5%. Por otro lado ***Fabio Lozano y Arborizadora Baja*** registran atrasos por debajo del 2%. La ***IED Santa Librada requiere que se implemente urgentemente un Plan de Choque para*** mitigar ***el atraso del 23.11% que registra a la fecha*** . El porcentaje de atraso del contrato es inferior al 0.5%.

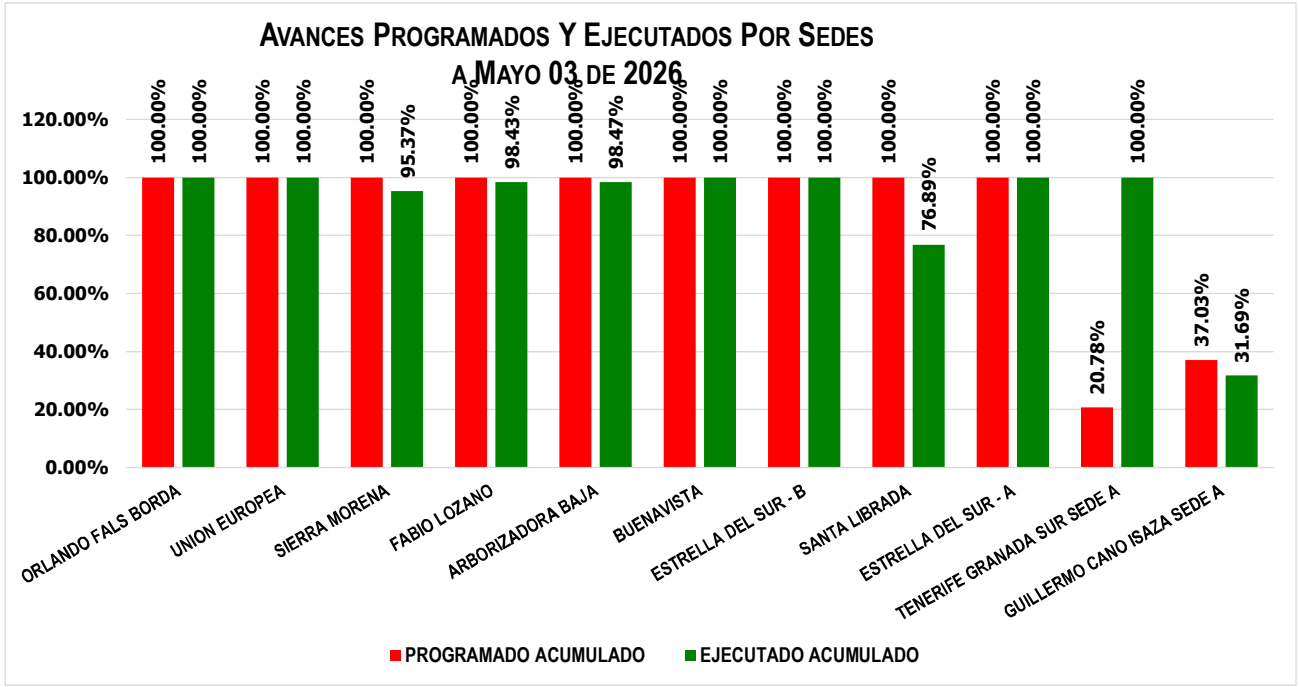

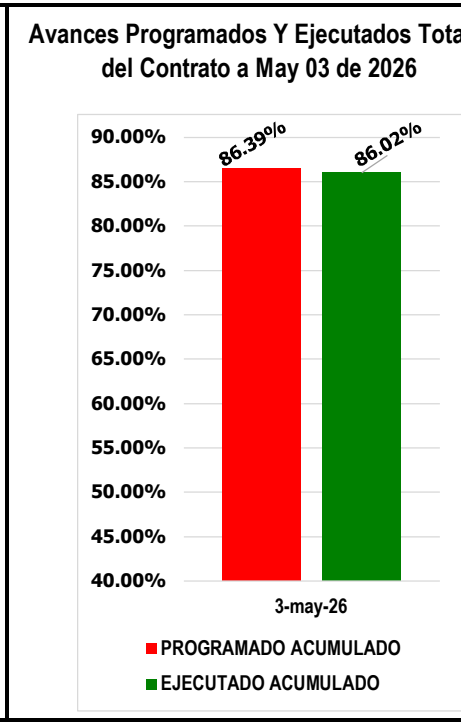

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - May. 03 2026

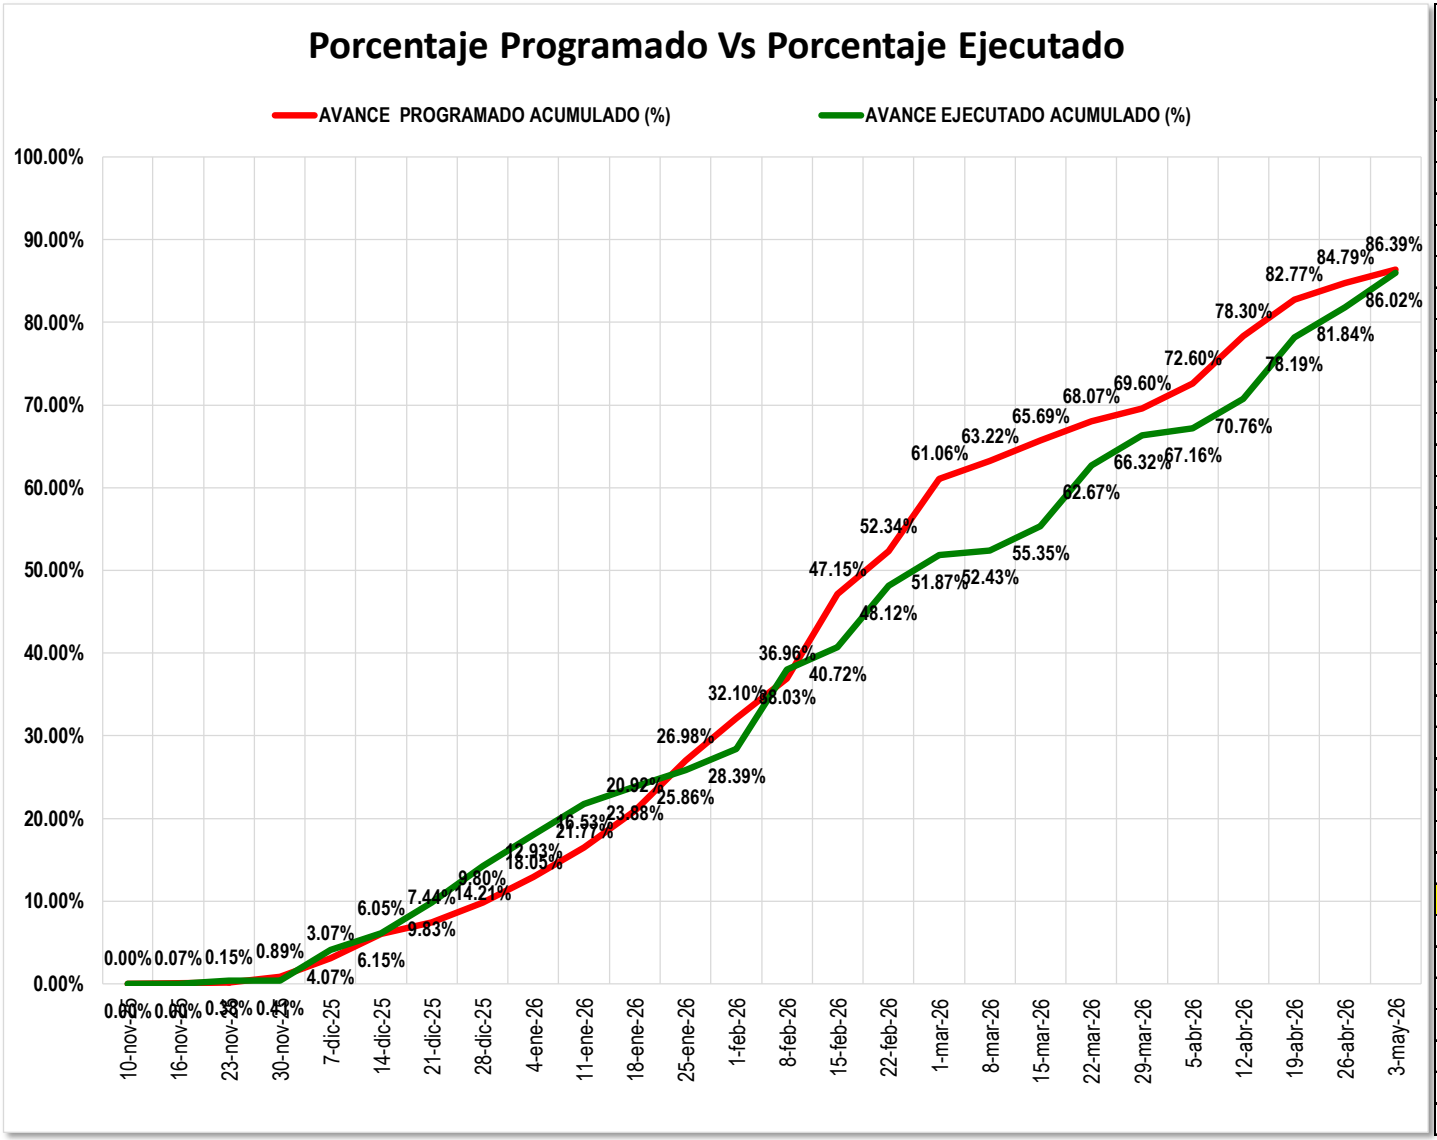

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.07%	0.00%
23-nov-25	0.15%	0.38%
30-nov-25	0.89%	0.41%
7-dic-25	3.07%	4.07%
14-dic-25	6.05%	6.15%
21-dic-25	7.44%	9.83%
28-dic-25	9.80%	14.21%
4-ene-26	12.93%	18.05%
11-ene-26	16.53%	21.77%
18-ene-26	20.92%	23.88%
25-ene-26	26.98%	25.86%
1-feb-26	32.10%	28.39%
8-feb-26	36.96%	38.03%
15-feb-26	47.15%	40.72%
22-feb-26	52.34%	48.12%
1-mar-26	61.06%	51.87%
8-mar-26	63.22%	52.43%
15-mar-26	65.69%	55.35%
22-mar-26	68.07%	62.67%
29-mar-26	69.60%	66.32%
5-abr-26	72.60%	67.16%
12-abr-26	78.30%	70.76%
19-abr-26	82.77%	78.19%
26-abr-26	84.79%	81.84%
3-may-26	**86.39%**	**86.02%**
10-may-26	88.02%	
17-may-26	91.72%	
24-may-26	93.83%	
31-may-26	96.92%	
7-jun-26	98.26%	
14-jun-26	99.11%	
20-jun-26	100.00%	

ANEXO No. 3. ACTAS DE COMITE

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 20

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	07	04	2026	**HORA INICIO:**	4:30 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Erick José Castillo	Consorcio Serinco Educativo	Representante legal	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	JOHN CASTAÑEDA
Stefanía Ceballos	Consorcio Serinco Educativo	Coordinadora	
Alejandra Otalora Delgado	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo Coordinación	
Juan Carlos Velasquez	Consorcio País	Representante legal	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	ESTADO GENERAL DEL CONTRATO
2	EMERGENCIA – DILE USME
3	ADICION CONTRACTUAL
4	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
5	VISITA TECNICA Y SEGUIMIENTO
6	COMPROMISOS

DESARROLLO

1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

El comité inició con la presentación del estado general del contrato, el cual registra un avance del 0.78%, evidenciando un bajo nivel de ejecución frente a lo programado.

La interventoría detalló el estado de las sedes educativas, indicando que:

- ✓ Colegio Orlando Fals: atraso del 5.84%

- ✓ Colegio Sierra Morena: atraso del 15.99%.
- ✓ Colegio Arborizadora Baja: atraso del 2.38%.
- ✓ Colegio Calasanz Buenavista: atraso del 6.33%.
- ✓ Colegio Fabio Lozano Simonelli: avance del 10.16%.
- ✓ Colegio Santa Librada: avance del 15.48%.
- ✓ Colegio Guillermo Cano Isaza: atraso del 12.67%.
- ✓ Colegio Tenerife Granada: avance del 41.65%.

El Arq. Santiago Ángel - Apoyo a la Supervisión, enfatizó que no es aceptable mantener frentes sin ejecución, reiterando la obligación contractual de garantizar continuidad en obra.

El Ing. Juan Carlos – Representante legal de contratista informó que para el colegio Arborizadora baja se realizó:

- ✓ El cerramiento y el piso serán entregados el viernes.
- ✓ Las actividades finalizarán entre mié-09 y jue-10-abr-2026.

El Ing. Wilson Leonardo Parra - director de Obra confirmó que se gestionó la documentación del personal para ingreso a obra.

2. EMERGENCIA – DILE USME

Se abordó la situación crítica de la emergencia en el colegio Dile Usme, la cual no registra avance en las semanas más recientes, lo cual ha quedado registrado en los informes semanales de interventoría.

La interventoría solicitó claridad sobre el estado actual y fechas de ejecución.

El Ing. Wilson Leonardo Parra - Director de Obra indicó que:

- ✓ No se ha evidenciado humedad reciente en el muro afectado.
- ✓ Se propone intervenir mediante limpieza, resane, estuco y pintura, dejando el área en observación.

Ante esto, el Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión fue enfático en:

- ✓ Exigir un informe técnico formal que justifique la no demolición del muro.
- ✓ Establecer responsabilidad directa del contratista en caso de que la humedad reaparezca.
- ✓ Solicitar la reanudación inmediata de actividades a partir del día siguiente.

Adicionalmente, se exigió definir una fecha clara de entrega para esta emergencia.

3. ADICION CONTRACTUAL

Se discutió la necesidad de realizar una adición contractual para el Lote 6.

El Arq. Santiago Ángel – apoyo a la supervisión definió que:

- ✓ La adición será únicamente en tiempo, sin recursos económicos adicionales.
- ✓ Se establece una prórroga desde el 21 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026.

El Ing. Wilson Leonardo Parra Robles - Director de Obra manifestó que se encuentra estructurando la programación y el presupuesto requerido.

Stefania Ceballos – Coordinadora de interventoría expresó preocupación frente a la viabilidad operativa de la interventoría sin recursos adicionales, considerando la permanencia del personal.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión aclaró que:

- ✓ La interventoría debe ajustar su esquema operativo internamente y presentar la propuesta económica para la adición

Se estableció como prioridad la entrega de la documentación completa para radicación ante la entidad antes del viernes 10 de abril 2026

4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

La interventoría solicitó fechas claras para la entrega de:

- ✓ Respuesta a observaciones de APU y a
- ✓ Manuales de mantenimiento.

El Ing. Wilson Leonardo Parra - director de Obra se comprometió a entregar dicha información el día 9 de abril.

La interventoría preguntó sobre el cargue de la documentación RCD al aplicativo de la SDA

El Ing. Wilson Leonardo Parra - director de Obra indicó dificultades en la carga de información RCD.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión solicitó:
- ✓ Realizar la carga durante la semana.
- ✓ Enviar soporte con evidencia (pantallazo).

La interventoría reiteró que este proceso debe realizarse de forma mensual.

- **Colegio Fabio Lozano Simonelli**

El Arq. Santiago Ángel - Apoyo a la supervisión informó inconformidad por baja iluminación en la sala de profesores.

El Ing. John Castañeda - Residente de interventoría y el Ing. Wilson Leonardo Parra - Director de Obra aclararon que:

- ✓ Se instalaron las luminarias existentes.
- ✓ No se contempló cambio por luminarias nuevas.

Se identificó inconformidad mixta de usuarios (exceso de luz vs. insuficiencia).

- **Actas, cobros y documentación**

El Ing. Juan Carlos - Representante legal de obra solicitó claridad sobre la radicación del acta de cobro.

El Arq. Santiago Ángel - Apoyo a la supervisión indicó:

- ✓ Esperar aprobación del acta de interventoría.
- ✓ Evitar radicación anticipada para prevenir devoluciones.

Y frente a actas faltantes al Arq. Santiago Ángel, el Ing. John Castañeda – Residente de Interventoría se comprometió a remitir las actas pendientes.

5. VISITA TECNICA Y SEGUIMIENTO

El Arq. Santiago Ángel - Apoyo a la supervisión instruyó la realización de visita técnica al colegio Luis Eduardo Mora Osejo, con participación de:

- ✓ Ing. John Castañeda (Interventoría)
- ✓ Ing. Wilson Leonardo Parra Robles (Contratista)
- ✓ Especialista eléctrico

El objetivo será definir el alcance real de la intervención.

.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Elaborar informe técnico justificando no demolición de muro en Dile Usme	Alta	Contratista de Obra	08/04/2026	
2	Retomar actividades del DILE Usme	Alta	Contratista de Obra	08/04/2026	
3	Fecha de entrega de DILE Usme	Alta	Contratista de Obra	Lo antes posible	
4	Entregar programación y presupuesto de adición contractual	Alta	Contratista de Obra	08/04/2026	
5	Respuesta a observaciones de los APU´s de los ítems No Previstos	Alta	Contratista de Obra	09/04/2026	
6	Respuesta a observaciones de los manuales de mantenimiento	Alta	Contratista de Obra	09/04/2026	
7	Cargue de documentos RCD	Alta	Contratista de Obra	Lo antes posible	
8	Propuesta de adición de interventoría	Alta	Interventoría	09/04/026	
9	Entregar programación y presupuesto de la adición contractual	Alta	Contratista de Obra	09/04/026	

Convocatoria próximo comité:	Lunes 13 de abril de 2026 a las 4:30 pm
Hora de finalización:	5:20 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 21

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	15	04	2026	**HORA INICIO:**	2:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	JOHN CASTAÑEDA
Alejandra Otalora Delgado	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo Coordinación	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Estado General del Contrato
2	Seguimiento Emergencia – DILE Usme
3	Documentación Técnica y Administrativa
4	Compromisos

DESARROLLO

1. Estado General del Contrato

Durante el comité se presentó el estado de avance de los frentes de obra, evidenciando:

- Colegio Tenerife: avance de 55.90%. El resto de los colegios presentan atrasos:
- Orlando Fals: -5.84%
- Sierra Morena: -19.73%
- Arborizadora Baja: -20.30%
- Guillermo Cano Isaza: -17.16%
- Calasanz: -6.33%
- Santa Librada: -2.34%
- Fabio Lozano Simonelli: -3.28%

Para el contrato general se presenta un Atraso del 7.41%

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión advirtió que el incumplimiento de los plazos establecidos activará procesos sancionatorios conforme a las condiciones contractuales.

2. Seguimiento Emergencia – DILE Usme

La interventoría solicitó claridad sobre la finalización de la emergencia en DILE Usme y fecha de entrega.

El Ing. Wilson Parra – Director de Obra informó que:

- La entrega estaba prevista para el mismo día.
- Las actividades ejecutadas corresponden a limpieza, resane y pintura.
- No se evidencian actualmente filtraciones.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión indicó que:

- Se debe notificar cuando el frente esté completamente funcional para programar la entrega formal.

Se estableció que la entrega solo se realizará una vez este validada por interventoría.

3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

Entrega de balances financieros

El Ing. Wilson Parra – director de Obra se comprometió a entregar los balances pendientes el mismo día, donde se incluya el presupuesto individual por cada frente y el resumen consolidado en Excel.

El Ing. John Castañeda – Residente de Interventoría solicitó inicialmente un consolidado único, sin embargo, se acordó el formato propuesto por el contratista por viabilidad operativa.

Presupuesto y cronograma – emergencia Calasanz

El Ing. Wilson Parra – Director de Obra, junto con el Ing. Fabio Fajardo – Residente de Obra, se comprometieron a entregar presupuesto y cronograma a primera hora del día siguiente.

Entrega de manuales de mantenimiento

La interventoría reiteró el incumplimiento en la entrega de manuales.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión indico que no se aprobarán pagos sin manuales completos.

Se definió el siguiente cronograma:

Jueves 23-abr-2026
- Arborizadora
- Unión Europea
- Estrella del Sur (sede A y B)

Viernes 24-abr-2026
- Calasanz

- DILE USME

Gestión ambiental – cargue RCD

La interventoría menciono que se debe incluir mensualmente evidencia del cargue (pantallazo) de la documentación aprobada de RCD es obligatorio para trazabilidad.

Se concluyó que se debe incluir evidencia del mes anterior en cada informe.

Entrega pendiente – Colegio Orlando Fals

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión menciona que el plazo contractual vence el 05 de mayo.

El Ing. Wilson Parra – Director de Obra informo que existe retraso por perforación pendiente. Y que el subcontratista se presentará al día siguiente.

Se advirtió que el incumplimiento de entregas son objeto de procesos sancionatorios.

Correcciones técnicas – Sierra Morena

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión menciona que el cuarto de basuras debe cumplir con:
- 3 Muros
- 1 Puerta tipo rejilla
- Sin ventana

Se evidenció instalación no autorizada de ventana, por lo tanto se ordenó:

- Retirar ventana
- Corregir muro afectado
- No se reconocerán costos asociados

Filtraciones – Santa Librada y Guillermo Cano Isaza

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión informó nuevas filtraciones en Santa Librada.

El Ing. Camilo Andrés Cárdenas – Inspector de Interventoría menciona la persistencia de filtración en baño segundo piso.

El Ing. Fabio Fajardo – Residente de Obra se comprometió a realizar visita técnica con:
- Ing. John Castañeda
- Ing. Camilo Cárdenas

Entrega – Colegio Arborizadora Baja

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión señaló que se presentan atrasos por manchas en marcos y cambio no autorizado de rejillas.

El Ing. Fabio Fajardo – Residente de Obra mencionó que se realizaron correcciones finalizadas el mismo día.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 21

Se acordó realizar la entrega inmediata o mañana 16-abr-2026 a partir de las 8:00 a.m.

Documento de modificación contractual

Se le solicitó al Ing. Wilson Parra lo siguiente:

- Ajustar documento enviado:
- Ordenar contenido
- Incluir balance presupuestal

El documento será revisado por el Arq. Héctor Villazón – Director de Interventoría.

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	Confirmar fecha de entrega de la emergencia DILE Usme	Alta	Contratista de Obra	16/04/2026	
2	Entregar balances financieros completos	Alta	Contratista de Obra	15/04/2026	
3	Entregar presupuesto y cronograma Calasanz	Alta	Contratista de Obra	16/04/2026	
4	Respuesta a observaciones de los manuales de mantenimiento	Alta	Contratista de Obra	16/04/2026	
5	Corregir cuarto de basuras Sierra Morena	Alta	Contratista de Obra	18/04/2026	
6	Ajustar documento de modificación	Alta	Contratista de Obra	16/04/2026	

Convocatoria próximo comité:	Jueves 23 de abril
Hora de finalización:	3:00 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 22

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	23	04	2026	**HORA INICIO:**	3:15 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	JOHN CASTAÑEDA
Alejandra Otalora Delgado	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo Coordinación	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Estado General del Contrato
2	Emergencias
3	Balances financieros y reclamación de ANS
4	Manuales de Mantenimiento y Subsanaciones
5	Arborizadora Baja – Definición Técnica de Cerramiento y Entrega
6	Calasanz, Santa Librada y Cerramientos Complementarios

DESARROLLO

1. Estado General del Contrato

La interventoría informa que el proyecto registra actualmente un atraso general del 3,73 %.

Durante la revisión individual de frentes de obra se expuso lo siguiente:

- **Colegio Orlando Fals** presenta un atraso del 0,81 %.
- **Colegio Sierra Morena** registra un atraso del 9,63 %
- **Colegio Arborizadora Baja** presenta un atraso del 5,16 %.
- **Colegio Fabio Lozano Simonelli** presenta un retraso del **4,95 %.**
- **Colegio Calasanz** mantiene un atraso del **6,33 %.**
- **Colegio Santa Librada** presenta un atraso del **13,29 %.**

- **Colegio Guillermo Cano Isaza** registra un atraso del **18,67 %.**
- **Colegio Tenerife** no presentó actividades recientes, aunque tiene un avance acumulado del **51,85 %.**

2. Emergencias

- **DILE Usme**

La interventoría solicito claridad sobre la fecha definitiva de entrega de la emergencia de DILE Usme

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a supervisión indicó que puede formalizarse una entrega ya que la intervención principal ya se encuentra correctamente ejecutada y que el daño actualmente observado no tiene relación con las actividades desarrolladas por el contrato.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de obra indicó que durante la tarde recibirían la cotización formal de los trabajos pendientes requeridos para el cierre total.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión manifestó que, una vez se confirme la finalización total, deberá informarse inmediatamente a la interventoría para programar la entrega formal del sitio.

- **Segunda Emergencia – Colegio Calasanz**

El Ing. Wilson Leonardo Parra Robles – director de obra informó que la cotización formal sería entregada durante la tarde, incluyendo el alcance real de la intervención, manifestando preocupación por algunos ítems no previstos dentro del contrato.

La interventoría también solicito el presupuesto y cronograma de esta emergencia

El Ing. Wilson Leonardo Parra Robles – director de obra menciona que se estaba a la espera de solicitud de fecha de intervención para las vacaciones.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión solicitó la presentación del presupuesto definitivo, cronograma de ejecución, ya que de acuerdo con esta información es indispensable para definir si la obra debe ejecutarse antes, durante o después del periodo de vacaciones escolares.

3. Balances financieros y reclamación de ANS

La interventoría solicitó la entrega de los balances financieros pendientes con sus respectivas observaciones subsanadas.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra se comprometió a entregar los tres balances faltantes antes del mediodía del día siguiente.

El Arq. Héctor Villazón – director de Interventoría indicó que, además de los balances pendientes, existen observaciones técnicas sobre siete de los ocho balances ya remitidos, las cuales también deben ser corregidas.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra confirmó que dichas observaciones serían atendidas y entregadas el sábado.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a supervisión consultó sobre la reclamación correspondiente a descuentos duplicados por concepto de ANS.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra explicó que ya se identificó que algunos descuentos fueron cobrados dos veces.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a supervisión solicitó coordinar urgentemente con Juan Carlos el representante legal del consorcio la consolidación de soportes y remitirlos al Ing. Héctor Villazón – director de Interventoría, ya que el lunes constituye la fecha límite para formalizar la reclamación.

4. Manuales de Mantenimiento y Subsanaciones

La interventoría menciona la entrega de la subsanación de los manuales de mantenimiento

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra menciona que hasta el momento han entregado 5 manuales de mantenimiento, haciendo falta Dile Usme y Arborizadora

El Ing. Jhon Castañeda – Residente de interventoría menciona que como recomendación ya que se terminaron actividades en el Orlando Fals ir adelantándolo igual que el de Sierra Morena.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión reiteró que resulta prioritario cerrar primero Sierra Morena y Orlando Fals, garantizando que no existan entregas sin manuales completos.

También se mencionó la ficha correspondiente a la emergencia eléctrica de Luis Eduardo Mora Osejo, cuya acta ya fue recibida y se espera que el gestor territorial realice el ajuste final a más tardar el lunes.

5. Arborizadora Baja – Definición Técnica de Cerramiento y Entrega

Durante la revisión de Arborizadora Baja, El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión pregunto en qué momento la cancha quedara abierta para alumnos, ya que existe una preocupación frente al cerramiento existente.

Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra propuso reemplazar una franja de césped por una franja en concreto cerca de las gradas pequeñas, argumentando que el tránsito constante impediría el adecuado crecimiento del pasto y generaría acumulación permanente de tierra.

Respecto a la fecha de entrega de la cancha, el Ing. Jhon Castañeda – Residente de interventoría indicó que la rectora esperaba recibirla el día 30; sin embargo, el Arq. Santiago Ángel y el Ing. Wilson Parra aclararon que aún faltan las escaleras, baranda, empradización y acabados finales.

Por esta razón, se programó una reunión en sitio el lunes posterior a la entrega de Sierra Morena para definir prioridades y comunicar formalmente a la rectora el estado real de la obra.

6. Calasanz, Santa Librada y Cerramientos Complementarios

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 22

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra informó que la rampa de Calasanz tendrá aproximadamente 1,70 m de ancho, dejando 1,50 m libres por efecto de la baranda, evitando interferencia con la caja de inspección existente.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra pregunta si hay observaciones en Santa Librada sobre la propuesta de jardineras, planteando la instalación de membrana reciclada sobre poliurea, tierra negra, césped y sistema de drenaje perimetral con grava y tubería.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión menciona que se considera viable. Respecto al corredor, preguntó si tiene un alistado o si tiene algo ese corredor.

el Ing. Jhon Castañeda – Residente de interventoría menciona que hasta ahora se levantó lo que es la membrana y hoy están realizando trasiego de material para continuar con las rampas.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión preguntó si la pintura del corredor sería de un solo color o si se contemplaría un diseño especial ya que si el contratista lo plantea se le puede mencionar a la rectora que se encuentran las posibilidades de un solo color o un pequeño diseño.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra indicó que consultaría con el encargado de esto para definirlo.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión menciona que está pendiente subsanar unos NP'S, por lo tanto, se deja como compromiso para el lunes 27 de abril estén subsanados los NP`s para darle tramite.

Antes de finalizar, el Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión reconoció que el Consorcio País presenta actualmente el mejor desempeño entre los tres contratistas, con el menor nivel de atraso, e instó a mantener el ritmo de ejecución para cerrar frentes prioritarios.

También recordó que el próximo 1 de mayo será festivo y que el viernes siguiente no habrá clases, lo cual puede aprovecharse estratégicamente para actividades que requieran intervención sin presencia estudiantil.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Revisar y compartir cotización formal de trabajos pendientes en DILE Usme	Alta	Contratista de Obra	24/04/2026	
2	Entregar balances financieros pendientes	Alta	Contratista de Obra	25/04/2026	
3	Tramitar observaciones de manuales Estrellas Sedes A y B	Alta	Contratista de Obra	24/04/2026	
4	Subsanar los APU´s de los NP's	Alta	Contratista de Obra	27/04/2026	

Convocatoria próximo comité:	28/04/2026

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 22

Hora de finalización:	4:00 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 23

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	28	04	2026	**HORA INICIO:**	4:50 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	JOHN CASTAÑEDA
Alejandra Otalora Delgado	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo Coordinación	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Estado General del Contrato
2	Entrega Balances Financieros
3	Manuales de Mantenimiento y Cierre Documental
4	Procedimiento para la Atención de Garantías
5	Programación y Emergencia de Arborizadora Baja
6	Protección de tubería expuesta en emergencia DILE
7	Observaciones Técnicas
8	Compromisos

DESARROLLO

1. Estado General del Contrato

La interventoría presentó el estado actualizado de los frentes de obra, señalando lo siguiente:

El colegio Sierra Morena presenta un atraso del 3,94%
El colegio Arborizadora Baja presenta un atraso del 1,52%
El colegio Santa Librada registra un atraso de 26,60%
El colegio Fabio Lozano Simonelli presenta un atraso de 1,24%
El colegio Guillermo Cano Isaza presenta un atraso del 14,06%

Y para la sede Tenerife se presenta un avance del 59,40%

Finalmente, se informó que el estado general del contrato presenta un atraso consolidado del 2,11%.

El Ing. John Castañeda –Residente de Interventoría informó que ya se obtuvo la firma del rector del colegio Tenerife respecto a barandas y pasamanos instalados, así como también la firma correspondiente de Orlando Fals.

Frente al avance real de Tenerife, indicó que la ejecución se encuentra entre el 70% y 80%, pero una vez se presente el balance ajustado por parte del contratista se podrá cerrar al 100% durante la misma semana.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de obra confirmó además que la instalación de pasamanos se realizó en ambos costados de la escalera, lo que podría generar un excedente presupuestal aproximado entre 15 y 20 millones, valor que sería confirmado posteriormente con exactitud.

2. Entrega Balances Financieros

La Interventoría solicitó al contratista claridad frente al compromiso previamente adquirido sobre la entrega de balances completos.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra manifestó que debido a inconvenientes técnicos en la consolidación de la información no fue posible realizar la radicación completa. Indicó que los tres balances pendientes serían radicados hoy 28-abr-2026, estableciendo como fecha máxima el 29-abr-2026 para dichos documentos.

Adicionalmente, señaló que la atención de observaciones restantes sería presentada el día 30-abr-2026.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión enfatizó que no pueden seguir existiendo atrasos en balances, dado que esto afecta directamente el control financiero y administrativo del contrato.

3. Manuales de Mantenimiento y Cierre Documental

El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de obra solicitó que se revisaran primero los documentos de subsanación radicados previamente, con el fin de evitar duplicidad de trabajo y nuevas observaciones sobre información ya atendida.

El Ing. John Castañeda – Residente de Interventoría informó que el manual correspondiente a Sierra Morena, radicado el día 27, aún presenta faltantes relacionados con fichas técnicas, motivo por el cual enviará formalmente las observaciones correspondientes.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión reiteró que, aunque la ejecución física de obra ha mostrado mejora, resulta obligatorio que cada frente de obra entregado cuente con su respectivo manual de mantenimiento aprobado, ya que sin este soporte no puede darse cierre administrativo ni trámite de pagos.

Se dejó expresamente establecido que los pagos quedarán condicionados a la entrega completa de dichos manuales.

4. Procedimiento para la Atención de Garantías

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión relató el paso a paso para la atención de las garantías, recordando que…

(…)

a la fecha, se ha realizado la entrega total y parcial de varios frentes de obra, dichos espacios ya son susceptibles de requerimientos por parte de las Instituciones Educativas Distritales (IED) para la atención de garantías. En este sentido, a continuación, se establece el ***procedimiento a seguir para la atención de solicitudes de garantía****:*

- *La atención de garantía aplica exclusivamente a los espacios que ya han sido entregados a las IED y que cuentan con la respectiva formalización mediante Acta de Entrega.*
- *Ninguna institución educativa, ya sea a través de rectores, almacenistas, personal docente u otro funcionario, podrá realizar requerimientos de manera directa al contratista de obra y/o a la interventoría.*
- *Todas las solicitudes de garantía deberán ser presentadas por la IED a la DCCEE, ya sea por medio del gestor territorial, apoyo a la supervisión y/o mediante comunicación interna dirigida al Director de Construcciones.*
- *La DCCEE será la encargada de requerir al Contratista de Obra y a la Interventoría la atención de la garantía, a través de correo electrónico, en el cual se establecerán los plazos para el diagnóstico, atención y entrega de informes.*
- *Los plazos establecidos en los requerimientos realizados por la DCCEE son de obligatorio cumplimiento, dado que una atención no oportuna afecta directamente el normal y adecuado funcionamiento de los espacios intervenidos.*
- *Una vez realizada la atención de la garantía por parte del contratista y con el aval de la interventoría, el contratista de obra deberá elaborar y remitir a la interventoría un informe técnico detallado, en el que se describa el alcance de las actividades ejecutadas, debidamente soportado con registro fotográfico que evidencie la corrección de las observaciones. Posteriormente, este informe deberá ser remitido a la DCCEE por parte de la interventoría, quien avalará lo ejecutado.*
- *En caso de que el requerimiento presentado por la IED no corresponda a una garantía, dicha situación deberá indicarse claramente en el informe, justificando las razones por las cuales no aplica. Se deberá tener en cuenta que situaciones como vandalismo, uso inadecuado u otros eventos similares deberán ser soportadas con registro fotográfico.*

Es importante señalar que, si bien los espacios y frentes de obra intervenidos cuentan con un plazo de dos (2) años de garantía, este término empezará a contabilizarse una vez se haya tramitado oficialmente el Acta de Terminación del contrato entre las partes. Por esta razón, los frentes entregados de manera anticipada contarán con un periodo de garantía superior a los dos años. En este sentido, el término de garantía, incluyendo los tiempos adicionales establecidos en el Modificativo No. 2, se contabilizará desde octubre de 2026 hasta octubre de 2028.

5. Programación y Emergencia de Arborizadora Baja

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de obra informó que la programación de Arborizadora Baja ya se encontraba elaborada por otro profesional, pero debía ser ajustada al formato requerido por la interventoría para su seguimiento formal.

El Arq. Santiago Ángel – apoyo a la supervisión solicitó que dicha programación incluyera no solamente las actividades pendientes sino también la empradización total de la zona afectada por la ejecución de la cancha, ya que el estado actual genera mala percepción visual y afecta la entrega final.

6. Protección de tubería expuesta en emergencia DILE

El Arq. Santiago Ángel – apoyo a la supervisión manifestó preocupación por las fotografías remitidas sobre la emergencia de DILE, ya que la tubería instalada parecía encontrarse demasiado superficial, lo cual la hace vulnerable a robo de material o afectaciones por manipulación externa.

El Ing. Fabio Fajardo – residente de obra confirmó que la actividad fue ejecutada, pero que se revisaría nuevamente la profundidad real de la tubería.

Se evaluó la posibilidad de instalar una canaleta de protección adicional; sin embargo, El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión indicó que primero debía verificarse si la tubería estaba correctamente enterrada, ya que si se encontraba demasiado superficial sería necesario rehacer completamente la instalación.

7. Observaciones Técnicas

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión solicitó que en el acta quedaran claramente establecidas las fechas de entrega de informes mensuales de obra.

En cumplimiento de las condiciones y los plazos contractuales establecidos para la ejecución de los contratos de mejoramientos 2025, se informaron los plazos definidos para la presentación y radicación de los Informes Mensuales No. 7, correspondientes al período comprendido entre el 6 de abril y el 5 de mayo de 2026:

- Presentación de informes a la Interventoría: 12 de mayo (5 días hábiles)
- Emisión de observaciones por parte de la Interventoría: 15 de mayo (3 días hábiles)
- Subsanación de observaciones por parte de obra: 20 de mayo (2 días hábiles)

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de Obra expuso la necesidad de revisar el reconocimiento económico asociado al manejo de materiales desde altura y al doble trasiego realizado en Calasanz.

Indicó que se debía revisar particularmente unos ítems para validar la posibilidad de recuperación de dichos costos.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión indico que se debe revisar el tema directamente con el Ing. John Castañeda- residente de interventoría, aclarando que el reconocimiento económico deberá realizarse por un solo concepto y no de forma duplicada.

Asimismo, se solicitó revisar si ya existe un ítem presupuestal aplicable para la canaleta de protección instalada en el salón de sistemas de Unión Europea antes de tramitar un Nuevo Precio (NP).

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 23

8. **Compromisos**

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Radicar los 3 balances pendientes	Alta	Contratista de Obra	29/04/2026	
2	Radicar el resto de los balances pendientes	Alta	Contratista de Obra	30/04/2026	
3	Ajustar cronograma de Arborizadora Baja	Alta	Contratista de Obra	04/05/2026	
4	Subsanar manuales de mantenimiento	Alta	Contratista de Obra	04/05/2026	

Convocatoria próximo comité:	04/05/2026
Hora de finalización:	5:20 pm

COMITÉ TECNICO – LOTE 6

28 DE ABRIL DE 2026

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATISTA

Consorcio PAIS SED L6

INTERVENTORIA

Consorcio Serinco EDUCATIVO

SUPERVISION

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

ORDEN DEL DIA

1. INFORMACION GENERAL
2. ESTADO GENERAL DE CONTRATO
3. ESTADO DE FRENTES DE OBRA
4. REGISTRO FOTOGRAFICO
5. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Alcance: **“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.**

Contratista: **CONSORCIO PAIS**

Interventoría: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**

Inversión del proyecto: **$3.117.050.445**

Lote: **6** **Sedes:** **11**

Fecha de terminación: **20 de junio del 2026.**

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Lote	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA	DIRECCION	INICIO DE OBRA
6	523	USME	FABIO LOZANO SIMONELLI	A – FABIO LOZANO SIMONELLI	KR 4 ESTE No 65 31 SUR	1 DE DICIEMBRE 2025
	1904	CIUDAD BOLIVAR	ARBORIZADORA BAJA	A – ARBORIZADORA BAJA	CL 59 I SUR No 44 A 02	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
	1974	CIUDAD BOLIVAR	CALASANZ BUENA VISTA	A – BUENA VISTA	KR 17 F No 77 75 SUR	9 DE DICIEMBRE DE 2025
	1930	CIUDAD BOLIVAR	UNION EUROPEA	B – MARIA CANO (UNION EUROPEA)	CL 69 B SUR No 17 N 92	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
	1918	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	B – ESTRELLA II	CL 75 SUR No 18 B 45	1 DE DICIEMBRE 2025
	581	USME	ORLANDO FALS BORDA	A – BARRANQUILLITA NUEVO	KR 12 No 72 60 SUR	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
	546	USME	SANTA LIBRADA	A – SANTA LIBRADA	CL 75 A SUR No 1 B 45 ESTE	1 DE DICIEMBRE 2025
	1917	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	A – ESTRELLA I	KR 17 P No 72 25 SUR	1 DE DICIEMBRE 2025
	1913	CIUDAD BOLIVAR	SIERRA MORENA	C – DIVINO NIÑO	TV 46 A No 79 D 15 SUR	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
	548	USME	TENERIFE - GRANADA	A – TENERIFE	CRA. 14B BIS #91 SUR 14	09 DE MARZO DE 2026
	1959	CIUDAD BOLIVAR	GUILLERMO CANO ISAZA	A – GUILLERMO CANO	CRA. 16A #62 - 35 SUR	12 DE ENERO DE 2026

ESTADO DE FRENTE DE OBRA


SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMANA	ESTADO DE EJECUCION
UNION EUROPEA	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	• EJECUTADO AL 100%	AVANCE DEL 100%
ORLANDO FALS BORDA	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	• SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4“ • ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	AVANCE DEL 100%
SIERRA MORENA	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	• PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE • PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS	ATRASO DEL 3,94 %
ARBORIZADORA BAJA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	• PLACA CONTRAPISO DE 15 CM	ATRASO DEL 1,52 %
FABIO LOZANO SIMONELLI	1 DE DICIEMBRE DE 2025	• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO	ATRASO DEL 1,24 %
ESTRELLA DEL SUR – sede B	1 DE DICIEMBRE DE 2025	• EJECUTADO AL 100%	AVANCE DEL 100%
CALASANZ (BUENAVISTA)	9 DE DICIEMBRE DE 2025	• ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	AVANCE DEL 100%
SANTA LIBRADA	1 DE DICIEMBRE DE 2025	• TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES	ATRASO DEL 26,60%
ESTRELLA DEL SUR – SEDE A	9 DE DICIEMBRE DE 2025	• EJECUTADO AL 100%	AVANCE DEL 100 %
GUILLERMO CANO ISAZA	12 DE ENERO DE 2026	• VINILO TIPO 1 A TRES MANOS • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO	ATRASO DEL 14,06 %

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ESTADO DE EJECUCION
TENERIFE	09 DE MARZO DE 2026	• PINTURA EPOXICA A 3 MANOS • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA • ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	AVANCE DEL 59,40 %

ESTADO DE FRENTE DE OBRA


AVANCE GENERAL				
	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO	
AVANCE	81,77%	11,61%	78,60%	
PROGRAMADO	83,87%			
ATRASO	-2,11%	EN EJECUCION		

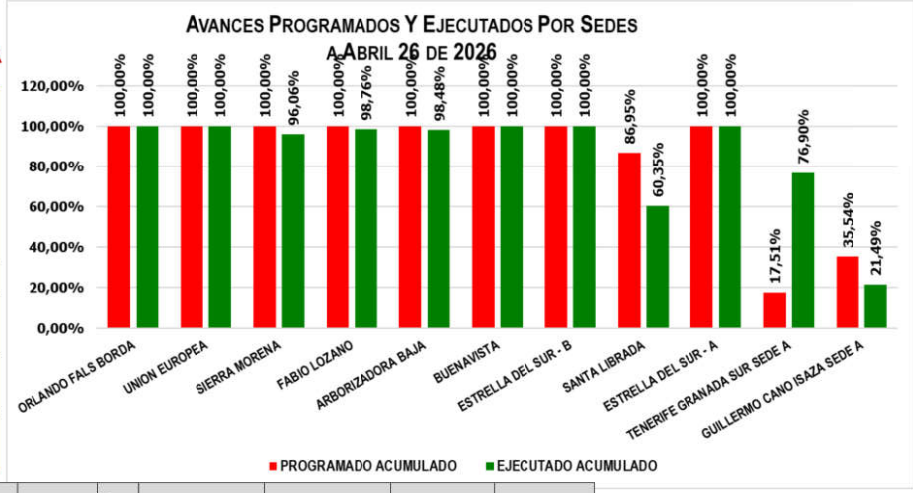

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	99,19%	100,00%	↑	100,00%	↑	$ 168.920.087	$ 168.920.087	10/11/2025	28/02/2026
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100,00%	100,00%	→	100,00%	↓	$ 165.727.196	$ 165.727.196	18/11/2025	21/02/2026
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	90,37%	96,06%	↑	100,00%	↓	$ 121.299.091	$ 116.516.356	10/11/2025	18/04/2026
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	95,05%	98,76%	↑	100,00%	↓	$ 210.813.697	$ 208.195.661	1/12/2025	11/04/2026
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	94,84%	98,48%	↑	100,00%	↓	$ 631.551.513	$ 621.932.553	24/11/2025	28/02/2026
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100,00%	100,00%	→	100,00%	✓	$ 186.103.596	$ 186.103.596	10/12/2025	21/03/2026
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100,00%	100,00%	→	100,00%	↓	$ 72.206.451	$ 72.206.450	1/12/2025	14/03/2026
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	60,09%	60,35%	↑	86,95%	↓	$ 212.173.903	$ 128.041.795	15/01/2026	2/05/2026
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100,00%	100,00%	→	100,00%	↑	$ 75.074.063	$ 75.074.063	15/01/2026	28/02/2026
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	65,14%	76,90%	↑	17,51%	↑	$ 130.006.456	$ 99.981.304	9/03/2026	7/06/2026
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	13,37%	21,49%	↑	35,54%	↑	$ 379.449.204	$ 81.539.394	13/01/2026	19/06/2026

REGISTRO FOTOGRAFICO


ORLANDO FALS - SEMANAL

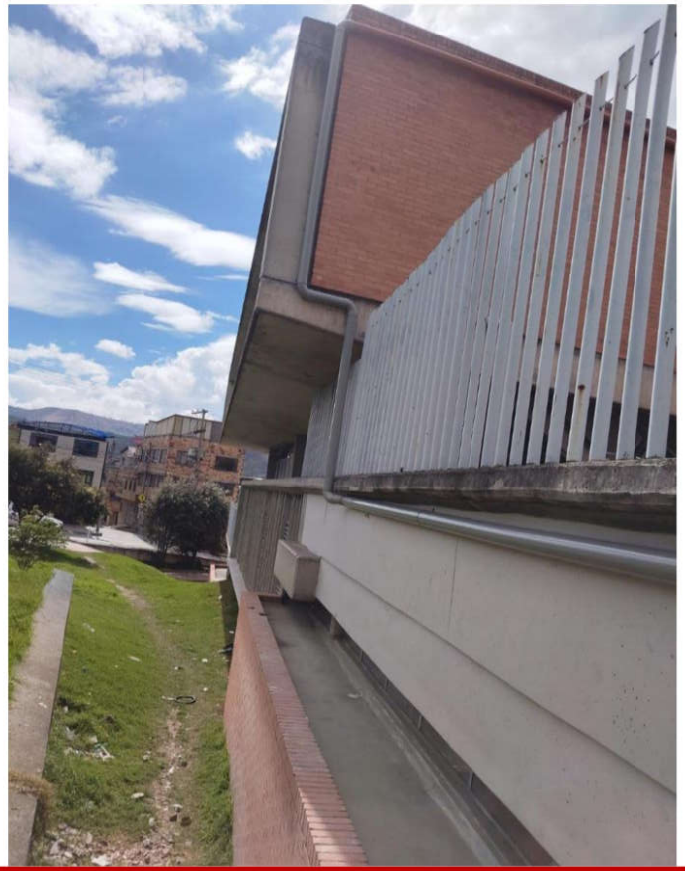




REGISTRO FOTOGRAFICO


SIERRA MORENA- SEMANAL

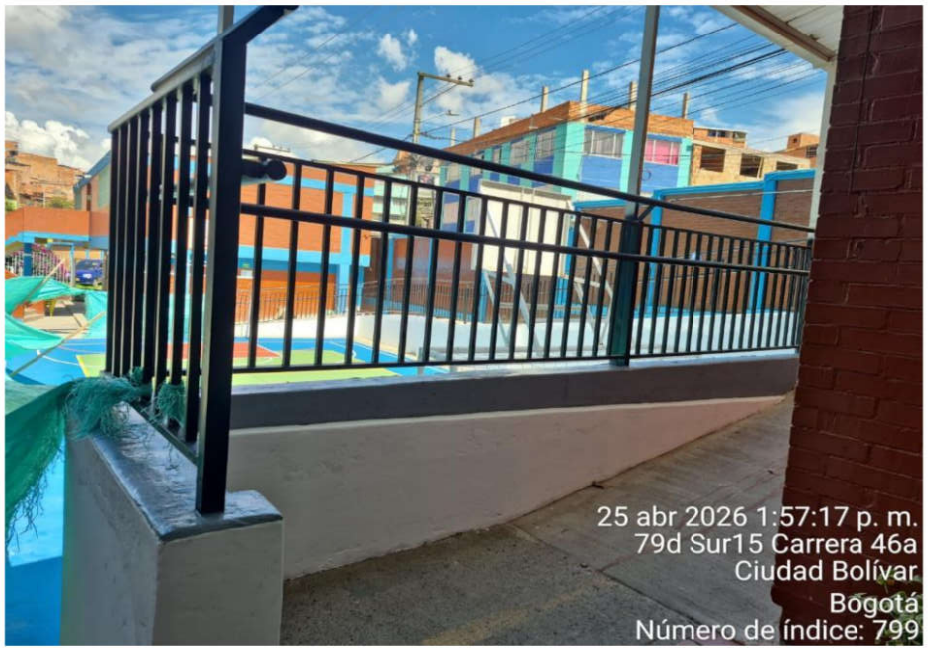


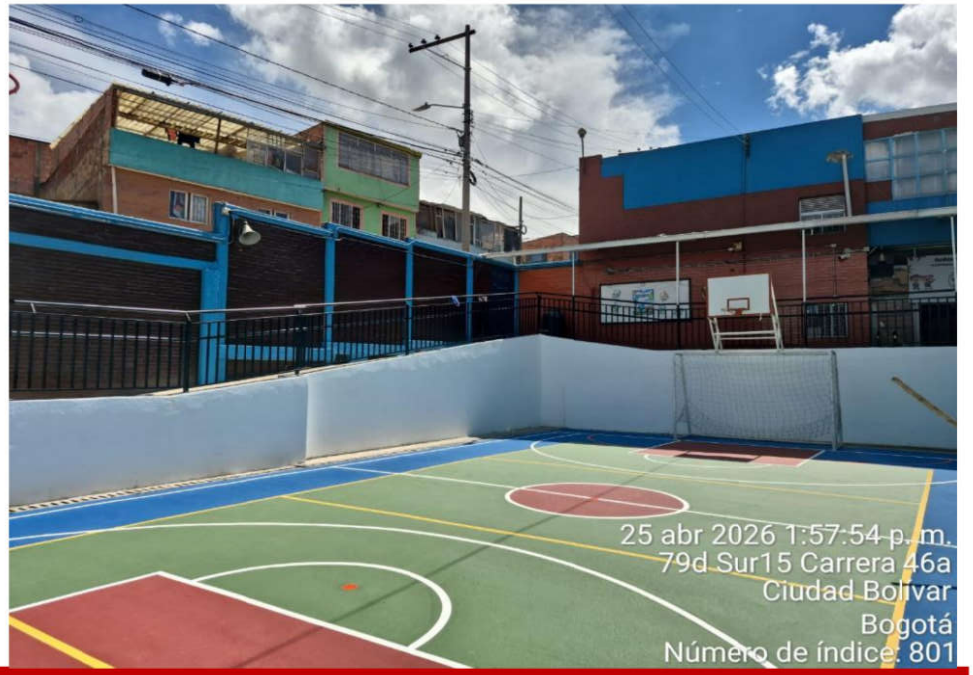

REGISTRO FOTOGRAFICO


ARBORIZADORA BAJA – SEMANAL

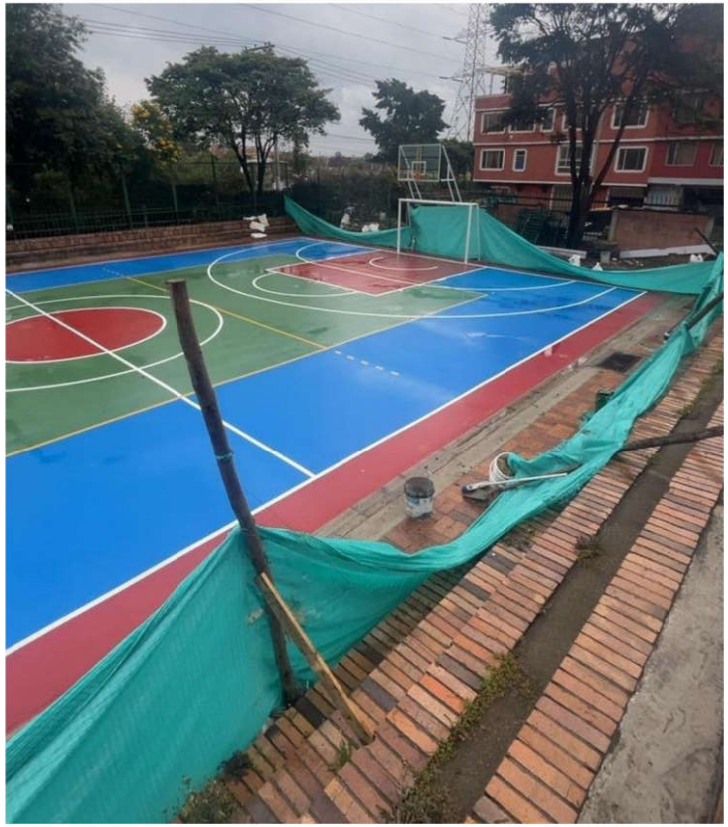

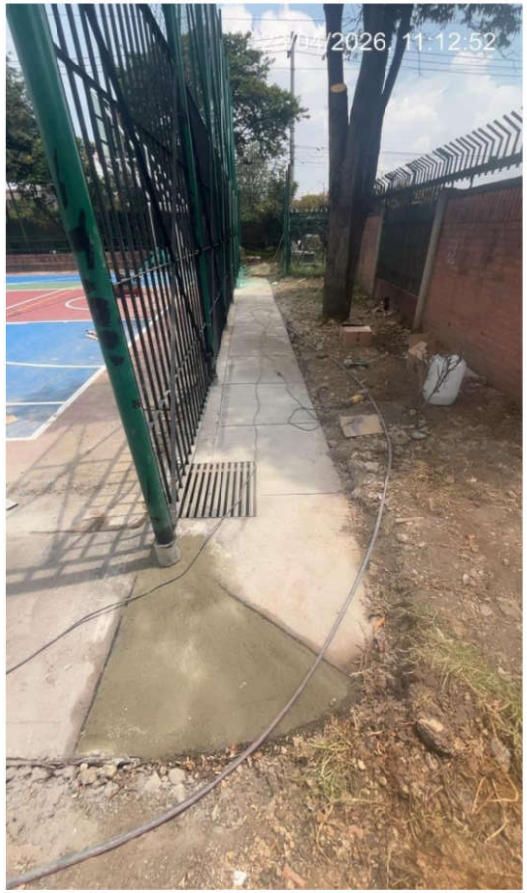

REGISTRO FOTOGRAFICO

FABIO LOZANO – SEMANAL

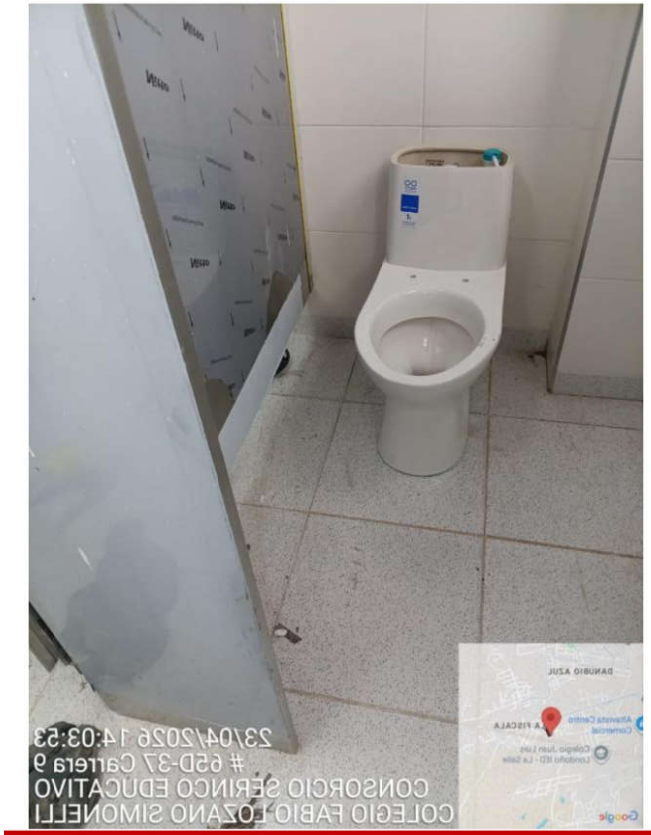






REGISTRO FOTOGRAFICO

SANTA LIBRADA – SEMANAL



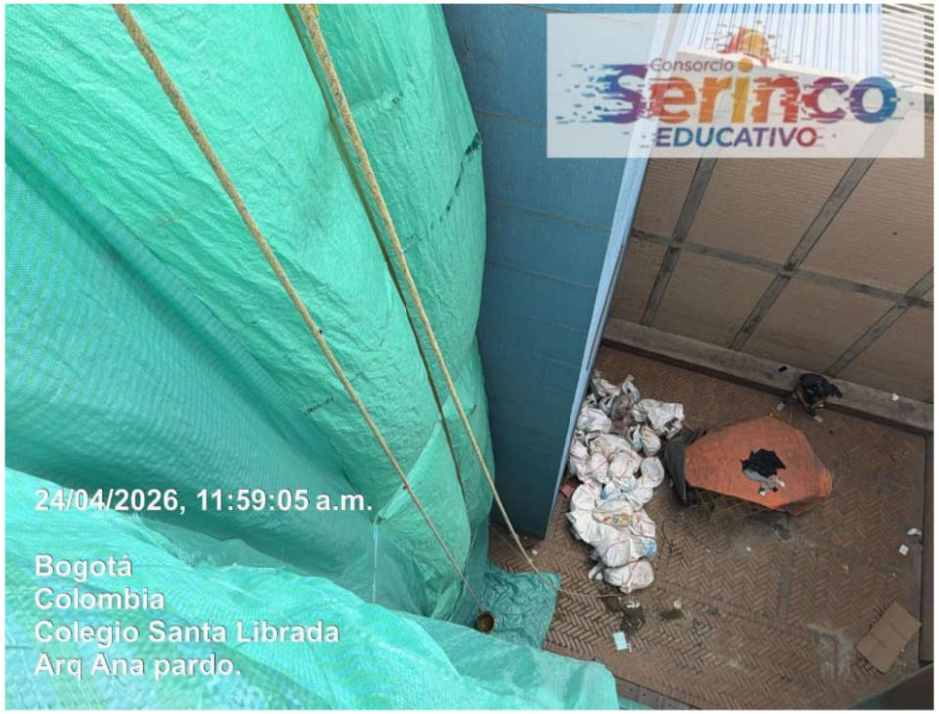

REGISTRO FOTOGRAFICO

GUILLERMO CANO ISAZA









REGISTRO FOTOGRAFICO

TENERIFE

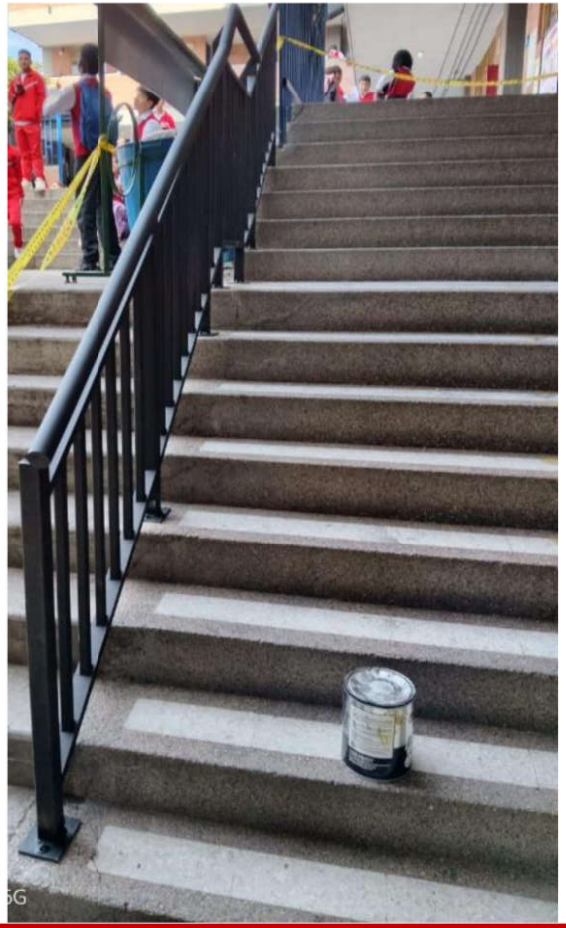



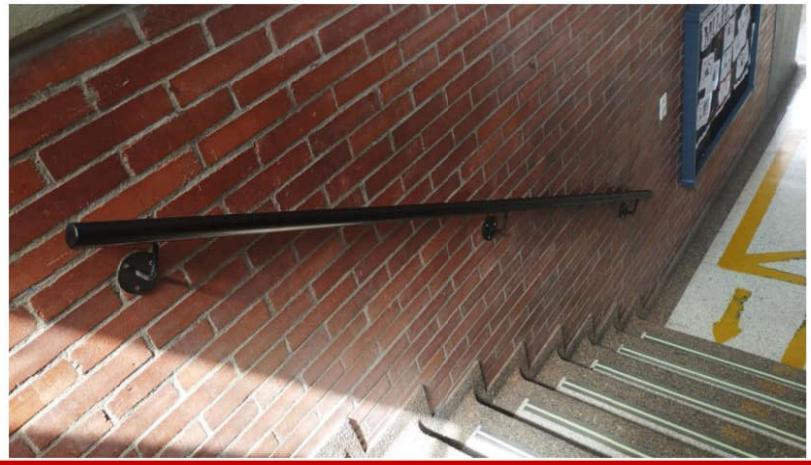

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALASANZ BUENAVISTA- EMERGENCIA





OBSERVACIONES / COMPROMISOS

- **Fecha de entrega de DILE usme – en tramite**
- **Entregar Balances completos según observaciones – 29 abril y 30 abril**
- **Subsanación de los manuales de mantenimiento**
- **Actualización de presupuesto y cronograma de emergencia Arborizadora baja**

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 24

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	05	05	2026	**HORA INICIO:**	4:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Apoyo a la Supervisión	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	JOHN CASTAÑEDA
Alejandra Otalora Delgado	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo Coordinación	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Fabio Fajardo	Consorcio País	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	Estado General del Contrato
2	Seguimiento a Emergencias
3	Subsanación de Manuales de Mantenimiento
4	Proceso de Radicación de Ítems No Previstos (NP)
5	Garantías, Observaciones y Estado Técnico
6	Estado de Muestras de Concreto – Calasanz
7	Compromisos

DESARROLLO

1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

La interventoría presentó el estado actualizado de los frentes de obra, señalando lo siguiente:

El colegio Sierra Morena presenta un atraso del 4,63%
El colegio Arborizadora Baja presenta un atraso del 1,53%
El colegio Santa Librada registra un atraso de 23,11%
El colegio Fabio Lozano Simonelli presenta un atraso de 1,57%
El colegio Guillermo Cano Isaza presenta un atraso del 5,34% y para la sede Tenerife se presenta un avance del 79,22%

Finalmente, se informó que el estado general del contrato presenta un atraso consolidado del 0,37%.

2. Seguimiento Emergencias DILE Usme

- **DILE Usme**

  La interventoría consultó sobre la fecha de entrega de la obra del DILE Usme.

  El Arq. Santiago Ángel - apoyo a la supervisión informó que la obra principal se encuentra ejecutada, quedando pendiente la finalización de la Emergencia 2, se definió que la solución para la tubería expuesta consiste en la instalación de abrazaderas cada 20 cm sobre la fachada, junto con la aplicación de pintura protectora similar al color del ladrillo, con el fin de mejorar la seguridad y estética.

  También se hizo la aclaración que la Emergencia 1 del Dile Usme ya fue recibida a satisfacción, quedando pendiente únicamente la formalización documental.

  El Ing. John Castañeda – Residente de Interventoría, indicó que aún no se cuenta con el presupuesto final ni el cronograma de la Emergencia 2, lo cual afecta la trazabilidad del proceso.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la supervisión, precisó que el cronograma requerido debe ser sencillo, incluyendo fechas de inicio y finalización, mientras que el presupuesto debe reflejar el costo real ejecutado.

- **Emergencia Arborizadora Baja – Presupuesto y Programación**

  El Ing. John Castañeda – Residente de interventoría, señaló que el presupuesto y cronograma previamente presentados deben ser actualizados, debido a variaciones en actividades, especialmente en la intervención con granito en graderías.

  El Arq. Santiago Ángel – apoyo a la supervisión, indicó que el presupuesto final deberá ajustarse una vez finalizada la obra, reflejando el valor real ejecutado, independientemente del valor inicialmente proyectado.

  Se estableció como fecha estimada de finalización el 14 de mayo, condicionada a factores climáticos y a la ejecución de actividades pendientes como escaleras y limpieza.

  El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de obra, propuso realizar la actualización documental posterior a la finalización de obra.

  El Arq. Santiago Ángel – apoyo a la supervisión, sugirió como fecha límite tentativa el 20 de mayo para la entrega de dicha actualización.

- **Inspección Emergencia Guillermo Cano Isaza**

  El Arq. Santiago Ángel – apoyo a la supervisión, informó que se realizará una visita técnica al día siguiente junto con el gestor Gerardo, con el fin de evaluar la emergencia correspondiente al cambio de piso en un aula.

Se indicó expresamente al Ing. Wilson Leonardo Parra– director de obra, limitar el alcance de la visita únicamente a la evaluación técnica, evitando compromisos adicionales.

- **Emergencia Calasanz – Programación y Ejecución**

  Se menciono la ausencia de presupuesto y cronograma para la Emergencia 2 del muro de Calasanz.

  Se acordó que los trabajos de perfilado de talud se ejecutarán durante el fin de semana, aprovechando la suspensión de clases del viernes 8 de mayo, lo cual permite intervención sin afectar la operación académica.

3. Subsanación de Manuales de Mantenimiento

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de obra, reconoció el atraso en la entrega de los manuales de mantenimiento, indicando que se debió a la priorización de otras actividades operativas.

Se comprometió a realizar la subsanación total entre hoy y mañana 05-may-2026

4. Proceso de Radicación de Ítems No Previstos (NP)

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de obra, indicó que realizará una revisión de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes para determinar cuáles ameritan la generación de NP.

Se acordó realizar una reunión conjunta con el Ing. John Castañeda – Interventoría, con el fin de consolidar el listado definitivo de NP´s a radicar.

El director de obra, Ing. Wilson Parra confirmó que se encuentra en proceso de conformación del NP 12, correspondiente a la canaleta de la IED Unión Europea.

5. Garantías, Observaciones y Estado Técnico

El Arq. Santiago Ángel – apoyo a la supervisión, consultó sobre un posible daño en la rampa de Santa Librada, el cual fue aclarado por el Ing. Wilson Leonardo Parra – director de obra, indicando que corresponde a manchas superficiales y no a fallas estructurales.

Asimismo, El Arq. Santiago Ángel – apoyo a la supervisión, solicitó con carácter urgente la entrega del informe de garantía del colegio Sierra Morena.

El Ing. Fabio Fajardo – residente de obra, informó que dicho informe se encuentra en elaboración.

6. Estado de Muestras de Concreto – Calasanz

El Arq. Santiago Ángel – apoyo a la supervisión, solicitó revisión del correo enviado previamente sobre los tiempos de respuesta de garantías en las sedes Calasanz, Guillermo Cano y DILE Usme.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – director de obra informó que existe atraso en la entrega de resultados del laboratorio para el cilindro de concreto de Calasanz.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 24

Indicó que realizará seguimiento inmediato e incluso visita presencial al laboratorio en caso de no obtener respuesta oportuna.

Se advirtió que, en caso de que el resultado sea satisfactorio, se deberá proceder con la entrega funcional del tanque durante el fin de semana.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entrega de emergencia DILE Usme	Alta	Contratista de Obra	05/05/2026	
2	Subsanar manuales de mantenimiento	Alta	Contratista de Obra	5/05/2026	
3	Ajustar cronograma y presupuesto de Arborizadora	Alta	Contratista de Obra	20/05/2026	
4	Definir listado final de NPs	Alta	Contratista de Obra	Próximo comité	

Convocatoria próximo comité:	--/05/2026
Hora de finalización:	5:00 pm

COMITÉ TECNICO – LOTE 6

04 DE MAYO DE 2026

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATISTA

Consorcio PAIS SED L6

INTERVENTORIA

Consorcio Serinco EDUCATIVO

SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

ORDEN DEL DIA

1. INFORMACION GENERAL
2. ESTADO GENERAL DE CONTRATO
3. ESTADO DE FRENTES DE OBRA
4. REGISTRO FOTOGRAFICO
5. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Alcance: **“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.**

Contratista: **CONSORCIO PAIS**

Interventoría: **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**

Inversión del proyecto: **$3.117.050.445**

Lote: **6** **Sedes:** **11**

Fecha de terminación: **20 de junio del 2026.**

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Lote	CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE EDUCATIVA	DIRECCION	INICIO DE OBRA
6	523	USME	FABIO LOZANO SIMONELLI	A – FABIO LOZANO SIMONELLI	KR 4 ESTE No 65 31 SUR	1 DE DICIEMBRE 2025
	1904	CIUDAD BOLIVAR	ARBORIZADORA BAJA	A – ARBORIZADORA BAJA	CL 59 I SUR No 44 A 02	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
	1974	CIUDAD BOLIVAR	CALASANZ BUENA VISTA	A – BUENA VISTA	KR 17 F No 77 75 SUR	9 DE DICIEMBRE DE 2025
	1930	CIUDAD BOLIVAR	UNION EUROPEA	B – MARIA CANO (UNION EUROPEA)	CL 69 B SUR No 17 N 92	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
	1918	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	B – ESTRELLA II	CL 75 SUR No 18 B 45	1 DE DICIEMBRE 2025
	581	USME	ORLANDO FALS BORDA	A – BARRANQUILLITA NUEVO	KR 12 No 72 60 SUR	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
	546	USME	SANTA LIBRADA	A – SANTA LIBRADA	CL 75 A SUR No 1 B 45 ESTE	1 DE DICIEMBRE 2025
	1917	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	A – ESTRELLA I	KR 17 P No 72 25 SUR	1 DE DICIEMBRE 2025
	1913	CIUDAD BOLIVAR	SIERRA MORENA	C – DIVINO NIÑO	TV 46 A No 79 D 15 SUR	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
	548	USME	TENERIFE - GRANADA	A – TENERIFE	CRA. 14B BIS #91 SUR 14	09 DE MARZO DE 2026
	1959	CIUDAD BOLIVAR	GUILLERMO CANO ISAZA	A – GUILLERMO CANO	CRA. 16A #62 - 35 SUR	12 DE ENERO DE 2026

ESTADO DE FRENTE DE OBRA


SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMANA	ESTADO DE EJECUCION
UNION EUROPEA	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	• EJECUTADO AL 100%	AVANCE DEL 100%
ORLANDO FALS BORDA	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	• SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS • ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	AVANCE DEL 100%
SIERRA MORENA	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	• SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45	ATRASO DEL 4,63 %
ARBORIZADORA BAJA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	• EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN • PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI	ATRASO DEL 1,53 %
FABIO LOZANO SIMONELLI	1 DE DICIEMBRE DE 2025	• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO	ATRASO DEL 1,57 %
ESTRELLA DEL SUR – sede B	1 DE DICIEMBRE DE 2025	• EJECUTADO AL 100%	AVANCE DEL 100%
CALASANZ (BUENAVISTA)	9 DE DICIEMBRE DE 2025	• EJECUTADO AL 100%	AVANCE DEL 100%
SANTA LIBRADA	1 DE DICIEMBRE DE 2025	• RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M • PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES • SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE	ATRASO DEL 23,11%
ESTRELLA DEL SUR – SEDE A	9 DE DICIEMBRE DE 2025	• EJECUTADO AL 100%	AVANCE DEL 100 %
GUILLERMO CANO ISAZA	12 DE ENERO DE 2026	• VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO	ATRASO DEL 5,34 %

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

SEDE EDUCATIVA	INICIO DE OBRA	ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA	ESTADO DE EJECUCION
TENERIFE	09 DE MARZO DE 2026	• NO SE EJECUTO ACTIVIDADES EN LA SEMANA	AVANCE DEL 79,22 %

ESTADO DE FRENTE DE OBRA

AVANCE GENERAL				
	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO	
AVANCE	86,02%	11,61%	81,32%	
PROGRAMADO	86,39%			
ATRASO	-0,37%	EN EJECUCION		

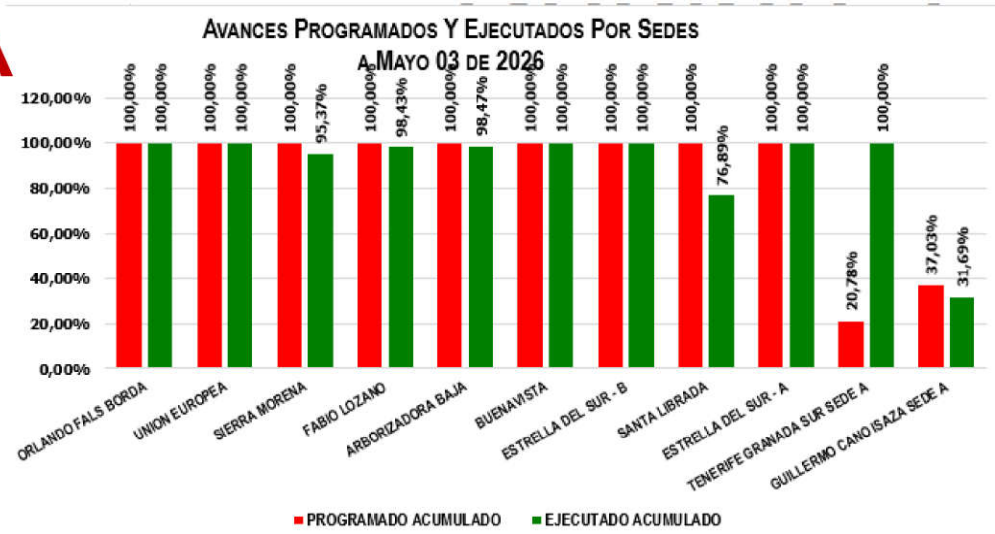


CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	100,00%	100,00%	→	100,00%	↑	$ 168.920.087	$ 168.920.087	10/11/2025	28/02/2026
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100,00%	100,00%	→	100,00%	↓	$ 165.727.196	$ 165.727.196	18/11/2025	21/02/2026
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	96,06%	95,37%	↓	100,00%	↓	$ 113.917.854	$ 108.648.799	10/11/2025	18/04/2026
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	98,76%	98,43%	↓	100,00%	↓	$ 234.917.032	$ 231.228.088	1/12/2025	11/04/2026
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	98,48%	98,47%	↓	100,00%	↓	$ 632.970.974	$ 623.292.062	24/11/2025	28/02/2026
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	100,00%	100,00%	→	100,00%	✓	$ 186.103.596	$ 186.103.596	10/12/2025	21/03/2026
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100,00%	100,00%	→	100,00%	↓	$ 72.206.451	$ 72.206.450	1/12/2025	14/03/2026
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	60,35%	76,89%	↑	100,00%	↓	$ 219.755.203	$ 168.977.700	15/01/2026	2/05/2026
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100,00%	100,00%	→	100,00%	↑	$ 75.074.063	$ 75.074.063	15/01/2026	28/02/2026
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	76,90%	100,00%	↑	20,78%	↑	$ 102.227.058	$ 102.227.058	9/03/2026	7/06/2026
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	21,49%	31,69%	↑	37,03%	↑	$ 379.449.204	$ 120.255.347	13/01/2026	19/06/2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

SIERRA MORENA- SEMANAL



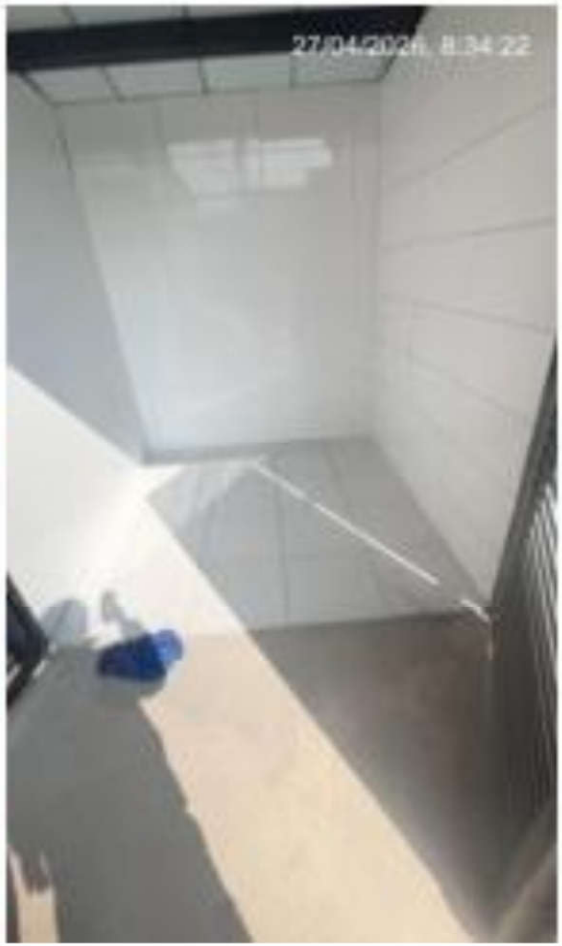



REGISTRO FOTOGRAFICO

ARBORIZADORA BAJA – SEMANAL





REGISTRO FOTOGRAFICO

FABIO LOZANO – SEMANAL









REGISTRO FOTOGRAFICO

SANTA LIBRADA – SEMANAL

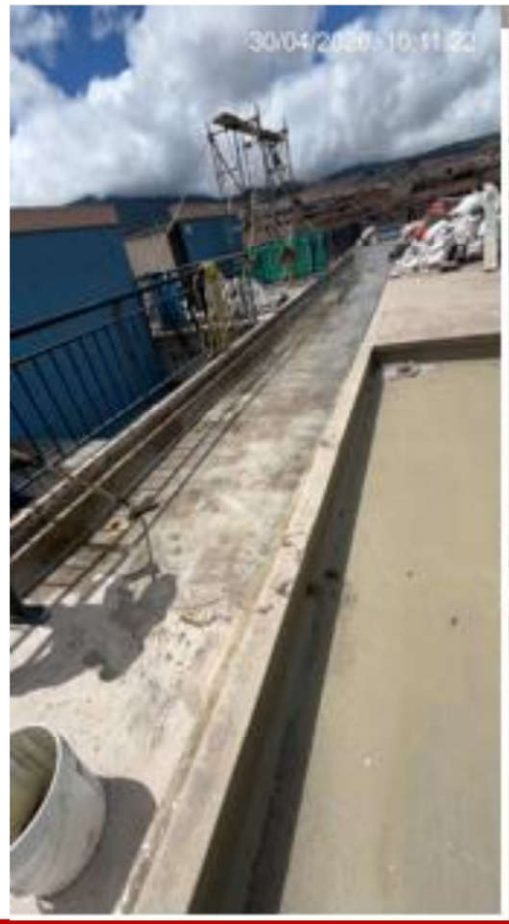

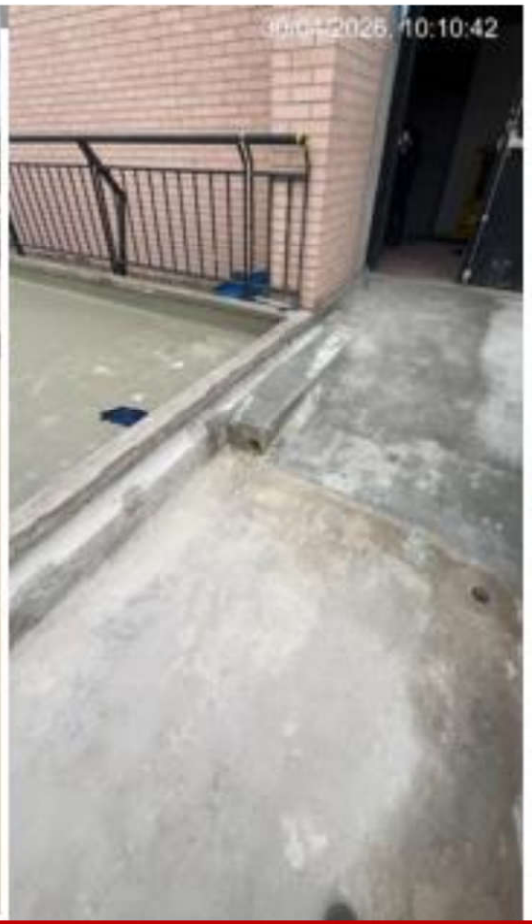



REGISTRO FOTOGRAFICO

GUILLERMO CANO ISAZA





REGISTRO FOTOGRAFICO

CALASANZ BUENAVISTA- EMERGENCIA





OBSERVACIONES / COMPROMISOS

- **Fecha de entrega de DILE usme – en tramite**
- **Subsanación de los manuales de mantenimiento - 4/5 de mayo**
- **Actualización de presupuesto y cronograma de emergencia Arborizadora baja – 20 mayo**
- **Atención a emergencia Guillermo cano Isaza – 05 mayo**
- **Presentación de programacion y presupuesto de segunda emergencia de Calasanz -**

ANEXO No. 4. PLANILLAS DE PAGO

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-12, 03:43:12 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1080952276

Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: abril de 2026 | Referencia pago 8823866386

PAGADA 05/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA YANNETH REYES MORA		
Documento	CC52215311	Dirección	CR 53 #14 - 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3202586895
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52215311	DIANA YANNETH REYES MORA	3	0																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$1,750,905	$280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,750,905	$218,900	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$0	$0	$280,200	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100	$0	$499,100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-04-27, 03:08:37 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 85252832

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

Fecha limite de pago: 2026-05-21

GUARDADA 27/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BUITRAGO GONZALEZ CARLOS SANTIAGO				
Documento	CC1020822976	**Dirección**	CR 38 #15 - 19		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3182651714		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020822976	BUITRAGO GONZALEZ CARLOS SANTIAGO	03	00		X														0	30	30	0	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700	$ 0	$ 509.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73129912	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73129912	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018462373	CASTAÑEDA MESIAS JOHN FREDDY	57	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016043952		BERMUDEZ ANDRADE ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 #47-82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3168254288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	202912484	9502794977	I	2026/05/14	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,004,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$1,004,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$1,004,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$1,004,000
1	CC	1016043952	BERMUDEZ ANA																	25-14	30	$2,680,000	$428,800	EPS005	30	$2,680,000	$335,000	CCF24	30	$2,680,000	$53,600	14-11	30	$2,680,000	6.960%	$186,600	30	$0	$0	No	$1,004,000
Total	**Afiliados(1)**																					$2,680,000	$428,800			$2,680,000	$335,000			$2,680,000	$53,600			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$1,004,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$428,800	$0	$0	$428,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$428,800	$0	$0	$428,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,600	$0	$0	$186,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$186,600	$0	$0	$186,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$0	$0	$53,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$335,000	$0	$0	$335,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$335,000	$0	$0	$335,000
TOTAL				**1**	**$1,004,000**	**$0**	**$0**	**$1,004,000**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE URIEL VANEGAS LOPEZ identificado(a) con CC 13707079 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUARDAS DE COLOMBIA LTDA GUARDACOL LTDA NI 800064114

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	302841513	9504613555	E	2026-05-12									X		X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	28	16%	$3,414,226	$546,300
AFP	PROTECCION	2	16%	$151,751	$24,300
ARL	COLPATRIA ARP	28	6.96%	$3,414,226	$237,700
ARL	COLPATRIA ARP	2	0%	$151,751	$0
CCF	COLSUBSIDIO	28	4%	$6,217,066	$248,700
CCF	COLSUBSIDIO	2	0%	$0	$0
EPS	SALUD TOTAL	28	4%	$3,414,226	$136,600
EPS	SALUD TOTAL	2	4%	$151,751	$6,100

Este certificado se expide el día 2026-05-13 a las 05:02.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-04, 10:20:15 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 97023712

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 01/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON QUINTERO ACEVEDO		
Documento	CC1053831407	**Dirección**	CR 69C #1 - 33 LA IGUALDAD
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8964867
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053831407	JHON JAIRO QUINTERO ACEVEDO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 437.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 437.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.500	$ 0	$ 997.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81963760	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$536.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	235.000	0		0		0	1	200	0	235.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	300.800	0	0	0	0	1	300	0	301.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	235.000	235.200
Pensión	1	300.800	301.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	535.800	536.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81963760	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$536.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvalo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 8767031	VILLAZON GUTIERREZ HECTOR JOSE	3	0			N																	25-14	1.880.000	30	300.800	0	0	0	0	EPS042	1.880.000	30	235.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ	calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	14/04/2026	67554775	$620.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades						Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización											
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	121.800							121.800			76	121.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.800	121.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	620.900	620.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ		calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SIBATÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	14/04/2026	67554775	$620.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	57	0			N																	230201	1.750.000	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	218.900	14-4	1.750.000	1	121.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099209679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA JUDITH PARDO DUARTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANS 65 59 21 SUR TORRES DE	TELÉFONO:	4202020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013421455**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		266699991

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	656.700	0		0		0	0	0	0	656.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	365.700				365.700	0	0	365.700			3.657	365.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	656.700	656.700
Pensión	2	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	365.700	365.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.863.000	1.863.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1024465811	PAREDES SERRANO FABIAN ADOLFO	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1026289628	CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 1030640730	MOLANO GALLO IVAN RENE	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 04:06:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081284379

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 14/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARILYN OSPINA LOPEZ		
Documento	CC1120574429	**Dirección**	CL 19A #28 A - 114 DIVINA NIÑO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	65840040
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Departamento**	GUAVIARE
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1120574429	MARILYN OSPINA LOPEZ	57	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.000	$ 1.800	$ 622.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80229176	JUAN CARLOS CORTES CORTES	Cll 3 A Sur No 19 42 Apto 502	6015974562	ingcortesjc@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78068368	28/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$928.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.800				16.800	0	0	16.800			168	16.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	400.000	400.000
Pensión	1	512.000	512.000
Riesgos Laborales	1	16.800	16.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.800	928.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80229176	JUAN CARLOS CORTES CORTES	Cll 3 A Sur No 19 42 Apto 502	6015974562	ingcortesjc@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78068368	28/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$928.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80229176	CORTES CORTES JUAN CARLOS	57	0			N																	231001	3.200.000	30	512.000	0	0	0	0	EPS008	3.200.000	30	400.000	14-11	3.200.000	30	1	16.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900208425-6	SEIING SAS	transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77427303	11/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$10,505,430	$2.248.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	3	400	0	140.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.400	0		0		0	3	700	0	281.100	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	3	700	0	280.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	3	700	0	280.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	3	1.300	0	561.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	280.600				280.600	3	700	281.300			2.806	281.300	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	420.600	3	1.000	421.600	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	420.600	421.700
Pensión	3	1.120.800	1.123.500
Riesgos Laborales	1	280.600	281.300
CCF	1	420.600	421.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.242.600	2.248.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900208425-6	SEIING SAS		transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77427303	11/05/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$10,505,430	$2.248.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiando	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19307265	GUTIERREZ SEGURA HORACIO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 24756524	GONZALEZ MEJIA MARIA LETICIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 53037176	GARZON UZETA NOHORA LEONOR	1	0			S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79207204	CANTOR RIVERA FREDY	1	0			S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 80070003	GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO	1	0			S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 80257171	SIERRA HERNANDEZ EDWIN FERNANDO	1	0			S																		230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901449393
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARINSEGUROSAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 97 # 70C 69	TELÉFONO:	7068824
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6017724371**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		266106800	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901094289-2	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS	CL 98 70 91 OF 703	6013688490	financieraconsorciosarinco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80481794	11/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$28,005,430	$6.965.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.050.600	0		0		0	0	0	0	1.050.600	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.640.700	0	0	87.500	87.500	0	0		3.815.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	347.600				347.600	0	0	347.600			3.476	347.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	980.400	0	0	980.400	5
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	140.300	0	0	140.300	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.120.700	1.120.700
Pensión	2	4.376.100	4.376.100
Riesgos Laborales	1	347.600	347.600
CCF	2	1.120.700	1.120.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.965.100	6.965.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901094289-2	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS	CL 98 70 91 OF 703	6013688490	financieraconsorciosarinco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80481794	11/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$28,005,430	$6.965.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000688837	CAÑON GUERRERO KAREN NATALIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1018489482	CEBALLOS GARCIA JULIETH STEFANIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1082861645	RAMIREZ CURIEUX REBECA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS005	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	5	97.500	CCF33	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
4	CC 1082861645	RAMIREZ CURIEUX REBECA PATRICIA	1	0			S												X					230301	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS005	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	5	0	CCF33	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
5	CC 36522707	CURIEUX DE CASTILLO LIDICE MERCEDES	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79602923	CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	1	0			S																	230301	17.500.000	30	2.800.000	0	0	87.500	87.500	EPS005	17.500.000	30	700.000	14-11	17.500.000	30	1	91.400	CCF24	17.500.000	30	700.000	0	0	0	0	0
7	CC 84452367	CURIEUX BORJA JHAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF33	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 84456959	CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO No. 5. CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES

NIT. 901.977.271-0

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 - ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

En mi condición de Revisora Fiscal de la sociedad CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, identificada con NIT. N° 901.977.271-0, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de pensiones, Riegos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra a paz y salvo y ha realizado los respectivos pagos durante los seis (6) meses anteriores a esta certificación.

Respecto a los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la sociedad se encuentra exonerada de acuerdo con lo señalado taxativamente en el inciso 1 del artículo 65 de la ley 1819 de 2016, el cual adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario “Exoneración de aportes”.

Así mismo, respecto a los pagos laborales, por prestación de servicios y no laborales del personal vinculado, la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto prestacional, salarial y no salarial.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

Se expide en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de mayo del año 2026.

Atentamente,

ARQ. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA GLADYS RINCON HURTADO
TP 126815-T
Revisora Fiscal

OFICINA PRINCIPAL
CALLE 98 No. 70-91
TELEFAX 3688490
BOGOTA, D.C.
propuestas@arincosas.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.674.785**

RINCON HURTADO

APELLIDOS

MARIA GLADYS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-NOV-1978**

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-MAR-1997 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0707900-00129117-F-0046674785-20081118 **0006**260471A 1 7300010240

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



126815-T

MARIA GLADYS
RINCON HURTADO
C.C. 46674785
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136938

FIRMA DEL TITULAR 48430

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E70DE46E26F932E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA GLADYS RINCON HURTADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46674785 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 126815-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO No. 6. ACTA DE INTERVENTORIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 6

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **CO1.PCCNTR.8169110 - 2025**

ACTA CORRESPONDIENTE AL COBRO FIJO MENSUAL: 06 DE MARZO AL 05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE CORTE FINAL DEL AVANCE DE OBRA: 05 DE MARZO DEL 2026

CONTRATISTA : CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 2

DIRECCION : CALLE 98 NO. 70-91

C.C. ó NIT : 901.977.271-0 — **ESTABLECIMIENTO :** GRUPO No.2 (ZONA SUR) CIUDAD BOLIVAR - USME — **PLAZO INICIAL :** 7 MESES

TELEFONO : 6013688490 — **FECHA INICIACION :** 06 DE OCTUBRE DEL 2025

SUPERVISOR: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA — **LOCALIDADES :** 5 Y 19 — **FECHA TERMINAC.INICIAL :** 05 DE MAYO DEL 2026

DIRECCION : Av. El dorado No. 66 -63 — **VR. INICIAL :** $ 796.184.131,00 — **PLAZO ADICIONAL :** 1,5 MESES

C.C. ó NIT : 79,258,415 — **VR. ADICIONAL :** $ 128.425.720,00 — **TIEMPO SUSPENDIDO :**

TELEFONO : 3241000 EXT.3149 — **VR. FINAL :** $ 924.609.851,00 — **PLAZO TOTAL :** 8,5 MESES

FECHA TERMINACION FINAL : 20 DE JUNIO DEL 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1984	10-mar-25	5012	5-sep-25	$ 796.184.131,00	$ 484.376.746,00	$ 265.555.239,00	$ 218.821.507,00
3698	5-dic-25	7587	23-dic-25	$ 128.425.720,00	$ 128.425.720,00		$ 128.425.720,00
TOTALES				$ 924.609.851,00	$ 612.802.466,00	$ 265.555.239,00	$ 347.247.227,00

A PAGAR **$ 265.555.239,00** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES / INTERVENTORIA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO DIRECTO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	PAGOS FIJO MENSUAL DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO	MES	7,00	$ 38.232.131,14	$ 267.624.917,98	2,00	$ 76.464.262,28	5,00	$ 191.160.655,70	7,00	$ 267.624.917,98	100,00%
2	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.4 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.4	%	100,00%	$ 148.563.595,22	$ 148.563.595,22	19,42%	$ 28.855.438,96	38,59%	$ 57.330.691,40	58,01%	$ 86.186.130,36	58,01%
3	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.5 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.5	%	100,00%	$ 124.714.573,22	$ 124.714.573,22	14,10%	$ 17.584.237,95	25,94%	$ 32.350.960,29	40,04%	$ 49.935.198,24	40,04%
4	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.6 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.6	%	100,00%	$ 128.159.208,53	$ 128.159.208,53	60,12%	$ 77.047.685,75	17,21%	$ 22.056.199,79	77,33%	$ 99.103.885,54	77,33%
	COSTO DIRECTO				**$ 669.062.294,95**		**$ 199.951.624,94**		**$ 302.898.507,18**		**$ 502.850.132,12**	**75,16%**

MODIFICACION No.1 / INTERVENTORIA ADICIONAL EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO DIRECTO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	PAGOS FIJO MENSUAL DURANTE EL PLAZO DE MODIFICACION DEL CONTRATO	MES	1,50	$ 28.778.872,83	$ 43.168.309,25							
2	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.4 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.4	%	100,00%	$ 17.447.172,59	$ 17.447.172,59	19,42%	$ 3.388.756,33	38,59%	$ 6.732.863,90	58,01%	$ 10.121.620,23	58,01%
3	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.5 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.5	%	100,00%	$ 18.740.152,58	$ 18.740.152,58	14,10%	$ 2.642.283,85	25,94%	$ 4.861.195,58	40,04%	$ 7.503.479,42	40,04%
4	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.6 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.6	%	100,00%	$ 28.565.138,69	$ 28.565.138,69	60,12%	$ 17.172.997,98	17,21%	$ 4.916.060,37	77,33%	$ 22.089.058,35	77,33%
	COSTO DIRECTO ADICION				**$ 107.920.773,11**		**$ 23.204.038,16**		**$ 16.510.119,85**		**$ 39.714.158,00**	**36,8%**

RESUMEN EJECUTIVO

			PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 776.983.068,06**	**$ 223.155.663,10**	**$ 319.408.627,03**	**$ 542.564.290,13**	**69,83%**
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	**19%**	**$ 147.626.782,94**	**$ 42.399.575,99**	**$ 60.687.639,15**	**$103.087.215,14**	**69,83%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 924.609.851,00**	**$ 265.555.239,09**	**$ 380.096.266,18**	**$645.651.505,27**	**69,83%**
AJUSTE AL PESO SEGÚN			**-$ 0,09**	**-$ 0,18**	**-$ 0,27**	
VALOR A PAGAR EN ACTA			**$ 265.555.239,00**	**$ 380.096.266,00**	**$ 645.651.505,00**	
DESCUENTO POR ANS PARA EL ACTA (Luego de lo acordado entre las partes el descuento es de)		**$ -**				
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		**278.958.346,00**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**	

CONTRATISTA — **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
Nit/ C.C **901.977.271-0**
REP. LEGAL **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**
C.C. **79.602.923**

APOYO A LA SUPERVISION — **SANTIAGO ANGEL URBIBE**
Nit/CC. **79.598.873**

SUPERVISOR — **JORGE ALBERTO MORENO ALDANA**
Nit/ C.C **79.464.477**

ANEXO No. 7. REGISTRO CAPACITACIONES

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 8 de 2025
	Versión:	01
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota.	Colegio alborada bosa	29	04	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? uso de EPP posturas prolongadas y prevención
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Arturo Suarez Bernal	1023939807	Auxiliar	
2	Jhon Alexander Espinosa	1935806[illegible]	Auxiliar	
3	Wilson Alexander [illegible]	2983911	Auxiliar	Carlos Nov.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:	Agosto 8 de 2025
		Versión:	01
			Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota.	Colegio Santa Librada	27	04	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad	X	postura prolongadas
Reuniones de SST / Operativas		uso de EPP.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Orlando Cobaa	79456299	MAESTRO	Orlando C.
2	Elkin Ortiz	1003392819	Aprendiz	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Edinson Farelo	Edinson Farelo

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Colsan 7	27	04	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? Uso adecuado de EPP. Postura prolongada
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Yhon Ruiz	79667531	oficial	
2	STEVEN JIMENEZ	1076556316	MAESTRO	
3	Wilson Alberto Lopez Perez	1024546955	aux	
4	FELIPE Devia	1024500839	aux	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Ferro	Edinson Ferro

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025 Versión: 01 Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Cano Ibata	27	04	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? posturas prolongadas uso de EPP
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jairo Millan	1049761a	CE	
2	Hector Mora	1033614 9.	Maestro	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edwan Ferro	Edwan Ferro

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025
	Versión: 01
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Orlando Fals Borda	20	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál? gestión de Sustancias químicas y residuos peligrosos (PGRESPEL) Consumo Sostenible y compras verdes
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Orlando Gomez	79486299	Docente	
2	Elkin Ortiz	1033392819	Aprendiz	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025
	Versión: 01
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Colegio Celestin	30	04	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cual? Gestion de Sustancias Quimicas y residuos Peligrosos (GESPEL) Consumo Sostenible y Compras verdes
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	
Otra		

No.	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Wilder Alfonso Mora	1116256555	aux	
2	Ingrid Ruiz	79467531	Operativa	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Ferro	Edinson Ferro

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS:	FT-SST-027
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 8 de 2025	
	Versión: 01	
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogota	Colegio Santa Librada	20	04	26

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		¿Cuál?
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo	X	Gestion de sustancias Quimicas y residuos peligrosos CRESPO
Otra		Consumo sostenible y compras verdes

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Andres Mauricio Tamara Gomez	1.016.076.090	Contratista	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Edinson Forero	Edinson Forero

Powered by CamScanner

ANEXO No. 8. REGISTRO FOTOGRAFICO






Fotografía No.1: Realización de paso, para Bajante, placa zona cafetería.





Fotografía No.2: Instalación de vidrio en claraboya, placa rectoría

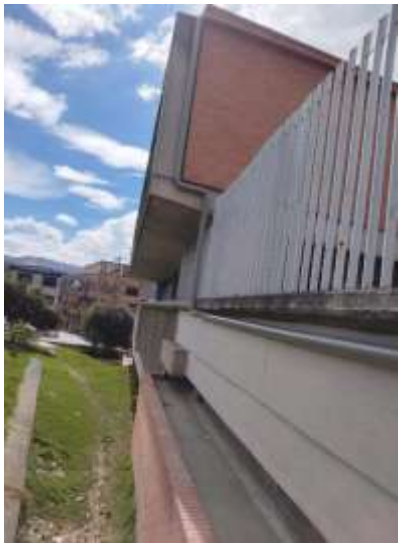

Fotografía No.3: Instalación Bajante manejo de agua placa rectoría



Fotografía No.4: Instalación Bajante conexión placa rectoría – placa cafetería.

Tabla 18 - Registro fotográfico Colegio Orlando Fals
Fuente: Propia

 	 
Fotografía No.5: Instalación cubierta tipo sándwich	**Fotografía No.6:** Pintura de muros colindantes, a la rampa y a la cancha deportiva.
 	 
Fotografía No.7: Terminación pintura muros colidantes rampa – Pintura cancha deportiva.	**Fotografía No.8:** Instalación puerta tipo reja, instalación de enchape cuarto de depósito de residuos.

Tabla 19 - Registro fotográfico Colegio sierra morena
Fuente: Propia

 	 
Fotografía No.9: Instalación cerramiento contra impacto de 2.5 m	**Fotografía No.10:** Instalación piso tipo vinilo – Bloque primera infancia.
 	 
Fotografía No.11: Instalación cerramiento contra impacto de 5.0 m	**Fotografía No.12:** Fundida Placa – parte interior cancha costado cerramiento 2.5 m

Tabla 20 - Registro fotográfico Colegio Arborizadora Baja
Fuente: Propia





Fotografía No.13: Adecuación caja de inspección, impermeabilización zona colindante aula de laboratorio.





Fotografía No.14: Instalación de grifería para lavamanos.





Fotografía No.15: Instalación de aparatos sanitarios zona baños



Fotografía No.16: Instalación de aparatos sanitarios zona baños

Tabla 21 - Registro fotográfico Colegio Fabio Lozano Simonelli
Fuente: Propia



Fotografía No.17: Aseo, Aula Múltiple



Fotografía No.18: Aseo, Aula Múltiple



Fotografía No.19: Aseo, Aula Múltiple




Fotografía No.20: Aseo, Aula Múltiple

Tabla 22 - Registro fotográfico Colegio Calasanz
Fuente: Propia

 	 
Fotografía No.21: Prueba de estanqueidad	**Fotografía No.22:** Picado de membrana – zona corredora
 	 
Fotografía No.23: Adecuación Rampas	**Fotografía No.24:** Impermeabilización con Poliurea

Tabla 23 - Registro fotográfico Colegio Santa Librada
Fuente: Propia





Fotografía No.25: Enchape baños Bloque b – Tercer piso





Fotografía No.26: Instalación mesones en policuarzo





Fotografía No.27: Instalación División en acero inoxidable





Fotografía No.28: Instalación División en acero inoxidable

Tabla 24 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza
Fuente: Propia





Fotografía No.29: Impermeabilización Tanque agua potable



Fotografía No.30: Instalación Baranda zona de escaleras





Fotografía No.31: Instalación Baranda zona de escaleras



Fotografía No.32: Instalación Pasamanos

Tabla 25 - Registro fotográfico Colegio Tenerife Granada Sur Sede A
Fuente: Propia

ANEXO No.09. RELACION DE CORRESPONDENCIA

ANEXO 1	CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SED-CM-A-DCCEE-018-2025.
PERIODO: ABRIL 2026	
FECHA: 30 DE ABRIL	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
VERSION: 1	

No. CONSECUTIVO	TIPO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	GRUPO	ASUNTO	MODO DE RADICACION	ARCHIVO	ELABORADO POR:	No. RADICADO
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA										
SERINCO-SDE-L5-2025-001	COMUNICACIÓN	8 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-002	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-003	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-004	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-005	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-006	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-007	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-008	COMUNICACIÓN	9 sep 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-009	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	RADICACIÓN DE POLIZA EN FISICO				
SERINCO-SDE-L6-2025-010	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-011	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-012	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-013	COMUNICACIÓN	1 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-014	COMUNICACIÓN	3 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-015	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-016	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-017	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-018	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-019	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L5-2025-001 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-020	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-002 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L4-2025-021	COMUNICACIÓN	6 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-004 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-022	COMUNICACIÓN	7 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-023	COMUNICACIÓN	7 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-024	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION OBSERVACIONES PRESUPUESTOS POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-025	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE OBSERVACIONES A PRESUPUESTO POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-026	COMUNICACIÓN	8 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SERINCO-SDE-2025-026-L5-REMISION DE OBSERVACIONES A LOS PRESUPUESTOS POR SEDE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON	
SERINCO-SDE-L5-2025-027	COMUNICACIÓN	9 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-028	COMUNICACIÓN	9 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGUN ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-029	COMUNICACIÓN	10 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-030	COMUNICACIÓN	14 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION DE HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DE RESIDENTE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-031	COMUNICACIÓN	15 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	TRASLADO SED-CF-L5-2025-004	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-032	COMUNICACIÓN	15 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-033	COMUNICACIÓN	17 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-034	COMUNICACIÓN	17 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE REMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-035	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-036	COMUNICACIÓN	20 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	NO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-037	COMUNICACIÓN	21 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-038	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-039	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	TRASLADO SED-CF-L5-2025-005 - PMT	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-040	COMUNICACIÓN	22 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-041	COMUNICACIÓN	23 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-042	COMUNICACIÓN	24 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-043	COMUNICACIÓN	24 oct 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-044	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-045	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-046	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-047	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 6	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-048	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-049	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-050	COMUNICACIÓN	28 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-051	COMUNICACIÓN	29 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-052	COMUNICACIÓN	31 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-053	COMUNICACIÓN	31 oct 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-054	COMUNICACIÓN	4 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD AJUSTE DE APU E INFORMACION PENDIENTE POR ENTREGA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L4-2025-057	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-058	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L6-2025-059	COMUNICACIÓN	7 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L6-2025-060	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTACION PARCIAL APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L6-2025-061	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-062	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTACION PARCIALAPROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L6-2025-063	COMUNICACIÓN	10 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	LISTADO DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L4-2025-064	COMUNICACIÓN	11 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO 046-ARSAF-2025 - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA PARA LA SELECCIÓN DE [illegible]	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L6-2025-065	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-066	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-067	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-068	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	AJUSTE DE PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-069	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-070	COMUNICACIÓN	12 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RECOMENDACIONES PARA APROBACIÓN DE LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-071	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-072	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-073	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-074	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-075	COMUNICACIÓN	13 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-076		13 nov 2025		CONSORCIO PAIS	LOTE 6	ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-077	COMUNICACIÓN	14 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES E INGRESO DEL PERSONAL - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-078	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-079	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SDE-L5-2025-080	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SDE-L5-2025-081	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-082	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-083	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME PRELIMINAR	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-084	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISIÓN CUENTA No. 1 - COSTOS FIJOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-085	COMUNICACIÓN	18 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REITERACION DE REMISION DE INFORMACION SOLICITADA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-086	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-087	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-088	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-089	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-090	COMUNICACIÓN	19 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SDE-L5-2025-091	COMUNICACIÓN	20 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	TRASLADO DE REMISION DE BALANCE Y ALCANCE – Colegio Guillermo Cano Isaza - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-092	COMUNICACIÓN	21 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-093	COMUNICACIÓN	20 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-094	COMUNICACIÓN	21 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	TRASLADO DE COMUNICADO - OFI-SED-L6-041, APANTALLAMIENTO CUBIERTA BLOQUE [illegible]	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-095	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		REMISIÓN CUENTA No. 2 - COSTOS FIJOS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SDE-L5-2025-096	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SDE-L5-2025-097	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SDE-L5-2025-098	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SDE-L5-2025-099	COMUNICACIÓN	24 nov 2025	C SERINCO	CONTRATISTAS	LOTE 4,5 Y 6	REMISIÓN FORMATO DE INFORME MENSUAL SST	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-100	COMUNICACIÓN	25 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLI

SERINCO-SED-L5-2025-101	COMUNICACIÓN	25 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-102	COMUNICACIÓN	25 nov 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-103	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	LLAMADO DE ATENCIÓN IMPLEMENTACIÓN EPP, INGRESO PERSONAL Y BITACORAS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-104	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO DE PROPUESTA DE BAJANTES Y GÁRGOLAS – IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-105	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - IED LOS TEJARES SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-106	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud de Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-107	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Comunicado OFI-SED-L6-045. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-108	COMUNICACIÓN	26 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Comunicado N° 067-ARSAF-2025. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-109	COMUNICACIÓN	27 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	RECOMENDACIONES SG-SST	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-110	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Comunicado OFI-SED-L6-050. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prorroga CTO 8154780-L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-111	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance al Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-112	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	OBSERVACIONES NP - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-113	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL MINUTO DE BUENOS AIRES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-114	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-047 - Alcance - Solicitud de Modificación Plazo de Ejecución Colegio Santa Librada Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-115	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-116	COMUNICACIÓN	28 nov 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-117	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-118	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-119	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	TRASLADO DE PROPUESTA ESQUEMA CERRAMIENTO COLEGIO LA ARABIA - Col La Arabia	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-120	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-121	COMUNICACIÓN	1 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORÍA	Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga. - Cto Interventoria	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-122	COMUNICACIÓN	2 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Reiteración por Incumplimiento Parcial de las Obligaciones Contractuales - Grupo 2 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-123	COMUNICACIÓN	4 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-124	COMUNICACIÓN	4 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto de Emergencia CEIF 1931 - IED El Minuto de Buenos Aires, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-125	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado con Asunto Solicitud Autorización Ingreso de Equipo - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-126	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de ensayos según especificaciones tecnicas - Col Jose Jaime Rojas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-127	COMUNICACIÓN	5 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - DIRECCION LOCAL DE USME - CDE 501	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-128	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-129	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-130	COMUNICACIÓN	9 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-131	COMUNICACIÓN	11 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-046 Solicitud de Modificación fecha de inicio intervención Colegios Santa Librada Sede A y Estrella del Sur Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-132	COMUNICACIÓN	11 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-133	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Asistencia del Director de Obra a los Comités Presenciales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-134	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales – Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-135	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales – Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-136	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales – Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-137	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Observaciones Informe Mensual No. 1 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-138	COMUNICACIÓN	12 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Comunicados No. 073 ARSAF - 2025 y No. 080 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE CONCEPTO ESTRUCTURAL CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A - V1 Y V2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-139	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-140	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-141	COMUNICACIÓN	15 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-142	COMUNICACIÓN	16 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-071. Hallazgo de Dos Capas de Piso en Cerámica y Alistado	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-143	COMUNICACIÓN	16 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Alcance al Comunicado SERINCO-SED-L6-2025-132 - Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-144	COMUNICACIÓN	17 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-145	COMUNICACIÓN	17 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-146	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Comunicado SED-CF-L5-2025-013 y Aprobación Concepto Estructural Losa de Piso Don Bosco - La Joya - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-147	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	CONSTRUCTORA PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-148	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-149	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-150	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-151	COMUNICACIÓN	18 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-152	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L4-2025-153	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-LX-2025-154	COMUNICACIÓN	19 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION		Remisión Acta Costos fijos y costos variables - Periodo (06.11.25 al 05.11.25) - Interventoria	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L4-2025-155	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-156	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-157	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-158	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Actividades en Ejecución I.E.D. Estrella del Sur Sede B – Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-159	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-160	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-161	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L5-2025-162	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L6-2025-163	COMUNICACIÓN	22 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L4-2025-164	COMUNICACIÓN	26 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a Radicado No. 091 ARSAF – 2025. Solicitud de información – Actividades no previstas (APUS)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-165	COMUNICACIÓN	26 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado comunicado Radicado N.° 092-ARSAF-2025 y solicitud de disposición de punto de acopio - IED M	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-166	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-167	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado Comunicado RADICADO N° 080-ARSAF-2025 y Aprobación Concepto Estructural CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A – LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-168	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-169	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-170	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas – I.E.D. Unión Europea Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-171	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Diseño de cubierta Biblioteca y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-172	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado Diseño de cubierta Orientación y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-173	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-079. Radicación presupuesto y esquema manejo Aguas Lluvias Unión Europea Sede B	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-174	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-080. Radicación presupuesto y diagnóstico Dirección Local de Educación de Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-175	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas – I.E.D. Arborizadora Baja, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-176	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-073 - Mejoramiento Cancha Multideportiva Norte Colegio Arborizadora Baja Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-177	COMUNICACIÓN	29 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Llamado de atención SST - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-178	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22, 7.2.23 y 14.4.25 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-179	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado Comunicado OFI-SED-L6-082 - Alcance OFI-SED-L6-071 Hallazgo dos Capas de Piso en Cerámica y Alistado	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-180	COMUNICACIÓN	31 dic 2025	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación de un Plan de Contingencia - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-181	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 097 Arsaf - 2025 - Hallazgos en Red Eléctrica I.E.D Compartir Pesquero Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-182	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-183	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-184	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-185	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a Radicado No. 096 Arsaf - 2025 - Remisión de Dosificación de Concreto Utilizado Para Placas de Baños, Pasillos y Andenes	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-186	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Situación Presentada en el Piso del Bloque de Primera Infancia del Colegio Arborizadora Baja	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-187	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-188	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22, 7.2.23 y 14.4.25 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-189	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-190	COMUNICACIÓN	5 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-191	COMUNICACIÓN	7 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Acabados en la Instalación de Cubierta Colegio Arborizadora Baja - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-192	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L5-2025-193	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L6-2025-194	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-INT-2025-195	COMUNICACIÓN	8 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISION CUENTA DE INTERVENTORIA No. 3	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-L4-2025-196	COMUNICACIÓN	9 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Entrega de Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-197	COMUNICACIÓN	9 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Entrega del Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-198	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-199	COMUNICACIÓN	13 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	

SERINCO-SED-LX-2025-207	COMUNICACIÓN	15 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RETIRO DE ACOPIO MATERIAL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA BERMUDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-208	COMUNICACIÓN	15 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	ALCANCE SERINCO-SED-L5-2025-193-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-209	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	ALCANCE SERINCO-SED-L6-2025-194-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-210	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frentes de Obra - Colegio Unión Europea Sede B, Colegio Estrella del Sur Sede A, Colegio Estrella del Sur Sede B, y Requerimientos del Colegio	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-211	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22, 7.2.23 y 16.1.25 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-212	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-213	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-214	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-215	COMUNICACIÓN	16 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SERINCO-SED-2025-215-L4-Traslado de RADICADO No. 106 ARSAF - 2025 - NOVEDAD ENTREGA DI	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-216	COMUNICACIÓN	17 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	ALCANCE SERINCO-SED-L4-2025-192-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-217	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-218	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-219	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación Inmediata de un Plan de Contingencia - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-220	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-221	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-222	COMUNICACIÓN	19 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-223	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-224	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO DE RADICADO No. 116 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE INCIO FRENTE DE OBRA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE C	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-225	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-226	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-227	COMUNICACIÓN	20 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-228	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-229	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L5-2025-230	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de entregables pendientes - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-231	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicados OFI-SED-L6-109 y OFI-SED-L6-110	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-232	COMUNICACIÓN	21 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de documentación requerida por la SED - Atenciones de emergencia - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-233	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-234	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-235	COMUNICACIÓN	22 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Comunicado Radicado No. 104 ARSAF-2025-Remisión de Informes Avifauna y Silvicultural-Atención de Emergencias de Tala y Poda	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-236	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-237	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-238	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-239	COMUNICACIÓN	23 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segundo llamado de atención SST - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-240	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-241	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-242	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-243	COMUNICACIÓN	26 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Orden y Aseo en las Diferentes Sedes Intervenidas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-244	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	SED - CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Compromisos Adquiridos en Mesa de Trabajo IED Los Tejares - Enero-23-2026	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-245	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Mantener en Buen Estado de Cerramiento Provisional IED Unión Europea.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-246	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Información Sobre el inicio de Actividades de Obra en la IED Guillermo Cano Isaza	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-247	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-248	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-249	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-250	COMUNICACIÓN	27 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-251	COMUNICACIÓN	28 ene 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Estado de las Obras en IED Confederación Brisas del Diamante	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-252	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-253	COMUNICACIÓN	29 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frente de Obra y Cerramiento Provisional en I.E.D. Unión Europea - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L5-2025-254	COMUNICACIÓN	30 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia de Personal Operativo en I.E.D. Miguel De Cervantes Saavedra	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-255	COMUNICACIÓN	30 ene 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones al Acabado Final de la Reja Metálica y Fecha de Entrega del Colegio.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L5-2025-256	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-257	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-258	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-259	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-260	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-261	COMUNICACIÓN	2 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-262	COMUNICACIÓN	4 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Actividad de Desmonte de Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista) Sede A.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-263	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Programa de Trabajo en Alturas para Actividad Desmonte Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista) - Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L5-2025-264	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD DE PERSONAL CONTRACTUAL	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-265	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-266	COMUNICACIÓN	5 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-267	COMUNICACIÓN	6 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-268	COMUNICACIÓN	6 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Información sobre el Número de Tanques Elevados a Reinstalar en la Dirección Local de Educación de Usme - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-269	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-270	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-271	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-272	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-273	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reubicación Zona de Acopio de Materiales de Desecho - IED. Colegio Orlando Fals Borda	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-274	COMUNICACIÓN	9 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Estado Actual Frentes de Obra y Solicitud de Información de las Fecha de Terminación de cada Colegio	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L6-2025-275	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Orden de Suspensión Inmediata de Actividades y Requerimiento de Cumplimiento Normativo - Resolución 4272/2021 - IED Buenavista (Calazans)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L6-2025-276	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SERINCO-SED-2025-276-L6-Entrega de EPP y Garantizar su uso por el Personal de Obra	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L4-2025-277	COMUNICACIÓN	11 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO DE RADICADO No. 135 ARSAF - 2025 - RESPUESTA OBSERVACIONES INFORMES SILVICULTURALES	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-278	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - IED ARBORIZADORA BAJA - CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-279	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL. FANNY MICKEY - CPF 1981	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-280	COMUNICACIÓN	12 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y TECNICO SST - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-281	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-282	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-283	COMUNICACIÓN	13 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-284	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L-2025-285	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-286	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-287	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-288	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de Suspensión de Actividades y Rechazo de Documentación - Oficio OFI-SED-L6-124	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-289	COMUNICACIÓN	16 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Citación al Representante Legal de Consorcio País a Recorrido de Obra - Santa Librada	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-290	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Ausencia Periódica del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-LX-2025-291	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento Reiterado en la Asistencia del Director de Obra a los Comités y Reuniones de Seguimiento - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-292	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-293	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8455135 - LOTE 4 - CONSORCIO APEGUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-294	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-295	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-296	COMUNICACIÓN	17 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 143 ARSAF - 2025 - NOVEDAD EN PROTECCIÓN DE ELEMENTOS EN ESPACIOS DE INFORMATICA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE D	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-297	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L6-2025-298	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-129	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-L4-2025-299	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-300	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-301	COMUNICACIÓN	18 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-302	COMUNICACIÓN	19 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	VIABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS		
SERINCO-SED-L4-2025-303	COMUNICACIÓN	19 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	RESPUESTA A RADICADO No. 141 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE DISEÑO PLACAS DE RECREACIÓN IED FANNY MICKEY SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-304	COMUNICACIÓN	20 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a Correo con Asunto Contrato Mejoramientos. Verificación Ítems Contractuales	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-305	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-

SERINCO-SED-L6-2025-313	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-314	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-315	COMUNICACIÓN	24 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L5-2025-316	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Información Sobre Atención de Emergencia en IED Rafael Uribe Uribe - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-317	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-318	COMUNICACIÓN	25 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-319	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Listado de Actividades Críticas para Entregas de Colegios y Tareas no Incluidas en el Balance Inicial	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-320	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Poca Presencia de Personal Operativo Durante el mes de Febrero en las Diferentes Sedes Educativas	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-321	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISIÓN DE INFORME ELÉCTRICO - IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-322	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Demoras en la Entrega de Espacios a la Interventoría y Falta de Control `por de Consorcio Fortaleza en la Toma de Detalles	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-LX-2025-323	COMUNICACIÓN	27 feb 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-324	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-325	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-326	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-327	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	EVALUACION ANS PERIODOS 4-SEP-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110. CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-328	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Cuarto Llamado de Atención por Ausencia Prolongada del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-329	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL SANTA LIBRADA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-330	COMUNICACIÓN	2 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO E INSPECTOR - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-331	COMUNICACIÓN	3 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-332	COMUNICACIÓN	4 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Citación para Levantamiento de Actas de Vecindad a Baterías Sanitarias Biblioteca Chandui, Usme - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-333	COMUNICACIÓN	4 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-334	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Seguimiento de Obras de Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-335	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU de NP-03 Suministro e Instalación de Cubierta Modular Tipo Sandwich (ancho=50 mm) - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-336	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-337	COMUNICACIÓN	5 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-338	COMUNICACIÓN	6 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Observación y solicitud — Incumplimiento en entrega de formatos, registros e informes del SG-SST y control de obra y subcontratistas CONSORCIO ARSAF LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-339	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-340	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-341	COMUNICACIÓN	9 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-342	COMUNICACIÓN	10 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU`s de NP-01 Suministro e Instalación de Sanitario y NP-07 Demolición de Acabado y Alistado de Piso en 0.18 Mt - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-343	COMUNICACIÓN	11 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Implementación de plan de mejoramiento - Entrega semanal de formatos SST (Lote 4)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-344	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención a Inspector SST de Localidad de Usme y Solicitud de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-345	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-026 - Solicitud Modificatorio No. 2 Adición y Prorroga - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-346	COMUNICACIÓN	12 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL FABIO LOZANO SIMONELLI	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-347	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-348	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-349	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-350	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Llamado de Atención por Material Utilizado en Relleno de la Zona de la Tarima	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-351	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 159 ARSAF - 2025 - INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN DE SALIDAS Y LUMINARIAS IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-352	COMUNICACIÓN	16 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 169 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE REPROGRAMACIÓN FRENTE DE OBRA IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-353	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-354	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-355	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-356	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-357	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-358	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-359	COMUNICACIÓN	17 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-360	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - CPF 564	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-361	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 546 - IED Santa Librada, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-362	COMUNICACIÓN	18 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 523 - IED Fabio Lozano Simonelli, Sede C - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-363	COMUNICACIÓN	19 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Nueva Esperanza, Sede A - CPF 556	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-364	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-365	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1904 - IED Arborizadora Baja, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-366	COMUNICACIÓN	20 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-030 - Solicitud prorroga entrega Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra Y Bicentenario	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-367	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-368	COMUNICACIÓN	25 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 180 Arsaf - 2025 - Solicitud de Modificatorio No. 2 de Adición y Prorroga Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-369	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-370	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-371	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1974 - IED Calasanz Buenavista, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-372	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de la Solicitud de Entrega de los Informes Técnicos y Manuales de Mantenimientos de las IED Estrella del Sur, Sedes A y B, y Unión Europea	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-373	COMUNICACIÓN	24 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José María Vargas Vila, Sede A - CPF 1983	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-374	COMUNICACIÓN	25 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Compartir Lucero Alto CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-375	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-376	COMUNICACIÓN	27 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-377	COMUNICACIÓN		C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-378	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-379	COMUNICACIÓN	26 mar 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-380	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-381	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-382	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-383	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión manual de mantenimiento - COL Brasilia, Luis Eduardo mora y Don Bosco	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-384	COMUNICACIÓN	30 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS	
SERINCO-SED-LX-2025-385	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en los Contratos de Obra CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780 / Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110. Vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-386	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Solicitud de revisión periódica sobre el uso adecuado de elementos de protección personal en obra de los contratos No. CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780 / Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110. Vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA	
SERINCO-SED-LX-2025-387	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-388	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-389	COMUNICACIÓN	31 mar 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-390	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-391	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-392	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-393	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED La Arabia, Sede B - CPF 1966	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-394	COMUNICACIÓN	1 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-395	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-396	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-397	COMUNICACIÓN	6 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-398	COMUNICACIÓN	7 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-399	COMUNICACIÓN	7 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta de RADICADO No. 188 - ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE PROTECCIÓN A VIDRIOS EN INTERVENCIÓN DE FACHADA - COLEGIO DIEGO MONTAÑA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-INT-2025-400	COMUNICACIÓN	8 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-401	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-160 Radicación Documentos para Prórroga 02	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-402	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 189 ARSAF -2025 - TRAZABILIDAD DE GESTIÓN DE CARGUE EN PLATAFORMA SDA - PIN 27920 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-403	COMUNICACIÓN	9 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-404	COMUNICACIÓN	10 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 191 ARSAF -2025 - PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE CORNISAS IED DIEGO MONTAÑA SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	

SERINCO-SED-LX-2025-405	COMUNICACIÓN	10 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de OFI-SED-L6-165. Solicitud de revisión de descuentos aplicados por concepto de ANS - Posible doble cobro	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-406	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-407	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-408	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-409	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-410	COMUNICACIÓN		C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-411	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-412	COMUNICACIÓN	13 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 199 ARSAF -2025 - AREAS DE CUBIERTAS PARA ENTREGA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-413	COMUNICACIÓN	14 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-414	COMUNICACIÓN	14 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-415	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-416	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 556 - IED Nueva Esperanza, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-417	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-418	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-419	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-420	COMUNICACIÓN	15 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Solicitud Concepto de Especialista Eléctrico y Actualización Ficha SAE para Atención de Emergencia, IED. Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-421	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - CPF 1912	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-422	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Paquete de APU`s de Items No Previstos del NP-08 al NP-12 Aprobados por Interventoría- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-423	COMUNICACIÓN	16 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Observaciones errores en bitácoras de obra.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ANA PARDO	
SERINCO-SED-L4-2025-424	COMUNICACIÓN	17 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Respuesta a RADICADO No. 201 ARSAF -2025 - RESPUESTA COMUNICADO SERINCO-SED-L4-2025-413 REMISIÓN DE INFORME MENSUAL TÉCNICO, AMBIENTAL Y SST VERSIÓN 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-425	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-426	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-427	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-428	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-429	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-430	COMUNICACIÓN	20 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-431	COMUNICACIÓN	21 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Falla Prematura en Bisagras de Portón Plegable - Solicitud de Solución Técnica	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-432	COMUNICACIÓN	22 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1983 - IED José María Vargas Vila, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-433	COMUNICACIÓN	22 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 564 - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-434	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1912 - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-435	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Brasilia - CPF 508	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-436	COMUNICACIÓN	24 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-437	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-438	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-439	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-440	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantía Portón IED Estrella del Sur Sede C	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L5-2025-441	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Gabriel Garcia Márquez, Sede A, Villa Diana - CPF 579	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-442	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTES 4 y 6	Solicitud para Gestionar Devolución de Dineros de Doble Cobro por Concepto de ANS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-443	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - Dirección Local de Usme, DILE - CPF 590	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-444	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Informe Ejecutivo Técnico Sobre Intervención de Baterías Sanitarias en IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	CESAR CARVAJAL	
SERINCO-SED-L6-2025-445	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-172-Atención Observaciones APUS de NP-08, NP-09, NP-10, y NP-12 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-446	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-447	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-448	COMUNICACIÓN	27 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-449	COMUNICACIÓN	28 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-450	COMUNICACIÓN	28 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-MAR-26 AL 05-ABR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L6-2025-451	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - CPF 1959	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-452	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-453	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-454	COMUNICACIÓN	29 abr 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-174-Atención a Observaciones - Ítems NP-13 al NP-16 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-455	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-033 - Reprogramación y Balances, Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra y Bicentenario - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-456	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-457	COMUNICACIÓN	7 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L4-2025-458	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1911 - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-459	COMUNICACIÓN	30 abr 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 212 ARSAF - 2025 - Remisión de Reprogramación Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135, Balance de Presupuestos y Disponibilidad de Espacios	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-460	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-461	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-462	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-INT-2025-463	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Alcance al Comunicado Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-464	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 218 Arsaf - 2025 - Respuesta a solicitud de fechas de entrega de baterías sanitarias de primaria y espacios piso 3 bloque A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-465	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Alcance a Comunicado Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-466	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Traslado de RADICADO No. 222 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-467	COMUNICACIÓN	4 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L4-2025-468	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicados N° 190-ARSAF-2025 y N° 213-ARSAF-2025 Con Anexos y Concepto Estructural de Interventoría IED Rural La Unión - Usme	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-469	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-415-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-470	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-471	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 569 - IED Gabriel García Márquez, Sede A, Villa Diana - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-472	COMUNICACIÓN	5 may 2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
