Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO DEPOR HD, identificado con **NIT** No. **901899950**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Acuerdo Marco de Precios No. 4348/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 59.738.028,43 "CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO CON 43/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Sexto Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
3525	C-3301-1603-40-20302F-3301001-02	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 59.738.028,43
T O T A L			**$ 59.738.028,43**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 09 días del mes de abril de 2026

JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

Seiing S.A.S
Nit. 900.208.425-6

Bogotá, Abril 01 del 2026

MINCULTURA-SEIING-254

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Atn. LAURA GINETH SANCHEZ TALERO
Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural (E)
La Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 4348-2024 cuyo objeto es contratar "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO"

Asunto: Entrega de acta parcial No. 5 del proyecto Biblioteca en Francisco Pizarro - Nariño.

Cordial saludo:

Con ocasión del referido contrato y teniendo en cuenta la cláusula 8 – Forma de pago, se adjunta lo siguiente:

1	Factura
2	Formato 6. Pago de Seguridad Social y aportantes Legales - Persona Jurídicas (actualizado a la fecha de la cuenta de cobro) - CONSORCIO DEPOR HD
3	Formato 6. Pago de Seguridad Social y aportantes Legales - Persona Jurídicas (actualizado a la fecha de la cuenta de cobro) - HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
4	Formato 6. Pago de Seguridad Social y aportantes Legales - Persona Jurídicas (actualizado a la fecha de la cuenta de cobro) - CONSTRUCTORA INGELAD S.A.S
5	Cedula Contador
6	TP Contador
7	Certificado Antecedentes Disciplinarios Contador
8	F-GIN-100 ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES
9	F-GIN-104 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA
10	F-GIN-103 MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
11	Informe del avance de cantidades ejecutadas, memorias gráficas y numéricas, registro fotográfico, porcentaje de obra ejecutado y porcentaje por ejecutar del mes correspondiente a la cuenta de cobro - Informes mes 6 y 7.

Sin otro particular,

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
Director de interventoría

Link de documentos - https://drive.google.com/drive/folders/1ncSxMcA9C3YlqY2YFjr9BaWWNbo_q8ag?usp=sharing

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO DEPOR HD
NIT 901.899.950-9
CALLE 18 N 25 19
Tel: (607) 3204747392
Arauca - Colombia
lmontillamelo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HD 6

Señores	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES		
NIT	830.034.348-5	**Teléfono**	(607) 0000000
Dirección	CRA 8 8 55	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2026, 09:12
Expedición	09/04/2026, 09:12
Vencimiento	01/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA PARCIAL No. 05 CONTRATO 4348 DE 2024 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES ANIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DEDESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO - PROYECTO BIBLIOTECA FRANCISCO PIZARRO (01 DE ENERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026)	1.00	0 %	0.00	95,565,555.00
2	ADMINISTRACION 18,07%	1.00	0 %	0.00	17,268,695.79
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	0 %	0.00	955,655.55
4	UTILIDAD 5%	1.00	19 %	907,872.77	5,686,150.52

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento diecinueve millones cuatrocientos setenta y seis mil cincuenta y seis pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Total Bruto	118,568,184.09
IVA 19%	907,872.77
Total a Pagar	**119,476,056.86**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-01 por $ 119,476,056.86

Observaciones:
POR FAVOR APLICAR LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR $59.738.028,43 FACTURA FV-2-6 Linea de negocio:#$33-01-01;contrato4348-2024;jramirezr@mincultura.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095681552 aprobado en 20250715 prefijo HD desde el número 1 al 10 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10
CUFE: 796e4ea25919c22b6d488e7ebb9c627933a6cf39ec510b627457a9f984e56e8648b691416add7f1810383fd32dfaf988

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Luis Alejandro Orjuela Cano identificado con cédula de ciudadanía n°1.116.789.686 y Jaime Vásquez Delgado identificado con cédula de ciudadanía n°91.068.251, en nuestra condición de representante legal y contador del CONSORCIO DEPOR HD, identificado con nit 901.899.950-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 01 días del mes de abril de 2026.

Luis Alejandro Orjuela Cano
Representante legal
Consorcio Depor Hd

Jaime Vásquez Delgado
Contador
Consorcio Depor Hd

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Horacio Diaz Torres identificado con cédula de ciudadanía n°13.701.763 y Jaime Vásquez Delgado identificada con cédula de ciudadanía n°91.068.251, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de Hd Ingenieria y Consultoria sas, identificada con nit 901.100.579-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 01 días del mes de abril de 2026.



Horacio Diaz Torres
Representante legal
Hd Ingenieria y Consultoria sas



Jaime Vásquez Delgado
Revisor Fiscal
Hd Ingenieria y Consultoria sas

FORMATO 6- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Edna Liliana Agudelo Diaz identificada con cédula de ciudadanía n°1.033.723.497 y Luisa María Téllez Arenas identificada con cédula de ciudadanía n°1.121.912.061, en nuestra condición de representante legal y contadora de Constructora Ingelad sas, identificada con nit 900.890.062-9, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 01 días del mes de abril de 2026.

Edna Liliana Agudelo Diaz
Representante legal
Constuctora Ingelad sas

Luisa María Téllez Arenas
Contadora
Constuctora Ingelad sas

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.068.251**


VASQUEZ DELGADO

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES

FIRMA

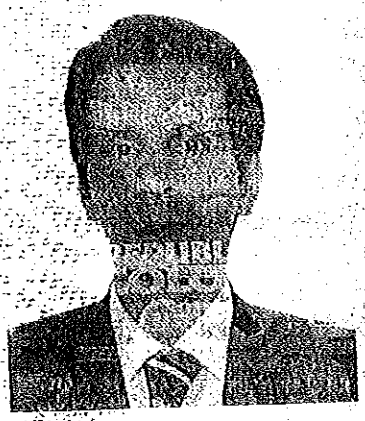



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-NOV-1961**

SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-OCT-1980 SAN GIL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00272636-M-0091068251-20101221 0025290001A 1 35687112

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



32236-T

JAIME
VASQUEZ DEVORO
C.C. 92.258.251
RESOLUCION INSCRIPCION 815-T FECHA 2-IV-92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente

00039451

02/02/2005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1DF096A824E87F8D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME VASQUES DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91068251 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32236-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.068.251**


VASQUEZ DELGADO

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES

FIRMA

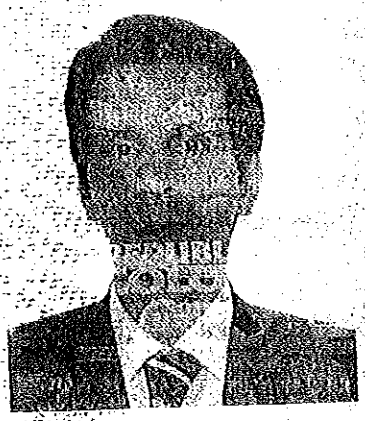



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-NOV-1961**

SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-OCT-1980 SAN GIL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00272636-M-0091068251-20101221 0025290001A 1 35687112

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



32236-T

JAIME
VASQUEZ DEVORO
C.C. 92.258.251
RESOLUCION INSCRIPCION 815-T FECHA 2-IV-92
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente

00039451

02/02/2005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1DF096A824E87F8D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME VASQUES DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91068251 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32236-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.912.061
TELLEZ ARENAS

APELLIDOS
LUISA MARIA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 22-FEB-1994
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

30-MAY-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES


P-5200100-00386635-F-1121912061-20120707 0030481621A 1 38078748

VALIDO SOLO PARA SOPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024 INGELAD SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

300240-T

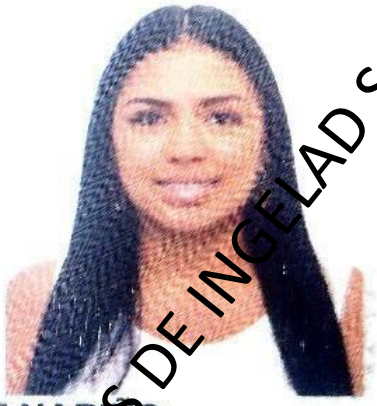

LUISA MARIA
TELLEZ ARENAS
C.C. 1121912061
RES. INSCRIPCION 3737 DEL 17/08/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL

323770 348353

VALIDO SOLO PARA REGISTRO UNICO PROPONENTES DE INGELAD SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8804129B1F8E0885

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUISA MARIA TELLEZ ARENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121912061 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 300240-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-100
Versión: 4
Fecha: 21/Feb/2022

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD
FECHA: 1/01/2026
OBRA: BIBLIOTECA FRANCISCO PIZARRO
INTERVENTOR: SEIING S.A.S
CONTRATO No: 4348 de 2024
PERIODO Desde 1/01/2026 hasta 28/02/2026
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO
VALOR: $ 1.795.350.594,00
N° ACTA 05

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS 20-02-2026		4. OBRA EJECUTADA											
								ACTA "01"		ACTA "02"		ACTA "03"		ACTA "04"		PRESENTE ACTA "05"		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																		
1,1	Descapote a máquina y/o manual profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado.	m2	$ 17.227,00	604,00	$ 10.405.108,00	319,42	$ 5.502.648,00	301,94	$ 5.201.520,00	17,48	$ 301.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	319,42	$ 5.502.648,00
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera roliza y/o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	$ 16.901,00	112,83	$ 1.906.914,00	113,02	$ 1.910.151,00	113,02	$ 1.910.151,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	113,02	$ 1.910.151,00
1,3	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRÁFICA	m2	$ 3.101,00	604,00	$ 1.873.004,00	360,00	$ 1.116.360,00	301,94	$ 936.316,00	58,06	$ 180.044,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	360,00	$ 1.116.360,00
1,4	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	$ 402.886,00	1,00	$ 402.886,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,5	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	$ 1.651.882,00	1,00	$ 1.651.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																		
2,1	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en m3 en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3	$ 37.867,00	190,00	$ 7.194.730,00	264,45	$ 10.013.928,00	82,09	$ 3.108.502,00	102,94	$ 3.898.029,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	185,03	$ 7.006.531,00
2,3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	$ 18.101,00	34,00	$ 615.434,00	308,72	$ 5.588.141,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,4	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	$ 198.716,00	27,23	$ 5.411.924,00	122,34	$ 24.310.915,00	0,00	$ -	0,00	$ -	122,34	$ 24.310.915,00	0,00	$ -	0,00	$ -	122,34	$ 24.310.915,00
2,5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos	m3	$ 55.520,00	16,80	$ 932.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,6	RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 50 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU).	m3	$ 53.863,00	7,00	$ 377.041,00	7,00	$ 377.041,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**CIMENTACIÓN**																		
3,1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	$ 30.474,00	62,00	$ 1.889.388,00	63,57	$ 1.937.232,00	54,72	$ 1.667.537,00	5,13	$ 156.332,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	59,85	$ 1.823.869,00
3,2	CONCRETO CICLOPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 290.706,00	5,00	$ 1.453.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,3,1	ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 665.177,00	21,16	$ 14.073.920,00	23,94	$ 15.924.337,00	0,00	$ -	23,94	$ 15.924.337,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,94	$ 15.924.337,00
3,4,1	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	$ 687.885,00	14,26	$ 9.810.540,00	22,43	$ 15.429.261,00	0,00	$ -	12,89	$ 8.866.838,00	0,27	$ 185.729,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,16	$ 9.052.567,00
3,5	Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el item de sellante).	m	$ 6.325,00	40,00	$ 253.000,00	40,00	$ 253.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,6	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	$ 17.684,00	40,00	$ 707.360,00	40,00	$ 707.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,7	PILOTE CUADRADO HINCADO 25X25CM, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	$ 409.802,00	400,00	$ 163.920.800,00	624,80	$ 256.044.290,00	624,80	$ 256.044.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	624,80	$ 256.044.290,00
3,8	Descabece de pilotes con martillo percutor, incluye cargue y retiro de sobrantes.	m	$ 55.409,00	55,20	$ 3.058.577,00	56,80	$ 3.147.231,00	56,80	$ 3.147.231,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	56,80	$ 3.147.231,00
4	**REFUERZO**																		
4,1	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 6.739,00	11410,98	$ 76.898.574,00	23.451,33	$ 158.038.513,00	9.272,29	$ 62.485.969,00	9.443,70	$ 63.641.115,00	2588,58	$ 17.444.427,00	1830,55	$ 12.336.076,00	0,00	$ -	23.135,12	$ 155.907.587,00
4,2	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 8.056,00	1722,00	$ 13.872.432,00	2.281,13	$ 18.376.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2281,13	$ 18.376.787,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2.281,13	$ 18.376.787,00
4,4	ANCLAJES PARA VARILLA ø 1/2" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	$ 11.085,00	128,00	$ 1.418.880,00	120,00	$ 1.330.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**																		
5,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=28 Mpa (4000 PSI) e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 107.789,00	25,00	$ 2.694.725,00	10,50	$ 1.131.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,2	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 892.638,00	12,25	$ 10.934.816,00	12,18	$ 10.872.331,00	0,00	$ -	3,89	$ 3.472.362,00	8,29	$ 7.399.969,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,18	$ 10.872.331,00
5,3	VIGAS DE CORONACIÓN EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 903.586,00	27,54	$ 24.884.758,00	8,62	$ 7.788.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,62	$ 7.788.911,00	0,00	$ -	8,62	$ 7.788.911,00
5,5,1	PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.12) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 171.362,00	267,00	$ 45.753.654,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.16	POYO EN CONCRETO REFORZADO f´c=17,5 Mpa (2500 PSI), a=0.45; e=0.08. No incluye acero de refuerzo.	m	$ 44.347,00	32,10	$ 1.423.539,00	33,12	$ 1.468.773,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.24	MORTERO TIPO S, DE RELLENO PARA DOVELAS	m3	$ 663.346,00	0,97	$ 645.210,00	0,54	$ 358.207,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.25	Viga canal forma en H, en concreto reforzado de 3.000 PSI, incluye mortero normalizado de nivelación para pendientado, impermeabilización elástica de ángulos rectos y/o juntas, impermeabilización con mortero cementoso bicomponente de alta elasticidad , según diseño.	m	$ 1.399.350,00	60,00	$ 83.961.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPOR HD				**FECHA:**	1/01/2026	**OBRA:**	BIBLIOTECA FRANCISCO PIZARRO													
INTERVENTOR:	SEIING S.A.S				**CONTRATO No:**	4348 de 2024	**PERIODO**	Desde	1/01/2026	hasta	28/02/2026										
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO				**VALOR:**	$ 1.795.350.594,00	**Nº ACTA**	05													

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS 20-02-2026		4. OBRA EJECUTADA													
								ACTA "01"		ACTA "02"		ACTA "03"		ACTA "04"		PRESENTE ACTA "05"		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
6	**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**																		
6,8,1	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL SAPAN 3"X6" PARA CUBIERTA, SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 243.409,00	368,00	$ 89.574.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,8,2	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL SAPAN 2"X4" PARA CUBIERTA, SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 235.887,00	400,00	$ 94.354.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,8,3	Platina Alumidi 120 ROTHOBLASS, con anclajes Vin fix pro para concreto y pasadores STA a madera o similares, (Para conexiones a elementos en concreto y entre madera)	u	$ 113.860,00	32,00	$ 3.643.520,00	138,00	$ 15.712.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN**																		
	REDES SANITARIAS Y RED PLUVIAL(EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)																		
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	u	$ 813.145,00	1,00	$ 813.145,00	1,00	$ 813.145,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 20.850,00	20,40	$ 425.340,00	59,57	$ 1.242.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 18.137,00	28,70	$ 520.532,00	46,46	$ 842.645,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 10.766,00	18,90	$ 203.477,00	44,57	$ 479.841,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.12	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 37.448,00	11,00	$ 411.928,00	6,00	$ 224.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.14	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 42.179,00	4,00	$ 168.716,00	3,00	$ 126.537,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 136.468,00	4,00	$ 545.872,00	3,00	$ 409.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 133.119,00	6,00	$ 798.714,00	6,00	$ 798.714,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 39.946,00	5,00	$ 199.730,00	2,00	$ 79.892,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	$ 2.007.603,00	3,00	$ 6.022.809,00	2,00	$ 4.015.206,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.13	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 41.786,00	1,00	$ 41.786,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" (manguera, solo para pocetas y jardines si se requieren)	u	$ 34.464,00	5,00	$ 172.320,00	4,00	$ 137.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,2	**REDES HIDRÁULICAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)**																		
7.2.3	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 78.011,00	2,00	$ 156.022,00	5,00	$ 390.055,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.1	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 46.798,00	4,00	$ 187.192,00	7,00	$ 327.586,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 44.265,00	6,90	$ 305.429,00	33,64	$ 1.489.075,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 26.360,00	9,70	$ 255.692,00	8,72	$ 229.859,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 48.034,00	2,00	$ 96.068,00	7,00	$ 336.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 108.542,00	4,00	$ 434.168,00	5,00	$ 542.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 14.524,00	8,20	$ 119.097,00	8,38	$ 121.711,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,3	**REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)**																		
7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 58.094,00	13,60	$ 790.078,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.1A	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)	m	$ 180.641,00	8,00	$ 1.445.128,00	4,00	$ 722.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 35.594,00	34,60	$ 1.231.552,00	11,35	$ 403.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	$ 61.870,00	8,80	$ 544.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	$ 35.945,00	12,80	$ 460.096,00	4,40	$ 158.158,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.60*0.60 m (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	$ 570.323,00	1,00	$ 570.323,00	1,00	$ 570.323,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.18	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	$ 530.733,00	5,00	$ 2.653.665,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.19	CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	$ 93.155,00	65,00	$ 6.055.075,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.16	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 80x80x1.50 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	$ 878.041,00	7,00	$ 6.146.287,00	2,00	$ 1.756.082,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPOR HD	**FECHA:**	1/01/2026	**OBRA:**	BIBLIOTECA FRANCISCO PIZARRO				
INTERVENTOR:	SEIING S.A.S	**CONTRATO No:**	4348 de 2024	**PERIODO**	Desde 1/01/2026	hasta	28/02/2026		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO	**VALOR:**	$ 1.795.350.594,00	**Nº ACTA**	05				

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS 20-02-2026		4. OBRA EJECUTADA											
								ACTA "01"		ACTA "02"		ACTA "03"		ACTA "04"		PRESENTE ACTA "05"		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**																		
8,1	**EQUIPO DE MEDIDA**																		
8.1.1	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes	u	$ 353.292,00	1,00	$ 353.292,00	1,00	$ 353.292,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,2	**REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN**																		
8.2.1	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación	m	$ 25.074,00	128,00	$ 3.209.472,00	60,00	$ 1.504.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.2.2	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red	m	$ 34.942,00	74,00	$ 2.585.708,00	40,00	$ 1.397.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.2.3	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma. incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 627.430,00	4,00	$ 2.509.720,00	4,00	$ 2.509.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,3	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**																		
8.3.1	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye: módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de	u	$ 6.815.411,00	1,00	$ 6.815.411,00	1,00	$ 6.815.411,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.3.2	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 12 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). Marcación en acrílico TN1 y TN2	u	$ 1.038.999,00	1,00	$ 1.038.999,00	1,00	$ 1.038.999,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.3.3	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnetico 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). TR1 y TR2	u	$ 405.548,00	1,00	$ 405.548,00	1,00	$ 405.548,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,4	**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN RCI Y BOMBAS DE SUMINISTRO**																		
8.4.1	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre medidor y tablero de distribución principal	m	$ 144.791,00	45,00	$ 6.515.595,00	70,00	$ 10.135.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.4.2	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TN1, TGD y TN2	m	$ 64.679,00	15,00	$ 970.185,00	10,00	$ 646.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.4.3	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TR1, TGD y TR2	m	$ 38.342,00	14,00	$ 536.788,00	20,00	$ 766.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.4.4	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexion borneras	m	$ 28.037,00	8,00	$ 224.296,00	8,00	$ 224.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,5	**RED NORMAL Y REGULADA**																		
8.5.1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada , tubería PVC DE 3/4", accesoiros PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 116.403,00	17,00	$ 1.978.851,00	19,00	$ 2.211.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.5.2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesoiros PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 182.971,00	2,00	$ 365.942,00	2,00	$ 365.942,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.5.3	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 136.034,00	14,00	$ 1.904.476,00	14,00	$ 1.904.476,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.5.4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 20A 120V, instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca tipo Tamper Resist, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), Blanco-Azul-verde, marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 120.639,00	6,00	$ 723.834,00	4,00	$ 482.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.5.5	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 20A 120V; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado tipo Tamper Resist, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, aT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 145.722,00	6,00	$ 874.332,00	4,00	$ 582.888,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.5.6	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 224.884,00	2,00	$ 449.768,00	2,00	$ 449.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.5.7	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C	m	$ 18.112,00	120,00	$ 2.173.440,00	120,00	$ 2.173.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.6	**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA**																		
8.6.1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalaciónn demas elémentos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 21.825,00	40,00	$ 873.000,00	28,77	$ 627.905,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.6.2	Suministro e instalación de canaleta plastica 100x45mm 2Mt, incluye accesorios de union, separador, angulos y demas accesorios para su correcta fijacion	m	$ 60.918,00	18,00	$ 1.096.524,00	17,26	$ 1.051.445,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPOR HD				**FECHA:**	1/01/2026	**OBRA:**	BIBLIOTECA FRANCISCO PIZARRO													
INTERVENTOR:	SEIING S.A.S				**CONTRATO No:**	4348 de 2024	**PERIODO**	Desde	1/01/2026	hasta	28/02/2026										
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO				**VALOR:**	$ 1.795.350.594,00	**Nº ACTA**	05													

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS 20-02-2026		4. OBRA EJECUTADA													
								ACTA "01"		ACTA "02"		ACTA "03"		ACTA "04"		PRESENTE ACTA "05"		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
8,7	**ILUMINACIÓN**																		
8.7.1	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 139.206,00	9,00	$ 1.252.854,00	16,00	$ 2.227.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.2	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería conduit PVC empotrada empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 178.963,00	4,00	$ 715.852,00	3,00	$ 536.889,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 235.759,00	39,00	$ 9.194.601,00	73,00	$ 17.210.407,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 124.628,00	16,00	$ 1.994.048,00	6,00	$ 747.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.5	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 162.903,00	3,00	$ 488.709,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.6	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W, 5500 Lumens,de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, kit de guayas aceradas para descolgar y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	un	$ 730.137,00	19,00	$ 13.872.603,00	21,00	$ 15.332.877,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.7	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 18 W Flujo Luminoso mínimo 1300 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.	un	$ 107.028,00	4,00	$ 428.112,00	4,00	$ 428.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.8	Suministro e instalación de luminaria hermetica de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.	un	$ 169.570,00	4,00	$ 678.280,00	5,00	$ 847.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.9	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360º horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.	u	$ 250.908,00	2,00	$ 501.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.10	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED tipo aplique, mínimo 350 lúmenes, IP20, mínimo 90 minutos de autonomía	un	$ 143.917,00	17,00	$ 2.446.589,00	20,00	$ 2.878.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.7.11	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía	un	$ 137.630,00	4,00	$ 550.520,00	4,00	$ 550.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,8	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**																		
8.8.1	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control.	u	$ 885.366,00	1,00	$ 885.366,00	1,00	$ 885.366,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.8.2	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica codensa AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 387.891,00	1,00	$ 387.891,00	3,00	$ 1.163.673,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.8.3	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona	m	$ 34.942,00	50,00	$ 1.747.100,00	13,90	$ 485.694,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.8.5	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	m	$ 18.986,00	50,00	$ 949.300,00	16,40	$ 311.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.8.6	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color maximo 3000K, mínimo 980 Lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	un	$ 378.384,00	16,00	$ 6.054.144,00	18,00	$ 6.810.912,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.8.7	Suministro e instalación de poste metalico poligonal para iluminación 3m, 150kgf,brazo 2mo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaira 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP	u	$ 831.040,00	1,00	$ 831.040,00	1,00	$ 831.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.8.8	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180, , temperatura de color maximo 3000K, lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	un	$ 124.276,00	7,00	$ 869.932,00	6,00	$ 745.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.8.9	Suministro e instalación de salida de iluminación en piso incluye caja plastica, tuberia PV 3/4" y accesorios,5m cable de cobre 3X12 THHN/THWN-2	un	$ 123.222,00	7,00	$ 862.554,00	6,00	$ 739.332,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,9	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**																		
8.9.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo Nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	$ 66.977,00	30,00	$ 2.009.310,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.9.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	$ 37.373,00	4,00	$ 149.492,00	1,00	$ 37.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.9.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 276.722,00	4,00	$ 1.106.888,00	1,00	$ 276.722,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.9.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 144.981,00	1,00	$ 144.981,00	1,00	$ 144.981,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.9.5	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	$ 98.224,00	4,00	$ 392.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPOR HD					**FECHA:**	1/01/2026	**OBRA:**	BIBLIOTECA FRANCISCO PIZARRO														
INTERVENTOR:	SEIING S.A.S					**CONTRATO No:**	4348 de 2024	**PERIODO**	Desde	1/01/2026	hasta	28/02/2026											
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO					**VALOR:**	$ 1.795.350.594,00	**Nº ACTA**	05														
1. ITEM	**2. CONDICIONES CONTRACTUALES** (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					**3. ACTUALIZADAS** 20-02-2026		**4. OBRA EJECUTADA**															
								ACTA "01"		**ACTA "02"**		**ACTA "03"**		**ACTA "04"**		**PRESENTE ACTA "05"**		**ACUMULADO**					
	DESCRIPCION	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**				
8,1	**APANTALLAMIENTO**																						
8.10.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	$ 53.063,00	110,00	$ 5.836.930,00	109,30	$ 5.799.786,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.10.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	$ 37.373,00	6,00	$ 224.238,00	6,00	$ 224.238,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.10.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 276.722,00	6,00	$ 1.660.332,00	6,00	$ 1.660.332,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.10.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 144.981,00	6,00	$ 869.886,00	6,00	$ 869.886,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.10.5	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8.	u	$ 187.673,00	6,00	$ 1.126.038,00	12,00	$ 2.252.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.10.6	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	m	$ 40.241,00	233,00	$ 9.376.153,00	138,00	$ 5.553.258,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.10.7	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	u	$ 117.229,00	6,00	$ 703.374,00	6,00	$ 703.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8,111	**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**																						
8.11.1	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (3,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tuberia PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.	un	$ 140.868,00	4,00	$ 563.472,00	4,00	$ 563.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.11.4	Suministro e instalación de ventilador de pared, mínimo 3 velocidades, aspas mínimo de 12", sistema conexión a 120V	un	$ 406.678,00	2,00	$ 813.356,00	4,00	$ 1.626.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.12	**VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**																						
8.12.1	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	gb	$ 3.607.644,00	1,00	$ 3.607.644,00	1,00	$ 3.607.644,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.12.2	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	gb	$ 4.509.555,00	1,00	$ 4.509.555,00	1,00	$ 4.509.555,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.12.3	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asigandas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados.	gb	$ 2.047.683,00	1,00	$ 2.047.683,00	1,00	$ 2.047.683,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
8.12.4	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	gb	$ 786.401,00	1,00	$ 786.401,00	1,00	$ 786.401,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9	**REDES ESPECIALES**																						
9,1	**CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)**																						
9.1.1	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	u	$ 93.906,00	20,00	$ 1.878.120,00	17,00	$ 1.596.402,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.2	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	$ 7.702,00	915,00	$ 7.047.330,00	272,20	$ 2.096.484,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.3	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	u	$ 1.159.657,00	1,00	$ 1.159.657,00	1,00	$ 1.159.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.4	Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000	u	$ 643.692,00	1,00	$ 643.692,00	1,00	$ 643.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.5	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	$ 38.110,00	20,00	$ 762.200,00	17,00	$ 647.870,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.6	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad 30CM de 1 RU	u	$ 1.017.815,00	1,00	$ 1.017.815,00	1,00	$ 1.017.815,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.7	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida	u	$ 2.886.853,00	1,00	$ 2.886.853,00	1,00	$ 2.886.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.8	Suministro e instalación de ACCES POINT DE USO INTERIOR (300Mbps Acces point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4Ghz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Boton QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB)	u	$ 231.600,00	2,00	$ 463.200,00	2,00	$ 463.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.9	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 10.123,00	80,00	$ 809.840,00	48,75	$ 493.496,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.10	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 26.703,00	36,00	$ 961.308,00	42,30	$ 1.129.537,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
9.1.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 21.825,00	60,00	$ 1.309.500,00	60,00	$ 1.309.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
10	**MAMPOSTERÍA**																						
10,1	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°5, Incluye suministro e instalación, grafil doble cada 4ta hilada, mortero de pega 1:3, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 55.420,00	50,50	$ 2.798.710,00	114,24	$ 6.331.181,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	110,92	$ 6.147.186,00	110,92	$ 6.147.186,00				
10,16	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones y forma según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	$ 36.741,00	50,00	$ 1.837.050,00	66,40	$ 2.439.602,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	66,40	$ 2.439.602,00	66,40	$ 2.439.602,00				
10,17	VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	$ 46.612,00	10,00	$ 466.120,00	80,68	$ 3.760.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	80,68	$ 3.760.656,00	80,68	$ 3.760.656,00				
10,31	LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete.	m	$ 40.488,00	50,29	$ 2.036.142,00	36,18	$ 1.464.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	36,18	$ 1.464.856,00	36,18	$ 1.464.856,00				
10,32	Muro en concreto a la vista de 3.000 PSI en concreto a la vista segun diseños, no incluye refuerzo.	m3	$ 1.403.185,00	5,30	$ 7.436.881,00	3,94	$ 5.528.549,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,94	$ 5.528.549,00	3,94	$ 5.528.549,00				

CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPOR HD				**FECHA:**	1/01/2026	**OBRA:**	BIBLIOTECA FRANCISCO PIZARRO													
INTERVENTOR:	SEIING S.A.S				**CONTRATO No:**	4348 de 2024	**PERIODO**	Desde	1/01/2026	hasta	28/02/2026										
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO				**VALOR:**	$ 1.795.350.594,00	**Nº ACTA**	05													

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS 20-02-2026		4. OBRA EJECUTADA													
								ACTA "01"		ACTA "02"		ACTA "03"		ACTA "04"		PRESENTE ACTA "05"		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
11	**CUBIERTA Y CIELO RASO**																		
11,1	**ELEMENTOS DE CUBIERTA**																		
11.1.2	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m	$ 53.185,00	98,74	$ 5.251.487,00	172,78	$ 9.189.304,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.2.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación	m2	$ 214.910,00	300,00	$ 64.473.000,00	413,88	$ 88.945.949,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.3.1	CIELO RASO DESCOLGADO EN LÁMINAS DE DRY WALL DE 1/2", con dilataciones, tratamiento de juntas con cinta malla. Pintura color blanco, 3 manos.	m2	$ 74.643,00	10,00	$ 746.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	**PAÑETES**																		
12,1	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	m2	$ 27.005,00	210,17	$ 5.675.587,00	280,93	$ 7.586.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	280,93	$ 7.586.515,00	280,93	$ 7.586.515,00
13	**ENCHAPES**																		
13,2	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m	$ 270.329,00	4,20	$ 1.135.382,00	4,32	$ 1.167.821,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,3	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	u	$ 244.492,00	1,00	$ 244.492,00	1,00	$ 244.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,8	ENCHAPE DE PARED/PISO EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m2	$ 67.617,00	26,20	$ 1.771.701,00	13,49	$ 912.153,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	**BASES Y PISOS**																		
14.1.	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, espesor 4 cm, incluye dilataciones en material flexible (según diseño), pendientado y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 33.936,00	4,91	$ 166.626,00	241,46	$ 8.194.187,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	241,46	$ 8.194.187,00	241,46	$ 8.194.187,00
14,15	ENCHAPE DE PISO/PARED EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m2	$ 67.617,00	245,23	$ 16.581.717,00	241,46	$ 16.326.801,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,16	ZÓCALO SANITARIO EN GRES tipo Media-Caña, GRES SAHARA. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m	$ 62.148,00	16,94	$ 1.052.476,00	14,24	$ 884.988,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	**CARPINTERÍA METALICA Y DE ALUMINIO**																		
15,1	**OTROS ELEMENTOS METÁLICOS**																		
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación	u	$ 118.744,00	1,00	$ 118.744,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,3	**PUERTAS METALICAS**																		
15.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y ESTRUCTURA EN ACERO COLD-ROLLED 4 HOJAS TIPO REJA CON PLATINAS DE 2" (3.30x2.20mts) PARA ENTRADA PRINCIPAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P-01). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	un	$ 3.799.040,00	1,00	$ 3.799.040,00	2,00	$ 7.598.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (0,9x2.20 mts.) BAÑO, COCINETA, BODEGA, ASEO, OFICINA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P-02) Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 517.363,00	11,88	$ 6.146.272,00	13,24	$ 6.849.886,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA CON MARCO Y ESTRUCTURA EN ACERO COLD-ROLLED CON PLATINAS DE 2" (3.30x2.20mts) PARA FACHADA HACIA LA CALLE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO R-01). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	un	$ 2.849.280,00	1,00	$ 2.849.280,00	1,00	$ 2.849.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	**CARPINTERÍA DE MADERA**																		
16.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TIPO PERSIANA DE 1.37x3.30mts EN TABLA (9x4cms) EN MADERA DE PINO AMARILLO INMUNIZADO A VACÍO PRESIÓN. INCLUYE PARALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE SUJECION, PROTECCIÓN CON LACA PORO ABIERTA TIPO PROFILAN NATURAL A DOS MANOS. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO V-01). PARA FACHADA LARGA 1	m2	$ 213.696,00	91,60	$ 19.574.554,00	109,95	$ 23.495.875,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	**CERRADURAS**																		
17,1	COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Eiffel, 2 Cierrapuertas Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 1.950.033,00	2,00	$ 3.900.066,00	2,00	$ 3.900.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17,3	CERRADURA CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO CROMADO MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 52.226,00	6,00	$ 313.356,00	6,00	$ 313.356,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**																		
18.1	**APARATOS SANITARIOS**																		
18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LINEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 658.739,00	1,00	$ 658.739,00	1,00	$ 658.739,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 732.925,00	1,00	$ 732.925,00	1,00	$ 732.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 402.088,00	1,00	$ 402.088,00	1,00	$ 402.088,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 181.770,00	2,00	$ 363.540,00	2,00	$ 363.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 162.862,00	1,00	$ 162.862,00	1,00	$ 162.862,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPOR HD					**FECHA:**	1/01/2026		**OBRA:**	BIBLIOTECA FRANCISCO PIZARRO													
INTERVENTOR:	SEIING S.A.S					**CONTRATO No:**	4348 de 2024		**PERIODO**	Desde	1/01/2026	hasta	28/02/2026										
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO					**VALOR:**	$ 1.795.350.594,00		**Nº ACTA**	**05**													
1. ITEM	**2. CONDICIONES CONTRACTUALES** (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					**3. ACTUALIZADAS** 20-02-2026		**4. OBRA EJECUTADA**															
								ACTA "01"		**ACTA "02"**		**ACTA "03"**		**ACTA "04"**		**PRESENTE ACTA "05"**		**ACUMULADO**					
	DESCRIPCION	**UNID.**	**V. UNITARIO**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**				
18,2	**GRIFERIA**																						
18.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 312.813,00	2,00	$ 625.626,00	2,00	$ 625.626,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXOMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 1.090.962,00	1,00	$ 1.090.962,00	1,00	$ 1.090.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
18.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 155.199,00	1,00	$ 155.199,00	1,00	$ 155.199,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
18.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA POCETA Y RIEGO + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 89.988,00	4,00	$ 359.952,00	4,00	$ 359.952,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
18.3	**ACCESORIOS**																						
18.3.1	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	u	$ 399.046,00	1,00	$ 399.046,00	1,00	$ 399.046,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
18.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared en acero inoxidable, para 450 toallas plegadas en C o 600 múltifold.	u	$ 241.306,00	2,00	$ 482.612,00	2,00	$ 482.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
18.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PARED, capacidad en peso: 25 kg, dimensiones 84 cm x 54 cm x 10 cm color gris, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	$ 1.184.774,00	1,00	$ 1.184.774,00	1,00	$ 1.184.774,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
19	**PINTURAS**																						
19,1	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m2	$ 22.852,00	210,17	$ 4.802.759,00	207,49	$ 4.741.561,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
20	**VIDRIOS Y ESPEJOS**																						
20,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 353.055,00	2,00	$ 706.110,00	2,00	$ 706.110,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
21	**EQUIPOS Y OTROS**																						
21,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica)	u	$ 281.164,00	1,00	$ 281.164,00	1,00	$ 281.164,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
21,2	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LB INCLUYE BASE DE APOYO Y BAJO CUMPLIMIENTO DE NORMA	u	$ 103.614,00	2,00	$ 207.228,00	2,00	$ 207.228,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
21,3	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidroacumulador, arrancador montado, válvula de pie, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20psi. Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1HP.	u	$ 3.453.127,00	2,00	$ 6.906.254,00	2,00	$ 6.906.254,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
22	**CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES**																						
22,1	ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el ancho del anden) incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 74.068,00	131,00	$ 9.702.908,00	73,30	$ 5.429.184,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,40	$ 399.967,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,40	$ 399.967,00				
22,2	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	$ 57.867,00	97,00	$ 5.613.099,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
22,7	BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación	u	$ 165.927,00	10,05	$ 1.667.566,00	6,00	$ 995.562,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 995.562,00	6,00	$ 995.562,00				
23	**SEÑALIZACIÓN**																						
23,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS METÁLICAS CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	un	$ 54.508,00	26,00	$ 1.417.208,00	26,00	$ 1.417.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
23,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN	gb	$ 832.835,00	1,00	$ 832.835,00	1,00	$ 832.835,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				
25	**ASEO GENERAL**																						
25,1	ASEO GENERAL DE OBRA	m2	$ 3.940,00	604,00	$ 2.379.760,00	319,42	$ 1.258.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -				

CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPOR HD					**FECHA:**	1/01/2026		**OBRA:**	BIBLIOTECA FRANCISCO PIZARRO													
INTERVENTOR:	SEIING S.A.S					**CONTRATO No:**	4348 de 2024		**PERIODO**	Desde	1/01/2026	hasta	28/02/2026										
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO					**VALOR:**	$ 1.795.350.594,00		**Nº ACTA**	05													

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS 20-02-2026		4. OBRA EJECUTADA													
								ACTA "01"		ACTA "02"		ACTA "03"		ACTA "04"		PRESENTE ACTA "05"		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
26	**NO PREVISTOS**																		
26,1	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CAIMO -CAIMITO 7CM X 15CM PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contraventos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 243.409,00			501,35	$ 122.033.102,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,2	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CAIMO -CAIMITO 5CM X 11CM PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contraventos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 235.887,00			708,96	$ 167.234.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,3	PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m2	$ 159.752,00			326,97	$ 52.234.111,00	0,00	$ -	0,00	$ -	316,47	$ 50.556.715,00	0,00	$ -	10,50	$ 1.677.396,00	326,97	$ 52.234.111,00
26,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO ESTRUCTURAL CON ROSCA TOTAL ROTHOBLAAS O SIMILAR, Ø 9 MM Y LONGITUD 160 MM	u	$ 7.575,00			690,00	$ 5.226.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE QUIMICO EN VARILLA ø 3/8" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, Epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	$ 14.193,00			160,00	$ 2.270.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,6	VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI) impermeabilizado , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 y/o similar, capas en todo el contorno de la canal, incluye mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 1.988.843,00			18,91	$ 37.609.021,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,91	$ 37.609.021,00	18,91	$ 37.609.021,00
26,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZADOPARA MUROS EXTERIORES E INTERIORES H<=3.00 M.-INCLUYE APLICACIÓN	m2	$ 30.311,00			207,49	$ 6.289.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,8	CAMPO DE INFILTRACION DE 14m x 8m x 0.60 EN TUBERIA DE 4", INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTIL Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Gb	$ 36.769.188,00			1,00	$ 36.769.188,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,9	DEMOLICIÓN ELEMENTOS EN CONCRETO	m3	$ 203.927,00			4,32	$ 880.965,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,32	$ 880.965,00	4,32	$ 880.965,00
26,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA EXPANDIDA 12 CALIBRE 18 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXIPOLIAMINA Y PUERTA DOBLE BATIENTE	m2	$ 257.029,00			97,15	$ 24.970.367,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,11	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PLATINAS 240X200X3/8", DOS PLATINAS DE 200X150X3/8" Y DOS PLATINAS DE 150X150X3/8" PARA CONEXIONES DE VIGAS DE MADERA PARA ESTRUCTURA DE MADERA	u	$ 328.606,00			16,00	$ 5.257.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,12	ENTIBADO EN MADERA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN	m2	$ 54.821,00			247,85	$ 13.587.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	247,85	$ 13.587.385,00	247,85	$ 13.587.385,00
26,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	$ 4.346.220,00			1,00	$ 4.346.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,14	MENSULAS EN CONCRETO DE 4000 PSI f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto	u	$ 653.932,00			8,00	$ 5.231.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 5.231.456,00	8,00	$ 5.231.456,00
26,15	SOBRESALTO EN CONCRETO DE 4000 PSI f´c=28 Mpa (4000 PSI), 0.40x0.30 mts según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto	m	$ 290.316,00			16,00	$ 4.645.056,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ANTIRRETORNO DE 4" PARA SISTEMA SANITARIO.	u	$ 462.219,00			1,00	$ 462.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 462.219,00	1,00	$ 462.219,00
26,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA SEGÚN DISEÑO, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación.	u	$ 1.317.952,00			1,00	$ 1.317.952,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO EN ESTRUCTURA DE MADERA Y MALLA EN ANGEO.	m2	$ 60.314,00			40,00	$ 2.412.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26,19	CIELO RASO EN LÁMINA PVC CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 1 PULG. CAL. 26, incluye cornisa e instalación.	m2	$ 80.690,00			122,03	$ 9.846.601,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
A	**SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS**				**$ 1.032.468.856,00**		**$ 1.436.050.707,00**		**$ 334.501.516,00**		**$ 96.440.185,00**		**$ 118.674.509,00**		**$ 20.124.987,00**		**$ 95.565.555,00**		**$ 665.306.752,00**
B	ADMINISTRACIÓN	18,07%			$ 186.567.122,00		$ 259.494.363,00		$ 60.444.423,94		$ 17.426.741,43		$ 21.444.483,78		$ 3.636.585,15		$ 17.268.695,79		$ 120.220.930,09
	IMPREVISTO	1,00%			$ 10.324.689,00		$ 14.360.507,00		$ 3.345.015,16		$ 964.401,85		$ 1.186.745,09		$ 201.249,87		$ 955.655,55		$ 6.653.067,52
	UTILIDAD	5,00%			$ 51.623.443,00		$ 71.802.535,00		$ 16.725.075,80		$ 4.822.009,25		$ 5.933.725,45		$ 1.006.249,35		$ 4.778.277,75		$ 33.265.337,60
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%			$ 9.808.454,00		$ 13.642.482,00		$ 3.177.764,40		$ 916.181,76		$ 1.127.407,84		$ 191.187,38		$ 907.872,77		$ 6.320.414,14
	SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 258.323.708,00**		**$ 359.299.887,00**		**$ 83.692.279,30**		**$ 24.129.334,29**		**$ 29.692.362,15**		**$ 5.035.271,75**		**$ 23.910.501,86**		**$ 166.459.749,35**
C	**TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+B+C)**				**$ 1.290.792.564,00**		**$ 1.795.350.594,00**		**$ 418.193.795,30**		**$ 120.569.519,29**		**$ 148.366.871,16**		**$ 25.160.258,75**		**$ 119.476.056,86**		**$ 831.766.501,36**
D	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**50,00%**							**$ 209.096.897,65**		**$ 60.284.759,65**		**$ 74.183.435,58**		**$ 12.580.129,38**		**$ 59.738.028,43**		**$ 415.883.250,68**
E	**TOTAL PRESENTE ACTA PARCIAL**								**$ 209.096.897,65**		**$ 60.284.759,64**		**$ 74.183.435,57**		**$ 12.580.129,37**		**$ 59.738.028,43**		**$ 415.883.250,66**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **CIENTO DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTIOCHO (28) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026

LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL. CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATISTA

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
RL. SEIING S.A.S
INTERVENTOR

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATO No: 4348 de 2024
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO
INTERVENTOR: SEING S.A.S
VALOR: $1.795.350.594,00
FECHA: 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																			4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																									
1,1	Descapote a máquina y/o manual profundidad 0.30 m, incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado.	m2	$ 17.227,00	604,00	**$ 10.405.108,00**		319,42	$ 5.502.648,00		319,42	$ 5.502.648,00		319,42	$ 5.502.648,00		319,42	$ 5.502.648,00		319,42	$ 5.502.648,00	=			**319,42**	**$ 5.502.648,00**	
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, incluye postes en madera rolliza y/o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	$ 16.901,00	112,83	**$ 1.906.914,00**		113,02	$ 1.910.151,00		113,02	$ 1.910.151,00		113,02	$ 1.910.151,00		113,02	$ 1.910.151,00		113,02	$ 1.910.151,00	=			**113,02**	**$ 1.910.151,00**	
1,3	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRÁFICA	m2	$ 3.101,00	604,00	**$ 1.873.004,00**		319,42	$ 990.521,00		360,00	$ 1.116.360,00		360,00	$ 1.116.360,00		360,00	$ 1.116.360,00		360,00	$ 1.116.360,00	=			**360,00**	**$ 1.116.360,00**	
1,4	RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	$ 402.886,00	1,00	**$ 402.886,00**		1,00	$ 402.886,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
1,5	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	$ 1.651.882,00	1,00	**$ 1.651.882,00**		1,00	$ 1.651.882,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																									
2,1	CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECANICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en m3 en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye selección, trasiego, almacenamiento en obra, disposición interna en el proyecto, profundidad hasta 2,00 m.	m3	$ 37.867,00	190,00	**$ 7.194.730,00**		190,00	$ 7.194.730,00		190,00	$ 7.194.730,00		190,00	$ 7.194.730,00		190,00	$ 7.194.730,00		264,45	$ 10.013.928,00	=			**264,45**	**$ 10.013.928,00**	
2,3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	$ 18.101,00	34,00	**$ 615.434,00**		34,00	$ 615.434,00		69,00	$ 1.248.969,00		69,00	$ 1.248.969,00		69,00	$ 1.248.969,00		308,72	$ 5.588.141,00	=			**308,72**	**$ 5.588.141,00**	
2,4	RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	$ 198.716,00	27,23	**$ 5.411.924,00**		27,23	$ 5.411.924,00		27,23	$ 5.411.924,00		27,23	$ 5.411.924,00		122,34	$ 24.310.915,00		122,34	$ 24.310.915,00	=			**122,34**	**$ 24.310.915,00**	
2,5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos	m3	$ 55.520,00	16,80	**$ 932.736,00**		16,80	$ 932.736,00		16,80	$ 932.736,00		16,80	$ 932.736,00		0,00	$ -		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
2,6	RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 50 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU).	m3	$ 53.863,00	7,00	**$ 377.041,00**		7,00	$ 377.041,00		7,00	$ 377.041,00		7,00	$ 377.041,00		7,00	$ 377.041,00		7,00	$ 377.041,00	=			**7,00**	**$ 377.041,00**	
3	**CIMENTACIÓN**																									
3,1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0,05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	$ 30.474,00	62,00	**$ 1.889.388,00**		62,00	$ 1.889.388,00		62,00	$ 1.889.388,00		62,00	$ 1.889.388,00		59,85	$ 1.823.869,00		63,57	$ 1.937.232,00	=			**63,57**	**$ 1.937.232,00**	
3,2	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 290.706,00	5,00	**$ 1.453.530,00**		5,00	$ 1.453.530,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
3,3,1	ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 665.177,00	21,16	**$ 14.073.920,00**		21,16	$ 14.073.920,00		25,56	$ 17.000.699,00		25,56	$ 17.000.699,00		23,94	$ 15.923.112,00		23,94	$ 15.924.337,00	=			**23,94**	**$ 15.924.337,00**	
3,4,1	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	$ 687.885,00	14,26	**$ 9.810.540,00**		14,26	$ 9.810.540,00		14,26	$ 9.810.540,00		14,26	$ 9.810.540,00		13,16	$ 9.053.867,00		22,43	$ 15.429.261,00	=			**22,43**	**$ 15.429.261,00**	
3,5	Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf:>4,1<=7,0 cm (ver adicional el item de sellante).	m	$ 6.325,00	40,00	**$ 253.000,00**		40,00	$ 253.000,00		40,00	$ 253.000,00		40,00	$ 253.000,00		40,00	$ 253.000,00		40,00	$ 253.000,00	=			**40,00**	**$ 253.000,00**	
3,6	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf:>4,1<=10,0 mm a.>9,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	$ 17.684,00	40,00	**$ 707.360,00**		40,00	$ 707.360,00		40,00	$ 707.360,00		40,00	$ 707.360,00		40,00	$ 707.360,00		40,00	$ 707.360,00	=			**40,00**	**$ 707.360,00**	
3,7	PILOTE CUADRADO HINCADO 25X25CM, f'c = 3000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	$ 409.802,00	400,00	**$ 163.920.800,00**		624,80	$ 256.044.290,00		624,80	$ 256.044.290,00		624,80	$ 256.044.290,00		624,80	$ 256.044.290,00		624,80	$ 256.044.290,00	=			**624,80**	**$ 256.044.290,00**	
3,8	Descabece de pilotes con martillo percutor, incluye cargue y retiro de sobrantes.	m	$ 55.409,00	55,20	**$ 3.058.577,00**		56,80	$ 3.147.231,00		56,80	$ 3.147.231,00		56,80	$ 3.147.231,00		56,80	$ 3.147.231,00		56,80	$ 3.147.231,00	=			**56,80**	**$ 3.147.231,00**	
4	**REFUERZO**																									
4,1	Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 6.739,00	11410,98	**$ 76.898.574,00**		11.410,98	$ 76.898.574,00		11410,98	$ 76.898.574,00		23.451,33	$ 158.038.513,00		23451,33	$ 158.038.513,00		23451,33	$ 158.038.513,00	=			**23.451,33**	**$ 158.038.513,00**	
4,2	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 8.056,00	1722,00	**$ 13.872.432,00**		1.722,00	$ 13.872.432,00		1722,00	$ 13.872.432,00		6.228,06	$ 50.173.251,00		3722,00	$ 29.984.432,00		2281,14	$ 18.376.864,00	-	**-0,01**		**2.281,13**	**$ 18.376.783,00**	Se presenta una menor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
4,4	ANCLAJES PARA VARILLA ø 1/2" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	$ 11.085,00	128,00	**$ 1.418.880,00**		128,00	$ 1.418.880,00		128,00	$ 1.418.880,00		128,00	$ 1.418.880,00		128,00	$ 1.418.880,00		120,00	$ 1.330.200,00	=			**120,00**	**$ 1.330.200,00**	
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**																									
5,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c=28 Mpa (4000 PSI) e=0,10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 107.789,00	25,00	**$ 2.694.725,00**		25,00	$ 2.694.725,00		25,00	$ 2.694.725,00		25,00	$ 2.694.725,00		25,00	$ 2.694.725,00		10,50	$ 1.131.785,00	=			**10,50**	**$ 1.131.785,00**	
5,2	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 892.638,00	12,25	**$ 10.934.816,00**		12,25	$ 10.934.816,00		12,25	$ 10.934.816,00		12,25	$ 10.934.816,00		12,18	$ 10.872.331,00		11,07	$ 9.881.503,00	+	**1,11**		**12,18**	**$ 10.872.331,00**	Se presenta una mayor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATO No: 4348 de 2024
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO
INTERVENTOR: SEIING S.A.S
VALOR: $1.795.350.594,00
FECHA: 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																		4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
5,3	VIGAS DE CORONACIÓN EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 903.586,00	27,54	**$ 24.884.758,00**		27,54	$ 24.884.758,00		27,54	$ 24.884.758,00		27,54	$ 24.884.758,00		27,54	$ 24.884.758,00		8,62	$ 7.788.911,00	=			**8,62**	**$ 7.788.911,00**	
5,5,1	PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.12) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 171.362,00	267,00	**$ 45.753.654,00**		267,00	$ 45.753.654,00		267,00	$ 45.753.654,00		267,00	$ 45.753.654,00		0,00	$ -		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
5.16	POYO EN CONCRETO REFORZADO f´c=17,5 Mpa (2500 PSI), a=0.45; e=0.08. No incluye acero de refuerzo.	m	$ 44.347,00	32,10	**$ 1.423.539,00**		32,10	$ 1.423.539,00		32,10	$ 1.423.539,00		32,10	$ 1.423.539,00		32,10	$ 1.423.539,00		33,12	$ 1.468.773,00	=			**33,12**	**$ 1.468.773,00**	
5.24	MORTERO TIPO S, DE RELLENO PARA DOVELAS	m3	$ 663.346,00	0,97	**$ 645.210,00**		0,97	$ 645.210,00		0,97	$ 645.210,00		0,97	$ 645.210,00		0,97	$ 645.210,00		0,54	$ 358.207,00	=			**0,54**	**$ 358.207,00**	
5.25	Viga canal forma en H, en concreto reforzado de 3.000 PSI, incluye mortero normalizado de nivelación para pendientado, impermeabilización elástica de ángulos rectos y/o juntas, impermeabilización con mortero cementoso bicomponente de alta elasticidad , según diseño.	m	$ 1.399.350,00	60,00	**$ 83.961.000,00**		60,00	$ 83.961.000,00		60,00	$ 83.961.000,00		60,00	$ 83.961.000,00		60,00	$ 83.961.000,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
6	**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**																									
6,8,1	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN 3"X6" PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 243.409,00	368,00	**$ 89.574.512,00**		197,42	$ 48.053.805,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
6,8,2	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL SAPÁN 2"X4" PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 235.887,00	400,00	**$ 94.354.800,00**		209,61	$ 49.445.069,00		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
6,8,3	Platina Alumidi 120 ROTHOBLASS, con anclajes Vin fix pro para concreto y pasadores STA a madera o similares. (Para conexiones a elementos en concreto y entre madera)	u	$ 113.860,00	32,00	**$ 3.643.520,00**		32,00	$ 3.643.520,00		32,00	$ 3.643.520,00		32,00	$ 3.643.520,00		32,00	$ 3.643.520,00		138,00	$ 15.712.680,00	=			**138,00**	**$ 15.712.680,00**	
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN**																									
	REDES SANITARIAS Y RED PLUVIAL(EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)																									
7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	u	$ 813.145,00	1,00	**$ 813.145,00**		1,00	$ 813.145,00		1,00	$ 813.145,00		1,00	$ 813.145,00		1,00	$ 813.145,00		1,00	$ 813.145,00	=			**1,00**	**$ 813.145,00**	
7.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 20.850,00	20,40	**$ 425.340,00**		20,40	$ 425.340,00		20,40	$ 425.340,00		20,40	$ 425.340,00		20,40	$ 425.340,00		59,57	$ 1.242.035,00	=			**59,57**	**$ 1.242.035,00**	
7.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 18.137,00	28,70	**$ 520.532,00**		28,70	$ 520.532,00		28,70	$ 520.532,00		28,70	$ 520.532,00		28,70	$ 520.532,00		46,46	$ 842.645,00	=			**46,46**	**$ 842.645,00**	
7.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 10.766,00	18,90	**$ 203.477,00**		18,90	$ 203.477,00		18,90	$ 203.477,00		18,90	$ 203.477,00		18,90	$ 203.477,00		44,57	$ 479.841,00	=			**44,57**	**$ 479.841,00**	
7.1.12	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 37.448,00	11,00	**$ 411.928,00**		11,00	$ 411.928,00		11,00	$ 411.928,00		11,00	$ 411.928,00		11,00	$ 411.928,00		6,00	$ 224.688,00	=			**6,00**	**$ 224.688,00**	
7.1.14	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 42.179,00	4,00	**$ 168.716,00**		4,00	$ 168.716,00		4,00	$ 168.716,00		4,00	$ 168.716,00		4,00	$ 168.716,00		3,00	$ 126.537,00	=			**3,00**	**$ 126.537,00**	
7.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 136.468,00	4,00	**$ 545.872,00**		4,00	$ 545.872,00		4,00	$ 545.872,00		4,00	$ 545.872,00		4,00	$ 545.872,00		3,00	$ 409.404,00	=			**3,00**	**$ 409.404,00**	
7.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 133.119,00	6,00	**$ 798.714,00**		6,00	$ 798.714,00		6,00	$ 798.714,00		6,00	$ 798.714,00		6,00	$ 798.714,00		6,00	$ 798.714,00	=			**6,00**	**$ 798.714,00**	
7.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 39.946,00	5,00	**$ 199.730,00**		5,00	$ 199.730,00		5,00	$ 199.730,00		5,00	$ 199.730,00		5,00	$ 199.730,00		2,00	$ 79.892,00	=			**2,00**	**$ 79.892,00**	
7.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	$ 2.007.603,00	3,00	**$ 6.022.809,00**		3,00	$ 6.022.809,00		3,00	$ 6.022.809,00		3,00	$ 6.022.809,00		3,00	$ 6.022.809,00		2,00	$ 4.015.206,00	=			**2,00**	**$ 4.015.206,00**	
7.1.13	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 41.786,00	1,00	**$ 41.786,00**		1,00	$ 41.786,00		1,00	$ 41.786,00		1,00	$ 41.786,00		1,00	$ 41.786,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
7.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" (manguera, solo para pocetas y jardines si se requieren)	u	$ 34.464,00	5,00	**$ 172.320,00**		5,00	$ 172.320,00		5,00	$ 172.320,00		5,00	$ 172.320,00		5,00	$ 172.320,00		4,00	$ 137.856,00	=			**4,00**	**$ 137.856,00**	
7,2	**REDES HIDRÁULICAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)**																									
7.2.3	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 78.011,00	2,00	**$ 156.022,00**		2,00	$ 156.022,00		2,00	$ 156.022,00		2,00	$ 156.022,00		2,00	$ 156.022,00		5,00	$ 390.055,00	=			**5,00**	**$ 390.055,00**	
7.2.1	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 46.798,00	4,00	**$ 187.192,00**		4,00	$ 187.192,00		4,00	$ 187.192,00		4,00	$ 187.192,00		4,00	$ 187.192,00		7,00	$ 327.586,00	=			**7,00**	**$ 327.586,00**	
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 44.265,00	6,90	**$ 305.429,00**		6,90	$ 305.429,00		6,90	$ 305.429,00		6,90	$ 305.429,00		6,90	$ 305.429,00		33,64	$ 1.489.075,00	=			**33,64**	**$ 1.489.075,00**	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 26.360,00	9,70	**$ 255.692,00**		9,70	$ 255.692,00		9,70	$ 255.692,00		9,70	$ 255.692,00		9,70	$ 255.692,00		8,72	$ 229.859,00	=			**8,72**	**$ 229.859,00**	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 48.034,00	2,00	**$ 96.068,00**		2,00	$ 96.068,00		2,00	$ 96.068,00		2,00	$ 96.068,00		2,00	$ 96.068,00		7,00	$ 336.238,00	=			**7,00**	**$ 336.238,00**	
7.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 108.542,00	4,00	**$ 434.168,00**		4,00	$ 434.168,00		4,00	$ 434.168,00		4,00	$ 434.168,00		4,00	$ 434.168,00		5,00	$ 542.710,00	=			**5,00**	**$ 542.710,00**	
7.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 14.524,00	8,20	**$ 119.097,00**		8,20	$ 119.097,00		8,20	$ 119.097,00		8,20	$ 119.097,00		8,20	$ 119.097,00		8,38	$ 121.711,00	=			**8,38**	**$ 121.711,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD | **CONTRATO No:** 4348 de 2024 | **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S | **VALOR:** $1.795.350.594,00 | **FECHA:** 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																		4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
7,3	**REDES DE RECOLECCIÓN O AGUAS LLUVIAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)**																									
7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 58.094,00	13,60	**$ 790.078,00**		13,60	$ 790.078,00		13,60	$ 790.078,00		13,60	$ 790.078,00		13,60	$ 790.078,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
7.3.1A	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño)	m	$ 180.641,00	8,00	**$ 1.445.128,00**		8,00	$ 1.445.128,00		8,00	$ 1.445.128,00		8,00	$ 1.445.128,00		8,00	$ 1.445.128,00		4,00	$ 722.564,00	=			**4,00**	**$ 722.564,00**	
7.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 35.594,00	34,60	**$ 1.231.552,00**		34,60	$ 1.231.552,00		34,60	$ 1.231.552,00		34,60	$ 1.231.552,00		34,60	$ 1.231.552,00		11,35	$ 403.992,00	=			**11,35**	**$ 403.992,00**	
7.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	$ 61.870,00	8,80	**$ 544.456,00**		8,80	$ 544.456,00		8,80	$ 544.456,00		8,80	$ 544.456,00		8,80	$ 544.456,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
7.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.	m	$ 35.945,00	12,80	**$ 460.096,00**		12,80	$ 460.096,00		12,80	$ 460.096,00		12,80	$ 460.096,00		12,80	$ 460.096,00		4,40	$ 158.158,00	=			**4,40**	**$ 158.158,00**	
7.3.14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.60*0.60 m (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	$ 570.323,00	1,00	**$ 570.323,00**		1,00	$ 570.323,00		1,00	$ 570.323,00		1,00	$ 570.323,00		1,00	$ 570.323,00		1,00	$ 570.323,00	=			**1,00**	**$ 570.323,00**	
7.3.18	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	$ 530.733,00	5,00	**$ 2.653.665,00**		5,00	$ 2.653.665,00		5,00	$ 2.653.665,00		5,00	$ 2.653.665,00		5,00	$ 2.653.665,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
7.3.19	CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	$ 93.155,00	65,00	**$ 6.055.075,00**		65,00	$ 6.055.075,00		65,00	$ 6.055.075,00		65,00	$ 6.055.075,00		65,00	$ 6.055.075,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
7.3.16	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 80x80x1.50 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	$ 878.041,00	7,00	**$ 6.146.287,00**		7,00	$ 6.146.287,00		7,00	$ 6.146.287,00		7,00	$ 6.146.287,00		7,00	$ 6.146.287,00		2,00	$ 1.756.082,00	=			**2,00**	**$ 1.756.082,00**	
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**																									
8,1	**EQUIPO DE MEDIDA**																									
8.1.1	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes	u	$ 353.292,00	1,00	**$ 353.292,00**		1,00	$ 353.292,00		1,00	$ 353.292,00		1,00	$ 353.292,00		1,00	$ 353.292,00		1,00	$ 353.292,00	=			**1,00**	**$ 353.292,00**	
8,2	**REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN**																									
8.2.1	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación	m	$ 25.074,00	128,00	**$ 3.209.472,00**		128,00	$ 3.209.472,00		128,00	$ 3.209.472,00		128,00	$ 3.209.472,00		128,00	$ 3.209.472,00		60,00	$ 1.504.440,00	=			**60,00**	**$ 1.504.440,00**	
8.2.2	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red	m	$ 34.942,00	74,00	**$ 2.585.708,00**		74,00	$ 2.585.708,00		74,00	$ 2.585.708,00		74,00	$ 2.585.708,00		74,00	$ 2.585.708,00		40,00	$ 1.397.680,00	=			**40,00**	**$ 1.397.680,00**	
8.2.3	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma. incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 627.430,00	4,00	**$ 2.509.720,00**		4,00	$ 2.509.720,00		4,00	$ 2.509.720,00		4,00	$ 2.509.720,00		4,00	$ 2.509.720,00		4,00	$ 2.509.720,00	=			**4,00**	**$ 2.509.720,00**	
8,3	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**																									
8.3.1	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye: módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x60a de 25/15KA SCHNEIDER, ABB, LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x20A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) dps de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10kA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a merz ó similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar	u	$ 6.815.411,00	1,00	**$ 6.815.411,00**		1,00	$ 6.815.411,00		1,00	$ 6.815.411,00		1,00	$ 6.815.411,00		1,00	$ 6.815.411,00		1,00	$ 6.815.411,00	=			**1,00**	**$ 6.815.411,00**	
8.3.2	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 12 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). Marcación en acrílico TN1 y TN2	u	$ 1.038.999,00	1,00	**$ 1.038.999,00**		1,00	$ 1.038.999,00		1,00	$ 1.038.999,00		1,00	$ 1.038.999,00		1,00	$ 1.038.999,00		1,00	$ 1.038.999,00	=			**1,00**	**$ 1.038.999,00**	
8.3.3	Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución monofásico de 6 Circuitos con totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, interruptor termomagnetico 1x30A 10kA, cinco (5) interruptores 1x20A 10kA; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado). TR1 y TR2	u	$ 405.548,00	1,00	**$ 405.548,00**		1,00	$ 405.548,00		1,00	$ 405.548,00		1,00	$ 405.548,00		1,00	$ 405.548,00		1,00	$ 405.548,00	=			**1,00**	**$ 405.548,00**	
8,4	**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN RCI Y BOMBAS DE SUMINISTRO**																									
8.4.1	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N #2 + 1T #4AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre medidor y tablero de distribución principal	m	$ 144.791,00	45,00	**$ 6.515.595,00**		45,00	$ 6.515.595,00		45,00	$ 6.515.595,00		45,00	$ 6.515.595,00		45,00	$ 6.515.595,00		70,00	$ 10.135.370,00	=			**70,00**	**$ 10.135.370,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD | **CONTRATO No:** 4348 de 2024 | **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S | **VALOR:** $1.795.350.594,00 | **FECHA:** 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																		4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.4.2	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TN1, TGD y TN2	m	$ 64.679,00	15,00	**$ 970.185,00**		15,00	$ 970.185,00		15,00	$ 970.185,00		15,00	$ 970.185,00		15,00	$ 970.185,00		10,00	$ 646.790,00	=			**10,00**	**$ 646.790,00**	
8.4.3	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre TGD y TR1, TGD y TR2	m	$ 38.342,00	14,00	**$ 536.788,00**		14,00	$ 536.788,00		14,00	$ 536.788,00		14,00	$ 536.788,00		14,00	$ 536.788,00		20,00	$ 766.840,00	=			**20,00**	**$ 766.840,00**	
8.4.4	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexion bomeras	m	$ 28.037,00	8,00	**$ 224.296,00**		8,00	$ 224.296,00		8,00	$ 224.296,00		8,00	$ 224.296,00		8,00	$ 224.296,00		8,00	$ 224.296,00	=			**8,00**	**$ 224.296,00**	
8,5	**RED NORMAL Y REGULADA**																									
8.5.1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito, caja galvanizada , tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 116.403,00	17,00	**$ 1.978.851,00**		17,00	$ 1.978.851,00		17,00	$ 1.978.851,00		17,00	$ 1.978.851,00		17,00	$ 1.978.851,00		19,00	$ 2.211.657,00	=			**19,00**	**$ 2.211.657,00**	
8.5.2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI instalación embebida en muro (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesoiros PVC y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 182.971,00	2,00	**$ 365.942,00**		2,00	$ 365.942,00		2,00	$ 365.942,00		2,00	$ 365.942,00		2,00	$ 365.942,00		2,00	$ 365.942,00	=			**2,00**	**$ 365.942,00**	
8.5.3	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación embebida en muro; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería PVC DE 3/4", accesorios PVC elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 136.034,00	14,00	**$ 1.904.476,00**		14,00	$ 1.904.476,00		14,00	$ 1.904.476,00		14,00	$ 1.904.476,00		14,00	$ 1.904.476,00		14,00	$ 1.904.476,00	=			**14,00**	**$ 1.904.476,00**	
8.5.4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para tomacorriente normal 1F+N+T 20A 120V, instalación embebida en muro; (incluye Tomacorriente doble blanca tipo Tamper Resist, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), Blanco-Azul-verde, marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 120.639,00	6,00	**$ 723.834,00**		6,00	$ 723.834,00		6,00	$ 723.834,00		6,00	$ 723.834,00		6,00	$ 723.834,00		4,00	$ 482.556,00	=			**4,00**	**$ 482.556,00**	
8.5.5	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 20A 120V; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado tipo Tamper Resist, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, aT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 145.722,00	6,00	**$ 874.332,00**		6,00	$ 874.332,00		6,00	$ 874.332,00		6,00	$ 874.332,00		6,00	$ 874.332,00		4,00	$ 582.888,00	=			**4,00**	**$ 582.888,00**	
8.5.6	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación.	u	$ 224.884,00	2,00	**$ 449.768,00**		2,00	$ 449.768,00		2,00	$ 449.768,00		2,00	$ 449.768,00		2,00	$ 449.768,00		2,00	$ 449.768,00	=			**2,00**	**$ 449.768,00**	
8.5.7	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80°C.	m	$ 18.112,00	120,00	**$ 2.173.440,00**		120,00	$ 2.173.440,00		120,00	$ 2.173.440,00		120,00	$ 2.173.440,00		120,00	$ 2.173.440,00		120,00	$ 2.173.440,00	=			**120,00**	**$ 2.173.440,00**	
8.6	**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA**																									
8.6.1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación)y demas elémentos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 21.825,00	40,00	**$ 873.000,00**		40,00	$ 873.000,00		40,00	$ 873.000,00		40,00	$ 873.000,00		40,00	$ 873.000,00		28,77	$ 627.905,00	=			**28,77**	**$ 627.905,00**	
8.6.2	Suministro e instalación de canaleta plastica 100x45mm 2Mt, incluye accesorios de union, separador, angulos y demas accesorios para su correcta fijacion	m	$ 60.918,00	18,00	**$ 1.096.524,00**		18,00	$ 1.096.524,00		18,00	$ 1.096.524,00		18,00	$ 1.096.524,00		18,00	$ 1.096.524,00		17,26	$ 1.051.445,00	=			**17,26**	**$ 1.051.445,00**	
8,7	**ILUMINACIÓN**																									
8.7.1	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 139.206,00	9,00	**$ 1.252.854,00**		9,00	$ 1.252.854,00		9,00	$ 1.252.854,00		9,00	$ 1.252.854,00		9,00	$ 1.252.854,00		16,00	$ 2.227.296,00	=			**16,00**	**$ 2.227.296,00**	
8.7.2	Suministro de materiales y mano de obra para nstalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería conduit PVC empotrada empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 178.963,00	4,00	**$ 715.852,00**		4,00	$ 715.852,00		4,00	$ 715.852,00		4,00	$ 715.852,00		4,00	$ 715.852,00		3,00	$ 536.889,00	=			**3,00**	**$ 536.889,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATO No: 4348 de 2024
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO
INTERVENTOR: SEIING S.A.S
VALOR: $1.795.350.594,00
FECHA: 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																		4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8.7.3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 235.759,00	39,00	**$ 9.194.601,00**		39,00	$ 9.194.601,00		39,00	$ 9.194.601,00		39,00	$ 9.194.601,00		39,00	$ 9.194.601,00		73,00	$ 17.210.407,00	=			**73,00**	**$ 17.210.407,00**	
8.7.4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación embebida en muro; (incluye, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 124.628,00	16,00	**$ 1.994.048,00**		16,00	$ 1.994.048,00		16,00	$ 1.994.048,00		16,00	$ 1.994.048,00		16,00	$ 1.994.048,00		6,00	$ 747.768,00	=			**6,00**	**$ 747.768,00**	
8.7.5	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida de iluminación de emergencia; embebida en muro (incluye cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería PVC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 162.903,00	3,00	**$ 488.709,00**		3,00	$ 488.709,00		3,00	$ 488.709,00		3,00	$ 488.709,00		3,00	$ 488.709,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
8.7.6	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W, 5500 Lumens,de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, kit de guayas aceradas para descolgar y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	un	$ 730.137,00	19,00	**$ 13.872.603,00**		19,00	$ 13.872.603,00		19,00	$ 13.872.603,00		19,00	$ 13.872.603,00		19,00	$ 13.872.603,00		21,00	$ 15.332.877,00	=			**21,00**	**$ 15.332.877,00**	
8.7.7	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 18 W Flujo Luminoso mínimo 1300 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.	un	$ 107.028,00	4,00	**$ 428.112,00**		4,00	$ 428.112,00		4,00	$ 428.112,00		4,00	$ 428.112,00		4,00	$ 428.112,00		4,00	$ 428.112,00	=			**4,00**	**$ 428.112,00**	
8.7.8	Suministro e instalación de luminaria hermetica de 36W Flujo Luminoso mínimo 4500 Lumenes Temperatura De Color 4000K CRI 80 Ángulo De Apertura 100°, 120 V, Vida Útil De 50.000 Horas.	un	$ 169.570,00	4,00	**$ 678.280,00**		4,00	$ 678.280,00		4,00	$ 678.280,00		4,00	$ 678.280,00		4,00	$ 678.280,00		5,00	$ 847.850,00	=			**5,00**	**$ 847.850,00**	
8.7.9	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de iluminación Sensor 360° horizontal Voltaje 120V 60Hz Consumo estático 0.5W Distancia de transmisión 6 metros Material Pasta. Incluye: Cable 2x12AWG, Tubería 3/4 EMT, Caja 2400, elementos de fijación, tapa y demás elementos para su correcta instalación.	u	$ 250.908,00	2,00	**$ 501.816,00**		2,00	$ 501.816,00		2,00	$ 501.816,00		2,00	$ 501.816,00		2,00	$ 501.816,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
8.7.10	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED tipo aplique, mínimo 350 lúmenes, IP20, mínimo 90 minutos de autonomía	un	$ 143.917,00	17,00	**$ 2.446.589,00**		17,00	$ 2.446.589,00		17,00	$ 2.446.589,00		17,00	$ 2.446.589,00		17,00	$ 2.446.589,00		20,00	$ 2.878.340,00	=			**20,00**	**$ 2.878.340,00**	
8.7.11	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía	un	$ 137.630,00	4,00	**$ 550.520,00**		4,00	$ 550.520,00		4,00	$ 550.520,00		4,00	$ 550.520,00		4,00	$ 550.520,00		4,00	$ 550.520,00	=			**4,00**	**$ 550.520,00**	
8,8	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**																									
8.8.1	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para control.	u	$ 885.366,00	1,00	**$ 885.366,00**		1,00	$ 885.366,00		1,00	$ 885.366,00		1,00	$ 885.366,00		1,00	$ 885.366,00		1,00	$ 885.366,00	=			**1,00**	**$ 885.366,00**	
8.8.2	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x700 mm (Norma técnica codensa AP080 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 387.891,00	1,00	**$ 387.891,00**		1,00	$ 387.891,00		1,00	$ 387.891,00		1,00	$ 387.891,00		1,00	$ 387.891,00		3,00	$ 1.163.673,00	=			**3,00**	**$ 1.163.673,00**	
8.8.3	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona	m	$ 34.942,00	50,00	**$ 1.747.100,00**		50,00	$ 1.747.100,00		50,00	$ 1.747.100,00		50,00	$ 1.747.100,00		50,00	$ 1.747.100,00		13,90	$ 485.694,00	=			**13,90**	**$ 485.694,00**	
8.8.5	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de inspección, uniones, accesorios y demás elementos para su correcta instalación.	m	$ 18.986,00	50,00	**$ 949.300,00**		50,00	$ 949.300,00		50,00	$ 949.300,00		50,00	$ 949.300,00		50,00	$ 949.300,00		16,40	$ 311.370,00	=			**16,40**	**$ 311.370,00**	
8.8.6	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color maximo 3000K, mínimo 980 Lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	un	$ 378.384,00	16,00	**$ 6.054.144,00**		16,00	$ 6.054.144,00		16,00	$ 6.054.144,00		16,00	$ 6.054.144,00		16,00	$ 6.054.144,00		18,00	$ 6.810.912,00	=			**18,00**	**$ 6.810.912,00**	
8.8.7	Suministro e instalación de poste metalico poligonal para iluminación 3m, 150kgf,brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla,, (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP	u	$ 831.040,00	1,00	**$ 831.040,00**		1,00	$ 831.040,00		1,00	$ 831.040,00		1,00	$ 831.040,00		1,00	$ 831.040,00		1,00	$ 831.040,00	=			**1,00**	**$ 831.040,00**	
8.8.8	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180, , temperatura de color maximo 3000K, lumens de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación	un	$ 124.276,00	7,00	**$ 869.932,00**		7,00	$ 869.932,00		7,00	$ 869.932,00		7,00	$ 869.932,00		7,00	$ 869.932,00		6,00	$ 745.656,00	=			**6,00**	**$ 745.656,00**	
8.8.9	Suministro e instalación de salida de iluminación en piso incluye caja plastica, tuberia PV 3/4" y accesorios,5m cable de cobre 3X12 THHN/THWN-2	un	$ 123.222,00	7,00	**$ 862.554,00**		7,00	$ 862.554,00		7,00	$ 862.554,00		7,00	$ 862.554,00		7,00	$ 862.554,00		6,00	$ 739.332,00	=			**6,00**	**$ 739.332,00**	
8,9	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**																									
8.9.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo Nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	$ 66.977,00	30,00	**$ 2.009.310,00**		30,00	$ 2.009.310,00		30,00	$ 2.009.310,00		30,00	$ 2.009.310,00		30,00	$ 2.009.310,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
8.9.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	$ 37.373,00	4,00	**$ 149.492,00**		4,00	$ 149.492,00		4,00	$ 149.492,00		4,00	$ 149.492,00		4,00	$ 149.492,00		1,00	$ 37.373,00	=			**1,00**	**$ 37.373,00**	
8.9.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 276.722,00	4,00	**$ 1.106.888,00**		4,00	$ 1.106.888,00		4,00	$ 1.106.888,00		4,00	$ 1.106.888,00		4,00	$ 1.106.888,00		1,00	$ 276.722,00	=			**1,00**	**$ 276.722,00**	
8.9.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 144.981,00	1,00	**$ 144.981,00**		1,00	$ 144.981,00		1,00	$ 144.981,00		1,00	$ 144.981,00		1,00	$ 144.981,00		1,00	$ 144.981,00	=			**1,00**	**$ 144.981,00**	
8.9.5	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	$ 98.224,00	4,00	**$ 392.896,00**		4,00	$ 392.896,00		4,00	$ 392.896,00		4,00	$ 392.896,00		4,00	$ 392.896,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATO No: 4348 de 2024
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO
INTERVENTOR: SEIING S.A.S
VALOR: $1.795.350.594,00
FECHA: 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																				4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)							
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
8,1	**APANTALLAMIENTO**																									
8.10.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	$ 53.063,00	110,00	**$ 5.836.930,00**		110,00	$ 5.836.930,00		110,00	$ 5.836.930,00		110,00	$ 5.836.930,00		110,00	$ 5.836.930,00		109,30	$ 5.799.786,00	=			**109,30**	**$ 5.799.786,00**	
8.10.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	$ 37.373,00	6,00	**$ 224.238,00**		6,00	$ 224.238,00		6,00	$ 224.238,00		6,00	$ 224.238,00		6,00	$ 224.238,00		6,00	$ 224.238,00	=			**6,00**	**$ 224.238,00**	
8.10.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 276.722,00	6,00	**$ 1.660.332,00**		6,00	$ 1.660.332,00		6,00	$ 1.660.332,00		6,00	$ 1.660.332,00		6,00	$ 1.660.332,00		6,00	$ 1.660.332,00	=			**6,00**	**$ 1.660.332,00**	
8.10.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 144.981,00	6,00	**$ 869.886,00**		6,00	$ 869.886,00		6,00	$ 869.886,00		6,00	$ 869.886,00		6,00	$ 869.886,00		6,00	$ 869.886,00	=			**6,00**	**$ 869.886,00**	
8.10.5	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o soporte para fijación a la pared. Altura 1,2m, roscada en diámetro 5/8.	u	$ 187.673,00	6,00	**$ 1.126.038,00**		6,00	$ 1.126.038,00		6,00	$ 1.126.038,00		6,00	$ 1.126.038,00		6,00	$ 1.126.038,00		12,00	$ 2.252.076,00	=			**12,00**	**$ 2.252.076,00**	
8.10.6	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	m	$ 40.241,00	233,00	**$ 9.376.153,00**		233,00	$ 9.376.153,00		233,00	$ 9.376.153,00		233,00	$ 9.376.153,00		233,00	$ 9.376.153,00		138,00	$ 5.553.258,00	=			**138,00**	**$ 5.553.258,00**	
8.10.7	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	u	$ 117.229,00	6,00	**$ 703.374,00**		6,00	$ 703.374,00		6,00	$ 703.374,00		6,00	$ 703.374,00		6,00	$ 703.374,00		6,00	$ 703.374,00	=			**6,00**	**$ 703.374,00**	
8,111	**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**																									
8.11.1	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (3,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12 LSHF libre de halógenos, accesorios.	un	$ 140.868,00	4,00	**$ 563.472,00**		4,00	$ 563.472,00		4,00	$ 563.472,00		4,00	$ 563.472,00		4,00	$ 563.472,00		4,00	$ 563.472,00	=			**4,00**	**$ 563.472,00**	
8.11.4	Suministro e instalación de ventilador de pared, mínimo 3 velocidades, aspas mínimo de 12", sistema conexión a 120V	un	$ 406.678,00	2,00	**$ 813.356,00**		2,00	$ 813.356,00		2,00	$ 813.356,00		2,00	$ 813.356,00		2,00	$ 813.356,00		4,00	$ 1.626.712,00	=			**4,00**	**$ 1.626.712,00**	
8.12	**VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**																									
8.12.1	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	gb	$ 3.607.644,00	1,00	**$ 3.607.644,00**		1,00	$ 3.607.644,00		1,00	$ 3.607.644,00		1,00	$ 3.607.644,00		1,00	$ 3.607.644,00		1,00	$ 3.607.644,00	=			**1,00**	**$ 3.607.644,00**	
8.12.2	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	gb	$ 4.509.555,00	1,00	**$ 4.509.555,00**		1,00	$ 4.509.555,00		1,00	$ 4.509.555,00		1,00	$ 4.509.555,00		1,00	$ 4.509.555,00		1,00	$ 4.509.555,00	=			**1,00**	**$ 4.509.555,00**	
8.12.3	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asigandas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados.	gb	$ 2.047.683,00	1,00	**$ 2.047.683,00**		1,00	$ 2.047.683,00		1,00	$ 2.047.683,00		1,00	$ 2.047.683,00		1,00	$ 2.047.683,00		1,00	$ 2.047.683,00	=			**1,00**	**$ 2.047.683,00**	
8.12.4	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	gb	$ 786.401,00	1,00	**$ 786.401,00**		1,00	$ 786.401,00		1,00	$ 786.401,00		1,00	$ 786.401,00		1,00	$ 786.401,00		1,00	$ 786.401,00	=			**1,00**	**$ 786.401,00**	
9	**REDES ESPECIALES**																									
9,1	**CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)**																									
9.1.1	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	u	$ 93.906,00	20,00	**$ 1.878.120,00**		20,00	$ 1.878.120,00		20,00	$ 1.878.120,00		20,00	$ 1.878.120,00		20,00	$ 1.878.120,00		17,00	$ 1.596.402,00	=			**17,00**	**$ 1.596.402,00**	
9.1.2	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	$ 7.702,00	915,00	**$ 7.047.330,00**		915,00	$ 7.047.330,00		915,00	$ 7.047.330,00		915,00	$ 7.047.330,00		915,00	$ 7.047.330,00		272,20	$ 2.096.484,00	=			**272,20**	**$ 2.096.484,00**	
9.1.3	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	u	$ 1.159.657,00	1,00	**$ 1.159.657,00**		1,00	$ 1.159.657,00		1,00	$ 1.159.657,00		1,00	$ 1.159.657,00		1,00	$ 1.159.657,00		1,00	$ 1.159.657,00	=			**1,00**	**$ 1.159.657,00**	
9.1.4	Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000	u	$ 643.692,00	1,00	**$ 643.692,00**		1,00	$ 643.692,00		1,00	$ 643.692,00		1,00	$ 643.692,00		1,00	$ 643.692,00		1,00	$ 643.692,00	=			**1,00**	**$ 643.692,00**	
9.1.5	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	$ 38.110,00	20,00	**$ 762.200,00**		20,00	$ 762.200,00		20,00	$ 762.200,00		20,00	$ 762.200,00		20,00	$ 762.200,00		17,00	$ 647.870,00	=			**17,00**	**$ 647.870,00**	
9.1.6	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad 30CM de 1 RU	u	$ 1.017.815,00	1,00	**$ 1.017.815,00**		1,00	$ 1.017.815,00		1,00	$ 1.017.815,00		1,00	$ 1.017.815,00		1,00	$ 1.017.815,00		1,00	$ 1.017.815,00	=			**1,00**	**$ 1.017.815,00**	
9.1.7	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida	u	$ 2.886.853,00	1,00	**$ 2.886.853,00**		1,00	$ 2.886.853,00		1,00	$ 2.886.853,00		1,00	$ 2.886.853,00		1,00	$ 2.886.853,00		1,00	$ 2.886.853,00	=			**1,00**	**$ 2.886.853,00**	
9.1.8	Suministro e instalación de ACCES POINT DE USO INTERIOR (300Mbps Acces point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Boton QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB)	u	$ 231.600,00	2,00	**$ 463.200,00**		2,00	$ 463.200,00		2,00	$ 463.200,00		2,00	$ 463.200,00		2,00	$ 463.200,00		2,00	$ 463.200,00	=			**2,00**	**$ 463.200,00**	
9.1.9	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de tubería conduit PVC de 3/4"; (incluye cajas de paso , curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 10.123,00	80,00	**$ 809.840,00**		80,00	$ 809.840,00		80,00	$ 809.840,00		80,00	$ 809.840,00		80,00	$ 809.840,00		48,75	$ 493.496,00	=			**48,75**	**$ 493.496,00**	
9.1.10	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 26.703,00	36,00	**$ 961.308,00**		36,00	$ 961.308,00		36,00	$ 961.308,00		36,00	$ 961.308,00		36,00	$ 961.308,00		42,30	$ 1.129.537,00	=			**42,30**	**$ 1.129.537,00**	
9.1.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalaciónny demas elémentos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 21.825,00	60,00	**$ 1.309.500,00**		60,00	$ 1.309.500,00		60,00	$ 1.309.500,00		60,00	$ 1.309.500,00		60,00	$ 1.309.500,00		60,00	$ 1.309.500,00	=			**60,00**	**$ 1.309.500,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATO No: 4348 de 2024
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO
INTERVENTOR: SEIING S.A.S
VALOR: $1.795.350.594,00
FECHA: 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																				4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)							
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
10	**MAMPOSTERÍA**																										
10,1	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°5, Incluye suministro e instalación, grafil doble cada 4ta hilada, mortero de pega 1:3, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 55.420,00	50,50	**$ 2.798.710,00**		50,50	$ 2.798.710,00		50,50	$ 2.798.710,00		50,50	$ 2.798.710,00		50,50	$ 2.798.710,00		114,24	$ 6.331.181,00	=			**114,24**	**$ 6.331.181,00**	
10,16	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones y forma según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	$ 36.741,00	50,00	**$ 1.837.050,00**		50,00	$ 1.837.050,00		50,00	$ 1.837.050,00		50,00	$ 1.837.050,00		50,00	$ 1.837.050,00		60,10	$ 2.208.134,00	+	**6,30**		**66,40**	**$ 2.439.602,00**	Se presenta una mayor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
10,17	VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	$ 46.612,00	10,00	**$ 466.120,00**		10,00	$ 466.120,00		10,00	$ 466.120,00		10,00	$ 466.120,00		10,00	$ 466.120,00		79,30	$ 3.696.332,00	+	**1,38**		**80,68**	**$ 3.760.656,00**	Se presenta una mayor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
10,31	LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete.	m	$ 40.488,00	50,29	**$ 2.036.142,00**		50,29	$ 2.036.142,00		50,29	$ 2.036.142,00		50,29	$ 2.036.142,00		50,29	$ 2.036.142,00		42,64	$ 1.726.408,00	-	**-6,46**		**36,18**	**$ 1.464.856,00**	Se presenta una menor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
10,32	Muro en concreto a la vista de 3.000 PSI en concreto a la vista segun diseños, no incluye refuerzo.	m3	$ 1.403.185,00	5,30	**$ 7.436.881,00**		5,30	$ 7.436.881,00		5,30	$ 7.436.881,00		5,30	$ 7.436.881,00		5,30	$ 7.436.881,00		3,94	$ 5.528.549,00	=			**3,94**	**$ 5.528.549,00**	
11	**CUBIERTA Y CIELO RASO**																										
11,1	**ELEMENTOS DE CUBIERTA**																										
11.1.2	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, desarrollo según diseño, incluye elementos de fijación, acabado con anticorrosivo Wash Primer y pintura en esmalte para exteriores, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m	$ 53.185,00	98,74	**$ 5.251.487,00**		98,74	$ 5.251.487,00		98,74	$ 5.251.487,00		98,74	$ 5.251.487,00		98,74	$ 5.251.487,00		172,78	$ 9.189.304,00	=			**172,78**	**$ 9.189.304,00**	
11.2.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación	m2	$ 214.910,00	300,00	**$ 64.473.000,00**		300,00	$ 64.473.000,00		300,00	$ 64.473.000,00		5,00	$ 1.074.550,00		5,00	$ 1.074.550,00		402,81	$ 86.567.897,00	+	**11,07**		**413,88**	**$ 88.945.949,00**	Se presenta una mayor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
11.3.1	CIELO RASO DESCOLGADO EN LÁMINAS DE DRY WALL DE 1/2", con dilataciones, tratamiento de juntas con cinta malla. Pintura color blanco, 3 manos.	m2	$ 74.643,00	10,00	**$ 746.430,00**		10,00	$ 746.430,00		10,00	$ 746.430,00		10,00	$ 746.430,00		10,00	$ 746.430,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
12	**PAÑETES**																										
12,1	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, canteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	m2	$ 27.005,00	210,17	**$ 5.675.587,00**		210,17	$ 5.675.587,00		210,17	$ 5.675.587,00		210,17	$ 5.675.587,00		210,17	$ 5.675.587,00		207,49	$ 5.603.267,00	+	**73,44**		**280,93**	**$ 7.586.515,00**	Se presenta una mayor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
13	**ENCHAPES**																										
13,2	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +- 0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m	$ 270.329,00	4,20	**$ 1.135.382,00**		4,20	$ 1.135.382,00		4,20	$ 1.135.382,00		4,20	$ 1.135.382,00		4,20	$ 1.135.382,00		4,32	$ 1.167.821,00	=			**4,32**	**$ 1.167.821,00**	
13,3	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PRIMERA CALIDAD, incluye refuerzo con malla electrosoldada en aluminio en todos sus vértices, win de aluminio, mano de obra y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución	u	$ 244.492,00	1,00	**$ 244.492,00**		1,00	$ 244.492,00		1,00	$ 244.492,00		1,00	$ 244.492,00		1,00	$ 244.492,00		1,00	$ 244.492,00	=			**1,00**	**$ 244.492,00**	
13,8	ENCHAPE DE PARED/PISO EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m2	$ 67.617,00	26,20	**$ 1.771.701,00**		26,20	$ 1.771.701,00		26,20	$ 1.771.701,00		26,20	$ 1.771.701,00		26,20	$ 1.771.701,00		13,49	$ 912.153,00	=			**13,49**	**$ 912.153,00**	
14	**BASES Y PISOS**																										
14.1.	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, espesor 4 cm, incluye dilataciones en material flexible (según diseño), pendientado y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 33.936,00	4,91	**$ 166.626,00**		4,91	$ 166.626,00		4,91	$ 166.626,00		4,91	$ 166.626,00		4,91	$ 166.626,00		238,75	$ 8.102.220,00	+	**2,71**		**241,46**	**$ 8.194.187,00**	Se presenta una mayor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
14,15	ENCHAPE DE PISO/PARED EN CERÁMICA GRES NEW TABLÓN TRADICIÓN SAHARA (Dimensión mínima 30 cm X 30 cm) PARA USO INSTITUCIONAL. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m2	$ 67.617,00	245,23	**$ 16.581.717,00**		245,23	$ 16.581.717,00		245,23	$ 16.581.717,00		245,23	$ 16.581.717,00		245,23	$ 16.581.717,00		238,75	$ 16.143.559,00	+	**2,71**		**241,46**	**$ 16.326.801,00**	Se presenta una mayor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
14,16	ZÓCALO SANITARIO EN GRES tipo Media-Caña, GRES SAHARA. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m	$ 62.148,00	16,94	**$ 1.052.476,00**		16,94	$ 1.052.476,00		16,94	$ 1.052.476,00		16,94	$ 1.052.476,00		16,94	$ 1.052.476,00		14,24	$ 884.988,00	=			**14,24**	**$ 884.988,00**	
15	**CARPINTERÍA METALICA Y DE ALUMINIO**																										
15,1	**OTROS ELEMENTOS METÁLICOS**																										
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación	u	$ 118.744,00	1,00	**$ 118.744,00**		1,00	$ 118.744,00		1,00	$ 118.744,00		1,00	$ 118.744,00		1,00	$ 118.744,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
15,3	**PUERTAS METALICAS**																										
15.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CON MARCO Y ESTRUCTURA EN ACERO COLD-ROLLED 4 HOJAS TIPO REJA CON PLATINAS DE 2" (3.30x2.20mts) PARA ENTRADA PRINCIPAL (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P-01). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	un	$ 3.799.040,00	1,00	**$ 3.799.040,00**		1,00	$ 3.799.040,00		1,00	$ 3.799.040,00		1,00	$ 3.799.040,00		1,00	$ 3.799.040,00		2,00	$ 7.598.080,00	=			**2,00**	**$ 7.598.080,00**	
15.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (0.9x2.20 mts.) BAÑO, COCINETA, BODEGA, ASEO, OFICINA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO P-02) Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 517.363,00	11,88	**$ 6.146.272,00**		11,88	$ 6.146.272,00		11,88	$ 6.146.272,00		11,88	$ 6.146.272,00		11,88	$ 6.146.272,00		13,24	$ 6.849.886,00	=			**13,24**	**$ 6.849.886,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD | **CONTRATO No:** 4348 de 2024 | **MUNICIPIO:** FRANCISCO PIZARRO

INTERVENTOR: SEIING S.A.S | **VALOR:** $1.795.350.594,00 | **FECHA:** 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																		4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
15.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA CON MARCO Y ESTRUCTURA EN ACERO COLD-ROLLED CON PLATINAS DE 2" (3.30x2.20mts) PARA FACHADA HACIA LA CALLE (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO R-01). Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	un	$ 2.849.280,00	1,00	**$ 2.849.280,00**		1,00	$ 2.849.280,00		1,00	$ 2.849.280,00		1,00	$ 2.849.280,00		1,00	$ 2.849.280,00		1,00	$ 2.849.280,00	=			**1,00**	**$ 2.849.280,00**	
16	**CARPINTERÍA DE MADERA**																									
16.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES TIPO PERSIANA DE 1.37x0.30mts EN TABLA (9x4cms) EN MADERA DE PINO AMARILLO INMUNIZADO A VACÍO PRESIÓN. INCLUYE PARALES, HERRAJES, ELEMENTOS DE SUJECION, PROTECCIÓN CON LACA PORO ABIERTA TIPO PROFILAN NATURAL A DOS MANOS. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO V-01). PARA FACHADA LARGA 1	m2	$ 213.696,00	91,60	**$ 19.574.554,00**		91,60	$ 19.574.554,00		91,60	$ 19.574.554,00		91,60	$ 19.574.554,00		91,60	$ 19.574.554,00		109,95	$ 23.495.875,00	=			**109,95**	**$ 23.495.875,00**	
17	**CERRADURAS**																									
17,1	COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija Elfeli, 2 Cerrapuertas Ref. 3005; incluye accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 1.950.033,00	2,00	**$ 3.900.066,00**		2,00	$ 3.900.066,00		2,00	$ 3.900.066,00		2,00	$ 3.900.066,00		2,00	$ 3.900.066,00		2,00	$ 3.900.066,00	=			**2,00**	**$ 3.900.066,00**	
17,3	CERRADURA CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO CROMADO MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 52.226,00	6,00	**$ 313.356,00**		6,00	$ 313.356,00		6,00	$ 313.356,00		6,00	$ 313.356,00		6,00	$ 313.356,00		6,00	$ 313.356,00	=			**6,00**	**$ 313.356,00**	
18	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**																									
18.1	**APARATOS SANITARIOS**																									
18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LINEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 658.739,00	1,00	**$ 658.739,00**		1,00	$ 658.739,00		1,00	$ 658.739,00		1,00	$ 658.739,00		1,00	$ 658.739,00		1,00	$ 658.739,00	=			**1,00**	**$ 658.739,00**	
18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 732.925,00	1,00	**$ 732.925,00**		1,00	$ 732.925,00		1,00	$ 732.925,00		1,00	$ 732.925,00		1,00	$ 732.925,00		1,00	$ 732.925,00	=			**1,00**	**$ 732.925,00**	
18.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 402.088,00	1,00	**$ 402.088,00**		1,00	$ 402.088,00		1,00	$ 402.088,00		1,00	$ 402.088,00		1,00	$ 402.088,00		1,00	$ 402.088,00	=			**1,00**	**$ 402.088,00**	
18.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 181.770,00	2,00	**$ 363.540,00**		2,00	$ 363.540,00		2,00	$ 363.540,00		2,00	$ 363.540,00		2,00	$ 363.540,00		2,00	$ 363.540,00	=			**2,00**	**$ 363.540,00**	
18.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 162.862,00	1,00	**$ 162.862,00**		1,00	$ 162.862,00		1,00	$ 162.862,00		1,00	$ 162.862,00		1,00	$ 162.862,00		1,00	$ 162.862,00	=			**1,00**	**$ 162.862,00**	
18,2	**GRIFERIA**																									
18.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 312.813,00	2,00	**$ 625.626,00**		2,00	$ 625.626,00		2,00	$ 625.626,00		2,00	$ 625.626,00		2,00	$ 625.626,00		2,00	$ 625.626,00	=			**2,00**	**$ 625.626,00**	
18.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXOMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 1.090.962,00	1,00	**$ 1.090.962,00**		1,00	$ 1.090.962,00		1,00	$ 1.090.962,00		1,00	$ 1.090.962,00		1,00	$ 1.090.962,00		1,00	$ 1.090.962,00	=			**1,00**	**$ 1.090.962,00**	
18.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 155.199,00	1,00	**$ 155.199,00**		1,00	$ 155.199,00		1,00	$ 155.199,00		1,00	$ 155.199,00		1,00	$ 155.199,00		1,00	$ 155.199,00	=			**1,00**	**$ 155.199,00**	
18.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA POCETA Y RIEGO + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y baja) Incluye desagüe, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 89.988,00	4,00	**$ 359.952,00**		4,00	$ 359.952,00		4,00	$ 359.952,00		4,00	$ 359.952,00		4,00	$ 359.952,00		4,00	$ 359.952,00	=			**4,00**	**$ 359.952,00**	
18.3	**ACCESORIOS**																									
18.3.1	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm., incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	u	$ 399.046,00	1,00	**$ 399.046,00**		1,00	$ 399.046,00		1,00	$ 399.046,00		1,00	$ 399.046,00		1,00	$ 399.046,00		1,00	$ 399.046,00	=			**1,00**	**$ 399.046,00**	
18.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared en acero inoxidable, para 450 toallas plegadas en C o 600 múltifold.	u	$ 241.306,00	2,00	**$ 482.612,00**		2,00	$ 482.612,00		2,00	$ 482.612,00		2,00	$ 482.612,00		2,00	$ 482.612,00		2,00	$ 482.612,00	=			**2,00**	**$ 482.612,00**	
18.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PARED, capacidad en peso: 25 kg, dimensiones 84 cm x 54 cm x 10 cm color gris, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	$ 1.184.774,00	1,00	**$ 1.184.774,00**		1,00	$ 1.184.774,00		1,00	$ 1.184.774,00		1,00	$ 1.184.774,00		1,00	$ 1.184.774,00		1,00	$ 1.184.774,00	=			**1,00**	**$ 1.184.774,00**	
19	**PINTURAS**																									
19,1	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m2	$ 22.852,00	210,17	**$ 4.802.759,00**		210,17	$ 4.802.759,00		210,17	$ 4.802.759,00		210,17	$ 4.802.759,00		210,17	$ 4.802.759,00		207,49	$ 4.741.561,00	=			**207,49**	**$ 4.741.561,00**	
20	**VIDRIOS Y ESPEJOS**																									
20,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 353.055,00	2,00	**$ 706.110,00**		2,00	$ 706.110,00		2,00	$ 706.110,00		2,00	$ 706.110,00		2,00	$ 706.110,00		2,00	$ 706.110,00	=			**2,00**	**$ 706.110,00**	
21	**EQUIPOS Y OTROS**																									

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATO No: 4348 de 2024
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO
INTERVENTOR: SEIING S.A.S
VALOR: $1.795.350.594,00
FECHA: 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																				4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)							
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
21,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS, incluye dotación (ver ficha técnica)	u	$ 281.164,00	1,00	**$ 281.164,00**		1,00	$ 281.164,00		1,00	$ 281.164,00		1,00	$ 281.164,00		1,00	$ 281.164,00		1,00	$ 281.164,00	=			**1,00**	**$ 281.164,00**	
21,2	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LB INCLUYE BASE DE APOYO Y BAJO CUMPLIMIENTO DE NORMA	u	$ 103.614,00	2,00	**$ 207.228,00**		2,00	$ 207.228,00		2,00	$ 207.228,00		2,00	$ 207.228,00		2,00	$ 207.228,00		2,00	$ 207.228,00	=			**2,00**	**$ 207.228,00**	
21,3	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado conformado por una motobomba, un tanque hidroacumulador, arrancador montado, válvula de pie, válvula de cheque, interconexión tanque - manómetro, manómetro, presostato y switch flotador. Tanque presurizado metálico, con membrana soportada en dos puntos de apoyo. Interruptores de presión con diferenciales de 20psi. Arrancadores eléctricos directos con protección térmica incorporada según potencia, control por switch de presión y switch de flotador para protección de mínimo nivel de agua; incluye materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Q = 19.5GPM, HB = 28.2 mca, POTENCIA =1HP.	u	$ 3.453.127,00	2,00	**$ 6.906.254,00**		2,00	$ 6.906.254,00		2,00	$ 6.906.254,00		2,00	$ 6.906.254,00		2,00	$ 6.906.254,00		2,00	$ 6.906.254,00	=			**2,00**	**$ 6.906.254,00**	
22	**CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES**																										
22,1	ANDENES y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el ancho del anden) incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m2	$ 74.068,00	131,00	**$ 9.702.908,00**		131,00	$ 9.702.908,00		131,00	$ 9.702.908,00		131,00	$ 9.702.908,00		131,00	$ 9.702.908,00		73,30	$ 5.429.184,00	=			**73,30**	**$ 5.429.184,00**	
22,2	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	$ 57.867,00	97,00	**$ 5.613.099,00**		97,00	$ 5.613.099,00		97,00	$ 5.613.099,00		97,00	$ 5.613.099,00		97,00	$ 5.613.099,00		0,00	$ -	=			**0,00**	**$ -**	
22,7	BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación	u	$ 165.927,00	10,05	**$ 1.667.566,00**		10,05	$ 1.667.566,00		10,05	$ 1.667.566,00		10,05	$ 1.667.566,00		10,05	$ 1.667.566,00		12,00	$ 1.991.124,00	-	**-6,00**		**6,00**	**$ 995.562,00**	Se presenta una menor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
23	**SEÑALIZACIÓN**																										
23,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS METÁLICAS, CON EL TEXTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO, UBICADO SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	un	$ 54.508,00	26,00	**$ 1.417.208,00**		26,00	$ 1.417.208,00		26,00	$ 1.417.208,00		26,00	$ 1.417.208,00		26,00	$ 1.417.208,00		26,00	$ 1.417.208,00	=			**26,00**	**$ 1.417.208,00**	
23,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN	gb	$ 832.835,00	1,00	**$ 832.835,00**		1,00	$ 832.835,00		1,00	$ 832.835,00		1,00	$ 832.835,00		1,00	$ 832.835,00		1,00	$ 832.835,00	=			**1,00**	**$ 832.835,00**	
25	**ASEO GENERAL**																										
25,1	ASEO GENERAL DE OBRA	m2	$ 3.940,00	604,00	**$ 2.379.760,00**		604,00	$ 2.379.760,00		604,00	$ 2.379.760,00		604,00	$ 2.379.760,00		604,00	$ 2.379.760,00		319,42	$ 1.258.515,00	=			**319,42**	**$ 1.258.515,00**	
26	**NO PREVISTOS**																										
26,1	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CAIMO - CAIMITO 7CM X 15CM PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contraventos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 243.409,00							197,42	$ 48.053.805,00		90,58	$ 22.048.881,00		81,15	$ 19.753.252,00		501,35	$ 122.033.102,00	=			**501,35**	**$ 122.033.102,00**	
26,2	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CAIMO - CAIMITO 5CM X 11CM PARA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contraventos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	m	$ 235.887,00							208,86	$ 49.267.214,00		90,00	$ 21.229.830,00		90,00	$ 21.229.830,00		708,96	$ 167.234.448,00	=			**708,96**	**$ 167.234.448,00**	
26,3	PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m2	$ 159.752,00													326,97	$ 52.234.111,00		323,43	$ 51.668.589,00	+	**3,54**		**326,97**	**$ 52.234.111,00**	Se presenta una mayor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
26,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO ESTRUCTURAL CON ROSCA TOTAL ROTHOBLAAS O SIMILAR, Ø 9 MM Y LONGITUD 160 MM	u	$ 7.575,00																690,00	$ 5.226.750,00	=			**690,00**	**$ 5.226.750,00**	
26,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE QUIMICO EN VARILLA ø 3/8" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, Epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	u	$ 14.193,00																160,00	$ 2.270.880,00	=			**160,00**	**$ 2.270.880,00**	
26,6	VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f'c=28 Mpa (4.000 PSI) impermeabilizado , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 y/o similar, capas en todo el contorno de la canal, incluye mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la	m3	$ 1.988.843,00																18,91	$ 37.609.021,00	=			**18,91**	**$ 37.609.021,00**	
26,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZADOPARA MUROS EXTERIORES E INTERIORES H<=3.00 M.-INCLUYE APLICACIÓN	m2	$ 30.311,00																207,49	$ 6.289.229,00	=			**207,49**	**$ 6.289.229,00**	
26,8	CAMPO DE INFILTRACION DE 14m x 8m x 0.60 EN TUBERIA DE 4". INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTIL Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Gb	$ 36.769.188,00																1,00	$ 36.769.188,00	=			**1,00**	**$ 36.769.188,00**	
26,9	DEMOLICIÓN ELEMENTOS EN CONCRETO	m3	$ 203.927,00																4,32	$ 880.965,00	=			**4,32**	**$ 880.965,00**	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 06

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATO No: 4348 de 2024
MUNICIPIO: FRANCISCO PIZARRO
INTERVENTOR: SEIING S.A.S
VALOR: $1.795.350.594,00
FECHA: 20/02/2026

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES					3. MODIFICACIONES																		4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)		JUSTIFICACIÓN
						(ACTA 1 -19 DE SEPTIEMBRE DE 2025)			(ACTA 2 - 16 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 3 - 27 DE OCTUBRE DE 2025)			(ACTA 4 - 27 DE NOVIEMBRE DE 2025)			(ACTA 5 - 28 DE ENERO DE 2026) MODIFICATORIO No 3. PRÓRROGA No 2. ADICIÓN No 1			PRESENTE ACTA (ACTA 6 - 20 DE FEBRERO DE 2026)					
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
26.10.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA EXPANDIDA 12 CALIBRE 18 CON TERMINADO EN PINTURA EPOXIPOLIAMINA Y PUERTA DOBLE BATIENTE	m2	$ 257.029,00																97,15	$ 24.970.367,00	=			**97,15**	**$ 24.970.367,00**	
26,11	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACION DE PLATINAS 240X200X3/8", DOS PLATINAS DE 200X150X3/8" Y DOS PLATINAS DE 150X150X3/8" PARA CONEXIONES DE VIGAS DE MADERA PARA ESTRUCTURA DE MADERA	u	$ 328.606,00																16,00	$ 5.257.696,00	=			**16,00**	**$ 5.257.696,00**	
26,12	ENTIBADO EN MADERA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN	m2	$ 54.821,00																247,85	$ 13.587.385,00	=			**247,85**	**$ 13.587.385,00**	
26,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 5000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)	u	$ 4.346.220,00																1,00	$ 4.346.220,00	=			**1,00**	**$ 4.346.220,00**	
26,14	MENSULAS EN CONCRETO DE 4000 PSI f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto	u	$ 653.932,00																16,00	$ 10.462.912,00	-	**-8,00**		**8,00**	**$ 5.231.456,00**	Se presenta una menor cantidad del item, de acuerdo a la revisión de cantidades en sitio.
26,15	SOBRESALTO EN CONCRETO DE 4000 PSI f´c=28 Mpa (4000 PSI), 0.40x0.30 mts según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto	m	$ 290.316,00																16,00	$ 4.645.056,00	=			**16,00**	**$ 4.645.056,00**	
26,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ANTIRRETORNO DE 4" PARA SISTEMA SANITARIO.	u	$ 462.219,00																1,00	$ 462.219,00	=			**1,00**	**$ 462.219,00**	
26,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA SEGÚN DISEÑO, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación.	u	$ 1.317.952,00																1,00	$ 1.317.952,00	=			**1,00**	**$ 1.317.952,00**	
26,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO EN ESTRUCTURA DE MADERA Y MALLA EN ANGEO.	m2	$ 60.314,00																40,00	$ 2.412.560,00	=			**40,00**	**$ 2.412.560,00**	
26,19	CIELO RASO EN LÁMINA PVC CON ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 1 PULG. CAL. 26, incluye cornza e instalación.	m2	$ 80.690,00																122,03	$ 9.846.601,00	=			**122,03**	**$ 9.846.601,00**	

A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		**$ 1.032.468.856,00**	**$ 1.032.468.856,00**	**$ 1.032.468.856,00**	**$ 1.032.468.856,00**	**$ 1.032.468.856,00**	**$ 1.436.050.707,00**	**$ 1.436.050.707,00**
B	ADMINISTRACION + IMPREVISTOS	19,07%	$ 196.891.811,00	$ 196.891.811,00	$ 196.891.811,00	$ 196.891.811,00	$ 196.891.811,00	$ 273.854.870,00	$ 273.854.870,00
C	UTILIDAD	5,00%	$ 51.623.443,00	$ 51.623.443,00	$ 51.623.443,00	$ 51.623.443,00	$ 51.623.443,00	$ 71.802.535,00	$ 71.802.535,00
D	**SUBTOTALTOTALES (A+B+C)**		**$ 1.280.984.110,00**	**$ 1.280.984.110,00**	**$ 1.280.984.110,00**	**$ 1.280.984.110,00**	**$ 1.280.984.110,00**	**$ 1.781.708.112,00**	**$ 1.781.708.112,00**
	IVA SOBRE UTILIDAD (16% sobre utilidad)	19,00%	$ 9.808.454,00	$ 9.808.454,00	$ 9.808.454,00	$ 9.808.454,00	$ 9.808.454,00	$ 13.642.482,00	$ 13.642.482,00
	TOTAL		**$ 1.290.792.564,00**	**$ 1.290.792.564,00**	**$ 1.290.792.564,00**	**$ 1.290.792.564,00**	**$ 1.290.792.564,00**	**$ 1.795.350.594,00**	**$ 1.795.350.594,00**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026

LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
RL. CONSORCIO DEPOR HD
CONTRATISTA

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
RL. SEIING S.A.S
INTERVENTOR

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 10

MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°5, Incluye suministro e instalación, grafil doble cada 4ta hilada, mortero de pega 1:3, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
10,1	m2	5

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1

REGISTRO FOTOGRAFICO










LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
MODULO BIBLIOTECA	EJE	ENTRE EJES	AREA	ANCHO	ALTO		
MURO EXTERIOR	H,A	1-2		7,25	2,10	2,00	30,45
MURO EXTERIOR	H,A	2-3		2,15	2,10	2,00	9,03
MURO INTERNO	B	2-3		2,15	2,10	1,00	4,52
MURO INTERNO	F,E	2-3		2,15	2,20	2,00	9,46
MURO INTERNO	D',B'	2-3		2,50	2,10	2,00	10,50
MURO INTERNO	E'	2-3		2,50	2,20	1,00	5,50
MURO INTERNO DOBLE	C,D	2-3		1,25	2,10	4,00	10,50
MURO INTERNO	2	A-B		2,40	2,10	1,00	5,04
MURO INTERNO	2	B-C		2,54	2,10	1,00	5,33
MURO INTERNO	2	D-E		2,54	2,10	1,00	5,33
MURO INTERNO	2	E-F		1,50	2,20	1,00	3,30
MUROS MESÓN COCINETA	D-E	2-3		0,48	0,75	6,00	2,16
MURO TANQUE				2,80	3,50	1,00	9,80
10,1						SUBTOTAL	**110,92**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**110,92**

REGISTRO GRAFICO: PLANTA MUROS

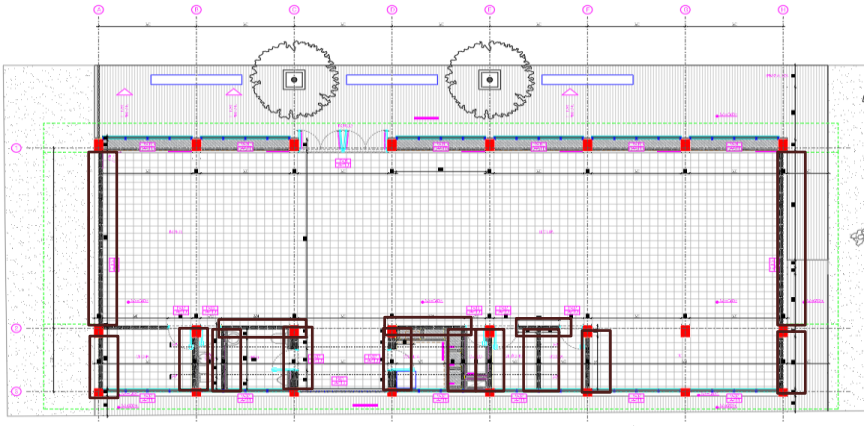

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

Abraham Vele García

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 10

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
10,16	m	5

COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones y forma según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1

REGISTRO FOTOGRAFICO










LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**AREA**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MURO EXTERIOR	H,A	1-2			2,20	2,00	4,40
MURO EXTERIOR	H,A	2-3			2,20	12,00	26,40
MURO INTERNO	F,E,B	1-2			2,20	2,00	4,40
MURO INTERNO	E',D',B'	1-2			2,20	2,00	4,40
MURO INTERNO DOBLE	C,D	1-2			2,20	1,00	2,20
MURO INTERNO	2	A-B			2,20	2,00	4,40
MURO INTERNO	2	B-C			2,20	3,00	6,60
MURO INTERNO	2	D-E			2,20	2,00	4,40
MURO INTERNO	2	E-F			2,20	1,00	2,20
MURO TANQUE					3,50	2,00	7,00
10,16						SUBTOTAL	**66,40**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**66,40**

REGISTRO GRAFICO: PLANTA MUROS

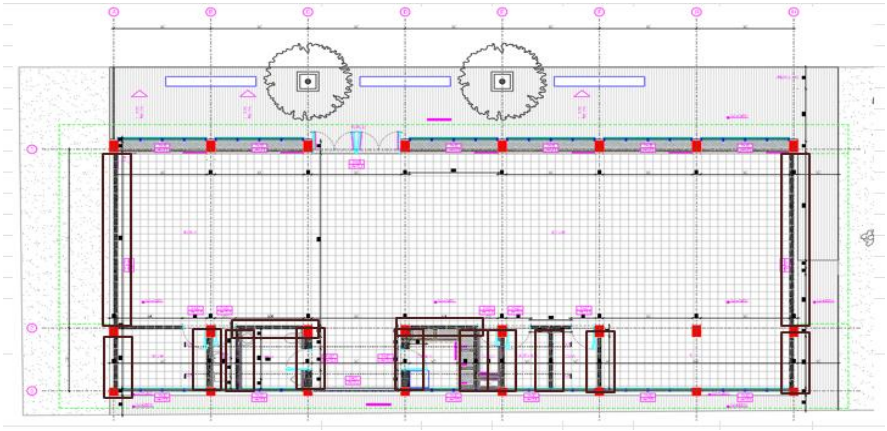

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 10			VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	
10,17	m	5	

REGISTRO FOTOGRAFICO








PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1

LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**AREA**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MURO EXTERIOR (ENTRE SOBRESALTO Y VIGACANAL)	1	A,H			29,54	1,00	29,54
MURO EXTERIOR (ENTRE SOBRESALTO Y VIGACANAL)	3	3			29,54	1,00	29,54
MURO EXTERIOR (EJES A Y H)	A, H	1,2			7,25	2,00	14,50
MURO EXTERIOR (EJES A Y H)	A, H	2,3			2,15	2,00	4,30
MURO TANQUE					2,80	1,00	2,80
10,17						SUBTOTAL	**80,68**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**80,68**

REGISTRO GRAFICO: PLANTA MUROS

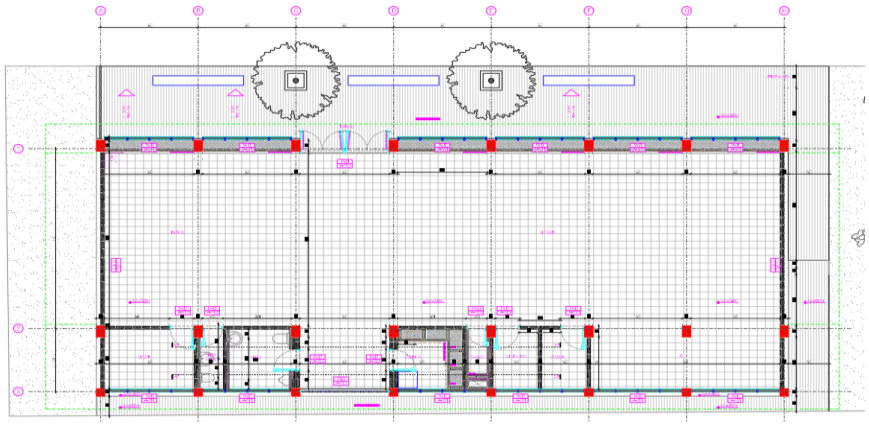

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Página 1 de 1
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha:** 24/Abr/2019

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO	**CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD**
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO	

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 10		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
10,31	m	5

LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete.

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1

REGISTRO FOTOGRAFICO








LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**AREA**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MURO EXTERIOR	H,A	1-2			7,25	2,00	14,50
MURO EXTERIOR	H,A	2-3			2,15	2,00	4,30
MURO INTERNO	B	2-3			2,15	1,00	2,15
MURO INTERNO	D',B'	2-3			2,50	2,00	5,00
MURO INTERNO DOBLE	C,D	2-3			1,25	1,00	1,25
MURO INTERNO	2	A-B			2,40	1,00	2,40
MURO INTERNO	2	B-C			2,54	1,00	2,54
MURO INTERNO	2	D-E			2,54	1,00	2,54
MURO INTERNO	2	E-F			1,50	1,00	1,50
10,31						SUBTOTAL	**36,18**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**36,18**

REGISTRO GRAFICO: PLANTA MUROS

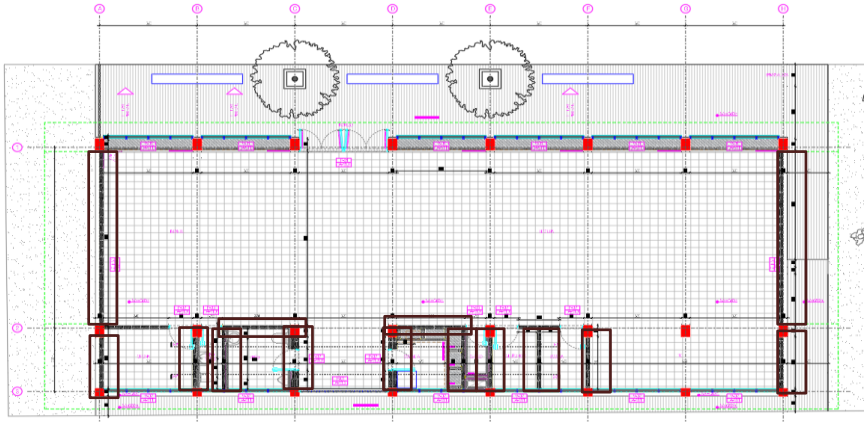

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Culturas

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 10

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
10,32	m3	5

Muro en concreto a la vista de 3.000 PSI en concreto a la vista segun diseños, no incluye refuerzo.

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACIÓN			MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
MODULO BIBLIOTECA	EJE	ENTRE EJES	LARGO	ALTO	ESPESOR		
MURO EXTERIOR	1 Y 3	A-H	3,30	0,83	0,12	12,00	3,94

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024
Contrato de Obra No.	4348 de 2024		
Vigencia del contrato	28/07/2025	28/03/2026	

CAPITULO: 12		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
12,1	m2	5

PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1


REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**AREA**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MURO EXTERIOR	H,A	1-2		7,25	2,10	4,00	60,90
MURO EXTERIOR	H,A	2-3		2,15	2,10	4,00	18,06
MURO INTERNO	B	2-3		2,15	2,10	2,00	9,03
MURO INTERNO	F,E	2-3		2,15	2,20	4,00	18,92
MURO INTERNO	D',B'	2-3		2,50	2,10	4,00	21,00
MURO INTERNO	E'	2-3		2,50	2,20	2,00	11,00
MURO INTERNO DOBLE	C,D	2-3		1,25	2,10	8,00	21,00
MURO INTERNO	2	A-B		2,40	2,10	2,00	10,08
MURO INTERNO	2	B-C		2,54	2,10	2,00	10,67
MURO INTERNO	2	D-E		2,54	2,10	2,00	10,67
MURO INTERNO	2	E-F		1,50	2,20	2,00	6,60
MUROS MESÓN COCINETA	D-E	2-3		0,48	0,75	12,00	4,32
MURO TANQUE				2,80	3,50	2,00	19,60
VIGA CANAL	1 Y 3	A-H		0,50	29,54	4,00	59,08
12,1						SUBTOTAL	**280,93**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**280,93**

REGISTRO GRAFICO: PLANTA MUROS

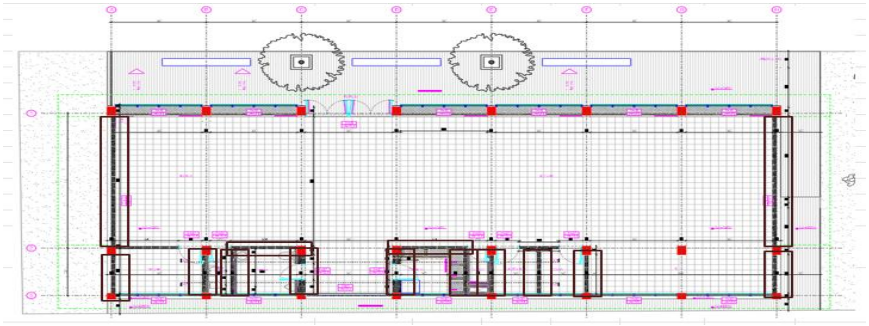

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 14

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, espesor 4 cm, incluye dilataciones en material flexible (según diseño), pendientado y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación.

ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**
14,1	m2	5

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1


REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**AREA**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BIBLIOTECA			246,25				246,25
MUROS (ESPESOR) DESCUENTO				-0,12	39,93		-4,79
14,1						SUBTOTAL	**241,46**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**241,46**

REGISTRO GRAFICO: PLANTA MUROS

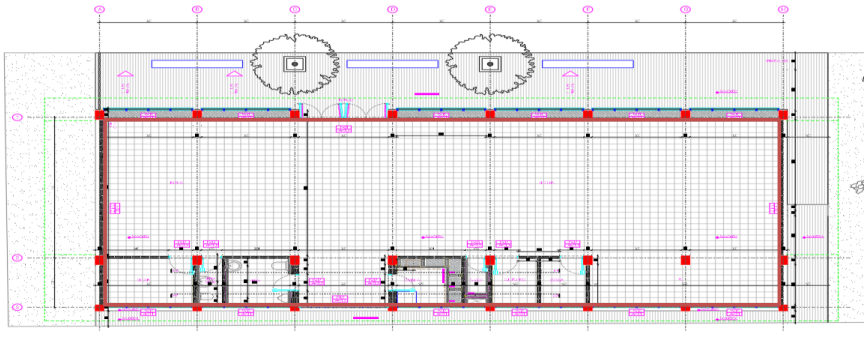

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 22

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
22,7	u	5

BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1


REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**AREA**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BANCAS EN CONCRETO FUNDIDAS EN SITIO	3	A-H				6,00	6,00
22,7						SUBTOTAL	**6,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**6,00**

REGISTRO GRAFICO: PLANTA MUROS

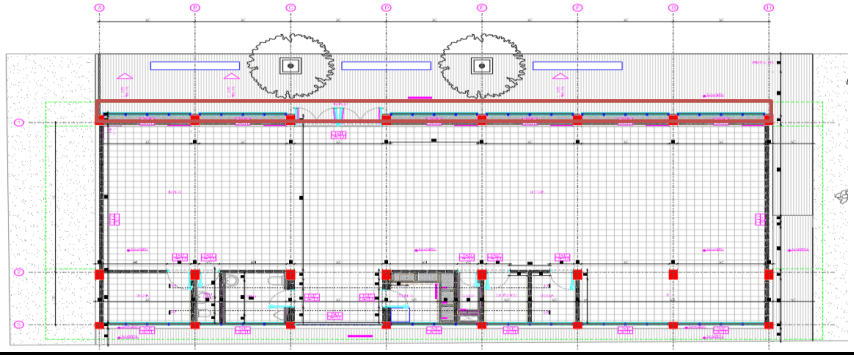

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 26

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
26,3	m2	5

PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1


REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**AREA**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
LOSA SUPERIOR TANQUES			10,5			1,00	10,50
26,3						SUBTOTAL	**10,50**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**10,50**

REGISTRO GRAFICO: PLANTA MUROS

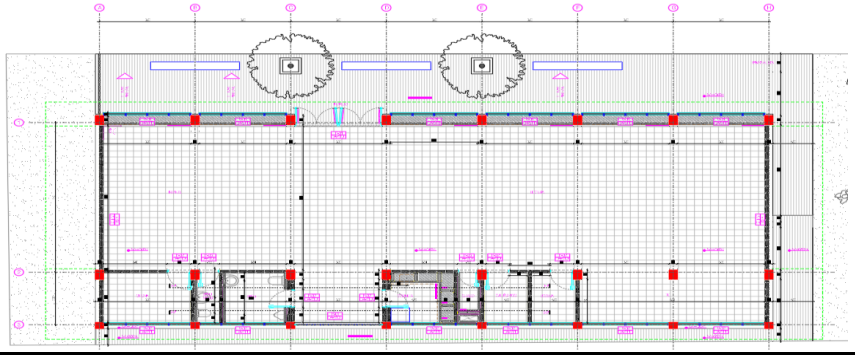

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024
Contrato de Obra No.	4348 de 2024		
Vigencia del contrato	28/07/2025	28/03/2026	

CAPITULO: 26

VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 PSI) impermeabilizado , forma y dimensiones según diseño, incluye formaleta acabo liso, mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado, impermeabilizante MAPELASTIC SMART A+B 2 y/o similar, capas en todo el contorno de la canal, incluye mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
26,6	m3	5

REGISTRO FOTOGRAFICO





PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ÁREA**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BIBLIOTECA							
VIGA CANAL				0,32	29,54	2,00	18,91
26,6						SUBTOTAL	**18,91**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**18,91**

REGISTRO GRAFICO: VIGA CANAL



VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** ☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-103 **Versión:** 3 **Fecha**: 24/Abr/2019

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024
Contrato de Obra No.	4348 de 2024		
Vigencia del contrato	28/07/2025	28/03/2026	

CAPITULO: 26			DEMOLICIÓN ELEMENTOS EN CONCRETO
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No**	
26,9	m3	5	

REGISTRO FOTOGRAFICO







PERIODO DEL CORTE:	Desde - 01/01/2026	Hasta - 28/02/2026	**FICHA**	1	de 1

LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**		
Elemento de Concreto existentes							
Cimentación enterrada en lote			1,50	1,20	0,80	3,00	4,32
26,9						SUBTOTAL	**4,32**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**4,32**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 26

ENTIBADO EN MADERA PARA CONTENCIÓN DE TALUDES DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
26,12	m2	5

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1


REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION			MEDIDAS				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
Entibado en Madera Cimentaciones							
D1			4,30		1,50	8,00	51,65
D2			3,70		1,50	8,00	44,40
D3			5,20		1,50	4,00	31,20
D4			6,70		1,50	12,00	120,60
26,12						SUBTOTAL	**247,85**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**247,85**

PLANTA CIMENTACIONES

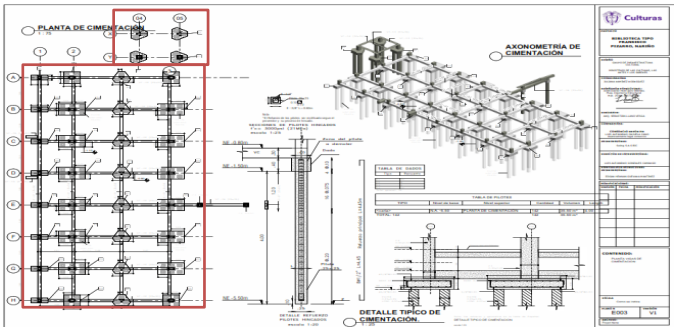

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORIA

Culturas

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024	**Contrato de Obra No.**	4348 de 2024
				Vigencia del contrato	28/07/2025 28/03/2026

CAPITULO: 26

MENSULAS EN CONCRETO DE 4000 PSI f´c=28 Mpa (4000 PSI), dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto.

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
26,14	Und	5

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1


REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION			MEDIDAS				
MODULO BIBLIOTECA	EJE	ENTRE EJES	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Ménsulas en concreto A= 0.16 m2	1					8,00	8,00
26,14						SUBTOTAL	8,00
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	8,00

Ver Plano E007



VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Culturas

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
DIRECCIÓN OBRA:	CABECERA MUNICIPAL SALAHONDA MUNICPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOR HD

INTERVENTORÍA:	SEIING S.A.S	**Contrato de interventoría No.**	4369 de 2024
Contrato de Obra No.	4348 de 2024		
Vigencia del contrato	28/07/2025	28/03/2026	

CAPITULO: 26

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
26,16	u	5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ANTIRRETORNO DE 4" PARA SISTEMA SANITARIO.

PERIODO DEL CORTE: Desde - 01/01/2026 Hasta - 28/02/2026 **FICHA** 1 de 1

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION			MEDIDAS				
MODULO BIBLIOTECA	**EJE**	**ENTRE EJES**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTURA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CAJA (ANTES DE POZO SÉPTICO)						1,00	1,00
26,16						SUBTOTAL	**1,00**
						CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	
						CANT. A PAGAR	**1,00**

VB. RESIDENTE CONTRATISTA
JORGE HUMBERTO SUAREZ OCHOA

VB RESIDENTE INTERVENTORIA

Seiing S.A.S
Nit. 900.208.425-6

Bogotá, Abril 01 del 2026

MINCULTURA-SEIING-252

Señores
CONSORCIO DEPOR HD
Atn. LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
Representante Legal
La Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 4348-2024 cuyo objeto es contratar "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026 Y DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO"

Asunto: Aprobación de los informes mensuales 3 y 4 de Sabanalarga – 6 y 7 del proyecto Francisco Pizarro.

Respetados señores:

De acuerdo con los informes remitidos en la fecha, esta interventoría emite aprobación a la información presentada correspondiente a los informes mensuales 3 y 4, correspondientes al proyecto de Sabanalarga y los Informes mensuales No. 6 y 7 del proyecto de Francisco Pizarro, respectivamente.

Sin otro particular

LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO
Director de interventoría

Con copia: DRA. LAURA GINETH SANCHEZ TALERO - Coordinadora Grupo de Infraestructura Cultural (E)

ENLACE DE DESCARGA INFORME MENSUAL

No. 6 Francisco Pizarro

11.1. Informe mensual No. 6 Pizarro V30mar.pdf

No. 7 Francisco Pizarro

11.2. Informe mensual No. 7 Pizarro V30mar.pdf
