CANAL TELEFÓNICO
CANAL PRESENCIAL
Avenida 5 # 13-82

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2026-04000-015201-3
2026-05-11 16:54 -INFRAESTRU
Destino: 4000
cc:
Rem/D: MIGUEL DAN JENSSEN D
Asunto: ORDEN DE PAGO No. 00
Folios: 791
Anexos: CUENTA DE COBRO

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE VIAS

ORDEN DE PAGO No. E- 0134

11 MAY 2026

Para: Adriana Boada Arguello, Profesional Especializado
De: Arq. Mary Fabiana Leal Garay – secretaria de Vías
Asunto: Presentación de documentos

Cumpliendo con las disposiciones establecidas por la secretaria de hacienda para la presentación de documentos para el pago de la obligación contraída por este despacho a favor de: **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S,** NIT 901.485.464-3 por concepto de pago al contrato interadministrativo CTOI-SV-02532-2023 cuyo objeto es GERENCIA INTEGRAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE PROYECTOS GISAP, MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER. Factura por valor de **MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.393.795.369,00).**

Pago que debe realizarse a nombre de **CONSORCIO VIA CENTRO** identificado con NIT No. 301740307-9 de conformidad con la autorización enviada por la **EICE FARO DEL CATATUMBO** en cumplimiento del modificatorio No. 4 al contrato interadministrativo No. 02532-2023 correspondiente al ACTA PARCIAL No. 13 del contrato **LP-FC-38-2023** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRANDO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATAMTUMBO S.A.S.**

El valor neto a pagar será por la suma de **MIL CIENTO QUINCE MILLONES, TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 1.115.036.295,00); CON CARGO AL RP-000853 de 25 de marzo de 2025, con fuente de recursos 1.3.3.11.07- RB –TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL.** El valor anterior teniendo en cuenta que de la factura presentada se amortiza la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 278.759.074,00); correspondiente al 20% del valor a pagar por concepto de amortización del anticipo entregado mediante FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA U CONSTRUCTORA CARGET S.A.S, CONSTRUCTORA MATICCES, EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA.**

Atentamente,

Arquitecta MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de Vías

Revisó técnica	Ing. Isabel Cristina Yañez Montaño	Profesional Universitario
Revisó Jurídica	Doc. Jenyffer Berbesi Medina	Profesional Universitario
Proyectó	Ing. Jonathan Lizcano	Profesional Contratista

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Cúcuta 08 de mayo de 2026

Arquitecta
MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de vías
Gobernación de Norte de Santander

Ref: "solicitud de pago cuenta N° 13 del proyecto MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER.

En la presente me permito muy respetuosamente solicitar el pago de la cuenta N° 13 del proyecto MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER

Atentamente

.

FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Gerente
EICE FARO DEL CATATUMBO

Proyecto: Rafael Redondo- Apoyo a la supervisión

Adjunto cuenta.

Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
A-001107
FECHA: 08/05/2026
FORMA PAGO : CREDITO-dias: 0
FEC. VENCE: 30/06/2026

CUFE: d94daccce1207300c00db3c0e4d9d789b0317e7e8dedea0126b3a36ca0dcaee7d551a4e0f46ee79b7ac7753e6767d494

Datos del Emisor	Adquiriente
Razón social/Nombre: EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.	**Razón social/Nombre:** DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 901485464-3	**NIT:** 800103927-7
Dirección: AV 5 13-82 BARRIO CENTRO	**Dirección:** A
Teléfonos: 310221490	**Teléfonos:** 5
	Email: tesoreria@nortedesantander.gov.co

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	% IVA	Vr. Total
1	0002	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CORREDOR VIAL 2.0	1.00	unidad	1,393,795,369.00	0.00	1,393,795,369.00

Obs:RECURSOS PARA EL MANEJO DE OPERACIONES SIN SITUACION DE FONDOS -OFSS- EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ-SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. CONSORCIO VIA CENTRO FACTURA N° FE-26 VALOR.$1.393.795.369,00

Código	Descripción	Vr. Total

Total base:	1,393,795,369.00
IVA:	0.00
SubTotal	1,393,795,369.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
TOTAL:	1,393,795,369.00

Monto en letras: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.

RECURSOS PARA EL MANEJO DE OPERACIONES SIN SITUACION DE FONDOS -OFSS- EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR-ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S. CONSORCIO VIA CENTRO FACTURA N° FE-26 VALOR.$1.393.795.369,00

Resolución Dian N° 18764102226472 prefijo A desde 1001 al 1501 Fecha 28/11/2025 Vigencia 28/11/2027

Powered by CamScanner

FACTURA

Factura Electrónica de Venta FE - 26

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/05/2026 08:04
Fecha de Vencimiento	08/05/2026 08:04
Fecha de Validación	08/05/2026 08:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO VIA CENTRO
NIT	901740307-9
Obligación	IVA
Email	consorcioviacentro@gmail.com
Teléfono	3202358957
Dirección Fiscal	CL 10 0 E 94 OF 4 120 CENTRO DE NEGOCIO VENTURA PLAZA, CUCUTA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT	901485464-3
Obligación	IVA
Email	farodelcatatumbotesoreria@gmail.com
Teléfono	3102214908
Dirección	AVENIDA 5 13-82 CENTRO
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	COSTO DE OBRA	1.0	EA	$1,072,150,284.00		$1,072,150,284.00	$1,072,150,284.00
2	02	A.I.U 30 %	1.0	EA	$321,645,085.00		$321,645,085.00	$321,645,085.00

2

Subtotal	$1,393,795,369.00
Total a Pagar	$1,393,795,369.00

PAGO ACTA PARCIAL 13 CONTRATO DE OBRA LP-FC-38-2023
OBJETO: MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
AMORTIZACIÓN 20 % ANTICIPO POR VALOR DE $ 278.759.074
SALDO A PAGAR: $ 1.115.036.295
Periodo Marzo 2026
PARTICIPACION:
CONSTRUCTORA CCC SAS - 35%
EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA - 30%
CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA - 30%
CONSTRUCTORA CARGET SAS - 5%

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: b0a7154d83d9c6cc3643a5dd9f4367ebd53d7a2a50e5649b5ecbe4f6ec7baef0c5c43f32df04678d7d4db7fb5b3083aa

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FE - 26

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764099611761 de 02/10/2025 - 02/10/2026 autoriza FE - 11 a FE - 50

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/05/2026 08:04
Fecha de Vencimiento	08/05/2026 08:04
Fecha de Validación	08/05/2026 08:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b0a7154d83d9c6cc3643a5dd9f4367ebd53d7a2a50e5649b5ecbe4f6ec7baef0c5c43f32df04678d7d4db7fb5b3083aa

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ESTAMPILLA PROHOSPITAL

CONSORCIO VIA CENTRO

NIT: 901740307-9

San José de Cúcuta, 01 de abril de 2026

Señores
EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S
Avenida 5 N 13-82 Centro de Negocios 5ta Avenida, Oficina 208
Cúcuta, Norte De Santander, Colombia.

Referencia: LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

Por medio de la presente y en mi facultad de representante legal del **CONSORCIO VIA CENTRO con NIT: 901740307-9**, autorizo a la Empresa **EICE FARO DEL CATATUMBO SAS**, identificada con NIT: 901485464-3, en virtud del contrato de obra de la referencia en llevar a cabo el descuento del 2% del valor del acta en trámite.

Atentamente,

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT: 901740307-9
R/L MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ

CERTIFICACION BANCARIA

Certificado
Bancario

martes, 3 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VIA CENTRO identificado(a) con NIT 901740307, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	83400007022	2023/08/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141067916309

(415)7707212489984(8020) 000014106791630 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta	7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIA CENTRO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 10 0 E 94 OF 4 120 CENTRO DE NEGOCIO VENTURA PLAZA

42. Correo electrónico consorcioviacentro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 3 5 8 9 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 8 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI X NO ☐ 60. No. de Folios: 25 61. Fecha 2024 - 07 - 25 / 11 : 27: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ ESPITIA MARIO ALONSO
985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141067916309

{415}7707212489984{8020} 000014106791630 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 7 2 1	
81. Hasta	2 0 2 6 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141067916309

(415)7707212489984(8020) 000014106791630 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 9 0 4 7 3 1 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DURAN	PAEZ	MIGUEL	DAN JENSSEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 2 1 2 3 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	ALVAREZ	HUGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141067916309

(415)7707212489984(8020) 000014106791630 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 4 0 3 0 7	9	Impuestos de Cúcuta	7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 3 7 2 6	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CCC S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 3 0 7 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 5 0 5 6 4 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EXPORIENTE REPRESENTACIONES LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 2 4 7 9 6 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 4 5 1 1 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 3 0 7 2 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERT. RETEICA

CONSORCIO VIA CENTRO

NIT: 901740307-9

San José de Cúcuta, 01 de abril de 2026

Señores
EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S
Avenida 5 N 13-82 Centro de Negocios 5ta Avenida, Oficina 208
Cúcuta, Norte De Santander, Colombia.

Referencia: LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.

ASUNTO: CERTIFICADO RETEICA.

Cordial saludo,

Con la presente el CONSORCIO VIA CENTRO en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, certifica que el cobro del acta parcial de obra No 13 con numero de factura FE-26 por valor de $ 1.393.795.369,00 que se ejecutó en:

- corresponde al municipio de SANTIAGO, con el 78.46% ($ 1.093.569.341,00) del valor parcial del acta de obra No 13.
- corresponde al municipio de SALAZAR, con el 10.42% ($ 145.173.317,00) del valor parcial del acta de obra No 13.
- corresponde al municipio de ARBOLEDAS, con el 2.26% ($ 31.495.155,00) del valor parcial del acta de obra No 13.
- corresponde al municipio de CUCUTILLA, con el 8.86% ($ 123.557.558,00) del valor parcial del acta de obra No 13.

Los cuales fueron desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de marzo del 2026 en el desarrollo del contrato de obra No **LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.**

Atentamente,

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT: 901740307-9
R/L MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ

CDP

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT : 901485464-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 000053

Fecha: 10/02/2026 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

OBRA MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GÓMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/otras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G. - Servicios para la comunidad sociales y personales

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.61	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/tOTRAS TRANFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G	37,485,464,309.20

Fuente Recurso: 1.3.1.1.07-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE DEL GOBIERNO EN GENERAL
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN

TOTALES **37,485,464,309.20**

VIGENCIA: 2026
VALOR: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 20 CENTAVOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
CARGO: GERENTE GENERAL
DEPENDENCIA: GERENCIA
DOCUMENTO DE SOLICITUD:

GERMAN PRADA DUARTE
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

RP

18

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
NIT : 901485464-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000064

FECHA : 03/03/2026
A FAVOR DE : CONSORCIO VIA CENTRO NIT: 901740307-9
COMPROMISO : OBRA MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GÓMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/otras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G. - Servicios para la comunidad sociales y personales
DISPONIBILIDAD : 00 000053 -- 10/02/2026
DEPENDENCIA : GERENCIA

TIPO CONTRATO : 04 - NO APLICA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.61	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO- PUENTE GOMEZ- SALAZAR ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER/t1.3.1.1.07/tOTRAS TRANFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO EN G	000053 - 10/02/2026	37,485,464,309.20

Fuente Recurso: 1.3.1.1.07-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS UNIDADES DE DEL GOBIERNO EN GENERAL
Producto MGA: 000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN

TOTALES **37,485,464,309.20**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 20 CENTAVOS.

GERMAN PRADA DUARTE
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PREACTA Y MEMORIAS

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

PREACTA N°13

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

A los uno (01) dias del mes de Abril de 2026 se reunieron los residentes de obra e interventoria para realizar las cantidades de obra de la preacta del Acta de Obra Parcial No. 13 del contrato de la referencia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No. 13	
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	V/R UNIT	CANT	V/R PARC
1		**CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900**				**841.207.185,00**
1.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**171.277.588,00**
1.2.1		**ALCANTARILLAS**				**13.734.519,00**
1.2.1.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	238.519,00	2,10	500.890,00
1.2.1.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	49.324,00	268,30	13.233.629,00
1.2.2		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**67.324.889,00**
1.2.2.3	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.042,00	5.933,00	65.512.186,00
1.2.2.4	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	173.962,00	1,70	295.735,00
1.2.2.5	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	161.765,00	3,50	566.178,00
1.2.2.6	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	9.165,00	24,00	219.960,00
1.2.2.9	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	4,00	76.880,00
1.2.2.10		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m	32.744,00	10,00	327.440,00
1.2.2.13	303	Demolicion manual en roca	m3	326.510,00	1,00	326.510,00
1.2.5		**BOXCULVERT**				**$ 90.218.180,00**
1.2.5.3	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	193.409,00	29,20	5.647.543,00
1.2.5.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	100,50	1.931.610,00
1.2.5.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	1.212.774,00	32,50	39.415.155,00
1.2.5.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	3.776,00	43.223.872,00
1.3		**OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.**				**906.372,00**
1.3.5		**MURO CAISSON K4+140**				**906.372,00**
1.3.5.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	238.519,00	3,80	906.372,00
1.5		**PAVIMENTOS**				**668.243.835,00**
1.5.1	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	180.292,33	81,10	14.621.708,00
1.5.2	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	173.962,00	746,60	129.880.029,00
1.5.3	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	191.244,00	649,70	124.251.227,00
1.5.5	1205	Riego de Imprimacion	m2	8.985,00	1.505,00	13.522.425,00
1.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	1.229.422,75	280,60	344.976.024,00
1.5.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	12.873,90	2.660,00	34.244.574,00
NP-11 1.5		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	3.059,00	2.205,90	6.747.848,00
1.7		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO**				**779.390,00**
1.7.2		**VIA**				**779.390,00**
1.7.2.2	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	77.939,00	10,00	779.390,00
3		**ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900**				**111.671.782,00**
3.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**27.713.187,00**
3.2.1		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**27.713.187,00**
3.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	2.421,00	27.713.187,00
3.3		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**26.812.416,00**
3.3.1		**ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO**				**1.102.185,00**
3.3.1.19	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	787.275,00	1,40	1.102.185,00
3.3.2		**BOXCULVERT**				**25.710.231,00**

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

PREACTA N°13

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

A los uno (01) dias del mes de Abril de 2026 se reunieron los residentes de obra e interventoria para realizar las cantidades de obra de la preacta del Acta de Obra Parcial No. 13 del contrato de la referencia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTA PARCIAL No. 13	
ITEM	**ID (APU)**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/R UNIT**	**CANT**	**V/R PARC**
3.3.2.29	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	180.292,33	1,40	252.409,00
3.3.2.30		Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm	m3	590.593,00	36,10	21.320.407,00
NP-06 3.3		Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi	m3	1.253.762,00	3,30	4.137.415,00
3.5		**OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES**				**8.617.139,00**
NP-05 3.5		Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils	m	118.043,00	73,00	8.617.139,00
3.9		**SEÑALIZACION VIAL**				**48.529.040,00**
3.9.6	1105	Defensa metalica acanalada a dos crestas en HG	m	606.613,00	80,00	48.529.040,00
4		**ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920**				**24.227.042,00**
4.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**24.227.042,00**
4.2.3		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**24.227.042,00**
4.2.3.15		Demolicion manual en roca	m3	326.510,00	74,20	24.227.042,00
5		**CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300**				**95.044.275,00**
5.1		**PRELIMINARES**				**3.516.972,00**
5.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	2.071,00	1.698,20	3.516.972,00
5.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**91.527.303,00**
5.2.1		**ALCANTARILLAS**				**91.527.303,00**
5.2.1.1	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	101.591,00	10,10	1.026.069,00
5.2.1.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	19.220,00	295,10	5.671.822,00
5.2.1.6	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	2.216.826,00	23,10	51.208.681,00
5.2.1.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	1.265.396,00	1,10	1.391.936,00
5.2.1.8	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas y omas)	m3	1.657.370,00	11,80	19.556.966,00
5.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.447,00	1.107,00	12.671.829,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		**1.072.150.284,00**
				A.I.U (30%)		**321.645.085,00**
				VALOR TOTAL DE OBRA FISICA:		**1.393.795.369,00**
				VALOR TOTAL PROYECTO:		**1.393.795.369,00**
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20,00%):		**278.759.074,00**
				VALOR TOTAL PRESENTE ACTA		**1.115.036.295,00**

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: MIL CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ING. WILLIAN QUINTERO PABON
MP. No 54202230225 NTS
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO VÍA CENTRO

ING. YORIS ALEXANDER MONTAÑO
MP. No 54202106093 NTS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONSORCIO R&Q - JOYCO

ING, MIGUEL DANN JENSSEN DURAN PAEZ
MP. No 54202380648 NTS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VÍA CENTRO

ING. SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
MP. No 54202209738 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CONSORCIO R&Q - JOYCO

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.1	**DESCRIPCION**	Demoliciones en concreto reforzado

FECHA DE INICIO:		**FECHA FINAL**		**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	KINICIAL	KFINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	OTROS M3	TOTAL M3
demolicion placa superior box culvert	k04+855	k04+855	4,00	2,60	0,20		2,08
						AJUSTE AL DECIMAL	0,02
						TOTAL	**2,10**

OBSERVACION:

WILLIAN QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1,2 OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
ITEM No.:	1.2.1.10	**DESCRIPCION**	Relleno compactado por medio mecánico (vibro compactador) , mat. selec de excavación
FECHA DE INICIO:		**FECHA FINAL:**	
UND.	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTOS M3	TOTAL M3
CAJON BOX	k04+850	k04+850	12,00			10,02	11,15	109,09
MEDIO CUERPO	k04+850	k04+850	7,54			2,82		21,26
NIVEL SUBRASANTE	k04+850	k04+850	11,11			0,87		9,67
CAJON BOX	k04+830	k04+830	10,02			12,00	24,99	95,25
MEDIO CUERPO	k04+830	k04+830	6,50			2,79		18,14
NIVEL SUBRASANTE	k04+830	k04+830	17,58			0,85		14,94
						AJUSTE AL DECIMAL		-0,05
						TOTAL		268,30

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

INFORME CANTIDAD DE RELLENOS BOXCULVERT ABSCISAS K4+830 – K4+850 EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

MARZO 2026

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO MURO BOX K4+830		
AREA	LONGITUD	VOLUMEN LLENO
10.02	12	95.3
CAJON BOX		
8.06	3.1	24.99

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DESCOLE Y MEDIO CUERPO BOX K4+830		
AREA	ALTURA	VOLUMEN LLENO
6.5	2.79	18.1

RELLENO PLACA HASTA NIVEL SUB RASANTE BOX K4+830		
AREA	ALTURA	VOLUMEN LLENO
17.58	0.85	14.94
	VOL TOTAL	128.3

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9


RELLENO MATERIAL SELECCIONADO MURO BOX K4+850		
AREA	LONGITUD	VOLUMEN LLENO
10.02	12	109.1
CAJON BOX		
5.31	2.1	11.15

RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DESCOLE Y MEDIO CUERPO BOX K4+850		
AREA	ALTURA	VOLUMEN LLENO
7.54	2.82	21.3


RELLENO PLACA HASTA NIVEL SUB RASANTE BOX K4+850		
AREA	ALTURA	VOLUMEN LLENO
11.11	0.87	9.67
	VOL TOTAL	140.0

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

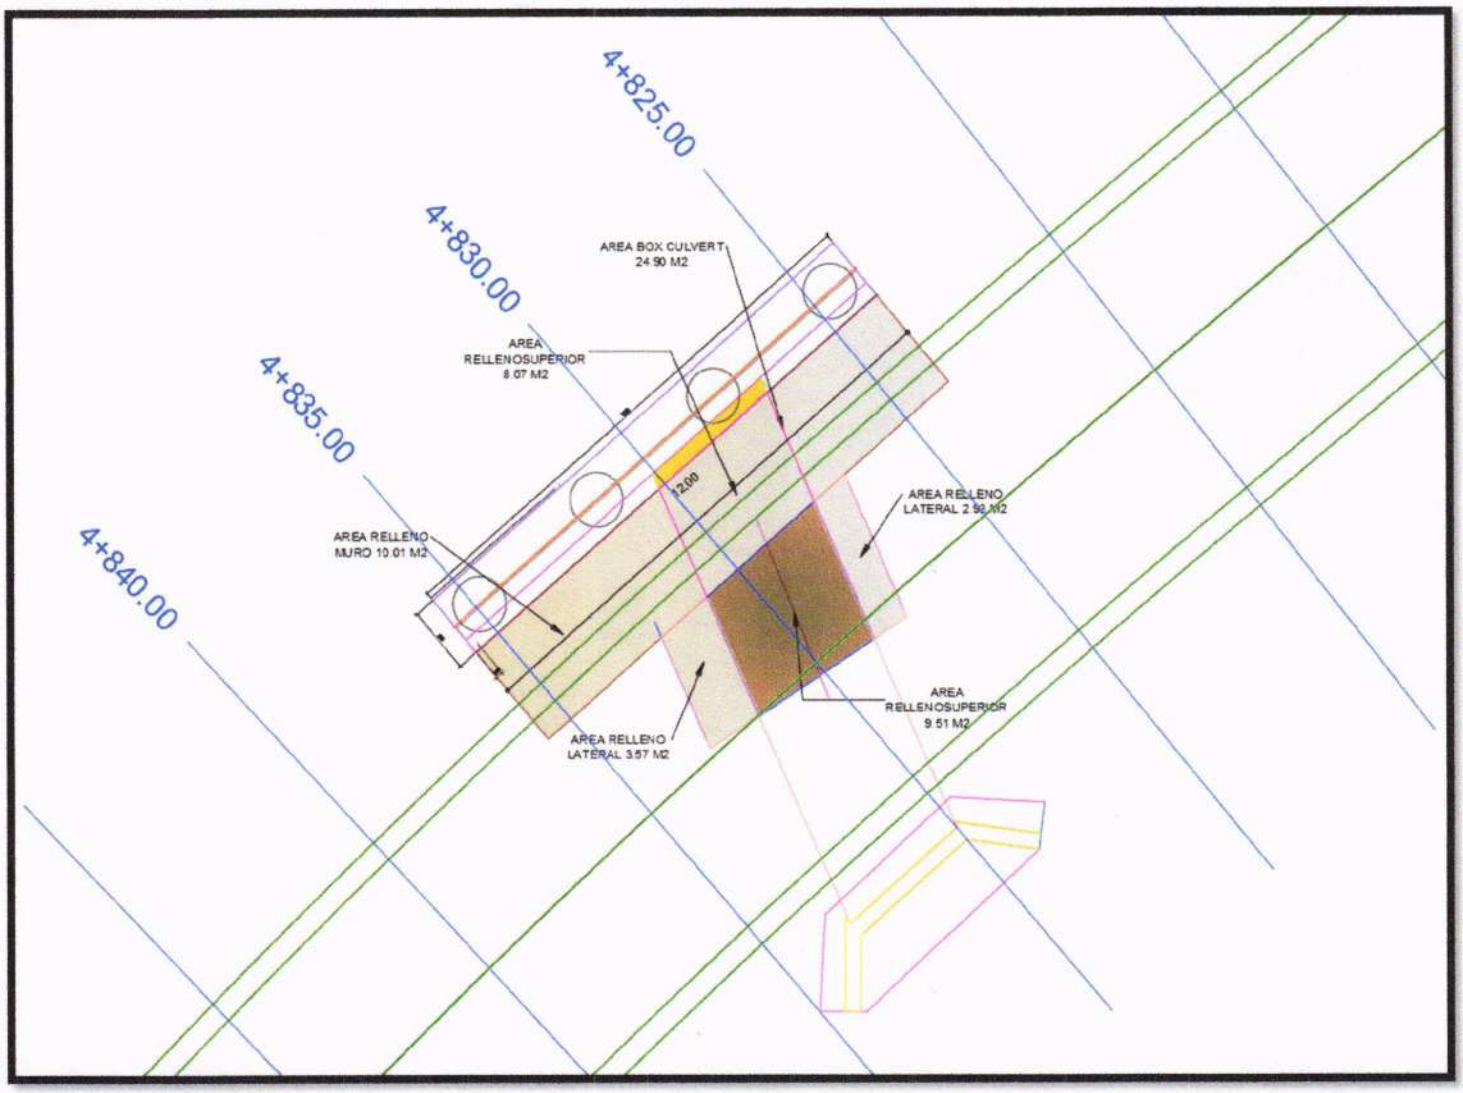


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

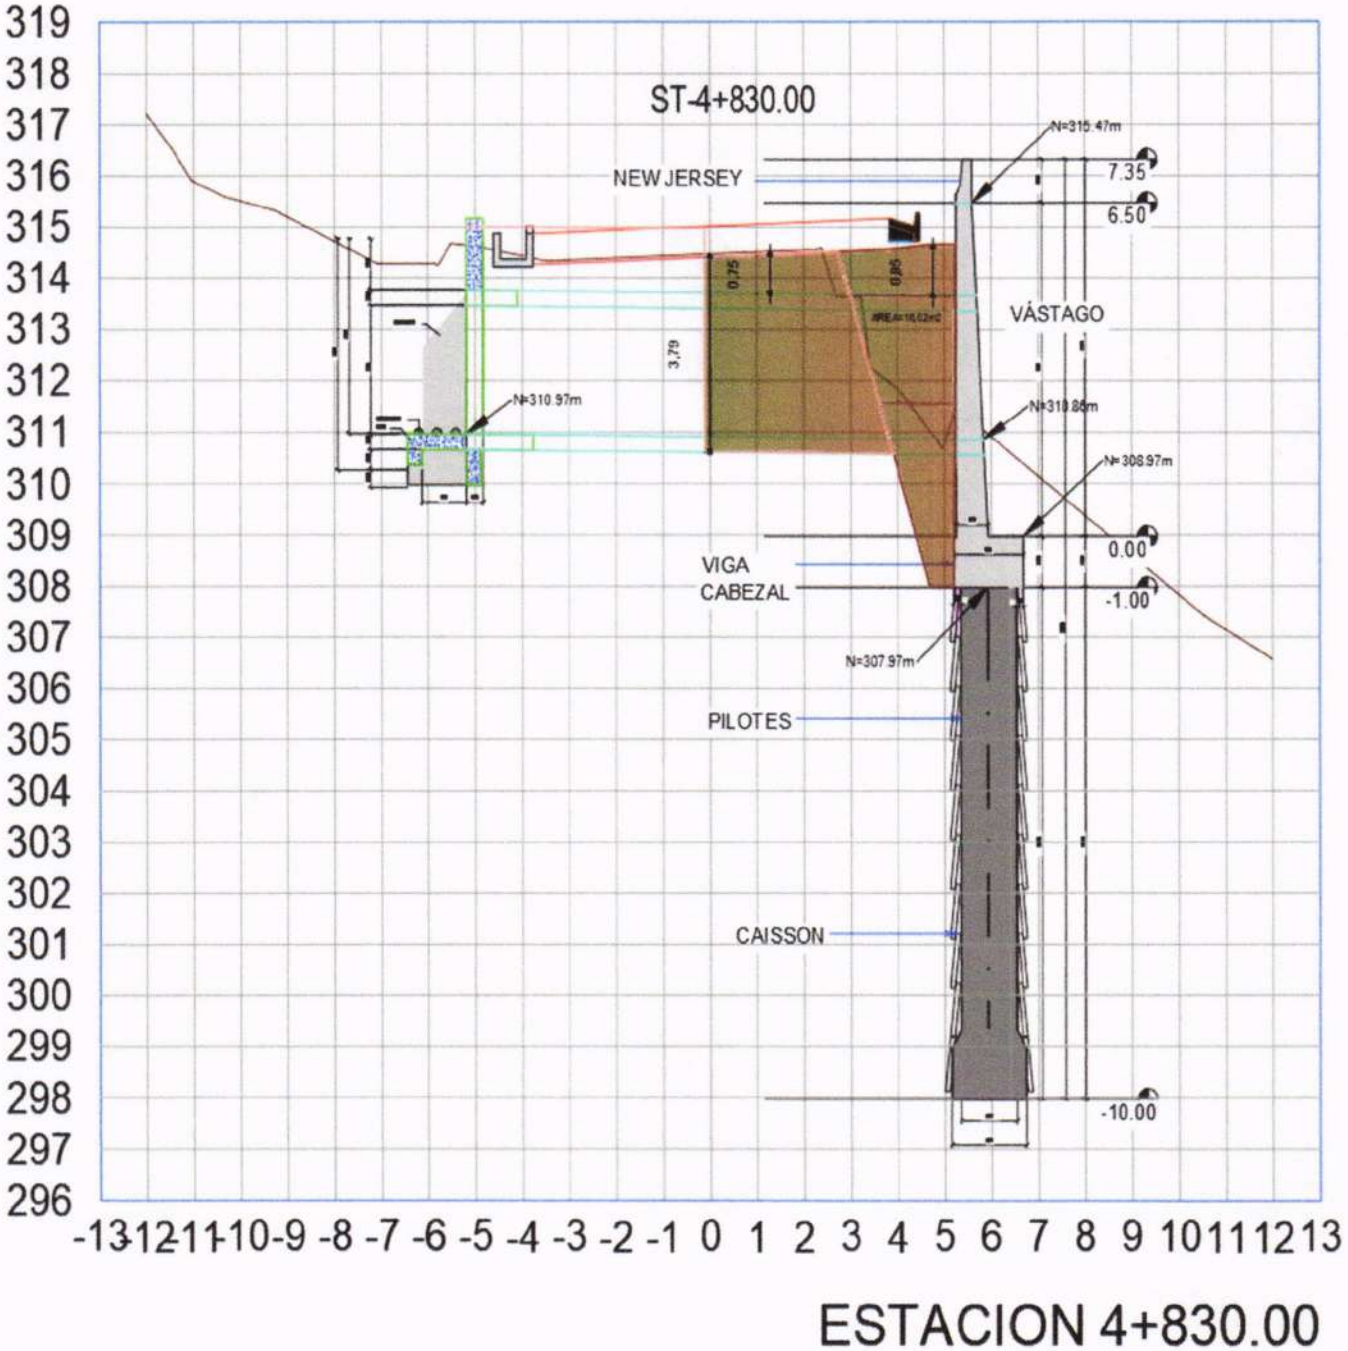


ESTACION 4+830.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

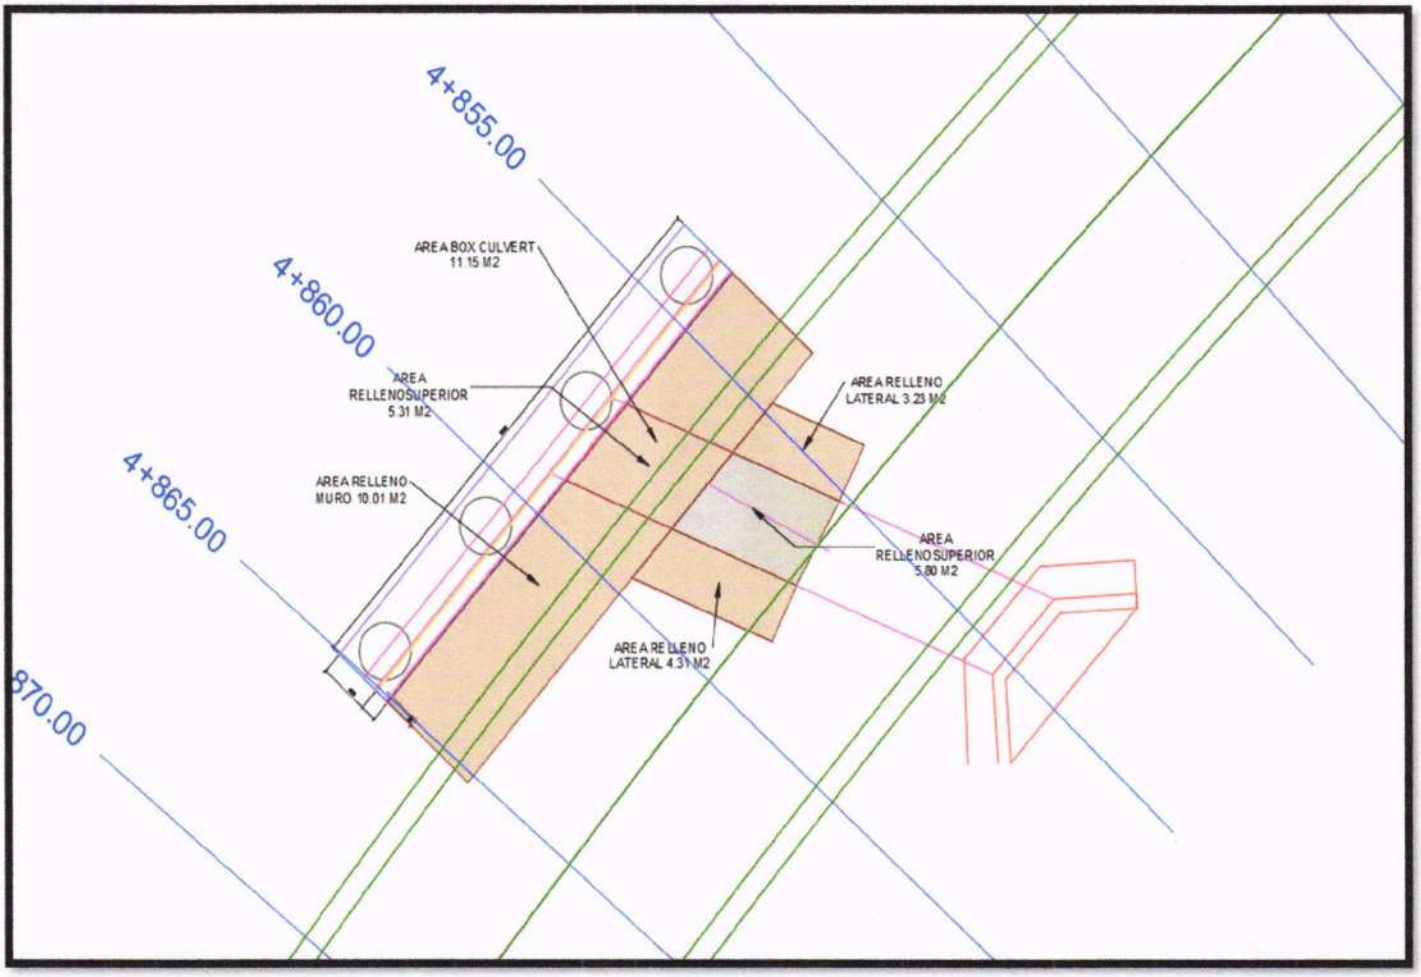

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

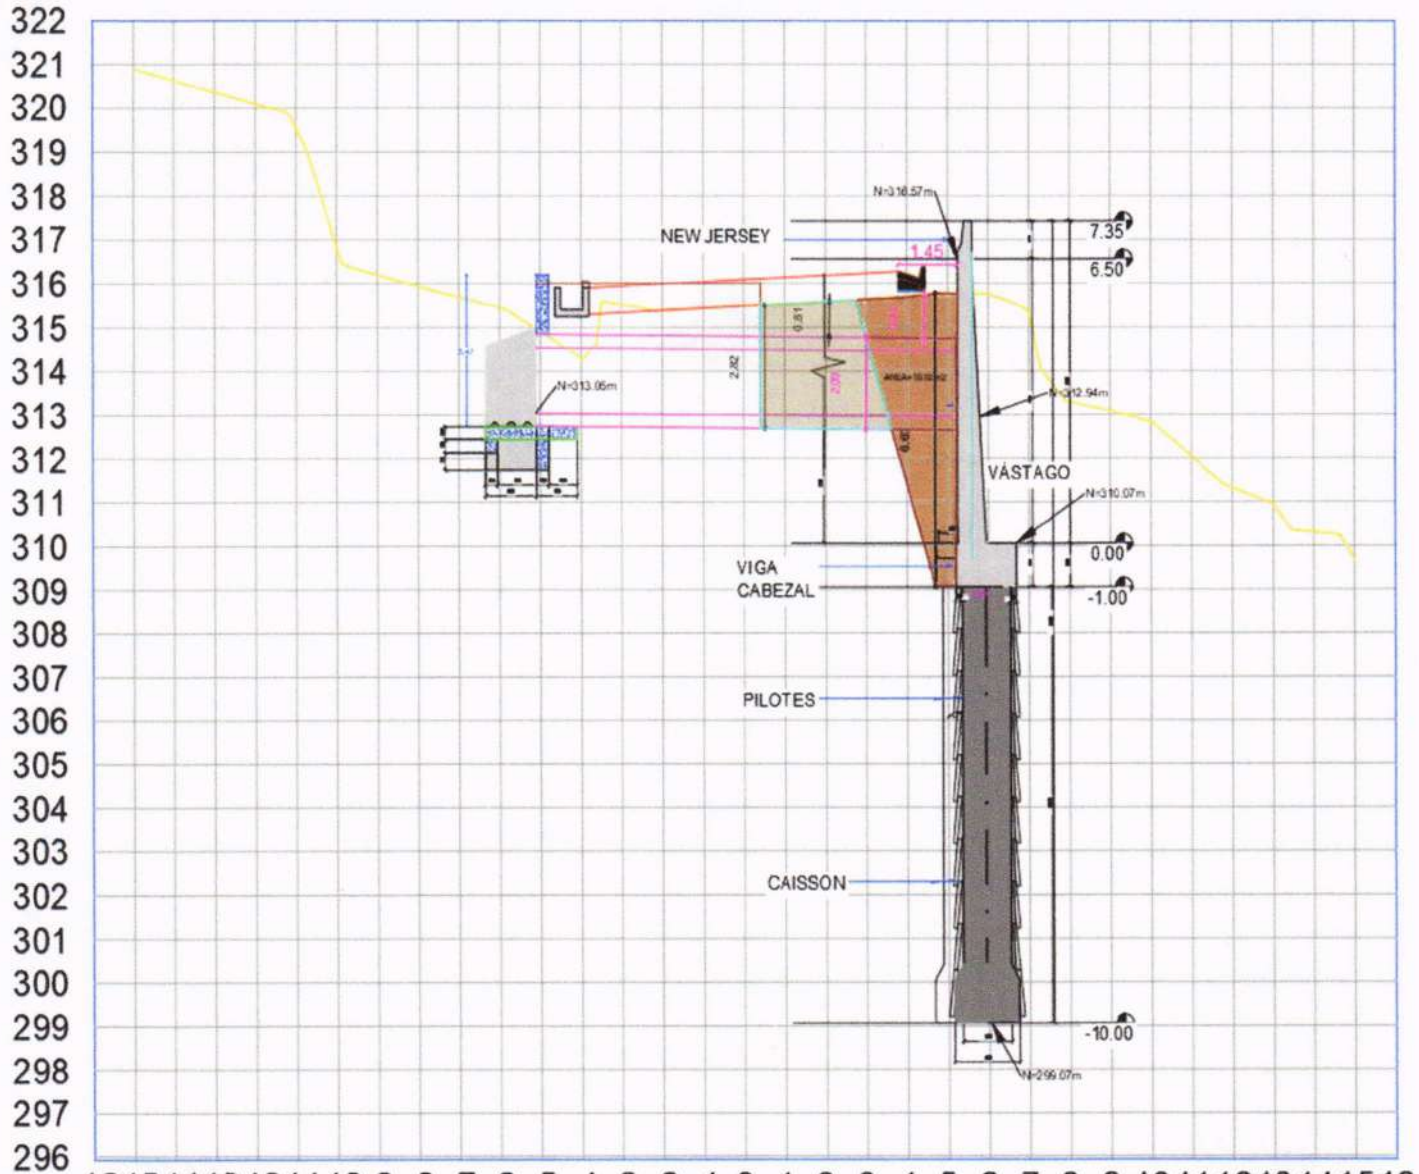

BOX CULVERT 4+855.00

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
CUNETA TRIANGULAR K4+616.5 - K4+646					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	139,00	42,81
30.10	3,00	30,10	0,560	3,00	50,57
0.10 / 0.10 / 0.62	3,00	0,82	0,560	139,00	63,83
30.10	3,00	30,10	0,560	3,00	50,57
CUNETA TRIANGULAR K5+740 - K5+810					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	350,00	107,80
76.60	3,00	76,60	0,560	3,00	128,69
0.10 / 0.10 / 0.62	3,00	0,82	0,560	350,00	160,72
76.60	3,00	76,60	0,560	3,00	128,69
CUNETA TRIANGULAR K5+810 - K5+868					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	291,00	89,63

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander


CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA

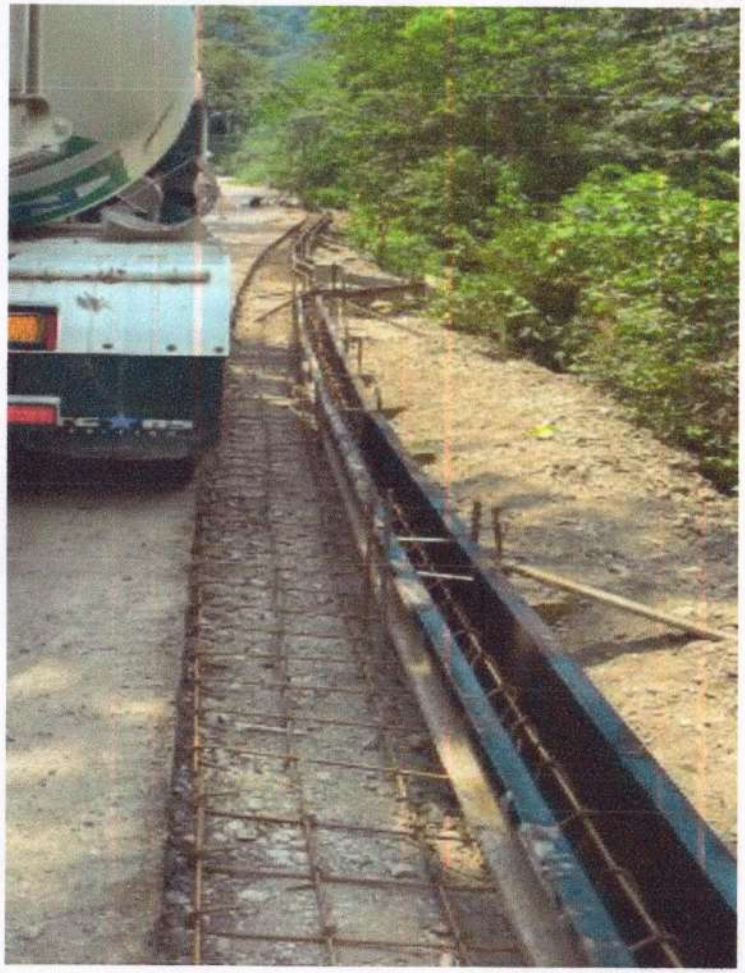

LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
64.00	3,00	64,00	0,560	3,00	107,52
0.10 — 0.62 — 0.10	3,00	0,82	0,560	291,00	133,63
64.00	3,00	64,00	0,560	3,00	107,52
CUNETA TRIANGULAR K5+878 - K5+900					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	107,00	32,96
23.10	3,00	23,10	0,56	3,00	38,81
0.10 — 0.62 — 0.10	3,00	0,82	0,56	107,00	49,13
23.10	3,00	23,10	0,56	6,00	77,62
CUNETA TRIANGULAR K5+868 - K5+878.70					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	35,00	10,78
6.90	3,00	6,90	0,56	3,00	11,59
0.10 — 0.90 — 0.10	3,00	1,10	0,56	54,00	33,26
12.10	3,00	12,10	0,56	5,00	33,88

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9









Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
CUNETA TRIANGULAR K5+900 - K5+908					
 h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	41,00	12,63
 8.60	3,00	8,60	0,56	3,00	14,45
 0.10 0.10 0.62	3,00	0,82	0,56	41,00	18,83
 8.60	3,00	8,60	0,56	3,00	14,45
PLACA ENCOLE OBRA #19 K5+870 - K5+927					
 12.60	4,00	12,60	0,994	4,00	50,10
 0.80	4,00	0,80	0,994	64,00	50,89
CUNETA TRIANGULAR K5+908 - K5+927					
 h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	96,00	29,57
 20.80	3,00	20,80	0,560	3,00	34,94
 0.10 0.10 0.62	3,00	0,82	0,560	96,00	44,08
 20.80	3,00	20,80	0,560	3,00	34,94
CUNETA TRIANGULAR K5+908 - K5+927					

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9









Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
	3,00	0,55	0,560	230,00	70,84
	3,00	50,20	0,560	3,00	84,34
	3,00	0,82	0,560	230,00	105,62
	3,00	50,20	0,560	3,00	84,34
CUNETA TRIANGULAR K5+642 - K5+694					
	3,00	0,55	0,560	260,00	80,08
	3,00	56,80	0,560	3,00	95,42
	3,00	0,82	0,560	260,00	119,39
	3,00	56,80	0,560	3,00	95,42
CUNETA TRIANGULAR K5+620 - K5+642					
	3,00	0,55	0,560	110,00	33,88
	3,00	22,00	0,560	3,00	36,96

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	110,00	50,51
22.00	3,00	22,00	0,560	3,00	36,96
PLACA CUNETA RECTANGULAR K4+940 - K4+952					
0.70 0.70 0.70	4,00	2,10	0,994	60,00	125,24
11.80	3,00	11,80	0,560	4,00	26,43
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+520 - K5+545					
L=1.3	4,00	1,30	0,994	126,00	162,82
26.40	3,00	26,40	0,560	3,00	44,35
CUNETA TRIANGULAR K5+545 - K5+559.6					
h / h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	73,00	22,48
14.60	3,00	14,60	0,560	3,00	24,53
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	73,00	33,52
14.60	3,00	14,60	0,560	3,00	24,53

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
CUNETA TRIANGULAR K5+545 - K5+559.6					
1.90	3,00	1,90	0,560	3,00	3,19
0.60	3,00	0,60	0,560	11,00	3,70
2.30	3,00	2,30	0,560	3,00	3,86
1.00	3,00	1,00	0,560	13,00	7,28
CUNETA TRIANGULAR K5+564 - K5+620					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	281,00	86,55
56.00	3,00	56,00	0,560	3,00	94,08
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	281,00	129,04
56.00	3,00	56,00	0,560	3,00	94,08
PLACA CUNETA TRIANGULAR K4+552.5 - K4+564.5					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	61,00	18,79
12.00	3,00	12,00	0,560	6,00	40,32

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
	3,00	0,82	0,560	61,00	28,01
12.00	3,00	12,00	0,560	6,00	40,32
PLACA CUNETA TRIANGULAR K4+552.5 - K4+564.5					
	3,00	0,82	0,560	78,00	35,82
15.40	3,00	15,40	0,560	3,00	25,87
PLACA ACCESO PREDIO K4+567.9 - K4+572.1					
4.00	4,00	4,00	0,994	5,00	19,88
1.00	4,00	1,00	0,994	20,00	19,88
BORDILLO DE CONFINAMIENTO K4+588.4 - K4+592.7					
4.30	4,00	4,30	0,994	3,00	12,82
	4,00	0,50	0,994	23,00	11,43
MURO DERECHO CUNETA K4+940 - K4+952					
11.80	3,00	11,80	0,560	3,00	19,82
11.80	3,00	11,80	0,560	3,00	19,82
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+484.5 - K5+496					

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9




Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
	3,00	0,55	0,560	58,00	17,86
	3,00	11,50	0,560	6,00	38,64
	3,00	0,82	0,560	58,00	26,63
	3,00	11,50	0,560	6,00	38,64
PLACA ACCESO PREDIO K5+502 - K5+506.5					
	4,00	4,35	0,994	14,00	60,53
	4,00	1,40	0,994	46,00	64,01
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+506.5 - K5+508.1					
	3,00	0,55	0,560	8,00	2,46
	3,00	1,40	0,560	3,00	2,35
	3,00	0,90	0,560	8,00	4,03
	3,00	1,40	0,560	3,00	2,35
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+508.1 - K5+520					

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	61,00	18,79
11.90	3,00	11,90	0,560	3,00	19,99
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	61,00	28,01
11.90	3,00	11,90	0,560	6,00	39,98
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+391.2 - K5+406.2					
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	75,00	34,44
14.90	3,00	14,90	0,560	6,00	50,06
PLACA ENCOLE OBRA #15 K5+375 - K5+389					
13.80	4,00	13,80	0,994	4,00	54,87
0.70	4,00	0,70	0,994	70,00	48,71
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+406.2 - K5+428.60					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	112,00	34,50
22.40	3,00	22,40	0,560	6,00	75,26

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	112,00	51,43
22.40	3,00	22,40	0,560	6,00	75,26
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+447.1 - K5+452					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	25,00	7,70
4.80	3,00	4,80	0,560	3,00	8,06
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	25,00	11,48
4.80	3,00	4,80	0,560	3,00	8,06
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+461.6 - K5+464					
2.40	3,00	2,40	0,560	3,00	4,03
0.40	3,00	0,40	0,560	13,00	2,91
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	12,00	3,70
2.30	3,00	2,30	0,560	3,00	3,86
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+478 - K5+482					

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
2.40	3,00	2,40	0,560	5,00	6,72
3.90	3,00	3,90	0,560	3,00	6,55
0.94	3,00	0,94	0,560	13,00	6,84
0.70	3,00	0,70	0,560	5,00	1,96
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+482 - K5+484.5					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	13,00	4,00
2.40	3,00	2,40	0,560	3,00	4,03
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	13,00	5,97
2.40	3,00	2,40	0,560	3,00	4,03
PLACA CUNETA TRIANGULAR K5+371.7 - K5+391.2					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,560	86,00	26,49
17.00	3,00	17,00	0,560	3,00	28,56
0.10 / 0.62 / 0.10	3,00	0,82	0,560	86,00	39,49

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
16.50	3,00	16,50	0,560	3,00	27,72
2.70	3,00	2,70	0,560	4,00	6,05
1.00	3,00	1,00	0,560	14,00	7,84
PLACA ACCESO PREDIO K5+496 - K5+502					
4.40	4,00	4,40	0,994	14,00	61,23
1.30	4,00	1,30	0,994	46,00	59,44
0.95	4,00	0,95	0,994	15,00	14,16
1.45	4,00	1,45	0,994	16,00	23,06
PLACA ACCESO PREDIO K5+427.6 - K5+447.1					
3.40	4,00	3,40	0,994	56,00	189,26
0.10 1.40 0.10	4,00	1,60	0,994	144,00	229,02
0.10 1.00 0.10	4,00	1,20	0,994	20,00	23,86
0.10 1.80 0.10	4,00	2,00	0,994	12,00	23,86
0.10 1.00 0.10	4,00	1,20	0,994	20,00	23,86

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.3	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:	**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.10 1.80 0.10	4,00	2,00	0,994	12,00	23,86
PLACA ACCESO PREDIO K5+452.4 - K5+464					
0.10 7.70 0.10	4,00	7,90	0,994	22,00	172,76
0.10 1.90 0.10	4,00	2,10	0,994	80,00	166,99
0.10 3.50 0.10	4,00	3,70	0,994	14,00	51,49
0.10 0.70 0.10	4,00	0,90	0,994	20,00	17,89
				AJUSTE AL DECIMAL	0,26
				TOTAL	**5.933,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.4	**DESCRIPCION**	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte
FECHA DE INICIO:		**FECHA FINAL:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	kinicial	kfinal	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
material de cobertura sobre filtro	k04+940	k04+950	10,00	0,85	0,20		1,70
						AJUSTE AL DECIMAL	0,00
						TOTAL	1,70

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.5	**DESCRIPCION**	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL m3
	filtro margen izquierdo	k04+940	k04+950	10,00	0,50	0,70			3,50
									0,00
									0,00
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	**3,50**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA GEODREN Y BORDILLO.
ITEM No.:	1.2.2.6	**DESCRIPCION**	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M2
	MANTO GEOTEXTIL FILTROS	k04+940	k04+950	10,00	2,40				24,00
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	**24,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.9	**DESCRIPCION**	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	EXCAVACION DE FILTROS	k04+940	k04+950	10,00	0,50	0,80			4,00
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	**4,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PADON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO

ITEM No.:	1.2.2.10	**DESCRIPCION**	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:** ML

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	TOTAL ML
	Tuberia para filtros	k04+940	k04+950	10,00				10,00
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**10,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.2 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	1.2.2.13	**DESCRIPCION**	Demolición manual de roca
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	demolicion manual en roca	k04+940	k04+950	10,00	0,50	0,20			1,00
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	**1,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PADON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.3	DESCRIPCION	Demolición de concreto ciclopeo
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	placa inferior	k04+830	k04+830	4,50	4,20	0,40			7,56
	muro 1	k04+830	k04+830	4,20	0,70	2,30			6,76
	muro 2	k04+830	k04+830	4,20	0,70	2,30			6,76
	muro existente en ciclopeo	k04+855	k04+855	4,00	3,40	0,60			8,16
								AJUSTE AL DECIMAL	-0,04
								TOTAL	29,20

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PADON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.4	**DESCRIPCION**	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	VOLUMEN M3	DESCUENTO M3	TOTAL M3
EXCAVACION BOX DESCOLE	k04+850	k04+850				33,20		33,20
EXCAVACION BOX DESCOLE	k04+830	k04+830				67,30		67,30
						AJUSTE AL DECIMAL		100,50
						TOTAL		**100,50**

OBSERVACIONES: La presente memoria esta respaldada por el informe de topografia anexo.

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

INFORME CANTIDAD DE EXCAVACION BOXCULVERT ABSCISAS K4+830 – K4+850 EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

MARZO 2026

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

EXCAVACION BOX K4+830 DESCOLE				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
0+000		10.6		
	1		14.16	14.16
0+001		17.72		
	1		18.53	18.53
0+002		19.34		
	1		19.17	19.17
0+003		18.99		
	1		15.40	15.40
0+004		11.8		
			VOLUMEN TOTAL	67.3

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

EXCAVACION BOX K4+850 DESCOLE				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
0+000		7.28		
	1		9.15	9.145
0+001		11.01		
	1		11.56	11.56
0+002		12.11		
	1		12.47	12.47
0+003		12.82		
			VOLUMEN TOTAL	33.2


FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9


BOX K4+830

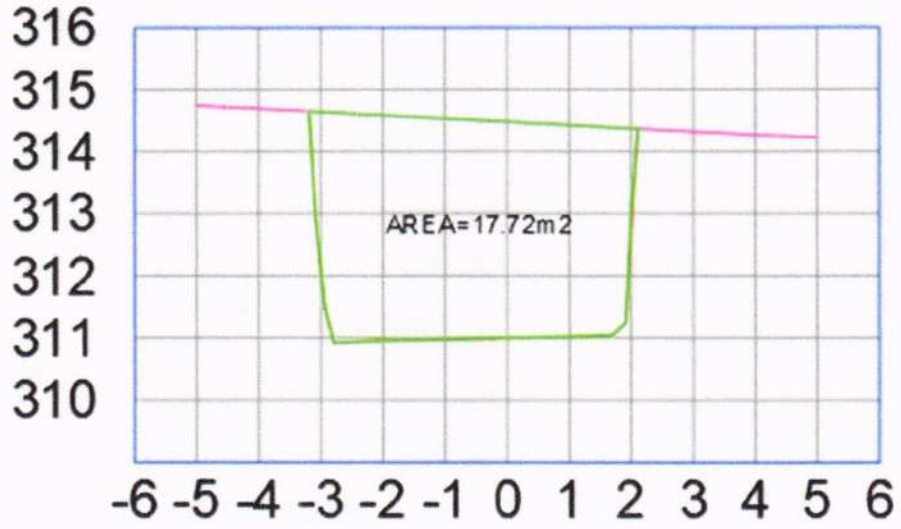


ESTACION 0+001.00

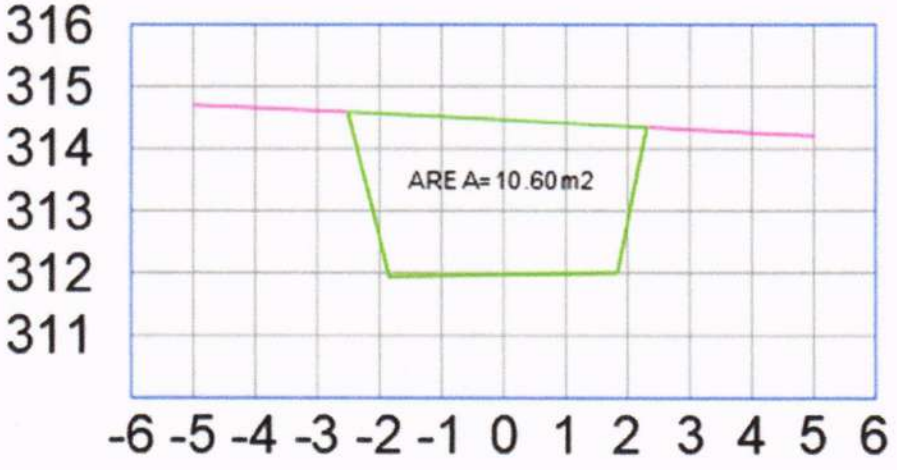

ESTACION 0+000.00

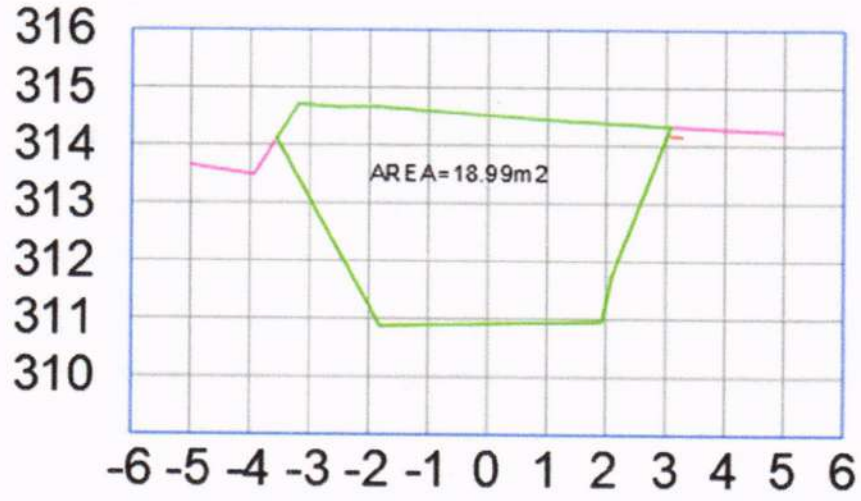


ESTACION 0+003.00

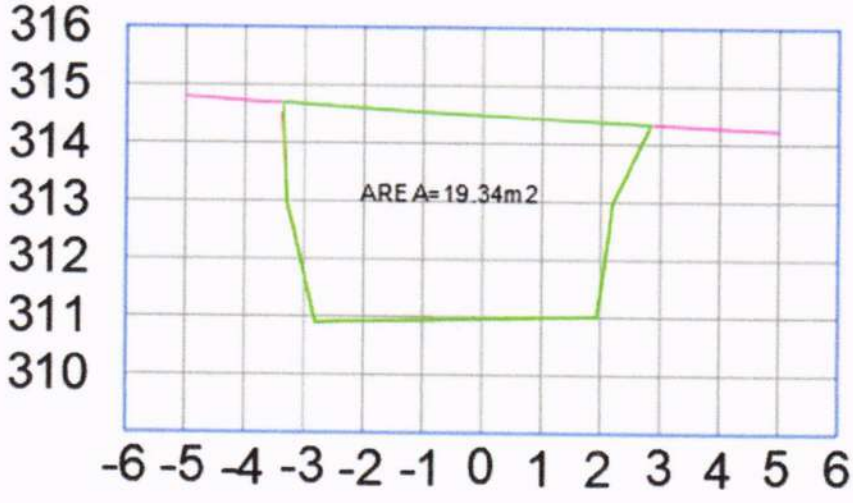

ESTACION 0+002.00


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

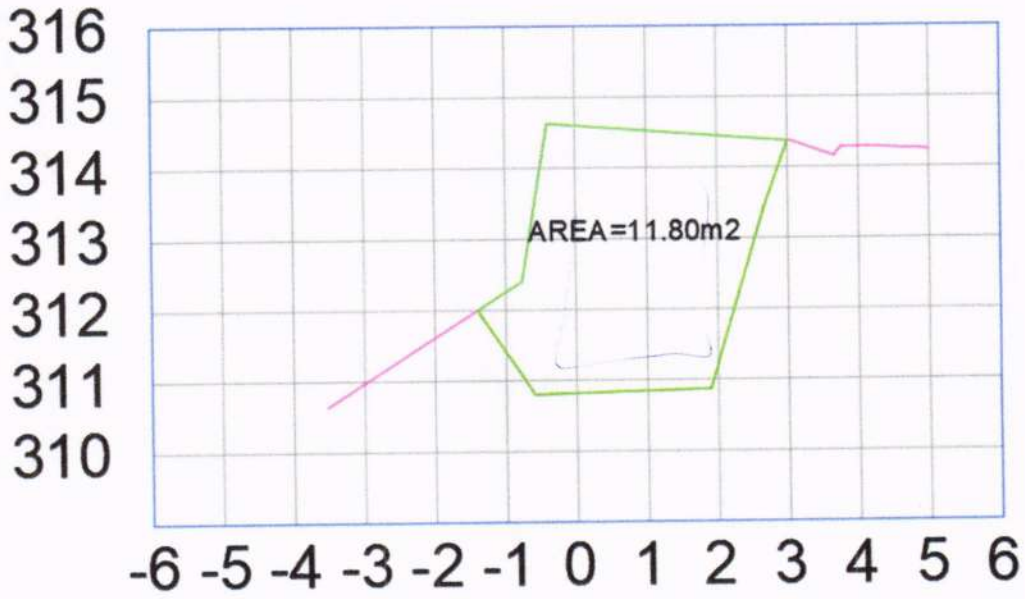


ESTACION 0+004.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

BOX K4+850

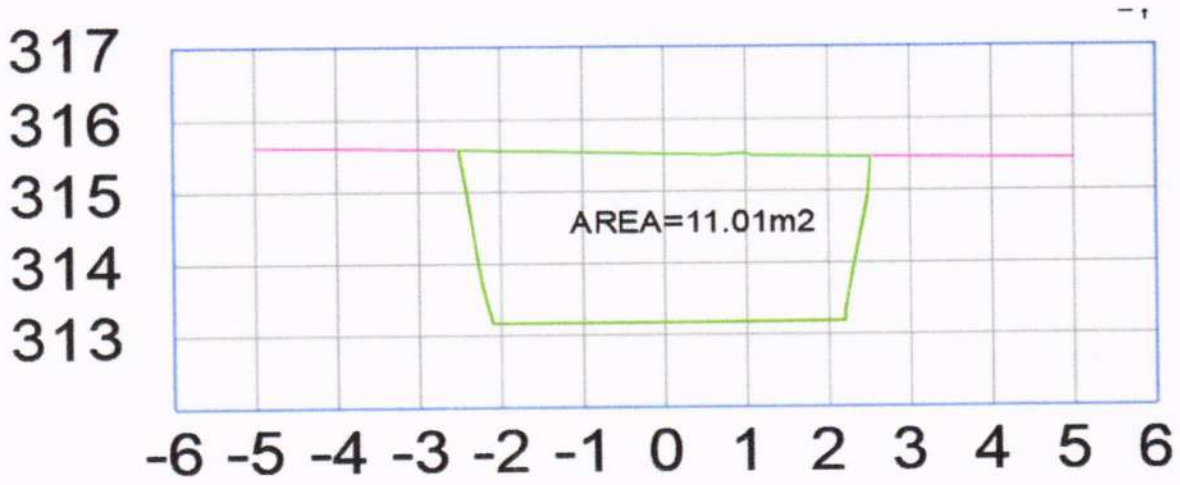


ESTACION 0+001.00

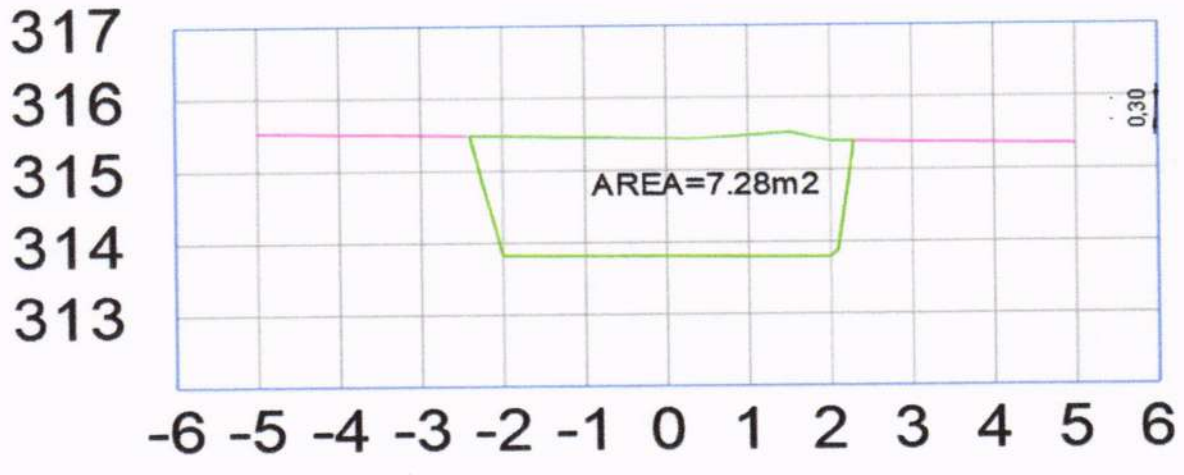


ESTACION 0+000.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

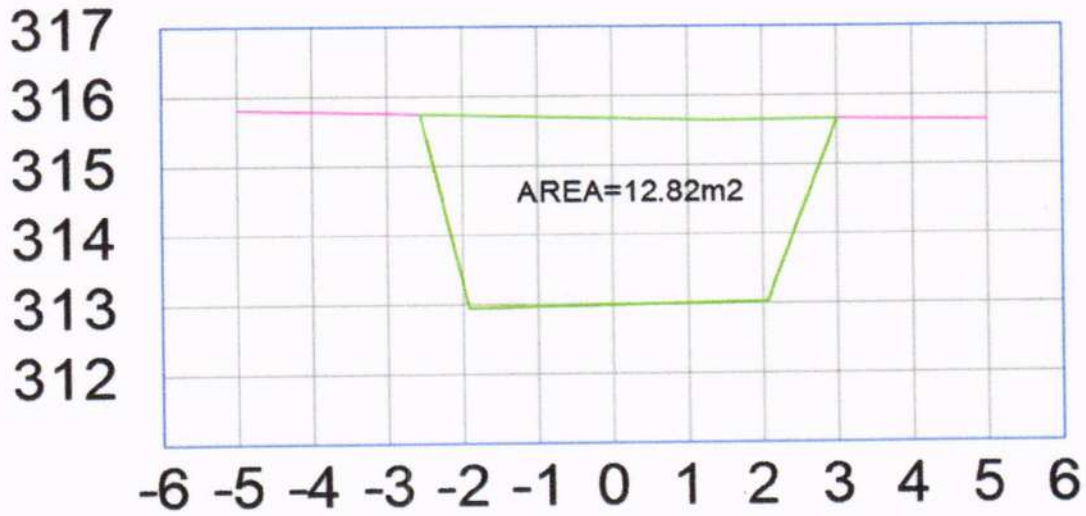

ESTACION 0+003.00

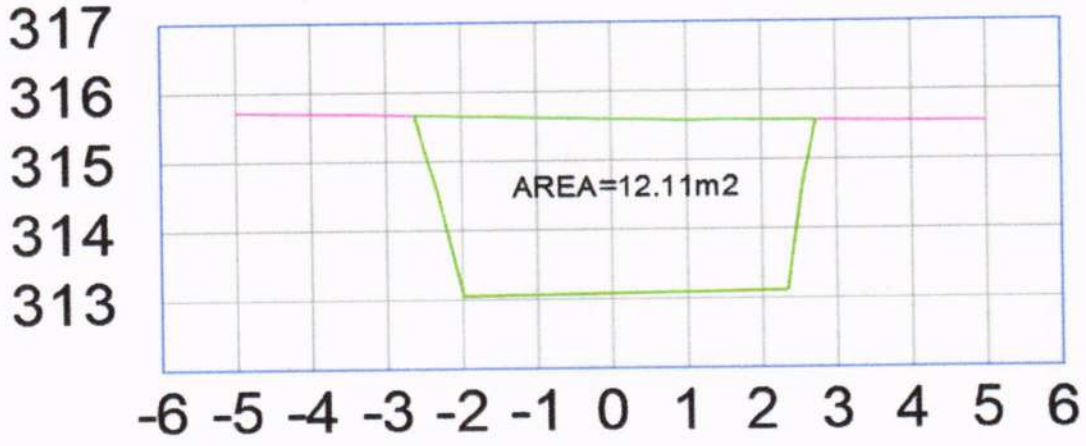

ESTACION 0+002.00

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.7	DESCRIPCION	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD	DESCUENTO M3	TOTAL M3
	Zarpa muro box	k04+829	k04+829	6,00	3,10	0,30			5,58
	Zarpa muro box	k04+829	k04+829	6,00	0,15	0,15			0,14
	Muros cuerpo box	k04+830	k04+830	12,00	2,20	0,30			7,92
	placa superior box	k04+830	k04+830	6,00	3,10	0,30			5,58
	placa superior box	k04+830	k04+830	6,00	0,15	0,15			0,14
	placa fondo box	k04+855	k04+855	6,00	2,00	0,25			3,00
	muros descole 1ra parte box	k04+855	k04+855	5,20	1,50	0,25	2,00		3,90
	Placa superior descole box	k04+855	k04+855	5,15	2,00	0,25			2,58
	muro realce descole boxculvert	k05+047	k05+065	18,40	0,80	0,25			3,68
								AJUSTE AL DECIMAL	0,00
								TOTAL	32,50

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.8	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
BOXCULVERT K4+684					
1.00	4,00	1,00	0,994	25,00	24,85
5.70	4,00	5,70	0,994	5,00	28,33
1.38	4,00	1,38	0,994	25,00	34,29
5.30	4,00	5,30	0,994	5,00	26,34
0.25 1.15	4,00	1,40	0,994	12,00	16,70
1.30	4,00	1,30	0,994	3,00	3,88
1.60	4,00	1,60	0,994	3,00	4,77
0.25 0.95	4,00	1,20	0,994	8,00	9,54
0.90	4,00	0,90	0,994	9,00	8,05
2.70	4,00	2,70	0,994	4,00	10,74
1.40	4,00	1,40	0,994	4,00	5,57
BOXCULVERT K4+740					
0.25 0.95	4,00	1,20	0,994	12,00	14,31

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.8	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
8.00	4,00	8,00	0,994	5,00	39,76
BOXCULVERT K4+830					
0.25 6.75	5,00	7,00	1,552	30,00	325,92
0.25 2.94 0.25	5,00	3,44	1,552	68,00	363,04
0.25 2.10 0.25	5,00	2,60	1,552	2,00	8,07
0.25 1.50 0.25	5,00	2,00	1,552	2,00	6,21
0.25 0.70 0.25	5,00	1,20	1,552	2,00	3,72
0.25 0.20 0.25	5,00	0,70	1,552	2,00	2,17
0.15 0.81 0.15	3,00	1,11	0,560	40,00	24,86
7.00	5,00	7,00	1,552	48,00	521,47
3.50	5,00	3,50	1,552	60,00	325,92
0.25 6.75	5,00	7,00	1,552	30,00	325,92
0.25 2.94 0.25	5,00	3,44	1,552	68,00	363,04
0.25 2.10 0.25	5,00	2,60	1,552	2,00	8,07

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.2.5 BOXCULVERT
ITEM No.:	1.2.5.8	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.25 1.50 0.25	5,00	2,00	1,552	2,00	6,21
0.25 0.70 0.25	5,00	1,20	1,552	2,00	3,72
0.25 0.20 0.25	5,00	0,70	1,552	2,00	2,17
0.15 0.81 0.15	3,00	1,11	0,560	40,00	24,86
BOXCULVERT K4+855					
0.25 1.75 0.25	4,00	2,25	0,994	54,00	120,77
0.25 1.00 0.25	4,00	1,50	0,994	2,00	2,98
0.25 0.40 0.25	4,00	0,90	0,994	2,00	1,79
0.25 5.75	4,00	6,00	0,994	20,00	119,28
0.20 5.80	4,00	6,00	0,994	32,00	190,85
0.20 1.85 0.20	4,00	2,25	0,994	106,00	237,07
0.20 5.80	4,00	6,00	0,994	20,00	119,28
0.20 1.90 0.20	4,00	2,30	0,994	56,00	128,03
BOXCULVERT K4+823 - K4+836					

Faro del Catatumbo			Gobernación de Norte de Santander		CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9			Consorcio R&Q - Joyco	
CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO								
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900			**SUB-CAPITULO:**	1.2.5 BOXCULVERT				
ITEM No.:	1.2.5.8	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
	0.20 5.60 0.20	4,00	6,00	0,994	28,00	166,99
	0.80	4,00	0,80	0,994	184,00	146,32
					AJUSTE AL DECIMAL	0,12
					TOTAL	**3.776,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.3.5 MURO CAISSON K4+140
ITEM No.:	1.3.5.3	**DESCRIPCION**	Demoliciones en concreto reforzado

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**			**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LARGO ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD	TOTAL M3
	demolicion placa superior	k04+830	k04+830	4,20	3,00	0,30		3,78
							AJUSTE AL DECIMAL	0,02
							TOTAL	**3,80**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	1.5.1	DESCRIPCION	Mejoramiento sub rasante en piedra rajon, extendida con transporte
FECHA DE INICIO:		FECHA FINAL:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTOS M3	TOTAL M3
Mejoramiento subrasante via	k04+735	k04+952	3,00	1,00	0,50		1,50
Mejoramiento subrasante via	k04+735	k04+952	4,00	1,50	0,50		3,00
Mejoramiento subrasante via	k04+735	k04+952	2,00	1,50	0,50		1,50
Mejoramiento subrasante via	k04+735	k04+952	8,00	1,50	0,50		6,00
Mejoramiento subrasante via	k04+900	k04+955	55,00	2,40	0,50		66,00
Mejoramiento subrasante via	k05+063	k05+048	5,00	2,50	0,25		3,13
						AJUSTE AL DECIMAL	-0,03
						TOTAL	81,10

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	1.5.2	**DESCRIPCION**	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
Subbase	k04+905	k05+080	175,00	10,53	0,30		552,83
Subbase	k04+715	k04+800	85,00	7,60	0,30		193,80
					AJUSTE AL DECIMAL		-0,02
					TOTAL		**746,60**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

INFORME CANTIDAD DE INSTALACION SUB BASE EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

MARZO 2026


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

CONSOLIDADO INSTALACION SUB BASE				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K4+905				
	175	10.53	0.3	552.83
K5+080				


CONSOLIDADO INSTALACION SUB BASE				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K4+715				
	85	7.6	0.3	193.80
K4+800				

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

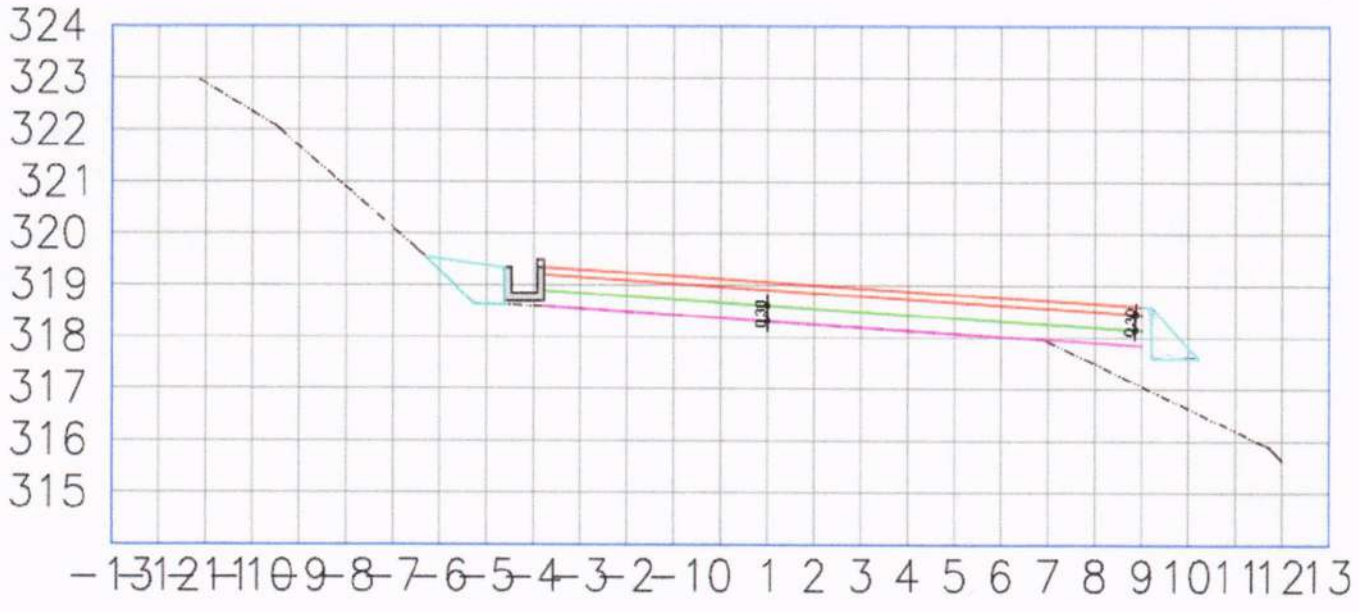


ESTACION 4+920.00

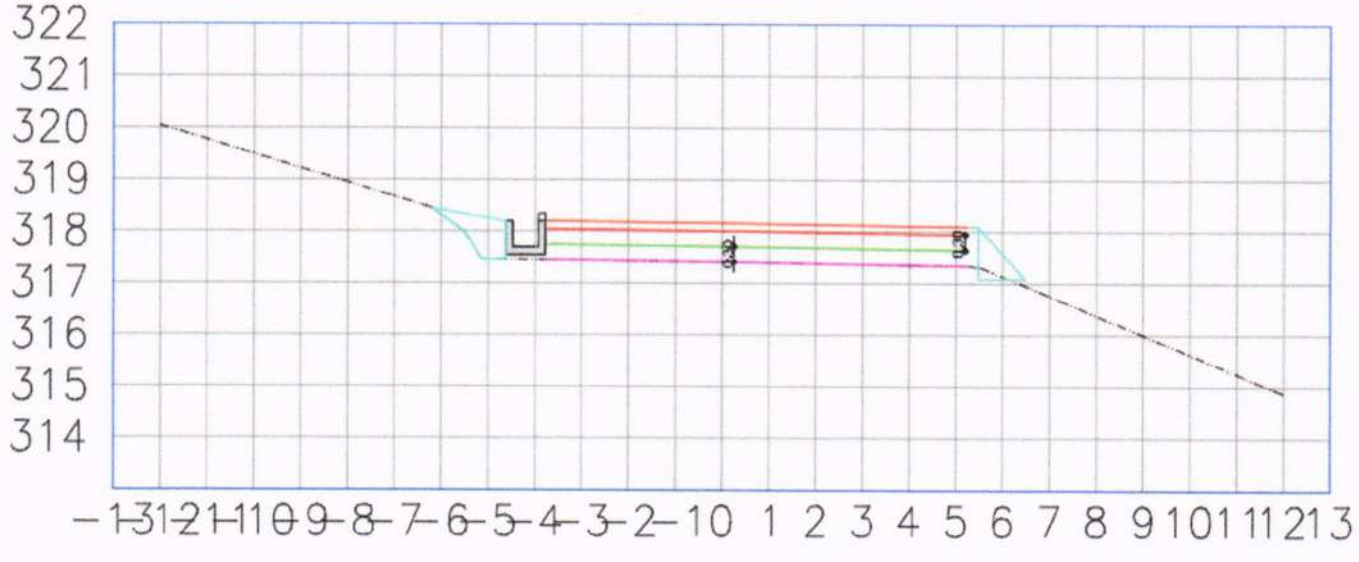


ESTACION 4+900.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

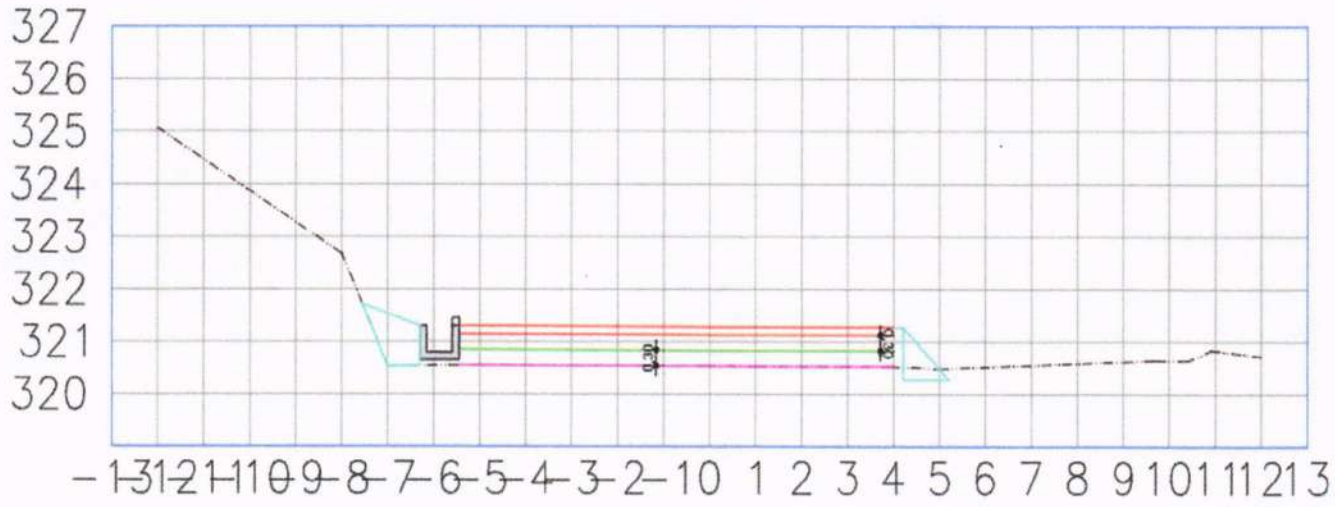


ESTACION 4+960.00

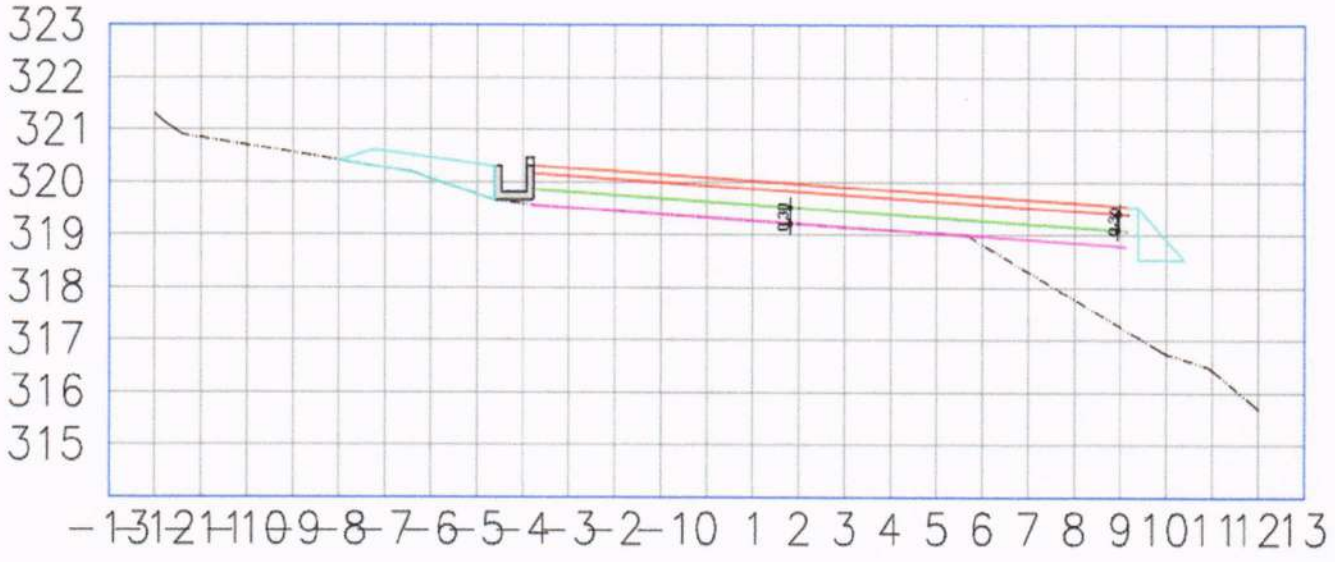


ESTACION 4+940.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

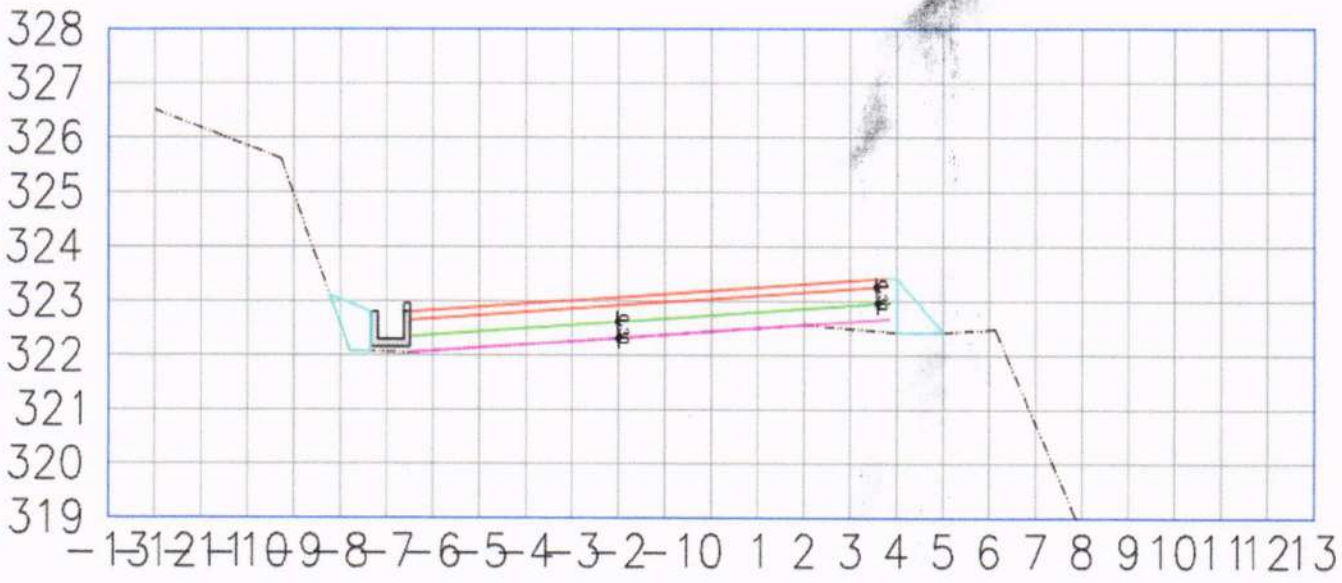


ESTACION 5+000.00

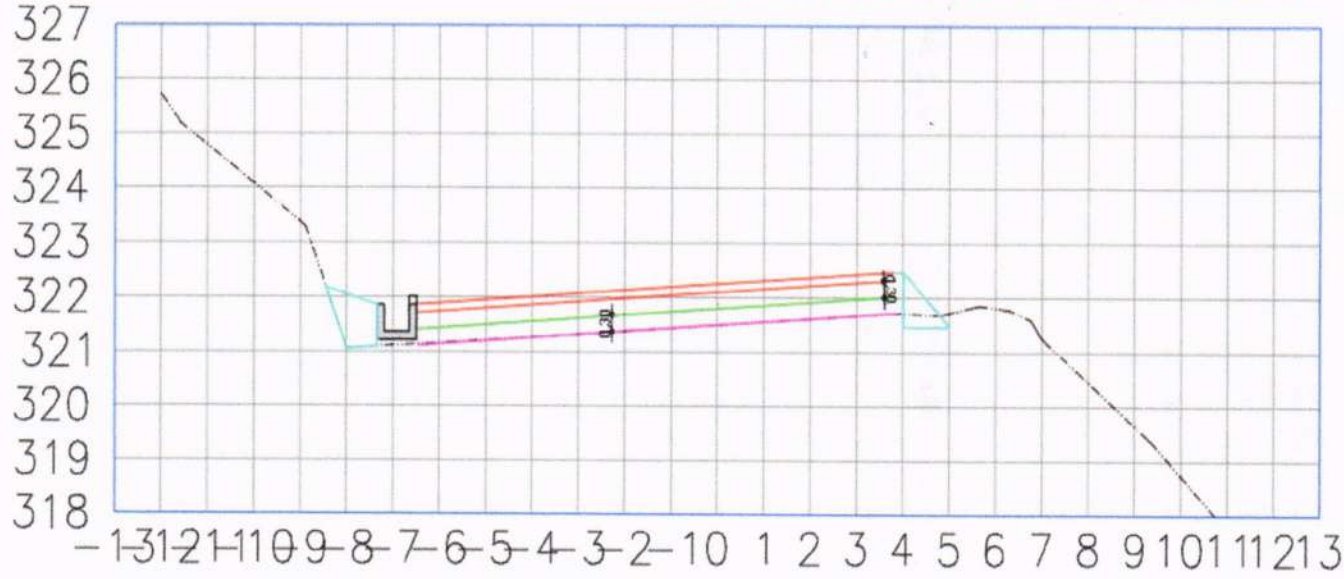


ESTACION 4+980.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

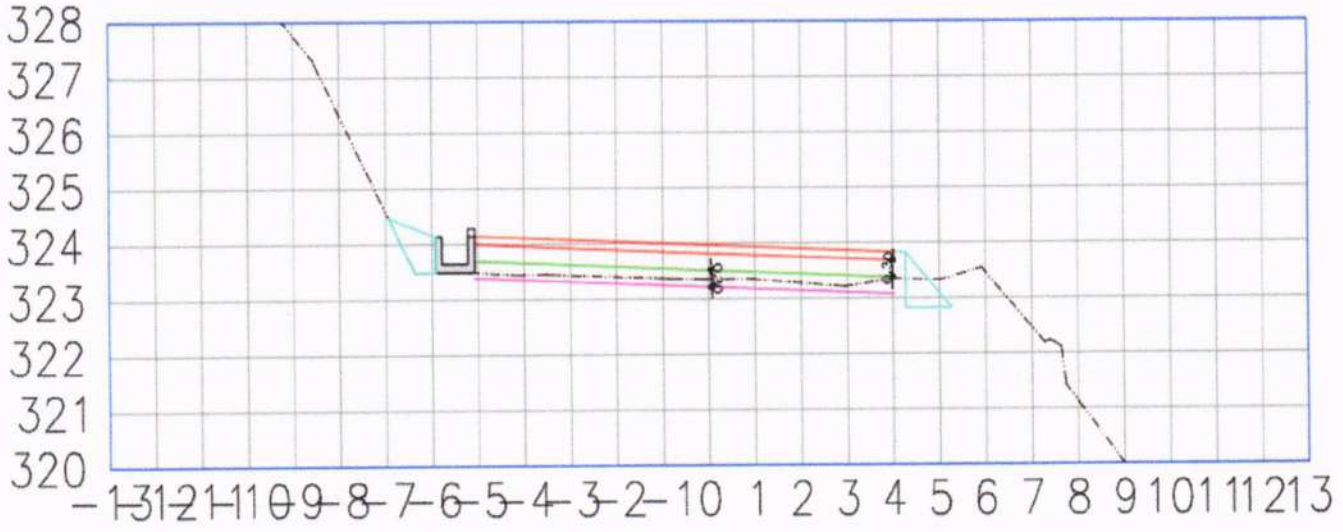


ESTACION 5+040.00

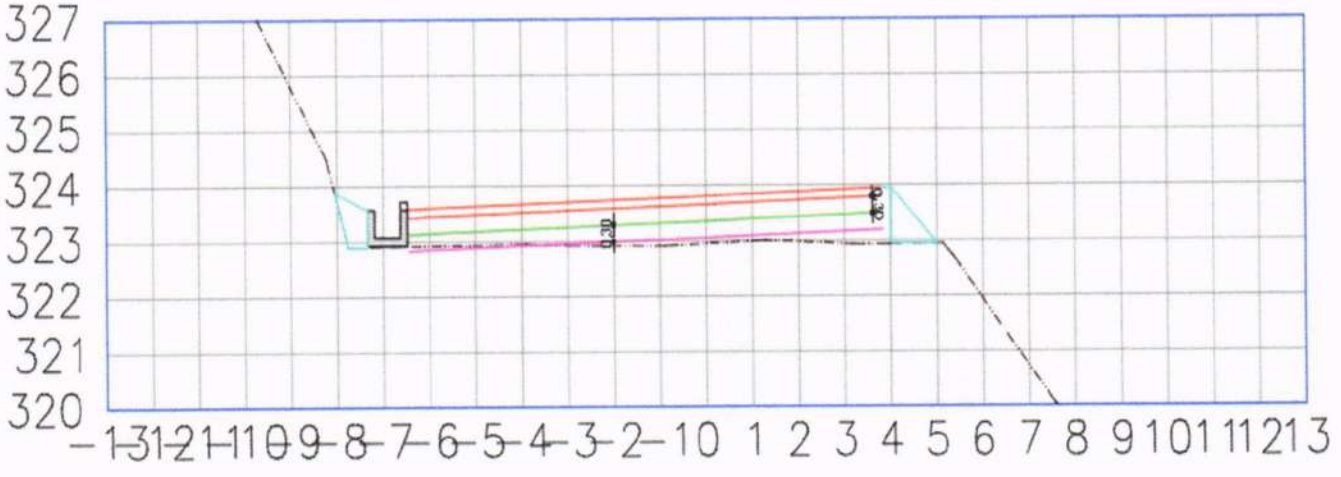


ESTACION 5+020.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

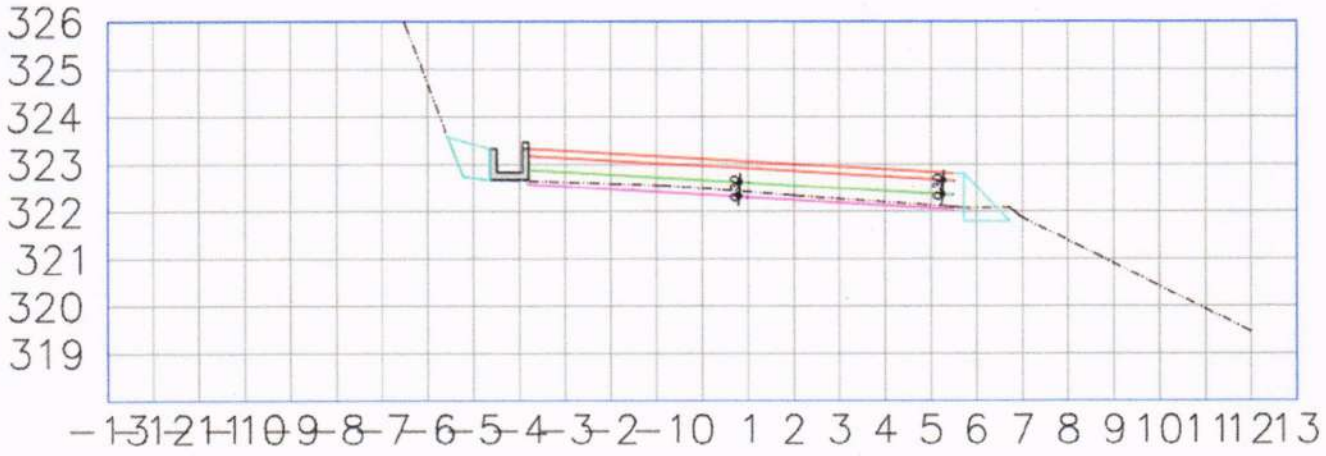


ESTACION 5+080.00

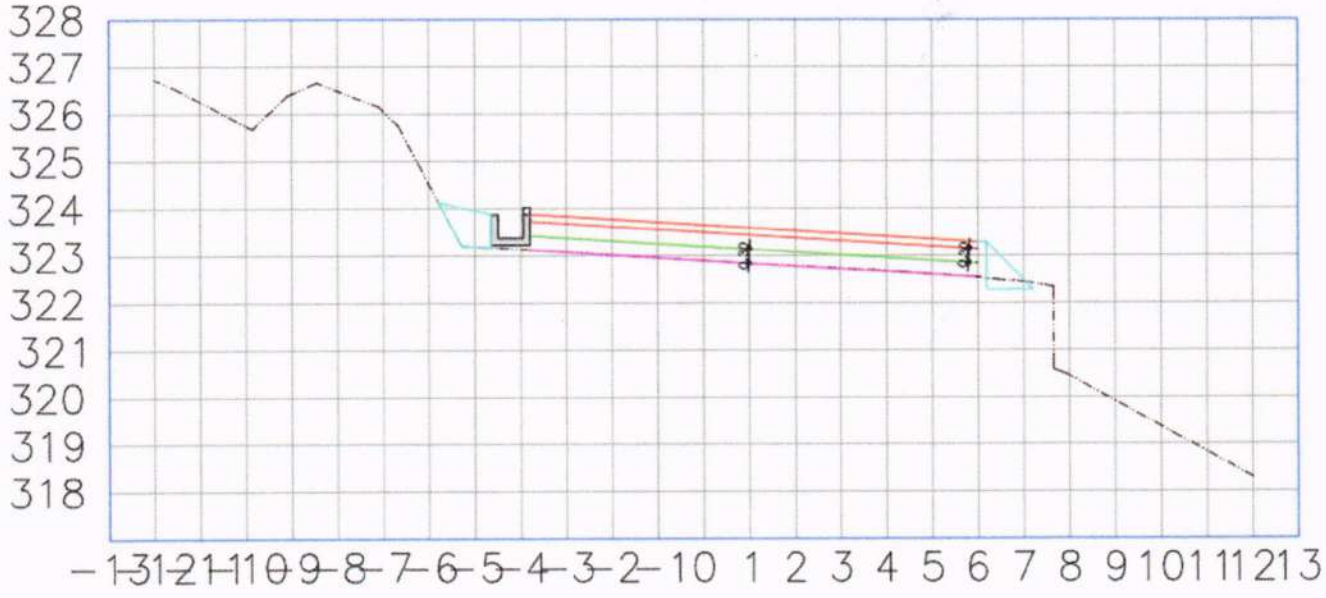


ESTACION 5+060.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

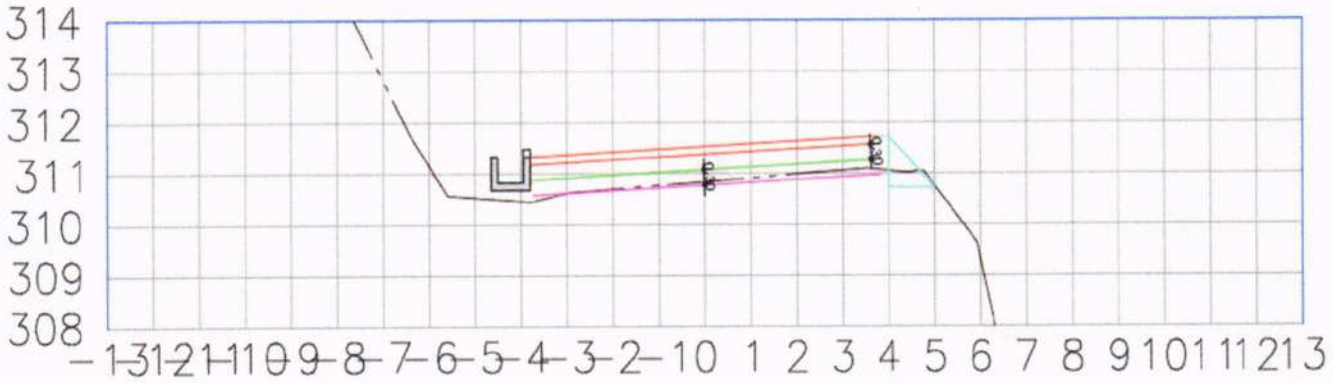


ESTACION 4+740.00

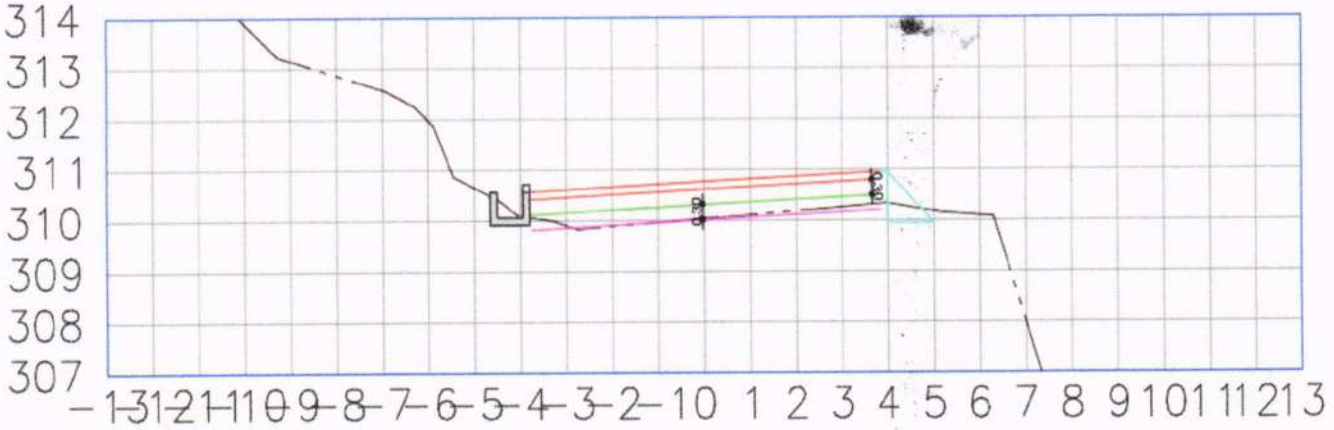


ESTACION 4+720.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

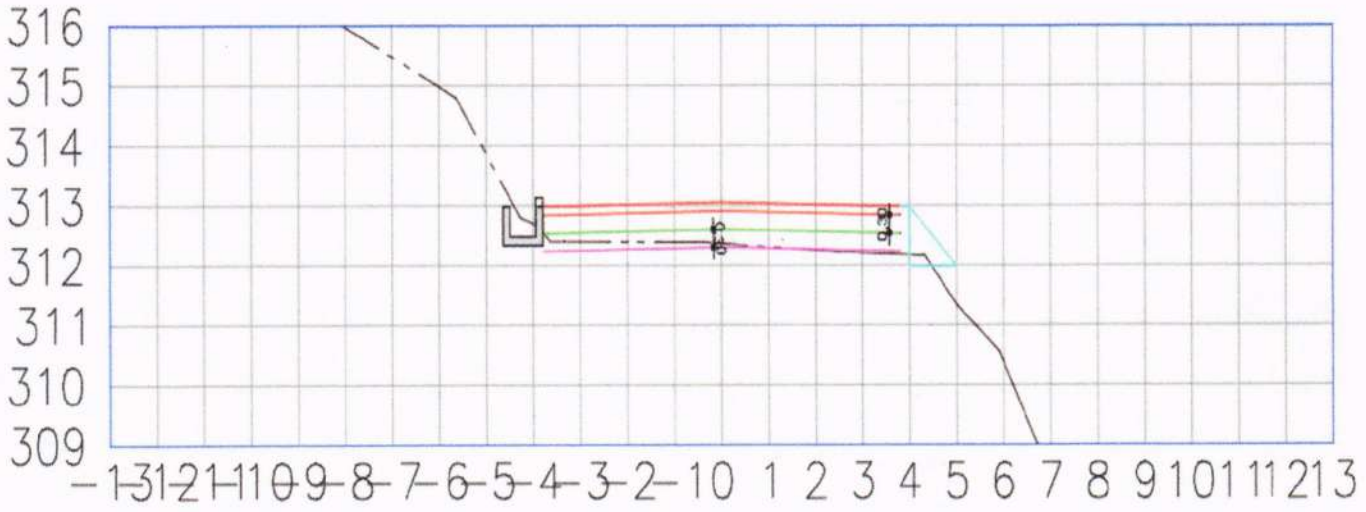


ESTACION 4+780.00

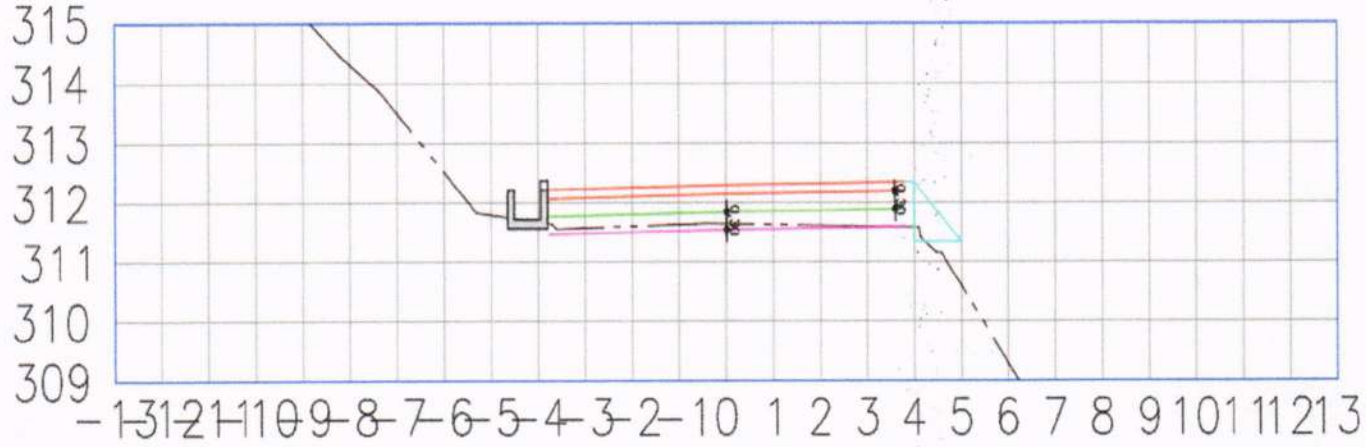

ESTACION 4+760.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

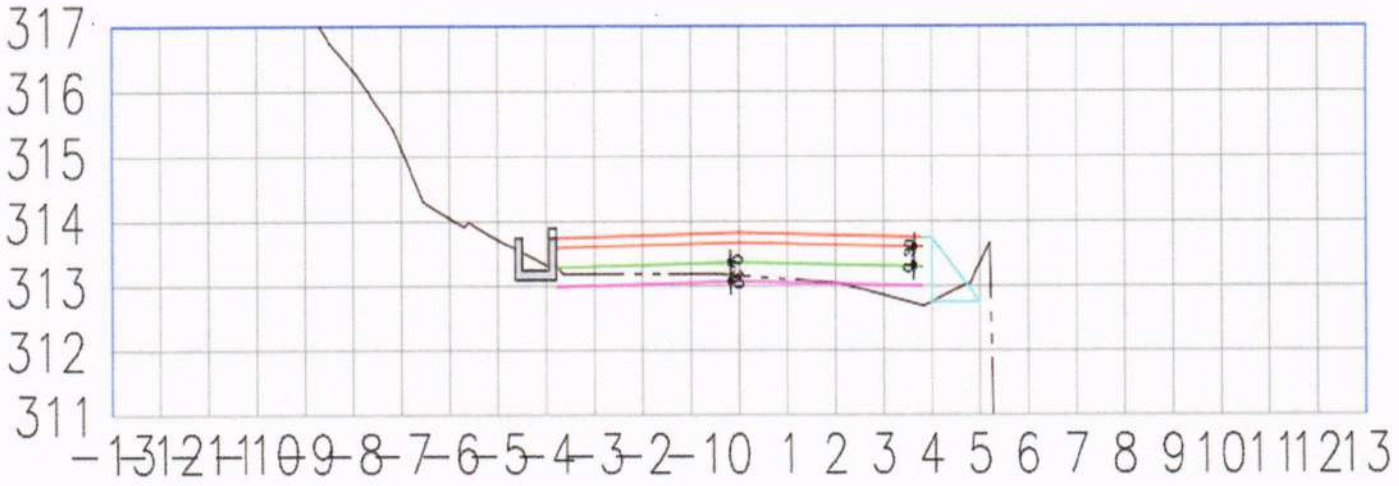

ESTACION 4+800.00

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	1.5.3	**DESCRIPCION**	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	TOTAL M3
BASE GRANULAR	k04+905	k05+080	175,00	10,53	0,30		552,83
BASE GRANULAR	k04+715	k04+800	85,00	3,80	0,30		96,90
					AJUSTE AL DECIMAL		-0,02
					TOTAL		**649,70**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

INFORME CANTIDAD DE INSTALACION BASE EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

MARZO 2026


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

CONSOLIDADO INSTALACION BASE				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K4+905				
	175	10.53	0.3	552.83
K5+080				


CONSOLIDADO INSTALACION BASE CARRIL IZQUIERDO				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K4+715				
	85	3.8	0.3	96.90
K4+800				

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

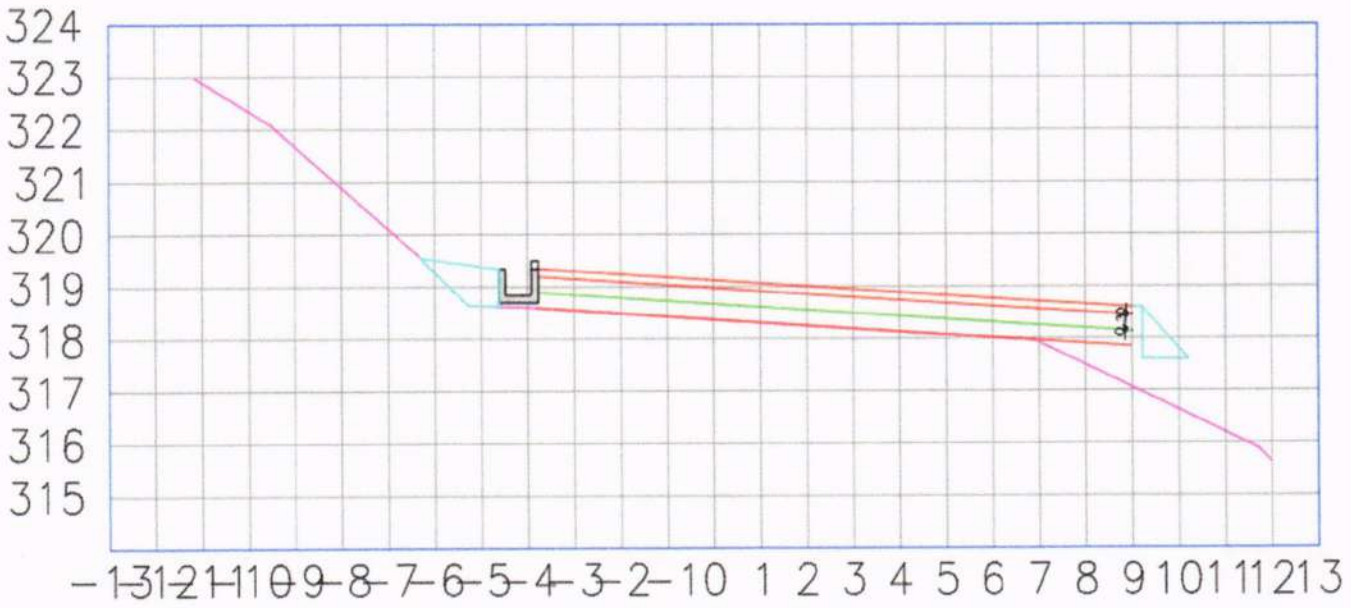


ESTACION 4+920.00

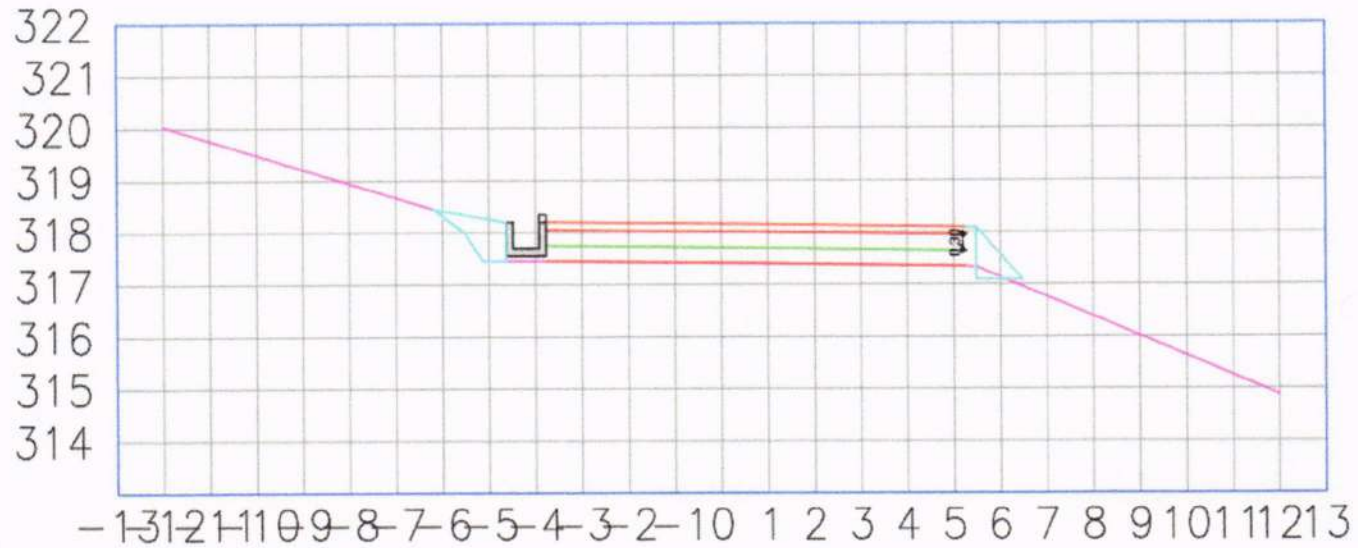


ESTACION 4+900.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

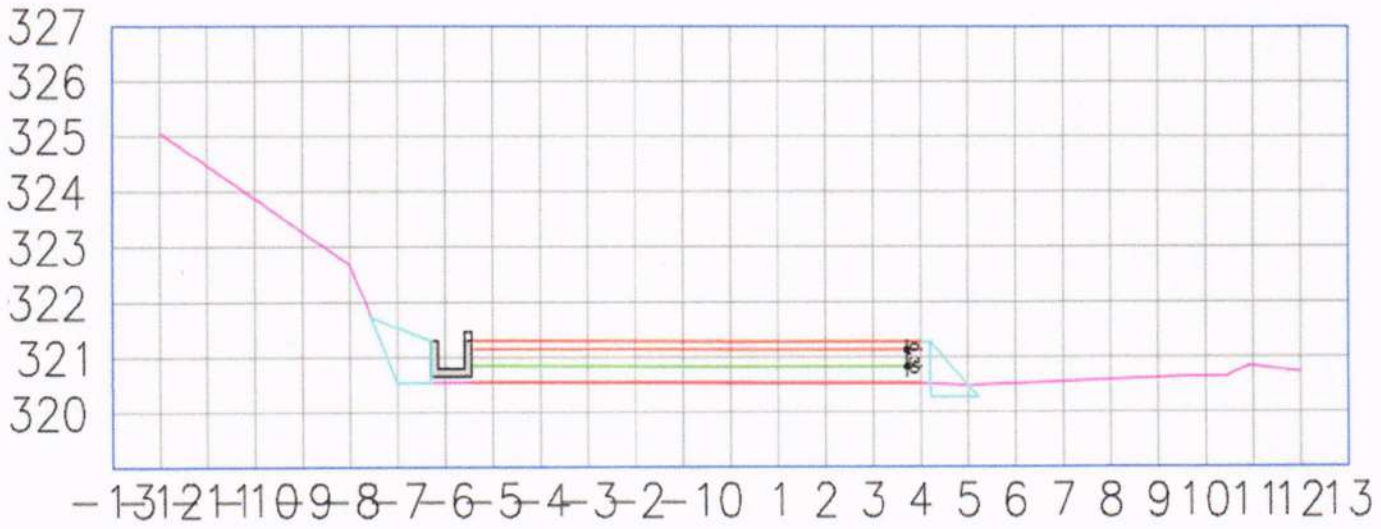


ESTACION 4+960.00

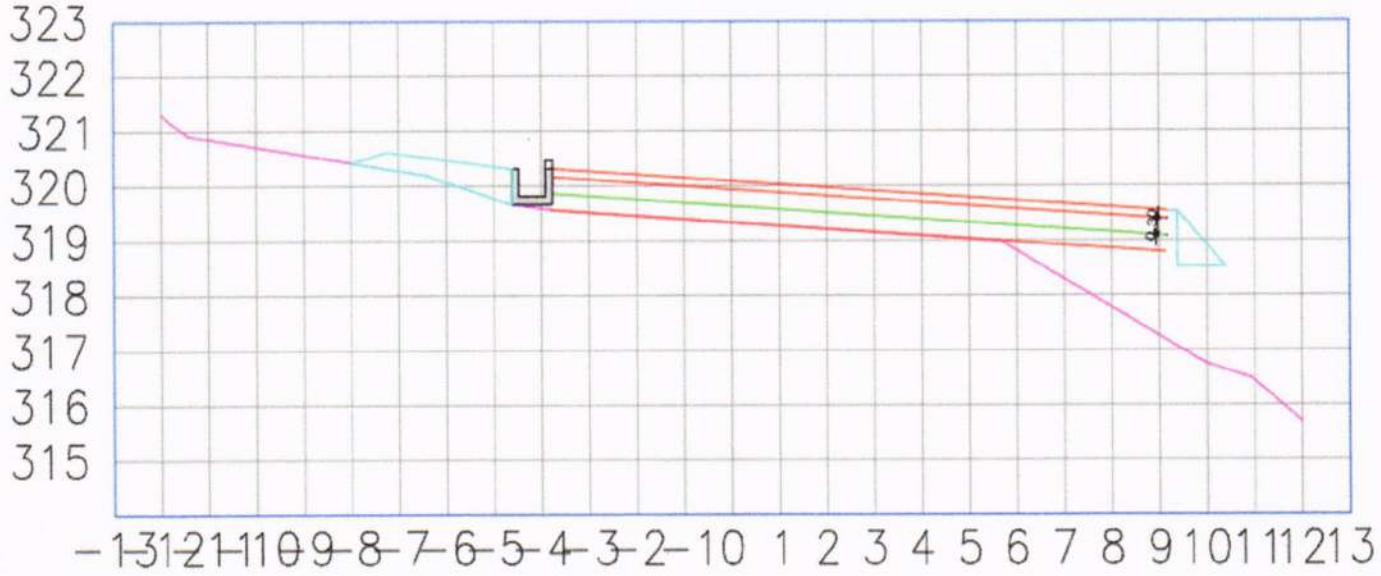


ESTACION 4+940.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

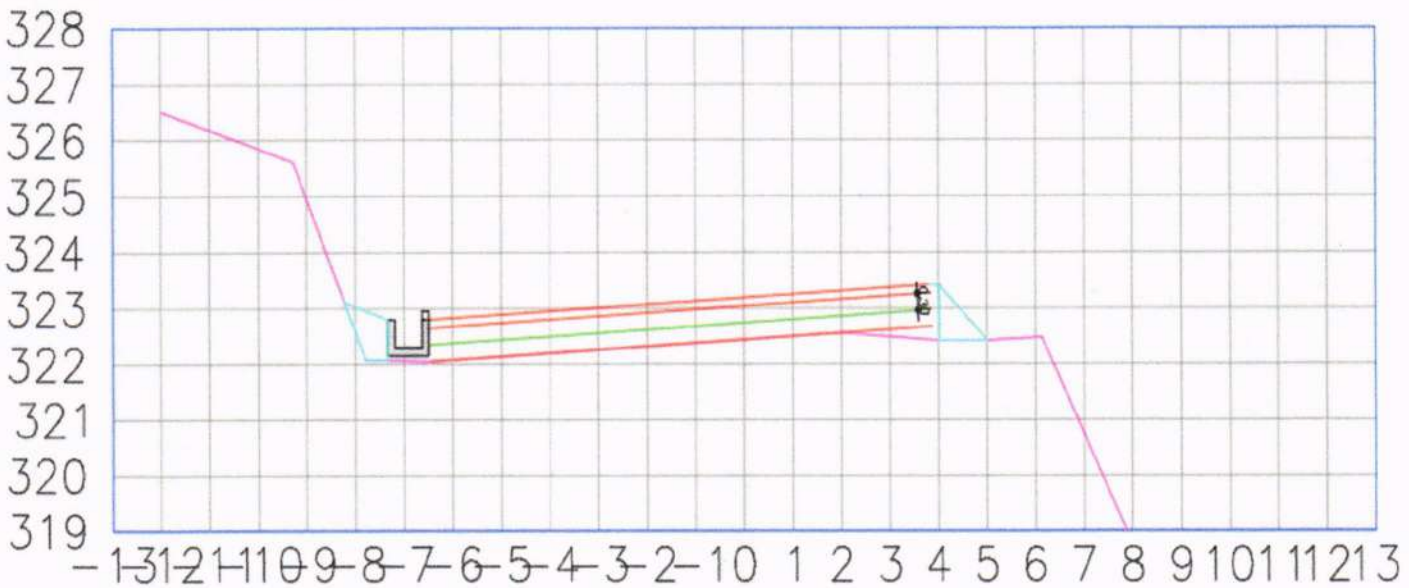


ESTACION 5+000.00

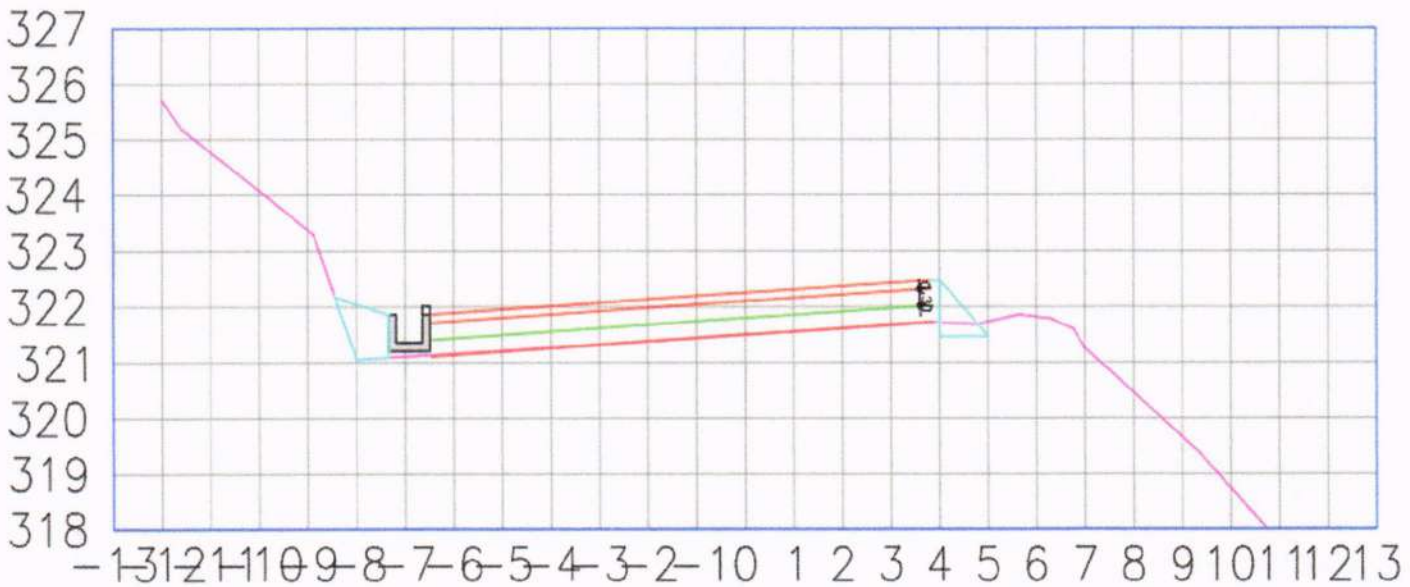


ESTACION 4+980.00

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: - 3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

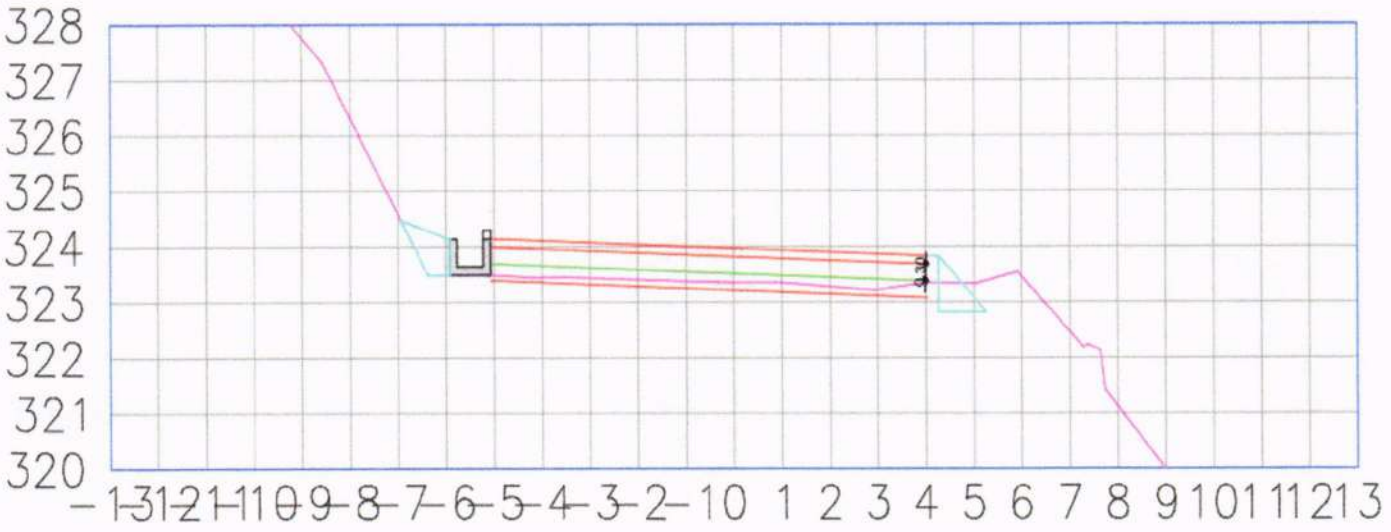


ESTACION 5+040.00

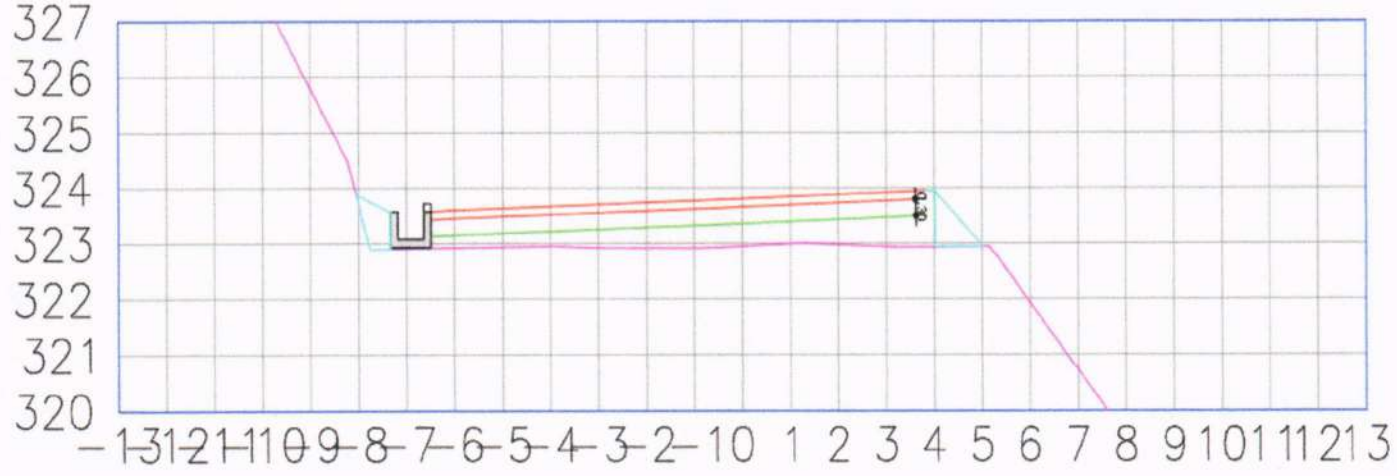


ESTACION 5+020.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

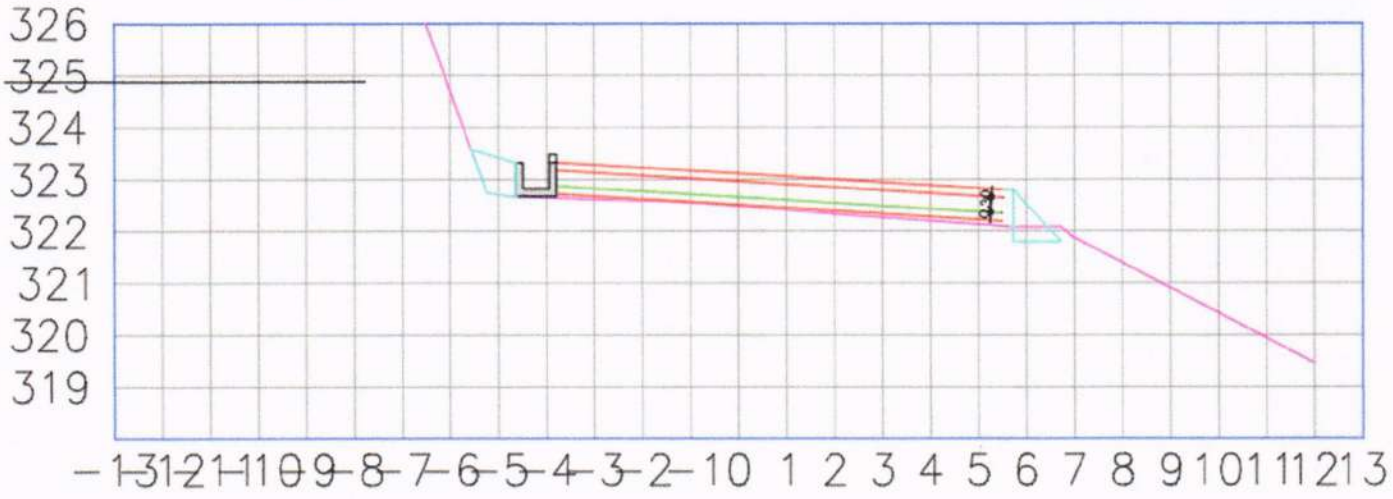


ESTACION 5+080.00

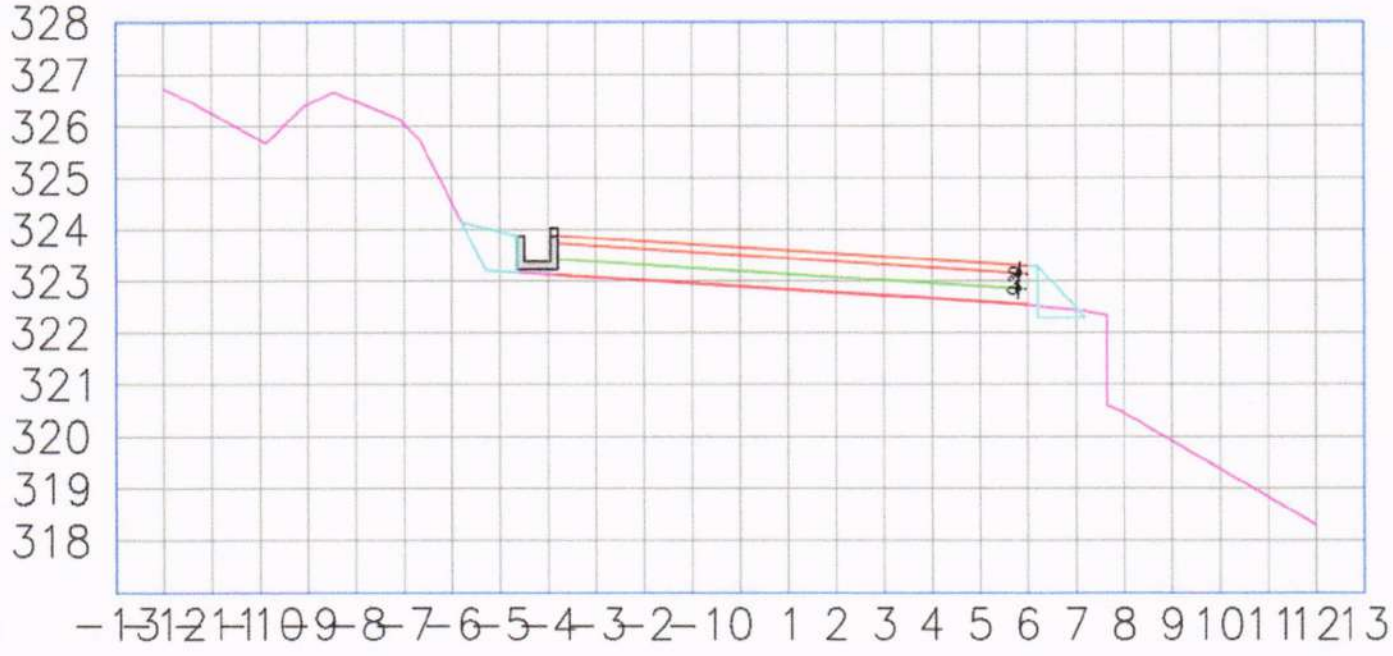


ESTACION 5+060.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

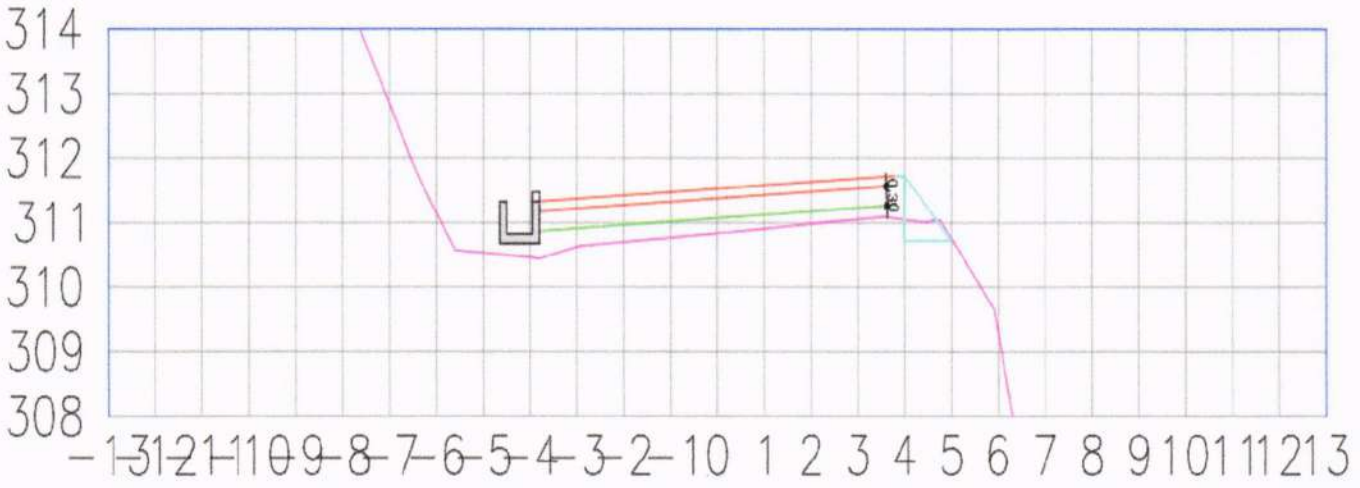

ESTACION 4+740.00

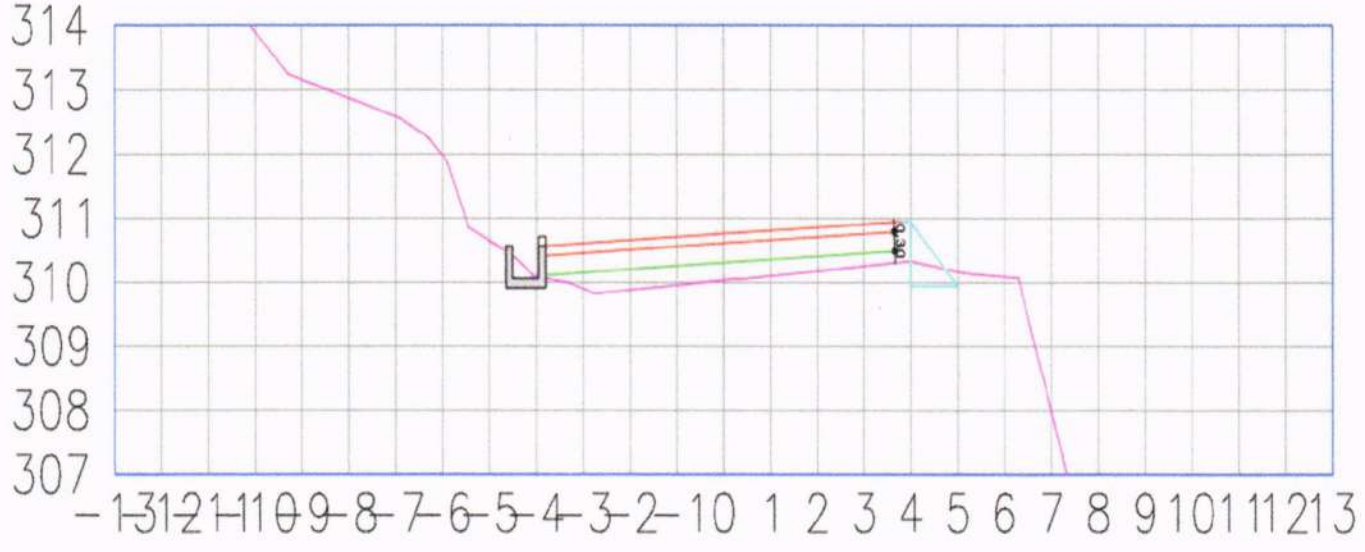


ESTACION 4+720.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9




ESTACION 4+780.00

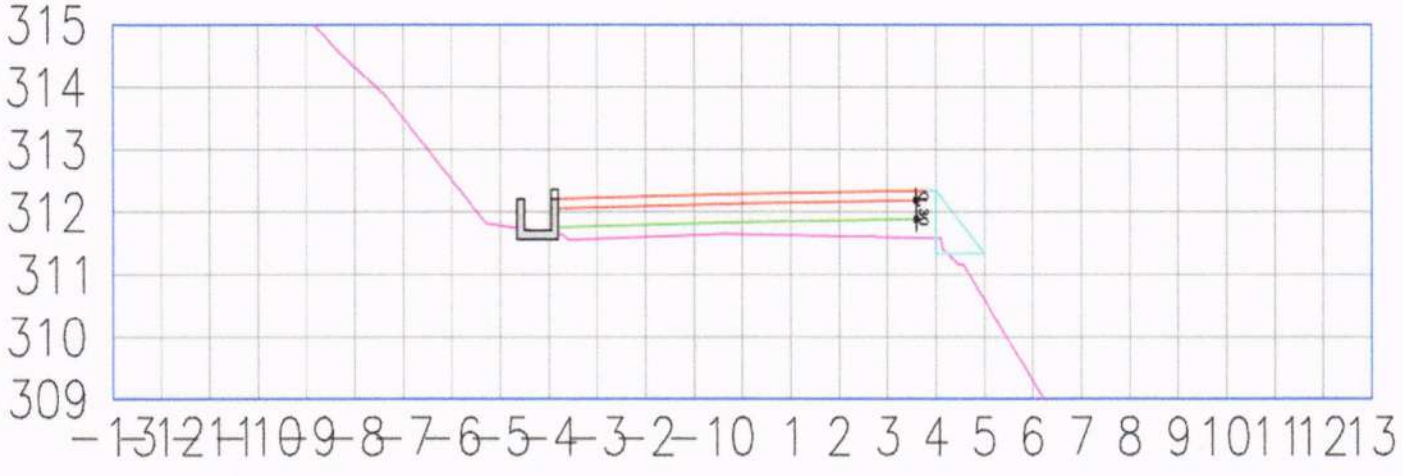

ESTACION 4+760.00

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -
3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

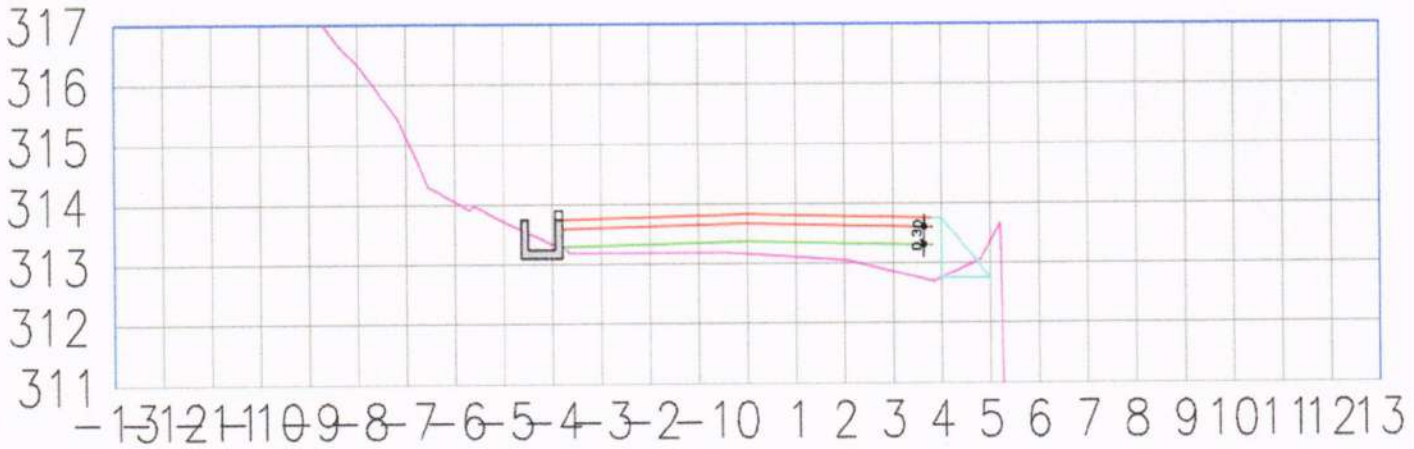

ESTACION 4+800.00

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	1.5.5	DESCRIPCION	Riego de Imprimacion

FECHA INICIAL DEL		FECHA FINAL DEL PERIODO:			UND:	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	TOTAL M2
	Carril izquierdo emulsión CRL-1	k04+715	k04+800	85,00	3,80			323,00
	Carril izquierdo emulsión CRL-1	k05+000	k05+080	80,00	4,80			384,00
	Carril izquierdo emulsión CRL-1	k04+905	k04+970	65,00	3,80			247,00
	Carril izquierdo emulsión CRL-1	k05+000	k05+080	80,00	4,90			392,00
	Carril izquierdo emulsión CRL-1	k04+970	k05+000	30,00	5,30			159,00
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**1.505,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander


CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	SUB-CAPITULO:	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	1.5.6	DESCRIPCION	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19
FECHA INICIAL DEL		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



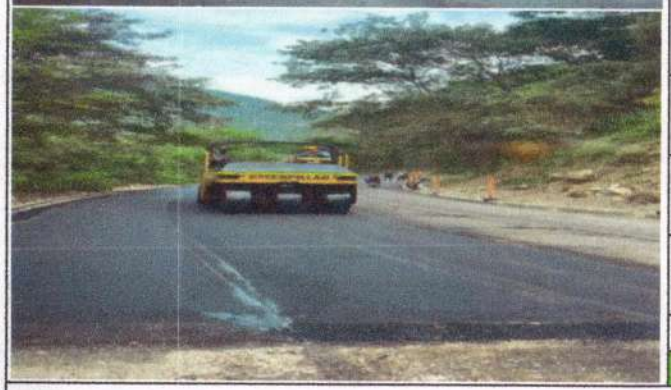

LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	TOTAL M3
Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	k05+005	k05+080	75.00	4.86	0.075		27.34
Carpeta asfaltica en caliente MDC-20	k04+715	k04+800	85.00	3.80	0.075		24.23
Carpeta asfaltica en caliente MDC-21	k04+011	k04+710	196.00	7.79	0.15		229.03
					AJUSTE AL DECIMAL		0.01
					TOTAL		280.60

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

90

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

INFORME CANTIDAD DE INSTALACION ASFALTO EN TRAMO 1.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."

MARZO 2026

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

CONSOLIDADO INSTALACION ASFALTO				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K5+005				
	75	4.86	0.075	27.34
K5+080				

CONSOLIDADO INSTALACION ASFALTO CARRIL IZQUIERDO				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
K4+715				
	85	3.8	0.075	24.23
K4+800				

CONSOLIDADO INSTALACION ASFALTO CARRIL IZQUIERDO				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN
k4+011				
	196	7,79	0,15	229,03
k4+710				

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.5 PAVIMENTOS

ITEM No.:	1.5.7	**DESCRIPCION**	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	TOTAL M2
GEOTEXTIL VIA	k04+715	k04+800	85,00	8,20			697,00
GEOTEXTIL VIA	k04+900	k05+020	120,00	11,37			1.364,40
GEOTEXTIL VIA	k05+020	k05+080	60,00	9,97			598,20
						AJUSTE AL DECIMAL	0,40
						TOTAL	**2.660,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA


Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.5 PAVIMENTOS
ITEM No.:	NP-11 1.5	**DESCRIPCION**	Riego de liga con emulsion asfaltica
FECHA INICIAL DEL		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M2		

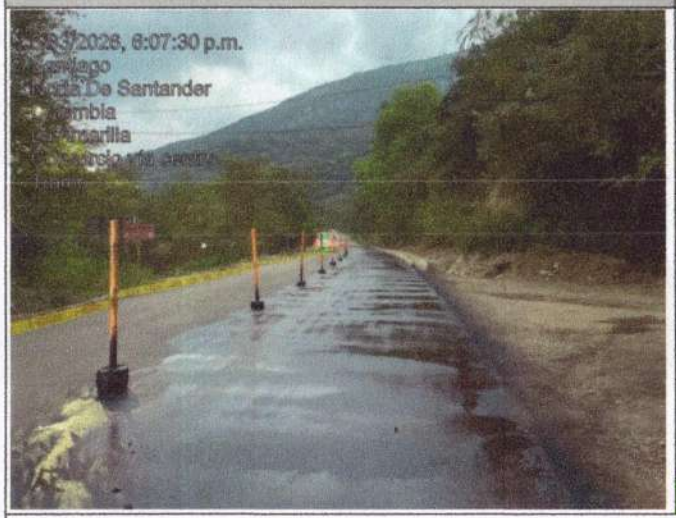REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	TOTAL M2
	riego de liga con emulsion asfaltica	k05+375	k05+464	89,00	3,80			338,20
	riego de liga con emulsion asfaltica	k05+620	k05+715	95,00	5,90			560,50
	riego de liga con emulsion asfaltica	k05+820	k05+900	80,00	3,80			304,00
	riego de liga con emulsion asfaltica	k05+375	k05+464	89,00	3,80			338,20
	riego de liga con emulsion asfaltica	k05+620	k05+715	95,00	3,80			361,00
	riego de liga con emulsion asfaltica	k05+820	k05+900	80,00	3,80			304,00
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**2.205,90**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	1. CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900	**SUB-CAPITULO:**	1.7 OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

ITEM No.:	1.7.2.2	**DESCRIPCION**	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	TOTAL ML
	trinchos	k05+615	k05+625	10,00				10,00
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**10,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9


Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	SUB-CAPITULO:	3.2.1 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	3.2.1.9	DESCRIPCION:	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
CANAL RECTANGULAR Y BORDILLO K22+825 - K22+900					
1.20	3,00	1,20	0,56	522,00	350,78
6.00	3,00	6,00	0,56	60,00	201,60
 h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	105,00	32,34
3.15	3,00	3,15	0,56	21,00	37,04
 h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	74,00	22,79
3.15	3,00	3,15	0,56	14,00	24,70
 h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	113,00	34,80
3.15	3,00	3,15	0,56	22,00	38,81
CUNETA Y BORDILLO K22+685 - K22+697					
 h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	61,00	18,79

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	SUB-CAPITULO:	3.2.1 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	3.2.1.9	DESCRIPCION	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.10 — 0.60 — 0.10	3,00	0,80	0,56	61,00	27,33
6.30	3,00	6,30	0,56	12,00	42,34
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	140,00	43,12
0.10 — 0.68 — 0.10	3,00	0,88	0,56	97,00	47,80
6.30	3,00	6,30	0,56	19,00	67,03
CUNETA Y BORDILLO K22+765 - K22+814					
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	246,00	75,77
0.10 — 0.68 — 0.10	3,00	0,88	0,56	246,00	121,23
6.30	3,00	6,30	0,56	79,00	278,71
1.90	3,00	1,90	0,56	77,00	81,93
14.70	3,00	14,70	0,56	22,00	181,10
CUNETA Y BORDILLO K22+729.2 - K22+746.50					

Faro del Catatumbo — Empresa Industrial y Comercial del Estado

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.2.1 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	3.2.1.9	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	87,00	26,80
0.10 — 0.68 — 0.10	3,00	0,88	0,56	87,00	42,87
6.30	3,00	6,30	0,56	17,30	61,03
h=0.40 g=0.075	3,00	0,55	0,56	51,00	15,71
0.10 — 0.68 — 0.10	3,00	0,88	0,56	51,00	25,13
6.30	3,00	6,30	0,56	10,00	35,28
PLACA ACCESO K22+830 - K22+833					
2.15	4,00	2,15	0,994	17,00	36,33
3.05	4,00	3,05	0,994	15,00	45,48
PLACA ENCOLE OBRA #14 K22+746 - K22+756.33					
10.65	4,00	10,65	0,994	4,00	42,34
1.40	4,00	1,40	0,994	45,00	62,62
MURO DISIPADOR K22+886 - K22+898					

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	SUB-CAPITULO:	3.2.1 CUNETA, GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	3.2.1.9	DESCRIPCION	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		FECHA FINAL DEL PERIODO:	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
1.98	3,00	1,98	0,56	5,00	5,54
1.55	3,00	1,55	0,56	5,00	4,34
1.70	3,00	1,70	0,56	5,00	4,76
1.17	3,00	1,17	0,56	5,00	3,28
4.77	3,00	4,77	0,56	5,00	13,36
PLACA FONDO DISIPADOR K22+886 - K22+898					
1.03 1.00 1.03	4,00	3,06	0,994	66,00	200,75
12.88	3,00	12,88	0,56	5,00	36,06
MURO DISIPADOR K22+886 - K22+898					
2.64	3,00	2,64	0,56	5,00	7,39
1.15	3,00	1,15	0,56	5,00	3,22
1.50	3,00	1,50	0,56	5,00	4,20
1.17	3,00	1,17	0,56	5,00	3,28
4.77	3,00	4,77	0,56	5,00	13,36
				AJUSTE AL DECIMAL	-0,14
				TOTAL	**2.421,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

94

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.3.2 BOXCULVERT
ITEM No.:	3.3.2.29	**DESCRIPCION**	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**			**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	CANTIDAD M3
	MEJORAMIENTO COLCHOGAVION	k22+875	k22+875	1,00	1,40	1,00		1,40
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**1,40**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
