Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.3.2 BOXCULVERT
ITEM No.:	3.3.2.29	**DESCRIPCION**	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**			**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	CANTIDAD M3
	MEJORAMIENTO COLCHOGAVION	k22+875	k22+875	1,00	1,40	1,00		1,40
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**1,40**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.3.1 ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO
ITEM No.:	3.3.1.19	**DESCRIPCION**	Concreto ciclópeo para piso y solados
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	CANTIDAD
	BATEA CUNETA MURO CRITICO	k21+998	k22+021	23,40	0,60	0,10		1,40
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**1,40**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

101

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO								
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900			**SUB-CAPITULO:**	3.3.2 BOXCULVERT				
ITEM No.:	3.3.2.30	**DESCRIPCION**	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	CANTIDAD M3
	COLCHOGAVION BOX	k22+875	k22+875	15,06	4,80	0,50		36,14
						AJUSTE AL DECIMAL		-0,04
						TOTAL		**36,10**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.3.2 BOX CULVERT
ITEM No.:	NP-06 3.3	**DESCRIPCION**	Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi

FECHA INICIAL DEL PERIODO:			**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	**M3**

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	CANTIDAD M3
RECUBRIMIENTO COLCHOGAVION	k22+875	k22+875	13,30	2,53	0,05		1,68
RECUBRIMIENTO COLCHOGAVION	k22+875	k22+875	9,00	3,60	0,05		1,62
					AJUSTE AL DECIMAL		0,00
					TOTAL		**3,30**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

104

INFORME CONSOLIDADO INSTALACION COLCHO GAVION K22+875 EN TRAMO 3.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S."


MARZO 2026

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9


CONSTRUCCION COLCHO GAVIONES				
ABSCISA	DISTANCIA	ANCHO PROMEDIO	ALTURA	AREA
22+875				
	14.69	13.62		200.08

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.


CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

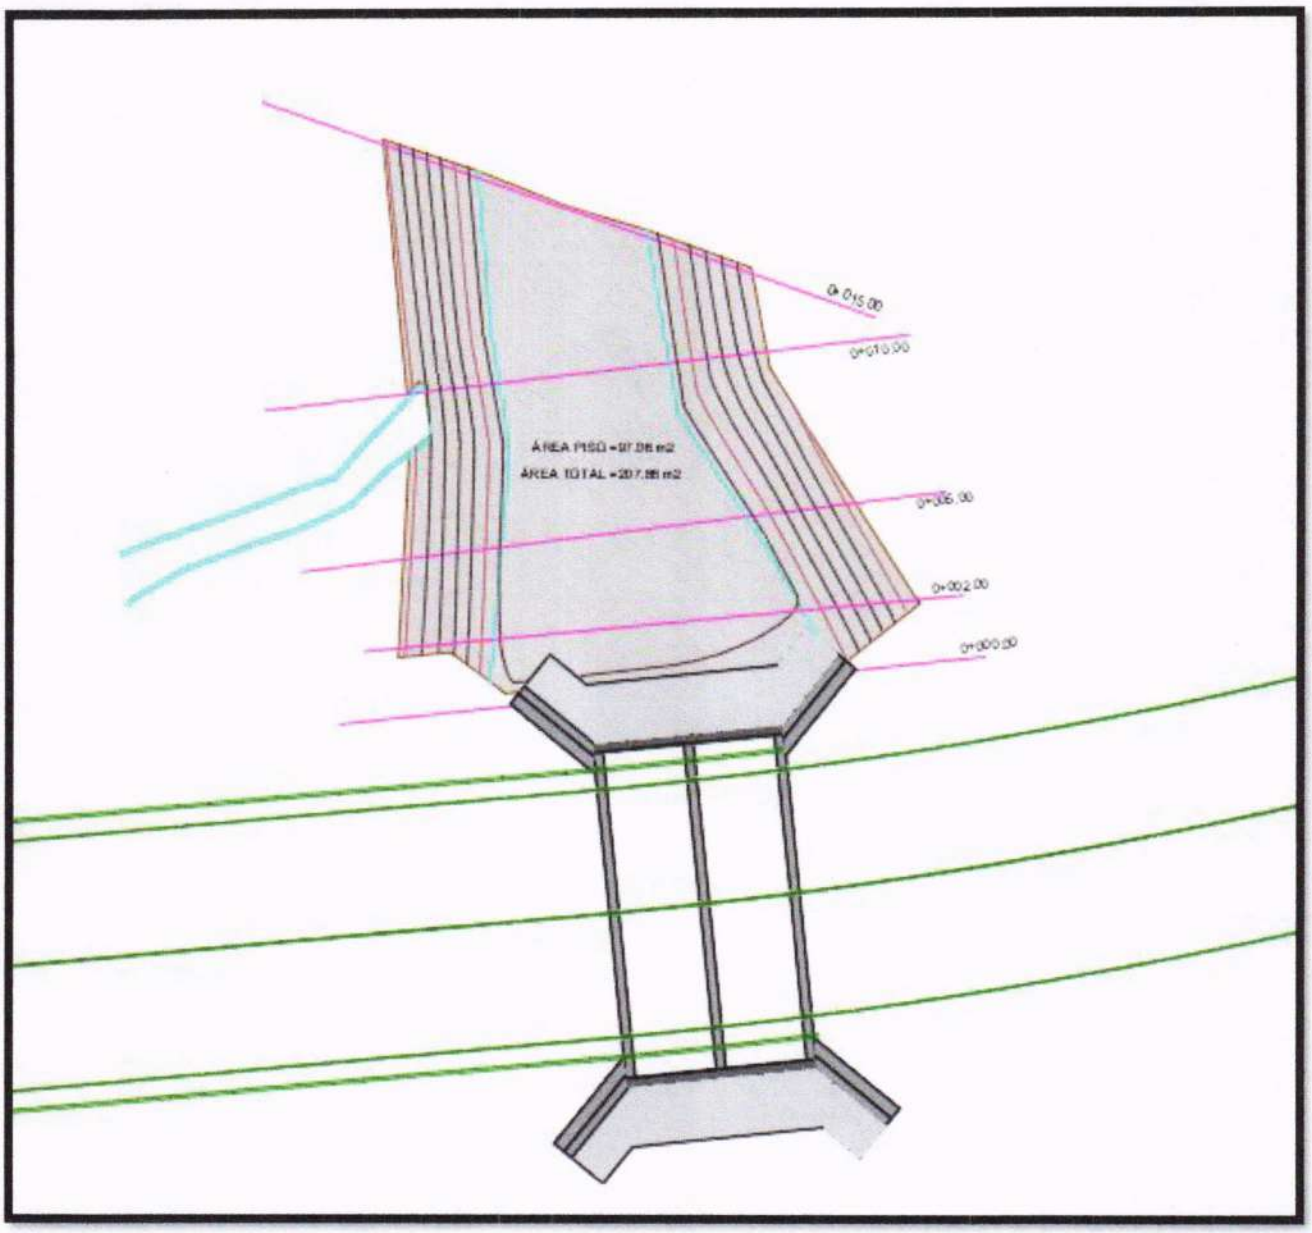

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

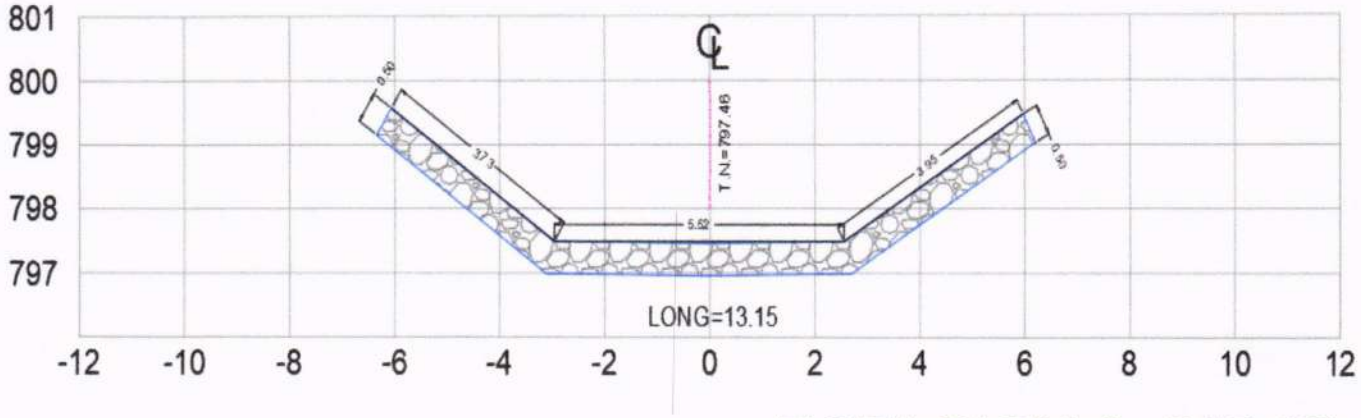


ESTACION 0+015.00

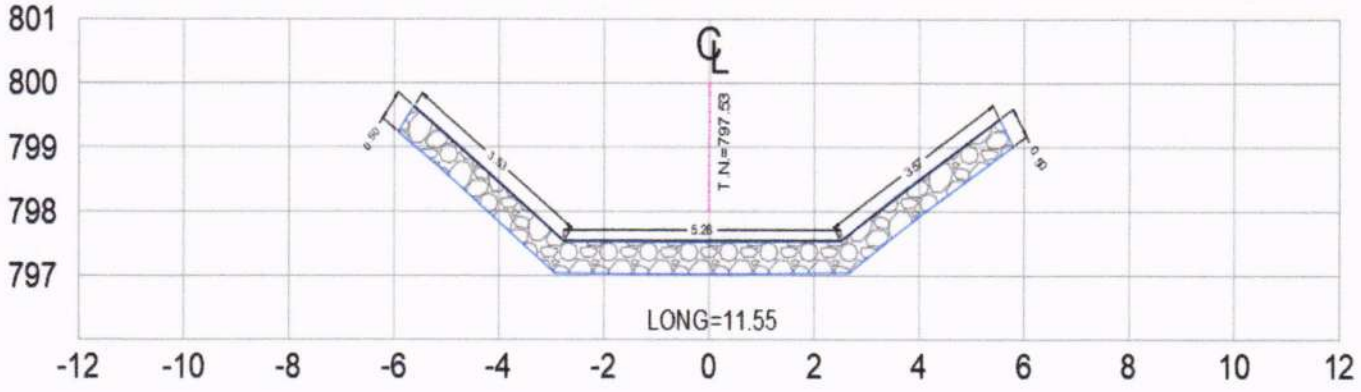


ESTACION 0+010.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

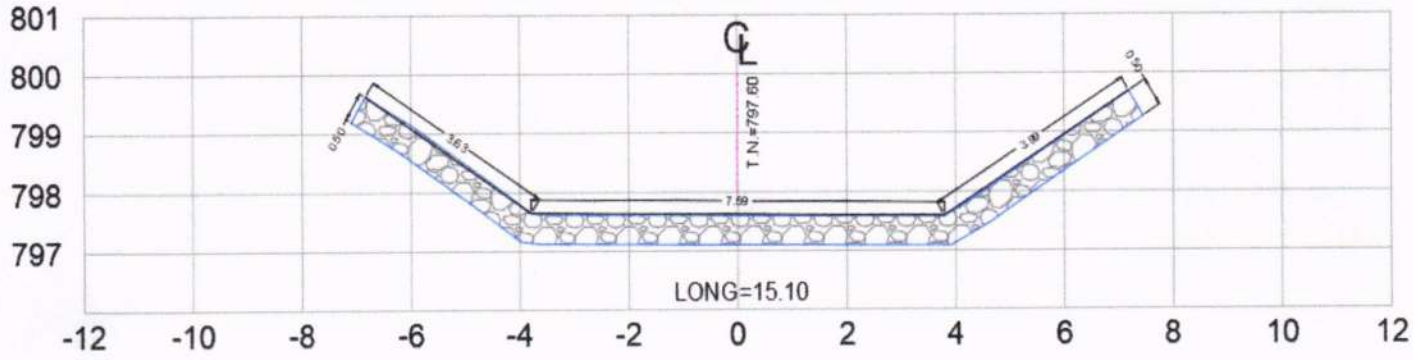

ESTACION 0+005.00

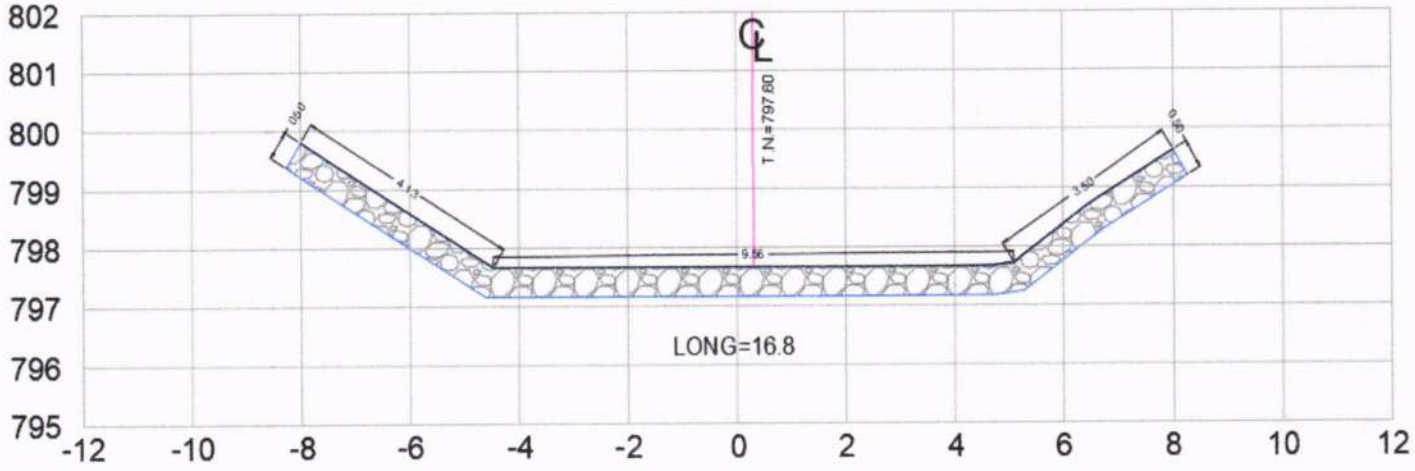

ESTACION 0+002.00

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO								
	R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO								
	R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO								
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900			**SUB-CAPITULO:**	3.6 PUNTOS CRITICOS				
ITEM No.:	NP-05 3.5	**DESCRIPCION**	Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**			**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:** ML

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	KINICIAL	KFINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	CANTIDAD UND	CANTIDAD ML
	CUNETA EN GEOMENBRANA	k21+944	k22+018	73,00		1,00	73,00
						AJUSTE AL DECIMAL	0,00
						TOTAL	**73,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	3. ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900	**SUB-CAPITULO:**	3.9 SEÑALIZACION VIAL

ITEM No.:	3.9.6	**DESCRIPCION**	Defensa metalica acanalada a dos crestas en HG	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	**UND:**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LARGO ML	ANCHO ML	ALTO ML	DESCUENTO M2	CANTIDAD M2
	DEFENSA METALICA ACANALADA	k21+900	k22+900	80,00				80,00
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	**80,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

AMO

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ.		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	4. ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920	**SUB-CAPITULO:**	4.2.3 CUNETA GEODREN Y BORDILLO
ITEM No.:	4.2.3.15	**DESCRIPCION**	demolicion manual en roca

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	KINCIAL	KFINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	TOTAL M3
muro 2	k00+325	k00+325	4,00	1,60	2,00		12,80
muro 2	k00+405	k00+405	4,80	4,00	3,20		61,44
						AJUSTE AL DECIMAL	-0,04
						TOTAL	**74,20**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABON
DIRECTOR DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

111

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO								
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300			**SUB-CAPITULO:**	5.1 PRELIMINARES				
ITEM No.:	5.1.2	**DESCRIPCION**	Rocería y Limpieza	**FECHA DE INICIO:**		**FECHA FINAL:**		**UND:**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	ANCHO ML	ALTO ML	LONGITUD ML	AREA M2	TOTAL M2
RECEPTOR #6	300,00	4,175			1.252,50
M.I K2+000 A K2+078	78,00	3,000			234,00
M.D K2+310 A K2+370	60,00	3,200			192,00
ALCANTARILLA K2+650 A K2+655	4,80	4,100			19,68
				AJUSTE AL DECIMAL	0,02
				TOTAL	**1.698,20**

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.1	**DESCRIPCION**	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.

FECHA DE INICIO:		**FECHA FINAL**		**UND:**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	TOTAL ML
Alcantarilla #01 K2+078	5,10				5,10
Alcantarilla #08 K3+211	5,00				5,00
				AJUSTE AL DECIMAL	0,00
				TOTAL	**10,10**

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABÓN
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.5	**DESCRIPCION**	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue
FECHA DE INICIO:		**FECHA FINAL**	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	VOLUMEN M3	TOTAL M3
ENCOLE , DESCOLE Y TUBERIA	k02+078	k02+078					112,80	112,80
ENCOLE , DESCOLE Y TUBERIA	k02+450	k02+450					76,80	76,80
ENCOLE , DESCOLE Y TUBERIA	k03+211	k03+211					105,50	105,50
							AJUSTE AL DECIMAL	0,00
							TOTAL	295,10

OBSERVACION: esta memoria va soportada con el informe de topografia que esta anexo.

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

44

INFORME CANTIDAD DE EXCAVACION ALCANTARILLAS ABSCISAS K2+080 – K2+450 K3+212 EN TRAMO 5.

OBJETO CONTRATO, "MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO-PUENTE GOMEZ - SALAZAR-ARBOLEDAS-CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL
CATATUMBO
S.A.S."

MARZO 2026

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

EXCAVACION ALC 1 K2+080 EXC ENCOLE, DESCOLE, Y TUBERIA				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
0+000		12.94		
	2		14.33	28.66
0+002		15.72		
	2		10.44	20.87
0+004		5.15		
	2		4.96	9.92
0+006		4.77		
	2		5.89	11.78
0+008		7.01		
	2		9.84	19.68
0+010		12.67		
	1.96		11.19	21.93
11.96		9.71		
			VOL EXC	112.8

EXCAVACION ALC 1 K2+450 EXC ENCOLE Y TUBERIA				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
0+000		9.61		
	2		11.97	23.94
0+002		14.33		
	2		11.44	22.88
0+004		8.55		
	2		7.13	14.26
0+006		5.71		
	2		5.87	11.74
0+008		6.03		
	1.45		6.47	9.37425
0+09.45		6.9		
			VOL EXC	82.2
			DEMOLICION	5.4
			TOTAL	76.8

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

TOPÓGRAFO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9


EXCAVACION ALC 1 K3+212 EXC ENCOLE, DESCOLE, TUBERIA				
ABSCISA	DISTANCIA	AREA	AREA PROMEDIO	VOLUMEN CORTE
0+000		15.76		
	2		14.08	28.15
0+002		12.39		
	2		9.37	18.74
0+004		6.35		
	2		5.28	10.56
0+006		4.21		
	2		5.27	10.53
0+008		6.32		
	2		8.00	16
0+010		9.68		
	2		10.77	21.53
0+012		11.85		
	1.47		10.08	14.82
0+013.47		8.31		
			VOL EXC	105.5

FRANKLIN JESUS OVALLES ORTIZ
TOPOGRAFO
C.C 1.090.434.194
T.P 01-20652 C.P.N.T.

TOPÓGRAFO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

ALC K2+080

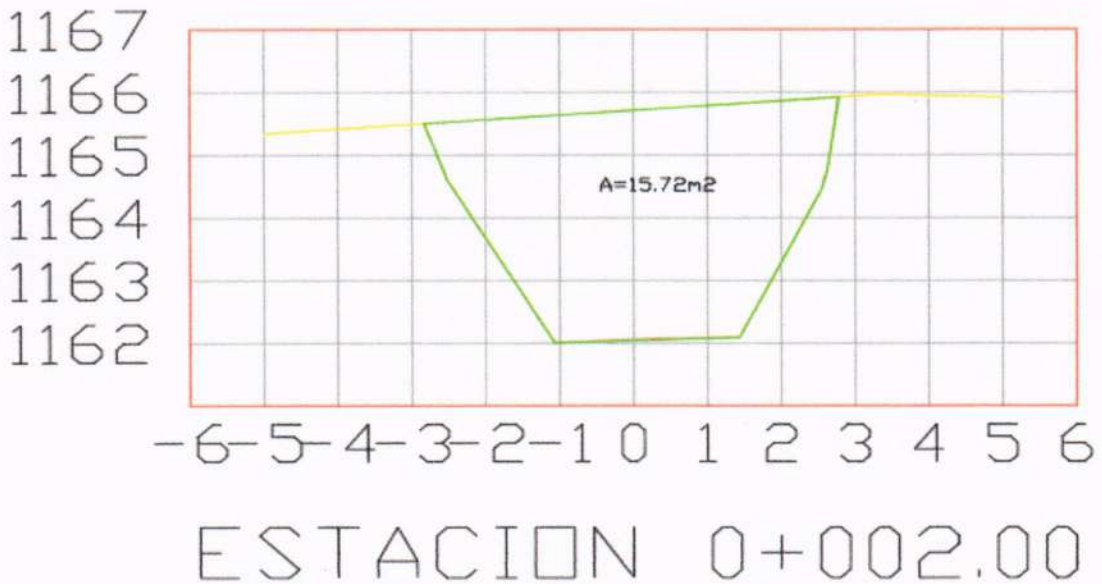


ESTACION 0+002.00




ESTACION 0+000.00

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

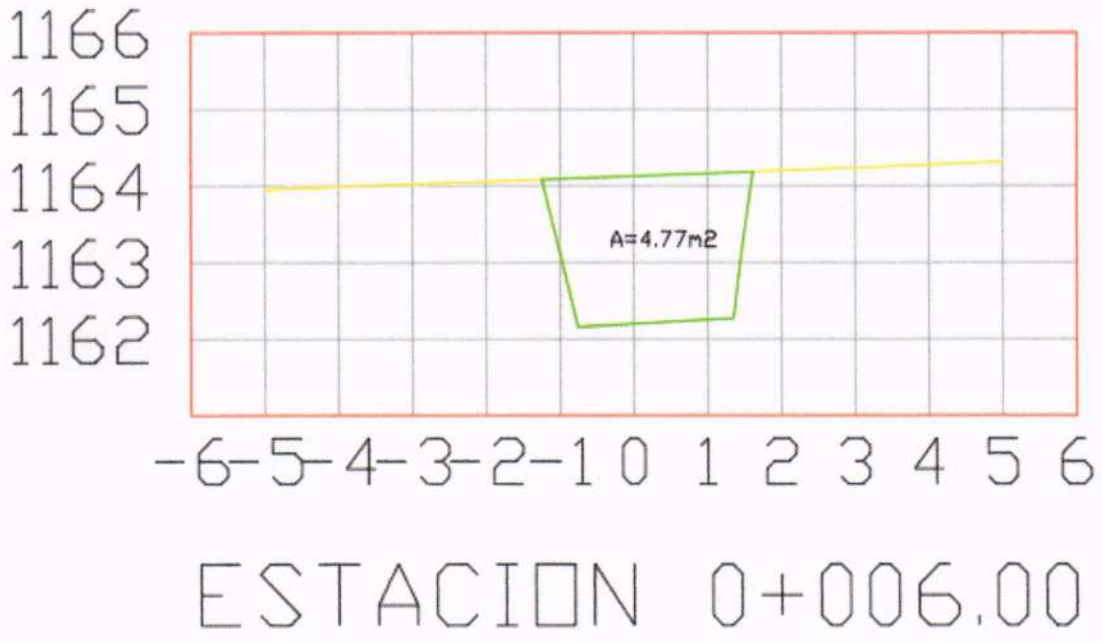


ESTACION 0+006.00

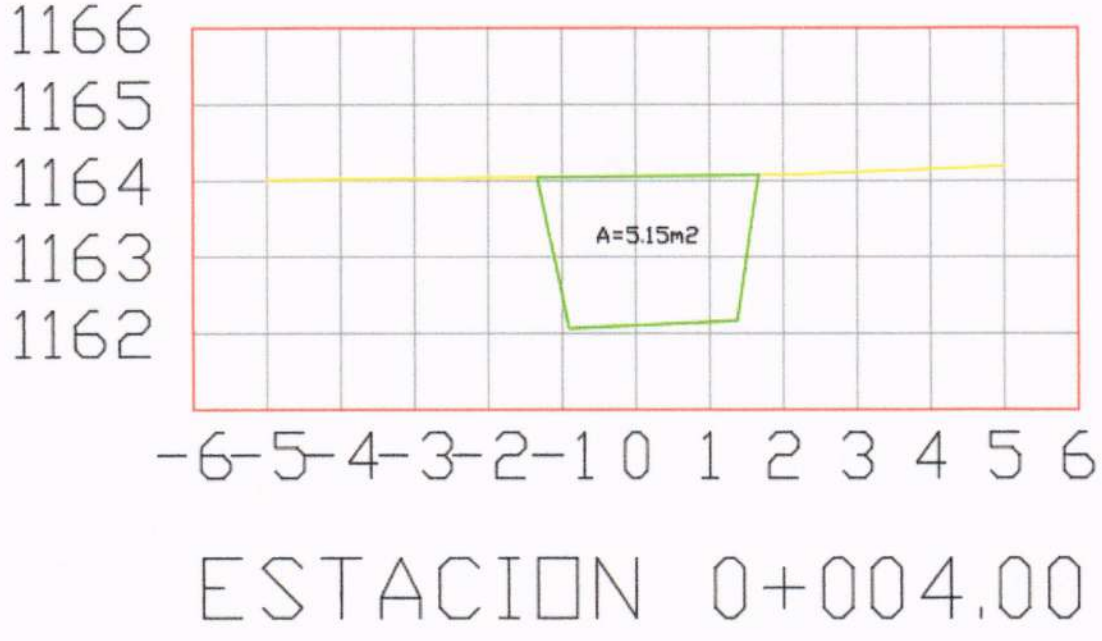

ESTACION 0+004.00

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -
3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

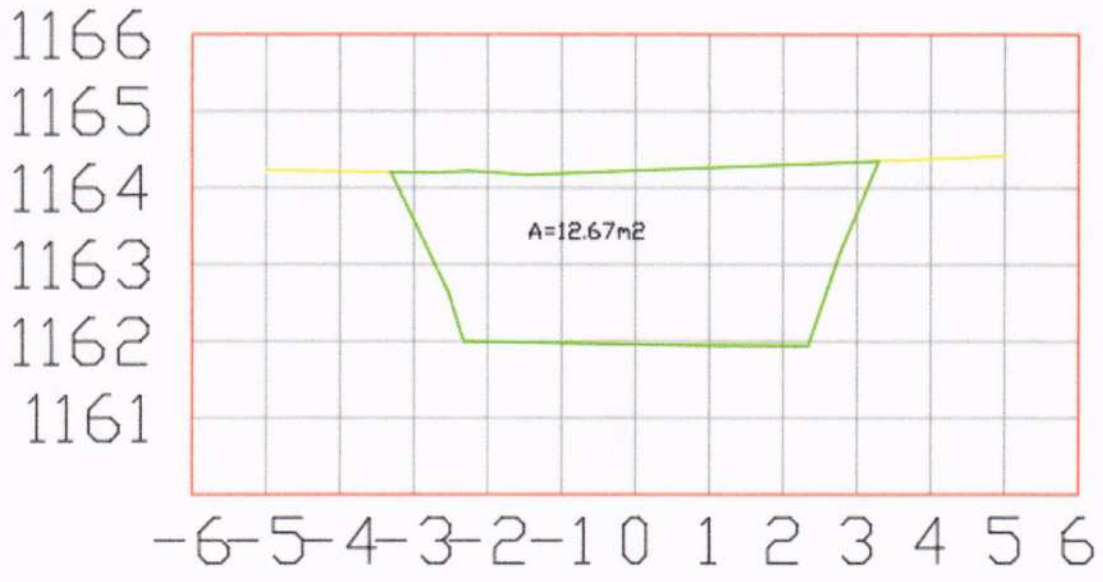


ESTACION 0+010.00



ESTACION 0+008.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S

NIT. 900.794.329-9

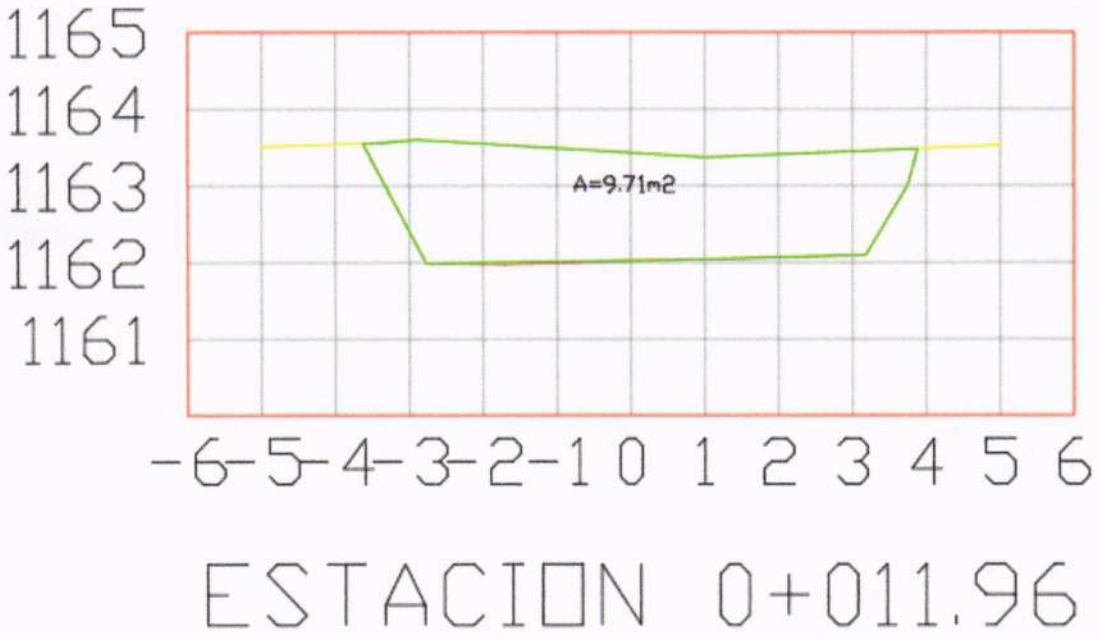


ESTACION 0+011.96


DIEGO PEÑA LINDARTE.
TOPÓGRAFO.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

ALC K2+450

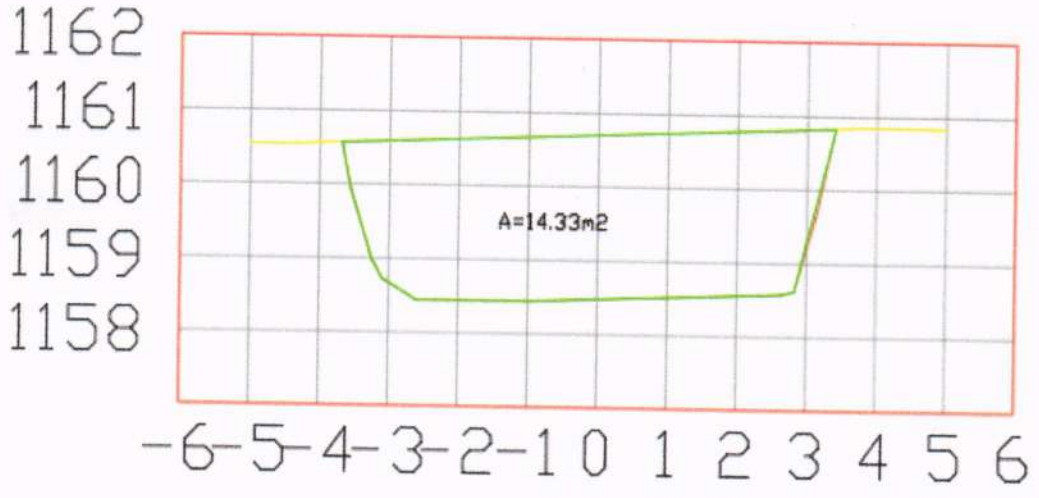


ESTACION 0+002.00

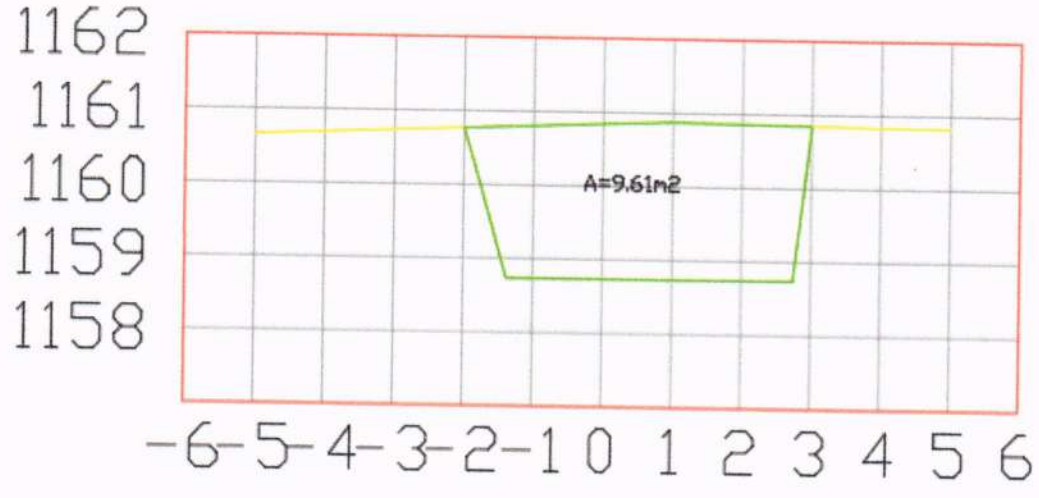


ESTACION 0+000.00

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -
3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9

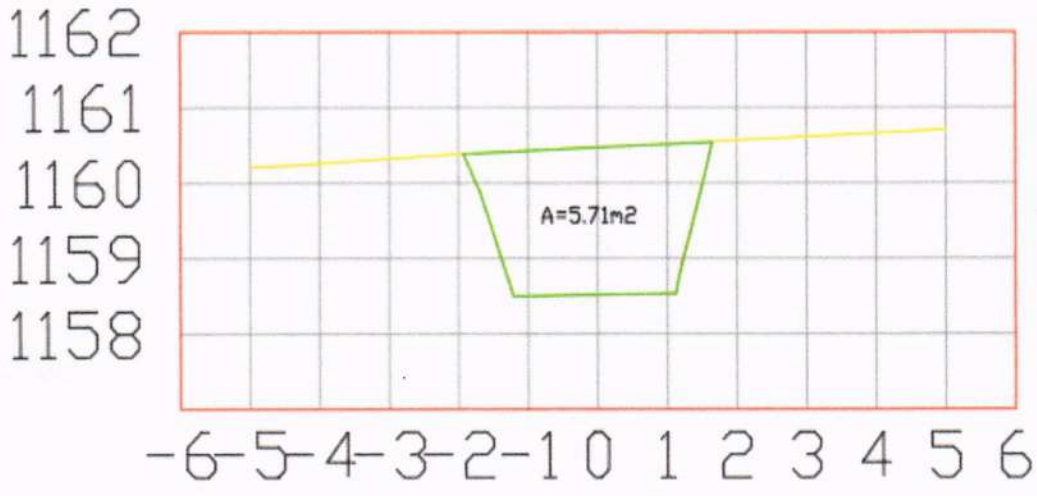

ESTACION 0+006.00

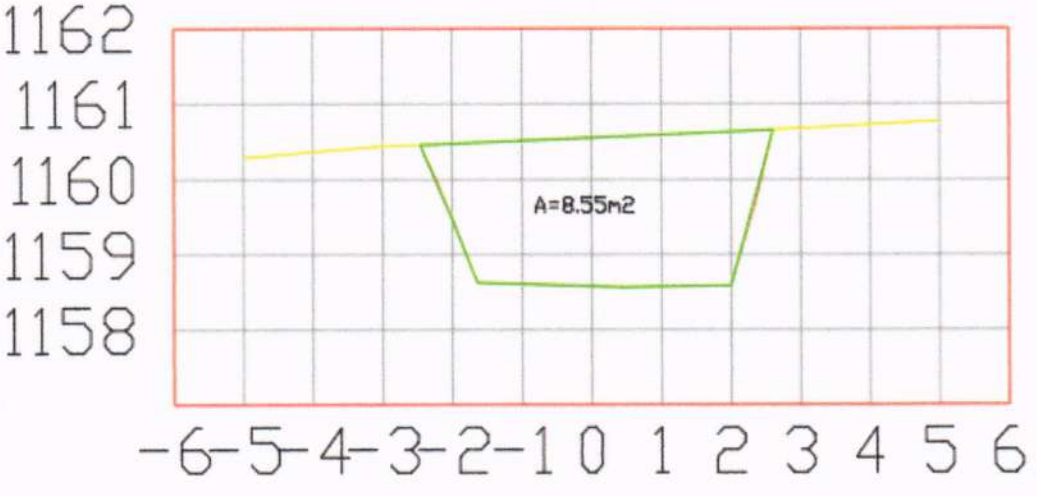

ESTACION 0+004.00

DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -
3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9



ESTACION 0+009.45




ESTACION 0+008.00


DIRECCION: AVENIDA 6C No. 8-12 BARRIO PRADOS DEL ESTE TELEFONO: -3208492598

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9


ALC K3+212

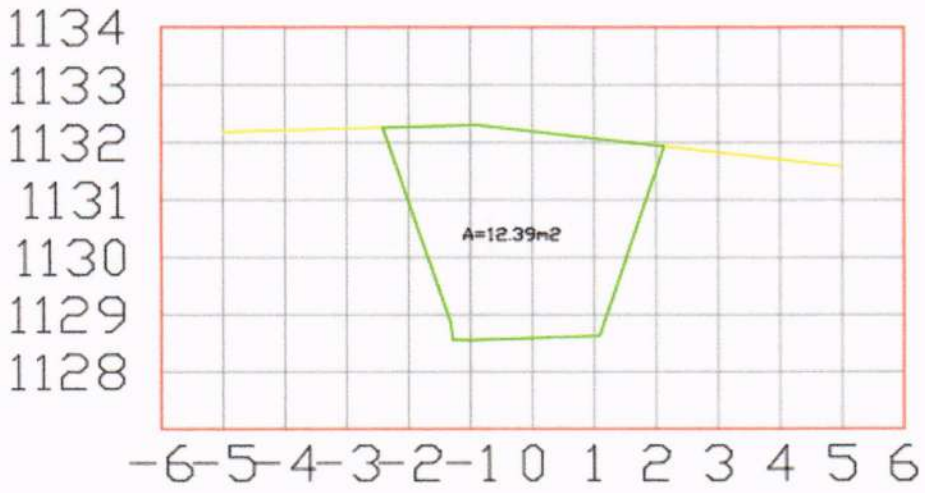

ESTACION 0+002.00

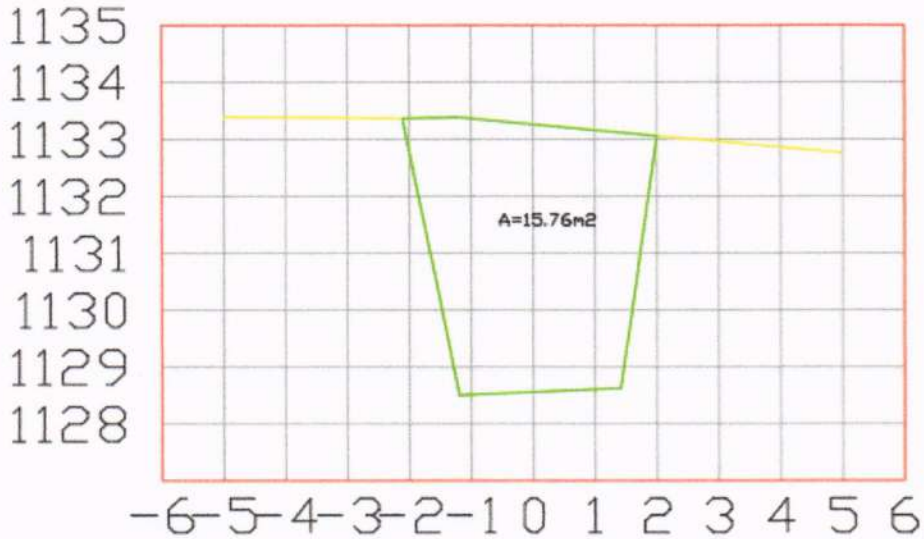


ESTACION 0+000.00

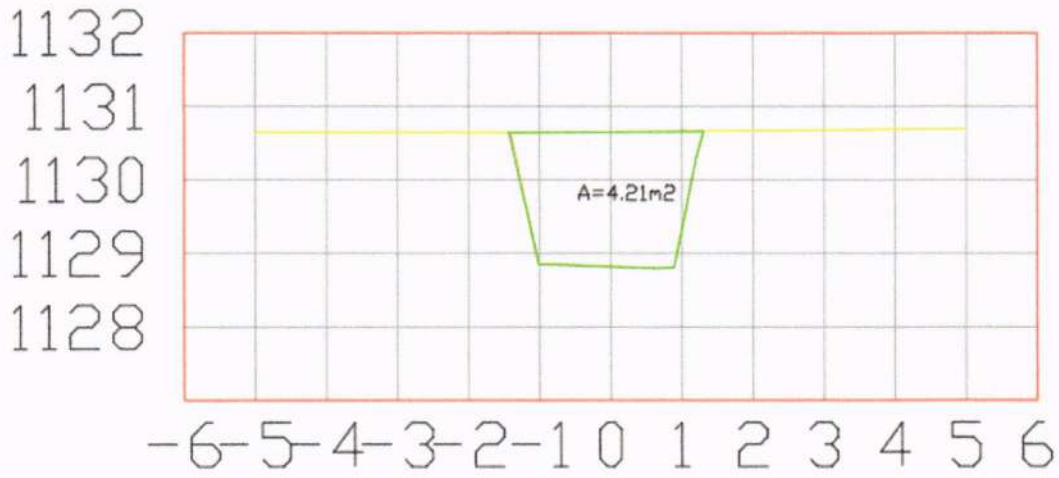


ESTACION 0+006.00



ESTACION 0+004.00

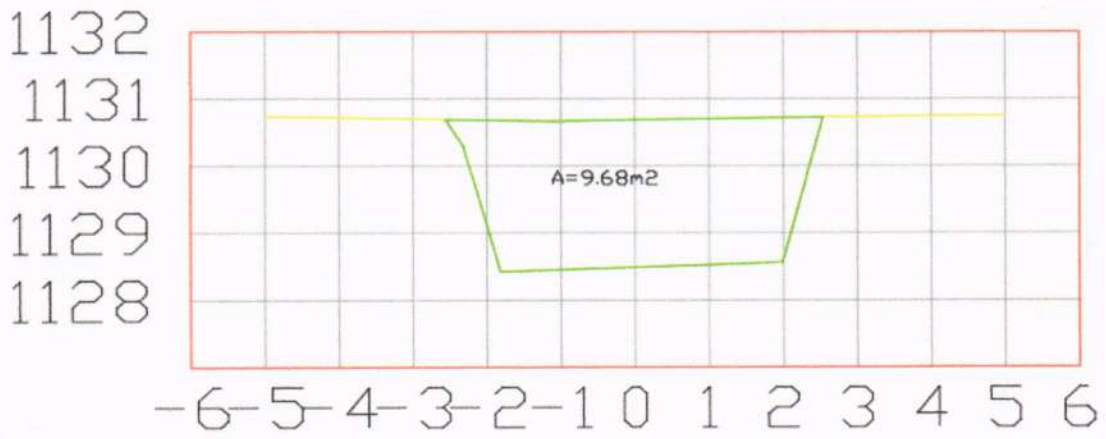

ESTACION 0+010.00

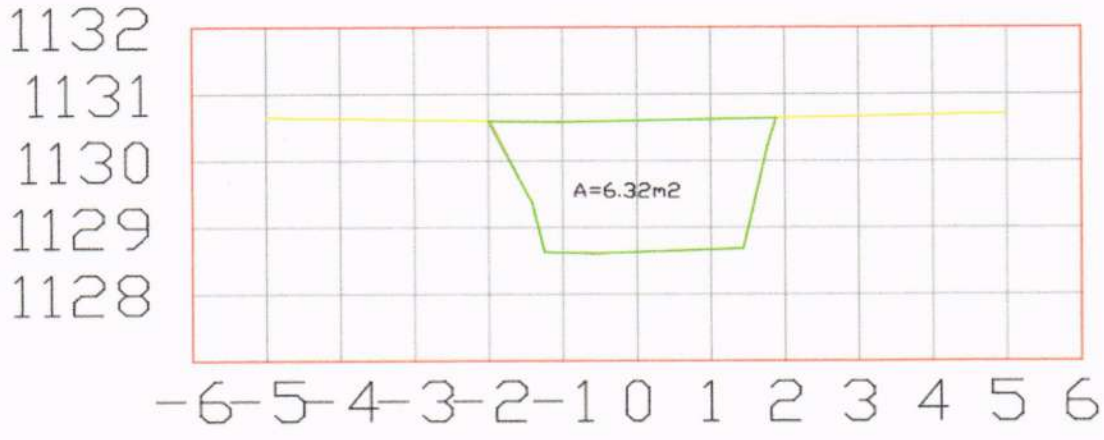


ESTACION 0+008.00

DIEGO PEÑA LINDARTE.
TOPÓGRAFO.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INGESAB S.A.S
NIT. 900.794.329-9



ESTACION 0+013.47

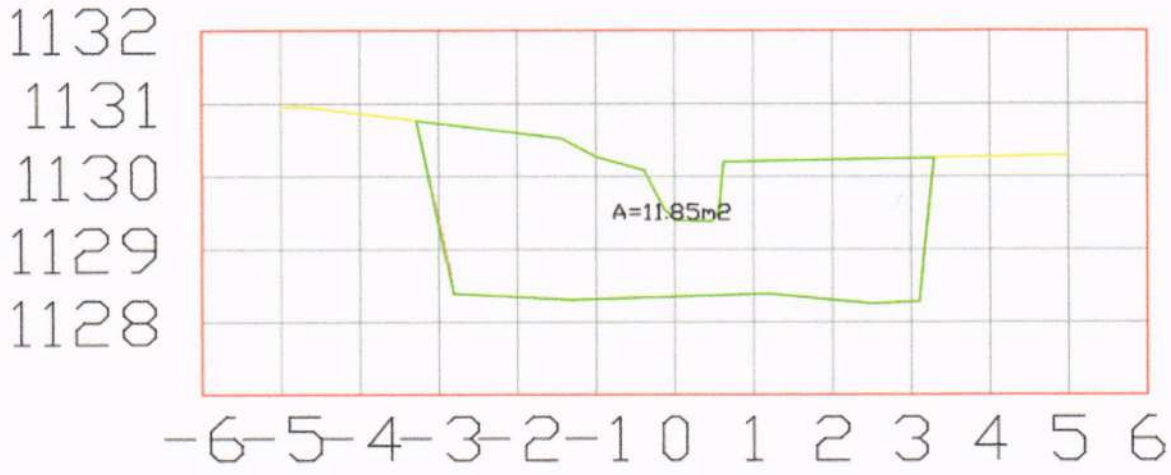

ESTACION 0+012.00

DIEGO PEÑA LINDARTE.
TOPÓGRAFO.

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.6	**DESCRIPCION**	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado
FECHA DE INICIO:		**FECHA FINAL**	
UND:	ML		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	CANTIDAD UND	TOTAL ML
TUBERIA ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078	7,70				7,70
TUBERIA ALCANTARILLA #03	k02+450	k02+450	7,70				7,70
TUBERIA ALCANTARILLA #08	k03+211	k03+211	7,70				7,70
						AJUSTE AL DECIMAL	0,00
						TOTAL	23,10

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	SUB-CAPITULO:	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.7	DESCRIPCION	Solado en concreto 17,5 Mpa
FECHA DE INICIO:		FECHA FINAL	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	VOLUMEN M3	TOTAL M3
ENCOLE ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078	2,40	2,00	0,05			0,24
DESCOLE ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078			0,05	8,90		0,45
DESCOLE ALCANTARILLA #03	k02+450	k02+450			0,05	8,90		0,45
							AJUSTE AL DECIMAL	-0,03
							TOTAL	1,10

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABÓN
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo | Gobernación de Norte de Santander | CONSORCIO VÍA CENTRO NIT. No. 901.740.307-9 | Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	OBJETO:	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	SUB-CAPITULO:	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.8	DESCRIPCION	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas y otras)
FECHA DE INICIO:		FECHA FINAL	
UND:	M3		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA





LOCALIZACIÓN	K INICIAL	K FINAL	LONGITUD ML	ANCHO ML	ALTO ML	AREA M2	CANTIDAD UND	DESCUENTO M3	TOTAL M3
DESCOLE LOSA ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078			0,20	8,90			1,78
DESCOLE DENTELLON ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078	4,35	0,27	0,20				0,23
DESCOLE MURO PANTALLA ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078	2,00	0,20	2,75				1,10
DESCOLE MURO ALETAS #1 ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078	1,95	0,20	2,20				0,86
DESCOLE MURO ALETAS #2 ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078	1,95	0,20	2,20				0,86
DESCUENTO TUBERIA	k02+078	k02+078						-0,16	-0,16
ENCOLE LOSA ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078	1,80	1,80	0,25				0,81
ENCOLE MURO ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078	1,80	0,20	2,71		2,00		1,95
ENCOLE MURO ALCANTARILLA #01	k02+078	k02+078	1,40	0,20	2,71		2,00		1,52
DESCOLE LOSA ALCANTARILLA #03	k02+450	k02+450			0,20	8,90			1,78
DESCOLE DENTELLON ALCANTARILLA #03	k02+450	k02+450	4,35	0,60	0,40				1,04
								AJUSTE AL DECIMAL	0,03
								TOTAL	11,80

OBSERVACION:

WILLIAM QUINTERO PABON
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9





Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.9	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	**BARRA No.**	**LARGO m**	**PESO Kg/m**	**CANT x ELEM UND**	**TOTAL Kg**
PLACA FONDO ENCOLE K2+078 - K2+080					
	4,00	7,02	0,994	4,00	27,91
	4,00	4,36	0,994	5,00	21,67
	4,00	6,82	0,994	7,00	47,45
	3,00	1,90	0,560	18,00	19,15
	3,00	2,71	0,560	26,00	39,46
ZARPA Y DENTELLON DESCOLE K2+078 - K2+080					
	4,00	2,45	0,994	24,00	58,45
	4,00	2,20	0,994	4,00	8,75
	4,00	2,00	0,994	4,00	7,95
	4,00	1,72	0,994	4,00	6,84

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.9	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)
FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	
UND:	Kg		

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.20 — 1.12 — 0.20	4,00	1,52	0,994	4,00	6,04
0.20 — 0.82 — 0.20	4,00	1,22	0,994	4,00	4,85
0.20 — 0.60 — 0.20	4,00	1,00	0,994	4,00	3,98
0.20 — 2.50 — 0.20	4,00	2,90	0,994	2,00	5,77
0.20 — 2.80 — 0.20	4,00	3,20	0,994	2,00	6,36
0.20 — 3.05 — 0.20	4,00	3,45	0,994	2,00	6,86
0.20 — 3.35 — 0.20	4,00	3,75	0,994	2,00	7,46
0.20 — 3.70 — 0.20	4,00	4,10	0,994	2,00	8,15
0.20 — 4.00 — 0.20	4,00	4,40	0,994	2,00	8,75
0.20 — 4.30 — 0.20	4,00	4,70	0,994	2,00	9,34
0.20 — 4.60 — 0.20	4,00	5,00	0,994	2,00	9,94
0.20 — 4.93 — 0.20	4,00	5,33	0,994	2,00	10,60
0.20 — 4.70 — 0.20	4,00	5,10	0,994	2,00	10,14

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.9	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.20 — 4.25 — 0.20	4,00	4,65	0,994	4,00	18,49
h, b=0.30, h=0.17, g=0.08	3,00	1,10	0,560	22,00	13,55
MURO ENCOLE ALCANTARILLA K2+078 - K2+080					
7.20	4,00	7,20	0,994	9,00	64,41
0.15 — 1.70 — 0.15	3,00	2,00	0,560	48,00	53,76
0.15 — 0.40 — 0.15	4,00	0,70	0,994	4,00	2,78
0.15 — 0.35 — 0.15	4,00	0,65	0,994	4,00	2,58
0.15 — 0.30 — 0.15	4,00	0,60	0,994	8,00	4,77
0.20 — 1.25 — 0.10	4,00	1,55	0,994	5,00	7,70
0.20 — 1.25 — 0.10	4,00	1,55	0,560	5,00	4,34
0.20 — 1.10	4,00	1,30	0,994	32,00	41,35
0.20 — 0.90	3,00	1,10	0,560	26,00	16,02
ZARPA Y DENTELLON DESCOLE K2+450 - K2+450					
0.20 — 2.05 — 0.20	4,00	2,45	0,994	24,00	58,45

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.9	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.20 — 1.80 — 0.20	4,00	2,20	0,994	4,00	8,75
0.20 — 1.60 — 0.20	4,00	2,00	0,994	4,00	7,95
0.20 — 1.32 — 0.20	4,00	1,72	0,994	4,00	6,84
0.20 — 1.12 — 0.20	4,00	1,52	0,994	4,00	6,04
0.20 — 0.82 — 0.20	4,00	1,22	0,994	4,00	4,85
0.20 — 0.60 — 0.20	4,00	1,00	0,994	4,00	3,98
0.20 — 2.50 — 0.20	4,00	2,90	0,994	2,00	5,77
0.20 — 2.80 — 0.20	4,00	3,20	0,994	2,00	6,36
0.20 — 3.05 — 0.20	4,00	3,45	0,994	2,00	6,86
0.20 — 3.35 — 0.20	4,00	3,75	0,994	2,00	7,46
0.20 — 3.70 — 0.20	4,00	4,10	0,994	2,00	8,15
0.20 — 4.00 — 0.20	4,00	4,40	0,994	2,00	8,75
0.20 — 4.30 — 0.20	4,00	4,70	0,994	2,00	9,34

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.9	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
0.20 — 4.60 — 0.20	4,00	5,00	0,994	2,00	9,94
0.20 — 4.93 — 0.20	4,00	5,33	0,994	2,00	10,60
0.20 — 4.70 — 0.20	4,00	5,10	0,994	2,00	10,14
0.20 — 4.25 — 0.20	4,00	4,65	0,994	6,00	27,73
 L=1.56	3,00	1,56	0,560	22,00	19,22
ALETAS Y MURO PANTALLA DESCOLE K2+078 - K2+080					
0.20 — 2.68 — 0.40	4,00	3,28	0,994	14,00	45,64
0.20 — 2.38 — 0.40	4,00	2,98	0,994	4,00	11,85
0.20 — 2.31 — 0.40	4,00	2,91	0,994	4,00	11,57
0.20 — 2.24 — 0.40	4,00	2,84	0,994	4,00	11,29
0.20 — 2.17 — 0.40	4,00	2,77	0,994	4,00	11,01
0.20 — 2.10 — 0.40	4,00	2,70	0,994	4,00	10,74
0.20 — 2.03 — 0.40	4,00	2,63	0,994	4,00	10,46

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9







Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS
ITEM No.:	5.2.1.9	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)

FECHA INICIAL DEL PERIODO:		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**		**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA



LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
	4,00	2,56	0,994	4,00	10,18
	4,00	2,48	0,994	4,00	9,86
	4,00	1,90	0,994	8,00	15,11
	4,00	5,85	0,994	8,00	46,52
	4,00	2,45	0,994	24,00	58,45
	4,00	2,55	0,994	4,00	10,14
	4,00	2,25	0,994	4,00	8,95
	4,00	1,20	0,994	4,00	4,77
	4,00	1,00	0,994	4,00	3,98
	4,00	2,80	0,994	8,00	22,27
	4,00	2,05	0,994	2,00	4,08

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Gobernación de Norte de Santander

CONSORCIO VÍA CENTRO
NIT. No. 901.740.307-9

Consorcio R&Q - Joyco

CONTRATO No.:	LP-FC-38-2023	**OBJETO:**	MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PAR LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GOMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍA CENTRO R/L ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN PÁEZ		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
CAPITULO:	5. CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300	**SUB-CAPITULO:**	5.2.1 ALCANTARILLAS

ITEM No.:	5.2.1.9	**DESCRIPCION**	Acero de refuerzo 60.000 PSI (corte, figurado y colocación)	**FECHA INICIAL DEL PERIODO:**		**FECHA FINAL DEL PERIODO:**	**UND:**	Kg

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA	LOCALIZACIÓN	BARRA No.	LARGO m	PESO Kg/m	CANT x ELEM UND	TOTAL Kg
		4,00	4,35	0,994	1,00	4,32
		4,00	2,95	0,994	1,00	2,93
					AJUSTE AL DECIMAL	0,12
					TOTAL	**1.107,00**

OBSERVACIONES:

WILLIAM QUINTERO PABÓN
RESIDENTE DE OBRA

SERGIO ALVEIRO JEREZ CAMARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL CON ANEXO 1

FECHA DEL ACTA	06 DE ABRIL DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-FC-38-2023 – 8 DE AGOSTO 23
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍA CENTRO
C.C. o N.I.T.	901.740.307-92
REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN
C.C. o N.I.T.	1.090.473.156 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	LP-FC-038-2023 MEJORAMIENTO EN MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 CORREDOR VIAL CORNEJO – PUENTE GÓMEZ – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, NORTE DE SANTANDER, CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CTOI-SV-02532-2023, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER Y EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS CON 00/100 ($69.756.000.000,00) M/CTE
ADICIONAL No.1	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($ 599.955.314.00) M/TE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($ 70.355.955.314.00) M/TE
PLAZO O DURACIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO ADICIONAL	N.A
PLAZO TOTAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Las actividades previstas en el presente Contrato se ejecutarán en el CORREDOR VIAL CORNEJO – SANTIAGO – SALAZAR – ARBOLEDAS – CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, y el domicilio contractual es el Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.009.81 mejoramiento en marco del programa para la conexión de territorios, en el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0 corredor vial cornejo – Santiago – Salazar – Arboledas – Cucutilla, Norte de Santander.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000189 del 12 de julio 2023 No. 00 000231 del 08 de agosto 2024 No. 00 000070 del 17 de febrero 2025 No. 00 000053 del 10 de febrero 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 000163 del 09 agosto 2023 No. 00 000222 del 13 de agosto 2024 No. 00 000032 del 18 de febrero 2025 No. 00 000064 del 03 de marzo 2026
SUPERVISOR	LILIANA FUENTES MEDINA, Designada mediante memorando del 08 de agosto de 2023. ING LUIS ALFONSO RIVERA PABON, Designada mediante memorando del 16 de octubre del 2024.
INTERVENTOR (externo)	CONSORCIO R&Q – JOYCO R/L ING. HECTOR MIGUEL DIAZ (APODERADO)
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	NO APLICA.
ACTAS PREVIAS REINICIO	NO APLICA.
GARANTIAS	**ANEXO 0** No. 400049798 – 400049799 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 11/08/2023 Fecha de Aprobación: 16/08/2023 **ANEXO 1** No. 400049798 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 16/08/2023 Fecha de Aprobación: 16/08/2023 **ANEXO 2** No. 400049799 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 11/08/2023 Fecha de Aprobación: 16/08/2023 **ANEXO 3** No. 400049799 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 4/09/2024 Fecha de Aprobación: 6/09/2024 **ANEXO 4** No. 400049798 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 4/09/2024 Fecha de Aprobación: 6/09/2024

ACTA DE APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ACTA No. 1 DEL 03 JUNIO DEL 2025. ACTA No. 2 DEL 03 JULIO DEL 2025.
ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES	ACTA No. 1 DEL 13 AGOSTO DEL 2024. ACTA No. 2 DEL 15 ENERO DEL 2025. ACTA No. 3 DEL 24 FEBRERO DEL 2025. ACTA No. 4 DEL 06 DE MARZO DEL 2025. ACTA No. 5 DEL 03 DE JULIO DEL 2025. ACTA No. 6 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025. ACTA No. 7 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	ACTA PARCIAL N° 1 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 2 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ACTA PARCIAL N° 3 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 4 DEL 04 DE MARZO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 5 DEL 05 DE MAYO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 6 DEL 01 DE JULIO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 7 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 8 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N° 9 DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ACTA PARCIAL N°10 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025

	ACTA PARCIAL N°11 DEL 03 DE MARZO DEL 2026 ACTA PARCIAL N°12 DEL 09 DE MARZO DEL 2026
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.393.795.369,00)
VALOR A CANCELAR EN PRESENTA ACTA	MIL CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.115.036.295,00)
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	1.98%
% EJECUTADO ACUMULADO	41.59%
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	77.49%
% A CANCELAR CON LA PRESENTE ACTA	1.58%
PERÍODO DEL ACTA	PRIMERO (1) DE MARZO DE 2026 AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026.

RESUMEN ACTAS DE PAGO		
RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 69.756.000.000,00	
VALOR ADICIONAL	$ 599.955.314.00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 70.355.955.314.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		$ 471.026.144,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02		$ 378.641.159,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 03		$ 1.344.468.123,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 04		$ 1.874.700.291,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 05		$ 2.187.803.958,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 06		$ 2.248.662.875,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 07		$ 2.414.655.762,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 08		$3.136.079.055,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 09		$2.496.597.312,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 10		$7.096.479.077,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 11		$2.070.850.890,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 12		$2.150.212.552,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 13 EN CURSO		$1.393.795.369,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 41.091.982.747,00
SUMAS IGUALES	$ 70.355.955.314.00	$ 70.355.955.314.00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL ANTICIPO (20%)	$ 13.951.200.000,00	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		$ 94.205.229,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02		$ 75.728.232
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 03		$ 268.893.625
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 04		$ 374.940.058
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 05		$ 437.560.792
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 06		$ 449.732.575,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 07		$ 482.931.152,00

Faro del Catatumbo EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13	Página 4 de 4

AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 08		$ 627.215.811,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 09		$499.319.462,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 10		$1.419.295.815,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 11		$414.170.178,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 12		$430.042.510,00
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 13		$278.759.074
SALDO POR AMORTIZAR		$ 8.098.405.486,80
SUMAS IGUALES	$ 13.951.200.000,00	$ 13.951.200.000,00

En San José de Cúcuta, en las oficinas de **E.I.C.E. FARO CATATUMBO S.A.S.**, se reunieron los suscritos a saber: **ING. FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS**, Ordenador del Gasto, **ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN,** Representante Legal Consorcio Vía Centro, Contratista, **ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON**, Supervisor, e **ING. HÉCTOR MIGUEL DIAZ**, R/L (APODERADO) del Consorcio R&Q - JOYCO, Interventor Contratado por el Instituto Nacional de Vías, con el fin de dar recibo al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se deja constancia que el periodo de pago de la presente acta es del Primero (01) de marzo del 2026 al treinta y uno de (31) de marzo de 2026.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ING. MIGUEL DAN JENSSEN DURAN
R/L CONSORCIO VÍA CENTRO
Contratista

ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON
E.I.C.E. FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Supervisor

ING. HÉCTOR MIGUEL DIAZ
GERENTE CONSORCIO R&Q - JOYCO
Interventor Externo

Vb. Ing Yoris montaño
Director de la interventoria

FREDDY A FONTIVEROS

Vo. Bo. ING. FREDDY ALEXANDER FONTIVEROS
Ordenador del gasto

Proyectó: Ing. Rafael Ricardo Redondo – Apoyo a la Supervisión.
Revisó: Ing. Luis Alfonso Rivera Pabón – Supervisor

Nota 1: **Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.**

Nota 2: Las cantidades y valores consignados en la presenta acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base del principio de la responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría y/o supervisión.

Powered by CamScanner

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1		**CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K4+000 - K5+900**				**8.242.656.855,00**		**9.538.627.208,00**	**57,35%**		**$ 16.631.739.530,00**		**841.207.185,00**	**5,06%**		**10.379.834.393,00**	**62,41%**
1.1		**PRELIMINARES**				**51.650.805,00**		**3.268.038,00**	**3,30%**		**$ 99.106.660,00**		**0,00**	**0,00%**		**3.268.038,00**	**3,30%**
1.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	8.587,00	3.944,00	33.867.128,00	0,00	0,00	0,00%	20.140,00	$ 79.432.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	8.587,00	2.071,00	17.783.677,00	1.578,00	3.268.038,00	16,61%	9.500,00	$ 19.674.500,00		0,00	0,00%	1.578,00	3.268.038,00	16,61%
1.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**2.687.082.215,00**		**3.574.062.005,00**	**52,12%**		**$ 6.856.832.813,00**		**171.277.588,00**	**2,50%**		**3.745.339.593,00**	**54,62%**
1.2.1		**ALCANTARILLAS**				**1.304.230.891,00**	0,00	**1.115.339.089,00**	**53,43%**		**$ 2.304.387.903,00**		**13.734.519,00**	0,66%	0,00	**1.129.073.608,00**	**49,00%**
1.2.1.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	147,00	238.519,00	35.062.293,00	15,80	3.768.600,00	10,75%	147,00	$ 35.062.293,00	2,10	500.890,00	1,43%	17,90	4.269.490,00	12,18%
1.2.1.2	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	58,00	101.591,00	5.892.278,00	80,00	8.127.280,00	68,03%	117,60	$ 11.947.102,00		0,00	0,00%	80,00	8.127.280,00	68,03%
1.2.1.3	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.918,00	3.944,00	7.564.592,00	0,00	0,00	0,00%	1.918,00	$ 7.564.592,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	4.296,00	19.220,00	82.569.120,00	702,20	13.496.284,00	16,35%	4.296,00	$ 82.569.120,00		0,00	0,00%	702,20	13.496.284,00	16,35%
1.2.1.5	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	24,00	865.060,00	20.761.440,00	11,50	9.948.190,00	38,33%	30,00	$ 25.951.800,00		0,00	0,00%	11,50	9.948.190,00	38,33%
1.2.1.6	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	19.295,00	11.042,00	213.055.390,00	25.416,60	280.650.097,00	81,99%	31.000,00	$ 342.302.000,00		0,00	0,00%	25.416,60	280.650.097,00	81,99%
1.2.1.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	299,00	1.212.774,00	362.619.426,00	158,90	192.709.789,00	45,40%	350,00	$ 424.470.900,00		0,00	0,00%	158,90	192.709.789,00	45,40%
1.2.1.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	108,00	2.216.826,00	239.417.208,00	118,10	261.807.151,00	98,42%	120,00	$ 266.019.120,00		0,00	0,00%	118,10	261.807.151,00	98,42%
1.2.1.9	835	Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena.	m	14,00	392.958,00	5.501.412,00	12,00	4.715.496,00	85,71%	14,00	$ 5.501.412,00		0,00	0,00%	12,00	4.715.496,00	85,71%
1.2.1.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	318,00	49.324,00	15.685.032,00	1.231,70	60.752.371,00	56,81%	2.168,00	$ 106.934.432,00	268,30	13.233.629,00	40,16%	1.500,00	73.986.000,00	69,19%
1.2.1.11	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	53,00	2.046.918,00	108.486.654,00	0,00	0,00	0,00%	53,00	$ 108.486.654,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.12	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	38,00	320.566,00	12.181.508,00	0,00	0,00	0,00%	38,00	$ 12.181.508,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.13	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	257,00	9.194,00	2.362.858,00	255,40	2.348.148,00	99,38%	257,00	$ 2.362.858,00		0,00	0,00%	255,40	2.348.148,00	99,38%
1.2.1.14	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	56.263,00	2.381,00	133.962.203,00	1.203,50	2.865.534,00	2,14%	56.263,00	$ 133.962.203,00		0,00	0,00%	1.203,50	2.865.534,00	2,14%
1.2.1.15	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	6.839,00	8.643,00	59.109.477,00	0,00	0,00	0,00%	6.839,00	$ 59.109.477,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00		0,00%		$ -				0,00		0,00%
1.2.1.16		Demoliciones en concreto ciclópeo	m3		193.409,00		161,00	31.138.849,00	52,61%	306,00	$ 59.183.154,00		0,00	0,00%	161,00	31.138.849,00	52,61%
1.2.1.17	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3		180.292,33		6,70	1.207.959,00	16,75%	40,00	$ 7.211.693,00		0,00	0,00%	6,70	1.207.959,00	16,75%
1.2.1.18		Demolicion manual en roca	m3		326.510,00		249,90	81.594.849,00	99,96%	250,00	$ 81.627.500,00		0,00	0,00%	249,90	81.594.849,00	99,96%
1.2.1.19		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00		156,00	11.148.384,00	111,43%	156,00	$ 10.004.960,00		0,00	0,00%	156,00	11.148.384,00	100,00%
1.2.1.20		Concreto ciclópeo para piso y solados	m3		787.275,00		55,30	43.536.308,00	73,73%	75,00	$ 59.045.625,00		0,00	0,00%	55,30	43.536.308,00	73,73%
1.2.1.21	1318	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	0,00	2.382.438,00		0,00	0,00	0,00%	150,00	$ 357.365.700,00			0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.22		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3	0,00	1.055.238,00		100,00	105.523.800,00	100,00%	100,00	$ 105.523.800,00		0,00	0,00%	100,00	105.523.800,00	100,00%
1.2.2		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**854.392.386,00**	0,00	**1.773.632.332,00**	**63,16%**		**$ 2.808.107.626,00**		**67.324.889,00**	**2,43%**	0,00	**1.840.957.221,00**	**65,56%**
1.2.2.1	815	Cunetas en concreto 21 Mpa e=0,10 m. Ancho 0,84mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	126,00	1.055.238,00	132.959.988,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.2	809	Bordillo en concreto 21 MPa sección trapezoide 40x30x20, incluye refuerzo	m	1.500,00	182.918,00	274.377.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	$ 274.377.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	9.000,00	11.042,00	99.378.000,00	43.138,70	476.337.525,00	68,47%	63.000,00	$ 695.646.000,00	5.933,00	65.512.186,00	9,42%	49.071,70	541.849.711,00	77,89%
1.2.2.4	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	126,00	173.962,00	21.919.212,00	289,80	50.414.188,00	96,60%	300,00	$ 52.188.600,00	1,70	295.735,00	0,85%	291,50	50.709.923,00	97,17%
1.2.2.5	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	750,00	161.765,00	121.323.750,00	650,20	105.179.603,00	34,92%	1.862,00	$ 301.206.430,00	3,50	566.178,00	0,19%	653,70	105.745.781,00	35,11%
1.2.2.6	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	4.133,00	9.165,00	37.878.945,00	4.738,80	43.431.102,00	67,94%	6.975,00	$ 63.925.875,00	24,00	219.960,00	0,34%	4.762,80	43.651.062,00	68,28%
1.2.2.7	901	Geodren con tubo 4" tipo ADS-PVC, H=1,50 mt	m	1.117,00	111.380,00	124.411.460,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.8	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m2	887,00	47.513,00	42.144.031,00	0,00	0,00	0,00%	887,00	$ 42.144.031,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00		0,00%						0,00	0,00	0,00%
1.2.2.9	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00		1.033,10	19.856.182,00	93,92%	1.100,00	$ 21.142.000,00	4,00	76.880,00	0,36%	1.037,10	19.933.062,00	94,28%
1.2.2.10		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m		32.744,00		1.880,00	61.558.720,00	97,66%	1.925,00	$ 63.032.200,00	10,00	327.440,00	0,52%	1.890,00	61.886.160,00	98,18%
1.2.2.11	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		865.060,00		35,40	30.623.124,00	29,50%	120,00	$ 103.807.200,00		0,00	0,00%	35,40	30.623.124,00	29,50%
1.2.2.12		Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3		1.212.774,00		73,50	89.138.889,00	43,24%	170,00	$ 206.171.580,00		0,00	0,00%	73,50	89.138.889,00	43,24%
1.2.2.13	303	Demolicion manual en roca	m3		326.510,00		329,70	107.650.347,00	57,84%	570,00	$ 186.110.700,00	1,00	326.510,00	0,18%	330,70	107.976.857,00	58,02%
1.2.2.14	1020	Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloradero	m	0,00	17.144,00	0,00	6,00	102.864,00	100,00%	6,00	$ 102.864,00		0,00	0,00%	6,00	102.864,00	100,00%
1.2.2.15	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	0,00	17.925,75	0,00	540,00	9.679.905,00	100,00%	540,00	$ 9.679.905,00		0,00	0,00%	540,00	9.679.905,00	100,00%
1.2.2.16	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	0,00	2.381,00	0,00	730,80	1.740.035,00	19,45%	3.757,50	$ 8.946.608,00		0,00	0,00%	730,80	1.740.035,00	19,45%
1.2.2.17	505	Extendido Humedecimiento y compacto de relleno en botaderos	m3	0,00	8.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35,00	$ 302.505,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3		1.055.238,00		736,20	776.866.216,00	99,99%	736,25	$ 776.918.978,00		0,00	0,00%	736,20	776.866.216,00	99,99%
1.2.2.19	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3		9.194,00		114,60	1.053.632,00	43,81%	261,60	$ 2.405.150,00		0,00	0,00%	114,60	1.053.632,00	43,81%
1.2.2.20	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m	2.000,00	110.030,20		0,00		0,00%								0,00%
1.2.3		**PUENTE QUEBRADA LA ESMERALDA**				**407.781.254,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**$ 431.399.504,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.2.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.610,00	3.944,00	6.349.840,00	0,00	0,00	0,00%	1.610,00	$ 6.349.840,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.2	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	396,00	19.220,00	7.611.120,00	0,00	0,00	0,00%	396,00	$ 7.611.120,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.3	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	162,00	590.592,80	95.676.034,00	0,00	0,00	0,00%	162,00	$ 95.676.034,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.4	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	540,00	16.153,20	8.722.728,00	0,00	0,00	0,00%	540,00	$ 8.722.728,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.5	403	Excavación manual material sin clasificar para pilas pre-excavadas, prof. De 0 - 4mt	m3	49,26	91.858,84	4.524.982,00	0,00	0,00	0,00%	49,26	$ 4.524.982,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.6	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	15,08	1.663.451,24	25.084.254,00	0,00	0,00	0,00%	15,08	$ 25.084.254,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.7	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	36,19	1.087.569,09	39.360.373,00	0,00	0,00	0,00%	36,19	$ 39.360.373,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.8	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	37,48	1.276.742,57	47.847.204,00	0,00	0,00	0,00%	37,48	$ 47.847.204,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	8.874,68	11.042,00	97.994.208,00	0,00	0,00	0,00%	8.874,68	$ 97.994.208,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.10	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	Kg	90,00	787.275,00	70.854.750,00	0,00	0,00	0,00%	120,00	$ 94.473.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025			ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR		CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1.2.3.11	1014	Conformación talud con material seleccionado del sitio , compactado a rana-vibrocompactador	Kg	514,80	5.605,00	2.885.454,00	0,00	0,00	0,00%	514,80	$	2.885.454,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.3.12	635	Union de Anclaje en concreto con resina epoxica.	Kg	48,00	18.131,40	870.307,00	0,00	0,00	0,00%	48,00	$	870.307,00			0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4		**PASOS PEATONALES**				**120.677.684,00**	0,00	0,00	0,00%		**$**	**120.677.684,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.2.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	Kg	88,00	3.944,00	347.072,00	0,00	0,00	0,00%	88,00	$	347.072,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.2	401	Excavación manual en material sin clasificar	Kg	21,20	71.464,01	1.515.037,00	0,00	0,00	0,00%	21,20	$	1.515.037,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.3	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	Kg	16,00	787.275,00	12.596.400,00	0,00	0,00	0,00%	16,00	$	12.596.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.4	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	Kg	5,20	1.276.742,57	6.639.061,00	0,00	0,00	0,00%	5,20	$	6.639.061,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.5	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	520,00	11.042,00	5.741.840,00	0,00	0,00	0,00%	520,00	$	5.741.840,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.6	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	Kg	32,00	458.207,00	14.662.624,00	0,00	0,00	0,00%	32,00	$	14.662.624,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.4.7	1637	Estructura paso peatonal Metalico, incluye transporte, suministros e instalacion.	Kg	44,00	1.799.446,60	79.175.650,00	0,00	0,00	0,00%	44,00	$	79.175.650,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5		**BOXCULVERT**				**0,00**	0,00	**685.090.584,00**	**0,00%**		**$**	**1.192.260.096,00**		**$ 90.218.180,00**	**0,00%**	0,00	**775.308.764,00**	65,03%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00									0,00	0,00	0,00%
1.2.5.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	219,00	$	419.385,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.2	204	Rocería y Limpieza	m2	0,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	219,00	$	453.549,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.3	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	0,00	193.409,00	0,00	106,60	20.617.399,00	69,54%	153,30	$	29.649.600,00	29,20	5.647.543,00	19,05%	135,80	26.264.942,00	88,58%
1.2.5.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	0,00	19.220,00	0,00	977,20	18.781.784,00	83,66%	1.168,00	$	22.448.960,00	100,50	1.931.610,00	8,60%	1.077,70	20.713.394,00	92,27%
1.2.5.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	0,00	71.464,00	0,00	19,20	1.372.109,00	3,29%	584,00	$	41.734.976,00		0,00	0,00%	19,20	1.372.109,00	3,29%
1.2.5.6	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	0,00	865.060,00	0,00	10,70	9.256.142,00	7,33%	146,00	$	126.298.760,00		0,00	0,00%	10,70	9.256.142,00	7,33%
1.2.5.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	0,00	1.212.774,00	0,00	239,60	290.580.650,00	66,56%	360,00	$	436.598.640,00	32,50	39.415.155,00	9,03%	272,10	329.995.805,00	75,58%
1.2.5.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	0,00	11.447,00	0,00	25.695,00	294.130.665,00	85,65%	30.000,00	$	343.410.000,00	3.776,00	43.223.872,00	12,59%	29.471,00	337.354.537,00	98,24%
1.2.5.9	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	0,00	349.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	277,40	$	96.852.268,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.10	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	0,00	9.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	146,00	$	1.342.324,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	0,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000,00	$	23.810.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	0,00	8.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.314,00	$	11.356.902,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.5.13	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3	0,00	787.275,00	0,00	10,60	8.345.115,00	90,75%	11,68	$	9.195.372,00		0,00	0,00%	10,60	8.345.115,00	90,75%
1.2.5.14		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3		458.207,00		86,00	39.405.802,00	0,00%	100,00	$	45.820.700,00		0,00	0,00%	86,00	39.405.802,00	86,00%
1.2.5.15		Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3		191.244,00		13,60	2.600.918,00	0,00%	15,00	$	2.868.660,00		0,00	0,00%	13,60	2.600.918,00	90,67%
1.2.5.16		Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m		36.592,00		0,00	0,00	0,00%					0,00		0,00	0,00	0,00%
1.3		**OBRAS DE ESTABILIDAD, AMPLIACION Y CONFINAMIENTO.**				**649.057.172,00**		**1.437.204.563,00**	**76,62%**		**$**	**1.875.692.895,00**		**906.372,00**	**0,05%**		**1.438.110.935,00**	**76,67%**
1.3.1		**OBRA K5+170-K5+215: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m**				**76.958.893,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**					**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	196,00	3.944,00	773.024,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	196,00	2.071,00	405.916,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	135,00	19.220,00	2.594.700,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	167,00	10.016,00	1.672.672,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	135,00	458.207,00	61.857.945,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	9,00	191.244,00	1.721.196,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.802,00	2.381,00	6.671.562,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	146,00	8.643,00	1.261.878,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2		**OBRA K5+255-K5+355: Muro en gaviones H=2.00m L=45.00m**				**61.646.559,00**	0,00	**193.412.922,00**	**77,80%**		**$**	**248.610.015,00**		**$ -**	**0,00%**	0,00	**193.412.922,00**	**77,80%**
1.3.2.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	416,00	3.944,00	1.640.704,00	0,00	0,00	0,00%	416,00	$	1.640.704,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	204	Rocería y Limpieza	m2	416,00	2.071,00	861.536,00	0,00	0,00	0,00%	416,00	$	861.536,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	100,00	19.220,00	1.922.000,00	312,00	5.996.640,00	86,19%	362,00	$	6.957.640,00		0,00	0,00%	312,00	5.996.640,00	86,19%
1.3.2.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	170,00	10.016,00	1.702.720,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	$	2.003.200,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	100,00	458.207,00	45.820.700,00	368,50	168.849.280,00	79,59%	463,00	$	212.149.841,00		0,00	0,00%	368,50	168.849.280,00	79,59%
1.3.2.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	20,00	191.244,00	3.824.880,00	33,40	6.387.550,00	100,00%	33,40	$	6.387.550,00		0,00	0,00%	33,40	6.387.550,00	100,00%
1.3.2.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.075,00	2.381,00	4.940.575,00	980,10	2.333.618,00	45,17%	2.170,00	$	5.166.770,00		0,00	0,00%	980,10	2.333.618,00	45,17%
1.3.2.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	108,00	8.643,00	933.444,00	0,00	0,00	0,00%	108,00	$	933.444,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00		450,00	4.124.250,00	100,00%	450,00	$	4.124.250,00		0,00	0,00%	450,00	4.124.250,00	100,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00	0,00	0,00%		$	-			0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	0,00	49.324,00		116,00	5.721.584,00	68,24%	170,00	$	8.385.080,00		0,00	0,00%	116,00	5.721.584,00	68,24%
1.3.2.11	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90.372,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3		**OBRA K5+485-K5+625: Muro en gaviones H=3.00m L=140.00m**				**468.022.539,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**$**	**-**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	720,00	3.944,00	2.839.680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.2	204	Rocería y Limpieza	m2	720,00	2.071,00	1.491.120,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	840,00	19.220,00	16.144.800,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	798,00	10.016,00	7.992.768,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	840,00	458.207,00	384.893.880,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	28,00	191.244,00	5.354.832,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	17.430,00	2.381,00	41.500.830,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	903,00	8.643,00	7.804.629,00	0,00	0,00	0,00%	-	$	-		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1.3.4		**OBRA K5+695-K5+720: Muro en gaviones H=2.00m L=25.00m**				**42.429.181,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**				**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.3.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	116,00	3.944,00	457.504,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.2	204	Rocería y Limpieza	m2	116,00	2.071,00	240.236,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	75,00	19.220,00	1.441.500,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.4	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	56,00	10.016,00	560.896,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	75,00	458.207,00	34.365.525,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.6	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	5,00	191.244,00	956.220,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.7	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.557,00	2.381,00	3.707.217,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.8	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	81,00	8.643,00	700.083,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.5		**MURO CAISSON K4+140**					0,00	**1.243.791.641,00**	**99,29%**		**$ 1.627.082.880,00**		**906.372,00**	0,07%	0,00	**1.244.698.013,00**	76,50%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00	0,00	0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.5.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	$ 788.800,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.5.2	204	Rocería y Limpieza	m2	0,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400,00	$ 828.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.5.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	0,00	238.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70,00	$ 16.696.330,00	3,80	906.372,00	12,67%	3,80	906.372,00	5,43%
1.3.5.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	0,00	19.220,00	0,00	114,50	2.200.690,00	76,33%	530,00	$ 10.186.600,00		0,00	0,00%	114,50	2.200.690,00	21,60%
1.3.5.5	405	Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita	m3	0,00	2.215.149,90	0,00	77,50	171.674.117,00	96,87%	80,00	$ 177.211.992,00		0,00	0,00%	77,50	171.674.117,00	96,87%
1.3.5.6	701	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	0,00	1.663.451,00	0,00	26,40	43.915.106,00	120,00%	28,00	$ 46.576.628,00		0,00	0,00%	26,40	43.915.106,00	94,29%
1.3.5.7	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt	m3	0,00	2.444.680,47	0,00	27,90	68.206.585,00	174,37%	30,00	$ 73.340.414,00		0,00	0,00%	27,90	68.206.585,00	93,00%
1.3.5.8	737	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	0,00	1.654.832,00	0,00	18,00	29.786.976,00	54,55%	40,00	$ 66.193.280,00		0,00	0,00%	18,00	29.786.976,00	45,00%
1.3.5.9	767	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	0,00	1.712.800,00	0,00	29,70	50.870.160,00	47,90%	80,00	$ 137.024.000,00		0,00	0,00%	29,70	50.870.160,00	37,13%
1.3.5.10	1012	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	0,00	11.042,00	0,00	33.997,90	375.404.812,00	113,33%	34.000,00	$ 375.428.000,00		0,00	0,00%	33.997,90	375.404.812,00	99,99%
1.3.5.11	401	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	0,00	2.381,00	0,00	1.030,80	2.454.335,00	98,17%	2.100,00	$ 5.000.100,00		0,00	0,00%	1.030,80	2.454.335,00	49,09%
1.3.5.12	1802	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	0,00	2.382.438,00	0,00	34,20	81.479.380,00	68,40%	100,64	$ 239.768.117,00		0,00	0,00%	34,20	81.479.380,00	33,98%
1.3.5.13	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	0,00	9.194,00		57,30	526.816,00	29,38%	195,00	$ 1.792.830,00		0,00	0,00%	57,30	526.816,00	29,38%
1.3.5.14	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		865.060,00	0,00	1,50	1.297.590,00	0,00%	24,00	$ 20.761.440,00		0,00	0,00%	1,50	1.297.590,00	6,25%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		0,00%
NP-02 1.3		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m	0,00	262.118,38	0,00	198,00	51.899.439,00	99,00%	200,00	$ 52.423.676,00		0,00	0,00%	198,00	51.899.439,00	99,00%
NP-12 1.3		Concreto 28MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	0,00	1.175.345,00	0,00	113,00	132.813.985,00	100,00%	113,00	$ 132.813.985,00		0,00	0,00%	113,00	132.813.985,00	100,00%
NP-13 1.3		Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 0 - 4mt, sin dinamita	m3	0,00	2.215.149,90	0,00	104,40	231.261.650,00	122,82%	122,00	$ 270.248.288,00		0,00	0,00%	104,40	231.261.650,00	85,57%
1.4		**MOVIMIENTO DE TIERAS**				**595.097.174,00**		**236.688.739,00**	**43,05%**		**$ 549.786.795,00**		**0,00**	**0,00%**		**236.688.739,00**	**43,05%**
1.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	10.835,00	19.220,00	208.248.700,00	3.600,70	69.205.454,00	25,00%	14.400,00	$ 276.768.000,00		0,00	0,00%	3.600,70	69.205.454,00	25,00%
1.4.2	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	1.918,00	17.925,75	34.381.579,00	499,00	8.944.949,00	99,80%	500,00	$ 8.962.865,00		0,00	0,00%	499,00	8.944.949,00	99,80%
1.4.3	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	500,00	180.292,33	90.146.165,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.4.4	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	76.508,00	2.381,00	182.165.548,00	5.856,00	13.943.136,00	6,77%	16.508,00	$ 39.305.548,00		0,00	0,00%	5.856,00	13.943.136,00	35,47%
1.4.5	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	9.274,00	8.643,00	80.155.182,00	0,00	0,00	0,00%	9.274,00	$ 80.155.182,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.4.6		Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90.372,00		1.600,00	144.595.200,00	0,00%	1.600,00	$ 144.595.200,00		0,00	0,00%	1.600,00	144.595.200,00	100,00%
1.4.7	1802	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3		2.382.438,00		0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTO - TALUD INFERIOR CURVA S PROYECTAR 30 ML					0,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-02 2.10		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m		262.118,38		0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-03 2.10		Suministro el Instalacion de Guaya 3/8" Perimetral y Diagonalmente Entre Anclajes para Refuerzo tipo STEEL GRID	m		57.178,11		0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-04 2.10		Suministro e instalacion malla Macmat R1 con Guaya Perimetral y Diagonales Tipo STEEL GRID.	m2		139.454,29		0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.5		**PAVIMENTOS**				**3.180.371.808,00**		**3.646.258.989,00**	**62,79%**		**$ 5.807.294.393,00**		**668.243.835,00**	**11,51%**		**4.314.502.825,00**	**74,29%**
1.5.1	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	2.100,00	180.292,33	378.613.893,00	449,00	80.951.256,00	11,22%	4.000,00	$ 721.169.320,00	81,10	14.621.708,00	2,03%	530,10	95.572.964,00	13,25%
1.5.2	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	3.375,00	173.962,00	587.121.750,00	2.404,20	418.239.440,00	62,04%	3.875,00	$ 674.102.750,00	746,60	129.880.029,00	19,27%	3.150,80	548.119.470,00	81,31%
1.5.3	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2.100,00	191.244,00	401.612.400,00	3.661,80	700.297.279,00	80,30%	4.560,00	$ 872.072.640,00	649,70	124.251.227,00	14,25%	4.311,50	824.548.506,00	94,55%
1.5.4	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	10.500,00	16.153,20	169.608.600,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.5.5	1205	Riego de Imprimacion	m2	10.500,00	8.985,00	94.342.500,00	11.559,80	103.864.803,00	76,05%	15.200,00	$ 136.572.000,00	1.505,00	13.522.425,00	9,90%	13.064,80	117.387.228,00	85,95%
1.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	1.260,00	1.229.422,75	1.549.072.665,00	1.533,70	1.885.565.672,00	67,27%	2.280,00	$ 2.803.081.671,00	280,60	344.976.024,00	12,31%	1.814,30	2.230.541.695,00	79,57%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00		0,00%					0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.5.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2		12.873,90		11.540,50	148.571.243,00	75,92%	15.200,00	$ 195.683.280,00	2.660,00	34.244.574,00	17,50%	14.200,50	182.815.817,00	93,42%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00	0,00	0,00%
NP-07 1.5		Demolicion de pavimento flexible	m2	0,00	44.147,00		6.572,30	290.147.328,00	81,02%	8.111,90	$ 358.115.932,00		0,00	0,00%	6.572,30	290.147.328,00	81,02%
NP-11 1.5		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	0,00	3.059,00		6.087,60	18.621.968,00	40,05%	15.200,00	$ 46.496.800,00	2.205,90	6.747.848,00	14,51%	8.293,50	25.369.817,00	54,56%
1.6		**SEÑALIZACION VIAL**				**70.363.534,00**		**651.167.224,00**	**50,04%**		**$ 1.301.165.686,00**		**0,00**	**0,00%**		**651.167.224,00**	**50,04%**
1.6.1	1101	Señal vial vertical, incluye: suministro e instalación	Un	23,00	525.144,60	12.078.326,00	0,00	0,00	0,00%	74,00	$ 38.860.700,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
1.6.2	1102	Demarcación horizontal	Km	2,00	3.089.213,75	6.178.428,00	0,00	0,00	0,00%	5,70	$ 17.608.518,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.6.3	1103	Tachas reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un	559,00	13.140,04	7.345.284,00	0,00	0,00	0,00%	662,00	$ 8.698.708,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.6.4	1104	Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un	115,00	389.230,40	44.761.496,00	0,00	0,00	0,00%	202,00	$ 78.624.541,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00%
1.6.5	1105	Defensa metalica acanalada a dos crestas en HG	m	0,00	606.613,00	0,00	1.072,00	650.289.136,00	56,42%	1.900,00	$ 1.152.564.700,00		0,00	0,00%	1.072,00	650.289.136,00	56,42%
1.6.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	0,00	71.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,00	$ 643.176,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		0,00%
NP-09 1.6		Delineador vial tipo corona	Un	0,00	109.761,00		8,00	878.088,00	30,77%	26,00	$ 2.853.786,00		0,00	0,00%	8,00	878.088,00	30,77%
NP-10 1.6		Marca vial con pinutra en frio	m2	0,00	64.292,00		0,00	0,00	0,00%	20,40	$ 1.311.557,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DEL RIESGO**				**1.009.034.147,00**		**88.940.662,00**	**62,70%**		**$ 141.860.288,00**		**779.390,00**	**0,55%**		**45.249.721,00**	**31,90%**
1.7.1		**ZODME K6+580**				**352.184.391,00**	0,00	**501.930,00**	**0,37%**		**$ 39.006.293,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**501.930,00**	**1,29%**
1.7.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	2.793,00	3.944,00	11.015.592,00	0,00	0,00	0,00%	2.793,00	$ 11.015.592,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	2.793,00	1.287,00	3.594.591,00	390,00	501.930,00	13,96%	2.793,00	$ 3.594.591,00		0,00	0,00%	390,00	501.930,00	13,96%
1.7.1.3	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	252,00	458.207,00	115.468.164,00	0,00	0,00	0,00%	53,24	$ 24.396.110,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.4	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	96,00	173.962,00	16.700.352,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.5	906	Filtro en geotextil y tubería perforada pvc Ø4" sección 0,5x1,0 mas material filtrante	m	300,00	100.653,80	30.196.140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.6	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2	1.829,00	90.372,00	165.290.388,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.1.7	837	Canal rampa en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	12,00	826.597,00	9.919.164,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2		**VIA**				**607.773.776,00**	0,00	**43.968.401,00**	**22,75%**		**$ 102.853.995,00**		**779.390,00**	**0,40%**	0,00	**44.747.791,00**	**43,51%**
1.7.2.1	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	40,00	248.765,10	9.950.604,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.2	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	60,00	77.939,00	4.676.340,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	$ 4.676.340,00	10,00	779.390,00	16,67%	10,00	779.390,00	16,67%
1.7.2.3	836	Canal sección 2,40x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	181,00	415.333,00	75.175.273,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.4	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	732,00	451.972,50	330.843.870,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.5	1401	Arborización con especies nativas	Un	2.500,00	50.192,30	125.480.750,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	$ 25.096.150,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.2.6	829	Cunetas en sacos de 60x50 rellenos de suelo cemento 3:1:1	m	569,00	108.342,60	61.646.939,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00				$ -		0,00		0,00		0,00%
1.7.2.7	1411	Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tocon	Un	0,00	205.997,00	0,00	84,00	17.303.748,00	50,91%	165,00	$ 33.989.505,00		0,00	0,00%	84,00	17.303.748,00	50,91%
1.7.2.8	1410	Revegetalizacion con semillas agricolas	m2	0,00	39.092,00	0,00	682,10	26.664.653,00	68,21%	1.000,00	$ 39.092.000,00		0,00	0,00%	682,10	26.664.653,00	68,21%
1.7.3		**BARRERA DE FLUJO**				**49.075.980,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		$ -		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
1.7.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	200,00	3.944,00	788.800,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.3.2	204	Rocería y Limpieza	m2	200,00	2.071,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.3.3	754	Micropilotes en concreto 28 Mpa Ø40cm + refuerzo + excavación + despuntar	m	40,00	459.555,00	18.382.200,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.3.4	702	Concreto 24,5 Mpa para viga cabezal	m3	12,00	1.208.185,00	14.498.220,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7.3.5	1702	Acero de refuerzo 2.400kg/cm2 (37.000psi) corte, figurado y colocación	Kg	1.320,00	11.358,00	14.992.560,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2		**CORNEJO - SANTIAGO - PUENTE GOMEZ, ABSCISAS K12+200 - K12+600, LONGITUD: 400 MTS**				**5.354.309.235,00**		**2.402.248.042,00**	**75,60%**		**$ 3.177.508.193,00**		**0,00**	**0,00%**		**2.402.248.042,00**	**75,60%**
2.1		**PRELIMINARES**				**175.459.285,00**		**13.371.550,00**	**43,23%**		**$ 30.934.321,00**		**0,00**	**0,00%**		**13.371.550,00**	**43,23%**
2.1.1		Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	7.519,58	3.944,00	29.657.224,00	0,00	0,00	0,00%	4.400,00	$ 17.353.600,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.1.2		Rocería y Limpieza	m2	3.135,79	2.071,00	6.494.221,00	995,00	2.060.645,00	90,78%	1.096,00	$ 2.269.816,00		0,00	0,00%	995,00	2.060.645,00	90,78%
2.1.3		Dique de desvio del rio, con material del sitio, adecuacion y conformacion	m3	960,00	56.786,00	54.514.560,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.1.4		Mantenimiento y conservación de dique de desvió del rio	Hora	320,00	264.979,00	84.793.280,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00							0,00%	0,00		0,00%
2.1.5		Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	und	0,00	2.262.181,00		5,00	11.310.905,00	100,00%	5,00	$ 11.310.905,00		0,00	0,00%	5,00	11.310.905,00	100,00%
2.2		**PROTECCIÓN DE TALUD CON COLCHONETA ENROCADA (Longitud 209.80m)**				**939.054.214,00**		**4.754.279,00**	**100,00%**		**$ 4.754.279,00**		**0,00**	**0,00%**		**4.754.279,00**	**100,00%**
2.2.1		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.536,74	24.823,00	38.146.497,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.2		Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	63,71	49.324,00	3.142.432,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.3		Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	1.479,67	540.592,80	799.898.948,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.4		Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	2.899,74	10.016,00	29.043.796,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.5		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	6.392,84	2.381,00	15.221.352,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.6		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.598,21	8.643,00	13.813.329,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.2.7		Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	510,50	77.939,00	39.787.860,00	61,00	4.754.279,00	0,00%	61,00	$ 4.754.279,00		0,00	0,00%	61,00	4.754.279,00	100,00%
2.3		**PROTECCIÓN DEL TALUD CON ESPIGONES (Son 6 Tramo K12+370 - K12+530)**				**1.729.188.996,00**		**0,00**	**0,00%**		**$ -**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
2.3.1		Excavación a maquina bajo agua, profundidad hasta 4mt. Incluye extender el material	m3	927,00	38.107,00	35.325.189,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.2		Bolsacreto en sacos polipropileno de 1,2x2,4 concreto 21Mpa, transportado 1:3:3	m3	386,00	1.733.589,00	669.165.354,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.3		Concreto ciclópeo tremie 21MPa para pisos solados	m3	772,00	1.034.073,00	798.304.356,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.4		Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	5.237,00	11.442,00	59.921.754,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.5		Concreto 24,5 Mpa 3500psi Basico	m3	9,00	844.688,00	7.602.192,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.6		Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	65,00	1.212.774,00	78.830.310,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.7		Micropilote Ø4" L=3mt con barra hueca R-32 Ø1 1/4" autoperforante	un	84,00	744.350,00	62.525.400,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.8		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	3.856,32	2.381,00	9.181.898,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.3.9		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	964,08	8.643,00	8.332.543,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 — **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
2.4		**PROTECCIÓN DE TALUD CON BOLSAS EN GAVIONES (Longitud : 40m)**				**241.808.096,00**		**0,00**	**0,00%**		**$ -**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
2.4.1		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	393,70	458.207,00	180.396.096,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.4.2		Protección del enrocado de gaviones sobre talud, con redmalla 8x10 MO, mas cables metálicos de 8mm en una dirección, para protección y soporte complementario de los sacos de gaviones colocados sobre el talud	m2	400,00	153.530,00	61.412.000,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5		**MURO EN GAVIONES PROYECTADO (Longitud 51.00m) (Prolongación de gaviones existentes)**				**520.144.729,00**		**0,00**	**0,00%**		**$ -**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
2.5.1		Excavación para estructuras con maquina, incluye cargue	m3	495,00	19.220,00	9.513.900,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5.2		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	1.094,00	458.207,00	501.278.458,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5.3		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.059,20	2.381,00	4.902.955,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.5.5		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	514,80	8.643,00	4.449.416,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**563.120.163,00**		**426.249.967,00**	**80,53%**		**$ 529.313.290,00**		**0,00**	**0,00%**		**426.249.967,00**	**80,53%**
2.6.1		**ALCANTARILLAS**				**563.120.163,00**	0,00	**426.249.967,00**	78,09%		**$ 529.313.290,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**426.249.967,00**	**80,53%**
2.6.1.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	40,00	238.519,00	9.540.760,00	0,00	0,00	0,00%	3,30	$ 787.113,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.2	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	30,00	101.591,00	3.047.730,00	29,50	2.996.935,00	88,64%	33,28	$ 3.380.948,00		0,00	0,00%	29,50	2.996.935,00	88,64%
2.6.1.3	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	160,00	1.915,00	306.400,00	0,00	0,00	0,00%	160,00	$ 306.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	160,00	24.823,00	3.971.680,00	518,40	12.868.243,00	72,66%	713,48	$ 17.710.714,00		0,00	0,00%	518,40	12.868.243,00	72,66%
2.6.1.5	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	8,00	1.265.396,00	10.123.168,00	9,70	12.274.341,00	99,94%	9,71	$ 12.281.427,00		0,00	0,00%	9,70	12.274.341,00	99,94%
2.6.1.6	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	7.200,00	11.442,00	82.382.400,00	9.802,30	112.157.942,00	85,47%	10.021,44	$ 114.665.298,00		0,00	0,00%	9.802,30	112.157.942,00	97,81%
2.6.1.7	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas)	m3	120,00	1.657.370,00	198.884.400,00	86,90	144.025.453,00	65,96%	131,75	$ 218.358.498,00		0,00	0,00%	86,90	144.025.453,00	65,96%
2.6.1.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	40,00	2.216.826,00	88.673.040,00	42,00	93.106.692,00	99,88%	42,05	$ 93.217.533,00		0,00	0,00%	42,00	93.106.692,00	99,88%
2.6.1.9	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	53,00	3.032.345,00	160.714.285,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.10	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.300,00	2.381,00	5.476.300,00	777,00	1.850.037,00	76,93%	1.010,00	$ 2.404.810,00		0,00	0,00%	777,00	1.850.037,00	76,93%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS															0,00%
2.6.1.11		Desmontar o desarmar gaviones	m3		43.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	$ 175.912,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.12		Concreto ciclópeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	29,50	23.224.613,00	56,08%	52,60	$ 41.410.665,00		0,00	0,00%	29,50	23.224.613,00	56,08%
2.6.1.13		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	$ 428.784,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.6.1.14		Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3		49.324,00	0,00	353,20	17.421.237,00	97,54%	362,11	$ 17.860.714,00		0,00	0,00%	353,20	17.421.237,00	97,54%
2.6.1.15		Demoliciones en concreto ciclópeo	m3		193.409,00	0,00	32,70	6.324.474,00	100,00%	32,70	$ 6.324.474,00		0,00	0,00%	32,70	6.324.474,00	100,00%
2.7		**PAVIMENTOS**				**1.185.533.752,00**		**717.528.814,00**	**78,52%**		**$ 913.780.179,00**		**0,00**	**0,00%**		**717.528.814,00**	**78,52%**
2.7.1		Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	1.200,00	180.292,00	216.350.400,00	377,00	67.970.084,00	95,06%	396,60	$ 71.503.807,00		0,00	0,00%	377,00	67.970.084,00	95,06%
2.7.2		Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	1.260,00	173.962,00	219.192.120,00	797,70	138.769.487,00	93,63%	852,00	$ 148.215.624,00		0,00	0,00%	797,70	138.769.487,00	93,63%
2.7.3		Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	960,00	193.405,00	185.668.800,00	760,20	147.026.481,00	94,91%	801,00	$ 154.917.405,00		0,00	0,00%	760,20	147.026.481,00	94,91%
2.7.4		Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	3.200,00	16.153,00	51.689.600,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.7.5		Riego de Imprimacion	m2	3.200,00	12.667,00	40.534.400,00	2.480,00	31.414.160,00	100,00%	2.480,00	$ 31.414.160,00		0,00	0,00%	2.480,00	31.414.160,00	100,00%
2.7.6		Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	384,00	1.229.423,00	472.098.432,00	232,60	285.963.790,00	62,53%	372,00	$ 457.345.356,00		0,00	0,00%	232,60	285.963.790,00	62,53%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS															0,00%
2.7.7		Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m3		12.873,90	0,00	2.800,00	36.046.920,00	100,00%	2.800,00	$ 36.046.920,00		0,00	0,00%	2.800,00	36.046.920,00	100,00%
2.7.8		Excavación mejoramiento sub-rasante con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	287,00	5.516.140,00	96,93%	296,10	$ 5.691.042,00		0,00	0,00%	287,00	5.516.140,00	96,93%
2.7.9		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km		2.381,00	0,00	432,00	1.028.592,00	97,08%	445,00	$ 1.059.545,00		0,00	0,00%	432,00	1.028.592,00	97,08%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00	0,00	0,00%
NP-11 2.7		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2	0,00	3.059,00		1.240,00	3.793.160,00	50,00%	2.480,00	$ 7.586.320,00		0,00	0,00%	1.240,00	3.793.160,00	50,00%
		CAPITULOS NO PREVISTOS															0
2.8		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL**				**0,00**		**20.565.091,00**	**49,17%**		**$ 41.824.336,00**		**0,00**	**0,00%**		**20.565.091,00**	**49,17%**
2.8.1		Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tronco	und		205.997,00	0,00	22,00	4.531.934,00	78,57%	28,00	$ 5.767.916,00		0,00	0,00%	22,00	4.531.934,00	78,57%
2.8.2		Arborización con especies nativas	Un		50.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	28,00	$ 1.405.384,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.8.3		Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3		8.643,00	0,00	182,00	1.573.026,00	10,47%	1.738,00	$ 15.021.534,00		0,00	0,00%	182,00	1.573.026,00	10,47%
2.8.4		Revegetalizacion con semillas agricolas	m2		39.092,00	0,00	369,90	14.460.131,00	16,05%	502,14	$ 19.629.502,00		0,00	0,00%	369,90	14.460.131,00	73,67%
2.9		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**0,00**		**423.485.809,00**	**66,21%**		**$ 716.959.380,00**		**0,00**	**0,00%**		**423.485.809,00**	**66,21%**
2.9.1		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	250,20	4.808.844,00	63,62%	393,28	$ 7.558.842,00		0,00	0,00%	250,20	4.808.844,00	63,62%
2.9.2		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km		2.381,00	0,00	375,00	892.875,00	89,78%	417,68	$ 994.486,00		0,00	0,00%	375,00	892.875,00	89,78%
2.9.3		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00	0,00	1.243,10	11.393.012,00	99,93%	1.244,00	$ 11.401.260,00		0,00	0,00%	1.243,10	11.393.012,00	99,93%
2.9.4		Tubo Ø 4" perforado para filtros	m		32.744,00	0,00	392,60	12.855.294,00	93,65%	419,20	$ 13.726.285,00		0,00	0,00%	392,60	12.855.294,00	93,65%
2.9.5		Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3		161.765,00	0,00	215,10	34.795.652,00	40,09%	536,60	$ 86.803.099,00		0,00	0,00%	215,10	34.795.652,00	40,09%
2.9.6		Cunetas en concreto de 21 Mpa e=0,10 m, ancho 0,91mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3		1.055.238,00	0,00	34,10	35.983.616,00	100,00%	34,10	$ 35.983.616,00		0,00	0,00%	34,10	35.983.616,00	100,00%
2.9.7		Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg		11.042,00	0,00	11.255,00	124.277.710,00	94,81%	11.871,00	$ 131.079.582,00		0,00	0,00%	11.255,00	124.277.710,00	94,81%
2.9.8		Solado en concreto 17,5 MPa	m3		1.265.396,00	0,00	8,10	10.249.708,00	20,84%	38,87	$ 49.189.249,00		0,00	0,00%	8,10	10.249.708,00	20,84%
2.9.9		Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	18,40	14.485.860,00	26,29%	70,00	$ 55.109.250,00		0,00	0,00%	18,40	14.485.860,00	26,29%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
2.9.10		Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas)	m3		1.657.370,00	0,00	35,30	58.505.161,00	34,47%	102,40	$ 169.714.688,00		0,00	0,00%	35,30	58.505.161,00	34,47%
2.9.11		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00	0,00	7,10	507.394,00	88,75%	8,00	$ 571.712,00		0,00	0,00%	7,10	507.394,00	88,75%
2.9.12	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador), mat. selec de excavación	m3		49.234,00	0,00	107,70	5.302.502,00	87,25%	122,65	$ 6.038.753,00		0,00	0,00%	107,70	5.302.502,00	87,81%
		ACTIVIDAD NO PREVISTA					0,00								0,00		0,00%
2.9.13		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa	m3		1.055.238,00		103,70	109.428.181,00	73,55%	141,00	$ 148.788.558,00		0,00	0,00%	103,70	109.428.181,00	73,55%
2.9.14	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m		110.030,20		0,00						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10		**AMPLIACION DE BANCA Y ESTABILIDAD DE TALUDES**				**0,00**		**597.180.277,00**	**84,49%**		**$ 706.803.255,00**		**0,00**	**0,00%**		**597.180.277,00**	**84,49%**
2.10.1		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	246,00	$ 4.728.120,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.2		Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km		2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	369,00	$ 878.589,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.3		Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90.372,00	0,00	602,30	54.431.056,00	55,26%	1.090,00	$ 98.505.480,00		0,00	0,00%	602,30	54.431.056,00	55,26%
2.10.4		Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg		11.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.5		Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas)	m3		1.657.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	$ -		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.6		Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3		458.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	$ 2.749.242,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.10.7	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m		451.972,50	0,00	45,00	20.338.763,00	100,00%	45,00	$ 20.338.763,00		0,00	0,00%	45,00	20.338.763,00	100,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JUNIO-2025 ACTA 01 APROBACION)					0,00								0,00		
NP-02 2.10		Anclajes Pasivo DE 1" Incluye suministro, perforacion e inyeccion, tuerca y platina abovedada 15x15	m		262.118,38	0,00	1.108,00	290.427.165,00	100,00%	1.108,00	$ 290.427.165,00		0,00	0,00%	1.108,00	290.427.165,00	100,00%
NP-03 2.10		Suministro el Instalacion de Guaya 3/8" Perimetral y Diagonalmente Entre Anclajes para Refuerzo tipo STEEL GRID	m		57.178,11	0,00	1.412,90	80.786.952,00	75,15%	1.880,00	$ 107.494.847,00		0,00	0,00%	1.412,90	80.786.952,00	75,15%
NP-04 2.10		Suministro e instalacion malla Macmat R1 con Guaya Perimetral y Diagonales Tipo STEEL GRID.	m2		139.454,29	0,00	1.084,20	151.196.341,00	83,22%	1.302,80	$ 181.681.049,00		0,00	0,00%	1.084,20	151.196.341,00	83,22%
2.11		**SEÑALIZACION VIAL**				**0,00**		**199.129.555,00**	**87,23%**		**$ 233.139.153,00**		**0,00**	**0,00%**		**199.129.555,00**	**85,41%**
2.11.1		Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	$ 357.320,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.2		Señal vial vertical, incluye: suministro e instalación	Un		525.144,60	0,00	2,00	1.050.289,00	6,90%	29,00	$ 15.229.193,00		0,00	0,00%	2,00	1.050.289,00	6,90%
2.11.3		Demarcación horizontal	km		3.089.213,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,20	$ 3.707.057,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.4		Tachas reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un		13.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	$ 2.628.008,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.5		Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un		389.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,00	$ 5.838.456,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2.11.6		Defensa metalica acanalada a dos crestas en HG	m		606.613,00	0,00	324,00	196.542.612,00	100,00%	324,00	$ 196.542.612,00		0,00	0,00%	324,00	196.542.612,00	100,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JUNIO-2025 ACTA 01 APROBACION)				0,00	0,00								0,00	0,00	0,00%
NP-08 2.11		Suministro e instalacion de estoperol	Un		7.757,00		0,00	0,00	0,00%	720,00	$ 5.585.040,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-09 2.11		Delineador vial tipo corona	und		109.761,00		14,00	1.536.654,00	58,33%	24,00	$ 2.634.264,00		0,00	0,00%	14,00	1.536.654,00	58,33%
NP-10 2.11		Marca vial con pinutra en frio	m2		64.292,00		0,00	0,00	0,00%	9,60	$ 617.203,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3		**ARBOLEDAS - SALAZAR, ABSCISAS K21+900 - K22+900**				**11.825.784.216,00**		**8.762.928.908,00**	**74,10%**		**11.825.784.216,00**		**111.671.782,00**	**0,94%**		**8.874.600.690,00**	**75,04%**
3.1		**PRELIMINARES**				**70.947.069,00**		**41.290.924,00**	**46,37%**		**89.044.517,00**		**0,00**	**0,00%**		**41.290.924,00**	**46,37%**
3.1.1	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	10.600,00	3.944,00	41.806.400,00	8.175,00	32.242.200,00	77,12%	10.600,00	41.806.400,00		0,00	0,00%	8.175,00	32.242.200,00	77,12%
3.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	4.240,00	2.071,00	8.781.040,00	0,00	0,00	0,00%	4.240,00	8.781.040,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.1.3	226	Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	un	9,00	2.262.181,00	20.359.629,00	4,00	9.048.724,00	44,44%	17,00	38.457.077,00		0,00	0,00%	4,00	9.048.724,00	23,53%
3.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**1.307.398.972,00**		**911.152.360,00**	**67,63%**		**1.347.196.658,00**		**27.713.187,00**	**2,06%**		**938.865.547,00**	**69,69%**
3.2.1		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**1.307.398.972,00**	0,00	**911.152.360,00**	**69,69%**		**1.347.196.658,00**		**27.713.187,00**	**2,12%**	0,00	**938.865.547,00**	**69,69%**
3.2.1.1	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	62,08	193.409,00	12.006.753,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	1.934.012,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.2	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1.656,00	71.464,00	118.344.384,00	35,50	2.536.972,00	2,14%	314,10	22.446.842,00		0,00	0,00%	35,50	2.536.972,00	11,30%
3.2.1.3	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	5.244,00	23.615,00	123.837.060,00	664,00	15.680.360,00	12,66%	664,00	15.680.360,00		0,00	0,00%	664,00	15.680.360,00	100,00%
3.2.1.4	901	Geodren con tubo 4" tipo ADS H=1,50 mt	m	1.000,00	111.380,00	111.380.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.5	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	960,00	393.912,00	378.155.520,00	694,30	273.493.102,00	72,32%	800,00	315.129.600,00		0,00	0,00%	694,30	273.493.102,00	86,79%
3.2.1.6	806	Cunetas en concreto de 21 Mpa e=0,10 m, ancho 0,91mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	91,00	1.477.118,00	134.417.738,00	19,70	29.099.225,00	21,65%	19,80	29.243.982,00		0,00	0,00%	19,70	29.099.225,00	99,51%
3.2.1.7	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m2	1.932,00	47.513,00	91.795.116,00	0,00	0,00	0,00%	132,00	6.271.716,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.8	809	Bordillo en concreto 21 Mpa, sección trapezoide 40x30x20, incluye refuerzo	m	1.000,00	233.544,00	233.544.000,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	116.772.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	6.000,00	11.447,00	68.682.000,00	16.592,00	189.928.624,00	54,85%	30.247,26	346.240.381,00	2.421,00	27.713.187,00	40,35%	19.013,00	217.641.811,00	62,86%
3.2.1.10	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	1.656,00	9.194,00	15.225.264,00	0,00	0,00	0,00%	62,08	570.764,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.152,80	2.381,00	5.125.817,00	2.195,60	5.227.724,00	37,99%	5.779,84	13.761.799,00		0,00	0,00%	2.195,60	5.227.724,00	37,99%
3.2.1.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.722,24	8.643,00	14.885.320,00	0,00	0,00	0,00%	800,00	6.914.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00%
3.2.1.13	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00	0,00	1.016,00	33.267.904,00	0,00%	1.400,00	45.841.600,00		0,00	0,00%	1.016,00	33.267.904,00	72,57%
3.2.1.14	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	630,90	12.125.898,00	0,00%	800,00	15.376.000,00		0,00	0,00%	630,90	12.125.898,00	78,86%
3.2.1.15	635	Union de Anclaje en concreto con resina epoxica.	kg		18.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	173,20	3.140.358,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.2.1.16	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00	0,00	3.151,30	28.881.665,00	0,00%	4.200,00	38.493.000,00		0,00	0,00%	3.151,30	28.881.665,00	75,03%
3.2.1.17	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		1.265.396,00	0,00	9,10	11.515.104,00	0,00%	47,32	59.878.539,00		0,00	0,00%	9,10	11.515.104,00	19,23%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025			ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR		CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.2.1.18		Obras hidraulicas longitudinales en concreto de 21Mpa			1.055.238,00		293,20	309.395.782,00	0,00%	293,30	309.501.305,00			0,00	0,00%	293,20	309.395.782,00	99,97%
3.3		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**1.638.882.726,00**		**2.156.391.165,00**	**83,43%**		**2.584.612.955,00**			**26.812.416,00**	**1,04%**		**2.183.203.581,00**	**84,47%**
3.3.1		**ALCANTARILLAS + MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO**				**1.056.008.192,00**	0,00	**1.143.949.025,00**	**88,05%**		**1.299.257.359,00**			**1.102.185,00**	**0,10%**	0,00	**1.145.051.210,00**	**88,13%**
3.3.1.1	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	56,40	101.591,00	5.729.732,00	56,37	5.726.685,00	99,95%	56,40	5.729.732,00			0,00	0,00%	56,37	5.726.685,00	99,95%
3.3.1.2	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	19,61	238.519,00	4.677.358,00	17,21	4.104.912,00	87,76%	19,61	4.677.358,00			0,00	0,00%	17,21	4.104.912,00	87,76%
3.3.1.3	303	Demolicion manual en roca	m3	6,36	326.510,00	2.076.604,00	6,50	2.122.315,00	100,00%	6,50	2.122.315,00			0,00	0,00%	6,50	2.122.315,00	100,00%
3.3.1.4	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	607,00	1.915,00	1.162.405,00	136,96	262.278,00	22,56%	904,84	1.732.769,00			0,00	0,00%	136,96	262.278,00	15,14%
3.3.1.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.673,976	19.220,00	32.173.819,00	2.294,87	44.107.401,00	90,89%	2.524,87	48.528.001,00			0,00	0,00%	2.294,87	44.107.401,00	90,89%
3.3.1.6	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	175,39	1.657.370,00	290.689.439,00	232,90	386.001.473,00	99,58%	233,87	387.610.365,00			0,00	0,00%	232,90	386.001.473,00	99,58%
3.3.1.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	2,73	1.265.396,00	3.448.837,00	4,53	5.732.244,00	100,00%	4,53	5.732.244,00			0,00	0,00%	4,53	5.732.244,00	100,00%
3.3.1.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	50,00	2.216.826,00	110.841.300,00	135,50	300.379.923,00	100,00%	173,75	385.173.518,00			0,00	0,00%	135,50	300.379.923,00	77,99%
3.3.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	11.186,48	11.447,00	128.051.682,00	23.942,13	274.065.562,00	97,81%	24.477,50	280.193.949,00			0,00	0,00%	23.942,13	274.065.562,00	97,81%
3.3.1.10	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	22,31	2.369.134,00	52.854.195,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.1.11	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	100,30	328.443,00	32.942.833,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.1.12	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	53,00	3.032.345,00	160.714.285,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.1.13	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	405,00	458.207,00	185.573.835,00	64,00	29.325.248,00	15,80%	64,00	29.325.248,00			0,00	0,00%	64,00	29.325.248,00	100,00%
3.3.1.14	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	355,48	49.324,00	17.533.853,00	716,70	35.350.511,00	84,35%	849,66	41.908.629,00			0,00	0,00%	716,70	35.350.511,00	84,35%
3.3.1.15	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	55,76	9.194,00	512.630,00	61,84	568.557,00	81,36%	76,01	698.808,00			0,00	0,00%	61,84	568.557,00	81,36%
3.3.1.16	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	4.463,85	2.381,00	10.628.431,00	2.064,87	4.916.455,00	46,26%	8.250,32	19.644.017,00			0,00	0,00%	2.064,87	4.916.455,00	25,03%
3.3.1.17	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.897,14	8.643,00	16.396.954,00	0,00	0,00	0,00%	2.172,00	18.772.569,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00										0,00	0,00%
3.3.1.18	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3		71.464,00	0,00	18,10	1.293.498,00	0,00%	30,00	2.143.920,00			0,00	0,00%	18,10	1.293.498,00	60,33%
3.3.1.19	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	63,50	49.991.963,00	0,00%	82,90	65.263.917,00		1,40	1.102.185,00	0,00%	64,90	51.094.148,00	78,29%
3.3.2		**BOXCULVERT**				**582.874.534,00**	0,00	**1.012.442.140,00**	**78,77%**		**1.285.355.596,00**			**25.710.231,00**	**4,41%**	0,00	**1.038.152.371,00**	**80,77%**
3.3.2.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	430,54	1.915,00	824.492,00	0,00	0,00	0,00%	430,54	824.492,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.2	204	Rocería y Limpieza	m2	430,54	2.071,00	891.657,00	0,00	0,00	0,00%	430,54	891.657,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	7,73	238.519,00	1.843.521,00	7,73	1.843.752,00	100,00%	18,13	4.324.349,00			0,00	0,00%	7,73	1.843.752,00	42,64%
3.3.2.4	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	29,37	193.409,00	5.680.244,00	58,50	11.314.427,00	27,68%	211,37	40.880.682,00			0,00	0,00%	58,50	11.314.427,00	27,68%
3.3.2.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	279,44	19.220,00	5.370.801,00	985,64	18.944.001,00	79,04%	1.247,00	23.967.304,00			0,00	0,00%	985,64	18.944.001,00	79,04%
3.3.2.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	277,57	71.464,00	19.836.162,00	0,00	0,00	0,00%	18,74	1.339.235,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	47,32	1.265.396,00	59.881.164,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.8	1307	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo	m3	2,64	2.252.438,00	5.941.931,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.9	730	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y estribos, bajo agua	m3	25,57	2.187.530,00	55.932.517,00	14,36	31.412.931,00	56,16%	34,19	74.785.417,00			0,00	0,00%	14,36	31.412.931,00	42,00%
3.3.2.10	1006	Muro pantalla en concreto 28 Mpa	m3	14,83	1.705.519,00	25.285.172,00	74,48	127.027.055,00	96,73%	77,00	131.319.846,00			0,00	0,00%	74,48	127.027.055,00	96,73%
3.3.2.11	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	43,89	1.849.526,00	81.170.388,00	126,88	234.667.859,00	98,36%	129,00	238.583.546,00			0,00	0,00%	126,88	234.667.859,00	98,36%
3.3.2.12	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	36,15	1.784.716,00	64.522.838,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.13	1239	Concreto 24,5MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	4,98	1.426.721,00	7.110.777,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.14	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	10.213,78	11.447,00	116.917.195,00	29.923,90	342.538.883,00	94,84%	31.553,00	361.187.191,00			0,00	0,00%	29.923,90	342.538.883,00	94,84%
3.3.2.15	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m2	18,44	47.513,00	876.140,00	0,00	0,00	0,00%	18,44	876.140,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.16	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	39,80	36.592,00	1.456.362,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.17	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	11,30	405.590,00	4.581.699,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.18	905	Manto Geotextil no tejido 1600. 467kn	m2	184,68	10.716,00	1.979.063,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.19	1020	Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloraderos	m	6,00	17.144,00	102.864,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	102.864,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.20	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	12,14	393.912,00	4.783.667,00	0,00	0,00	0,00%	5,00	1.969.560,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.21	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	68,28	349.143,00	23.838.402,00	17,10	5.970.345,00	25,05%	245,00	85.540.035,00			0,00	0,00%	17,10	5.970.345,00	6,98%
3.3.2.22	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	111,00	458.207,00	50.860.977,00	22,30	10.218.016,00	20,09%	25,00	11.455.175,00			0,00	0,00%	22,30	10.218.016,00	89,20%
3.3.2.23	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	54,60	590.592,80	32.246.367,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.3.2.24	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	409,07	9.194,00	3.760.959,00	7,73	71.070,00	1,89%	229,50	2.110.023,00			0,00	0,00%	7,73	71.070,00	3,37%
3.3.2.25	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	772,34	2.381,00	1.838.933,00	1.659,42	3.951.079,00	22,93%	7.236,80	17.230.809,00			0,00	0,00%	1.659,42	3.951.079,00	22,93%
3.3.2.26	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	617,87	8.643,00	5.340.242,00	0,00	0,00	0,00%	1.265,74	10.939.782,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00			0,00	0,00						0,00	0,00%
3.3.2.27	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	64,80	51.015.420,00	0,00%	64,80	51.015.420,00			0,00	0,00%	64,80	51.015.420,00	100,00%
3.3.2.28	303	Demolicion manual en roca	m3		326.510,00	0,00	9,00	2.938.590,00	0,00%	16,36	5.341.704,00			0,00	0,00%	9,00	2.938.590,00	55,01%
3.3.2.29	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3		180.292,33	0,00	23,20	4.182.782,00	0,00%	143,00	25.781.803,00		1,40	252.409,00	0,00%	24,60	4.435.191,00	17,20%
3.3.2.30		Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=50cm	m3		590.593,00	0,00	224,70	132.706.247,00	0,00%	261,00	154.144.773,00		36,10	21.320.407,00	0,00%	260,80	154.026.654,00	99,92%
3.3.2.31		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	0,00	9.165,00	0,00	31,60	289.614,00	0,00%	213,00	1.952.145,00			0,00	0,00%	31,60	289.614,00	14,84%
3.3.2.32		Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m	0,00	32.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	1.178.784,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00	0,00	0,00%							0,00		0,00%
NP-06 3.3		Recubrimiento de colchogavion en concreto 3000psi	m3		1.253.762,00	0,00	26,60	33.350.069,00		30,00	37.612.860,00		3,30	4.137.415,00	0,00%	29,90	37.487.484,00	99,67%
3.4		**OBRAS DE AMPLIACION DE BANCA**				**1.836.402.408,00**		**980.204.072,00**	**85,16%**		**1.150.995.432,00**			**0,00**	**0,00%**		**980.204.072,00**	**85,16%**
3.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	2.362,13	1.915,00	4.523.479,00	0,00	0,00	0,00%	219,38	420.113,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.2	204	Rocería y Limpieza	m2	2.362,13	2.071,00	4.891.971,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	28,66	238.519,00	6.836.666,00	16,40	3.911.712,00	57,22%	28,66	6.836.666,00			0,00	0,00%	16,40	3.911.712,00	57,22%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.4.4	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	14,30	101.591,00	1.452.751,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.679,72	19.220,00	32.284.295,00	4.256,00	81.800.320,00	59,01%	7.212,53	138.624.815,00		0,00	0,00%	4.256,00	81.800.320,00	59,01%
3.4.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	773,40	71.464,00	55.270.150,00	0,00	0,00	0,00%	4,50	321.588,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	22,68	1.265.396,00	28.703.294,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	68,10	2.216.826,00	150.970.284,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.434,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.9	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	84,49	1.657.370,00	140.029.886,00	217,80	360.975.186,00	100,00%	217,80	360.975.186,00		0,00	0,00%	217,80	360.975.186,00	100,00%
3.4.10	1004	Muro pantalla en concreto 24,5MPa	m3	105,21	1.657.645,00	174.400.830,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.11	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m	37,74	110.030,20	4.152.540,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	6.601.812,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.12	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	81,08	1.784.716,00	144.695.850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.13	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	36,38	1.596.819,00	58.096.267,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.14	1239	Concreto 24,5MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	16,83	1.426.721,00	24.011.714,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.15	1020	Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloraderos	m	40,26	17.144,00	690.217,00	0,00	0,00	0,00%	30,52	523.235,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.16	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	23.578,00	11.447,00	269.897.366,00	31.869,00	364.804.443,00	100,00%	31.869,00	364.804.443,00		0,00	0,00%	31.869,00	364.804.443,00	100,00%
3.4.17	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m	88,00	32.744,00	2.881.472,00	61,00	1.997.384,00	69,32%	74,80	2.449.251,00		0,00	0,00%	61,00	1.997.384,00	81,55%
3.4.18	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	1.443,98	12.873,90	18.589.654,00	0,00	0,00	0,00%	0,04	515,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.19	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	58,79	49.324,00	2.899.561,00	560,52	27.647.164,00	93,14%	601,82	29.684.007,00		0,00	0,00%	560,52	27.647.164,00	93,14%
3.4.20	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	91,85	393.912,00	36.180.817,00	39,50	15.559.524,00	43,00%	41,56	16.369.407,00		0,00	0,00%	39,50	15.559.524,00	95,05%
3.4.21	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	323,75	17.925,75	5.803.496,00	4,00	71.703,00	1,24%	20,00	358.515,00		0,00	0,00%	4,00	71.703,00	20,00%
3.4.22	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	155,19	349.143,00	54.183.502,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.23	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	143,73	405.590,00	58.295.451,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.24	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	30,60	3.032.345,00	92.789.757,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.25	1002	Gaviones revestidos por dos caras, cimentado en ciclópeo, muro de confinamiento	m3	6,00	1.618.029,00	9.708.174,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.26	814	Gradas disipadoras sección 1,5x2,0 con sacos (50x60) rellenos con suelo/cemento 1:5, mas arena de rio	m	44,19	281.906,00	12.457.426,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.27	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	14,10	234.428,00	3.305.435,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.28	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	16,65	2.369.134,00	39.452.715,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.29	1307	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo	m3	5,14	2.252.438,00	11.568.522,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.30	1318	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3	5,36	2.382.438,00	12.769.868,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.31	840	Canal sección 2,40x0,80 en sacos (1,20x2,40 y 0,50x0,60) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	8,20	394.178,00	3.232.260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.32	829	Cunetas en sacos de 60x50 rellenos de suelo cemento 3:1:1	m	158,34	122.011,00	19.319.222,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.33	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	285,00	451.972,50	128.812.163,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.34	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	20,00	85.732,90	1.714.658,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.35	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	398,00	458.207,00	182.366.386,00	96,30	44.125.334,00	24,20%	101,00	46.278.907,00		0,00	0,00%	96,30	44.125.334,00	95,35%
3.4.36	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	402,84	9.194,00	3.703.754,00	0,00	0,00	0,00%	28,66	263.527,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4.37	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	5.595,28	2.381,00	13.322.354,00	12.511,00	29.788.691,00	57,82%	21.637,59	51.519.098,00		0,00	0,00%	12.511,00	29.788.691,00	57,82%
3.4.38	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.561,40	8.643,00	22.138.201,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	25.929.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.4.39	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	59,40	46.763.946,00	0,00%	122,03	96.071.168,00		0,00	0,00%	59,40	46.763.946,00	48,68%
3.4.40	1.226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00	0,00	301,00	2.758.665,00	0,00%	322,94	2.959.745,00		0,00	0,00%	301,00	2.758.665,00	93,21%
3.5		**OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES**				**1.312.765.073,00**		**298.945.531,00**	**29,87%**		**1.000.735.900,00**		**8.617.139,00**	**0,86%**		**307.562.670,00**	**30,73%**
3.5.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	3.438,58	1.915,00	6.584.879,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.2	204	Rocería y Limpieza	m2	3.438,58	2.071,00	7.121.297,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	13,91	238.519,00	3.317.509,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.4	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	122,75	101.591,00	12.470.295,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	8.803,47	19.220,00	169.202.659,00	332,50	6.390.650,00	3,78%	1.500,00	28.830.000,00		0,00	0,00%	332,50	6.390.650,00	22,17%
3.5.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	307,65	71.464,00	21.986.021,00	10,00	714.640,00	3,25%	50,00	3.573.200,00		0,00	0,00%	10,00	714.640,00	20,00%
3.5.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	30,66	1.265.396,00	38.793.285,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.8	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	48,92	2.216.826,00	108.442.694,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.9	842	Tubería de PVC Ø20" incluye colchón de arena + atraque + afirmado	m	45,00	681.227,97	30.655.259,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.10	843	Tubería de PVC Ø20", incluye instalación	m	41,60	590.000,00	24.544.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.11	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	137,87	1.657.370,00	228.501.991,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.12	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	41,35	36.592,00	1.513.262,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.13	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	21,78	1.784.716,00	38.865.011,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.14	1012	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	2,91	1.712.800,00	4.987.674,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.15	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	10.083,42	11.447,00	115.424.910,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.16	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	20,00	12.873,90	257.478,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.17	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	119,94	17.925,75	2.149.935,00	2,00	35.852,00	1,67%	370,00	6.632.528,00		0,00	0,00%	2,00	35.852,00	0,54%
3.5.18	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2,00	405.590,00	811.180,00	5,60	2.271.304,00	13,02%	43,00	17.440.370,00		0,00	0,00%	5,60	2.271.304,00	13,02%
3.5.19	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	13,20	3.032.345,00	40.026.954,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 — **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.5.20	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	4,00	234.428,00	937.712,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.21	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	8,35	2.369.134,00	19.772.792,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.22	1403	Cartucho cortaflujo en varas de madera envuelta con agromanto Ø15cm	m	180,00	16.660,50	2.998.890,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.23	1410	Revegetalizacion con semillas agricolas	m2	201,40	39.092,00	7.873.129,00	459,00	17.943.228,00	45,90%	1.000,00	39.092.000,00		0,00	0,00%	459,00	17.943.228,00	45,90%
3.5.24	1402	Cultivo con hidrosiembra	m2	2.263,42	32.687,60	73.985.849,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.25	1317	Empradizado con cespedon, instalado y funcionando	m2	29,64	29.136,30	863.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.26	1405	Revegetalizacion de talud con manto permanente	m2	83,02	98.064,50	8.141.315,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.27	836	Canal sección 2,40x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	36,60	415.333,00	15.201.188,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.28	840	Canal sección 2,40x0,80 en sacos (1,20x2,40 y 0,50x0,60) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	14,68	394.178,00	5.786.533,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.29	812	Cunetas en sacos de 120x240 rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1	m	35,80	364.129,00	13.035.818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.30	829	Cunetas en sacos de 60x50 rellenos de suelo cemento 3:1:1	m	99,50	122.011,00	12.140.095,00	0,00	0,00	0,00%	50,18	6.122.279,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.31	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	300,00	451.972,50	135.591.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.32	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	9,98	85.732,90	855.614,00	30,60	2.623.427,00	30,60%	100,00	8.573.290,00		0,00	0,00%	30,60	2.623.427,00	30,60%
3.5.33	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	191,94	218.765,10	41.988.789,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.34	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	12,00	458.207,00	5.498.484,00	44,00	20.161.108,00	10,23%	430,00	197.029.010,00		0,00	0,00%	44,00	20.161.108,00	10,23%
3.5.35	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	339,25	9.194,00	3.119.083,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.36	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	11.760,46	2.381,00	28.001.645,00	77,00	183.337,00	0,65%	21.918,75	52.188.544,00		0,00	0,00%	77,00	183.337,00	0,35%
3.5.37	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	9.408,36	8.643,00	81.316.494,00	2.198,00	18.997.314,00	23,36%	6.000,00	51.858.000,00		0,00	0,00%	2.198,00	18.997.314,00	36,63%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.5.38	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2		90.372,00	0,00	2.165,80	195.727.678,00	0,00%	4.348,58	392.989.872,00		0,00	0,00%	2.165,80	195.727.678,00	49,80%
3.5.39	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32,93	25.926.540,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.5.40	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00	0,00	194,00	1.778.010,00	0,00%	597,00	5.471.505,00		0,00	0,00%	194,00	1.778.010,00	32,50%
3.5.41	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00	0,00	40,00	1.309.760,00	0,00%	50,00	1.637.200,00		0,00	0,00%	40,00	1.309.760,00	80,00%
3.5.42	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	0,00	393.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	7.878.240,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		
NP-05 3.5		Cuneta para zanja corona en geomembrana 30mils	m		118.043,00		261,00	30.809.223,00	0,00%	1.317,26	155.493.322,00	73,00	8.617.139,00	0,00%	334,00	39.426.362,00	25,36%
3.6		**PUNTOS CRITICOS**				**1.976.221.281,00**		**758.906.676,00**	**70,64%**		**1.074.385.234,00**		**0,00**	**0,00%**		**758.906.676,00**	**70,64%**
3.6.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.696,81	1.915,00	3.249.391,00	0,00	0,00	0,00%	1.137,90	2.179.086,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.2	204	Rocería y Limpieza	m2	1.197,44	2.071,00	2.479.898,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	24,73	238.519,00	5.898.511,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.4	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	17,70	101.591,00	1.798.161,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	2.111,89	19.220,00	40.590.601,00	1.532,40	29.452.728,00	72,56%	2.381,00	45.762.895,00		0,00	0,00%	1.532,40	29.452.728,00	64,36%
3.6.6	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	79,35	71.464,00	5.670.668,00	20,20	1.443.573,00	25,46%	229,10	16.372.402,00		0,00	0,00%	20,20	1.443.573,00	8,82%
3.6.7	403	Excavación manual material sin clasificar para pilas pre-excavadas, prof. De 0 - 4mt	m3	86,00	96.858,84	8.329.860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.8	405	Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita	m3	92,00	2.215.149,90	203.793.791,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.9	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	148,66	1.368.572,54	203.452.218,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.10	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	23,00	1.972.830,24	45.375.096,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.11	737	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 12mt	m3	23,00	2.444.680,47	56.227.651,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.12	702	Concreto 24,5 Mpa para viga cabezal	m3	71,40	1.579.715,96	112.791.720,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.13	209	Desmontar o desarmar gaviones	m3	14,09	43.978,00	619.650,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.14	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	19,48	1.265.396,00	24.656.203,00	0,40	506.158,00	2,05%	17,84	22.574.415,00		0,00	0,00%	0,40	506.158,00	2,24%
3.6.15	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	33,50	2.216.826,00	74.263.671,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.16	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	35,07	1.657.370,00	58.117.171,00	49,80	82.537.026,00	90,22%	55,20	91.486.824,00		0,00	0,00%	49,80	82.537.026,00	90,22%
3.6.17	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	35,10	1.596.819,00	56.048.347,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.18	1004	Muro pantalla en concreto 24,5MPa	m3	79,85	1.657.645,00	132.358.718,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.19	1239	Concreto 24,5MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	11,80	1.426.721,00	16.835.308,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.20	1020	Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloraderos	m	17,00	17.144,00	291.448,00	0,00	0,00	0,00%	5,60	96.006,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.21	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	33.407,27	11.447,00	382.413.074,00	4.179,00	47.837.013,00	12,51%	6.700,00	76.694.900,00		0,00	0,00%	4.179,00	47.837.013,00	62,37%
3.6.22	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	144,14	9.165,00	1.321.043,00	1.044,00	9.568.260,00	63,66%	1.640,00	15.030.600,00		0,00	0,00%	1.044,00	9.568.260,00	63,66%
3.6.23	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	700,45	12.873,90	9.017.523,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.24	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	328,62	405.590,00	133.283.039,00	1,30	527.267,00	0,40%	2,00	811.180,00		0,00	0,00%	1,30	527.267,00	65,00%
3.6.25	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	42,00	180.292,33	7.572.278,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.26	1228	Manto geotextil tejido R-41Kn/m para muro tierra armada	m2	428,72	18.009,00	7.720.818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.27	1027	Refuerzo para muro mecanicamente estabilizado en malla metalica INVIAS tipo 1. largo 3 mt, altura =0,5m	m	42,00	400.876,00	16.836.792,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.28	1028	Refuerzo para muro mecanicamente estabilizado en malla metalica INVIAS tipo 1. largo 3,5 mt, altura =0,5m	m	14,00	415.181,00	5.812.534,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.29	508	Relleno compactado con material tipo recebo para Muros mecanicamente reforzados	m3	68,60	360.952,00	24.761.307,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.30	905	Manto Geotextil no tejido 1600, 467kn	m2	196,50	10.716,00	2.105.694,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.31	1233	Relleno para terraplen de acceso, suministro y compactado	m3	132,28	327.234,27	43.286.549,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.6.32	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	48,85	49.324,00	2.409.379,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.33	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	6,00	3.032.345,00	18.194.070,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.34	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	1,60	234.428,00	375.085,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.35	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	178,40	458.207,00	81.744.129,00	311,40	142.685.660,00	97,31%	320,00	146.626.240,00		0,00	0,00%	311,40	142.685.660,00	97,31%
3.6.36	1002	Gaviones revestidos por dos caras, cimentado en ciclópeo, muro de confinamiento	m3	1,50	1.618.029,00	2.427.044,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.37	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2	276,31	90.372,00	24.970.687,00	808,20	73.038.650,00	87,86%	919,87	83.130.492,00		0,00	0,00%	808,20	73.038.650,00	87,86%
3.6.38	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	7,00	328.443,00	2.299.101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.39	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	4,86	2.369.134,00	11.513.991,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.40	1502	Enrocado con piedra RIP-RAP para espigones, control de socavacion	m3	18,00	333.046,00	5.994.828,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.41	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	138,26	590.592,80	81.655.361,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.42	1311	Concreto 17,5MPa húmedo, lanzado sobre taludes temporalmente + malla electrosoldada 6mm	m3	14,70	1.991.467,48	29.274.572,00	0,00	0,00	0,00%	21,55	42.916.124,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.43	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	257,94	9.194,00	2.371.540,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.44	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.223,71	2.381,00	5.294.646,00	344,00	819.064,00	15,47%	7.391,63	17.599.468,00		0,00	0,00%	344,00	819.064,00	4,65%
3.6.45	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.397,10	8.643,00	20.718.115,00	0,00	0,00	0,00%	2.111,89	18.253.099,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.6.46	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3		393.912,00	0,00	176,60	69.564.859,00	0,00%	242,26	95.429.121,00		0,00	0,00%	176,60	69.564.859,00	72,90%
3.6.47	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3		17.925,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	490,10	8.785.408,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.48	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3		349.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.49	840	Canal sección 2,40x0,80 en sacos (1,20x2,40 y 0,50x0,60) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m		394.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.50	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m		110.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	22,00	2.420.664,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.51	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2		23.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.52	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00	0,00	279,30	9.145.399,00	0,00%	338,30	11.077.295,00		0,00	0,00%	279,30	9.145.399,00	82,56%
3.6.53	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	25,50	20.075.513,00	0,00%	37,82	29.774.741,00		0,00	0,00%	25,50	20.075.513,00	67,42%
3.6.54		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.6.55		Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m		451.972,50		202,00	91.298.445,00	0,00%	220,00	99.433.950,00		0,00	0,00%	202,00	91.298.445,00	91,82%
3.6.56	1318	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo + malla electrosoldada	m3		2.382.438,00		4,10	9.767.996,00	0,00%	21,55	51.341.539,00		0,00	0,00%	4,10	9.767.996,00	19,03%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00	0,00	0,00%
NP-02 3.6		Anclajes pasivos de 1" incluye suministro, perforación e inyección, tuerca y platina abovedada 15x15	m		262.118,38		651,00	170.639.065,00	0,00%	750,00	196.588.785,00		0,00	0,00%	651,00	170.639.065,00	86,80%
3.7		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**175.454.138,00**		**113.802.953,00**	**55,78%**		**204.015.402,00**		**0,00**	**0,00%**		**113.802.953,00**	**55,78%**
3.7.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	3.813,45	19.220,00	73.294.509,00	4.663,50	89.632.470,00	93,12%	5.008,00	96.253.760,00		0,00	0,00%	4.663,50	89.632.470,00	93,12%
3.7.2	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	1.505,85	49.324,00	74.274.545,00	0,00	0,00	0,00%	461,10	22.743.296,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.7.3	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.999,88	2.381,00	7.142.714,00	10.151,40	24.170.483,00	57,92%	17.528,00	41.734.168,00		0,00	0,00%	10.151,40	24.170.483,00	57,92%
3.7.4	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.399,90	8.643,00	20.742.370,00	0,00	0,00	0,00%	5.008,00	43.284.178,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.8		**PAVIMENTOS**				**3.194.541.820,00**		**3.212.573.659,00**	**88,14%**		**3.644.728.171,00**		**0,00**	**0,00%**		**3.212.573.659,00**	**88,14%**
3.8.1	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	8.000,00	12.873,90	102.991.200,00	3.402,80	43.807.307,00	42,54%	8.142,83	104.829.975,00		0,00	0,00%	3.402,80	43.807.307,00	41,79%
3.8.2	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2.400,00	405.590,00	973.416.000,00	1.986,30	805.623.417,00	82,76%	2.035,71	825.662.574,00		0,00	0,00%	1.986,30	805.623.417,00	97,57%
3.8.3	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2.100,00	422.873,00	888.033.300,00	1.965,80	831.283.743,00	93,61%	2.035,71	860.845.706,00		0,00	0,00%	1.965,80	831.283.743,00	96,57%
3.8.4	1205	Riego de Imprimacion	m2	7.000,00	12.667,00	88.669.000,00	6.244,40	79.097.815,00	89,21%	8.142,83	103.145.224,00		0,00	0,00%	6.244,40	79.097.815,00	76,69%
3.8.5	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	840,00	1.358.848,00	1.141.432.320,00	805,80	1.094.959.718,00	95,93%	1.017,85	1.383.108.481,00		0,00	0,00%	805,80	1.094.959.718,00	79,17%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.8.6	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida	m3		180.292,33	0,00	1.894,20	341.509.731,00	0,00%	1.898,18	342.227.295,00		0,00	0,00%	1.894,20	341.509.731,00	99,79%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		0,00%
NP-11 3.8		Riego de liga con emulsion asfaltica	m2		3.059,00		5.325,90	16.291.928,00	0,00%	8.142,83	24.908.916,00		0,00	0,00%	5.325,90	16.291.928,00	65,41%
3.9		**SEÑALIZACION VIAL**				**109.191.415,00**		**97.058.080,00**	**35,58%**		**272.801.429,00**		**48.529.040,00**	**17,79%**		**145.587.120,00**	**53,37%**
3.9.1	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1,49	71.464,00	106.124,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.2	1101	Señal vial vertical, incluye: suministro e instalación	Un	48,00	525.144,60	25.206.941,00	0,00	0,00	0,00%	75,00	39.385.845,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.3	1102	Demarcación horizontal	km	3,00	3.089.213,75	9.267.641,00	0,00	0,00	0,00%	3,00	9.267.641,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.4	1103	Tachas reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un	795,00	13.140,04	10.446.335,00	0,00	0,00	0,00%	378,00	4.966.938,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.5	1104	Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un	9,00	389.230,40	3.503.074,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	14.012.294,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.9.6	1105	Defensa metalica acanalada a dos crestas en HG	m	100,00	606.613,00	60.661.300,00	160,00	97.058.080,00	66,67%	240,00	145.587.120,00	80,00	48.529.040,00	80,00%	240,00	145.587.120,00	100,00%
		ITEM NO PREVISTO (03-JULIO-2025 ACTA 02 APROBACION)					0,00								0,00		0,00%
NP-08 3.9		Suministro e instalacion de estoperol	Un		7.757,00		0,00	0,00	0,00%	4.725,00	36.651.825,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-09 3.9		Delineador vial tipo corona	Un		109.761,00		0,00	0,00	0,00%	90,00	9.878.490,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
NP-10 3.9		Marca vial con pintura en frio	m2		64.292,00		0,00	0,00	0,00%	203,00	13.051.276,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025			ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
3.10		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL**				**111.954.833,00**		**192.603.480,00**	**45,40%**		**424.232.432,00**		**0,00**	**0,00%**		**192.603.480,00**	**45,40%**
3.10.1	1411	Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tronco	un	245,00	205.997,00	50.469.265,00	58,00	11.947.826,00	23,67%	245,00	50.469.265,00		0,00	0,00%	58,00	11.947.826,00	23,67%
3.10.2	1401	Arborización con especies nativas	Un	1.225,00	50.192,30	61.485.568,00	0,00	0,00	0,00%	1.225,00	61.485.568,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
3.10.3	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3		1.265.396,00	0,00	1,20	1.518.475,00	0,00%	7,00	8.857.772,00		0,00	0,00%	1,20	1.518.475,00	17,14%
3.10.4	742	Concreto ciclopeo para piso y solados	m3		787.275,00	0,00	12,00	9.447.300,00	0,00%	32,20	25.350.255,00		0,00	0,00%	12,00	9.447.300,00	37,27%
3.10.5	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3		458.207,00	0,00	218,00	99.889.126,00	0,00%	293,46	134.463.780,00		0,00	0,00%	218,00	99.889.126,00	74,29%
3.10.6	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00	0,00	275,00	9.004.600,00	0,00%	340,00	11.132.960,00		0,00	0,00%	275,00	9.004.600,00	80,88%
3.10.7	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2		23.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.10.8	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3		393.912,00	0,00	129,30	50.932.822,00	0,00%	170,00	66.965.040,00		0,00	0,00%	129,30	50.932.822,00	76,06%
3.10.9	1410	Revegetalizacion con semillas agricolas	m2		39.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.336,30	52.238.612,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.10.10	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00	0,00	150,30	2.888.766,00	0,00%	204,00	3.920.880,00		0,00	0,00%	150,30	2.888.766,00	73,68%
3.10.11		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00		761,00	6.974.565,00	0,00%	1.020,00	9.348.300,00		0,00	0,00%	761,00	6.974.565,00	74,61%
3.11		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL**				**92.024.481,00**		**0,00**	**0,00%**		**33.036.086,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
3.11.1	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	110,00	218.765,10	24.064.161,00	0,00	0,00	0,00%	34,00	7.438.013,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.11.2	1411	Tala, cargue y retiro de arboles de altura h= 3m a 15m y DAP mayor a 15cm.	und	96,00	205.997,00	19.775.712,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.11.3	1401	Arborización con especies nativas	Un	960,00	50.192,30	48.184.608,00	0,00	0,00	0,00%	510,00	25.598.073,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4		**ARBOLEDAS - CUCUTILLA, ABSCISAS K0+000 - K0+920**				**12.935.862.159,00**		**218.307.809,00**	**2,33%**		**9.357.286.792,00**		**24.227.042,00**	**0,26%**		**242.534.851,00**	**2,59%**
4.1		**PRELIMINARES**				**70.156.370,00**		**0,00**	**0,00%**		**70.156.370,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
4.1.1	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	10.120,00	3.944,00	39.913.280,00	0,00	0,00	0,00%	10.120,00	39.913.280,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	3.680,00	2.071,00	7.621.280,00	0,00	0,00	0,00%	3.680,00	7.621.280,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.1.3	226	Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	un	10,00	2.262.181,00	22.621.810,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	22.621.810,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**6.012.109.395,00**		**197.907.331,50**	**8,13%**		**2.433.534.025,00**		**24.227.042,00**	**1,00%**		**210.020.852,50**	**8,63%**
4.2.1		**ALCANTARILLAS**				**221.231.397,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**	0,00	**221.231.397,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
4.2.1.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	6,26	238.519,00	1.493.924,00	0,00	0,00	0,00%	6,26	1.493.924,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.2	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	6,90	101.591,00	700.978,00	0,00	0,00	0,00%	6,90	700.978,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.3	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	283,40	1.915,00	542.711,00	0,00	0,00	0,00%	283,40	542.711,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	271,92	19.220,00	5.226.277,00	0,00	0,00	0,00%	271,92	5.226.277,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.5	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	19,40	2.216.826,00	43.006.424,00	0,00	0,00	0,00%	19,40	43.006.424,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.6	219	Solado en concreto 17,5 Mpa	m3	6,01	1.265.396,00	7.607.561,00	0,00	0,00	0,00%	6,01	7.607.561,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.7	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	8,37	405.590,00	3.396.005,00	0,00	0,00	0,00%	8,37	3.396.005,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.8	1307	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo	m3	2,40	2.252.438,00	5.405.851,00	0,00	0,00	0,00%	2,40	5.405.851,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.9	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	18,48	1.657.370,00	30.635.757,00	0,00	0,00	0,00%	18,48	30.635.757,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.10	1004	Muro pantalla en concreto 24,5MPa	m3	8,33	1.715.841,00	14.296.420,00	0,00	0,00	0,00%	8,33	14.296.420,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.11	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	10,56	1.655.015,00	17.476.958,00	0,00	0,00	0,00%	10,56	17.476.958,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.12	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	1,60	1.578.724,00	2.525.958,00	0,00	0,00	0,00%	1,60	2.525.958,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.13	1020	Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloraderos	m	3,80	17.144,00	65.147,00	0,00	0,00	0,00%	3,80	65.147,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.14	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	2.721,76	11.447,00	31.156.027,00	0,00	0,00	0,00%	2.721,76	31.156.027,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.15	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	1,20	787.275,00	944.730,00	0,00	0,00	0,00%	1,20	944.730,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.16	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	93,04	13.851,80	1.288.771,00	0,00	0,00	0,00%	93,04	1.288.771,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.17	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	8,00	393.912,00	3.151.296,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	3.151.296,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.18	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	31,08	49.324,00	1.533.089,00	0,00	0,00	0,00%	31,08	1.533.089,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.19	841	Gradas disipadoras en concreto de 21MPa, incluye acero	m3	10,17	2.251.728,00	22.898.047,00	0,00	0,00	0,00%	10,17	22.898.047,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.20	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	5,47	590.592,80	3.231.724,00	0,00	0,00	0,00%	5,47	3.231.724,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.21	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	2,00	3.032.345,00	6.064.690,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	6.064.690,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.22	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	30,00	328.443,00	9.853.290,00	0,00	0,00	0,00%	30,00	9.853.290,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.23	1002	Gaviones revestidos por dos caras, cimentado en solado, muro de confinamiento	m3	0,75	1.618.029,00	1.213.522,00	0,00	0,00	0,00%	0,75	1.213.522,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.24	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	12,00	234.428,00	2.813.136,00	0,00	0,00	0,00%	12,00	2.813.136,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.25	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	3,50	458.207,00	1.603.725,00	0,00	0,00	0,00%	3,50	1.603.725,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.26	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	10,23	9.194,00	94.033,00	0,00	0,00	0,00%	10,23	94.033,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.27	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	323,32	2.381,00	769.814,00	0,00	0,00	0,00%	323,32	769.814,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.1.28	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	258,65	8.643,00	2.235.532,00	0,00	0,00	0,00%	258,65	2.235.532,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2		**CANALES PARALELOS DEBAJO DE CUNETA**				**395.281.236,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**395.281.236,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
4.2.2.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	455,16	19.220,00	8.748.094,00	0,00	0,00	0,00%	455,16	8.748.094,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.2	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	28,44	1.265.396,00	35.982.421,00	0,00	0,00	0,00%	28,44	35.982.421,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.3	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	147,10	1.657.370,00	243.797.387,00	0,00	0,00	0,00%	147,10	243.797.387,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.4	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	8.781,46	11.447,00	100.521.382,00	0,00	0,00	0,00%	8.781,46	100.521.382,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.5	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	20,00	36.592,00	731.840,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	731.840,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.6	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	591,70	2.381,00	1.408.844,00	0,00	0,00	0,00%	591,70	1.408.844,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.7	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	473,36	8.643,00	4.091.268,00	0,00	0,00	0,00%	473,36	4.091.268,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**1.165.194.772,00**	0,00	**88.275.679,00**	**7,58%**	0,00	**1.165.194.772,00**		**24.227.042,00**	**2,08%**	0,00	**88.275.679,00**	**7,58%**
4.2.3.1	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1.440,00	71.464,00	102.908.160,00	0,00	0,00	0,00%	1.440,00	102.908.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
4.2.3.2	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	3.154,00	23.615,00	74.481.710,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-602.340,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.3	901	Geodren con tubo 4" tipo ADS H=1,50 mt	m	900,00	111.380,00	100.242.000,00	0,00	0,00	0,00%	855,77	95.315.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.4	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	996,00	393.912,00	392.336.352,00	224,10	88.275.679,00	22,50%	996,00	392.336.352,00		0,00	0,00%	224,10	88.275.679,00	22,50%
4.2.3.5	806	Cunetas concreto 21 Mpa e=0,10 m. Ancho 0,91mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	90,00	1.477.118,00	132.940.620,00	0,00	0,00	0,00%	90,00	132.940.620,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.6	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m	1.162,00	47.513,00	55.210.106,00	0,00	0,00	0,00%	1.162,00	55.210.106,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.7	809	Bordillo en concreto 21 MPa sección trapezoide 40x30x20, incluye refuerzo	m	900,00	233.544,00	210.189.600,00	0,00	0,00	0,00%	900,00	210.189.600,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	3.600,00	11.447,00	41.209.200,00	0,00	0,00	0,00%	3.600,00	41.209.200,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.9	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	1.872,00	9.194,00	17.211.168,00	0,00	0,00	0,00%	1.872,00	17.211.168,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.10	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	9.360,00	2.381,00	22.286.160,00	0,00	0,00	0,00%	9.360,00	22.286.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3.11	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.872,00	8.643,00	16.179.696,00	0,00			1.872,00	16.179.696,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS					0,00									0,00	0,00%
4.2.3.12		Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m		32.744,00		415,00	13.588.760,00		540,00	17.681.760,00		0,00	0,00%	415,00	13.588.760,00	76,85%
4.2.3.13		Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3		19.220,00		186,80	3.590.296,00		400,00	3.363.500,00		0,00	0,00%	186,80	3.590.296,00	0,00%
4.2.3.14		Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2		9.165,00		1.245,00	11.410.425,00		1.728,00	15.837.120,00		0,00	0,00%	1.245,00	11.410.425,00	0,00%
4.2.3.15		Demolicion manual en roca	m3		326.510,00		37,40	12.211.474,00		117,00	38.201.670,00	74,20	24.227.042,00	0,00%	111,60	36.438.516,00	0,00%
4.2.4		**BOXCULVERT**				**651.826.620,00**	0,00	**89.231.175,00**	**13,69%**		**651.826.620,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**89.231.175,00**	**13,69%**
4.2.4.1	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	19,81	238.519,00	4.725.205,00	17,90	4.269.490,00	90,36%	19,81	4.725.205,00		0,00	0,00%	17,90	4.269.490,00	90,36%
4.2.4.2	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	356,42	1.915,00	682.548,00	0,00	0,00	0,00%	356,42	682.548,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	416,61	19.220,00	8.007.198,00	127,00	2.440.940,00	30,48%	416,61	8.007.198,00		0,00	0,00%	127,00	2.440.940,00	30,48%
4.2.4.4	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	15,17	1.265.396,00	19.196.057,00	2,40	3.036.950,00	15,82%	15,17	19.196.057,00		0,00	0,00%	2,40	3.036.950,00	15,82%
4.2.4.5	767	Concreto 28 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	41,91	1.654.832,00	69.355.250,00	12,80	21.181.850,00	30,54%	41,91	69.355.250,00		0,00	0,00%	12,80	21.181.850,00	30,54%
4.2.4.6	1012	Concreto 28 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	43,31	1.712.800,00	74.185.479,00	9,70	16.614.160,00	22,40%	43,31	74.185.479,00		0,00	0,00%	9,70	16.614.160,00	22,40%
4.2.4.7	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	32,48	1.849.526,00	60.077.691,00	5,60	10.357.346,00	17,24%	32,48	60.077.691,00		0,00	0,00%	5,60	10.357.346,00	17,24%
4.2.4.8	1218	Concreto 21 MPa para placa de acceso	m3	90,52	1.482.869,00	134.235.233,00	0,00	0,00	0,00%	90,52	134.235.233,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.9	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	200,80	36.592,00	7.347.674,00	0,00	0,00	0,00%	200,80	7.347.674,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.10	841	Gradas disipadoras en concreto de 21MPa, incluye acero	m3	3,59	2.251.728,00	8.072.445,00	0,00	0,00	0,00%	3,59	8.072.445,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.11	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	19.869,01	11.447,00	227.440.597,00	2.737,00	31.330.439,00	13,78%	19.869,01	227.440.597,00		0,00	0,00%	2.737,00	31.330.439,00	13,78%
4.2.4.12	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	51,48	590.592,80	30.403.717,00	0,00	0,00	0,00%	51,48	30.403.717,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.13	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	194,70	13.851,80	2.696.945,00	0,00	0,00	0,00%	194,70	2.696.945,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.14	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	19,81	9.194,00	182.139,00	0,00	0,00	0,00%	19,81	182.139,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.15	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	561,40	2.381,00	1.336.695,00	0,00	0,00	0,00%	561,40	1.336.695,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.4.16	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	449,12	8.643,00	3.881.747,00	0,00	0,00	0,00%	449,12	3.881.747,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5		**MUROS Y OBRAS DE ACOMPAÑAMIENTO PUENTE**				**573.100.830,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
4.2.5.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	213,34	19.220,00	4.100.395,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.2	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	9,76	1.265.396,00	12.350.265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.3	1032	Concreto 24.5 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	100,25	1.341.938,00	134.532.639,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.4	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	8.122,47	11.447,00	92.977.963,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.5	1020	Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloraderos	m	17,20	17.144,00	294.877,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.6	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	258,50	458.207,00	118.446.510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.7	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	340,25	9.165,00	3.118.391,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.8	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	546,27	17.925,75	9.792.335,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.9	1502	Enrocado con piedra RIP-RAP para espigones, control de socavacion	m3	573,92	333.046,00	191.141.760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.10	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	272,00	13.851,80	3.767.690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	277,34	2.381,00	660.351,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.5.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	221,87	8.643,00	1.917.654,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6		**PUENTE JULIO ABSCISA K0+800 Longitud:40m**				**3.005.474.540,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
4.2.6.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.297,47	1.915,00	2.484.655,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.2	204	Rocería y Limpieza	m2	1.387,16	2.071,00	2.872.808,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.3	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	316,34	193.409,00	61.183.003,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.4	311	Desmonte y traslado de estructuras metalicas	kg	8.000,00	1.973,00	15.784.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.5	411	Excavación para estructuras con maquina, incluye cargue	m3	2.509,20	14.291,00	35.858.977,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.6	416	Excavación manual para pilas, profundidad 0 - 4mt, bajo agua	m3	46,37	1.962.689,00	91.009.708,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.7	417	Excavación manual para pilas, profundidad 4 - 12mt, bajo agua	m3	52,04	2.443.730,56	127.180.594,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.8	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	14,58	1.972.830,24	28.757.927,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.9	737	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 12mt	m3	15,83	2.444.680,47	38.708.159,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.10	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	94,72	1.368.572,54	129.629.848,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.11	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	12,39	1.265.396,00	15.683.318,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.12	748	Concreto 24.5 MPa para zapatas, vigas y estribos	m3	145,66	1.697.371,00	247.239.017,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.13	1627	Concreto 28 Mpa para topes sismicos y bloques de apoyo.	m3	4,28	1.962.838,00	8.404.676,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.14	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	100,94	1.849.526,00	186.694.853,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.15	1025	Concreto 35 MPa para losa y vigas VP	m3	176,45	1.971.944,00	347.949.519,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.16	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	17,35	1.578.724,00	27.394.019,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.17	1207	Concreto 21 Mpa para anden + vigas + tabiques, incluye refuerzo	m2	80,00	620.328,00	49.626.240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.18	1218	Concreto 21 MPa para placa de acceso	m3	24,06	1.482.869,00	35.681.535,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.19	1706	Acero de pre-esfuerzo, postensado	Ton/m	179.502,92	3.408,00	611.745.951,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.20	904	Drenaje de tablero 4" L=1,50m, con rejilla	UN	22,00	103.334,50	2.273.359,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
4.2.6.21	1238	Estructura baranda Peatonal en tubo metalico, h=1,2 fy322psi, Seis lineas de tubos + paral (para Puentes)	m	80,00	606.927,00	48.554.160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.22	1234	Estructura baranda metalica Ø2" para peaton, h=1,2 fy322 psi, de un solo tubo, incrustado New jersey	m	80,00	236.708,00	18.936.640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.23	1638	Apoyo en neopreno D-60 reforzado con platina A36 3mm (400x600x113mm)	un	8,00	2.118.321,00	16.946.568,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.24	1637	Apoyo en neopreno D-60 (200x200x20mm)	un	4,00	165.224,00	660.896,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.25	1625	Junta elastomerica para puentes D-60 pernada c/u 30cm. E=4,5cm elongacio rotura >300%, pernos de 15cm Ø7/8"	m	23,00	978.275,20	22.500.330,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.26	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	67.171,01	11.447,00	768.906.575,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.27	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	247,66	17.925,75	4.439.491,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.28	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	444,28	9.194,00	4.084.688,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.29	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	3.458,58	2.381,00	8.234.873,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.30	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.766,86	8.643,00	23.913.989,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.31	224	Prueba de carga estática, para puentes	un	1,00	9.322.945,80	9.322.946,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.32	225	Pre-Prueba de carga estática, para puentes	un	1,00	8.752.235,80	8.752.236,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.6.33	227	Prueba de carga para vigas pos-tensadas	un	1,00	4.058.982,20	4.058.982,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3		**OBRAS DE AMPLIACION DE BANCA**				**3.742.649.659,00**		**0,00**	**0,00%**		**3.742.649.660,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00%**
4.3.1		**SUPERESTRUCTURA EN VOLADIZO**				**3.018.754.288,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**3.018.754.289,00**			**0,00**	0,00		**0,00**	**0,00%**
4.3.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	2.159,06	1.915,00	4.134.600,00	0,00	0,00	0,00%	2.159,06	4.134.600,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	1.354,00	2.071,00	2.804.134,00	0,00	0,00	0,00%	1.354,00	2.804.134,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.3	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	6,83	193.409,00	1.320.171,00	0,00	0,00	0,00%	6,83	1.320.171,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.4	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	452,70	3.944,00	1.785.449,00	0,00	0,00	0,00%	452,70	1.785.449,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	65,95	71.464,00	4.712.908,00	0,00	0,00	0,00%	65,95	4.712.908,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.6	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	607,78	19.220,00	11.681.532,00	0,00	0,00	0,00%	607,78	11.681.532,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.7	403	Excavación manual material sin clasificar para pilas pre-excavadas, prof. De 0 - 4mt	m3	190,85	96.858,84	18.485.679,00	0,00	0,00	0,00%	190,85	18.485.679,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.8	405	Excavación manual en roca o coluvión para pilas, prof. 4 - 12mt, sin dinamita	m3	143,14	2.215.149,90	317.073.932,00	0,00	0,00	0,00%	143,14	317.073.932,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.9	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	28,14	1.265.396,00	35.603.182,00	0,00	0,00	0,00%	28,14	35.603.182,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.10	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	35,70	2.216.826,00	79.140.688,00	0,00	0,00	0,00%	35,70	79.140.688,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.11	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	8,97	1.657.370,00	14.869.196,00	0,00	0,00	0,00%	8,97	14.869.196,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.12	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	47,50	1.972.830,24	93.711.174,00	0,00	0,00	0,00%	47,50	93.711.175,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.13	737	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt	m3	35,63	2.444.680,47	87.093.357,00	0,00	0,00	0,00%	35,63	87.093.357,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.14	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	250,86	1.368.572,54	343.325.619,00	0,00	0,00	0,00%	250,86	343.325.619,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.15	1016	Viga cabezal en concreto 28 Mpa	m3	259,20	1.654.742,00	428.909.126,00	0,00	0,00	0,00%	259,20	428.909.126,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.16	748	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y estribos	m3	5,04	1.697.371,00	8.554.750,00	0,00	0,00	0,00%	5,04	8.554.750,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.17	1032	Concreto 24.5 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	5,25	1.341.938,00	7.045.175,00	0,00	0,00	0,00%	5,25	7.045.175,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.18	1222	Viga acartelada en concreto 28Mpa	m3	23,80	1.727.784,26	41.121.265,00	0,00	0,00	0,00%	23,80	41.121.265,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.19	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	51,00	1.849.526,00	94.325.826,00	0,00	0,00	0,00%	51,00	94.325.826,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.20	1015	Concreto 28Mpa Columnas, Viga corona y Vástago	m3	37,80	1.654.832,00	62.552.650,00	0,00	0,00	0,00%	37,80	62.552.650,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.21	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	22,75	1.578.724,00	35.919.128,00	0,00	0,00	0,00%	22,75	35.919.128,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.22	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	12,22	2.369.134,00	28.950.817,00	0,00	0,00	0,00%	12,22	28.950.817,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.23	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	0,18	234.428,00	41.353,00	0,00	0,00	0,00%	0,18	41.353,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.24	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	83.745,76	11.447,00	958.637.757,00	0,00	0,00	0,00%	83.745,76	958.637.757,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.25	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	10,00	49.324,00	493.240,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	493.240,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.26	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	143,60	369.143,00	53.008.935,00	0,00	0,00	0,00%	143,60	53.008.935,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.27	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	0,18	787.275,00	143.284,00	0,00	0,00	0,00%	0,18	143.284,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.28	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	112,52	590.592,80	66.452.321,00	0,00	0,00	0,00%	112,52	66.452.321,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.29	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	18,90	393.912,00	7.444.937,00	0,00	0,00	0,00%	18,90	7.444.937,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.30	1226	Manto Geotextil no tejido 2500, 712kn	m2	205,20	9.165,00	1.880.658,00	0,00	0,00	0,00%	205,20	1.880.658,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.31	901	Geodren con tubo 4" tipo ADS H=1,50 mt	m	108,00	111.380,00	12.029.040,00	0,00	0,00	0,00%	108,00	12.029.040,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.32	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	96,00	248.765,10	23.881.450,00	0,00	0,00	0,00%	96,00	23.881.450,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.33	1305	Empradizado con pasto vetiver, instalado y funcionando	m2	178,18	33.198,00	5.915.220,00	0,00	0,00	0,00%	178,18	5.915.220,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.34	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2	20,47	90.372,00	1.849.915,00	0,00	0,00	0,00%	20,47	1.849.915,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.35	1403	Cartucho cortaflujo en varas de madera envuelta con agromanto Ø15cm	m	79,84	16.660,50	1.330.174,00	0,00	0,00	0,00%	79,84	1.330.174,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.36	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	290,00	451.972,50	131.072.025,00	0,00	0,00	0,00%	290,00	131.072.025,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.37	903	Estructura de descole para recibo del sub dren, en concreto reforzado, según planos	UN	9,00	727.215,80	6.544.942,00	0,00	0,00	0,00%	9,00	6.544.942,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.38	1401	Arborización con especies nativas	Un	150,00	50.192,30	7.528.845,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	7.528.845,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.39	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	510,01	9.194,00	4.689.040,00	0,00	0,00	0,00%	510,01	4.689.040,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.40	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.151,20	2.381,00	2.741.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.151,20	2.741.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.1.41	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.151,20	8.643,00	9.949.794,00	0,00	0,00	0,00%	1.151,20	9.949.794,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2		**OBRAS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES**				**723.895.371,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**723.895.371,00**			**0,00**	0,00		**0,00**	**0,00%**
4.3.2.1	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	574,00	3.944,00	2.263.856,00	0,00	0,00	0,00%	574,00	2.263.856,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.2	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	638,00	1.915,00	1.221.770,00	0,00	0,00	0,00%	638,00	1.221.770,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.3	204	Rocería y Limpieza	m2	1.487,18	2.071,00	3.079.950,00	0,00	0,00	0,00%	1.487,18	3.079.950,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
4.3.2.4	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	1.907,92	19.220,00	36.670.299,00	0,00	0,00	0,00%	1.907,92	36.670.299,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.5	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	376,53	71.464,00	26.908.483,00	0,00	0,00	0,00%	376,53	26.908.483,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.6	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	8,58	1.265.396,00	10.859.628,00	0,00	0,00	0,00%	8,58	10.859.628,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.7	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	20,00	2.216.826,00	44.336.520,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	44.336.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.8	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	26,71	1.657.370,00	44.260.364,00	0,00	0,00	0,00%	26,71	44.260.364,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.9	832	Gradas disipadoras en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	9,78	2.369.134,00	23.160.654,00	0,00	0,00	0,00%	9,78	23.160.654,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.10	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en gradas (20X20)cm + refuerzo de 3/8"	m	0,28	234.428,00	64.983,00	0,00	0,00	0,00%	0,28	64.983,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.11	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	3.620,51	11.447,00	41.443.991,00	0,00	0,00	0,00%	3.620,51	41.443.991,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.12	830	Gradas disipadoras sección 1,20x0,60 con sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	15,50	368.783,80	5.716.149,00	0,00	0,00	0,00%	15,50	5.716.149,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.13	831	Gradas disipadoras sección 0,60x0,60 con sacos (0,60x0,50) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	10,00	316.493,80	3.164.938,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	3.164.938,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.14	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	256,00	458.207,00	117.300.992,00	0,00	0,00	0,00%	256,00	117.300.992,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.15	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	10,59	49.324,00	522.095,00	0,00	0,00	0,00%	10,59	522.095,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.16	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	8,70	369.143,00	3.211.544,00	0,00	0,00	0,00%	8,70	3.211.544,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.17	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	27,00	405.590,00	10.950.930,00	0,00	0,00	0,00%	27,00	10.950.930,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.18	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	873,40	13.851,80	12.098.162,00	0,00	0,00	0,00%	873,40	12.098.162,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.19	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	9,30	3.032.345,00	28.200.809,00	0,00	0,00	0,00%	9,30	28.200.809,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.20	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	0,90	787.275,00	710.122,00	0,00	0,00	0,00%	0,90	710.122,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.21	1403	Cartucho cortaflujo en varas de madera envuelta con agromanto Ø15cm	m	369,00	16.660,50	6.147.725,00	0,00	0,00	0,00%	369,00	6.147.725,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.22	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	14,40	590.592,80	8.504.536,00	0,00	0,00	0,00%	14,40	8.504.536,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.23	1017	Gaviones en saco de L=3mt Ø0,65mt malla (10X12) cal. 3mm triple torsión	m3	10,95	412.954,00	4.522.017,00	0,00	0,00	0,00%	10,95	4.522.017,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.24	1302	Revestimiento de talud con geomanta tridimensional e=1cm	m2	22,50	46.003,70	1.035.083,00	0,00	0,00	0,00%	22,50	1.035.083,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.25	810	Trincho-cuneta en sacos rellenos de suelo/arena/cemento 3:1:1, mas geotextil, mas madera	m	236,50	248.765,10	58.832.946,00	0,00	0,00	0,00%	236,50	58.832.946,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.26	1305	Empradizado con pasto vetiver, instalado y funcionando	m2	155,00	33.198,00	5.145.690,00	0,00	0,00	0,00%	155,00	5.145.690,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.27	1404	Cubrir talud con geomanto permanente de polypropileno y fajina, con hidrosiembra	m2	30,80	90.372,00	2.783.458,00	0,00	0,00	0,00%	30,80	2.783.458,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.28	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	345,00	451.972,50	155.930.513,00	0,00	0,00	0,00%	345,00	155.930.513,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.29	903	Estructura de descole para recibo del sub dren, en concreto reforzado, según planos	UN	34,00	727.215,80	24.725.337,00	0,00	0,00	0,00%	34,00	24.725.337,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.30	1401	Arborización con especies nativas	Un	230,00	50.192,30	11.544.229,00	0,00	0,00	0,00%	230,00	11.544.229,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.31	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	419,51	9.194,00	3.856.944,00	0,00	0,00	0,00%	419,51	3.856.944,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.32	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.546,24	2.381,00	6.062.588,00	0,00	0,00	0,00%	2.546,24	6.062.588,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.3.2.33	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.158,75	8.643,00	18.658.066,00	0,00	0,00	0,00%	2.158,75	18.658.066,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.4		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**301.297.067,00**		**0,00**	**0,00%**		**301.297.067,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
4.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	9.278,45	19.220,00	178.331.809,00	0,00	0,00	0,00%	9.278,45	178.331.809,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.4.2	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	291,20	49.324,00	14.363.149,00	0,00	0,00	0,00%	291,20	14.363.149,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.4.3	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	11.683,43	2.381,00	27.818.235,00	0,00	0,00	0,00%	11.683,43	27.818.235,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.4.4	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	9.346,74	8.643,00	80.783.874,00	0,00			9.346,74	80.783.874,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5		**PAVIMENTOS**				**2.499.920.159,00**		**0,00**	**0,00%**		**2.499.920.159,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
4.5.1	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	6.750,00	12.873,90	86.898.825,00	0,00	0,00	0,00%	6.750,00	86.898.825,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.2	507	Relleno con material de afirmado, extendida y compactada, incluye transporte	m3	305,55	402.570,00	123.005.264,00	0,00	0,00	0,00%	305,55	123.005.264,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.3	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2.025,00	405.590,00	821.319.750,00	0,00	0,00	0,00%	2.025,00	821.319.750,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.4	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	1.260,00	422.873,00	532.819.980,00	0,00	0,00	0,00%	1.260,00	532.819.980,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.5	1205	Riego de Imprimacion	m2	6.300,00	12.667,00	79.802.100,00	0,00	0,00	0,00%	6.300,00	79.802.100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	630,00	1.358.848,00	856.074.240,00	0,00	0,00	0,00%	630,00	856.074.240,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6		**SEÑALIZACION VIAL**				**170.660.969,00**		**0,00**	**0,00%**		**170.660.971,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
4.6.1	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	0,59	71.464,00	41.806,00	0,00	0,00	0,00%	0,59	41.806,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.2	1101	Señal vial vertical, Suministro e instalación	Un	8,00	525.144,60	4.201.157,00	0,00	0,00	0,00%	8,00	4.201.157,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.3	1102	Demarcación Horizontal	km	2,00	3.089.213,75	6.178.428,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	6.178.428,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.4	1103	Tachas reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un	690,00	13.140,04	9.066.628,00	0,00	0,00	0,00%	690,00	9.066.630,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.5	1104	Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un	5,00	389.230,40	1.946.152,00	0,00			5,00	1.946.152,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.6.6	1105	Defensa metalica acanalada a dos crestas	m	246,00	606.613,00	149.226.798,00	0,00			246,00	149.226.798,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL**				**139.068.540,00**		**0,00**	**0,00%**		**139.068.540,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
4.7.1	1411	Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tocon.	un	160,00	205.997,00	32.959.520,00	0,00	0,00	0,00%	160,00	32.959.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7.2	1401	Arborización con especies nativas	Un	800,00	50.192,30	40.153.840,00	0,00	0,00	0,00%	800,00	40.153.840,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7.3	829	Cunetas en sacos de 60x50 rellenos de suelo cemento 3:1:1	m	300,00	125.577,00	37.673.100,00	0,00	0,00	0,00%	300,00	37.673.100,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7.4	1412	Revegetalización con pasto Brachiaria Decumbens	m2	600,00	30.764,80	18.458.880,00	0,00	0,00	0,00%	600,00	18.458.880,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4.7.5	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m	300,00	32.744,00	9.823.200,00	0,00			300,00	9.823.200,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5		**CUCUTILLA - ARBOLEDAS, ABSCISAS K2+000 - K3+300**				**12.548.021.119,00**		**0,00**	**0,00%**		**9.914.314.854,00**		**95.044.275,00**	**0,96%**		**95.044.275,00**	**0,96%**
5.1		**PRELIMINARES**				**48.884.724,00**		**0,00**	**0,00%**		**46.000.081,00**		**3.516.972,00**	**7,65%**		**3.516.972,00**	**7,65%**
5.1.1	203	Nivelación, replanteo y control topográfico	m2	8.000,00	3.944,00	31.552.000,00	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	31.552.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.1.2	204	Rocería y Limpieza	m2	4.000,00	2.071,00	8.284.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.607,13	5.399.357,00	1.698,20	3.516.972,00	42,45%	1.698,20	3.516.972,00	65,14%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
5.1.3	226	Retiro, traslado y reubicación de poste de paso y baja tensión	un	4,00	2.262.181,00	9.048.724,00	0,00	0,00	0,00%	4,00	9.048.724,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2		**OBRAS DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**				**4.549.372.142,00**		**0,00**	**0,00%**		**3.082.184.763,00**		**91.527.303,00**	**2,97%**		**91.527.303,00**	**2,97%**
5.2.1		**ALCANTARILLAS**				**793.335.909,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**	0,00	**793.335.909,00**		**91.527.303,00**	**11,54%**	0,00	**91.527.303,00**	**11,54%**
5.2.1.1	304	Demolición de alcantarillas existentes, no incluye excavación.	m	40,00	101.591,00	4.063.640,00	0,00	0,00	0,00%	40,00	4.063.640,00	10,10	1.026.069,00	25,25%	10,10	1.026.069,00	25,25%
5.2.1.2	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	63,09	193.409,00	12.202.909,00	0,00	0,00	0,00%	63,09	12.202.909,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.3	301	Demoliciones en concreto reforzado	m3	23,86	238.519,00	5.690.485,00	0,00	0,00	0,00%	23,86	5.690.485,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.4	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	184,00	1.915,00	352.360,00	0,00	0,00	0,00%	184,00	352.360,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.5	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	184,00	19.220,00	3.536.480,00	0,00	0,00	0,00%	296,00	3.536.480,00	295,10	5.671.822,00	160,38%	295,10	5.671.822,00	160,38%
5.2.1.6	801	Tubería de PVC Ø36" incluye colchón de arena o atraque + afirmado	m	40,00	2.216.826,00	88.673.040,00	0,00	0,00	0,00%	296,00	88.673.040,00	23,10	51.208.681,00	57,75%	23,10	51.208.681,00	57,75%
5.2.1.7	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	4,60	1.265.396,00	5.820.822,00	0,00	0,00	0,00%	4,60	5.820.822,00	1,10	1.391.936,00	23,91%	1,10	1.391.936,00	23,91%
5.2.1.8	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (para alcantarillas y omas)	m3	150,00	1.657.370,00	248.605.500,00	0,00	0,00	0,00%	150,00	248.605.500,00	11,80	19.556.966,00	7,87%	11,80	19.556.966,00	7,87%
5.2.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	9.500,00	11.447,00	108.746.500,00	0,00	0,00	0,00%	9.500,00	108.746.500,00	1.107,00	12.671.829,00	11,65%	1.107,00	12.671.829,00	11,65%
5.2.1.10	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	6,06	49.324,00	299.002,00	0,00	0,00	0,00%	6,06	299.002,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.11	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	62,24	405.590,00	25.245.544,00	0,00	0,00	0,00%	62,24	25.245.544,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.12	805	Descole en gaviones (Incluye excavación y relleno)	m	61,00	3.032.345,00	184.973.045,00	0,00	0,00	0,00%	61,00	184.973.045,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.13	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	105,00	328.443,00	34.486.515,00	0,00	0,00	0,00%	105,00	34.486.515,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.14	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	12,00	436.752,00	5.241.024,00	0,00	0,00	0,00%	12,00	5.241.024,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.15	837	Canal rampa en concreto de 24,5MPa sección 1,00x0,60 +pantalla deflectoras incluye acero	m3	41,00	851.226,00	34.900.266,00	0,00	0,00	0,00%	41,00	34.900.266,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.16	827	Dentellones en concreto 21MPa disipadores de energía en gradas + refuerzo de 1/2"	m	16,40	234.428,00	3.844.619,00	0,00	0,00	0,00%	16,40	3.844.619,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.17	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	86,95	9.194,00	799.431,00	0,00	0,00	0,00%	86,95	799.431,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.18	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	2.765,28	2.381,00	6.584.142,00	0,00	0,00	0,00%	2.765,28	6.584.142,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.1.19	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.229,62	8.643,00	19.270.585,00	0,00	0,00	0,00%	2.229,62	19.270.585,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2		**CUNETA, GEODREN Y BORDILLO**				**1.245.300.078,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**1.245.300.078,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
5.2.2.1	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	1.600,00	71.464,00	114.342.400,00	0,00	0,00	0,00%	1.600,00	114.342.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.2	1231	Suministro y colocacion de geotextil NT 4000	m2	5.000,00	23.615,00	118.075.000,00	0,00	0,00	0,00%	5.000,00	118.075.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.3	901	Geodren con tubo 4" tipo ADS H=1,50 mt	m	1.000,00	111.380,00	111.380.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	111.380.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.4	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	1.000,00	393.912,00	393.912.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	393.912.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.5	807	Cunetas concreto 21 MPa e=0,10 m. Ancho 1,06mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	106,00	1.513.858,00	160.468.948,00	0,00	0,00	0,00%	106,00	160.468.948,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.6	809	Bordillo en concreto 21 MPa sección trapezoide 40x30x20, incluye refuerzo	m	1.000,00	233.544,00	233.544.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	233.544.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.7	826	Sello elástico para juntas con poliuretano autonivelante	m	355,00	16.694,00	5.926.370,00	0,00	0,00	0,00%	355,00	5.926.370,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	4.000,00	11.447,00	45.788.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	45.788.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.9	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	2.080,00	9.194,00	19.123.520,00	0,00	0,00	0,00%	2.080,00	19.123.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.10	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	10.400,00	2.381,00	24.762.400,00	0,00	0,00	0,00%	10.400,00	24.762.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.11	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	2.080,00	8.643,00	17.977.440,00	0,00	0,00	0,00%	2.080,00	17.977.440,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3		**BOXCULVERT**				**1.043.548.776,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**1.043.548.776,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
5.2.3.1	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	125,84	193.409,00	24.337.912,00	0,00	0,00	0,00%	125,84	24.337.912,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.2	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	964,87	19.220,00	18.544.859,00	0,00	0,00	0,00%	964,87	18.544.859,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.3	742	Concreto ciclópeo para piso y solados	m3	10,90	1.284.576,00	13.995.456,00	0,00	0,00	0,00%	10,90	13.995.456,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.4	1007	Concreto 28 MPa para muros, estribos, parapetos, losetas, zapatas (Para alcantarillas y omas)	m3	296,21	1.657.370,00	490.926.584,00	0,00	0,00	0,00%	296,21	490.926.584,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.5	741	Cinta flexible pvc e=15cm, para sello de juntas	m	91,20	36.592,00	3.337.190,00	0,00	0,00	0,00%	91,20	3.337.190,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.6	1218	Concreto 21 MPa para placa de acceso	m3	36,39	1.482.869,00	53.962.374,00	0,00	0,00	0,00%	36,39	53.962.374,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.7	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	11,18	1.578.724,00	17.645.714,00	0,00	0,00	0,00%	11,18	17.645.714,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.8	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	26.872,25	11.447,00	307.606.651,00	0,00	0,00	0,00%	26.872,25	307.606.651,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.9	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	115,50	49.324,00	5.696.922,00	0,00	0,00	0,00%	115,50	5.696.922,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.10	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	193,70	400.096,00	77.496.595,00	0,00	0,00	0,00%	193,70	77.496.595,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.11	1212	Estructura baranda peatonal en tubo metalico, h=1,2 fy322psi, Seis lineas de tubos + paral	m	17,20	681.595,00	11.723.434,00	0,00	0,00	0,00%	17,20	11.723.434,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.12	1234	Estructura baranda metalica Ø2" para peaton, h=1,2 fy322 psi, de un solo tubo, incrustado New jersey	m	17,20	236.708,00	4.071.378,00	0,00	0,00	0,00%	17,20	4.071.378,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.13	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	125,84	9.194,00	1.156.941,00	0,00	0,00	0,00%	125,84	1.156.941,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.3.14	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.380,17	2.381,00	3.286.188,00	0,00	0,00	0,00%	1.380,17	3.286.188,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
5.2.3.15	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.129,30	8.643,00	9.760.578,00	0,00	0,00	0,00%	1.129,30	9.760.578,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4		**PUENTE K3+225**				**1.467.187.379,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**0,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
5.2.4.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	410,52	1.915,00	786.146,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.2	302	Demoliciones en concreto ciclópeo	m3	126,00	193.409,00	24.369.534,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.3	411	Excavación para estructuras con maquina, incluve cargue	m3	962,32	14.291,00	13.752.479,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.4	416	Excavación manual para pilas, profundidad 0 - 4mt, bajo agua	m3	61,07	1.962.689,00	119.866.444,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.5	417	Excavación manual para pilas, profundidad 4 - 12mt, bajo agua	m3	91,61	2.443.730,56	223.867.326,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.6	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	12,06	2.142.545,00	25.847.054,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.7	737	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad de 4 - 12mt	m3	18,10	2.576.181,00	46.617.473,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.8	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	28,27	1.591.386,00	44.995.379,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.9	219	Solado en concreto 17,5 MPa	m3	3,74	1.265.396,00	4.737.643,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.10	748	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y estribos	m3	89,97	1.697.371,00	152.717.561,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.11	1011	Concreto 24,5 MPa para muros, estribos, losetas y parapetos, Incluye bomba de concreto	m3	16,02	1.784.716,00	28.584.011,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.12	1627	Concreto 28 Mpa para topes sismicos y bloques de apoyo.	m3	1,02	1.962.838,00	1.992.281,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.13	1201	Concreto 28 Mpa para vigas y losa	m3	61,19	1.849.526,00	113.174.345,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.14	1235	Concreto 28MPa para barrera tipo New Jersey + Acero	m3	5,20	3.655.703,00	19.009.656,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.15	1207	Concreto 21 Mpa para anden + vigas + tabiques, incluye refuerzo	m2	3,83	620.328,00	2.374.740,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.16	1218	Concreto 21 MPa para placa de acceso	m3	25,82	1.482.869,00	38.293.965,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.17	1238	Estructura baranda Peatonal en tubo metalico, h=1,2 fy322psi, Seis lineas de tubos + paral (para Puentes)	m	26,00	733.613,00	19.073.938,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.18	1234	Estructura baranda metalica Ø2" para peaton, h=1,2 fy322 psi, de un solo tubo, incrustado New jersey	m	26,00	236.708,00	6.154.408,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.19	1630	Apoyo en neopreno D-60 reforzado con platina A36 1,5mm (150x150x67,5mm)	Un	10,00	325.409,40	3.254.094,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.20	1631	Apoyo en neopreno D-60 reforzado con platina A36 1,5mm (250x250x67,5mm)	Un	4,00	841.577,40	3.366.310,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.21	1625	Junta elastomerica para puentes D-60 pernada c/u 30cm. E=4,5cm elongacio rotura >300%, pernos de 15cm Ø7/8"	m	23,40	989.820,80	23.161.807,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.22	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	39.381,91	11.447,00	450.804.678,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.23	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina (rana)	m3	141,35	17.925,75	2.533.804,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.24	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	552,50	13.851,80	7.653.120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.25	740	Colchoneta enrocada para control a la socavacion en orillas y lechos de rios, e=30cm	m3	165,75	446.825,00	74.061.244,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.26	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	324,49	9.194,00	2.983.323,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.27	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.391,74	2.381,00	3.313.741,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.2.4.28	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	1.138,59	8.643,00	9.840.875,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3		**OBRAS DE AMPLIACION DE BANCA**				**3.809.293.963,00**		**0,00**	**0,00%**		**2.645.659.720,00**		**0,00**	**0,00%**			**0,00**	**0,00%**
5.3.1		**MUROS EN GAVIONES**				**484.624.690,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**	0,00	**484.624.687,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
5.3.1.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	484,00	1.915,00	926.860,00	0,00	0,00	0,00%	484,00	926.860,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.2	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	352,20	71.464,00	25.169.621,00	0,00	0,00	0,00%	352,20	25.169.618,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.3	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	35,20	17.925,75	630.986,00	0,00	0,00	0,00%	35,20	630.986,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.4	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	64,10	422.873,00	27.106.159,00	0,00	0,00	0,00%	64,10	27.106.159,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.5	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	760,50	13.851,80	10.534.294,00	0,00	0,00	0,00%	760,50	10.534.294,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.6	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	452,50	436.752,00	197.630.280,00	0,00	0,00	0,00%	452,50	197.630.280,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.7	907	Tubería drenaje con tubo pvc Ø6" h=3,0 mt	m	163,35	143.316,00	23.410.669,00	0,00	0,00	0,00%	163,35	23.410.669,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.8	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	61,11	1.578.724,00	96.467.930,00	0,00	0,00	0,00%	61,11	96.467.930,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	8.361,54	11.447,00	95.714.523,00	0,00	0,00	0,00%	8.361,54	95.714.523,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.10	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	380,40	9.194,00	3.497.398,00	0,00	0,00	0,00%	380,40	3.497.398,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.11	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	380,40	2.381,00	905.732,00	0,00	0,00	0,00%	380,40	905.732,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.1.12	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	304,32	8.643,00	2.630.238,00	0,00	0,00	0,00%	304,32	2.630.238,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2		**MUROS EN CONCRETO REFORZADO**				**2.556.670.090,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**1.661.835.562,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**

Faro del Catatumbo
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 | **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACIÓN N°07 05-noviembre-2025		ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
5.3.2.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.267,00	1.915,00	2.426.305,00	0,00	0,00	0,00%	823,55	1.577.098,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.2	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	2.452,50	19.220,00	47.137.050,00	0,00	0,00	0,00%	1.594,13	30.639.084,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.3	1307	Concreto 21MPa lanzado sobre taludes, e=10cm húmedo	m3	118,87	2.252.438,00	267.747.305,00	0,00	0,00	0,00%	77,27	174.035.748,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.4	504	Rellenos para estructuras, con subbase granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	84,16	400.096,00	33.672.079,00	0,00	0,00	0,00%	54,70	21.886.853,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.5	1004	Muro pantalla en concreto 24,5MPa	m3	461,84	1.807.706,00	834.870.939,00	0,00	0,00	0,00%	300,20	542.666.110,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.6	729	Concreto 24,5 MPa para zapatas, vigas y dentellones	m3	299,47	1.713.263,00	513.070.871,00	0,00	0,00	0,00%	194,66	333.496.066,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.7	1230	Junta de dilatacion con cordon de espuma elastico Ø3/8" + sellador	m	191,43	187.051,34	35.807.862,00	0,00	0,00	0,00%	124,43	23.275.110,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.8	1202	Concreto 28MPa para barrera, tipo New Jersey	m3	84,80	1.578.724,00	133.875.795,00	0,00	0,00	0,00%	55,12	87.019.267,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.9	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	43.149,34	11.447,00	493.930.495,00	0,00	0,00	0,00%	28.047,07	321.054.822,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.10	1020	Tubo PVC Ø2´´ sanitario, para paso de lloraderos	m	231,00	21.977,30	5.076.756,00	0,00	0,00	0,00%	150,15	3.299.893,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.11	908	Tubería perforada PVC Ø4" corrugada para filtro horizontal, instalado	m	424,00	32.744,00	13.883.456,00	0,00	0,00	0,00%	275,60	9.024.246,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.12	1239	Manto Geotextil no tejido 3000	m2	3.366,40	13.851,80	46.630.700,00	0,00	0,00	0,00%	2.188,16	30.309.955,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.13	502	Relleno con material filtrante extendida, humedecida y compactada	m3	226,96	393.912,00	89.402.268,00	0,00	0,00	0,00%	147,52	58.111.474,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.14	503	Relleno con material seleccionada de excavacion, extendida, humedecida y compactada a maquina	m3	1.626,60	17.925,75	29.158.017,00	0,00	0,00	0,00%	1.057,29	18.952.711,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.15	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	1.073,67	2.381,00	2.556.408,00	0,00	0,00	0,00%	697,89	1.661.665,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.2.16	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	858,94	8.643,00	7.423.784,00	0,00	0,00	0,00%	558,31	4.825.460,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3		**ESTABILIDAD PUNTOS CRITICOS**				**767.999.183,00**	0,00	**0,00**	**0,00%**		**499.199.471,00**		**0,00**	**0,00%**	0,00	**0,00**	**0,00%**
5.3.3.1	201	Localización, replanteo y control topográfico	m2	1.112,00	1.915,00	2.129.480,00	0,00	0,00	0,00%	722,80	1.384.162,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.2	204	Rocería y Limpieza	m2	1.112,00	2.071,00	2.302.952,00	0,00	0,00	0,00%	722,80	1.496.919,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.3	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	4.550,90	19.220,00	87.468.298,00	0,00	0,00	0,00%	2.958,09	56.854.394,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.4	416	Excavación manual para pilas, profundidad 0 - 4mt, bajo agua	m3	30,79	1.962.689,00	60.426.500,00	0,00	0,00	0,00%	20,01	39.277.225,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.5	1403	Cartucho cortaflujo en varas de madera envuelta con agromanto Ø15cm	m	508,00	16.660,50	8.463.534,00	0,00	0,00	0,00%	330,20	5.501.297,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.6	1305	Empradizado con pasto vetiver, instalado y funcionando	m2	415,00	33.198,00	13.777.170,00	0,00	0,00	0,00%	269,75	8.955.160,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.7	902	Sub drenes horizontales en tubería pvc Ø2"	m	250,00	451.972,50	112.993.125,00	0,00	0,00	0,00%	162,50	73.445.531,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.8	903	Estructura de descole para recibo del sub dren, en concreto reforzado, según planos	UN	25,00	727.215,80	18.180.395,00	0,00	0,00	0,00%	16,25	11.817.257,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.9	806	Cunetas concreto 21 Mpa e=0,10 m. Ancho 0,91mt, incluye excavación, replanteo y conformación	m3	12,00	1.477.118,00	17.725.416,00	0,00	0,00	0,00%	7,80	11.521.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.10	833	Canal sección 1,20x0,60 en sacos (1,20x2,40) rellenos con suelo/arena/cemento 3:1:1	m	151,00	328.443,00	49.594.893,00	0,00	0,00	0,00%	98,15	32.236.680,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.11	811	Trincho en madera vertical H=1,60 D= 3-4"	m	147,00	85.732,90	12.602.736,00	0,00	0,00	0,00%	95,55	8.191.780,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.12	736	Anillo para pilas, en concreto 21MPa, hasta una profundidad max de 4mt	m3	8,17	2.142.545,00	17.500.609,00	0,00	0,00	0,00%	5,31	11.375.396,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.13	701	Concreto 21MPa para pilas pre-excavadas, a cualquier profundidad	m3	26,55	1.591.386,00	42.245.661,00	0,00	0,00	0,00%	17,26	27.459.680,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.14	1016	Viga cabezal en concreto 24,5 Mpa	m3	30,60	1.249.087,00	38.222.062,00	0,00	0,00	0,00%	19,89	24.844.340,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.15	1004	Concreto 24.5 MPa para muros, vástago y pantallas	m3	21,00	1.807.706,00	37.961.826,00	0,00	0,00	0,00%	13,65	24.675.187,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.16	1701	Acero de refuerzo 60.000psi (corte, figurado y colocación)	Kg	12.078,37	11.447,00	138.261.101,00	0,00	0,00	0,00%	7.850,94	89.869.716,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.17	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	120,00	436.752,00	52.410.240,00	0,00	0,00	0,00%	78,00	34.066.656,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.18	1801	Cargue de material sobrante de excavaciones, derrumbes y demoliciones, en volqueta	m3	40,02	9.194,00	367.980,00	0,00	0,00	0,00%	26,02	239.187,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.19	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	5.956,19	2.381,00	14.181.698,00	0,00	0,00	0,00%	3.871,53	9.218.104,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.3.3.20	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	4.764,96	8.643,00	41.183.507,00	0,00	0,00	0,00%	3.097,22	26.769.280,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**790.565.278,00**		**0,00**	**0,00%**		**790.565.278,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
5.4.1	402	Excavación y corte en tierra con maquina, incluye cargue	m3	17.408,75	19.220,00	334.596.175,00	0,00	0,00	0,00%	17.408,75	334.596.175,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4.2	501	Relleno compactado por medio mecánico (vibrocompactador) , mat. selec de excavación	m3	613,80	49.324,00	30.275.071,00	0,00	0,00	0,00%	613,80	30.275.071,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4.3	1802	Transporte en volqueta, material de excavación, derrumbes y demoliciones	m3/km	21.833,44	2.381,00	51.985.409,00	0,00	0,00	0,00%	21.833,44	51.985.409,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4.4	1003	Gaviones en malla galvanizada triple torsión, 8x12 C.12 suministro y construcción	m3	510,00	436.752,00	222.743.520,00	0,00	0,00	0,00%	510,00	222.743.520,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.4.5	505	Extendido Humedecimiento y compact de relleno en botaderos	m3	17.466,75	8.643,00	150.965.103,00	0,00	0,00	0,00%	17.466,75	150.965.103,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.5		**PAVIMENTO**				**3.139.120.500,00**		**0,00**	**0,00%**		**3.139.120.500,00**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
5.5.1	1225	Manto Geotextil no tejido 3000, para separar capas granulares	m2	14.000,00	12.873,90	180.234.600,00	0,00	0,00	0,00%	14.000,00	180.234.600,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.5.2	1210	Mejoramiento sub rasante con piedra rajon extendida, con transporte	m3	1.200,00	248.217,00	297.860.400,00	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	297.860.400,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Faro del Catatumbo
ESPERANZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 — **06-abr.-26**

CONTRATO DE OBRA No. LP-FC-38-2023 DE 8 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE PAGO: 01 DE MARZO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			MODIFICACION N°07 85-noviembre-2025			ACTA PARCIAL No. 13			EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	ID (APU)	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRACTUALES	V/R UNIT	V/R PARC	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR		CANT	V/R PARC	%	CANT	VALOR	%
5.5.3	1204	Subbase en material, extendida y compactada, incluye transporte	m3	2.250,00	405.590,00	912.577.500,00	0,00	0,00	0,00%	2.250,00	912.577.500,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.5.4	1203	Base en material granular, extendida y compactada, incluye transporte	m3	1.500,00	422.873,00	634.309.500,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	634.309.500,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.5.5	1205	Imprimacion con emulsion asfaltica MC-70	m2	7.500,00	12.667,00	95.002.500,00	0,00	0,00	0,00%	7.500,00	95.002.500,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.5.6	1206	Carpeta asfaltica en caliente MDC-19	m3	750,00	1.358.848,00	1.019.136.000,00	0,00	0,00	0,00%	750,00	1.019.136.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.6		**SEÑALIZACION VIAL**				**68.549.762,00**		**0,00**	**0,00%**		**68.549.762,00**			**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
5.6.1	401	Excavación manual en material sin clasificar	m3	3,78	71.464,00	270.134,00	0,00	0,00	0,00%	3,78	270.134,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.6.2	1101	Señal vial vertical, Suministro e instalación	Un	36,00	571.817,00	20.585.412,00	0,00	0,00	0,00%	36,00	20.585.412,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.6.3	1102	Demarcación Horizontal	km	2,00	3.387.000,00	6.774.000,00	0,00	0,00	0,00%	2,00	6.774.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.6.4	1103	Tachas reflectivas bidireccionales, suministro e instalacion	Un	1.000,00	13.473,00	13.473.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	13.473.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.6.5	1104	Delineador de curva y corona horizontal 60x75cm	Un	48,00	571.817,00	27.447.216,00	0,00	0,00	0,00%	48,00	27.447.216,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.7		**OBRAS DE MANEJO AMBIENTAL**				**142.234.750,00**		**0,00**	**0,00%**		**142.234.750,00**			**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**
5.7.1	1411	Tala de arboles de entre 5 a 10m de altura con extraccion de tocon	und	350,00	205.997,00	72.098.950,00	0,00	0,00	0,00%	350,00	72.098.950,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
5.7.2	1401	Arborización con especies nativas	Un	1.050,00	66.796,00	70.135.800,00	0,00	0,00	0,00%	1.050,00	70.135.800,00			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
					TOTAL COSTO DIRECTO	50.906.633.584,00		20.922.097.069,00	41,10%		$ 50.906.633.584,00			1.072.150.284,00	2,11%		21.994.247.353,00	43,21%
					A.I.U (30%)	15.271.990.076,00		6.276.629.121,00	41,10%		$ 15.271.990.076,00			321.645.085,00	2,11%		6.598.274.206,00	43,21%
					VALOR TOTAL DE OBRA FISICA:	66.178.623.660,00		27.198.726.190,00	41,10%		$ 66.178.623.660,00			1.393.795.369,00	2,11%		28.592.521.559,00	43,21%
		ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS EXISTENTES Y ELABORACION DE AMENAZA Y RIESGO SUSTENTANDO VARIABILIDAD CLIMATICA (0.3% CT OBRA FISICA):				198.535.871,00		0,00	0,00%		702.790.000,00				0,00%		0,00	0,00%
		VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS:				37.721.815,00		0,00	0,00%		133.513.000,00				0,00%		0,00	0,00%
		AUTORIZACION O PERMISO DE TALA O PODA DE ARBOLES AISLADOS:				46.806.526,00		52.693.458,00	66,14%		79.673.080,00				0,00%		59.292.790,00	74,42%
		EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL (PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES (0.4% CT OBRA FISICA):				203.220.417,00		49.162.258,00	24,19%		203.220.417,00				0,00%		81.623.915,00	40,17%
		IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO Y CONTROL DE TRANSITO (PMT) (0.5% CT OBRA FISICA):				330.893.118,00		0,00	0,00%		330.893.118,00				0,00%		0,00	0,00%
		VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL				384.470.388,00		14.495.800,00	3,77%		384.470.388,00				0,00%		14.495.800,00	3,77%
		ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL MEJORAMIENTO:				2.220.796.951,00		516.038.501,00	23,24%		2.220.796.951,00				0,00%		516.038.501,00	23,24%
		PAGO DE SERVIDUMBRE TEMPORAL (ZODME):				43.789.406,00		0,00	0,00%		11.024.852,00				0,00%		0,00	0,00%
		PLAN DE GESTION SOCIO PREDIAL (5% CT PREDIOS):				111.039.848,00		0,00	0,00%		111.039.848,00				0,00%		0,00	0,00%
					VALOR TOTAL PROYECTO:	69.756.000.000,00		27.831.116.207,00	39,90%		$ 70.355.955.314,00			1.393.795.369,00	1,98%		29.263.972.565,00	41,59%
					AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20,00%)	13.951.200.000,00		5.574.935.439,00	39,95%					278.759.074,00	2,00%		5.852.794.513,00	41,95%

VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO No.13 DEL 06 ABRIL DE 2026 — **$ 1.115.036.295,00**

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: MIL CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 13.951.200.000,00	100%
Valor Amortizado Presente Acta	$ 278.759.074,00	2,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 5.852.794.513,00	41,95%
Valor Saldo por Amortizar	$ 8.098.405.487,00	58,05%

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Contratista
ING. MIQUEL DAN JENSSEN DURAN PAEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIA CENTRO
MP. No 5420380648 NTS

Supervisor
ING. LUIS ALFONSO RIVERA PABON
MP. No 5420236550 NTS

Interventor (Externo)
ING. HECTOR MIGUEL DIAZ
GERENTE CONSORCIO R&Q - JOYCO
MP. No 2520213914 CND

VoBo. DIRECTOR INTERVENTORIA
YORIS MONTAÑO

Vo.Bo. Ordenador del Gasto
ING FREDY ALEXANDER FONTIVEROS

Powered by CamScanner

CERTIFICADO INTERV. (CANTIDADES)

gvÚX z" P y v39: z" vx ñ z" 979B

PRf hVSVPNPVc b

g" ." 0
Sf RQQn NZRmNb QRf Sc b hVJ Rf c g
T" "Ú" T"Ú" vÍ
RVPR SNf c QRZ PNhNhi a Oc gNg
R4Óvñ F"ñy"áv z"Íyv v Óx v MÚ "z" vÚvÚz" 5é 5y
N 5A v &8: 4D9 cáñy597B Rzá5P"Ú z" Ú"é yñ A v v "Úñzv

f "á" "Úyñv F

85 P Ú v z" ñÚ" "Ú v b 587: 9 z" 9799 Vb hRf j Rb hc f N dNf N ZN NhRb PV b QR j Ng f RTVc b NZRg Rb RZ QRdNf hNa Rb hc QR b c f hR QR gNb hNb QRf Pc b c Of Ng QR a RXc f Na VRb hc EN RZ a Nf Pc QRZ df c Tf Na N QR c Of N d OZVPN #j Ng dNf N ZN Pc b RmV b QR hRf f Vhc f Vc g3RZ Pf RPVa VRb hc gc gh Rb VOZR n ZN f RNPhVJ NPV b 957 5 95 d y" z" Zd4SP47: D4979: Pc b gc f PVc j VN PRb hf c 5

N Ú F PvÚñzvz" z" x v " "Úvzv "Ú" Ívy v dv yñvÍ z" cx v b 58: y " Úzñ Ú" vÍ " ñz z" Í78 z" Óv vÍ: 8 z" Óv z" Í979B

RÍy Ú yñ f, e XcnPc3 ñÚvy v y Ó ñÚ" "Ú z" Íy Ú v z" x v Zd4SP47: D4979: 3" Ú z" xÍñevyñÚ" y Ó Óñ 3y" ñáñyv " "Ív vÚy" á ñy "ó y vz y " Úzñ Ú" vÍ " ñz z" Í78 z" Óv vÍ: 8 z" Óv z" Í979B3 " "Úy "Ú v vy z" v Ív yvÚñzvz" "Ívyñ Úvzv "Ú" Ívy v v yñvÍ z" x v b 58: v v " "y ñ y x 3 Ív y vÍ" á " Ú " ñvzv 3 y Úyñ ñvzv v xvzv z" y Úá Óñzvz y Ú Í ÍñÚ" vÓ ñÚ " ñ Ívz "Ú Ív " "yáñyvyñÚ" yÚñyv z" Ívb j VNg ñé" Ú" 5

N "Ú vÓ "Ú" 3

URPhc f a VTi RZ Q No T a Ro
P5P 8E5: 95DCE
f " " "Ú vÚ" Í" évÍ .N0
P Ú yñ f, e 4 XcnPc

f "ñ v n ñ a Ú v
Qñ" y VÚ" "Ú v
a d A@979 87B7E: b hg

CERTIFICADO INTERV. (VERACIDAD INFORMACION)

gvÚX z" P y v39: z" vx ñí z" 979B

PRf hVSVPNPVc b

g" ." 0
Sf RQQn NZRmNb QRf Sc b hVj Rf c g
T" "Ú" T"Ú" vÍ
RVPR SNf c QRZ PNhNhi a Oc gNg
R4Ó vñÍF"ñy"áv z"Íyv v Óx v MÚ "z" vÚvÚz" 5é 5y
N 5A v &8: 4D9 cáñy597B Rzá5P"Ú z" Ú"é yñ A v v "Úñzv

f "á" "ÚyñvF
85 P Ú v z" ñÚ" "Ú v b 587: 9 z" 9799 Vb hRf j Rb hc f N d Nf N ZN NhRb PV b QR j Ng f RTVc b NZRg Rb RZ QRd Nf hNa Rb hc QR b c f hR QR gNb hNb QRf Pc b c Of Ng QR a RXc f Na VRb hc EN RZ a Nf Pc QRZ df c Tf Na N QR c Of N d OZVPN #j Ng d Nf N ZN Pc b RmV b QR hRf f Vhc f Vc g3RZ Pf RPVa VRb hc gc ghRb VOZR n ZN f RNPhVj NPV b 957 5
95 d y" z" Zd4SP47: D4979: Pc b gc f PVc j VN PRb hf c 5

N Ú FQ y Ó"Ú v v "Í y x z"Í Ny v dv yñvÍ z" c x v b 58: y " Úzñ Ú" vÍ " ñz z"Í 78 z" Ó v vÍ: 8 z" Ó v z"Í 979B5

RÍ y Ú yñ f , e 4 Xc nPc ñÚ vy v y Ó ñÚ" "Ú z"Í y Ú v z" x v Zd4SP47: D4979: 3 "Ú z" xÍñevyñÚ" y Ó Ó ñ 3 y" ñññyv " Pc b gc f PVc j VN PRb hf c ív " "Úvz Ív z y Ó"Úvyñ Úz" á Óv y Ó Í" v " v v v "Í vé z" vy v v yñvÍ z" c x v b 58: y " Úzñ Ú" vÍ " ñz 78 z" Ó v vÍ: 8 z" Ó v z"Í 979B3 "é ÚÍ ÍñÚ" vÓ ñ Ú " " ñÓ ñ Ú " ñéñz Ív "Úñzvz y Ú v vÚ" RVPR SNf c QRZ PNhNhi a Oc 5

N "Úv Ó "Ú"3

URPhc f a VTi RZ Q No T a Ro
P5P 8E5: 95DCE
f " " "ÚvÚ" Í" évÍ .N0
P Ú yñ f , e 4 Xc nPc

f " ñ n ñ a Úv
Qñ"y VÚ" "Ú v
a d A@979 87B7E: b hg

Espacio	Conocimientos y herramientas	¿Cómo resolvían los conflictos

CERTIFICADO INHABILIDAD

CONSORCIO VIA CENTRO
NIT 901.740.307 - 9

Cúcuta, 22 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

PERSONA JURIDICA

Yo, **JESSICA VALENTINA SUAREZ ORTIZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.004.967.761 de Cúcuta, con Tarjeta Profesional No. 331695-T, de la Junta Central de Contadores, Obrando en calidad de **CONTADOR PÚBLICO**, del **CONSORCIO VIA CENTRO** identificado con NIT 901.740.307-9 CERTIFICO que: el **CONSORCIO VIA CENTRO**, NO tiene inhabilidad e incompatibilidad de tipo tributaria, para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con el artículo 8 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 núm. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el Art. 44 núm. 1o. de la misma norma y, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que NO se encuentra incurso en ninguna de ellas.

Dado en Cúcuta, Norte de Santander a los veintidós (22) días del mes abril del 2026

MIGUEL DAN JESSEN DUARN PEREZ
CC 1.090.473.156
Representante Legal

Jessica Suarez
JESSICA VALENTINA SUAREZ ORTIZ
CC. 1.004.967.761 de Cucuta
Contador Público TP 331695-T designado
por Luna Asesores &Consultores S.A.S TP 2175-T

PLANILLAS SS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JARP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN #15E- 148 URB. LA ESPERANZA	TELÉFONO:	5972254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	025 - OBRA TRAMO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6013589232			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			202972485

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
230201	230201- PROTECCION	8	$ 1.980.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 1.980.200	$ 1.400	$ 1.981.600
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.521.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 2.521.800	$ 1.800	$ 2.523.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.681.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 1.681.200	$ 1.200	$ 1.682.400
SUBTOTALES:										$ 6.183.200	$ 4.400	$ 6.187.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE															
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 407.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 407.500	$ 300	$ 0	$ 407.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.049.200	$ 0	$ 800	$ 0	$ 1.049.200	$ 800	$ 0	$ 1.050.000
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 210.300	$ 200	$ 0	$ 210.500
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
SUBTOTALES:													$ 1.807.200	$ 1.500	$ 0	$ 1.808.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
14-11	14-11 - ARL SURA	26		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.053.300	$ 3.053.300	$ 2.100	$ 0	$ 3.055.400
SUBTOTALES:									$ 3.053.300	$ 2.100	$ 0	$ 3.055.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE				
CCF37	CCF37-COMFANORTE	20	$ 1.769.100	$ 1.200	$ 1.770.300
SUBTOTALES:			$ 1.769.100	$ 1.200	$ 1.770.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JARP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN #15E- 148 URB. LA ESPERANZA	TELÉFONO:	5972254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	025 - OBRA TRAMO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6013589232	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO		2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			202972485

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901357100
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES JARP S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 AN #15E- 148 URB. LA ESPERANZA	TELÉFONO:	5972254
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	018 - VÍA SALAZAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6013649650	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			203005284

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 280.200	$ 200	$ 280.400
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.401.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 1.401.000	$ 1.000	$ 1.402.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 1.120.800	$ 800	$ 1.121.600
SUBTOTALES:										**$ 2.802.000**	**$ 2.000**	**$ 2.804.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 210.300	$ 200	$ 0	$ 210.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 140.200	$ 100	$ 0	$ 140.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 200	$ 0	$ 210.300	$ 200	$ 0	$ 210.500
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 140.200	$ 100	$ 0	$ 140.300
SUBTOTALES:													**$ 701.000**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 701.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.097.100	$ 1.097.100	$ 800	$ 0	$ 1.097.900
SUBTOTALES:									**$ 1.097.100**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 1.097.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	9	$ 639.000	$ 500	$ 639.500
SUBTOTALES:			**$ 639.000**	**$ 500**	**$ 639.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	RESIDENTE EXTERIOR	APORTANTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007887610	ORTIZ PEREZ JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1063483429	GARCIA ROJAS FELIX	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1093864367	PEREZ MONCADA JOSE PRIMITIVO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.952.805	$CCF37-COMFANORTE	$ 78.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1093896824	LAGUADO PALACIOS LUIS ARVEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1083889499	PEREZ ROLON JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	01-30 25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 0	30	$ 1.750.905	$CCF37-COMFANORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 5497753	LAGUADO DELVIES EMILIO HERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 88178746	PALACIOS PALACIOS JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 88179256	RAMIREZ CARDENAS LUIS ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 88179321	PALACIOS PALACIOS CRISANTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 88179353	ROJAS ORTIZ LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.243.000

Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901740307	9	CONSORCIO VIA CENTRO	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
54-1	CL 10 5 50 LC 27 ED CENTRO AGROBANCARIO		3175217717			CONSORCIOVIACENTRO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36969787	E	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	17.525.600	12.600	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
34	36969787	2026-04-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INO	RET	TDE	TAE	TDP	YAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AUP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5401800	QUINTANA ALVERNIA YEFERSON	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.000.000	120.000	COMFAORIENTE-CCF36	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5429001
2	CC 5483795	BECERRA LINDARTE JOSE BELEN	1.750.905	F		X														0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	933.816	149.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	933.816	37.400	COMFAORIENTE-CCF36	933.816	37.400	933.816	65.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	289.300	S	5429001
3	CC 12703347	SOTO HERNANDEZ JULIO ALBERTO	1.750.905	F	X															0			22	22	22	22	PROTECCION-230201	1.283.997	205.500	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.283.997	51.400	COMFAORIENTE-CCF36	1.283.997	51.400	1.283.997	89.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	397.700	S	5429001
4	CC 13278653	QUINTERO PABON WILLIAM	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
5	CC 13410660	MONCADA REINALDO	1.750.905	F	X	X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.575.815	252.200	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.575.815	63.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.575.815	63.100	1.575.815	109.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	488.100	S	5429001
6	CC 13411159	CONTRERAS GELVES JESUS DARIO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
7	CC 13487307	VALERO GARCIA LUIS EDUARDO	1.750.905	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	875.453	140.100	0	0	SANITAS-EPS005	875.453	35.100	COMFAORIENTE-CCF36	875.453	35.100	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	271.300	S	5429001
8	CC 30050210	RAMIREZ GOMEZ DENIS JOHANNA	6.000.000	F											X					0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	3.866.280	618.700	0	0	SANITAS-EPS005	3.866.280	154.700	COMFAORIENTE-CCF36	0	0	3.866.280	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	773.400	S	5429001
9	CC 30050210	RAMIREZ GOMEZ DENIS JOHANNA	6.000.000	F											X					0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	200.000	32.000	0	0	SANITAS-EPS005	200.000	8.000	COMFAORIENTE-CCF36	0	0	200.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	40.000	S	5429001
10	CC 60391400	GUTIERREZ PARRA MARLENE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	COOSALUD-EPS042	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
11	CC 88178147	PEÑARANDA PEÑARANDA JAIME	1.750.905	F		X														0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.050.543	168.100	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.050.543	42.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.050.543	42.100	1.050.543	73.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	325.500	S	5429001
12	CC 88179493	URIBE LAGUADO JOSE BELEN	1.750.905	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
13	CC 88239557	LOPEZ FERREIRA JAVIER ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
14	CC 88278073	GAMERO PAEZ JOSE JOAQUIN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
15	CC 1004896942	NEIRA FERNANDEZ MILDRETH JOHANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
16	CC 1005024623	SANCHEZ ORTEGA JENIFFER ALEXANDRA	1.750.905	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.692.542	370.900	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.692.542	67.800	COMFAORIENTE-CCF36	1.692.542	67.800	1.692.542	117.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	524.400	S	5429001
17	CC 1005025734	FUENTES PEREZ LUISA DANIELA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
18	CC 1005060367	GALVIS GARCIA DIEGO FERNEY	1.750.905	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	641.999	102.800	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	641.999	25.700	COMFAORIENTE-CCF36	641.999	25.700	641.999	44.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	198.900	S	5429001
19	CC 1007307881	ASCANIO ASCANIO YILMER JAVIER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
20	CC 1090175924	CASTRILLON CONTRERAS MARLON ALEXI	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
21	CC 1090385445	PARRA RAMIREZ CARLOS SNEIDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
22	CC 1090445824	CASTILLA RIVERA ADRIAN REINALDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
23	CC 1090473156	DURAN PAEZ MIGUEL DAN JENSSEN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
24	CC 1090495934	CARDENAS LINDARTE MARCO ANTONIO	1.750.905	F		X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	933.816	149.500	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	933.816	37.400	COMFAORIENTE-CCF36	933.816	37.400	933.816	65.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	289.300	S	5429001
25	CC 1093412043	BUITRAGO ARIAS LUIS ALEXANDER	1.750.905	F	X	X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.575.815	252.200	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.575.815	63.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.575.815	63.100	1.575.815	109.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	488.100	S	5429001
26	CC 1093413184	GALVIS GARCIA YOHANA	1.750.905	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.575.815	252.200	0	0	COMFAORIENTE-CCFC50	1.575.815	63.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.575.815	63.100	1.575.815	109.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	488.100	S	5429001
27	CC 1093414353	ORTEGA CORDERO EDISET	1.750.905	F	X															0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	1.517.451	242.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.517.451	60.700	COMFAORIENTE-CCF36	1.517.451	60.700	1.517.451	105.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	469.900	S	5429001
28	CC 1093774341	GALVIS RODRIGUEZ DARLY JUDITH	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
29	CC 1093884767	PEREZ LINDARTE GERSON JAVIER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001
30	CC 1093886323	URBINA POLENTINO BELCY YOHANNA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001

434

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901740307	9	CONSORCIO VIA CENTRO	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 10 5 50 LC 27 ED CENTRO AGROBANCARIO		3175217717		CONSORCIOVIACENTRO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36968522	Y	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	763.300	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	36968522	2026-04-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1012322528	ALBARRACIN BELLON DIANA ROCIO	2.200.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	153.200	N	5429001
2	CC 1018499112	DURAN CERON MARIA ALEJANDRA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
3	CC 1090469880	PULIDO YAÑEZ JESSICA DAYANNA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
4	CC 1093774397	OLEJUA ROJAS LINA GABRIELA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
5	CC 1096947236	PEÑA YURY MARCELA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
6	CC 1193066917	MARQUEZ RINCON FELIPE	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901740307	9	CONSORCIO VIA CENTRO	A	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 10 5 50 LC 27 ED CENTRO AGROBANCARIO		3175217717		CONSORCIOVIACENTRO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36968522	Y	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	763.300	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	36968522	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	10.954.525	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				6	762.700	0	600	0	763.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	762.700	0	600	0	763.300
Gran Total					762.700	0	600	0	763.300

172

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1193066917
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FELIPE MARQUEZ RINCON
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 4E 6 49 UR SAYAGO	TELÉFONO:	3124294
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6008986460	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			175903196

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1193066917	MARQUEZ RINCON FELIPE	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012322528		ALBARRACIN BELLON DIANA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 68 A # 23-47 INT 5 AP 604	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183545206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	150669661	9501564620	I	2026/04/09	2026/03/18	BANCO DE BOGOTA	0	$1,392,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$562,500			$0	$0			$4,500,000	$109,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$4,500,000**	**$720,000**			**$4,500,000**	**$562,500**			**$0**	**$0**			**$4,500,000**	**$109,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$562,500			$0	$0			$4,500,000	$109,700		$0	$0
1	CC 1012322528	ALBARRACIN DIANA	25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$562,500		0	$0	$0	14-23	30	$4,500,000	$109,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$4,500,000**	**$720,000**			**$4,500,000**	**$562,500**			**$0**	**$0**			**$4,500,000**	**$109,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012322528		ALBARRACIN BELLON DIANA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 68 A # 23-47 INT 5 AP 604	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183545206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	150669661	9501564620	I	2026/04/09	2026/03/18	BANCO DE BOGOTA	0	$1,392,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$720,000	$0	$0	$720,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,700	$0	$0	$109,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$109,700	$0	$0	$109,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$562,500	$0	$0	$562,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$562,500	$0	$0	$562,500
TOTAL				1	$1,392,200	$0	$0	$1,392,200

2026/03/18 09:26 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090469880
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JESSICA DAYANNA PULIDO YANEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CONJ. RESIDENCIAL VERONA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6008378290	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			125117468

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																															PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1090469880	PULIDO YANEZ JESSICA DAYANNA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.800.000				NO							01-30											230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.800.000	109046988	$ 9.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 522.400

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018499112		DURAN CERON MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV BOYACA #131-19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8888888	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03		9501684322	I	2026/04/07			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018499112	DURAN MARIA																		230301	30	$2,268,000	$362,900	EPS005	30	$2,268,000	$283,500		0	$0	$0	14-4	30	$2,268,000	$23,700	0	$0	$0	No	$670,100
Total	**Afiliados(1)**																						$2,268,000	$362,900			$2,268,000	$283,500			$0	$0			$2,268,000	$23,700		$0	$0		$670,100

2026/04/06 10:00 AM

126

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018499112		DURAN CERON MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV BOYACA #131-19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8888888	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03		9501684322	I	2026/04/07			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,900	$0	$0	$362,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$362,900	$0	$0	$362,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,700	$0	$0	$23,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$23,700	$0	$0	$23,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$283,500	$0	$0	$283,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$283,500	$0	$0	$283,500
TOTAL				1	$670,100	$0	$0	$670,100

2026/04/06 10:00 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007909639
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO PINEDA TARAZONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 11 #36-20 BELLAVISTA	TELÉFONO:	3154526
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6009614613**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	190056916		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 121.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 121.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 621.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 621.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

VALOR SIN MORA:

VALOR MORA:

TOTAL PAGADO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1092645373
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILSON ELIAS ORTEGA GALVIS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTILLA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA 25 SECTOR EL	TELÉFONO:	1000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6014313524**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	199184917		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905006756	CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 121.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 121.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 621.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 621.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

VALOR SIN MORA:

VALOR MORA:

TOTAL PAGADO:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1093774397
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LINA GABRIELA OLEJUA ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CUCUTA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4649368178	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996327199

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 435.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.200	$ 0	$ 435.200
SUBTOTALES:										**$ 435.200**	**$ 0**	**$ 435.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 340.000
SUBTOTALES:													**$ 340.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 340.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 189.400	$ 189.400	$ 0	$ 0	$ 189.400
SUBTOTALES:									**$ 189.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 189.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1093774397	OLEJUA ROJAS LINA GABRIELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.720.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.720.000	$ 435.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 435.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.720.000	$ 340.000	$ 0	$ 340.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.720.000	109377439	$ 189.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 964.600

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090380386		SANDRA KATHERINE BARRERA MONSALVE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUCUTA	Carrera 3 Nro 3-10 Barrio El Centro	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5732794	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	213854881	9502751989	E	2026/04/22	2026/04/13	BANCOLOMBIA	0	$3,796,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	ima	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte						Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUCUTA (7 Afiliados)																								$12,256,335	$1,961,400			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$853,300						$0	$0		$3,796,100
Centro de Trabajo: CUCUTA (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$365,700						$0	$0		$1,626,900
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$365,700						$0	$0		$1,626,900
1	CC	88221008	GOMEZ ROJAS JOSE ALCIDES																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	6.960%				30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	1010063145	ORTEGA SANCHEZ YEIFERSON ESTIWARD																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	6.960%				30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1090485739	PEREZ PEREZ SERGIO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	6.960%				30	$0	$0	SI	$542,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																								$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600						$0	$0		$2,169,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																								$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$487,600						$0	$0		$2,169,200
4	CC	88159891	BARROSO ROZO LUIS EDUARDO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	6.960%				30	$0	$0	SI	$542,300
5	CC	1004996797	JAIME JAIMES MARLYN YELITSA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	6.960%				30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1093140436	MONTES SUAREZ JAIRO HERNANDO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	6.960%				30	$0	$0	SI	$542,300
7	CC	1090434194	OVALLES ORTIZ FRANKLIN JESUS																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF36	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	6.960%				30	$0	$0	SI	$542,300
Total Afiliados(7)																								$12,256,335	$1,961,400			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$853,300						$0	$0		$3,796,100

180

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,961,400	$0	$0	$1,961,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$853,300	$0	$0	$853,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$853,300	$0	$0	$853,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$490,700	$0	$0	$490,700
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	7	$490,700	$0	$0	$490,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$490,700	$0	$0	$490,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				7	$3,796,100	$0	$0	$3,796,100

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1050065513	9	JOSE DE LA HOS BELEÑO MORA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MNZ A-46 LOTE D-16 VILLA PAZ	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5729321	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	186836148	9502553344	E	2026/04/07	2026/04/01	BANCOLOMBIA	0	$10,362,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$5,594,800						$1,399,900	
																				$793,900						$198,600	
																				$793,900						$198,600	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	25	$1,459,088	16%	SIN RIESGO	$233,500	$0	$0	$0	$0	$0	$233,500		COMFAORIENTE	25	$1,459,088	4%	$58,400	
																				$4,800,900						$1,201,300	
																				$4,800,900						$1,201,300	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	10	$583,635	16%	SIN RIESGO	$93,400	$0	$0	$0	$0	$0	$93,400		SALUD TOTAL	10	$583,635	4%	$23,400	
		X	2026/03/11	2026/03/30		$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	20	$1,167,270	16%	SIN RIESGO	$186,800	$0	$0	$0	$0	$0	$186,800		SALUD TOTAL	20	$1,167,270	4%	$46,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		COMFAORIENTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		COMFAORIENTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		FAMISANAR	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	7	$408,545	16%	SIN RIESGO	$65,400	$0	$0	$0	$0	$0	$65,400		SANITAS	7	$408,545	4%	$16,400	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	7	$408,545	16%	SIN RIESGO	$65,400	$0	$0	$0	$0	$0	$65,400		SANITAS	7	$408,545	4%	$16,400	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	5	$291,818	16%	SIN RIESGO	$46,700	$0	$0	$0	$0	$0	$46,700		SANITAS	5	$291,818	4%	$11,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	7	$408,545	16%	SIN RIESGO	$65,400	$0	$0	$0	$0	$0	$65,400		NUEVA E.P.S.	7	$408,545	4%	$16,400	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	7	$408,545	16%	SIN RIESGO	$65,400	$0	$0	$0	$0	$0	$65,400		SANITAS	7	$408,545	4%	$16,400	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	18	$1,050,543	16%	SIN RIESGO	$168,100	$0	$0	$0	$0	$0	$168,100		SALUD TOTAL	18	$1,050,543	4%	$42,100	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	26	$1,517,451	16%	SIN RIESGO	$242,800	$0	$0	$0	$0	$0	$242,800		NUEVA E.P.S.	26	$1,517,451	4%	$60,700	
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	20	$1,167,270	16%	SIN RIESGO	$186,800	$0	$0	$0	$0	$0	$186,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	20	$1,167,270	4%	$46,700	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	27	$1,575,815	16%	SIN RIESGO	$252,200	$0	$0	$0	$0	$0	$252,200		NUEVA E.P.S.	27	$1,575,815	4%	$63,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,750,905	4%	$70,100	
		X	2026/03/01	2026/03/03		$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	3	$175,091	16%	SIN RIESGO	$28,100	$0	$0	$0	$0	$0	$28,100		NUEVA E.P.S.	3	$175,091	4%	$7,100	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,399,900						$1,346,700						$2,021,700				$0		$0		$0		$0	
	$198,600						$198,600						$26,100				$0		$0		$0		$0	
	$198,600						$198,600						$26,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$58,400		COMFANORTE	25	$1,459,088	4%	$58,400	ARL SURA	25	$1,459,088	0.522%	1	$7,700	25	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,201,300						$1,147,500						$1,995,600				$0		$0		$0		$0	
	$1,201,300						$1,147,500						$1,995,600				$0		$0		$0		$0	
$0	$23,400		COMFANORTE	10	$583,635	4%	$23,400	ARL SURA	10	$583,635	6.96%	5	$40,700	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,700		COMFANORTE	20	$1,167,270	0%	$0	ARL SURA	20	$1,167,270	0%	5	$0	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$16,400		COMFANORTE	7	$408,545	4%	$16,400	ARL SURA	7	$408,545	6.96%	5	$28,500	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$16,400		COMFANORTE	7	$408,545	4%	$16,400	ARL SURA	7	$408,545	6.96%	5	$28,500	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$11,700		COMFANORTE	5	$291,818	4%	$11,700	ARL SURA	5	$291,818	6.96%	5	$20,400	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$16,400		COMFANORTE	7	$408,545	4%	$16,400	ARL SURA	7	$408,545	6.96%	5	$28,500	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$16,400		COMFANORTE	7	$408,545	4%	$16,400	ARL SURA	7	$408,545	6.96%	5	$28,500	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$42,100		COMFANORTE	18	$1,050,543	4%	$42,100	ARL SURA	18	$1,050,543	6.96%	5	$73,200	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$60,700		COMFANORTE	26	$1,517,451	4%	$60,700	ARL SURA	26	$1,517,451	6.96%	5	$105,700	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,700		COMFANORTE	20	$1,167,270	4%	$46,700	ARL SURA	20	$1,167,270	6.96%	5	$81,300	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$63,100		COMFANORTE	27	$1,575,815	4%	$63,100	ARL SURA	27	$1,575,815	6.96%	5	$109,700	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,100		COMFANORTE	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	6.96%	5	$121,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,100		COMFANORTE	3	$175,091	0%	$0	ARL SURA	3	$175,091	0%	5	$0	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
						$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	27	$1,575,815	16%	SIN RIESGO	$252,200	$0	$0	$0	$0	$0	$252,200		NUEVA E.P.S.	27	$1,575,815	4%	$63,100	
																				$5,594,800						$1,399,900	

2026/04/01 10:21 AM

183

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$63,100		COMFANORTE	27	$1,575,815	4%	$63,100	ARL SURA	27	$1,575,815	6.96%	5	$109,700	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,399,900						$1,346,100						$2,021,700				$0		$0		$0		$0	

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1096947236	0	YURY MARCELA PEÑA	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	AV 27 14A 16 URBANIZACION BELLAVISTA		3123541945			YURY4228@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36815751	I	2026-04-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	500.200	1.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36815751	2026-04-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 1096947236	PEÑA YURY MARCELA	1.750.905																		0		30	30	0	0	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	499.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1096947236	0	YURY MARCELA PEÑA	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7220	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	AV 27 14A 16 URBANIZACION BELLAVISTA		3123541945			YURY4228@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36815751	I	2026-04-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	500.200	1.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36815751	2026-04-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	600	0	280.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	600	0	280.800
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	500	0	219.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	500	0	219.400
Gran Total					499.100	0	1.100	0	500.200

184
