112	Del 17 octubre al 23 octubre 2025
113	Del 24 octubre al 30 octubre 2025
114	Del 31 octubre al 6 noviembre 2025
115	Del 7 noviembre al 13 noviembre 2025
116	Del 14 noviembre al 20 noviembre 2025
117	Del 21 noviembre al 27 noviembre 2025
118	Del 28 noviembre al 04 diciembre 2025
119	Del 05 diciembre al 11 diciembre 2025
120	Del 12 diciembre al 18 diciembre 2025
121	Del 19 diciembre al 25 diciembre 2025
122	Del 26 diciembre del 2025 al 01 enero 2026
123	Del 02 enero al 08 enero 2026
124	Del 09 enero al 15 enero 2026
125	Del 16 enero al 22 enero 2026
126	Del 23 enero al 29 enero 2026
127	Del 30 enero al 05 febrero 2026
128	Del 06 febrero al 12 febrero 2026
129	Del 13 febrero al 19 febrero 2026
130	Del 20 febrero al 26 febrero 2026
131	Del 27 febrero al 05 marzo 2026
132	Del 06 marzo al 12 marzo 2026
133	Del 13 marzo al 19 marzo 2026
134	Del 20 marzo al 26 marzo 2026

Tabla 4. Relación informe semanales.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

Durante el periodo EL CONSORCIO VIA CENTRO realiza actividades de obra en Tramo 1-Tramo 3-Tramo 4- Tramo 5. (se anexa formatos diligenciados)

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN15-FR-6

Durante el periodo la interventoría CONSORCIO R&Q – JOYCO solicito al contratista por medio del 70-03-2026/1032-2022 el día 28 de marzo del 2026 la entrega de soportes de pago de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente, sin embargo, a corte de este informe, la misma no ha sido objeto de entrega por el CONSORCIO VIA CENTRO. (se anexa formato con la seguridad social del mes de febrero).

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

Durante el periodo la interventoría CONSORCIO R&Q – JOYCO realiza seguimiento, mediante comunicado 70-03-2026/1032-2022 el día 28 de marzo del 2026 se solicitó la entrega del formato diligenciado financiero y presupuestal del contrato de obra en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, sin embargo, a corte de este informe, la misma no ha sido objeto de

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

entrega por el CONSORCIO VIA CENTRO. (Dicho formato se diligencia por la interventoría y se anexa con sus respectivas firmas)

4.5 Estado general del tiempo. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Durante el periodo la interventoría CONSORCIO R&Q – JOYCO realiza seguimiento del estado del tiempo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 para tramo 1, tramo 3, tramo 4 y tramo 5. (Se anexa formato).

4.6 Resumen ensayos de Laboratorio. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Durante el periodo la interventoría CONSORCIO R&Q – JOYCO realiza seguimiento de las actividades para ensayos de laboratorio (prueba de resistencia del concreto-tomas de densidades-pruebas subbase-pruebas base-mezcla asfáltica) en tramo 1, tramo 3, tramo 4 y tramo 5, se solicito al contratista por medio del oficio 70-03-2026/1032-2022 el día 28 de marzo del 2026 la entrega de los ensayos realizados en campo en el mes de marzo. Sin embargo, a corte de este informe, la misma no ha sido objeto de entrega por el CONSORCIO VIA CENTRO.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

Durante el periodo la interventoría CONSORCIO R&Q – JOYCO realiza seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra. Se anexa el formato establecido con las pólizas.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

Durante el periodo la interventoría CONSORCIO R&Q – JOYCO realiza solicitud al contratista por medio del oficio 70-03-2026/1032-2022 el día 28 de marzo del 2026 del informe de seguimiento de revisión del plan de calidad. sin embargo, a corte de este informe, la misma no ha sido objeto de entrega por el CONSORCIO VIA CENTRO.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

Mediante el comunicado No. 19-03-2026/1032-2022, de fecha 6 de marzo de 2026, la Interventoría aprobó la Orden de Operación No. 46. Así mismo, la Orden de Operación No. 47 se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de la Interventoría.

Durante el mes de marzo, la Interventoría brindó respuesta a las Órdenes de Operación No. 38, 7, 28, 33 y 37. Se encuentra pendiente que el contratista subsane las observaciones realizadas.

- **Seguimiento Programa de Obra.** se encuentra en seguimiento por parte del contratista-Interventoría.

- **Seguimiento Programa de Inversiones.** Se encuentra en seguimiento por parte de la interventoría y se anexa formato, cabe resaltar que el seguimiento al programa de inversión que se adjunta es con base al seguimiento diario que se realiza en campo, mas no con base al seguimiento de las actas de obra, por lo que su valor podría variar

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Actas de Comité de Obra (Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1) las cuales se anexan.
- Actas de Reunión (Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2) (En el mes de marzo no se realizan reuniones)

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato de interventoría.

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de Interventoría.

PROCESO DE SELCCION	CMA-DTE-SEP-191-2021		
NÚMERO ID DEL SECOP			
CONTRATO No.	1032 DE 2022		
FECHA DE SUCRIPCION	15 DE JUNIO DE 2022		
OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"		
CONTRATISTA	CONSORCIO R&Q - JOYCO		
NUMERO NIT	901.740.307-9		
INTEGRANTES	NOMBRE	NIT	%
	R&Q INGENIERIA COLOMBIA S.A.	900.508.277-1	50%
	JOYCO S.A.S. BIC	860.067.561-9	50%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.690.446.350		
PLAZO	CUARENTA Y DOS (42) MESES Y CINCO (05) DÍAS		
FECHA INICIACIÓN	26 DE JUNIO DE 2023		
FECHA TERMINACION	31 DE DICIMBRE DE 2026		
DIRECCION	AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503		
NUMERO TELEFONO	6012210190		

Tabla 5. Información general del contrato de Interventoría

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el presente periodo la interventoría adelanto un gran número de actividades para el cumplimiento del objeto contractual las cuales se resumen a continuación en las diferentes áreas:

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

5.2.1 Actividades de gestión técnica realizadas por la parte técnica de la interventoría

Las actividades técnicas desarrolladas por la interventoría en el mes de marzo de 2026 son las siguientes:

- Atención de requerimiento y Gestión de Correspondencia asignada al área técnica (Se anexa correspondencia).
- Participación en comités de obra (se anexan actas)
- Mesas de trabajo de especialistas contratista e interventoría.
- Realizar informes semanales y subir la información correspondiente a la plataforma CIFRA. (Se anexan informes semanales)
- Supervisión y acompañamiento en la ejecución de actividades Tramo 1, Tramo 2, Tramo 3, tramo 4 y tramo 5.
- Regleta del corredor Tramo 1-Tramo 2-Tramo 3- tramo 4-tramo 5 Arboledas-Salazar.
- Visita a campo
- Conclusiones del componente técnico.

- **PARTICIPACIÓN DEL AREA TECNICA EN COMITÉS DE OBRA (Se anexan comités)**


Comité de obra (contratista e interventoría)	Fecha	Temas tratados durante el desarrollo del comité
No 85	13-03-26	Avances del contratista: Área técnica, ambiental, social, predial.
No 86	19-03-26	Avances del contratista: Área técnica, ambiental, social, predial.
No 87	31-03-26	Avances del contratista: Área técnica, ambiental, social, predial.

INFORMES SEMANALES (SE ANEXAN INFORMES SEMANALES)

ID	INFORMES SEMANALES MES DE ENERO 2026
131	Del 27 febrero al 05 marzo 2026
132	Del 06 marzo al 12 marzo 2026
133	Del 13 marzo al 19 marzo 2026
134	Del 20 marzo al 26 marzo 2026

RADICACIÓN DE LOS INFORMES SEMANALES EN LA PLATAFORMA CIFRA

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

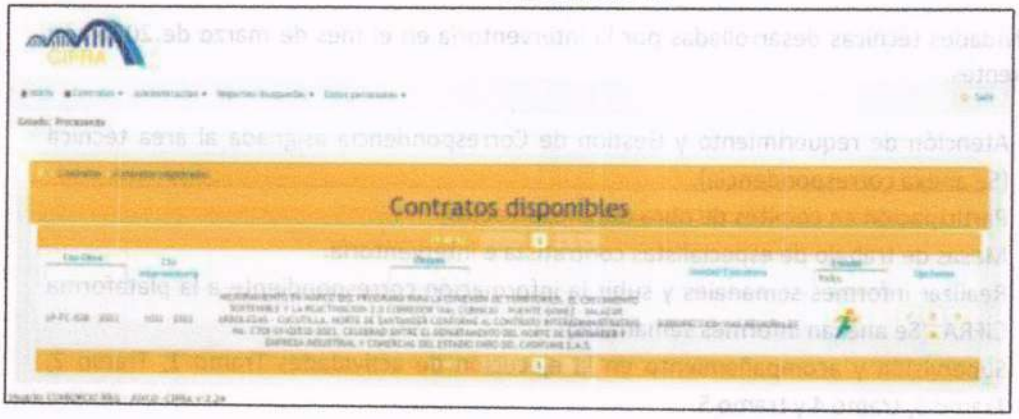



SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EJECUCION DE OBRA EN EL MES.

Tramo 1


El 02 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisas k4+616-k4+646 se realiza excavación para conformación terreno y construcción de cuneta triangular
- En obra #6 se realiza amarre de acero refuerzo e instalación de formaleta para fundir contrahuella #3 canal encole box culvert
- En obra #7 se realiza retiro de material derrumbado en encole box culvert.
- En obra #8 se realiza conformación de terreno para fundir solado mejoramiento para construcción viga cabezal muro box.
- En obra #9 se realiza excavación para conformación terreno para viga cabezal muro box
- Entre abscisa k4+940-k4+951 se realiza excavación y construcción de filtro entre obra #9 a #10
- Entre abscisa k5+000-k5+050 se realiza excavación caja para conformación estructura de vía
- Entre abscisa k5+710-k5+900 se realiza corte de asfalto y excavación para conformación de terreno para conformación de cuneta triangular

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Entre abscisa k4+970 se instala malla electrosoldada para concreto lanzado protección de talud



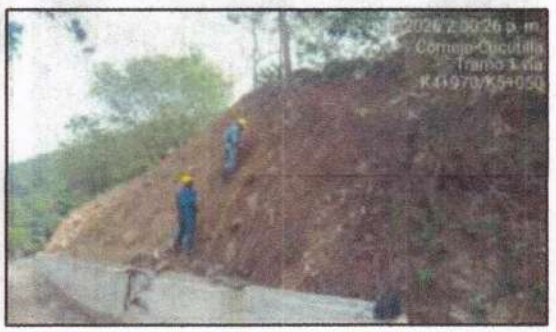



El 03 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisas k4+616.5-k4+646 se realiza amarre de acero refuerzo, instalacion de formaleta y fundida placas de cuneta triangular en concreto de 21 MPA.
- En abscisa k4+740 obra #7 se realiza amarre de acero refuerzo, instalacion de malla e instalacion de formaleta para fundida contra huella encole box culvert.
- En abscisa k4+830 obra #8 se realiza amarre de acero refuerzo para funidr zarpa box culvert muro.
- Entre abascisa k4+905-k4+945 se realiza instalacion de abono y semilla brechada para proteccion de talud terraplen.
- Entre abscisa k4+715-k4+810 se realiza excavacion de caja para conformar estructura de via.
- Entre abscisa k4+900-k5+080 se realiza excavacion de caja para estructura de via.
- Entre abscisa k4+970-k5+060 se realiza instalacion de malla electrosoldada para concreto lanzado proteccionde talud.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co






El 04 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k4+547-k4+580 se realiza excavación y conformación de terreno para construcción de cuenta triangular
- Entre abscisa k4+605-k4+646 se realiza desencofre y curado de concreta cuneta triangular.
- En abscisa k4+740 obra #7 se realiza instalación de malla electrosoldada para concreto lanzado protección de talud encole box culvert.
- En abscisa k4+830 obra #8 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta y fundida de viga cabezal muro box culvert en concreto premezclado de 28MPA.
- En abscisa k4+855 obra #9 se realiza demolición de anillos para construcción viga cabezal muro box.
- Entre abscisas k4+715-k4+810 se realiza verificación de niveles de subrasante para construcción estructura de vía.
- Entre abscisa k4+860-k4+920 se realiza demolición de rocas en orilla de vía y en excavación de caja para estructura de vía
- Entre abscisa k4+970-k5+060 se realiza instalación de malla electrosoldada para protección de talud costado izquierdo.
- Entre abscisa k5+380-k5+465, k5+620-k5+715 y k5+820-k5+927 carril izquierdo. Se realiza extracción de núcleos en 1ra capa carpeta asfáltica MDC-19.
- Entre abscisa k5+740-k5+810 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta y fundida de placa de cuneta triangular en concreto de 21 MPA premezclado.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co







El 05 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisas k4+547-k4+580 se realiza conformación de terreno para construcción de cuneta triangular.
- En abscisa k4+684 obra #6 se realizan llenos laterales en contrahuella #3 canal encole box culvert.
- En abscisa k4+740 en obra #7 se realiza instalación de malla electrosoldada para concreto lanzado protección de talud.
- En abscisa k4+833 obra #8 se realiza amarre de acero refuerzo para fundir 1ra parte muro box culvert.
- Entre abscisas k4+715-k4+800 se instala geotextil 3000 para separaciones de capas granulares y se instala 1ra capa de subbase granular estructura de vía.
- En abscisa k4+855 obra #9 se realiza demolición de anillo sobrante para fundir solado mejoramiento.





Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co






El 06 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisas k4+590-k4+602 se realiza excavación para conformación de terreno y construir acceso a predio la quiracha.
- En abscisa k4+684 obra #6 se realiza amarre de acero refuerzo para fundida de huella #3
- En abscisa k4+740 obra #7 se realiza instalación de malla electrosoldada para concreto lanzado protección de talud encole box culvert.
- En abscisa k4+823-k4+835 obra #8 se realizan llenos perimetrales en material seleccionado de excavaciones a viga cabezal box culvert se realizan ensayos de densidad; también se continuo amarre de acaro refuerzo para fundir primera parte muro box culvert.
- En abscisa k4+855 obra #9 se realiza demolición de anillo para conformación de terreno para construcción de viga cabezal muro box culvert.
- Entre abscisa k4+864-k4+890 se realiza demolición de roca para construcción de viga cabezal y rocas de anillo de vía.
- Entre abscisa k4+715-k4+800 se verifican niveles de primera capa de subbase estructura de vía y se realizan ensayos de densidad a esta capa.
- Entre abscisa k4+900-k5+020 se verifican niveles de subrasante y se inicia instalación de geotextil 3000 para separación de capas granulares y se instala primera capa de subbase estructura de vía.
- Entre abscisas k5+000-k5+060 se realiza instalación de concreta protección de talud costado izquierdo.
- Entre abscisas k5+375-k5+464 se realiza imprimación con emulsión asfáltica CRR-1 carril izquierdo y se instala y compacta 2da capa de mezcla asfáltica MDC-19.
- Entre abscisa k5+620-k5+715 se realiza riego de imprimación CRR-1 carril izquierdo y se instala 2da capa de mezcla asfáltica MDC-19.
- Entre abscisa k5+810-k5+900 se realiza amarre de acero, instalación de formaleta y fundida placas cuneta triangular concreto 21MPA.
- Entre abscisa k5+820-k5+900 se realiza riego de imprimación CRR-1 carril izquierdo.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

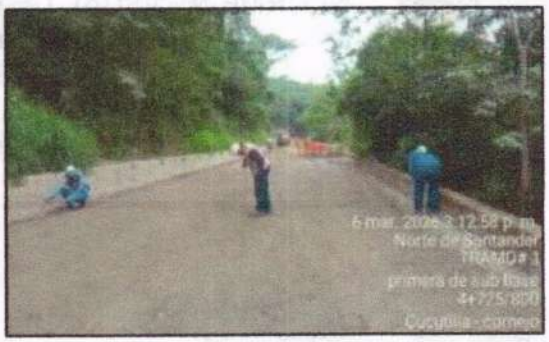


El 7 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisas k4+590-k4+602 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta u fundida de placa acceso a predio la quiracha en concreto premezclado 21 MPA.
- En abscisa k4+684 obra #6 se realiza amarre de acero refuerzo y fundida de huella #3 canal encole box culvert.
- En abscisa k4+740 obra #7 se realiza instalación de malla electrosoldada para concreto lanzado protección de talud encole box culvert.
- Entre abscisa k4+715-k4+800 se realiza instalación y compactación 2da capa de subbase granular para conformación estructura de vía.
- Entre abscisa k4+823-k4+835 obra #8 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta para fundir 1ra parte muro box culvert.
- En abscisa k4+855 obra #9 se realiza demolición de anillos para conformar terreno y construir viga cabezal muro box culvert.
- Entre abscisa k4+900-k4+020 se realiza instalación de geotextil 3000 y 1ra capa de subbase para conformar estructura de vía.
- Entre abscisa k5+375-k5+464 se realiza riego de imprimación emulsión asfáltica CRR-1 carril derecho.
- Entre abscisa k5+620-k5+715 se realiza riego de imprimación emulsión asfáltica CRR-1 carril derecho.
- Entre abscisa k5+820-k5+827 se realiza instalación y compactación 2da capa de mezcla asfáltica MDC-19 carril izquierdo.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Entre abscisa k5+900-k5+908 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta y fundida placa cuneta triangular en concreto premezclado de 21MPA.

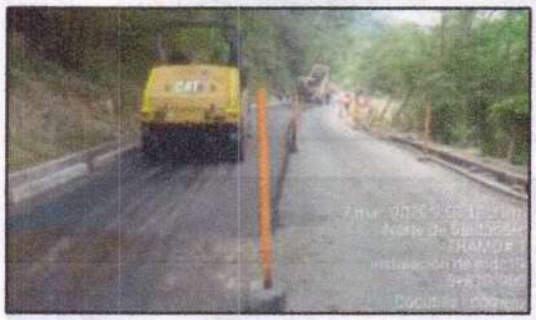El 9 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+599-k4+602 se realiza fundida de losa en concreto de 21MPA acceso a la quiracha.
- Entre abscisa k4+715-k4+800 se realiza instalación y compactación 2da capa de subbase estructura de vía.
- En abscisa k4+823 obra #8 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta y fundida 1ra parte del vástago muro box culvert en concreto premezclado 28MPA
- En abscisa k4+853 obra #9 se realiza demolición de anillos fundida de solado mejoramiento y se inicia amarre de acero refuerzo para fundir viga cabezal muro box culvert.
- Entre abscisa k4+900-k5+020 se realiza instalación y compactación 1ra capa subbase granular estructura de vía.
- Entre abscisa k5+080-k5+278 se realiza instalación de amortiguadores de impacto en barrera metálica.
- Entre abscisa k5+375-k5+464 se realiza instalación de amortiguadores de impacto en barrera metálica.
- Entre abscisa k5+820-k5+900 se realiza corte de asfalto CRR-1 carril izquierdo.
- Entre abscisa k5+870-k5+883 se realiza amarre de hacer refuerzo y fundida placa encole alcantarilla.
- Entre abscisa k5+908-k5+927 se realiza amarre de acero y fundida de placa cuneta triangular concreto premezclado.




Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co




El 10 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k4+560-k4+590 se realiza excavación para conformación terreno y construir cuneta triangular
- En abscisa k4+823-k4+835 obra #8 se realiza amarre de acero refuerzo para fundir viga cabezal muro box culvert.
- Entre abscisa k4+900-k5+020 se realiza instalación y compactación 1ra capa de subbase.
- Entre abscisa k4+880-k4+890 se realiza demolición de roca en carril izquierdo borde de vía.
- Entre abscisa k4+853-k4+864 se realiza demolición de 2 anillos para proceso constructivo de caisson para llegar a la cota de viga cabezal.
- Entre abscisa k5+700-k5+740 se realiza excavación para conformación de terreno y construcción cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+820-k5+900 se realiza corte eje de asfalto carril izquierdo y se instala emulsión asfáltica CRR-1 carril izquierdo.
- Entre abscisa k5+870-k5+883 se realiza amarre de acero refuerzo y fundida placa encole alcantarilla.




El 11 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Entre abscisas k4+715-k4+800 se realiza instalacion y compactacion de 2da capa subbase granular para conformacion estructura de via.
- Entre abscisa k4+823-k4+835 obra #8 se realiza construccion de filtro y llenos perimetrales 1ra parte de vastago.
- Entre abscisa k4+853-k4+865 obra #9 se realiza amarre de acero refuerzo, instalacion de formaleta y fundida de viga cabezal muro box culvert en concreto de 28MPA.
- Entre abscisa k4+900-k4+080 se realiza instalacion y compactacion de 1ra capa de subbase granular para conformacion estructura de via.
- Entre abscisas k5+694-k5+740 se realiza amarre de acero refuerzo, instalacion de formaleta y fundida de 13 placas de cuneta triangular en concreto premezclado de 21MPA.
- Entre abscisa k5+760-k5+830 se realiza excavacion para instalacion postes de barrera metalica.








El 12 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+684 obra #6 se realiza amarre de acero refuerzo e instalación de formaleta para fundida de muro canal encole box culvert
- Entre abscisa k4+715-k4+800 se realiza instalación y compactación de 1ra capa de base granular para conformación estructura de vía
- Entre abscisa k4+823-k4+835 se realizan llenos perimetrales 1ra parte vástago muro box culvert en material seleccionado de excavaciones y se realizan ensayos de densidad a estas capas.
- Entre abscisa k4+853-k4+865 se realiza amarre de acero refuerzo para 1ra parte box culvert obra #9; también se realizan llenos perimetrales viga box culvert.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Entre abscisa k4+900-k4+080 se realiza instalación y compactación 1ra capa de base granular estructura de vía.
- Entre abscisa k5+000-k5+020 se realiza instalación de concreto lanzado protección de talud.
- Entre abscisas k5+580-k5+620 se realiza construcción de trinchos costado derecho
- Entre abscisa k5+650-k5+694 se realiza conformación de terreno y amarre de acero refuerzo para construcción de cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+760-k5+830 se realiza instalación de barrer metálica.

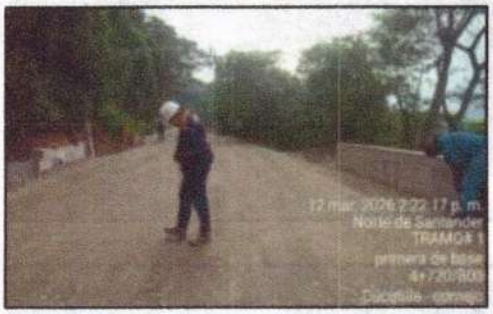




El 13 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+684 obra #6 se realiza amarre de acero refuerzo e instalación de formaleta para fundir muro canal encole box culvert.
- Entre abscisa k4+715-k4+800 se realiza instalación y compactación de 2da capa base granular para estructura de vía.
- En obra #8 se terminan llenos perimetrales de 1ra parte vástago muro box y se realiza demolición 1ra parte estructura box existente.
- Entre abscisa k4+853-k4+865 se realiza amarre de acero refuerzo y se inicia instalación de formaleta para fundir 1ra parte vástago muro box
- En abscisa k4+740 obra #7 se realiza instalación de concreto lanzado protección de talud encole.
- Entre abscisa k4+900-k4+080 se realiza instalación y compactación 1ra capa subbase granular para estructura de vía.
- Entre abscisa k5+000-k5+020 se realiza instalación y compactación 1ra capa subbase granular para estructura de vía
- Entre abscisa k5+615-k5+625 se realiza construcción de trinchos costado derecho.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Entre abscisa k5+642-k5+694 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta y fundida de placa cuneta triangular en concreto 21MPA premezclado.
- Entre abscisa k5+750-k5+830 se realiza instalación de barrera metálica.






El 14 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k4+715-k4+800 se realiza céreo y compactación 2da capa base granular para conformación estructura de vía y se realiza imprimación CRL-1.
- En abscisa k4+830 obra #8 se realiza demolición de concreto reforzado y concreto ciclópeo de box culvert existente.
- En abscisa k4+853-k4+865 obra #9 se realiza instalación de formaleta y fundida de primera parte vástago de muro box culvert.
- Entre abscisa k4+900-k5+080 se realiza instalación y compactación de 1ra capa de subbase granular estructura de vía.
- Entre abscisa k5+560-k5+642 se realiza instalación y compactación de terreno para construcción de cuneta triangular.





Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

El 16 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+684 obra #6 se realiza instalación de formaleta y amarre de acero refuerzo para fundir muros del canal disipador descole box culvert
- En abscisa k4+830 obra #8 se realiza demolición de roca en encole box culvert.
- En abscisa k4+855 obra #9 se realiza desencofre y curado de 1ra parte vástago muro box culvert.
- Entre abscisa k4+900-k5+020 se realiza excavación de caja por fallo encontrado y mejoramiento de subrasante en predio rajón.
- Entre abscisa k4+560-k4+080 se realiza instalación y compactación de 1ra capa de subbase granular para estructura de vía
- Entre abscisa k5+478-k5+600 se realiza excavación y conformación de terreno para construcción de terreno para construcción de cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+622-k5+642 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta para fundir placas cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+615-k5+625 se realiza excavación y construcción de trinchos.



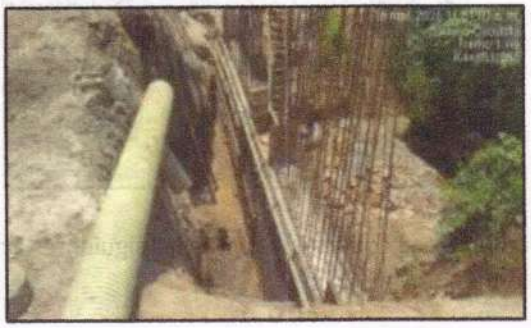

El 17 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+900-k4+950 se realiza chequeo primera capa de base.
- Entre abscisa k5+760-k5+840 se realiza fundida de la base en concreto de barrera metálica.
- Entre abscisa k4+900-k4+955 se realiza toma de densidades primera capa de subbase.
- Entre abscisa k5+940-k5+950 se realiza fundida de cuneta triangular.
- En abscisa k5+030 se realiza concreto lanzado para protección de talud
- En abscisa k5+520-k5+545 se realiza fundida de zarpa para fundida de cuenta.
- En abscisa k4+860 obra #9 se realiza relleno y construcción de filtro.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co






El 18 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k4+940-k4+950 se realiza encofrado de muro del cárcamo
- Entre abscisas k4+011-k4+900 se realiza verificación de la planicidad
- Entre abscisa k4+940-k4+952 se realiza fundida de muro cuneta triangular.
- Entre abscisa k4+552-k4+591 se realiza fundida cuenta triangular.




El 19 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k4+900-k5+020 se realiza chequeo de niveles segunda capa subbase.
- Entre abscisa k5+020-k5+080 se realiza chequeo de primera capa subbase.
- En abscisa k4+830 obra #8 se realiza demolición de box culvert existente.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- En abscisa k5+464 se realiza excavación y replanteo para construcción de cuneta.
- Entre abscisas k5+520-k5+545 se realiza amarre de acero refuerzo para fundida de cuneta triangular.
- En abscisa k4+830 se realiza fundida de solado.







El 20 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k5+780-k5+468 se realiza excavación y replanteo para conformación cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+020-k5+080 se realiza instalación de segunda capa de subbase.
- En abscisa k5+060 obra #11 se realiza realce en el acero para fundida de muro box culvert.
- En abscisa k4+870 obra #9 se realizan llenos y compactación en muro para nivelar y armar acero 1ra parte box culvert.
- En abscisa k4+832 se realiza armado de acero zarpa.
- Entre abscisa k5+020-k5+080 se realiza chequeo para liberación segunda capa subbase y se realiza toma de densidades.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

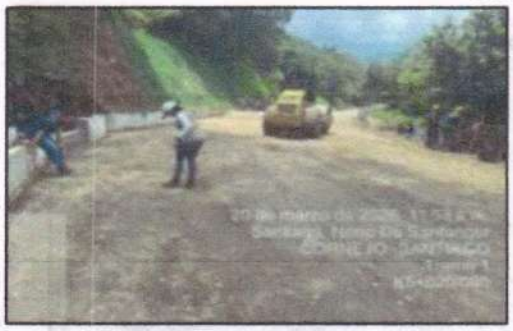



El 21 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+829 se realiza fundida de zarpa box culvert.
- Entre abscisa k5+375-k5+389 se realiza fundida en concreto de 21MPA placa encole obra #15
- Entre abscisa k5+391.2-k5+406.2 se realiza fundida en concreto de 21MPA placa sin borde cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+406.2-k5+428.6 se realiza fundida en concreto de 21MPA. Placa cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+452-k5+461.6 se realiza fundida en concreto de 21MPA bordillo y placa cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+461.6-k5+464 se realiza fundida en concreto de 21MPA cuneta especial con bordillo izquierdo.
- Entre abscisa k5+478-k5+482 se realiza fundida den concreto de 21MPA cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+482-k5+484.5 se realiza fundida en concreto de 21MPA placa cuneta triangular.
- Entre abscisa k5+520-k5+545 se realiza fundida cuneta triangular.

El 24 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisas k4+720-k4+760 borde derecho se realiza instalación de barrera metálica.
- En abscisa k5+500 se realiza armado de acero en cuneta. En el acceso para el predio la esmeralda
- Entre abscisa k5+574-k5+389 se realiza amado de acero para fundida de cuneta, costado izquierdo.
- En abscisa k5+830 costado derecho se realiza construcción de muro realce zarpa obra #9.
- En abscisa k5+840 se realiza armado de acero y fundida de muro box culvert.
- Entre abscisa k5+005-k5+080 se realiza chequeo primera capa de base.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co



El 25 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+830 se realiza desencofrado muro descole 1ra parte cuerpo box culvert.
- En abscisa k4+870 se realizan llenos y compactación 5ta capa en descole box culvert.




El 26 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+860 se realiza armado de acero refuerzo placa inferior del box culvert.
- En abscisa k4+830 se realiza armado acero de refuerzo losa superior del box culvert
- Entre abscisa k5+000-k5+080 se realiza planicidad en la 2da capa sub base carril izquierdo

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Entre abscisa k5+450 se realiza fundida den concreto premezclado de 21MPA, batea de la entrada coquisadora los morochos
- Entre abscisa k5+000-k5+080 se realiza chequeo de base, toma de densidades y imprimación para instalación de MDC-19 carril izquierdo
- En abscisa k4+860 se realiza armado de acero y fundida en concreto de 21MPA cuerpo del box culvert.
- En abscisa k4+830 se realiza armado de acero refuerzo y fundida en concreto de 21MPA placa superior.

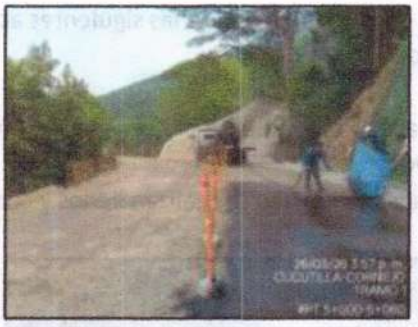

El 27 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+830 se realiza armado de acero refuerzo del muro vástago box culvert
- Entre abscisa k4+720-k4+800 se realiza instalación de asfalto MDC-19 1ra capa carril izquierdo.
- Entre abscisa k4+900-k4+950 se realiza chequeo a la primera capa de base.
- En abscisa k4+855 se realiza arma acero 1ra parte muros descole cuerpo Boxculvert.
- Entre abscisa k5+000-k5+080 se realiza instalación de asfalto MDC-19 primera capa carril izquierdo.
- Entre abscisa K4+900-K5+005 se realiza extienda 2da capa de base granular estructura de vía
- En abscisa k4+855 se realiza fundida muros 1ra parte cuerpo Boxculvert descole.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co






El 28 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisas K4+715-k4+800 Carril derecho se realiza céreo de 2da capa de base granular estructura de vía
- Entre abscisa k4+905-k4+970 se realiza céreo de base y se realiza la respectiva liberación.
- Entre abscisa k4+905-k4+907 se realiza instalación de MDC-19 primera capa carril izquierdo




Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co



El 30 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k4+860 se realiza armado de acero refuerzo y encofrado al realce del muro
- En abscisa k4+830 se realiza armado de acero muro box culvert





El 31 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría


- Entre abscisa k4+950-k5+000 se realiza chequeo de planicidad para instalación MDC-19





A continuación, se presenta el estado de intervención del tramo 1. El color amarillo indica el sitio que se encuentra en intervención, mientras que el color verde señala las actividades que ya fueron realizadas.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

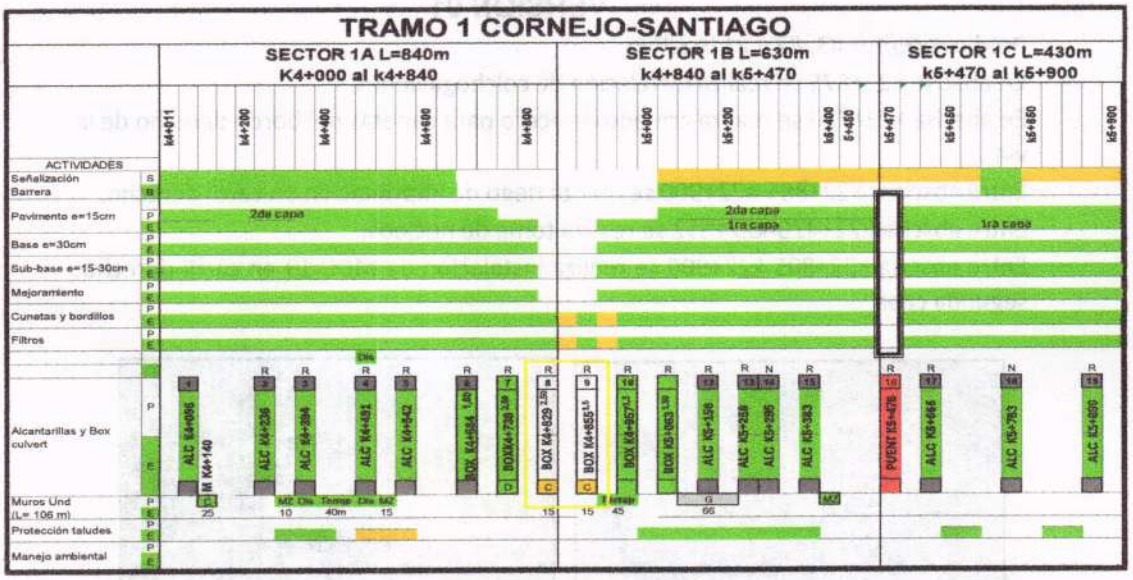

Tramo 3

El 02 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2, #3 inactivo.
- En abscisa k22+635 se realiza conformación de cunetas costado derecho.
- En abscisa k22+800 se realiza instalación de geomanto de Revegetalizacion en los taludes del costado izquierdo.
- Entre abscisa k22+805-k22+900 se realiza céreo de la caja de base carril derecho
- Entre abscisa k22+011-k22+365 se realiza toma de núcleos.
- Entre abscisa k22+800 se realiza instalación de geomanto de revegetación en el talud.
- El equipo de topografía de interventoría realizo el levantamiento topográfico de de los puntos de sitio crítico.



El 03 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Predio receptor #3, #2 y #1 inactivo
- En abscisa k22+875 se realiza instalación de colchogaviones.
- En abscisa k22+710 se realiza armado de acero para cunetas del borde derecho de la vía
- Entre abscisas k22+885-k22+900 se realiza riego de imprimación en carril derecho.
- Entre abscisa k22+420-k22+652 se realiza toma de núcleos.
- Entre abscisa k22+805-k22+900 se realiza instalación de MDC-19 en carril derecho, segunda capa







El 04 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #3, #2 y #1 inactivo
- Entre abscisa k22+720-k22+800 se realiza excavación para cunetas, costado derecho
- Entre abscisa k22+630-k22+650 se realiza empalme de la cuneta rectangular, costado izquierdo.
- Entre abscisa k22+755-k22+810 se realiza instalación de geomanto en el talud del costado izquierdo
- Entre abscisa k18-800 predio receptor #3 se realiza adecuación de material

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co







El 05 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivo.
- Predio receptor #3 se realiza adecuación de material.
- En abscisa k22+730 hacia mayores se realiza verificación de niveles para fundida de cunetas, costado derecho.
- Se realiza armado de acero y formaleta para fundida cuneta, borde derecho de la vía





Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co



El 06 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 inactivo
- Predio receptor #3 se realiza conformación de material.
- En abscisa k22+994 Punto crítico retoman la actividad de relleno atrás del muro de contención
- Entre abscisa k22+670-k22+695 se realiza levantamiento topográfico a las cunetas, costado izquierdo.
- Entre abscisa k22+730-k22+765 se realiza fundida de cunetas en concreto mesclado en obra.









El 07 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Predio receptor #1, #2 inactivo
- Predio receptor #3 se realiza conformación de material.
- En abscisa k22+770 hacia mayores. Se realiza excavación para construcción de cunetas, carril derecho.




El 09 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivo.
- En abscisa k22+800 hacia mayores se realiza armado de cunetas.
- En abscisa k22+875 se realiza amado de acero del canal.



El 10 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k22+848 hacia mayores. Se realiza excavación para cunetas, costado izquierdo
- En abscisa k22+800 hacia mayores se realiza armado de acero para cunetas del borde derecho y bate a de acero al hotel
- Entre k22+750-k22+885 se realizan toma de núcleos. Costado derecho de la vía.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co






El 11 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivo
- Entre abscisas k22+660-k22+675 y k22+675-k22+922 se realiza instalación de MDC-19, carril derecho.






Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

El 12 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivo
- Entre abscisa k22+840-k22+900 se realiza armado de acero para la parrilla de cunetas, costado izquierdo
- Entre abscisa k22+835-k22+870 se realiza instalación de tubería de los servicios agua y gas




El 13 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivos
- Entre abscisa k22+662-k22+806 se realiza instalación de MDC-19 segunda capa, carril derecho.
- Entre abscisa k22+840-k22+900 se realiza fundida de cunetas en concreto premezclado, costado izquierdo de la vía.





Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

El 14 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivo.
- Se realizan rellenos de la zanja donde se desplazó la tubería de agua y del gas
- En abscisa k22+875 se realiza levantamiento topográfico del canal descole del box culvert.
- Se realiza instalación de barrera metálica.




El 16 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #3 y #2 sin actividad
- Entre abscisas k22+830-ki22+876, k22+876-k22+900,k22+815-k22+865y k22+865-k22+895 se realiza instalación asfalto MDC-19, carril izquierdo.
- Entre abscisa k22+805-k22+875 se realiza instalación asfalto MDC-19, carril derecho.





Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

El 17 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor#1, #2 y #3 inactivo
- Entre abscisa k22+895-k22+900 se realiza instalación de asfalto MDC-19 carril derecho.
- Entre abscisa k22+820-k22+900 se realiza armado de acero de cuneta.

El 18 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1,#2 y #3 inactivo
- Entre abscisa k22+020-k22+900 se realiza fundida de cuneta en el borde izquierdo de la vía.
- Entre abscisa k22+695-k22+710 se realiza excavación para cunetas.



El 19 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k21+998-k22+020 se realiza instalación de geomanto en talud de sitio crítico.
- Entre abscisa k22+372-k22+390 se realiza excavación para instalar barrera metálica.
- Entre abscisa k22+595-k22+605 en la entrada del hatillo se realiza excavación para conformar acceso en batea.
- Entre abscisa k22+695-k22+710 se realiza excavación y conformación de terreno para continuar con armado de acero en cuneta triangular y batea de acceso, carril derecho.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co







El 20 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivo
- Entre abscisa k21+998-k22+020 se realiza instalación de geomanto e hidrosiembra en talud de punto crítico.
- Entre abscisa k22+390-k22+430 se realiza nivelación y fundida de parales metálicos, carril derecho.
- Entre abscisa k22+595-k22+605 se realiza vaciado de concreto en la vetea de acceso entrada urbanización al hatillo.
- Entre abscisa k22+695-k22+710 se realiza vaciado de concreto en 21MPA en cuneta triangular, carril derecho.





Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co




El 21 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivo
- Entre abscisa k22+540-k22+800 se realizan labores de limpieza.

El 23 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivo
- En abscisa k18+800 se realiza excavación de terrazas para construcción de filtros en predio receptor #3.

El 24 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Predio receptor #1, #2 y #3 inactivo
- Entre abscisa k22+595-k22+605 se realiza excavación para conformar acceso batea el hatillo y amarre de acero
- Entre abscisa k22+870-k22+875 se realiza excavación para replanteo disipador a canal box culvert
- En abscisa k18+800 se realiza excavación en terrazas para construcción de filtros en predio receptor.




Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

El 25 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k18+860 predio receptor #2 se realiza nivelación de mojones para control de asentamiento por parte de comisión de topografía interventoría
- Entre abscisa k21+900-k21+950 se realiza instalación de horcones para cerramiento de predios.
- Entre abscisa k21+900-k21+950 se realiza instalación de horcones para cerramiento de predios
- Entre abscisa k22+595-k22+605 se realiza armado de formaleta para vaciado en concreto de 28MPA acceso batea urbanización el hatillo.
- En abscisa k22+840 se realiza fundida de placa entrada señor Humberto y mejoramiento del acceso casas enseguida señor Carlos carril derecho.







El 26 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k21+910-k21+926 se realiza nivelación y ajuste de barrera metálica carril derecho.
- Entre abscisa k21+998-k22+010 se realiza excavación e instalación de geomanto talud sitio crítico.
- En abscisa k22+875 se realiza armado de formaleta y amarre de acero para fundida de muros que descarga fuentes hídricas a canal disipador box culvert
- En abscisa k22+875 encole box culvert se extiende malla electrosoldada a talud para lanzar concreto y proteger talud.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- En abscisa k18+800 se realiza excavación y construcción de filtro en terrazas de predio receptor #3.






El 27 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k21+930-k21+970 se realiza instalación de horcones para cerramiento de predios guiados por la línea de compra
- Se realizan tapas en concreto para encajar en cuneta rectangular frente a la vivienda del señor Humberto.
- En abscisa k22+895 se realiza corte de carpeta asfáltica y excavación de la misma para construcción de realce vehicular, costado izquierdo.
- En abscisa k18+800 predio receptor. Se realiza costura y lleno de filtros en terrazas.

El 28 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k22+895 se realiza realce en concreto, después de haber armado parilla en acero.

El 30 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k21+940-k21+980 se realiza excavación para horconadura de cerca en piedras, guiados por la comisión de topografía del consorcio vía centro en alineamiento a la compra.
- En abscisa k21+998-k22+010 en muro de sitio critico se realiza excavación para replanteo de cuneta.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co







El 31 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k21+970-k22+000 se realiza excavación para horconadura de acuerdo con línea de compra en predios.
- En abscisa k22+895 se realiza Armado de acero y realce en concreto.
- En abscisa k22+638 hacia mayores se realiza extracción de Núcleos.

A continuación, se presenta el estado de intervención del tramo 3. El color amarillo indica el sitio que se encuentra en intervención, mientras que el color verde señala las actividades que ya fueron realizadas.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

REGLETA DEL CORREDOR TRAMO 3 ARBOLEDAS-SALAZAR

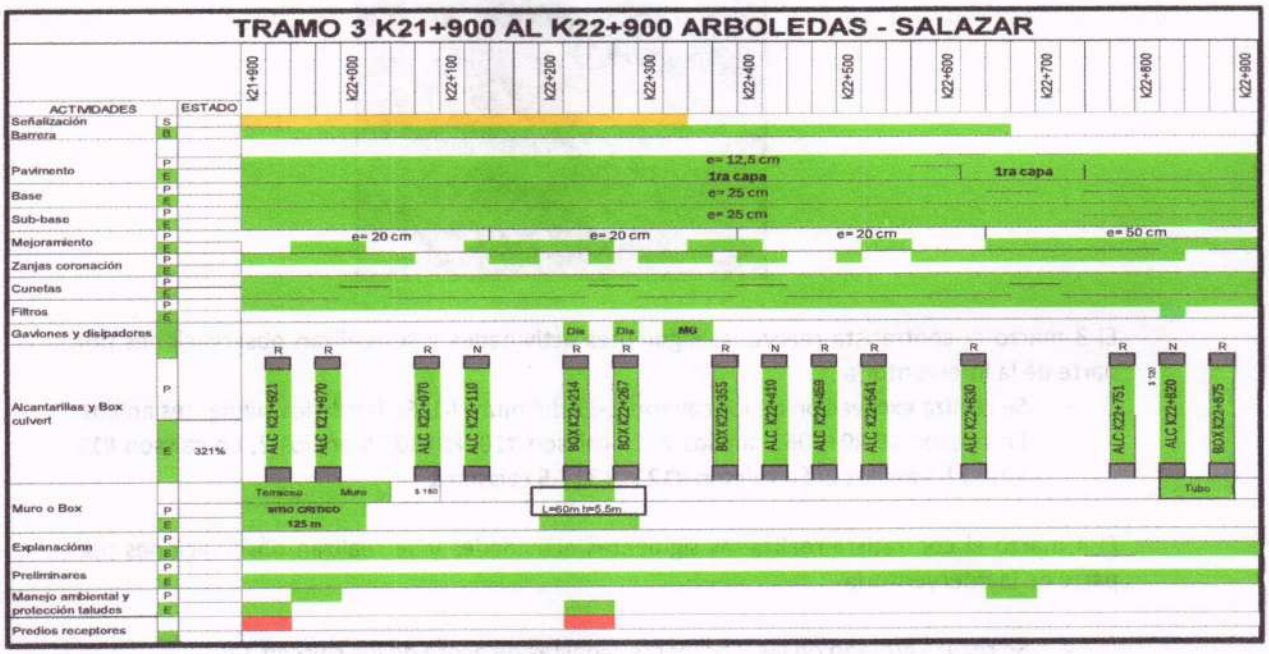

Tramo 4

El 2 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k0+308-k0+310 se realiza demolición de roca.
- Se funde los anillos #1 de los caisson 9, 10,11, 12 del muro 1.
- Se realiza excavación de los demás caisson del muro 1
- Entre abscisa k0+403-k0+420 se realiza armado de filtro en el borde derecho.





Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co



El 3 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Se realiza excavación de los caisson 1-12 del muro #1. Se funde los siguientes anillos. En caisson #9 k0+306.5 anillos 2, En caisson #10 k0+307.5 anillos 2, En caisson #11 k0+312.5 anillos 2, En caisson #12 k0+317.5 caisson 1

El 4 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Se realiza armado de las 2 primeras canastas de acero de los caisson 1 y 2.
- Se realiza excavación del resto de los caisson intervenidos en el muro #1
- Se funde el anillo #3 de caisson #10
- En el predio receptor se inician labores de acomodo de material de excavación.
- La comisión de topografía de interventoría realiza el levantamiento topográfico y basimétrica de los sectores de los muros







El 5 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Continúan con la excavación de los caisson del muro #1 del 1-12, y al mismo tiempo realizan el armado de acero para los caisson 1 y 2.
- Entre abscisa k0+000-k0+060 Se inicia con la excavación para mejoramiento de subrasante en el carril izquierdo.
- Se funden los anillos: caisson #1 k0+262.5 anillo #6, caisson #3 k0+272.5 anillo #8, caisson #4 anillo #7, caisson #9 k0+302.5 anillo #3, caisson #10 k0+307.5 anillo #4.




El 6 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- El personal se dedica a labores de fisurada y armado de acero parar las canastas de los caisson.
- Se realiza traslado de material de excavación al predio receptor. Se funden los siguientes anillos: anillo #9 de caisson #3 y anillo#4 del caisson #9.

El 7 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Se continúa adelantando labores de figurado y armado de acero para caisson.
- Predio receptor activo

El 9 marzo febrero el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Se continua con excavación de la construcción de los caisson, se funden los anillos #5 de caisson #9, anillo #3 del caisson #11, anillo #2 del caisson #12.

El 10 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k0+300-k0+320 Se reali8za excavación y demolición de caisson muro contención #1.
- Entre abscisa k0+380-k0+410 se realiza compactación a material de cobertura en filtro.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co




El 11 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k0+300-k0+320 Se continúan trabajos de perforación y demolición de caisson de muro contención #1
- Se realiza amarre de acero y armado de núcleos para caisson en muro #1.



El 12 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k0+300-k0+320 se realiza excavación en caisson #9, #10, #11, #12 de muro contención #1.
- Entre abscisa k0+262-k0+308 se realiza chequeo por parte de topografía de la interventoría a caisson, niveles de anillos y fondo quebrada monar.
- Se realiza amarre de acero para armado de niveles para caisson en muro de contención #1.
- Se realiza fundida de anillos en pilotes #4 y #10 de muro de contención #1




Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co



El 13 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k0+020-k0+035 se realiza caja de mejoramiento en carril izquierdo en piedra rajón a subrasante.
- Se realiza excavación y demolición de roca para caisson #9, #10, #11, #12 de muro de contención #1.







El 14 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k0+260-k0+320 se realiza amarre de acero para núcleos de caisson muro de contención #1.
- Se realiza excavación y demolición de roca en caisson #9, #10, #11, #12 de muro de contención #1.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co





El 16 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k0+390 Se realiza fundida de anillos de caisson #10, amarre de acero encole box culvert
- En abscisa k0+067 se realiza mejoramiento con piedra rajón en el margen izquierdo.






El 17 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Se realiza excavación y demolición de roca en caisson #10, #11, #12 módulos 5 y 6 muro sector 1.
- Se realiza fundido anillo #7 en caisson #10 modulo 5.
- Entre abscisa k0+080-k0+110 se realiza perfilado y conformación de subrasante.




El 18 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Se realiza excavación y demolición de roca en caisson #10, #11, #12.
- Se finaliza la excavación de caisson #3 y #9 modulo 2 y 5.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para caisson #3 y #9 modulo 3 y 9 modulo 2 y 5 sector 1 abscisa k0+272.5 caisson 3, abscisa k0+300.7 caisson 9.




El 19 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Se realiza excavación manual para construcción de anillos caisson #7, #8, #10, #12 finalizan con excavación de caisson #12.
- En abscisa k0+272.5 se realiza fundida de núcleo caisson #3 en concreto de 28MPA premezclado en obra.



El 20 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Se realiza excavación manual para construcción de anillo caisson #3, #4, #5, #6, #7 y #10 realizando liberación de anillos #3, #4, #5, #6, #7, #8 y #9 del caisson #10.
- En abscisa k0+317 se realiza fundida de niveles caisson #12 en concreto de 28MPA premezclado en obra.






El 21 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k0+262-k0+317 se realiza excavación para construcción anillos de caisson #4, #5, #6, #7
- Se realiza amarre de acero refuerzo e instalación del mismo para fundida de caisson #10.





El 23 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k0+262-k0+317 se realiza excavación para construcción de anillos de caisson #5, #7, #8.
- se realiza fundida de caisson #10 en concreto de 25 MPA preparado en obra.

El 24 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- Entre abscisa K0+262-K0+317 se realiza excavación para construcción de anillos de caisson #5, #7 y #8.
- Se realiza fundida de caisson #9 muro #1 en concreto de 28MPA premezclado en obra.
- En abscisa k0+405 borde izquierdo. Se realiza barrenado de roca para demolición de la misma en tramo de muro z

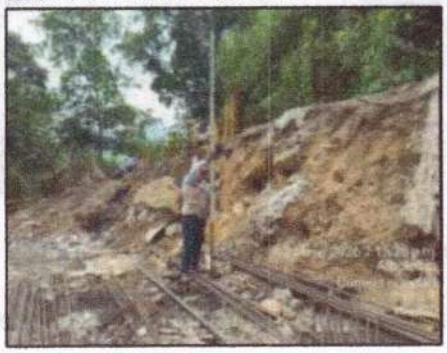


El 25 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisas k0+140-k0+180 se realiza excavación de caja para conformar estructura de vía.
- Entre abscisa k0+282-k0+297.5 se realiza excavación de manual para construcción de anillos de caisson #5, #6, #7 y #8 muro 1.
- En abscisa k0+312.5 se realiza fundida de núcleo caisson #11 en concreto de 28MPA preparado en obra, se toman muestras para ensayos del mismo.
- En abscisa k0+405 se realiza demolición de roca en muro #2.




El 26 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k0+282.9 se realiza excavación de caja para mejoramiento de subrasante carril izquierdo.
- En abscisa k0+282.9 se realiza excavación y fundida de anillo #9 caisson #5 en concreto de 21MPA premezclado en obra.
- En abscisa k0+292.5 se realiza excavación y fundida de anillo #5 caisson #8 en concreto de 21MPA. Preparado en obra.
- Se realiza amarre de acero refuerzo para parrillas de núcleos caisson.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co




El 27 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k0+165 hacia mayores se realiza caja para mejoramiento de subrasante carril izquierdo.
- Entre abscisa k0+260 al k0+320 se realiza excavación manual para construcción de caisson muro #1




El 28 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En abscisa k0+292.8 se realiza verificación de profundidad caisson #7 módulo 4
- Entre abscisas k0+262/317 se continúa excavación de anillos para construcción de caisson




Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

El 30 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisas K0+262/317 se realiza excavación para construcción anillos caisson # 6 y 8 muro # 1.





El 31 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría


- Se toman medidas de excavación de caisson # 5 k0+282.5 y caisson # 8 k0+297.5



Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

A continuación, se presenta el estado de intervención del tramo 4. El color amarillo indica el sitio que se encuentra en intervención, mientras que el color verde señala las actividades que ya fueron realizadas.

REGLETA DEL CORREDOR TRAMO 4 ARBOLEDAS-CUCUTILLA

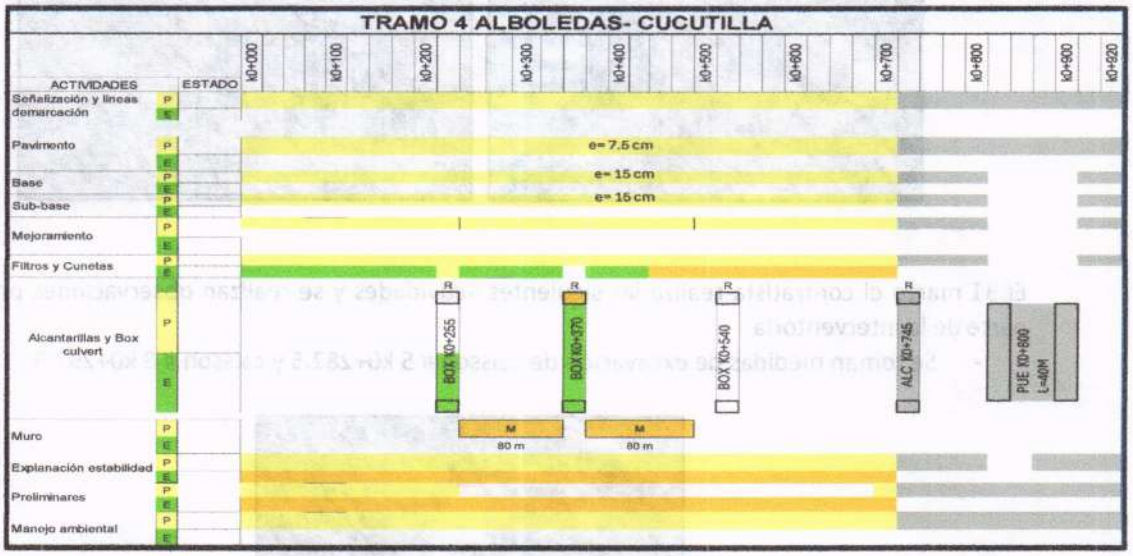

Tramo 5

El 11 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Se realiza localización, replanteo y rocería en predio receptor.
- Entre abscisa k2+000-k2+078 se realiza rocería en carril izquierdo.
-

El 12 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k2+310-k2+370 se realiza rocería.

El 13 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría


- Entre abscisa k2+310-k2+370 se realiza rocería, carril izquierdo.
- Entre abscisa k2+810-k2+775 se realiza ampliación de margen izquierdo para construcción de filtro.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co




El 14 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k2+695-k2+775 se realiza ampliación en margen izquierdo para construcción de filtro.

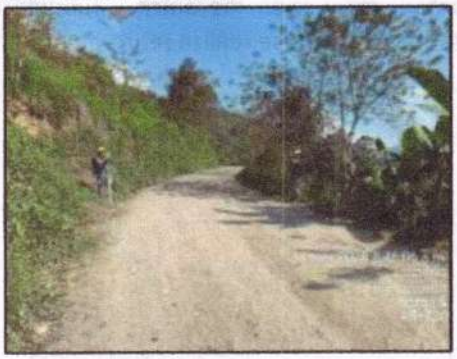




El 16 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k2+010-k2+078 se realiza ampliación marguen izquierdo para construcción de filtro.
- En abscisa k2+078 obra 11 se realiza excavación e instalación de 7.70ml de tubería de 36" coma y atraque de arena y rellenos perimetrales de tubería en crudo de rio.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

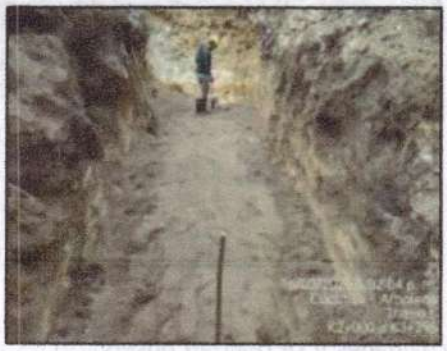


El 17 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En obra #1 se realiza localización, replanteo, excavación mecánica y fundida de solado para construcción de encole alcantarilla, también se realiza retiro de material de excavación a sitio de disposición.




El 18 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- En obra #1 se realiza localización, replanteo, excavación mecánica y fundida de solado para construcción de descole alcantarilla, también se realiza retiro de material de excavación a sitio de disposición.
- Entre abscisas k2+110-k2+180 se realiza ampliación de margen izquierdo para construcción de filtro.

El 19 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k2+055-k2+075 se realiza excavación para construcción de filtro.
- Entre abscisas k2+120-k2+140 se realiza ampliación en margen izquierdo para construcción de filtro.
- En abscisa k2+450 se realiza excavación mecánica, instalación cama de arena, instalación de 7.70ml de tubería de 36"se realiza atraque de tubería de arena y se llena con material crudo de rio.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co







El 20 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k2+055-k2+075 se realiza excavación para construcción de filtro.
- Entre abscisas k2+100-k2+180 se realiza perfilado de talud y ampliación ancho de via construcción de filtro.
- En abscisa k3+211.5 se realiza excavación mecánica, demolición de tubería 14" existente, instalación cama de arena, instalación de 7.70m de tubería 36" atraques y rellenos de tubería para alcantarilla obra #8



El 21 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k2+040-k2+060 se realiza excavación para construcción de filtros

El 24 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa k2+000-k2+050 se realiza excavación mecánica para construcción de filtro
- Entre abscisa k2+220-k2+250 se realiza perfilado de talud para ampliación ancho de vía. Se realiza retiro de material a sitio de disposición.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co




El 25 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa KI2+000-K2+050 se realiza excavación mecánica para construcción de filtro.
- Entre abscisa k2+078-k2+080 obra #1 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta y fundida de placa fondo encole alcantarilla.
- Entre abscisa k2+450obra #3 se realiza excavación mecánica y fundida de solado mejoramiento para construcción descole alcantarilla.
- Entre abscisa k2+180-k2+280 se realiza perfilado de talud para ampliación ancho de vía.
- En abscisa k2+450 obra #3 se realiza excavación mecánica y fundida de solado mejoramiento para construcción descole alcantarilla.






El 26 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa K2+050-K2+060 se realiza excavación mecánica para construcción de filtro. Costado izquierdo.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

- En abscisa k2+080 obra #1 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta y fundida miro encole alcantarilla.
- Entre abscisa k2+075-k2+085 obra #3 se realiza amarre de acero refuerzo para fundir muro encole alcantarilla.
- Entre abscisa k2+250-k2+280 se realiza perfilado de talud para ampliación ancho de vía.
- En abscisa k2+450 obra #3 se realiza perfilado de talud 1:4 para ampliación de vía.




El 27 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa K2+040-K2+050 se realiza construcción de filtro costado izquierdo.
- En abscisa k2+080 obra #1 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta y fundida de zarpa y dentellón descole alcantarilla en concreto de 28MPA.
- Entre abscisa k2+075-k2+085 obra #3 se realiza barrenado de rocas para demolición de las mismas.
- Entre abscisa k2+220-k2+280 se realiza perfilado de talud T:4 para ampliación ancho de vía.






Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

El 28 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa K2+040-K2+050 se realiza construcción de filtro costado izquierdo.
- En abscisa k2+080 obra #1 se realiza amarre de acero refuerzo, instalación de formaleta y fundida de zarpa y dentellón descole alcantarilla en concreto de 28MPA.
- Entre abscisa k2+075-k2+085 obra #3 se realiza barrenado de rocas para demolición de las mismas.
- Entre abscisa k2+220-k2+280 se realiza perfilado de talud T:4 para ampliación ancho de vía.

El 30 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría

- Entre abscisa K2+220-K2+300 se realiza corte de talud para ampliación de banca.
- En abscisa k2+078 obra 1 se realiza se realiza armado de acero refuerzo aleta y muro pantalla descole alcantarilla.
- En abscisa k2+450 obra #3 se realiza armado de acero refuerzo zarpa dentellón descole alcantarilla

El 31 marzo el contratista realiza las siguientes actividades y se realizan observaciones por parte de la interventoría


- Entre abscisa K2+220-K2+300 se realiza corte de talud para ampliación de banca.
- En abscisa k2+078 obra 1 se realiza instalación de formaleta para fundir aletas y muro pantalla descole alcantarilla.
- En abscisa k2+450 obra #3 se realiza fundida zarpa y dentellón descole alcantarilla en concreto 28 MPA preparado en obra.





A continuación, se presenta el estado de intervención del tramo 5. El color amarillo indica el sitio que se encuentra en intervención, mientras que el color verde señala las actividades que ya fueron realizadas.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.comejo@joyco.com.co

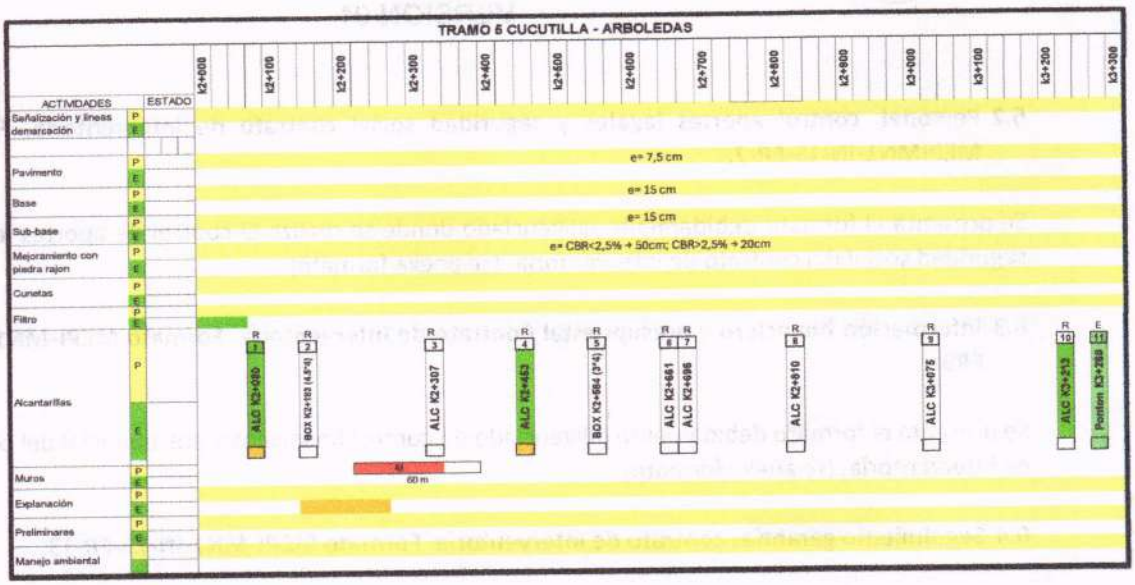

5.2.2 Oficios realizados por la interventoría

Durante el periodo del mes de marzo 2026 la interventoría realizo observaciones y solicitudes mediante oficios (se anexa relación de correspondencia)

5.2.3 Informe del Programa Anual de Caja - PAC

En el mes se realiza entrega por parte de la profesional de apoyo a la supervisión planta central INVIAS el registro presupuestal de la vigencia 2026 interventoría

5.2.4 Informe de especialistas

Durante el mes de marzo los especialistas y profesionales realizan acompañamiento al contratista desde las diferentes áreas: ambiental, sostenibilidad, predial, hidráulico, geométrico, calidad, pavimentos, estructuras, geotecnia, avalúos. (Se anexan informes)

5.2.5 Informe de matriz de riesgos

Se anexa el seguimiento a la matriz de riesgos del consorcio R&Q JOYCO.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

Durante el periodo la interventoría CONSORCIO R&Q – JOYCO relaciona en el formato el equipo presente en el proyecto. (Se anexa formato)

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. Formato MEPIMN1-IN-15-FR-7.

Se presenta el formato debidamente diligenciado donde se realiza el control de aportes legales y seguridad social del contrato de interventoría. (se anexa formato)

6.3 Información financiero y presupuestal Contrato de Interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR9.

Se presenta el formato debidamente diligenciado de control financiero y presupuestal del contrato de interventoría, (se anexa formato).

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

Se realiza seguimiento a las garantías del contrato de Interventoría mediante el formato indicado. (se anexa formato)

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

Durante el mes de marzo la interventoría realiza ensayos de laboratorio (se anexa formato del área de calidad).

6.6 Seguimiento financiero a la cuenta del convenio 1914-2021

Durante el mes de marzo la gobernación realiza la gestión de los reintegros del convenio al Banco de la republica correspondiente a los meses de mayo 2025 a diciembre 2025, se encuentra a la espera de la entrega de los comprobantes de egreso.

Asimismo, mediante los comunicados No. 48-02-2026/1032-2022, enviado el 12 de febrero de 2026, y No. 05-04-2026/1032-2022, enviado el 6 de abril de 2026, se realizó la respectiva solicitud del reintegro de los rendimientos financieros.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda al profesional de área por parte del contratista, el cumplimiento de la información requerida a tiempo, ya que esto dificulta el avance en lo demás procesos necesarios para el desarrollo de actividades antes y durante el inicio de obra.

- Se han realiza los acercamientos con el profesional de área del contratista permitiéndose dar claridad sobre las actividades exigidas para el presente proyecto, visitas a frente de obra y mesas de trabajo que permitan el avance de los compromisos. Los materiales para rellenos, presentados por el contratista cumplen lo requerido, el material tipo base granular cumple con los requerimientos para tramo 1, 3,4 y 5 los agregados para la mezcla asfáltica cumplen con lo requerido.

- Los materiales para rellenos, presentados por el contratista cumplen lo requerido, el material tipo base granular cumple con los requerimientos para tramo 1, 3,4 y 5 los agregados para la mezcla asfáltica cumplen con lo requerido.
- Se realiza acompañamiento a las pruebas de campo realizados por el contratista para el control de concretos.
- Se realizan ensayos de densidades de campo verificando el cumplimiento de la compactación en las capas de la estructura del pavimento, llenos en la instalación de tuberías para alcantarillas y llenos de muros.
- Seguimiento y control a los concretos usados en la elaboración de las estructuras de alcantarillas y muros,
- Seguimiento a la instalación de mezcla asfáltica en los diferentes tramos y toma de muestra de esta.
- Se realiza toma de núcleos de la mezcla asfáltica instalada para verificación de la correcta compactación.
- En el marco de cumplimiento de la Guía de Manejo Ambiental – Modo Carretero, versión 2022, se revisó la trazabilidad de los permisos desde el componente social y se concluye que el contratista se encuentra a la espera de un pronunciamiento por parte del MININTERIOR con respecto al certificado de consulta previa para tramo #1, tramo #2, tramo #4 y tramo #5.
- Desde esta interventoría se han estructurado los oficios necesarios para dar cumplimento a las actividades iniciales correspondientes al área, según cronograma de obra vigente, y el diligenciamiento de los respectivos formatos para cada una de las fases; Mediante oficio 29-12-2023/1032-2022 (Radicado interno CC-92) del 21/12/23, se solicita al contratista el diligenciamiento de los formatos MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta Radicación Y Actualización Social De Proyectos, MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan De Inversión Social y MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz Cumplimiento Actividades Sociales, que hasta la fecha de realización del presente informe, los documentos para los periodos de DICIEMBRE, ENERO del 2025 y FEBRERO del 2026, no han sido presentados por el contratista.
- El documento PAGA fue aprobado parcialmente para tramo #3 k22+900- k21+900 ARBOLEDAS - SALAZAR, mediante oficio CC-396, 55-05-2024/1032-2022, Para tramo #2 k12+200-k12+600 CORNEJO SANTIAGO, y tramo #1 k4+000-k5+900 CORNEJO-SANTIAGO

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co

mediante oficio CC-907, 68-12-2024/1032-2022, tramo #4 k0+000-k0+920 ARBOLEDAS mediante oficio CC-1893, 46-12-2025/1032-2022, Documento actual, versión 6.

- Se recomienda al profesional de área por parte del contratista, el cumplimiento de la información requerida a tiempo, ya que esto dificulta el avance en lo demás procesos necesarios para el desarrollo de actividades antes y durante el inicio de obra.
- Se han realiza los acercamientos con el profesional de área del contratista permitiéndose dar claridad sobre las actividades exigidas para el presente proyecto, visitas a frente de obra y mesas de trabajo que permitan el avance de los compromisos.
- El plan de inversión social fue entregado por el contratista y se realizaron las observaciones con referencia al rubro destinado para "obras con participación comunitaria" mediante oficios 65-05-2024/1032-2022 cc-406 del 29 de mayo y 71-05-2024/1032-2022, CC-412, del presente año, a la fecha no se han recibido actualizaciones de este y de igual manera, se presenta desactualizado el ítem socio-predial.
- El contratista presenta información correspondiente a las obras con participación comunitaria para tramo #3, pero este, carece de información técnica y presupuestal para dar cumplimiento a lo dispuesto en la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero INVIAS.
- Se solicita al contratista de obra adelantar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de la elaboración de actas de vecindad de seguimiento y cierre según aplique el tramo de intervención. y del mismo modo, las reuniones de avance y seguimiento.
- El consorcio vía centro está haciendo entrega de la seguridad social de manera atrasada.

Dirección AC 26 69 76 ED ELEMENTO TO TIERRA OF 1503; teléfono 6012210190
E-mail: Cucutilla.cornejo@joyco.com.co
