CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

4. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO ELECTRONICO

NOMBRE: JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el presente mes:

- Verificación de estudios, diseños y cantidades de obra

Atentamente,



JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO
Ingeniero Electrónico
MP AN 206-104636
Contrato No. 006-24

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

5. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO MECANICO

NOMBRE: KAREN MELISSA CAVADIA FORERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

NOMBRE:

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de en el mes de diciembre:

Revisión de estudios, diseños y cantidades de obra.

Atentamente,



KAREN MELISSA CAVADIA FORERO
Ingeniero Mecánico
MP CN230-90220

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

6. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO SANITARIO

NOMBRE: ANGELICA AIDEE CORONADO A

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023


CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de en el mes de DICIEMBRE:

- Revisión de estudios, diseños y cantidades de obra
- Acompañamiento y verificación de las instalaciones sanitarias e hidráulicas.
- Visitas técnicas.

Atentamente,



ANGELICA AIDEE CORONADO A
Ingeniero sanitario
MP 22236108281 COR
Contrato No. 003-24

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

7. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO TOPOGRAFICO

NOMBRE: YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de Dic del 2024:


1. Acompañamiento y verificación de la localización, trazado y replanteo de los diferentes bloques.

2. Verificación de la cartera de volúmenes de excavación.

3. Verificación de las coordenadas topográficas.

4. Apoyo en la revisión de los temas correspondientes a la solicitud de mayores cantidades de obra presentada por el contratista.

Atentamente,



YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA
Ingeniero topográfico
CC 1.069.490.072
Contrato 010 -2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

EQUIPO MINIMO INTERVENTORIA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
Computador con licencias	4
Vehículo	1

Tabla 28 Equipo mínimo interventoría

En el Formato FSI-800-018, el Interventor lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el periodo reportado en el presente informe de interventoría.

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

En el Formato FSI-800-019, el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por La Gobernación de Sucre.

6.3 Información financiero y presupuestal

De acuerdo con el presupuesto contractual inicial la interventoría tiene un presupuesto inicial por valor de $ 1.330.217.540,00 M/CTE, IVA incluido, equivalentes a 1023,24 SMMLV para el año de suscripción del contrato, respaldado con certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 312 del 28/02/2024. La forma de pago es la siguiente:

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	**NO APLICA**
PAGOS POR AVANCE	La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato hasta un 95% según avance de ejecución y los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de las actividades por parte del supervisor; No obstante, los giros estarán supeditados a las transferencias programadas en el marco de la ejecución del Contrato Específico No. 2230170, suscrito entre ENTerritorio, MINSALUD y Departamento de Sucre. Para lo cual será requerido certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde Del pago final. Valor interventoría $ 1,330,217,540 conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

PAGO FINAL	**5%** del valor del contrato, se realizará contra la liquidación del contrato y será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Requisitos para el pago final. Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Elaboración y suscripción de acta final a satisfacción por parte del supervisor. • Elaboración y presentación de informes de INTERVENTORIA. • Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo con disponibilidad del PAC.

A la fecha se han tramitado (6) actas de pago, con la siguiente información:

Acta No. (Fecha)	Costo directo	IVA 19%	Costo total	Acumulado	Saldo por ejecutar
No. 1 junio 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$73.985.007,25	$ 1.256.232.532,75
No. 2 Julio 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$147.970.014.50	$1.182.247.525,50
No. 3 Agos 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$221.955.021.75	$1.108.262.518,25
No. 4 Sep. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$295.940.029.0	$1.034.277.511,00
No. 5 Oct. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$369.925.036.25	$ 960.292.504,00
No. 6 Nov. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$443.910.043.50	$ 886.307.497,00

Tabla 29 Inf. Financiera interventoría

En el Formato FSI-800-020, el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100010928 – INTERVENTORIA			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$133.021.754,00	31/05//2024	31/05/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 66´510.877,00	24/04//2024	30/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$133.021.754,00	30/11//2025	30/11/2030

Tabla 30. Inf. pólizas interventoría

En el Formato FSI-800-020, el Interventor y el Supervisor del contrato de Interventoría realizan el seguimiento a las garantías del contrato.

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **CONTROL EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	FSI-800-018
		VERSIÓN	1
		FECHA	01/0172024

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA 31/12/2024 **PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. CM 001-24 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMPUTADOR	HP 7000 SERIES		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
COMPUTADOR	LENOVO		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
COMPUTADOR	ASUS VIVOBOOK X512D		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
COMPUTADOR	LENOVO		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
IMPRESORA RICOH	C2504		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
VEHICULO	CHANGAN C35 - PLACA LXX715 - MODELO 2024		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
CELULAR	SAMSUMG		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202090255COR

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	FSI-800-020
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/2024

FECHA 31/10/2024 **MES INFORME MENSUAL::** 7
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1955	2023002700021 CONSTRUCC1ON , EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTAC1ON DEL HOSPITAL DEL GOLF0 DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	2.3.2.01.01.001.02.08	APORTES NACION	PRINCIPAL	$ 1.330.217.540,00	$ 1.330.217.540,00
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.330.217.540**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Observaciones
1	jun-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.256.232.533	$ 1.256.232.532,75	jul-24	Pagada
2	jul-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.182.247.526	$ 1.182.247.525,50	jul-24	Pagada
3	ago-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.108.262.518	$ 1.108.262.518,25	ago-24	Pagada
4	sep-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.034.277.511	$ 1.034.277.511,00	sep-24	Pagada
5	oct-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 960.292.504	$ 960.292.503,75	oct-24	Pagada
6	nov-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 886.307.497	$ 886.307.496,50	nov-24	Pagada
TOTALES		**$ 373.033.650,00**	**$ 70.876.393,50**	**$ 443.910.043,50**	N/A	N/A	N/A					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTAPARCIAL 1	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 2	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 3	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 4	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 5	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 6	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
VALOR TOTAL			**$ 443.910.043,50**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**



Firma:
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	FSI-800-021
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/2024

FECHA 31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM-001/24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA DE INICIO: 31/05/2024

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: nov-25
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.330.217.540,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.330.217.540,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 133.021.754,00	31	5	2024	31	5	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 66.510.877,00	24	4	2024	30	11	2028
Calidad del servicio	10%	$ 133.021.754,00	30	11	2025	30	11	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100010928

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 6/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

Vo.Bo.

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Supervisor Contrato de Interventoría

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Mediante oficio se solicitó al contratista hacer claridad frente al tema de cumplimiento de las obligaciones contractuales del personal y se le recordó que el incumplimiento de las obligaciones acarrea multas.
- Todos los cálculos y gráficos del presente informe se realizaron partiendo de la reprogramación de obra adjunta.
- Con ocasión de las festividades navideñas, el Ministerio de Transporte, conforme a lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014, ha dispuesto la restricción de circulación para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas (3400 kilogramos) en la red vial nacional decreto restricciones del carga algunos días del mes de diciembre, situación imposibilito el suministro de concreto premezclado y otros insumos necesarios para el desarrollo de las actividades en obra. Adicionalmente, el incremento de las actividades turísticas durante estas fechas genera dificultades en la movilidad, la seguridad y el desarrollo normal de las actividades cotidianas en el municipio, se concertó con el contratista la suspensión de algunas actividades en la obra durante dicho mes.
- La suspensión mencionada anteriormente ocasiono una disminución en el rendimiento y en consecuencia una menor inversión durante este periodo, no obstante para los meses venideros se tomaran las medidas necesarias para subsanar el atraso generado.

8. ANEXOS

Anexo 8.1 Correspondencia enviada y recibida

Anexo 8.2 Registro fotográfico Documentos de interventoría

Anexo 8.3 Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, calidad y sostenibilidad

Anexo 8.4. Bitácora



HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legar Consorcio
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

Gobernación de Sucre

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024



ANEXOS

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

ANEXO 8.1

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Gobernación de Sucre

CONTRATO DE OBRA LP 018-23	CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-001-24

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INTERVENTOR:	CONSORCIO INRHOSPITAL COVEÑAS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DICIEMBRE 2024			
FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	CONSECUTIVO
12 de diciembre de 2024	GOBERNACION DE SUCRE/CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	CITACION COMITÉ UGENTE	OFC-055-INTERHOSPITAL-2024
18 de diciembre de 2024	PERSONERIA COVEÑAS	CONVOCATORIA A REUNIÓN – RADICADO PMC-408	OFC-056-INTERHOSPITAL-2024
19 de diciembre de 2024	PERSONERIA COVEÑAS	SUSPENSIÓN ACTIVIDADES PRINCIPALES	OFC-058-INTERHOSPITAL-2024

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 13 de diciembre de 2024.

OFC-055-INTERHOSPITAL-2024

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: CITACION COMITÉ TECNICO URGENTE

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta incidente ocurrido el día de hoy 13 de diciembre de 2024 en la obra de la referencia, donde repentinamente durante el proceso de vaciado de la placa de entrepiso del bloque 3, se produjo el colapso parcial de la misma, situación que de manera preliminar se atribuye a un fallo en los gatos de carga utilizados para soportar la estructura, y que por fortuna solo dejo pérdidas materiales; nos permitimos citar a comité presencial urgente en el sitio de la obra el día lunes 16 de diciembre a las 9:00 am, el cual deberá contar con la presencia del especialista en estructuras que hace parte de su equipo de trabajo.

Así mismo, con el fin de evaluar más a fondo las causas del colapso y determinar las acciones técnicas correctivas a seguir que permitan garantizar la estabilidad de la obra y evitar que a futuro se repitan situaciones como esta, solicitamos el concepto técnico por parte del contratista de obra, así como un informe estructural correspondiente para evaluar el estado de la estructura y tomar las acciones correctivas necesarias.

Por último, y con el fin de evitar poner en riesgo la integridad de quienes allí laboran, solicitamos que se inicie la demolición del área afectada y tomar de manera previa las medidas de seguridad necesarias, como el acordonamiento de la zona y la restricción de acceso a personal no autorizado.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 18 de diciembre de 2024.

OFC-056-INTERHOSPITAL-2024

Doctor
JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
Personero Municipal - Coveñas
contactenos@personeria-covenas.gov.co, secretaria@personeria-covenas.gov.co
Coveñas-Sucre


REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: CONVOCATORIA A REUNIÓN – RADICADO PMC-408

Cordial Saludo,

En atención al oficio de la referencia y con el ánimo de atender su convocatoria para la realización reunión de hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEHOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, programada por usted para el día viernes 20 de diciembre de 2024 a las 2.00pm en la Casa de la cultura, me permito informar que por compromisos laborales adquiridos de manera previa no me es posible asistir, por lo anterior y teniendo en cuenta la importancia de este comité para el adecuado desarrollo del proyecto, me permito solicitar amablemente sea evaluada la posibilidad de reprogramar la reunión para el mes de enero de 2025. Quedo atento en caso de que pueda ser reprogramada.

Cordialmente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 19 de diciembre de 2024.

OFC-058-INTERHOSPITAL-2024

Doctor
JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
Personero Municipal - Coveñas
contactenos@personeria-covenas.gov.co, secretaria@personeria-covenas.gov.co
Coveñas-Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: SUSPENSIÓN ACTIVIDADES PRINCIPALES

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito informar que, con ocasión de las festividades navideñas, el Ministerio de Transporte, conforme a lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014, ha dispuesto la restricción de circulación para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas (3400 kilogramos) en la red vial nacional.
Dicha restricción estará vigente durante los siguientes periodos:


- **Navidad**: del sábado 21 al miércoles 25 de diciembre de 2024.
- **Año Nuevo**: del sábado 28 de diciembre de 2024 al miércoles 01 de enero de 2025.
- **Puente festivo "Día de los Reyes Magos"**: del viernes 03 al lunes 06 de enero de 2025.

Esta situación imposibilita el suministro de concreto premezclado y otros insumos necesarios para el desarrollo de las actividades en obra. Adicionalmente, el incremento de las actividades turísticas durante estas fechas genera dificultades en la movilidad, la seguridad y el desarrollo normal de las actividades cotidianas en el municipio.

Por lo anterior, y en concertación con el contratista de la obra **"Construcción, Equipamiento Fijo y Dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas"**, se ha decidido suspender las actividades principales en la obra a partir del **domingo 22 de diciembre hasta el martes 7 de enero de 2025**.

Cabe aclarar que esta suspensión afecta únicamente algunas actividades operativas en la obra, mientras que las actividades menores y administrativas continuarán desarrollándose con normalidad.

Cordialmente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA		Gobernación de Sucre
CONTRATO DE OBRA LP 018-23		CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-001-24	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INTERVENTOR:	CONSORCIO INRHOSPITAL COVEÑAS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA - DICIEMBRE 2024			
Fecha	Consecutivo	Entidad de origen	Asunto
9 de diciembre de 2024	800-11-04/SI3214	GOBERNACION DE SUCRE	CERTIFICADO E INFORME DE MANEJO ANTICIPO
10 de diciembre de 2024	HGM24052024-39	CONSORCIO CMO	ENTREGA DE INFORME DE OBRA No. 6
7 de noviembre de 2024	PMC-408	PERSONERIA	CONVOCATORIA A REUNION TERCEROS

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

800-11-04/ SI – 3214

Sincelejo, 09 de diciembre de 2024.

Señor
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Contrato No. CM-001-2024

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-001-2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

Asunto: CERTIFICADO E INFORME DE MANEJO DE ANTICIPO

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las funciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales y jurídicas de la Interventoría, y en aras de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, nos permitimos solicitar la siguiente información:

- Certificado de Buen Manejo del Anticipo del CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE. Mediante este certificado el interventor garantiza que hizo seguimiento y verificación de la correcta inversión de los recursos del anticipo.
- Formato FSI-800-013 Informe De Inversión Y Buen Manejo Del Anticipo Contrato De Obra debidamente diligenciado y actualizado a la fecha.
- Resumen ejecutivo donde describa las inversiones realizadas por el Contratista de Obra de acuerdo a lo relacionado en el Formato FSI-800-013 Informe De Inversión Y Buen Manejo Del Anticipo Contrato De Obra.
- Informe de Rendimientos Financieros (si aplica)

La Secretaria de infraestructura Departamental quiere promover el flujo de información con las partes participantes del proyecto y los entes de control que mensualmente solicitan información actualizada, y también buscando el cumplimiento efectivo de contrato de obra y el mejoramiento continuo.

El anterior requerimiento se hace en base a las siguientes condiciones contractuales:

*(...) **CONTRATO. CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR.***
***a) DEL CONTRATISTA** En cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: De carácter General....8. **Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran**.*
***CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR.....** 13. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, **así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo** (Cuando aplique) (...)*

Agradezco su atención quedando a la espera de recibir lo anteriormente mencionado, en un término de tiempo no mayor a 5 días hábiles contados a partir del recibo de este oficio.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Roy Iriarte Pico	Contratista - Secretaría de Infraestructura	
Reviso:	Ismael Sierra Iriarte	Profesional Especializado - Secretaría de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

Coveñas, diciembre 17 de 2024

Radicado: PMC-408

Doctor:
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura Departamental
Despacho.

Doctor:
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal Contratista Consorcio CMO Hospital Sucre
Despacho.

Doctor:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legal Interventoría Consorcio Inter hospital Coveñas 2024
Despacho

Doctor:
SAMIR TAMAYO ÁLVAREZ
Secretario De infraestructura
Despacho

Señores:
VEEDORES CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DE HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS
Despacho

Doctora
NETSKY FERIA MORENO
Alcaldesa Municipal Coveñas
Despacho

ASUNTO: Convocatoria a reunión

Respetados señores,

Mediante la presente me permito convocarlos a una reunión con el fin de hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DE HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, el día viernes 20 de diciembre de 2024 a las 2.00pm en la Casa de la cultura 1er piso.

Cordialmente,

JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
Personero Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Keiry Julio Medina	Contratista		17/12/2024
Revisó	James David Palacios	Personero Municipal		17/12/2024
Aprobó	James David Palacios	Personero Municipal		17/12/2024
Los arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.				

Sincelejo, diciembre 10 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-39

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE OBRA No. 6

Cordial Saludo,

Mediante la presente hago entrega del Informe de Obra No. 6, correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024 donde se consigna la información del contrato, estado, avance de actividades de obra, aspectos administrativos, relación del equipo en obra, relación del personal en obra, registros fotográficos.

Lo anterior se realiza con el fin de cumplir con la entrega de los informes mensuales de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 10 del Contrato de Obra de la referencia.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

Anexo: INFORME DE OBRA No. 6 - CONTRATO No. LP-018-2023.pdf
ANEXOS INFORME No. 6

ANEXO 8.2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Coveñas, Departamento de Sucre
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Número del contrato:	SI-LP-018-2023
Fecha del registro fotográfico:	Desde 1 de diciembre de 2024 a 31 de diciembre de 2024

LISTADO DE FOTOGRAFÍA


Fotografía 1. Desencofre formaletas bloque 2 2
Fotografía 2. Equipo desencofrado bloque 1 2
Fotografía 3. Armado de encofrados losa bloque 2 3
Fotografía 4. Protección de acero 3
Fotografía 5. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1 4
Fotografía 6. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1 4
Fotografía 7. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1 5
Fotografía 8. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1 5
Fotografía 9. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1 6
Fotografía 10. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1 6
Fotografía 11. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 3 7
Fotografía 12. Vista interior estado bloque 2 7
Fotografía 13. Vista interior estado bloque 2 8
Fotografía 14. Vista exterior bloque 1 8
Fotografía 15. Vista interior estado bloque 2 9
Fotografía 16. Vista exterior bloque 3 9
Fotografía 17. Muro de contención 10
Fotografía 18. Tanque subterráneo 10



Fotografía 1. Desencofre formaletas bloque 2



Fotografía 2. Equipo desencofrado bloque 1

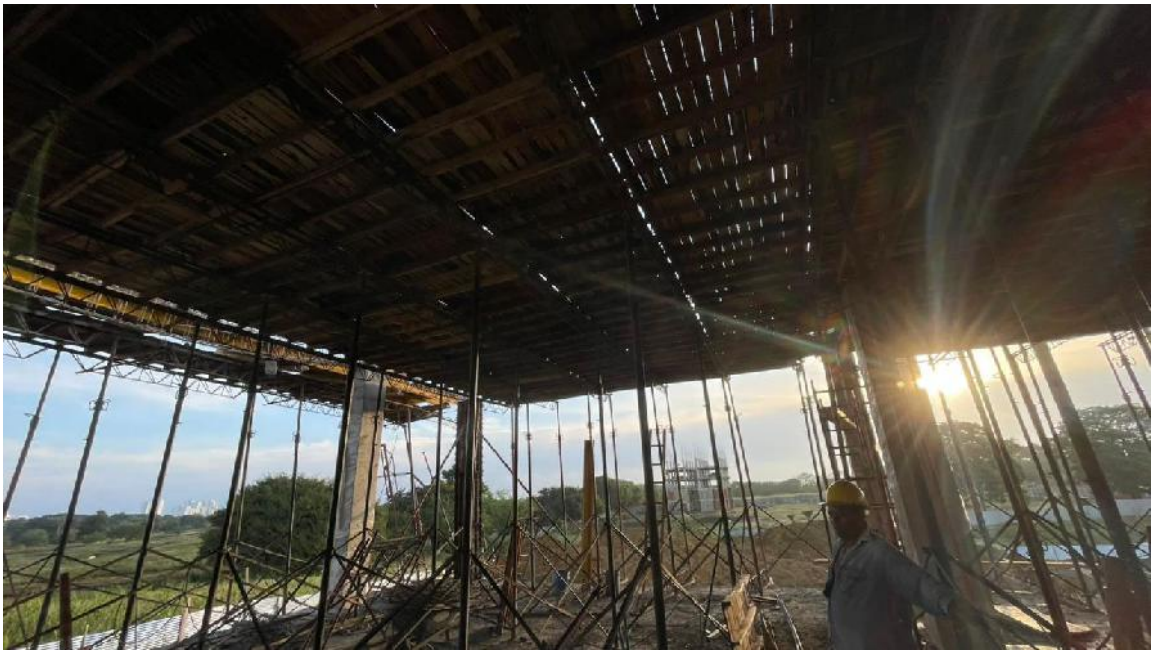

Fotografía 3. Armado de encofrados losa bloque 2



Fotografía 4. Protección de acero



Fotografía 5. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1



Fotografía 6. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1



Fotografía 7. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1



Fotografía 8. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1



Fotografía 9. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1



Fotografía 10. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 1



Fotografía 11. Fundida de concreto losa de cubierta bloque 3



Fotografía 12. Vista interior estado bloque 2



Fotografía 13. Vista interior estado bloque 2



Fotografía 14. Vista exterior bloque 1



Fotografía 15. Vista interior estado bloque 2



Fotografía 16. Vista exterior bloque 3



Fotografía 17. Muro de contención



Fotografía 18. Tanque subterráneo

ANEXO 8.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIAL
DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. LP018 DE 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

CONTRATISTA
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERHOSPITAL 2024

SOCIAL
KAROLAY CARABALLO REYES

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ALCANCE 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 5
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 6
5.1. Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (ficha GPY-F-08) 6
5.2. Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (fotos WhatsApp o cualquier otro mecanismo) 7
5.3. Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos 8
5.4. Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22) 9
5.5. Proyecto No 5 Contratación mano de obra (Ficha PGS-6.6-23). 10
6. ANEXO FO TOGRÁF ICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. INTRODUCCIÓN

El siguiendo documento obedece al informe de seguimiento social periodo de AGOSTO 31 DE 2024- SEPTIEMBRE 30 DE 2024 de la implementación del Programa de Gestión Social del proyecto CONTRATO No. 098 DE 2021 OBJETO: CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

2. ALCANCE

Las medidas de manejo para la implementación de la Gestión Social están encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios y del estimula a la participación de las comunidades para el proyecto con objeto: “CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La zona de influencia directa del proyecto es en el casco urbano del municipio de Coveñas en la calle 6 con carrera 25 esquina, predio denominado Caribe. El proyecto del Hospital de Coveñas se emplaza en un lote que goza de una proyección constructiva para edificaciones de uso institucional, sobre un sector que brinda continuidad en su morfología urbana y vial. Además, el lote garantiza la fácil accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad, cubriendo un gran radio de acción para satisfacer las necesidades municipales y departamentales de su uso comunitario, en la Ilustración 1 se expone la localización geográfica del municipio de Coveñas en el departamento de Sucre.



***Ilustración 1**. Localización geográfica del municipio de Coveñas.*





Ilustración 2. *Localización especifica del proyecto, vista satelital.*

Tabla 1. *Coordenadas de localización del predio.*

LATITUD	LONGITUD
9°23’41.03”N	75°40’49.01”O

4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El Plan de Gestión Social - PGS, es el conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, generados como resultado de la ejecución del proyecto. Dicho plan define las estrategias de acción para crear las condiciones que permitan cambios en las comunidades y en las administraciones locales y regionales dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental y recibir los beneficios socioeconómicos esperados con ocasión del proyecto.

El objetivo principal del PGS será brindar acompañamiento Social y comunitario para el fortalecimiento social, económico y ambiental, de los actores sociales identificados por el profesional social durante la ejecución del proyecto, mediante la implementación de programas que se desarrollaran de manera transversal a la ejecución del proyecto, orientados a reducir y mitigar los impactos generados por las obras civiles, dentro de los programas a implementar se tienen:

- Programa de información y divulgación.
- Programa atención al ciudadano.
- Programa organización social y participación ciudadana.
- Programa generación de ingresos
- Programa de sostenibilidad.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las medidas de manejo para la gestión Social estuvieron encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios para estimular la participación de las comunidades.

A continuación, se presenta la descripción de actividades por cada programa:

5.1.Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (ficha GPY-F-08)

Objetivo: Brindar atención y soporte continuo a la comunidad mediante canales de comunicación accesibles, asegurando la resolución efectiva de inquietudes y la promoción de una relación positiva entre el proyecto y los residentes.

Actividad: Durante el mes, se implementaron las siguientes acciones para la atención de la comunidad:

5.1.1. Se mantuvo un servicio de atención telefónica para resolver dudas y recibir feedback de los residentes. Las llamadas fueron atendidas por personal capacitado para brindar respuestas adecuadas y garantizar que las solicitudes fueran dirigidas a las áreas correspondientes para su resolución. (parte social).

5.1.2. Como se ha venido realizando desde el inicio de la obra, esta semana también se brindó atención a la comunidad los días martes y jueves, en el campamento de obra, en el horario habitual de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Los residentes de Coveñas saben que este es el espacio donde pueden acercarse para resolver sus inquietudes, obtener información sobre el avance del proyecto y plantear cualquier duda relacionada con las actividades en curso.

Esta atención continua ha garantizado una comunicación abierta y fluida entre el equipo de la obra y la comunidad, promoviendo una gestión participativa y fortaleciendo la confianza en el desarrollo del proyecto.

.

Tabla 2. *Indicador atención a la comunidad.*

Indicadores de seguimiento
***No se han presentado PQRS de manera formal**
***No se han presentado PQRS de predios**
*** A la fecha no se han presentado afectaciones de predios**

5.2.Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (fotos WhatsApp o cualquier otro mecanismo)

El objetivo de las actividades de información y divulgación fue mantener a la comunidad informada sobre los avances del proyecto de construcción del hospital en el Golfo de Morrosquillo, utilizando diversos canales de comunicación para asegurar un alcance amplio y efectivo.

Actividades ejecutadas:

5.2.1. Actualización de la Cartelera Informativa: La cartelera informativa fue actualizada cada 15 días para asegurar que la comunidad tuviera acceso a la información más reciente sobre el proyecto. Esta cartelera incluyó detalles sobre el progreso de las actividades, recordatorios sobre buenas prácticas y anuncios relevantes para los residentes.

5.2.2. Reunión mensual comunidad: Se llevó a cabo la reunión mensual con la comunidad, representantes de las acciones comunales y veedores, cumpliendo con los compromisos establecidos en el cronograma. Durante la reunión, se socializaron los avances del proyecto y se abordaron inquietudes y sugerencias por parte de los asistentes. Además, se reafirmó el compromiso con la participación activa de la comunidad en las actividades de seguimiento, asegurando la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes. Los representantes comunales y veedores participaron de manera activa, contribuyendo al fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre todos los actores involucrados.
(fotos adjuntas en anexos)

Tabla 3. *Indicador Información y divulgación a la comunidad.*

Indicadores de cumplimiento
_____
ó _____ ó

5.3.Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.

5.3.1. Servicios Públicos

Actualmente, en la obra contamos con servicios públicos esenciales, tales como alcantarillado, suministro de energía eléctrica e internet, lo cual facilita el desarrollo de las actividades y garantiza un entorno adecuado tanto para los trabajadores como para las visitas técnicas.

5.3.2. Seguimiento a la Estructura Vial

- **Tránsito de Vehículos Pesados:** Se ha realizado un seguimiento riguroso de la estructura vial utilizada por los vehículos pesados, tales como mixers que transportan concreto, volquetas que retiran material de excavación y camiones que ingresan con acero, A pesar de entradas y salidas de estos vehículos pesados no se han presentado

daños en la infraestructura vial, y se utilizan controladores de tráfico en este caso paleteros para controlar la entrada y salida de los mismos y evitar accidentes.

- En la zona de acceso para los vehículos pesados que transportan material entre la obra y el Parque de Guayabal, existe un callejón que pertenece al propietario de la finca ubicada detrás de la obra. Se ha llegado a un acuerdo con el dueño para ir mejorando esa vía en el tramo de entrada, dentro de los límites permitidos por los lineamientos establecidos, ya que esta vía está siendo utilizada para el tránsito de los vehículos de la obra

- **Impacto en Viviendas Aledañas:** Se han llevado a cabo visitas en las viviendas aledañas para monitorear el impacto de la construcción. Hasta la fecha, no se han reportado novedades o quejas por parte de los residentes.

5.4.Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22)

5.4.1. Bingo con la comunidad: Se realizó un bingo comunitario el pasado 15 de diciembre, en el cual participaron los habitantes de la comunidad y los representantes de la Acción Comunal de Guayabal, Etapa 2. Durante el evento, se vivieron momentos de alegría y risas, además de contar con diversos premios para los ganadores.

La actividad fue organizada en colaboración entre CMO hospital de Coveñas y la Acción Comunal de Guayabal, etapa 2, logrando un resultado exitoso gracias al trabajo conjunto. Los fondos recolectados serán destinados a la compra de regalos de Navidad para los niños de la comunidad, como un gesto de celebración y unión en estas fechas festivas.

5.4.2. Además del bingo, se realizó una actividad creativa con la comunidad para la elaboración de figuras navideñas y placas de soporte, promoviendo el espíritu festivo y la integración. El Hospital de Coveñas donó los materiales necesarios, mientras que los miembros de la comunidad se encargaron de llevar a cabo la actividad, demostrando su compromiso y habilidades en equipo.

Estas iniciativas no solo fortalecieron los lazos comunitarios, sino que también contribuyeron a embellecer los espacios comunes con decoraciones navideñas, reflejando el esfuerzo y la colaboración mutua entre el hospital y la comunidad.

5.4.3. Compartir con cada frente de trabajo: se llevó a cabo una integración especial con los bloques 1, 2 y 3, contando con la participación de representantes de la Gobernación, la interventoría y la constructora. El evento, organizado con el

objetivo de dar una sorpresa al secretario de Infraestructura de la Gobernación, incluyó un almuerzo especial y música en vivo, generando un ambiente festivo y de camaradería.

5.4.4. En esta ocasión, se llevó a cabo el comité con los representantes de la veeduría en las instalaciones del campamento de la obra. Durante la reunión, se brindó un informe detallado sobre el avance del proyecto, destacando tanto los logros alcanzados como los desafíos que se han enfrentado en su desarrollo.

Asimismo, se revisaron los acuerdos establecidos en comités anteriores para verificar su cumplimiento y se definieron nuevos compromisos, reforzando la transparencia y la colaboración entre las partes. Este espacio permitió mantener una comunicación abierta y fortalecer el trabajo conjunto en beneficio del proyecto y la comunidad.

Tabla 4. *Indicador Cultura vial y Participación Comunitaria.*

Indicador	Cantidad Ejecutada	Cantidad Programada	Porcentaje de Cumplimiento
Acción Social con la comunidad	2	2	100%
Reunión Mensual con la Comunidad	1	1	100%

5.5.Proyecto No 5 Contratación mano de obra (Ficha PGS-6.6-23).

El objetivo principal de la contratación de mano de obra y las actividades ejecutadas es asegurar una ejecución eficiente y segura de las etapas preliminares del proyecto de construcción del Hospital en el Golfo de Morrosquillo. A su vez, se busca cumplir con los siguientes objetivos:

- **Optimizar el bienestar económico regional:** Generar empleo en las comunidades dentro del área de influencia directa, lo que fortalece la economía local y proporciona ingresos sostenibles.
- **Fomentar la armonía comunitaria:** Evitar conflictos mediante una comunicación abierta y transparente, garantizando que las preocupaciones de la comunidad sean escuchadas y atendidas de manera efectiva.
- **Promover la inclusión de mano de obra regional:** Asegurar que un porcentaje significativo del personal empleado provenga de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, impulsando así el desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, se busca integrar de manera adecuada a personal calificado para la ejecución de tareas específicas dentro de la obra, garantizando la cobertura de todos los roles necesarios para asegurar el avance eficiente y la calidad del proyecto.

Actividad: Durante el mes, se llevó a cabo un proceso integral de recepción de hojas de vida y reclutamiento de personal para el proyecto, con la finalidad de cubrir diversos roles en el equipo de trabajo. Las actividades incluyeron:

- **Reclutamiento de Obreros y Oficiales:**

Durante este mes, la mano de obra estuvo compuesta principalmente por obreros, quienes desempeñaron labores esenciales en los distintos frentes de trabajo, asegurando el avance constante de la obra.

La mano de obra empleada en el proyecto del mes de septiembre está conformada por un equipo calificado y diverso, que incluye:

- **4 obreros.**

- **Personal Calificado:**

En el transcurso de este mes, no se ha registrado el ingreso de nueva mano de obra calificada, por lo que las actividades se han concentrado en los obreros y oficiales de obra que ya forman parte del proyecto. Hasta el momento, se ha logrado cumplir con el personal mínimo requerido por la entidad contratante.

De acuerdo con lo anterior se tiene el siguiente indicador de cumplimiento:

Tabla 5. *Indicador Contratación mano de obra.*

Indicadores de cumplimiento
Se ha logrado cumplir con el personal mínimo requerido por la entidad contratante

ó

Tenemos el 75% de la mano de obra no calificada de la región

Clausula 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Destinar la ejecución del contrato de mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato.
En todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Desde la perspectiva social del proyecto "Construcción, Equipamiento Fijo y Dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre", es importante resaltar nuestro compromiso con la inclusión y el desarrollo comunitario a través del empleo local. En la actualidad, el 75% de la mano de obra no calificada empleada proviene de la región, lo que nos permite cumplir con lo estipulado en la Cláusula 9 del contrato, que establece que al menos un 10% de dicha mano de obra debe ser regional.

En cuanto a la participación femenina, hemos alcanzado un 2.5% de mano de obra no calificada, y estamos comprometidos a seguir incrementando este porcentaje conforme avance el proyecto, con el objetivo de cumplir con la cuota mínima del 5% establecida en el contrato.

Además, estamos orgullosos de que el 100% del personal en el proyecto es de nacionalidad colombiana, en línea con lo estipulado en el contrato, lo que contribuye al fortalecimiento del empleo nacional y regional. Estos esfuerzos reflejan nuestro enfoque en la integración social y la generación de oportunidades laborales en la comunidad local, asegurando un impacto positivo y duradero. La siguiente tabla detalla los avances logrados en este aspecto.

Tabla 6. *MANO DE OBRA NO CALIFICADA: TOTALIDAD 80 PERSONAS.*

SEGUIMIENTO		INFORMACION
MES ACTUALIZACION	Nº	NOMBRES Y APELLIDOS
PERIODO: DICIEMBRE	1	GERMAN PERALTA CARDENAS
	2	IVAN DARÍO GARAY GLORIA
	3	JUAN DAVID RAMOS DÍAZ
	4	5+B16:B44
	5	MANUEL FRANCISCO TOBAR CORREA
	6	PEDRO LUIS MURILLO DE HOYOS
	7	LUIS MIGUEL CONTRERAS RINCO
	8	ABRAHAM DAVID RODRIGUEZ ESCUDERO
	9	GUSTABO ADOLFO RAMOS DIAZ
	10	JHON JAIRO BANQUET DONADO
	12	RICARDO JOSÉ MANJARRES PAREJO
	13	IVAN DANILO DORIA TIRADO
	14	JORGE ELIECER CANTILLO GUTIERREZ
	15	HUGO ALBERTO GARAY GLORIA
	16	GABRIEL MORENO LICONA
	17	ALDRIN ROBERT VALENCIA
	19	ANI LUZ SUAREZ MORALES
	20	DOMINGUEZ PACHECO MANUEL DE JESUS
	21	JARLIN ARIEL VALENCIA
	22	OSWALDO URANGO HERNANDEZ
	23	JULIO CESSAR POSSO PEREZ
PERIODO: DICIEMBRE	24	EVER ANTONIO FUENTES ARCIA
	25	JEAN CARLOS CARDENAS BOHORQUEZ
	26	ROMULO EDUARDO PALMERA APARICIO
	27	DIEGO ALEJANDRO BARRERA UPARELA
	28	JAIDER CHAMORRO ESTRADA
	29	ALVARO ANDRES MANJARREZ OVIDIO
	30	ALEXANDER VERGARA GALLEGO
	31	WILLIAM JOSE DE AGUSTIN HERNANDEZ
	32	JESUS ALBERTO TARRA CORDOBA
	33	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ
	34	EDER LUIS RINCO SUAREZ
	35	FAIDER ELIAS VARGAS LADEUS
	36	CRISTIAN DAVID MALARRIAGA LADEUS
	37	JUAN CARLOS INSIGNARES GLORIA
	38	LUIS ALFONSO MENDOZA MARTINEZ
	39	PEDRO JAFET MARQUEZ PEREGRINO
	40	CARLOS MARIO SIERRA BELLO
	41	KENER GONZALEZ BANQUET
PERIODO: DICIEMBRE	42	HELIODORO PRADA REGINO
	43	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ
	45	OSCAR MIGUEL CAUSIL GALVAN
	46	ELIECER CONEO MARQUEZ
	47	JORGE ELIECER GARZON LOPEZ
	49	ARISTIDE CONEO MARQUEZ
	51	CARLOS ENRIQUE SARMIENTO TORRES
	52	DANIEL DARIO DIAZ PEREZ
	54	EUCLIDES MANUEL MONTERROSA LOPEZ

HOVER LUIS HERRERA TIRADO
IVAN DARIO SALGADO CRUZ
JAIRO DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS
JOHAN SEBASTIAN ZUÑIGA LOPEZ
JOHNNY LUIS DORIA MOLINA
JORGE ENRIQUE CRUZ BENNEDETTI
JARLIN ARIEL VALENCIA
RICARDO JOSÉ MANJARRES PAREJO
TOMAS SEGUNDO CUAVAS ESQUIVEL
LUIS EDUARDO SEPULVEDA AGUAS
CAMILO ANDRES SIERRA ZUÑIGA
LEONARDO FABIO RIVERA GARRIDO
JORGE LUIS MORELO MARTINEZ
EUCEBIO ANTONIO VILORIA SUAREZ
EDUARDO DE JESUS ARRIETA PATERNINA
ALDRIN ROBERT VALENCIA
DUBAN ARIAS MADRID
KENYA PATRICIA DURANGO ESPITIA
PEDRO MIGUEL FERNANDEZ BENAVIDEZ
MANUEL DE JESUS JULIO MILLAN
CARLOS ANDRES MESTRA GONZALEZ
JAIME LUIS CARRASCAL AVILA
YEINER BRAVO CASTRO
JEAN CARLOS COA ROMERO


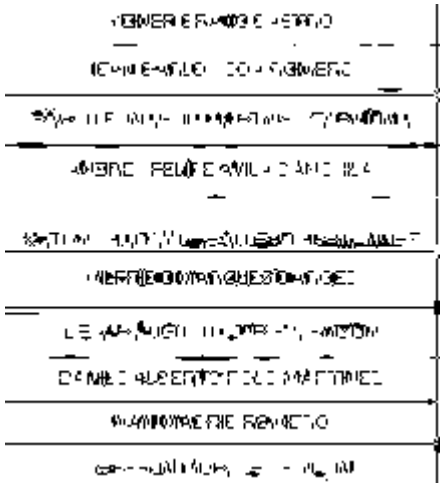


***Tabla 7**.MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA REGIÓN: TOTALIDAD 60*

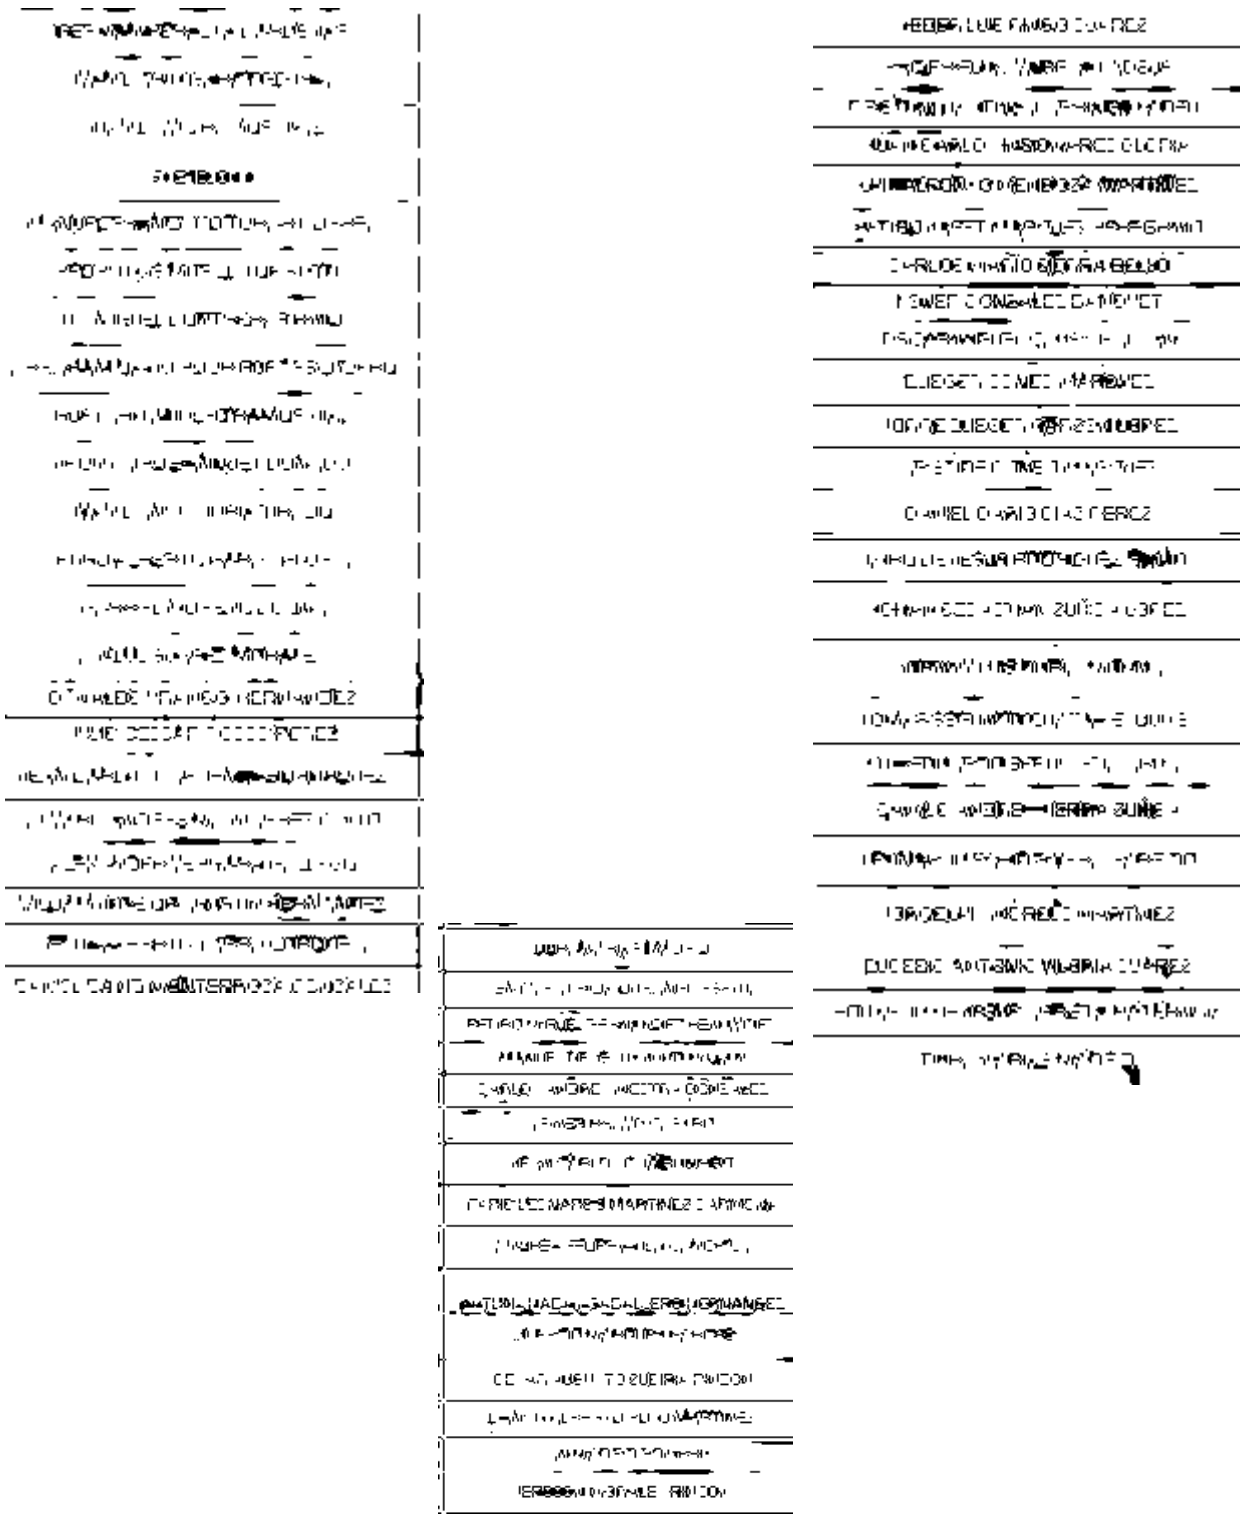

El consorcio encargado del Hospital de Coveñas, Sucre, ha implementado una política de inclusión étnica y social en el proyecto. Hasta la fecha, se ha integrado un total de 15 personas de grupos históricamente vulnerables en el equipo laboral, distribuidos de la siguiente manera:

- **10 trabajadores indígenas**
- **2 trabajadores desplazados**
- **3 trabajadores afrocolombianos**

Esta iniciativa responde al compromiso del consorcio con la diversidad y la equidad laboral, promoviendo oportunidades para poblaciones vulnerables en la región.

Proyecto No 6: Supervisión y Participación Interinstitucional

- El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo el comité con la entidad ENTerritorio, en el cual se presentó el informe detallado sobre el avance de la obra. Durante la reunión, se expusieron los aspectos positivos y los logros alcanzados, así como los retos y dificultades enfrentados a lo largo del desarrollo del proyecto. Este espacio permitió analizar los altos y bajos que han surgido, buscando soluciones conjuntas y estrategias para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
  .

ANEXOS.

CARTELERA INFORMATIVA



REUNION MENSUAL CON REPRESENTANTES DE LA VEEDURIA.






SEGUIMIENTO VIAL





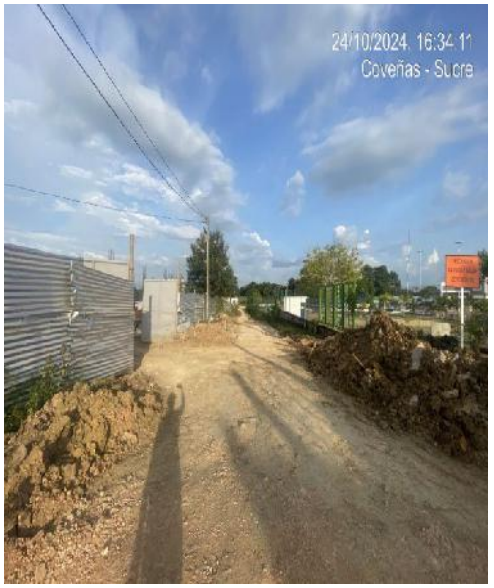







OBRAS CON LA COMUNIDAD









TRABAJADORES.







SUPERVISION Y PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL.









cronograma de actividades.

Mes de DICIEMBRE 2024.

Semana 1, 2 ,3 Y 4	**Atención a la comunidad.** Atención a través de WhatsApp y via telefonica
semana 2 y 3	**Información y divulgación a la comunidad** Actualización de la Cartelera Informativa, Reunión mensual con comunidad.
SEMANA 3	**Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos** seguimiento a la estructura vial e impactos a las viviendas aledañas.
semana 3 y 4	**Cultura vial y Participación Comunitaria** Jornada de esparcimiento con la comunidad , Reunión Mensual con representantes puntuales y charlas con los trabajadores.
semana 1 a la 4	**Contratación mano de obra** contratación mano de obra no calificada.

CMO HOSPITAL DE COVEÑAS.

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INFORME No.7 MES DE DICIEMBRE DEL 2024

TANIA DAYANA YENERIS PADILLA ING. AMBIENTAL Y SANITARIA
CC. 1.131.107.171
MP 071024-0540988 CES

30/ DICIEMBRE /2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
2.1 Objetivo General 4
2.2 Objetivos Específicos 4
4. LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
4.1 Diagnóstico del Estado Inicial del Ambiente Existente 6
4.2 Análisis ambiental sobre áreas de interés 6
4.3 Descripción de la etapa de construcción 7
5. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 8
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FICHAS DE MANEJO 9
7. CONCLUSIONES 85
ACTA DE CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION AMBIENTAL 87

1. INTRODUCCION

El plan de manejo ambiental (PMA) del contrato de obra No. LP-018-2023 que lleva por objeto “Construcción, equipamiento fijo y dotación del hospital del golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre” se implementa con fin de contribuir con el medio ambiente, y a su vez corregir, prevenir, mitigar, compensar y/o mitigar posibles afectaciones al medio ambiente durante la ejecución de la obra.

Se presenta el informe mensual de seguimiento ambiental No.7 que corresponde al mes de diciembre del 2024, donde se describe la gestión ambiental realizada por el contratista Consorcio CMO hospital Sucre, con ayuda de los profesionales, los cuales conforman un grupo de gestión ambiental, que busca cumplir con todas las actividades descritas en las fichas de manejo ambiental que se describen en el PMA al cuál se le debe hacer seguimiento y monitoreo semanalmente.

El consorcio CMO hospital sucre se rige al decreto 1728 (agosto 6 de 2002) donde establece que los proyectos de construcción de hospitales deben estar sujetos al artículo 11 para dar con el cumplimiento a la implementación del plan de manejo ambiental, contribuyendo con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Se desarrolla la gestión ambiental, se realizan capacitaciones, reuniones técnicas para ver el estado de la obra y programar la supervisión en el transcurso del mes, con el fin de cumplir con los requerimientos de las autoridades, la comunidad y la interventoría, por otro lado, se les da manejo a los materiales del proyecto, se cuida la señalización en obra como requisito fundamental para prevención de accidentes y cumplimiento al PMA. Adicionalmente se identifican las normas ambientales aplicables en las diferentes etapas del proyecto como la identificación de permisos y/o autorizaciones a requerir por uso, afectación y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables por la ejecución del proyecto en la etapa de construcción.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar el informe de seguimiento ambiental del mes de diciembre del 2024, basado en las fichas de manejo ambiental, para la ejecución del contrato de obra No. LP-018-2023 con el objetivo de disponer de un documento de soporte que permita Identificar, evaluar, mitigar los potenciales impactos ambientales negativos y maximizar los positivos mediante un conjunto de medidas ambientales de acuerdo a las principales actividades a ser desarrolladas para la construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, enmarcándose en la legislación ambiental vigente.

2.2 Objetivos Específicos

- Describir, caracterizar y analizar los medios físico, biótico y socioeconómico, en el cual se pretende desarrollar el proyecto de Construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas departamento de Sucre.
- Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental, que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera especial para el desarrollo y ejecución del proyecto.
- Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que serán producidos por el proyecto.
- Incluir la información necesaria sobre los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o afectados durante la construcción y operación del proyecto.
- Presentar las fichas de manejo ambiental para cada una de las etapas del proyecto.
- Evidenciar mediante registro fotográfico las actividades aplicables a las fichas de manejo ambiental.

3 ALCANCE

El presente informe busca cumplir con la normativa ambiental y de las entidades que tienen jurisdicción sobre el área de influencia del proyecto, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Coveñas y se encuentra ubicado geográficamente al Sureste del departamento de Sucre.


4. LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Su implantación está proyectada al sur del casco urbano del municipio de Coveñas sobre la calle los tramposos entre calles 9 y 12 en el predio denominado Caribí, ubicado en suelo urbano en la urbanización del mismo nombre, de acuerdo con las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Coordenadas de localización del predio

Latitud	Longitud
9°23'41.03"N	75°40'49.01"O

Ilustración 1. Localización General

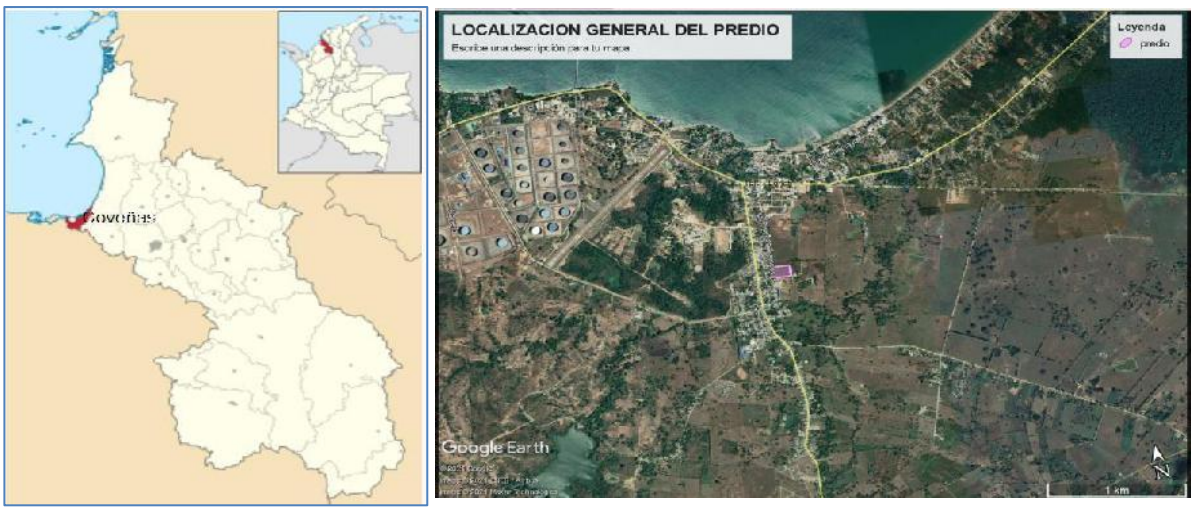

Fuente: Google Earth

Como se puede observar en la figura No. 1, el predio de implantación del Hospital del Golfo de Morrosquillo, es un predio que en la actualidad no cuenta con ningún tipo de infraestructura construida dentro del mismo. Su ubicación está dada sobre la carrera 1 que es una vía pavimentada que sirve de tránsito alterno hacia la alcaldía municipal.

4.1 Diagnóstico del Estado Inicial del Ambiente Existente

Con el fin de prevenir, mitigar y/o compensar cualquier afectación al medio ambiente, y evitar daños futuros a la comunidad, en el ámbito socio económico, y cultural, se realiza un seguimiento a las fichas de manejo ambiental.

El Consorcio CMO hospital sucre, en aras de mantener una buena relación con interventoría del proyecto, mensualmente se compromete a rendir informes de la gestión ambiental que le concierne a este tipo de contrato de obra civil.

Este diagnóstico permite establecer la situación ambiental en las áreas de influencia, antes de la ejecución de los trabajos a manera de punto inicial de referencia, para poder monitorear posteriormente los posibles impactos ambientales a causa de la realización del Proyecto.

Teniendo en cuenta las características, se incluyó:

- El medio abiótico
- El medio biótico
- Medio socioeconómico

4.2 Análisis ambiental sobre áreas de interés

Se incluyó la evaluación ambiental del área a ocupar por el proyecto incluyendo la cuantificación y calificación de los impactos potenciales.

El análisis considera:

- Población directa e indirectamente afectada y beneficiada.
- Actividades productivas directa e indirectamente afectadas y beneficiadas.
- Interferencia en las relaciones socioeconómicas preexistentes.

4.3 Descripción de la etapa de construcción

Actividades desarrolladas por el consorcio CMO en el mes de diciembre del 2024 comprende:

Maquinarias y equipos. (1 mini cargador)

Excavación de zarpa y viga
Desencrofado de formaleta en losa y columnas
Armado y colocación de formaletas para losa de cubierta.
Figuración y colocación de acero para losa de cubierta.
Instalaciones sanitarias.
Demolición de vigas descolgadas
Fundición de solado para zarpa de muro de contención para rampa peatonal.

Construcción de cercos perimétricos

Relleno de zapatas

Corte y figurado de acero

Conformación de terreno con maquinaria

Los trabajos iniciaron el día 31 de mayo del 2024, luego del acta de inicio con las obras provisionales, que constan de construcción de los almacenes.
Se realiza el inventario forestal del lote del proyecto para ajustarlo al plan de manejo ambiental y definir el aprovechamiento forestal y la compensación forestal que se realizará en el proyecto, del mismo modo se realizan levantamiento topográfico, a finales del mes de junio hasta la fecha, se evidencian cambios climáticos por fenómenos naturales

5. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

Con el fin de implementar acciones tendientes a minimizar, controlar, prevenir, mitigar y/o corregir y compensar los impactos ambientales, que se pueden causar por la ejecución de la obra, asociadas al presente contrato de obra No. LP-018-2023, durante el mes de diciembre del 2024, el contratista presenta la gestión ambiental, dándole el seguimiento a las fichas de manejo ambiental.

Por lo cual, en el siguiente cuadro se muestran los programas que aplican para llevar a cabo la ejecución del contrato.

PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMA		PROYECTO	CODIGO
Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	1.	Capacitación ambiental al personal de obra Acta de conformación del grupo ambiental	PAC-13
Manejo de equipos	1.	Manejo de maquinaria y equipos	PAC-02
Manejo de residuos	5.	Manejo de aguas residuales, manejo RDC, manejo de vegetación y capa orgánica, manejo de residuos líquidos.	PCA-03-04-06-10
Actividades Constructivas	1.	Proyecto de Manejo Integral de. Materiales de Construcción,	PAC-05
	2	Manejo de campamento y zonas de almacenamiento	PAC-01
	4.	Control de emisiones atmosféricas y ruido.	PAC-07
	5.	Proyecto de Manejo y Disposición final de Escombros y Lodos, excavaciones y rellenos manejo de obras en concreto,	PAC-09-08

A continuación, se describen las actividades ambientales asociadas a las fichas del PMA son de carácter mensual, para la ejecución del presente contrato.

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

a) Manejo de campamento y zonas de almacenamiento

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 1	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de campamento y zonas de almacenamiento	FICHA: PMA – AC - 01
Objetivo	
o Establecer las acciones necesarias para garantizar el manejo ambiental adecuado durante la instalación operación de campamentos y zonas de almacenamiento.	
Metas	Indicadores
PE = Puntos ecológicos en campamentos y talleres Valor aceptable = >50%	$PE = \left(\frac{\text{Número de puntos ecológicos instalados}}{\text{Número de campamentos y/o talleres instalados}}\right) x\ 100$ = (–) = %
EX = Número de extintores Valor aceptable = Mínimo un (1) extintor por cada 200 m2 (según Resolución 2400 de 1979)	EX = El número total de extintores no será inferior a uno (1) por cada 200 m² de local o fracción
KA = Kits ambientales Valor aceptable = 100%	$KA = \left(\frac{\text{Número de kits ambientales para derrames}}{\text{Número de áreas para almacenamiento de insumos químicos}}\right) x\ 100$ = (–) = %
Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe ambiental o Registro fotográfico
TIPO DE MEDIDA EJECUTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024	
CONTROL ☐ MITIGACION ☐ MINIMIZAR ☒ PREVENCION ☒ CORRECCION ☐	
IMPACTOS A CONTROLAR	
o Erosión de suelo o Inducción de procesos erosivos y sedimentación de materiales de suelo y roca o Cambio en la calidad visual y morfológica del paisaje	

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 1	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de campamento y zonas de almacenamiento	FICHA: PMA – AC - 01

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

1. Consideraciones en obra

Campamento y/o almacén:

- El campamento y/o almacén contiene señalizaciones para los accesos, áreas, paso de maquinaria, almacenamiento de combustibles y equipos de emergencias.
- El campamento cuenta con equipo contra incendio portátil, en este caso cuenta con 1 extintor.
- Se instaló el área adecuada para el cambio de los obreros.
- El agua destinada al consumo humano es potable, por el momento se está comprando el agua en bolsa, esta agua está siendo suministrada por compras en tienda comerciales del municipio, se están comprando de 28 pacas de agua diría para el consumo de los obreros, y parte administrativa en obra.
- El campamento y/o almacén cuenta con puntos ecológicos, en los cuales se facilita la segregación adecuada de los residuos generados, se clasifican los residuos y luego son dispuestos al relleno sanitario ubicado en Sincelejo Sucre, por la empresa INTERASEO, esta pasa 3 veces por semana y el aseo general en obra se hace diario, 15 minutos antes de terminar la jornada laboral.
- En el campamento se realizaron las conexiones a la red de alcantarillado del municipio, se construyeron los baños provisionales y hasta la fecha ya están en funcionamiento los 11 baños en la obra, a estos baños se les hace mantenimiento y limpieza los días martes, jueves y sábado de cada semana.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de Diciembre del 2024			
	1	2	3	4
Campamentos y/o almacén				
La ubicación del campamento y/o almacén garantiza la protección de los canales de agua lluvia y/o ecosistemas sensibles, no obstaculiza las actividades de obra y/ o				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 1					
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS					
Subprograma 1. Manejo de campamento y zonas de almacenamiento				FICHA: PMA – AC - 01	
	vehiculares				
	Uso de material prefabricado para el establecimiento de los campamentos y/o talleres (Madera)				
	Insumos químicos				
	Los insumos químicos están protegidos de la intemperie				
	El área de almacenamiento de insumos químicos debe contar con señalización, extintores, kit ambiental en caso de derrames				
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental				

ANEXO FOTOGRÁFICO










CAMPAMENTO EN FRENTE DE OBRAS.



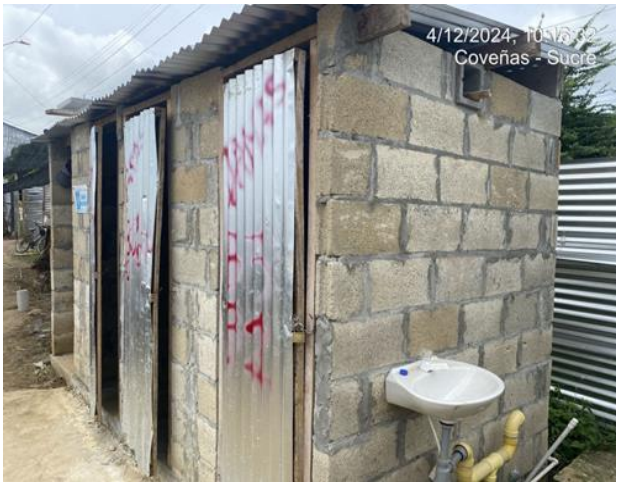





BAÑOS PROVISIONALES EN FRENTE DE OBRA

Se realiza limpieza tres veces por semana en los baños provisionales en el frente de obras, con el objetivo de contribuir a las buenas prácticas que alimenta la buena higiene en el trabajador y ayudan a evitar la contaminación cruzada a efectos de salvaguardar la salud y seguridad de todos, evitando reducir la probabilidad de albergar hongos, virus y bacterias perjudiciales para la salud. Estas actividades se llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes.









DISPOSICION DE RESIDUOS EN OBRA


Se instalaron puntos ecológicos en frente de obra, con el fin de que los trabajadores no arrojen residuos al suelo, y al finalizar la jornada laboral se llevan los residuos a su disposición final, en este punto pasa INTERASEO y es donde son llevados a su destino final en el relleno sanitario el OASIS en el municipio de Sincelejo. Se realiza charlas al personal en obras, para el manejo y disposición de residuos sólidos en obras del mismo modo se dispone de un punto donde se está acumulando los residuos peligrosos como bolsas de cemento que son corrosivos y nocivos para la salud.





SUMINISTRO DE AGUA EN OBRA

Se están suministrando 28 pacas de agua diariamente, estas se mantienen en cavas y se le entrega a cada grupo en frente de obra para su hidratación.

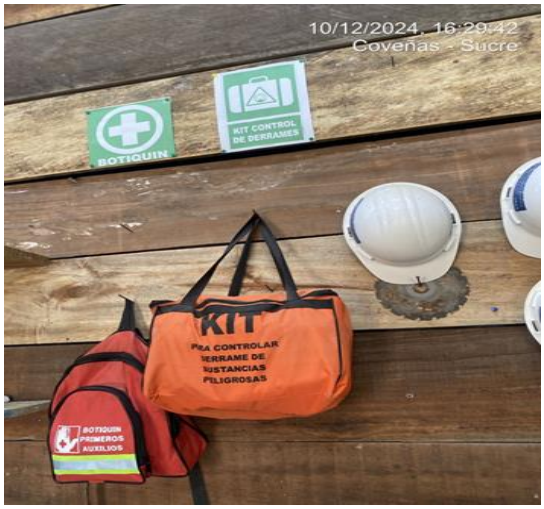



EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS EN CAMPAMENTO

b) Manejo de maquinaria y equipos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 2	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de maquinaria y equipos	FICHA: PMA – AC - 02

Objetivo

- Establecer las medidas para garantizar un adecuado manejo de la maquinaria, equipos y vehículos en las actividades de construcción.
- Proporcionar los lineamientos para el óptimo uso de la maquinaria, equipos y vehículos de acuerdo a lo exigido por la normatividad vigente colombiana

Metas	Indicadores
MV = Mantenimiento de vehículos Valor aceptable = 100%	$MV = \left(\frac{\text{Número de mantenimientos ejecutados a vehículos}}{\text{Número de mantenimientos programados a vehículos}}\right) X\ 100$ NOTA: las máquinas y vehículos en obras ya vienen con mantenimiento realizado y se programan cada 3 meses en lugares autorizados para la ejecución del mismo.
MV = Mantenimiento de maquinaria y equipos Valor aceptable = 100%	$MV = \left(\frac{\text{Número de mantenimientos ejecutados a maqunarias y equipos}}{\text{Número de mantenimientos programados a maquinarias y equipos}}\right) X\ 100$
Responsables	**Registros / Evidencias**
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe ambiental o Registro fotográfico o Certificados de gases, revisión técnico-mecánica y seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)

TIPO DE MEDIDA EJECUTADA

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 2	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de maquinaria y equipos	FICHA: PMA – AC - 02

- Alteración de la calidad del aire por gases contaminantes (CO2, CO, SO2, NOX)
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exige al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

- Todas las máquinas y/o equipos que se encuentran dentro de los frentes de obra están debidamente señalizados.
- Está prohibido el lavado de maquinaria, equipos y/o vehículos dentro de los frentes de obra, ni en cuerpos de agua cercanos. Excavadora de uruga y retroexcavadora
- El mantenimiento de maquinarias, equipos y vehículos se realizan en sitios autorizados para tal fin, nunca se realizan dentro de los frentes de obras, o áreas cercanas a cuerpos de agua.

Vehículos

- En el mes de diciembre no se transportó material con residuos de construcción y demolición (RCD) para donación, hasta la fecha se han solicitado las volquetas para la carga y descarga de este material, pero solo en frente de obras, este material se está utilizando en obras para relleno, estas volquetas cuentan con licencia de tránsito, SOAT y certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM).
- Los vehículos para el transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) cumplen con lo establecido en la Resolución No. 0472 del 2017 modificada por la Resolución 1257 de 2021.
- Lo vehículos utilizados cumplen con la normatividad en cuanto a tránsito y transporte, y emisiones atmosféricas, como lo establece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Los vehículos que están en frente de obra están en buen estado, cumpliendo los requisitos técnico mecánico, evitando así la contaminación por emisiones, material particulado y ruido.


FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 2	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de maquinaria y equipos	FICHA: PMA – AC - 02
o En el siguiente anexo fotográfico se registran las características de los vehículos que ingresaron a obras en el mes de diciembre del 2024, con su respectiva placa, licencia de tránsito, revisión técnica mecánica y SOAT. o Estos vehículos cuentan con toda la documentación al día y con su respectiva licencia de tránsito.	
Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 2	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de maquinaria y equipos	FICHA: PMA – AC - 02
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de diciembre del 2024			
	1	2	3	4
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos				
Señalización de la maquinaria, equipos y vehículos				
Mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos den lugares autorizados				
Vehículos				
Revisión de documentación reglamentaria para vehículos que transporten material, RCD, equipos,				

Observación	Se tiene documentación de la maquinaria que está operando en el frente de obra. Se tiene documentación al día de las volquetas que transportan el material RCD
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRAFICO

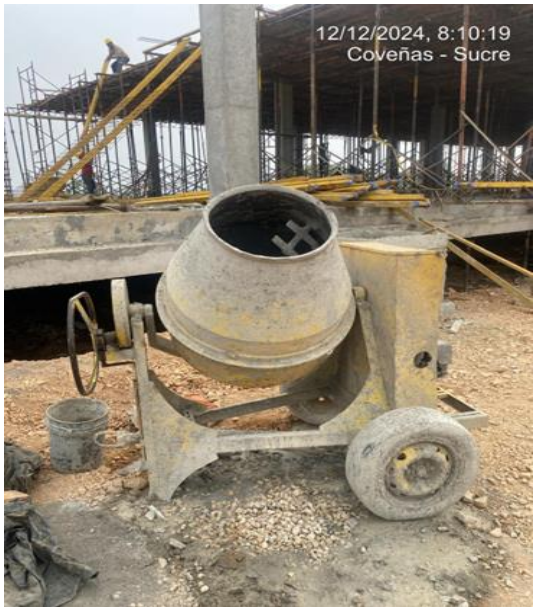











EQUIPO EN OBRA

PLACA DEL VEHÍCULO:

WCU323

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10016010943

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
21380040661776380	27/05/2024	28/05/2024	27/05/2025	310	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
85720222	26/05/2023	27/05/2023	26/05/2024	310	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
28303226	26/05/2022	27/05/2022	26/05/2023	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
26541962	18/05/2021	22/05/2021	21/05/2022	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
24615821	21/05/2020	22/05/2020	21/05/2021	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	22/01/2024	22/01/2025	METROCAR S.E.S	SI	171242840	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	20/01/2023	20/01/2024	METROCAR S.E.S	NO	164134447	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/01/2022	21/01/2023	METROCAR S.E.S	NO	157627978	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/01/2021	21/01/2022	METROCAR S.E.S	NO	151388357	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	23/01/2020	23/01/2021	METROCAR S.E.S	NO	145539657	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

UPB448

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10021472103

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
20021002133040O	02/08/2024	04/08/2024	03/08/2025	310	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	VIGENTE
20021002133030O	03/08/2023	04/08/2023	03/08/2024	310	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE
20021002133020O	03/08/2022	04/08/2022	03/08/2023	310	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE
20021002133020O	03/08/2022	04/08/2022	03/08/2023	310	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE
20021002133010O	03/08/2021	04/08/2021	03/08/2022	310	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	03/08/2024	03/08/2025	CDA DEL CARIBE LIMITADA	SI	174970730	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/08/2023	05/08/2024	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	167609912	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	06/08/2022	06/08/2023	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	160724173	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/08/2021	05/08/2022	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	154273454	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	04/08/2020	04/08/2021	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	148066942	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

WCU317

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10016477714

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
2108004063120000	26/06/2024	29/06/2024	28/06/2025	310	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
2108004044739000	28/06/2023	29/06/2023	28/06/2024	310	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
28986743	28/06/2022	29/06/2022	28/06/2023	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
26615663	11/05/2021	13/05/2021	12/05/2022	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
24564920	12/05/2020	13/05/2020	12/05/2021	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	10/09/2024	10/09/2025	CDA DEL CARIBE LIMITADA	SI	175726514	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/09/2023	08/09/2024	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	168260664	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2022	07/09/2023	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	161173831	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/08/2021	28/08/2022	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	154674075	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/08/2020	27/08/2021	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	148470224	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

WHP101

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10014959558

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
2108004066093000	29/08/2024	30/08/2024	29/08/2025	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
2108004047348000	29/08/2023	30/08/2023	29/08/2024	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
28773105	19/05/2022	21/05/2022	20/05/2023	320	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
26641902	18/05/2021	21/05/2021	20/05/2022	320	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
24610851	20/05/2020	21/05/2020	20/05/2021	320	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	29/08/2024	29/08/2025	CDA DEL CARIBE LIMITADA	SI	175527484	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/08/2023	30/08/2024	METROCAR S.E.S.	NO	168085492	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	23/07/2022	23/07/2023	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	160454620	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/06/2021	19/06/2022	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	153183996	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/06/2020	16/06/2021	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	146875214	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

TRL948

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10024092925

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
2108004058483000	02/04/2024	03/04/2024	02/04/2025	330	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
33120196	01/04/2023	02/04/2023	01/04/2024	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
28261762	15/02/2022	01/04/2022	31/03/2023	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
26477784	31/03/2021	01/04/2021	31/03/2022	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
24048435	20/01/2020	22/02/2020	21/02/2021	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	04/04/2024	04/04/2025	CDA DEL CARIBE LIMITADA	SI	172517786	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/03/2023	18/03/2024	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	165334769	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/03/2022	19/03/2023	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	158742339	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/03/2021	18/03/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PAPIROS PARK	NO	152445455	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/02/2020	10/02/2021	IVESUR COLOMBIA BARRANQUILLA	NO	145848857	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

WHP102

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10014992138

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
2108004065435000	12/08/2024	13/08/2024	12/08/2025	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
2108004046079000	25/07/2023	28/07/2023	27/07/2024	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
29186965	27/07/2022	28/07/2022	27/07/2023	320	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
81277108	23/07/2021	28/07/2021	27/07/2022	320	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
25011881	27/07/2020	28/07/2020	27/07/2021	320	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	15/08/2024	15/08/2025	CDA DEL CARIBE LIMITADA	SI	175171828	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	14/08/2023	14/08/2024	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	167711793	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	10/08/2022	10/08/2023	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	160620046	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/07/2021	28/07/2022	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	154107716	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/07/2020	28/07/2021	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CARNAVAL S.A.S.	NO	147958241	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

SNS549

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10029305825

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
931001029670100	28/11/2023	29/11/2023	28/11/2024	330	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A	VIGENTE
10285000037430	29/07/2022	23/08/2022	22/08/2023	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
81419025	27/07/2021	23/08/2021	22/08/2022	330	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
78675613	28/07/2020	23/08/2020	22/08/2021	330	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
76712053	16/08/2019	23/08/2019	22/08/2020	330	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	03/12/2023	03/12/2024	METROCAR S.E.S	SI	169984521	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/09/2022	08/09/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	NO	161357468	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	09/09/2021	09/09/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	NO	154940125	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	09/09/2020	09/09/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	NO	148771717	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/09/2019	07/09/2020	C.D.A SUROESTE S.A.S	NO	143249755	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

TUQ091

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10031342980

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
1508005882389000	07/10/2024	08/10/2024	07/10/2025	330	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
1508005442708000	27/09/2023	28/09/2023	27/09/2024	330	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
12605600004960	17/11/2020	18/11/2020	17/11/2021	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
36278717	05/04/2017	07/04/2017	06/04/2018	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
33340420	06/04/2016	07/04/2016	06/04/2017	330	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	08/10/2024	08/10/2025	CDA SANTA CRUZ	SI	176401123	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/09/2023	30/09/2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN RAFAEL	NO	168715305	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/09/2014	30/09/2015	INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.	NO	118148944	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	15/08/2013	15/08/2014	INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.	NO	113649995	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/05/2012	05/05/2013	INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.	NO	109029265	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

ZCA980

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10021093047

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
4308005944003000	30/10/2024	31/10/2024	30/10/2025	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
14289404657810	24/02/2023	25/02/2023	24/02/2024	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
15092300004950	18/02/2022	19/02/2022	18/02/2023	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
14665900048660	18/02/2021	19/02/2021	18/02/2022	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
77778379	29/01/2020	30/01/2020	29/01/2021	320	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	31/10/2024	31/10/2025	CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CORDOBA E.U.	SI	176893843	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	25/02/2023	25/02/2024	METROCAR S.E.S	NO	164915635	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/02/2022	19/02/2023	METROCAR S.E.S	NO	158206327	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	21/02/2021	21/02/2022	METROCAR S.E.S	NO	151978240	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/01/2020	30/01/2021	METROCAR S.E.S	NO	145659060	NO	



PLACA DEL VEHÍCULO:

KBJ770

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10027717824

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

VOLQUETA

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
4308004702345000	15/12/2023	16/12/2023	15/12/2024	320	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
3308004802247000	25/11/2022	26/11/2022	25/11/2023	321	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
14581000031430	22/11/2021	24/11/2021	23/11/2022	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
14864500053540	23/11/2020	24/11/2020	23/11/2021	320	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	NO VIGENTE
77339954	22/11/2019	24/11/2019	23/11/2020	320	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	19/02/2024	19/02/2025	METROCAR S.E.S	SI	171881773	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	24/02/2023	24/02/2024	METROCAR S.E.S	NO	164885730	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	22/11/2021	22/11/2022	CDA MI RIO	NO	156343563	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	23/11/2020	23/11/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE S.A	NO	150165832	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	22/11/2019	22/11/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CRISTALES	NO	144391582	SI	



c) Manejo de aguas residuales

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 3	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de aguas residuales	FICHA: PMA – AC - 03
Objetivo	
Realizar un adecuado manejo de los residuos líquidos que se pueden generar en las actividades de obras civiles, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, y como mecanismo de minimización de cualquier alteración al ambiente	
Metas	Indicadores
DP = Disposición final de residuos líquidos Valor aceptable: 100%	$DP = \left(\frac{\text{Cantidad de residuos líquidos dispuestos adecuadamente}}{\text{Cantidad de residuos líquidos generados}}\right) X\ 100$ = (———) = %

CP = Capacitaciones al personal de la obra civil Valor aceptable: 100%	$CP = \left(\frac{\text{Número de personas capacitadas en manejo de residuos líquidos}}{\text{Número total de empleados}}\right) X\ 100$ = ( ) = %

Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe ambiental o Registro fotográfico

TIPO DE MEDIDA EJECUTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- o Erosión de rondas hídricas
- o Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- o Alteración de la calidad del agua superficial
- o Alteración de la calidad del agua subterránea

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

1. Manejo de Residuos líquidos

En el mes de diciembre del 2024 se generaron aguas residuales domesticas en las unidades sanitarias del campamento se están utilizando 11 baños provisionales, 7 baños de hombres y 4 baños de mujeres, están conectados directamente

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 3	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de aguas residuales	FICHA: PMA – AC - 03

con la red de alcantarillado del municipio.

Se han hecho lavado de equipos en frente de obra en un sitio autorizado por la parte ambiental.

Prevención y minimización

- Se realiza la capacitación a todos los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos líquidos., para prevenir y evitar contaminación de aguas lluvias con aceites u otros químicos a manejar en obra.
- Se tiene la conexión del campamento al sistema de alcantarillado del municipio con el fin de que estas aguas sean tratadas y dispuestas de manera adecuada.

Almacenamiento temporal

- En el mes de diciembre del 2024 se almacenaron aceites usados en frente de obra.
- El almacenamiento de los residuos líquidos combustibles dentro de la obra está en un punto por fuera del almacén totalmente aislado bajo techo, no expuestos al aire libre.
- Los recipientes de almacenamiento de los residuos líquidos están rotulados, de igual forma están rotulados por etiquetas donde se especifica su contenido y clases de riesgos, así como con las etiquetas de seguridad y precauciones a tomar en caso de una contingencia.

Entrega a gestores externos.

- En el mes de diciembre del 2024 no se asignaron gestores externos para la disposición final de residuos líquidos.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de diciembre del 2024			
	1	2	3	4
Manejo de residuos líquidos				
Prevención y minimización				
Realizar todas las actividades en cuanto a prevención y minimización				
Almacenamiento temporal				
Realizar todas las actividades en cuanto a almacenamiento temporal				
Tratamiento y disposición final				
Realizar todas las actividades en cuanto a tratamiento y disposición final				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 3	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de aguas residuales	FICHA: PMA – AC - 03
ambiental	

ANEXO FOTOGRAFICO





CAPACITACION Y PUNTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

d) Manejo y disposición de materiales sobrantes RCD

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 5	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo y disposición de materiales sobrantes RCD	FICHA: PMA – AC - 04

Objetivo

- Brindar los lineamientos a seguir para el adecuado manejo de los materiales sobrantes durante las obras civiles.
- Realizar la disposición de materiales sobrantes de acuerdo a la normatividad ambiental.
- Dar cumplimiento a los objetivos del PNCC (Plan nacional del cambio climático) y a lo establecido en la resolución 1257 de 2021 en cuanto al re - uso de material sobrante se refiere.

Metas	Indicadores
MS = Manejo de materiales sobrantes Valor aceptable: 0	MS = Número de incidentes ambientales ocasionados por un deficiente manejo de materiales sobrantes =

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 4	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo y disposición de materiales sobrantes RCD	FICHA: PMA – AC - 04
VS = Volumen de materiales sobrantes dispuestos o reutilizados Valor aceptable: 100%	$VM = \left(\frac{\text{Volumen de materiales sobrantes dispuestos y/o reutilizados}}{\text{Volumen total de materiales sobrantes}} \right) X\ 100$

Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe de interventoría técnica y ambiental o Registro fotográfico o Registro de cantidades de materiales sobrantes o Certificados de disposición final de materiales sobrantes

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR					
CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo
- Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

2. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

1. Almacenamiento de materiales sobrantes

- Se da estricto cumplimiento a la Resolución No. 0472 del 2017 modificada por la resolución 1257 de 2021 "por la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD" o la norma que lo modifique o sustituya. De esta manera inicialmente se debe planear adecuadamente la obra, determinando las cantidades necesarias de materiales de construcción, de tal manera que se eviten perdidas de materiales.

- Se dispone de varios sitios de almacenamiento temporal para RCD, estos sitios están situados en puntos que no afectan el ecosistema.

- El lugar de almacenamiento esta adecuadamente señalizado, se evita la dispersión de material particulado.

Transporte de materiales sobrantes

.

- El material sobrante se encuentra en puntos del frente de obra, durante este mes de diciembre se ha hecho cargue y descargue de material RCD en obra, las maquinas siguen realizando actividades de excavación mecánica y relleno de zapatas en frente de obra,

Disposición de materiales sobrantes

- La disposición del material sobrante (RCD) se reutiliza como relleno en frente de obra, de acuerdo a lo

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 4	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo y disposición de materiales sobrantes RCD	FICHA: PMA – AC - 04

previsto en el contrato.

Manejo de reutilizables

- Los materiales sobrantes que se reutilizan en obra están almacenados en un sitio específico y están debidamente señalizados, se minimiza la posibilidad de dispersión del material particulado evitando incidentes ambientales.
- En cumplimiento a lo establecido en la resolución 1257 de 2021 se usará el 20% de material sobrante dentro del desarrollo de la obra como material de relleno y paisajismo

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de Diciembre de l 2024			
	1	2	3	4
Manejo de materiales sobrantes				
Almacenamiento de materiales sobrantes				
Cumplir cabalmente con la Resolución No. 0472 del 2017				
Disponer de sitios de almacenamiento temporal de materiales sobrantes				
Limpieza de canales perimetrales en los sitios de acopio de materiales sobrantes				
Transporte de materiales sobrantes				
Cumplir cabalmente con la Resolución No. 0472 del 2017				
Asegurar que el volumen de carga de materiales obrantes en un vehículo cumpla con la normatividad vigente				
Cumplimiento de los requisitos técnico mecánicos de los vehículos de transporte de materiales sobrantes				
Disposición de materiales sobrantes				
Selección de una empresa para la disposición final de materiales sobrantes				
Almacenamiento de materiales sobrantes reutilizables				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental













MATERIALES SOBRANTES EN FRENTE DE OBRA

En frente de obras en el mes de diciembre se realiza relleno con el material sobrante que resulta de las actividades de excavación, no se realizó donación de este material durante este mes, debido a que se está utilizando para relleno en el frente de obras.

e) Manejo de materiales de construcción

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 6	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de materiales de construcción	FICHA: PMA – AC - 05
Objetivo	
o Establecer los requisitos para la adquisición de materiales de construcción durante las obras civiles. o Manejar adecuadamente los materiales de construcción minimizando cualquier alteración al ambiente circundante	
Metas	Indicadores
MS = Manejo de materiales de construcción Valor aceptable: 0	MS = Número de incidentes ambientales ocasionados por un deficiente manejo de materiales de construcción =
CM = Capacitación en manejo de materiales Valor aceptable: Entre el 80 y el 100%	$CM = \left(\frac{\text{No. de personas capacitadas en manejo de materiales de construcción}}{\text{No. total de personas encargadas de los frentes de obra}} \right) X\ 100$ = (—) = %
Responsables	Registros / Evidencias

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 6	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de materiales de construcción	FICHA: PMA – AC - 05
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe de interventoría técnica y ambiental o Registro fotográfico o Licencias y/o permisos ambientales de proveedores de materiales o Facturas y/o soportes de compra de materiales en lugares autorizados

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR					
CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo
- Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)

ACCIONES A EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

3. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre la entidad contratante.

1. Manejo de materiales de construcción

Origen de los materiales de construcción

- Con el fin de garantizar la procedencia de los materiales de construcción se tienen la copia de los permisos ambientales de las instalaciones que proveen de estos materiales (plantas de triturado, concreto y/o asfalto, etc.).
- El proveedor de los materiales de construcción tales como, arena, grava, crudo de rio, piedra rajón, triturado, arena gruesa y delgada, etc., cuenta con licencia ambiental, para la "cantera San Nicolás de Bari" localizada en el municipio de Santa Cruz de Lorica- Córdoba amparada en el contrato concesión minera nº OD8-11331 Sobre un área de 63.2580 has. Esta licencia es otorgada a la señora María Cecilia Manjarrez Arteaga, con cedula de ciudadanía nº 43.272.817 expedida en Medellín, Colombia.

Transporte de materiales

- Los vehículos que transportan el material que ingresa al frente de obra cuenta con certificados de gases vigentes, revisión técnico mecánica, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, seguro contra terceros, y demás documentación exigida por las autoridades de tránsito. Los vehículos están en buen estado, cumpliendo los requisitos técnicos mecánicos, evitando así la contaminación por emisiones, material particulado o ruido. Estos soportes se encuentran en el anexo de la ficha técnica de materiales y equipos ficha PMA: AC-02.

Almacenamiento temporal de materiales de construcción

- El lugar de almacenamiento de los materiales está adecuadamente señalizado, evitando la dispersión de material particulado.
- Los materiales de construcción están debidamente cubiertos y demarcados con cintas de seguridad, en áreas autorizadas por la interventoría, con el fin de evitar incidentes ambientales.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 6	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de materiales de construcción	FICHA: PMA – AC - 05

Manejo de concretos

- La preparación del concreto se realiza con mezcladoras de concreto en el frente de la obra para actividades más simples.
- El concreto en frentes de obras viene premezclado y es manejado por medio de camión mezclador y camión bomba, esto con el objetivo de fundir muros de contención y columnas considerándose un adecuado control de calidad y mejor distribución del concreto.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de diciembre del 2024			
	1	2	3	4
Manejo de materiales de construcción				
Origen de los materiales de construcción				
Conservar permisos ambientales de la adquisición de materiales a terceros				
Transporte de materiales				
Los vehículos utilizados deberán cumplir con la normatividad en cuanto a tránsito y transporte y emisiones				
Almacenamiento temporal de materiales de construcción				
Instalar barreras que eviten el impacto visual del lugar de almacenamiento				
Disponer de extintores y kit anti derrames en el lugar de almacenamiento de sustancias peligrosas				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRAFICO












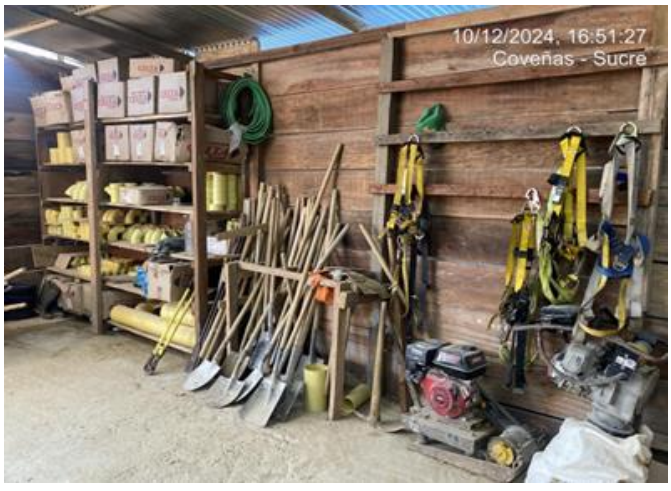



CAMIÓN MEZCLADOR WOV872
CAPACIDAD: 20000KG/PSJ,
LICENCIA DE TRANSITO N.º 10032649790
REVISIÓN TÉCNICO-MECANICO N.º170028453
N.º POLIZA SOAT: 2108004062063000



CAMIÓN MEZCLADOR WNV995
CAPACIDAD: 2519KG/PSJ,
LICENCIA DE TRANSITO N.º 10016477714
REVISIÓN TÉCNICO-MECANICO N.º 175726514
N.º POLIZA SOAT: 2108004063120000




CAMIÓN MEZCLADOR TRL948
CAPACIDAD: 18000KG/PSJ,
LICENCIA DE TRANSITO Nº 10024092925
REVISIÓN TÉCNICO-MECANICO Nº 172517786
N.º POLIZA SOAT: 2108004058483000



CAMIÓN BOMBA WCU323
CAPACIDAD: 2519KG/PSJ,
LICENCIA DE TRANSITO N.º 10016010943
REVISIÓN TÉCNICO-MECANICO N.º
171242840 N.º POLIZA SOAT :
2108004061776000

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FRENTE DE OBRA

En la ficha de manejo ambiental FICHA: PMA – AC – 02 se encuentra el anexo de los documentos de estos equipos.

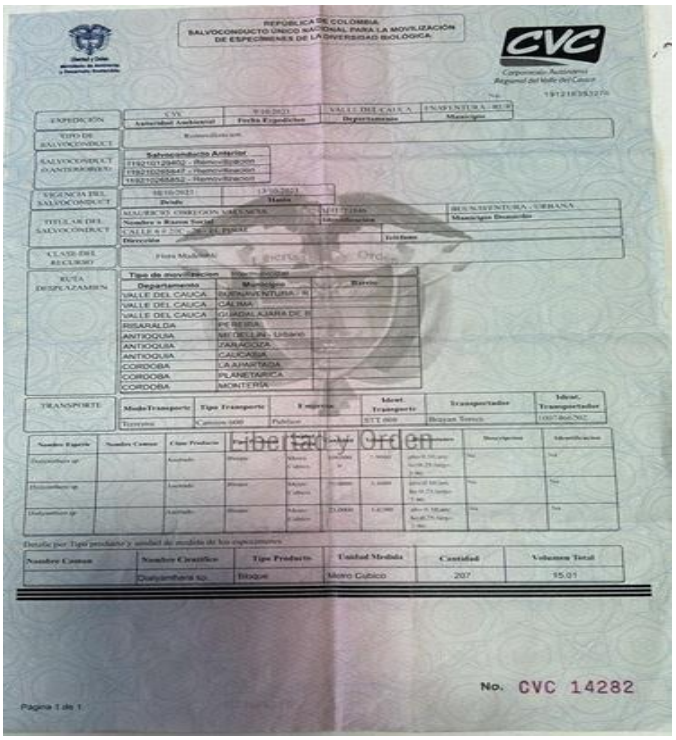

REPUBLICA DE COLOMBIA
SALVOCONDUCTO ÚNICO NACIONAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE ESPECIMENES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

No. CVC 14282


Página 1 de 1



ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

REGISTRO DE CULTIVOS FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES CONFINES COMERCIALES

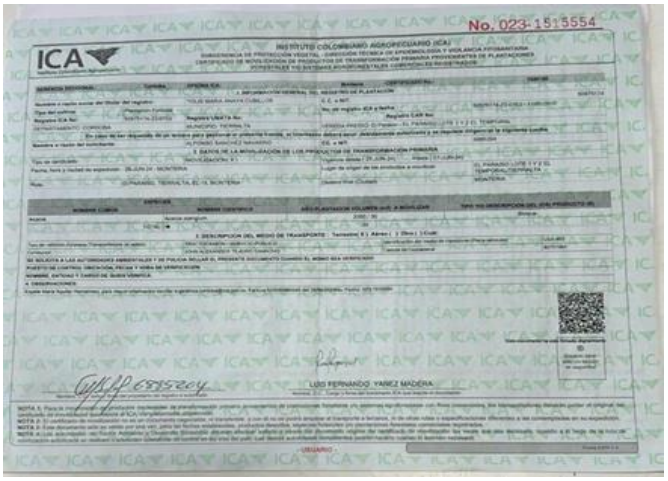

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

No. 023-1515554



PERMISOS AMBIENTALES DEL PROVEEDOR DE LA MADERA

Permisos de tala, salvoconducto de movilización de madera y permiso de comercialización.
Nota: la madera que se va aprovechar en frente de obras de los 4 árboles que se están retirando no necesita de salvoconducto y aun no entra en el informe este mes debido a que solo este mes se está empezando hacer la actividad.

ANEXO LICENCIA AMBIENTAL CANTERA SAN NICOLAS DE BARI

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANDO:

Que a través de oficio con radicado CVS No. 20201105350 de fecha 21 de septiembre de 2020, la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, presentó a la CAR-CVS solicitud de Licencia Ambiental Temporal para el proyecto denominado "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – dentro del trámite de formalización minera No. OD8- 11331", localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari, en el Municipio de Santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba.

Que mediante **Resolución No. 2-8820 del 20 de enero del 2022**, la CAR-CVS otorgó Licencia Ambiental Temporal a la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín.

Que mediante **Auto GML No. 429 de 30 de noviembre de 2021**, se aprobó por parte del Grupo de Legalización Minera, el Programa de Trabajos y Obras – PTO, presentado por la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, ante la Agencia Nacional de Minería – ANM.

Que la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM** y la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, celebraron el contrato para la Explotación de un Yacimiento de Materiales de Construcción **No. OD8-11331.**

Que a través de oficio radicado CVS No. 20221107411 de fecha 09 de agosto de 2022, la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, presentó a la CAR – CVS solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI" amparado en el contrato de Concesión Minera **No. OD8-11331"**, localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari, en el Municipio de Santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba.

Que a través de **Auto No. 14583 del 20 de enero de 2023**, esta corporación inicia el trámite de la solicitud de Licencia Ambiental.

Que, como consecuencia de la evaluación, se emitió el concepto técnico **ALP No.CT- 2023 – 1373** de fecha 14 de septiembre de 2023, en el cual se recomendó aprobar Licencia Ambiental a la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, para la explotación de materiales de construcción en el proyecto "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI" en el marco del contrato de concesión minera OD8-11331, localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari, en el municipio de Santa

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cruz de Lorica, departamento de Córdoba, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se transcribe en su integridad a continuación desde los antecedentes hasta las conclusiones y las recomendaciones se incorporan en la parte resolutiva como obligaciones a cumplir por parte del peticionario:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Artículo 31, numeral 2, es deber de las Corporaciones Autónomas Regionales, "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo a las normas de carácter superior y de conformidad a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. "Numeral 12 "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PREVIA CON COMUNIDADES DE COMUNIDADES ETNICAS – MINISTERIO DEL INTERIOR.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante Certificación Número ST- 0933 del 15 octubre 2020, resuelve lo siguiente:

> *"(…) **PRIMERO:** Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331", localizado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.*
>
> *"(…) **SEGUNDO:** Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331", localizado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.*
>
> *"(…) **TERCERO:** Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331", localizado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA – ICANH

El instituto Colombiano de Antropología e Historias mediante radicado No. 2023184200006632 del 30 de enero de 2023 se realiza radicación del Plan de Arqueología Preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH para el proyecto denominado " *CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331".*

CONCEPTO DE USO DEL SUELO – PLANEACIÓN MUNICIPAL

La Secretaría de Planeación municipal de Lorica a través de certificación expedida el día 23 de noviembre de 2022, expone lo siguiente:

> *"(…) Que según el Acuerdo No 042 de 4 de diciembre de 2001 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA SE HACE VISIBLE" 2002-2010" en su Artículo 12°. Literal 3 establece la clasificación como suelo rural.*
>
> *Por lo tanto, los predios identificados con la referencia catastral 00010007019900 0 y 00010007020000, que se ubican en la margen derecha del Rio Sinú, predios denominados **NIÑA MARÍA Y LA MARÍA** respectivamente. Corregimiento de San Nicolás de Barí. Zona Rural de Santa Cruz de Lorica y cuyo uso del suelo solicita **MARÍA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, se encuentra ubicado en un área apta para ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.*
>
> *Uso del suelo reglamentado vigente es el **AGROPECUARIO/AGRÍCOLA**.*
>
> *Uso complementario: De uso sostenible; Comprenden todas las actividades de producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales.*
>
> *Uso restringido: No presenta restricción para la extracción de materiales de construcción.*
>
> *Uso prohibido: Uso de químicos*
>
> *Según la visita realizada por la Secretaría de Planeación, con fecha de 18 de noviembre de 2022 se pudo establecer que no hay ocupación al espacio público y no está en zona residencial. La actividad realizada desde hace más de 10 años es la explotación de materiales de construcción (…)"*

SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD

Según la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, referente a Estudios de Impacto Ambiental, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades", establece desarrollar el proceso de socialización de la información. Este

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

proceso debe garantizar los siguientes propósitos que deben ser acogidos por el titular del contrato No. OD8- 11331:

- Socializar la información relacionada con las características técnicas, actividades y alcance tanto del proyecto como del estudio ambiental a desarrollar.

  El titular minero sustentó con soportes que el día 03 de marzo de 2022, se realizó la primera socialización con las comunidades, donde se presentaron los siguientes aspectos:

  - *Por parte del titular minero y el grupo de profesionales se explicó a la comunidad por medio de reunión informativa el inicio de trámite de licencia ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.*
  - *Por parte del proyecto minero OD8-11331, se generó el espacio de reunión donde se explicó los materiales para la explotación en este caso Arenas, Gravas y Recebo.*
  - *Por parte del titular minero y la comunidad se identificaron los sectores económicos del área de influencia del proyecto minero.*
  - *Finalmente, y con el fin de comunicar las actividades a realizar y la participación de la comunidad en el proyecto minero OD8-11331, se presenta la presente acta.*

  *Adicionalmente en el formato de asistencia se evidenció un total de 18 personas, de esta manera, el titular **CUMPLIÓ** con lo estipulado en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades", **referente al primero momento**.*

- Generar espacios de participación durante la elaboración del EIA, en los cuales se presente información y se reciba retroalimentación sobre el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, fases, actividades, infraestructura proyectada, áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, compensaciones del medio biótico, permisos solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (captaciones, vertimientos, entre otros), inversiones de no menos del 1% y el plan de gestión del riesgo.

  El titular minero sustentó con soportes que el día 22 de julio de 2022, se realizó la segunda socialización con las comunidades, donde se presentaron los siguientes aspectos:

  - *Se le informa a la comunidad que el proyecto Cantera San Nicolas de Barí, cuenta actualmente con contrato de concesión otorgado por la ANM por un lapso de 20 años y con licencia temporal de explotación y que en estos momentos se encuentra en trámite la licencia global frente a la autoridad ambiental competente, es decir la CVS, se da la exposición de los posibles riesgos que trae el proyecto minero en la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

comunidad haciendo uso de diapositivas (Se observaron anexas en el documento soporte). Posteriormente se procede a escuchar a la comunidad y sus inquietudes, toma la palabra la señora Edilis Palomo quien ocupa el cargo de secretaria de la junta de acción comunal del corregimiento San Nicolas de Bari y quien manifiesta que está preocupada por la utilización del tramo de la placa huella, y se le responde que la cantera San Nicolas de Bari , se hará responsable con los daños subsanado las tramos que resulten averiados y que se están en negociaciones con fincas vecinas para buscar otra salida y así no hacer uso de la placa huella.

Adicionalmente en el formato de asistencia se evidenció un total de 25 personas, de esta manera, el titular ***CUMPLIÓ*** *con lo estipulado en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades",* ***referente al segundo momento***.

- Socializar los resultados del EIA, de manera previa a la radicación del mismo en la autoridad ambiental.

El titular minero sustentó con soportes que el día 28 de julio de 2023, se realizó la tercera socialización con las comunidades, donde se presentaron los siguientes aspectos:

- *Por parte del grupo de profesionales del proyecto minero OD8-11331, se socializo por medio reunión informativa la información relacionada con las características técnicas, actividades y alcance tanto del proyecto como del estudio ambiental a desarrollar a las comunidades.*
- *Por parte del proyecto minero OD8-11331, se generaron espacios de participación por medio de talleres durante la elaboración del EIA, en los cuales se presentó información y se brindó una retroalimentación sobre el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, fases, actividades, infraestructura proyectada, áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, compensaciones del medio biótico, permisos solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el plan de gestión del riesgo.*
- *Por parte del proyecto minero OD8-11331, se socializaron por medio de reuniones los impactos identificados y las medidas formuladas para el manejo ambiental en cada una de las fases del proyecto. Asimismo, se promovieron espacios donde los participantes identificaron otros impactos y medidas de manejo no contempladas en el estudio ambiental a fin de incluirlas en la evaluación de impactos y en el Plan de Manejo Ambiental.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- *Por parte del proyecto minero OD8-11331 se socializo a la comunidad por medio de reuniones y talleres los resultados del EIA, previa a la radicación del mismo ante la autoridad ambiental.*
- *Por parte de la comunidad, al proyecto minero OD8-11331, se compromete hacer parte de las actividades y programas a implementar. Y una vez manifiestan por intermedio de la secretaria de la junta de acción comunal la señora Edilis Palomo, la preocupación por la utilización por parte de la Cantera San Nicolás de Bari de la placa huella, la cual manifiesta que, a pesar de estar en mal estado, el paso constante de las volquetas empeoraría sus condiciones. Esta preocupación ha estado presente y fue manifestada en la socialización anterior y una vez más se le informa a la comunidad que la Cantera San Nicolás de Bari se compromete a realizar mantenimiento permanente de la vía de acceso y que se está en dialogo con fincas vecinas para buscar otra salida y no hacer uso de la placa huella.*
- *Finalmente, y con el fin de comunicar las actividades a realizar y la participación de la comunidad en el proyecto minero OD8-11331, se presenta la presente acta*

Adicionalmente en el formato de asistencia se evidenció un total de 25 personas, de esta manera, el titular ***CUMPLIÓ*** *con lo estipulado en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades",* ***referente al Tercer momento***.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización

El proyecto minero denominado Cantera San Nicolás de Bari se encuentra localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari del municipio de Santa Cruz de Lorica Departamento de Córdoba con Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331 de la Agencia Nacional de Minera - ANM.

El área del título minero se encuentra legalizada bajo el expediente No. OD8-11331 otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), para la exploración y explotación de material de construcción, con una extensión de 63.25 Hectáreas.

El área con una extensión de 63.25 Hectáreas se encuentra ubicada sobre una vía o carreteable secundario con accesos de vías terciarias, que comunican a varios corregimientos y veredas del municipio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

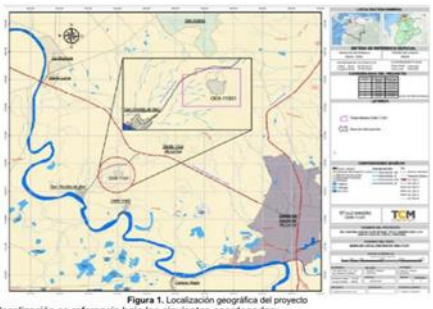


Figura 1. Localización geográfica del proyecto

Su localización se referencia bajo las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Coordenadas límites del proyecto Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331

PUNTO	ESTE	NOTE
1	802682	1515939
2	803451	1515939
3	803451	1515270
4	802459	1515270
5	802459	1515831
6	802682	1515831

Mediante Nota Interna No. 20233100494 del febrero de 2023, la Subdirección de Planeación Ambiental de la CVS, remite a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS "Respuesta al radicado 20233100340: Solicitud de determinantes ambientales para el proyecto minero "Cantera San Nicolás de Bari" – Ubicada en el municipio de Santa Cruz de Lorica". Determinando lo siguiente:

Una vez realizada la georreferenciación de las coordenadas de los puntos solicitados, referidos en la Nota Interna, 20233100340, sobre verificación de los determinantes ambientales y luego de consultadas las fuentes de información de la Corporación se pudo constatar que:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El polígono solicitado NO se encuentra localizado dentro del sistema nacional de áreas protegidas inscritas en el RUNAP, Distritos de Conservación de suelos, Distritos de Manejo Integrado, Parques Nacionales Naturales o Reserva Forestal nacional.

Según la zonificación Ambiental del POMCA Sinú, el polígono solicitado se encuentra clasificado así:

CATEGORIA	ZONA DE USO Y MANEJO	SUBZONA DE USO Y MANEJO	PORCENTAJE(%)
Uso Múltiple	Áreas de Restauración	Áreas de recuperacion para el uso multiple	83
Conservación y Protección Ambiental	Áreas de Protección	Áreas complementarias para la conservación	6
Conservación y Protección Ambiental	Áreas de Protección	Áreas de importancia Ambiental	11

El uso potencial del suelo se encuentra clasificado en Sistema forestal productor (FPD). El polígono solicitado se encuentra en zona de amenaza BAJA por inundación y zona de amenaza BAJA Y MEDIA por movimiento en masa.

El polígono solicitado NO se encuentra en zona de recarga de acuíferos. Según el plan general de ordenación Forestal - PGOF, el polígono solicitado se encuentra clasificado como Áreas no Forestales.


Es importante resaltar que la franja de protección para los cauces de ríos, quebradas, arroyos y demás cuerpos de agua sean permanentes o no, deben ser como máximo de 30 metros después de la cota máxima de inundación al lado y lado del cuerpo de agua, por ende, se debe restringir cualquier uso diferente al de conservación (Decreto 2811 de 1974 Art. 83).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

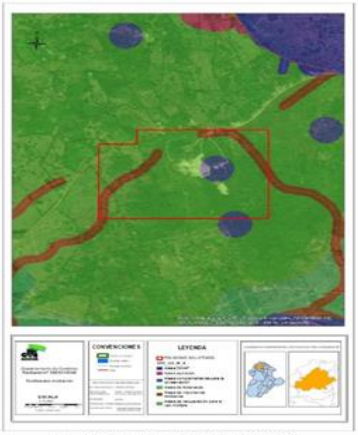

Mapa 1: Zonificación Ambiental – Fuente CAR-CVS.


9

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

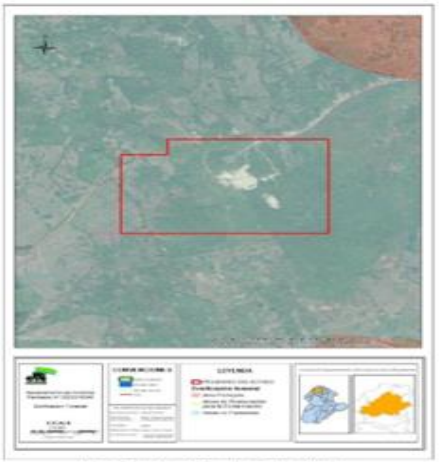

Mapa 2: Zonificación Forestal – Fuente CAR-CVS.


10

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

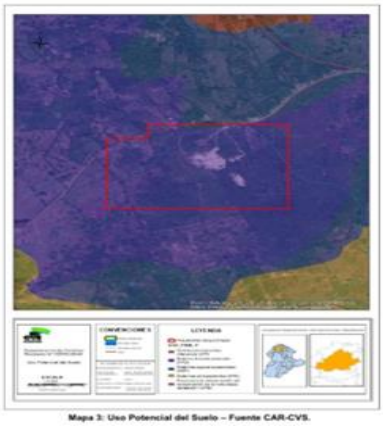

Mapa 3: Uso Potencial del Suelo – Fuente CAR-CVS.


11

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

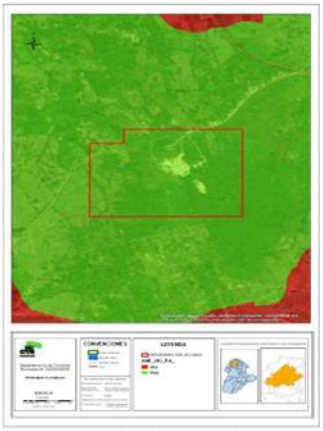

Mapa 4: Amenaza por Inundación – Fuente CAR-CVS.

12

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO


Infraestructura existente

En el proyecto las infraestructuras existentes más próximas al área de influencia son las siguientes vías: Vía tipo 2: vía en zona rural en estado destapado y vía tipo 4, que hace referencia a senderos.

Vías de acceso

- Aéreas: El municipio no cuenta con acceso por vía aérea.
- Terrestres: El municipio de Santa Cruz de Lorica cuenta con una carretera que comunica con los municipios de Coveñas a 29 kilómetros, Tolú a 50 kilómetros y Montería a 60 kilómetros.
- Fluviales: El municipio cuenta con accesos por vía fluvial desde el río Sinú.

Figura 2. Localización a escala 1:25000 del proyecto

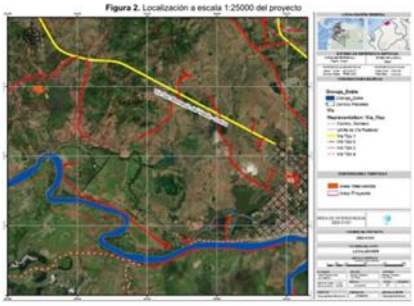

En cuanto a su estado se mantendrán, pues el proyecto no tiene planteado ninguna modificación sobre estas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Sistema y métodos de explotación

De acuerdo con el Plan de Trabajos y Obra de la cantera el desarrollo de la exploración geológica consistió en la apertura de cuatro apiques con el fin de determinar la cantidad, calidad y tipo de depósito en las zonas de interés.

Para efectos de los factores modificadores mencionados, determinaron, como límite de explotación, la topografía del terreno, definiendo el final del avance en las zonas norte hasta el contacto con las vías principales, de igual forma hacia las zonas sur y oriental del título, por la presencia de terrenos más bajos y limitantes por las coordenadas de este, además, se estableció un margen de protección de las zonas con presencia forestal variable, de manera que solo un porcentaje de la zona de explotación será desarrollada, adicional al factor de uso de la maquinaria y de las labores de producción se estima un volumen a explotar, la estimación realizada puede variar, es decir, aumentar o disminuir sus capacidades de acuerdo a las características topográficas, de desarrollo y de avance de la explotación, presentadas en el PTO.

A continuación, se detalla la estimación de las reservas

Estimado (m3)	Factor de aprovechamien topor método de explotación	Factor de perdida por parámetros ambientales	Estimación de reservas explotables(m3)
14.876.741	0.6	15%	7.587.137

El volumen calculado anteriormente (7.587.137 m^3 o 7.500.000 m^3) corresponde a un volumen puntual promedio en sitio, si se proyecta la extracción a lo determinado por la ley (25 años) el periodo de explotación permite superar 300.000 metros cúbicos en capacidad anual del yacimiento.

Finalmente se determina para efectos del presente proyecto, que se cuenta con una reserva probable de 7.500.000 m^3 de material aprovechable para las características técnicas, ambientales y sociales del mismo.

Fases del proyecto:

Actividades previas: como la adecuación de accesos a los sitios de explotación. Actualmente se encuentran la vía principal, la cual corresponde a una vía destapada, además existen tres accesos al frente de explotación que necesitan ser adecuados.

Construcción y montaje

Se contempla la construcción de obras de infraestructura civil indispensables para el funcionamiento normal de las labores de apoyo y administración de la empresa minera y las que

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

se requieran para ejercitar las servidumbres de cualquier clase a que tiene derecho el minero Dentro de las instalaciones que se consideran levantar de soporte de campamentos, talleres, oficinas, zonas de servicios sanitarios, fijos y portátiles, bodegas de acopio de combustibles y repuestos, etc.

Intervención de redes de servicios públicos: Actividad relacionada con el traslado y/o protección de redes de servicios públicos, en la etapa inicial, para lo cual se despliegan actividades particulares.

Aprovechamiento de árboles aislados: esta actividad consiste en el aprovechamiento de árboles aislados de las áreas requeridas para la extracción de materiales y las zonas o fajas laterales de los accesos. Incluye la remoción de tocones, raíces, escombros, residuos, con el propósito que el terreno se encuentre despejado y libre de toda vegetación y su superficie se considere adecuada para iniciar los demás trabajos extractivos.

Explotación

Sistema de Explotación de Materiales Corresponde a la explotación de material por La clase de minería planteada es a cielo abierto, El método elegido (terrazas con bancos descendentes), consiste en realizar la operación de extracción, en forma de bancos extrayendo el material de manera directa, creando zonas donde el ancho y la longitud permitan el desempeño de los equipos, de manera paralela a la topografía del terreno.

Transporte de materiales Comprende las labores de cargue, descargue y transporte de material de extracción hacia la planta de producción de materiales.

Señalización durante la etapa de extracción: Se dispondrá de los elementos y dispositivos requeridos para garantizar la extracción de materiales y el transporte, así como la operación vial segura en el área de influencia.

Desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación:

Revegetalización Corresponde a la implementación de las medidas relacionadas con la recuperación de áreas intervenidas durante el desarrollo extractivo y la ejecución de las medidas compensatorias que se requieran, incluida la revegetalización, conforme las especificaciones particulares existentes al respecto.

Diseño del proyecto
El proceso de extracción de material de construcción objetivo del título se desarrollará desde la cota más alta del terreno, donde se encuentran zonas de material de grava de bastante provecho para su explotación, además de considerar ciertas medidas ambientales y sociales para el desarrollo de la extracción.

Se conformarán taludes y terrazas desde la cota 75 en sentido descendente hasta la cota 25 con las siguientes características:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

H =Altura de salud = 5 m
B = Ancho de berma final = 10 m
θ = Ángulo de inclinación del talud de recuperación = 60°
Área total= 63,2567 Ha

- Áreas de explotación
- Áreas de beneficio y transformación de minerales
- Material sobrante del proceso minero
- Áreas para manejo de material sobrante
- Instalaciones de soporte minero

El método de explotación a implementar es por terrazas con bancos descendentes, el cual consiste en realizar la operación de extracción, en forma de bancos extrayendo el material de manera directa, creando zonas donde el ancho y la longitud permitan el desempeño de los equipos, de manera paralela a la topografía del terreno. La operación de extracción se llevará a cabo desde las zonas más altas de manera descendente y con desplazamiento hacia la zona sur - occidental del área de explotación, permitiendo una extracción considerable. La explotación del área dependerá de los requerimientos de material en el mercado, a fin de mantener un buen flujo entre la demanda y la oferta de este.

Para la efectiva explotación del material en los bancos, se definirán secciones de trabajo, a lo largo de la línea topográfica, que se han de operar de manera cíclica, permitiendo desarrollar la explotación de manera ordenada y técnica. Estas secciones se diseñarán teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Tamaño de los equipos de arranque
- Altura o espesor de los bancos de material
- Movilidad de los equipos de transporte.
- Acceso y facilidad en transporte del material.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023




Figura 3. Diseño labores de explotación
Tabla 2. Parámetros de diseño minero

Altura de Banco	5 m
Ancho de Banco	20 m a 25 m
Angulo del Talud de Banco	55 °
Talud final	18 °
Ancho de Vías	12 m
Largo Rampas	50 m
Inclinación Rampas	10

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El ancho de las secciones de explotación se determina como espacio mínimo 16 metros para el funcionamiento cómodo y adecuado del equipo de arranque, sin embargo, en el cálculo inicial de las labores el planteamiento de continuidad con el dimensionamiento actual no permite cumplir con lo establecido, por esta razón el diseño de las labores se debe ajustar, para facilitar el desplazamiento conjunto de los equipos de transporte y cargue se dispondrá de zonas de entre 20 y 25 metros de ancho; modificando los valores iniciales de 10 y 15 metros de ancho.

Diseño de vías internas

La construcción de vías de acceso perimetrales a los diferentes frentes, estas vías tendrán relación con vías secundarias menores, las cuales se comunicarán con las distintas áreas de la mina, patios de acopio, zonas de talleres, bodegas, vías de salida, etc. Para el diseño de las vías de tránsito principal se toman en cuenta los parámetros de dimensión de los equipos para definir el ancho de las vías; se toma en cuenta el ancho de los camiones más grandes a usar dentro de la mina, este será de 2,53 m.

Se plantea la construcción de vías de acceso perimetrales a los diferentes frentes, estas vías tendrán relación con vías secundarias menores, las cuales se comunicarán con las distintas áreas de la mina, patios de acopio, zonas de talleres, bodegas, vías de salida, etc.

El ancho adecuado de vías es de nueve (9) metros, sin embargo, para las vías de tránsito principal se realizarán dos carriles cada uno con seis (6) metros lo que corresponde a doce (12) metros.

Las vías además deben contar con una pendiente de 2%, descendente desde el eje de las vías hacia las cunetas para permitir que estas se mantengan libres de corrientes de agua y facilitar su drenaje, así como también cuidar el estado de estas.

Labores de desarrollo

Arranque: La labor de arranque del material que se encontrará en cada frente de trabajo se hará de manera directa a través del uso de los equipos escogidos; se utilizará arranque directo con retroexcavadora, facilitando de manera rápida y dinámica la extracción del material para su mayor aprovechamiento. No se contempla el uso de voladuras con explosivos.

La formación geológica en la cual se encuentra el material de extracción, objetivo del proyecto minero, se caracteriza por ser blando, de fácil arranque directo sin hacer necesaria la fracturación previa del mismo; por esto solo se considera realizar la explotación con el uso de maquinaria.

Secuenciamiento

Se plantea un arranque en la misma dirección de las capas del material de interés; y de igual forma de manera descendente. El avance de cada frente se desarrollará de manera perpendicular a la dirección de arranque permitiendo seguir de manera normal y natural la topografía del terreno

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

a modo de aprovechar al máximo las reservas planteadas y a la vez generando la menor cantidad de impacto en el paisaje, facilitando las futuras y posteriores labores de restauración.

Cargue y transporte

El material será cargado directamente en los equipos de transporte interno (volqueta doble), y llevado a los patios de acopio, desde donde se realizará el proceso de transporte final hasta la planta de beneficio para trituración o de lo contrario será utilizado directamente según el requerimiento del cliente final. El proceso de cargue se hará de manera perpendicular al equipo de transporte, de manera que el cargue se haga de manera rápida y eficiente distribuyendo la carga de manera uniforme.

Electrificación

Para el desarrollo vital de la explotación el fluido eléctrico es fundamental, sin embargo, la mayoría de las labores de extracción se llevarán a cabo en horarios diurnos, permitiendo el mayor aprovechamiento de la luz de día. Sin embargo, en el proceso de beneficio el uso de equipos y maquinaria eléctrica requiere de un flujo constante y adecuado de energía, por lo tanto, se considera la instalación y adecuación de redes eléctricas necesarias para su función.

En el área destinada para el beneficio del material extraído no se cuenta con energía eléctrica por acometida, cercana al punto de acceso de la planta, por lo que la energía en este sector será brindada por mecanismos auxiliares como plantas eléctricas de capacidad suficiente para el funcionamiento de los equipos; adicionalmente, se habrá de disponer de plantas auxiliares para momentos de contingencia o emergencia en los que no se cuente con el fluido eléctrico normal. Para este fin se propone disponer de una planta eléctrica de alta capacidad y de tipo industrial que aporte la energía necesaria para el funcionamiento de la planta.

Desagüe:

El sistema de desagüe será diseñado de manera sencilla, en cuanto el manejo de aguas de escorrentía no será demasiado, así como también las características de las aguas no representan inconveniente en contaminación alguna. Los principales inconvenientes encontrados son:
- Pérdida de material en pilas de acopio (arenas) por corrientes de agua
- Daño de las vías por corrientes de agua superficiales

Por consiguiente, las consideraciones necesarias para el diseño del sistema de desagüe serán:

- Asegurar el mantenimiento de las vías principales y secundarias de la mina, a través de canales o cunetas perimetrales a lo largo de las vías.
- Canales de control de aguas de escorrentía alrededor de las pilas de acopio para controlar la pérdida de material.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Escombreras: El proyecto no contempla la remoción en exceso o manejo en demasía de material estéril, por lo que el uso de escombreras solo estará limitado a las áreas para disposición de la capa vegetal que se retire en las labores de desarrollo y preparación de la mina.

Sin embargo, en el avance del proyecto a futuro, se tiene prevista la remoción de un porcentaje aproximado de 27 hectáreas de material de descapote, por lo que es necesario establecer una zona de disposición adecuada para este material.

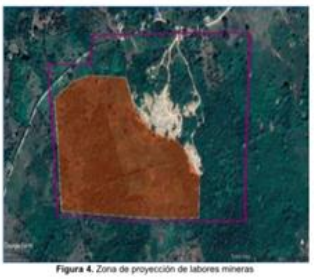


Figura 4. Zona de proyección de labores mineras

El material estéril, capa orgánica removido de las zonas explotadas, será reutilizado en procesos futuros para restauración de botaderos, realizando las actividades pertinentes de reajuste topográfico de la zona, adecuación del botadero y finalmente la disposición del material orgánico almacenado.

Labores de desmonte:

La tarea de retiro de la cobertura vegetal o desmonte, para desarrollar las vías de acceso, se llevará a cabo con maquinaria pesada, así mismo el material retirado deberá ser acopiado y almacenado de manera adecuada para su posterior uso en reforestación e intervención de áreas afectadas.

El área perteneciente al proyecto OD8-11331, cuenta con vías ya formadas, hechas por los pobladores de la zona para su propio uso, así como de parte del explotador; que permiten acceso directo a las zonas pensadas para la extracción del material.

Labores de explotación:

Cada frente en función desarrollará la adecuación de un único patio de acopio para el material extraído, en el cual se acumularán los volúmenes de material que se explotarán en cada banco. Este patio de acopio deberá contar con un área no menor a los 2.500 metros cuadrados (2.500 m2).

El planteamiento para el desarrollo del avance se define en dirección Sur – Occidental, pues el avance hacia la zona norte se encuentra interrumpido por la presencia de instalaciones privadas (Antena de Telecomunicaciones), por lo que la extracción del material en dicho punto no es factible, en la medida que se pueden generar afectaciones a terceros. De igual forma hacia la zona Norte del título se puede encontrar vía de acceso y comunicación intermunicipal, por lo que direccionar las labores de explotación hacia esos sectores podría acarrear problemas posteriores.

Beneficio y transformación

El proceso de beneficio del material extraído en los diferentes frentes se manejará de dos maneras, un material para ser comercializado de manera directa, sin ningún tipo de cambio o beneficio; mientras otra parte será llevada a proceso de clasificación, donde se buscará, a través de un proceso sencillo de zarandeo, aumentar su valor comercial, así como mejorar la calidad del mismo material.

El material será arrancado en el frente y acopiado en los patios respectivos, aquel que ha de ser procesado se clasificará inicialmente mediante zarandas vibratorias, de donde se separaran los sobre tamaños del material beneficiado, produciendo dos resultados, grava de menor diámetro y un sobre tamaño, así como también arenas.

Dentro de los insumos del proyecto, la cantera tiene como insumos materiales de construcción tipo recebo y pequeñas presencias de caliza, equipos de acarreo, excavadoras y combustible.

Residuos peligrosos y no peligrosos

Con el propósito de garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos ordinarios que se produzcan en el área definida para la extracción de material de construcción se incluyen en el PMA el proyecto sobre el manejo de Residuos sólidos identificada con el código: PMA-Pmr-12.

Producción y costos del proyecto:

Producción:

El desarrollo del proyecto en su fase de explotación estima una producción anual reciente año a año, iniciando con la extracción de 43.200 m^3 de material; que serán procesados y transformadas para efectos de la comercialización final del mismo.

Finalmente, para las etapas finales de la explotación se estima que se habrán extraído aproximadamente un total de 1.428.449 m^3 de material.

Para una base inicial de 7.500.000 m^3 de material estimados como reservas, la extracción final de 1.428.449 m^3, equivale al 19.04% del total de las reservas, por lo que el proyecto es viable en cuanto al tiempo de extracción y duración del mismo.

Costos:

La valoración de los costos asociados al proyecto se definió en el respectivo PTO mediante la metodología de evaluación financiera del que se muestra a continuación el resumen de costos totales por año con el fin de determinar los valores proyectados de mantenimiento del proyecto a lo largo de sus años de vida útil.

Tabla 3. Resumen de costos anuales

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIONES ANUALES	
CONCEPTO	VALOR ANUAL
Nomina	$ 190,267,140
Dotaciones	$ 12,800,000
Herramientas, materiales e insumos	$ 170,736,000
Alquiler de equipos y maquinaria	$ -
Manejo ambiental	$ 45,000,000
Regalias	$ 4,039,891
TOTAL	$ 422,843,031

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Área de influencia:

Esta área está determinada principalmente por las coberturas vegetales representativas tales como vegetación secundaria y pequeños bosques aislados, incluyendo los accesos a utilizar para el transporte del material.



Figura 5. Determinación del área de influencia

Medio Abiótico

Geología

Regionalmente el proyecto se localiza en el departamento de Córdoba, noroccidente de Colombia; situado sobre la extensa Llanura del Caribe, Córdoba presenta dos zonas fácilmente diferenciables: una plana y otra montañosa.

- **Estratigrafía**

La unidad principal dentro de la cual se encuentra ubicada el área de ejecución del proyecto OD8-11331 es la Formación Brechas de Cispatá (EMbc).

Formación cansona (Kca): La Formación Cansona se encuentra presente de forma muy esporádica a lo largo del cinturón plegado de San Jacinto. Su franja más extensa se localiza en el Cerro Cansona sector de los Montes de María (INGEOMINAS, Mapa Plancha 36- 37 María La Baja, 1998), con una extensión aproximada de 23 km de largo, contrastando con los pequeños

afloramientos que se reportan hacia el sur cuyas extensiones no son mayores a un par de kilómetros. Al norte de los Montes de María no se han reportado afloramientos de esta formación.

En el área de estudio, en el sector de Lorica, la Formación Cansona se encuentra aflorando hacia la esquina suroriental, en una franja de 2 km de largo por 0,6 Km de ancho, localizada a tres kilómetros de la ciudad de Lorica, lugar que localmente se conoce en la literatura geológica como cantera San Carlos, o como la balastrera según los habitantes de la región. La unidad esta replegada (con pliegues recumbentes), haciendo parte de una estructura anticlinal con flanco oriental invertido y con un tren estructural N25E, aproximadamente. Jaramillo et al., (2011), en la cantera San Carlos reporta una edad Santoniano temprano a Maastrichtiano usando nanofósiles. De acuerdo con Juliao et al., (2016) el ambiente de depósito corresponde a plataforma interna a media.

Formación San Cayetano (Psc): La Formación San Cayetano abarca casi toda la totalidad de la franja central y oriental de la cartografía adelantada, limitada al occidente por la Falla del Sinú. Esta delimitación por parte de la Falla del Sinú con la Formación San Cayetano es de carácter regional y dicha formación o sedimentos de edad Paleoceno tardío, no se han reportado en superficie o subsuelo dentro del Cinturón Plegado del Sinú.

Formación Toluviejo: La Formación Toluviejo ha sido descrita como una sucesión de margas y limolitas calcáreas, color oscuro que varía lateral y verticalmente a areniscas grises de grano fino con glauconita y cemento calcáreo.

Hacia el tope se compone de calizas color crema, muy compactadas y con abundantes fósiles coralinos, equinodermos y algas (Villafrade, 2007). Datos de micropaleontología y nanoplancton calcáreo, indican una sedimentación en ambientes marinos someros, con salinidad normal y aguas cálidas (Bermúdez, 2009). A esta formación se le atribuye una edad Eoceno tardío – Oligoceno temprano y localmente reposa en discordancia sobre la Formación San Cayetano y es paraconforme con la Formación Maco y Chengue.

Formación El floral: Esta unidad ha sido descrita como una secuencia de arcillolitas y lodolitas, hacia la base presenta intercalaciones de areniscas de grano fino a medio (Caro, 2009). Datos de palinología indican influencia marina, con aporte del continente, evidenciado por la presencia de dinoflagelados, material vegetal degradado y de manglar (Bermúdez, 2009).

Formación Brechas de Cispatá (EMbc): Esta unidad aparece en el bloque yacente de la Falla de San Jacinto, siendo una formación que se restringe al Cinturón Plegado del Sinú. Barrera (2003), propuso este nombre para denominar el conjunto de rocas aflorantes en la Cuchilla de Cispatá, que topográficamente resaltan con el paisaje de llanura adyacente a esta. La edad asignada para esta formación es post-Eoceno medio argumentada en el hecho que esta formación es generada por fuerte actividad tectónica, la cual la constituye rocas de la Formación San Cayetano (Barrera, 2003).

Es la unidad principal dentro de la cual se encuentra ubicada el área de ejecución del proyecto OD8-11331, por lo que su descripción será más detallada.

- **Descripción litológica**

En esta unidad se identifican dos facies sedimentarias distintas que marcan diferentes procesos de depositación y que representan dos unidades distintas. En esta memoria se proponen dos miembros para esta formación; el miembro inferior consiste en una roca caja en donde predominan las limolitas siliceas que con frecuencia registran brechamiento y están afectadas por inyecciones de lodo; el miembro superior fue formado por un retrabajamiento del miembro inferior y corresponde a una brecha sedimentaria compuesta por fragmentos angulares de limolitas siliceas.

Se puede indicar que el miembro superior, con base en su naturaleza brechoide y matriz-soportada puede corresponder a un depósito de flujo de detritos relacionado con abanicos aluviales, esto asociado a una previa exhumación del miembro superior.

- **Geología estructural**

En el área de estudio se presentan dos fallas (Falla San Jacinto y Falla La Tragedia) de importancia regional que delimitan las cuencas de Sinú y San Jacinto (Duque Caro, 1979 y 1980). En el bloque colgante de la Falla San Jacinto se observa una serie de plegamientos con cabeceos en dirección noreste.

La Falla La Tragedia es un rasgo mucho más local en comparación con la Falla San Jacinto, en sí, se trata de una falla secundaria cuya clasificación es un splay aislado a una falla principal (Falla San Jacinto). Esta falla parece estar condicionando el emplazamiento en superficie de unidades de edades Eoceno temprano en la cuenca del Sinú, es decir, parte alta de la formación San Cayetano.

Hacia el costado norte de la cartografía en cercanías al pozo Lorica-1, no se tiene registro alguno de estaciones de campo, sin embargo, se mapea la Formación Toluviejo ayudados por el contexto regional de los pliegues registrados al oriente y en donde esta unidad aparece claramente. Se analizó el registro dipmeter del pozo Lorica-1 y se estableció la existencia de una discordancia angular al tope del San Cayetano que correspondería a la discordancia del Eoceno medio.

En el costado sur, en la cantera San Carlos, se observa el único afloramiento de la Formación Cansona en donde el pozo Sinú-2 fue perforado, hacia el suroriente de este, se perforo el pozo Sinú 1 a 850m, sobre las litoarenitas de la Formación San Cayetano.
Se realizó un corte a través de estos dos pozos con el fin de entender como la Formación Cansona está emplazada en superficie.

- **Geología local**



Figura 6. Geología local

El área de estudio se caracteriza por la presencia de material de origen sedimentario, con presencia de materiales del tipo Limolitas siliceas, en el terreno se llegan a observar presencias de inyecciones marcadas de lodo, facilitando terrenos blandos a sueltos.

En general se observan formaciones geológicas y geomorfológicas representativas de la zona, con pendientes suaves a bajas, planicies que facilitan el desarrollo de la actividad minera actualmente y a futuro.

Actualmente en la zona de interés se adelantan labores de explotación sobre el material conformado principalmente por conglomerados y material arenoso, autosoportante, por lo que, ayudado a la baja altura de los taludes finales y la recuperación vegetal, permiten que la estabilidad del terreno sea optima; de tal manera que no represente impacto para el mismo.

Por tanto y ante la presencia de material mayormente sedimentario, se estima técnicamente no es necesario la implementación de un estudio geomecánico a detalle, sin embargo, se recomienda mantener las labores de recuperación en frentes abandonados, así como mantener las labores de explotación según los parámetros a continuación establecidos de modo que se pueda tener un área estable y segura topográficamente.

- **Geomorfología**

La zona de estudio se caracteriza por tener zonas de topografía montañosa, con un relieve relativamente bajo, donde las laderas presentan pendientes abruptas y una rugosidad media que aumenta el grado de susceptibilidad a los movimientos en masa. Se da en geoformas de origen estructural como lomos (Sl) y unidades denudacionales como lomos residuales (Dlres).

Hacia las zonas norte y este se pueden encontrar áreas donde sobresale el relieve colinado a alomado, en unidades de origen estructural como lomos (Sl), laderas estructurales y de contrapendiente de cuesta (Scle – Sclc) y unidades denudacionales como cerros residuales (Dcrs), lomos residuales (Dlres); y al Oeste unidades de lomerios (Dlpd – Dlmd) y lomas residuales (Dlor). Estas geoformas se caracterizan por un relieve relativo bajo, de materiales blandos erosionables y una amplia variación del rango de pendientes que van desde inclinadas en la zona de lomeríos hasta inclinadas a abruptas en los lomos (denudacionales y estructurales), el patrón de drenaje es principalmente subdendrítico con un grado de incisión moderado.

Hacia el Oeste de la zona se encuentran unidades de origen fluvial como abanicos aluviales (Faa), con características morfométricas como bajo relieve relativo y laderas con pendientes planas a suaves inclinadas. La mayor parte de la zona está asociada a extensas áreas de morfología plana a suave ondulada, con un relieve relativo muy bajo característico de materiales blandos erosionables y pendientes planas a suavemente inclinadas. Se presenta en unidades geomorfológicas de origen denudacional como planicies (Dp) y planicies onduladas (Dpo), montículos y ondulaciones denudacionales (Dmo); además en unidades de origen fluvial como planos o llanuras de inundación (Fpi), planos anegadizos (Fpa) y terrazas de acumulación (Fta).

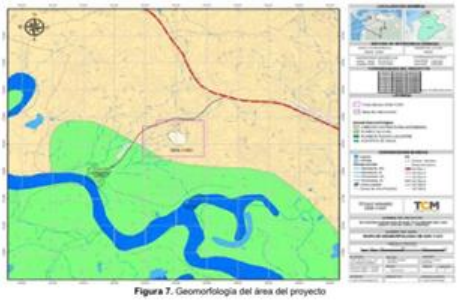


Figura 7. Geomorfología del área del proyecto

En el área del proyecto, ubicado en el municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba; se hace evidente la presencia de dos unidades geomorfológicas descritas a continuación.

- Abanicos aluviales (Planicie aluvial): Superficie en forma de cono, de laderas cóncavas a convexas de morfología plana, aterrazada. Su origen es relacionado a la acumulación torrencial y fluvial en forma radial, donde una corriente desemboca en una zona plana. Los depósitos aluviales se depositan radialmente desde el ápice del abanico localizado en la salida de la corriente de las montañas. Los canales fluyen cortando el abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al alejarse de él.

- Ladera estructural (Lomerío estructural – Erosional): Superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).

Paisaje

A continuación, se muestra la figura de la capa de paisaje que se enmarca en el área de la concesión minera OD8-113311.



Figura 8. Paisaje lomerio

El área de estudio corresponde a una región de topografía plana y ondulada con colinas, con desarrollo de quebradas y drenajes producto de la dinámica fluvial de estos ríos que da origen a terrazas, llanuras de inundación y abanicos aluviales principalmente.

Se encontró una extensión de:

- Planicie aluvial, Se define como una gran extensión de terreno plano de materiales fluviales o aluviales, se desarrollan a la salida de flujos de corrientes intramontanos, con capacidad de transporte de sedimentos en régimen torrencial.
- Cuerpos de agua, El predio es surcado por varios arroyos de nombres no determinados, esos arroyos tienen su drenaje (por es correntía) en dirección directa al rio Sinú; Río que además se encuentra a una distancia de aproximadamente 850 m (Esta distancia entre el Río Sinú y el predio puede variar cercana a ese valor por la existencia de paleocauces o madres viejas.
- Lomerío, Este paisaje incluye unidades de tipo denudativo y estructural cuyas alturas, con relación a las áreas circundantes, no sobrepasan los 300 m. Generalmente se encuentra entre los paisajes de montaña y planicie o entre los de montaña y piedemonte. Las lomas son de forma redondeada o alargada con cimas planas o agudas. Los tipos de relieve

presentes son lomas, crestones homoclinales, lomas y crestones, espinazos y lomas y vallecitos.

Paisaje escénico

El paisaje del área del título minero OD8-11331 y la calificación presentada por cada tipo de cobertura:

SIMBOLO	COBERTURA VEGETAL	PAISAJE ESCÉNICO	
GENERAL		ESTÉTICO	
Vs	Vegetación secundaria	Común	Agradable- alto valor estético
Tu-d	Tejido urbano discontinuo	Monótono	No agradable - alto valor estético

Suelo y usos de la tierra

El predio donde se encuentra ubicado la cantera San Nicolás de Bari está en la zona rural del municipio de Lorica, tomando información del POMCA del Río Sinú y el POT del municipio de Santa Cruz de Lorica, la Cantera SNB se encuentra ubicado en una zona que representa suelos de clasificación agrológica tipo VII, los suelos de clasificación agrológica tipo VII presentan aptitud especial principalmente para protección de la vegetación forestal, por las limitaciones severas que presenta en erosión y pendiente, lo que se verifica a través del sistema de Información geográfica, obteniendo la siguiente salida.

los vértices del polígono, los cuales deberán tener las coordenadas geográficas, para el adecuado seguimiento de los técnicos de la Corporación, los beneficiarios deberán presentar ante la CAR-CVS, registro fotográfico donde conste que dicha actividad se desarrolló, además se deberá alinderar el área minera propiamente dicha, estableciendo los mojones que indique el área susceptible a ser intervenida en labores de explotación. La alinderación deberá ejecutarse en un periodo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente Licencia Ambiental.

- El arranque y cargue que se autoriza para el tipo de explotación, es mecanizado como actividad principal, el acarreo en camiones de capacidad hasta 14m^3, hasta el sitio de acopio autorizado, las volquetas utilizadas en el proyecto deberán ser identificadas adecuadamente, así como el personal que labora en el proyecto minero.
- La Licencia Ambiental que se aprueba autoriza la adecuación del sitio de acopio de los materiales de construcción autorizados para explotar, sitio que se enmarca dentro de las siguientes coordenadas planas con origen Magna Sirgas Oeste:

PUNTO	ESTE	NOTE
1	802682	1515939
2	803451	1515939
3	803451	1515270
4	802459	1515270
5	802459	1515831
6	802682	1515831

- Las labores mineras se deberán desarrollar solo en el polígono considerado para tales efectos dentro del área del Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331 y fundamentadasen el Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Los beneficiarios como propietarios de la cantera deberán adoptar las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad geotécnica de las áreas, para lo cual deberá adelantar un programa de monitoreo permanente de la estabilidad en las áreas de influenciadel proyecto Minero (el titular minero debe contratar personal idóneo y competente ingeniero civil y geotecnista que realicen un estudio en campo de la estabilidad de los taludes que se formen en las áreas de influencia directa, para lo cual presentará ante la Corporación los estudios que contengan las medidas para evitar el colapso de los mismos). Bimensualmente se deberá presentar el reporte de los puntos críticos definidos mediante el monitoreo. En caso de presentarse afectación en las áreas del proyecto como consecuencia de la actividad minera, los perjuicios y daños causados al igual que los estudios y obras de estabilización geotécnica correrán por cuenta del propietario del proyecto.
- La presente Licencia Ambiental solo amparará las actividades y obras contempladas en el desarrollo minero, dando cumplimiento estricto al método y metodologías establecidas y presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental. En caso de modificación o incremento de

actividades no contempladas se deberá solicitar la modificación del instrumento de planificación y manejo ambiental, anexando para ello la complementación del EIA.

- El beneficiario de la presente Licencia Ambiental debe exigir y tener un control del uso de los Elementos de Protección Personal requeridos para dicha actividad, según el estudiorealizado por el beneficiario y el personal encargado de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de igual forma el Titular deberá tener los debidos permisos emitidos para en transporte y comercialización de minerales RUCOM.
- El acarreo en volquetas con capacidad de 14 m^3 hasta el sitio de consumo, estos vehículos deberán tener involucrados en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a finde que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que evite el derrame, perdida del material durante el transporte. Por lo tanto, el contenedor o platón debe estar constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o platones deberán estar en perfecto estado de mantenimiento, la carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen este a ras del contenedor o platón, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor, además las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas deberán permanecer aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.
- Es obligatorio cubrir la carpa transportadora con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón. En el evento en que se presente cualquier escape, pérdida o derrame de algún material o elementos de los vehículos en áreas de espacio público, este deberá ser recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo necesario. Para verificar dicha actividad, esta deberá ser contemplada en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs, por el beneficiario con registros fotográficos, así como copia de las actas de capacitacionesy registro de asistencia de los operadores.
- Con el fin de controlar y evaluar las emisiones atmosféricas generadas por la extracción de materiales de construcción, el beneficiario de la Licencia Ambiental deberá:
  - ✓ Ejecutar dos campañas anuales de monitoreo de calidad de aire de material particulado PM10 y PM2.5. una en época seca y otra en lluviosa con mínimo una estación de fondo vientos arriba del proyecto, una estación vientos abajo y una en la zona urbana más cercana a la planta. Para ello deberá garantizar que sean realizados bajo una operación representativa, es decir, aquella que se realice bajo condición de operación normal
- Los vehículos utilizados en actividades mineras no deberán sobrepasar la velocidad máxima permitida en vías veredales de 30 Km/h. El beneficiario de la presente Licencia Ambiental trimestralmente deberá presentar el listado del personal operativo, autorizados por él para explotar y transportar carbón en el área solicitada, indicando nombre y número de identificación de todo el personal, la placa del vehículo en caso de los transportadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- En ningún caso se permitirá el lavado y mantenimiento mecánico y/o eléctrico de maquinarias y equipos utilizados en labores mineras en el área del proyecto.
- Los frentes de trabajo deberán ser debidamente señalizados, mediante señalización vertical y según lo establece el decreto 539 de 8 de abril del 2022 por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto. Los beneficiarios deberán presentar ante la Corporación el debido informe del cumplimiento dedicha actividad, con los respectivos registros fotográficos, en un plazo máximo de dos (02)meses, a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que otorgue la Licencia Ambiental.
- Queda prohibido la quema o establecer fogatas en el área del proyecto por parte de personal adscrito bajo cualquier modalidad al proyecto minero.
- El propietario del Proyecto deberá informar a la CAR – CVS la ocupación, perturbación o despojo de terceros que la realice en el área objeto del proyecto.
- Una vez se tenga definido el sitio para el acopio de materiales mineros se deberá presentarlos diseños definitivos para aprobación de la CAR – CVS, indicando las medidas de manejo ambiental a implementar durante su construcción y operación. El beneficiario deberá en un término que no supere los treinta (30) días a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un cerramiento perimetral a manera de barreras vivas del centro de acopio de tal manera que se evite o mitigue el impacto visual, la contaminación auditiva y la emisión de material particulado a la atmósfera. El beneficiariodeberá presentar ante la CAR-CVS, registros fotográficos donde ese evidencie dicha actividad.
- En ningún caso se permitirá la captura y comercialización de especies de fauna nativa, por parte de personal del proyecto minero o de personal vinculado bajo cualquier modalidad al proyecto.
- En ningún caso se permitirá la presencia de menores de edad en el proyecto minero.
- El beneficiario deberá socializar el proyecto y sus características, el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, el Plan de Manejo Ambiental y el programa de Gestión Social a las autoridades y a la comunidad, en un término no superior a treinta (30) días, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y presentar los debidos soportes a la CAR-CVS.
- El beneficiario deberá realizar un taller de Educación Ambiental, dirigido a técnicos y trabajadores del proyecto, en un término no superior a treinta (30) días, a partir de la notificación del presente acto administrativo y presentar los debidos soportes a la CAR-CVS.
- Durante el tiempo que dure el proyecto se deberá prevenir el deterioro físico, mental y socialde los trabajadores, así como la ocurrencia de accidentes de trabajo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- Una vez finalizado el proyecto se deberá recuperar el entorno paisajístico, alterado por las labores mineras, recuperar las aptitudes potenciales del suelo anterior a la explotación de conformidad con el POT del municipio de Santa Cruz de Lorica, y proteger el suelo contra la erosión, la siguiente consideración es para el respectivo Plan de Cierre y Abandono, presentado a la CAR-CVS, para aprobación. El Plan de Cierre y Abandono será presentando por el beneficiario en un plazo máximo de un (1) mes, de haber culminado las labores de explotación, ante la CAR-CVS. La Autoridad Ambiental le hará seguimiento porun periodo de un (1) año, una vez sea entregada el área restaurada por el beneficiario y las actividades contempladas en el Plan de Cierre y Abandono.
- Queda prohibido establecer derivaciones, emplear máquina, aparato, detener o desviar el curso de las aguas, alterar o contaminar las aguas, en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.
- La CVS supervisará a través de la Subdirección de Gestión Ambiental la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo que apruebe la Licencia Ambiental. Cualquier contravención al mismo será causal para la aplicación de sanciones legales vigentes.
- La CVS ordenará si es caso la suspensión provisional o definitiva de las explotaciones cuando se derive peligro grave o perjuicio para las poblaciones y las obras o servicios públicos. Cualquier perjuicio causado por el proyecto, a las obras, a la infraestructura y a las personas, será asumido en su totalidad por los beneficiarios.
- La CVS, podrá ordenar la destrucción de las obras ejecutadas sin permiso de las autoridades, que puedan causar daños inminentes, que no hayan sido previstas en el PMA,así como también podrá ordenar la ejecución de obras para mitigar o corregir cualquier impacto ambiental no previsto.
- En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución de las obras, efectos ambientales no previstos, como resultado de la ejecución de actividades de monitoreo y seguimiento contempladas en el PMA, el beneficiario deberá suspender los trabajos e informar a la CVSde manera inmediata, para que esta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias sin perjuicio de las medidas que deba adoptar el beneficiario del PMA para impedir la degradación del medio.
- En caso de que el beneficiario, requiera realizar una modificación de las actividades del proyecto que impliquen nuevas obras que puedan producir deterioro de los recursos naturales, deberá presentar previamente los estudios y diseños, para su evaluación y la respectiva solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, según lo establece el Decreto1076 de 2015 "Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
- La Licencia Ambiental que se apruebe, no ampara ningún tipo de obra o actividad diferente a las descritas en los documentos aportados por el beneficiario. De igual forma, ampara las

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

actividades realizadas a partir de la ejecutoria del acto administrativo, y de ningún modo, sustituye, reemplaza, modifica o altera los procesos que se adelanten en la autoridad ambiental previamente o por otras entidades.

- Las vías públicas que se utilicen en actividades mineras deberán ser periódicamente rehabilitadas técnicamente, mediante un proceso concertado Titular de la solicitud/Alcaldía-Gobernación, según sea el caso. El beneficiario deberá presentar las rehabilitaciones delas vías en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs.
- Deberá mantener actualizado trimestralmente, mediante planos a escala adecuada el avance físico de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y el avance de la explotación y deberán ser remitidos a la Corporación.
- La decisión que adopte la CVS, estará sujeta al pronunciamiento de aquellas personas que quieran hacer valer sus derechos, así como el pronunciamiento de las entidades reguladoras de este tipo de proyecto
- El presente acto administrativo no ampara las labores de acopio en el área urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica
- Las labores mineras deberán ser supervisadas periódicamente por personal experto que dirija los trabajos de manera técnica.
- Según lo contemplado en el PMA y como cumplimiento a este, el beneficiario de la Licencia deberá presentar ante la CVS, durante el primer semestre, una vez emitido el Acto Administrativo que otorgue la Licencia Ambiental, la siguiente información documentada y con registros fotográficos respectivamente:
  - ✓ Evidencia de las socializaciones del proyecto planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, a las comunidades aledañas al proyecto.
  - ✓ Documento que soporte la creación de una veeduría comunitaria ambiental y la capacitación en mecanismos de participación.
  - ✓ Evidencia documentada y con registros fotográficos de los talleres, charlas, capacitaciones al personal directo e indirecto del proyecto.
- Las obras y programas establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental EIA, los ajustes del mismo, lo estipulado en el concepto técnico y en la presente resolución, serán de obligatorio cumplimiento por parte del beneficiario.
- El proyecto deberá contar con la respectiva señalización preventiva, informativa y de seguridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- El incumplimiento de lo establecido en el presente Acto Administrativo, o la no ejecución en el espacio y en el tiempo de las medidas establecidas en elPlan de Manejo Ambiental dará lugar a la Revocatoria y suspensión de dicho instrumento, sin perjuicio de la previa ejecución de las labores de restauración paisajística, geomorfológica y forestal del área intervenida.
- El horario estipulado por la corporación para la operación y ejecución del proyecto es el horario diurno, según lo establece la normativa ambiental Res. 627/06.

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES.

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

NEGAR el permiso de aprovechamiento forestal único en el marco de la solicitud de licencia ambiental en el marco de proyecto de explotación de minerales "Cantera San Nicolás de Bari", ubicado en el municipio de Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba, amparado en el Contrato de Concesión Minera No. ODB-11331, por incumplimiento de los lineamientos establecidos dicha solicitud y claridad en la información presentada dentro del Estudio de Impacto Ambiental -EIA.

En consecuencia, se requiere que el solicitante presente la información faltante y cumpla con todos los requisitos estipulados en la metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales establecidos.

Por tanto, el usuario en el marco de sus actividades no puede desarrollar ningún tipo de intervención a individuos frustales mayores a 10 cm de DAP.

- La Licencia Ambiental que se aprueba en ningún caso ampara los permisos, autorizaciones o concesiones para el desarrollo de actividades mineras o conexas que demanden el uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales no contemplados dentro de la solicitud inicial de Licencia Ambiental. En caso de requerirse el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales para el desarrollo de actividades mineras conexas se deberá presentar con la debida anticipación la solicitud de modificación del EIA respectivamente, diligenciando los formatos establecidos para ello, de conformidad con el sistema de Gestión de Calidad de la CAR - CVS y anexando los estudios técnicos complementarios del caso.
- Por lo anterior, la señora María Cecilia Manjarrez identificada con cédula No. 43.272.817 de la ciudad de Medellín (Titular Minero), para intervenir áreas dentro del proyecto minero donde se identifiquen la presencia de flora, deberá solicitar la modificación de la Licencia Ambiental incluyendo el respectivo permiso de aprovechamiento forestal según los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", teniendo en cuenta que no cumplió con dicha documentación, lineamientos y metodología en el Estudio de Impacto Ambiental presentado en la solicitud de Licencia Ambiental.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- El cumplimiento a cada uno de los ítems descritos anteriormente deberá ser soportado a esta Corporación en medio magnético y físico.
- Además, se deberá realizar las siguientes actividades de restauración y conformación (geomorfológica y paisajística) progresiva en el proyecto, así:

  - ✓ Arranque de material propio de la mina para ser empleado en labores deadecuación.
  - ✓ Extendido y homogenización del material.
  - ✓ Restauración geomorfológica y adecuación de taludes.
  - ✓ Modelado de taludes y reconformación paisajística de áreas degradadas.
  - ✓ Retiro mecánico de montículos de rocas.
  - ✓ Acumular el material de manera que se articule con el paisaje.
  - ✓ Sembrar árboles alrededor de la cantera, que sirvan como barrera visual.
  - ✓ Mantenimiento técnico a las vías como riego de material y conservación de drenes naturales y canales perimetrales.
  - ✓ Adquisición establecimiento y resiembra de especies nativas.
  - ✓ Mantenimiento de la especie.
  - ✓ Seguimiento y monitoreo de las actividades.

- El beneficiario de la presente Licencia Ambiental deberá realizar todas las actividades de socialización y relacionamiento con las comunidades presentes en el área de influencia del proyecto, incluyendo las comunidades étnicas presentes durante toda la operación minera, según lo estipule el Ministerio del Interior, así como el cumplimiento a las actas de concertación y demás obligaciones adquiridas.

- El Concepto Técnico, el presente Acto Administrativo, están basados en el Estudio de Impacto Ambiental EIA, presentado por el Titular Minero, y son de total cumplimiento por el beneficiario de la Licencia Ambiental.

PARÁGRAFO PRIMERO: La CAR - CVS, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo amerita, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área de influencia. Dentro de las funciones de control y vigilancia asignadas en la Ley 99 de 1993, podrá requerir información adicional que bajo criterios técnicos se considere de importancia para el seguimiento de la presente Licencia Ambiental.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La CAR - CVS, supervisará la ejecución de la actividad y verificará en cualquier momento y sin previo aviso, las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de la etapa de monitoreo se desprenda la necesidad y en caso de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones adquiridas o por violación a las normas sobre protección ambiental o de los recursos naturales, se procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. Así mismo, la revocatoria o suspensión de la presente Resolución, de conformidad con la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y "Decretos reglamentarios".

174

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ARTÍCULO TERCERO: La señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, deberá pagar la suma de: **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($2.187.493 M/L)**, por concepto de seguimiento ambiental, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, con fundamento en la ley 633 de 2000 y la Resolución No. 1280 de Julio 07 de 2010 emanada del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Cuenta de Ahorro No. 438-75432-7 de Banco de Bogotá, a nombre de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS.

PARÁGRAFO: Anualmente y durante la vida útil del proyecto, obra o actividad el beneficiario deberá consignar a favor de la Corporación la suma indicada en el presente artículo, actualizada de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor-IPC, certificado por el DANE.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez pagados los costos antes señalados, se deberá reportar el pago por el servicio de evaluación de y/o seguimiento ambiental en la Oficina de Tesorería de la Corporación y/o en el Email: cvs@cvs.gov.co, en el cual debe anexar copia de la consignación y/o transacción electrónica, copia del Auto de Inicio o Resolución objeto del cobro y Registro Único Tributario- RUT.

PARÁGRAFO: La no cancelación de los costos aquí indicados dará lugar a que se tomen las medidas administrativas correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente Resolución a la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y siguientes del C.P.A.C.A.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, según lo establecido en el artículo 76 del C.P.A.C.A.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Director General CVS

Proyectó: L.R.
Revisó: A. Arrieta

175

f) Manejo de vegetación y capa orgánica

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 7	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de vegetación y capa orgánica	FICHA: PMA – AC - 06

Objetivo

- Establecer las medidas ambientales para el adecuado manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote en las áreas designadas para tal fin, minimizando los impactos generados por la intervención de estas zonas.

Metas	Indicadores
RCV = Remoción de cobertura vegetal Valor aceptable: 100%	$RCV = \left(\frac{\text{Volumen de material de cobertura vegetal dispuesto adecuadamente y/o reutilizado}}{\text{Volumen total de material de cobertura vegetal}}\right) X\ 100$ $= \frac{35\ \ 3}{35\ \ 3}\ \ 100$ = 100%
RD = Remoción de descapote Valor aceptable: 100%	$RD = \left(\frac{\text{Volumen de material de descapote dispuesto adecuadamente y/o reutilizado}}{\text{Volumen total de material de descapote}}\right) X\ 100$ = 100%

Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe de interventoría técnica y ambiental o Registro fotográfico o Licencias y/o permisos ambientales de proveedores de materiales o Facturas y/o soportes de compra de materiales en lugares autorizados

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL			
PREVENCION		CORRECCION	

IMPACTOS A CONTROLAR

- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo
- Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)

ACCIONES A EJECUTAR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

1. Consideraciones de la entidad contratante
   El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 7	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de vegetación y capa orgánica	FICHA: PMA – AC - 06

- En frente de obra se tiene total cuidado de no dañar árboles ni vegetación existente más allá de las líneas de excavación y construcción que se muestren en los planos y demarcados en campo por la comisión de topografía con la aprobación de la interventoría.
  En el mes de octubre sale la resolución por parte de la corporación autónoma regional de sucre CARSUCRE para intervenir 4 árboles que están en frente de obra: 1 abeto, 2 campanos y 1 carbonero, con el fin de compensar los daños ambientales generados, en el mes de octubre se realiza el aprovechamiento forestal de estos 4 árboles que se encontraban ubicados en puntos críticos, donde se desarrollan las actividades constructivas de la infraestructura propia del proyecto, los cuales estaban interfiriendo en el avance de obras del mismo, para el mes de diciembre no se hace el aprovechamiento forestal y esta en proceso la solicitud a CARSUCRE para solicitar el numero de especies a compensar por el aprovechamiento forestal de los 4 arboles intervenidos en obras.

3. Manejo de descapote

- El material orgánico retirado en la actividad de descapote, fue almacenado temporalmente en lugares que cumplían con las siguientes condiciones: estabilidad geotécnica, baja pendiente, facilidad de acceso, distancia de mínimo 30 metros a cuerpos de agua. Lo anterior, con el objetivo de ser reutilizado en las labores de revegetalización y cubrimiento de taludes.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de Diciembre del 2024			
	1	2	3	4
Manejo de remoción de cobertura vegetal				
Demarcar áreas a ser removidas				
La vegetación sobrante deberá ser reutilizada en la obra civil o dispuesta en un sitio apropiado				
Manejo de descapote				
Disponer el descapote en los sitios de almacenamiento temporal apropiados				
El descapote que no se reutilice disponerlo en los sitios apropiados				
El descapote deberá ser almacenado protegiéndolo del viento, la lluvia y el sol.				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

FORMATO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR PARTE DE CARSUCRE BAJO RESOLUCION N°1786 DE 29 DIC. 2022

CARSUCRE — COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Ambiente

FORMATO DE AUTORIZACION PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL ESPECIAL BAJO EL ESQUEMA DE LA RESOLUCION N° 1786 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022 SUBDIRECCION DE ASUNTOS MARINOS Y COSTEROS.

FECHA: 17/10/2024 FORMULARIO N°: 006

1) Información general

Nombre peticionario: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Identificación (NIT): 901.811.441-3

Representante legal: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Identificación (C.C): 1.067.943.743

Teléfono: 3002737187

Correo electrónico: consorciocmohospitalsucre@gmail.com

Dirección de correspondencia: Calle 42 # 7 – 40 LC 1 Monteria

Dirección del predio: Sector Guayabal

Municipio: Coveñas

Queja __ Oficio X N° **4800** Fecha: **17 de Julio de 2024**

2) Datos vecindad

2.1) Nombres y apellidos: NO REGISTRA
Identificación (C.c. C.e.): NO REGISTRA
Teléfono: NO REGISTRA
Celular: NO REGISTRA
De acuerdo: SI __**NO** __

3) Componente biológico

Ubicación del individuo: Espacio público: __ Espacio privado: X

Coordenadas Origen Único Nacional (MAGNA- SIRGAS BGT):

Árbol UNO (01): LN: 2597124.255 **LW:** 4705722.459
Árbol UNO (01) Nombre científico especie: *Samanea saman* **Nombre común:** Campano

Árbol DOS (02): LN: 2597130.494 **LW:** 4705710.299
Árbol DOS (02) Nombre científico especie: *Samanea saman* **Nombre común:** Campano

Árbol TRES (03): LN: 2597124.628 **LW:** 4705673.631
Árbol TRES (03) Nombre científico especie: *Senna siamea* **Nombre común:** Abeto

Árbol CUATRO (04): LN: 2597198.149 **LW:** 4705704.712
Árbol CUATRO (04) Nombre científico especie: *Pithecellobium dulce* **Nombre común:** Chimango

4) Medidas dasométricas:

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

CARSUCRE — COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Ambiente

Árbol UNO (01) DAP: 0.53 m **Altura total:** 12.5 m

Árbol DOS (02) DAP: 0.48 m **Altura total:** 9.5 m

Árbol TRES (03) DAP: 0.25 m Altura **total:** 6.6 m

Árbol CUATRO (04) DAP: 0.46 m **Altura total:** 7.6 m

Descripción estado fitosanitario:

Zona(s) afectada (s): Árboles en estado fitosanitario REGULAR, que interfiere con la construcción del Hospital nuevo del municipio de Coveñas por parte del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

Tipo de afectación: Los arboles interfieren con el desarrollo de la obra pública "construcción del nuevo hospital del Municipio de Coveñas.

Grado de afectación: Alto

Riesgos: Los individuos arbóreos se encuentran en el predio donde se construirá el nuevo hospital del Municipio de Coveñas, interfiriendo con las obras a desarrollar, debido a que se encuentran ubicados donde se desarrollaran actividades constructivas de la infraestructura propia del proyecto.

Observaciones: En atención al a los oficios No 4800 del 17 de julio del 2024 y No. 6451 del 11 de septiembre de 2024, se realizó la visita técnica para evaluar y conceptuar sobre la viabilidad de obtener permiso de aprovechamiento forestal en compañía de la señora Tania Olaya, Yeneris Padilla, en calidad de Ingeniera Ambiental y Sanitaria del Consorcio CMO Hospital Sucre, al lugar ubicado en sector Guayabal, Municipio de Coveñas, donde se evidencio que los individuos arbóreos se encuentran en pie, correspondiendo a cuatro (4) arboles de especie *Samanea saman* (2), *pithecellobium dulce* (1) y *Senna siamea* (1), los cuales se encuentran debidamente marcados con su respectivo código, los individuos arbóreos se encuentran en el área donde se desarrollaran actividades constructivas, propias del desarrollo del proyecto. Durante la visita se corroboro que no hay presencia de epifitas en los individuos arbóreos objeto de aprovechamiento forestal. Por lo anterior descrito, se considera **VIABLE** autorizar el **APROVECHAMIENTO FORESTAL AISLADO** de la especie en mención.

Fauna asociada: SI __ NO X
Nombre especie: NO REGISTRA **Nombre Común:** NO REGISTRA
Observaciones: No se evidenciaron especies de fauna asociadas a los árboles a aprovechar.

5)COMPONENTE JURÍDICO:

5.1) Estado de veda (Resolución 0617 de 2015 CARSUCRE): SI___ **NO X**

Tipo de condición del árbol (Artículo 2.2.1.1.3.1, Decreto 1532 de 29 de agosto de 2019, Resolución 1786 de 2022):

Artículo 2.2.1.1.9.1: Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobados requieren ser talados, se solicitarán permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud **NO APLICA**

Artículo 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles. **NO APLICA**

Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

CARSUCRE — COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Ambiente

tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. **NO APLICA**

El Decreto 1532 del 29 de agosto de 2019, incluyó las definiciones de:

Árboles aislados dentro de la cobertura de bosque natural. Son los árboles ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que, por razones de orden fitosanitario debidamente comprobadas, requieran ser talados. **NO APLICA**

Árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural. Son los individuos que resulten de regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura de bosque natural o cultivo forestal con fines comerciales. **SI APLICA** ✓

6) Concepto técnico:

De acuerdo a lo observado en campo y el diagnostico generado por el profesional adscrito a la subdirección de Asuntos marinos y costeros de la Corporación Autónoma de Sucre (CARSUCRE), se considera que los árboles:

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	VEDA (SI/NO)	TIPO DE MADERA (ESPECIAL, MUY ESPECIAL, ORDINARIA)	TRATAMIENTO	REPOSICIÓN
Samanea saman	Campano	No	Muy especial	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación
Samanea saman	Campano	No	Muy especial	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación
Senna siamea	Abeto	No	Ordinaria	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación
Pithecellobium dulce	Chimango	No	Ordinaria	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación

7) RESUELVE:

PRIMERO: Se considera **viable** autorizar al **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con Nit: 901.811.441-3, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria, el aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a de **CUATRO** (4) árboles; discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	GEORREFERENCIACIÓN		VOLUMEN (m^3)
C13	*Samanea saman*	Campano	2597124.255	4705722.459	4.95
C14	*Samanea saman*	Campano	2597130.494	4705710.299	4.95
P16	*Senna siamea*	Abeto	2597124.628	4705673.631	1,23
O15	*Pithecellobium dulce*	Cimango	2597198.149	4705704.712	9,96

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

CARSUCRE — COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Ambiente

SEGUNDO: El **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con Nit: 901.811.441-3, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria para el presente aprovechamiento deberá dar cumplimiento a las siguientes medidas:

- ✓ El autorizado deberá anunciar a CARSUCRE la fecha de inicio de sus actividades de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
- ✓ No exceder la cantidad de **CUATRO** (4) árboles, únicamente de las especies autorizadas en mención.
- ✓ Capacitar al personal que va a ejecutar las labores de aprovechamiento para que las realice con un criterio técnico y ambiental.
- ✓ El aprovechamiento forestal debe evitar accidentes a los operarios o que la caída de las ramas arrastre innecesariamente a otros árboles vecinos o caigan encima de personas.
- ✓ La fauna del área no será aprovechada de ninguna manera por el personal asignado para ejecutar las labores.
- ✓ En el caso de las aves, se obliga a reubicar los nidos y polluelos que se encuentren en árboles o entregarlos a CARSUCRE.

El aprovechamiento forestal deberá ser realizado bajo las metodologías y criterios técnicos definidos en el Estudio técnico aportado por el peticionario.

TERCERO: El aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, se otorgará por un término de **TREINTA DIAS** (30), contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución por medio de la cual se autoriza el respectivo aprovechamiento forestal.

CUARTO: CARSUCRE no se hace responsable de los daños causados a terceros durante el proceso de aprovechamiento forestal.

QUINTO: El autorizado en ningún momento podrá incinerar los productos resultantes de la actividad de aprovechamiento forestal, deberá recoger todos los residuos provenientes de dicha actividad.

SEXTO: El autorizado deberá presentar un informe final de aprovechamiento forestal a la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE.

SEPTIMO: El autorizado deberá cumplir con las disposiciones contempladas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y en todas aquellas que se dicten en materia de protección de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del Medio Ambiente.

OCTAVO: Se considera **viable** el plan de compensación propuesto por **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con Nit: **901.811.441-3**, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria.

NOVENO: El **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con **Nit: 901.811.441-3**, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria.

DECIMO: Se considera técnicamente **VIABLE ACEPTAR** el área propuesta para la compensación, georreferenciada bajo las siguientes coordenadas:

COORDENADAS GEOGRAFICAS		COORDENADAS ORIGEN UNICO NACIONAL	
N	W	N	E
09°23'38,56"	75°41'59,68"	2597191.671	4703584.165
09°23'37,45"	75°42'0,35"	2597157.716	4703563.455
09°23'38,76"	75°42'2,13"	2597198.393	4703509.443
09°23'39,65"	75°42'1,15"	2597225.513	4703539.561

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

CARSUCRE COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Ambiente

DECIMO PRIMERO: Los árboles a compensar deberán ser previamente concertado con la corporación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: especies (nativas de la región), cantidad o porcentaje a establecer por especies, densidad de siembra, arreglo espacial, sin embargo, deberán priorizar las siguientes especies: el 70% de los individuos a establecer deberá ser priorizado con las siguientes especies: Carreto (Aspidosperma dugandii), Trébol (Platimiscium pinnatum), Caracolí (Anacardium excelsum), Tolúa (Pachira quinata), Cedro (Cedrela odorata), Caoba (Swieteniama crophylla), Ébano (Libidibia ébano), Guayacán de bola (Bulnesia arborea), Polvillo (Tabebuia chrysantha), (Coccoloba acuminata), Orejero (Enterolobium cyclocarpum), Campano (Samanea saman), Arisal (Brownea ariza), un 30% en especies frutales nativas de la región.

DECIMO SEGUNDO: El área de compensación se deberá delimitar con cercado con cinco (5) hilos de alambre, buen posterio y puntales, aporte de abundante materia orgánica e hidrorretenedor a los huecos donde se establecerán los individuos; el tamaño de las plántulas deberá oscilar entre los 0.70 a 1.0 metro de altura y deberán presentar buen estado fitosanitario, tallo leñoso y erecto.

DECIMO TERCERO: El **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE**, identificados con **NIT: 901.811.441-3**, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Montería, debe presentar informes de seguimiento y monitoreo semestrales donde se evidencie el cumplimiento de las actividades silviculturales, en caso de muerte de algunos individuos plantados se deberá reportar el número y sitio de ubicación e informar mediante indicadores de desarrollo el estado de los individuos y su estado fitosanitario a CARSUCRE.
Para el seguimiento del proceso de compensación, en los informes de cumplimiento ambiental-ICA, incluir la siguiente información:

a) Polígono georreferenciado del área(s), de implementación de la medida.

b) Superficie plantada con sus fechas, indicando: número de individuos plantados, nombre científico y familia y su clasificación en especie nativas y/o potencial forofito.

c) Avances a la fecha de los arreglos florísticos establecidos, de acuerdo con la vegetación existente en el área seleccionada y su estado con respecto al grado de disturbio que está presente.

d) Informar la procedencia del material vegetal a emplear.

e) Reportar el análisis de crecimiento de los individuos establecidos (alturas y diámetros).

f) Seguimiento de indicadores de supervivencia y estado fitosanitario. En el caso de registrar supervivencia inferior al 80%, se debe documentar las causas y describir las acciones correctivas que se tomen.

g) Reporte de las actividades de mantenimiento programadas y realizadas.

h) Registro fotográfico

i) Presentar cartografía impresa con escala de salida gráfica entre 1:2000 a 1:10000, de la localización y delimitación del área donde se realizarán las acciones de rehabilitación, incluyendo las coberturas y acompañado del correspondiente archivo digital Shape, formato kml/kmz.

j) Descripción y análisis de la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo.

DECIMO CUARTO: **El CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE**, identificados con **NIT: 901.811.441-3,** representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Montería, deberá anexar la respectiva acta de acuerdo o acuerdos de conservación, teniendo en cuenta que el predio de

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

CARSUCRE COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Ambiente

interés para el desarrollo de las compensaciones es de naturaleza privada. Estos acuerdos o acta se deberán concretar y ratificar mediante la firma de contrato o acta de compromiso con el propietario, el cual debe ser construido por las partes interesadas y cumplir con lo establecido en el Código Civil Colombiano, o información predial en caso que los mismos sean comprados para tal fin.

8) ANEXOS:

- Registro fotográfico
- Oficio N° 4006 de 14 de junio de 2024
- Acta de visita

9) RESPONSABLES

9.1) FUNCIONARIOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

NOMBRE: PABLO ANDRÉS CÁRDENAS OSPINO
CEDULA: 1.103.097.151
CARGO: BIOLOGO CONTRATISTA S.A.M.C.O
INSTITUCION: CARSUCRE

FIRMA:

9.2) PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO


NOMBRE: NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
(C.C.): 1.067.943.743 de Montería
TELEFONO: 3002737187

FIRMA:
Vo.Bo. FADEL DEL CRISTO CUELLO ALFARO / PROFESIONAL ESPECIALIZADO S.A.M.C.O

El suscrito Subdirector de Asuntos Marinos y Costeros certifica que el funcionario **Fadel Del Cristo Cuello Alfaro** y el contratista **Pablo Andrés Cárdenas Ospino** están adscritos a esta subdirección.

ALEJANDRO DE LA OSSA LACAYO
Subdirector de Asuntos Marinos y Costeros
CARSUCRE

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

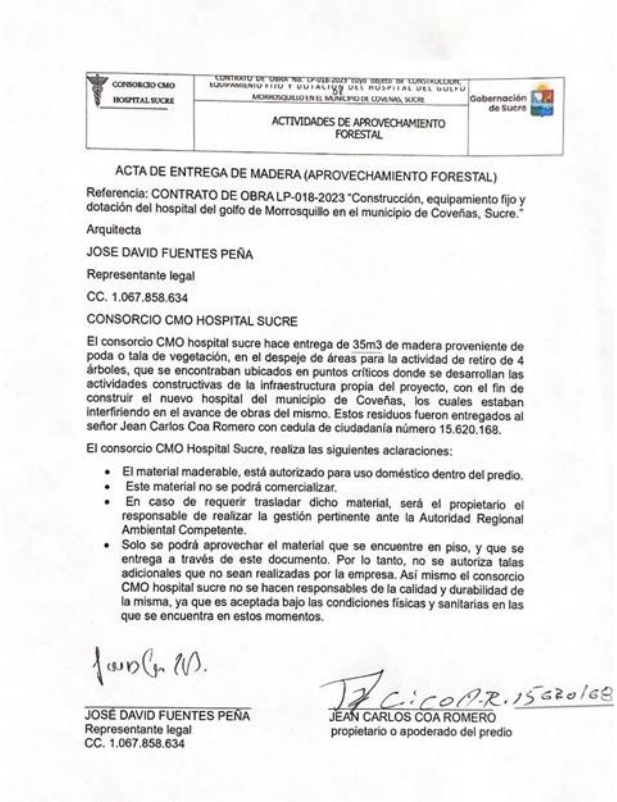

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023 cuyo objeto de CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Gobernación de Sucre

ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

ACTA DE ENTREGA DE MADERA (APROVECHAMIENTO FORESTAL)

Referencia: CONTRATO DE OBRA LP-018-2023 "Construcción, equipamiento fijo y dotación del hospital del golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre."

Arquitecta

JOSE DAVID FUENTES PEÑA

Representante legal

CC. 1.067.858.634

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

El consorcio CMO hospital sucre hace entrega de 35m3 de madera proveniente de poda o tala de vegetación, en el despeje de áreas para la actividad de retiro de 4 árboles, que se encontraban ubicados en puntos críticos donde se desarrollan las actividades constructivas de la infraestructura propia del proyecto, con el fin de construir el nuevo hospital del municipio de Coveñas, los cuales estaban interfiriendo en el avance de obras del mismo. Estos residuos fueron entregados al señor Jean Carlos Coa Romero con cedula de ciudadanía número 15.620.168.

El consorcio CMO Hospital Sucre, realiza las siguientes aclaraciones:

- El material maderable, está autorizado para uso doméstico dentro del predio.
- Este material no se podrá comercializar.
- En caso de requerir trasladar dicho material, será el propietario el responsable de realizar la gestión pertinente ante la Autoridad Regional Ambiental Competente.
- Solo se podrá aprovechar el material que se encuentre en piso, y que se entrega a través de este documento. Por lo tanto, no se autoriza talas adicionales que no sean realizadas por la empresa. Así mismo el consorcio CMO hospital sucre no se hacen responsables de la calidad y durabilidad de la misma, ya que es aceptada bajo las condiciones físicas y sanitarias en las que se encuentra en estos momentos.

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante legal
CC. 1.067.858.634

JEAN CARLOS COA ROMERO
propietario o apoderado del predio

C.C. 15620168

Anexo. CERTIFICADO DE DONACIÓN MATERIAL DE PODA

g) Control de emisiones atmosféricas y ruido

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 8	
Programa: MANEJO DEL RECURSO AIRE	
Subprograma 1. Control de emisiones atmosféricas y ruido	FICHA: PMA – AC - 07
Objetivo	
o Establecer las medidas ambientales para el manejo adecuado de fuentes de emisiones y ruido, con el fin de prevenir o mitigar los impactos negativos de las actividades de las obras civiles a la calidad del aire. o Seguir lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 en el titulo 5 Reglamento de protección y control de la calidad del aire que aplique a las acciones realizadas en las etapas del proyecto.	
Metas	Indicadores
R = Riego o humedecimiento de las zonas que lo requieren Valor aceptable: 100%	$R = \left(\frac{\text{No. de veces que se realiza riego al día}}{\text{No. de veces que se programa riego al día}}\right) X\ 100$ = (–) = %

CV = Certificación de vehículos Valor aceptable: 100%	$CV = \left(\frac{\text{No. de vehículos que cuenta con certificado de gases vigente}}{\text{No. total de vehículos en la obra civil}}\right) X\ 100$ = (—) = %
Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Registro fotográfico o Informe de interventoría técnica y ambiental o Certificado de gases, revisión técnico-mecánica y seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) de los vehículos utilizados en la obra civil

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 8	
Programa: MANEJO DEL RECURSO AIRE	
Subprograma 1. Control de emisiones atmosféricas y ruido	FICHA:PMA – AC - 07

- Alteración de la calidad del aire por gases contaminantes (CO2, CO, SO2, NOX)
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)
- Disminución del confort acústico

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exige al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Manejo de fuentes de emisiones

- Los vehículos utilizados en la obra, tienen los certificados de emisiones atmosféricas vigentes, el proveedor garantiza el mantenimiento de los vehículos antes de ingresar a realizar las actividades dentro de la obra.
- Se mantiene el aislamiento de equipos como cortadores y pulidoras para mitigar la generación de material particulado.
- La velocidad de los vehículos dentro del área del proyecto es inferior a los 20 km/h.


3. Manejo de fuentes de ruido

- En medio de la ejecución de obras no se hizo uso de cornetas, bocinas, pitos y alarmas de los vehículos que están involucrados en la obra civil, a excepción de la alarma de reversa y los dispositivos diseñados para evitar accidentes o anunciar situaciones de emergencia.
- Se garantiza los niveles establecidos en la Resolución 0627 de 2006 (artículo 13 y articulo 17, sector C. Ruido intermedio restringido o la que haga sus veces).
- Se le provee a los trabajadores equipo de protección auditiva (tipo inserción).

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 8					
Programa: MANEJO DEL RECURSO AIRE					
Subprograma 1. Control de emisiones atmosféricas y ruido					FICHA:PMA – AC - 07
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.				
Cronograma de aplicación de las actividades	Actividades	Cronograma			
		Mes de diciembre del 2024			
		1	2	3	4
	Manejo de fuentes de emisiones				
	Instalación de polisombra en los frentes de obra				
	Mantenimientos a vehículos, equipos y maquinarias				
	Aislamiento de equipos para mitigar la generación de material particulado.				
	Cubrimiento de la carga que transportan los vehículos de la obra civil.				
	Operación de vehículos, maquinaria y equipos en horarios permitidos.				
	Manejo de fuentes de ruido				
	Revisar la solicitud de permisos de ruido nocturno si aplica				
	No usar cornetas ni pitos en los vehículos de la obra civil				
	Garantizar los niveles de ruido de la norma Resolución 627 de 2017 o la que aplique.				
	Proveer de protección auditiva a los trabajadores				
Observaciones	Hasta la fecha no se hace necesario pasar la solicitud de permisos para ruidos nocturnos.				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 8	
Programa: MANEJO DEL RECURSO AIRE	
Subprograma 1. Control de emisiones atmosféricas y ruido	FICHA: PMA – AC - 07
	En la ficha técnica PMA-AC-02 Se encuentran los anexos de los vehículos que ingresaron en el frente de obra durante el mes de agosto del 2024, como RUT, SOAT y licencia de conducción
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

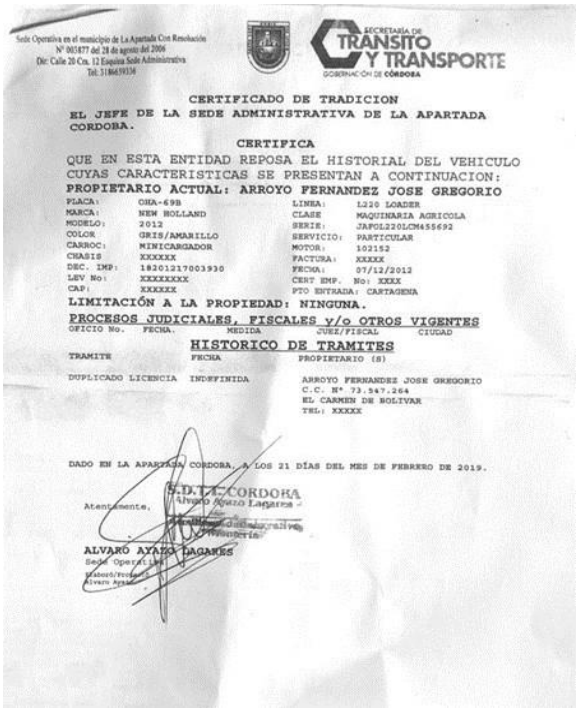

Sede Operativa en el municipio de La Apartada Con Resolución N° 003877 del 28 de agosto del 2006
Dir: Calle 20 Cra. 12 Esquina Sede Administrativa
Tel: 5186659136

SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CERTIFICADO DE TRADICION

EL JEFE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA APARTADA CORDOBA.

CERTIFICA

QUE EN ESTA ENTIDAD REPOSA EL HISTORIAL DEL VEHICULO CUYAS CARACTERISTICAS SE PRESENTAN A CONTINUACION:

PROPIETARIO ACTUAL: ARROYO FERNANDEZ JOSE GREGORIO

PLACA:	OHA-69B	LINEA:	1220 LOADER
MARCA:	NEW HOLLAND	CLASE	MAQUINARIA AGRICOLA
MODELO:	2012	SERIE:	JAF0L220LCM455692
COLOR	GRIS/AMARILLO	SERVICIO:	PARTICULAR
CARROC:	MINICARGADOR	MOTOR:	102152
CHASIS	XXXXXX	FACTURA:	XXXXX
DEC. IMP:	18201217003930	FECHA:	07/12/2012
LEV No:	XXXXXXXX	CERT EMP. No:	XXXX
CAP:	XXXXXX	PTO ENTRADA:	CARTAGENA

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: NINGUNA.

PROCESOS JUDICIALES, FISCALES y/o OTROS VIGENTES

OFICIO No.	FECHA.	MEDIDA	JUEZ/FISCAL	CIUDAD

HISTORICO DE TRAMITES

TRAMITE	FECHA	PROPIETARIO (S)
DUPLICADO LICENCIA	INDEFINIDA	ARROYO FERNANDEZ JOSE GREGORIO C.C. Nº 73.547.264 EL CARMEN DE BOLIVAR TEL: XXXXX

DADO EN LA APARTADA CORDOBA, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

S.D.T.T. CORDOBA
Álvaro Ayazo Lagares

Atentamente,

ALVARO AYAZO LAGARES
Sede Operativa

CERTIFICADO DE TRADICION MINICARGADOR





PROTECTORES AUDITIVOS

Los trabajadores en cada frente de obra cuentan con protectores auditivos previniendo la pérdida de audición inducida por el ruido.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 9	
Programa: MANEJO DEL RECURSO SUELO	
Subprograma 1. Manejo de obras en concreto	FICHA: PMA – AC - 09

Objetivo

- Establecer las medidas ambientales para el manejo adecuado del concreto, con el fin de prevenir o mitigar los impactos negativos de las actividades de las obras civiles.

Metas	Indicadores
Cumplir al 100% las actividades propuestas	No. Incidentes presentados x 100 No. Incidentes resueltos

Responsables	Registros / Evidencias
• Supervisor para la ejecución de la obra • Contratista encargado de la ejecución de la obra • Interventoría de obras y ambiental	• Registro fotográfico • Informe de interventoría técnica y ambiental

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Alteración de la calidad del suelo
- Alteración de la calidad del agua fuentes superficiales
- Control de agua de lavada de volquetas
- Disposición de recursos sobrantes
- Manejo adecuado de aditivos

ACCIONES A EJECUTADAS MES DICIEMBRE 2024

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Manejo de concreto

- El cemento en sacos es almacenado en sitios secos, aislados del suelo y a una altura no mayor a sietes (7) metros, protegerlo de la humedad se almacena en el sitio adecuado para tal fin protegidos de la lluvia y la intemperie
- El personal tiene prohibido manipular el cemento, la pasta de cemento o el hormigón sin los elementos de protección adecuada, el contacto con estos puede generar daños en la piel o causar hemorragias e infecciones.
- Se prohíbe realizar mezcla directamente sobre el suelo.
- Se desploma la loza en bloque 3 con mezcla de concreto, ésta se recoge y traslada al sitio destinado para la disposición de escombros. La zona donde se presente el derrame se limpia, de tal forma que no queda evidencia del vertimiento presentado.
- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en el frente de obra o en los cuerpos de aguas cercanos, se dispone un punto especifico para el lavado de las mezcladoras.
- El hierro se protege con el fin de evitar que las condiciones climáticas afecten la estructura, de igual forma para evitar la escorrentía de agua con trazas de hierro y metal, sinérgicamente la contaminación de agua superficial, subterránea y suelo.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 9	
Programa: MANEJO DEL RECURSO SUELO	
Subprograma 1. Manejo de obras en concreto	FICHA: PMA – AC - 09
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considera la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma Mes de diciembre 2024			
	1	2	3	4
Manejo de concreto				
Almacenar cemento correctamente				
Contar con plataforma o geotextil para proteger el suelo cuando se hace mezcla				
El personal hace uso de los elementos de protección personal				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRÁFICO



Punto destinado en obras para el lavado de equipos mezcladores de concreto.



Sacos de cemento en bodega cubiertos y aislados del suelo, protegidos de lluvia e intemperie.





h) Excavaciones y rellenos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 10	
Programa: MANEJO DEL RECURSO SUELO	
Subprograma 1. Excavaciones y rellenos	FICHA: PMA – AC - 9

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Objetivo
o Establecer las medidas necesarias para el manejo de los movimientos de tierra y material sobrante asociado a las excavaciones durante la construcción del proyecto.

Metas	Indicadores
Dar adecuada disposición al 100% de los materiales sobrantes generados durante los movimientos de tierra en la construcción del proyecto	(IDO) Disposición de material: (Volumen de material dispuesto en el Zodme o escombrera municipal / Volumen de material generado en las actividades que implican movimientos de tierra) = 1
Responsables	**Registros / Evidencias**
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Registro fotográfico o Informe de interventoría técnica y ambiental

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR					
CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR
o Activación de procesos erosivos o Alteración del paisaje

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
4. Consideraciones de la entidad contratante El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante. 1. Manejo de excavaciones o Durante el mes de diciembre se realizan labores de excavación en el frente de obra, se aísla totalmente el área excavada, se delimita el área con cinta como medida de protección que indica la labor que se está realizando. o Se ubica los materiales de los frentes de obra en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehicular. o Los residuos de excavaciones se adecuan de manera temporal, del mismo modo este material es reutilizado en obras. o La madera que se utiliza en obra para la construcción y adecuación de campamentos se encuentra libre de clavos, nudos grandes y astillas.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 10		
Programa: MANEJO DEL RECURSO SUELO		
Subprograma 1. Excavaciones y rellenos		FICHA:PMA – AC - 9
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.	
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.	
Cronograma de aplicación de las actividades		

Actividades	Cronograma			
	Mes de diciembre del 2024			
	1	2	3	4
Manejo de escombros y rellenos				
Delimitación de áreas a ser intervenidas				
Asignación de áreas para acopio temporal				
Implementación de medidas de manejo para el acopio de materiales en el área asignada				
Limpieza y recuperación de áreas intervenidas				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRAFICO









EXCAVACION EN FRENTE DE OBRA

i) Manejo de residuos líquidos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 11	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de residuos líquidos	FICHA: PMA – AC - 10
Objetivo	
o Realizar un adecuado manejo de los residuos líquidos que se pueden generar en las actividades de obras civiles, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, y como mecanismo de minimización de cualquier alteración al ambiente.	
Metas	Indicadores
DP = Disposición final de residuos líquidos Valor aceptable: 100%	$DP = \left(\frac{\text{Cantidad de residuos líquidos dispuestos adecuadamente}}{\text{Cantidad de residuos líquidos generados}}\right) X\ 100$ = (———) = %
MB = Mantenimiento de baños portátiles Valor aceptable: 100%	$MB = \left(\frac{\text{No. de baños portátiles con mantenimiento}}{\text{No. total de baños portátiles}}\right) X\ 100$ = (—) = %
MT = Mantenimientos a trampas de grasas Valor aceptable: 100%	$MT = \left(\frac{\text{N° de mantenimientos realizadas a trampas de grasas}}{\text{N° de mantenimientos programados a trampas de grasas}}\right) X\ 100$ No aplica para este mes.
CP = Capacitaciones al personal de la obra civil Valor aceptable: 100%	$CP = \left(\frac{\text{Número de personas capacitadas en manejo de residuos líquidos}}{\text{Número total de empleados}}\right) X\ 100$ = (—) = %

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 11	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de residuos líquidos	FICHA: PMA – AC - 10

Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Registro fotográfico o Informe de interventoría técnica y ambiental o Certificado de disposición final de residuos líquidos o Registro generación de residuos líquidos

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Contaminación de las fuentes de agua por vertimiento de sustancias inertes, tóxicas o biodegradables
- Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la calidad del agua subterránea

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Manejo de residuos líquidos

Los residuos líquidos generados en las actividades en frente de obra:

- En este mes se revisan las conexiones y se adecuaron los sanitarios donde ese generan aguas residuales de los 11 baños provisionales instalados en obra.
- se genera aguas residuales provenientes del lavado de equipos y materiales en frente de obra.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 11	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de residuos líquidos	FICHA: PMA – AC - 10

Prevención y minimización

- Se realiza capacitación a todos los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos líquidos.
- Se construyeron 11 unidades sanitarias en el frente de obra, con esto se gestiona adecuadamente los residuos líquidos generados, los baños están en funcionamiento se les dicta charlas de sensibilización ambiental a los trabajadores para evitar desperdiciar el agua que se genera dentro de la obra.

Almacenamiento temporal

- Se cuenta con un sitio de almacenamiento temporal de residuos líquidos en el frente de obra.
- Se tiene disponible en frente de obra un área específica para el almacenamiento temporal de los residuos líquidos peligrosos, el área de almacenamiento está ubicado en un área de bajo tránsito de personal y vehicular, de fácil acceso, cuenta con ventilación e iluminación natural, impermeable (placa de concreto), posee un sistema de prevención y atención de emergencias (extintor y kit anti derrames), y está señalizado internamente y externamente
- Los aceites usados se almacenan independiente de los demás tipos de residuos líquidos o sólidos

Tratamiento y disposición final

- Se hacen las conexiones de las aguas residuales domesticas a la red municipal.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma
	Mes de diciembre del 2024

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 11					
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO					
Subprograma 1. Manejo de residuos líquidos					FICHA: PMA – AC - 10
		1	2	3	4
	Manejo de residuos líquidos				
	Prevención y minimización				
	Realizar todas las actividades en cuanto a prevención y minimización se refiere				
	Almacenamiento temporal				
	Realizar todas las actividades en cuanto a almacenamiento temporal se refiere				
	Tratamiento y disposición final				
	Realizar todas las actividades en cuanto a tratamiento y disposición final se refiere				
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental				

ANEXO FOTOGRAFICO





PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS EN OBRA

En obra contamos con dos tanques de almacenamiento de 2000L c/u, con el fin de proveer de agua el proyecto durante el tiempo que lo requiera.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 12	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Señalización	FICHA: PMA – AC - 11

Objetivo

- Determinar las directrices para la correcta señalización en las áreas donde se desarrollen actividades constructivas, con el fin de ejecutar los trabajos de manera segura y eficiente.

Metas	Indicadores
ES = Eficiencia de la señalización Valor aceptable = 100%	$ES = \left(\frac{\text{Número de sitios señalizados adecuadamente}}{\text{Número de sitios potencialmente peligrosos}}\right) X\ 100$
Responsables	**Registros / Evidencias**
• Supervisor para la ejecución de la obra • Contratista encargado de la ejecución de la obra • Interventoría de obras y ambiental	• Informe de interventoría técnica y ambiental • Señales de tipo preventivo, informativo y reglamentario • Cintas reflectivas, conos, etc. • Registro fotográfico

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Conflictos con la comunidad

ACCIONES A EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Señalización

- En frente de obras se señalizan las zonas altamente peligrosas, zonas que pueden generar accidente e incidente laboral, del mismo modo se dispone de un punto de acopio de materiales sobrantes como madera con puntillas, con el fin de evitar una lesión con estos mismos al trabajador.

- Se pasa al informe del componente SSG-SST esta ficha con el fin de complementar y darle más cumplimiento a todas las actividades que el auxiliar siso realiza en el frente de trabajo con respecto a este programa.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de diciembre 2024			
	1	2	3	4
Señalización de frentes de obra				
Ubicar señalización del frente de obra				
Ubicar señalización en campamento				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 12						
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						
Subprograma 1. Señalización						FICHA: PMA – AC - 11
	Mantener el material utilizado en la construcción debidamente acordonado y señalizado					
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental					

ANEXO FOTOGRÁFICO









SEÑALIZACION EN OBRAS

Se realizan las actividades de señalización en obras, con el fin de evitar accidentes e incidentes laborales, del mismo modo se realiza señalización para entrada y salida de vehículos para conseguir una mayor seguridad, tanto para la comunidad del sector como para personal de obras.

Programa de seguridad industrial y salud ocupacional

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 13	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Programa de seguridad industrial y salud ocupacional	FICHA: PMA – AC - 12

Objetivo

- Capacitar a todo el personal que hace parte del proyecto sobre los temas de salud ocupacional, seguridad industrial, calidad ambiental, entre otras.
- Minimizar la posibilidad de que se presenten afectaciones ambientales por desconocimiento del personal de trabajadores del proyecto.
- Evitar los accidentes de trabajo y ambientales por falta de conocimiento de los trabajadores.

Metas	Indicadores
• Implementar el 100% de las acciones planteadas en la ficha.	• Número de registros y acciones implementadas en el mes/ No. De actividades a ejecutar en el mes de acuerdo a la normativa vigente.
• Tener 0 Accidentes de Trabajo.	• Índice de accidentalidad= al No. total, de accidentes de trabajo en el mes * K / No. De Horas Hombre Trabajadas.
• Tener 0 Enfermedades Profesionales.	• No. de enfermedades profesionales/No. De trabajadores en el mes
Tener el 100% del personal empleado en la obra afiliado a ARP, EPS, y Fondo de pensiones	• No. de personas afiliadas/No. de personas contratadas

Responsables	Registros / Evidencias
• Supervisor para la ejecución de la obra • Contratista encargado de la ejecución de la obra • Interventoría de obras y ambiental	• Informe de interventoría técnica y ambiental • Señales de tipo preventivo, informativo y reglamentario • Registro fotográfico • Registro entrega E.P.P • Certificaciones medicas de los trabajadores

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Conflictos con la comunidad
- Riesgos de accidentes de trabajo
- Riesgos de accidentes de trabajo

ACCIONES A EJECUTAR MES DE DICIEMBRE 2024

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Responsabilidades de obra

- Esta ficha se pasa al componente SGSST con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072 de 2015, Decreto 1295 de 1994, Res.2013 de 1986, Res.1016 de 1989, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443de 2014, Decreto Único del sector trabajo 1072 de 2015, entre otros), dotación y elementos de protección personal (EPP), maquinas, equipos y herramientas.

Controles para el manejo de sustancias químicas y combustibles

- Para el manejo de productos químicos y combustible en obras se mantiene un punto especifico como punto de acopio de estas sustancias químicas.
- En obras en el mes de diciembre del 2024 se tiene un punto de acopio para el almacenamiento del combustible, ya que para las maquinas y/o equipos llega directamente un vehículo a tanquear en el frente de

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 13	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Programa de seguridad industrial y salud ocupacional	FICHA: PMA – AC - 12

obras, se realiza un protocolo con el kit antiderrames y un plástico que cubra el área donde se tanquea con el objetivo de no contaminar el suelo.

- En obras se dispone de un punto para el mantenimiento de las máquinas y/o equipos que requieren revisión por parte mecánica y se realiza el mismo protocolo con el fin no contaminar el suelo.
- El personal se capacita mediante charlas, una vez al mes para el manejo adecuado de productos químicos y combustibles.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de diciembre del 2024			
	1	2	3	4
Programa de seguridad industrial y salud ocupacional				
Exámenes ingreso personal				
Exámenes de egreso del personal				
Entrega de dotación				
Seguimiento uso E.P.P a los trabajadores				
Adaptación bodega almacenamiento sustancias químicas				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRÁFICO





ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE , SUSTANCIAS QUIMICAS EN FRENTE DE OBRA Y PUNTO DE MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS

 Charlas de seguridad y salud en el trabajo por parte del componente SGSST.	 Charla sobre manejo de sustancias químicas en frente de obras por parte del componente ambiental.

Derrame de combustible

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 13	
Programa: ATENCION DE CONTINGENCIAS	
Subprograma 1. Derrame de combustible	**FICHA:** PC – AC - 02
Objetivo	
● Saber cómo actuar y qué hacer ante el derrame de combustible en cualquier etapa y lugar de desarrollo del proyecto. ● Minimizar los daños e impactos generados por el derrame de combustible. ● Identificar y minimizar los factores de riesgo existentes que pueda generar el derrame de combustible.	
IMPACTOS A CONTROLAR	
● Contaminación del suelo ● Contaminación del agua ● Afectaciones en la salud ● Afectación de fauna y flora	
ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	

Estos derrames pueden ocurrir cuando se realiza el abastecimiento de combustible de la maquinaria o por daños presentados durante su funcionamiento; jamás por mantenimiento realizado en el lugar del proyecto. Estos derrames se presentan cuando las herramientas utilizadas no son las adecuadas y no se cumple con los lineamientos establecidos para estos procedimientos. Un derrame puede ocurrir cuando se abastece de combustible la maquina o por daños causados

¿Qué hacer en caso de derrame de combustible?

1. Ante todo, utilizar los elementos de protección personal.
2. Evaluar el tamaño y el lugar de la emergencia.
3. Identificar el tipo de líquido o residuo contaminante y la cantidad derramada.
4. Identifica el entorno y zonas peligrosas, eliminando las fuentes de energía y puntos de ignición.
5. Eliminar el punto de fuga del combustible y evitar que este siga derramándose.
6. Dar aviso a la brigada ambiental.
7. Señalice el área.
8. Evite el traspaso de personas ajenas al evento
9. Retire con herramientas antichispas el exceso de material derramado
10. Use almohadillas para retirar las “islas” de hidrocarburo remanente
11. Retire material contaminado y limpie el área afectada
12. Empaque el material y dispóngalo adecuadamente según el procedimiento de residuos peligrosos

Lugar De Aplicación	Área de influencia directa









PLAN DE CONTINGENCIA

En frente de obras se realizan las actividades de suministro de combustible para las maquinas, con el objetivo de evitar contaminación del suelo por derrames de combustible se utiliza un plástico con el fin de cubrir el área y se tiene a mano el kit anti derrames dispuesto en obras para cualquier evento de emergencias, del mismo modo se realiza reparación de bomba hidráulica y motores de traslación a las maquinas,

Se destina un punto de lavado de camiones mezcladores con el fin de evitar contaminación.

El día 13 de diciembre en el bloque 3 se presenta un incidente durante la fundición de la cubierta, se suspende la fundida debido a un impase ocasionado por el fallo de algunos gatos y cerchas, lo cual generó el desplome de una parte de las formaletas afectando las vigas y viguetas ubicadas entre los ejes A-B y 9-10, se procedió a tomar los correctivos pertinentes propuesto por el especialista estructural y aprobado por la interventoría, lo de demolición se disponen en un sitio especifico en obras para luego disponerse como residuos de escombros.

Programa de gestión social

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 14	
Programa: GESTION SOCIAL	
Subprograma 1. Programa de gestión social	FICHA: PMA – AC - 13

Objetivo

- Informar y promover la comunicación permanente con las entidades locales y comunidades del AI, con el fin de informar de manera clara y oportuna las actividades de obras civiles que se lleven a cabo y los relacionados con los lineamientos ambientales.
- Establecer y mantener canales de comunicación con la población del área de influencia y entidades locales, encaminados a mantener estrategias de acercamiento y la minimización de impactos de carácter socio-ambiental.
- Informar el procedimiento y formas de atención de las PQR que se presenten por parte de los grupos de interés y que estén relacionadas con las obras civiles a ejecutarse para la construcción del hospital de Morrosquillo.
- Realizar actividades de socialización del Plan de manejo ambiental - programa de gestión social de la etapa de obras civiles, enmarcadas dentro de las actividades de obras civiles proyectadas.
- Impulsar la creación de un espacio de participación con los diferentes actores sociales de las comunidades del AI y entidades locales, que permita el conocimiento continuo sobre las actividades referentes a la construcción del hospital de Morrosquillo.

Metas	Indicadores
IGI = Garantizar que el 100% de las personas de entidades locales y del AI, estén informados de las obras civiles a ejecutarse	$IGI = \left(\frac{\text{No. de grupos de interés informados}}{\text{No. de grupos de interés en el AI}}\right) X\ 100$
PQR = Estadística de las PQR (peticiones, quejas y reclamos) por parte de los grupos de interés y que estén relacionadas con la ejecución de obras civiles de la construcción del Hospital de Morrosquillo	$PQR = \left(\frac{\text{No. de quejas atendidas}}{\text{No. de quejas recepcionadas}}\right) X\ 100$
SPMA = Socializar el Plan de manejo ambiental de la etapa de obras civiles, a personal de la obra y a entidades locales	$SPMA = \left(\frac{\text{No. total de socializaciones realizadas}}{\text{No. total de socializaciones programadas}}\right) X\ 100$

Responsables	Registros / Evidencias
• Supervisor para la ejecución de la obra • Contratista encargado de la ejecución de la obra • Interventoría de obras y ambiental	• Registros de asistencia • Memorias de reunión • Registro fotográfico

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL	☐	MITIGACION	☐	MINIMIZAR	▒
PREVENCION	▒	CORRECCION	☐		

IMPACTOS A CONTROLAR

- Conflictos con la comunidad
- Generación de expectativas

ACCIONES A EJECUTAR EN EL MES DE DICIEMBRE

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 14	
Programa: GESTION SOCIAL	
Subprograma 1. Programa de gestión social	FICHA: PMA – AC - 13

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exige al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

Esta ficha de manejo ambiental se complementa el informe del componente social donde se da cumplimiento con las actividades descritas en este programa.
Durante este mes, se realizaron reuniones con el fin de informarle a las comunidades del municipio de Coveñas el avance de obras y como se está manejando la parte ambiental fuera y dentro de obras, así mismo escuchamos quejas y reclamos de las comunidades y del personal que labora en cada frente de obras, con el objetivo de atender solicitudes, sugerencias e inquietudes.

Lugar De Aplicación	Área de Influencia directa
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Comunidad del área de influencia con interés en la obra civil
Mecanismos y estrategias participativas	Convocatoria
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de diciembre del 2024			
	1	2	3	4
Gestión Social				
Elaborar y actualizar directorio y bases de datos de los actores sociales y entidades locales relacionados establecer un contacto inicial				
Concertar y realizar reuniones				
Convocar y realizar un espacio de encuentro participativo para presentar el plan de obras civiles relacionado con las actividades a ejecutarse en la construcción del Hospital de Morrosquillo.				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRÁFICO



Charla ambiental con las comunidades del municipio de Coveñas.



Charla ambiental con los frentes de obra.

Uso eficiente de la energía

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 15	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Programa: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA	FICHA: PMA – OP - 01

Objetivo

Adoptar estrategias para hacer uso eficiente del recurso energético en el Hospital de Morrosquillo.

Metas	Indicadores
Porcentaje de avance	$\frac{\text{Total de actividades realizadas}}{\text{Total de actividades programadas}} * 100$
Porcentaje de reducción de consumo per cápita de energía eléctrica	$\frac{\frac{\text{Consumo del periodo anterior (KWh)}}{\text{Camas hospitalarias}} - \frac{\text{Consumo del periodo actual (KWh)}}{\text{Camas hospitalarias}}}{\frac{\text{Consumo del periodo anterior (KWh)}}{\text{Camas hospitalarias}}} * 100$
Responsables	**Registros / Evidencias**
Alta Dirección Departamento de activos fijos y mantenimiento Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria.	• Registro de capacitaciones • Recibos pago de energía • Registros de mantenimiento

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL	☐	MITIGACION	☐	MINIMIZAR	▒
PREVENCION	▒	CORRECCION	☐		

IMPACTOS A CONTROLAR

- Disminución de recursos renovables
- Emisión de contaminantes

ACCIONES A EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

1. Capacitación y educación ambiental

Se realiza capacitación al personal que labora en el hospital sobre buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de la energía y manejo de aparatos eléctricos.

2. Diagnóstico del consumo

Teniendo en cuenta que el hospital se encuentra en un 18% de avance en obra, la energía que se utiliza dentro de las instalaciones, en este caso en el campamento donde se encuentra la parte administrativa y bodega, se realiza charla al personal con el objeto de generar concientización sobre el uso eficiente de la energía dentro del mismo, así mismo en el frente de obras, en cada bloque apenas se está haciendo el proceso de conexión de redes eléctricas, sin embargo contamos con energía en la parte constructivas de cada frente de obras con el objetivo de realizar las actividades que los maestros de obras requieren y para el alumbrado dentro del área de construcción.
Durante el mes de octubre del 2024 el consumo energético en la construcción del hospital llego por un valor de $2.112.890

Lugar De Aplicación	Hospital de Morrosquillo
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha.
Población Beneficiada	Comunidad del área de influencia con interés
Mecanismos y estrategias participativas	Capacitación al personal


FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 15	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Programa: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA	FICHA: PMA – OP - 01

Cronograma de aplicación de las actividades

Actividades	Cronograma			
	Mes de diciembre 2024			
	1	2	3	4
Capacitar y sensibilizar a todo el personal del hospital				
Distinguir las fuentes de energía utilizadas por el hospital, principales usos y distribución de los consumos energéticos				
Verificar el estado y funcionamiento de instalaciones eléctricas.				

ANEXO FOTOGRAFICO



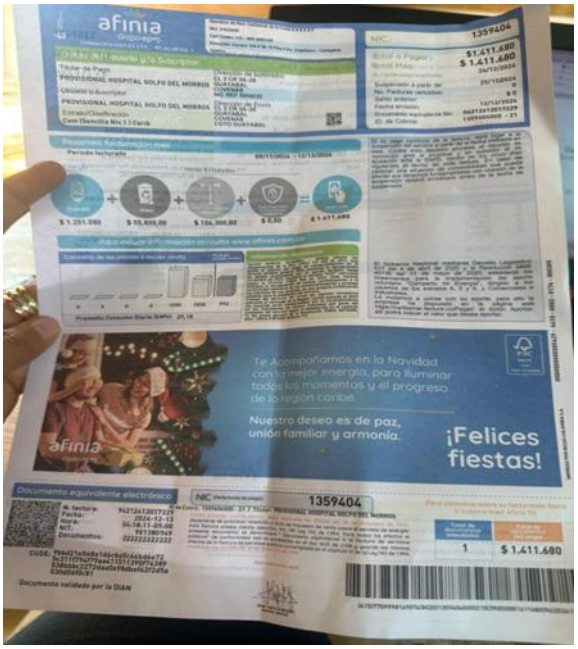

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 16

Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Sub programa: USO EFICIENTE DEL AGUA	**FICHA:** PMA – OP - 02

Objetivo

Adoptar estrategias para hacer uso eficiente del agua en el Hospital con el fin de dar cumplimiento a las estrategias del PNCC (Plan Nacional para el cambio climático)

Metas	Indicadores
Porcentaje de avance	$\frac{\text{Total de actividades realizadas}}{\text{Total de actividades programadas}} * 100$
Porcentaje de reducción del consumo per cápita de agua potable	$\frac{\frac{\text{Consumo del periodo anterior } (m^3)}{\text{Camas hospitalarias}} - \frac{\text{Consumo del periodo actual } (m^3)}{\text{Camas hospitalarias}}}{\frac{\text{Consumo del periodo anterior } (m^3)}{\text{Camas hospitalarias}}} * 100$
Responsables	Registros / Evidencias
Alta Dirección Departamento de activos fijos y mantenimiento Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS)	• Registro de capacitaciones • Recibos pago de agua • Registros de mantenimiento

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL	☐	MITIGACION	☐	MINIMIZAR	▒
PREVENCION	▒	CORRECCION	☐		

IMPACTOS A CONTROLAR

- Disminución de recursos renovables
- Conflictos con la comunidad

ACCIONES A EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024

1. Capacitación y educación ambiental

Durante el mes de diciembre se capacitó al personal en obras sobre la importancia y conservación del agua y fuentes hídricas, buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua en obras. Del mismo modo se realizan actividades de limpieza de sanitarios en frente de obras con el objetivo de disminuir el uso excesivo del agua y adopción de hábitos de uso responsable.

Lugar De Aplicación	Hospital de Morrosquillo

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 16

Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Sub programa: USO EFICIENTE DEL AGUA	**FICHA:** PMA – OP - 02

Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha.
Población Beneficiada	Comunidad del área de influencia con interés
Mecanismos y estrategias participativas	Capacitación al personal
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	**Cronograma**			
	Mes de diciembre del 2024			
	1	2	3	4
Capacitación y educación ambiental				
Accesorios ahorradores de agua nota: se instalaron lavamanos en baños provisionales con el objetivo de ahorrar agua.				
Las aguas residuales son depositadas directamente a la red de alcantarillado del municipio				
.				

ANEXO FOTOGRÁFICO





ANEXO. CAPACITACIÓN AMBIENTAL

7. CONCLUSIONES

El plan de manejo ambiental del contrato N° LP-018-2023 cuyo objeto es Construcción, Equipamiento Fijo Y Dotación Del Hospital Del Golfo De Morrosquillo En El Municipio De Coveñas, Sucre entre Consorcio CMO Hospital Sucre, la Gobernación de Sucre, y junto con la interventoría del proyecto, busca garantizar que todas las actividades dispuestas en el contrato se realicen al 100% garantizando que la ejecución de la obra se trabaje conjuntamente.
Con el objetivo de cuidar y/o proteger el medio ambiente, en frente de obras se conforma un grupo ambiental, los cuales darán cumplimiento a la ejecución y puesta en marcha del PMA, con el fin de cumplir con cada uno de los programas estipulados en la ficha técnica del PMA y la normatividad que lo ampara, este grupo está conformado por la ingeniera ambiental, el auxiliar SG-SST, la directora de obra, el componente social y el ingeniero residente de obra.

La elaboración del plan de manejo ambiental establece metodologías prácticas para realizar el seguimiento y evaluación de las medidas ambientales con el fin de medir la aplicabilidad y eficiencia de las mismas, planteando acciones correctivas y de mejoramiento en la parte constructiva del proyecto.

Durante el mes de diciembre del 2024, se le hizo seguimiento a las actividades que están contempladas en el PMA con el fin de que se cumplieran durante la ejecución de la obra, se realizaron charlas de sensibilización ambiental a los trabajadores que se encuentran en frentes de obras, se realiza visita a la comunidad del sector donde se está ejecutando el proyecto, con el fin de atender las quejas y/o reclamos que estos tengan, para ponerlos en contexto con las actividades ambientales que se están llevando a cabo en obras y así contribuir a mejorar el medio ambiente, aumentando la concienciación y el conocimiento de la comunidad sobre los problemas ambientales a los que se le hace seguimiento, se les explica cómo se está implementando el plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar el medio ambiente durante la ejecución de la parte constructiva del proyecto. Cabe resaltar que estamos en la parte constructiva del proyecto, durante el mes de diciembre se realizaron las limpiezas a los 11 baños provisionales, los cuales ya están en funcionamiento, se realizaron actividades de construcción como: Excavación de zarpa y viga, desencofrado de formaleta en losa y columnas, armado y colocación de formaletas para losa de cubierta, figuración y colocación de acero para losa de cubierta, instalaciones sanitarias, demolición de vigas descolgadas, fundición de solado para zarpa de muro de contención para rampa peatonal, construcción de cercos perimétricos, relleno de zapatas, corte y figurado de acero, conformación de terreno con maquinaria, entre otras actividades. Junto con la Corporación Autónoma Regional, de Sucre CARSUCRE, se le hace entrega al consorcio CMO hospital sucre, la autorización para el aprovechamiento forestal, de los 4 árboles que hay que ser removidos en el frente de obra, por lo tanto, en el mes de octubre iniciamos las actividades de retiro de estos 4 árboles: 2 campanos, 1 carbonero y 1 abeto, durante el mes de noviembre, se hicieron actividades de retiro de materiales sobrantes de poda y/o vegetación, se hace entrega y firma del acta de donación de estos mismos.

Las fichas ambientales para dar con el cumplimiento a lo establecido en el plan de manejo ambiental del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, señalización, y el programa de gestión social, son remitidos al informe SG-SST y al informe del componente social, con el fin de garantizar que todas las actividades de la ficha técnica se lleven a cabo.

ACTA DE CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Desde el 25 de Julio al 25 de diciembre del 2024 en las instalaciones donde se está ejecutando el proyecto del contrato No. LP-018-2023, se llevó a cabo la reunión para la conformación del grupo ambiental del proyecto.

El objeto de esta reunión es establecer un equipo encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales durante la ejecución de la obra.

Se establecen medidas sólidas para garantizar el cumplimiento de normativas e implementación de buenas prácticas durante el desarrollo de la obra de construcción

Objetivo del grupo de gestión ambiental

- Promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
- Conservar la flora y la fauna durante la operación.
- Eliminar y/o minimizar los impactos ambientales durante la ejecución de la obra.
- Fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos dentro de la obra.
- Establecer canales de comunicación local con la comunidad.




Responsabilidades del grupo de gestión ambiental

El grupo ambiental tiene las siguientes responsabilidades:

- **Monitoreo y control de residuos**: asegurar el correcto manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos generados en la obra.
- **Educación y capacitación:** implementar programas de capacitación para el personal sobre prácticas ambientales.
- **Monitoreo de impactos ambientales**: realizar evaluaciones periódicas para identificar y mitigar impactos ambientales potenciales derivado de las actividades de construcción.

- **Cumplimiento normativo**: asegurar que todas las actividades de la obra cumplan con las leyes y regulaciones legales vigentes.
- **Comunicación con la comunidad**: establecer canales de comunicación con la comunidad local para informar sobre las actividades del proyecto y abordar cualquier preocupación ambiental que pueda surgir.

Participantes:

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Tania Yeneris Padilla	Ing. Ambiental y sanitaria	
2	Stephanny Garay Salgado	Auxiliar SG-SST	
3	Diney Pamela Ospino Jiménez	Residente de obras técnicas parte arquitectónica.	
4	Víctor Cruz Paternina	Residente auxiliar técnico de obras.	
5	Karolay Caraballo Reyes	Psicóloga	

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA N° LP-018-2023

PROYECTO
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Elaboró:
LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA
ING. INDUSTRIAL
ESP. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESP. GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA N° LP-018-2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 8

PERIODO: 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA:
CONSOCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT. 901811441-3

2024

"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **No. 8**
Periodo:	**1 AL 30 DE DICEIMBRE DEL 2024**
No. Contrato de Interventoría	**No. CM-001-2024**
No. Contrato de Obra	**N° LP-018-2023**
Elaboró: **Especialista SG-SST** LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	Firma:
Reviso y aprobó: **Representante legal** JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA C.C. No. 1.067.858.634 de Montería	Firma:

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7

1. OBJETIVOS 8

1.1. OBJETIVO GENERAL 8

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 8

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 9

3. ALCANCE DEL INFORME 16

4. JUSTIFICACIÓN 16

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 16

5.1. CONTRATO DE OBRA. 16

5.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 18

5.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 18

6. RECURSOS 18

6.1. RECURSO HUMANO 18

6.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 21

7. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 21

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 22

7.3. PAGO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 22

7.4. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SST 23

7.5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 24

7.6. INDUCCIÓN PERSONAL 25

7.7. NOTIFICACIÓN DE RIESGO. 25

7.8. DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SST. 25

7.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 26

7.9.1. EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES 26

7.9.2. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD..... 26

7.9.3. EXÁMENES ESPECÍFICOS ALTURAS 29

7.9.4. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PROYECTO 29

7.9.5. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO 29

7.10. MANEJO ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA ... 29

7.11. ENTREGA DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 34

7.12. INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO37

7.13. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 37

7.14. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 37

7.15. SUSTANCIAS QUIMICAS 38

7.16. CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO EN ALTURAS..... 38

7.17. PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISES DE TRABAJO SEGURO 39

7.18. HERRAMIENTAS, VOLQUETAS, MAQUINAS Y EQUIPOS 39

7.19. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y EQUIPOS 39

7.20. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LA OBRA 40

7.21. ESTABLECIMIENTO DEL PUNTO DE HIDRATACIÓN 40

7.22. SEGUIMIENTO Y CONTROL A SUBCONTRATISTAS 41

7.23. BAÑOS RESOLUCIÓN 2400 DE 1979. 41

7.24. COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO41

7.25. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 42

7.26. BRIGADAS DE ASEO..... 42

8. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DELSISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 42

9. CONCLUSIONES..... 43

10. ANEXOS..... 44

1. INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del plan de gestión integral de obra, el cual está fundamentado en el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente. Por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto.

De otro lado, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales generados por las actividades propias del proceso constructivo son objeto de trabajo del Plan de gestión integral de obra, el cual es generado y ejecutado por el contratista de obra. El cual es basado en la legislación vigente, lo cual permite establecer metodologías y estrategias claras que apunten al crecimiento de las empresas en una relación armónica con la naturaleza, minimizando la contaminación, compensando los impactos negativos que se generan y en el mejor de los casos, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones ambientales en el área de intervención. Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumpliendo con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

De lo anterior es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el presente documento, se relacionan las actividades de seguimiento realizadas por la interventoría, al contratista en el **CONTRATO N° LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".**

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Hacer seguimiento al desarrollar las actividades planificadas o programadas en el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y promover los impactos positivos asociados a la ejecución del **CONTRATO No LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".**

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- Verificar los cumplimientos de los controles establecidos en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, en el desarrollo de las diferentes actividades ejecutas en el proyecto.

- Revisar los registros o documentación; donde se evidencia el cumplimento en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio.

- Hacer recomendaciones en el desarrollo de procedimientos según la etapa constructiva o avance del proyecto.

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área ·a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación. .
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) ·las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato

socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño.

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST.

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

Sistema General de Riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Riesgos Laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.

Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

Enfermedad Profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional**.**

SST: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado nivel de bienestar en los trabajadores, previniendo alteraciones de la salud generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.

Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas.

Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de SST dentro de la empresa.

Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y extra laboral.

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Con actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población en un tiempo determinado.

Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en un tiempo determinado.

Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales.

Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador.

Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.

Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o enfermedad en el momento, independientemente de cuándo se haya originado.

Tasa El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que presenta un hecho particular, la población susceptible a ese hecho.

Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el total de la misma. Expresa la relación de una parte con el todo.

Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la relación de tamaño entre ellos. Se define como la relación existente entre dos poblaciones o universos diferentes.

Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se somete el trabajador expuesto.

Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la intensidad y el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos.

Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más probables derivadas de una condición de riesgo específica.

Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de información y registro.

Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro.

Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de máquinas y herramientas.

Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una empresa.

Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición.

Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no.

3. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe recopila las actividades desarrolladas por el contratista, contempladas en los controles establecidos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del **CONTRATO No. LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".**

4. JUSTIFICACIÓN

La razón de la ejecución y seguimiento de las actividades del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo; es de optimizar, cuidar y racionalizar el uso de los recursos, el desarrollo del proyecto y mantener un lugar de trabajo seguro; minimizando el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (AT/EL). Desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los aspectos o impactos negativos que pueda ocasionar la realización de las diferentes actividades del proyecto.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

5.1. Contrato de obra.

Mediante el Contrato de obra **No. LP-018-2023 celebrado** entre el Departamento de Sucre, en adelante por medio de su secretario general **ANDRÉS RAFAEL VIVERO LEÓN**, en uso de sus facultades conferidas a través del Decreto Departamental N° 0570 de 2021, por una parte; y, por la otra, **JOSÉ DAVID FUENTE PEÑA**, identificada con cedula de ciudadanía No.1.067.943.743. en calidad de representante legal de **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE,** identificado con **Nit. No. 901811441-3**, se celebrar el presente Contrato.

Tabla No. 1 descripción contrato de obra

CONTRATO No.	No LP-018-2023
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOSÉ DAVID FUENTE PEÑA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No.1.067.943.743
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024,
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ, CC No. 89.006.321
VALOR CONTRATO	El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C ($34.420.762.624), equivalentes a 26.477,51 SMLMV para el año de suscripción del Contrato (2024)
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de dieciocho (18) meses

5.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

5.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".** Se llevará a cabo en el municipio de Coveñas, zona urbana.

Figura 1: Localización General Coveñas Sucre

6. RECURSOS

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, cuenta con los recursos técnicos, humanos y de materiales necesarios y apropiados para el correcto desarrollo del proyecto. Así mismo proporciona el personal suficiente, idóneo y calificado para la prestación de los servicios, los implementos necesarios y de seguridad requeridos para el cumplimiento de los mismos.

6.1. RECURSO HUMANO

Debido a la importancia que es para **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE**, contar con el recurso humano adecuado para la prestación de sus servicios,

se ha definido unos lineamientos claros para la selección y evaluación de personal que trabaje en el proyecto. Dichos lineamientos se evalúa la Educación, Experiencia, Habilidades y las necesidades de formación que sean necesarias para el correcto desarrollo de las funciones de cada una de las personas que trabajen en el proyecto.

De acuerdo a las necesidades del proyecto y el anexo técnico, se cuenta con los profesionales con la formación y experiencia establecidas por el cliente:

- Un (1) ingeniero civil o arquitecto – Director de obra
- Un (1) ingeniero civil (estructural)- Residente de obra (técnico No. 1)
- Un (1) Arquitecto – Residente de obra (técnico No. 2)
- Un (1) profesional en seguridad industrial
- Un (1) ingeniero civil – Auxiliar

- **Planta de Personal**

La planta de personal inicial del proyecto de acuerdo a la formación y experiencia exigidas en los pliegos:

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DAVID FUENTE PEÑA

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE (S)
DIRECTOR DE OBRA	1	JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA
RESIDENTE TÉCNICO No. 1 (ESTRUCTURAL)	1	JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI
RESIDENTE TÉCNICO No. 2 (ARQUITECTO)	1	DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO
PROFESIONAL EN SEGURIDADSOCIAL	1	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA
INGENIERO AUXILIAR	1	ÓSCAR ANTONIO RAMOS BEDOYA
MAESTRO DE OBRA	1	EUCLIDES MANUEL MONTERROSA LÓPEZ

Tabla N° 3: personal administrativo

- **Organigrama del consorcio**

El organigrama del **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE**, Se presenta a continuación:

6.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

A continuación, se indican los requisitos específicos con respecto a las instalaciones para el desarrollo del proyecto, tecnologías de información y comunicación, servicios de apoyo etc.

- **INSTALACIONES**

  Se cuenta con Oficina central ubicada en Montería Córdoba y campamento de obra dotado, en zona de influencia directa del proyecto: zonas de oficina, bodega, baños, zona de parqueos, acopio de materiales, zonas de disposición de residuos y manejo de sustancias químicas.

- **EQUIPOS ESPECIFICACIÓN**

  Equipos de cómputo para cada uno de los puestos de trabajo (portátil, teclados, mouse, equipo ergonómico de oficina, apoya pies.

- **TECNOLOGÍAS, INFOMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

  Correo electrónico, celular, internet.

7. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El contratista estableció para el desarrollo del proyecto **"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"**, la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en modelo de gestión por procesos en los que se da cumplimiento a los requisitos contractuales y normatividad vigente en Colombia.

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Durante el presente periodo del informe, el contratista para desarrollo del proyecto, programa la ejecución de las diferentes actividades de acuerdo al cronograma y presupuesto oficial de obra.

Dichas actividades, se realizan bajo los procedimientos establecidos en el plan de gestión integral de obra (PGIO), donde a través de una lista de chequeo, se inspecciona antes, durante y después, las actividades en los diferentes componentes de seguridad; tales como excavación, cargue y descargue, relleno y compactación, transporte de material y fundición de concreto etc**. (Ver anexos 1, Inspección de trabajo seguro)**

7.2. RECURSO HUMANO (LISTADO PERSONAL VINCULADO - AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP).

El contratista da cumplimiento a los requisitos contractuales y normatividad vigente; con el fin de que todo el personal que labora en el proyecto, este vinculado a seguridad social integral **(ARL, AFP, EPS Y CCF)** (ley 100 de 1993), la cual garantiza que cada trabajador tenga cobertura en caso de sufra una eventualidad en términos de salud, pérdida de empleo y otros. De acuerdo a lo anterior, hace entrega de los radicados de afiliación del personal que ingreso en el periodo. **(ver anexo 2. Control de personal directos (radicados de afiliaciones, listado de personal).**

7.3. PAGO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta planilla de seguridad social del personal directo y subcontratado, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE 2024**; teniendo en cuenta las fechas establecidas por el decreto 1990 de 2016, con el fin de garantizar la cobertura y asistencia médica a los trabajadores en caso de una eventualidad. Dando así cumplimiento con las normas legales

estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art 1° de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. **(ver anexo 3. Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal)**

Tabla 5: Relación de pago de aportes personal directo

RELACIÓN PAGO DE APORTES			
RAZON SOCIAL	**MES PAGO**	**Planilla No,**	**VALOR PAGADO**
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Mayo 2024	9469836155	$91,100
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Junio 2024	9469835002	$2,986,900
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Julio 2024	9471247993	$4,543,700
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Agosto 2024	9473035677	$13,687,700
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Septiembre 2024	9475213061	$33,114,700
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Octubre 2024	9477173740	$29,993,700
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Octubre 2024	9477204396	$5,754,300
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Noviembre 2024	9478755643	$9,823,400
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Noviembre 2024	9478597034	$24,997,700

7.4. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SST

El contratista hace la designación del responsable de diseñar y ejecutar el SG-SST o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; dando cumplimiento al Decreto 1072 y el **Artículo 2.2.4.6.35**. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución de los Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden, el Trabajo SG-SST, deberán realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del artículo 12 de la

ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación del mismo". **(Acta de designación responsable del SGSST primer informe).**

7.5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

El contratista desarrolla las actividades del plan de trabajo y cronograma de capacitaciones del SGSST, teniendo en cuenta los riesgos, el plazo contractual, los recursos financieros, humanos y físicos; así mismo el porcentaje de cumplimiento de las actividades programada vs ejecutadas (**Ver Anexo 4. Plan de trabajo y cronograma de capacitaciones P vs E).**

Tabla seguimiento de plan de trabajo anual.

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO															
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
FORMULA	Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0	0	0	0	0	12	14	8	8	15	10	10	77
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	12	14	8	8	15	10	10	77
		RESULTADO						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Gráfico de seguimiento de plan de trabajo anual

7.6. INDUCCIÓN PERSONAL

Durante el periodo, se realizó inducción y reinducción al personal (DIRECTO O SUBCONTRATADO), en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo tales como: políticas, reglamento de higiene y seguridad, plan de Emergencias, protocolo de bioseguridad, seguridad social, procedimiento etc. **(Ver anexo 5, Inducción de personal que ingreso en el periodo).**

7.7. NOTIFICACIÓN DE RIESGO.

El contratista realiza notificación de riesgo del **personal vinculado en el periodo (directo o subcontratado)**; con el fin de informar al trabajador de manera detallada y específica los riesgos asociados tanto a condiciones, como actos inseguros a los cuales se encuentra expuesto y los controles a implementar antes, durante y después del cumplimiento de su jornada laboral. **(Ver anexo 6, Notificación de riesgo personal que ingreso en el periodo).**

7.8. DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SST.

Se establecen las capacitaciones-charla SST, de acuerdo a los riesgos encontrados en la obra, y contemplados en la matriz de identificación de peligro evaluación y valoración de riesgos. Estas se realizan dos veces a la semana dependiendo las actividades a ejecutar, cronograma o fase de ejecución del proyecto. Con el objetivo de generar conciencia en el personal del proyecto sobre la importancia de realizar las actividades de forma segura y la protección del medio ambiente. Adicional a lo anterior se realiza calistenia y estiramiento de forma frecuente, con el fin de evitar lesiones osteomusculares al realizar una actividad. **(Ver Anexo 7, Capacitaciones SST).**

7.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

7.9.1. EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

El contratista dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007, la Resolución 1918 de 2009 y el Decreto 1072 de 2015, en el periodo realizó la valoración medico ocupación de ingreso a los trabajadores vinculados al proyecto; dicha evaluación fue realizada por un médico especialista en salud ocupacional. **(Ver anexo 8, Registro de seguimiento de las evaluaciones médicas de ingreso).**

Estas evaluaciones tienen como objetivo establecer si un trabajador es apto o no para desarrollar de acuerdo a sus condiciones las actividades a la cual se va a dedicar en el objeto del proyecto, Así mismo como control de patologías asociadas a las características y condicionas de cada trabajador al puesto de trabajo, a los factores de riesgos y a las condiciones ambientales.

7.9.2. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD

El contratista mediante la contratación de los servicio del médico ocupacional, realiza el DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD de todos los trabajadores de acuerdo a las evaluaciones medicas ocupacionales arrojando información tales como: Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, estrato socioeconómico), Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgos ocupacionales, Información de exposición laboral actual a riesgos ocupacionales según la manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios, sintomatología reportada por los trabajadores, resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas complementarias a los exámenes físicos realizados, Impresiones diagnósticas encontradas en la población

trabajadora, análisis y conclusiones de la evaluación y recomendaciones. **Informe de condiciones de salud se soportó informe 5.**

De acuerdo al informe de condiciones de salud presentado por el médico especialista en salud ocupacional se remiten el siguiente porcentaje:

- El 36% fueron remitidos al OFTALMÓLOGA
- EL 31 % fueron remitidos al nutricionista de la EPS.
- EL 23 % fueron remitidos al nutricionista de la EPS.
- EL 2 % fueron remitidos al cirujano.
- EL 2 % fueron remitidos al cirujano.
- EL 5 % fueron remitidos al médico internista. EL 3 % fueron remitidos al médico internista.

Así mismo se establece recomendaciones generales a tener en cuenta:

- Fomentar Estilo De Vida Saludable
- Promover jornadas de salud con capacitaciones, talleres prácticos de cuidado con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y por lo tanto mejorar los niveles de productividad de la empresa.
- Reforzar mediante afiches y folletos etc la prevención de factores de riesgo (COVID - 19) con el fin de fomentar un estilo de vida saludable.
- Fomentar las prácticas deportivas con deportes dinámicos (bailar, futbol, ciclismo, trotar, aeróbicos y levantar pesas ligeras).
- Hacer remisión a la EPS de acuerdo a los hallazgos encontrados y realizar seguimientos de hipertensión.
- Realizar actividades de formación de sensibilización frente a los riesgos laborales presentes y la manera de cómo prevenirlas.
- Seguimiento a los trabajadores en el programa de vigilancia epidemiológica de riesgos cardiovascular, a través de la formación y los menús de las dietas, jornada de valoración física y valoración por nutrición a las personas con el fin de disminuir la incidencia de patologías cardiovasculares.
- Solicitar a la ARL charlas y capacitaciones sobre pautas activas, educación de hábitos saludables de vida.
- Realizar inspecciones de los riesgos laborales para su control en los ambientes de trabajo.
- Utilizar protocolos de bioseguridad en la empresa contra enfermedades infecciosas y COVID-19.
- Realizar tamizajes de covid.
- Realizar promoción sobre la vacunación del covid. Recomendar citología vaginal anual.
- Desarrollar un programa de identificación de riesgo psicolaboral. Capacitación de temas para levantamientos y movilización de cargas. Promoción al personal femenino para realización de exámenes de citología vaginal anual y autoexamen de mama.

7.9.3. EXÁMENES ESPECÍFICOS ALTURAS

Se realiza exámenes Médicos ocupacionales para Trabajo en Alturas a los trabajadores que se desempeñarán en cargos que requieran tareas con exposición a caídas de 2 mts de altura. Estos exámenes médicos ocupacionales de Trabajo alturas constituyen una de las modalidades de evaluación médica específica, y está comprendido por un examen médico, exámenes paraclínicos y las pruebas de laboratorio clínico mínimas obligatorias exigidas por la Resolución 4272 de 2021. **Concepto de aptitud trabajo en alturas entregado en el mes de octubre de 2024.**

7.9.4. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PROYECTO

Con el fin de resumir las características sociales y demográficas del personal vinculado en las actividades del proyecto se elaboró el perfil sociodemográfico de la población trabajadora. Para tal fin se recolectó la información a través de una encuesta, como herramienta de visualización de los rasgos más prominente del personal. **(Ver anexo 9, encuesta y tabulación Perfil sociodemográfico).**

7.9.5. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO

El contratista presenta como primera medida, el cuestionario de morbilidad sentida, del personal vinculado en el periodo (directo o subcontratado). El cual se tendrá en cuenta para definir el programa de vigilancia epidemiológico, al igual que los exámenes con énfasis osteomuscular. **(Ver anexo 10. Cuestionario de morbilidad)**

7.10. MANEJO ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

Se lleva las estadísticas del control de ausentismo y accidentalidad de trabajadores directos, con el fin de establecer las causas y analizar las

tendencias por enfermedad laboral o por accidentes de trabajo. Para el periodo **se presentaron dos (2)** accidentes de trabajo. Así mismos **se registra** ausentismo trece (13) días laboral por Incapacidad medica general y accidente de trabajo; según **Resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015. (Ver anexo 11, Reporte e investigación de AT, lecciones aprendidas y ausentismo laboral).**

- **Registro de accidente por periodo vinculación directa**

PERIODO	NO. DE ACCIDESTES
JUNIO 2024	0
JULIO 2024	0
AGOSTO 2024	1
SEPTIEMBRE 2024	2
OCTUBRE 2024	5
NOVIEMBRE 2024	1
DICIEMBRE 2024	2
TOTAL, ACCIDENTES	12

- **Registro de Ausentismo por causas medicas vinculación directa**

PERIODO	NO. DE AUSENTISMO
JUNIO 2024	0
JULIO 2024	0
AGOSTO 2024	2
SEPTIEMBRE 2024	17
OCTUBRE DE 2024	13
NOVIEMBRE DE 2024	5
DICIEMBRE DE 2024	13
TOTAL, AUSENTISMO	50

Tabla No. 9. Ausentismos presentados por periodo

- **Indicadores accidentalidad Resolución. 0312 de 2019**

Se registra mes a mes los indicadores de accidentalidad con el fin de medir o comparar los resultados obtenidos en el consorcio, en relación a los accidentes y los días perdidos, **(ver anexo 12 cálculo de indicadores de accidentalidad directos**), a continuación, se presenta los siguientes indicadores:

- **Tablero de control de indicadores personal directo**

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO TRABAJADORES DIRECTOS

Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Interpretación	Periodicidad Mínima	RESULTADOS											
					ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	Mensual						0%	0%	1%	2%	4%	2%	2%
Proporcion	Proporción de accidentes de trabajo mortale	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Anual						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	Mensual						0%	0%	3%	19%	11%	2%	5%
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	Mensual						0%	0%	8%	71%	54%	21%	54%

- Gráficos de resultados de frecuencia, severidad y ausentismo x mes personal directo.

	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Frecuencia de accidentalidad						0%	0%	1%	2%	4%	2%	2%
Severidad de accidentalidad						0%	0%	3%	19%	11%	2%	5%
Ausentismo por causa médica						0%	0%	8%	71%	54%	21%	54%

- Gráficos de prevalencia incidencia personal directo

	RESULTADO ACUMULADO DEL PROYECTO
Proporción de accidente de trabajo	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	0%
Incidencia de la enfermedad laboral	0%

- **Accidentes que se han presentado año 2024**

REPORTE ACCIDENTES DE TRABAJO				
Fecha de ocurrencia	**Documento**	**Nombre**	**Tipo accidente**	**Estado**
17/12/2024	C1003655298	CESAR AUGUSTO ZUBIRIA PINON	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
26/08/2024	C1003655736	ROBERTO ANTONIO AGAMEZ JIMENEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
26/11/2024	C1005708714	EDER LUIS RINCO SUAREZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
02/10/2024	C1005708736	LUIS ALFONSO MENDOZA MARTINEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
02/10/2024	C1007245363	JEAN CARLOS CARDENAS BOHORQUEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
08/11/2024	C1064310879	IVAN DANILO DORIA TIRADO	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
03/10/2024	C1129504510	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
31/10/2024	C1131104278	KEVIN DAVID SIERRA ZUÑIGA	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
09/12/2024	C1131108476	MANUEL DE JESUS JULIO MILLAN	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
18/09/2024	C15682314	JORGE ELIECER GARZON LOPEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
11/10/2024	C72215503	ENOC DIAZ ACOSTA	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
12/09/2024	C85083707	HEYNER ALFONSO MONSALVO CASTRO	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO

Accidentes calificados que se han presentado y que fueron calificados como leves

- **Gráfico de tendencia de accidentalidad**

7.11. ENTREGA DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista según la clase de actividad que va a realizar el personal vinculado al proyecto; hace entrega de la dotación y los diferentes elementos de protección personal, de acuerdo a los controles establecidos en la matriz de identificación del peligro evaluación y valoración de los riesgos. **(Ver anexo 13, Acta entrega de epp y dotación).** Así mismo se cuenta con inventario de elementos de protección personal, para hacer la reposición de estos cuando se requieran por el mal estado de los mismos.
A continuación, se relaciona los elementos de protección entregados de acuerdo a la exposición del cargo.

PERSONAL EXPUESTO	ACTIVIDAD	RIESGOS	GENERADOR	REPOSICION	TIPO DE EPP	EJEMPLAR
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	compactación, corte, demolición	RUIDO	maquina retro, cortadoras de concreto, pulidora,	A través de las auxiliares SST	protección auditiva tipo copa para insertar en el casco o individual	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	compactación, corte, demolición	RUIDO	maquina retro, cortadoras de concreto, pulidora,	A través de las auxiliares SST	Protector auditivo tipo tapón en silicona	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero	limpieza de áreas, instalación de tubería, preparación de mezcla	POLVO	Ambiente, material de obra.	A través de las auxiliares SST	Mascarilla respiratoria	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse,	excavaciones, reparación de tubería, manejo de sustancias químicas, demolición	Proyección de partícula, salpicaduras de sustancias químicas.	proyecciones de concreto, sustancias químicas	A través de las auxiliares SST	anteojos de seguridad monogafas	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse,	circulación o trabajo a cielo abierto	radiaciones no ionizantes	ambiente de trabajo	A través de las auxiliares SST	Anteojo de seguridad antirespland or	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, cadenero, almacenistas	excavación, manejo de cargar y material, operación de equipos , herramienta y maquina	físico: fricción, corte, golpe.	manipulación de herramienta ,materiales, máquinas y equipos	A través de las auxiliares SST	Guantes de seguridad	

ayudantes, almacenistas	corte con maquina manual, manejo de sustancias químicas	proyecciones de partículas o Riesgo químico	equipos, herramientas y sustancias químicas	A través de las auxiliares SST	Careta porta vidrio levantarle en M	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse cadenero, topógrafo	Supervisión, excavaciones, conducción, manejo de cargas y material. Condiciones ambientales Etc	Caída de objeto, manejo de equipos compactadores. Condiciones ambientales	material, equipos, herramienta, orden y aseo. Condiciones ambientales (clima)	A través de las auxiliares SST	Botas de Seguridad en cuero con puntera de acero	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	Supervisión, excavaciones, conducción, manejo de cargas y material. Etc	Caída de objeto, manejo de equipos compactadores.	Material, equipos, herramienta, orden y aseo.	A través de las auxiliares SST	Botas de Seguridad en cuero con puntera de acero	
Operarios y ayudantes	Aplicación de soldadura pvc.	Riesgo Químico.	material-sustancias químicas	A través de las auxiliares SST	Guantes para manipulación de productos químicos	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	Supervisiónexcavaciones, conducción, manejo de cargas y material. Etc	caída de objeto a distinto nivel, protección de choque eléctrico, traslado de material	condiciones de trabajo, excavación	A través de las auxiliares SST	casco de seguridad	

Tabla: Matriz de epp

7.12. INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se establece cronograma de las inspecciones planeadas (señalización, Pre-operacional Maquina, Botiquín, Extintor, epp, herramientas, etc.); el cual busca a través de la revisión de las instalaciones, equipo, máquinas y proceso constructivos, identificar los peligros y condiciones existentes; con el fin de tomar las medidas preventivas y correctivas durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. **(Ver Anexo 14, Registro de inspecciones y Cronograma de inspecciones).**

7.13. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

El contratista de acuerdo a las actividades constructivas que se vayan ejecutando, identifica actos inseguros y condiciones de seguridad, durante la jornada laboral. Para el periodo no se reportó actos o condiciones inseguro.

7.14. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

El contratista con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores, los bienes y recursos materiales, dispone de un plan de emergencia, donde establece la secuencia de las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que se puedan desarrollarse en las distintas actividades que ejecutan los diferentes frentes del proyecto. Así mismo se cuenta con recursos básicos para prestar **primeros auxilios (Botiquín), extintor tipo ABC multipropósito para control de conatos de incendios, inmovilización y traslado de heridos (CAMILLA**); elementos indispensables para manejo de emergencia y primera atención básica a víctimas de un accidente. **(Ver anexo, registro fotográfico general).** Adicional a lo anterior el contrista hace actualización de la brigada de

emergencia. **Acta de conformación brigada de emergencias se soportó informe octubre 2024; Adicional se realizó capacitación de manejo de emergencias a todo el personal por parte de la ARL.**

7.15. SUSTANCIAS QUIMICAS

El contratista cuenta con listado de sustancias químicas y realiza inspección de estas, teniendo en cuenta las actividades que requieren dichas sustancias. Se publica las hojas de seguridad, con el nuevo sistema global armonizado y con el anterior sistema, con el fin de dar manejo en caso de un accidente, un derrame, un incendio etc. **(Ver Anexo 15, inspección – listado de sustancias químicas).**

Para mitigar y evitar el impacto que puede ocasionar la recolección y evacuación de residuos líquidos (aguas residuales, domesticas) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) que se producen durante el desarrollo de estas. En la Obras, se prohíbe el lavado de vehículos y maquinaria emergencia ambiental. Así mismo se cuenta con una zona de almacenamiento de las sustancias químicas asignada y un kit antiderrame en caso que ocurra un derrame establecer las medidas correctivas. **(Ver Anexo, registro fotográfico general).**

7.16. CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO EN ALTURAS

El contratista realizó el entrenamiento del personal que realizan actividades en alturas, en un centro de entrenamiento aprobado por el Mini-trabajo. **Certificado de entrenamiento en alturas se soportó informe octubre 2024.**

7.17. PERMISOS DE TRABAJO Y ANALISES DE TRABAJO SEGURO

El contratista, para el periodo, se realiza la emisión de permisos de trabajo para actividades que generan chispa (trabajo en caliente) y permisos de trabajo en alturas para actividades que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. ; en los frentes de obras, con el fin de identificar los riesgos, medidas de prevención, descripción de actividades y los EPP o equipos específicos que se deben usar en el desarrollo de las actividades. (**Ver anexo 16, Permisos altura, en caliente y ATS e inventario de equipos de altura**).

7.18. HERRAMIENTAS, VOLQUETAS, MAQUINAS Y EQUIPOS

Para la realización de las diferentes actividades constructivas se cuenta con herramientas, vehículos, máquinas y equipos mínimos según características del proyecto, los cuales como medida de control de los riesgos que estas pudieran originar; se tienen en cuenta el adiestramiento y/o utilización, la adquisición, el control, almacenamiento y los mantenimientos de las mismas. El contratista hace el inventario de las máquinas, vehículos, herramientas y equipo según los formatos establecido en el plan de gestión integral de obra. (**Ver anexo 17, Listado máquina, vehículo, herramientas y equipos**).

7.19. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y EQUIPOS

Durante el periodo el contratista realiza control de la maquinaria y vehículos, con el objetivo de mitigar los impactos que se puedan ocasionar en el desarrollo de las actividades del proyecto, bien sea al personal de la obra, a la comunidad. Así mismo el contratista garantiza la revisión de la documentación que debe tener los vehículos y maquinarias tales como: Licencias de conducción, Certificado TECNOMECANICA, SOAT, RUNT,

manifiesto de aduana etc. Se le exige este documento a los vehículos con el objetivo de verificar que se encuentren en condiciones óptimas con el fin de garantizar la seguridad a los usuarios de las vías Y personal de obra. Para el periodo no ingreso **máquina.**

Adicionalmente se lleva registro de los mantenimientos preventivos o correctivos y se realiza diligenciamiento de lista de chequeo realizada a las maquinarias, y equipos que intervienen en el proyecto**; para el presente periodo no se realizó mantenimientos correctivos.**

7.20. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LA OBRA

Se realizó la respectiva instalación de las señalizaciones en los diferentes frentes de obra y campamento; reglamentaria, informativa, de prohibición y preventivas, el cual cumple con las características de colores y forma del manual de señalización y norma técnica, con el fin de identificar áreas de trabajo, almacenamiento, etc. Adicional a lo anterior se hace delimitaciones de áreas intervenida con cinta preventiva de peligro y balizas tubulares, se realiza instalación de señales preventivas en el corredor vial, instalación de valla informativa y cerramiento en todo el perímetro de la obra; como barrera dura para limitación del acceso a personal no autorizado. **(Ver anexo 18, Inventario de señalización y registro fotográfico general).**

7.21. ESTABLECIMIENTO DEL PUNTO DE HIDRATACIÓN

Durante el desarrollo de actividades y control del gasto energético del personal, por la exposición a condiciones de temperaturas a cielo abierto y jornadas continuas de trabajo, se estableció puntos de hidratación; con la finalidad de mantener al personal bien hidratado. Dando cumplimiento a lo

dispuesto en la **Resolución 2400 De 1979. (Ver anexo. Registro fotográfico general).**

7.22. SEGUIMIENTO Y CONTROL A SUBCONTRATISTAS

Durante el desarrollo de actividades, se realiza control en materia de seguridad y salud en el trabajo a los subcontratistas que desarrollan actividades en el proyecto. **(Ver anexo 19, Seguimiento subcontratista)**

- **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**
- **LISTADO DE PERSONAL**

7.23. BAÑOS RESOLUCIÓN 2400 DE 1979.

El contratista dispone de baños en la obra tal como lo establece la **Resolución 2400 del 1979**, garantizando así, que el personal realice sus necesidades fisiológicas, durante la jornada laboral. **(Ver anexo. Registro fotográfico general).**

7.24. COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista de acuerdo con el número de personal vinculado a la razón social principal; realizará conformación o asignación del comité paritario o vigía en SST; tal como lo establece la **Resolución 2013. (Ver anexo 20, Acta de reunión del COPASST)**

7.25. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

El contratista realizará de acuerdo al cronograma de actividades y numero de persona, Se realiza la conformación del comité de convivencia laboral; tal como lo establece la resolución 652 de 2012. Cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral. **Próxima sesión febrero de 2025.**

7.26. BRIGADAS DE ASEO.

Se realizan inspecciones y controles de orden y aseo bajo la metodología 5s, con el fin de mantener el frente de obra limpio para evitar la aparición de virus y bacterias por acumulación de residuos, y orden para disminuir para probabilidad de un accidente laboral por golpe contra objetos o caídas al mismo nivel. **(Ver anexo 21, Inspección de orden y aseo).**

8. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DELSISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se presenta evidencias fotográficas de todas las actividades contempladas en el de gestión SST. Dichos registros fotográfico evidencias actividades tales como: entrega de epp y dotación, señalización en los frentes de obra, capacitaciones de sst, manejo de sustancias químicas, uso de epp, elementos de emergencias, políticas y reglamento publicados, manejo de residuos, jornadas de orden y aseo, punto de hidratación, kit antiderrame, , baños en obra, ETC.**(Ver anexo 22. Registro fotográfico generales).**

9. CONCLUSIONES

Del anterior informe presentado podemos concluir que:

- Se garantiza la afiliación de todos los trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Colombia.
- Se realiza revisión de personal afiliado,
- Se lleva control de ausentismo por enfermedad común o accidente de trabajo.
- Se establece cronograma de inspecciones planeadas
- Se establece seguimiento del cronograma de capacitaciones
- Se realiza las actividades programas en el plan de trabajo
- Se lleva los indicadores de accidentalidad y ausentismo de acuerdo al número de personal por mes.
- Se cuenta con responsable del diseño e implementación del SGSST

10. ANEXOS

Anexo 1, Inspección de trabajo seguro

Anexo 2, Control de personal (radicados de afiliaciones, listado de personal directo)

Anexo 3, Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal

Anexo 4. Plan de trabajo P vs E

Anexo 5, Inducción de personal que ingreso en el periodo

Anexo 6, Notificación de riesgo personal que ingreso en el periodo

Anexo 7, Capacitaciones SST

Anexo 8, Concepto medico de las evaluaciones medicas de ingreso,

Anexo 9, Encuesta y tabulación Perfil sociodemográfico

Anexo 10. Cuestionario de morbilidad

Anexo 11, Reporte e investigación de AT, lecciones aprendidas y ausentismo laboral

Anexo 12, Cálculo de indicadores de accidentalidad directos

Anexo 13, Acta entrega de epp y dotación

Anexo 14 – Registros de Inspecciones de seguridad y cronograma de inspecciones

Anexo 15, Inspección – listado de sustancias químicas

Anexo 16, Permisos altura, en caliente, ATS e inventario de equipos de altura

Anexo 17, Listado máquina, vehículo, herramientas y equipos.

Anexo 18, Inventario de señalización

Anexo 19, Seguimiento de subcontratista

Anexo 20, Acta de conformación del COPASST

Anexo 21, Inspección de orden y aseo

Anexo 22. Registro fotográfico generales

Anexos

Anexo 1, Inspección de trabajo seguro

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

VERSIÓN 1

INS-T-017

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO DICIEMBRE.

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL Dic 9 / 2024 FECHA FINAL Dic 14 / 2024.

INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	NOVEDADES SEMANA INSPECCIONADA
	Armado y Colocacion para loza. Armado y colocacion de formaleta de tanque figuracion de acero.	Armado y colocacion de formaleta para loza de cubierta. vellena de excavacion.	Armado y Colocacion de formaleta para loza de cubierta. Armado y colocacion de columnas.	• fundicion de losa de cubierta • Fundicion de tanque Sobre terreno, armado y colocacion de formaletas	• Armado y colocacion de cubierta. • Armado y colocacion de formaleta para losa de cubierta. • Instalaciones Sanitarias	Colocacion de • Armado y formaletas para loza cubierta • figuracion de cubierta de acero para losa piso.	

DIAS DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
	ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
1	Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2	La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3	Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL, EPS y AFP)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5	Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecucion de las actividades.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6	Se consulta si algun trabajador se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7	Se implemetan programas de seguridad, orden y aseo en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8	El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9	Se revisa los planos de redes de servicios publicos, se realiza apiques para su ilvocacion?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
10	Todos los trabajadores cuentan con las evaluaciones medicas de ingreso ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11	Los baños quimicos se encuentran en buen estado, ubicados a un nivel diferente del piso, limpios y dotado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12	Las camilla está correctamente ubicada y se encuentran limpia y en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13	Se ha establecido sistemas de control de tráfico para evitar accidentes a trabajadores y peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14	Se cuenta con ayudante de maquina en los frentes de obra ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15	Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones a el personal sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
16	los baños, y campamento se encuentran limpios y siguen con las normas de seguridad y gestión ambiental?	✓						✓			✓						✓			
	Señalización de seguridad y ambiental en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
18	La obra cuenta con la señalización correspondientes según el tipo de actividades que se desarrollan?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19	Se cuenta con personal para dirgir el tráfico en la zona, portando paletas de color rojo (PARE) y verde (SIGA).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20	La cantidad de señalización es suficiente de acuerdo a las actividad; se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21	Se cuenta con la documentación de la maquinaria.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
22	Se encuentran definidas y señalizadas las rutas para peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23	Éxisten adecuados caminos de acceso, pasarelas, para que los obreros puedan circular sin problema en la obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24	Los escombros se encuentran señalizados, cubiertos y hay sitios especificos para almacenarlos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
25	El perimetro de la obra se encuentra bien demarcado y señalizado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
26	Los materiales que se utilizan en obra se encuentran demarcados y señalizados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
27	Se manejan volantes informativos, vallas y/o información a la Comunidad?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

VERSIÓN 1

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO DICIEMBRE.

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL Dic 9 / 2024. FECHA FINAL Dic 14 / 2024.

	Manejo de equipos, herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
28	Las herramientas, equipos y materiales se encuentran bien almacenados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
29	Las herramientas se revisan regularmente para verificar su estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
30	Las herramientas se almacenan organizadamente después de su uso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
31	los trabajadores usan las herramientas apropiada de acuerdo a a la labor ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
32	Las herramientas se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
33	Se le capacito al personal sobre el correcto uso de las herramientas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Higiena Postural y Manejo de Cargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene encuenta el peso para levantar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
35	Las cargas se levanta correctamente doblando las piernas y no el tronco?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
36	Al levantar y transportar las cargas el trabajador usa ayudas mecanicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
37	Las cargas que sobrepasan la capacidad individual de la persona (25 kg desde el suelo, 30 kg desde el plano de trabajo) son levantadas y transportadas entre dos personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
38	Antes de levantar las cargas se verifica el camino por el cual van ha ser transportadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
39	Los trabajadores verifican la forma de los objetos para al ser levantados se hagan de la forma mas correcta?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Golpes ,Caidas cargue y descargue	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
a	Los pasillos están libres de objetos que puedan ocacionar caidas y de materiales que obstaculicen el paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
b	El personal evita correr aunque esté apurado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
c	Las personas toman precaución al transitar por pisos desiguales y alfombras desiguales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
d	se cuenta con punto ecologico y se encuentra fuera de los medios de paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
e	las redes de servicio aereas se identifican en operaciones de cargue y descargue de material?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Incendios	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
45	El frente de trabajo cuenta con equipo apropiado contra incendios?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
46	Los Extintores no se encuentran obstruidos ?		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
47	Las salidas y pasillos se encuentran despejadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
48	Los numeros telefónicos de emergencias se encuentran en un lugar visible?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Conclusión de inspección: ¿Se cuenta en general con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la actividad?	**SI**		**NO**		**AUTORIZA - RESIDENTE CIVIL - INSPECTOR SST**													

N.A.: No aplicable

DIA DE LA SEMANA	HALLAZGOS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	
ACCIONES CORRECTIVAS	

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

FIRMA COORDINADOR SST

Stephanny Garay

FIRMA AUXILIAR SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO DICIEMBRE.

SEMANA COMPRENDIDA: **FECHA INICIAL** Dic 2 / 2024. **FECHA FINAL** Dic 7 / 2024.

INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	NOVEDADES TERMINA INSPECCIONADA
	Descargue de formaleta colocación de formaleta para columnas armado y colocación de formaleta para losa.	Armado y colocación de formaleta para losa de cubierta. Figuración y colocación de acero para losa.	Fundida de columnas Fundida de muro de contención armado y colocación de formaleta.	Se Para obra por Paro de trabajadores	Armado y colocación de formaleta para columnas Armado y figuración de	Armado y colocación de formaleta para losa de cubierta Fundida de columna fundida de losa entre piso	

DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
1 Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan ?	✓			✓			✓						✓			✓			
2 La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓						✓			✓			
3 Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓			✓						✓			✓			
4 El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL, EPS y AFP)	✓			✓			✓						✓			✓			
5 Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecucion de las actividades.	✓			✓			✓						✓			✓			
6 Se constata si algun trabajador se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva ?	✓			✓			✓						✓			✓			
7 Se implemetan programas de seguridad, orden y aseo en los frentes de obra?	✓			✓			✓						✓			✓			
8 El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor	✓			✓			✓						✓			✓			
9 Se revisa los planos de redes de servicios publicos, se realiza apiques para su ubicacion?	✓			✓			✓						✓			✓			
10 Todos los trabajadores cuentan con las evaluaciones medicas de ingreso ?	✓			✓			✓						✓			✓			
11 Los botiquines se encuentran en buen estado, ubicados a un nivel diferente del piso, limpios y dotado?	✓			✓			✓						✓			✓			
12 Los camilla está correctamente ubicada y se encuentran limpia y en buen estado?	✓			✓			✓						✓			✓			
13 Se ha establecido sistemas de control de tráfico para evitar accidentes a trabajadores y peatones?	✓			✓			✓						✓			✓			
14 Se cuenta con ayudante de maquina en los frentes de obra ?	✓			✓			✓						✓			✓			
15 Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones a el personal sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓						✓			✓			
16 los baños, y campamento se encuentran limpios y siguen con las normas de seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓						✓			✓			
Señalización de seguridad y ambiental en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
18 La obra cuenta con la señalización correspondientes según el tipo de actividades que se desarrollan?	✓			✓			✓						✓			✓			
19 Se cuenta con personal para dirigir el tráfico en la zona, portando paletas de color rojo (PARE) y verde (SIGA).	✓			✓			✓						✓			✓			
20 La cantidad de señalización es suficiente de acuerdo a las actividad: se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓						✓			✓			
21 Se cuenta con la documentación de la maquinaria.	✓			✓			✓						✓			✓			
22 Se encuentran definidas y señalizadas las rutas para peatones?	✓			✓			✓						✓			✓			
23 Existen adecuados caminos de acceso, pasarelas, para que los obreros puedan circular sin problema en la obra?	✓			✓			✓						✓			✓			
24 Los escombros se encuentran señalizados, cubiertos y hay sitios especificos para almacenarlos?	✓			✓			✓						✓			✓			
25 El perimetro de la obra se encuentra bien demarcado y señalizado ?	✓			✓			✓						✓			✓			
26 Los materiales que se utilizan en obra se encuentran demarcados y señalizados?	✓			✓			✓						✓			✓			
27 Se manejan volantes informativos, vallas y/o información a la Comunidad?	✓			✓			✓						✓			✓			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

VERSIÓN 1

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO DICIEMBRE.

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL DIC 2/2024 FECHA FINAL DIC 7/2024.

	Manejo de equipos, herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
28	Los herramientas, equipos y materiales se encuentran bien almacenados?	✓			✓			✓						✓			✓		
29	Las herramientas se revisan regularmente para verificar su estado?	✓			✓			✓					/	✓			✓		
30	Las herramientas se almacenan organizadamente después de su uso?	✓			✓			✓						✓			✓		
31	los trabajadores usan las herramientas apropiada de acuerdo a a la labor ?	✓			✓			✓						✓			✓		
32	Las herramientas se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓						✓			✓		
33	Se le capacito al personal sobre el correcto uso de las herramientas?	✓			✓			✓						✓			✓		
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene encuenta el peso para levantar?	✓			✓			✓						✓			✓		
35	Las cargas se levanta correctamente doblando las piernas y no el tronco?	✓			✓			✓						✓			✓		
36	Al levantar y transportar las cargas el trabajador usa ayudas mecanicas	✓			✓			✓					/	✓			✓		
37	Las cargas que sobrepasan la capacidad individual de la persona (25 kg desde el suelo, 30 kg desde el plano de trabajo) son levantadas y transportadas entre dos personas?	✓			✓			✓						✓			✓		
38	Antes de levantar las cargas se verifica el camino por el cual van ha ser transportadas?	✓			✓			✓					/	✓			✓		
39	Los trabajadores verifican la forma de los objetos para al ser levantados se hagá de la forma mas correcta?	✓			✓			✓						✓			✓		
	Sobre la Prevención de Golpes ,Caidas cargas y descargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
a.	Los pasillos están libres de objetos que puedan ocacionar caidas y de materiales que obstaculicen el paso?	✓			✓			✓						✓			✓		
b.	El personal evita correr cunque esté apurado?	✓			✓			✓					/	✓			✓		
c.	Las personas toman precaución al transitar por pisos desiguales y alombras desiguales?	✓			✓			✓						✓			✓		
d.	se cuenta con punto ecologico y se encuentra fuera de los medios de paso?	✓			✓			✓					/	✓			✓		
e.	las redes de servicio aereas se identifican en operaciones de cargue y descargue de materiales?	✓			✓			✓						✓			✓		
	Sobre la Prevención de Incendios	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
45	El frente de trabajo cuenta con equipo apropiado contra incendios?	✓			✓			✓					/	✓			✓		
46	Los Extintores no se encuentran obstruidos ?	✓			✓			✓							✓			✓	
47	Las salidas y pasillos se encuentran despejadas?	✓			✓			✓						✓			✓		
48	Los numeros telefónicos de emergencias se encuentran en un Lugar visible?	✓			✓			✓						✓			✓		
	Conclusión de Inspección: ¿Se cuenta en general con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la actividad?	**SI**		**NO**		**AUTOREA - RESIDENTE CIVIL - INSPECTOR SST**													

N.A.: No aplicable

DIA DE LA SEMANA	HALLAZGOS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	
ACCIONES CORRECTIVAS	

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA COORDINADOR SST

Stephanny G.

FIRMA AUXILIAR SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO DICIEMBRE.

SEMANA COMPRENDIDA: **FECHA INICIAL** 16/12/24. **FECHA FINAL** 21/12/24.

INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	NOMBRE DEL TEMA A INSPECCIONAR
	armado y colocacion de formaleta para losa de fundida de losa bloque 3 instalaciones sanitarias.	armado colocacion de formaleta para losa de cubierta. Instalaciones sanitarias.	Armado y colocacion de formaleta para losa de cubierta. Instalaciones sanitarias	Armado y colocacion de formaleta para losa cubierta. figuracion y colocacion de acero y fundida.	Armado y colocación de formaleta. Para losa figuracion y colocacion de acero. instalaciones sanitarias.	Armado y colocacion de formaleta para losa para losa de cubierta figuracion y colocacion de acero	

DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
1 Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan ?	✓			✓			✓			✓				✓		✓			
2 La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3 Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4 El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL, EPS y AFP)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5 Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecucion de las actividades.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6 Se consulta si algun trabajador se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7 Se implamentan programas de seguridad, orden y aseo en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8 El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9 Se revisa los planos de redes de servicios publicos, se realiza apiques para su ubicación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
10 Todos los trabajadores cuentan con las evaluaciones medicas de ingreso ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11 Los botiquines se encuentran en buen estado, ubicados a un nivel diferente del piso, limpios y dotados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12 Los camilla está correctamente ubicada y se encuentran limpia y en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13 Se ha establecido sistemas de control de tráfico para evitar accidentes a trabajadores y peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14 Se cuenta con ayudante de maquina en los frentes de obra ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15 Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones a el personal sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
16 los baños, y campamento se encuentran limpios y siguen con las normas de seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Señalización de seguridad y ambiental en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
18 La obra cuenta con la señalización correspondientes según el tipo de actividades que se desarrollan?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19 Se cuenta con personal para dirigir el tráfico en la zona, portando paletas de color rojo (PARE) y verde (SIGA).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20 La cantidad de señalización es suficiente de acuerdo a las actividad; se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21 Se cuenta con la documentación de la maquinaria.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
22 Se encuentran definidas y señalizadas las rutas para peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23 Existen adecuados caminos de acceso, pasarelas, para que los obreros puedan circular sin problema en la obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24 Los escombros se encuentran señalizados, cubiertos y hay sitios especificos para almacenarlos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
25 El perimetro de la obra se encuentra bien demarcado y señalizado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
26 Los materiales que se utilizan en obra se encuentran demarcados y señalizados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
27 Se manejan volantes informativos, vallas y/o información a la Comunidad?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO DICIEMBRE

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL 16/12/24 FECHA FINAL 21/12/24.

	Manejo de equipos, herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
28	Los herramientas, equipos y materiales se encuentran bien almacenados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
29	Las herramientas se revisan regularmente para verificar su estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
30	Las herramientas se almacenan organizadamente después de su uso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
31	los trabajadores usan las herramientas apropiada de acuerdo a a la labor ll	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
32	Las herramientas se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
33	Se le capacita al personal sobre el correcto uso de las herramientas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene encuenta el peso para levantar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
35	Las cargas se levanta correctamente doblando las piernas y no el tronco?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
36	Al levantar y transportar las cargas el trabajador usa ayudas mecanicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
37	Las cargas que sobrepasan la capacidad individual de la persona (25 kg desde el suelo, 30 kg desde el plano de trabajo) son levantadas y transportadas entre dos personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
38	Antes de levantar las cargas se verifica el camino por el cual vanlla ser transportadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
39	Los trabajadores verifican la forma de los objetos para al ser levantadas se hagia de la forma mas correcta?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Golpes ,Caidas cargue y descargue	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
c.	Los pasillos están libres de objetos que puedan ocasionar caidas y de materiales que obstaculicen el paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
c.	El personal evita correr aunque esté apurado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
c.	Las personas toman precaución al transitar por pisos desiguales y alfombras desiguales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
c.	se cuenta con punto ecologico y se encuentra fuera de los medios de paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
c.	las redes de servicio aereas se identifican en operaciones de cargue y descargue de materiales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Incendios	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
41.	El frente de trabajo cuenta con equipo apropiado contra incendios?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
46.	Los Extintores no se encuentran obstruidos ll		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
47.	Las salidas y pasillos se encuentran despejados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
48.	Los numeros telefónicos de emergencias se encuentran en un lugar visible?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Conclusión de inspección: ¿Se cuenta en general con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la actividad?	**SI**		**NO**		**AUTORIZA - RESIDENTE CIVIL - INSPECTOR SST**													

N.A.: No aplica

DIA DE LA SEMANA	HALLAZGOS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	
ACCIONES CORRECTIVAS	

FIRMA RESIDENTE DE LA INTERVENTORIA

FIRMA COORDINADOR SST

Stephanny Caraballo.

FIRMA COORDINADOR SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: DICIEMBRE.

SEMANA COMPRENDIDA — **FECHA INICIAL:** 23/12/24 — **FECHA FINAL:** 28/12/24.

INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	Armado y colocacion de formaleta para muro de cubierta y instalaciones sanitarias	Armado y colocacion de formaleta para losa de cubierta. Instalaciones Sanitarias	Fundida losa de cubierta lo cual se suspendio por lluvia. Armado y colocacion de formaleta para losa de cubierta. Instalaciones Sanitarias	Fundida de losa de cubierta y figuracion de columna. Armado de losa de cubierta en acero para losa fundida de columna.	Retiro de formaleta Armado y colocacion de formaleta para losa cubierta	Fundida de losa de cubierta en placas aereas Armado y colocacion de refuerzo para losa cubierta	

DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección ambiental local	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El personal se encuentra afiliado al SGSSI (ARL EPS y AFP)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecución de las actividades	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se consulta si algún trabajador se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se implementan programas de seguridad, orden y aseo en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se tienen los planes de retiro de servicios públicos, se realizo apagado total al trabajador?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Todos los trabajadores cuentan con las vacunas/dosis requeridas de ingreso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Los baños se encuentran en buen estado ubicados a un nivel diferente del piso limpios y dotados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
El comedor está correctamente ubicado y se encuentran limpio y en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se han establecido sistemas de control de tráfico para evitar accidentes a trabajadores y peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se cuenta con ayudante de maquina en los frentes de obra ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones a el demand sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
los frentes, y el campamento se encuentran limpios y aseo con las normas de seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Señalización de seguridad y ambiental en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
18 La obra cuenta con la señalización correspondiente según el tipo de actividad que se desarrolla?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19 Se cuenta con personal para dirigir el ingreso de la zona, portando prendas de color rojo (PARA y vest (SOA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20 El sanitario de la ubicación es suficiente de acuerdo a la actividad se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21 Se cuenta con la documentación de la maquinaria	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
22 Se encuentran señalizadas y señalizadas las rutas para evacuación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23 Poseen adecuados caminos de acceso, peatonales para que los obreros puedan circular sin problema en la obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24 Los materiales se encuentran señalizados cubiertos y hay áreas específicas para almacenarlos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
25 El personal de la obra se encuentra bien demarcado y señalizado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
26 Los materiales que se utilizan en obra se encuentran delimitados y señalizados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
27 Se manejan rutas alternativas, vallas y/o información a la Comunidad?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: DICIEMBRE

SEMANA A COMPRENDER: FECHA INICIAL 23/12/24 FECHA FINAL 28/12/2024

	Manejo de equipos, herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
28	Las herramientas, equipos y materiales se encuentran bien almacenados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
29	Las herramientas se revisan regularmente para verificar su estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
30	Las herramientas se almacenan organizadamente después de su uso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
31	los trabajadores usan las herramientas apropiadas de acuerdo a la labor?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
32	Las herramientas se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
33	Se le ha capacitado al personal sobre el correcto uso de las herramientas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene en cuenta el plan para levantar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
35	Las cargas se levanta correctamente doblando las piernas y no el tronco?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
36	Alimenta y transporta las cargas si obstaculizar sus vistas mecánicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
37	Las cargas que sobrepasan la capacidad individual de la persona (25 kg mujer 40 kg hombre) el peso se divide entre dos personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
38	A la hora de izar las cargas se verifica el camino por el cual van hacer transportadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
39	Los trabajadores realizan la labor de las anteriores con el elementos de protección personal correcto?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de daños ¿Cómo cargar y descargar	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
a	Los sanitarios están libres de riesgos que puedan ocasionar caídas y de materiales que obstaculicen el paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
c	El personal evita correr cuando sale apurado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
e	Las personas tienen precaución al transitar por pisos desgastados y deformados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
g	se cuenta con puntos de alegría y se encuentra fuera de las medidas de pisos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
i	Las tareas de servicio cuentan se identifican en especialmente las riesgos y descargas de material?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Aspecto Personales de Seguridad	**SI**	**No**	**N.A.**	**SI**	**No**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**No**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
k	El diseño de trabajo cuenta con ayudas ergonómicas (sillas ergonómicas)?	✓						✓			✓			✓			✓		
m	Los botiquines se encuentran abastecidos?		✓						✓		✓			✓			✓		
o	Las sillas y grafilla se encuentran despejadas?	✓						✓			✓			✓			✓		
q	Los números telefónicos de emergencia se encuentran en un lugar visible?	✓						✓			✓			✓			✓		
	Condición de inspección ¿Se cuenta cumplimiento con las condiciones de seguridad establecidas para realizar la actividad?	SI	✓	NO		ARMELA - GERENTE DVS - SUPERVISOR HSE								Victor Cruz.					

DIA DE LA SEMANA	HALLAZGOS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	
ACCIONES CORRECTIVAS	

Nombre y cédula de la Residencia

Luis Salgado.

FIRMA COORDINADOR SST

Stefanny Garay

FIRMA AUXILIAR SST

Anexo 2, Control de personal (radicados de afiliaciones, listado de personal directo)

ARL | sura

Medellín, 02 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha Inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 COVEÑAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1003655298	ZUBIRIA PINON CESAR AUGUSTO	03/12/2024		94147R45	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2024 20:49:22 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.19.143.45, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CESAR AUGUSTO ZUBIRIA PINZON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.003.655.298**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4813839753	1|8|1|2|2|0|2|4

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite: A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion: B. Colectiva ☐ A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐

3.Regimen: A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS): 1

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

A. AFILIACIÓN

6.Apellidos y nombres			
ZUBIRIA (Primer apellido)	PINZON (Segundo apellido)	CESAR (Primer nombre)	AUGUSTO (Segundo nombre)
7.Tipo documento de identidad: CC	8.Número del documento de identidad: 1003655298	9.Sexo: Femenino ☐ Masculino ☒	10.Fecha de nacimiento: 1|5|0|2|2|0|0|1

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Categoria: Condicion: TIP		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	1300000

18.Residencia			
CR 2 83 61 (Dirección)	7823456 (Telefono fijo)	3002898521 (Telefono celular)	ZUBIRIAPINZON15@GMAIL.COM (Correo electronico)
SINCELEJO (Municipio/Distrito)	zona: Urbana cabecera municipal ☒ Urbana centro poblado ☐ Rural dispersa ☐ Resto rural ☐	Localidad / comuna	SUCRE (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Categoria de discpacidad	Condición	
				T	P
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona				Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Cabecera municipal	Centro poblado	Rural dispersa	Resto rural			
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

Seleccion de la IPS Primaria

	C	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
B		VS SINCELEJO - VS VIVA SINCELEJO	VSSINCELEJ - VSSINCE
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	NIT	901811441	01

39.Ubicación				
CL 42 7 40 LAURELES (Dirección)	7823456 (Teleéfono)	LEU.1973@HOTMAIL.COM (Correo electrónico)	MONTERIA (Municipio/distrito)	CORDOBA (Departamento)

No de Radicacion
4013839753

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la Identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		0|3|1|2|2|0|2|4

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46.☒ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47.☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 48.☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49.☒ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50.☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51.☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- 52.☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- 53.☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Cesar Zubria	Leidit Yanez

IX.ANEXOS

☐ 56.Anexo Copia del documento de Identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

ARL | sura

Medellín, 02 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000002 COVEÑAS			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1193087173	MADRID ROMERO IVAN	03/12/2024		O1956147	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2024 20:42:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.19.143.45, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

IVAN MADRID ROMERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.193.087.173**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 2 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 17/12/2024, el empleador CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE identificado con NIT número 901811441 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8046997	17/12/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1193087173	IVAN MADRID ROMERO	1300000	AYUDANTE DE OBRA	2024-12-03

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de Diciembre del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

ARL | sura

Medellín, 02 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 COVEÑAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1072531796	MORALES RINCON JERSSON	03/12/2024		g2828130	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2024 20:45:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.19.143.45, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

mutuaiser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No de Radicación: 23672-00004627-SM

Fecha de Radicación: 18/12/2024

I. DATOS DE TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación		3. Régimen
A. Afiliación (X) B. Reporte de Novedades ( )	B. Colectiva ( )	A. Individual: -Cotizante o Cabeza de Familia (X) -Beneficiario o Afiliado ( ) C. Institucional ( ) D. De Oficio ( )	A. Contributivo (X) B. Subsidiado ( )

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	
A. Cotizante (X) B. Cabeza de Familia ( ) C. Beneficiario ( )	A. Dependiente (X) B. Independiente ( ) C. Pensionado ( )	Código (a registrar por la EPS) ( )

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y Nombres			
MORALES	PINZON	JERSSON	
7. Tipo de Documento de Identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de Nacimiento
CC	1072531796	Femenino ( ) Masculino (X)	02/11/1999

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad		13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de Población Especial
06	Tipo ( )	Condición ( )	0	5

15. Administradora de Riesgos Laborales -	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
CIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA SURATEP	PORVENIR	1300000

18. Residencia			
CRA 29 71	7732980	3042229415	ANDERSONMORALESPINZO@GMAIL.COM
SAN ANTERO Municipio/Distrito	Zona: Urbana (X) Rural ( )	OBRERO Localidad/Comuna	CORDOBA Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente

19. Apellidos y Nombres			
20. Tipo de Documento de Identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo Femenino ( ) Masculino ( )	23. Fecha de Nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados

24.	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

25.	Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

29.	Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo		Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32.	Datos de residencia	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado (a registrar por la EPS)
	Municipio/Distrito	Urban	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B	1	
B	2	
B	3	
B	4	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón	36. Tipo de Documento de identidad	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	NI	901811441	Empleador

39. Ubicación				
CALLE 42 # 7 - 40 LOCAL 1 Dirección	7919612 Teléfono	consorciocmohospitalsucre@gmail.com Correo electrónico	MONTERIA Municipio/Distrito	CORDOBA Departamento

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 900.005.894-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

40. Tipo de Novedad — **B. REPORTE DE NOVEDADES**

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [x] 13. Movilidad: [x] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad		Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]		0 3 1 2 2 0 2 4

43. EPS anterior	44. Motivo de Traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 46. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [x] 49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o de cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación, colectiva institucional o de Oficio
Jesson Morales	Afiliación realizada el 19/12/2024 por el empleador 901811441, CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE a través del portal aportante.

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC]
  Cantidad: [0] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [0] Total [0]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

ARL | sura

Medellín, 02 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000002 COVEÑAS			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C8743873	POLO MARTINEZ DANILO ALBERTO	03/12/2024		11129253	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2024 20:51:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.19.143.45, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

Bogota 18.12.2024

Señores,
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE - NI 901811441
Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 1 usuarios enviados para tramite de novedad web radicadas el 2024-12-18 con numero de radicado 6125516 :

Cordialmente,

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

NUMERO DE RADICADO : 6125516

EPS Sanitas

Montería, diciembre 18 de 2024

Señores
EPS Sanitas
Ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del empleador identificado como Consorcio CMO Hospital sucre con nit. 901811441-3, para las personas que se detallan a continuación

N	Tipo Doc Empleado	No. Doc Empleado	Nombre Empleado	IBC	Fecha Ingreso Empresa	Fecha Retiro SI Aplica**	Dirección Residencia	Municipio / Departamento	# Celular	Correo electrónico
1	CC	8.743.873	DANILO POLO MARTINEZ	1.300.000	03/12/2024		VEREDA GUAYABAL COVEÑAS	COVEÑAS SUCRE	3175322770	danipolomar@gmail.com
2										
3										
4										
5										
6										
7										
9										
10										

** La fecha de retiro aplica solamente para los casos en los cuales aún el usuario se encuentra activo en el sistema bajo el mismo empleador

Cordialmente

Leudit Yánez Ramos
Auxiliar administrativa

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F01
	Listado del personal - Vinculación directa	Pag. 1 de 1

PROYECTO :	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**
PERIODO :	**DICIEMBRE DE 2024**

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	Cargo	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	JAIRO DE JESUS RAMOS RODRÍGUEZ	18857561	AYUDANTE	27-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	COLFONDOS
2	VICTOR JOSE CRUZ PATERNINA	92517051	RESIDENTE	30-08-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
3	JOHAN SEBASTIAN ZUÑIGA LOPEZ	1131104030	AYUDANTE	27-08-2024		SURA	COOSALUD E.S.S. COOP.SALUD Y DLLO INT. CARTAGENA	PORVENIR
4	ADRIAN JOSÉ DIAZ ZARZA	1007245348	AYUDANTE	25-10-2024		SURA	CAJACOPI ATLANTICO - CCF	PORVENIR
5	EUCLIDES MANUEL MONTERROZA LOPEZ	92496761	MAESTRO	22-06-2024		SURA	SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	NINGUNA AFP
6	EDER LUIS RINCO SUAREZ	1005708714	AYUDANTE	25-08-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PORVENIR
7	ALVARO ANDRES MANJARRES OVIDIO	1116615548	BODEGUERO	21-08-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PORVENIR
8	LUIS ALFONSO MENDOZA MARTÍNEZ	1005708736	AYUDANTE	22-08-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
9	ARISTIDES CONEO MARQUEZ	15620652	AYUDANTE	24/10/2024		SURA	PENDIENTE	PENDIENTE
10	HOVER LUIS HERRERA TIRADO	78704837	PLOMERO	6/09/2024		SURA	MUTUAL SER	PORVENIR
11	EUCEBIO ANTONIO VILORIA SUAREZ	1007245394	AYUDANTE	01-10-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	COLPENSIONES
12	EDUARDO DE JESUS ARRIETA PATERNINA	1131105563	AYUDANTE	16-10-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
13	GARZON LOPEZ JORGE ELIECER	15682314	PLOMERO	4/09/2024		SURA	CAJA COPI	PORVENIR
14	CONEO MARQUEZ ELIECER	1131104488	PLOMERO	4/09/2024		SURA	FAMILIAR EPS	COLPENSIONES
15	KENYA PATRICIA DURANGO ESPITIA	1131107550	AYUDANTE	01-10-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	COLPENSIONES
16	ANDRES FELIPE AVILA CANCHILA	1131108993	AYUDANTE	09-11-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
17	PEDRO MIGUEL FERNANDEZ BENAVIDEZ	C73432693	OFICIAL DE OBRA	25-09-2024		SURA	NINGUNA EPS	PROTECCION
18	JUAN DAVID RAMOS DIAZ	1131111481	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	CAJACOPI ATLANTICO - CCF	PORVENIR
19	IVAN DARIO GARAY GLORIA	1193142465	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
20	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	8741258	MAESTRO	17-08-2024		SURA	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PORVENIR
21	FARID LEONARDO MARTINEZ CARMONA	1067403531	AYUDANTE	09-11-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PROTECCION
22	HELIODORO PRADA REGINO	78717284	OFICIAL	17-08-2024		SURA	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PORVENIR
23	OSCAR MIGUEL CAUSIL GALVAN	1073809586	AYUDANTE	29-08-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PROTECCION
24	DUBAN ARIAS MADRID	1131104002	AYUDANTE	01-10-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PORVENIR
25	JHON JAIRO BANQUET DONADO	15621529	OFICIAL	17-08-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR

FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F01
	Listado del personal - Vinculación directa	Pag. 1 de 1

PROYECTO :	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**
PERIODO :	**DICIEMBRE DE 2024**

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	Cargo	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	PEDRO JAFET MARQUEZ PEREGRINO	1131107808	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
2	OSWALDO URANGO HERNANDEZ	1131108401	AYUDANTE	29-08-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	NINGUNA
3	KENER GONZALEZ BANQUET	1007245339	AYUDANTE	22-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PROTECCION
4	JUAN CARLOS INSIGNARES GLORIA	1131110865	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	COOSALUD E.S.S. COOP.SALUD Y DLLO INT. CARTAGENA	PORVENIR
5	JOHNNY LUIS DORIA MOLINA	15034491	AYUDANTE	29-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
6	CARLOS MARIO SIERRA BELLO	1131106681	AYUDANTE	29-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
7	JEAN CARLOS COA ROMERO	15620168	AYUDANTE	09-11-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
8	MARCO EMILIO ATENCIO AVILA	1193556241	AYUDANTE	13-10-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
9	KATLIN SHADAY CABALLERO HERNANDEZ	1007599388	AYUDANTE	01-11-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	COLPENSIONES
10	MANUEL DE JESUS JULIO MILLAN	1131108476	AYUDANTE	01-10-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PORVENIR
11	CARLOS ENRIQUE SARMIENTO TORRES	78700868	MAESTRO	5/09/2024		SURA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
12	CARLOS ANDRES MESTRA GONZALEZ	1005708548	AYUDANTE	25-09-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PORVENIR
13	JAIME LUIS CARRASCAL AVILA	78076914	OFICIAL	25-09-2024		SURA	CAJACOPI ATLANTICO - CCF	PORVENIR
14	MANUEL FRANCISCO TOBAR CORREA	15029586	OFICIAL	27-08-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PORVENIR
15	ROMULO EDUARDO PALMERA APARICIO	11000373	MAESTRO	21-08-2024		SURA	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PORVENIR
16	JESUS ALBERTO TARRAS CORDOBA	1131108265	AYUDANTE	22-08-2024		SURA	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	COLFONDOS
17	ALEXANDER VERGARA GALLEGO	1131108085	AYUDANTE	22-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
18	CRISTIAN DAVID MALARIAGA LADEUTH	1072522613	AYUDANTE	25-08-2024		SURA	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PORVENIR
19	WILFRIDO MARQUEZ GARCES	15621843	AYUDANTE	09-11-2024		SURA	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PORVENIR
20	YEINER BRAVO CASTRO	1193543998	AYUDANTE	06-10-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
21	JEAN CARLOS CARDENAS BOHORQUEZ	1007245363	AYUDANTE	30-08-2024		SURA	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PORVENIR
22	LEONARDO FABIO RIVERA GARRIDO	15620960	AYUDANTE	13-10-2024		SURA	COOSALUD E.S.S. COOP.SALUD Y DLLO INT. CARTAGENA	COLFONDOS
23	PEDRO LUIS MURILLO DE HOYOS	9229029	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	COLFONDOS
24	ABRAHAM RODRIGUEZ ESCUDERO	1193043889	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	COOSALUD E.S.S. COOP.SALUD Y DLLO INT. CARTAGENA	PORVENIR
25	GUSTABO RAMOS DÍAZ	1131110304	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	COOSALUD E.S.S. COOP.SALUD Y DLLO INT. CARTAGENA	PORVENIR

560 / 705

FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F01
	Listado del personal - Vinculación directa	Pag. 1 de 1

PROYECTO :	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**
PERIODO :	**DICIEMBRE DE 2024**

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	Cargo	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	YEINER LUIS HERNANDEZ ALVAREZ	1003561521	AYUDANTE	22-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	COLPENSIONES
2	GERMAN ALONSO PERALTA CARDENAS	1005708688	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
3	ANI LUZ SUAREZ MORALES	1007245380	AYUDANTE	14-08-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PROTECCION
4	GABRIEL MORENO LICONA	1072529607	AYUDANTE	14-08-2024		SURA	COOSALUD E.S.S. COOP.SALUD Y DLLO INT. CARTAGENA	PORVENIR
5	JULIO CESAR POSSO PEREZ	1072522158	AYUDANTE	14-08-2024		SURA	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PROTECCION
6	CAMILO ANDRES SIERRA ZUÑIGA	1005708765	AYUDANTE	01-10-2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PORVENIR
7	HUGO ALBERTO GARAY GLORIA	1005708729	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
8	IVAN DANILO DORIA TIRADO	1064310879	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	COLPENSIONES
9	LUIS MIGUEL CONTRERAS RINCO	1131108111	AYUDANTE	21-08-2024		SURA	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	PORVENIR
10	OSCAR ANTONIO RAMOS BEDOYA	78034012	RESIDENTE	17-08-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
11	LUISA SIBAJA LUNA	1003395473	AUXILIAR	17-08-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
12	LUIS EDUARDO SEPULVEDA AGUAS	1131109665	AYUDANTE	16-10-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
13	MANUEL ENRIQUE MIRANDA HERNANDEZ	1064309595	AYUDANTE	13-10-2024		SURA	ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PORVENIR
14	JAIDER JOSÉ CHAMORRO ESTRADA	92640310	OFICIAL	16-08-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
15	DIEGO ALEJANDRO BARRERA UPARELA	15725762	OFICIAL	16-08-2024	R	SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
16	EVER ANTONIO FUENTES ARCIA	92539319	MAESTRO	16-08-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PROTECCION
17	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ	1129504510	AYUDANTE	17/08/2024		SURA	CAJACOPI ATLANTICO - CCF	PORVENIR
18	WILLIAM JOSE DE AGUSTIN HERNANDEZ	1067400596	AYUDANTE	17/08/2024		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	COLPENSIONES
19	STEPHANNY GARAY SALGADO	1131104122	AUXILIAR SST	22/06/2024		SURA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN
20	PAMELA OSPINO JIMENEZ	1067920553	RESIDENTE DE OBRA	22/06/2024		SURA	SANITAS	COLFONDOS
21	KAROLAY CARABALLO REYES	1069496540	PSICOLOGA	25/07/2024		SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
22	TANIA DAYANA YENERIS PADILLA	1131107171	ING AMBIENTAL	11/07/2024		SURA	SANITAS	PORVENIR
23	JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA	50909828	DIRECTORA DE OBRA	15-06-2024		SURA	SURA	COLFONDOS
24	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	1047393966	RESIDENTE DE OBRA	22-06-2024		SURA	ASOCIACIÓN	PORVENIR
25	SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO	1067280132	COORDINADOR SST	22-06-2024		SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR

FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F01
	Listado del personal - Vinculación directa	Pag. 1 de 1

PROYECTO :	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**
PERIODO :	**DICIEMBRE DE 2024**

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	Cargo	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI	9074773	TECNICO ESTRUCTURAL	22-06-2024		SURA	SANITAS	COLPENSIONES
2	TOMAS SEGUNDO CUAVAS ESQUIVEL	92229788	CELADOR	04-07-2024		SURA	COOSALUD	PORVENIR
3	NAYALIBE MANJARREZ ELJACH	1067943743	AUXILIAR DE ARQUITECTURA	29-06-2024		SURA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN
4	IVAN DARIO SALGADO CRUZ	1067855135	OPERADOR MINICARGADOR	1/08/2024		SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
5	ALDRIN ROBERT VALENCIA	8769402	MAESTRO	18/08/2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	COLFONDOS
6	JARLIN ARIEL VALENCIA	72212811	MAESTRO	14-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
7	JORGE ELIECER CANTILLO GUTIERREZ	1047043732	OFICIAL	14-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	COLFONDOS
8	MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ PACHECHO	8772760	OFICIAL	14-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PROTECCION
9	RICARDO JOSE MANJARREZ PAREJO	1007564070	OFICIAL	14-08-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
10	DANIEL DARIO DIAZ PEREZ	1192749961	AYUDANTE	24/10/2024		SURA	CAJACOPI ATLANTICO - CCF	NINGUNA AFP
11	JORGE LUIS MORELO MARTINEZ	1072523581	AYUDANTE	13-10-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PROTECCION
12	FAIDER ELIAS VARGAS LADEUS	1003655340	OFICIAL	5/09/2024		SURA	MUTUAL SER	PORVENIR
13	CESAR AUGUSTO ZUBIRIA PINZON	1003655298	AYUDANTE	03-12-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA	PORVENIR
14	DANILO ALBERTO POLO MARTINEZ	8743873	AYUDANTE	03-12-2024		SURA	SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA	COLFONDOS
15	IVAN MADRID ROMERO	1193087173	AYUDANTE	03-12-2024		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
16	JERSSON MORALES RINCON	1072531796	AYUDANTE	03-12-2024		SURA	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	COLFONDOS
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

Anexo 3, Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO**	VERSION. 1 PAG. 1 DE 1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No 1067858634, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE,** identificada con NIT 901.811.441-3 CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos laborales, y los correspondientes a aportes parafiscales: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar, de **noviembre de 2024**, del personal dependiente e independiente del Contrato de Obra **No LP-018-2023**, **CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.** dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1.

Se expide el presente certificado el día 28 de diciembre del 2024 en la ciudad de Montería departamento de Córdoba

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTE PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811441	3	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CMO HOSPITAL	CALLE 42 N 7-40	SINCELEJO-SUCRE	3114269116	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1116234645	9478755643	E	2024/12/10	2024/12/10	BANCOLOMBIA	0	$9,823,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003367668	AVILA DIYER		X																231001	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
2	CC	15621529	BANQUET JHON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	15725762	BARRERA DIEGO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	92230393	BARRIOS JULIAN		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
5	CC	1104867738	BLANQUICETT CARLOS		X																230301	1	$43,334	$7,000	CCFC55	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
6	CC	1007599388	CABALLERO KATLIN	X																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1047043732	CANTILLO JORGE																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
8	CC	92640310	CHAMORRO JAIDER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	15620168	COA JEAN	X																	230301	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF41	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
10	CC	1067400596	DE AGUSTIN WILLIAM																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	8772760	DOMINGUEZ MANUEL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	92539319	FUENTES EVER																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	8741258	HERNANDEZ JOSE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	1003656434	LOPEZ IVAN		X																25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
15	CC	1007564070	MANJARRES RICARDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
16	CC	15621843	MARQUEZ WILFRIDO	X																	230301	22	$953,334	$152,600	ESSC07	22	$953,334	$38,200	CCF41	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
17	CC	1067403531	MARTINEZ FARID	X																	230201	22	$953,334	$152,600	EPS041	22	$953,334	$38,200	CCF41	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0	Si	$295,400
18	CC	1129504510	MONTERROZA DANIEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
19	CC	1072529607	MORENO GABRIEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
20	CC	1193317178	PICOT EZEQUIEL		X																230201	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
21	CC	1072522158	POSSO JULIO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
22	CC	78717284	PRADA HELIODORO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
23	CC	1131111481	RAMOS JUAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
24	CC	78034012	RAMOS OSCAR																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
25	CC	1193043889	RODRIGUEZ ABRAHAM																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
26	CC	1067855135	SALGADO IVAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
27	CC	1003395473	SIBAJA LUISA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
28	CC	1131104278	SIERRA KEVIN		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
29	CC	1007245380	SUAREZ ANI																		230201	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
30	CC	8769402	VALENCIA ALDRIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
31	CC	72212811	VALENCIA JARLIN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(31)**																				$31,720,006	$5,075,800			$31,720,006	$1,269,400			$31,720,006	$1,269,400			$31,720,006	$2,208,800		$0	$0		$9,823,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811441	3	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CMO HOSPITAL	CALLE 42 N 7-40	SINCELEJO-SUCRE	3114269116	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1116234645	9478755643	E	2024/12/10	2024/12/10	BANCOLOMBIA	0	$9,823,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$5,075,800	$0	$0	$5,075,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$215,000	$0	$0	$215,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$423,000	$0	$0	$423,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,238,200	$0	$0	$3,238,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,199,600	$0	$0	$1,199,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,208,800	$0	$0	$2,208,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$2,208,800	$0	$0	$2,208,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,269,400	$0	$0	$1,269,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	31	$1,269,400	$0	$0	$1,269,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				31	$1,269,400	$0	$0	$1,269,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$105,800	$0	$0	$105,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$142,200	$0	$0	$142,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$352,000	$0	$0	$352,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$93,800	$0	$0	$93,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$263,600	$0	$0	$263,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				31	$9,823,400	$0	$0	$9,823,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811441	3	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CMO HOSPITAL	CALLE 42 N 7-40	SINCELEJO-SUCRE	3114269116	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1105716861	9478597034	E	2024/12/10	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$24,997,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1131104002	ARIAS DUBAN																	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1131105563	ARRIETA EDUARDO																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	1193556241	ATENCIO MARCO																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1131108993	AVILA ANDRES	X	X															230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
5	CC	1193543998	BRAVO YEINER																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1069496540	CARABALLO KAROLAY																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1007245363	CARDENAS JEAN																	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
8	CC	78076914	CARRASCAL JAIME																	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	1073809586	CAUSIL OSCAR																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	15620652	CONEO ARISTIDES																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	1131104488	CONEO ELIECER																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1131108111	CONTRERAS LUIS																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	9074773	CRUZ JORGE																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	92517051	CRUZ VICTOR																	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF41	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
15	CC	92229788	CUAVAS TOMAS																	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
16	CC	1007245348	DIAZ ADRIAN																	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
17	CC	1192749961	DIAZ DANIEL																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
18	CC	1072525455	DIAZ YEISON	X	X															230201	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
19	CC	1064310879	DORIA IVAN																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
20	CC	15034491	DORIA JOHNNY																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
21	CC	1131107550	DURANGO KENYA																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
22	CC	1067943743	ELJACH NAYALIBE																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
23	CC	1010092215	ESPAÑA ANDRES																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
24	CC	1047393966	FALS CARLOS																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
25	CC	73432693	FERNANDEZ PEDRO																	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
26	CC	50909828	FUENTES JOHANNA																	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
27	CC	1005708729	GARAY HUGO																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
28	CC	1193142465	GARAY IVAN																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
29	CC	1131104122	GARAY STEPHANNY																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
30	CC	15682314	GARZON JORGE																	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
31	CC	15621127	GLORIA JUAN	X	X															230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
32	CC	1007245339	GONZALEZ KENER																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
33	CC	1014658274	HERNANDEZ JHOAN		X															25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
34	CC	1003561521	HERNANDEZ YEINER																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
35	CC	78704837	HERRERA HOVER																	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500

Planilla Resumen

36	CC	1131110865	INSIGNARES JUAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
37	CC	1131108476	JULIO MANUEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
38	CC	1131108805	LADEUTH LUIS		X																230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
39	CC	1072522613	MALARIAGA CRISTIAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
40	CC	1116615548	MANJARRES ALVARO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
41	CC	1131107808	MARQUEZ PEDRO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
42	CC	1005708736	MENDOZA LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
43	CC	1005708548	MESTRA CARLOS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
44	CC	1064309595	MIRANDA MANUEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
45	CC	92496761	MONTERROSA EUCLIDES																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$194,500
46	CC	1072523581	MORELO JORGE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
47	CC	92229029	MURILLO PEDRO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
48	CC	1067920553	OSPINO DINEY																		231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
49	CC	11000373	PALMERA ROMULO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
50	CC	1005708688	PERALTA GERMAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
51	CC	1131111625	PINZON JULIO		X																230301	1	$43,334	$7,000	CCFC55	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
52	CC	1131110304	RAMOS GUSTABO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
53	CC	18857561	RAMOS JAIRO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
54	CC	1005708714	RINCO EDER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
55	CC	15620960	RIVERA LEONARDO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
56	CC	1067280132	SALGADO LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
57	CC	78700868	SARMIENTO CARLOS																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
58	CC	1131109665	SEPULVEDA LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
59	CC	1005708765	SIERRA CAMILO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
60	CC	1131106681	SIERRA CARLOS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
61	CC	1131104539	SUAREZ YOFRAN		X																230201	1	$43,334	$7,000	MIN002	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
62	CC	1131108265	TARRAS JESUS																		231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
63	CC	15029586	TOBAR MANUEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
64	CC	1131108401	URANGO OSWALDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	CCFC33	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
65	CC	1003655340	VARGAS FAIDER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
66	CC	1131108085	VERGARA ALEXANDER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
67	CC	1007245394	VILORIA EUCEBIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
68	CC	1131107171	YENERIS TANIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
69	CC	1131104030	ZUÑIGA JOHAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(69)**																						$80,103,338	$12,817,000			$81,403,338	$3,256,600			$81,403,338	$3,256,600			$81,403,338	$5,667,500		$0	$0		$24,997,700

568 / 705

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811441	3	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CMO HOSPITAL	CALLE 42 N 7-40	SINCELEJO-SUCRE	3114269116	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1105716861	9478597034	E	2024/12/10	2024/12/06	BANCOLOMBIA	0	$24,997,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$12,817,000	$0	$0	$12,817,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,488,000	$0	$0	$1,488,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,879,000	$0	$0	$1,879,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$8,188,000	$0	$0	$8,188,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,262,000	$0	$0	$1,262,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$5,667,500	$0	$0	$5,667,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	69	$5,667,500	$0	$0	$5,667,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$3,256,600	$0	$0	$3,256,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	69	$3,256,600	$0	$0	$3,256,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				69	$3,256,600	$0	$0	$3,256,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	5	$209,800	$0	$0	$209,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	8	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$1,800	$0	$0	$1,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$365,800	$0	$0	$365,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$523,600	$0	$0	$523,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$469,800	$0	$0	$469,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$697,800	$0	$0	$697,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$0	$0	$156,000
TOTAL				69	$24,997,700	$0	$0	$24,997,700

Anexo 4. Plan de trabajo P vs E

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

SISTEMA GESTION INTEGRAL

CRONOGRAMA DE CAPACITACION SST

VERSION 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTIVIDADES	P/E	FECHA	Periocidad en que se debe realizar la actividad	Responsable de realizar la actividad	A quien o a que va dirigida la actividad	EJECUTADO	PROGRAMADO	%CUMPLIMIENTO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INDUCCION- REINDUCCION - CAPACITACIONES								
induccion en SST y MA	P	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		18	82	22%
	E							
Notificacion de riesgo a los que se esta expuesto en la ejecucion de las actividades.	P	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		18	82	22%
	E							
Perfil sociodemografico a todo el personal de obra	P	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		18	82	22%
	E							
Adecuado uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal	P	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Cultura de Autocuidado	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Que hacer en caso de un Accidente-lineas de emergencias	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Socialización del manual de convivencia laboral	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Estilos de vida y trabajo saludable sustancias psicoactivas	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Higiene postural y manejo de cargas	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Qué es el acoso laboral y medida preventivas	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Riesgos asociados al consumo de alcohol, droga y sustancias psicoactivas.	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Agotamiento por calor - golpe de calor	G	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Procedimiento de Herramientas electricas, manuales y pequeños implementos	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	1	100%
	E							
Proteccion partes del cuerpo: manos, oidos, ojos, pies etc	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal			1	0%
	E							
Socialización del Plan de emergencias	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal			1	0%
	E							
Manejo de Extintores de incendios	P	Programada	ENCARGADO SST	Brigada de emergencia de manejo de incendio			1	0%
	E							
Primeros auxilios	P	Programada	ENCARGADO SST	Brigada de emergencias de primeros auxilios			1	0%
	E							
Socialización del procedimiento trabajo seguro alturas	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.			1	0%
	E							
Capacitacionenquesinicidente ,accidenteyenfermedad laboral y la forma como se debe reportar.	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.			1	0%
	E							
Socializacion de fichas tecnicas de sustancias quimicas	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.			1	0%
	E							
Capacitacion del COPASST	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.			1	0%
	E							
Medidas de prevencion - mordedura de culebra	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.			1	0%
	E							
CapacitacionSeguridadvial,medidaspreventivasenlaconduccion, uso del cinturon de seguridad .	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.			1	0%
	E							

Riesgo en excavaciones y sus controles	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
	E						
Capacitacion Uso e importancia de los EPP y la dotacion	P	Segùn ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
Socializacion de puntos de atencion medica en caso de accidente y entrega de medicamentos	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
Importancia de la señalizacion preventiva en obra	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
	E						
Capacitacionenriesgobiologico picaduras,mordeduraside animales	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
	E						
Primeros auxilios de desmayo	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
Importancia de la inspeccion de equipos contra caida - como hacerla	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
	E						
riesgo de exposicion al ruido y proteccion auditiva	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
	E						
Importancia de la realizacion de las pausas activas o relajacion	P	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
	E						
Normas de seguridad para conduccion de vehiculos y maquinaria	P	Programada	ENCARGADO SST	conductores y operadores		1	0%
	E						
Como idententificar actos y condiciones inseguras	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
Riesgos fisicos (ruido, vibraciones)	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
manejo de maquinaria, equipos y vehiculos	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
Los riesgos del exceso de confianza	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
Funciones del Comité de convivencia Laboral y como hacer un comité eficaz.	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
Riesgos Eléctricos	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
Riesgos Eléctricos y andamios	P	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
	E						
TOTAL						64	283	23%
OBSERVACIONES:								

CONVENSIONES		
	P	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES
	E	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
	R	ACTIVIDADES REPROGRAMADAS EN EL MES
	NA	ACTIVIDADES QUE NO APLICAN EN EL MES

FIRMA ESPECIALISTA:		FIRMA REP. LEGAL	
NOMBRE	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	NOMBRE	JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA C.C. No. 1.067.858.634 de Montería
CARGO	PROFESIONAL SST	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL
FECHA	2/06/2024	FECHA	1/12/2024

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PLAN DE TRABAJO ANUAL	VERSIÓN: 01
		CODIGO: SST-P02
		FECHA: 02 de Julio de 2024


ETAPA	OBJETIVO	ACTIVIDAD A DESARROLLAR		CRONOGRAMA												RESPONSABLE	RECURSOS	OBSERVACIONES
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
				Cuando se cumpla se marca con 1, en **P si es (Planeado) o con** 1 si es **(Ejecutado)**														
PLANEAR	odentes en el trabajo y enfermedad laboral por la exposición de los trabajadores a factores de riesgo, asociados con las actividades desarrolladas por EL CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil: El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.	P*						P*							Representante legal	Financieros	
			E*						1									
		seguimiento al pago de seguridad social de personal directo y subcontratatado mensual	P*						P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	Representante legal	Financieros	
			E*						1	1	1	1	1	1	1			
		Elaborar presupuesto y designar los recursos para el diseño y mantenimeinto del SG-SST.	P*						P*							Representante legal	Financieros	
			E*						1									
		Acondicionamiento de señalización, equipos de emergencias, almacen, disponibilidad elementos de bioseguridad,acondicionamiento y reposición elementos de bioseguridad, punto ecologico, publicacion poliitcas, reglamentos (interno de trabajo y higiene y seguridad industrial),	P*							P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*							1								
		Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de convivencia laboral	P*										P*			profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*										1					
		actas de reunion del CCL	P*											P*		profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*											1				
		Capacitar Al CCL para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.	P*											P*		profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*											1				
		Conformar y garantizar el funcionamiento del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.	P*										P*			profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*										E*					
		Actas de reunion del COPASST	P*											P*	P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*											1	1			
		Capacitar Al Vigía SST o COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.	P*											P*		profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*											1				
		Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, referente a los peligros/riesgos prioritarios	P*							P*						Representante legal	Técnicos, Humanos	
			E*							1								
		Realizar actividades de inducción en seguridad y saldud en el trabajo al personal	P*							P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*							1								
		Establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo que cuente con los numerales establecidos en el Decreto 1072 de 2015	P*							P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*							1								
		Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST	P*							P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*							1								
		Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.	P*						P*							profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*						1									
		Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST	P*						P*							profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*						1									
		Contar con procedimiento en el que se defina el sistema de archivo y retención documental	P*										P*			profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*										1					
		Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST	P*												P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*												1			
		Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.	P*									P*				profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*									1						
		Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud	P*							P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*							1								
		Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios.	P*							P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*							1								

Fase	Objetivo	Actividad		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Responsable	Recursos	
	Diseñar e Implementar el sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos de la resolución 0312 de 2019 con el fin de prevenir la ocurrencia de ac	Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.	P*							P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*							1								
HACER		Seguimiento al cumplimiento restricciones médico - laborales (según el número de recomendaciones que lleguen a los trabajadores)	P*									P*				profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*									1						
		Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.	P*									P*				profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*									1						
		Realizar inspecciones que incluya locativas, epp, equipos, herramientas, sistema de proteccion contra caidas, emergencias, orden y aseo, observacion de comportamiento, ambientales; de acuerdo al cronograma de inspecciones	P*						P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*						1	1	1	1	1	1	1			
		Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable.	P*										P*			profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*										1					
		Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otro	P*							P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*							1								
		Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores.	P*								P*					profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*								1							
		Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos	P*										P*			profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*										1					
		Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores	P*										P*			profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*										1					
		Realización del inventario y/o actualizaciónde los equipos, herramientas maquinas , señalizacion asignadas al proyecto							P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
									1	1	1	1	1	1	1			
		Reportar e investigar los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, según corresponda, en caso de presentarse	P*								P*					profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*								1							
		Realizar medición de indicadores Accidentalidad Morbilidad Severidad Ausentismo	P*						P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*						1	1	1	1	1	1	1			
		Establecer controles de los peligros identificados.	P*						P*		P*		P*		P*	profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*						1		1		1		1			
		Elaborar formatos para el registro de inspecciones. (Orden y Aseo, Botiquín, extintor)	P*						P*							profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*						1									
		Reporte para los trabajadores para realizar actividad de altura	P*										P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*										1	1	1			
		Continuar con la Entrega de Elementos de Protección personal y revisión del uso de los mismos	P*						P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	Vigía ocupacional	Humanos (disponibilidad de personal)	
			E*						1	1	1	1	1	1	1			
		Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.	P*						P*							profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*						1									
		Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa.	P*										P*			profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*										1					
VERIFICAR		Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección.	P*												P*	Representante legal	Financieros	
			E*												1			
		Medir indicadoresdefinidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	P*												P*	profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*												1			
ACTUAR		Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	P*										P*			Adminsitradora /profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*										1					
		TOTAL PROGRAMADO		0	0	0	0	0	12	14	8	15	15	10	10			
		TOTAL EJECUTADO		0	0	0	0	0	12	14	8	8	15	10	10			

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO													
FORMULA	Actividades ejecutadas *100 / Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0	0	0	0	0	12	14	8	8	15	10	10	77
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	12	14	8	8	15	10	10	77
		RESULTADO						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

GRAFICA



JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA C.C. No. 1.067.858.634 de Montería		LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
Representante Legal		PROF SST	

Anexo 5, Inducción de personal que ingreso en el periodo

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE COLABORADORES	
	COD: SST- F 002	versión 1

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR				
Nombre Completo	Jerson Morales Rincon.			
Nº de Identificación	1072531756.			
Cargo	Ayudante.		Fecha	13/12/2024.
Seleccione el tipo de inducción	Nuevo colaborador ☑		Reinducción ☐	Otro: _____
Seleccione tipo de contrato de quien recibe la inducción	Obra/labor ☐	Indefinido ☐	Prestación de Servicios ☑	Otro: _____

I. INDUCCION GENERAL	RESPONSABLE
☑ Explicación de las generalidades de la empresa.	Stephanny G. Nombre del Coordinador o auxiliar SST
☑ Recorrido por frente de obra y presentación del equipo de trabajo (compañeros).	
☑ Política, Principios y Valores.	
☑ Reglamento Interno de Trabajo (Horario, Formas de pago, faltas y sanciones, solicitud de permisos).	
☑ Seguridad Social (ARL, AFP, EPS, Caja de Compensación,).	
☑ Funciones del Cargo.	
II. INDUCCIÓN EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
☑ Socialización de la Política del SGI.	
☑ Deberes y Derechos de los Trabajadores.	
☑ Definiciones de Peligro, Riesgo, Condiciones y Actos inseguros.	
☑ Identificación y control de peligros y riesgos en su puesto de trabajo.	
☑ Procedimiento de Accidente de trabajo / enfermedad laboral/ Enfermedad común	
☑ Examenes Médicos Ocupacionales	
☑ Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias	
☐ Entrega de elementos de protección personal, recomendaciones de uso y reposición	Stephanny G. Firma
Otro? Cual?: _____	
III. Otras actividades al ingreso del trabajador	
☑ **PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO**	
☑ **NOTIFICACIÓN DE RIESGO**	
☑ **ENCUESTA DE MORBILIDAD**	

MANIFIESTO HABER COMPRENDIDO CADA ASPECTO EXPLICADO (FIRMA TRABAJADOR) Jersson Morales

OBSERVACION:

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE COLABORADORES	
	COD: SST- F 002	versión 1

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR				
Nombre Completo	Cesar Zubiria Pinzón.			
Nº de Identificación	1003655298.			
Cargo	Ayudante		Fecha	13/12/2024
Seleccione el tipo de inducción	Nuevo colaborador ☐		Reinducción ☐	Otro: _____
Seleccione tipo de contrato de quien recibe la inducción	Obra/labor ☐	Indefinido ☐	Prestación de Servicios ☑	Otro: _____

I. INDUCCION GENERAL	RESPONSABLE
☑ Explicación de las generalidades de la empresa.	
☑ Recorrido por frente de obra y presentación del equipo de trabajo (compañeros).	
☑ Política, Principios y Valores.	
☑ Reglamento Interno de Trabajo (Horario, Formas de pago, faltas y sanciones, solicitud de permisos).	
☑ Seguridad Social (ARL, AFP, EPS, Caja de Compensación,).	
☑ Funciones del Cargo.	
II. INDUCCIÓN EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
☑ Socialización de la Política del SGI.	
☑ Deberes y Derechos de los Trabajadores.	
☑ Definiciones de Peligro, Riesgo, Condiciones y Actos Inseguros.	
☑ Identificación y control de peligros y riesgos en su puesto de trabajo.	
☑ Procedimiento de Accidente de trabajo / enfermedad laboral/ Enfermedad común	
☑ Exámenes Médicos Ocupacionales	
☑ Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias	
☑ Entrega de elementos de protección personal, recomendaciones de uso y reposición	
Otro? Cual?: _____	
III. Otras actividades al ingreso del trabajador	
☑ **PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO**	
☑ **NOTIFICACIÓN DE RIESGO**	
☑ **ENCUESTA DE MORBILIDAD**	

Stephanny C.
Nombre del Coordinador o auxiliar SST

Stephanny
Firma

MANIFIESTO HABER COMPRENDIDO CADA ASPECTO EXPLICADO (FIRMA TRABAJADOR) Cesar zubiria

OBSERVACION:

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE COLABORADORES	
	COD: SST- F 002	versión 1

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR				
Nombre Completo	Danilo Polo Martinez.			
Nº de Identificación	8743873			
Cargo	Ayudante de Plomería	Fecha	13/12/2024	
Seleccione el tipo de inducción	Nuevo colaborador ☑	Reinducción ☐	Otro: _____	
Seleccione tipo de contrato de quien recibe la inducción	Obra/labor ☐	Indefinido ☐	Prestación de Servicios ☑	Otro: _____

I. INDUCCION GENERAL	RESPONSABLE
☑ Explicación de las generalidades de la empresa.	
☑ Recorrido por frente de obra y presentación del equipo de trabajo (compañeros).	
☑ Política, Principios y Valores.	
☑ Reglamento Interno de Trabajo (Horario, Formas de pago, faltas y sanciones, solicitud de permisos).	
☑ Seguridad Social (ARL, AFP, EPS, Caja de Compensación,).	
☑ Funciones del Cargo.	
II. INDUCCIÒN EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
☑ Socialización de la Política del SGI.	
☑ Deberes y Derechos de los Trabajadores.	
☑ Definiciones de Peligro, Riesgo, Condiciones y Actos inseguros.	
☑ Identificación y control de peligros y riesgos en su puesto de trabajo.	
☑ Procedimiento de Accidente de trabajo / enfermedad laboral/ Enfermedad común	
☑ Exámenes Médicos Ocupacionales	
☑ Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias	
☑ Entrega de elementos de protección personal, recomendaciones de uso y reposición	
Otro? Cual?: _____	
III. Otras actividades al ingreso del trabajador	
☑ **PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO**	
☑ **NOTIFICACIÓN DE RIESGO**	
☑ **ENCUESTA DE MORBILIDAD**	

Stephanny G.
Nombre del Coordinador o auxiliar SST

Stephanny
Firma

MANIFIESTO HABER COMPRENDIDO CADA ASPECTO EXPLICADO (FIRMA TRABAJADOR) Danilo Polo

OBSERVACION:

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE COLABORADORES	
	COD: SST- F 002	versión 1

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR				
Nombre Completo	Iván Madrid Romero.			
Nº de Identificación	1193087173.			
Cargo			Fecha	13/12/2024
Seleccione el tipo de inducción	Nuevo colaborador ☑		Reinducción ☐	Otro: _____
Seleccione tipo de contrato de quien recibe la inducción	Obra/labor ☐	Indefinido ☐	Prestación de Servicios ☑	Otro: _____

I. INDUCCION GENERAL	RESPONSABLE
☑ Explicación de las generalidades de la empresa.	Stephanny G. Nombre del Coordinador o auxiliar SST
☑ Recorrido por frente de obra y presentación del equipo de trabajo (compañeros).	
☑ Política, Principios y Valores.	
☑ Reglamento Interno de Trabajo (Horario, Formas de pago, faltas y sanciones, solicitud de permisos).	
☑ Seguridad Social (ARL, AFP, EPS, Caja de Compensación,).	
☑ Funciones del Cargo.	
II. INDUCCIÓN EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
☑ Socialización de la Política del SGI.	
☑ Deberes y Derechos de los Trabajadores.	
☑ Definiciones de Peligro, Riesgo, Condiciones y Actos inseguros.	
☑ Identificación y control de peligros y riesgos en su puesto de trabajo.	
☑ Procedimiento de Accidente de trabajo / enfermedad laboral/ Enfermedad común	
☑ Exámenes Médicos Ocupacionales	
☑ Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias	
☑ Entrega de elementos de protección personal, recomendaciones de uso y reposición	Stephanny G. Firma
Otro? Cual?: _____	
III. Otras actividades al ingreso del trabajador	
☑ **PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO**	
☑ **NOTIFICACIÓN DE RIESGO**	
☐ **ENCUESTA DE MORBILIDAD**	

MANIFIESTO HABER COMPRENDIDO CADA ASPECTO EXPLICADO (FIRMA TRABAJADOR) Iván Madrid

OBSERVACION:

Anexo 6, Notificación de riesgo personal que ingreso en el periodo

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	NOTIFICACION DE RIESGO	VERSION 1 COD. SST. F-003 PAG 1 DE 2

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA DE NOTIFICACION	13/12/2024	NUMERO DE TRABAJADORES NOTIFICADOS :	4
ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL		

TAREA PRINCIPAL SEGÚN CARGO:

CARGO	TAREAS	CARGO	TAREAS
Ayudante -	Cargue y descargue de Materiales		

RIESGO		EFECTOS POSIBLES A LA SALUD	MEDIDAS / SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EXISTENTES	MEDIDAS DE CONTROL QUE DEBE CUMPLIR EL TRABAJADOR
DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN			
Superficies de trabajo inadecuadas	Condiciones de Seguridad	Contusiones Esguinces y torceduras Golpes Fracturas Raspones Caídas al mismo nivel Cortadas	Charlas de Seguridad Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos) Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor.	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Atrapamientos entre máquinas en movimiento, cuando se obstaculiza la evacuadora	Condiciones de Seguridad	Atrapamiento, fracturas, amputación,	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Procedimientos de trabajo Normas de seguridad Educacion al personal	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Accidentes (Volcaduras, Atropellamiento y/o aplastamiento)	Condiciones de Seguridad	Golpes Fracturas Heridas Contusiones Muerte	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Procedimientos de trabajo Normas de seguridad Educación al personal	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Manipulación de Objetos Cortopunzantes	Condiciones de Seguridad	Heridas Lacraciones	Charlas de Seguridad Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos) Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor.	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Contactos con bacterias y hongos por las aguas estancadas.	Biológico	Mareos, vómitos, alergias, afecciones en la piel y del Sistema Respiratorio	Charlas de Seguridad Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos) Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor.	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	Biológico	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte,	Esquema completo de vacunacion Capacitación frente al riesgo Lavado de manos frecuente Distanciamiento físico Hidratación constante del personal Disposición de insumos para la desinfección (Alcohol, hipoclorito, detergente, jabon)	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Manipulación de cargas por encima de 25 kg	Biomecánico	Fatiga muscular Lesiones osteomusculares Hernias Discales	Charlas de Seguridad Realización de evaluan medios ocupacional Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor.	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Vibraciones cuerpo entero	Físico	EN columna Vertebral: Cervicalgias, espondilitis, osteocondritis intervertebral, calcificación de discos, etc. Aparato digestivo, Hemorroides, enfermedades gástricas. Aparato urogenital: Prostatitis, hematuria Visión. Pérdida de agudeza visual. Comportamiento: Retardo en el tiempo de reacción, menor habilidad manual, irritación nerviosa Síndrome de Raynaud	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Procedimientos de trabajo Normas de seguridad Educación al personal Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Ruido Continuo originado por (Máquina cortadora - Taladro Rotomartillo - Retroexcavadora)	Físico	Fatiga Desconcentración Disconfort	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Procedimientos de trabajo Normas de seguridad Educación al personal Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales

Contacto con sustancias	Químico	Efectos solo cuando se ingiere o inhala, como irritaciones, dolor de cabeza y vértigo	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Publicación y socialización de las hojas de seguridad Educación al personal Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimiento de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Presencia de Polvos Generación de polvos al realizar las labores de excavación y durante el trasteo de escombros a los puntos de recolección	Químico	Alergias y dermatitis Quemaduras químicas irritación ocular asfixia	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Publicación y socialización de las hojas de seguridad Educación al personal Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimiento de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Trabajo bajo presion, por atrasos o actividas nocturnas	Psicosocial	Estrés, cansancio, fatiga, ansiedad,	Contrata de Convencial Laboral operativo	
OTROS				

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Iván Madrid	1193081733	Ayudante	Iván Madrid
Jersson Morales S.	1072531756	Ayudante	Jersson Morales
Cesar Zubiria Pinzón	1003655298	Ayudante	Cesar Zubiria
Danilo polo Martinez.	87-43873.	Ayudante	Danilo Polo

INFORMACION DE LA PERSONA QUE SOCIALIZA		
RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
COORDINADOR SST	Luis Salgado	Luis Salgado
AUXILIAR SST	Stephanny Garay	Stephanny C.

Anexo 7, Capacitaciones SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	23/12/2014	DURACIÓN:	90 min.
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE:	Stephanny Garay		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☑ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Protección partes del cuerpo: Manos, oidos, ojos, pies etc

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Kevin David Sierra Zuñiga	obrero		Kevin Sierra
2	Pedro Martinez Palomino	obrero		Pedro Martinez P.
3	Carlos Mario Sierra Bello	Obrero		
4	Abraham Rodriguez	obrero		
5	Jesus Enrique Higuera	obrero		
6	OSCAR CAUSIL	OF		
7	Reiner Gonzalez	Obrero		Reiner Gonzalez
8	Ivan Dario Garay Gloria	obrero		
9	Jairo Suarez Bello	obrero		Jairo Suarez Bello
10	Pedro Murillo	obrero		
11	Jairo Tejeda Rodriguez	obrero		Jairo
12	Johnny Garcia	obrero		Johnny
13	Jeiner Hernandez	obrero		Jeiner Hernandez
14	Jhon Sebastian Zuñiga	obrero		
15	Daniel Montesinos	Obrero		
16	Diego Barrera	Oficial		
17	Luis Fuentes Abril	oficial		Luis Fuentes A.
18	Eusebio Viloria	ayudante		Eusebio
19	Juan David Ramos Diaz	obrero		
20	KENIA DURANGO ESPITIA	obrero		
21	Jaider Granados	Ofic		Jaider GR
22	Guillermo Hernandez	obrero		
23	MANUEL TABOR CORREA	OFICIOR		
24	IVAN Lopez Lopez	oficial		
25	Carlos Sarmiento	oficial	#2	
26				
27	Hugo Garay	obrero		Hugo Garay
28	WILFRIDO MARQUEZ	oficio		WILFRIDO
29	OMAR CARDENAS B.	obrero		OMAR CAS.
30	CARLOS ANDRES	Mestro		CARLOS
31	Angel Guerrero	obrero		Angel
32	Osvaldo Urbina	Obrero		Osvaldo
33	Julian Barrios.	obrero		Julian Barrios.

Stephanny Garay
RESPONSABLE

Anexo 8, Concepto medico de las evaluaciones medicas de ingreso,

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F21
	SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA ACTUALIZACION	20/12/2024

No.	Nombre	cedula	Examen de Ingreso Fecha	Examen Periódico Fecha	Examen de Retiro Fecha	Observaciones y Recomendaciones
1	JAIRO DE JESUS RAMOS RODRÍGUEZ	18857561	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
2	KENYA PATRICIA DURANGO ESPITIA	1131107550	POR PROGRAMAR			
3	JAIDER JOSÉ CHAMORRO ESTRADA	92640310	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
4	DIEGO ALEJANDRO BARRERA UPARELA	15725762	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
5	EVER ANTONIO FUENTES ARCIA	92539319	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
6	WILFRIDO MARQUEZ GARCES	15621843	POR PROGRAMAR			
7	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ	1129504510	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
8	WILLIAM JOSE DE AGUSTIN HERNANDEZ	1067400596	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
9	PEDRO MIGUEL FERNANDEZ BENAVIDES	73432693	12/10/2024			APTO SIN RESTRICCION
10	ROMULO EDUARDO PALMERA APARICIO	11000373	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
11	JESUS ALBERTO TARRAS CORDOBA	1131108265	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
12	ALEXANDER VERGARA GALLEGO	1131108085	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
13	CRISTIAN DAVID MALARIAGA LADEUTH	1072522613	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
14	LEONARDO FABIO RIVERA GARRIDO	15620960	12/10/2024			APTO SIN RESTRICCION
15	LUIS EDUARDO SEPULVEDA AGUAS	1131109665	12/10/2024			APTO SIN RESTRICCION
16	MANUEL DE JESUS JULIO MILLAN	1131108476	12/10/2024			APTO SIN RESTRICCION
17	JEAN CARLOS CARDENAS BOHORQUEZ	1007245363	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
18	JOHAN SEBASTIAN ZUÑIGA LOPEZ	1131104030	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
19	EUCLIDES MANUEL MONTERROZA LOPEZ	92496761	POR PROGRAMAR			
20	EDER LUIS RINCO SUAREZ	1005708714	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
21	ALVARO ANDRES MANJARRES OVIDIO	1116615548	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
22	CESAR AUGUSTO ZUBIRIA PINZON	1003655298	POR PROGRAMAR			
23	NAYALIBE ELJACH MANJARREZ	1067943743	PENDIENTE			
24	JAIME LUIS CARRASCAL AVILA	78076914	12/10/2024			APTO SIN RESTRICCION

FIRMA COORDINADOR SST

FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F21
	SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA ACTUALIZACION	20/12/2024

No.	Nombre	cedula	Examen de Ingreso Fecha	Examen Periódico Fecha	Examen de Retiro Fecha	Observaciones y Recomendaciones
1	YEINER BRAVO CASTRO	1193543998	POR PROGRAMAR			
2	ANI LUZ SUAREZ MORALES	1007245380	5/03/2024			APTO SIN RESTRICCION
3	GABRIEL MORENO LICONA	1072529607	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
4	JULIO CESAR POSSO PEREZ	1072522158	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
5	HUGO ALBERTO GARAY GLORIA	1005708729	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
6	IVAN DANILO DORIA TIRADO	1064310879	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
7	OSCAR ANTONIO RAMOS BEDOYA	78034012	POR PROGRAMAR			
8	LUISA SIBAJA LUNA	1003395473	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
9	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	8741258	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
10	HELIODORO PRADA REGINO	78717284	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
11	OSCAR MIGUEL CAUSIL GALVAN	1073809586	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
12	ARISTIDES CONEO MARQUEZ	15620652	POR PROGRAMAR			
13	PEDRO JAFET MARQUEZ PEREGRINO	1131107808	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
14	DANIEL DARIOS DIAZ PEREZ	1192749961	POR PROGRAMAR			
15	KENER GONZALEZ BANQUET	1007245339	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
16	JUAN CARLOS INSIGNARES GLORIA	1131110865	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
17	JOHNNY LUIS DORIA MOLINA	15034491	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
18	CARLOS MARIO SIERRA BELLO	1131106681	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
19	ADRIAN JOSÉ DIAZ ZARZA	1007245348	POR PROGRAMAR			
20	MANUEL ENRIQUE MIRANDA HERNANDEZ	1064309595	POR PROGRAMAR			
21	CARLOS ANDRES MESTRA GONZALEZ	1005708548	POR PROGRAMAR			
22	JERSSON MORALES RINCON	1072531796				
23	DANILO ALBERTO POLO MARTINEZ	8743873	POR PROGRAMAR			

FIRMA COORDINADOR SST

FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F21
	SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA ACTUALIZACION	20/12/2024

No.	Nombre	cedula	Examen de Ingreso Fecha	Examen Periódico Fecha	Examen de Retiro Fecha	Observaciones y Recomendaciones
1	DINEY PAMELA OSPINO JÍMENEZ	1067920553	22/07/2024			APTO SIN RESTRICION
2	KAROLAY CARABALLO REYES	1069496540	1/08/2024			APTO SIN RESTRICION
3	TANIA DAYANA YENERIS PADILLA	1131107171	6/07/2024			APTO SIN RESTRICION
4	CUAVAS ESQUIVEL TOMAS SEGUNDO	9229788	2/07/2024			APTO SIN RESTRICION
5	STEPHANNY GARAY SALGADO	1131104122	1/07/2024			APTO SIN RESTRICION
6	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	1067280132	1/07/2024			APTO SIN RESTRICION
7	MARCO EMILIO ATENCIO AVILA	1193556241	POR PROGRAMAR			
8	ANDRES FELIPE AVILA CANCHILA	1131108993	POR PROGRAMAR			
9	PEDRO LUIS MURILLO DE HOYOS	9229029	POR PROGRAMAR			
10	LUIS MIGUEL CONTRERAS RINCO	1131108111	13/07/2024			APTO SIN RESTRICION
11	ABRAHAM RODRIGUEZ ESCUDERO	1193043889	13/07/2024			APTO SIN RESTRICION
12	GUSTABO RAMOS DÍAZ	1131110304	13/07/2024			APTO SIN RESTRICION
13	YEINER LUIS HERNANDEZ ALVAREZ	1003561521	16/07/2024			APTO SIN RESTRICION
14	GERMAN ALONSO PERALTA CARDENAS	1005708688	16/07/2024			APTO SIN RESTRICION
15	JUAN DAVID RAMOS DIAZ	1131111481	16/07/2024			APTO SIN RESTRICION
16	MANUEL FRANCISCO TOBAR CORREA	15029586	16/07/2024			APTO SIN RESTRICION
17	IVAN DARIO GARAY GLORIA	1193142465	16/07/024			APTO SIN RESTRICION
18	ALDRIN ROBERT VALENCIA	8769402	3/09/2024			APTO SIN RESTRICION
19	JARLIN ARIEL VALENCIA	72212811	3/09/2024			APTO CON RESTRICION
20	JORGE ELIECER CANTILLO GUTIERREZ	1047043732	3/09/2024			APTO SIN RESTRICION
21	MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ PACHECHO	8772760	3/09/2024			APTO SIN RESTRICION
22	RICARDO JOSE MANJARREZ PAREJO	1007564070	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
23	IVAN MADRID ROMERO	1193087173	POR PROGRAMAR			

FIRMA COORDINADOR SST

FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F21
	SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA ACTUALIZACION	20/12/2024

No.	Nombre	cedula	Examen de Ingreso Fecha	Examen Periódico Fecha	Examen de Retiro Fecha	Observaciones y Recomendaciones
1	FAIDER ELIAS VARGAS LADEUS	1003655340	03/092026			APTO SIN RESTRICCION
2	CARLOS ENRIQUE SARMIENTO TORRES	78700868	03/092027			APTO SIN RESTRICCION
3	OSWALDO URANGO HERNANDEZ	1131108401	03/092028			APTO SIN RESTRICCION
4	HOVER LUIS HERRERA TIRADO	78704837	POR PROGRAMAR			
5	FARID LEONARDO MARTINEZ CARMONA	1067403531	POR PROGRAMAR			
6	JORGE LUIS MORELO MARTINEZ	1072523581	12/10/2024			
7	GARZON LOPEZ JORGE ELIECER	15682314	POR PROGRAMAR			
8	CONEO MARQUEZ ELIECER	1131104488	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
9	JEAN CARLOS COA ROMERO	15620168	POR PROGRAMAR			
10	JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI	9074773	POR PROGRAMAR			
11	JOHN JAIRO BANQUET DONADO	15621529	24/07/2024			APTO SIN RESTRICCION
12	JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA	50909828	POR PROGRAMAR			
13	LUIS ALFONSO MARTINEZ MENDOZA	1005708736	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
14	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	1047393966	POR PROGRAMAR			
15	IVAN DARIO SALGADO CRUZ	1067855135	POR PROGRAMAR			
16	VICTOR JOSE CRUZ PATERNINA	92517051	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
17	DUBAN ARIAS MADRID	1131104002	POR PROGRAMAR			
18	EDUARDO DE JESUS ARRIETA PATERNINA	1131105563	12/10/2024			APTO SIN RESTRICCION
19	KATLIN SHADAY CABALLERO HERNANDEZ	1007599388	POR PROGRAMAR			
20	EUCEBIO ANTONIO VILORIA SUAREZ	1007245394	POR PROGRAMAR			
21	CAMILO ANDRES SIERRA ZUÑIGA	1005708765	12/10/2024			APTO SIN RESTRICCION
22						
23						

FIRMA COORDINADOR SST

FIRMA AUXILIAR SST

Anexo 9, Encuesta y tabulación Perfil sociodemográfico

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO - CONTROL DE PERSONAL	PAG 1 DE 2
		COD SST F048
		VERSION 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA DE ACTUALIZADO	30/12/2024

SEGUIMIENTO	INFORMACION PERSONAL			NOVEDAD		AFIACION A SEGURIDAD SOCIAL			DATOS				
MES ACTUALIZACION	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	ARL	AFP	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	MUNICIPIO	TELEFONO	EDAD	GENERO
	1	GERMAN PERALTA CARDENAS	1005708688	AYUDANTE	17/07/2024		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	PUNTA SECA	COVEÑAS	PENDIENTE	22	MASCULINO
	2	IVAN DARÍO GARAY GLORIA	1193142465	AYUDANTE	17/07/2024		FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	PUNTA SECA	COVEÑAS	3217549500	21	MASCULINO
	3	JUAN DAVID RAMOS DÍAZ	1131111481	AYUDANTE	17/07/2024		CAJACOPI	SURA	PORVENIR	GUAYABAL	COVEÑAS	3242597316	25	MASCULINO
	4	YEINER LUIS HERNANDEZ ALVAREZ	1003561521	AYUDANTE	17/07/2024		NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	PUNTA SECA	COVEÑAS	3206082768	25	MASCULINO
	5	MANUEL FRANCISCO TOBAR CORREA	15029586	AYUDANTE	16/07/2024		FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	COLFONDOS	CALLE LOS TRAMPOSOS	COVEÑAS	3007316049	54	MASCULINO
	6	PEDRO LUIS MURILLO DE HOYOS	9229029	AYUDANTE	12/07/2024		SALUD TOTAL	SURA	COLPENSIONES	PUNTA SECA	COVEÑAS	3004044834	48	MASCULINO
	7	LUIS MIGUEL CONTRERAS RINCO	1131108111	AYUDANTE	13/07/2024		NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	GUAYABAL	COVEÑAS	3117324319	33	MASCULINO
	8	ABRAHAM DAVID RODRIGUEZ ESCUDERO	1193043889	AYUDANTE	3/07/2024		COOSALUD	SURA	PORVENIR	CALLE LOS TRAMPOSOS	COVEÑAS	3123018504	22	MASCULINO
	9	GUSTABO ADOLFO RAMOS DIAZ	1131110304	AYUDANTE	6/07/2024		COOSALUD	SURA	PORVENIR	GUAYABAL	COVEÑAS	3146586703	27	MASCULINO
	10	JHON JAIRO BANQUET DONADO	15621529	OFICIAL	24/07/2024		SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	PORVENIR	COVEÑAS	3145024765	45	MASCULINO
	11	VICTOR JOSE CRUZ PATERNINA	92517051	RESIDENTE	30-08-2024		SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3013903726	49	MASCULINO
	12	RICARDO JOSÉ MANJARRES PAREJO	1007564070	OFICIAL	14-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	K1 VIA PUERTO	BARRANQUILLA	3001971956	29	MASCULINO
	13	IVAN DANILO DORIA TIRADO	1064310879	AYUDANTE	21-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	COLPENSIONES	BELLAVISTA	COVEÑAS	3044777748	19	MASCULINO
	14	JORGE ELIECER CANTILLO GUTIERREZ	1047043732	AYUDANTE	14-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	COLFONDOS	CRA 9 M2 #57-14	BARRANQUILLA	3122171972	35	MASCULINO
	15	HUGO ALBERTO GARAY GLORIA	1005708729	AYUDANTE	21-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	PUNTA SECA	COVEÑAS	30121023789	24	MASCULINO
	16	GABRIEL MORENO LICONA	1072529607	AYUDANTE	14-08-2024		EPS COOSALUD MOVILIDAD	SURA	PORVENIR	PARCELAS	COVEÑAS	3009526471	27	MASCULINO
	17	ALDRIN ROBERT VALENCIA	8769402	MAESTRO	14-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	CRA 16 #7-15	BARRANQUILLA	3022142219	54	MASCULINO
	18	LUISA FERNANDA SIBAJA LUNA	1003395473	RESIDENTE	17-08-2024		SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE	SURA	PORVENIR	CRA 15 #34-51	MONTERIA	3162794532	22	FEMENINO
	19	ANI LUZ SUAREZ MORALES	1007245380	AYUDANTE	14-08-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PROTECCION	TORRENTE INDIGENA	COVEÑAS	3147586625	22	FEMENINO
	20	DOMINGUEZ PACHECO MANUEL DE JESUS	8772760	OFICIAL	14-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PROTECCION	C 22 #13-18	BARRANQUILLA	3014399529	53	MASCULINO
	21	JARLIN ARIEL VALENCIA	72212811	MAESTRO	14-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PROTECCION	C 68 E #20-40	BARRANQUILLA	3007740758	49	MASCULINO
	22	OSWALDO URANGO HERNANDEZ	1131108401	AYUDANTE	29-08-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	NINGUNA AFP	TORRENTE INDIGENA	COVEÑAS	3216508510	32	MASCULINO
	23	JULIO CESSAR POSSO PEREZ	1072522158	AYUDANTE	14-08-2024		NINGUNA EPS	SURA	PROTECCION	PUNTE PIEDRA	COVEÑAS	3005091977	20	MASCULINO
	24	EVER ANTONIO FUENTES ARCIA	92539319	MAESTRO	16-08-2024		SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE	SURA	PROTECCION	BARRIO URIBE URIBE	SINCELEJO	3213778063	43	MASCULINO
	25	JEAN CARLOS CARDENAS BOHORQUEZ	1007245363	AYUDANTE	30-08-2024		NINGUNA EPS	SURA	PORVENIR	PUNTA SECA	COVEÑAS	3012738202	24	MASCULINO
	26	ROMULO EDUARDO PALMERA APARICIO	11000373	MAESTRO	21-08-2024		NINGUNA EPS	SURA	PORVENIR	MANZANA 122 LOT 5	MONTERIA	3013132810	47	MASCULINO
	27	DIEGO ALEJANDRO BARRERA UPARELA	15725762	OFICIAL	16-08-2024		SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	C 10 #15-36	CHINÚ	3002315008	42	MASCULINO
	28	JAIDER CHAMORRO ESTRADA	92640310	OFICIAL	16-08-2024		SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	TIERRA PROMETIDA	SINCELEJO	3244456314	41	MASCULINO
	29	ALVARO ANDRES MANJARREZ OVIDIO	1116615548	BODEGURO	21-08-2024		FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	CRA 26 #3-26	COVEÑAS	3146848668	28	MASCULINO
	30	ALEXANDER VERGARA GALLEGO	1131108085	AYUDANTE	22-08-2024		FOSYGA	SURA	PORVENIR	EL TIGRE	COVEÑAS	PENDIENTE	33	MASCULINO
	31	WILLIAM JOSE DE AGUSTIN HERNANDEZ	1067400596	AYUDANTE	17-08-2024		FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	NINGUNA AFP	REPARO	COVEÑAS	3117085152	39	MASCULINO
	32	JESUS ALBERTO TARRA CORDOBA	1131108265	AYUDANTE	22-08-2024		NINGUNA EPS	SURA	COLFONDOS	ASERRRADERO EL TIGRE	COVEÑAS	3243134424	30	MASCULINO

PERIODO: DICIEMBRE

33	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ	1129504510	AYUDANTE	17-08-2024		CAJACOPI	SURA	PORVENIR	PUNTA SECA	COVEÑAS	3235382881	20	MASCULINO
34	EDER LUIS RINCO SUAREZ	1005708714	AYUDANTE	25-08-2024		FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	GUAYABAL	COVEÑAS	3113795231	24	MASCULINO
35	FAIDER ELIAS VARGAS LADEUS	1003655340	OFICIAL	05-09-2024		ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA	SURA	PORVENIR	PORVENIR	COVEÑAS	3046314487	25	MASCULINO
36	CRISTIAN DAVID MALARRAGA LADEUS	1072522613	AYUDANTE	25-08-2024		ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA	SURA	PORVENIR	PORVENIR	COVEÑAS	3145593906	24	MASCULINO
37	JUAN CARLOS INSIGNARES GLORIA	1131110865	AYUDANTE	21-08-2024		COOSALUD	SURA	PORVENIR	PUNTA SECA	COVEÑAS	3242431733	28	MASCULINO
38	LUIS ALFONSO MENDOZA MARTINEZ	1005708736	AYUDANTE	22-08-2024		SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	REPARO	COVEÑAS	3242329369	26	MASCULINO
39	PEDRO JAFET MARQUEZ PEREGRINO	1131107808	AYUDANTE	21-08-2024		FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	SURA	PORVENIR	GUAYABAL	COVEÑAS	3017388922	32	MASCULINO
40	CARLOS MARIO SIERRA BELLO	1131105681	AYUDANTE	29-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	PARCELAS ALGARROBO	COVEÑAS	3205609487	34	MASCULINO
41	KENER GONZALEZ BANQUET	1007245339	AYUDANTE	29-08-2024		FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	SURA	PORVENIR	PARCELAS DE ALGARROBO	COVEÑAS	3216738752	24	MASCULINO
42	HELIODORO PRADA REGINO	78717284	MAESTRO	17-08-2024		NINGUNA EPS	SURA	PORVENIR	EL FARO CL 101 CRA 96	MONTERIA	3225054927	54	MASCULINO
43	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ	8741258	MAESTRO	17-08-2024		ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA	SURA	PORVENIR	MANZANA C4-53B	MONTERIA	3215786776	60	MASCULINO
44	TANIA DAYANA YENERIS PADILLA	1131107171	ING AMBIENTAL	11-07-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	PORVENIR	ALICANTE	COVEÑAS	3155679632	33	FEMENINO
45	OSCAR MIGUEL CAUSIL GAUYAN	1073809586	AYUDANTE	29-08-2024		EPS FAMISANAR LTDA	SURA	PROTECCION	GUAYABAL	COVEÑAS	3146512112	32	MASCULINO
46	EUECER CONEO MARQUEZ	1131104488	PLOMERO	04-09-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	COLPENSIONES	PARCELAS ALGARROBO	COVEÑAS	3156620585	38	MASCULINO
47	JORGE EUECER GARZON LOPEZ	15682314	PLOMERO	04-09-2024		CAJACOPI ATLANTICO - CCF	SURA	PORVENIR	JOOVAL	COVEÑAS	3128075143	52	MASCULINO
48	STEPHANNY GARAY SALGADO	1131104122	AUXILIAR SST	22-06-2024		NUEVA EPS	SURA	PROTECCION	CALLE 5 1-5 GUAYABAL	COVEÑAS	3154896049	21	FEMENINO
49	ARISTIDE CONEO MARQUEZ	15626652	AYUDANTE	24/10/2024		PENDIENTE	SURA	PENDIENTE	LAS PARCELAS	COVEÑAS	3114095431	45	MASCULINO
50	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	1047393966	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	22-06-2024		ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
51	CARLOS ENRIQUE SARMIENTO TORRES	78700868	OFICIAL DE OBRA	05-09-2024		ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA	SURA	COLPENSIONES	MONTERIA	MONTERIA	3013809040	55	MASCULINO
52	DANIEL DARIO DIAZ PEREZ	1192749961	AYUDANTE DE OBRA	24/10/2024		PENDIENTE	SURA	PENDIENTE	LAS PARCELAS	COVEÑAS	3013375073	22	FEMENINO
53	DINET PAMELA OSPINO JIMENEZ	1067920553	DIRECTORA DE OBRA	22-06-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	COLFONDOS	MONTERIA	MONTERIA	3007481091	33	FEMENINO
54	EUCLIDES MANUEL MONTERROSA LOPEZ	92496761	MAESTRO DE OBRA	22-06-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	NINGUNA AFP	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
55	HOVER LUIS HERRERA TIRADO	78704837	PLOMERO	06-09-2024		ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	3207071274	55	MASCULINO
56	IVAN DARIO SALGADO CRUZ	1067855135	OPERADOR MINI	01-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	3104897083	36	MASCULINO
57	JAIRO DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS	18857561	AYUDANTE DE OBRA	27-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3145172936	50	MASCULINO
58	JOHAN SEBASTIAN ZUÑIGA LOPEZ	1131104030	AYUDANTE DE OBRA	27-08-2024		EPS COOSALUD MOVILIDAD	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3128119152	23	MASCULINO
59	JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA	50909828	DIRECTORA DE OBRA	15-06-2024		SURA EPS	SURA	COLFONDOS	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	FEMENINO
60	JOHNNY LUIS DORIA MOLINA	15034491	AYUDANTE DE OBRA	29-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3217258777	54	MASCULINO
61	JORGE ENRIQUE CRUZ BENNEDETTI	9074773	TECNICO ESTRUCTURAL	22-06-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	NINGUNA AFP	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
62	JARLIN ARIEL VALENCIA	72212811	MAESTRO	14-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PROTECCION	C 68 E #20-40	BARRANQUILLA	3007740758	49	MASCULINO
63	KAROLAY CARABALLO REYES	1069486540	TRABAJADOR SOCIAL	25-06-2024		FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	3142602320	30	FEMENINO
64	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	1067280132	PROF SEGURIDAD INDUSTRIAL	22-06-2024		SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	3107231289	38	MASCULINO
65	NAYAUBE ELIACH MANJARREZ	1067943743	AUXILIAR DE ARQUITECTURA	29-06-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PROTECCION	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	FEMENINO
66	OSCAR ANTONIO RAMOS BEDOYA	78034012	ING CIVIL	17-08-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
67	RICARDO JOSE MANJARRES PAREJO	1007564070	OFICIAL	14-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	BARRANQUILLA	K1 VIA PUERTO	3001971956	29	MASCULINO
68	TOMAS SEGUNDO CUAVAS ESQUIVEL	92223788	CELADOR	04-07-2024		EPS COOSALUD MOVILIDAD	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
69	LUIS EDUARDO SEPULVEDA AGUAS	1131109665	AYUDANTE	16-10-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	SINCELEJO	COVEÑAS	3023886636	29	MASCULINO
70	CAMILO ANDRES SIERRA ZUÑIGA	1005708765	AYUDANTE	01-10-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
71	LEONARDO FABIO RIVERA GARRIDO	15620960	AYUDANTE	13-10-2024		COOP SALUD Y DLLO INT. CARTAGENA	SURA	COLFONDOS	COVEÑAS	COVEÑAS	3148941597	44	MASCULINO
72	JORGE LUIS MORELO MARTINEZ	1072533581	AYUDANTE	13-10-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PROTECCION	COVEÑAS	COVEÑAS	3005913252	37	MASCULINO
73	EUCEBIO ANTONIO VIGORIA SUAREZ	1007245394	AYUDANTE	01-10-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	COLPENSIONES	COVEÑAS	COVEÑAS	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
74	EDUARDO DE JESUS ARRIETA PATERNINA	1131105563	AYUDANTE	16-10-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3006076990	39	MASCULINO

75	ALDRIN ROBERT VALENCIA	8769402	MAESTRO	14-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	CRA 16 #7-15	BARRANQUILLA	3022142219	54	MASCULINO
76	DUBAN ARIAS MADRID	1131104002	AYUDANTE	01-10-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3218102835	23	MASCULINO
77	KENYA PATRICIA DURANGO ESPITIA	1131107550	AYUDANTE	01-10-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	COLPENSIONES	GUAYABAL	COVEÑAS	3144559410	32	FEMENINO
78	PEDRO MIGUEL FERNANDEZ BENAVIDEZ	C73432693	OFICIAL DE OBRA	25-09-2024		NINGUNA EPS	SURA	PROTECCION	COVEÑAS	COVEÑAS	3235077506	42	MASCULINO
79	MANUEL DE JESUS JULIO MILLAN	1131108476	AYUDANTE	01-10-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	32155889498	31	MASCULINO
80	CARLOS ANDRES MESTRA GONZALEZ	1005708548	AYUDANTE	25-09-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3042298153	24	MASCULINO
81	JAIME LUIS CARRASCAL AVILA	78076914	OFICIAL	25-09-2024		CAJACOPI ATLANTICO - CCF	SURA	PORVENIR	MANZANA 198 LOTE 14	MONTERIA	3216168551	44	MASCULINO
82	YEINER BRAVO CASTRO	1193543998	AYUDANTE	06-10-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3012892919	32	MASCULINO
83	JEAN CARLOS COA ROMERO	15620168	AYUDANTE	09-11-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	LAS PARCELAS	COVEÑAS	3148708185	45	MASCULINO
84	FARID LEONARDO MARTINEZ CARMONA	1067403531	AYUDANTE	09-11-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PROTECCION	COVEÑAS	COVEÑAS	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
85	ANDRES FELIPE AVILA CANCHILA	1131108993	AYUDANTE	09-11-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3126041104	30	MASCULINO
86	KATLIN SHADAY CABALLERO HERNANDEZ	1007599388	AYUDANTE	01-11-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	COLPENSIONES	LA SABANERA	COVEÑAS	3218435323	21	FEMENINO
87	WILFRIDO MARQUEZ GARCES	15621843	AYUDANTE	09-11-2024		ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	SURA	PORVENIR	COVVEÑAS	COVEÑAS	3043030844	41	MASCULINO
88	CESAR AUGUSTO ZUBIRIA PINZON	1003655298	AYUDANTE	03-12-2024		ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	PORVENIR	PUNTA SECA	COVEÑAS	3205710627	23	MASCULINO
89	DANILO ALBERTO POLO MARTINEZ	8743873	AYUDANTE	03-12-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	COLFONDOS	GUAYABAL	COVEÑAS	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
90	IVAN MADRID ROMERO	1193087173	AYUDANTE	03-12-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	EL REPARO	COVEÑAS	31226136319	31	MASCULINO
91	JERSSON MORALES RINCON	1072531796	AYUDANTE	03-12-2024		EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	SURA	COLFONDOS	PUNTA SECA	COVEÑAS	3014275143	25	MASCULINO

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO - CONTROL DE PERSONAL	PAG 2 DE 2
		COD SST F048
		VERSION 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA DE ACTUALIZADO	30-dic-24

MES ACTUALIZACION	N°	NIVEL DE ESCOLARIDAD	NÚMERO DE PERSONAS A CARGO	USO DEL TIEMPO LIBRE	PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)	ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA	ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL	TIPO DE CONTRATACIÓN	LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD	CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS (SI/NO)	PRACTICA ALGUN DEPORTE (SI/NO)	FUMA (SI/NO)
	1	BACHILLERATO	4	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	SI
	2	TECNICO	NO	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	4 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	3	BACHILLERATO	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	7 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	4	BACHILLERATO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	EPS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	AFP	SI	SI	NO
	5	BACHILLERATO	2	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	30 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	6	BACHILLERATO	4	LABORES DOMESTICA	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	2 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	7	BACHILLERATO		NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	8	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	5 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	NO	NO
	9	BACHILLERATO	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	17 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	10	PRIMARIA	2	AYUDANTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	15 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	11	UNIVERSITARIO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	ENTRE 1 Y 3 SML	MENOS DE 1 AÑO	2 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	SI	NO	NO	NO
	12	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	8 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	13	TECNICO	NO	ESTUDIO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	3 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	14	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	8 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	SI
	15	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	4 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	16	BACHILLERATO	2	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	9 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	17	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	32 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	18	UNIVERSITARIO	0	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	9 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	19	BACHILLERATO	2	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	2 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	NO	NO
	20	PRIMARIA	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	30 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	21	BACHILLERATO	5	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	31 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	22	BACHILLERATO	4	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	3 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	23	BACHILLERATO	1	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	24	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	17 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	25	BACHILLERATO	5	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	7 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	26	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	12 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	27	POSTGRADO	3	LABORES DOMESTICA	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	5 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	28	PRIMARIA	4	OTRO TRABAJO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	16 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	29	TECNICO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO
	30	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	12 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	31	BACHILLERATO	4	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	32	TECNICO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	8 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO

PERIODO: DICIEMBRE

33	BACHILLERATO	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	5 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
34	BACHILLERATO	0	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	11 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
35	BACHILLERATO	2	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	4 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI
36	BACHILLERATO	3	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	8 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
37	BACHILLERATO	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	NO
38	BACHILLERATO	3	OTRO TRABAJO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	4 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
39	BACHILLERATO	4	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	NO
40	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	20 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	SI	SI	NO
41	BACHILLERATO	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	14 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
42	PRIMARIA	3	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	25 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
43	BACHILLERATO	1	RECREACIÓN Y DEPORTE	ENTRE 1 Y 3 SML	MENOS DE 1 AÑO	35 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	SI	SI	NO
44	UNIVERSITARIO	1	LABORES DOMESTICA	ENTRE 1 Y 3 SML	MENOS DE 1 AÑO	6 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI
45	PRIMARIA	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI
46	PRIMARIA	2	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	15 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
47	PRIMARIA	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	30 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	NO
48	TECNOLOGO	1	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
49	PRIMARIA	4	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	15 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	NO
50	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
51	BACHILLERATO	5	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
52	BACHILLERATO	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
53	UNIVERSITARIO	3	RECREACIÓN Y DEPORTE	ENTRE 1 Y 3 SML	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
54	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
55	TECNICO	MAS DE 6	RECREACIÓN Y DEPORTE	ENTRE 1 Y 3 SML	MENOS DE 1 AÑO	32 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO
56	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	12 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO
57	BACHILLERATO	4	LABORES DOMESTICA	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	35 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO
58	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	6 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO
59	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
60	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	4 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO
61	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
62	BACHILLERATO	0	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	5 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
63	UNIVERSITARIO	1	OTRO TRABAJO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	2 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO
64	UNIVERSITARIO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
65	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
66	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
67	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	12 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	NO
68	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
69	TECNICO	3	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO
70	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
71	PRIMARIA	5	OTRO TRABAJO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO
72	BACHILLERATO	3	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	7 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO
73	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
74	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

75	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
76	PRIMARIA	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	SI	SI
77	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
78	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	2 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	SI	NO
79	BACHILLERATO	6	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	21 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO	NO
80	PRIMARIA	0	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	5 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	NO	SI	NO
81	BACHILLERATO	2	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	NO	NO	NO
82	BACHILLERATO	4	OTRO TRABAJO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	5 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	NO	SI	NO
83	PRIMARIA	6	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	SI	NO
84	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
85	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	3 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	NO	SI	NO
86	TECNICO	2	LABORES DOMESTICA	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MENOS DE 1 AÑO	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	NO	NO	NO
87	PRIMARIA	3	LABORES DOMESTICA	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	NO	SI	NO
88	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	6 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	SI	NO
89	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
90	TECNICO	3	ESTUDIO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	8 MESES	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO	NO
91	BACHILLERATO	2	OTRO TRABAJO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVICI	NO	SI	NO	NO

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-FOR-025
		VERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO PUO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Jesson Morales Rincon.
Cargo	Ayudante
Vereda o corregimiento	
MUNICIPIO	Coveñas
DIRECCION	Punta Seca.

FECHA 13/12/2024.

Encierra en un circulo

1. EDAD
a. Menor de 18 años
(b) 19 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
(b) Casado (a)/unión libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GENERO
(a) Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
(b) 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
(b) Secundaria
c. Tecnico / Tecnologo
d. Universitario
e. Especialista Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
(b) Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
(a) Descanso
b. Labores domésticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Más de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 6 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 6 a 10 años
d. De 10 a 15 años
(e) Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Obra labor
b. Aprendiz
(c) Contrato de Prestacion de Servicios
d. Fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunacion
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
(f) Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. Si
(b) No
Cual _____

14. FUMA
a. Si
(b) No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
(b) Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
(a) No
b. Si
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(b) Si

x Jersson Morales
Firma y/o huella

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, en esta ley se establecen los requisitos exigidos para la recolección del derecho humano social y se fijan los procedimientos necesarios para el manejo de la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-025
		VERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Danilo Polo Martinez.
Cargo	Ayudante de plomeria.
Vereda o corregimiento	Guayabal
MUNICIPIO	Coveñas
DIRECCION	

FECHA 13/12/2024.

Encierra en un circulo:

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
(e) 48 años o más

2. GENERO
(a) Masculino
b. Femenino

3. ESTADO CIVIL
(a) Soltero (a)
b. Casado (a)unión libre
c. Separado (a)Divorciado
d. Viudo (a)

4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
(b) 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
(b) Secundaria
c. Tecnica / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestria

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
(c) Familiar
d. Compartida con otras(s) familias(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
(a) Descanso
b. Labores domésticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Más de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
(a) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Obra labor
b. Indefinido
(c) Contrato de Prestación de Servicios
d. Aprendizaje
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Sos (Ratación)
(f) Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
(a) SI
(b) No
CUAL _____

14. FUMA
a. SI
(b) No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
(b) SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
(a) No
b. SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

17. CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
(b) SI

Danilo Polo
Firma trabajador

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a conocer la información (Datos) que se ha recolectado en bases de datos o archivos, su correcto tratamiento, actualización y rectificación

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	56[illegible]035
		[illegible]ERSION 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FLID Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Iván Madrid Romero.
Cargo	Ayudante
Vereda o corregimiento	
Municipio	Coveñas.
DIRECCION	El Reparo

FECHA 13/12/2024.

Encierra en un circulo.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. GENERO
a. Masculino
b. Femenino

3. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/unión libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 5 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Con trabajo
b. Labores domesticas
c. Recreación y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Obra labor
b. Aprendizaje
c. Contrato de Prestación de Servicios
d. Fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Eps (Relajación)
f. Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. SI
b. No
Cual _____

14. FUMA
a. Si
b. No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
b. Si
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional _____

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
b. Si
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. No
b. Si

Firma trabajador: Evan Madrid

Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, en esta ley se establecen los requisitos exigidos para la recolección del dato y tratado legal. La Empresa debe solicitar autorización de información Particular que no divulgarán en bases de datos y archivos, así como su posterior tratamiento y finalidad.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SST-FOR-[illegible]
		VERSIÓN 1

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Cesar Zubiria Pinzon.
Cargo	Ayudante
Vereda o corregimiento	
MUNICIPIO	Coveñas.
DIRECCION	Punta Seca.

FECHA 13/12/2024.

Encierra en un círculo

1. EDAD
a. Menor de 18 años
(b.) 18 - 47 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
(b.) Casado (a)/unión libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GENERO
(a.) Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
(b.) 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
(b.) Secundaria
c. Tecnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
(c.) Familiar
d. Compartida con otras(s) familia(s)

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
(c.) Recreación y deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
(a.) Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 6 y 8 S.M.L.
e. Más de 7 S.M.L.

9. ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA
(a.) Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGUEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
(c.) De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACIÓN
a. Obra labor
b. Aprendiz
(c.) Contrato de Prestación de Servicios
d. Fijo
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Sos (Reinducción)
(f.) Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. SI
(b.) No
CUAL _____

14. FUMA
a. SI
(b.) No
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. No
(b.) SI Semanal _____
Quincenal _____
Ocasional _____

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. No
(b.) SI Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional _____

17-CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. NO
(b.) SI

x Cesar Zubiria
Firma trabajador

Ley 1581 de 2012. De protección de datos personales, en esta ley que complementando la regulación vigente para la protección del derecho a [illegible] que tienen todas las personas respecto a [illegible]

Anexo 10. Cuestionario de morbilidad

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	CUESTIONARIO DE MORBILIDAD SENTIDA	VERSION 1
		SST- FO30
		Página 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DATOS GENERALES							
FECHA	Jersson Morales Rincon			CEDULA	1027531956.		
NOMBRE	Jerson Morales Rincon.						
CARGO	Ayudante						
SEXO	F		M ✓	ESTATURA	1.70.	# HIJOS	1.
EDAD	25.			PESO 68	USA GAFAS	SI	NO ✓
TIEMPO EN EL OFICIO ACTUAL				16 años.			
CIUDAD	Coveñas			DIRECCIÓN			
BARRIO	Punta seca.			COMUNA			

1.ANTECEDENTES MÉDICOS	SI	NO	EXPLIQUE
Presenta alguno de los siguientes diagnósticos médicos:			
Enfermedades de los pulmones como asma, enfisema, bronquitis?		✓	
enfermedades de la sangre		✓	
Enfermedades cardiacas		✓	
Enfermedades cerebrales como derrames, trombosis, epilepsia?		✓	
Artritis, osteoporosis, osteoartritis o gota (Inflamación o desgaste de una articulación)		✓	
Síndrome de túnel del carpo (Dolor, debilidad o entumecimiento de la mano y la muñeca, extendiéndose por todo el brazo)		✓	
Epicóndilitis (Inflamación e irritación de la zona del centro del codo)		✓	
Síndrome manguito rotador o tendinitis de hombro (Dolor en la articulación del hombro)		✓	
Escoliosis o deformidades de columna (Desviación de la columna vertebral)		✓	
Lumbalgia (Dolor de espalda baja, en la zona lumbar)		✓	
Hernia discal (La hernia provoca dolor en la zona lumbar en las vértebras)		✓	
Diabetes (azúcar alta en la sangre)?		✓	
Enfermedades digestivas		✓	
Enfermedades de la piel		✓	
Alergias en piel o vías respiratorias?		✓	
Trastornos de audición?		✓	
otros		✓	
Ustad ha presentado alguno de estos rasgos caracteristicos	**SI**	**NO**	**EXPLIQUE**
Cansancio		✓	
Sobrepeso		✓	
Sedentarismo		✓	
deseos de fumar o fuma		✓	
Deseo de consumir sustancias alucinógenas		✓	
Deseos de ingerir bebidas alcohólicas		✓	
Síntomas de estrés		✓	

2. OTRAS ACTIVIDADES EXTRA LABORALES	SI	NO	EXPLIQUE
Seleccione la opción si hay molestia o dolor, en algunas de las partes del cuerpo relacionadas en la siguiente figura. Si no tiene ninguna, marcar NO. Si tiene, por favor especifique hace cuánto tiempo, según la tabla relacionada a continuación			
S		✓	A. Cuello
		✓	B. Hombro derecho
		✓	C. Hombro izquierdo
		✓	D. Brazo derecho
		✓	E. Brazo izquierdo
		✓	F. Codo derecho
		✓	G. Codo izquierdo
		✓	H. Antebrazo derecho
		✓	I. Antebrazo izquierdo
		✓	J. Dedos, Mano derecho
		✓	K. Dedos, Mano izquierdo
		✓	L. Espalda Alta (cervical)
		✓	M. espalda Media (dorsal)
		✓	N. Espalda baja / cintura
		✓	O. Rodilla derecha
		✓	P. Rodilla izquierda
		✓	Q. Pie derecho
		✓	R. Pie izquierdo
		✓	S. Cabeza
	SI	**NO**	**EXPLIQUE**
Hace cuanto tiempo?		✓	
Si presenta molestia en mas de un segmento corporal, especifique el segmento que mas duele		✓	
La molestia mejora con el reposo, masajes, medicamentos		✓	
Ha tenido incapacidades expedidas por la EPS a causas de estas molestias		✓	
4. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MANOS Y MIEMBROS INFERIORES			
Si ha presentado síntomas en las manos conteste las siguientes preguntas			
	SI	**NO**	**EXPLIQUE**
Adormecimiento		✓	
Hormigueo		✓	
Inflamación		✓	
Otras molestias		✓	
En qué circunstancias se presentan las molestias en las manos?			
Duele cuando se expone al frio?		✓	
Duele cuando se expone al calor?		✓	
Cambios de temperatura (frio, caliente)?		✓	
Duele por permanecer en una sola posición?		✓	
Otra, Cual?		✓	
¿Alguna vez le han diagnosticado alguna enfermedad laboral? De ser así indique cuales.			
Jersson Morales			

FIRMA TRABAJADOR

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	CUESTIONARIO DE MORBILIDAD SENTIDA	VERSION 1
		SST- FO30
		Página 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS. SUCRE

DATOS GENERALES									
FECHA	13/12/2024				CEDULA	1003655218			
NOMBRE	Cesar Zubiria Pinzón.								
CARGO									
SEXO	F		M	✓	ESTATURA	1.70	# HIJOS	2	
EDAD	23				PESO	65	USA GAFAS	SI	NO ✓
TIEMPO EN EL OFICIO ACTUAL					6 años.				
CIUDAD	Coveñas				DIRECCIÓN				
BARRIO	Punta Seca.				COMUNA				

1.ANTECEDENTES MÉDICOS	SI	NO	EXPLIQUE
Presenta alguno de los siguientes diagnósticos médicos:			
Enfermedades de los pulmones como asma, enfisema, bronquitis?		✓	
enfermedades de la sangre		✓	
Enfermedades cardiacas		✓	
Enfermedades cerebrales como derrames, trombosis, epilepsia?		✓	
Artritis, osteoporosis, osteoartritis o gota (Inflamación o desgaste de una articulación)		✓	
Síndrome de túnel del carpo (Dolor, debilidad o entumecimiento de la mano y la muñeca, extendiéndose por todo el brazo)		✓	
Epicóndilitis (Inflamación e irritación de la zona del centro del codo)		✓	
Síndrome manguito rotador o tendinitis de hombro (Dolor en la articulación del hombro)		✓	
Escoliosis o deformidades de columna (Desviación de la columna vertebral)		✓	
Lumbalgia (Dolor de espalda baja, en la zona lumbar)			
Hernia discal (La hernia provoca dolor en la zona lumbar en las vértebras)		✓	
Diabetes (azúcar alta en la sangre)?		✓	
Enfermedades digestivas		✓	
Enfermedades de la piel		✓	
Alergias en piel o vías respiratorias?		✓	
Trastornos de audición?		✓	
otros		✓	
Usted ha presentado alguno de estos riesgos característicos	**SI**	**NO**	**EXPLIQUE**
Cansancio		✓	
Sobrepeso		✓	
Sedentarismo		✓	
deseos de fumar o fuma		✓	
Deseo de consumir sustancias alucinógenas		✓	
Deseos de ingerir bebidas alcohólicas		✓	
Síntomas de estrés		✓	

2. OTRAS ACTIVIDADES EXTRA LABORALES	SI	NO	EXPLIQUE
Seleccione la opción si hay molestia o dolor, en algunas de las partes del cuerpo relacionadas en la siguiente figura. Si no tiene ninguna, marcar NO. Si tiene, por favor especifique hace cuánto tiempo, según la tabla relacionada a continuación			
5		✓	A. Cuello
		✓	B. Hombro derecho
		✓	C. Hombro izquierdo
		✓	D. Brazo derecho
		✓	E. Brazo izquierdo
		✓	F. Codo derecho
		✓	G. Codo izquierdo
		✓	H. Antebrazo derecho
		✓	I. Antebrazo izquierdo
		✓	J. Dedos, Mano derecho
		✓	K. Dedos, Mano izquierdo
		✓	L. Espalda Alta (cervical)
		✓	M. espalda Media (dorsal)
		✓	N. Espalda baja / cintura
		✓	O. Rodilla derecha
		✓	P. Rodilla izquierda
		✓	Q. Pie derecho
		✓	R. Pie izquierdo
		✓	S. Cabeza

	SI	NO	EXPLIQUE
Hace cuanto tiempo?		✓	
Si presenta molestia en mas de un segmento corporal, especifique el segmento que mas duele		✓	
La molestia mejora con el reposo, masajes, medicamentos		✓	
Ha tenido incapacidades expedidas por la EPS a causas de estas molestias		✓	

4. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MANOS Y MIEMBROS INFERIORES			
Si ha presentado síntomas en las manos conteste las siguientes preguntas			
	SI	**NO**	**EXPLIQUE**
Adormecimiento		✓	
Hormigueo		✓	
Inflamación		✓	
Otras molestias		✓	
En qué circunstancias se presentan las molestias en las manos?			
Duele cuando se expone al frio?		✓	
Duele cuando se expone al calor?		✓	
Cambios de temperatura (frío, caliente)?		✓	
Duele por permanecer en una sola posición?		✓	
Otra, Cual?		✓	
¿Alguna vez le han diagnosticado alguna enfermedad laboral? De ser así indique cuales.			
César Zuluaga			

FIRMA TRABAJADOR

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	CUESTIONARIO DE MORBILIDAD SENTIDA	VERSION 1
		SST- FO30
		Página 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DATOS GENERALES							
FECHA	13/12/2024			CEDULA	8743873		
NOMBRE	Danilo Polo Martinez						
CARGO	Ayudante de Plomería						
SEXO	F	M ✓	ESTATURA	1.67	# HIJOS		
EDAD		PESO 62	USA GAFAS	SI	NO ✓		
TIEMPO EN EL OFICIO ACTUAL							
CIUDAD	Coveñas	DIRECCIÓN					
BARRIO	Guayabal	COMUNA					

1.ANTECEDENTES MÉDICOS	SI	NO	EXPLIQUE
Presenta alguno de los siguientes diagnósticos médicos:			
Enfermedades de los pulmones como asma, enfisema, bronquitis?		✓	
enfermedades de la sangre		✓	
Enfermedades cardiacas		✓	
Enfermedades cerebrales como derrames, trombosis, epilepsia?		✓	
Artritis, osteoporosis, osteoartritis o gota (inflamación o desgaste de una articulación)		✓	
Síndrome de túnel del carpo (Dolor, debilidad o entumecimiento de la mano y la muñeca, extendiéndose por todo el brazo)		✓	
Epicóndilitis (Inflamación e irritación de la zona del centro del codo)		✓	
Síndrome manguito rotador o tendinitis de hombro (Dolor en la articulación del hombro)		✓	
Escoliosis o deformidades de columna (Desviación de la columna vertebral)		✓	
Lumbalgia (Dolor de espalda baja, en la zona lumbar)		✓	
Hernia discal (La hernia provoca dolor en la zona lumbar en las vértebras)		✓	
Diabetes (azúcar alta en la sangre)?		✓	
Enfermedades digestivas		✓	
Enfermedades de la piel		✓	
Alergias en piel o vías respiratorias?		✓	
Trastornos de audición?		✓	
otros		✓	
Ustad ha presentado alguno de estos rasgos característicos	**SI**	**NO**	**EXPLIQUE**
Cansancio		✓	
Sobrepeso		✓	
Sedentarismo		✓	
deseos de fumar o fuma		✓	
Deseo de consumir sustancias alucinógenas		✓	
Deseos de ingerir bebidas alcohólicas		✓	
Síntomas de estrés		✓	

2. OTRAS ACTIVIDADES EXTRA LABORALES	SI	NO	EXPLIQUE
Seleccione la opción si hay molestia o dolor, en algunas de las partes del cuerpo relacionadas en la siguiente figura. Si no tiene ninguna, marcar NO. Si tiene, por favor especifique hace cuánto tiempo, según la tabla relacionada a continuación			
S		✓	A. Cuello
		✓	B. Hombro derecho
		✓	C. Hombro izquierdo
		✓	D. Brazo derecho
		✓	E. Brazo izquierdo
		✓	F. Codo derecho
		✓	G. Codo izquierdo
		✓	H. Antebrazo derecho
		✓	I. Antebrazo izquierdo
		✓	J. Dedos, Mano derecho
		✓	K. Dedos, Mano izquierdo
		✓	L. Espalda Alta (cervical)
		✓	M. espalda Media (dorsal)
		✓	N. Espalda baja / cintura
		✓	O. Rodilla derecha
		✓	P. Rodilla izquierda
		✓	Q. Pie derecho
		✓	R. Pie izquierdo
		✓	S. Cabeza

	SI	NO	EXPLIQUE
Hace cuanto tiempo?		✓	
Si presenta molestia en mas de un segmento corporal, especifique el segmento que mas duele		✓	
La molestia mejora con el reposo, masajes, medicamentos		✓	
Ha tenido incapacidades expedidas por la EPS a causas de estas molestias		✓	
4. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MANOS Y MIEMBROS INFERIORES			
Si ha presentado síntomas en las manos conteste las siguientes preguntas			
	SI	**NO**	**EXPLIQUE**
Adormecimiento		✓	
Hormigueo		✓	
Inflamación		✓	
Otras molestias		✓	
En qué circunstancias se presentan las molestias en las manos?			
Duele cuando se expone al frio?		✓	
Duele cuando se expone al calor?		✓	
Cambios de temperatura (frío, caliente)?		✓	
Duele por permanecer en una sola posición?		✓	
Otra, Cual?		✓	
¿Alguna vez le han diagnosticado alguna enfermedad laboral? De ser así indique cuales.			
Danilo Polo			

FIRMA TRABAJADOR

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	CUESTIONARIO DE MORBILIDAD SENTIDA	VERSION 1
		SST- F030
		Página 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DATOS GENERALES							
FECHA	13/12/2024.			CEDULA	1193827173.		
NOMBRE	Juan Madrid Romero.						
CARGO	Ayudante						
SEXO	F	M —	ESTATURA	1.70.	# HIJOS	1	
EDAD	31	PESO 68	USA GAFAS	SI	NO —		
TIEMPO EN EL OFICIO ACTUAL							
CIUDAD	Coveñas	DIRECCIÓN					
BARRIO	El Reparo.	COMUNA					

1. ANTECEDENTES MÉDICOS	SI	NO	EXPLIQUE
Presenta alguno de los siguientes diagnósticos médicos:			
Enfermedades de los pulmones como asma, enfisema, bronquitis?		✓	
enfermedades de la sangre		✓	
Enfermedades cardiacas		✓	
Enfermedades cerebrales como derrames, trombosis, epilepsia?		✓	
Artritis, osteoporosis, osteoartritis o gota (Inflamación o desgaste de una articulación)		✓	
Síndrome de túnel del carpo (Dolor, debilidad o entumecimiento de la mano y la muñeca, extendiéndose por todo el brazo)		✓	
Epicóndilitis (Inflamación e irritación de la zona del centro del codo)		✓	
Síndrome manguito rotador o tendinitis de hombro (Dolor en la articulación del hombro)		✓	
Escoliosis o deformidades de columna (Desviación de la columna vertebral)		✓	
Lumbalgia (Dolor de espalda baja, en la zona lumbar)		✓	
Hernia discal (La hernia provoca dolor en la zona lumbar en las vértebras)		✓	
Diabetes (azúcar alta en la sangre)?		✓	
Enfermedades digestivas		✓	
Enfermedades de la piel		✓	
Alergias en piel o vías respiratorias?		✓	
Trastornos de audición?		✓	
otros		✓	
Usted ha presentado alguno de estos rasgos característicos	**SI**	**NO**	**EXPLIQUE**
Cansancio		✓	
Sobrepeso		✓	
Sedentarismo		✓	
deseos de fumar o fuma		✓	
Deseo de consumir sustancias alucinógenas		✓	
Deseos de ingerir bebidas alcohólicas		✓	
Síntomas de estrés		✓	

2. OTRAS ACTIVIDADES EXTRA LABORALES	SI	NO	EXPLIQUE
Seleccione la opción si hay molestia o dolor, en algunas de las partes del cuerpo relacionadas en la siguiente figura. Si no tiene ninguna, marcar NO. Si tiene, por favor especifique hace cuánto tiempo, según la tabla relacionada a continuación			
		✓	A. Cuello
		✓	B. Hombro derecho
		✓	C. Hombro izquierdo
		✓	D. Brazo derecho
		✓	E. Brazo izquierdo
		✓	F. Codo derecho
		✓	G. Codo Izquierdo
		✓	H. Antebrazo derecho
		✓	I. Antebrazo izquierdo
		✓	J. Dedos, Mano derecho
		✓	K. Dedos, Mano izquierdo
		✓	L. Espalda Alta (cervical)
		✓	M. espalda Media (dorsal)
		✓	N. Espalda baja / cintura
		✓	O. Rodilla derecha
		✓	P. Rodilla izquierda
		✓	Q. Pie derecho
		✓	R. Pie izquierdo
		✓	S. Cabeza

	SI	NO	EXPLIQUE
Hace cuanto tiempo?		✓	
Si presenta molestia en mas de un segmento corporal, especifique el segmento que mas duele		✓	
La molestia mejora con el reposo, masajes, medicamentos		✓	
Ha tenido incapacidades expedidas por la EPS a causas de estas molestias		✓	

4. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MANOS Y MIEMBROS INFERIORES			
Si ha presentado síntomas en las manos conteste las siguientes preguntas			
	SI	NO	EXPLIQUE
Adormecimiento		✓	
Hormigueo		✓	
Inflamación		✓	
Otras molestias		✓	
En qué circunstancias se presentan las molestias en las manos?			
Duele cuando se expone al frio?		✓	
Duele cuando se expone al calor?		✓	
Cambios de temperatura (frio, caliente)?		✓	
Duele por permanecer en una sola posición?		✓	
Otra, Cual?		✓	
¿Alguna vez le han diagnosticado alguna enfermedad laboral? De ser así indique cuales.			
Juan Madrid			

FIRMA TRABAJADOR

Anexo 11, Reporte e investigación de AT, lecciones aprendidas y ausentismo laboral

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F07
	CONTROL DE AUSENTISMO	Pag. 1 de 1

PROYECTO	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**		
MES	**DICIEMBRE DE 2024**		
AUXILIAR SST	**STEPHANNY GARAY**	**COORDINADOR SST**	**LUIS SALGADO**

NOMBRE Y APELIDOS	N° CC	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CLASES DE AUSENTISMO		TOTAL DIAS
				AT	EC	
MANUEL DE JESUS JULIO MILLAN	1131108476	9/12/2024	10/12/2024	X		2
ELIECER CONEO MARQUEZ	1131104488	6/12/2024	13/12/2024		X	8
CESAR AUGUSTO ZUBIRÍA PINZÓN	1003655298	17/12/20244	19/12/2024	X		3
TOTAL DIAS PERDIDOS						13

OBSERVACIONES
INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO
ESCRIBA NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS
ESCRIBA LA FECHA INICIAL DEL EVENTO DD/MM/AAAA
ESCRIBA LA FECHA FINAL DEL EVENTO DD/MM/AAAA

TOTAL DIAS AUSENTES **13**

AT ACCIDENTE DE TRABAJO
EC: ENFERMEDAD COMUN

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	002	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: PORVENIR — Código AFP: 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

Nombre o razón social: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901811441

Dirección	Teléfono	Fax
CL 42 # 7 - 40	3114269116	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
LEU.1973@HOTMAIL.COM	CORDOBA	MONTERIA	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5411201

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES

Dirección	Teléfono	Fax
CR 25 AV LA ESMERALDA	3114269116	7919612

Departamento	Municipio	Zona
SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
ZUBIRIA	PINON	CESAR AUGUSTO

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1003655298	15022001	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
PUNTA SECA	3002896521	7919612

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	0:15

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
03122024	1300000	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
17122024 09:00:00	N	Martes

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(•) Normal ( ) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
2:0	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente ○ Dentro de la empresa ◉ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ○ Almacenes o depósitos
- ◉ Áreas de producción
- ○ Áreas recreativas o deportivas
- ○ Corredores o pasillos
- ○ Escaleras
- ○ Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ○ Oficinas
- ○ Otras áreas comunes
- ○ Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ○ Cabeza
- ○ Ojo
- ○ Cuello
- ○ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ○ Tórax
- ○ Abdomen
- ○ Miembros superiores
- ○ Manos
- ◉ Miembros inferiores
- ○ Pies
- ○ Ubicaciones múltiples
- ○ Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ○ Fractura
- ○ Luxación
- ○ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ○ Conmoción o trauma interno
- ○ Amputación o ennucleación
- ○ Herida
- ○ Trauma superficial
- ◉ Golpe contusión o aplastamiento
- ○ Quemadura
- ○ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ○ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ○ Asfixia
- ○ Efecto de la electricidad
- ○ Efecto nocivo de la radiación
- ○ Lesiones múltiples
- ○ Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ○ Máquinas y/o equipos
- ○ Medios de transporte
- ○ Aparatos
- ◉ Herramientas, implementos o utensilios
- ○ Materiales o sustancias
- ○ Radiaciones
- ○ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ○ Otros agentes no clasificados
- ○ Animales (vivos o productos animales)
- ○ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ○ Caída de personas
- ○ Caída de objetos
- ○ Pisadas, choques o golpes
- ○ Atrapamientos
- ○ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ○ Exposición o contacto con temperatura extrema
- ○ Exposición o contacto con la electricidad
- ○ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ◉ Golpes por o contra objetos
- ○ Otro

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA DESARMANDO LOS TABLEROS DE MADERA CON MARTILLO, CUANDO SE DISPONÍA A DESARMAR UNA TABLA, ESTE CALCULA MAL PEGÁNDOSE CON EL MARTILLO EN LA PIERNA IZQUIERDA, CAUSANDO FUERTE DOLOR

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? ○ Si ◉ No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado) — Documento de identidad — No.

Apellidos y nombres: SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO — ◉ CC ○ TI ○ CE ○ NU ○ PA — 1067280132

Cargo: COORDINADOR SST

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente: 18-12-2024 07:00:19

Fecha de recibido en ARL SURA: 18-12-2024 07:00:19

ARL SURA RECIBIDO

Fecha Impresión: 18-12-2024 07:00:30

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	330	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: PORVENIR — Código AFP: 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

Nombre o razón social

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901811441

Dirección	Teléfono	Fax
CL 42 # 7 - 40	3114269116	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
LEU.1973@HOTMAIL.COM	CORDOBA	MONTERIA	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5411201

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES

Dirección	Teléfono	Fax
CR 25 AV LA ESMERALDA	3114269116	7919612

Departamento	Municipio	Zona
SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
RINCO	SUAREZ	EDER LUIS

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1005708714	16121999	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
GUAYABAL	3113795231	7919612

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	3:9

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
25082024	1300000	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
26112024 11:15:00	N	Martes

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(•) Normal ( ) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
4:15	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente ○ Dentro de la empresa ◉ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ○ Almacenes o depósitos
- ◉ Áreas de producción
- ○ Áreas recreativas o deportivas
- ○ Corredores o pasillos
- ○ Escaleras
- ○ Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ○ Oficinas
- ○ Otras áreas comunes
- ○ Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ○ Cabeza
- ○ Ojo
- ○ Cuello
- ○ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ○ Tórax
- ○ Abdomen
- ◉ Miembros superiores
- ○ Manos
- ○ Miembros inferiores
- ○ Pies
- ○ Ubicaciones múltiples
- ○ Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ○ Fractura
- ○ Luxación
- ◉ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ○ Conmoción o trauma interno
- ○ Amputación o ennucleación
- ○ Herida
- ○ Trauma superficial
- ○ Golpe contusión o aplastamiento
- ○ Quemadura
- ○ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ○ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ○ Asfixia
- ○ Efecto de la electricidad
- ○ Efecto nocivo de la radiación
- ○ Lesiones múltiples
- ○ Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ◉ Máquinas y/o equipos
- ○ Medios de transporte
- ○ Aparatos
- ○ Herramientas, implementos o utensilios
- ○ Materiales o sustancias
- ○ Radiaciones
- ○ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ○ Otros agentes no clasificados
- ○ Animales (vivos o productos animales)
- ○ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ○ Caída de personas
- ○ Caída de objetos
- ○ Pisadas, choques o golpes
- ○ Atrapamientos
- ◉ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ○ Exposición o contacto con temperatura extrema
- ○ Exposición o contacto con la electricidad
- ○ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ○ Golpes por o contra objetos
- ○ Otro

SOBREESFUERZO MUSCULAR ASOCIADO A MINIPULACIÓN DE CARGAS...

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA BAJANDO UNOS EQUIPOS (CERCHAS METÁLICAS) UBICADAS EN LA CARROCERÍA DEL VEHÍCULO TRANSPORTADOR, CUANDO SE DISPONÍA A BAJAR UNA CERCHA DE FORMA MANUAL EN EL HOMBRO, SE TROPIEZA CAUSANDO QUE LA CERCHA SE LE DESLIZARA Y LE OCASIONARA UN TIRÓN EN EL HOMBRO DERECHO.

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? ○ Si ◉ No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado) — Documento de identidad — No.

Apellidos y nombres: SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO — ◉ CC ○ TI ○ CE ○ NU ○ PA — 1067280132

Cargo: COORDINADOR SST

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

ARL | sura
02-12-2024 21:08:20
02-12-2024 21:08:20
RECIBIDO

Fecha Impresión 02-12-2024 21:08:28

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	330	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: PORVENIR — Código AFP: 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

Nombre o razón social

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901811441

Dirección	Teléfono	Fax
CL 42 # 7 - 40	3114269116	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
LEU.1973@HOTMAIL.COM	CORDOBA	MONTERIA	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5411201

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES

Dirección	Teléfono	Fax
CR 25 AV LA ESMERALDA	3114269116	7919612

Departamento	Municipio	Zona
SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
JULIO	MILLAN	MANUEL DE JESUS

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1131108476	01051993	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
PUNTA SECA	3116862127	7919612

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	2:8

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
01102024	1300000	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
09122024 11:00:00	N	Lunes

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(•) Normal ( ) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
4:0	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente ○ Dentro de la empresa ◉ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ○ Almacenes o depósitos
- ◉ Áreas de producción
- ○ Áreas recreativas o deportivas
- ○ Corredores o pasillos
- ○ Escaleras
- ○ Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ○ Oficinas
- ○ Otras áreas comunes
- ○ Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ○ Cabeza
- ◉ Ojo
- ○ Cuello
- ○ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ○ Tórax
- ○ Abdomen
- ○ Miembros superiores
- ○ Manos
- ○ Miembros inferiores
- ○ Pies
- ○ Ubicaciones múltiples
- ○ Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ○ Fractura
- ○ Luxación
- ○ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ○ Conmoción o trauma interno
- ○ Amputación o ennucleación
- ○ Herida
- ◉ Trauma superficial
- ○ Golpe contusión o aplastamiento
- ○ Quemadura
- ○ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ○ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ○ Asfixia
- ○ Efecto de la electricidad
- ○ Efecto nocivo de la radiación
- ○ Lesiones múltiples
- ○ Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ○ Máquinas y/o equipos
- ○ Medios de transporte
- ○ Aparatos
- ○ Herramientas, implementos o utensilios
- ◉ Materiales o sustancias
- ○ Radiaciones
- ○ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ○ Otros agentes no clasificados
- ○ Animales (vivos o productos animales)
- ○ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ○ Caída de personas
- ○ Caída de objetos
- ○ Pisadas, choques o golpes
- ○ Atrapamientos
- ○ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ○ Exposición o contacto con temperatura extrema
- ○ Exposición o contacto con la electricidad
- ○ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ○ Golpes por o contra objetos
- ◉ Otro

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO CORTE DE VARILLAS CON PULIDORA, CUANDO ESTABA HACIENDO EL PROCEDIMIENTO DE CORTE, LE CAYO UNA ESQUIRLA EN EL OJO DERECHO, CAUSÁNDOLE MOLESTIA

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente? ○ Si ◉ No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

Apellidos y nombres: SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO — Documento de identidad: ◉ CC ○ TI ○ CE ○ NU ○ PA — No.: 1067280132

Cargo: COORDINADOR SST

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

ARL | sura
09-12-2024 14:55:16
09-12-2024 14:55:16
RECIBIDO

Fecha Impresión 09-12-2024 14:55:26

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Anexo 12, Cálculo de indicadores de accidentalidad directos

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO TRABAJADORES DIRECTOS

Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Interpretación	Periodicidad Mínima	RESULTADOS											
					ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	Mensual						0%	0%	1%	2%	4%	2%	3%
Proporcion	Proporción de accidentes de trabajo mortale	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Anual						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	Mensual						0%	0%	3%	19%	11%	2%	5%
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	Mensual						0%	0%	8%	71%	54%	21%	54%

FORMULA FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Frecuencia de accidentalidad	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Numerador						0	0	1	2	4	2	3
Denominador						18	11	80	88	108	99	91
Resultado						0%	0%	1%	2%	4%	2%	3%
Interpretación	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron cero 0 accidentes de trabajo											

FORMULA SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Severidad de accidentalidad	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Numerador						0	0	2	17	12	2	5
Denominador						18	11	80	88	108	99	91
Resultado						0%	0%	3%	19%	11%	2%	5%
Interpretación	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo											

FORMULA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000

Prevalencia de la enfermedad laboral	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	TERMINACIÓN DEL PROYECTO
Numerador						0	0	0	0	0	0	0	0
Denominador						18	11	80	88	108	99	91	70,71428571
Resultado						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Interpretación	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z												

FORMULA AUSENTIMOS POR CAUSA MEDICA												
(Número de dias de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de dias de trabajo programados en el mes) * 100												
Ausentismo por causa médica	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Numerador						0	0	2	17	13	5	13
Denominador						20	24	24	24	24	24	24
Resultado						0%	0%	8%	71%	54%	21%	54%
Interpretación	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica											

FORMULA INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL													
(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000													
Incidencia de la enfermedad laboral	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	TERMINACIÓN DEL PROYECTO
Numerador						0	0	0	0	0	0	0	0
Denominador						18	11	80	88	108	99	91	70,71428571
Resultado						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Interpretación	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z												

FORMULA PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES													
Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100													
ACCIDENTES MORTALES	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	TERMINACIÓN DEL PROYECTO
Numerador						0	0	0	0	0	0	0	0
Denominador						0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#¡DIV/0!
Interpretación	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales												

Anexo 13, Acta entrega de epp y dotación

Hoja 2

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSION: 1 CODIGO: SST - F -045 PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN																	Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	Segunda del año	Tercera del año	Cascos de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos tipo copa	Protectores Auditivos de inserción	Protector respiratorio	Camisa manga larga	Overol	Botas Pantaneras punta acerada	Botas de cuero con punta acerada	Guantes de Vaqueta	Guantes de carnaza	Arnés de seguridad	Careta para soldar	Peto y polaina soldar	Chaleco reflectivo	
02/12/2024	Alexander Vargas	1131108085	✓															✓						Alexander Vargas
02/12/2024	Wilfrido Marquez	15621843	✓						✓									✓						Wilfrido Marquez
02/12/2024	Yaner Bravo	1193543998	✓						✓															Yaner Bravo
02/12/2024	Oscar Chica	1131104582	✓						✓									✓						Oscar Chica
02/12/2024	Diego Barrera	15725762	✓															✓						Diego B
02/12/2024	Edwer Vargas	1003655340	✓															✓						Edwer Vargas
03/12/24	Juan Cardenas	1007245363	✓					✓																Juan C.
03/12/24	Diban Madrid	1193787173	✓						✓															Juan M.R.
03/12/24	Jose Angel Perez	1005662830	✓						✓									✓						J. Perez
03/12/24	Manuel Julio	1131108476	✓															✓						Manuel
03/12/24	Daniel Montero	1129504510	✓															✓						Daniel
05/12/24	William de Agosto	1067400596	✓															✓						William
06/12/24	Jean Coa	15620161	✓															✓						Jean Coa
06/12/24	Diego Barrera	15725762	✓															✓						Diego B
06/12/24	Cristian Malanaga	1032522613	✓															✓						Cristian
06/12/24	Faider Vargas	1003655340	✓															✓						Faider
06/12/24	Diban Arias	1131104002	✓															✓						Diban
07/12/24	Kenya Durango	1131107550	✓															✓						Kenya
09/12/24	Yaner Bravo	1193543998	✓															✓						Yaner Bravo
13/12/24	Javier Chamorro	92840310	✓															✓						Javier
13/12/24	Juan Cardenas	1007245363	✓															✓						Juan C.
13/12/24	Jesus Salvador	1131129655	✓															✓						Jesus

COMPROMISO:
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88, DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el area de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

Bloque 2 GPP

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	VERSION: 1 CODIGO: SST - F -045 PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN															Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	Segunda del año	Tercera del año	Cascos de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos tipo copa	Protectores Auditivos de inserción	Protector respiratorio	Camisa manga larga	Overol	Botas Protectoras punta acerada	Botas de caucho con punta acerada	Guantes de Nitrilo	Guantes de carnaza	Arnés de seguridad	Coraza para soldar	Pala y polainas soldar	Otros(s) relleno	
14/12/24	Cesar Zubiria	1003655798	✓															✓	✓					Cesar Z.P.
14/12/24	Jose Perez	1005662930	✓						✓									✓						Jose Angel P
14/12/24	Camilo Zuñiga	1005708765	✓															✓						
14/12/24	Cristian Holguin	1032522613	✓															✓						
14/12/24	Yamer Bravo	1193543998	✓															✓						Yamer Bravo C.
14/12/24	Jean Carlos Coa	15620168	✓															✓						C.C.O.A.R
14/12/24	Ruban Arias	1131104002	✓															✓						Ruban Arias M.
14/12/24	William de Agos	1067405946	✓															✓						
14/12/24	Daniel Perez	1192744990	✓															✓						
14/12/24	Jairo Ramos	18857561	✓															✓						Jairo Ramos
14/12/24	Jean Cardona S.	1003245563	✓															✓						Jean C.
20/12/24	Alfredo Vargas	15621843							✓									✓						Alfredo Vargas
28/12/24	Camilo Zuñiga	1005708765	✓						✓									✓						
28/12/24	Yamer Bravo	1193543998	✓						✓															Yamer Bravo Castro
28/12/24	Jaime Carrascal	78076914	✓						✓															
18/12/24	Javier Chamorro								✓															Javier Ch.
19/12/24	Javier Chamorro	92640310	✓															✓						Javier Ch.
19/12/24	Daniel Montero	1199504510	✓															✓						
20/12/24	William de Agosta	1067405946	✓															✓						William
20/12/24	Alexander Vargas	1131108988																						Alexander
20/12/24	Juan Madrid	1193087173																						Juan Mad.
20/12/24	Jean Coa	15620168	✓															✓						C.C.O.A.R

Confidencial: Me comprometo a utilizar los elementos durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos. Usandolos correctamente y abandonar los protección personal brindo ayuda mia de trabajo estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979, Art. 84, DECRETO 1295 DE 1994, Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP, reconozco que de venir laborando en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso queda archivado en el área de seguridad y salud en el trabajo como asimismo de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

Plomería

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VERSION: 1
CODIGO: SST - F -045
PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN																Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	Segunda del año	Tercera del año	Casco de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos Tipo Copa	Protectores Auditivos de Insercion	Protector respiratorio	Careta manga larga	Overol	Botas Pantanera para acueducto	Botas de caucho con punta de acero	Guantes de Nitrilo	Guantes de carnaza	Arnes de seguridad	Chaleco para soldar	Peto y polainas soldar	Chaleco reflectivo	
04/11/2024	Eliecer Garzon		✓						✓									✓						
04/11/2024	Ezequiel picott.		✓															✓						Ezequiel picott G.
06/11/24	Oscar Herrera		✓						✓									✓						
20/11/24	Ezequiel picott		✓						✓									✓						Ezequiel picott
22/11/24	Danilo Polo		✓															✓						Danilo Polo
25/11/24	Oscar Herrera	78794837	✓														✓							Oscar Herrera
20/11/24	Jorge Garzon		✓															✓						
30/11/24	Eliecer Garzon		✓															✓						
02/12/2024	Omar Cardenas	92227580	✓															✓						OMAR CK.
03/12/24	Danilo Polo	8743873	✓						✓									✓						Danilo Polo
03/12/24	Manuel Miranda.	1064309595	✓						✓															Manuel Miranda
06/12/24	Jorge Garzon	15682314	✓															✓						Jorge Eliecer
14/12/24	Manuel Miranda	1064309595	✓															✓						Manuel Miranda
14/12/24	Danilo Polo.	8743873	✓															✓						Danilo Polo
18/12/24	Oscar Mesa.	1131104582	✓															✓						Oscar Mesa
19/12/24	Eliecer Garzon	15682314	✓															✓						Jorge Eliecer

Empleado:
Me comprometo a usar los implementos de protección personal de forma adecuada y mantenerlos en buen estado. Cumplir completamente a las normas de salud ocupacional que establezcan a mi labor tanto Física, metodológica y mental. Declaro que la anterior información sobre el uso adecuado de los mismos. Usando los equipos y herramientas de protección personal mientras trabaje y cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO (art. 56 y Art. 58 numeral 7) LEY 1562 (art. 30, DECRETO 1295 DE 1994 Art. 21 Son obligaciones del afiliado y cotizante: de los CPS prestados por la entidad, en todas partes, o dependencias. El presente compromiso lo suscribo en el área de seguridad y salud en el trabajo como actividad de inducción y reinducción del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del HOSPITAL DE LOS MORROSQUILLO SUCRE

RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

EPP

Bloque 1.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSION: 1 CODIGO: SST - F -045 PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN																Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	Segunda del año	Tercera del año	Cascos de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos tipo copa	Protectores Auditivos de inserción	Protector respiratorio	Camisa manga larga	Overol	Bocas Panalonoras punta reforzada	Botas de cuero con punta acerada	Guantes de Vaqueta	Guantes de camisa	Arnés de seguridad	Careta para soldar	Peto y polaina soldar	Chaleco reflectivo	
29/11/24	Ricardo Manjarrez	1007564070	✓															✓						
29/11/24	Hugo Garay	1005708729	✓															✓						
29/11/24	Gabriel Moreno	1072529607	✓						✓									✓						
29/11/24	Julio Posso	1072522158	✓						✓									✓						
29/11/24	Jorge Morelo	1072523581	✓						✓									✓						
29/11/24	Andres Avila	1131108993	✓															✓						
29/11/24	Carlos Mestra	1005708548	✓															✓						
29/11/24	Marlo Atencio	1193556241	✓						✓									✓						
29/11/24	Jorge Cantillo	1047043732	✓						✓									✓						
29/11/24	Eduardo Arrieta	1231105563	✓						✓									✓						
02/12/24	Adam Valencia	8769402	✓															✓						
05/12/24	Tian Doria	1064380879	✓															✓						
06/12/24	Hugo Garay	1005708729	✓															✓						
09/12/24	Hugo Garay	1005708729		✓					✓									✓						
09/12/24	Ani Sugrch	1007245380	✓															✓						
10/12/24	Prado Manjarrez	1003564080	✓															✓						
11/12/24	Eduardo Arrieta	1131105563	✓															✓						
12/12/24	Leonardo Parra	15620960	✓															✓						
13/12/24	Hugo Garay	1005708729	✓															✓						
13/12/24	Andres Avila	1131108993	✓															✓						
13/12/24	Julio Posso	1072522158	✓															✓						
14/12/24	Carlos Mestra	1005708548	✓															✓						

Comentarios:

Me comprometo a usar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen al bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos. Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador dictados en la ley a través de la siguiente norma vividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 84; DECRETO 1295 DE 1994, Art. 32. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP, mismo no cierra de verse firmado en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el área de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

RESPONSABLE

625 / 705

Escaneado con CamScanner

Bloque 3.
EPP.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSION: 1 CODIGO: SST - F -045 PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA	NOMBRE DEL EMPLEADO	CÉDULA	TIPO DE ENTREGA					ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN																		Firma
			Reposición	Perdida	ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año	ENTREGA PERIÓDICA: Segunda del año	ENTREGA PERIÓDICA: Tercera del año	Cascos de seguridad	Gafas de seguridad	Protección facial	Protectores Auditivos tipo copa	Protectores Auditivos de Inserción	Protector respiratorio	Camisa manga larga	Overol	Botas Pantaneras punta acerada	Botas de cuero con punta acerada	Guantes de Vaqueta	Guantes de carnaza	Arnés de seguridad	Careta para soldar	Peto y polaina soldar	Chaleco reflectivo	
11/12/24	Jairo Ramos.	18857561	✓															✓							Jairo Ramos
11/12/24	Eva Fontes	92539319	✓															✓							Eva Fontes A.
11/12/24	Johan Zuñiga	1131010360	✓															✓							
11/12/24	Ivan Cardy																								
11/12/24	Pedro Murillo.	92789029	✓															✓							Pedro Murillo
12/12/24	Carlos Sierra	1131105681.	✓															✓							Carlos Sierra
12/12/24	Johnny Doria.	15034491	✓															✓							Johnny
12/12/24	Adnan Diaz.	1007245348	✓					✓										✓							Adnan
12/12/24	Angelvis Conco	15620552	✓															✓							Angelvis de
12/12/24	Yeiner Hernandez			✓														✓							Yeiner Hernandez
16/12/24	Carlos Sierra			✓														✓							Carlos Sierra
16/12/24	Alberto Baba			✓														✓							
16/12/24	Adnan Diaz.	1007245348	✓															✓							Adnan
16/12/24	Juan Gaby	1193142435	✓															✓							
17/12/24	Abraham Palmquez	1193043889	✓															✓							
17/12/24	Pedro Marquez	1131107808	✓															✓							Pedro Marquez P.
18/12/2024	Yeiner Hernandez.	1003561521	✓															✓							Yeiner Hernandez
18/12/2024	Abraham Palmquez	1193043889	✓					✓										✓							
18/12/2024	Esmeralda Peralta	1056788788	✓															✓							

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley o través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979, Art. 84, DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo sabiendo de verme incurso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el área de seguridad y salud en el trabajo como evidencia de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

Anexo 14 – Registros de Inspecciones de seguridad y cronograma de inspecciones

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS**	**version 1**

TIPO DE CRONOGRAMA: INSPECCIONES PLANEADAS **PERIODO CRONOGRAMA:** MENSUAL

OBJETO "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	JUNIO 2024								JULIO 2024								AGOSTO 2024							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada											A	E			A	E			A	E			A	E
Inspección de maquinaria	SEMANAL														A	E							A	E		
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL														A	E							A	E		
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL														A	E							A	E		
Inspección de orden y aseo	SEMANAL										A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL														A	E							A	E		
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL														A	E							A	E		
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL														A	E							A	E		
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA										A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA										A	NA	A	E	A	NA	A	NA	A	E	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA										A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA										A	NA	A	E	A	NA	A	NA	A	NA	A	E	A	NA	E	E
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA										A	NA	A		A	NA	A	NA	A	E	A	E	A	E	A	E
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL														A	NA							A	NA		
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA										A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	SEPTIEMBRE 2024								OCTUBRE 2024								NOVIEMBRE 2024							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A	E			A	E			A	E			A	E			A	E			A	E
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A	E							A	E							A	E		
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A	E	A	NA	A	NA	A	NA	A	E	A	E	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	E	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	DICIEMBRE 2024								ENERO 2025								FEBRERO 2025							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A	E			A	E			A				A				A				A	
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A	E							A								A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A	E							A								A			
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A	E							A								A			
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A	E	A	E	A	E	A	E	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A	E							A								A			
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A	E							A								A			
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A	E							A								A			
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	E	A	NA	A	NA	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A		A		A		A		A		A		A		A	
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A	E							A								A			
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A		A		A		A		A		A		A		A	

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	MARZO 2025								ABRIL 2025								MAYO 2025							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A				A				A				A				A				A	
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A								A								A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A								A								A			
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A								A								A			
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	JUNIO 2025								JULIO 2025								AGOSTO 2025							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A				A				A				A				A				A	
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A								A								A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A								A								A			
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A								A								A			
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	SEPTIEMBRE 2025								OCTUBRE 2025								NOVIEMBRE 2025							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A				A				A				A				A				A	
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A								A								A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A								A								A			
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A								A								A			
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	DICIEMBRE 2025								ENERO 2026								FEBRERO 2026							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A				A				A				A				A				A	
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A								A								A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A								A								A			
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A								A								A			
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	

CONTROL DE DOCUMENTO			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
FIRMA ESPECIALISTA:		FIRMA REP. LEGAL:	
NOMBRE	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	NOMBRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA
CARGO	PROFESIONALSST	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION 1
	INSPECCION KIT ANTIDERRAME	SST COD F034
		PAG. 1 DE 1

Proyecto: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DATOS BÁSICOS				KIT ANTIDERRAME / KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS															
N° IDENTIFICACIÓN DEL KIT / UBICACIÓN:				Campamento.															
FECHA INSPECCIÓN:				02/12/24.			09/12/24.			16/12/24.									
N°	COMPONENTES	Unidad	Cantidad Mínima	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F	
1	Ubicación (Protección condiciones ambientales)	Und	1	✓			✓			✓									
2	Señalización y visibilidad			✓			✓			✓									
3	Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso)			✓			✓			✓									
4	Estado de empaque (maletín o barril...)	Und	1	✓			✓			✓									
5	Maletín / Contenedor	Und	1	✓			✓			✓									
6	Bolsas Rojas	Und	2	✓			✓			✓									
7	Paño Absorbente tela Oleofílica	Und	1	✓			✓			✓									
8	Pala plástica	Und	1	✓			✓			✓									
9	Cinta de Señalización	Und	1	✓			✓			✓									
10	Etiquetas de residuos peligrosos					✓			✓		✓								
11	Overol Tyvek					✓			✓		✓								
12	Gafas de seguridad	Und	1	✓			✓			✓									
13	Guantes de Nitrilo	Und	1	✓			✓			✓									
14	Mascarilla protección vapores orgánicos	Und	1	✓			✓			✓									
15	Otros	Und		✓			✓			✓									

Convenciones: B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

FIRMA DE INSPECTOR:	Stephanny G.			Stephanny G.			Stephanny G.					
CUMPLIMIENTO: Yo como autoridad en SST del área he verificado que el elemento inspeccionado cumple para permanecer en sitio	X	NO (Debe ser retirado del área y notificado a la jefe inmediato)		NO (Debe ser retirado del área y notificado a la jefe inmediato)		NO (Debe ser retirado del área y notificado a la jefe inmediato)		NO (Debe ser retirado del área y notificado a la jefe inmediato)		NO (Debe ser retirado del área y notificado a la jefe inmediato)		

	OBSERVACIONES				
Descripción					

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Tronzadora			SERIE:	—0— D28720B3
ACTIVIDAD:	Corte de acero			MARCA:	Dewalt
SEMANA DEL	02/12/2024	AL	07/12	DE	2024.

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

	Stephanny Garay	
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Tronzadora			SERIE:	—G— D2872083
ACTIVIDAD:	Corte de acero.			MARCA:	Dewalt
SEMANA DEL	09/12	AL	14/12	DE	2024.

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

Abraham Rodriguez	Stephany Garay	
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Tronzadora		**SERIE:**	00212622.	
ACTIVIDAD:			**MARCA:**	Makita	
SEMANA DEL	09/12/2024	**AL** 14/12	**DE**	2024	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?			
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

SEGUIMIENTO

Arnol Marquez	Stephanny E.	
FIRMA DEL OPERADOR	**FIRMA AUXILIAR SST**	**FIRMA SUPERVISOR SST**
NOMBRE	**NOMBRE**	**NOMBRE**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Tronzadora		**SERIE:**	002126 22.	
ACTIVIDAD:			**MARCA:**	Makita.	
SEMANA DEL	02/12	**AL** 07/12	**DE**	2024.	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

Anilva Suarez	Stephanny G.	
FIRMA DEL OPERADOR	**FIRMA AUXILIAR SST**	**FIRMA SUPERVISOR SST**
NOMBRE	**NOMBRE**	**NOMBRE**

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	CÓDIGO	SST-F033
		VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

EQUIPO: Mezcladora. MARCA: —

SEMANA: DESDE 14 / 12 / · HASTA ___ / ___ / ___

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Llantas en buen estado					✓		✓		✓					
Ejes en buen estado (Sin torceduras)					✓		✓		✓					
Estructura de soporte en buena condición					✓		✓		✓					
* Balinera y bujes de rotación					✓		✓		✓					
* Mecanismo de giro para vaciado					✓		✓		✓					
* Palanca de giro para vaciado					✓		✓		✓					
* Seguro en buen estado					✓		✓		✓					
Corona de rotación del trompo					✓		✓		✓					
Patas de anclaje en buenas condiciones					✓		✓		✓					
*Motor en buena condicion					✓		✓		✓					
Tubo de escape en buena condicion					✓		✓		✓					
Estado de pasadores (bastidor)					✓		✓		✓					
* Resguardos correas motor.					✓		✓		✓					
* Resguardos mecanismos de giro trompo					✓		✓		✓					
Tapa del motor con seguro					✓		✓		✓					
Clutch de giro del trompo					✓		✓		✓					
Corona de arranque del motor					✓		✓		✓					
Control de fugas de combustible					✓		✓		✓					
Control de fugas hidraulicas					✓		✓		✓					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI NO Resp. De correccion:

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguros	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL COORDINADOR SST	FIRMA DEL SUPERVISOR SST	FIRMA DEL OPERADOR
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F16
	INSPECCION EXTINTOR	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA INSPECCIÓN	20/Dic/2024.		
COORDINADOR SST	Jairo Segura	AUXILIAR SST	Stephanny Garay.

TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA ACTUAL	FECHA PROXIMA	UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR															
						PRESIÓN		ETIQUETA		MANÓMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		PALANCA		MANGUERA		BOQUILLA		PERNO	
						B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABC	Polvo Químico Seco	10 libras			Bodega.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONVENCIONES: B (Bueno) M (Malo)

#	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN
1					
2					
3					
4					

Partes de un extintor



Observaciones

Perno y sello: El perno que bloquea la manija del extintor en su lugar tiene que estar presente y no doblada o dañada de alguna manera, de lo contrario es necesario sustituirlo. El perno también debe tener un sello intacto alrededor de él, que significa que nadie haya utilizado el extintor y haya simplemente reemplazado el perno.

Medidor de presión: Si el extintor tiene un medidor de presión, compruébalo para ver si el extintor debe ser recargado. La aguja del indicador debería estar dentro de la parte verde del indicador. Un extintor que no tiene suficiente presión no podrá disparar su contenido de forma normal, causando que la lucha contra un incendio sea más peligrosa. Si la aguja indica que el extintor debe ser recargado, llama a un técnico de servicio profesional para que realice el trabajo. Algunos extintores no tienen un medidor de presión, pero el mismo se puede medir para asegurarse de que está correctamente presurizado.

Cilindro: El cilindro de metal del extintor de fuego debe estar intacto, o podrías experimentar problemas con el funcionamiento más tarde. Reemplaza el extintor si observas abolladuras, signos de oxidación o corrosión, depósitos o acumulación de químicos o cualquier otro signo de que el cilindro haya sido manipulado bruscamente. Un extintor dañado es potencialmente peligroso y debe manipularse lo menos posible.

Manguera y boquilla: La manguera y la boquilla en el extintor no deberían mostrar ninguna señal de daños o grietas, ya que esto también disminuirá el rango del extintor. La manguera podría lucir bien, pero si se aprieta suavemente podrás sentir si la manguera es frágil y quebradiza. Si la manguera o la boquilla están podridas o dañadas reemplaza el extintor para que puedas tenerlo en servicio profesional.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	VERSION. 1 Cod: SST-F024 PAG. 1 DE 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA	20 Dic 2024.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			NO/SI
		BUENO	MALA	NA	
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**				
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓			SI
2	Se encuentran en buen estado	✓			SI
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓			SI
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			NO
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓			SI
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**				
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			✓	
2	Los cinceles se encuentran afilados			✓	
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			✓	
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓	
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			✓	
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓	
7	Se usa correctamente por parte del trabajador	✓			SI
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			SI
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓			SI
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓			NO
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			✓	
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓	
2	Se observan en la llave huellas y palancas			✓	
3	Se dispone de llaves para golpear			✓	
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			✓	
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			✓	
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓			SI
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓	
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	✓			SI
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓			SI
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓			SI
3	Están limpia y lubricadas	✓			SI
4	Tienen sus guardas	✓			SI
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓			SI
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓			NO
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓			NO
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓			NO
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			✓	
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			✓	
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.			✓	
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓	✓	✓	NO
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**				
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	✓			SI
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	✓			SI
3	Se trabaja a las presiones indicadas			✓	
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓	

OBSERVACIONES

COORDINADOR SST

Stephanny Paray
AUXILIAR SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA SST-048
		Version 1

PROYECYO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA	MES DICIEMBRE · FECHA INICIAL 09 / 24 · FECHA FINAL 14 / 24 .

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

			EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo													
						DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
						B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1		**TEJIDO O CORREA**																
	1.1		FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.3		GRIETAS	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.5		DETERIORO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.6		CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.7		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.8		DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.9		PRESENCIA DE MOHO	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.10		OTROS	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	2		**COSTURAS**																
	2.1		CORTADURAS	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.2		DESHILACHAMIENTO	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.3		HILOS FALTANTES	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.4		QUEMADURAS	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.5		EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.6		OTROS			X		X		X		X		X		X		X		X	
	3		**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES**																
	3.1		CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.2		PICADURAS, GRIETAS	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.3		DETERIORO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.4		DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.5		CORROSIÓN	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.6		OTROS	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1		FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS																
	4.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	4.3		AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD																
	4.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	4.5		DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)																
	4.6		PIEZAS FALTANTES																
	4.7		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	4.8		PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS																
	4.9		OTROS																

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA SST-049
		Version 1

Sección	Ítem	Descripción								
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.6	PIEZAS FALTANTES	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.9	OTROS	X	X	X	X	X	X	X	X
CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	6.6	PIEZAS FALTANTES								
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.								
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS								
	6.9	OTROS								
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
	7.3	GRIETAS O PICADURAS								
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)								
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)								
	7.5	DETERIORO GENERAL								
	7.6	CORROSIÓN								
	7.7	PRESENCIA DE MOHO								
	7.8	OTROS								
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.5	ROTOS EN GUANTES	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.6	OTROS	X	X	X	X	X	X	X	X
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.2	PICADURAS, GRIETAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.3	PRESENTA DESGASTE	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.13	PRESENCIA DE MOHO	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	X	X	X	X	X	X	X	X

Vo.Bo. Coordinador Certificado Contratista	Nombre: Stephanny Garay	Cédula: 1.131.104.122	Firma: Stephanny G

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA SST-049
		Version 1

PROYECYO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA	MES DICIEMBRE · FECHA INICIAL 16/24 FECHA FINAL 21/24.

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

			EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1		**TEJIDO O CORREA**																
	1.1		FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.3		GRIETAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.5		DETERIORO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.6		CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.7		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.8		DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.9		PRESENCIA DE MOHO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.10		OTROS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2		**COSTURAS**																
	2.1		CORTADURAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.2		DESHILACHAMIENTO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.3		HILOS FALTANTES	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.4		QUEMADURAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.5		EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.6		OTROS			X		X		X		X		X		X		X	
	3		**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES**																
	3.1		CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.2		PICADURAS, GRIETAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.3		DETERIORO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.4		DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.5		CORROSIÓN	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.6		OTROS	X		X		X		X		X		X		X		X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1		FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS																
	4.2		CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	4.3		AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD																
	4.4		ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	4.5		DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)																
	4.6		PIEZAS FALTANTES																
	4.7		QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	4.8		PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS																
	4.9		OTROS																

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

ISA SST-049
Versión 1

Sección	No.	Ítem								
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.6	PIEZAS FALTANTES	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.9	OTROS	X	X	X	X	X	X	X	X
CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	6.6	PIEZAS FALTANTES								
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o areas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.								
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS								
	6.9	OTROS								
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
	7.3	GRIETAS O PICADURAS								
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)								
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)								
	7.5	DETERIORO GENERAL								
	7.6	CORROSIÓN								
	7.7	PRESENCIA DE MOHO								
	7.8	OTROS								
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.5	ROTOS EN GUANTES	X	X	X	X	X	X	X	X
	8.6	OTROS	X	X	X	X	X	X	X	X
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.2	PICADURAS, GRIETAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.3	PRESENTA DESGASTE	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.13	PRESENCIA DE MOHO	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	X	X	X	X	X	X	X	X

Vo.Bo. Coordinador Certificado Contratista	Nombre: Stephanny Garay	Cédula: 1.131.104.122	Firma: Stephanny G

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA SST-049
		Version 1

PROYECYO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA	MES DICIEMBRE · FECHA INICIAL 02/12/2024 FECHA FINAL 07/12/2024.

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	**TEJIDO O CORREA**																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.3	GRIETAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.5	DETERIORO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.9	PRESENCIA DE MOHO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.10	OTROS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2	**COSTURAS**																
	2.1	CORTADURAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.2	DESHILACHAMIENTO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.3	HILOS FALTANTES	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.4	QUEMADURAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.6	OTROS			X		X		X		X		X		X		X	
	3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES**																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.2	PICADURAS, GRIETAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.3	DETERIORO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.5	CORROSIÓN	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.6	OTROS	X		X		X		X		X		X		X		X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS																
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD																
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)																
	4.6	PIEZAS FALTANTES																
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS																
	4.9	OTROS																

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA SST-049
		Version 1

ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		X	X	X	X	X	X	X
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X		X	X	X	X	X	X	X
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X		X	X	X	X	X	X	X
	5.6	PIEZAS FALTANTES	X		X	X	X	X	X	X	X
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	X		X	X	X	X	X	X	X
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	5.9	OTROS	X		X	X	X	X	X	X	X
CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS									
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS									
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD									
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO									
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)									
	6.6	PIEZAS FALTANTES									
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.									
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS									
	6.9	OTROS									
MOSQUETONES Y MANUST	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)									
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD									
	7.3	GRIETAS O PICADURAS									
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)									
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)									
	7.5	DETERIORO GENERAL									
	7.6	CORROSIÓN									
	7.7	PRESENCIA DE MOHO									
	7.8	OTROS									
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	X		X	X	X	X	X	X	X
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	X		X	X	X	X	X	X	X
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	X		X	X	X	X	X	X	X
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	8.5	ROTOS EN GUANTES	X		X	X	X	X	X	X	X
	8.6	OTROS	X		X	X	X	X	X	X	X
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.2	PICADURAS, GRIETAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.3	PRESENTA DESGASTE	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.13	PRESENCIA DE MOHO	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		X	X	X	X	X	X	X
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	X		X	X	X	X	X	X	X

Vo.Bo. Coordinador Certificado Contratista	Nombre: Stephanny Garay	Cédula: 1.131.104.122	Firma: StephannyG

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA SST-049
		Versión 1

PROYECYO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA	MES DICIEMBRE FECHA INICIAL 23/24 FECHA FINAL 28/24

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1 TEJIDO O CORREA																
	1.1 FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS. Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.2 CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.3 GRIETAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.4 ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.5 DETERIORO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.6 CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICION A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.7 QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS. Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.8 DECOLORACIÓN DEL MATERIAL. Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.9 PRESENCIA DE MOHO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1.10 OTROS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2 COSTURAS																
	2.1 CORTADURAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.2 DESHILACHAMIENTO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.3 HILOS FALTANTES	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.4 QUEMADURAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.5 EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.6 OTROS	X		X		X		X		X		X		X		X	
ADAPTADOR DE ANCLAJE	3 ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1 CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.2 PICADURAS, GRIETAS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.3 DETERIORO GENERAL	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.4 DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.5 CORROSIÓN	X		X		X		X		X		X		X		X	
	3.6 OTROS	X		X		X		X		X		X		X		X	
	4.1 FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS																
	4.2 CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS																
	4.3 AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD																
	4.4 ESTIRAMIENTO EXCESIVO																
	4.5 DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)																
	4.6 PIEZAS FALTANTES																
	4.7 QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS. Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	4.8 PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS																
	4.9 OTROS																

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA SST-049 Version 1

					1	2	3	4	5	6	7
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X		B	B	B	B	B	B	B
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	X		B	B	B	B	B	B	B
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		B	B	B	B	B	B	B
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X		B	B	B	B	B	B	B
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X		B	B	B	B	B	B	B
	5.6	PIEZAS FALTANTES	X		B	B	B	B	B	B	B
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	X		B	B	B	B	B	B	B
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X		B	B	B	B	B	B	B
	5.9	OTROS	X		B	B	B	B	B	B	B
CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS									
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS									
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD									
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO									
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)									
	6.6	PIEZAS FALTANTES									
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.									
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS									
	6.9	OTROS									
MOSQUETONES Y MANUST	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)									
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD									
	7.3	GRIETAS O PICADURAS									
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)									
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)									
	7.5	DETERIORO GENERAL									
	7.6	CORROSIÓN									
	7.7	PRESENCIA DE MOHO									
	7.8	OTROS									
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	X		B	B	B	B	B	B	B
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	X		B	B	B	B	B	B	B
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	X		B	B	B	B	B	B	B
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	X		B	B	B	B	B	B	B
	8.5	ROTOS EN GUANTES	X		B	B	B	B	B	B	B
	8.6	OTROS	X		B	B	B	B	B	B	B
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.2	PICADURAS, GRIETAS	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.3	PRESENTA DESGASTE	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS.	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICION AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.13	PRESENCIA DE MOHO	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	X		B	B	B	B	B	B	B
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	X		B	B	B	B	B	B	B

Vo.Bo. Coordinador Certificado Contratista	Nombre: Stephanny Garcy	Cédula: 1 131 104 122	Firma: Stephanny G.

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 1
		Cod: SST-F19
	INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO PUO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA INSPECCION:	20/12/2024.

NOMBRES Y APELLIDOS	LISTA DE VERIFICACION																				ACCIÓN CORRECTIVA
	CASCO		TAPABOCAS		GAFAS		ARNES DE SEGURIDAD		VIAS FACIAL		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION AUDITIVA		GUANTES VAQUETA		GUANTES NITRILO		OVEROL		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		BOTAS PANTANERAS		CHALECO		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Abraham Rodriguez.	✓		✓		✓		✓								✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Adrian Diaz Zarza.	✓		✓		✓			✓							✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Carlos Mario Siera	✓		✓		✓			✓								✓			✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Yeiner Hernandez Suarez	✓		✓		✓			✓								✓			✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Juan David Ramos Diaz.	✓		✓		✓			✓								✓			✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Jhonny Doria Molina.	✓		✓		✓			✓							✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Heladoro Prada Pelgrino.	✓		✓		✓			✓							✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Gabriel Moreno Arana	✓		✓		✓			✓							✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Julio Rosso.	✓		✓		✓			✓							✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Pedro Marquez Pelegrino.	✓		✓		✓			✓								✓			✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Jhon Jairo Barquet	✓		✓		✓			✓								✓			✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Yobani Sebastian Zuñiga.	✓		✓		✓			✓							✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Juan Dario Garay Olivo	✓		✓		✓		✓								✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Gustabo Ramos Diaz	✓		✓		✓		✓								✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Luis Arbulda Agras	✓		✓		✓		✓								✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Javier Chamorro Estrada	✓		✓		✓		✓								✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Daniel Monterrosa Gonzalez	✓		✓		✓		✓								✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Oscar Miguel Cavil	✓		✓		✓		✓								✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Leonardo Ruega Garrido	✓		✓		✓		✓								✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Pedro Miguel Fernandez	✓		✓		✓			✓							✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Erna Chica Monterrosa.	✓		✓		✓			✓							✓				✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Cristhan Malanaga Lacles	✓		✓		✓			✓								✓			✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Germán Peralta Cardenas	✓		✓		✓			✓								✓			✓				✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL

B: BUEN ESTADO - M: MAL ESTADO

RESPONSABLES:			
NOMBRE:	Luis Salgado.	NOMBRE	Stephanny Garay
FIRMA COORDINADOR SST	Luis Salgado.	FIRMA AUXILIAR SST	Stephanny Garay.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 1
		Cod: SST-F19
	INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA INSPECCION:	20/12/2024.

NOMBRES Y APELLIDOS	LISTA DE VERIFICACION																										ACCIÓN CORRECTIVA
	CASCO		TAPA OIDOS		BARBIQUEJO		GAFAS DE SEGURIDAD		VISOR FACIAL		PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION AUDITIVA		GUANTES TIPO CARNAZA		GUANTES MATERIAL		OVEROL		CAMISA		BOTAS DE SEGURIDAD		BOTAS PANTANERAS		OVALLOS		
	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	
Eduardo Prieto Petersing	✓		✓				✓								✓				✓		✓		✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Ana Luz Suarez Morales	✓		✓				✓								✓				✓		✓		✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Jorge castillo Gutierrez	✓		✓				✓									✓			✓		✓			✓	✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Carlos Sarmiento Torres	✓		✓				✓									✓			✓		✓			✓	✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
William De Agustin Hernandez	✓		✓				✓									✓			✓		✓			✓	✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Jean Carlos Cardenas	✓		✓				✓								✓				✓		✓		✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Fausto Vargas Ricardo.	✓		✓				✓								✓				✓		✓		✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Manuel Julio Millan.	✓		✓				✓								✓				✓		✓		✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Duban J Arias Madrid	✓		✓				✓								✓				✓		✓		✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Eusebio Viloria Sanes.	✓		✓				✓									✓			✓		✓		✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Osvaldo Urango Hernandez	✓		✓				✓								✓				✓		✓		✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL
Eduardo Palma Aparicio	✓		✓				✓									✓			✓		✓		✓		✓				REPOSICION: GUANTES GAFAS CUBRE BOCA CASCO BOTAS CAMISA OVEROL

B: BUEN ESTADO - M: MAL ESTADO

RESPONSABLES:			
NOMBRE	Luis Salgado.	NOMBRE	Stephanny Garay
FIRMA COORDINADOR SST	Luis Salgado	FIRMA AUXILIAR SST	Stephanny Garay

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Pulidora.			SERIE:	— 0 —
ACTIVIDAD:	Corte de acero			MARCA:	Dewalt.
SEMANA DEL	23/12	AL	28/12	DE	2024

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general de la gula y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO Jaime Carrascal 21

Jaime Carrascal	Stephanny Garay	Luis Salgado
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE Jaime Carrascal.	NOMBRE Stephanny G.	NOMBRE Luis Salgado.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Tronzadora.			SERIE:	— o —
ACTIVIDAD:	Corte de acero			MARCA:	Dawalt.
SEMANA DEL	23/12	AL	28/12	DE	2024.

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓				✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		\		✓		\	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓			\	✓			\
Estado del mango	✓		✓		✓		✓			\	✓			\
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		\		✓		\	
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓			\	✓			\
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓			\	✓			\
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓				✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓				✓			
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

Pedro Martinez P	Stepharny Caray	Luis Salgado
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE	NOMBRE Stepharny Caray	NOMBRE Luis Salgado.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Tronzadora			SERIE:	—0—
ACTIVIDAD:	Corte de acero.			MARCA:	Makita.
SEMANA DEL	23/12	AL	28/12	DE	2024.

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

Ani Luz Suarez	Stephanny Garay	Luis Salgado.
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE Ani Luz Suarez	NOMBRE Stephanny Garay.	NOMBRE Luis Salgado.

Anexo 15, Inspección – listado de sustancias químicas

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INVENTARIO E INSPECCION SUSTANCIAS QUIMICAS	Version. 1 Cod: SST-F11 Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
AREA O FRENTE INSPECCIONADO:	Obra hospital
FECHA INSPECCION:	20/12/2024.

LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	Nº	INSPECCION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	ACCIONES DE MEJORA	OBSERVACIONES
Aceite	1	El piso del depósito de productos químicos es plano, para un manejo sencillo y seguro y evitar derrames	✓			
Gasolina	2	Está suficientemente identificado y correctamente señalizado las sustancias químicas	✓			
CAL.	3	Se dispone de las fichas de seguridad de todos las sustancias químicas que se utilizan	✓			
Cemento	4	Las hojas de seguridad del producto químico están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando.	✓			
	5	Las personas que manipulan las Sustancias Químicas, cuentan con los respectivos EPP (guantes, tapabocas con cartuchos, monogafas)	✓			
	6	Conocen las personas que tienen contacto con las sustancias químicas las hojas de seguridad.	✓			
	7	Se cumplen con las indicaciones de almacenaje de las sustancias químicas según las hojas de seguridad que entregan los proveedores.	✓			
	8	Se almacenan las sustancias químicas agrupando los que tienen riesgos comunes y evitando proximidad con incompatibles.	✓			
	9	Los estantes donde se almacenan las sustancias químicas están debidamente anclados para evitar derrames.	✓			
	10	Son totalmente seguros los envases de sustancias químicas que se utilizan	✓			
	11	Los residuos de envases de productos químicos se almacenan y disponen adecuadamente.	✓			
	12	Se evita transvasar productos químicos a otros envases y si se realiza, se etiqueta o rotula.	✓			
	13	El Cuarto de almacenamiento cuenta con suficiente iluminación y ventilación.	✓			
	14	El cuarto de almacenamiento debe tener paredes y pisos impermeables de facil limpieza.	✓			
	15	Se cuenta con Kits antiderrames para controlar un eventos por derrames de Sustancias Químicas	✓			
	15	Se cuenta con mínimo 1 extintor multiproposito ABC en el frente de obra o lugar de almacenamiento en caso de incendio.	✓			
	17	Se transportan las sustancias químicas teniendo encuenta las indicaciondes de la ficha tecnica.	✓			
	18	Se manipulan las sustancias quimicas a distancia de cualquier equipo electico o electronico que puedan general chispas o energia estatica.	✓			
	19	Se controla el acceso al espacio donde se deponen las suetancias químicas (PROHIBIDO ENTRADA)	✓			

RESPONSABLES:	
FIRMA COORDINADOR SST	Stephanny Garay FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION 1
	INSPECCION KIT ANTIDERRAME	SST COD F034
		PAG. 1 DE 1

Proyecto: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DATOS BÁSICOS				KIT ANTIDERRAME / KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS															
N° IDENTIFICACIÓN DEL KIT / UBICACIÓN:				Campamento.															
FECHA INSPECCIÓN:				04/11/24.			11/11/24.			18/11/24			25/11/24.			dd/mm/aa		
N°	COMPONENTES	Unidad	Cantidad Mínima	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F
1	Ubicación (Protección condiciones ambientales)			✓			✓			✓			✓					
2	Señalización y visibilidad			✓			✓			✓			✓					
3	Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso)			✓			✓			✓			✓					
4	Estado de empaque (maletín o bamil...)			✓			✓			✓			✓					
5	Maletin / Contenedor			✓			✓			✓			✓					
6	Bolsas Rojas	und	2	✓			✓			✓			✓					
7	Paño Absorbente tela Oleofílica	und	1	✓			✓			✓			✓					
8	Pala plástica	und	1	✓			✓			✓			✓					
9	Cinta de Señalización	und	1	✓			✓			✓			✓					
10	Etiquetas de residuos peligrosos					✓			✓	✓			✓					
11	Overol Tyvek					✓			✓		✓							
12	Gafas de seguridad		1	✓			✓			✓			✓					
13	Guantes de Nitrilo	par	1	✓			✓			✓			✓					
14	Mascarilla protección vapores orgánicos	und	1	✓			✓			✓			✓					
15	Otros			✓			✓			✓			✓					

Convenciones: B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

FIRMA DE INSPECTOR:				Stephanny G.			Stephanny G.			Stephanny G.			Stephanny G.						
CUMPLIMIENTO: Yo como autoridad en SST del área he verificado que el elemento inspeccionado cumple para permanecer en sitio				SI ✓	NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato)		SI ✓	NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato)		SI	NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato)		SI	NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato)		SI	NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato)		

	OBSERVACIONES				
Descripción					

Anexo 16, Permisos altura, en caliente, ATS e inventario de equipos de altura

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ANALISIS DE RIESGOS POR OFICIO/TAREAS	SST- F-022 Versión: 02

OBRA DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ESTE REGISTRO SE REALIZA POR FRENTE DE OBRA

TAREA: Fundida de losa	FECHA INICIO: 09/12/24	FECHA FINAL 14/12/24.	SUSPENSION
ACTIVIDAD: Armado de Varilla.			
LUGAR DE TRABAJO: Bloque 3.			

TAREAS A REALIZAR	EPP		PELIGRO / RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES REQUERIDOS	
			FISICOS				
	Arnés	✓	Ruido	✓	Disminución capacidad auditiva	Uso de protección auditiva, capacacitaciones	✓
			Vibración		Enfermedades osteomusculares	Uso de guantes	
	Overol	✓	Temperaturas radiación solar	✓	Deshidratación ,desmayos	Hidratarse frecuentamente	✓
			QUIMICOS				
			Material particulado polvo	✓	Enfermedades pulmonales	Uso de protección respiratoria	
	Lineas de vida		Gases, vapores		Enfermedades pulmonales, intoxicación	Aislar,vapores,gases y polvo. Ventilar	
		✓	**MECANICOS - FISICOS**				
			Uso de herramientas, equipos / Atrapamiento, golpe con		Golpes,machucones,heridas	Inspección pre operacional	
	Delantal Carnaza		Contacto Con objetos cortos punzantes		heridas, lesiones, hemorragia,hepatitis B,C	El Orden y la Prevención son la clave principal para evitar este tipo de heridas,Utilizar guantes siempre que sea posible para proteger sus manos,Utilizar botas y lentes de seguridad, Usar los objetos punzantes de forma adecuada.	
	Gafas de seguridad		Partes en movimiento / Atrapamiento	✓	Golpes, atrapamientos, amputación	No acercarse a partes en movimientos	✓
		✓	Trabajo en alturas	✓	Caidas,golpes,fracturas,fatalidad	Permiso de trabajo en alturas	✓
			BIOMECANICO				
			Posturas sedente de pie	✓	Fatiga, cansancio	Manejo de la mecánica corporal, pausas de trabajo	✓
			Sobre-esfuerzo	✓	Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	✓
	Visor Transparente		Manejo manual de cargas		Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	✓
			LOCATIVOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Superficies deslizantes	✓	Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área, mirada en el camino	✓
			Superficies irregulares		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Verificar las condiciones del piso como nivelación	
	Protección respiratoria		Orden y aseo		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores mantener orden y aseo en áreas de trabajo	
			BIOLOGICOS				
			Insectos, reptiles	✓	Alergias, envenenamiento, fatalidad	Prestar constante atención a la presencia de animales (serpientes,abejas,avispas,hormigas,y roedores	✓
	Guantes nitrilo		Virus,bacterias,y hongos	✓	Alergias, enfermedad	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores	✓
			ELECTRICOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Baja tención		Quemaduras, fatalidad	Mantener distancias mayores a tres metros con redes de baja, media y alta tención	
			Media tención		Quemaduras, fatalidad		
			Alta tención		Quemaduras, fatalidad		

Escaneado con CamScanner

TAREAS A REALIZAR	EPP		PELIGRO/RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES REQUERIDOS	
			PSICOSOCIALES				
	Guantes tipo Ingeniero	✓	Carga de trabajo	✓	Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	✓
			Problemas laborales y familiares, presiones anormales.		Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	
			RIESGO PUBLICO - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Atracos, atentados terroristas, secuestros, asonadas.		Golpes, heridas, fatalidad,lesiones,estrés	Consultar con las autoridades competentes antes de visitar el área la situación o el orden de la zona, evitar el panico, no responder a las agresiones fisicas	
	Casco de seguridad	✓	**EMERGENCIA - FENOMENOS NATURALES**				
			Sismo		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (vigas de soporte debajo de una puerta)	
			Inundación		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Ir a un terreno más alto, Consultar con las autoridades competentes antes de visitar la zona a la situación (comité municipal o departamental de gestión de riesgos y desastres)	
			Incendio		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Sistemas de alarma, sistemas contra incendio, Dar aviso autoridades competentes "bomberos"	
			Caída de Estructuras	✓	Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (vigas de soporte debajo de una puerta)	✓
	Tapones auditivos		Deslizamiento de Tierra		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Evitar pasar o estar en zonas de posibles deslizamientos, en caso de deslizamientos alejarse de las zonas afectadas manteniendo la calma	
			Vendavales		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde allá posibilidades de colazo de estructuras y/o árboles, desprendimiento de tejas	
	Chaleco reflectivo		Descargas Eléctricas		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Mantenerse dentro del vehiculo, con puertas y ventanas cerradas, Usar conexiones a tierra, Desenchufar equipos eléctricos, No permanecer en sitios abiertos altos y/o debajo de árboles	
	Botas de seguridad	✓	Huracanes		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde allá posibilidades de colazo de estructuras arboles y/o desprendimiento de tejas	
			TRÁNSITO - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
	Botas PVC		Colisiones, volcamientos, atropellamientos de medios de transporte.	✓	Golpes, heridas, amputaciones, fatalidad	Inspeccionar área, mirada en el camino, instalar y respetar las señales de transito . Estableces control de trafico, acordonar el area,	✓

Nombre y apellido de Trabajadores	cedula	Firma del trabajador
Jenny Fernanda Alvarez	1003561521	
Carlos Sierra	1.131106681	
Paula Barrios	1005108888	
Fabio Nova	93557561	
Pedro Montes	1131047808	

EPP: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Stephanny G.

FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA DEL COORDINADOR SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ANALISIS DE RIESGOS POR OFICIO/TAREAS	SST- F-022
		Versión: 02

OBRA DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ESTE REGISTRO SE REALIZA POR FRENTE DE OBRA

TAREA: Fundida de losa.	FECHA INICIO: 09/12/24	FECHA FINAL	SUSPENSION
ACTIVIDAD: Armado de Varilla.			
LUGAR DE TRABAJO: Bloque1			

TAREAS A REALIZAR	EPP		PELIGRO / RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES REQUERIDOS	
			FISICOS				
	Arnés	✓	Ruido	✓	Disminución capacidad auditiva	Uso de protección auditiva, capacacitaciones	✓
			Vibración		Enfermedades osteomusculares	Uso de guantes	
	Overol	✓	Temperaturas radiación solar	✓	Deshidratación ,desmayos	Hidratarse frecuentemente	✓
			QUIMICOS				
			Material particulado polvo	✓	Enfermedades pulmonales	Uso de protección respiratoria	✓
	Lineas de vida	✓	Gases, vapores		Enfermedades pulmonales, intoxicación	Aislar,vapores,gases y polvo. Ventilar	
			MECANICOS - FISICOS				
			Uso de herramientas, equipos / Atrapamiento, golpe con		Golpes,machucones,heridas	Inspección pre operacional	
	Delantal Carnaza		Contacto Con objetos cortos punzantes		heridas, lesiones, hemorragia,hepatitis B,C	El Orden y la Prevención son la clave principal para evitar este tipo de heridas,Utilizar guantes siempre que sea posible para proteger sus manos,Utilizar botas y lentes de seguridad, Usar los objetos punzantes de forma adecuada.	
	Gafas de seguridad	✓	Partes en movimiento / Atrapamiento	✓	Golpes, atrapamientos, amputación	No acercarse a partes en movimientos	✓
			Trabajo en alturas	✓	Caidas,golpes,fracturas,fatalidad	Permiso de trabajo en alturas	✓
			BIOMECANICO				
			Posturas sedente de pie	✓	Fatiga, cansancio	Manejo de la mecánica corporal, pausas de trabajo	✓
			Sobre-esfuerzo		Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	✓
	Visor Transparente		Manejo manual de cargas		Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	
			LOCATIVOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Superficies deslizantes	✓	Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área, mirada en el camino	✓
			Superficies irregulares		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Verificar las condiciones del piso como nivelación	
	Protección respiratoria		Orden y aseo		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores mantener orden y aseo en áreas de trabajo	
			BIOLOGICOS				
			Insectos, reptiles	✓	Alergias, envenenamiento, fatalidad	Prestar constante atención a la presencia de animales (serpientes,abejas,avispas,hormigas,y roedores	✓
	Guantes nitrilo		Virus,bacterias,y hongos	✓	Alergias, enfermedad	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores	✓
			ELECTRICOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Baja tención		Quemaduras, fatalidad	Mantener distancias mayores a tres metros con redes de baja, media y alta tención	
			Media tención		Quemaduras, fatalidad		
			Alta tención		Quemaduras, fatalidad		

Escaneado con CamScanner

TAREAS A REALIZAR	EPP		PELIGRO/RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES REQUERIDOS	
			PSICOSOCIALES				
	Guantes tipo Ingeniero		Carga de trabajo	✓	Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	
			Problemas laborales y familiares, presiones anormales.		Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	
		✓	**RIESGO PUBLICO - CONDICIONES DE SEGURIDAD**				
			Atracos, atentados terroristas, secuestros, asonadas.		Golpes, heridas, fatalidad,lesiones,estrés	Consultar con las autoridades competentes antes de visitar el área la situación o el orden de la zona, evitar el panico, no responder a las agresiones fisicas	
	Casco de seguridad		**EMERGENCIA - FENOMENOS NATURALES**				
			Sismo		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (vigas de soporte debajo de una puerta)	
		✓	Inundación		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Ir a un terreno más alto, Consultar con las autoridades competentes antes de visitar la zona a la situación (comité municipal o departamental de gestión de riesgos y desastres)	
			Incendio		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Sistemas de alarma, sistemas contra incendio, Dar aviso autoridades competentes "bomberos"	
			Caída de Estructuras	✓	Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (vigas de soporte debajo de una puerta)	✓
	Tapones auditivos		Deslizamiento de Tierra		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Evitar pasar o estar en zonas de posibles deslizamientos, en caso de deslizamientos alejarse de las zonas afectadas manteniendo la calma	
			Vendavales		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde allá posibilidades de colazo de estructuras y/o árboles, desprendimiento de tejas	
	Chaleco reflectivo		Descargas Eléctricas		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Mantenerse dentro del vehiculo, con puertas y ventanas cerradas, Usar conexiones a tierra, Desenchufar equipos eléctricos, No permanecer en sitios abiertos altos y/o debajo de árboles	
	Botas de seguridad		Huracanes		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde allá posibilidades de colazo de estructuras arboles y/o desprendimiento de tejas	
			TRÁNSITO - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
	Botas PVC		Colisiones, volcamientos, atropellamientos de medios de transporte.	✓	Golpes, heridas, amputaciones, fatalidad	Inspeccionar área, mirada en el camino, instalar y respetar las señales de transito , Estableces control de trafico, acordonar el area,	

Nombre y apellido de Trabajadores	cedula	Firma del trabajador
Edgardo Arrieta	1131105563	
Julio Cesar Posso Perez	1072527150	
Pedro Jaramillo Bruno	73432693	
Osvaldo Vargas	1131168401	
Ricardo Montalvo	1007560070	
Hugo Jaraba	1005708729	

EPP: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Stephanny Garay
FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA DEL COORDINADOR SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ANALISIS DE RIESGOS POR OFICIO/TAREAS	SST- F-022
		Versión: 02

OBRA DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ESTE REGISTRO SE REALIZA POR FRENTE DE OBRA

TAREA: Fundida de losa	FECHA INICIO: 02/12/24	FECHA FINAL 12/12/24	SUSPENSION
ACTIVIDAD: Armado de formas.			
LUGAR DE TRABAJO: Bloque 1.			

TAREAS A REALIZAR	EPP		PELIGRO / RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES REQUERIDOS	
			FISICOS				
	Arnés	✓	Ruido	✓	Disminución capacidad auditiva	Uso de protección auditiva, capacacitaciones	✓
			Vibración		Enfermedades osteomusculares	Uso de guantes	
	Overol	✓	Temperaturas radiación solar	✓	Deshidratación ,desmayos	Hidratarse frecuentemente	✓
			QUIMICOS				
			Material particulado polvo		Enfermedades pulmonales	Uso de protección respiratoria	
	Lineas de vida	✓	Gases, vapores		Enfermedades pulmonales, intoxicación	Aislar,vapores,gases y polvo. Ventilar	
			MECANICOS - FISICOS				
			Uso de herramientas, equipos / Atrapamiento, golpe con		Golpes,machucones,heridas	Inspección pre operacional	
	Delantal Carnaza		Contacto Con objetos cortos punzantes		heridas, lesiones, hemorragia,hepatitis B,C	El Orden y la Prevención son la clave principal para evitar este tipo de heridas,Utilizar guantes siempre que sea posible para proteger sus manos,Utilizar botas y lentes de seguridad, Usar los objetos punzantes de forma adecuada.	
	Gafas de seguridad	✓	Partes en movimiento / Atrapamiento	✓	Golpes, atrapamientos, amputación	No acercarse a partes en movimientos	✓
			Trabajo en alturas	✓	Caidas,golpes,fracturas,fatalidad	Permiso de trabajo en alturas	✓
			BIOMECANICO				
			Posturas sedente de pie	✓	Fatiga, cansancio	Manejo de la mecánica corporal, pausas de trabajo	✓
			Sobre-esfuerzo	✓	Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	✓
	Visor Transparente		Manejo manual de cargas		Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	
			LOCATIVOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Superficies deslizantes	✓	Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área, mirada en el camino	✓
			Superficies irregulares		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Verificar las condiciones del piso como nivelación	
	Protección respiratoria		Orden y aseo		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores mantener orden y aseo en áreas de trabajo	
			BIOLOGICOS				
			Insectos, reptiles	✓	Alergias, envenenamiento, fatalidad	Prestar constante atención a la presencia de animales (serpientes,abejas,avispas,hormigas,y roedores	✓
	Guantes nitrilo		Virus,bacterias,y hongos	✓	Alergias, enfermedad	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores	✓
			ELECTRICOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Baja tención		Quemaduras, fatalidad	Mantener distancias mayores a tres metros con redes de baja, media y alta tención	
			Media tención		Quemaduras, fatalidad		
			Alta tención		Quemaduras, fatalidad		

Escaneado con CamScanner

TAREAS A REALIZAR	EPP		PELIGRO/RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES REQUERIDOS	
			PSICOSOCIALES				
	Guantes tipo ingeniero		Carga de trabajo	✓	Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	✓
			Problemas laborales y familiares, presiones económicas		Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	
			RIESGO PUBLICO - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Atracos, atentados terroristas, secuestros, asonadas.		Golpes, heridas, fatalidad,lesiones,estres	Consultar con las autoridades competentes antes de visitar el área la situación o el orden de la zona, evitar el panico, no responder a las agresiones físicas	
	Casco de seguridad		**EMERGENCIA - FENOMENOS NATURALES**				
			Sismo		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (bajo de soporte debajo de una puerta)	
			Inundación		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Ir a un terreno más alto, Consultar con las autoridades competentes antes de visitar la zona o la situación (comité municipal o departamental de gestión de riesgos y desastres)	
			Incendio		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Sistemas de alarma, sistemas contra incendio, Dar aviso autoridades competentes "bomberos"	
			Caida de Estructuras		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (bajo de soporte debajo de una puerta)	✓
	Tapones auditivos		Deslizamiento de Tierra		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Evitar pasar o estar en zonas de posibles deslizamientos, en caso de deslizamientos alejarse de las zonas afectadas manteniendo la calma	
			Vendavales		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde allá posibilidades de colapso de estructuras y/o arboles, desprendimiento de tejas	
	Chaleco reflectivo		Descargas Electricas		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Mantenerse dentro del vehiculo, con puertas y ventanas cerradas, Usar conexiones a tierra, Desenchufar equipos electricos, No permanecer en sitios abiertos altos y/o debajo de árboles	
	Botas de seguridad	✓	Huracanes		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde allá posibilidades de colapso de estructuras arboles y/o desprendimiento de tejas	
			TRÁNSITO - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
	Botas PVC		Colisiones, volcamientos, atropellamientos de medios de transporte.		Golpes, heridas, amputaciones, fatalidad	Inspeccionar área, mirada en el camino, instalar y respetar las señales de transito ; Establecer control de tráfico, acordonar el area.	✓

Nombre y apellido de Trabajadores	cedula	Firma del trabajador
Eduardo Arrieta	1181105563	
Julio cesar Rossio Perez	1072522758	JRopasso
Pedro Fernandez Barrera	77432643	
Oswaldo Ubarnado	1131108401	Oswaldo
Leonardo Rivera	1196209600	
Jose Castillo C.	1047043752	
Hugo Juvay	1005708729	Hugo Juvay

EPP: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Stephanny Gray
FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA DEL COORDINADOR SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ANALISIS DE RIESGOS POR OFICIO/TAREAS	SST- F-022
		Versión: 02

OBRA DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ESTE REGISTRO SE REALIZA POR FRENTE DE OBRA

TAREA: Desencofre de Columnas.	FECHA INICIO: 09/12/24	FECHA FINAL 14/12/24	SUSPENSION
ACTIVIDAD: Desencofre de Columnas.			
LUGAR DE TRABAJO:			

TAREA/ACTIVIDAD	EPP		PELIGRO / RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES RECOMENDADOS	
	Arnés	✓	**FISICOS**				
			Ruido	✓	Disminución capacidad auditiva	Uso de protección auditiva, capacitaciones	✓
			Vibración		Enfermedades osteomusculares	Uso de guantes	
	Overol	✓	Temperaturas radiación solar	✓	Deshidratación ,desmayos	Hidratarse frecuentemente	✓
			QUIMICOS				
			Material particulado polvo		Enfermedades pulmonales	Uso de protección respiratoria	
	Líneas de vida	✓	Gases, vapores		Enfermedades pulmonales, intoxicación	Aislar,vapores gases y polvo. Ventilar	
			MECANICOS - FISICOS				
			Uso de herramientas, equipos / Atrapamiento, golpe con		Golpes,machucones,heridas	Inspección pre operacional	
	Delantal Carnaza		Contacto Con objetos cortos punzantes		heridas, lesiones, hemorragia,hepatitis B,C	El Orden y la Prevención son la clave principal para evitar este tipo de heridas Utilizar guantes siempre que sea posible para proteger sus manos.Utilizar botas y lentes de seguridad, Usar los objetos punzantes de forma adecuada	
	Gafas de seguridad	✓	Partes en movimiento / Atrapamiento	✓	Golpes, atrapamientos, amputación	No acercarse a partes en movimientos	✓
			Trabajo en alturas	✓	Caidas,golpes,fracturas,fatalidad	Permiso de trabajo en alturas	✓
			BIOMECANICO				
			Posturas sedente de pie	✓	Fatiga, cansancio	Manejo de la mecánica corporal, pausas de trabajo	✓
			Sobre-esfuerzo	✓	Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	✓
	Visor Transparente		Manejo manual de cargas		Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	
			LOCATIVOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Superficies deslizantes	✓	Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área, mirada en el camino	✓
			Superficies irregulares		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Verificar las condiciones del piso como: nivelación	
	Protección respiratoria		Orden y aseo		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores mantener orden y aseo en áreas de trabajo	
			BIOLOGICOS				
			Insectos, reptiles	✓	Alergias envenenamiento, fatalidad	Prestar constante atención a la presencia de animales (serpientes abejas avispas hormigas y roedores	✓
	Guantes nitrilo		Virus,bacterias y hongos	✓	Alergias, enfermedad	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores	✓
			ELECTRICOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Baja tención		Quemaduras, fatalidad	Mantener distancias mayores a tres metros con redes de baja, media y alta tención	
			Media tención		Quemaduras, fatalidad		
			Alta tención		Quemaduras, fatalidad		

Escaneado con CamScanner

TAREAS A REALIZAR	EPP		PELIGRO/RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES REQUERIDOS	
			PSICOSOCIALES				
	Guantes tipo ingeniero	✓	Carga de trabajo	✓	Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	✓
			Problemas laborales y familiares, preiones anormales		Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	
			RIESGO PUBLICO - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Atracos, atentados terroristas, secuestros, asonadas		Golpes, heridas, fatalidad lesiones,estrés	Consultar con las autoridades competentes antes de visitar el área la situación o el orden de la zona, evitar el panico, no responder a las agresiones físicas	
	Casco de seguridad	✓	**EMERGENCIA - FENOMENOS NATURALES**				
			Sismo		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (vigas de soporte debajo de una puerta)	
			Inundación		Fatelidad, heridas, perdidas económicas	Ir a un terreno más alto, Consultar con las autoridades competentes antes de visitar la zona a la situación (comité municipal o departamental de gestión de riesgos y desastres)	
			Incendio		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Sistemas de alarma, sistemas contra incendio, Dar aviso autoridades competentes "bomberos"	
			Caida de Estructuras	✓	Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (vigas de soporte debajo de una puerta)	✓
	Tapones auditivos		Deslizamiento de Tierra		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Evitar pasar o estar en zonas de posibles deslizamientos, en caso de deslizamientos alejarse de las zonas afectadas manteniendo la calma	
			Vendavales		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde aria posibilidades de colazo de estructuras y/o árboles desprendimiento de tejas	
	Chaleco reflectivo		Descargas Eléctricas		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Mantenerse dentro del vehiculo, con puertas y ventanas cerradas, User conexiones a tierra. Desenchufar equipos eléctricos. No permanecer en sitios abiertos altos y/o debajo de árboles	
	Botas de seguridad	✓	Huracanes		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde aria posibilidades de colazo de estructures arboles y/o desprendimiento de tejas	
			TRÁNSITO - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
	Botas PVC		Colisiones, volcamientos, atropellamientos de medios de transporte	✓	Golpes, heridas, amputaciones, fatalidad	Inspeccionar área, mirada en el camino, instalar y respetar las señales de transito, Estableces control de trafico, acordonar el area	✓

Nombre y apellido de Trabajadores	cedula	Firma del trabajador
Jaime Carrascal	780769	
Faider Vargas	1003655340	faider vargas
Cristian Maldonado Ladeuth	1072522617	
Jesus Sepulveda	1131164665	

EPP: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Stephanny Garay
FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA DEL COORDINADOR SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ANALISIS DE RIESGOS POR OFICIO/TAREAS	SST- F-022
		Versión: 02

OBRA DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ESTE REGISTRO SE REALIZA POR FRENTE DE OBRA

TAREA: Fundida de losa.	FECHA INICIO:	FECHA FINAL	SUSPENSION
ACTIVIDAD: Armado de Tarima.	02/12/24	09/12/24.	
LUGAR DE TRABAJO: Bloque 3.			

TAREAS A REALIZAR	EPP		PELIGRO / RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES REQUERIDOS	
			FISICOS				
	Arnés	✓	Ruido		Disminución capacidad auditiva	Uso de protección auditiva, capacacitaciones	✓
			Vibración		Enfermedades osteomusculares	Uso de guantes	
	Overol	✓	Temperaturas radiación solar	✓	Deshidratación ,desmayos	Hidratarse frecuentamente	✓
			QUIMICOS				
			Material particulado polvo	✓	Enfermedades pulmonales	Uso de protección respiratoria	✓
	Lineas de vida	✓	Gases, vapores		Enfermedades pulmonales, intoxicación	Aislar,vapores,gases y polvo. Ventilar	
			MECANICOS - FISICOS				
			Uso de herramientas, equipos / Atrapamiento, golpe con		Golpes,machucones,heridas	Inspección pre operacional	
	Delantal Carnaza		Contacto Con objetos cortos punzantes		heridas, lesiones, hemorragia,hepatitis B,C	El Orden y la Prevención son la clave principal para evitar este tipo de heridas,Utilizar guantes siempre que sea posible para proteger sus manos,Utilizar botas y lentes de seguridad, Usar los objetos punzantes de forma adecuada.	
			Partes en movimiento / Atrapamiento	✓	Golpes, atrapamientos, amputación	No acercarse a partes en movimientos	✓
	Gafas de seguridad	✓	Trabajo en alturas	✓	Caidas,golpes,fracturas,fatalidad	Permiso de trabajo en alturas	✓
			BIOMECANICO				
			Posturas sedente de pie	✓	Fatiga, cansancio	Manejo de la mecánica corporal, pausas de trabajo	✓
			Sobre-esfuerzo	✓	Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	✓
	Visor Transparente		Manejo manual de cargas		Desgarres, lumbalgias	No alzar cargas superiores 25kg para hombres y 10 kg para las mujeres	
			LOCATIVOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Superficies deslizantes	✓	Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área, mirada en el camino	✓
			Superficies irregulares		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Verificar las condiciones del piso como nivelación	✓
	Protección respiratoria		Orden y aseo		Resbalon,caidas,golpes, fracturas	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores mantener orden y aseo en áreas de trabajo	
			BIOLOGICOS				
			Insectos, reptiles	✓	Alergias, envenenamiento, fatalidad	Prestar constante atención a la presencia de animales (serpientes,abejas,avispas,hormigas,y roedores	✓
	Guantes nitrilo		Virus,bacterias,y hongos	✓	Alergias, enfermedad	Inspeccionar área de trabajo antes de iniciar labores	✓
			ELECTRICOS - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
			Baja tención		Quemaduras, fatalidad	Mantener distancias mayores a tres metros con redes de baja, media y alta tención	
			Media tención		Quemaduras, fatalidad		
			Alta tención		Quemaduras, fatalidad		

Escaneado con CamScanner

TAREAS A REALIZAR	EPP		PELIGRO/RIESGO		CONSECUENCIA	CONTROLES REQUERIDOS	
			PSICOSOCIALES				
	Guantes tipo Ingeniero		Carga de trabajo	✓	Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	✓
			Problemas laborales y familiares, presiones anormales.		Tension,estres	Distribución del trabajo, rotación del personal, pausas de trabajo	
		✓	**RIESGO PUBLICO - CONDICIONES DE SEGURIDAD**				
			Atracos, atentados terroristas, secuestros, asonadas.		Golpes, heridas, fatalidad,lesiones,estrés	Consultar con las autoridades competentes antes de visitar el área la situación o el orden de la zona, evitar el panico, no responder a las agresiones físicas	
	Casco de seguridad	✓	**EMERGENCIA - FENOMENOS NATURALES**				
			Sismo		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (Vigas de soporte debajo de una puerta)	
			Inundación		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Ir a un terreno más alto, Consultar con las autoridades competentes antes de visitar la zona a la situación (comité municipal o departamental de gestión de riesgos y desastres)	
			Incendio		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Sistemas de alarma, sistemas contra incendio, Dar aviso autoridades competentes "bomberos"	
			Caida de Estructuras	✓	Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Conserve la calma, identificar la ubicación de las zonas más seguras (vigas de soporte debajo de una puerta)	✓
	Tapones auditivos		Deslizamiento de Tierra		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Evitar pasar o estar en zonas de posibles deslizamientos, en caso de deslizamientos alejarse de las zonas afectadas manteniendo la calma	
			Vendavales		Fatalidad, heridas,perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde allá posibilidades de colazo de estructuras y/o árboles, desprendimiento de tejas	
	Chaleco reflectivo		Descargas Eléctricas		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Mantenerse dentro del vehiculo, con puertas y ventanas cerradas, Usar conexiones a tierra, Desenchufar equipos eléctricos, No permanecer en sitios abiertos altos y/o debajo de árboles	
	Botas de seguridad	✓	Huracanes		Fatalidad, heridas, perdidas económicas	Buscar refugios y no salir a zonas donde alta posibilidades de colazo de estructuras arboles y/o desprendimiento de tejas	
			TRÁNSITO - CONDICIONES DE SEGURIDAD				
	Botas PVC		Colisiones, volcamientos, atropellamientos de medios de transporte.	✓	Golpes, heridas, amputaciones, fatalidad	Inspeccionar área, mirada en el camino, instalar y respetar las señales de transito , Estableces control de trafico, acordonar el area,	✓

Nombre y apellido de Trabajadores	cedula	Firma del trabajador
Jaime Hernandez	1003561521	
Carlos Sierra	1.151.106.681	
Rosalba German	1005 708 698	
Jairo Ramos	18857561	
Juan David Ramos	1131111981	

EPP: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Stephanny Garay
FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA DEL COORDINADOR SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA- SST F051 Versión: 01 - 2024

PROYECTO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

1. GENERALIDADES

INICIO DEL PERMISO				FINALIZACION DEL PERMISO			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
09	12	2024	7:00am.	14	12	24	12: pm.

EMPRESA QUE SOLICITA EL PERMISO	CONSORCIO MONTAJES RURAL
LUGAR DONDE SE VA REALIZA EL TRABAJO	Bloque 3.
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (m)	7m.
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Armado de tarima para fundición de loza.

2. CLASE DE PERMISO

TRABAJO EN ALTURAS	✓	ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO EN EXCAVACION	
TRABAJO ELECTRICO		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN FRIO		OTRO CUAL?	

3. RIESGOS ASOCIADOS

FISICO		QUIMICO		BIOLOGICO		COND.SEGURIDAD		BIOMECANICOS		NATURALEZA	
Ruido		Polvos	✓	Virus	✓	Mecánico		Postura		Lluvias	✓
Iluminación		Líquidos		Bacterias	✓	Locativo	✓	Esfuerzo	✓	Vendaval	
Vibración		Gas/Vapor		Hongos		Eléctrico		Mov. Repetitivo	✓	Inundación	
Temperatura	✓	Niebla/Rocio	✓	Protista		Tecnológico		Manip. Manual	✓	Derrame	
Radiación		Humo Metálico		Picaduras	✓	Acc. Transito				Sismo	
Ionizante	✓	Mat. Particulado		Mordeduras		Públicos				Terremoto	
				Fluidos		Trabajo alturas	✓				
SICOSOCIAL		Contenido tarea		Org. Trabajo	✓	Relac.Humanas	✓	Monotonia		Gestión	
AMBIENTAL		Derrames o Fugas		Aguas Residu. Industriales		Aguas Residual Domesticas		Residuos Sólid. Ordinarios		Residuos Peligrosos	

4. PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	Yeiner Hernandez	obrero	1003561521	Yeiner Hernandez
2.	Carlos Sierra	obrero	1.232.806.681	
3.	Rosalba Guzman	obrero	1005708689	
4.	Jairo Romero	obrero	18857561	
5.	Pedro Martinez	1131167809	obrero	Pedro Martinez
6				
7				
8				

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo	✓	Protección Auditiva		Overol - Ropa de trabajo	✓	Careta para soldar	
Gafas de Seguridad	✓	Protección Respiratoria		Peto - Delantal		Careta con visor	
Botas de Seguridad	✓	Equipo de Autocontenido		Protector facial		Otro	

6. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Punto de Anclaje		Arnes cuerpo completo	✓	Eslinga de Posicionamiento		Línea de Vida Horizontal	✓
Cinta de Anclaje (Tie Off)		Descendedores		Eslinga de Detención caída	✓	Línea de Vida Vertical	
Mosqueton		Ascendedores		Arrestador o Freno		Línea de Vida Retráctil	

7. EQUIPO A UTILIZAR

Escaneado con CamScanner

Herramienta mano	✓	Pulidora		Alicates		Voltímetro	
Herram. Eléctricas		Taladro		Pinzas		Amperímetro	
Herram. Neumáticas		Rotomotor		Destornilladores		Ventiladores	
Herram. Hidráulicas		Compresor		E. Soldadura / oxicorte		Extractores	
Otros:							

8. SISTEMAS DE ACCESO PARA ALTURAS

Escalera de Extensión		Escalera tipo Tijera		Andamio	✓	Man Lift	
Escalera tipo Avión		Escalera tipo Gato		Grúa Canasta		Elevador de personas	
Escalera fija con LVV		Pretales		Montacargas		Otro, Cual?	

9. MEDIDAS DE PREVENCION

Uso de Demarcación	✓	Ubicación de Barandas		Charla de 5 minutos	✓	Bloqueo Eléctrico	
Uso de Señalización		Control de Acceso		Control de Huecos u orificios		Bloqueo Mecánico	
Equipo de Prim. Auxilios	✓	Extintor		Bloqueo y Etiqueteado		Puesta a tierra	

10. LISTA DE CHEQUEO

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro? (ATS)	✓		
El personal cumple con los requisitos de aptitud medica para realizar la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio	✓		
El personal cuenta con el pago de seguridad social (Eps - Afp - Arl) vigente	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados	✓		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar	✓		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente	✓		
Se ha instalado cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	✓		
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas	✓		
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida		✓	
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores	✓		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro	✓		
Las cuerdas se encuentran libres de nudos	✓		
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos	✓		
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación			✓
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario	✓		
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios	✓		
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas	✓		
Se ha revisado las condiciones de riesgo teniendo en cuenta lineas energizadas o equipos electricos	✓		

11. DESIGNACION DE AYUDANTE

Nombre: Pedro Manuel Polanco	Cedula: 1131107808
Firma: Pedro Manuel	Cargo: Obrero

12. AUTORIZACION DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Ha verificado con el Ejecutor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.	RESPONSABLE DE VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD: He verificado con el Emisor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a esta trabajo y me comprometo a comunicarlos al grupo ejecutor, considero seguro proceder con la ejecución de este trabajo. (Coordinador en alturas)
Nombre: Heliodoro Brazoban	Nombre: Stephanny Garay
Cédula: 78+197584.	Cédula: 1.131.104.122
Firma:	Firma: Stephanny G.
Cargo: Oficial.	Cargo: Aux SST.

12. CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA- SST F051
		Versión: 01 - 2024

PROYECTO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

1. GENERALIDADES

INICIO DEL PERMISO				FINALIZACION DEL PERMISO			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
09	12	24	7am	14	12	24.	12pm.

EMPRESA QUE SOLICITA EL PERMISO	CONSORCIO MONTAJES RURAL
LUGAR DONDE SE VA REALIZA EL TRABAJO	Bloque 1.
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (m)	
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Armado de tapma para fundidas de losa.

2. CLASE DE PERMISO

TRABAJO EN ALTURAS	✓	ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO EN EXCAVACION	
TRABAJO ELECTRICO		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN FRIO		OTRO CUAL?	

3. RIESGOS ASOCIADOS

FISICO		QUIMICO		BIOLOGICO		COND.SEGURIDAD		BIOMECANICOS		NATURALEZA	
Ruido	✓	Polvos	✓	Virus	✓	Mecánico	✓	Postura	✓	Lluvias	✓
Iluminación		Liquidos		Bacterias	✓	Locativo	✓	Esfuerzo	✓	Vendaval	
Vibración	✓	Gas/Vapor	✓	Hongos		Eléctrico		Mov. Repetitivo	✓	Inundación	
Temperatura	✓	Niebla/Rocio	✓	Protista		Tecnológico		Manip. Manual	✓	Derrame	
Radiación		Humo Metálico		Picaduras	✓	Acc. Transito				Sismo	
Ionizante	✓	Mat. Particulado		Mordeduras		Públicos				Terremoto	
				Fluidos		Trabajo alturas	✓				
SICOSOCIAL		Contenido tarea		Org. Trabajo	✓	Relac.Humanas	✓	Monotonía		Gestión	
AMBIENTAL		Derrames o Fugas		Aguas Residu. Industriales		Aguas Residual Domesticas		Residuos Sólid. Ordinarios		Residuos Peligrosos	

4. PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	Eduardo Arrieta	1131105567	o/p	
2.	Pedro Jimenez	73432643	oficios	Pedro
3.	Oswaldo Urango	1131108401	Oficial	Oswaldo
4.	Teodoro	1562060		Teo
5	Ricardo manjarres	1007569	OF	
6	Hugo garay	1065708724	Obra	Hugo garay
7.				
8				

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo	✓	Protección Auditiva		Overol - Ropa de trabajo		Careta para soldar	
Gafas de Seguridad	✓	Protección Respiratoria		Peto - Delantal		Careta con visor	
Botas de Seguridad	✓	Equipo de Autocontenido		Protector facial		Otro	

6. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Punto de Anclaje		Arnes cuerpo completo	✓	Eslinga de Posicionamiento		Línea de Vida Horizontal	✓
Cinta de Anclaje (Tie Off)		Descendedores		Eslinga de Detención caída	✓	Línea de Vida Vertical	
Mosqueton		Ascendedores		Arrestador o Freno		Línea de Vida Retráctil	

7. EQUIPO A UTILIZAR

Escaneado con CamScanner

Herramienta mano	✓	Pulidora		Alicates		Voltimetro	
Herram. Eléctricas		Taladro		Pinzas		Amperimetro	
Herram. Neumáticas		Rotomotor		Destornilladores		Ventiladores	
Herram. Hidráulicas		Compresor		E. Soldadura / oxicorte		Extractores	
Otros:							

8. SISTEMAS DE ACCESO PARA ALTURAS

Escalera de Extensión		Escalera tipo Tijera		Andamio	✓	Man Lift	
Escalera tipo Avión		Escalera tipo Gato		Grúa Canasta		Elevador de personas	
Escalera fija con LVV		Pretales		Montacargas		Otro, Cual?	

9. MEDIDAS DE PREVENCION

Uso de Demarcación		Ubicación de Barandas		Charla de 5 minutos		Bloqueo Eléctrico	
Uso de Señalización		Control de Acceso		Control de Huecos u orificios		Bloqueo Mecánico	
Equipo de Prim. Auxilios		Extintor		Bloqueo y Etiqueteado		Puesta a tierra	

10. LISTA DE CHEQUEO

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro? (ATS)	✓		
El personal cumple con los requisitos de aptitud medica para realizar la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio	✓		
El personal cuenta con el pago de seguridad social (Eps - Afp - Arl) vigente	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados	✓		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar	✓		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente	✓		
Se ha instalado cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	✓		
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas	✓		
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida		✓	
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores	✓		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro	✓		
Las cuerdas se encuentran libres de nudos	✓		
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos	✓		✓
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación	✓		
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario	✓		
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios	✓		
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas	✓		
Se ha revisado las condiciones de riesgo teniendo en cuenta lineas energizadas o equipos electricos	✓		

11. DESIGNACION DE AYUDANTE

Nombre Julio cesar posso perez	**Cedula** 1072522158
Firma: Julio posso	**Cargo** obrero

12. AUTORIZACION DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: He verificado con el Ejecutor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.	**RESPONSABLE DE VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD:** He verificado con el Emisor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y me comprometo a comunicarlos al grupo ejecutor, considero seguro proceder con la ejecución de este trabajo. **(Coordinador en alturas)**
Nombre: Cristian valencia	Nombre: Stephanny Garay
Cédula 8769402	Cédula 1.131.104.177
Firma: Cristian Valencia	Firma: Stephanny G.
Cargo: Maestro	Cargo: Aux SST.

12. CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA- SST F051
		Versión: 01 - 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

1. GENERALIDADES

INICIO DEL PERMISO				FINALIZACION DEL PERMISO			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
02	12	24	7:am.	07	12	2024	

EMPRESA QUE SOLICITA EL PERMISO	CONSORCIO MONTAJES RURAL
LUGAR DONDE SE VA REALIZA EL TRABAJO	Bloque 1.
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (m)	6metros.
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Armado de tarima para Fundicion de Losa.

2. CLASE DE PERMISO

TRABAJO EN ALTURAS	✓	ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO EN EXCAVACION	
TRABAJO ELECTRICO		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN FRIO		OTRO CUAL?	

3. RIESGOS ASOCIADOS

FISICO		QUIMICO		BIOLOGICO		COND.SEGURIDAD		BIOMECANICOS		NATURALEZA	
Ruido		Polvos	✓	Virus	✓	Mecánico	✓	Postura		Lluvias	
Iluminación		Liquidos		Bacterias	✓	Locativo	✓	Esfuerzo	✓	Vendaval	
Vibración		Gas/Vapor		Hongos		Eléctrico		Mov. Repetitivo	✓	Inundación	
Temperatura	✓	Niebla/Rocio	✓	Protista		Tecnológico		Manip. Manual	✓	Derrame	
Radiación		Humo Metálico		Picaduras	✓	Acc. Transito				Sismo	
Ionizante	✓	Mat. Particulado		Mordeduras		Públicos				Terremoto	
				Fluidos		Trabajo alturas	✓				
SICOSOCIAL		Contenido tarea		Org. Trabajo	✓	Relac.Humanas	✓	Monotonia		Gestión	
AMBIENTAL		Derrames o Fugas		Aguas Residu. Industriales		Aguas Residual Domesticas		Residuos Sólid. Ordinarios		Residuos Peligrosos	

4. PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	Edwin Tejada	1123105573	Ayudante	
2.	Julio Ponso	9072522758	Oficial	
3.	Pedro Ibrahim	9543276	oficial	
4.	Reinaldo Urango	1131108401	Oficial	
5	Jorge Castillo C.	1047043732	Ayud.	
6	Hugo Javay	1005708729	Oficial	Hugo Javay
7.				
8				

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo	✓	Protección Auditiva		Overol - Ropa de trabajo	✓	Careta para soldar	
Gafas de Seguridad	✓	Protección Respiratoria		Peto - Delantal		Careta con visor	
Botas de Seguridad	✓	Equipo de Autocontenido		Protector facial		Otro	

6. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Punto de Anclaje		Arnes cuerpo completo	✓	Eslinga de Posicionamiento		Línea de Vida Horizontal	✓
Cinta de Anclaje (Tie Off)		Descendedores		Eslinga de Detención caída	✓	Línea de Vida Vertical	
Mosqueton		Ascendedores		Arrestador o Freno		Línea de Vida Retráctil	

7. EQUIPO A UTILIZAR

Escaneado con CamScanner

Herramienta mano	✓	Pulidora		Alicates		Voltímetro	
Herram. Eléctricas		Taladro		Pinzas		Amperímetro	
Herram. Neumáticas		Rotomotor		Destornilladores		Ventiladores	
Herram. Hidráulicas		Compresor		E. Soldadura / oxicorte		Extractores	
Otros:							

8. SISTEMAS DE ACCESO PARA ALTURAS

Escalera de Extensión		Escalera tipo Tijera		Andamio	✓	Man Lift	
Escalera tipo Avión		Escalera tipo Gato		Grúa Canasta		Elevador de personas	
Escalera fija con LVV		Pretales		Montacargas		Otro, Cual?	

9. MEDIDAS DE PREVENCION

Uso de Demarcación		Ubicación de Barandas		Charla de 5 minutos		Bloqueo Eléctrico	
Uso de Señalización		Control de Acceso		Control de Huecos u orificios		Bloqueo Mecánico	
Equipo de Prim. Auxilios		Extintor		Bloqueo y Etiqueteado		Puesta a tierra	

10. LISTA DE CHEQUEO

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro? (ATS)	✓		
El personal cumple con los requisitos de aptitud medica para realizar la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio	✓		
El personal cuenta con el pago de seguridad social (Eps - Afp - Arl) vigente	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados	✓		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar	✓		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente	✓		
Se ha instalado cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	✓		
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas	✓		
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida		✓	
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores	✓		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro	✓		
Las cuerdas se encuentran libres de nudos	✓		
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos	✓		✓
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación			
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario	✓		
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios	✓		
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas	✓		
Se ha revisado las condiciones de riesgo teniendo en cuenta lineas energizadas o equipos electricos	✓		

11. DESIGNACION DE AYUDANTE

Nombre Leoltoro Rivera	**Cedula** 15620960
Firma:	**Cargo** otro so

12. AUTORIZACION DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: He verificado con el Ejecutor la aplicación del SG SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.	**RESPONSABLE DE VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD:** He verificado con el Emisor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y me comprometo a comunicarlos al grupo ejecutor, considero seguro proceder con la ejecución de este trabajo. (Coordinador en alturas)
Nombre: Jaider Valencia	Nombre: Stephanny Garay
Cédula: 77.2.7811	Cédula 1.131.104.122
Firma: Jvalencia	Firma: Stephanny G.
Cargo: Encargado	Cargo: Aux SST.

12. CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

TSA- SST F051

Versión: 01 - 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

1. GENERALIDADES

INICIO DEL PERMISO				FINALIZACION DEL PERMISO			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
09	12	24	7:00am	14	12	24	12:pm.

EMPRESA QUE SOLICITA EL PERMISO: CONSORCIO MONTAJES RURAL

LUGAR DONDE SE VA REALIZA EL TRABAJO: Blogue 2.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (m):

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Armado de Columnas.

2. CLASE DE PERMISO

TRABAJO EN ALTURAS		ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO EN EXCAVACION	
TRABAJO ELECTRICO		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN FRIO		OTRO CUAL?	

3. RIESGOS ASOCIADOS

FISICO	✓	QUIMICO	✓	BIOLOGICO	✓	COND.SEGURIDAD	✓	BIOMECANICOS	✓	NATURALEZA	✓
Ruido		Polvos		Virus		Mecánico		Postura		Lluvias	
Iluminación		Liquidos		Bacterias		Locativo		Esfuerzo		Vendaval	
Vibración		Gas/Vapor		Hongos		Eléctrico		Mov. Repetitivo		Inundación	
Temperatura	✓	Niebla/Rocio	✓	Protista		Tecnológico		Manip. Manual		Derrame	
Radiación		Humo Metálico		Picaduras	✓	Acc. Transito				Sismo	
Ionizante		Mat. Particulado		Mordeduras		Públicos				Terremoto	
				Fluidos		Trabajo alturas	✓				
SICOSOCIAL		Contenido tares		Org. Trabajo	✓	Relac.Humanas	✓	Monotonia		Gestión	
AMBIENTAL		Derrames o Fugas		Aguas Residu. Industriales		Aguas Residual Domesticas		Residuos Sólid. Ordinarios		Residuos Peligrosos	

4. PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaime Carrasquel	78766	Oficial	Jaime
2	Faiders Vargas	1003655340	obrero	Faiders Vargas
3	Gestion Maderera Logistica	1072522613	obr	
4				
5				
6				
7				
8				

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo	✓	Protección Auditiva		Overol - Ropa de trabajo		Careta para soldar	
Gafas de Seguridad	✓	Protección Respiratoria		Peto - Dotantal		Careta con visor	
Botas de Seguridad	✓	Equipo de Autocontenido		Protector facial		Otro	

6. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Punto de Anclaje		Arnes cuerpo completo	✓	Eslinga de Posicionamiento		Linea de Vida Horizontal	✓
Cinta de Anclaje (Tie Off)		Descendedores		Eslinga de Detención caida	✓	Linea de Vida Vertical	
Mosqueton		Ascendedores		Arrestador o Freno		Linea de Vida Retráctil	

7. EQUIPO A UTILIZAR

Escaneado con CamScanner

Herramienta manu	✓	Pulidora		Alicates		Voltimetro	
Herram. Eléctricas		Taladro		Pinzas		Amperimetro	
Herram. Neumáticas		Rotomartor		Destornilladores		Ventiladores	
Herram. Hidráulicas		Compresor		E. Soldadura / oxicorte		Extractoras	
Otros.							

8. SISTEMAS DE ACCESO PARA ALTURAS

Escalera de Extensión		Escalera tipo Tijera		Andamio		Man Lift	
Escalera tipo Avión		Escalera tipo Gato		Grúa Canasta		Elevador de personas	
Escalera fija con LVV		Pretales		Montacargas		Otro, Cual?	

9. MEDIDAS DE PREVENCION

Uso de Demarcación		Ubicación de Barandas		Charla de 5 minutos		Bloqueo Eléctrico	
Uso de Señalización		Control de Acceso		Control de Huecos u orificios		Bloqueo Mecánico	
Equipo de Prim. Auxilios		Extintor		Bloqueo y Etiquetado		Puesta a tierra	

10. LISTA DE CHEQUEO

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
Se realizó el Analisis de Trabajo Seguro? (ATS)	✓		
El personal cumple con los requisitos de aptitud medica para realizar la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio	✓		
El personal cuenta con el pago de seguridad social (Eps - Afp - Arl) vigente	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados	✓		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar	✓		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente	✓		
Se ha instalado cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	✓		
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caidas	✓		
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida		✓	
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores	✓		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro	✓		
Las cuerdas se encuentran libres de nudos	✓		
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos	✓		
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación			✓
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario	✓		
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios	✓		
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas	✓		
Se ha revisado las condiciones de riesgo teniendo en cuenta líneas energizadas o equipos electricos	✓		

11. DESIGNACION DE AYUDANTE

Nombre: Luis Saputeda	Cedula: 1131104605
Firma: Luis	Cargo: O.f

12. AUTORIZACION DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: He verificado con el Ejecutor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo	RESPONSABLE DE VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD: He verificado con el Emisor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y me comprometo a comunicarlos al grupo ejecutor, considero seguro proceder con la ejecución de este trabajo. (Coordinador en alturas)
Nombre: Victor Ovr	Nombre: Stephanny Garay
Cédula: 92517057	Cédula: 1.131.104.122
Firma:	Firma: Stephanny
Cargo: Residente de Obras	Cargo: Aux SST.

12. CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA- SST F051
		Versión: 01 - 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

1. GENERALIDADES

INICIO DEL PERMISO				FINALIZACION DEL PERMISO			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
02	12	2024	7:00am.	07	12	2024.	5:00pm.

EMPRESA QUE SOLICITA EL PERMISO	CONSORCIO MONTAJES RURAL CMO.
LUGAR DONDE SE VA REALIZA EL TRABAJO	Bloque 3 Obra hospital.
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (m)	7m.
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Armado de Formaleta para Vaciado de Losa

2. CLASE DE PERMISO

TRABAJO EN ALTURAS	✓	ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO EN EXCAVACION	
TRABAJO ELECTRICO		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN FRIO		OTRO CUAL?	

3. RIESGOS ASOCIADOS

FISICO		QUIMICO		BIOLOGICO		COND.SEGURIDAD		BIOMECANICOS		NATURALEZA	
Ruido		Polvos	✓	Virus	✓	Mecánico	✓	Postura	✓	Lluvias	✓
Iluminación		Líquidos		Bacterias	✓	Locativo	✓	Esfuerzo	✓	Vendaval	
Vibración		Gas/Vapor		Hongos		Eléctrico		Mov. Repetitivo	✓	Inundación	
Temperatura	✓	Niebla/Rocio	✓	Protista		Tecnológico		Manip. Manual	✓	Derrame	
Radiación		Humo Metálico		Picaduras	✓	Acc. Transito				Sismo	
Ionizante	✓	Mat. Particulado		Mordeduras		Públicos				Terremoto	
				Fluidos		Trabajo alturas	✓				
SICOSOCIAL		Contenido tarea		Org. Trabajo	✓	Relac.Humanos	✓	Monotonia		Gestión	
AMBIENTAL		Derrames o Fugas		Aguas Residu. Industriales		Aguas Residual Domesticas		Residuos Sólid. Ordinarios		Residuos Peligrosos	

4. PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1.	Yenci Hernandez	1003561821	Obrero	Yenci Hernandez
2.	Carlos Sierra	1.131.106.611	Obrero	
3.	Peralta Germon	1005709688	Obrero	
4.	Jairo Rojas	18857561	Obrero	
5.	Jairo Martinez	1121107808	Obrero	
6				
7				
8				

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo	✓	Protección Auditiva		Overol - Ropa de trabajo	✓	Careta para soldar	
Gafas de Seguridad	✓	Protección Respiratoria		Peto - Delantal		Careta con visor	
Botas de Seguridad	✓	Equipo de Autocontenido		Protector facial		Otro	

6. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Punto de Anclaje		Arnes cuerpo completo	✓	Eslinga de Posicionamiento		Línea de Vida Horizontal	✓
Cinta de Anclaje (Tie Off)		Descendedores		Eslinga de Detención caída	✓	Línea de Vida Vertical	
Mosqueton		Ascendedores		Arrestador o Freno		Línea de Vida Retráctil	

7. EQUIPO A UTILIZAR

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	TSA- SST F051
		Versión: 01 - 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

1. GENERALIDADES

INICIO DEL PERMISO				FINALIZACION DEL PERMISO			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
02	12	2024	7:00am.	01	12	2024	5:00pm.

EMPRESA QUE SOLICITA EL PERMISO: CONSORCIO MONTAJES RURAL CMO.

LUGAR DONDE SE VA REALIZA EL TRABAJO: Bloque 3 Obra Hospital.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (m): 7m.

DESCRIPCION DEL TRABAJO: Armado de Tarima para Vaciado de Losa

2. CLASE DE PERMISO

TRABAJO EN ALTURAS	✓	ESPACIOS CONFINADOS		TRABAJO EN CALIENTE		TRABAJO EN EXCAVACION	
TRABAJO ELECTRICO		IZAJE DE CARGAS		TRABAJO EN FRIO		OTRO CUAL?	

3. RIESGOS ASOCIADOS

FISICO		QUIMICO		BIOLOGICO		COND.SEGURIDAD		BIOMECANICOS		NATURALEZA	
Ruido		Polvos	✓	Virus	✓	Mecánico	✓	Postura	✓	Lluvias	✓
Iluminación		Liquidos		Bacterias	✓	Locativo	✓	Esfuerzo	✓	Vendaval	
Vibración		Gas/Vapor		Hongos		Eléctrico		Mov. Repetitivo	✓	Inundación	
Temperatura	✓	Niebla/Rocio	✓	Protista		Tecnológico		Manip. Manual	✓	Derrame	
Radiación		Humo Metálico		Picaduras	✓	Acc. Transito				Sismo	
Ionizante	✓	Mat. Particulado		Mordeduras		Públicos				Terremoto	
				Fluidos		Trabajo alturas	✓				
SICOSOCIAL		Contenido tarea		Org. Trabajo	✓	Relac Humanas	✓	Monotonía		Gestión	
AMBIENTAL		Derrames o Fugas		Aguas Residu. Industriales		Aguas Residual Domesticas		Residuos Sólid. Ordinarios		Residuos Peligrosos	

4. PERSONAL AUTORIZADO PARA EJECUTAR EL TRABAJO

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yenes Hernandez	1002561521	obrero	Yenes Hernandez
2	Carlos Sierra	1.531.106.614	Obrero	
3	Peralta Gorman	1005709688	Obrero	
4	Jairo Ramos	1885756l	obrero	
5	Pedro Martinez	1121107808	Obrero	Pedro Martinez
6				
7				
8				

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco con barbuquejo	✓	Protección Auditiva		Overol - Ropa de trabajo	✓	Careta para soldar	
Gafas de Seguridad	✓	Protección Respiratoria		Peto - Delantal		Careta con visor	
Botas de Seguridad	✓	Equipo de Autocontenido		Protector facial		Otro	

6. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

Punto de Anclaje		Arnes cuerpo completo	✓	Eslinga de Posicionamiento		Línea de Vida Horizontal	✓
Cinta de Anclaje (Tie Off)		Descendedores		Eslinga de Detención caída	✓	Línea de Vida Vertical	
Mosqueton		Ascendedores		Arrestador o Freno		Línea de Vida Retráctil	

7. EQUIPO A UTILIZAR

Escaneado con CamScanner

Herramienta mano	✓	Pulidora		Alicates		Voltimetro	
Herram. Eléctricas		Taladro		Pinzas		Amperimetro	
Herram. Neumáticas		Rotomotor		Destornilladores		Ventiladores	
Herram. Hidráulicas		Compresor		E. Soldadura / oxicorte		Extractores	
Otros:							

8. SISTEMAS DE ACCESO PARA ALTURAS

Escalera de Extensión		Escalera tipo Tijera		Andamio	✓	Man Lift	
Escalera tipo Avión		Escalera tipo Gato		Grúa Canasta		Elevador de personas	
Escalera fija con LVV		Pretales		Montacargas		Otro, Cual?	

9. MEDIDAS DE PREVENCION

Uso de Demarcación		Ubicación de Barandas		Charla de 5 minutos	✓	Bloqueo Eléctrico	
Uso de Señalización	✓	Control de Acceso		Control de Huecos u orificios		Bloqueo Mecánico	
Equipo de Prim. Auxilios	✓	Extintor		Bloqueo y Etiqueteado		Puesta a tierra	

10. LISTA DE CHEQUEO

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	N/A
Se realizó el Análisis de Trabajo Seguro? (ATS)	✓		
El personal cumple con los requisitos de aptitud medica para realizar la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea	✓		
El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio	✓		
El personal cuenta con el pago de seguridad social (Eps - Afp - Arl) vigente	✓		
El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados	✓		
Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar	✓		
El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente	✓		
Se ha instalado cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas	✓		
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas	✓		
Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida		✓	
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores	✓		
Los conectores o mosquetones son de doble seguro	✓		
Las cuerdas se encuentran libres de nudos	✓		
Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos	✓		
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación			✓
Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo	✓		
Esta presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario	✓		
El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse	✓		
El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate	✓		
Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios	✓		
Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas	✓		
Se ha revisado las condiciones de riesgo teniendo en cuenta lineas energizadas o equipos electricos			

11. DESIGNACION DE AYUDANTE

Nombre Juan David Ramos Diaz	**Cedula** 1131114781
Firma:	**Cargo** obrero

12. AUTORIZACION DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: He verificado con el Ejecutor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.	**RESPONSABLE DE VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD:** He verificado con el Emisor la aplicación del SG-SST y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y me comprometo a comunicarlos al grupo ejecutor, considero seguro proceder con la ejecución de este trabajo. (Coordinador en alturas)
Nombre: Jose Antonio Hernandez	Nombre: Stephanny Gomez
Cédula 8741258.	Cédula 1.131.104.177
Firma: Jose A Hernandez G.	Firma: Stephanny G.
Cargo: Maestro.	Cargo: Aux SST.

12. CANCELACION / CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	CARGO	FECHA	HORA	MOTIVO

Escaneado con CamScanner

Anexo 17, Listado máquina, vehículo, herramientas y equipos.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
	INVENTARIO E INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Cod: SST-F15
		Pag. 1 de 1

PROTECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA DE INSPECCIÓN:	20/12/2024.

HERRAMIENTA / EQUIPOS	CANTIDAD	ESTADO	
		CANT. BUENO	CANT. DEFECTUOSA
Lampara Led	5	5	0
Disco Sierra 7"	10	10	0
Palas Redondas.	22	18	4
Palas Cuadradas.	9	7	2
Canguro.	1	1	0
Rana	1	1	0
Sisaya.	2	2	0
Carretillas.	10	10	0
Llave. Expansiva	1	1	0
Destornillador	1	1	0
Soldadora	1	1	0
Caleta pare y Siga	2	2	0
Conos	4	4	0
Llave Expansiva	1	1	0
Cerchas 1065	1065	1065	0
Gatos 3m	378	378	0
Gatos 1m	302	302	0
Gatos 4m	250	250	0
Gatos Extra largos.	391	391	7
Escalera Metalica	1	1	0
Disco Diamantado	1	1	0
Sumergible.	1	1	0
Equipo de Soldar	1	1	0
Vibro	1	1	0
Machete.	2	2	0
Monas.	2	2	0

RESPONSABLES

NOMBRE	NOMBRE
Luis Salgado	Stephanny Garay.
FIRMA COORDINADOR SST	FIRMA AUXILIAR SST

Anexo 18, Inventario de señalización

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F14
	INSPECCION E INVENTARIO DE SEÑALIZACION	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**

FECHA DE INSPECCIÓN	**30/12|/2024**

TIPO DE SEÑALIZACION	CANTIDAD	INSPECCION SAÑALIZACION		REPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		CANT. BUENO	CANT. MALO		
SALIDA DE EMERGENCIA	5	5	0		
PUNTO DE ENCUENTRO	0	0	0		
RIESGO ELECTRICO	5	5	0		
RESIDUOS PELIGROSOS	1	1	0		
BODEGA	1	1	0		
OBRA EN CONSTRUCCION	2	2	0		
BAÑO HOMBRE	1	1	0		
EXTINTOR	1	1	0		
PRECAUCION ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULO	2	2	0		
INICIO DE OBRA	2	2	0		
VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO	1	1	0		
USE GAFAS	1	1	0		
CAMILLA DE EMERGENCIA	2	2	0		
USE CASCO	1	1	0		
PELIGRO CAIDA A MISMO NIVEL	5	5	0		
PARQUEADERO DE MÁQUINAS	1	1	0		
SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA	5	5	0		
SALIDA DE EMERGENCIA DERECHA	6	6	0		
USE MASCARILLA	1	1	0		
USE PROTECTOR AUDITIVO	1	1	0		
USE GUANTES	1	1	0		
LIBRE DE HUMO	1	1	0		
PELIGRO LIQUIDOS INFLAMABLES	1	1	0		
PERSONAL AUTORIZADO	2	2	0		

RENPONSABLE :	
FIRMA COORDINADOR SST	**FIRMA AUXILIAR SST**

Anexo 19, Seguimiento de subcontratista

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**CONTROL DE SUBCONTRATISTA**	VERSION 1 COD: SST-F055

Fecha de Control	**Día**	**MES**	**Año**
	20	12	2024.
Proyecto	"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FDO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA (Razón Social)	Ingel cor. SAS.		
NIT	812000053.		

ACTIVIDADES	Cargue y descargue material ☐		Fundicion concreto ☐	
	Servicio de Mantenimiento ☑	Reparaciones ☐	Urbanismo ☐	
	Otro cual:			
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO	Trabajo en altura ☐	Espacios Confinados ☐	Trabajo en Caliente ☐	
	Trabajo Eléctrico ☑	Trabajo Con Sustancias Químicas ☐		

ASPECTOS A EVALUAR

Criterios	C	NC	N/A	Observación
Planilla de Pago a Seguridad Social o radicados de afiliacion	✓			
Elementos de Protección Personal	✓			
Maquinaria, Equipos y Herramientas	✓			
Cumplimiento de Normas y Procedimientos	✓			
Evalauaciones medicas ocumacionales de ingreso o especificos	-		✓	
Evalauaciones medicas ocumacionales de ingreso o especificos	-		✓	
Accidentes e Incidentes de Trabajo	✓			
Participación en actividades del SST	✓			
Induccion-perfil sociodemografico- notificacion de riesgo ETC			✓	
Atención a los Requerimientos y Solicitudes	✓			
Proveedor de maquinaria debe soportar los siguiente documentación: Registro de importación de ADUANA, Cedula del operador, Afiliación o pago de seguridad social del operador, Certificado de mantenimientos preventivos realizado o buen funcionamiento de la maquinaria. Certificado de experiencia o estudios como operador maquina.	✓			
Para el transporte de materiales permanente en obra, el subcontratista de volco debe presentar los sgtes documentos: Licencia de transito, SOAT, Certificado de técnico mecánica y de gases, Cedula de conducto, Licencia de conducción del conductor vigentges.	✓			

ASPECTOS A MEJORAR - OBSERVACIONES

Stephanny Garay
INSP SST

Ivan G.
NOMBRE Y FIMA - SUBCONTRATISTA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cod: SST-F42
	Listado del personal - Subcontratado	Pag. 1 de 1

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO : DICIEMBRE DE 2024

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	EMPRESA	NIT	Cargo	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	MANUEL JOSE MARTINEZ DIAZ	1003034906	INGELCOR SAS	812000053	AUX ELECTRICISTA	24/09/2024		COLMENA	SALUDTOTAL	PENDIENTE
2	JOSE JORGE PAEZ HERRERA	1002324886	INGELCOR SAS	812000053	AUX ELECTRICISTA	24/09/2024		COLMENA	COMPENSAR	PENDIENTE
3	OBERT LUIS ALTAMIRANDA DIAZ	1063154691	INGELCOR SAS	812000053	AUX ELECTRICISTA	24/09/2024		COLMENA	MUTUALSER	COLFONDOS
4	EVER ENRIQUE MARTINEZ LOPEZ	11036321	INGELCOR SAS	812000053	AUX ELECTRICISTA	24/09/2024		COLMENA	MUTUALSER	COLPENSIONES
5	JUAN DAVID MARZAN PEÑATE	1029720262	INGELCOR SAS	812000053	AUX ELECTRICISTA	19/11/2024		COLMENA	PENDIENTE	PORVENIR
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

Anexo 20, Acta de conformación del COPASST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ACTA REUNION COPASST	Versión 1 Hoja 1 de 5

ACTA DE REUNIÓN COPASST
ACTA No. 2

Objetivo:

Seguimiento a las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo: Capacitación funciones y responsabilidades del Copasst.

Fecha:	20/12/2024
Hora de inicio y terminación	10:30am / 11am
Lugar:	Obra hospital

1. Asistentes

NOMBRE	CARGO
Pamela Ospino Jimenez.	Presidente designado por el empleador
Luisa Fda Sibaja Ulloa.	Integrante principal trabajadores
German Peralta Cardenas.	Integrante principal trabajadores
Alvaro Manjarres Oviedo	Integrante suplente trabajadores
Gustavo Adolfo Ramos Diaz.	Integrante suplente trabajadores
	Integrante principal del empleador
	Integrante principal del empleador
	Integrante suplente del empleador
	Integrante suplente del empleador
Stephanny Baray.	auxiliar sst

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Orden del día
3. Lectura acta anterior
4. Seguimiento de actividades del periodo
5. Seguimiento de enfermedades laborales y accidente de trabajo durante el tiempo de ejecución del proyecto.
6. Seguimiento al ausentismo de acuerdo a la norma

7. Seguimiento al pago de aportes a seguridad social
8. Proposiciones.
9. Compromisos
10. Cierre de reunión

2. Desarrollo

1. Verificación del quórum
   Siendo las 10:30 am. Habiendo quórum reglamentario se dio inicio a la reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Aprobación del orden del día: Se da aprobación del orden del día por parte de los miembros asistentes.

3. Se da lectura del acta anterior, donde se hace seguimiento de las actividades del cronograma de inspecciones planeadas, plan de trabajo y entrega de epp.

4. Seguimientos de actividades

   - En el periodo ingreso personal subcontratado y reingreso personal directo, los cuales se les realiza las actividades preliminares de inducción o reinducción etc

   - **Seguimientos de las actividades del cronograma de inspecciones planeadas**: se da revisión al cronograma de inspecciones planeadas, donde no todas las actividades programadas se llevan a cabo en el periodo, dado que algunos equipos no son utilizados en las actividades desarrolladas. Por tanto, se observa que se selecciona el "NA" no aplica. Dando así el cumplimiento del 100% de las inspecciones planeadas de seguridad.

   - **Seguimiento del cronograma de capacitaciones y plan anual de trabajo:** se viene ejecutando las actividades programas de acuerdo al cronograma y plan de trabajo; adicional a lo anterior se vienen ejecutando el plan de trabajo con la ARL y actividades adicionales; las cuales se relacionan a continuación:

CAPACITACIONES/ACTIVIDADES /JORNADAS		
TEMA	ENTIDAD	FECHA
RUMBA TERAPIA / ZUMBA	PERSONA NATURAL	20/11/2024
CUIDADO DE LA PIEL	SALUD TOTAL	8/11/2024
OFTALMOLOGÍA	SALUD TOTAL	8/11/2024
BRIGADA DE EMERGENCIA	ARL	7/11/2024
HERRAMIENTAS MANUALES	ARL	26/11/2024
TAMIZAJE CARDIOVASCULAR	SALUD TOTAL	24/09/2024
ALTURA - ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO	ARPA SAS	14/10/2024

- **Verificación de entrega de EPP**: Los EPP se entregan oportunamente a cada trabajador: mascarilla desechable, botas de seguridad, casco de seguridad, gafas de seguridad de acuerdo a la exposición de riesgo; a través del encargado de SST. Se realiza requerimiento para tener inventario y solicitud de dotación para los ingresos realizados en el mes.

5. **Seguimiento de enfermedades laborales y accidente de trabajo:** De acuerdo a los indicadores de accidentalidad y ausentismo (Resolución 0312 de 2022), se determina que durante el tiempo que se viene ejecutando las actividades en el proyecto, se han presentado ocho (10) accidentes de trabajo; de los cuales todos son calificados como leves.

- **Accidentes que se han presentado año 2024**

Contrato 057453306 Documento N901011441

Empresa CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

8000600082 - COVEÑAS - COVEÑAS


Fecha accidente	Expediente	Documento	Nombre	Tipo de Afiliado	Diagnóstico	Días de Incapacidad
29-08-2024	1520209105	C1002665736	AGAMEZ JIMENEZ ROBERTO ANTONIO	DEP	CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0
02-10-2024	1520210710	C1007248363	CARDENAS BOHORQUEZ JEAN CARLOS	DEP	HERIDAS DE OTRAS PARTES DE LA MUNECA Y DE LA MANO	0
19-10-2024	1520211064	C72215603	DIAZ ACOSTA ENOC	DEP	CONTUSION DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DEL PIE	0
08-11-2024	1520212120	C1064310879	DORIA TIRADO IVAN DANILO	DEP	CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UNA(S)	0
18-09-2024	1520210172	C15682314	GARZON LOPEZ JORGE ELIECER	DEP	HERIDA DE LA MUNECA Y DE LA MANO, PARTE NO ESPECIFICADA	0
09-12-2024	1520213219	C1131108476	JULIO MILLAN MANUEL DE JESUS	DEP	CUERPO EXTRANO EN PARTE EXTERNA DEL OJO, SITIO NO ESPECIFICADO	0
02-10-2024	1520210774	C1005708736	MENDOZA MARTINEZ LUIS ALFONSO	DEP	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL LABIO Y DE LA CAVIDAD BUCAL	0
12-09-2024	1520208935	C56083707	MONSALVO CASTRO HEYNER ALFONSO	DEP	HERIDAS DE OTRAS PARTES DE LA MUNECA Y DE LA MANO	0
03-10-2024	1520210780	C1128504810	MONTERROZA GONZALEZ DANIEL DAVID	DEP	CONTUSION DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UNA(S)	0
31-10-2024	1520211815	C1131104278	SIERRA ZUÑIGA KEVIN DAVID	DEP	CONTUSION DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS	0

Número accidentes sentro de trabajo 10 Días de incapacidad pagados centro de trabajo 0

Accidentes calificados que se han presentado y que fueron calificados como leves

- **Gráfico de tendencia de accidentalidad**

Contrato	Documento	Empresa
097453305	N901811441	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

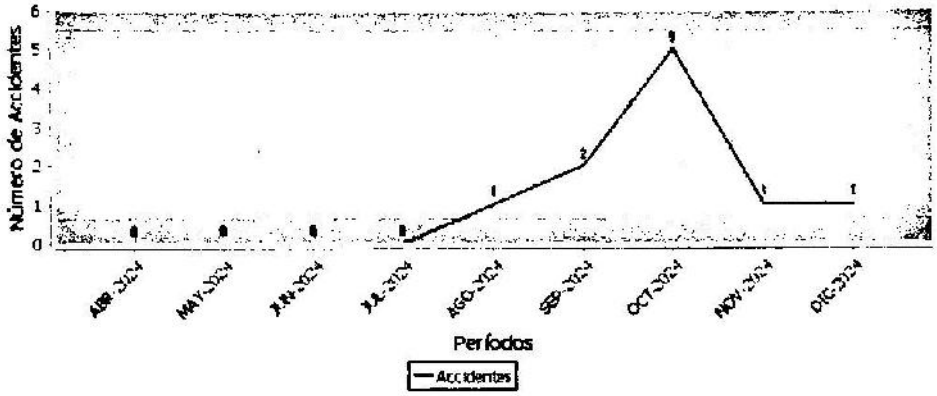

Fecha de proceso: 18-12-2024 07:11:23

Se evidencia que en el mes de octubre fue donde mas se ha presentado accidentes durante la ejecución de las actividades,

6. Seguimiento del pago de seguridad social

El consorcio por concepto de seguridad social se encuentra al día.

7. Preposiciones

Ninguno

8. Compromisos

3. *Compromisos (si aplica)*			
N°	Actividades	Fecha	Responsable
1.	*Ejecutar el plan de acción de todos los accidentes*	*Diciembre 2024*	*Área SST*
2.	*Socializar lecciones aprendidas*	*Diciembre 2024*	*Área SST*
3.	*Revisar cobertura de todo el personal*	*Diciembre 2024*	*Área SST*

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ACTA REUNION COPASST	Versión 1 Hoja 5 de 5

Siendo las _____ horas se da por terminada la reunión, Para constancia se anexa firma de los asistentes

Presidente

Representante del empleador principal

VoBo Stephanny Garay

Auxilar de SST

Representante de los trabajadores

Gustavo Ramos

Representante de los trabajadores

Representante del empleador

Anexo 21, Inspección de orden y aseo

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO	Cod: SST-F06
		VERSION 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

AREA O FRENTE INSPECCIONADO: Obra.

5 "S"	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	Fecha de ejecución: 07/12/2024. Insp. 1		
		Nivel 1	Nivel 3	Nivel 5
SEIRI Clasificar	1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación.	✓		
	2.Existen acopio de materiales (Mecanicos o civiles)			✓
	3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehículos señalizada.			✓
	4. El almacenamiento de combustible es adecuado/Dique			✓
	5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos.			✓
	6, Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos.	✓		
	7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo.			✓
	8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas.			✓
	9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra.			✓
	10. Existe delimitación /Señalización de Excavaciones.			✓
	11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente.			✓
	12.Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente.			✓
SEITON Ordenar	13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados.			✓
	14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.			✓
	15. La maquinaria se encuentera correctamente ordenada y limpia.		✓	
	16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo.		✓	
	17. Las vias de acceso se encuentran libres de obnstaculos como herramientas y demas objetos.			✓
	18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas.			✓
	19. El punto ecologico se encuentra ordenadoen cueanto a residuos generados en la obra.			✓
	20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas.			✓
	21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente.			✓
	22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables			✓
SEISO Limpiar Inspeccionar	23. Los trabajadores disponen de un area para ubicar sus pertenencias.			✓
	24, Las baterias sanitarias se encuentran limpias.			✓
	25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de obstaculos, grasas y barro.		✓	
	26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios.			✓
	27, Se dispone de elementos para el aseo de los EPP			✓
	28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad.			✓
Seiketsu ESTANDARIZAR.	29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo.			✓
	30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante)			✓
Shitzuke. DISCIPLINA Y SEGUIMIENTO.	31.Se mantiene como habito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s"			✓
	32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores?			✓
	33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo?			✓
	34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones?			✓

Calificación para cada estandar

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar).

Observaciones de la inspección:

Firma de quien realiza la inspección: Stephanny Garay

Firma del coordinador SST:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO	Cod: SST-F06
		VERSION 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

AREA O FRENTE INSPECCIONADO: obra hospital.

5 "S"		Fecha de ejecución	14/12/2024.	
	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	Insp. 1		
		Nivel 1	Nivel 3	Nivel 5
SEIRI Clasificar	1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación.			✓
	2.Existen acopio de materiales (Mecanicos o civiles)			✓
	3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehículos señalizada.			✓
	4. El almacenamiento de combustible es adecuado/Dique			✓
	5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos.			✓
	6, Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos.			✓
	7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo.			✓
	8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas.			✓
	9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra.			✓
	10. Existe delimitación /Señalización de Excavaciones.			✓
	11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente.		✓	
	12.Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente.		✓	
SEITON Ordenar	13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados.			✓
	14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.			✓
	15. La maquinaria se encuentera correctamente ordenada y limpia.			✓
	16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo.			✓
	17. Las vias de acceso se encuentran libres de obnstaculos como herramientas y demas objetos.			✓
	18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas.			✓
	19. El punto ecologico se encuentra ordenadoen cueanto a residuos generados en la obra.			✓
	20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas.			✓
	21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente.			✓
	22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables			✓
SEISO Limpiar Inspeccionar	23. Los trabajadores disponen de un area para ubicar sus pertenencias.			✓
	24, Las baterias sanitarias se encuentran limpias.			✓
	25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de obstaculos, grasas y barro.			✓
	26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios.		✓	
	27, Se dispone de elementos para el aseo de los EPP		✓	
	28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad.		✓	
Seiketsu ESTANDARIZAR.	29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo.			✓
	30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante)			✓
Shitzuke. DISCIPLINA Y SEGUIMIENTO.	31.Se mantiene como habito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s"			✓
	32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores?			✓
	33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo?			✓
	34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones?			✓

Calificación para cada estandar

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar).

Observaciones de la inspección:

Firma de quien realiza la inspección:

Firma del coordinador SST:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO	Cod: SST-F06
		VERSION 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

AREA O FRENTE INSPECCIONADO: Obra hospital.

5 "S"	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	Fecha de ejecución: 21/12/24. Insp. 1		
		Nivel 1	Nivel 3	Nivel 5
SEIRI Clasificar	1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación.			✓
	2.Existen acopio de materiales (Mecanicos o civiles)			✓
	3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehículos señalizada.			✓
	4. El almacenamiento de combustible es adecuado/Dique			✓
	5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos.			✓
	6, Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos.			✓
	7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo.			✓
	8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas.			✓
	9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra.			✓
	10. Existe delimitación /Señalización de Excavaciones.			✓
	11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente.			✓
	12.Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente.		✓	
SEITON Ordenar	13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados.		✓	
	14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.			✓
	15. La maquinaria se encuentera correctamente ordenada y limpia.			✓
	16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo.			✓
	17. Las vías de acceso se encuentran libres de obnstaculos como herramientas y demas objetos.			✓
	18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas.			✓
	19. El punto ecologico se encuentra ordenadoen cueanto a residuos generados en la obra.			✓
	20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas.			✓
	21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente.			✓
	22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables			✓
SEISO Limpiar Inspeccionar	23. Los trabajadores disponen de un area para ubicar sus pertenencias.			✓
	24, Las baterias sanitarias se encuentran limpias.			✓
	25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de obstaculos, grasas y barro.		✓	✓
	26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios.		✓	
	27, Se dispone de elementos para el aseo de los EPP			
	28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad.			✓
Seiketsu ESTANDARIZAR.	29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo.			✓
	30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante)			✓
Shitzuke. DISCIPLINA Y SEGUIMIENTO.	31.Se mantiene como habito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s"			✓
	32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores?			✓
	33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo?			✓
	34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones?			✓

Calificación para cada estandar

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar).

Observaciones de la inspección:

Firma de quien realiza la inspección:

Firma del coordinador SST:

Escaneado con CamScanner

Anexo 22. Registro fotográfico generales

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	SST F-044
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**CONTRATO N°**	No LP-018-2023	**PLAZO**	18 MESES
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024,	**CONTRATO N°**			
NOMBRE DEL PROYECTO	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**				
PERIODO	**DICIEMBRE DE 2024**				

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS DE CADA COMPONENTE A EVALUAR

REGISTRO No.	1	REGISTRO No.	2
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	**VALLA PRINCIPAL**	**BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO**	**JORNADA DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN**
REGISTRO No.	**3**	**REGISTRO No.**	**4**
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	**INTEGRACION CON GOBERNACION**	**BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO**	**INTEGRACION CON GOBERNACION**
REGISTRO No.	**5**	**REGISTRO No.**	**6**
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	**PLANOS DE EVACUACION Y MEDEVAC**	**BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO**	**REUNION CON VEEDURÍA**
REGISTRO No.	**7**	**REGISTRO No.**	**8**
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	**INPECCION BOTIQUIN**	**BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO**	**SEÑALIZACIÓN DE PROXIMIDAD**
REGISTRO No.	**9**	**REGISTRO No.**	**10**

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

EQUIPAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS

REGISTRO No. 11

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

JORNADA DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN

REGISTRO No. 12

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

INSPECCION KIT DE DERRAMES

REGISTRO No. 13

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

INSPECCION EXTINTOR

REGISTRO No. 14

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS Y ATS

REGISTRO No. 15

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

JORNADA DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN

REGISTRO No. 16

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

REUNION CON VEEDURÍA Y CONTRATISTA

REGISTRO No. 17

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

REGISTRO No. 18

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA

REGISTRO No. 19

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

BRIGADA DE EMERGENCIA- EVACUACION DE HERIDO

REGISTRO No. 20

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

REPOSICION DE EPP

REGISTRO No.	19	REGISTRO No.	20
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
PUNTO ECOLÓGICO		CAMPAMENTO	
REGISTRO No.	21	REGISTRO No.	22
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
CONTROLES VIALES		BODEGA	
REGISTRO No.	23	REGISTRO No.	24
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
BODEGA DOTACION Y EPP		EQUIPOS ALTURAS	

ANEXO 8.4

BITACORA

entrepiso, y muro de contencion. figuracion y colocacion de acero para losa y muro de Contencion, Instalaciones electricas
Bloque 2: Armado y Colocacion de formaleta para losa de entrepiso y tanque subterraneo, figuracion y Colocacion de acero para losa y tanque Subterraneo.
Bloque 3: Armado y Colocacion de formaleta para losa de cubierta figuracion y Colocacion de acero para losa de cubierta.
Se ejecutaron actividades de Instalaciones Sanitarias y Ubicacion y colocacion de puntos electricos Sobre losa en Bloque 1.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, Ambiental y HSC.

Nov. 30/24 → Dia Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria, Cuadrilla Sanitaria, Ingeniero Civil.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades ejecutadas:
Bloque 1: Fundida de losa de entrepiso con concreto de 4000 PSI, fundida de un tramo de muro de Contencion en el eje 9, entre ejes H-I.
Bloque 2: Fundida de 9 Columnas con concreto de 4.000 PSI. (D8, D9, D11, E8, E9, E10, F8, F9 y F10); armado y colocacion de Formaleta para losa de entrepiso y tanque Subterraneo, figuracion y Colocacion de acero para losa de entrepiso y tanque Subterraneo.
Bloque 3: Fundida de 3 Columnas con concreto de 4000 PSI, (A5, C5 y B6); armado y Colocacion de Formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta.
Se ejecutaron actividades de Instalacion Sanitarias
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los

Componentes Social, Ambiental y HSC.

Dic 2/24 → Dia Soleado.
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria Cuadrilla Sanitaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofre de formaleta de muro de Contencion, armado y colocacion de formaleta para Columnas y muro de Contencion, figuracion y Colocacion de acero para Columnas y muro de Contencion
Bloque 2: Armado y colocacion de formaleta para losa de entrepiso y muro de Contencion, figuracion y colocacion de acero para losa de entre piso y tanque Subterraneo.
Bloque 3: Armado y Colocacion de formaleta para losa de entrepiso, figuracion y Colocacion de acero para losa de entrepiso.
Se ejecutaron actividades de Instalaciones Sanitarias, Construccion de registros de agua lluvia. Se ejecutaron actividades de los componentes Social, Ambiental y Siso.

Dic. 3/24 → Dia Soleado, lluvias al final de la jornada (5:15 PM)
Personal en Obra: Director de Obra, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Ingeniero Civil, Residente Social, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria, Cuadrilla Sanitaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta y

Columnas y Muro de Contención, Figuración y Colocación de Acero para Columnas y muro de contención.
Bloque 2: Armado y Colocación de formaleta para losa, tanque Columnas y losa de cubierta, Figuración y Colocación de acero para losa de entrepiso y tanque subterraneo.
Bloque 3: Armado y Colocación de formaleta para losa de Cubierta, Figuración y Colocación de acero para losa de Cubierta. Construcción de registros Sanitarios y aguas lluvias.
Se realizaron las actividades pertinentes a los componentes Social, Ambiental y HSE.

Dic. 4/24 → Día Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Residente Ambiental, 4 Maestros de Obra, Cuadrilla Sanitaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Fundida de 9 Columnas (G12, G13, G14, H12, H13, H14, I12, I13, I14, I9, I8), fundida de un tramo de muro de contención a altura de 2.40, Se continuo el armado, Figuración y colocación de acero para Columnas.
Bloque 2: Se continuo el armado y Colocación de Formaleta para losa de entrepiso y losa de Cubierta, ~~tanque~~ subterraneo, figuración y Colocación de acero para losa de entrepiso y tanque subterraneo.
Bloque 3: Se Continuó con el armado y colocación de formaleta de losa de Cubierta, figuración y colocación de acero para losa de Cubierta, excavación para viga-cimiento y zarpa para rampa peatonal.
Se continuaron con las actividades de Instalaciones Sanitarias y aguas lluvias, con la Construcción de Registros Sanitarios.
Se ejecutaron las actividades de los componentes Social, Ambiental y HSE respectivamente.

Dic 5/24 — Día Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Ingeniero Civil, Residente Ambiental, Residente Social, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria, cuadrilla Sanitaria, Cuadrilla Electrica,
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas: Se iniciaron las labores en los frentes y a las 9:00 am, paralizaron las actividades, debido al no pago de Mano de Obra, por Impases presentados en la ejecucion de los correspondientes Cheques.

Dic. 6/24 → Día Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Ingeniero Civil, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra cuadrilla electrica,
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para Columnas, F
Bloque 2: Armado y Colocación de formaleta para losa de entrepiso Figuración y Colocacion de acero para losa de entrepiso, Instalacion de puntos electricos sobre losa de entrepiso.
Bloque 3: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de cubierta. Se ejecutaron los componentes Social, Ambiental y HSE.

Dic 7/24 → Día Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoría, Auxiliar Siso, 3 Maestros en Obra.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocación de formaleta para losa de Cubierta, fundida de 9 Columnas
Bloque 2: Fundida de Losa de entrepiso,
Bloque 3: Armado y Colocación de formaleta para losa de Cubierta, figuración y Colocación de acero para losa de Cubierta.
Se desarrollaron las actividades correspondientes a los Componentes Social, Ambiental y HSE.

Dic 9/24 → Día Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoría, Auxiliar Siso, 3 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria, Cuadrilla Sanitaria, personal administrativo.
Maquinaria y Equipo: 1 Mini cargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocación de formaleta para losa de Cubierta.
Bloque 2: Armado y Colocación de Formaleta para losa de entrepiso y tanque Subterraneo; figuración y Colocación de acero para tanque Subterraneo.
Bloque 3: Armado y Colocación de formaleta para losa de Cubierta; figuración y Colocación de acero para losa de Cubierta.
Se ejecutaron actividades de Instalaciones Sanitarias y los Componentes Social, Ambiental y HSE.

Dic 10/24 → Día Soleado.
Personal en Obra: Personal: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoría, Auxiliar Siso, Residente ambiental, Residente Social, 4 Maestros de Obra, 2 Operador de Maquinarias, Cuadrilla Sanitaria.
Maquinaria y Equipo: 2 Minicargadores. (Ingresa Minicargador)
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocación de formaleta para losa de Cubierta, relleno con material de excavación Seleccionado previo de Contención.
Bloque 2: Armado y Colocación de formaleta para losa de Cubierta, armado y Colocación de formaleta para tanque Subterraneo, Figuración y colocación de acero para tanque Subterraneo.
Bloque 3: Armado y Colocación de formaleta para losa de Cubierta, Figuración y Colocación de acero para losa de Cubierta.
Se Continuo con la Instalación de tubería de aguas lluvias. Se realizo comité interno con funcionarios de la Veeduría.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los Componentes ambiental, social y HSE.

Dic 11/24 → Día Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Auxiliar Siso, Residente de Interventoría, Ingeniero Civil, 4 Maestro de Obra, 2 operadores de maquinaria, Cuadrilla Sanitaria.
Maquinaria y Equipo: 2 Minicargadores
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocación de Formaleta para losa de Cubierta, figuración y colocación de acero para losa de Cubierta, lleno de zapatas y Ciclopeo con material de Excavación Seleccionado en ejes I8, I9.
Bloque 2: Armado y Colocación de Formaleta para Columnas, Losa de Cubierta y tanque Subterraneo, figuración y Colocación de acero para tanque ~~Sub~~terraneo.
Bloque 3: Armado y Colocación de formaleta para Losa

de cubierta. Se continua con las instalaciones Sanitarias en la construccion de registros y instalacion de tuberia Ø 8".
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE.

Dic. 12/24 → Soleado
Personal en Obra → Personal en Obra: Director de proyectos, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Residente ambiental, Residente Social, Auxiliar Siso, Residente Siso, Cuadrilla Sanitaria.
Maquinaria Equipo: 2 Minicargadores.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para losa de cubierta, figuracion y Colocacion de acero para losa de cubierta, lleno de zapatas y Ciclopeo en ejes I3, I9. figuracion acero para muros.
Bloque 2: Armado y Colocacion de formaleta para tanque Subterraneo, armado y Colocacion de formaleta para Columnas.
Bloque 3: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, figuracion y Colocacion de acero para tanque Subterraneo.
Se ejecutaron la construccion de Registros Sanitarios y aguas lluvias.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE.

Dic. 13/24 → Dia Soleado.
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, 4 maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria, Cuadrilla Sanitaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:

Bloque 3: Fundicion de losa de Cubierta, se suspende la fundida debido a un impase ocasionado por el fallo de algunas gatas y Cerchas, lo cual genero el desplome de una parte de las formaletas afectando las vigas y viguetas ubicadas entre los ejes A-B y 9-10.
Se procedio a tomar los correctivos pertinentes propuestos por el especialista estructural y aprobado por la Interventoria.
Bloque 2: Fundicion de tanque Subterraneo, Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta.
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para losa de cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta.
Se continuaron las actividades de las Instalaciones Sanitarias y se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE,
Componente SST; Se realiza preoperacionales de maquinas y equipos, acompañamiento y Seguimiento a las actividades de alto riesgo, Se realiza apoyo a la emergencia que tuvimos con el desplome de formaletas, ingresa vecindad a la obra y se le solicita retirarse ya que ingresaron al lugar de los hechos Sin ningun tipo de Seguridad.

Dic. 14/24 — Dia Soleado.
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Residente Ambiental, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 4 maestros de Obra, Cuadrilla Sanitaria, 1 Operador de maquinaria.
Maquinaria y Equipos: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta. Figuracion y Colocacion de acero para losa de piso.
Bloque 2: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta,

figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta,
Armado y Colocacion de formaleta para Columnas.
Bloque 3: Se procedio a realizar las demoliciones de vigas y viguetas descolgadas segun recomendaciones del Ingeniero Estructural.
Se formaron Correctivos de reforzamiento de la Formaleteria de la losa de Cubierta que quedo sin fundir.
Se realizo comite tecnico para evaluar y formar los correctivos pertinentes.
Se realizaron las actividades pertinentes a los Componentes ambiental, Social y HSE

Dic. 16/24 — Dia Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Residente Social, Residente ambiental, Ingeniero Civil, 4 Maestros de Obra, Cuadrilla Sanitaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Se continua con el armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta, Se funde losa de piso entre ejes 9-10 y H-I, Se Funden Columnas H8 y I8.
Bloque 2: Se continua tal armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta.
Bloque 3: Se fundio losa de Cubierta que quedo pendiente, dem vez se realizaron los repuestos pertinentes.
Se continuo con las Instalaciones Sanitarias, y los componente ambiental, Social y HSE. Se Celebro en Obra un Compartir con los trabajadores, con la Celebracion del Cumpleaños del Secretario de Infraestructura de la Gobernacion de Sucre.

Dic. 17/24 → Dia Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente Social, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, Ingeniero Civil, Cuadrilla Sanitaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta,
Bloque 2: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta,
Bloque 3: Demolicion de vigas descolgadas, Armado y Colocacion de Formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta, excavacion de zarpa y viga-cimiento para rampa peatonal.
Se continuo con las Instalaciones Sanitarias. y se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE.

Dic. 18/24 → Dia Soleado.
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 3 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria, cuadrilla Sanitaria, personal administrativo.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta.
Bloque 2: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta, Delimpieza y preparacion de terreno para tanque Subterraneo.
Bloque 3: Armado y Colocacion de Formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta, demolicion de Vigas descolgadas en eje A: del 9-10. Fundicion de Solado para zarpa de muro de contencion para rampa peatonal,

Se continuaron las instalaciones Sanitarias con la excavacion y Colocacion de tuberia para aguas lluvias.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSC.

Dic. 19/24 → Dia Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Auxiliar Siso, Residente de Interventoria, Ingeniero Civil, 4 Maestros de Obra, Cuadrilla Sanitaria, personal administrativo,
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de Acero para losa de Cubierta.
Bloque 2: Fundida de losa de Cubierta, fundida de 6 Columnas: , , , , , , armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta.
Bloque 3: Fundida de tres Columnas: A5, B6, C5, fundida de pedestal y Viga-Cimiento de Rampa peatonal, Armado y Colocacion de Formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para Cubierta.
Se Continuo con las Instalaciones Sanitarias, y se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, Ambiental y HSC.

Dic. 20/24 → Dia Soleado, lloviznа en horas de la tarde
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 4 maestros de Obra; 1 Operador de maquinaria, personal administrativo, cuadrilla Sanitaria, Residente ambiental.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta,
Bloque 2: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta, fundida de Concreto de limpieza para tanque sub-terraneo.
Bloque 3: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para Zapata y Viga-cimiento de rampa peatonal. Se realizaron las actividades de las Instalaciones Sanitarias y se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental, y HSC

Dic. 21/24 → Dia Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria, Cuadrilla Sanitaria, personal administrativo.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta.
Bloque 2: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, figuracion y Colocacion de Acero para losa de Cubierta.
Bloque 3: Armado y Colocacion de formaleta para losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para losa de Cubierta y Muro de contencion de Rampa peatonal.
Se Continuo con las Instalaciones Sanitarias y se ejecutaron

las actividades correspondientes a los componentes ambiental, social y HSC.

Dic. 23/24 → Día Soleado.
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente Ambiental, Auxiliar Siso, 1 Maestro de Obra, Cuadrilla Sanitaria, Ingeniero Civil, personal administrativo, 1 operador de maquinaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocación de formaleta para losa de cubierta, figuración y colocación de acero para losa de cubierta.
Bloque 2: Armado y Colocación de formaleta para losa de cubierta, figuración y colocación de acero para losa de cubierta.
Bloque 3: Armado y Colocación de formaleta para losa de cubierta figuración y colocación de acero para losa de cubierta y para muro de contención de rampa peatonal.
Se continuo con las instalaciones sanitarias y se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes ambiental, social y HSC.
Se presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde de 2:30 – 3:10 P.M.

Dic. 29/24 → Día Soleado.
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 4 Maestro de Obra, 1 Operador de maquinaria.
Máquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Armado y Colocación de formaleta para losa de cubierta, figuración y colocación de acero para losa de

cubierta.
Bloque 2: Armado y Colocación de formaleta para losa de cubierta, figuración y colocación de acero para losa de cubierta.
Bloque 3: Armado y Colocación de formaleta para losa de cubierta, figuración y colocación de acero para losa de cubierta, fundida Columna A10'.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Ambiental, Social y HSE.
Se laboró hasta medio día.

Dic. 26/24 → Día Soleado.
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente Social, auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria, personal administrativo.
A pesar de iniciar el día Soleado, apartir de las 9:40 am. se presentaron fuertes lluvias hasta las 12:53 pm, quedando una leve llovizna.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Se fundió losa de cubierta, no en su totalidad, ya q debido a las fuertes lluvias, se tomo la decisión de no fundir la placa aereas, en las areas donde los gatos estaban apoyados directamente sobre el terreno natural, con el compromiso de terminar de fundirlo al día siguiente.
Bloque 2: Armado y Colocación de formaleta para losa de cubierta, figuración y colocación de acero para losa de cubierta.
Bloque 3: Armado y Colocación de formaleta para losa de cubierta, figuración y colocación de acero para losa de cubierta.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, Ambiental y HSC.

Dic 27/24 → Día Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente Social, Residente Ambiental, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, 1 operador de maquinaria, personal Administrativo.
Equipo y Maquinaria: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Se termino de reforzar la zona de la formaleta q cubre las placas aereas, para terminar de fundir el día sabado 28 de diciembre.
Bloque 2: Armado y colocacion de formaleta para losa de cubierta figuracion y colocacion de acero para losa de concreto de cubierta
Bloque 3: Armado y Colocacion de formaleta para losa de cubierta, figuracion y colocacion de acero para losa de cubierta..
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Ambiental, Social, HSE.

Dic. 28/24 → Día Nublado
Personal en Obras: Residente de Obras, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, 1 operador de maquinaria, personal administrativo.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Se termino de fundir la losa de cubierta, en la zona de las placas aereas.
Bloque 2: Armados Colocacion y reforzo de formaleta y figuracion y colocacion de acero para losa de Cubierta
Bloque 3: Se termino de fundir la losa de cubierta, que habia quedado por fundir.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los Componentes Ambiental, Siso y Social.
Se suspenden actividades por temporada navideña.

Enero 8/25 → Día Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Ingeniero Civil, Auxiliar Siso, 4 Maestros de Obra, Personal administrativo.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Se inicio el desencofrado de la losa de cubierta fundida, Se inicio la figuracion y Colocacion del acero de las vigas-Cimiento pendientes por fundir en los ejes G,H,I, entre ejes 8 y 9. Se inicio el armado y Colocacion de formaleta del muro de contencion, eje 9, entre ejes H-I y en el eje I entre ejes 9-10.
Bloque 2: Se inicio el desencofrado de la losa de cubierta fundida, se continua con reforzamiento de las formaletas de losa de cubierta por fundir.
Bloque 3: Se inicio con el desencofrado de la losa de cubierta fundida, se continua con la figuracion y Colocacion del acero de las vigas y viguetas de la losa de cubierta.
Se ejecutaron las actividades pertinentes a los componentes ambiental Social y HSE.

Enero 9/25 → Día Soleado.
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente ambiental, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 4 Maestros de Obra, Personal administrativo
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Figuracion y Colocacion de acero para viga-Cimiento, armado y Colocacion de formaleta para viga-Cimiento y muro de Contencion, trazado cuarto de aseo, desencofrado losa de Cubierta
Bloque 2: Desencofrado losa de Cubierta y tanque Subterraneo, armado, colocacion de reforzo de formaleta para losa de cubierta.
Bloque 3: Desencofrado losa de Cubierta, Figuracion y Colocacion de acero para Vigas y viguetas de losa de cubierta, y Zarpa para Muro de Contencion de Rampa peatonal, y armado y Colocacion de Formaleta para Junta estructural en losa de piso.
