INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 12
MAYO 1 – MAYO 31 DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº CM-001-2024
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-018-2023
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE
2025

Contenido

1. INTRODUCCION 7
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 9
2.1 Localización 9
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 11
2.3 Inventario y estado inicial 11
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 15
2.4.1 Determinante de diseño arquitectónico 17
2.4.2 Descripción de la estructura 27
2.4.3 Características del uso y del suelo 28
2.4.4 Normas....29
2.4.6 Especificaciones de los materiales 30
2.4.7 Resistencia al fuego 30
3.INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 33
3.1 Información general del contrato 33
3.2 Cumplimiento de las obligaciones contractuales. 33
3.3 Garantías y Seguros contrato de obra....37
3.4 Información financiera y presupuestal contrato de obra.....38
4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTARTO DE OBRA 42
4.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes – avance físico.....42
4.1.1 Esquemas avance físico de obra....60
4.2 Seguimiento Programa de Obra. 72
4.2.1 Seguimiento Programa de Inversiones. 79
4.3 Reportes de obra....80
4.3.1 Informe quincenal....80
4.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra. 80
4.3.3 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 81
4.3.4 Estado general del tiempo. 81
4.4 Resumen ensayos de Laboratorio. 90
4.5 Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra. 93
4.5.1 Control de materiales 93
4.6 Otros documentos seguimiento mensual....98
4.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo. 98
4.6.2 Actas de comité y reunión 99
4.6.3 Seguimiento ítems No Previstos. 99
4.6.5 Control modificaciones al diseño y/o especificaciones....103
4.6.6 Seguimiento al plan social....108

4.6.7 Seguimiento al plan de manejo ambiental 110
4.6.8 Seguimientos protocolos plan SST 116
4.6.9 Actas de vecindad 117
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 118
5.1 Informe de gestión de interventoría 119
5.1.2 Control profesionales y especialistas de la interventoría 123
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 128
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. 128
6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. 128
6.3 Información financiero y presupuestal 128
6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría. 129
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 133
8. ANEXOS 135

Listado de tablas

Tabla 1 Áreas a construir 15
Tabla 2 Distribución áreas 16
Tabla 3 Norma de Planeación 18
Tabla 4 Capacidad instalada 21
Tabla 5 Presupuesto por capítulos 25
Tabla 6 Especificaciones materiales estructura 30
Tabla 7 Grupos y subgrupos de ocupación 31
Tabla 8 Categorización edificaciones 31
Tabla 9 Resistencia requerida al fuego Norma NTC 1480, en horas 32
Tabla 10 Espesor elementos en concreto HGM 32
Tabla 11 Control Legal Contratista 33
Tabla 12 Inf. pólizas contrato de obra 38
Tabla 13 Inf. pólizas modificatorio No.1 38
Tabla 14 Forma de pago 39
Tabla 15 Porcentaje de avance obra 73
Tabla 16 Avance presupuestal 79
Tabla 17 Avance tiempo 79
Tabla 18 Equipo mínimo contrato de obra 80
Tabla 19 Personal mínimo requerido 81
Tabla 20 Personal en obra 81
Tabla 21 Control certificados calidad 94
Tabla 22 Verificación de cumplimiento factor de calidad 94
Tabla 23 Plan de manejo del anticipo 98
Tabla 24 Flujo de caja fiducia 99
Tabla 25 Información general Contrato interventoría 118
Tabla 26 Presupuesto interventoría 119
Tabla 27 Obligaciones de la interventoría 123
Tabla 28 Personal mínimo interventoría 123
Tabla 29 Equipo mínimo interventoría 128
Tabla 30 Inf. Financiera interventoría 129

Tabla 31. Inf. pólizas interventoría 129

Listado de imágenes

Imagen 1 Ubicación del Municipio de Coveñas ……..……9
Imagen 2 Localización municipal 10
Imagen 3 Localización del predio.....10
Imagen 4 Planta general.....16
Imagen 5 Planta primer piso 16
Imagen 6 Planta segundo piso.....17
Imagen 7 Pagina IDEAM.....83

Listado de graficas

Gráfico 1 Porcentaje ejecución preliminares 60
Gráfico 2 Porcentaje ejecución cimentaciones.....60
Gráfico 3 Porcentaje ejecución estructura.....60
Gráfico 4 Porcentaje ejecución mampostería.....61
Gráfico 5 Porcentaje ejecución elementos fachada.....61
Gráfico 6 Porcentaje ejecución pañetes.....61
Gráfico 7 Porcentaje ejecución cubierta.....62
Gráfico 8 Porcentaje ejecución impermeabilizaciones.....62
Gráfico 9 Porcentaje ejecución cielo raso 62
Gráfico 10 Porcentaje ejecución pisos 63
Gráfico 11 Porcentaje ejecución enchape muros 63
Gráfico 12 Porcentaje ejecución inst. hidrosanitarias 63
Gráfico 13 Porcentaje ejecución red contra incendio.....64
Gráfico 14 Porcentaje ejecución gas natural 64
Gráfico 15 Porcentaje ejecución gases medicinales 64
Gráfico 16 Porcentaje ejecución inst. eléctricas 65
Gráfico 17 Porcentaje ejecución Inst. iluminación 65
Gráfico 18 Porcentaje ejecución voz y datos.....65
Gráfico 19 Porcentaje ejecución seguridad y control.....66
Gráfico 20 Porcentaje ejecución aire acondicionado 66
Gráfico 21 Porcentaje ejecución aparatos sanitarios.....66
Gráfico 22 Porcentaje ejecución carpintería madera 67
Gráfico 23 Porcentaje ejecución carpintería metálica.....67
Gráfico 24 Porcentaje ejecución carpintería aluminio.....67
Gráfico 25 Porcentaje ejecución carpintería acero 68
Gráfico 26 Porcentaje ejecución cerrajería.....68
Gráfico 27 Porcentaje ejecución vidrios y espejos 68
Gráfico 28 Porcentaje ejecución pintura.....69
Gráfico 29 Porcentaje línea institucional hospitalaria 69
Gráfico 30 Porcentaje ejecución aseo.....69
Gráfico 31 Porcentaje ejecución vías urbanismo interno.....70
Gráfico 32 Porcentaje ejecución andenes - internos 70
Gráfico 33 Porcentaje ejecución mobiliario - interno 70
Gráfico 34 Porcentaje ejecución edificaciones exteriores.....71
Gráfico 35 Porcentaje ejecución rampa peatonal 71
Gráfico 36 Porcentaje ejecución andenes externo 71
Gráfico 37 Porcentaje ejecución cerramiento.....72
Gráfico 38 Porcentaje por componente de acuerdo con reprogramación.....73

Gráfico 39 Porcentaje general de ejecución....73
Gráfico 40 Avance en tiempo....79
Gráfico 41 Horas de lluvia al día....82
Gráfico 42 Horas de lluvia mensuales....82

1. INTRODUCCION

De acuerdo con el análisis de la situación de salud del Departamento de Sucre para el 2020, el municipio de Coveñas reporta las peores tasas medias de mortalidad perinatal y neonatal del departamento, ubicadas en 15,9% y 9,4% respectivamente, así como una alta tasa media de mortalidad infantil de 12,2%, lo anterior obedece a la inadecuada red de salud con que cuenta el municipio que no le permite atender a su población ni a la población flotante derivada del turismo, así como a los tiempos de traslados que deben hacer los pacientes hasta la ciudad de Sincelejo para recibir atención médica en casos de mayor complejidad.

Teniendo en cuenta lo anterior y dándole cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 2023 "Sucre Diferente" con la estrategia Inclusión social y paz / salud, al Programa: Salud Universal Indicador de producto: número de hospitales de I nivel de atención construidos, equipados y dotados en el Golfo de Morrosquillo, Línea Estratégica: Coveñas Equitativa e Incluyente / Programas: Salud y Protección Social / Producto: Prestación de servicios de salud / Indicador: Hospital construido y dotado; la Gobernación de Sucre, como entidad territorial encargada de salvaguardar los derechos de sus habitantes incluyo en su plan de desarrollo y crecimiento, el proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", con el objetivo garantizar servicios de salud adecuados para apoyar el crecimiento socioeconómico y mejorar la calidad de vida de la comunidad, la gobernación de Sucre mediante la resolución 6272 de 27 de noviembre de 2023 dio apertura al proceso de contratación LP-018-2023, que tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.”, el cual se adjudica al CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE mediante la Resolución 0905 del 28 de febrero de 2024, y se formaliza con el contrato de obra pública No. 018 de 2023, con un valor inicial de $34.420.762.624.

Para asegurar la ejecución efectiva y eficiente de este proyecto, se ha suscrito el contrato de interventoría No CM-001-2024 cuya ejecución estará a cargo del CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024 y que tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, cuya supervisión está a cargo del ingeniero JORGE ALBERTO ROMERO POMERO, secretario de infraestructura departamental.

Con el propósito de dar cumplimiento al contrato, la interventoría presenta el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N.º 12 el cual comprende el periodo entre el 01 y el 31 de mayo de 2025, donde se le da seguimiento a las actividades de obras desarrolladas dentro del marco del Contrato de Obra pública LP-018 – 2023, en el cual la interventoría efectúa un análisis completo del desarrollo de actividades técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica, efectuadas por el contratista encaminadas a la ejecución de la obra.

Dentro del presente informe y sus anexos, se encuentra consignados los documentos que se originan en el control de las actividades, tanto en obra como administrativas, en el ejercicio de la función como interventoría para velar por el cumplimiento de los diseños suministrados por la entidad, de los requisitos de calidad, de las Normas Técnicas y de Construcción que apliquen, y en el desarrollo de los trabajos contemplados en el Contrato de Obra.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización

Localizacion Regional: El proyecto se encuentra localizado en la Región Caribe Colombiana, en el departamento de sucre, subregión del Golfo de Morrosquillo, como se muestra en la Imagen 1 e Imagen 2, especificamente en el casco urbano del municipio de Coveñas.



Imagen 1 Ubicación del Municipio de Coveñas

Límites del Municipio: Coveñas, limita al Norte con el mar caribe, al Sur con los municipios de Palmito y Purísima; al Este con el municipio de Santiago de Tolu y al Oeste con el municipio de San Antero.

Extensión total: 74 Km^2

Temperatura media: 30 °C Aproximadamente

Distancia de referencia: Su distancia a la Capital del Departamento, Sincelejo, es de 58,9 Km por una vía totalmente pavimentada, con un tiempo de desplazamiento de 1 hora 10 minutos aproximadamente.

Localización Municipal: El hospital limita por el norte con un predio sin desarrollar, con coordenadas 9° 23 ' 31" N - 75° 40 ' 47.17" O, por el sur con la futura calle 6 (actualmente carreteable), por el oriente por un predio sin desarrollar y por el occidente con la carrera 25 que se encuentra actualmente pavimentada.

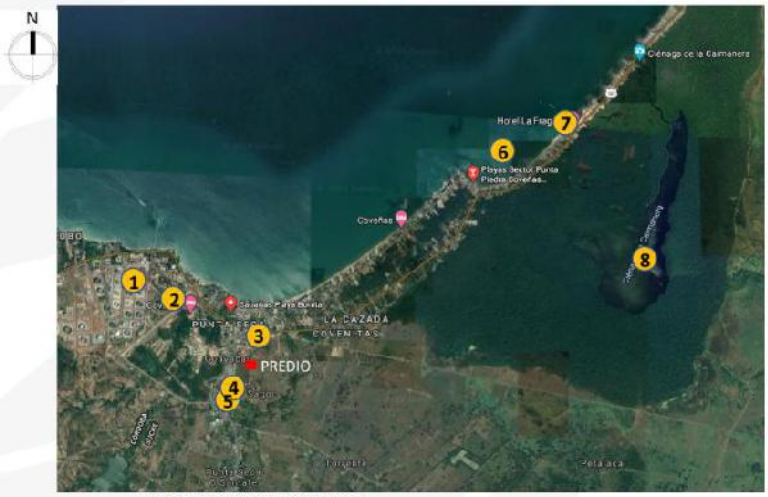


Imagen 2 Localización municipal

Localización predio: El hospital está localizado especificamente en el casco urbano del municipio de Coveñas en la calle 6 con carrera 25 esquina, predio denominado Caribí.



Imagen 3 Localización del predio

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Los municipios de la zona de influencia y los cuales se verán beneficiados son aquellos que hacer parte de Golfo de Morrosquillo, como es el caso de Coveñas, San Antero, San Onofre, Lorica, Toluviejo, Santiago de Tolú, San Bernardo del Viento y Moñitos

2.3 Inventario y estado inicial

A continuación, se hace registro fotográfico estado de las vías aledañas al predio, así como del estado de este a la fecha, así mismo se llevaron a cabo actas de vecindad de las edificaciones del sector para evidenciar su estado actual, estas se encuentran en el Anexo 10 del informe de interventoría No. 1.

	
Foto Inicial lote (Julio 23 de 2024)	**Foto avance**

	
Foto Inicial Cra. 25 (Julio 9 de 2024)	**Foto avance**
	
Foto Inicial Cra. 25 (Julio 9 de 2024)	**Foto avance**
	
Foto Inicial Cra. 25 Cll. 6 (Julio 9 de 2024)	**Foto avance**

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO





Pérgola sobre acceso



Fachada oriental





Imagen acceso principal, esquina Carrera 25 – Calle 6



Imagen Fachada sur– Calle 6

Imagen 4 Imágenes Proyecto

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro del marco del convenio se estableció la siguiente **META:**

Cofinanciar la ejecución del proyecto denominado Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre, que busca mejorar la atención, calidad, oportunidad y garantía del servicio, con las especificaciones técnicas descritas en los estudios y diseños viabilizados en la ficha Técnica del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el cumplimiento de la meta se realizarán las siguientes actividades principales de construcción: Se plantea una infraestructura con un área total construida de 6.483,64 m2, para prestar el servicio de salud, diagnóstico de enfermedades, tratamientos, incluidas cirugías, consulta externa, internación y servicios de apoyo. La alternativa propuesta comprende la Construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre, con las siguientes condiciones:

UBICACIÓN	AREA
Área Administrativa	255, 11 m2
Área Consulta externa	618,46 m2
Área de Urgencias	708,24 m2
Área Apoyo Diagnóstico	661,53 m2
Área Hospitalización	488,70 m2
Área de Cirugía, atención de parto y esterilización	809,81 m2
Área Servicios Generales y complementarios	1.240,60 m2.
Otras Áreas	1.117,47 m2
Aleros	583,72 m2
AREA TOTAL	**6.483.64 m2**

Tabla 1 Áreas a construir



Imagen 5 Planta general

Distribuidas así:

UBICACIÓN	AREA CUBIRTA A CONSTRUIR
Piso 1	1.324,76
Piso 2	5.158,88
Área total a construir	6.483,64
Área ocupada a nivel de terreno	5.387,18

Tabla 2 Distribución áreas

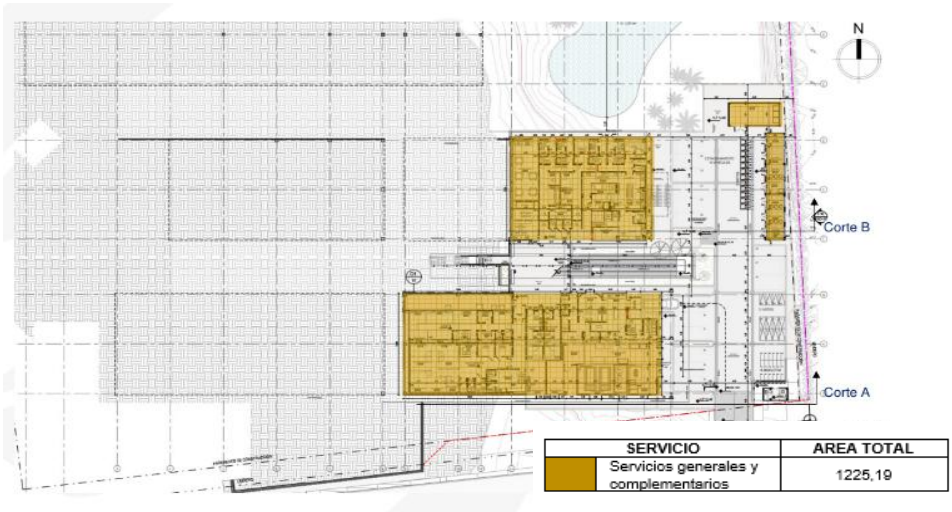


Imagen 6 Planta primer piso

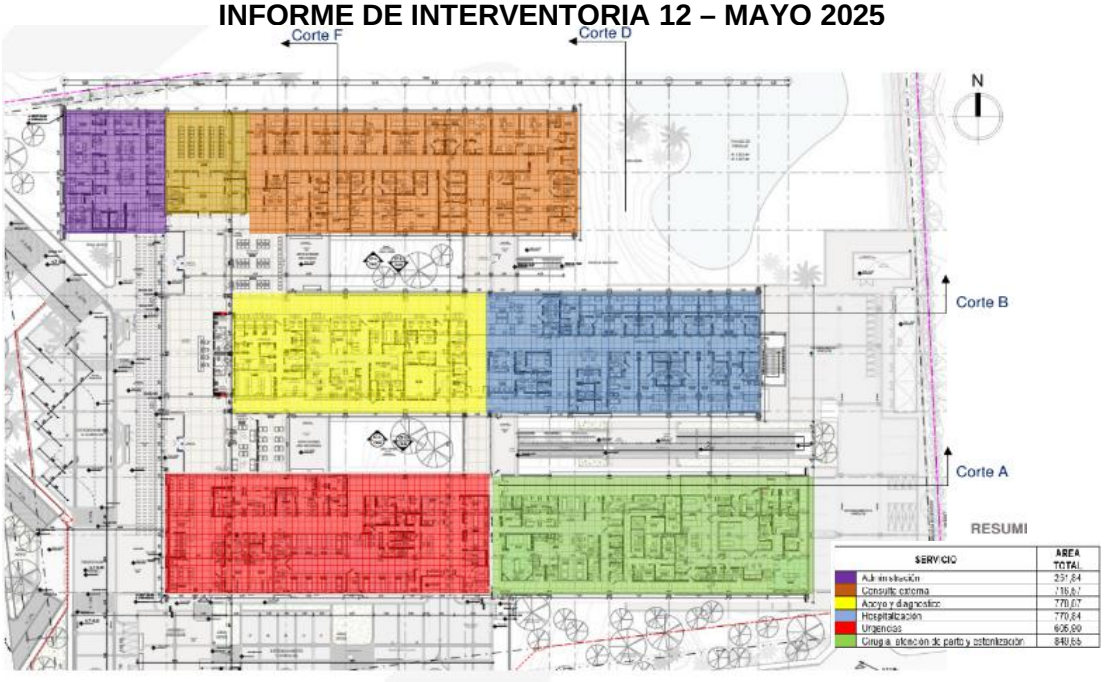


Imagen 7 Planta segundo piso

El proyecto cumple con las normatividades arquitectónicas relacionadas a los espacios de circulación y acceso, en especial aquellas que establecen mecanismos de integración personas con movilidad reducida: 4139, 4143, 4144, 4201, 4279, 5610, además a nivel estructural cumple con el reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10), los estudios de suelos Titulo H y norma Invias, los diseño lumínicos y eléctricos RETIE Y RETILAP, diseños Hidrosanitarios resolución 0330, RAS 2000 Y NTC 1500.

2.4.1 Determinante de diseño arquitectónico

Análisis normativo: se aplicaron los siguientes criterios de diseño determinantes de acuerdo con la norma de Planeación del 6 de julio de 2021, la cual se encuentra vigente a la fecha.

CONCEPTO DE NORMA DE PLANEACIÓN DEL 6 DE JULIO DE 2021			
criterios	**Dato/exigencia**	**Unidades**	**Precisiones**
Área del lote	12118,00	m2	En el levantamiento topográfico el área es de 12,137.43 m2

Uso para desarrollar	INSTITUCIONAL GRUPO I	N/A	"Se exige, únicamente, cumplir con la condición de contar con un predio que tenga frente sobre "[…] las vías arterias urbanas definidas en las normas del plan vial […]. Que el predio objeto de esta consulta cuenta con un frente sobre la Calle 25 (Calle de los tramposos), identificada por el Plan Vial Urbano del PBOT (Mapa No. 09) como de Categoría V-2 Vía Arterial Urbana."
Índice de ocupación	0,60	Porcentaje	
Índice de construcción	100%	Porcentaje	Lo interpretamos como índice de "1"
Altura permitida	2,00	Pisos	(no se establece altura específica por piso)
Retiro frontal - Antejardín	3,50	ml	
Retiro posterior	3,00	ml	
Retiro lateral	1,50	ml	
Voladizo frontal	1,75	ml	50%
Voladizo lateral	0,45	ml	50%

Tabla 3 Norma de Planeación

Perfil vial Carrera 25



Foto vía colindante por el occidente del lote



SECCION TRANSVERSAL VIA V4

El perfil vial según levantamiento topográfico y revisión de condiciones existentes, es una vía vehicular urbana tipo V-4



SECCION TRANSVERSAL VIA V2

Imagen tomada del plano *09A Perfiles Viales Aj-Model del PBOT*

Imagen 8 Perfil vial Cra. 25

Criterios de diseño arquitectónico: Se implemento un el diseño basado en espacios modulares, con una retícula típica en estructura y ambientes donde sea posible.

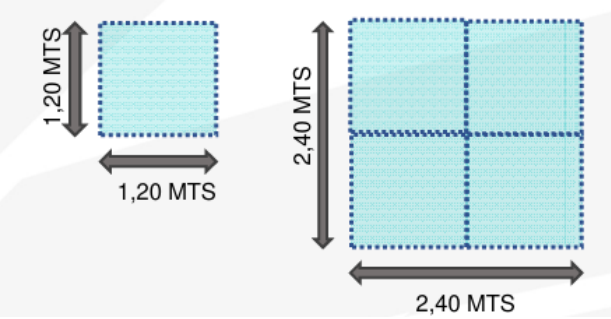


Imagen 9 Retícula

Condicionales existentes y naturales del lote – topografía, cuerpo de agua y vegetación

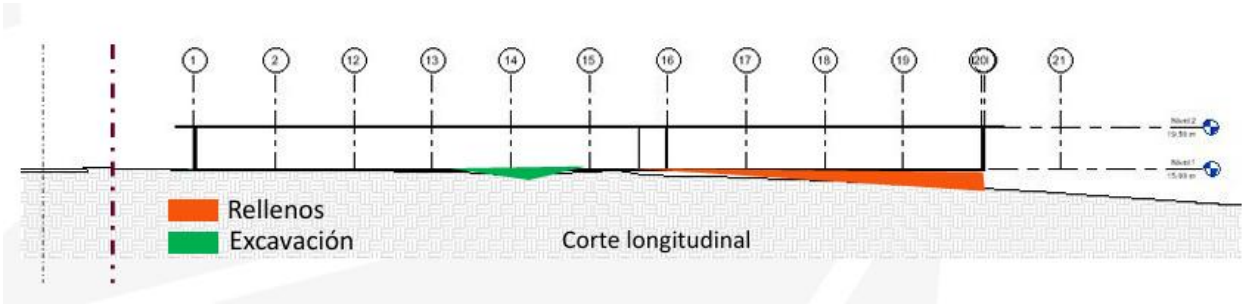


Imagen 10 Corte longitudinal lote

Paisajismo en urbanismo interno

Materiales en fachada con gran masa térmica para retrasar la transmisión térmica al interior de la edificación: ladrillo o bloques de hormigón. Cubierta con aislante térmico.

Generadores de sombra: Aleros en fachadas para mitigar asoleación, tratamiento de texturas.

Ventanearía con coeficientes de transmisión térmica y transmisión de luz especificados por el estudio bioclimático.

Condiciones funcionales

Planteamiento de circulaciones claras (públicas semipúblicas– privadas / séptica– asépticas / paciente– personal médico).

Proponer un proyecto que pueda ser construido rápidamente mediante un planteamiento conformado por volúmenes independientes que facilitan su construcción simultánea en un tiempo menor.

La funcionalidad estará conjugada con el humanismo o con el bienestar del paciente, el de su familia y el del personal médico; que son base y el insumo principal para el proyecto arquitectónico.

El diseño de las habitaciones se basará en el bienestar del paciente y en su privacidad e higiene; planteando el área semipública contigua al ingreso y la privada al fondo de la habitación

Análisis bioclimático Para el diseño del sistema de ventilación natural se tiene en cuenta la dirección predominante del viento en Coveñas proveniente del noroccidente, con una velocidad media de 8.0 m/s y velocidades máximas de 10.8m/s. Se recomendó orientar el proyecto a 190 grados con respecto al norte con el fin de exponer las fachadas más cortas a la radiación solar oriente occidente evitando así periodos de sobrecalentamiento en el proyecto. De igual forma se recomienda orientar las fachadas más largas en sentido norte sur permitiendo reducir ganancias solares y a su vez permite una mayor área de ventanearía facilitando la ventilación natural de los espacios.

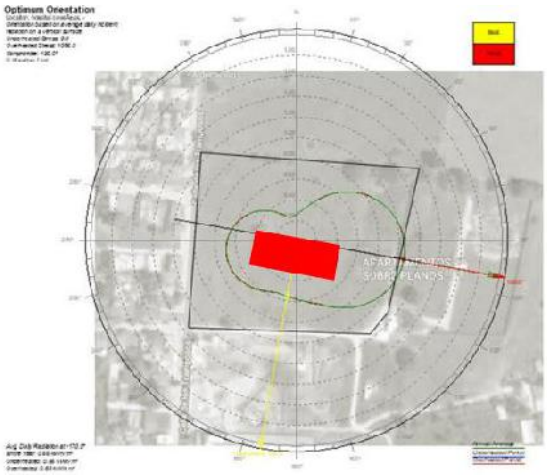


Imagen 11 Diagrama de optima orientación
Fuente, informe Bioclimático - Ecoarq

Capacidad instalada

GRUPO DE SERVICIO	DESCRIPCION	ACTUAL	PROPUESTA Y CONCERTADA
Atención Inmediata	Consultorio TRIAGE	0	1
Atención Inmediata	Consultorio Médicos De Urgencias	1	2
Atención Inmediata	Sala De Procedimientos	1	1
Atención Inmediata	Ambiente para inmovilización	0	1
Atención Inmediata	Sala De Reanimación	1	1
Atención Inmediata	Sala De Observación (4 Hombre; 4 Mujeres ,3 Pediátricas, 1 Aislado)	6	12
Atención Inmediata	Sala E.R.A	0	2
Atención Inmediata	Sala E.D.A.	0	2
Atención Inmediata	Ambiente De Trabajo De Parto / sala de partos	1	2
Atención Inmediata	Ambiente De Preparación Parto (Camillas)	1	2
Atención Inmediata	Ambiente De Recuperación Parto (Camillas)	0	2
Quirúrgico	Sala De Cirugía	0	1
Consulta Externa	Consultorios Médicos Consulta Externa	3	5
Consulta Externa	Consultorios Médicos- (Atención Especial)	0	2
Consulta Externa	Consultorios Médicos -Telemedicina	0	1
Consulta Externa	Consultorios de Enfermería (Promoción y prevención)	1	5
Consulta Externa	Unidades De Odontología (Sillas odontológicas)	1	2
Consulta Externa	Servicio De Vacunación (Según Ministerio)	1	1
Apoyo Diagnostico	Laboratorio Clínico (baja complejidad)	1	1
Apoyo Diagnostico	Toma De Muestras (Venopunción)	1	2
Apoyo Diagnostico	Toma De Muestras (Ginecológicos/Especiales)	0	1
Apoyo Diagnostico	Toma De Citología	1	1
Apoyo Diagnostico	Servicio Farmacéutico (Baja Complejidad)	1	1
Apoyo Diagnostico	Radiología E Imágenes Diagnósticas - Rx Convencional	0	1
Apoyo Diagnostico	Radiología E Imágenes Diagnósticas - Rx Odontológico	0	1
Apoyo Diagnostico	Terapia Respiratoria	0	1
Apoyo Diagnostico	Terapia Física	0	1
Apoyo Diagnostico	Servicio farmacéutico (Baja complejidad)	1	1
Internación	Camas Adultos	2	4
Internación	Camas Pediátricas	0	4
Internación	Camas Obstétricas	0	3
Internación	Camas Aislado	0	1

Tabla 4 Capacidad instalada

Proyecto se desarrolla una construcción en dos pisos por la mejor adaptación física a la topografía inclinada del predio logrando que la localización de los servicios de Urgencias, Emergencias, Atención del Parto, Cirugía, Esterilización, Farmacia, Laboratorio, Rayos X, Hospitalización, Consulta Externa, Salón Múltiple y Administración queden localizados en el segundo nivel del proyecto o en el nivel que tiene relación directa con la Carrera. 25. Esta distribución en piso 2 conserva los 3 módulos o bloques que permiten una mayor y más clara zonificación y funcionalidad de los servicios como el mejor confort térmico y de ventilación e iluminación de los recintos, como se puede evidenciar en las plantas y cortes que se adjuntan. El acceso peatonal y vehicular (particulares y taxis) a este piso 2 se logra principalmente a través

de la Carrera 25 y al servicio de Urgencias por la intersección de la misma Cra. 25 con la Calle 6. En el extremo oriental de esta misma calle y en forma totalmente independiente al piso 2 destinado a servicios médicos, se accede a las áreas de infraestructura del proyecto, Mantenimiento, Almacenes, Cocina, Lavandería, Morgue y al ingreso y salida de productos, insumos y residuos. Se desarrolla el diseño arquitectónico y detalles constructivos y especificaciones de acabados necesarias para la ejecución del Hospital del Golfo de Morrosquillo; así como los estudios técnicos definitivos, incluyendo la coordinación de estos, presupuestos definitivos junto con los estudios técnicos, planos y detalles de las diferentes especialidades, renders, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, programación y las actas de socialización que fueran pertinentes. En lo relativo al componente bioclimático, este componente determino de manera muy clara y precisa las condiciones arquitectónicas con las que debía diseñarse el proyecto en vista de la alta radiación solar existente en la zona. De igual forma fue la base para plantear las características del diseño de ventilación / aire acondicionado del proyecto.

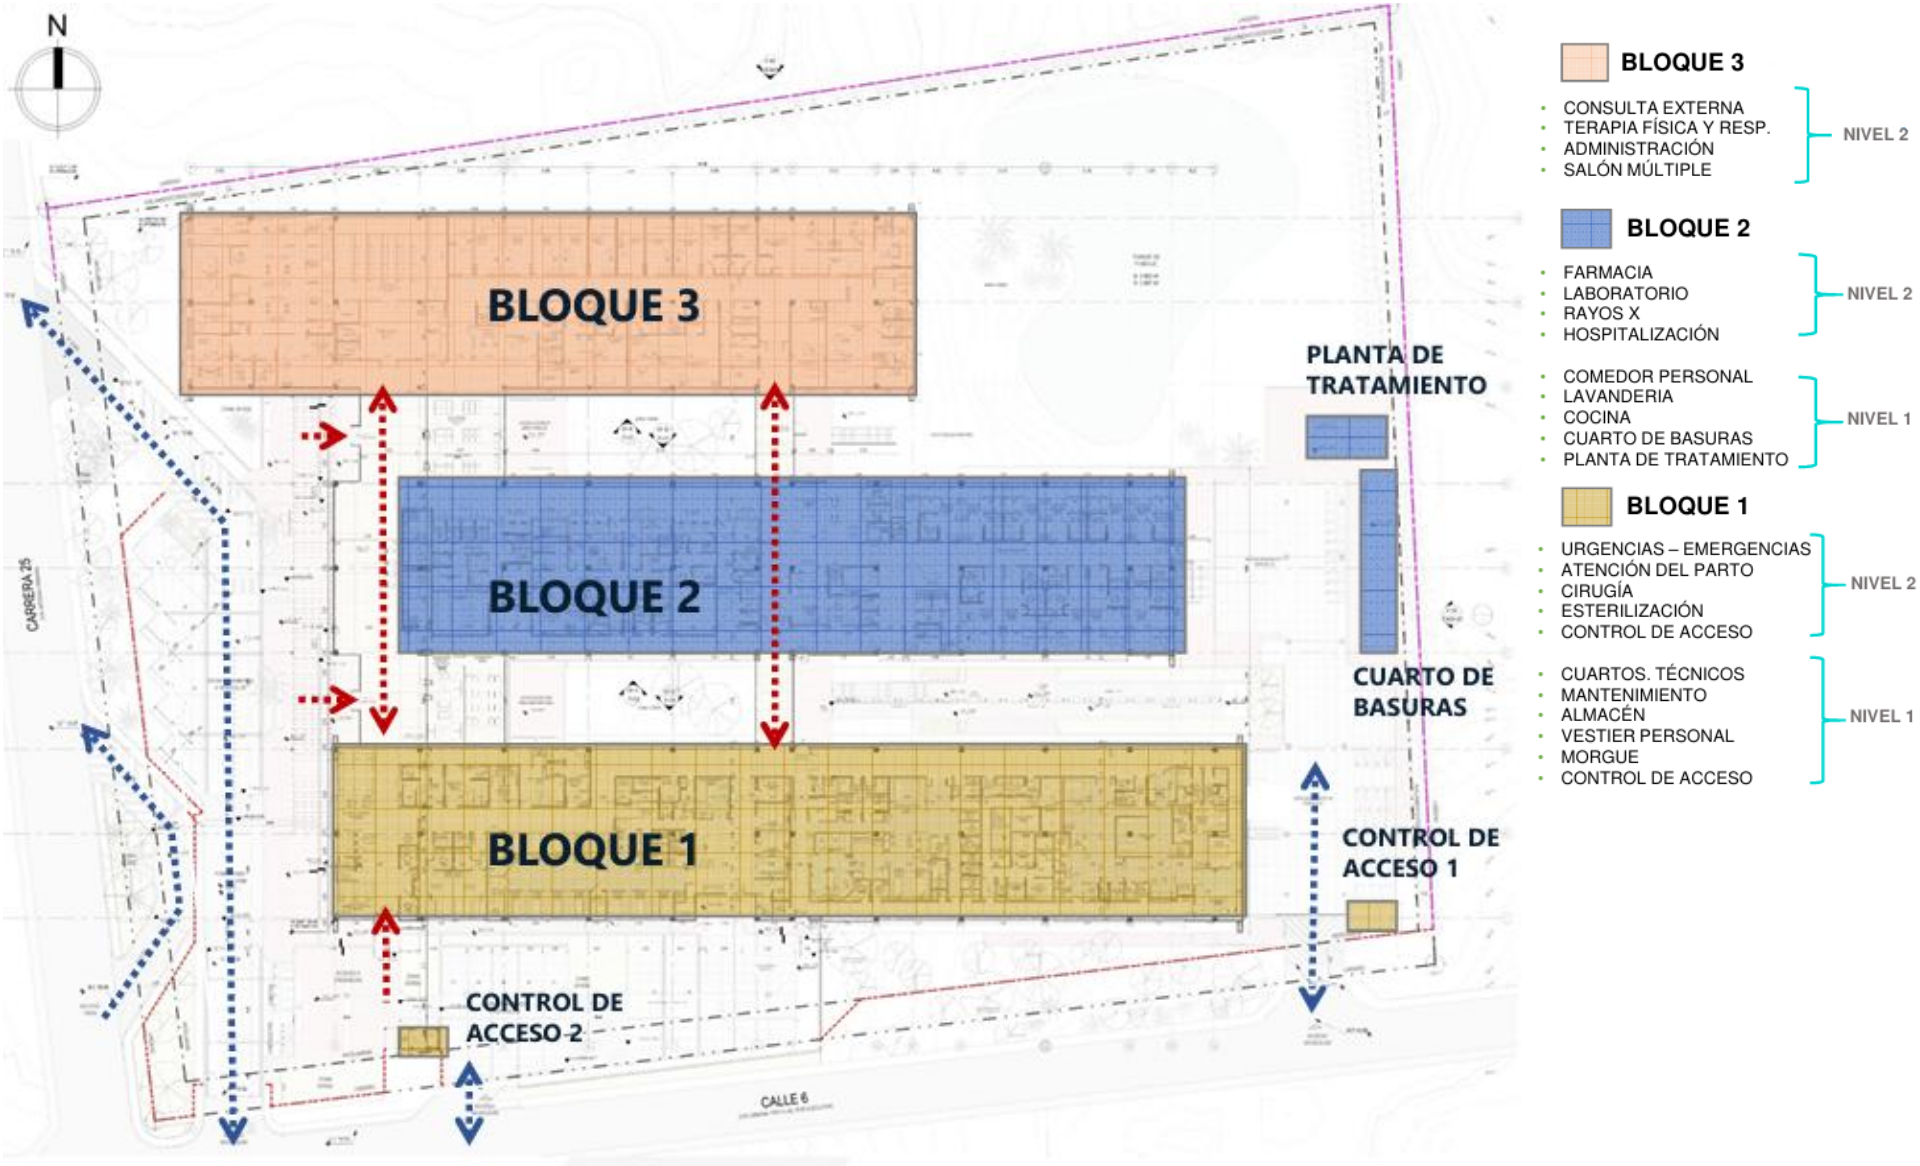


Imagen 12 Bloques estructurales y localización de servicios

El presupuesto inicial está conformado por los siguientes capítulos:

No.	Ítem de pago	DESCRIPCION	SUB TOTAL CAPITULO
A. CONSTRUCCION			
A1	1.00.00	PRELIMINARES	$ 293.612.574,00
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN	$ 1.673.590.220,00
A3	3.00.00	ESTRUCTURA	$ 6.107.120.603,00
A4	4.00.00	MAMPOSTERÍA	$ 2.064.664.406,00
A5	5.00.00	ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE	$ 241.347.866,00
A6	6.00.00	PAÑETES	$ 220.385.955,00
A7	7.00.00	CUBIERTAS	$ 533.702.824,00
A8	8.00.00	IMPERMEABILIZACIONES	$ 807.898.777,00
A9	9.00.00	CIELO RASOS	$ 360.449.952,00
A10	10.00.00	PISOS Y GUARDA ESCOBAS	$ 979.690.737,00
A11	11.00.00	ENCHAPES MUROS	$ 265.703.264,00
A12	12.00.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 711.629.419,00
A13	13.00.00	INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO	$ 567.611.713,00
A14	14.00.00	INSTALACIONES GAS NATURAL	$ 7.023.266,00
A15	15.00.00	INSTALACIONES GASES MEDICINALES	$ 319.035.912,00
A16	16.00.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 3.823.267.936,00
A17	17.00.00	INSTALACIONES ILUMINACIÓN	$ 223.253.630,00
A18	18.00.00	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	$ 98.291.889,00
A19	19.00.00	INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL	$ 1.143.586.094,00
A20	20.00.00	INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	$ 1.481.791.453,00
A21	21.00.00	APARATOS SANITARIOS	$ 251.074.110,00
A22	22.00.00	CARPINTERÍA MADERA	$ 755.352.668,00
A23	23.00.00	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 355.723.164,00
A24	24.00.00	CARPINTERÍA ALUMINIO	$ 1.038.765.058,00
A25	25.00.00	CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	$ 368.756.983,00
A26	26.00.00	CERRAJERÍA	$ 80.758.155,00
A27	27.00.00	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 93.555.709,00
A28	28.00.00	PINTURA	$ 606.553.407,00
A29	29.00.00	LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA	$ 100.113.772,00
A30	30.00.00	ASEO	$ 97.160.419,00
D. URBANISMO INTERNO			
D1	31.00.00	VIAS - URBANISMO INTERNO	$ 378.727.397,00
D2	32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO	$ 898.219.123,00
D3	33.00.00	MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO	$ 28.071.631,00

D4	34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES-CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO	$ 725.724.351,00
D5	35.00.00	RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO	$ 448.602.113,00
E. URBANISMO EXTERNO			
E1	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO	$ 6.066.585,00
E2	37.0.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO	$ 131.275.012,00
		SUB TOTAL OBRA	**$ 28.288.158.147,00**

B. EQUIPOS			
B1	38.00.00	ELECTRICOS	$ 1.309.825.823,00
B3	39.00.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	$ 1.653.139.852,00
B5	40.00.00	HIDROSANITARIOS	$ 167.621.825,00
B7	41.00.00	OTROS	$ 13.564.335,00
		SUB TOTAL EQUIPOS	**$ 3.144.151.835,00**

F. AMUEBLAMIENTO			
F1	42.00.00	AMUEBLAMIENTO	$ 396.676.371,00
G4	43.00.00	EQUIPOS DE OFICINA	$ 114.411.546,00
G3	44.00.00	MOBILIARIO INDUSTRIAL	$ 115.228.477,00
		SUB TOTAL EQUIPOS DE OFICINA	**$ 626.316.394,00**

G. EQUIPOS MEDICOS			
G1	45.00.00	EQUIPOS MEDICOS	$ 2.183.119.592,00
G2	46.00.00	MOBILIARIO MEDICO	$ 179.016.656,00
		SUB TOTAL EQUIPOS MEDICOS	**$ 2.362.136.248,00**

RESUMEN PRESUPUESTO	
SUB TOTAL OBRA CIVIL	$ 28.288.158.147,00
SUB TOTAL EQUIPOS	$ 3.144.151.835,00
SUB TOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 626.316.394,00
SUB TOTAL EQUIPOS MEDICOS	$ 2.362.136.248,00
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 34.420.762.624,00**

Tabla 5 Presupuesto por capítulos

El presupuesto de acuerdo con la modificación No. 1 está conformado por los mismos capítulos e ítems, pero varia en algunas cantidades y por ende en los valores.

No.	Ítem de pago	DESCRIPCION	SUB TOTAL CAPITULO
A. CONSTRUCCION			
A1	1.00.00	PRELIMINARES	$ 293.612.574,00
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN	$ 3,981,907,118.00
A3	3.00.00	ESTRUCTURA	$ 6,559,434,158.00
A4	4.00.00	MAMPOSTERÍA	$ 2.064.664.406,00

A5	5.00.00	ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE	$ 241.347.866,00
A6	6.00.00	PAÑETES	$ 220.385.955,00
A7	7.00.00	CUBIERTAS	$ 533.702.824,00
A8	8.00.00	IMPERMEABILIZACIONES	$ 807.898.777,00
A9	9.00.00	CIELO RASOS	$ 360.449.952,00
A10	10.00.00	PISOS Y GUARDA ESCOBAS	$ 979.690.737,00
A11	11.00.00	ENCHAPES MUROS	$ 265.703.264,00
A12	12.00.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 711.629.419,00
A13	13.00.00	INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO	$ 567.611.713,00
A14	14.00.00	INSTALACIONES GAS NATURAL	$ 7.023.266,00
A15	15.00.00	INSTALACIONES GASES MEDICINALES	$ 319.035.912,00
A16	16.00.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 3.823.267.936,00
A17	17.00.00	INSTALACIONES ILUMINACIÓN	$ 223.253.630,00
A18	18.00.00	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	$ 98.291.889,00
A19	19.00.00	INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL	$ 1.143.586.094,00
A20	20.00.00	INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	$ 1.481.791.453,00
A21	21.00.00	APARATOS SANITARIOS	$ 251.074.110,00
A22	22.00.00	CARPINTERÍA MADERA	$ 755.352.668,00
A23	23.00.00	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 355.723.164,00
A24	24.00.00	CARPINTERÍA ALUMINIO	$ 1.038.765.058,00
A25	25.00.00	CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	$ 368.756.983,00
A26	26.00.00	CERRAJERÍA	$ 80.758.155,00
A27	27.00.00	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 93.555.709,00
A28	28.00.00	PINTURA	$ 606.553.407,00
A29	29.00.00	LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA	$ 100.113.772,00
A30	30.00.00	ASEO	$ 97.160.419,00
D. URBANISMO INTERNO			
D1	31.00.00	VIAS - URBANISMO INTERNO	$ 378.727.397,00
D2	32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO	$ 898.219.123,00
D3	33.00.00	MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO	$ 28.071.631,00
D4	34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO	$ 725.724.351,00
D5	35.00.00	RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO	$ 448.602.113,00
E. URBANISMO EXTERNO			
E1	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO	$ 6.066.585,00
E2	37.0.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO	$ 131.275.012,00
		SUB TOTAL OBRA	**$ 28.288.158.147,00**

B. EQUIPOS

B1	38.00.00	ELECTRICOS	$ 1.309.825.823,00
B3	39.00.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	$ 1.653.139.852,00
B5	40.00.00	HIDROSANITARIOS	$ 167.621.825,00
B7	41.00.00	OTROS	$ 13.564.335,00
		SUB TOTAL EQUIPOS	**$ 3.144.151.835,00**

F. AMUEBLAMIENTO			
F1	42.00.00	AMUEBLAMIENTO	$ 396.676.371,00
G4	43.00.00	EQUIPOS DE OFICINA	$ 114.411.546,00
G3	44.00.00	MOBILIARIO INDUSTRIAL	$ 115.228.477,00
		SUB TOTAL EQUIPOS DE OFICINA	**$ 626.316.394,00**

G. EQUIPOS MEDICOS			
G1	45.00.00	E’p7QUIPOS MEDICOS	$ 2.183.119.592,00
G2	46.00.00	MOBILIARIO MEDICO	$ 179.016.656,00
		SUB TOTAL EQUIPOS MEDICOS	**$ 2.362.136.248,00**

RESUMEN PRESUPUESTO	
SUB TOTAL OBRA CIVIL	$ 31.048.788.600,00
SUB TOTAL EQUIPOS	$ 3.144.151.835,00
SUB TOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 626.316.394,00
SUB TOTAL EQUIPOS MEDICOS	$ 2.362.136.248,00
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 37.181.393.077,00**

2.4.2 Descripción de la estructura

Las edificaciones correspondientes al proyecto son edificaciones nuevas y se encuentran dentro de las edificaciones indispensables, su uso es una institución hospitalaria. El proyecto consiste en edificaciones de uno y dos pisos, por las luces y modulación del proyecto, el sistema estructural se definió como un sistema de pórticos de concreto con Capacidad Moderada de Disipación de Energía (DMO).

- **Cuarto basuras, pérgola, porterías, rampa, tanque y escaleras, edificaciones de un piso.** Por las luces y modulación del proyecto, el sistema estructural se definió como un sistema de pórticos de concreto con Capacidad Moderada de Disipación de Energía (DMO), se proyecta una cimentación con una serie de zapatas con profundidad de desplante de -1.5m y una dimensión mínima de 1.0mx1.0m según estudio de suelos.
- **Bloque 1.** Es una edificación de 2 pisos**,** tiene un área total aproximada de 2249 m² y se desarrolla en 17 ejes entre alfabéticos y numéricos, con luces variables, las cuales oscilan

entre 3.5 m y 8.4 m. El sistema de cubierta está conformado por una placa maciza de concreto. El sistema estructural ira hasta el nivel +4.65 m.

- **Bloque 2.** Esta es una edificación de dos pisos y tiene un área total aproximada de 1725 m² y se desarrolla en 17 ejes entre alfabéticos y numéricos, con luces variables, las cuales oscilan entre 3.5 m y 8.4 m. El sistema de cubierta está conformado por una placa maciza de concreto. El sistema estructural ira hasta el nivel +4.65 m.
- **Bloque 3.** Esta edificación de un piso tiene un área total aproximada de 1253 m² y se desarrolla en 14 ejes entre alfabéticos y numéricos, con luces variables, las cuales oscilan entre 3.5 m y 8.4 m. El sistema de cubierta está conformado por una placa maciza de concreto. El sistema estructural ira hasta el nivel +4.65 m.

De acuerdo con la Norma Sismo Resistente Colombiana actual, NSR-10, el proyecto “DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO” se encuentra localizado en una zona de amenaza sísmica Intermedia.

Para todos los bloques se proyecta una cimentación con una serie de zapatas con profundidad de desplante de -1.5m y una dimensión mínima de 1.0mx1.0m según estudio de suelos.

2.4.3 Características del uso y del suelo

Por su uso, la edificación se clasifica en el Grupo IV, correspondiente a la categoría de edificaciones indispensables (I=1.5).

El estudio de suelos ejecutado por la firma ALFONSO URIBE S. Y CÍA S.A, con base en la información suministrada y de acuerdo con la norma NSR-10, determino que el suelo sobre el que se levantará la estructura corresponde a un **PERFIL ESTRATIGRÁFICO tipo D**, y por lo tanto, los coeficientes para el análisis sísmico de la estructura serán **Aa= 0.10, Av=0.15, Fa=1.60 y Fv= 2.20.**

2.4.4 Normas

El diseño de la estructura y todos sus elementos constitutivos, fue realizado cumpliendo con los requerimientos establecidos por el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, y decretos posteriores complementarios y reglamentarios tales como:

- LEY 400 DE 1997 NORMA SISMO RESISTENTE DEL 2010 - NSR-10
- Decreto 926 de marzo de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10.
- Decreto 2525 del 13 de julio de 2010.
- Decreto 523 del 16 diciembre 2010 (Microzonificación sísmica Bogotá).
- Decreto 092 de enero de 2011, por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010.
- Decreto 0340 de feb de 2012.
- Ley 1796 de 2016
- Decreto 945 del 5 de junio de 2017.
- Resolución 017 del 2017 de la Comisión Asesora Permanente Para el Régimen de Construcciones Sismo Resistente.

2.4.5 Análisis y diseño

El modelo de la estructura se realizó en el programa RCB v.9.0.9; partiendo de los planos arquitectónicos del proyecto se tomaron la geometría y ejes, con el fin de plasmar en el modelo computacional en las dimensiones reales de los elementos que conforman la edificación.

El sistema resistente para cargas son pórticos en concreto con Capacidad Moderada de Disipación de Energía (DMO) y Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico Ro= 5.0, debido a que la estructura presenta irregularidad torsional extrema en dirección X se emplea un factor de reducción de 0.80 y presenta irregularidad por ausencia de redundancia, los coeficientes de capacidad de disipación de energía a emplear en el diseño son:

- DIRECCION X R=4.00
- DIRECCION Y R=3.75

2.4.6 Especificaciones de los materiales

A continuación, se presentan los materiales utilizados en el análisis y en el posterior diseño de la estructura:

CONCRETOS		
UBICACION	**RESISTENCIA**	
ZAPATAS	f´c = 21.0 MPa	3000 psi
VIGAS DE CIMENTACION	f´c = 24.5 MPa	3500 psi
VIGAS AEREAS	f´c = 28.0 MPa	4000 psi
MUROS	f´c = 28.0 MPa	4000 psi
PLACAS MACIZAS	f´c = 21.0 MPa	3000 psi
COLUMNAS	f´c = 28.0 MPa	4000 psi
ACERO DE REFUERZO		
Ø < 3/8”	fy= 420 MPa	
Ø < 3/8” Y MAYORES	fy= 420 MPa	
MALLA ELECTROSOLDADA		
NORMA NTC 2310 (ASTM A497)		
ACERO DE REFUERZO		
PERFILES	ASTM A50	
ANGULOS	ASTM A50	
PLATINAS	A36	

Tabla 6 Especificaciones materiales estructura

2.4.7 Resistencia al fuego

La siguiente es la evaluación de requisitos de resistencia contra incendios en edificaciones

CLASIFICACIÓN I-2 INSTITUCIONAL – SALUD

Grupos y subgrupos de ocupación	Clasificación	Sección del reglamento
A	**ALMACENAMIENTO**	**K.2.2**
A-1	Riesgo moderado	
A-2	Riesgo bajo	
C	**COMERCIAL**	**K.2.3**
C-1	Servicios	
C-2	Bienes	
E	**ESPECIALES**	**K.2.4**
F	**FABRIL E INDUSTRIAL**	**K.2.5**
F-1	Riesgo moderado	
F-2	Riesgo bajo	

I	**INSTITUCIONAL**	**K.2.6**
I-1	Reclusión	
I-2	Salud o incapacidad	
I-3	Educación	
I-4	Seguridad publica	
I-5	Servicio publico	
L	**LUGARES DE REUNION**	**K.2.7**
L-1	Deportivos	
L-2	Culturales y teatros	
L-3	Sociales y recreativos	
L-4	Religioso	
L-5	De transporte	
M	**MIXTO Y OTROS**	**K.2.8**
P	**ALTA PELIGROSIDAD**	**K.2.9**
R	**RESIDENCIAL**	**K.2.10**
R-1	Unifamiliar - bifamiliar	
R-2	Multifamiliar	
R-3	Hoteles	
T	**TEMPORAL**	**K.2.11**

Tabla 7 Grupos y subgrupos de ocupación

CATEGORIA DEL RIESGO II (Ver NSR-10 J.3.3)

Grupos y sub grupos de ocupación	Área total construida A_T – m^2	Sección del reglamento						
		1	2	3	4	5	6	> 7
(C-1)	$A_T > 1500$	III	III	II	II	II	I	I
	$A_T < 1500$	III	III	III	II	II	II	I
(C-2)	$A_T > 500$	II	I	I	I	I	I	I
	$A_T < 500$			II	I	I	I	I
(E)	Sin limite	III	III	III	II	II	II	I
(I-2), (I-4)	$A_T > 1000$	III	II	II	I	I	I	I
	$500 < A_T < 1000$	III	III	II	II	I	I	I
	$A_T < 500$	III	III	III	II	II	II	I
(I-3)	$A_T > 1000$	II	II	I	I	I	I	I
	$A_T < 1000$		III	II	II	I	I	I
(L-1), (L-2), (L-3), (L-4)	$A_T > 1000$	II	I	I	I	I	I	I
(L-5), (I-1), (I-5)	$500 < A_T < 1000$	II	II	I	I	I	I	I
	$A_T < 500$	III	III	II	II	I	I	I
(R-1), (R-2)	Unidades > $140m^2$				II	I	I	I
	Unidades < $140m^2$				III	II	II	I
(R-3)	$A_T > 5000$	III	II	I	I	I	I	I
	$A_T < 5000$	III	II	II	II	I	I	I

Tabla 8 Categorización edificaciones

RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA 1:30h

ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION	CATEGORIA SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DADA EN J.3.31		
	I	II	III
Muros cortafuego	3	2 ½	2
Muros de cerramiento de escaleras, ascensores, buitrones, ductos de basura y corredores de evacuación	2	2	1 ½
Muros divisorios entre unidades	2	1 ½	1
Muros interiores no portantes	½	¼	-
Columnas, vigas, viguetas, losas y muros portantes de cualquier material y estructuras metálicas en celosía	2	1 ½	1
Cubiertas	1	1	½
Escaleras interiores no encerradas con muros	2	1 ½	1

Tabla 9 Resistencia requerida al fuego Norma NTC 1480, en horas

ESPESOR ELEMENTOS DE CONCRETO

ELEMENTO DE CONCRETO	ESPESOR	TIEMPO
Columnas de concreto	50 cm	1:30 h
Losas de piso	11 cm	1:30 h
Viguetas	20 cm	1:30 h
Vigas de concreto	35 cm	1:30 h
Muros mampostería NE	9 cm	1:30 h

Tabla 10 Espesor elementos en concreto HGM

3.INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
PROCESO DE SELECCIÓN No.	LP 018-2023
NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.6043985
TIPO DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA
CONTRATO NUMERO	LP-018/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 DE MARZO DE 2024
CONTRATANTE	GOBERNACION DE SUCRE
LOCALIZACION	COVEÑAS – SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE – NIT No. 901811441-3 / Representante legal NAYALIBE ELJACH MANJARREZ, cedula de ciudadanía No.1.067.943.743 integrado por CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S – participación 35% CONSTRUCCIONES MASTER S.A.S - participación 35% PROMOTORA DE PROYECTOS ORTECO S.A.S - participación 30%
DIRECCION	CALLE 62ª No. 11ª-50
NUMERO DE TELEFONO	3002737187
OBJETO	
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	
INTERVENTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
PLAZO DE EJECUCION	18 MESES
FECHA INICIO	31 DE MAYO 2024
FECHA VENCIMIENTO INICIAL	30 NOVIEMBRE 2025
VALOR INICIAL	$ 34.420.762.624,00
VALOR ANTICIPO	$ 6.884.152.524,80 (20%)
VALOR ADICIONAL	$ 2.760.630.453,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 37.181.393.077,00

Tabla 11 Control Legal Contratista

3.2 Cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Acorde a las cláusulas 9 y 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y OBLIGACIONES ESPECIFICAS, del contrato de obra pública LP No. 018-2023., se dictamina la siguiente lista:

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA			
1	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres	CUMPLE	La mano de obra no calificada en la ejecución es local.
2	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	En ejecución
3	Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	En ejecución
4	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	CUMPLE	En ejecución
5	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
6	Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
7	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	CUMPLE	En ejecución
8	Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
9	Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	CUMPLE	En ejecución
10	Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	CUMPLE	En ejecución
11	Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	CUMPLE	En ejecución
12	Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.	CUMPLE	En ejecución
13	Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
14	Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	CUMPLE	En ejecución
15	Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
16	Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	CUMPLE	En ejecución
17	Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
18	Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
19	El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	CUMPLE	En ejecución
20	Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad	CUMPLE	En ejecución
21	Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
22	Incorporar como mínimo 90% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.	CUMPLE	En ejecución
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
1	Cumplir con el objeto en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el proponente.	CUMPLE	En ejecución
2	Diseñar, implementar y mantener la organización del contratista y definir las líneas de autoridad y las relaciones entre el personal clave y las actividades del proyecto.	CUMPLE	En ejecución
3	Contar con los diferentes frentes de trabajo con la bitácora donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas	CUMPLE	En ejecución
4	Establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de la construcción del proyecto.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
5	Establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y oportuno de los asuntos relacionados con la coordinación y control de contratos.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
6	Presentar un cronograma de trabajo: el proponente al que le sea adjudicado deberá presentar una programación de las actividades a desarrollar en las diferentes actividades objeto de este contrato. El cronograma de trabajo deberá ser entregado al interventor del contrato en original y en medio magnético.	CUMPLE	En ejecución
7	Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de su propia gestión.	CUMPLE	En ejecución
8	Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE y en otras entidades relacionadas con el proyecto o su zona de influencia que pueda ser utilizada para la ejecución de los trabajos.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
9	Estudiar y analizar los planos, licencias, informes, especificaciones y Pliego de Condiciones para la construcción de las obras contenidas en el objeto contractual del presente proceso de selección.	CUMPLE	En ejecución
10	Coordinar el oportuno suministro y manejo de materiales destinados a las obras del proyecto, los procesos de elaboración de los materiales y presentar los Certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad especificada.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
11	Realizar los replanteos de construcción antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, ejecutar todos los trabajos y especificaciones de construcción.	CUMPLE	En ejecución
12	Emplear personal profesional y/o técnico capacitado.	CUMPLE	En ejecución

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
13	Colocar a disposición de la obra a especialistas técnicos cuando la complejidad de las obras lo amerite.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
14	Cumplir los programas de trabajo, el Programa de Inversión, y presentar mensualmente a la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, los informes de los programas de trabajo.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
15	Preparar y presentar mensualmente informes técnicos - financieros, y de programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, las documentaciones de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos, los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras	CUMPLE	En ejecución
16	Mantener personal calificado y competente en número suficiente según las dedicaciones definidas en la propuesta, para una adecuada y oportuna ejecución de la obra.	CUMPLE	En ejecución
17	Asistir a las reuniones fijadas por la interventoría, y/o la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y/o el supervisor, o quienes hagan sus veces, con el objeto de analizar en el sitio o en oficina todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras.	CUMPLE	En ejecución
18	Poner en práctica durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos adecuados de construcción y de conservación, para lo cual debe prever y evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.	CUMPLE	En ejecución
19	Contar con un Programa de seguridad industrial conforme a las normas vigentes en la utilización de maquinaria y equipos. Programa detallado en GANTT o similares, indicando de manera detallada la forma y tiempo calculados para la ejecución de las obras en cada una de las actividades.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
20	Concertar reuniones periódicas ordinarias u extraordinarias, con la interventoría, y/o la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y/o el supervisor, o quienes hagan sus veces, o sus designados -representantes, para analizar el avance de la obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, y demás, para mantener a la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE plenamente informada en tiempo real, sobre detalles del avance de las obras y del desarrollo del contrato	CUMPLE	En ejecución
21	Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
22	Presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, financieros, ambientales, jurídicos, legales, contractuales o administrativos, cada vez que la interventoría, y/o la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y/o el supervisor, o quienes hagan sus veces lo solicite.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
23	Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
24	Elaborar un informe semanal de construcción con inclusión de los elementos administrativos y técnicos del contrato, incluyendo todos los datos sobre su desarrollo y memorias técnicas de la construcción de las obras. Este informe deberá ser presentado a la interventoría, y/o la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y al supervisor, o a quienes hagan sus veces.	CUMPLE	En ejecución
25	Elaborar antes de iniciar al contrato, el acta de espacio público o de vecindad con el respectivo registro fotográfico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos (en caso de que aplique).	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
26	Velar por que el Departamento de sucre se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	
27	Cumplir con el Sistema de Seguridad Social Integral, y Parafiscales del personal que utilice el Contratista.	CUMPLE	En ejecución
28	Cumplir de las normas de Seguridad Industrial y salud Ocupacional, por parte del Contratista en el personal que utilice.	CUMPLE	En ejecución
29	Cumplir con las licencias y la colocación oportuna de VALLA informativa, con las características impartidas por la Secretaría de Infraestructura Departamental.	CUMPLE	En ejecución
30	Todas aquellas que sean de injerencia o que se determine su aplicabilidad para la ejecución de las obras y todos los aspectos técnicos relacionados, incluibles, medibles, necesarios, suficientes; las de los manejos financieros; las de las condiciones ambientales; las de los aspectos administrativos; y, las de condición jurídico, legal, normativo y similar del proyecto	CUMPLE	En ejecución
31	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto con ocasión a la naturaleza del contrato.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO	

Imagen 13 Obligaciones contratista

3.3 Garantías y Seguros contrato de obra

A la fecha se han suscrito la póliza de garantía iniciales de acuerdo con el contrato de obra y las pólizas actualizadas con la fecha del acta de inicio de mayo 29 de 2024, estas últimas fueron aprobadas por la entidad el día 27 de julio del 2024.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100011333 – OBRA			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$3.442.076.262,40	31/05//2024	31/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$6.884´152.524,80	31/05//2024	31/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$3.442.076.262,40	31/05//2024	31/11/2028

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$1.325´696.298,14	3 años a partir acta de recibo	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$3.442.076.262,40	5 años a partir acta de recibo	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° CMT-100002562			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)	$1.721´038.131,00	31/05//2024	31/11//2025

Tabla 12 Inf. pólizas contrato de obra

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100011333 – OBRA – ANEXO 3			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$3.718.139.307,70	31/05//2024	31/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$7.436.278.615,40	31/05//2024	31/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$3.718.139.307,70	31/05//2024	31/11/2028
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$1.432.315.381,23	3 años a partir acta de recibo	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$3.718.139.307,70	5 años a partir acta de recibo	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° CMT-100002562 – ANEXO 3			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)	$1.721´038.131,00	31/05//2024	30/11//2025

Tabla 13 Inf. pólizas modificatorio No.1

En el Formato FFSI-800-011, se lleva a cabo el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y se verifica la aprobación de estas por parte de la Entidad.

3.4 Información financiera y presupuestal contrato de obra.

De acuerdo con el presupuesto contractual inicial la obra tiene un presupuesto inicial por precios unitarios de por valor de $ 34.420.762.624,00, equivalentes a 26.477,51 SMLMV para el año de suscripción del Contrato (2024), respaldado con certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 312 del 28/02/2024. La forma de pago es la siguiente:

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	**20%** del valor del contrato, el cual será entregado al contratista previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato.
PAGOS POR AVANCE	• **Acta parcial 1:** cuando el contratista haya alcanzado mínimo el 10% de avance de obra acumulado. • **Acta parcial 2:** cuando el contratista haya alcanzado mínimo el 25% de avance de obra acumulado.

	• **Acta parcial 3:** cuando el contratista haya alcanzado mínimo el 45% de avance de obra acumulado. • **Acta parcial 4:** cuando el contratista haya alcanzado mínimo el 70% de avance de obra acumulado. • **Acta parcial 5:** cuando el contratista haya alcanzado mínimo el 100% de avance de obra acumulado, con facturación por el 95% Todas las actas deberán ser aprobadas previamente por la interventoría. En cada pago parcial se irá amortizando el anticipo.
PAGO FINAL	**5%** del valor del contrato, con la liquidación del contrato, para lo cual será requerido certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el Interventor, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee.

Tabla 14 Forma de pago

El día 21 de noviembre del 2024 se suscribió contrato modificatorio No. 01, mediante el cual se aprueba una adición por valor de $2.760.630.453, que representa aproximadamente el 8.02% del valor inicial, amparado en el CDP No. 312 del 28/02/2024, el valor actualizado asciende a $ 37.181.393.077,00.

A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VR/ AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
ANTICIPO 20%			$ 6.884.152.524,80
ACTA No. 1	$ 3.713.773.512,00	$ 688.415.525,48	$ 6.195.736.999,32
ACTA No. 2	$ 5.576.623.114,00	$ 1.032.514.426,73	$ 5.163.222.572,59
TOTAL	**$ 9.290.396.626,00**	**$ 1.720.929.952.21**	**$ 5.163.222.572,59**

Se anexa Formato FSI-800-010. Este formato permite llevar el control financiero y presupuestal con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	**CÓDIGO**	**FSI-800-011**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 31 / 5 / 2025

CONTRATO DE OBRA No. LP 018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA DE INICIO: 31/05/2024

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 34.420.762.624,00

VALOR ACUMULADO: $ 37.181.393.077,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 3.442.076.262,40	31/5/2024	31/3/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 6.884.152.524,80	31/5/2024	31/3/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	$ 3.442.076.262,40	31/5/2024	31/11/2028
Calidad de Estudios y Diseños	20%	$ 1.325.969.298,14	Vigencia de tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo definitivo de Obra	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 3.442.076.262,40	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo definitivo de Obra	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT 100011333

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 1.721.038.131,20	31/5/2024	31/11/2025
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100002562 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 3.718.139.307,70	31/5/2024	31/3/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 7.436.278.615,40	31/5/2024	31/3/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	$ 3.718.139.307,70	31/5/2024	30/11/2028
Calidad de Estudios y Diseños	20%	$ 1.432.315.381,23	Vigencia de tres (03) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo definitivo de Obra	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	$ 3.718.139.307,70	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de recibo definitivo de Obra	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT 100011333

	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	FSI-800-011
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 | 5 | 2025

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 1.721.038.131,20	31	5	2024	30	11	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año


PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100002562 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202090255COR

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	**CÓDIGO**	**FSI-800-010**
		VERSIÓN	**1**
		FECHA	**1/01/2024**

FECHA 31-may

CONTRATO DE OBRA No: LP 018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N CM-001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1954	Fondo 7 Proyecto 2023002700021	2.3.2.01.01.001.02.08	NACION	LP 018-2023	$ 34.420.762.624	$ 34.420.762.624
2024	1954	Fondo 7 Proyecto 2023002700021	2.3.2.01.01.001.02.08	NACION	MODIFICACION No,01	$ 2.760.630.453	$ 2.760.630.453
		TOTAL				$ 37.181.393.077	$ 37.181.393.077

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 37.181.393.077,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	DICIEMBRE	$ 3.713.773.512,00	$ -	$ 3.713.773.512,00	$ 688.415.525,48	$ 3.025.357.986,52	$ 6.195.736.999,32	1954	$ 33.467.619.565,00	$ 33.467.619.565,00	N/A	N/A	N/A	PAGA
2	PARCIAL	DICIEMBRE	$ 5.576.623.114,00	$ -	$ 5.576.623.114,00	$ 1.032.514.426,73	$ 4.544.108.687,27	$ 5.163.222.572,59	1954	$ 27.890.996.451,00	$ 27.890.996.451,00	N/A	N/A	N/A	PAGA
TOTALES			**$ 9.290.396.626,00**		**$ 9.290.396.626,00**	**$ 1.720.929.952,21**	**$ 7.569.466.673,79**	**$ 5.163.222.572,59**		**$ 27.890.996.451,00**	**$ 27.890.996.451,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA PARCIAL No. 1	$ 3.713.773.512	$ -	$ 3.713.773.512
ACTA PARCIAL No. 2	$ 5.576.623.114	$ -	$ 5.576.623.114
VALOR TOTAL	**$ 9.290.396.626**	**$ -**	**$ 9.290.396.626**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Firma:
JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A08101999-50909828

Firma
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTARTO DE OBRA

4.1 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes – avance físico.

A fecha de corte del presente informe (31 de mayo del 2025), dentro del componente de obra civil se tienen los siguientes avances de acuerdo con la reprogramación (Modificatorio No.1):

- El capítulo de preliminares presenta un avance acumulado de ejecución del 81%, a la fecha se han realizaron las actividades de: descapote y limpieza, campamento, sanitarios portátiles, batería de lavamanos, cerramiento en teja de zinc, instalación de puerta metálica, traslado de coordenadas IGAC, localización y replanteo, provisional de obra acueducto, provisional de obra energía, piscina para curado cilindros (2.00x1.00x0.50 mt) y desarenador aguas residuales cortes material de acabados.
- El capítulo de cimentaciones presenta un avance acumulado de 100%, se han realizado las actividades de: columnas en concreto 28 mpa, muro de contención, concreto 28 mpa, placa aligerada de entrepiso e=0,55m, concreto 28 mpa. incluye vigas y viguetas, tanque de agua en concreto 28 mpa, polietileno cal. 6 bajo concreto de limpieza placa cimentación, acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, figurado y malla electrosoldada.
- El capítulo de estructura presenta un avance acumulado de 99%, se han realizado las actividades de: columnas en concreto 28 mpa, muro de contención, concreto 28 mpa, placa aligerada de entrepiso y cubierta e=0,55m, concreto 28 mpa. incluye vigas y viguetas, tanque de agua en concreto 28 mpa, polietileno cal. 6 bajo concreto de limpieza placa cimentación, acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, figurado y malla electrosoldada.
- El capítulo de mampostería presenta un avance de 35% durante ete periodo se iniciaron las actividades de M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt..
- El capítulo de elementos de fachada - envolvente presenta un avance de 0.00%.

- El capítulo de pañetes presenta un avance de 60%, se han ejecutado los ítems de pañete muros internos, mortero 1:4, incl. filos y dilataciones y pañete tanques de agua, etc., mortero 1:3 impermeabilizado, incl. filos y dilataciones.
- El capítulo de cubierta presenta un avance de 67%, se han ejecutado las actividades correspondientes a pendientado mortero 1:3 impermeabilizado (E. prom= 7 cm) incl. malla gallinero.
- El capítulo de impermeabilizaciones presenta un avance de 48%, se han ejecutado las actividades de impermeabilización membrana PVC no intemperie, membrana PVC para impermeabilización de cubiertas no expuestas reforzada con fibra de poliéster e= 1.2 mm incl. geotextil nt-2500 para parte superior, botas y accesorios, no va anclada a placa puesto que el acabado que la cubre la arriostra) y sistema de impermeabilización para tanque de agua potable y RCI con membrana a base de PVC plastificado y reforzado con armadura de poliéster de alta tenacidad para la impermeabilización de tanques de agua 1.2 mm. incluye geotextil nt 2500 en la zona del fondo de los tanques
- El capítulo de cielo raso presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de pisos y guarda escobas presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de enchape muros presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de instalaciones hidrosanitarias presenta un avance acumulado de 36%. se han realizado las actividades de: acometida en diferentes diámetros dependiendo de la necesidad, redes de agua fría y caliente, así como redes para la evacuación de aguas grasas y patógenas; y redes de aguas lluvias.
- El capítulo de red contra incendio presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de instalaciones gas natural presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de instalaciones gases medicinales presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de instalaciones eléctricas presenta un avance acumulado de 3%.
- El capítulo de instalaciones iluminación presenta un avance de 0.00%.

- El capítulo de instalaciones voz y datos presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de instalaciones seguridad y control presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de instalación equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de aparatos sanitarios presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de carpintería madera presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de carpintería metálica presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de carpintería aluminio presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de carpintería acero inoxidable presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de cerrajería presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de vidrios y espejos presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de pintura presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de línea institucional hospitalaria presenta un avance de 0.00%.
- El capítulo de aseo presenta un avance de 8%, se han ejecutado las actividades de retiro de sobrantes.
- El capítulo de vías-urbanismo interno presenta un avance de 23%, se han ejecutado las actividades de localización y replanteo, subbase granular sbg-1 de acuerdo con la recomendación en el estudio de suelos del proyecto y filtro francés en base muro de contención según diseño 0.25 x 0.30 mt, incl. excavación, geotextil NT0 1600, tubería y material filtrante según especificación.

. • El capítulo de andenes-urbanismo interno presenta un avance de 24%, se han ejecutado las actividades de subbase granular sbg-1, e. min=0.30 mt, muro de contención visto ambas caras, concreto 28 mpa, acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, figurado.

- El capítulo de mobiliario urbano - urbanismo interno presenta un avance de 0.00%.
- el capítulo de edificaciones exteriores- caseta control -urbanismo interno presenta un avance de 19%.

- el capítulo de rampa peatonal, e=0.12 mt. - urbanismo interno presenta un avance de 16%.
- el capítulo de andenes - urbanismo externo presenta un avance de 0.00%.
- el capítulo de cerramiento - urbanismo externo presenta un avance de 0.00%.

Lo componentes de equipos, amueblamiento y equipos médicos no tienen programación ni avance a la fecha.

En el siguiente cuadro se relacionan las actividades ejecutadas durante el periodo:

ACTIVIDAD	UN	CONTRATADO			EJECUTADO			% DE AVANCE ACUMULADO
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO	ACUMULADO TOTAL	
CONSTRUCCIÓN								
PRELIMINARES								
DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	m3	1212,00	$ 50.926,00	$ 61.722.312,00		1212,00	$ 61.722.312,00	**100%**
CAMPAMENTO, Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoría, dos módulos tipo almacén de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acústica sostenida por estructura en repisa ordinaria distanciada cada 2.8 mts + repisa ordinaria distanciada cada 1.40mts según recomendación de proveedor de cubierta, los demás que requiera el contratista serán a su costo	un	1,00	$ 43.760.810,00	$ 43.760.810,00		1,00	$ 43.760.810,00	**100%**
SANITARIOS PORTÁTILES, 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres, los demás que requiera el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento según necesidad	mes	18,00	$ 5.341.688,00	$ 96.150.384,00		8,00	$ 42.733.504,00	**44%**
Batería para lavamanos en bloque # 5 más columnetas y cinta de confinamiento superior, pañetada con mortero 1:4; cada una con cinco lavamanos de colgar, más grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	un	1,00	$ 4.750.158,00	$ 4.750.158,00		1,00	$ 4.750.158,00	**100%**
CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MÁS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 76 x 38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR, DISTANCIADA CADA 3.00 mt, h=2.40 mt	m	450,00	$ 110.833,00	$ 49.874.850,00		450,00	$ 49.874.850,00	**100%**

PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm, PAÑOS EN LÁMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl. Riel en ángulo invertido más rodamientos y rodamiento guía. Ancho 4.50 mt, Altura 2.50 mt	un	1,00	$ 3.525.044,00	$ 3.525.044,00		1,00	$ 3.525.044,00	**100%**
TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1,00	$ 687.324,00	$ 687.324,00		1,00	$ 687.324,00	**100%**
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4635,94	$ 4.198,00	$ 19.461.676,00		4635,94	$ 19.461.676,12	**100%**
PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	un	1,00	$ 1.218.644,00	$ 1.218.644,00		1,00	$ 1.218.644,00	**100%**
PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador)	un	1,00	$ 3.642.755,00	$ 3.642.755,00		1,00	$ 3.642.755,00	**100%**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico	UN	6,00	$ 302.441,00	$ 1.814.646,00		6,00	$ 1.814.646,00	**100%**
PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)	un	1,00	$ 1.614.484,00	$ 1.614.484,00		1,00	$ 1.614.484,00	**100%**
DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	un	1,00	$ 4.441.677,00	$ 4.441.677,00		1,00	$ 4.441.677,00	**100%**
				$ 293.612.574,00			**$ 239.247.884,12**	**81%**
CIMENTACIÓN								
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	14130,00	$ 50.926,00	$ 719.584.380,00		14130,00	$ 719.584.380,00	**100%**
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	1165,60	$ 14.360,00	$ 16.738.016,00		1165,60	$ 16.738.016,00	**100%**
EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	3964,90	$ 68.797,00	$ 272.773.225,30		3964,90	$ 272.773.225,30	**100%**
FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	589,20	$ 77.661,00	$ 45.757.861,20		589,20	$ 45.757.861,20	**100%**
PERFILADA Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	M2	4635,94	$ 1.841,00	$ 8.534.765,54		4635,94	$ 8.534.765,54	**100%**

CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	1308,50	$ 428.166,00	$ 560.255.211,00		1308,50	$ 560.255.211,00	**100%**
CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt	m2	3265,34	$ 32.680,00	$ 106.711.311,20		3265,34	$ 106.711.311,20	**100%**
ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Premezclado no incluye refuerzo)	m3	348,92	$ 755.880,00	$ 263.741.649,60		348,92	$ 263.741.649,60	**100%**
PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	90,88	$ 859.554,00	$ 78.116.267,52		90,88	$ 78.116.267,52	**100%**
VIGA DE CIMENTACIÓN VC F´c= 28 Mpa, Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	171,15	$ 830.536,00	$ 142.146.236,40		171,15	$ 142.146.236,40	**100%**
EXTENDIDA Y COMACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	1165,60	$ 9.372,00	$ 10.924.003,20		1165,60	$ 10.924.003,20	**100%**
RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	11105,40	$ 114.007,00	$ 1.266.093.337,80		11105,40	$ 1.266.093.337,80	**100%**
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	64450,25	$ 7.611,00	$ 490.530.852,75		64450,25	$ 490.530.852,75	**100%**
				$ 3.981.907.118,00			**$ 3.981.907.117,51**	100%
ESTRUCTURA								
COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	147,27	$ 859.554,00	$ 126.586.518,00		147,27	$ 126.586.517,58	**100%**
MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	101,26	$ 904.041,00	$ 91.543.191,66		101,26	$ 91.543.191,66	**100%**
PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO e=0,55m, concreto 28 Mpa. Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5960,55	$ 291.675,00	$ 1.738.543.421,25		5960,55	$ 1.738.543.421,25	**100%**
PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0,55m, concreto 28 Mpa. con fibra según especificación estructural, Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5329,53	$ 293.780,00	$ 1.565.709.323,40		5329,53	$ 1.565.709.323,40	**100%**
TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa. incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería	m3	128,29	$ 1.020.614,00	$ 130.934.570,06		128,29	$ 130.934.570,06	**100%**

RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DETRÁS DE MUROS DE CONTENCIÓN, según recomendación estudio de suelos	m3	126,00	$ 114.007,00	$ 14.364.882,00		126,00	$ 14.364.882,00	**100%**
POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN	m2	4545,28	$ 3.068,00	$ 13.944.919,04		4545,28	$ 13.944.919,04	**100%**
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	269666,39	$ 7.611,00	$ 2.052.430.894,29		269666,39	$ 2.052.430.894,29	**100%**
MALLA ELECTROSOLDADA	kg	97182,80	$ 7.781,00	$ 756.179.366,80		97182,80	$ 756.179.366,80	**100%**
				$ 6.559.434.158,00			**$ 6.490.237.086,08**	**99%**
MAMPOSTERIA								
M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	2042,78	$ 53.317,00	$ 108.914.901,26		2042,78	$ 108.914.901,26	**100%**
M-16: MURO BLOQUE No. 12, e=0.12 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1075,20	$ 89.047,00	$ 95.743.334,00		1075,20	$ 95.743.334,00	**100%**
M-16: MURO BLOQUE No. 20, e=0.20 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	612,25	$ 100.267,00	$ 61.388.471,00		555.07	$ 55.655.203,69	**91%**
M-19:MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0.12 mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	M2	500,30	$ 163.676,00	$ 81.887.103,00		388.00	$ 63.506.288,00	**78%**

M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.115 mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1528,29	$ 154.851,00	$ 236.657.932,00		1376,22	$ 213.109.043,22	**90%**
COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, incl. Refuerzo según diseño	m	3015,68	$ 43.363,00	$ 130.768.932,00		2509,66	$ 108.826.386,58	**83%**
ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	2025,00	$ 29.132,00	$ 59.720.600,00		1878,00	$ 54.709.896,00	**92%**
ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi	m	735.63	$ 31.981,00	$ 24.101.841,00		587,08	$ 18.775.405,48	**59%**
				$ 2.064.664.406,00			**$ 719.240.458,63**	**35%**
PAÑETES								
PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:4, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	5112,37	$ 28.524,00	$ 145.825.241,88		3541,00	$ 115.835.964,00	**79%**
PAÑETE TANQUES DE AGUA, ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones	m2	486,10	$ 38.569,00	$ 18.748.390,90		401,00	$ 15.466.169,00	**82%**
				$ 220.385.955,00			**$ 131.302.133,00**	**60%**
CUBIERTAS								
PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e.prom= 7 cm) Incl. Malla Gallinero	m2	5240,36	$ 61.064,00	$ 319.997.343,04		5039.34	$ 307.722.257.76	**96%**
BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	560,50	$ 65.572,00	18.748.391,00		468,00	$ 30.687.696,00	**83%**

BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos	ml					283.00	$ 18.556.876,00	**78%**
				$ 533.702.824,00			**$ 356.966.829,76**	**67%**
PERMEABILIZACIONES								
IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTEMPERIE, MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER e= 1.2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR, BOTAS Y ACCESORIOS, NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA ARRIOSTRA)	m2	5287,68	$ 125.229,00	$ 662.170.878,72		2655,00	$ 332.482.995,00	**50%**
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1.2 mm. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES	m2	486,10	$ 157.331,00	$ 76.478.599,10		250,00	$ 57.425.815,00	**51%**
				$ 807.898.777,00			**$ 389.908.810,00**	**48%**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
ACOMETIDAS								
TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	300,00	$ 10.429,00	$ 3.128.700,00		119,50	$ 1.246.265,50	**40%**
ACCESORIOS PVCP Ø1"	un	236,00	$ 6.019,00	$ 1.420.484,00		90,00	$ 541.710,00	**38%**
				$ 7.764.475,00			**$ 1.787.975,50**	**23%**
RED DE AGUA FRÍA								
TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø4"	m	56,98	$ 107.887,00	$ 6.147.401,00		43,70	$ 4.714.661,90	**77%**
ACCESORIOS PVC 4"	un	19,00	$ 125.628,00	$ 2.386.932,00		7,00	$ 879.396,00	**37%**
TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	9,12	$ 70.650,00	$ 644.328,00		6,00	$ 423.900,00	**66%**
ACCESORIOS PVC 3"	un	15,00	$ 68.461,00	$ 1.026.915,00		2,00	$ 136.922,00	**13%**
TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2-1/2"	m	26,21	$ 45.841,00	$ 1.201.493,00		8,40	$ 385.064,40	**32%**
ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un	8,00	$ 53.161,00	$ 425.288,00		3,00	$ 159.483,00	**38%**

TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2"	m	56,52	$ 34.928,00	$ 1.974.131,00		23,20	$ 810.329,60	**41%**
ACCESORIOS PVC 2"	un	64,00	$ 30.298,00	$ 1.939.072,00		17,00	$ 515.066,00	**27%**
TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/4"	m	136,32	$ 18.749,00	$ 2.555.864,00		68,00	$ 1.274.932,00	**50%**
ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un	92,00	$ 22.658,00	$ 2.084.536,00		34,00	$ 770.372,00	**37%**
TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	1248,44	$ 10.429,00	$ 13.019.981,00		577,50	$ 6.022.747,50	**46%**
ACCESORIOS PVC 1"	un	1230,00	$ 5.666,00	$ 6.969.180,00		295,00	$ 1.671.470,00	**24%**
TUBERÍA PVCP RDE 9 Ø1/2"	m	1769,00	$ 7.763,00	$ 13.732.747,00		613,40	$ 4.761.824,20	**35%**
ACCESORIOS PVC 1/2"	un	2238,00	$ 2.687,00	$ 6.013.506,00		853,00	$ 2.292.011,00	**38%**
				$ 107.961.675,00			**$ 24.818.179,60**	**23%**
RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA								
TUBERÍA CPVC 1/2"	m	298,45	$ 12.203,00	$ 3.641.985,00		153,00	$ 1.867.059,00	**51%**
ACCESORIOS CPVC 1/2"	un	369,00	$ 4.190,00	$ 1.546.110,00		83,00	$ 347.770,00	**22%**
				$ 12.860.540,00			**$ 2.214.829,00**	**17%**
RED DE AGUAS NEGRAS								
TUBERÍA PVCS 6"	m	157,66	$ 93.519,00	$ 14.744.205,54		135,00	$ 12.625.065,00	**86%**
ACCESORIOS PVCS 6"	un	203,00	$ 153.466,00	$ 31.153.598,00		64,00	$ 9.821.824,00	**32%**
ABRAZADERA 6"	Un	79,00	$ 10.922,00	$ 862.838,00		20,00	$ 218.440,00	**25%**
TUBERÍA PVCS 4"	m	815,54	$ 63.790,00	$ 52.023.296,60		553,00	$ 35.275.870,00	**68%**
ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 43.200,00	$ 15.984.000,00		68,00	$ 2.937.600,00	**18%**
ABRAZADERA 4"	Un	408,00	$ 19.592,00	$ 7.993.536,00		55,00	$ 1.077.560,00	**13%**
TUBERÍA PVCS 2"	m	530,17	$ 23.118,00	$ 12.256.470,06		406,00	$ 9.385.908,00	**77%**
ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	$ 9.751,00	$ 6.357.652,00		283,00	$ 2.759.533,00	**43%**
ABRAZADERA 2"	Un	250,00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00		62,00	$ 622.914,00	**25%**
TUBERÍA PVCS LIVIANA 2"	m	485,56	$ 17.138,00	$ 8.321.527,28		432,60	$ 7.413.898,80	**89%**
				$ 153.608.783,00			**$ 82.138.612.80**	**54%**
RED DE AGUAS PATÓGENAS								
TUBERÍA PVCS 4"	m	149,70	$ 46.449,00	$ 6.953.415,30		90,00	$ 4.180.410,00	**60%**
ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00		103,00	$ 2.663.477,00	**28%**
ABRAZADERA 4"	un	70,00	$ 10.922,00	$ 764.540,00		20,00	$ 218.440,00	**29%**
TUBERÍA PVCS 3"	m	164,46	$ 33.127,00	$ 5.448.066,42		89,00	$ 2.948.303,00	**54%**
ACCESORIOS PVCS 3"	un	45,00	$ 14.718,00	$ 662.310,00		45,00	$ 662.310,00	**100%**

ABRAZADERA 3"	un	80,00	$ 10.047,00	$ 803.760,00		20,00	$ 200.940,00	**25%**
TUBERÍA PVCS 2"	m	527,34	$ 23.118,00	$ 12.191.046,12		443,00	$ 10.241.274,00	**84%**
ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	$ 9.751,00	$ 6.357.652,00		150,00	$ 1.462.650,00	**23%**
ABRAZADERA 2"	un	250,00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00		30,00	$ 301.410,00	**12%**
				$ 45.260.369,00			**$ 22.879.214,00**	**51%**
RED DE AGUAS LLUVIAS								
TUBERÍA PVCS 6"	m	577,40	$ 93.519,00	$ 53.997.870,60		460,00	$ 43.018.740,00	**80%**
ACCESORIOS PVCS 6"	un	203,00	$ 117.069,00	$ 23.765.007,00		75,00	$ 8.780.175,00	**37%**
ABRAZADERA 6"	un	250,00	$ 10.922,00	$ 2.730.500,00		30,00	$ 327.660,00	**12%**
TUBERÍA PVCS 4"	m	689,23	$ 46.449,00	$ 32.014.044,27		540,00	$ 25.082.460,00	**78%**
ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00		120,00	$ 3.103.080,00	**32%**
ABRAZADERA 4"	un	400,00	$ 10.922,00	$ 4.368.800,00		30,00	$ 327.660,00	**8%**
				$ 144.452.562,00			**$ 80.639.775,00**	**56%**
CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA								
CAJA DE INSPECCION 0,70*0,70	UN	25,00	$ 1.014.754,00	$ 25.368.850,00		18,00	$ 18.265.572,00	**72%**
				$ 25.368.850,00			**$ 18.265.572,00**	**72%**
REDES EXTERIORES								
TUBERÍA PVC 160 mm	m	92,58	$ 67.332,00	$ 6.233.596,56		30,00	$ 2.019.960,00	**32%**
TUBERÍA PVC 200 mm	m	370,39	$ 92.623,00	$ 34.306.632,97		245,00	$ 22.692.635,00	**66%**
				$ 52.633.007,00			**$ 24.712.595,00**	**47%**
INSTALACIONES ELECTRICAS								
SALIDAS ELECTRICAS								
SALIDA LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	Un	68,00	$ 189.456,00	$ 12.883.008,00		3.00	$ 568.368,00	**4%**
SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	Un	151,00	$ 134.170,00	$ 20.259.670,00		10.00	$ 1.341.700,00	**7%**

SALIDA LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA, - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	Un	156,00	$ 120.608,00	$ 18.814.848,00		3.00	$ 361.824,00	**2%**
SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA FLUXOMETROS LAVAMANOS QUIRÚRGICOS, SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½", CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM, Y ACCESORIOS	Un	122,00	$ 95.137,00	$ 11.606.714,00		41,00	$ 3.900.617,00	**34%**
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, ESCLAVA GFCI, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	Un	10,00	$ 77.583,00	$ 775.830,00		2,00	$ 155.166,00	**20%**
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTEMPERIE INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	62,00	$ 132.139,00	$ 8.192.618,00		24,00	$ 3.171.336,00	**39%**
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI, UNIDAD ODONTOLOGICAS, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 151.918,00	$ 303.836,00		1,00	$ 151.918,00	**50%**
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	138,00	$ 130.452,00	$ 18.002.376,00		26,00	$ 3.391.752,00	**19%**

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MÉDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	48,00	$ 151.643,00	$ 7.278.864,00		9,00	$ 1.364.787,00	**19%**
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, TAPA Y ACCESORIOS	un	23,00	$ 241.851,00	$ 5.562.573,00		4,00	$ 967.404,00	**17%**
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	336,00	$ 97.044,00	$ 32.606.784,00		63,00	$ 6.113.772,00	**19%**
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	176,00	$ 154.626,00	$ 27.214.176,00		33,00	$ 5.102.658,00	**19%**
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	93,00	$ 310.153,00	$ 28.844.229,00		17,00	$ 5.272.601,00	**18%**
SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTO Y CIRUGIA, 120 V, 15 A INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	32,00	$ 359.154,00	$ 11.492.928,00		8,00	$ 2.873.232,00	**25%**

SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA RAYOS X PORTATILES, HUBBELL IN16494 60A, 220 V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 2", CABLE TRENZADO XHHW-2 NO. 2 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	5,00	$ 8.701.246,00	$ 43.506.230,00		1,00	$ 8.701.246,00	**20%**
SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLOGÍA, BAÑO MARIA Y CALENTADORES ELÉCTRICOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	9,00	$ 235.327,00	$ 2.117.943,00		2,00	$ 470.654,00	**22%**
SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, MÁQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 512.257,00	$ 512.257,00		1,00	$ 512.257,00	**100%**
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	310,00	$ 42.785,00	$ 13.263.350,00		58,00	$ 2.481.530,00	**19%**
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	49,00	$ 49.084,00	$ 2.405.116,00		9,00	$ 441.756,00	**18%**
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	7,00	$ 52.942,00	$ 370.594,00		1,00	$ 52.942,00	**14%**
SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	28,00	$ 145.734,00	$ 4.080.552,00		5,00	$ 728.670,00	**18%**

SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SÓTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	66,00	$ 181.044,00	$ 11.948.904,00		12,00	$ 2.172.528,00	**18%**
SALIDAS TRIFÁSICA 208 V, PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCLAVE, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12+1X10T AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	4,00	$ 313.717,00	$ 1.254.868,00		1,00	$ 313.717,00	**25%**
SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBAS EYECTORAS, PRESIÓN Y PONDAJE, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12,00	$ 188.419,00	$ 2.261.028,00		2,00	$ 376.838,00	**17%**
				$ 457.153.402,00			**$ 45.419.247,00**	**10%**
DUCTERÍAS, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES B.T								
TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	$ 350,00	$ 10.185,00	$ 3.564.750,00		350,00	$ 3.564.750,00	**100%**
TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	170,00	$ 15.497,00	$ 2.634.490,00		170,00	$ 2.634.490,00	**100%**
TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	15,00	$ 17.322,00	$ 259.830,00		15,00	$ 259.830,00	**100%**
TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	520,00	$ 20.832,00	$ 10.832.640,00		520,00	$ 10.832.640,00	**100%**
TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	20,00	$ 22.240,00	$ 444.800,00		20,00	$ 444.800,00	**100%**
TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	60,00	$ 29.538,00	$ 1.772.280,00		60,00	$ 1.772.280,00	**100%**
				$ 1.133.677.540,00			**$ 19.508.790,00**	**2%**

CÁMARAS Y CANALIZACIÓN								
CANALIZACIÓN TUBERÍA 4Ø6" PVC (INCLUYE CAMA DE ARENA)	m	140,00	$ 296.965,00	$ 41.575.100,00		120,00	$ 35.635.800,00	**86%**
CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO DOBLE AFINIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	5,00	$ 4.315.782,00	$ 21.578.910,00		2,00	$ 8.631.564,00	**40%**
				$ 68.342.112,00			**$ 44.267.364,00**	**65%**
SISTEMA PUESTA A TIERRA								
PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, RECTANGULAR DE 5X5 M CON CUADRICULAS DE 2,5 M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	$ 6.065.140,00	$ 6.065.140,00		1,00	$ 6.065.140,00	**100%**
PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, TRIANGULAR DE 5M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	$ 3.105.840,00	$ 3.105.840,00		1,00	$ 3.105.840,00	**100%**
				$ 23.793.914,00			**$ 9.170.980,00**	**39%**
ASEO								
RETIRO DE SOBRANTES	vj	70,00	$ 121.190,00	$ 8.483.300,00		65,00	$ 7.877.350,00	**93%**
				$ 97.160.419,00			**$ 7.877.350,00**	**8%**
VIAS - URBANISMO INTERNO								
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2973,12	$ 4.198,00	$ 12.481.158,00		2973,12	$ 12.481.157,76	**100%**
SUB-BASE GRANULAR SBG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533,69	$ 116.022,00	$ 61.919.781,00		530,00	$ 61.491.660,00	**99%**

FILTRO FRANCÉS EN BASE MURO DE CONTENCIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25 x 0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	170,03	$ 77.661,00	$ 13.204.700,00		170,03	$ 13.204.699,83	**100%**
				$ 378.727.397,00			**$ 87.177.517,59**	**23%**
ANDENES - URBANISMO INTERNO								
SUB BASE GRANULAR SBG-1, e. Min=0.30 mt	m3	358,25	$ 119.931,00	$ 42.965.281,00		351,12	$ 42.110.172,72	**98%**
MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS, concreto 28 Mpa	m3	128,99	$ 897.030,00	$ 115.707.900,00		125,00	$ 112.128.750,00	**97%**
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	8833,77	$ 7.611,00	$ 67.233.823,00		7500,00	$ 57.082.500,00	**85%**
				$ 898.219.123,00			**$ 211.321.422,72**	**24%**
EDIFICACIONES EXTERIORES-CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO								
CONTROL DE ACCESO 1	un	1,00	$ 31.097.277,00	$ 31.097.277,00		0,65	$ 20.213.230,05	**65%**
CONTROL DE ACCESO 2	un	2,00	$ 28.288.682,00	$ 56.577.364,00		0,97	$ 27.440.021.54	**49%**
CUARTO DE BASURAS	un	1,00	$ 143.175.155,00	$ 143.175.155,00		0,61	$ 87.336.844,55	**61%**
				$ 725.724.351,00			**$ 134.990.096.14**	**19%**
RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO								
EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	187,64	$ 70.816,00	$ 13.287.914,24		187,64	$ 13.287.914,24	**100%**
CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt,	m2	29,69	$ 32.680,00	$ 970.269,20		29,69	$ 970.269,20	**100%**
ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3	7,42	$ 755.880,00	$ 5.608.629,60		7,42	$ 5.608.629,60	**100%**
VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F´C 28 Mpa, No incluye refuerzo	m3	4,46	$ 829.320,00	$ 3.698.767,20		4,46	$ 3.698.767,20	**100%**
COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	9,98	$ 859.554,00	$ 8.578.348,92		9,98	$ 8.578.348,92	**100%**
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	5497,87	$ 7.611,00	$ 41.844.288,57		5099,00	$ 61.869.819,00	**84%**
				$ 448.602.113,00			**$ 86.402.748.16**	**19%**
			COSTO TOTAL	**$ 37.181.393.077,00**			**$ 13.571.208.473,00**	**36,50%**

ALCANCE FÍSICO Y FINANCIERO

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES			EJECUTADO						% DE AVANCE ACUMULADO
						CANTIDADES			VALORES			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
CONSTRUCCIÓN												
1.00.00	**PRELIMINARES**											
1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	m3	1.212,00	$ 50.926,00	$ 61.722.312,00	1.212,00		1.212,00	$ 61.722.312,00	$ -	$ 61.722.312,00	**100%**
1.00.02	CAMPAMENTO, Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoría, dos módulos tipo almacén de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acústica sostenida por estructura en repisa ordinaria distanciada cada 2.8 mts + repisa ordinaria distanciada cada 1.40mts según recomendación de proveedor de cubierta, los demás que requiera el contratista serán a su costo	un	1,00	$ 43.760.810,00	$ 43.760.810,00	1,00		1,00	$ 43.760.810,00	$ -	$ 43.760.810,00	**100%**
1.00.03	SANITARIOS PORTÁTILES, 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres, los demás que requiera el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento según necesidad	mes	18,00	$ 5.341.688,00	$ 96.150.384,00	8,00		8,00	$ 42.733.504,00	$ -	$ 42.733.504,00	**44%**
1.00.04	Batería para lavamanos en bloque # 5 más columnetas y cinta de confinamiento superior, pañetada con mortero 1:4; cada una con cinco lavamanos de colgar, más grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	un	1,00	$ 4.750.158,00	$ 4.750.158,00	1,00		1,00	$ 4.750.158,00	$ -	$ 4.750.158,00	**100%**
1.00.05	CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MÁS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 76 x 38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR, DISTANCIADA CADA 3.00 mt, h=2.40 mt	m	450,00	$ 110.833,00	$ 49.874.850,00	450,00		450,00	$ 49.874.850,00	$ -	$ 49.874.850,00	**100%**
1.00.06	PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm, PAÑOS EN LÁMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl. Riel en ángulo invertido más rodamientos y rodamiento guía. Ancho 4.50 mt, Altura 2.50 mt	un	1,00	$ 3.525.044,00	$ 3.525.044,00	1,00		1,00	$ 3.525.044,00	$ -	$ 3.525.044,00	**100%**
1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1,00	$ 687.324,00	$ 687.324,00	1,00		1,00	$ 687.324,00	$ -	$ 687.324,00	**100%**
1.00.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4.635,94	$ 4.198,00	$ 19.461.676,00	4.635,94		4.635,94	$ 19.461.676,12	$ -	$ 19.461.676,12	**100%**
1.00.09	PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	un	1,00	$ 1.218.644,00	$ 1.218.644,00	1,00		1,00	$ 1.218.644,00	$ -	$ 1.218.644,00	**100%**
1.00.10	PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador)	un	1,00	$ 3.642.755,00	$ 3.642.755,00	1,00		1,00	$ 3.642.755,00	$ -	$ 3.642.755,00	**100%**
1.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico	un	6,00	$ 302.441,00	$ 1.814.646,00	6,00		6,00	$ 1.814.646,00	$ -	$ 1.814.646,00	**100%**
1.00.12	CÁRCAMO LAVADO LLANTAS, incl. desarenados y rejilla	un	1,00	$ 947.810,00	$ 947.810,00					$ -	$ -	
1.00.13	PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)	un	1,00	$ 1.614.484,00	$ 1.614.484,00	1,00		1,00	$ 1.614.484,00	$ -	$ 1.614.484,00	**100%**
1.00.14	DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	un	1,00	$ 4.441.677,00	$ 4.441.677,00	1,00		1,00	$ 4.441.677,00	$ -	$ 4.441.677,00	**100%**
					$ 293.612.574,00						**$ 239.247.884,12**	**81%**
2.00.00	**CIMENTACIÓN**											
2.00.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	14.130,00	$ 50.926,00	$ 719.584.380,00	14.130,00		14.130,00	$ 719.584.380,00	$ -	$ 719.584.380,00	**100%**
2.00.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	1.165,60	$ 14.360,00	$ 16.738.016,00	1.165,60		1.165,60	$ 16.738.016,00	$ -	$ 16.738.016,00	**100%**
2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	3.964,90	$ 68.797,00	$ 272.773.225,00	3.964,90		3.964,90	$ 272.773.225,30	$ -	$ 272.773.225,30	**100%**
2.00.04	FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	589,20	$ 77.661,00	$ 45.757.861,00	589,20		589,20	$ 45.757.861,20	$ -	$ 45.757.861,20	**100%**
2.00.05	PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	4.635,94	$ 1.841,00	$ 8.534.766,00	4.635,94		4.635,94	$ 8.534.765,54	$ -	$ 8.534.765,54	**100%**
2.00.06	CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	1.308,50	$ 428.166,00	$ 560.255.211,00	1.308,50		1.308,50	$ 560.255.211,00	$ -	$ 560.255.211,00	**100%**
2.00.07	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt	m2	3.265,34	$ 32.680,00	$ 106.711.311,00	3.265,34		3.265,34	$ 106.711.311,20	$ -	$ 106.711.311,20	**100%**
2.00.08	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Premezclado no incluye refuerzo)	m3	348,92	$ 755.880,00	$ 263.741.650,00	348,92		348,92	$ 263.741.649,60	$ -	$ 263.741.649,60	**100%**
2.00.09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	90,88	$ 859.554,00	$ 78.116.268,00	90,88		90,88	$ 78.116.267,52	$ -	$ 78.116.267,52	**100%**
2.00.10	VIGA DE CIMENTACIÓN VC F´c= 28 Mpa, Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	171,15	$ 830.536,00	$ 142.146.236,00	171,15		171,15	$ 142.146.236,40	$ -	$ 142.146.236,40	**100%**
2.00.11	EXTENDIDA Y COMACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	1.165,60	$ 9.372,00	$ 10.924.003,00	1.165,60		1.165,60	$ 10.924.003,20	$ -	$ 10.924.003,20	**100%**
2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	11.105,40	$ 114.007,00	$ 1.266.093.338,00	11.105,40		11.105,40	$ 1.266.093.337,80	$ -	$ 1.266.093.337,80	**100%**

2.00.13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	64.450,25	$ 7.611,00	$ 490.530.853,00	64.450,25		64.450,25	$ 490.530.852,75	$ -	$ 490.530.852,75	100%
					$ 3.981.907.118,00					**$ -**	**$ 3.981.907.117,51**	100%
3.00.00	**ESTRUCTURA**											
3.00.01	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	147,27	$ 859.554,00	$ 126.586.518,00	147,28		147,27	$ 126.586.517,58	$ -	$ 126.586.517,58	100%
3.00.02	ESCALERAS CONCRETO A LA VISTA, DE 28 Mpa, CON FORMALETA SÚPER T Inc. Gualderas y lineales, filos rebajados	m3	14,54	$ 1.117.309,00	$ 16.244.556,00					$ -	$ -	
3.00.03	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	101,26	$ 904.041,00	$ 91.543.192,00	101,26		101,26	$ 91.543.191,66	$ -	$ 91.543.191,66	100%
3.00.04	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO e=0,55m, concreto 28 Mpa. Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5.960,55	$ 291.675,00	$ 1.738.543.421,00	5.960,55		5.960,55	$ 1.738.543.421,25	$ -	$ 1.738.543.421,25	100%
3.00.05	PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0,55m, concreto 28 Mpa. con fibra según especificación estructural, Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5.329,53	$ 293.780,00	$ 1.565.709.323,00	5.329,53		5.329,53	$ 1.565.709.323,40	$ -	$ 1.565.709.323,40	100%
3.00.06	TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa. incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería	m3	128,29	$ 1.020.614,00	$ 130.934.570,00	128,29		128,29	$ 130.934.570,06	$ -	$ 130.934.570,06	100%
3.00.07	GEODREN PLANAR DETRÁS DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	430,81	$ 103.255,00	$ 44.483.287,00					$ -	$ -	
3.00.08	RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DETRAS DE MUROS DE CONTENCIÓN, según recomendación estudio de suelos	m3	126,00	$ 114.007,00	$ 14.364.882,00	126,00		126,00	$ 14.364.882,00	$ -	$ 14.364.882,00	100%
3.00.09	NEOPRENO 3/8" PARA JUNTAS ESTRUCTURALES DUREZA 60 0.35x0.70 mts	un	52,00	$ 136.022,00	$ 7.073.144,00					$ -	$ -	
3.00.10	POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN	m2	4.545,28	$ 3.068,00	$ 13.944.919,00	4.545,28		4.545,28	$ 13.944.919,04	$ -	$ 13.944.919,04	100%
3.00.11	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	269.666,39	$ 7.611,00	$ 2.052.430.894,00	269.666,39		269.666,39	$ 2.052.430.894,29	$ -	$ 2.052.430.894,29	100%
3.00.12	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	97.182,80	$ 7.781,00	$ 756.179.367,00	97.182,80		97.182,80	$ 756.179.366,80	$ -	$ 756.179.366,80	100%
3.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CUBIERTA, Incl. Peldaños en tubo de acero galvanizado de D=3/4" Cal.16 + Pintura Anticorrosiva	m	15,73	$ 88.753,00	$ 1.396.085,00					$ -	$ -	
					$ 6.559.434.158,00						**$ 6.490.237.086,08**	99%
4.00.00	**MAMPOSTERÍA**											
4.00.01	M-1 . MURO LIVIANO - 15. cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+ DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	136,24	$ 239.155,00	$ 32.582.477,00					$ -	$ -	
4.00.02	M-2. MURO LIVIANO 16.1 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + ENCHAPE SUPERBOARD 8mm. RESIT AL FUEGO 120 min, incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	51,40	$ 302.978,00	$ 15.573.069,00					$ -	$ -	
4.00.03	M-3 MURO LIVIANO 14 cms DOBLE PLACA DE YESO ST 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + 2 PLACAS DE YESO ST 1/2" RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 min, incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	2.026,31	$ 165.755,00	$ 335.871.014,00					$ -	$ -	
4.00.04	M-4: MURO LIVIANO 14,72 cms 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + 2 PLACAS DE YESO RH 1/2"+ RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA RESISTENCIA AL FUEGO 60 minutos. incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	193,44	$ 227.384,00	$ 43.985.161,00					$ -	$ -	
4.00.05	M-7: MURO LIVIANO 1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA.incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	69,20	$ 76.409,00	$ 5.287.503,00					$ -	$ -	
4.00.06	M-6:INDICA MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ". RESIST. AL FUEGO 60 MIN. incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	676,81	$ 208.683,00	$ 141.238.741,00					$ -	$ -	

4.00.07	M-8: MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD JUNTAS INV. 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ". RESIST. AL FUEGO 60 MIN..incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	138,85	$ 217.781,00	$ 30.238.892,00					$ -	$ -	
4.00.08	M-9: MURO LIVIANO 12.1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO ST 5/8". Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.335,61	$ 132.392,00	$ 176.824.079,00					$ -	$ -	
4.00.09	M-10: MURO LIVIANO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAPE DE 8mm.incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	256,86	$ 173.719,00	$ 44.621.462,00					$ -	$ -	
4.00.10	M-11: MURO LIVIANO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RH 5/8",incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	81,84	$ 171.637,00	$ 14.046.772,00					$ -	$ -	
4.00.11	M-12: MURO LIVIANO 11.5 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 5/8".incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.006,92	$ 158.029,00	$ 159.122.561,00					$ -	$ -	
4.00.12	M-13: MURO LIVIANO- 12.2 cms PLACA RH 5/8"+ PLACA DE YESO 5/8 + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA ", incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	171,15	$ 148.777,00	$ 25.463.630,00					$ -	$ -	
4.00.13	M-14: MURO LIVIANO 0.98 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR, RESISTENCIA A HUMEDAD DIRECTA.incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	93,19	$ 113.453,00	$ 10.572.685,00					$ -	$ -	
4.00.14	M-15: MURO LIVIANO PLACA DE SILICATO CÁLCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLÍTICA . incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	58,77	$ 189.607,00	$ 11.143.203,00					$ -	$ -	
4.00.15	M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	2.042,78	$ 53.317,00	$ 108.914.901,00	2.042,78		2.042,78	$ 108.914.901,26	$ -	$ 108.914.901,26	**100%**
4.00.16	M-17: MURO BLOQUE No. 12, e=0.12 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1.075,20	$ 89.047,00	$ 95.743.334,00	1.075,20		1.075,20	$ 95.743.334,40	$ -	$ 95.743.334,40	**100%**
4.00.17	M-18 MURO BLOQUE No. 20, e=0.20 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	612,25	$ 100.267,00	$ 61.388.471,00	555,07		555,07	$ 55.655.203,69	$ -	$ 55.655.203,69	**91%**
4.00.18	M-19:MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0.12 mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	500,30	$ 163.676,00	$ 81.887.103,00	253,00	135,00	388,00	$ 41.410.028,00	$ 22.096.260,00	$ 63.506.288,00	**78%**

4.00.19	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE RAYOS X DE 1.8 g/cm3 Según planos arquitectonicos e=0.12, incl. Grafil hztal. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	81,74	$ 130.267,00	$ 10.647.412,00					$ -	$ -	
4.00.20	M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.115 mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1.528,29	$ 154.851,00	$ 236.657.235,00	1.376,22		1.376,22	$ 213.109.043,22	$ -	$ 213.109.043,22	**90%**
4.00.21	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, incl. Refuerzo según diseño	m	3.015,68	$ 43.363,00	$ 130.768.932,00	2.509,66		2.509,66	$ 108.826.386,58	$ -	$ 108.826.386,58	**83%**
4.00.22	VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, incl. Refuerzo según diseño	m	435,01	$ 40.476,00	$ 17.607.465,00					$ -	$ -	
4.00.23	ALFAJIA EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No.20, incl. Refuerzo según diseño	m	287,45	$ 119.820,00	$ 34.442.259,00					$ -	$ -	
4.00.24	DINTELES EN BLOQUE N°5 PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (incluye refuerzo).	m	100,80	$ 69.959,00	$ 7.051.867,00					$ -	$ -	
4.00.25	DINTEL (0.15x0.20 mt) EN CONCRETO 3.000 PSI, incl. Rfzo según diseño	m	51,36	$ 89.122,00	$ 4.577.306,00					$ -	$ -	
4.00.26	DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 mt (Incl. Refuerzo)	m	11,10	$ 190.450,00	$ 2.113.995,00					$ -	$ -	
4.00.27	DINTELES EN DRY WALL H.prom=0.50 mt	m	285,40	$ 53.454,00	$ 15.255.772,00					$ -	$ -	
4.00.28	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	2.050,00	$ 29.132,00	$ 59.720.600,00	1.878,00		1.878,00	$ 54.709.896,00	$ -	$ 54.709.896,00	**92%**
4.00.29	BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS, CONCRETO 3000 PSI (0.40x0.28 mts), Incl.. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	98,16	$ 163.331,00	$ 16.032.571,00					$ -	$ -	
4.00.30	BORDILLO PARA DIQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, en concreto 3.000 PSI (0.70X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	13,22	$ 88.494,00	$ 1.169.891,00					$ -	$ -	
4.00.31	BORDILLO PARA DIQUE PLANTA ELÉCTRICA, en concreto 3.000 PSI (0.20X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	23,28	$ 45.898,00	$ 1.068.505,00					$ -	$ -	
4.00.32	CONTRAMARCO PISO - TECHO EN VANO PUERTAS SISTEMA MUROS LIVIANOS TUBERÍA ESTRUCTURAL 7X7 cm cal.1.5 mm	m	3.156,40	$ 33.166,00	$ 104.685.162,00					$ -	$ -	
4.00.33	ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi	m	753,63	$ 31.981,00	$ 24.101.841,00	587,08		587,08	$ 18.775.405,48	$ -	$ 18.775.405,48	**78%**
4.00.34	MEDIACAÑA PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ASEPSIA	m	36,00	$ 54.305,00	$ 1.954.980,00					$ -	$ -	
4.00.35	SELLO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERÍAS Y BANDEJAS REDES A DUCTOS	un	5,00	$ 196.745,00	$ 983.725,00					$ -	$ -	
4.00.36	SELLO CORTA FUEGO PASO PLACA ENTREPISO	un	10,00	$ 131.983,00	$ 1.319.830,00					$ -	$ -	
					$ 2.064.664.406,00						**$ 719.240.458,63**	**35%**
5.00.00	**ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE**											
5.00.01	REVESTIMIENTO DE FACHADA COMPUESTO POR UNA PLACA SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA 10 mm. incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.437,51	$ 167.893,00	$ 241.347.866,00					$ -	$ -	
					$ 241.347.866,00					**$ -**	**$ -**	
6.00.00	**PAÑETES**											
6.00.01	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:4, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	5.112,37	$ 28.524,00	$ 145.825.242,00	3.021,00	520,00	3.541,00	$ 101.003.484,00	$ 14.832.480,00	$ 115.835.964,00	**79%**
6.00.02	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	250,28	$ 31.606,00	$ 7.910.350,00					$ -	$ -	
6.00.03	PAÑETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.422,69	$ 33.670,00	$ 47.901.972,00					$ -	$ -	
6.00.04	PAÑETE TANQUES DE AGUA, ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones	m2	486,10	$ 38.569,00	$ 18.748.391,00	401,00		401,00	$ 15.466.169,00	$ -	$ 15.466.169,00	**82%**
					$ 220.385.955,00						**$ 131.302.133,00**	**60%**
7.00.00	**CUBIERTAS**											

7.00.01	PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e.prom= 7 cm) Incl. Malla Gallinero	m2	5.240,36	$ 61.064,00	$ 319.997.343,00	5.039,34		5.039,34	$ 307.722.257,76	$ -	$ 307.722.257,76	**96%**
7.00.02	MEDIACAÑA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m	2.197,12	$ 23.797,00	$ 52.284.865,00					$ -	$ -	
7.00.03	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	560,50	$ 65.572,00	$ 36.753.106,00	468,00		468,00	$ 30.687.696,00	$ -	$ 30.687.696,00	**83%**
7.00.04	BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	363,79	$ 65.572,00	$ 23.854.438,00	163,00	120,00	283,00	$ 10.688.236,00	$ 7.868.640,00	$ 18.556.876,00	**78%**
7.00.05	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 100 CM	m	334,65	$ 50.025,00	$ 16.740.866,00					$ -	$ -	
7.00.06	REALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO, incl. mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales	m	363,79	$ 128.575,00	$ 46.774.299,00					$ -	$ -	
7.00.07	LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS mt, según diseño elementos no estructurales y recomendaciones acústicas. Incl. Refuerzo, impactodan 10, impermeabilización flanche y todos los insumos necesarios para el desarrollo de las mismas	un	1,00	$ 36.940.845,00	$ 36.940.845,00					$ -	$ -	
7.00.08	DADOS EN CONCRETO PARA LÍNEA DE VIDA Según detalle arquitectónico (Se proyecta infraestructura para la instalación de la misma, será la oficina de mantenimiento quien suministrará la misma cuando el hospital se encuentre en funcionamiento)	m3	0,23	$ 1.552.444,00	$ 357.062,00					$ -	$ -	
					$ 533.702.824,00						**$ 356.966.829,76**	**67%**
8.00.00	**IMPERMEABILIZACIONES**											
8.00.01	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTEMPERIE, MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER e= 1.2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR, BOTAS Y ACCESORIOS, NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA ARRIOSTRA)	m2	5.287,68	$ 125.229,00	$ 662.170.879,00	1.903,00	752,00	2.655,00	$ 238.310.787,00	$ 94.172.208,00	$ 332.482.995,00	**50%**
8.00.02	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1.2 mm. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES	m2	486,10	$ 157.331,00	$ 76.478.599,00	250,00	115,00	250,00	$ 39.332.750,00	$ 18.093.065,00	$ 57.425.815,00	**51%**
8.00.03	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA POSTERIOR MURO DE CONTENCIÓN, CON SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTES AL VAPOR. según ficha técnica del proveedor	m2	379,24	$ 67.268,00	$ 25.510.716,00					$ -	$ -	
8.00.04	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CAÑUELA A.LL. RAMPAS con aditivo liquido mejorado con polímeros sintéticos que actúa como impermeabilizante integral tapando poros y capilares en morteros.	m	196,76	$ 17.662,00	$ 3.475.175,00					$ -	$ -	
8.00.05	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN MURO GRAN FORMATO	m2	1.628,12	$ 24.730,00	$ 40.263.408,00					$ -	$ -	
					$ 807.898.777,00						**$ 389.908.810,00**	**48%**
9.00.00	**CIELO RASOS**											
9.00.01	CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA ST. (½ "), CON DILATACIONES DE 1 CM ,CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3.567,28	$ 62.136,00	$ 221.656.510,00					$ -	$ -	
9.00.02	CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA RH. (½ ") , CON DILATACIONES DE 1 CM ,CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	354,88	$ 83.986,00	$ 29.804.952,00					$ -	$ -	
9.00.03	PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADA, ZONA POSTERIOR CARTÓN ROSA Y LA CARA VISTA CARTÓN MARFIL, PERFORACIÓN EN BLOQUE DISEÑO B4 12/25R EN LAMINAS DE 1.2X2.40 E=12.5MM INCL. VELO DE FIBRA ACÚSTICA ESTÁNDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE ACUSTEC, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	468,89	$ 133.299,00	$ 62.502.568,00					$ -	$ -	
9.00.04	CIELO RASO EN LÁMINA DE SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA (e=10mm) CON DILATACIONES DE 1 CM ,CONTRA MURO Y CIELO RASO , incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3,81	$ 80.666,00	$ 307.337,00					$ -	$ -	
9.00.05	MEDIACAÑA PLÁSTICA EN CIELO RASO EN ZONAS DE ASEPSIA 6cm	m	411,43	$ 54.305,00	$ 22.342.706,00					$ -	$ -	
9.00.06	CUELGAS EN DRY WALL (placa 12,5 mm), 0.20 x 0.40 mt, incl. 1 mano de pintura vinilo tipo 2, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m	111,87	$ 53.454,00	$ 5.979.899,00					$ -	$ -	
9.00.07	RECEDIDOS EN DRY WALL 8mm, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse.	m	120,96	$ 53.454,00	$ 6.465.796,00					$ -	$ -	
9.00.08	ESCOTILLAS RETRACTILES PARA INSPECCIÓN 60x60 DE 12.5 mm, incluye apertura de vanos	un	13,00	$ 190.762,00	$ 2.479.906,00					$ -	$ -	

9.00.09	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A CUBIERTA PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 60x60 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1,00	$ 1.369.386,00	$ 1.369.386,00					$ -	$ -	
9.00.10	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA COMPUERTAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 80x80 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	3,00	$ 1.634.095,00	$ 4.902.285,00					$ -	$ -	
9.00.11	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN EN CUARTO DE BOMBAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 100x100 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1,00	$ 2.638.607,00	$ 2.638.607,00					$ -	$ -	
					$ 360.449.952,00					**$ -**	**$ -**	
10.00.00	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS**											
10.00.01	AFINADO DE PISO e=0.04 mt, mortero 1:4 arena de pozo, incl. Lineales	m2	505,89	$ 31.892,00	$ 16.133.844,00					$ -	$ -	
10.00.02	AFINADO IMPERMEABILIZADO e=0.04 mt, mortero 1:4 arena de pozo más imp. integral, incl. Lineales	m2	152,30	$ 34.762,00	$ 5.294.253,00					$ -	$ -	
10.00.03	CONCRETO 3000PARA PASO ESCALERA METÁLICA, ESCOBIADO Y REBORDEADO CON LLANA METÁLICA e= 5cms	m	34,04	$ 39.238,00	$ 1.335.662,00					$ -	$ -	
10.00.04	BALDOSA GRANO DE MÁRMOL RED OCL 1 DE 30x30 cms, INC. mortero o concreto de pega según ficha técnica del proveedor, incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos	m2	4.547,13	$ 99.472,00	$ 452.312.115,00					$ -	$ -	
10.00.05	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.60 mts, INC. mortero o concreto de pega según ficha técnica del proveedor, incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos	m2	105,76	$ 136.572,00	$ 14.443.855,00					$ -	$ -	
10.00.06	PISO VINÍLICO EN ROLLO CONDUCTIVO DE 2.00 mts x 23 mts Incl. Pegante conductivo, Cinta cobre, Cordón de soldadura. .	m2	56,42	$ 315.072,00	$ 17.776.362,00					$ -	$ -	
10.00.07	PISO VINÍLICO EN ROLLO LÍNEA PREMIUM DE 2.00 mts x 23 mts HOMOGÉNEO e=2 mm INC. Pegante y cordón de soldadura.	m2	449,47	$ 238.426,00	$ 107.165.334,00					$ -	$ -	
10.00.08	MEDIACAÑA MORTERO 1:4, TERMINADA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO, incl. dilatación	m	1.862,17	$ 44.897,00	$ 83.605.846,00					$ -	$ -	
10.00.09	PERFIL RINCONERO PARA PISOS VINÍLICOS	m	376,18	$ 67.655,00	$ 25.450.458,00					$ -	$ -	
10.00.10	GUARDA ESCOBAS VINILO h=0,12 mt	m	2.434,81	$ 35.465,00	$ 86.350.537,00					$ -	$ -	
10.00.11	DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ESMALTADA PISO GRANO DE MÁRMOL	m2	4.547,13	$ 32.919,00	$ 149.686.972,00					$ -	$ -	
10.00.12	POYOS BAJO MUEBLES - (a<= 0.50 mt, h=0.10 mt)	m	109,48	$ 96.810,00	$ 10.598.759,00					$ -	$ -	
10.00.13	CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS	m2	164,75	$ 44.360,00	$ 7.308.310,00					$ -	$ -	
10.00.14	BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOQUILLADO, FUNDIDO PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF.: PCL 1 DE 30x30 cms CON DILATACIONES EN ALUMINIO	m	30,00	$ 74.281,00	$ 2.228.430,00					$ -	$ -	
					$ 979.690.737,00					**$ -**	**$ -**	
11.00.00	**ENCHAPES MUROS**											
11.00.01	CERÁMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 0.60 X 0.30 mt, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m2	2.364,89	$ 109.091,00	$ 257.988.215,00					$ -	$ -	
11.00.02	MESÓN PARA BAÑOS PÚBLICOS SEGÚN DETALLES ARQ. EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHO= 0.60 mt MÁS RE ENGRUESE DE 16 cm Y SALPICADERO DE 10 cm), INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGULO, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m	8,07	$ 956.016,00	$ 7.715.049,00					$ -	$ -	
					$ 265.703.264,00					**$ -**	**$ -**	
12.00.00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
12.01.00	**ACOMETIDAS**											
12.01.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	300,00	$ 10.429,00	$ 3.128.700,00	119,50		119,50	$ 1.246.265,50	$ -	$ 1.246.265,50	**40%**
12.01.02	ACCESORIOS PVCP Ø1"	un	236,00	$ 6.019,00	$ 1.420.484,00	90,00		90,00	$ 541.710,00	$ -	$ 541.710,00	**38%**
12.01.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	30,00	$ 8.220,00	$ 246.600,00					$ -	$ -	
12.01.04	REGISTRO RW Ø1"	un	2,00	$ 166.874,00	$ 333.748,00					$ -	$ -	
12.01.05	UNIVERSAL PVCP Ø1"	un	2,00	$ 16.789,00	$ 33.578,00					$ -	$ -	
12.01.06	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"	un	2,00	$ 667.998,00	$ 1.335.996,00					$ -	$ -	
12.01.07	FLOTADOR MECÁNICO Ø1"	un	2,00	$ 242.156,00	$ 484.312,00					$ -	$ -	
12.01.08	MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"	un	1,00	$ 316.681,00	$ 316.681,00					$ -	$ -	
12.01.09	CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 252.784,00	$ 252.784,00					$ -	$ -	
12.01.10	CAJILLA MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 203.463,00	$ 203.463,00					$ -	$ -	
12.01.11	PLAQUETA IDENTIFICACIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 8.129,00	$ 8.129,00					$ -	$ -	

12.02.00	**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**											
12.02.01	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø6"	m	7,80	$ 510.337,00	$ 3.980.629,00					$ -	$ -	
12.02.02	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø6"	un	13,00	$ 227.736,00	$ 2.960.568,00					$ -	$ -	
12.02.03	ABRAZADERAS Ø6"	un	3,90	$ 10.922,00	$ 42.596,00					$ -	$ -	
12.02.04	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	m	7,80	$ 298.311,00	$ 2.326.826,00					$ -	$ -	
12.02.05	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	un	13,00	$ 253.326,00	$ 3.293.238,00					$ -	$ -	
12.02.06	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	3,90	$ 10.047,00	$ 39.183,00					$ -	$ -	
12.02.07	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2"	m	15,60	$ 151.477,00	$ 2.363.041,00					$ -	$ -	
12.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2"	un	26,00	$ 104.308,00	$ 2.712.008,00					$ -	$ -	
12.02.09	ABRAZADERAS Ø2"	un	7,80	$ 8.666,00	$ 67.595,00					$ -	$ -	
12.02.10	REGISTRO P/D Ø2-1/2"	un	1,00	$ 436.075,00	$ 436.075,00					$ -	$ -	
12.02.11	VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1"	un	1,00	$ 496.375,00	$ 496.375,00					$ -	$ -	
12.02.12	UNIVERSAL Ø2"	un	1,00	$ 49.977,00	$ 49.977,00					$ -	$ -	
12.02.13	NIPLE PASAMUROS Ø6"	un	1,00	$ 1.488.064,00	$ 1.488.064,00					$ -	$ -	
12.02.14	REGISTRO P/D Ø6"	un	1,00	$ 2.468.088,00	$ 2.468.088,00					$ -	$ -	
12.02.15	CHEQUE PERFORADO Ø6"	un	1,00	$ 2.755.309,00	$ 2.755.309,00					$ -	$ -	
12.02.16	NIPLE PASAMUROS Ø2"	un	2,00	$ 887.419,00	$ 1.774.838,00					$ -	$ -	
12.02.17	BRIDA EN ACERO (PAREJA) Ø2-1/2"	un	2,00	$ 251.945,00	$ 503.890,00					$ -	$ -	
12.02.18	UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA Ø2-1/2"	un	1,00	$ 245.186,00	$ 245.186,00					$ -	$ -	
12.02.19	MANÓMETRO	un	2,00	$ 55.024,00	$ 110.048,00					$ -	$ -	
12.03.00	**RED DE AGUA FRÍA**											
12.03.01	TUBERÍA PVC SCH 80 6"	m	6,00	$ 265.972,00	$ 1.595.832,00					$ -	$ -	
12.03.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	2,00	$ 319.777,00	$ 639.554,00					$ -	$ -	
12.03.03	ABRAZADERAS 6"	un	5,00	$ 10.922,00	$ 54.610,00					$ -	$ -	
12.03.04	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø4"	m	56,98	$ 107.887,00	$ 6.147.401,00	43,70		43,70	$ 4.714.661,90	$ -	$ 4.714.661,90	**77%**
12.03.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	19,00	$ 125.628,00	$ 2.386.932,00	7,00		7,00	$ 879.396,00	$ -	$ 879.396,00	**37%**
12.03.06	ABRAZADERAS 4"	un	29,00	$ 10.922,00	$ 316.738,00					$ -	$ -	
12.03.07	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	9,12	$ 70.650,00	$ 644.328,00	6,00		6,00	$ 423.900,00	$ -	$ 423.900,00	**66%**
12.03.08	ACCESORIOS PVC 3"	un	15,00	$ 68.461,00	$ 1.026.915,00	2,00		2,00	$ 136.922,00	$ -	$ 136.922,00	**13%**
12.03.09	ABRAZADERAS 3"	un	4,00	$ 10.047,00	$ 40.188,00					$ -	$ -	
12.03.10	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2-1/2"	m	26,21	$ 45.841,00	$ 1.201.493,00	8,40		8,40	$ 385.064,40	$ -	$ 385.064,40	**32%**
12.03.11	ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un	8,00	$ 53.161,00	$ 425.288,00	3,00		3,00	$ 159.483,00	$ -	$ 159.483,00	**38%**
12.03.12	ABRAZADERAS 2-1/2"	un	10,00	$ 10.047,00	$ 100.470,00					$ -	$ -	
12.03.13	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2"	m	56,52	$ 34.928,00	$ 1.974.131,00	23,20		23,20	$ 810.329,60	$ -	$ 810.329,60	**41%**
12.03.14	ACCESORIOS PVC 2"	un	64,00	$ 30.298,00	$ 1.939.072,00	17,00		17,00	$ 515.066,00	$ -	$ 515.066,00	**27%**
12.03.15	ABRAZADERAS 2"	un	30,00	$ 8.666,00	$ 259.980,00					$ -	$ -	
12.03.16	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/2"	m	82,22	$ 25.142,00	$ 2.067.175,00					$ -	$ -	
12.03.17	ACCESORIOS PVC 1-1/2"	un	77,00	$ 13.017,00	$ 1.002.309,00					$ -	$ -	
12.03.18	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	40,00	$ 8.666,00	$ 346.640,00					$ -	$ -	
12.03.19	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/4"	m	136,32	$ 18.749,00	$ 2.555.864,00	68,00		68,00	$ 1.274.932,00	$ -	$ 1.274.932,00	**50%**
12.03.20	ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un	92,00	$ 22.658,00	$ 2.084.536,00	34,00		34,00	$ 770.372,00	$ -	$ 770.372,00	**37%**
12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	un	80,00	$ 8.666,00	$ 693.280,00					$ -	$ -	
12.03.22	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	1.248,44	$ 10.429,00	$ 13.019.981,00	577,50		577,50	$ 6.022.747,50	$ -	$ 6.022.747,50	**46%**
12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	un	1.230,00	$ 5.666,00	$ 6.969.180,00	295,00		295,00	$ 1.671.470,00	$ -	$ 1.671.470,00	**24%**
12.03.24	ABRAZADERAS 1"	un	625,00	$ 8.666,00	$ 5.416.250,00					$ -	$ -	
12.03.25	TUBERÍA PVCP RDE 11 Ø3/4"	m	51,76	$ 8.897,00	$ 460.509,00					$ -	$ -	
12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	un	36,00	$ 3.723,00	$ 134.028,00					$ -	$ -	
12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	un	25,00	$ 8.666,00	$ 216.650,00					$ -	$ -	
12.03.28	TUBERÍA PVCP RDE 9 Ø1/2"	m	1.769,00	$ 7.763,00	$ 13.732.747,00	613,40		613,40	$ 4.761.824,20	$ -	$ 4.761.824,20	**35%**
12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	un	2.238,00	$ 2.687,00	$ 6.013.506,00	853,00		853,00	$ 2.292.011,00	$ -	$ 2.292.011,00	**38%**
12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	un	885,00	$ 8.666,00	$ 7.669.410,00					$ -	$ -	
12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	un	2,00	$ 264.086,00	$ 528.172,00					$ -	$ -	
12.03.32	REGISTRO 1"	un	89,00	$ 166.874,00	$ 14.851.786,00					$ -	$ -	
12.03.33	REGISTRO 3/4"	un	4,00	$ 124.894,00	$ 499.576,00					$ -	$ -	
12.03.34	REGISTRO 1/2"	un	104,00	$ 105.261,00	$ 10.947.144,00					$ -	$ -	
12.04.00	**PUNTOS HIDRÁULICOS**											
12.04.01	SANITARIO	un	92,00	$ 49.785,00	$ 4.580.220,00					$ -	$ -	
12.04.02	LAVAMANOS	un	139,00	$ 42.532,00	$ 5.911.948,00					$ -	$ -	
12.04.03	LAVAPLATOS	un	53,00	$ 45.238,00	$ 2.397.614,00					$ -	$ -	
12.04.04	DUCHA	un	23,00	$ 47.945,00	$ 1.102.735,00					$ -	$ -	

12.04.05	CALENTADOR	un	3,00	$ 42.532,00	$ 127.596,00					$ -	$ -	
12.04.06	LLAVE MANGUERA	un	24,00	$ 42.776,00	$ 1.026.624,00					$ -	$ -	
12.04.07	ORINAL	un	1,00	$ 44.372,00	$ 44.372,00					$ -	$ -	
12.05.00	**RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA**											
12.05.01	TUBERÍA CPVC 1"	m	46,76	$ 26.575,00	$ 1.242.647,00					$ -	$ -	
12.05.02	ACCESORIOS CPVC 1"	un	21,00	$ 19.714,00	$ 413.994,00					$ -	$ -	
12.05.03	ABRAZADERAS 1"	un	20,00	$ 8.666,00	$ 173.320,00					$ -	$ -	
12.05.04	TUBERÍA CPVC 3/4"	m	74,54	$ 20.308,00	$ 1.513.758,00					$ -	$ -	
12.05.05	ACCESORIOS CPVC 3/4"	un	46,00	$ 5.895,00	$ 271.170,00					$ -	$ -	
12.05.06	ABRAZADERAS 3/4"	un	35,00	$ 8.666,00	$ 303.310,00					$ -	$ -	
12.05.07	TUBERÍA CPVC 1/2"	m	298,45	$ 12.203,00	$ 3.641.985,00	153,00		153,00	$ 1.867.059,00	$ -	$ 1.867.059,00	**51%**
12.05.08	ACCESORIOS CPVC 1/2"	un	369,00	$ 4.190,00	$ 1.546.110,00	83,00		83,00	$ 347.770,00	$ -	$ 347.770,00	**22%**
12.05.09	ABRAZADERAS 1/2"	un	150,00	$ 8.666,00	$ 1.299.900,00					$ -	$ -	
12.05.10	REGISTRO 3/4"	un	3,00	$ 124.894,00	$ 374.682,00					$ -	$ -	
12.05.11	REGISTRO 1/2"	un	19,00	$ 109.456,00	$ 2.079.664,00					$ -	$ -	
12.06.00	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE**											
12.06.01	LAVAMANOS CPVC 1/2"	un	15,00	$ 52.879,00	$ 793.185,00					$ -	$ -	
12.06.02	LAVAPLATOS CPVC 1/2"	un	8,00	$ 57.806,00	$ 462.448,00					$ -	$ -	
12.06.03	DUCHA CPVC 1/2"	un	15,00	$ 62.733,00	$ 940.995,00					$ -	$ -	
12.06.04	CALENTADOR CPVC 1/2"	un	3,00	$ 43.026,00	$ 129.078,00					$ -	$ -	
12.07.00	**SALIDA SANITARIA**											
12.07.01	SANITARIO PVCS 4"	un	92,00	$ 124.472,00	$ 11.451.424,00					$ -	$ -	
12.07.02	LAVAMANOS PVCS 2"	un	139,00	$ 75.253,00	$ 10.460.167,00					$ -	$ -	
12.07.03	LAVAPLATOS PVCS 2"	un	53,00	$ 75.253,00	$ 3.988.409,00					$ -	$ -	
12.07.04	DUCHA PVCS 2"	un	23,00	$ 82.463,00	$ 1.896.649,00					$ -	$ -	
12.07.05	SIFÓN PISO PVCS 2"	un	118,00	$ 77.219,00	$ 9.111.842,00					$ -	$ -	
12.07.06	ORINAL PVCS 2"	un	1,00	$ 75.253,00	$ 75.253,00					$ -	$ -	
12.08.00	**RED DE AGUAS NEGRAS**											
12.08.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	157,66	$ 93.519,00	$ 14.744.206,00	135,00		135,00	$ 12.625.065,00	$ -	$ 12.625.065,00	**86%**
12.08.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203,00	$ 153.466,00	$ 31.153.598,00	64,00		64,00	$ 9.821.824,00	$ -	$ 9.821.824,00	**32%**
12.08.03	ABRAZADERA 6"	un	79,00	$ 10.922,00	$ 862.838,00	20,00		20,00	$ 218.440,00	$ -	$ 218.440,00	**25%**
12.08.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	815,54	$ 63.790,00	$ 52.023.297,00	553,00		553,00	$ 35.275.870,00	$ -	$ 35.275.870,00	**68%**
12.08.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 43.200,00	$ 15.984.000,00	68,00		68,00	$ 2.937.600,00	$ -	$ 2.937.600,00	**18%**
12.08.06	ABRAZADERA 4"	un	408,00	$ 19.592,00	$ 7.993.536,00	55,00		55,00	$ 1.077.560,00	$ -	$ 1.077.560,00	**13%**
12.08.07	TUBERÍA PVCS 3"	m	7,18	$ 33.127,00	$ 237.852,00					$ -	$ -	
12.08.08	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45,00	$ 23.389,00	$ 1.052.505,00					$ -	$ -	
12.08.09	ABRAZADERA 3"	un	4,00	$ 27.388,00	$ 109.552,00					$ -	$ -	
12.08.10	TUBERÍA PVCS 2"	m	530,17	$ 23.118,00	$ 12.256.470,00	406,00		406,00	$ 9.385.908,00	$ -	$ 9.385.908,00	**77%**
12.08.11	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	$ 9.751,00	$ 6.357.652,00	283,00		283,00	$ 2.759.533,00	$ -	$ 2.759.533,00	**43%**
12.08.12	ABRAZADERA 2"	un	250,00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00	62,00		62,00	$ 622.914,00	$ -	$ 622.914,00	**25%**
12.08.13	TUBERÍA PVCS LIVIANA 2"	m	485,56	$ 17.138,00	$ 8.321.527,00	432,60		432,60	$ 7.413.898,80	$ -	$ 7.413.898,80	**89%**
12.09.00	**RED DE AGUAS GRASAS**											
12.09.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	7,63	46.449,00	$ 354.406,00					$ -	$ -	
12.09.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	25.859,00	$ 9.567.830,00					$ -	$ -	
12.09.03	ABRAZADERA 4"	un	10,00	10.922,00	$ 109.220,00					$ -	$ -	
12.09.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	18,19	33.127,00	$ 602.580,00					$ -	$ -	
12.09.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45,00	14.718,00	$ 662.310,00					$ -	$ -	
12.09.06	ABRAZADERA 3"	un	10,00	10.047,00	$ 100.470,00					$ -	$ -	
12.09.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	22,23	23.118,00	$ 513.913,00					$ -	$ -	
12.09.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	9.751,00	$ 6.357.652,00					$ -	$ -	
12.09.09	ABRAZADERA 2"	un	11,00	10.047,00	$ 110.517,00					$ -	$ -	
12.10.00	**RED DE AGUAS PATÓGENAS**											
12.10.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	149,70	$ 46.449,00	$ 6.953.415,00	90,00		90,00	$ 4.180.410,00	$ -	$ 4.180.410,00	**60%**
12.10.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	103,00		103,00	$ 2.663.477,00	$ -	$ 2.663.477,00	**28%**
12.10.03	ABRAZADERA 4"	un	70,00	$ 10.922,00	$ 764.540,00	20,00		20,00	$ 218.440,00	$ -	$ 218.440,00	**29%**
12.10.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	164,46	$ 33.127,00	$ 5.448.066,00	89,00		89,00	$ 2.948.303,00	$ -	$ 2.948.303,00	**54%**

12.10.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45,00	$ 14.718,00	$ 662.310,00	45,00		45,00	$ 662.310,00	$ -	$ 662.310,00	100%
12.10.06	ABRAZADERA 3"	un	80,00	$ 10.047,00	$ 803.760,00	20,00		20,00	$ 200.940,00	$ -	$ 200.940,00	25%
12.10.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	527,34	$ 23.118,00	$ 12.191.046,00	443,00		443,00	$ 10.241.274,00	$ -	$ 10.241.274,00	84%
12.10.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	$ 9.751,00	$ 6.357.652,00	150,00		150,00	$ 1.462.650,00	$ -	$ 1.462.650,00	23%
12.10.09	ABRAZADERA 2"	un	250,00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00	30,00		30,00	$ 301.410,00	$ -	$ 301.410,00	12%
12.11.00	**RED DE AGUAS LLUVIAS**											
12.11.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	577,40	$ 93.519,00	$ 53.997.871,00	460,00		460,00	$ 43.018.740,00	$ -	$ 43.018.740,00	80%
12.11.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203,00	$ 117.069,00	$ 23.765.007,00	75,00		75,00	$ 8.780.175,00	$ -	$ 8.780.175,00	37%
12.11.03	ABRAZADERA 6"	un	250,00	$ 10.922,00	$ 2.730.500,00	30,00		30,00	$ 327.660,00	$ -	$ 327.660,00	12%
12.11.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	689,23	$ 46.449,00	$ 32.014.044,00	540,00		540,00	$ 25.082.460,00	$ -	$ 25.082.460,00	78%
12.11.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	120,00		120,00	$ 3.103.080,00	$ -	$ 3.103.080,00	32%
12.11.06	ABRAZADERA 4"	un	400,00	$ 10.922,00	$ 4.368.800,00	30,00		30,00	$ 327.660,00	$ -	$ 327.660,00	8%
12.11.09	SIFÓN PISO 4"	un	130,00	$ 138.527,00	$ 18.008.510,00					$ -	$ -	
12.12.00	**BOMBEO POZO EYECTORES**											
12.12.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	138,23	$ 70.650,00	$ 9.765.950,00					$ -	$ -	
12.12.02	ACCESORIOS PVC 3"	un	35,00	$ 68.461,00	$ 2.396.135,00					$ -	$ -	
12.12.03	ABRAZADERAS 3"	un	70,00	$ 10.047,00	$ 703.290,00					$ -	$ -	
12.12.04	REGISTRO 3"	un	8,00	$ 928.948,00	$ 7.431.584,00					$ -	$ -	
12.12.05	CHEQUE HIDRO 3"	un	8,00	$ 1.348.978,00	$ 10.791.824,00					$ -	$ -	
12.13.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS**											
12.13.01	MONTAJE SANITARIOS TANQUE	un	92,00	$ 27.145,00	$ 2.497.340,00					$ -	$ -	
12.13.02	CONEXIÓN LAVAMANOS	un	139,00	$ 27.145,00	$ 3.773.155,00					$ -	$ -	
12.13.03	CONEXIÓN LAVAPLATOS	un	53,00	$ 27.145,00	$ 1.438.685,00					$ -	$ -	
12.13.04	MONTAJE ORINAL	un	1,00	$ 27.145,00	$ 27.145,00					$ -	$ -	
12.13.05	MONTAJE LLAVE MANGUERA	un	24,00	$ 27.145,00	$ 651.480,00					$ -	$ -	
12.13.06	MONTAJE DUCHA	un	23,00	$ 27.145,00	$ 624.335,00					$ -	$ -	
12.13.07	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA	un	1,00	$ 2.650.220,00	$ 2.650.220,00					$ -	$ -	
12.13.08	MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR	un	1,00	$ 271.284,00	$ 271.284,00					$ -	$ -	
12.13.09	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS	un	8,00	$ 1.388.520,00	$ 11.108.160,00					$ -	$ -	
12.13.10	MONTAJE BOMBAS CALENTADORES DE PASO	un	3,00	$ 271.284,00	$ 813.852,00					$ -	$ -	
12.14.00	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA**											
12.14.01	CAJA INSPECCIÓN 0.70 x 0.70 (Con marco y contra marco)	un	25,00	$ 1.014.754,00	$ 25.368.850,00	18,00		18,00	$ 18.265.572,00	$ -	$ 18.265.572,00	72%
12.15.00	**PRUEBAS**											
12.15.01	PRUEBAS DE PRESIÓN	un	1,00	$ 145.114,00	$ 145.114,00					$ -	$ -	
12.15.02	PRUEBAS DE BAJANTES	un	1,00	$ 139.437,00	$ 139.437,00					$ -	$ -	
12.15.03	PRUEBAS DE COLECTORES	un	1,00	$ 145.114,00	$ 145.114,00					$ -	$ -	
12.16.00	**REDES EXTERIORES**											
12.16.01	TUBERÍA PVC 160 mm	m	92,58	$ 67.332,00	$ 6.233.597,00	30,00		30,00	$ 2.019.960,00	$ -	$ 2.019.960,00	32%
12.16.02	TUBERÍA PVC 200 mm	m	370,39	$ 92.623,00	$ 34.306.633,00	245,00		245,00	$ 22.692.635,00	$ -	$ 22.692.635,00	66%
12.16.03	TUBERÍA PVC 250 mm	m	96,86	$ 124.848,00	$ 12.092.777,00					$ -	$ -	
12.17.00	**OTROS**											
12.17.01	DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1,00	$ 635.789,00	$ 635.789,00					$ -	$ -	
12.17.02	PLANOS RECORD	un	26,00	$ 161.456,00	$ 4.197.856,00					$ -	$ -	
12.17.03	MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1,00	$ 518.418,00	$ 518.418,00					$ -	$ -	
					$ 711.629.419,00					**$ -**		
13.00.00	**INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO**											
13.00.01	TABLERO DE DETECCIÓN	un	1,00	$ 18.677.708,00	$ 18.677.708,00					$ -	$ -	
13.00.02	DETECTOR FOTOELÉCTRICO	un	210,00	$ 366.862,00	$ 77.041.020,00					$ -	$ -	
13.00.03	DETECTOR TÉRMICO	un	11,00	$ 326.768,00	$ 3.594.448,00					$ -	$ -	
13.00.04	SIRENA DE EVACUACIÓN	un	18,00	$ 299.607,00	$ 5.392.926,00					$ -	$ -	
13.00.05	MODULO MONITOR / CONTROL	un	16,00	$ 256.454,00	$ 4.103.264,00					$ -	$ -	
13.00.06	ESTACIONES MANUALES	un	18,00	$ 714.792,00	$ 12.866.256,00					$ -	$ -	
13.00.07	DETECTOR FOTO ELÉCTRICO PARA DUCTOR AIRE ACONDICIONADO	un	9,00	$ 941.828,00	$ 8.476.452,00					$ -	$ -	
13.00.08	CABLE 2x18 DETECCIÓN INCENDIOS	m	1.573,00	$ 3.411,00	$ 5.365.503,00					$ -	$ -	

					$ 135.517.577,00					**$ -**	**$ -**	
13.01.00	**CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO**											
13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	m	6,00	$ 323.438,00	$ 1.940.628,00					$ -	$ -	
13.01.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	10,00	$ 151.768,00	$ 1.517.680,00					$ -	$ -	
13.01.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	26,00	$ 61.685,00	$ 1.603.810,00					$ -	$ -	
13.01.04	ABRAZADERAS 6"	un	5,00	$ 22.114,00	$ 110.570,00					$ -	$ -	
13.01.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	3,00	$ 156.307,00	$ 468.921,00					$ -	$ -	
13.01.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	5,00	$ 82.506,00	$ 412.530,00					$ -	$ -	
13.01.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10,00	$ 33.059,00	$ 330.590,00					$ -	$ -	
13.01.08	ABRAZADERAS 4"	un	3,00	$ 14.435,00	$ 43.305,00					$ -	$ -	
13.01.09	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 1-1/2"	m	12,00	$ 53.349,00	$ 640.188,00					$ -	$ -	
13.01.10	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	12,00	$ 19.708,00	$ 236.496,00					$ -	$ -	
13.01.11	ACOPLE ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	30,00	$ 19.701,00	$ 591.030,00					$ -	$ -	
13.01.12	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	8,00	$ 9.786,00	$ 78.288,00					$ -	$ -	
13.01.13	VÁLVULA DE ALIVIO 1"	un	1,00	$ 4.374.736,00	$ 4.374.736,00					$ -	$ -	
13.01.14	LAMINA ANTI VÓRTICE 0.30 x 0.30 4"	un	1,00	$ 1.187.602,00	$ 1.187.602,00					$ -	$ -	
13.01.15	COPA EXCÉNTRICA 4"X3"	un	1,00	$ 958.325,00	$ 958.325,00					$ -	$ -	
13.01.16	COPA EXCÉNTRICA 4" X 1-1/2"	un	1,00	$ 934.891,00	$ 934.891,00					$ -	$ -	
13.01.17	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 4"	un	1,00	$ 2.916.459,00	$ 2.916.459,00					$ -	$ -	
13.01.18	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1,00	$ 1.488.638,00	$ 1.488.638,00					$ -	$ -	
13.01.19	CHEQUE RANURADO 6"	un	1,00	$ 1.877.029,00	$ 1.877.029,00					$ -	$ -	
13.01.20	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	un	1,00	$ 1.036.147,00	$ 1.036.147,00					$ -	$ -	
13.01.21	VÁLVULA BOLA 1/4"	un	1,00	$ 845.522,00	$ 845.522,00					$ -	$ -	
13.01.22	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	un	1,00	$ 1.337.892,00	$ 1.337.892,00					$ -	$ -	
13.01.23	BRIDA ACERO (PAREJA) 4"	un	2,00	$ 725.189,00	$ 1.450.378,00					$ -	$ -	
13.01.24	BRIDA ACERO (PAREJA) 1-1/2"	un	2,00	$ 694.488,00	$ 1.388.976,00					$ -	$ -	
13.01.25	MANÓMETRO 0-200 PSI	un	5,00	$ 773.683,00	$ 3.868.415,00					$ -	$ -	
13.01.26	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	un	1,00	$ 668.732,00	$ 668.732,00					$ -	$ -	
13.01.27	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 4"	un	2,00	$ 1.429.247,00	$ 2.858.494,00					$ -	$ -	
13.01.28	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 1-1/2"	un	1,00	$ 839.598,00	$ 839.598,00					$ -	$ -	
13.01.29	VÁLVULA MARIPOSA UL/FM 6"	un	4,00	$ 2.625.139,00	$ 10.500.556,00					$ -	$ -	
					$ 46.506.426,00					**$ -**	**$ -**	
13.02.00	**RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL RED CONTRA INCENDIO**											
13.02.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	m	104,76	$ 323.438,00	$ 33.883.365,00					$ -	$ -	
13.02.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	20,00	$ 151.768,00	$ 3.035.360,00					$ -	$ -	
13.02.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	16,00	$ 61.685,00	$ 986.960,00					$ -	$ -	
13.02.04	ABRAZADERAS 6"	un	30,00	$ 22.114,00	$ 663.420,00					$ -	$ -	
13.02.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	57,59	$ 156.307,00	$ 9.001.720,00					$ -	$ -	
13.02.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	17,00	$ 82.506,00	$ 1.402.602,00					$ -	$ -	
13.02.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10,00	$ 33.059,00	$ 330.590,00					$ -	$ -	
13.02.08	ABRAZADERAS 4"	un	16,00	$ 14.435,00	$ 230.960,00					$ -	$ -	
13.02.09	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 3"	m	42,60	$ 154.472,00	$ 6.580.507,00					$ -	$ -	
13.02.10	ACCESORIOS RANURADOS 3"	un	6,00	$ 60.910,00	$ 365.460,00					$ -	$ -	
13.02.11	COUPLING RANURADO 3"	un	4,00	$ 31.580,00	$ 126.320,00					$ -	$ -	
13.02.12	ABRAZADERAS UL/FM 3"	un	12,00	$ 14.108,00	$ 169.296,00					$ -	$ -	
13.02.13	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2-1/2"	m	232,07	$ 99.649,00	$ 23.125.543,00					$ -	$ -	
13.02.14	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	un	68,00	$ 47.259,00	$ 3.213.612,00					$ -	$ -	
13.02.15	COUPLING RANURADO 2-1/2"	un	6,00	$ 26.276,00	$ 157.656,00					$ -	$ -	
13.02.16	ABRAZADERAS UL/FM 2-1/2"	un	65,00	$ 11.362,00	$ 738.530,00					$ -	$ -	
13.02.17	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2"	m	824,25	$ 63.472,00	$ 52.316.796,00					$ -	$ -	
13.02.18	ACCESORIOS RANURADOS 2"	un	108,00	$ 30.987,00	$ 3.346.596,00					$ -	$ -	
13.02.19	COUPLING RANURADO 2"	un	11,00	$ 23.808,00	$ 261.888,00					$ -	$ -	
13.02.20	ABRAZADERAS UL/FM 2"	un	229,00	$ 9.721,00	$ 2.226.109,00					$ -	$ -	
13.02.21	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1-1/4"	m	434,85	$ 43.266,00	$ 18.814.220,00					$ -	$ -	
13.02.22	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/4"	un	49,00	$ 14.864,00	$ 728.336,00					$ -	$ -	
13.02.23	COUPLING RANURADO 1-1/4"	un	49,00	$ 17.493,00	$ 857.157,00					$ -	$ -	
13.02.24	ABRAZADERAS UL/FM 1-1/4"	un	121,00	$ 9.059,00	$ 1.096.139,00					$ -	$ -	
13.02.25	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1"	m	1.157,44	$ 34.479,00	$ 39.907.374,00					$ -	$ -	
13.02.26	ACCESORIOS ROSCADO 1"	un	1.893,00	$ 10.861,00	$ 20.559.873,00					$ -	$ -	

13.02.27	ABRAZADERAS UL/FM 1"	un	322,00	$ 8.735,00	$ 2.812.670,00					$ -	$ -	
13.02.28	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22,00	$ 102.313,00	$ 2.250.886,00					$ -	$ -	
13.02.29	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582,00	$ 97.374,00	$ 56.671.668,00					$ -	$ -	
13.02.30	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604,00	$ 15.214,00	$ 9.189.256,00					$ -	$ -	
13.02.31	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	un	1,00	$ 2.829.551,00	$ 2.829.551,00					$ -	$ -	
13.02.32	CHEQUE HIDRO 4"	un	1,00	$ 1.370.641,00	$ 1.370.641,00					$ -	$ -	
13.02.33	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	un	1,00	$ 908.687,00	$ 908.687,00					$ -	$ -	
13.02.34	REGISTRO BOLA 1"	un	1,00	$ 164.167,00	$ 164.167,00					$ -	$ -	
					$ 300.323.915,00					**$ -**	**$ -**	
13.03.00	**GABINETES Y VÁLVULAS**											
13.03.01	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18,00	$ 2.092.161,00	$ 37.658.898,00					$ -	$ -	
13.03.02	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7,00	$ 3.119.706,00	$ 21.837.942,00					$ -	$ -	
					$ 59.496.840,00					**$ -**	**$ -**	
13.04.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS**											
13.04.01	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	un	1,00	$ 380.421,00	$ 380.421,00					$ -	$ -	
13.04.02	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18,00	$ 254.251,00	$ 4.576.518,00					$ -	$ -	
13.04.03	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22,00	$ 14.528,00	$ 319.616,00					$ -	$ -	
13.04.04	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582,00	$ 14.528,00	$ 8.455.296,00					$ -	$ -	
13.04.05	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604,00	$ 5.678,00	$ 3.429.512,00					$ -	$ -	
13.04.06	MONTAJE BOMBA LÍDER INCENDIO	un	1,00	$ 2.668.514,00	$ 2.668.514,00					$ -	$ -	
13.04.07	MONTAJE BOMBA JOCKEY	un	1,00	$ 1.388.520,00	$ 1.388.520,00					$ -	$ -	
13.04.08	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7,00	$ 649.794,00	$ 4.548.558,00					$ -	$ -	
					$ 25.766.955,00					**$ -**	**$ -**	
14.00.00	**INSTALACIONES GAS NATURAL**											
14.00.00	**REDES DE GAS**											
14.00.01	TUB. POLIETILENO DE POR TERMO FUSIÓN 32 mm (1-1/2")	m	42,26	$ 39.900,00	$ 1.686.174,00					$ -	$ -	
14.00.02	ACCES. POLIETILENO 32 mm (1-1/2")	un	20,00	$ 14.675,00	$ 293.500,00					$ -	$ -	
14.00.03	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25 mm (1")	m	33,38	$ 32.300,00	$ 1.078.174,00					$ -	$ -	
14.00.04	ACCES. POLIETILENO 25 mm (1")	un	16,00	$ 10.427,00	$ 166.832,00					$ -	$ -	
14.00.05	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	m	12,00	$ 24.699,00	$ 296.388,00					$ -	$ -	
14.00.06	ACCES. POLIETILENO 20 mm (3/4")	un	15,00	$ 7.773,00	$ 116.595,00					$ -	$ -	
14.00.07	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 16 mm (1/2")	m	18,00	$ 20.647,00	$ 371.646,00					$ -	$ -	
14.00.08	ACCES. POLIETILENO 16 mm (1/2")	un	20,00	$ 6.809,00	$ 136.180,00					$ -	$ -	
					$ 4.145.489,00					**$ -**	**$ -**	
14.01.00	**PUNTOS DE GAS NATURAL**											
14.01.01	PUNTO DE GAS ESTUFA	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00					$ -	$ -	
14.01.02	PUNTO DE GAS HORNO	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00					$ -	$ -	
14.01.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	un	3,00	$ 52.199,00	$ 156.597,00					$ -	$ -	
					$ 286.811,00					**$ -**	**$ -**	
14.02.00	**VÁLVULAS DE GAS**											
14.02.01	REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	un	2,00	$ 140.605,00	$ 281.210,00					$ -	$ -	
14.02.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	un	3,00	$ 107.093,00	$ 321.279,00					$ -	$ -	
					$ 602.489,00					**$ -**	**$ -**	
14.03.00	**MONTAJE DE APARATOS**											
14.03.01	ESTUFA	un	1,00	$ 145.745,00	$ 145.745,00					$ -	$ -	
14.03.02	HORNO	un	1,00	$ 139.437,00	$ 139.437,00					$ -	$ -	
14.03.03	CALENTADORES	un	3,00	$ 567.765,00	$ 1.703.295,00					$ -	$ -	
					$ 1.988.477,00					**$ -**	**$ -**	
15.00.00	**INSTALACIONES GASES MEDICINALES**											
15.00.01	TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2"	m	707,24	$ 61.381,00	$ 43.411.098,00					$ -	$ -	
15.00.02	TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4"	m	87,90	$ 94.379,00	$ 8.295.914,00					$ -	$ -	
15.00.03	TUBERÍA COBRE TIPO L 1"	m	40,88	$ 116.190,00	$ 4.749.847,00					$ -	$ -	
15.00.04	TUBERÍA COBRE TIPO L 1 1/4"	m	43,05	$ 147.341,00	$ 6.343.030,00					$ -	$ -	
15.00.05	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO. 2 GASES	un	2,00	$ 1.020.961,00	$ 2.041.922,00					$ -	$ -	
15.00.06	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO. 3 GASES	un	3,00	$ 217.000,00	$ 651.000,00					$ -	$ -	

15.00.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1/2" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	4,00	$ 120.385,00	$ 481.540,00					$ -	$ -	
15.00.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un		$ 156.863,00	$ -					$ -	$ -	
15.00.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	2,00	$ 259.225,00	$ 518.450,00					$ -	$ -	
15.00.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	10,00	$ 143.242,00	$ 1.432.420,00					$ -	$ -	
15.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 2 GASES	un	2,00	$ 5.550.827,00	$ 11.101.654,00					$ -	$ -	
15.00.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 3 GASES	un	3,00	$ 6.972.678,00	$ 20.918.034,00					$ -	$ -	
15.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 MAESTRA	un	1,00	$ 3.942.904,00	$ 3.942.904,00					$ -	$ -	
15.00.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC OXIGENO	un	44,00	$ 383.105,00	$ 16.856.620,00					$ -	$ -	
15.00.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC AIRE MEDICINAL	un	6,00	$ 383.105,00	$ 2.298.630,00					$ -	$ -	
15.00.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC VACÍO	un	10,00	$ 383.105,00	$ 3.831.050,00					$ -	$ -	
15.00.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA VACÍO MEDICINAL DÚPLEX 3 HP, CUMPLE NORMA NFPA	un	1,00	$ 107.912.233,00	$ 107.912.233,00					$ -	$ -	
15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXÍGENO 2 X 8 CON BARRAS DE BRONPIGTAIL DE COBRE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1,00	$ 34.465.457,00	$ 34.465.457,00					$ -	$ -	
15.00.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2 X 2 CON BARRAS DE BRONCE DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1,00	$ 27.167.279,00	$ 27.167.279,00					$ -	$ -	
15.00.20	SG-SST Y TRANSPORTES	un	1,00	$ 22.616.830,00	$ 22.616.830,00					$ -	$ -	
					$ 319.035.912,00					**$ -**	**$ -**	
16.00.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**											
16.01.00	**SALIDAS ELÉCTRICAS**											
16.01.01	SALIDA LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68,00	$ 189.456,00	$ 12.883.008,00	3,00		3,00	$ 568.368,00	$ -	$ 568.368,00	**4%**
16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	151,00	$ 134.170,00	$ 20.259.670,00	10,00		10,00	$ 1.341.700,00	$ -	$ 1.341.700,00	**7%**
16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA, - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156,00	$ 120.608,00	$ 18.814.848,00	3,00		3,00	$ 361.824,00	$ -	$ 361.824,00	**2%**
16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA Y SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693,00	$ 120.608,00	$ 83.581.344,00					$ -	$ -	
16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W Y AXIS LENS 33W 60*60 - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30,00	$ 120.608,00	$ 3.618.240,00					$ -	$ -	
16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M, 2,28M, 3.4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	26,00	$ 138.124,00	$ 3.591.224,00					$ -	$ -	
16.01.07	SALIDA APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORES LED 12W Y 30W -WALL PACK, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79,00	$ 71.850,00	$ 5.676.150,00					$ -	$ -	

16.01.08	SALIDA ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49,00	$ 158.616,00	$ 7.772.184,00					$ -	$ -	
16.01.09	SALIDA PARA MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	140,00	$ 224.996,00	$ 31.499.440,00					$ -	$ -	
16.01.10	SALIDA APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6 W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24,00	$ 181.044,00	$ 4.345.056,00					$ -	$ -	
16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120W, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15,00	$ 158.616,00	$ 2.379.240,00					$ -	$ -	
16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7,7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	27,00	$ 138.124,00	$ 3.729.348,00					$ -	$ -	
16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG - 600 VOLT CON CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA, DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA. TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETIE	un	1.151,00	$ 16.094,00	$ 18.524.194,00					$ -	$ -	
16.01.14	SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA FLUXOMETROS LAVAMANOS QUIRÚRGICOS, SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½", CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM, Y ACCESORIOS	un	122,00	$ 95.137,00	$ 11.606.714,00	41,00		41,00	$ 3.900.617,00	$ -	$ 3.900.617,00	**34%**
16.01.15	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA TALANQUERAS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 4X12 AWG, CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 363.391,00	$ 726.782,00					$ -	$ -	
16.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, ESCLAVA GFCI, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	10,00	$ 77.583,00	$ 775.830,00	2,00		2,00	$ 155.166,00	$ -	$ 155.166,00	**20%**
16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTEMPERIE INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	62,00	$ 132.139,00	$ 8.192.618,00	24,00		24,00	$ 3.171.336,00	$ -	$ 3.171.336,00	**39%**
16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI, UNIDAD ODONTOLOGICAS, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 151.918,00	$ 303.836,00	1,00		1,00	$ 151.918,00	$ -	$ 151.918,00	**50%**
16.01.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	138,00	$ 130.452,00	$ 18.002.376,00	26,00		26,00	$ 3.391.752,00	$ -	$ 3.391.752,00	**19%**
16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MÉDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	48,00	$ 151.643,00	$ 7.278.864,00	9,00		9,00	$ 1.364.787,00	$ -	$ 1.364.787,00	**19%**
16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, TAPA Y ACCESORIOS	un	23,00	$ 241.851,00	$ 5.562.573,00	4,00		4,00	$ 967.404,00	$ -	$ 967.404,00	**17%**
16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	336,00	$ 97.044,00	$ 32.606.784,00	63,00		63,00	$ 6.113.772,00	$ -	$ 6.113.772,00	**19%**
16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	176,00	$ 154.626,00	$ 27.214.176,00	33,00		33,00	$ 5.102.658,00	$ -	$ 5.102.658,00	**19%**

16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	93,00	$ 310.153,00	$ 28.844.229,00	17,00		17,00	$ 5.272.601,00	$ -	$ 5.272.601,00	**18%**
16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTO Y CIRUGIA, 120 V, 15 A INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	32,00	$ 359.154,00	$ 11.492.928,00	8,00		8,00	$ 2.873.232,00	$ -	$ 2.873.232,00	**25%**
16.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA RAYOS X PORTATILES, HUBBELL IN16494 60A, 220 V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 2", CABLE TRENZADO XHHW-2 NO. 2 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	5,00	$ 8.701.246,00	$ 43.506.230,00	1,00		1,00	$ 8.701.246,00	$ -	$ 8.701.246,00	**20%**
16.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 258.033,00	$ 516.066,00					$ -	$ -	
16.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLOGÍA, BAÑO MARIA Y CALENTADORES ELÉCTRICOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	9,00	$ 235.327,00	$ 2.117.943,00	2,00		2,00	$ 470.654,00	$ -	$ 470.654,00	**22%**
16.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 235.327,00	$ 470.654,00					$ -	$ -	
16.01.30	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, MÁQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 512.257,00	$ 512.257,00	1,00		1,00	$ 512.257,00	$ -	$ 512.257,00	**100%**
16.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRÍLICO EN ACRÍLICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	un	941,00	$ 3.537,00	$ 3.328.317,00					$ -	$ -	
16.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	310,00	$ 42.785,00	$ 13.263.350,00	58,00		58,00	$ 2.481.530,00	$ -	$ 2.481.530,00	**19%**
16.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	49,00	$ 49.084,00	$ 2.405.116,00	9,00		9,00	$ 441.756,00	$ -	$ 441.756,00	**18%**
16.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	7,00	$ 52.942,00	$ 370.594,00	1,00		1,00	$ 52.942,00	$ -	$ 52.942,00	**14%**
16.01.35	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	28,00	$ 145.734,00	$ 4.080.552,00	5,00		5,00	$ 728.670,00	$ -	$ 728.670,00	**18%**
16.01.36	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SÓTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	66,00	$ 181.044,00	$ 11.948.904,00	12,00		12,00	$ 2.172.528,00	$ -	$ 2.172.528,00	**18%**
16.01.37	SALIDAS TRIFÁSICA 208 V, PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCLAVE, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12+1X10T AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	4,00	$ 313.717,00	$ 1.254.868,00	1,00		1,00	$ 313.717,00	$ -	$ 313.717,00	**25%**
16.01.38	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBAS EYECTORAS, PRESIÓN Y PONDAJE, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12,00	$ 188.419,00	$ 2.261.028,00	2,00		2,00	$ 376.838,00	$ -	$ 376.838,00	**17%**
16.01.39	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA JOCKEY, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¾", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CAJA RAWELT ¾" Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 258.938,00	$ 258.938,00					$ -	$ -	
16.01.40	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA INCENDIO, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE 4", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE FLEXIBLE 3#250+1#2/0T AWG, CONDULETA 4" Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 1.576.929,00	$ 1.576.929,00					$ -	$ -	

16.02.00	**ALIMENTADORES DE CIRCUITO Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO**											
16.02.01	ALIMENTADORES UNIDAD FCP, DCA, CVV, EN PISO 1 Y 2, CABLEADA EN 3X12, INCLUYE SOPORTES, TUBERÍA EMT ½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE, CONECTORES DUCTOS Y CONECTORES TIPO, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	m	2.300,00	$ 23.788,00	$ 54.712.400,00					$ -	$ -	
16.02.02	SALIDA UNIDAD UCA, UEX, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12,00	$ 113.033,00	$ 1.356.396,00					$ -	$ -	
16.02.03	SALIDAS UNIDADES UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	18,00	$ 87.236,00	$ 1.570.248,00					$ -	$ -	
16.02.04	SALIDA UNIDAD UCA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1¼", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 137.516,00	$ 137.516,00					$ -	$ -	
16.02.05	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 158.884,00	$ 317.768,00					$ -	$ -	
16.02.06	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 2", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	2,00	$ 195.583,00	$ 391.166,00					$ -	$ -	
16.02.07	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 3", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	1,00	$ 492.033,00	$ 492.033,00					$ -	$ -	
16.02.08	TUBERÍA EMT Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	268,00	$ 15.265,00	$ 4.091.020,00					$ -	$ -	
16.02.09	TUBERÍA PVC Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	30,00	$ 13.104,00	$ 393.120,00					$ -	$ -	
16.02.10	TUBERÍA EMT Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	3.275,00	$ 19.798,00	$ 64.838.450,00					$ -	$ -	
16.02.11	TUBERÍA PVC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	300,00	$ 8.995,00	$ 2.698.500,00					$ -	$ -	
16.02.12	TUBERÍA IMC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	120,00	$ 33.296,00	$ 3.995.520,00					$ -	$ -	
16.02.13	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE LUMINARIA EN 2#12#12T	m	3.800,00	$ 15.743,00	$ 59.823.400,00					$ -	$ -	
16.02.14	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X10 AWG	m	1.800,00	$ 19.836,00	$ 35.704.800,00					$ -	$ -	
16.02.15	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X12 AWG	m	4.100,00	$ 14.475,00	$ 59.347.500,00					$ -	$ -	
16.02.16	CAJA DE 10X10 CM RAWELT DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	un	15,00	$ 26.960,00	$ 404.400,00					$ -	$ -	
16.02.17	CAJA DE 15X15 CM DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	un	25,00	$ 43.719,00	$ 1.092.975,00					$ -	$ -	
16.03.00	**INSTALACIÓN LUMINARIAS**											
16.03.01	INSTALACIÓN LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68,00	$ 23.439,00	$ 1.593.852,00					$ -	$ -	
16.03.02	INSTALACIÓN LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	151,00	$ 16.211,00	$ 2.447.861,00					$ -	$ -	
16.03.03	INSTALACIÓN LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156,00	$ 22.865,00	$ 3.566.940,00					$ -	$ -	
16.03.04	INSTALACIÓN LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693,00	$ 22.865,00	$ 15.845.445,00					$ -	$ -	
16.03.05	INSTALACIÓN LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30,00	$ 22.865,00	$ 685.950,00					$ -	$ -	
16.03.06	INSTALACIÓN LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M, 2,28M, 3.4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	26,00	$ 33.286,00	$ 865.436,00					$ -	$ -	
16.03.07	INSTALACIÓN APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORESLED 30W - WALL PACK, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79,00	$ 17.389,00	$ 1.373.731,00					$ -	$ -	

16.03.08	INSTALACIÓN ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49,00	$ 15.403,00	$ 754.747,00					$ -	$ -	
16.03.09	INSTALACIÓN MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	140,00	$ 16.211,00	$ 2.269.540,00					$ -	$ -	
16.03.10	INSTALACIÓN APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN TECHO, 6 W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24,00	$ 17.389,00	$ 417.336,00					$ -	$ -	
16.03.11	INSTALACIÓN POSTE POSTE DE LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15,00	$ 47.161,00	$ 707.415,00					$ -	$ -	
16.03.12	INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7,7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	27,00	$ 33.286,00	$ 898.722,00					$ -	$ -	
16.04.00	**DUCTERÍAS, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES B.T**											
16.04.01	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	350,00	$ 10.185,00	$ 3.564.750,00	350,00		350,00	$ 3.564.750,00	$ -	$ 3.564.750,00	**100%**
16.04.02	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	170,00	$ 15.497,00	$ 2.634.490,00	170,00		170,00	$ 2.634.490,00	$ -	$ 2.634.490,00	**100%**
16.04.03	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	15,00	$ 17.322,00	$ 259.830,00	15,00		15,00	$ 259.830,00	$ -	$ 259.830,00	**100%**
16.04.04	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	520,00	$ 20.832,00	$ 10.832.640,00	520,00		520,00	$ 10.832.640,00	$ -	$ 10.832.640,00	**100%**
16.04.05	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	20,00	$ 22.240,00	$ 444.800,00	20,00		20,00	$ 444.800,00	$ -	$ 444.800,00	**100%**
16.04.06	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	60,00	$ 29.538,00	$ 1.772.280,00	60,00		60,00	$ 1.772.280,00	$ -	$ 1.772.280,00	**100%**
16.04.07	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	180,00	$ 27.270,00	$ 4.908.600,00					$ -	$ -	
16.04.08	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	45,00	$ 38.321,00	$ 1.724.445,00					$ -	$ -	
16.04.09	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	40,00	$ 42.333,00	$ 1.693.320,00					$ -	$ -	
16.04.10	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	120,00	$ 53.530,00	$ 6.423.600,00					$ -	$ -	
16.04.11	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	30,00	$ 117.893,00	$ 3.536.790,00					$ -	$ -	
16.04.12	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	35,00	$ 151.103,00	$ 5.288.605,00					$ -	$ -	
16.04.13	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	55,00	$ 70.614,00	$ 3.883.770,00					$ -	$ -	
16.04.14	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	$ 82.680,00	$ 2.067.000,00					$ -	$ -	
16.04.15	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	$ 93.611,00	$ 2.340.275,00					$ -	$ -	
16.04.16	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	$ 117.150,00	$ 2.928.750,00					$ -	$ -	
16.04.17	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	15,00	$ 257.326,00	$ 3.859.890,00					$ -	$ -	
16.04.18	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO T-EI	m	5,00	$ 341.306,00	$ 1.706.530,00					$ -	$ -	
16.04.19	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø1½"	m	80,00	$ 66.387,00	$ 5.310.960,00					$ -	$ -	
16.04.20	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø3"	m	45,00	$ 189.024,00	$ 8.506.080,00					$ -	$ -	
16.04.21	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø4"	m	60,00	$ 227.704,00	$ 13.662.240,00					$ -	$ -	
16.04.22	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 40X0,5CM	m	25,00	$ 210.475,00	$ 5.261.875,00					$ -	$ -	
16.04.23	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 30X0,5CM	m	360,00	$ 168.802,00	$ 60.768.720,00					$ -	$ -	
16.04.24	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 20X0,5CM	m	580,00	$ 144.734,00	$ 83.945.720,00					$ -	$ -	
16.04.25	CABLE NO. 4 CU PARA ATERRIZAJE DE DUCTO PORTACABLE A LO LARGO DE SU TRAYECTO, INCLUYE CONECTORES BIMETÁLICAS GRIFEQUIP A LO LARGO DEL DUCTO	m	965,00	$ 26.647,00	$ 25.714.355,00					$ -	$ -	
16.04.26	CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	15,00	$ 77.665,00	$ 1.164.975,00					$ -	$ -	
16.04.27	CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	20,00	$ 94.554,00	$ 1.891.080,00					$ -	$ -	
16.04.28	CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	12,00	$ 162.845,00	$ 1.954.140,00					$ -	$ -	
16.04.29	CAJA DE PASO METÁLICA 40X40X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	16,00	$ 425.885,00	$ 6.814.160,00					$ -	$ -	
16.04.30	CAJA DE PASO METÁLICA 60X60X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	9,00	$ 546.983,00	$ 4.922.847,00					$ -	$ -	
16.04.31	ALIMENTADOR EN 3#12+1#12T PARA TABLERO	m	930,00	$ 18.576,00	$ 17.275.680,00					$ -	$ -	
16.04.32	ALIMENTADOR EN 2#10+1#10T PARA TABLERO	m	25,00	$ 19.605,00	$ 490.125,00					$ -	$ -	
16.04.33	ALIMENTADOR EN 3#10+1#10T PARA TABLERO	m	420,00	$ 24.774,00	$ 10.405.080,00					$ -	$ -	
16.04.34	ALIMENTADOR EN 2#8+1#10T PARA TABLEROS	m	45,00	$ 24.284,00	$ 1.092.780,00					$ -	$ -	
16.04.35	ALIMENTADOR EN 3#8+1#10T PARA TABLEROS	m	320,00	$ 30.381,00	$ 9.721.920,00					$ -	$ -	
16.04.36	ALIMENTADOR EN 3#8+1#8+1#10T PARA TABLEROS	m	410,00	$ 36.793,00	$ 15.085.130,00					$ -	$ -	
16.04.37	ALIMENTADOR EN 3#8+1#4+1#10T PARA TABLEROS	m	40,00	$ 45.403,00	$ 1.816.120,00					$ -	$ -	
16.04.38	ALIMENTADOR EN 3#6+1#10T PARA TABLEROS	m	205,00	$ 40.348,00	$ 8.271.340,00					$ -	$ -	

16.04.39	ALIMENTADOR EN 3#6+1#6+1#10T PARA TABLEROS	m	680,00	$ 50.166,00	$ 34.112.880,00					$ -	$ -	
16.04.40	ALIMENTADOR EN 3#4+1#8T PARA TABLEROS	m	425,00	$ 62.526,00	$ 26.573.550,00					$ -	$ -	
16.04.41	ALIMENTADOR EN 3#4+1#4+1#8T PARA TABLEROS	m	170,00	$ 77.549,00	$ 13.183.330,00					$ -	$ -	
16.04.42	ALIMENTADOR EN 3#2+1#6T	m	420,00	$ 96.341,00	$ 40.463.220,00					$ -	$ -	
16.04.43	ALIMENTADOR EN 3#2+1#2+1#6T PARA TABLEROS	m	580,00	$ 119.668,00	$ 69.407.440,00					$ -	$ -	
16.04.44	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	105,00	$ 134.508,00	$ 14.123.340,00					$ -	$ -	
16.04.45	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	370,00	$ 168.471,00	$ 62.334.270,00					$ -	$ -	
16.04.46	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#3/0+1#6T PARA TABLEROS	m	60,00	$ 196.510,00	$ 11.790.600,00					$ -	$ -	
16.04.47	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	65,00	$ 182.381,00	$ 11.854.765,00					$ -	$ -	
16.04.48	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	240,00	$ 230.242,00	$ 55.258.080,00					$ -	$ -	
16.04.49	ALIMENTADOR EN 3#3/0+1#250+1#2T PARA TABLERO	m	15,00	$ 329.546,00	$ 4.943.190,00					$ -	$ -	
16.04.50	ALIMENTADOR EN 3#4/0+1#2T PARA TABLERO	m	105,00	$ 277.156,00	$ 29.101.380,00					$ -	$ -	
16.04.51	ALIMENTADOR EN 3#250+1#2T PARA TABLERO	m	65,00	$ 338.128,00	$ 21.978.320,00					$ -	$ -	
16.04.52	ALIMENTADORES EN 2(3#4/0+1#4/0)+1#2/0T CU	m	15,00	$ 704.365,00	$ 10.565.475,00					$ -	$ -	
16.04.53	ALIMENTADORES EN 3#350+1#2T CU	m	145,00	$ 412.511,00	$ 59.814.095,00					$ -	$ -	
16.04.54	ALIMENTADORES EN 3#350+1#350+1#2T CU	m	15,00	$ 525.744,00	$ 7.886.160,00					$ -	$ -	
16.04.55	ALIMENTADORES EN 2(3#350)+1#4/0T CU	m	15,00	$ 796.325,00	$ 11.944.875,00					$ -	$ -	
16.04.56	ALIMENTADORES EN 3(3#350)+2#1/0T CU	m	15,00	$ 1.182.711,00	$ 17.740.665,00					$ -	$ -	
16.04.57	ALIMENTADORES EN 3(3#350+1#350)+2#1/0T	m	60,00	$ 1.495.757,00	$ 89.745.420,00					$ -	$ -	
16.04.58	ALIMENTADORES EN 3#500+1#500+1#2T CU	m	28,00	$ 899.605,00	$ 25.188.940,00					$ -	$ -	
16.04.59	ALIMENTADORES EN 4(3#500+1#500)+1#250T CU	m	20,00	$ 3.310.157,00	$ 66.203.140,00					$ -	$ -	
16.04.60	ALIMENTADORES EN 7(3#500+1#500)+2#4/0T CU	m	17,00	$ 5.642.394,00	$ 95.920.698,00					$ -	$ -	
16.04.61	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#8+1#4+1#10T UPS 12 KVA	m	10,00	$ 52.060,00	$ 520.600,00					$ -	$ -	
16.04.62	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#1/0+1#3/0+1#6T UPS 40 KVA	m	15,00	$ 226.102,00	$ 3.391.530,00					$ -	$ -	
16.04.63	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#3/0+1#250+1#2T UPS 90 KVA	m	15,00	$ 379.059,00	$ 5.685.885,00					$ -	$ -	
16.05.00	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN**											
16.05.01	TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	12,00	$ 418.395,00	$ 5.020.740,00					$ -	$ -	
16.05.02	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	3,00	$ 562.184,00	$ 1.686.552,00					$ -	$ -	
16.05.03	TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	8,00	$ 732.973,00	$ 5.863.784,00					$ -	$ -	
16.05.04	TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	6,00	$ 948.073,00	$ 5.688.438,00					$ -	$ -	
16.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X60 A, 208V	un	2,00	$ 237.860,00	$ 475.720,00					$ -	$ -	
16.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X20 A, 208V, PARA EYECTORAS	un	2,00	$ 241.232,00	$ 482.464,00					$ -	$ -	
16.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X15 A, 208V	un	1,00	$ 237.860,00	$ 237.860,00					$ -	$ -	
16.05.08	INTERRUPTOR 1X10, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	9,00	$ 26.108,00	$ 234.972,00					$ -	$ -	
16.05.09	INTERRUPTOR 1X20, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	274,00	$ 26.757,00	$ 7.331.418,00					$ -	$ -	
16.05.10	INTERRUPTOR 2X20, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	11,00	$ 68.790,00	$ 756.690,00					$ -	$ -	
16.05.11	INTERRUPTOR 3X20, 3X30, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	2,00	$ 147.956,00	$ 295.912,00					$ -	$ -	
16.05.12	INTERRUPTOR 3X30, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	12,00	$ 209.385,00	$ 2.512.620,00					$ -	$ -	
16.05.13	INTERRUPTOR 3X40, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	5,00	$ 210.152,00	$ 1.050.760,00					$ -	$ -	
16.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	7,00	$ 205.373,00	$ 1.437.611,00					$ -	$ -	
16.05.15	INTERRUPTOR 3X60, 3X70, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	2,00	$ 208.019,00	$ 416.038,00					$ -	$ -	
16.05.16	INTERRUPTOR 3X80, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	$ 202.284,00	$ 202.284,00					$ -	$ -	

16.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7,5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 7 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (CIRUGÍA)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00					$ -	$ -
16.05.19	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7,5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 9 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (PARTO)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00					$ -	$ -
16.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 30A, 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (UCI NEONATAL)	un	1,00	$ 27.129.618,00	$ 27.129.618,00					$ -	$ -
16.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 15KVA EQUIPOS PORTÁTILES RAYOS X , 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 90A, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 30A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, PLC PARA CONTROL DE 5 CIRCUITOS CON MÁXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTÁNEAMENTE, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	un	1,00	$ 75.308.429,00	$ 75.308.429,00					$ -	$ -
16.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET, (TCP/IP) INTEGRADO, 10/100/1000 MBITS, ACCESO REMÓTO A TRAVÉS DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS BMS INTERNO A TRAVÉS DE MODBUS RTU O MODBUS/TCP	un	2,00	$ 13.013.834,00	$ 26.027.668,00					$ -	$ -
16.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	1,00	$ 7.646.594,00	$ 7.646.594,00					$ -	$ -
16.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	3,00	$ 12.851.716,00	$ 38.555.148,00					$ -	$ -
16.06.00	**TABLEROS PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS**										
16.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 56.500.126,00	$ 56.500.126,00					$ -	$ -
16.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "F-A", PARA 70KVARS, 200A, 208V, FILTRO DE ARMÓNICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCIÓN DEL 5% O MENOS EN ITDD DE TODO EL SISTEMA. MARCA TCI O ACUSSINE DE SCHNEIDER ELECTRIC. EL FILTRO INCLUYE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	un	1,00	$ 219.955.090,00	$ 219.955.090,00					$ -	$ -
16.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 25.013.282,00	$ 25.013.282,00					$ -	$ -
16.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TV" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 38.587.296,00	$ 38.587.296,00					$ -	$ -
16.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 86.652.528,00	$ 86.652.528,00					$ -	$ -
16.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 53.657.815,00	$ 53.657.815,00					$ -	$ -

16.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 46.131.669,00	$ 46.131.669,00					$ -	$ -	
16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TC-RG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 23.477.857,00	$ 23.477.857,00					$ -	$ -	
16.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 38.350.671,00	$ 38.350.671,00					$ -	$ -	
16.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 142.283.534,00	$ 142.283.534,00					$ -	$ -	
16.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	1,00	$ 18.111.411,00	$ 18.111.411,00					$ -	$ -	
16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	1,00	$ 16.184.857,00	$ 16.184.857,00					$ -	$ -	
16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 10.850.188,00	$ 10.850.188,00					$ -	$ -	
16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 12.732.576,00	$ 12.732.576,00					$ -	$ -	
16.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 10.038.457,00	$ 10.038.457,00					$ -	$ -	
16.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_02 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 17.733.390,00	$ 17.733.390,00					$ -	$ -	
16.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_03 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 10.702.581,00	$ 10.702.581,00					$ -	$ -	
16.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TCC-01_03 A" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 14.969.255,00	$ 14.969.255,00					$ -	$ -	
16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_03A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 3.006.411,00	$ 3.006.411,00					$ -	$ -	
16.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 3.189.485,00	$ 3.189.485,00					$ -	$ -	
16.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 4.136.266,00	$ 4.136.266,00					$ -	$ -	

16.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_04" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 4.688.086,00	$ 4.688.086,00					$ -	$ -	
16.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 3.344.120,00	$ 3.344.120,00					$ -	$ -	
16.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 2.623.821,00	$ 2.623.821,00					$ -	$ -	
16.06.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_03 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 4.536.986,00	$ 4.536.986,00					$ -	$ -	
16.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE " TNE-TCC-01_02 A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 2.652.470,00	$ 2.652.470,00					$ -	$ -	
16.07.00	**SUBESTACIONES**											
16.07.01	CELDA A DE CONEXIÓN SECCIONADORA PARA ENTRADA Ó SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 17,5 KV - 630A, 20 KA. INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1,00	$ 55.331.013,00	$ 55.331.013,00					$ -	$ -	
16.07.02	CELDA B PARA GRUPO DE MEDIDA SF6 EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBARRADO TRIPOLAR AISLADO EN SF6, CORRIENTE NOMINAL DE 630A. CORRIENTE DE CORTO DE 20KA - PLATINA DE COBRE DE 30X3MM PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN - (2) DOBLE ANALIZADOR DE RED CON MEDIDA DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA MEDIDA REDUNDANTE, MEDIDA Y CALIDAD DE ENERGÍA. PRECISIÓN CLASE 0.5 CON COMUNICACIÓN MODBUS RTU - JUEGO DE CT´S (3UND), BURDEN-PRECISIÓN DE 20VA-CL0.5(S). AISLAMIENTO A 17.5KV. SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS CORTOCIRCUITABLES DE PRUEBA Y DISPONIBLE PARA USO DEL MEDIDOR DE ENERGÍA - JUEGO DE PT´S (3UND) RELACIÓN 13.200:V3 / 110:V3 V, BURDEN-PRECISIÓN DE 25VA-CL0.5. AISLAMIENTO A 17.5KV. INCLUYE JUEGOS DE TERMINALES PREMOLDEADOS Y CABLE SECO PARA INTERCONEXIÓN. SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS SECCIONABLES DE PRUEBA Y DISPONIBLE PARA USO DEL MEDIDOR DE ENERGÍA	un	1,00	$ 140.376.674,00	$ 140.376.674,00					$ -	$ -	
16.07.03	CELDA C DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Y SECCIONADOR DE AISLAMIENTO EN VACIO PARA TRANSFORMADORES DE 800 KVA, 17,5KV - 630A, 20KA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, MANDO MOTORIZADO, COORDINACIÓN DE PROTECIONES, PARAMETRIZACIÓN DEL RELÉ, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1,00	$ 96.082.309,00	$ 96.082.309,00					$ -	$ -	
16.07.04	CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR 800KVA, IP54, DIMENSIONES APROPIADAS SEGÚN CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 21.800.868,00	$ 21.800.868,00					$ -	$ -	
16.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15 KV DEL TIPO DE ÓXIDO METÁLICO, POR EL LADO DE M.T. DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, JUEGO X 3	un	2,00	$ 1.262.848,00	$ 2.525.696,00					$ -	$ -	

16.07.06	INTERCONEXIÓN ENTRE LAS CELDAS DE PROTECCIÓN (CT) Y TRANSFORMADOR (T) EN 3X2/0 XLPE, 15 KV, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE PUNTAS Y ACCESORIOS	m	15,00	$ 452.571,00	$ 6.788.565,00					$ -	$ -	
16.07.07	TERMINALES PREMOLDEADOS DE USO INTERIOR	un	3,00	$ 704.311,00	$ 2.112.933,00					$ -	$ -	
16.07.08	TERMINAL PREMOLDEADO RECTO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE - 15 KV, JUEGO X 3 UND	un	1,00	$ 746.088,00	$ 746.088,00					$ -	$ -	
16.07.09	JUEGO DE PASACABLES PARA M.T. CORTAFUEGO PARA CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN A CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	un	2,00	$ 2.112.816,00	$ 4.225.632,00					$ -	$ -	
16.07.10	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA ACOMETIDAS SALIENDO DESDE EL CUARTO DE TABLEROS GENERALES	un	5,00	$ 1.095.339,00	$ 5.476.695,00					$ -	$ -	
16.07.11	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA DUCTOS VERTICALES EN PLACAS DE CADA PISO	un	2,00	$ 1.095.339,00	$ 2.190.678,00					$ -	$ -	
16.08.00	**REDES DE MEDIA TENSIÓN**											
16.08.01	CABLE DE M.T TRIPLEX 15KV EN 120 MM² AL AWG XLPE	m	150,00	419.754,00	$ 62.963.100,00					$ -	$ -	
16.08.02	PRUEBA DE CABLE VLF DE M.T. POR ENTE ACREDITADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE INFORME DE PRUEBAS	un	2,00	2.170.927,00	$ 4.341.854,00					$ -	$ -	
16.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN LAMINA 100X100X40 CMS	un	1,00	2.188.221,00	$ 2.188.221,00					$ -	$ -	
16.08.04	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO EN TUBO GALVANIZADO IMC DE 6"*6 MTS (INCLUYE BOQUILLA TERMINAL, CURVA DE GRAN RADIO Y AMARRES EN CINTA ACERO INOXIDABLE)	un	1,00	5.634.803,00	$ 5.634.803,00					$ -	$ -	
16.09.00	**CÁMARAS Y CANALIZACIÓN**											
16.09.01	CANALIZACIÓN TUBERÍA 4Ø6" PVC (INCLUYE CAMA DE ARENA)	m	140,00	$ 296.965,00	$ 41.575.100,00	120,00		120,00	$ 35.635.800,00	$ -	$ 35.635.800,00	**86%**
16.09.02	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO DOBLE AFINIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	5,00	$ 4.315.782,00	$ 21.578.910,00	2,00		2,00	$ 8.631.564,00	$ -	$ 8.631.564,00	**40%**
16.09.03	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VEHÍCULAR AFINIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	1,00	$ 5.188.102,00	$ 5.188.102,00					$ -	$ -	
16.10.00	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**											
16.10.01	PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, RECTANGULAR DE 5X5 M CON CUADRICULAS DE 2,5 M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	$ 6.065.140,00	$ 6.065.140,00	1,00		1,00	$ 6.065.140,00	$ -	$ 6.065.140,00	**100%**
16.10.02	PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, TRIANGULAR DE 5M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	$ 3.105.840,00	$ 3.105.840,00	1,00		1,00	$ 3.105.840,00	$ -	$ 3.105.840,00	**100%**
16.10.03	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	4,00	$ 357.358,00	$ 1.429.432,00					$ -	$ -	
16.10.04	INTERCONEXIÓN A LOS BORNES DE NEUTRO DEL TRANSFORMADOR Y ATERRIZADA DEL CABLE DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE NO. 4/0	m	20,00	$ 93.950,00	$ 1.879.000,00					$ -	$ -	
16.10.05	GABINETE DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS DE 50X20X12 CM, INCLUYE DOS BARRAS DE CU DE 1¼" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS PARA TIERRA DE POTENCIA Y TIERRA AISLADA, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	1,00	$ 945.700,00	$ 945.700,00					$ -	$ -	
16.10.06	GABINETE PARA UPS, TMGB Y TGB DE TELECOMUNICACIONES PARA TIERRA AISLADA, INCLUYE UNA BARRA DE CU DE 1¼" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	4,00	$ 945.700,00	$ 3.782.800,00					$ -	$ -	
16.10.07	KIT DE TIERRAS Y BARRAJE HORIZONTAL PARA ATERRIZAR RACK Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES MONTADO SOBRE AISLADORES Y FIJADO A LA ESTRUCTURA DE GABINETE, DEBE TENER COMO MINIMO 12 PUNTOS DE CONEXIÓN	un	1,00	$ 716.925,00	$ 716.925,00					$ -	$ -	
16.10.08	MODULO DE TIERRA PARTO	un	1,00	$ 5.869.077,00	$ 5.869.077,00					$ -	$ -	

16.11.00	**PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**											
16.11.01	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 30 Y 40 CMTS PERPENDICULAR 90º, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	76,00	$ 360.144,00	$ 27.370.944,00					$ -	$ -	
16.11.02	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 60 Y 80 CMTS 90º, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	36,00	$ 390.704,00	$ 14.065.344,00					$ -	$ -	
16.11.03	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 100 Y 120 CMTS 90º, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	6,00	$ 597.062,00	$ 3.582.372,00					$ -	$ -	
16.11.04	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA: 1.5M EN ACERO INOXIDABLE	un	39,00	$ 539.527,00	$ 21.041.553,00					$ -	$ -	
16.11.05	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA: 1M EN ACERO INOXIDABLE	un	38,00	$ 539.527,00	$ 20.502.026,00					$ -	$ -	
16.11.07	ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE AISLADORES, SOPORTERIA Y FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA PARA ANILLO PERIMETRAL EN CUBIERTAS	m	1.100,00	$ 15.849,00	$ 17.433.900,00					$ -	$ -	
16.11.08	AISLADOR DE FIJACIÓN ALAMBRÓN DEP SNAP O SIMILAR	un	1.050,00	$ 21.496,00	$ 22.570.800,00					$ -	$ -	
16.11.09	KIT DE MARCACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO MARCA OBO, INCLUYE PLACAS Y SEÑALIZACIÓN	un	1,00	$ 94.834,00	$ 94.834,00					$ -	$ -	
16.11.10	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE FIJACIÓN Y CABLEADO EN BAJANTE	m	280,00	$ 26.523,00	$ 7.426.440,00					$ -	$ -	
16.11.11	CONECTOR PARA ALUMINIO - ALUMINIO DE PRESIÓN	un	36,00	$ 55.636,00	$ 2.002.896,00					$ -	$ -	
16.11.12	TUBERÍA 1" PVC EMBEBIDA EN ESTRUCTURA	m	250,00	$ 50.287,00	$ 12.571.750,00					$ -	$ -	
16.11.13	JUEGO DE CONECTORES DE DUCTO METÁLICO A CONDUCTOR REF. GAR1426	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00					$ -	$ -	
16.11.14	JUEGO DE CONECTORES CONDUCTOR A CONDUCTOR REF. KS23	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00					$ -	$ -	
16.11.15	INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN TERRENO EN CABLE DESNUDO DE CU NO. 2/0 INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	570,00	$ 99.812,00	$ 56.892.840,00					$ -	$ -	
16.11.16	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (ACERO) DE LOS EDIFICIOS, INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PLATINAS DE CONEXIÓN, PERFORAR LA COLUMNA EN BUSCA DE LOS HIERROS DE LA MISMA. (NO INCLUYE EL RESANE RESPECTIVO)	un	36,00	$ 388.984,00	$ 14.003.424,00					$ -	$ -	
16.11.17	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 357.358,00	$ 12.864.888,00					$ -	$ -	
16.11.18	PUNTOS DE UNIÓN CON CONECTOR BIMETÁLICA ACERO DE ESTRUCTURA-COBRE EN CAJA DE INSPECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 116.165,00	$ 4.181.940,00					$ -	$ -	
16.11.19	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO (5/8"X3.6)	un	36,00	$ 323.343,00	$ 11.640.348,00					$ -	$ -	
16.11.20	PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	105,00	$ 116.165,00	$ 12.197.325,00					$ -	$ -	
16.12.00	**DOCUMENTACIÓN**											
16.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE AVISOS TIPO REFLECTIVOS SEGÚN NORMA DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA PUERTA DE LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS A 1.5 M DE ALTURA EN LÁMINA GALVANIZADA	un	9,00	$ 159.592,00	$ 1.436.328,00					$ -	$ -	
16.12.02	MARCACIONES DE TUBERÍAS Y BANDEJAS PORTACABLES REDES DE ENERGÍA(CON BANDAS PLÁSTICAS O PINTURA), CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACIÓN TIPO CLIP), TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA	un	1,00	$ 3.483.312,00	$ 3.483.312,00					$ -	$ -	
					$ 3.823.267.936,00					$ -	$ 123.936.407,00	**3%**
17.00.00	**INSTALACIONES ILUMINACIÓN**											

17.00.01	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO CON STRIP LED Y DIFUSOR OPALIZADO CHASIS EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO 40W NW SOBREPONER, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326 4000K DE SOBREPONER	un	45,00	$ 147.412,00	$ 6.633.540,00					$ -	$ -	
17.00.02	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO,DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO INSTALACIÓN INCRUSTADO O RECESADO EN MARCO (MARCO NO INCLUIDO) O COLGADO	un	151,00	$ 146.048,00	$ 22.053.248,00					$ -	$ -	
17.00.03	BALA GU10 7W INCRUSTADA	un	156,00	$ 45.043,00	$ 7.026.708,00					$ -	$ -	
17.00.04	LÁMPARA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR, 3 W, LUZ SUAVE CÁLIDA STEPLIGHT ETLLED	un	401,00	$ 42.313,00	$ 16.967.513,00					$ -	$ -	
17.00.05	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 24W 100-240V	un	178,00	$ 28.664,00	$ 5.102.192,00					$ -	$ -	
17.00.06	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 18W 100-240V	un	8,00	$ 156.967,00	$ 1.255.736,00					$ -	$ -	
17.00.07	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 24W SOBREPONER	un	2,00	$ 368.531,00	$ 737.062,00					$ -	$ -	
17.00.08	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 33W 3288LM SOBREPONER	un	9,00	$ 737.062,00	$ 6.633.558,00					$ -	$ -	
17.00.09	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 24W SOBREPONER	un	3,00	$ 737.062,00	$ 2.211.186,00					$ -	$ -	
17.00.10	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 66W 6576 LM SOBREPONER	un	4,00	$ 1.064.645,00	$ 4.258.580,00					$ -	$ -	
17.00.11	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 3.4M 24W SOBREPONER	un	28,00	$ 887.205,00	$ 24.841.740,00					$ -	$ -	
17.00.12	LUMINARIA DE USO INTERIOR CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE HUMEDAD O IMPACTO TIPO CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W	un	12,00	$ 102.370,00	$ 1.228.440,00					$ -	$ -	
17.00.13	PROYECTOR EXTERIOR TIPO PX-0214-NEG 6W	un	37,00	$ 69.611,00	$ 2.575.607,00					$ -	$ -	
17.00.14	BALA DE PISO PX 1110BALA PISO GU 10	un	11,00	$ 1.105.593,00	$ 12.161.523,00					$ -	$ -	
17.00.15	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODEIN FLAT LENS 90 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	11,00	$ 928.152,00	$ 10.209.672,00					$ -	$ -	
17.00.16	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 60 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	82,00	$ 31.393,00	$ 2.574.226,00					$ -	$ -	
17.00.17	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, DE USO INTERIOR. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA. MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO 18W SOBREPONER	un	5,00	$ 794.389,00	$ 3.971.945,00					$ -	$ -	
17.00.18	LUMINARIA TIPO CORAL LENS 12*40 CMLED 6-3R1FT 1100LM 7.4W 41K	un	13,00	$ 1.927.281,00	$ 25.054.653,00					$ -	$ -	

17.00.19	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE. GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA FÁCIL INSTALACIÓN H 4M 60W	un	2,00	$ 3.173.462,00	$ 6.346.924,00					$ -	$ -	
17.00.20	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE. GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA FÁCIL INSTALACIÓN H 4M 120V	un	7,00	$ 395.830,00	$ 2.770.810,00					$ -	$ -	
17.00.21	LUMINARIA LED TIPO WALL PACK 30W - DISEÑO ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN Y ÓPTICA SELLADA, INCORPORADO CON LED DE ALTA EFICIENCIA RESISTENTE AL IMPACTO Y LA INTEMPERIE CONTROL DE EMISIÓN DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR (CUTOFF)	un	23,00	$ 170.616,00	$ 3.924.168,00					$ -	$ -	
17.00.22	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ HERMÉTICA 40W NW SUSPENDIDA 1, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326	un	32,00	$ 150.142,00	$ 4.804.544,00					$ -	$ -	
17.00.23	LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER, DISEÑO DELGADO DE USO INTERIOR. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ PANEL SLIM 24W SOBREPONER DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA Y DIFUSOR OPALIZADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO, ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO	un	2,00	$ 341.233,00	$ 682.466,00					$ -	$ -	
17.00.24	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO AXIS LENS 60*60CM 33W INCRUSTAR	un	72,00	$ 79.166,00	$ 5.699.952,00					$ -	$ -	
17.00.25	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VVHE INCRUSTAR 2W 415LM 5700K	un	115,00	$ 313.934,00	$ 36.102.410,00					$ -	$ -	
17.00.26	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VMV3 DESCOLGADA 1.35 2W 415LM 5700K	un	3,00	$ 341.233,00	$ 1.023.699,00					$ -	$ -	
17.00.27	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO.PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4W SUSPENDIDA 1.35M	un	7,00	$ 143.318,00	$ 1.003.226,00					$ -	$ -	
17.00.28	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE INCRUSTADA EN TECHO, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO.PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4.5W 170LM 6000K INCRUSTAR	un	25,00	$ 143.318,00	$ 3.582.950,00					$ -	$ -	
17.00.29	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO.PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 180 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4W 302LM 6000K SOBREPONER	un	14,00	$ 129.668,00	$ 1.815.352,00					$ -	$ -	
					$ 223.253.630,00					$ -	$ -	
18.00.00	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**											
18.00.01	SERVIDOR INTEGRACION	un	1,00	$ 15.309.852,00	$ 15.309.852,00					$ -	$ -	

18.00.02	SOFTWARE INTEGRACION-ACCESOS-SERVICIOS	un	1,00	$ 19.778.960,00	$ 19.778.960,00					$ -	$ -
18.00.03	PULSADOR LLAMADO Incl Modulo y cable de conexión	un	45,00	$ 412.132,00	$ 18.545.940,00					$ -	$ -
18.00.04	LÁMPARA EXTERIOR LLAMADO Incl. Cable de conexión	un	18,00	$ 310.199,00	$ 5.583.582,00					$ -	$ -
18.00.05	UNIDAD CONTROL LLAMADO Incl. Cable de conexión	un	5,00	$ 7.814.711,00	$ 39.073.555,00					$ -	$ -
					$ 98.291.889,00					$ -	$ -
19.00.00	**INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL**										
19.00.01	PANEL DE SEGURIDAD (1 LAZO)	un	1,00	$ 6.138.130,00	$ 6.138.130,00					$ -	$ -
19.00.02	DETECTOR APERTURA	un	69,00	$ 22.640,00	$ 1.562.160,00					$ -	$ -
19.00.03	PULSADOR PÁNICO	un	4,00	$ 81.880,00	$ 327.520,00					$ -	$ -
19.00.04	BOTÓN APERTURA	un	27,00	$ 198.052,00	$ 5.347.404,00					$ -	$ -
19.00.05	ESTACIÓN ADMÓN. ACCESOS	un	1,00	$ 11.361.445,00	$ 11.361.445,00					$ -	$ -
19.00.06	LECTOR DE PROXIMIDAD	un	20,00	$ 894.076,00	$ 17.881.520,00					$ -	$ -
19.00.07	CONTROLADOR LECTORAS X 8	un	3,00	$ 16.945.106,00	$ 50.835.318,00					$ -	$ -
19.00.08	RETENEDOR MAGNÉTICO	un	33,00	$ 682.931,00	$ 22.536.723,00					$ -	$ -
19.00.09	ESTACIÓN BASE CITOFONIA	un	1,00	$ 789.195,00	$ 789.195,00					$ -	$ -
19.00.10	CITOFONO MANOS LIBRES	un	4,00	$ 677.903,00	$ 2.711.612,00					$ -	$ -
19.00.11	SERVIDOR VIDEO	un	1,00	$ 13.615.324,00	$ 13.615.324,00					$ -	$ -
19.00.12	TECLADO DE CONTROL	un	1,00	$ 735.663,00	$ 735.663,00					$ -	$ -
19.00.13	CÁMARA FIJA	un	30,00	$ 1.307.887,00	$ 39.236.610,00					$ -	$ -
19.00.14	CÁMARA FIJA CON HOUSING Incl. Conectores	un	13,00	$ 1.420.528,00	$ 18.466.864,00					$ -	$ -
19.00.15	ESTACIÓN OPERACIÓN Incl. Conectores	un	1,00	$ 7.720.717,00	$ 7.720.717,00					$ -	$ -
19.00.16	SOFTWARE VIDEO Incl. Conectores	un	1,00	$ 17.630.068,00	$ 17.630.068,00					$ -	$ -
19.00.17	GABINETE 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	1,00	$ 5.082.746,00	$ 5.082.746,00					$ -	$ -
19.00.18	RACK 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	4,00	$ 2.199.701,00	$ 8.798.804,00					$ -	$ -
19.00.19	BANDEJA F.O. X 6 LC Incl. Pernos de instalación	un	8,00	$ 936.069,00	$ 7.488.552,00					$ -	$ -
19.00.20	SWITCH X 48 PTO. Incl. Pernos de instalación	un	10,00	$ 34.228.013,00	$ 342.280.130,00					$ -	$ -
19.00.21	SWITCH CORE 5 PT. FO Incl. Pernos de instalación	un	1,00	$ 57.042.273,00	$ 57.042.273,00					$ -	$ -
19.00.22	SALIDA PTO. SENCILLO RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	81,00	$ 141.926,00	$ 11.496.006,00					$ -	$ -
19.00.23	PATCH PANEL X 48 PTO Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	10,00	$ 4.087.270,00	$ 40.872.700,00					$ -	$ -
19.00.24	SALIDA PTO. DOBLE RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	192,00	$ 250.672,00	$ 48.129.024,00					$ -	$ -
19.00.25	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK	un	10,00	$ 93.117,00	$ 931.170,00					$ -	$ -
19.00.26	PATCH CORD 2M	un	480,00	$ 67.141,00	$ 32.227.680,00					$ -	$ -
19.00.27	CABLE UTP CAT 6A	m	23.250,00	$ 6.485,00	$ 150.776.250,00					$ -	$ -
19.00.28	FIBRA ÓPTICA OM3 X 6 HILOS	un	550,00	$ 17.346,00	$ 9.540.300,00					$ -	$ -
19.00.29	PATCH CORD FO. MULTIMODO LC-LC Incl. Marcación de las salidas	un	10,00	$ 176.968,00	$ 1.769.680,00					$ -	$ -
19.00.30	CONECTORES LC Incl. Certificación	un	48,00	$ 99.824,00	$ 4.791.552,00					$ -	$ -
19.00.31	ACCESS POINT	un	4,00	$ 5.011.368,00	$ 20.045.472,00					$ -	$ -
19.00.32	CONTROLADOR WIFI	un	1,00	$ 5.339.415,00	$ 5.339.415,00					$ -	$ -
19.00.33	SERVIDOR TELEFONÍA IP	un	1,00	$ 7.786.044,00	$ 7.786.044,00					$ -	$ -
19.00.34	TERMINAL TELEFÓNICO IP SECRETARIAL INC. TELEFONO	un	3,00	$ 1.543.457,00	$ 4.630.371,00					$ -	$ -
19.00.35	TERMINAL TELEFÓNICO IP SENCILLO INC. TELEFONO	un	90,00	$ 360.096,00	$ 32.408.640,00					$ -	$ -
19.00.36	BANDEJA CORTACABLES DE 30CM DE ANCHO Inc. Soportes y pernos de instalación	m	500,00	$ 110.600,00	$ 55.300.000,00					$ -	$ -
19.00.37	TUBERÍA 1" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	200,00	$ 42.834,00	$ 8.566.800,00					$ -	$ -
19.00.38	TUBERÍA 3/4" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	1.494,00	$ 39.046,00	$ 58.334.724,00					$ -	$ -
19.00.39	CANALIZACIÓN 3X4" pvc	m	140,00	$ 69.900,00	$ 9.786.000,00					$ -	$ -
19.00.40	CAJA0.6X0.6 M	un	8,00	$ 408.186,00	$ 3.265.488,00					$ -	$ -
					$ 1.143.586.094,00					$ -	$ -
20.00.00	**INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA**										
20.01.00	**CONDUCTOS**										
20.01.01	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1.557,00	$ 112.398,00	$ 175.003.686,00					$ -	$ -
20.01.02	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	m2	1.984,00	$ 131.332,00	$ 260.562.688,00					$ -	$ -
20.01.03	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	m2	123,00	$ 169.196,00	$ 20.811.108,00					$ -	$ -
20.01.04	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	m2	133,00	$ 226.234,00	$ 30.089.122,00					$ -	$ -

20.01.05	AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO	m2	3.346,00	$ 41.878,00	$ 140.123.788,00					$ -	$ -	
20.01.06	CONDUCTOS EXTRACCIÓN COCINAS CALIBRE 16	m2	41,00	$ 241.301,00	$ 9.893.341,00					$ -	$ -	
20.01.07	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 4"	m	67,00	$ 95.888,00	$ 6.424.496,00					$ -	$ -	
20.01.08	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 6"	m	9,00	$ 93.166,00	$ 838.494,00					$ -	$ -	
20.01.09	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 12"	m	9,00	$ 153.759,00	$ 1.383.831,00					$ -	$ -	
20.01.10	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	21,00	$ 228.665,00	$ 4.801.965,00					$ -	$ -	
20.01.11	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	143,00	$ 215.903,00	$ 30.874.129,00					$ -	$ -	
20.01.12	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	45,00	$ 228.930,00	$ 10.301.850,00					$ -	$ -	
20.01.13	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	61,00	$ 315.742,00	$ 19.260.262,00					$ -	$ -	
20.01.14	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	41,00	$ 337.226,00	$ 13.826.266,00					$ -	$ -	
20.01.15	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	68,00	$ 334.478,00	$ 22.744.504,00					$ -	$ -	
20.01.16	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	63,00	$ 407.419,00	$ 25.667.397,00					$ -	$ -	
20.01.17	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	56,00	$ 368.679,00	$ 20.646.024,00					$ -	$ -	
20.01.18	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 34"	m	3,00	$ 565.839,00	$ 1.697.517,00					$ -	$ -	
20.01.19	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	4,00	$ 152.983,00	$ 611.932,00					$ -	$ -	
20.01.20	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	19,00	$ 296.598,00	$ 5.635.362,00					$ -	$ -	
20.01.21	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	19,00	$ 237.528,00	$ 4.513.032,00					$ -	$ -	
20.01.22	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	23,00	$ 286.160,00	$ 6.581.680,00					$ -	$ -	
20.01.23	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	54,00	$ 331.863,00	$ 17.920.602,00					$ -	$ -	
20.01.24	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	32,00	$ 340.885,00	$ 10.908.320,00					$ -	$ -	
20.01.25	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	62,00	$ 393.449,00	$ 24.393.838,00					$ -	$ -	
20.01.26	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	59,00	$ 434.002,00	$ 25.606.118,00					$ -	$ -	
20.01.27	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 30"	m	52,00	$ 384.815,00	$ 20.010.380,00					$ -	$ -	
20.01.28	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 36"	m	3,00	$ 534.831,00	$ 1.604.493,00					$ -	$ -	
20.01.29	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø6"	m	91,00	$ 35.159,00	$ 3.199.469,00					$ -	$ -	
20.01.30	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø8"	m	108,00	$ 40.603,00	$ 4.385.124,00					$ -	$ -	
20.01.31	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø10"	m	80,00	$ 49.589,00	$ 3.967.120,00					$ -	$ -	
20.01.32	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø12"	m	57,00	$ 59.175,00	$ 3.372.975,00					$ -	$ -	
20.01.33	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"	un	1,00	$ 53.736,00	$ 53.736,00					$ -	$ -	
20.01.34	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x6"	un	179,00	$ 49.034,00	$ 8.777.086,00					$ -	$ -	
20.01.36	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	un	2,00	$ 77.423,00	$ 154.846,00					$ -	$ -	
20.01.37	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x26"	un	2,00	$ 134.199,00	$ 268.398,00					$ -	$ -	
20.01.38	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x6"	un	4,00	$ 59.357,00	$ 237.428,00					$ -	$ -	
20.01.39	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x8"	un	66,00	$ 59.357,00	$ 3.917.562,00					$ -	$ -	
20.01.40	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x10"	un	1,00	$ 65.810,00	$ 65.810,00					$ -	$ -	
20.01.41	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x18"	un	2,00	$ 105.811,00	$ 211.622,00					$ -	$ -	
20.01.42	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x22"	un	6,00	$ 136.780,00	$ 820.680,00					$ -	$ -	
20.01.43	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x36"	un	6,00	$ 215.494,00	$ 1.292.964,00					$ -	$ -	
20.01.44	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x8"	un	4,00	$ 65.810,00	$ 263.240,00					$ -	$ -	
20.01.45	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x10"	un	43,00	$ 80.003,00	$ 3.440.129,00					$ -	$ -	

20.01.46	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x14"	un	10,00	$ 103.230,00	$ 1.032.300,00					$ -	$ -	
20.01.47	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x20"	un	2,00	$ 150.975,00	$ 301.950,00					$ -	$ -	
20.01.48	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x22"	un	9,00	$ 162.587,00	$ 1.463.283,00					$ -	$ -	
20.01.49	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x26"	un	1,00	$ 176.783,00	$ 176.783,00					$ -	$ -	
20.01.50	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x34"	un	1,00	$ 234.848,00	$ 234.848,00					$ -	$ -	
20.01.51	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x38"	un	1,00	$ 24.518,00	$ 24.518,00					$ -	$ -	
20.01.52	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x12"	un	18,00	$ 99.360,00	$ 1.788.480,00					$ -	$ -	
20.01.53	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x14"	un	4,00	$ 113.553,00	$ 454.212,00					$ -	$ -	
20.01.54	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x18"	un	2,00	$ 138.071,00	$ 276.142,00					$ -	$ -	
20.01.55	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x22"	un	4,00	$ 172.910,00	$ 691.640,00					$ -	$ -	
20.01.56	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x48"	un	3,00	$ 347.112,00	$ 1.041.336,00					$ -	$ -	
20.01.57	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x10"	un	2,00	$ 103.230,00	$ 206.460,00					$ -	$ -	
20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x14"	un	5,00	$ 134.199,00	$ 670.995,00					$ -	$ -	
20.01.59	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x18"	un	2,00	$ 163.879,00	$ 327.758,00					$ -	$ -	
20.01.60	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x40"	un	1,00	$ 338.078,00	$ 338.078,00					$ -	$ -	
20.01.61	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 16"x6"	un	1,00	$ 89.037,00	$ 89.037,00					$ -	$ -	
20.01.62	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x48"	un	1,00	$ 520.022,00	$ 520.022,00					$ -	$ -	
20.01.63	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 22"x38"	un	1,00	$ 509.699,00	$ 509.699,00					$ -	$ -	
20.01.64	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 6"x6"	un	13,00	$ 49.680,00	$ 645.840,00					$ -	$ -	
20.01.65	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x20"	un	2,00	$ 238.461,00	$ 476.922,00					$ -	$ -	
20.01.66	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 6"x6"	un	6,00	$ 98.971,00	$ 593.826,00					$ -	$ -	
20.01.67	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 9"x9"	un	6,00	$ 149.297,00	$ 895.782,00					$ -	$ -	
20.01.68	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 6"x6"	un	19,00	$ 91.359,00	$ 1.735.821,00					$ -	$ -	
20.01.69	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 9"x9"	un	26,00	$ 137.812,00	$ 3.583.112,00					$ -	$ -	
20.01.70	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 12"x12"	un	41,00	$ 184.266,00	$ 7.554.906,00					$ -	$ -	
20.01.71	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 6"x6"	un	18,00	$ 89.810,00	$ 1.616.580,00					$ -	$ -	
20.01.72	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 9"x9"	un	91,00	$ 137.812,00	$ 12.540.892,00					$ -	$ -	
20.01.73	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 12"x12"	un	48,00	$ 184.266,00	$ 8.844.768,00					$ -	$ -	
20.01.74	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"X24"-ø8"-ø6"	un	2,00	$ 7.425.088,00	$ 14.850.176,00					$ -	$ -	
20.01.75	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO 34"X4"-ø6"-ø6"	un	2,00	$ 354.854,00	$ 709.708,00					$ -	$ -	
20.01.76	COMPUERTA DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTOS 24"x8"	un	2,00	$ 120.649,00	$ 241.298,00					$ -	$ -	
20.01.77	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE 8"x4"-8"x4"	un	2,00	$ 73.553,00	$ 147.106,00					$ -	$ -	
20.01.78	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x8"-4"x8"	un	2,00	$ 134.199,00	$ 268.398,00					$ -	$ -	
20.01.79	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x10"-4"x10"	un	2,00	$ 147.103,00	$ 294.206,00					$ -	$ -	
20.01.80	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x8"-6"x8"	un	1,00	$ 134.199,00	$ 134.199,00					$ -	$ -	
20.01.81	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x10"-6"x10"	un	5,00	$ 147.103,00	$ 735.515,00					$ -	$ -	
20.01.82	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x12"-6"x12"	un	9,00	$ 160.007,00	$ 1.440.063,00					$ -	$ -	
20.01.83	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"	un	2,00	$ 170.330,00	$ 340.660,00					$ -	$ -	
20.01.84	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x4"-10"x4"	un	1,00	$ 147.103,00	$ 147.103,00					$ -	$ -	
20.01.85	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x10"-10"x10"	un	2,00	$ 190.976,00	$ 381.952,00					$ -	$ -	
20.01.86	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x12"-10"x12"	un	7,00	$ 211.622,00	$ 1.481.354,00					$ -	$ -	
20.01.87	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x14"-10"x14"	un	1,00	$ 234.848,00	$ 234.848,00					$ -	$ -	
20.01.88	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x4"-12"x4"	un	2,00	$ 160.007,00	$ 320.014,00					$ -	$ -	
20.01.89	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x6"-12"x6"	un	2,00	$ 160.007,00	$ 320.014,00					$ -	$ -	
20.01.90	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	2,00	$ 237.429,00	$ 474.858,00					$ -	$ -	
20.01.91	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"	un	1,00	$ 234.848,00	$ 234.848,00					$ -	$ -	
20.01.92	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x12"-14"x12"	un	1,00	$ 265.817,00	$ 265.817,00					$ -	$ -	

20.01.93	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 16"x6"-16"x6"	un	1,00	$ 314.852,00	$ 314.852,00					$ -	$ -	
20.01.94	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"	un	1,00	$ 335.498,00	$ 335.498,00					$ -	$ -	
20.01.95	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 22"x12"-22"x12"	un	1,00	$ 353.563,00	$ 353.563,00					$ -	$ -	
20.01.96	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"	un	1,00	$ 314.852,00	$ 314.852,00					$ -	$ -	
20.01.97	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"	un	1,00	$ 529.054,00	$ 529.054,00					$ -	$ -	
					$ 1.020.670.360,00					$ -	$ -	
20.03.00	**TUBERÍA**											
20.03.01	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/4"	m	88,00	$ 35.090,00	$ 3.087.920,00					$ -	$ -	
20.03.02	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/8"	m	311,00	$ 37.399,00	$ 11.631.089,00					$ -	$ -	
20.03.03	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/2"	m	155,00	$ 47.043,00	$ 7.291.665,00					$ -	$ -	
20.03.04	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 5/8"	m	209,00	$ 54.793,00	$ 11.451.737,00					$ -	$ -	
20.03.05	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/4"	m	146,00	$ 64.989,00	$ 9.488.394,00					$ -	$ -	
20.03.06	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 7/8"	m	99,00	$ 81.009,00	$ 8.019.891,00					$ -	$ -	
20.03.07	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/8"	m	88,00	$ 101.537,00	$ 8.935.256,00					$ -	$ -	
20.03.08	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/4"	m	5,00	$ 114.644,00	$ 573.220,00					$ -	$ -	
20.03.09	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 3/8"	m	72,00	$ 127.753,00	$ 9.198.216,00					$ -	$ -	
20.03.10	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/2"	m	1,00	$ 145.561,00	$ 145.561,00					$ -	$ -	
20.03.11	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 5/8"	m	32,00	$ 163.367,00	$ 5.227.744,00					$ -	$ -	
20.03.12	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2"	m	2,00	$ 426.815,00	$ 853.630,00					$ -	$ -	
20.03.13	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/8"	m	7,00	$ 533.519,00	$ 3.734.633,00					$ -	$ -	
20.03.14	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/2"	m	1,00	$ 640.222,00	$ 640.222,00					$ -	$ -	
					$ 80.279.178,00					$ -	$ -	
20.04.00	**ACCESORIOS TUBERÍA**											
20.04.01	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN01621	un	11,00	$ 470.591,00	$ 5.176.501,00					$ -	$ -	
20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN03321	un	13,00	$ 649.430,00	$ 8.442.590,00					$ -	$ -	
20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN07121	un	16,00	$ 329.445,00	$ 5.271.120,00					$ -	$ -	
20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN14521	un	7,00	$ 215.972,00	$ 1.511.804,00					$ -	$ -	
20.04.05	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN23220	un	2,00	$ 600.699,00	$ 1.201.398,00					$ -	$ -	
20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN21	un	5,00	$ 401.621,00	$ 2.008.105,00					$ -	$ -	
20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN31	un	3,00	$ 974.778,00	$ 2.924.334,00					$ -	$ -	
20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN41	un	1,00	$ 669.511,00	$ 669.511,00					$ -	$ -	
20.04.09	ACCESORIO EEV KIT PRLK048A0	un	3,00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00					$ -	$ -	
20.04.10	ACCESORIO EEV KIT PRLK096A0	un	3,00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00					$ -	$ -	

20.04.11	ACCESORIO EEV KIT PRLK396A0	un	5,00	$ 1.587.619,00	$ 7.938.095,00					$ -	$ -
					$ 44.669.172,00					$ -	$ -
20.05.00	**BALANCEO**										
20.05.01	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DEL AIRE	un	1,00	$ 58.133.195,00	$ 58.133.195,00					$ -	$ -
					$ 58.133.195,00					$ -	$ -
20.00.06	**CONTROL**										
20.06.01	CONTROLADOR AC SMART 5	un	1,00	$ 7.906.469,00	$ 7.906.469,00					$ -	$ -
20.06.02	MULTI V S SINGLE	un	1,00	$ 560.742,00	$ 560.742,00					$ -	$ -
20.06.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO/SL-2000+FAST TUBE	un	11,00	$ 1.560.065,00	$ 17.160.715,00					$ -	$ -
20.06.04	TABLERO DE CONTROL	un	1,00	$ 4.060.380,00	$ 4.060.380,00					$ -	$ -
20.06.05	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	un	1,00	$ 6.542.201,00	$ 6.542.201,00					$ -	$ -
20.06.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN.	un	1,00	$ 241.809.041,00	$ 241.809.041,00					$ -	$ -
					$ 278.039.548,00					$ -	$ -
21.00.00	**APARATOS SANITARIOS**										
21.00.01	SANITARIO ADRIÁTICO ALONGADO ENTRADA POSTERIOR, INCL. MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA	un	92,00	$ 1.108.247,00	$ 101.958.724,00					$ -	$ -
21.00.02	ORINAL, COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Incl. Fluxometro	un	3,00	$ 892.389,00	$ 2.677.167,00					$ -	$ -
21.00.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE PETITE. CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4,00	$ 243.093,00	$ 972.372,00					$ -	$ -
21.00.04	LAVAMANOS DE COLGAR, AQUAPRO CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	104,00	$ 182.232,00	$ 18.952.128,00					$ -	$ -
21.00.05	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100. CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	30,00	$ 676.259,00	$ 20.287.770,00					$ -	$ -
21.00.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4,00	$ 496.743,00	$ 1.986.972,00					$ -	$ -
21.00.07	GRIFERÍA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMO	un	3,00	$ 647.855,00	$ 1.943.565,00					$ -	$ -
21.00.09	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR	un	7,00	$ 707.183,00	$ 4.950.281,00					$ -	$ -
21.00.10	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA TELÉFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACIÓN	un	19,00	$ 1.299.978,00	$ 24.699.582,00					$ -	$ -
21.00.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA, SUJECIÓN OCULTA A LA PARED, BOTÓN PULSADOR EN A.B.S, CAPACIDAD 1.2 LITROS, VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, INDICADOR DEL NIVEL DE JABÓN	un	88,00	$ 220.023,00	$ 19.362.024,00					$ -	$ -
21.00.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO, DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON LLAVE	un	84,00	$ 206.220,00	$ 17.322.480,00					$ -	$ -
21.00.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPLEGABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304. DIÁMETRO TUBERÍA DE 1 ¼"	un	24,00	$ 482.546,00	$ 11.581.104,00					$ -	$ -
21.00.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 24" CON ESCUDOS TORNILLOS OCULTOS	un	24,00	$ 162.938,00	$ 3.910.512,00					$ -	$ -
21.00.15	DISPENSADOR HORIZONTAL, DE SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA	un	64,00	$ 194.538,00	$ 12.450.432,00					$ -	$ -
21.00.16	CAMBIADORES DE PAÑALES	un	1,00	$ 1.444.496,00	$ 1.444.496,00					$ -	$ -
21.00.17	CORTINAS PARA DUCHA, incl.: tubo	un	25,00	$ 35.652,00	$ 891.300,00					$ -	$ -
21.00.18	SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS	un	4,00	$ 1.059.525,00	$ 4.238.100,00					$ -	$ -
21.00.19	EXTRACTORES DE OLOR , EXTRACCIÓN 98/HR m3	un	4,00	$ 152.999,00	$ 611.996,00					$ -	$ -
21.00.20	REJILLA PLÁSTICA DE VENTILACIÓN 0.25 x 0.25 mt	un	26,00	$ 27.390,00	$ 712.140,00					$ -	$ -
21.00.21	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 0.15 x 0.15 mt	un	5,00	$ 24.193,00	$ 120.965,00					$ -	$ -
					$ 251.074.110,00					$ -	$ -
22.00.00	**CARPINTERÍA MADERA**										
22.01.00	**PUERTAS**										

22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mts+ MONTANTE 0.70x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	8,00	$ 2.077.506,00	$ 16.620.048,00					$ -	$ -	
22.01.02	P00-K PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1,00	$ 1.679.773,00	$ 1.679.773,00					$ -	$ -	
22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0.80x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1,00	$ 2.927.642,00	$ 2.927.642,00					$ -	$ -	
22.01.04	P01-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mts + MONTANTE 0.80x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	75,00	$ 2.041.587,00	$ 153.119.025,00					$ -	$ -	
22.01.05	P00-N. PUERTA ENTAMBORADA 0.80 x2.40 mts+ MONTANTE 0.80x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS	un	18,00	$ 1.723.340,00	$ 31.020.120,00					$ -	$ -	
22.01.06	P02-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	31,00	$ 2.088.991,00	$ 64.758.721,00					$ -	$ -	
22.01.07	P02-N. PUERTA ENTAMBORADA 0.90 x2.40 mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS+ CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	1,00	$ 2.552.056,00	$ 2.552.056,00					$ -	$ -	
22.01.08	P08-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1.60x2.40mts + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.20cm x 0.70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"3" CROMO MATE	un	10,00	$ 4.498.575,00	$ 44.985.750,00					$ -	$ -	
22.01.09	P03D- PUERTA ENTAMBORADA 1.00x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts HOJA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4,00	$ 3.187.875,00	$ 12.751.500,00					$ -	$ -	
22.01.10	P03-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40mts+ MONTANTE 1.00x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	61,00	$ 2.446.908,00	$ 149.261.388,00					$ -	$ -	
22.01.11	P03-N. PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	4,00	$ 2.979.806,00	$ 11.919.224,00					$ -	$ -	
22.01.12	P04-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40mts+ MONTANTE 1.10x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	35,00	$ 2.312.649,00	$ 80.942.715,00					$ -	$ -	
22.01.13	P05-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts ++ MONTANTE 1.20x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	12,00	$ 2.427.500,00	$ 29.130.000,00					$ -	$ -	
22.01.14	P07-NJ. PUERTA ENTAMBORADA1.40 x2.40 mts HOJAS ENTAMBORADA + LAMINA DE ACERO + MIRILLA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	2,00	$ 3.227.473,00	$ 6.454.946,00					$ -	$ -	
22.01.15	P06-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts + MONTANTE 1.20x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4,00	$ 2.295.710,00	$ 9.182.840,00					$ -	$ -	
					$ 617.305.748,00					$ -	$ -	
22.02.00	**MUEBLES**											
22.02.01	M.1.1-MUEBLE DE RECEPCIÓN PRINCIPAL CON SUPERFICIE PÚBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PÚBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5.65X.0.90 M	un	1,00	$ 11.888.170,00	$ 11.888.170,00					$ -	$ -	

22.02.02	M.2.1 RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN CON SUPERFICIE EN GRANITO, FRETE PUBLICO EN FORMICA 3.40x0.75	un	1,00	$ 5.173.632,00	$ 5.173.632,00					$ -	$ -	
22.02.03	M.2.2-RECEPCIÓN CONSULTA EXT, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.05 X 1.10M	un	1,00	$ 4.627.660,00	$ 4.627.660,00					$ -	$ -	
22.02.04	M.2.3-FARMACIA- ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M	un	1,00	$ 3.871.248,00	$ 3.871.248,00					$ -	$ -	
22.02.05	M.2.4-RECEPCIÓN CIRUGÍA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.85 X 1.10M	un	1,00	$ 4.064.810,00	$ 4.064.810,00					$ -	$ -	
22.02.06	M.2.5-RECEPCIÓN HOSPITALIZACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.50 X 1.10M	un	1,00	$ 3.580.904,00	$ 3.580.904,00					$ -	$ -	
22.02.07	M.2.6-ENTREGA MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 1.37 X 1.10M	un	1,00	$ 2.905.037,00	$ 2.905.037,00					$ -	$ -	
22.02.08	M.2.7-ENTREGA RESULTADOS - MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.95 X 1.10M	un	1,00	$ 5.671.377,00	$ 5.671.377,00					$ -	$ -	
22.02.09	M.2.8-IMÁGENES DIAGNOSTICAS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M	un	1,00	$ 5.758.480,00	$ 5.758.480,00					$ -	$ -	
22.02.10	M.2.9-ENTREGA RESULTADOS- MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.90 X 1.10M	un	1,00	$ 4.113.200,00	$ 4.113.200,00					$ -	$ -	
22.02.11	M.2.10-CAJA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	un	1,00	$ 3.290.047,00	$ 3.290.047,00					$ -	$ -	
22.02.12	M.3.1-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.98 X 1.10M	un	1,00	$ 2.806.654,00	$ 2.806.654,00					$ -	$ -	
22.02.13	M.3.2-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - URGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.80 X 1.10M	un	1,00	$ 2.757.706,00	$ 2.757.706,00					$ -	$ -	
22.02.14	M.3.3-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - EMERGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.10 X 1.10M	un	3,00	$ 4.412.539,00	$ 13.237.617,00					$ -	$ -	
22.02.15	M.3.4-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - RECUPERACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.30 X 1.10M	un	1,00	$ 6.290.126,00	$ 6.290.126,00					$ -	$ -	
22.02.16	M.4.13-COCINETA CCTV, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1,00	$ 2.675.810,00	$ 2.675.810,00					$ -	$ -	
22.02.17	M.5.2-MEDICAMENTOS ESTERI, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA 0.85 X 0.53M	un	1,00	$ 1.858.198,00	$ 1.858.198,00					$ -	$ -	
22.02.18	M.5.4-ROPA-MEDICAMENTOS, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.98 X 0.60M	un	1,00	$ 1.549.743,00	$ 1.549.743,00					$ -	$ -	
22.02.19	M.5.5-INSUMOS SALARA ERA, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.85 X 0.45M	un	6,00	$ 1.330.807,00	$ 7.984.842,00					$ -	$ -	
22.02.20	M.5.6-DEP. MATERIALES, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 1.05 X 0.53M	un	2,00	$ 1.838.843,00	$ 3.677.686,00					$ -	$ -	
22.02.21	M.5.9- HABITACIONES HOS, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 2.60 (1.90 X 0.80M) X 0.6M	un	10,00	$ 2.051.601,00	$ 20.516.010,00					$ -	$ -	
22.02.22	M.5.10- HABITACIONES HOSPITA 2P, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 3.21 (1.90 X 0.70M - DOBLE) X 0.45M	un	1,00	$ 4.585.676,00	$ 4.585.676,00					$ -	$ -	
22.02.23	M.5.11- MEDICAMENTOS ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 2.2 X 0.45M	un	2,00	$ 437.325,00	$ 874.650,00					$ -	$ -	

22.02.24	M.5.12- ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.88 X 0.45M	un	1,00	$ 521.950,00	$ 521.950,00					$ -	$ -	
22.02.25	M6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	un	2,00	$ 610.399,00	$ 1.220.798,00					$ -	$ -	
22.02.26	M6.2 PORTERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.91x0.6x0.75	un	2,00	$ 737.085,00	$ 1.474.170,00					$ -	$ -	
22.02.27	M6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.77	un	1,00	$ 595.657,00	$ 595.657,00					$ -	$ -	
22.02.28	M6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.78	un	1,00	$ 755.353,00	$ 755.353,00					$ -	$ -	
22.02.29	M6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	un	1,00	$ 743.069,00	$ 743.069,00					$ -	$ -	
22.02.30	M6.6 TOMADE MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.80	un	1,00	$ 1.040.445,00	$ 1.040.445,00					$ -	$ -	
22.02.31	M6.7 LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.81	un	2,00	$ 1.190.408,00	$ 2.380.816,00					$ -	$ -	
22.02.32	M6.8 RECEPCIÓN Y COCINA, CLASIFICACIÓN LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.82	un	2,00	$ 440.354,00	$ 880.708,00					$ -	$ -	
22.02.33	M6.9 CONTROL, INFORMACIÓN Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.83	un	1,00	$ 871.031,00	$ 871.031,00					$ -	$ -	
22.02.34	M6.10 AMBIENTE DE TRANSICIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.84	un	3,00	$ 464.549,00	$ 1.393.647,00					$ -	$ -	
22.02.35	M6.11 ADAPTACIÓN NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.85	un	2,00	$ 803.331,00	$ 1.606.662,00					$ -	$ -	
22.02.36	M6.12 ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.86	un	1,00	$ 803.331,00	$ 803.331,00					$ -	$ -	
					$ 138.046.920,00					$ -	$ -	
23.00.00	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
23.00.01	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	11,26	$ 239.887,00	$ 2.701.128,00					$ -	$ -	
23.00.02	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO I, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	26,27	$ 573.366,00	$ 15.062.325,00					$ -	$ -	
23.00.03	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO II, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	85,60	$ 627.848,00	$ 53.743.789,00					$ -	$ -	
23.00.04	BARANDA METÁLICA CON MURO EN CONCRETO (0.2M x 1.1M)	m	67,95	$ 882.279,00	$ 59.950.858,00					$ -	$ -	
23.00.05	P00A PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	$ 2.318.819,00	$ 4.637.638,00					$ -	$ -	
23.00.06	P00B PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	$ 2.370.337,00	$ 35.555.055,00					$ -	$ -	
23.00.07	P01A PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	8,00	$ 1.959.745,00	$ 15.677.960,00					$ -	$ -	
23.00.08	P01B PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	$ 2.379.702,00	$ 35.695.530,00					$ -	$ -	

23.00.09	P02A PUERTA METÁLICA 0.90x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	$ 2.889.166,00	$ 5.778.332,00					$ -	$ -	
23.00.10	P03A PUERTA METÁLICA 1.00 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	$ 2.239.716,00	$ 4.479.432,00					$ -	$ -	
23.00.11	P07A PUERTA METÁLICA 1.40 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	4,00	$ 2.239.716,00	$ 8.958.864,00					$ -	$ -	
23.00.12	P06A PUERTA METÁLICA 1.20 x 2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	5,00	$ 2.435.696,00	$ 12.178.480,00					$ -	$ -	
23.00.13	P07-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18. MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	un	2,00	$ 2.477.692,00	$ 4.955.384,00					$ -	$ -	
23.00.14	P02-F PUERTA METÁLICA 1.00 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE	un	1,00	$ 2.490.216,00	$ 2.490.216,00					$ -	$ -	
23.00.15	P06-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18. MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	un	8,00	$ 2.323.707,00	$ 18.589.656,00					$ -	$ -	
23.00.16	P09 AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40. HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 4.520.007,00	$ 4.520.007,00					$ -	$ -	
23.00.17	P08R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40 EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3,00	$ 2.766.320,00	$ 8.298.960,00					$ -	$ -	
23.00.18	P05H PUERTA 1.20x 2.40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20 +BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMÉTICO	un	1,00	$ 3.175.092,00	$ 3.175.092,00					$ -	$ -	
23.00.19	P02R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3,00	$ 1.353.366,00	$ 4.060.098,00					$ -	$ -	

23.00.20	P02 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	11,00	$ 2.841.655,00	$ 31.258.205,00					$ -	$ -	
23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	1,00	$ 2.841.655,00	$ 2.841.655,00					$ -	$ -	
23.00.22	P05 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	4,00	$ 2.841.655,00	$ 11.366.620,00					$ -	$ -	
23.00.23	P10 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	3,00	$ 2.841.655,00	$ 8.524.965,00					$ -	$ -	
23.00.24	P10 P PUERTA 2.00x2.40 mts METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 2 MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.0015 EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 1.222.915,00	$ 1.222.915,00					$ -	$ -	
					$ 355.723.164,00					$ -	$ -	
24.00.00	**CARPINTERÍA ALUMINIO**											
24.00.01	VE-01A VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 8.10 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	3,00	$ 17.008.111,00	$ 51.024.333,00					$ -	$ -	
24.00.02	VE-01B VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 9.07 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	$ 18.938.228,00	$ 37.876.456,00					$ -	$ -	
24.00.03	VE-01C VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 7.87 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	$ 16.436.068,00	$ 32.872.136,00					$ -	$ -	
24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9.13 X 2.90 MTS, 6 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	$ 14.860.547,00	$ 29.721.094,00					$ -	$ -	
24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 2 CUERPOS 8.10 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	1,00	$ 4.938.251,00	$ 4.938.251,00					$ -	$ -	

24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 4 CUERPOS 2.29 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2,00	$ 14.317.494,00	$ 28.634.988,00					$ -	$ -	
24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 3 CUERPOS 5.43 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2,00	$ 12.517.453,00	$ 25.034.906,00					$ -	$ -	
24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 3 CUERPOS 8.10 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	1,00	$ 8.483.152,00	$ 8.483.152,00					$ -	$ -	
24.00.09	VE-02A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR(1,10 MTS)	un	2,00	$ 12.535.383,00	$ 25.070.766,00					$ -	$ -	
24.00.10	VE-02B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.85 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 12.428.387,00	$ 12.428.387,00					$ -	$ -	
24.00.11	VE-02C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.83 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 12.381.577,00	$ 12.381.577,00					$ -	$ -	
24.00.12	VE-02D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.775 X 2.90 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	1,00	$ 12.334.440,00	$ 12.334.440,00					$ -	$ -	
24.00.13	VE-02E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 7.87 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	9,00	$ 10.218.160,00	$ 91.963.440,00					$ -	$ -	
24.00.14	VE-02F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.7 3 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 12.085.369,00	$ 12.085.369,00					$ -	$ -	
24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE	un	2,00	$ 15.131.254,00	$ 30.262.508,00					$ -	$ -	
24.00.16	VE-02H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5 CUERPOS 6.505 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 10.317.794,00	$ 10.317.794,00					$ -	$ -	
24.00.17	VE-02I PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4CUERPOS 6.23 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 9.740.214,00	$ 9.740.214,00					$ -	$ -	
24.00.18	VE-02J PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076.4CUERPOS 5.32 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 8.317.485,00	$ 8.317.485,00					$ -	$ -	
24.00.19	VE-02K PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4.03X2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	2,00	$ 6.338.469,00	$ 12.676.938,00					$ -	$ -	
24.00.20	VE-02L PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	3,00	$ 5.775.048,00	$ 17.325.144,00					$ -	$ -	
24.00.21	VE-02N PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 5.361.517,00	$ 5.361.517,00					$ -	$ -	

24.00.22	VE-02O PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 3.752.249,00	$ 3.752.249,00					$ -	$ -	
24.00.23	VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 4.40 X 2.90	un	1,00	$ 6.879.123,00	$ 6.879.123,00					$ -	$ -	
24.00.24	VE-03A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1,00 MTS) 6 CUERPOS	un	3,00	$ 6.956.635,00	$ 20.869.905,00					$ -	$ -	
24.00.25	VE-03B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	2,00	$ 6.076.138,00	$ 12.152.276,00					$ -	$ -	
24.00.26	VE-03C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.85 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	2,00	$ 7.315.780,00	$ 14.631.560,00					$ -	$ -	
24.00.27	VE-03D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5.86 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	1,00	$ 8.921.619,00	$ 8.921.619,00					$ -	$ -	
24.00.28	VE-03E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3.60 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	2,00	$ 9.132.445,00	$ 18.264.890,00					$ -	$ -	
24.00.29	VE-03F CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 2.755 x 2.30 mts	un	1,00	$ 2.483.083,00	$ 2.483.083,00					$ -	$ -	
24.00.30	VE 03 G- CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 7.77 x 2.30 mts	un	2,00	$ 12.043.052,00	$ 24.086.104,00					$ -	$ -	
24.00.31	VE-04A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	5,00	$ 15.827.591,00	$ 79.137.955,00					$ -	$ -	
24.00.32	VE-04B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	2,00	$ 13.748.314,00	$ 27.496.628,00					$ -	$ -	
24.00.33	VE-05A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 6.84 X 0.50 MTS	un	1,00	$ 2.140.968,00	$ 2.140.968,00					$ -	$ -	
24.00.34	VE-05B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 5.20 X 0.50 MTS	un	1,00	$ 1.652.177,00	$ 1.652.177,00					$ -	$ -	
24.00.35	VE-05C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 3.08 X 0.50 MTS	un	2,00	$ 983.316,00	$ 1.966.632,00					$ -	$ -	
24.00.36	VE-05D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 2.95 X 0.50 MTS	un	1,00	$ 923.371,00	$ 923.371,00					$ -	$ -	

24.00.37	VE-05E. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 1.08 X 1.50 MTS	un	1,00	$ 1.014.143,00	$ 1.014.143,00					$ -	$ -	
24.00.38	VE-05F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2.00 X 0.50 MTS	un	1,00	$ 806.021,00	$ 806.021,00					$ -	$ -	
24.00.39	VE-06A. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1,00	$ 2.661.508,00	$ 2.661.508,00					$ -	$ -	
24.00.40	VE-06B. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1,00	$ 1.383.491,00	$ 1.383.491,00					$ -	$ -	
24.00.41	VE-06C. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	2,00	$ 1.162.101,00	$ 2.324.202,00					$ -	$ -	
24.00.42	VE-06D. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1.11 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	4,00	$ 1.594.395,00	$ 6.377.580,00					$ -	$ -	
24.00.43	VE-06E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.18 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	2,00	$ 1.809.560,00	$ 3.619.120,00					$ -	$ -	
24.00.44	VE-06F. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.50 X 1.30 MTS	un	2,00	$ 2.591.955,00	$ 5.183.910,00					$ -	$ -	
24.00.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 1.80 X 0.40	un	7,00	$ 412.076,00	$ 2.884.532,00					$ -	$ -	
24.00.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 3.55 X 0.95	un	1,00	$ 1.222.915,00	$ 1.222.915,00					$ -	$ -	
24.00.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 2.95 X 1.15	un	1,00	$ 1.230.168,00	$ 1.230.168,00					$ -	$ -	
24.00.48	VE-09A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 7.12 X 0.90 MTS	un	1,00	$ 4.725.834,00	$ 4.725.834,00					$ -	$ -	
24.00.49	VE-09B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 0.90 X 1.70 MTS	un	1,00	$ 1.034.305,00	$ 1.034.305,00					$ -	$ -	
24.00.50	VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038 (0.60 X 1.30M)	un	7,00	$ 479.726,00	$ 3.358.082,00					$ -	$ -	
24.00.51	VE-11A-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.27 X 2.70M	un	2,00	$ 4.630.225,00	$ 9.260.450,00					$ -	$ -	
24.00.52	VE-11B-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3.66 X 2.70M	un	1,00	$ 6.927.034,00	$ 6.927.034,00					$ -	$ -	
24.00.53	VE-11C-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 3.26) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 3.26M	un	2,00	$ 6.404.596,00	$ 12.809.192,00					$ -	$ -	
24.00.54	VE-11D-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.84M	un	2,00	$ 5.273.129,00	$ 10.546.258,00					$ -	$ -	

24.00.55	VE-11E-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.65M	un	2,00	$ 5.852.408,00	$ 11.704.816,00					$ -	$ -	
24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 3.22) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 3.22M	un	1,00	$ 5.960.410,00	$ 5.960.410,00					$ -	$ -	
24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 3 CUERPOS 2.54 X 2.70M	un	3,00	$ 4.693.296,00	$ 14.079.888,00					$ -	$ -	
24.00.58	VE-11H-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.93) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.93M	un	1,00	$ 3.957.088,00	$ 3.957.088,00					$ -	$ -	
24.00.59	VE-11I-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.94) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.94M	un	2,00	$ 4.255.636,00	$ 8.511.272,00					$ -	$ -	
24.00.60	VE-11J-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60 x 1.72) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.72 M	un	1,00	$ 3.248.086,00	$ 3.248.086,00					$ -	$ -	
24.00.61	VE-11K-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.83) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.83 M	un	1,00	$ 3.312.731,00	$ 3.312.731,00					$ -	$ -	
24.00.62	VE-11L-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.18 M	un	1,00	$ 2.183.269,00	$ 2.183.269,00					$ -	$ -	
24.00.63	VE-11M-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 0.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 0.65 M	un	2,00	$ 1.440.646,00	$ 2.881.292,00					$ -	$ -	
24.00.64	VE-11N-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.47) 2 CUERPOS + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.47 M	un	2,00	$ 3.034.298,00	$ 6.068.596,00					$ -	$ -	
24.00.65	VE-11O-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1.80 X 1.80M	un	12,00	$ 2.562.381,00	$ 30.748.572,00					$ -	$ -	

24.00.66	VE-11P-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1.70 X 1.80M	un	3,00	$ 2.521.576,00	$ 7.564.728,00					$ -	$ -	
24.00.67	VE-11Q-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 2 CUERPOS 2.30 X 1.80M	un	3,00	$ 3.271.038,00	$ 9.813.114,00					$ -	$ -	
24.00.68	VE-11R-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 2.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 2.18 M	un	1,00	$ 4.696.592,00	$ 4.696.592,00					$ -	$ -	
24.00.69	VE-12A. VENTANA PLOMADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO	un	1,00	$ 243.359,00	$ 243.359,00					$ -	$ -	
24.00.70	VE 13A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1.60 x 1.90 mts	un	1,00	$ 2.136.250,00	$ 2.136.250,00					$ -	$ -	
24.00.71	VE-13B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.28 x 1.30 MTS BATIENTE 1.00 MTS	un	1,00	$ 3.023.967,00	$ 3.023.967,00					$ -	$ -	
24.00.72	VE-13C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 1.90 x 1.30 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	1,00	$ 1.696.767,00	$ 1.696.767,00					$ -	$ -	
24.00.73	VE-13D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 3.06 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	1,00	$ 3.889.349,00	$ 3.889.349,00					$ -	$ -	
24.00.74	VE-13E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.38 x 1.90 MTS BATIENTE 0.60 MTS	un	1,00	$ 2.718.530,00	$ 2.718.530,00					$ -	$ -	
24.00.75	VE-13F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 4.00 x 1.90 MTS	un	1,00	$ 4.865.207,00	$ 4.865.207,00					$ -	$ -	
24.00.76	VE-13G. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.31 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	2,00	$ 2.905.298,00	$ 5.810.596,00					$ -	$ -	
24.00.77	VE-13H. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.00 x 1.60 MTS	un	1,00	$ 2.186.138,00	$ 2.186.138,00					$ -	$ -	
24.00.78	VE-14A. CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.90 X 1.30 MTS	un	1,00	$ 801.744,00	$ 801.744,00					$ -	$ -	
24.00.79	VE-15A. CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.80 X 0.50 MTS	un	2,00	$ 270.901,00	$ 541.802,00					$ -	$ -	
24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0.80 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	8,00	$ 1.476.017,00	$ 11.808.136,00					$ -	$ -	
24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0.90 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	15,00	$ 1.775.757,00	$ 26.636.355,00					$ -	$ -	
24.00.82	P02V 0.90 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	13,00	$ 2.430.724,00	$ 31.599.412,00					$ -	$ -	

24.00.83	P03V 1.00 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	3,00	$ 2.734.781,00	$ 8.204.343,00					$ -	$ -	
24.00.84	P05L 1.20 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	2,00	$ 3.680.163,00	$ 7.360.326,00					$ -	$ -	
24.00.85	P09V 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	1,00	$ 4.496.121,00	$ 4.496.121,00					$ -	$ -	
24.00.86	P09L 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANBLASTING	un	7,00	$ 3.491.146,00	$ 24.438.022,00					$ -	$ -	
					$ 1.038.765.058,00					$ -	$ -	
25.00.00	**CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE**											
25.00.01	DIVISIÓN BAÑO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	58,25	$ 1.165.400,00	$ 67.884.550,00					$ -	$ -	
25.00.02	DIVISIÓN ORINALES LÁMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1,44	$ 1.234.334,00	$ 1.777.441,00					$ -	$ -	
25.00.03	POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE	un	15,00	$ 332.007,00	$ 4.980.105,00					$ -	$ -	
25.00.04	M.4.1-HEMATOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.49 X 0.90M	un	1,00	$ 3.093.256,00	$ 3.093.256,00					$ -	$ -	
25.00.05	M.4.2-QUIMICA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.59 X 0.90M	un	1,00	$ 3.291.113,00	$ 3.291.113,00					$ -	$ -	
25.00.06	M.4.3-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.10 X 0.90M	un	1,00	$ 4.760.984,00	$ 4.760.984,00					$ -	$ -	
25.00.07	M.4.4-OBSERVACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0.96 X 0.90M	un	1,00	$ 1.401.718,00	$ 1.401.718,00					$ -	$ -	
25.00.08	M.4.5-CAMBIA PAÑALES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.07 X 0.90M	un	1,00	$ 1.281.556,00	$ 1.281.556,00					$ -	$ -	
25.00.09	M.4.6-VACUNACION , MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.36 X 0.90M	un	3,00	$ 2.105.691,00	$ 6.317.073,00					$ -	$ -	
25.00.10	M.4.7-SECADO Y CLASIFICACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.08 X 0.90M	un	2,00	$ 3.208.227,00	$ 6.416.454,00					$ -	$ -	
25.00.11	M.4.8-AMBIENTE TRANSACCIÓN, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90M	un	1,00	$ 1.842.896,00	$ 1.842.896,00					$ -	$ -	
25.00.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.73 X 0.90M	un	1,00	$ 2.672.273,00	$ 2.672.273,00					$ -	$ -	
25.00.13	M.4.10-REPOSTERIA-MUESTRAS, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.40 X 0.90M	un	2,00	$ 4.056.973,00	$ 8.113.946,00					$ -	$ -	
25.00.14	M.4.12-ODONTOLOGIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.25 X 0.90M	un	2,00	$ 6.210.432,00	$ 12.420.864,00					$ -	$ -	
25.00.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	un	1,00	$ 4.123.855,00	$ 4.123.855,00					$ -	$ -	
25.00.16	M.4.15-COCINETA ADMINISTRACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	1,00	$ 5.522.507,00	$ 5.522.507,00					$ -	$ -	
25.00.17	M.4.16-OBSERVACION, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.89 X 0.90M	un	1,00	$ 2.254.864,00	$ 2.254.864,00					$ -	$ -	
25.00.18	M.4.17-TRABAJO LIMPIO-SUCIO CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	4,00	$ 2.993.336,00	$ 11.973.344,00					$ -	$ -	

25.00.19	M.4.18-CIRUGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.27 X 0.90M	un	1,00	$ 4.461.919,00	$ 4.461.919,00					$ -	$ -	
25.00.20	M.4.19-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.60 X 0.60M	un	1,00	$ 3.630.714,00	$ 3.630.714,00					$ -	$ -	
25.00.21	M.4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.33 X 0.90M	un	2,00	$ 2.803.410,00	$ 5.606.820,00					$ -	$ -	
25.00.22	M.4.21-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.50M	un	1,00	$ 3.739.908,00	$ 3.739.908,00					$ -	$ -	
25.00.23	M.4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	2,00	$ 3.903.700,00	$ 7.807.400,00					$ -	$ -	
25.00.24	M.4.23-PARTOS / CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	un	2,00	$ 3.114.369,00	$ 6.228.738,00					$ -	$ -	
25.00.25	M.4.24-PARTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.56 X 0.90M	un	1,00	$ 3.280.212,00	$ 3.280.212,00					$ -	$ -	
25.00.26	M.4.25-PARTOS/PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1,00	$ 3.363.135,00	$ 3.363.135,00					$ -	$ -	
25.00.27	M.4.26-PARTOS PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.66 X 0.90M	un	1,00	$ 3.508.249,00	$ 3.508.249,00					$ -	$ -	
25.00.28	M.4.27-LACTANCIA - PAQUETES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	un	6,00	$ 3.837.634,00	$ 23.025.804,00					$ -	$ -	
25.00.29	M.4.28-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.94 X 0.90M	un	1,00	$ 4.067.973,00	$ 4.067.973,00					$ -	$ -	
25.00.30	M.4.29-VACUNACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90	un	1,00	$ 2.741.219,00	$ 2.741.219,00					$ -	$ -	
25.00.31	M.4.30-S. INMOVILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.48 X 0.90	un	1,00	$ 6.770.053,00	$ 6.770.053,00					$ -	$ -	
25.00.32	M.4.31-PROCEDIMIENTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	2,00	$ 5.270.343,00	$ 10.540.686,00					$ -	$ -	
25.00.33	M.4.32-LAVADO - DESACT, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.76 X 0.90M	un	1,00	$ 5.767.876,00	$ 5.767.876,00					$ -	$ -	
25.00.34	M.4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	un	1,00	$ 8.735.552,00	$ 8.735.552,00					$ -	$ -	
25.00.35	M.4.34-MICROSCOPIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.45 X 1.53 X 0.90M	un	1,00	$ 7.875.480,00	$ 7.875.480,00					$ -	$ -	

25.00.36	M.4.35-ALISTAMIENTO FARMACIA, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.81 X 1.96 X 0.90M	un	1,00	$ 5.781.697,00	$ 5.781.697,00					$ -	$ -	
25.00.37	M.4.36-LAVADO MATERIAL, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.94 X 0.90M	un	2,00	$ 6.230.857,00	$ 12.461.714,00					$ -	$ -	
25.00.38	M.4.37-AMBIENTE TÉCNICO, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.95 X 2.15 X 0.90M	un	1,00	$ 8.079.330,00	$ 8.079.330,00					$ -	$ -	
25.00.39	M.4.38-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 0.95 X 0.90M	un	1,00	$ 1.179.780,00	$ 1.179.780,00					$ -	$ -	
25.00.40	M.4.39-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.21 X 0.90M	un	1,00	$ 1.393.908,00	$ 1.393.908,00					$ -	$ -	
25.00.41	M.4.40-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.45 X 0.90M	un	1,00	$ 1.409.858,00	$ 1.409.858,00					$ -	$ -	
25.00.42	M.4.41-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.93 X 0.90M	un	1,00	$ 1.238.760,00	$ 1.238.760,00					$ -	$ -	
25.00.43	M.4.42-SALA DE LACTANCIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.45 X 0.60M	un	1,00	$ 4.897.690,00	$ 4.897.690,00					$ -	$ -	
25.00.44	M.4.43, COCION Y PREPARACIÓN SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.60M	un	1,00	$ 3.096.901,00	$ 3.096.901,00					$ -	$ -	
25.00.45	M.4.44, COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.90 X 0.50M	un	1,00	$ 3.268.950,00	$ 3.268.950,00					$ -	$ -	
25.00.46	M.4.45, LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.00 X 0.50M	un	1,00	$ 3.441.000,00	$ 3.441.000,00					$ -	$ -	
25.00.47	M.4.46, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	1,00	$ 4.129.200,00	$ 4.129.200,00					$ -	$ -	
25.00.48	M.4.47, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.57 X 0.50M	un	1,00	$ 4.427.419,00	$ 4.427.419,00					$ -	$ -	
25.00.49	M.4.48, HABITACIONES OBSTÉTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	8,00	$ 3.670.400,00	$ 29.363.200,00					$ -	$ -	
25.00.50	M.4.49, HABITACIONES AISLADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	un	2,00	$ 2.695.450,00	$ 5.390.900,00					$ -	$ -	
25.00.51	M.4.50, HABITACIONES PEDIÁTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	un	3,00	$ 3.142.780,00	$ 9.428.340,00					$ -	$ -	
25.00.52	M.7.1-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.78 X 0.90M	un	1,00	$ 2.294.000,00	$ 2.294.000,00					$ -	$ -	
25.00.53	M.7.2-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.94 X 0.90MVE-02G PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,038. 6 CUERPOS 7.45 X 1.80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 2.523.399,00	$ 2.523.399,00					$ -	$ -	
25.00.54	M.7.3-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA (DOBLE) CON SENSOR 1.59 X 0.90M	un	1,00	$ 3.670.400,00	$ 3.670.400,00					$ -	$ -	
					$ 368.756.983,00					$ -	$ -	
26.00.00	**CERRAJERÍA**											
26.00.01	POMO LÍNEA ORBOT CROMADA MATE, CIEGO POR DENTRO, POR FUERA BOCA LLAVE	un	293,00	$ 117.609,00	$ 34.459.437,00					$ -	$ -	
26.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF.: CERR B352 CROMADO MATE	un	15,00	$ 112.052,00	$ 1.680.780,00					$ -	$ -	
26.00.03	CERRADURA ANTIPÁTICO HORIZONTAL F-19R EO	un	4,00	$ 559.068,00	$ 2.236.272,00					$ -	$ -	
26.00.04	MANIJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF.: A80PD JÚPITER CROMADA MATE	un	72,00	$ 96.796,00	$ 6.969.312,00					$ -	$ -	
26.00.05	MANIJA CON BOTÓN POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE, REF. A40S JÚPITER CROMADA MATE SCHLANGE O EQUIVALENTE.	un	265,00	$ 73.486,00	$ 19.473.790,00					$ -	$ -	
26.00.06	MANIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.20.	un	13,00	$ 94.547,00	$ 1.229.111,00					$ -	$ -	
26.00.07	MANIJA CAZUELA RECTANGULAR 120 x 50 x 13 mm, En acero inoxidable	un	4,00	$ 35.885,00	$ 143.540,00					$ -	$ -	
26.00.08	MANIJONES EN ACERO INOXIDABLE X1.00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDO INFERIOR	un	36,00	$ 327.236,00	$ 11.780.496,00					$ -	$ -	
26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANIJA POR AMBOS LADOS 8302 SCHALANGE	un	5,00	$ 143.151,00	$ 715.755,00					$ -	$ -	
26.00.10	BRAZO HIDRÁULICO	un	7,00	$ 295.666,00	$ 2.069.662,00					$ -	$ -	
					$ 80.758.155,00					$ -	$ -	
27.00.00	**VIDRIOS Y ESPEJOS**											
27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM. BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. SISTEMA DE INSTALACIÓN FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	m2	79,90	$ 460.002,00	$ 36.754.160,00					$ -	$ -	
27.00.02	CLARABOYA VIDRIO LAMINADO 3+3 mm	m2	159,80	$ 355.454,00	$ 56.801.549,00					$ -	$ -	

					$ 93.555.709,00					$ -	$ -		
28.00.00	**PINTURA**												
28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PAÑETE PARA ZONAS DE ASEPSIA: ESTUCO PLÁSTICO +1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 +2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	134,35	$ 51.098,00	$ 6.865.016,00					$ -	$ -		
28.00.02	MI-6. ESTUCO PLÁSTICO Y VINO SOBRE PAÑETE: ESTUCO PLÁSTICO + 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE VINILO TIPO1	m2	342,40	$ 38.502,00	$ 13.183.085,00					$ -	$ -		
28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PAÑETADOS: ESTUCO PLÁSTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO EQUIVALENTE	m2	3.162,59	$ 40.495,00	$ 128.069.082,00					$ -	$ -		
28.00.04	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE PINTURA KORAZA	m2	1.959,59	$ 61.219,00	$ 119.964.140,00					$ -	$ -		
28.00.05	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE FIBROCEMENTO PARA DINTELES DE FACHADA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA KORAZA	m2	1.437,51	$ 30.772,00	$ 44.235.058,00					$ -	$ -		
28.00.06	MI-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2+ 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	229,44	$ 18.694,00	$ 4.289.151,00					$ -	$ -		
28.00.07	MI-5. PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEMAS LIVIANOS: 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2+ 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	1.126,87	$ 35.141,00	$ 39.599.339,00					$ -	$ -		
28.00.08	MI-7. ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEMA LIVIANO: 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 +2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO	m2	6.487,89	$ 23.690,00	$ 153.698.114,00					$ -	$ -		
28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO: 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	m2	3.695,92	$ 14.630,00	$ 54.071.310,00					$ -	$ -		
28.00.10	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO EN ZONAS DE ASEPSIA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA	m2	203,70	$ 36.571,00	$ 7.449.513,00					$ -	$ -		
28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS: 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACIÓN DE TOPELLANTAS	un	58,00	$ 10.107,00	$ 586.206,00					$ -	$ -		
28.00.12	PINTURA O PAÑETE + ESTUCO + 2MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + SALPICADERO, CON RECUBRIMIENTO LÁMINA "GLASSLINER"	m2	205,40	$ 106.910,00	$ 21.958.886,00					$ -	$ -		
28.00.13	PANEL CON NÚCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (E=35MM) TIPO SONOACUSTIC , FORRADO CON TELA FONO PERMEABLE TIPO UNOXUNO SOBRE MUROS DE SALÓN MÚLTIPLE SEGÚN DISEÑO ACÚSTICO	m2	49,44	$ 254.541,00	$ 12.584.507,00					$ -	$ -		
					$ 606.553.407,00					$ -	$ -		
29.00.00	**LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA**												
29.00.01	GUARDA CAMILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, incl. Punteras	m	208,76	$ 177.284,00	$ 37.009.808,00					$ -	$ -		
29.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, Incl. Punteras	m	52,28	$ 228.667,00	$ 11.954.711,00					$ -	$ -		
29.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1.22 x 90°	un	208,00	$ 63.446,00	$ 13.196.768,00					$ -	$ -		
29.00.05	LAMINA PROTECCIÓN DE MUROS DE ALTO IMPACTO POR ACCIÓN DE LAS CAMAS EN RECUPERACIÓN Y OBSERVACIÓN	m2	68,27	$ 180.468,00	$ 12.320.550,00					$ -	$ -		
29.00.06	CORTINAS PARA ÁREAS DE OBSERVACIÓN (URGENCIAS) Y RECUPERACIÓN (QUIRÚRGICAS), COLOR SEGÚN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L", CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL, LAVABLE	m	74,49	$ 344.099,00	$ 25.631.935,00					$ -	$ -		
					$ 100.113.772,00					$ -	$ -		
30.00.00	**ASEO**												
30.00.01	ASEO	m2	6.678,27	$ 12.407,00	$ 82.857.296,00					$ -	$ -		
30.00.02	LIMPIEZA DE VIDRIO	m2	1.317,00	$ 4.419,00	$ 5.819.823,00					$ -	$ -		
30.00.03	RETIRO DE SOBRANTES	vj	70,00	$ 121.190,00	$ 8.483.300,00	65,00		65,00	$ 7.877.350,00	$ -	$ 7.877.350,00	**93%**	
					$ 97.160.419,00					$ -	**$ 7.877.350,00**	**8%**	
31.00.00	**VIAS - URBANISMO INTERNO**												
31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.973,12	$ 4.198,00	$ 12.481.158,00	2.973,12		2.973,12	$ 12.481.157,76	$ -	$ 12.481.157,76	**100%**	
31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.778,97	$ 1.841,00	$ 3.275.084,00					$ -	$ -		
31.00.03	GEOTEXTIL T -2400	m2	1.778,97	$ 7.132,00	$ 12.687.614,00					$ -	$ -		
31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533,69	$ 116.022,00	$ 61.919.781,00	530,00		530,00	$ 61.491.660,00	$ -	$ 61.491.660,00	**99%**	
31.00.05	BASE GRANULAR BG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	355,79	$ 128.693,00	$ 45.787.682,00					$ -	$ -		
31.00.06	SARDINEL PREFABRICADO A-10	m	894,96	$ 66.837,00	$ 59.816.442,00					$ -	$ -		
31.00.07	ADOQUÍN CONCRETO 10 x 20 x 8 TEXTURA LISA	m2	1.329,49	$ 118.018,00	$ 156.903.751,00					$ -	$ -		
31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO L=0.40 mt, T-40, incl. Pintura	un	58,00	$ 149.324,00	$ 8.660.792,00					$ -	$ -		
31.00.09	FLECHA SENCILLA: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN	un	3,00	$ 73.605,00	$ 220.815,00					$ -	$ -		

31.00.10	FLECHA DOBLE GIRO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	2,00	$ 89.034,00	$ 178.068,00					$ -	$ -	
31.00.11	LOGO DISCAPACITADOS: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	1,00	$ 448.437,00	$ 448.437,00					$ -	$ -	
31.00.12	CEBRAS: LIMPIEZA Y LIJADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3,90	$ 25.443,00	$ 99.228,00					$ -	$ -	
31.00.13	LÍNEA TRAFICO: PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204,20	$ 10.704,00	$ 2.185.757,00					$ -	$ -	
31.00.14	NUMERACIÓN PARQUEADERO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28,00	$ 30.646,00	$ 858.088,00					$ -	$ -	
31.00.15	FILTRO FRANCÉS EN BASE MURO DE CONTENCIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25 x 0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	170,03	$ 77.661,00	$ 13.204.700,00	170,03		170,03	$ 13.204.699,83	$ -	$ 13.204.699,83	**100%**
					$ 378.727.397,00					$ -	**$ 87.177.517,59**	**23%**
32.00.00	**ANDENES - URBANISMO INTERNO**											
32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.194,15	$ 1.841,00	$ 2.198.430,00					$ -	$ -	
32.00.02	GEOTEXTIL T -2100	m2	1.194,15	$ 8.800,00	$ 10.508.520,00					$ -	$ -	
32.00.03	SUB BASE GRANULAR SBG-1, e. Min=0.30 mt	m3	358,25	$ 119.931,00	$ 42.965.281,00	351,12		351,12	$ 42.110.172,72	$ -	$ 42.110.172,72	**98%**
32.00.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 mt	m2	464,67	$ 83.491,00	$ 38.795.846,00					$ -	$ -	
32.00.05	BALDOSA EN GRES TIPO TABLÓN CAFÉ REF = 225012589 de 30.5 x 7.5 cm de alfa o equivalente instalación de piso trabada Incl. Lineales	m2	1.321,35	$ 66.000,00	$ 87.209.100,00					$ -	$ -	
32.00.06	CÁRCAMO PREFABRICADO POLÍMERO REF. ACO A-15, INCLUYE REJILLA, DADO CONCRETO e=2.5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO	m	8,00	$ 148.939,00	$ 1.191.512,00					$ -	$ -	
32.00.07	MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS, concreto 28 Mpa	m3	128,99	$ 897.030,00	$ 115.707.900,00	125,00		125,00	$ 112.128.750,00	$ -	$ 112.128.750,00	**97%**
32.00.08	CONTENEDORES DE RAÍCES B-20	un	12,00	$ 127.503,00	$ 1.530.036,00					$ -	$ -	
32.00.09	REPOSICIÓN ESPECIES ARBÓREAS H=1.5 MT, incl. Tierra negra	un	12,00	$ 136.935,00	$ 1.643.220,00					$ -	$ -	
32.00.10	RAMPA PARA ACCESO MINUSVÁLIDOS EN CONCRETO 2500 PSI, e=0.10 mt, Sub base=0.40mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	109,67	$ 157.623,00	$ 17.286.514,00					$ -	$ -	
32.00.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI ESTRIADO, e=0.20 mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	318,37	$ 332.095,00	$ 105.729.085,00					$ -	$ -	
32.00.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	m	771,02	$ 60.242,00	$ 46.447.787,00					$ -	$ -	
32.00.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO	m	15,25	$ 1.867.183,00	$ 28.474.541,00					$ -	$ -	
32.00.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI	m	58,28	$ 14.398,00	$ 839.115,00					$ -	$ -	
32.00.15	CÉSPED PARA EXTERIORES, incl. tierra negra e=0.10 mts para nivelación sustrato más emparejada superficie entre sepedones	m2	3.172,83	$ 59.089,00	$ 187.479.352,00					$ -	$ -	
32.00.16	LUMINARIA METÁLICA, POSTE DE 6 M M-130	un	5,00	$ 70.437,00	$ 352.185,00					$ -	$ -	
32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI e=0.10 mt con acero según especificación estructural	m2	729,48	$ 89.976,00	$ 65.635.692,00					$ -	$ -	
32.00.18	SUMIDERO	un	27,00	$ 1.467.568,00	$ 39.624.336,00					$ -	$ -	
32.00.19	CAÑUELA 22.5 x 30 x 80 cm REF. A-120 PREFABRICADA CONCRETO	m	196,76	$ 176.890,00	$ 34.804.876,00					$ -	$ -	
32.00.20	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	8.833,77	$ 7.611,00	$ 67.233.823,00	7.500,00		7.500,00	$ 57.082.500,00	$ -	$ 57.082.500,00	**85%**
32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329,26	$ 7.781,00	$ 2.561.972,00					$ -	$ -	
					$ 898.219.123,00					$ -	**$ 211.321.422,72**	**24%**
33.00.00	**MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO**											
33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1,80m x 0,79m x 0,45m)	un	11,00	$ 1.969.441,00	$ 21.663.851,00					$ -	$ -	
33.00.02	CANECAS DE BASURA METÁLICA M-120	un	5,00	$ 1.281.556,00	$ 6.407.780,00					$ -	$ -	
					$ 28.071.631,00					$ -	$ -	
34.00.00	**EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO**											
34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un	1,00	$ 31.097.277,00	$ 31.097.277,00	0,65		0,65	$ 20.213.230,05	$ -	$ 20.213.230,05	**65%**
34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un	2,00	$ 28.288.682,00	$ 56.577.364,00	0,97		0,97	$ 27.440.021,54	$ -	$ 27.440.021,54	**49%**
34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un	1,00	$ 74.242.811,00	$ 74.242.811,00					$ -	$ -	
34.00.04	CUARTO DE BASURAS	un	1,00	$ 143.175.155,00	$ 143.175.155,00	0,61		0,61	$ 87.336.844,55	$ -	$ 87.336.844,55	**61%**
34.00.05	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (PONDAJE) Inc. Bombas, desarenador, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución	un	1,00	$ 191.581.539,00	$ 191.581.539,00					$ -	$ -	
34.00.06	PÉRGOLA	un	1,00	$ 229.050.205,00	$ 229.050.205,00					$ -	$ -	
					$ 725.724.351,00					$ -	**$ 134.990.096,14**	**19%**

35.00.00	**RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO**											
35.00.01	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	187,64	$ 70.816,00	$ 13.287.914,00	187,64		187,64	$ 13.287.914,24	$ -	$ 13.287.914,24	**100%**
35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt,	m2	29,69	$ 32.680,00	$ 970.269,00	29,69		29,69	$ 970.269,20	$ -	$ 970.269,20	**100%**
35.00.03	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3	7,42	$ 755.880,00	$ 5.608.630,00	7,42		7,42	$ 5.608.629,60	$ -	$ 5.608.629,60	**100%**
35.00.04	VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F´C 28 Mpa, No incluye refuerzo	m3	4,46	$ 829.320,00	$ 3.698.767,00	4,46		4,46	$ 3.698.767,20	$ -	$ 3.698.767,20	**100%**
35.00.05	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	9,98	$ 859.554,00	$ 8.578.349,00	9,98		9,98	$ 8.578.348,92	$ -	$ 8.578.348,92	**100%**
35.00.06	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0,10 m, concreto 28 Mpa	m2	41,26	$ 247.682,00	$ 10.219.359,00					$ -	$ -	
35.00.07	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL e=variable m, concreto 28 Mpa	m2	76,06	$ 289.999,00	$ 22.057.324,00					$ -	$ -	
35.00.08	MURO LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.115 mt. incl. Grafil hztal, grouting de celdas con rfzo y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales	m2	35,91	$ 127.865,00	$ 4.591.632,00					$ -	$ -	
35.00.09	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	84,00	$ 59.072,00	$ 4.962.048,00					$ -	$ -	
35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Cristal, incluye conector, cinta de acabado, tapón de remate y silicona trasparente	m2	175,69	$ 165.392,00	$ 29.057.720,00					$ -	$ -	
35.00.11	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA Cal:20 ancho: 90cm	m	41,83	$ 50.025,00	$ 2.092.546,00					$ -	$ -	
35.00.12	BAJANTE PARA DESAGÜE CUBIERTA PÉRGOLA, tubería PVC AGUAS LLUVIAS 3"	m	72,90	$ 102.287,00	$ 7.456.722,00					$ -	$ -	
35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA, HUECO SOLDADO 2" X 1" CALIBRE 14 , Incluye ANGULO 1/-1/4X1/8 PULG, PLATINA 1X1/8 PULG y puntos de soldadura. PARA PERFILERIA ESTRUCTURAL PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL	m2	329,69	$ 290.110,00	$ 95.646.366,00					$ -	$ -	
35.00.14	GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" incluye GUARDACABO GALVANIZADO (GUÍA PARA PERRO) 3/16", Perros Para Cable Galvanizado 3/16-pulg y TENSOR INOXIDABLE GANCHO Y OJO DE 3-16" AISI 316 LONGITUD 122mm	m	78,57	$ 28.061,00	$ 2.204.753,00					$ -	$ -	
35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN	m2	35,91	$ 24.730,00	$ 888.054,00					$ -	$ -	
35.00.16	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	42,87	$ 573.366,00	$ 24.580.200,00					$ -	$ -	
35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	5.497,87	$ 7.611,00	$ 41.844.289,00	5.099,00		5.099,00	$ 38.808.489,00	$ -	$ 38.808.489,00	**93%**
35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	98,10	$ 7.781,00	$ 763.316,00					$ -	$ -	
35.00.19	SUMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA RAMPA PEATONAL Inc. Pernos, rigidizadores, imprimante epóxico rico en cinc, barrera, acabado en poliuretano e= 3mils	kg	7.521,95	$ 22.613,00	$ 170.093.855,00					$ -	$ -	
					$ 448.602.113,00					$ -	**$ 70.952.418,16**	**16%**
36.00.00	**ANDENES - URBANISMO EXTERNO**											
36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA: arreglo paisajístico conformado por una franja de arbustos de la especie limoncillo, distanciada a 0.30 mts, se propone plantar además a una distancia mínima de 10 ml, individuos de la especie Guayacán amarillo	m	230,05	20.700,00	$ 4.762.035,00					$ -	$ -	
36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA: Se propone plantar individuos de la especie palma azul, a una interdistancia mínima de 10 mts	un	45,00	28.990,00	$ 1.304.550,00					$ -	$ -	
					$ 6.066.585,00					$ -	$ -	
37.00.00	**CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO**											
37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN BARRA REDONDA LISA DE 1/2" Inc. Viga de cimentación, concreto ciclópeo y refuerzo de vigas	m	152,34	$ 238.594,00	$ 36.347.410,00					$ -	$ -	
37.00.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCA FORT EN MALLA ELECTRO SOLDAD, RECUBIERTO EN PVC, inc. Postes de tensionamiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto ciclópeo. Garantía 2 años	m	230,05	$ 412.639,00	$ 94.927.602,00					$ -	$ -	
					$ 131.275.012,00					$ -	$ -	
SUBTOTAL OBRA CIVIL					**$ 31.048.788.600,00**							
EQUIPOS												
38.00.00	**ELÉCTRICOS**											
38.00.01	PLANTA DIÉSEL 450 KVA 208V/120V SERVICIO STAND BY EFECTIVOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	un	1,00	$ 248.235.068,00	$ 248.235.068,00					$ -	$ -	
38.00.02	GENERADOR DE ENERGÍA VACUNACIÓN A COMBUSTIBLE DIESEL, GENERA 5 KW DE ENERGÍA. MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE OHV, CON CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11.5 LITROS, SALIDA DE ENERGÍA DE 110V/220V	un	1,00	$ 6.659.538,00	$ 6.659.538,00					$ -	$ -	
38.00.03	DESCARGUE Y PUESTA EN SITIO DE GRUPO ELECTROGENO CON MONTACARGAS	un	1,00	$ 8.806.000,00	$ 8.806.000,00					$ -	$ -	

38.00.04	ANCLAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO 450 KVA EN EL SITIO DE INSTALACIÓN	un	1,00	$ 6.748.743,00	$ 6.748.743,00					$ -	$ -	
38.00.05	SISTEMA DE ESCAPE PLANTA DE 450 KVA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA CR, SILENCIADOR, AISLAMIENTO TÉRMICO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	un	1,00	$ 25.099.953,00	$ 25.099.953,00					$ -	$ -	
38.00.06	SISTEMA DE COMBUSTIBLE, INCLUYE TANQUE GENERAL, TANQUES DIARIOS, FLOTADORES, TUBERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA	un	1,00	$ 17.572.528,00	$ 17.572.528,00					$ -	$ -	
38.00.07	CABINA DE INSONORIZACIÓN	un	1,00	$ 64.937.925,00	$ 64.937.925,00					$ -	$ -	
38.00.08	UPS 20 kVA, Inc. Banco de baterías	un	1,00	$ 85.443.720,00	$ 85.443.720,00					$ -	$ -	
38.00.09	UPS 40 kVA, Inc. Banco de baterías	un	1,00	$ 261.368.124,00	$ 261.368.124,00					$ -	$ -	
38.00.10	UPS 100 kVA, Inc. Banco de baterías	un	1,00	$ 404.656.302,00	$ 404.656.302,00					$ -	$ -	
38.00.11	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 800 KVA, SECO, CLASE F, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 11,4KV / 208-120V, AISLANTE EN RESINA EPÓXICA CON BOBINAS ENCAPSULADAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURAS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, 3 SENSORES PT 100-1 Y TERMÓMETRO TR 42 DE INDICACIÓN DIGITAL ENFRENTE CELDA CON DOS CONTACTOS SECOS, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 110.673.393,00	$ 110.673.393,00					$ -	$ -	
38.00.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-I" DE 225 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 33.351.918,00	$ 33.351.918,00					$ -	$ -	
38.00.13	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-NE" DE 300 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 36.272.611,00	$ 36.272.611,00					$ -	$ -	
					$ 1.309.825.823,00					$ -	$ -	
39.00.00	**AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA**											
39.00.01	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1670 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 20.461.918,00	$ 20.461.918,00					$ -	$ -	
39.00.02	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1559 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.082.343,00	$ 19.082.343,00					$ -	$ -	
39.00.03	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3102 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.567.346,00	$ 21.567.346,00					$ -	$ -	
39.00.04	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 571 CFM POTENCIA 0.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 675 x 900 x 801 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 7.295.826,00	$ 7.295.826,00					$ -	$ -	
39.00.05	UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 905 x 905 x 800 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 9.139.680,00	$ 9.139.680,00					$ -	$ -	
39.00.06	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3080 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 12.065.085,00	$ 12.065.085,00					$ -	$ -	

39.00.07	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2744 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.082.343,00	$ 19.082.343,00					$ -	$ -	
39.00.08	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1578 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 14, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 11.735.226,00	$ 11.735.226,00					$ -	$ -	
39.00.09	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1259 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.095.608,00	$ 19.095.608,00					$ -	$ -	
39.00.10	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3143 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.098.644,00	$ 21.098.644,00					$ -	$ -	
39.00.11	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3428 CFM POTENCIA 5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 23.321.882,00	$ 23.321.882,00					$ -	$ -	
39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2602 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.363.947,00	$ 21.363.947,00					$ -	$ -	
39.00.13	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 20.435.387,00	$ 20.435.387,00					$ -	$ -	
39.00.14	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.422 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 32.277.995,00	$ 32.277.995,00					$ -	$ -	
39.00.15	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.141 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00					$ -	$ -	
39.00.16	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 7.236 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 70.123.321,00	$ 70.123.321,00					$ -	$ -	
39.00.17	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 13.512 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 138.580.504,00	$ 138.580.504,00					$ -	$ -	
39.00.18	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 10.300 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 115.621.611,00	$ 115.621.611,00					$ -	$ -	

39.00.19	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 9.224 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 98.512.984,00	$ 98.512.984,00					$ -	$ -	
39.00.20	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 11.885 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 109.283.823,00	$ 109.283.823,00					$ -	$ -	
39.00.21	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.312 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 36.745.058,00	$ 36.745.058,00					$ -	$ -	
39.00.22	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.962 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 50.282.302,00	$ 50.282.302,00					$ -	$ -	
39.00.23	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.427 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00					$ -	$ -	
39.00.24	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.483 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 44.352.672,00	$ 44.352.672,00					$ -	$ -	
39.00.25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 229300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1,00	$ 27.676.366,00	$ 27.676.366,00					$ -	$ -	
39.00.26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 593000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1,00	$ 69.945.645,00	$ 69.945.645,00					$ -	$ -	
39.00.27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 633300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1,00	$ 74.344.122,00	$ 74.344.122,00					$ -	$ -	
39.00.28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 363700 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 2 EQUIPOS	un	1,00	$ 44.593.932,00	$ 44.593.932,00					$ -	$ -	
39.00.29	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 76400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1,00	$ 10.731.332,00	$ 10.731.332,00					$ -	$ -	
39.00.30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60.5 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 12.39Kw DIMENSIONES 1,240 x 760 x 1,690mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	$ 18.444.939,00	$ 18.444.939,00					$ -	$ -	

39.00.31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1,00	$ 26.148.993,00	$ 26.148.993,00					$ -	$ -	
39.00.32	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 54.600 Btu NIVEL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 4Kw DIMENSIONES 950 x 330 x 1,170mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	$ 6.732.373,00	$ 6.732.373,00					$ -	$ -	
39.00.33	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 10.32Kw DIMENSIONES 930 x 760 x 1,690mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	2,00	$ 18.444.939,00	$ 36.889.878,00					$ -	$ -	
39.00.34	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 305.700 Btu NIVEL DE RUIDO 63.8 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 22.42Kw DIMENSIONES (1,240 x 760 x 1,690) x 1 + (930 x 760 x 1,690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL MINIMO 2	un	1,00	$ 39.330.989,00	$ 39.330.989,00					$ -	$ -	
39.00.35	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 765.000 Btu NIVEL DE RUIDO 69.4 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 60.82Kw DIMENSIONES (1,240 x 760 x 1,690) x 3 + (930 x 760 x 1,690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	$ 87.387.265,00	$ 87.387.265,00					$ -	$ -	
39.00.36	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 30 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.011Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	4,00	$ 973.289,00	$ 3.893.156,00					$ -	$ -	
39.00.37	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 9.000 Btu NIVEL DE RUIDO 34 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.013Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.056.105,00	$ 1.056.105,00					$ -	$ -	
39.00.38	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.032Kw DIMENSIONES 975 x 209 x 354mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.270.175,00	$ 1.270.175,00					$ -	$ -	
39.00.39	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 28.000 Btu NIVEL DE RUIDO 49 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.054Kw DIMENSIONES 1,190 x 265 x 346mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	1,00	$ 2.410.491,00	$ 2.410.491,00					$ -	$ -	
39.00.40	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.02Kw DIMENSIONES 1,100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3,00	$ 1.486.955,00	$ 4.460.865,00					$ -	$ -	
39.00.41	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.024Kw DIMENSIONES 1,100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.627.812,00	$ 1.627.812,00					$ -	$ -	

39.00.42	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.051Kw DIMENSIONES 1420500166mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	11,00	$ 2.300.189,00	$ 25.302.079,00					$ -	$ -
39.00.43	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.017Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 248mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 1.875.529,00	$ 3.751.058,00					$ -	$ -
39.00.44	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.024Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	4,00	$ 1.996.518,00	$ 7.986.072,00					$ -	$ -
39.00.45	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 37 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.025Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.996.518,00	$ 1.996.518,00					$ -	$ -
39.00.46	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 39 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.032Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 2.070.684,00	$ 2.070.684,00					$ -	$ -
39.00.47	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.037Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 2.196.498,00	$ 4.392.996,00					$ -	$ -
39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.048Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3,00	$ 2.196.498,00	$ 6.589.494,00					$ -	$ -
39.00.49	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.069Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 2.353.765,00	$ 2.353.765,00					$ -	$ -
39.00.50	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 48.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.097Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 2.509.369,00	$ 2.509.369,00					$ -	$ -
39.00.51	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 48 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.11Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 2.070.684,00	$ 4.141.368,00					$ -	$ -
39.00.52	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 58.000 Btu NIVEL DE RUIDO 50 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.135Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 313mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 4.062.575,00	$ 4.062.575,00					$ -	$ -

39.00.53	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO LOW STATIC, EXPANSION DIRECTA, R-410, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500 Btu NIVEL DE RUIDO 25 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.029Kw DIMENSIONES 700x700x190mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 1.636.877,00	$ 1.636.877,00					$ -	$ -	
39.00.54	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.184Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 2.897.622,00	$ 2.897.622,00					$ -	$ -	
39.00.55	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 42.000 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.231Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 2.936.932,00	$ 2.936.932,00					$ -	$ -	
39.00.56	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.26Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 360mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 6.683.992,00	$ 6.683.992,00					$ -	$ -	
39.00.57	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.765Kw DIMENSIONES 765 x 500 x 500mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3,00	$ 7.060.825,00	$ 21.182.475,00					$ -	$ -	
39.00.58	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 96.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.8Kw DIMENSIONES 800 x 750 x 750mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3,00	$ 7.386.272,00	$ 22.158.816,00					$ -	$ -	
39.00.59	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 427 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.655.617,00	$ 2.655.617,00					$ -	$ -	
39.00.60	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 355 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.655.770,00	$ 2.655.770,00					$ -	$ -	
39.00.61	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 319 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.655.770,00	$ 2.655.770,00					$ -	$ -	
39.00.62	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 1230 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.959.709,00	$ 2.959.709,00					$ -	$ -	
39.00.63	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 996 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00					$ -	$ -	
39.00.64	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 267 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00					$ -	$ -	

39.00.65	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 219 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00					$ -	$ -	
39.00.66	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00					$ -	$ -	
39.00.67	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00					$ -	$ -	
39.00.68	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 985 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.959.709,00	$ 2.959.709,00					$ -	$ -	
39.00.69	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 106 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00					$ -	$ -	
39.00.70	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 794 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00					$ -	$ -	
39.00.71	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 688 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00					$ -	$ -	
39.00.72	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 872 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00					$ -	$ -	
39.00.73	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 755 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00					$ -	$ -	
39.00.74	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3,00	$ 814.304,00	$ 2.442.912,00					$ -	$ -	
39.00.75	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3,00	$ 1.298.175,00	$ 3.894.525,00					$ -	$ -	
39.00.76	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	5,00	$ 657.065,00	$ 3.285.325,00					$ -	$ -	
39.00.77	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	4,00	$ 1.056.189,00	$ 4.224.756,00					$ -	$ -	
					$ 1.653.139.852,00					$ -	$ -	
40.00.00	**HIDROSANITARIOS**											
40.00.01	BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIO	un	1,00	$ 99.638.789,00	$ 99.638.789,00					$ -	$ -	
40.00.02	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE	un	1,00	$ 24.700.830,00	$ 24.700.830,00					$ -	$ -	
40.00.03	EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS	un	1,00	$ 9.880.332,00	$ 9.880.332,00					$ -	$ -	
40.00.04	CALENTADOR ELECTRICO PASO 5-9 Lts Bifasico	un	2,00	$ 944.229,00	$ 1.888.458,00					$ -	$ -	
40.00.05	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0.5 lps incl. Tamiz de entrada, 2 filtros descendestes, 2 ascendentes, microtubulencia centrifuga, sedimentacion, filtracion Q=240 m3/m2/día	un	1,00	$ 31.513.416,00	$ 31.513.416,00					$ -	$ -	
					$ 167.621.825,00					$ -	$ -	
41.00.00	**OTROS**											
41.00.01	TALANQUERAS	un	3,00	$ 4.521.445,00	$ 13.564.335,00					$ -	$ -	
					$ 13.564.335,00					$ -	$ -	
SUBTOTAL EQUIPOS (INCLUYE IVA)					**$ 3.144.151.835,00**							
42.00.00	**AMUEBLAMIENTO**											

42.00.01	OA 2.1. PUESTOS DE TRABAJO en L. 1.20m x 1.50 m, Superficie Laminada 1.20 m x 0.60 m en 25 mm + Ducto debajo de superficie con troqueles para conectividad + falda en melanina. Base porto soldado tubular cuadrado. Incluye: 1 módulo de servicios frente metálico 2M1A 3 gavetas	un	31,00	$ 1.639.660,00	$ 50.829.460,00					$ -	$ -	
42.00.02	OA 2.4. MESA DE JUNTAS DE 3.30 M X 1.20 M Superficie Laminada 3.30 m x 1.20 m en 25 mm. Base porto soldado tubular cuadrado. Grommets para conectividad	un	1,00	$ 1.396.863,00	$ 1.396.863,00					$ -	$ -	
42.00.03	OA 2.5 MESA DE CAFÉ Superficie Laminada 0.90 m x 0.90 m en 25 mm, Base pedestal fija pintada	un	6,00	$ 646.086,00	$ 3.876.516,00					$ -	$ -	
42.00.04	OA.1.1 SILLA OPERATIVA. Espaldar alto con asiento. Tapizador espaldar y asiento en textil vinílico lavable para zonas de salud (no silvertex). Mecanismo de 3 palancas. Sin brazos	un	119,00	$ 559.746,00	$ 66.609.774,00					$ -	$ -	
42.00.05	O.A 1.4 SILLA SALA DE JUNTAS	un	10,00	$ 254.021,00	$ 2.540.210,00					$ -	$ -	
42.00.06	OA.1.5 TÁNDEM TRES PUESTOS: monoconcha plástica en diferentes colores. Base pintada negra. Tándem de 3 sillas	un	34,00	$ 740.438,00	$ 25.174.892,00					$ -	$ -	
42.00.07	OA.1.2. SILLA INTERLOCUTORA. Monoconcha plástica. Base 4 apoyos pintada negra	un	73,00	$ 110.535,00	$ 8.069.055,00					$ -	$ -	
42.00.08	OA 2.6 SILLA PARA COMEDOR CAFETERÍA MY WAY: Monoconcha plástica de colores	un	24,00	$ 236.453,00	$ 5.674.872,00					$ -	$ -	
42.00.09	OA 1.8. SOFÁ LOLA 2 PUESTOS. Tapizado en serie a. Base pintada	un	17,00	$ 1.133.406,00	$ 19.267.902,00					$ -	$ -	
42.00.10	OA 1.6. POLTRONA 1. PUESTO. Tapizado en serie a. base pintada	un	49,00	$ 439.935,00	$ 21.556.815,00					$ -	$ -	
42.00.11	OA 2.2 PUESTO EN L - TIPO 1. CON SUPERFICIE PRINCIPAL Y SUPERFICIE RETORNO, Superficie Laminada 1.50 m x 0.60 m en 30 mm y superficie retorno de 90 cm + falda frontal en Melamina + Ducto debajo de superficie en retorno. 2 Base porto soldado + 1 chambrana de soporte. Medidas: 1,50 x 60. 1 módulo de almacenamiento 2M1A 3 gavetas cuerpo y frente metálico de 30cm de frente	un	1,00	$ 3.785.904,00	$ 3.785.904,00					$ -	$ -	
42.00.12	OA 3.1. LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1,55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con aro para candado. Cantidad total: 6	un	10,00	$ 818.969,00	$ 8.189.690,00					$ -	$ -	
42.00.13	OA1.7 SOFÁ SENCILLO, UN PUESTO	un	4,00	$ 740.438,00	$ 2.961.752,00					$ -	$ -	
42.00.14	OA.1.9 SILLAS AUDITORIO 8 PUESTOS	un	5,00	$ 245.010,00	$ 1.225.050,00					$ -	$ -	
42.00.15	OA.2.3 PUESTO DE TRABAJO SENCILLO	un	22,00	$ 879.440,00	$ 19.347.680,00					$ -	$ -	
42.00.16	OA 3.2. LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1,55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con aro para candado. Cantidad total: 4	un	6,00	$ 646.789,00	$ 3.880.734,00					$ -	$ -	
42.00.17	OA 4.1 GABIENETE 5 NIVELES, ENTREPAÑOS DIM: 1.81 x 0.90 x 0.49	un	14,00	$ 1.755.397,00	$ 24.575.558,00					$ -	$ -	
42.00.18	OA 4.2 ESTANTERÍA LIVIANA 60cms DE FONDO. DIM 2 x 0.92 x 0.60 EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 22 RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADLE DE ALTA RESISTENCIA	un	7,00	$ 1.225.470,00	$ 8.578.290,00					$ -	$ -	
42.00.19	SEÑALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Incl. Señalización interior, exterior y tótems	un	1,00	$ 119.135.354,00	$ 119.135.354,00					$ -	$ -	
					$ 396.676.371,00					$ -	$ -	
43.00.00	**EQUIPOS DE OFICINA**											
43.00.01	EQUIPO DE COMPUTO CORPORATIVO INTEL CELERON DUAL DECIMA GENERACION INC. 2 Nucleos, 2 Subprocesos, Tarjeta de video, Disco duro de 1 Tera	un	78,00	$ 1.352.257,00	$ 105.476.046,00					$ -	$ -	
43.00.02	IMPRESORA	un	7,00	$ 1.276.500,00	$ 8.935.500,00					$ -	$ -	
					$ 114.411.546,00					$ -	$ -	
44.00.00	**MOBILIARIO INDUSTRIAL**											
44.00.01	ESTUFA 6 PUESTOS CON PLANCHA DE ASAR	un	1,00	$ 2.719.500,00	$ 2.719.500,00					$ -	$ -	
44.00.02	NEVERAS DE ALIMENTOS	un	2,00	$ 8.555.787,00	$ 17.111.574,00					$ -	$ -	
44.00.03	BASCULA	un	1,00	$ 633.162,00	$ 633.162,00					$ -	$ -	
44.00.04	CAMPANA EXTRACTORA	un	1,00	$ 3.522.400,00	$ 3.522.400,00					$ -	$ -	
44.00.05	LICUADORA	un	2,00	$ 3.085.800,00	$ 6.171.600,00					$ -	$ -	
44.00.06	HORNO MULTIPROPOSITO	un	1,00	$ 6.164.200,00	$ 6.164.200,00					$ -	$ -	
44.00.07	LAVADORA	un	1,00	$ 30.821.000,00	$ 30.821.000,00					$ -	$ -	
44.00.08	SECADORA	un	1,00	$ 26.143.500,00	$ 26.143.500,00					$ -	$ -	
44.00.09	PLANCHA	un	1,00	$ 19.113.836,00	$ 19.113.836,00					$ -	$ -	
44.00.10	MAQUINA DE COSER	un	1,00	$ 1.607.095,00	$ 1.607.095,00					$ -	$ -	
44.00.11	BASCULA	un	2,00	$ 610.305,00	$ 1.220.610,00					$ -	$ -	
					$ 115.228.477,00					$ -	$ -	
					$ 626.316.394,00							
45.00.00	**EQUIPOS MÉDICOS**											
45.01.01	AGITADOR DE MAZZINI	un	1,00	$ 758.500,00	$ 758.500,00					$ -	$ -	
45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES	un	1,00	$ 25.900.000,00	$ 25.900.000,00					$ -	$ -	
45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMATICO	un	1,00	$ 21.145.500,00	$ 21.145.500,00					$ -	$ -	
45.01.04	AUTOCLAVE	un	1,00	$ 86.950.000,00	$ 86.950.000,00					$ -	$ -	

45.01.05	AUTOCLAVE DE MESA	un	1,00	$ 10.423.730,00	$ 10.423.730,00					$ -	$ -
45.01.06	BAÑO SEROLOGICO	un	1,00	$ 2.881.764,00	$ 2.881.764,00					$ -	$ -
45.01.07	BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO	un	12,00	$ 1.113.409,00	$ 13.360.908,00					$ -	$ -
45.01.08	BOMBA DE INFUSIÓN	un	17,00	$ 2.867.500,00	$ 48.747.500,00					$ -	$ -
45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	un	3,00	$ 12.312.990,00	$ 36.938.970,00					$ -	$ -
45.01.10	CAMA HOSPITALARIA	un	12,00	$ 7.371.558,00	$ 88.458.696,00					$ -	$ -
45.01.11	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS	un	10,00	$ 4.255.000,00	$ 42.550.000,00					$ -	$ -
45.01.12	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS CON RCP	un	12,00	$ 5.522.250,00	$ 66.267.000,00					$ -	$ -
45.01.13	CAMILLA FIJA TIPO DIVAN	un	12,00	$ 777.277,00	$ 9.327.324,00					$ -	$ -
45.01.14	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLOGICO	un	7,00	$ 1.833.850,00	$ 12.836.950,00					$ -	$ -
45.01.15	CAVITRON	un	2,00	$ 1.341.250,00	$ 2.682.500,00					$ -	$ -
45.01.16	CENTRIFUGA	un	2,00	$ 23.125.000,00	$ 46.250.000,00					$ -	$ -
45.01.17	COMPRESOR	un	2,00	$ 1.748.250,00	$ 3.496.500,00					$ -	$ -
45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRIOS	un	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00					$ -	$ -
45.01.19	CONGELADOR DE PILAS	un	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00					$ -	$ -
45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	un	1,00	$ 1.994.311,00	$ 1.994.311,00					$ -	$ -
45.01.21	DESFIBRILADOR	un	4,00	$ 21.321.250,00	$ 85.285.000,00					$ -	$ -
45.01.22	DIGITALIZADOR DE RX	un	1,00	$ 94.350.000,00	$ 94.350.000,00					$ -	$ -
45.01.23	DOPPLER FETAL	un	6,00	$ 1.109.478,00	$ 6.656.868,00					$ -	$ -
45.01.24	ECOGRAFO	un	1,00	$ 91.297.499,00	$ 91.297.499,00					$ -	$ -
45.01.25	ELECTROBISTURI	un	1,00	$ 24.327.500,00	$ 24.327.500,00					$ -	$ -
45.01.26	ELECTROCARDIOGRAFO	un	2,00	$ 4.191.656,00	$ 8.383.312,00					$ -	$ -
45.01.27	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	un	12,00	$ 3.675.034,00	$ 44.100.408,00					$ -	$ -
45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	un	3,00	$ 2.654.750,00	$ 7.964.250,00					$ -	$ -
45.01.29	EQUIPO DE RX FIJO	un	1,00	$ 253.762.650,00	$ 253.762.650,00					$ -	$ -
45.01.30	EQUIPO DE RX PERIAPICAL	un	1,00	$ 12.469.000,00	$ 12.469.000,00					$ -	$ -
45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERISFERICO	un	1,00	$ 17.112.499,00	$ 17.112.499,00					$ -	$ -
45.01.32	FLUJOMETRO SENCILLO	un	38,00	$ 245.125,00	$ 9.314.750,00					$ -	$ -
45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	un	22,00	$ 589.452,00	$ 12.967.944,00					$ -	$ -
45.01.34	FONENDOSCOPIO NEONATAL	un	2,00	$ 203.033,00	$ 406.066,00					$ -	$ -
45.01.35	GLUCOMETRO	un	10,00	$ 235.781,00	$ 2.357.810,00					$ -	$ -
45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	un	1,00	$ 4.608.905,00	$ 4.608.905,00					$ -	$ -
45.01.37	INCUBADORA DE CULTIVOS	un		$ 19.648.388,00	$ -					$ -	$ -
45.01.38	INCUBADORA DE TRANSPORTE	un	1,00	$ 32.240.384,00	$ 32.240.384,00					$ -	$ -
45.01.39	KIT MICROPIPETAS	un	2,00	$ 3.405.721,00	$ 6.811.442,00					$ -	$ -
45.01.40	LAMPARA CIELITICA	un	1,00	$ 47.905.750,00	$ 47.905.750,00					$ -	$ -
45.01.41	LAMPARA CIELITICA MONOSATELITE	un	1,00	$ 32.560.000,00	$ 32.560.000,00					$ -	$ -
45.01.42	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	un	2,00	$ 21.219.500,00	$ 42.439.000,00					$ -	$ -
45.01.43	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	un	12,00	$ 2.747.250,00	$ 32.967.000,00					$ -	$ -
45.01.44	LAMPARA DE FOTOCURADO	un	2,00	$ 314.500,00	$ 629.000,00					$ -	$ -
45.01.45	LARINGOSCOPIO	un	4,00	$ 2.421.650,00	$ 9.686.600,00					$ -	$ -
45.01.46	MAQUINA DE ANESTESIA	un	1,00	$ 44.298.249,00	$ 44.298.249,00					$ -	$ -
45.01.47	MESA DE ATENCION DE PARTO	un	1,00	$ 10.741.119,00	$ 10.741.119,00					$ -	$ -
45.01.48	MESA DE CIRUGIA	un	1,00	$ 38.942.500,00	$ 38.942.500,00					$ -	$ -
45.01.49	MICROSCOPIO	un	1,00	$ 4.023.750,00	$ 4.023.750,00					$ -	$ -
45.01.50	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	un	1,00	$ 24.568.000,00	$ 24.568.000,00					$ -	$ -
45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	un	9,00	$ 6.442.050,00	$ 57.978.450,00					$ -	$ -
45.01.52	MONITOR FETAL	un	1,00	$ 11.889.950,00	$ 11.889.950,00					$ -	$ -
45.01.53	NEBULIZADOR	un	2,00	$ 2.034.999,00	$ 4.069.998,00					$ -	$ -
45.01.54	PESA BEBE	un	4,00	$ 1.113.409,00	$ 4.453.636,00					$ -	$ -
45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	un	4,00	$ 666.000,00	$ 2.664.000,00					$ -	$ -
45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	un	4,00	$ 305.250,00	$ 1.221.000,00					$ -	$ -
45.01.57	PULSOXIMETRO	un	10,00	$ 1.571.871,00	$ 15.718.710,00					$ -	$ -
45.01.58	RADIOVISIOGRAFO	un	1,00	$ 9.055.750,00	$ 9.055.750,00					$ -	$ -
45.01.59	REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS	un	1,00	$ 10.435.110,00	$ 10.435.110,00					$ -	$ -
45.01.60	REFRIGERADOR HORIZONTAL	un	1,00	$ 25.252.499,00	$ 25.252.499,00					$ -	$ -
45.01.61	REFRIGERADOR PARA INSUMOS	un	1,00	$ 7.585.000,00	$ 7.585.000,00					$ -	$ -
45.01.62	REFRIGERADOR REACTIVOS	un	1,00	$ 10.435.110,00	$ 10.435.110,00					$ -	$ -
45.01.63	RX PORTATIL DIGITAL	un	1,00	$ 297.850.000,00	$ 297.850.000,00					$ -	$ -
45.01.64	SIERRA CORTA YESO	un	1,00	$ 3.200.500,00	$ 3.200.500,00					$ -	$ -

45.01.65	SILLA DE RUEDA ADULTO	un	6,00	$ 572.390,00	$ 3.434.340,00					$ -	$ -		
45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	un	6,00	$ 1.210.825,00	$ 7.264.950,00					$ -	$ -		
45.01.67	SUCCIONADOR	un	4,00	$ 1.137.750,00	$ 4.551.000,00					$ -	$ -		
45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE	un	5,00	$ 2.377.455,00	$ 11.887.275,00					$ -	$ -		
45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	un	14,00	$ 1.257.497,00	$ 17.604.958,00					$ -	$ -		
45.01.70	TERMOHIGROMETRO	un	4,00	$ 248.881,00	$ 995.524,00					$ -	$ -		
45.01.71	TERMOMETRO NEONATAL	un	1,00	$ 226.091,00	$ 226.091,00					$ -	$ -		
45.01.72	TERMOS DE VACUNA	un	1,00	$ 1.692.750,00	$ 1.692.750,00					$ -	$ -		
45.01.73	UNIDAD ODONTOLOGICA	un	2,00	$ 10.864.403,00	$ 21.728.806,00					$ -	$ -		
45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	un	1,00	$ 6.287.484,00	$ 6.287.484,00					$ -	$ -		
45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	un	1,00	$ 17.806.250,00	$ 17.806.250,00					$ -	$ -		
45.01.76	HORNO DE SECADO	un	1,00	$ 19.648.388,00	$ 19.648.388,00					$ -	$ -		
45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	un	1,00	$ 2.421.650,00	$ 2.421.650,00					$ -	$ -		
45.01.78	PULSOXIMETRO NEONATAL	un	1,00	$ 1.571.871,00	$ 1.571.871,00					$ -	$ -		
45.01.79	REGULADOR DE VACIO	un	33,00	$ 1.341.250,00	$ 44.261.250,00					$ -	$ -		
45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	un	1,00	$ 12.829.750,00	$ 12.829.750,00					$ -	$ -		
45.01.81	EQUIPO TENS	un	1,00	$ 2.044.250,00	$ 2.044.250,00					$ -	$ -		
					$ 2.183.119.592,00								
46.00.00	**MOBILIARIO MEDICO**												
46.00.01	ATRIL PORTA BOMBA	un	17,00	$ 629.000,00	$ 10.693.000,00					$ -	$ -		
46.00.02	BALON TERAPEUTICO	un	4,00	$ 203.500,00	$ 814.000,00					$ -	$ -		
46.00.03	BARRAS PARALELAS	un	1,00	$ 595.237,00	$ 595.237,00					$ -	$ -		
46.00.04	BICICLETA FIJA	un	1,00	$ 2.034.999,00	$ 2.034.999,00					$ -	$ -		
46.00.05	BIOMBO	un	16,00	$ 407.000,00	$ 6.512.000,00					$ -	$ -		
46.00.06	CAMINADORA ELECTRICA	un	1,00	$ 4.070.000,00	$ 4.070.000,00					$ -	$ -		
46.00.07	CARRO DE MEDICAMENTOS	un	2,00	$ 3.459.500,00	$ 6.919.000,00					$ -	$ -		
46.00.08	CARRO DE PARO	un	4,00	$ 2.575.755,00	$ 10.303.020,00					$ -	$ -		
46.00.09	CARRO DE YESOS	un	1,00	$ 1.230.250,00	$ 1.230.250,00					$ -	$ -		
46.00.10	CARRO TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO	un	11,00	$ 550.375,00	$ 6.054.125,00					$ -	$ -		
46.00.11	CONGELADOR DE PLACENTA	un	1,00	$ 8.907.269,00	$ 8.907.269,00					$ -	$ -		
46.00.12	DUCHA LAVAOJOS	un	1,00	$ 1.942.500,00	$ 1.942.500,00					$ -	$ -		
46.00.13	ESCALERILLA DE DOS PASOS	un	42,00	$ 118.862,00	$ 4.992.204,00					$ -	$ -		
46.00.14	ESTERILIZADOR DE TETEROS	un	1,00	$ 777.000,00	$ 777.000,00					$ -	$ -		
46.00.15	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	un	2,00	$ 723.350,00	$ 1.446.700,00					$ -	$ -		
46.00.16	KIT DE PROTECCION RADIOLOGICA	un	2,00	$ 2.964.625,00	$ 5.929.250,00					$ -	$ -		
46.00.17	MESA AUXILIAR	un	32,00	$ 555.000,00	$ 17.760.000,00					$ -	$ -		
46.00.18	MESA DE AUTOPSIA	un	1,00	$ 6.475.000,00	$ 6.475.000,00					$ -	$ -		
46.00.19	MESA DE INSTRUMENTAL	un	7,00	$ 1.424.500,00	$ 9.971.500,00					$ -	$ -		
46.00.20	MESA DE MAYO	un	10,00	$ 231.250,00	$ 2.312.500,00					$ -	$ -		
46.00.21	MESA DE NOCHE	un	25,00	$ 878.750,00	$ 21.968.750,00					$ -	$ -		
46.00.22	MESA PUENTE	un	18,00	$ 388.500,00	$ 6.993.000,00					$ -	$ -		
46.00.23	NEGATOSCOPIO	un	6,00	$ 349.650,00	$ 2.097.900,00					$ -	$ -		
46.00.24	NEVERA CAVA	un	1,00	$ 13.986.000,00	$ 13.986.000,00					$ -	$ -		
46.00.25	NEVERA TETEROS	un	1,00	$ 7.585.000,00	$ 7.585.000,00					$ -	$ -		
46.00.26	PATO COPROLOGICO	un	30,00	$ 111.000,00	$ 3.330.000,00					$ -	$ -		
46.00.27	PESA PAÑAL	un	1,00	$ 1.683.500,00	$ 1.683.500,00					$ -	$ -		
46.00.28	PISINGO ADULTO	un	20,00	$ 78.625,00	$ 1.572.500,00					$ -	$ -		
46.00.29	RIÑONERA	un	22,00	$ 44.400,00	$ 976.800,00					$ -	$ -		
46.00.30	RUEDA DE HOMBRO	un	1,00	$ 559.625,00	$ 559.625,00					$ -	$ -		
46.00.31	SILLA RECLINABLE	un	5,00	$ 1.655.750,00	$ 8.278.750,00					$ -	$ -		
46.00.32	TERMOHIGROMETRO	un	1,00	$ 245.277,00	$ 245.277,00					$ -	$ -		
					$ 179.016.656,00								
					$ 2.362.136.248,00								
				COSTOS DIRECTOS					**$ 13.210.413.214,00**	**$ 360.795.259,00**	**$ 13.571.208.473,00**		
				AUI (___%)	**$ -**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		**36,50%**
				COSTO TOTAL	**$ 37.181.393.077,00**					**$ 360.795.259,00**	**$ 13.571.208.473,00**		

INVERSIÓN EN OBRA			**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 25.950.631.075,00	69,79%	MANO DE OBRA CALIFICADA:	11

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**			**CÓDIGO**	**FSI-800-023**
				VERSION	**1**

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 13.571.208.473,00	36,00%	MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	34
AVANCE O ATRASO DE OBRA EN %:	**33,79%**		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	18
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**63**

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

4.1.1 Esquemas avance físico de obra

Preliminares

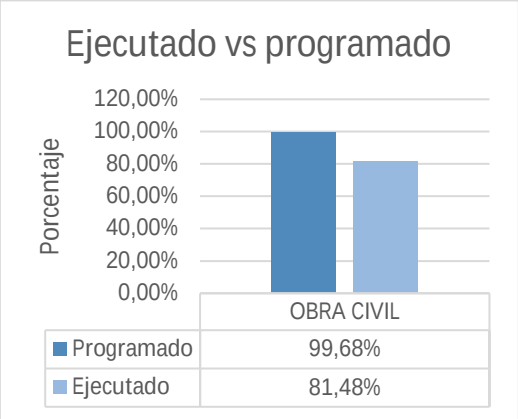


Gráfico 1 Porcentaje ejecución preliminares

Cimentaciones

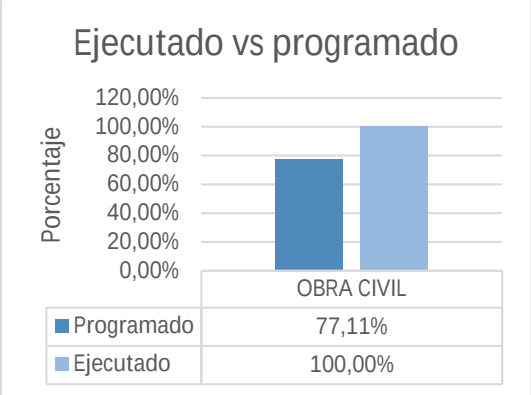


Gráfico 2 Porcentaje ejecución cimentaciones

Estructura

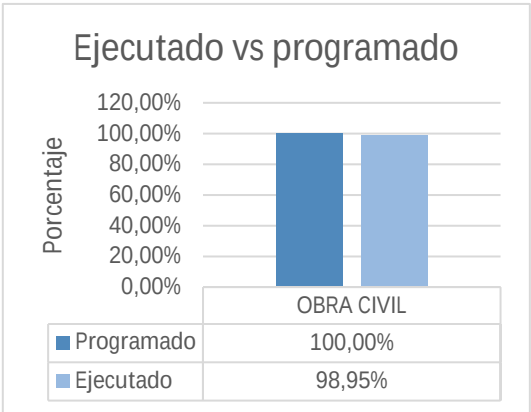


Gráfico 3 Porcentaje ejecución estructura

Mampostería

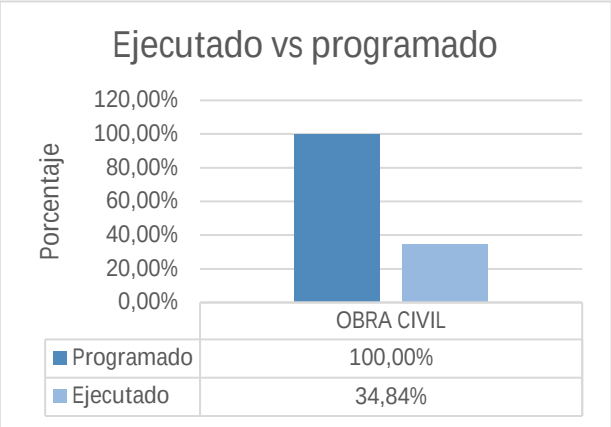


Gráfico 4 Porcentaje ejecución mampostería

Elementos de fachada - envolvente

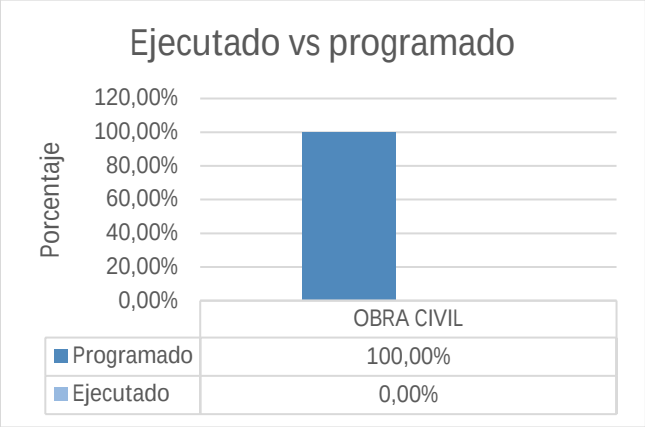


Gráfico 5 Porcentaje ejecución elementos fachada

Pañetes

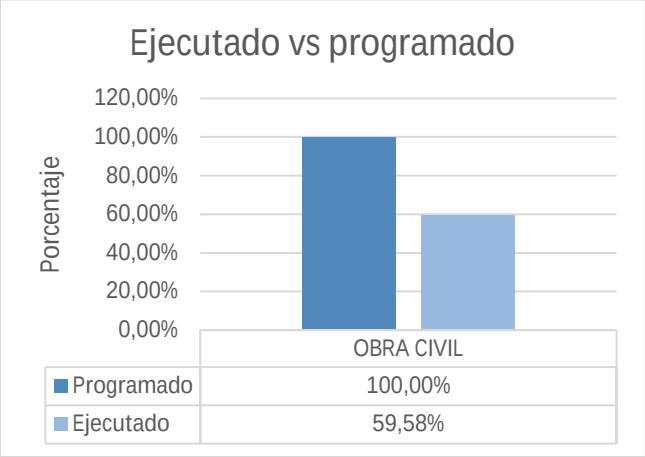


Gráfico 6 Porcentaje ejecución pañetes

Cubierta

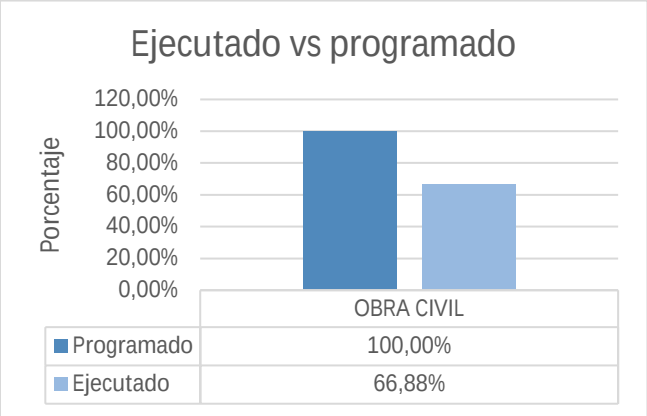


Gráfico 7 Porcentaje ejecución cubierta

Impermeabilizaciones

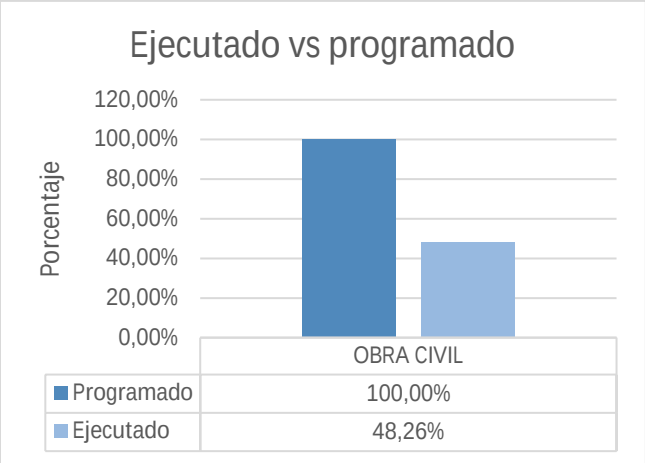


Gráfico 8 Porcentaje ejecución impermeabilizaciones

Cielo raso

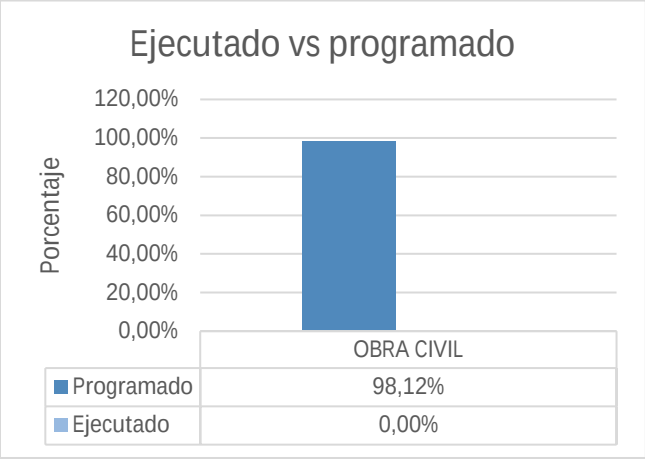


Gráfico 9 Porcentaje ejecución cielo raso

Pisos y guarda escobas

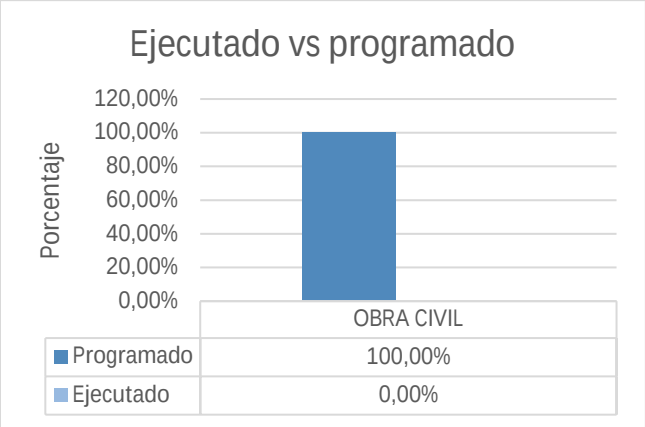


Gráfico 10 Porcentaje ejecución pisos

Enchape muros

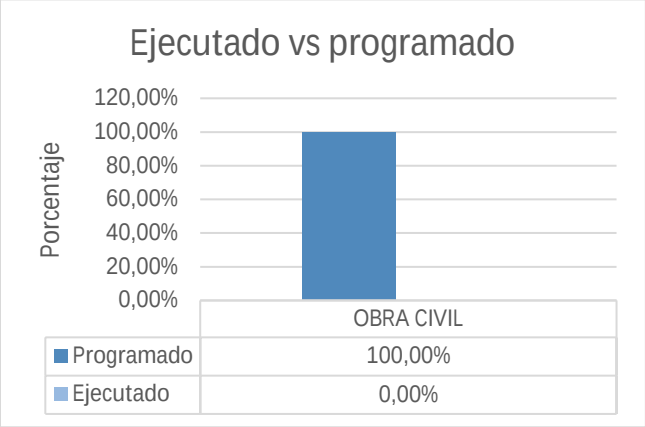


Gráfico 11 Porcentaje ejecución enchape muros

Instalaciones hidrosanitarias

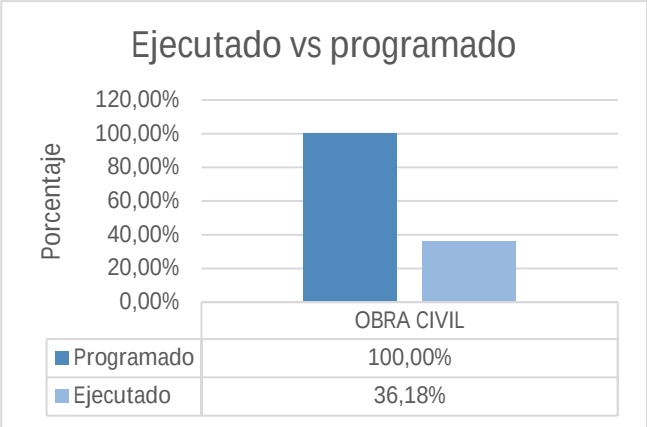


Gráfico 12 Porcentaje ejecución inst. hidrosanitarias

Red contra incendio

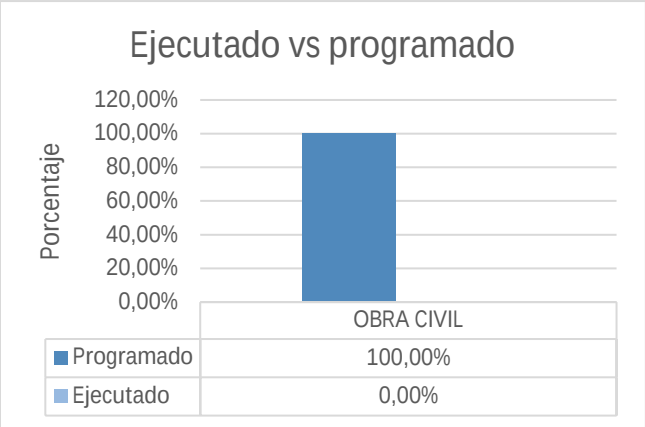


Gráfico 13 Porcentaje ejecución red contra incendio

Instalaciones gas natural

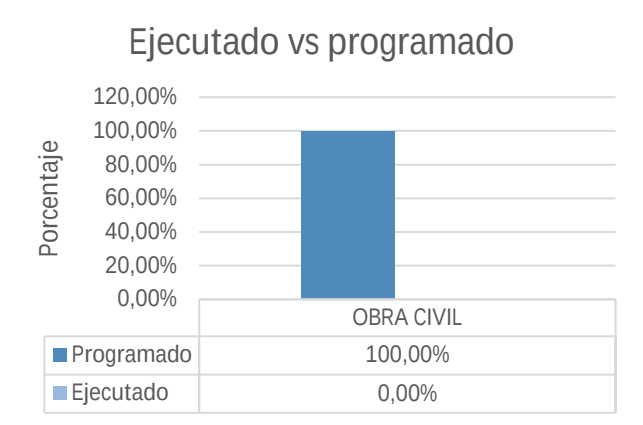


Gráfico 14 Porcentaje ejecución gas natural

Instalaciones gases medicinales

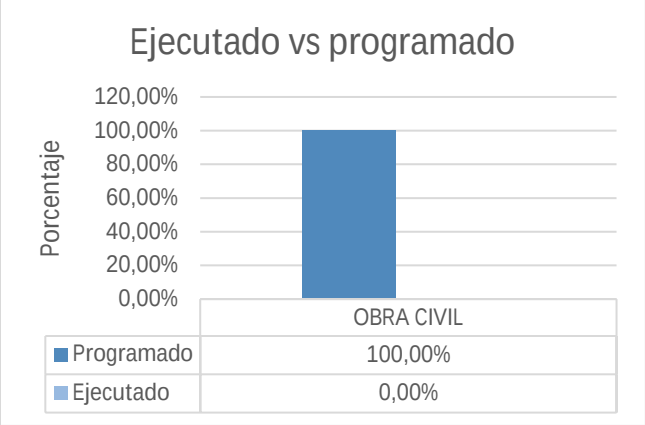


Gráfico 15 Porcentaje ejecución gases medicinales

Instalaciones eléctricas

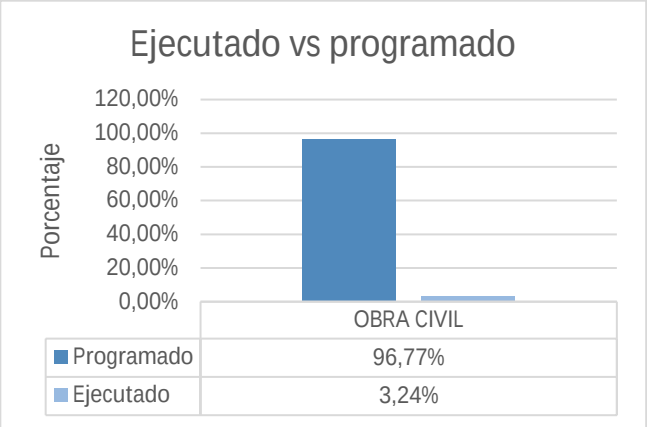


Gráfico 16 Porcentaje ejecución inst. eléctricas

Instalaciones iluminación

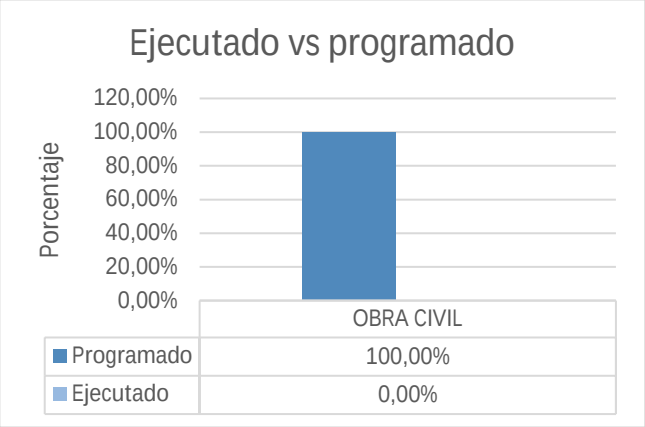


Gráfico 17 Porcentaje ejecución Inst. iluminación

Instalaciones voz y datos

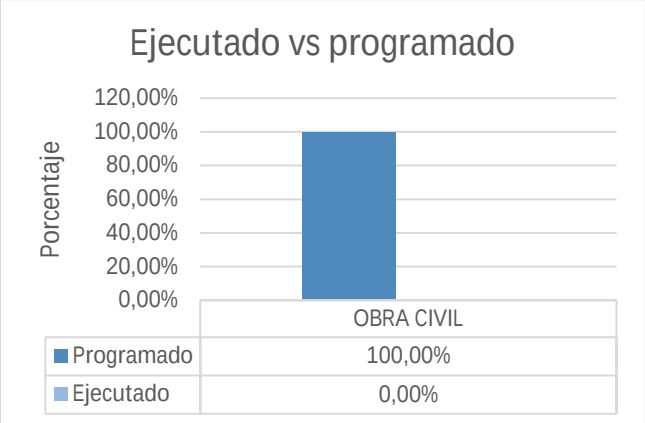


Gráfico 18 Porcentaje ejecución voz y datos

Instalaciones seguridad y control

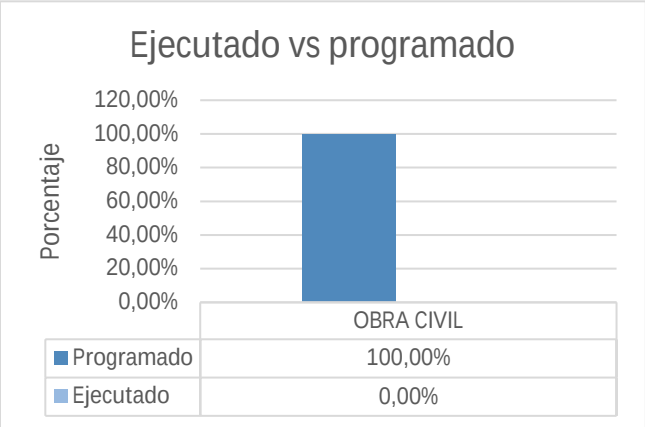


Gráfico 19 Porcentaje ejecución seguridad y control

Instalaciones equipos de aire acondicionado

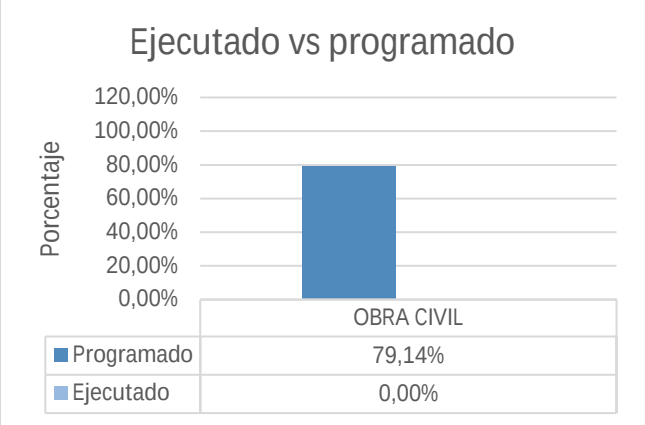


Gráfico 20 Porcentaje ejecución aire acondicionado

Aparatos sanitarios

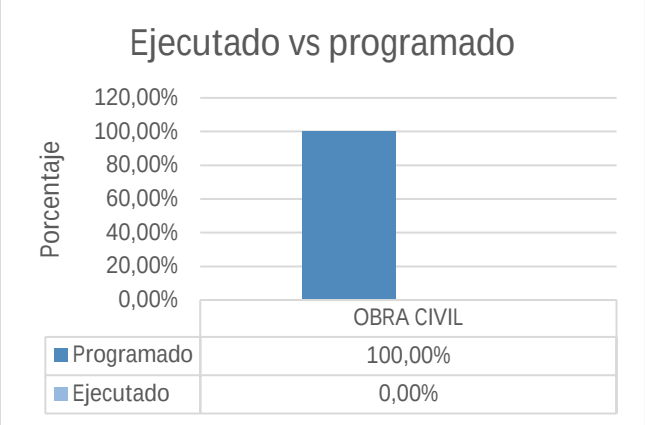


Gráfico 21 Porcentaje ejecución aparatos sanitarios

Carpintería madera

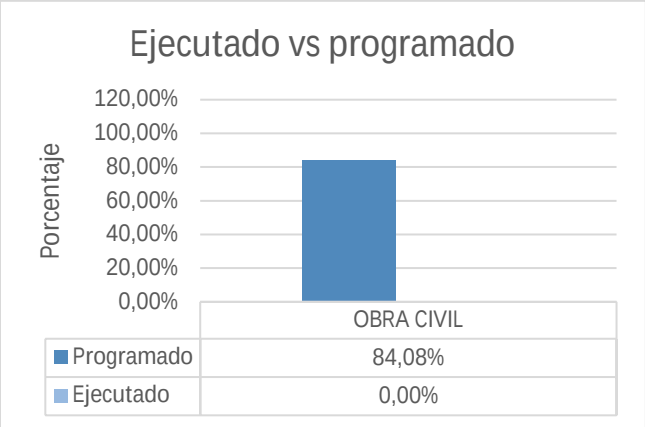


Gráfico 22 Porcentaje ejecución carpintería madera

Carpintería metálica

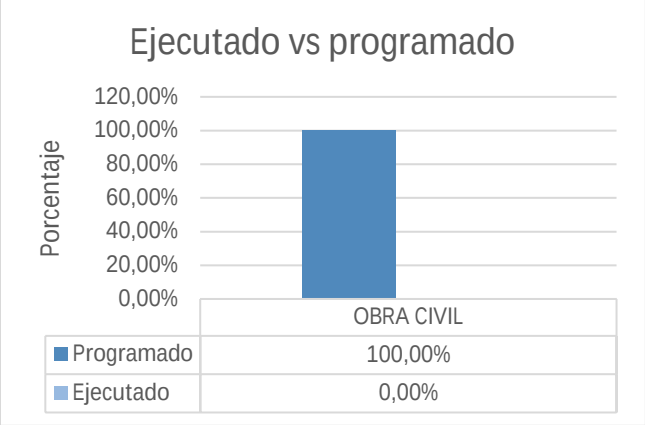


Gráfico 23 Porcentaje ejecución carpintería metálica

Carpintería aluminio

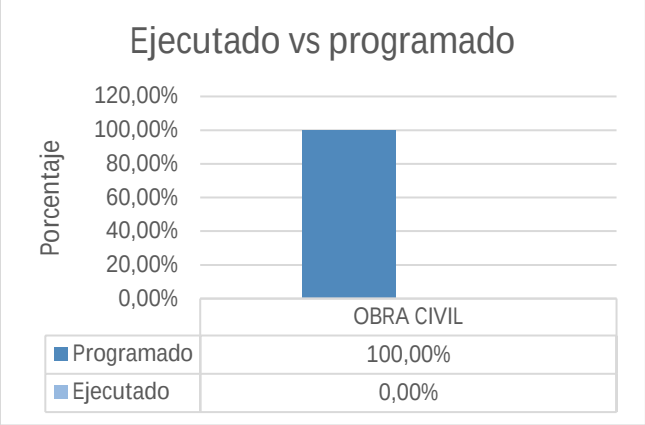


Gráfico 24 Porcentaje ejecución carpintería aluminio

Carpintería acero inoxidable

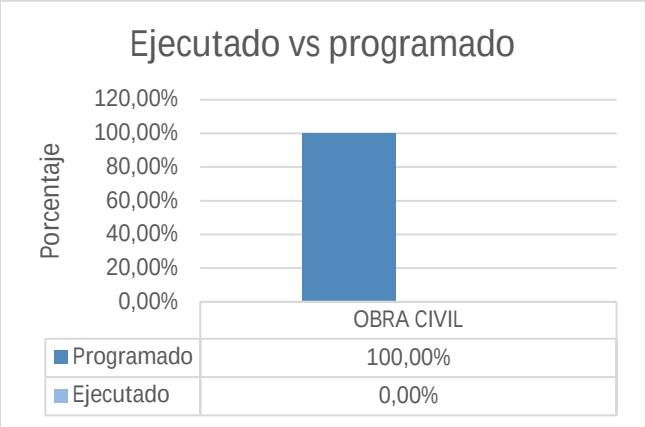


Gráfico 25 Porcentaje ejecución carpintería acero

Cerrajería

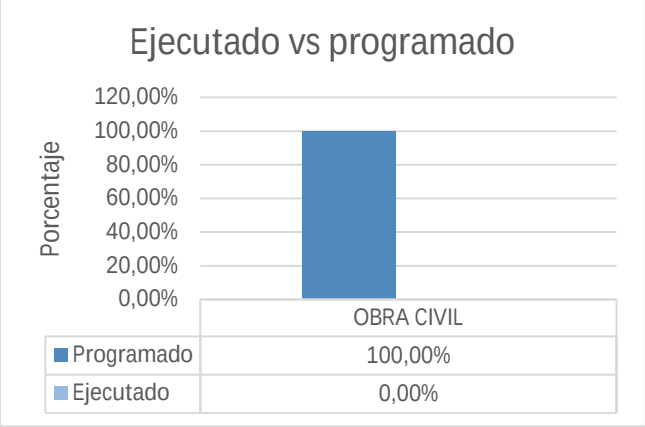


Gráfico 26 Porcentaje ejecución cerrajería

Vidrios y espejos

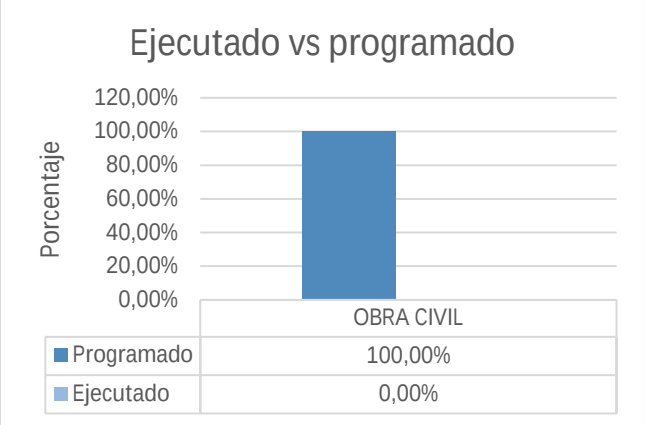


Gráfico 27 Porcentaje ejecución vidrios y espejos

Pintura

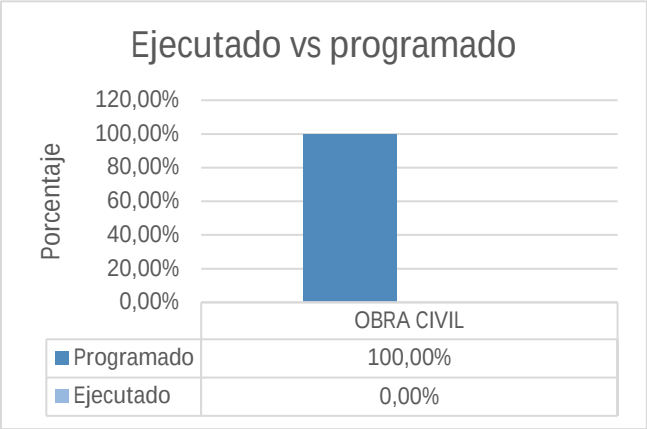


Gráfico 28 Porcentaje ejecución pintura

Línea institucional hospitalaria

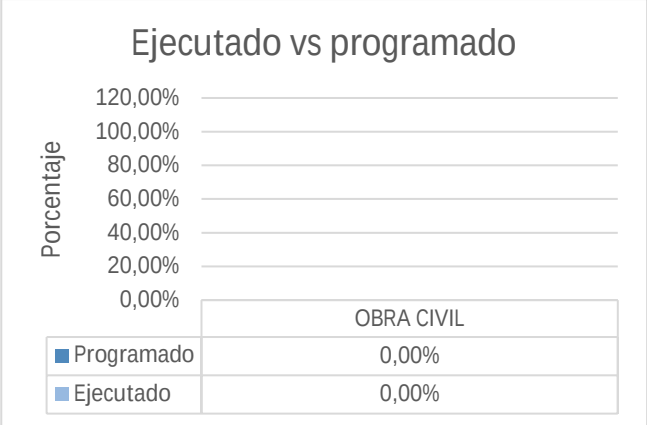


Gráfico 29 Porcentaje línea institucional hospitalaria

Aseo

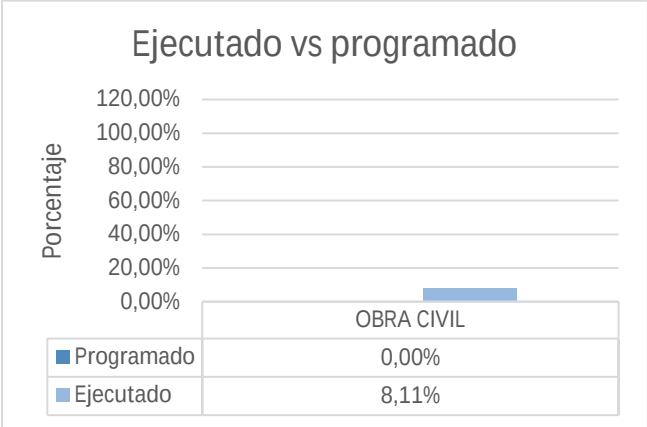


Gráfico 30 Porcentaje ejecución aseo

Vías urbanismo interno

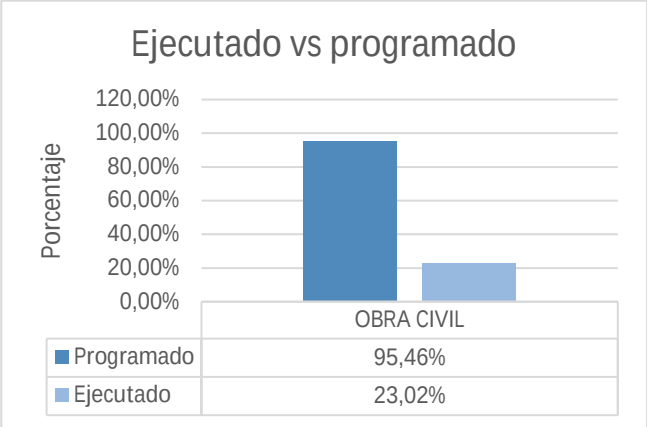


Gráfico 31 Porcentaje ejecución vías urbanismo interno

Andenes urbanismo interno

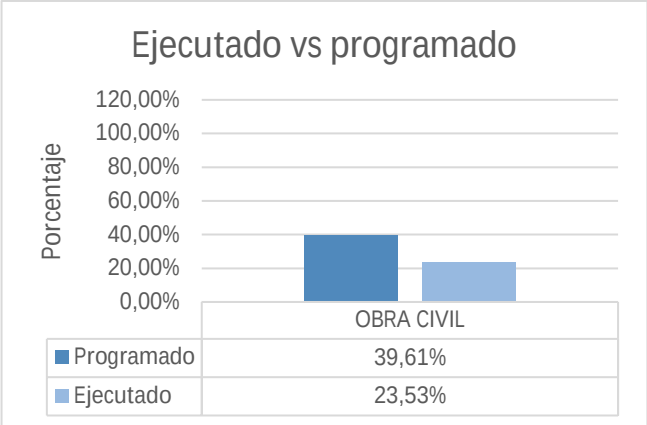


Gráfico 32 Porcentaje ejecución andenes - internos

Mobiliario urbanismo interno

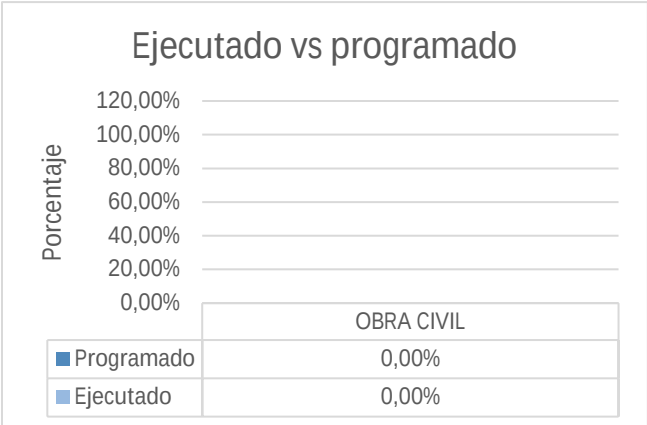


Gráfico 33 Porcentaje ejecución mobiliario - interno

Edificaciones exteriores

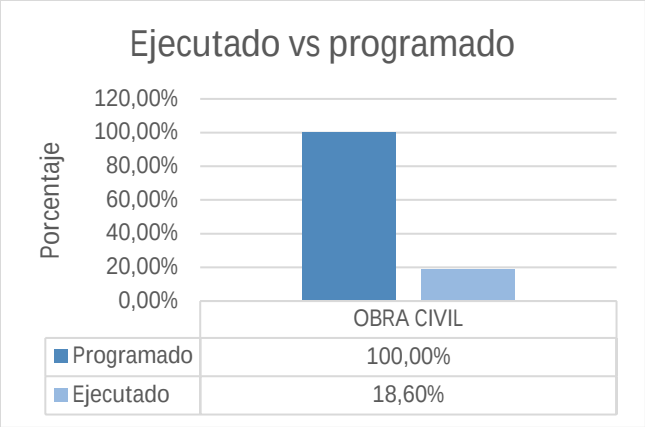


Gráfico 34 Porcentaje ejecución edificaciones exteriores

Rampa peatonal – urbanismo interno

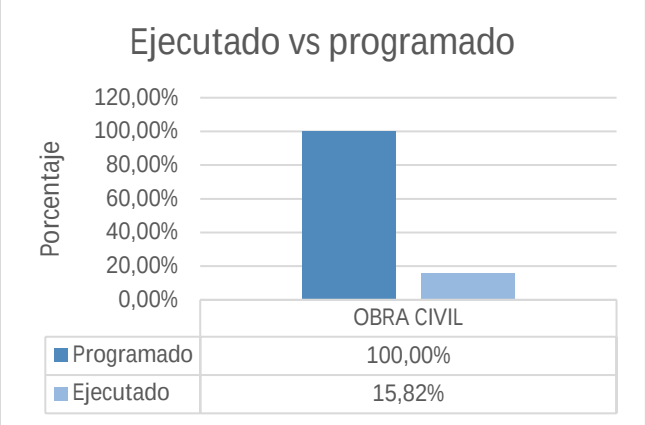


Gráfico 35 Porcentaje ejecución rampa peatonal

Andenes - externo

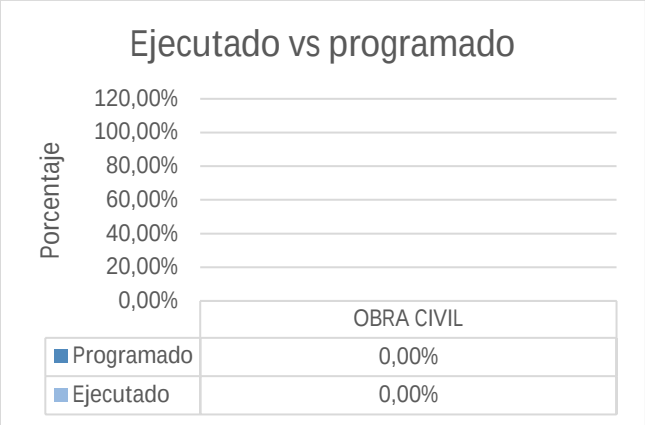


Gráfico 36 Porcentaje ejecución andenes externo

Cerramiento - externo

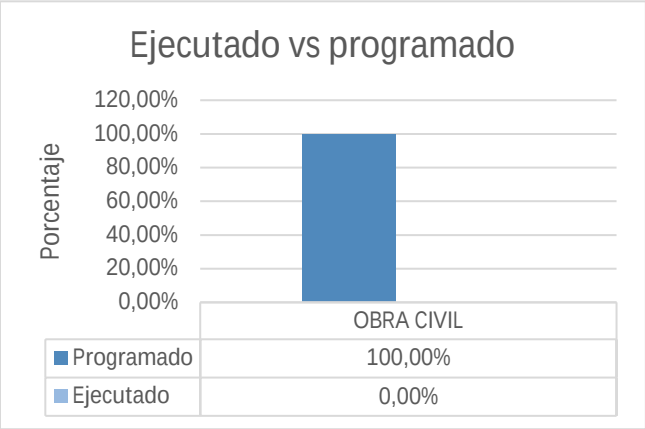


Gráfico 37 Porcentaje ejecución cerramiento

Las gráficas anteriores fueron realizadas teniendo en cuenta las cantidades registradas en la reprogramación de obra que hace parte de la modificación No. 1 (adición de obra).

4.2 Seguimiento Programa de Obra.

Durante el presente periodo no se ha registrado reporte de cantidades de obra ejecutadas, razón por la cual el porcentaje de avance físico acumulado se mantiene invariable respecto al mes anterior. Es importante aclarar que esta situación no implica una suspensión de las actividades constructivas en el frente de obra, sino que obedece a que las labores desarrolladas no han alcanzado un nivel de ejecución que permita su medición, certificación o contabilización, así como a la ejecución de actividades para corregir observaciones hechas por la interventoría.

De igual manera, se evidenció una reducción significativa en el volumen de personal presente en obra, lo cual ha repercutido negativamente en el ritmo de ejecución de las actividades programadas. Esto se suma a que la fecha no se ha implementado aun el plan de contingencia solicitado; cabe señalar que el contratista ha remitido documentos relacionados con dicho plan de contingencia; sin embargo, estos presentan inconsistencias técnicas y administrativas que impiden su aprobación por parte de la interventoría. Hasta tanto no se subsanen dichas observaciones, no será posible dar viabilidad al plan propuesto ni adoptar medidas efectivas de mitigación frente a los atrasos identificados.

Durante este periodo se continúan ejecutando las siguientes actividades: m-18 muro bloque no. 20, e=0.20, m-19: muro ladrillo prensado liviano con todas las celdas rellenas e= 0.12, m-20 muro gran formato e= 0.115 mts, columneta confinamiento elementos no estructurales, concreto 21 mpa, anclaje varilla ø 5/8, atraque para mediacañas estructura muros livianos.

Para este periodo de acuerdo con la reprogramación de obra se tenía previsto un porcentaje de avance general acumulado equivalente al 77.44%, la ejecución reportada corresponde a un 36,50%. Lo que representa un atraso equivalente al 40.94%.

COMPONENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
OBRA CIVIL	92.73%	44.00%
EQUIPOS	0,00%	0,00%
AMUEBLAMIENTO	0,00%	0,00%
EQUIPOS MEDICOS	0,00%	0,00%

Tabla 15 Porcentaje de avance obra

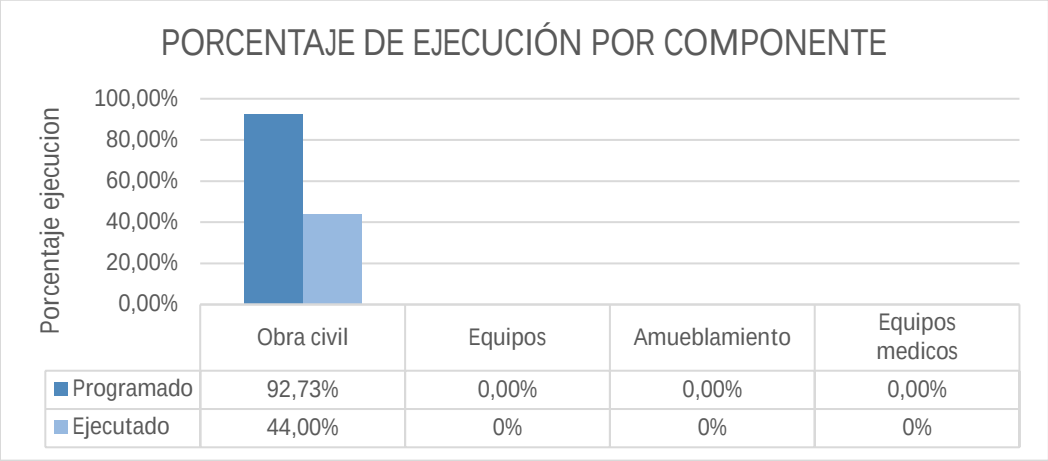


Gráfico 38 Porcentaje por componente de acuerdo con reprogramación

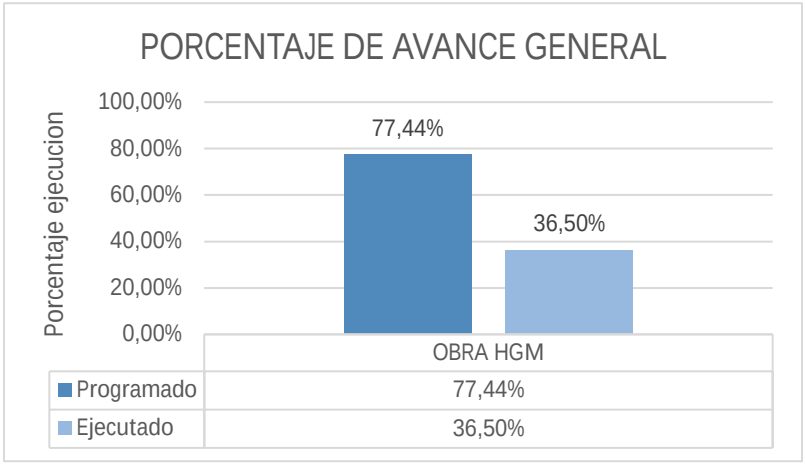


Gráfico 39 Porcentaje general de ejecución

FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL ATRASO

- **Restricciones de transporte y festividades:** en los meses de diciembre y enero, el contratista reporto dificultades logísticas como consecuencia de las festividades navideñas, durante las cuales se debieron suspender las actividades principales en obra, de conformidad a las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014, ha dispuesto la restricción de circulación para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas (3400 kilogramos) en la red vial nacional, emitidas por el Ministerio de Transporte, situación que fue notificada mediante el oficio OFC-058-INTERHOSPITAL-2024 del 19 de diciembre del 2024.
- **Cronograma de actividades**: durante el mes de febrero el atraso en la obra persistió, Por tal motivo, mediante el oficio **OFC-070-INTERHOSPITAL-2024** del 19 de febrero, se solicitó al contratista revisar el cronograma de obra y analizar las causas del las situaciones que estaban generado retrasos en la ejecución, pues según el cronograma vigente, debían estar en ejecución los capítulos **21.00.00 al 25.00.00**, relacionados con la instalación de aparatos sanitarios y trabajos de carpintería en madera, metálica, aluminio y acero. No obstante, dichas actividades no se pudieron ejecutar por condiciones evidentes del proyecto, esta solicitud fue reiterada el 4 de marzo durante una reunión de seguimiento con las veedurías y la Personería del municipio de Coveñas, así como durante comités técnicos realizados. Adicionalmente, mediante el oficio **OFC-086-INTERHOSPITAL-2024** del 25 de marzo, se solicitó al contratista un informe técnico detallado con el análisis de los factores que han generado el atraso, así como la presentación de un **Plan de Contingencia**.
- **Inconvenientes con diseños:** uno de los factores estructurales más relevantes en el atraso tiene que ver con las inconsistencias o falta de diseños de componentes claves, como es el caso del sistema HVAC (climatización y ventilación) y el sistema manejo de aguas residuales o, siendo el primero más complejo de acuerdo con lo manifestado por el contratista en el oficio HGM120325-47, en el cual señala una serie de inconsistencias en el diseño de redes de aire acondicionado y ventilación mecánica, las cuales deben cumplir con la normativa ASHRAE 170-2013 y el Anexo General RETSIT (Resolución 40773 de 29 de diciembre de 2023). A continuación, se resumen las principales observaciones técnicas:

- **Bloque 1** El piso 1 alberga áreas clave como almacenamiento, taller, cuarto CCV, cuarto de racks, sala de autopsias y depósitos de cadáveres, con consideraciones importantes de clima y ventilación.

  Áreas sin aire acondicionado: Espacios como el cuarto CCV y almacenamiento carecen de climatización, lo que podría afectar equipos e insumos sensibles.

  Contaminación en la morgue: La sala de autopsias y el depósito de cadáveres no están completamente aislados, lo que podría generar contaminación cruzada. El piso 2 incluye áreas críticas como quirófanos, salas de recuperación y salas de parto, que requieren estrictos controles de ventilación y aire acondicionado.

  Sistema de aire compartido: Un único sistema de aire para todas las áreas críticas no cumple con la normativa ASHRAE 170-2013, que exige sistemas independientes.

  Cumplimiento normativo: Los quirófanos y salas de parto deben contar con filtración HEPA, control de temperatura (18°C-24°C), renovación de aire cada 4 horas, difusores de flujo laminar y lámparas UV para cumplir con los estándares.
- **Bloque 2** Este bloque incluye las áreas de farmacia y radiología.

  Sistema VRF compartido: El sistema propuesto para el laboratorio y farmacia no separa los ambientes de trabajo según la normativa ASHRA.

  Los laboratorios deben tener un flujo de aire adecuado para eliminar contaminantes, con un sistema de ventilación diseñado para evacuar adecuadamente el aire contaminado.

  La zona de hospitalización cuenta con un equipo compartido con otras áreas lo cual no cumple con la normatividad de ventilación mecánica en clínica y hospitales tales como: la mezcla de los flujos de aire acondicionado, y extracción de la misma.
- **Aislamiento de áreas específicas:** Las habitaciones de aislamiento para pacientes con enfermedades transmisibles deben contar con presión negativa para evitar la propagación de contaminantes a otras áreas del hospital. Además, deben estar equipadas con sistemas de filtración adicionales.
- **Áreas comunes y pasillos:** Los pasillos y áreas comunes deben tener un flujo adecuado de aire, sin comprometer la calidad del aire en las habitaciones. La ventilación de estos espacios debe ser suficiente para evitar la acumulación de contaminantes.

- **Bloque 3** Cuenta con un sistema VRF para administración, auditorio, consultorios y odontología, con unidades FANCOIL de pared y ductales. Sin embargo, este sistema de redes no es suficiente para cubrir toda el área, incluyendo el parque de coworking en la zona administrativa.

  El sistema de redes de los edificios está compuesto de la siguiente manera: red de aguas lluvias o residuales dependiendo del piso, red de aire acondicionado y ventilación, red contra incendio, red de agua, red eléctrica y red de gases medicinales, por lo que las inconsistencias en el diseño han imposibilitado el avance de obras complementarias, como instalaciones eléctricas, redes de gases medicinales y cielorrasos, las cuales dependen de la ubicación definitiva de equipos HVAC y sus ductos.

Acciones adoptadas por la interventoría:

Este atraso en la ejecución ha sido objeto de múltiples solicitudes por parte de la interventoría para que el contratista cumpla con el cronograma de ejecución y acelere los avances en la obra. Las siguientes solicitudes de intervención han sido presentadas al contratista en distintas ocasiones:

- El 19 de febrero de 2025, mediante oficio OFC-070-INTERHOSPITAL-2024, se solicitó al contratista la revisión de la programación de la obra, considerando que para este periodo contemplaba la ejecución de actividades correspondientes a los capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00 y 25.00.00, las cuales no podían aun ejecutarse, representando aproximadamente el 4% del valor programado, dicha solicitud fue reiterada el 4 marzo en reunión de seguimiento con las veedurías y la Personería Municipio de Coveñas.
- El día 5 de marzo, mediante el oficio OFC-072-INTERHOSPITAL-2024, se convocó comité técnico para revisar el tema de mayores cantidades de obra y las inconsistencias en la programación.
- El 13 de marzo, mediante oficio HGM120325-48, el contratista radicó el documento de reprogramación, orientado a priorizar actividades independientes de las mencionadas anteriormente. Entre ellas, destacan los trabajos de

urbanismo y la adecuación de zonas exteriores. Dicho documento fue revisado y avalado por la interventoría.

- El 25 de marzo, mediante oficio OFC-086-INTERHOSPITAL-2024, se solicito al contratista la presentación de un informe donde se especifiquen los factores que han generado el atraso de la obra, así mismo se solicitó formalmente la presentación de un plan de contingencia para mitigar el impacto del atraso en la obra.
- El 27 de marzo, mediante oficio OFC-091-INTERHOSPITAL-2024, ante la evidente falta de personal en la obra la interventoría solicito la incorporación urgente de personal para reactivar los tres frentes de obra.
- El 31 de marzo, a través del oficio OFC-094-INTERHOSPITAL-2024, los compromisos adquiridos en el desarrollo del comité técnico realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social el día 27 de marzo de 2025, correspondientes a la entrega de: Plan de contingencia: Fecha máxima de entrega, 02 de abril de 2025 y Ajustes y/o optimización sistema HVAC: Fecha máxima de entrega, 10 de abril de 2025.
- El 15 de abril, a través del oficio OFC-097-INTERHOSPITAL-2024, se reiteraron los compromisos adquiridos durante el comité técnico del 27 de marzo de 2025 en el Ministerio de Salud y Protección Social.
- El 21 de abril, a través del oficio OFC-100-INTERHOSPITAL-2024, con el fin de garantizar la adecuada implementación y cumplimiento del plan de contingencia presentado mediante oficio HGM24052024-65, se solicitó al contratista la entrega semanal del formato de informe F-IH001, con el fin de que se reporten específicamente las actividades y cantidades ejecutadas durante el trascurso de la semana y el personal que laboro en obra. Es importante aclarar que dicho plan pese a ser entregado a la interventoría y este a su vez remitido a la Gobernación, no se ha puesto en marcha toda vez que la programación de obra y flujo de caja de el mismo fue entregada el día de ayer 6 de abril de 2025, mediante correo

electrónico recibido a las 10:14 pm, razón por la cual tampoco ha sido revisado por la interventoría.

- Adicionalmente, se ha requerido verbalmente la entrega actualizada de la reprogramación de obra y del flujo de fondos, los cuales resultan ser insumos fundamentales para la aprobación por parte de la Gobernación y el posterior seguimiento del plan de contingencia propuesto.
- El 23 de abril, a través del oficio OFC-105-INTERHOSPITAL-2024, tras una revisión preliminar de los documentos entregados por el contratista el 18 de abril con el oficio HGM24052024-66, se realizaron las siguientes observaciones: No se especifica si las modificaciones al sistema HVAC afectan otras redes y diseños existentes, no se incluyen las especificaciones técnicas detalladas de cada ítem y por ultimo no se presenta el presupuesto correspondiente, ni memoria de cantidades y análisis de precios del sistema propuesto, situación que impidió realizar una evaluación integral del proyecto y dar cumplimiento al compromiso de revisión asumido por la interventoría. Para ello se dio un plazo de 3 días calendario.
- El 5 de mayo, a través del oficio OFC-111-INTERHOSPITAL-2024, la interventoría reitero la solicitud enviada el 23 de abril de 2025 mediante el oficio OFC-105-INTERHOSPITAL-2024, solicitando en un plazo de un día la entrega de la información antes solicitada.
- El día 8 de mayo, a atreves del oficio OFC-115-INTERHOSPITAL-2024, la interventoría recomendó a la entidad dar inicio al **procedimiento administrativo correspondiente por presunto incumplimiento contractual,** en cumplimiento de lo dispuesto en la **Cláusula 15 del Contrato (MULTAS)** y la normativa aplicable en la **Ley 80 de 1993** y el **Decreto 1082 de 2015,** con el fin de **imponer las sanciones correspondientes** por los retrasos ya mencionados.
- Solicitud que fue reiterada por la interventoría pese a la objeción presentada por el contratista mediante el oficio OFC-123-INTERHOSPITAL-2024 del 28 de mayo, a la fecha se está a la espera de las acciones tomadas por la Gobernación al respecto.

4.2.1 Seguimiento Programa de Inversiones.

De acuerdo con el seguimiento que la Interventoría realiza a las actividades ejecutadas vs las programadas en el periodo, el porcentaje acumulado de obra de 36.5% respecto al 77.44% programado, lo que representa un atraso en la inversión equivalente a $ 15.220.572.518,00.

AVANCE PRESUPUESTAL		
COMPONENTE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
OBRA CIVIL	$ 28.791.780.991,00	$ 13.571.208.473,00
EQUIPOS	$ 0,00	$ 0,00
AMUEBLAMIENTO	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS MEDICOS	$ 0,00	$ 0,00

Tabla 16 Avance presupuestal

AVANCE PLAZO EJECUCION	
MES	**% TIEMPO TRANSCURRIDO**
1 (junio 2024)	5.55%
2 (Julio 2024)	5.55%
3 (agosto 2024)	5.55%
4 (septiembre 2024)	5.55%
5 (octubre 2024)	5.55%
6 (noviembre 2024)	5.55%
7 (diciembre 2024)	5.55%
8 (enero 2025)	5.55%
9 (febrero 2025)	5.55%
10 (marzo 2025)	5.55%
11 (abril 2025)	5.55%
12 (mayo 2025)	5.55%
% ACUMULADO	**66.65%**

Tabla 17 Avance tiempo

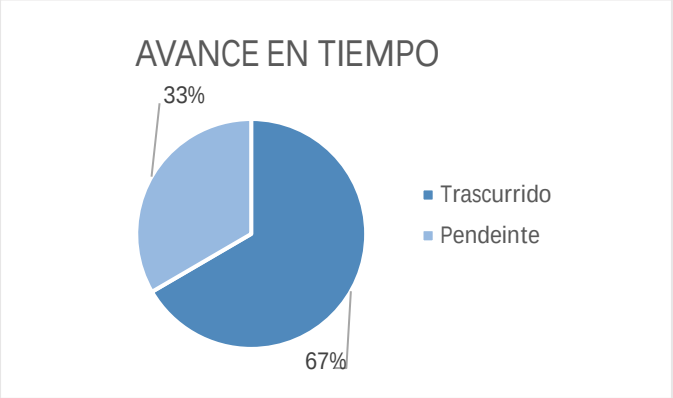


Gráfico 40 Avance en tiempo

Se anexa copia del Programa de Inversiones aprobado (Formato FSI-800-014) y copia del documento de seguimiento al Programa de Obra e Inversiones realizado por la Interventoría. (Formato FSI-800-015).

4.3 Reportes de obra

4.3.1 Informe quincenal

Se adjuntan de los informes quincenales de interventoría gestionados en el mes, firmados por el director de interventoría, Formato FSI-800-002.

4.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra.

En el cuadro a continuación se relaciona el equipo o maquinaria mínimo con que debe contar el contratista de obra durante la ejecución del contrato y cuales estuvieron durante este periodo.

EQUIPO	DESCRIPCION	EN SITIO
Volquetas	Daewoo 15 m3/ Mack 20 ton.	NO
Retroexcavadora	Marca Caterpillar/modelo 416f2 /65Kw – 87 hp	NO
Herramienta menor	N/A	NO
Equipo de topografía	Estación Total Marca Topcon	NO
Compactador tipo canguro	N/A	SI
Minicargador	New Holland / Línea L220 Loader	NO
Minicargador	Case	NO
Mezcladora de concreto	1 Bulto	NO
Motobomba sumergible	N/A	SI
Motobomba	N/A	NO
Motoniveladora	N/A	NO
Compactador tipo rana	N/A	SI
Carrotanque	N/A	NO
Bulldozer	N/A	NO
Vibrador de concreto	N/A	SI
Equipo de soldadura	N/A	SI
Tronzadora (Disco de cortar)	N/A	NO

Tabla 18 Equipo mínimo contrato de obra

Así mismo, se anexa el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras, en cual se verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones. FSI-800-006.

4.3.3 Control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

En el cuadro a continuación se relaciona personal mínimo requerido para el desarrollo de la obra:

NOMBRE	CARGO	ESTADO
JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA	Director de obra	APROBADO
JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI	Residente técnico 1 (Estructural)	APROBADO
DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ	Residente técnico 2 (Arquitecto)	APROBADO
CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	Residente administrativo	APROBADO
LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	Profesional en seguridad industrial	APROBADO
LUISA FERNANDA SIBAJA LUNA	Ingeniero auxiliar	APROBADO
EUCLIDES MANUEL MONTERROSA L	Maestro de obra	APROBADO

Tabla 19 Personal mínimo requerido

Así mismo se relaciona el personal que conforma la mano de obra calificada y no calificada que laboro durante este periodo.

PERSONAL	CANTIDAD
Ayudantes	53
Oficiales	8
Plomeros	0
Maestro de obra	3
Operario maquinaria	1
Almacenista	1
Administrativos	10
TOTAL	**76**

Tabla 20 Personal en obra

Igualmente se anexa el formato FSI-800-007, en el cual se verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal, Igualmente se verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente.

4.3.4 Estado general del tiempo.

Al igual que los meses anteriores durante el periodo predomino el tiempo seco.

LLUVIAS MODERADAS 3.90% - LLUVIAS INTENSAS 0.27% - SECO 95.83%

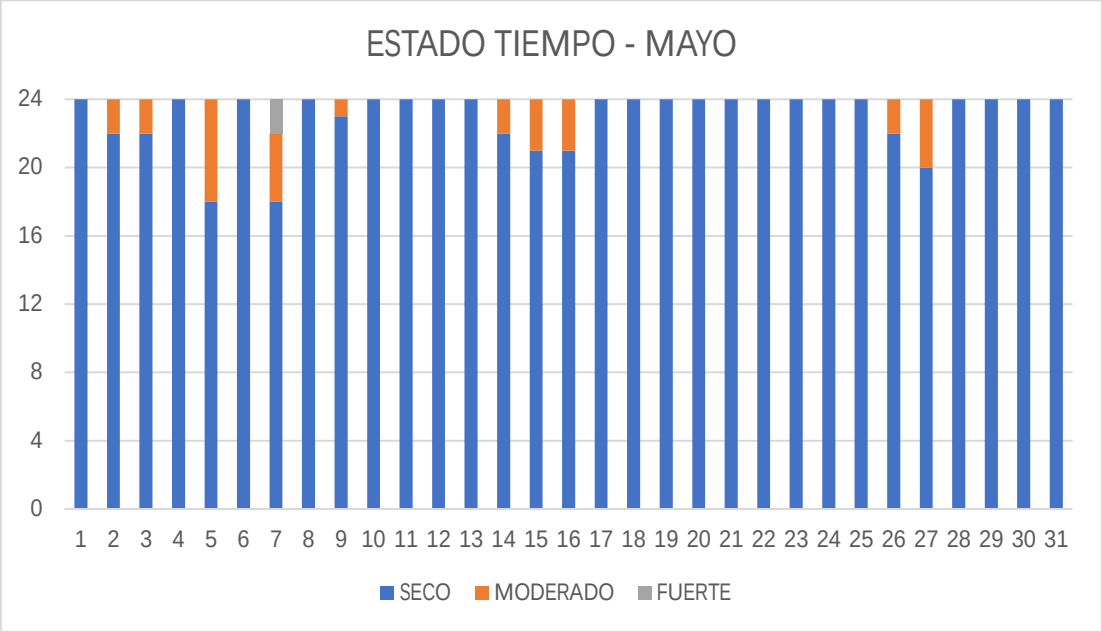


Gráfico 41 Horas de lluvia al día

Durante el presente aumentaron disminuyeron las lluvias respecto a los meses anteriores.

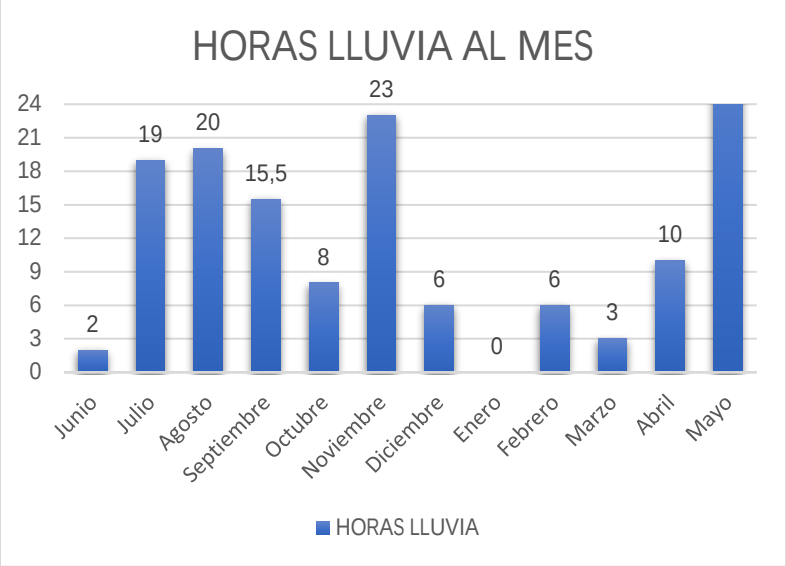


Gráfico 42 Horas de lluvia mensuales

En el Formato FSI-800-008 se lleva el registro diario del estado general del tiempo; indicando en cada casilla el número de horas por día señalando la clase de tiempo: Seco, lluvias moderadas, lluvias intensas. Se reviso el registro pluviométrico del IDEAM sin embargo como se puede evidenciar en la siguiente imagen, no hay registros para este periodo en le estación más cercana a la obra que en este caso sería la de Tolú.

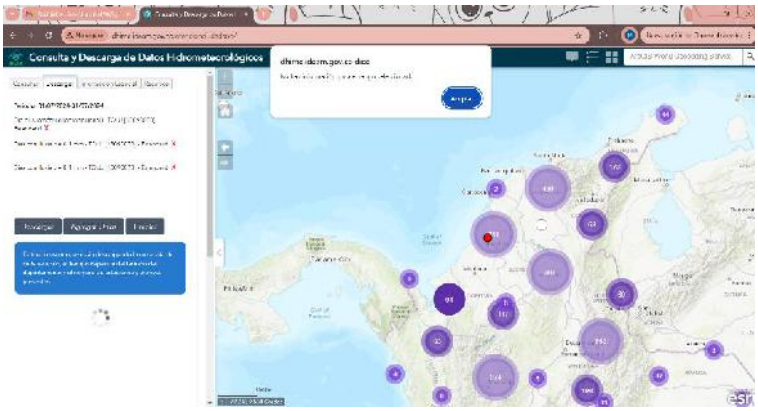


Imagen 14 Pagina IDEAM

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	FSI-800-014
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/2024

FECHA: 31/05/2025

PROGRAMA DE INVERSIONES | REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1

CONTRATO No: LP-018-2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM-001-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/05/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 34.420.762.624,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 2.760.630.453,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 37.181.393.077,00

CAPITULOS	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 / jun-24	2 / jul-24	3 / ago-24	4 / sep-24	5 / oct-24	6 / nov-24	7 / dic-24	8 / ene-25	9 / feb-25	10 / mar-25	11 / abr-25	12 / may-25
OBRA CIVIL	$31.048.788.592,00	69,79%	$ 28.791.780.992,00	% P	0,65%	2,59%	7,19%	6,20%	11,16%	9,85%	10,66%	11,60%	13,51%	10,55%	5,86%	1,78%
				$ P	$222.699.583	$892.048.006	$ 2.475.308.249,00	$2.305.199.556	$3.842.809.913	$3.662.512.592	$4.185.982.547	$4.313.174.543	$5.024.247.661	$3.921.513.462	$2.177.495.511	$663.654.406
		36,50%	$ 13.571.208.473,00	$ E	$49.576.284	$1.112.126.534	$1.249.968.707	$2.113.543.719	$2.363.259.642	$1.840.189.704	$1.327.837.238	$1.547.536.264	$1.130.196.693	$375.177.503	$360.795.259	$0
				% E	0,14%	3,24%	3,63%	6,14%	6,86%	3,46%	3,58%	4,16%	3,79%	1,00%	0,50%	0,00%
EQUIPOS	$0,00	0,00%	$ -	% P												
				$ P												
	$0,00	0,00%	$ -	$ E												
				% E												
AMUEBLAMIENTO	$0,00	0,00%	$ -	% P												
				$ P												
	$0,00	0,00%	$ -	$ E												
				% E												
EQUIPOS MEDICOS	$0,00	0,00%	$ -	% P												
				$ P												
	$0,00	0,00%	$ -	$ E												
				% E												
				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 31.048.788.592,00**	**70%**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																

		1 / jun-24	2 / jul-24	3 / ago-24	4 / sep-24	5 / oct-24	6 / nov-24	7 / dic-24	8 / ene-25	9 / feb-25	10 / mar-25	11 / abr-25	12 / may-25
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,65%	2,59%	7,19%	6,20%	11,16%	9,85%	10,66%	11,60%	13,51%	10,55%	5,86%	1,78%
	VALOR (Miles de Pesos)	$222.699.583	$892.048.006	$2.475.308.249	$2.305.199.556	$3.842.809.913	$3.662.512.592	$3.965.355.733	$4.313.174.543	$5.024.247.661	$3.921.513.462	$2.177.495.511	$663.654.406
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,65%	3,24%	10,43%	16,63%	27,79%	22,88%	35,64%	69,79%	59,25%	69,80%	75,66%	77,44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$222.699.583	$1.114.747.589	$3.590.055.838	$5.895.255.394	$9.738.065.307	$8.505.712.862	$13.260.858.169	$28.791.780.992	$22.029.117.613	$25.950.631.075	$28.128.126.586	$28.791.780.992
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,14%	3,24%	3,63%	6,14%	6,86%	3,46%	3,58%	4,16%	3,79%	1,00%	0,50%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.576.284	$1.112.126.534	$1.249.968.707	$2.113.543.719	$2.363.259.642	$1.840.189.704	$3.130.281.737	$1.547.536.264	$1.130.196.693	$375.177.503	$360.795.259	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,14%	3,38%	7,01%	13,15%	20,01%	23,47%	27,05%	36,50%	35,00%	36,00%	36,50%	36,50%
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.576.284	$1.161.702.818	$2.411.671.525	$4.525.215.244	$6.888.474.886	$8.728.664.590	$10.056.501.828	$13.571.208.473	$12.835.235.711	$13.210.413.214	$13.571.208.473	$13.571.208.473

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ - / $ -	$ -	%

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada Capitulo.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada capitulo se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor del capituloP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por capitulo, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES						
TIPO DE DIBUJO			PROGRAMADO			EJECUTADO
BARRAS			$ Valor			$ Valor
CURVAS						

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

JOSE DAVID FUENTES PEÑA

Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

Representante legal o apoderado del Interventor

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	FSI-800-015
VERSIÓN	1
PÁGINA	1/01/2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-018-2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM-001-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

PLAZO INICIAL: 18 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 34.420.762.624,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 37.181.393.077,00**

PLAZO ACUMULADO: 18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 2.760.630.453,00

CAPITULOS	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-24	2 jul-24	3 ago-24	4 sep-24	5 oct-24	6 nov-24	7 dic-24	8 ene-25	9 feb-25	10 mar-25	11 abr-25	11 may-25
OBRA CIVIL	$31.048.788.592	28,29%	$ 28.791.780.992,00	% P	0,65%	2,59%	7,19%	6,20%	11,16%	9,85%	10,66%	11,60%	13,51%	10,55%	5,86%	1,78%
				$ P	$222.699.583	$892.048.006	$ 2.475.308.249,00	$2.305.199.556	$3.842.809.913	$3.662.512.592	$4.185.982.547	$4.313.174.543	$5.024.247.661	$3.921.513.462	$2.177.495.511	$663.654.406
	$28.791.780.992	20,01%	$ 13.571.208.473,00	$ E	$49.576.284	$1.112.126.534	$1.249.968.707	$2.113.543.719	$2.363.259.642	$1.840.189.704	$1.327.837.238	$1.547.536.264	$1.130.196.693	$375.177.503	$360.795.259	$0
				% E	0,14%	3,24%	3,63%	6,14%	6,86%	3,46%	3,58%	4,16%	3,79%	1,00%	0,50%	0,00%
EQUIPOS	$3.144.151.835	9,13%	$ -	% P												
				$ P												
	$0	0,00%	$ -	$ E												
				% E												
AMUEBLAMIENTO	$626.316.394	1,82%	$ -	% P												
				$ P												
	$0	0,00%	$ -	$ E												
				% E												
EQUIPOS MEDICOS	$2.362.136.248	6,86%	$ -	% P												
				$ P												
	$0	0,00%	$ -	$ E												
				% E												
GPP8				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												
TOTAL OTROS ITEMS				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												

VALOR BÁSICO DE OBRA (A) $ 37.181.393.077,00
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') **$ 37.181.393.069,00**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada Capitulo.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada capitulo se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor del capitulo y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por capitulo, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO		EJECUTADO
BARRAS	$ Valor		$ Valor
CURVAS			

		1 jun-24	2 jul-24	3 ago-24	4 sep-24	5 oct-24	6 nov-24	7 dic-24	8 ene-25	9 feb-25	10 mar-25	11 abr-25	11 may-25
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,65%	2,59%	7,19%	6,20%	11,16%	9,85%	10,66%	11,60%	13,51%	10,55%	5,86%	1,78%
	VALOR (Miles de Pesos)	$222.699.583	$892.048.006	$2.475.308.249	$2.305.199.556	$3.842.809.913	$3.662.512.592	$3.965.355.733	$4.313.174.543	$5.024.247.661	$3.921.513.462	$2.177.495.511	$663.654.406
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,65%	3,24%	10,43%	16,63%	27,79%	22,88%	35,64%	45,73%	59,25%	69,80%	75,66%	77,44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$222.699.583	$1.114.747.589	$3.590.055.838	$5.895.255.394	$9.738.065.307	$8.505.712.862	$13.260.858.169	$17.004.869.952	$22.029.117.613	$25.950.631.075	$28.128.126.586	$28.791.780.992
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,14%	3,24%	3,63%	6,14%	6,86%	3,46%	3,58%	4,16%	3,79%	1,00%	0,50%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.576.284	$1.112.126.534	$1.249.968.707	$2.113.543.719	$2.363.259.642	$1.840.189.704	$3.130.281.737	$1.547.536.264	$1.130.196.693	$375.177.503	$360.795.259	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,14%	3,38%	7,01%	13,15%	20,01%	23,47%	27,05%	31,21%	35,00%	36,00%	36,50%	36,50%
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.576.284	$1.161.702.818	$2.411.671.525	$4.525.215.244	$6.888.474.886	$8.728.664.590	$10.056.501.828	$11.604.038.092	$12.734.234.785	$13.210.413.214	$13.571.208.473	$13.571.208.473

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba : **JOSE DAVID FUENTES PEÑA**
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba: **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante legal o apoderado del Interventor

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA INFORME QUINCENAL	CÓDIGO	FSI-800-002
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/05/2025

I. INFORMACION GENERAL

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

PERIODO No.: 23 del 28/04/2025 al 10/05/2025

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, consiste en una infraestructura con área total construida de 6.483.64 m2, para prestar servicios de salud, diagnóstico de enfermedades, tratamientos, cirugías, consulta externa, internación y servicios de apoyo.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP 018-2023	VALOR INICIAL:	$ 34.420.762.624,00
FECHA DE INICIO:	31/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.760.630.453,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/11/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 37.181.393.077,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CM-001-24	VALOR INICIAL:	$ 1.330.217.540,00
FECHA DE INICIO:	31/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/11/2025	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 37.181.393.077			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 37.181.393.077			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.330.217.540			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 850.827.583			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 479.389.957			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 37.181.393.077,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.470.741.390,00	76,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 13.571.208.472,86	36,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14.899.532.917,14)	40,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 342.614.806,00	0,92%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.330.217.540,14	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 850.827.583,38	63,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 36.992.503,63	2,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36.992.503,63	2,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 73.985.007,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	6.884.152.524,80
Amortizado $	
Saldo $	6.884.152.524,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 76,57%
Meta Física Ejecutada %: 36,50%
Avance o Atraso Físico %: **40,57%**

Meta Física (Programa de Obra)					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	FRENTE y/o SECTOR 1	FRENTE y/o SECTOR 2	FRENTE y/o SECTOR 3	Total	%
OBRAS CIVILES,EQUIPAMIENTO Y DOTACION	N/A	N/A	N/A	N/A	Prog	N/A	N/A	N/A	$ 28.470.741.390,00	76,57%
					Ejec	N/A	N/A	N/A	$ 13.571.208.472,86	36,50%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

FRENTE Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
FERENTE Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retroexcavadora	1	
estacion de topografica	2	
herramienta menor	1	1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Lorica - Cordoba	PERMISO MINERO:	SI x	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO x	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO x	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:
El proyecto Hospital del Golfo de Morrosquillo se encuentra a la espera de la resolución del permiso de aprovechamiento forestal solic, de igual manera se esta a la espera de la zona de deposito solicitadas

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:
Actualización del Item No. 9 DEMANDA, USO Y APROVECHAMIENTO DE RECUROSOS NATURALES, de acuerdo a los requisitos ambientales solicitados/obtenidos.

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	90	21
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	65	17
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	25	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	80	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 111

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0,55m, M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, M-17: MURO BLOQUE No. 12, e=0.12 mt, M-18 MURO BLOQUE No. 20, e=0.20 mt, COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño, ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi, PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e.prom= 7 cm) Incl. Malla Gallinero, BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" , TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS, TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS, TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS, TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Durante el presente periodo no se ha registrado reporte de cantidades de obra ejecutadas, razón por la cual el porcentaje de avance físico acumulado se mantiene invariable respecto al mes anterior. Es importante aclarar que esta situación no implica una suspensión de las actividades constructivas en el frente de obra, sino que obedece a que las labores desarrolladas no han alcanzado un nivel de ejecución que permita su medición, certificación o contabilización, así como a la ejecución de actividades para corregir observaciones hechas por la interventoría.


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en por el Supervisor y el Manual de Interventoría de la Gobernacion de Sucre

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

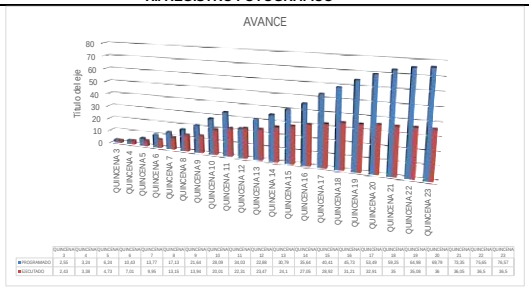

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

Original: Informe mensual de Interventoría.

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA INFORME QUINCENAL	CÓDIGO	FSI-800-002
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/05/2025

I. INFORMACION GENERAL

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

PERIODO No.: 24 del 12/05/2025 al 24/05/2025

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, consiste en una infraestructura con área total construida de 6.483.64 m2, para prestar servicios de salud, diagnóstico de enfermedades, tratamientos, cirugías, consulta externa, internación y servicios de apoyo.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	LP 018-2023	VALOR INICIAL:	$ 34.420.762.624,00	CONTRATO No.	CM-001-24	VALOR INICIAL:	$ 1.330.217.540,00
FECHA DE INICIO:	31/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.760.630.453,00	FECHA DE INICIO:	31/05/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/11/2025	VALOR ACUMULADO:	$ 37.181.393.077,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/11/2025	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 37.181.393.077			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 37.181.393.077			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.330.217.540			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 887.820.087			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 442.397.453			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 37.181.393.077,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.791.780.990,00	77,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 13.571.208.472,86	36,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (15.220.572.517,14)	41,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 321.039.600,00	0,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.330.217.540,14	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 887.820.087,00	66,74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 36.992.503,63	2,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36.992.503,63	2,78%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MAYO
VALOR FACTURA: $ 73.985.007,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	6.884.152.524,80
Amortizado $	
Saldo $	6.884.152.524,80

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 77,44%
Meta Física Ejecutada %: 36,50%
Avance o Atraso Físico %: **41,44%**

Meta Física (Programa de Obra)					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	FRENTE y/o SECTOR 1	FRENTE y/o SECTOR 2	FRENTE y/o SECTOR 3	Total	%
OBRAS CIVILES,EQUIPAMIENTO Y DOTACION	N/A	N/A	N/A	N/A	Prog	N/A	N/A	N/A	$ 28.791.780.990,00	77,44%
					Ejec	N/A	N/A	N/A	$ 13.571.208.472,86	36,50%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

FRENTE Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
FERENTE Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retroexcavadora	1	
estacion de topografica	2	
herramienta menor	1	1
Total		1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: Lorica - Cordoba	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
El proyecto Hospital del Golfo de Morrosquillo se encuentra a la espera de la resolución del permiso de aprovechamiento forestal solic, de igual manera se esta a la espera de la zona de deposito solicitadas

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:
Actualización del Item No. 9 DEMANDA, USO Y APROVECHAMIENTO DE RECUROSOS NATURALES, de acuerdo a los requisitos ambientales solicitados/obtenidos.

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	90	21
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	65	17
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	25	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	80	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 111

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO Y ACUMULADAS

PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0,55m, M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, M-17: MURO BLOQUE No. 12, e=0.12 mt, M-18 MURO BLOQUE No. 20, e=0.20 mt, COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño, ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi, PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e.prom= 7 cm) Incl. Malla Gallinero, BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" , TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS, TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS, TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS, TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

Durante el presente periodo no se ha registrado reporte de cantidades de obra ejecutadas, razón por la cual el porcentaje de avance físico acumulado se mantiene invariable respecto al mes anterior. Es importante aclarar que esta situación no implica una suspensión de las actividades constructivas en el frente de obra, sino que obedece a que las labores desarrolladas no han alcanzado un nivel de ejecución que permita su medición, certificación o contabilización, así como a la ejecución de actividades para corregir observaciones hechas por la interventoría.


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS





El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en por el Supervisor y el Manual de Interventoría de la Gobernacion de Sucre

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

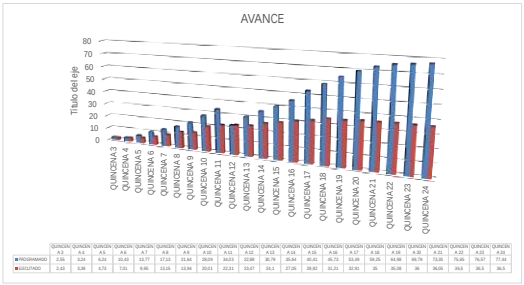

	QUINCEN A3	QUINCEN A4	QUINCEN A5	QUINCEN A6	QUINCEN A7	QUINCEN A8	QUINCEN A9	QUINCEN A10	QUINCEN A11	QUINCEN A12	QUINCEN A13	QUINCEN A14	QUINCEN A15	QUINCEN A16	QUINCEN A17	QUINCEN A18	QUINCEN A19	QUINCEN A20	QUINCEN A21	QUINCEN A22	QUINCEN A23	QUINCEN A24
PROGRAMADO	2,81	3,24	4,24	61,43	13,77	17,16	21,84	29,09	34,63	22,66	26,79	35,44	40,41	45,73	52,85	59,25	64,96	69,79	73,26	75,45	76,57	77,44
EJECUTADO	2,43	3,38	4,73	7,01	9,95	13,15	13,94	20,01	22,21	23,67	28,1	27,05	28,92	31,21	32,91	35	35,68	36	36,05	36,5	36,5	36,5

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

Original: Informe mensual de Interventoría.

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	FSI-800-006
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2024

FECHA: 30-may

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO No. LP 018-23

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. CM 001-24

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
*RETROEXCAVADORA	KATO HD820R	150 HP	N/A		I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
MINICARGADOR	NEW HOLLAND 220	905 KG	N/A		I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
MOTOBOMBA	N/A	N/A	N/A		I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
MOTOBOMBA SUMERGIBLE	N/A	N/A	N/A		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA DE CCTO	N/A	N/A	N/A		I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
TRONZADORA	N/A	N/A	N/A		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO	N/A	N/A	N/A		I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
COMPACTADOR TIPO CANGURO	N/A	N/A	N/A		I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
COMPACTADOR TIPO RANA	N/A	N/A	N/A		I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
EQUIPO SOLDADURA	N/A	N/A	N/A		I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10	100,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	20,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	8	80,0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
*** ESTOS EQUIPOS CORRESPONDEN AL EQUIPO MINIMO REQUERIDO**

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

Firma

DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: A28952014-1067920553

Firma

CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: A441522011-79788484

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACIÓN DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	FSI-800-019
		VERSIÓN	1
		FECHA	31/11/2024

PERIODO DEL INFORME	INFORME:	12	MES:	MAYO	FECHA	31/05/2025
CONTRATO DE OBRA N°	LP-018-2023					
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE					

NUMERO DE PLANILLA:	9482912945	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de marzo de 2025	a	31 de marzo de 2025

No.	Nombre personal	Cargo y/o oficio	Cedula	Dias Cotizados	sueldo	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN		Total a pagar
						EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR			CCF	VALOR	
1	APARICIO LUIS	MAESTRO DE OBRA	1.067.915.162	2	$ 94.900	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	$ 3.800,00	PORVENIR	$ 15.200,00	ARL SURA	$ 6.700,00			COMFASUCRE	$ 3.800,00	$ 29.500,00
2	ARRIETA EDUARDO	AYUDANTE	1.131.105.563	9	$ 427.050	SALUD TOTAL	$ 17.100,00	PORVENIR	$ 68.400,00	ARL SURA	$ 29.800,00			COMFASUCRE	$ 17.100,00	$ 132.400,00
3	ATENCIO MARCO	AYUDANTE	1.193.556.241	30	$ 1.423.500	NUEVA E.P.S.	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
4	BETIN MANUEL	AYUDANTE	1.131.104.577	30	$ 1.423.500	SALUD TOTAL	$ 57.000,00	PORVENIR	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
5	BRAVO YEINER	AYUDANTE	1.193.543.998	1	$ 47.450	NUEVA E.P.S.	$ 1.900,00	COLFONDOS	$ 7.600,00	ARL SURA	$ 3.400,00			COMFASUCRE	$ 1.900,00	$ 14.800,00
6	CARABALLO KAROLAY	PSICOLOGA	1.069.496.540	30	$ 1.423.500	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
7	CARRASCAL JAIME	OFICIAL	78.076.914	30	$ 1.423.500	CAJACOPI	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
8	CAUSIL OSCAR	AYUDANTE	1.073.809.586	1	$ 47.450	SALUD TOTAL	$ 1.900,00	COLFONDOS	$ 7.600,00	ARL SURA	$ 3.400,00			COMFASUCRE	$ 1.900,00	$ 14.800,00
9	COA JEAN	AYUDANTE	15.620.168	7	$ 332.150	NUEVA E.P.S.	$ 13.300,00	PORVENIR	$ 53.200,00	ARL SURA	$ 23.200,00			COMFASUCRE	$ 13.300,00	$ 103.000,00
10	CONEO ARISTIDES	AYUDANTE	15.620.652	30	$ 1.423.500	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	$ 57.000,00	COLPENSIONES	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
11	CRUZ JORGE	TECNICO ESTRUCTURAL	9.074.773	30	$ 1.423.500	SANITAS	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
12	CRUZ VICTOR	INGENIERO AUXILIAR	92.517.051	30	$ 1.600.000	SALUD TOTAL	$ 64.000,00	COLFONDOS	$ 256.000,00	ARL SURA	$ 111.400,00			COMFASUCRE	$ 64.000,00	$ 495.400,00
13	CUESTA ALEX	AYUDANTE	1.065.373.424	30	$ 1.423.500	CAJACOPI	$ 57.000,00	COLPENSIONES	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
14	DE AGUSTIN WILLIAM	AYUDANTE	1.067.400.596	30	$ 1.423.500	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	$ 57.000,00	COLPENSIONES	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
15	DIAZ CARLOS	AYUDANTE	1.072.529.626	1	$ 47.450	NUEVA EPS	$ 1.900,00	PORVENIR	$ 7.600,00	ARL SURA	$ 3.400,00			COMFASUCRE	$ 1.900,00	$ 14.800,00
16	DORIA IVAN	AYUDANTE	1.064.310.879	30	$ 1.423.500	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 57.000,00	COLPENSIONES	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
17	FALS CARLOS	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1.047.393.966	30	$ 1.423.500	EPS MUTUAL SER	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
18	FERNANDEZ MANUEL	AYUDANTE	15.617.421	8	$ 379.600	NUEVA E.P.S.	$ 15.200,00	COLPENSIONES	$ 60.800,00	ARL SURA	$ 26.500,00			COMFASUCRE	$ 15.200,00	$ 117.700,00
19	FERNANDEZ PEDRO	OFICIAL	73.432.693	30	$ 1.423.500	EPS MUTUAL SER	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
20	FUENTES JOHANNA	DIRECTORA DE OBRA	50.909.828	30	$ 1.423.500	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
21	GARAY HUGO	AYUDANTE	1.005.708.729	9	$ 427.050	SALUD TOTAL	$ 17.100,00	PORVENIR	$ 68.400,00	ARL SURA	$ 29.800,00			COMFASUCRE	$ 17.100,00	$ 132.400,00
22	GARAY STEPHANNY	AUXILIAR SST	1.131.104.122	30	$ 1.423.500	NUEVA E.P.S.	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
23	GARCIA CARLOS	AYUDANTE	1.003.344.259	1	$ 47.450	MUTUAL SER	$ 1.900,00	PORVENIR	$ 7.600,00	ARL SURA	$ 3.400,00			COMFASUCRE	$ 1.900,00	$ 14.800,00
24	GARCIA TEODORO	AYUDANTE	8.168.513	30	$ 1.423.500	NUEVA E.P.S.	$ 57.000,00	PORVENIR	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
25	GAVIRIA JESUS	AYUDANTE	1.072.525.704	9	$ 427.050	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 17.100,00	COLPENSIONES	$ 68.400,00	ARL SURA	$ 29.800,00			COMFASUCRE	$ 17.100,00	$ 132.400,00
26	GONZÁLEZ LUIS	AYUDANTE	1.072.525.704	15	$ 711.750	NUEVA E.P.S.	$ 28.500,00	PORVENIR	$ 113.900,00	ARL SURA	$ 49.600,00			COMFASUCRE	$ 28.500,00	$ 220.500,00
27	HERRERA HOVER	AYUDANTE	78.704.837	9	$ 427.050	MUTUAL SER	$ 17.100,00	PORVENIR	$ 68.400,00	ARL SURA	$ 29.800,00			COMFASUCRE	$ 17.100,00	$ 132.400,00
28	JIMÉNEZ LEOVIGILDO	AYUDANTE	1.003.655.741	1	$ 47.450	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 1.900,00	PORVENIR	$ 7.600,00	ARL SURA	$ 3.400,00			COMFASUCRE	$ 1.900,00	$ 14.800,00
29	MANJARRES ALVARO	BODEGUERO	1.116.615.548	30	$ 1.423.500	COLOMBIA SAS	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
30	MARTINEZ FARID	AYUDANTE	1.067.403.531	30	$ 1.423.500	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 57.000,00	PROTECCIÓN	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
31	MARTINEZ JOSÉ	AYUDANTE	1.047.488.987	9	$ 427.050	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	$ 17.100,00	PORVENIR	$ 68.400,00	ARL SURA	$ 29.800,00			COMFASUCRE	$ 17.100,00	$ 132.400,00
32	MARTÍNEZ WILLIAM	AYUDANTE	78.076.416	30	$ 1.423.500	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 57.000,00	PROTECCIÓN	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
33	MENDOZA FRANCISCO	AYUDANTE	1.065.372.811	8	$ 379.600	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 15.200,00	PORVENIR	$ 60.800,00	ARL SURA	$ 26.500,00			COMFASUCRE	$ 15.200,00	$ 117.700,00
34	MENDOZA LUIS	AYUDANTE	1.005.708.736	30	$ 1.423.500	SALUD TOTAL	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
35	MESTRA CARLOS	AYUDANTE	1.005.708.548	30	$ 1.423.500	SALUD TOTAL	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
36	MIRANDA MANUEL	AYUDANTE	1.064.309.595	9	$ 427.050	MUTUAL SER	$ 17.100,00	PORVENIR	$ 68.400,00	ARL SURA	$ 29.800,00			COMFASUCRE	$ 17.100,00	$ 132.400,00
37	MONTERROSA EUCLIDES	MAESTRO DE OBRA	92.496.761	30	$ 1.423.500	SANITAS	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ -	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 213.100,00
38	MONTERROSA DANIEL	AYUDANTE	1.129.504.510	2	$ 94.900	CAJACOPI	$ 3.800,00	PORVENIR	$ 15.200,00	ARL SURA	$ 6.700,00			COMFASUCRE	$ 3.800,00	$ 29.500,00
39	MORALES JAIDER	AYUDANTE	1.003.655.556	8	$ 379.600	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 15.200,00	CAJACOPI	$ 60.800,00	ARL SURA	$ 26.500,00			COMFASUCRE	$ 15.200,00	$ 117.700,00
40	MORELO ISRAEL	AYUDANTE	15.620.027	30	$ 1.423.500	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
41	MORENO GABRIEL	AYUDANTE	1.072.529.607	30	$ 1.423.500	COOSALUD MOVILIDAD	$ 57.000,00	PORVENIR	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
42	MURILLO PEDRO	AYUDANTE	92.229.029	30	$ 1.423.500	SALUD TOTAL	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
43	OSPINO DINEY	RESIDENTE DE OBRA	1.067.920.553	30	$ 1.500.000	SALUD TOTAL	$ 60.000,00	COLFONDOS	$ 240.000,00	ARL SURA	$ 104.400,00			COMFASUCRE	$ 60.000,00	$ 464.400,00

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACIÓN DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	FSI-800-019
		VERSIÓN	1
		FECHA	31/11/2024

PERIODO DEL INFORME	INFORME: 12	MES: MAYO	FECHA	31/05/2025
CONTRATO DE OBRA N°	LP-018-2023			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE			

NUMERO DE PLANILLA:	9482912945	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de marzo de 2025	a	31 de marzo de 2025

No.	Nombre personal	Cargo y/o oficio	Cedula	Dias Cotizados	sueldo	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES		I.C.B.F.	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN		Total a pagar
						EPS	VALOR	PENSION	VALOR	ARL	VALOR			CCF	VALOR	
44	PALMERA ROMULO	MAESTRO DE OBRA	11.000.373	30	$ 1.423.500	MUTUAL SER	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
45	PEREZ JORGE	AYUDANTE	78.078.970	7	$ 332.150	MUTUAL SER	$ 13.300,00	PORVENIR	$ 53.200,00	ARL SURA	$ 23.200,00			COMFASUCRE	$ 13.300,00	$ 103.000,00
46	RAMOS JAIRO	OFICIAL DE OBRA	18.857.561	7	$ 332.150	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 13.300,00	PORVENIR	$ 53.200,00	ARL SURA	$ 23.200,00			COMFASUCRE	$ 13.300,00	$ 103.000,00
47	RAVELE DARWIN	AYUDANTE	1.067.400.415	7	$ 332.150	MUTUAL SER	$ 13.300,00	PORVENIR	$ 53.200,00	ARL SURA	$ 23.200,00			COMFASUCRE	$ 13.300,00	$ 103.000,00
48	RINCO EDER	AYUDANTE	1.005.708.714	30	$ 1.423.500	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	$ 57.000,00	PORVENIR	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
49	RINCO MARCELINO	OFICIAL DE OBRA	4.020.724	9	$ 427.050	CAJACOPI	$ 17.100,00	COLPENSIONES	$ 68.400,00	ARL SURA	$ 29.800,00			COMFASUCRE	$ 17.100,00	$ 132.400,00
50	ROBLES CARLOS	AYUDANTE	73.119.953	9	$ 427.050	MUTUAL SER	$ 17.100,00	COLPENSIONES	$ 68.400,00	ARL SURA	$ 29.800,00			COMFASUCRE	$ 17.100,00	$ 132.400,00
51	SALGADO IVAN	OPERADOR MINI	1.067.855.135	30	$ 1.423.500	SALUD TOTAL	$ 57.000,00	PORVENIR	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
52	SALGADO LUIS	COORDINADOR SST	1.067.280.132	30	$ 1.423.500	SALUD TOTAL	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
53	SANTOS EDUARDO	AYUDANTE	1.131.107.866	9	$ 427.050	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	$ 17.100,00	PORVENIR	$ 68.400,00	ARL SURA	$ 29.800,00			COMFASUCRE	$ 17.100,00	$ 132.400,00
54	SARMIENTO CARLOS	OFICIAL DE OBRA	78.700.868	30	$ 1.423.500	EPS MUTUAL SER	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
55	SIBAJA LUISA	RESIDENTE	1.003.395.473	30	$ 1.423.500	SALUD TOTAL	$ 57.000,00	PORVENIR	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
56	SIERRA JOSE	AYUDANTE	1.003.064.240	8	$ 379.600	NUEVA EPS	$ 15.200,00	PORVENIR	$ 60.800,00	ARL SURA	$ 26.500,00			COMFASUCRE	$ 15.200,00	$ 117.700,00
57	TOBAR MANUEL	OFICIAL	15.029.586	30	$ 1.423.500	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
58	URANGO OSWALDO	AYUDANTE	1.131.108.401	30	$ 1.423.500	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	$ 57.000,00	COLPENSIONES	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
59	VALLEJO ALEXANDER	AYUDANTE	73.575.276	8	$ 379.600	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	$ 15.200,00	COLFONDOS	$ 60.800,00	ARL SURA	$ 26.500,00			COMFASUCRE	$ 15.200,00	$ 117.700,00
60	VEGA DUBAN	AYUDANTE	1.067.169.554	8	$ 379.600	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 15.200,00	COLPENSIONES	$ 60.800,00	ARL SURA	$ 26.500,00			COMFASUCRE	$ 15.200,00	$ 117.700,00
61	VERGARA MIGUEL	AYUDANTE DE PLOMERÍA	1.065.373.882	8	$ 379.600	NUEVA EPS MOVILIDAD	$ 15.200,00	COLPENSIONES	$ 60.800,00	ARL SURA	$ 26.500,00			COMFASUCRE	$ 15.200,00	$ 117.700,00
62	YENERIS TANIA	ING. AMBIENTAL	1.131.107.171	30	$ 1.423.500	SANITAS	$ 57.000,00	COLFONDOS	$ 227.800,00	ARL SURA	$ 99.100,00			COMFASUCRE	$ 57.000,00	$ 440.900,00
															TOTAL	$ 17.621.800,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día sábado, 31 de mayo de 2025

Firma:
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
HUGO HERNÁN HERRA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA
DIRECTOR DE OBRA
No. Matrícula Profesional: A08101999-50909828

Firma:
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
No. Matrícula Profesional: 22202090255 COR

OBSERVACIONES:
* ESTOS PROFESIONALES ESTAN VINCULADOS AL CONSORCIO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGAN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811441	3	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CMO HOSPITAL	CALLE 42 N 7-40	SINCELEJO-SUCRE	7919612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1458519803	9485682612	E	2025/05/12	2025/05/05	BANCOLOMBIA	0	$17,621,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067915162	APARICIO LUIS		X																230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
2	CC	1131105563	ARRIETA EDUARDO	X																	230301	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
3	CC	1193556241	ATENCIO MARCO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1131104577	BETIN MANUEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1193543998	BRAVO YEINER		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
6	CC	1069496540	CARABALLO KAROLAY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	78076914	CARRASCAL JAIME																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1073809586	CAUSIL OSCAR		X																230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
9	CC	15620168	COA JEAN	X																	230301	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF41	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
10	CC	15620652	CONEO ARISTIDES																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	9074773	CRUZ JORGE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	92517051	CRUZ VICTOR																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF41	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
13	CC	1065373424	CUESTA ALEX																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1067400596	DE AGUSTIN WILLIAM																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	1072529626	DIAZ CARLOS	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
16	CC	1064310879	DORIA IVAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	1047393966	FALS CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
18	CC	15617421	FERNANDEZ MANUEL	X																	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF41	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
19	CC	73432693	FERNANDEZ PEDRO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
20	CC	50909828	FUENTES JOHANNA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
21	CC	1005708729	GARAY HUGO	X																	230301	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
22	CC	1131104122	GARAY STEPHANNY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
23	CC	1003344259	GARCIA CARLOS		X																230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
24	CC	8168513	GARCIA TEODORO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
25	CC	1071432118	GAVIRIA JESUS	X																	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS041	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
26	CC	1072525704	GONZALEZ LUIS		X																230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF41	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0	Si	$220,500
27	CC	78704837	HERRERA HOVER	X																	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
28	CC	1003655741	JIMENEZ LEOVIGILDO		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
29	CC	1116615548	MANJARRES ALVARO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
30	CC	1067403531	MARTINEZ FARID																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
31	CC	1047488987	MARTINEZ JOSE	X																	230301	9	$427,050	$68,400	CCFC33	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
32	CC	78076416	MARTINEZ WILLIAM																		231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
33	CC	1065372811	MENDOZA FRANCISCO	X																	230301	8	$379,600	$60,800	EPS041	8	$379,600	$15,200	CCF41	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
34	CC	1005708736	MENDOZA LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
35	CC	1005708548	MESTRA CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

149 / 947

Planilla Resumen

36	CC	1064309595	MIRANDA MANUEL	X																	230301	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
37	CC	92496761	MONTERROSA EUCLIDES																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100
38	CC	1129504510	MONTERROZA DANIEL		X																230301	2	$94,900	$15,200	CCFC55	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
39	CC	1003655556	MORALES JAIDER	X																	230201	8	$379,600	$60,800	ESSC07	8	$379,600	$15,200	CCF41	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
40	CC	15620027	MORELO ISRAEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
41	CC	1072529607	MORENO GABRIEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
42	CC	92229029	MURILLO PEDRO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
43	CC	1067920553	OSPINO DINEY																		231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
44	CC	11000373	PALMERA ROMULO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
45	CC	78078970	PEREZ JORGE	X																	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF41	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
46	CC	18857561	RAMOS JAIRO	X																	231001	7	$332,150	$53,200	EPS041	7	$332,150	$13,300	CCF41	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
47	CC	1067400415	RAVELES DARWIN	X																	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC07	7	$332,150	$13,300	CCF41	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
48	CC	1005708714	RINCO EDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
49	CC	4020724	RINCO MARCELINO	X																	25-14	9	$427,050	$68,400	CCFC55	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
50	CC	73119953	ROBLES CARLOS	X																	25-14	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
51	CC	1067855135	SALGADO IVAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
52	CC	1067280132	SALGADO LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
53	CC	1131107866	SANTOS EDUARDO	X																	230301	9	$427,050	$68,400	CCFC33	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
54	CC	78700868	SARMIENTO CARLOS																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
55	CC	1003395473	SIBAJA LUISA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
56	CC	1003064240	SIERRA JOSE	X																	230301	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF41	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
57	CC	15029586	TOBAR MANUEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
58	CC	1131108401	URANGO OSWALDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
59	CC	73575276	VALLEJO ALEXANDER	X																	231001	8	$379,600	$60,800	CCFC33	8	$379,600	$15,200	CCF41	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
60	CC	1067169554	VEGA DUBAN	X																	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS041	8	$379,600	$15,200	CCF41	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
61	CC	1065373882	VERGARA MIGUEL	X																	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS041	8	$379,600	$15,200	CCF41	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
62	CC	1131107171	YENERIS TANIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(62)**																						$56,196,550	$8,994,100			$57,620,050	$2,307,100			$57,620,050	$2,307,100			$57,620,050	$4,013,500		$0	$0		$17,621,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811441	3	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CMO HOSPITAL	CALLE 42 N 7-40	SINCELEJO-SUCRE	7919612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1458519803	9485682612	E	2025/05/12	2025/05/05	BANCOLOMBIA	0	$17,621,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$8,994,100	$0	$0	$8,994,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,493,000	$0	$0	$1,493,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$1,754,400	$0	$0	$1,754,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$4,994,900	$0	$0	$4,994,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$751,800	$0	$0	$751,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$4,013,500	$0	$0	$4,013,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	62	$4,013,500	$0	$0	$4,013,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$2,307,100	$0	$0	$2,307,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	62	$2,307,100	$0	$0	$2,307,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				62	$2,307,100	$0	$0	$2,307,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$134,900	$0	$0	$134,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	8	$334,400	$0	$0	$334,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$60,800	$0	$0	$60,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$209,000	$0	$0	$209,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$247,000	$0	$0	$247,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$362,900	$0	$0	$362,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$616,100	$0	$0	$616,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				**62**	**$17,621,800**	**$0**	**$0**	**$17,621,800**

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	**CÓDIGO**	**FSI-800-008**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	

FECHA 31-may-25

CONTRATO DE OBRA No: LP-018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES ENERO AÑO 2024																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	22	22	24	18	24	18	24	23	24	24	24	24	22	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	20	24	24	24	24	713,00
Lluvias moderadas		2	2		6		4		1					2	3	3										2	4					29,00
Lluvias intensas							2																									2,00
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: A28952014-1067920553

Firma

CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: A441522011-79788484

4.4 Resumen ensayos de Laboratorio.

Durante este periodo el contratista NO realizo ensayos de compresión y resistencia del concreto.

En el Formato FSI-800-009, se registran los resultados de los ensayos de laboratorio requeridos para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes, así mismo se anexan los resultados y el registro fotográfico.

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **CONTROL ENSAYOS DE LABORATORIO**	**CÓDIGO**	**FSI-800-009**
		VERSIÓN	**1**
		FECHA	**1/01/2024**

FECHA 31/05/2025

CONTRATO DE OBRA No.: LP 018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

Fecha del Ensayo	Laboratorio	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Firma
JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A08101999-50909828

Firma
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

4.5 Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra.

En el formato anexo se hace la verificación del cumplimiento mensual del Plan de Calidad del Contrato de Obra, Plan de inspección y ensayo y toma las acciones correctivas en el caso contrario. Formato FSI-800-012.

4.5.1 Control de materiales

De acuerdo con el plan de inspección y ensayo entregado por el contratista y a las actividades ejecutadas en la obra durante el periodo los siguientes son los controles que se deben llevar a cabo.

ACTIVIDAD	CONTROL	CUMPLE
Sanitarios portátiles, 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres, los demás que requiera el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento según necesidad	Control cantidad y aseo baterías sanitarias	SI
CIMENTACIÓN		
Filtro francés bajo placa de cimentación según diseño 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, geotextil nt 1600, tubería y material filtrante según especificación	Certificado calidad geotextil NT1600 de Pavco o similar	SI
Pedestales, concreto 28 mpa (premezclado no incluye refuerzo)	Ensayos de concreto Certificado calidad del concreto	SI
Viga de cimentación vc f´c= 28 mpa, según diseño estructural (premezclado no incluye refuerzo)	Ensayos de concreto Certificado calidad del concreto	SI
Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, figurado	Certificado calidad material	
ESTRUCTURA		
Columnas, concreto 28 mpa	Ensayos de concreto Certificado calidad del concreto	SI
Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, figurado	Certificado calidad material	
Malla electrosoldada	Certificado calidad material	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
ACOMETIDAS		
Tubería pvcp rde 21 ø1"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvcp ø1"	Certificado calidad material	SI
RED DE AGUA FRÍA		
Tubería pvcp rde 21 ø4"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvc 4"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcp rde 21 ø3"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvc 3"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcp rde 21 ø2-1/2"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvc 2-1/2"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcp rde 21 ø2"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvc 2"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcp rde 21 ø1-1/4"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvc 1-1/4"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcp rde 21 ø1"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvc 1"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcp rde 9 ø1/2"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvc 1/2"	Certificado calidad material	SI
RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA		
Tubería cpvc 1/2"	Certificado calidad material	SI
Accesorios cpvc 1/2"	Certificado calidad material	SI

RED DE AGUAS NEGRAS		
Tubería pvcs 6"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvcs 6"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcs 4"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvcs 4"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcs 2"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvcs 2"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcs liviana 2"	Certificado calidad material	SI
RED DE AGUAS PATÓGENAS		
Tubería pvcs 4"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvcs 4"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcs 3"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcs 2"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvcs 2"	Certificado calidad material	SI
RED DE AGUAS LLUVIAS		
Tubería pvcs 6"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvcs 6"	Certificado calidad material	SI
Tubería pvcs 4"	Certificado calidad material	SI
Accesorios pvcs 4"	Certificado calidad material	SI
CÁMARAS Y CANALIZACIÓN		
Canalización tubería 4ø6" pvc (incluye cama de arena)	Certificado calidad material	SI
Caja de media tensión tipo doble afinia (incluye excavación y retiro a botadero certificado, lo mismo que tapa homologada)	Certificado calidad material	SI
SISTEMA PUESTA A TIERRA		
Puesta a tierra sistemas de potencia compuesto por cuatro electrodos de puesta a tierra de cobre homologado de 5/8" y 2.44 m, rectangular de 5x5 m con cuadriculas de 2,5 m, interconectado por un conductor de cobre desnudo tipo de calibre 2/0 awg con soldadura termofundente	Certificado calidad material	SI
Puesta a tierra sistemas aislado compuesto por tres electrodos de puesta a tierra de cobre homologado de 5/8" y 2.44 m, triangular de 5m, interconectado por un conductor de cobre desnudo tipo de calibre 2/0 awg con soldadura termofundente	Certificado calidad material	SI
VIAS - URBANISMO INTERNO		
Filtro francés en base muro de contención según diseño 0.25 x 0.30 mt, incl. Excavación, geotextil nt 1600, tubería y material filtrante según especificación	Certificado calidad material	
ANDENES - URBANISMO INTERNO		
Muro de contención visto ambas caras, concreto 28 mpa	Ensayos de concreto Certificado calidad del concreto	SI
Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, figurado	Certificado calidad material	SI

Tabla 21 Control certificados calidad

4.5.2 Certificación del factor de calidad.

La interventoría en desempeño de sus obligaciones como veedor, comprueba el cumplimiento de este factor de calidad por parte del contratista, en este periodo los equipos utilizados en obra son los que se describen a continuación:

MAQUINARIA/EQUIPO	CANT	ESPECIFICACIONES	OBSERVACIONES	CUMPLE (SI/NO)
RETROEXCAVADORA	1	Caterpillar – Modelo 416f2/ 65Kw – 87 hp		SI
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1	Estacion total – marca Topcon/Ref 22 – ID: UN1330 – Nivel ajutomatico marca Nikon Ref. AC-25 ID 662799	YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA	SI

Tabla 22 Verificación de cumplimiento factor de calidad

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	FSI-800-012
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2024

FECHA 31/05/2025

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

FECHA DE INICIO: 31/05/2024 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/11/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CM-001-2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X N APROBADO: SI NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **29/07/2024**

OBSERVACIONES:

Se revisa plan de calidad especifico para la obra emitido por el contratista; el documento cuenta con esquema, procedimientos, instructivos y formatos de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO :2018

2. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO X APROBADO: SI X NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 5

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones tecnicas contractuales

3. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 1

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 1

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 5

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 4

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 2

OBSERVACIONES:

4. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: **Índice de gestión 1** para medir el objetivo general "**Indicador de Cumplimiento del Cronograma y Control de Costos**"= ICCP= ((NAC/TAC) * 0,5) + ((CP/BP)*0,5)	**0,52**	Este indicador permite medir el objetivo general " Cumplir a cabalidad el cronograma de actividades haciendo enfasis en la ruta critica y controlando el costo estipulado de las actividades y materiales del presupuesto sin llegar a presentar desviaciones" **Donde:** NAC: Número de Actividades Completadas en la Ruta Crítica en el periodo. TAC: Total de Actividades en la Ruta Crítica programadas en el periodo. CP: Costo Real del Proyecto en el periodo. BP: Costo Presupuestado del Proyecto en el periodo. **Interpretacion** **. Un ICCP de 1 indica que la obra esta cumpliendo tanto en cronograma como en el presupuesto programado vs ejecutado** **. Un ICCP Menor a 1 indica que el proyecto presenta deviaciones en el cronograma o en el presuesto.** **. Para propositos de evaluacion y seguimiento, se considera aceptable un ICCP entre 0,85 a 1; para ICCP menor a 0,85 se requerira plan de mejora.**
IG2: **Índice de gestión 2** para mediir el objetivo general "Mantener el talento humano competente, proveedores confiables y la infraestructura adecuada para lograr mayor eficiencia y eficacia en la ejecuccion del proyecto": Indicador de Eficiencia y Eficacia en la Ejecución de Obra (IEEO) IEEO=((NTC/NTCP)*0,6)+((CCP/CCR)*0,4)	**0,95**	Este indicador permite medir el objetivo general "Mantener el talento humano competente, proveedores confiables y la infraestructura adecuada para lograr mayor eficiencia y eficacia en la ejecuccion del proyecto", el proposito de este indicador es medir la permanencia del equipo tecnico ofertado por el contratista, evaluacion del aporte de los certificados de calidad de materiales de los proveedores. Donde: NTC: Numero de profesionales afiliados al SGSS pertenecientes al personal clave del contratista NTCP: Total de profesionales pertenecientes al personal clave de acuerdo al pliego de condiciones CCP: Certificados de calidad de materiales aportados por los proveedores en el periodo CCR: Certificados de calidad de materiales requeridos en el peridodo. **Interpretacion:** . Un IEEO cercano a 1 indica un alto nivel de competencia, confiabilidad y adecuacion . Un IEEO menor a 1 indica que las areas que mide el indicador requieren mejoras Acciones correctivas: si el IEEO es menor a 1 se deben identificar las area de mejora y tomar medidas correctivas, como revision de contrato, pliego de condiciones, revision de contrato con proveedores.
IG3: **Índice de gestión 3** para medir el objetivo "implementar controles para contrarrestar desviaciones de calidad que se puedan generar en el desarrollo de actividades planteadas" EFC= Número de Controles Correctivos Efectivos / Total de Desviaciones de Calidad Detectadas.	**1**	Este indicador permite medir el objetivo "implementar controles para contrarrestar desviaciones de calidad que se puedan generar en el desarrollo de actividades planteadas" Donde **Número de Controles Correctivos Efectivos:** equivalen numeros de acciones realizadas efectivas ante una no conformidad detectada, ya sea en deficiencias en mediciones realizas, deficiencia en acabados, deficiencia en analisis de laboratorio **Total de Desviaciones de Calidad Detectadas:** equivalen al total desviaciones en el cumplimiento de parametros de calidad detectados en el periodo. Meta: EFC >=95% Nota: EFC =0 indica que en el periodo evaluado, no se encontraron desviaciones en cumplimiento de parametros de calidad por corregir por parte del contratista

IG4: **Índice de gestión 4** para medir el objetivo "Lograr una mejor eficacia del sistema de control de calidad a mediados del plazo de la entrega del proyecto" EFC= (Numero de actividades o productos conformes entregados / Numero de actividades o productos conformes programados el periodo)*100	**27,21%**	este indicador permite medir el objetivo "Lograr una mejor eficacia del sistema de control de calidad a mediados del plazo de la entrega del proyecto" Donde: .Numero de actividades o productos conformes entregados: equivale a productos y/o actividades aprobadas por la interventoria, teniendo en cuenta parametros de calidad y especificaciones tecnicas. .Numero de actividades o productos conformes programados el periodo: se calcula de acuerdo a la programacion del periodo y entrega de actividades de acuerdo a cronograma. Meta: EFC=100%
IG5: Índice de gestión 5 para medir el objetivo "integrar los estandares de calidad con los requerimientos de prevencion de riesgo necesarios durante la construccion, asegurando un producto final que supere las expectativas de los clientes y dentro de los plazos reales de construccion". Tasa de Accidentalidad= TA TA=(N°AT * 100)/ N° PROMEDIO DE TRABAJADORES EN EL PERIODO	**2%**	Fuente de informacion: Registro de control de casos de AT, reporte de accidentes de trabajo y listado de personal en obra. Donde: TA: Tasa de Accidentalidad N°AT: Numero de accidentes de trabajo en el periodo Meta: TA:0% Interpretacion: TA:0% indica que en el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo en la obra

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

5. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION ELECTRONICA	TOPCON GTS	285663	28/05/2024	N-07-23 - 21/06/2024	18/12/2024	A la fecha de revision, el equipo mensionado se encuientra calibrado y debidamente certificado
2	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C24 SERIAL 000045	SOKKIA C24	000045	1/05/2024	N-07-23 - 21/06/2024	18/12/2024	A la fecha de revision, el equipo mensionado se encuientra calibrado y debidamente certificado

OBSERVACIONES:

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 22202090255COR

Firma

CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: A441522011-79788484

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
1.00.00	**PRELIMINARES DE OBRA**							
1.00.01	**DESCAPOTE Y LIMPIEZA**	Diseños del proyecto	• Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico. • Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. • Guiarse por los planos para obtener la nivelación correcta del terreno.	Verificación con equipo topográfico de presición.	Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • La Disposición de desechos se debe realizar acatando los procedimientos reglamentados por la autoridad competente. • Las determinadas por el interventor o recomendaciones por el estudio de suelos. • Se deberá cumplir con las especificaciones de profundidad del descapote	Antes de iniciar demoliciones y excavaciones.	Residente de Obra e interventoría	Certificado calibración equipo topografia, Anotación en bitácora, Carteras topográficas, Planos. Derecho de botadero • Transporte de material
1.00.02	**CAMPAMENTO, Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2**	Especificaciones de construcción	Localización y diseño Material Instalación	Medición.	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • El campamento debe quedar ubicado en el lugar que se dispuso en la obra con un error de ± 0.30m. • El campamento debe estar correctamente nivelado para evitar accidente y aumentar la vida útil del mismo. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Antes de iniciar la actividad.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitácora, Medición de obra, Registro fotográfico. (Imágenes, esquemas, etc…)
1.00.03	**SANITARIOS PORTATILES 7 HOMBRES 4 MUJERES**	Especificaciones de construcción	• Se tiene que proporcionar un número suficiente de baños móviles para evitar largas filas. El acceso oportuno es el objetivo principal. • En el lugar debe haber baños para hombres y baños para mujeres, el baño portátil debe estar rotulado y con fácil acceso, la cantidad de baños debe ser proporcional a la cantidad de empleados debiendo haber 1 baño por cada 15 trabajadores. • Los baños deben ser ubicados en zonas ventiladas y de fácil acceso. • Los baños deben ser aseados a diario y coordinando su mantenimiento con el proveedor.	Medición. Y verificacion	• Se deben tener una unidad de baños para máximo 15 trabajadores y en base al número de trabajadores se solicitarán la cantidad de baños portátiles. • El sitio donde se dispondrán los baños debe estar correctamente nivelado para evitar cualquier accidente al momento de ser usado por los trabajadores. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
1.00.04	**BATERIA LAVAMANOS**	Especificaciones de construcción	• Trabajos descritos en el numerales 5 y 6 • Materiales descritos en el numeral 10 • Equipos y herramientas descritos en el numeral 11 • Desperdicios y mano de obra • Transporte dentro y fuera de la obra. • Una vez se terminen los trabajos el CONTRATISTA se tendrá que realizar la demolición y disposición final de las baterias de lavamanos.	Medición. Verificación	• Se deben tener una unidad de lavamanos para máximo 15 trabajadores y en base al número de trabajadores se realizarán las baterias de lavamanos. • El sitio donde se dispondrán los lavamanos debe estar correctamente nivelado para evitar cualquier accidente al momento de ser usado por los trabajadores. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
1.00.05	**CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34**	Especificaciones de construcción	Localización Obras de drenaje Permisos y la legalización de las instalaciones provisionales de servicios públicos	Verificación e inspección ocular Verificación Verificación documental / Inspección en campo	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • La instalación del cerramiento debe estar correctamente nivelada y estar correctamente anclado los postes donde se anclarán las láminas trapezoidales galvanizadas. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
1.00.06	**PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm.**	Especificaciones de construcción	• Suministro de materiales, mano de obra, equipos y/o herramientas requeridas para la instalación de la puerta metálica. • Limpieza del sitio de montaje de la puerta, antes y durante el transcurso de ejecución de la obra. • Desmonte de la puerta y aseo del sitio, una vez finalizados los trabajos objeto del contrato. • Trámite de los permisos, autorizaciones por las Entidades que sean requeridos.	Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría.	Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • La instalación de la puerta debe estar correctamente nivelada y estar correctamente anclado en el marco de tubería estructural. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
1.00.07	**TRASLADO DE COORDENADAS IGAC**	Diseños del proyecto	• Se deben confirmar primero los pasos para solicitar la información geodésica oficial disponible en el momento de la solicitud de los puntos materializados por el IGAC en el territorio nacional. • También se debe realizar una descripción del punto geodésico que consiste en la realizar una explicación detallada del punto donde se encuentra materializado. • Por último, se debe tener en cuenta la documentación requerida, puntos de atención, tiempo de obtención y los medios de seguimiento por parte del usuario.	Verificación con equipo topográfico de presición.	• Cumplir con normas de precisión y los respectivos sistemas geográficos en los cuales se materializaron las coordenadas del proyecto. • Debe tenerse la información esencial la cual es: Coordenadas geodésicas y planas Gauss Kruger, referidas al datum Magna Sirgas, el valor de la altura de precisión, referido al datum buenaventura sobre el nivel medio dl mar y por último el valor gravimétrico IGSN71.	Antes de iniciar demoliciones y excavaciones.	Residente de Obra e interventoría	• Red básica de primer orden del IGAC • Descripción del punto geodésico.
1.00.08	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO**	Seguir recomendaciones de planos topográficos, estudio de suelos, planos estructurales y planos arquitectónicos y/o estructurales.	• Antes de iniciar las actividades se debe constatar la calibración de los equipos de medición para lo cual se debe tener certificado de calibración no mayor a 15 días antes de iniciar los trabajos en campo en caso de ser requerido por la interventoría. • El área demarcada se limpiará y despejará de árboles, matorrales, arbustos, árboles caídos, madera en descomposición, vegetación, escombros y desechos, y de todos los materiales extraños que obstaculicen las labores posteriores. Si es necesario se deben solicitar los permisos necesarios ante las entidades competentes. • Determinar la mejor ubicación del vértice de inicio para confirmar la poligonal de referencia, se procede a limpiar el área alrededor para eliminar obstáculos o interferencias.	Verificación con equipo topográfico de presición.	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra. • Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles. .	Antes de iniciar demoliciones y excavaciones.	Residente de Obra e interventoría	Certificado calibración equipo topografia, Anotación en bitacora, Carteras topográficas, Planos.
1.00.09	**PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador**	• Normativa de la empresa de acueducto aguas de sucre S.A E.S.P.	Esta instalación requiere una solicitud previa a la Empresa de Acueducto, labor que coordinará y realizará el CONSTRUCTOR • La acometida se hará por tubería en PVC o cómo lo determine la empresa de acueducto municipal hasta un lugar de fácil acceso y desde donde se pueda usar el servicio para las diversas necesidades de la obra. • Deberá dejarse por lo menos una llave para que los trabajadores puedan tener agua potable. • Además, habrá aprovisionamiento suficiente para el aseo de los sanitarios comunes.	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente los escombros y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.s	revision mensual del servicio	Residente de Obra e interventoría	Certificado calibración equipo instalado e instalacion de la caliad del servicio
1.00.10	**PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador)**	• Normativa de la empresa de acueducto CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.-AFINIA. • NTC 2050(manual eléctrico colombiano).	• La red eléctrica provisional se construirá, tomando la energía del lugar autorizado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.-AFINIA; una vez dentro del proyecto, se conectará al tablero y protecciones según diseño. • Además de eso el contratista deberá seguir con las recomendaciones de la norma NTC 2050(manual eléctrico colombiano	• Especificaciones técnicas del fabricante	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Se deberá cumplir con la distancia de max de 20 mt para realizar la respectiva acometida provisional. • Cumplir con los requisitos y especificaciones que se dio por parte de la entidad ´prestadora del servicio. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	revision mensual del servicio	Residente de Obra e interventoría	Certificado calibración equipo instalado e instalacion de la caliad del servicio
1.00.11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico**	• Tener en cuenta la norma NTC 2050(manual eléctrico colombiano).	Después de ubicar las zonas se debe consultar con la interventoría y el contratista para confirmar si los reflectores están correctamente ubicados. • Al finalizar la ubicación se debe proceder a realizar la instalación de los puntos eléctrico según especificaciones de interventoria y norma NTC 2050(manual eléctrico colombiano). • Al finalizar la instalación de los puntos eléctricos, se procede a instalar los reflectores siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante.	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Cumplir con la instalación de todos los puntos eléctricos correspondientes a los reflectores. • Cumplir con los requisitos y especificaciones que se dio por parte de la interventoría. • Los reflectores instalados deben estar en su respectiva ubicación de tal manera que cumplan con su función sin ningún tipo de contratiempo	revision mensual del servicio	Residente de Obra e interventoría	Certificado calibración equipo instalado e instalacion de la caliad del servicio

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
1.00.12	**CÁRCAMO LAVADO LLANTAS, incl. desarenados y rejilla**	• Planos Estructurales. • La norma NSR 10.	Colocar refuerzo de acero para cada elemento. - Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. • Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. -Prever el sistema de anclaje. • Verificar dimensiones, plomos y secciones. -Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de ½" (12mm). • Vaciar concreto sobre los moldes. -Vibrar concreto mecánicamente. • Curar elementos. -Desencofrar elementos. Ver Tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados. • Piso limpio y nivelado -Evitar esfuerzos de los elementos durante el almacenamiento. • Verificar plomos y alineamientos. -Instalar rejilla • Resanar y aplicar acabado exterior.	Se medirá y pagará por unidad (un)	• Los elementos deben estar correctamente curados para garantizar su integridad y duración durante el tiempo de ejecución de la obra. • Las dilataciones y modulaciones (si se requieren) deben estar ejecutadas correctamente de tal forma que cumpla con las especificaciones. • El cárcamo debe quedar correctamente aplomado. • El cárcamo se debe entregar con sus respectivos acabados exteriores. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Mantenimiento, aseo durante el transcurso de la obra	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
1.00.13	**PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)**	• Planos Estructurales. • La norma NSR 10.	• Consultar Planos Arquitectónicos - Consultar Planos Estructurales -consultar planos de detalles • Consultar NSR 10. • Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. - Estudiar dimensiones y manipulación. • Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva. • Limpiar formaletas y preparar moldes. - Aplicar desmoldantes. • Colocar refuerzo de acero para cada elemento. - Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.	Se medirá y pagará por unidad (un)	• Cumplir con las especificaciones que aparecen en los planos arquitectónicos y estructurales. • Los elementos deben estar correctamente curados para garantizar su integridad y duración durante el tiempo de ejecución de la obra. • Las dilataciones y modulaciones (si se requieren) deben estar ejecutadas correctamente de tal forma que cumpla con las especificaciones. • Los muros de la piscina deben debe quedar correctamente aplomado y la base de la piscina para curado de cilindros debe quedar correctamente nivelada. • La piscina para curado de cilindros se debe entregar con sus respectivos acabados exteriores.	Mantenimiento, aseo durante el transcurso de la obra	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
1.00.14	**DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)**	• Planos Estructurales. • La norma NSR 10.	• Consultar NSR 10. • Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista. - Estudiar dimensiones y manipulación. • Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su localización definitiva. • Limpiar formaletas y preparar moldes. - Aplicar desmoldantes. • Colocar refuerzo de acero para cada elemento. - Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. • Colocar la tubería correspondiente en su ubicación dada por los planos de detalles. • Se procede a vaciar el concreto de la base adonde se colocará el tanque tipo Eternit de 250 lt. • Después de realizar la curación de la base, se procede a ejecutar los muros en mampostería de ladrillo recocido común. • Verificar dimensiones, plomos y secciones.	Se medirá y pagará por unidad (un)	• Cumplir con las especificaciones que aparecen en los planos arquitectónicos y estructurales. • Los elementos deben estar correctamente curados para garantizar su integridad y duración durante el tiempo de ejecución de la obra. • Las dilataciones y modulaciones (si se requieren) deben estar ejecutadas correctamente de tal forma que cumpla con las especificaciones. • Los muros del desarenador deben debe quedar correctamente aplomado y la base del desarenador para aguas residuales debe quedar correctamente nivelada.	Mantenimiento, aseo durante el transcurso de la obra	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.00	**CIMENTACION**							
2.00.01	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero**	• Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS). • Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.	• El material excavado no podrá almacenarse en la parte superior de la excavación, deberá cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado fuera de la obra en un sitio donde las Autoridades Municipales lo permitan. • Antes de comenzar las excavaciones, el CONSTRUCTOR deberá realizar en conjunto con el CONTRATANTE el levantamiento para determinar los niveles superiores del material a excavar, con el fin de poder calcular la cantidad de obra a ejecutar. • Las excavaciones se ajustarán a los niveles y planos horizontales, verticales o inclinados, de acuerdo con los detalles estructurales tomando en cuenta las recomendaciones del estudio de suelos. • El CONSTRUCTOR proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONSTRUCTOR.	Medición. Y verificacion	• Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado. • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• El CONSTRUCTOR verificará en el estudio de suelos las recomendaciones especiales que deban seguirse para la ejecución de las excavaciones. Los taludes provisionales que se utilicen para estabilizar la excavación deberán ser aprobados por el Asesor de suelos. • Para las excavaciones manuales de los cimientos el CONSTRUCTOR deberá prever las condiciones climáticas, de consistencia del terreno y profundidad de las excavaciones, transporte vertical etc., pues al presentarse condiciones extremas de las mismas que hagan necesario el uso de entibados o equipos de bombeo, no se reconocerá obra adicional o ajustes por tales conceptos	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.02	**EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra**	• Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS). • Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.	• El material excavado no podrá almacenarse en la parte superior de la excavación, deberá cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado fuera de la obra en un sitio donde las Autoridades Municipales lo permitan. • Antes de comenzar las excavaciones, el CONSTRUCTOR deberá realizar en conjunto con el CONTRATANTE el levantamiento para determinar los niveles superiores del material a excavar, con el fin de poder calcular la cantidad de obra a ejecutar. • Las excavaciones se ajustarán a los niveles y planos horizontales, verticales o inclinados, de acuerdo con los detalles estructurales tomando en cuenta las recomendaciones del estudio de suelos. • El CONSTRUCTOR proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONSTRUCTOR.	Medición. Y verificacion	• Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado. • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• El CONSTRUCTOR verificará en el estudio de suelos las recomendaciones especiales que deban seguirse para la ejecución de las excavaciones. Los taludes provisionales que se utilicen para estabilizar la excavación deberán ser aprobados por el Asesor de suelos. • Para las excavaciones manuales de los cimientos el CONSTRUCTOR deberá prever las condiciones climáticas, de consistencia del terreno y profundidad de las excavaciones, transporte vertical etc., pues al presentarse condiciones extremas de las mismas que hagan necesario el uso de entibados o equipos de bombeo, no se reconocerá obra adicional o ajustes por tales conceptos	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.03	**EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero**	• Según ART. 200 Desmonte y limpieza (INVIAS). • Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.	• El material excavado no podrá almacenarse en la parte superior de la excavación, deberá cargarse directamente en volquetas para ser transportado y botado fuera de la obra en un sitio donde las Autoridades Municipales lo permitan. • Antes de comenzar las excavaciones, el CONSTRUCTOR deberá realizar en conjunto con el CONTRATANTE el levantamiento para determinar los niveles superiores del material a excavar, con el fin de poder calcular la cantidad de obra a ejecutar. • Las excavaciones se ajustarán a los niveles y planos horizontales, verticales o inclinados, de acuerdo con los detalles estructurales tomando en cuenta las recomendaciones del estudio de suelos. • El CONSTRUCTOR proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra, los materiales de excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras correspondientes y serán a cargo del CONSTRUCTOR.	Medición. Y verificacion	• Se debe asegurar que la densidad alcanzada en obra sea de al menos el 95% de la densidad conseguida en el ensayo de Proctor modificado. • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• El CONSTRUCTOR verificará en el estudio de suelos las recomendaciones especiales que deban seguirse para la ejecución de las excavaciones. Los taludes provisionales que se utilicen para estabilizar la excavación deberán ser aprobados por el Asesor de suelos. • Para las excavaciones manuales de los cimientos el CONSTRUCTOR deberá prever las condiciones climáticas, de consistencia del terreno y profundidad de las excavaciones, transporte vertical etc., pues al presentarse condiciones extremas de las mismas que hagan necesario el uso de entibados o equipos de bombeo, no se reconocerá obra adicional o ajustes por tales conceptos	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
2.00.04	**FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación**	• Estudio de suelos • Especificaciones técnicas	• En primer lugar, se debe hacer la excavación de la zanja teniendo en cuenta lo establecido en el diseño en lo que tiene que ver con dimensiones cotas y pendientes. También hay que tener en cuenta que el ancho para la instalación de esta clase de órdenes es mucho menor que la que usualmente se utiliza para la construcción de drenes franceses por lo cual el rendimiento será mucho mayor. • inicialmente se colocan alrededor de 5 centímetros de material de relleno en el fondo de la excavación. Posteriormente se coloca el geodrén de forma vertical preferiblemente en el centro de la excavación. • Tanto la tubería como el geodrén pueden cortarse en la medida en la que se requiera dentro del proyecto. • Es necesario que haya un adecuado contacto del geo redes en el traslapo de mínimo 20 centímetros y que quede muy bien cubierta con el geotextil. En cuanto a la tubería, se recomienda el uso de acoples de unión. • La zanja deberá ser rellenada con material granular tipo filtro preferiblemente arena limpia o grava con el propósito de aumentar la vida útil del sistema subdrenaje y el relleno deberá hacerse llenando simultáneamente ambos lados del geodrén. • Este material deberá compactarse adecuadamente de tal manera que se mejore el contacto que tiene éste con el geodrén y se disminuya la compresibilidad del relleno. • Posteriormente se debe sellar la parte superior del drenaje con un material granular que permita la adecuada infiltración del agua al sistema.	filtro francés bajo placa de cimentación según diseño 0.25x0.30 m. El trabajo comprende la apertura de la zanja, el suministro y colocación de geotextil NT1600 de pavco o similar	• Hacer un adecuado traslapo del geodrén. Las redes deben quedar en contacto unas con otras con una longitud mínima de 20 centímetros y deben quedar adecuadamente cubiertas por el geotextil para que no haya intrusión de materiales finos al sistema. • No rellenar la zanja con el mismo material de la excavación, sobre todo si este tiene los plásticos a su interior, esto afectaría el rendimiento del sistema a largo plazo. • Compactar el relleno para no afectar la eficiencia del geodrén a largo plazo además de generar deformaciones superficiales. • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia	Se rige según las indicaciones de planos cimentación y los resultados arrojados en el estudio de suelos Alfonso Uribe	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.05	**PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE**	• Proctor modificado AASHTOT-180 Método D • Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.	Una vez concluidos los cortes, se procederá a escarificar la superficie del camino mediante el uso de una motoniveladora, tractor con ripper o de rastras en zonas de difícil acceso, en una profundidad mínima de 15 cm; los agregados pétreos mayores a 3" que se encuentren serán retirados. • Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, con el empleo repetido y alternativo de camiones cisterna, provisto de dispositivos que garanticen un riego uniforme y motoniveladora. • La operación será continua hasta lograr un material homogéneo, de humedad lo más cercana a la óptima definida por el ensayo de compactación proctor modificado que se indica en el estudio de suelos del proyecto. • En seguida, empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado, se efectuará la compactación del material hasta conformar una superficie de acuerdo a los perfiles y geometría de la rasante proyectada, una vez compactada. • La cota de cualquier punto de la subrasante, conformada y compactada, no debe variar en más de 20 milímetros (20mm) de la cota proyectada	• Estudio de suelos • Especificaciones técnicas	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Método de prueba estándar densidad en sitio y contenido de agua de suelo y agregados por métodos nucleares (superficiales) ASTM D6938.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.06	**CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa**	Ensayo de resistencia a la compresión INV-E-410-07	• Antes de comenzar la colocación del concreto ciclópeo, el ingeniero de suelos deberá aprobar el suelo de fundación. • El fondo de la excavación debe encontrarse limpio de cualquier material suelto que no le permita desempeñar las funciones al concreto de mejoramiento de la cimentación. • La mezcla de concreto ciclópeo tendrá una resistencia a la compresión de 17 MPa, medida a los 28 días y tendrá un porcentaje de 40 % de media zonga. • El espesor de este concreto dependerá de las especificaciones del plano estructura. • El concreto ciclópeo no se considera parte de la cimentación inferior al acero de refuerzo.	• El espesor de este concreto dependerá de las especificaciones del plano estructura. • El concreto ciclópeo no se considera parte de la cimentación inferior al acero de refuerzo.	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Estudio de suelos Alfonso Uribe S. • Especificaciones técnicas • Planos de detalles • NTC 550	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.07	**CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt**	Ensayos para concreto (NSR 2010)	• Consultar Cimentación en Planos Estructurales. • Verificar excavaciones. • Verificar cotas de cimentación. • Aprobación del suelo por el Ingeniero Geotecnista • Limpiar fondo de la excavación. • Retirar materias orgánicas. • Cubrir el fondo de la excavación con concreto. • Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. • Nivelar superficie. • Verificar cotas inferiores de cimentación	• El fondo de la cimentación debe encontrarse limpio de cualquier material suelto que no le permita las funciones del concreto de limpieza, la Interventoría deberá revisar y aprobar el fondo de la cimentación antes de comenzar la colocación del concreto de limpieza	• Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010 • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Ensayos para concreto (NSR 2010)	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.08	**ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Premezclado no incluye refuerzo)**	• Asentamiento (ICONTEC 396) • Método para ensayos de cilindros de concreto a la compresión. (designación C-39 de la ASTM o ICONTEC 550 y 673).	• Terminados los trabajos de instalación de acero de refuerzo • Si se requiere por la calidad del terreno o las condiciones de la excavación se procederá a la instalación de formaleta que garantice la conformación y dimensiones previstas • Proceder a la colocación del concreto de 4000 PSI, el cual debe tener óptimas condiciones de manejabilidad • Una vez se coloque el concreto por bombeo de mixer, se debe vibrar	• Verificar resistencia del concreto utilizado por medio de ensayos del apartado 13. • Curar durante 28 días • Seguir indicaciones de interventoría en cuanto a ensayos adicionales.	• Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010 • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Ensayos para concreto (NSR 2010)	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.09	**PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)**	• Asentamiento (ICONTEC 396) • Características de los agregados • Método para ensayos de cilindros de concreto a la compresión. (designación C-39 de la ASTM o ICONTEC 550 y 673).	Consultar detalles de armado y figuración en Planos Estructurales. • Verificar cotas y alineamiento, refuerzo instalado, localización y estado de la formaleta, controlando tolerancias para el recubrimiento del acero. • Asegurar, nivelar y plomar formaletas • Preparar y Colocar concreto de acuerdo a lo indicado en las normas, prestando especial atención a la labor de vibrado y compactación del concreto para evitar defectos de apariencia y construcción.	• Verificar niveles finales de vaciado. • Retirar formaletas cuando las condiciones de fraguado lo permitan. • Inspeccionar e iniciar el proceso de curado	• Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010 • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Ensayos para concreto (NSR 2010)	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.10	**VIGA DE CIMENTACIÓN VC F´c= 28 Mpa, Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)**	• Asentamiento (ICONTEC 396) • Características de los agregados • Método para ensayos de cilindros de concreto a la compresión. (designación C-39 de la ASTM o ICONTEC 550 y 673).	• Verificar excavaciones. • Verificar cotas de cimentación. • Verificar excavación y concreto de limpieza. • Verificar localización y dimensiones. • Replantear vigas sobre concreto de limpieza. • Verificar nivel superior del concreto de limpieza. • Colocar y revisar refuerzo de acero. • Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. • Verificar refuerzos y recubrimientos. • Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. • Vaciar concreto progresivamente. • Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.	• Aplicar un curador al concreto (antisol tipo sika o similar) • Verificar niveles finales para aceptación.	• Las vigas podrán descimbrarse 12 horas después de fundidas; una vez desencofradas debe mantenerse húmeda superficialmente, recubriéndolas con plástico su superficie para evitar que pierda humedad rápidamente durante los 7 primeros días del fraguado. • No debe exagerarse el tiempo de vibrado de los elementos, para evitar que salga de la formaleta la pasta de la mezcla • Las vigas deben quedar correctamente niveladas. • La viga no deberá quedar con vacios u hormiguero	Ensayos para concreto (NSR 2010)	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
2.00.11	**EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN**	• Se deberán efectuar ensayos de densidad en el campo para verificar las condiciones del relleno durante el proceso de compactación. • Calidad de los agregados: Desgaste (INV E-218) • Pérdida de solidez (INV E-220) • Plasticidad (INV E-125, INV E-126) • Compactación (INV E-142) • Granulometría INV E-123	• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. • Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. • Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza. • Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. • Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. • Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. • Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta alcanzar los niveles previstos. • Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando la uniformidad. • Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sit	La cimentación de los bloques que conforman el proyecto estará conformada por zapatas aisladas para las columnas que se fundarán sobre las arcillas de color café, así las cosas, el material proveniente de excavación debe estar libre del material proveniente del descapote así como no deberá contener raíces.	• La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cms. siempre que no se repita sistemáticamente. • El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de la proyectada. • Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cms. de las del proyecto	• Equipos vibradores Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de 48" de diámetro y peso de 7000 libras. • Cilindros oscilantes de neumáticos Estos cilindros se pueden emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. • Apisonadoras Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². Velocidades de operación de las maquinas • Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 km/h. • Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. • Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. • Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. • Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es suministrada, disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km /h.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.12	**RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO**	• Se deberán efectuar ensayos de densidad en el campo para verificar las condiciones del relleno durante el proceso de compactación. • Calidad de los agregados: Desgaste (INV E-218) • Pérdida de solidez (INV E-220) • Plasticidad (INV E-125, INV E-126) • Compactación (INV E-142) • Granulometría INV E-123	• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. • Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. • Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza. • Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno. • Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. • Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. • Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta alcanzar los niveles previstos. • Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando la uniformidad. • Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sit	• Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. • Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación y estado general del relleno. • Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos. • Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. • Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas	• La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cms. siempre que no se repita sistemáticamente. • El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de la proyectada. • Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cms. de las del proyecto	• Equipos vibradores Los equipos vibradores por medio de una plataforma oscilante, se usan con frecuencias de 1500 a 2000 ciclos por segundo, también se emplean equipos vibradores por medio de cilindros lisos oscilantes de 48" de diámetro y peso de 7000 libras. • Cilindros oscilantes de neumáticos Estos cilindros se puedan emplear para suelos granulares y cohesivos. En general son para remolcar y su sistema es de un eje con llantas de gran dimensión. El sistema de vibración puede ser desconectado de modo que se pueda operar el cilindro sin vibración. • Apisonadoras Para compactar suelos en los sitios de difícil acceso para las maquinas, se emplean pisones neumáticos, ranas o pisones de mano. Estos últimos se suelen construir de hierro o de acero, con peso total de 25 kg. y superficie del piso de 600 cm². Velocidades de operación de las maquinas • Rodillos lisos de acero: de 4 - 8 km/h se considera que la velocidad optima es de 5 km/h. • Patecabras : de 6 - 10 km/h optima = 8 km/h. • Rodillos de llantas neumáticas: de 10 - 20 km/h. • Cilindros de malla: de 15 a 25 km/h. • Cilindros lisos oscilantes: cada suelo tiene una velocidad apropiada, que si no es suministrada, disminuye la eficiencia de la máquina. En general la velocidad debe ser de 3 a 8 km /h.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
2.00.13	**ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado**	• NSR-10 • NTC 1925 • NTC 2289 • NTC 2310 • NTC 3353	El acero de refuerzo deberá colocarse con las longitudes, calibres, calidades y ubicación indicada en los planos estructurales y poniendo especial cuidado al recubrimiento mínimo. • El recubrimiento inferior y lateral de los hierros de refuerzo deberá garantizarse por medio del uso de espaciadores, a proponer por el CONSTRUCTOR, de la medida adecuada a cada elemento estructural. No podrán utilizarse espaciadores metálicos o de madera. • No se aceptarán traslapos ni empates de las varillas de refuerzo en ningún sitio distinto al mostrado en los planos. Las longitudes de corte de las varillas serán exactamente las indicadas en los planos y no podrán ser modificadas en ningún elemento estructural, por lo cual el CONSTRUCTOR asumirá el costo del desperdicio por sobrantes de hierro al efectuar los cortes. • En refuerzos donde por su longitud no sean necesarios los despieces en planos, se utilizarán longitudes de varillas así: Para varillas de 1/4" y 3/8" longitudes de 12 metros o más incluyendo ganchos en todos los extremos de 15 cm.	• El concreto sólo podrá vaciarse después de que el CONTRATANTE verifique la colocación, formaletas, cantidad y diámetro de las varillas de refuerzo.	• Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada. • Estribos amarrados con alambre y distribuidos	• El concreto sólo podrá vaciarse después de que el CONTRATANTE verifique la colocación, formaletas, cantidad y diámetro de las varillas de refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.00	**ESTRUCTURA**							
3.00.01	**COLUMNAS, concreto 28 Mpa**	• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C31	Antes del vaciado y durante él, debe verificarse la orientación de sus caras, el plomado o verticalidad de los elementos y su posición con respecto a los ejes estructurales, los que el Contratista habrá cimbrado previamente para su revisión. • Las normas de recubrimientos y cuidados del vaciado del concreto deberán ajustarse a lo determinado por la NSR-10. Con el fin de garantizar los recubrimientos del acero de refuerzo y las separaciones entre varillas, deben utilizarse elementos separadores y distanciadores de la marca recomendada en los planos estructurales. • Se utilizará concreto con resistencia a la compresión a los 28 días de 28 Mpa. • Dependiendo del sistema que use el Constructor para el amarre de la base de la formaleta (taches de acero, piezas de madera etc.), estará en la obligación de quitar los taches o retirar la madera utilizada para esta sujeción y llenar con mortero los huecos dejados por estos elementos para garantizar el acabado del piso en toda la superficie. • En ningún momento se permitirá que el sistema de fijación de las formaletas consista en soldar al refuerzo de la columna elementos de acero.	• No se admitirá ninguna holgura en la distancia entre ejes, es decir que las columnas deberán quedar localizadas tal y como se muestra en los planos. En cuanto a ortogonalidad, no se admitirán desviaciones mayores a 1mm, en la longitud de la cara más larga verificada. • Se deben utilizar chaflanes en los vértices de las formaletas para facilitar el desencofrado y así mejorar la apariencia final del elemento. El Constructor deberá mantener en la obra un ingeniero civil debidamente matriculado como responsable directo de la ejecución de los trabajos. Estas operaciones requieren mano de obra calificada y supervisión permanente de profesionales idóneos.	• Las columnas podrán descimbrarse 12 horas después de fundidas; una vez desencofradas debe mantenerse húmeda superficialmente, recubriéndolas con plástico su superficie para evitar que pierda humedad rápidamente durante los 7 primeros días del fraguado. • No debe exagerarse el tiempo de vibrado de los elementos, para evitar que salga de la formaleta la pasta de la mezcla • Las columnas deben quedar correctamente aplomadas y niveladas. • La columna no deberá quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	• Se deberá realizar el ensayo del Slump o asentamiento conforme a como lo indica la norma NTC 396. • Se deberá realizar el ensayo de resistencia a la compresión y se realizará en los cilindros estándar de ensayo, elaboración y fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C31. • Calidad de los materiales.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
3.00.02	**ESCALERAS CONCRETO A LA VISTA, DE 28 Mpa, CON FORMALETA SÚPER T Inc. Gualderas y lineales, filos rebajados**	• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C32	Estudiar y definir formaletas a emplear. • Estudiar y definir las dilataciones de formaletas - Replantear la escalera y/o rampas en la losa precedente. • Preparar formaletas y aplicar desmoldante. • Armar formaletas de descansos y gualderas. • Armar formaletas para tramos inclinados. • Instalar soportes y distanciadores para refuerzo	• Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Vaciar concreta escalera y/o rampa verificando el espesor. • Vibrar concreto. • Curar concreto. • Desencofrar. • Realizar resanes y reparaciones. • Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. Se utilizará concreto con resistencia a la compresión a los 28 días de 28 Mpa.	• Las escaleras podrán descimbrarse 12 horas después de fundidas; una vez desencofradas debe mantenerse húmeda superficialmente, recubriéndolas con plástico su superficie para evitar que pierda humedad rápidamente durante los 7 primeros días del fraguado. • No debe exagerarse el tiempo de vibrado de los elementos, para evitar que salga de la formaleta la pasta de la mezcla • Las escaleras deben quedar correctamente aplomadas y niveladas. • La escalera no deberá quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	• Las escaleras podrán descimbrarse 12 horas después de fundidas; una vez desencofradas debe mantenerse húmeda superficialmente, recubriéndolas con plástico su superficie para evitar que pierda humedad rápidamente durante los 7 primeros días del fraguado. • No debe exagerarse el tiempo de vibrado de los elementos, para evitar que salga de la formaleta la pasta de la mezcla • Las escaleras deben quedar correctamente aplomadas y niveladas. • La escalera no deberá quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.03	**MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa**	• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C31• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C31	• El refuerzo será limpiado con grata hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que a juicio del Interventor no permita la adherencia entre el acero y el Concreto. • El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será gravilla fina. • El concreto utilizado tendrá la resistencia exigida en los planos estructurales a los 28 días. • Una vez desformaleteadas los muros el Constructor verificará en presencia del Interventor la verticalidad de estas y la ortogonalidad de las caras. • Los asentamientos deberán ser comparados con los estimativos del Estudio de Suelos y se deberá informar al Ingeniero de Suelos sobre los resultados obtenidos. Esta labor será tenida en cuenta por el Constructor dentro del AIU.Se deben utilizar chaflanes en los vértices de las formaletas para facilitar el desencofrado y así mejorar la apariencia final del elemento. • El Constructor deberá mantener en la obra un ingeniero civil debidamente matriculado como responsable directo de la ejecución de los trabajos. Estas operaciones requieren mano de obra calificada y supervisión permanente de profesionales idóneos.	• Consultar Planos Arquitectónicos. • Consultar Planos Estructurales. • Consulta NSR-10. • Estudiar y definir formaletas a emplear.	Los muros de contención podrán descimbrarse 12 horas después de fundidos; una vez desencofradas debe mantenerse húmeda superficialmente, recubriéndolas con plástico su superficie para evitar que pierda humedad rápidamente durante los 7 primeros días del fraguado. • No debe exagerarse el tiempo de vibrado de los elementos, para evitar que salga de la formaleta la pasta de la mezcla • Los muros de contención deben quedar correctamente aplomados y nivelados. • Los muros de contención no deberán quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto	Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminar la colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.04	**PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO e=0,55m, concreto 28 Mpa. Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.**	• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C31• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C32	• Utilizar casetón de guadua para placas de cimentación y/o contra terreno. • Dimensiones y especificaciones técnicas según diseño estructural, formaleta en tablero liso aglomerado con capa impermeabilizante de resina cal 19 mm tipo Tablemac súper T o semejante metálica de formato mínimo 1x2m., achaflanada según diseño estructural. El concreto debe ser fluido para acabado arquitectónico con asentamiento de 15cms tolerancia máximo 1". Interventoría debe determinar la máxima reutilización de la formaleta. Cumplir con condiciones especiales para aplicación de pisos epóxicos. • La formaleta que se vaya a utilizar y su sistema de apuntalamiento deben ser aprobados por el Interventor antes de su alquiler o compra. • Colocar formaleta y nivelar • Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. • Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. • Colocar testeros de borde. • Colocar refuerzo de acero. • Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.	• Consultar Planos Arquitectónicos. • Consultar Planos Estructurales. • Consulta NSR-10. • Estudiar y definir formaletas a emplear.	Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminar la colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.	Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminar la colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.05	**PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0,55m, concreto 28 Mpa. con fibra según especificación estructural, Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.**	• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C31• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C33	• Utilizar casetón de guadua para placas de cimentación y/o contra terreno. • Dimensiones y especificaciones técnicas según diseño estructural, formaleta en tablero liso aglomerado con capa impermeabilizante de resina cal 19 mm tipo Tablemac súper T o semejante metálica de formato mínimo 1x2m., achaflanada según diseño estructural. El concreto debe ser fluido para acabado arquitectónico con asentamiento de 15cms tolerancia máximo 1". Interventoría debe determinar la máxima reutilización de la formaleta. Cumplir con condiciones especiales para aplicación de pisos epóxicos. • La formaleta que se vaya a utilizar y su sistema de apuntalamiento deben ser aprobados por el Interventor antes de su alquiler o compra. • Colocar formaleta y nivelar • Replantear elementos estructurales sobre la formaleta. • Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas. • Colocar testeros de borde. • Colocar refuerzo de acero. • Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.	• Consultar Planos Arquitectónicos. • Consultar Planos Estructurales. • Consulta NSR-10. • Estudiar y definir formaletas a emplear.	Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminar la colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.	Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminar la colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.06	**TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa, incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería**	• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C31• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C34	Los materiales utilizados deberán cumplir con las especificaciones generales antes descritas. La resistencia del acero y del concreto debe ser la especificada en los planos de construcción. • Se deberá prever una escalera, garantizando su fijación, tipo gato en aluminio, anclada al muro, con patas de cabra o platinas. Adicionalmente se deberán tener en cuenta los pasamuros en acero galvanizado, es decir, reboses, respiraderos y pases de acometida, lavado, succión y recirculación, provistos de ruanas en acero galvanizado (según los planos hidráulicos). • Los marcos y tapas de inspección se harán de acuerdo a los detalles mostrados en los planos. Se deberán dejar previstos los pases para la tubería y accesorios necesarios para la acometida del tanque, al igual que las instalaciones eléctricas necesarias. • De igual manera se deberán seguir las indicaciones de los planos hidrosanitarios para la construcción del tanque. • Todos los requerimientos de recubrimientos y cuidados del vaciado del concreto deberán ajustarse a lo determinado por la NSR-10. • Dependiendo del sistema que use el Constructor para el amarre de la base de la formaleta (taches de acero, piezas de madera etc.), estará en la obligación de quitar los taches o retirar la madera utilizada para esta sujeción y llenar con mortero los huecos dejados por estos elementos para garantizar el acabado del piso en toda la superficie. • En ningún momento se permitirá que el sistema de fijación de las formaletas consista en soldar al refuerzo de la columna elementos de acero	• Consultar Planos Arquitectónicos. • Consultar Planos Estructurales. • Consultar NSR 10.	• El tanque podrá descimbrarse 12 horas después de fundidas; una vez desencofradas debe mantenerse húmeda superficialmente, recubriéndolas con plástico su superficie para evitar que pierda humedad rápidamente durante los 7 primeros días del fraguado. • No debe exagerarse el tiempo de vibrado de los elementos, para evitar que salga de la formaleta la pasta de la mezcla. • El tanque deberá cumplir con todas las especificaciones que se encuentran en los planos, estructurales, arquitectónicos y hidráulicos. • El tanque debe quedar correctamente aplomado y nivelado. • El tanque no deberá quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	Inspeccionar la concordancia del acero de refuerzo en planos; para tal efecto debe culminar la colocación de refuerzo con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
3.00.07	**GEODREN PLANAR DETRÁS DE MURO DE CONTENCIÓN**	• Comprobar que el GEODRÉN (Geotextil, Geo-red, tubería circular perforada) cumpla con las especificaciones descritas. • Verificar que el material de relleno cumpla con las características establecidas en esta Especificación. • Verificar que todo trabajo se realice de acuerdo con la especificación y los planos de diseño.	• Se instalará el geodrén con tubería en contrapendiente para asegurar, en tiempo de invierno, la fácil evacuación del agua a los sitios finales de disposición indicados en los planos. El geodrén se colocará en contacto directo con las capas granulares de la estructura de pavimento • El geodrén se anclará al terreno natural de tal forma que no se vaya a deslizar, conservando todos los parámetros de diseño. Para su anclaje se utilizarán ganchos metálicos. • No se permitirá que el geodrén quede expuesto, sin cubrir, por un lapso mayor de mayor a tres (3) días. • Se utilizará como material de lleno de la zanja grava, arena gruesa, ó material tipo sub-base granular. • El relleno se llevará a cabo hasta la altura indicada en los planos o la autorizada por el interventor. • Completado el relleno, la zanja se cubrirá se cubrirá con el suelo proveniente de la excavación, colocado y compactado en capas sucesivas, hasta la altura requerida en los planos o la ordenada por el Interventor.	• Comprobar que el GEODRÉN (Geotextil, Geo-red, tubería circular perforada) cumpla con las especificaciones descritas. • Verificar que el material de relleno cumpla con las características establecidas en esta Especificación. • Verificar que todo trabajo se realice de acuerdo con la especificación y los planos de diseño. • Supervisar la correcta disposición de los materiales en los sitios definidos para este fin. • Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos de calidad exigidos por la presente especificación. • Verificar que cada rollo de geodrén tenga la información del fabricante y el número del lote.	Cada despacho de geodrén deberá venir acompañado de una certificación del laboratorio del fabricante para el geotextil, la geo-red, el Geodrén planar y la tubería, que garantice que el producto satisface las exigencias de calidad indicadas en los documentos del proyecto y en esta especificación. El Interventor, con la frecuencia que considere necesaria, efectuará las pruebas especificadas y rechazará el geodrén si éste incumple una ó más de las exigencias de las pruebas.	• Comprobar que durante el transporte y el almacenamiento, los geotextiles tengan los empaques que los proteja de la acción de los rayos ultravioleta, agua, barro, polvo. • Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a su satisfacción.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.08	**RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DETRÁS DE MUROS DE CONTENCIÓN, según recomendación estudio de suelos**	• Se deberán efectuar ensayos de densidad en el campo para verificar las condiciones del relleno durante el proceso de compactación. • Calidad de los agregados: Desgaste (INV E-218) • Pérdida de solidez (INV E-220) • Plasticidad (INV E-125, INV E-126) • Compactación (INV E-142) • Granulometría INV E-123	• Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. • Garantizar suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego. • Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cms hasta alcanzar los niveles previstos. • Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego ó secado garantizando la uniformidad. • Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales. • Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación y estado general del relleno. • Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser requeridos. • Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación. • Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas	• Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. • Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. • Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza. • Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno.	• La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más ó menos 1.5 cms. siempre que no se repita sistemáticamente. • El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cms de la proyectada. • Las cotas de superficie de la base terminada, no deberán variar en más de 3 cms. de las del proyecto	Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales. • Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. • Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.09	**NEOPRENO 3/8" PARA JUNTAS ESTRUCTURALES DUREZA 60 0.35x0.70 mts**	NEOPRENO 3/8" DUREZA 60 0.35x0.70 mts	Verificar dimensiones de las juntas de neopreno, cada trozo debe cumplir con tener las dimensiones de los cruces viga-columna de 0.35 x 0.70 m o en su defecto 0.35 x 0.80 m • Disponer de las juntas y verificar niveles, simetrías y proporcionalidad antes de fundir. • Se debe recibir aprobación de residente antes de proceder con la colocación del concreto.	Revisar los planos arquitectónicos y estructurales. • Identificar las zonas de pasarelas que requieren juntas de neopreno entre elementos de concreto	• Se debe garantizar el calibre del Neopreno, dureza 60. • Cortes rectos, sin enmendaduras por unidad.	se revisa anualmente de acuerdo a los moviemientos y comportamientos de la losa	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.10	**POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN**	Traslapes de la lámina de 30 cm.	Cubrir la zona de interés con la lámina de polietileno calibre 6 teniendo en cuenta traslapes aproximados a 30 cm entre cada una de las láminas • Limpiar la superficie antes de la colocación de la capa niveladora de concreto pobre que subyace a la losa. • Limpiar la zona de trabajo.	Verificación de planos estructurales • Establecer zona de huella de placa • Limpiar el terreno natural de irregularidades notorias y cuerpos geológicos que dificulten la regularidad del terreno	Traslapes de la lámina de 30 cm.	se revisa anualmente de acuerdo a los moviemientos y comportamientos de la losa	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.11	**ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado**	• NSR-10 • NTC 1925 • NTC 2289 • NTC 2310 • NTC 3353	El acero de refuerzo deberá colocarse con las longitudes, calibres, calidades y ubicación indicada en los planos estructurales y poniendo especial cuidado al recubrimiento mínimo. • El recubrimiento inferior y lateral de los hierros de refuerzo deberá garantizarse por medio del uso de espaciadores, a proponer por el CONSTRUCTOR, de la medida adecuada a cada elemento estructural. No podrán utilizarse espaciadores metálicos o de madera. • No se aceptarán traslapos ni empates de las varillas de refuerzo en ningún sitio distinto al mostrado en los planos. Las longitudes de corte de las varillas serán exactamente las indicadas en los planos y no podrán ser modificadas en ningún elemento estructural, por lo cual el CONSTRUCTOR asumirá el costo del desperdicio por sobrantes de hierro al efectuar los cortes. • En refuerzos donde por su longitud no sean necesarios los despieces en planos, se utilizarán longitudes de varillas así: Para varillas de 1/4" y 3/8" longitudes de 12 metros o más incluyendo ganchos en todos los extremos de 15 cm.	• El concreto sólo podrá vaciarse después de que el CONTRATANTE verifique la colocación, formaletas, cantidad y diámetro de las varillas de refuerzo.	• Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada. • Estribos amarrados con alambre y distribuidos	• El concreto sólo podrá vaciarse después de que el CONTRATANTE verifique la colocación, formaletas, cantidad y diámetro de las varillas de refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
3.00.12	**MALLA ELECTRO SOLDADA**	• NSR-10 • NTC 1925 • NTC 2289 • NTC 2310 • NTC 3353	El acero de refuerzo deberá colocarse con las longitudes, calibres, calidades y ubicación indicada en los planos estructurales y poniendo especial cuidado al recubrimiento mínimo. • El recubrimiento inferior y lateral de los hierros de refuerzo deberá garantizarse por medio del uso de espaciadores, a proponer por el CONSTRUCTOR, de la medida adecuada a cada elemento estructural. No podrán utilizarse espaciadores metálicos o de madera. • No se aceptarán traslapos ni empates de las varillas de refuerzo en ningún sitio distinto al mostrado en los planos. Las longitudes de corte de las varillas serán exactamente las indicadas en los planos y no podrán ser modificadas en ningún elemento estructural, por lo cual el CONSTRUCTOR asumirá el costo del desperdicio por sobrantes de hierro al efectuar los cortes. • En refuerzos donde por su longitud no sean necesarios los despieces en planos, se utilizarán longitudes de varillas así: Para varillas de 1/4" y 3/8" longitudes de 12 metros o más incluyendo ganchos en todos los extremos de 15 cm.	• El concreto sólo podrá vaciarse después de que el CONTRATANTE verifique la colocación, formaletas, cantidad y diámetro de las varillas de refuerzo.	• Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada. • Estribos amarrados con alambre y distribuidos	• El concreto sólo podrá vaciarse después de que el CONTRATANTE verifique la colocación, formaletas, cantidad y diámetro de las varillas de refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
3.00.13	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CUBIERTA, Incl. Peldaños en tubo de acero galvanizado de D=3/4" Cal.16 + Pintura Anticorrosiva**	• NSR-10 • NTC 1925 • NTC 2289 • NTC 2310 • ASTM E-165	Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros serán los indicados en planos de detalles y en las especificaciones particulares de cada estructura. • Los aceros empleados cumplirán las especificaciones generales y deberán encontrarse en condiciones similares a las que tengan al salir de la fábrica y no deberán haber sufrido dobladuras ni calentamientos. Ningún elemento metálico deberá sufrir accidentes mecánicos o químicos antes, durante o después del montaje o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecánicas de los elementos, en el caso de que esto suceda el elemento deberá ser sustituido. • Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricarán en la forma indicada en los planos, de modo que no varíen sus centros de gravedad. • Una vez montada la estructura, esta deberá ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias, Si el interventor lo exigiere, el CONSTRUCTOR deberá efectuar las pruebas de cargas apropiadas para el caso. • Todas las partes de la estructura deberán ser revisadas detalladamente por el interventor antes del montaje para su aceptación u observación.	• El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusión de escorias, porosidades grandes, cavidades u otros defectos de deposición. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada será aceptada a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundirá adecuadamente con el de las piezas a unir, sin socavación seria o traslapo de los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse con esmeril para presentar contornos sólidos y uniformes. En casos en que el metal de la soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas, sin fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y escoplearán y la junta se soldará de nuevo. Las socavaciones se podrán reparar depositando más metal. • La estructura metálica llevará una mano de pintura anticorrosiva con base en cromato de zinc, aplicada en los talleres y otra adicional en la obra, para lo cual se limpiarán con papel esmeril o cepillo de acero todos los elementos previamente. Finalmente, se le aplicará la pintura de acabado en esmalte o intumescente especial para metales.	• La estructura deberá ser diseñada con los códigos AISC y CCCSR, y fabricada con perfiles de acero de procedencia nacional que cumplan con las normas NTC. • Todos los materiales serán nuevos y de la mejor calidad. La carga total de diseño será estipulada por el diseñador estructural. Antes de proceder a la fabricación de la estructura en general, las medidas deberán ser verificadas en la obra para evitar modificaciones posteriores.	• En los miembros principales de la estructura, todos los elementos deberán ser únicamente perfiles de acero de sección en ángulo; no se aceptarán elementos en varilla o tubulares de cualquier sección. • Deben además incluirse los elementos para arriostramiento de la estructura • El proponente deberá anexar a su propuesta el diseño, así como las memorias de cálculo respectivas, para efecto de verificación por parte del Contratante del cumplimiento de las normas existentes al respecto, de las condiciones de trabajo de la estructura y demás requerimientos. Sin el cumplimiento de estos requisitos no deberá iniciarse esta actividad.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.00	**MAMPOSTERIA**							
4.00.01	**M-1 . MURO LIVIANO - 15. cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+ DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• La estructura consta de placas en una cara, las cuales se deben fijar con tornillos tipo Drywall N° 6 x 1", separados cada 30cm. • Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo de ¼" x 1-1/2" cada 61cm. • Los parales se fijan a los canales separados cada 40.7 cm con tornillos extraplanos N°8 ½". • Se instalan travesaños de apoyo horizontales que garanticen la fijación de la placa Superboard en todo su perímetro. • El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de parales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Garantizar entre 8 y 10 mm de distancia entre parales y techo, con el fin de garantizar las propiedades de dilatación térmica de los elementos del muro. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.02	**M-2. MURO LIVIANO 16.1 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + ENCHAPE SUPERBOARD 8mm. RESIT AL FUEGO 120 min, incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• La estructura consta de placas en una cara, las cuales se deben fijar con tornillos tipo Drywall N° 6 x 1", separados cada 30cm. • Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo de ¼" x 1-1/2" cada 61cm. • Los parales se fijan a los canales separados cada 40.7 cm con tornillos extraplanos N°8 ½". • Se instalan travesaños de apoyo horizontales que garanticen la fijación de la placa Superboard en todo su perímetro. • El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de parales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Garantizar entre 8 y 10 mm de distancia entre parales y techo, con el fin de garantizar las propiedades de dilatación térmica de los elementos del muro. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.03	**M-3 MURO LIVIANO 14 cms DOBLE PLACA DE YESO ST 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + 2 PLACAS DE YESO ST 1/2" RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 min. incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• Doble pared. La primera capa se fija con tornillos tipo drywall N° 6 x 1 "separados cada 0.6m. La segunda capa de placas se fija con tornillos tipo Drywall N° 6 x 1 – 5/8" separados cada 30cm en sus centros y 15cm en las juntas. • La estructura está compuesta por canales y parales 3-1/2" x 1-1/4" cal 25 e=0.478mm de acero galvanizado y rolados en frio según NTC 5680 o ASTM C 645. Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo metálico. • El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio 3.5" D=12.2kg/m3. • El perímetro de la pared se sella con un cordón de Banda- Estanca IMPERMEABILIZANTE • El tratamiento de la junta primera capa se realiza pegando la cinta de papel con una masilla en Pasta acorde al nivel de acabado solicitado. • Todo elemento que implique la perforación del muro RF (paso de tubería, bandeja portacable, etc) necesariamente debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para mantener la resistencia al fuego del sistema. Este sello cortafuego debe contar con su correspondiente sticker de identificación.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de parales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Garantizar entre 8 y 10 mm de distancia entre parales y techo, con el fin de garantizar las propiedades de dilatación térmica de los elementos del muro. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.04	**M-4: MURO LIVIANO 14,72 cms 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + 2 PLACAS DE YESO RH 1/2"+ RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA RESISTENCIA AL FUEGO 60 minutos. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• Sistema de pared media compuesta por una placa de yeso RH de 5/8" fijadas con tornillos druwall N°6" x 1" separados cada 30cm. • La estructura está compuesta por canales y parales 3-1/2" x 1 " cal 0,25 e=0.5mm de acero galvanizado y rolados en frio según NTC S680 o ASTM C 645. • Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivitas con chazo expansivo de ¼" x 1 ½ " cada 50 cm. • Los parales se fijan a los canales separados cada 61 cm. • El tratamiento de juntas se realiza con cinta de papel , dos capas de masilla en polvo y las últimas capas con masilla en Pasta capas con masilla en Pasta Cyplac, acorde al nivel acabado solicitado. • Consultar documento de niveles de acabado en placas de yeso.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de parales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Garantizar entre 8 y 10 mm de distancia entre parales y techo, con el fin de garantizar las propiedades de dilatación térmica de los elementos del muro. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
4.00.05	**M-7: MURO LIVIANO 1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA.incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• Sistema de pared media compuesta por una placa de yeso RH de 5/8" fijadas con tornillos dry wall N°6" x 1" separados cada 30cm. • La estructura está compuesta por canales y perales 3-1/2" x 1 "cal 0.25 e=0.5mm de acero galvanizado y rolados en frio según NTC S680 o ASTM C 645. • Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivitas con chazo expansivo de ¼" x 1 ½ "cada 50 cm. • Los perales se fijan a los canales separados cada 61 cm. • El tratamiento de juntas se realiza con cinta de papel, dos capas de masilla en polvo y las últimas capas con masilla en Pasta capas con masilla en Pasta, acorde al nivel acabado solicitado. • Consultar documento de niveles de acabado en placas de yeso.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de perales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Garantizar entre 8 y 10 mm de distancia entre perales y techo, con el fin de garantizar las propiedades de dilatación térmica de los elementos del muro. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.06	**M-6:INDICA MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ". RESIST. AL FUEGO 60 MIN. incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• Sistema de pared media compuesta por una placa de yeso RH de 5/8" fijadas con tornillos druwall N°6" x 1" separados cada 30cm. • La estructura está compuesta por canales y perales 3-1/2" x 1 " cal 0.25 e=0.5mm de acero galvanizado y rolados en frio según NTC S680 o ASTM C 645. • Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivitas con chazo expansivo de ¼" x 1 ½ " cada 50 cm. • Los perales se fijan a los canales separados cada 61 cm. • El tratamiento de juntas se realiza con cinta de papel , dos capas de masilla en polvo y las últimas capas con masilla en Pasta capas con masilla en Pasta Cyplac, acorde al nivel acabado solicitado. • Consultar documento de niveles de acabado en placas de yeso.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de perales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Garantizar entre 8 y 10 mm de distancia entre perales y techo, con el fin de garantizar las propiedades de dilatación térmica de los elementos del muro. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.07	**M-8: MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD JUNTAS INV. 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ". RESIST. AL FUEGO 60 MIN..incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• Las placas se fijan con tornillos tipo drywall N° 6 x 1 " separados cada 30cm. • La estructura está compuesta por canales y perales de 3-1/2" x 1 5/8 " cal 20 e=0.85cm. Los canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo de ½" x 1-1/2" cada 61cm. • Los perales se fijan a las canales separados cada 40.7cm con tornillos extraplanos N°8 x ½. • Se instalan travesaños de apoyo horizontales que garanticen la fijación de la placa Superboard en todo su perímetro. • El espacio formado por la separación de los perales se llena con lana de fibra de vidrio 3.5" de espesor. • El tratamiento de juntas entre placas Superboard puede ser tipo invisible-rígida para lo cual se dejan las placas dilatadas 3mm y se realiza sellado con adhesivos epóxicosPanel o similar y posterior al secado de 12 horas se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard y una capa del adhesivo del enchape. • El tratamiento de juntas de placa yeso se realiza con cinta de Papel , dos capas de masilla en polvo y las ultimas capas con masilla en Pasta acorde al nivel de acabado solicitado (consultar documentos de Niveles de acabado en placas de Yeso).	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de perales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Garantizar entre 8 y 10 mm de distancia entre perales y techo, con el fin de garantizar las propiedades de dilatación térmica de los elementos del muro. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.08	**M-9: MURO LIVIANO 12.1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO ST 5/8", Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• La primera capa de placas se fija con tornillos tipo drywall N° 6x1'', separados cada 60cm. • La segunda y tercera capa de placas se fija con tornillos tipo drywall N°6 x1-5/8'' separados cada 30cm en sus centros y 15cm en las justas. • La estructura estará compuesta por canales y parales 3-1/2''x1-5/8'' cal 24 e= 0.60mm de acero galvanizado y rolados en frio según NTC 5680 o ASTM c645. Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo metálico de ¼''x1-1/2'' cada 50 cm. • Además, si el muro tiene una altura menor a 3m se le debe agregar un refuerzo en perfilería tipo colmena. • Los perales se fijan a los canales separados cada 61 cm con tornillos extraplanos N°8x1/2''. • El espacio formado por la separación se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5''-D= 12.2kg/m3 . • El perímetro de la pared se sella con un cordón de BANDA- ESTANCA IMPERMEABILIZANTE • El tratamiento de juntas en la primera capa se realiza pegando la cinta de papel , con masilla en polvo . • El tratamiento de juntas en la primera capa se realiza pegando la cinta de papel , dos capas masilla en polvo y las ultimas capas con masilla en pasta , acorde al nivel de acabado solicitado. • Todo elemento que implique la perforación del muro RF debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para mantener la resistencia al fuego d	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de perales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 ms. (1:1.200) en cualquier punto de la estructura. • Perforaciones ubicadas en las partes especificadas en el plano arquitectónico y de detalles. • El Dry wall debe estar en su totalidad masillado y lijado para su acabado. • El muro liviano debe entregarse por completo pintado sin grumos, ni bultos generados por la masilla o pintura. • El muro liviano no podrá ser instalado con láminas de dry wall deterioradas. • Seguir las recomendaciones del fabricante	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.09	**M-10: MURO LIVIANO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAPE DE 8mm.incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• La primera capa de placas se fija con tornillos tipo drywall N° 6x1'', separados cada 60cm. • La segunda y tercera capa de placas se fija con tornillos tipo drywall N°6 x1-5/8'' separados cada 30cm en sus centros y 15cm en las justas. • La estructura estará compuesta por canales y parales 3-1/2''x1-5/8'' cal 24 e= 0.60mm de acero galvanizado y rolados en frio según NTC 5680 o ASTM c645. Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo metálico de ¼''x1-1/2'' cada 50 cm. • Además, si el muro tiene una altura menor a 3m se le debe agregar un refuerzo en perfilería tipo colmena. • Los perales se fijan a los canales separados cada 61 cm con tornillos extraplanos N°8x1/2''. • Se instalan travesaños de apoyo horizontales que garanticen la fijación de la placa Superboard hacia el espacio interior puede ser tipo invisible-rígida para lo cual la placa queda dilatada 3mm y se realiza sellado con adhesivos epoxicos, panel o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard y una capa de adhesivo del enchape. • El espacio formado por la separación se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5''-D= 12.2kg/m3 . • El perímetro de la pared se sella con un cordón de BANDA- ESTANCA IMPERMEABILIZANTE • El tratamiento de juntas en la primera capa se realiza pegando la cinta de papel , con masilla en polvo . • El tratamiento de juntas en la primera capa se realiza pegando la cinta de papel , dos capas masilla en polvo y las ultimas capas con masilla en pasta , acorde al nivel de acabado solicitado. • Todo elemento que implique la perforación del muro RF debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para mantener la resistencia al fu	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de perales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 ms. (1:1.200) en cualquier punto de la estructura. • Perforaciones ubicadas en las partes especificadas en el plano arquitectónico y de detalles. • El Dry wall debe estar en su totalidad masillado y lijado para su acabado. • El muro liviano debe entregarse por completo pintado sin grumos, ni bultos generados por la masilla o pintura. • El muro liviano no podrá ser instalado con láminas de dry wall deterioradas. • Seguir las recomendaciones del fabricante	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
4.00.10	**M-11: MURO LIVIANO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RH 5/8",incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• La estructura está compuesta por canales y parales 3-1/2" c 1-5/8" calibre 24 e=0.60 mm de acero galvanizado y rolados en frío según NTC 5680 ó ASTM C 645. Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo metálico de ¼" x ½" cada 50 cm. Los parales se fijan a los canales separados cada 40.7 cm con tornillos extraplanos N°8 x ½". • El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5"-D=10.8 kg/m3. • El perímetro de la pared se sella con un cordón de sellante elastomérico • El tratamiento de juntas se realiza con cinta de Papel , dos capas de masilla en polvo y las últimas capas con masilla en Pasta , acorde al nivel de acabado solicitado (consultar documento de Niveles de acabado en placas de Yeso). • Garantizar la estabilidad del elemento una vez se hayan fijado las placas de yeso a lado y lado del muro, confinando sobre el mismo la lana de fibra de vidrio. • Si desea instalar redes eléctricas o hidráulicas, se recomienda establecer perfilería en la base de la tubería para soportarla, al menos en el tramo de accesorios y aparatos.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de parales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Garantizar entre 8 y 10 mm de distancia entre parales y techo, con el fin de garantizar las propiedades de dilatación térmica de los elementos del muro. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.11	**M-12: MURO LIVIANO 11.5 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 5/8",incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• La primera capa de placas se fija con tornillos tipo drywall N° 6x1'', separados cada 60cm. • La segunda capa de placas se fija con tornillos tipo drywall N°6 x1-5/8'' separados cada 30cm en sus centros y 15cm en las justas. • La estructura estará compuesta por canales y parales 3-1/2''x1-5/8'' cal 24 e= 0.60mm de acero galvanizado y rolados en frio según NTC 5680 o ASTM c645. Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo metálico de ¼''x1-1/2'' cada 50 cm. • Además, si el muro tiene una altura menor a 3m se le debe agregar un refuerzo en perfilería tipo colmena. • Los parales se fijan a los canales separados cada 61 cm con tornillos extraplanos N°8x1/2''. • El espacio formado por la separación se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5''-D= 12.2kg/m3 . • El perímetro de la pared se sella con un cordón de BANDA- ESTANCA IMPERMEABILIZANTE • El tratamiento de juntas en la primera capa se realiza pegando la cinta de papel , con masilla en polvo . • El tratamiento de juntas en la primera capa se realiza pegando la cinta de papel , dos capas masilla en polvo y las ultimas capas con masilla en pasta , acorde al nivel de acabado solicitado. • Todo elemento que implique la perforación del muro RF debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para mantener la resistencia al fuego del sistema.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de parales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 ms. (1:1.200) en cualquier punto de la estructura. • Perforaciones ubicadas en las partes especificadas en el plano arquitectónico y de detalles.• El Dry wall debe estar en su totalidad masillado y lijado para su acabado. • El muro liviano debe entregarse por completo pintado sin grumos, ni bultos generados por la masilla o pintura. • El muro liviano no podrá ser instalado con láminas de dry wall deterioradas. • Seguir las recomendaciones del fabricante	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.12	**M-13: MURO LIVIANO- 12.2 cms PLACA RH 5/8"+ PLACA DE YESO 5/8 + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA ", incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	• El Tratamiento de juntas entre placas Superboard hacia el espacio interior puede ser tipo invisibile-rigida, para lo cual se dejan las placas dilatadas 3mm y se realiza sellado con adhesivos epóxicos, Panel o similar y posterior al secado, (12 horas) se realiza el tratamiento de juntas • El tratamiento de juntas de la primera capa se realiza pegando la cinta de Papel , con masilla en polvo . • El tratamiento de juntas de la segunda capa se realiza con cinta de Papel , dos capas de masilla en polvo , y las últimas capas con masilla en Pasta , acorde al nivel de acabado solicitado (consultar documento de Niveles de acabado en placas de Yeso). • Todo elemento que implique la perforación del muro RF (paso de tubería, bandeja portacable, etc) necesariamente debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para mantener la resistencia al fuego del sistema. Este sello cortafuego debe contar con su correspondiente sticker de identificación. • El muro es de 3.1 (mayor a 3 m) por lo que no requiere refuerzo en perfilería tipo Colmena.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de parales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5" - -D=12.2 kg/m3 • El perímetro de la pared se sella con un cordón de Banda- Estanca impermeabilizante • El tratamiento de juntas de la primera capa se realiza pegando la cinta de Papel, con masilla en polvo. • El tratamiento de juntas de la segunda capa se realiza con cinta de Papel, dos capas de masilla en polvo, y las últimas capas con masilla en Pasta, acorde al nivel de acabado solicitado (consultar documento de Niveles de acabado en placas de Yeso) • . Todo elemento que implique la perforación del muro RF (paso de tubería, bandeja portacable, etc) necesariamente debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para mantener la resistencia al fuego del sistema. Este sello cortafuego debe contar con su correspondiente sticker de identificación.	• El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5" - -D=12.2 kg/m3 • El perímetro de la pared se sella con un cordón de Banda- Estanca impermeabilizante • El tratamiento de juntas de la primera capa se realiza pegando la cinta de Papel, con masilla e	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.13	**M-14: MURO LIVIANO 0.98 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR, RESISTENCIA A HUMEDAD DIRECTA.incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN • Las placas de fibrocemento se fijarán a traslape de 30 cm con tornillos tipo drywall N°6 x 1", separados cada 30 cm. • Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo tie ¼" x 1 ½ "cada 61 cm. Los parales se fijan a los canales separados cada 40.7 cm. con tornillos extraplanos N°8 x ½". Se instalan travesaños de apoyo horizontales que garanticen la fijación de la placa Superboard en todo su perímetro. • El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio 3.5" de espesor. • El tratamiento de juntas entre placas Superboard hacia el espacio interior puede ser tipo invisible-rigida, para lo cual se dejan las placas dilatadas 3 mm y se realiza , sellado adhesivo epóxico Panel o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard y una capa del adhesivo del enchape.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de parales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5" - -D=12.2 kg/m3 • El perímetro de la pared se sella con un cordón de Banda- Estanca impermeabilizante • El tratamiento de juntas de la primera capa se realiza pegando la cinta de Papel, con masilla en polvo. • El tratamiento de juntas de la segunda capa se realiza con cinta de Papel, dos capas de masilla en polvo, y las últimas capas con masilla en Pasta, acorde al nivel de acabado solicitado (consultar documento de Niveles de acabado en placas de Yeso) • . Todo elemento que implique la perforación del muro RF (paso de tubería, bandeja portacable, etc) necesariamente debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para mantener la resistencia al fuego del sistema. Este sello cortafuego debe contar con su correspondiente sticker de identificación.	• El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5" - -D=12.2 kg/m3 • El perímetro de la pared se sella con un cordón de Banda- Estanca impermeabilizante • El tratamiento de juntas de la primera capa se realiza pegando la cinta de Papel, con masilla e	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.14	**M-15: MURO LIVIANO PLACA DE SILICATO CÁLCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLÍTICA , incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• NTC 5680 – ASTM C 645	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN • Las placas de fibrocemento se fijarán a traslape de 30 cm con tornillos tipo drywall N°6 x 1", separados cada 30 cm. • Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo tie ¼" x 1 ½ "cada 61 cm. Los parales se fijan a los canales separados cada 40.7 cm. con tornillos extraplanos N°8 x ½". Se instalan travesaños de apoyo horizontales que garanticen la fijación de la placa Superboard en todo su perímetro. • El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio 3.5" de espesor. • El tratamiento de juntas entre placas Superboard hacia el espacio interior puede ser tipo invisible-rigida, para lo cual se dejan las placas dilatadas 3 mm y se realiza , sellado adhesivo epóxico Panel o similar y posterior al secado (12 horas), se realiza el tratamiento de juntas con cinta malla Superboard y una capa del adhesivo del enchape.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobre-cimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, localización de parales y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5" - -D=12.2 kg/m3 • El perímetro de la pared se sella con un cordón de Banda- Estanca impermeabilizante • El tratamiento de juntas de la primera capa se realiza pegando la cinta de Papel, con masilla en polvo. • El tratamiento de juntas de la segunda capa se realiza con cinta de Papel, dos capas de masilla en polvo, y las últimas capas con masilla en Pasta, acorde al nivel de acabado solicitado (consultar documento de Niveles de acabado en placas de Yeso) • . Todo elemento que implique la perforación del muro RF (paso de tubería, bandeja portacable, etc) necesariamente debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para mantener la resistencia al fuego del sistema. Este sello cortafuego debe contar con su correspondiente sticker de identificación.	• El espacio formado por la separación de los parales se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5" - -D=12.2 kg/m3 • El perímetro de la pared se sella con un cordón de Banda- Estanca impermeabilizante	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
4.00.15	**M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas, Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m**	• NSR-10 título D. • NTC 4076.	• Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y plomadas. • Todas las hiladas de los muros deben quedar trabadas y los huecos del bloque deben coincidir verticalmente. Los muros y tabiques que queden sueltos se deben trabar o anclar como se indique en los planos o lo que orden el Interventor. • Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultáneamente, se deben proveer trabas en el primero que se construya. Si es necesario enlazar el muro nuevo con otro antiguo, se debe practicar en este una regata del ancho de un bloque o ladrillo y de profundidad igual por lo menos a la mitad de su espesor. • Cada cuatro hiladas según detalles estructurales para elementos no estructurales mostrados en los planos, se deben colocar dentro del mortero de pega 2 el grafil horizontal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural. • Antes de emprender la construcción de los muros, el CONTRATISTA debe cerciorarse de la localización y naturaleza de las piezas que deban quedar embebidas; también debe modular los tramos de muros para darle cabida a las columnetas de confinamiento, siguiendo las recomendaciones dadas en los planos estructurales. • Debe evitarse hasta donde sea posible tener que romper los muros ya construidos para insertar tuberías y anclajes. En los remates de los muros contra las estructuras de concreto se deben dejar dilataciones que se llenaran con cortes de láminas de poliestireno de baja densidad.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobrecimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, espesor de juntas de pega, localización de refuerzo y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Para morteros de pega y unidades de mampostería consultar el título D 3.8 "Evaluación y aceptación de mampostería" de la NSR-10. • Plomo de la pared(verticalidad). • Espaciamiento de juntas de pega.	• Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10). • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.16	**M-17: MURO BLOQUE No. 12, e=0.12 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas, Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m**	• NSR-10 título D. • NTC 4076.	• Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. • Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. • Instalar anclajes. • Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. • Instalar boquilleras y guías. • Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. • Esparcir morteros en áreas de pega. • Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. • Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. Aplicar grouting. • Verificar niveles, plomos y alineamientos. • Limpiar superficies de muros. • Proteger muros contra la intemperie.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobrecimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, espesor de juntas de pega, localización de refuerzo y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Para morteros de pega y unidades de mampostería consultar el título D 3.8 "Evaluación y aceptación de mampostería" de la NSR-10. • Plomo de la pared(verticalidad). • Espaciamiento de juntas de pega.	• Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10). • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.17	**M-18 MURO BLOQUE No. 20, e=0.20 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas, Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m**	• NSR-10 título D. • NTC 4076.	• Para la construcción de los muros de mampostería el CONTRATISTA deberá utilizar mano de obra calificada, provista de las herramientas y guías necesarias para el control de alineamiento, nivelación y plomo de los muros. • Cada bloque debe colocarse sobre una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1cm, que hará junta horizontal, debidamente alineado, nivelado e hilado. A los extremos de los bloques también se les debe colocar una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1cm, que conformará la junta vertical; posteriormente se procede con la segunda hilada de bloques construida en la misma forma, haciendo traba de por lo menos media unidad cuidando que se coloque suficiente mortero para la junta horizontal. Una vez que el mortero de las juntas haya fraguado hasta el punto de tomar las huellas de los dedos, se repasarán las juntas para obtener el acabado requerido para su posterior revoque. • Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y plomadas. • Todas las hiladas de los muros deben quedar trabadas y los huecos del bloque deben coincidir verticalmente. Los muros y tabiques que queden sueltos se deben trabar o anclar como se indique en los planos o lo que orden el Interventor. • Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultáneamente, se deben proveer trabas en el primero que se construya. Si es necesario enlazar el muro nuevo con otro antiguo, se debe practicar en este una regata del ancho de un bloque o ladrillo y de profundidad igual por lo menos a la mitad de su espesor.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobrecimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, espesor de juntas de pega, localización de refuerzo y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Para morteros de pega y unidades de mampostería consultar el título D 3.8 "Evaluación y aceptación de mampostería" de la NSR-10. • Plomo de la pared(verticalidad)• Espaciamiento de juntas de pega.	• Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10). • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.18	**M-19:MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0.12 mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m**	• NSR-10 título D. • NTC 4076.	• Los ladrillos se humedecerán antes de colocarse y se pegarán con mortero de cemento y arena en proporción 1:4, los resanes se harán con mezcla húmeda en la misma proporción. • Los medios ladrillos serán cortados en la obra por medios mecánicos, no se aceptan ladrillos cortados con palustre. • Para la construcción de los muros de mampostería el Contratista deberá utilizar mano de obra calificada, provista de las herramientas y guías necesarias para el control de alineamiento, nivelación y aplomo de los muros. • Cada bloque debe colocarse sobre una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1cm, que hará junta horizontal, debidamente alineado, nivelado e hilado. A los extremos de los ladrillos también se les debe colocar una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1cm, que conformará la junta vertical; posteriormente se procede con la segunda hilada de bloques construida en la misma forma, haciendo traba de por lo menos media unidad cuidando que se coloque suficiente mortero para la junta horizontal. Una vez que el mortero de las juntas haya fraguado hasta el punto de tomar las huellas de los dedos, se repasarán las juntas para obtener el acabado requerido para su posterior revoque. • Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y aplomadas.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobrecimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, espesor de juntas de pega, localización de refuerzo y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Para morteros de pega y unidades de mampostería consultar el título D 3.8 "Evaluación y aceptación de mampostería" de la NSR-10. • Plomo de la pared(verticalidad)• Espaciamiento de juntas de pega.	• Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10). • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
4.00.19	**MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE RAYOS X DE 1.8 g/cm3 Según planos arquitectonicos e=0.12, incl. Grafil hztal. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m**	• NSR-10 título D. • NTC 4076.	Cada bloque debe colocarse sobre una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1cm, que hará junta horizontal, debidamente alineado, nivelado e hilado. A los extremos de los ladrillos también se les debe colocar una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1cm, que conformará la junta vertical; posteriormente se procede con la segunda hilada de bloques construida en la misma forma, haciendo traba de por lo menos media unidad cuidando que se coloque suficiente mortero para la junta horizontal. Una vez que el mortero de las juntas haya fraguado hasta el punto de tomar las huellas de los dedos, se repasarán las juntas para obtener el acabado requerido para su posterior revoque. • Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y aplomadas. • Cada ladrillo se debe colocar en lecho completo de mortero, el cual se extenderá en una capa de espesor uniforme, no mayor a 1 cm de manera que la junta sea uniforme, sin interrupciones en sentido horizontal y las verticales queden alineadas en hiladas intermedias. A los extremos de los ladrillos se aplicará suficiente mezcla para llenar la junta vertical. Los bloques que queden en los cantos o finales de muros sueltos, se les llenarán los huecos con el mismo mortero de pega. • Todas las hiladas de los muros deben quedar trabadas y los huecos del ladrillo deben coincidir verticalmente, y las celdas de cada fila debe corresponder a la fila subyacente, de manera que se comuniquen las celdas de la primera y la última fila de mampuestos. Los muros y tabiques que queden sueltos se deben trabar o anclar como se indique en los planos o lo que orden el Interventor. • Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultáneamente, se deben proveer trabas en el primero que se construya. Si es necesario enlazar el muro nuevo con otro antiguo, se debe practicar en este una regata del ancho de un bloque o ladrillo y de profundidad igual por lo menos a la mitad de su espesor.	• Construcción de elementos en concreto • Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y Estructurales para verificar localización y refuerzo. • Limpiar losas y/o sobrecimientos verificar niveles y replantear muros verificando localización de juntas de control, espesor de juntas de pega, localización de refuerzo y de elementos de instalaciones técnicas para incrustar.	• Para morteros de pega y unidades de mampostería consultar el título D 3.8 "Evaluación y aceptación de mampostería" de la NSR-10. • Plomo de la pared(verticalidad)• Espaciamiento de juntas de pega.	• Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10). • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.20	**M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.115 mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m**	• NSR-10 título D. • NTC 4076.	• Emplear condiciones adecuadas, transporte, colocación y acabado. • Humedecer la superficie antes de colocar el mortero si es necesario. • Es un producto exclusivo para pega de unidades de mampostería. • Almacenar en un lugar seco y ventilado, bajo techo, protegido de humedad y evitando el contacto con el agua hasta por el término máximo de 3 meses contados a partir de su expedición. • Consumir el mismo día en el que fue abierto el saco. • Almacenar en pilas de menos 10 sacos. • Conservar los sacos sobre estibas y no sobre el suelo. • El mortero no debe utilizarse para la fabricación de concretos estructurales. En caso de usarse para aplicaciones de mampostería estructural, se deberá validar que la resistencia del producto cumpla con las especificaciones estructurales definidas para el proyecto	Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada. • Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. • Estudiar y definir modulación horizontal y vertical de los diferentes muros.	• Para morteros de pega y unidades de mampostería consultar el título D 3.8 "Evaluación y aceptación de mampostería" de la NSR-10. • Plomo de la pared(verticalidad). • Espaciamiento de juntas de pega.	• Consultar norma NSR 10 (D 4.5.10). • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.21	**COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, Incl. Refuerzo según diseño**	NSR-10.	Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. • prever el sistema de anclaje. • Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de ½" (12mm). • Vaciar concreto sobre los moldes. • Vibrar concreto mecánicamente. • Curar elementos prefabricados. • Encorazar con muros laterales en 15 cm. mínimo. • Completar la mampostería por encima del área fundida en toda la longitud que lo requiera. • Verificar plomos y alineamientos. • Resanar y aplicar acabado exterior	• Consultar los planos arquitectónicos y/o estructurales • Verificar la instalación del acero de refuerzo de acuerdo a los detalles del proyecto • Instalar la formaleta ajustada a las caras de las unidades de mampostería	• No se aceptarán muros cuya mampostería sea ejecutada posteriormente a la colocación del concreto de los elementos de confinamiento. • Tolerancias constructivas para muros de mampostería. tabla d.4.2-2 – nsr 10 • Verificar plomos y niveles • Verificar verticalidad en filos y remates	Se verificará junto con la interventoría si es pertinente realizar los ensayos de asentamiento y resistencia a la compresión	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.22	**VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, incl. Refuerzo según diseño**	NSR-10.	• replantear verificar niveles. • preparar formaletas y aplicar desmoldantes. • colocar refuerzos de acero. ver c.3.5 nsr-10 • verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. ver c.7 nsr-10 • levantar y acodalar formaletas. • estudiar y definir dilataciones y modulaciones. ver c.6.4 nsr-10. • verificar alineamientos y dimensiones. • vaciar el concreto en una sola etapa. • vibrar concreto. • desencofrar viga cinta. ver c.6.2 nsr-10. • curar concreto. ver c.1.3.3 yc.5.6 nsr-10.	• Consultar los planos arquitectónicos y/o estructurales • Verificar la instalación del acero de refuerzo de acuerdo a los detalles del proyecto • Instalar la formaleta ajustada a las caras de las unidades de mampostería	• Cinta aplomada y nivelada. • La cinta de amarre no deberá quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	Se verificará junto con la interventoría si es pertinente realizar los ensayos de asentamiento y resistencia a la compresión	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.23	**ALFAJIA EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No.20, incl. Refuerzo según diseño**	NSR-10.	Colocar refuerzo de acero para cada elemento. • Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. • Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. • Prever el sistema de anclaje. • Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Preparar el concreto de 21 Mpa. • Vaciar concreto sobre los moldes. • Utilizar concreto fluido para acabado arquitectónico con un asentamiento de 6" +/- 1" y vibrar concreto mecánicamente. • Colocar alfajías empotradas sobre el muro No.20. • Fijar la alfajía al muro con mortero de pega 1:4 con arena lavada • Adherir la alfajía en los extremos al elemento siguiente con mortero • Verificar plomos y alineamientos de las alfajías	• Consultar los planos arquitectónicos y/o estructurales • Verificar la instalación del acero de refuerzo de acuerdo a los detalles del proyecto • Instalar la formaleta ajustada a las caras de las unidades de mampostería	• Alfajía aplomada y nivelada. • La alfajía no deberá quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	Se verificará junto con la interventoría si es pertinente realizar los ensayos de asentamiento y resistencia a la compresión	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.24	**DINTELES EN BLOQUE N°5 PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (incluye refuerzo).**	NSR 10 – Título D 3.8	• debidamente alineado, nivelado e hilado. A los extremos de los bloques también se les debe colocar una capa uniforme de mortero de pega no mayor de 1cm, que conformará la junta vertical; posteriormente se procede con la segunda hilada de bloques construida en la misma forma, haciendo traba de por lo menos media unidad cuidando que se coloque suficiente mortero para la junta horizontal. Una vez que el mortero de las juntas haya fraguado hasta el punto de tomar las huellas de los dedos, se repasarán las juntas para obtener el acabado requerido para su posterior revoque. • Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y aplomadas. • Cada bloque se debe colocar en lecho completo de mortero, el cual se extenderá en una capa de espesor uniforme, no mayor a 1 cm de manera que la junta sea uniforme, sin interrupciones en sentido horizontal y las verticales queden alineadas en hiladas intermedias. A los extremos de los bloques se aplicará suficiente mezcla para llenar la junta vertical. Los bloques que queden en los cantos o finales de muros sueltos, se les llenarán los huecos con el mismo mortero de pega. • Todas las hiladas de los muros deben quedar trabadas y los huecos del bloque deben coincidir verticalmente. Los muros y tabiques que queden sueltos se deben trabar o anclar como se indique en los planos o lo que orden el Interventor.	• Consultar los planos arquitectónicos y/o estructurales • Verificar la instalación del acero de refuerzo de acuerdo a los detalles del proyecto • Instalar la formaleta ajustada a las caras de las unidades de mampostería	Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D.4.2-2 – NSR 10	• Consultar Planos arquitectónicos de Detalle y Cortes de Fachada. • Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. • Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
4.00.25	**DINTEL (0.15x0.20 mt) EN CONCRETO 3.000 PSI, incl. Rfzo según diseño**	NSR 10 (D4.5.10)	• Armar la formaleta para moldear el dintel con las dimensiones descritas. Acodalar con varas para mantener el nivel y resista el peso del concreto. • Realizar la canasta de refuerzo que se hará de la misma manera que una viga cualquiera, cuatro barras longitudinales y estribos cada 20cm. • Colocar el armazón y revisar que las armaduras de fierro no choquen en ningún punto con su formaleta. Esto garantizará que después del vaciado, las piezas de fierro tengan el debido recubrimiento de concreto. Para esto, se deben usar dados de concreto que permitan los siguientes recubrimientos. • Vaciar el concreto mezclado para la resistencia indicada. • Golpear el encofrado con una maceta de caucho (chipote), para ayudar a eliminar las burbujas de aire y los vacíos que reduce la resistencia del concreto.	• Consultar los planos arquitectónicos y/o estructurales • Verificar la instalación del acero de refuerzo de acuerdo a los detalles del proyecto • Instalar la formaleta ajustada a las caras de las unidades de mampostería	• Cinta aplomada y nivelada. • La cinta de amarre no deberá quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	Se verificará junto con la interventoría si es pertinente realizar los ensayos de asentamiento y resistencia a la compresión	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.26	**DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 mt (Incl. Refuerzo)**	NSR 10	• Armar la formaleta para moldear el dintel con las dimensiones descritas. Acodalar con varas para mantener el nivel y resista el peso del concreto. • Realizar la canasta de refuerzo que se hará de la misma manera que una viga cualquiera, cuatro barras longitudinales y estribos a la distancia especificada en el plano de detalles. • Colocar el armazón y revisar que las armaduras de fierro no choquen en ningún punto con su formaleta. Esto garantizará que después del vaciado, las piezas de fierro tengan el debido recubrimiento de concreto. Para esto, se deben usar dados de concreto que permitan los siguientes recubrimientos. • Vaciar el concreto mezclado para la resistencia indicada. • Golpear el encofrado con una maceta de caucho (chipote), para ayudar a eliminar las burbujas de aire y los vacíos que reduce la resistencia del concreto. • Nivelar con el palustre, no importa que la superficie no quede lisa ya que por encima de ella continuará el muro en mampostería. • Al día siguiente, se puede proceder al desencofrado e inspeccionar su superficie y se debe verificar que no existan vacíos u hormigueros. • Finalmente curar el concreto mínimo 7 días.	• Consultar los planos arquitectónicos y/o estructurales • Verificar la instalación del acero de refuerzo de acuerdo a los detalles del proyecto • Instalar la formaleta ajustada a las caras de las unidades de mampostería	• Cinta aplomada y nivelada. • La cinta de amarre no deberá quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	Se verificará junto con la interventoría si es pertinente realizar los ensayos de asentamiento y resistencia a la compresión	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.27	**DINTELES EN DRY WALL H.prom=0.50 mt**	• NSR 10 • NTC 4373	• Instalación de soportes, laminas drywall, cintas y masillas para juntas. • Aplicar dos capas de estuco en el sector afectado, utilizando llana de acero. • Aplicar tres capas de pintura tipo 1 utilizando rodillo o brocha en las secciones más pequeñas. • Limpiar con escoba o paño la superficie intervenida. • Retiro y disposición final de material sobrante.	• Consultar los planos arquitectónicos y/o estructurales • Verificar la instalación del acero de refuerzo de acuerdo a los detalles del proyecto • Instalar la formaleta ajustada a las caras de las unidades de mampostería	• Cinta aplomada y nivelada. • La cinta de amarre no deberá quedar con vacíos u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	Se verificará junto con la interventoría si es pertinente realizar los ensayos de asentamiento y resistencia a la compresión	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.28	**ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño**	NSR-10	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros. • Reportar inconsistencias a la Residencia de interventoría para consultas y aclaraciones. Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a longitud y diámetro de las perforaciones. • Realizar la perforación para el diámetro de la varilla a anclar, en longitudes establecidas en la norma • Instalar la varilla e inyectar el epóxico de acuerdo con las indicaciones de los Planos Estructurales y a la ficha técnica del proveedor. • Proteger la varilla contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto ó del mortero tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización. • Consultar la NSR-10 • Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros	• Las indicadas en la norma NSR-10 • Verificar la correspondencia de la varilla colocada con los despieces de elementos estructurales. • Tener en cuenta las demás indicaciones dadas por el fabricante	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.29	**BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS, CONCRETO 3000 PSI (0.40x0.28 mts), Incl.. Anclajes y refuerzo según planos estructurales**	NSR-10	Replantear y localizar bordillos en concreto • Colocar refuerzos de acero. Ver C.3.5 NSR-10 • Verificar refuerzos. • Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. • Levantar y acodalar formaletas. • Verificar plomos y dimensiones. • Vaciar y vibrar el concreto. • Desencofrar bordillo en concreto en concreto. Ver C.6.2 NSR-10. • Curar concreto. Ver C.1.3.3 yC.5.6 NSR-10.	Haber realizados las actividades correspondientes a la mampostería y ventanería.	• Verificar plomos y niveles para aceptación	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.30	**BORDILLO PARA DIQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, en concreto 3.000 PSI (0.70X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales**	NSR-10	• Replantear y localizar bordillos en concreto • Colocar refuerzos de acero. Ver C.3.5 NSR-10 • Verificar refuerzos. • Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. • Levantar y acodalar formaletas. • Verificar plomos y dimensiones. • Vaciar y vibrar el concreto. • Desencofrar bordillo en concreto en concreto. Ver C.6.2 NSR-10. • Curar concreto. Ver C.1.3.3 yC.5.6 NSR-10.	Haber realizados las actividades correspondientes a la mampostería y ventanería.	• Verificar plomos y niveles para aceptación	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.31	**BORDILLO PARA DIQUE PLANTA ELÉCTRICA, en concreto 3.000 PSI (0.20X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales**	NSR-10	• Replantear y localizar bordillos en concreto • Colocar refuerzos de acero. Ver C.3.5 NSR-10 • Verificar refuerzos. • Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. • Levantar y acodalar formaletas. • Verificar plomos y dimensiones. • Vaciar y vibrar el concreto. • Desencofrar bordillo en concreto en concreto. Ver C.6.2 NSR-10. • Curar concreto. Ver C.1.3.3 yC.5.6 NSR-10.	Haber realizados las actividades correspondientes a la mampostería y ventanería.	• Verificar plomos y niveles para aceptación	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.32	**CONTRAMARCO PISO - TECHO EN VANO PUERTAS SISTEMA MUROS LIVIANOS TUBERÍA ESTRUCTURAL 7X7 cm cal.1.5 mm**	NSR-10	• Replantear y localizar los lugares donde se instalarán los contramarcos. • Preparar la zona en la cual se realizará la instalación del contramarco en puertas de sistema de muros livianos. • Se procede a realizar la instalación del contramarco según especificaciones técnicas. • Verificar plomos y dimensiones.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales. • Consultar Planos Estructurales. • Consultar Titulo C NSR-10	• Verificar plomos y niveles para aceptación	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.33	**ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi**	NSR-10	• Replantear y localizar los lugares donde se llevará a cabo la fundida del atraque. • Después de haber realizado la instalación del refuerzo para el anclaje de la estructura para muros livianos se procede a instalar la formaleta para el atraque según las medidas de los planos de detalles. • Luego se procede a fundir el atraque en concreto y se vibra. • Después de que se desencofre el atraque se procede a realizar su respectivo curado para evitar fisuras en el mismo y garantizar su integridad. • Después de que el atraque este curado se procede a definir que zonas llevaran media caña o guarda escobas. • Por último, se verificar plomos y niveles.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales. • Consultar Planos Estructurales. • Consultar Titulo C NSR-10	• Verificar plomos y niveles para aceptación	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.34	**MEDIACAÑA PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ASEPSIA**	• Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM	• Se debe proceder a tomar las medidas para realizar el recorte de la media caña plástica en PVC. • Se procede a realizar las perforaciones en el perfil rígido y se procede a realizar el anclaje con sus respectivos tornillos y chazos. • Después de eso se procede a instalar la media caña a presión. • Realizar la limpieza posterior únicamente con agua	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Limpiar y nivelar el empate entre el cielo raso y el muro.	• Variaciones de nivel de 3 mm. • Es recomendable instalarse en muros, cielos rasos y pisos que tengan superficies perfectamente lisas y formen angulo de 90°.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Limpiar y nivelar el empate entre el cielo raso y el muro.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
4.00.35	**SELLO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERÍAS Y BANDEJAS REDES A DUCTOS**	NSR-10	• Luego se procede a instalar los sellos corta fuego según las especificaciones técnicas del fabricante. • Después se procede a limpiar la zona de trabajo.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Preparar la zona de instalación de los sellos cortafuego.	Se validarán las condiciones especificadas en las especificaciones técnicas del fabricante para la validación de la correcta instalación del sello corta fuego.	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
4.00.36	**SELLO CORTA FUEGO PASO PLACA ENTREPISO**	NSR-10	• Luego se procede a instalar los sellos corta fuego según las especificaciones técnicas del fabricante. • Después se procede a limpiar la zona de trabajo.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Preparar la zona de instalación de los sellos cortafuego.	Se validarán las condiciones especificadas en las especificaciones técnicas del fabricante para la validación de la correcta instalación del sello corta fuego.	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
5.00.00	**ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE**							
5.00.01	**REVESTIMIENTO DE FACHADA COMPUESTO POR UNA PLACA SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA 10 mm, incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	NTC 5680 – ASTM C 645.	• La primera capa de placas se fija con tornillos tipo drywall N° 6x1'', separados cada 60cm. • La segunda capa de placas se fija con tornillos tipo drywall N°6 x1-5/8'' separados cada 30cm en sus centros y 15cm en las juntas. • La estructura estará compuesta por canales y parales 3-1/2''x1-5/8'' cal 24 e= 0.60mm de acero galvanizado y rolados en frio según NTC 5680 o ASTM c645. Las canales se fijan a las losas o vigas con chazo expansivo metálico de ¼''x1-1/2'' cada 50 cm. • Además, si el muro tiene una altura menor a 3m se le debe agregar un refuerzo en perfilería tipo colmena. • Los parales se fijan a los canales separados cada 61 cm con tornillos extraplanos N°8x1/2''. • El espacio formado por la separación se llena con lana de fibra de vidrio de 3.5''-D= 12.2kg/m3 . • El perímetro de la pared se sella con un cordón de BANDA- ESTANCA IMPERMEABILIZANTE • El tratamiento de juntas en la primera capa se realiza pegando la cinta de papel, dos capas masilla en polvo y las ultimas capas con masilla en pasta, acorde al nivel de acabado solicitado. • Todo elemento que implique la perforación del muro RF debe tratarse con un sello cortafuego que cumpla con los requerimientos respectivos para mantener la resistencia al fuego del sistema.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles. • Replanteo:	• Verificar acabados para aceptación • Verificar niveles	Verificar medidas, cantidades, despieces y diámetros.Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
6.00.00	**PAÑETES**							
6.00.01	**PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:4, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• Norma NSR-10 • Norma NTC y ASTM	Se utilizará mortero en proporción 1:4. El pañete deberá tener un espesor máximo de 2,0cms, el CONTRATISTA deberá tomar plomos y escuadras para trazar maestras en la totalidad del área antes de iniciar la actividad, de tal forma que se garantice una superficie uniforme. Se afinará con llana de madera. • La actividad se realizará en dos etapas, en una primera se hará un llenado inicial en toda el área a pañetar y posteriormente se recorrerá la superficie sobre las maestras con boquillera para remover el exceso y en la segunda etapa, realizada unas horas después, filos y dilataciones, se terminará de llenar y se repetirá la actividad anterior con boquillera y llana de madera. No se aceptarán juntas de construcción visibles. El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones del caso, retirando del piso todo el mortero suelto caído como consecuencia del llenado del muro. • El pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.	• Es condición indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de frisos en un área determinada de la obra, que se hayan ejecutado la totalidad de las regatas e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias así estas sean responsabilidad de un Contratista independiente, las cuales deben haber sido probadas previamente.	• Pañetes verificados a plomo y nivel • Superficie de pañetes perfectamente lisos, sin ondulaciones • Superficies a escuadra	El pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.Para estas actividades no se permiten abultamientos que no garanticen superficies homogéneas con los pañetes ya construidos. La elaboración de dilataciones o goteras bajo placas ya pañetadas se realizarán paralelamente con esta actividad.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
6.00.02	**PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• Norma NSR-10 • Norma NTC y ASTM	Se utilizará mortero en proporción 1:4. El pañete deberá tener un espesor máximo de 2,0cms, el CONTRATISTA deberá tomar plomos y escuadras para trazar maestras en la totalidad del área antes de iniciar la actividad, de tal forma que se garantice una superficie uniforme. Se afinará con llana de madera. • La actividad se realizará en dos etapas, en una primera se hará un llenado inicial en toda el área a pañetar y posteriormente se recorrerá la superficie sobre las maestras con boquillera para remover el exceso y en la segunda etapa, realizada unas horas después, filos y dilataciones, se terminará de llenar y se repetirá la actividad anterior con boquillera y llana de madera. No se aceptarán juntas de construcción visibles. El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones del caso, retirando del piso todo el mortero suelto caído como consecuencia del llenado del muro. • El pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros	• Es condición indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de frisos en un área determinada de la obra, que se hayan ejecutado la totalidad de las regatas e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias así estas sean responsabilidad de un Contratista independiente, las cuales deben haber sido probadas previamente.	• Pañetes verificados a plomo y nivel • Superficie de pañetes perfectamente lisos, sin ondulaciones • Superficies a escuadra	El pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.Para estas actividades no se permiten abultamientos que no garanticen superficies homogéneas con los pañetes ya construidos. La elaboración de dilataciones o goteras bajo placas ya pañetadas se realizarán paralelamente con esta actividad.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
6.00.03	**PAÑETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse**	• Norma NSR-10 • Norma NTC y ASTM	Se utilizará mortero en proporción 1:4. El pañete deberá tener un espesor máximo de 2,0cms, el CONTRATISTA deberá tomar plomos y escuadras para trazar maestras en la totalidad del área antes de iniciar la actividad, de tal forma que se garantice una superficie uniforme. Se afinará con llana de madera. • La actividad se realizará en dos etapas, en una primera se hará un llenado inicial en toda el área a pañetar y posteriormente se recorrerá la superficie sobre las maestras con boquillera para remover el exceso y en la segunda etapa, realizada unas horas después, filos y dilataciones, se terminará de llenar y se repetirá la actividad anterior con boquillera y llana de madera. No se aceptarán juntas de construcción visibles. El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones del caso, retirando del piso todo el mortero suelto caído como consecuencia del llenado del muro. • El pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros	• Es condición indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de frisos en un área determinada de la obra, que se hayan ejecutado la totalidad de las regatas e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias así estas sean responsabilidad de un Contratista independiente, las cuales deben haber sido probadas previamente.	• Pañetes verificados a plomo y nivel • Superficie de pañetes perfectamente lisos, sin ondulaciones • Superficies a escuadra	El pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.Para estas actividades no se permiten abultamientos que no garanticen superficies homogéneas con los pañetes ya construidos. La elaboración de dilataciones o goteras bajo placas ya pañetadas se realizarán paralelamente con esta actividad.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
6.00.04	**PAÑETE TANQUES DE AGUA, ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones**	• Norma NSR-10 • Norma NTC y ASTM	Se utilizará mortero en proporción 1:4. El pañete deberá tener un espesor máximo de 2,0cms, el CONTRATISTA deberá tomar plomos y escuadras para trazar maestras en la totalidad del área antes de iniciar la actividad, de tal forma que se garantice una superficie uniforme. Se afinará con llana de madera. • La actividad se realizará en dos etapas, en una primera se hará un llenado inicial en toda el área a pañetar y posteriormente se recorrerá la superficie sobre las maestras con boquillera para remover el exceso y en la segunda etapa, realizada unas horas después, filos y dilataciones, se terminará de llenar y se repetirá la actividad anterior con boquillera y llana de madera. No se aceptarán juntas de construcción visibles. El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones del caso, retirando del piso todo el mortero suelto caído como consecuencia del llenado del muro. • El pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros	• Es condición indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de frisos en un área determinada de la obra, que se hayan ejecutado la totalidad de las regatas e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias así estas sean responsabilidad de un Contratista independiente, las cuales deben haber sido probadas previamente.	• Pañetes verificados a plomo y nivel • Superficie de pañetes perfectamente lisos, sin ondulaciones • Superficies a escuadra	El pañete que se detecte no adherido a los muros, que no quede a nivel, hilado, a plomo, o a escuadra debe repetirse.Para estas actividades no se permiten abultamientos que no garanticen superficies homogéneas con los pañetes ya construidos. La elaboración de dilataciones o goteras bajo placas ya pañetadas se realizarán paralelamente con esta actividad.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
7.00.00	**CUBIERTAS**							

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
7.00.01	**PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e.prom= 7 cm) Incl. Malla Gallinero**	NTC 3546	• Ubicar lugar de trabajo. • Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica el mortero debe quedar libre de rebabas o material suelto • Humedecerse completamente la superficie de concreto. • Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia. • Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la boquillera o regla a utilizar. • Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por interventoría añadiendo la cantidad suficiente de impermeabilizante a la mezcla. • A partir de los puntos de referencia medir hacia el piso la altura teniendo en cuenta las respectivas pendientes que llevara el piso en todos los puntos y coloco con mortero unas guías maestras horizontales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados. • Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de pala.	Consultar planos arquitectónicos y/o estructurales.	La dosificación y relación Agua / cemento deberá ser uniforme de manera que permita la obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. • Todos los vértices y aristas resultantes de la intersección entre dos planos del piso y el muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por ambas caras. • La superficie terminada del mortero afinado tendrá las pendientes necesarias para asegurar el flujo rápido y directo del agua de cualquier punto hacia los desagües de piso.	Moldear los filos si la interventoría lo requiere. • Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. • Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
7.00.02	**MEDIACAÑA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**	• Adherencia	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización. • Limpiar bases y losas y verificar niveles. • Conformar la mediacaña con mortero 1:4 imp.	• Verificar planos arquitectónicos y de detalles constructivos • Verificar instrucciones del proveedor	• Debe hacerse uniforme, para lograrlo se debe contar con un moldeador.	• Verificar planos arquitectónicos y de detalles constructivos • Verificar instrucciones del proveedor • Capítulos culminados para iniciar:	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
7.00.03	**BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales**	• Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM	• Colocar refuerzo de acero del bordillo. • Preparar el concreto y vaciar sobre formaleta. • Realizar el acabado final con llana metálica. • Después se procede a ubicar el anclaje donde se asegurarán las líneas de vida. • Desencofrar elementos.	• Verificar planos arquitectónicos y/o estructurales y de detalles constructivos • Verificar instrucciones del proveedor	• Tolerancia elementos en concreto – Norma NSR 10 • Recubrimientos del refuerzo	• Ensayos para concreto NSR 10	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
7.00.04	**BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales**	• Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM	• Colocar refuerzo de acero del bordillo. • Preparar el concreto y vaciar sobre formaleta. • Realizar el acabado final con llana metálica. • Después se procede a ubicar el anclaje donde se asegurarán las líneas de vida. • Desencofrar elementos.	• Verificar planos arquitectónicos y/o estructurales y de detalles constructivos • Verificar instrucciones del proveedor	• Tolerancia elementos en concreto – Norma NSR 10 • Recubrimientos del refuerzo	• Ensayos para concreto NSR 10	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
7.00.05	**CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 100 CM**	• No aplica	• Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se harán con remaches y se le aplicara un epóxico para evitar la filtración del agua. • Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles. • Anclar con remaches la canal a los soportes. • Instalar la rejilla y la bajante.	• Paredes pañetadas • Superficie de muebles instalados	• La canal debe tener la pendiente para el corrido del agua y sin filtraciones de agua.	• La canal debe tener la pendiente para el corrido del agua y sin filtraciones de agua	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
7.00.06	**REALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO, incl. mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sismico contra estructura según diseño. Incluye lineales**	Prueba de anclaje y caída de agua	• Se procede a disponer el grafil horizontal. • Luego de proceder a colocar las hiladas del ladrillo gran formato. • Verificar el nivel y aplome del muro.	• Establecer el área que va a ser objeto de la presente actividad. • Demarcar y delimitar el área a ser intervenida con esta actividad.	• Cumplir con normas de seguridad, manipulación de los materiales y soldadura. • Los muros deben quedar correctamente aplomado y nivelado. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	• Prueba de anclaje y caída de agua.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
7.00.07	**LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS mt, según diseño elementos no estructurales y recomendaciones acústicas. Incl. Refuerzo. Impactodan 10. impermeabilización flanche y todos los insumos necesarios para el desarrollo de las mismas**	NTC 673 vigente, NTC 174, NTC 3459	• Armar la formaleta (madera o icopor). aplicar aditivo sobre superficie de concreto endurecido con fresco tipo sikadur-32 y fundir los bordillos en concreto. en caso de requerirse la instalación de los equipos en plazo menor de 28 días utilizar un acelerador de fraguado que garantice el 80% de la resistencia del concreto antes de la instalación del equipo. • Posterior al fraguado de los bordillos, instalar las capas de geotextil nt junto con el manto impermeabilizante de acuerdo a las instrucciones del proveedor. para la impermeabilización, realizar un corte en el bordillo de concreto de 10 mm de profundidad y del espesor de la hoja de corte por ambos lados. insertar el manto en los cortes y sellar con un producto . adicional a esto, el proceso de impermeabilización se deja a criterio de la obra. • Armar los aceros de la placa, los pedestales y las vt. fundir la placa y posteriormente los pedestales. puede usarse acelerante si así se desea para obtener la resistencia última de manera rápida. esta placa al ser flotante e independiente del sistema estructural puede fundirse en el mismo sitio o ser pre-fabricada en otro sitio de la obra. • Instalar los soportes o aislantes elastoméricos de acuerdo a las instrucciones del proveedor. • Realizar instalación del equipo de acuerdo a instrucciones del proveedor.	• Verificar planos arquitectónicos. • Verificar planos estructurales. • Verificar plano de detalle NOE-7 de losa anti vibratoria.	• El área de los trabajos debe quedar limpia. • Verificar el tipo de apoyo adecuado con el proveedor del equipo. se recomienda utilizar apoyos de aislamiento elastomérico para minimizar el ruido generado por los equipos. la instalación de estos apoyos deberá ser revisada en conjunto con el proveedor del equipo. • Todas las cargas generadas por los acabados de piso y equipos deberán ser aprobadas por el diseñador estructural en aras de verificar que las mismas fueron contempladas en el diseño estructural • Realizar aislamiento acústico de acuerdo a las recomendaciones del ingeniero experto en dicha área • Materiales: concreto: 24mpa.el concreto deberá fundirse con aditivo impermeabilizante	• Ensayo de resistencia a compresión según NTC 673 vigente • Especificaciones de los agregados para concreto NTC 174 • Agua para la elaboración de concreto NTC 3459	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
7.00.08	**DADOS EN CONCRETO PARA LÍNEA DE VIDA Según detalle arquitectónico (Se proyecta infraestructura para la instalación de la misma, será la oficina de mantenimiento quien suministrará la misma cuando el hospital se encuentre en funcionamiento)**	NTC 673 vigente, NTC 174, NTC 3459	• Verificar nivel superior del concreto de limpieza. Colocar refuerzos de acero. Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. • Preparar formaletas. • Levantar y acodalar formaletas. • Verificar plomos y dimensiones. Verificar refuerzos y recubrimientos. • Vaciar progresivamente y vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. • Desencofrar viguetas. Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados. • Curar concreto. • Verificar plomos y niveles para aceptación.	• Verificar planos arquitectónicos. • Verificar planos estructurales. • Verificar plano de detalle NOE-7 de losa antivibratoria.	• Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 • Recubrimientos del refuerzo – Tabla 7.7.1	• Ensayo de resistencia a compresión según NTC 673 vigente • Especificaciones de los agregados para concreto NTC 174 • Agua para la elaboración de concreto NTC 3459	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
8.00.00	**IMPERMEABILIZACIONES**							
8.00.01	**IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTEMPERIE, MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER e= 1.2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR, BOTAS Y ACCESORIOS, NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA ARRIOSTRA)**	Consultar norma NSR 10.• Planos de detalles	• Áreas adheridas en encuentros de cubierta y pase de tuberías: SIKAPLAN 12R se adhiere a sustratos tales como hormigón, paneles de madera, láminas de metal, etc., mediante adhesivo de contacto del tipo Sarnacol2130 Plus. Los traslapos se realizan con aire caliente. • Método de soldadura: • Antes de soldar las costuras se preparan con limpiador tipo alcohol industrial. Los traslapos se sueldan con equipos eléctricos por aire caliente, tales como máquinas manuales en conjunto con rodillos de presión, o máquinas automáticas con temperatura controlada de aire caliente.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Haber culminado actividades referentes a la fundición e intervención de la estructura de la zona de cubierta • Consultar norma NSR 10.	• Para soldadura automática. (Varmat-Omnibo) Verificar siempre los parámetros de soldadura incluyendo la temperatura, la velocidad de la máquina, el caudal de aire, la presión y los ajustes de la máquina. • Evaluados, adaptados y controlados en terreno de acuerdo al tipo de equipo y la situación climática. • El ancho efectivo de los traslapos debe tener un mínimo de 11 cm en cubiertas expuestas con anclajes mecánicos, y sin anclajes mecánicos el traslapo debe ser de mínimo de 5 cm. • Los traslapos deben ser probadas mecánicamente con un destornillador para asegurar la integridad y la terminación de la lámina. • Cualquier imperfecta Chapa solamente	• Prueba de estanqueidad de cubiertas planas AP-023	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
8.00.02	**SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1,2 mm. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES**	Consultar norma NSR 10.• Planos de detalles	• Soldadura final: en esta fase, se debe utilizar el rodillo presionando sobre la lámina a una distancia de 30 mm paralela al extremo de la boquilla de soldadura. • Presionar con el rodillo por toda la junta. • Calentar la tira de lámina de PVC, presionarla con habilidad contra el borde y pegarla a la lámina sobre la superficie de la cubierta. • Moldear el pliegue sobresaliente de lámina PVC formando un pliegue en inglete de 45°. • Marcar el pliegue y cortarlo formando una bolsa de 50 mm contigua al saliente. • Los Perfiles de Metal Sheet son láminas metálicas revestidas por una cara con PVC de la misma calidad que las membranas, pero en condición rígida. Son productos auxiliares para la realización de remates en zonas especiales de cubiertas, piscinas y tanques. Las membranas pueden soldarse a los perfiles hechos de Metal Sheet con gran facilidad.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Haber culminado actividades referentes a la fundición e intervención de la estructura de los tanques de agua potable • Haber culminado la implementación total del diseño de la red contra incendios • Consultar norma NSR 10.	• El soporte deberá estar limpio y exento de restos de elementos que sean incompatibles con el PVC. Así mismo, las zonas puntiagudas que puedan dañar la membrana deberán eliminarse o redondearse. Los daños existentes en el sustrato deben regularizarse con morteros. • Se debe garantizar la estanqueidad óptima siguiendo paso a paso los procedimientos indicados en el manual de aplicación y realizando pruebas adecuadas. • Prueba de soldadura para comprobar los ajustes de la herramienta (soldadura manual y automática).	• Prueba de soldadura para comprobar los ajustes de la herramienta (soldadura manual y automática). • Comprobación de juntas durante y después de la soldadura. • Verificación de que la cubierta está plana	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
8.00.03	**IMPERMEABILIZACIÓN ZONA POSTERIOR MURO DE CONTENCIÓN, CON SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTES AL VAPOR. según ficha técnica del proveedor**	Consultar norma NSR 10.• Planos de detalles	• Después de realizar la preparación de la superficie, se procede a aplicar una solución de asfaltos reforzada con elastómeros y adhesivos plastificantes, mediante brocha o rodillo. • Luego si así se encuentra especificado, se procederá a aplicar la segunda mano de solución de asfaltos reforzada con elastómeros y adhesivos plastificantes, se debe verificar que la primera capa se encuentre seca al tacto, este tiempo dependerá de las condiciones ambientales de la zona. • En caso de que la base presente excesiva porosidad, • rellene los poros previamente con una pasta confeccionada con solución de asfaltos reforzada con elastómeros y adhesivos plastificantes y cemento. • Luego se procede a verificar que toda la zona quedara totalmente imprimada para confirmar su correcta impermeabilización	Revisar y definir especificaciones y recomendaciones dadas por proveedor.	• Se validarán las condiciones especificadas en las especificaciones técnicas del fabricante para la validación de la correcta impermeabilización del muro de contención.	• consultar planos estructurales y planos arquitectónicos. • preparar la superficie para realizar la impermeabilización.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
8.00.04	**MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CAÑUELA A.LL. RAMPAS con aditivo líquido mejorado con polímeros sintéticos que actúa como impermeabilizante integral tapando poros y capilares en morteros.**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Se prepara el mortero en proporciones indicadas - Mortero 1:3 con arena de peña, cemento gris, agua y se le añade su dosificación de un aditivo líquido mejorado con polímeros sintéticos que actúa como impermeabilizante integral tapando poros y capilares en morteros. para su respectiva impermeabilización. • Para desplegar el mortero se deben seguir las instrucciones de los planos de detalles para validar capas de aplicación. • Se aplica el mortero hasta lograr el espesor promedio indicado • Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. • Por último, se procede a limpiar la zona de trabajo.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría las zonas a intervenir.	• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado. • Definir los plomos finos.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría las zonas a intervenir.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
8.00.05	**LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN MURO GRAN FORMATO**	Consultar norma NSR 10.	• El primer paso es verificar se tienen humedades en la fachada y proceder a sellarlas. • Evaluar el estado actual de las cubiertas de las edificaciones y verificar que no existan escurrimientos de aguas lluvias hacia los muros, en caso de requerirse, proceder a su reparación y una vez corregidas todas las humedades y eliminando el ingreso activo de agua, dejar secar el agua retenida en las perforaciones, es decir, hay que dejar que "cure el muro", esperando a que seque totalmente la superficie antes de proceder a la limpieza de la fachada. • El siguiente paso es preparar la mezcla para realizar el lavado de la fachada. • Por último, se procede a realizar el lavado de la fachada sin objetos abrasivos que dañen la integridad de la fachada. • Lavar los muros completamente secos mínimo con 28 días de levantados hasta que los muros hayan alcanzado su equilibrio de humedad interna. • Usar un aditivo de lavado según el tipo de ladrillo y según la condición de la fachada	• Revisar, definir especificaciones y recomendaciones dadas por interventoría. • Identificar las zonas de la fachada en mamposteria Gran Formato a la vista. • Recomendaciones de uso: • Es una mezcla de ácidos que provoca un efecto irritante, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias para su uso y manejo. • Este producto puede emanar vapores, mantener y abrir en sitios ventilados.	• Nunca utilizar ácido muriático (clorhídrico) para el lavado del ladrillo. • Nunca lavar con ácido sobre humedades activas o residuales, ya que el ácido se introduce y mezcla con el agua de las perforaciones, favoreciendo la formación de manchas blancas o negras. • Nunca contratar lavado de fachadas con brillado del ácido, es decir, ácido que no se enjuaga o se humedece ligeramente y se brilla con un tapete, dejando una película aceitosa de ácido vivo sobre el muro, potencializando la formación de manchas blancas a corto y mediano plazo. A mayor efecto de la intemperie sobre la fachada, mayor será la formación de manchas. • No emplee agua sucia, de pozo o contaminada para el lavado del ladrillo. • No permita fogueos de estuco o pintura en el ladrillo. Haga que antes de realizar estas actividades se cubran los muros en ladrillo a la vista. Las manchas de estos residuos provocan daños en el esmalte y dependiendo del producto con el que se deba retirar (solventes por ejemplo) el deterioro puede ser mayor. • La superficie debe estar libre de grasas, partículas sueltas, materiales	• Se validará que la fachada no tenga ningún imperfecto producido por los productos usados para el lavado de la misma. • La superficie debe quedar limpia y se debe entregar el trabajo ejecutado sin ningún residuo sobre el muro impermeabilizado.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
9.00.00	**CIELO RASOS**							
9.00.01	**CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA ST. (¼ "), CON DILATACIONES DE 1 CM ,CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	o Previo a la colocación se realizará una lectura de planos arquitectónicos, tomando en cuenta todos los puntos eléctricos, de incendio, aire acondicionado, sonido, etc. para verificar que el despiece no se cruce con la estructura a montar. También se tomará nota de la ubicación de puertas, ventanas y columnas que puedan modificar la altura del cieloraso o necesiten cortineros o dilataciones. o A continuación, se nivela tomando los puntos críticos inferiores y superiores como referencia, partiendo del nivel de acabado y demarcado por la cimbra. Se marcará el nivel de colocación de la estructura metálica. o Se hará una revisión de escuadra y plomo de muros. o Una vez determinado el nivel se procederá a colocar la estructura metálica, partiendo con el ángulo de muro en todo el perímetro, luego con la colocación de las viguetas, y por último, se coloca el canal y/o omega en sentido perpendicular a las viguetas. o La estructura se colocará con perfiles ángulo metálico (no se aceptará alambre), debidamente anclados al concreto mediante pernos de fijación (tiros).	Se puede iniciar la actividad una vez esté culminado el capítulo de cubiertas e impermeabilizaciones.	• Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 ms. (1:1.200) en cualquier punto de la corredera. • Perforaciones ubicadas en las partes especificadas en el plano arquitectónico y de detalles. • El Dry wall debe estar en su totalidad masillado y lijado para su acabado. • El cielo raso debe entregarse por completo pintado sin grumos, ni bultos generados por la masilla o pintura. • El cielo raso no podrá ser instalado con laminas de dry wall deterioradas. • El cielo raso debe tener las dilataciones de 1 cm contra muro.. • Seguir las recomendaciones del fabricante	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar plomos y niveles. • Colocación de la estructura metálica	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
9.00.02	**CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA RH. (½ "), CON DILATACIONES DE 1 CM ,CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	o Previo a la colocación se realizará una lectura de planos arquitectónicos, tomando en cuenta todos los puntos eléctricos, de incendio, aire acondicionado, sonido, etc. para verificar que el despiece no se cruce con la estructura a montar. También se tomará nota de la ubicación de puertas, ventanas y columnas que puedan modificar la altura del cieloraso o necesiten cortineros o dilataciones. o A continuación, se nivela tomando los puntos críticos inferiores y superiores como referencia, partiendo del nivel de acabado y demarcado por la cimbra. Se marcará el nivel de colocación de la estructura metálica. o Se hará una revisión de escuadra y plomo de muros. o Una vez determinado el nivel se procederá a colocar la estructura metálica, partiendo con el ángulo de muro en todo el perímetro, luego con la colocación de las viguetas, y por último, se coloca el canal y/o omega en sentido perpendicular a las viguetas. o La estructura se colocará con perfiles ángulo metálico (no se aceptará alambre), debidamente anclados al concreto mediante pernos de fijación (tiros).	Se puede iniciar la actividad una vez esté culminado el capítulo de cubiertas e impermeabilizaciones.	• Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 ms. (1:1.200) en cualquier punto de la corredera. • Perforaciones ubicadas en las partes especificadas en el plano arquitectónico y de detalles. • El Dry wall debe estar en su totalidad masillado y lijado para su acabado. • El cielo raso debe entregarse por completo pintado sin grumos, ni bultos generados por la masilla o pintura. • El cielo raso no podrá ser instalado con laminas de dry wall deterioradas. • El cielo raso debe tener las dilataciones de 1 cm contra muro.. • Seguir las recomendaciones del fabricante	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar plomos y niveles. • Colocación de la estructura metálica	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
9.00.03	**PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADA, ZONA POSTERIOR CARTÓN ROSA Y LA CARA VISTA CARTÓN MARFIL, PERFORACIÓN EN BLOQUE DISEÑO B4 12/25R EN LAMINAS DE 1,2X2,40 E=12,5MM INCL. VELO DE FIBRA ACÚSTICA ESTÁNDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE ACUSTEC, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	o Previo a la colocación se realizará una lectura de planos arquitectónicos, tomando en cuenta todos los puntos eléctricos, de incendio, aire acondicionado, sonido, etc. para verificar que el despiece no se cruce con la estructura a montar. También se tomará nota de la ubicación de puertas, ventanas y columnas que puedan modificar la altura del cieloraso o necesiten cortineros o dilataciones. o A continuación, se nivela tomando los puntos críticos inferiores y superiores como referencia, partiendo del nivel de acabado y demarcado por la cimbra. Se marcará el nivel de colocación de la estructura metálica. o Se hará una revisión de escuadra y plomo de muros. o Una vez determinado el nivel se procederá a colocar la estructura metálica, partiendo con el ángulo de muro en todo el perímetro, luego con la colocación de las viguetas, y por último, se coloca el canal y/o omega en sentido perpendicular a las viguetas. o La estructura se colocará con perfiles ángulo metálico (no se aceptará alambre), debidamente anclados al concreto mediante pernos de fijación (tiros).	Se puede iniciar la actividad una vez esté culminado el capítulo de cubiertas e impermeabilizaciones.	• Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 ms. (1:1.200) en cualquier punto de la corredera. • Perforaciones ubicadas en las partes especificadas en el plano arquitectónico y de detalles. • El Dry wall debe estar en su totalidad masillado y lijado para su acabado. • El cielo raso debe entregarse por completo pintado sin grumos, ni bultos generados por la masilla o pintura. • El cielo raso no podrá ser instalado con laminas de dry wall deterioradas. • El cielo raso debe tener las dilataciones de 1 cm contra muro.. • Seguir las recomendaciones del fabricante	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar plomos y niveles. • Colocación de la estructura metálica	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
9.00.04	**CIELO RASO EN LÁMINA DE SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA (e=10mm) CON DILATACIONES DE 1 CM ,CONTRA MURO Y CIELO RASO , incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	o Previo a la colocación se realizará una lectura de planos arquitectónicos, tomando en cuenta todos los puntos eléctricos, de incendio, aire acondicionado, sonido, etc. para verificar que el despiece no se cruce con la estructura a montar. También se tomará nota de la ubicación de puertas, ventanas y columnas que puedan modificar la altura del cieloraso o necesiten contineros o dilataciones. o A continuación, se nivela tomando los puntos críticos inferiores y superiores como referencia, partiendo del nivel de acabado y demarcado por la cimbra. Se marcará el nivel de colocación de la estructura metálica. o Se hará una revisión de escuadra y plomo de muros. o Una vez determinado el nivel se procederá a colocar la estructura metálica, partiendo con el ángulo de muro en todo el perímetro, luego con la colocación de las viguetas, y por último, se coloca el canal y/o omega en sentido perpendicular a las viguetas. o La estructura se colocará con perfiles ángulo metálico (no se aceptará alambre), debidamente anclados al concreto mediante pernos de fijación (tiros).	Se puede iniciar la actividad una vez esté culminado el capítulo de cubiertas e impermeabilizaciones.	• Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 ms. (1:1.200) en cualquier punto de la corredera. • El cielo raso debe tener las dilataciones de 1 cm contra muro.. • Seguir las recomendaciones del fabricante	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar plomos y niveles. • Colocación de la estructura metálica	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
9.00.05	**MEDIACAÑA PLÁSTICA EN CIELO RASO EN ZONAS DE ASEPSIA 6cm**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	• Limpiar y nivelar el empate entre el cielo raso y el muro. • Se debe proceder a tomar las medidas para realizar el recorte de la media caña plástica en PVC. • Se procede a realizar las perforaciones en el perfil rígido y se procede a realizar el anclaje con sus respectivos tornillos y chazos. • Después de eso se procede a instalar la media caña a presión. • Realizar la limpieza posterior únicamente con agua	• Revisar y definir especificaciones y recomendaciones dadas por proveedor.	• Variaciones de nivel de 3 mm. • Es recomendable instalarse en muros, cielos rasos y pisos que tengan superficies perfectamente lisas y formen angulo de 90°.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar plomos y niveles. • Colocación de la estructura metálica	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
9.00.06	**CUELGAS EN DRY WALL (placa 12.5 mm), 0.20 x 0.40 mt, incl. 1 mano de pintura vinilo tipo 2, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	• Se debe proceder a tomar las medidas para realizar el recorte de las cuelgas en drywall (placa 12.5mm). • Se realiza la ubicación de los puntos de las perforaciones. • Se procede a realizar las perforaciones en el Angulo y se procede a realizar el anclaje con sus respectivos chazos y tornillos. • Realizar la limpieza posterior únicamente con agua.	• Revisar y definir especificaciones y recomendaciones dadas por proveedor.	• Variaciones de nivel de 3 mm. • Es recomendable instalarse en muros, cielos rasos y pisos que tengan superficies perfectamente lisas y formen angulo de 90°.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar plomos y niveles. • Colocación de la estructura metálica	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
9.00.07	**RECEDIDOS EN DRY WALL 8mm, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse.**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	Instalar colgaderas con anclas o insertos, distanciadas según las especificaciones del plano. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la localización de las correderas. Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla., Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción. Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales y verificar localización. • Consultar Planos de Detalles.	Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 ms. (1:1.200) en cualquier punto de la corredera. • El cielo raso debe tener las dilataciones de 1 cm contra muro.. • Seguir las recomendaciones del fabricante	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
9.00.08	**ESCOTILLAS RETRACTILES PARA INSPECCIÓN 60x60 DE 12.5 mm, incluye apertura de vanos**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	Cortar la placa de cielo o tabique de acuerdo a la medida trazada, con una sierra circular o serrucho de punta. • Presentar el marco exterior de la tapa de inspección en la perforación realizada y marcar la posición de los refuerzos, los que se ubicarán entre 8 a 10 cm del borde de la perforación. Los perfiles de los refuerzos • se fijan a la placa con tornillos cabeza de trompeta y entre ellos con tornillos cabeza de lenteja. • Fijados los refuerzos, se instala el marco, atornillándolo a la placa. Dependiendo de las dimensiones de la tapa, se instalarán de 2 a 4 fijaciones por cada lado, considerando una distancia máxima entre tornillo de 15 cm. La distancia de la primera fijación, debe estar a una distancia de los vértices de 10 a 12 cm, de forma de no obstruir el mecanismo de apertura (los tornillos adecuados se entregan con cada tapa en un kit de instalación). En esta etapa se debe prestar especial atención a la cuadratura del marco. • Instalar la tapa en el marco, chequear que el cierre y la abertura funcionan de forma óptima.	Se puede iniciar la actividad una vez esté culminado el capítulo de cubiertas e impermeabilizaciones y la instalación cielos rasos.	• La tapa debe quedar ubicada en el lugar especificado del plano arquitectónico y de detalles. • Al momento de realizar la instalación no se debe afectar la integridad del cielo raso. • Se debe entregar la tapa correctamente instalada y rematada (Según sea el caso).	Cheque de correcta apertura de la tapa • Fabricante debe garantizar realización previa de ensayos de tracción, compresión, prueba dimensional e inspección visual.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
9.00.09	**ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A CUBIERTA PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 60x60 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	• Revisar planos estructurales para ubicar la zona donde se realizará la instalación de la escotilla ALFAJOR 80x80 cm. • Se realizarán las respectivas perforaciones para la instalación de la misma, de tal forma que la escotilla quede correctamente empotrada y asegurada. • Presentar el marco exterior de la tapa de inspección en la perforación realizada y marcar la posición de los refuerzos, los que se ubicarán entre 8 a 10 cm del borde de la perforación. Los perfiles de los refuerzos se fijan al bordillo con tornillos para garantizar su fijación. • Fijados los refuerzos, se instala el marco, atornillándolo a la placa. Dependiendo de las dimensiones de la tapa, se instalarán de 2 a 4 fijaciones por cada lado, considerando una distancia máxima entre tornillo de 15 cm. La distancia de la primera fijación, debe estar a una distancia de los vértices de 10 a 12 cm, de forma de no obstruir el mecanismo de apertura (los tornillos adecuados se entregan con cada tapa en un kit de instalación). En esta etapa se debe prestar especial atención a la cuadratura del marco. • Instalar la tapa en el marco, chequear que el cierre y la abertura funcionan de forma óptima.	Se puede iniciar la actividad una vez esté culminado el capítulo de cubiertas e impermeabilizaciones y la instalación cielos rasos.	• La escotilla debe quedar ubicada en el lugar especificado del plano arquitectónico y de detalles. • Al momento de realizar la instalación no se debe afectar la integridad de los bordillos. • Se debe entregar la tapa correctamente instalada y rematada (Según sea el caso).	Cheque de correcta apertura de la tapa • Fabricante debe garantizar realización previa de ensayos de tracción, compresión, prueba dimensional e inspección visual.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
9.00.10	**ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA COMPUERTAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 80x80 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	• Revisar planos estructurales para ubicar la zona donde se realizará la instalación de la escotilla en lamina ALFAJOR 80x80 cm. • Se realizarán las respectivas perforaciones para la instalación de la misma, de tal forma que la escotilla quede correctamente empotrada y asegurada. • Presentar el marco exterior de la tapa de inspección en la perforación realizada y marcar la posición de los refuerzos, los que se ubicarán entre 8 a 10 cm del borde de la perforación. Los perfiles de los refuerzos se fijan al bordillo con tornillos para garantizar su fijación. • Fijados los refuerzos, se instala el marco, atornillándolo a la placa. Dependiendo de las dimensiones de la tapa, se instalarán de 2 a 4 fijaciones por cada lado, considerando una distancia máxima entre tornillo de 15 cm. La distancia de la primera fijación, debe estar a una distancia de los vértices de 10 a 12 cm, de forma de no obstruir el mecanismo de apertura (los tornillos adecuados se entregan con cada tapa en un kit de instalación). En esta etapa se debe prestar especial atención a la cuadratura del marco. • Instalar la tapa en el marco, chequear que el cierre y la abertura funcionan de forma óptima. • Aprobado el paso anterior se procede a realizar el retape de tornillos y masillado de los bordes.	Se puede iniciar la actividad una vez esté culminado el capítulo de cubiertas e impermeabilizaciones y la instalación cielos rasos.	• La escotilla debe quedar ubicada en el lugar especificado del plano arquitectónico y de detalles. • Al momento de realizar la instalación no se debe afectar la integridad de los bordillos. • Se debe entregar la tapa correctamente instalada y rematada (Según sea el caso).	Cheque de correcta apertura de la tapa • Fabricante debe garantizar realización previa de ensayos de tracción, compresión, prueba dimensional e inspección visual.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
9.00.11	**ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN EN CUARTO DE BOMBAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 100x100 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos**	• Norma NSR-10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • ASTM C-840	Revisar planos estructurales para ubicar la zona donde se realizará la instalación de la escotilla en lamina ALFAJOR 100x100 cm. • Se realizarán las respectivas perforaciones para la instalación de la misma, de tal forma que la escotilla quede correctamente empotrada y asegurada. • Presentar el marco exterior de la tapa de inspección en la perforación realizada y marcar la posición de los refuerzos, los que se ubicarán entre 8 a 10 cm del borde de la perforación. Los perfiles de los refuerzos se fijan al bordillo con tornillos para garantizar su fijación. • Fijados los refuerzos, se instala el marco, atornillándolo a la placa. Dependiendo de las dimensiones de la tapa, se instalarán de 2 a 4 fijaciones por cada lado, considerando una distancia máxima entre tornillo de 15 cm. La distancia de la primera fijación, debe estar a una distancia de los vértices de 10 a 12 cm, de forma de no obstruir el mecanismo de apertura (los tornillos adecuados se entregan con cada tapa en un kit de instalación). En esta etapa se debe prestar especial atención a la cuadratura del marco. • Instalar la tapa en el marco, chequear que el cierre y la abertura funcionan de forma óptima. • Aprobado el paso anterior se procede a realizar el retape de tornillos y masillado de los bordes.	Se puede iniciar la actividad una vez esté culminado el capítulo de cubiertas e impermeabilizaciones y la instalación cielos rasos.	• La escotilla debe quedar ubicada en el lugar especificado del plano arquitectónico y de detalles. • Al momento de realizar la instalación no se debe afectar la integridad de los bordillos. • Se debe entregar la tapa correctamente instalada y rematada (Según sea el caso).	Cheque de correcta apertura de la tapa • Fabricante debe garantizar realización previa de ensayos de tracción, compresión, prueba dimensional e inspección visual.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
10.00.00	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS**							
10.00.01	**AFINADO DE PISO e=0.04 mt, mortero 1:4 arena de pozo, incl. Lineales**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Verificar niveles estructurales y de acabados. Consultar Planos arquitectónicos • Se prepara el mortero en proporciones indicadas - Mortero 1:4 con arena de peña, cemento gris y agua. • Se despliega una capa de 1 cm. con mortero mezcla 1:4 Su proporción será indicada en los planos. • Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 m. con un espesor igual al de la primera capa. • Se aplica el mortero hasta lograr el espesor promedio indicado • Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría	• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado. • Definir los plomos finos. • Proteger pisos contra la intemperie	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
10.00.02	**AFINADO IMPERMEABILIZADO e=0.04 mt, mortero 1:4 arena de pozo más imp. integral, incl. Lineales**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Verificar niveles estructurales y de acabados. Consultar Planos arquitectónicos • Se prepara el mortero en proporciones indicadas - Mortero 1:4 con arena de peña, cemento gris y agua. • Se despliega una capa de 1 cm. con mortero mezcla 1:4 Su proporción será indicada en los planos. • Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 m. con un espesor igual al de la primera capa. • Se aplica el mortero hasta lograr el espesor promedio indicado • Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal.3/10/2024 • Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría	• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado. • Definir los plomos finos. • Proteger pisos contra la intemperie	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
10.00.03	**CONCRETO 3000PARA PASO ESCALERA METÁLICA, ESCOBIADO Y REBORDEADO CON LLANA METÁLICA e= 5cms**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Verificar niveles estructurales y de acabados. Consultar Planos arquitectónicos • Preparar la mezcla de concreto 3000 psi GF. • Vaciar mezcla de concreto en las plataformas de huella. • Se uniformiza el nivel y homogeneiza la superficie por medio de allanado. • No después de 30 minutos se debe realizar el escobiado con elemento predestinado según el caso. • Se realiza labor de rebordiado para entrega final. • Por último, se procede a limpiar la zona de trabajo.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría	• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado. • Definir los plomos finos. • Proteger pisos contra la intemperie	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
10.00.04	**BALDOSA GRANO DE MÁRMOL RED OCL 1 DE 30x30 cms, INC. mortero o concreto de pega según ficha técnica del proveedor, incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Retire de la tableta (planchuela) cualquier elemento contaminante o grasoso. Compruebe que la superficie de instalación esté limpia. • Prepare la pega para mármoles oscuros. En el caso de mármoles claros, usar la pega adecuada. En mármol verde de formatos grandes se debe hacer la instalación con adhesivos epóxidos, para evitar el pandeo del material. Remojar los mármoles de acuerdo a instrucciones del fabricante antes de la instalación. • Aplique el mortero con llana metálica dentada adecuada al formato a instalar; de lo contrario, se corre el riesgo de futuros desprendimientos. • Considere un espesor no inferior a 5 mm para el material de pegue. • Use cuerdas y líneas maestras; nivele con boquillera metálica. • Utilice separadores como guías para evitar desplazamientos y obtener juntas perfectas. • La dilatación recomendada entre piezas es de 2 mm aproximadamente. Esto permite el emboquillado, aumenta la adherencia lateral, facilita la dilatación térmica, rellena espacios impidiendo filtraciones, etc. Nunca instale a tope placas o planchuela.	TÉCNICAS: plomo, nivel, escuadra donde se requiera, plana y bien afinada (con llana de madera). FÍSICAS: adherencia, resistencia del revoque, humedad o resequedad, ausencia de polvo y contaminación que pueda afectar el pegue. No es recomendable instalar mármol sobre otro acabado que no sea mortero y, o, concreto, ya que con el tiempo se soltará porque el adhesivo necesita una superficie más porosa para garantizar un buen agarre.	La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a una evaluación de acabados, constantemente durante el proceso para garantizar su calidad. • Definir los plomos finos. • Proteger las baldosas retal de mármol contra la intemperie	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
10.00.05	**PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.60 mts, INC. mortero o concreto de pega según ficha técnica del proveedor, incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Definir despieces y orden de colocación del porcelanato, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible. • Preparar el mortero de pega con la dosificación indicada con el pegacor. • Hilar juntas en ambas direcciones. • Extender el mortero de pega con espesor mínimo de 3 cm. • Colocar el porcelanato en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. • Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 7 mm. • Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. • Realizar la limpieza del tablón después de que se sequen las juntas. • Proteger el piso para conservar durante construcción. • Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación.	TÉCNICAS: plomo, nivel, escuadra donde se requiera, plana y bien afinada (con llana de madera). FÍSICAS: adherencia, resistencia del revoque, humedad o resequedad, ausencia de polvo y contaminación que pueda afectar el pegue. No es recomendable instalar mármol sobre otro acabado que no sea mortero y, o, concreto, ya que con el tiempo se soltará porque el adhesivo necesita una superficie más porosa para garantizar un buen agarre.	• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a una evaluación de acabados, constantemente durante el proceso para garantizar su calidad. • Definir los plomos finos. • Proteger el porcelanato contra la intemperie	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
10.00.06	**PISO VINÍLICO EN ROLLO CONDUCTIVO DE 2.00 mts x 23 mts Incl. Pegante conductivo, Cinta cobre, Cordón de soldadura. .**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Aplicación de Mástico especial o masilla para eliminar las dilataciones del suelo o superficie, (evitar grumos). • Aplicación de adhesivo de contacto (A base de agua), para esta aplicación es recomendable utilizar llana dentada. Dejarlo secar al tacto. • Instalación del piso, hilera por hilera con lo que se asegura que no queden dilataciones al final, y se debe presionar con la mano con lo que se obtiene una unión homogénea y continua. • Además, se debe instalar el sistema conductivo. • Colocación de Guarda escobas (si el cliente lo requiere). • Después se procede a realizar la instalación del cordón de soldadura. • Realizar la limpieza del piso vinílico después de que se sequen las juntas. • Proteger el piso para conservar durante construcción. • Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. • Estudiar y determinar niveles y pendientes. • Limpieza de la superficie para que quede libre de pelusas y polvillos que dificulta el trabajo del pegante. • Definir despieces y orden de colocación del piso vinílico, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible.	• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a una evaluación de acabados, constantemente durante el proceso para garantizar su calidad. • Definir los plomos finos. • Proteger el porcelanato contra la intemperie	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	10.00.07	**PISO VINÍLICO EN ROLLO LÍNEA PREMIUM DE 2.00 mts x 23 mts HOMOGÉNEO e=2 mm INC. Pegante y cordón de soldadura.**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Aplicación de Mástico especial o masilla para eliminar las dilataciones del suelo o superficie, (evitar grumos). • Aplicación de adhesivo de contacto (A base de agua), para esta aplicación es recomendable utilizar llana dentada. Dejarlo secar al tacto. • Instalación del piso, hilera por hilera con lo que se asegura que no queden dilataciones al final, y se debe presionar con la mano con lo que se obtiene una unión homogénea y continua. • Además, se debe instalar el sistema conductivo. • Colocación de Guarda escobas (si el cliente lo requiere). • Después se procede a realizar la instalación del cordón de soldadura. • Realizar la limpieza del piso vinílico después de que se sequen las juntas. • Proteger el piso para conservar durante construcción. • Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. • Estudiar y determinar niveles y pendientes. • Limpieza de la superficie para que quede libre de pelusas y polvillos que dificulta el trabajo del pegante. • Definir despieces y orden de colocación del piso vinílico, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible.	• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a una evaluación de acabados, constantemente durante el proceso para garantizar su calidad. • Definir los plomos finos. • Proteger el porcelanato contra la intemperie	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
	10.00.08	**MEDIACAÑA MORTERO 1:4, TERMINADA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO, incl. dilatación**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Extender capa de mortero 1:4 con espesor variable, definiendo con plantilla de madera la forma del guarda escoba. • Llenar cada espacio con granito. Se hará la capa en base a las especificaciones brindadas en los planos arquitectónicos. • Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta. • Afinar con plantilla. • Humedecer la mezcla de gravilla durante 8 días después de la aplicación. • Lavar con solución de ácido muriático y agua en proporción 1:10. • Realizar la limpieza posterior únicamente con agua.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Limpiar y nivelar el empate entre la losa del piso y el muro. • Extender capa de mortero 1:4 con espesor variable, definiendo con plantilla de madera la forma del guarda escoba.	• La superficie terminada será uniforme y firme por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado de la media caña, se someterá a un curado de agua, constantemente durante 8 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado. • Definir los plomos finos. • Proteger la media caña contra la intemperie	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
	10.00.09	**PERFIL RINCONERO PARA PISOS VINÍLICOS**	• Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM	Se debe proceder a tomar las medidas para realizar el recorte de la media caña plástica en PVC. • Se procede a pegar la mediacaña en la intersección del piso y el muro para luego acomodar nuevamente el piso vinílico y y de esa forma garantizar la estética. • Realizar la limpieza posterior únicamente con agua	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Limpiar y nivelar el empate entre el piso y el muro.	• Variaciones de nivel de 3 mm. • Es recomendable instalarse en muros, cielos rasos y pisos que tengan superficies perfectamente lisas y formen ángulo de 90°.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Limpiar y nivelar el empate entre el piso y el muro.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
	10.00.10	**GUARDA ESCOBAS VINILO h=0.12 mt**	• Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM	• Limpieza de la superficie para que quede libre de pelusas y polvillos que dificulta el trabajo del pegante. • Definir despieces y orden de colocación del piso vinílico, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible. • Aplicación de Mastico especial o masilla para eliminar las dilataciones del suelo o superficie, (evitar grumos). • Aplicación de adhesivo de contacto (A base de agua), para esta aplicación es recomendable utilizar llana dentada. Dejarlo secar al tacto. • Instalación del piso, hilera por hilera con lo que se asegura que no queden dilataciones al final, y se debe presionar con la mano con lo que se obtiene una unión homogénea y continua. • Además, se debe instalar el sistema conductivo. • Colocación de Guarda escobas (si el cliente lo requiere). • Después se procede a realizar la instalación del cordón de soldadura. • Realizar la limpieza del piso vinílico después de que se sequen las juntas. • Proteger el piso para conservar durante construcción. • Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. • Estudiar y determinar niveles y pendientes. • Limpieza de la superficie para que quede libre	La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua, constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado. • Definir los plomos finos. • Proteger los pisos vinílicos contra cualquier trabajo extra.	Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
	10.00.11	**DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ESMALTADA PISO GRANO DE MÁRMOL**	• Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM	• Ubicar el lugar donde va el poyo y trazar los ejes, dimensiones y niveles del poyo con la ayuda de niveles de burbuja y de manguera, cinta métrica y lápiz para marcar los niveles y ejes. • Después del trazado se limpia la superficie donde se va a construir el poyo. • Se procede a instalar la guía para el POYO en madera o del material que se disponga. • Preparar el concreto pobre según especificaciones y vaciar dentro del poyo en una sola capa. • Nivelar la superficie con una boquillera y pañetar las caras exteriores del poyo. • Curar el concreto.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales. • Estudiar y definir formaletas a emplear. • Preparar formaleta y aplicar desmoldante. • Colocar testeros de borde • Capítulos culminados para iniciar: • Obras preliminares • Cimentaciones • Estructuras en concreto y metálicas	• Las superficies del poyo deben estar niveladas y aplomadas	• Ubicar el lugar donde va el poyo y trazar los ejes, dimensiones y niveles del poyo con la ayuda de niveles de burbuja y de manguera, cinta métrica y lápiz para marcar los niveles y ejes.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
	10.00.12	**POYOS BAJO MUEBLES - (a<= 0.50 mt, h=0.10 mt)**	• Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM	• Ubicar el lugar donde va el poyo y trazar los ejes, dimensiones y niveles del poyo con la ayuda de niveles de burbuja y de manguera, cinta métrica y lápiz para marcar los niveles y ejes. • Después del trazado se limpia la superficie donde se va a construir el poyo. • Se procede a instalar la guía para el POYO en madera o del material que se disponga. • Preparar el concreto pobre según especificaciones y vaciar dentro del poyo en una sola capa. • Nivelar la superficie con una boquillera y pañetar las caras exteriores del poyo. • Curar el concreto.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales. • Estudiar y definir formaletas a emplear. • Preparar formaleta y aplicar desmoldante. • Colocar testeros de borde • Capítulos culminados para iniciar: • Obras preliminares • Cimentaciones • Estructuras en concreto y metálicas	• Las superficies del poyo deben estar niveladas y aplomadas	• Ubicar el lugar donde va el poyo y trazar los ejes, dimensiones y niveles del poyo con la ayuda de niveles de burbuja y de manguera, cinta métrica y lápiz para marcar los niveles y ejes.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
	10.00.13	**CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS**	• Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM	• Consultar Planos arquitectónicos y de detalle. • Verificar niveles y pendientes de pisos acabados. • Respetar dimensiones y perfiles señalados en los Planos de Detalle. • Se deberá fundir el piso en concreto e inmediatamente se debe aplicar el endurecedor.	• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. • Estudiar y determinar niveles y pendientes. • Limpieza de la superficie para que quede libre	• Las superficies del poyo deben estar niveladas y aplomadas	• Ensayo de resistencia a la compresión INV-E-410-07 • Se debe validar con interventoría si se requiere hacer más ensayos al concreto.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
	10.00.14	**BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOQUILLADO, FUNDIDO PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF.: PCL 1 DE 30x30 cms CON DILATACIONES EN ALUMINIO**	• Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM	• Preparar el mortero de pega. • Hilar juntas en ambas direcciones. • Extender el mortero de pega 1:4 con espesor mínimo de 3 cm. • Colocar el baldosín en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. • Dejar juntas entre las piezas entre 2 y 7 mm. • Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. • Sellar juntas de hasta 2 mm, con lechada de cemento con colorante mineral de igual color al baldosín, antes del fraguado del mortero de pega.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría.	La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a una evaluación de acabados, constantemente durante el proceso para garantizar su calidad. • Definir los plomos finos. • Proteger las baldosas retal de mármol contra la intemperie	• Ensayo de resistencia a la compresión INV-E-410-07 • Se debe validar con interventoría si se requiere hacer más ensayos al concreto.	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
	11.00.00	**ENCHAPES MUROS**							
	11.00.01	**CERÁMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 0.60 X 0.30 mt, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	La instalación se iniciará una vez se encuentren revisados y aprobados los pañetes o mortero de nivelación y exista una repartición de las tabletas, ubicando piezas y recortes (hechos a máquina), en los sitios menos visibles. Enseguida se colocará la baldosa asegurándose de que quede sentada en todas las superficies de la pared, siguiendo la línea dada por las muestras tanto para fijar el plomo de la pared como conservar la línea recta de la junta. La colocación de las baldosas deberá comenzar por la hilada inferior. • Las baldosas se plomarán y ajustarán con golpes suaves y cada hilada deberá nivelarse y alinearse a fin de tener un acabado perfecto. • La separación entre tabletas será de 2 mm como máximo, quedando perfectamente hiladas y a escuadra, conservando los plomos precisos. Se rechazarán variaciones por encima de 0.5 mm por metro continuo y bordes de tabletas resaltados, hundidos, con ralladuras o vencidas. Las tabletas de pisos, muros y cielo rasos deberán hilar perfectamente sin presentarse trabas de ninguna clase.	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría	• Las superficies deben quedar perfectamente niveladas y las hiladas horizontales a nivel. • El pegante a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado	Transcurridas 24 horas la superficie se lavará con agua y jabón, debiéndose mantener protegida y limpia con cartones o con los elementos adicionales requeridos. • Estructura metálica anclada a muro según el tipo, indicado en los planos de detalle o por el Interventor	Residente de Obra e interventoría	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	11.00.02	**MESÓN PARA BAÑOS PÚBLICOS SEGÚN DETALLES ARQ. EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHO= 0.60 mt MÁS RE ENGRUESE DE 16 cm Y SALPICADERO DE 10 cm), INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGULO, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos**	• Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM	• Una vez limpia y humedecida la superficie, en el momento anterior a la colocación de la losa base del mesón, la cual se pegará sobre una capa de mortero o lechada de cemento gris puro de espesor uniforme entre 7 y 12 mm como mínimo, forzando y golpeando suavemente la losa sobre la pega hasta obtener su posición definitiva, asegurándose de evitar vacíos entre los dos materiales, conservando todas sus esquinas y áreas a plomo y nivel con las alturas medidas y ángulos indicados en planos (tolerancia 1 mm en toda su longitud). • La losa será recortada en la obra a máquina demarcando con plantilla las superficies de los orificios a perforar; los cuales deberán quedar pulidos y ejecutados en forma precisa (tolerancia 5 mm como máximo por orificio). • Una vez fraguada la losa del mesón se colocarán siguiendo el procedimiento anterior los frenteros y salpicaderos en las formas y dimensiones indicadas en planos, cuidando rigurosamente de conservar las escuadras, plomos, colillas y ajustes entre sí de las piezas de mármol y materiales de muros o remates varios (tolerancia 1 mm).	• Consultar Planos arquitectónicos y/o estructurales • Definir y localizar en los planos constructivos, arquitectónicos y la interventoría.	• La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera. El terminado del piso, se someterá a una evaluación de acabados, constantemente durante el proceso para garantizar su calidad. • Definir los plomos finos.	Transcurridas 24 horas la superficie se lavará con agua y jabón, debiéndose mantener protegida y limpia con cartones o con los elementos adicionales requeridos. • Estructura metálica anclada a muro según el tipo, indicado en los planos de detalle o por el Interventor	Residente de Obra e interventoria	Anotación en bitacora y Registro fotográfico y protocolo de calidad del material.
	12.00.00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**							
	12.01.00	**ACOMETIDAS**							
	12.01.01	**TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.01.02	**ACCESORIOS PVCP Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.01.03	**ABRAZADERAS Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.01.04	**REGISTRO RW Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.01.05	**UNIVERSAL PVCP Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.01.06	**NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.01.07	**FLOTADOR MECÁNICO Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.01.08	**MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.01.09	**CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.01.10	**CAJILLA MEDIDOR Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.01.11	**PLAQUETA IDENTIFICACIÓN MEDIDOR Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	•La ejecución de este ÍTEM corresponderá directamente al diseño planteado en los planos de red hidrosanitaria del hospital, y seguido por las recomendaciones de los proveedores. CONEXIONES A TANQUE DE AGUA. • El cuarto de bombas estará ubicado al lado del tanque de almacenamiento, por lo cual los pases en el tanque para las succiones, estarán en el muro que comparten el tanque y el cuarto de bombas. • Para hacer las conexiones necesarias al Tanque de agua se dejaran pases, con tuberías de Acero inoxidable de acuerdo con los detalles de los planos.	Medición	• Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión RDE 21 para la conducción desde la red pública hasta el cuarto de bombas y tubería y accesorios de acero inoxidable (fabricado bajo las recomendaciones de la norma ISO), • entre el cuarto de bombas. • Para la transición de PVC a acero inoxidable se utilizará una unión roscada y un adaptador macho de PVC. • Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • El tramo de tubería que queda enterrado, se conducirá a una profundidad mínima de 30 centímetros rodeada de material libre de partículas gruesas que puedan dañarlo, las tuberías metálicas se recubrirán con anticorrosivo según se indica en la especificación de materiales.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.02.00	**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**							

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	12.02.01	**TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.02	**ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.03	**ABRAZADERAS Ø6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.04	**TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	12.02.05	**ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.06	**ABRAZADERAS Ø2-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.07	**TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.08	**ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	12.02.09	**ABRAZADERAS Ø2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.10	**REGISTRO P/D Ø2-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.11	**VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.12	**UNIVERSAL Ø2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.02.13	**NIPLE PASAMUROS Ø6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.02.14	**REGISTRO P/D Ø6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.02.15	**CHEQUE PERFORADO Ø6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.02.16	**NIPLE PASAMUROS Ø2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	12.02.17	**BRIDA EN ACERO (PAREJA) Ø2-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.18	**UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA Ø2-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.02.19	**MANÓMETRO**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIOS. • Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas. **TANQUES DE AGUA POTABLE** • Serán en concreto reforzado con revestimiento interior en pañete impermeabilizado integralmente. • La inspección se realizará por medio de tapas en alfajor, ubicadas en la pared del tanque. • Se proyectarán cárcamos en cada uno de los tanques para la succión, con las dimensiones necesarias para que las succiones de los equipos puedan aprovechar en su totalidad el volumen de almacenamiento de los tanques. • El fondo del tanque tendrá una pendiente mínima del 0.5% hacia el cárcamo. • Para el acceso a cada tanque se dejarán empotrados en éstos escaleras de gato con peldaños cada 40 cms., en tubería galvanizada de ¾ de diámetro o una escalera removible. • Antes de llenar los tanques se deberá retirar cualquier tipo de impurezas, tierra, madera, etc., que hubieren podido quedar dentro de los mismos, producto de la formaleta utilizada o de las perforaciones efectuadas.	Medición	• Los tanques deben desinfectarse mediante la aplicación de una solución de 100 P.P.M. de cloro. • Además se lavarán con agua a presión y se escurrirán cuidadosamente, también se verificará que las tuberías no estén obstruidas. • Para la instalación de los equipos se utilizarán tubería y accesorios de Acero Galvanizado calidad Agua.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.03.00	**RED DE AGUA FRÍA**							
	12.03.01	**TUBERÍA PVC SCH 80 6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.03.02	**ACCESORIOS PVC 6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.03.03	**ABRAZADERAS 6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.03.04	**TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.03.05	**ACCESORIOS PVC 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.06	**ABRAZADERAS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.07	**TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.08	**ACCESORIOS PVC 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.09	**ABRAZADERAS 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.10	**TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.11	**ACCESORIOS PVC 2-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.12	**ABRAZADERAS 2-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.13	**TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.14	**ACCESORIOS PVC 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.15	**ABRAZADERAS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.16	**TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.17	**ACCESORIOS PVC 1-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.18	**ABRAZADERAS 1-1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.19	**TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.20	**ACCESORIOS PVC 1-1/4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.22	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.24	ABRAZADERAS 1"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.25	TUBERÍA PVCP RDE 11 Ø3/4"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.28	TUBERÍA PVCP RDE 9 Ø1/2"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.32	REGISTRO 1"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.33	REGISTRO 3/4"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.03.34	REGISTRO 1/2"	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la puerta de acceso de los apartamentos. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la red interior corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la salida del medidor hasta la válvula de control o registro de cada área donde se encuentran aparatos sanitarios.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.04.00	PUNTOS HIDRAULICOS							

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.04.01	**SANITARIO**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Preferiblemente los aparatos se conectarán con acoples metálicos y válvula de regulación. • El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes desde la válvula de control hasta cada una de las unidades sanitarias y en PVCP desde la válvula de control ubicado según los planos hasta la conexión de cada aparato. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos el punto hidráulico corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la válvula de control o registro hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.04.02	**LAVAMANOS**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Preferiblemente los aparatos se conectarán con acoples metálicos y válvula de regulación. • El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes desde la válvula de control hasta cada una de las unidades sanitarias y en PVCP desde la válvula de control ubicado según los planos hasta la conexión de cada aparato. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos el punto hidráulico corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la válvula de control o registro hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.04.03	**LAVAPLATOS**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Preferiblemente los aparatos se conectarán con acoples metálicos y válvula de regulación. • El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes desde la válvula de control hasta cada una de las unidades sanitarias y en PVCP desde la válvula de control ubicado según los planos hasta la conexión de cada aparato. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos el punto hidráulico corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la válvula de control o registro hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.04.04	**DUCHA**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Preferiblemente los aparatos se conectarán con acoples metálicos y válvula de regulación. • El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes desde la válvula de control hasta cada una de las unidades sanitarias y en PVCP desde la válvula de control ubicado según los planos hasta la conexión de cada aparato. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos el punto hidráulico corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la válvula de control o registro hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.04.05	**CALENTADOR**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Preferiblemente los aparatos se conectarán con acoples metálicos y válvula de regulación. • El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes desde la válvula de control hasta cada una de las unidades sanitarias y en PVCP desde la válvula de control ubicado según los planos hasta la conexión de cada aparato. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos el punto hidráulico corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la válvula de control o registro hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.04.06	**LLAVE MANGUERA**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Preferiblemente los aparatos se conectarán con acoples metálicos y válvula de regulación. • El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes desde la válvula de control hasta cada una de las unidades sanitarias y en PVCP desde la válvula de control ubicado según los planos hasta la conexión de cada aparato. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos el punto hidráulico corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la válvula de control o registro hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.04.07	**ORINAL**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Preferiblemente los aparatos se conectarán con acoples metálicos y válvula de regulación. • El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes desde la válvula de control hasta cada una de las unidades sanitarias y en PVCP desde la válvula de control ubicado según los planos hasta la conexión de cada aparato. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos el punto hidráulico corresponde a la red de tuberías, accesorios y soportes desde la válvula de control o registro hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.00	**RED DE AGUA CALIENTE**							
12.05.01	**TUBERÍA CPVC 1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.02	**ACCESORIOS CPVC 1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.03	**ABRAZADERAS 1"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.04	**TUBERÍA CPVC 3/4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.05	**ACCESORIOS CPVC 3/4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.05.06	**ABRAZADERAS 3/4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.07	**TUBERÍA CPVC 1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.08	**ACCESORIOS CPVC 1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.09	**ABRAZADERAS 1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.10	**REGISTRO 3/4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.05.11	**REGISTRO 1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Este capítulo comprende la tubería, accesorios, soportes y demás implementos necesarios para la correcta instalación de la red de agua caliente desde la salida del calentador de paso hasta la llegada a cada unidad sanitaria. • Se utilizarán tuberías y accesorios de CPVC.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.06.00	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA CALIENTE**							
12.06.01	**LAVAMANOS CPVC 1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes en CPVC desde la válvula de control hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.06.02	**LAVAPLATOS CPVC 1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes en CPVC desde la válvula de control hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.06.03	**DUCHA CPVC 1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes en CPVC desde la válvula de control hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.06.04	**CALENTADOR CPVC 1/2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• El punto incluye toda la tubería, accesorios y soportes en CPVC desde la válvula de control hasta la conexión de cada aparato. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de los aparatos, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Medición	• Todas las redes se mantendrán en estado de prueba permanente (según se indica en las especificaciones de materiales) hasta el montaje de aparatos. • Durante la etapa de construcción, todos los puntos hidráulicos deberán permanecer taponados con los accesorios adecuados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.07.00	**SALIDA SANITARIA**							
12.07.01	**SANITARIO PVCS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Se incluye la salida sanitaria como toda la tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con la bajante cercana. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la salida sanitaria es toda tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con el colector horizontal. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de aparatos, todas las salidas sanitarias deberán permanecer taponadas con los accesorios adecuados y no con papel, plástico u otro tipo de material inconveniente.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.07.02	**LAVAMANOS PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Se incluye la salida sanitaria como toda la tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con la bajante cercana. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la salida sanitaria es toda tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con el colector horizontal. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de aparatos, todas las salidas sanitarias deberán permanecer taponadas con los accesorios adecuados y no con papel, plástico u otro tipo de material inconveniente.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.07.03	**LAVAPLATOS PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Se incluye la salida sanitaria como toda la tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con la bajante cercana. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la salida sanitaria es toda tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con el colector horizontal. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de aparatos, todas las salidas sanitarias deberán permanecer taponadas con los accesorios adecuados y no con papel, plástico u otro tipo de material inconveniente.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.07.04	**DUCHA PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Se incluye la salida sanitaria como toda la tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con la bajante cercana. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la salida sanitaria es toda tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con el colector horizontal. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de aparatos, todas las salidas sanitarias deberán permanecer taponadas con los accesorios adecuados y no con papel, plástico u otro tipo de material inconveniente.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	12.07.05	**SIFÓN PISO PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Se incluye la salida sanitaria como toda la tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con la bajante cercana. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la salida sanitaria es toda tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con el colector horizontal. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de aparatos, todas las salidas sanitarias deberán permanecer taponadas con los accesorios adecuados y no con papel, plástico u otro tipo de material inconveniente.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.07.06	**ORINAL PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Se incluye la salida sanitaria como toda la tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con la bajante cercana. • En lo correspondiente al edificio de parqueaderos la salida sanitaria es toda tubería, accesorios y soportes desde el o los aparatos sanitarios hasta la conexión con el colector horizontal. • Durante la etapa de construcción y antes del montaje de aparatos, todas las salidas sanitarias deberán permanecer taponadas con los accesorios adecuados y no con papel, plástico u otro tipo de material inconveniente.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.08.00	**RED DE AGUAS NEGRAS**							
	12.08.01	**TUBERÍA PVCS 6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.08.02	**ACCESORIOS PVCS 6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.08.03	**ABRAZADERA 6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.08.04	**TUBERÍA PVCS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.08.05	**ACCESORIOS PVCS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.08.06	**ABRAZADERA 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.08.07	**TUBERÍA PVCS 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.08.08	**ACCESORIOS PVCS 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.08.09	**ABRAZADERA 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.08.10	**TUBERÍA PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.08.11	**ACCESORIOS PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.08.12	**ABRAZADERA 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.08.13	**TUBERÍA PVCS LIVIANA 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.09.00	**RED DE AGUAS GRASAS**							
12.09.01	**TUBERÍA PVCS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.09.02	**ACCESORIOS PVCS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.09.03	**ABRAZADERA 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.09.04	**TUBERÍA PVCS 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.09.05	**ACCESORIOS PVCS 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.09.06	**ABRAZADERA 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.09.07	**TUBERÍA PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.09.08	**ACCESORIOS PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.09.09	**ABRAZADERA 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.10.00	**REDES DE AGUAS PATOGENAS**							
12.10.01	**TUBERÍA PVCS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.10.02	**ACCESORIOS PVCS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.10.03	**ABRAZADERA 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.10.04	**TUBERÍA PVCS 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.10.05	**ACCESORIOS PVCS 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.10.06	**ABRAZADERA 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.10.07	**TUBERÍA PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	12.10.08	**ACCESORIOS PVCS 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.10.09	**ABRAZADERA 2"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	ENTILACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES • Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. RECOMENDACIONES GENERALES • Antes de cubrir todas las arañas, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. ABRAZADERAS • Las abrazaderas serán del tipo U o Pera según sea el caso en acero Cold Rolled Galvanizado,	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.11.00	**REDES DE AGUA LLUVIAS**							
	12.11.01	**TUBERÍA PVCS 6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende el suministro e instalación de la tubería y accesorios desde las cubiertas hasta los empates a las cajas de inspección. • Se utilizarán en bajantes y colectores colgantes tubería PVC - SANITARIA. • Todas las redes se probarán manteniéndolas llenas de agua hasta la terminación de la mampostería. • El montaje de los aparatos se efectuará con acoples metálico doble tuerca con válvula de regulación. • Para los desagües de los lavaplatos y lavamanos se utilizará el adaptador desmontable con empaque de caucho.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.11.02	**ACCESORIOS PVCS 6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende el suministro e instalación de la tubería y accesorios desde las cubiertas hasta los empates a las cajas de inspección. • Se utilizarán en bajantes y colectores colgantes tubería PVC - SANITARIA. • Todas las redes se probarán manteniéndolas llenas de agua hasta la terminación de la mampostería. • El montaje de los aparatos se efectuará con acoples metálico doble tuerca con válvula de regulación. • Para los desagües de los lavaplatos y lavamanos se utilizará el adaptador desmontable con empaque de caucho.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.11.03	**ABRAZADERA 6"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende el suministro e instalación de la tubería y accesorios desde las cubiertas hasta los empates a las cajas de inspección. • Se utilizarán en bajantes y colectores colgantes tubería PVC - SANITARIA. • Todas las redes se probarán manteniéndolas llenas de agua hasta la terminación de la mampostería. • El montaje de los aparatos se efectuará con acoples metálico doble tuerca con válvula de regulación. • Para los desagües de los lavaplatos y lavamanos se utilizará el adaptador desmontable con empaque de caucho.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.11.04	**TUBERÍA PVCS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende el suministro e instalación de la tubería y accesorios desde las cubiertas hasta los empates a las cajas de inspección. • Se utilizarán en bajantes y colectores colgantes tubería PVC - SANITARIA. • Todas las redes se probarán manteniéndolas llenas de agua hasta la terminación de la mampostería. • El montaje de los aparatos se efectuará con acoples metálico doble tuerca con válvula de regulación. • Para los desagües de los lavaplatos y lavamanos se utilizará el adaptador desmontable con empaque de caucho.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.11.05	**ACCESORIOS PVCS 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende el suministro e instalación de la tubería y accesorios desde las cubiertas hasta los empates a las cajas de inspección. • Se utilizarán en bajantes y colectores colgantes tubería PVC - SANITARIA. • Todas las redes se probarán manteniéndolas llenas de agua hasta la terminación de la mampostería. • El montaje de los aparatos se efectuará con acoples metálico doble tuerca con válvula de regulación. • Para los desagües de los lavaplatos y lavamanos se utilizará el adaptador desmontable con empaque de caucho.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.11.06	**ABRAZADERA 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende el suministro e instalación de la tubería y accesorios desde las cubiertas hasta los empates a las cajas de inspección. • Se utilizarán en bajantes y colectores colgantes tubería PVC - SANITARIA. • Todas las redes se probarán manteniéndolas llenas de agua hasta la terminación de la mampostería. • El montaje de los aparatos se efectuará con acoples metálico doble tuerca con válvula de regulación. • Para los desagües de los lavaplatos y lavamanos se utilizará el adaptador desmontable con empaque de caucho.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	12.11.09	**SIFÓN PISO 4"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• Comprende el suministro e instalación de la tubería y accesorios desde las cubiertas hasta los empates a las cajas de inspección. • Se utilizarán en bajantes y colectores colgantes tubería PVC - SANITARIA. • Todas las redes se probarán manteniéndolas llenas de agua hasta la terminación de la mampostería. • El montaje de los aparatos se efectuará con acoples metálico doble tuerca con válvula de regulación. • Para los desagües de los lavaplatos y lavamanos se utilizará el adaptador desmontable con empaque de caucho.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoría	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.12.00	**BOMBEO POZO EYECTORES**							
	12.12.01	**TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizará la obra. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de la tubería. • Después del replanteo se procede a realizar la instalación de la tubería pvcp rde 21 ø3" con sus respectivos accesorios. • Para finalizar se realiza la instalación del registro 3" con su respectivo cheque hidro 3".	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoría	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.12.02	**ACCESORIOS PVC 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizará la obra. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de la tubería. • Después del replanteo se procede a realizar la instalación de la tubería pvcp rde 21 ø3" con sus respectivos accesorios. • Para finalizar se realiza la instalación del registro 3" con su respectivo cheque hidro 3".	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoría	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.12.03	**ABRAZADERAS 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizará la obra. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de la tubería. • Después del replanteo se procede a realizar la instalación de la tubería pvcp rde 21 ø3" con sus respectivos accesorios. • Para finalizar se realiza la instalación del registro 3" con su respectivo cheque hidro 3".	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoría	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.12.04	**REGISTRO 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizará la obra. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de la tubería. • Después del replanteo se procede a realizar la instalación de la tubería pvcp rde 21 ø3" con sus respectivos accesorios. • Para finalizar se realiza la instalación del registro 3" con su respectivo cheque hidro 3".	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoría	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.12.05	**CHEQUE HIDRO 3"**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizará la obra. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de la tubería. • Después del replanteo se procede a realizar la instalación de la tubería pvcp rde 21 ø3" con sus respectivos accesorios. • Para finalizar se realiza la instalación del registro 3" con su respectivo cheque hidro 3".	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoría	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.13.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS**							
	12.13.01	**MONTAJE SANITARIOS TANQUE**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoría	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	12.13.02	**CONEXIÓN LAVAMANOS**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoría	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.13.03	**CONEXIÓN LAVAPLATOS**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.13.04	**MONTAJE ORINAL**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.13.05	**MONTAJE LLAVE MANGUERA**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.13.06	**MONTAJE DUCHA**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.13.07	**MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.13.08	**MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.13.09	**MONTAJE BOMBAS EYECTORAS**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.13.10	**MONTAJE BOMBAS CALENTADORES DE PASO**	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la instalación de los aparatos. • Después del replanteo se procede a realizar las conexiones e instalación de los aparatos sanitarios.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.14.00	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**							
12.14.01	**CAJA INSPECCIÓN 0.70 x 0.70 (Con marco y contra marco)**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las CAJAS DE INSPECCION, TOMA DE MUESTRAS Y LA TRAMPA DE GRASA. • Luego se procede a realizar el replanteo de la zona donde se llevará a cabo la construcción. • Después del replanteo se procede a realizar una verificación de los planos de elementos no estructurales de tal forma que se cumpla con las recomendaciones realizadas por el ingeniero estructural. • Por ultimo se procede a ejecutar las obras, asegurándose de que se cumpla con las especificaciones dadas por el especialista. • Por ultimo se realizan las conexiones correspondientes para cada elemento no estructural.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. • Las cajas de inspección deben cumplir con todas las normas y recomendaciones dadas por el especialista.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
12.15.00	**PRUEBAS**							
12.15.01	**PRUEBAS DE PRESIÓN**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las pruebas. • Luego se procede a preparar los sistemas para las pruebas que se van a llevar a cabo. • Después de haber realizado las pruebas, los datos obtenidos pasan por una revisión para estimar si está funcionando correctamente o no el sistema de tuberías y obras anexas. • Por último, se procede a confirmas si se requiere alguna obra adicional o anexa de tal manera que mejore el funcionamiento de los sistemas. • Por último, se realizan las conexiones correspondientes para cada elemento no estructural.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. • Las cajas de inspección deben cumplir con todas las normas y recomendaciones dadas por el especialista. • Todas las pruebas realizadas deben cumplir con los estándares permisibles para su correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.15.02	**PRUEBAS DE BAJANTES**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las pruebas. • Luego se procede a preparar los sistemas para las pruebas que se van a llevar a cabo. • Después de haber realizado las pruebas, los datos obtenidos pasan por una revisión para estimar si está funcionando correctamente o no el sistema de tuberías y obras anexas. • Por último, se procede a confirmas si se requiere alguna obra adicional o anexa de tal manera que mejore el funcionamiento de los sistemas. • Por último, se realizan las conexiones correspondientes para cada elemento no estructural.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. • Las cajas de inspección deben cumplir con todas las normas y recomendaciones dadas por el especialista. • Todas las pruebas realizadas deben cumplir con los estándares permisibles para su correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.15.03	**PRUEBAS DE COLECTORES**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• En primer lugar, se debe realizar una inspección visual y ubicación de la zona donde se realizarán las pruebas. • Luego se procede a preparar los sistemas para las pruebas que se van a llevar a cabo. • Después de haber realizado las pruebas, los datos obtenidos pasan por una revisión para estimar si está funcionando correctamente o no el sistema de tuberías y obras anexas. • Por último, se procede a confirmas si se requiere alguna obra adicional o anexa de tal manera que mejore el funcionamiento de los sistemas. • Por último, se realizan las conexiones correspondientes para cada elemento no estructural.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes. • Las cajas de inspección deben cumplir con todas las normas y recomendaciones dadas por el especialista. • Todas las pruebas realizadas deben cumplir con los estándares permisibles para su correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.16.00	**REDES EXTERIORES**							
12.16.01	**TUBERÍA PVC 160 mm**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• El primer paso es realizar el replanteo de las redes, las cuales serán instaladas de acuerdo a las especificaciones de los planos hidrosanitarios, ejecutando todas las recomendaciones del especialista. • El segundo paso es identificar los diferentes diámetros que se instalaran y su respectiva zona de instalación. • Por ultimo se procede a instalar las redes exteriores teniendo en cuenta las recomendaciones que se encuentran en el plano.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.16.02	**TUBERÍA PVC 200 mm**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• El primer paso es realizar el replanteo de las redes, las cuales serán instaladas de acuerdo a las especificaciones de los planos hidrosanitarios, ejecutando todas las recomendaciones del especialista. • El segundo paso es identificar los diferentes diámetros que se instalaran y su respectiva zona de instalación. • Por ultimo se procede a instalar las redes exteriores teniendo en cuenta las recomendaciones que se encuentran en el plano.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.16.03	**TUBERÍA PVC 250 mm**	Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	• El primer paso es realizar el replanteo de las redes, las cuales serán instaladas de acuerdo a las especificaciones de los planos hidrosanitarios, ejecutando todas las recomendaciones del especialista. • El segundo paso es identificar los diferentes diámetros que se instalaran y su respectiva zona de instalación. • Por ultimo se procede a instalar las redes exteriores teniendo en cuenta las recomendaciones que se encuentran en el plano.	Medición	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana. • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.17.00	**OTROS**							
12.17.01	**DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN**	**resolucion 4445 de 1996, resolución 3100 de 2019**	realiacion de seguimiento en obra, de acuerdo a los espacios creados de cada zona	medicion			Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.17.02	**PLANOS RECORD**	**resolucion 4445 de 1996, resolución 3100 de 2019**	realiacion de seguimiento en obra, de acuerdo a los espacios creados de cada zona	medicion			Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
12.17.03	**MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN**	**resolucion 4445 de 1996, resolución 3100 de 2019**	realiacion de seguimiento en obra, de acuerdo a los espacios creados de cada zona	medicion			Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
13.00.00	**INSTALACIONES REDES CONTRAINCENDIO**							
13.00.01	**TABLERO DE DETECCIÓN**	Cumplir Normas NFPA y FM	• Instalación en el interior del cuarto de seguridad • Conexión a la red eléctrica regulada: 120 VAC- 60 Hz • Conexión directa de los 5 lazos de detección • Programación y configuración en sitio	Unidad	• No aplica	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.00.02	**DETECTOR FOTOELÉCTRICO**	Cumplir Normas NFPA y FM	• Instalación del cableado • Montaje de la base • Conexión de la base • Instalación del detector	Unidad	• No aplica	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.00.03	**DETECTOR TÉRMICO**	Cumplir Normas NFPA y FM	• Instalación del cableado • Montaje de la base • Conexión de la base • Instalación del detector	Unidad	• No aplica	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.00.04	**SIRENA DE EVACUACIÓN**	Cumplir Normas NFPA y FM	• Instalación del cableado • Montaje de la sirena • Conexión de la sirena	Unidad	• No aplica	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.00.05	**MODULO MONITOR / CONTROL**	Cumplir Normas NFPA y FM	• Instalación del cableado • Montaje del módulo • Conexión del módulo y asignación de dirección	Unidad	• No aplica	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.00.06	**ESTACIONES MANUALES**	Cumplir Normas NFPA y FM	• Instalación del cableado • Montaje del módulo y estación • Conexión del módulo y asignación de dirección • Instalación de cubierta de protección	Unidad	• No aplica	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.00.07	**DETECTOR FOTO ELÉCTRICO PARA DUCTOR AIRE ACONDICIONADO**	Cumplir Normas NFPA y FM	• Instalación del cableado • Montaje de la base • Conexión de la base • Instalación del detector	Unidad	• No aplica	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.00.08	**CABLE 2x18 DETECCIÓN INCENDIOS**	Cumplir Normas UL	• Instalación del cableado • Pruebas de continuidad	Unidad	• No aplica	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.00	**CUARTO DE BOMBAS RED CONTRAINCENDIO**							
13.01.01	**TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"**	Normas ASTM A 135 ó ASTM A 795.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de los puntos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Medición	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.02	**ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"**	Los accesorios tendrán uniones roscadas para diámetros de 1-1/4" e inferiores clase 150 y 300 de acuerdo con la norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.03	**ACOPLE ACERO RANURADOS 6"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.04	**ABRAZADERAS 6"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.05	**TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"**	Normas ASTM A 135 ó ASTM A 795.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de los puntos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Medición	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.06	**ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.07	**ACOPLE ACERO RANURADOS 4"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.08	**ABRAZADERAS 4"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.09	**TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 1-1/2"**	Normas ASTM A 135 ó ASTM A 795.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de los puntos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Medición	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.10	**ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1-1/2"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.11	**ACOPLE ACERO RANURADOS 1-1/2"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.12	**ABRAZADERAS 1-1/2"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.13	**VÁLVULA DE ALIVIO 1"**	Listadas por UL/FM.	Se proveerán válvulas de un fabricante, que muestre el nombre del fabricante, la marca registrada y el valor nominal de la presión.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.14	**LAMINA ANTI VÓRTICE 0.30 x 0.30 4"**	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.15	**COPA EXCÉNTRICA 4"X3"**	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.16	**COPA EXCÉNTRICA 4" X 1-1/2"**	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.17	**REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 4"**	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.18	**REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 1-1/2"**	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.19	**CHEQUE RANURADO 6"**	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.20	**CHEQUE HIDRO 1-1/2"**	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
13.01.21	VÁLVULA BOLA 1/4"	Aprobadas UL, FM.	Se proveerán válvulas de un fabricante, que muestre el nombre del fabricante, la marca registrada y el valor nominal de la presión.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.22	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.23	BRIDA ACERO (PAREJA) 4"	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.24	BRIDA ACERO (PAREJA) 1-1/2"	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.25	MANÓMETRO 0-200 PSI	NORMAS ASME.	Como criterio general se instalarán manómetros de glicerina en las tuberías de impulsión de las bombas. Donde se indique, además de la aguja de la presión medida, llevarán otra aguja en rojo cuya posición se deja fija por medio de un tornillo para indicar la posición que, en funcionamiento normal, debe ocupar la aguja móvil.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.26	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	Aprobadas UL, FM.	Como criterio general se instalarán manómetros de glicerina en las tuberías de impulsión de las bombas. Donde se indique, además de la aguja de la presión medida, llevarán otra aguja en rojo cuya posición se deja fija por medio de un tornillo para indicar la posición que, en funcionamiento normal, debe ocupar la aguja móvil.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.27	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 4"	Aprobadas UL, FM.	Como criterio general se instalarán manómetros de glicerina en las tuberías de impulsión de las bombas. Donde se indique, además de la aguja de la presión medida, llevarán otra aguja en rojo cuya posición se deja fija por medio de un tornillo para indicar la posición que, en funcionamiento normal, debe ocupar la aguja móvil.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.28	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 1-1/2"	Aprobadas UL, FM.	Como criterio general se instalarán manómetros de glicerina en las tuberías de impulsión de las bombas. Donde se indique, además de la aguja de la presión medida, llevarán otra aguja en rojo cuya posición se deja fija por medio de un tornillo para indicar la posición que, en funcionamiento normal, debe ocupar la aguja móvil.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.01.29	VÁLVULA MARIPOSA UL/FM 6"	Aprobadas UL, FM.	Se proveerán válvulas de un fabricante, que muestre el nombre del fabricante, la marca registrada y el valor nominal de la presión.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.00	RED DE DISRIBUCION GENERAL RED CONTRAINCENDIO							
13.02.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	Normas ASTM A 135 ó ASTM A 795.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de losputos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Metro Lineal	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	Los accesorios tendrán uniones roscadas para diámetros de 1-1/4" e inferiores clase 150 y 300 de acuerdo con la norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.04	ABRAZADERAS 6"	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	Normas ASTM A 135 ó ASTM A 795.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de losputos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Metro Lineal	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	Los accesorios tendrán uniones roscadas para diámetros de 1-1/4" e inferiores clase 150 y 300 de acuerdo con la norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.08	ABRAZADERAS 4"	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.09	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 3"	Normas ASTM A 135 ó ASTM A 795.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de losputos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Metro Lineal	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.10	ACCESORIOS RANURADOS 3"	Los accesorios tendrán uniones roscadas para diámetros de 1-1/4" e inferiores clase 150 y 300 de acuerdo con la norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.11	COUPLING RANURADO 3"	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.12	ABRAZADERAS UL/FM 3"	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.13	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2-1/2"	Aprobadas UL, FM.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de losputos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Metro Lineal	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.14	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	Los accesorios tendrán uniones roscadas para diámetros de 1-1/4" e inferiores clase 150 y 300 de acuerdo con la norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.15	COUPLING RANURADO 2-1/2"	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.16	ABRAZADERAS UL/FM 2-1/2"	Aprobadas UL, FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
13.02.17	**TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2"**	Normas ASTM A 135 ó ASTM A 795.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de los puntos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Metro Lineal	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.18	**ACCESORIOS RANURADOS 2"**	Los accesorios tendrán uniones roscadas para diámetros de 1-1/4" e inferiores clase 150 y 300 de acuerdo con la norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.19	**COUPLING RANURADO 2"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.20	**ABRAZADERAS UL/FM 2"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.21	**TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1-1/4"**	Normas ASTM A 135 ó ASTM A 795.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de los puntos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Metro Lineal	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.22	**ACCESORIOS RANURADOS 1-1/4"**	Los accesorios tendrán uniones roscadas para diámetros de 1-1/4" e inferiores clase 150 y 300 de acuerdo con la norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.23	**COUPLING RANURADO 1-1/4"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.24	**ABRAZADERAS UL/FM 1-1/4"**	Norma ASME-B16.3	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.25	**TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1"**	Normas ASTM A 135 ó ASTM A 795.	La descarga de la bomba se conducirá mediante una columna de distribución a cada uno de los pisos de la edificación en donde se instalaran redes de tuberías colgadas de los techos, en las zonas comunes de los puntos fijos, conectando a las regaderas automáticas.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.26	**ACCESORIOS ROSCADO 1"**	Los accesorios roscados deben cumplir los requerimientos de las NORMAS ASME. Debe incluir certificación del fabricante del cumplimiento de los requerimientos de la NORMA ASME.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.27	**ABRAZADERAS UL/FM 1"**	Listadas UL y aprobadas FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.28	**ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)**				Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.29	**ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)**				Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.30	**ESCUDO CROMADO ROCIADOR**				Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.31	**SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2"**	Listadas UL y aprobadas FM.	Las siamesas serán construidas en bronce de cuerpo recto con sus cadenas, tapones y tapas correspondientes. La tapa será en bronce pulido y brillado, bronce cromado y aluminio anodizado.	Unidad	Las siamesas tendrán placa de identificación, bocas de alimentación de ø2½", roscas NST, con tapas y cadenas localizadas en las fachadas exteriores de acuerdo con los planos y deben ser listadas UL y aprobadas FM.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.32	**CHEQUE HIDRO 4"**	Listadas UL y aprobadas FM.	El diseño de los accesorios debe garantizar presiones no menores a 12 bares (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado.	Unidad	Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.33	**VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"**	Listadas UL y aprobadas FM.			Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.02.34	**REGISTRO BOLA 1"**	Listadas UL y aprobadas FM.			Cumplir con las recomendaciones de las Normas Adoptadas para el desarrollo del proyecto y es responsable de los cambios que se le hagan al presente diseño.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
13.03.00	**GABINETES Y VÁLVULAS**							
13.03.01	**GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 1-1/2"-2-1/2")**	Deben cumplir los parámetros de fabricación exigidos por la NORMA ICONTEC 1669	Cada uno de estos estará compuesto por: • Gabinete metálico fabricado en lámina Cold Rolled calibre 18 para sobreponer de acuerdo a las dimensiones de las columnas donde se instalarán con su respectiva cerradura y llave, vidrio de seguridad de 4 mm, puerta batiente, acabado con anticorrosivo y terminado en pintura esmalte color rojo. • Soporte tipo carretel para manguera de ø1½" de 100 pies de longitud. • Válvula en ángulo tipo Globo fabricada en Bronce ø1½", Hembra-Macho. Con reguladora de presión o restrictora de presión según los describan los planos. • Manguera tipo duraline para gabinetera de 100 pies de longitud, ø 1½" acoplada en duraluminio, roscas NST, Hembra-Macho. • Boquilla tipo chorro/neblina graduable ø 1½", caudal 50 – 60 GPM @ 65 PSI. • Hacha con mango de madera. • Extinguidor multipropósito. • Válvula de bronce en ángulo tipo globo de 2½"	Unidad	Todos los gabinetes tendrán un solo tipo de cerradura de tal manera que puedan ser accionados por una sola llave y estarán espaciados en una distancia que no exceda entre ellos los 39 m, y en las áreas y cantidad como se señala en los planos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	13.03.02	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	• El sensor de flujo debe ser listado UL / FM. • El Sensor de Posición debe ser listado UL y aprobado FM. • La conexión del Supervisor de Posición de las válvulas al panel de alarmas del cuarto de seguridad debe realizarse según lo estipulado por NFPA 70 y 72, última edición.	•Este sensor de flujo deberá ser instalado después de la válvula de corte (válvula mariposa) y del cheque en el sentido del flujo. •Los sensores de Posición "OS&Y Supervisory Switch", aquí requeridos son para ser instalados en las válvulas de control del riser de los sistemas de rociadores diseñados. •El diámetro de la esfera de los manómetros será de 80 mm de Ø como mínimo y la conexión a 9.53 mm de diámetro.	Unidad	• Los Sensores de Flujo diseñados serán Tipo Paleta para ser usados en los risers de los sistemas de rociadores. • Los sensores de Posición "OS&Y Supervisory Switch", aquí requeridos son para ser instalados en las válvulas de control del riser de los sistemas de rociadores diseñados. • Como criterio general se instalarán manómetros de glicerina en las tuberías de impulsión de las bombas.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	13.04.00	MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS							
	13.04.01	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	Listadas UL y aprobadas FM.	Las siamesas serán construidas en bronce de cuerpo recto con sus cadenas, tapones y tapas correspondientes. La tapa será en bronce pulido y brillado, bronce cromado y aluminio anodizado.	Unidad	Las siamesas tendrán placa de identificación, bocas de alimentación de ø2½", roscas NST, con tapas y cadenas localizadas en las fachadas exteriores de acuerdo con los planos y deben ser listadas UL y aprobadas FM.		Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	13.04.02	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 1-1/2"-2-1/2")	Deben cumplir los parámetros de fabricación exigidos por la NORMA ICONTEC 1669	Cada uno de estos estará compuesto por: • Gabinete metálico fabricado en lámina Cold Rolled calibre 18 para sobreponer de acuerdo a las dimensiones de las columnas donde se instalarán con su respectiva cerradura y llave, vidrio de seguridad de 4 mm, puerta batiente, acabado con anticorrosivo y terminado en pintura esmalte color rojo. • Soporte tipo carretel para manguera de ø1½" de 100 pies de longitud. • Válvula en ángulo tipo Globo fabricada en Bronce ø1½", Hembra-Macho. Con reguladora de presión o restrictora de presión según los describan los planos. • Manguera tipo duraline para gabinetera de 100 pies de longitud, ø 1½" acoplada en duraluminio, roscas NST, Hembra-Macho. • Boquilla tipo chorro/neblina graduable ø 1½", caudal 50 – 60 GPM @ 65 PSI. • Hacha con mango de madera. • Extinguidor multipropósito. • Válvula de bronce en ángulo tipo globo de 2½"	Unidad	Todos los gabinetes tendrán un solo tipo de cerradura de tal manera que puedan ser accionados por una sola llave y estarán espaciados en una distancia que no exceda entre ellos los 39 m, y en las áreas y cantidad como se señala en los planos.		Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	13.04.03	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)			Unidad			Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	13.04.04	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)			Unidad			Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	13.04.05	ESCUDO CROMADO ROCIADOR			Unidad			Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	13.04.06	MONTAJE BOMBA LÍDER INCENDIO	• Bomba: Norma N.F.P.A.-20. • Motor: Listado por U.L. y aprobado por F.M., cumplir con los requerimientos de N.F.P.A.-20 y estar aprobado para uso en sistemas contra incendios • Tablero de control: UL listed y FM approved		Unidad			Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	13.04.07	MONTAJE BOMBA JOCKEY	• Bomba: Norma N.F.P.A.-20. • Motor: Listado por U.L. y aprobado por F.M., cumplir con los requerimientos de N.F.P.A.-20 y estar aprobado para uso en sistemas contra incendios • Tablero de control: UL listed y FM approved		Unidad			Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	13.04.08	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	• El sensor de flujo debe ser listado UL / FM. • El Sensor de Posición debe ser listado UL y aprobado FM. • La conexión del Supervisor de Posición de las válvulas al panel de alarmas del cuarto de seguridad debe realizarse según lo estipulado por NFPA 70 y 72, última edición.	•Este sensor de flujo deberá ser instalado después de la válvula de corte (válvula mariposa) y del cheque en el sentido del flujo. •Los sensores de Posición "OS&Y Supervisory Switch", aquí requeridos son para ser instalados en las válvulas de control del riser de los sistemas de rociadores diseñados. •El diámetro de la esfera de los manómetros será de 80 mm de Ø como mínimo y la conexión a 9.53 mm de diámetro.	Unidad	• Los Sensores de Flujo diseñados serán Tipo Paleta para ser usados en los risers de los sistemas de rociadores. • Los sensores de Posición "OS&Y Supervisory Switch", aquí requeridos son para ser instalados en las válvulas de control del riser de los sistemas de rociadores diseñados. • Como criterio general se instalarán manómetros de glicerina en las tuberías de impulsión de las bombas.		Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	14.00.00	INSTALACIONES GAS NATURAL							
	14.00.00	REDES DE GAS							
	14.00.01	TUB. POLIETILENO DE POR TERMO FUSIÓN 32 mm (1-1/2")	• Ensayos de presión para verificar que no se presenten ningún tipo de fugas. • Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Se procede a inspeccionar toda la circunferencia, el reborde se haya formado uniformemente. La unión de la tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento dado en la tabla, después de haberse efectuado la operación y antes de someterla a esfuerzos o presión. • Se procede a inspeccionar que la unión de tal forma que no se despegue debido a la contaminación o a un mal procedimiento de unión.	Medición	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	14.00.02	ACCES. POLIETILENO 32 mm (1-1/2")	• Ensayos de presión para verificar que no se presenten ningún tipo de fugas. • Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Si el fundido es satisfactorio, rápidamente empuje el accesorio sobre el extremo del tubo con una estocada llana y recta, sin movimientos laterales, ni de giros, hasta que haga contacto con el anillo frío. Mantenga la presión constante hasta completar el tiempo de enfriamiento (ver tabla Nº 2) para soltar el anillo frío. • Revisar que la unión no presente vacíos, ranuras, ni material extraño o contaminación. • La tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento recomendado tabla Nº 2 (pàg. 22) para realizar pruebas de presión. No acelere el enfriamiento con agua, solventes ni corrientes de aire, protéjala de los rayos solares, así como de la humedad o lluvia.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	14.00.03	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25 mm (1")	• Ensayos de presión para verificar que no se presenten ningún tipo de fugas. • Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Se procede a inspeccionar toda la circunferencia, el reborde se haya formado uniformemente. La unión de la tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento dado en la tabla, después de haberse efectuado la operación y antes de someterla a esfuerzos o presión. • Se procede a inspeccionar que la unión de tal forma que no se despegue debido a la contaminación o a un mal procedimiento de unión.	Medición	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
	14.00.04	ACCES. POLIETILENO 25 mm (1")	• Ensayos de presión para verificar que no se presenten ningún tipo de fugas. • Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Si el fundido es satisfactorio, rápidamente empuje el accesorio sobre el extremo del tubo con una estocada llana y recta, sin movimientos laterales, ni de giros, hasta que haga contacto con el anillo frío. Mantenga la presión constante hasta completar el tiempo de enfriamiento (ver tabla Nº 2) para soltar el anillo frío. • Revisar que la unión no presente vacíos, ranuras, ni material extraño o contaminación. • La tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento recomendado tabla Nº 2 (pàg. 22) para realizar pruebas de presión. No acelere el enfriamiento con agua, solventes ni corrientes de aire, protéjala de los rayos solares, así como de la humedad o lluvia.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
14.00.05	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	• Ensayos de presión para verificar que no se presenten ningún tipo de fugas. • Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Se procede a inspeccionar toda la circunferencia, el reborde se haya formado uniformemente. La unión de la tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento dado en la tabla, después de haberse efectuado la operación y antes de someteria a esfuerzos o presión. • Se procede a inspeccionar que la unión de tal forma que no se despegue debido a la contaminación o a un mal procedimiento de unión.	Medición	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.00.06	ACCES. POLIETILENO 20 mm (3/4")	• Ensayos de presión para verificar que no se presenten ningún tipo de fugas. • Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Si el fundido es satisfactorio, rápidamente empuje el accesorio sobre el extremo del tubo con una estocada llana y recta, sin movimientos laterales, ni de giros, hasta que haga contacto con el anillo frío. Mantenga la presión constante hasta completar el tiempo de enfriamiento (ver tabla N° 2) para soltar el anillo frío. • Revisar que la unión no presente vacíos, ranuras, ni material extraño o contaminación. • La tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento recomendado tabla N° 2 (pág. 22) para realizar pruebas de presión. No acelere el enfriamiento con agua, solventes ni corrientes de aire, protéjala de los rayos solares, así como de la humedad o lluvia.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.00.07	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 16 mm (1/2")	• Ensayos de presión para verificar que no se presenten ningún tipo de fugas. • Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Se procede a inspeccionar toda la circunferencia, el reborde se haya formado uniformemente. La unión de la tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento dado en la tabla, después de haberse efectuado la operación y antes de someteria a esfuerzos o presión. • Se procede a inspeccionar que la unión de tal forma que no se despegue debido a la contaminación o a un mal procedimiento de unión.	Medición	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.00.08	ACCES. POLIETILENO 16 mm (1/2")	• Ensayos de presión para verificar que no se presenten ningún tipo de fugas. • Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Si el fundido es satisfactorio, rápidamente empuje el accesorio sobre el extremo del tubo con una estocada llana y recta, sin movimientos laterales, ni de giros, hasta que haga contacto con el anillo frío. Mantenga la presión constante hasta completar el tiempo de enfriamiento (ver tabla N° 2) para soltar el anillo frío. • Revisar que la unión no presente vacíos, ranuras, ni material extraño o contaminación. • La tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento recomendado tabla N° 2 (pág. 22) para realizar pruebas de presión. No acelere el enfriamiento con agua, solventes ni corrientes de aire, protéjala de los rayos solares, así como de la humedad o lluvia.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.01.00	PUNTOS DE GAS NATURAL							
14.01.01	PUNTO DE GAS ESTUFA	Ensayo de presión para tuberías y accesorios de gas indicados en la NTC 2505 y la NTC 3727.	Se deben instalar los puntos de gas usando los acoples y transiciones de material permitidos por las normas y por la Entidad prestadora del servicio. Se deben usar las trabas químicas para el sellado de las roscas. Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando tapón roscado en el diámetro respectivo.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.01.02	PUNTO DE GAS HORNO	Ensayo de presión para tuberías y accesorios de gas indicados en la NTC 2505 y la NTC 3727.	Se deben instalar los puntos de gas para horno usando los acoples y transiciones de material permitidos por las normas y por la Entidad prestadora del servicio. Se deben usar las trabas químicas para el sellado de las roscas. Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando tapón roscado en el diámetro respectivo.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.01.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	Ensayo de presión para tuberías y accesorios de gas indicados en la NTC 2505 y la NTC 3727.	Se deben instalar los puntos de gas para calentadores usando los acoples y transiciones de material permitidos por las normas y por la Entidad prestadora del servicio. Se deben usar las trabas químicas para el sellado de las roscas. Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando tapón roscado en el diámetro respectivo.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.02.00	VÁLVULAS DE GAS							
14.02.01	REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	Prueba de suministro.	• Consultar Planos red de gas y verificar localización • Localizar en lugares señalados en planos • Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante • Verificar instalación y funcionamiento para aprobación • Se deben ubicar en: a la salida de las redes de gas, en los puntos de conexión de cada uno de los equipos. • Las válvulas de corte deben ser de cierre rápido mediante el giro del maneral de un cuarto (1/4) de vuelta. • Todas las válvulas de corte de gas previstas en la conexión de los artefactos de consumo deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación. • En caso de ser necesario se debe colocar un dispositivo de anclaje cercano a la válvula de paso de cada artefacto. • En las cocinas las válvulas de corte se colocarán de tal forma que su accionamiento no se realice sobre la zona de cocción, conservando los lineamientos de seguridad establecidos en la NTC 2505. • Las posiciones de abierto y cerrado quedaran correctamente identificada.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.02.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	Prueba de suministro.	• Consultar Planos red de gas y verificar localización • Localizar en lugares señalados en planos • Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante • Verificar instalación y funcionamiento para aprobación • Se deben ubicar en: a la salida de las redes de gas, en los puntos de conexión de cada uno de los equipos. • Las válvulas de corte deben ser de cierre rápido mediante el giro del maneral de un cuarto (1/4) de vuelta. • Todas las válvulas de corte de gas previstas en la conexión de los artefactos de consumo deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación. • En caso de ser necesario se debe colocar un dispositivo de anclaje cercano a la válvula de paso de cada artefacto. • En las cocinas las válvulas de corte se colocarán de tal forma que su accionamiento no se realice sobre la zona de cocción, conservando los lineamientos de seguridad establecidos en la NTC 2505. • Las posiciones de abierto y cerrado quedaran correctamente identificada.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.03.00	MONTAJE DE APARATOS							

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
14.03.01	**ESTUFA**	• Prueba de correcto funcionamiento. • Prueba de Fugas.	• Consultar Planos para determinar donde se encuentran los puntos de Gas para las estufas y su ubicación para proceder con la instalación. • Se debe encontrar la conexión de gas que debe estar certificada. • Se debe verificar el estado del equipo a instalar y sus especificaciones. • Empiece cerrando bien la llave del gas, que esté apagada y desconectada del tubo en la parte posterior. • Luego se aplica teflón en la manguera de gas que sale en la pared. • Haga la conexión de la manguera o tubo. Revísela para cerciorarse que no tenga ningún daño que pueda causar fugas. Debe ser una manguera certificada. • Quite todo el plástico y elementos que vienen en el embalaje de la estufa. • Se debe realizar la conexión desde el punto de gas hasta la estufa con las boquillas. • Después se valida que no haya fugas. Si hay, debe cambiar la manguera. • Proceder a ajustar bien todas las conexiones. • Ubique correctamente la estufa. La superficie debe estar nivelada. • Verifique los fogones y retire todo el embalaje. • Haga la conexión eléctrica (si es necesario), abra la válvula y compruebe que encienda. • Por ultimo se verifica nuevamente que no se presente ninguna fuga.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.03.02	**HORNO**	• Prueba de correcto funcionamiento. • Prueba de Fugas.	• Consultar Planos para determinar donde se encuentran los puntos de Gas para los hornos y su ubicación para proceder con la instalación. • Se debe encontrar la conexión de gas que debe estar certificada. • Se debe verificar el estado del equipo a instalar y sus especificaciones. • Empiece cerrando bien la llave del gas, que esté apagada y desconectada del tubo en la parte posterior. • Luego se aplica teflón en la manguera de gas que sale en la pared. • Haga la conexión de la manguera o tubo. Revísela para cerciorarse que no tenga ningún daño que pueda causar fugas. Debe ser una manguera certificada. • Quite todo el plástico y elementos que vienen en el embalaje del horno. • Se debe realizar la conexión desde el punto de gas hasta el horno con las boquillas. • Después se valida que no haya fugas. Si hay, debe cambiar la manguera. • Proceder a ajustar bien todas las conexiones. • Ubique correctamente el horno. • Retire todo el embalaje. • Haga la conexión eléctrica (si es necesario), abra la válvula y compruebe que encienda. • Por último, se verifica nuevamente que no se presente ninguna fuga.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
14.03.03	**CALENTADORES**	• Prueba de correcto funcionamiento. • Prueba de Fugas.	• Consultar Planos para determinar donde se encuentran los puntos de Gas para los hornos y su ubicación para proceder con la instalación. • Se deben realizar las instalaciones de agua necesarias para el correcto funcionamiento del calentador. • Se debe encontrar la conexión de gas que debe estar certificada. • Se debe verificar que el paso de agua y gas este correctamente cerrado. • Luego se procede a instalar la estructura de soporte del calentador. • Después se procede a realizar la instalación del calentador (Siguiendo las recomendaciones del fabricante). • Se procede a realizar el ajuste de todas las uniones de los accesorios de conexión del calentador. • Por ultimo se procede a realizar una verificación de fugas y el correcto funcionamiento del calentador.	Unidad	La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, de presión y de la ejecución total del trabajo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.00	**INSTALACIONES GASES MEDICINALES**							
15.00.01	**TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2"**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Presentación de la tubería • Soldadura oxiacetilénica de tubería usando accesorios • Cuando la obra lo permita deberán iniciar las labores de instalación de la red • Se usará desengrasante para la limpieza de los tubos, se procede a instalar los soportes y se ubican los tubos en los soportes. • Se sueldan dos tubos al accesorio requerido según diseño (unión, codo o tee), usando soldadura de plata para garantizar el sello y que el medicamento no se contamine.	Medición	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.02	**TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4"**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Presentación de la tubería • Soldadura oxiacetilénica de tubería usando accesorios • Cuando la obra lo permita deberán iniciar las labores de instalación de la red • Se usará desengrasante para la limpieza de los tubos, se procede a instalar los soportes y se ubican los tubos en los soportes. • Se sueldan dos tubos al accesorio requerido según diseño (unión, codo o tee), usando soldadura de plata para garantizar el sello y que el medicamento no se contamine.	Medición	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.03	**TUBERÍA COBRE TIPO L 1"**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Presentación de la tubería • Soldadura oxiacetilénica de tubería usando accesorios • Cuando la obra lo permita deberán iniciar las labores de instalación de la red • Se usará desengrasante para la limpieza de los tubos, se procede a instalar los soportes y se ubican los tubos en los soportes. • Se sueldan dos tubos al accesorio requerido según diseño (unión, codo o tee), usando soldadura de plata para garantizar el sello y que el medicamento no se contamine.	Medición	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.04	**TUBERÍA COBRE TIPO L 1 1/4"**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Presentación de la tubería • Soldadura oxiacetilénica de tubería usando accesorios • Cuando la obra lo permita deberán iniciar las labores de instalación de la red • Se usará desengrasante para la limpieza de los tubos, se procede a instalar los soportes y se ubican los tubos en los soportes. • Se sueldan dos tubos al accesorio requerido según diseño (unión, codo o tee), usando soldadura de plata para garantizar el sello y que el medicamento no se contamine.	Medición	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.05	**CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO, 2 GASES**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Se instalan cajas de control zonal con cajón en inoxidable, empotradas en muros y válvulas en su interior, se ubica la caja de control previo a la zona que va a controlar. • Para el suministro de aire comprimido para las unidades odontológicas, se instala un compresor de aire libre de aceite, requiere alimentación eléctrica de 220 VAC y cuarto independiente. • Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de los tres documentos.	Unidad	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
15.00.06	**CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO, 3 GASES**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Se instalan cajas de control zonal con cajón en inoxidable, empotradas en muros y válvulas en su interior, se ubica la caja de control previo a la zona que va a controlar. • Para el suministro de aire comprimido para las unidades odontológicas, se instala un compresor de aire libre de aceite, requiere alimentación eléctrica de 220 VAC y cuarto independiente. • Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de los tres documentos.	Unidad	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.07	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1/2" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Se instalan válvulas en acero inoxidable, 4 tornillos soldada, con extensiones de cobre prefabricadas en el taller y se instalan usando uniones lisas en los puntos donde el diseño lo indique.	Unidad	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.08	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Se instalan válvulas en acero inoxidable, 4 tornillos soldada, con extensiones de cobre prefabricadas en el taller y se instalan usando uniones lisas en los puntos donde el diseño lo indique.	Unidad	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.09	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Se instalan válvulas en acero inoxidable, 4 tornillos soldada, con extensiones de cobre prefabricadas en el taller y se instalan usando uniones lisas en los puntos donde el diseño lo indique.	Unidad	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018**	• Deben hacerse de acuerdo con la NFPA 99	• Se instalan válvulas en acero inoxidable, 4 tornillos soldada, con extensiones de cobre prefabricadas en el taller y se instalan usando uniones lisas en los puntos donde el diseño lo indique.	Unidad	• Cumplimiento de norma NFPA 99	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 2 GASES**	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• La alarma debe ubicarse en un microprocesador con una pantalla de 10" [25.4 cm], capaz de monitorear hasta 8 sensores. • Los sensores deben montarse localmente (en la caja de conexiones / tablero), instalando la tubería de cobre incluida o pueden ser instalados remotamente. Los sensores detectarán automáticamente un gas específico. • Cada unidad de sensores es para un gas específico y aparecerá un mensaje de error cuando se realice una conexión incorrecta. • Cada servicio específico contará con una lectura digital que abarque de 0-250 psi (0-1,724 kPa) para presión y 0-30"Hg (-100-0 kPa) para vacío. La lectura digital proporcionará una indicación constante de cada servicio medido. Se dispondrá de un indicador para cada servicio que indicará las condiciones de la alarma, verde "NORMAL" y rojo "HIGH" (alta) o "LOW" (baja). • Si se activa una alarma, el indicador verde cambiará a rojo y se escuchará la alarma. Presionando el botón (botón silenciador) se cancelará la alarma audible, pero la unidad seguirá en la condición de alarma hasta que se haya rectificado el problema. • Los puntos de referencia establecidos tendrán una variación de +/- 20% de la condición normal. En el modo de calibración, los puntos de referencia High/Low (alto /bajo) se pueden ajustar con los botones de la placa. • La caja está fabricada de acero calibre 18 (1.3 mm) con una tubería de cobre tipo "K" con diámetro exterior de 3/8" (9.53 mm) para la línea de servicio. • Los soportes de montaje de la caja se pueden ajustar para instalarse en paredes de distintos grosores.	Unidad	• Rango de presión de operación del Sensor LCD: • resión Media: (0 psi to 99 psi) - OXY, AIR, N_2O, CO_2 Vacío: (0 inHg to 30 inHg) - VAC, EVA Presión Alta: (0 psi to 249 psi) - NIT, IAR • La potencia de entrada de la alarma Alert-3 de Amico es: • 115-120 VCA, 50-60 HZ. • La Alarma LCD Alert-3 de Amico está certificada cETLus listed para el • estándar UL 1069 y estándar CSA C22.2 No. 205. • Los productos Amico cumplen con los certificados NFPA 99 y • CSA Z7396.1. • La Alarma LCD Alert-3 de Amico cumple con los siguientes • estándares de compatibilidad electromagnética: FCC Part 15 Class A e • ICES-003 Class A.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.12	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 3 GASES**	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• La alarma debe ubicarse en un microprocesador con una pantalla de 10" [25.4 cm], capaz de monitorear hasta 8 sensores. • Los sensores deben montarse localmente (en la caja de conexiones / tablero), instalando la tubería de cobre incluida o pueden ser instalados remotamente. Los sensores detectarán automáticamente un gas específico. • Cada unidad de sensores es para un gas específico y aparecerá un mensaje de error cuando se realice una conexión incorrecta. • Cada servicio específico contará con una lectura digital que abarque de 0-250 psi (0-1,724 kPa) para presión y 0-30"Hg (-100-0 kPa) para vacío. La lectura digital proporcionará una indicación constante de cada servicio medido. Se dispondrá de un indicador para cada servicio que indicará las condiciones de la alarma, verde "NORMAL" y rojo "HIGH" (alta) o "LOW" (baja). • Si se activa una alarma, el indicador verde cambiará a rojo y se escuchará la alarma. Presionando el botón (botón silenciador) se cancelará la alarma audible, pero la unidad seguirá en la condición de alarma hasta que se haya rectificado el problema. • Los puntos de referencia establecidos tendrán una variación de +/- 20% de la condición normal. En el modo de calibración, los puntos de referencia High/Low (alto /bajo) se pueden ajustar con los botones de la placa. • La caja está fabricada de acero calibre 18 (1.3 mm) con una tubería de cobre tipo "K" con diámetro exterior de 3/8" (9.53 mm) para la línea de servicio. • Los soportes de montaje de la caja se pueden ajustar para instalarse en paredes de distintos grosores.	Unidad	• Rango de presión de operación del Sensor LCD: • resión Media: (0 psi to 99 psi) - OXY, AIR, N_2O, CO_2 Vacío: (0 inHg to 30 inHg) - VAC, EVA Presión Alta: (0 psi to 249 psi) - NIT, IAR • La potencia de entrada de la alarma Alert-3 de Amico es: • 115-120 VCA, 50-60 HZ. • La Alarma LCD Alert-3 de Amico está certificada cETLus listed para el • estándar UL 1069 y estándar CSA C22.2 No. 205. • Los productos Amico cumplen con los certificados NFPA 99 y • CSA Z7396.1. • La Alarma LCD Alert-3 de Amico cumple con los siguientes • estándares de compatibilidad electromagnética: FCC Part 15 Class A e • ICES-003 Class A.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
15.00.13	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 MAESTRA**	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• La alarma debe ubicarse en un microprocesador con una pantalla de 10" [25.4 cm], capaz de monitorear hasta 8 sensores. • Los sensores deben montarse localmente (en la caja de conexiones / tablero), instalando la tubería de cobre incluida o pueden ser instalados remotamente. Los sensores detectarán automáticamente un gas específico. • Cada unidad de sensores es para un gas específico y aparecerá un mensaje de error cuando se realice una conexión incorrecta. • Cada servicio específico contará con una lectura digital que abarque de 0-250 psi (0-1,724 kPa) para presión y 0-30"Hg (-100-0 kPa] para vacío. La lectura digital proporcionará una indicación constante de cada servicio medido. Se dispondrá de un indicador para cada servicio que indicará las condiciones de la alarma, verde "NORMAL" y rojo "HIGH" (alta) o "LOW" (baja). • Si se activa una alarma, el indicador verde cambiará a rojo y se escuchará la alarma. Presionando el botón (botón silenciador) se cancelará la alarma audible, pero la unidad seguirá en la condición de alarma hasta que se haya rectificado el problema. • Los puntos de referencia establecidos tendrán una variación de +/- 20% de la condición normal. En el modo de calibración, los puntos de referencia High/Low (alto /bajo) se pueden ajustar con los botones de la placa. • La caja está fabricada de acero calibre 18 (1.3 mm) con una tubería de cobre tipo "K" con diámetro exterior de 3/8" (9.53 mm) para la línea de servicio. • Los soportes de montaje de la caja se pueden ajustar para instalarse en paredes de distintos grosores.	Unidad	• Rango de presión de operación del Sensor LCD: • resión Media: (0 psi to 99 psi) - OXY, AIR, N_2O, CO_2 Vacío: (0 inHg to 30 inHg) - VAC, EVA Presión Alta: (0 psi to 249 psi) - NIT, IAR • La potencia de entrada de la alarma Alert-3 de Amico es: • 115-120 VCA, 50-60 HZ. • La Alarma LCD Alert-3 de Amico está certificada cETLus listed para el • estándar UL 1069 y estándar CSA C22.2 No. 205. • Los productos Amico cumplen con los certificados NFPA 99 y • CSA Z7396.1. • La Alarma LCD Alert-3 de Amico cumple con los siguientes • estándares de compatibilidad electromagnética: FCC Part 15 Class A e • ICES-003 Class A.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC OXIGENO**	Los productos Amico cumplen con la norma NFPA 99 y CSA Z7396.1.		Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.15	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC AIRE MEDICINAL**	Los productos Amico cumplen con la norma NFPA 99 y CSA Z7396.1.		Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.16	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC VACÍO**	Los productos Amico cumplen con la norma NFPA 99 y CSA Z7396.1.		Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.17	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA VACÍO MEDICINAL DÚPLEX 3 HP. CUMPLE NORMA NFPA**	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Todos los componentes están conectados y conectados a conexiones de servicio de un solo punto. Las únicas conexiones de campo son entrada de aire, aire descarga y energía en el panel de control. • Todas las tuberías y el cableado de interconexión están completos y se prueban operativamente previo al envío. • Se proporcionan conductos, accesorios y cajas de conexiones herméticos para todo el cableado de control y alimentación.. RECEPTOR • El sistema incluye un receptor de vacío de construcción ASME clasificado para 200 PSI MWP. El tanque incluye una aspiradora manómetro, by-pass con válvula y drenaje manual del tanque. PANEL DE CONTROL • El panel de control listado por UL se suministra en un gabinete NEMA 12 e incluye cortocircuito, monofásico y térmico. • protección de sobrecarga. Disyuntores operables externamente con enclavamiento de puerta, transformadores de circuito de control con fusible bobinas primarias y secundarias, interruptores H-O-A, arrancadores magnéticos con protección de sobrecarga de 3 patas e interruptores de reinicio estándar. • El controlador lógico programable proporciona alternancia automática y control de adelanto-retraso con la opción de seleccionar entre una de las bombas como permanente plomo durante períodos de mantenimiento de la bomba. Incluye temporizadores de funcionamiento mínimo para evitar ciclos cortos de funcionamiento. • La pantalla de interfaz hombre-máquina (HMI) incluye indicación de funcionamiento de la bomba, tiempo de funcionamiento acumulado y condiciones de alarma. • Las alarmas sonoras y visuales locales de "respaldo en uso" se proporcionan según NFPA 99. La alarma sonora se puede reconocer con el botón "Silencio". La alarma visual permanecerá encendida hasta que se reinicie manualmente. • Todos los controles y alarmas funcionarán incluso si una de las bombas se apaga por mantenimiento o reparaciones. • El panel incluye un conjunto de contactos secos para la conexión a la alarma maestra.	Unidad	• La bomba de vacío arrancará automáticamente a 18 "Hg si la bomba de vacío principal no funciona. • Las bombas están provistas de un suministro de aceite recirculado completo. La separación de aceite consiste de cuatro etapas de eliminadores de aceite y humo, capaces de eliminar el 99,9 +% de las partículas de aceite y humo del escape. • Cada bomba de vacío es impulsada por un motor trifásico, 60 ciclos, TEFC NEMA C-face. • Cada bomba de vacío se suministra con una válvula de retención de entrada, una válvula de aislamiento de entrada, una válvula antirretorno incorporada, una pantalla de filtro, mirilla de aceite, válvula de drenaje de aceite, manómetro de escape, interruptor de vacío, entrada y descarga flexible conectores y una llave de cierre para manómetros y vacuostatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.18	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXÍGENO 2 X 8 CON BARRAS DE BRONPIGTAIL DE COBRE CON VÁLVULA ANTI RETORNO**	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Se ancla el gabinete al muro. • Se instalan las barras en bronce. • Se conectan ciiindros y se presuriza .	Unidad	• La bomba de vacío arrancará automáticamente a 18 "Hg si la bomba de vacío principal no funciona. • Las bombas están provistas de un suministro de aceite recirculado completo. La separación de aceite consiste de cuatro etapas de eliminadores de aceite y humo, capaces de eliminar el 99,9 +% de las partículas de aceite y humo del escape. • Cada bomba de vacío es impulsada por un motor trifásico, 60 ciclos, TEFC NEMA C-face. • Cada bomba de vacío se suministra con una válvula de retención de entrada, una válvula de aislamiento de entrada, una válvula antirretorno incorporada, una pantalla de filtro, mirilla de aceite, válvula de drenaje de aceite, manómetro de escape, interruptor de vacío, entrada y descarga flexible conectores y una llave de cierre para manómetros y vacuostatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2 X 2 CON BARRAS DE BRONCE DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTI RETORNO**	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	• Se ancla el gabinete al muro. • Se instalan las barras en bronce. • Se conectan ciiindros y se presuriza .	Unidad	• La bomba de vacío arrancará automáticamente a 18 "Hg si la bomba de vacío principal no funciona. • Las bombas están provistas de un suministro de aceite recirculado completo. La separación de aceite consiste de cuatro etapas de eliminadores de aceite y humo, capaces de eliminar el 99,9 +% de las partículas de aceite y humo del escape. • Cada bomba de vacío es impulsada por un motor trifásico, 60 ciclos, TEFC NEMA C-face. • Cada bomba de vacío se suministra con una válvula de retención de entrada, una válvula de aislamiento de entrada, una válvula antirretorno incorporada, una pantalla de filtro, mirilla de aceite, válvula de drenaje de aceite, manómetro de escape, interruptor de vacío, entrada y descarga flexible conectores y una llave de cierre para manómetros y vacuostatos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
15.00.20	**SG-SST Y TRANSPORTES**					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	Calibración del equipo de presión y de las bombas
16.00.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
16.01.00	**SALIDAS ELÉCTTRICAS**							

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.01.01	SALIDA LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIAMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA, - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA Y SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W Y AXIS LENS 33W 60*60 - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M, 2.28M, 3.4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.07	SALIDA APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORES LED 12W Y 30W -WALL PACK, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.08	SALIDA ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.09	SALIDA PARA MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.10	SALIDA APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6 W, 120V, INCLUYE. TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120W, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL I ENS 36W, 57W, 7,7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG - 600 VOLT CON CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA, DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA, TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETIE	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.14	SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA FLUXOMETROS LAVAMANOS QUIRÚRGICOS, SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½", CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM, Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.15	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA TALANQUERAS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 4X12 AWG, CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, ESCLAVA GFCI, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTEMPERIE INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI, UNIDAD ODONTOLOGICAS, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MÉDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTO Y CIRUGIA, 120 V, 15 A INCLUYE TUBERÍA EMT DIAMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA RAYOS X PORTATILES, HUBBELL IN16494 60A, 220 V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 2", CABLE TRENZADO XHHW-2 NO. 2 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLOGÍA, BAÑO MARIA Y CALENTADORES ELÉCTRICOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.30	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, MÁQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRÍLICO EN ACRÍLICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	• RETIE	• Adherencia de la marquilla una vez puesta	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Identificación de cada uno de los circuitos eléctricos de cada salida, en acrílico en bajo relieve o cinta termo impreso con letra apropiada y legible para su fácil lectura e identificación	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Fucionamiento del aparato.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Fucionamiento del aparato.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Fucionamiento del aparato.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.35	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.36	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SÓTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.37	SALIDAS TRIFÁSICA 208 V, PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCLAVE, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12+1X10T AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Polaridad en tomacorriente	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.38	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBAS EYECTORAS, PRESIÓN Y PONDAJE, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¼", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.39	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA JOCKEY, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¾", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CAJA RAWELT ¾" Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.01.40	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA INCENDIO, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE 4", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE FLEXIBLE 3#250+1#2/0T AWG, CONDULETA 4" Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, cajas de paso, cajas de salida tipo rawelt, toma monofásica doble con polo a tierra todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.00	ALIMENTADORES DE CIRCUITO Y EQUIPOS DE AIREA ACONDICIONADO							

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.02.01	**ALIMENTADORES UNIDAD FCP, DCA, CVV, EN PISO 1 Y 2, CABLEADA EN 3X12, INCLUYE SOPORTES, TUBERÍA EMT ½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE, CONECTORES DUCTOS Y CONECTORES TIPO, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, conduleta, coraza LT, conectores coraza, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.02	**SALIDA UNIDAD UCA, UEX, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, conduleta, coraza LT, conectores coraza, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.03	**SALIDAS UNIDADES UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, conduleta, coraza LT, conectores coraza, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.04	**SALIDA UNIDAD UCA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, conduleta, coraza LT, conectores coraza, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.05	**SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, conduleta, coraza LT, conectores coraza, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.06	**SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 2", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.**	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, conduleta, coraza LT, conectores coraza, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.07	**SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 3", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.**	• RETIE	• Continuidad eléctrica. • Tensión en las puntas de conexión. • Secuencia de fases.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, conduleta, coraza LT, conectores coraza, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.08	**TUBERÍA EMT Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.09	**TUBERÍA PVC Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN**	• RETIE	• Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería PVC con sus respectivos accesorios, soportes, soldadura, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.10	**TUBERÍA EMT Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.11	**TUBERÍA PVC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN**	• RETIE	• Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería PVC con sus respectivos accesorios, soportes, soldadura, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.12	**TUBERÍA IMC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.). • Tipo de conductor en cobre apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE), incluido conectores de resorte, amarres, conduleta, coraza LT, conectores coraza, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.02.13	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE LUMINARIA EN 2#12#12T	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.14	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X10 AWG	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.15	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X12 AWG	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.16	CAJA DE 10X10 CM RAWELT DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja de paso con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.02.17	CAJA DE 15X15 CM DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja de paso con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.00	INSTALACION LUMINARIAS							
16.03.01	INSTALACIÓN LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.02	INSTALACIÓN LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.03	INSTALACIÓN LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.04	INSTALACIÓN LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.05	INSTALACIÓN LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.06	INSTALACIÓN LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M, 2.28M, 3.4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.07	INSTALACIÓN APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORESLED 30W - WALL PACK, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.08	INSTALACIÓN ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.09	INSTALACIÓN MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.10	INSTALACIÓN APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN TECHO, 6 W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.11	INSTALACIÓN POSTE POSTE DE LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	• RETIE	• Estabilidad del elemento y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, elementos de soporte y fijación.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.03.12	INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7,7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	• RETIE	• Funcionamiento, encendido, apagado, nivel de iluminación en los casos en los cuales son controladas por dimmer	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Montaje, conexionado, elementos de soporte y fijación, conectores, etc. • Pruebas y puesta en marcha.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.00	DUCTERÍAS, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES B.T							
16.04.01	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería PVC con sus respectivos accesorios, soportes, soldadura, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.02	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería PVC con sus respectivos accesorios, soportes, soldadura, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.03	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería PVC con sus respectivos accesorios, soportes, soldadura, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	16.04.04	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería PVC con sus respectivos accesorios, soportes, soldadura, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.05	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería PVC con sus respectivos accesorios, soportes, soldadura, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.06	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería PVC con sus respectivos accesorios, soportes, soldadura, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.07	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.08	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.09	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.10	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.11	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.12	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería EMT con sus respectivos accesorios, soportes, abrazaderas galvanizadas, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.13	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.14	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.15	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.16	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.17	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.18	**TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO T-EI**	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.04.19	**CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø1½"**	• RETIE	• Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.04.20	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø3"	• RETIE	• Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.21	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø4"	• RETIE	• Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.22	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 40X0,5CM	• RETIE	• Continuidad eléctrica de las uniones, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Bandeja portacables tipo ducto con sus respectivos accesorios, tapa, curvas, tees, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, abrazaderas, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.23	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 30X0,5CM	• RETIE	• Continuidad eléctrica de las uniones, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Bandeja portacables tipo ducto con sus respectivos accesorios, tapa, curvas, tees, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, abrazaderas, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.24	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 20X0,5CM	• RETIE	• Continuidad eléctrica de las uniones, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Bandeja portacables tipo ducto con sus respectivos accesorios, tapa, curvas, tees, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, abrazaderas, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.25	CABLE NO. 4 CU PARA ATERRIZAJE DE DUCTO PORTACABLE A LO LARGO DE SU TRAYECTO, INCLUYE CONECTORES BIMETÁLICAS GRIFEQUIP A LO LARGO DEL DUCTO	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Cable No. 4 para aterrizar la bandeja portacables tipo ducto con su respectivo conector, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.26	CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	• RETIE	• Continuidad eléctrica de las uniones, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja de paso con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.27	CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	• RETIE	• Continuidad eléctrica de las uniones, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja de paso con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.28	CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	• RETIE	• Continuidad eléctrica de las uniones, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja de paso con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.29	CAJA DE PASO METÁLICA 40X40X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	• RETIE	• Continuidad eléctrica de las uniones, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja de paso con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.30	CAJA DE PASO METÁLICA 60X60X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	• RETIE	• Continuidad eléctrica de las uniones, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja de paso con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.31	ALIMENTADOR EN 3#12+1#12T PARA TABLERO	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.32	ALIMENTADOR EN 2#10+1#10T PARA TABLERO	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.33	ALIMENTADOR EN 3#10+1#10T PARA TABLERO	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.34	ALIMENTADOR EN 2#8+1#10T PARA TABLEROS	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.04.35	**ALIMENTADOR EN 3#8+1#10T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.36	**ALIMENTADOR EN 3#8+1#8+1#10T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.37	**ALIMENTADOR EN 3#8+1#4+1#10T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.38	**ALIMENTADOR EN 3#6+1#10T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.39	**ALIMENTADOR EN 3#6+1#6+1#10T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.40	**ALIMENTADOR EN 3#4+1#8T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.41	**ALIMENTADOR EN 3#4+1#4+1#8T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.42	**ALIMENTADOR EN 3#2+1#6T**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.43	**ALIMENTADOR EN 3#2+1#2+1#6T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.44	**ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#6T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.45	**ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#1/0+1#6T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.46	**ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#3/0+1#6T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.47	**ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#4T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.48	**ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#2/0+1#4T PARA TABLEROS**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.49	**ALIMENTADOR EN 3#3/0+1#250+1#2T PARA TABLERO**	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.04.50	ALIMENTADOR EN 3#4/0+1#2T PARA TABLERO	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.51	ALIMENTADOR EN 3#250+1#2T PARA TABLERO	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.52	ALIMENTADORES EN 2(3#4/0+1#4/0)+1#2/0T CU	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.53	ALIMENTADORES EN 3#350+1#2T CU	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.54	ALIMENTADORES EN 3#350+1#350+1#2T CU	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.55	ALIMENTADORES EN 2(3#350)+1#4/0T CU	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.56	ALIMENTADORES EN 3(3#350)+2#1/0T CU	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.57	ALIMENTADORES EN 3(3#350+1#350)+2#1/0T	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.58	ALIMENTADORES EN 3#500+1#500+1#2T CU	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.59	ALIMENTADORES EN 4(3#500+1#500)+1#250T CU	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.60	ALIMENTADORES EN 7(3#500+1#500)+2#4/0T CU	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, conectores de resorte y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.61	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#8+1#4+1#10T UPS 12 KVA	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, bornas y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.62	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#1/0+1#3/0+1#6T UPS 40 KVA	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, bornas y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.04.63	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#3/0+1#250+1#2T UPS 90 KVA	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado (BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROGAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS SEGÚN RETIE) • Usar código de colores establecidos en la norma, amarres, bornas y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.05.00	TABLEROS DE DISTRIBUCION							
16.05.01	TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero con sus respectivos acesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo barrajes, tapa con puerta y chapa, bornes para conexión de acometida, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	16.05.02	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo barrajes, tapa con puerta y chapa, bornes para conexión de acometida, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.03	TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo barrajes, tapa con puerta y chapa, bornes para conexión de acometida, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.04	TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo barrajes, tapa con puerta y chapa, bornes para conexión de acometida, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X60 A, 208V	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo interruptor, tapa, salidas conduit en sus laterales, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X20 A, 208V, PARA EYECTORAS	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo interruptor, tapa, salidas conduit en sus laterales, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X15 A, 208V	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo interruptor, tapa, salidas conduit en sus laterales, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.08	INTERRUPTOR 1X10, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	• RETIE	• Apertura y cierre del interruptor verificando presencia o ausencia de tensión según la posición.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Interruptor, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.09	INTERRUPTOR 1X20, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	• RETIE	• Apertura y cierre del interruptor verificando presencia o ausencia de tensión según la posición.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Interruptor, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.10	INTERRUPTOR 2X20, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	• RETIE	• Apertura y cierre del interruptor verificando presencia o ausencia de tensión según la posición.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Interruptor, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.11	INTERRUPTOR 3X20, 3X30, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	• RETIE	• Apertura y cierre del interruptor verificando presencia o ausencia de tensión según la posición.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Interruptor, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.12	INTERRUPTOR 3X30, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	• RETIE	• Apertura y cierre del interruptor verificando presencia o ausencia de tensión según la posición.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Interruptor, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.13	INTERRUPTOR 3X40, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	• RETIE	• Apertura y cierre del interruptor verificando presencia o ausencia de tensión según la posición.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Interruptor, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	• RETIE	• Apertura y cierre del interruptor verificando presencia o ausencia de tensión según la posición.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Interruptor, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.15	INTERRUPTOR 3X60, 3X70, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	• RETIE	• Apertura y cierre del interruptor verificando presencia o ausencia de tensión según la posición.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Interruptor, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.16	INTERRUPTOR 3X80, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	• RETIE	• Apertura y cierre del interruptor verificando presencia o ausencia de tensión según la posición.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Interruptor, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	16.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7,5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 7 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (CIRUGÍA)	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme de todos los elementos, pruebas de funcionamiento de los accesorios y puesta en marcha con el acompañamiento del proveedor.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero con sus respectivos accesorios, elementos de fijación, incluyendo barrajes, localizador de fallas por circuito, sistema de comunicación BMS por zona, indicador de alarma remota, protecciones y demás accesorios para su correcto funcionamiento, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.05.19	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7.5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 9 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (PARTO)	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme de todos los elementos, pruebas de funcionamiento de los accesorios y puesta en marcha con el acompañamiento del proveedor.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero con sus respectivos accesorios, elementos de fijación, incluyendo barrajes, localizador de fallas por circuito, sistema de comunicación BMS por zona, indicador de alarma remota, protecciones y demás accesorios para su correcto funcionamiento, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 30A, 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (UCI NEONATAL)	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme de todos los elementos, pruebas de funcionamiento de los accesorios y puesta en marcha con el acompañamiento del proveedor.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero con sus respectivos accesorios, elementos de fijación, incluyendo barrajes, localizador de fallas por circuito, sistema de comunicación BMS por zona, indicador de alarma remota, protecciones y demás accesorios para su correcto funcionamiento, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 15KVA EQUIPOS PORTÁTILES RAYOS X , 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 90A, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 30A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, PLC PARA CONTROL DE 5 CIRCUITOS CON MÀXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTÁNEAMENTE, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme de todos los elementos, pruebas de funcionamiento de los accesorios y puesta en marcha con el acompañamiento del proveedor.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero con sus respectivos accesorios, elementos de fijación, incluyendo barrajes, localizador de fallas por circuito, sistema de comunicación BMS por zona, indicador de alarma remota, protecciones y demás accesorios para su correcto funcionamiento, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET, (TCP/IP) INTEGRADO, 10/100/1000 MBITS, ACCESO REMÓTO A TRAVÉS DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS BMS INTERNO A TRAVÉS DE MODBUS RTU O MODBUS/TCP	• RETIE	• Funcionamiento de los accesorios según configuración y puesta en marcha con el acompañamiento del proveedor.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Sistema de comunicaciones con sus respectivos accesorios, incluyendo configuración del sistema de comunicación al BMS por zona y demás accesorios para su correcto funcionamiento, todo bajo requerimientos normativos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	• RETIE	• Funcionamiento de los accesorios según configuración y puesta en marcha con el acompañamiento del proveedor.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Localizadores de falla con sus respectivos accesorios, incluyendo configuración del sistema de comunicación al BMS por zona y demás accesorios para su correcto funcionamiento, todo bajo requerimientos normativos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	• RETIE	• Funcionamiento de los accesorios según configuración y puesta en marcha con el acompañamiento del proveedor.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Localizadores de falla con sus respectivos accesorios, incluyendo configuración del sistema de comunicación al BMS por zona y demás accesorios para su correcto funcionamiento, todo bajo requerimientos normativos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.00	TABLEROS PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS							
16.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero con sus respectivos accesorios, elementos de fijación, incluyendo barrajes, localizador de fallas por circuito, sistema de comunicación BMS por zona, indicador de alarma remota, protecciones y demás accesorios para su correcto funcionamiento, bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "F-A", PARA 70KVARS, 200A, 208V, FILTRO DE ARMÓNICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCIÓN DEL 5% O MENOS EN ITDD DE TODO EL SISTEMA, MARCA TCI O ACUSSINE DE SCHNEIDER ELECTRIC, EL FILTRO INCLUYE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	• RETIE	• Pruebas SAT	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de filtro activo completamente ensamblado de fábrica. • Montaje, configuración, puesta en marcha por un Ingeniero representante de la Marca, con capacitación para la operación del equipo. • Transformadores de corriente en tablero general, protecciones, barraje, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TV" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TC-RG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas SAT.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de transferencia con bypass completamente ensamblado de fábrica. • Montaje, configuración, puesta en marcha por un Ingeniero representante de la Marca, con capacitación para la operación del equipo. • Protecciones, barraje, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_02 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.06.17	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_03 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.18	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TCC-01_03 A" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_03A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.20	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.21	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.22	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_04" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.23	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.24	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.25	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_03 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.06.26	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE " TNE-TCC-01_02 A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)**	• RETIE	• Pruebas FAT. • Pruebas SAT. • Inspección general (Grado de protección envolvente / Distancias de aislamiento / Protección contra choque eléctrico / Incorporación de componentes / Circuitos eléctricos y conexiones / Terminales / Operación mecánica / Cableado). • Pruebas de aislamiento (Líneas de fuga / Propiedades dieléctricas). • Medidas de protección (Comprobación de circuitos de protección)	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tablero de potencia completamente armado, alambrados y con los diferentes elementos colocados en su sitio de operación. • Puesta en marcha. • Aparatos de medición y transformadores de corriente, protecciones, barraje, transferencia, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.07.00	SUBESTACIONES							
16.07.01	CELDA A DE CONEXIÓN SECCIONADORA PARA ENTRADA Ó SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 17,5 KV - 630A, 20 KA, INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	• RETIE	• Pruebas SAT	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Celda completamente ensamblada de fábrica. • Montaje, anclaje, configuración, puesta en marcha y capacitación para la operación del equipo. • Seccionadores, barraje, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.02	CELDA B PARA GRUPO DE MEDIDA SF6 EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBARRADO TRIPOLAR AISLADO EN SF6, CORRIENTE NOMINAL DE 630A, CORRIENTE DE CORTO DE 20KA - PLATINA DE COBRE DE 30X3MM PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN - (2) DOBLE ANALIZADOR DE RED CON MEDIDA DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA MEDIDA REDUNDANTE, MEDIDA Y CALIDAD DE ENERGÍA, PRECISIÓN CLASE 0.5 CON COMUNICACIÓN MODBUS RTU - JUEGO DE CT´S (3UND), BURDEN-PRECISIÓN DE 20VA CL0.5(S), AISLAMIENTO A 17.5KV, SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS CORTOCIRCUITABLES DE	• RETIE	• Pruebas SAT	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Celda completamente ensamblada de fábrica. • Montaje, anclaje, configuración, puesta en marcha y capacitación para la operación del equipo. • Seccionadores, barraje, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.03	CELDA C DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Y SECCIONADOR DE AISLAMIENTO EN VACIO PARA TRANSFORMADORES DE 800 KVA, 17,5KV - 630A, 20KA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, MANDO MOTORIZADO, COORDINACIÓN DE PROTECIONES, PARAMETRIZACIÓN DEL RELÉ, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	• RETIE	• Pruebas SAT	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Celda completamente ensamblada de fábrica. • Montaje, anclaje, configuración, puesta en marcha y capacitación para la operación del equipo. • Seccionadores, barraje, cableado y demás elementos de control, interconexión y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.04	CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR 800KVA, IP54, DIMENSIONES APROPIADAS SEGÚN CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	• RETIE	• Estabilidad mecánica. • Revisión de apertura. • Cierre de puertas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Celda para alojar el transformador tipo seco. • Montaje, ensamble, anclaje, instalación de termómetro en puerta y señalización. • Certificado de producto RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15 KV DEL TIPO DE ÓXIDO METÁLICO, POR EL LADO DE M.T. DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, JUEGO X 3	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja de paso con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.06	INTERCONEXIÓN ENTRE LAS CELDAS DE PROTECCIÓN (CT) Y TRANSFORMADOR (T) EN 3X2/0 XLPE, 15 KV, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE PUNTAS Y ACCESORIOS	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado. • Código de colores establecidos en la norma, amarres, tratamiento de puntas y etiquetado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.07	TERMINALES PREMOLDEADOS DE USO INTERIOR	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Terminal, elementos de ponchado al cable, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.08	TERMINAL PREMOLDEADO RECTO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE - 15 KV, JUEGO X 3 UND	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Terminal, elementos de ponchado al cable, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.09	JUEGO DE PASACABLES PARA M.T. CORTAFUEGO PARA CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN A CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	• RETIE	• Sellamiento total de un muro a otro.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Pasamuros a prueba de fuego, accesorios y complementos para su correcta instalación, todo bajo requerimientos de producto del RETIE	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.10	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA ACOMETIDAS SALIENDO DESDE EL CUARTO DE TABLEROS GENERALES	• RETIE	• Sellamiento total de un muro a otro.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Pasamuros a prueba de fuego, accesorios y complementos para su correcta instalación, todo bajo requerimientos de producto del RETIE	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.07.11	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA DUCTOS VERTICALES EN PLACAS DE CADA PISO	• RETIE	• Sellamiento total de un muro a otro.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Pasamuros a prueba de fuego, accesorios y complementos para su correcta instalación, todo bajo requerimientos de producto del RETIE	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.08.00	REDES DE MEDIA TENSIÓN							
16.08.01	CABLE DE M.T TRIPLEX 15KV EN 120 MM² AL AWG XLPE	• RETIE	• Continuidad eléctrica y aislamiento.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tipo de conductor apropiado. • Código de colores establecidos en la norma, amarres, terminales y	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.08.02	PRUEBA DE CABLE VLF DE M.T. POR ENTE ACREDITADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE INFORME DE PRUEBAS	• RETIE	• VFL en cable de MT.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Cable de Media Tensión con informe por equipo de prueba calibrado y certificado, todo bajo requerimientos del Operador de Red.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN LAMINA 100X100X40 CMS	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Caja de paso con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.08.04	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO EN TUBO GALVANIZADO IMC DE 6""6 MTS (INCLUYE BOQUILLA TERMINAL, CURVA DE GRAN RADIO Y AMARRES EN CINTA ACERO INOXIDABLE)	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería IMC con sus respectivos accesorios, soportes, elementos de fijación (pernos, anclajes, abrazaderas, boquilla, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.09.00	CÁMARAS Y CANALIZACIÓN							
16.09.01	CANALIZACIÓN TUBERÍA 4Ø6" PVC (INCLUYE CAMA DE ARENA)	• RETIE	• Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Canalización de tubería PVC con sus respectivos accesorios, elementos de acople o unión, campanas, todo bajo requerimientos del operador de red	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.09.02	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO DOBLE AFINIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	• RETIE	• Resistencia. • Estabilidad. • Desagües.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Construcción de la caja según norma de Afinia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.09.03	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VEHÍCULAR AFINIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	• RETIE	• Resistencia. • Estabilidad. • Desagües.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Construcción de la caja según norma de Afinia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.10.00	SISTEMA PUESTA A TIERRA							
16.10.01	PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, RECTANGULAR DE 5X5 M CON CUADRICULAS DE 2.5 M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	• RETIE	• Medición de resistencia de puesta a tierra.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Construcción de la malla de puesta a tierra según configuración del diseño, incluye conductor de cobre 2/0, soldadura exotérmica, electrodos de puesta a tierra Cu.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.10.02	PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, TRIANGULAR DE 5M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	• RETIE	• Medición de resistencia de puesta a tierra.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Construcción de la malla de puesta a tierra según configuración del diseño, incluye conductor de cobre 2/0, soldadura exotérmica, electrodos de puesta a tierra Cu.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.10.03	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	• RETIE	• Resistencia. • Estabilidad. • Desagües.	Medición	• Construcción de la caja según norma Codensa.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.10.04	INTERCONEXIÓN A LOS BORNES DE NEUTRO DEL TRANSFORMADOR Y ATERRIZADA DEL CABLE DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE NO. 4/0	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Cable No. 4/0 para aterrizar el transformador y el cable de Media Tensión, con su respectiva borna, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.10.05	GABINETE DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS DE 50X20X12 CM, INCLUYE DOS BARRAS DE CU DE 1¼" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS PARA TIERRA DE POTENCIA Y TIERRA AISLADA, AISLADORES, TORNILLERIA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Gabinete de puesta a tierra con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo barras de Cu pretaladrados, aisladores, tornillería y demás elementos para la conexión de los conductores de puesta a tierra, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.10.06	GABINETE PARA UPS, TMGB Y TGB DE TELECOMUNICACIONES PARA TIERRA AISLADA, INCLUYE UNA BARRA DE CU DE 1¼" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Gabinete de puesta a tierra con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo barras de Cu pretaladrados, aisladores, tornillería y demás elementos para la conexión de los conductores de puesta a tierra, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.10.07	KIT DE TIERRAS Y BARRAJE HORIZONTAL PARA ATERRIZAR RACK Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES MONTADO SOBRE AISLADORES Y FIJADO A LA ESTRUCTURA DE GABINETE, DEBE TENER COMO MINIMO 12 PUNTOS DE CONEXIÓN	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Kit de puesta a tierra con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), incluyendo barras de Cu pretaladrados, aisladores, tornillería y demás elementos para la conexión de los conductores de puesta a tierra, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.10.08	MODULO DE TIERRA PARTO	• RETIE	• Funcionamiento de los accesorios según configuración y puesta en marcha con el acompañamiento del proveedor.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Módulo de tierra con sus respectivos accesorios, incluyendo soporteria, elementos de fijación y demás accesorios para su correcto funcionamiento todo bajo requerimientos normativos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.00	PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS							
16.11.01	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 30 Y 40 CMTS PERPENDICULAR 90º, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Punta franklin con sus respectivos accesorios, base, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.02	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 60 Y 80 CMTS 90º, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Punta franklin con sus respectivos accesorios, base, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
16.11.03	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 100 Y 120 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Punta franklin con sus respectivos accesorios, base, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.04	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA: 1.5M EN ACERO INOXIDABLE	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y estabilidad mecánica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Mastil par apunta captadora, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.05	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA: 1M EN ACERO INOXIDABLE	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y estabilidad mecánica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Mastil par apunta captadora, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.07	ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE AISLADORES, SOPORTERIA Y FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA PARA ANILLO PERIMETRAL EN CUBIERTAS	• RETIE	• Continuidad eléctrica, rigidez y estabilidad mecánica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Alambrón de Al 8mm para aterrizar las puntas captoras en toda la cubierta.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.08	AISLADOR DE FIJACIÓN ALAMBRÓN DEP SNAP O SIMILAR	• RETIE	• Rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Aislador para soportar el alambrón con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.09	KIT DE MARCACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO MARCA OBO, INCLUYE PLACAS Y SEÑALIZACIÓN	• RETIE	• Durabilidad de las marquillas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Kit de marcación con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.10	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE FIJACIÓN Y CABLEADO EN BAJANTE	• RETIE	• Continuidad eléctrica.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Cable de Al 8mm para las bajantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.11	CONECTOR PARA ALUMINIO - ALUMINIO DE PRESIÓN	• RETIE	• Rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Conector para acero - acero con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.12	TUBERÍA 1" PVC EMBEBIDA EN ESTRUCTURA	• RETIE	• Continuidad eléctrica para verificar aterrizaje (debe ser certificada para garantizar las pruebas propias de fábrica). • Sondear las tuberías para validar que no se encuentren obstruidas.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Tendido de tubería PVC con sus respectivos accesorios, soportes, soldadura, elementos de fijación (pernos, anclajes, etc.), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.13	JUEGO DE CONECTORES DE DUCTO METÁLICO A CONDUCTOR REF. GAR1426	• RETIE	• Rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Conector para aluminio aluminio con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.14	JUEGO DE CONECTORES CONDUCTOR A CONDUCTOR REF. KS23	• RETIE	• Rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de éste.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Conector para aluminio aluminio con sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.15	INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN TERRENO EN CABLE DESNUDO DE CU NO. 2/0 INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	• RETIE	• Continuidad eléctrica entre puntos de conexión.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Equipotencialización del sistema de puesta a tierra según configuración del diseño, conductor de cobre 2/0, soldadura exotérmica.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.16	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (ACERO) DE LOS EDIFICIOS, INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PLATINAS DE CONEXIÓN, PERFORAR LA COLUMNA EN BUSCA DE LOS HIERROS DE LA MISMA. (NO INCLUYE EL RESANE RESPECTIVO)	• RETIE	• Rigidez y fijación firme sin que exista movimiento de ésta. • Continuidad.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Conexión equipotencia con la estructura del edificio, incluyendo sus respectivos accesorios, elementos de fijación (pernos, anclajes), todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.17	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	• RETIE	• Resistencia. • Estabilidad. • Desagües.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Construcción de la caja según norma de Afinia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.18	PUNTOS DE UNIÓN CON CONECTOR BIMETÁLICA ACERO DE ESTRUCTURA-COBRE EN CAJA DE INSPECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	• RETIE	• Rigidez y fijación firme. • Continuidad.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Conexión equipotencia de la estructura del edificio con el electrodo de puesta a tierra, incluyendo sus respectivos elementos de soldadura, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.19	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO (5/8"X3.6)	• RETIE	• Continuidad.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Electrodo de puesta a tierra Cu-Cu, incluyendo sus respectivos elementos de soldadura, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.11.20	PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	• RETIE	• Rigidez y fijación firme. • Continuidad.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE. • Puntos de soldadura con el electrodo de puesta a tierra, incluyendo sus respectivos elementos de soldadura, todo bajo requerimientos de producto del RETIE.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.12.00	DOCUMENTACIÓN							
16.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE AVISOS TIPO REFLECTIVOS SEGÚN NORMA DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA PUERTA DE LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS A 1.5 M DE ALTURA EN LÁMINA GALVANIZADA	• RETIE	• Calidad de adherencia y durabilidad.	Medición	• Avisos en los lugares que aplique.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
16.12.02	MARCACIONES DE TUBERÍAS Y BANDEJAS PORTACABLES REDES DE ENERGÍA(CON BANDAS PLÁSTICAS O PINTURA), CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACIÓN TIPO CLIP), TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA	• RETIE	• Calidad de adherencia y durabilidad.	Medición	• Avisos en los lugares que aplique.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
17.00.00	**INSTALACIONES ILUMINACIÓN**							
17.00.01	**LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO CON STRIP LED Y DIFUSOR OPALIZADO. CHASIS EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO 40W NW SOBREPONER. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326 4000K DE SOBREPONER**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.02	**LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO.DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO INSTALACIÓN INCRUSTADO O RECESADO EN MARCO (MARCO NO INCLUIDO) O COLGADO**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.03	**BALA GU10 7W INCRUSTADA**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de cielorraso o piso con sierra de agujero dentada de diámetro 40mm. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la bala. • Sellar. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.04	**LÁMPARA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR, 3 W, LUZ SUAVE CÁLIDA STEPLIGHT ETLLED**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Preparación y picado de muro en área de carcasa de la luminaria. • Conexión del dispositivo. • Sellar. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.05	**LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO. CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO. ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 24W 100-240V**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje del LED panel. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.06	**LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO. CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO. ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 18W 100-240V**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje del LED panel. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.07	**LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 24W SOBREPONER**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje del ATENEA 1.1. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.08	**LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 33W 3288LM SOBREPONER**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje del ATENEA 1.1. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.09	**LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 24W SOBREPONER**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje del ATENEA 1.1. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.10	**LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 66W 6576 LM SOBREPONER**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje del ATENEA 1.1. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.11	**LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 3.4M 24W SOBREPONER**	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje del ATENEA 1.1. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
17.00.12	LUMINARIA DE USO INTERIOR CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE HUMEDAD O IMPACTO TIPO CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Preparación de techo para colocación de soportes. • Conexión del dispositivo. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.13	PROYECTOR EXTERIOR TIPO PX-0214-NEG 6W	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Preparación de superficies blandas y marcar ubicación de estacado. • Conexión del dispositivo. • Montaje del FOR LIGHT TIDIAN. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.14	BALA DE PISO PX 1110BALA PISO GU 10	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de cieloraso o piso con sierra de agujero dentada de diámetro 40mm. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la bala. • Sellar. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.15	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODEIN FLAT LENS 90 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Preparación de techo para colocación de soportes. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.16	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 60 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Preparación de techo para colocación de soportes. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.17	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, DE USO INTERIOR. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA. MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO 18W SOBREPONER	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje del LED panel. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.18	LUMINARIA TIPO CORAL LENS 12*40 CMLED 6-3R1FT 1100LM 7.4W 41K	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Preparación de techo para colocación de soportes. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.19	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE. GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA FÁCIL INSTALACIÓN H 4M 60W	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente. • Driver ensamblado en bandeja portaequipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento. • El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna. • La protección de sobre-corriente del Driver desconecta la carga ante un corto circuito y reconecta automáticamente. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.20	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE. GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA FÁCIL INSTALACIÓN H 4M 120V	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente. • Driver ensamblado en bandeja portaequipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento. • El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna. • La protección de sobre-corriente del Driver desconecta la carga ante un corto circuito y reconecta automáticamente. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
17.00.21	LUMINARIA LED TIPO WALL PACK 30W - DISEÑO ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN Y ÓPTICA SELLADA, INCORPORADO CON LED DE ALTA EFICIENCIA RESISTENTE AL IMPACTO Y LA INTEMPERIE CONTROL DE EMISIÓN DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR (CUTOFF)	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Preparación de posta para colocación de soportes. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.22	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ HERMÉTICA 40W NW SUSPENDIDA 1, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Preparación de posta para colocación de soportes. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.23	LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER, DISEÑO DELGADO DE USO INTERIOR. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ PANEL SLIM 24W SOBREPONER DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA Y DIFUSOR OPALIZADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO, ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Preparación de posta para colocación de soportes. • Conexión del dispositivo. • Montaje del LED panel. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.24	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO AXIS LENS 60*60CM 33W INCRUSTAR	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.25	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED VVHE INCRUSTAR 2W 415LM 5700K	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.26	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED VMV3 DESCOLGADA 1.35 2W 415LM 5700K	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.27	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO,PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4W SUSPENDIDA 1.35M	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.28	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE INCRUSTADA EN TECHO, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO,PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4.5W 170LM 6000K INCRUSTAR	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
17.00.29	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO,PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 180 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4W 302LM 6000K SOBREPONER	• RETIE • RETILAP	• Prueba de funcionamiento. • Verificar con interventoría si es necesario la ejecución de algún tipo de ensayo.	Medición	• Cumplimiento de norma RETIE y RETILAP. • Instalación del cableado. • Perforación de elemento liviano o de losa para incrustar. • Conexión del dispositivo. • Montaje de la luminaria. • Verificar correcto funcionamiento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
18.00.00	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS							
18.00.01	SERVIDOR INTEGRACION	Normas ANSI/EIA/TIA-568-A	• Configuración de la plataforma • Configuración de los formatos de visualización y almacenamiento de imágenes.	Unidad	Pruebas de compatibilidad con la base de datos de personal médico y administrativo	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	Configuración de la plataforma Configuración de los formatos de visualización y almacenamiento de imágenes.
18.00.02	SOFTWARE INTEGRACION-ACCESOS-SERVICIOS	Normas ANSI/EIA/TIA-568-A	• Configuración de la plataforma • Configuración de los formatos de visualización y almacenamiento de imágenes. • Configuración de despliegues gráfico	Unidad	Pruebas de compatibilidad con la base de datos de personal médico y administrativo	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	Configuración de la plataforma, Configuración de los formatos de visualización y almacenamiento de imágenes, Configuración de despliegues gráfico
18.00.03	PULSADOR LLAMADO Incl Modulo y cable de conexión	Normas ANSI/EIA/TIA-568-A	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo • Conexión del módulo	Unidad	Cumplir Normas UL	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
18.00.04	LÁMPARA EXTERIOR LLAMADO Incl. Cable de conexión	Normas ANSI/EIA/TIA-568-A	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
18.00.05	UNIDAD CONTROL LLAMADO Incl. Cable de conexión	Normas ANSI/EIA/TIA-568-A	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo • Montaje del panel • Configuración del software	Unidad	Cumplir Normas UL	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
19.00.00	**INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL**							
19.00.01	**PANEL DE SEGURIDAD (1 LAZO)**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Montaje de la caja del panel • Conexión de lazo • Configuración del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.02	**DETECTOR APERTURA**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Montaje del detector • Conexión del dispositivo y asignación de dirección	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.03	**PULSADOR PÁNICO**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Montaje del pulsador • Conexión al módulo monitor • Conexión del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.04	**BOTÓN APERTURA**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.05	**ESTACIÓN ADMÓN. ACCESOS**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.06	**LECTOR DE PROXIMIDAD**	• Normas FCC y UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.07	**CONTROLADOR LECTORAS X 8**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.08	**RETENEDOR MAGNÉTICO**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Montaje del retenedor sobre el marco de la puerta • Montaje de la platina sobre el marco de la puerta • Conexión del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.09	**ESTACIÓN BASE CITOFONIA**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.10	**CITOFONO MANOS LIBRES**					Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.11	**SERVIDOR VIDEO**		• Instalación del cableado • Configuración del software • Configuración de nomenclatura de cámaras	Unidad	Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.12	**TECLADO DE CONTROL**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo • Configuración del teclado	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.13	**CÁMARA FIJA**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.14	**CÁMARA FIJA CON HOUSING Incl. Conectores**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo • Instalación de la cámara	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.15	**ESTACIÓN OPERACIÓN Incl. Conectores**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo • Configuración del software	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.16	**SOFTWARE VIDEO Incl. Conectores**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo • Instalación de estación de trabajo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.17	**GABINETE 2.1 M Incl. Pernos de instalación**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Conexión del dispositivo • Instalación de estación de trabajo	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.18	**RACK 2.1 M Incl. Pernos de instalación**	• Normas UL	• Instalación del cableado • Montaje de equipos	Unidad	Cumplir Normas UL Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.19	**BANDEJA F.O. X 6 LC Incl. Pernos de instalación**	• C22.2 de las Normas de Telecomunicaciones Canadienses	• Instalación de FO • Conectorización de FO • Conexión del dispositivo	Unidad	Debe estar certificado por Underwriters Laboratories para las normas de Estados Unidos y por C22.2 de las Normas de Telecomunicaciones Canadienses Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.20	**SWITCH X 48 PTO. Incl. Pernos de instalación**	• Serie de Estándares para Norma Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-568-C • ANSI/TIA/EIA-568-C.1 y adendos • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 • ANSI/TIA/EIA-568-C.3 • ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda • " Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces" • ANSI/TIA/EIA-606-A • "Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings" • ANSI/TIA 607-B"Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications" • ANSI/TIA/EIA-758 y addenda • "Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard" • IEEE 802.3an "Physical Layer and Management Parameters for 1Gb/s Operation – Type 10GBASE-T. • IEC 61156-5 and IEC 61156-6. Manejo del Alien Crosstalk para categoría 6 A y categoría 7 A	• Instalación del cableado • Conexión de las salidas RJ-45 • Conexión de la FO • Configuración del dispositivo	Unidad	Cumplir Serie de Estándares para Norma Cableado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-568-C • ANSI/TIA/EIA-568-C.1 y adendos • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 • ANSI/TIA/EIA-568-C.3 • ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda • " Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces" • ANSI/TIA/EIA-606-A • "Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings" • ANSI/TIA 607-B"Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications" • ANSI/TIA/EIA-758 y addenda • "Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard" • IEEE 802.3an "Physical Layer and Management Parameters for 1Gb/s Operation – Type 10GBASE-T. • IEC 61156-5 and IEC 61156-6. Manejo del Alien Crosstalk para categoría 6 A y categoría 7 A	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.21	**SWITCH CORE 5 PT. FO Incl. Pernos de instalación**		• Instalación del cableado • Conexión de las salidas RJ-45 • Conexión de la FO • Configuración del dispositivo	Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.22	**SALIDA PTO. SENCILLO RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas**		• Conexión de jacks • Marcación de la salida • Certificación del punto	Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.23	**PATCH PANEL X 48 PTO Incl. Certificación y marcación de las salidas**		• Instalación de terminales RJ-45 • Amarre de conductores • Fijación al rack	Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.24	**SALIDA PTO. DOBLE RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas**		• Conexión de jacks • Marcación de la salida • Certificación del punto	Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
19.00.25	**ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK**		• Montaje sobre el rack • Tendido de conductores UTP 6A	Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	19.00.26	**PATCH CORD 2M**	Alien Crosstalk para categoría 6 A y categoría 7 A.	• Conexión desde el patch panel hasta el switch	Unidad	6 A y categoría 7 A.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.27	**CABLE UTP CAT 6A**		• Instalación del cableado • Instalación de amarres de velcro • Instalación de marquillas de marcación	Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.28	**FIBRA ÓPTICA OM3 X 6 HILOS**		Conexión desde el patch panel hasta toma terminal	Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.29	**PATCH CORD FO. MULTIMODO LC-LC Incl. Marcación de las salidas**		Conexión desde switch a bandeja de FO	Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.30	**CONECTORES LC Incl. Certificación**		Conexión desde switch a bandeja de FO	Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.31	**ACCESS POINT**	Cumplir con el estándar IEEE 802.11ª/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)	• Soporte • Instalación de antena • Conexión y configuración	Unidad	Cumplir con el estándar IEEE 802.11ª/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.32	**CONTROLADOR WIFI**	Cumplir con el estándar IEEE 802.11ª/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)	• Instalación de controlador • Conexión y configuración	Unidad	Cumplir con el estándar IEEE 802.11ª/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi)	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.33	**SERVIDOR TELEFONÍA IP**	Cumplir con las normas UL	• Instalación del servidor • Configuración del equipo	Unidad	Cumplir con las normas UL	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.34	**TERMINAL TELEFÓNICO IP SECRETARIAL INC. TELEFONO**	Cumplir con las normas UL	• Conexión del terminal • Configuración del equipo	Unidad	Cumplir con las normas UL	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.35	**TERMINAL TELEFÓNICO IP SENCILLO INC. TELEFONO**	Cumplir con las normas UL	• Conexión del terminal • Configuración del equipo	Unidad	Cumplir con las normas UL	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.36	**BANDEJA CORTACABLES DE 30CM DE ANCHO Inc. Soportes y pernos de instalación**	Cumplir con las normas UL	• Fijar tramos de bandeja • Instalar conductores	Unidad	Cumplir con las normas UL	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.37	**TUBERÍA 1" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación**	• NTC 4011 • Retie	• Corte de tramos de tubería • Instalación de uniones entre tamos • Conexión a cajas de paso • Instalación de soportes	Medición	NTC 4011 Retie	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.38	**TUBERÍA 3/4" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación**	• NTC 4011 • Retie	• Corte de tramos de tubería • Instalación de uniones entre tamos • Conexión a cajas de paso • Instalación de soportes	Medición	NTC 4011 Retie	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.39	**CANALIZACIÓN 3X4" pvc**	• ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda • " Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces" • NTC 369, 718, 979, 1125	• Instalación de tubería • Relleno del terreno	Medición	La instalación, documentación, componentes y sistemas deben cumplir o exceder las siguientes especificaciones de la industria: ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda " Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces" NTC 369, 718, 979, 1125	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	19.00.40	**CAJA0.6X0.6 M**	Cumplir con RETIE	• Excavación • Aplicación de recebo • Construcción de paredes con ladrillo tolete • Instalación de ductos • Pañetado • Fundicion de la tapa	Unidad	Cumplir con RETIE	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.00.00	**INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA**							
	20.01.00	**CONDUCTOS**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association)	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en canales tipo U de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Cuando se requiera, los conductos que transportan aire enfriado deberán ser aislados de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento.	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares. Los conductos no sobrepasarán la velocidad de 2000 fpm en su interior ni tendrán una presión estática superior a 2" c.a. De acuerdo a los siguientes lineamientos: Materiales: Se utilizarán láminas de acero galvanizado de primera calidad, de calibre apropiado según la norma y con la siguiente equivalencia para el caso de las láminas fabricadas por ACESCO:  [table]	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.01.01	**CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association)		Medición		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.01.02	**CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association)		Medición		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.01.03	**CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association)		Medición		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.01.04	**CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association)		Medición		Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.01.05	**AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO**	Aislar térmicamente según la especificación AEC-02	Una vez fabricadas las diferentes secciones de manto, estas serán adosadas a la cara exterior de los conductos. Una vez instaladas las secciones del aislamiento, se deben sellar los traslapos y uniones con cinta autoadhesiva de foil de aluminio para garantizar la integridad de la barrera de vapor.	Medición	Clasificado UL 723 / ASTM E 84. Listado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Listado GSA. Cumplimiento LEED.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.01.06	**CONDUCTOS EXTRACCIÓN COCINAS CALIBRE 16**	Conductos extracción según la especificación CEC-02	Los conductos de los sistemas de extracción de cocina serán construidos en lámina galvanizada mínimo calibre 16 utilizando uniones de brida en ángulo de hierro no menor de 1 ½" x 1 ½" x1/8" con empaque a prueba de agua, (se podrá utilizar calibre 18, únicamente al utilizar acero inoxidable). Todas las uniones longitudinales y transversales serán de construcción hermética, pudiendo ser las longitudinales soldadas. Además, el conducto tendrá las puertas de inspección y limpieza cada 6 metros como mínimo y de 0.4mts x 0.3 mts, en los ductos que su tamaño lo permita.	Medición	Cumplir con las normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.01.07	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 4"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
20.01.08	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 6"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.09	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 12"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.10	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.11	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.12	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.13	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.14	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.15	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.16	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.17	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.18	**CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 34"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.19	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
20.01.20	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.21	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.22	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.23	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.24	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.25	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.26	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.27	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 30"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.28	**CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 36"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos circulares.	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en flejes de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Los conductos que transportan aire enfriado, deberán ser recubiertos internamente con AEROCOR de 1.0" de espesor de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.29	**CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø6"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) y de acuerdo a las recomendaciones	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en canales tipo U de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.30	**CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø8"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) y de acuerdo a las recomendaciones	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en canales tipo U de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.31	**CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø10"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) y de acuerdo a las recomendaciones	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en canales tipo U de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.32	**CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø12"**	De acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) y de acuerdo a las recomendaciones	Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio de soportes construidos en canales tipo U de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso	Medición	Cumplir de acuerdo a lo establecido en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.33	**REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"**	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.34	**REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x6"**	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.36	**REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"**	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.37	**REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x26"**	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.38	**REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x6"**	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
20.01.39	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x8"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.40	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x10"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.41	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x18"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.42	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x22"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.43	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x36"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.44	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x8"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.45	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x10"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.46	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x14"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.47	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x20"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.48	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x22"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.49	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x26"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.50	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x34"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.51	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x38"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.52	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x12"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.53	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x14"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.54	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x18"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.55	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x22"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.56	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x48"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.57	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x10"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x14"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.59	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x18"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.


ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
20.01.60	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x40"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.61	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 16"x6"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.62	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x48"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.63	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 22"x38"	Rrejillas de extracción según la especificación RRA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.64	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 6"x6"	Rrejillas de extracción según la especificación RSA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello delconducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.65	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x20"	Rrejillas de extracción según la especificación RSA-01	Las rejillas se montarán sobre la pared, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello delconducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.66	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 6"x6"	Difusores según la especificación DTR-01	Los difusores se montarán sobre el cielo raso, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, el difusor se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura del cielo raso, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.67	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 9"x9"	Difusores según la especificación DTR-01	Los difusores se montarán sobre el cielo raso, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, el difusor se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura del cielo raso, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.68	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 6"x6"	Difusores según la especificación DTR-01	Los difusores se montarán sobre el cielo raso, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, el difusor se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura del cielo raso, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.69	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 9"x9"	Difusores según la especificación DTR-01	Los difusores se montarán sobre el cielo raso, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, el difusor se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura del cielo raso, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.70	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 12"x12"	Difusores según la especificación DTR-01	Los difusores se montarán sobre el cielo raso, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, el difusor se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura del cielo raso, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.71	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 6"x6"	Difusores según la especificación DTR-01	Los difusores se montarán sobre el cielo raso, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, el difusor se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura del cielo raso, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.72	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 9"x9"	Difusores según la especificación DTR-01	Los difusores se montarán sobre el cielo raso, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, el difusor se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura del cielo raso, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.73	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 12"x12"	Difusores según la especificación DTR-01	Los difusores se montarán sobre el cielo raso, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, el difusor se fijará mediante tornillos apropiados a la estructura del cielo raso, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.74	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"X24"-ø8"-ø6"	Difusores de flujo laminar según la especificación DFLH-01	Los difusores se montarán sobre el cielo raso, garantizando un sello entre este elemento y el conducto flexible, utilizando siempre materiales anticorrosivos y que garanticen los niveles de limpieza propios de ambientes críticos. El difusor se fijará a la estructura del cielo raso, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando las fugas de aire en todas las juntas. El difusor se montará sobre un marco metálico de forma tal que se garantice la hermeticidad del empate. El contratista suministrará dámper de balanceo en cada conexión de entrada al sistema.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.75	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO 34"X4"-ø6"-ø6"	Difusores según la especificación DLSC-01	Las rejillas se montarán sobre el ducto o la pared, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante empaques y tornillos apropiados a la estructura, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del conducto.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.76	COMPUERTA DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTOS 24"x8"		En las partes indicadas en los planos y en las que el contratista considere necesario, se instalarán compuertas o reguladores de volumen de fácil manejo exterior, para el correcto balanceo del sistema.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.77	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE 8"x4"-8"x4"	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	Se fija directo sobre la pared exterior en 4 puntos de sujeción.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.78	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x8"-4"x8"	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.79	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x10"-4"x10"	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.80	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x8"-6"x8"	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
20.01.81	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x10"-6"x10"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.82	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x12"-6"x12"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.83	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.84	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x4"-10"x4"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.85	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x10"-10"x10"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.86	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x12"-10"x12"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.87	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x14"-10"x14"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.88	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x4"-12"x4"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.89	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x6"-12"x6"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.90	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.91	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.92	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x12"-14"x12"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.93	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 16"x6"-16"x6"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.94	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.95	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 22"x12"-22"x12"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.96	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.01.97	**DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"**	Dámper de control de operación proporcional, según la especificación DCA-01-P	El Dámper se montará en el conducto y se soportará de manera independiente de tal forma que su peso no influya sobre el mismo. Los acoples entre el dámper y el ducto deben ser con lona flexible.	Unidad	Cumplir con la norma ISO 9001:2000.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.00	**TUBERÍA**							
20.03.01	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/4"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.02	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/8"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.03	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/2"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
20.03.04	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 5/8"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.05	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/4"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.06	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 7/8"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.07	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/8"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.08	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/4"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.09	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 3/8"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.10	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/2"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.11	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 5/8"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.12	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.03.13	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/8"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
20.03.14	**TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/2"**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislarán en su totalidad por separado, por el mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.	Medición	Cumplir con la Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónicas sensibles al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realizan nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de realizar el vacío y carga del sistema.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.04.00	**ACCESORIOS TUBERÍA**							
20.04.01	**ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN01621**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.04.02	**ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN03321**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.04.03	**ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN07121**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.04.04	**ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN14521**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.04.05	**ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN23220**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.04.06	**ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN21**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.04.07	**ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN31**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.04.08	**ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN41**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
20.04.09	**ACCESORIO EEV KIT PRLK048A0**	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	20.04.10	ACCESORIO EEV KIT PRLK096A0	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.04.11	ACCESORIO EEV KIT PRLK396A0	Normas ASHRAE, RITE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-10, así como los códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.	Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Todos los accesorios requeridos según Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.05.00	BALANCEO							
	20.05.01	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DEL AIRE	ESTANDAR ANSI/ASHRAE 111	Todo el proceso de medición, pruebas, ajustes y balanceo de los sistemas de aire acondicionado deberá realizarse según los procedimientos y recomendaciones descritos en el ESTANDAR ANSI/ASHRAE 111 (MEASUREMENT, TESTING, ADJUSTING, AND BALANCING OF BUILDING HVAC SYSTEMS), en la versión que se encuentre vigente para el momento de la puesta en operación del sistema instalado.	No aplica	Cumplir con los procedimientos y recomendaciones descritos en el ESTANDAR ANSI/ASHRAE 111 (MEASUREMENT, TESTING, ADJUSTING, AND BALANCING OF BUILDING HVAC SYSTEMS)	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.00.06	CONTROL							
	20.06.01	CONTROLADOR AC SMART 5		Se suministrará e instalará donde lo indiquen los planos un interruptor horario, el cual permite controlar la apertura y cierre del circuito eléctrico según una programación diaria, semanal o manualmente fijando una posición ON/OFF, de acuerdo a los requerimientos del sistema.	Unidad	Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.06.02	MULTI V S SINGLE		Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.06.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO/SL-2000+FAST TUBE	Estándares NFPA e ICC con respecto a los detectores de humos de conductos de retorno y de suministro de HVAC	Detector de conductos de humo de la serie SL-2000 es la última innovación para la detección temprana de humo y productos de combustión presentes en el aire que se mueve a través de conductos HVAC en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales. La unidad está diseñada para evitar la recirculación o propagación del humo por sistemas de manejo de aire, ventiladores y ventiladores.	Unidad	Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.06.04	TABLERO DE CONTROL	cumplir, con las normas de tratamiento anticorrosivo, lavado de lámina, sellantes, pintura final en RAL7032 (beige), electroestática, horneable, con un mínimo de 60 micras de espesor.	El tablero de control y los arrancadores deberán ser para montaje sobre pared, hasta un peso de 50 kilogramos, después de este peso serán tipo autosoportado, con base de 100 mm, estructura rígida soldada, tipo cerrado (siempre y cuando, no se manifieste lo contrario), con encerramiento adecuado para uso interior, NEMA 12 (IP54),	Unidad	cumplir, con las normas de tratamiento anticorrosivo, lavado de lámina, sellantes, pintura final en RAL7032 (beige), electroestática, horneable, con un mínimo de 60 micras de espesor.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.06.05	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO		Este Gateway se encargara de realizar el acople de Las cajas de volumen variable que tienen comunicación BACNET MSTP con el sistema BAS que recibe modbus RTU, esta serie puede soportar 32 dispositivos modbus rtu	Unidad	Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	20.06.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN.		Cumplir con las especificaciones del fabricante	Unidad	Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	21.00.00	APARATOS SANITARIOS							
	21.00.01	SANITARIO ADRIÁTICO ALONGADO ENTRADA POSTERIOR, INCL. MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA	• Especificaciones técnicas del fabricante.	Prueba de presión hidrostática a 80 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de tolerancia del 2%	Unidad	Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	21.00.02	ORINAL, COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Incl. Fluxometro	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se realizarán las pruebas hidráulicas exigidas por el interventor. • Se realizará prueba de presión. • Se realizará prueba de fijación	Unidad	Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	21.00.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE PETITE, CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Prueba de fijación, sello perimetral	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. • Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	21.00.04	LAVAMANOS DE COLGAR, AQUAPRO CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Prueba de fijación, sello perimetral	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. • Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	21.00.05	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100. CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Prueba de fijación, sello perimetral	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. • Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
21.00.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Prueba de fijación, sello perimetral	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. • Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.07	GRIFERÍA CON SENSOR CUELLO ALTO. CROMO	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Prueba de fijación, sello perimetral	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. • Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.09	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR		• Prueba de fijación, sello perimetral	Unidad	• Para prevenir un escape, se debe envolver las tuercas de las llaves con teflón.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.10	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA TELÉFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACIÓN		• Prueba de fijación, sello perimetral	Unidad	• Para prevenir un escape, se debe envolver las tuercas de las llaves con teflón.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA, SUJECIÓN OCULTA A LA PARED, BOTÓN PULSADOR EN A.B.S, CAPACIDAD 1.2 LITROS, VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, INDICADOR DEL NIVEL DE JABÓN		No aplica	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • El dispositivo instalado debe estar correctamente nivelado y ubicado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO, DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON LLAVE		No aplica	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • El dispositivo instalado debe estar correctamente nivelado y ubicado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPLEGABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304. DIÁMETRO TUBERÍA DE 1 ¼"		• Prueba de fijación	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • Deben quedar totalmente fijada y asegurada la barra de seguridad en L.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 24" CON ESCUDOS TORNILLOS OCULTOS	• Recomendaciones recogidas de NTC 6047. • NTC 6004.	• Prueba de fijación	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • Deben quedar totalmente fijada y asegurada la barra de seguridad en L.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.15	DISPENSADOR HORIZONTAL, DE SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA		• No aplica	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • El dispositivo instalado debe estar correctamente nivelado y ubicado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.16	CAMBIADORES DE PAÑALES		• No aplica	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • El dispositivo instalado debe estar correctamente nivelado y ubicado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.17	CORTINAS PARA DUCHA, incl.: tubo	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • El dispositivo instalado debe estar correctamente nivelado y ubicado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.18	SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS		• No aplica	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • El dispositivo instalado debe estar correctamente nivelado y ubicado de tal manera que cumpla sin función sin contratiempos	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.19	EXTRACTORES DE OLOR . EXTRACCIÓN 98/HR m3	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Los aparatos sanitarios y accesorios se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes. • El dispositivo instalado debe estar correctamente nivelado y ubicado de tal manera que cumpla sin función sin contratiempos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.20	REJILLA PLÁSTICA DE VENTILACIÓN 0.25 x 0.25 mt	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • No dañar el revestimiento existente en el piso o pared.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
21.00.21	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 0.15 x 0.15 mt	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Cuidar y preservar del buen funcionamiento del registro. • No dañar el revestimiento existente en el piso o pared.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.00.00	CARPINTERÍA MADERA							

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
22.01.00	PUERTAS							
22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mts+ MONTANTE 0.70x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.02	P00-K PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0.80x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.04	P01-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mts + MONTANTE 0.80x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.05	P00-N. PUERTA ENTAMBORADA 0.80 x2.40 mts+ MONTANTE 0.80x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.06	P02-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.07	P02-N. PUERTA ENTAMBORADA 0.90 x2.40 mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS+ CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.08	P08-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1.60x2.40mts + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.20cm x 0.70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.09	P03D- PUERTA ENTAMBORADA 1.00x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts HOJA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.10	P03-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40mts+ MONTANTE 1.00x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.11	P03-N. PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.12	P04-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40mts+ MONTANTE 1.10x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
22.01.13	P05-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts ++ MONTANTE 1.20x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.14	P07-NJ. PUERTA ENTAMBORADA1.40 x2.40 mts HOJAS ENTAMBORADA + LAMINA DE ACERO + MIRILLA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.01.15	P06-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts + MONTANTE 1.20x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. Sobre el último. • Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.00	MUEBLES							
22.02.01	M.1.1-MUEBLE DE RECEPCIÓN PRINCIPAL CON SUPERFICIE PÚBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PUBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5.65X.0.90 M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.02	M.2.1 RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN CON SUPERFICIE EN GRANITO, FRETE PUBLICO EN FORMICA 3.40x.0.75	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.03	M.2.2-RECEPCIÓN CONSULTA EXT, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.05 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.04	M.2.3-FARMACIA- ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.05	M.2.4-RECEPCIÓN CIRUGÍA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.85 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Identidicar posibles des	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.06	M.2.5-RECEPCIÓN HOSPITALIZACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.50 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.07	M.2.6-ENTREGA MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 1.37 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.08	M.2.7-ENTREGA RESULTADOS - MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.95 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.09	M.2.8-IMÁGENES DIAGNOSTICAS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Cumplir espesores de los materiales según detalles constructivos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.10	M.2.9-ENTREGA RESULTADOS- MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.90 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Cumplir espesores de los materiales según detalles constructivos. • Verificar cantos	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.11	M.2.10-CAJA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Cumplir espesores de los materiales según detalles constructivos. • Verificar cantos	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.12	M.3.1-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.98 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
22.02.13	M.3.2-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - URGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.80 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.14	M.3.3-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - EMERGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.10 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.15	M.3.4-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - RECUPERACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.30 X 1.10M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.16	M.4.13-COCINETA CCTV, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.17	M.5.2-MEDICAMENTOS ESTERI, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA 0.85 X 0.53M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Horizontalidad, estabilidad y comportamiento monolítico en todo el elemento.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.18	M.5.4-ROPA-MEDICAMENTOS, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.98 X 0.60M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.19	M.5.5-INSUMOS SALARA ERA, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.85 X 0.45M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.20	M.5.6-DEP. MATERIALES, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 1.05 X 0.53M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.. • Curado de concreto	Unidad	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.21	M.5.9- HABITACIONES HOS. MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 2.60 (1.90 X 0.80M) X 0.6M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.. • Ensayo de flujo	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.22	M.5.10- HABITACIONES HOSPITA 2P, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 3.21 (1.90 X 0.70M - DOBLE) X 0.45M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.. • Ensayo de flujo	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.23	M.5.11- MEDICAMENTOS ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 2.2 X 0.45M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.24	M.5.12- ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.88 X 0.45M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.25	M6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.26	M6.2 PORTERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.91x0.6x0.75	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.27	M6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.77	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
22.02.28	M6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.78	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.29	M6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.30	M6.6 TOMADE MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.80	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.31	M6.7 LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.81	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.32	M6.8 RECEPCIÓN Y COCINA, CLASIFICACIÓN LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.82	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.33	M6.9 CONTROL, INFORMACIÓN Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.83	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.34	M6.10 AMBIENTE DE TRANSICIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.84	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.35	M6.11 ADAPTACIÓN NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.85	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
22.02.36	M6.12 ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.86	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles • Norma NSR 10	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1. • Prueba de anclaje	Unidad	• Aprobación de interventoría	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.00	CARPINTERÍA METÁLICA							
23.00.01	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Metro lineal	• No dañar el revestimiento existente en el piso o pared. • Además de eso cumplir con todas las especificaciones técnicas del fabricante.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.02	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO I, incl. Anticorrosivo + esmalte	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Metro lineal	• No dañar el revestimiento existente en el piso o pared. • Además de eso cumplir con todas las especificaciones técnicas del fabricante.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.03	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO II, incl. Anticorrosivo + esmalte	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Metro lineal	• No dañar el revestimiento existente en el piso o pared. • Además de eso cumplir con todas las especificaciones técnicas del fabricante.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.04	BARANDA METÁLICA CON MURO EN CONCRETO (0.2M x 1.1M)	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Metro lineal	• No dañar el revestimiento existente en el piso o pared. • Además de eso cumplir con todas las especificaciones técnicas del fabricante.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.05	P00A PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
23.00.06	**P00B PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.07	**P01A PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.08	**P01B PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.09	**P02A PUERTA METÁLICA 0.90x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.10	**P03A PUERTA METÁLICA 1.00 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
23.00.11	**P07A PUERTA METÁLICA 1.40 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	23.00.12	**P06A PUERTA METÁLICA 1.20 x 2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.13	**P07-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18. MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.14	**P02-F PUERTA METÁLICA 1.00 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.15	**P06-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18. MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.16	**P09 AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40. HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.17	**P08R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40 EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	23.00.18	P05H PUERTA 1.20x 2.40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 40 MM. ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 +BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMÉTICO	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.19	P02R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.20	P02 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.22	P05 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	23.00.23	P10 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
23.00.24	**P10 P PUERTA 2.00x2.40 mts METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 2 MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.0015 EN ACERO INOXIDABLE**	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la puerta y respectivos anclajes no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre la puerta y entre el marco ± 2 mm en la altura. • Las puertas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma. • Si las puertas llevan pintura esmaltada al horno, se debe entregar sin ningún tipo de imperfección (rayón o abolladura). • Si las puertas o cortinas tienen especificación de espaciado entre el suelo y la puerta, se debe respetar los detalles del plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.00	**CARPINTERÍA ALUMINIO**							
24.00.01	**VE-01A VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 8.10 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.02	**VE-01B VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 9.07 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.03	**VE-01C VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 7.87 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.04	**VE-01D VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9.13 X 2.90 MTS, 6 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.05	**VE-01E VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 2 CUERPOS 8.10 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.06	**VE-01F VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 4 CUERPOS 2.29 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	24.00.07	**VE-01G VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 3 CUERPOS 5.43 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.08	**VE-01H VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 3 CUERPOS 8.10 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.09	**VE-02A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR(1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.10	**VE-02B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.85 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.11	**VE-02C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.83 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.12	**VE-02D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.775 X 2.90 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.13	**VE-02E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 7.87 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	24.00.14	**VE-02F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.7 3 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.15	**VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.16	**VE-02H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5 CUERPOS 6.505 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.17	**VE-02I PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4CUERPOS 6.23 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.18	**VE-02J PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076.4CUERPOS 5.32 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.19	**VE-02K PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4.03X2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.20	**VE-02L PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	24.00.21	**VE-02N PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.22	**VE-02O PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.23	**VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 4.40 X 2.90**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.24	**VE-03A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1,00 MTS) 6 CUERPOS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.25	**VE-03B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.26	**VE-03C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.85 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.27	**VE-03D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5.86 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	24.00.28	**VE-03E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3.60 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.29	**VE-03F CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 2.755 x 2.30 mts**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.30	**VE 03 G- CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 7.77 x 2.30 mts**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.31	**VE-04A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.32	**VE-04B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.33	**VE-05A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 6.84 X 0.50 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.34	**VE-05B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 5,20 X 0.50 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
24.00.35	**VE-05C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 3.08 X 0.50 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.36	**VE-05D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 2.95 X 0.50 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.37	**VE-05E. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 1.08 X 1.50 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.38	**VE-05F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2.00 X 0.50 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.39	**VE-06A. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.40	**VE-06B. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.41	**VE-06C. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
24.00.42	**VE-06D. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1.11 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.43	**VE-06E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.18 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.44	**VE-06F. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.50 X 1.30 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.45	**VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 1.80 X 0.40**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.46	**VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 3.55 X 0.95**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.47	**VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 2.95 X 1.15**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.48	**VE-09A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 7.12 X 0.90 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
24.00.49	**VE-09B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,076; JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 0.90 X 1.70 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.50	**VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 (0.60 X 1.30M)**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.51	**VE-11A-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.27 X 2.70M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.52	**VE-11B-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3.66 X 2.70M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.53	**VE-11C-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 3.26) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 3.26M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.54	**VE-11D-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.84M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.55	**VE-11E-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.65M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 3.22) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 3.22M	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 3 CUERPOS 2.54 X 2.70M	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.58	VE-11H-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.93) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.93M	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.59	VE-11I-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.94) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.94M	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.60	VE-11J-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60 x 1.72) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.72 M	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.61	VE-11K-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.83) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.83 M	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.62	VE-11L-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.18 M	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	24.00.63	**VE-11M-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 0.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 0.65 M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.64	**VE-11N-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.47) 2 CUERPOS + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.47 M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.65	**VE-11O-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1.80 X 1.80M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.66	**VE-11P-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1.70 X 1.80M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.67	**VE-11Q-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 2 CUERPOS 2.30 X 1.80M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.68	**VE-11R-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 2.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 2.18 M**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	24.00.69	**VE-12A. VENTANA PLOMADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
24.00.70	**VE 13A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1.60 x 1.90 mts**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.71	**VE-13B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.28 x 1.30 MTS BATIENTE 1.00 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.72	**VE-13C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 1.90 x 1.30 MTS BATIENTE 0.80 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.73	**VE-13D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 3.06 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.74	**VE-13E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.38 x 1.90 MTS BATIENTE 0.60 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.75	**VE-13F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 4.00 x 1.90 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.76	**VE-13G. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.31 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
24.00.77	**VE-13H. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.00 x 1.60 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.78	**VE-14A. CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.90 X 1.30 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.79	**VE-15A. CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.80 X 0.50 MTS**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.80	**P01L PUERTA EN VIDRIO 0.80 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.81	**P02L PUERTA EN VIDRIO 0.90 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.82	**P02V 0.90 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.83	**P03V 1.00 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
24.00.84	**P05L 1.20 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.85	**P09V 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
24.00.86	**P09L 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANBLASTING**	• Consultar norma NSR 10. • Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la ventana y respectivo marco no cumple con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. • Verticalidad entre hojas y entre marco y hojas ± 2 mm en la altura, estando cerrada no debe verse luz entre el marco y perfil de la hoja ni entre las hojas que constituyen la ventana. • Defectos del vidrio percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche). • Las ventanas deben estar selladas en sus vanos de tal forma que se evite filtraciones de aire y agua, de la forma que considere el contratista garantizando la estética de la misma.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.00	**CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE**							
25.00.01	**DIVISIÓN BAÑO LAMINA ACERO INOXIDABLE**	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Catálogo SOCODA Institucional – Actualización vigente a fecha de instalación..	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Metro cuadrado	• No incluye mampostería • Dilataciones del enchape de 10mm x 100mm.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.02	**DIVISIÓN ORINALES LÁMINA ACERO INOXIDABLE**	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Metro cuadrado	• Verificar niveles y acabados	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.03	**POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE**	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.04	**M.4.1-HEMATOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.49 X 0.90M**	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Metro Lineal	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.05	**M.4.2-QUIMICA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.59 X 0.90M**	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.06	**M.4.3-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.10 X 0.90M**	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.07	**M.4.4-OBSERVACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0.96 X 0.90M**	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.08	**M.4.5-CAMBIA PAÑALES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.07 X 0.90M**	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.09	**M.4.6-VACUNACION , MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.36 X 0.90M**	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
25.00.10	M.4.7-SECADO Y CLASIFICACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.08 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.11	M.4.8-AMBIENTE TRANSACCIÓN, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.73 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.13	M.4.10-REPOSTERIA-MUESTRAS, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.40 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.14	M.4.12-ODONTOLOGIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.25 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.16	M.4.15-COCINETA ADMINISTRACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.17	M.4.16-OBSERVACION, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.89 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.18	M.4.17-TRABAJO LIMPIO-SUCIO CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.19	M.4.18-CIRUGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.27 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.20	M.4.19-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.60 X 0.60M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.21	M.4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.33 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.22	M.4.21-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.50M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.23	M.4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.24	M.4.23-PARTOS / CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
25.00.25	M.4.24-PARTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.56 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.26	M.4.25-PARTOS/PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.27	M.4.26-PARTOS PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.66 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.28	M.4.27-LACTANCIA - PAQUETES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.29	M.4.28-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.94 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.30	M.4.29-VACUNACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.31	M.4.30-S. INMOVILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.48 X 0.90	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.32	M.4.31-PROCEDIMIENTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.33	M.4.32-LAVADO - DESACT, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.76 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.34	M.4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.35	M.4.34-MICROSCOPIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.45 X 1.53 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.36	M.4.35-ALISTAMIENTO FARMACIA, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.81 X 1.96 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.37	M.4.36-LAVADO MATERIAL, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.94 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.38	M.4.37-AMBIENTE TÉCNICO, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.95 X 2.15 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
25.00.39	M.4.38-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 0.95 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1.. • Para el óptimo mantenimiento del acero inoxidable se recomienda lavar con agua caliente y un trapo o esponja sin fibra, si hace falta, agregar un poco de detergente aplicado en toda la superficie o en los elementos fabricados en acero inoxidable. Es recomendable hacer una prueba con el detergente en una área poco visible primero.	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.40	M.4.39-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.21 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.41	M.4.40-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.45 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.42	M.4.41-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.93 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.43	M.4.42-SALA DE LACTANCIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.45 X 0.60M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.44	M.4.43, COCION Y PREPARACIÓN SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.60M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.45	M.4.44, COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.90 X 0.50M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.46	M.4.45, LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.00 X 0.50M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.47	M.4.46, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.48	M.4.47, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.57 X 0.50M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.49	M.4.48, HABITACIONES OBSTÉTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.50	M.4.49, HABITACIONES AISLADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.51	M.4.50, HABITACIONES PEDIÁTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.52	M.7.1-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.79 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.53	M.7.2-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.94 X 0.90MVE-02G PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,038. 6 CUERPOS 7.45 X 1.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
25.00.54	M.7.3-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRÓNICA (DOBLE) CON SENSOR 1.59 X 0.90M	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Especificaciones técnicas del fabricante • Planos de detalles	• Ensayo de doblamiento para producto metálico NTC No. 1..	Unidad	• Los accesorios y griferías se instalarán siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
26.00.00	CERRAJERÍA							
26.00.01	POMO LÍNEA ORBOT CROMADA MATE, CIEGO POR DENTRO, POR FUERA BOCA LLAVE	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• Los pomos deben estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
26.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF.: CERR B352 CROMADO MATE	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• Los pomos deben estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
26.00.03	CERRADURA ANTIPÁTICO HORIZONTAL F-19R EQ	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• Los pomos deben estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
26.00.04	MANIJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF.: A80PD JUPITER CROMADA MATE	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• Los manijones deben estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
26.00.05	MANIJA CON BOTÓN POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE, REF. A40S JÚPITER CROMADA MATE SCHLANGE O EQUIVALENTE.	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• Los manijones deben estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
26.00.06	MANIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.20.	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• Los manijones deben estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
26.00.07	MANIJA CAZUELA RECTANGULAR 120 x 50 x 13 mm, En acero inoxidable	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• Los manijones deben estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
26.00.08	MANIJONES EN ACERO INOXIDABLE X1.00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDO INFERIOR	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• Los manijones deben estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANIJA POR AMBOS LADOS 8302 SCHALANGE	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• Los manijones deben estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
26.00.10	BRAZO HIDRÁULICO	• Especificaciones técnicas del fabricante. • NTC 1.	• Adecuado ensamble, funcionamiento e instalación de accesorios. • Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún ensayo.	Unidad	• El brazo hidráulico debe estar correctamente instalados conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
27.00.00	VIDRIOS Y ESPEJOS							
27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM. BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. SISTEMA DE INSTALACIÓN FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si el vidrio de cristal y su respectivo sistema de instalacion no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el plano de detalles arquitectónicos. • Verticalidad entre el espejo cristal. • Defectos del espejo percibidos visualmente entre 3m y 1m de distancia (con luz de día y noche).	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
27.00.02	CLARABOYA VIDRIO LAMINADO 3+3 mm	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si la claraboya y su respectivo sistema de instalación no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el plano de detalles arquitectónicos.	Posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.00	PINTURA							
28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PAÑETE PARA ZONAS DE ASEPSIA: ESTUCO PLÁSTICO +1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 +2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.02	MI-6. ESTUCO PLÁSTICO Y VINO SOBRE PAÑETE: ESTUCO PLÁSTICO + 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE VINILO TIPO1	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PAÑETADOS: ESTUCO PLÁSTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO EQUIVALENTE	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.04	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE PINTURA KORAZA	• Especificaciones técnicas del fabricante. • ISO 2810 • NTC 5828	Ensayo de intemperismo natural – ISO 2810 – NTC 5828	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.05	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE FIBROCEMENTO PARA DINTELES DE FACHADA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA KORAZA	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.06	MI-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2+ 1 MANO DE VINILO TIPO 1	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.07	MI-5. PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEMAS LIVIANOS: 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2+ 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.08	MI-7. ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEMA LIVIANO: 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 +2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO: 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
28.00.10	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO EN ZONAS DE ASEPSIA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS: 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACIÓN DE TOPELLANTAS	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre topellantas debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.12	PINTURA O PAÑETE + ESTUCO + 2MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + SALPICADERO, CON RECUBRIMIENTO LAMINA "GLASSLINER"	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• La pintura sobre las paredes debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
28.00.13	PANEL CON NÚCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (E=35MM) TIPO SONOACUSTIC , FORRADO CON TELA FONO PERMEABLE TIPO UNOXUNO SOBRE MUROS DE SALÓN MÚLTIPLE SEGÚN DISEÑO ACÚSTICO	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro cuadrado	• El panel debe quedar correctamente adherido al muro y forrado en su totalidad para garantizar que cumpla con su correcto funcionamiento.	Durante la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
29.00.00	LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA							
29.00.01	GUARDA CAMILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, incl. Punteras	• Especificaciones técnicas del fabricante. • Ficha técnica INPRO	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún ensayo.	Metro Lineal	• Se debe realizar la entrega por parte del CONTRATISTA de una muestra física de una puntera, guarda camillas y pasamanos completa donde se observe el modelo, con sus respectivas características en conjunto para ser aprobada por el diseñador e interventoría. • Las tolerancias indicadas no serán válidas si los guardacamillas y su respectivo sistema de instalación no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el plano de detalles arquitectónicos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
29.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, Incl. Punteras	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún ensayo.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si los guarda camiollas y su respectivo sistema de instalación no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el plano de detalles arquitectónicos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
29.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1.22 x 90°	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún ensayo.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si los esquineros y su respectivo sistema de instalación no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el plano de detalles arquitectónicos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
29.00.05	LAMINA PROTECCIÓN DE MUROS DE ALTO IMPACTO POR ACCIÓN DE LAS CAMAS EN RECUPERACIÓN Y OBSERVACIÓN	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún ensayo.	Unidad	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si las láminas de protección y su respectivo sistema de instalación no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el plano de detalles arquitectónicos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
29.00.06	CORTINAS PARA ÁREAS DE OBSERVACIÓN (URGENCIAS) Y RECUPERACIÓN (QUIRÚRGICAS), COLOR SEGÚN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L", CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL, LAVABLE	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún ensayo.	Metro Cuadrado	• Las tolerancias indicadas no serán válidas si las láminas de protección y su respectivo sistema de instalación no cumplen con su funcionalidad. • Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el plano de detalles arquitectónicos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Contratista, Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
30.00.00	ASEO							
30.00.01	ASEO	• NTC 6047. Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos.	• No aplica	Metro Cuadrado	• Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecución de la obra.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
30.00.02	LIMPIEZA DE VIDRIO	• NTC 6047. Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos.	• No aplica	Metro Cuadrado	• Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecución de la obra.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
30.00.03	RETIRO DE SOBRANTES	• NTC 6047. Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos.	• No aplica	VJ	• Entregar totalmente limpio el lugar de la ejecución de la obra.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
31.00.00	VIAS - URBANISMO INTERNO							
31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	• NC-MN-OC01-01 EPM	• No aplica	Metro Cuadrado	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Contener todos los planos contemplados en el replanteo de la obra como lo son: plano de replanteo de excavaciones, plano de replanteo de estructuras y todos los planos correspondientes para su oportuno ejecuta miento de la obra. • Todos los planos deben contar con sus respectivos ejes, cotas parciales y acumuladas, y sus respectivos niveles.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	• Recomendaciones del estudio de suelos		Metro Cuadrado	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente los escombros y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	31.00.03	GEOTEXTIL T -2400	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún ensayo.	Metro Cuadrado	• El mínimo traslapo deberá ser de 30 cm y estará en función del CBR de la subrasante; la costura debe hacerse con hilo de Kevlar, aramida, polipropileno (nunca con alambre), con una densidad de costura entre 150 y 200 puntadas por metro lineal. • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente los escombros y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Se deberán efectuar ensayos de densidad en el campo para verificar las condiciones del relleno durante el proceso de compactación. • Calidad de los agregados: Desgaste (INV E-218) Pérdida de solidez (INV E-220) • Plasticidad (INV E-125, INV E-126) • Compactación (INV E-142) • Granulometría INV E-123	Metro Cúbico	• El mínimo traslapo deberá ser de 30 cm y estará en función del CBR de la subrasante; la costura debe hacerse con hilo de Kevlar, aramida, polipropileno (nunca con alambre), con una densidad de costura entre 150 y 200 puntadas por metro lineal. • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente los escombros y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.05	BASE GRANULAR BG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Proctor modificado • Granulometría	Metro Cúbico	• Toda fundación deberá ser drenada en forma satisfactoria, y no se deberá colocar ningún material de relleno hasta tanto el nivel de implantación haya sido secado y alistado.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.06	SARDINEL PREFABRICADO A-10		• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10	Metro Lineal	• Tolerancia elementos en concreto – Norma NSR 10	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.07	ADOQUÍN CONCRETO 10 x 20 x 8 TEXTURA LISA	• Norma ISO 10545-11 • Norma ISO 10545.12	• Resistencia al cuarteo ISO 10545-11 • Resistencia al congelamiento ISO 10545.12	Metro Cuadrado	• Las superficies deben quedar perfectamente niveladas. • El mortero a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado. • El enchape de los muros debe estar completamente aplomado. • Todas las superficies deben estar correctamente emboquilladas para asegurar la estética del trabajo. • El enchape no debe tener ningún residuo del mortero a usar para su disposición final en el muro. • Según especificación los filos deben estar correctamente protegidos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO L=0.40 mt, T-40, incl. Pintura	• NTC 4109 • Normas NTC y ASTM • Especificaciones técnicas del fabricante.	• Se debe validar con interventoría que ensayos se deben llevar a cabo.	Unidad	• Se verificará la correcta forma y colocación de los elementos, de acuerdo con lo mostrado en planos u otros documentos que rijan el proyecto • Todos los tope llantas deben estar correctamente alineamientos y estar correctamente ubicados. • Debe estar correctamente ejecutado el sistema de fundación y soporte	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.09	FLECHA SENCILLA: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• La pintura aplicada para demarcar debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, corrimientos, manchas o marcas de brocha. • Debe cumplir con la visibilidad tanto de día como de noche.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.10	FLECHA DOBLE GIRO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• La pintura aplicada para demarcar debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, corrimientos, manchas o marcas de brocha. • Debe cumplir con la visibilidad tanto de día como de noche.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.11	LOGO DISCAPACITADOS: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• La pintura aplicada para demarcar debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, corrimientos, manchas o marcas de brocha. • Debe cumplir con la visibilidad tanto de día como de noche.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.12	CEBRAS: LIMPIEZA Y LIJADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro Cuadrado	• La pintura aplicada para demarcar debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, corrimientos, manchas o marcas de brocha. • Debe cumplir con la visibilidad tanto de día como de noche.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.13	LÍNEA TRAFICO: PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Metro Lineal	• La pintura aplicada para demarcar debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, corrimientos, manchas o marcas de brocha. • Debe cumplir con la visibilidad tanto de día como de noche.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.14	NUMERACIÓN PARQUEADERO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	• Especificaciones técnicas del fabricante.	• No aplica	Unidad	• La pintura aplicada para demarcar debe quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, corrimientos, manchas o marcas de brocha. • Debe cumplir con la visibilidad tanto de día como de noche.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	31.00.15	FILTRO FRANCÉS EN BASE MURO DE CONTENCIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25 x 0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	• Seguir recomendaciones de interventoría. • Estudio de suelos • Especificaciones técnicas • Planos de detalles	• No aplica	Metro Lineal	• Hacer un adecuado traslapo del geodrén. Las redes deben quedar en contacto unas con otras con una longitud mínima de 20 centímetros y deben quedar adecuadamente cubiertas por el geotextil para que no haya intrusión de materiales finos al sistema. • No rellenar la zanja con el mismo material de la excavación, sobre todo si este tiene los plásticos a su interior, esto afectaría el rendimiento del sistema a largo plazo. • Compactar el relleno para no afectar la eficiencia del geodrén a largo plazo además de generar deformaciones superficiales. • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO							
	32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	• Recomendaciones del estudio de suelos		Metro Cuadrado	• Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente los escombros y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
32.00.02	**GEOTEXTIL T -2100**	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Se debe validar con interventoría si es necesario realizar algún ensayo.	Metro Cuadrado	• El mínimo traslapo deberá ser de 30 cm y estará en función del CBR de la subrasante; la costura debe hacerse con hilo de Kevlar, aramida, polipropileno (nunca con alambre), con una densidad de costura entre 150 y 200 puntadas por metro lineal. • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente los escombros y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.03	**SUB BASE GRANULAR SBG-1, e. Min=0.30 mt**		• proctor modificado • granulometria • limites • desgaste en la máquina de los angeles • densidad	Metro Cúbico	• El mínimo traslapo deberá ser de 30 cm y estará en función del CBR de la subrasante; la costura debe hacerse con hilo de Kevlar, aramida, polipropileno (nunca con alambre), con una densidad de costura entre 150 y 200 puntadas por metro lineal. • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente los escombros y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.04	**ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 mt**	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10.	Metro Cuadrado	• No superar desviación permisible de cotas y niveles mostrados en planos y detalles constructivos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.05	**BALDOSA EN GRES TIPO TABLÓN CAFÉ REF = 225012589 de 30.5 x 7.5 cm de alfa o equivalente instalación de piso trabada Incl. Lineales**	• Norma ISO 10545-11 • Norma ISO 10545.12	• Resistencia al cuarteo ISO 10545-11 • Resistencia al congelamiento ISO 10545.12	Metro Cuadrado	• Las superficies deben quedar perfectamente niveladas. • El mortero a utilizar debe estar en perfectas condiciones de uso, es decir no estar pasado. • El enchape de los muros debe estar completamente aplomado. • Todas las superficies deben estar correctamente emboquilladas para asegurar la estética del trabajo. • El enchape no debe tener ningún residuo del mortero a usar para su disposición final en el muro. • Según especificación los filos deben estar correctamente protegidos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.06	**CÁRCAMO PREFABRICADO POLÍMERO REF. ACO A-15, INCLUYE REJILLA, DADO CONCRETO e=2.5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO**	• NTC 4024 Procedimientos para el muestreo y el ensayo de prefabricados de concreto.	• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10 • NTC	Metro Lineal	• Tolerancia elementos en concreto – Norma NSR 10	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.07	**MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS, concreto 28 Mpa**	• NSR-10 • NTC 396 • ASTM C31	• Se deberá realizar el ensayo del Slump o asentamiento conforme a como lo indica la norma NTC 396. • Se deberá realizar el ensayo de resistencia a la compresión y se realizará en los cilindros estándar de ensayo, elaboración y fraguado que esté de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM C31. • Calidad de los materiales.	Metro Cúbico	• Los muros de contención podrán descimbrarse 12 horas después de fundidos; una vez desencofradas debe mantenerse húmeda superficialmente, recubriéndolas con plástico su superficie para evitar que pierda humedad rápidamente durante los 7 primeros días del fraguado. • No debe exagerarse el tiempo de vibrado de los elementos, para evitar que salga de la formaleta la pasta de la mezcla • Los muros de contención deben quedar correctamente aplomados y nivelados. • Los muros de contención no deberán quedar con vacios u hormigueros. • El refuerzo deberá quedar totalmente recubierto.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.08	**CONTENEDORES DE RAÍCES B-20**		• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10	Unidad	• Tolerancia elementos en concreto – Norma NSR 10	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.09	**REPOSICIÓN ESPECIES ARBÓREAS H=1.5 MT, incl. Tierra negra**			Unidad		Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.10	**RAMPA PARA ACCESO MINUSVÁLIDOS EN CONCRETO 2500 PSI, e=0.10 mt, Sub base=0.40mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía**	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Proctor modificado • granulometria	Unidad	• Rampa con pendiente adecuada y niveles correctos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.11	**RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI ESTRIADO, e=0.20 mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía**	• Recomendaciones del estudio de suelos	• proctor modificado • granulometria	Metro Cuadrado	• Rampa con pendiente adecuada y niveles correctos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.12	**BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80**		• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10	Metro Lineal	• Tolerancia elementos en concreto – Norma NSR 10 • Contenido mínimo de cemento en la mezcla – Especificaciones Generales Numeral 1.1.3 Proporciones de la Mezcla	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.13	**POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO**	• Norma NSR-10 • Especificaciones técnicas del fabricante.	• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10	Metro Lineal	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE LOS ESCOMBROS Y SOBRANTES, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O ESCOMBRERA AUTORIZADA. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.14	**CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI**	• Norma NSR VIGENTE. • Normas técnicas aplicables. • Normas de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables • Seguir recomendaciones de interventoría. • Estudio de suelos Alfonso Uribe S. • Especificaciones técnicas • Planos de detalles • NTC 550	• Se validará con interventoría si es necesario realizar algún tipo de ensayo.	Metro Lineal	Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR 2010 • Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • Acopiar, transportar y disponer correctamente el material de excavación y sobrantes, en el sitio de disposición final o escombrera autorizada. • El área de los trabajos debe quedar limpia.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.15	**CÉSPED PARA EXTERIORES, incl. tierra negra e=0.10 mts para nivelación sustrato más emparejada superficie entre sepedones**		• Se debe validar con interventoria si es necesario realizar algún tipo de ensayo	Metro Cuadrado	• Cuidar y proteger la grama sembrada, deberá ser sometida a riego hasta el recibo final de las obras objeto del contrato	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
32.00.16	**LUMINARIA METÁLICA, POSTE DE 6 M M-130**		• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10	Unidad	• Longitud total del poste: Se acepta +20mm –10mm. • Desviación longitudinal (deformación permanente al eje longitudinal) se acepta una tolerancia no mayor a +10 mm. • Sección transversal: En la dimensión del diámetro externo se acepta +5mm y –3mm. • En espesores - 0,2mm. • Los tornillos, pernos y tuercas deben cumplir en cuanto las roscas la norma ANSI/ASME B1.1 –1982. Los tornillos de ⅞" x 3" serán hexagonales, de acero galvanizado en caliente SAE grado 5, rosca ordinaria y que case con la tuerca de ⅞" soldada en el soporte del brazo de la luminaria. • Los brazos serán fabricados con tubo de acero de diámetro nominal de 1 ¼" con pared de por lo menos 3mm. • El soporte del brazo de la luminaria se fabricará en platina de acero de por lo menos 3/16". • El poste tendrá una perforación de ½" (13mm), para el alambrado interior del mismo. Se localiza en una distancia de 665mm de la cima y se instalará unos prensaestopas, para proteger los conductores y evitar el ingreso de agua. En el poste con una luminaria, la perforación estará debajo del soporte de la luminaria. Para el poste con doble luminaria la perforación estará en la mitad de la distancia entre los soportes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI e=0.10 mt con acero según especificación estructural	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10.	Metro Cuadrado	• No superar desviación permisible de cotas y niveles mostrados en planos y detalles constructivos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	32.00.18	SUMIDERO	• NTC 4024 Procedimientos para el muestreo y el ensayo de prefabricados de concreto. • Norma de Construcción de Sumideros NC_AS_IL02_17 EPM	• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10	Unidad	• Tolerancia elementos en concreto – Norma NSR 10	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	32.00.19	CAÑUELA 22.5 x 30 x 80 cm REF. A-120 PREFABRICADA CONCRETO	• Especificaciones técnicas de fabricante.	• Ensayos para concreto de acuerdo con la norma NSR 10	Metro Lineal	• Tolerancia elementos en concreto – Norma NSR 10	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	32.00.20	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2. figurado							
	32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA							
	33.00.00	MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO							
	33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1,80m x 0,79m x 0,45m)	• Se deben seguir las recomendaciones de la ficha técnica del fabricante.	• No aplica.	Unidad	• La banca debe quedar completamente nivelada. • Se debe entregar en condiciones óptimas de estética y físicas para su correcto uso.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	33.00.02	CANECAS DE BASURA METÁLICA M-120	• Recomendaciones del plano de detalles. • Ficha técnica del fabricante	• Se debe validar con interventoría si se debe realizar algún tipo de ensayo.	Unidad	• La caneca debe quedar completamente aplomada. • Se debe entregar en condiciones óptimas de estética y físicas para su correcto uso.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL - URBANISMO INTERNO							
	34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Ensayo a la compresión a los 28 días (NTC-550). • Se validará con interventoría si es necesario realizar más ensayos.	Unidad	• Estructura correctamente fundida, muros aplomados y ejecutados de acuerdo a especificaciones estructurales, y todos los acabados deben estar correctamente ejecutados sin desniveles y con las juntas correctamente rematadas. • El pendientado de la cubierta debe cumplir con lo especificado en los planos arquitectónicos y la media caña debe quedar correctamente ejecutada respecto a lo especificado en el plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2		• Ensayo a la compresión a los 28 días (NTC-550). • Se validará con interventoría si es necesario realizar más ensayos.	Unidad	• Estructura correctamente fundida, muros aplomados y ejecutados de acuerdo a especificaciones estructurales, y todos los acabados deben estar correctamente ejecutados sin desniveles y con las juntas correctamente rematadas. • El pendientado de la cubierta debe cumplir con lo especificado en los planos arquitectónicos y la media caña debe quedar correctamente ejecutada respecto a lo especificado en el plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Ensayo a la compresión a los 28 días (NTC-550). • Se validará con interventoría si es necesario realizar más ensayos.	Unidad	• Estructura correctamente fundida, muros aplomados y ejecutados de acuerdo a especificaciones estructurales, y todos los acabados deben estar correctamente ejecutados sin desniveles y con las juntas correctamente rematadas. • El pendientado de la cubierta debe cumplir con lo especificado en los planos arquitectónicos y la media caña debe quedar correctamente ejecutada respecto a lo especificado en el plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	34.00.04	CUARTO DE BASURAS	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Ensayo a la compresión a los 28 días (NTC-550). • Se validará con interventoría si es necesario realizar más ensayos.	Unidad	• Estructura correctamente fundida, muros aplomados y ejecutados de acuerdo a especificaciones estructurales, y todos los acabados deben estar correctamente ejecutados sin desniveles y con las juntas correctamente rematadas. • El pendientado de la cubierta debe cumplir con lo especificado en los planos arquitectónicos y la media caña debe quedar correctamente ejecutada respecto a lo especificado en el plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	34.00.05	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (PONDAJE) Inc. Bombas, desarenador, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Ensayo a la compresión a los 28 días (NTC-550). • Se validará con interventoría si es necesario realizar más ensayos.	Unidad	• Estructura correctamente fundida, muros aplomados y ejecutados de acuerdo a especificaciones estructurales, y todos los acabados deben estar correctamente ejecutados sin desniveles y con las juntas correctamente rematadas. • El pendientado de la cubierta debe cumplir con lo especificado en los planos arquitectónicos y la media caña debe quedar correctamente ejecutada respecto a lo especificado en el plano arquitectónico.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	34.00.06	PÉRGOLA	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Pérgola con pendiente adecuada, niveles correctos, cubierta sin imperfecciones, con todos sus respectivos acabados.	Unidad	• Ensayo a la compresión a los 28 días (NTC-550). • Se validará con interventoría si es necesario realizar más ensayos.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	35.00.00	RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO							
	35.00.01	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero			Metro Cúbico				
	35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa. e.prom=0.05 mt.			Metro Cúbico				
	35.00.03	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)			Metro Cúbico				
	35.00.04	VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F´C 28 Mpa. No incluye refuerzo			Metro Lineal				
	35.00.05	COLUMNAS, concreto 28 Mpa			Metro Lineal				

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	35.00.06	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0,10 m, concreto 28 Mpa	• Recomendaciones del estudio de suelos	• Ensayo a la compresión a los 28 días (NTC-550). • Se validará con interventoría si es necesario realizar más ensayos.	Metro Cúbico	• Rampa con pendiente adecuada, niveles correctos, cubierta sin imperfecciones, con todos sus respectivos acabados.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	35.00.07	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL e=variable m, concreto 28 Mpa			Metro Cúbico				
	35.00.08	MURO LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.115 mt, incl. Grafil hztal, grouting de celdas con rfzo y aislante sismico contra estructura según diseño. Incluye lineales			Metro Cuadrado				
	35.00.09	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño			Kilogramo				
	35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Cristal, incluye conector, cinta de acabado, tapón de remate y silicona trasparente			Metro Cuadrado				
	35.00.11	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA Cal:20 ancho: 90cm			Metro Lineal				
	35.00.12	BAJANTE PARA DESAGÜE CUBIERTA PÉRGOLA, tubería PVC AGUAS LLUVIAS 3"			Metro Lineal				
	35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA, HUECO SOLDADO 2" X 1" CALIBRE 14 , Incluye ANGULO 1/-1/4X1/8 PULG, PLATINA 1X1/8 PULG y puntos de soldadura, PARA PERFILERIA ESTRUCTURAL PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL			Kilogramo				
	35.00.14	GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" incluye GUARDACABO GALVANIZADO (GUÍA PARA PERRO) 3/16", Perros Para Cable Galvanizado 3/16-pulg y TENSOR INOXIDABLE GANCHO Y OJO DE 3-16" AISI 316 LONGITUD 122mm			Kilogramo				
	35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN			Metro Cuadrado				
	35.00.16	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte			Metro Lineal				
	35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado			Kilogramo				
	35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA			Kilogramo				
	35.00.19	SUMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA RAMPA PEATONAL Inc. Pernos, rigidizadores, imprimante epóxico rico en cinc, barrera, acabado en poliuretano e= 3mils			Unidad				
	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO							
	36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA: arreglo paisajístico conformado por una franja de arbustos de la especie limoncillo, distanciada a 0.30 mts, se propone plantar además a una distancia mínima de 10 ml, individuos de la especie Guayacán amarillo							
	36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA: Se propone plantar individuos de la especie palma azul, a una interdistancia mínima de 10 mts							
	37.00.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO							
	37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN BARRA REDONDA LISA DE 1/2" Inc. Viga de cimentación, concreto ciclópeo y refuerzo de vigas		No aplica	Metro Lineal	Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • La instalación del cerramiento debe estar correctamente nivelada y estar correctamente anclado los postes donde se anclarán las láminas trapezoidales galvanizadas. • El área de los trabajos debe quedar limpia	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	37.00.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCA FORT EN MALLA ELECTRO SOLDAD, RECUBIERTO EN PVC, inc. Postes de tensionamiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto ciclópeo. Garantía 2 años		No aplica	Metro Lineal	Cumplir con normas de seguridad y las medidas de manejo ambiental previstas. • La instalación del cerramiento debe estar correctamente nivelada y estar correctamente anclado los postes donde se anclarán las láminas trapezoidales galvanizadas. • El área de los trabajos debe quedar limpia	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	38.00.00	ELÉCTRICOS							
	38.00.01	PLANTA DIÉSEL 450 KVA 208V/120V SERVICIO STAND BY EFECTIVOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ							

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	38.00.02	GENERADOR DE ENERGÍA VACUNACIÓN A COMBUSTIBLE DIESEL, GENERA 5 KW DE ENERGÍA, MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE OHV, CON CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11.5 LITROS, SALIDA DE ENERGÍA DE 110V/220V							
	38.00.03	DESCARGUE Y PUESTA EN SITIO DE GRUPO ELECTROGENO CON MONTACARGAS							
	38.00.04	ANCLAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO 450 KVA EN EL SITIO DE INSTALACIÓN							
	38.00.05	SISTEMA DE ESCAPE PLANTA DE 450 KVA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA CR, SILENCIADOR, AISLAMIENTO TÉRMICO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN							
	38.00.06	SISTEMA DE COMBUSTIBLE, INCLUYE TANQUE GENERAL, TANQUES DIARIOS, FLOTADORES, TUBERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA							
	38.00.07	CABINA DE INSONORIZACIÓN							
	38.00.08	UPS 20 kVA, Inc. Banco de baterías							
	38.00.09	UPS 40 kVA, Inc. Banco de baterías							
	38.00.10	UPS 100 kVA, Inc. Banco de baterías							
	38.00.11	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 800 KVA, SECO, CLASE F, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 11,4KV / 208-120V, AISLANTE EN RESINA EPOXICA CON BOBINAS ENCAPSULADAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURAS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, 3 SENSORES PT 100-1 Y TERMÓMETRO TR 42 DE INDICACIÓN DIGITAL ENFRENTE CELDA CON DOS CONTACTOS SECOS, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO							
	38.00.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-I" DE 225 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA							
	38.00.13	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-NE" DE 300 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA							
	39.00.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA							
	39.00.01	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1670 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.02	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1559 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
39.00.03	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3102 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	Norma ISO 9000 ó posterior aplicable.	Al ubicarse en el sitio designado por los planos y realizarse las pruebas, balanceo y ser recibido por el cliente o su representante, al aprobar hoja de protocolo de pruebas.	Unidad	Unidad de ventilación de aire, completamente ensamblada y probada en fábrica, que incluya motor y blower, sección de filtros y controles, todos en un mueble, que se pueda instalar en configuración horizontal o vertical con las siguientes características: Mueble: Construido en lámina galvanizada resistente a la corrosión, las bases serán en perfilería calibre 16 para montaje e instalación de resortes anti vibratorios, con tortillería que haga fácil el desarme y rearme de la unidad. Con puertas de acceso para mantenimiento y con hermeticidad para aplicación exterior. Ventilador: La unidad poseerá un ventilador centrífugo de doble oído de aspiración con rodete de alabes rectos atrasados, con eficiencia Premium y cerramiento IP55, el motor descansa sobre un bastidor común al ventilador. Todo el conjunto se encuentra reforzado: rodetes robustos y con altos estándares de balanceo, soportes reforzados, rodamientos en carcasa industrial de larga vida útil, así mismo están dimensionados apropiadamente para el caudal y presión estática de operación. Filtros: Estos filtros serán MERV 8, MERV 11, MERV 13, HEPA El equipo debe ser manufacturado en una fábrica certificada bajo norma ISO 9000 ó posterior aplicable. Las capacidades, desempeños y nivel de ruido del equipo deben ser aprobadas y certificadas en una instalación autorizada por AMCA (Air Movement and Control Association Internacional). (Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas – TCT-01)	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.04	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 571 CFM POTENCIA 0.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 675 x 900 x 801 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.05	UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 905 x 905 x 800 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.06	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3080 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.07	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2744 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.08	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1578 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 14, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.09	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1259 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.10	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3143 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.11	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3428 CFM POTENCIA 5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2602 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	39.00.13	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.14	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.422 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Standard ASHRAE 90.1 de consumo de energía.	Al ubicarse en el sitio designado por los planos y realizarse las pruebas, balanceo y ser recibido por el cliente o su representante, al aprobar hoja de protocolo de pruebas.	Unidad	Unidad manejadora de aire para refrigerante variable, completamente ensamblada y probada en fábrica, que incluya sección de: caja de mezclas, pre-filtros, serpentín de enfriamiento, ventilador, bandeja de condensados, motor y blower, todo según se requiera en la tabla de características técnicas TCT suministrada y todos en un mueble y que se pueda instalar en configuración horizontal, para ser instalado a la intemperie. El producto deberá estar listado UL, CCC, ETL, EUROVENT, CRAA o similares. Debe permitir la inserción en obra de los elementos y módulos de control necesarios para la realización de rutinas de control establecidas en el diseño. La unidad debe cumplir con las siguientes características: Mueble: Las unidades para uso exterior, estarán diseñadas para trabajar a la intemperie: el gabinete exterior de la unidad será pintado con pintura electrostática horneada o con revestimiento de plastisol resistente a la corrosión y rayos UV. La unidad deberá tener de techo independiente inclinado fabricado en aluminio-magnesio, que impida escurrimiento de lluvia por las paredes de la unidad. El gabinete tendrá aislamiento en fibra mineral con densidad de 50 Kg/m3, de 1.5" de espesor, con clasificación A1 al fuego y cumplirá con NFPA 90A, con recubri-miento antibacterial aplicado de fábrica. Los módulos y Las secciones de las unidades acondicionadoras en transferencia térmica cumplirán como mínimo o superior, con T2/TB3, las láminas de los panales serán en acero galvanizado de calibre 20 como mínimo. La sección caja de mezcla tendrá una conexión para retorno con ducto y una toma de aire exterior con persiana para protección de lluvia. Serpentín: Los tubos deberán ser de cobre, sin costura, expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio para obtener un conjunto rígido. No se deberán utilizar soldadura en el armado de los serpentines. Los serpentines deberán ser diseñados para utilizar toda la sección disponible dentro de la unidad, el serpentín debe ser ensayado a una presión de 400 Psig. Ventilador: Las secciones de ventiladores tendrán ventiladores del tipo plenum de transmisión directa, eje común motor y ventilador, balanceados estática y dinámicamente. De igual forma serán aceptados ventiladores con transmisión por poleas, balanceados estática y dinámicamente. El conjunto del ventilador, motor y soporte, estará montado sobre resortes aisladores de vibración, que garanticen impedir el paso de ruidos y vibraciones a la estructura de la Unidad. Para la selección de los ventiladores, se tendrá en cuenta la perdida de presión exterior y la resistencia ofrecida por los diversos componentes de las Unidades seleccionadas. Para los ventiladores tipo plenum el motor que se suministre en conjunto con cada unidad, tipo EC, electrónicamente conmutado o del tipo PM – eficiencia IE3 o superior que corresponde a la misma tecnología con el variador de velocidad instalado en fábrica sobre el motor. Motor: Cumplirán con el standard ASHRAE 90.1 de consumo de energía. Filtros: Las secciones de filtros requeridas son las indicadas en el TCT, y deberá contar con la correspondiente sección de pre-filtros. Ambas secciones de acceso fácil para su mantenimiento, montado sobre riel de 2" de profundidad. Los filtros deberán ser de una marca reconocida en el mercado, como AAF o similar.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.15	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.141 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.16	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 7.236 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.17	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 13.512 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.18	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 10.300 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.19	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 9.224 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.20	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 11.885 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.21	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.312 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.22	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.962 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	39.00.23	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.427 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.24	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.483 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 229300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 593000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 633300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 363700 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 2 EQUIPOS					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.29	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 76400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60.5 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 12.39Kw DIMENSIONES 1.240 x 760 x 1.690mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	Especificaciones técnicas definidas en el diseño	Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Unidad	Unidad condensadora compuesta de módulo tipo monobloque para trabajar con refrigerante R-410A, descarga vertical, provisto de todos sus accesorios y de un compresor de tipo scroll hermético con tecnología INVERTER, serpentín de tubos de cobre y aletas de aluminio recubiertas contra la corrosión, probados en fábrica a 450 psig, todo el conjunto ensamblado y probado en fábrica, con caja de control, capacitores de arranque y marcha, presóstato de baja y alta presión, tarjeta electrónica de control que comande todas las funciones, con recubrimiento de uretano. La unidad debe incluir el control del motor y el compresor, de acuerdo a la carga instantánea de las unidades interiores. El módulo poseerá salidas de refrigerante, permitiendo diferentes combinaciones y operación independiente de cada uno de ellos. Sistema de expansión lineal electrónico. Capacidad de comunicación con todo el sistema. Mueble con pintura electrostática de alta resistencia al medio ambiente que supere las 500 horas del test de spray salado. Compuerta hermética para controles.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	39.00.31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO				Con ventilador axial de aluminio acoplado a motores de alta eficiencia y velocidad variable para trabajar a la intemperie. Rejilla de protección del ventilador axial y válvulas de servicio instaladas en fábrica.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.32	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 54.600 Btu NIVEL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 4Kw DIMENSIONES 950 x 330 x 1.170mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.33	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 10.32Kw DIMENSIONES 930 x 760 x 1.690mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.34	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 305.700 Btu NIVEL DE RUIDO 63.8 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 22.42Kw DIMENSIONES (1,240 x 760 x 1,690) x 1 + (930 x 760 x 1,690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL MINIMO 2					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.35	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 765.000 Btu NIVEL DE RUIDO 69.4 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 60.82Kw DIMENSIONES (1,240 x 760 x 1,690) x 3 + (930 x 760 x 1,690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.36	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 30 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.011Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA				Unidad Fancoil ensamblada y probada en fábrica, compuesta de un serpentín de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.37	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED , DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 9.000 Btu NIVEL DE RUIDO 34 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.013Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.38	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.032Kw DIMENSIONES 975 x 209 x 354mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	39.00.39	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER, CAPACIDAD MINIMA 28.000 Btu NIVEL DE RUIDO 49 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.054Kw DIMENSIONES 1.190 x 265 x 346mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	Especificaciones técnicas definidas en el diseño	Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Unidad	Unidad Fancoil ensamblada y probada en fábrica, compuesta de un serpentín de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio, ventilador del tipo Flujo Cruzado, con funciones de manejo automático de velocidad para optimizar el desempeño. Bajo nivel de ruido y control remoto alambrado tipo hotelero. Especialmente diseñado para trabajar en conjunto con unidades condensadoras de Refrigerante variable. La unidad poseerá válvula de expansión lineal. Capacidad de comunicación con un sistema de control centralizado. Mueble plástico de apariencia decorativa. Filtro electrónico de aire. (Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas – TCT-01)	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.40	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.02Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.41	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.024Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.42	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.051Kw DIMENSIONES 1420500166mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.43	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.017Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 248mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.44	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.024Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.45	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 37 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.025Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.46	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 39 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.032Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.47	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.037Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	Especificaciones técnicas definidas en el diseño	Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Unidad	Unidad Fancoil ensamblada y probada en fábrica, compuesta de un serpentín de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio, ventilador del tipo flujo cruzado, con funciones de manejo automático de velocidad para optimizar el desempeño. Bajo nivel de ruido y control remoto inalámbrico. Especialmente diseñado para trabajar en conjunto con unidades condensadoras de refrigerante variable. La unidad poseerá válvula de expansión lineal.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.048Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	Especificaciones técnicas definidas en el diseño	Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Unidad	Mueble plástico de apariencia decorativa. Incluye panel de orientadores de aire. Filtro electrónico de aire opcional (Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas – TCT-01)	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.49	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.069Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.50	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 48.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.097Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.51	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 48 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.11Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.52	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 58.000 Btu NIVEL DE RUIDO 50 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.135Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 313mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.53	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO LOW STATIC, EXPANSION DIRECTA, R-410, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500 Btu NIVEL DE RUIDO 25 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.029Kw DIMENSIONES 700x700x190mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	Especificaciones técnicas definidas en el diseño	Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Unidad	Unidad Fancoil ensamblada y probada en fábrica, compuesta de un serpentín de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio, ventiladores del tipo Centrífugos, con funciones de manejo automático de velocidad para optimizar el desempeño. Bajo nivel de ruido y control remoto inalámbrico. Especialmente diseñado para trabajar en conjunto con unidades condensadoras de Refrigerante variable. La unidad poseerá válvula de expansión lineal. Mueble en acero galvanizado y bomba de condensado incorporada Filtro electrónico de aire. (Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas – TCT-01)	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.54	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.184Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
39.00.55	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 42.000 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.231Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES				Unidad Fancoil ensamblada y probada en fábrica, compuesta de un serpentín de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio, ventiladores del tipo Centrífugos, con funciones de manejo automático de velocidad para optimizar el desempeño. Bajo nivel de ruido y control remoto	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	39.00.56	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.26Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 360mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	Especificaciones técnicas definidas en el diseño	Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Unidad	inalámbrico. Especialmente diseñado para trabajar en conjunto con unidades condensadoras de Refrigerante variable. La unidad poseerá válvula de expansión lineal. Mueble en acero galvanizado y bomba de condensado incorporada Filtro electrónico de aire opcional. (Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas – TCT-01)	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.57	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.765Kw DIMENSIONES 765 x 500 x 500mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.58	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 96.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.8Kw DIMENSIONES 800 x 750 x 750mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.59	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 427 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.60	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 355 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.61	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 319 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.62	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 1230 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.63	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 996 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.64	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 267 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.65	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 219 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION				Cada caja de volumen variable (CVV) contará con su propio módulo de control instalado desde fábrica, que se comunicará a través de protocolo BACnet con el BAS. El actuador de la caja CVV responderá a la señal de un sensor de	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	39.00.66	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	Especificaciones técnicas definidas en el diseño	Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Unidad	temperatura de zona que permitirá su apertura o cierre según la necesidad de acondicionamiento en pro de la temperatura de cada zona. Los controladores deberán tener programado el caudal mínimo y máximo de suministro de aire permitido por la unidad, el cual debe corresponder con el de recambios por hora exigidos por el estándar ASHRAE 170 para la zona (Según Tabla de Memorias de cálculo y diagramas de flujo entregados). A través de comunicación BACnet se transmite al sistema de control el nivel de temperatura de la zona y el porcentaje del nivel de apertura del dámper. Algunas zonas (ver diagrama P&ID), dispondrán de cajas de volumen variable del tipo sencillas, cada una dispondrá de su propio módulo de control instalado en fábrica, que se comunicará a través de protocolo BACnet con el BAS.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.67	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.68	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 985 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.69	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 106 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.70	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 794 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.71	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 688 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.72	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 872 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.73	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 755 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.74	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	Especificaciones técnicas definidas en el diseño	Tabla de Características Técnicas de Equipos (TCT) y especificaciones técnicas definidas en el diseño	Unidad	Atenuador de ruido del tipo rectangular, con un radio de entrada optimizado para minimizar el flujo turbulento, además de una geometría interna diseñada para maximizar la recuperación estática y una conexión deslizante de 1" en ambos lados del sistema. El elemento deberá poseer internamente bafles metálicos perforados de acero galvanizado (material por defecto), con un relleno al interior hecho en fibra de vidrio, para la atenuación de ruido en conductos. Diseñado para adaptarse a las dimensiones del conducto, sin transiciones que ocasionen caídas de presión adicionales. Los rangos de velocidad aceptados en el ducto serán de 0-2500 FPM. Materiales: Deberá consistir en una carcasa de metal sólido, con una lámina metálica perforada calibre 26 ubicada internamente la cual contendrá un medio acústico en fibra de vidrio. Certificación: El desempeño acústico deberá ser certificado bajo el estándar ASTM E477 (Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas – TCT-01)	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.75	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.76	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	39.00.77	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
40.00.00	**HIDROSANITARIOS**							
40.00.01	**BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIO**	• Especificaciones técnicas del fabricante. • Informe hidrosanitario de especialistas. • Planos hidrosanitarios. • Normativa de la empresa de acueducto aguas de sucre S.A E.S.P.	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	Unidad	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
40.00.02	**EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE**	• Especificaciones técnicas del fabricante. • Informe hidrosanitario de especialistas. • Planos hidrosanitarios. • Normativa de la empresa de acueducto aguas de sucre S.A E.S.P.	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	Unidad	• Se recomienda pre ensamblarlo sobre una base metálica. Esta a su vez, se apoyará mediante soportes de caucho neopreno o similar. • Para la descarga se instalará una unión flexible anti vibratoria con bridas de acero en sus extremos. La temperatura máxima debe ser de 50 °C y deben ser resistentes a la corrosión y a la abrasión. • En el evento de no tener pre ensamblado el equipo, se recomienda instalar uniones flexibles para cada una de las descargas de las motobombas.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
40.00.03	**EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS**	• Especificaciones técnicas del fabricante. • Informe hidrosanitario de especialistas. • Planos hidrosanitarios. • Normativa de la empresa de acueducto aguas de sucre S.A E.S.P.	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	Unidad	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
40.00.04	**CALENTADOR ELECTRICO PASO 5-9 Lts Bifasico**	• Especificaciones técnicas del fabricante. • Informe hidrosanitario de especialistas. • Planos hidrosanitarios. • Normativa de la empresa de acueducto aguas de sucre S.A E.S.P.	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	Unidad	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
40.00.05	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0.5 lps incl. Tamiz de entrada, 2 filtros descendestes, 2 ascendentes, microtubulencia centrifuga, sedimentacion, filtracion Q=240 m3/m2/dia**	• Especificaciones técnicas del fabricante. • Informe hidrosanitario de especialistas. • Planos hidrosanitarios. • Normativa de la empresa de acueducto aguas de sucre S.A E.S.P.	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	Unidad	• Para las ventilaciones y re ventilaciones del sistema de evacuación de aguas residuales se utilizará tubería PVC-Liviana • Antes de cubrir cualquier tubería, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2 mts. • En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubo accesorio, éste deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. • Las bajantes y colgantes de desagües se llenarán paralelamente con su prolongación y no se desocuparán hasta tanto no se haya terminado la mampostería y pañetes.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
41.00.00	**OTROS**							
41.00.01	**TALANQUERAS**	• No aplica	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas EAAB, RAS, NTC, NSR10.	Unidad	• Cumplir con todas las normativas aplicables.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.00	**AMUEBLAMIENTO**							
42.00.01	**OA 2.1. PUESTOS DE TRABAJO en L. 1.20m x 1.50 m. Superficie Laminada 1.20 m x 0.60 m en 25 mm + Ducto debajo de superficie con troqueles para conectividad + falda en melanina. Base porto soldado tubular cuadrado. Incluye: 1 módulo de servicios frente metálico 2M1A 3 gavetas**	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.02	**OA 2.4. MESA DE JUNTAS DE 3.30 M X 1.20 M Superficie Laminada 3.30 m x 1.20 m en 25 mm. Base porto soldado tubular cuadrado. Grommets para conectividad**	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.03	**OA 2.5 MESA DE CAFÉ Superficie Laminada 0.90 m x 0.90 m en 25 mm, Base pedestal fija pintada**	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.04	**OA 1.1 SILLA OPERATIVA. Espaldar alto con asiento. Tapizador espaldar y asiento en textil vinilico lavable para zonas de salud (no silvertex). Mecanismo de 3 palancas. Sin brazos**	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.05	**O.A 1.4 SILLA SALA DE JUNTAS**	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.06	**OA 1.5 TÁNDEM TRES PUESTOS: monoconcha plástica en diferentes colores. Base pintada negra. Tándem de 3 sillas**	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
42.00.07	OA.1.2. SILLA INTERLOCUTORA. Monoconcha plástica. Base 4 apoyos pintada negra	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.08	OA 2.6 SILLA PARA COMEDOR CAFETERÍA MY WAY: Monoconcha plástica de colores	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.09	OA 1.8. SOFÁ LOLA 2 PUESTOS. Tapizado en serie a. Base pintada	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.10	OA 1.6. POLTRONA 1. PUESTO. Tapizado en serie a. base pintada	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.11	OA 2.2 PUESTO EN L - TIPO 1. CON SUPERFICIE PRINCIPAL Y SUPERFICIE RETORNO. Superficie Laminada 1.50 m x 0.60 m en 30 mm y superficie retorno de 90 cm + falda frontal en Melamina + Ducto debajo de superficie en retorno. 2 Base porto soldado + 1 chambrana de soporte. Medidas: 1.50 x 60. 1 módulo de almacenamiento 2M1A 3 gavetas cuerpo y frente metálico de 30cm de frente	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.12	OA 3.1. LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1,55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con aro para candado. Cantidad total: 6	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.13	OA1.7 SOFÁ SENCILLO, UN PUESTO	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.14	OA.1.9 SILLAS AUDITORIO 8 PUESTOS	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.15	OA.2.3 PUESTO DE TRABAJO SENCILLO	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.16	OA 3.2. LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1,55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con aro para candado. Cantidad total: 4	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.17	OA 4.1 GABIENETE 5 NIVELES, ENTREPAÑOS DIM: 1.81 x 0.90 x 0.49	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.18	OA 4.2 ESTANTERÍA LIVIANA 60cms DE FONDO, DIM 2 x 0.92 x 0.60 EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 22 RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADLE DE ALTA RESISTENCIA	• Norma Técnica Colombiana NTC 6047 • Especificaciones Técnica del Fabricante	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo, y de ser así ejecutarlo con base en las normas NTC 5345, NTC 5178, NTC 5270.	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL MOBILIARIO PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
42.00.19	SEÑALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Incl. Señalización interior, exterior y tótems	Norma Icontec NTC2387 Símbolos Gráficos Norma Icontec NTC2389 Uso de Flechas Norma Icontec NTC4166 Símbolos gráficos para protección de Incendios Norma ISO3864 Safety Colors and Safety Signs	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	• CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD Y LAS MEDIDAS DE MANEJO DEL SEÑALIZACIÓN PREVISTAS. • ACOPIAR, TRANSPORTAR Y DISPONER CORRECTAMENTE EL MOBILIARIO, EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. • EL ÁREA DE LOS TRABAJOS DEBE QUEDAR LIMPIA.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
43.00.00	EQUIPOS DE OFICINA							
43.00.01	EQUIPO DE COMPUTO CORPORATIVO INTEL CELERON DUAL DECIMA GENERACION INC. 2 Nucleos, 2 Subprocesos, Tarjeta de video, Disco duro de 1 Tera	• Especificaciones Técnica del Fabricante donde especifique que los equipos suministrados por cada tipo o grupo de equipos (modelo especifico) cumplen con las siguientes normas ambientales. Ítem computadores EPEAT, Energy Star, RoHS Ítem impresoras Obligatorio cumplimiento RoHS y una de las siguientes EPEAT, Energy Star o similares. Ítem escáner Obligatorio cumplimiento RoHS y una de las siguientes EPEAT, Energy Star o similares.	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	La revisión de especificaciones técnicas, garantías de fábrica y funcionamiento, se realizará una vez el contratista instale equipo en el sitio asignado El contratista solucionará cualquier inconveniente técnico que se presente en el equipo el día de la entrega, de lo contrario deberá retirar el equipo de las instalaciones y se programará una nueva entrega.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
43.00.02	IMPRESORA					Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
44.00.00	**MOBILIARIO INDUSTRIAL**							
44.00.01	**ESTUFA 6 PUESTOS CON PLANCHA DE ASAR**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.02	**NEVERAS DE ALIMENTOS**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.03	**BASCULA**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.04	**CAMPANA EXTRACTORA**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.05	**LICUADORA**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.06	**HORNO MULTIPROPOSITO**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.07	**LAVADORA**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.08	**SECADORA**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.09	**PLANCHA**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.10	**MAQUINA DE COSER**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
44.00.11	**BASCULA**	Norma ASTM A240	• Verificar con Interventoría si es requerido algún tipo de ensayo	Unidad	Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.	Antes, durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.00.00	**EQUIPOS MÉDICOS**							
45.01.01	**AGITADOR DE MAZZINI**		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMATICO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.04	AUTOCLAVE		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.05	AUTOCLAVE DE MESA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.06	BAÑO SEROLOGICO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.07	BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.08	BOMBA DE INFUSIÓN		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.10	CAMA HOSPITALARIA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.11	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.12	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS CON RCP		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.13	CAMILLA FIJA TIPO DIVAN		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.14	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLOGICO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.15	CAVITRON		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.16	CENTRIFUGA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.17	COMPRESOR		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRIOS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.19	CONGELADOR DE PILAS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.20	CONTADOR DE CELULAS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.21	DESFIBRILADOR		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.22	DIGITALIZADOR DE RX		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.23	DOPPLER FETAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.24	ECOGRAFO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.25	ELECTROBISTURI		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.26	ELECTROCARDIOGRAFO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
45.01.27	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	Es importante recordar que dentro de la normatividad vigente en Colombia, para la tecnología biomédica se presentan diferentes requerimientos que debe tener en cuenta una institución tanto al momento de adquirir nuevos equipos como en el momento de ponerlos en funcionamiento, a continuación se describen algunos de ellos con el objetivo de mejorar el proceso de adquisición y puesta en marcha de los equipos biomédicos en las ESE del departamento. Según el decreto 4725 de 2005, De los requisitos que se deben presentar para la expedición de registros sanitarios y permisos de comercialización se tiene: Articulo 18. Documentación para la evaluación técnica de los dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada. … 'h) Cuando se trate de equipos biomédicos, la declaración por parte del titular o del importador autorizado, en donde se afirme que posee manuales de operación y mantenimiento en idioma castellano, así como el compromiso de su presentación al requerimiento de la autoridad sanitaria competente y la entrega de los mismos al momento de la adquisición de los equipos biomédicos;' Artículo 24. De los requisitos para el permiso de comercialización. … '3. Que está en capacidad para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la vida útil del equipo si es inferior.' '5. Que suministrará al usuario los manuales de operación, instalación y mantenimiento en el idioma de origen y en castellano' Por lo tanto, el momento de adquirir un equipo biomédico para dar cumplimiento tanto a este decreto como a la resolución 2003 que se presenta a continuación, se deben solicitar también los manuales descritos anteriormente según la clasificación del riesgo del dispositivo médico. Además de exigir para los equipos de tecnología controlada insumos, partes, repuestos y el servicio de mantenimiento durante cinco años, como mínimo. Según la resolución 2003 de 2014, de las condiciones de habilitación para todos los servicios, en el ítem de 'Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos'' Para dispositivos médicos de uso humano requeridos para la prestación de los servicios de salud que ofrece, debe contar con soporte documental que asegure la verificación y seguimiento de la siguiente información: descripción, marca del dispositivo, serie (cuando aplique), presentación comercial, registro sanitario vigente expedido por el INVIMA o permiso de comercialización, clasificación del riesgo (información consignada en el registro sanitario o permiso de comercialización) y vida útil si aplica. [5] Por lo tanto, se adjunta un formato de hoja de vida del Ministerio de salud y protección social, por medio del cual, se puede hacer seguimientos a los requisitos exigidos por la resolución.	Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.29	EQUIPO DE RX FIJO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.30	EQUIPO DE RX PERIAPICAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERISFERICO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.32	FLUJOMETRO SENCILLO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.34	FONENDOSCOPIO NEONATAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.35	GLUCOMETRO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.37	INCUBADORA DE CULTIVOS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.38	INCUBADORA DE TRANSPORTE		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.39	KIT MICROPIPETAS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.40	LAMPARA CIELITICA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.41	LAMPARA CIELITICA MONOSATELITE		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.42	LAMPARA DE CALOR RADIANTE		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.43	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.44	LAMPARA DE FOTOCURADO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.45	LARINGOSCOPIO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.46	MAQUINA DE ANESTESIA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.47	MESA DE ATENCION DE PARTO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.48	MESA DE CIRUGIA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.49	MICROSCOPIO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.50	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control		Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
45.01.52	MONITOR FETAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.53	NEBULIZADOR		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.54	PESA BEBE		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.57	PULSOXIMETRO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.58	RADIOVISIOGRAFO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.59	REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.60	REFRIGERADOR HORIZONTAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.61	REFRIGERADOR PARA INSUMOS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.62	REFRIGERADOR REACTIVOS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.63	RX PORTATIL DIGITAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.64	SIERRA CORTA YESO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.65	SILLA DE RUEDA ADULTO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.67	SUCCIONADOR		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.70	TERMOHIGROMETRO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.71	TERMOMETRO NEONATAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.72	TERMOS DE VACUNA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.73	UNIDAD ODONTOLOGICA		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.76	HORNO DE SECADO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Calibración (Si aplica)	Certificado de	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM	Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.78	PULSOXIMETRO NEONATAL		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.79	REGULADOR DE VACIO		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
45.01.81	EQUIPO TENS		Registro sanitario o permiso de comercialización (Si aplica) Certificado de Calibración (Si aplica)	Unidad	Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante. Después del período de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.00	MOBILIARIO MEDICO							
46.00.01	ATRIL PORTA BOMBA	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.02	BALON TERAPEUTICO	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.03	BARRAS PARALELAS	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.04	BICICLETA FIJA	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.05	BIOMBO	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.06	CAMINADORA ELECTRICA	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.07	CARRO DE MEDICAMENTOS	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.08	CARRO DE PARO	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.09	CARRO DE YESOS	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.10	CARRO TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.11	CONGELADOR DE PLACENTA	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.12	DUCHA LAVAOJOS	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.13	ESCALERILLA DE DOS PASOS	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.14	ESTERILIZADOR DE TETEROS	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.15	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.16	KIT DE PROTECCION RADIOLOGICA	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.17	MESA AUXILIAR	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.18	MESA DE AUTOPSIA	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
46.00.19	MESA DE INSTRUMENTAL	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

ITEM		Actividad / Prueba ó Ensayo	Norma que aplica	Variable de control	Método de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro
	46.00.20	**MESA DE MAYO**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.21	**MESA DE NOCHE**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.22	**MESA PUENTE**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.23	**NEGATOSCOPIO**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.24	**NEVERA CAVA**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.25	**NEVERA TETEROS**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.26	**PATO COPROLOGICO**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.27	**PESA PAÑAL**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.28	**PISINGO ADULTO**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.29	**RIÑONERA**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.30	**RUEDA DE HOMBRO**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.31	**SILLA RECLINABLE**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.
	46.00.32	**TERMOHIGROMETRO**	Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional.	El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomienden. La Inspección de Obra, cuando lo crea conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.	Unidad	Mueble entregado de acuerdo con los planos de detalle. Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta, constatada en obra, de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.	Durante y posterior a la instalación	Residente de obra e interventoria	• Anotación en bitacora y Registro fotográfico.

CERTIFICADOS DE CALIDAD MATERIALES

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA A PRESIÓN

Fabricado por CELTA S.A.S.: Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; Planta Maquila: Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by CELTA S.A.S.: Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; Planta Maquila: Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Plásticos. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series)

SECTOR ICS: 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-1
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1975-12-05	Fecha Última Modificación: Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	Fecha de Vencimiento: Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

SOLDADURA PVC

Fabricado por CELTA S.A.S., en la Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia

Manufactured by CELTA S.A.S., in the Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 576 (2021)

Cemento solvente para sistemas de tubos plásticos de Poli-Cloruro de vinilo -PVC-
Solvent cement for poly-vinyl chloride--pvc- plastics piping systems

SECTOR ICS: 83,140,00

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-6
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1982-08-17	Fecha Última Modificación: Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	Fecha de Vencimiento: Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17065 PRODUCT CERTIFICATION BODY ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS SANITARIOS - AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

Fabricado por **CELTA S.A.S.**, en la Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia

Manufactured by **CELTA S.A.S.**, in the Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1087 (2016)

Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación

Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent pipe

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-2
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1977-03-30	Fecha Última Modificación: Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	Fecha de Vencimiento: Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIOS PRESIÓN

Fabricado por **CELTA S.A.S.**, en la Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia

Manufactured by **CELTA S.A.S.**, in the Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1339 (2006)

Accesorios de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) Schedule 40

Pipe fittings of poly (vinyl chloride) (PVC) Schedule 40

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-4
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1978-09-30	Fecha Última Modificación: Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	Fecha de Vencimiento: Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIOS SANITARIO Y VENTILACIÓN

Fabricado por **CELTA S.A.S.**, en la Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia

Manufactured by **CELTA S.A.S.**, in the Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1341 (2006)

Accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para tubería sanitaria-aguas lluvias y ventilación
Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent fittings

SECTOR ICS: 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-5
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1978-09-30	Fecha Última Modificación: Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	Fecha de Vencimiento: Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

UNIONES MECÁNICAS RIEBER

Fabricado por CELTA S.A.S.: Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; Planta Maquila: Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by CELTA S.A.S.: Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; Planta Maquila: Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 2295 (2008)

Uniones con sellos elastomÉricos flexibles para tubos plásticos empleados para el transporte de fluidos a presión

Joints for plastics pressure pipes using flexible eleastomeric seals

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-8
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1989-08-02	Fecha Última Modificación: Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	Fecha de Vencimiento: Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

4.6 Otros documentos seguimiento mensual

4.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo.

Se incluye copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado, en el formato se registran los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual y el reintegro de los rendimientos causados, registrando en el formato los generados en el mes anterior al mes del informe (Formato FSI-800-013).

El Consorcio contratista de obra presento a la interventoría el plan de manejo del anticipo, por un valor correspondiente a $ 6.884´152.524,80 M/CTE, sin embargo, luego del descuento por impuestos y demás, el valor definitivo del anticipo entregado al contratista es de $ 6.539.944.899,00, A la fecha se le han realizado desembolsos por el total del valor del anticipo.

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO	VALOR GIRADO	% GIRADO
1	Compra de materiales e insumos consumibles, equipos menores, herramientas de obra, dotación de personal, señalización y valla informativa.	$ 2.532.266.664,89	$ 2.532.266.664,89	100%
2	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 2.828.526.168,82	$ 2.828.526.168,82	100%
3	Pago de Mano de Obra, nómina personal, seguridad social y parafiscales	$ 1.179.152.065,29	$ 1.179.152.065,29	100%
TOTALES		**$ 6.539.944.899,00**	**$ 6.539.944.899,00**	**100%**

Tabla 23 Plan de manejo del anticipo

A la fecha la fiduciaria ALIANZA FIDUACIARIA giro al contratista el 100% del valor otorgado De acuerdo con el certificado de liquidación de la fiducia, se giraron los rendimientos financieros por valor $ 1.902.051,13, los cuales se consignaron a la cuenta Ahorros de Banco Av Villas a nombre de SUCRE Nit. 892.280.021, el cual se anexa al presente informe, así como el informe de rendición de cuentas del fideicomiso, mediante el cual manifiestan que a la fecha este negocio no presenta cuentas por pagar pendientes, no posee recursos y no ha presentado proceso Jurídicos, ni reclamos por parte de terceros.

En la siguiente tabla se pueden evidenciar los movimientos realizados:

Alianza Fiduciario	FIDEICOMISO CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO FLUJO DE CAJA CUENTA No. 04000009669				
PERIODO	**ago-24**	**sep-24**	**oct-24**	**nov-24**	**CONSOLIDADO TOTAL**
SALDO INICIAL	**$0,00**	**$3.117.717.088,50**	**$1.756.841.680,84**	**$4.182.425,20**	**$0,00**
SALDO INICIAL	$0,00	$3.117.717.088,50	$1.756.841.680,84	$4.182.425,20	$0,00
INGRESOS	**$6.555.146.686,57**	**$8.593.352,56**	**$7.075.700,24**	**$91,74**	**$6.570.815.831,11**
Aportes Entidad	$6.539.944.899,00	$0,00	$0,00	$0,00	$6.539.944.899,00
Aportes Fdte	$14.255.186,00	$7.696.903,00	$7.017.686,00	$0,00	$28.969.775,00
Rendimientos	$946.601,57	$896.449,56	$58.014,24	$91,74	$1.901.157,11
Rechazo Rendimientos	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
EGRESOS	**$3.437.429.598,07**	**$1.369.468.760,22**	**$1.759.734.955,88**	**$4.182.516,94**	**$6.570.815.831,11**
Giros realizados	$3.423.726.872,94	$1.364.503.874,00	$1.754.421.402,06	$2.281.000,00	$6.544.913.149,00
Giro Rendimientos	$0,00	$0,00	$0,00	$1.902.051,13	$1.902.051,13
Costos bancarios	$7.797,44	$46.486,10	$16.839,00	$4.263,35	$75.385,89
G.M.F	$13.694.927,69	$4.918.400,12	$5.296.714,82	$15.202,46	$23.925.245,09
SALDO FINAL	**$3.117.717.088,50**	**$1.756.841.680,84**	**$4.182.425,20**	**$0,00**	**$0,00**
VR EXTRACTO	$3.117.717.088,50	$1.756.841.680,84	$4.182.425,20	$0,00	$0,00

Tabla 24 Flujo de caja fiducia

4.6.2 Actas de comité y reunión

Durante este periodo se llevaron a cabo un (1) comité de obra. Formato FSI-800-016.

Durante este periodo se no se llevaron a cabo reuniones. Formato FSI-800-017.

4.6.3 Seguimiento ítems No Previstos.

En el presente periodo no se ha realizado solicitud para la evaluación de ítems no previstos.

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	FSI-800-013
		VERSIÓN	1
		FECHA	1 de 4 1/01/2024

	FECHA	31/05/2025

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. FINAL **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☑

CONTRATO DE OBRA No. LP 018-2023
(Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 121139 **DE** 2024 ENTIDAD FINANCIERA: ALIANZA FIDUCIARIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. N/A SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 20 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 6.884.152.524,80** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 001-24
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
REMBOLSO			CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	$ 412.726.180,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FV 77448	16-may-24	DOBLACERO S.A.S	$ 257.742,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FV 82258	16-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 70.151.978,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FV 82348	17-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 20.234.754,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FV 81661	5-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 21.859.597,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FV 81658	5-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 38.869.770,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FV 81739	6-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 15.000.397,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FV 82197	15-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 46.852.502,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FV 82235	15-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 4.155.307,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FV 82243	15-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 39.752.531,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	CON24843	17-jul-24	CONCREACEROS S.A.S	$ 18.517.836,53	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	CON24863	17-jul-24	CONCREACEROS S.A.S	$ 36.755.576,73	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	CON24883	18-jul-24	CONCREACEROS S.A.S	$ 36.836.451,13	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	CON24889	18-jul-24	CONCREACEROS S.A.S	$ 1.142.399,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	CON24978	23-jul-24	CONCREACEROS S.A.S	$ 23.129.976,55	1	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA	FAE-42	24-jul-24	AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZÁLEZ	$ 2.510.040.210,00	2	TRANSPORTE Y ALQUILER MAQUINARIA
REMBOLSO			CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	$ 10.008.900,00	2	TRANSPORTE Y ALQUILER MAQUINARIA
REMBOLSO			CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	$ 117.434.765,00	3	PAGO DE MANO DE OBRA, NÓMINA PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
FACTURA	FV 83789	30-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 6.725.300,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	ECOR9688	29-ago-24	EQUIPOS CORDOBA S.A.S	$ 14.249.500,00	2	TRANSPORTE MAQUINARIA

						FECHA	31/05/2025
FACTURA	ECOR9749	29-ago-24	EQUIPOS CORDOBA S.A.S	$	3.200.000,00	2	TRANSPORTE MAQUINARIA
FACTURA	CGS144	30-sep-24	CONSTRUCTORA GANEM	$	90.208.400,00	3	PAGO MANO DE OBRA
FACTURA	EICR 4396	15-jun-24	ENERGÍA INTEGRAL DE LA SABANA	$	5.354.141,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EICR 4411	16-jun-24	ENERGÍA INTEGRAL DE LA SABANA	$	37.800,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EICR 4425	18-jul-24	ENERGÍA INTEGRAL DE LA SABANA	$	92.400,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EICR 4742	15-jun-24	ENERGÍA INTEGRAL DE LA SABANA	$	1.274.157,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EICR 4744	15-jun-24	ENERGÍA INTEGRAL DE LA SABANA	$	681.980,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CL1431	31-ago-24	CONCRETO DE LORICA S.A.S	$	34.149.524,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CL1432	5-sep-24	CONCRETO DE LORICA S.A.S	$	18.032.025,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CL1433	5-sep-24	CONCRETO DE LORICA S.A.S	$	18.234.785,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FEV 8787	27-ago-24	SOMOS IMPRESORES S.A.S	$	297.500,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FEV 8655	14-abr-24	SOMOS IMPRESORES S.A.S	$	154.700,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FEV-20	27-ago-24	LUZ MARY RODRÍGUEZ ACOSTA	$	11.700.000,00	1	COMPRA MATERIALES
CUENTA COBRO	CC No. 01	5-sep-24	RAUL HINCAPIE	$	10.233.600,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FV 82755	26-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$	4.182.201,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FV 82660	24-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$	34.713.267,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FEP44032	18-jul-24	ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	$	544.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FEVE3426	17-may-24	EQUIPSEG MONTERÍA S.A.S.	$	75.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FEVE3834	26-jun-24	EQUIPSEG MONTERÍA S.A.S.	$	1.706.382,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EPM76774	29-jul-24	EQUIPSEG PLUS MONTERÍA SAS	$	2.683.416,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EPM77751	12-ago-24	EQUIPSEG PLUS MONTERÍA SAS	$	660.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EPM77916	15-ago-24	EQUIPSEG PLUS MONTERÍA SAS	$	4.962.508,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EPM78914	15-ago-24	EQUIPSEG PLUS MONTERÍA SAS	$	7.871.093,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EPM78915	15-ago-24	EQUIPSEG PLUS MONTERÍA SAS	$	230.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	EPM78917	2-sep-24	EQUIPSEG PLUS MONTERÍA SAS	$	9.228.954,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	SVC17186	25-jun-24	DISTRIAS S.A.S.	$	1.435.117,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	SVC17138	25-jun-24	DISTRIAS S.A.S.	$	16.142.012,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	DM599	9-jul-24	DISTRIAS S.A.S.	$	1.248.683,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	DM1785	24-jul-24	DISTRIAS S.A.S.	$	5.382.552,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	DM2430	24-jul-24	DISTRIAS S.A.S.	$	2.377.434,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	DM3438	14-jun-24	DISTRIAS S.A.S.	$	5.907.501,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	DM3562	15-jun-24	DISTRIAS S.A.S.	$	973.568,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	DM4153	24/08/204	DISTRIAS S.A.S.	$	2.126.369,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FESA 25057	15-jul-24	DEPÓSITO LAS CASAS S.A.S	$	1.152.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FE-3145	26-jun-24	CARLOS MARIO RAMIÍREZ ZULUAGA	$	15.294.025,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FE-3169	9-jul-24	CARLOS MARIO RAMIÍREZ ZULUAGA	$	4.281.425,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FE-3230	1-ago-24	CARLOS MARIO RAMIÍREZ ZULUAGA	$	2.734.700,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FE-3262	15-ago-24	CARLOS MARIO RAMIÍREZ ZULUAGA	$	3.792.500,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FE-3277	26-ago-24	CARLOS MARIO RAMIÍREZ ZULUAGA	$	9.327.500,00	1	COMPRA MATERIALES
CUENTA COBRO	CC No. 0019	26-jun-24	DAGOVERTO SEVERICHE RAMOS	$	2.882.490,00	1	COMPRA MATERIALES
CUENTA COBRO	CC No. 0029	25-jul-24	DAGOVERTO SEVERICHE RAMOS	$	2.409.420,00	1	COMPRA MATERIALES
CUENTA COBRO	CC No. 0037	14-ago-24	DAGOVERTO SEVERICHE RAMOS	$	1.061.000,00	1	COMPRA MATERIALES
CUENTA COBRO	CC No. 0048	30/082024	DAGOVERTO SEVERICHE RAMOS	$	1.125.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	ACH5905	24-jul-24	AVISOS EL CHAMO S.A.S	$	1.957.200,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CON25669	27-ago-24	CONCREACEROS S.A.S.	$	35.310.444,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CON25694	29-ago-24	CONCREACEROS S.A.S.	$	24.478.725,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CON25759	2-sep-24	CONCREACEROS S.A.S.	$	22.186.848,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CON25761	2-sep-24	CONCREACEROS S.A.S.	$	17.822.409,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CON25817	4-sep-24	CONCREACEROS S.A.S.	$	72.534.719,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FEJQ 231	3-sep-24	JOSE NORALDO QUIÑONES UÑATES	$	77.721.930,00	2	TRANSPORTE MAQUINARIA
FACTURA	R195	16-ago-24	JANNE MIGUEL ROQUE RAFAEL	$	7.825.950,00	2	TRANSPORTE MAQUINARIA
FACTURA	FEDS24	2-sep-24	DEIVIS ENRIQUE SALAS BUSTAMANTE	$	5.464.800,00	2	TRANSPORTE MAQUINARIA

					FECHA	31/05/2025
FACTURA	FE 163	28-ago-24	SERTET S.A.S	$ 8.571.423,00	3	PAGO MANO DE OBRA
FACTURA	FE 2	30-sep-24	INVERSIONES SAIMEREJ S.A.S.	$ 3.495.690,00	1	COMPRA MATERIALES
CONSIGNACION	REC. CONSIG.	1-ago-24	ODALYS BRAVO	$ 2.500.000,00	3	PAGO MANO DE OBRA
CONSIGNACION	PLANILLA SS	10-sep-24	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	$ 13.687.700,00	3	PAGO MANO DE OBRA
CONSIGNACION		10-jul-24	DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ	$ 1.931.397,00	3	PAGO MANO DE OBRA
FACTURA	FV 83809	31-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 35.691.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CL1424	23-ago-24	CONCRETO DE LORICA S.A.S	$ 37.797.159,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CL1425	23-ago-24	CONCRETO DE LORICA S.A.S	$ 38.222.167,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CL1430	23-ago-24	CONCRETO DE LORICA S.A.S	$ 38.651.770,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CL1431	31-ago-24	CONCRETO DE LORICA S.A.S	$ 5.328.904,00	1	COMPRA MATERIALES
CHEQUE	CHEQUE No. 718888	10-sep-24	OSCAR RAMOS BEDOYA	$ 19.660.616,00	3	PAGO MANO DE OBRA
CHEQUE	CHEQUE No. 718887	10-sep-24	OBRAS CIVILES JHG SAS	$ 16.916.977,00	3	PAGO MANO DE OBRA
CHEQUE	CHEQUE No. 718889	10-sep-24	ATRIKA PROYECTOS SAS	$ 20.328.403,00	3	PAGO MANO DE OBRA
FACTURA	MM049-59018	27-ago-24	DISTRIBUIDORA NISSAN SA	$ 7.415.979,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	ETEN41406	30-ago-24	MAPEI COLOMBIA SAS	$ 3.272.480,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FE-10684	30-ago-24	BIVIANA MARIA GOMEZ GIRALDO	$ 2.418.110,00	1	COMPRA MATERIALES
CHEQUE	CHEQUE No. 306528	10-sep-24	OBRAS CIVILES JHG SAS	$ 10.901.361,00	3	PAGO MANO DE OBRA
CHEQUE	CHEQUE No. 306526	10-sep-24	ATRIKA PROYECTOS SAS	$ 10.052.500,00	3	PAGO MANO DE OBRA
FACTURA	FE-279	22-ago-24	FRANCISCO JAVIER ESCUDERO NARVAEZ	$ 2.341.950,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	7729	22-ago-24	IVAN DARIO SALGADO	$ 242.000,00	3	PAGO MANO DE OBRA
FACTURA	1067855135	21-ago-24	IVAN DARIO SALGADO	$ 731.000,00	3	PAGO MANO DE OBRA
FACTURA	JCR 42	26-jul-24	JONABEL COGOLLO RECUERO	$ 1.568.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FEM No. 52893	17-ago-24	ALMACEN TORFER	$ 300.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	68931	21-ago-24	TOMAS CUEVAS	$ 780.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	C DE E	17-ago-24	DANIS DALADIER TAPIA GOMEZ	$ 700.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FV 82792	18-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 2.707.250,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FV 82804	18-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 467.351,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FV 82406	17-ago-24	DOBLACERO S.A.S	$ 13.794.908,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	CM 49	12-sep-24	CONSTRUCCIONES MASTER CIA LTDA	$ 134.950.325,00	3	PAGO MANO DE OBRA
FACTURA	FEIC 162	12-sep-24	INVERSIONES CARIBE SIGLO XXI SAS	$ 300.000.000,00	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	MON1915	30-ago-24	EQUINORTE	$ 31.391.136,00	2	ALQUILER MAQUINARIA
FACTURA	MON1942	17-sep-24	EQUINORTE	$ 7.858.824,00	2	ALQUILER MAQUINARIA
CUENTA DE COBRO	CC No. 01	24-sep-24	ORTECO	$ 430.259.532,00	3	PAGO MANO DE OBRA
FACTURA	FE-1009	3-oct-24	CONSTRUCTORA PC & PG SAS	$ 824.151.324,95	1	COMPRA MATERIALES
FACTURA	FE-1010	3-oct-24	CONSTRUCTORA PC & PG SAS	$ 160.764.918,82	2	TRANSPORTE MATERIAL
FACTURA	FE-1011	3-oct-24	CONSTRUCTORA PC & PG SAS	$ 298.267.500,00	3	PAGO MANO DE OBRA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Compra de materiales e insumos consumibles, equipos menores, herramientas de obra, dotación de personal, señalización y valla informativa.	$ 2.532.266.664,89	$ 2.532.266.664,89		$ 2.532.266.664,89	$ -

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	FSI-800-013
		VERSIÓN	1
		FECHA	4 de 4 1/01/2024

					FECHA	31/05/2025
2	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 2.828.526.168,82	$ 2.828.526.168,82		$ 2.828.526.168,82	$ -
3	Pago de Mano de Obra, nómina personal, seguridad social y parafiscales	$ 1.179.152.065,29	$ 1.179.152.065,29		$ 1.179.152.065,29	$ -
	TOTALES	**$ 6.539.944.899,00**	**$ 6.539.944.899,00**	**$ -**	**$ 6.539.944.899,00**	**$ -**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (FINAL) : $ 3.149,23
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 32.045,15
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES:
El Consorcio contratista de obra presento a la interventoría el plan de manejo del anticipo, por un valor correspondiente a $ 6.884´152.524,80 M/CTE, sin embargo, luego del descuento por impuestos y demás, el valor definitivo del anticipo entregado al contratista es de $ 6.539.944.899,00

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	**CÓDIGO**	**FSI-800-016**
		VERSIÓN	**1**
		FECHA	**1/01/2024** 1 de 2

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. **12** **FECHA** 6/05/2025

CONTRATO DE OBRA No. LP 018-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL 2024

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N/A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Estado ejecucion contrato
Problemas técnicos y rediseños
Plan de contingencia y reprogramación

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El contratista manifestó que, si bien la responsabilidad principal de ejecución recae sobre él, existen múltiples factores técnicos y económicos que han alterado sustancialmente la ejecución del proyecto. Entre ellos se destacan:
Inconsistencias técnicas en los diseños originales, particularmente en los sistemas de aire acondicionado (HVAC), redes hidro-sanitarias, sistema eléctrico, muros en drywall, planta de tratamiento y elementos de acabados exteriores (ventanería, mobiliario médico, entre otros).
Necesidad de rediseños no contemplados inicialmente en el contrato, cuya elaboración y aprobación han requerido tiempo, recursos técnicos adicionales y coordinación con proveedores especializados.
Desequilibrio económico originado por la variación significativa de precios de mercado frente a los valores contractuales.
La interventoría reiteró que sin un soporte no puede emitir concepto técnico que permita valorar un eventual desequilibrio económico, asi mismo le recalco al contratista que no cuenta con la competencia para modificar condiciones contractuales ni suspender el contrato, y que solo podrá emitir conceptos sobre eventuales ajustes o desequilibrios económicos una vez el contratista presente la documentación técnica debidamente soportada. También se insistió en que el estudio de mercado y la reprogramación actualizada del cronograma son de entera responsabilidad del contratista.

Por su parte, la entidad contratante manifestó que tanto el Ministerio de Salud como el Departamento Nacional de Planeación han manifestado preocupación por los incumplimientos reiterados en los compromisos adquiridos, especialmente en relación con la entrega de información técnica y el avance físico del proyecto. Se advirtió que, en caso de mantenerse la tendencia actual se pondra en riesgo la continuidad de la financiación por parte de estas entidades.

El contratista anunció su intención de radicar una solicitud formal de suspensión del contrato, como mecanismo para frenar el cómputo del plazo mientras se resuelven los rediseños y se ajustan los valores contractuales. Sin embargo, la entidad contratante dejó claro que no existe, por ahora, una causal jurídicamente sustentada que permita autorizar la suspensión, y que esta podría desencadenar consecuencias presupuestales graves, incluyendo la pérdida de los recursos del orden nacional.

Finalmente, se dejó constancia de que la solicitud de suspensión del contrato, inicialmente considerada por el contratista, no es viable en este momento debido a que no existen causales justificadas conforme a la normativa aplicable y a los términos contractuales vigentes. En su lugar, se instó al contratista a cumplir con la entrega inmediata de los insumos técnicos y administrativos requeridos, en aras de adoptar decisiones que permitan mitigar el incumplimiento y garantizar la culminación exitosa del proyecto.

Como alternativa, la entidad y la interventoría solicitaron al contratista que presente de manera urgente una reprogramación técnica del cronograma, que contemple:

Las actividades que pueden ejecutarse sin restricciones técnicas.

Las actividades que requieren rediseño, justificación de su postergación y cronograma de solución.
Adicionalmente, se reiteró la obligación del contratista de presentar el estudio de mercado que sustente el presunto desequilibrio económico.

Finalmente, se reconoció el esfuerzo demostrado por el contratista en resolver ciertos aspectos técnicos de forma proactiva, así como su voluntad de cumplir con la ejecución. No obstante, se advirtió que la situación ha llegado a un punto crítico que requiere acciones inmediatas, documentadas y verificables, para evitar consecuencias contractuales, financieras y legales para todas las partes involucradas.


COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentación de reprogramación ajustada		contratista
Entrega del estudio de mercado		contratista
Revisión técnica del estudio de mercado		Interventoria
Creacion de espacios técnicos y administrativos		Gobernacion/contratista/Interventoria
Comunicación con entidades financiadoras		Gobernacion

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO	Secretario de infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE	
ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE	Supervisor	GOBERNACION DE SUCRE	
HUGO HERNAN HERRERA G	contratista interventoria	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS	
DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ	contratista obra	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	
CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN	Contratista interventoria	CONSORCIO INTERHOSPITALCOVEÑAS	

4.6.4 Justificación mayores y menores cantidades de obra

Al momento de iniciar la ejecución de las obras difieren significativamente de las Condiciones descritas en los documentos iniciales de los estudios y diseños entregados debido a la alta expansividad de las arcillas presentes en la subrasante, lo que está generando un incremento en el volumen de material resultante de las excavaciones que debe ser retirado de la obra ya que por sus características no puede ser utilizado para realizar actividades de lleno, así mismo verificando a través de levantamientos topográficos en el sitio se evidencio que en las actividades de excavación correspondientes a los ítems 2.00.01, 2.00.02 y 2.00.03 del presupuesto presentan diferencias entre lo contratado y lo obtenido en los levantamientos realizados, así mismo se evidencian menores cantidades presupuestadas para los siguientes ítems:

No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND.	CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS
				CANTIDAD	CANT. A EJECUTAR
A2	**2.00.00**	**CIMENTACIÓN**			
2033	2.00.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	859.02	14130.00
2037	2.00.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	517.76	1165.60
2021	2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	675.18	3964.90
2003	2.00.04	FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	325.65	589.20
2032	2.00.06	CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	226.50	1308.50
2035	2.00.09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	78.36	90.88
2036	2.00.10	VIGA DE CIMENTACIÓN VC F´c= 28 Mpa, Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	84.19	171.15
2038	2.00.11	EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	517.76	1165.60
2006	2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	4,425.86	11105.40
2020	2.00.13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	56,233.32	64450.25
A3	**3.00.00**	**ESTRUCTURA**			
3032	3.00.03	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	93.25	101.26
3040	3.00.06	TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa. incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería	m3	122.73	128.29
3023	3.00.11	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	233,373.91	269666.39
3024	3.00.12	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	76,211.78	97182.80

- **2.00.01 - EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO**, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero: En este ítem se presenta una mayor cantidad de debido a que estas excavaciones no se calcularon correctamente inicialmente y de acuerdo con la revisión de los planos topográficos y medición en el sitio del proyecto se presenta una diferencia de 13.270,98 m3.
- **2.00.02 - EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO**, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra: En este ítem se presenta una mayor cantidad por la misma razón que el ítem anterior y de acuerdo con la revisión realizada en campo y en los planos del proyecto existe una diferencia de equivalente a 647,84 m3.
- **2.00.03 - EXCAVACIÓN MANUAL**, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero: En revisión realizada en campo y en los planos de diseño del proyecto se evidencia una mayor cantidad, la cual asciende a 3.289,72. De igual forma en el terreno de la obra se encontraron fallas que son necesaria su corrección.
- **2.00.04 - FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30** mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación: Al realizar la revisión de los diseños del proyecto y medición en campo se comprueba la discrepancia entre estos por lo que se presenta una mayor cantidad correspondiente a 263,55 m.
- **2.00.06 - CONCRETO CICLÓPEO**, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa: En este ítem no se tiene en cuenta la totalidad que conlleva el proyecto por lo que de acuerdo con la revisión hecha en los diseños y teniendo en cuenta que se modificó la profundidad de desplante debido a que el terreno con baja capacidad

portante y así aumentar la estabilidad de la estructura es necesaria una mayor cantidad de 1.082,00 m3.

- **2.00.09 - PEDESTALES**, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo): Debido a que el proyecto se elevó a una cota 17.17 (50 cms), a diferencia de la cota 16.67, la cual se encuentra por debajo de la vía. De esta manera se evita que el agua lluvia ingrese y perjudique el Área de Servicios y cuarto de máquinas, por lo tanto la cantidad mayor corresponde a 12,52 m.
- **2.00.10 - VIGA DE CIMENTACIÓN VC F´c= 28 Mpa**, Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo): Debido a no se tiene en cuenta la totalidad de las cantidades contempladas en el diseño estructural, por lo tanto, la cantidad mayor corresponde a 86,96 m
- **2.00.11 - EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN**: Al aumentar las excavaciones, aumenta directamente la cantidad de material seleccionado de la excavación en 647,84 m3
- **2.00.12 - RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO**: Igual que en el capítulo anterior se aumenta en una cantidad de 6679,54 m3. • 2.00.13 - 3.00.11 - ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado: Esta cantidad aumenta debido a que no se tuvo en cuentas el peso correspondiente del refuerzo en las cimentaciones y losas con una mayor cantidad de acero de refuerzo.
- **3.00.03 - MURO DE CONTENCIÓN**, concreto 28 Mpa: Al elevar la cota del bloque 3, aumenta la altura de este, por lo tanto, la mayor cantidad es 8,01 m3.
- **3.00.06 - TANQUE DE AGUA**, concreto 28 Mpa. incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería: Por

encontrarse en una cota inferior (16,67), se hace necesario elevarlo a la cota 17,17 y que las aguas lluvias no inunden el área donde se encuentra el tanque de agua, se presenta una mayor cantidad de 5,56 m3.

- **3.00.12 - MALLA ELECTROSOLDADA:** Esta cantidad aumenta debido a que no se tuvo en cuentas las mallas de las tres (3) losas para el cálculo inicial con el peso correspondiente de cada una, con una mayor cantidad de 20.971,02 kg.

4.6.5 Control modificaciones al diseño y/o especificaciones

Durante el mes de marzo, el contratista radico el oficio HGM120325-47, señalando inconsistencias en el diseño de redes de aire acondicionado y ventilación mecánica, las cuales deben cumplir con la normativa ASHRAE 170-2013 y el Anexo General RETSIT (Resolución 40773 de 29 de diciembre de 2023).

Bloque 1

El piso 1 alberga áreas clave como almacenamiento, taller, cuarto CCV, cuarto de racks, sala de autopsias y depósitos de cadáveres, con consideraciones importantes de clima y ventilación.
Áreas sin aire acondicionado: Espacios como el cuarto CCV y almacenamiento carecen de climatización, lo que podría afectar equipos e insumos sensibles.
Contaminación en la morgue: La sala de autopsias y el depósito de cadáveres no están completamente aislados, lo que podría generar contaminación cruzada.

El piso 2 incluye áreas críticas como quirófanos, salas de recuperación y salas de parto, que requieren estrictos controles de ventilación y aire acondicionado.
Sistema de aire compartido: Un único sistema de aire para todas las áreas críticas no cumple con la normativa ASHRAE 170-2013, que exige sistemas independientes.
Cumplimiento normativo: Los quirófanos y salas de parto deben contar con filtración HEPA, control de temperatura (18°C-24°C), renovación de aire cada 4 horas, difusores de flujo laminar y lámparas UV para cumplir con los estándares.

Bloque 2

Este bloque incluye las áreas de farmacia y radiología.
Sistema VRF compartido: El sistema propuesto para el laboratorio y farmacia no separa los ambientes de trabajo según la normativa ASHRA.
Los laboratorios deben tener un flujo de aire adecuado para eliminar contaminantes, con un sistema de ventilación diseñado para evacuar adecuadamente el aire contaminado.

La zona de hospitalización cuenta con un equipo compartido con otras áreas lo cual no cumple con la normatividad de ventilación mecánica en clínica y hospitales tales como: la mezcla de los flujos de aire acondicionado, y extracción de la misma.

Aislamiento de áreas específicas: Las habitaciones de aislamiento para pacientes con enfermedades transmisibles deben contar con presión negativa para evitar la propagación de contaminantes a otras áreas del hospital. Además, deben estar equipadas con sistemas de filtración adicionales.

Áreas comunes y pasillos: Los pasillos y áreas comunes deben tener un flujo adecuado de aire, sin comprometer la calidad del aire en las habitaciones. La ventilación de estos espacios debe ser suficiente para evitar la acumulación de contaminantes.

Bloque 3

Cuenta con un sistema VRF para administración, auditorio, consultorios y odontología, con unidades fancoil de pared y ductales. Sin embargo, este sistema de redes no es suficiente para cubrir toda el área, incluyendo el parque de coworking en la zona administrativa.

El sistema de redes de los edificios está compuesto de la siguiente manera: red de aguas lluvias o residuales dependiendo del piso, red de aire acondicionado y ventilación, red contra incendio, red de agua, red eléctrica y red de gases medicinales.

Atendiendo a esta solicitud el día 27 de marzo de 2025 se llevó cabo un comité en las oficinas del Ministerio de Salud y Protección Social, durante la cual se suscribieron compromisos que incluían la entrega de la revisión y ajuste de los diseños del sistema HVAC.

El 18 de abril recibimos el oficio HGM24052024-66, a través del cual se hizo entrega de los diseños del sistema HVAC.

El 23 de abril se remitió el oficio OFC-105-INTERHOSPITAL-2024 mediante el cual se realizaron las siguientes observaciones a los diseños entregados: No se especifican posibles afectaciones a otras redes por las modificaciones al sistema HVAC, ni se incluyen las especificaciones técnicas, el presupuesto, la memoria de cantidades o el análisis de precios. Se

solicita remitir esta información en un plazo máximo de tres (3) días calendario para avanzar con la evaluación del proyecto.

En atención a la solicitud del contratista mediante oficio HGM24052024-70 del 26 de abril, se convoca a mesa técnica, con el fin de reactivar el análisis técnico conjunto.

El 5 de mayo de 2025 mediante oficio OFC-111-INTERHOSPITAL-2024, se reitera la solicitud de información técnica y presupuestal del sistema HVAC, aún no recibida. Se otorga un plazo máximo de un (1) día calendario para su entrega, según los compromisos establecidos.

A la fecha el contratista no ha hecho entrega de los diseños definitivos, para su revisión y aprobación.

4.6.6 Seguimiento al plan social

Entendiendo que una comunidad desinformada es una comunidad complicada, inadvertida y excluida, se comprende que es necesario organizar encuentros de información, comunicación, intercambio e interacción entre la comunidad, el contratista y la interventoría, que permitan fortalecer por un lado, la relación con la población de influencia directa beneficiada con la obra que permitan el desarrollo de los procesos orientados hacia la asimilación, aceptación y apropiación de la obra, por medio de una construcción unida, debido a que esta entra en el espacio y el territorio circundante, transformando durante la fase de ejecución las costumbres diarias de la comunidad.

Por medio de este programa se busca realizar estrategias de comunicación que favorezcan a crear y consolidar fuentes de comunicación entre la comunidad y el contratista.

El primer paso para general estos canales de comunicación es la instalación de la valla informativa de la obra como medio de divulgación:



Imagen 15 Valla

A la fecha del presente informe, no se han registrado PQR o solicitudes, peticiones o reclamos, se realizó una reunión informativa y estableció el punto de atención a la comunidad los días martes y jueves, en el campamento de obra, en el horario habitual de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

En cuanto al manejo de la infraestructura aledaña se realizó levantamiento topográfico para la verificación de los linderos del predio aledaño con la asistencia de un topógrafo. Las coordenadas fueron confirmadas, quedando todo en conformidad con las especificaciones de la propiedad del hospital; por otro lado, la vía destapada al lado derecho de la obra ha sido mejorada con material triturado y se ha realizado un seguimiento riguroso de la estructura vial aledaña, la cual está siendo utilizada por los vehículos pesados, tales como mixers que transportan concreto, volquetas que retiran material de excavación y camiones que ingresan con acero. Por último, en el fin de buscar generar el menor impacto en Viviendas Aledañas se han llevado a cabo visitas para monitorear el impacto de la construcción. Hasta la fecha, no se han reportado novedades o quejas por parte de los residentes.

Se llevó a cabo la reunión mensual (virtual) con representantes de las acciones comunales y veedores, programada según el cronograma establecido.

Durante este periodo se ha revisado el informe de seguimiento social entregado por el contratista, se puede evidenciar que se han desarrollado las actividades pertinentes para dar

cumplimiento a las labores de socialización y divulgación de los temas referentes a la obra que tienen como objetivos mejorar la comunicación, fomentar la participación, garantizar la transparencia y responder inquietudes.

En el marco del componente social del proyecto, se realizó una jornada lúdico-pedagógica con los niños del CDI cercano a la obra, en conmemoración del mes de la Afrocolombianidad. La actividad incluyó cuentos, bailes, juegos tradicionales y dinámicas recreativas que destacaron la riqueza cultural afrocolombiana, fomentando el respeto por la diversidad y el reconocimiento de las raíces. Al cierre, se ofreció un refrigerio como gesto de integración y cuidado.



Imagen 16 Actividades con la comunidad

4.6.7 Seguimiento al plan de manejo ambiental

En cumplimiento de los requerimientos contractuales y tomando como fundamento las buenas prácticas de ingeniería, la demanda de recursos naturales, el cumplimiento de la normatividad vigente y basados en los programas propuestos en la Guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura, se hace este seguimiento mensual teniendo como eje fundamental minimizar y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se generan con la construcción de la obra que se adelanta, así como la protección de la salud y el bienestar de todos los trabajadores y la satisfacción de los grupos de interés.

Es entonces que se relaciona la evolución y progreso respectivo de cada una de las actividades contempladas dentro de la obra, en aspectos como: Gestión ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Para la elaboración del presente informe de seguimiento se tuvieron en cuenta las normas legales vigentes, que se relacionan a continuación:

AMBIENTAL Y SG-SST	
Ley 9 de 1979:	Por el cual se dictan medidas sanitarias
Resolución 0312 de 2019:	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
Resolución 1401 de 2007:	Investigación y reportes de todos los incidentes y accidentes laborales.
LEY 1562 de 2012:	Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otra disposición en materia de salud ocupacional
Decreto 1772 de 1994:	Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos laboral.
Resolución 2400 de 1979:	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
Resolución 156 del 2005:	"Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones"
Resolución 2346 del 2007:	Por la cual se regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales
Resolución 1918 de 2009:	Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones
Resolución 2413 de 1979:	Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción
Resolución 2844 de 2007:	Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional basadas en la evidencia
Decreto 614 de 1984:	Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de la Salud Ocupacional en el país.
Resolución 1016 de 1989:	Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y formas de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
LEY 430 1998:	Por el cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Resolución 2291 de 2010:	Por el cual se amplía el plazo establecido en el artículo 4 de la resolución 736 de 2009 y se citan otras disposiciones
Resolución 1409 de 2012:	Reglamento de Seguridad Para Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas
Resolución 2013 de 1986:	Por el Cual se Reglamenta la Organización y funcionamiento de los Comités de Medicina Higiene y Seguridad Industrial en los Lugares de Trabajo.
Resolución 2646 de 2008:	Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación evaluación y prevención de los factores de riesgo psicosocial por estrés ocupacional.
Decreto 1670 de 2007:	Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al sistema de la protección social y para la obligatoriedad del uso de la planilla integrada de liquidación de aportes.

AMBIENTAL Y SG-SST	
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 (Ministerio Ambiente):	Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. En lo pertinente al manejo de escombros esta Resolución regula el debido cubrimiento de escombros mientras se encuentran en el frente de trabajo, así como las especificaciones de los automotores que los transporten y los permisos que deben acreditar los dueños de los lugares donde se han de disponer definitivamente.
Decreto 948 del 5 de junio de 1995 (Ministerio Ambiente):	"Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76del Decreto Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire". Modificado por el Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995.Este decreto se menciona en este punto por guardar íntima relación con el tema de escombros si se tiene en cuenta que dentro de su articulado señala la obligación de almacenarlos de tal forma que no se generen partículas al aire.
Resolución 2413 de 1979 (Ministerio Trabajo):	Por la cual se reglamenta la higiene y seguridad para la industria de la construcción.
Decreto Ley 2811/74:	Código de Recursos Naturales.
Ley 9/79:	Código Sanitario Nacional.
Ley 769/02:	Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Ley 491/99:	Define los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal.

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

Aseo y limpieza baños provisionales

se realiza limpieza tres veces por semana en los baños en el frente de obras con el objetivo de contribuir a las buenas prácticas que alimenta la buena higiene en el trabajador y ayudan a evitar la contaminación cruzada a efectos de salvaguardar la salud y seguridad de todos, evitando reducir la probabilidad de albergar hongos, virus y bacterias perjudiciales para la salud.



Imagen 17 Aseo baterias sanitarias

Manejo de equipos

Los vehículos tipo volqueta encargados del transporte de material y/o residuos deben contar con elementos tipo barreras de protección que eviten que el material se disperse por acción del viento durante los trayectos del vehículo hasta su destino final. Las barreras pueden ser tipo carpas, precintos y/o amarres, así mismo se verifica periódicamente que los vehículos se encuentren al día en cuanto a mantenimiento y documentación.



Imagen 18 Manejo de vehículos

Manejo de residuos

Se cuenta en la obra con un plan de manejo de residuos sólidos de construcción y demolición que contempla prevención y reducción, recolección y transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de estos residuos. Se establece en este procedimiento en obra para gestionar residuos sólidos de tipo doméstico y de construcción y demolición (RCD) desde su recolección, pasando por su separación, hasta su reutilización, reciclaje o disposición.

Se da estricto cumplimiento a la Resolución No. 0472 del 2017 modificada por la resolución 1257 de 2021 “por la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD” o la norma que lo modifique o sustituya. De esta manera inicialmente se debe planear adecuadamente la obra, determinando las cantidades necesarias de materiales de construcción, de tal manera que se eviten perdidas de materiales.

o Se dispone de varios sitios de almacenamiento temporal para RCD, estos sitios están situados en puntos que no afectan el ecosistema.

o El lugar de almacenamiento esta adecuadamente señalizado, se evita la dispersión de material particulado.

o El material sobrante se encuentra en puntos del frente de obra, durante este mes de septiembre se ha hecho cargue y descargue de material RCD en obra, y este material se ha dispuesto en un lote para donación por medio del municipio, se han donado más de 1.995m3 de material de excavación en el mes de septiembre, las maquinas siguen realizando actividades de excavación mecánica y relleno de zapatas en frente de obra.

o La disposición del material sobrante (RCD) se reutiliza como relleno en frente de obra, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

o Los materiales sobrantes que se reutilizan en obra están almacenados en un sitio específico y están debidamente señalizados, se minimiza la posibilidad de dispersión del material particulado evitando incidentes ambientales.

o En cumplimiento a lo establecido en la resolución 1257 de 2021 se usará el 20% de material sobrante dentro del desarrollo de la obra como material de relleno y paisajismo



MUNICIPIO DE COVEÑAS | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN OBRAS PUBLICAS Y SANEAMIENTO BÁSICO.

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPAL DE COVEÑAS- SUCRE.

Que, en atención a solicitud realizada a este despacho por **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ,** representante legal del **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE** identificada con NIT 901.811.441-3, en la cual solicita autorización para la disposición de material producto de los trabajos que se realizan en el marco del **CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023** Cuyo Objeto es **"CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS-SUCRE.**

Teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con Escombrera para disponer RCD, esta entidad AUTORIZA donar el material producto de las actividades constructivas en predio referenciado con cedula catastral **70221010200460101000**, cuya ubicación se encuentra en el sector EL EDEN, zona urbana del municipio de Coveñas, acuerdo a solicitud radicada a esta secretaría, el día 31 de julio del año en curso.

Es de anotar que el material a disponer se prohíbe arrojar en zonas de humedales y/o manglares.

Para mayor constancia se firma en Coveñas, a los (01) días del mes de agosto de 2024.

GERMAN EDUARDO ALVARINO NOVOA
Secretario de Planeación Municipal

Proyectó: Sugey Ayala
P.U Secretaria de Planeación

ALCALDÍA DE COVEÑAS, SUCRE
República de Colombia – Departamento de Sucre – Municipio de Coveñas
NIT: 823.003.543-7 - Calle 9B Nro. 23A – 15. Código postal: 706050
planeacion@covenas-sucre.gov.co – www.covenas-sucre.gov.co

Imagen 19 Acta donación tierra

Disposición de residuos en obra

Se instalaron puntos ecológicos en frente de obra para que los trabajadores no arrojen residuos al suelo y al finalizar la jornada laboral se llevan los residuos a su disposición final, en este punto pasa INTERASEO y es donde son llevados a su destino final en el relleno sanitario el OASIS en el municipio de Sincelejo, se está esperando el recibo de energía para que la empresa pueda generar el certificado de los residuos sólidos que está recibiendo. Se realiza charlas al personal en obras para el manejo y disposición de residuos sólidos en obras del mismo modo se dispone de un punto donde se está acumulando los residuos peligrosos como bolsas de cemento ue son corrosivos y nocivos para la salud.



Imagen 20 Disposición residuos

El día 25 de marzo de 2025, se radico oficio OFC-088-INTERHOSPITAL-2024, mediante el cual, se solicitó la implementación y/o mejora del plan de aseo y mantenimiento periódico, asegurando que los trabajadores cuenten con los recursos adecuados para su cumplimiento.

Señalización de obra

Se realiza la actividad de señalización en obra con el fin de evitar accidentes e incidentes laborales, se realiza la señalización para entrada y salida de vehículos en obra con un paletero evitando el tráfico vehicular.



Imagen 21 Señalización

Suministro de agua en obra

Se están suministrando 24 pacas de agua diariamente, estas se mantienen en cavas y se le entrega a cada grupo en frente de obra para su hidratación.



Imagen 22 Suministro de agua en la obra

PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS EN OBRA

En obra se cuenta con dos tanques de almacenamiento de 2000L c/u en el mes de septiembre, con el fin de proveer de agua el proyecto durante el tiempo que lo requiera.

Se anexa informe ambiental entregado por el contratista de obra.



Imagen 23 Almacenamiento agua

4.6.8 Seguimientos protocolos plan SST

Se remite el informe SST del contratista de obra donde se muestra el cumplimiento a los requisitos contractuales y normatividad vigente, tales como:

- Pago de aporte al sistema de seguridad social
- Designación responsable sst
- Plan de trabajo y cronograma de capacitaciones
- Inducción personal
- Notificación de riesgo.

- Desarrollo de capacitaciones en sst.
- Subprograma de medicina preventiva y del trabajo
  Evaluaciones medicas ocupacionales
- Diagnóstico de condiciones de salud
- Perfil sociodemográfico del proyecto
- Sistema de vigilancia epidemiológico
- Manejo accidentalidad y ausentismo por causa médica
- Entrega de dotaciones y elementos de protección personal
- Inspecciones planeadas de seguridad y salud en el trabajo
- Reporte de actos y condiciones inseguras
- Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Sustancias químicas
- Permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro
- Herramientas, volquetas, máquinas y equipos
- Manejo de maquinaria, vehículo y equipos
- Instalación de señalización y demarcación en la obra
- Establecimiento del punto de hidratación
- Seguimiento y control a subcontratistas
- Baños resolución 2400 de 1979.
- Comité paritario o vigía en seguridad y salud en el trabajo
- Brigadas de aseo.

4.6.9 Actas de vecindad

Para la obra “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”, se realizaron actas de vecindad de los predios aledaños a la vía y a los predios aledaños al lote donde se llevará a cabo la obra, en dichas actas se estableció el estado actual de las edificaciones o elementos existentes. (Anexo 10 – Informe 1).

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el presente contrato de obra la Gobernación de Sucre abrió el Concurso de Méritos No. CM-001-20 el cual fue adjudicado mediante Resolución 1606 del 12 de abril de 2024, contempla la ejecución de actividades de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”, En el cuadro a continuación se relaciona la información general del contrato de interventoría:

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
PROCESO DE SELECCIÓN No.	CM-001-2024
NUMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.6218818
TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS
CONTRATO NUMERO	CM-001-24
FECHA DE SUSCRIPCION	24 DE ABRIL DE 2024
CONTRATANTE	GOBERNACION DE SUCRE
LOCALIZACION	COVEÑAS – SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024– NIT No. 901823436-8 / Representante legal HUGO HERNAN HERRERA G, Integrado por: ANDRES FELIPE BOTERO MARIN – participación 70% GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS S.A.S – participación 30%
OBJETO	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”.	
SUPERVISOR	ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE – Gobernación de Sucre
PLAZO DE EJECUCION	18 MESES
FECHA INICIO	31 DE MAYO 2024
FECHA VENCIMIENTO INICIAL	30 NOVIEMBRE 2025
VALOR INICIAL	$1.330.217.540
VALOR ANTICIPO	NO APLICA

Tabla 25 Información general Contrato interventoría

- **Presupuesto de interventoría**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"							CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
OFERTA ECONOMICA							
	ACTIVIDAD	CANTIDAD	CATEGORÍA MÍNIMA	Vr. M/H	TOTAL MESES	% DEDICACIÓN MIN.	V. UNITARIO
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE . (RESIDENTE , Y AUXILIARES)						$ 506.295.000,00
1,1	Director de Interventoría	1	Director Perfil 1	$ 10.000.000,00	18	50,00%	$ 90.000.000,00
1,2	Residente de Interventoría	1	Residente Perfil 1	$ 6.000.000,00	18	100,00%	$ 108.000.000,00
1,3	Auxiliar de Ingeniería	1	Tecnólogo perfil 1	$ 2.000.000,00	18	100,00%	$ 36.000.000,00
1,4	Ingeniero Topográfico	1	Profesional Perfil 2	$ 4.000.000,00	18	20,00%	$ 14.400.000,00
1,5	Gestor SISOMA	1	Profesional Perfil 3	$ 4.000.000,00	18	100,00%	$ 72.000.000,00
1,6	Arquitecto - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	50,00%	$ 45.000.000,00
1,7	Ingeniero Civil - Asesor Estructural	1	Especialista Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,8	Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero Civil Especialista en Hidráulica	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,9	Ingeniero Electricista - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,1	Ingeniero Mecánico - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,11	Ingeniero de comunicaciones y/o ingeniero electrónico - Asesor	1	Profesional Perfil 1	$ 5.000.000,00	18	30,00%	$ 27.000.000,00
1,12	Abogado	1	Especialista Perfil 2	$ 3.000.000,00	18	5,00%	$ 2.700.000,00
1,13	Contador	1	Profesional Perfil 3	$ 3.550.000,00	18	5,00%	$ 3.195.000,00
2	PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL						$ 9.720.000,00
2,1	Cadenero 1	1	Tecnico Perfil 2	$ 1.800.000,00	18	15,00%	$ 4.860.000,00
2,2	Cadenero 2	1	Tecnico Perfil 2	$ 1.800.000,00	18	15,00%	$ 4.860.000,00
3	SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECÍFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere a la nómina del personal que labora en la oficina del interventor en forma regular y permanente, y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la Interventoria)						$ 19.440.000,00
3,1	Secretaria	1	Personal Adm. perfil 1	$ 2.000.000,00	18	30,00%	$ 10.800.000,00
3,2	Mensajero	1	Personal Adm. perfil 2	$ 1.600.000,00	18	30,00%	$ 8.640.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO						$ 535.455.000,00
	SUBTOTAL FACTOR MULTIPLICADOR						2,09
	Costo directo						$ 1.117.829.865,65
	Iva						$ 212.387.674,48
	Costo total						$ 1.330.217.540,14

Tabla 26 Presupuesto interventoría

5.1 Informe de gestión de interventoría

Actividades realizadas por el interventor

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades en cumplimiento de las obligaciones contractuales:

- Revisión del cronograma de obra y plan de inversiones del proyecto.
- Revisión del plan de calidad.
- Convocatoria y desarrollo de los comités de obra de seguimiento del proyecto.
- Recorridos de obra.
- Asistencia a reuniones programadas.
- Elaboración informe mensual
- Elaboración de oficios para dar respuesta a las solicitudes del contratista de obra o del departamento de Sucre.
- Elaboración de oficios para solicitar al contratista el cumplimiento de sus obligaciones

5.1.1 Acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA			
1	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ENTIDAD y el contratista, por una parte, y entre la ENTIDAD y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del contratista por la otra.	SI	N/A
2	Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en la resolución mediante la cual se comunica la aceptación de la oferta, los estudios previos, los pliegos de condiciones, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma, la oferta presentada por el PROPONENTE y todos los documentos de respaldo y complementarios a los demás surgidos durante el proceso contractual y su desarrollo, así como lo aplicable en cuanto a leyes, normas y demás de carácter jurídico, legal y contractual.	SI	EN ELECUCION
3	Ejecutar las obligaciones en los términos y plazos ofertados acorde con el proceso contractual.	SI	Suscripción acta de inicio
4	Sufragar los gastos a los que legalmente haya lugar para la formalización, legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.	SI	Se realizaron los pagos de estampillas y demás requeridos para la legalización
5	Otorgar las pólizas dentro de los términos que solicite la ENTIDAD.	SI	Se han suscritos las pólizas requeridas
6	Aceptar la Vigilancia, supervisión y control por parte de la ENTIDAD y/o su Interventoría.	SI	Aceptar y acatar instrucciones por parte de la supervisión
7	Informar oportunamente por escrito al DEPARTAMENTO, directamente o a través del SUPERVISOR, de los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	SI	EN EJECUCION
8	Presentar debidamente soportados, los informes que se le requieran.	SI	Entrega informe mensual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12
9	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones o el establecimiento de obstáculos que puedan presentar para retardar o trabar la ejecución contractual.	SI	EN EJECUCION
10	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y consultada para el desarrollo del objeto del contrato.	SI	EN EJECUCION
11	No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, de lo cual deberá	SI	EN EJECUCION

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
	informar con inmediatez a la administración Departamental y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.		
12	Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por La entidad.	SI	Se entrego la documentación requerida
13	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas entregadas por el Departamento de Sucre contenidas en la propuesta presentada y pliego de condiciones.	SI	EN EJECUCION
14	Suministrar tanto en calidad como en cantidad, los servicios y demás elementos objeto del contrato.	SI	EN EJECUCION
15	Responder por los impuestos, contribuciones y demás obligaciones de carácter legal u ordenanza que genere la legalización del contrato.	SI	Se legalizo el contrato conforme a lo estipulado
16	Hacer la entrega de los servicios contratados dentro del tiempo pactado según programación de suministro y flujo de caja presentado por el proponente.	SI	EN EJECUCION
17	Garantizar el cumplimiento del contrato, tanto con la buena calidad del servicio, como en el tiempo de entrega.	SI	Se solicito inicio de proceso sancionatorio al contratista
18	Verificar el cumplimiento de los Planes de Calidad, Plan de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito y/u otros planes aplicables al contrato de obra, así como, la programación de obra y demás entregables que el contratista deba presentar conforme a sus obligaciones contractuales.	SI	EN EJECUCION
19	Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.	SI	EN EJECUCION
20	Acatar las instrucciones del Supervisor y/o Interventor del contrato.	SI	EN EJECUCION
21	Acreditar el pago de los aportes de sus empleados y de todo el recurso humano de la oferta, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal, según el caso; con fundamento en lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes.	SI	Entregados
22	Las contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015, en cuanto a sus derechos y deberes.	SI	EN EJECUCION

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
23	Las demás que sean de injerencia acorde con la contratación que se pretende a través de los presentes estudios previos.	SI	EN EJECUCION
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA			
1	Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.	SI	Suscrita
2	Garantizar los servicios prestados para la consecución del Objeto contractual dentro de los plazos especificados y estipulados, optimizando.	SI	EN EJECUCION
3	Ejecutar el objeto del contrato, prestar los servicios, objeto de este contrato cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas planteadas	SI	EN EJECUCION
4	Tener capacidad para suministrar personal exigido según corresponda, certificado para acreditar sus conocimientos en el área respectiva para ejecutar las obras, prestar los servicios y hacer los suministros que le corresponden.	SI	EN EJECUCION
5	Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).	SI	Informe mensual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 e Informes quincenales
6	Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el valor del mismo.	SI	Verificación en Informe mensual 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 y 12
7	Invertir los recursos del Departamento de tal forma que se cumplan con el objeto del contrato.	SI	EN EJECUCION
8	Entregar la totalidad de las cantidades establecidas con sus especificaciones técnicas.	SI	EN EJECUCION
9	Coordinar con el supervisor del contrato las diferentes actividades para el desarrollo del objeto del mismo.	SI	EN EJECUCION
10	Dar oportuna respuesta a las solicitudes y requerimientos que realice el supervisor del contrato, a través de los funcionarios competentes para ellos.	SI	EN EJECUCION
11	Guardar plena reserva a propósito de todos los datos e informaciones que obtenga en desarrollo o con ocasión del contrato.	SI	EN EJECUCION
12	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrolló en virtud del contrato, cuando ellos causen perjuicio a la administración o a terceros.	SI	EN EJECUCION
13	Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, Nacionales, Departamentales o Municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato.	SI	EN EJECUCION
14	Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la secretaria de infraestructura.	SI	EN EJECUCION

No.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	ANOTACIÓN
15	5.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y dificultades.	SI	EN EJECUCION
16	Todas las demás inherentes y relacionadas con el objeto contractual en cumplimiento de las leyes, normas y argumentos comerciales, tributarios, administrativos, de carácter técnico, ambiental, jurídico, legal y contractual.	SI	EN EJECUCION

Tabla 27 Obligaciones de la interventoría

5.1.2 Control profesionales y especialistas de la interventoría

En la siguiente tabla se evidencia el personal profesional que conforma el equipo de trabajo de la interventoría, de acuerdo con los requisitos de los pliegos, así:

NOMBRE	CARGO	DEDICACION
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO M	Director de interventoría	50%
CAMILO JOSE PEREZ VELLON	Residente técnico Arquitecto	100%
JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO	Gestor SISOMA	100%
MARGARITA MARIA GIRALDO C	Arquitecto asesor	50%
LIBARTO JOSE GARCIA H	Asesor estructural	30%
ANGELICA AIDEE CORONADO A	Ingeniero sanitario y ambiental	30%
GELSON JULIO GUERRA ALMARO	Asesor - electricista	30%
KAREN MELISSA FORERO	Ing. Mecánico - asesor	30%
JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO	Ing. Electrónico - asesor	30%
IRWIN RAUL PUERTA ROMERO	Abogado	5%
DAVID FERNANDO BOTERO M	Auxiliar de ingeniería	100%
YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA	Ing. Topográfico	20%
ANA KARELIS LOPEZ BEDOYA	Contador	5%
CRISTIAN ANDRES CIFUENTES B	Cadeneros	15%
PEDRO CAVADIA O	Cadeneros	15%
LUZ MARIA C. DE GIRALDO	Secretaria	30%
PEDRO CAVADIA O	mensajero	30%

Tabla 28 Personal mínimo interventoría.

Se anexa FSI-003 informe gestión interventoría e informes de especialistas.

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	FSI-800-019
		VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2024

PERIODO DEL INFORME	MAYO	FECHA	31/05/2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	CM-001-24		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		

NUMERO DE PLANILLA:					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:				1 de septiembre de 2024	a	##########		
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
LUZ MARIA CALDERON DE GIRALDO	Secretaria	24.488.537	$ 2.000.000,00	15	EPS SURA	$ 26.000,00	COLPENSIONES	$ -	$ 3.400,00			$ 26.000,00	$ 55.400,00
KAREN MELISSA CAVADIA FORERO	Ing. Mecanico - asesor	1.067.900.438	$ 5.000.000,00	9	EPS MUTUAL SER	$ 60.000,00	COLPENSIONES	$ 240.000,00	$ 7.900,00			$ 60.000,00	$ 367.900,00
CRISTIAN ANDRES CIFUENTES B	Cadenero	1.094.882.382	$ 1.800.000,00	30	NUEVA EPS	$ 52.000,00	PORVENIR	$ 208.000,00	$ 1.900,00			$ 13.900,00	$ 275.800,00
MARGARITA MARIA GIRALDO C	Arquitecto asesor	41.940.151	$ 5.000.000,00	30	NUEVA EPS	$ 100.000,00	PROTECCION	$ 400.000,00	$ 13.600,00				$ 513.600,00
ANA KARELIS LOPEZ BEDOYA	Contador	44.003.385	$ 3.550.000,00	5	SALUD TOTAL	$ 8.700,00	PROTECCION	$ 34.700,00	$ 1.200,00			$ 8.700,00	
CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN	Residente técnico Arquitecto	79.788.484	$ 6.000.000,00	25	SALUD TOTAL	$ 200.000,00	PORVENIR	$ 800.000,00	$ 31.400,00			$ 240.000,00	$ 1.271.400,00
JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO	Gestor SISOMA	72.342.940	$ 4.000.000,00	20	EPS MUTUAL SER	$ 106.700,00	COLPENSIONES	$ 426.700,00	$ 14.000,00			$ 106.700,00	$ 654.100,00
*LIBARDO JOSE GARCIA H	Asesor estructural	79.790.222	$ 5.000.000,00	30	EPS SURA	$ 217.500,00	COLPENSIONES	$ 278.400,00	$ 9.100,00				$ 505.000,00
*ANGELICA AIDEE CORONADO A	Ingeniero sanitario y ambiental	43.156.516	$ 5.000.000,00	30	SALUD TOTAL	$ 162.500,00	PORVENIR	$ 208.000,00	$ 13.600,00			$ 26.000,00	$ 410.100,00
*GELSON JULIO GUERRA ALMARO	Asesor - electicista	78.673.385	$ 5.000.000,00	30	SANITAS	$ 162.500,00	COLFONDOS	$ 208.000,00	$ 90.500,00				$ 461.000,00
*JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO	Ing. Electronico - asesor	1.094.909.269	$ 5.000.000,00	30	EPS SURA	$ 202.500,00	PROTECCION	$ 259.200,00	$ 8.500,00				$ 470.200,00
*IRWIN RAUL PUERTA ROMERO	Abogado	10.766.570	$ 3.000.000,00	30	NUEVA EPS	$ 163.100,00	COLFONDOS	$ 208.700,00					$ 371.800,00
*YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA	Ing. Topografico	1.069.490.072	$ 4.000.000,00	30	NUEVA EPS	$ 162.500,00	PORVENIR	$ 208.000,00	$ 6.800,00				$ 377.300,00
*PEDRO CAVADIA O	Cadenero/mensajero	78.689.489	$ 1.800.000,00	30	SALUD TOTAL	$ 200.000,00	COLPENSIONES	$ 256.000,00	$ 69.600,00				$ 525.600,00
												Total	$ 3.138.200,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **DD/MM/AA**

Firma: _____
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma: _____
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES:
* ESTOS PROFESIONALES ESTAN VINCULADOS AL CONSORCIO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGAN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTES

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**MAYO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
VALOR DEL CONTRATO:	$1.330.217.540
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$1.330.217.540
OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
VALOR DEL PROYECTO:	$1.330.217.540
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$1.330.217.540
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2024
CORREO ELECTRONICO:	Inter.hospital24@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 MAYO 2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 30 DEL 2025
Meses	Días

SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

A. INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

1. AVANCE ACUMULADO PROPUESTA ECONOMICA VIGENTE

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**MAYO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 01/MARZO/2025 AL 31/MARZO/2025

CATEGORIA	CARGO	No. Personas	% dedicacion	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
PERFIL PROFESIONAL						
DIRECTOR PERFIL 1 OCTAVIO CALIXTO CABALLERO	Director de interventoría	1	50%	12	$ 10.000.000,00	$ 60.000.000,00
RESIDENTE PERFIL 1 CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN	Residente de interventoría	1	100%	12	$ 6.000.000,00	$ 72.000.000,00
TECNOLOGO PERFIL 1 DAVID FERNANDO BOTERO M	Auxiliar de Ingeniería	1	100%	12	$ 2.000.000,00	$ 24.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 2 YEISON DAVID SALABARRIA	Ingeniero Topográfico	1	20%	12	$ 4.000.000,00	$ 9.600.000,00
PROFESIONAL PERFIL 3 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO	Gestor SISOMA	1	100%	12	$ 4.000.000,00	$ 48.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 SOFIA CAROLINA FLOREZ	Arquitecto - Asesor	1	50%	12	$ 5.000.000,00	$ 30.000.000,00
ESPECIALISTA PERFIL 1 LIBARDO JOSE GARCIA H	Ingeniero Civil - Estructural	1	30%	12	$ 5.000.000,00	$ 18.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 ANGELICA AIDEE CORONADO A	Ingeniero Sanitario	1	30%	12	$ 5.000.000,00	$ 18.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 GELSON JULIO GUERRA ALMARO	Ingeniero Electricista - Asesor	1	30%	12	$ 5.000.000,00	$ 18.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 KAREN MELISSA CAVADIA F	Ingeniero Mecánico -	1	30%	12	$ 5.000.000,00	$ 18.000.000,00
PROFESIONAL PERFIL 1 JUAN SEBASTIAN HERRERA	ingeniero electrónico	1	30%	12	$ 5.000.000,00	$ 18.000.000,00
ESPECIALISTA PERFIL 2 IRWIN RAUL PUERTA ROMERO	Abogado	1	5%	12	$ 3.000.000,00	$ 1.800.000,00
PROFESIONAL PERFIL 3 ANA KARELIS LOPEZ BEDOYA	Contador	1	5%	12	$ 3.550.000,00	$ 2.130.000,00
PERFIL TECNICO						
TECNICO PERFIL 2 CRISTIAN ANDRES CIFUENTES B	Cadenero	1	15%	12	$ 1.800.000,00	$ 3.240.000,00
TECNICO PERFIL 2 PEDRO CAVADIA O	Cadenero	1	15%	12	$ 1.800.000,00	$ 3.240.000,00
PERFIL AUXILIAR						
PERSONAL ADM. PERFIL 1 LUZ MARIA C. DE GIRALDO	Secretaria	1	30%	12	$ 2.000.000,00	$ 7.200.000,00
PERSONAL ADM. PERFIL 2 PEDRO CAVADIA O	Mensajero	1	30%	12	$ 1.600.000,00	$ 5.760.000,00
SUBTOTAL PERSONAL						$ 356.970.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,09
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 746.067.300,00**

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**MAYO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			


COSTOS DIRECTOS					
TIPO	**CANTIDAD**	**%**	**MESES**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL	1	100	12	$ 62.172.275,00	**$ 746.067.300,00**
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 746.067.300,00
				TOTAL COSTOS	$ 746.067.300,00
				IVA 19%	$ 141.752.787,00
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 887.820.087,00**

Avance físico programado 61.16% y avance físico ejecutado 61.16%.

2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE INTERVENTORIA

MENSUAL	**PROGRAMADO**				**EJECUTADO**			
	MENSUAL		**ACUMULADO**		**MENSUAL**		**ACUMULADO**	
Periodo 1	5,56%	$ 73.985.007,25	5,56%	$ 73.985.007,25	5,56%	$ 73.985.007,25	5,56%	$ 73.985.007,25
Periodo 2	5,56%	$ 73.985.007,25	11,12%	$ 147.970.014,50	5,56%	$ 73.985.007,25	11,12%	$ 147.970.014,50
Periodo 3	5,56%	$ 73.985.007,25	16,68%	$ 221.955.021,75	5,56%	$ 73.985.007,25	16,68%	$ 221.955.021,75
Periodo 4	5,56%	$ 73.985.007,25	22,24%	$ 295.940.029,00	5,56%	$ 73.985.007,25	22,24%	$ 295.940.029,00
Periodo 5	5,56%	$ 73.985.007,25	27,80%	$ 369.925.036,25	5,56%	$ 73.985.007,25	27,80%	$ 369.925.036,25
Periodo 6	5,56%	$ 73.985.007,25	33,36%	$ 443.910.043,50	5,56%	$ 73.985.007,25	33,36%	$ 443.910.043,50
Periodo 7	5,56%	$ 73.985.007,25	38,92%	$ 517.895.050,75	5,56%	$ 73.985.007,25	38,92%	$ 517.895.050,75
Periodo 8	5,56%	$ 73.985.007,25	44.48%	$ 591.880.058,00	5.56%	$ 73.985.007,25	44.48%	$ 591.880.058,00
Periodo 9	5,56%	$ 73.985.007,25	50.04%	$ 665.865.065,25	5.56%	$ 73.985.007,25	44.48%	$ 665.865.065,25
Periodo 10	5,56%	$ 73.985.007,25	55.60%	$ 739.850.072,50	5.56%	$ 73.985.007,25	55.60%	$ 739.850.072,50
Periodo 11	5,56%	$ 73.985.007,25	61.16%	$ 813.835.079,75	5.56%	$ 73.985.007,25	61.16%	$ 813.835.079,75
Periodo 12	5,56%	$ 73.985.007,25	66.72%	$ 887.820.087,00	5.56%	$ 73.985.007,25	66.72%	$ 887.820.087,00

Grafica

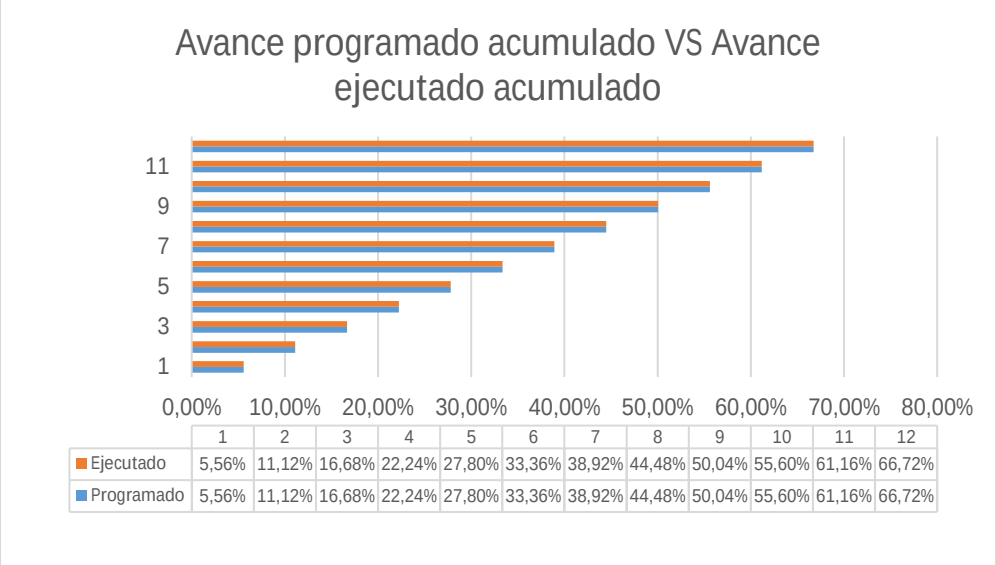

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**		**PERIODO**	**MAYO**			
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**							
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**			
		OTROS(Especifique)		**PNG**					

3. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida en la CLAUSULA 8 del contrato es la siguiente: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato hasta un 95% según avance de ejecución y los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de las actividades por parte del supervisor; No obstante, los giros estarán supeditados a las transferencias programadas en el marco de la ejecución del Contrato Específico No. 2230170, suscrito entre ENTerritorio, MINSALUD y Departamento de Sucre. Para lo cual será requerido certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde Del pago final. Valor interventoría $ 1,330,217,540 conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

Pago final: 5% del valor del contrato, se realizará contra la liquidación del contrato y será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Requisitos para el pago final. Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Elaboración y suscripción de acta final a satisfacción por parte del supervisor.
- Elaboración y presentación de informes de INTERVENTORIA.
- Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo con disponibilidad del PAC.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las obligaciones del contratista establecidas en la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA del contrato realizadas en el periodo de ejecución del informe, con su respectiva justificación:

OBLIGACIONES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.	Se suscribió acta de inicio el día 25 de mayo de 2024
2. Garantizar los servicios prestados para la consecución del Objeto contractual dentro de los plazos especificados y estipulados, optimizando.	EN EJECUCION
3. Ejecutar el objeto del contrato, prestar los servicios, objeto de este contrato cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas planteadas	La ejecución se está llevando a cabo conforme a lo contratado.

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**MAYO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

4. Tener capacidad para suministrar personal exigido según corresponda, certificado para acreditar sus conocimientos en el área respectiva para ejecutar las obras, prestar los servicios y hacer los suministros que le corresponden.	Se cuenta con el personal exigido.
5. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).	Se han presentado los informes de interventoría No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12
6. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objeto de no prestar servicios que excedan el valor del mismo.	Se realiza el seguimiento financiero de la obra.
7. Invertir los recursos del Departamento de tal forma que se cumplan con el objeto del contrato.	Se realiza el seguimiento de la ejecución financiera y técnica.
8. Entregar la totalidad de las cantidades establecidas con sus especificaciones técnicas.	Se realiza el seguimiento de la ejecución financiera y técnica
9. Coordinar con el supervisor del contrato las diferentes actividades para el desarrollo del objeto del mismo.	Se ha mantenido comunicación constante.
10. Dar oportuna respuesta a las solicitudes y requerimientos que realice el supervisor del contrato, a través de los funcionarios competentes para ellos.	Se ha dado respuesta a las solicitudes mediante oficios o de manera verbal.
11. Guardar plena reserva a propósito de todos los datos e informaciones que obtenga en desarrollo o con ocasión del contrato.	EN EJECUCION
12. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrolló en virtud del contrato, cuando ellos causen perjuicio a la administración o a terceros.	EN EJECUCION
13. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, Nacionales, Departamentales o Municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato.	Se realizo el pago de estampillas y demás.
14. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la secretaria de infraestructura.	EN EJECUCION
15. 5.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y dificultades.	Se cumple.
16. Todas las demás inherentes y relacionadas con el objeto contractual en cumplimiento de las leyes, normas y argumentos comerciales, tributarios, administrativos, de carácter técnico, ambiental, jurídico, legal y contractual.	EN EJECUCION

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**MAYO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

5. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA:

En esta sección se describe la gestión técnica a cargo del contratista:

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA Ingeniero Topográfico	• Verificación de localización trazado y replanteo • Verificación de cartera de volúmenes de excavación
JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO Gestor SISOMA	• verificación en obra del uso correcto de los EPP • Verificación de señalización adecuada de los sectores de riesgo de accidente. • Verificación del cumplimiento de las normas SST
SOFIA CAROLINA FLOREZ URUETA Arquitecto – Asesor	• Acompañamiento y verificación de la localización de las edificaciones • Revisión de estudios, diseños y detalles arquitectónicos
LIBARDO JOSE GARCIA H Asesor Estructural	• Acompañamiento y verificación de la localización de elementos estructurales • Revisión de estudios y diseños
ANGELICA AIDEE CORONADO A Ingeniero Sanitario	• Acompañamiento y verificación de la instalación sanitaria e hidráulica para los baños provisionales. • Revisión de estudios y diseños
GELSON JULIO GUERRA ALMARO Ingeniero Electricista	• Acompañamiento en la instalación del medidor eléctrico y en la instalación interna en el campamento • Verificación de los trámites para disponibilidad provisional del servicio
KAREN MELISSA CAVADIA FORERO Ingeniero Mecánico	• Revisión de estudios, diseños y cantidades de obra
JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO Ingeniero electrónico	• Revisión de estudios, diseños y cantidades de obra
IRWIN RAUL PUERTA ROMERO Abogado	• Acompañamiento jurídico
ANA KARELIS LOPEZ BEDOYA Contador	• Acompañamiento en el trámite de apertura de la fiducia para el contrato LP 018-24

Se debe anexar al presente informe, copia de la gestión realizada por cada especialista, debidamente firmado por el profesional.

6. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Oficios y documentos elaborados sobre el desarrollo del proyecto, comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**MAYO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO 2025			
FECHA	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**	**CONSECUTIVO**
2 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE / SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO 800.11-03/SI-0851	OFC-108 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE / SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO 800.11-03/SI-0799 – SOLICITUD ACTUALIZACION DE INFORME	OFC-108 INTERHOSPITAL-2024
2 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SOLICITUD INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP-018 2023.	OFC-109 INTERHOSPITAL-2024
2 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE / SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO 800.11-03/SI-0851	OFC-110 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REVISION DISEÑOS AJUSTADOS SISTEMA HVAC	OFC-111 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP-018-2023.	OFC-112 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	RESPUESTA OFICIO HGM24052024-72 - REPROGRAMACION MESA TÉCNICA	OFC-113 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE / SEC. INFRAESTRUCTURA	REMISION OFICIO HGM29042025-60 – LIQUIDACIÓN FIDEICOMISO	OFC-114 INTERHOSPITAL-2024
8 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE / SEC. INFRAESTRUCTURA	APREMIO POR ATRASO EL PROGRAMA DE OBRA DEL CO-018-2023	OFC-115 INTERHOSPITAL-2024
12 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	COMPROMISOS COMITÉ TECNICO	OFC-116 INTERHOSPITAL-2024
15 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE / SEC. INFRAESTRUCTURA	REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 11.	OFC-117 INTERHOSPITAL-2024
15 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE / SEC. INFRAESTRUCTURA	RADICADO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO. 11	OFC-118 INTERHOSPITAL-2024
19 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	RESPUESTA OFICIO HGM24052024-77 - ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA, CON PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA	OFC-119 INTERHOSPITAL-2024

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**MAYO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

19 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE / SEC. INFRAESTRUCTURA	OFICIO HGM24052024-76– SOLICITUD PRORROGA PARA ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA Y DISEÑOS CON ESTUDIO DE MERCADO	OFC-120 INTERHOSPITAL-2024
23 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	RESPUESTA OFICIO HGM24052024-79 - ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA	OFC-121 INTERHOSPITAL-2024
23 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	CANTIDADES DE OBRA	OFC-121 INTERHOSPITAL-2024
29 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE / SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO HGM24052024-75 – OBJECIÓN MEDIDA DE APREMIO POR INCUMPLIMIENTO	OFC-123 INTERHOSPITAL-2024

7. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°:

Anexo: CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

8. GESTIÓN SOCIAL

8.1 EMPLEOS GENERADOS

EMPLEO	OBRA	INTERVENTORIA
Total empleos generados:	87	21
Empleos directos generados:	67	17
Empleos indirectos generados:	20	4

8.2 CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

INFORME No.	12	FECHA	NOVIEMBRE/2024	PERIODO	MAYO		
CONTRATO N°	CM 001-24	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)		PNG			

CLASIFICACIÓN	DETALLE	OBRA	INTERVENTORIA
Etaria (Edad)	15 a 19 años	1	
Etaria (Edad)	20 a 59 años	65	12
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0	2
Grupos étnicos	Población Indígena		
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana		
Grupos étnicos	Población Raizal		
Género	Masculino	60	9
Género	Femenino	7	5
Población Vulnerable	Desplazados		
Población Vulnerable	Discapacitados		
Población Vulnerable	Víctimas		
Total		67	14

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

2. **GARANTIAS**: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CMT-100010928
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	N/A
ANEXO N°	N/A
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	06/08/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	MUNDIAL

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**MAYO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	31/05/2024	31/05/2026	$133.021.754,00
PRESTACIONES SOCIALES	24/04/2024	30/11/2028	$ 66´510.877,00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2025	30/11/2030	$133.021.754,00

C. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
1		JULIO	5,56%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 73.985.007,25
2		AGOSTO	11,12%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 147.970.014,50
3		SEP	16,68%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 221.955.021,75
4		OCT	22.24%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 295.940.029,00
5		NOV	27.80%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 369.925.036,25
6		DIC	33.36%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 443.910.043,50
7		ENE	38.92%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 517.895.050,75
8		FEB	44.48%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 591.880.058,00
9		MAR	50.04%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 665.865.065,25
10		ABRIL	55.60%	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	$ 739.850.072,50
		TOTALES	**50,04%**	**$ 73.985.007,25**			**$ 739.850.072,50**

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 1/MAYO/2025 AL 31/MAYO/2025

Avance físico ejecutado 66.72% y avance financiero ejecutado 66.72%.

INFORME No.	12	FECHA	NOVIEMBRE/2024	PERIODO	MAYO		
CONTRATO N°	CM 001-24	CODIGO BPIN PROYECTO					
FUENTE DE FINANCIACION		SGPR		CONVENIO		RECURSOS PROPIOS	
		OTROS(Especifique)		PNG			

D. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	INTERVENTORÍA PROFESIONAL, AUXILIAR, TECNICA…	EJECUTADO	%
	N/A		
	OBSERVACIONES Personal de la interventoría y de la obra en reunión con la comunidad		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	ALQUILER, ESTUDIOS DE SUELOS, TOPOGRAFIA…	EJECUTADO	%
	N/A		
	OBSERVACIONES		

E. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Todos los cálculos, proyecciones y representaciones gráficas incluidas en el presente informe se basan en la reprogramación de obra más reciente, la cual constituye el principal insumo técnico para el análisis comparativo del avance físico real frente al cronograma reprogramado.
- Con corte al mes de mayo, se ha evidenciado un atraso acumulado del 40,94%, producto de una ejecución física del 36,50%, frente a un avance programado del 77,44%, según el cronograma vigente. Esta desviación representa un incumplimiento sustancial de las obligaciones contractuales
- Si bien se reconoce que factores externos como las restricciones de movilidad durante las festividades de fin de año pudieron tener un impacto parcial en la ejecución del proyecto, se ha detectado que durante los meses de febrero y marzo continuaron presentándose dificultades operativas internas, atribuibles directamente al contratista,

INFORME No.	**12**	**FECHA**	**NOVIEMBRE/2024**	**PERIODO**	**MAYO**		
CONTRATO N°	**CM 001-24**	**CODIGO BPIN PROYECTO**					
FUENTE DE FINANCIACION		**SGPR**		**CONVENIO**		**RECURSOS PROPIOS**	
		OTROS(Especifique)		**PNG**			

que impidieron el cumplimiento de los frentes de trabajo programados. Estas situaciones no fueron debidamente justificadas ni superadas en los plazos razonables, lo cual evidencia deficiencias en la planificación y en la capacidad operativa del contratista.

- Se reitera la necesidad de que el contratista remita de manera urgente un informe técnico detallado, en el cual identifique, sustente y clasifique los factores que han generado el retraso. Así mismo, debe presentar un Plan de Contingencia integral, técnicamente viable y medible, con metas verificables y mecanismos de seguimiento que permitan mitigar los impactos del atraso actual y prevenir futuros incumplimientos. La no presentación o deficiencia de estos documentos podría constituir un agravante frente a las acciones administrativas que adelante la entidad contratante.
- En atención a los porcentajes de incumplimiento evidenciados y conforme a lo estipulado en el contrato de obra, se recomienda a la entidad iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente, consistente en la imposición de una multa equivalente al 5% del valor del contrato. Dicha sanción se justifica plenamente, toda vez que el número de días de atraso acumulado supera el umbral establecido contractualmente. El valor estimado de la multa asciende a $1.859.069.653,85 (mil ochocientos cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos con ochenta y cinco centavos), monto que deberá ser exigido conforme a los mecanismos contractuales y legales aplicables.
-

F. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los TREINTA Y UN días del mes MAYO del 2025.

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoría
N° MP: 22202090255COR

Firma

CAMILO JOSE PEREZ VELLOJIN
Residente de Interventoría
No.MP: A441522011-79788484

Firma V°B°

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Supervisor

INFORMES ESPECIALISTAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

1. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: ARQUITECTO ASESOR

NOMBRE: MARGARITA MARIA GIRALDO CALDERON

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de mayo de 2025:

- Visitas técnicas a la obra.
- Revisión de estudios, diseños y detalles arquitectónicos.
- Apoyo en la elaboración de correspondencia y demás documentos relacionados con la interventoría.
- Elaboración del acta de pago de la interventoría.
- Apoyo en la elaboración de informes y en la respuesta a las solicitudes presentadas a la interventoría.
- Apoyo en la resolución de consultas técnicas en obra.

Atentamente,



MARGARITA MARIA GIRALDO C
Arquitecto asesor
MP A63012001-41940151
E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

2. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO ELECTRICISTA

NOMBRE: GELSON JULIO GUERRA ALMARO

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de mayo de 2025:

Revisión de estudios y diseños para verificación de cantidades.

Visita de acompañamiento en la localización de los puntos eléctricos.

Apoyo en la resolución de consultas técnicas en obra.

Atentamente,



GELSON JULIO GUERRA ALMARO
Ingeniero electricista
MP BL205-51702
Contrato No. 004-24

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

1. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: ASESOR ESTRUCTURAL

NOMBRE: LIBARDO JOSE GARCIA H

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de mayo de 2025:

Visitas técnicas de verificación de encontrados y demás temas relacionados con la parte estructural.

Entrega de informes o conceptos técnicos.

Apoyo en la resolución de consultas técnicas en obra.

Atentamente,



LIBARDO JOSE GARCIA H
Asesor estructural
MP 25202-77246 CND
Contrato No. 002-24

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

3. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: GESTOR SISOMA

NOMBRE: JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de MAYO del 2025:

- Revisión de la planilla de pago de Seguridad social del personal tanto administrativo como personal en obra.

- Verificación de la realización de capacitaciones en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo tales como: políticas, reglamento de higiene y seguridad, plan de Emergencias, protocolo de bioseguridad, seguridad social, procedimiento etc.

- Verificaciones de la valoración medico ocupación de ingreso a los trabajadores vinculados al proyecto.

- Verificación de las estadísticas del control de ausentismo y accidentalidad de trabajadores directos del contrato de obra LP-018-24.

- Verificación de la entrega y adecuado uso de la dotación y de los diferentes elementos de protección personal, de acuerdo con los controles establecidos en la matriz de identificación del peligro evaluación y valoración de los riesgos, entregada por el contratista.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

- Inspecciones periódicas para la verificación de la señalización, Botiquín, Extintor, EPP, herramientas, etc. Con el fin de identificar los peligros y condiciones existentes; para así tomar las medidas preventivas y correctivas durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto.

- Verificación de la implementación del plan de manejo ambiental.

Atentamente,



JOSE LUIS RODRIGUEZ HERAZO
Gestor SISOMA
MP 08228-269648 ATL

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

4. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO ELECTRONICO

NOMBRE: JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023


CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el presente mes:

- Verificación de estudios, diseños y cantidades de obra
- Apoyo en la revisión de optimización de diseños.

Atentamente,



JUAN SEBASTIAN HERRERA PARDO
Ingeniero Electrónico
MP AN 206-104636
Contrato No. 006-24

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

5. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO MECANICO

NOMBRE: KAREN MELISSA CAVADIA FORERO

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

NOMBRE:

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de mayo:

Apoyo revisión de estudios de rediseño sistema HVAC y cantidades de obra.
Visitas de verificación a la obra.

Atentamente,



KAREN MELISSA CAVADIA FORERO
Ingeniero Mecánico
MP CN230-90220

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

6. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO SANITARIO

NOMBRE: ANGELICA AIDEE CORONADO A

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023


CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de mayo de 2025:

- Revisión de estudios, diseños y cantidades de obra
- Acompañamiento y verificación de las instalaciones sanitarias e hidráulicas.
- Visitas técnicas.

Atentamente,



ANGELICA AIDEE CORONADO A
Ingeniero sanitario
MP 22236108281 COR
Contrato No. 003-24

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTAS

7. GENERALIDADES

ESPECIALISTA: INGENIERO TOPOGRAFICO

NOMBRE: YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CM 001-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA INICIO: 31 DE MAYO 2024

FECHA TERMINACION: 30 NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE OBRA: LP 018-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE


2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría de la referencia se realizaron las siguientes gestiones en el mes de MAYO del 2025:

1. Acompañamiento y verificación de la localización, trazado y replanteo de los diferentes bloques.

2. Verificación de las coordenadas topográficas.

Atentamente,



YEISON DAVID SALABARRIA MOLINA
Ingeniero topográfico
CC 1.069.490.072
Contrato 010 -2024

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

EQUIPO MINIMO INTERVENTORIA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
Computador con licencias	4
Vehículo	1

Tabla 29 Equipo mínimo interventoría

En el Formato FSI-800-018, el Interventor lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el periodo reportado en el presente informe de interventoría.

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

En el Formato FSI-800-019, el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por La Gobernación de Sucre.

6.3 Información financiero y presupuestal

De acuerdo con el presupuesto contractual inicial la interventoría tiene un presupuesto inicial por valor de $ 1.330.217.540,00 M/CTE, IVA incluido, equivalentes a 1023,24 SMMLV para el año de suscripción del contrato, respaldado con certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 312 del 28/02/2024. La forma de pago es la siguiente:

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	**NO APLICA**
PAGOS POR AVANCE	La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato hasta un 95% según avance de ejecución y los pagos se efectuarán previa verificación del cumplimiento de las actividades por parte del supervisor; No obstante, los giros estarán supeditados a las transferencias programadas en el marco de la ejecución del Contrato Específico No. 2230170, suscrito entre ENTerritorio, MINSALUD y Departamento de Sucre. Para lo cual será requerido certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde Del pago final. Valor interventoría $ 1,330,217,540 conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

PAGO FINAL	**5%** del valor del contrato, se realizará contra la liquidación del contrato y será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Requisitos para el pago final. Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Elaboración y suscripción de acta final a satisfacción por parte del supervisor. • Elaboración y presentación de informes de INTERVENTORIA. • Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo con disponibilidad del PAC.

A la fecha se han tramitado (11) actas de pago, con la siguiente información:

Acta No. (Fecha)	Costo directo	IVA 19%	Costo total	Acumulado	Saldo por ejecutar
No. 1 junio 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$73.985.007,25	$ 1.256.232.532,75
No. 2 Julio 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$147.970.014.50	$1.182.247.525,50
No. 3 Agos 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$221.955.021.75	$1.108.262.518,25
No. 4 Sep. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$295.940.029.0	$1.034.277.511,00
No. 5 Oct. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$369.925.036.25	$ 960.292.504,00
No. 6 Nov. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$443.910.043.50	$ 886.307.497,00
No. 7 dic. 2024	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$517.895.050,75	$ 738.337.482,00
No. 8 Enero. 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$591.880.058,00	$ 738.337.482,00
No. 9 Febrero. 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$665.865.065.25	$ 644.352.474,75
No. 10 marzo. 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$739.850.072,50	$ 590.367.467,50
No. 11 abril. 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$813.835.079,75	$ 516.382.460,25
No. 12 mayo 2025	$62.172.275,00	$11.812.732,25	$73.985.007,25	$ 887.820.087,00	$ 442.397.453,00

Tabla 30 Inf. Financiera interventoría

En el Formato FSI-800-020, el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

PÓLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100010928 – INTERVENTORIA			
EMPRESA ASEGURADORA		MUNDIAL	
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$133.021.754,00	31/05//2024	31/05/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 66´510.877,00	24/04//2024	30/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$133.021.754,00	30/11//2025	30/11/2030

Tabla 31. Inf. pólizas interventoría

En el Formato FSI-800-020, el Interventor y el Supervisor del contrato de Interventoría realizan el seguimiento a las garantías del contrato.

800-018

800-020

800-02

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **CONTROL EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	FSI-800-018
		VERSIÓN	1
		FECHA	01/0172024

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA 30/04/2025 **PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** MAYO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. CM 001-24 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-23 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMPUTADOR	HP 7000 SERIES		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR	LENOVO		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR	ASUS VIVOBOOK X512D		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR	LENOVO		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
IMPRESORA RICOH	C2504		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
VEHICULO	CHANGAN C35 - PLACA LXX715 - MODELO 2024		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A
CELULAR	SAMSUMG		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202090255COR

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	GOBERNACION DE SUCRE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	FSI-800-020
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1/01/2024

FECHA 31/05/2024 **MES INFORME MENSUAL::** 12
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM 001-24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA No INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1955	2023002700021 CONSTRUCC1ON , EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTAC1ON DEL HOSPITAL DEL GOLF0 DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	2.3.2.01.01.001.02.08	APORTES NACION	PRINCIPAL	$ 1.330.217.540,00	$ 1.330.217.540,00
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.330.217.540**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Observaciones
1	jun-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.256.232.533	$ 1.256.232.532,75	jul-24	Pagada
2	jul-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.182.247.526	$ 1.182.247.525,50	jul-24	Pagada
3	ago-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.108.262.518	$ 1.108.262.518,25	ago-24	Pagada
4	sep-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 1.034.277.511	$ 1.034.277.511,00	sep-24	Pagada
5	oct-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 960.292.504	$ 960.292.503,75	oct-24	Pagada
6	nov-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 886.307.497	$ 886.307.496,50	nov-24	Pagada
7	dic-24	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 812.322.489	$ 812.322.489,25	feb-25	Pagada
8	ene-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 738.337.482	$ 738.337.482,00	feb-25	Pagada
9	feb-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 664.352.475	$ 664.352.474,75	mar-25	Pagada
10	mar-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 590.367.468	$ 590.367.467,50	abr-25	Pagada
11	abr-25	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25	N/A	N/A	N/A	1955	$ 516.382.460	$ 516.382.460,25	abr-25	Pagada
TOTALES		**$ 683.895.025,00**	**$ 129.940.054,75**	**$ 813.835.079,75**	N/A	N/A	N/A		**$ 516.382.460**	**$ 516.382.460**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTAPARCIAL 1	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 2	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 3	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 4	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 5	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 6	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 7	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 8	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 9	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 10	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
ACTAPARCIAL 11	$ 62.172.275,00	$ 11.812.732,25	$ 73.985.007,25
VALOR TOTAL			**$ 813.835.079,75**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

Firma:
OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

Gobernación de Sucre / Secretaría de Infraestructura	**GOBERNACION DE SUCRE** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	**CÓDIGO**	**FSI-800-021**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	**1/01/2024**

FECHA 31/05/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CM-001/24 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA DE INICIO: 31/05/2024

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: nov-25
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.330.217.540,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.330.217.540,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 133.021.754,00	31	5	2024	31	5	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,0%	$ 66.510.877,00	24	4	2024	30	11	2028
Calidad del servicio	10%	$ 133.021.754,00	30	11	2025	30	11	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100010928

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 6/08/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

OCTAVIO CALIXTO CABALLERO MENDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 22202090255COR

Vo.Bo.

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Supervisor Contrato de Interventoría

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Todos los cálculos, proyecciones y representaciones gráficas incluidas en el presente informe se basan en la reprogramación de obra más reciente, la cual constituye el principal insumo técnico para el análisis comparativo del avance físico real frente al cronograma reprogramado.
- Con corte al mes de mayo, se ha evidenciado un atraso acumulado del 40,94%, producto de una ejecución física del 36,50%, frente a un avance programado del 77,44%, según el cronograma vigente. Esta desviación representa un incumplimiento sustancial de las obligaciones contractuales
- Si bien se reconoce que factores externos como las restricciones de movilidad durante las festividades de fin de año pudieron tener un impacto parcial en la ejecución del proyecto, se ha detectado que durante los meses de febrero y marzo continuaron presentándose dificultades operativas internas, atribuibles directamente al contratista, que impidieron el cumplimiento de los frentes de trabajo programados. Estas situaciones no fueron debidamente justificadas ni superadas en los plazos razonables, lo cual evidencia deficiencias en la planificación y en la capacidad operativa del contratista.
- Se reitera la necesidad de que el contratista remita de manera urgente un informe técnico detallado, en el cual identifique, sustente y clasifique los factores que han generado el retraso. Así mismo, debe presentar un Plan de Contingencia integral, técnicamente viable y medible, con metas verificables y mecanismos de seguimiento que permitan mitigar los impactos del atraso actual y prevenir futuros incumplimientos. La no presentación o deficiencia de estos documentos podría constituir un agravante frente a las acciones administrativas que adelante la entidad contratante.
- En atención a los porcentajes de incumplimiento evidenciados y conforme a lo estipulado en el contrato de obra, se recomienda a la entidad iniciar el procedimiento administrativo

sancionatorio correspondiente, consistente en la imposición de una multa equivalente al 5% del valor del contrato. Dicha sanción se justifica plenamente, toda vez que el número de días de atraso acumulado supera el umbral establecido contractualmente. El valor estimado de la multa asciende a $1.859.069.653,85 (mil ochocientos cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos con ochenta y cinco centavos), monto que deberá ser exigido conforme a los mecanismos contractuales y legales aplicables.

8. ANEXOS

Anexo 8.1 Correspondencia enviada y recibida

Anexo 8.2 Registro fotográfico Documentos de interventoría

Anexo 8.3 Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, calidad y sostenibilidad

Anexo 8.4. Bitácora



HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legar Consorcio
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS

Gobernación de Sucre

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024



ANEXOS

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

ANEXO 8.1

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	Gobernación de Sucre

CONTRATO DE OBRA LP 018-23	CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-001-24

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INTERVENTOR:	CONSORCIO INRHOSPITAL COVEÑAS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA MAYO 2025			
FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	CONSECUTIVO
2 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO 800.11-03/SI-0851	OFC-108 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO 800.11-03/SI-0799 – SOLICITUD ACTUALIZACION DE INFORME	OFC-108 INTERHOSPITAL-2024
2 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SOLICITUD INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP-018 2023.	OFC-109 INTERHOSPITAL-2024
2 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO 800.11-03/SI-0851	OFC-110 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REVISION DISEÑOS AJUSTADOS SISTEMA HVAC	OFC-111 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REITERACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OFC-112 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	RESPUESTA OFICIO HGM24052024-72 - REPROGRAMACION MESA TÉCNICA	OFC-113 INTERHOSPITAL-2024
5 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	REMISION OFICIO HGM29042025-60 – LIQUIDACIÓN FIDEICOMISO	OFC-114 INTERHOSPITAL-2024
8 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	APREMIO POR ATRASO EL PROGRAMA DE OBRA DEL CO-018-2023	OFC-115 INTERHOSPITAL-2024
12 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	COMPROMISOS COMITÉ TECNICO	OFC-116 INTERHOSPITAL-2024
15 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	REMISIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 11.	OFC-117 INTERHOSPITAL-2024
15 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	RADICADO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA NO. 11	OFC-118 INTERHOSPITAL-2024
19 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	RESPUESTA OFICIO HGM24052024-77 - ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA, CON PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA	OFC-119 INTERHOSPITAL-2024
19 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	OFICIO HGM24052024-76– SOLICITUD PRORROGA PARA ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA Y DISEÑOS CON ESTUDIO DE MERCADO	OFC-120 INTERHOSPITAL-2024
23 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	RESPUESTA OFICIO HGM24052024-79 - ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA	OFC-121 INTERHOSPITAL-2024
23 de mayo de 2025	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	CANTIDADES DE OBRA	OFC-121 INTERHOSPITAL-2024
29 de mayo de 2025	GOBERNACION DE SUCRE SEC. INFRAESTRUCTURA	RESPUESTA OFICIO HGM24052024-75 – OBJECIÓN MEDIDA DE APREMIO POR INCUMPLIMIENTO	OFC-123 INTERHOSPITAL-2024

Coveñas, Sucre, 30 de abril de 2025 **OFC-108-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor del contrato
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de obra **CO-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: RESPUESTA OFICIO 800.11-03/SI-0851 – Traslado solicitud de información relacionada con la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE""

Cordial Saludo,

En atención al oficio del asunto, nos permitimos remitir la siguiente información solicitada por el Senador de la Republica Alex Flórez Hernández, así:

1. Copia del contrato de obra suscrito con el Consorcio CMO HOSPITAL SUCRE, incluyendo sus anexos técnicos y financieros.
2. Copia del contrato de interventoría suscrito con el Consorcio INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024, incluyendo estudios previos, alcance, obligaciones y recursos asignados.
3. Acta de inicio tanto del contrato de obra como de la interventoría
4. Cronograma de ejecución inicial de la obra aprobado contractualmente y cronogramas modificados si los hubiere.
5. Estado del avance físico y financiero actual de la obra, acompañado de los informes de avance de obra e intervención más recientes.
10. Listado de hallazgos o incumplimientos reportados por la interventoría o la supervisión frente al contratista de obra.
11. Informes de calidad técnica de la obra, pruebas de materiales, ensayos de carga o cualquier documento técnico que evalúe el estado de la estructura.
12. Informe financiero consolidado del proyecto, que indique los recursos apropiados, ejecutados y pendientes de ejecutar.
13. Plan de mejora solicitado o aprobado en caso de hallazgos o retrasos en la ejecución.
14. Copia del presupuesto oficial del proyecto y del presupuesto presentado por el contratista.
15. Actas del comité de obra o reuniones de seguimiento que se hayan tenido lugar desde el inicio del proyecto.
La numeración corresponde al número de la carpeta que contiene la información.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

En cuanto al Informe de cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, en especial sobre el pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y condiciones de vinculación del personal, este fue solicitado al contratista por competencia mediante oficio OFC-109-INTERHOSPITAL-2024 del 30 de abril de 2025, numeral 8 de la solicitud.

Por ultimo la siguiente información deberá ser recaudad por la secretaria de Infraestructura ya que como interventoría no tenemos acceso a la información.

6. Relación de giros realizados al contratista, indicando fechas, montos y conceptos.
7. Relación de giros realizados a la interventoría, indicando fechas, montos y conceptos.
9. Relación de las acciones de supervisión realizadas por la entidad ejecutora (Secretaría de Infraestructura Departamental) sobre el proyecto.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 30 de abril de 2025 **OFC-108-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor del contrato
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de obra **CO-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: RESPUESTA OFICIO 800.11-03/SI-0799 – SOLICITUD ACTUALIZACION DE INFORME – ANÁLISIS DEL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO – MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

Cordial Saludo,

En atención al oficio del asunto, nos permitimos presentar nuevamente informe de análisis detallado del atraso que presenta la obra CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, con base en el informe correspondiente al mes de marzo, que cubre el periodo del 1 al 31 del mismo mes y toma en cuenta los antecedentes contractuales, avances físicos y financieros, así como los factores técnicos que han incidido en el atraso de las actividades contractuales.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

INFORME ATRASO DE OBRA

1. CONTEXTO DEL PROYECTO

La Gobernación de Sucre, en el marco de su Plan de Desarrollo, priorizó la ejecución de este proyecto con el fin de fortalecer la red pública hospitalaria del departamento, mejorar el acceso a servicios de salud especializados y reducir las brechas territoriales en la atención en salud. Para ello, adelantó el proceso de contratación pública LP-018-2023, el cual fue adjudicado el 28 de febrero de 2024 al Consorcio CMO Hospital Sucre, por un valor inicial de $34.420.762.624. Posteriormente, mediante acto administrativo en noviembre del mismo año, se aprobó una adición presupuestal por valor de $2.760.630.453, estableciendo un nuevo valor total del contrato en $37.181.393.077.

El acta de inicio de la obra se suscribió el 31 de mayo de 2024, con una duración prevista de 18 meses calendario, proyectando la finalización para el 30 de noviembre de 2025.

2. ANALISIS COMPARATIVO DE EJECUCION

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los porcentajes y valores programados vs ejecutados, así como el porcentaje de atraso acumulado por mes:

MES	PROGRAMADO		EJECUTADO		ATRASO	
DICIEMBRE	35.64%	$ 13.260.858.169	27.05%	$10.058.518.744	8.61%	$ 3.202.339.426
ENERO	45.73%	$ 17.004.869.592	31.21%	$ 11.604.038.093	14.53%	$ 5.400.831.499
FEBRERO	59.25%	$ 22.029.117.613	34.25%	$ 12.734.234.785	25.00%	$ 9.294.882.828
MARZO	69.79%	$ 25.950.631.075	36.00%	$ 13.210.413.214	33.79%	$ 12.740.217.861

3. PORCENTAJE DE ATRASO POR CAPITULO

En el siguiente cuadro se evidencia capitulo a capitulo el porcentaje de atraso.

No.	Ítem de pago	DESCRIPCION	SUB TOTAL CAPITULO	MARZO				
A. CONSTRUCCION				PROGRAMADO acum	prog	EJECUTADO acum	ejec	Dif
A1	1.00.00	PRELIMINARES	$ 293.612.574,00	$ 292.664.764,00	**99,68%**	$ 239.247.884,00	**81,48%**	18%
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN	$ 3.981.907.118,00	$ 3.070.443.341,00	**77,11%**	$ 3.981.907.118,00	**100,00%**	-23%
A3	3.00.00	ESTRUCTURA	$ 6.559.434.150,00	$ 6.559.434.150,00	**100,00%**	$ 6.490.237.086,00	**98,95%**	1%
A4	4.00.00	MAMPOSTERÍA	$ 2.064.664.406,00	$ 2.064.664.406,00	**100,00%**	$ 697.144.198,63	**33,77%**	66%
A5	5.00.00	ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE	$ 241.347.866,00	$ 241.347.866,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
A6	6.00.00	PAÑETES	$ 220.385.955,00	$ 181.279.226,00	**82,26%**	$ 129.801.259,00	**58,90%**	23%
A7	7.00.00	CUBIERTAS	$ 533.702.824,00	$ 533.702.824,00	**100,00%**	$ 349.098.189,76	**65,41%**	35%
A8	8.00.00	IMPERMEABILIZACIONES	$ 807.898.777,00	$ 807.898.777,00	**100,00%**	$ 277.643.537,00	**34,37%**	66%
A9	9.00.00	CIELO RASOS	$ 360.449.952,00	$ 321.653.448,00	**89,24%**	$ -	**0,00%**	89%
A10	10.00.00	PISOS Y GUARDA ESCOBAS	$ 979.690.737,00	$ 978.772.469,00	**99,91%**	$ -	**0,00%**	100%
A11	11.00.00	ENCHAPES MUROS	$ 265.703.264,00	$ 226.892.675,00	**85,39%**	$ -	**0,00%**	85%
A12	12.00.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 711.629.419,00	$ 572.884.683,00	**80,50%**	$ 258.450.353,00	**36,32%**	44%
A13	13.00.00	INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO	$ 567.611.713,00	$ 567.611.713,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
A14	14.00.00	INSTALACIONES GAS NATURAL	$ 7.023.266,00	$ 2.653.113,00	**37,78%**	$ -	**0,00%**	38%

A15	15.00.00	INSTALACIONES GASES MEDICINALES	$ 319.035.912,00	$ 319.035.912,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
A16	16.00.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 3.823.267.936,00	$ 3.699.713.664,00	**96,77%**	$ 123.936.407,00	**3,24%**	94%
A17	17.00.00	INSTALACIONES ILUMINACIÓN	$ 223.253.630,00	$ 223.253.630,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
A18	18.00.00	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS	$ 98.291.889,00	$ 98.291.889,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
A19	19.00.00	INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL	$ 1.143.586.094,00	$ 857.689.571,00	**75,00%**	$ -	**0,00%**	75%
A20	20.00.00	INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	$ 1.481.791.453,00	$ 188.728.803,00	**12,74%**	$ -	**0,00%**	13%
A21	21.00.00	APARATOS SANITARIOS	$ 251.074.110,00	$ 251.074.110,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
A22	22.00.00	CARPINTERÍA MADERA	$ 755.352.668,00	$ 617.305.748,00	**81,72%**	$ -	**0,00%**	82%
A23	23.00.00	CARPINTERÍA METÁLICA	$ 355.723.164,00	$ 355.723.164,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
A24	24.00.00	CARPINTERÍA ALUMINIO	$ 1.038.765.058,00	$ 744.448.293,00	**71,67%**	$ -	**0,00%**	72%
A25	25.00.00	CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE	$ 368.756.983,00	$ 368.756.983,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
A26	26.00.00	CERRAJERÍA	$ 80.758.155,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
A27	27.00.00	VIDRIOS Y ESPEJOS	$ 93.555.709,00	$ 93.555.709,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
A28	28.00.00	PINTURA	$ 606.553.407,00	$ 384.150.491,00	**63,33%**	$ -	**0,00%**	63%
A29	29.00.00	LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA	$ 100.113.772,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
A30	30.00.00	ASEO	$ 97.160.419,00	$ -	**0,00%**	$ 7.877.350,00	**8,11%**	-8%
D. URBANISMO INTERNO								
D1	31.00.00	VIAS - URBANISMO INTERNO	$ 378.727.397,00	$ 176.028.947,00	**46,48%**	$ 87.177.518,00	**23,02%**	23%
D2	32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO	$ 898.219.123,00	$ -	**0,00%**	$ 211.321.423,00	**23,53%**	-24%
D3	33.00.00	MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO	$ 28.071.631,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
D4	34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO	$ 725.724.351,00	$ 725.724.351,00	**100,00%**	$ 134.990.096,00	**18,60%**	81%
D5	35.00.00	RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO	$ 448.602.113,00	$ 293.971.336,00	**65,53%**	$ 94.013.748,00	**20,96%**	45%
E. URBANISMO EXTERNO								
E1	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO	$ 6.066.585,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
E2	37.0.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO	$ 131.275.012,00	$ 131.275.012,00	**100,00%**	$ -	**0,00%**	100%
		SUB TOTAL OBRA	**$ 31.048.788.592,00**	**$ 25.950.631.068,00**		**$ 13.210.413.214,00**		**0%**
								0%
B. EQUIPOS								
B1	38.00.00	ELECTRICOS	$ 1.309.825.823,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
B3	39.00.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA	$ 1.653.139.852,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
B5	40.00.00	HIDROSANITARIOS	$ 167.621.825,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
B7	41.00.00	OTROS	$ 13.564.335,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
		SUB TOTAL EQUIPOS	**$ 3.144.151.835,00**	$ -				
								0%
F. AMUEBLAMIENTO								
F1	42.00.00	AMUEBLAMIENTO	$ 396.676.371,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
G4	43.00.00	EQUIPOS DE OFICINA	$ 114.411.546,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
G3	44.00.00	MOBILIARIO INDUSTRIAL	$ 115.228.477,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
		SUB TOTAL EQUIPOS DE OFICINA	**$ 626.316.394,00**	$ -	**0,00%**			
								0%
G. EQUIPOS MEDICOS								
G1	45.00.00	EQUIPOS MEDICOS	$ 2.183.119.592,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
G2	46.00.00	MOBILIARIO MEDICO	$ 179.016.656,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
		SUB TOTAL EQUIPOS MEDICOS	**$ 2.362.136.248,00**	$ -	**0,00%**			
								0%
RESUMEN PRESUPUESTO								
		SUB TOTAL OBRA CIVIL	$ 31.048.788.592,00	$ 25.950.631.068,00	**83,58%**	$ 13.210.413.214,00	**42,55%**	41%
		SUB TOTAL EQUIPOS	$ 3.144.151.835,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
		SUB TOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 626.316.394,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
		SUB TOTAL EQUIPOS MEDICOS	$ 2.362.136.248,00	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	0%
		TOTAL PRESUPUESTO	**$ 37.181.393.069,00**	**$ 25.950.631.068,00**	**69,79%**	**$ 13.210.413.214,00**	**36,00%**	**33,79%**

4. FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL ATRASO

- **Restricciones de transporte y festividades:** en los meses de diciembre y enero, el contratista reporto dificultades logísticas como consecuencia de las festividades navideñas, durante las cuales se debieron suspender las actividades principales en obra, de conformidad a las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014, ha dispuesto la restricción de circulación para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas (3400 kilogramos) en la red vial nacional, emitidas por el Ministerio de Transporte, situación que fue notificada mediante el oficio OFC-058-INTERHOSPITAL-2024 del 19 de diciembre del 2024.
- **Cronograma de actividades**: durante el mes de febrero el atraso en la obra persistió, Por tal motivo, mediante el oficio **OFC-070-INTERHOSPITAL-2024** del 19 de febrero, se solicitó al contratista revisar el cronograma de obra y analizar las causas del las situaciones que estaban generado retrasos en la ejecución, pues según el cronograma vigente, debían estar en ejecución los capítulos **21.00.00 al 25.00.00**, relacionados con la instalación de aparatos sanitarios y trabajos de carpintería en madera, metálica, aluminio y acero. No obstante, dichas actividades no se pudieron ejecutar por condiciones evidentes del proyecto, esta solicitud fue reiterada el 4 de marzo durante una reunión de seguimiento con las veedurías y la Personería del municipio de Coveñas, así como durante comités técnicos realizados. Adicionalmente, mediante el oficio **OFC-086-INTERHOSPITAL-2024** del 25 de marzo, se solicitó al contratista un informe técnico detallado con el análisis de los factores que han generado el atraso, así como la presentación de un **Plan de Contingencia**.
- **Inconvenientes con diseños:** uno de los factores estructurales más relevantes en el atraso tiene que ver con las inconsistencias o falta de diseños de componentes claves, como es el caso del sistema HVAC (climatización y ventilación) y el sistema manejo de aguas residuales o, siendo el primero mas complejo de acuerdo con lo manifestado por el contratista en el oficio HGM120325-47, en el cual señala una serie de inconsistencias en el diseño de redes de aire acondicionado y ventilación mecánica, las cuales deben cumplir con la normativa ASHRAE 170-2013 y el Anexo General RETSIT (Resolución 40773 de 29 de diciembre de 2023). A continuación, se resumen las principales observaciones técnicas:

- **Bloque 1** El piso 1 alberga áreas clave como almacenamiento, taller, cuarto CCV, cuarto de racks, sala de autopsias y depósitos de cadáveres, con consideraciones importantes de clima y ventilación.

  Áreas sin aire acondicionado: Espacios como el cuarto CCV y almacenamiento carecen de climatización, lo que podría afectar equipos e insumos sensibles.

  Contaminación en la morgue: La sala de autopsias y el depósito de cadáveres no están completamente aislados, lo que podría generar contaminación cruzada.

  El piso 2 incluye áreas críticas como quirófanos, salas de recuperación y salas de parto, que requieren estrictos controles de ventilación y aire acondicionado.

  Sistema de aire compartido: Un único sistema de aire para todas las áreas críticas no cumple con la normativa ASHRAE 170-2013, que exige sistemas independientes.

  Cumplimiento normativo: Los quirófanos y salas de parto deben contar con filtración HEPA, control de temperatura (18°C-24°C), renovación de aire cada 4 horas, difusores de flujo laminar y lámparas UV para cumplir con los estándares.
- **Bloque 2** Este bloque incluye las áreas de farmacia y radiología.

  Sistema VRF compartido: El sistema propuesto para el laboratorio y farmacia no separa los ambientes de trabajo según la normativa ASHRA.

  Los laboratorios deben tener un flujo de aire adecuado para eliminar contaminantes, con un sistema de ventilación diseñado para evacuar adecuadamente el aire contaminado.

  La zona de hospitalización cuenta con un equipo compartido con otras áreas lo cual no cumple con la normatividad de ventilación mecánica en clínica y hospitales tales como: la mezcla de los flujos de aire acondicionado, y extracción de la misma.
- **Aislamiento de áreas específicas:** Las habitaciones de aislamiento para pacientes con enfermedades transmisibles deben contar con presión negativa para evitar la propagación de contaminantes a otras áreas del hospital. Además, deben estar equipadas con sistemas de filtración adicionales.

- **Áreas comunes y pasillos:** Los pasillos y áreas comunes deben tener un flujo adecuado de aire, sin comprometer la calidad del aire en las habitaciones. La ventilación de estos espacios debe ser suficiente para evitar la acumulación de contaminantes.
- **Bloque 3** Cuenta con un sistema VRF para administración, auditorio, consultorios y odontología, con unidades FANCOIL de pared y ductales. Sin embargo, este sistema de redes no es suficiente para cubrir toda el área, incluyendo el parque de coworking en la zona administrativa.

  El sistema de redes de los edificios está compuesto de la siguiente manera: red de aguas lluvias o residuales dependiendo del piso, red de aire acondicionado y ventilación, red contra incendio, red de agua, red eléctrica y red de gases medicinales, por lo que las inconsistencias en el diseño han imposibilitado el avance de obras complementarias, como instalaciones eléctricas, redes de gases medicinales y cielorrasos, las cuales dependen de la ubicación definitiva de equipos HVAC y sus ducterías.

5. **ACCIONES ADOPTADAS:**

Ante la situación expuesta, se han adelantado las siguientes acciones:

- Se solicito al contratista la entrega de un **informe técnico detallado**, con análisis causal del atraso y un **Plan de Contingencia** integral. Esto fue solicitado mediante el **oficio OFC-086-INTERHOSPITAL-2024** del 25 de marzo.
- Durante la visita de seguimiento del 21 de marzo, realizada por funcionarios de Enterritorio y del ministerio de salud y protección social, se socializaron estos de marzo, se expusieron los inconvenientes, lo que dio lugar a un proceso de revisión y posible reestructuración del sistema HVAC, para ello se han realizado mesas de trabajo y comités técnicos tanto en la Gobernación de Sucre, como en la Ciudad de Bogotá, estas ultimas contaron con la presencia de todos los actores involucrados en el proceso.
- En el comité Técnico llevado a cabo en las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social el día 27 de marzo de 2025, se acordaron compromisos que incluían la entrega de la revisión y ajuste de los diseños del sistema HVAC, en dicha

reunión se definieron los parámetros y la fecha de entrega de los mismos, información que fue ratificada por la interventoría mediante los oficios OFC-094-INTERHOSPITAL-2024 y OFC-097-INTERHOSPITAL-2024, el 18 de abril el contratista radico el oficio HGM24052024-66, mediante el cual hizo entrega de los diseños del sistema HVAC (compromiso pactado en mesa técnica para el 10 de abril del 2025), sin embargo, tras una revisión preliminar, mediante el oficio **OFC-105-INTERHOSPITAL-2024** del 23 de abril se solicitó información complementaria (solicitada inicialmente), incluyendo:

Especificaciones técnicas de los equipos propuestos.

Presupuesto, memoria de cantidades y análisis de precios.

Evaluación de impactos en otras redes y sus posibles soluciones.

A la fecha, dicha información **no ha sido entregada**, incumpliendo el plazo de 3 días otorgado por la interventoría.

Adicionalmente, se ha solicitado la entrega actualizada del **cronograma de obra** y el **flujo de fondos**, documentos esenciales para la aprobación y seguimiento del Plan de Contingencia por parte de la Gobernación de Sucre.

6. CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado, se evidencia un atraso acumulado de **33.8% al mes de marzo**, con una ejecución física del 36% frente a un avance programado del 69.79%.

Si bien factores externos como las restricciones de movilidad durante las festividades de fin de año han influido en el desarrollo de la obra, se ha detectado que en los meses de febrero y marzo persistieron dificultades que impidieron el cumplimiento de los frentes de trabajo programados.

Se reitera la necesidad de que el contratista presente un informe técnico detallado con los factores causantes del retraso, así como un **Plan de Contingencia** claro, viable y medible, que permita mitigar los impactos actuales y evitar futuros incumplimientos.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 30 de abril de 2025 **OFC-109-INTERHOSPITAL-2024**

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: solicitud información relacionada con la ejecución del contrato de obra LP-018-2023.

Cordial Saludo,

En atención al oficio 800.11-03/SI 0851, del 29 de abril, mediante el cual el secretario de infraestructura solicita información sobre los contratos de obra e interventoría LP-018-2023 y CM-001-2024 respectivamente, para dar respuesta a la solicitud enviada por el Senador de la Republica Alex Flórez Hernández, me permito solicitar específicamente el envío de los siguientes documentos:

- Informe de cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, en especial sobre el pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y condiciones de vinculación del personal.

- Informes de calidad técnica de la obra, pruebas de materiales, ensayos de carga o cualquier documento técnico que evalúe el estado de la estructura.

- Fechas previstas de entrega actualizadas y las medidas adoptadas para garantizar la culminación del proyecto dentro de los parámetros de calidad, plazo y costo estipulados

Cabe resaltar que esta solicitud es de obligatorio cumplimiento y debe ser remitida a la secretaría de infraestructura para dar respuesta dentro del plazo estipulado por la ley (cinco días después de recibir la petición del senador – fecha de radicación 28 de abril).

https://drive.google.com/drive/folders/1r2KgFlNS6gmaII_Wr_8oAQDEULX01A-k?usp=sharing

Cordial saludo,

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 2 de mayo de 2025 **OFC-110-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor del contrato
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de obra **CO-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: RESPUESTA OFICIO 800.11-03/SI-0851 – Traslado solicitud de información relacionada con la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE""

Cordial Saludo,

En atención al oficio del asunto, nos permitimos remitir la siguiente información solicitada por el Senador de la Republica Alex Flórez Hernández, así:

1. Copia del contrato de obra suscrito con el Consorcio CMO HOSPITAL SUCRE, incluyendo sus anexos técnicos y financieros.
2. Copia del contrato de interventoría suscrito con el Consorcio INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024, incluyendo estudios previos, alcance, obligaciones y recursos asignados.
3. Acta de inicio tanto del contrato de obra como de la interventoría
4. Cronograma de ejecución inicial de la obra aprobado contractualmente y cronogramas modificados si los hubiere.
5. Estado del avance físico y financiero actual de la obra, acompañado de los informes de avance de obra e intervención más recientes.
10. Listado de hallazgos o incumplimientos reportados por la interventoría o la supervisión frente al contratista de obra.
11. Informes de calidad técnica de la obra, pruebas de materiales, ensayos de carga o cualquier documento técnico que evalúe el estado de la estructura.
12. Informe financiero consolidado del proyecto, que indique los recursos apropiados, ejecutados y pendientes de ejecutar.
13. Plan de mejora solicitado o aprobado en caso de hallazgos o retrasos en la ejecución.
14. Copia del presupuesto oficial del proyecto y del presupuesto presentado por el contratista.
15. Actas del comité de obra o reuniones de seguimiento que se hayan tenido lugar desde el inicio del proyecto.
La numeración corresponde al número de la carpeta que contiene la información.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

En cuanto al Informe de cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, en especial sobre el pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y condiciones de vinculación del personal, este fue solicitado al contratista por competencia mediante oficio OFC-109-INTERHOSPITAL-2024 del 30 de abril de 2025, numeral 8 de la solicitud.

Por ultimo la siguiente información deberá ser recaudad por la secretaria de Infraestructura ya que como interventoría no tenemos acceso a la información.

6. Relación de giros realizados al contratista, indicando fechas, montos y conceptos.
7. Relación de giros realizados a la interventoría, indicando fechas, montos y conceptos.
9. Relación de las acciones de supervisión realizadas por la entidad ejecutora (Secretaría de Infraestructura Departamental) sobre el proyecto.

https://drive.google.com/drive/folders/1r2KgFlNS6gmaII_Wr_8oAQDEULX01A-k?usp=sharing

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 5 de mayo de 2025 **OFC-111-INTERHOSPITAL-2024**

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Revisión diseños ajustados sistema HVAC

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta los compromisos establecidos durante el Comité Técnico realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social el pasado 27 de marzo de 2025, reiteramos la solicitud enviada el 23 de abril de 2025 mediante el oficio OFC-105-INTERHOSPITAL-2024, en el cual se presentaron las siguientes observaciones a la información remitida a través del oficio HGM24052024-66:

- No se especifica si las modificaciones al sistema HVAC afectan otras redes o diseños existentes. En consecuencia, no se tiene claridad sobre posibles afectaciones ni se proponen ajustes en caso de ser necesarios.
- No se incluyen las especificaciones técnicas detalladas de cada ítem, ni de los equipos y suministros propuestos.
- No se presenta el presupuesto correspondiente, ni la memoria de cantidades ni el análisis de precios del sistema propuesto. Es importante recordar que, para los materiales, equipos, mano de obra y transporte requeridos, deben aportarse al menos tres (3) cotizaciones como respaldo del análisis.

La interventoría estableció un plazo de tres (3) días calendario para la entrega de esta información; sin embargo, a la fecha no se ha recibido la documentación solicitada. Dado que estos documentos son insumos fundamentales para realizar una evaluación integral del proyecto y cumplir con el compromiso de revisión asumido por la interventoría, solicitamos una vez más el envío completo y definitivo de la información en un plazo máximo de **un (1) día calendario**.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 05 de mayo de 2025 **OFC-112-INTERHOSPITAL-2024**

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Reiteración solicitud información relacionada con la ejecución del contrato de obra LP-018-2023.

Cordial Saludo,
En atención al oficio No. 800.11-03/SI 0851 enviado por la Gobernación de Sucre el día 29 de abril y a la solicitud previamente enviada, me permito reiterar la necesidad urgente del envío de la siguiente información, con el fin de dar respuesta a la solicitud del Senador de la República, Dr. Alex Flórez Hernández, el día el 28 de abril:

- Informe de cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, incluyendo información detallada sobre el pago de salarios, aportes a seguridad social, prestaciones sociales y condiciones de vinculación del personal.
- Informes de calidad técnica de la obra: pruebas de materiales, ensayos de carga o cualquier otro documento técnico que permita evaluar el estado de la estructura.
- Fechas previstas de entrega actualizadas, junto con las medidas adoptadas para asegurar la culminación del proyecto en los términos de calidad, plazo y costo establecidos.

Teniendo en cuenta que el plazo legal para dar respuesta vence el día de mañana, se solicita que esta información sea entregada el día de hoy, a fin de consolidar la respuesta institucional dentro del término estipulado por la ley.

Agradezco su atención y quedo atento a la confirmación del envío.

Cordial saludo,

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 5 de mayo de 2025 **OFC-113-INTERHOSPITAL-2024**

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **CO-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: RESPUESTA OFICIO HGM24052024-72 - REPROGRAMACION MESA TÉCNICA

Cordial Saludo,

En atención al oficio de la referencia y conforme a la conversación sostenida con la Gobernación de Sucre, nos permitimos informarle que, a pesar de su solicitud de reprogramación, la mesa técnica se mantiene para el día 7 de mayo de 2025 a las 9:30 a. m., tal como fue establecida inicialmente. Esta decisión obedece a la relevancia de los temas a tratar, los cuales son fundamentales para el avance del proyecto.

Cabe resaltar que la solicitud de realización de la mesa técnica fue presentada por el contratista, por lo cual se entiende su interés y disponibilidad para participar, así mismo, la programación se realizó con la debida anticipación para permitir a las partes ajustar sus agendas.

En cuanto a la visita con proveedores mencionada, esta pudo haberse reagendado o, en su defecto, podrá ser atendida por el residente de obra o algún otro profesional del equipo técnico del contratista.

Agradecemos su comprensión y disposición para dar continuidad a los procesos establecidos en el marco del contrato

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 2 de mayo de 2025 **OFC-114-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor del contrato
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de obra **CO-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: REMISION OFICIO HGM29042025-60 – LIQUIDACIÓN FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir el oficio HGM29042025-60, mediante el cual el contratista hace entrega de la siguiente documentación correspondiente al cierre y liquidación del negocio fiduciario:

1. Certificación de consignación de rendimientos financieros a la cuenta de la entidad contratante y liquidación Fideicomiso.
2. Soportes de pago de los rendimientos financieros a la entidad contratante.
3. Informe de rendición de cuentas: cierre y liquidación del negocio fiduciario.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 8 de mayo de 2025 **OFC-115-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de obra **CO-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: APREMIO POR ATRASO EL PROGRAMA DE OBRA DEL CO-018-2023

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales como interventor del contrato de obra CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, me permito formalmente recomendar a la Gobernación de Sucre aperturar proceso sancionatorio de acuerdo al seguimiento y control del cronograma de ejecución del contrato (reprogramación), el cual hace parte de la modificación No. 1 suscrita entre el departamento de Sucre y el consorcio CMO Hospital Sucre el día 21 de noviembre de 2024.

Hechos que motivan la solicitud

De acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA 4 (Plazo del Contrato)**, el plazo estimado para la ejecución del contrato es de dieciocho (18) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin embargo a la fecha observamos que, a pesar de haber transcurrido más de 11 meses (60% del plazo), el avance de los trabajos no se ajusta al cronograma previsto, ya que según la reprogramación aprobada, se esperaba que para la fecha actual, el proyecto hubiese alcanzado un porcentaje de avance del 75.65% equivalente a $ 28.128.126.586. Sin embargo, el porcentaje ejecución es del 37.1%, lo cual representa una discrepancia significativa respecto a lo establecido.

Por otro lado, durante el comité técnico realizado el 27 de marzo de 2025 en las instalaciones del Ministerio de Salud, durante el cual se trato el tema de las inconsistencias en los diseños del sistema HVAC, el contratista se comprometió a hacer la entrega del ajuste a los diseños el día 10 de abril, no obstante, a la fecha no ha hecho entrega del documento completo.

Solicitudes reiteradas de la interventoría

Es importante destacar que este retraso en la ejecución ha sido objeto de múltiples solicitudes por parte de la interventoría para que el contratista cumpla con el cronograma de ejecución y acelere los avances en la obra. Las siguientes solicitudes de intervención han sido presentadas al contratista en distintas ocasiones:

- El 19 de febrero de 2025, mediante oficio OFC-070-INTERHOSPITAL-2024, se solicito al contratista la revisión de la programación de la obra, considerando que para este periodo contemplaba la ejecución de actividades correspondientes a los capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00 y 25.00.00, las cuales no podían aun ejecutarse, representando aproximadamente el 4% del valor programado, dicha solicitud fue reiterada el 4 marzo en reunión de seguimiento con las veedurías y la Personería Municipio de Coveñas.

- El día 5 de marzo, mediante el oficio OFC-072-INTERHOSPITAL-2024, se convocó comité técnico para revisar el tema de mayores cantidades de obra y las inconsistencias en la programación.

- El 13 de marzo, mediante oficio HGM120325-48, el contratista radicó el documento de reprogramación, orientado a priorizar actividades independientes de las mencionadas anteriormente. Entre ellas, destacan los trabajos de urbanismo y la adecuación de zonas exteriores. Dicho documento fue revisado y avalado por la interventoría.

- El 25 de marzo, mediante oficio OFC-086-INTERHOSPITAL-2024, se solicito al contratista la presentación de un informe donde se especifiquen los factores que han generado el atraso de la obra, así mismo se solicitó formalmente la presentación de un plan de contingencia para mitigar el impacto del atraso en la obra.

- El 27 de marzo, mediante oficio OFC-091-INTERHOSPITAL-2024, ante la evidente falta de personal en la obra la interventoría solicito la incorporación urgente de personal para reactivar los tres frentes de obra.

- El 31 de marzo, a través del oficio OFC-094-INTERHOSPITAL-2024, los compromisos adquiridos en el desarrollo del comité técnico realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social el día 27 de marzo de 2025, correspondientes a la entrega de: Plan de contingencia: Fecha máxima de entrega, 02 de abril de 2025 y Ajustes y/o optimización sistema HVAC: Fecha máxima de entrega, 10 de abril de 2025.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

- El 15 de abril, a través del oficio OFC-097-INTERHOSPITAL-2024, se reiteraron los compromisos adquiridos durante el comité técnico del 27 de marzo de 2025 en el Ministerio de Salud y Protección Social.

- El 21 de abril, a través del oficio OFC-100-INTERHOSPITAL-2024, con el fin de garantizar la adecuada implementación y cumplimiento del plan de contingencia presentado mediante oficio HGM24052024-65, se solicitó al contratista la entrega semanal del formato de informe F-IH001, con el fin de que se reporten específicamente las actividades y cantidades ejecutadas durante el trascurso de la semana y el personal que laboro en obra. Es importante aclarar que dicho plan pese a ser entregado a la interventoría y este a su vez remitido a la Gobernación, no se ha puesto en marcha toda vez que la programación de obra y flujo de caja de el mismo fue entregada el día de ayer 6 de abril de 2025, mediante correo electrónico recibido a las 10:14 pm, razón por la cual tampoco ha sido revisado por la interventoría.

- Adicionalmente, se ha requerido verbalmente la entrega actualizada de la reprogramación de obra y del flujo de fondos, los cuales resultan ser insumos fundamentales para la aprobación por parte de la Gobernación y el posterior seguimiento del plan de contingencia propuesto.

- El 23 de abril, a través del oficio OFC-105-INTERHOSPITAL-2024, tras una revisión preliminar de los documentos entregados por el contratista el 18 de abril con el oficio HGM24052024-66, se realizaron las siguientes observaciones: No se especifica si las modificaciones al sistema HVAC afectan otras redes y diseños existentes, no se incluyen las especificaciones técnicas detalladas de cada ítem y por ultimo no se presenta el presupuesto correspondiente, ni memoria de cantidades y análisis de precios del sistema propuesto, situación que impidió realizar una evaluación integral del proyecto y dar cumplimiento al compromiso de revisión asumido por la interventoría. Para ello se dio un plazo de 3 días calendario.

- El 5 de mayo, a través del oficio OFC-111-INTERHOSPITAL-2024, la interventoría reitero la solicitud enviada el 23 de abril de 2025 mediante el oficio OFC-105-INTERHOSPITAL-2024, solicitando en un plazo de un día la entrega de la información antes solicitada.

Estas solicitudes, a pesar de haber sido emitidas en varias oportunidades y de haber sido fundamentadas en el incumplimiento del cronograma de ejecución, no han logrado que el Contratista tome las acciones necesarias para subsanar el retraso. Esta falta de respuesta efectiva y la ausencia de mejoras en el avance de la obra demuestran un incumplimiento

reiterado por parte del Contratista, a pesar de los esfuerzos realizados por el interventor para corregir la situación.

Consideraciones

En virtud de lo expuesto y conforme a lo dispuesto en la **Cláusula 15 (MULTAS)** del Contrato, estos retrasos en la ejecución del cronograma generan una **multa equivalente al 0,5% del valor total del contrato por cada día calendario de atraso**, a partir de la fecha en que el avance real de la obra comenzó a estar por debajo del avance programado, conforme a lo estipulado en el cronograma de ejecución.

Tasación multa

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los porcentajes y valores programados vs ejecutados, así como el porcentaje de atraso acumulado por mes:

MES	PROGRAMADO		EJECUTADO		ATRASO	
DICIEMBRE	35.64%	$ 13.260.858.169	27.05%	$10.058.518.744	8.61%	$ 3.202.339.426
ENERO	45.73%	$ 17.004.869.592	31.21%	$ 11.604.038.093	14.53%	$ 5.400.831.499
FEBRERO	59.25%	$ 22.029.117.613	34.25%	$ 12.734.234.785	25.00%	$ 9.294.882.828
MARZO	69.79%	$ 25.950.631.075	36.00%	$ 13.210.413.214	33.79%	$ 12.740.217.861
ABRIL	77,44%	$ 28.791.780.991	37.00%	$ 13.757.115.438	40,44%	$ 15.034.665.553

Días de atraso	127
Valor contrato	$ 37.181.393.077,00
Sanción diaria	$ 185.906.965,39
Tasación sanción	**$ 23.610.184.603,90**

No obstante, el **Parágrafo 7** del contrato establece que ¨***El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva, lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas*** ¨.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece la sanción equivalente al 5% del valor del contrato, en el entendido de que la tasación por días de atraso supera lo estipulado en el **Párrafo 7** del contrato de obra ya mencionado, lo cual representa un valor de **($ 1.859.069.653,85)**, mil ochocientos cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos con ochenta y cinco centavos.

Solicitud de acción inmediata

En virtud a lo expuesto anteriormente, y en cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoría CM-001-2024, recomendamos dar inicio al **procedimiento administrativo correspondiente por presunto incumplimiento contractual,** en cumplimiento de lo dispuesto en la **Cláusula 15 del Contrato (MULTAS)** y la normativa aplicable en la **Ley 80 de 1993** y el **Decreto 1082 de 2015,** con el fin de **imponer las sanciones correspondientes** por los retrasos ya mencionados. Además, requerimos que el Contratista implemente las medidas correctivas necesarias para asegurar el cumplimiento inmediato de los plazos establecidos en el contrato, de forma que no se sigan generando más retrasos en la ejecución de la obra.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 12 de mayo de 2025 **OFC-116-INTERHOSPITAL-2024**

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **CO-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: COMPROMISOS COMITÉ TECNICO

Cordial saludo,

Como es de conocimiento, durante la mesa técnica celebrada el pasado 7 de mayo en la Gobernación de Sucre, se acordó como compromiso para el día 8 de mayo, la radicación de las fechas de entrega de los siguientes documentos:

- Optimización de los diseños HVAC y todos aquellos que se vean afectados por las modificaciones de este.
- Optimización demás diseños que presenten inconsistencias o incongruencias.
- Cantidades, especificaciones técnicas y presupuesto para cada uno de los anteriores.
- Estudio de mercado de los ítems contractuales que a su juicio están generando desequilibrio económico del contrato.

Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido dicha información, lo cual podría afectar la planificación y ejecución oportuna de las actividades programadas.

Así mismo, le reiteramos que, para mañana, 13 de mayo, está prevista la entrega del plan de contingencia, el cual debe incluir la reprogramación detallada y el flujo de caja actualizado de la obra. Este documento es fundamental para identificar

posibles riesgos, establecer medidas correctivas y garantizar la continuidad del proyecto sin contratiempos.

Es crucial cumplir con los plazos establecidos para asegurar la finalización de la obra dentro del plazos establecidos y evitar posibles repercusiones contractuales o administrativas.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 15 mayo de 2025

OFC-117-INTERHOSPITAL-2024

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Remisión Informe mensual de interventoría No. 11.

Cordial Saludo,

Para su revisión, observaciones y aprobación nos permitimos allegar el informe mensual de interventoría No. 11 correspondiente al mes de abril de 2025 y el formato de resumen mensual de obra en formato Excel.

Debido al peso del archivo, se remite la información en formato PDF mediante el vínculo Google drive que se anexa a continuación con el siguiente contenido:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lTeJR9bKt_G_MJdQI2R1rXjAko71CyVq

1. Carpeta informe 11

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 15 de mayo de 2025

OFC-118-INTERHOSPITAL-2024

Ingeniero
ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Supervisor del contrato
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Radicado acta parcial de interventoría No. 11

Cordial Saludo,

Para su revisión, aprobación y tramite nos permitimos allegar el acta parcial de interventoría No. 11 correspondiente al mes de abril del 2025 para el contrato **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", con sus respectivos anexos.

Atentamente,

_____

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 19 de mayo de 2025 **OFC-119-INTERHOSPITAL-2024**

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **LP-018-2023** “"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”.

Asunto: RESPUESTA OFICIO HGM24052024-77 - ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA, CON PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA

Cordial Saludo,

En atención a los documentos remitidos mediante el oficio de la referencia, y tras una revisión preliminar del contenido entregado, me permito presentar las siguientes observaciones, con el fin de avanzar en la consolidación, aprobación y puesta en marcha del plan de contingencia requerido:

1. **Plan de contingencia:**

De acuerdo con lo indicado en el oficio OFC-093-INTERHOSPITAL-2024 del 28 de marzo, se hace necesario complementar la información entregada con un documento que contenga, como mínimo, los siguientes aspectos:

- **Diagnóstico de la situación actual:** Identificación de las causas que han generado el retraso y análisis del impacto que esto ha tenido sobre el cronograma general del proyecto.
- **Identificación de actividades a ejecutar:** Se requiere un desglose detallado, bloque por bloque, de las actividades que se ven afectadas y de aquellas que no, debido a los ajustes en el diseño del sistema HVAC. Esta información debe incluir planos que representen gráficamente las áreas impactadas y describir de manera clara y cuantificada las actividades que se pueden ejecutar.

- **Estrategias correctivas**: incluir las medidas específicas a implementar para acelerar el avance de la obra y mitigar los efectos del retraso.
- **Recursos adicionales:** Detallar el personal, maquinaria e insumos que se destinaran para la ejecución del plan de contingencia.
- **Compromisos y seguimiento:** Establecer mecanismos de control, supervisión y seguimiento que garanticen el cumplimiento del plan y eviten futuros atrasos.
- **Establecer fechas de inicio y terminación de la implementación del plan.**

2. Presupuesto - Plan de contingencia:

- Es necesario precisar las fechas de inicio y finalización de la implementación del plan de contingencia, con el fin de facilitar el control y seguimiento de su ejecución.
- Incluir el valor ejecutado a la fecha por cada actividad, así como el valor acumulado. Es necesario identificar con exactitud a qué mes corresponde la columna denominada “Acumulado mes pasado”, de forma que se evidencie claramente el valor proyectado para ejecutar semana a semana
- Corregir el encabezado del formato, ya que actualmente las celdas de fecha aparecen en formato moneda, lo que impide interpretar correctamente la información.

3. Flujo de caja - Plan de contingencia:

- Con el objetivo de tener mayor claridad respecto a las fechas, valores y porcentajes programados, se solicita presentar el flujo de caja en el formato aprobado para la programación inicial y para la Reprogramación No.1, conservando las semanas y fechas allí establecidas.
- Verificar que las fechas de inicio y finalización, así como el número total de semanas del proyecto, coincidan con lo establecido contractualmente.
- Los valores indicados en el flujo de fondos deben ser coherentes con los presentados en el presupuesto del plan de contingencia. Actualmente, se reporta una inversión acumulada de $29.388.072.618,76, equivalente al 79,04%, cifra que no corresponde con el estado real del proyecto.

4. Reprogramación de obra

- Se solicita remitir el documento de reprogramación de obra en formatos Microsoft Project y PDF, para su respectiva revisión y validación.

5. Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2

- En atención a la solicitud del secretario de Infraestructura durante mesa de trabajo, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2 para su diligenciamiento conforme a la reprogramación presentada. Asimismo, se adjunta el instructivo correspondiente y un formato modelo que contiene información que debe ser revisada y ajustada.

Por último, solicitamos tener en cuenta estas observaciones y remitir la documentación corregida a la mayor brevedad posible, considerando la urgencia de aprobar e implementar el plan de contingencia que permita mitigar el atraso actual del proyecto.

Atentamente,



ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 19 de mayo de 2025 **OFC-120-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de obra **CO-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: OFICIO HGM24052024-76– SOLICITUD PRORROGA PARA ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA Y DISEÑOS CON ESTUDIO DE MERCADO

Cordial Saludo,

A través de la presente nos permitimos dar traslado de la solicitud presentada por el contratista mediante en oficio de la referencia, en el cual solicita la ampliación del plazo para la entrega del plan de contingencia que incluye la reprogramación de obras y flujo de fondos. Cabe resaltar que dicho documento fue entregado previamente a través de correo electrónico el pasado 16 de mayo, no obstante, el día de hoy mediante oficio OFC-120-INTERHOSPITAL-2024, se realizaron observaciones a la documentación entregada.

así mismo, el contratista solicita una prórroga de **30 días hábiles** para la entrega de los diseños del sistema HVAC y de los demás sistemas que puedan verse afectados por las modificaciones en las redes de aire acondicionado. Esta solicitud se fundamenta en lo indicado en el oficio **OFC-116-INTERHOSPITAL-2024**, con asunto *COMPROMISOS COMITÉ TÉCNICO*, enviado por la interventoría el 12 de mayo, y en la que según él se solicita ser "***más explícitos en los cambios proyectados".***

Es pertinente señalar que las especificaciones y requerimientos técnicos para la entrega de dichos diseños ya habían sido establecidos previamente mediante los oficios OFC-093-INTERHOSPITAL-2024, OFC-105-INTERHOSPITAL-2024, y OFC-111-INTERHOSPITAL-2024, del 28 de marzo, 23 de abril y 5 de mayo respectivamente.

Por tal motivo, consideramos que a la fecha el contratista debería tener considerablemente adelantado el proceso de ajuste de diseños. En ese sentido, estimamos que la prórroga solicitada resulta excesiva y que su aprobación podría generar impactos negativos sobre el cronograma general del proyecto, teniendo en cuenta que los diseños deberán ser revisados y aprobados tanto por la Gobernación como por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Sin embargo, dejamos a consideración de la Gobernación, en su calidad de entidad contratante, la decisión final respecto a la viabilidad de otorgar la ampliación solicitada.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Coveñas, Sucre, 23 de mayo de 2025 **OFC-121-INTERHOSPITAL-2024**

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **LP-018-2023** “"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”.

Asunto: RESPUESTA OFICIO HGM24052024-79 - ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA, CON PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA

Cordial Saludo,

En atención a la documentación remitida mediante el oficio de la referencia y con fundamento en las observaciones efectuadas en el oficio **OFC-119-INTERHOSPITAL-2024**, en relación con la documentación presentada mediante el oficio **HGM24052024-79**, me permito formular las siguientes observaciones, cuya atención y subsanación resulta **imprescindible** para la validación del plan de contingencia propuesto y la continuidad del proyecto:

1. Plan de contingencia:

Tal como fue requerido en los oficios **OFC-093-INTERHOSPITAL-2024** y **OFC-119-INTERHOSPITAL-2024**, el plan de contingencia debió presentarse en formato de informe técnico, incluyendo de manera clara y estructurada la siguiente información mínima:

- **Diagnóstico de la situación actual:** Identificación objetiva de las causas que originaron los retrasos y análisis del impacto sobre el cronograma contractual.
- **Identificación de actividades a ejecutar:** Se requiere un desglose detallado, bloque por bloque, de las actividades afectadas y no afectadas por los ajustes al sistema HVAC, incluyendo planos que delimiten las áreas impactadas y una descripción técnica, cuantificada y verificable de las actividades a desarrollar.

- **Estrategias correctivas**: Definición de acciones específicas orientadas a la recuperación del cronograma y mitigación del atraso acumulado.
- **Recursos adicionales:** Identificación y justificación del personal, maquinaria, equipos y materiales que serán asignados específicamente al plan de contingencia.
- **Compromisos y seguimiento:** Establecimiento de instrumentos de control técnico, operativo y administrativo que permitan verificar el cumplimiento del plan y prevengan nuevos incumplimientos.
- **Cronograma de implementación:** Fechas claras de inicio y finalización de las acciones contempladas.

Sin embargo, dicha información no fue entregada, la información presentada se limita a una reiteración parcial del comunicado HGM24052024-75, sin el correspondiente análisis técnico ni el desarrollo estructurado del informe del plan de contingencia. En consecuencia, lo entregado no permite su evaluación ni la implementación de mecanismos de seguimiento ni control.

Adicionalmente, las gráficas anexas al oficio carecen de contexto técnico y explicativo, por lo que deben ser complementadas con su respectiva interpretación dentro del informe técnico exigido.

2. Presupuesto - Plan de contingencia:

A pesar de haber sido presentado mediante el oficio **HGM24052024-79** y pese a las observaciones realizadas por la interventoría el día 19 de mayo**,** el presupuesto específico del plan de contingencia **no fue incluido** en los documentos remitidos con el oficio del asunto**,** por tanto, reiteramos las solicitudes que al respecto se hicieron:

- Especificar fechas de inicio y finalización de la implementación del plan de contingencia para facilitar su seguimiento.
- Incluir el valor ejecutado a la fecha por cada actividad, así como el valor acumulado. Es fundamental identificar el mes al que corresponde la columna "Acumulado mes pasado", a fin de evidenciar claramente el valor proyectado para ejecución semanal.
- Corregir el encabezado del formato: actualmente las celdas de fecha están en formato moneda, lo que impide una interpretación adecuada de la información.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

3. Flujo de caja - Plan de contingencia:

Aunque el flujo fue presentado en un formato similar al solicitado, no incluye los porcentajes programados ni acumulados. A modo de referencia, se adjunta la **Ilustración 1**, tomada del documento inicial.

COSTO SEMANAL	$	$ 166.622.127	$ 175.992.679	$ 188.071.065	$ 132.968.534
PORCENTAJE SEMANAL		0,45%	0,47%	0,51%	0,36%
COSTO ACUMULADO SEMANAL	$	$ 28.294.748.713	$ 28.470.741.392	$ 28.658.812.457	$ 28.791.780.991
PORCENTAJE SEMANAL ACUMULADO		76,10%	76,57%	77,08%	77,44%
$ COSTO MENSUAL	$	$			663.654.406
% MENSUAL			1,78%		
$ COSTO MENSUAL ACUMULADO	$	$			28.791.780.991
% MENSUAL ACUMULADO			77,44%		

Ilustración 1Formato flujo inicial

Asimismo, una vez más las fechas no coinciden con el cronograma contractual del proyecto. Es así que el archivo Excel propone una inversión de $4.659.824.665,88 (12.53%) durante la semana 80, correspondiente al 1 al 7 de diciembre, lo cual no concuerda con la fecha de finalización establecida contractualmente.

Según el flujo de caja entregado y lo indicado en el oficio, el plan de contingencia entraría en vigor en la **semana 50** (28 de abril). Sin embargo, a la fecha, no se ha iniciado su implementación. Se solicita verificar si la ejecución en obra actual corresponde a lo proyectado, cuya inversión acumulada debería ser de $14.252.593.626,27.

4. Reprogramación de obra

Según la **Ilustración 2**, la fecha de terminación de la obra en la reprogramación entregada es el **26 de noviembre**, lo cual no coincide con la fecha contractual del **30 de noviembre de 2025** estipulada en el contrato de obra **LP-018-2023**, ni con la fecha erróneamente establecida por ustedes en el flujo de caja (1-7 de diciembre), como se muestra en la **Ilustración 3**. Esto evidencia una falta de congruencia entre los documentos presentados y el contrato vigente.




Ilustración 2 Programación Project

1/12/2025	Total
semana 80	
$ -	$ -
$ -	$ 61.722.312,00

Ilustración 3 Flujo de caja plan contingencia

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

En la **Ilustración 4**, se indica que la representante legal del consorcio es la **Arq. Nayalibe Eljach Manjarrez**, dato que no coincide con la información actual del proyecto.



Ilustración 4 Reprogramación de obra

5. Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Este formato no fue entregado. Se solicita su remisión en el próximo envío.

Finalmente, solicitamos tener en cuenta las observaciones aquí presentadas y remitir la documentación **completa y corregida** en un plazo máximo de **cuatro (4) días calendario**, dada la urgencia de aprobar e implementar el plan de contingencia para mitigar el actual atraso del proyecto.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 23 de mayo de 2025 **OFC-121-INTERHOSPITAL-2024**

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra **LP-018-2023** ""CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: CANTIDADES DE OBRA

Cordial Saludo,

Con el fin de llevar a cabo el registro de las medidas ejecutadas en la obra de manera concertada entre el contratista y la interventoría, solicitamos respetuosamente que se designe formalmente, mediante oficio, a un profesional técnico de su equipo para participar en dicha actividad. Esta medición está programada para el martes 27 de mayo de 2025 y se realizará en compañía de la arquitecta Margarita Giraldo, quien asistirá como profesional asesora de la interventoría.

Adicionalmente, solicitamos la designación de una persona de apoyo que colabore en esta actividad, con el objetivo de facilitar el desarrollo eficiente de la misma.

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos a la confirmación del profesional designado.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre,29 de mayo de 2025 **OFC-123-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de obra **CO-018-2023** "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: RESPUESTA OFICIO HGM24052024-75 – OBJECIÓN MEDIDA DE APREMIO POR INCUMPLIMIENTO

Cordial saludo,

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual el contratista formula objeción enfática a la medida de apremio solicitada por la interventoría mediante el oficio **OFC-115-INTERHOSPITAL-2024** del 8 de mayo del presente año, nos permitimos hacer las siguientes precisiones:

PLAZO DEL CONTRATO

El contratista señala que el plazo de ejecución contractual se ha visto afectado por diversas situaciones, entre ellas, las **mayores cantidades de obra y la reprogramación de obras, con fecha 12 de marzo de 2025,** el primer tema a analizar tiene que ver con las cantidades de obra, sobre este particular, es preciso indicar que tales mayores cantidades fueron reportadas por el contratista mediante el oficio HGM24052024-22 del 16 de septiembre de 2024, y que, la interventoría en ejercicio de las funciones asignadas en el marco del contrato CM-001-2024 llevo a cabo la revisión y posterior concepto favorable de dicha solicitud, el cual fue radicado mediante el oficio OFC-034-INTERHOSPITAL-2024 del 3 de octubre de 2024. Posteriormente se tramito el **Modificatorio No. 01**, aprobado por la Gobernación de Sucre el 21 de noviembre de 2024, a través del cual se adicionaron recursos por valor de $2.760.630.453.

Es importante precisar la adición surgió en respuesta a la solicitud del contratista, en razón a las necesidades técnicas derivadas del aumento en las cantidades en obra. En ese sentido, carece de fundamento la insinuación contenida en el oficio del contratista, según la cual la solicitud de adición fue iniciativa de la interventoría, afirmación que implicaría una indebida **atribución de competencia a la interventoría**, contraria a las funciones que le son propias.

Así las cosas, corresponde **exclusivamente al contratista** solicitar de manera **expresa y oportuna** la modificación del plazo contractual en caso de considerar que el mismo resulta insuficiente para atender las nuevas condiciones de ejecución. Por consiguiente, **no es procedente endilgar a la interventoría responsabilidad alguna** por no haber tramitado una prórroga que no fue solicitada, pese a los múltiples espacios de concertación existentes (comités de obra, correspondencia, etc.) durante el trámite del **Modificatorio No. 01**, razón por la cual no se incluyó modificación alguna en tal sentido.

Por otro lado, el contratista aduce que ***"evidentemente las mayores cantidades de obra generaron una prórroga tacita en el plazo",*** esta afirmación carece respaldo en el ordenamiento jurídico colombiano, por tal razón esta solicitud resulta jurídicamente improcedente, toda vez que cualquier extensión del plazo debe surgir de un acto administrativo **expreso, motivado y soportado técnicamente** y su otorgamiento está sujeto al análisis de la entidad contratante, conforme lo establece el régimen de contratación estatal.

En cuanto a lo estipulado en el considerando 9 del documento **Modificatorio No. 01,** este establece claramente que la normativa colombiana a través de la Agencia Colombia compra eficiente permite modificar contratos estatales ya sea en plazo o valor, siempre que se cumplan las condiciones y límites legales, y se garantice el cumplimiento de los principios de la contratación pública, tales como la legalidad, la eficiencia, la eficacia y la responsabilidad.

> 9. Que la Agencia Colombia Compra Eficiente ha analizado que: "*Como distinción inicial, se tiene que el* ***concepto prórroga está particularmente ligado con la modificación —ampliación— del plazo de los contratos; las adiciones con el incremento del valor, debido a la inclusión de nuevas obligaciones, sea por la introducción de nuevas actividades o por la ejecución de una mayor cantidad de las pactadas inicialmente****; (…) Durante la fase de ejecución de los contratos estatales, las partes podrían identificar alguna*

En ese sentido, la interpretación que realiza el contratista respecto de este considerando es **equivocada**, en la medida en que el mismo **no establece, ni de manera expresa ni implícita, que una adición presupuestal conlleve necesariamente una prórroga del plazo contractual**. Dicho considerando se limita a enunciar las condiciones generales bajo las cuales puede darse lugar a modificaciones contractuales, sin que de ello pueda inferirse una vinculación automática entre el incremento del valor y la extensión del término contractual.


Ahora bien, según la precisión del contratista, en la revisión de los documentos contractuales respecto al retraso en la ejecución y plazo del contrato a la fecha de la modificación, este manifiesta un atrasó del 10,12% en las actividades contractuales, argumentando que, según el certificado de avance financiero emitido por la Interventoría con fecha 30 de septiembre del 2024, se tiene un avance acumulado del 7,01% y que según el informe de interventoría No. 4 con fecha 30 de septiembre la ejecución asciende a $5.895.255.394, equivalente al 17.13%, lo que matemáticamente representaría el atraso que el argumenta.

No obstante, es evidente que en el documento el contratista expone una información incompleta y sesgada, ya que en la imagen donde solo se puede observar lo programado para el periodo y no lo ejecutado, información que esta adjunta en el cuadro por el presentado y que hace parte del numeral 4.2.1 Seguimiento Programa de Inversiones, del informe de interventoría No. 4 del mes de septiembre de 2024.



COMPONENTE	PROGRAM
OBRA CIVIL	$ 5.895.255.3
EQUIPOS	
AMUEBLAMIENTO	

A continuación, se muestra la imagen completa en la que de manera explícita la interventoría reporta un atraso en la inversión equivalente a $ 1.370.039.849,63, es decir el 3.98%.

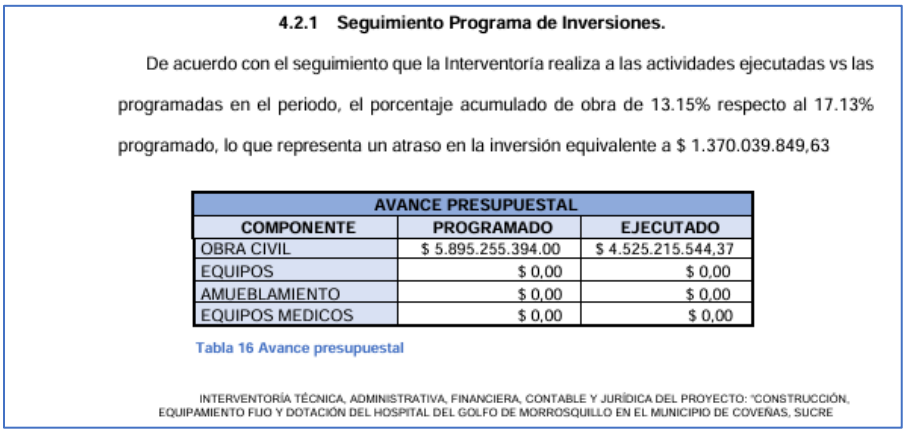

4.2.1 Seguimiento Programa de Inversiones.


De acuerdo con el seguimiento que la Interventoría realiza a las actividades ejecutadas vs las programadas en el periodo, el porcentaje acumulado de obra de 13.15% respecto al 17.13% programado, lo que representa un atraso en la inversión equivalente a $ 1.370.039.849,63

AVANCE PRESUPUESTAL		
COMPONENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
OBRA CIVIL	$ 5.895.255.394.00	$ 4.525.215.544,37
EQUIPOS	$ 0,00	$ 0,00
AMUEBLAMIENTO	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS MEDICOS	$ 0,00	$ 0,00

Tabla 16 Avance presupuestal

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Por otro lado, el certificado de avance físico y financiero expedido por la interventoría como parte de los documentos que soportan la adición fue suscrito efectivamente el día 30 de noviembre, sin embargo y pese a que no se hace referencia a esto las cantidades allí contenidas corresponden al reporte del informe No.3 del mes de agosto de 2024, como se puede apreciar en la siguiente imagen tomada del informe, el cual reposa en la Gobernación de Sucre.

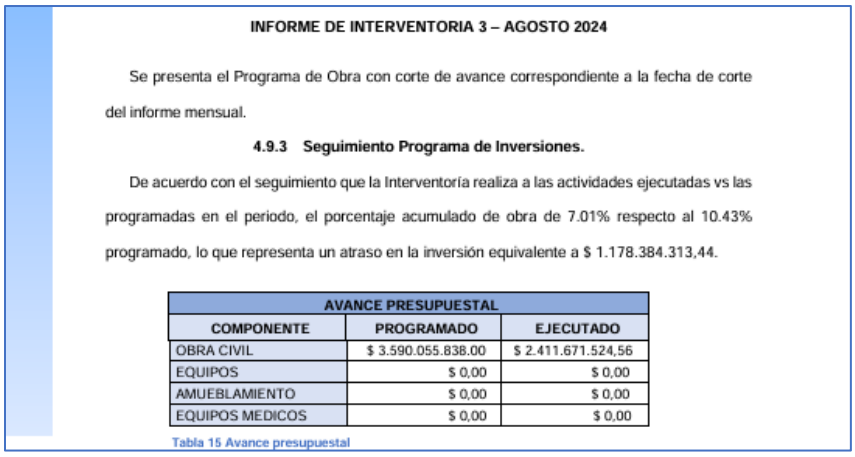

INFORME DE INTERVENTORIA 3 – AGOSTO 2024

Se presenta el Programa de Obra con corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual.

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones.

De acuerdo con el seguimiento que la Interventoría realiza a las actividades ejecutadas vs las programadas en el periodo, el porcentaje acumulado de obra de 7.01% respecto al 10.43% programado, lo que representa un atraso en la inversión equivalente a $ 1.178.384.313,44.

AVANCE PRESUPUESTAL		
COMPONENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
OBRA CIVIL	$ 3.590.055.838.00	$ 2.411.671.524,56
EQUIPOS	$ 0,00	$ 0,00
AMUEBLAMIENTO	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS MEDICOS	$ 0,00	$ 0,00

Tabla 15 Avance presupuestal

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Así las cosas, el cálculo presentado por el contratista en cual manifiesta que: "***Se concluye entonces de los documentos que soportan el modificatorio No 01 que por efecto de las situaciones presentadas en obra que afectaron la normal ejecución del plazo una afectación del 10,12% del plazo inicial, y por efecto del plazo necesario para ejecutar las mayores cantidades de obra el 8.0% del plazo inicial, para un total del 18,12% adicional al plazo establecido en el contrato, es decir una afectación en el plazo de ejecución del contrato de obra de 3,26 meses adicionales – noventa y siete (97) días adicionales (18 meses x 0,1812= 3,26 meses x 30 = 97 días), lo cual no fue reconocido en la modificación del plazo del contrato al momento de la suscripción por las partes intervinientes.",*** carece de todo sustento, ya que como se demostró anteriormente el atraso real a la fecha del modificatorio era del 3.98% y no del 10.12%, por otro lado la adición presupuestal del 8% no equivale a 8 puntos de atraso o de tiempo necesario para la ejecución, toda vez que el recurso Vs el plazo no son una constante ni equivalen a una ecuación lineal, por tanto los 97 días de atraso resultantes de la ecuación no son reales.

Es importante precisar que, en el marco del proceso de adición, el contratista llevó a cabo la reprogramación de la obra, mediante la cual se logró que esta no presentara ningún tipo de atraso. Por el contrario, en el informe correspondiente al mes de noviembre se reportó un superávit de $221.433.386,20, con una ejecución equivalente al 23,47 % del porcentaje acumulado de obra, frente al 22,88 % programado.

4.2.1 Seguimiento Programa de Inversiones.

De acuerdo con el seguimiento que la Interventoría realiza a las actividades ejecutadas vs las programadas en el periodo, el porcentaje acumulado de obra de 23.47% respecto al 22.88% programado, lo que representa un avance en la inversión equivalente a $ 221.433.386.20

AVANCE PRESUPUESTAL		
COMPONENTE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
OBRA CIVIL	$ 8.505.712.862,00	$ 8.727.146.248,20
EQUIPOS	$ 0,00	$ 0,00
AMUEBLAMIENTO	$ 0,00	$ 0,00
EQUIPOS MEDICOS	$ 0,00	$ 0,00

En cuanto a la reprogramación (No. 2) de las actividades de obra, es necesario precisar que la imposibilidad de ejecutar los ítems correspondientes a los capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00 y 25.00.00 relativos a la instalación de aparatos sanitarios, carpintería en madera, metálica, de aluminio y de acero inoxidable, respectivamente, no obedece a causas externas, por el contrario, dicha imposibilidad deviene de una deficiente planificación técnica atribuible exclusivamente al contratista, quien programó la ejecución de dichas actividades sin considerar las condiciones técnicas mínimas requeridas para su viabilidad, seguridad y estabilidad, esta situación no guarda relación con interferencias por parte de otros sistemas constructivos o frentes de trabajo.

En concordancia con lo anterior, y conforme se evidencia en el oficio HGM24052024-48 de fecha 12 de marzo de 2025, suscrito por el contratista, la interventoría solicitó formalmente la reprogramación del cronograma de obra. En dicho documento, se indicó que las actividades en cuestión representan aproximadamente el 5% del valor total del contrato. Sin embargo, debe aclararse que el contratista ha distorsionado el contenido y alcance de esta comunicación, ya que la finalidad de la solicitud de reprogramación fue estrictamente técnica, en el sentido de permitir una reorganización lógica del cronograma conforme al estado real de avance del proyecto, con el propósito de mitigar los atrasos acumulados. Esta motivación fue registrada tanto en la mesa de seguimiento con la Personería Municipal de Coveñas como en los comités técnicos respectivos.

En este contexto, se concluye que la solicitud del contratista de reconocimiento de una afectación equivalente a 29 días carece de fundamento técnico y jurídico, resultando, por ende, improcedente.

En relación las respuestas y/o observaciones del contratista a lo expuesto por la interventoría en el oficio OFC-115-INTERHOSPITAL-2024 del 12 de mayo con asunto APREMIO POR ATRASO EL PROGRAMA DE OBRA DEL CO-018-2023, respecto a las solicitudes hechas por la interventoría nos permitimos hacer las siguientes precisiones:

- **Oficio OFC-070-INTERHOSPITAL-2024 del 19 de febrero de 2025:** Mediante este se requirió al contratista revisar y ajustar el cronograma de obra, dado que contemplaba para dicho periodo la ejecución de actividades comprendidas en los capítulos 21.00.00 al 25.00.00, cuya ejecución no era técnicamente viable en ese momento. Tales actividades representaban aproximadamente el 4% del valor programado. Esta solicitud fue reiterada en la reunión de seguimiento del 4 de marzo, con participación de las veedurías y la Personería Municipal de Coveñas.

  En atención a dicha solicitud, el contratista remitió los oficios HGM24052024-45 y HGM24052024-48 (de fechas 4 y 12 de marzo, respectivamente); sin embargo, la información contenida en estos presentaba errores técnicos y aritméticos sustanciales. Para su corrección, se efectuó un trabajo conjunto entre contratista e interventoría. A la fecha, no se ha radicado un documento oficial de balance o reprogramación de obra debidamente aprobado.

- **Oficio OFC-094-INTERHOSPITAL-2024 del 31 de marzo de 2025:** Se reiteraron compromisos adquiridos en el comité técnico del 27 de marzo de 2025, realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Se solicitó expresamente:
  - **Plan de contingencia:** con fecha límite de entrega el 2 de abril de 2025.
  - **Ajustes/optimización del sistema HVAC:** con fecha límite de entrega el 10 de abril de 2025.

Los oficios mencionados por el contratista fueron recibidos y debidamente trasladados a la Gobernación de Sucre. No obstante, a la fecha no se ha recibido de forma completa la información requerida.

Sobre la afirmación hecha por el contratista: ***"Rechazamos que la interventoría motive un posible incumplimiento por efecto de una obligación no inherente al contratista de obra, la cual es la propuesta de optimización y/o cambio de los componentes en el Sistema de Aire Acondicionado HVAC".*** Aclaramos que la solicitud de incumplimiento presentada por la interventoría se basa en el atraso en la ejecución y en la inversión acumulada del contrato, que supera el 38%. En consecuencia, dicha afirmación carece de fundamento técnico o contractual.

- **Oficio OFC-100-INTERHOSPITAL-2024 del 21 de abril de 2025:** Se solicitó al contratista, en el marco de la implementación del plan de contingencia radicado mediante el oficio HGM24052024-65, la entrega semanal del formato F-IH001, a fin de reportar actividades ejecutadas y personal asignado.

En respuesta, el contratista manifestó: ***"los hechos aducidos por la interventoría en su comunicado de apremio, página 3 párrafo 2 no son ciertos ",*** en esta afirmación demuestra nuevamente la mala fe del contratista al desconocer un oficio por un error de forma en la numeración interna de la correspondencia, ya que en efecto el oficio OFC-100-INTERHOSPITAL-2024, con Asunto: Respuesta oficio HGM24052024-62 - solicitud de convocatoria de mesas técnicas – Contrato de Obra No. LP-018-2023 fue enviado por la interventoría el 21 de abril, no obstante, el mismo día la interventoría envió al contratista el oficio OFC-100-INTERHOSPITAL-2024, con Asunto: VERIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA. Tal y como se puede constatar en la siguiente imagen del correo electrónico de envío.



24/6/25, 10:23 a.m. Gmail - VERIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA

Gmail INTERVENTORIA INTERHOSPITAL <inter.hospital24@gmail.com>

VERIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA

INTERVENTORIA INTERHOSPITAL <inter.hospital24@gmail.com> 21 de abril de 2025, 12:07 p.m.
Para: "consorciointerhospitalsucre@gmail.com" <consorciointerhospitalsucre@gmail.com>, "obra.hospitaldelgolfo@gmail.com" <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>, "soflorez@gmail.com" <soflorez@gmail.com>
CC: "infraestructura@sucre.gov.co" <infraestructura@sucre.gov.co>, "ismael.sierra@gobsucre.gov.co" <ismael.sierra@gobsucre.gov.co>
CCO: "ingandresbotero@hotmail.com" <ingandresbotero@hotmail.com>

Coveñas, Sucre, 21 de abril de 2025

OFC-100-INTERHOSPITAL-2024

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
CC.
consorciointerhospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jagream@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

Asunto: VERIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

2 archivos adjuntos
REPORTE SEMANAL.xlsx 36K
OFC-101- VERIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA.pdf 120K

En ese sentido la interventoría podría invalidar la entrega del oficio HGM03042025-66 del 19 de abril con asunto: Entrega de diseños ajustados del sistema HVAC y Solicitud de esa de trabajo con el ministerio de salud e interventoría para socializar los cambios, ya que con ese mismo número de consecutivo se recibió el oficio con asunto: Entrega de informe de obra no. 10 del 6 de abril, no obstante, es evidente que esto obedece a un error involuntario y que no afecta la validez, veracidad o fundamento técnico del documento.

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA		Gobernación de Sucre
CONTRATO DE OBRA LP 018-23			CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-001-24
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INTERVENTOR:	CONSORCIO INRHOSPITAL COVEÑAS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA ABRIL 2025			
Fecha	Consecutivo	Entidad de origen	Asunto
1 abril de 2025	PMC-094	PERSONERIA	CONVOCATORIA A REUNION
3 de abril de 2025	HGM03042025-58	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
6 de abril de 2025	HGM03042025-66	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE INFORME DE OBRA No. 10
7 de abril de 2025	HGM03042025-62	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
7 de abril de 2025	HGM03042025-63	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - ENVIADO A GOBERNACION
8 de abril de 2025	HGM03042025-65	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA – CORREGIDO
9 de abril de 2025	HGM03042025-64	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
19 de abril de 2025	HGM03042025-66	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE DISEÑOS AJUSTADOS DEL SISTEMA HVAC Y SOLICITUD DE ESA DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE SALUD E INTERVENTORÍA PARA SOCIALIZAR LOS CAMBIOS

- **Oficios OFC-105-INTERHOSPITAL-2024 y OFC-111-INTERHOSPITAL-2024 del 23 de abril y del 5 de mayo del 2025.**
  A través de estos oficios, la interventoría solicita la entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y demás documentos que componen la optimización del sistema.

En respuesta el contratista manifiesta: "***la interventoría pone como responsabilidad del contratista la obligación de los diseños, y establece en cada comunicado nuevos alcances de los documentos que hemos generado de nuestra parte sin que el contratista de obra reciba pago alguno, ES INDEBIDO A TODAS LUCES QUE LA INTERVENTORIA IMPONGA CARGAS AGENAS A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA POSTERIORMENTE ADUCIR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA E IMPONER SANCIONES",*** en ese sentido es necesario precisar lo que la optimización de los diseños del sistema HVAC **no ha sido en ningún momento una obligación impuesta por la interventoría,** Por el contrario, la revisión, ajuste y optimización de los diseños del sistema HVAC fue una iniciativa promovida, aceptada y ejecutada de manera expresa y voluntaria por parte del contratista y que fue debidamente

concertada tanto con la Gobernación de Sucre como entre contratante como con el Ministerio de Salud y protección social con entidad cofinanciadora del proyecto, tal como consta en los siguientes documentos emitidos por él mismo:

- Oficio HGM24052024-66 del 19 de abril de 2025, mediante el cual el contratista entregó los diseños ajustados del sistema HVAC y solicitó la realización de una mesa de trabajo para socializar los cambios propuestos.
- Oficio HGM24052024-67 del 21 de abril de 2025, en el que nuevamente solicitó el agendamiento de una reunión técnica con el fin de socializar los ajustes realizados en la red de aire acondicionado.

En ambos documentos, queda evidenciado que el contratista asumió voluntariamente la revisión y ajuste del sistema HVAC, sin que ello se derivara de una imposición o exigencia unilateral por parte de la interventoría. La solicitud de mesas de trabajo, así como la entrega de los documentos técnicos, fueron actos espontáneos que reflejan la disposición del contratista para optimizar el diseño conforme a criterios técnicos y al avance real del proyecto.

Por tanto, la interventoría, **no ha establecido nuevos alcances contractuales ni ha trasladado al contratista cargas ajenas a sus obligaciones**, por tanto, se rechaza categóricamente cualquier afirmación que sugiera que las solicitudes de información técnica adicional constituyen una imposición indebida o arbitraria y en este mismo sentido se reitera que la solicitud de incumplimiento presentada por la interventoría no se fundamenta en la entrega oportuna o completa de la documentación técnica relacionada con la optimización del sistema HVAC, la cual, como se ha expuesto, fue asumida de manera voluntaria por el contratista.

El fundamento real y objetivo de la solicitud de incumplimiento radica en el atraso significativo en la ejecución física y en la inversión acumulada del contrato, la cual, a la fecha del presente informe, supera el 38% respecto al cronograma contractual aprobado.

Dicho atraso compromete gravemente el cumplimiento de las metas del proyecto y constituye una causal suficiente para la adopción de medidas de apremio, conforme a lo establecido en el marco normativo y contractual aplicable.

Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 4.3 del documento de pliegos tipo para obra pública adoptado mediante Resolución 00015 de 2021 de Colombia compra eficiente, así como en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 1882 de 2018, el análisis y gestión de riesgos constituye un componente esencial del proceso de contratación estatal. En tal sentido, la Gobernación de Sucre elaboró y aprobó la matriz de riesgos del proceso contractual, la cual fue puesta a disposición de los interesados y aceptada por el contratista con la suscripción del contrato, en cuya clausula 25 estipula lo siguiente: "**CLAUSULA 25. DOCUMENTOS,** ***Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:***

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Dentro de dicha matriz, se identificaron, evaluaron y asignaron los riesgos inherentes al desarrollo del proyecto. De manera específica, los numerales 8 y 9 de la matriz hacen referencia a riesgos operacionales de carácter interno y relacionados con la etapa de ejecución, conforme se detalla a continuación:

Numeral 8:

Descripción del riesgo: Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el contratista.

Consecuencias: Retrasos en el cronograma de ejecución, variación en cantidades de obra.

Responsable: Proponente y/o Contratista.

Nivel de riesgo: Inicial: Medio (3-2-5) – Residual: Bajo (2-2-4).

Medidas de mitigación: Interventoría adecuada, revisión oportuna de inconsistencias, seguimiento especializado semanal durante la etapa de ajuste.

Numeral 9:

Descripción del riesgo: Necesidad de elaboración de estudios e intervenciones requeridas para la correcta ejecución y operación de las obras.

Consecuencias: Necesidad de realizar estudios e intervenciones adicionales.

Responsable: Proponente y/o Contratista, con participación del Departamento.

Nivel de riesgo: Inicial: Medio (3-2-5) – Residual: Bajo (2-2-4).

Medidas de mitigación: Verificación de propuesta técnica adecuada, interventoría permanente, seguimiento técnico semanal durante la etapa de ajuste.

Con base en lo anterior, es claro que estos riesgos fueron asignados expresamente al contratista desde la etapa precontractual y hacen parte de las condiciones aceptadas por las partes. En virtud del principio de planeación contractual, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y de los principios de autonomía de la voluntad, responsabilidad contractual y riesgo empresarial, corresponde al contratista asumir los efectos que se deriven de la ocurrencia de dichos riesgos, sin que ello implique una modificación unilateral de las condiciones contractuales pactadas ni dé lugar a reclamaciones de mayor valor o plazo sin el procedimiento legalmente establecido.

Asimismo, se recuerda que conforme al artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el contratista es responsable de prever las condiciones necesarias para la ejecución del contrato, y que las intervenciones, diseños y estudios que sean requeridos para cumplir con el objeto contractual hacen parte del alcance de sus obligaciones, cuando así ha sido previsto en los documentos del proceso.

Por lo anterior, cualquier impacto que derive de la actualización, ajuste o corrección de estudios y diseños, conforme a los numerales mencionados, debe ser gestionado por el contratista dentro de los márgenes técnicos, contractuales y financieros establecidos, sin perjuicio de los deberes de coordinación y seguimiento por parte de la interventoría y esta entidad.

En cuanto a la solicitud de formulación e implementación de un plan de contingencia solicitado, esta solicitud está fundamentada en lo estipulado por el contrato de obra LP-018-2023 en el numeral 23 de la **CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**, la cual establece lo siguiente: "***Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos".***

RESPUESTA A LA REFUTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

La interventoría reconoce que existen aspectos técnicos del proyecto que han requerido ajustes o complementación de diseño, tales como la necesidad de optimización del sistema HVAC, la falta de diseños detallados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la definición completa de algunas redes técnicas esenciales. Estos aspectos han sido objeto de observación y seguimiento, y en varios casos, se ha solicitado la entrega de información técnica adicional con el fin de avanzar en la revisión y ajuste integral del proyecto.

Sin embargo, es importante subrayar que la medida de apremio solicitada mediante el citado oficio no se fundamenta en dichas omisiones o deficiencias de diseño, sino que se basa en el incumplimiento evidente de las obligaciones contractuales del contratista, específicamente en lo relacionado con el atraso acumulado tanto en la ejecución física de la obra como en la inversión financiera comprometida, el cual supera el 38% respecto del cronograma aprobado.

Por tanto, resulta improcedente sostener que la solicitud de imposición de multa parte de una lectura parcial o descontextualizada de los antecedentes. La interventoría ha actuado con estricto apego a los principios de objetividad, proporcionalidad y debido proceso, sustentando la medida en indicadores verificables y cuantificables que reflejan un atraso material significativo, independiente de los aspectos de diseño aún pendientes.

Por otro lado, Si bien es cierto que el contratista ha presentado múltiples documentos como planes de contingencia, balances de obra, estudios de mercado y rediseños técnicos, **es preciso señalar que, de forma reiterada, dichos documentos han sido entregados con inconsistencias, errores técnicos y omisiones sustanciales** que han impedido su

validación oportuna y efectiva. Esta situación ha generado retrabajos, retrasos en la revisión técnica y ha afectado el adecuado seguimiento del contrato, por tanto, se rechaza de manera enfática que exista vulneración al debido proceso o a los principios de actuación administrativa.

Por último, en respuesta a la afirmación del contratista donde manifiesta: ***se evidencia una inconsistencia crítica en la base misma de la solicitud de apremio,*** como se evidencio al inicio de la presente las ecuaciones con las que el contratista pretende justificar la reducción de los días de atraso en la ejecución no son válidas.

Por lo anterior, se concluye que:

- La solicitud de adición al contrato fue promovida exclusivamente por el contratista, sin que mediara una iniciativa ni una recomendación expresa por parte de la interventoría.

- Durante la gestión del Modificatorio No. 01 no se presentó por parte del contratista ninguna solicitud formal de prórroga del plazo contractual. Esta omisión reviste importancia jurídica, ya que impide alegar posteriormente la existencia de una ampliación tácita del término de ejecución, toda vez que cualquier modificación del plazo debe tramitarse conforme a los procedimientos contractuales y legales establecidos.

- En el marco del ordenamiento jurídico colombiano no existe la figura de la prórroga tácita. Por tanto, cualquier interpretación o actuación que pretenda sustentar una ampliación del plazo contractual sin acto expreso y debidamente motivado carece de validez jurídica, y no puede producir efectos vinculantes para la entidad contratante.

- La interpretación realizada por el contratista en relación con el considerando noveno del Modificatorio No. 01 resulta jurídicamente insostenible, pues no cuenta con respaldo normativo, jurisprudencial ni doctrinario.

- El análisis técnico realizado por la entidad determinó que, a la fecha de suscripción del Modificatorio No. 01, el atraso real en la ejecución de la obra ascendía a $1.370.039.849,63, correspondiente al 3,98 % del valor del contrato, y no al 10,12 % reportado por el contratista.

- Como parte del proceso de adición y ajuste del cronograma contractual, el contratista ejecutó una primera reprogramación de actividades (Reprogramación No. 1), mediante la cual se corrigieron los atrasos existentes, logrando que la obra quedara con un 0 % de atraso. A partir de dicha reprogramación se reinició el seguimiento del avance de ejecución bajo parámetros actualizados y con corte a dicha intervención.

- Posteriormente, la interventoría solicitó una segunda reprogramación (Reprogramación No. 2), con el objetivo de corregir deficiencias técnicas en la planeación realizada inicialmente por el contratista. Es importante resaltar que dicha

reprogramación no se debió a factores externos, sino a falencias propias del contratista en la estructuración del cronograma de actividades.

- Conforme a lo establecido en la cláusula 25 del contrato, la matriz de riesgos hace parte integral de los documentos contractuales, y, por tanto, tiene plena validez jurídica y fuerza vinculante entre las partes.

- La matriz de riesgos del proyecto en sus numerales 8 y 9 relacionados con las posibles modificaciones a los diseños, establece que estos riesgos fueron asignados expresamente al contratista desde la etapa precontractual y hacen parte de las condiciones aceptadas por las partes.

- La tasación de la multa fue realizada con fundamento en los atrasos reportados durante el período comprendido entre los meses de diciembre de 2024 y abril de 2025. Para tal efecto, se tuvo en cuenta el análisis detallado del cumplimiento del cronograma contractual, evidenciándose demoras significativas en la ejecución de las actividades programadas, las cuales afectaron el desarrollo normal de la obra.

- No obstante, las medidas adoptadas por la Entidad y la interventoría para mitigar los retrasos y propiciar el cumplimiento del cronograma contractual, la ejecución del proyecto continúa ampliando la brecha entre lo programado y lo efectivamente ejecutado. A la fecha, no se evidencia por parte del contratista la implementación de medidas correctivas eficaces ni acciones concretas que permitan revertir la tendencia de incumplimiento

En consecuencia, **las medidas de apremio solicitadas por la interventoría se encuentran debidamente fundamentadas**, y las afirmaciones del contratista carecen de sustento jurídico y fáctico.

En virtud de lo expuesto y conforme a lo dispuesto en la **Cláusula 15 (MULTAS)** del Contrato, estos retrasos en la ejecución del cronograma generan una **multa equivalente al 0,5% del valor total del contrato por cada día calendario de atraso**, a partir de la fecha en que el avance real de la obra comenzó a estar por debajo del avance programado, conforme a lo estipulado en el cronograma de ejecución.

Tasación multa

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los porcentajes y valores programados vs ejecutados, así como el porcentaje de atraso acumulado por mes:

MES	PROGRAMADO		EJECUTADO		ATRASO	
DICIEMBRE	35.64%	$ 13.260.858.169	27.05%	$10.058.518.744	8.61%	$ 3.202.339.426
ENERO	45.73%	$ 17.004.869.592	31.21%	$ 11.604.038.093	14.53%	$ 5.400.831.499
FEBRERO	59.25%	$ 22.029.117.613	34.25%	$ 12.734.234.785	25.00%	$ 9.294.882.828
MARZO	69.79%	$ 25.950.631.075	36.00%	$ 13.210.413.214	33.79%	$ 12.740.217.861
ABRIL	77,44%	$ 28.791.780.991	37.00%	$ 13.757.115.438	40,44%	$ 15.034.665.553

Días de atraso	127
Valor contrato	$ 37.181.393.077,00
Sanción diaria	$ 185.906.965,39
Tasación sanción	**$ 23.610.184.603,90**

No obstante, el **Parágrafo 7** del contrato establece que ¨***El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva, lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas*** ¨.

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece la sanción equivalente al 5% del valor del contrato, en el entendido de que la tasación por días de atraso supera lo estipulado en el **Párrafo 7** del contrato de obra ya mencionado, lo cual representa un valor de **($ 1.859.069.653,85)**, mil ochocientos cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos con ochenta y cinco centavos.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

ANEXOS

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

CORRESPONDENCIA

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA		Gobernación de Sucre
CONTRATO DE OBRA LP 018-23			CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-001-24
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INTERVENTOR:	CONSORCIO INRHOSPITAL COVEÑAS

CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA MAYO 2025			
Fecha	Consecutivo	Entidad de origen	Asunto
5 de mayo de 2025	HGM03042025-72	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REPROGRAMACION MESA TÉCNICA
5 de mayo de 2025	PMC-127	PERSONERIA	CONVOCATORIA A REUNIÓN
5 de mayo de 2025	HGM03042025-73	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	RELACION SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA LP 018-23
6 de mayo de 2025	HGM03042025-74	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA REPROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE CAJA
13 de mayo de 2025	HGM03042025-75	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	OBJECIÓN MEDIDA APREMIO POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE OBRA DEL CO-018-2023,
13 de mayo de 2025	HGM03042025-76	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SOLICITUD PRORROGA PARA ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA Y DISEÑOS CON ESTUDIO DE MERCADO
16 de mayo de 2025	HGM03042025-77	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA, CON PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA
17 de mayo de 2025	HGM03042025-78	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	ENTREGA DE INFORME DE OBRA No. 11
19 de mayo de 2025	800,11-03SI-0799	GOBERNACION SUCRE	TRASLADO RESPUESTA CONTRATISTA - APREMIO POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE LA REFENCIA
21 de mayo de 2025	HGM03042025-79	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REMISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA CON REPROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA – ALCANCE COMUNICADO HGM24052024-77 / RESPUESTA COMUNICADO OFC-119 INTERHOSPITAL-2024 TRAMITE FINALIZADO
26 de mayo de 2025	HGM03042025-80	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	CANTIDADES DE OBRA
29 de mayo de 2025	HGM03042025-81	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REMISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA CON REPROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA – ALCANCE COMUNICADO HGM24052024-77 / RESPUESTA COMUNICADO OFC-119 INTERHOSPITAL-2024 Y OFC-121 INTERHOSPITAL-2024 TRAMITE FINALIZADO

PERSONERÍA DE COVEÑAS

Coveñas, mayo 05 de 2025

Radicado: PMC-127

Doctor:
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura Departamental
Despacho.

Doctor:
NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
Representante Legal Contratista Consorcio CMO Hospital Sucre
Despacho.

Doctor:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legal Interventoría Consorcio Inter hospital Coveñas 2024
Despacho

Doctor:
SAMIR TAMAYO ÁLVAREZ
Secretario De infraestructura
Despacho

Señores:
VEEDORES CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DE HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS
Despacho

Doctora
NETSKY FERIA MORENO
Alcaldesa Municipal Coveñas
Despacho

ASUNTO: Convocatoria a reunión

Respetados señores,

Mediante la presente me permito convocarlos a una reunión con el fin de hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DE HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, el día martes 13 de mayo de 2025 a las 9.30am en la Casa de la cultura 1er piso.

Cordialmente,

JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
Personero Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Luz Yenny Palacios Cuesta	Contratista		05/05/2025
Revisó	James David Palacios	Personero Municipal		05/05/2025
Aprobó	James David Palacios	Personero Municipal		05/05/2025
Los arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.				

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 5 mayo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura Gobernación de Sucre
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co

HGM24052024-72

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Reprogramacion Mesa Técnica

Cordial saludo

En atención a la solicitud de las mesas técnicas, programadas para el próximo 7 de mayo de 2025, respetuosamente solicitamos sean reprogramadas, dado que el día siete (7), tenemos agendado previamente visita con los proveedores de eterboard para muros y cielo rasos, redes electricas por las modificaciones pertinentes de aires acondicionado, pisos exteriores e interiores, ventaneria, con el objeto de revisar situaciones técnicas que se desarrollaran en las mesas técnicas.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 5 mayo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura Gobernación de Sucre
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co

HGM24052024-73

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Relacion solicitud de informacion relacionada con la ejecucion del contrato de obra LP-018-2023

Cordial saludo

En atención al oficio No. 800.11-03/SI 0851 enviado por la Gobernación de Sucre el día 29de abril con el fin de dar respuesta a la solicitud del Senador de la República, Dr. Alex Flórez Hernández, el día el 28 de abril:

• Informe de cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, incluyendo información detallada sobre el pago de salarios, aportes a seguridad social, prestaciones sociales y condiciones de vinculación del personal.

• Informes de calidad técnica de la obra: pruebas de materiales, ensayos de carga o cualquier otro documento técnico que permita evaluar el estado de la estructura.

• Fechas previstas de entrega actualizadas, junto con las medidas adoptadas para

asegurar la culminación del proyecto en los términos de calidad, plazo y costo establecidos.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

ANEXO:

1. *CARPETA ZIP OBLIGACIONES SOCIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA*
2. *INFORMES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES HASTA LA FECHA*
3. *FECHAS PREVISTAS Y ENTREGA DE PLANES*

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 13 de mayo de 2025

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura Gobernación de Sucre
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Doctor
ANDRES RAFAEL VIVERO LEÓN
Secretaria General Gobernación de Sucre
Calle 25 No. 25B - 35 Av. - juridica@sucre.gov.co

Doctora
KEYNA MEBARAK COVALEDA
Secretaria de Planeación Gobernación de Sucre
Calle 25 No. 25B - 35 Av. - keyna.mebarak@gobsucre.gov.co

Doctora
LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Gerente General ENTERRITORIO
Calle 26 No 13 -19. Bogotá D.C., Colombia - correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor

HGM24052024-75

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Objeción Medida Apremio Por Atraso en el Programa de Obra del CO-018-2023, en razón a deficiencias generalizadas en los diseños, ruptura del equilibrio económico e imposibilidad de ejecución.

Respetados señores,

Por medio de la presente, y en ejercicio de nuestras responsabilidades contractuales, nos dirigimos respetuosamente a usted para manifestar nuestra ENFÁTICA OBJECIÓN A LA MEDIDA DE APREMIO solicitada por la interventoría en razón a que las situaciones que vienen generando el **atraso en el Programa de Obra no son de responsabilidad del contratista de obra, sino en virtud a la persistencia de deficiencias generalizadas y estructurales en los diseños técnicos suministrados por la entidad contratante**, **las cuales constituyen una circunstancia sobreviniente, imprevisible y ajena a la esfera de control y responsabilidad del contratista**, además de la grave alteración la ecuación económica del contrato tanto en recursos financieros como en el plazo del contrato, que vienen originando la imposibilidad material y jurídica de continuar parcialmente las obras.

Con el objeto de que **no se de inicio** a la medida solicitada por la interventoría, a continuación, presentamos respuesta a cada uno de los hechos aducidos por la interventoría, presentando evidencias contundentes que comprueban la realidad de las graves afectaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras, que viene sufriendo el Consorcio Contratista, de las cuales tienen conocimiento tanto la interventoría como la entidad contratante, pero dado que como contratistas nos hemos distraído en actuar para darles solución pronta, no hemos generado la trazabilidad de las numerosas deficiencias que aún seguimos encontrando y que impactan directamente la continuidad de los trabajos de ejecución de obras; por ello rechazamos contundentemente que las situaciones que vienen afectando gravosamente al consorcio constructor, socializadas y explicadas en cada escenario no sean estudiadas y valoradas con objetividad y a cambio se ponga al contratista de obra en total situación de indefensión.

RESPECTO AL PLAZO DEL CONTRATO:

Respecto al Plazo del contrato, estimado en dieciocho (18) meses (contados a partir del perfeccionamiento del contrato), es evidente (de acuerdo con los documentos contractuales publicados) que el plazo de ejecución del contrato ha sufrido desequilibrio en dos momentos contractuales a saber:

1. El primero por efecto de las **MAYORES CANTIDADES DE OBRA** reportadas por la interventoría el día 3 de octubre de 2024, y que justificaron el **Modificatorio No 01**[1], con fecha 21/11/2024, por valor de Dos Mil Millones Setecientos Sesenta Mil Seiscientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte. ($2.760.630.453=). En cuya justificación la interventoría evidencia mayores cantidades de obra debido a que el terreno donde se ubica el proyecto es de baja capacidad portante que aumentó la profundidad de desplante en 1,5 metros que genero aumento en las cantidades de excavaciones lleno y concretos.

   Evidentemente las mayores cantidades de obra generaron una prorroga tacita en el plazo del contrato, lo cual está ampliamente explicado en la consideración 9 del modificatorio No 01 del contrato:

   9. Que la Agencia Colombia Compra Eficiente ha analizado que: "*Como distinción inicial, se tiene* ***prórroga está particularmente ligado con la modificación –ampliación– del plazo de lo adiciones con el incremento del valor, debido a la inclusión de nuevas obligacio introducción de nuevas actividades o por la ejecución de una mayor cantidad d inicialmente***; *(…) Durante la fase de ejecución de los contratos estatales, las partes podrían de las siguientes situaciones: i) la necesidad de acometer mayores cantidades de los íte inicialmente previstos, a lo que en la práctica se le conoce como «mayores cantidades a*

[1]Anexo 1: Modificatorio No 01 del 21 Nov 2024 – 4 folios

Y, aunque se enuncia el tratamiento de la ampliación del plazo del contrato (prorroga), este desequilibrio no fue subsanado por la interventoría en representación de la entidad.

Para mayor claridad revisemos entonces los documentos contractuales respecto al retraso en la ejecución y plazo del contrato a la fecha de la modificación del contrato (21 noviembre de 2024); del certificado de avance financiero de la Interventoria[2], de fecha 30 de septiembre del 2024, se tiene un avance acumulado del 7,01%,

TOTAL EJECUCION ACUMULADA	$ 2.411.671.524

Para constancia se firma a los 30 días del mes de septiembre del 2024.

y del informe de interventoría No 4[3] una ejecución programada por valor de $5.895.255.394, equivalente al 17.13%:

COMPONENTE	PROGRAM
OBRA CIVIL	$ 5.895.255.3
EQUIPOS	
AMUEBLAMIENTO	

Es decir, de los documentos que soportan el modificatorio No 01 se colige la existencia de un atrasó del 10,12% en las actividades contractuales por efecto de los argumentos avalados por la Interventoria en el modificatorio.

Aunado a esto el plazo necesario para ejecutar obras por efecto de mayores cantidades de obra por valor de $2.760.630.453=, es decir un 8% por mayores cantidades de obra.

Se concluye entonces de los documentos que soportan el modificatorio No 01 que por efecto de las situaciones presentadas en obra que afectaron la normal ejecución del

[2] Anexo 2: certificado de avance financiero de la Interventoria – 3 folios
[3] Informe de Interventoría No 04, soporte del contrato modificatorio.

plazo una afectación del 10,12% del plazo inicial, y por efecto del plazo necesario para ejecutar las mayores cantidades de obra el 8.0% del plazo inicial, para un total del **18,12% adicional al plazo establecido** en el contrato, es decir una afectación en el plazo de ejecución del contrato de obra de **3,26 meses adicionales – noventa y siete (97) días adicionales** (18 meses x 0,1812= 3,26 meses x 30 = 97 días), lo cual no fue reconocido en la modificación del plazo del contrato al momento de la suscripción por las partes intervinientes.

2. **Reprogramación de obras**[4], **con fecha 12 de marzo de 2025** (HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025 - ver anexo 4), por efecto de la imposibilidad de llevar a cabo obras capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00, 25.00.00, aparatos sanitarios, carpintería en madera, metálica, aluminio, acero inoxidable, y deficiencias en el sistema de aire acondicionado HVAC.
   Esta solicitud **viabilizada por la interventoría**[5] (OFC-085-INTERHOSPIATL-2024, del 18/04/2025- Ver anexo 5), en cuyo oficio establece: *"…, por razones evidentes, estas actividades no pueden ejecutarse en este momento, representando aproximadamente el 5% del avance total",* cursiva y subrayado fuera de texto; reconoce la imposibilidad de ejecutar obras por valor de mil ochocientos cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. $1.859.069.654= ($37.181.393.077 x 5%).
   En atención al equilibrio contractual respecto al plazo del contrato, es decir 18 meses, para ejecutar obras por valor de $1.859.069.654=, equivalentes al 5.4% del valor pactado inicialmente (1.859.069.654/34.420.762.624=5.4%), serían necesarios 0,97 meses (5,4% x 34.420.762.624 = 0.97) del plazo inicial, es decir veintinueve días (0.97 x 30 = 29).

   Se concluye entonces que con base en los documentos que soportan la reprogramación de obras que **por efecto de las dificultades presentadas en obra no se pudieron atender obras programadas por valor de 1.859.069.654, cuya afectación al plazo es de 29 días calendario.**

CONCLUSIÓN: DEMOSTRADO ESTÁ, CON LAS EVIDENCIAS DE LOS DOS MOMENTOS CONTRACTUALES, QUE LAS AFECTACIONES DIRECTAS AL PLAZO DEL CONTRATO POR **FACTORES NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA** SON DE CIENTO VEINTE SEIS DÍAS, y por tanto no es viable que la interventoría manifieste como causa del proceso conminatorio un atraso de 127 días y con ello sea tasada de manera incipiente la multa correspondiente, sin hacer ningún análisis más juicios de las situaciones que vienen afectando el contrato y que han sido reconocidas por ellos mismos en su comunicados oficiales.

HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025: Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC. (Ver anexo 8)

[4] Anexo 3: Comunicado HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025: Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC. – 3 folios

[5] Anexo 4: OFC-085-INTERHOSPIATL-2024 Aprobación Reprogramación Obra – 1 folio

RESPECTO DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA

A continuación, se da respuesta detallada a cada uno de los hechos en los cuales la interventoría aduce un posible incumplimiento, con el objeto de demostrar que los mismos no pueden ser aducidos como incumplimiento por parte del contratista de obra tal como de mostramos a continuación:

a) Solicitud mediante oficio OFC-070-INTERHOSPITAL-2024 (19/02/2025): La interventoría solicita la entrega de cantidades de obra actualizadas para todos los ítems que componen el presupuesto y reprogramación de obra de las actividades que no se pueden llevar a cabo.

Respuesta: En atención a dicha solicitud se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-45[6] de fecha 04/03/2025: Entrega de Balance de obra y Estudio de Mercado. (Ver anexo 5)

2. HGM24052024-46[7] de fecha 04/03/2025: Remisión Balance de Obra No 02 y Solicitud de Suspensión No 01. (Ver anexo 6)

3. HGM24052024-48[8] de fecha 12/03/2025: Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC. (Ver anexo 7)

4. HGM24052024-49[9] de fecha 12/03/2025 (Ver anexo 8): Solicitud mesas de trabajo por la existencia de vacíos e incongruencias en los siguientes temas:

   1. Faltante de áreas de pasarelas para interconexión entre los bloques.
   2. Cantidades mayores en muros.
   3. Conexión principal de aguas limpias a distribución interna de redes hidráulicas.
   4. Conexiones faltantes para desagües en zonas claves críticas de redes de aguas patógenas que deberían de contar con dicho suministro de acuerdo a la norma de habilitación 3100 del 25 de noviembre del 2019.
   5. conexión y ubicación de sillas odontológicas, al igual que la ubicación de los compresores con su red de gases medicinales.
   6. cantidades mayores en redes contraincendios por la reubicación de los tanques de almacenamiento.

   Solicitud a la Interventoria para que requiera de manera urgente a la firma consultora la definición del diseño final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Según los planos y el presupuesto actual, no cuenta con ella ya que existe el ítem como una estructura que contiene columnas, entrepisos, muros y cubierta y no como el sistema integrado para realizar el tratado de aguas residuales.

---

[6] Anexo 5: Comunicado HGM24052024-45 de fecha 04/03/2025: Entrega de Balance de obra y Estudio de Mercado.
[7] Anexo 6: Comunicado HGM24052024-46 de fecha 04/03/2025 Remisión Balance de Obra No 02 y Solicitud de Suspensión No 01.
[8] Anexo 7: Comunicado HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025 Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC.
[9] Anexo 8: Comunicado HGM24052024-49 de fecha 12/03/2025 Solicitud mesas de trabajo por la existencia de vacíos e incongruencias

5. HGM24052024-47[10] de fecha 13/03/2025: Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC. (Ver anexo 9)

6. HGM24052024-50[11] de fecha 14/03/2025: Solicitud de Diseños instalaciones Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR (Ver anexo 10)

b) **OFC-072-INTERHOSPITAL-2024 (19/02/2025)**: Convocatoria Comité Técnico, para revisar mayores cantidades e inconsistencias en la programación.

Respuesta: está solicitud fue respuesta lógica al comunicado HGM24052024-49 del contratista de obra, y en ella se trataron los temas relacionados con las múltiples situaciones que afectan la ejecución del contrato, tanto por vacíos técnicos en los diseños como en la definición de actividades propias de obra que no permiten establecer con claridad el balance de las cantidades de obra y el alcance físico y económico del contrato.

c) **OFC-086-INTERHOSPITAL-2024 (25/03/2025)**: presentación de un informe sobre los atrasos y solicitud formal de un Plan de Contingencia.

Respuesta: En atención a dicha solicitud se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-54[12] de fecha 29/03/2025: Respuesta a oficio OFC-086 OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024. (Ver anexo 11)

2. HGM24052024-58[13] de fecha 03/04/2025: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA (Ver anexo 12).

d) **OFC-094-INTERHOSPITAL-2024 (31/03/2025)**: Entrega Plan de contingencia con fecha máxima 2 de abril y entrega ajustes y/o optimización sistema HVAC, con fecha máxima de entrega 10 de abril.

Respuesta: En atención a la solicitud del **Plan de Contingencia** se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-58[14] de fecha 03/04/2025: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA (Ver anexo 13).

2. HGM24052024-62[15] de fecha 07/04/2025: SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN DEL DESEQUILIBRIO

[10] Anexo 9: Comunicado HGM24052024-47 de fecha 13/03/2025 Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC.
[11] Anexo 10: Comunicado HGM24052024-50 de fecha 14/03/2025 Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC.
[12] Anexo 11: Comunicado HGM24052024-54 de fecha 29/03/2025 Respuesta a oficio OFC-086 OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024.
[13] Anexo 12: Comunicado HGM24052024-58 de fecha 03/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
[14] Anexo 12: Comunicado HGM24052024-58 de fecha 03/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

ECONOMICO (Ver anexo 13). Esta solicitud se instauro con el objeto lleve a cabo la validación y comprobación de las situaciones que afectan gravosamente el equilibrio económico del contrato e impiden determinar el alcance físico y financiero, lo que impacta directamente en el alcance del contrato de obra.
Se enfatiza en la existencia de vacíos e incongruencias que solicitamos sean valoradas por la interventoría, entre ellas son fundamentales las variaciones sustanciales en las cantidades de obra, las modificaciones en los diseños y la falta completa de diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

3. HGM24052024-65[16] de fecha 08/04/2025: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA - CORREGIDO (Ver anexo 14).

4. HGM24052024-68[17] de fecha 21/04/2025: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA V3 - CORREGIDO (Ver anexo 15).

   En atención a la solicitud del **Optimización Del Sistema HVAC** se enviaron los siguientes comunicados:

5. HGM24052024-66[18] de fecha 19/04/2025: Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios. (Ver anexo 18).

6. HGM24052024-67[19] de fecha 21/04/2025: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO (Ver anexo 19).

COMENTARIO: Rechazamos que la interventoría motive un posible incumplimiento por efecto de una **obligación no inherente al contratista de obra,** la cual es la propuesta de optimización y/o cambio de los componentes en el Sistema de Aire Acondicionado HVAC.

e) **OFC-097-INTERHOSPITAL-2024 (15/04/2025)**: Reiteración entrega ajustes y/o optimización sistema HVAC, con fecha máxima de entrega 14 de abril.

Respuesta: En atención a la solicitud del **Optimización Del Sistema HVAC** se enviaron los siguientes comunicados

1. HGM24052024-66[20] de fecha 19/04/2025: Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios. (Ver anexo 18).

---

[15] Anexo 13: Comunicado HGM24052024-62 de fecha 07/04/2025 SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN DEL DESEQUILIBRIO ECONOMICO

[16] Anexo 14: Comunicado HGM24052024-65 de fecha 08/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA - CORREGIDO

[17] Anexo 15: Comunicado HGM24052024-68 de fecha 21/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA V3 - CORREGIDO

[18] Anexo 16: Comunicado HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025 Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios.

[19] Anexo 17: Comunicado HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025 SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO

2. HGM24052024-67[21] de fecha 21/04/2025: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DETRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO (Ver anexo 19).

f) **OFC-100-INTERHOSPITAL-2024 (21/04/2025)**: la Interventoria en su comunicado de apremio OFC-100-INTERHOSPITAL-2024 enuncia al respecto:

- El 21 de abril, a través del oficio OFC-100-INTERHOSPITAL-2024, garantizar la adecuada implementación y cumplimiento del plan de presentado mediante oficio HGM24052024-65, se solicitó al contratis semanal del formato de informe F-IH001, con el fin de que específicamente las actividades y cantidades ejecutadas durante el tra semana y el personal que laboro en obra. Es importante aclarar que dic a ser entregado a la interventoría y este a su vez remitido a la Goberr ha puesto en marcha toda vez que la programación de obra y flujo d mismo fue entregada el día de ayer 6 de abril de 2025, mediante corre

NO COINCIDE, el texto anterior con el contenido del comunicado OFC-100-INTERHOSPITAL-2024[22] entregado al contratista de obra, donde la interventoría formalmente manifiesta no contar con facultades para estudiar y validar el desequilibrio económico del contrato tal como se detalla a continuación:

> La interventoría, en ejercicio de sus funciones contractuales, **no cuenta co legal ni contractual para convocar, autorizar ni negociar mecanismos d restablecimiento del equilibrio económico del contrato**. Esta es una exclusiva de la **entidad contratante**, en este caso la Gobernación de Sucre, d de considerarlo procedente y conforme a la normativa aplicable, puede

Y, en otro aparte enuncia:

> En este sentido, cualquier solicitud tendiente a modificar el equilibrio económic deberá ser **tramitada directamente ante la Gobernación de Sucre**, acom documentación soporte correspondiente, para que sea evaluada conforme a

[20] Anexo 16: Comunicado HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025 Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios.
[21] Anexo 17: Comunicado HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025 SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO
[22] Anexo 18: Comunicado interventoría OFC-100-INTERHOSPIATL-2024 Respuesta oficio HGM24052024-62

Por tanto, los hechos aducidos por la interventoría en su comunicado de apremio, página 3 párrafo 2 no son ciertos.

No obstante, el comunicado OFC-100-INTERHOSPITAL-2024, fue contestado mediante comunicado HGM24052024-70[23] de fecha 26/04/2025 (anexo 19). Con el Asunto: Respuesta al Oficio OFC-100 – Solicitud de requerimiento a la entidad contratante y reactivación de análisis técnico conjunto

g) **OFC-105-INTERHOSPITAL-2024 (23/04/2025)**: Respecto a la revisión de los diseños ajustado del sistema HVAC se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025: Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios. (Ver anexo 16).

2. HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO (Ver anexo 17).

Ha sido nuestra solicitud, que las revisiones acerca del diseño del sistema de HVAC, se hagan de manera conjunta, sin embargo, la interventoría solicita en su comunicado que el contratista de respuesta a las siguientes observaciones:

- *No se especifica si las modificaciones al sistema HVAC afectan otras redes y diseños existentes. En consecuencia, no hay claridad sobre posibles afectaciones ni se plantean ajustes en caso de ser necesario.*
- *No se incluyen las especificaciones técnicas detalladas de cada ítem, así como de los equipos y suministros propuestos.*
- *No se presenta el presupuesto correspondiente, ni la memoria de cantidades y análisis de precios del sistema propuesto. Cabe recordar que, para los materiales, equipos, mano de obra y transporte requeridos, deben aportarse al menos tres (3) cotizaciones como respaldo para el análisis.*

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos remitir la información faltante en un plazo no mayor a tres (3) días calendario, ya que estos documentos son insumos indispensables para realizar una evaluación integral del proyecto y dar cumplimiento al compromiso de revisión asumido por la interventoría.

Nuevamente, la interventoría pone como responsabilidad del contratista la obligación de los diseños, y establece en cada comunicado nuevos alcances de los documentos que hemos generado de nuestra parte sin que el contratista de obra reciba pago alguno, ES INDEBIDO A TODAS LUCES QUE LA INTERVENTORIA IMPONGA CARGAS AGENAS

[23] Anexo 19: Comunicado HGM24052024-70 de fecha 26/04/2025. Respuesta al Oficio OFC-100 – Solicitud de requerimiento a la entidad contratante y reactivación de análisis técnico conjunto

A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA POSTERIORMENTE ADUCIR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA E IMPONER SANCIONES.

h) **OFC-111-INTERHOSPITAL-2024 (23/04/2025):** Respecto a la revisión de los diseños ajustado del sistema HVAC se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025: Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios. (Ver anexo 16).

2. HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO (Ver anexo 17).

Ha sido nuestra solicitud, que las revisiones acerca del diseño del sistema de HVAC, se hagan de manera conjunta, sin embargo, la interventoría solicita en su comunicado que el contratista de respuesta a las siguientes observaciones:

- *No se especifica si las modificaciones al sistema HVAC afectan otras redes y diseños existentes. En consecuencia, no hay claridad sobre posibles afectaciones ni se plantean ajustes en caso de ser necesario.*

- *No se incluyen las especificaciones técnicas detalladas de cada ítem, así como de los equipos y suministros propuestos.*

- *No se presenta el presupuesto correspondiente, ni la memoria de cantidades y análisis de precios del sistema propuesto. Cabe recordar que, para los materiales, equipos, mano de obra y transporte requeridos, deben aportarse al menos tres (3) cotizaciones como respaldo para el análisis.*

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos remitir la información faltante en un plazo no mayor a tres (3) días calendario, ya que estos documentos son insumos indispensables para realizar una evaluación integral del proyecto y dar cumplimiento al compromiso de revisión asumido por la interventoría.

Nuevamente, la interventoría pone como responsabilidad del contratista la obligación de los diseños, y establece en cada comunicado nuevos alcances de los documentos que hemos generado de nuestra parte sin que el contratista de obra reciba pago alguno, ES INDEBIDO A TODAS LUCES QUE LA INTERVENTORIA IMPONGA CARGAS AGENAS A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA POSTERIORMENTE ADUCIR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA E IMPONER SANCIONES.

RESPUESTA AL PÁRRAFO FINAL DE LOS HECHOS

Las condiciones actuales del proyecto, incluyendo los atrasos en el cronograma de obra y las afectaciones al equilibrio económico del contrato, no son resultado de una negligencia o incumplimiento atribuible al Contratista. Reiteramos que la viabilidad y éxito de este tipo de proyectos de infraestructura pública demandan una planeación rigurosa y la entrega de diseños completos y coherentes desde el inicio, así como un trabajo mancomunado y diligente entre la Entidad Contratante y el Contratista para abordar los hallazgos y necesidades de optimización que surjan durante la ejecución. En este sentido, las necesidades de revisión y optimización de los diseños originales, así como la consideración de las condiciones particulares del terreno y ambientales no consideradas en su totalidad en los estudios y diseños iniciales, surgen de un análisis exhaustivo **in situ durante el desarrollo propio de la obra**, donde se han identificado **particularidades inherentes a la construcción diaria, así como cambios en la normativa aplicable** desde la concepción de los diseños.

I. PLAN DE ACCIÓN:

Conscientes de la importancia del proyecto para el interés público y en aras de mantener el impulso de la obra, manifestamos nuestra disposición a proceder con las labores que, de alguna manera, puedan desarrollarse sin estar comprometidas por los puntos críticos presentados en esta misiva. Lo anterior, a fin de mantener un avance de la obra, en tanto se resuelven las definiciones fundamentales. Para ello, y como muestra de nuestra buena fe y compromiso, presentaremos en el menor tiempo posible un plan de contingencia con su respectivo anexo de reprogramación, que permitirá seguir avanzando en los frentes posibles. Sin embargo, es fundamental señalar que, pese a nuestros esfuerzos y este plan de contingencia, **la obra inevitablemente enfrentará un letargo significativo** debido a la poca capacidad de ejecución que se presentará frente a una toma de decisiones de fondo y la necesidad de reformulación de los diseños y selección de materiales, además de los cambios que las propias normas que regulan el sector salud nos obligan a realizar. La operatividad completa y eficiente de la obra está supeditada a la resolución de estos desafíos técnicos y normativos.

II. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS ORIGINALES Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN:

Desde los inicios de la ejecución del contrato, hemos constatado que los diseños entregados, si bien representan una base fundamental, requieren ser optimizados para asegurar su plena funcionalidad y el cumplimiento normativo. Estas optimizaciones, que se hacen evidentes en el desarrollo mismo de la obra y gracias a nuestra experiencia específica en este tipo de proyectos, así como por la evolución de la normativa aplicable, son cruciales para su total congruencia con la realidad de la localización del proyecto (altas condiciones de humedad y salinidad), las características del terreno (suelos poco cohesivos e inestables, alto nivel freático, evidencia de movimientos en masa pasados), y las condiciones

ambientales (temperaturas elevadas y radiación solar intensa). Esto ha requerido que, como Contratista, hayamos tenido que revaluar constantemente el cumplimiento de la normativa actual y llevar a cabo una coordinación integral entre las diferentes especialidades desde cero.

A continuación, detallamos las necesidades específicas de optimización en los diseños que han generado los atrasos y la alteración del equilibrio económico, tal como se expuso en nuestro Oficio HGM24052024-70:

- **Cimentación:** Se encontraron discrepancias fundamentales en las profundidades de desplante y una falla geológica de gran magnitud. Esto exigió sobre-excavaciones no contempladas y el uso de entibados para la seguridad del personal, generando costos adicionales asumidos por el Contratista. La definición de la cimentación se prolongó por un periodo de **3 meses (del 15 de agosto al 21 de noviembre)**, afectando directamente el inicio de otras actividades

- **Estructuras:** El diseño estructural presenta omisiones e incoherencias (ej. necesidad de vigas de enlace para amarrar zapatas, aumento de longitudes de columnas por cambio de cota, separación de tanques de almacenamiento). Estos ajustes han ralentizado los procesos y han generado un retraso significativo de **1.8 meses**, aunque se han subsanado paralelamente a la construcción. La responsabilidad de entregar diseños completos y construibles que garanticen la operatividad y eficiencia de la obra recae en la Entidad Contratante.

- **Redes Hidrosanitarias:** Se detectó la falta de conexión principal de la red de agua potable, la necesidad de reubicar tanques por inestabilidad del terreno, un rediseño de la red contra incendios con mayores recorridos y cambios en presiones de diseño (implicando cambio de equipos de bombeo), y deficiencias en las descargas de desechos patógenos y sifones de piso. Esto ha llevado a la inclusión de ítems no previstos en el contrato.

- **Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR): No existe un diseño final** para esta planta. La información proporcionada es incompleta y no especifica el tratamiento requerido para aguas domésticas, no domésticas y patógenas. Sin un diseño aprobado por las autoridades ambientales y de servicios, la operación futura del hospital es inviable, lo cual podría configurar un detrimento patrimonial para el Estado. La ausencia de este diseño definitivo impide el avance en un componente crítico del proyecto y compromete su funcionalidad futura.

- **Redes de Ventilación Mecánica (HVAC):** El diseño presenta serias deficiencias, incluyendo la falta de cobertura de aire acondicionado en áreas críticas (ej. cuarto de CCV, almacenamiento de insumos), aislamiento insuficiente de áreas de riesgo (ej. sala de autopsias), y la ausencia de condiciones especiales (filtración, temperatura, renovación de aire) en quirófanos, salas de parto, laboratorios y farmacias. Además, la instalación de estas redes es una precedencia para otras instalaciones (contraincendios,

agua, eléctrico, gases medicinales), lo que implica que el atraso en esta definición afecta directamente otros capítulos de la obra.

- **Redes de Gases Especiales:** No se contemplan puntos de conexión para sillas odontológicas y existe una configuración incorrecta de compresores y controladores que debilita la presurización del sistema, incumpliendo además la Resolución 1497 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social.

- **Instalaciones Eléctricas:** Los cambios en los sistemas HVAC, bombeo y STAR afectan directamente las cargas de operación del diseño eléctrico. La definición de este sistema está supeditada a la aprobación de los diseños de todos los sistemas mencionados (HVAC, STAR, Hidrosanitario, gases medicinales), lo que a su vez impide el cumplimiento normativo del RETIE (2023).

III. CONSECUENCIAS DIRECTAS EN EL CRONOGRAMA Y AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

La programación inicial de la obra, construida bajo la premisa de diseños completos y aptos para una ejecución directa, **requiere una revalidación a la luz de las inconsistencias y necesidades de optimización identificadas**. Las desviaciones en la cimentación marcaron el inicio de una cadena de retrasos que no son imputables a nuestra gestión, sino a la necesidad de abordar estas optimizaciones. Es evidente que cualquier cambio en los diseños originales altera ineludiblemente el alcance, el tiempo y el costo del proyecto, tal como lo establece la "triple restricción" en la gestión de proyectos.

A la fecha, la insistencia en mantener la medición del avance del proyecto basada en una programación inicial que no refleja el cambio en el alcance ni la ausencia de diseños definitivos, es contraproducente y no permite una comparación justa. Es fundamental disponer de los diseños definitivos u optimizados para la construcción de elementos específicos, pues su ausencia impide la ejecución material y genera inviabilidad jurídica. El 57.86% del presupuesto del proyecto aún depende de estas definiciones.

Hemos alertado sobre una nueva alteración al equilibrio económico del contrato, debido a las mayores cantidades de obra y actividades nuevas requeridas. Además, destacamos que la propia Interventoría emitió una respuesta favorable a una solicitud de suspensión anterior (OFC-073-INTERHOSPITAL-2024 del 5 de marzo de 2025), la cual, hasta la fecha, no ha culminado su trámite por parte de la entidad contratante.

IV. NUESTRA VOCACIÓN COLABORATIVA Y LA URGENCIA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Como Contratista, hemos adoptado una postura proactiva y colaborativa, coordinando los diseños de manera autónoma para anticipar y resolver problemas. Hemos presentado reprogramaciones (la del 12 de marzo de 2025, priorizando urbanismo y exteriores) y un plan de contingencia (3 de abril de 2025, con correcciones el 8 de abril), a pesar de que una gran parte del presupuesto depende de diseños aún no optimizados. Subrayamos que este

ejercicio proactivo requiere una correlativa respuesta diligente por parte de la Entidad Contratante, en el marco del deber de colaboración mutua que rige la contratación estatal. La persistencia de observaciones y aclaraciones sin resolver nos impide vislumbrar el alcance físico y económico real del contrato con la claridad necesaria para una ejecución óptima.

V. PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

Nuestra solicitud de medidas correctivas parte de una necesidad elemental: garantizar que el contrato siga siendo viable técnica y económicamente, y que el interés público no se vea afectado por condiciones ajenas a la voluntad del contratista.

- Alteración del equilibrio contractual: Las condiciones encontradas en obra, como la falta de diseños definitivos o la necesidad de optimizarlos, son situaciones sobrevenidas que no dependen del contratista. Estas circunstancias han generado una afectación significativa a la ecuación inicial del contrato, y no avanzar sin corregirlas pondría en riesgo tanto la calidad del proyecto como los recursos públicos involucrados.

- Limitaciones técnicas que impiden continuar: La ejecución de una obra requiere contar con insumos técnicos claros, viables y ejecutables. Si requieren ajustes sustanciales, la responsabilidad recae en quien debe garantizarlos. El contratista no puede avanzar de forma segura ni eficiente si se encuentra con inconsistencias que bloquean el desarrollo del proyecto.

- Necesidad de colaboración efectiva: El cumplimiento del contrato no es una tarea unilateral. Cuando se presentan alertas técnicas, se espera que haya respuesta oportuna y soluciones desde la administración. La ausencia de decisiones frente a los problemas detectados ha generado una barrera real que impide avanzar sin exponerse a errores o reprocesos.

- Suspensión como medida responsable: Frente a este panorama, la suspensión no debe entenderse como una interrupción negativa, sino como una herramienta preventiva y estratégica. Suspender temporalmente la ejecución permite revisar, ajustar y garantizar que las condiciones estén dadas para seguir adelante sin desperdiciar recursos ni comprometer la calidad del resultado.

VI. COMPROMISO FORMAL: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y ANEXOS TÉCNICOS

En concordancia con lo expuesto en el presente escrito y reafirmando nuestro compromiso con la continuidad y el éxito del proyecto, informamos que presentaremos formalmente un plan de contingencia acompañado de los respectivos anexos técnicos que sustentan la propuesta de reprogramación contractual. Dichos documentos establecerán una priorización clara de las actividades que no se ven afectadas por los hallazgos técnicos y normativos descritos en esta comunicación, permitiendo así una hoja de ruta viable para el avance parcial de la obra.

Este plan se ha diseñado bajo criterios de eficiencia operativa, considerando las restricciones técnicas actuales, y tiene como propósito mantener la dinámica contractual mientras se adoptan las decisiones de fondo requeridas por parte de las entidades competentes.

De no ser posible la adopción inmediata de dichas decisiones, solicitamos anticipadamente que, una vez culminadas las actividades no condicionadas a los aspectos técnicos en revisión, se decrete la suspensión temporal del contrato. Esta medida permitiría a las entidades aportantes contar con el tiempo y la capacidad técnica, jurídica y financiera necesaria para evaluar y resolver adecuadamente las situaciones advertidas, en aras de garantizar la correcta ejecución y finalización del objeto contractual.

VII. SOLICITUD FORMAL:

En atención a los hechos expuestos y a la realidad técnica que enfrenta el proyecto, consideramos necesario que se reconsidere la apertura del procedimiento por presunto incumplimiento contractual, contenido en el Oficio OFC-115-INTERHOSPITAL-2024, dado que las circunstancias que han generado los retrasos en la ejecución no son imputables en su totalidad al Contratista. Por el contrario, obedecen a la ausencia de decisiones oportunas y a la necesidad de ajustes técnicos, administrativos y normativos cuya resolución recae en la Entidad Contratante.

La programación actualmente vigente no refleja las variaciones sustanciales en el alcance del contrato, ni contempla los efectos generados por la necesidad de la optimización de los diseños, ni la definición adecuada de materiales conforme a las condiciones reales de ejecución. Esta situación ha provocado una distorsión significativa en la evaluación del avance físico y financiero de la obra, al medirse contra una línea base construida sobre insumos técnicos parciales o desactualizados. Por tanto, solicitamos que dicha medición se limite exclusivamente a los frentes de obra que han podido ser ejecutados, dado que no es necesaria una optimización ni de los diseños de ni de los materiales necesarios para la ejecución.

Reafirmamos que la reprogramación constituye, para el Contratista, la vía técnica y jurídicamente preferente para continuar con la ejecución del proyecto. No obstante, si la Entidad no adopta en el corto plazo las decisiones que permitan disponer de diseños y materiales optimizados, será necesario solicitar la suspensión temporal del contrato como mecanismo subsidiario, preventivo y legalmente reconocido, con el fin de evitar una ejecución ineficiente, el riesgo de reprocesos y la eventual consolidación de un detrimento al patrimonio público.

VIII. REFUTACIÓN DEL OFICIO OFC-115 DE LA INTERVENTORÍA

Respecto del contenido del Oficio OFC-115-INTERHOSPITAL-2024, se considera que las conclusiones ahí contenidas carecen de fundamentación técnica suficiente y omiten de forma sistemática el análisis integral de los antecedentes y hechos sobrevinientes que han sido ampliamente documentados por este contratista. En efecto, la medida de apremio solicitada

se basa en una lectura parcial de los datos de avance sin considerar las afectaciones reconocidas incluso por la propia interventoría en oficios anteriores, como son las fallas estructurales de diseño, la ausencia de la PTAR, las deficiencias graves del sistema HVAC y la falta de definición de redes técnicas esenciales.

Aun cuando se han entregado a la interventoría múltiples versiones del plan de contingencia, balances de obra, estudios de mercado, y rediseños técnicos de alto detalle, la recomendación sancionatoria desconoce por completo el principio de colaboración interinstitucional, el deber de actuación objetiva, y el principio de proporcionalidad. Al desestimar las causas exógenas del retraso, se trasladan injustamente al contratista las consecuencias de omisiones y vacíos que desde el diseño inicial comprometen la viabilidad misma del contrato. La imposición de una medida sancionatoria sin agotar antes los mecanismos técnicos y contractuales de restablecimiento constituye, además, una vulneración al debido proceso administrativo y contractual.

De manera particular, se evidencia una inconsistencia crítica en la base misma de la solicitud de apremio: la interventoría aduce un atraso de 127 días calendario, cifra que omite considerar los 97 días derivados de las mayores cantidades de obra formalizadas en el Modificatorio No. 01 del contrato, y los 29 días adicionales producto de la reprogramación aprobada por la misma interventoría mediante el oficio OFC-085-INTERHOSPITAL-2024. Es decir, un total de 126 días de afectación al plazo, debidamente acreditados y reconocidos institucionalmente, no pueden ser imputables al contratista. Queda entonces en evidencia que el supuesto desfase que motiva el inicio de sanción (127 días) se reduce a un (1) día no explicado, cuya naturaleza y justificación no ha sido objeto de análisis técnico por parte de la interventoría. En consecuencia, no existe fundamento material para estructurar un incumplimiento sancionable.

Solicitamos respetuosamente que, antes de avanzar en una medida de apremio contraria a la realidad fáctica del proyecto, se convoque una mesa técnica con todas las entidades intervinientes, como único escenario idóneo para validar, desde la evidencia, la situación real del contrato y adoptar decisiones proporcionales, legales y ajustadas al interés público.

Ante la necesidad de la entrega del plan de contingencia solicitamos (2 días hábiles) para entregarlo de manera completa, siendo que para el día 15 de mayo estaríamos subsanando.

Para los ajustes de diseño, primeramente, en diseño HVAC, de acuerdo al oficio enviado el día de ayer 12 de mayo de 2025, por medio de la interventoría en base al informe descrito por la supervisión, solicitaron ser mas explícitos en los cambios de acuerdo a las normas, que este incluya memorias descriptiva de los cambios, cálculos, cantidades, presupuesto con sus análisis de precios unitarios y el impacto que este genere en las otras redes como red eléctrica, red hidrosanitaria, así como el anexo de los faltantes, en gases medicinales, rci, y otros tales como la inclusión de las mayores y menores cantidades que se generen en dichos cambios, por medio de un segundo balance de obra, será entregado para su estudio dentro de 30 días hábiles.
En vista que venimos trabajando en conjunto también será entregado el estudio de mercado para poder tratar de balancear la ecuación del contrato, este mismo explicado en los párrafos

anteriores, con el fin de crear los espacios pertinentes por medio de mesas de trabajos técnicas para llevar un resultado a la satisfacción del contrato.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Anexos:

Anexo 1: Modificatorio No 01 del 21 Nov 2024 – 4 folios
Anexo 2: certificado de avance financiero de la Interventoria – 3 folios
Anexo 3: Comunicado HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025: Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC. – 3 folios
Anexo 4: OFC-085-INTERHOSPIATL-2024 Aprobación Reprogramación Obra – 1 folio
Anexo 5: Comunicado HGM24052024-45 de fecha 04/03/2025: Entrega de Balance de obra y Estudio de Mercado.
Anexo 6: Comunicado HGM24052024-46 de fecha 04/03/2025 Remisión Balance de Obra No 02 y Solicitud de Suspensión No 01.
Anexo 7: Comunicado HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025 Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC.
Anexo 8: Comunicado HGM24052024-49 de fecha 12/03/2025 Solicitud mesas de trabajo por la existencia de vacíos e incongruencias
Anexo 9: Comunicado HGM24052024-47 de fecha 13/03/2025 Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC.
Anexo 10: Comunicado HGM24052024-50 de fecha 14/03/2025 Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC.
Anexo 11: Comunicado HGM24052024-54 de fecha 29/03/2025 Respuesta a oficio OFC-086 OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024.
Anexo 12: Comunicado HGM24052024-58 de fecha 03/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
Anexo 13: Comunicado HGM24052024-62 de fecha 07/04/2025 SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN DEL DESEQUILIBRIO ECONOMICO
Anexo 14: Comunicado HGM24052024-65 de fecha 08/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA - CORREGIDO
Anexo 15: Comunicado HGM24052024-68 de fecha 21/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA V3 - CORREGIDO
Anexo 16: Comunicado HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025 Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios.
Anexo 17: Comunicado HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025 SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO
Anexo 18: Comunicado interventoría OFC-100-INTERHOSPIATL-2024 Respuesta oficio HGM24052024-62
Anexo 19: Comunicado HGM24052024-70 de fecha 26/04/2025. Respuesta al Oficio OFC-100 – Solicitud de requerimiento a la entidad contratante y reactivación de análisis técnico conjunto

Copia: Doctora LUCY GARCIA MONTES / Gobernadora De Sucre
Oficina Jurídica Gobernación de Sucre

Gobernación de Sucre | Subsecretaría de Gestión de la Contratación

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-018-2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y EL CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATO ESTATAL No.:	LP-018-2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 34.420.762.624
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO (18) MESES
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	31 DE MAYO DE 2024
MODIFICATORIO No. 1 (ACTUAL MODIFICACION):	SE ADICIONAN $2.760.630.453

Entre los suscritos a saber: **ANDRÉS RAFAEL VIVERO LEÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.556.331, en su calidad de Secretario General del Departamento de Sucre, código 020. Grado 03 de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de Sucre, según resolución de nombramiento número 0016 de fecha 03 de enero de 2024 y acta de posesión del 04 de enero de 2024, y en ejercicio de las facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto No. 0570 del 01 de octubre del 2021 y otras disposiciones, actuando en nombre y representación de la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, y por otra parte, **JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA**, en calidad de representante del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, contratista de obra, quienes manifestaron previamente su consentimiento para llevar a cabo la suscripción de la presente MODIFICACIÓN No. 1 previo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 24 de abril de 2024, se suscribió el Contrato de Obra No. LP-018-2023 entre el departamento de Sucre y el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE con el fin de llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE..
2. Que el día 3 de octubre de 2024 el contratista de obra CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, mediante oficio No. HGM24052024-22 presentó a la interventoría oficio de asunto *SOLICITUD DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA,* en el cual manifiesta entre otras cosas que *"En virtud de la ejecución del contrato en referencia y como lo hemos manifestado mediante comunicación enviada a la interventoría se evidencian cantidades de obra mayores de acuerdo con el balance anexo a la presente, soportadas mediante replanteo de topografía con sus respectivas memorias de cantidades. Igualmente, se realizaron sondeos, debido a que el terreno del proyecto es bajo en capacidad portante, esto para establecer la profundidad de desplante la cual en promedio es de 1,5 m., y con ello aumentar la estabilidad de la estructura, y por lo tanto aumenta la cantidad de metros cúbicos en CONCRETO CICLÓPEO, que soporta dicha estructura. (…) Como se muestra el valor solicitado corresponde a DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MLC ($ 2.760.630.453,00), por lo que estamos haciendo entrega para su revisión y se considere la necesidad aquí planteada para dar cumplimiento al objeto contractual."*

3. Que el día 3 de octubre del 2024 el contratista de interventoría CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024, mediante oficio No. OFC-034-INTERHOSPITAL-2024 dirigido al departamento de Sucre, de asunto SOLICITUD DE ACTUALIZACION POR INCREMENTO DE VALOR NO. 001 AL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" CON CÓDIGO BPIN2023002700021, manifestó que *"Mediante la presente, y en cumplimiento de las funciones adquiridas en el contrato en referencia, les informamos que hemos recibido por parte del contratista de obra oficio de fecha 16 de septiembre de 2024, en el cual solicitan el incremento del valor inicial del proyecto en un porcentaje de 8,02% equivalente a DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MLC ($ 2.760.630.453,00) priorizando para la presente vigencia fiscal con el fin de no suspender la ejecución del proyecto (…) Finalmente tras el análisis de la información presentada por parte del contratista de obra, la interventoría concluye que dichos cambios son necesarios y se ajustan adecuadamente a las necesidades y condiciones presentes en el lugar de ejecución de las obras, y reconoce que las mayores cantidades de obra son pertinentes y necesarias para la ejecución a buen término de las obras en el municipio de Coveñas, concluye que los cambios no afectan la meta del proyecto, por lo que* ***APRUEBA*** *las mayores y menores cantidades presentadas por el contratista para la finalización de la obra contractual (…) Para la ejecución de las obras antes descritas se requiere adicionar el contrato por un valor de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUANTROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MLC ($ 2.760.630.453,00) (…) Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando que hemos analizado las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la solicitud esta interventoría concluye que el ajuste es oportuno y necesario para cumplir con el objetivo del proyecto. Por lo tanto, manifestamos que* ***SÍ AVALAMOS*** *la solicitud de ajuste.*
4. Que el día 24 de octubre de 2024 el Secretario de Infraestructura Departamental mediante oficio 800.11-03/SI-2782 de asunto SOLICITUD DE TRAMITE CONTRACTUAL DE MODIFICACION DEL CONTRATO CONFORME BALANCE DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA EN REFERENCIA dirigido a la Subsecretaría de Gestión de la Contratación, el secretario de infraestructura solicita la adición al contrato de obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE y argumenta que *"La Secretaría de Infraestructura en ejercicio de las funciones de supervisión y seguimiento que viene realizando al contrato de obra, se permite señalar que considera viable técnicamente la modificación del contrato conforme balance de mayores y menores cantidades de obra anexa, aprobada y avalada por la interventoría, toda vez que con ello se persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin el cual, se vería frustrado el cometido propuesto por la Entidad estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia ésta se hace necesaria, para garantizar la oportuna e idónea ejecución del contrato (…) En este sentido, de manera respetuosa se solicita a la Subsecretaría de Gestión Contractual de la entidad, previo estudio de la presente, se adelante el trámite administrativo y cotractual correspondientes para la realización de Modificatorio del contrato conforme balance de mayores y menores cantidades de obra, donde se adicionará la suma de DOS MIL SETECIENTES SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MLC ($2.760.630.453) Anexo envío la siguiente información (…) 3. Copia CDP No. 312 del 28/02/2024".*
5. Que el contrato de obra LP-018-2023 se encuentra aún en ejecución.
6. Que el valor inicial del contrato fue de $34.420.762.624 y la presente adición por valor de $2.760.630.453 representa aproximadamente el 8.02% del valor inicial.
7. Que conforme a lo manifestado por el supervisor, la adición en recursos pretendida en los contratos en mención, persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin el cual, se vería frustrado el fin perseguido por la

entidad estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia ésta se hace necesaria, para garantizar la idónea ejecución del contrato.

8. Que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993.
9. Que la Agencia Colombia Compra Eficiente ha analizado que: "*Como distinción inicial, se tiene que el* ***concepto prórroga está particularmente ligado con la modificación —ampliación— del plazo de los contratos; las adiciones con el incremento del valor, debido a la inclusión de nuevas obligaciones, sea por la introducción de nuevas actividades o por la ejecución de una mayor cantidad de las pactadas inicialmente****; (…) Durante la fase de ejecución de los contratos estatales, las partes podrían identificar alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de acometer mayores cantidades de los ítems o actividades inicialmente previstos, a lo que en la práctica se le conoce como «mayores cantidades de obra», «obras adicionales» o adición de «ítems contractuales»; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan «obras extra» o «amplían el alcance» del contrato mediante la celebración de un «contrato adicional». No obstante, este último término, al igual que los señalados entre comillas —algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra— son nociones doctrinarias y empleadas en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos. Lo importante, y que se reiteró en distintos lugares de este concepto es que frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato, que es lo que implica una adición, por cualquiera de los dos supuesto señalados previamente, e independientemente del nombre que se le dé al acuerdo, aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre se debe observar esta última disposición*." [1] . Así las cosas, es claro que el ordenamiento jurídico en materia de contratación estatal, permite la modificación de los contratos, siempre con miras a dar cumplimiento a los principios como el de Responsabilidad, Eficacia, Eficiencia y siempre encaminada a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, que como en este caso constituyen el objeto contractual.
10. Que, la presente adición constituye una decisión administrativa con el único objeto de hacer prevalecer el interés general, logrando la finalización de la obra pública contratada, no obstante, se deja expresamente establecido que este no constituye una convalidación o purga de posibles incumplimientos que pudieran existir, por lo cual el Departamento se reserva la facultad de adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar en caso de identificarse mora, incumplimiento parcial o cumplimiento tardío de las obligaciones a cargo del contratista, que hayan ocasionado perjuicios al contratante.
11. Todos los soportes constitutivos de la trazabilidad relacionada en la parte considerativa de esta adición de recursos hacen parte integral de la misma
12. Que, vistas las anteriores consideraciones, el Departamento estima la celebración del presente modificatorio al contrato de obra No. LP-018-2023, el cual se sujetará integralmente a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y en especial por las siguientes cláusulas:

[1] Concepto C-628 de 2020

Gobernación de Sucre

Subsecretaría de Gestión de la Contratación

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente modificatorio tiene por objeto adicionar al valor estipulado del acuerdo contractual inicial y realizar la inclusión de mayores y menores cantidades de obra, para el cumplimiento del objeto del contrato principal No. LP-018-2023, suscrito entre las partes antes anotadas.

CLAUSULA SEGUNDA: TERMINO DE ADICIÓN. Se incrementa el valor del contrato principal de obra pública No. LP-018-2023 en DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($2.760.630.453) M/CTE, el cual se encuentra soportado en el balance de obras que hace parte integral del presente modificatorio y amparado en el CDP No. 312 del 28/02/2024.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR CLÁUSULA 5. Se modifica la CÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO del Contrato de Obra No. LP-019-2023 que tiene por objeto el "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", así: Se adicionan las cantidades de obra, las unidades, los precios unitarios y valores finales, tal y como se encuentran definidos dentro del balance de obras anexo, el cual hace parte integral del presente modificatorio.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO ADICIÓN. La entidad pagará los recursos adicionados de la misma manera como se estableció en la minuta contractual dentro de su CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO.

CLAUSULA QUINTA: EJECUCIÓN. Para la ejecución del presente modificatorio deberá actualizarse y posteriormente aprobarse las respectivas garantías.

CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS. El contratista se obliga a ampliar la vigencia de la póliza de la garantía única que ampara el contrato de obra pública No. LP-018-2023, dentro de los parámetros establecidos en la Cláusula No. 18 – Garantías, dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación contractual.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Que, para amparar el valor del presente modificatorio, el Departamento de Sucre cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 312 del 28/02/2024.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal (y sus modificatorios), no modificadas por el presente acuerdo se mantienen vigentes y su exigibilidad permanece.

CLAUSULA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO. La presente MODIFICACIÓN se perfecciona con el acuerdo de las partes a través de la plataforma SECOP II.

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

CERTIFICADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA

CERTIFICA:

Por medio de la presente me permito certificar el avance físico y financiero a la fecha, del contrato de obra LP 018-23, cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.**

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
PROCESO DE SELECCIÓN No.	LP 018-2023
NÚMERO ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.6043985
TIPO DE CONTRATO	LICITACION PUBLICA
CÓDIGO BPIN	2023002700021 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
CONTRATANTE	GOBERNACION DE SUCRE
LOCALIZACION	COVEÑAS – SUCRE
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE – NIT No. 901811441-3 / Representante legal NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
FECHA DE INICIO	31 MAYO DEL 2024
FECHE DE TERMINACION	30 NOVIEMBRE 2025
OBJETO	
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	

CUADRO DE BALANCE FÍSICO Y FINANCIERO

DESCRIPCION	Cantidad acumulada	Vr. Parcial ejecutado	% Ejecución
DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	1212	$ 61.722.312,00	100,00%
CAMPAMENTO, Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoría, dos módulos tipo almacén de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acústica sostenida por estructura en repisa ordinaria distanciada cada 2.8 mts + repisa ordinaria distanciada cada 1.40mts según recomendación de proveedor de cubierta, los demás que requiera el contratista serán a su costo	1	$ 43.760.810,00	100,00%

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

CERTIFICADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

SANITARIOS PORTÁTILES, 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres, los demás que requiera el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento según necesidad	3.00	$ 16.025.064,00	17.00%
Batería para lavamanos en bloque # 5 más columnetas y cinta de confinamiento superior, pañetada con mortero 1:4; cada una con cinco lavamanos de colgar, más grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	1	$ 4.750.158,00	100,00%
CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MÁS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 76 x 38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR, DISTANCIADA CADA 3.00 mt, h=2.40 mt	450	$ 49.874.850,00	100,00%
PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm, PAÑOS EN LÁMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl. Riel en ángulo invertido más rodamientos y rodamiento guía. Ancho 4.50 mt, Altura 2.50 mt	1	$ 3.525.044,00	100,00%
TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	1	$ 687.324,00	100,00%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	4635,94	$ 19.461.676,12	100,00%
PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	1	$ 1.218.644,00	100,00%
PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador)	1	$ 3.642.755,00	100,00%
PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)	1	$ 1.614.484,00	100,00%
DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	1	$ 4.441.677,00	100,00%
SUB TOTAL		**$ 210.724.798,12**	**72.00%**
CIMENTACIÓN			
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	859,02	$ 43.746.453,00	100,00%
EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	517,76	$ 2.297,60	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	675,18	$ 46.450.358,46	100,00%
CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	226,5	$ 96.979.599,00	100,00%
CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt	3265,34	$ 106.711.311,20	100,00%
ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Premezclado no incluye refuerzo)	348,92	$ 263.741.650,00	100,00%
RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	1120	$ 127.687.840,00	25,00%
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	51.700,00	$ 393.488.700,00	92,00%
SUB TOTAL		**$ 466.576.768,66**	**65.00%**
ESTRUCTURA			
MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	31,08	$ 28.100.607,75	33,33%

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

CERTIFICADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa. incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería	40,91	$ 41.753.318,74	33,33%
POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN	4545,28	$ 13.944.919,04	100,00%
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	135.450,00	$ 1.030.909.950,00	42.00%
TOTAL EJECUCION ACUMULADA		**$ 2.411.671.524,56**	**7.01%**

Para constancia se firma a los 30 días del mes de septiembre del 2024.

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

Gmail

INTERVENTORIA INTERHOSPITAL <inter.hospital24@gmail.com>

ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN DE OBRAS Y FLUJO DE INVERSIONES

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 13 de marzo de 2025, 5:18 p.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>
CC: ismael.sierra@gobsucre.gov.co, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL <infraestructura@gobsucre.gov.co>

Montería, 12 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM120325-48

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Reprogramación de obra

Cordial saludo

En atención a su solicitud de la reprogramación de obras del contrato en mención, nos permitimos informar lo siguiente:

Al momento de dar inicio a las obras reprogramadas, y considerando que a la fecha deberían estar en ejecución las actividades correspondientes a los capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00 y 25.00.00, relacionadas con la instalación de aparatos sanitarios y trabajos de carpintería en madera, metálica, aluminio y acero, se evidencio que estos ítems si se ejecutan quedarían expuestos a daños que se podrían generar por la ejecución de otros ítems que se realizan de manera simultánea a estos.

Adicional a lo anterior expuesto, se evidencio también que existen deficiencias en el diseño del sistema de Aires acondicionados, en lo referente a la ubicación e instalación de los ductos del mismo, por lo que se considera se debe trabajar en la optimalización de ella por parte de la firma consultora.

Por lo tanto, con el objetivo de minimizar el impacto en el cronograma general programado del proyecto, se ha elaborado un plan de reprogramación enfocado en priorizar actividades que no dependen directamente de los anteriores descritos, entre ellas, se destacan los trabajos de urbanismo y adecuación de zonas exteriores.

Es importante resaltar que esta reprogramación es prioritaria y estrictamente necesaria para poder avanzar en la ejecución del proyecto y así garantizar la continuidad de la obra sin comprometer su calidad ni generar afectaciones adicionales al desarrollo del proyecto.

3 archivos adjuntos

- **1. PROGRAMACIÓN HOSPITAL COVEÑAS_Reprogramación de obras (VERSION_3).mpp** 3396K
- **FLUJO DE FONDOS HOSPITAL COVEÑAS OK_versión_03 - Reprogramación de Obras.xlsx** 583K
- **1. PROGRAMACIÓN HOSPITAL COVEÑAS_Reprogramación de Obras (VERSION_3).pdf** 8787K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 12 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM120325-48

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Reprogramación de obra

Cordial saludo

En atención a su solicitud de la reprogramación de obras del contrato en mención, nos permitimos informar lo siguiente:

Al momento de dar inicio a las obras reprogramadas, y considerando que a la fecha deberían estar en ejecución las actividades correspondientes a los capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00 y 25.00.00, relacionadas con la instalación de aparatos sanitarios y trabajos de carpintería en madera, metálica, aluminio y acero, se evidencio que estos ítems si se ejecutan quedarían expuestos a daños que se podrían generar por la ejecución de otros ítems que se realizan de manera simultánea a estos.

Adicional a lo anterior expuesto, se evidencio también que existen deficiencias en el diseño del sistema de Aires acondicionados, en lo referente a la ubicación e instalación

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

de los ductos del mismo, por lo que se considera se debe trabajar en la optimalización de ella por parte de la firma consultora.

Por lo tanto, con el objetivo de minimizar el impacto en el cronograma general programado del proyecto, se ha elaborado un plan de reprogramación enfocado en priorizar actividades que no dependen directamente de los anteriores descritos, entre ellas, se destacan los trabajos de urbanismo y adecuación de zonas exteriores.

Es importante resaltar que esta reprogramación es prioritaria y estrictamente necesaria para poder avanzar en la ejecución del proyecto y así garantizar la continuidad de la obra sin comprometer su calidad ni generar afectaciones adicionales al desarrollo del proyecto.

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE NIT:
901.811.441-3

Anexo: Reprogramación de Obra_Ms Project
Reprogramación de Obra_PDF
Flujo de Inversiones_MS Excel

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 18 de marzo de 2025 **OFC-085-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Asunto: Remisión oficio HGM120325-48, Reprogramación de obra.

Cordial Saludo,

El 19 de febrero, mediante el oficio OFC-070-INTERHOSPITAL-2024, se solicitó al contratista revisar la programación de obra. Esto, debido a que, tras analizar las situaciones que han generado retrasos en la ejecución, se evidenció que, según el cronograma, debían estar en ejecución los capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00 y 25.00.00, correspondientes a la instalación de aparatos sanitarios y trabajos de carpintería en madera, metálica, aluminio y acero, respectivamente. Sin embargo, por razones evidentes, estas actividades no pueden ejecutarse en este momento, representando aproximadamente el 5% del avance total.

El 13 de marzo, mediante el oficio de referencia, el contratista radicó el documento de reprogramación, orientado a priorizar actividades independientes de las mencionadas anteriormente. Entre ellas, destacan los trabajos de urbanismo y la adecuación de zonas exteriores. Dicho documento fue revisado y avalado por la interventoría.

Es importante resaltar que esta reprogramación es prioritaria y estrictamente necesaria para avanzar en la ejecución del proyecto, garantizando su continuidad sin comprometer la calidad ni generar afectaciones adicionales en su desarrollo, por tal razón solicitamos que esta sea revisada y avalada por parte de ustedes.

Quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Sincelejo, marzo 4 de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-45

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA DE BALANCE DE OBRA Y ESTUDIO DE MERCADO

Cordial Saludo,

Mediante la presente hago entrega la información solicitada con el objeto de que se realice la respectiva revisión, la cual describo a continuación:

1. Ejercicio con el avance de obra a 45%
2. Balance General con precios contractuales
3. Balance completo con estudio de mercado y APUS
4. Estudio de mercado
5. Cantidades contractuales y Estudio de Mercado

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

Gmail

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

BALANCE DE OBRAS Y ESTUDIO DE MERCADO (LINK CARPETAS DRIVE)

1 mensaje

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 4 de marzo de 2025, 9:48 a.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>

Sincelejo, marzo 4 de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-45

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA DE BALANCE DE OBRA Y ESTUDIO DE MERCADO

Cordial Saludo,

Mediante la presente hago entrega la información solicitada con el objeto de que se realice la respectiva revisión, la cual describo a continuación:

1. Ejercicio con el avance de obra a 45%
2. Balance General con precios contractuales
3. Balance completo con estudio de mercado y APUS
4. Estudio de mercado
5. Cantidades contractuales y Estudio de Mercado

link carpeta de archivos

https://drive.google.com/drive/folders/1jpsYGuLTS0mRv57rSIsmZqVFY3DqRWQk

OFICIO HGM24052024-45_ENTREGA DE BALANCE DE OBRA Y ESTUDIO DE MERCADO.pdf
151K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 04 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM0403025-46

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Remisión de Balance de Obra No.2 y Solicitud de Suspensión No.1

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Balance de Obra No. 2 y, a su vez, solicitar la Suspensión de Obra No. 1 del contrato de referencia, sustentando dicha solicitud en las siguientes consideraciones:

1. Variaciones en las cantidades de obra y necesidad de actualización del Balance

Durante la ejecución del proyecto, se han identificado diferencias significativas entre las cantidades de obra contractuales y las reales a ejecutar. Estas variaciones incluyen tanto incrementos como reducciones en diferentes ítems del contrato, lo que hace indispensable la elaboración del Balance de Obra No. 2 para reflejar con precisión la situación actual del proyecto.

Es importante señalar que estas modificaciones afectan directamente la ruta crítica del proyecto y, por lo tanto, su ejecución es imprescindible para garantizar la continuidad y culminación exitosa de la obra dentro de los plazos y condiciones estipulados en el contrato.

2. Revisión del Balance de Obra No. 2 por parte de la interventoría

Dado que el Balance de Obra No. 2 incluye ajustes en las cantidades de obra, su revisión y validación por parte de la interventoría es un indispensable antes de proceder con su ejecución.

En este sentido, resulta inviable continuar con la obra hasta que dicho procedimiento se haya completado, con el fin de evitar que estas modificaciones sean asumidas como un hecho complido sin el análisis y aprobación correspondientes.

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

En consecuencia, se requiere que la interventoría revise y avale las cantidades presentadas en el Balance de Obra No. 2, asegurando que reflejen con precisión la realidad del proyecto y que se enmarquen en los términos contractuales vigentes.

3. Definición de lineamientos por parte de la entidad contratante

Una vez presentado el Balance de Obra No. 2, es fundamental que la entidad contratante defina las directrices a seguir para la continuidad del proyecto. La toma de decisiones respecto a la gestión de estas variaciones permitirá garantizar que la obra avance conforme a los objetivos establecidos y bajo los principios de eficiencia y transparencia en la ejecución contractual.

4. Solicitud de suspensión temporal del contrato

En virtud de lo expuesto, solicitamos formalmente la Suspensión No. 1 del contrato de referencia por un período de un (1) mes. Este tiempo resulta necesario para llevar a cabo la revisión detallada del Balance de Obra No. 2 y obtener las aprobaciones correspondientes, garantizando así la correcta planificación y ejecución de los trabajos pendientes.

Agradecemos su pronta atención a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para su trámite.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

Gmail HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

Remisión de Balance de Obra No.2 y Solicitud de Suspensión No.1

2 mensajes

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 5 de marzo de 2025, 12:04 p.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>
CC: ismael.sierra@gobsucre.gov.co, ANDRÉS BOTERO <ingandresbotero@hotmail.com>

BALANCE No. 2.rar

Montería, 05 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM0403025-46

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Remisión de Balance de Obra No.2 y Solicitud de Suspensión No.1

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Balance de Obra No. 2 y, a su vez, solicitar la Suspensión de Obra No. 1 del contrato de referencia, sustentando dicha solicitud en las siguientes consideraciones:

1. Variaciones en las cantidades de obra y necesidad de actualización del Balance

Durante la ejecución del proyecto, se han identificado diferencias significativas entre las cantidades de obra contractuales y las reales a ejecutar. Estas variaciones incluyen tanto incrementos como reducciones en diferentes ítems del contrato, lo que hace indispensable la elaboración del Balance de Obra No. 2 para reflejar con precisión la situación actual del proyecto.

Es importante señalar que estas modificaciones afectan directamente la ruta crítica del proyecto y, por lo tanto, su ejecución es imprescindible para garantizar la continuidad y culminación exitosa de la obra dentro de los plazos y condiciones estipulados en el

contrato.

2. Revisión del Balance de Obra No. 2 por parte de la interventoría

Dado que el Balance de Obra No. 2 incluye ajustes en las cantidades de obra, su revisión y validación por parte de la interventoría es un indispensable antes de proceder con su ejecución.

En este sentido, resulta inviable continuar con la obra hasta que dicho procedimiento se haya completado, con el fin de evitar que estas modificaciones sean asumidas como un hecho complido sin el análisis y aprobación correspondientes.

En consecuencia, se requiere que la interventoría revise y avale las cantidades presentadas en el Balance de Obra No. 2, asegurando que reflejen con precisión la realidad del proyecto y que se enmarquen en los términos contractuales vigentes.

3. Definición de lineamientos por parte de la entidad contratante

Una vez presentado el Balance de Obra No. 2, es fundamental que la entidad contratante defina las directrices a seguir para la continuidad del proyecto. La toma de decisiones respecto a la gestión de estas variaciones permitirá garantizar que la obra avance conforme a los objetivos establecidos y bajo los principios de eficiencia y transparencia en la ejecución contractual.

4. Solicitud de suspensión temporal del contrato

En virtud de lo expuesto, solicitamos formalmente la Suspensión No. 1 del contrato de referencia por un período de un (1) mes. Este tiempo resulta necesario para llevar a cabo la revisión detallada del Balance de Obra No. 2 y obtener las aprobaciones correspondientes, garantizando así la correcta planificación y ejecución de los trabajos pendientes.

OFICIO HGM24052024-46_Remisión de Balance de Obra No.2 y Solicitud de Suspensión No.1.pdf
158K

INTERVENTORIA INTERHOSPITAL <inter.hospital24@gmail.com> 5 de marzo de 2025, 4:01 p.m.
Para: "infraestructura@sucre.gov.co" <infraestructura@sucre.gov.co>, "ismael.sierra@gobsucre.gov.co" <ismael.sierra@gobsucre.gov.co>, "consorciocmohospitalsucre@gmail.com" <consorciocmohospitalsucre@gmail.com>, "obra.hospitaldelgolfo@gmail.com" <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>, "soflorez@gmail.com" <soflorez@gmail.com>

Coveñas, Sucre, 5 de marzo de 2025

OFC-073-INTERHOSPITAL-2024

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Asunto: SOLICITUD SUSPENSIÓN DE OBRA

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

OFICIO HGM24052024-46_Remisión de Balance de Obra No.2 y Solicitud de Suspensión No.1.pdf
158K

OFC-073 SOLICITUD SUSPENSION OBRA.pdf
83K

Gmail INTERVENTORIA INTERHOSPITAL <inter.hospital24@gmail.com>

ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN DE OBRAS Y FLUJO DE INVERSIONES

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 13 de marzo de 2025, 5:18 p.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>
CC: ismael.sierra@gobsucre.gov.co, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL <infraestructura@gobsucre.gov.co>

Montería, 12 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM120325-48

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Reprogramación de obra

Cordial saludo

En atención a su solicitud de la reprogramación de obras del contrato en mención, nos permitimos informar lo siguiente:

Al momento de dar inicio a las obras reprogramadas, y considerando que a la fecha deberían estar en ejecución las actividades correspondientes a los capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00 y 25.00.00, relacionadas con la instalación de aparatos sanitarios y trabajos de carpintería en madera, metálica, aluminio y acero, se evidencio que estos ítems si se ejecutan quedarían expuestos a daños que se podrían generar por la ejecución de otros ítems que se realizan de manera simultánea a estos.

Adicional a lo anterior expuesto, se evidencio también que existen deficiencias en el diseño del sistema de Aires acondicionados, en lo referente a la ubicación e instalación de los ductos del mismo, por lo que se considera se debe trabajar en la optimalización de ella por parte de la firma consultora.

Por lo tanto, con el objetivo de minimizar el impacto en el cronograma general programado del proyecto, se ha elaborado un plan de reprogramación enfocado en priorizar actividades que no dependen directamente de los anteriores descritos, entre ellas, se destacan los trabajos de urbanismo y adecuación de zonas exteriores.

Es importante resaltar que esta reprogramación es prioritaria y estrictamente necesaria para poder avanzar en la ejecución del proyecto y así garantizar la continuidad de la obra sin comprometer su calidad ni generar afectaciones adicionales al desarrollo del proyecto.

3 archivos adjuntos

1. PROGRAMACIÓN HOSPITAL COVEÑAS_Reprogramación de obras (VERSION_3).mpp
3396K

FLUJO DE FONDOS HOSPITAL COVEÑAS OK_versión_03 - Reprogramación de Obras.xlsx
583K

1. PROGRAMACIÓN HOSPITAL COVEÑAS_Reprogramación de Obras (VERSION_3).pdf
8787K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 12 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM120325-48

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Reprogramación de obra

Cordial saludo

En atención a su solicitud de la reprogramación de obras del contrato en mención, nos permitimos informar lo siguiente:

Al momento de dar inicio a las obras reprogramadas, y considerando que a la fecha deberían estar en ejecución las actividades correspondientes a los capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00 y 25.00.00, relacionadas con la instalación de aparatos sanitarios y trabajos de carpintería en madera, metálica, aluminio y acero, se evidencio que estos ítems si se ejecutan quedarían expuestos a daños que se podrían generar por la ejecución de otros ítems que se realizan de manera simultánea a estos.

Adicional a lo anterior expuesto, se evidencio también que existen deficiencias en el diseño del sistema de Aires acondicionados, en lo referente a la ubicación e instalación

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

de los ductos del mismo, por lo que se considera se debe trabajar en la optimalización de ella por parte de la firma consultora.

Por lo tanto, con el objetivo de minimizar el impacto en el cronograma general programado del proyecto, se ha elaborado un plan de reprogramación enfocado en priorizar actividades que no dependen directamente de los anteriores descritos, entre ellas, se destacan los trabajos de urbanismo y adecuación de zonas exteriores.

Es importante resaltar que esta reprogramación es prioritaria y estrictamente necesaria para poder avanzar en la ejecución del proyecto y así garantizar la continuidad de la obra sin comprometer su calidad ni generar afectaciones adicionales al desarrollo del proyecto.

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE NIT:
901.811.441-3

Anexo: Reprogramación de Obra_Ms Project
Reprogramación de Obra_PDF
Flujo de Inversiones_MS Excel

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 12 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM120325-49

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Solicitud Programación de Mesa de Trabajo

Cordial saludo

Mediante el presente, solicitamos de manera urgente, programar una Mesa de Trabajo para tratar los siguientes temas, que son necesarios definir para el correcto desarrollo del proyecto:

1. Faltante de áreas de pasarelas para interconexión entre los bloques.

2. Cantidades mayores en muros.

3. Conexión principal de aguas limpias a distribución interna de redes hidráulicas.

4. Conexiones faltantes para desagües en zonas claves críticas de redes de aguas patógenas que deberían de contar con dicho suministro de acuerdo a la norma de habilitación 3100 del 25 de noviembre del 2019

5. conexión y ubicación de sillas odontológicas, al igual que la ubicación de los

compresores con su red de gases medicinales.

6. cantidades mayores en redes contraincendio por la reubicación de los tanques de almacenamiento.

De manera atenta tambien, nos permitimos solicitar a la interventoría que requiera de manera urgente a la firma consultora la definición del diseño final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Según los planos y el presupuesto actual, no cuenta con ella ya que existe el item como una estructura que contiene columnas, entrepisos, muros y cubierta y no como el sistema integrado para realizar el tratado de aguas residuales.

Esto es de vital importancia, ya que está en línea con lo estipulado en la Resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, que nos exige conducir las aguas tratadas y clarificadas al alcantarillado publico existente.

Adicional a lo anterior se evidencia que no existen las certificaciones retie y retilap, descargue y conexión final en caliente para las redes eléctricas y sus puntos.
Conexión final a red de gases doméstico y el trámite de implementación de los cuatro arboles existentes en el predio del proyecto, con el cual la CAR envía como plan de compensación, árboles maderables, que deberían de sembrarse durante la ejecución del proyecto y realizar visitas periódicas por parte la CAR.

Es fundamental que estos temas se traten a la brevedad para asegurar el avance del proyecto.
Agradecemos dar pronta respuesta a nuestra solicitud.

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Gmail

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

SOLICITUD PROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO

3 mensajes

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 13 de marzo de 2025, 5:31 p.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>
CC: ismael.sierra@gobsucre.gov.co, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL <infraestructura@gobsucre.gov.co>

Montería, 12 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM120325-49

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Solicitud Programación de Mesa de Trabajo

Cordial saludo

Mediante el presente, solicitamos de manera urgente, programar una Mesa de Trabajo para tratar los siguientes temas, que son necesarios definir para el correcto desarrollo del proyecto:

1. Faltante de áreas de pasarelas para interconexión entre los bloques.

2. Cantidades mayores en muros.

3. Conexión principal de aguas limpias a distribución interna de redes hidráulicas.

4. Conexiones faltantes para desagües en zonas claves críticas de redes de aguas patógenas que deberían de contar con dicho suministro de acuerdo a la norma de habilitación 3100 del 25 de noviembre del 2019

5. conexión y ubicación de sillas odontológicas, al igual que la ubicación de los

compresores con su red de gases medicinales.

6. cantidades mayores en redes contraincendio por la reubicación de los tanques de almacenamiento.

De manera atenta tambien, nos permitimos solicitar a la interventoría que requiera de manera urgente a la firma consultora la definición del diseño final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Según los planos y el presupuesto actual, no cuenta con ella ya que existe el item como una estructura que contiene columnas, entrepisos, muros y cubierta y no como el sistema integrado para realizar el tratado de aguas residuales.
Esto es de vital importancia, ya que está en línea con lo estipulado en la Resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, que nos exige conducir las aguas tratadas y clarificadas al alcantarillado publico existente.

Adicional a lo anterior se evidencia que no existen las certificaciones retie y retilap, descargue y conexión final en caliente para las redes eléctricas y sus puntos.
Conexión final a red de gases doméstico y el trámite de implementación de los cuatro arboles existentes en el predio del proyecto, con el cual la CAR envía como plan de compensación, árboles maderables, que deberían de sembrarse durante la ejecución del proyecto y realizar visitas periódicas por parte la CAR.

OFICIO HGM12032024-49 solicitud de mesa de trabajo.pdf
428K

postmaster@gobsucre.gov.co <postmaster@gobsucre.gov.co> 13 de marzo de 2025, 5:31 p.m.
Para: obra.hospitaldelgolfo@gmail.com

Office 365

=?us-ascii?Q?9TnJCA1FCHkfQWtBIJDqbbn9Yo9sdx/xnWvU+DugoslJfy3Tp/9qclumPhDL?=
=?us-ascii?Q?DRoKJ6YG3biW7LieZkoscwQx6jKhOS65GNFLLJ/yWSHsGN4Rwh+KdPdMIu+o?=
=?us-ascii?Q?DORN+zn8XhVU8DM6UGRNfrMy/rPpEs08VRB9xOhgxSIBJ3Q7WcZzuFDTJX+6?=
=?us-ascii?Q?v8NO2Xw1SuUWxb12OKMXerr5AQq5TXF0PG2tQgsOjaUsfn6zTlXl0v05MzoE?=
=?us-ascii?Q?THcOHAbmZlfaE9UbFS8nRKu0sESzREF9+GQV0dVY2VxnnRoJYnRYeTLFrwxW?=
=?us-ascii?Q?zWP+Sv4Rz0KGzCs06Ux0pYyLuVrO2EiCFVyiSds9kE+stLge4oyE/4hF1/Tn?=
=?us-ascii?Q?fSbAU8tHsLaAXSZ2ckm/aYw57uBJnH9uRQjV/Uf/1HKjhskMFSBz74soRnAt?=
=?us-ascii?Q?0VKZIgM6Y2yH1xn0KgyAdPDM2j442cLeSHBNcr763nF9DS4nZCS4WXGmSknd?=
=?us-ascii?Q?NYrYFCVmNqz1DWBE5W17wwOvhF1jZMsSgESnEPW5/BQIazdZm+eOsX/w73Xb?=
=?us-ascii?Q?Mfrb19NMdy5gLJYMo6HZx8bXdFS6yS4MfMvsWeFEVtP8Jm7qqxsTaJfxF2IP?=
=?us-ascii?Q?Sg+9nO6XfVPE30p4mE2WAb1iNJhfExgFckBZTn0OgaN/OQmfquKp8f+F9OKK?=
=?us-ascii?Q?IoE6qcA/3jbdq7Si+tcWsykKeb+TgeBBXNtoQux9nkFprZhNZ+OBtGcuQwuG?=
=?us-ascii?Q?++fa1tcXfA6vCd5ZUZTaWnWWa54HbFTZykI1NQrJ+LbJQaewOhKJKGReIniO?=
=?us-ascii?Q?/Pfo4i53ikqVSzwqADby29Orhu84i4jz4H/t9uZmnKzqG2223rtKPOQJfuV/?=
=?us-ascii?Q?F3jvPTZyOdzQUxRUFvFkBkoyQygxuy3m/qGwWZJc8VX7D718FwZMnYyvODXH?=
=?us-ascii?Q?F6SyJ7mRD5UEKJTYaHp27w2r1AxB7CnwoiTxhUPNQBOPtG7fmr523w2LDYAT?=
=?us-ascii?Q?kxJ0vwsVCEnW80Mkq/FTGMbxg7eFNdCXf0yqNs+lEpho5gxb0Nr19U/baMVW?=
=?us-ascii?Q?G45CdRFBdxQm13HDo3fK2ZZANmXunsokKWFECd1W92hTYOmOcXVOShsU7621?=
=?us-ascii?Q?E9xwATVcCAgZQy5RnBqWBrEKUQZRf/TIk3RMFB1IQETUAqoURy3//krwlyV7?=
=?us-ascii?Q?pPB+jVs6SGJggYDB8AD6B6R61qAXcQQq+F8m2il69yVJh733v8T5NMsQpaDC?=
=?us-ascii?Q?xjZPCYSxRxQII6sPT4O4jNoJKJKb9bEPxX5TrSouJrCldQcCrU4LcjA3MgqN?=
=?us-ascii?Q?xmb2QCo4AxpLFGmnsLM9OBW3mDJ5yAGXaiZbWtfKv3GIjR2+WBd+f9OwiT/z?=
=?us-ascii?Q?EKumtliBum8o7FgUME1NgVrYCAFG/OPsd6PNhmWrvY6kdAC0ccSp+UOT4eKE?=
=?us-ascii?Q?yfVm3UyS7hqL2nTxD32gCF8fX4ZJdegaKRkfnUE49xtANCVfasRLJsl0pLVb?=
=?us-ascii?Q?xuj+SoMCehMEHySpvzbCdMietZMOzpk9Y7ZEqZClo5PZAxXP5xy3Hu9GiTwD?=
=?us-ascii?Q?itUqMp4IupZ054WDXJZWvmkLDh9PxmcLqCdffIxdO14vw56Lkb46wQb1hTXe?=
=?us-ascii?Q?pSEQelaGs6sW36WJzHAbeKctM9L9nN5NbUPGHzzoDrbE9A8ScOekFIWm9xPO?=
=?us-ascii?Q?ZhZsHPFqUU+8nYkp5o4EV54B7wO3OB5WoWxoIxXwY4GpAUb87v4+v5l76zj/?=
=?us-ascii?Q?gsN5gH8FR0BipuGCfdoXpi5cRH4LuuDVAVPE+nxsScXEKUL3wtvFyidF3B7E?=
=?us-ascii?Q?NASJVEk9SkVcnLJnndZdFpyo5ij7ERwzpHiRAZJLgx/DfZot3/q/PhyuAfMV?=
=?us-ascii?Q?RZuqb884VYDvn0qXn2VB0SgjHqJaSybiGhHLGHKOJ/eOkP1kLmQEcWI=3D?=
X-Forefront-Antispam-Report:
CIP:2a00:1450:4864:20::52a;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail-ed1-x52a.google.com;PTR:mail-ed1-x52a.google.com;CAT:NONE;SFS:(13230040)(7093399012)(4053099003)(8096899003);DIR:INB;
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 13 Mar 2025 22:31:31.7156
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 4f1c7f36-83bb-4cda-f1ca-08dd627ece2e
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: ded4b5ac-325f-4214-9439-22d98c01b9c8
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:
MWH0EPF000989E8.namprd02.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: LV8PR22MB4528

Final-Recipient: rfc822;infraestructura@gobsucre.gov.co
Action: failed
Status: 5.7.193
Diagnostic-Code: smtp;550 5.7.193 UnifiedGroupAgent; Delivery failed because the sender isn't a group member or external senders aren't permitted to send to this group.
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?SECRETAR=CDA_DE_INFRAESTRUCTURA_DPTAL?=

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS" <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>
To: "INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS" <inter.hospital24@gmail.com>
Cc: ismael.sierra@gobsucre.gov.co, "SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL" <infraestructura@gobsucre.gov.co>
Bcc:
Date: Thu, 13 Mar 2025 17:31:16 -0500
Subject: SOLICITUD PROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO

Montería, 12 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM120325-49

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Solicitud Programación de Mesa de Trabajo

Cordial saludo

Mediante el presente, solicitamos de manera urgente, programar una Mesa de Trabajo para tratar los siguientes temas, que son necesarios definir para el correcto desarrollo del proyecto:

1. Faltante de áreas de pasarelas para interconexión entre los bloques.
2. Cantidades mayores en muros.

3. Conexión principal de aguas limpias a distribución interna de redes hidráulicas.

4. Conexiones faltantes para desagües en zonas claves críticas de redes de aguas patógenas que deberían de contar con dicho suministro de acuerdo a la norma de habilitación 3100 del 25 de noviembre del 2019

5. conexión y ubicación de sillas odontológicas, al igual que la ubicación de los

compresores con su red de gases medicinales.

6. cantidades mayores en redes contraincendio por la reubicación de los tanques de almacenamiento.

De manera atenta tambien, nos permitimos solicitar a la interventoría que requiera de manera urgente a la firma consultora la definición del diseño final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Según los planos y el presupuesto actual, no cuenta con ella ya que existe el item como una estructura que contiene columnas, entrepisos, muros y cubierta y no como el sistema integrado para realizar el tratado de aguas residuales.
Esto es de vital importancia, ya que está en línea con lo estipulado en la Resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, que nos exige conducir las aguas tratadas y clarificadas al alcantarillado publico existente.

Adicional a lo anterior se evidencia que no existen las certificaciones retie y retilap, descargue y conexión final en caliente para las redes eléctricas y sus puntos.
Conexión final a red de gases doméstico y el trámite de implementación de los cuatro arboles existentes en el predio del proyecto, con el cual la CAR envía como plan de compensación, árboles maderables, que deberían de sembrarse durante la ejecución del proyecto y realizar visitas periódicas por parte la CAR.

OFICIO HGM12032024-49 solicitud de mesa de trabajo.pdf
428K

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 13 de marzo de 2025, 5:36 p.m.
Para: infraestructura@sucre.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS** <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>
Date: jue, 13 mar 2025 a la(s) 5:31 p.m.
Subject: SOLICITUD PROGRAMACIÓN MESA DE TRABAJO
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

OFICIO HGM12032024-49 solicitud de mesa de trabajo.pdf
428K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 13 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM120325-47

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: SOLICITUD REVISION DISEÑOS POR PARTE DE LA CONSULTORIA DE LOS DISEÑOS DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA

Cordial saludo.

A manera general nos permitimos hacer una descripción breve del proyecto, el cual consta de 3 bloques con áreas de servicios hospitalarios, conformando una sola edificación que se conectara por unas pasarelas.

Teniendo en cuenta que el proyecto incluye áreas críticas y no críticas que deben cumplir con requisitos estrictos de ventilación y aire acondicionado según el diseño establecido.

Al momento de inicio de la actividad de instalaciones de airea acondicionados, se logró identificar los siguientes hallazgos, todo esto bajo la norma **ASHRAE.** (2013). *ANSI/ASHRAE Standard 170-2013: Ventilation of Health Care Facilities*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. Y **Norma ASHRAE 170-2013**. *Ventilación para instalaciones de atención médica*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 2013. Y Anexo general **RETSIT resolución 407 73 de 29 Dic de 2023**

Bloque 1

El Primer Piso del Bloque 1 incluye las áreas de almacenamiento, taller, cuarto CCV, cuarto de racks, sala de autopsias y depósitos de cadáveres. Estas áreas son de relevancia en términos de clima y ventilación.

En el plano se evidencian dos equipos manejadores de aire para distribuir entre todas estas áreas, incluyendo la sala de autopsias y depósito de cadáveres.

1. Áreas sin aire acondicionado: Se encontraron áreas que no cuentan con sistema de aire acondicionado (cuarto de CCV, almacenamiento de insumos, entre otros), consideramos que es pertinente que estas áreas cuenten con sistema ya que contendrá equipos e insumos que requieren refrigeración.
2. Contaminación en la morgue: La sala de autopsias y el depósito de cadáveres no están completamente aislados de las áreas circundantes, lo cual podría generar riesgos de contaminación cruzada.

En Segundo Piso del Bloque 1 comprende áreas críticas como quirófanos, salas de recuperación, y salas de parto, todas las cuales deben cumplir con requisitos estrictos de ventilación y aire acondicionado.

1. Sistema de aire compartido: El plano muestra un único sistema de aire acondicionado para áreas críticas, lo que no cumple en su totalidad con las normativas, ya que cada área debe tener un sistema independiente para cumplir con los requisitos de temperatura, humedad, y presión determinada por el estándar 170-2013 ASRHA.
2. Cumplimiento normativo: La normativa ASHRAE 170-2013 especifica que el quirófano debe contar con equipos con filtración AL 35%, 65% Y HEPA al 99.9%, temperatura controlada entre 18°C y 24°C, y renovación de aire cada 4 horas, Uso de difusores de flujo laminar, renovación entre el 15% y 25%, La sala de parto, también debe ser tratada como un quirófano, con sistemas independientes, lámparas UV, filtros para cumplir con estos requisitos.

Bloque 2 – Segundo Piso

Este bloque incluye las áreas de farmacia y radiología.

1. Sistema VRF compartido: El sistema propuesto para el laboratorio y farmacia no separa los ambientes de trabajo según la normativa ASHRA.

2. Los laboratorios deben tener un flujo de aire adecuado para eliminar contaminantes, con un sistema de ventilación diseñado para evacuar adecuadamente el aire contaminado.

3. La zona de hospitalización se encuentra con un equipo compartido con otras áreas la cual no cumple con la normatividad de ventilación mecánica en clínica y hospitales tales como: la mezcla de los flujos de aire acondicionado, y extracción de la misma.

4. Aislamiento de áreas específicas: Las habitaciones de aislamiento para pacientes con enfermedades transmisibles deben contar con presión negativa para evitar la propagación de contaminantes a otras áreas del hospital. Además, deben estar equipadas con sistemas de filtración adicionales.

5. Áreas comunes y pasillos: Los pasillos y áreas comunes deben tener un flujo adecuado de aire, sin comprometer la calidad del aire en las habitaciones. La ventilación de estos espacios debe ser suficiente para evitar la acumulación de contaminantes.

Bloque 3

Este bloque está diseñado con un sistema VRF para áreas como administración, auditorio, consultorios y odontología, utilizando unidades fancoil tipo pared y ductales, pero este sistema propuesto no es suficiente para toda el área que incluye parque de coworking en el área administrativa

En consecuencia, solicitamos a interventoría que requiera a la consultoría que realizo el diseño, para que brinde claridad sobre estos hallazgos y proponga soluciones inmediatas. Es fundamental optimizar el diseño para evitar impactos negativos en el desarrollo del proyecto, ya que este aspecto es clave para la correcta ejecución de todas las instalaciones especiales, toda vez que lo primero que se debe instalar es la ductería de aires acondicionados para posteriormente instalar las redes contraincendios, agua, eléctrico y gases medicinales.

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Se anexa corte en referencia de niveles para la instalación de dichos sistemas

Agradecemos su pronta gestión para garantizar el eficiente funcionamiento de estas redes

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Gmail **HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>**

SOLICITUD REVISION DISEÑOS POR PARTE DE LA CONSULTORIA DE LOS DISEÑOS DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA

1 mensaje

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 13 de marzo de 2025, 5:36 p.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>, ismael.sierra@gobsucre.gov.co, infraestructura@sucre.gov.co

Montería, 13 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM120325-47

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: SOLICITUD REVISION DISEÑOS POR PARTE DE LA CONSULTORIA DE LOS DISEÑOS DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA

Cordial saludo.

A manera general nos permitimos hacer una descripción breve del proyecto, el cual consta de 3 bloques con áreas de servicios hospitalarios, conformando una sola edificación que se conectara por unas pasarelas.

Teniendo en cuenta que el proyecto incluye áreas críticas y no críticas que deben cumplir con requisitos estrictos de ventilación y aire acondicionado según el diseño establecido.

Al momento de inicio de la actividad de instalaciones de airea acondicionados, se logró identificar los siguientes hallazgos, todo esto bajo la norma **ASHRAE.** (2013). *ANSI/ASHRAE*

Standard 170-2013: Ventilation of Health Care Facilities. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. Y **Norma ASHRAE 170-2013**. *Ventilación para instalaciones de atención médica*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 2013. Y Anexo general **RETSIT resolución 407 73 de 29 Dic de 2023**

Bloque 1

El Primer Piso del Bloque 1 incluye las áreas de almacenamiento, taller, cuarto CCV, cuarto de racks, sala de autopsias y depósitos de cadáveres. Estas áreas son de relevancia en términos de clima y ventilación.

En el plano se evidencian dos equipos manejadores de aire para distribuir entre todas estas áreas, incluyendo la sala de autopsias y depósito de cadáveres.

1. Áreas sin aire acondicionado: Se encontraron áreas que no cuentan con sistema de aire acondicionado (cuarto de CCV, almacenamiento de insumos, entre otros), consideramos que es pertinente que estas áreas cuenten con sistema ya que contendrá equipos e insumos que requieren refrigeración.

2. Contaminación en la morgue: La sala de autopsias y el depósito de cadáveres no están completamente aislados de las áreas circundantes, lo cual podría generar riesgos de contaminación cruzada.

En Segundo Piso del Bloque 1 comprende áreas críticas como quirófanos, salas de recuperación, y salas de parto, todas las cuales deben cumplir con requisitos estrictos de ventilación y aire acondicionado.

1. Sistema de aire compartido: El plano muestra un único sistema de aire acondicionado para áreas críticas, lo que no cumple en su totalidad con las normativas, ya que cada área debe tener un sistema independiente para cumplir con los requisitos de temperatura, humedad, y presión determinada por el estándar 170-2013 ASRHA.

2. Cumplimiento normativo: La normativa ASHRAE 170-2013 especifica que el quirófano debe contar con equipos con filtración AL 35%, 65% Y HEPA al 99.9%, temperatura controlada entre 18°C y 24°C, y renovación de aire cada 4 horas, Uso de difusores de flujo laminar, renovación entre el 15% y 25%, La sala de parto, también debe ser tratada como un quirófano, con sistemas independientes, lámparas UV, filtros para cumplir con estos requisitos.

Bloque 2 – Segundo Piso

Este bloque incluye las áreas de farmacia y radiología.

1. Sistema VRF compartido: El sistema propuesto para el laboratorio y farmacia no separa los ambientes de trabajo según la normativa ASHRA.

2. Los laboratorios deben tener un flujo de aire adecuado para eliminar contaminantes, con un sistema de ventilación diseñado para evacuar adecuadamente el aire contaminado.

3. La zona de hospitalización se encuentra con un equipo compartido con otras áreas la cual no cumple con la normatividad de ventilación mecánica en clínica y hospitales tales como: la mezcla de los flujos de aire acondicionado, y extracción de la misma.

4. Aislamiento de áreas específicas: Las habitaciones de aislamiento para pacientes con enfermedades transmisibles deben contar con presión negativa para evitar la propagación

de contaminantes a otras áreas del hospital. Además, deben estar equipadas con sistemas de filtración adicionales.

5. Áreas comunes y pasillos: Los pasillos y áreas comunes deben tener un flujo adecuado de aire, sin comprometer la calidad del aire en las habitaciones. La ventilación de estos espacios debe ser suficiente para evitar la acumulación de contaminantes.

Bloque 3

Este bloque está diseñado con un sistema VRF para áreas como administración, auditorio, consultorios y odontología, utilizando unidades fancoil tipo pared y ductales, pero este sistema propuesto no es suficiente para toda el área que incluye parque de coworking en el área administrativa

En consecuencia, solicitamos a interventoría que requiera a la consultoría que realizo el diseño, para que brinde claridad sobre estos hallazgos y proponga soluciones inmediatas. Es fundamental optimizar el diseño para evitar impactos negativos en el desarrollo del proyecto, ya que este aspecto es clave para la correcta ejecución de todas las instalaciones especiales, toda vez que lo primero que se debe instalar es la ductería de aires acondicionados para posteriormente instalar las redes contraincendios, agua, eléctrico y gases medicinales.

OFICIO HGM12032024-47 solicitud por optimizacion de diseño hvac.pdf
634K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 14 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM140325-50

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: SOLICITUD DE DISEÑOS POR PARTE DE LA CONSULTORIA LOS DISEÑOS DE INSTALACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Cordial saludo

De manera atenta, nos permitimos solicitar a la interventoría que requiera de manera urgente a la firma consultora la definición del diseño final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Según los planos y el presupuesto actual, no cuenta con ella ya que existe el item como una estructura que contiene columnas, entrepisos, muros y cubierta y no como el sistema integrado para realizar el tratado de aguas residuales.

Esto es de vital importancia, ya que está en línea con lo estipulado en la Resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, que nos exige conducir las aguas tratadas y clarificadas al alcantarillado publico existente.

Agradecemos dar pronta respuesta a nuestra solicitud.

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Gmail

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

solicitud de diseños de las instalaciones planta de tratamiento de aguas residuales

1 mensaje

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 14 de marzo de 2025, 3:59 p.m.
Para: infraestructura@sucre.gov.co, ismael.sierra@gobsucre.gov.co, INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>

Montería, 14 de marzo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM140325-50

REF: Contrato de Obra No. LP-018-2023 de objeto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: SOLICITUD DE DISEÑOS POR PARTE DE LA CONSULTORÍA LOS DISEÑOS DE INSTALACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Cordial saludo

De manera atenta, nos permitimos solicitar a la interventoría que requiera de manera urgente a la firma consultora la definición del diseño final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Según los planos y el presupuesto actual, no cuenta con ella ya que existe el item como una estructura que contiene columnas, entrepisos, muros y cubierta y no como el sistema integrado para realizar el tratado de aguas residuales.

OFICIO HGM14032025-50 solicitud para ptar.pdf
422K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Coveñas, 29 de marzo de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM27072024-54

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OFC-086- OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024

Cordial Saludo,

En atención a los oficios OFC-086- INTERHOSPITAL-2024 y OFC-089-INTERHOSPITAL-2024 de fecha 25 de marzo del presente año donde se solicita información y toma de acciones pertinentes a atrasos cronograma de obra e igualmente mediante oficio OFC-093-INTERHOSPITAL-2024 de fecha 28 de marzo de 2025, nuevamente nos solicita dicha información, por lo que, como contratista de la obra referida paso a responder lo siguiente:

Como es de su amplio conocimiento no hemos podido avanzar debido a que se le tiene que dar solución al sistema HVAC, que es actividad predecesora de actividades como instalaciones eléctricas, Red contraincendios, sanitarias e hidráulicas, así también gases medicinales, que a su vez permite la instalación de muros internos en drywall y/o superboard, que están diseñados para las áreas en general del hospital, , con ello sus puertas y divisiones en vidrio, de las cuales en la conclusión de la MESA DE TRABAJO realizada el día de ayer, se dejó claro que existen unas áreas que no preceden con el sistema de HVAC y que con base a ello se trabajará el plan de contingencia, esperando que problemas presentados en las zonas comprometidas con el sistema sea resuelto después de haber presentado las correcciones pertinentes ante el Ministerio de Salud y aprobado.

Asimismo, como contratista me encuentro en disposición de responder los oficios arriba mencionados entregando el PLAN DE CONTINGENCIA y la REPROGRAMACIÓN DE OBRAS para intentar entregar lo requerido el día 2 de abril, fecha establecida en Comité de obra de fecha 27 de marzo, y de esa manera

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

permita superar el atraso de las actividades de obra y cumplir con el objeto contractual.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente y a su vez en continua disposición de resolver las inquietudes en aras de cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Gmail HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

RESPUESTA A OFICIO OFC-086- OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024

2 mensajes

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 29 de marzo de 2025, 8:56 a.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>

Coveñas, 29 de marzo de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM27072024-54

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OFC-086- OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024

Cordial Saludo,

En atención a los oficios OFC-086- INTERHOSPITAL-2024 y OFC-089-INTERHOSPITAL-2024 de fecha 25 de marzo del presente año donde se solicita información y toma de acciones pertinentes a atrasos cronograma de obra e igualmente mediante oficio OFC-093-INTERHOSPITAL-2024 de fecha 28 de marzo de 2025, nuevamente nos solicita dicha información, por lo que, como contratista de la obra referida paso a responder lo siguiente:

Como es de su amplio conocimiento no hemos podido avanzar debido a que se le tiene que dar solución al sistema HVAC, que es actividad predecesora de actividades como instalaciones eléctricas, Red contraincendios, sanitarias e hidráulicas, así también gases medicinales, que a su vez permite la instalación de muros internos en drywall y/o superboard, que están diseñados para las áreas en general del hospital, , con ello sus puertas y divisiones en vidrio, de las cuales en la conclusión de la MESA DE TRABAJO realizada el día de ayer, se dejó claro que existen unas áreas que no preceden con el sistema de HVAC y que con base a ello se trabajará el plan de contingencia, esperando que problemas presentados en las zonas comprometidas con el sistema sea resuelto después de haber presentado las correcciones pertinentes ante el Ministerio de Salud y aprobado.

Asimismo, como contratista me encuentro en disposición de responder los oficios arriba mencionados entregando el PLAN DE CONTINGENCIA y la REPROGRAMACIÓN DE OBRAS para intentar entregar lo requerido el día 2 de abril, fecha establecida en Comité de obra de fecha 27 de marzo, y de esa manera permita superar el atraso de las actividades de obra y cumplir con el objeto contractual.

OFICIO HGM24052024-54_RESPUESTA A OFICIO OFC-086- OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024.pdf
146K

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 29 de marzo de 2025, 9:03 a.m.
Para: infraestructura@sucre.gov.co, ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Buenos dias
Envío documento respuesta a oficio de interventoría OFC-086- OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024, para su conocimiento y fines pertinentes.
[Texto citado oculto]

OFICIO HGM24052024-54_RESPUESTA A OFICIO OFC-086- OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024.pdf
146K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Sincelejo, abril 3 de 2025.

Señores
GOBERNACIÓN DE SUCRE
Atte. **JORGE ROMERO ROMERO**
Secretario de Infraestructura
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co
E. S. M.

HGM03042025-58

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

Cordial Saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega del PLAN DE CONTINGENCIA correspondiente al CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 para la construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre. Dicho plan ha sido elaborado con el objetivo de reducir el atraso generado durante la ejecución de las obras y además, para asegurar una gestión efectiva y oportuna ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante el desarrollo del proyecto.

El plan incluye el diagnóstico de los atrasos, medidas preventivas y correctivas que abarcan aspectos clave que se encuentran detallados en dicho informe.

Agradecemos su atención y colaboración en la implementación de este plan, y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que pueda surgir en relación con el mismo.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

Gmail **HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>**

adjunto plan de contingencia

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 3 de abril de 2025, 4:35 p.m.
Para: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL <infraestructura@gobsucre.gov.co>, INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>, ANDRÉS BOTERO <ingandresbotero@hotmail.com>

Sincelejo, abril 3 de 2025.
Señores
GOBERNACIÓN DE SUCRE
Atte. JORGE ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co
E. S. M.
HGM03042025-58
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
Cordial Saludo,
Por medio de la presente hacemos entrega del PLAN DE CONTINGENCIA correspondiente al CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 para la construcción, equipamiento fijo y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre. Dicho plan ha sido elaborado con el objetivo de reducir el atraso generado durante la ejecución de las obras y además, para asegurar una gestión efectiva y oportuna ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante el desarrollo del proyecto.
El plan incluye el diagnóstico de los atrasos, medidas preventivas y correctivas que abarcan aspectos clave que se encuentran detallados en dicho informe.
Agradecemos su atención y colaboración en la implementación de este plan, y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que pueda surgir en relación con el mismo.
Atentamente,

OFICIO HGM03042025-58_Entrega de Plan de Contingencia.pdf

2 archivos adjuntos

PLAN DE CONTINGENCIA.pdf
369K

INFORME PLAN DE CONTINGENCIA.pdf
25168K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Coveñas, 7 de abril de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ - Interventor**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-62

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Respetado ingeniero Herrera:

En atención al desarrollo del Contrato de Obra No. LP-018-2023, y obrando en mi calidad de representante legal del Consorcio CMO Hospital Sucre, respetuosamente solicito a esta interventoría la convocatoria formal e inmediata a mesas técnicas de trabajo, con el objeto de validar y comprobar integralmente las circunstancias técnicas, económicas y jurídicas que motivan la presente solicitud.

El fundamento que da lugar a la presente solicitud de restablecimiento del equilibrio económico contractual radica en la alteración sustancial y verificable de la ecuación económica inicialmente pactada, como consecuencia de una serie de circunstancias excepcionales, imprevisibles y ajenas a nuestra voluntad que han sobrevenido durante la ejecución del Contrato de Obra No. LP-018-2023. Esta situación fue puesta en conocimiento de la interventoría mediante nuestro **Oficio HGM24052024-46 del 6 de marzo de 2025**, donde solicitamos la suspensión parcial de la ejecución contractual. En respuesta, la interventoría, a través de sus oficios **OFC-073 del 5 de marzo**, **OFC-078 del 11 de marzo** y **OFC-090 del 13 de marzo**, validó técnica y contractualmente los hallazgos que sustentan nuestra solicitud de suspensión, dejando en claro que las condiciones actuales del proyecto exceden el riesgo ordinario inicialmente asumido. Finalmente, en nuestro **Oficio HGM24052024-54 del 29 de marzo de 2025**, reiteramos las afectaciones económicas y técnicas, confirmando que persiste la ruptura de la ecuación contractual sin que, a la fecha, la entidad contratante haya adoptado medidas concretas para recomponerla.

Ante este panorama, se configura un **desequilibrio económico** que hace necesaria la adopción de mecanismos que garanticen la ejecución continua, eficiente y jurídicamente viable del proyecto, tal como lo establecen el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado. En lo esencial, nuestras justificaciones se sustentan en:

1. **Fluctuaciones extraordinarias en los precios de materiales, insumos y jornales**, desbordando los parámetros contemplados en la **Matriz de Riesgos** (ítem No. 3) y afectando de manera directa los costos de ejecución.

2. **Variaciones sustanciales en las cantidades de obra y modificaciones en diseños técnicos especializados**, principalmente en redes de aires acondicionados o red de (HVAC), redes eléctricas con la norma de este año, red contraincendio, red de gases medicinales, y por complemento a la estructura del hospital no cuenta con una Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) para tratar aguas industriales, (patógenas) para verter luego al alcantarillado, así como a su vez no cuenta con elementos como las pasarelas que no se encuentra dentro de las cantidades de obra, esto y entre otros temas, que han hecho el aumento en los costos más allá de lo inicialmente pactado, generando un claro desequilibrio contractual.

En atención a lo anterior, estimamos jurídicamente procedente el restablecimiento de la ecuación económica del contrato, con el fin de evitar un empobrecimiento injustificado del contratista y asegurar la culminación de un proyecto de evidente interés público como lo es la construcción y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

Como es ampliamente conocido por la interventoría, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 impone la obligación jurídica de mantener la igualdad o equivalencia en las condiciones contractuales inicialmente acordadas, mediante el mecanismo del **restablecimiento del equilibrio económico**. Sobre este particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que:

«...Como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, *"ante la ruptura del equilibrio económico del contrato, el contratista tiene derecho a exigir su restablecimiento, pues no obstante que debe asumir el riesgo normal y propio de cualquier negocio, ello no incluye el deber de soportar un comportamiento del contratante o circunstancias ajenas que lo priven de los ingresos y las ganancias razonables que podría haber obtenido, si la relación contractual se hubiese ejecutado en las condiciones inicialmente convenidas"* [1]

En este contexto, resulta urgente e indispensable proceder a una **verificación técnica y objetiva**, por lo que respetuosamente solicitamos se programen de

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. (2012, 28 de junio). *Sentencia Rad. 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990)*. C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá, D.C.

manera prioritaria estas mesas técnicas conjuntas, donde intervengan la Interventoría, el Contratista y representantes técnicos y financieros designados por la entidad contratante, con el objetivo específico de:

- Verificar objetivamente los incrementos reales en los costos de materiales, insumos, mano de obra y equipos.
- Comprobar documentalmente las modificaciones sustanciales en las cantidades y especificaciones técnicas de obra.
- Determinar con exactitud el impacto económico real derivado de dichas circunstancias, para sustentar debidamente las decisiones que sean necesarias.

La presente solicitud se formula desde el principio de **buena fe contractual** que ha regido nuestra relación contractual, y tiene por objeto evitar un empobrecimiento injustificado e injusto del contratista de buena fe. De mantenerse la ecuación contractual tal y como fue inicialmente planteada, se generará inevitablemente una situación crítica e insostenible, independientemente del músculo económico que pueda tener el contratista, toda vez que los recursos obtenidos mediante actas parciales no cubrirán la totalidad de los costos reales que requiere la culminación satisfactoria del proyecto. En consecuencia, se produciría una paralización inminente de la obra, afectando gravemente no solo la situación del contratista, sino también los intereses generales comprometidos en este proyecto.

Agradeciendo la atención prestada a esta petición, quedamos atentos a que nos indiquen fecha y hora para dar inicio a las mesas técnicas mencionadas, reiterando nuestra entera disposición para suministrar toda la documentación técnica, contable y jurídica necesaria para facilitar la comprobación integral y objetiva de lo aquí manifestado.

Cordialmente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Gmail **HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>**

SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS

1 mensaje

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 7 de abril de 2025, 9:59 a.m.
Para: infraestructura@sucre.gov.co
CC: ismael.sierra@gobsucre.gov.co, INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>

Coveñas, 7 de abril de 2025.

Señores
GOBERNACIÓN DE SUCRE
Atte. **JORGE ROMERO ROMERO**
Secretario de Infraestructura
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co
E. S. M.

HGM24052024-62

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Respetado ingeniero Herrera:

En atención al desarrollo del Contrato de Obra No. LP-018-2023, y obrando en mi calidad de representante legal del Consorcio CMO Hospital Sucre, respetuosamente solicito a esta interventoría la convocatoria formal e inmediata a mesas técnicas de trabajo, con el objeto de validar y comprobar integralmente las circunstancias técnicas, económicas y jurídicas que motivan la presente solicitud.

El fundamento que da lugar a la presente solicitud de restablecimiento del equilibrio económico contractual radica en la alteración sustancial y verificable de la ecuación económica inicialmente pactada, como consecuencia de una serie de circunstancias excepcionales, imprevisibles y ajenas a nuestra voluntad que han sobrevenido durante la ejecución del Contrato de Obra No. LP-018-2023. Esta situación fue puesta en conocimiento de la interventoría mediante nuestro **Oficio HGM24052024-46 del 6 de marzo de 2025**, donde solicitamos la suspensión parcial de la ejecución contractual. En respuesta, la interventoría, a través de sus oficios **OFC-073 del 5 de marzo**, **OFC-078 del 11 de marzo** y **OFC-090 del 13 de marzo**, validó técnica y contractualmente los hallazgos que sustentan nuestra solicitud de suspensión, dejando en claro que las condiciones actuales del proyecto exceden el riesgo ordinario inicialmente asumido. Finalmente, en nuestro **Oficio HGM24052024-54 del 29 de marzo de 2025**, reiteramos las afectaciones económicas y técnicas, confirmando que persiste la ruptura de la ecuación contractual sin que, a la fecha, la entidad contratante haya adoptado medidas concretas para recomponerla.

Ante este panorama, se configura un **desequilibrio económico** que hace necesaria la adopción de mecanismos que garanticen la ejecución continua, eficiente y jurídicamente viable del proyecto, tal como lo establecen el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado. En lo esencial, nuestras justificaciones se sustentan en:

1. **Fluctuaciones extraordinarias en los precios de materiales, insumos y jornales**, desbordando los parámetros contemplados en la **Matriz de Riesgos** (ítem No. 3) y afectando de manera directa los costos de ejecución.

2. **Variaciones sustanciales en las cantidades de obra y modificaciones en diseños técnicos especializados**, principalmente en redes de aires acondicionados o red de (HVAC), redes eléctricas con la norma de este año, red contraincendio, red de gases medicinales, y por complemento a la estructura del hospital no cuenta con una Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) para tratar aguas industriales, (patógenas) para verter luego al alcantarillado, así como a su vez no cuenta con elementos como las pasarelas que no se encuentra dentro de las cantidades de obra, esto y entre otros temas, que han hecho el aumento en los costos más allá de lo inicialmente pactado, generando un claro desequilibrio contractual.

En atención a lo anterior, estimamos jurídicamente procedente el restablecimiento de la ecuación económica del contrato, con el fin de evitar un empobrecimiento injustificado del contratista y asegurar la culminación de un proyecto de evidente interés público como lo es la construcción y dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

OFICIO HGM24052024-63_SOLICITUD CONVOCATORIA MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO CONTRATO.pdf
205K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Coveñas, abril 8 de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ - Interventor**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-65

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA – CORREGIDO

Cordial saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega del PLAN DE CONTINGENCIA corregido de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría en reunión el día lunes 7 de abril del presente año.

Agradeciendo la atención prestada a la presente y en espera de sus comentarios al respecto.

Cordialmente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Gmail

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA – CORREGIDO

1 mensaje

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 8 de abril de 2025, 2:40 p.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>

Coveñas, abril 8 de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ - Interventor**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-65

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA – CORREGIDO

Cordial saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega del PLAN DE CONTINGENCIA corregido de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría en reunión el día lunes 7 de abril del presente año.

2 archivos adjuntos

INFORME PLAN DE CONTINGENCIA - corregido.pdf
13098K

OFICIO HGM24052024-65_ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA – CORREGIDO.pdf
141K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Coveñas, abril 21 de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ - Interventor**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-68

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA V3 – CORREGIDO

Cordial saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega del PLAN DE CONTINGENCIA Versión 3 corregido de acuerdo con las observaciones realizadas por usted mediante conversación telefónica el día lunes 21 de abril del presente año.

Agradeciendo la atención prestada a la presente y en espera de sus comentarios al respecto.

Cordialmente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Gmail

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA V3 – CORREGIDO

1 mensaje

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 21 de abril de 2025, 2:59 p.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>

Coveñas, abril 21 de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ - Interventor**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-68

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA V3 – CORREGIDO

Cordial saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega del PLAN DE CONTINGENCIA Versión 3 corregido de acuerdo con las observaciones realizadas por usted mediante conversación telefónica el día lunes 21 de abril del presente año.

3 archivos adjuntos

PLAN DE CONTINGENCIA v3.pdf
377K

INFORME PLAN DE CONTINGENCIA v3.pdf
11687K

OFICIO HGM24052024-68_ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA V3 – CORREGIDO.pdf
147K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Monteria, abril 19 de 2025.
Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-66

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: Entrega de diseños ajustados del sistema HVAC y Solicitud de Mesa de Trabajo con el ministerio de salud e interventoría para socializar los cambios

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito excusar el retraso en la entrega de los diseños ajustados del sistema HVAC, el cual fue previamente acordado para el día 14 de abril. Lamentablemente, la demora se debe a que surgieron otros ajustes técnicos para el desarrollo y entrega del mismo, que afectaron el cronograma de entrega, como adaptar las áreas faltantes con aire acondicionado y la consulta de los cambios eléctricos, al ingeniero encarado de las redes eléctricas https://drive.google.com/drive/folders/1TzvtHakXpMrTBmb6LOYGZxXyN_Q2SDu1?authuser=0

Quiero reiterar nuestro compromiso entregando el diseño con los ajustes y requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera se programe la mesa de trabajo con el grupo profesional de las partes involucradas. Por lo tanto, hacemos entrega de lo acordado en el día de hoy 19 de abril de 2025, asegurándonos de cumplir con los requerimientos necesarios, por medio del siguiente link donde se entregan los cambios pertinentes.

Agradezco de antemano su comprensión ante esta situación y quedo atento para resolver cualquier inquietud adicional que pueda surgir con la entrega de la documentación anexa al presente comunicado.

Cordialmente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

Gmail HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

ADJUNTO MODIFICACIONES AIRE ACONDICIONADO

2 mensajes

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 19 de abril de 2025, 10:21 a.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>, ANDRÉS BOTERO <ingandresbotero@hotmail.com>, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL <infraestructura@gobsucre.gov.co>, ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Calle 42 No.7-40 Local
1 Montería - Córdoba
consorciocmohospitalsucre@gmail.com
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com
300-2737187
604 791 96 12
CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE
Monteria, abril 19 de 2025.
Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.
HGM24052024-66
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
ASUNTO: Entrega de diseños ajustados del sistema HVAC y Solicitud de Mesa de Trabajo con el ministerio de salud e interventoría para socializar los cambios
Cordial saludo,
Por medio de la presente, me permito excusar el retraso en la entrega de los diseños ajustados del sistema HVAC, el cual fue previamente acordado para el día 14 de abril. Lamentablemente, la demora se debe a que surgieron otros ajustes técnicos para el desarrollo y entrega del mismo, que afectaron el cronograma de entrega, como adaptar las áreas faltantes con aire acondicionado y la consulta de los cambios eléctricos, al ingeniero encargado de las redes eléctricas

https://drive.google.com/drive/folders/1TzvtHakXpMrTBmb6LOYGZxXyN_Q2SDu1

Quiero reiterar nuestro compromiso entregando el diseño con los ajustes y requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera se programe la mesa de trabajo con el grupo profesional de las partes involucradas. Por lo tanto, hacemos entrega de lo acordado en el día de hoy 19 de abril de 2025, asegurándonos de cumplir con los requerimientos necesarios, por medio del siguiente link donde se entregan los cambios pertinentes.
Agradezco de antemano su comprensión ante esta situación y quedo atento para resolver cualquier inquietud adicional que pueda surgir con la entrega de la documentación anexa al presente comunicado.

OFICIO HGM12032024-66 solicitud socializacion y mesa de trabajo pertiente a cambios.pdf
373K

postmaster@gobsucre.gov.co <postmaster@gobsucre.gov.co> 19 de abril de 2025, 10:22 a.m.
Para: obra.hospitaldelgolfo@gmail.com

Office 365

Your message to the Microsoft 365 group infraestructura@gobsucre.gov.co couldn't be delivered.

The group infraestructura isn't set up to receive messages from obra.hospitaldelgolfo@gmail.com.

obra.hospitaldelgolf. . .	Office 365	infraestructura
Sender		**Action Required**
		Sender not allowed

How to Fix It

Try one or more of the following:

- If you're a member of the group, you might be registered with an email address other than obra.hospitaldelgolfo@gmail.com. Resend your message using the email address where you received a welcome message from the group.
- Ask the group owner to add obra.hospitaldelgolfo@gmail.com as a group member. If you don't know who the group owner is, contact the organization's customer service department for assistance.
- Ask the group owner to allow people outside their organization to send email to the group.

More Info for Email Admins

Status code: 550 5.7.193

The Microsoft 365 group, infraestructura@gobsucre.gov.co, is configured to reject messages sent to it from outside its organization -- unless the sender is a guest group member. obra.hospitaldelgolfo@gmail.com isn't part of the organization, and it isn't a guest group member.

If you're the group's email admin or owner, check if the sender is a member of the group, but is registered under a different email address. Alternatively, the group owner, or email admin, can add obra.hospitaldelgolfo@gmail.com as a guest member of the group.

Original Message Details

Created Date:	4/19/2025 3:21:29 PM
Sender Address:	obra.hospitaldelgolfo@gmail.com
Recipient Address:	infraestructura@gobsucre.gov.co
Subject:	ADJUNTO MODIFICACIONES AIRE ACONDICIONADO

Error Details

Error:	*550 5.7.193 UnifiedGroupAgent; Delivery failed because the sender isn't a group member or external senders aren't permitted to send to this group.*
Message rejected by:	SA1PR22MB5445.namprd22.prod.outlook.com

Notification Details

Sent by:	*SA1PR22MB5445.namprd22.prod.outlook.com*

Message Hops

HOP	TIME (UTC)	FROM	TO	WITH	RELAY TIME
1	4/19/2025 3:21:44 PM		mail-ej1-x62c.google.com	SMTP	15 sec
2	4/19/2025 3:21:44 PM	mail-ej1-x62c.google.com	CY4PEPF0000EE39.mail.protection.outlook.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384)	*
3	4/19/2025 3:21:44 PM	CY4PEPF0000EE39.namprd03.prod.outlook.com	PH8PR22CA0021.outlook.office365.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384)	*
4	4/19/2025 3:21:44 PM	PH8PR22CA0021.namprd22.prod.outlook.com	SA1PR22MB5445.namprd22.prod.outlook.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	*

Original Message Headers

```
Received: from PH8PR22CA0021.namprd22.prod.outlook.com (2603:10b6:510:2d1::7)
 by SA1PR22MB5445.namprd22.prod.outlook.com (2603:10b6:806:3ec::10) with
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.8655.20; Sat, 19 Apr
 2025 15:21:44 +0000
Received: from CY4PEPF0000EE39.namprd03.prod.outlook.com
 (2603:10b6:510:2d1:cafe::a2) by PH8PR22CA0021.outlook.office365.com
 (2603:10b6:510:2d1::7) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_3,
 cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.8655.23 via Frontend Transport; Sat,
 19 Apr 2025 15:21:44 +0000
```

```
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 2a00:1450:4864:20::62c)
 smtp.mailfrom=gmail.com; dkim=pass (signature was verified)
 header.d=gmail.com;dmarc=pass action=none header.from=gmail.com;compauth=pass
 reason=100
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of gmail.com designates
 2a00:1450:4864:20::62c as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
 client-ip=2a00:1450:4864:20::62c; helo=mail-ej1-x62c.google.com; pr=C
Received: from mail-ej1-x62c.google.com (2a00:1450:4864:20::62c) by
 CY4PEPF0000EE39.mail.protection.outlook.com (2603:10b6:92f::1004:0:5) with
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384) id
 15.20.8655.12 via Frontend Transport; Sat, 19 Apr 2025 15:21:44 +0000
Received: by mail-ej1-x62c.google.com with SMTP id a640c23a62f3a-abbb12bea54so411212766b.0;
        Sat, 19 Apr 2025 08:21:44 -0700 (PDT)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=gmail.com; s=20230601; t=1745076102; x=1745680902; darn=gobsucre.gov.co;
        h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:from:to:cc:subject
         :date:message-id:reply-to;
        bh=lVnWtGAt8Dwt3i8uYiH+FFKb23FOQH/Do7/sLgmkda4=;
        b=AzsoyYBlM/dlcDWtrepTyMz63sjgJw7QyXRbHbjsNSg++8YINox5fDUP4m0UD/xAba
         sJjmxtLbW1URSghk3JPHvDHvU+AY338yeOHPcB5D50EYl0iY/TesTHabY9Oy0iuCUEGP
         znwX4Jc2BQhsavuCJjMUoHW8Wu0gVU8A1qeJWc2//oJpuYS1UPuEOvytxaJqe6I6AJPN
         TRf7NwuMIRNpZPCclx0O93jl0uawBmVuOn1MWdGTi8yZj8p93+FBlOn0Q2C0LgjJAfR/
         bsiExRbX9HGdXmGnP8LstYx3itTQhvHyciPZ6ICWzePQZA0aBep/jTd/Rormx4lXw13C
         F8kQ==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
        d=1e100.net; s=20230601; t=1745076102; x=1745680902;
        h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-message-state
         :from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;
        bh=lVnWtGAt8Dwt3i8uYiH+FFKb23FOQH/Do7/sLgmkda4=;
        b=s9FpmjTCi0D9KkLKrM8HOhCRgyQNjWHA1gtxK09JxvJn1hiQwt+Uo/xlBpzYwpy5tN
         71jQz9fTuEKckVLIiO9tW2PJj/GWW+yv8VxZmxx0rRk1GT8nbIYDW0M3GOP0BMkIrFoA
         ZN/cENw5A9wBH4WlAWv9bg1dejLGPJOxxfjBmA+im4MU+Sf4IDxGb2H0Kf6uck6B2iQ1
         yqWIgg5TTvI48MunDtyIfgUUDN2sD3kk1NXGKNMibkAouBYHo2+z6W+6N7g4TCFQSecz
         Xu/zdMMl0do0A60HpL0nADft+cX5h0HO+vtTR5eWiqeo9EF+JrlwORPICwBoFH+KYy+V
         iJHw==
X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCVUUET9eUcglmcB3b6fntZXWadqYopLkuNxlsJvION4MCCRuYWKT/OyEkZKUHlCBKHlUlbnFPsVBqQmI/
dl+xk=@gobsucre.gov.co, AJvYcCXanjujagftscpUGndce/cEC+eW6txi+HHWo9Yz8C4RQXGt3aeNDnMihM772kevpJfV8xMaE9iyOfeKyyRvJQ==@gobs
ucre.gov.co
X-Gm-Message-State: AOJu0Yy5FnW78uFLDddzYb8Q9wGsBIe8xoTm7yIWKTt6v7VCwtfBQ1lg
        WaVA+fHGyRLaS/Lo0Xljgjy6gGYy5319VNX3qDWjyy18R3kofIjK+Yjaq3fQ6ZGrpEP38fp6ZAe
        tssScFScIB5+h9QwsQZy0hfmZ8YE=
X-Gm-Gg: ASbGnct/1dCTjhmfJCuvFmOS0SRdDd6l4POrdZXNMrcqckwIEy2K/2HroNhureux7m0
        9f87xPwq/zPePeMwppiNQ1YCkyLi5293ICvGybxxcJzi7uFfQH0mLNnGGF+i0nMDCfdautYpHU1
        jUYZoduF767ZKY5c9U0aZYm7if
X-Google-Smtp-Source: AGHT+IFlCdURuBOp9T5SGUCAwmZ5WbXG31GnDlOMTRLbMyzXvjlrun/2BNxch/b3psV6W1Zg9MPe4gwgPMQXb5zIn+Q=
X-Received: by 2002:a17:906:6a23:b0:ac7:391a:e158 with SMTP id
 a640c23a62f3a-acb74dda17dmr555654466b.59.1745076101817; Sat, 19 Apr 2025
 08:21:41 -0700 (PDT)
MIME-Version: 1.0
From: =?UTF-8?Q?HOSPITAL_DEL_GOLFO_COVE=C3=91AS?= <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>
Date: Sat, 19 Apr 2025 10:21:29 -0500
X-Gm-Features: ATxdqUHBiO7L07-E3afvsFCK5h2kEOXyXtdUXnHjYp7pDP2Vw-hXrQsvIAKDMT4
Message-ID: <CANXUK4N2O_GWEUmCS98PvJZ=-okzFtB8BiCPy3dGc3iVENyTtw@mail.gmail.com>
Subject: ADJUNTO MODIFICACIONES AIRE ACONDICIONADO
To: =?UTF-8?Q?INTERVENTORIA_HOSPITAL_COVE=C3=91AS?= <inter.hospital24@gmail.com>,
        =?UTF-8?Q?ANDR=C3=89S_BOTERO?= <ingandresbotero@hotmail.com>,
        =?UTF-8?Q?SECRETAR=C3=8DA_DE_INFRAESTRUCTURA_DPTAL?= <infraestructura@gobsucre.gov.co>,
        ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Content-Type: multipart/mixed; boundary="0000000000002817a606332331a7"
Return-Path: obra.hospitaldelgolfo@gmail.com
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: ded4b5ac-325f-4214-9439-22d98c01b9c8:0
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: CY4PEPF0000EE39:EE_|SA1PR22MB5445:EE_
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: e0de362b-d68e-4882-a23b-08dd7f55e4ba
X-MS-Exchange-AtpMessageProperties: SA|SL
X-Microsoft-Antispam:
        BCL:0;ARA:13230040|7093399015|13003099007|8096899003|4053099003;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info:
        =?us-ascii?Q?DB9rl6Y08llYZYzNl8cJJTxcTfn6TUC+9q8rraN2khOi3MfwUiAN2uObOsfd?=
 =?us-ascii?Q?zum6UqL+iw5/xt8Ah8BIZSVqsOWW1dAYcDhK3bIQLZExk145VmbixiIkpPbo?=
 =?us-ascii?Q?oNGz+zajD/HStPeYbpeoaoD1febSE7ADQfWkfwSmxSfJOcP6QjPtGXaEvl32?=
 =?us-ascii?Q?EPck2WZUrOjK9Wpq8lou8QRMKQwQ8of0lX4W7zz9TzZ3TS14GVWsFOvd4e7d?=
 =?us-ascii?Q?vu+eG690/RRITuTOVKEY/MCaQSkEce/ue4DjOvYfYFz+5qcMfUsX5AGre4VB?=
 =?us-ascii?Q?gTA7PRkVmC86Hki4fcwnza0YTjikppUQnhcteS2oXc6xGhYyqqfbeYMBxc0N?=
 =?us-ascii?Q?w9fdXKOgvufttXvawOD1g/M/uNKJXYrf23AROXR9iWUCpOv7dOPGgOVahnD+?=
 =?us-ascii?Q?19hyL7JFQzPZ+hVBkdRjupKlxGcpLhsSoueAsAdcG7Mtq5jsjBoL/0f9I4us?=
 =?us-ascii?Q?P1nGu4W1WlCk0eOMLc3IPJRwJQyJxd+Qweh3dA7BgJwnt09vPmcfpRSkr/8n?=
 =?us-ascii?Q?7cikGs7MlxDRb96RR3bcvbxjp4qa5xFVibBfZOa349UqSviwqvMafGuMYQ88?=
 =?us-ascii?Q?YmH4/U06XKCYsQ8tScfgMCxiY1zzn6uqfZUKfp48kQzXS+Jm23ImAZXCXQOi?=
 =?us-ascii?Q?+U2ugRX4U7GLq9IkP7UKFRB2DKuX1aaoPfgwcYmWd8PLC0yWZV1iPKtYXRC7?=
 =?us-ascii?Q?E6oVCKSvyuKWn9QdCXhq3rUYGac9YaUvajONTT2sm7JsrxA04eg4GRN6xzZ8?=
 =?us-ascii?Q?giyWukn/dRKa3dou1NyI0u6b/HeN7TGZRQOH6eZewUn1zU6wYbgur16r0Vaf?=
 =?us-ascii?Q?CoyPgyImi5KLfNoAfxRKvS3Ylk0pxqOwdt7dHULx9N+TsPFWUHr+4MY7Mbsz?=
 =?us-ascii?Q?B9eUgDl9fHhYWm4PF4dOJAMh83/dUi5UE/xhYkEiPO7wCXHU4Dlm/hw6Ktlf?=
 =?us-ascii?Q?Ks3ujIVs9742IFzu2o7PrDA9kai8M1FH61mKmqZvTNzAfEE7GjcKhAtTL0Bg?=
 =?us-ascii?Q?0HoS/U3ZfzHvTLf9knf4CdTZu0E5zAT1UlgFZB3ZllA8rhwXvJw11Z6iod2V?=
 =?us-ascii?Q?wlgFiFO5+OseOp60xNc/bL194pYKbMsvWVu60uMhsG7jx5+HoEJ6EFN9UnNM?=
 =?us-ascii?Q?DwtSlGEPVkFrKE0QxiXaPRaEbFGRPBLdcfbZLOmFVku5Yf0fSIm0knzPHI58?=
 =?us-ascii?Q?X0SQywtdA6r2xy+JqyROOJMgWK/wnLrC/h1T6CKeaBCYOeuJRF2JMmhMXrxl?=
 =?us-ascii?Q?vCV90XFmWLGCcfZHekjl0vHh6S7Kc3u3khTkzO5qn10qHejZApPOxxxwF+Sz?=
 =?us-ascii?Q?D1I8QUxr0eI23rHji5xeYUshviiEXgOHopgG5HGyWWAsb2kb64ZNpC4HLwU7?=
 =?us-ascii?Q?WqhKKhYKcT+fW7N8L9K9iXqXnVBUXWsxW8K3S7VUpJG6CJp5clDyPVRUF+ct?=
```

=?us-ascii?Q?F3TZ2kYwNx0TGmVYAsYXCW7cbTbL39FtyDGLGvxsWPWrzwVQR/+KQfT10Iv/?=
=?us-ascii?Q?JqX54QS/Vx7HP3iqBZviTixrtKsGtzyzKtFipwkkNBlhdNVOoHqy8qCU4+wa?=
=?us-ascii?Q?qrMHAh0HoiyKX8bH7XgRlsQ1ojSqiAJ9mG6YawQ/dx6nS+wVQXN4ab2lYyop?=
=?us-ascii?Q?YtuulaW5uVGdMkbKakoIAOelITG0gtnAlJdIxRbnzb6803ta8N0877DHlyn0?=
=?us-ascii?Q?y0Oho9XRGawagahpK39USdovX6MnEAwv4LljyFfoktj93HCEzC4QLVg+DqAD?=
=?us-ascii?Q?0W9phi2Gmaq1qgixSPjxxGOnPYLInhvG9f5mDUdQrARzBt/igDZtj6j/PZcx?=
=?us-ascii?Q?StT8gg3eEUXWgRVw6jVCGFZYVg15d0g35tu+FltSMHqsOlZlasCjyW2686jF?=
=?us-ascii?Q?rzlPi2WVDwyv17DuZGCqH5Fn36HodTCORP1Qxq9IA1bYZuqgmO15UkucVe/m?=
=?us-ascii?Q?fRt+CY/8uLLZOtm/CHS333DLMxKpz4OvbRF0RsulWzTuaWBg+mvMReBXvsXZ?=
=?us-ascii?Q?iRUqwwO0BcBHaSpkm0WJyj4KHE9W9hVXhccvL+1O5dH9NGRK5+3yfeSyIxjN?=
=?us-ascii?Q?LN0MsREi0jkJPHT0NKZqaa7mmgRIh0GwuwjAkpf55A1wvRi9yhk=3D?=
X-Forefront-Antispam-Report:
CIP:2a00:1450:4864:20::62c;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail-ej1-x62c.google.com;PTR:mail-ej1-x62c.google.com;CAT:NONE;SFS:(13230040)(7093399015)(13003099007)(8096899003)(4053099003);DIR:INB;
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 19 Apr 2025 15:21:44.1143
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: e0de362b-d68e-4882-a23b-08dd7f55e4ba
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: ded4b5ac-325f-4214-9439-22d98c01b9c8
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:
CY4PEPF0000EE39.namprd03.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SA1PR22MB5445

Final-Recipient: rfc822;infraestructura@gobsucre.gov.co
Action: failed
Status: 5.7.193
Diagnostic-Code: smtp;550 5.7.193 UnifiedGroupAgent; Delivery failed because the sender isn't a group member or external senders aren't permitted to send to this group.
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?SECRETAR=CDA_DE_INFRAESTRUCTURA_DPTAL?=

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS" <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>
To: "INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS" <inter.hospital24@gmail.com>, "ANDRÉS BOTERO" <ingandresbotero@hotmail.com>, "SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL" <infraestructura@gobsucre.gov.co>, ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Cc:
Bcc:
Date: Sat, 19 Apr 2025 10:21:29 -0500
Subject: ADJUNTO MODIFICACIONES AIRE ACONDICIONADO
Calle 42 No.7-40 Local
1 Montería - Córdoba
consorciocmohospitalsucre@gmail.com
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com
300-2737187
604 791 96 12
CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE
Monteria, abril 19 de 2025.
Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.
HGM24052024-66
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
ASUNTO: Entrega de diseños ajustados del sistema HVAC y Solicitud de Mesa de Trabajo con el ministerio de salud e interventoría para socializar los cambios
Cordial saludo,
Por medio de la presente, me permito excusar el retraso en la entrega de los diseños ajustados del sistema HVAC, el cual fue previamente acordado para el día 14 de abril. Lamentablemente, la demora se debe a que surgieron otros ajustes técnicos para el desarrollo y entrega del mismo, que afectaron el cronograma de entrega, como adaptar las áreas faltantes con aire acondicionado y la consulta de los cambios eléctricos, al ingeniero encargado de las redes eléctricas

https://drive.google.com/drive/folders/1TzvtHakXpMrTBmb6LOYGZxXyN_Q2SDu1

Quiero reiterar nuestro compromiso entregando el diseño con los ajustes y requerimientos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera se programe la mesa de trabajo con el grupo profesional de las partes involucradas. Por lo tanto, hacemos entrega de lo acordado en el día de hoy 19 de abril de 2025, asegurándonos de cumplir con los requerimientos necesarios, por medio del siguiente link donde se entregan los cambios pertinentes.
Agradezco de antemano su comprensión ante esta situación y quedo atento para resolver cualquier inquietud adicional que pueda surgir con la entrega de la documentación anexa al presente comunicado.

OFICIO HGM12032024-66 solicitud socializacion y mesa de trabajo pertiente a cambios.pdf
373K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Sincelejo, abril 21 de 2025.

Señores
MINISTERIO DE SALUD
Atte. **JAIRO ENRIQUE BERJAN VASQUEZ**
Email: jberjan@minsalud.gov.co , jrodriguezf@minsalud.gov.co

Señores
GOBERNACIÓN DE SUCRE
Atte. **JORGE ROMERO ROMERO**
Secretario de Infraestructura
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co

Atte: **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Supervisor
Email: ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com

HGM24052024-67

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACIÓN CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO

Por medio de la presente, me permito solicitar la convocatoria de una mesa de trabajo con todas las partes intervinientes en el contrato referido, con el propósito de socializar y exponer los cambios realizados en la red de aire acondicionado. Dichos cambios fueron entregados a la interventoría mediante un enlace de descarga el pasado 19 de abril del presente año, anexo al presente documento.

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Agradezco de antemano la confirmación del agendamiento para la realización de la mesa de trabajo.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

Anexo: Link de descarga: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TzvtHakXpMrTBmb6LOYGZxXyN_Q2SDu1 Modificaciones Aire Acondicionado

Gmail

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACIÓN CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO

3 mensajes

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 21 de abril de 2025, 11:54 a.m.
Para: jberjan@minsalud.gov.co, jrodriguezf@minsalud.gov.co, ismael.sierra@gobsucre.gov.co, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL <infraestructura@gobsucre.gov.co>
CC: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>, ANDRÉS BOTERO <ingandresbotero@hotmail.com>

Sincelejo, abril 21 de 2025.

Señores
MINISTERIO DE SALUD
Atte. **JAIRO ENRIQUE BERJAN VASQUEZ**
Email: jberjan@minsalud.gov.co , jrodriguezf@minsalud.gov.co

Señores
GOBERNACIÓN DE SUCRE
Atte. **JORGE ROMERO ROMERO**
Secretario de Infraestructura
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co

Atte: **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Supervisor
Email: ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com

HGM24052024-67

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACIÓN CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO

Por medio de la presente, me permito solicitar la convocatoria de una mesa de trabajo con todas las partes intervinientes en el contrato referido, con el propósito de socializar y exponer los cambios realizados en la red de aire acondicionado. Dichos cambios fueron entregados a la interventoría mediante un enlace de descarga el pasado 19 de abril del presente año, anexo al presente documento.

Anexo: Link de descarga: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TzvtHakXpMrTBmb6LOYGZxXyN_Q2SDu1 Modificaciones Aire Acondicionado

OFICIO HGM24052024-67_AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO.pdf
137K

postmaster@gobsucre.gov.co <postmaster@gobsucre.gov.co> 21 de abril de 2025, 11:58 a.m.
Para: obra.hospitaldelgolfo@gmail.com

Office 365

Your message to the Microsoft 365 group infraestructura@gobsucre.gov.co couldn't be delivered.

BCL:0;ARA:13230040|7093399015|8096899003|4053099003|4013099003|13003099007|7053199007;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info:
=?us-ascii?Q?VhoYZuA1U0cFZI9jPoXu+ERKXHem13IyjswqStz8VC/DhuOFyWOjIPs9n46d?=
=?us-ascii?Q?0MTngmG4NlH7DMBWGchsLHdjgBpCyoRIkSI88nL4e+KjHektOYJ9aXtsPo7g?=
=?us-ascii?Q?m3Lq7pKG45sMRGPuLGXSGG0/Df3xyTD8qrLzFstVMS3Z2yU9f6Q0aX/pTtPV?=
=?us-ascii?Q?eAtrr2KE9Ip3vJzyrrU075ae0bmufe+ybkSGGKKfMxzrf+CT0UuQpjKju6Q1?=
=?us-ascii?Q?39ASu1PXUpUiW35/zijJLy9gVf1YKP9qh2mSDVdiJNmPgv2iDaYkIUn8KX7z?=
=?us-ascii?Q?84PmM0U62Sfosa83ZolTlbvfmUgUd+veB+h1Lv9RGsJHHbdqYfVFYSWU0aTL?=
=?us-ascii?Q?zVLVCPEEvUC2aUYJ9e1sXPOPag7kh4KLHQlfvkD6e9fPjmxHPYJ99g2l5Mop?=
=?us-ascii?Q?6xjiCLBouGK4qTg4Muwazy83UDFM1sHJ45gOFA5894Qr612kpICNk2pkvodn?=
=?us-ascii?Q?FMiGa/66DS2j+8zZuLnUKmil2QTiiikOYI+lQzqOmk7BkOKFQrihG1csfHph?=
=?us-ascii?Q?8IX9KpX+bpibbOGnTKEmSAsbY9736Z2jQIbEdrcpQATx8/fXO9m75yk9J8fG?=
=?us-ascii?Q?CXHzvE2txidAtLh5v3fDP7EuU1kR/yg/yZHszMrkiiSns085M8VUZKDp2Azh?=
=?us-ascii?Q?e3XPUgP8mevJjnsQ3DLhN6470CL4oGOvCP4cjX0Vf1H1tXpycrb689M9xAx9?=
=?us-ascii?Q?Ck3/c3Tghb45TLq816mHWTGm4bBZwNv1Cyxmg4kKBLUcEk9bSlUrFcCYUipB?=
=?us-ascii?Q?3lrg3QzOBYPICzgVjIzoKtnW7wpkLWa243omz/XM7XirXzmRlijN0X/e2F1m?=
=?us-ascii?Q?CEa6PhdgQIRu/c7uqhoYOqbKPaDa+Fj+qgdblyJq6Y2J3xYVnKiWMsOsRSJ1?=
=?us-ascii?Q?hy0GHtQQoEU0AV5sckUjLYwQjyL1DJD+brj4MS9gP5WSrym8NkQh2Mi9Ys4r?=
=?us-ascii?Q?d6uzfTeg2fUvGR/VVfpQ0TG7uQqPCMl8ZzRVo8F4O+B+J5KG5qwsJyrQ2c3e?=
=?us-ascii?Q?NbmkvL5fevieDU1zOLJq+1flOVS21b2xOGqRC49CY3rTJOTFjq4Fe6SDPqSE?=
=?us-ascii?Q?Se7x8xmATqtbJdV9wfbUHxbS4d0Zp365GdRKUJuI01ULjx4u3kyCVBnV5O6y?=
=?us-ascii?Q?+O6JNuNGJjCH1WE0ZeI224KsreHk4D/8ggK0fSvUjgpg2oKN0rrdb+D9gBmp?=
=?us-ascii?Q?n/uBpDawHcbpeK+fQiXpQyi4oxWa3IGqc5Vjmr5+wwpi1f5fbkJDdfUuTOtN?=
=?us-ascii?Q?sozRyNMIrWNDebNtdT+fcg71BZiK8KZz5AVpojBEA+3u16VzL7ISi84PuWMd?=
=?us-ascii?Q?0ZULKfnVFhYzmaiUwTZ+jDjMP3dtlof8z2X7WhwfjLRGy3VNiZpTtFrmKeLm?=
=?us-ascii?Q?iVAbXFe3xzOIXTUdTNgSvK72mv/wdzwT2/vEiO262iwuKQok5aS64tpqqF8i?=
=?us-ascii?Q?db2ZWRcVNX59h/kTC0LmXVv+XDk9ezl19N6LcWI+X8M4qLImc1vYRhTofD6e?=
=?us-ascii?Q?iKPxRljGTXpNqfB6xFJ7U79LbJgZA43gGtN5w1MFsrIiAUhx3SjOxNUAEkZ2?=
=?us-ascii?Q?IDqY0hrqLnY4OPKiYa9OE93k2/nqjlo21lFmdVuXJQgG8oUW3FLb+/bQukok?=
=?us-ascii?Q?W1ScS7Oa176WXedtDPhnXtfYIGCJe/nzjewpYgZ8g3uFd7k+qsHUPrDo2Eva?=
=?us-ascii?Q?aRrK8Fsnvv0Caw6VvEh+AEIWzvZToTB6uSOwITqk51zEo+k7VcNfubTf3o/k?=
=?us-ascii?Q?gVoc5qrO8D5koHwpQ30zpWlyDKSRETHnCGsnD20ZazavV70tKFaGWm4cfSj7?=
=?us-ascii?Q?nePtl2h3jeJx2KBZj38V+ireaA1HP5uKFhTdwhTa8IjeY2M+I4XWdGEaPF0p?=
=?us-ascii?Q?d9V5TLK1aYWnw/uR6hbdxM5i06w3+NnrKapq02dAZppNAWgUVzzXq7Z/sn5Q?=
=?us-ascii?Q?hYBf1uFrLDJmSqFkp8CIhr1bnX6UPfFqz9qceJ2MtLHN1zy7L4++x+EsI1+F?=
=?us-ascii?Q?YctaQ0vVSwZPGrOKw+mbTxeV7S4tFoggF7U4GmLE9AvdfFvEMiYfrqKOG7Kc?=
=?us-ascii?Q?4v5ecGjgJeG0s9J9yDCSHRKC+/CKDYptKppdDWk4rRBHlWCgGVU=3D?=
X-Forefront-Antispam-Report:
CIP:2a00:1450:4864:20::530;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail-ed1-x530.google.com;PTR:mail-ed1-x530.google.com;CAT:NONE;SFS:(13230040)(7093399015)(8096899003)(4053099003)(4013099003)(13003099007)(7053199007);DIR:INB;
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 21 Apr 2025 16:54:53.6554
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 7ed0f801-7a54-453e-50e6-08dd80f53d34
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: ded4b5ac-325f-4214-9439-22d98c01b9c8
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:
MWH0EPF000989EC.namprd02.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: LV8PR22MB5891

Final-Recipient: rfc822;infraestructura@gobsucre.gov.co
Action: failed
Status: 5.7.193
Diagnostic-Code: smtp;550 5.7.193 UnifiedGroupAgent; Delivery failed because the sender isn't a group member or external senders aren't permitted to send to this group.
X-Display-Name: =?Windows-1252?Q?SECRETAR=CDA_DE_INFRAESTRUCTURA_DPTAL?=

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS" <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>
To: jberjan@minsalud.gov.co, jrodriguezf@minsalud.gov.co, ismael.sierra@gobsucre.gov.co, "SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL" <infraestructura@gobsucre.gov.co>
Cc: "INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS" <inter.hospital24@gmail.com>, "ANDRÉS BOTERO" <ingandresbotero@hotmail.com>
Bcc:
Date: Mon, 21 Apr 2025 11:54:40 -0500
Subject: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACIÓN CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO

Sincelejo, abril 21 de 2025.

Señores
MINISTERIO DE SALUD
Atte. **JAIRO ENRIQUE BERJAN VASQUEZ**
Email: jberjan@minsalud.gov.co , jrodriguezf@minsalud.gov.co

Señores
GOBERNACIÓN DE SUCRE
Atte. **JORGE ROMERO ROMERO**
Secretario de Infraestructura
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co

Atte: **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Supervisor
Email: ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com

HGM24052024-67

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACIÓN CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO

Por medio de la presente, me permito solicitar la convocatoria de una mesa de trabajo con todas las partes intervinientes en el contrato referido, con el propósito de socializar y exponer los cambios realizados en la red de aire acondicionado. Dichos cambios fueron entregados a la interventoría mediante un enlace de descarga el pasado 19 de abril del presente año, anexo al presente documento.

Anexo: Link de descarga: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TzvtHakXpMrTBmb6LOYGZxXyN_Q2SDu1 Modificaciones Aire Acondicionado

OFICIO HGM24052024-67_AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO.pdf
137K

Jesus Leonardo Rodriguez Florian <jrodriguezf@minsalud.gov.co> 29 de abril de 2025, 3:39 p.m.
Para: HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>, Jairo Enrique Berjan Vasquez <jberjan@minsalud.gov.co>, "ismael.sierra@gobsucre.gov.co" <ismael.sierra@gobsucre.gov.co>, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL <infraestructura@gobsucre.gov.co>
CC: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>, ANDRÉS BOTERO <ingandresbotero@hotmail.com>

Cordial saludo.

Por medio del presente se notifica a todos los interesados que cualquier tipo de solicitud que se realice ante el Ministerio de Salud y Protección Social, debe ser presentada por el ente departamental, quien actúa como responsable de la radicación del proyecto. En este caso, la Secretaría de Salud Departamental de Sucre.

En ese orden de ideas, se requiere que la presente solicitud sea nuevamente enviada desde la SSD, incluyendo en copia a los demás intervinientes del proyecto. Una vez recibida y de acuerdo a la disponibilidad de los profesionales del ministerio, se procederá al agendamiento de la asistencia técnica en modalidad virtual.

Quedo atento a sus comentarios.

Muchas gracias.

Leonardo Rodríguez Florián
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud
Ministerio de Salud y Protección Social
Tel: 330 5000
Cra. 13 No. 32-76, Bogotá D.C.
www.minsalud.gov.co

[Texto citado oculto]

Gmail

INTERVENTORIA INTERHOSPITAL <inter.hospital24@gmail.com>

Respuesta oficio HGM24052024-62

1 mensaje

INTERVENTORIA INTERHOSPITAL <inter.hospital24@gmail.com> 21 de abril de 2025, 10:38 a.m.
Para: "consorciocmohospitalsucre@gmail.com" <consorciocmohospitalsucre@gmail.com>, "obra.hospitaldelgolfo@gmail.com" <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>
CCO: "ingandresbotero@hotmail.com" <ingandresbotero@hotmail.com>

Coveñas, Sucre, 21 de abril de 2025

OFC-100-INTERHOSPITAL-2024

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
CC.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Respuesta oficio HGM24052024-62 - solicitud de convocatoria de mesas técnicas – Contrato de Obra No. LP-018-2023

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

OFC-100- RESPUESTA OFICIO HGM24052024-62.pdf
127K

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 21 de abril de 2025

OFC-100-INTERHOSPITAL-2024

Señor
JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Calle 42 N° 7-40. MONTERIA, CORDOBA.
CC.
consorciocmohospitalsucre@gmail.com;
obra.hospitaldelgolfo@gmail.com;
jogrearr@yahoo.com

REFERENCIA: Contrato de obra LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Respuesta oficio HGM24052024-62 - solicitud de convocatoria de mesas técnicas – Contrato de Obra No. LP-018-2023

Cordial Saludo,

En atención a su comunicación radicada mediante Oficio HGM24052024-54 del 29 de marzo de 2025, por medio de la cual solicitan la convocatoria formal e inmediata a mesas técnicas con el objeto de revisar y validar las circunstancias que, a su juicio, han generado un desequilibrio económico en el Contrato de Obra No. LP-018-2023, me permito informar lo siguiente:

La interventoría, en ejercicio de sus funciones contractuales, **no cuenta con la facultad legal ni contractual para convocar, autorizar ni negociar mecanismos orientados al restablecimiento del equilibrio económico del contrato**. Esta es una competencia exclusiva de la **entidad contratante**, en este caso la Gobernación de Sucre, quien en caso de considerarlo procedente y conforme a la normativa aplicable, puede adelantar el respectivo análisis jurídico, técnico y presupuestal.

Adicionalmente, es preciso señalar que **los precios unitarios y condiciones contractuales fueron establecidos y aceptados por ambas partes en el marco del proceso de selección y suscripción del contrato**, siendo estos parámetros **de**

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

obligatorio cumplimiento durante la ejecución del mismo. La interventoría ha validado en sus informes técnicos diversos aspectos de la ejecución contractual, sin que ello implique pronunciamiento alguno respecto a una eventual modificación del régimen económico pactado.

En este sentido, cualquier solicitud tendiente a modificar el equilibrio económico del contrato deberá ser **tramitada directamente ante la Gobernación de Sucre**, acompañada de la documentación soporte correspondiente, para que sea evaluada conforme a los principios de legalidad, competencia y responsabilidad fiscal.

La interventoría continuará cumpliendo sus funciones de seguimiento, control y verificación técnica, administrativa, financiera y legal del contrato, en los términos establecidos en el marco legal y contractual vigente.

Cordial saludo,

Atentamente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 26 de abril de 2025

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ - Interventor**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-70

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Respuesta al Oficio OFC-100 – Solicitud de requerimiento a la entidad contratante y reactivación de análisis técnico conjunto

En atención a la comunicación de esa interventoría mediante el Oficio OFC-100, en respuesta a nuestra solicitud formal radicada bajo el Oficio HGM24052024-62, nos permitimos presentar las siguientes observaciones y requerimientos:

1. Objeto de nuestra solicitud

La comunicación inicial remitida por este consorcio no tuvo por objeto solicitar a la interventoría la adopción de decisiones de orden jurídico o contractual, cuya competencia recae exclusivamente en cabeza de la entidad contratante. Por el contrario, el propósito fue solicitar su participación activa como órgano técnico, imparcial y de verificación, dentro de un espacio tripartito (Entidad – Interventoría – Contratista), que permita sustanciar, validar y documentar las afectaciones que actualmente comprometen la ejecución contractual, bajo principios de coordinación interinstitucional y salvaguarda del interés público.

2. Reconocimiento previo de afectaciones por parte de la interventoría

En los oficios técnicos OFC-073 del 5 de marzo, OFC-078 del 11 de marzo y OFC-090 del 13 de marzo de 2025, esa interventoría validó hallazgos técnicos y contractuales que claramente desbordan el riesgo ordinario asumido contractualmente, tales como:

- Modificaciones en las cantidades de obra,
- Ajustes técnicos no previstos inicialmente, y

- Intervenciones en sistemas especializados como HVAC, PTAR y redes hospitalarias.

Estos pronunciamientos técnicos constituyen un precedente institucional relevante, que, lejos de ser desestimado, demanda una respuesta articulada y de fondo por parte de todos los actores contractuales. Sin embargo, estas validaciones han quedado en el aire, sin que se haya registrado una reacción formal o una postura oficial por parte de la entidad contratante frente a los asuntos técnicos y financieros advertidos.

3. Solicitud de requerimiento formal a la entidad contratante

Desconocemos si esa interventoría ha requerido formalmente a la Gobernación de Sucre – Secretaría de Infraestructura un pronunciamiento claro sobre las situaciones técnicas y económicas advertidas, y si ha consultado:

- Si existe alguna situación de desfinanciación del proyecto, ya sea del orden departamental o nacional (Ministerio de Salud), y
- Si hay comunicaciones institucionales que, no habiendo sido puestas en conocimiento del contratista, incidan en el no pago de actas parciales como la No. 2.

Por tanto, solicitamos expresamente que esa interventoría requiera a la entidad contratante un pronunciamiento documentado y expreso sobre estos puntos, el cual constituirá un insumo esencial para los análisis jurídicos, técnicos y presupuestales que deban desarrollarse con posterioridad.

4. Falta de trazabilidad y necesidad de respuesta de fondo

Desde la perspectiva de este consorcio, nos encontramos en una situación de incertidumbre operativa, al no conocer cuál ha sido el curso institucional seguido por nuestras advertencias y solicitudes. En otras palabras: ¿qué ha pasado con las solicitudes de suspensión, reconfiguración técnica y recomposición económica advertidas y validadas?

La ausencia de respuesta y seguimiento compromete el adecuado ejercicio de nuestros derechos y deberes contractuales, pero también limita el cumplimiento del principio de planeación y protección del erario público. El contratista, como primer defensor del patrimonio estatal, tiene el deber de advertir cualquier circunstancia que ponga en riesgo la ejecución o estabilidad financiera del contrato, lo cual ha hecho de forma técnica, oportuna y documentada.

Por ello, no resulta jurídicamente razonable que nuestras advertencias no sean canalizadas formalmente por la interventoría ante la entidad contratante, o que se pretenda limitar su rol únicamente a cuestiones procedimentales. La interventoría ostenta un deber activo de supervisión, verificación y defensa de los intereses públicos, y en tal sentido también responde por los efectos que su omisión pueda generar en el desarrollo del contrato.

5. Solicitud de reactivación de espacio técnico conjunto

En virtud de lo expuesto, solicitamos la reactivación inmediata del análisis técnico conjunto, a través de mesas tripartitas formales, como espacio legítimo y necesario para canalizar los conflictos y afectaciones contractuales de manera trazable, transparente y objetiva.

Requerimos, además, que tales mesas se documenten mediante actas y grabaciones oficiales, que permitan dar trazabilidad institucional a cada una de las actuaciones, especialmente en atención a las incongruencias detectadas en los diseños, las cuales comprometen seriamente la viabilidad técnica y jurídica de la ejecución contractual, y podrían constituir una amenaza directa al patrimonio público.

En ese sentido, dejar de lado estas problemáticas alegando únicamente cuestiones de competencia, y sin asumir un rol activo, podría configurar eventualmente un comportamiento culposo, dada la naturaleza jurídica y funcional de la interventoría como representante técnico de la entidad contratante.

Solicitamos, por tanto, que esa interventoría radique ante la Gobernación de Sucre todas y cada una de nuestras solicitudes, así como los documentos técnicos que las sustentan, para que la entidad adopte una posición formal y debidamente motivada al respecto.

Agradecemos su atención a este requerimiento y quedamos atentos a su pronta y formal respuesta, en aras de continuar bajo principios de coordinación, buena fe, legalidad y eficiencia contractual.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Gmail HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com>

(sin asunto)

2 mensajes

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 26 de abril de 2025, 5:23 p.m.
Para: INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>, ANDRÉS BOTERO <ingandresbotero@hotmail.com>
CCO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DPTAL <infraestructura@gobsucre.gov.co>, ismael.sierra@gobsucre.gov.co, infraestructura@sucre.gov.co

Monteria, abril 26 de 2025

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ - Interventor**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-70

REFERENCIA: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: Respuesta al Oficio OFC-100 – Solicitud de requerimiento a la entidad contratante y reactivación de análisis técnico conjunto

En atención a la comunicación de esa interventoría mediante el Oficio OFC-100, en respuesta a nuestra solicitud formal radicada bajo el Oficio HGM24052024-62, nos permitimos presentar las siguientes observaciones y requerimientos:

1. Objeto de nuestra solicitud

La comunicación inicial remitida por este consorcio no tuvo por objeto solicitar a la interventoría la adopción de decisiones de orden jurídico o contractual, cuya competencia recae exclusivamente en cabeza de la entidad contratante. Por el contrario, el propósito fue solicitar su participación activa como órgano técnico, imparcial y de verificación, dentro de un espacio tripartito (Entidad – Interventoría – Contratista), que permita sustanciar, validar y documentar las afectaciones que actualmente comprometen la ejecución contractual, bajo principios de coordinación interinstitucional y salvaguarda del interés público.

HGM24052025-70 REQUERIMIENTO A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y REACTIVACION DE ANALISIS TECNICO CONJUNTO.pdf
479K

postmaster@gobsucre.gov.co <postmaster@gobsucre.gov.co> 26 de abril de 2025, 5:23 p.m.
Para: obra.hospitaldelgolfo@gmail.com

Office 365

Your message to the Microsoft 365 group infraestructura@gobsucre.gov.co couldn't be delivered.

The group infraestructura isn't set up to receive messages from obra.hospitaldelgolfo@gmail.com.

obra.hospitaldelgolf. . .	Office 365	infraestructura
Sender		**Action Required**
		Sender not allowed

How to Fix It

Try one or more of the following:

- If you're a member of the group, you might be registered with an email address other than obra.hospitaldelgolfo@gmail.com.

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 13 de mayo de 2025

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura Gobernación de Sucre
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor

HGM24052024-76

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Solicitud Prorroga para entrega de Plan de Contingencia y Diseños con estudio de mercado.

Respetados señores,

Ante la inminente necesidad del suministro por parte del contratista, del plan de contingencia, para salvaguardar los atrasos presentados en la ejecución de la obra del proyecto de la referencia, solicitamos dos (2) días hábiles para hacer la entrega de manera completa, incluyendo la programación de obras y flujo de fondos, siendo que para el día 15 de mayo estaríamos subsanando este hecho.

Para los ajustes de diseño, primeramente, en diseño HVAC, de acuerdo al oficio enviado por medio de la interventoría, el día de ayer 12 de mayo de 2025, en base al informe descrito por la supervisión, solicitaron ser más explícitos en los cambios proyectados de acuerdo a las normas, y solicitamos de igual manera que este incluya memorias descriptiva de los cambios, cálculos, cantidades, presupuesto con sus análisis de precios unitarios y el impacto que este genere en las otras redes como son: red eléctrica, red hidrosanitaria, así como el anexo de los faltantes, en gases medicinales, Rci, y otros tales como la inclusión de las mayores y menores cantidades que se generen en dichos cambios, por medio de un segundo balance de obra, el cual será entregado para su estudio dentro de 30 días hábiles.

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

En vista que venimos trabajando en conjunto también será entregado el estudio de mercado para poder tratar de balancear la ecuación del contrato, este mismo explicado en los oficios anteriores, con el fin de crear los espacios pertinentes por medio de mesas de trabajos técnicas para llevar un resultado a la satisfacción del contrato.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 16 de mayo de 2025

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura Gobernación de Sucre
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor

HGM24052024-77

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Entrega plan de contingencia, con programacion y flujo de caja

Respetados señores,

Se hace entrega del plan de contingencia, de las actividades descritas en comités en días pasados, reprogramacion, flujo de caja en formato editable, para su revisión y aprobación

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Sincelejo, mayo 17 de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-78

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME DE OBRA No. 11

Cordial Saludo,

Mediante la presente hago entrega del Informe de Obra No. 11, correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril de 2025 hasta el 30 de abril de 2025 donde se consigna la información del contrato, estado, avance de actividades de obra, aspectos administrativos, relación del equipo en obra, relación del personal en obra, registros fotográficos.

Lo anterior se realiza con el fin de cumplir con la entrega de los informes mensuales de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 10 del Contrato de Obra de la referencia.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Archivo: OFICIOS CONSECUTIVOS CONT. LP-018-2023

Anexo: INFORME DE OBRA No. 11 - CONTRATO No. LP-018-2023.pdf
ANEXOS INFORME No. 11 (comprimido ZIP)

Gobernación de **Sucre**

800-11-03/ SI – 0997

Sincelejo, Sucre, mayo 19 de 2025

Señor:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
R.L CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Email: Ingandresbotero@hotmail.com
3116195411
Montería, Córdoba.

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-018-2023 – CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

ASUNTO: Traslado respuesta contratista de obra - apremio por atraso en el programa de obra del contrato de la referencia.

Cordial saludo,

De manera respetuosa y, en consideración al informe rendido por la firma contratista **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE,** me permito trasladar el mencionado al **CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024** en calidad de interventor de la obra pública para que realicen el respectivo pronunciamiento frente al descargo presentado por el contratista y frente a ello adoptar la decisión que corresponda de inicio o no de la actuación administrativa por parte de la entidad contratante.

Por lo anterior, para mayor ilustración y análisis se anexa al presente traslado:

- Diecinueve (19) folios correspondientes al informe HGM24052024-75
- Oficio No. HGM24052024-77 correspondiente al plan de contingencia

Atentamente,

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura Departamental

CC: obra.hospitaldelgolfo@gmail.com

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Claudia Pérez Palencia	Apoyo jurídico externo- Secretaría de Infraestructura	
Revisó	Sol Milena Diaz Viloria	Apoyo jurídico externo- Secretaría de Infraestructura	
Revisó	Ismael Sierra Iriarte	Profesional especializado- Secretaría de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

0997

Gmail Secretaria de Infraestructura Departamento De Sucre <infraestructura@sucre.gov.co>

RESPUESTA APREMIO ATRASO Y FECHAS DE ENTREGA DE LO REQUERIDO

1 mensaje

HOSPITAL DEL GOLFO COVEÑAS <obra.hospitaldelgolfo@gmail.com> 13 de mayo de 2025, 14:56
Para: infraestructura@sucre.gov.co, INTERVENTORIA HOSPITAL COVEÑAS <inter.hospital24@gmail.com>, ANDRÉS BOTERO <ingandresbotero@hotmail.com>

Montería, 13 de marzo de 2025

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO
Atte. **Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Secretaria de Infraestructura Gobernación de Sucre
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Doctor
ANDRES RAFAEL VIVERO LEÓN
Secretaria General Gobernación de Sucre
Calle 25 No. 25B - 35 Av. - juridica@sucre.gov.co

Doctora
KEYNA MEBARAK COVALEDA
Secretaria de Planeación Gobernación de Sucre
Calle 25 No. 25B - 35 Av. - keyna.mebarak@gobsucre.gov.co

Doctora
LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Gerente General ENTERRITORIO
Calle 26 No 13 -19. Bogotá D.C., Colombia - correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Ingeniero
HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

HGM24052024-75

REFERENCIA: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: Objeción Medida Apremio Por Atraso en el Programa de Obra del CO-018-2023, en razón a deficiencias generalizadas en los diseños, ruptura del equilibrio económico e imposibilidad de ejecución.

Respetados señores,

Por medio de la presente, y en ejercicio de nuestras responsabilidades contractuales, nos dirigimos respetuosamente a usted para manifestar nuestra ENFÁTICA OBJECIÓN A LA MEDIDA DE APREMIO solicitada por la interventoría en razón a que las situaciones que vienen generando el **atraso en el Programa de Obra no son de responsabilidad del contratista de obra, sino en virtud a la persistencia de deficiencias generalizadas y estructurales en los diseños técnicos suministrados por la entidad contratante, las cuales constituyen una circunstancia sobreviniente, imprevisible y ajena a la esfera de control y responsabilidad del contratista**, además de la grave alteración la

ecuación económica del contrato tanto en recursos financieros como en el plazo del contrato, que vienen originando la imposibilidad material y jurídica de continuar parcialmente las obras.

INFORME 4-SEPTIEMBRE INTERV HOSPICOVEÑAS.pdf

i

HGM24052024-75 OFICIO DE INCUMPLIMIENTO C .pdf
12462K

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 13 de mayo de 2025

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura Gobernación de Sucre
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co

Doctor
ANDRES RAFAEL VIVERO LEÓN
Secretaria General Gobernación de Sucre
Calle 25 No. 25B - 35 Av. - juridica@sucre.gov.co

Doctora
KEYNA MEBARAK COVALEDA
Secretaria de Planeación Gobernación de Sucre
Calle 25 No. 25B - 35 Av. - keyna.mebarak@gobsucre.gov.co

Doctora
LINA MARÍA BARRERA RUEDA
Gerente General ENTERRITORIO
Calle 26 No 13 -19. Bogotá D.C., Colombia - correspondencia.lira@enterritorio.gov.co

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor

HGM24052024-75

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Objeción Medida Apremio Por Atraso en el Programa de Obra del CO-018-2023, en razón a deficiencias generalizadas en los diseños, ruptura del equilibrio económico e imposibilidad de ejecución.

Respetados señores,

Por medio de la presente, y en ejercicio de nuestras responsabilidades contractuales, nos dirigimos respetuosamente a usted para manifestar nuestra ENFÁTICA OBJECIÓN A LA MEDIDA DE APREMIO solicitada por la interventoría en razón a que las situaciones que vienen generando el **atraso en el Programa de Obra no son de responsabilidad del contratista de obra, sino en virtud a la persistencia de deficiencias generalizadas y estructurales en los diseños técnicos suministrados por la entidad contratante**, **las cuales constituyen una circunstancia sobreviniente, imprevisible y ajena a la esfera de control y responsabilidad del contratista**, además de la grave alteración la ecuación económica del contrato tanto en recursos financieros como en el plazo del contrato, que vienen originando la imposibilidad material y jurídica de continuar parcialmente las obras.

Con el objeto de que **no se de inicio** a la medida solicitada por la interventoría, a continuación, presentamos respuesta a cada uno de los hechos aducidos por la interventoría, presentando evidencias contundentes que comprueban la realidad de las graves afectaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras, que viene sufriendo el Consorcio Contratista, de las cuales tienen conocimiento tanto la interventoría como la entidad contratante, pero dado que como contratistas nos hemos distraído en actuar para darles solución pronta, no hemos generado la trazabilidad de las numerosas deficiencias que aún seguimos encontrando y que impactan directamente la continuidad de los trabajos de ejecución de obras; por ello rechazamos contundentemente que las situaciones que vienen afectando gravosamente al consorcio constructor, socializadas y explicadas en cada escenario no sean estudiadas y valoradas con objetividad y a cambio se ponga al contratista de obra en total situación de indefensión.

RESPECTO AL PLAZO DEL CONTRATO:

Respecto al Plazo del contrato, estimado en dieciocho (18) meses (contados a partir del perfeccionamiento del contrato), es evidente (de acuerdo con los documentos contractuales publicados) que el plazo de ejecución del contrato ha sufrido desequilibrio en dos momentos contractuales a saber:

1. El primero por efecto de las **MAYORES CANTIDADES DE OBRA** reportadas por la interventoría el día 3 de octubre de 2024, y que justificaron el **Modificatorio No 01**[1], con fecha 21/11/2024, por valor de Dos Mil Millones Setecientos Sesenta Mil Seiscientos Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte. ($2.760.630.453=). En cuya justificación la interventoría evidencia mayores cantidades de obra debido a que el terreno donde se ubica el proyecto es de baja capacidad portante que aumentó la profundidad de desplante en 1,5 metros que genero aumento en las cantidades de excavaciones lleno y concretos.

   Evidentemente las mayores cantidades de obra generaron una prorroga tacita en el plazo del contrato, lo cual está ampliamente explicado en la consideración 9 del modificatorio No 01 del contrato:

   9. Que la Agencia Colombia Compra Eficiente ha analizado que: "*Como distinción inicial, se tiene* ***prórroga está particularmente ligado con la modificación —ampliación— del plazo de lo adiciones con el incremento del valor, debido a la inclusión de nuevas obligacio introducción de nuevas actividades o por la ejecución de una mayor cantidad d inicialmente****; (...) Durante la fase de ejecución de los contratos estatales, las partes podrian de las siguientes situaciones: i) la necesidad de acometer mayores cantidades de los iter inicialmente previstos, a lo que en la práctica se le conoce como «mayores cantidades o*


[1]Anexo 1: Modificatorio No 01 del 21 Nov 2024 – 4 folios

Y, aunque se enuncia el tratamiento de la ampliación del plazo del contrato (prorroga), este desequilibrio no fue subsanado por la interventoría en representación de la entidad.

Para mayor claridad revisemos entonces los documentos contractuales respecto al retraso en la ejecución y plazo del contrato a la fecha de la modificación del contrato (21 noviembre de 2024); del certificado de avance financiero de la Interventoria[2], de fecha 30 de septiembre del 2024, se tiene un avance acumulado del 7,01%,

TOTAL EJECUCION ACUMULADA	$ 2.411.671.52

Para constancia se firma a los 30 días del mes de septiembre del 2024.



y del informe de interventoría No 4[3] una ejecución programada por valor de $5.895.255.394, equivalente al 17.13%:

COMPONENTE	PROGRAM
OBRA CIVIL	$ 5.895.255.3
EQUIPOS	
AMUEBLAMIENTO	

Es decir, de los documentos que soportan el modificatorio No 01 se colige la existencia de un atrasó del 10,12% en las actividades contractuales por efecto de los argumentos avalados por la Interventoria en el modificatorio.

Aunado a esto el plazo necesario para ejecutar obras por efecto de mayores cantidades de obra por valor de $2.760.630.453=, es decir un 8% por mayores cantidades de obra.

Se concluye entonces de los documentos que soportan el modificatorio No 01 que por efecto de las situaciones presentadas en obra que afectaron la normal ejecución del

[2] Anexo 2: certificado de avance financiero de la Interventoria – 3 folios
[3] Informe de Interventoría No 04, soporte del contrato modificatorio.

plazo una afectación del 10,12% del plazo inicial, y por efecto del plazo necesario para ejecutar las mayores cantidades de obra el 8.0% del plazo inicial, para un total del **18,12% adicional al plazo establecido** en el contrato, es decir una afectación en el plazo de ejecución del contrato de obra de **3,26 meses adicionales – noventa y siete (97) días adicionales** (18 meses x 0,1812= 3,26 meses x 30 = 97 días), lo cual no fue reconocido en la modificación del plazo del contrato al momento de la suscripción por las partes intervinientes.

2. **Reprogramación de obras**[4], **con fecha 12 de marzo de 2025** (HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025 - ver anexo 4), por efecto de la imposibilidad de llevar a cabo obras capítulos 21.00.00, 22.00.00, 23.00.00, 24.00.00, 25.00.00, aparatos sanitarios, carpintería en madera, metálica, aluminio, acero inoxidable, y deficiencias en el sistema de aire acondicionado HVAC.
   Esta solicitud **viabilizada por la interventoría**[5] (OFC-085-INTERHOSPIATL-2024, del 18/04/2025- Ver anexo 5), en cuyo oficio establece: *"…, por razones evidentes, estas actividades no pueden ejecutarse en este momento, representando aproximadamente el 5% del avance total"*, cursiva y subrayado fuera de texto; reconoce la imposibilidad de ejecutar obras por valor de mil ochocientos cincuenta y nueve millones sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. $1.859.069.654= ($37.181.393.077 x 5%).
   En atención al equilibrio contractual respecto al plazo del contrato, es decir 18 meses, para ejecutar obras por valor de $1.859.069.654=, equivalentes al 5.4% del valor pactado inicialmente (1.859.069.654/34.420.762.624=5.4%), serían necesarios 0,97 meses (5,4% x 34.420.762.624 = 0.97) del plazo inicial, es decir veintinueve días (0.97 x 30 = 29).

   Se concluye entonces que con base en los documentos que soportan la reprogramación de obras que **por efecto de las dificultades presentadas en obra no se pudieron atender obras programadas por valor de 1.859.069.654, cuya afectación al plazo es de 29 días calendario.**

CONCLUSIÓN: DEMOSTRADO ESTÁ, CON LAS EVIDENCIAS DE LOS DOS MOMENTOS CONTRACTUALES, QUE LAS AFECTACIONES DIRECTAS AL PLAZO DEL CONTRATO POR **FACTORES NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA DE OBRA** SON DE CIENTO VEINTE SEIS DÍAS, y por tanto no es viable que la interventoría manifieste como causa del proceso conminatorio un atraso de 127 días y con ello sea tasada de manera incipiente la multa correspondiente, sin hacer ningún análisis más juicios de las situaciones que vienen afectando el contrato y que han sido reconocidas por ellos mismos en su comunicados oficiales.

HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025: Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC. (Ver anexo 8)

[4] Anexo 3: Comunicado HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025: Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC. – 3 folios

[5] Anexo 4: OFC-085-INTERHOSPIATL-2024 Aprobación Reprogramación Obra – 1 folio

RESPECTO DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA

A continuación, se da respuesta detallada a cada uno de los hechos en los cuales la interventoría aduce un posible incumplimiento, con el objeto de demostrar que los mismos no pueden ser aducidos como incumplimiento por parte del contratista de obra tal como de mostramos a continuación:

a) **Solicitud mediante oficio OFC-070-INTERHOSPITAL-2024 (19/02/2025):** La interventoría solicita la entrega de cantidades de obra actualizadas para todos los ítems que componen el presupuesto y reprogramación de obra de las actividades que no se pueden llevar a cabo.

Respuesta: En atención a dicha solicitud se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-45[6] de fecha 04/03/2025: Entrega de Balance de obra y Estudio de Mercado. (Ver anexo 5)
2. HGM24052024-46[7] de fecha 04/03/2025: Remisión Balance de Obra No 02 y Solicitud de Suspensión No 01. (Ver anexo 6)
3. HGM24052024-48[8] de fecha 12/03/2025: Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC. (Ver anexo 7)
4. HGM24052024-49[9] de fecha 12/03/2025 (Ver anexo 8): Solicitud mesas de trabajo por la existencia de vacíos e incongruencias en los siguientes temas:

    1. Faltante de áreas de pasarelas para interconexión entre los bloques.
    2. Cantidades mayores en muros.
    3. Conexión principal de aguas limpias a distribución interna de redes hidráulicas.
    4. Conexiones faltantes para desagües en zonas claves críticas de redes de aguas patógenas que deberían de contar con dicho suministro de acuerdo a la norma de habilitación 3100 del 25 de noviembre del 2019.
    5. conexión y ubicación de sillas odontológicas, al igual que la ubicación de los compresores con su red de gases medicinales.
    6. cantidades mayores en redes contraincendios por la reubicación de los tanques de almacenamiento.

    Solicitud a la Interventoria para que requiera de manera urgente a la firma consultora la definición del diseño final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Según los planos y el presupuesto actual, no cuenta con ella ya que existe el ítem como una estructura que contiene columnas, entrepisos, muros y cubierta y no como el sistema integrado para realizar el tratado de aguas residuales.

---

[6] Anexo 5: Comunicado HGM24052024-45 de fecha 04/03/2025: Entrega de Balance de obra y Estudio de Mercado.

[7] Anexo 6: Comunicado HGM24052024-46 de fecha 04/03/2025 Remisión Balance de Obra No 02 y Solicitud de Suspensión No 01.

[8] Anexo 7: Comunicado HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025 Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC.

[9] Anexo 8: Comunicado HGM24052024-49 de fecha 12/03/2025 Solicitud mesas de trabajo por la existencia de vacíos e incongruencias

5. HGM24052024-47[10] de fecha 13/03/2025: Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC. (Ver anexo 9)

6. HGM24052024-50[11] de fecha 14/03/2025: Solicitud de Diseños instalaciones Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR (Ver anexo 10)

b) **OFC-072-INTERHOSPITAL-2024 (19/02/2025)**: Convocatoria Comité Técnico, para revisar mayores cantidades e inconsistencias en la programación.

Respuesta: está solicitud fue respuesta lógica al comunicado HGM24052024-49 del contratista de obra, y en ella se trataron los temas relacionados con las múltiples situaciones que afectan la ejecución del contrato, tanto por vacíos técnicos en los diseños como en la definición de actividades propias de obra que no permiten establecer con claridad el balance de las cantidades de obra y el alcance físico y económico del contrato.

c) **OFC-086-INTERHOSPITAL-2024 (25/03/2025)**: presentación de un informe sobre los atrasos y solicitud formal de un Plan de Contingencia.

Respuesta: En atención a dicha solicitud se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-54[12] de fecha 29/03/2025: Respuesta a oficio OFC-086 OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024. (Ver anexo 11)

2. HGM24052024-58[13] de fecha 03/04/2025: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA (Ver anexo 12).

d) **OFC-094-INTERHOSPITAL-2024 (31/03/2025)**: Entrega Plan de contingencia con fecha máxima 2 de abril y entrega ajustes y/o optimización sistema HVAC, con fecha máxima de entrega 10 de abril.

Respuesta: En atención a la solicitud del **Plan de Contingencia** se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-58[14] de fecha 03/04/2025: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA (Ver anexo 13).

2. HGM24052024-62[15] de fecha 07/04/2025: SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN DEL DESEQUILIBRIO

[10] Anexo 9: Comunicado HGM24052024-47 de fecha 13/03/2025 Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC.
[11] Anexo 10: Comunicado HGM24052024-50 de fecha 14/03/2025 Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC.
[12] Anexo 11: Comunicado HGM24052024-54 de fecha 29/03/2025 Respuesta a oficio OFC-086 OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024.
[13] Anexo 12: Comunicado HGM24052024-58 de fecha 03/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
[14] Anexo 12: Comunicado HGM24052024-58 de fecha 03/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

ECONOMICO (Ver anexo 13). Esta solicitud se instauro con el objeto lleve a cabo la validación y comprobación de las situaciones que afectan gravosamente el equilibrio económico del contrato e impiden determinar el alcance físico y financiero, lo que impacta directamente en el alcance del contrato de obra.
Se enfatiza en la existencia de vacíos e incongruencias que solicitamos sean valoradas por la interventoría, entre ellas son fundamentales las variaciones sustanciales en las cantidades de obra, las modificaciones en los diseños y la falta completa de diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.

3. HGM24052024-65[16] de fecha 08/04/2025: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA - CORREGIDO (Ver anexo 14).

4. HGM24052024-68[17] de fecha 21/04/2025: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA V3 - CORREGIDO (Ver anexo 15).

En atención a la solicitud del **Optimización Del Sistema HVAC** se enviaron los siguientes comunicados:

5. HGM24052024-66[18] de fecha 19/04/2025: Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios. (Ver anexo 18).

6. HGM24052024-67[19] de fecha 21/04/2025: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO (Ver anexo 19).

COMENTARIO: Rechazamos que la interventoría motive un posible incumplimiento por efecto de una **obligación no inherente al contratista de obra,** la cual es la propuesta de optimización y/o cambio de los componentes en el Sistema de Aire Acondicionado HVAC.

e) **OFC-097-INTERHOSPITAL-2024 (15/04/2025)**: Reiteración entrega ajustes y/o optimización sistema HVAC, con fecha máxima de entrega 14 de abril.

Respuesta: En atención a la solicitud del **Optimización Del Sistema HVAC** se enviaron los siguientes comunicados
1. HGM24052024-66[20] de fecha 19/04/2025: Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios. (Ver anexo 18).

[15] Anexo 13: Comunicado HGM24052024-62 de fecha 07/04/2025 SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN DEL DESEQUILIBRIO ECONOMICO
[16] Anexo 14: Comunicado HGM24052024-65 de fecha 08/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA - CORREGIDO
[17] Anexo 15: Comunicado HGM24052024-68 de fecha 21/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA V3 - CORREGIDO
[18] Anexo 16: Comunicado HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025 Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios.
[19] Anexo 17: Comunicado HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025 SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO

2. HGM24052024-67[21] de fecha 21/04/2025: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DETRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO (Ver anexo 19).

f) **OFC-100-INTERHOSPITAL-2024 (21/04/2025)**: la Interventoria en su comunicado de apremio OFC-100-INTERHOSPITAL-2024 enuncia al respecto:

- El 21 de abril, a través del oficio OFC-100-INTERHOSPITAL-2024, garantizar la adecuada implementación y cumplimiento del plan de presentado mediante oficio HGM24052024-65, se solicitó al contratis semanal del formato de informe F-IH001, con el fin de que específicamente las actividades y cantidades ejecutadas durante el tra semana y el personal que laboro en obra. Es importante aclarar que dic a ser entregado a la interventoría y este a su vez remitido a la Goberr ha puesto en marcha toda vez que la programación de obra y flujo mismo fue entregada el día de ayer 6 de abril de 2025, mediante corre

NO COINCIDE, el texto anterior con el contenido del comunicado OFC-100-INTERHOSPITAL-2024[22] entregado al contratista de obra, donde la interventoría formalmente manifiesta no contar con facultades para estudiar y validar el desequilibrio económico del contrato tal como se detalla a continuación:

> La interventoría, en ejercicio de sus funciones contractuales, **no cuenta co legal ni contractual para convocar, autorizar ni negociar mecanismos restablecimiento del equilibrio económico del contrato**. Esta es una exclusiva de la **entidad contratante**, en este caso la Gobernación de Sucre, de considerarlo procedente y conforme a la normativa aplicable, puede

Y, en otro aparte enuncia:

> En este sentido, cualquier solicitud tendiente a modificar el equilibrio económic deberá ser **tramitada directamente ante la Gobernación de Sucre**, acom documentación soporte correspondiente, para que sea evaluada conforme a

[20] Anexo 16: Comunicado HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025 Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios.
[21] Anexo 17: Comunicado HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025 SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO
[22] Anexo 18: Comunicado interventoría OFC-100-INTERHOSPIATL-2024 Respuesta oficio HGM24052024-62

Por tanto, los hechos aducidos por la interventoría en su comunicado de apremio, página 3 párrafo 2 no son ciertos.

No obstante, el comunicado OFC-100-INTERHOSPITAL-2024, fue contestado mediante comunicado HGM24052024-70[23] de fecha 26/04/2025 (anexo 19). Con el Asunto: Respuesta al Oficio OFC-100 – Solicitud de requerimiento a la entidad contratante y reactivación de análisis técnico conjunto

g) **OFC-105-INTERHOSPITAL-2024 (23/04/2025)**: Respecto a la revisión de los diseños ajustado del sistema HVAC se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025: Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios. (Ver anexo 16).

2. HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO (Ver anexo 17).

Ha sido nuestra solicitud, que las revisiones acerca del diseño del sistema de HVAC, se hagan de manera conjunta, sin embargo, la interventoría solicita en su comunicado que el contratista de respuesta a las siguientes observaciones:

- *No se especifica si las modificaciones al sistema HVAC afectan otras redes y diseños existentes. En consecuencia, no hay claridad sobre posibles afectaciones ni se plantean ajustes en caso de ser necesario.*
- *No se incluyen las especificaciones técnicas detalladas de cada ítem, así como de los equipos y suministros propuestos.*
- *No se presenta el presupuesto correspondiente, ni la memoria de cantidades y análisis de precios del sistema propuesto. Cabe recordar que, para los materiales, equipos, mano de obra y transporte requeridos, deben aportarse al menos tres (3) cotizaciones como respaldo para el análisis.*

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos remitir la información faltante en un plazo no mayor a tres (3) días calendario, ya que estos documentos son insumos indispensables para realizar una evaluación integral del proyecto y dar cumplimiento al compromiso de revisión asumido por la interventoría.

Nuevamente, la interventoría pone como responsabilidad del contratista la obligación de los diseños, y establece en cada comunicado nuevos alcances de los documentos que hemos generado de nuestra parte sin que el contratista de obra reciba pago alguno, ES INDEBIDO A TODAS LUCES QUE LA INTERVENTORIA IMPONGA CARGAS AGENAS

[23] Anexo 19: Comunicado HGM24052024-70 de fecha 26/04/2025. Respuesta al Oficio OFC-100 – Solicitud de requerimiento a la entidad contratante y reactivación de análisis técnico conjunto

A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA POSTERIORMENTE ADUCIR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA E IMPONER SANCIONES.

h) **OFC-111-INTERHOSPITAL-2024 (23/04/2025):** Respecto a la revisión de los diseños ajustado del sistema HVAC se enviaron los siguientes comunicados:

1. HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025: Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios. (Ver anexo 16).

2. HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025: SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO (Ver anexo 17).

Ha sido nuestra solicitud, que las revisiones acerca del diseño del sistema de HVAC, se hagan de manera conjunta, sin embargo, la interventoría solicita en su comunicado que el contratista de respuesta a las siguientes observaciones:

- *No se especifica si las modificaciones al sistema HVAC afectan otras redes y diseños existentes. En consecuencia, no hay claridad sobre posibles afectaciones ni se plantean ajustes en caso de ser necesario.*

- *No se incluyen las especificaciones técnicas detalladas de cada ítem, así como de los equipos y suministros propuestos.*

- *No se presenta el presupuesto correspondiente, ni la memoria de cantidades y análisis de precios del sistema propuesto. Cabe recordar que, para los materiales, equipos, mano de obra y transporte requeridos, deben aportarse al menos tres (3) cotizaciones como respaldo para el análisis.*

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos remitir la información faltante en un plazo no mayor a tres (3) días calendario, ya que estos documentos son insumos indispensables para realizar una evaluación integral del proyecto y dar cumplimiento al compromiso de revisión asumido por la interventoría.

Nuevamente, la interventoría pone como responsabilidad del contratista la obligación de los diseños, y establece en cada comunicado nuevos alcances de los documentos que hemos generado de nuestra parte sin que el contratista de obra reciba pago alguno, ES INDEBIDO A TODAS LUCES QUE LA INTERVENTORIA IMPONGA CARGAS AGENAS A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA POSTERIORMENTE ADUCIR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA E IMPONER SANCIONES.

RESPUESTA AL PÁRRAFO FINAL DE LOS HECHOS

Las condiciones actuales del proyecto, incluyendo los atrasos en el cronograma de obra y las afectaciones al equilibrio económico del contrato, no son resultado de una negligencia o incumplimiento atribuible al Contratista. Reiteramos que la viabilidad y éxito de este tipo de proyectos de infraestructura pública demandan una planeación rigurosa y la entrega de diseños completos y coherentes desde el inicio, así como un trabajo mancomunado y diligente entre la Entidad Contratante y el Contratista para abordar los hallazgos y necesidades de optimización que surjan durante la ejecución. En este sentido, las necesidades de revisión y optimización de los diseños originales, así como la consideración de las condiciones particulares del terreno y ambientales no consideradas en su totalidad en los estudios y diseños iniciales, surgen de un análisis exhaustivo **in situ durante el desarrollo propio de la obra**, donde se han identificado **particularidades inherentes a la construcción diaria, así como cambios en la normativa aplicable** desde la concepción de los diseños.

I. PLAN DE ACCIÓN:

Conscientes de la importancia del proyecto para el interés público y en aras de mantener el impulso de la obra, manifestamos nuestra disposición a proceder con las labores que, de alguna manera, puedan desarrollarse sin estar comprometidas por los puntos críticos presentados en esta misiva. Lo anterior, a fin de mantener un avance de la obra, en tanto se resuelven las definiciones fundamentales. Para ello, y como muestra de nuestra buena fe y compromiso, presentaremos en el menor tiempo posible un plan de contingencia con su respectivo anexo de reprogramación, que permitirá seguir avanzando en los frentes posibles. Sin embargo, es fundamental señalar que, pese a nuestros esfuerzos y este plan de contingencia, **la obra inevitablemente enfrentará un letargo significativo** debido a la poca capacidad de ejecución que se presentará frente a una toma de decisiones de fondo y la necesidad de reformulación de los diseños y selección de materiales, además de los cambios que las propias normas que regulan el sector salud nos obligan a realizar. La operatividad completa y eficiente de la obra está supeditada a la resolución de estos desafíos técnicos y normativos.

II. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS ORIGINALES Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN:

Desde los inicios de la ejecución del contrato, hemos constatado que los diseños entregados, si bien representan una base fundamental, requieren ser optimizados para asegurar su plena funcionalidad y el cumplimiento normativo. Estas optimizaciones, que se hacen evidentes en el desarrollo mismo de la obra y gracias a nuestra experiencia específica en este tipo de proyectos, así como por la evolución de la normativa aplicable, son cruciales para su total congruencia con la realidad de la localización del proyecto (altas condiciones de humedad y salinidad), las características del terreno (suelos poco cohesivos e inestables, alto nivel freático, evidencia de movimientos en masa pasados), y las condiciones

ambientales (temperaturas elevadas y radiación solar intensa). Esto ha requerido que, como Contratista, hayamos tenido que revaluar constantemente el cumplimiento de la normativa actual y llevar a cabo una coordinación integral entre las diferentes especialidades desde cero.

A continuación, detallamos las necesidades específicas de optimización en los diseños que han generado los atrasos y la alteración del equilibrio económico, tal como se expuso en nuestro Oficio HGM24052024-70:

- **Cimentación:** Se encontraron discrepancias fundamentales en las profundidades de desplante y una falla geológica de gran magnitud. Esto exigió sobre-excavaciones no contempladas y el uso de entibados para la seguridad del personal, generando costos adicionales asumidos por el Contratista. La definición de la cimentación se prolongó por un periodo de **3 meses (del 15 de agosto al 21 de noviembre)**, afectando directamente el inicio de otras actividades

- **Estructuras:** El diseño estructural presenta omisiones e incoherencias (ej. necesidad de vigas de enlace para amarrar zapatas, aumento de longitudes de columnas por cambio de cota, separación de tanques de almacenamiento). Estos ajustes han ralentizado los procesos y han generado un retraso significativo de **1.8 meses**, aunque se han subsanado paralelamente a la construcción. La responsabilidad de entregar diseños completos y construibles que garanticen la operatividad y eficiencia de la obra recae en la Entidad Contratante.

- **Redes Hidrosanitarias:** Se detectó la falta de conexión principal de la red de agua potable, la necesidad de reubicar tanques por inestabilidad del terreno, un rediseño de la red contra incendios con mayores recorridos y cambios en presiones de diseño (implicando cambio de equipos de bombeo), y deficiencias en las descargas de desechos patógenos y sifones de piso. Esto ha llevado a la inclusión de ítems no previstos en el contrato.

- **Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR): No existe un diseño final** para esta planta. La información proporcionada es incompleta y no especifica el tratamiento requerido para aguas domésticas, no domésticas y patógenas. Sin un diseño aprobado por las autoridades ambientales y de servicios, la operación futura del hospital es inviable, lo cual podría configurar un detrimento patrimonial para el Estado. La ausencia de este diseño definitivo impide el avance en un componente crítico del proyecto y compromete su funcionalidad futura.

- **Redes de Ventilación Mecánica (HVAC):** El diseño presenta serias deficiencias, incluyendo la falta de cobertura de aire acondicionado en áreas críticas (ej. cuarto de CCV, almacenamiento de insumos), aislamiento insuficiente de áreas de riesgo (ej. sala de autopsias), y la ausencia de condiciones especiales (filtración, temperatura, renovación de aire) en quirófanos, salas de parto, laboratorios y farmacias. Además, la instalación de estas redes es una precedencia para otras instalaciones (contraincendios,

agua, eléctrico, gases medicinales), lo que implica que el atraso en esta definición afecta directamente otros capítulos de la obra.

- **Redes de Gases Especiales:** No se contemplan puntos de conexión para sillas odontológicas y existe una configuración incorrecta de compresores y controladores que debilita la presurización del sistema, incumpliendo además la Resolución 1497 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social.

- **Instalaciones Eléctricas:** Los cambios en los sistemas HVAC, bombeo y STAR afectan directamente las cargas de operación del diseño eléctrico. La definición de este sistema está supeditada a la aprobación de los diseños de todos los sistemas mencionados (HVAC, STAR, Hidrosanitario, gases medicinales), lo que a su vez impide el cumplimiento normativo del RETIE (2023).

III. CONSECUENCIAS DIRECTAS EN EL CRONOGRAMA Y AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

La programación inicial de la obra, construida bajo la premisa de diseños completos y aptos para una ejecución directa, **requiere una revalidación a la luz de las inconsistencias y necesidades de optimización identificadas**. Las desviaciones en la cimentación marcaron el inicio de una cadena de retrasos que no son imputables a nuestra gestión, sino a la necesidad de abordar estas optimizaciones. Es evidente que cualquier cambio en los diseños originales altera ineludiblemente el alcance, el tiempo y el costo del proyecto, tal como lo establece la "triple restricción" en la gestión de proyectos.

A la fecha, la insistencia en mantener la medición del avance del proyecto basada en una programación inicial que no refleja el cambio en el alcance ni la ausencia de diseños definitivos, es contraproducente y no permite una comparación justa. Es fundamental disponer de los diseños definitivos u optimizados para la construcción de elementos específicos, pues su ausencia impide la ejecución material y genera inviabilidad jurídica. El 57.86% del presupuesto del proyecto aún depende de estas definiciones.

Hemos alertado sobre una nueva alteración al equilibrio económico del contrato, debido a las mayores cantidades de obra y actividades nuevas requeridas. Además, destacamos que la propia Interventoría emitió una respuesta favorable a una solicitud de suspensión anterior (OFC-073-INTERHOSPITAL-2024 del 5 de marzo de 2025), la cual, hasta la fecha, no ha culminado su trámite por parte de la entidad contratante.

IV. NUESTRA VOCACIÓN COLABORATIVA Y LA URGENCIA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Como Contratista, hemos adoptado una postura proactiva y colaborativa, coordinando los diseños de manera autónoma para anticipar y resolver problemas. Hemos presentado reprogramaciones (la del 12 de marzo de 2025, priorizando urbanismo y exteriores) y un plan de contingencia (3 de abril de 2025, con correcciones el 8 de abril), a pesar de que una gran parte del presupuesto depende de diseños aún no optimizados. Subrayamos que este

ejercicio proactivo requiere una correlativa respuesta diligente por parte de la Entidad Contratante, en el marco del deber de colaboración mutua que rige la contratación estatal. La persistencia de observaciones y aclaraciones sin resolver nos impide vislumbrar el alcance físico y económico real del contrato con la claridad necesaria para una ejecución óptima.

V. PROTECCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

Nuestra solicitud de medidas correctivas parte de una necesidad elemental: garantizar que el contrato siga siendo viable técnica y económicamente, y que el interés público no se vea afectado por condiciones ajenas a la voluntad del contratista.

- Alteración del equilibrio contractual: Las condiciones encontradas en obra, como la falta de diseños definitivos o la necesidad de optimizarlos, son situaciones sobrevenidas que no dependen del contratista. Estas circunstancias han generado una afectación significativa a la ecuación inicial del contrato, y no avanzar sin corregirlas pondría en riesgo tanto la calidad del proyecto como los recursos públicos involucrados.

- Limitaciones técnicas que impiden continuar: La ejecución de una obra requiere contar con insumos técnicos claros, viables y ejecutables. Si requieren ajustes sustanciales, la responsabilidad recae en quien debe garantizarlos. El contratista no puede avanzar de forma segura ni eficiente si se encuentra con inconsistencias que bloquean el desarrollo del proyecto.

- Necesidad de colaboración efectiva: El cumplimiento del contrato no es una tarea unilateral. Cuando se presentan alertas técnicas, se espera que haya respuesta oportuna y soluciones desde la administración. La ausencia de decisiones frente a los problemas detectados ha generado una barrera real que impide avanzar sin exponerse a errores o reprocesos.

- Suspensión como medida responsable: Frente a este panorama, la suspensión no debe entenderse como una interrupción negativa, sino como una herramienta preventiva y estratégica. Suspender temporalmente la ejecución permite revisar, ajustar y garantizar que las condiciones estén dadas para seguir adelante sin desperdiciar recursos ni comprometer la calidad del resultado.

VI. COMPROMISO FORMAL: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y ANEXOS TÉCNICOS

En concordancia con lo expuesto en el presente escrito y reafirmando nuestro compromiso con la continuidad y el éxito del proyecto, informamos que presentaremos formalmente un plan de contingencia acompañado de los respectivos anexos técnicos que sustentan la propuesta de reprogramación contractual. Dichos documentos establecerán una priorización clara de las actividades que no se ven afectadas por los hallazgos técnicos y normativos descritos en esta comunicación, permitiendo así una hoja de ruta viable para el avance parcial de la obra.

Este plan se ha diseñado bajo criterios de eficiencia operativa, considerando las restricciones técnicas actuales, y tiene como propósito mantener la dinámica contractual mientras se adoptan las decisiones de fondo requeridas por parte de las entidades competentes.

De no ser posible la adopción inmediata de dichas decisiones, solicitamos anticipadamente que, una vez culminadas las actividades no condicionadas a los aspectos técnicos en revisión, se decrete la suspensión temporal del contrato. Esta medida permitiría a las entidades aportantes contar con el tiempo y la capacidad técnica, jurídica y financiera necesaria para evaluar y resolver adecuadamente las situaciones advertidas, en aras de garantizar la correcta ejecución y finalización del objeto contractual.

VII. SOLICITUD FORMAL:

En atención a los hechos expuestos y a la realidad técnica que enfrenta el proyecto, consideramos necesario que se reconsidere la apertura del procedimiento por presunto incumplimiento contractual, contenido en el Oficio OFC-115-INTERHOSPITAL-2024, dado que las circunstancias que han generado los retrasos en la ejecución no son imputables en su totalidad al Contratista. Por el contrario, obedecen a la ausencia de decisiones oportunas y a la necesidad de ajustes técnicos, administrativos y normativos cuya resolución recae en la Entidad Contratante.

La programación actualmente vigente no refleja las variaciones sustanciales en el alcance del contrato, ni contempla los efectos generados por la necesidad de la optimización de los diseños, ni la definición adecuada de materiales conforme a las condiciones reales de ejecución. Esta situación ha provocado una distorsión significativa en la evaluación del avance físico y financiero de la obra, al medirse contra una línea base construida sobre insumos técnicos parciales o desactualizados. Por tanto, solicitamos que dicha medición se limite exclusivamente a los frentes de obra que han podido ser ejecutados, dado que no es necesaria una optimización ni de los diseños de ni de los materiales necesarios para la ejecución.

Reafirmamos que la reprogramación constituye, para el Contratista, la vía técnica y jurídicamente preferente para continuar con la ejecución del proyecto. No obstante, si la Entidad no adopta en el corto plazo las decisiones que permitan disponer de diseños y materiales optimizados, será necesario solicitar la suspensión temporal del contrato como mecanismo subsidiario, preventivo y legalmente reconocido, con el fin de evitar una ejecución ineficiente, el riesgo de reprocesos y la eventual consolidación de un detrimento al patrimonio público.

VIII. REFUTACIÓN DEL OFICIO OFC-115 DE LA INTERVENTORÍA

Respecto del contenido del Oficio OFC-115-INTERHOSPITAL-2024, se considera que las conclusiones ahí contenidas carecen de fundamentación técnica suficiente y omiten de forma sistemática el análisis integral de los antecedentes y hechos sobrevinientes que han sido ampliamente documentados por este contratista. En efecto, la medida de apremio solicitada

se basa en una lectura parcial de los datos de avance sin considerar las afectaciones reconocidas incluso por la propia interventoría en oficios anteriores, como son las fallas estructurales de diseño, la ausencia de la PTAR, las deficiencias graves del sistema HVAC y la falta de definición de redes técnicas esenciales.

Aun cuando se han entregado a la interventoría múltiples versiones del plan de contingencia, balances de obra, estudios de mercado, y rediseños técnicos de alto detalle, la recomendación sancionatoria desconoce por completo el principio de colaboración interinstitucional, el deber de actuación objetiva, y el principio de proporcionalidad. Al desestimar las causas exógenas del retraso, se trasladan injustamente al contratista las consecuencias de omisiones y vacíos que desde el diseño inicial comprometen la viabilidad misma del contrato. La imposición de una medida sancionatoria sin agotar antes los mecanismos técnicos y contractuales de restablecimiento constituye, además, una vulneración al debido proceso administrativo y contractual.

De manera particular, se evidencia una inconsistencia crítica en la base misma de la solicitud de apremio: la interventoría aduce un atraso de 127 días calendario, cifra que omite considerar los 97 días derivados de las mayores cantidades de obra formalizadas en el Modificatorio No. 01 del contrato, y los 29 días adicionales producto de la reprogramación aprobada por la misma interventoría mediante el oficio OFC-085-INTERHOSPITAL-2024. Es decir, un total de 126 días de afectación al plazo, debidamente acreditados y reconocidos institucionalmente, no pueden ser imputables al contratista. Queda entonces en evidencia que el supuesto desfase que motiva el inicio de sanción (127 días) se reduce a un (1) día no explicado, cuya naturaleza y justificación no ha sido objeto de análisis técnico por parte de la interventoría. En consecuencia, no existe fundamento material para estructurar un incumplimiento sancionable.

Solicitamos respetuosamente que, antes de avanzar en una medida de apremio contraria a la realidad fáctica del proyecto, se convoque una mesa técnica con todas las entidades intervinientes, como único escenario idóneo para validar, desde la evidencia, la situación real del contrato y adoptar decisiones proporcionales, legales y ajustadas al interés público.

Ante la necesidad de la entrega del plan de contingencia solicitamos (2 días hábiles) para entregarlo de manera completa, siendo que para el día 15 de mayo estaríamos subsanando.

Para los ajustes de diseño, primeramente, en diseño HVAC, de acuerdo al oficio enviado el día de ayer 12 de mayo de 2025, por medio de la interventoría en base al informe descrito por la supervisión, solicitaron ser mas explícitos en los cambios de acuerdo a las normas, que este incluya memorias descriptiva de los cambios, cálculos, cantidades, presupuesto con sus análisis de precios unitarios y el impacto que este genere en las otras redes como red eléctrica, red hidrosanitaria, así como el anexo de los faltantes, en gases medicinales, rci, y otros tales como la inclusión de las mayores y menores cantidades que se generen en dichos cambios, por medio de un segundo balance de obra, será entregado para su estudio dentro de 30 días hábiles.
En vista que venimos trabajando en conjunto también será entregado el estudio de mercado para poder tratar de balancear la ecuación del contrato, este mismo explicado en los párrafos

anteriores, con el fin de crear los espacios pertinentes por medio de mesas de trabajos técnicas para llevar un resultado a la satisfacción del contrato.

Atentamente,

JOSE DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Anexos:

Anexo 1: Modificatorio No 01 del 21 Nov 2024 – 4 folios
Anexo 2: certificado de avance financiero de la Interventoria – 3 folios
Anexo 3: Comunicado HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025: Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC. – 3 folios
Anexo 4: OFC-085-INTERHOSPIATL-2024 Aprobación Reprogramación Obra – 1 folio
Anexo 5: Comunicado HGM24052024-45 de fecha 04/03/2025: Entrega de Balance de obra y Estudio de Mercado.
Anexo 6: Comunicado HGM24052024-46 de fecha 04/03/2025 Remisión Balance de Obra No 02 y Solicitud de Suspensión No 01.
Anexo 7: Comunicado HGM24052024-48 de fecha 12/03/2025 Entrega Reprogramación Obras y reiteración de las deficiencias del diseño de aire acondicionado HVAC.
Anexo 8: Comunicado HGM24052024-49 de fecha 12/03/2025 Solicitud mesas de trabajo por la existencia de vacíos e incongruencias
Anexo 9: Comunicado HGM24052024-47 de fecha 13/03/2025 Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC.
Anexo 10: Comunicado HGM24052024-50 de fecha 14/03/2025 Solicitud Revisión Diseños Aires Acondicionados HVAC.
Anexo 11: Comunicado HGM24052024-54 de fecha 29/03/2025 Respuesta a oficio OFC-086 OFC-089-INTERHOSPITAL y OFC-093-INTERHOSPITAL-2024.
Anexo 12: Comunicado HGM24052024-58 de fecha 03/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
Anexo 13: Comunicado HGM24052024-62 de fecha 07/04/2025 SOLICITUD FORMAL DE CONVOCATORIA A MESAS TÉCNICAS PARA VALIDACIÓN DEL DESEQUILIBRIO ECONOMICO
Anexo 14: Comunicado HGM24052024-65 de fecha 08/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA - CORREGIDO
Anexo 15: Comunicado HGM24052024-68 de fecha 21/04/2025 ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA V3 - CORREGIDO
Anexo 16: Comunicado HGM24052024-66 de fecha 19/04/2025 Entrega de diseños ajustados del Sistema HVAC y solicitud de mesa de trabajo para socializar los cambios.
Anexo 17: Comunicado HGM24052024-67 de fecha 21/04/2025 SOLICITUD DE AGENDAMIENTO MESA DE TRABAJO – SOCIALIZACION CAMBIOS EN LA RED DE AIRE ACONDICIONADO
Anexo 18: Comunicado interventoría OFC-100-INTERHOSPIATL-2024 Respuesta oficio HGM24052024-62
Anexo 19: Comunicado HGM24052024-70 de fecha 26/04/2025. Respuesta al Oficio OFC-100 – Solicitud de requerimiento a la entidad contratante y reactivación de análisis técnico conjunto

Copia: Doctora LUCY GARCIA MONTES / Gobernadora De Sucre
Oficina Jurídica Gobernación de Sucre

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 21 de mayo de 2025

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM24052024-79

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Remisión Plan De Contingencia Con Reprogramación Y Flujo De Caja – Alcance comunicado HGM24052024-77 / Respuesta Comunicado OFC-119-INTERHOSPITAL-2024 Tramite Finalizado

Cordial saludo,

Dando alcance a los comunicados descritos en el Asunto y atendidas las observaciones hechas por la interventoría, nos permitimos remitir los siguientes documentos:

1. Reprogramación de obra en archivo Project – 4.336 KB (Ver Anexo 1)
2. Reprogramación de obra en archivo PDF – 836 KB (Ver Anexo 2)
3. Flujo de Caja en archivo Project - 4.336 KB (Ver Anexo 1)
4. Flujo de Caja en archivo Excel, exportado del Project 490 KB (Ver Anexo 3)
5. Flujo de Caja en archivo PDF, exportado del Project 12.400 KB (Ver Anexo 4)

En los archivos anteriormente descritos se encuentran:

a) La ejecución de las actividades de obra desde el inicio del contrato hasta el 31 de abril de 2025, que corresponden al 37% de avance a dicha fecha.

b) La Reprogramación de las actividades establecidas como Plan de Contingencia, desde la semana cincuenta (50), 28/04/2025 hasta la semana sesenta (60), 7/07/2025; que corresponden a ocho (8%) de avance, hasta completar el cuarenta y cinco (45%) de avance total del contrato.
c) La Reprogramación de las actividades correspondientes al cincuenta y cinco por ciento (55) restante del contrato, las cuales son susceptibles de cambios por efecto de ajustes y/o actualización de diseños y/o cambio de materialidad y/o actualización de costos de insumos y/o equipos (Estudio de Mercado), que se llevan a cabo durante la contingencia de dos meses.

d) En el flujo de caja adjunto se puede detallar completamente, la cantidad y valor reprogramado semana a semana (De la 50 a la 60) durante la contingencia hasta llegar al cuarenta y cinco por ciento (45%), y subsecuentemente semana a semana las actividades contractuales (55%) susceptibles de cambios posterior a la contingencia.

Respecto a las observaciones hechas acerca de: fechas en formato moneda, congruencia y coincidencia de fechas de inicio, terminación, numero de semanas e inversión acumulada programada y ejecutada, fueron verificadas y los archivos anexos están de acuerdo a dichas observaciones. Aclaramos que se presentó confusión en la información, siguiendo las instrucciones anteriores acerca de tener como punto de partida la reprogramación anterior, la cual claramente tiene incongruencias en su contenido.

Respecto al **Diagnostico De La Situación Actual** nos permitimos transcribir apartes del comunicado HGM24052024-75:

> *Las condiciones actuales del proyecto, incluyendo los atrasos en el cronograma de obra y las afectaciones al equilibrio económico del contrato, no son resultado de una negligencia o incumplimiento atribuible al Contratista. Reiteramos que la viabilidad y éxito de este tipo de proyectos de infraestructura pública demandan una planeación rigurosa y la entrega de diseños completos y coherentes desde el inicio, así como un trabajo mancomunado y diligente entre la Entidad Contratante y el Contratista para abordar los hallazgos y necesidades de optimización que surjan durante la ejecución. En este sentido, las necesidades de revisión y optimización de los diseños originales, así como la consideración de las condiciones particulares del terreno y ambientales no consideradas en su totalidad en los estudios y diseños iniciales, surgen de un análisis exhaustivo* ***in situ durante el desarrollo propio de la obra****, donde se han identificado* ***particularidades inherentes a la construcción diaria, así como cambios en la normativa aplicable*** *desde la concepción de los diseños.*
>
> ***I. PLAN DE ACCIÓN:***

Conscientes de la importancia del proyecto para el interés público y en aras de mantener el impulso de la obra, manifestamos nuestra disposición a proceder con las labores que, de alguna manera, puedan desarrollarse sin estar comprometidas por los puntos críticos presentados en esta misiva. Lo anterior, a fin de mantener un avance de la obra, en tanto se resuelven las definiciones fundamentales. Para ello, y como muestra de nuestra buena fe y compromiso, presentaremos en el menor tiempo posible un plan de contingencia con su respectivo anexo de reprogramación, que permitirá seguir avanzando en los frentes posibles.
Sin embargo, es fundamental señalar que, pese a nuestros esfuerzos y este plan de contingencia, ***la obra inevitablemente enfrentará un letargo significativo*** *debido a la poca capacidad de ejecución que se presentará frente a una toma de decisiones de fondo y la necesidad de reformulación de los diseños y selección de materiales, además de los cambios que las propias normas que regulan el sector salud nos obligan a realizar. La operatividad completa y eficiente de la obra está supeditada a la resolución de estos desafíos técnicos y normativos.*

II. ANÁLISIS DE LOS DISEÑOS ORIGINALES Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN:

Desde los inicios de la ejecución del contrato, hemos constatado que los diseños entregados, si bien representan una base fundamental, requieren ser optimizados para asegurar su plena funcionalidad y el cumplimiento normativo. Estas optimizaciones, que se hacen evidentes en el desarrollo mismo de la obra y gracias a nuestra experiencia específica en este tipo de proyectos, así como por la evolución de la normativa aplicable, son cruciales para su total congruencia con la realidad de la localización del proyecto (altas condiciones de humedad y salinidad), las características del terreno (suelos poco cohesivos e inestables, alto nivel freático, evidencia de movimientos en masa pasados), y las condiciones ambientales (temperaturas elevadas y radiación solar intensa). Esto ha requerido que, como Contratista, hayamos tenido que revaluar constantemente el cumplimiento de la normativa actual y llevar a cabo una coordinación integral entre las diferentes especialidades desde cero.

A continuación, detallamos las necesidades específicas de optimización en los diseños que han generado los atrasos y la alteración del equilibrio económico, tal como se expuso en nuestro Oficio HGM24052024-70:

- ***Cimentación:*** *Se encontraron discrepancias fundamentales en las profundidades de desplante y una falla geológica de gran magnitud. Esto exigió sobre excavaciones no contempladas y el uso de entibados para la seguridad del personal, generando costos adicionales asumidos por el Contratista. La definición de la cimentación se prolongó por un periodo de* ***3 meses (del 15 de agosto al 21 de noviembre)****, afectando directamente el inicio de otras actividades*

- ***Estructuras:*** *El diseño estructural presenta omisiones e incoherencias (ej. necesidad de vigas de enlace para amarrar zapatas, aumento de longitudes de columnas por cambio de cota, separación de tanques de almacenamiento). Estos*

*ajustes han ralentizado los procesos y han generado un retraso significativo de **1.8 meses**, aunque se han subsanado paralelamente a la construcción. La responsabilidad de entregar diseños completos y construibles que garanticen la operatividad y eficiencia de la obra recae en la Entidad Contratante.*

- ***Redes Hidrosanitarias:** Se detectó la falta de conexión principal de la red de agua potable, la necesidad de reubicar tanques por inestabilidad del terreno, un rediseño de la red contra incendios con mayores recorridos y cambios en presiones de diseño (implicando cambio de equipos de bombeo), y deficiencias en las descargas de desechos patógenos y sifones de piso. Esto ha llevado a la inclusión de ítems no previstos en el contrato.*

- ***Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR): No existe un diseño final** para esta planta. La información proporcionada es incompleta y no especifica el tratamiento requerido para aguas domésticas, no domésticas y patógenas. Sin un diseño aprobado por las autoridades ambientales y de servicios, la operación futura del hospital es inviable, lo cual podría configurar un detrimento patrimonial para el Estado. La ausencia de este diseño definitivo impide el avance en un componente crítico del proyecto y compromete su funcionalidad futura.*

- ***Redes de Ventilación Mecánica (HVAC):** El diseño presenta serias deficiencias, incluyendo la falta de cobertura de aire acondicionado en áreas críticas (ej. cuarto de CCV, almacenamiento de insumos), aislamiento insuficiente de áreas de riesgo (ej. sala de autopsias), y la ausencia de condiciones especiales (filtración, temperatura, renovación de aire) en quirófanos, salas de parto, laboratorios y farmacias. Además, la instalación de estas redes es una precedencia para otras instalaciones (contraincendios, agua, eléctrico, gases medicinales), lo que implica que el atraso en esta definición afecta directamente otros capítulos de la obra.*

- ***Redes de Gases Especiales:** No se contemplan puntos de conexión para sillas odontológicas y existe una configuración incorrecta de compresores y controladores que debilita la presurización del sistema, incumpliendo además la Resolución 1497 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social.*

- ***Instalaciones Eléctricas:** Los cambios en los sistemas HVAC, bombeo y STAR afectan directamente las cargas de operación del diseño eléctrico. La definición de este sistema está supeditada a la aprobación de los diseños de todos los sistemas mencionados (HVAC, STAR, Hidrosanitario, gases medicinales), lo que a su vez impide el cumplimiento normativo del RETIE (2023).*

III. CONSECUENCIAS DIRECTAS EN EL CRONOGRAMA Y AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

*La programación inicial de la obra, construida bajo la premisa de diseños completos y aptos para una ejecución directa, **requiere una revalidación a la luz de las inconsistencias y necesidades de optimización identificadas**. Las desviaciones*

en la cimentación marcaron el inicio de una cadena de retrasos que no son imputables a nuestra gestión, sino a la necesidad de abordar estas optimizaciones. Es evidente que cualquier cambio en los diseños originales altera ineludiblemente el alcance, el tiempo y el costo del proyecto, tal como lo establece la "triple restricción" en la gestión de proyectos.


A la fecha, la insistencia en mantener la medición del avance del proyecto basada en una programación inicial que no refleja el cambio en el alcance ni la ausencia de diseños definitivos, es contraproducente y no permite una comparación justa. Es fundamental disponer de los diseños definitivos u optimizados para la construcción de elementos específicos, pues su ausencia impide la ejecución material y genera inviabilidad jurídica. El 57.86% del presupuesto del proyecto aún depende de estas definiciones.

Hemos alertado sobre una nueva alteración al equilibrio económico del contrato, debido a las mayores cantidades de obra y actividades nuevas requeridas. Además, destacamos que la propia Interventoría emitió una respuesta favorable a una solicitud de suspensión anterior (OFC-073-INTERHOSPITAL-2024 del 5 de marzo de 2025), la cual, hasta la fecha, no ha culminado su trámite por parte de la entidad contratante.

Las **Actividades A Ejecutar Durante La Contingencia**, están descritas en la reprogramación entre las semanas cincuenta (50) y sesenta (60), las áreas de trabajo de dichas actividades se muestran a continuación:


GRAFICOS

FIGURA 1 – UBICACIÓN ESCALERA DE SERVICIOS – BLOQUE 2 – PISO 1

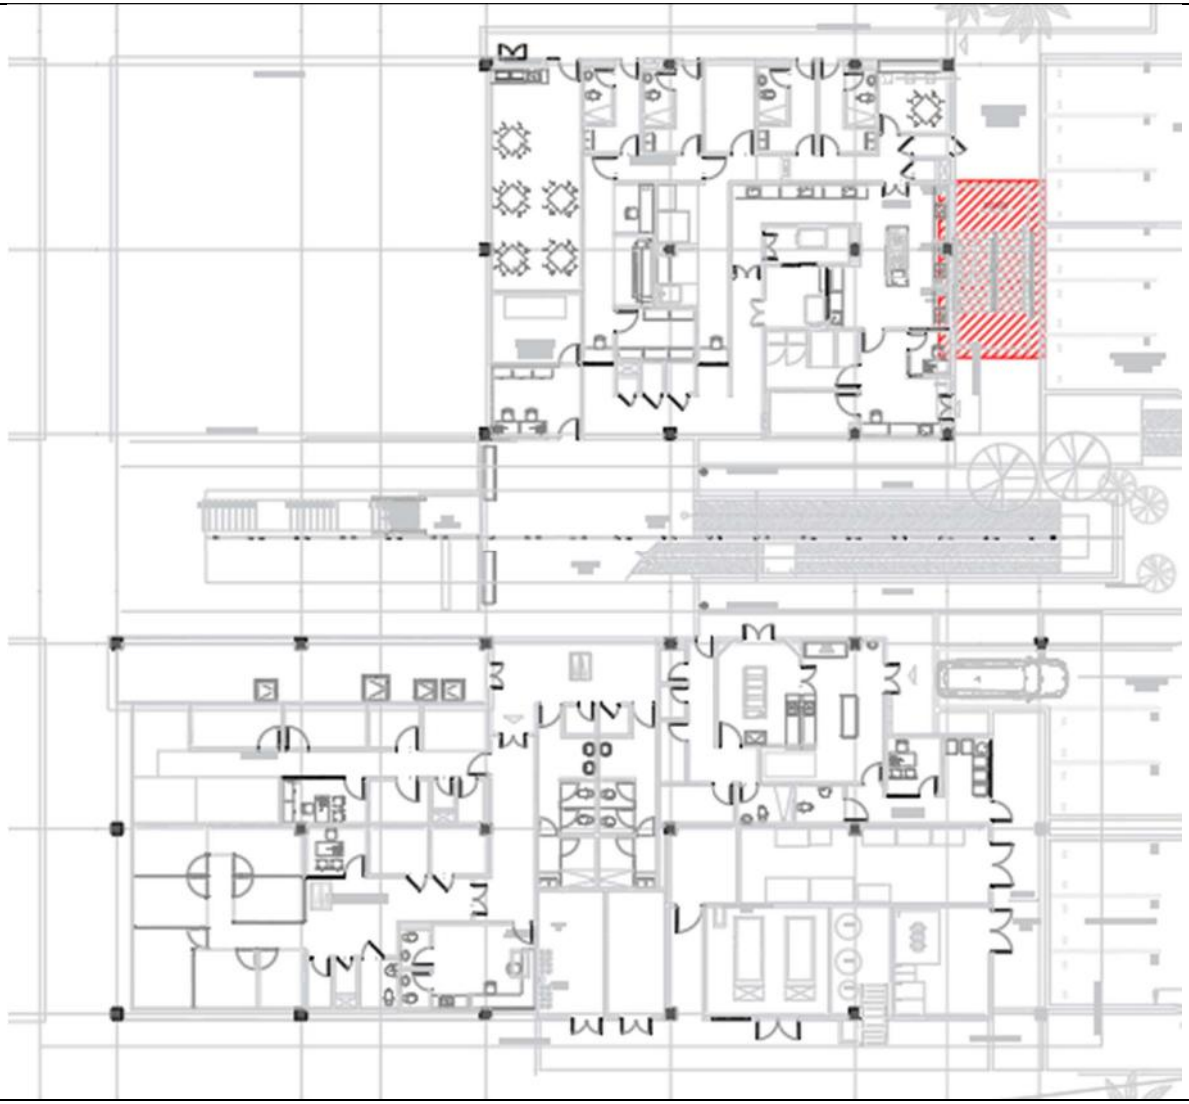


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 2 – UBICACIÓN MAMPOSTERIA GENERAL – BLOQUE 1 Y 2 – PISO 1 Y PISO 2

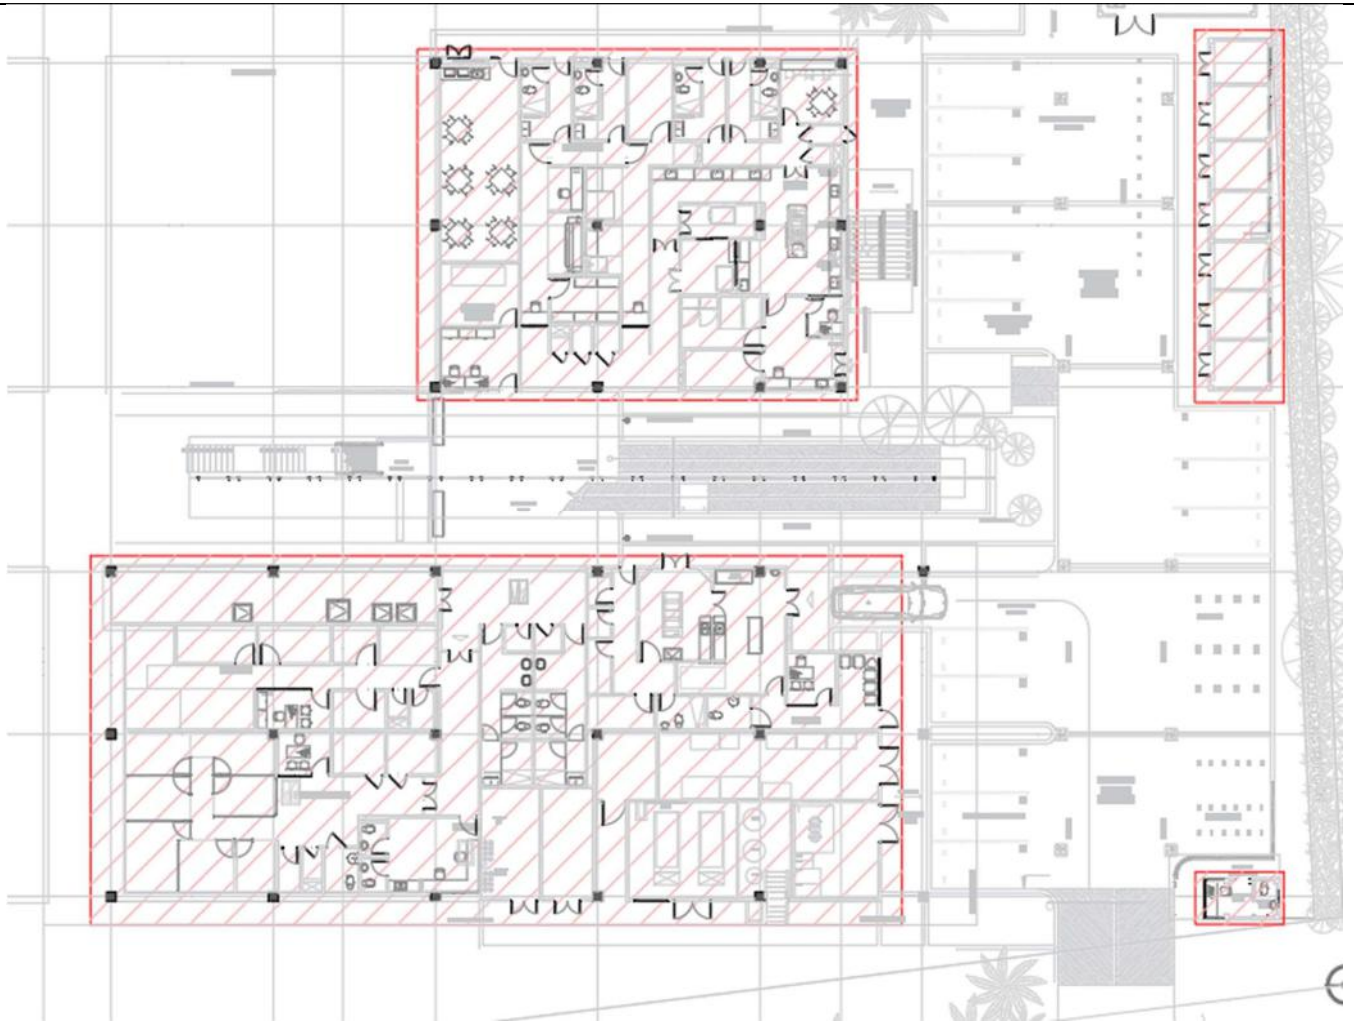


BLOQUE 1 Y 2
PISO 1

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

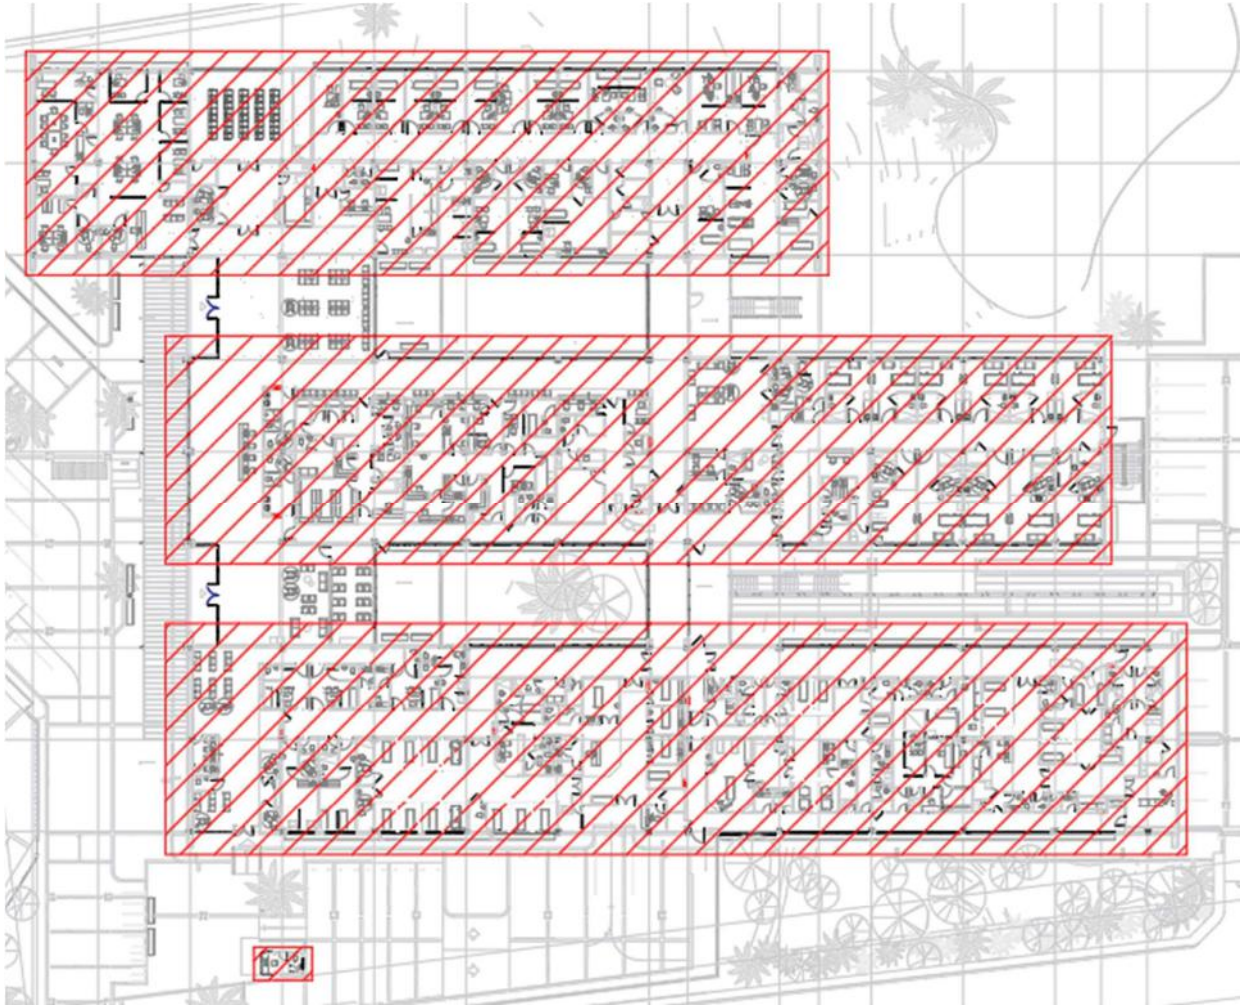


BLOQUE 1, 2 Y 3
PISO 2

FIGURA 3 – UBICACIÓN PAÑETES MUROS EXTERIORES INTERIORES Y DE TANQUES SUBTERRANEOS – BLOQUE 1 Y 2 – PISO 1 Y PISO 2

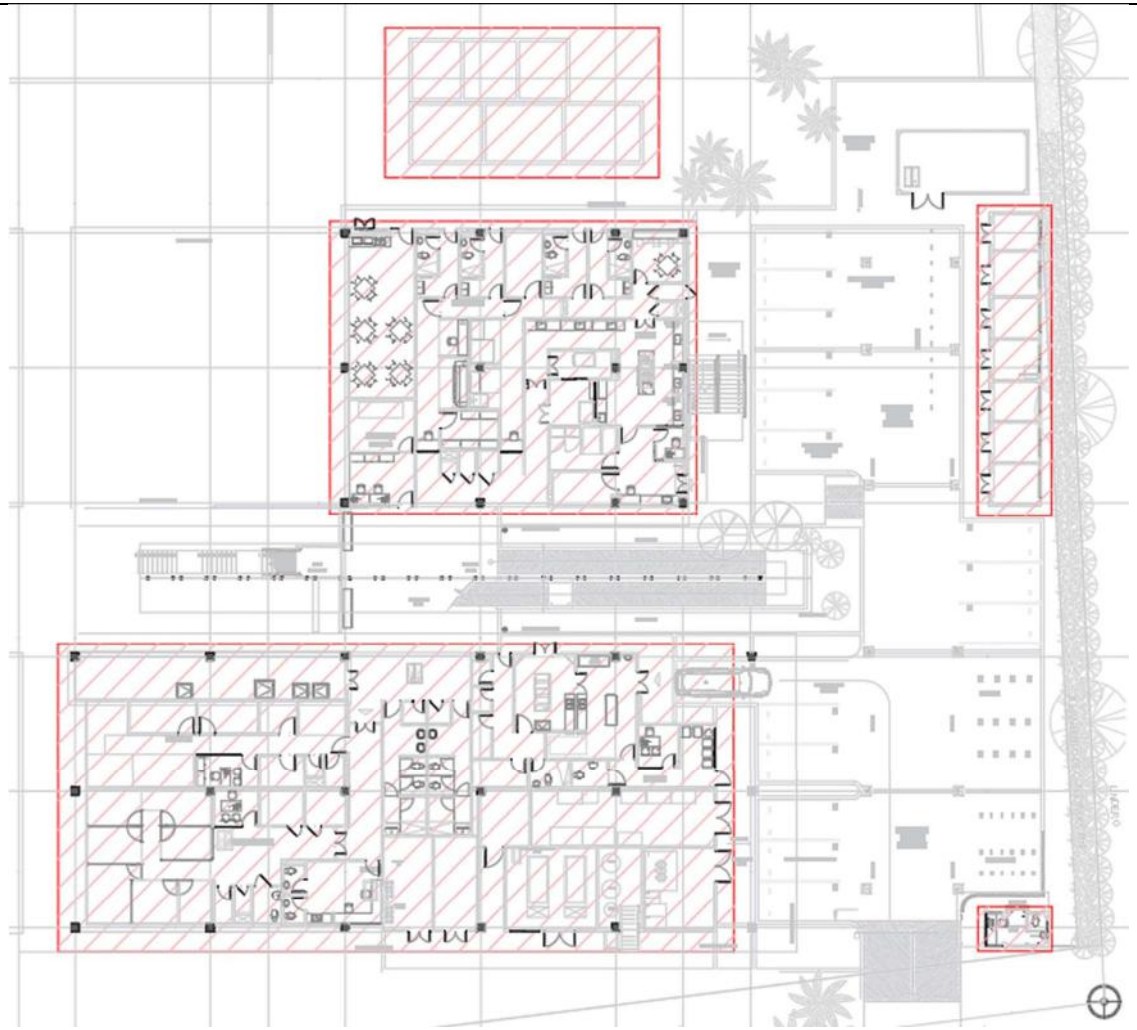


BLOQUE 1 Y 2, TANQUES SUBTERRANEOS
PISO 1

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

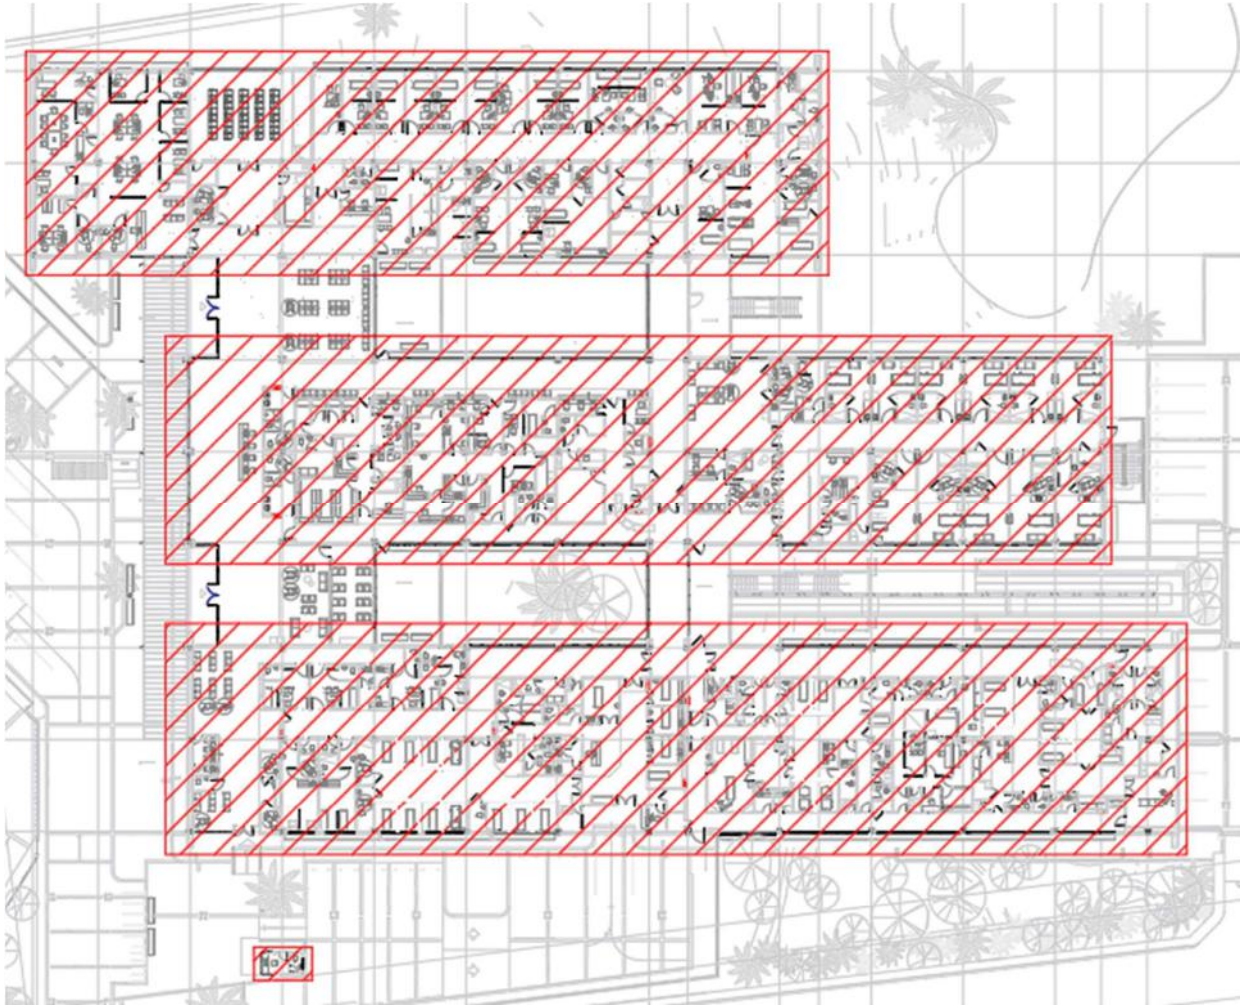

BLOQUE 1, 2 Y 3
PISO 2


FIGURA 4 – UBICACIÓN BORDILLOS DE CUBIERTA Y CLARABOYAS – BLOQUE 1 Y 2 – PISO 1

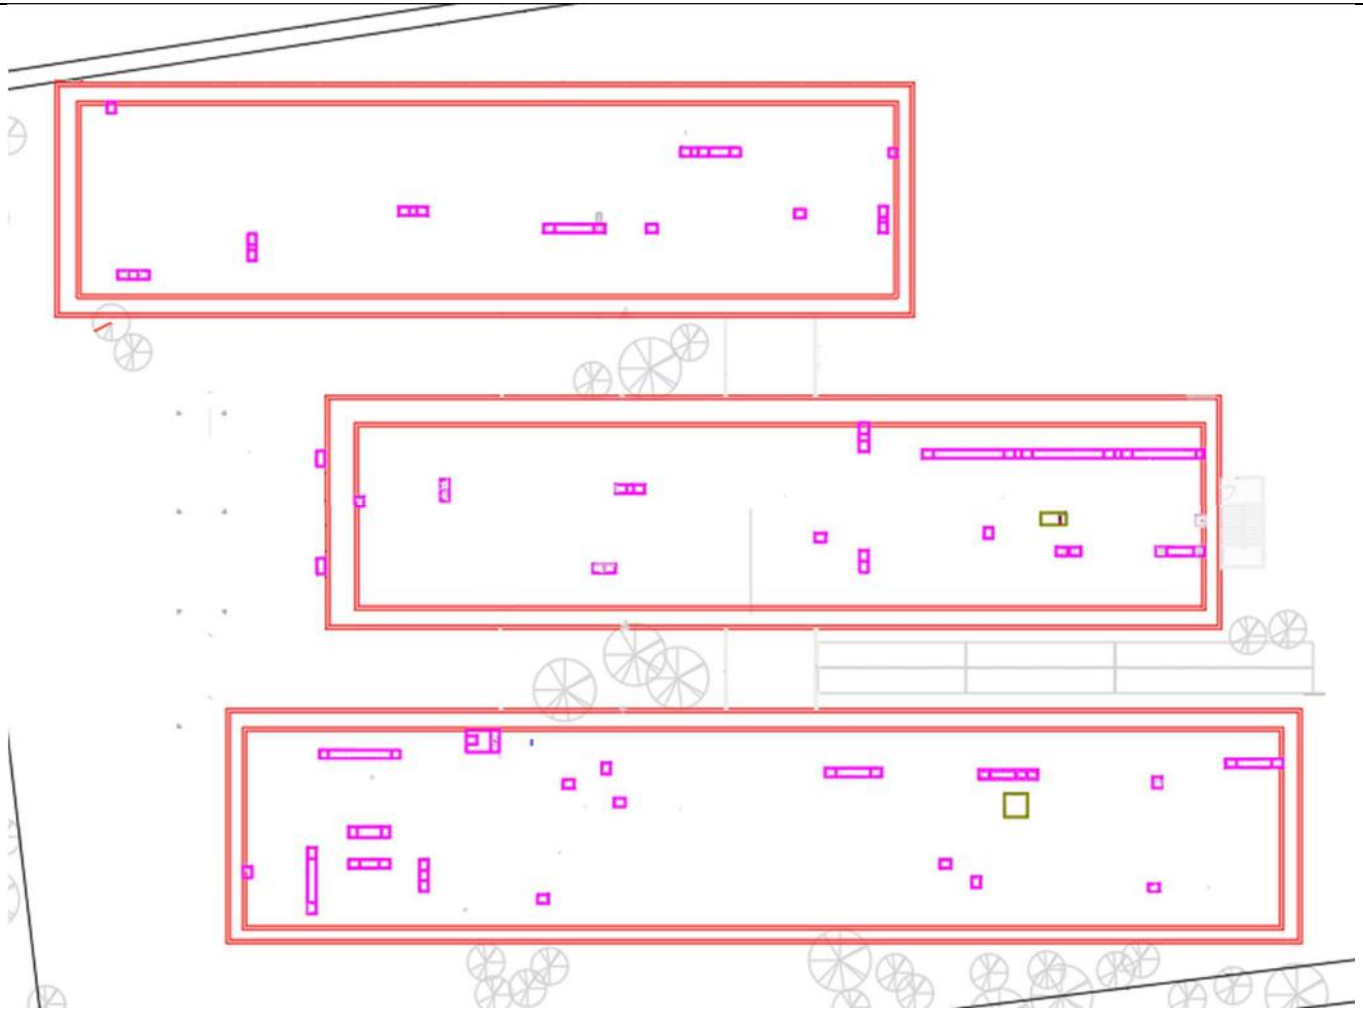

CUBIERTA BLOQUE 1, 2 Y 3


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 5 – INSTALACIONES SANITARIAS – BLOQUE 1 Y 2 – PISO 1

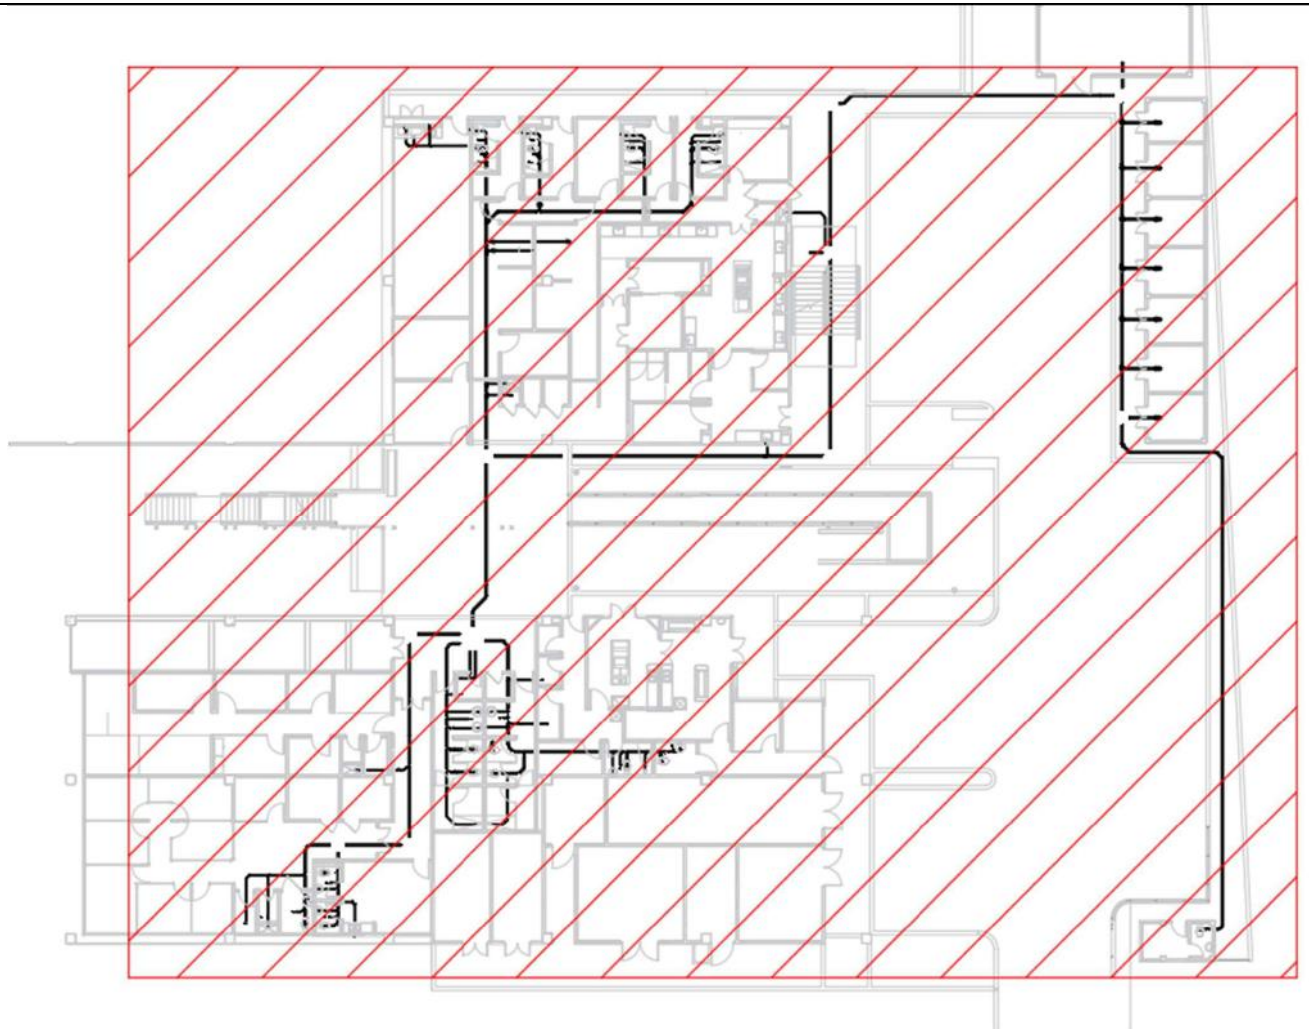

INSTALACIONES SANITARIAS BLOQUE 1 Y 2 – PISO 1


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

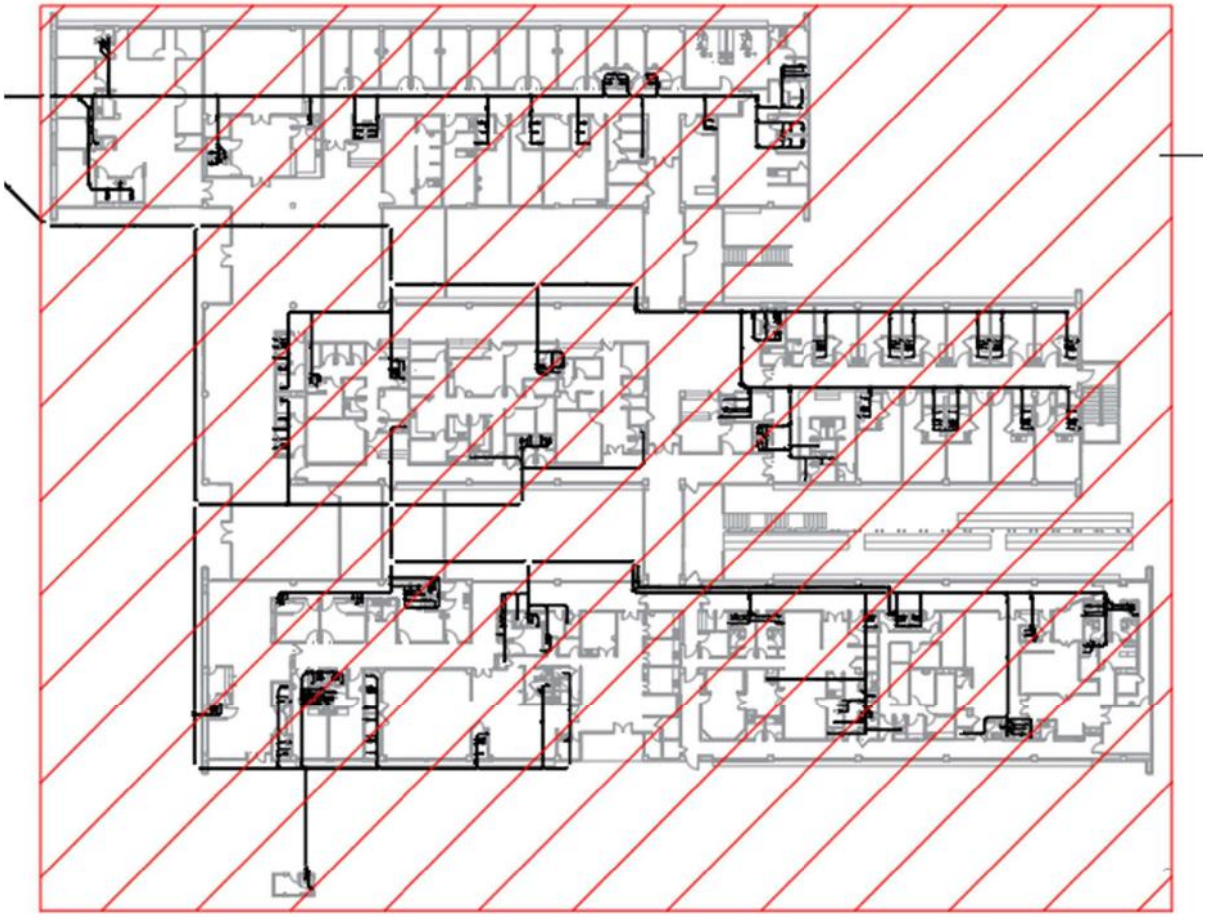


INSTALACIONES SANITARIAS BLOQUE 1, 2 Y 3 – PISO 2

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 6 – INSTALACION RED DE AGUA FRIA BLOQUE 1 Y 2 – PISO 1

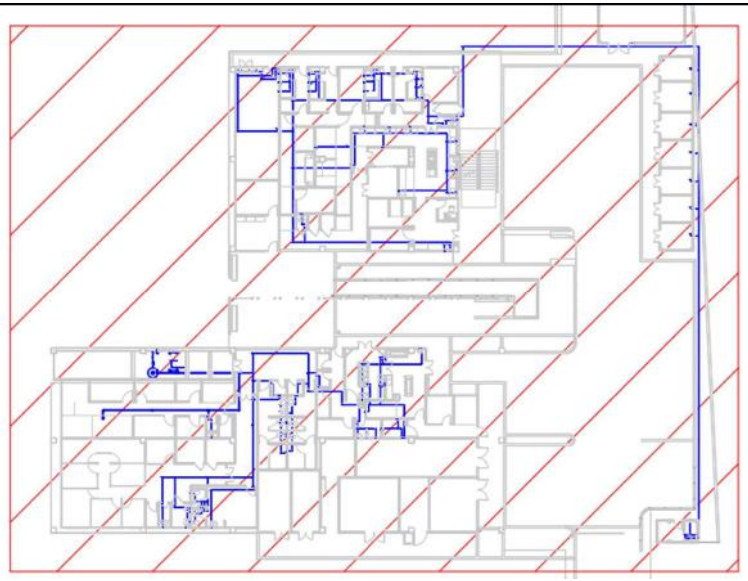


BLOQUE 1 Y 2 – PISO 1

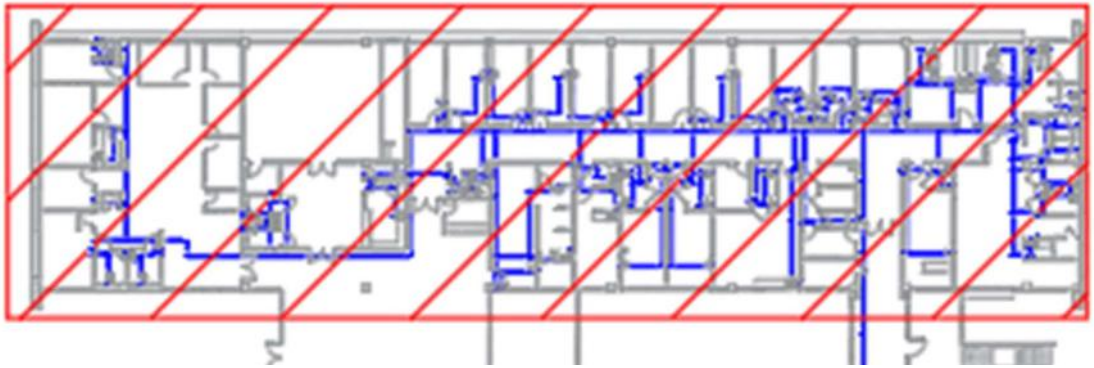

BLOQUE 3
PISO 2

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba


FIGURA 7 – INSTALACION RED DE AGUA CALIENTE BLOQUE 2 – PISO 1

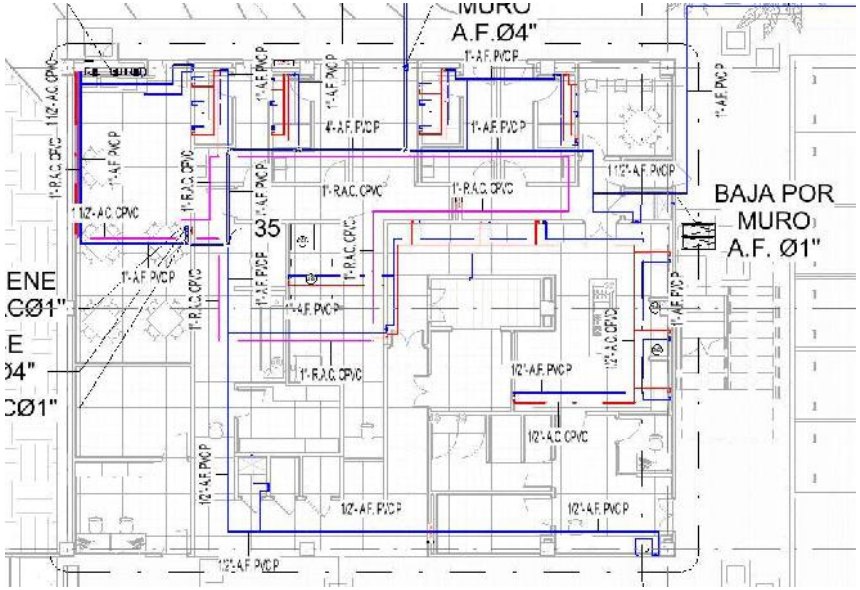


BLOQUE 2
PISO 1

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 8 – RED CONTRAINCENDIO – PISO 1 BLOQUE 1 Y BLOQUE 2

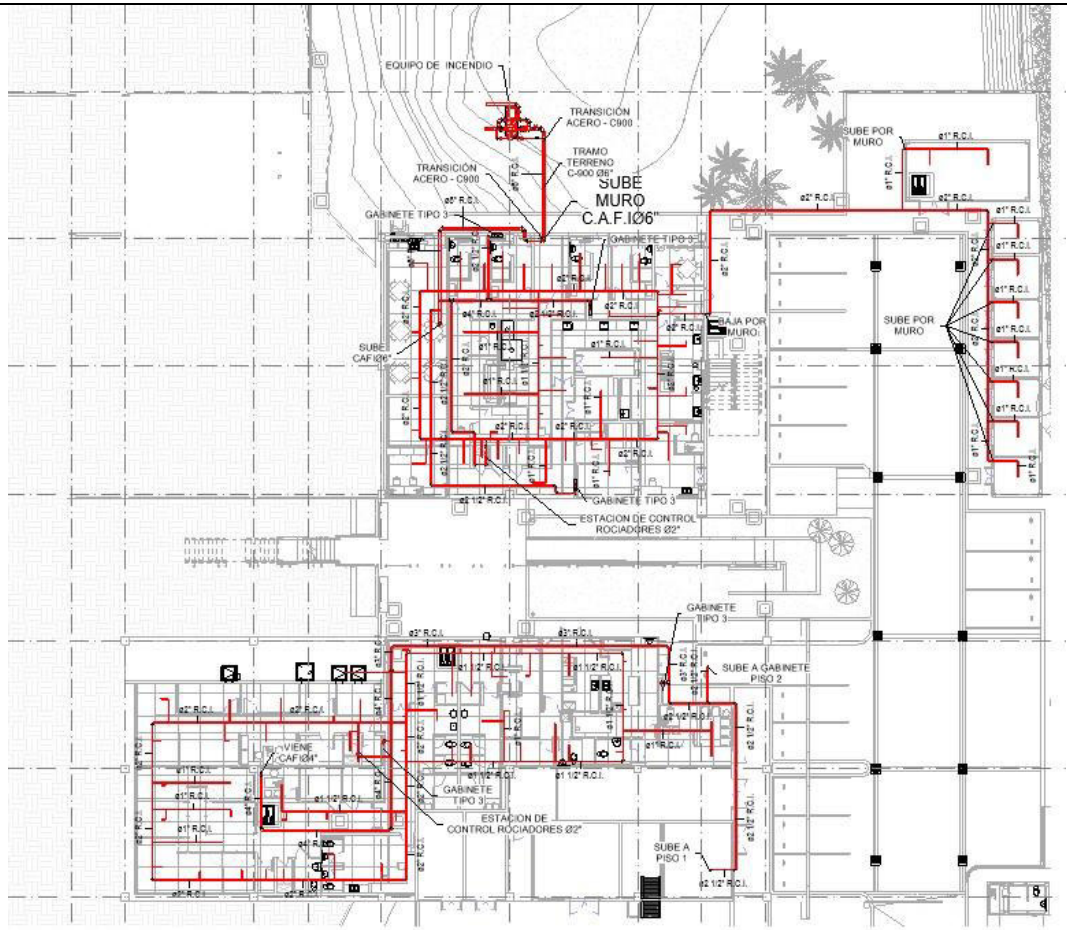


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

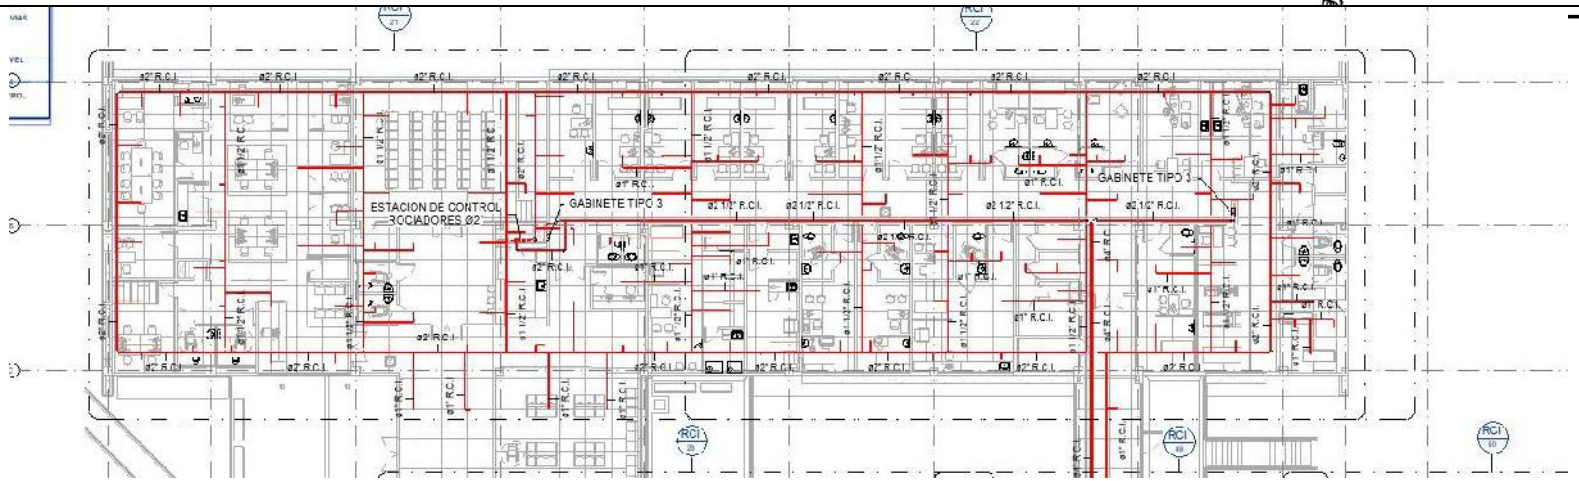

PISO 2 - BLOQUE 3

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 9 – INSTALACION RED DE AGUAS PATOGENAS BLOQUE 1 Y 2 – PISO 1

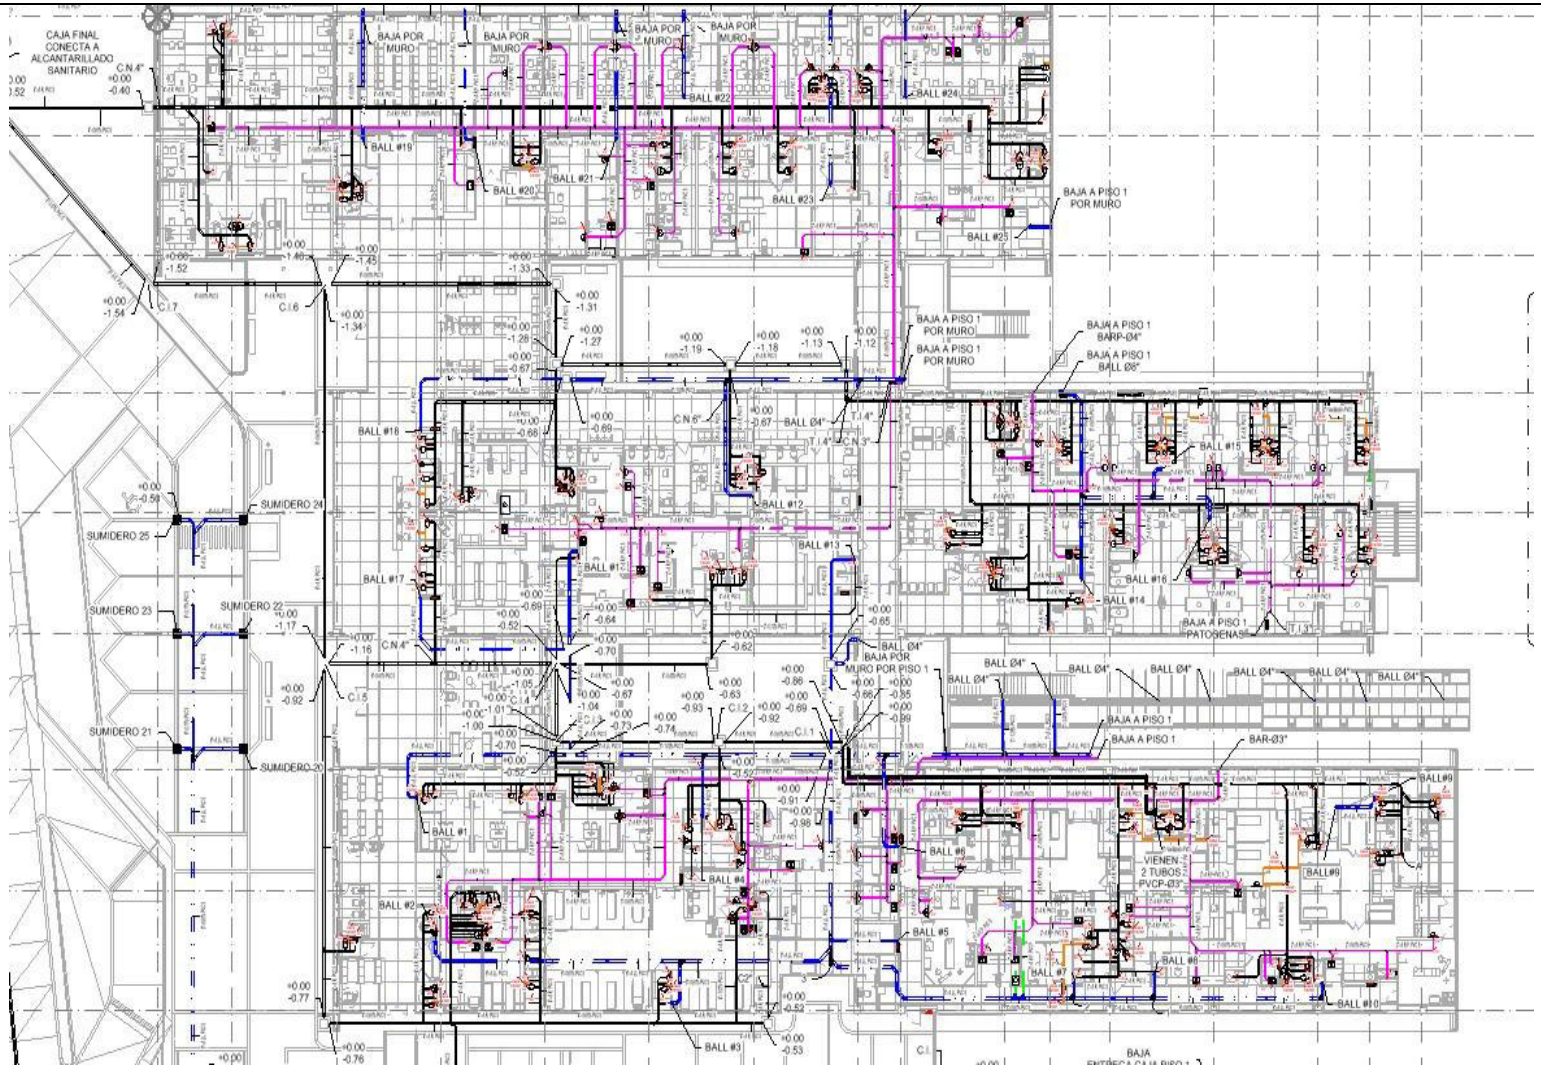

BLOQUE 1 Y 2
PISO 1

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 10 – RED DE GASES NATURAL



Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 11 – VENTANERIA EN ALUMINIO



Bloque 1



Boque 2



Bloque 3

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 12– MESONES EN ACERO GRADO QUIRURGICO



Bloque 3



Bloque 2


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba



bloque 1

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 13 – PUERTAS EN MADERA

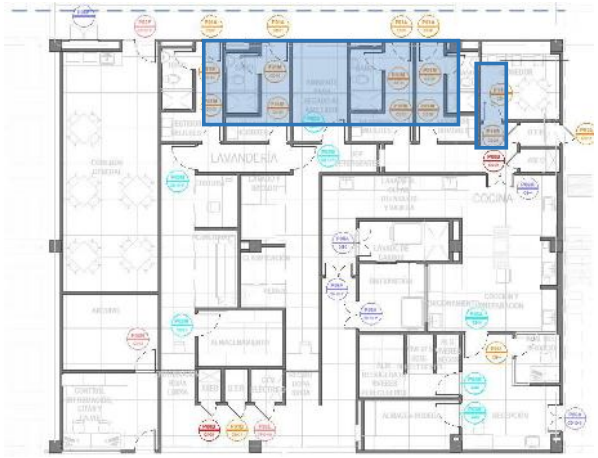

Bloque 2 primer piso



Bloque 1 primer piso

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba



Bloque 1 segundo piso



Bloque 2 segundo piso


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba



Bloque 3 segundo piso


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 14 – APANTALLAMIENTO

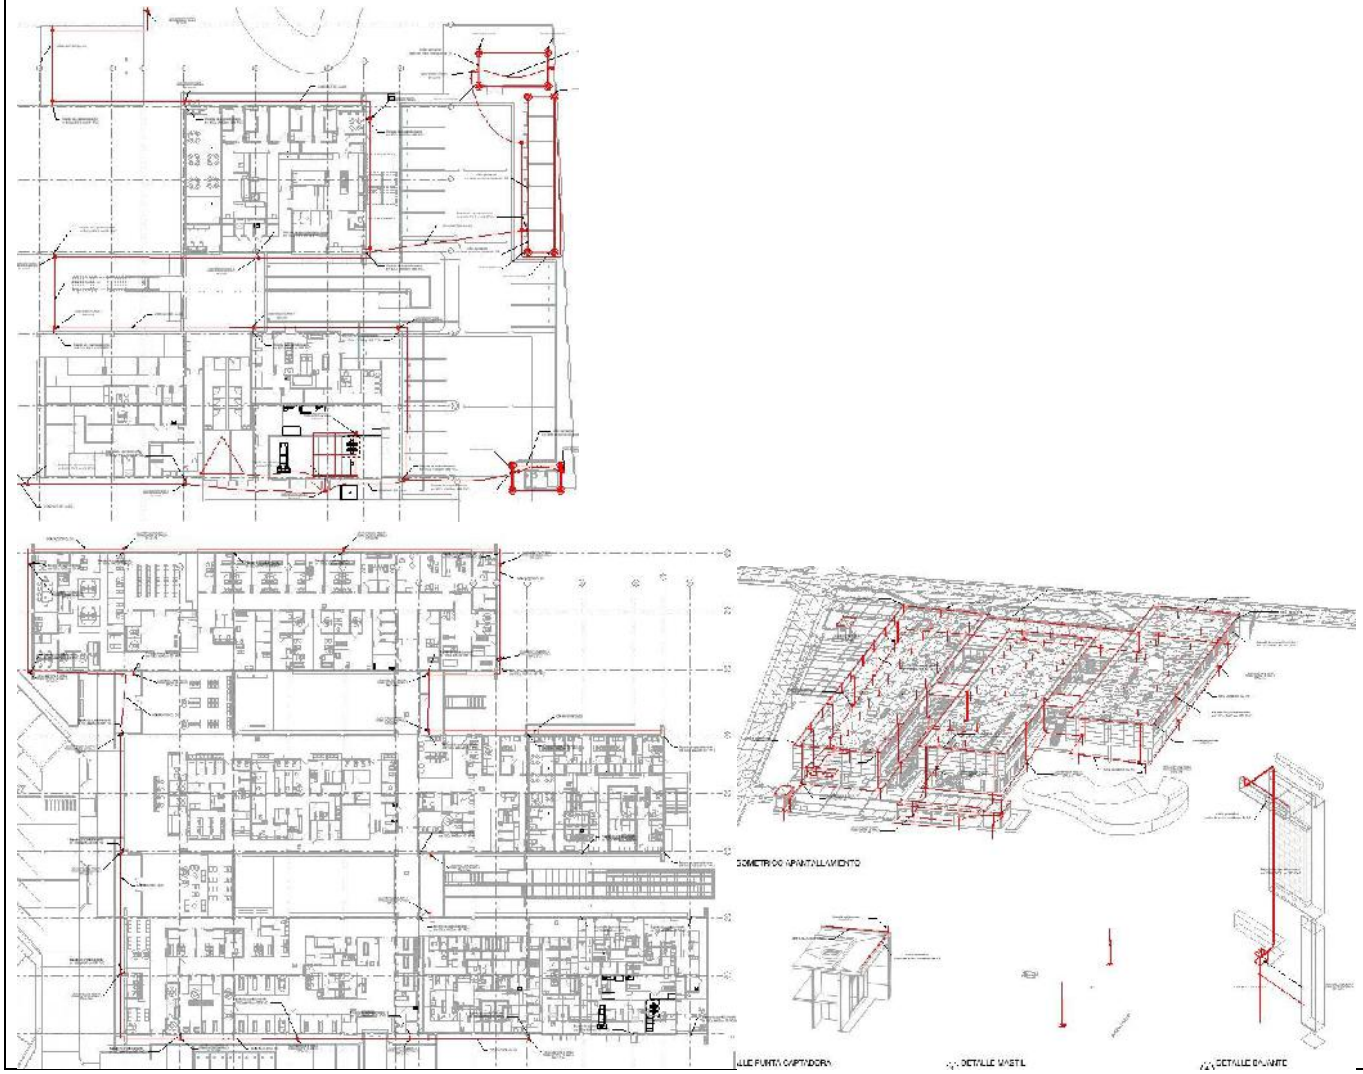


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 15 – VIAS - URBANISMO INTERNO

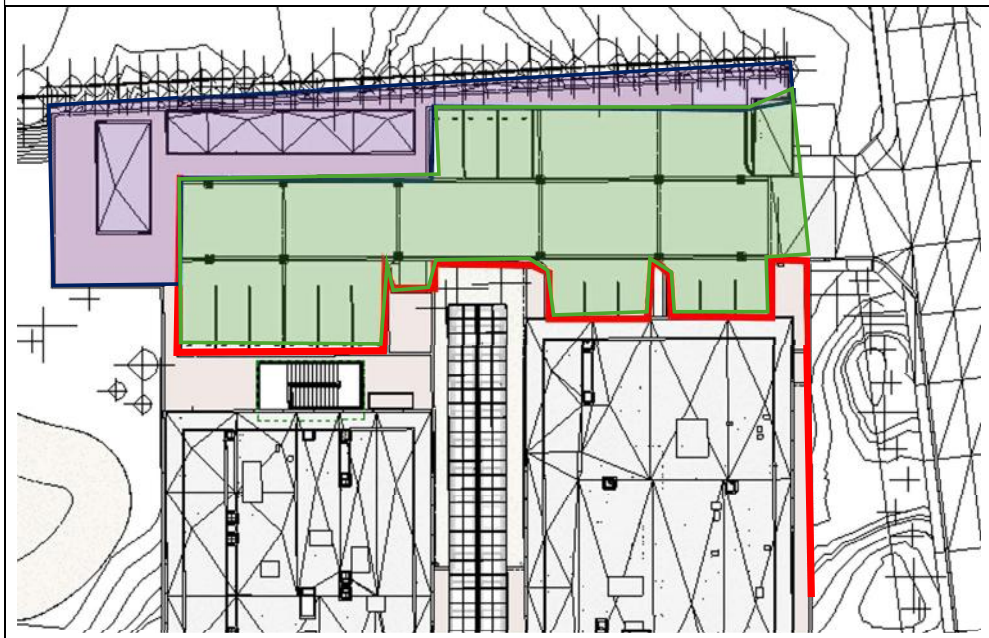


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 16 – ANDENES - URBANISMO INTERNO

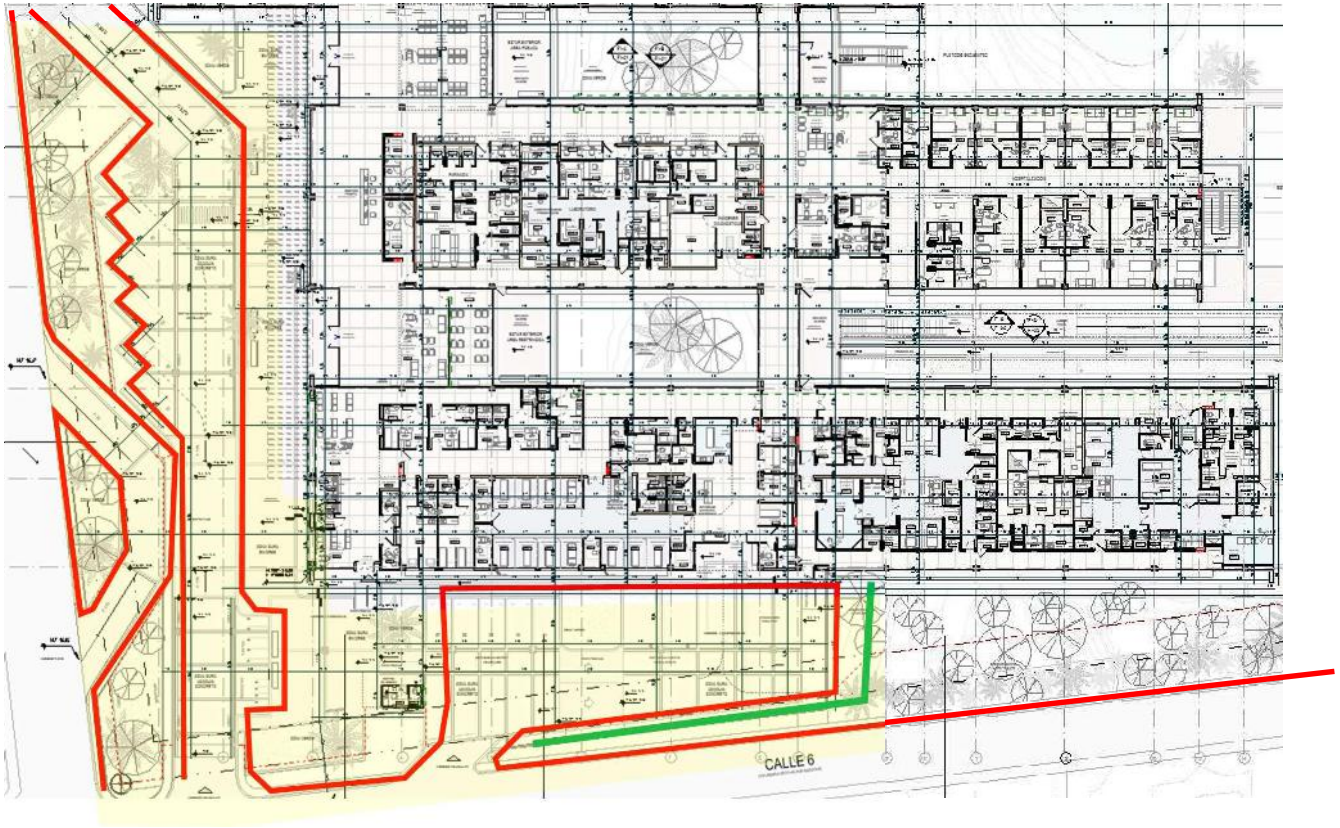


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 17 – EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO

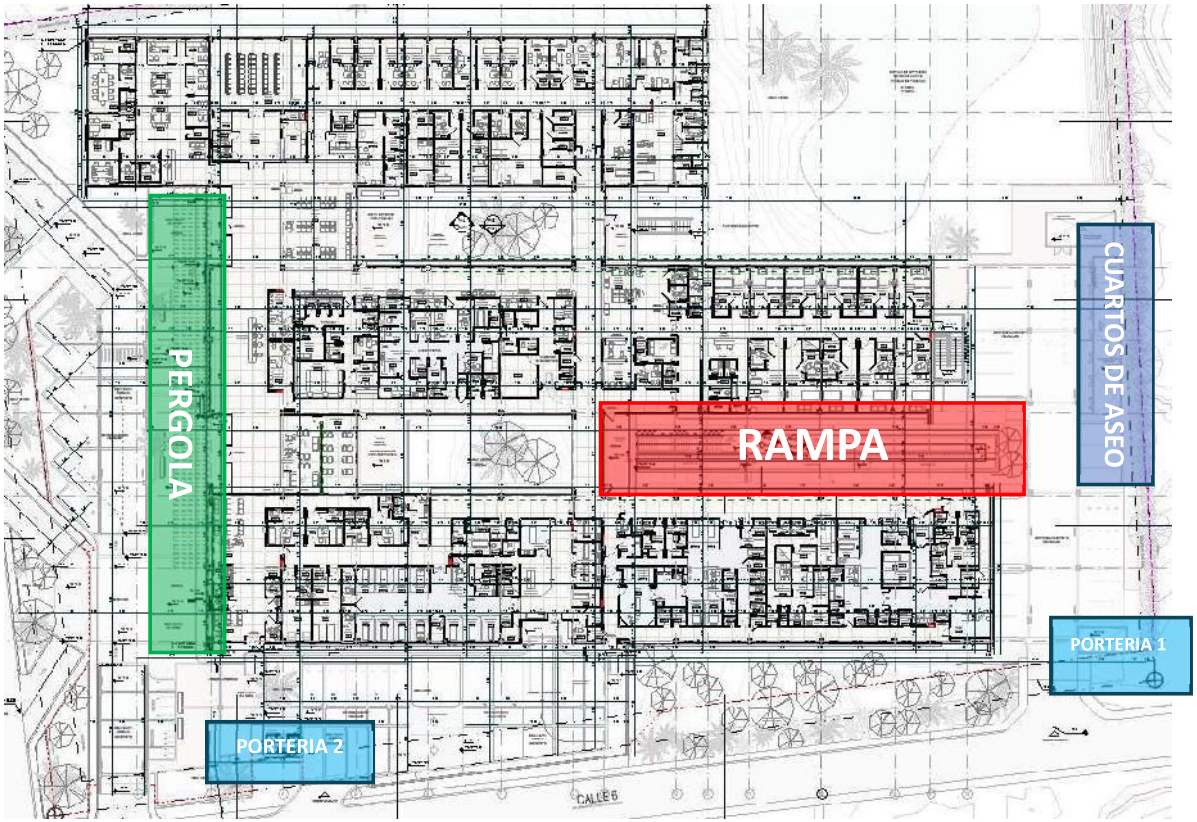


Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 18 – CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA

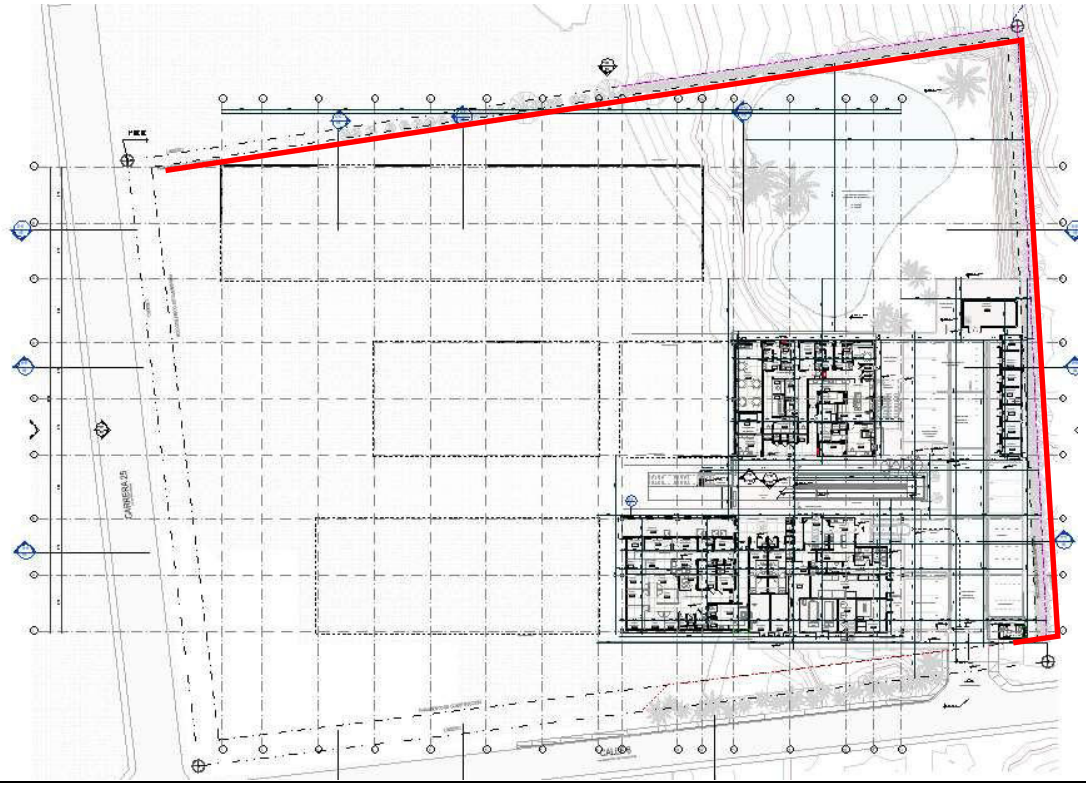

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

FIGURA 19 – CERRAMIENTO ESPACIO PUBLICO ARRIBA

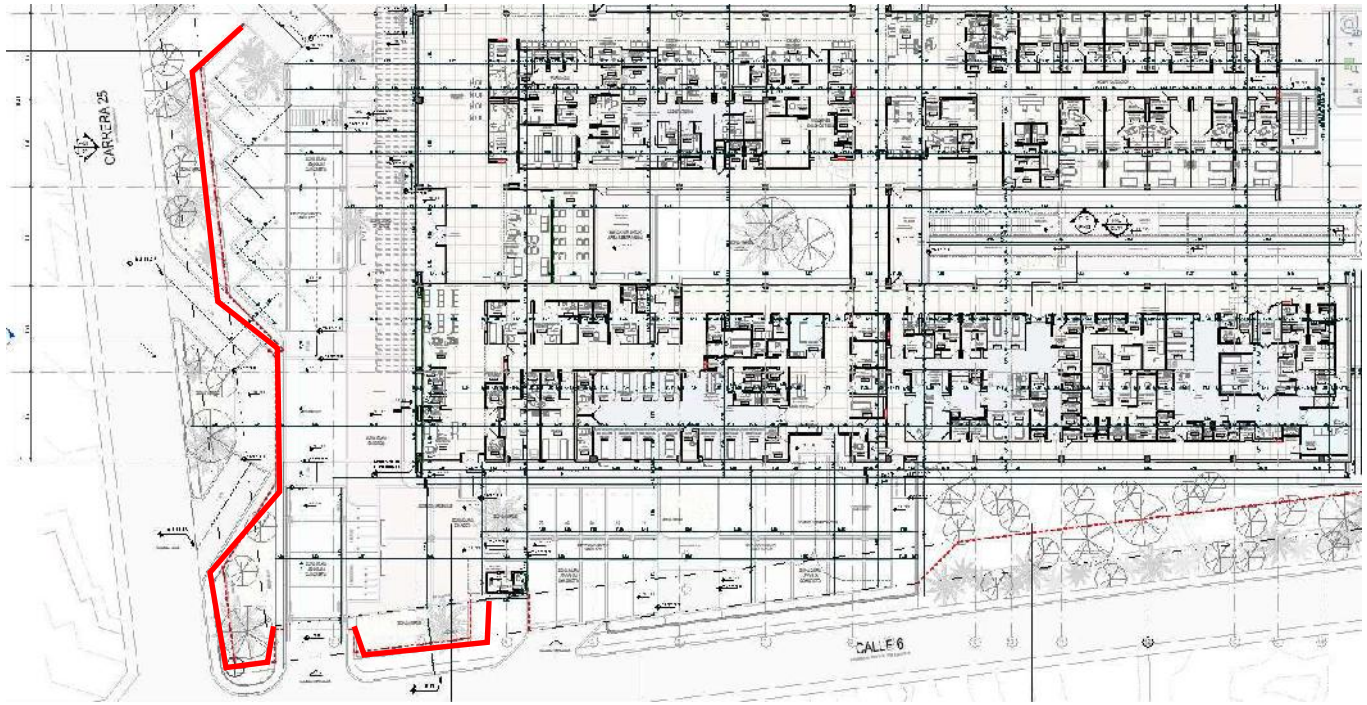

Calle 42 No.7-40 Local 1 / 311 426 91 16 / consorciocmohospitalsucre@gmail.com
Montería – Córdoba

Las medidas a implementar para acelerar el avance de la obra son:

1. Aumento de personal de trabajo en Oficiales y Cuadrillas de trabajo.
2. Extensión de la jornada laboral en la semana en una hora y programación de trabajos en horario nocturno, sábados y domingos.
3. Cierre de negociaciones y entrega de anticipos a nuevos proveedores de agregados.
4. Solicitud de cotización para cerrar negociaciones a proveedores de las actividades de Mesones de trabajos, carpintería en madera y aluminio, apantallamiento en el sistema eléctrico de protección contra condiciones atmosféricas.
5. Cierre de negociaciones con los proveedores de prefabricados para el espacio público en el urbanismo interno.
6. Solicitud de acero figurado de la rampa para minusválidos en urbanismo interno.
7. Aumento de herramientas menores para las nuevas cuadrillas de trabajo.
8. Acopio de material en obra tales como cemento, arena y gravilla.

Los recursos de personal, maquinaría e insumos están descritos en los análisis de precios unitarios de las actividades a ejecutar, las cuales siguen siendo contractuales.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Anexo:

1. Reprogramación de obra en archivo Project – 4.336 KB, con flujo de caja
2. Reprogramación de obra en archivo PDF – 836 KB
3. Flujo de Caja en archivo Excel, exportado del Project 490 KB
4. Flujo de Caja en archivo PDF, exportado del Project 12.400 KB (

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 26 de mayo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor

HGM24052024-80

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: CANTIDADES DE OBRA

Cordial saludo,

Con el fin de llevar a cabo el registro de las medidas ejecutadas en la obra de manera concertada entre el contratista y la interventoría, solicitado por parte de interventoría, la persona encargada será la Arquitecta Pamela Ospino y el residente Víctor Cruz, para el día martes 27 de mayo de 2025, en donde se contará con el apoyo asistido del personal de trabajo de la obra.

Atentamente,

JOSE DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Montería, 29 de mayo de 2025

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor
inter.hospital24@gmail.com

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO
Atte. **ing**. **ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE**
Secretaria de Infraestructura Gobernación de Sucre
Email: infraestructura@gobsucre.gov.co, ismael.sierra@gobsucre.gov.co

HGM24052024-81

Referencia: Contrato de Obra No. LP-018-2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Asunto: Remisión Plan De Contingencia Con Reprogramación Y Flujo De Caja – Alcance comunicados HGM24052024-77, HGM24052024-79/ Respuesta OFC-119-INTERHOSPITAL-2024 y OFC-121-INTERHOSPITAL-2024 Tramite Finalizado.

Cordial saludo,

Dando alcance a los comunicados descritos en el Asunto y atendidas las observaciones hechas por la interventoría, nos permitimos remitir los siguientes documentos:

1. Informe Diagnostico Plan de Contingencia. – 70 folios / Archivo PDF 6.854KB
2. Alcance Plan de Contingencia – 15 folios / Archivo PDF 6.854KB

3. Reprogramación No. 2 Archivo Project – 4.152 KB
4. Reprogramación No. 2 – 8 folios / Archivo PDF – 884 KB
5. Flujo de Caja Reprogramación No. 2- Archivo Excel – 490 KB
6. Flujo de Caja Reprogramación No. 2- 8 folios / Archivo Excel – 490 KB
7. Programación Plan de Contingencia Archivo Project – 4.151 KB
8. Programación Plan de Contingencia – 10 folios / Archivo PDF – 901 KB
9. Flujo de Caja Plan de Contingencia - Archivo Excel – 489 KB
10. Flujo de Caja Plan de Contingencia - 10 folios / Archivo Excel – 10.415 KB

En los archivos se encuentran el contenido solicitado en sus comunicados, sin embargo, si se necesita aclaración y/o ampliación de la información solicitamos no se dé tramite mediante oficio, sino que se lleve a cabo una mesa conjunta, con ello garantizamos agilidad y puesta en marcha del plan de contingencia.

Finalmente, acerca de la solicitud de llevar a cabo el formato MEPI-MN1-IN-06-FR-2 (formato del manual de interventoría del INVIAS), solicitamos amablemente una vez sea aprobado el presente plan de contingencia brindar un espacio de tres días hábiles para su elaboración y entrega, dado que su proceso es dispendioso y bien podría estar afectado por cualquier cambio en las condiciones que considere la interventoría para la aprobación del Plan de Contingencia.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

Anexo: Lo enunciado.

ANEXO 8.2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Coveñas, Departamento de Sucre
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Número del contrato:	SI-LP-018-2023
Fecha del registro fotográfico:	Desde 1 de mayo de 2025 a 31 de mayo de 2025

LISTADO DE FOTOGRAFÍA

Fotografía 1. Levante EN bloque No. 5 buitrones cubierta (bloque 1) 2
Fotografía 2. Levante EN bloque No. 5 buitrones cubierta (bloque 1) 2
Fotografía 3. Levante en bloque No. 20 (bloque 1) 3
Fotografía 4. Levante en bloque No. 20 (bloque 1) 3
Fotografía 5. Levante EN bloque No. 5 (bloque 1) 4
Fotografía 6. Levante en bloque gran formato (bloque 1) 4
Fotografía 7. Levante en ladrillo gran formato (bloque 1) 5
Fotografía 8. Plantilla de cubierta (bloque 1) 5
Fotografía 9. Perforaciones instalaciones sanitarias (bloque 1) 6
Fotografía 10. Pañete sobre muros (bloque 1) 6
Fotografía 11. Pañete sobre muros (bloque 1) 7
Fotografía 12. Levante en bloque No. 20 (Bloque 2) 8
Fotografía 13. Levante en bloque No. 12 (bloque 2) 8
Fotografía 14. Levante en bloque No. 12 (bloque 2) 9
Fotografía 15. Levante en bloque No. 5 (bloque 2) 9
Fotografía 16. Instalaciones sanitarias (bloque 2) 10
Fotografía 17. Instalaciones sanitarias (bloque 2) 10
Fotografía 18. Instalaciones sanitarias (bloque 2) 11
Fotografía 19. Instalaciones aguas lluvias (bloque 2) 11
Fotografía 20. Pañete sobre muros (bloque 3) 12
Fotografía 21. Pañete sobre muros (bloque 3) 12
Fotografía 22. Pañete sobre muros (bloque 3) 13
Fotografía 23. Pañete sobre muros (bloque 3) 13
Fotografía 24. Plantilla de nivelación cubierta (bloque 3) 14
Fotografía 25. Instalaciones sanitarias (bloque 3) 14
Fotografía 26. Instalaciones sanitarias (bloque 3) 15
Fotografía 27. Instalaciones sanitarias (bloque 3) 15
Fotografía 28. Instalaciones sanitarias (bloque 3) 16
Fotografía 29. Bordillo perimetral cubierta (bloque 3) 16
Fotografía 30. Instalaciones de gas natural 17
Fotografía 31. Instalaciones de gas natural 17
Fotografía 32. Instalaciones de gas natural 18



Fotografía 1. Levante EN bloque No. 5 buitrones cubierta (bloque 1)



Fotografía 2. Levante EN bloque No. 5 buitrones cubierta (bloque 1)



Fotografía 3. Levante en bloque No. 20 (bloque 1)



Fotografía 4. Levante en bloque No. 20 (bloque 1)



Fotografía 5. Levante EN bloque No. 5 (bloque 1)



Fotografía 6. Levante en bloque gran formato (bloque 1)



Fotografía 7. Levante en ladrillo gran formato (bloque 1)



Fotografía 8. Plantilla de cubierta (bloque 1)



Fotografía 9. Perforaciones instalaciones sanitarias (bloque 1)



Fotografía 10. Pañete sobre muros (bloque 1).



Fotografía 11. Pañete sobre muros (bloque 1).



Fotografía 12. Levante en bloque No. 20 (Bloque 2)



Fotografía 13. Levante en bloque No. 12 (bloque 2)



Fotografía 14. Levante en bloque No. 12 (bloque 2)



Fotografía 15. Levante en bloque No. 5 (bloque 2)



Fotografía 16. Instalaciones sanitarias (bloque 2)



Fotografía 17. Instalaciones sanitarias (bloque 2)



Fotografía 18. Instalaciones sanitarias (bloque 2)



Fotografía 19. Instalaciones aguas lluvias (bloque 2)



Fotografía 20. Pañete sobre muros (bloque 3)



Fotografía 21. Pañete sobre muros (bloque 3)



Fotografía 22. Pañete sobre muros (bloque 3)



Fotografía 23. Pañete sobre muros (bloque 3)



Fotografía 24. Plantilla de nivelación cubierta (bloque 3)



Fotografía 25. Instalaciones sanitarias (bloque 3)



Fotografía 26. Instalaciones sanitarias (bloque 3)



Fotografía 27. Instalaciones sanitarias (bloque 3)



Fotografía 28. Instalaciones sanitarias (bloque 3)



Fotografía 29. Bordillo perimetral cubierta (bloque 3)



Fotografía 30. Instalaciones de gas natural



Fotografía 31. Instalaciones de gas natural



Fotografía 32. Instalaciones de gas natural

ANEXO 8.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIAL
MAYO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. LP018 DE 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

CONTRATISTA
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERHOSPITAL 2024

SOCIAL
KAROLAY CARABALLO REYES
T. PROFESIONAL 233012

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

CONTENIDO

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ALCANCE 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
4. PLAN DE GESTION SOCIAL 5
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 5
5.1. Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (ficha GPY-F-08) 6
5.2. Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (fotos WhatsApp o cualquier otro mecanismo) 7
Actividades ejecutadas: 7
5.3. Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos. 8
5.4. Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22) 8
5.5. Proyecto No 5 Contratación mano de obra (Ficha PGS-6.6-23). 9
- Reclutamiento de Obreros y Oficiales: 9
- Personal Calificado: 9
Charlas de Formación y Convivencia en la Obra con los trabajadores. 11
6. ANEXO FO TOGRÁF ICO 11

1. INTRODUCCIÓN

El siguiendo documento obedece al informe de seguimiento social periodo de **MAYO** 01 DE 2025- **MAYO** 31 DE 2025 de la implementación del Programa de Gestión Social del proyecto CONTRATO No. 098 DE 2021 OBJETO: CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

2. ALCANCE

Las medidas de manejo para la implementación de la Gestión Social están encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios y del estimula a la participación de las comunidades para el proyecto con objeto: "CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La zona de influencia directa del proyecto es en el casco urbano del municipio de Coveñas en la calle 6 con carrera 25 esquina, predio denominado Caribe. El proyecto del Hospital de Coveñas se emplaza en un lote que goza de una proyección constructiva para edificaciones de uso institucional, sobre un sector que brinda continuidad en su morfología urbana y vial. Además, el lote garantiza la fácil accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad, cubriendo un gran radio de acción para satisfacer las necesidades municipales y departamentales de su uso comunitario, en la Ilustración 1 se expone la localización geográfica del municipio de Coveñas en el departamento de Sucre.

Tabla 1. *Coordenadas de localización del predio.*

LATITUD	LONGITUD
9°23'41.03"N	75°40'49.01"O

***Ilustración 1**. Localización geográfica del municipio de Coveñas.*





Ilustración 2. *Localización especifica del proyecto, vista satelital.*



4. PLAN DE GESTION SOCIAL

El Plan de Gestión Social - PGS, es el conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, generados como resultado de la ejecución del proyecto. Dicho plan define las estrategias de acción para crear las condiciones que permitan cambios en las comunidades y en las administraciones locales y regionales dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental y recibir los beneficios socioeconómicos esperados con ocasión del proyecto.

El objetivo principal del PGS será brindar acompañamiento Social y comunitario para el fortalecimiento social, económico y ambiental, de los actores sociales identificados por el profesional social durante la ejecución del proyecto, mediante la implementación de programas que se desarrollaran de manera transversal a la ejecución del proyecto, orientados a reducir y mitigar los impactos generados por las obras civiles, dentro de los programas a implementar se tienen:

- Programa de información y divulgación.
- Programa atención al ciudadano.
- Programa organización social y participación ciudadana.
- Programa generación de ingresos
- Programa de sostenibilidad.

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Las medidas de manejo para la gestión Social estuvieron encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios para estimular la participación de las comunidades.

A continuación, se presenta la descripción de actividades por cada programa:

5.1. Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (ficha GPY-F-08)

Objetivo: Brindar atención y soporte continuo a la comunidad mediante canales de comunicación accesibles, asegurando la resolución efectiva de inquietudes y la promoción de una relación positiva entre el proyecto y los residentes.

Actividad: Durante el mes, se implementaron las siguientes acciones para la atención de la comunidad:

1. Se mantuvo un servicio de atención telefónica para resolver dudas y recibir feedback de los residentes. Las llamadas fueron atendidas por personal capacitado para brindar respuestas adecuadas y garantizar que las solicitudes fueran dirigidas a las áreas correspondientes para su resolución. (parte social).
2. Como se ha venido realizando desde el inicio de la obra, esta semana también se brindó atención a la comunidad los días martes y jueves, en el campamento de obra, en el horario habitual de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Los residentes de Coveñas saben que este es el espacio donde pueden acercarse para resolver sus inquietudes, obtener información sobre el avance del proyecto y plantear cualquier duda relacionada con las actividades en curso.
   Esta atención continua ha garantizado una comunicación abierta y fluida entre el equipo de la obra y la comunidad, promoviendo una gestión participativa y fortaleciendo la confianza en el desarrollo del proyecto.

Tabla 2. *Indicador atención a la comunidad.*

Indicadores de seguimiento
$\frac{PQRS\ Atendida}{PQRS\ Recibida} X100$ *No se han presentado PQRS de manera formal
$\frac{Numero\ de\ predios\ con\ PQRS}{Numero\ total\ de\ predios\ identificados} X1$ *No se han presentado PQRS de predios
$\frac{Numero\ de\ predios\ con\ reparaciones}{Numero\ total\ de\ predios\ identificados} X1$ * **A la fecha no se han presentado afectaciones de predios**

5.2. Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (fotos WhatsApp o cualquier otro mecanismo)

El objetivo de las actividades de información y divulgación fue mantener a la comunidad informada sobre los avances del proyecto de construcción del hospital en el Golfo de Morrosquillo, utilizando diversos canales de comunicación para asegurar un alcance amplio y efectivo.

Actividades ejecutadas:

- ✓ **Actualización de la Cartelera Informativa:** La cartelera informativa fue actualizada 1 vez al mes para asegurar que la comunidad tuviera acceso a la información más reciente sobre el proyecto. Esta cartelera incluyó detalles sobre el progreso de las actividades, recordatorios sobre buenas prácticas y anuncios relevantes para los residentes.
- ✓ **Reunión mensual comunidad y entes puntuales:** Como parte del compromiso con la transparencia y la participación ciudadana, se realiza mensualmente una reunión con la comunidad y actores institucionales, entre ellos la veeduría ciudadana, la Gobernación, la Personería, representantes de la Alcaldía, la interventoría y el equipo técnico y social del proyecto. Durante estos espacios se socializan los avances técnicos y sociales de la obra, se resuelven inquietudes de los asistentes y se promueve el diálogo para fortalecer la articulación entre las partes involucradas. Estas reuniones permiten mantener informada a la comunidad sobre el desarrollo del proyecto y garantizar un seguimiento conjunto a su ejecución.

Tabla 3. Indicador Información y divulgación a la comunidad.

Indicadores de cumplimiento
$\frac{1\ Reuniones\ realizadas\ al\ mes}{1\ Reuniones\ programadas\ en\ el\ mes} X100$
$\frac{1 Punto\ de\ información\ programadas}{1 Punto\ de\ información\ instaladas} X100$

5.3. Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.

- **Servicios Públicos:** Actualmente, en la obra contamos con servicios públicos esenciales, tales como alcantarillado, suministro de energía eléctrica, vigilancia por cámaras, un celador e internet, lo cual facilita el desarrollo de las actividades y garantiza un entorno adecuado tanto para los trabajadores como para las visitas técnicas.
- **Impacto en Viviendas Aledañas:** Se han llevado a cabo visitas en las viviendas aledañas para monitorear el impacto de la construcción. Hasta la fecha, no se han reportado novedades o quejas por parte de los residentes.
- **Tránsito de Vehículos Pesados:** Se ha realizado un seguimiento riguroso de la estructura vial utilizada por los vehículos pesados, tales como mixers que transportan concreto y camiones que ingresan con acero, entre otros vehículos de proveedores. A pesar de entradas y salidas de estos vehículos pesados no se han presentado daños en la infraestructura vial, y se utilizan controladores de tráfico en este caso paleteros para controlar la entrada y salida de los mismos y evitar accidentes.
- En la zona de acceso para los vehículos pesados que transportan material entre la obra y el Parque de Guayabal, existe un callejón que pertenece al propietario de la finca ubicada detrás de la obra. Se ha llegado a un acuerdo con el dueño para ir mejorando esa vía en el tramo de entrada, dentro de los límites permitidos por los lineamientos establecidos, ya que esta vía está siendo utilizada para el tránsito de los vehículos de la obra.

5.4. Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22)

- ✓ **Acción social con la comunidad:**

  En el marco del componente social del proyecto, se llevó a cabo una jornada lúdico-pedagógica con los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ubicado en inmediaciones de la obra, con motivo de la conmemoración del mes de la Afrocolombianidad. Durante la actividad se realizaron dinámicas recreativas, cuentos, bailes y juegos tradicionales que resaltan la riqueza cultural afrocolombiana, promoviendo en los menores el respeto por la diversidad y el reconocimiento de nuestras raíces. Al finalizar la jornada, se ofreció un refrigerio a todos los participantes como gesto de integración y cuidado.

5.5. Proyecto No 5 Contratación mano de obra (Ficha PGS-6.6-23).

El objetivo principal de la contratación de mano de obra y las actividades ejecutadas es asegurar una ejecución eficiente y segura de las etapas preliminares del proyecto de construcción del Hospital en el Golfo de Morrosquillo. A su vez, se busca cumplir con los siguientes objetivos:

- **Optimizar el bienestar económico regional:** Generar empleo en las comunidades dentro del área de influencia directa, lo que fortalece la economía local y proporciona ingresos sostenibles.
- **Fomentar la armonía comunitaria:** Evitar conflictos mediante una comunicación abierta y transparente, garantizando que las preocupaciones de la comunidad sean escuchadas y atendidas de manera efectiva.
- **Promover la inclusión de mano de obra regional:** Asegurar que un porcentaje significativo del personal empleado provenga de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, impulsando así el desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, se busca integrar de manera adecuada a personal calificado para la ejecución de tareas específicas dentro de la obra, garantizando la cobertura de todos los roles necesarios para asegurar el avance eficiente y la calidad del proyecto.

Actividad: Durante el mes, se llevó a cabo un proceso integral de recepción de hojas de vida y reclutamiento de personal para el proyecto, con la finalidad de cubrir diversos roles en el equipo de trabajo. Las actividades incluyeron:

- **Reclutamiento de Obreros y Oficiales:**

Durante este mes, la mano de obra estuvo compuesta principalmente por obreros, quienes desempeñaron labores esenciales en los distintos frentes de trabajo, asegurando el avance constante de la obra.

- **Personal Calificado:**

En el transcurso de este mes, no se ha registrado el ingreso de nueva mano de obra calificada, por lo que las actividades se han concentrado en los obreros y oficiales de obra que ya forman parte del proyecto. Hasta el momento, se ha logrado cumplir con el personal mínimo requerido por la entidad contratante.

De acuerdo con lo anterior se tiene el siguiente indicador de cumplimiento:

Tabla 4. *Indicador Contratación mano de obra.*

Indicadores de cumplimiento
$\frac{Total\ de\ Personal\ Contratadas}{Personal\ Mano\ de\ Obra\ Calificada\ Contratada} X100$ Se ha logrado cumplir con el personal mínimo requerido por la entidad contratante
$\frac{46\ Total\ de\ Personal\ No\ Calificado\ Contratada\ de\ la\ región}{66\ \ Personal\ Mano\ de\ Obra\ No\ Calificada\ Contratada} X100$ **Tenemos el 69.70 % de la mano de obra no calificada de la región**

Durante el presente mes, contamos con un total de 66 trabajadores correspondientes a mano de obra no calificada. De este grupo, 46 personas son oriundas del municipio de Coveñas, lo que representa un 69.70% de cumplimiento con la vinculación de personal local, conforme a lo estipulado en el contrato. Los 20 trabajadores restantes provienen de municipios cercanos, los cuales también se verán beneficiados cuando el hospital entre en funcionamiento. Seguimos avanzando y fortaleciendo nuestro compromiso con el desarrollo regional y la generación de oportunidades para las comunidades del área de influencia.

Además, estamos orgullosos de que el 100% del personal en el proyecto es de nacionalidad colombiana, en línea con lo estipulado en el contrato, lo que contribuye al fortalecimiento del empleo nacional y regional. Estos esfuerzos reflejan nuestro enfoque en la integración social y la generación de oportunidades laborales en la comunidad local, asegurando un impacto positivo y duradero. La siguiente tabla detalla los avances logrados en este aspecto

Adjunto encontraras un link que te mostrara en Excel el perfil sociodemográfico de toda la obra detallada y completa.

LINK:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yqp1qjqYnDpsmPUTvUQf1_EeAp1kLSGV/edit?usp=sharing&ouid=117349325142250648395&rtpof=true&sd=true

- ***Charlas de Formación y Convivencia en la Obra con los trabajadores.***

  Durante el presente mes se realizó la charla mensual de Formación y Convivencia con los trabajadores de la obra, enfocada en el fortalecimiento del sentido de pertenencia. En esta sesión se abordaron temas clave como el respeto por los elementos personales de los compañeros, haciendo énfasis en no apropiarse de objetos ajenos, así como la importancia de hacer un uso adecuado y responsable de la dotación entregada. Estas acciones buscan fomentar un ambiente laboral basado en el respeto, la responsabilidad y la sana convivencia entre todos los miembros del equipo.

6. ANEXO FO TOGRÁF ICO

FOTOS ADJUNTAS SIGUIENTE HOJA.











ANEXOS

CARTELERA INFORMATIVA




Reunión mensual comunidad y entes puntuales

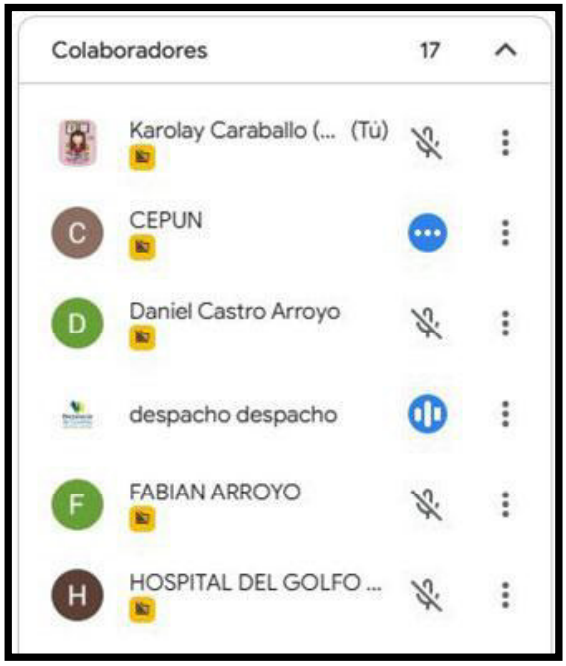

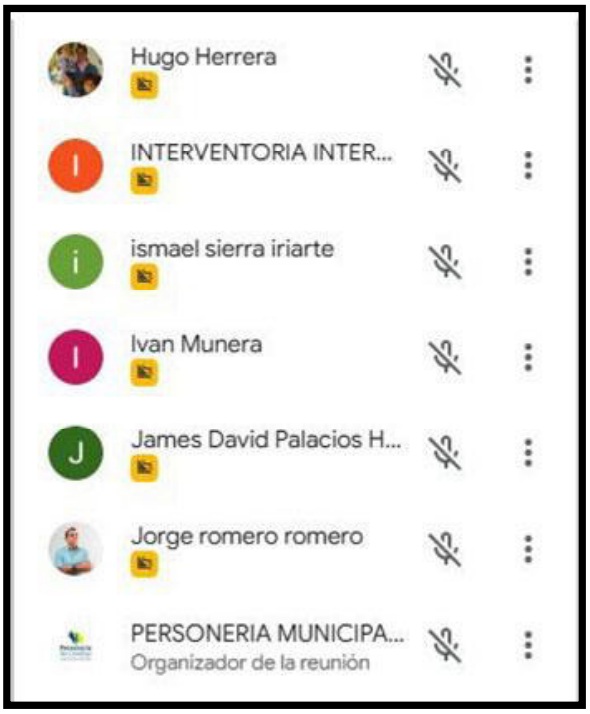



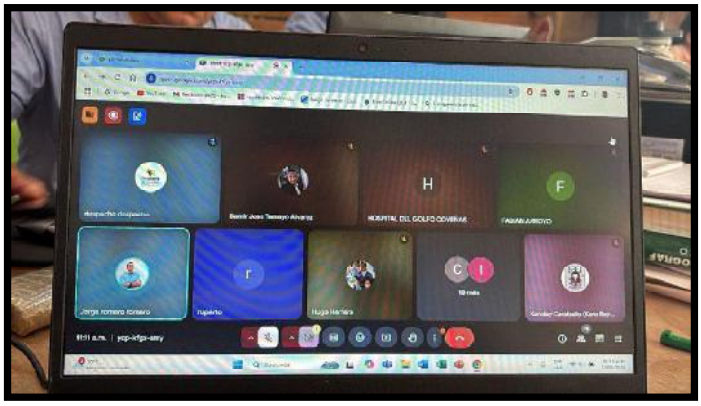


Impacto en Viviendas Aledañas







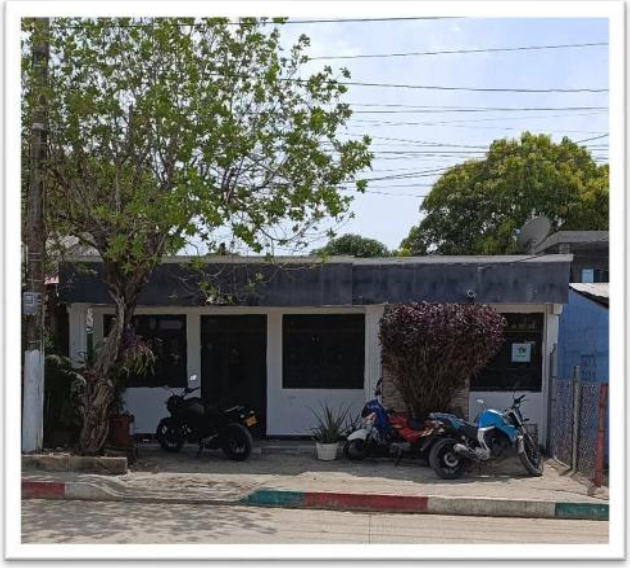

Tránsito de Vehículos Pesados












Acción social con la comunidad













CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

SEMANA 1,2,3 Y 4.
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ATENCIÓN VIA WHATSAPP, TELEFONICA Y ATENCIÓN PRESENCIAL.

SEMANA 2 Y 3
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD. ACTUALIZACIÓN DE CARTELERA, REUNIÓN MENSUAL CON COMUNIDAD/VEEDURIA.

SEMANA3
MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS. SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA VIAL E IMPACTOS A VIVIENDAS ALEDAÑAS.

SEMANA 1 A LA 4
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

MES ACTUAL
MAYO

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



CONTRATO DE OBRA N° LP-018-2023

PROYECTO
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONTRATO DE OBRA N° LP-018-2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 12

PERIODO: MAYO DE 2025

CONTRATISTA:
CONSOCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT. 901811441-3

2025

"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE



DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **No. 12**
Periodo:	**MAYO DE 2025**
No. Contrato de Interventoría	**No. CM-001-2024**
No. Contrato de Obra	**N° LP-018-2023**
Elaboró: **Especialista SG-SST** LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	Firma: 
Reviso y aprobó: **Representante legal** JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA C.C. No. 1.067.858.634 de Montería	Firma: 

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

1. OBJETIVOS 7

1.1. OBJETIVO GENERAL 7

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 7

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 8

3. ALCANCE DEL INFORME 15

4. JUSTIFICACIÓN 15

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 15

5.1. CONTRATO DE OBRA. 15

5.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 17

5.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 17

6. RECURSOS 17

6.1. RECURSO HUMANO 17

6.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 20

7. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 20

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 21

7.3. PAGO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 21

7.4. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SST 23

7.5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 23

7.6. INDUCCIÓN PERSONAL 25

7.7. NOTIFICACIÓN DE RIESGO. 25

7.8. DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SST. 25

7.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 26
