ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	Código: PA05-FO-025
	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA CONSOLIDADO PARCIAL	Versión:
		Fecha: 27-05-2024

PERIODO CORTE DE OBRA

letras>	UNO	FEBRERO	2026	letras>	VEINTIOCHO	FEBRERO	2026
números>	1	2		números>	28	2	
	DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA **CORTE PARCIAL 11**

CONTRATO No CO1.PCCNTR 2024

(No Contrato) (Año de suscripción)

Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico

PLANEAMIENTO FISICO

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INICIAL. CONTRATO: $ 2.325.484.185

VR. ADICION. CONTRATO: $ 1.160.009.362

VR. TOTAL. CONTRATO: $ 3.485.493.547

CONDICIONES SEGÚN BALANCE NO. 3 DEL CONTRATO						ACTA No. 11		ACUMULADO	
ITEM	B	UND	CANT	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [g]	Vr Parcial Directo [h]
	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD Y GALAN								
1	**PRELIMINARES PARA REFORZAMIENTO :(Inc. Preliminares,Localización,Replanteo manual,Demoliciones y Desmontes)**				**$ 95.446.841,76**		**$ 1.916.377,61**		**$ 92.078.441,76**
1.1	**PRELIMINARES**				**$ 35.137.130,68**		**$ 1.916.377,61**		**$ 35.137.130,68**
1,1,1	Suministro e instalación de cerramiento provisional hasta h=2.00 m en repisa y lona verde	ML	779,77	$ 28.909,00	$ 22.542.370,93	66,29	$ 1.916.377,61	779,77	$ 22.542.370,93
1.1.2	Suministro e instalación de cerramiento en lamina ondulada de zinc h=3.048 m	ML	110,07	$ 114.425,00	$ 12.594.759,75		$ -	110,07	$ 12.594.759,75
1.1.8	Cerramiento Perimetral para Protección en la Demolición en Altura (incl. varas, Repisa, malla electrosoldada, tela verde,templetes,Instalación y Desmonte)	ML	0,00	$ 111.898,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.2	**Localización y Replanteo Manual**				**$ 2.184.038,88**		**$ -**		**$ 2.184.038,88**
1,2,1	Replanteo y Localización para arquitectura, sobre terreno.	M²	1162,96	$ 1.878,00	$ 2.184.038,88		$ -	1.162,96	$ 2.184.038,88
1.3	**Varios Preliminares para reforzamiento (Incluye desmontes y demoliciòn).**				**$ 58.125.672,20**		**$ -**		**$ 54.757.272,20**
1,3,6	Desmonte e instalación tablero electrico 12 circuitos	UN	0,00	$ 129.342,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,3,7	Desmonte red eléctrica (incluye retiro y transporte)	ML	342,76	$ 12.030,00	$ 4.123.402,80		$ -	62,76	$ 755.002,80
1,3,11	Desmonte bajante en PVC A.LL. h= 4-5 m	ML	66,60	$ 20.476,00	$ 1.363.701,60		$ -	66,60	$ 1.363.701,60
1,3,12	Desmonte de Luminarias (Incluye Retiro de sobrantes).	UN	23,00	$ 40.392,00	$ 929.016,00		$ -	23,00	$ 929.016,00
1,3,14	Demolición de Cimientos Manual (Incluye Retiro a escombrera certificada)	M³	20,26	$ 300.455,00	$ 6.087.218,30		$ -	20,26	$ 6.087.218,30
1,3,15	Demolición de Vigas y Columnas Manual (Incluye: Retiro a escombrera certificada)	M³	0,00	$ 374.381,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,3,17	Desmonte red sanitaria colgante diámetro de 2" a 4" (Inc. Retiro de Sobrantes)	M2	0,00	$ 6.864,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,3,18	Desmonte de Tubería Hidráulica Colgante bajo Placa en diámetros de ½" a 4" (Incluye Retiro de Sobrantes).	M2	0,00	$ 5.776,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,3,20	Demolición placa contrapiso (Incluye Retiro de sobrantes) e=20 cm	M2	964,50	$ 41.323,00	$ 39.856.033,50		$ -	964,50	$ 39.856.033,50
1,3,31	Demolición meson corrido (incluye retiro de sobrantes)	ML	0,00	$ 21.025,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,3,34	Desmonte Baranda Metálica (Incluye: Retiro de sobrante a sitio de bodegaje)	ML	0,00	$ 24.215,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1.3.39	Desmonte y retiro de muro en Dry- Wall (Incluye: Retiro de sobrante a escombrera certificada).	M2	0,00	$ 14.903,00	$ -		$ -	0,00	$ -
1,3,48	Desvió Temporal Colector colgante diámetro 4" a 6" (Inc. Tubería, accesorios y retiro de Sobrantes)	ML	60,00	$ 96.105,00	$ 5.766.300,00		$ -	60,00	$ 5.766.300,00
2.	**EXCAVACIÓN Y RELLENOS PARA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS: (Inc. Excavación manual y/o maquina,Rellenos material selecionado o recebo)**				**$ 65.772.908,16**		**$ 1.770.102,24**		**$ 65.596.928,16**
2,1	**EXCAVACIÓN DE TIERRA**				**$ 65.772.908,16**		**$ 1.770.102,24**		**$ 65.596.928,16**

2,1,1	Excavación manual en material común h=0.0-2.5 m (incluye retiro de sobrantes)	M3	231,31	$ 83.382,00	$ 19.287.090,42		$ -	231,31	$ 19.287.090,42
2,1,2	Relleno con material proveniente de la excavación	M3	77,04	$ 31.376,00	$ 2.417.207,04	39,44	$ 1.237.469,44	77,04	$ 2.417.207,04
2,1,3	Relleno en recebo común apisonado (Suministro e instalación, extendido manual, humedecido y compactación transporte a 28 KM)	M3	0,00	$ 97.552,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,1,4	Suministro e instalación de Recebo B - 400	M3	282,67	$ 134.422,00	$ 37.996.797,90		$ -	282,67	$ 37.996.797,90
2.1.7	Cargue de Material de Demolición	M3	724,56	$ 8.380,00	$ 6.071.812,80	63,56	$ 532.632,80	703,56	$ 5.895.832,80
3	**CIMENTACIÓN NUEVAS PARA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS: (Inc. Concreto Pobre Base,Zapatas,Vigas ,Placas,Pilotes,Sacanucleos,Dados y Estructura Metálicas).**				**$ 79.253.611,51**		**$ -**		**$ 79.253.611,51**
3,1	**CIMENTACIÓN**				**$ 79.253.611,51**		**$ -**		**$ 79.253.611,51**
3,1,1	Base Concreto Pobre de limpieza 2000 PSI e=0,05	M2	263,54	$ 27.813,00	$ 7.329.838,02		$ -	263,54	$ 7.329.838,02
3,1,2	Zapatas de Concreto 4000 PSI (No incluye acero)	M³	46,47	$ 840.084,00	$ 39.038.703,48		$ -	46,47	$ 39.038.703,48
3,1,3	Vigas de Cimentación en Concreto Reforzado 4000 PSI	M³	33,79	$ 973.219,00	$ 32.885.070,01		$ -	33,79	$ 32.885.070,01
3,1,16	Pilotes Pre-Excavado sin entubación con lodos tixotrópicos de Diametro 20 cm inc (Incluye: Pre-hueco en lugar restringido , concreto 4000 psi)	ML	0,00	$ 130.686,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,1,18	Recalce de Zapatas y/o capiteles en Concreto 4500 PSI (inc. Epóxico para pega de concreto Nuevo con viejo, escarificación de zapatas,formaleta y suministro e instalación de concreto, el acero se paga en ítem respectivo)	M³	0,00	$ 1.319.439,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	**REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTES:(Columnas,vigas áereas,Placas áereas y contrapiso, Juntas de dilatación, Estructuras Metálicas y Anclajes)**				**$ 388.985.676,22**		**$ 1.808.062,00**		**$ 388.985.676,22**
4,1	**ESTRUCTURA DE CONCRETO**				**$ 14.455.609,92**		**$ -**		**$ 14.455.609,92**
4,1,1	Suministro e Instalación de Concreto 4000 psi Columnas - Pantalla (INCL. Formaleta,andamios , suministo e instalación concreto)	M³	12,96	$ 1.115.402,00	$ 14.455.609,92		$ -	12,96	$ 14.455.609,92
4,1,6	Placa de contapiso Concreto 4000 psi e= 20cm (incluye Malla electrosoldada M-188 Q = 5 6,0mm 1,5 x 1,5 cm + amarre de translapo y polietileno cal. 6)	M2	0,00	$ 176.859,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,2	**ESTRUCTURA METÁLICAS**				**$ 348.370.950,78**		**$ -**		**$ 348.370.950,78**
4,2,1	Perfileria de Acero para Estructuras Metálicas (Incluye: conexiones,permos de anclaje y platina según detalles)	KG	20190,74	$ 17.254,00	$ 348.370.950,78		$ -	20.190,74	$ 348.370.950,78
4,3	**REFORZAMIENTO EN LA CIMENTACIÒN Y ANCLAJES EN LA ESTRUCTURAL Y SUPER ESTRUCTURA. (INCLUYE ANCLAJES EN:VIGAS DE CIMENTACIÒN Y AÈREAS,COLUMNAS, PANTALLAS,DADOS, ZAPATAS).**				**$ 14.651.676,00**		**$ 1.808.062,00**		**$ 14.651.676,00**
4,3,1	Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 1" con Longitud de 50 cm de profundidad estandar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del anclaje, limpieza y epóxico),	UN	0,00	$ 102.789,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,3,2	Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 7/8" con Longitud de 40 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del anclaje, limpieza y epóxico)	UN	0,00	$ 87.210,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,3,3	Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 3/4" con Longitud de 35 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del anclaje, limpieza y epóxico)	UN	0,00	$ 73.955,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,3,4	Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 5/8" con Longitud de 35 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del anclaje, limpieza y epóxico)	UN	64,00	$ 63.921,00	$ 4.090.944,00		$ -	64,00	$ 4.090.944,00
4,3,5	Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 1/2" con Longitud de 35 cm de profundidad estándar. (Incluye: Perforación en concreto con diámetro de 1/4 más del anclaje, limpieza y epóxico)	UN	352,00	$ 19.729,00	$ 6.944.608,00		$ -	352,00	$ 6.944.608,00
4,3,6	Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 3/8" con Longitud de 9 cm de profundidad estandar. (Incluye: Perforacion en concreto con diámetro de 1/4 más del anclaje, limpieza y epóxico)	UN	206,00	$ 17.554,00	$ 3.616.124,00	103,00	$ 1.808.062,00	206,00	$ 3.616.124,00
4,4	**REFORZAMIENTO COLUMNAS**				**$ 11.507.439,52**		**$ -**		**$ 11.507.439,52**
4,4,1	Encamisado y Reforzamiento estructural de Columnas en Concreto 4000 PSI (inc. Epóxico para pega de concreto,perforación de vigas para cruce de acero verticales, escarificación de columnas, formaleta a la vista y suministro e instalación de concreto)	M³	4,10	$ 2.803.957,00	$ 11.507.439,52		$ -	4,10	$ 11.507.439,52
5	**ACERO DE REFUERZO Y MALLAS PARA REFORZAMIENTO : (Inc. Cimentación, Vigas, Columnas,Placas, Pantallas,Pilotes)**				**$ 71.334.828,86**		**$ 2.137.311,90**		**$ 71.334.828,86**
5,1	**ACERO DE REFUERZO CIMENTACIÓN**				**$ 45.587.697,30**		**$ -**		**$ 45.587.697,30**
5,1,1	Acero de refuerzo 60000 psi (en zapatas, capiteles y micropilotes)	KG	6078,37	$ 5.490,00	$ 33.370.251,30		$ -	6.078,37	$ 33.370.251,30
5,1,3	Acero de refuerzo 60000 psi (en vigas de cimentación))	KG	2225,40	$ 5.490,00	$ 12.217.446,00		$ -	2.225,40	$ 12.217.446,00
5,1,4	Suministro e instalación mallas electrosoldadas	KG	0,00	$ 5.559,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5,2	**ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA**				**$ 25.747.131,56**		**$ 2.137.311,90**		**$ 25.747.131,56**
5,2,1	Acero de refuerzo 60000 psi (Columnas y Muros)	KG	4689,82	$ 5.490,00	$ 25.747.131,56	389,31	$ 2.137.311,90	4.689,82	$ 25.747.131,56
9	**PISOS: (Inc. Alistado, Afinados,Media cañas y acabados)**				**$ 136.088.291,14**		**$ 26.057.477,50**		**$ 93.791.572,92**
9,1	**AFINADO PISOS**				**$ 58.611.738,78**		**$ 13.274.727,66**		**$ 42.466.656,75**
9,1,1	Alistado de pisos e= 0.05 m, en mortero 1:3	M²	932,03	$ 29.466,00	$ 27.463.195,98	450,51	$ 13.274.727,66	932,03	$ 27.463.195,98
9,1,6	Poceta Aseo h= 65cmts. (Incluye: Mampostería , terminación en granito con media caña)	ML	12,08	$ 245.485,00	$ 2.965.458,80		$ -	8,93	$ 2.192.181,05
9,1,7	Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m	ML	586,00	$ 48.094,00	$ 28.183.084,00		$ -	266,38	$ 12.811.279,72
9,2	**ACABADOS DE PISOS**				**$ 77.476.552,36**		**$ 12.782.749,84**		**$ 51.324.916,17**
9,2,4	Piso Tipo 1 Baldosa Granito 40 X 40 Similar al existente.	M²	388,95	$ 71.416,00	$ 27.777.253,20	178,99	$ 12.782.749,84	388,95	$ 27.777.253,20
9,2,5	Pulida y brillada pisos en granito	M2	657,34	$ 19.338,00	$ 12.711.640,92		$ -	221,65	$ 4.286.267,70
9,2,10	Suministro e instalación ceramica para piso de ,33 x ,33, Duro piso - incluye boquilla, totalmente terminado	M2	532,48	$ 69.463,00	$ 36.987.658,24		$ -	277,29	$ 19.261.395,27
9,2,11	Piso en Concreto Esmaltado con Sikafloor- 3 Quartz Top (Placa de concreto paga en item de placas de contrapiso)	M²	0,00	$ 38.865,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.15	Concreto Escobiado con Dilataciones cada 100cm y e= 10cm (Incluye refuerzo suminstro e instalación)	M2	0,00	$ 84.580,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9.2.19	Grada en Gravilla Lavada de 0,30cm	ML	0,00	$ 96.445,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10	**ENCHAPES: (Inc. Enchapes para muros)**				**$ 19.098.240,00**		**$ -**		**$ 9.105.085,92**
10,1	**ENCHAPES MUROS**				**$ 19.098.240,00**		**$ -**		**$ 9.105.085,92**
10,1,1	Suministro e instalación enchape pared Egeo 20.5 x 20.5 (incluye win y remate en aluminio)	M2	320,00	$ 59.682,00	$ 19.098.240,00		$ -	152,56	$ 9.105.085,92
11	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 15.232.142,76**		**$ 2.946.662,16**		**$ 11.621.225,16**
11,1	**ESTUCO Y PINTURA**				**$ 15.232.142,76**		**$ 2.946.662,16**		**$ 11.621.225,16**

11,1,1	Suministro e instalación estuco sobre pañete para muros y/o techos	M2	468,84	$ 14.599,00	$ 6.844.595,16	201,84	$ 2.946.662,16	468,84	$ 6.844.595,16
11,1,2	Vinilo tipo 1 sobre muro 2 manos	M2	468,84	$ 17.890,00	$ 8.387.547,60		$ -	267,00	$ 4.776.630,00
11,1,3	Aplicación pintura epoxica azul o gris para pisos (3 capas), incluye retiro de pintura anterior y desmanche de piso	M2	0,00	$ 33.440,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11,1,4	Pintura Sistema Alquidico para Estructura Metálica	ML	0,00	$ 15.398,00	$ -		$ -	0,00	$ -
13	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
13,1	Instaaciones Hidráulicas y Sanitarias	GLB	0,00	$ 54.801.692,41	$ -		$ -	0,00	$ -
14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
14,1	Instalaciones Eléctricas	GLB	0,00	$ 140.287.475,00	$ -		$ -	0,00	$ -
17	**CUBIERTA: (Inc. Cubiertas traslusidad,marquesinas,canales matálica,Cielos rasos,Impermeabilizaciónes,Techos falsos)**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
17,1	**CUBIERTA**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
17,1,5	Cielo Raso Dry Wall plano pintado 1/2".	M2		$ 60.524,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	**GENERALES: (Aseo ,Montajes)**				**$ 27.172.753,37**		**$ 4.957.416,45**		**$ 16.326.331,37**
19,1,1	Aseo y limpieza general obra	M2	3032,71	$ 8.847,00	$ 26.830.385,37	560,35	$ 4.957.416,45	1.806,71	$ 15.983.963,37
19,1,4	Instalación de divisiones Modulares	M2		$ 52.883,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,1,6	Montaje de canaleta, cableado de fuerza y regulada.	ML		$ 46.500,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,1,7	Montaje de puertas con marco	UN		$ 83.854,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,1,8	Montaje de Lámparas	UN		$ 50.934,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,1,18	Montaje de Cubierta Existente (Incluye correas, anclajes, reemplazos de platinas ,madera y trasiego).	M2		$ 156.153,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19,1,19	Apuntalamiento temporal con cercha, camilla y paral metálico,	M2	16,00	$ 21.398,00	$ 342.368,00		$ -	16,00	$ 342.368,00
20	**ADECUACIONES LOCALES (ITEM CANASTA DE PRECIOS IPES INDEX 2024)**				**$ 110.392.985,55**		**$ 23.366.870,86**		**$ 84.103.682,18**
20,1,1	Demolición cajas de inspeccion 100cm x 100 cm (incluye retiro de material)	UN	0,00	$ 94.122,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,2	Demolición cajas de inspeccion 60cm x 60cm (incluye retiro de material)	UN	2,00	$ 63.577,00	$ 127.154,00		$ -	2,00	$ 127.154,00
20,1,3	Demolición cajas de inspeccion 80cm x 80cm (incluye retiro de material)	UN	2,00	$ 66.096,00	$ 132.192,00		$ -	2,00	$ 132.192,00
20,1,4	Demolición enchapes ceramicos (incluye retiro de sobrantes)	M2	2,03	$ 8.396,00	$ 17.043,88		$ -	2,03	$ 17.043,88
20,1,5	Demolición media caña y/o guarda escoba todo tipo. incluye corte con pulidora ,resanes, alistamiento de superficie con mortero para fundida de mediacaña en granito.(incluye retiro de sobrantes)	ML	21,96	$ 29.837,00	$ 655.220,52		$ -	21,96	$ 655.220,52
20,1,6	Demolición meson corrido (incluye retiro de sobrantes)	ML	44,27	$ 21.025,00	$ 930.776,75	22,73	$ 477.898,25	44,27	$ 930.776,75
20,1,7	Demolición muros e= 15 cm. (Incluye Retiro de sobrantes)	M2	387,66	$ 22.269,00	$ 8.632.800,54		$ -	387,66	$ 8.632.800,54
20,1,8	Demolición muros e= 25 cm. (Incluye Retiro de sobrantes)	M2	0,00	$ 30.703,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,9	Demolición pisos espesor variable hasta 10 cm (incluye cargue y transporte hasta sitio de disposición final autorizado)	M2	0,00	$ 10.994,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,10	Demolición sobrepiso	M2	0,00	$ 12.704,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,11	Desmonte estanterías pesada	M2	0,00	$ 23.385,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,12	Desmonte estanterias fijas a pared	M2	0,00	$ 17.446,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,13	Desmonte puntos sanitarios	UN	0,00	$ 15.242,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,14	Desmonte red eléctrica (incluye retiro y transporte)	ML	633,75	$ 12.030,00	$ 7.624.012,50		$ -	633,75	$ 7.624.012,50
20,1,15	Desmonte Redes Hidro Sanitarias	ML	0,00	$ 12.341,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,16	Desmonte salida electrica	UN	10,00	$ 24.199,00	$ 241.990,00	10,00	$ 241.990,00	10,00	$ 241.990,00
20,1,17	Desmonte, traslado y re instalación de locales en carpinterias metálicas, mallas eslabonadas y ventanerias, incluye corte, traslado, soldaduras, y demas elementos para su correcto funcionamiento	M2	199,80	$ 84.147,00	$ 16.812.570,60	70,09	$ 5.897.863,23	199,80	$ 16.812.570,60
20,1,18	Alfajías o remates en mampostería	ML	0,00	$ 18.515,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,19	Filos y dilataciones en pañete	ML	732,87	$ 7.357,00	$ 5.391.724,59	327,47	$ 2.409.196,79	732,87	$ 5.391.724,59
20,1,20	Muro drywall doble cara 0.10 m (incluye estructura metálica, masilla, cinta y primera mano de pintura)	M2	0,00	$ 71.426,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,21	Muro en bloque No. 4 e=10 cm	M2	337,75	$ 59.825,00	$ 20.205.893,75	179,19	$ 10.720.041,75	337,75	$ 20.205.893,75
20,1,22	Muro en ladrillo tolete e=12 cm	M2	5,08	$ 58.881,00	$ 299.115,48	5,08	$ 299.115,48	5,08	$ 299.115,48
20,1,23	Muro en ladrillo tolete e=20 - 25 cm	M2	4,52	$ 98.486,00	$ 445.156,72		$ -	4,52	$ 445.156,72
20,1,24	Muro entre h=0 a 3 m en Bloque No. 5 e=12 cm	M2	0,00	$ 78.402,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,25	Suministro e Instalación de SUPERBOARD de 4mm, 1 cara-en muros y cieloraso- NO INCLUYE estuco ni pinturas. (Incluye estructura metálica, perfilería, tornillos para su correcta instalación)	M2	22,20	$ 53.052,00	$ 1.177.754,40	12,93	$ 685.962,36	22,20	$ 1.177.754,40
20,1,26	Afinado endurecido en mortero 1:3 h=4 cm.	M2	0,00	$ 35.364,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,27	Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m	ML	0,00	$ 48.094,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,28	Pulida y brillada pisos en granito	M2	0,00	$ 19.338,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,29	Suministro e instalación rejilla de piso cuadrada de 6"x6"x4" en aluminio	UN	12,00	$ 98.808,00	$ 1.185.696,00		$ -	0,00	$ -
20,1,30	Win metálico	ML	600,00	$ 25.718,00	$ 15.430.800,00		$ -	304,64	$ 7.834.731,52
20,1,31	Suministro e instalación cielo raso en lamina de PVC (Incluye estructura metálica)	M2	147,82	$ 75.401,00	$ 11.145.775,82		$ -	58,93	$ 4.443.380,93
20,1,32	Cancelación de punto sanitario de 2" a 4"	UN	0,00	$ 37.935,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,33	Punto Sanitario PVC 2"	UN	13,00	$ 110.499,00	$ 1.436.487,00	13,00	$ 1.436.487,00	13,00	$ 1.436.487,00
20,1,34	Instalación puntos hidráulicos sobreponer con material desmonte	UN	0,00	$ 30.138,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,35	Punto agua fria pvc-p (incluye accesorios)	UN	13,00	$ 59.176,00	$ 769.288,00	13,00	$ 769.288,00	13,00	$ 769.288,00
20,1,36	Instalación punto eléctrico con material de desmonte, incluye aparato, luminaria, tablero u otro	UN	0,00	$ 42.902,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,37	Luminaria panel led incrustar 8w	UN	4,00	$ 39.954,00	$ 159.816,00		$ -	4,00	$ 159.816,00
20,1,38	Salida de tomacorriente bifásica	UN	1,00	$ 94.326,00	$ 94.326,00		$ -	1,00	$ 94.326,00
20,1,39	Suministro e instalación interruptor doble	UN	0,00	$ 11.172,00	$ -		$ -	0,00	$ -
20,1,40	Suministro e instalación interruptor sencillo	UN	16,00	$ 10.069,00	$ 161.104,00		$ -	1,00	$ 10.069,00
20,1,41	Suministro e instalación lampara led high bay de 100 w (tipo ufo)	UN	45,00	$ 249.326,00	$ 11.219.670,00		$ -	25,00	$ 6.233.150,00
20,1,42	Suministro e instalación, salida iluminación tubería em ¾ " (3ml). promedio de 3.5 ml en cable lshf 12awg no incluye luminaria.	UN	47,00	$ 120.587,00	$ 5.667.589,00		$ -	0,00	$ -
20,1,43	Suministro e instalación, salida interruptor doble en tubería em ¾" (incluye aparato). promedio de 3.5 ml en cable lshf 12awg	UN	4,00	$ 107.257,00	$ 429.028,00	4,00	$ 429.028,00	4,00	$ 429.028,00
21	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 1.481.185.751,91**		**$ 130.848.545,64**		**$ 1.328.402.862,90**
NP1	Limpieza de superficie metálica existente según norma SSPC SP2 (limpieza manual) Incluye solvente y herramienta manual cepillo rotativo y lija	ML	635,84	$ 15.506,00	$ 9.859.335,04		$ -	635,84	$ 9.859.335,04

NP2	Mantenimiento cortinas enrrollables (incluye desmonte, mantenimiento y cambio de resortes, engrase, arreglo de tapa rollo y cambio de flejes y angulo doble 1" a riel aplicación de anticorrosivo y pintura esmaltada)	M2	17,13	$ 381.149,00	$ 6.529.082,37		$ -	17,13	$ 6.529.082,37
NP3	Montaje de estructura metálica. Ancaje a piso con aplicación de epoxico. Incluye anticorrosivo y esmalte.	ML	59,30	$ 54.416,00	$ 3.226.868,80		$ -	59,30	$ 3.226.868,80
NP4	Pintura bajo placa (incluye resane, pintura epoxica)	M2	28,52	$ 23.135,00	$ 659.810,20		$ -	28,52	$ 659.810,20
NP5	CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO DE pisos espesor variable hasta 10 cm	ML	920,42	$ 18.704,00	$ 17.215.535,68		$ -	920,42	$ 17.215.535,68
NP6	Instalación de Superboard Entrepiso 20mm Placa Fibrocemento , para cieloraso- NO INCLUYE estuco ni pinturas. (corte, trasiego de material y tornillos para su correcta instalación)	M2	13,92	$ 52.802,00	$ 735.003,84		$ -	13,92	$ 735.003,84
NP7	Excavación en conglomerado incluye retiro a botadero certificado	M3	217,98	$ 92.369,00	$ 20.134.594,62	63,56	$ 5.870.973,64	217,98	$ 20.134.594,62
NP8	Suministro e instalación Tuberia PVC de 1/2", incluye accesorios de instalación	ML	34,50	$ 16.770,00	$ 578.565,00		$ -	34,50	$ 578.565,00
NP9	Suministro e instalación cable encauchetado de 3x10 AWG	ML	79,40	$ 34.038,00	$ 2.702.617,20	44,00	$ 1.497.672,00	79,40	$ 2.702.617,20
NP10	Suministro e instalación Tablero MONOFASICO	UN	0,00	$ 52.288,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP11	Suministro e instalación Tablero BIFASICO	UN	2,00	$ 68.870,00	$ 137.740,00		$ -	2,00	$ 137.740,00
NP12	Aditivo plastificante para concreto MAPEPLAST (Micropilotes)	UN/M3	37,50	$ 45.367,00	$ 1.701.262,50		$ -	37,50	$ 1.701.262,50
NP13	Desmonte tablero eléctrico monofásico incl. retiro tuberia y descableado	UN	3,00	$ 105.707,00	$ 317.121,00		$ -	3,00	$ 317.121,00
NP14	Desmonte técnico de cielo raso en pvc alveolar existente	M2	56,26	$ 23.032,00	$ 1.295.780,32	38,62	$ 889.495,84	56,26	$ 1.295.780,32
NP15	Cable N.12 libre de halógeno (Suministro de instalación)	ML	175,50	$ 5.896,00	$ 1.034.748,00		$ -	175,50	$ 1.034.748,00
NP16	Suministro e instalación caja RAWELT 5800 - 3 huecos	UN	52,00	$ 19.146,00	$ 995.592,00		$ -	52,00	$ 995.592,00
NP17	Suministro e instalación Tuberia EMT de 1/2", incluye accesorios de instalación	ML	24,00	$ 14.189,00	$ 340.536,00		$ -	24,00	$ 340.536,00
NP18	Suministro e instalación Toma corriente doble (Incluye retiro de existente y montaje de nueva)	UN	13,00	$ 19.935,00	$ 259.155,00		$ -	13,00	$ 259.155,00
NP19	Suministro e instalación breaker 1X30 amp	UN	13,00	$ 17.665,00	$ 229.645,00		$ -	3,00	$ 52.995,00
NP20	Suministro e instalación Breaker automático 1X20 amp enchufable	UN	87,00	$ 17.235,00	$ 1.499.445,00		$ -	3,00	$ 51.705,00
NP21	Alquiler de sección de andamio multidireccional certificado. Seccion/día (Incluye Verticales 1m y 2m, horizontales , dIagonales, plataformas, escalera interna, niveladores, pasadores, juego de ruedas)	SECCION/DIA	1666,00	$ 13.646,00	$ 22.734.236,00	90,00	$ 1.228.140,00	1.666,00	$ 22.734.236,00
NP22	Disposicion Residuos Peligrosos Especiales	KG	33609,50	$ 1.808,00	$ 60.765.976,54		$ -	26.628,00	$ 48.143.424,00
NP23	Pañete liso muros 1:4	M2	721,35	$ 18.411,00	$ 13.280.774,85	392,08	$ 7.218.584,88	721,35	$ 13.280.774,85
NP24	Pañete liso muros 1:4	ML	330,41	$ 12.791,00	$ 4.226.274,31	158,76	$ 2.030.699,16	330,41	$ 4.226.274,31
NP25	Placa de Contrapiso de 10 CM - Concreto 4000 PSI (Incluye malla electrosoldada M-084 Q=5 4,0 mm 1,5X1,5 cm+amarre de traslapo y polietileno cal 6)	M2	953,79	$ 112.716,00	$ 107.507.393,64	23,86	$ 2.689.403,76	953,79	$ 107.507.393,64
NP26	Suministro e instalación de Tablero de 42 circuitos trifásico, con puerta, chapa y espacio para totalizador.Incluye marcación	UN	2,00	$ 1.001.812,00	$ 2.003.624,00		$ -	2,00	$ 2.003.624,00
NP27	Suministro e instalación Breaker automático 1X20 amp enchufable	UN	38,00	$ 17.235,00	$ 654.930,00	2,00	$ 34.470,00	38,00	$ 654.930,00
NP28	Suministro e instalacion de breaker automatico Bipolar 2x20 enchufable	UN	0,00	$ 49.789,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP29	Suministro e instalacion de Totalizador Breaker Industrial Regulable de 88 A 125 Amperios	UN	1,00	$ 587.127,00	$ 587.127,00	1,00	$ 587.127,00	1,00	$ 587.127,00
NP30	Suministro e instalacion de Totalizador Breaker Industrial 125 Amperios	UN	1,00	$ 529.207,00	$ 529.207,00		$ -	0,00	$ -
NP31	Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#2F + 1#2N +1#4T (libre de halogenos)	ML	0,00	$ 139.349,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP32	Suministro e instalación bornas No. 2	UN	10,00	$ 42.854,00	$ 428.540,00		$ -	0,00	$ -
NP33	Suministro e instalación bornas No. 4	UN	10,00	$ 43.467,00	$ 434.670,00		$ -	0,00	$ -
NP34	Suministro e instalación caja de paso 30 x 30 x 30	UN	10,00	$ 232.322,00	$ 2.323.220,00		$ -	10,00	$ 2.323.220,00
NP35	Suministro e instalación Tuberia EMT de 2", incluye accesorios de instalación	ML	84,24	$ 70.982,00	$ 5.979.523,68		$ -	84,24	$ 5.979.523,68
NP36	Suministro e instalación de soportes para instalación de tuberia EMT incluye fijacion a muros y sujeción estructura de cubierta	UN	107,00	$ 42.810,00	$ 4.580.670,00	19,00	$ 813.390,00	87,00	$ 3.724.470,00
NP37	Caja de paso doble fondo 10x10	UN	26,00	$ 41.540,00	$ 1.080.040,00	1,00	$ 41.540,00	26,00	$ 1.080.040,00
NP38	Suministro e instalación Tuberia EMT de 1", incluye accesorios de instalación	ML	546,01	$ 26.802,00	$ 14.634.160,02	13,25	$ 355.126,50	101,05	$ 2.708.342,10
NP39	Suministro e instalación Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalación	ML	429,69	$ 20.238,00	$ 8.696.066,22	100,01	$ 2.024.002,38	259,19	$ 5.245.487,22
NP40	Suministro e instalación de salida de tomacorriente monofásico doble tipo levinton, con tapa para intemperie. Hasta 1 metro. Se utilizará cable aislado de cobre calibre 12 AWG (No. 12), tipo LSHF, compuesto por un conductor para fase (1#12 F), uno para neutro (1#12 N) y uno para tierra (1#12 T). El cable se instalará en tubería metálica sobrepuesta IMC de 3/4". Incluye todos los accesorios necesarios para la fijación de la instalación.	ML	54,00	$ 113.414,00	$ 6.124.356,00		$ -	25,00	$ 2.835.350,00
NP41	Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 1#12F + 1#12N +1#12T (libre de halogenos)	ML	1936,44	$ 17.511,00	$ 33.909.000,84	481,77	$ 8.436.274,47	1.034,20	$ 18.109.876,20
NP42	Suministro e instalacion de Tuberia IMC 3/4" incluye accesorios de instalación	ML	388,57	$ 65.478,00	$ 25.442.786,46	49,82	$ 3.262.113,96	201,65	$ 13.203.638,70
NP43	Suministro e instalación de salida de tomacorriente monofásico doble GFCI, con tapa para intemperie. Hasta 1 metro Se utilizará cable aislado de cobre calibre 12 AWG (No. 12), tipo LSHF, compuesto por un conductor para fase (1#12 F), uno para neutro (1#12 N) y uno para tierra (1#12 T). El cable se instalará en tubería metálica sobrepuesta IMC de 3/4" . Incluye todos los accesorios necesarios para la fijación de la instalación	UN	175,00	$ 163.479,00	$ 28.608.825,00	2,00	$ 326.958,00	73,00	$ 11.933.967,00
NP44	Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásico. Hasta 1 metro Se utilizará cable aislado de cobre calibre 10 AWG, tipo LSHF, compuesto por dos conductores para fase (2#10 F) y uno para tierra (1#10 T). El cable se instalará en tubería metálica sobrepuesta IMC de 3/4" de diámetro. Incluye todos los accesorios necesarios para la fijación de la instalación	UN	0,00	$ 122.785,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP45	Suministro e instalación Riel chanel ranurado de 4X2	ML	176,88	$ 31.086,00	$ 5.498.491,68	38,40	$ 1.193.702,40	80,40	$ 2.499.314,40
NP46	Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 1#10F + 1#1ON +1#10T (libre de halogenos)	ML	128,85	$ 22.361,00	$ 2.881.214,85	13,25	$ 296.283,25	13,25	$ 296.283,25
NP47	Suministro e instalación de un sistema de puesta a tierra tipo delta, conformado por tres (3) electrodos de puesta a tierra de cobre, de 5/8" de diámetro y 2,40 m de longitud, interconectados mediante conductor de cobre desnudo calibre #2 AWG , El sistema debe incluir conectores mecánicos o soldadura exotérmica tipo Cadweld, cajas de inspección en concreto (una por varilla), materiales mejoradores de conductividad, y todo lo necesario para su correcta instalacion	UN	1,00	$ 2.326.152,00	$ 2.326.152,00		$ -	1,00	$ 2.326.152,00
NP48	Suministro e instalación de Tablero de 6 circuitos trifásico, con puerta.Incluye marcación	UN	0,00	$ 369.268,00	$ -		$ -	0,00	$ -

NP49	Suministro e instalación de interruptor totalizador tipo breaker industrial regulable, con capacidad nominal de operación mínima de 280 A y máxima igual o superior a 400 A, o equivalente	UN	1,00	$ 2.855.421,00	$ 2.855.421,00		$ -	0,00	$ -
NP50	Bajante Aguas Lluvias pvc-ll ø 4" (Incluye Accesorios)	ML	71,16	$ 35.499,00	$ 2.526.108,84	38,16	$ 1.354.641,84	71,16	$ 2.526.108,84
NP51	Caja inspeccion 80 x 80cm (incluye base, angulo, cañuela y tapa con marco metalico)	UN	15,00	$ 653.679,00	$ 9.805.185,00		$ -	10,00	$ 6.536.790,00
NP52	Red Sanitaria de Ø 4" (PVC)	ML	96,89	$ 29.878,00	$ 2.894.879,42	65,90	$ 1.968.960,20	96,89	$ 2.894.879,42
NP53	Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 6" en PVC (incluye accesorios)	ML	86,39	$ 87.248,00	$ 7.537.354,72	11,58	$ 1.010.331,84	86,39	$ 7.537.354,72
NP54	Suministro e instalación Tuberia NOVAFORT 8" (No incluye excavaciones)	ML	0,00	$ 106.904,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP55	Red Suministro agua fria pvc-p 1/2" (Incluye Accesorios)	ML	139,94	$ 69.536,00	$ 9.730.867,84	139,94	$ 9.730.867,84	139,94	$ 9.730.867,84
NP56	Red Suministro PVC-P 1"	ML	0,00	$ 14.516,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP57	Relleno de Arena s/lav de peña cernida +trans base para tuberia	M3	12,07	$ 121.623,00	$ 1.467.989,61		$ -	12,07	$ 1.467.989,61
NP58	Sifón Piso Punto desague pvc ø 4" (sifón)	UN	40,00	$ 117.941,00	$ 4.717.640,00	28,00	$ 3.302.348,00	34,00	$ 4.009.994,00
NP59	Suministro e instalación Rejilla Piso de 3"	UN	28,00	$ 16.133,00	$ 451.724,00	28,00	$ 451.724,00	28,00	$ 451.724,00
NP60	Suministro e instalación Yee PVC de 6" x 6" sanitaria	UN	0,00	$ 154.243,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP61	Suministro e instalación YEE PVC DE 4" Sanitaria	UN	0,00	$ 33.643,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP62	Suministro e instalación de registro Red White de 1/2" (incluye accesorios)	UN	0,00	$ 84.352,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP63	Sifón Piso Punto desague pvc ø 3" (sifón)	UN	29,00	$ 86.866,00	$ 2.519.114,00	18,00	$ 1.563.588,00	29,00	$ 2.519.114,00
NP64	Relleno con grava 1/2"	M3	0,74	$ 251.392,00	$ 186.030,08		$ -	0,74	$ 186.030,08
NP65	Cajas inspeccion 60 X 60cm (incluye base, angulo, cañuela y tapa con marco metalico)	UN	3,00	$ 554.947,00	$ 1.664.841,00		$ -	3,00	$ 1.664.841,00
NP66	Sondeo para estudio de suelos (Incluye perforación con equipo mecánico, Ensayo de determinación por lavado del material que pasa el tamiz No. 22, Determinación del límite líquido, del límite plástico y del índice de plasticidad de los suelos, Determinación de contenido de humedad)	ML	20,00	$ 587.360,00	$ 11.747.200,00		$ -	20,00	$ 11.747.200,00
NP67	Bordillo en ladrillo tolete para construcción de poyos (2 hiladas)	ML	449,67	$ 37.271,00	$ 16.759.650,57	22,44	$ 836.361,24	448,90	$ 16.730.951,90
NP68	Desmonte de estructura metálica de cubierta (cerchas)	ML	46,00	$ 34.856,00	$ 1.603.376,00		$ -	46,00	$ 1.603.376,00
NP69	Sello de juntas para dilatación de placa (Incluye cinta de poliuretano y sellador elástico con poliuretano)	ML	668,34	$ 49.168,00	$ 32.860.941,12		$ -	668,34	$ 32.860.941,12
NP70	Suministro e instalación de dilataciones plásticas para piso en baldosin granito	ML	270,00	$ 7.908,00	$ 2.135.160,00		$ -	121,40	$ 960.031,20
NP71	Visita y concepto técnicos (Incluye: planos, memorias de cálculo, modelación con programas especializados, firma de responsabilidad especialista y diagnóstico inicial)	UND	3,00	$ 2.500.000,00	$ 7.500.000,00		$ -	3,00	$ 7.500.000,00
NP72	Desmonte cerramiento en lamina ondulada de zinc h=3.00 m (incluye retiro de sobrantes)	ML	179,82	$ 5.120,00	$ 920.678,40	89,91	$ 460.339,20	179,82	$ 920.678,40
NP73	Desmonte cerramiento provisional hasta h=2.00 m en repisa y lona verde	ML	500,00	$ 5.120,00	$ 2.560.000,00		$ -	337,82	$ 1.729.638,40
NP74	Instalación de cerramiento provisional hasta h=2.00 m en repisa y lona verde con material de desmonte	ML	0,00	$ 1.405,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP75	Instalación de cerramiento en lamina ondulada de zinc h=3.048 m con material de desmonte	ML	89,91	$ 69.551,00	$ 6.253.330,41		$ -	89,91	$ 6.253.330,41
NP76	Desmonte de lamparas	UND	14,00	$ 12.592,00	$ 176.288,00		$ -	14,00	$ 176.288,00
NP77	Desmonte cubierta asbesto cemento (incluye retiro de sobrantes y trasiego)	M2	1771,06	$ 26.901,00	$ 47.643.285,06		$ -	1.771,06	$ 47.643.285,06
NP78	DESMONTE Y RETIRO DE CANAL METALICA EXISTENTE	ML	472,00	$ 19.689,00	$ 9.293.208,00		$ -	472,00	$ 9.293.208,00
NP79	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, soldadura, limpieza manual, retiro de piezas deterioradas, aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica)	ML	8244,42	$ 21.273,00	$ 175.383.546,66		$ -	8.244,42	$ 175.383.546,66
NP80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CANALETA DESARROLLO CALIBRE 26	ML	170,50	$ 95.967,00	$ 16.362.373,50		$ -	170,50	$ 16.362.373,50
NP81	Suministro e instalación Canal en lamina galvanizada calibre 18, desarrollo de 81 cms, incluye accesorios de fijación, soldadura, wash primer y anticorrosivo -no incluye andamios	ML	300,00	$ 146.145,00	$ 43.843.500,00	23,20	$ 3.390.564,00	300,00	$ 43.843.500,00
NP82	Suministro e instalación Flanche en lamina galvanizada calibre 26, DE 40 cms de ancho, incluyen dobleces, incluyen chazos expansivos de 1/4" x 1-1/2" y sikalex 1A, para instalación - No incluyen pinturas, No incluyen andamios	ML	64,00	$ 52.331,00	$ 3.349.184,00		$ -	64,00	$ 3.349.184,00
NP83	CUBIERTA EN TEJA DE 300 mm de ancho util CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye, instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	1598,45	$ 87.592,00	$ 140.011.432,40	45,90	$ 4.020.472,80	1.598,45	$ 140.011.432,40
NP84	Suministro e Instalación de Teja Traslucida Standing Seam a=0.50 m. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2	212,00	$ 168.677,00	$ 35.759.524,00		$ -	212,00	$ 35.759.524,00
NP85	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL CABLE 5/16 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ABSORBEDOR DE IMPACTO	ML	226,00	$ 113.342,00	$ 25.615.292,00		$ -	226,00	$ 25.615.292,00
NP86	Torre puente de andamio multidireccional de2,13X19,06 a 3 mts Base Plana (ALQUILER) TUNEL.	Dia	911,91	$ 308.760,00	$ 281.561.331,60	114,01	$ 35.201.727,60	851,46	$ 262.896.789,60
NP87	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE SOPORTE PARA LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA ROTHOBLAAS O SIMILAR, INCLUYE PERFORACIÓN, ANCLAJE EPÓXICO, VARILLA PARA ANCLAJE ADHESIVO, SOPORTE PARA LINEA DE VIDA (INICIAL Y/O INTERMEDIO), TUERCAS, ARANDELAS, PRUEBA CON DINAMOMETRO PARA CADA PERNO, SELLO DE FIJACIÓN CON CINTA ASFALTICA Y SIKA.	UND	26,00	$ 2.195.135,00	$ 57.073.510,00		$ -	26,00	$ 57.073.510,00
NP88	Suministro e instalacion de Tuberia IMC 2" incluye accesorios de instalación	UND	0,00	$ 117.626,00	$ -		$ -	0,00	$ -
NP89	Cable N.6 libre de halógeno (Suministro de instalación)	UND	209,58	$ 14.719,00	$ 3.084.808,02		$ -	0,00	$ -
NP90	Cable N.8 libre de halógeno (Suministro de instalación)	UND	1298,28	$ 11.306,00	$ 14.678.353,68		$ -	0,00	$ -
NP91	Tablero de automáticos de 12 circuitos. Tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntg-412t y barraje de tierra aislada	UND	9,00	$ 347.117,00	$ 3.124.053,00	1,00	$ 347.117,00	1,00	$ 347.117,00
NP92	Suministro e instalacion Breaker 3x30 industrial	UND	4,00	$ 239.580,00	$ 958.320,00	4,00	$ 958.320,00	4,00	$ 958.320,00
NP93	Suministro e Instalación de Salida Completa para Tomacorriente trifásico, en calibre 10 AWG (3F, N, T) y ducto EMT de 1" (Incluye aparato)	UND	4,00	$ 159.645,00	$ 638.580,00	4,00	$ 638.580,00	4,00	$ 638.580,00
NP94	Suministro e instalación bornas No. 6	UND	10,00	$ 64.176,00	$ 641.760,00		$ -	0,00	$ -
NP95	Suministro e instalación de marco y puerta en lámina cold rolled Cal. 18 Entamborada (0,7 X 2,11 M)	UND	1,00	$ 1.533.114,00	$ 1.533.114,00		$ -	0,00	$ -
NP96	Suministro e Instalación de rejilla de pisos de 40 x 40	UND	12,00	$ 396.952,00	$ 4.763.424,00	12,00	$ 4.763.424,00	12,00	$ 4.763.424,00
NP97	Suministro e instalación de vidrio laminado 3+3 en estructura de aluminio existente, incluye desmonte de carpintería para instalación de vidrio y reinstalación de las ventanas	M2	26,95	$ 410.079,00	$ 11.051.629,05		$ -	26,95	$ 11.051.629,05
NP98	Suministro e instalación Guaya entre 3/8" (con accesorios colgar lámpara)	ML	78,00	$ 24.408,00	$ 1.903.824,00		$ -	30,00	$ 732.240,00
NP99	Suministro e Instalación de enchapes lineales	ML	201,69	$ 23.961,00	$ 4.832.694,09	201,69	$ 4.832.694,09	201,69	$ 4.832.694,09
NP100	Maniobra de corte de alimentación para desconexión de red existente y conexión de acometida a tablero nuevo incluye la conexión y desconexion	UND	1,00	$ 542.468,00	$ 542.468,00		$ -	0,00	$ -
NP101	Suministro e instalación caja de paso 50x50	UND	10,00	$ 289.556,00	$ 2.895.560,00	1,00	$ 289.556,00	1,00	$ 289.556,00
NP102	Suministro e instalación de cable desnudo No. 14	ML	2205,01	$ 4.892,00	$ 10.786.908,92	757,50	$ 3.705.690,00	757,50	$ 3.705.690,00
NP103	Suministro e instalación de cable desnudo No. 6	ML	42,00	$ 16.289,00	$ 684.138,00	42,00	$ 684.138,00	42,00	$ 684.138,00
NP104	Suministro e instalación de cable desnudo No. 2	ML	0,00	$ 30.180,00	$ -		$ -	0,00	$ -

NP105	Suministro e Instalación de Cable desnudo Estructura No. 10	ML	133,51	$ 9.564,00	$ 1.276.889,64	61,65	$ 589.620,60	61,65	$ 589.620,60
NP106	Suministro e instalación de cofre metálico de doble fondo, con puerta abatible y chapa de seguridad, para distribución de parciales en baja tensión. Dimensiones: alto 0,80 m, ancho 0,60 m, fondo 0,30 m. Incluye barraje de cobre escalonado de 300 A, aisladores dieléctricos, terminales eléctricos y totalizador principal de 250 A, instalado y en funcionamiento conforme a RETIE.	M2	1,00	$ 4.018.919,00	$ 4.018.919,00		$ -	0,00	$ -
NP107	Suministro e instalacion de ventana fachada en aluminio con vidrio laminado 3+3 según diseño	M2	7,03	$ 889.859,00	$ 6.255.708,77		$ -	7,03	$ 6.255.708,77
NP108	Suministro e instalacion de superboard 6 mm una cara (Inc. Estructura de soporte)	ML	166,60	$ 45.199,00	$ 7.530.153,40	83,30	$ 3.765.076,70	166,60	$ 7.530.153,40
NP109	Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#4F + 1#4N +1#6T (libre de halogenos)	ML	42,00	$ 95.904,00	$ 4.027.968,00	42,00	$ 4.027.968,00	42,00	$ 4.027.968,00
NP110	Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#6F + 1#6N +1#8T (libre de halogenos)	ML	61,65	$ 67.453,00	$ 4.158.477,45	61,65	$ 4.158.477,45	61,65	$ 4.158.477,45
NP111	Luminaria panel Led incrustar 18w	UND	77,00	$ 30.368,00	$ 2.338.336,00		$ -	45,00	$ 1.366.560,00
NP112	Suministro e instalacion de Totalizador Breaker Industrial 100 Amperios	UND	0,00	$ 480.628,00	$ -		$ -	0,00	$ -

TOTALES DEL CONTRATO

TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I)		$ 2.489.964.031,00	$ 195.808.826,00	$ 2.240.600.247,00
AIU				
Administracion	**34,98168259%**	$ 871.031.314,00	$ 68.497.222,00	$ 783.799.666,00
Imprevistos	**1,00%**	$ 24.899.640,00	$ 1.958.088,00	$ 22.406.002,00
Utilidad	**4,00%**	$ 99.598.562,00	$ 7.832.353,00	$ 89.624.010,00
VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)		**$ 3.485.493.547,00**	**$ 274.096.489,00**	**$ 3.136.429.925,00**
IVA		$ -	$ -	$ -
RETENCIÓN A LIQUIDACIÓN				
VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA		**$ 3.485.493.547,00**	**$ 274.096.489,00**	**$ 3.136.429.925,00**

XI) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

FIRMA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ
Contratista: UNION TEMPORAL OBRAS CYZ

No Contrato de Obra: CO1.PCCNTR.7119721

Vº Bº INTERVENTORIA

DIRECTORA DE INTERVENTORIA: DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA
Contratista: CABA INTERVENTORIA S.A.S


No Contrato de Interventoría: CO1.PCCNTR.7162568

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568


CAPITULO	PRELIMINARES	ITEM	1.1.1	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cerramiento provisional hasta h=2.00 m en repisa y lona verde	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

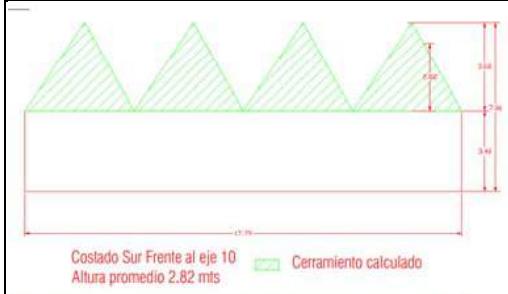











Localización	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Altura Promedio	Largo	Area		
Costado Sur Posterior al desmonte de Pasarela		2,82		9,00	25,38
Costado Oriental Posterior al desmonte de Pasarela		2,95		11,00	32,45
Costado Norte Posterior al desmonte de Pasarela		2,82		3,00	8,46
Subtotal					66,29
Vienen					
TOTAL					66,29

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	PRELIMINARES	ITEM	2.1.2	DESCRIPCIÓN	Relleno con material proveniente de la excavación	UNID	M3	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

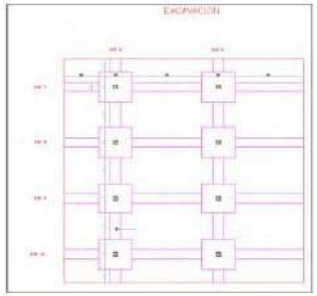



Localización	DIMENSIONES				No. Elementos	Medida Total
	Ancho	Largo	Altura	M3		
EJE 7 VIGAS	1,00	17,03	0,30	5,11	1,00	5,11
EJE 8 VIGAS	1,00	17,03	0,30	5,11	1,00	5,11
EJE 9 VIGAS	1,00	17,03	0,30	5,11	1,00	5,11
EJE 10 VIGAS	1,00	17,03	0,30	5,11	1,00	5,11
EJE Q VIGAS	1,00	11,19	0,30	3,36	1,00	3,36
EJE S VIGAS	1,00	11,19	0,30	3,36	1,00	3,36
EJE 7 ZAPATAS	3,20	3,20	0,30	3,07	1,00	3,07
EJE 8 ZAPATAS	3,20	3,20	0,30	3,07	1,00	3,07
EJE 9 ZAPATAS	3,20	3,20	0,30	3,07	1,00	3,07
EJE 10 ZAPATAS	3,20	3,20	0,30	3,07	1,00	3,07
Subtotal						39,44
Vienen						
TOTAL						39,44

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	Cargue de Material de Demolición	ITEM	2.1.7	DESCRIPCIÓN	Cargue de Material de Demolición	UNID	M3	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

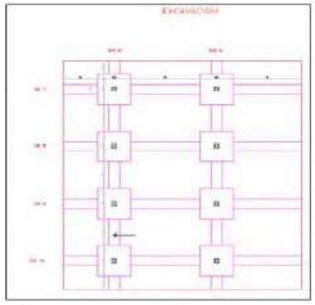

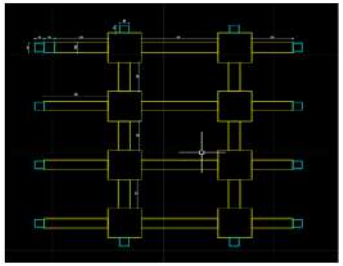



Localización	DIMENSIONES			Volumen	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto		
EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO TERRENO CON SUB BASE					
ETAPA 2					
AREA PLACA	22,50	22,00	0,10	49,50	49,50
Descuento Area Excavaciones Cimentacion					
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Vigas Eje 7	1,00	5,70	0,10	0,57	-0,57
	1,00	6,99	0,10	0,70	-0,70
	1,00	3,75	0,10	0,38	-0,38
Vigas Eje 8	1,00	5,70	0,10	0,57	-0,57
	1,00	6,99	0,10	0,70	-0,70
	1,00	3,75	0,10	0,38	-0,38
Vigas Eje 9	1,00	5,70	0,10	0,57	-0,57
	1,00	6,99	0,10	0,70	-0,70
	1,00	3,75	0,10	0,38	-0,38
Vigas Eje 10	1,00	5,70	0,10	0,57	-0,57
	1,00	6,99	0,10	0,70	-0,70
	1,00	3,75	0,10	0,38	-0,38
Vigas Eje M	1,00	9,00	0,10	0,90	-0,90
Vigas Eje O	1,00	9,00	0,10	0,90	-0,90
ETAPA 1					
AREA PLACA	21,07	22,24	0,10	46,86	46,86
Descuento Area Excavaciones Cimentacion					
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Vigas Eje 7	1,00	17,03	0,10	1,70	-1,70
Vigas Eje 8	1,00	17,03	0,10	1,70	-1,70
Vigas Eje 9	1,00	17,03	0,10	1,70	-1,70
Vigas Eje 10	1,00	17,03	0,10	1,70	-1,70
Vigas Eje Q	1,00	11,19	0,10	1,12	-1,12
Vigas Eje S	1,00	11,19	0,10	1,12	-1,12
Subtotal					63,56
Vienen					
TOTAL					63,56

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LIONETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	REFORZAMIENTO EN LA CIMENTACIÓN Y ANCLAJES EN LA ESTRUCTURAL Y SUPER ESTRUCTURA. (INCLUYE ANCLAJES EN:VIGAS DE CIMENTACIÓN Y AÈREAS,COLUMNAS, PANTALLAS,DADOS, ZAPATAS).	ITEM	4.3.6	DESCRIPCIÓN	Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 3/8" con Longitud de 9 cm de profundidad estandar. (Incluye: Perforacion en concreto con diámetro de 1/4 más del anclaje, limpieza y epóxico)	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN













Localización	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Ancho	Ancho	Altura		
EJE 7				9,00	9,00
EJE 7 - ANCLAJE SOBRE COLUMNAS 2 POR CARA				10,00	10,00
EJE 8				10,00	10,00
EJE 8 - ANCLAJE SOBRE COLUMNAS 2 POR CARA				8,00	8,00
EJE 9				14,00	14,00
EJE 9 - ANCLAJE SOBRE COLUMNAS 2 POR CARA				4,00	4,00
EJE 10				11,00	11,00
EJE 10 - ANCLAJE SOBRE COLUMNAS 2 POR CARA				12,00	12,00
Subtotal					78,00
Vienen					
TOTAL					78,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	REFORZAMIENTO EN LA CIMENTACIÒN Y ANCLAJES EN LA ESTRUCTURAL Y SUPER ESTRUCTURA. (INCLUYE ANCLAJES EN:VIGAS DE CIMENTACIÒN Y AÉREAS,COLUMNAS, PANTALLAS,DADOS, ZAPATAS).	ITEM	4.3.6	DESCRIPCIÓN	Anclaje para reforzamiento en concreto para D= 3/8" con Longitud de 9 cm de profundidad estandar. (Incluye: Perforacion en concreto con diámetro de 1/4 más del anclaje, limpieza y epóxico)	UNID	Und	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

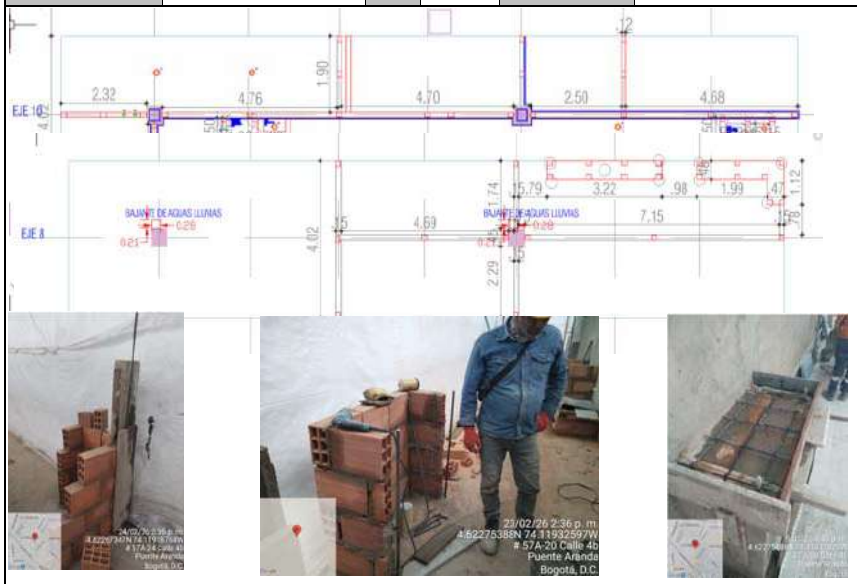

Localización	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Altura	No. Elementos	Medida Total
EJE 8					
EJE 8 - ANCLAJE PARA MUROS DE MESONES				9,00	9,00
EJE 10					
EJE 10 - ANCLAJE PARA MUROS DE MESONES				16,00	16,00
Subtotal					25,00
Vienen					
TOTAL					25,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ACERO DE REFUERZO Y MALLAS	ITEM	5.2.1	DESCRIPCIÓN	Acero de refuerzo 60000 psi (Columnas y Muros)	UNID	KG	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

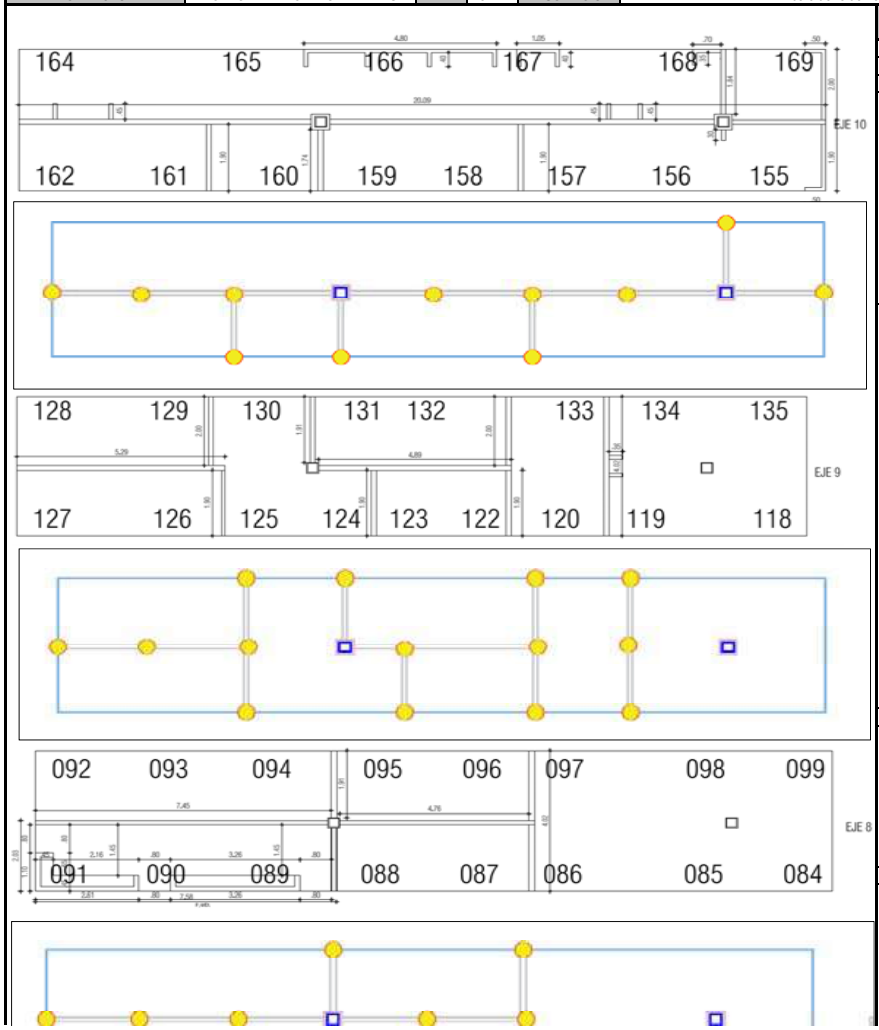


Localización		DIMENSIONES Cantidad	No. Varilla	Longitud	Peso (kg/m)	No Elem	Peso total
ETAPA 1							
LOCALES 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 169, 168, 167, 166, 165 Y 165. EJE 10	COLUMNETA	11,00	5,00	1,91	1,55		32,61
	COLUMNETA	4,00	5,00	1,35	1,55		8,38
	GRAFIL	4,00	6,00	2,35	0,10		0,94
	GRAFIL	4,00	6,00	1,98	0,10		0,79
	GRAFIL	4,00	6,00	4,67	0,10		1,87
	GRAFIL	4,00	4,00	1,77	0,10		0,71
	GRAFIL	4,00	6,00	9,42	0,10		3,77
	GRAFIL	4,00	4,00	1,93	0,10		0,77
	GRAFIL	4,00	6,00	2,29	0,10		0,92
	GRAFIL	4,00	6,00	2,11	0,10		0,84
	VIGAS	122,00	3,00	0,50	0,38		22,88
	VIGAS	2,00	5,00	26,38	1,55		81,76
MESONES LOCALES 168, 167, 166, 165 Y 164. EJE 10	COLUMNETA	2,00	5,00	0,70	1,55		2,17
	COLUMNETA	8,00	5,00	0,80	1,55		9,92
	MESON	4,00	4,00	0,41	0,99		1,63
	MESON	2,00	4,00	0,68	0,99		1,35
	MESON	2,00	4,00	1,18	0,99		2,35
	MESON	6,00	4,00	0,30	0,99		1,79
	MESON	4,00	4,00	0,80	0,99		3,18
	MESON	1,00	4,00	0,18	0,99		0,18
	MESON	8,00	4,00	0,35	0,99		2,78
	MESON	10,00	4,00	0,35	0,99		3,48
	MESON	4,00	4,00	0,97	0,99		3,86
	MESON	4,00	4,00	1,05	0,99		4,17
	GRAFIL	4,00	2,00	0,24	0,10		0,10
	GRAFIL	2,00	2,00	0,60	0,10		0,12
	GRAFIL	4,00	2,00	0,20	0,10		0,08
	GRAFIL	10,00	2,00	0,24	0,10		0,24
	GRAFIL	4,00	2,00	0,97	0,10		0,39
	GRAFIL	4,00	2,00	1,05	0,10		0,42
	GRAFIL	6,00	2,00	0,30	0,10		0,18
	GRAFIL	6,00	2,00	0,53	0,10		0,32
	GRAFIL	6,00	2,00	0,30	0,10		0,18
	GRAFIL	2,00	2,00	0,60	0,10		0,12
	GRAFIL	2,00	2,00	0,70	0,10		0,14
					Total eje 10		195,39
LOCALES 134, 119, 132, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 129 Y 128, EJE 9	COLUMNETA	15,00	5,00	1,35	1,55		31,39
	GRAFIL	4,00	4,00	4,66	0,10		1,86
	GRAFIL	4,00	4,00	1,74	0,10		0,70
	GRAFIL	4,00	4,00	4,60	0,10		1,84
	GRAFIL	4,00	4,00	1,91	0,10		0,76
	GRAFIL	4,00	4,00	3,95	0,10		1,58
	GRAFIL	4,00	4,00	0,95	0,10		0,38
	GRAFIL	4,00	4,00	3,38	0,10		1,35
					Total eje 9		39,86
LOCALES 080, 086, 097, 096, 095, 094, 093, 092.	COLUMNETA	3,00	5,00	1,91	1,55		8,88
	COLUMNETA	7,00	5,00	1,35	1,55		14,65
	GRAFIL	2,00	4,00	7,13	0,10		1,43
	GRAFIL	2,00	4,00	1,78	0,10		0,36
	GRAFIL	2,00	4,00	1,73	0,10		0,35
	GRAFIL	2,00	4,00	4,62	0,10		0,92
	GRAFIL	2,00	4,00	3,99	0,10		0,80
	GRAFIL	2,00	4,00	1,05	0,10		0,21





EJE 7







EJE 8	GRAFIL	2,00	6,00	0,35	0,10		0,07
	GRAFIL	2,00	6,00	2,25	0,10		0,45
	GRAFIL	2,00	6,00	0,43	0,10		0,09
	GRAFIL	2,00	6,00	3,02	0,10		0,60
	VIGAS	37,00	3,00	0,50	0,38		6,94
	VIGAS	2,00	5,00	7,30	1,55		22,63
MESONES LOCALES 091, 090, 092 Y 093 EJE 8	MESON	2,00	4,00	1,12	0,99		2,23
	MESON	2,00	4,00	2,46	0,99		4,89
	MESON	10,00	4,00	0,48	0,99		4,77
	MESON	3,00	4,00	1,12	0,99		3,34
	MESON	12,00	5,00	0,80	1,55		14,88
	MESON	4,00	4,00	2,82	0,10		1,13
	MESON	12,00	4,00	0,28	0,10		0,34
	MESON	2,00	4,00	2,16	0,10		0,43
	MESON	2,00	4,00	1,69	0,10		0,34
	MESON	2,00	4,00	0,27	0,10		0,05
					Total eje 8		90,78
LOCALES 065, 064, 051, 063, 062, 061, 055, 060 EJE 7	COLUMNETA	9,00	5,00	1,35	1,55		18,83
	GRAFIL	6,00	4,00	3,74	0,10		2,24
	GRAFIL	2,00	4,00	2,37	0,10		0,47
	GRAFIL	2,00	4,00	1,71	0,10		0,34
	GRAFIL	2,00	4,00	6,87	0,10		1,37
	GRAFIL	2,00	4,00	2,36	0,10		0,47
	GRAFIL	2,00	4,00	1,66	0,10		0,33
	GRAFIL	2,00	4,00	9,22	0,10		1,84
					Total eje 7		25,89
CUARTO ELECTRICO	COLUMNETA	3,00	5,00	2,53	1,55		11,76
	GRAFIL	4,00	6,00	1,77	0,10		0,71
	GRAFIL	4,00	6,00	1,38	0,10		0,55
	GRAFIL	4,00	2,00	1,82	0,10		0,73
	Vigas	29,00	3,00	0,50	0,38		5,44
	Vigas	2,00	5,00	5,87	1,55		18,20
					Total Cuarto Eléctrico		37,39
Subtotal							389,31
Vienen							
TOTAL							389,31

OBSERVACION: AL DETERMINAR LAS LONGITUDES DE LAS VARILLAS EN EL CASO DEL GRAFIL SE DESCONTÓ LA SECCIÓN VISTA EN PLANTA DE LA SECCIÓN DE LA COLUMNETA SEGÚN LAS DIMENSIONES DE CADA EJE.

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND


Residente de Interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568


CAPITULO	ACABADOS DE PISOS	ITEM	9.1.1	DESCRIPCIÓN	Alistado de pisos e= 0.05 m, en mortero 1:3	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN









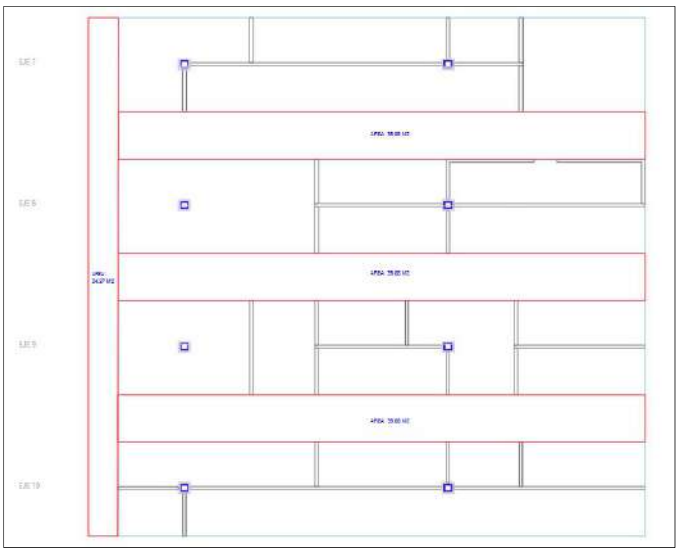





Localización	DIMENSIONES Ancho	Ancho	Area sobre planos	No. Elementos	Medida Total
EJE # 7					
Local 1			14,54	1,00	14,54
Local 2			14,00	1,00	14,00
Local 3			5,01	1,00	5,01
Local 4			18,70	1,00	18,70
Local 5			24,78	1,00	24,78
EJE # 8					
Local 1			30,19	1,00	30,19
Local 2			9,13	1,00	9,13
Local 3			12,70	1,00	12,70
Local 4			14,82	1,00	14,82
Local 5			9,62	1,00	9,62
EJE # 9					
Local 1			20,24	1,00	20,24
Local 2			9,52	1,00	9,52
Local 3			6,26	1,00	6,26
Local 4			12,76	1,00	12,76
Local 5			9,22	1,00	9,22
Local 6			9,71	1,00	9,71
Local 7			9,67	1,00	9,67
EJE # 10					
Local 1			14,19	1,00	14,19
Local 2			9,19	1,00	9,19
Local 3			5,01	1,00	5,01
Local 4			8,86	1,00	8,86
Local 5			32,85	1,00	32,85
Local 6			4,93	1,00	4,93
CIRCULACION ENTRE EJE 7 Y 8			39,88	1,00	39,88
CIRCULACION ENTRE EJE 8 Y 9			39,88	1,00	39,88
CIRCULACION ENTRE EJE 9 Y 10			39,88	1,00	39,88
CIRCULACION ENTRE ETAPAS			24,97	1,00	24,97
Subtotal					450,51
Vienen					
TOTAL					450,51

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	PISOS: (Inc. Alistado, Afinados,Media cañas y acabados)	ITEM	9.2.4	DESCRIPCIÓN	Piso Tipo 1 Baldosa Granito 40 X 40 Similar al existente.	UNID	M²	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

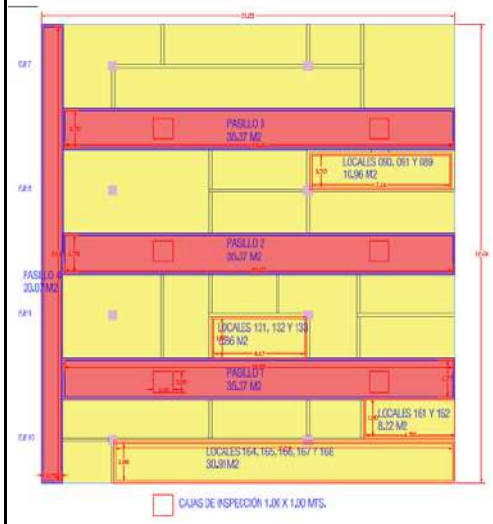





Localización	DIMENSIONES Ancho	Largo	Area	No Elem	Medida Total
LOCALES 164, 165, 166, 167 Y 168 EJE 10	1,80	17,22	30,91	1,00	30,91
LOCALES 161 Y 162 EJE 9	1,80	4,58	8,22	1,00	8,22
LOCALES 131, 132, Y 133. EJE 8	1,90	4,68	8,86	1,00	8,86
LOCALES 090, 091, Y 089. EJE 7	1,55	7,10	10,96	1,00	10,96
PASILLO 1	1,77	19,89	35,21	1,00	35,21
PASILLO 2	1,77	19,89	35,21	1,00	35,21
PASILLO 3	1,77	19,89	35,21	1,00	35,21
PASILLO 4	0,92	21,81	20,07	1,00	20,07
			SUBTOTAL PISOS		184,65
DESCUENTO AREA CAJAS DE INSPECCION	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00
REJILLAS DE SIFONES	0,34	0,34	0,11	6,00	0,66
			TOTAL DESCUENTO		5,66
Subtotal					178,99
Vienen					
TOTAL					178,99

OBSERVACION: En las dimensiones tomadas en campo se descontaron las medidas de la media caña, cuyo espesor es de 10 cms a excepción de las cajas de inspección. Estas cajas serán para cobrar una vez se hayan enchapado estas superficies.

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568


CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	ITEM	11,1,1	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación estuco sobre pañete para muros y/o techos	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

EJE 10






EJE 9





Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ETAPA 1					
EJE 10					
MURO DIVISORIO LOCAL 160-161	0,12	2,25	0,27	1,00	0,27
LATERAL LOCAL 160 ZONA SUPERIOR ENCHAPE	1,90	0,90	1,71	1,00	1,71
POSTERIOR LOCAL 160	2,50	0,90	2,25	1,00	2,25
ZONA COLUMNA	0,16	0,90	0,14	1,00	0,14
	0,17	0,90	0,15	1,00	0,15
FRONTAL DIVISORIO 160-159	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
LATERAL IZQUIERDO 159	1,74	1,35	2,35	1,00	2,35
ZONA COLUMNA	0,17	2,25	0,38	1,00	0,38
	0,16	2,25	0,36	1,00	0,36
ZONA COLUMNA SOBRE MURO	0,79	2,30	1,82	1,00	1,82
POSTERIOR LOCALES 159 Y 158	4,70	2,25	10,58	1,00	10,58
LATERAL DERECHO LOCAL 158	1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
FRONTAL DIVISORIO 158.157	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
ZONA COLUMNA SOBRE MURO	0,79	2,30	1,82	1,00	1,82
BORDE SUPERIOR LOCALES 157 Y 158	0,12	1,90	0,23	1,00	0,23
BORDE SUPERIOR LOCALES 160 Y 159	0,12	1,90	0,23	1,00	0,23
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
EJE 9					0,00
POLIGONO LOCALES 128 129 130 127 126 Y 125					0,00
LADO 1	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
LADO 2	4,87	1,35	6,57	1,00	6,57
LADO 3	2,00	1,35	2,70	1,00	2,70
LADO 4	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
LADO 5	2,00	1,35	2,70	1,00	2,70
LADO 6	0,30	1,35	0,41	1,00	0,41






EJE 8





LADO 7	2,03	1,35	2,74	1,00	2,74
LADO 8	0,09	1,35	0,12	1,00	0,12
LADO 9	1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
LADO 10	5,20	1,35	7,02	1,00	7,02
BORDE SUPERIOR	5,29	0,12	0,63	1,00	0,63
BORSE SUPERIOR	1,90	0,09	0,17	1,00	0,17
	2,00	0,12	0,24	1,00	0,24
DIVISORIO 130 - 131	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
	1,84	1,35	2,48	1,00	2,48
SUPERIOR	1,84	0,12	0,22	1,00	0,22
	0,17	1,35	0,23	1,00	0,23
ZONA COLUMNA	0,45	4,55	2,05	1,00	2,05
	0,45	3,20	1,44	1,00	1,44
	0,45	3,20	1,44	1,00	1,44
	0,45	3,20	1,44	1,00	1,44
LATERAL 123	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
	1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
SUPEROOR	1,90	0,12	0,23	1,00	0,23
	3,30	1,35	4,46	1,00	4,46
LATERAL 122	1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
	1,90	0,12	0,23	1,00	0,23
SUPERIOR POSTERIOR	4,70	0,12	0,56	1,00	0,56
LATERALES 120 Y 133	4,02	1,35	5,43	2,00	10,86
SUPERIORES	4,02	0,12	0,48	2,00	0,96
FRONTALES	0,12	1,35	0,16	4,00	0,64
					0,00
EJE 8					0,00
LATERAL LOCAL 092	0,13	2,25	0,29	1,00	0,29
SUPEROR POSTERIOR LOCALES 092 093 094	7,30	0,12	0,88	1,00	0,88
POSTERIOR LOCALES 092 093 094	7,30	2,25	16,43	1,00	16,43
ZONA COLUMNA	0,16	2,25	0,36	1,00	0,36
	0,45	2,20	0,99	1,00	0,99
	0,15	1,35	0,20	1,00	0,20
	0,45	3,20	1,44	1,00	1,44
DIVISORIO LOCAL 094-095	1,84	1,35	2,48	1,00	2,48
SUPERIOR DIVISORIO LOCAL 094-095	1,84	0,12	0,22	1,00	0,22
FRONTAL	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
DIVISORIO LOCAL 095-094	1,58	1,35	2,13	1,00	2,13
RECUBRIMIENTO BAJANTE	0,27	1,35	0,36	1,00	0,36
	0,43	1,35	0,58	1,00	0,58
ZONA COLUMNA	0,45	3,20	1,44	1,00	1,44
POSTERIOR 095 096	4,57	1,35	6,17	1,00	6,17
SUPERIOR POSTERIOR 095 096	4,57	0,12	0,55	1,00	0,55
DIVISORIO 096-097	2,00	1,35	2,70	1,00	2,70
SUPERIOR DIVISORIO 096-097	2,00	0,12	0,24	1,00	0,24
FRONTAL	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
FRONTAL DIVISORIO 086 - 087	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
DIVISORIO087-086	1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
SUPERIOR DIVISORIO087-086	1,90	0,12	0,23	1,00	0,23
POSTERIOR 087 - 088	4,68	1,35	6,32	1,00	6,32
ZONA COLUMNA	0,16	1,35	0,22	1,00	0,22
	0,17	1,35	0,23	1,00	0,23
	0,45	3,20	1,44	1,00	1,44
SUPERIOR LATERAL 088-089	1,74	0,12	0,21	1,00	0,21
LATERAL 088-089	1,74	1,35	2,35	1,00	2,35
FRONTAL	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
					0,00
					0,00
EJE 7					0,00
					0,00
FRONTALES LOCAL 055	0,12	1,35	0,16	2,00	0,32
LATERAL IZQUIERDO 055	1,92	1,35	2,59	1,00	2,59
POSTERIOR 055	2,48	1,35	3,35	1,00	3,35
ZONA COLUMNA	0,16	1,35	0,22	1,00	0,22







SUPERIOR POSTERIOR 055	2,48	0,12	0,30	1,00	0,30
	0,45	3,2	1,44	1,00	1,44
ZONA COLUMNA	0,15	1,35	0,20	1,00	0,20
	0,45	3,2	1,44	1,00	1,44
LATERAL DERECHO 055	1,76	1,35	2,38	1,00	2,38
LATERAL IZQUIERDO 054	1,76	1,35	2,38	1,00	2,38
ZONA COLUMNA	0,15	1,35	0,20	1,00	0,20
POSTERIOR 054 053 052	7,18	1,35	9,69	1,00	9,69
LATERAL DERECHO 052	1,92	1,35	2,59	1,00	2,59
FRONTAL 052	0,12	1,35	0,16	1,00	0,16
SUPERIOR DIVISORIO 056-055	0,12	1,92	0,23	1,00	0,23
SUPERIOR DIVISORIO 055-054	0,12	1,92	0,23	1,00	0,23
SUPEROR POSTERIOR 054-053-052-051	0,12	9,58	1,15	1,00	1,15
LATERAL 064	1,81	1,35	2,44	1,00	2,44
SUPERIOR LATERAL 064	1,81	0,12	0,22	1,00	0,22
LATERAL 060	1,97	1,35	2,66	1,00	2,66
SUPERIOR LATERAL 060	1,97	0,12	0,24	1,00	0,24
					0,00
					0,00
					0,00
CUARTO ELECTRICO					0,00
LATERAL	1,93	2,33	4,50	2,00	8,99
FRENTE	2,18	2,33	5,08	2,00	10,16
LATERAL	1,93	2,33	4,50	2,00	8,99
					0,00
DESCUENTOS VANO DE PUERTA	0,70	2,10	1,47	2,00	2,94
					0,00
FILOS PUERTA	4,90	0,12	0,59	1,00	0,59
Subtotal					201,84
Vienen					
TOTAL					201,84

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	GENERALES: (Aseo ,Montajes)	ITEM	19.1.1	DESCRIPCIÓN	Aseo y limpieza general obra	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

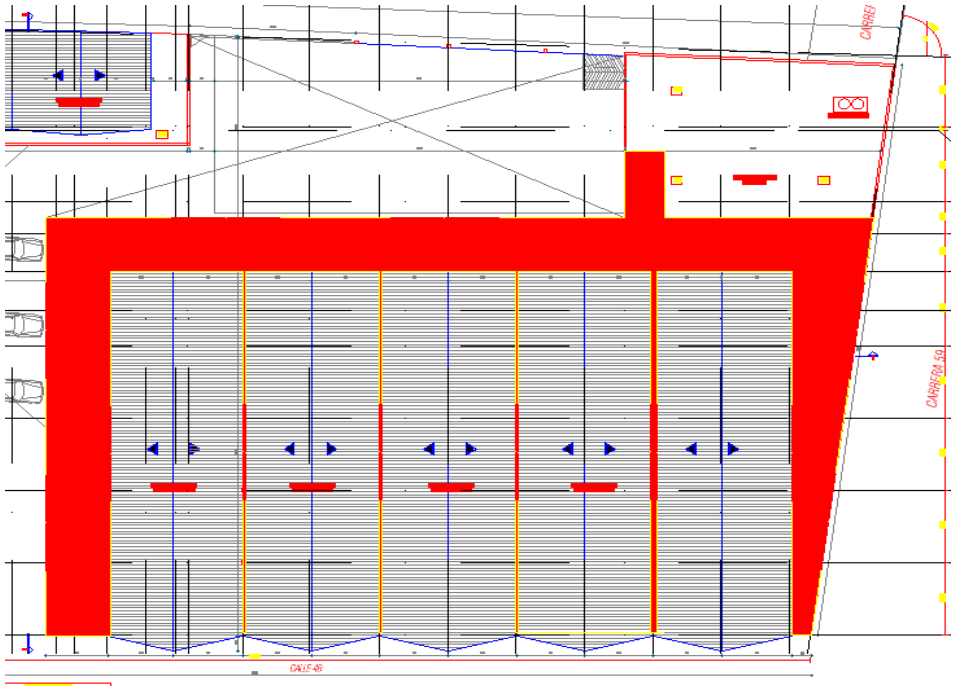

Localización	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Altura	Largo	Area		
ASEO GENERAL CUBIERTA PLANA AREA OBJETO DE INTERVENCION			560,35	1,00	560,35
Area tomado según planimetria					
Subtotal					560,35
Vienen					
TOTAL					560,35

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Residente de Interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2025	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	20	ITEM	20.1.6	DESCRIPCIÓN	Demolición meson corrido (incluye retiro de sobrantes)	ML	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD



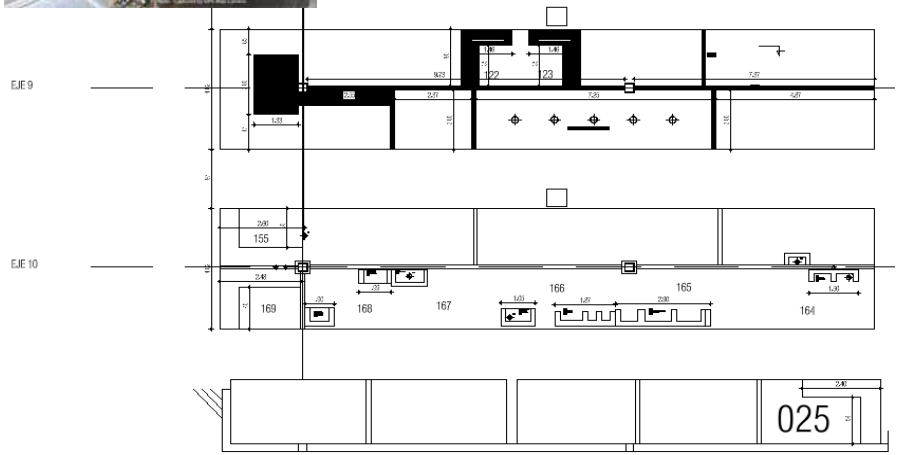

Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
LOCAL 025 PARA TRASLADO DE PESCADOS PEDRO CARREÑO	2,40			1,00	2,40
	1,54			1,00	1,54
DEMOLICION MESONES PEDRO CARREÑO LOCALES 168 167 166 165 Y 164	1,50			1,00	1,50
	2,90			1,00	2,90
	1,87			1,00	1,87
	1,05			1,00	1,05
	0,99			1,00	0,99
	0,90			1,00	0,90
LOCAL 169	2,48			1,00	2,48
	1,40			1,00	1,40
LOCAL 155	2,60			1,00	2,60
	1,30			1,00	1,30
LOCAL 123 122	0,90			1,00	0,90
LOCALES 090 091	0,90			1,00	0,90
Subtotal					22,73
Vienen					
TOTAL					22,73

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2025	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	20	ITEM	20,1,16	DESCRIPCIÓN	Desmonte salida electrica	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

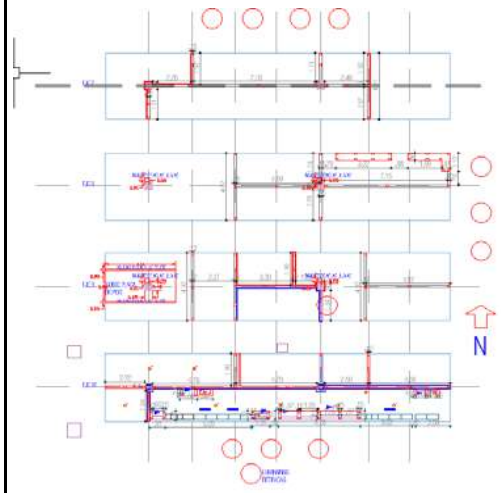





Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
Costado Sur Desarme pasarela				4,00	4,00
Costado Oriental Desarme Pasarela				3,00	3,00
Costado Norte Desarme Pasarela				3,00	3,00
Subtotal					10,00
Vienen					
TOTAL					10,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ADECUACIONES LOCALES (ITEM CANASTA DE PRECIOS IPES INDEX 2024)	ITEM	20,1,17	DESCRIPCIÓN	Desmonte, traslado y re instalación de locales en carpinterias metálicas, mallas eslabonadas y ventanerias, incluye corte, traslado, soldaduras, y demas elementos para su correcto funcionamiento	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN



















Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
LAS CANTIDADES Y MEDIDAS SE SOPORTA POR MEDIO DEL ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS					
1	1,05	1,05	1,10	0,00	0,00
2	1,23	0,76	0,93	0,00	0,00
3	1,20	0,86	1,03	1,00	1,03
4	2,65	1,25	3,31	2,00	6,63
5	2,75	0,10	0,28	2,00	0,55
6	37,23	0,10	3,72	2,00	7,45
7	1,90	1,07	2,03	1,00	2,03
8	1,90	1,07	2,03	1,00	2,03
9	1,26	1,92	2,42	1,00	2,42
10	2,00	2,00	4,00	2,00	8,00
11	2,00	2,00	4,00	1,00	4,00
12	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00
13	1,50	1,10	1,65	0,00	0,00
14	1,90	0,05	0,10	1,00	0,10
15	1,90	0,55	1,05	1,00	1,05
16	2,00	0,55	1,10	2,00	2,20
17	2,60	0,35	0,91	1,00	0,91
18	1,60	1,10	1,76	1,00	1,76
19	2,33	0,55	1,28	1,00	1,28
20	1,78	0,54	0,96	1,00	0,96
21	2,30	0,54	1,24	1,00	1,24
22	1,53	0,53	0,81	1,00	0,81
23	1,76	0,55	0,97	1,00	0,97
24	2,00	0,40	0,80	1,00	0,80
25	6,25	0,05	0,31	1,00	0,31
26	0,80	1,10	0,88	1,00	0,88
27	1,55	0,55	0,85	1,00	0,85
28	0,80	1,10	0,88	1,00	0,88
29	5,76	0,05	0,29	1,00	0,29
30	2,20	2,00	4,40	0,00	0,00
31	2,00	3,75	7,50	1,00	7,50
32	5,00	2,10	10,50	1,00	10,50
33	5,00	2,10	10,50	0,00	0,00
34	3,30	0,05	0,17	4,00	0,66






Tema: Contrato No. CO1.PCCNTR.7119721, "Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste las obras de reforzamiento estructural etapas 1 y 2 de la Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán del Instituto Para La Economía Social".

Lugar: Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán	**Fecha: 05 /12/2025**	**Hora inicial: 10:43 a.m.** **Hora Final:**

Objetivo: Realizar entrega de elementos desmontados de los locales y/o puestos correspondientes a la Etapa 1, a la Administración de la PDM Trinidad Galán.

Relación de elementos entregados:

Localización	DIMENSIONES			Elemento	Medida Total	Registro Fotográfico
	Largo	Alto	Ancho			
	1.05	1.05	0.65	Mesa metálica Local 156-155	0.72 m³	
	1.23	0.76	0.36	Estantería metálica Local 156-155	0.34 m³	

Relación de elementos entregados:

Localización	DIMENSIONES			Elemento	Medida Total	Registro Fotográfico
	Largo	Alto	Ancho			
	1.20	0.86		Ventana corrediza con malla Local 155 y 156	1.032 m²	
		2.65	1.25	2 rejas con malla eslabonada Nota: estos elementos fueron entregados en la etapa 2 a la administración.	6.63 m²	

Carrera 9 N° 10-59
PBX. 6014841930
Línea Gratuita
018000517621
www.ipes.gov.co

	2.75			2 ángulos de estructura Nota: estos elementos fueron entregados en la etapa 2 a la administración.	5.4 ml	

Relación de elementos entregados:

Localización	DIMENSIONES			Elemento	Medida Total	Registro Fotográfico
	Largo	Alto	Ancho			
	37.23			Estructura metálica blanca Locales 130, 131, 132	37.23 ml	
	1.90	1.07		Ventana / Vitrina Surti Carnes Choconta con dos apoyos de 1.22 cada uno Locales 130, 131, 132	2.033 m^2	
	1.90	1.07		Ventana / Vitrina Surti Carnes Choconta sin apoyos Locales 130, 131, 132	2.033 m^2	

	1.26	1.92		Estiba en madera Locales 130, 131, 132	2.43 m²	

Nota aclaratoria
Los siguientes elementos fueron entregados a la Administración correspondientes al local 146, 179, 177, sin embargo continúan en la zona, razón por la cual se relacionan:

Localización	DIMENSIONES			Elemento	Medida Total	Registro Fotográfico
	Largo	Alto	Ancho			
		2	2	2 puerta ventana corrediza sin perfil de corredera / Delipollos y presas	8 m²	
		2	2	1 puerta ventana corrediza con perfil de corredera / Delipollos y presas	4 m²	
		1	2	Marco con espacio para puerta	2 m²	

Carrera 9 N° 10-59
PBX. 6014841930
Línea Gratuita
018000517621
www.ipes.gov.co

Relación de elementos entregados:

Localización	DIMENSIONES			Elemento	Medida Total	Registro Fotográfico
	Largo	Alto	Ancho			
	1.50	1.10	0.35	Vitrina en aluminio con vidrio Locales 166, 167	2.00 m^3	
	1.9			Ángulos metálicos Locales 155 y 156	1.9 ml	

Relación de elementos entregados:

Localización	DIMENSIONES			Elemento	Medida Total	Registro Fotográfico
	Largo	Alto	Ancho			
	1.90		0.55	Mesón con platero en acero inoxidable Locales 169	1.045 m²	
	2.00		0.55	2 mesones sin platero en acero inoxidable Locales 155 y 156	2.20 m²	
	2.60		0.35	Lamina de recubrimiento de mesón en acero inoxidable Locales 155 y 156	0.91 m²	

Relación de elementos entregados:

Localización	DIMENSIONES			Elemento	Medida Total	Registro Fotográfico
	Largo	Alto	Ancho			
		1.60	1.10	Lamina de policarbonato con estructura Local 090 y 091	1.76 m²	
		2.33	0.55	Lámina de policarbonato Local 090 y 091	1,29 m²	

		1.78	0.54	Lamina de policarbonato Local 090 y 091	0,96 m²	
		2.30	0.54	Lamina de policarbonato con estructura Local 090 y 091	1.42 m²	
		1.53	0.53	Lamina de policarbonato con estructura Local 090 y 091	0.81 m²	
		1.76	0.55	Lamina de policarbonato con estructura Local 090 y 091	0.97 m²	

		2.00	0.40	Lamina de policarbonato con estructura Local 090 y 091	0.8 m²	
	6.25			Perfiles Local 090 y 091	6.25 ml	
		0.8	1.1	Lamina de policarbonato con estructura Local 090 y 091	0.88 m²	

Carrera 9 N° 10-59
PBX. 6014841930
Línea Gratuita
018000517621
www.ipes.gov.co

		1.55	0.55	Lamina de policarbonato Local 090 y 091	0.85 m²	
		0.8	1.1	Lamina de policarbonato Local 090 y 091	0.88 m²	
	5.76			Perfil Local 090 y 091	5.76 ml	

	2.20	2.00	0.53	Vitrina Local 166 y 167	0.35 m³	
		2.00	3.75	2 Estructuras de policarbonato Local 091 y 090	7.50 m²	
		5.00	2.10	Estructura de policarbonato Local 091 y 090	10.10 m²	

		5.00	2.10	Policarbonato azul Local 091 y 090	10.10 m²	
		3.30		4 Soportes de báscula Uno local 050 y tres del local 060, 059, 058	4 Und	

Relación de elementos entregados:

Medidores de agua	
	Local

	Local
	Local
	Local 162 y 161
	Local

	Local
	Local
	Local

	Local 066, 084, 085, 086
	Local 066, 084, 085, 086
	6 iluminarias de la zona: Etapa 1.
	Local 156, 155

Carrera 9 N° 10-59
PBX. 6014841930
Línea Gratuita
018000517621
www.ipes.gov.co

 	Lamina de madera y postes rectangulares en madera. Locales 051, 050, 065.
	Lamina de madera y postes rectangulares en madera. Locales 058, 059, 060.



Mediante esta acta se deja constancia que se le informo a la Administración de la Plaza lo siguiente:

1. Cada uno de los elementos se encuentran relacionados mediante actas de vecindad, por lo tanto, en relación al contrato de obra clausula número *13. "Garantizar que las áreas intervenidas para el desarrollo de las obras, se han entregadas como mínimo en condiciones similares a las que se encontraron antes de su intervención, o en su defecto dejarlas en mejores condiciones, procurando que los acabados y funcionalidad de las estructuras, redes húmedas y secas y/o elementos queden en óptimas condiciones. Esta acción se soporta con el levantamiento de actas de vecindad al inicio de la intervención y al final de la misma"*, dichas actividades serán acordadas con la Entidad y previo a contar con el aval de la Interventoría.

2. El siguiente proceso conto con la presencia de los representantes de la entidad, interventoría y Contratista como consta en el registro de asistencia y firma del acta.

3. Cabe aclarar que el Contratista no tiene responsabilidad sobre el uso o disposición final de estos elementos, limitándose únicamente a su entrega conforme a lo solicitado por la Administración de la Plaza.

Conclusiones:

1. A partir de este momento, dichos elementos quedan bajo la custodia, responsabilidad y disposición de la Administración de la Plaza, quien podrá decidir su uso final de acuerdo con sus necesidades o lineamientos internos.
2. Se firma la presente acta para conocimiento de las partes.

Decisiones	Responsables	Fechas

Carrera 9 N° 10-59
PBX. 6014841930
Línea Gratuita
018000517621
www.ipes.gov.co

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Natalia Pinto	IPES - SESEC	Pdmtransitualidad@ipes.gov.co	3027439295	N Pinto
Maria Torres	UT Obras C y C	pro.social.construcciones.cyc@gmail.com	3193588965	
Daira Correa	CABA Interventoria	interventoria.ipes@cicaingenieria.com	3107649589	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			

Carrera 9 N° 10-59
PBX. 6014841930
Línea Gratuita
018000517621
www.ipes.gov.co


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	20	ITEM	20.1.19	DESCRIPCIÓN	Filos y dilataciones en pañete	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD


EJE 10








EJE 9




Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo Horizontal	Largo Vertical	Largo Total		
ETAPA 1					
EJE 10					
MURO DIVISORIO LOCALES LONGITUDINAL	20,09	2,25	22,34	2,00	44,68
DESCUENTO COLUMNAS	0,45	0,00	0,45	-2,00	-0,90
MURO DIVISORIO LOCALES 168 Y 169	1,84	2,25	4,09	2,00	8,18
MURO DIVISORIO LOCALES 160 Y 161	1,90	2,25	4,15	2,00	8,30
MURO DIVISORIO LOCALES 160 Y 159	1,90	1,35	3,25	2,00	6,50
MURO DIVISORIO LOCALES 158 Y 157	1,74	1,35	3,09	2,00	6,18
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155 AL 156		0,85	0,85	2,00	1,70
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155		0,85	0,85	2,00	1,70
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155 FILO		0,85	0,85	1,00	0,85
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 169		0,85	0,85	2,00	1,70
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 169 FILO		0,85	0,85	1,00	0,85
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 164 AL 168		0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	2,00	1,80
EJE 9					
MURO DIVISORIO LOCALES 128Y129 - 126Y127 LONGITUDINAL	5,29	1,35	6,64	2,00	13,28
FILO		1,35	1,35	1,00	1,35
MURO DIVISORIO LOCALES 129 Y 130	2,00	1,35	3,35	2,00	6,70
MURO DIVISORIO LOCALES 125 Y 126	1,90	1,35	3,25	2,00	6,50




EJE 8



EJE 7



MURO DIVISORIO LOCALES 131Y132 - 122 123 Y124 LONGITUDINAL	4,89	1,35	6,24	2,00	12,48
MURO ADICION TABLERO	0,45	0,90	1,35	2,00	2,70
MURO DIVISORIO LOCALES 130 Y 131	1,91	1,35	3,26	2,00	6,52
MURO DIVISORIO LOCALES 132 Y 133	2,00	1,35	3,35	2,00	6,70
MURO DIVISORIO LOCALES 124 Y 123	1,90	1,35	3,25	2,00	6,50
MURO DIVISORIO LOCALES 120 Y 122	1,90	1,35	3,25	2,00	6,50
MURO DIVISORIO LOCALES 133Y120 - 119Y134 TRANSVERSAL	4,02	1,35	5,37	2,00	10,74
MURETE PARA POCETA 119		0,85	0,85	2,00	1,70
MURETE PARA POCETA 134		0,85	0,85	2,00	1,70
			0,00		
EJE 8					
MURO DIVISORIO LOCALES LONGITUDINAL 089 090 091	7,45	2,25	9,70	2,00	19,40
MOCHETA MESON 1		0,85	0,85	2,00	1,70
LATERAL MESON 1		0,85	0,85	1,00	0,85
MOCHETA MESON 1		0,85	0,85	2,00	1,70
FRONTAL MESON 1		0,85	0,85	2,00	1,70
MOCHETA MESON 2		0,85	0,85	2,00	1,70
LATERAL MESON 2		0,85	0,85	1,00	0,85
MOCHETA MESON 2		0,85	0,85	2,00	1,70
FRONTAL MESON 2		0,85	0,85	2,00	1,70
MURO DIVISORIO LOCALES 088 Y 089	1,84	1,35	3,19	2,00	6,38
MURO DIVISORIO LOCALES 094 Y 095	1,84	1,35	3,19	2,00	6,38
MURO DIVISORIO LOCALES 088-087 Y 095-096	4,76		4,76	2,00	9,52
MURO DIVISORIO LOCALES 087-096 Y 086-097	4,02	1,35	5,37	2,00	10,74
		1,35	1,35	2,00	2,70
EJE 7					
MURO DIVISORIO LOCALES 056Y059 - 055Y060	4,01	1,35	5,36	2,00	10,72
MURO DIVISORIO LOCALES 055 - 060	2,56		2,56	2,00	5,12
MURO LONGITUDINAL 054,053,052,051 Y 061,062,063,064	9,73		9,73	2,00	19,46
MURO DIVISORIO LOCALES 065 - 064	1,88	1,35	3,23	2,00	6,46
MURO DIVISORIO LOCALES 051 - 052	1,92	1,35	3,27	2,00	6,54
MURO DIVISORIO LOCALES 054 - 055	1,83	1,35	3,18	2,00	6,36
CUARTO ELECTRICO					

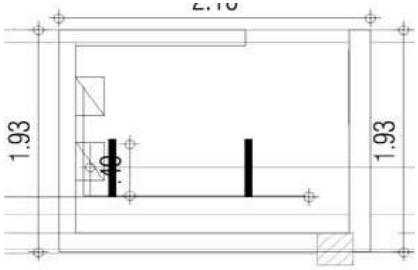



LATERAL	1,93		1,93	2,00	3,86
FRENTE	2,18		2,18	2,00	4,36
LATERAL	1,93		1,93	2,00	3,86
VANO PUERTA		2,10	2,10	2,00	4,20
DESCUENTO COLUMNETAS MURO DIVISORIO LOCALES		2,10	2,10	1,00	2,10
Subtotal					327,47
Vienen					
TOTAL					327,47

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	20	ITEM	20,1,21	DESCRIPCIÓN	Muro en bloque No. 4 e=10 cm	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD


EJE 10








COLUMNETAS




EJE 9


Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ETAPA 1					
EJE 10					
MURO DIVISORIO LOCALES LONGITUDINAL	20,09	2,25	45,20	1,00	45,20
MURO DIVISORIO LOCALES 168 Y 169	1,84	2,25	4,14	1,00	4,14
MURO DIVISORIO LOCALES 160 Y 161	1,90	2,25	4,28	1,00	4,28
MURO DIVISORIO LOCALES 160 Y 159	1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
MURO DIVISORIO LOCALES 158 Y 157	1,74	1,35	2,35	1,00	2,35
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155 AL 156	0,30	0,85	0,26	1,00	0,26
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155	0,50	0,85	0,43	1,00	0,43
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155	1,90	0,85	1,62	1,00	1,62
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 169	0,50	0,85	0,43	1,00	0,43
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 169	1,90	0,85	1,62	1,00	1,62
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 164 AL 168	0,70	0,90	0,63	1,00	0,63
MESONES INTERNOS	0,35	0,90	0,32	1,00	0,32
MESONES INTERNOS	0,45	0,90	0,41	1,00	0,41
MESONES INTERNOS	0,45	0,90	0,41	1,00	0,41
MESONES INTERNOS	1,05	0,90	0,95	1,00	0,95
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	1,00	0,36
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	1,00	0,36
MESONES INTERNOS	4,80	0,90	4,32	1,00	4,32
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	1,00	0,36
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	1,00	0,36
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	1,00	0,36
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	1,00	0,36
MESONES INTERNOS	0,45	0,90	0,41	1,00	0,41
MESONES INTERNOS	0,45	0,90	0,41	1,00	0,41
DESCUENTO COLUMNAS	0,40	2,25	0,90	-2,00	-1,80
DESCUENTO COLUMNETAS MURO LONGITUDINAL	0,10	2,05	0,21	-7,00	-1,47
DESCUENTO COLUMNETA MURO DIVISORIO LOCALES 160 Y 161	0,10	2,05	0,21	-1,00	-0,21
DESCUENTO COLUMNETAS MURO DIVISORIO LOCALES 168 Y 169	0,10	2,05	0,21	-1,00	-0,21
DESCUENTO COLUMNETAS MURO DIVISORIO LOCALES 157 Y 158	0,10	1,35	0,14	-1,00	-0,14
DESCUENTO VIGA DE CONFINAMIENTO MURO LONGITUDINAL	19,29	0,20	3,86	-1,00	-3,86
DESCUENTO VIGA DE CONFINAMIENTO MURO DIVISORIO LOCALES 168 Y 169	1,85	0,20	0,37	-1,00	-0,37
EJE 9					
MURO DIVISORIO LOCALES 128Y129 - 126Y127 LONGITUDINAL	5,29	1,35	7,14	1,00	7,14




COLUMNETAS




EJE 8






EJE 7




COLUMNETAS



MURO DIVISORIO LOCALES 129 Y 130	2,00	1,35	2,70	1,00	2,70
MURO DIVISORIO LOCALES 125 Y 126	1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
MURO DIVISORIO LOCALES 131Y132 - 122 123 Y124 LONGITUDINAL	4,89	1,35	6,60	1,00	6,60
MURO ADICION TABLERO	0,45	0,90	0,41	1,00	0,41
MURO DIVISORIO LOCALES 130 Y 131	1,91	1,35	2,58	1,00	2,58
MURO DIVISORIO LOCALES 132 Y 133	2,00	1,35	2,70	1,00	2,70
MURO DIVISORIO LOCALES 124 Y 123	1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
MURO DIVISORIO LOCALES 120 Y 122	1,90	1,35	2,57	1,00	2,57
MURO DIVISORIO LOCALES 133Y120 - 119Y134 TRANSVERSAL	4,02	1,35	5,43	1,00	5,43
MURETE PARA POCETA 119	0,35	0,85	0,30	1,00	0,30
MURETE PARA POCETA 134	0,35	0,85	0,30	1,00	0,30
DESCUENTO COLUMNETAS MURO DIVISORIO LOCALES	0,10	1,35	0,14	-14,00	-1,96
EJE 8					
MURO DIVISORIO LOCALES LONGITUDINAL 089 090 091	7,45	2,25	16,76	1,00	16,76
MOCHETA MESON 1	0,45	0,85	0,38	1,00	0,38
LATERAL MESON 1	1,10	0,85	0,94	1,00	0,94
MOCHETA MESON 1	0,45	0,85	0,38	1,00	0,38
FRONTAL MESON 1	2,61	0,85	2,22	1,00	2,22
MOCHETA MESON 2	0,45	0,85	0,38	1,00	0,38
LATERAL MESON 2	3,26	0,85	2,77	1,00	2,77
MOCHETA MESON 2	0,45	0,85	0,38	1,00	0,38
MURO DIVISORIO LOCALES 088 Y 089	1,84	1,35	2,48	1,00	2,48
MURO DIVISORIO LOCALES 094 Y 095	1,84	1,35	2,48	1,00	2,48
MURO DIVISORIO LOCALES 088-087 Y 095-096	4,76	1,35	6,43	1,00	6,43
MURO DIVISORIO LOCALES 087-096 Y 086-097	4,02	1,35	5,43	1,00	5,43
DESCUENTO COLUMNETAS MURO LONGITUDINAL	0,10	2,05	0,21	-3,00	-0,63
DESCUENTO COLUMNETA MURO DIVISORIO LOCALES 088 Y 089	0,10	1,35	0,14	-1,00	-0,14
DESCUENTO COLUMNETAS MURO DIVISORIO LOCALES 094 Y 095	0,10	1,35	0,14	-1,00	-0,14
DESCUENTO COLUMNETAS MURO DIVISORIO LOCALES 088-087 Y 095-096	0,10	1,35	0,14	-1,00	-0,14
DESCUENTO COLUMNETAS MURO DIVISORIO LOCALES 087-096 Y 086-097	0,10	1,35	0,14	-3,00	-0,42
DESCUENTO COLUMNETAS MURO ESQUINERO MESON LOCAL 091	0,10	1,35	0,14	-1,00	-0,14
DESCUENTO VIGA DE CONFINAMIENTO MURO LONGITUDINAL	7,45	0,20	1,49	-1,00	-1,49
EJE 7					
MURO DIVISORIO LOCALES 056Y059 - 055Y060	4,01	1,35	5,41	1,00	5,41
MURO DIVISORIO LOCALES 055 - 060	2,56	1,35	3,46	1,00	3,46
MURO LONGITUDINAL 054,053,052,051 Y 061,062,063,064	9,73	1,35	13,14	1,00	13,14
MURO DIVISORIO LOCALES 065 - 064	1,88	1,35	2,54	1,00	2,54
MURO DIVISORIO LOCALES 051 - 052	1,92	1,35	2,59	1,00	2,59
DESCUENTO COLUMNETAS MURO DIVISORIO LOCALES	0,10	1,35	0,14	-9,00	-1,26
MURO DIVISORIO LOCALES 054 - 055	1,83	1,35	2,47	1,00	2,47



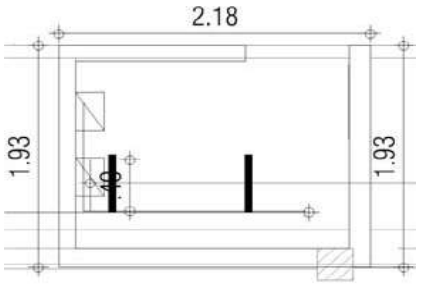



CUARTO ELECTRICO					
LATERAL	1,93	2,33	4,50	1,00	4,50
FRENTE	2,18	2,33	5,08	1,00	5,08
LATERAL	1,93	2,33	4,50	1,00	4,50
DESCUENTOS VANO DE PUERTA	0,70	2,10	1,47	1,00	1,47
DESCUENTO COLUMNETAS MURO DIVISORIO LOCALES	0,10	2,33	0,23	-1,00	-0,23
DESCUENTO VIGUETA	5,84	0,20	1,17	-1,00	-1,17
Subtotal					179,19
Vienen					
TOTAL					179,19

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568


CAPITULO	ADECUACIONES LOCALES (ITEM	ITEM	20,1,22	DESCRIPCIÓN	Muro en ladrillo tolete e=12 cm	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

COLUMNA Q8






COLUMNA Q9






COLUMNA S8



COLUMNA S9



Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE Q8	0,7	1,35	0,95	1	0,95
	0,3	1,35	0,41	1	0,41
	0,23	1,35	0,31	1	0,31
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE Q9	0,7	1,25	0,88	1	0,88
	0,3	1,25	0,38	1	0,38
	0,23	1,25	0,29	1	0,29
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE S8	0,27	1,35	0,36	1	0,36
	0,42	1,35	0,57	1	0,57
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE S9	0,27	1,35	0,36	1	0,36
	0,42	1,35	0,57	1	0,57
Subtotal					5,08
Vienen					
TOTAL					5,08

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ADECUACIONES LOCALES (ITEM CANASTA DE PRECIOS IPES INDEX 2024)	ITEM	20,1,25	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de SUPERBOARD de 4mm, 1 cara-en muros y cieloraso- NO INCLUYE estuco ni pinturas. (Incluye estructura metálica, perfilería, tornillos para su correcta instalación)	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN







Localización	DIMENSIONES Ancho	Largo	Area	No Elem	Medida Total
PROTECCION DE LOCAL TRANSLADO COMERCIANTE ETAPA 1 - UBICADO CONTIGUO AL ESPACIO DE CUARTO ELECTRICO	1,34	1,20	1,61	1,00	1,61
	1,62	1,20	1,94	1,00	1,94
DIVISION LOCALES DE VENTA DE JUGOS EJE # 7 - ETAPA # 2	1,97	1,35	2,66	1,00	2,66
DIVISION LOCAL PARA REUBICACION DE 2 COMERCIANTES EJE # 10 - ETAPA # 2 / COMERCIANTE VENTA FRITANGA	4,98	1,35	6,72	1,00	6,72
Subtotal					12,93
Vienen					
TOTAL					12,93

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


FECHA	DD	24	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	20	ITEM	20,1,33	DESCRIPCIÓN	Punto Sanitario PVC 2"	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

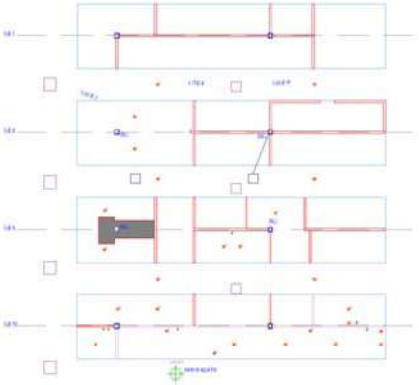



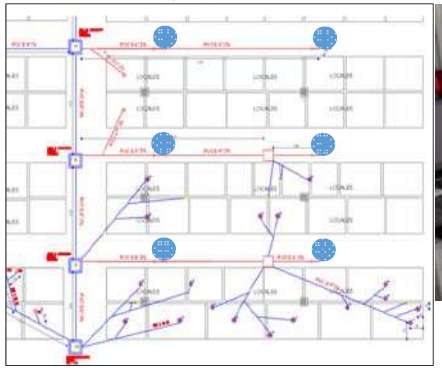




Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
ETAPA 2					
EJE 7				1,00	1,00
EJE 8				3,00	3,00
EJE 9				1,00	1,00
EJE 10				1,00	1,00
			TOTAL ETAPA 2		6,00
ETAPA 1					
EJE 8				1,00	1,00
EJE 9				3,00	3,00
EJE 10				3,00	3,00
			TOTAL ETAPA 1		7,00

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


FECHA	DD	24	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	20	ITEM	20,1,35	DESCRIPCIÓN	Punto agua fria pvc-p (incluye accesorios)	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

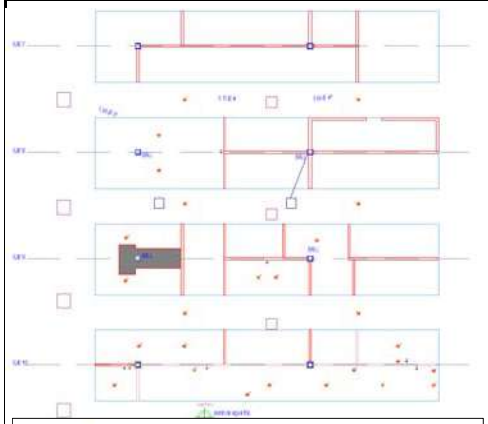



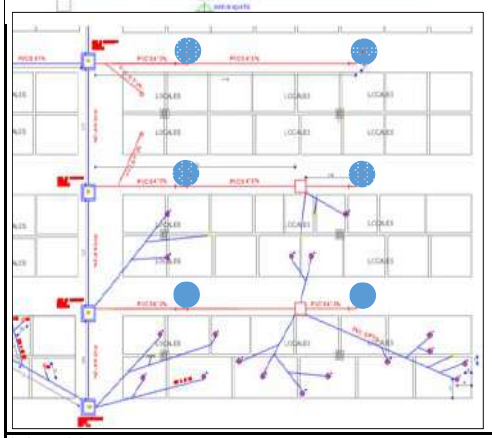



Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
ETAPA 2					
EJE 7				1,00	1,00
EJE 8				3,00	3,00
EJE 9				1,00	1,00
EJE 10				1,00	1,00
			TOTAL ETAPA 2		6,00
ETAPA 1					
EJE 8				1,00	1,00
EJE 9				3,00	3,00
EJE 10				3,00	3,00
			TOTAL ETAPA 1		7,00
			Subtotal		13,00
			Vienen		
			TOTAL		13,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ADECUACIONES LOCALES (ITEM	ITEM	20.1.43	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación, salida interruptor doble en tubería em ¾" (incluye aparato). promedio de	UNID	UND	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD



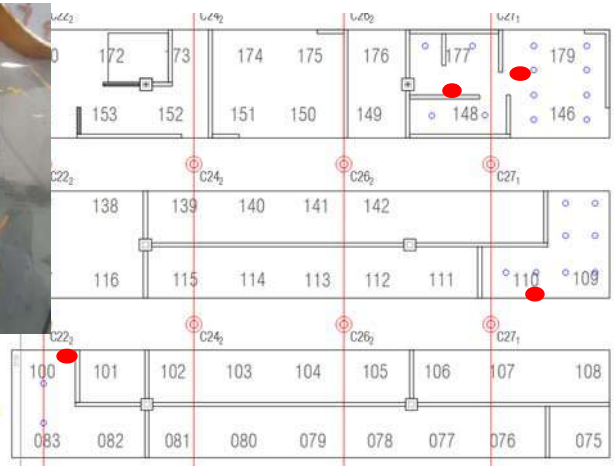

Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ETAPA 2					
LOCAL 110 - 109 - 145					
ZONA 1				1	1,00
ZONA 2				0	0,00
LOCAL 179-177-146-148					
ZONA 1				1	1,00
ZONA 2				0	0,00
ZONA 2				1	1,00
ZONA 2				0	0,00
LOCAL 100 - 083					
ZONA 1				1	1,00
Subtotal					4,00
Vienen					
TOTAL					4,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Faber Alí Parra R.
Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 7	DESCRIPCIÓN	Excavación en conglomerado incluye retiro a botadero certificado	UNID	M3	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

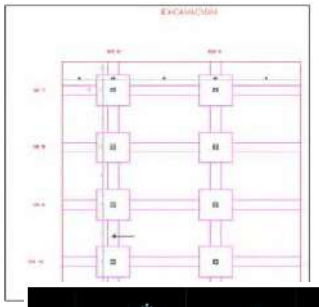

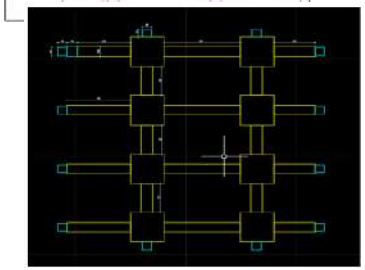



Localización	DIMENSIONES			Volumen	Medida Total
	Ancho	Largo	Alto		
EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO TERRENO CON SUB BASE					
ETAPA 2					
AREA PLACA	22,50	22,00	0,10	49,50	49,50
Descuento Area Excavaciones Cimentacion					
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Zapata	3,00	3,00	0,10	0,90	-0,90
Vigas Eje 7	1,00	5,70	0,10	0,57	-0,57
	1,00	6,99	0,10	0,70	-0,70
	1,00	3,75	0,10	0,38	-0,38
Vigas Eje 8	1,00	5,70	0,10	0,57	-0,57
	1,00	6,99	0,10	0,70	-0,70
	1,00	3,75	0,10	0,38	-0,38
Vigas Eje 9	1,00	5,70	0,10	0,57	-0,57
	1,00	6,99	0,10	0,70	-0,70
	1,00	3,75	0,10	0,38	-0,38
Vigas Eje 10	1,00	5,70	0,10	0,57	-0,57
	1,00	6,99	0,10	0,70	-0,70
	1,00	3,75	0,10	0,38	-0,38
Vigas Eje M	1,00	9,00	0,10	0,90	-0,90
Vigas Eje O	1,00	9,00	0,10	0,90	-0,90
ETAPA 1					
AREA PLACA	21,07	22,24	0,10	46,86	46,86
Descuento Area Excavaciones Cimentacion					
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Zapata	3,20	3,20	0,10	1,02	-1,02
Vigas Eje 7	1,00	17,03	0,10	1,70	-1,70
Vigas Eje 8	1,00	17,03	0,10	1,70	-1,70
Vigas Eje 9	1,00	17,03	0,10	1,70	-1,70
Vigas Eje 10	1,00	17,03	0,10	1,70	-1,70
Vigas Eje Q	1,00	11,19	0,10	1,12	-1,12
Vigas Eje S	1,00	11,19	0,10	1,12	-1,12
Subtotal					63,56
Vienen					
TOTAL					63,56

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LIZZETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 9	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación cable encauchetado de 3x10 AWG	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD



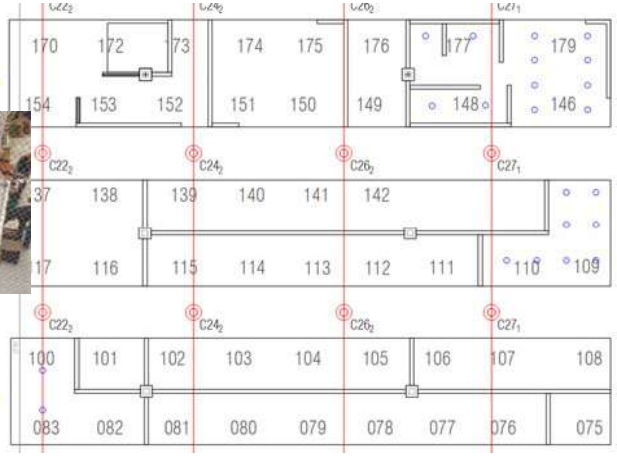

Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
ETAPA 2					
LOCAL 110 - 109 - 145					
ZONA 1	2,00			4	8,00
ZONA 2	2,00			4	8,00
LOCAL 179-177-146-148					
ZONA 1	2,00			8	16,00
ZONA 2	2,00			2	4,00
ZONA 2	2,00			1	2,00
ZONA 2	2,00			1	2,00
LOCAL 100 - 083					
ZONA 1	2,00			2	4,00
Subtotal					44,00
Vienen					
TOTAL					44,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2025	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	NP	ITEM	NP 14	DESCRIPCIÓN	Desmonte técnico de cielo raso en pvc alveolar existente	ML	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD



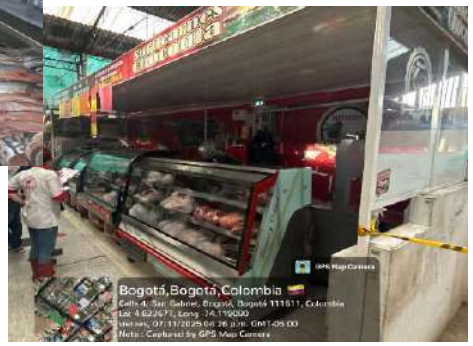

Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Ancho	Area		
EJE 10					
DESMONTE LOCAL PEDRO CARREÑO LOCALES 168 167 166 165 Y 164	9,91	2,00	19,82	1,00	19,82
DESMONTE LOCALES 130 131 132 CHOCONTA	9,40	2,00	18,80	1,00	18,80
Subtotal					38,62
Vienen					
TOTAL					38,62

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 21	DESCRIPCIÓN	Alquiler de sección de andamio multidireccional certificado. Seccion/día (Incluye Verticales 1m y 2m, horizontales , diagonales, plataformas, escalera interna, niveladores, pasadores, juego de ruedas)	UNID	SECCION/DIA	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

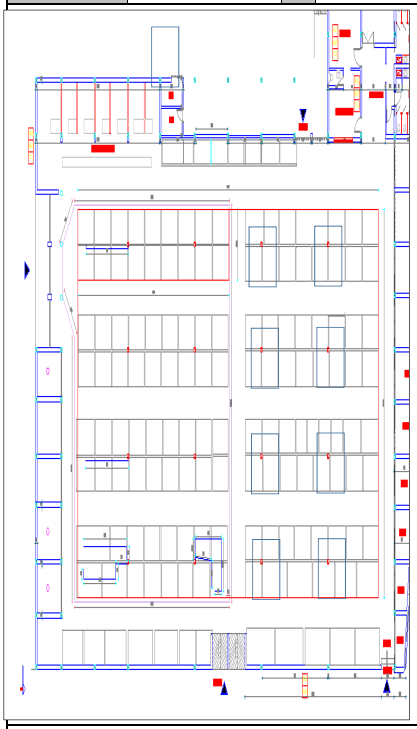









Localización	DIMENSIONES			No. Dias	Medida Total
	Ancho	Alto	Secciones de Andamio		
Semana 1 *(02-08 Febrero) Andamio escalera*			3,00	6,00	18,00
Semana 2 *(09-15 Febrero) Andamio escalera*			3,00	6,00	18,00
Semana 3 *(16-22 Febrero) Andamio escalera*			3,00	6,00	18,00
Semana 4 *(23 Feb -1 Mar) Andamios para estucar y pintar columnas en la etapa 1*			3,00	6,00	18,00
Semana 4 *(23 Feb -1 Mar) Andamio escalera*			3,00	6,00	18,00
Subtotal					90,00
Vienen					
TOTAL					90,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND

Residente de Interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568


CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 23	DESCRIPCIÓN	Pañete liso muros 1:4	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

EJE 10






EJE 9




Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ETAPA 1					
EJE 10					
MURO DIVISORIO LOCALES LONGITUDINAL	20,09	2,25	45,20	2,00	90,40
MURO DIVISORIO LOCALES 168 Y 169	1,84	2,25	4,14	2,00	8,28
MURO DIVISORIO LOCALES 160 Y 161	1,90	2,25	4,28	2,00	8,56
MURO DIVISORIO LOCALES 160 Y 159	1,90	1,35	2,57	2,00	5,14
MURO DIVISORIO LOCALES 158 Y 157	1,74	1,35	2,35	2,00	4,70
					0,00
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155 AL 156	0,30	0,85	0,26	2,00	0,52
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155	0,50	0,85	0,43	2,00	0,86
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155	1,90	0,85	1,62	2,00	3,24
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 169	0,50	0,85	0,43	2,00	0,86
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 169	1,90	0,85	1,62	2,00	3,24
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 164 AL 168	0,70	0,90	0,63	2,00	1,26
MESONES INTERNOS	0,35	0,90	0,32	2,00	0,64
MESONES INTERNOS	0,45	0,90	0,41	2,00	0,82
MESONES INTERNOS	0,45	0,90	0,41	2,00	0,82
MESONES INTERNOS	1,05	0,90	0,95	2,00	1,90
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	2,00	0,72
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	2,00	0,72
MESONES INTERNOS	4,80	0,90	4,32	2,00	8,64
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	2,00	0,72
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	2,00	0,72
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	2,00	0,72
MESONES INTERNOS	0,40	0,90	0,36	2,00	0,72
MESONES INTERNOS	0,45	0,90	0,41	2,00	0,82
MESONES INTERNOS	0,45	0,90	0,41	2,00	0,82
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
EJE 9					0,00
MURO DIVISORIO LOCALES 128Y129 - 126Y127 LONGITUDINAL	5,29	1,35	7,14	2,00	14,28
MURO DIVISORIO LOCALES 129 Y 130	2,00	1,35	2,70	2,00	5,40
MURO DIVISORIO LOCALES 125 Y 126	1,90	1,35	2,57	2,00	5,14







EJE 8




EJE 7







				2,00	0,00
MURO DIVISORIO LOCALES 131Y132 - 122 123 Y124 LONGITUDINAL	4,89	1,35	6,60	2,00	13,20
MURO ADICION TABLERO	0,45	0,90	0,41	2,00	0,82
MURO DIVISORIO LOCALES 130 Y 131	1,91	1,35	2,58	2,00	5,16
MURO DIVISORIO LOCALES 132 Y 133	2,00	1,35	2,70	2,00	5,40
MURO DIVISORIO LOCALES 124 Y 123	1,90	1,35	2,57	2,00	5,14
MURO DIVISORIO LOCALES 120 Y 122	1,90	1,35	2,57	2,00	5,14
					0,00
MURO DIVISORIO LOCALES 133Y120 - 119Y134 TRANSVERSAL	4,02	1,35	5,43	2,00	10,86
					0,00
MURETE PARA POCETA 119	0,35	0,85	0,30	2,00	0,60
MURETE PARA POCETA 134	0,35	0,85	0,30	2,00	0,60
					0,00
					0,00
					0,00
EJE 8					0,00
					0,00
MURO DIVISORIO LOCALES LONGITUDINAL 089 090 091	7,45	2,25	16,76	2,00	33,52
MOCHETA MESON 1	0,45	0,85	0,38	2,00	0,76
LATERAL MESON 1	1,10	0,85	0,94	2,00	1,88
MOCHETA MESON 1	0,45	0,85	0,38	2,00	0,76
FRONTAL MESON 1	2,61	0,85	2,22	2,00	4,44
MOCHETA MESON 2	0,45	0,85	0,38	2,00	0,76
LATERAL MESON 2	3,26	0,85	2,77	2,00	5,54
MOCHETA MESON 2	0,45	0,85	0,38	2,00	0,76
MURO DIVISORIO LOCALES 088 Y 089	1,84	1,35	2,48	2,00	4,96
MURO DIVISORIO LOCALES 094 Y 095	1,84	1,35	2,48	2,00	4,96
MURO DIVISORIO LOCALES 088-087 Y 095-096	4,76	1,35	6,43	2,00	12,86
MURO DIVISORIO LOCALES 087-096 Y 086-097	4,02	1,35	5,43	2,00	10,86
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
EJE 7					0,00
					0,00
MURO DIVISORIO LOCALES 056Y059 - 055Y060	4,01	1,35	5,41	2,00	10,82
MURO DIVISORIO LOCALES 055 - 060	2,56	1,35	3,46	2,00	6,92
MURO LONGITUDINAL 054,053,052,051 Y 061,062,063,064	9,73	1,35	13,14	2,00	26,28
MURO DIVISORIO LOCALES 065 - 064	1,88	1,35	2,54	2,00	5,08
MURO DIVISORIO LOCALES 051 - 052	1,92	1,35	2,59	2,00	5,18
MURO DIVISORIO LOCALES 054 - 055	1,83	1,35	2,47	2,00	4,94
					0,00
					0,00
CUARTO ELECTRICO					0,00
LATERAL	1,93	2,33	4,50	2,00	8,99
FRENTE	2,18	2,33	5,08	2,00	10,16
LATERAL	1,93	2,33	4,50	2,00	8,99
					0,00
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE Q8	0,7	1,35	0,95	1	0,95
	0,3	1,35	0,41	1	0,41
	0,23	1,35	0,31	1	0,31
					0,00
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE Q9	0,7	1,25	0,88	1	0,88





	0,3	1,25	0,38	1	0,38
	0,23	1,25	0,29	1	0,29
					0,00
					0,00
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE S8	0,27	1,35	0,36	1	0,36
	0,42	1,35	0,57	1	0,57
					0
					0
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE S9	0,27	1,35	0,36	1	0,36
	0,42	1,35	0,57	1	0,57
Subtotal					392,08
Vienen					
TOTAL					392,08

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568


CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 24	DESCRIPCIÓN	Pañete liso muros 1:4	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

EJE 10





EJE 9




Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Long Alto Borde	Longitud Total		
ETAPA 1					
EJE 10					
MURO DIVISORIO LOCALES LONGITUDINAL	20,09	2,25	22,34	1,00	22,34
DESCUENTO COLUMNAS	0,45	0,00	0,45	-2,00	-0,90
MURO DIVISORIO LOCALES 168 Y 169	1,84	2,25	4,09	1,00	4,09
MURO DIVISORIO LOCALES 160 Y 161	1,90	2,25	4,15	1,00	4,15
MURO DIVISORIO LOCALES 160 Y 159	1,90	1,35	3,25	1,00	3,25
MURO DIVISORIO LOCALES 158 Y 157	1,74	1,35	3,09	1,00	3,09
					0,00
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155 AL 156		0,85	0,85	1,00	0,85
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155		0,85	0,85	1,00	0,85
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 155	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 169		0,85	0,85	1,00	0,85
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 169	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
MURETES PARA MESONES LOCALES PESCADOS DEL 164 AL 168		0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MESONES INTERNOS	0,00	0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS	0,00	0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	1,00	0,90
MESONES INTERNOS		0,90	0,90	1,00	0,90
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
EJE 9					0,00
MURO DIVISORIO LOCALES 128Y129 - 126Y127 LONGITUDINAL	5,29	1,35	6,64	1,00	6,64
MURO DIVISORIO LOCALES 129 Y 130	2,00	1,35	3,35	1,00	3,35







EJE 8



COLUMNETAS


EJE 7







MURO DIVISORIO LOCALES 125 Y 126	1,90	1,35	3,25	1,00	3,25
					0,00
MURO DIVISORIO LOCALES 131Y132 - 122 123 Y124 LONGITUDINAL	4,89	0,00	4,89	1,00	4,89
MURO ADICION TABLERO	0,45	0,90	1,35	1,00	1,35
MURO DIVISORIO LOCALES 130 Y 131	1,91	1,35	3,26	1,00	3,26
MURO DIVISORIO LOCALES 132 Y 133	2,00	1,35	3,35	1,00	3,35
MURO DIVISORIO LOCALES 124 Y 123	1,90	1,35	3,25	1,00	3,25
MURO DIVISORIO LOCALES 120 Y 122	1,90	1,35	3,25	1,00	3,25
					0,00
MURO DIVISORIO LOCALES 133Y120 - 119Y134 TRANSVERSAL	4,02	1,35	5,37	1,00	5,37
		1,35	1,35	1,00	1,35
MURETE PARA POCETA 119		0,85	0,85	1,00	0,85
MURETE PARA POCETA 134		0,85	0,85	1,00	0,85
					0,00
					0,00
					0,00
EJE 8					0,00
					0,00
MURO DIVISORIO LOCALES LONGITUDINAL 089 090 091	7,45	2,25	9,70	1,00	9,70
MOCHETA MESON 1		0,85	0,85	1,00	0,85
LATERAL MESON 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOCHETA MESON 1		0,85	0,85	1,00	0,85
FRONTAL MESON 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOCHETA MESON 2		0,85	0,85	1,00	0,85
LATERAL MESON 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOCHETA MESON 2		0,85	0,85	1,00	0,85
FRONTAL MESON 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MURO DIVISORIO LOCALES 088 Y 089	1,84	1,35	3,19	1,00	3,19
MURO DIVISORIO LOCALES 094 Y 095	1,84	1,35	3,19	1,00	3,19
MURO DIVISORIO LOCALES 088-087 Y 095-096	4,76		4,76	1,00	4,76
MURO DIVISORIO LOCALES 087-096 Y 086-097	4,02	1,35	5,37	1,00	5,37
		1,35	1,35	1,00	1,35
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
EJE 7					0,00
					0,00
MURO DIVISORIO LOCALES 056Y059 - 055Y060	4,01	1,35	5,36	1,00	5,36
		1,35	1,35	1,00	1,35
MURO DIVISORIO LOCALES 055 - 060	2,56		2,56	1,00	2,56
MURO LONGITUDINAL 054,053,052,051 Y 061,062,063,064	9,73		9,73	1,00	9,73
MURO DIVISORIO LOCALES 065 - 064	1,88	1,35	3,23	1,00	3,23
MURO DIVISORIO LOCALES 051 - 052	1,92	1,35	3,27	1,00	3,27
MURO DIVISORIO LOCALES 054 - 055	1,83	1,35	3,18	1,00	3,18
					0,00
					0,00
CUARTO ELECTRICO					0,00
VANO PUERTA	0,70	2,10	2,80	1,00	2,80
FRENTE		2,10	2,10	1,00	2,10
					0,00
			0,00		0,00
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE Q8	0,7		0,7	1	0,7
	0,3		0,3	1	0,3





	0,23		0,23	1	0,23
			0,00		0,00
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE Q9	0,7		0,7	1	0,7
	0,3		0,3	1	0,3
	0,23		0,23	1	0,23
			0,00		0,00
			0,00		0,00
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE S8	0,27		0,27	1	0,27
	0,42		0,42	1	0,42
			0		0
			0		0
MURO PARA TAPAR BAJANTE EJE S9	0,27		0,27	1	0,27
	0,42		0,42	1	0,42
Subtotal					158,76
Vienen					
TOTAL					158,76

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	#¡REF!	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11		Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ		901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S		901.463.604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP25	DESCRIPCIÓN	Placa de Contrapiso de 10 CM - Concreto 4000 PSI (Incluye malla electrosoldada M-084 Q=5 4,0 mm 1,5X1,5 cm+amarre de traslapo y polietileno cal 6)	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

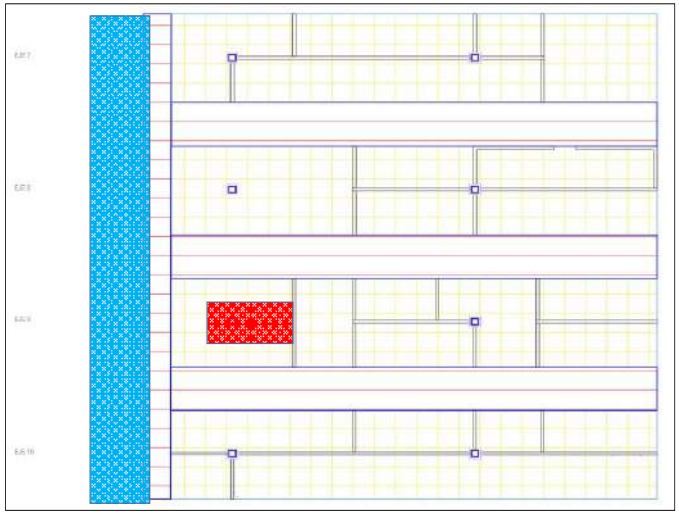



Localización	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Ancho	Longitud	Area		
EJE # 9	1,86	4,10	7,63	1,00	7,63
Subtotal					7,63
DESCUENTOS COLUMNAS					
COLUMNA	0,46	0,46	0,21	-1,00	-0,21
BAJANTE AGUAS LLUVIAS	0,23	0,28	0,06	-1,00	-0,06
PLACA EMPALME ETAPA 1 Y 2	0,75	22,00	16,50	1,00	16,50
TOTAL					23,86

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND

Residente de Interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 27	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación Breaker automático 1X20 amp enchufable	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
LOCAL 170 154 153 152 172 173				2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					2,00
Cobrado a la fecha					
TOTAL					2,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 29	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de Totalizador Breaker Industrial Regulable de 88 A 125 Amperios	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
LOCAL 170 154 153 152 172 173				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					1,00
Cobrado a la fecha					
TOTAL					1,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 36	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de soportes para instalación de tuberia EMT incluye fijacion a muros y	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD





Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ALIMENTACION A TABLEROS					
COFRE NUEVO - CAJA 50X50 1				4,00	4,00
					0,00
CAJA 50X50 1 - TABLERO 1				15,00	15,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					19,00
Vienen					
TOTAL					19,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de Interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 37	DESCRIPCIÓN	Caja de paso doble fondo 10x10	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

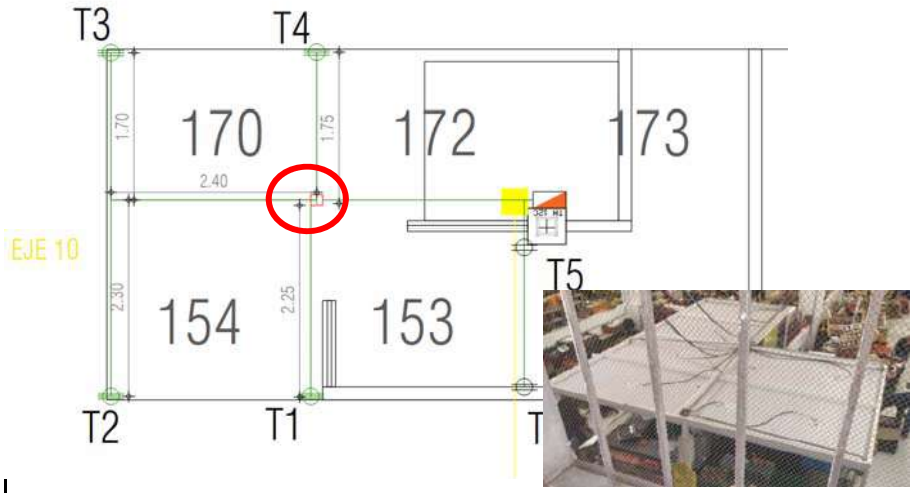

Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
CAJA TRAZADO LOCAL 170 154 153 152 172 173					
CAJA DE PASO TOMAS BIFASICAS				1,00	1,00
					0,00
Subtotal					1,00
Vienen					
TOTAL					1,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO		ITEM	NP38	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación Tuberia EMT de 1", incluye accesorios de instalación	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

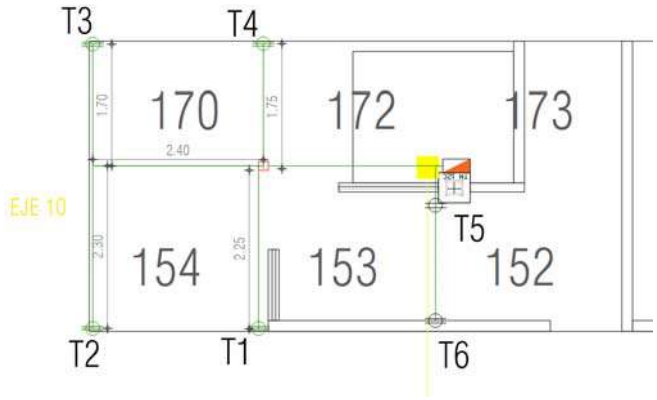



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Largo Vertical	Long Total		
TOMA 1 A CAJA 10X10	2,25	0,40	2,65	1,00	2,65
TOMA 2 A CAJA 10X10	4,70	0,40	5,10	1,00	5,10
TOMA 3 A CAJA 10X10	4,10	0,40	4,50	1,00	4,50
TOMA 4 A CAJA 10X10	1,75	0,40	2,15	1,00	2,15
CAJA 10X10 A TABLERO	2,45	0,40	2,85	1,00	2,85
					0,00
					0,00
DESCUENTO TOMARIA EN PUNTOS	1,00			-4,00	-4,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					13,25
Vienen					
TOTAL					13,25

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7162568


CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 39	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación Tuberia EMT de 3/4", incluye accesorios de instalación	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD







Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ETAPA 2					
TABLERO 1					
CIRCUITO 1 EJE M					
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			1	6,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			0	0,00
CIRCUITOS DE ILUMINACION PASILLOS					0,00
TABLERO 1					0,00
CIRCUITO 27					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO NORTE	7,10			1	7,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			0	0,00



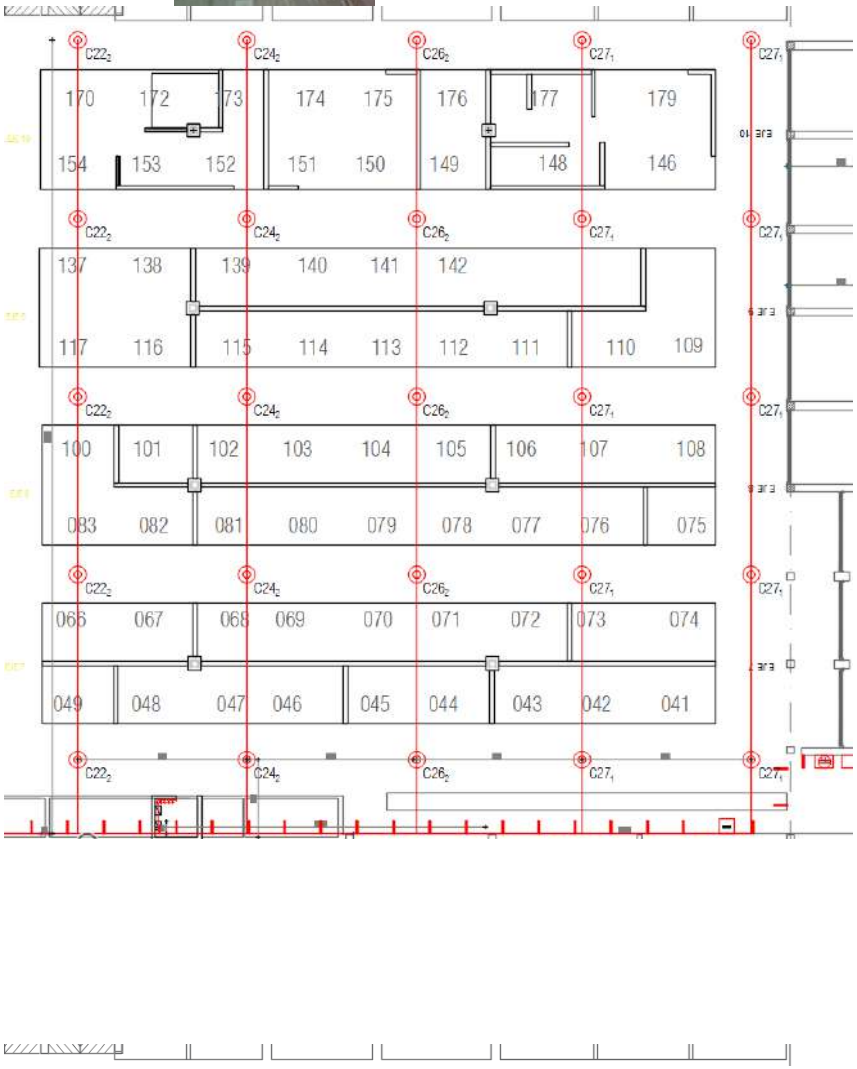

DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
CIRCUITO 25					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO NORTE	9,90			1	9,90
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
TABLERO 2					
CIRCUITO 26					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO CENTRAL	16,10			1	16,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			0	0,00

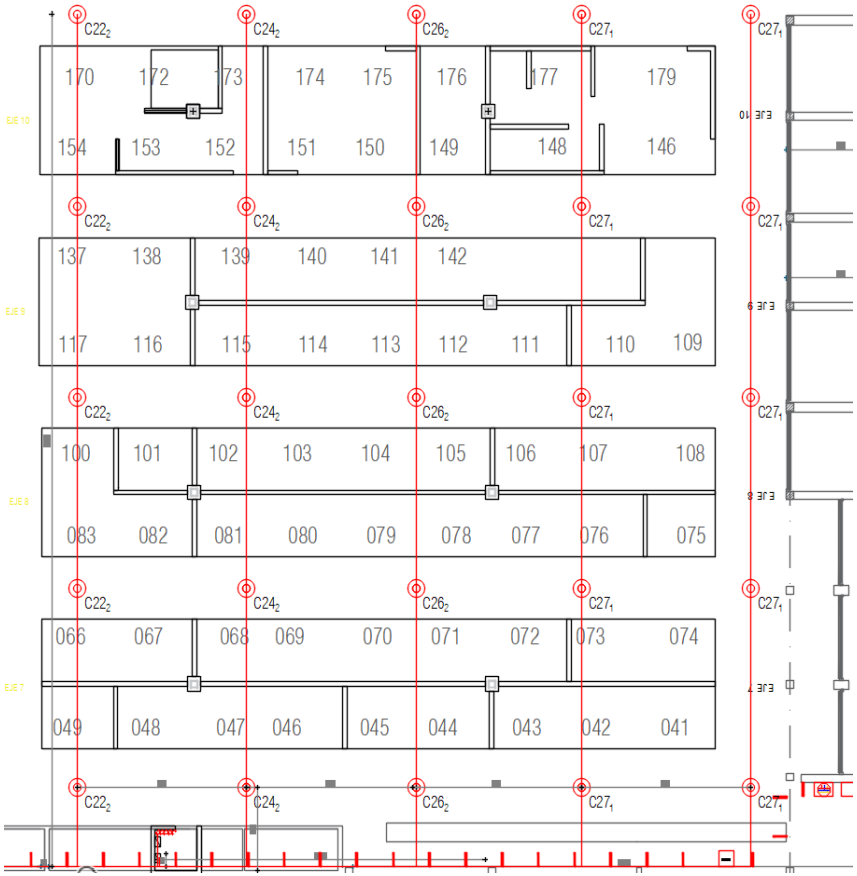

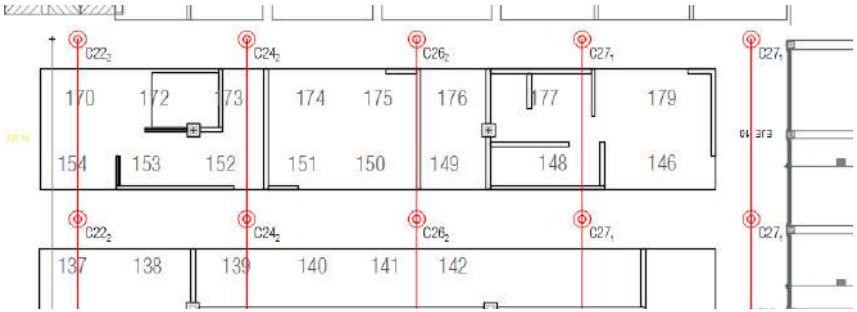

CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
CIRCUITO 24					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO SUR	22,10			1	22,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			0	0,00





DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
CIRCUITO 22					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO SUR	28,10			1	28,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			0	0,00
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
MENOS COBRADO A LA FECHA	159,18			-1	-159,18
Subtotal					100,01
Vienen					
TOTAL					100,01

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP41	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 1#12F + 1#12N +1#12T (libre de	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

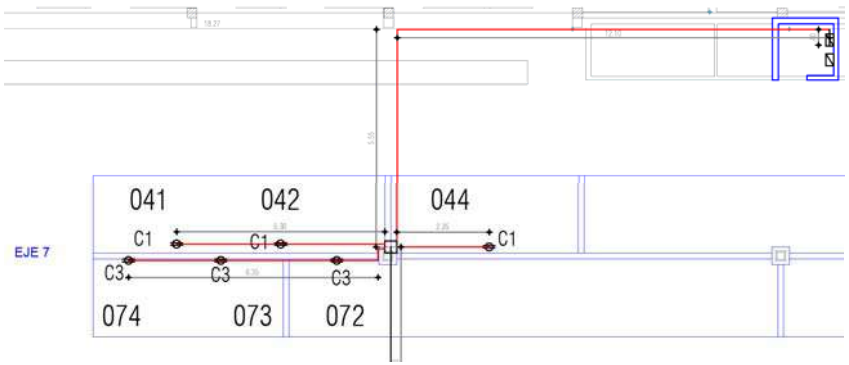




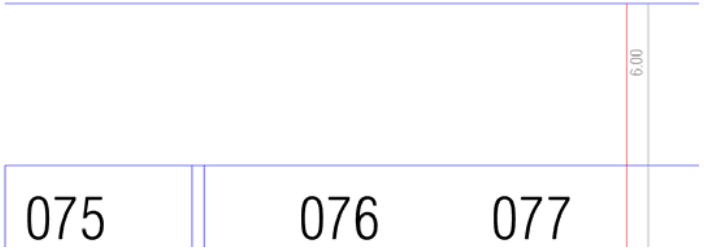



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ETAPA 2					
TABLERO 1					
CIRCUITO 1 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 041	5,30			1	5,30
BUCLE TOMA 1 LOCAL 041	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 042	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CAJA M7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 044	2,35			1	2,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 044	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CIRCUITO 3 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 074	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 074	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 073	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 072	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 5 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			1	0,60
CAJA M8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 075	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 075	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 076	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 077	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00

EJE 8

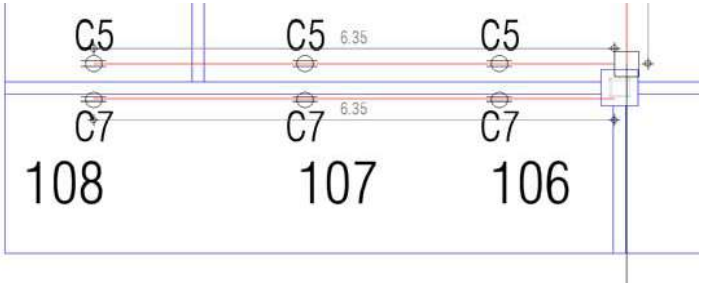



EJE 9

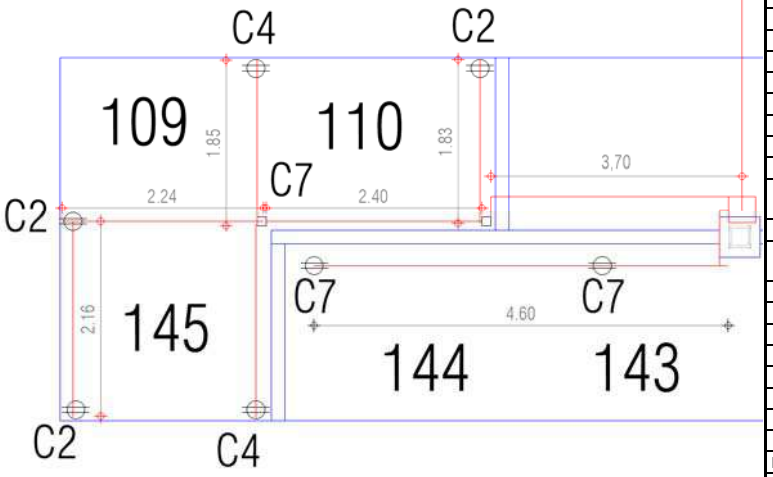





CIRCUITO 7 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			1	0,60
CAJA M8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 108	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 108	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 107	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 106	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 7 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			1	0,60
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			1	0,60
CAJA M9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 144	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 144	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 143	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CIRCUITO 4 EJE 9 LOCAL CARNICOS 145-109-110					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			1	0,60
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			1	0,60
CAJA M9 - CAJA DISTRIBUCION 1	6,70			1	6,70
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DISTRIBUCION LOCAL - MEDIDOR	0,40			1	0,40
BUCLE MEDIDOR	0,30			1	0,30
MEDIDOR - CAJA DE DISTRIBUCION 1	0,40			1	0,40
BUCLE RETORNO CAJA DISTRIBUCION 1	0,45			1	0,45
CAJA DE DISTRIBUCION 1 - CAJA DISTRIBUCION 2	2,40			1	2,40
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION 2	0,45			1	0,45
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 1	2,15			1	2,15
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 2	1,85			1	1,85
BUCLE TOMA 1	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CIRCUITO 2 EJE 9 LOCAL CARNICOS 145-109-110					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			1	0,60
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			1	6,00

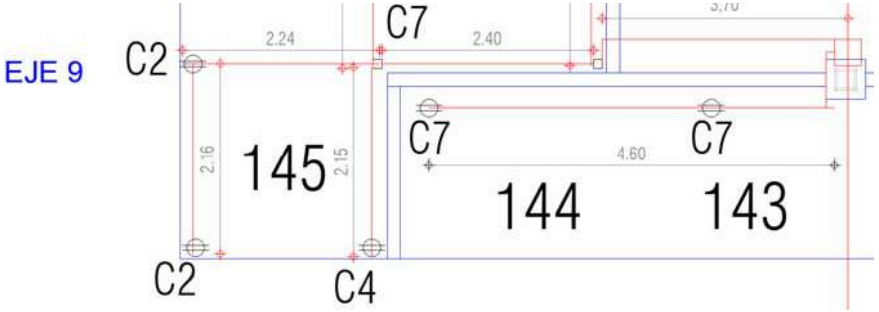


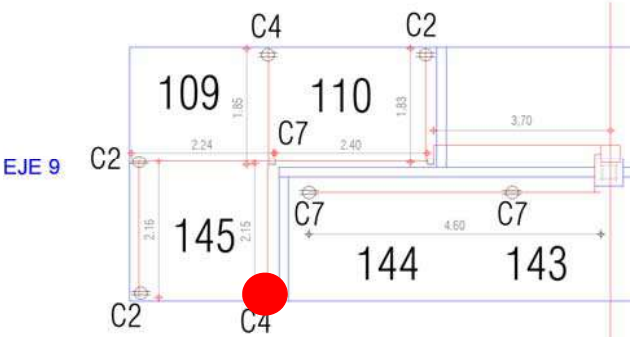

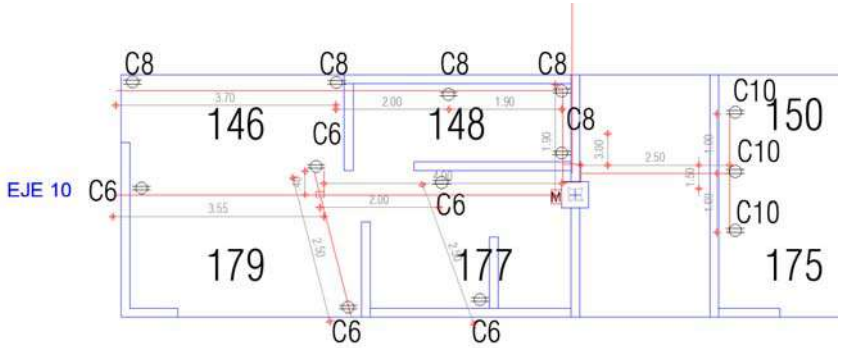






BUCLE CAJA EJE M9	0,60			1	0,60
CAJA M9 - CAJA DISTRIBUCION 1	6,70			1	6,70
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DISTRIBUCION LOCAL - MEDIDOR	0,40			1	0,40
BUCLE MEDIDOR	0,30			1	0,30
MEDIDOR - CAJA DE DISTRIBUCION 1	0,40			1	0,40
BUCLE RETORNO CAJA DISTRIBUCION 1	0,45			1	0,45
CAJA DISTRIBUCION 1 -TOMA 3	1,83			1	1,83
BUCLE TOMA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE DISTRIBUCION 1 - CAJA DISTRIBUCION 2	2,40			1	2,40
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION 2	0,45			1	0,45
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 4	2,24			1	2,24
TOMA 4 - CAJA TOMA 5	2,16			1	2,16
BUCLE TOMA 4	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 2 EJE 9 LOCAL CARNICOS 145-109-110 ILUMINACION					
MEDIDOR - CAJA DE DISTRIBUCION 1	0,40			1	0,40
BUCLE RETORNO CAJA DISTRIBUCION 1	0,45			1	0,45
CAJA DE DISTRIBUCION 1 - CAJA DISTRIBUCION 2	2,40			1	2,40
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION 2	0,45			1	0,45
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 1	2,15			1	2,15
TOMA 1 - INTERRUPTOR DOBLE VERTICAL	0,40			1	0,40
BUCLE INTERRUPTOR DOBLE	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE INTERRUPTOR ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM 20.1.43	3,50			-1	-3,50
				1	0,00
CIRCUITO 10 EJE 10 LOCALES 150-175					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			1	0,60
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			1	0,60
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			1	0,60
CAJA M10 - PRIMER TOMA TRAZADO SOBRE LOCALES 149 Y 176	7,00			1	7,00
BUCLE TOMA LOCAL 150	0,34			1	0,34
TOMA LOCAL 150 1 - TOMA LOCAL 150 2	1,00			1	1,00
TOMA LOCAL 150 1 - TOMA LOCAL 175	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 150 2	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 175	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 8 EJE 10 LOCALES 146 Y 148 DE CARNICOS ZONA 1					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			1	0,60
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			1	0,60
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			1	0,60






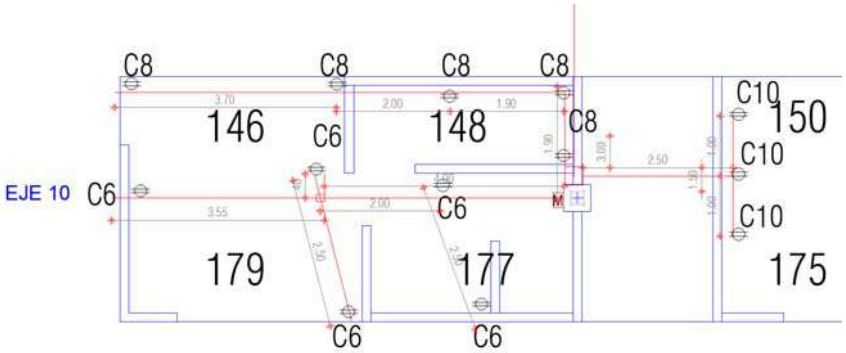








CAJA M10 - CAJA DOBLE FONDO DISTRIBUCION 1	3,00			1	3,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DOBLE FONDO 1 - MEDIDOR	4,00			1	4,00
BUCLE MEDIDOR	0,45			1	0,45
MEDIDOR - CAJA DOBLE FONDO 1 (RETORNO)	0,40			1	0,40
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DOBLE FONDO - TOMA 1	0,40			1	0,40
BUCLE TOMA 1	0,34			1	0,34
TOMA 1 - TOMA 2	1,90			1	1,90
BUCLE TOMA 2	0,34			1	0,34
TOMA 2 - TOMA 3	1,90			1	1,90
BUCLE TOMA 3	0,34			1	0,34
TOMA 3 - TOMA 4	2,00			1	2,00
BUCLE TOMA 4	0,34			1	0,34
TOMA 4 - TOMA 5	3,70			1	3,70
BUCLE TOMA 5	0,15			1	0,15
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-5	-5,00
CIRCUITO 6 EJE 10 LOCALES 146 Y 148 DE CARNICOS ZONA 2					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			1	21,64
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			1	0,60
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			1	0,60
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			1	0,60
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			1	0,60
CAJA M10 - CAJA DOBLE FONDO DISTRIBUCION 1	3,00			1	3,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DOBLE FONDO 1 - MEDIDOR	4,00			1	4,00
BUCLE MEDIDOR	0,45			1	0,45
MEDIDOR - CAJA DOBLE FONDO 1 (RETORNO)	0,40			1	0,40
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DOBLE FONDO 1 - TOMA 6	2,00			1	2,00
BUCLE TOMA 6	0,34			1	0,34
TOMA 6 - CAJA DOBLE FONDO 2	2,00			1	2,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO 2	0,34			1	0,34
CAJA DOBLE FONDO 2 - TOMA 7	0,40			1	0,40
BUCLE TOMA 7	0,34			1	0,34
TOMA 7 - TOMA 8	3,55			1	3,55
BUCLE TOMA 8	0,17			1	0,17
TOMA 7 - TOMA 9	2,50			1	2,50
BUCLE TOMA 9	0,17			1	0,17
TOMA 6 - TOMA 10	2,50			1	2,50
BUCLE TOMA 10	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-5	-5,00
ETAPA 2					
TABLERO 2					
CIRCUITO 1 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			1	10,46
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			1	0,60
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 049	3,75			1	3,75
BUCLE TOMA 1 LOCAL 049	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 048	0,34			1	0,34

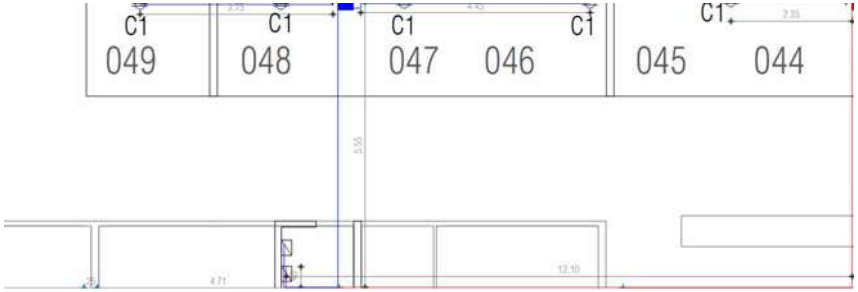


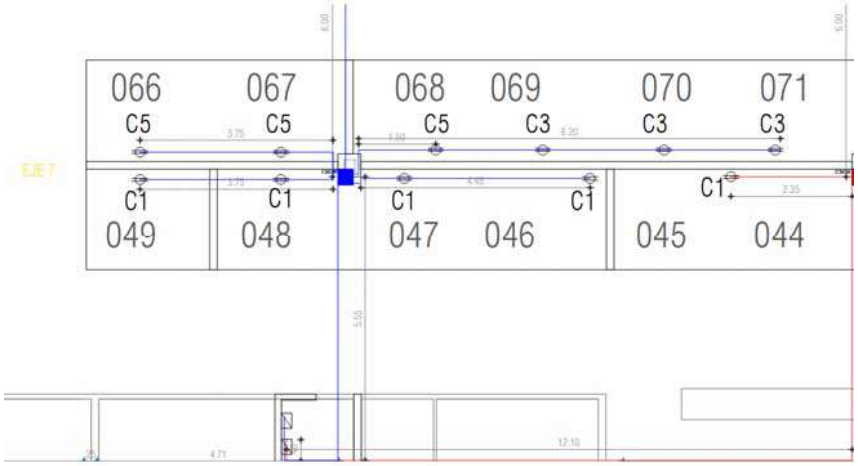


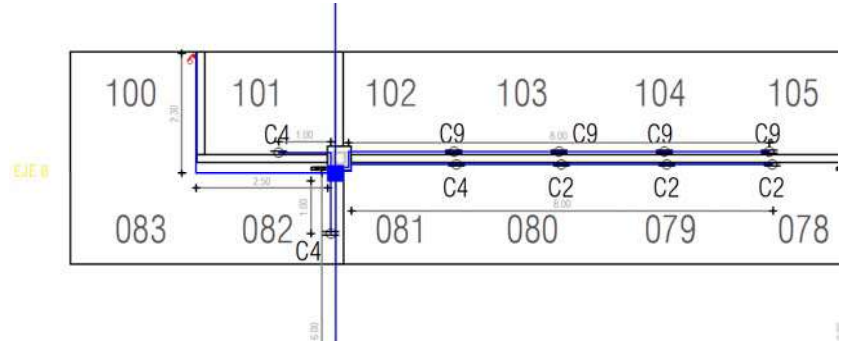


DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
				1	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 046	4,45			1	4,45
BUCLE TOMA 1 LOCAL 046	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 047	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
				1	0,00
CIRCUITO 3 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			1	10,46
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			1	0,60
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 071	8,20			1	8,20
BUCLE TOMA 1 LOCAL 071	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 070	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 3 LOCAL 069	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
				1	0,00
CIRCUITO 5 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			1	10,46
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			1	0,60
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 068	1,50			1	1,50
BUCLE TOMA 1 LOCAL 068	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
				1	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 066	3,75			1	3,75
BUCLE TOMA 1 LOCAL 066	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 1 LOCAL 067	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CIRCUITO 4 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			1	10,46
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			1	0,60
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			1	0,60
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 082	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 082	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 101	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 101	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 81	2,00			1	2,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 81	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00

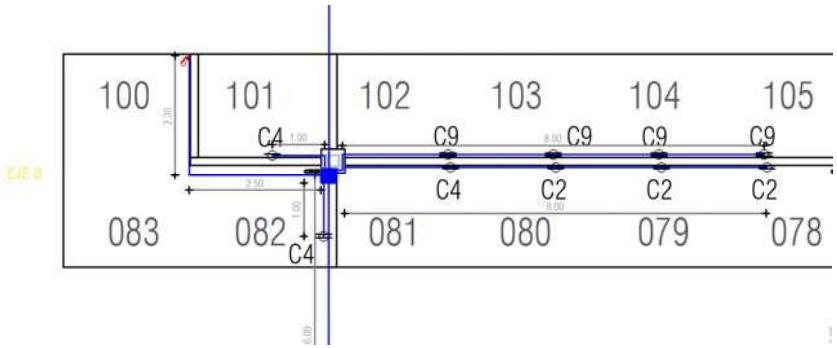


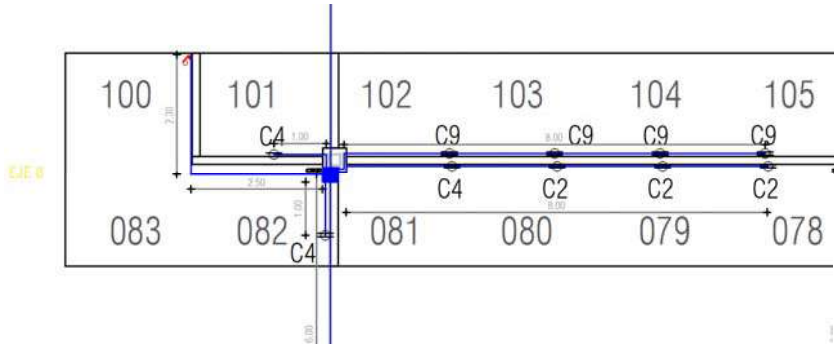


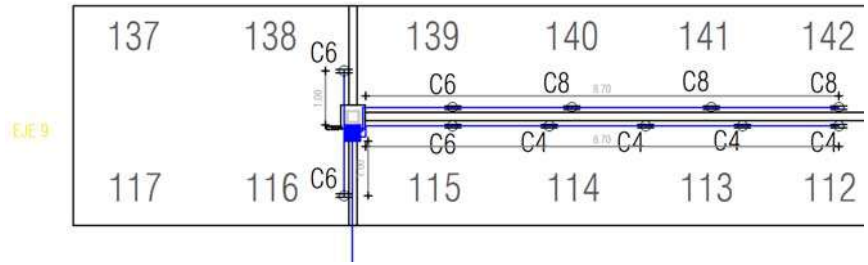

CAJA O8 - CAJA DE PASO SOBRE TECHO	5,50			1	5,50
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO CAJA BAJANTE	2,30			1	2,30
CAJA BAJANTE INTERRUPTOR	0,70			1	0,70
BUCLE INTERUPTOR	0,70			1	0,70
DESCUENTO CABLE INTERRUPTOR ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM 20.1.43	3,50			-1	-3,50
CIRCUITO 9 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			1	10,46
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			1	0,60
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			1	0,60
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 105	8,00			1	8,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 105	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 104	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 103	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 102	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-4	-4,00
CIRCUITO 2 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			1	10,46
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			1	0,60
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			1	0,60
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 77	8,00			1	8,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 77	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 78	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 79	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 6 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			1	10,46
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			1	0,60
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			1	0,60
CAJA O8 - CAJA EJE O9	4,60			1	4,60
BUCLE CAJA EJE O9	0,60			1	0,60
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 116	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 116	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
				1	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 138	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 138	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
				1	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 139	1,60			1	1,60
BUCLE TOMA 1 LOCAL 139	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
				1	0,00




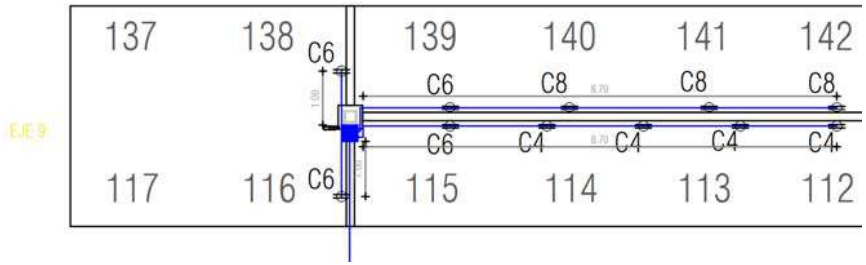

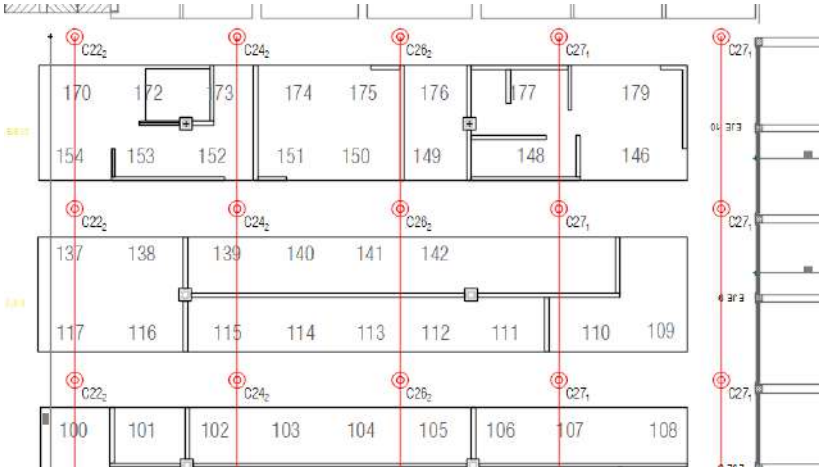



CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 115	1,60			1	1,60
BUCLE TOMA 1 LOCAL 115	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
				1	0,00
CIRCUITO 8 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			1	10,46
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			1	0,60
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			1	0,60
CAJA O8 - CAJA EJE O9	4,60			1	4,60
BUCLE CAJA EJE O9	8,00			1	8,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 142	8,70			1	8,70
BUCLE TOMA 1 LOCAL 142	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 141	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 1 LOCAL 140	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
				1	0,00
CIRCUITO 4 EJE 9					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			1	10,46
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			1	0,60
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			1	0,60
CAJA O8 - CAJA EJE O9	4,60			1	4,60
BUCLE CAJA EJE O9	8,00			1	8,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 111	8,70			1	8,70
BUCLE TOMA 1 LOCAL 111	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 112	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 113	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 1 LOCAL 114	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-4	-4,00
				1	0,00
CIRCUITOS DE ILUMINACION PASILLOS					0,00
TABLERO 1					0,00
CIRCUITO 27					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO NORTE	7,10			1	7,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17



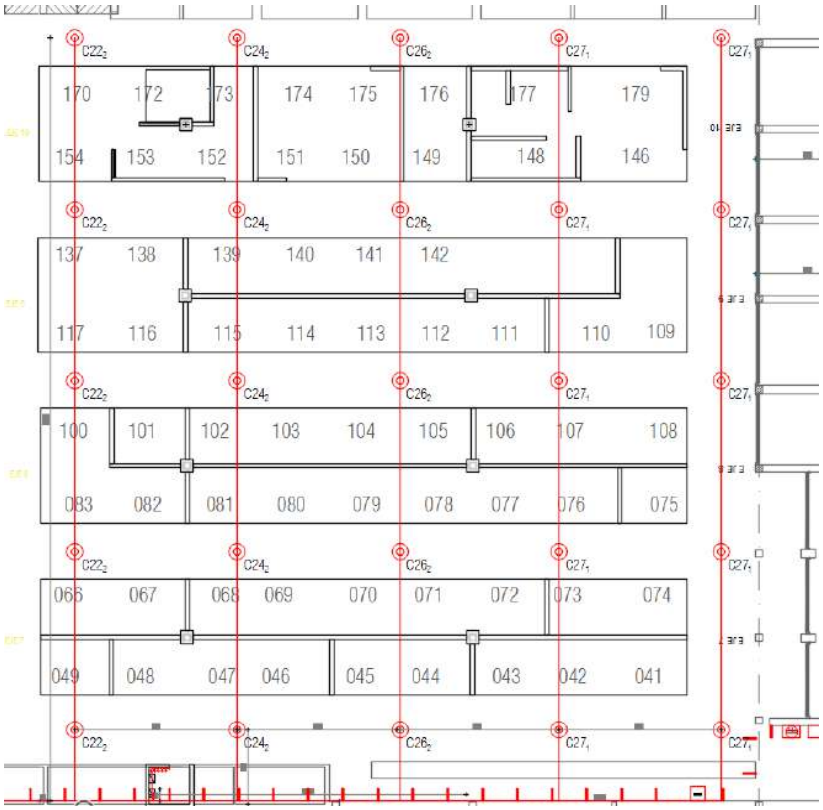


CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
CIRCUITO 25					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO NORTE	9,90			1	9,90
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
TABLERO 2				1	0,00
CIRCUITO 26					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO CENTRAL	16,10			1	16,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70

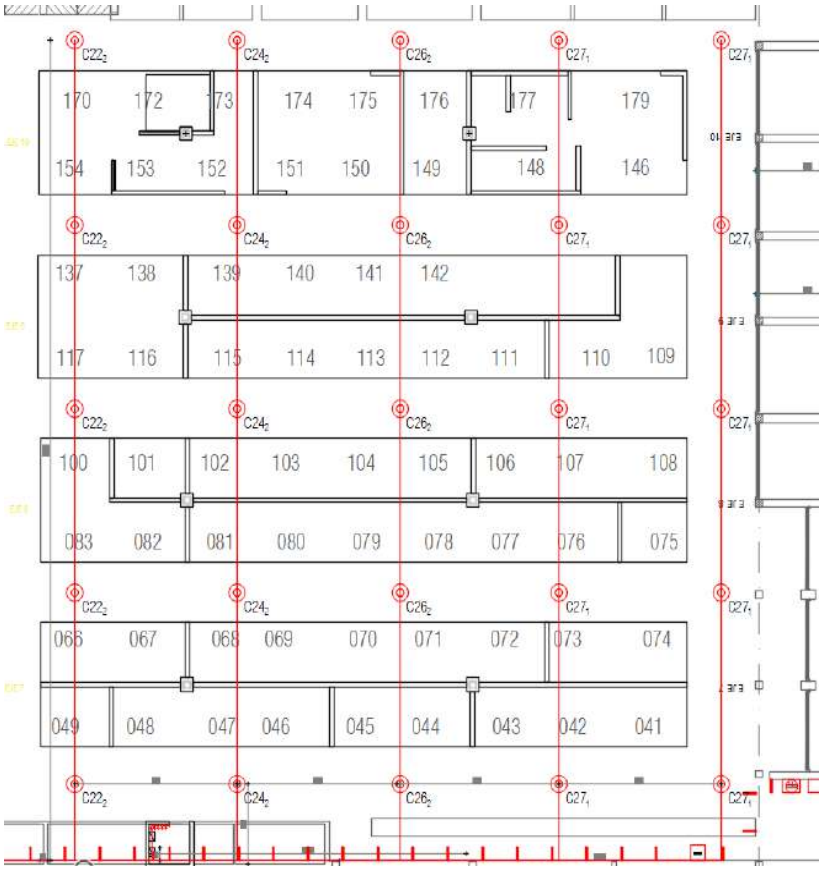



BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
CIRCUITO 24					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO SUR	22,10			1	22,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17

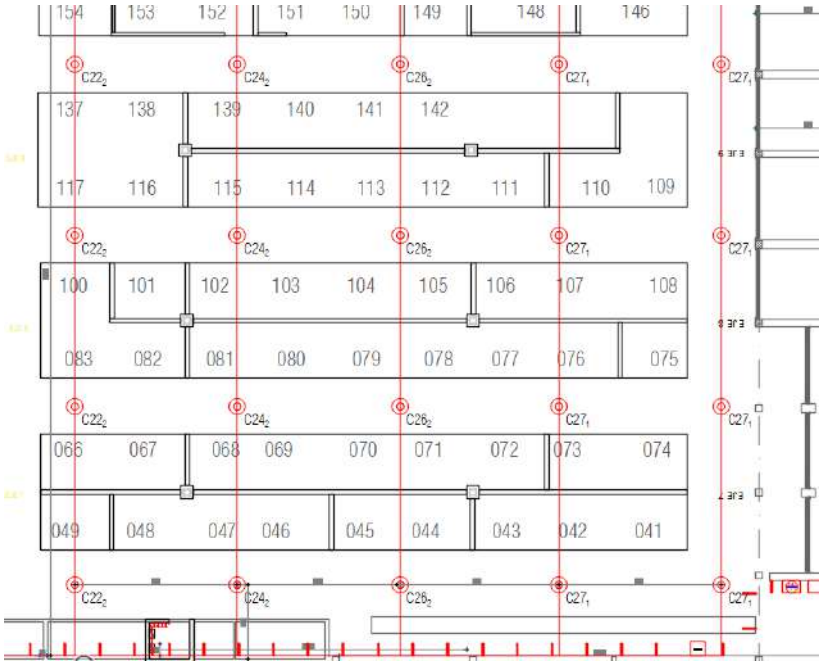

CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
CIRCUITO 22					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO SUR	28,10			1	28,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			-5	-5,00
MENOS COBRADO A LA FECHA	552,43			-1	-552,43
Subtotal					481,77
Vienen					
TOTAL					481,77

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP42	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de Tuberia IMC 3/4" incluye accesorios de instalación	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

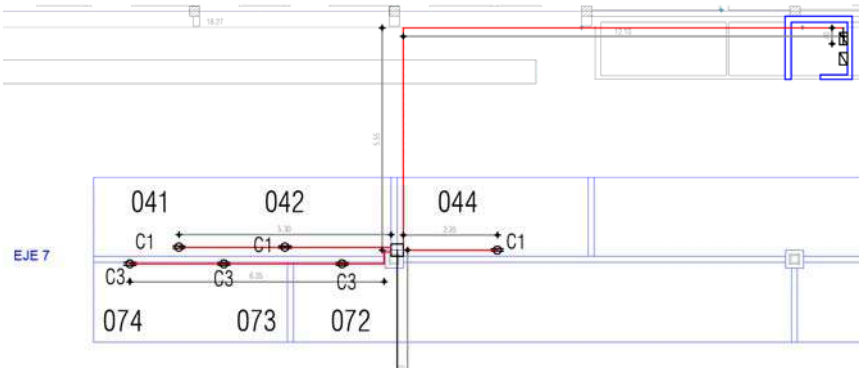







Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ETAPA 2					
TABLERO 1					
CIRCUITO 1 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 041	5,30			1	5,30
BUCLE TOMA 1 LOCAL 041	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 042	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CAJA M7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 044	2,35			1	2,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 044	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CIRCUITO 3 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 074	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 074	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 073	0,34			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 072	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 5 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 075	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 075	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 076	0,34			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 077	0,34			0	0,00

EJE 8

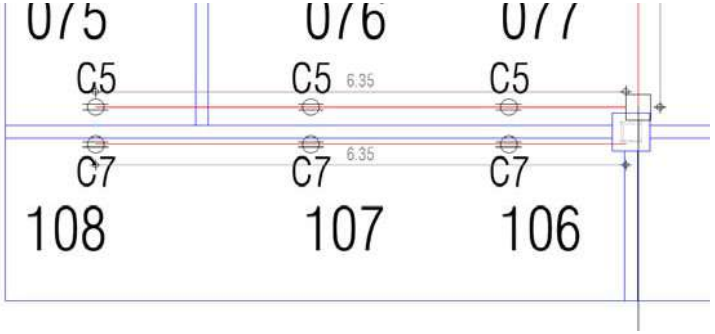


EJE 9

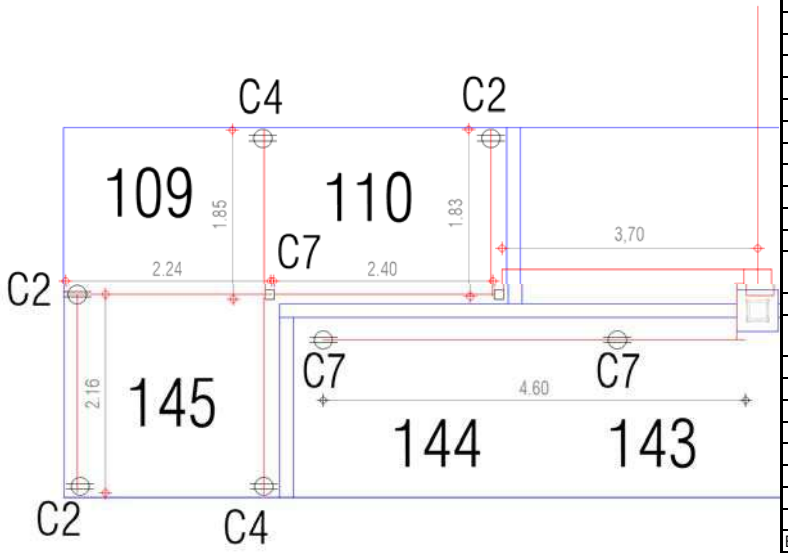











DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 7 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 108	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 108	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 107	0,34			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 106	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 7 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 144	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 144	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 143	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CIRCUITO 4 EJE 9 LOCAL CARNICOS 145-109-110					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA DISTRIBUCION 1	6,70			1	6,70
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION DOBLE FONDO	0,45			0	0,00
CAJA DISTRIBUCION LOCAL - MEDIDOR	0,40			1	0,40
BUCLE MEDIDOR	0,30			0	0,00
MEDIDOR - CAJA DE DISTRIBUCION 1	0,40			0	0,00
BUCLE RETORNO CAJA DISTRIBUCION 1	0,45			0	0,00
CAJA DE DISTRIBUCION 1 - CAJA DISTRIBUCION 2	2,40			1	2,40
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION 2	0,45			0	0,00
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 1	2,15			1	2,15
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 2	1,85			1	1,85
BUCLE TOMA 1	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CIRCUITO 2 EJE 9 LOCAL CARNICOS 145-109-110					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00

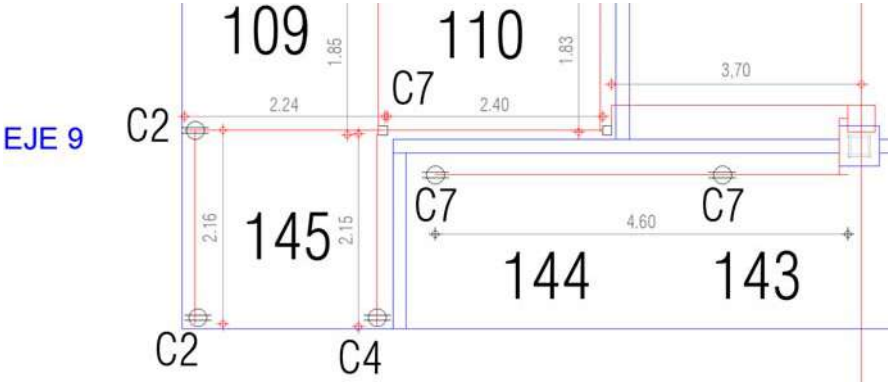


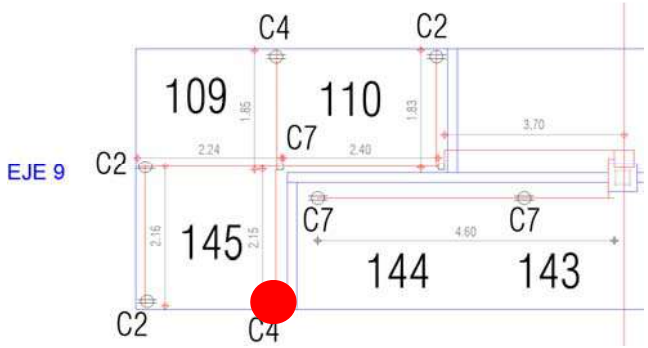


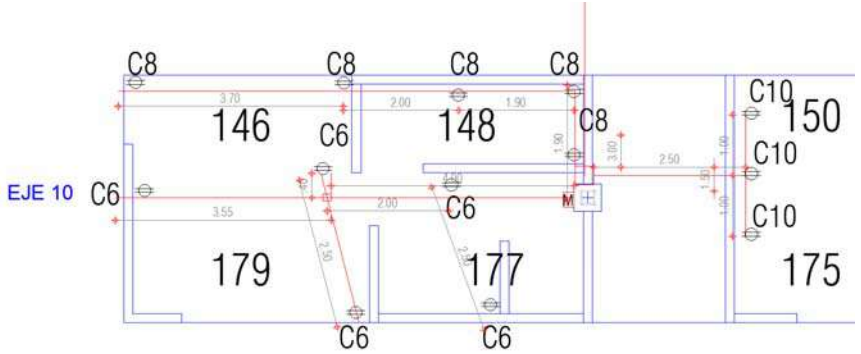




CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA DISTRIBUCION 1	6,70			0	0,00
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION DOBLE FONDO	0,45			0	0,00
CAJA DISTRIBUCION LOCAL - MEDIDOR	0,40			0	0,00
BUCLE MEDIDOR	0,30			0	0,00
MEDIDOR - CAJA DE DISTRIBUCION 1	0,40			0	0,00
BUCLE RETORNO CAJA DISTRIBUCION 1	0,45			0	0,00
CAJA DISTRIBUCION 1 -TOMA 3	1,83			1	1,83
BUCLE TOMA 3	0,17			0	0,00
CAJA DE DISTRIBUCION 1 - CAJA DISTRIBUCION 2	2,40			1	2,40
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION 2	0,45			0	0,00
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 4	2,24			1	2,24
TOMA 4 - CAJA TOMA 5	2,16			1	2,16
BUCLE TOMA 4	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 5	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 2 EJE 9 LOCAL CARNICOS 145-109-110 ILUMINACION					
MEDIDOR - CAJA DE DISTRIBUCION 1	0,40			0	0,00
BUCLE RETORNO CAJA DISTRIBUCION 1	0,45			0	0,00
CAJA DE DISTRIBUCION 1 - CAJA DISTRIBUCION 2	2,40			0	0,00
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION 2	0,45			0	0,00
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 1	2,15			0	0,00
TOMA 1 - INTERRUPTOR DOBLE	0,40			0	0,00
BUCLE INTERRUPTOR DOBLE	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE INTERRUPTOR ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM 20.1.43	3,50			0	0,00
CIRCUITO 10 EJE 10 LOCALES 150-175					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			0	0,00
CAJA M10 - PRIMER TOMA TRAZADO SOBRE LOCALES 149 Y 176	7,00			1	7,00
BUCLE TOMA LOCAL 150	0,34			0	0,00
TOMA LOCAL 150 1 - TOMA LOCAL 150 2	1,00			1	1,00
TOMA LOCAL 150 1 - TOMA LOCAL 175	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 150 2	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 175	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 8 EJE 10 LOCALES 146 Y 148 DE CARNICOS ZONA 1					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00




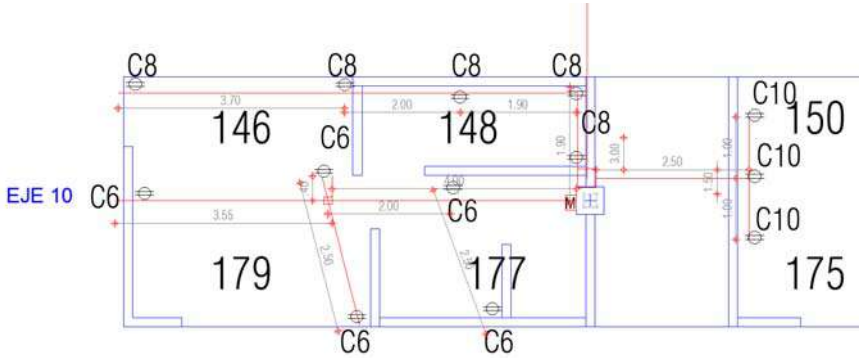





CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			0	0,00
CAJA M10 - CAJA DOBLE FONDO DISTRIBUCION 1	3,00			1	3,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			0	0,00
CAJA DOBLE FONDO 1 - MEDIDOR	4,00			1	4,00
BUCLE MEDIDOR	0,45			0	0,00
MEDIDOR - CAJA DOBLE FONDO 1 (RETORNO)	0,40			0	0,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			0	0,00
CAJA DOBLE FONDO - TOMA 1	0,40			1	0,40
BUCLE TOMA 1	0,34			0	0,00
TOMA 1 - TOMA 2	1,90			1	1,90
BUCLE TOMA 2	0,34			0	0,00
TOMA 2 - TOMA 3	1,90			1	1,90
BUCLE TOMA 3	0,34			0	0,00
TOMA 3 - TOMA 4	2,00			1	2,00
BUCLE TOMA 4	0,34			0	0,00
TOMA 4 - TOMA 5	3,70			1	3,70
BUCLE TOMA 5	0,15			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-5	-5,00
CIRCUITO 6 EJE 10 LOCALES 146 Y 148 DE CARNICOS ZONA 2					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			0	0,00
CAJA M10 - CAJA DOBLE FONDO DISTRIBUCION 1	3,00			0	0,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			0	0,00
CAJA DOBLE FONDO 1 - MEDIDOR	4,00			0	0,00
BUCLE MEDIDOR	0,45			0	0,00
MEDIDOR - CAJA DOBLE FONDO 1 (RETORNO)	0,40			0	0,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			0	0,00
CAJA DOBLE FONDO 1 - TOMA 6	2,00			1	2,00
BUCLE TOMA 6	0,34			0	0,00
TOMA 6 - CAJA DOBLE FONDO 2	2,00			1	2,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO 2	0,34			0	0,00
CAJA DOBLE FONDO 2 - TOMA 7	0,40			1	0,40
BUCLE TOMA 7	0,34			0	0,00
TOMA 7 - TOMA 8	3,55			1	3,55
BUCLE TOMA 8	0,17			0	0,00
TOMA 7 - TOMA 9	2,50			1	2,50
BUCLE TOMA 9	0,17			0	0,00
TOMA 6 - TOMA 10	2,50			1	2,50
BUCLE TOMA 10	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-5	-5,00
ETAPA 2					
TABLERO 2					
CIRCUITO 1 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00

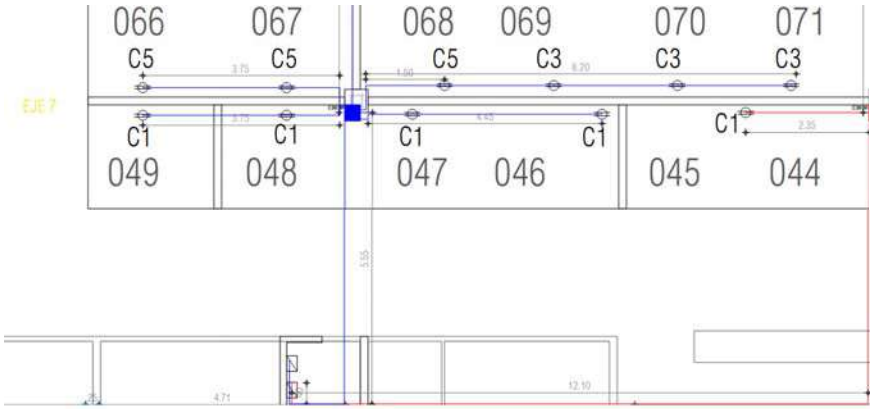

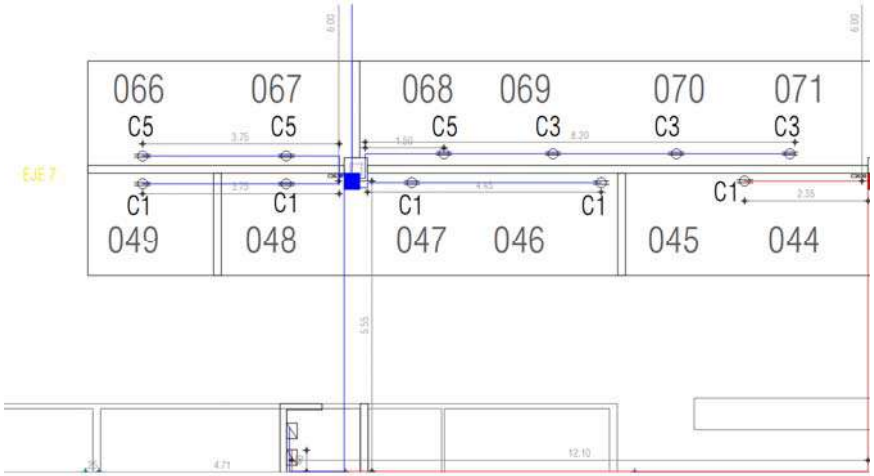

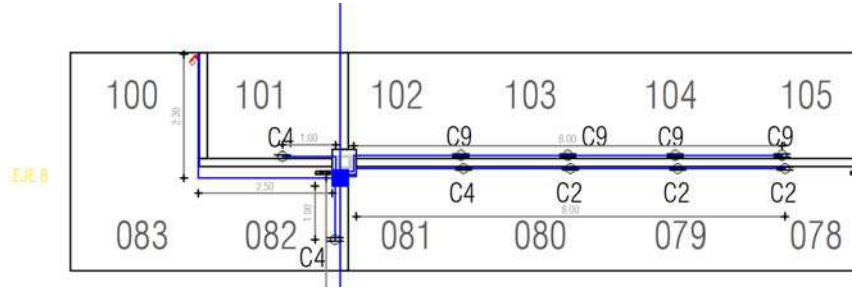



BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 049	3,75			1	3,75
BUCLE TOMA 1 LOCAL 049	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 048	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 046	4,45			1	4,45
BUCLE TOMA 1 LOCAL 046	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 047	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CIRCUITO 3 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 071	8,20			1	8,20
BUCLE TOMA 1 LOCAL 071	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 070	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 3 LOCAL 069	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 5 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 068	1,50			1	1,50
BUCLE TOMA 1 LOCAL 068	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 066	3,75			1	3,75
BUCLE TOMA 1 LOCAL 066	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 067	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-2	-2,00
CIRCUITO 4 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 082	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 082	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 101	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 101	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00

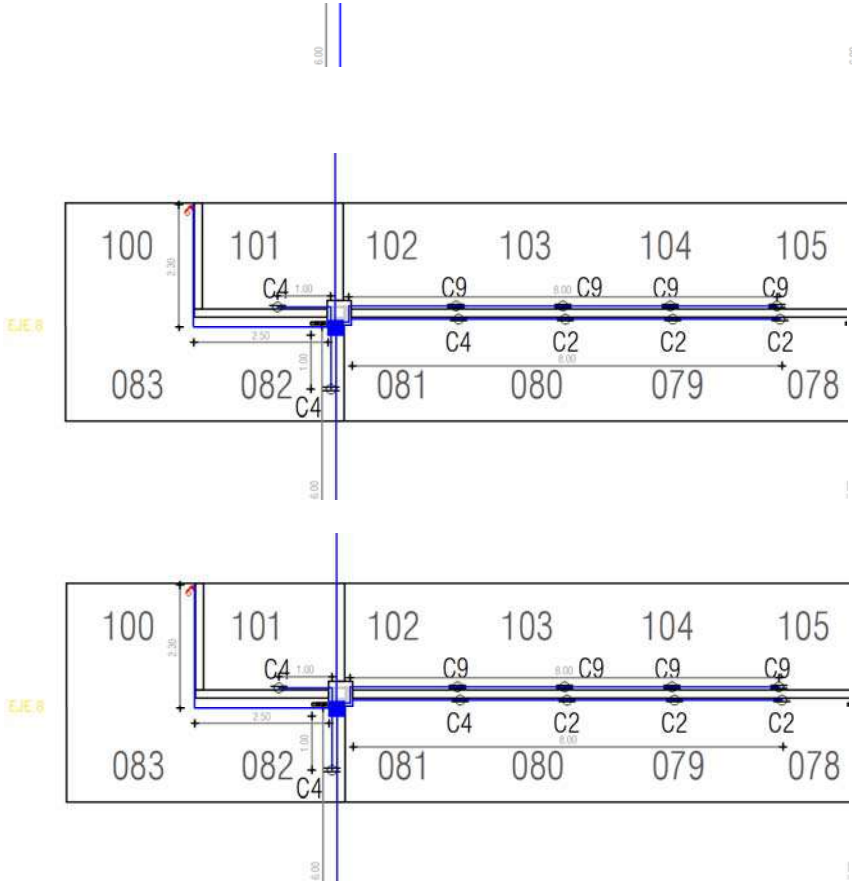



CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 81	2,00			1	2,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 81	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CAJA O8 - CAJA DE PASO SOBRE TECHO	5,50			1	5,50
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			0	0,00
CAJA DE PASO CAJA BAJANTE	2,30			1	2,30
CAJA BAJANTE INTERRUPTOR	0,70			1	0,70
BUCLE INTERUPTOR	0,70			0	0,00
DESCUENTO CABLE INTERRUPTOR ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM 20.1.43	3,50			-1	-3,50
CIRCUITO 9 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 105	8,00			1	8,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 105	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 104	0,34			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 103	0,34			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 102	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-4	-4,00
CIRCUITO 2 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 77	8,00			1	8,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 77	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 78	0,34			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 79	0,34			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 6 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - CAJA EJE O9	4,60			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O9	0,60			0	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 116	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 116	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 138	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 138	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00

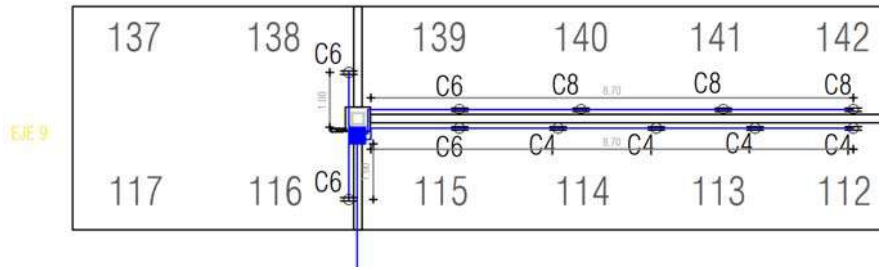

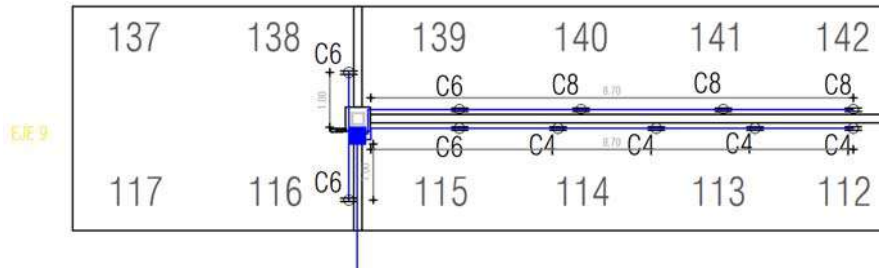

CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 139	1,60			1	1,60
BUCLE TOMA 1 LOCAL 139	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 115	1,60			1	1,60
BUCLE TOMA 1 LOCAL 115	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-1	-1,00
CIRCUITO 8 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - CAJA EJE O9	4,60			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O9	8,00			0	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 142	8,70			1	8,70
BUCLE TOMA 1 LOCAL 142	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 141	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 140	0,17			0	0,00
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-3	-3,00
CIRCUITO 4 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - CAJA EJE O9	4,60			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O9	8,00			0	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 111	8,70			1	8,70
BUCLE TOMA 1 LOCAL 111	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 112	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 2 LOCAL 113	0,17			0	0,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 114	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			-4	-4,00
MENOS COBRADO A LA FECHA	151,83			-1	-151,83
			Subtotal		49,82
			Vienen		
			TOTAL		49,82

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 43	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de salida de tomacorriente monofásico doble GFCI, con tapa para intemperie. Hasta 1 metro Se utilizará cable aislado de cobre calibre 12 AWG (No. 12), tipo	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

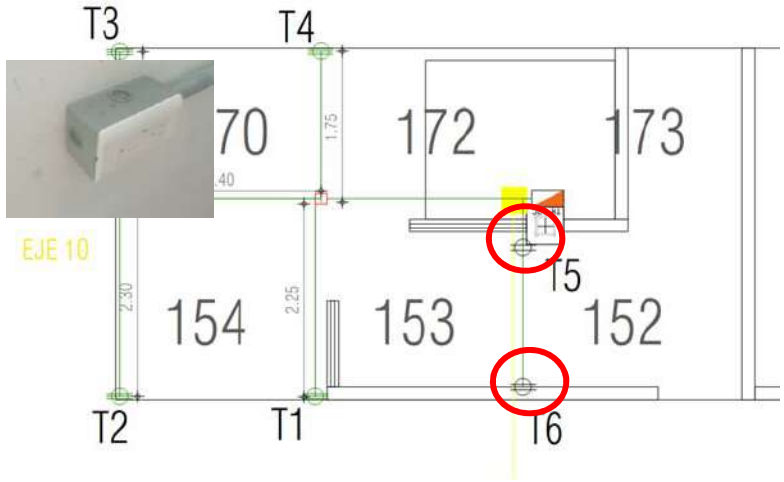

Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
LOCAL 170 154 153 152 172 173					
TOMA 1				1,00	1,00
TOMA 2				1,00	1,00
					0,00
					0,00
Subtotal					2,00
Cobrado a la fecha					
TOTAL					2,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 45	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación Riel chanel ranurado de 4X2	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD



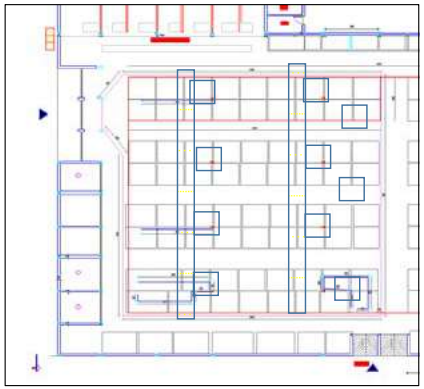

Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Canti Tramo	Area		
ETAPA 2					
SOPORTES PARA CAJAS DE 30X30	0,60	4,00		10	24,00
SOPORTES PARA TUBERIAS EJE M	0,60	3,00		13	23,40
	0,60	2,00		6	7,20
SOPORTES PARA TUBERIAS EJE O	0,60	3,00		9	16,20
	0,60	2,00		8	9,60
DESCUENTO COBRADO ACTA 8	70,00	0,60		-1	-42,00
Subtotal					38,40
Vienen					
TOTAL					38,40

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 46	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 1#10F + 1#1ON +1#10T (libre de halogenos)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Vertical	Long Total		
TOMA 1 A CAJA 10X10	2,25	0,40	2,65	1,00	2,65
TOMA 2 A CAJA 10X10	4,70	0,40	5,10	1,00	5,10
TOMA 3 A CAJA 10X10	4,10	0,40	4,50	1,00	4,50
TOMA 4 A CAJA 10X10	1,75	0,40	2,15	1,00	2,15
CAJA 10X10 A TABLERO	2,45	0,40	2,85	1,00	2,85
					0,00
					0,00
DESCUENTO TOMARIA EN PUNTOS	1,00			-4,00	-4,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					13,25
Vienen					
TOTAL					13,25

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 50	DESCRIPCIÓN	Bajante Aguas Lluvias pvc-ll ø 4" (Incluye Accesorios)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

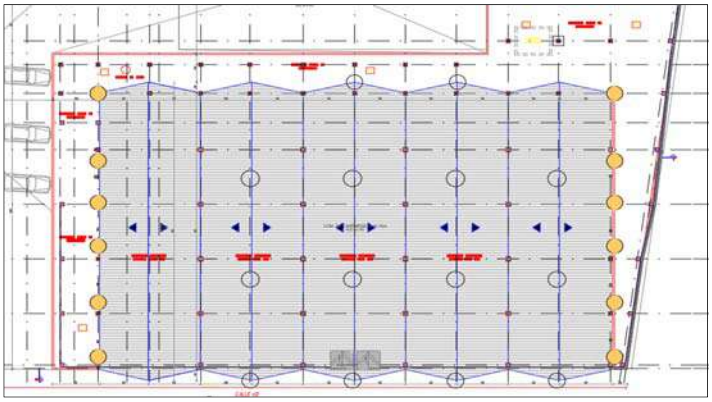





Localización	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud Horizontal	Longitud Vertical	Longitud Total		
BAJANTES DE COSTADO ORIENTAL		1,20	1,20	6,00	7,20
BAJANTES DE COSTADO OCCIDENTAL		1,20	1,20	6,00	7,20
COLUMNA EJE 8 Q		5,94	5,94	1,00	5,94
COLUMNA EJE 8 Q		5,94	5,94	1,00	5,94
COLUMNA EJE 9 S		5,94	5,94	1,00	5,94
COLUMNA EJE 9 R		5,94	5,94	1,00	5,94
Subtotal					38,16
Vienen					
TOTAL					38,16

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	52	DESCRIPCIÓN	Red Sanitaria de Ø 4" (PVC)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

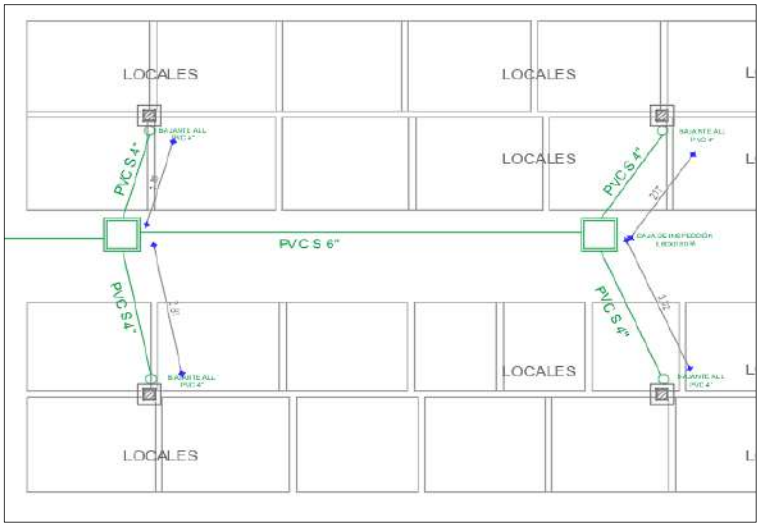

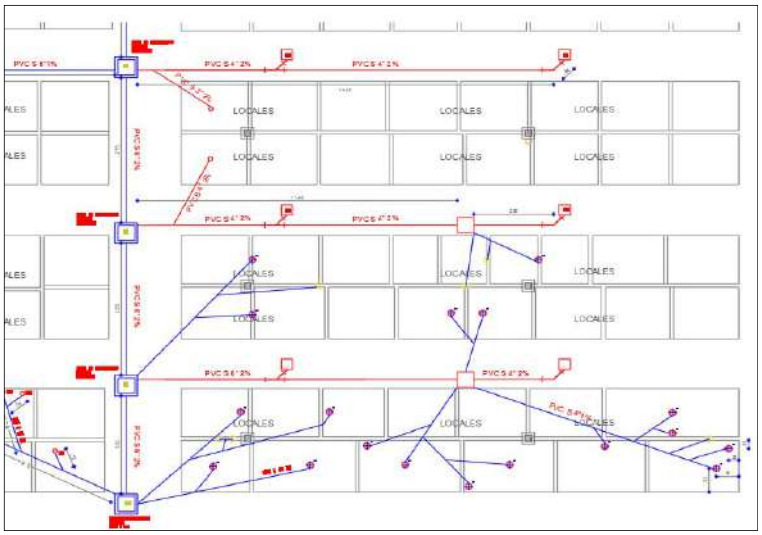



Localización	DIMENSIONES Ancho	Largo	Area	No. Elementos	Medida Total
S Q					
AGUAS LLUVIAS					
Tramo 1 / Eje 8 - Q		2,17		1,00	2,17
Tramo 2 / Eje 8 - S		1,86		1,00	1,86
Tramo 3 / Eje 9 - Q		3,02		1,00	3,02
Tramo 4 / Eje 9 - S		2,81		1,00	2,81
AGUAS RESIDUALES					
Tramo 1 entre Eje 7-8		14,88		1,00	14,88
		0,56		2,00	1,12
Tramo 3 entre Eje 8-9		2,85		1,00	2,85
		11,43		1,00	11,43
		0,56		2,00	1,12
Tramo 4 entre Eje 9-10		2,85		1,00	2,85
		11,43		1,00	11,43
		0,56		2,00	1,12
Tramo 5 entre caja y local de santa marta		9,24		1,00	9,24
Subtotal					65,90
Vienen					
TOTAL					65,90

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	53	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 6" en PVC (incluye accesorios)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

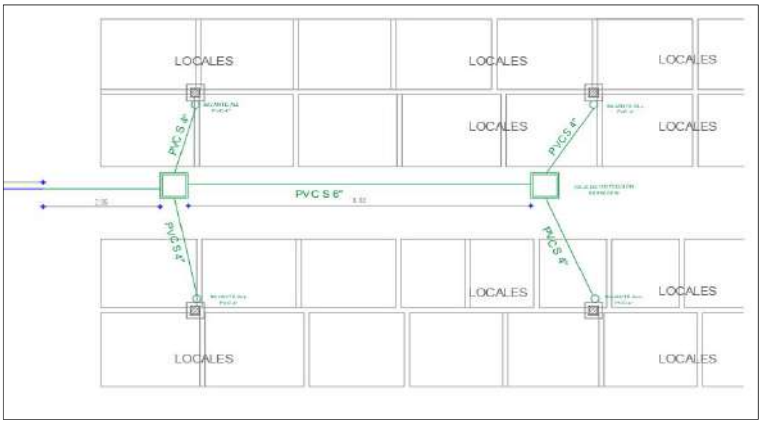



Localización	DIMENSIONES Ancho	Largo	Area	No. Elementos	Medida Total
AGUAS LLUVIAS					
Tramo 1 / Entre eje 8 y 9		8,63		1,00	8,63
Tramo 1 / Entre eje 8 y 9 a caja de inspeccion		2,95		1,00	2,95
Subtotal					11,58
Vienen					
TOTAL					11,58

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	55	DESCRIPCIÓN	Red Suministro agua fria pvc-p 1/2" (Incluye Accesorios)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

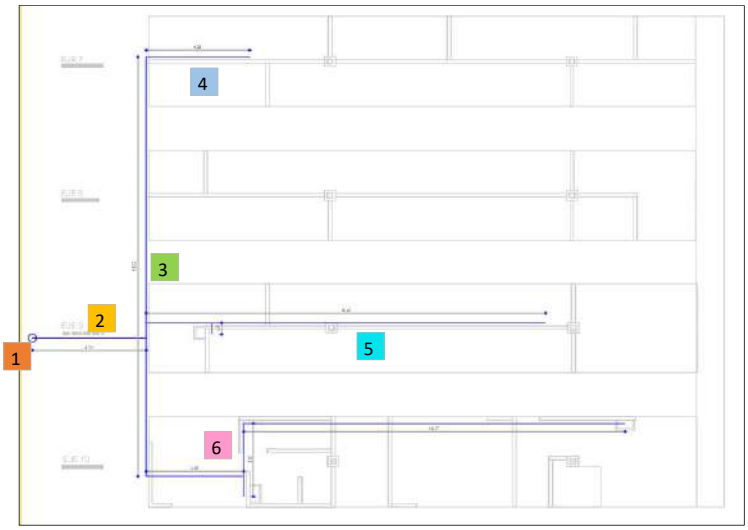





Localización	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Ancho	Largo	Area		
ETAPA # 2					
Tramo # 1 / Bajando de cubierta		4,50		1,00	4,50
Tramo # 2 / cruce circulacion		4,71		1,00	4,71
Tramo # 3 / sobre circulacion		19,02		1,00	19,02
Tramo # 4 / sobre eje 7		4,28		1,00	4,28
Tramo # 5 / sobre eje 9		17,04		1,00	17,04
Tramo # 6 / sobre eje 10		23,11		1,00	23,11
Subtotal					72,66
Vienen					
TOTAL					72,66

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de Interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	55	DESCRIPCIÓN	Red Suministro agua fria pvc-p 1/2" (Incluye Accesorios)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

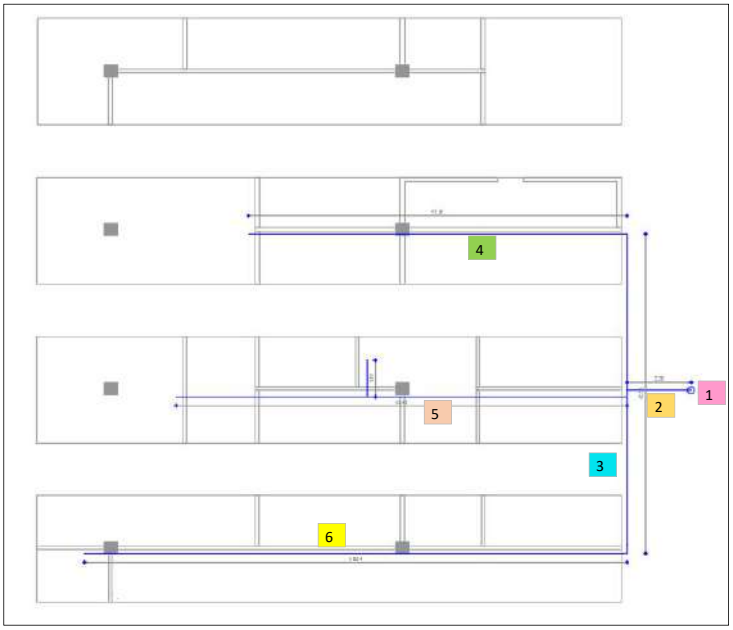





Localización	DIMENSIONES Ancho	Largo	Area	No. Elementos	Medida Total
ETAPA # 1					
Tramo # 1 / Bajando de cubierta		4,50		1,00	4,50
Tramo # 2 / cruce circulacion		2,20		1,00	2,20
Tramo # 3 / sobre circulacion		12,04		1,00	12,04
Tramo # 4 / sobre eje 8		13,01		1,00	13,01
Tramo # 5 / sobre eje 9		16,89		1,00	16,89
Tramo # 6 / sobre eje 10		18,64		1,00	18,64
Subtotal					67,28
Vienen NP55					72,66
TOTAL					139,94

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 58	DESCRIPCIÓN	Sifón Piso Punto desague pvc ø 4" (sifón)	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

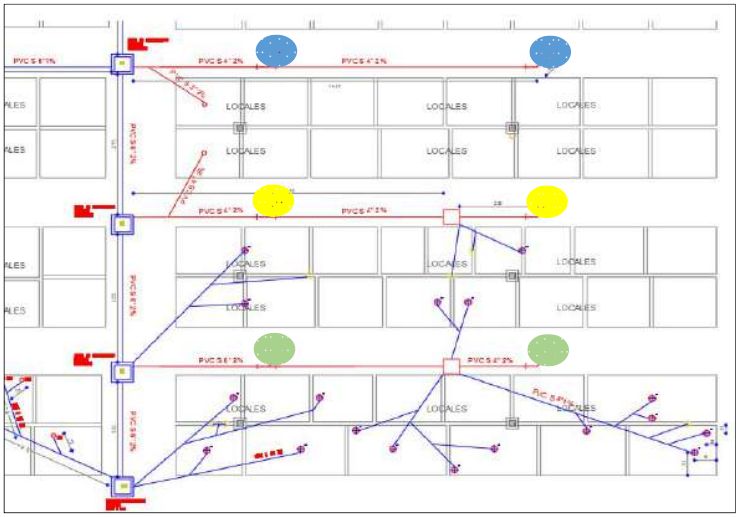

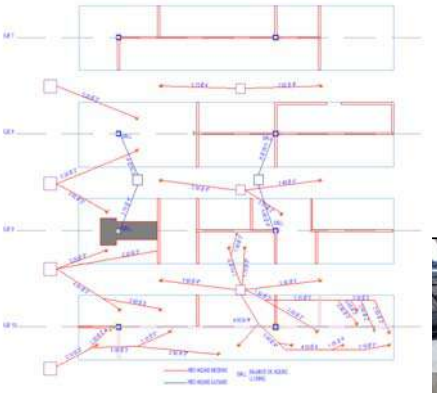



Localización	DIMENSIONES Ancho	Largo	Area	No. Elementos	Medida Total
ETAPA 2					
EJE 7					
LOCAL 041					1,00
			TOTAL EJE 7		1,00
EJE 8					
LOCALES 075, 076, 108 Y 107					3,00
LOCALES 079 Y 080					1,00
			TOTAL EJE 8		4,00
EJE 9					
LOCALES 040 Y 039					3,00
			TOTAL EJE 9		3,00
EJE 10					
LOCALES 153, 154, 170 Y 172					3,00
			TOTAL EJE 10		3,00
			TOTAL ETAPA 2		11,00
ETAPA 1					
EJE 8					
LOCAL 085					1,00
LOCAL 098					1,00
			TOTAL EJE 8		2,00
EJE 9					
LOCALES 129 Y 126					2,00
LOCAL 134					1,00
LOCALES 122 Y 123					2,00
LOCAL 125					1,00
			TOTAL EJE 9		6,00
EJE 10					
LOCALES 155 Y 158					2,00
LOCALES 161 Y 160					2,00
LOCAL 164					2,00
LOCAL166					1,00
LOCAL165					1,00
LOCAL169					1,00
			TOTAL EJE 10		9,00
			TOTAL ETAPA 1		17,00
Subtotal					28,00
Vienen					
TOTAL					28,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	24	MM	2	AA	2025	ACTA N°	CORTE 1	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	NP	ITEM	NP59	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación Rejilla Piso de 3"	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

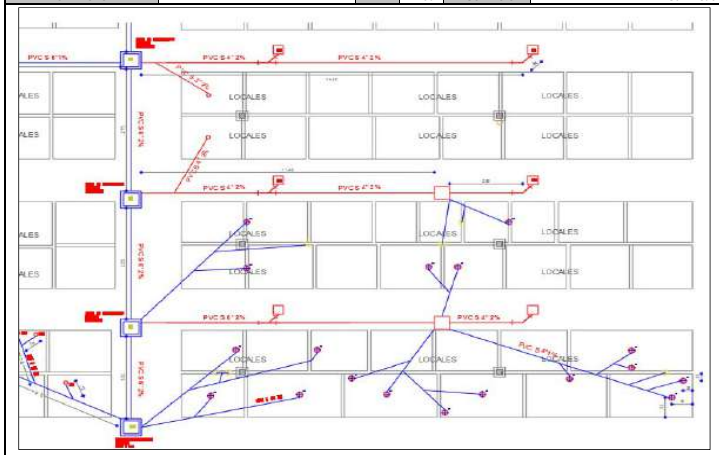

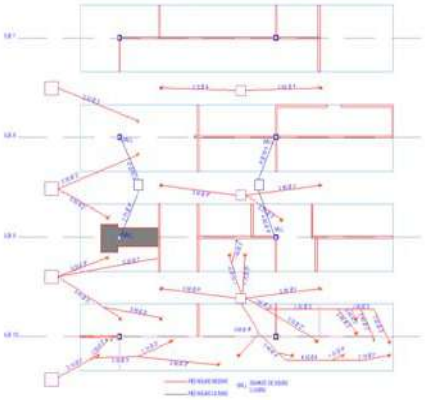



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ETAPA 2					
EJE 7					
LOCAL 041					1,00
			TOTAL EJE 7		1,00
EJE 8					
LOCALES 075, 076, 108 Y 107					3,00
LOCALES 079 Y 080					1,00
			TOTAL EJE 8		4,00
EJE 9					
LOCALES 040 Y 039					3,00
			TOTAL EJE 9		3,00
EJE 10					
LOCALES 153, 154, 170 Y 172					3,00
			TOTAL EJE 10		3,00
			TOTAL ETAPA 2		11,00
ETAPA 1					
EJE 8					
LOCAL 085					1,00
LOCAL 098					1,00
			TOTAL EJE 8		2,00
EJE 9					
LOCALES 129 Y 126					2,00
LOCAL 134					1,00
LOCALES 122 Y 123					2,00
LOCAL 125					1,00
			TOTAL EJE 9		6,00
EJE 10					
LOCALES 155 Y 158					2,00
LOCALES 161 Y 160					2,00
LOCAL 164					2,00
LOCAL166					1,00
LOCAL165					1,00
LOCAL169					1,00
			TOTAL EJE 10		9,00
			TOTAL ETAPA 1		17,00
Subtotal					28,00
Vienen					
TOTAL					28,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 63	DESCRIPCIÓN	Sifón Piso Punto desague pvc ø 3" (sifón)	UNID	UNIDAD	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

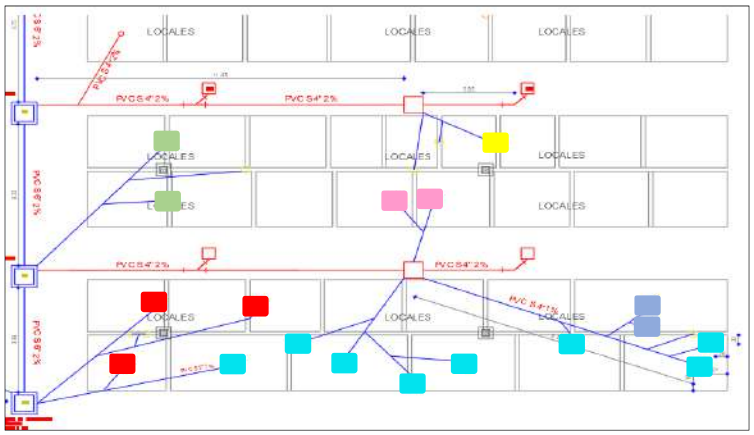







Localización	DIMENSIONES Ancho	Largo	Area	No. Elementos	Medida Total
EJE 9					
Locales 134/135/118/119				2,00	2,00
Locales 132/131				2,00	2,00
Locales 130/125/124				1,00	1,00
EJE 10					
Locales 155/156/157/169				3,00	3,00
Locales 162/161				2,00	2,00
Locales 168/167/166/165/164				8,00	8,00
Subtotal					18,00
Vienen					
TOTAL					18,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	31	MM	1	AA	2026	ACTA N°	CORTE 10	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM		NP 67	DESCRIPCIÓN	Bordillo en ladrillo tolete para construcción de poyos (2 hiladas)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

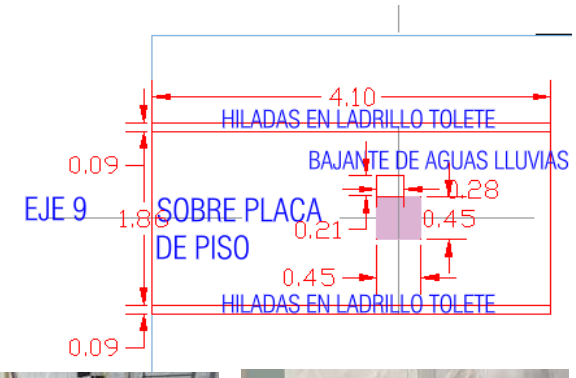







Localización	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Area	# Elementos	Medida Total
EJE 8					
Longitudinal		4,10		1,00	4,10
		4,10		1,00	4,10
		1,80		1,00	1,80
					0,00
HILADA DE LADRILLOS SOBRE LOCALES 168, 167, 166, 165 Y 164					
		2,00		1,00	2,00
		7,11		1,00	7,11
		3,33		1,00	3,33
Subtotal					22,44
Vienen					
TOTAL					22,44

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	25	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	NO PREVISTOS	ITEM	NP 72	DESCRIPCIÓN	Desmonte cerramiento en lamina ondulada de zinc h=3.00 m (incluye retiro de sobrantes)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

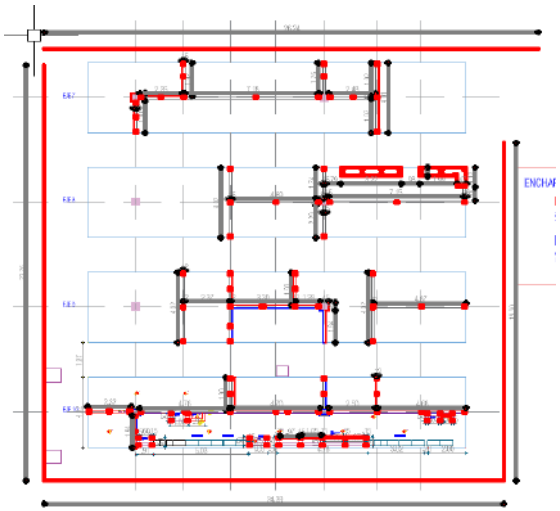




Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
CERRAMIENTOS PARALELO AL EJE R POR EL COSTADO OCCIDENTAL	21,87				21,87
CERRAMIENTOS PARALELO AL EJE 10 POR EL COSTADO SUR	24,39				24,39
CERRAMIENTOS PARALELO AL EJE S POR EL COSTADO ORIENTAL	17,41				17,41
CERRAMIENTOS PARALELO AL EJE 7 POR EL COSTADO NORTE	26,24				26,24

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 81	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación Canal en lamina galvanizada calibre 18, desarrollo de 81 cms, incluye accesorios de fijación, soldadura, wash primer y anticorrosivo -no incluye andamios	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

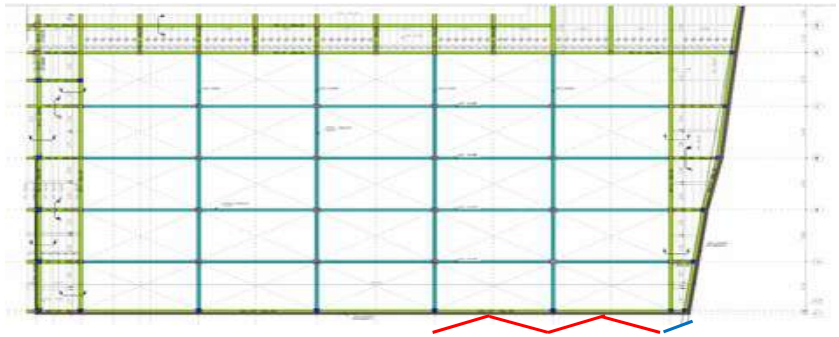









Localización	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
TRAMO 1	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00
TRAMO 2	0,00	5,30	0,00	4,00	21,20
Subtotal					23,20
Vienen					
TOTAL					23,20

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 83	DESCRIPCIÓN	CUBIERTA EN TEJA DE 300 mm de ancho util CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye, instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	UNID	M2	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

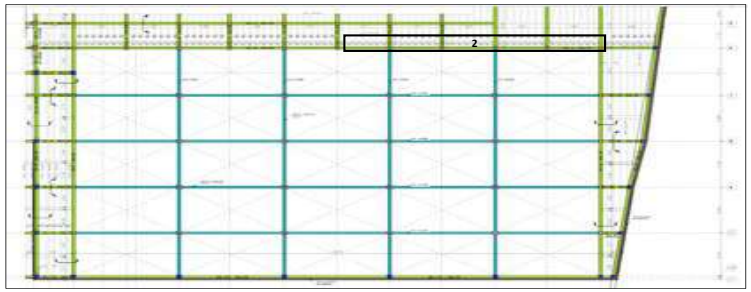

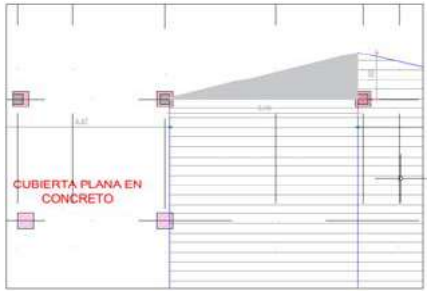



AREA DE INTERVENCION= 5,10 X 1,80 = 9,18 / 2 : 4,59 M2





Localización	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Ancho	Longitud	Area		
AREA 2 PUNTAS DE CUBIERTA TRIANGULARES	5,10	1,80	4,59	10,00	45,90
Subtotal					45,90
Vienen					
TOTAL					45,90

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES


FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 86	DESCRIPCIÓN	Torre puente de andamio multidireccional de2,13X19,06 a 3 mts Base Plana (ALQUILER) TUNEL.	UNID	Dia	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN



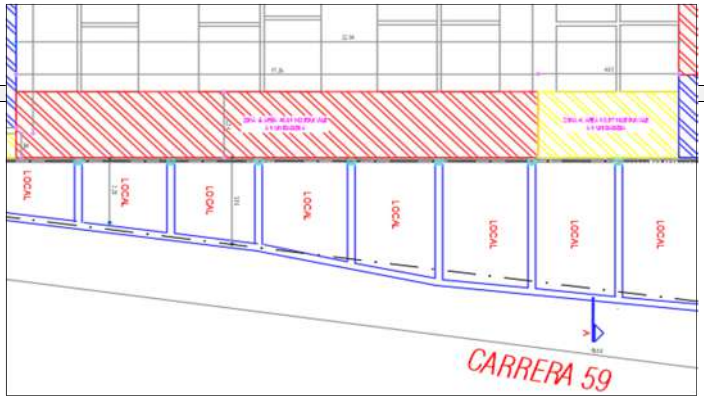







Localización	DIMENSIONES Ancho	Largo	Area	Equivalencia Dia	Medida Total
ZONA # 1	10,63	3,82	40,61	1,00	1,00
ZONA # 2	10,63	3,82	40,61	1,00	1,00
ZONA # 3	3,82	2,94	11,23	0,28	0,28
TOTAL DE PLATAFORMA EN DIAS					2,28
DIAS FEBRERO	DIAS DE ALQUILER			CANT DE TORRES	
1/02/2026 28/02/2026	28,00			2,28	63,74
ZONA # 4	4,69	2,34	10,97	0,27	0,27
ZONA # 5	17,35	2,34	40,60	1,00	1,00
TOTAL DE PLATAFORMA EN DIAS					1,27
DIAS FEBRERO	DIAS DE ALQUILER			CANT DE TORRES	
1/02/2026 15/02/2026	15,00			1,27	19,05
ZONA # 6	3,82	0,86	3,29	0,08	0,08
ZONA # 7	10,63	3,82	40,61	1,00	1,00
ZONA # 8	10,63	3,82	40,61	1,00	1,00
TOTAL DE PLATAFORMA EN DIAS					2,08
DIAS FEBRERO	DIAS DE ALQUILER			CANT DE TORRES	
1/02/2026 15/02/2026	15,00			2,08	31,22
Subtotal					114,01
Vienen					
TOTAL					114,01

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 91	DESCRIPCIÓN	Tablero de automáticos de 12 circuitos. Tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

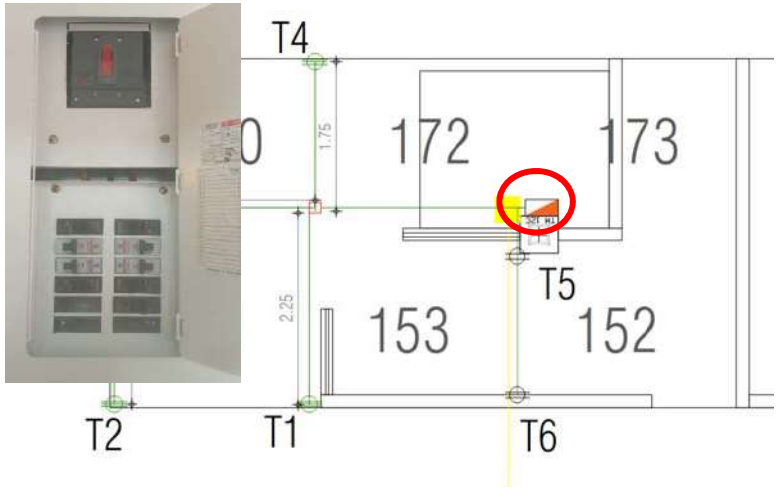

Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
TABLERO PARA LOCAL 170 154 153 152 172 173				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					1,00
Cobrado a la fecha					
TOTAL					1,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 92	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion Breaker 3x30 industrial	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

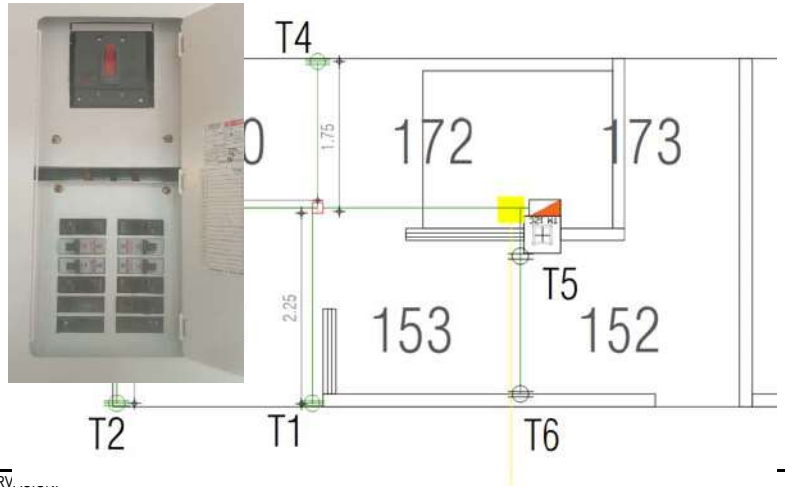

Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
LOCAL 170 154 153 152 172 173					
BREAKER PARA TOMA 1				1,00	1,00
BREAKER PARA TOMA 2				1,00	1,00
BREAKER PARA TOMA 3				1,00	1,00
BREAKER PARA TOMA 4				1,00	1,00
Subtotal					4,00
Cobrado a la fecha					
TOTAL					4,00

OBSERV...

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 93	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Salida Completa para Tomacorriente trifásico, en calibre 10 AWG (3F, N, T) y ducto EMT de 1" (Incluye aparato)	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN

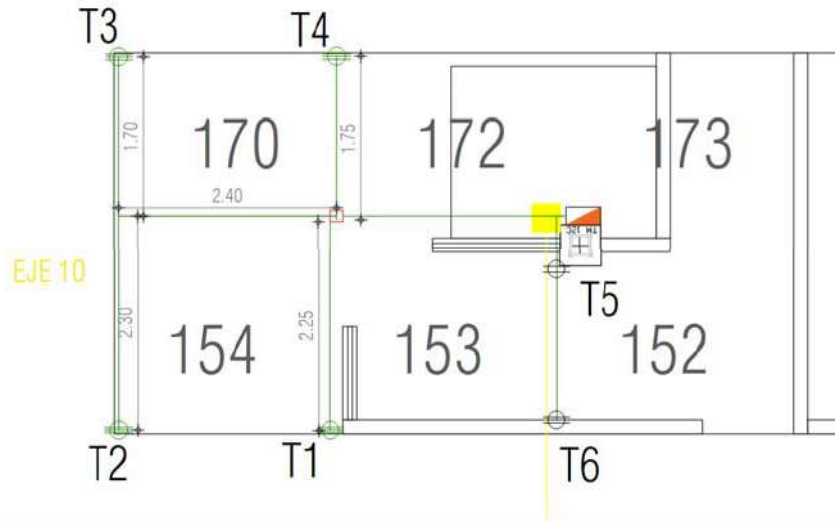

Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
LOCAL 170 154 153 152 172 173					
TOMA 1				1,00	1,00
TOMA 2				1,00	1,00
TOMA 3				1,00	1,00
TOMA 4				1,00	1,00
Subtotal					4,00
Cobrado a la fecha					
TOTAL					4,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. Dayra Corredor
TP: 25202-096647CND


SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	24	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	NP	ITEM	NP 96	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de rejilla de pisos de 40 x 40	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

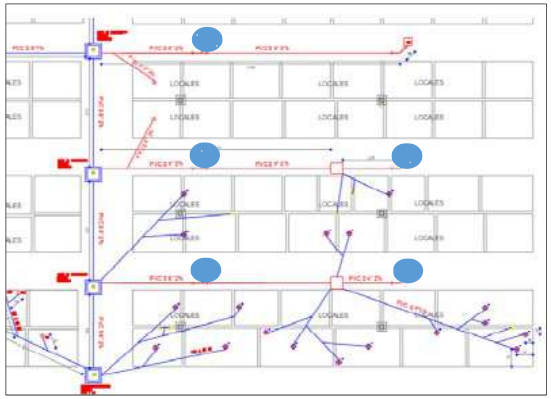

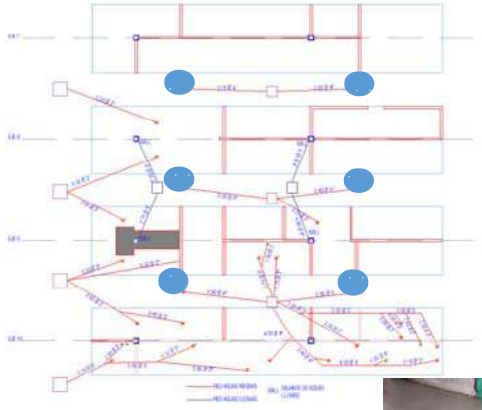




Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
ETAPA 2					
PASILLO EJE 9				2,00	2,00
PASILLLO EJE 8				2,00	2,00
PASILLO EJE 7				2,00	2,00
			TOTAL EJE 10		6,00
ETAPA 1					
PASILLO EJE 9				2,00	2,00
PASILLLO EJE 8				2,00	2,00
PASILLO EJE 7				2,00	2,00
			TOTAL EJE 10		6,00

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	24	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 1	ELABORÓ	Ing. Miguel Trujillo

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	NP	ITEM	NP 99	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de enchapes lineales	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

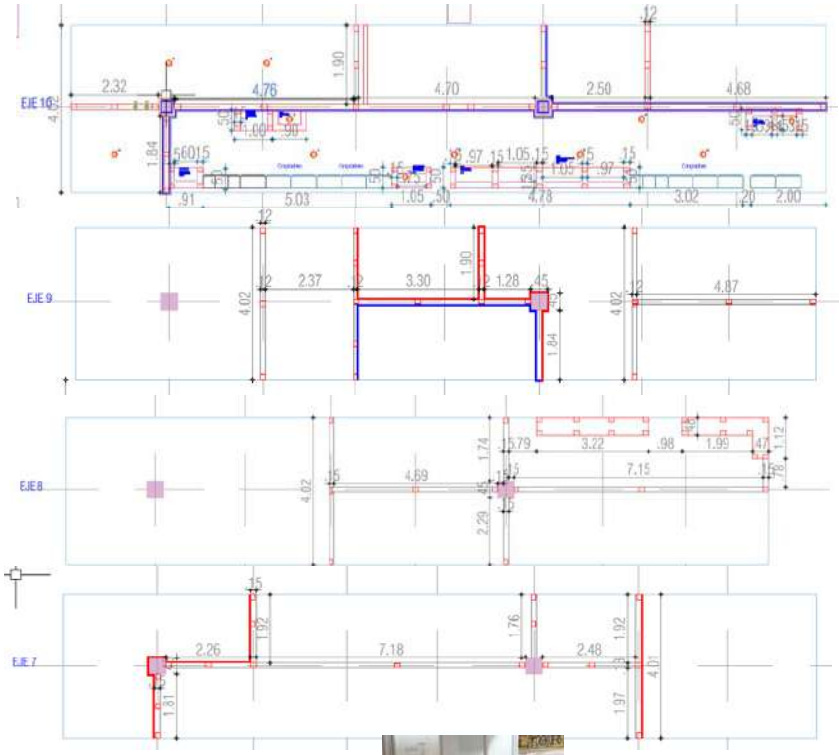



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ETAPA 2					
EJE 10					
LOCALES: 179, 177, 148 y 146	28,99			1,00	28,99
LOCALES: 152, 153, 154, 170, 172 y 173.	22,65			1,00	22,65
			TOTAL EJE 10		51,64
EJE 9					
LOCALES: 145, 109, 110.	2,50			1,00	2,50
LOCALES: 116, 117, 137, 138.	4,00			1,00	4,00
LOCALES 115, 114, 113, 112, 111.	10,65			1,00	10,65
			TOTAL EJE 9		17,15
EJE 8					
LOCAL 082. EJE 8.	2,65			1,00	2,65
			TOTAL EJE 8		2,65
EJE 7					
LOCALES: 041, 042, 043.	4,00			1,00	4,00
LOCALES: 044, 045.	2,65			1,00	2,65
			TOTAL EJE 7		6,65
			TOTAL ETAPA 2		78,09
ETAPA 1					
EJE 7					
LOCALES 050, 051, 053 Y 054. MUROS	1,35			4,00	5,40
			TOTAL EJE 7		5,40
EJE 8					
LOCALES 090, 091. MESONES.	0,74			12,00	8,88
	3,28			2,00	6,56
	2,00			2,00	4,00
	1,12			1,00	1,12
	0,62			1,00	0,62
LOCALES 090, 091. EJE 8. MUROS	1,22			2,00	2,44
	1,25			6,00	7,50
EJE 8 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	1,35			4,00	5,40
			TOTAL EJE 8		31,12
EJE 9					
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	1,35			6,00	8,10
LOCALES 127 Y 128. MUROS	0,86			6,00	5,16
LOCAL 131. MUROS	1,25			2,00	2,50
LOCALES 125, 130 Y 124. MUROS	1,35			4,00	5,40
			TOTAL EJE 9		21,16





EJE 10					
LOCAL 162. MUROS	2,15			5,00	10,75
LOCAL 160. MUROS	1,35			2,00	2,70
	1,35			3,00	4,05
	0,90			2,00	1,80
LOCAL 169. MUROS	8,00			1,00	8,00
	1,35			2,00	2,70
LOCALES 168, 167, 166, 165 Y 164	2,15			2,00	4,30
	0,75			22,00	16,50
	1,18			1,00	1,18
	4,50			2,00	9,00
	1,06			2,00	2,12
	1,07			2,00	2,14
	0,68			1,00	0,68
			TOTAL EJE 10		65,92
			TOTAL ETAPA 1		123,60
Subtotal					201,69
Vienen					
TOTAL					201,69

OBSERVACION:

Residente de obra
Ing. MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE
TP: 25202-164053 CND.


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 101	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación caja de paso 50x50	UNID	UN	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

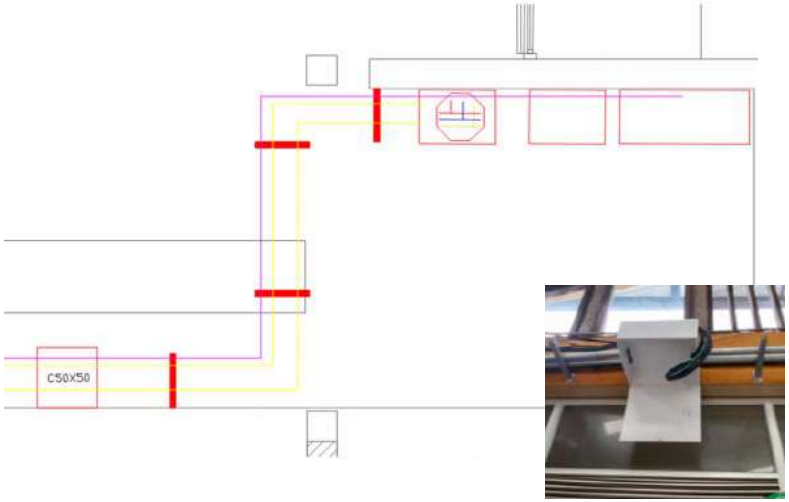

Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
CAJA DE PASO INICIAL ENTRE GABINETE - TABLEROS				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					1,00
Cobrado a la fecha					
TOTAL					1,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoría
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. JULIO TOVAR


OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901.463.604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568


CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 102	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cable desnudo No. 14	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

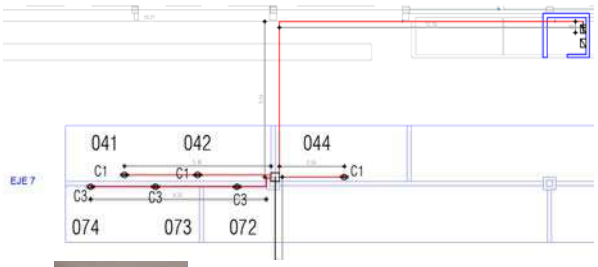







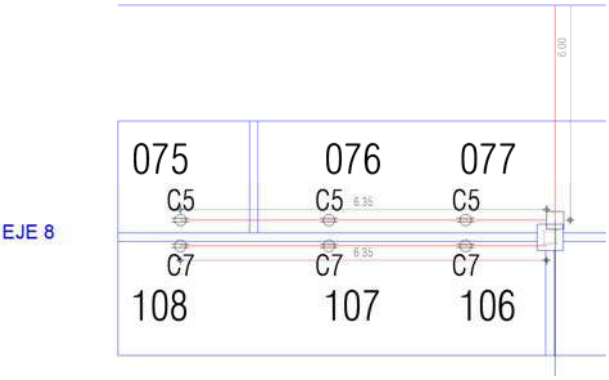


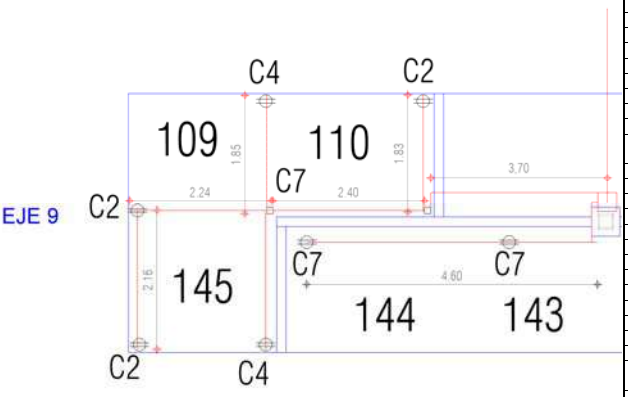



Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
ETAPA 2					
TABLERO 1					
BUCLE TABLERO	1,60			3	4,80
TABLERO 1 - CAJA EJE M7 (2 Tuberia EMT 1" + 1 Tuberia EMT 3/4")	21,64			3	64,92
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			3	1,80
CAJA EJE M7 - CAJA EJE M8 (2 Tuberia EMT 1" + 1 Tuberia EMT 3/4")	6,00			3,00	18,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			3,00	1,80
CAJA EJE M8 - CAJA EJE M9 (2 Tuberia EMT 1" + 1 Tuberia EMT 3/4")	6,00			2,00	12,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			2,00	1,20
CAJA EJE M9 - CAJA EJE M10 (2 Tuberia EMT 1" + 1 Tuberia EMT 3/4")	6,00			2,00	12,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			2,00	1,20
CIRCUITO 1 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 041	5,30			1	5,30
BUCLE TOMA 1 LOCAL 041	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 042	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CAJA M7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 044	2,35			1	2,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 044	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 3 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 074	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 074	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 073	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 072	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 5 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 075	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 075	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 076	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 077	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 7 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 108	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 108	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 107	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 106	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 7 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 144	6,35			1	6,35
BUCLE TOMA 1 LOCAL 144	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 143	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 4 EJE 9 LOCAL CARNICOS 145-109-110					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA DISTRIBUCION 1	6,70			1	6,70
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DISTRIBUCION LOCAL - MEDIDOR	0,40			1	0,40
BUCLE MEDIDOR	0,30			1	0,30
MEDIDOR - CAJA DE DISTRIBUCION 1	0,40			1	0,40
BUCLE RETORNO CAJA DISTRIBUCION 1	0,45			1	0,45

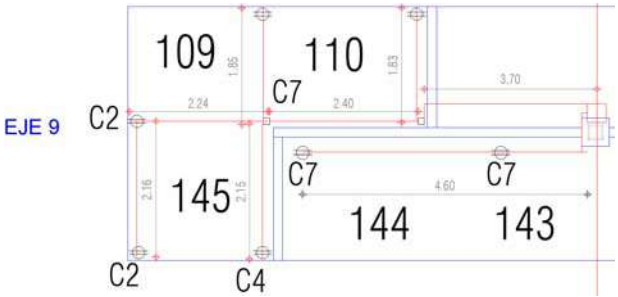




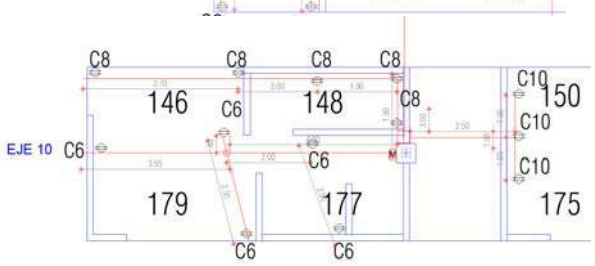


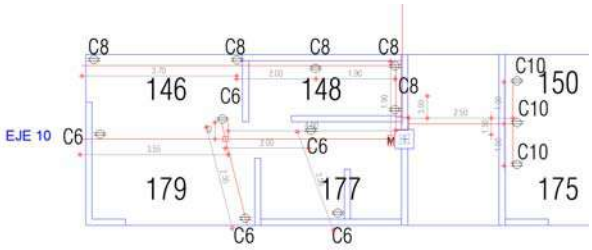


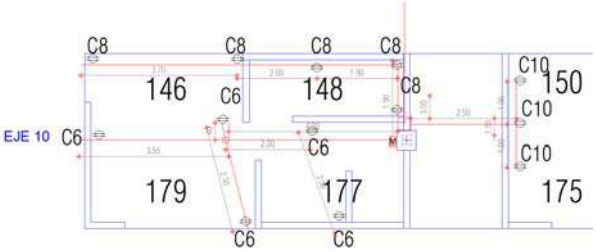



CAJA DE DISTRIBUCION 1 - CAJA DISTRIBUCION 2	2,40			1	2,40
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION 2	0,45			1	0,45
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 1	2,15			1	2,15
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 2	1,85			1	1,85
BUCLE TOMA 1	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 2 EJE 9 LOCAL CARNICOS 145-109-110					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA DISTRIBUCION 1	6,70			1	6,70
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DISTRIBUCION LOCAL - MEDIDOR	0,40			1	0,40
BUCLE MEDIDOR	0,30			1	0,30
MEDIDOR - CAJA DE DISTRIBUCION 1	0,40			1	0,40
BUCLE RETORNO CAJA DISTRIBUCION 1	0,45			1	0,45
CAJA DISTRIBUCION 1 -TOMA 3	1,83			1	1,83
BUCLE TOMA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE DISTRIBUCION 1 - CAJA DISTRIBUCION 2	2,40			1	2,40
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION 2	0,45			1	0,45
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 4	2,24			1	2,24
TOMA 4 - CAJA TOMA 5	2,16			1	2,16
BUCLE TOMA 4	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 2 EJE 9 LOCAL CARNICOS 145-109-110 ILUMINACION					
MEDIDOR - CAJA DE DISTRIBUCION 1	0,40			1	0,40
BUCLE RETORNO CAJA DISTRIBUCION 1	0,45			1	0,45
CAJA DE DISTRIBUCION 1 - CAJA DISTRIBUCION 2	2,40			1	2,40
BUCLE CAJA DE DISTRIBUCION 2	0,45			1	0,45
CAJA DE DISTRIBUCION 2 - TOMA 1	2,15			1	2,15
TOMA 1 - INTERRUPTOR DOBLE	0,40			1	0,40
BUCLE INTERRUPTOR DOBLE	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE INTERRUPTOR ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM 20.1.43	3,50			0	0,00
CIRCUITO 10 EJE 10 LOCALES 150-175					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			0	0,00
CAJA M10 - PRIMER TOMA TRAZADO SOBRE LOCALES 149 Y 176	7,00			1	7,00
BUCLE TOMA LOCAL 150	0,34			1	0,34
TOMA LOCAL 150 1 - TOMA LOCAL 150 2	1,00			1	1,00
TOMA LOCAL 150 1 - TOMA LOCAL 175	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 150 2	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 175	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 8 EJE 10 LOCALES 146 Y 148 DE CARNICOS ZONA 1					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			0	0,00
CAJA M10 - CAJA DOBLE FONDO DISTRIBUCION 1	3,00			1	3,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DOBLE FONDO 1 - MEDIDOR	4,00			1	4,00
BUCLE MEDIDOR	0,45			1	0,45
MEDIDOR - CAJA DOBLE FONDO 1 (RETORNO)	0,40			1	0,40
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DOBLE FONDO - TOMA 1	0,40			1	0,40
BUCLE TOMA 1	0,34			1	0,34
TOMA 1 - TOMA 2	1,90			1	1,90
BUCLE TOMA 2	0,34			1	0,34
TOMA 2 - TOMA 3	1,90			1	1,90
BUCLE TOMA 3	0,34			1	0,34
TOMA 3 - TOMA 4	2,00			1	2,00
BUCLE TOMA 4	0,34			1	0,34
TOMA 4 - TOMA 5	3,70			1	3,70
BUCLE TOMA 5	0,15			1	0,15
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 6 EJE 10 LOCALES 146 Y 148 DE CARNICOS ZONA 2					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 1 - CAJA EJE M7	21,64			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M7	0,60			0	0,00
CAJA M7 - CAJA M8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M8	0,60			0	0,00
CAJA M8 - CAJA M9	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M9	0,60			0	0,00
CAJA M9 - CAJA M10	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE M10	0,60			0	0,00
CAJA M10 - CAJA DOBLE FONDO DISTRIBUCION 1	3,00			1	3,00
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DOBLE FONDO 1 - MEDIDOR	4,00			1	4,00
BUCLE MEDIDOR	0,45			1	0,45
MEDIDOR - CAJA DOBLE FONDO 1 (RETORNO)	0,40			1	0,40
BUCLE CAJA DOBLE FONDO	0,45			1	0,45
CAJA DOBLE FONDO 1 - TOMA 6	2,00			1	2,00
BUCLE TOMA 6	0,34			1	0,34
TOMA 6 - CAJA DOBLE FONDO 2	2,00			1	2,00

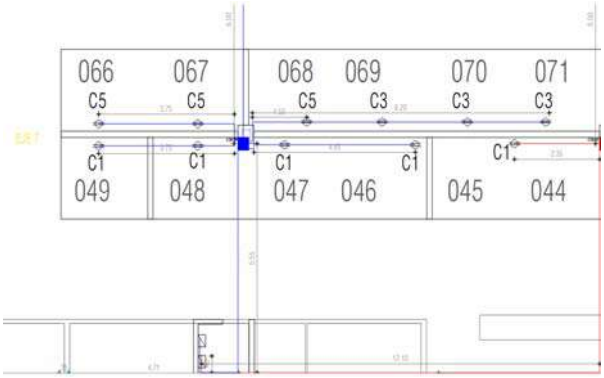


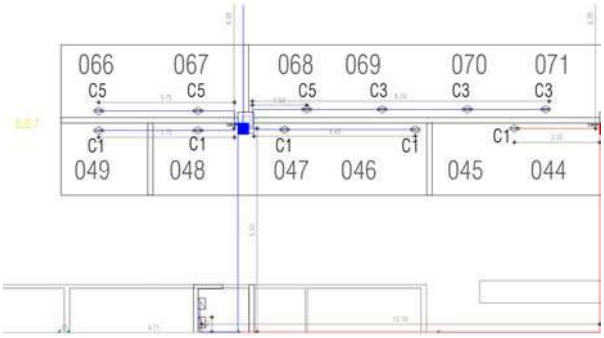

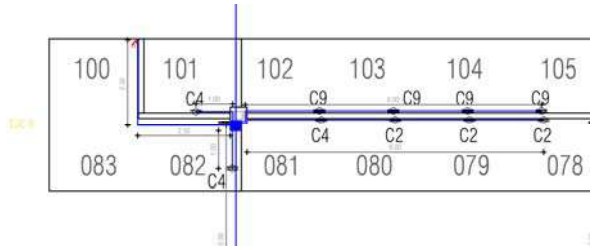


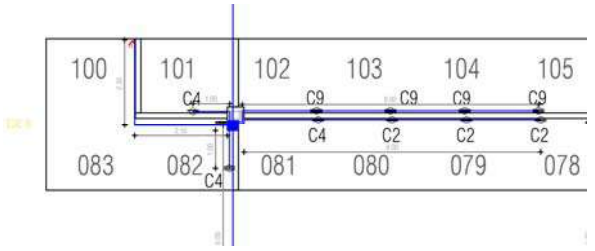


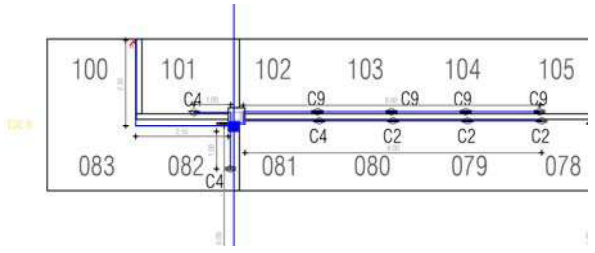





BUCLE CAJA DOBLE FONDO 2	0,34			1	0,34
CAJA DOBLE FONDO 2 - TOMA 7	0,40			1	0,40
BUCLE TOMA 7	0,34			1	0,34
TOMA 7 - TOMA 8	3,55			1	3,55
BUCLE TOMA 8	0,17			1	0,17
TOMA 7 - TOMA 9	2,50			1	2,50
BUCLE TOMA 9	0,17			1	0,17
TOMA 6 - TOMA 10	2,50			1	2,50
BUCLE TOMA 10	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
ETAPA 2					
TABLERO 2					
BUCLE TABLERO	1,60			2	3,20
TABLERO 2 - CAJA EJE O7 (2 Tuberia EMT 1")	10,46			2	20,92
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			2	1,20
CAJA EJE O7 - CAJA EJE O8 (2 Tuberia EMT 1")	6,00			2,00	12,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			2,00	1,20
CAJA EJE O8 - CAJA EJE O9 (2 Tuberia EMT 1")	6,00			1,00	6,00
BUCLE CAJA EJE O9	0,60			1,00	0,60
ETAPA 2					
TABLERO 2					
CIRCUITO 1 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 2 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 049	3,75			1	3,75
BUCLE TOMA 1 LOCAL 049	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 048	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 046	4,45			1	4,45
BUCLE TOMA 1 LOCAL 046	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 047	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 3 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 2 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 071	8,20			1	8,20
BUCLE TOMA 1 LOCAL 071	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 070	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 3 LOCAL 069	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 5 EJE 7					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 2 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 068	1,50			1	1,50
BUCLE TOMA 1 LOCAL 068	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CAJA O7 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 066	3,75			1	3,75
BUCLE TOMA 1 LOCAL 066	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 1 LOCAL 067	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 4 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 2 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 082	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 082	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 101	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 101	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 81	2,00			1	2,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 81	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CAJA O8 - CAJA DE PASO SOBRE TECHO	5,50			1	5,50
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO CAJA BAJANTE	2,30			1	2,30
CAJA BAJANTE INTERRUPTOR	0,70			1	0,70
BUCLE INTERUPTOR	0,70			1	0,70
DESCUENTO CABLE INTERRUPTOR ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM 20.1.43	3,50			0	0,00
CIRCUITO 9 EJE 8					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 2 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 105	8,00			1	8,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 105	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 104	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 103	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 102	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 2 EJE 8					










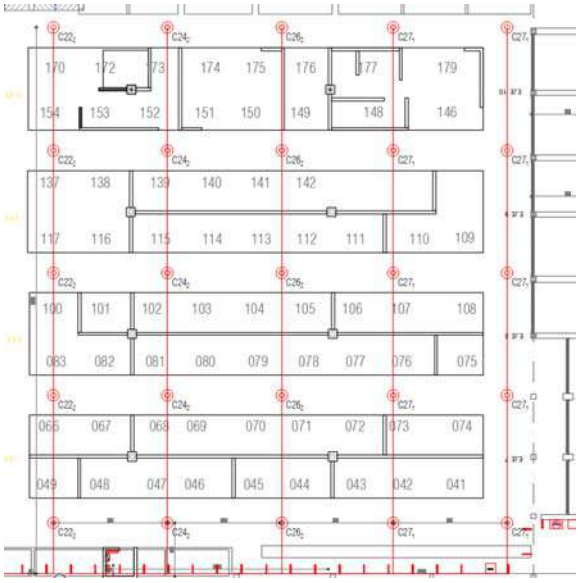


BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 2 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 77	8,00			1	8,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 77	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 78	0,34			1	0,34
BUCLE TOMA 2 LOCAL 79	0,34			1	0,34
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 6 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 2 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - CAJA EJE O9	4,60			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O9	0,60			0	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 116	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 116	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 138	1,00			1	1,00
BUCLE TOMA 1 LOCAL 138	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 139	1,60			1	1,60
BUCLE TOMA 1 LOCAL 139	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 115	1,60			1	1,60
BUCLE TOMA 1 LOCAL 115	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 8 EJE 9					
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 2 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - CAJA EJE O9	4,60			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O9	8,00			0	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 142	8,70			1	8,70
BUCLE TOMA 1 LOCAL 142	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 141	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 1 LOCAL 140	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITO 4 EJE 9					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			0	0,00
TABLERO 2 - CAJA EJE O7	10,46			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O7	0,60			0	0,00
CAJA O7 - CAJA EJE O8	6,00			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O8	0,60			0	0,00
CAJA O8 - CAJA EJE O9	4,60			0	0,00
BUCLE CAJA EJE O9	8,00			0	0,00
CAJA O9 - BASE COLUMNA	4,60			1	4,60
BASE COLUMNA - TOMA FINAL LOCAL 111	8,70			1	8,70
BUCLE TOMA 1 LOCAL 111	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 112	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 2 LOCAL 113	0,17			1	0,17
BUCLE TOMA 1 LOCAL 114	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 43	1,00			0	0,00
CIRCUITOS DE ILUMINACION PASILLOS					
TABLERO 1					
CIRCUITO 27					
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO NORTE	7,10			1	7,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			0	0,00
CIRCUITO 25					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO NORTE	9,90			1	9,90

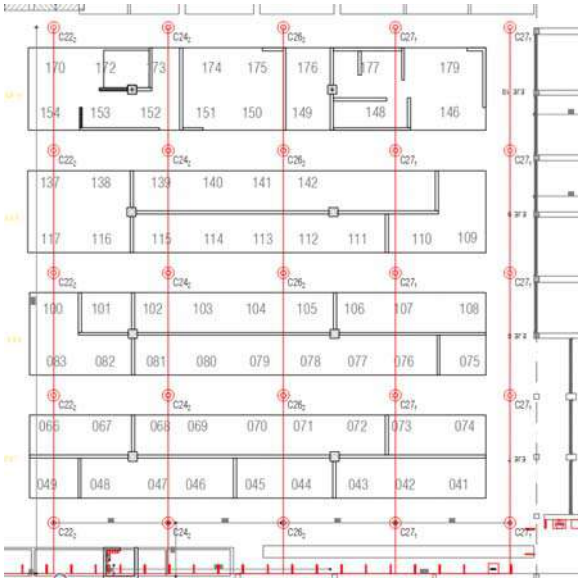

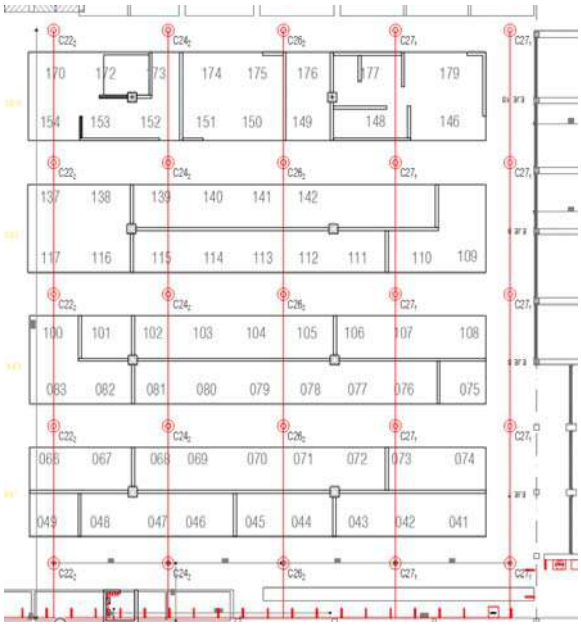



BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO NORTE - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 SEGUNDO PASILLO NORTE	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			0	0,00
TABLERO 2				1	0,00
CIRCUITO 26					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO CENTRAL	16,10			1	16,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO CENTRAL - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 PASILLO CENTRAL	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			0	0,00
CIRCUITO 24					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO SUR	22,10			1	22,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 SEGUNDO PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 SEGUNDO PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,10			1	1,10
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			0	0,00
CIRCUITO 24					0,00
BUCLE TABLERO	1,60			1	1,60
TABLERO A CAJA DE PASO	2,75			1	2,75
BUCLE CAJA DE PASO	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO SUR	28,10			1	28,10
BUCLE CAJA DE PASO 1	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 1	1,70			1	1,70

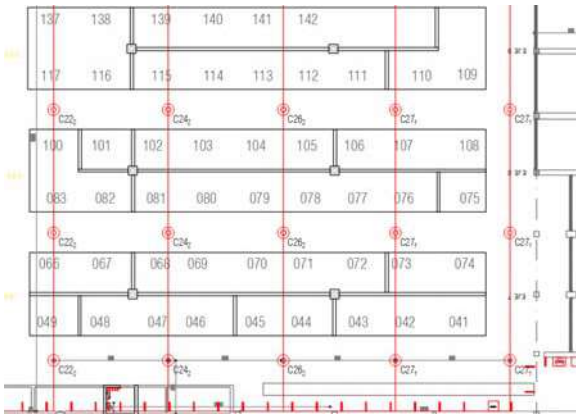

BUCLE LUMINARIA 1	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 1 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 2	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 2	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 2	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 2 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 3	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 3	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 3	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 4 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 4	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 4	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 4	0,17			1	0,17
CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 3 PASILLO SUR - CAJA DE PASO A DERIVACION LUMINARIA 5 PASILLO SUR	6,00			1	6,00
BUCLE CAJA DE PASO 5	0,45			1	0,45
CAJA DE PASO A SALIDA TOMA LUMINARIA 5	1,70			1	1,70
BUCLE LUMINARIA 5	0,17			1	0,17
DESCUENTO CABLE TOMAS ESTE CIRCUITO SEGÚN ITEM NP 40	1,00			0	0,00
Subtotal					757,50
Vienen					
TOTAL					757,50

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Ali Parra
MAT. CN205-11308

Residente de interventoría
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 103	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cable desnudo No. 6	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD





Localización	DIMENSIONES Largo	Alto	Area	No Elem	Medida Total
ALIMENTACION A TABLEROS					
MEDIDOR BUCLE	2,00			1,00	2,00
MEDIDOR - COFRE EXISTENTE	0,05			1,00	0,05
COFRE EXISTENTE - BUCLE	2,00			1,00	2,00
COFRE EXISTENTE - COFRE NUEVO	0,05			1,00	0,05
COFRE NUEVO - BUCLE	3,00			1,00	3,00
COFRE NUEVO - CAJA 50X50 1	6,50			1,00	6,50
CAJA 50X50 1 - BUCLE	2,00			1,00	2,00
CAJA 50X50 1 - TABLERO 1	22,40			1,00	22,40
TABLERO 1 BUCLE	1,80			1,00	1,80
TABLERO 1 - TABLERO 2	0,40			1,00	0,40
TABLERO 2 BUCLE	1,80			1,00	1,80
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					42,00
Cobrado a la fecha					
TOTAL					42,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 105	DESCRIPCIÓN	Suministro e Instalación de Cable desnudo Estructura No. 10	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

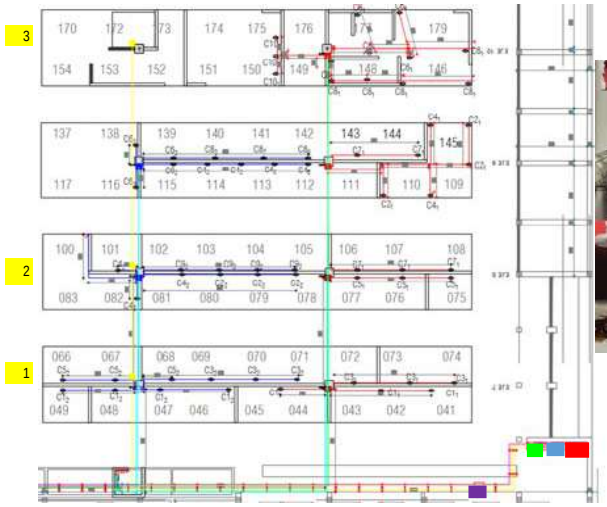



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
TRAZADO ALIMENTACION ELECTRICA LOCAL 170 154 153 152 172 173					
MEDIDOR BUCLE	1,50			1,00	1,50
MEDIDOR - COFRE EXISTENTE	0,05			1,00	0,05
COFRE EXISTENTE - BUCLE	1,50			1,00	1,50
COFRE EXISTENTE - COFRE NUEVO	0,05			1,00	0,05
COFRE NUEVO - BUCLE	1,50			1,00	1,50
COFRE NUEVO - CAJA 50X50 1	6,50			1,00	6,50
CAJA 50X50 1 - BUCLE	1,00			1,00	1,00
CAJA 50X50 1 - CAJA 30X30 - 1	22,65			1,00	22,65
CAJA 30X30 1 - BUCLE	0,90			1,00	0,90
CAJA 30X30 1 - CAJA 30X30 2	6,40			1,00	6,40
CAJA 30X30 2 - BUCLE	0,90			1,00	0,90
CAJA 30X30 2 - CAJA 30X30 3	12,50			1,00	12,50
CAJA 30X30 3 - BUCLE	0,90			1,00	0,90
CAJA 30X30 3 - CAJA 10X10 VERTICAL	3,00			1,00	3,00
CAJA 10X10 - BUCLE	0,30			1,00	0,30
CAJA 10X10 - TABLERO BREAKER	0,50			1,00	0,50
TABLERO BREAKER - BUCLE	1,50			1,00	1,50
Subtotal					61,65
Cobrado a la fecha					
TOTAL					61,65

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 108	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de superboard 6 mm una cara (Inc. Estructura de soporte)	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD







Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
COSTADO SUR CUMBRERAS	5,23			10,00	52,30
					0,00
COSTADO OCCIENDENTAL REMATE LONGITUDINAL SOBRE VIGA	31,00			1,00	31,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					83,30
Cobrado a la fecha					
TOTAL					83,30

OBSERVACION:

Residente de ob
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219


Residente de interventoria
Ing DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 109	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#4F + 1#4N +1#6T (libre de	UNID	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD





Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
ALIMENTACION A TABLEROS					
MEDIDOR BUCLE	2,00			1,00	2,00
MEDIDOR - COFRE EXISTENTE	0,05			1,00	0,05
COFRE EXISTENTE - BUCLE	2,00			1,00	2,00
COFRE EXISTENTE - COFRE NUEVO	0,05			1,00	0,05
COFRE NUEVO - BUCLE	3,00			1,00	3,00
COFRE NUEVO - CAJA 50X50 1	6,50			1,00	6,50
CAJA 50X50 1 - BUCLE	2,00			1,00	2,00
CAJA 50X50 1 - TABLERO 1	22,40			1,00	22,40
TABLERO 1 BUCLE	1,80			1,00	1,80
TABLERO 1 - TABLERO 2	0,40			1,00	0,40
TABLERO 2 BUCLE	1,80			1,00	1,80
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					42,00
Cobrado a la fecha					
TOTAL					42,00

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Faber Alí Parra R.
Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308


Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

FECHA	DD	28	MM	2	AA	2026	ACTA N°	CORTE 11	ELABORÓ	Arq. Julio Cesar Tovar

OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO				
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ	NIT O C.C.	901.898.137-2	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7119721
INTERVENTORIA	CABA INTERVENTORIA S.A.S	NIT O C.C.	901,463,604-3	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.7162568

CAPITULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP 110	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación acometida en cable conducto LSHF 3#6F + 1#6N +1#8T (libre de	e	ML	UBICACIÓN	PLAZA DE MERCADO TRINIDAD

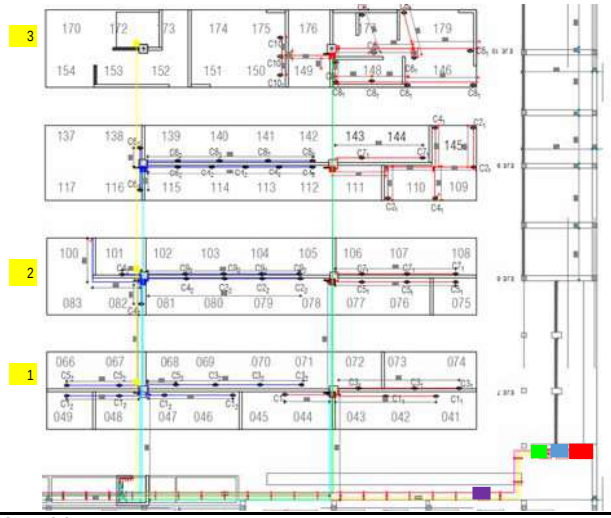



Localización	DIMENSIONES			No Elem	Medida Total
	Largo	Alto	Area		
TRAZADO ALIMENTACION ELECTRICA LOCAL 170 154 153 152 172 173					
MEDIDOR BUCLE	1,50			1,00	1,50
MEDIDOR - COFRE EXISTENTE	0,05			1,00	0,05
COFRE EXISTENTE - BUCLE	1,50			1,00	1,50
COFRE EXISTENTE - COFRE NUEVO	0,05			1,00	0,05
COFRE NUEVO - BUCLE	1,50			1,00	1,50
COFRE NUEVO - CAJA 50X50 1	6,50			1,00	6,50
CAJA 50X50 1 - BUCLE	1,00			1,00	1,00
CAJA 50X50 1 - CAJA 30X30 - 1	22,65			1,00	22,65
CAJA 30X30 1 - BUCLE	0,90			1,00	0,90
CAJA 30X30 1 - CAJA 30X30 2	6,40			1,00	6,40
CAJA 30X30 2 - BUCLE	0,90			1,00	0,90
CAJA 30X30 2 - CAJA 30X30 3	12,50			1,00	12,50
CAJA 30X30 3 - BUCLE	0,90			1,00	0,90
CAJA 30X30 3 - CAJA 10X10 VERTICAL	3,00			1,00	3,00
CAJA 10X10 - BUCLE	0,30			1,00	0,30
CAJA 10X10 - TABLERO BREAKER	0,50			1,00	0,50
TABLERO BREAKER - BUCLE	1,50			1,00	1,50
Subtotal					61,65
Cobrado a la fecha					
TOTAL					61,65

OBSERVACION:

Residente de obra
Arq JULIO TOVAR
TP: 2502005-79730219

Técnico Electricista Interventoría
Ing. Faber Alí Parra
MAT. CN205-11308

Residente de interventoria
Ing. DAYRA LISSETTE CORREDOR DIAZ
TP: 25202-096647CND
