	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/4/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	6

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-184-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	13/2/2025	**FECHA INCIO**	24/4/2025
	ICCU-235-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	7/3/2025	**FECHA INCIO**	24/4/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S	**NIT**	829.002.160-7
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO SGO VIAL	**NIT**	901.902.324-6
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de OCHO (8) meses según el acta de inicio, va desde el 24 de ABRIL del 2025 hasta el 23 de DICIEMBRE de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de OCHO (8) meses según el acta de inicio, va desde el 24 de ABRIL del 2025 hasta el 23 de DICIEMBRE de 2025 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES 1 CONTRATO DE OBRA No.ICCU 184 DE 2025	MODIFICACION CONTRATO DE OBRA No.ICCU 184 DE 2025, "el contratista tenga pagos mensuales mediante actas parciales de avance de obra, hasta cumplir el 95% del valor total del contrato y el 5% que corresponde valor restante del total del contrato una vez sea recibida a satisfacción la obra."				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES 1	Se suspende el proyecto por un término de veinte (20) días calendario contados a partir del 3 de octubre de 2025 hasta el 23 de octubre del 2025. Esta solicitud se sustenta con base a lo solicitado por el contratista de obra, el cual ha informado que las actividades actuales están tomando considerablemente más tiempo de lo previsto en el contrato. Esto se debe, principalmente, al mal estado de la vía de ingreso a la obra				
SUSPENSIONES 2	Se suspende el proyecto por un término de doce (12) días calendario contados a partir del 23 de octubre de 2025 hasta el 4 de noviembre de 2025. Se mantiene la condición con respecto al clima y a la vía				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 23 de DICIEMBRE de 2025 según acta de inicio.				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 24 de ENERO de 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. Eel contratista tenga pagos mensuales mediante actas parciales de avance de obra, hasta cumplir el 95% del valor total del contrato. 2. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de satisfacción la obra. 3. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro del Anexo No. 1 - Anexo técnico. Se pagarán actas mensuales de recibo parcial de obra, considerando que el avance de ejecución del proyecto será medido con base en el programa de inversiones presentado por el Contratista de Obra y que refleja las condiciones reales del proyecto. El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; implementación de protocolos de bioseguridad, computadores, licencias de utilización de software; protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que allá lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$2.390.638.458,00

FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato. El pago al interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$666.671.435,00

	PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/10/2025-31/10/2025

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**400 47 994000105820 ANEXO 3**	**24/4/2025**	**24/5/2026**	**$ 478.127.691,60**
Pago de salarios	**400 47 994000105820 ANEXO 3**	**24/4/2025**	**24/12/2028**	**$ 478.127.691,60**
Estabilidad de la obra	**400 47 994000105820 ANEXO 3**	**SI AMPARA 5 AÑOS, CERO MESES Y CERO DIAS**		**$ 717.191.537,40**
Todo Riesgo	**400 74 994000026839 ANEXO 2 RCE**	**24/4/2025**	**24/12/2025**	**$ 427.050.000,00**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	**Valor Amparado**
Cumplimiento	**21-44-101464585 ANEXO 2**	**24/4/2025**	**24/4/2026**	**$ 66.667.143,50**
Pago de salarios	**21-44-101464585 ANEXO 2**	**24/4/2025**	**25/12/2028**	**$ 33.333.571,75**
Calidad del servicio	**21-44-101464585 ANEXO 2**	**25/12/2025**	**25/12/2030**	**$ 200.001.430,50**
Todo Riesgo				


4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**Sergio Fabian Romero Abelló**
	Fecha diligenciamiento	**24/4/2025**

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Una vez transcurrido el mes de octubre dentro de la ejecución del contrato "MEJORAMIENTO DE LA VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", el día 30 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones del Instituto. En dicha reunión participaron representantes del contratista de obra GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S., de la interventoría CONSORCIO SGO VIAL y funcionarios del INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, con el fin de revisar y evaluar la solicitud de suspensión presentada por el contratista, en atención a las condiciones actuales del estado de la vía.
Como resultado de lo anterior, se aprobó la Suspensión No. 1 del proyecto por un término de veinte (20) días, comprendidos entre el 3 de octubre y el 23 de octubre de 2025, debido a la imposibilidad de continuar con la ejecución en condiciones adecuadas.
Posteriormente, dado que persistieron las condiciones adversas que motivaron la suspensión inicial, se determinó la necesidad de prorrogar dicha medida mediante la Suspensión No. 2, por un término adicional de doce (12) días, desde el 23 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2025.
El proceso de incumplimiento continua, por lo que el area de juridica citó a audiencia para descargos a la empresa GLOBAL ENGINEERING AND DESING SAS el día 07 de octubre del 2025 por los incumplimientos

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:

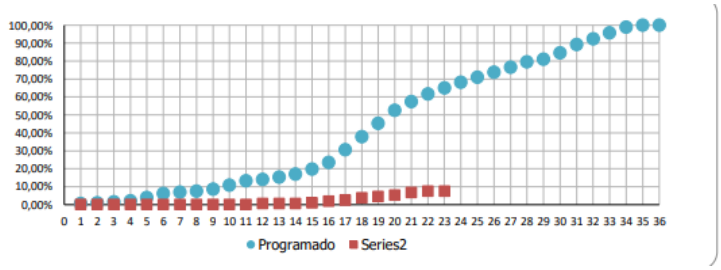

A la fecha de terminación del periodo de octubre de 2025, se tuvo un avance programado de 65.00% y un Avance Ejecutado del 7,40% generando así un atraso del -57,60%

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS		
NOMBRE CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S	CONSORCIO SGO VIAL
Anticipo	$0,00	$100.000.715,00
Pago No. 1	$0,00	$64.937.783,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$0,00	$64.937.783,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$2.390.638.458,00	$601.733.652
Porcentaje de ejecución	$0,00	9,74%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	**Sergio Fabian Romero Abelló**
	Fecha diligenciamiento	**11/11/2025**


7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**X**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**X**	**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotografico del contrato de obra e interventoría....(Incluir comentarios generales a las fotografias)



Fotografía 1: Comite Presencial 30 De Septiembre 2025

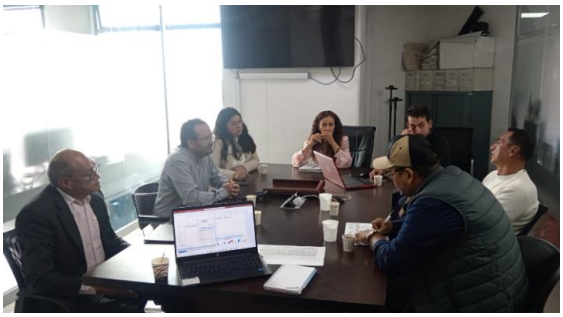

Fotografía 2: Comite Presencial 30 De Septiembre 2025

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Segun el registro fotografico del presente informe donde se socializo el mal estado de la via, se vio necesario realizar la suspension del proyecto debido a la solicitud realizada por el contratista de obra.

10- ANEXOS

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - SUPERVISOR(A)**
ING. SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ	SUBDIRECTORA TECNICA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL / SUPERVISOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	martes, 11 de noviembre de 2025	
