Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO Informe semanal de interventoria			INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3	

#######

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 57 **DEL** 2/03/2026 **AL** 8/03/2026

CONTRATO No No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CO1.PCCNTR.7119721 No.784 de fecha 13 de diciembre de 2024

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ **NIT** 901.898.137-2

INTERVENTOR CABA INTERVENTORÍA SAS **NIT** 901.463.604-3

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. HUMBERTO CARLOS NOYA ROMERO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 29 **DE** ENERO **DE** 2025


FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 28 **DE** MARZO **DE** 2026

Contrato de Obra	
Valor Inicial	$ 2.325.484.185,00
Valor Actualizado	$ 3.485.493.547,00
No. empleos Directos generados	47
No. empleos Indirectos generados	102

Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 314.215.530,00
Valor Actualizado	$ 471.323.295,00
No. empleos Directos generados	15
No. empleos Indirectos generados	10

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	2,90%	93,47%	Trabajo Ejecutado	2,48%	92,60%
Valor del Trabajo Programado	$ 19.644.230,82	$ 3.156.777.390	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 15.676.394,00	$ 3.141.145.632

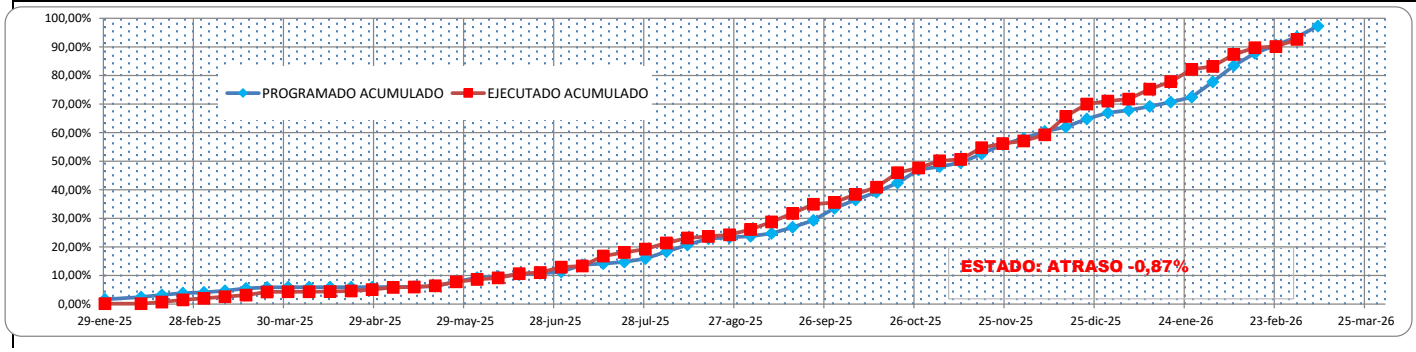

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

#######

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 57 **DEL** 2/03/2026 **AL** 8/03/2026

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTADO GENERAL DEL CONTRATO	93,47%	92,60%	-0,87%	SE PRESENTA ATRASO DE EN DIAS POR LA FALTA DE ENTREGA DE DISEÑOS ELECTRICOS POR PARTE DE LA ENTIDAD LO QUE ATRASA LA FINALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ETAPA 1
APROPIACION DE DISEÑO	100%	65%	-35,00%	PENDIENTE APROPIACION DE DISEÑOS
Suministro e instalación ceramica para piso de ,33 x ,33, Duro piso - incluye boquilla, totalmente terminado	95%	100%	5,00%	LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA POR PARTE DEL CONTRATISTA PRESENTA ADELANTO
Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m	30%	50%	20,00%	ACTIVIDAD SIN INICIO, DEBIÓ INICIAR 20 FEB. FINALIZACION 6 MARZO 2026. 5 DIAS ATRASO A LA FECHA DE PRESENTE INFORME FALTANTES EN LOCALES DE EJE 9 , 8 Y 7
Piso Tipo 1 Baldosa Granito 40 X 40 Similar al existente.	50%	100%	50,00%	ACTIVIDAD TERMINADA PRESENTA ADELANTO

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO:
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE :
COMPONENTE TÉCNICO:
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:
•Poceta Aseo h= 65cmts. (Incluye: Mampostería, terminación en granito con media caña)
•Win metálico
•Alquiler de sección de andamio multidireccional certificado. Sección/día (Incluye Verticales 1m y 2m, horizontales, diagonales, plataformas, escalera interna, niveladores, pasadores, juego de ruedas)
•Suministro e instalación caja de paso 30 x 30 x 30
•Suministro e instalación Tubería EMT e IMC de 3/4"
•Suministro e instalación de soportes para instalación de tuberia EMT incluye fijacion a muros y sujeción estructura de cubierta.
•Suministro e instalación cerámica para piso de ,33 x ,33, Duro piso.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:
•Se reitera ante la entidad en comité # 49 que se encuentra ala espera por parte del contratista la entrega de los diseños finales del componente eléctrico fase 1
•Se recibe por parte del contratista de obra el radicado correspondiente al acta de cobro No.11 481-IPES-CYZ-2024.
•Por parte de la entidad se reciben observaciones a HOJA DE VIDA para el cambio del residente de interventoría.

FECHA DE PRESENTACION DE ACTAS PARCIALE 25 DE CADA MES.

COMPONENTE SOCIAL:
En el componente social, durante la semana objeto de seguimiento se realizó acompañamiento a las actividades de socialización del avance de obra y seguimiento a los compromisos adquiridos con los comerciantes de la Plaza Trinidad Galán.

Asimismo, se efectuó comité veedor realizado el día 04 de marzo de 2026, socializando el estado y avance de las actividades ejecutadas en obra. De igual manera, se suministraron las actas correspondientes al comité veedor participativo y al avance de obra desarrollado durante el periodo evaluado.

Se realizó seguimiento a los requerimientos presentados por comerciantes de la plaza, evidenciándose confirmación del enchape correspondiente al local de la señora Carmen Muñoz, así como validación de la media caña existente en el local por parte de la interventoría.

Finalmente, se identificaron pendientes relacionados con la instalación de policarbonato y revisión de rejilla de nevera en el área de pescadería, así como acercamientos pendientes con la señora Tatiana y revisión de contadores independientes correspondientes a los locales de Flaminio y Luz Marina Casas.

Durante el periodo evaluado no se presentaron PQRS en los medios asignados para atención a la comunidad.

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

#######

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 57 **DEL** 2/03/2026 **AL** 8/03/2026

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**

COMPONENTE SST:

Durante la semana comprendida entre el 02 de marzo y el 08 de marzo de 2026, en el marco del seguimiento realizado por la Interventoría al contrato en ejecución, se evidenció un personal activo en obra correspondiente a doce (12) trabajadores, registrándose dos (2) ingresos y cero (0) retiros durante el periodo evaluado, conforme a lo presentado en la relación de personal activo y aprobado en obra.

Asimismo, se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad en las áreas de trabajo intervenidas, verificando las condiciones locativas y operativas de los diferentes frentes de obra. De igual manera, se efectuó inspección a las condiciones de orden y aseo en las zonas intervenidas, así como seguimiento a los implementos correspondientes al plan de emergencias.

Finalmente, se realizó revisión al reporte de accidentalidad presentado durante la semana evaluada, conforme a la información reportada en comité de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL

En el componente ambiental, durante la semana objeto de seguimiento se realizó verificación al manejo de acopio de material y residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a las condiciones evidenciadas en obra.

Asimismo, se efectuó seguimiento a las medidas implementadas para el manejo de emisiones atmosféricas en los diferentes frentes intervenidos.

De igual manera, se realizó revisión al manejo de residuos RESPEL, verificando las condiciones implementadas para su disposición y control dentro del área de obra.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

NO SE PRSENTAN SOLICITUDES DE ITEMS NO PREVISTOS PARA LA EJECICION DEL CONTRATO

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

#######

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 57 **DEL** 2/03/2026 **AL** 8/03/2026

CONTRATO No No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1 .

embiquillado de enchape pisos eje 7



Descripción Foto 2

Enchape de muros en local papas eje 7



Descripción Foto 3.

Instalacion de tuberia ETM para acometida pricipal etapa 1



Descripción Foto 4.

Instalacion de tuberia para cuanrto electrico

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

#######

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 57 **DEL** 2/03/2026 **AL** 8/03/2026

CONTRATO No No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024



Descripción Foto 5 y 6

Instalacion de mediacaña en granito en corredores entre ejes 8 y 9 y 7



Descripción Foto 7.

Instalacion de enchape de muros en local pescaderia eje 10 altura de 2.05 mtrs



Descripción Foto 8.

Instalacion de tablero 1 principal cuarto electrico de 24 circuitos



Descripción Foto 9.

Mesa de trabajo componente electrico entidad, contratista e interventoria

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

#######

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 57 **DEL** 2/03/2026 **AL** 8/03/2026

CONTRATO No No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024



Descripción Foto 10.

Condiciones de seguridad (áreas de trabajo – uso de EPP).



Descripción Foto 11.

Observación tablero de provisional eléctrica con cables expuestos a tropiezos por parte de los trabajadores y personal administrativo



Descripción Foto 12 y 13.

Comité de veedor 4 de marzo en presencia de inbterventoria, contratista entidad IPES y administracion plaza Trinidad Galan



Descripción Foto 6.

Acopio de material enchape

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

OCHO (8) días del mes de MARZO de 2026

ING. DIANA RAMIREZ ZABALA
Director de Interventoría.
CABA INTERVENTORÍA SAS

ARQ. CARLOS A. MARQUEZ FEDUYO
Residente Interventoría.
CABA INTERVENTORÍA SAS

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Telefono: 753 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERIODO DEL INFORME: 2/03/2026 AL 8/03/2026

SEMANA REPORTADA: 57

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT	CARGO	INGRESO	SALIDA	DIK	EN CAMPO
1	DIANA RAMIREZ	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	25%	Oficina
2	CARLOS MARQUES	1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	100%	Trabajo en campo
3	FABER ALI PARRA RAMÍREZ	1	TECNICO O TECNOLOGO ELECTRICO	N/A	N/A	20%	Trabajo en campo
4	FABIAN FAJARDO	1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	N/A	N/A	10%	Trabajo en campo
5	GINA PAOLA GARZÓN CHINCHILLA	1	PROFESIONAL SISOMA	N/A	N/A	40%	Trabajo en campo
6	ANDREA ORTEGA TABARES	1	GESTOR SOCIAL	N/A	N/A	40%	Trabajo en campo
	JHON DIAZ LUNA	1	TECNICO O TECNOLOGO HIDRAHULICO	N/A	N/A	20%	Trabajo en campo
7	SERGIO ARANDA	1	COORDINADOR DE PROYECTO	N/A	N/A	50%	Trabajo en campo
8	ANGELICA MARIA GUERRERO	1	CONTADORA	N/A	N/A	10%	Oficina

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Teléfono: 763 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

PERSONAL DE OBRA							Semana						57
PERIODO DEL INFORME	2-mar-26	AL	8-mar-26										
SEMANA REPORTADA		57											
NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	EJECUCION DEL PROYECTO	2-mar-26			AL		8-mar-26	
							LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
							23	24	25	26	27	28	1
PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA													
1	FELIPE PULIDO GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	57	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	A	A	A	A	A	A	
2	LAURA DANIELA FUENTES AVILA	COORDINADOR DE PROYECTOS	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
3	TOVAR BERMEO JULIO CESAR	RESIDENTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	10-feb-26	ADMINISTRA							
4	LISNEY PAEZ	SISOMA	Bogotá	13-nov-25	N/A	ADMINISTRA	T	T	T	T	T	T	
5	TORRES BARRERA MARIA ALEJANDRA	PROFESIONAL SOCIAL	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	T	T	T	T	T	D	
6	FREDDY ALEXANDER ORDOÑEZ GONZALEZ	ASESOR ESTRUCTURAL	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
7	OSCAR LEONARDO ROMERO	TECNICO ELECTRICISTA	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	I	I	I	I	I	I	
8	CAMILO ANDRES PULIDO VILLAMIL	TECNICO HIDROSANITARIO	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
9	ANDY ANDRES VIDEZ BAZANTA	TECNICO ELÉCTRICO	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
10	CESAR AUGUSTO PULIDO NIÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	A	A	A	A	A	A	
11													
12													
PERSONAL OPERATIVO													
CIMENTACION SUPERFICIAL													
1	HEREDIA ORDOÑEZ WILSON MANUEL	OFICIAL DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
2	PAEZ MELVIS CARINA	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES							
3	RUBIANO LOPEZ PEDRO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
4	SANDOVAL VALBUENA NILSON	OFICIAL DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES							
5	SANDOVAL VALBUENA ROSELINO	MAESTRO	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
6	CRISTIAN DAVID ALVARES MELENDEZ	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
7	EDGAR NIETO ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	11-jun-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
8	LUIS FELIPE MEDINA SALCEDO	OFICIAL DE OBRA	Bogotá	1-ago-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
9	JORGE BARRETO	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	25-ago-25	N/A	OBRAS CIVILES							
10													
11													
12													
13													
14													
SUBCONTRATISTA CUBIMET													
1	DARIO ALBEIRO CRUZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	4-abr-25	N/A	EST. METALICA							
2	EDWIN ALEXANDER GONZALEZ CRUZ	COODINADOR ALTURAS	Bogotá	4-abr-25	N/A	EST. METALICA							
3	MOISES GABRIEL CRUZ RODRIGUEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	4-abr-25	N/A	EST. METALICA							
4	CARLOS ALBERTO LOPEZ NIÑO	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
5	EFRAIN ANTONIO DOMINGUEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
6	CARLOS OCTAVIO PERDOMO YONDA	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
7	DAGOBERTO HERRERA SANCHEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
8	IVAN ALEJANDRO OCAMPO VALENCIA	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
9	JOSE JULIAN HERRERA SANCHEZ	AUXILIAR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
10	LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ QUIJANO	AUXILIAR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
11	BRAYAN DAVID TRIANA CRUZ	INGENIERO ESTRUCTURA	Bogotá	25-jul-25	N/A	EST. METALICA							
12	ESNEIDER JAVIER BELTRAN ESPINOSA	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
13	JHON ESNEYDER TELLEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
14	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Teléfono: 763 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

PERSONAL DE OBRA

							Semana	57
PERIODO DEL INFORME	**2-mar-26**	**AL**	**8-mar-26**					
SEMANA REPORTADA		**57**						

NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	EJECUCION DEL PROYECTO	2-mar-26 AL 8-mar-26						
							LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
							23	24	25	26	27	28	1
		INSTALACIONES ELECTRICAS											
1	JAIR ALFONSO LOPEZ CRIOLLO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
2	MISAEL MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
3	CARLOS MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
4	EDWIN FERNANDO RUBIANO YOSSA	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
5	CARLOS GIOVANNI BEJARANO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
6	JEFERSON DAMIAN TORRES	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
7	JUAN CARLOS TORRES ROMERO TECNICO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
		INSTALADORES PASARELAS Y LINEAS DE VIDA											
1	MAYERLIS CAROLINA GONZALEZ VIVANCO	INSPECTOR SST	**Bogotá**	17-sep-25	N/A	INSPECTOR SST							
2	HERNAN DAVID GONZALEZ VIVANCO	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR	**Bogotá**	18-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
3	JOEL ISAAC VIVANCO MONTOYA	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR	**Bogotá**	19-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
4	VICTOR MANUEL VIVANCO MONTOYA	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR ANDAMIERO	**Bogotá**	20-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
5	HERNAN ENRIQUE GONZALEZ GUZMAN	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR ANDAMIERO	**Bogotá**	21-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
6													
		RETIRADO											
1	Enuar Enrique Jimenez Gonzalez	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**10-mar-25**	OBRAS CIVILES							
2	Edwin Stewar Alvarado ALvarez	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**14-mar-25**	OBRAS CIVILES							
3	Wilmar Campos Cárdenas	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**14-mar-25**	OBRAS CIVILES							
4	Andys Andrés Videz Bazanta	Tec. Eléctrico	**Bogotá**	**29-ene-25**	**19-mar-25**	ELECTRICOS							
5	Jairo Antonio Sierra Villamil	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**4-abr-25**	OBRAS CIVILES							
6	Yaison Lima Peña	Auxiliar	**Bogotá**	**4-abr-25**	**22-may-25**	OBRAS CIVILES							
7	Joser Esteban Ospina marulanda	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29-may-25**	PILOTES							
8	Gabriel Andrés Pabon Ospina	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29-may-25**	PILOTES							
9	David Alexander Marulanda	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29/05/2025**	PILOTES							
10	Jonathan Arley Bustos Lopez	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29-may-25**	PILOTES							
11	Luis Eduardo Pulido	Operario	**Bogotá**	**4-jun-25**	**25-jun-25**	MINICARGADOR							
12	Abelardo Corredor Camacho	Oficial de obra	**Bogotá**	**29-ene-25**	**30-jun-25**	OBRAS CIVILES							
13	DAMAR JOSE BARRAZA TORRENEGRA	AYUDANTE DE OBRA	**Bogotá**	**16-jun.25**	15-ago-25	OBRAS CIVILES							
14	JAIR ALFONSO LOPEZ CRIOLLO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
15	MISAEL MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
16	CARLOS MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							

OBSERVACIÓN:

(T): TRABAJANDO
(D): DISPONIBLE
( ): RETIRADO
(V): VISITA OBRA DE UNO A VARIOS DÍAS
(I): INCAPACITADO
(A): PERSONAL ADMINISTRATIVO
