Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO Informe semanal de interventoria			INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3	

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 58 **DEL** 9/03/2026 **AL** 15/03/2026

CARLOS MARQUES

CONTRATO No No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CO1.PCCNTR.7119721 No.784 de fecha 13 de diciembre de 2024

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ **NIT** 901.898.137-2

INTERVENTOR CABA INTERVENTORÍA SAS **NIT** 901.463.604-3

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. HUMBERTO CARLOS NOYA ROMERO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 29 **DE** ENERO **DE** 2025


FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 28 **DE** MARZO **DE** 2026

Contrato de Obra	
Valor Inicial	$ 2.325.484.185,00
Valor Actualizado	$ 3.485.493.547,00
No. empleos Directos generados	47
No. empleos Indirectos generados	102

Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 314.215.530,00
Valor Actualizado	$ 471.323.295,00
No. empleos Directos generados	15
No. empleos Indirectos generados	10

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	3,81%	97,28%	Trabajo Ejecutado	1,12%	93,72%
Valor del Trabajo Programado	$ 19.644.230,82	$ 3.156.777.390	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 15.676.394,00	$ 3.141.145.632

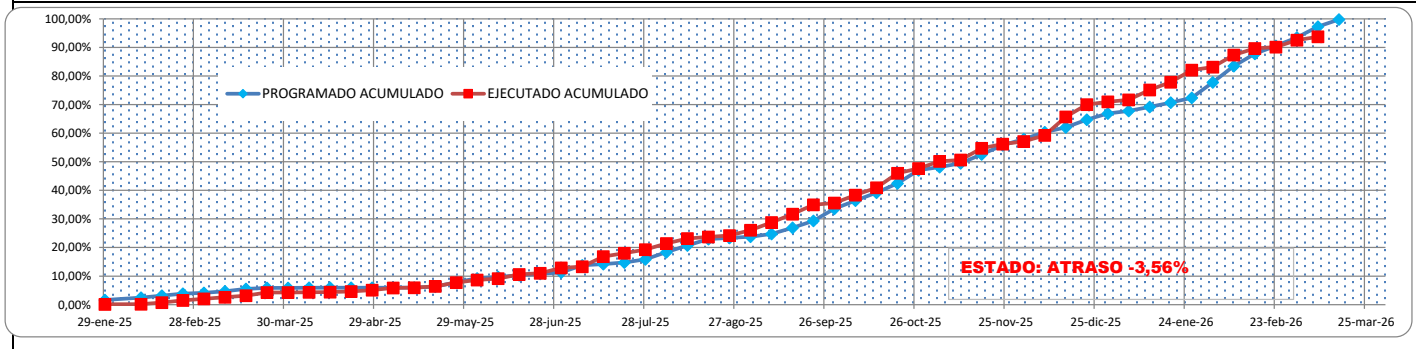

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 58 **DEL** 9/03/2026 **AL** 15/03/2026

CARLOS MARQUES

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTADO GENERAL DEL CONTRATO	97,28%	93,72%	-3,56%	SE PRESENTA ATRASO DE EN DIAS POR LA FALTA DE ENTREGA DE DISEÑOS ELECTRICOS POR PARTE DE LA ENTIDAD LO QUE ATRASA LA FINALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ETAPA 1
APROPIACION DE DISEÑO	100%	65%	-35,00%	PENDIENTE APROPIACION DE DISEÑOS
INSTALACION DE MEDIA CAÑA	100%	85%	-15,00%	LA ACTIVIDAD PRESENTA ATRASO EN SU FECHA DE FINALIZACION SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA MEJORAR LOS TIEMPOS EJES FALTANTES 7 Y 8 Y LOCAL SEÑORA MARTHA
Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m	100%	85%	-15,00%	LA ACTIVIDAD PRESENTA ATRASO EN SU FECHA DE FINALIZACION SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA MEJORAR LOS TIEMPOS EJES FALTANTES 7 Y 8 Y LOCAL SEÑORA MARTHA
Intalacion de vinilo tipo 1 a tres manos	100%	85%	-15,00%	ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y DEBERIA ESTAR CULMINADA EL 1 DE MARZO DEL 2026 PRESENTADO 14 DIAS DE ATRASO EN LOS EJES COMPRENDIDOS 8 Y 7 MUROS NO CULMINADOS
Suministro e instalacion de estuco sobre pañete	100%	85%	-15,00%	ESTA ACTIVIDAD AUN SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y PRESENTA ATRASO SEGÚN PROGRAMACION PRESENTRADA POR EL CONTRATISTA FALTANTES EN EJE 7 Y LOS LOCALES PENDIENTES POR CULMINAR LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA Y MURO DIVISORIO EN DRYWALL (CHOCONTA Y FLAMINIO)
Piso Tipo 1 Baldosa Granito 40 X 40 Similar al existente.	70%	100%	30,00%	ACTIVIDAD TERMINADA
Actividades electricas	100%	60%	-40,00%	SE PRESENTAN ATRASOS DEBIDO A LA ENTREA TARDIA DE LOS DISEÑOS POR PARTE DE LA ENTIDAD ALA FECHA DEL INMFORME YA SE NECUENTRA APROVADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL DISEÑO ELECTRICO , EL CONTRATISTA PRESENTO UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ADELANTAR LAS ZONAS DE TRABAJO Y LOGRAR TERMINAR EL CONTRATO, SE DEJA CLARIDAD QUE PARA LA FECHA DEL INFORME SE PROGRAMO MESA DE TRABAJO PARA EL DIA 17 DE MARZO CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD (ELECTRICOS) PARA SUBSANACION DE AVANCE Y DUDAS REFERENTE A EL DISEÑO ELECTRICO.

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO:
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:
COMPONENTE TÉCNICO:
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:
•Se continua con instalación de enchape piso con guarda escoba eje 7
•Se continua con el acopio de materia RCD y señalización de obra por parte del contratista
•Instalación de tubería EMT Y IMC para tomas e interruptores
•Se continua con la instalación de mediacaña en granito
•Reparación de manto sobre placa local 001 fase 2
•Llegada de material eléctrico (tubería, cajas y accesorios)
•Fundida de tapas de cajas hidráulicas
•Se da inicio ala instalación de estructuras en locales comerciantes

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:
•se envió a la Administración por parte de la interventoría la solicitud de requerimiento ante la empresa ENEL para el retiro de los sellos correspondientes a los medidores eléctricos, esta solicitud ya está en trámite por parte de la entidad IPES
•Entrega de diseños eléctricos aprobados por la entidad
•Entrega de plan de contingencia por parte del contratista para la culminación de obra

FECHA DE PRESENTACION DE ACTAS PARCIALE 25 DE CADA MES.
COMPONENTE SOCIAL:

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 58 **DEL** 9/03/2026 **AL** 15/03/2026

CARLOS MARQUES

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**

COMPONENTE SST:

Durante la semana comprendida entre el 09 y el 14 de marzo de 2026, en el marco del seguimiento realizado por la Interventoría al contrato en ejecución, se registraron cero (0) ingresos y cero (0) retiros de personal reportados por el profesional SST del contratista. El promedio de personal en obra durante el periodo evaluado fue de doce (12) trabajadores.

En desarrollo de las actividades de inspección y control en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenciaron condiciones y actos inseguros en las áreas intervenidas, observándose herramientas acopiadas de manera incorrecta dentro de las zonas de trabajo sin encontrarse en uso. Asimismo, se continúa evidenciando falta de uso de elementos de protección personal (EPP) y deficiencias en el seguimiento y control por parte del profesional SST del contratista.

De igual manera, se verificó la correcta instalación, señalización y acceso a los implementos correspondientes al plan de emergencias, tales como botiquín, camilla y extintor; no obstante, se recomendó despejar las áreas intervenidas y mantener una única zona de acopio de materiales.

En cuanto a accidentalidad laboral, durante la semana evaluada no se reportaron accidentes de trabajo ni casos de enfermedad laboral; sin embargo, se presentó un (1) caso de ausentismo por causa médica.

Finalmente, se evidenció implementación parcial de las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, situación que genera riesgos para el personal que desarrolla actividades en obra, por lo cual se recomienda fortalecer las medidas de control y seguimiento en SST.

COMPONENTE AMBIENTAL

En el componente ambiental, durante la semana objeto de seguimiento se evidenció nuevamente clasificación incorrecta de residuos en las áreas de acopio, por lo cual se recomendó revisar las condiciones del área y, de ser posible, desmontar el acopio existente y efectuar los respectivos retiros de material, teniendo en cuenta la proximidad de terminación del contrato de obra y la necesidad de contar con la totalidad de certificaciones emitidas por los gestores ambientales para el cierre del PIN ambiental.

Asimismo, al interior de la zona de trabajo se evidenció acopio de materiales, específicamente sacos de cemento, bajo parámetros ambientales adecuados.

De igual manera, se informó que durante el periodo evaluado no se reportaron capturas de roedores. Respecto al PIN Ambiental, el contratista remitió la información correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026, otorgándose aval al mes de febrero; no obstante, el mes de enero continúa en revisión y requiere validación conjunta con el contratista.

Finalmente, se indicó que a la fecha no ha sido posible realizar el cargue del PIN ambiental con el supervisor, debido a la necesidad de efectuar previamente la trazabilidad entre los profesionales de la entidad, quedando

4. PRECIOS NO PREVISTOS

NO SE PRSENTAN SOLICITUDES DE ITEMS NO PREVISTOS PARA LA EJECICION DEL CONTRATO

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 58 **DEL** 9/03/2026 **AL** 15/03/2026

CARLOS MARQUES

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1 .

Instalacion de guarda escoba y boquilla enchape de piso en eje 7



Descripción Foto 2

Instalacion local papa boquila y guarda escoba eje 7



Descripción Foto 3.

Instalacion de estuco y pitura vinilo tipo 1 en eje 8



Descripción Foto 4.

Incio de instalacion de media caña en granito eje 9

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 58 **DEL** 9/03/2026 **AL** 15/03/2026

CARLOS MARQUES

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**



Descripción Foto 5

Instalacion de rejilla de sifon de 3" corredor



Descripción Foto 6

Instalacion de enchape en barras pescaderia eje 10



Descripción Foto 7

Se realizo comité numero 50 contratista interventoria y IPES



Descripción Foto 8

Pnediente acercamiento señora tatiana para reparaciones local

Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 763 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO		INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria		
	CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 58 **DEL** 9/03/2026 **AL** 15/03/2026

CARLOS MARQUES

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**



Descripción Foto 11

Condiciones de seguridad (áreas de trabajo – uso de EPP).



Descripción Foto 12 y 13

Seguimiento a uso de de plan de emergencioa en obra



Descripción Foto 14

Acopio de material RCD



Descripción Fotos 15 y 16

Imagen 14 almacenamiento de accesorios electricos , Imagen 15 tubberia EMT Y IMC

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

QUINCE (15) días del mes de MARZO de 2026

ING. DIANA RAMIREZ ZABALA
Director de Interventoría.
CABA INTERVENTORÍA SAS

ARQ. CARLOS A. MARQUEZ FEDUYO
Residente Interventoría.
CABA INTERVENTORÍA SAS

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Telefono: 753 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERIODO DEL INFORME: 9/03/2026 AL 15/03/2026

SEMANA REPORTADA: 58

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT	CARGO	INGRESO	SALIDA	DIK	EN CAMPO
1	DIANA RAMIREZ	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	25%	Oficina
2	CARLOS MARQUES	1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	100%	Trabajo en campo
3	FABER ALI PARRA RAMÍREZ	1	TECNICO O TECNOLOGO ELECTRICO	N/A	N/A	20%	Trabajo en campo
4	FABIAN FAJARDO	1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	N/A	N/A	10%	Trabajo en campo
5	GINA PAOLA GARZÓN CHINCHILLA	1	PROFESIONAL SISOMA	N/A	N/A	40%	Trabajo en campo
6	ANDREA ORTEGA TABARES	1	GESTOR SOCIAL	N/A	N/A	40%	Trabajo en campo
7	JHON DIAZ LUNA	1	TECNICO O TECNOLOGO HIDRAHULICO	N/A	N/A	20%	Trabajo en campo
8	SERGIO ARANDA	1	COORDINADOR DE PROYECTO	N/A	N/A	50%	Trabajo en campo

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Teléfono: 763 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

PERSONAL DE OBRA							Semana						58
PERIODO DEL INFORME	9-mar-26	AL	15-mar-26										
SEMANA REPORTADA		58											
NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	EJECUCION DEL PROYECTO	9-mar-26			AL	15-mar-26		
							LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
							23	24	25	26	27	28	1
PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA													
1	FELIPE PULIDO GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	A	A	A	A	A	A	
2	LAURA DANIELA FUENTES AVILA	COORDINADOR DE PROYECTOS	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
3	TOVAR BERMEO JULIO CESAR	RESIDENTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	10-feb-26	ADMINISTRA							
4	LISNEY PAEZ	SISOMA	Bogotá	13-nov-25	N/A	ADMINISTRA	T	T	T	T	T	T	
5	TORRES BARRERA MARIA ALEJANDRA	PROFESIONAL SOCIAL	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	T	T	T	T	T	D	
6	FREDDY ALEXANDER ORDOÑEZ GONZALEZ	CARLOS MARQUES	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
7	OSCAR LEONARDO ROMERO	TECNICO ELECTRICISTA	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	I	I	I	I	I	I	
8	CAMILO ANDRES PULIDO VILLAMIL	TECNICO HIDROSANITARIO	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
9	ANDY ANDRES VIDEZ BAZANTA	TECNICO ELÉCTRICO	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
10	CESAR AUGUSTO PULIDO NIÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	A	A	A	A	A	A	
11													
12													
PERSONAL OPERATIVO													
CIMENTACION SUPERFICIAL													
1	HEREDIA ORDOÑEZ WILSON MANUEL	OFICIAL DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
2	PAEZ MELVIS CARINA	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES							
3	RUBIANO LOPEZ PEDRO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
4	SANDOVAL VALBUENA NILSON	OFICIAL DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES							
5	SANDOVAL VALBUENA ROSELINO	MAESTRO	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
6	CRISTIAN DAVID ALVARES MELENDEZ	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
7	EDGAR NIETO ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	11-jun-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
8	LUIS FELIPE MEDINA SALCEDO	OFICIAL DE OBRA	Bogotá	1-ago-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
9	JORGE BARRETO	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	25-ago-25	N/A	OBRAS CIVILES							
10													
11													
12													
13													
14													
SUBCONTRATISTA CUBIMET													
1	DARIO ALBEIRO CRUZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	4-abr-25	N/A	EST. METALICA							
2	EDWIN ALEXANDER GONZALEZ CRUZ	COODINADOR ALTURAS	Bogotá	4-abr-25	N/A	EST. METALICA							
3	MOISES GABRIEL CRUZ RODRIGUEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	4-abr-25	N/A	EST. METALICA							
4	CARLOS ALBERTO LOPEZ NIÑO	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
5	EFRAIN ANTONIO DOMINGUEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
6	CARLOS OCTAVIO PERDOMO YONDA	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
7	DAGOBERTO HERRERA SANCHEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
8	IVAN ALEJANDRO OCAMPO VALENCIA	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
9	JOSE JULIAN HERRERA SANCHEZ	AUXILIAR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
10	LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ QUIJANO	AUXILIAR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
11	BRAYAN DAVID TRIANA CRUZ	INGENIERO ESTRUCTURA	Bogotá	25-jul-25	N/A	EST. METALICA							
12	ESNEIDER JAVIER BELTRAN ESPINOSA	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
13	JHON ESNEYDER TELLEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
14	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Teléfono: 763 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

PERSONAL DE OBRA							Semana						58
PERIODO DEL INFORME	9-mar-26	AL	15-mar-26				9-mar-26			AL			15-mar-26
SEMANA REPORTADA		58					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	EJECUCION DEL PROYECTO	23	24	25	26	27	28	1
INSTALACIONES ELECTRICAS													
1	JAIR ALFONSO LOPEZ CRIOLLO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
2	MISAEL MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
3	CARLOS MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
4	EDWIN FERNANDO RUBIANO YOSSA	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
5	CARLOS GIOVANNI BEJARANO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
6	JEFERSON DAMIAN TORRES	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
7	JUAN CARLOS TORRES ROMERO TECNICO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
INSTALADORES PASARELAS Y LINEAS DE VIDA													
1	MAYERLIS CAROLINA GONZALEZ VIVANCO	INSPECTOR SST	**Bogotá**	17-sep-25	N/A	INSPECTOR SST							
2	HERNAN DAVID GONZALEZ VIVANCO	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR	**Bogotá**	18-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
3	JOEL ISAAC VIVANCO MONTOYA	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR	**Bogotá**	19-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
4	VICTOR MANUEL VIVANCO MONTOYA	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR ANDAMIERO	**Bogotá**	20-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
5	HERNAN ENRIQUE GONZALEZ GUZMAN	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR ANDAMIERO	**Bogotá**	21-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
6													
RETIRADO													
1	Enuar Enrique Jimenez Gonzalez	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**10-mar-25**	OBRAS CIVILES							
2	Edwin Stewar Alvarado ALvarez	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**14-mar-25**	OBRAS CIVILES							
3	Wilmar Campos Cárdenas	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**14-mar-25**	OBRAS CIVILES							
4	Andys Andrés Videz Bazanta	Tec. Eléctrico	**Bogotá**	**29-ene-25**	**19-mar-25**	ELECTRICOS							
5	Jairo Antonio Sierra Villamil	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**4-abr-25**	OBRAS CIVILES							
6	Yaison Lima Peña	Auxiliar	**Bogotá**	**4-abr-25**	**22-may-25**	OBRAS CIVILES							
7	Joser Esteban Ospina marulanda	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29-may-25**	PILOTES							
8	Gabriel Andrés Pabon Ospina	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29-may-25**	PILOTES							
9	David Alexander Marulanda	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29/05/2025**	PILOTES							
10	Jonathan Arley Bustos Lopez	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29-may-25**	PILOTES							
11	Luis Eduardo Pulido	Operario	**Bogotá**	**4-jun-25**	**25-jun-25**	MINICARGADOR							
12	Abelardo Corredor Camacho	Oficial de obra	**Bogotá**	**29-ene-25**	**30-jun-25**	OBRAS CIVILES							
13	DAMAR JOSE BARRAZA TORRENEGRA	AYUDANTE DE OBRA	**Bogotá**	**16-jun.25**	15-ago-25	OBRAS CIVILES							
14	JAIR ALFONSO LOPEZ CRIOLLO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
15	MISAEL MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
16	CARLOS MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							

OBSERVACIÓN:
(T): TRABAJANDO
(D): DISPONIBLE
( ): RETIRADO
(V): VISITA OBRA DE UNO A VARIOS DÍAS
(I): INCAPACITADO
(A): PERSONAL ADMINISTRATIVO
