| Consorcio Urbano Interventores<br>Calle 45A No. 51 - 47<br>Barrio La Esmeralda<br>Teléfono: 753 0396<br>CABA INTERVENTORÍA SAS | FORMATO<br>Informe semanal de interventoria | | | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL |
|---|---|---|---|---|
| | CODIGO | PROCESO | VERSIÓN | |
| | CABA-IPES-09 | Ejecucion del proyecto | 3 | |

**ENTIDAD CONTRATANTE** INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

**SEMANA N.** 59 **DEL** 16/03/2026 **AL** 22/03/2026

CARLOS MARQUES

**CONTRATO No** No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024

## 1. ANTECEDENTES

**OBJETO DEL CONTRATO**

10 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO** CO1.PCCNTR.7119721 No.784 de fecha 13 de diciembre de 2024

**CONTRATISTA** UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ **NIT** 901.898.137-2

**INTERVENTOR** CABA INTERVENTORÍA SAS **NIT** 901.463.604-3

**APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION** ING. HUMBERTO CARLOS NOYA ROMERO

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 29 **DE** ENERO **DE** 2025


**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** 28 **DE** MARZO **DE** 2026

| Contrato de Obra | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 2.325.484.185,00 |
| Valor Actualizado | $ 3.485.493.547,00 |
| No. empleos Directos generados | 47 |
| No. empleos Indirectos generados | 102 |

| Contrato de Interventoría | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 314.215.530,00 |
| Valor Actualizado | $ 471.323.295,00 |
| No. empleos Directos generados | 15 |
| No. empleos Indirectos generados | 10 |

## 2. AVANCES DEL PROYECTO

| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
| Trabajo Programado | 2,49% | 99,77% | Trabajo Ejecutado | 1,10% | 94,82% |
| Valor del Trabajo Programado | $ 19.644.230,82 | $ 3.156.777.390 | Valor del Trabajo Ejecutado | $ 15.676.394,00 | $ 3.141.145.632 |

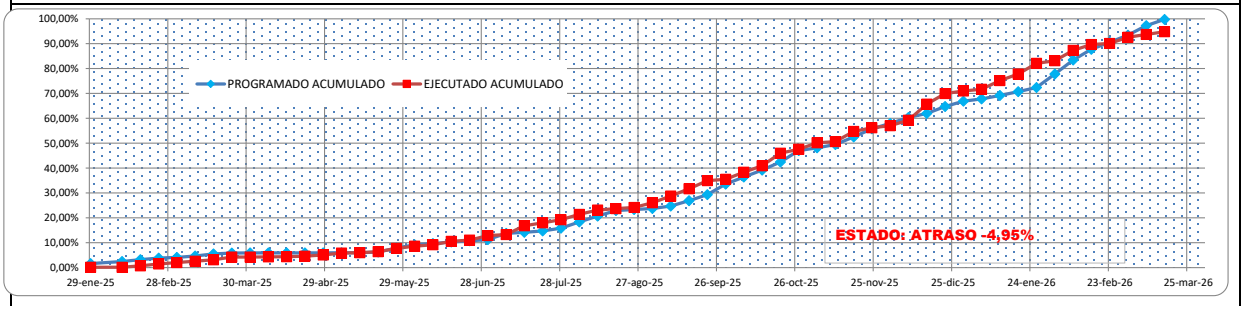

| Consorcio Urbano Interventores<br>Calle 46A No. 51 - 47<br>Ramo La Esmeralda<br>Telefono: 753 0396<br>CABA INTERVENTORÍA SAS | FORMATO | | | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL |
|---|---|---|---|---|
| | Informe semanal de interventoria | | | |
| | CODIGO | PROCESO | VERSIÓN | |
| | CABA-IPES-09 | Ejecucion del proyecto | 3 | |

**ENTIDAD CONTRATANTE** INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

**SEMANA N.** 59 **DEL** 16/03/2026 **AL** 22/03/2026

CARLOS MARQUES

**CONTRATO No** No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024

| FRENTE O COMPONENTE | % PROGRAM (FÍSICO) | % EJECUTADO (FÍSICO) | % VARIACIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO GENERAL DEL CONTRATO | 99,77% | 94,82% | -4,95% | SE PRESENTA ATRASO DE EN DIAS POR LA FALTA DE ENTREGA DE DISEÑOS ELECTRICOS POR PARTE DE LA ENTIDAD LO QUE ATRASA LA FINALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ETAPA 1 |
| APROPIACION DE DISEÑO | 100% | 65% | -35,00% | PENDIENTE APROPIACION DE DISEÑOS |
| INSTALACION DE MEDIA CAÑA | 100% | 98% | -2,00% | LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y AVANCE OPTIMO SEGÚN LO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA |
| Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m | 100% | 98% | -2,00% | LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y AVANCE OPTIMO SEGÚN LO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA FALTANTES EJE 8 Y 7 CORREDORES |
| Intalacion de vinilo tipo 1 a tres manos | 100% | 95% | -5,00% | ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y DEBERIA ESTAR CULMINADA EL 1 DE MARZO DEL 2026 PRESENTADO 21 DIAS DE ATRASO, ESTO SE DEBE QUE EL COMPONENTE ELECTRICO EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA TOMAS E INTERRUPTORES NO ESTA CULMINADA PARA DARLE LA ULTIMA MANO DE PINTURA EN EJES 9,8 Y 7 |
| Suministro e instalacion de estuco sobre pañete | 100% | 95% | -5,00% | ESTA ACTIVIDAD AUN SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y PRESENTA ATRASO SEGÚN PROGRAMACION PRESENTRADA POR EL CONTRATISTA, POR ATRASOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA TOMAS NO SE ENCUENTRA CULMINADA EJES 9,8 Y 7 |
| Piso Tipo 1 Baldosa Granito 40 X 40 Similar al existente. | 80% | 100% | 20,00% | ACTIVIDAD TERMINADA |
| Actividades electricas | 100% | 60% | -40,00% | SE PRESENTAN ATRASOS DEBIDO A LA ENTREA TARDIA DE LOS DISEÑOS POR PARTE DE LA ENTIDAD ALA FECHA DEL INMFORME YA SE NECUENTRA APROVADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL DISEÑO ELECTRICO , EL CONBTRATIUSTA PRESENTO UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ADELANBATR ZONAS DE TRABAJO Y LOAGRAR TERMINAR EL CONTRATO ACABALIDAD |
| | | | | |

## 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

**COMPONENTE TÉCNICO:**
**SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:**
**COMPONENTE TÉCNICO:**
**SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:**
•Se continua con la instalación de mediacaña en local eje 9 y 8
•Se continua con la instalación de tubería EMT y cajas para tomas en eje 9 y 8
•Pulida y destronque de piso en granito locales eje 10
•Instalación de marcos en granito pulido para sifones en rejillas de desagüe en pasillos corredor eje 8
•Ubicación de alturas y cantidades de tomas e interruptores en locales ejes 10 y 9
•Pintura epoxica bajo mesones en ele 8 local huevos y eje 10 locales jugos
•Se continua con la aplicación de pintura vinilo tipo 1 general muros etapa 1
•

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO:**
•Se recibe por parte de la administración fecha y hora de la intervención de la empresa ENEL para el levantamiento de sellos de los medidores de etapa 1 la cual se realizará el día 10 de abril
•Por parte de la administración de la plaza se recibe contestación al requerimiento de los titulares de los medidores de la etapa 1
•Recorrido eléctrico para verificación y revisión de medidas
•El contratista aplica los horarios extendidos para el mejoramiento a los rendimientos de obra p en la parte eléctrica

**FECHA DE PRESENTACION DE ACTAS PARCIALE 25 DE CADA MES.**

**COMPONENTE SOCIAL:**

En el componente social, durante la semana objeto de seguimiento se recibió el informe social No. 14 el día 26 de marzo de 2026, el cual quedó en proceso de revisión por parte de la interventoría.

Asimismo, se realizó acercamiento con la señora Tatiana por parte de la interventoría y el contratista; sin embargo, la comerciante no asistió a la reunión programada para revisión de los pendientes relacionados con su local.

De igual manera, se informó que los locales del señor Flaminio quedarían conforme a los diseños iniciales establecidos para la etapa 2 del proyecto. También se indicó la subsanación de las actas correspondientes al avance de obra del 09 de febrero y del comité veedor realizado el 04 de marzo de 2026.

Se mantienen pendientes relacionados con la pescadería de la señora Martha, específicamente respecto a la revisión de la rejilla de nevera y cambio de lámina correspondiente por parte del contratista. Asimismo, a la fecha no se contaba con la documentación requerida para el ingreso de instalación de estructuras en los locales de Flaminio y Chocontá.

Finalmente, durante el periodo comprendido entre el 16 y el 22 de marzo de 2026 no se presentaron PQRS en los medios asignados para atención y seguimiento a la comunidad.

| Consorcio Urbano Interventores<br>Calle 46A No. 51 - 47<br>Barrio La Esmeralda<br>Telefono: 753 0396<br>CABA INTERVENTORÍA SAS | FORMATO | | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL |
|---|---|---|---|
| | Informe semanal de interventoria | | |
| | CODIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| | CABA-IPES-09 | Ejecucion del proyecto | 3 |

**ENTIDAD CONTRATANTE** INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA N.** | **59** | | | **DEL** | 16/03/2026 | **AL** | 22/03/2026 | |
| CARLOS MARQUES | | | | | | | | |
| **CONTRATO No** | **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024** | | | | | | | |

**COMPONENTE SST**:

Durante la semana comprendida entre el 16 y el 21 de marzo de 2026, en el marco del seguimiento realizado por la Interventoría al contrato en ejecución, se registraron dos (2) ingresos y dos (2) retiros de personal reportados por el profesional SST del contratista. El promedio de personal en obra durante el periodo evaluado fue de diez (10) trabajadores.

En desarrollo de las actividades de inspección y control en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenciaron condiciones inseguras de trabajo, identificándose falta de señalización en áreas intervenidas y presencia de vacíos que representan riesgos para el personal en obra.

Asimismo, durante la semana evaluada se verificaron las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, evidenciándose cumplimiento parcial en los diferentes frentes intervenidos.

En cuanto al reporte de accidentalidad, no se presentaron accidentes laborales ni casos de enfermedad laboral; sin embargo, se reportó un (1) caso de ausentismo por causa médica.

Finalmente, se recomienda al contratista fortalecer las medidas de señalización, control de riesgos y seguimiento permanente por parte del profesional SST, garantizando condiciones seguras para el desarrollo de las actividades en obra.

**COMPONENTE AMBIENTAL**

En el componente ambiental, durante la semana objeto de seguimiento se recomendó al contratista realizar la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) acopiados en obra, teniendo en cuenta la proximidad de finalización del contrato. En caso de no efectuarse el retiro total del punto de acopio, se recomendó replantear y reducir el espacio actualmente destinado para dicha actividad, considerando que el área utilizada resulta extensa frente al volumen de material almacenado.

Asimismo, se recordó al contratista que al cierre del contrato deberá contar con la totalidad de las certificaciones de residuos generados y dispuestos mediante gestores autorizados, desde el inicio hasta la culminación del proyecto. De igual manera, deberá presentar los porcentajes de aprovechamiento y circularidad exigidos por la normativa vigente, requisitos necesarios para el trámite de cierre del PIN ambiental ante la SDA.

Al interior de la zona de trabajo se evidenció acopio de materiales bajo parámetros ambientales adecuados.

Finalmente, respecto al PIN Ambiental, se informó que se realizó el cargue de información correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026, actividad desarrollada conjuntamente entre entidad, contratista e interventoría mediante el aplicativo web de la SDA. No obstante, continúa pendiente la subsanación de las observaciones correspondientes a los informes de gestión SST No. 12 y 13 por parte del contratista de obra.

## 4. PRECIOS NO PREVISTOS

NO SE PRSENTAN SOLICITUDES DE ITEMS NO PREVISTOS PARA LA EJECICION DEL CONTRATO

| Consorcio Urbano Interventores<br>Calle 46A No. 51 - 47<br>Barrio La Esmeralda<br>Telefono: 753 0396<br>CABA INTERVENTORÍA SAS | FORMATO<br>Informe semanal de interventoria | | | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL |
|---|---|---|---|---|
| | CODIGO | PROCESO | VERSIÓN | |
| | CABA-IPES-09 | Ejecucion del proyecto | 3 | |

**ENTIDAD CONTRATANTE** INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA N.** | | **59** | | | **DEL** | 16/03/2026 | **AL** 22/03/2026 |
| CARLOS MARQUES | | | | | | | |
| **CONTRATO No** | | | | | | **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024** | |

**5. REGISTRO FOTOGRAFICO**



Descripción Foto 1 .

Avances en Instalacion de mediacaña en locales eje 8

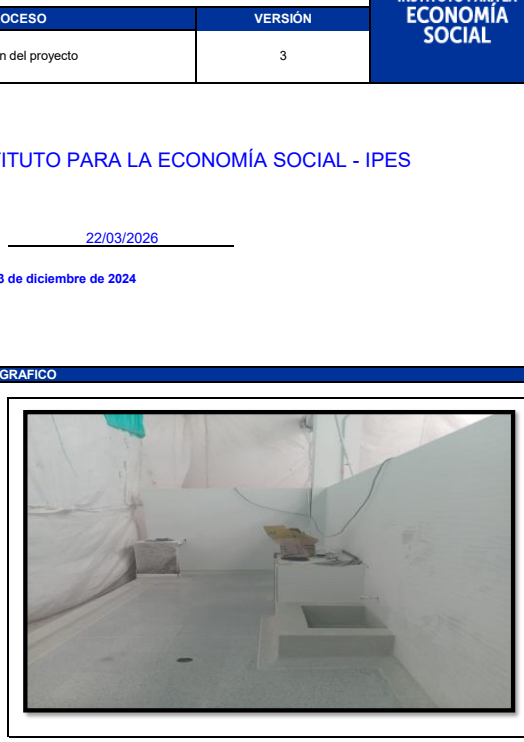


Descripción Foto 2

Se culmina la actividad de pulida de piso en granito locales eje 10



Descripción Foto 3.

Pulida de piso y destronque en eje 10

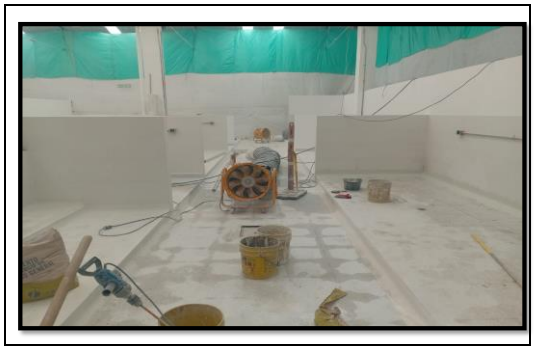

Descripción Foto 4.

Incio de actividad de destronque y pulida eje 10 y 9

| Consorcio Urbano Interventores<br>Calle 46A No. 51 - 47<br>Ramo La Esmeralda<br>Telefono: 753 0396<br>CABA INTERVENTORÍA SAS | FORMATO | | | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL |
|---|---|---|---|---|
| | Informe semanal de interventoria | | | |
| | CODIGO | PROCESO | VERSIÓN | |
| | CABA-IPES-09 | Ejecucion del proyecto | 3 | |

**ENTIDAD CONTRATANTE** INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA N.** | | **59** | | | **DEL** | 16/03/2026 | **AL** | 22/03/2026 | |
| CARLOS MARQUES | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No** | | | | | | **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024** | | | |




Descripción Foto 5

Instalacion marco en granito pulido para sifones rejulla de aguas en corredor eje 8



Descripción Foto 6

Instalacion de tuberia EMT para tomas en locales eje 9

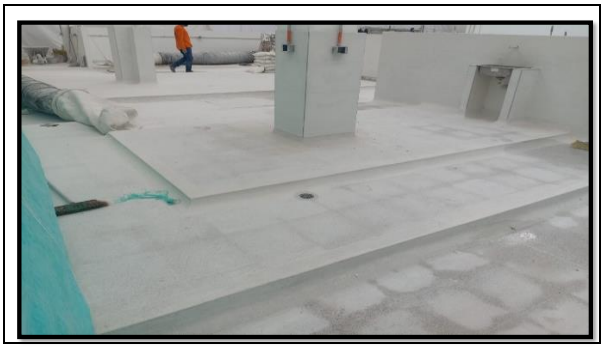

Descripción Foto 7

Intalacion de mediacaña en locales eje 9 y destronque de piso en granito



Descripción Foto 10

Visita y recorrido electrico copn el acompañamiento interventor5ia , obra y entidad

| Consorcio Urbano Interventores<br>Calle 46A No. 51 - 47<br>Barrio La Esmeralda<br>Telefono: 753 0396<br>CABA INTERVENTORÍA SAS | FORMATO | | | INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL |
|---|---|---|---|---|
| | Informe semanal de interventoria | | | |
| | CODIGO | PROCESO | VERSIÓN | |
| | CABA-IPES-09 | Ejecucion del proyecto | 3 | |

**ENTIDAD CONTRATANTE** INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA N.** | **59** | | | **DEL** | 16/03/2026 | **AL** | 22/03/2026 | | |
| CARLOS MARQUES | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No** | | | | | **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024** | | | | |



Descripción Foto 11

Revision de medidas y ubicación de tomas locales etapa 1



Descripción Foto 12 y 13

Instalacion de tuberia y tomas en locales eje 9 y 8



Descripción Foto 14

Pintura epoxica bajo mesones eje 8 local huevos



Descripción Fotos 15 y 16

Imagen 14 Instalacion mediacaña en eje 7 , Imagen 15 Instalacion y pulida de mediacaña eje 8

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIDOS 22 días del mes de MARZO de 2026

ING. DIANA RAMIREZ ZABALA
Director de Interventoría.
CABA INTERVENTORÍA SAS

ARQ. CARLOS A. MARQUEZ FEDUYO
Residente Interventoría.
CABA INTERVENTORÍA SAS

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Telefono: 753 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

**PERSONAL DE INTERVENTORIA**

**PERIODO DEL INFORME:** 16/03/2026 AL 22/03/2026

**SEMANA REPORTADA:** 59

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANT | CARGO | INGRESO | SALIDA | DIK | EN CAMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANA RAMIREZ | 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. | 25% | Oficina |
| 2 | CARLOS MARQUES | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 7:00 a. m. | 5:00 p. m. | 100% | Trabajo en campo |
| 3 | FABER ALI PARRA RAMÍREZ | 1 | TECNICO O TECNOLOGO ELECTRICO | N/A | N/A | 20% | Trabajo en campo |
| 4 | FABIAN FAJARDO | 1 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | N/A | N/A | 10% | Trabajo en campo |
| 5 | GINA PAOLA GARZÓN CHINCHILLA | 1 | PROFESIONAL SISOMA | N/A | N/A | 40% | Trabajo en campo |
| 6 | ANDREA ORTEGA TABARES | 1 | GESTOR SOCIAL | N/A | N/A | 40% | Trabajo en campo |
| 7 | JHON DIAZ LUNA | 1 | TECNICO O TECNOLOGO HIDRAHULICO | N/A | N/A | 20% | Trabajo en campo |
| 8 | SERGIO ARANDA | 1 | COORDINADOR DE PROYECTO | N/A | N/A | 50% | Trabajo en campo |

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Teléfono: 763 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

| PERSONAL DE OBRA | | | | | | | Semana | | | | | | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DEL INFORME | 16-mar-26 | AL | 22-mar-26 | | | | | | | | | | |
| SEMANA REPORTADA | | 59 | | | | | | | | | | | |
| NUMERO | NOMBRE | CARGO | PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO) | INGRESO | RETIRO | EJECUCION DEL PROYECTO | 16-mar-26 AL 22-mar-26 | | | | | | |
| | | | | | | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FELIPE PULIDO GOMEZ | DIRECTOR DE OBRA | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | ADMINISTRA | A | A | A | A | A | A | |
| 2 | LAURA DANIELA FUENTES AVILA | COORDINADOR DE PROYECTOS | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | ADMINISTRA | D | D | D | D | D | D | |
| 3 | TOVAR BERMEO JULIO CESAR | RESIDENTE DE OBRA | Bogotá | 29-ene-25 | 10-feb-26 | ADMINISTRA | | | | | | | |
| 4 | LISNEY PAEZ | SISOMA | Bogotá | 13-nov-25 | N/A | ADMINISTRA | T | T | T | T | T | T | |
| 5 | TORRES BARRERA MARIA ALEJANDRA | PROFESIONAL SOCIAL | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | ADMINISTRA | T | T | T | T | T | D | |
| 6 | FREDDY ALEXANDER ORDOÑEZ GONZALEZ | CARLOS MARQUES | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | ADMINISTRA | D | D | D | D | D | D | |
| 7 | OSCAR LEONARDO ROMERO | TECNICO ELECTRICISTA | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | ADMINISTRA | I | I | I | I | I | I | |
| 8 | CAMILO ANDRES PULIDO VILLAMIL | TECNICO HIDROSANITARIO | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | ADMINISTRA | D | D | D | D | D | D | |
| 9 | ANDY ANDRES VIDEZ BAZANTA | TECNICO ELÉCTRICO | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | ADMINISTRA | D | D | D | D | D | D | |
| 10 | CESAR AUGUSTO PULIDO NIÑO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | ADMINISTRA | A | A | A | A | A | A | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CIMENTACION SUPERFICIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | HEREDIA ORDOÑEZ WILSON MANUEL | OFICIAL DE OBRA | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | OBRAS CIVILES | T | T | T | T | T | T | |
| 2 | PAEZ MELVIS CARINA | AYUDANTE DE OBRA | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 3 | RUBIANO LOPEZ PEDRO ANTONIO | AYUDANTE DE OBRA | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | OBRAS CIVILES | T | T | T | T | T | T | |
| 4 | SANDOVAL VALBUENA NILSON | OFICIAL DE OBRA | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 5 | SANDOVAL VALBUENA ROSELINO | MAESTRO | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | OBRAS CIVILES | T | T | T | T | T | T | |
| 6 | CRISTIAN DAVID ALVARES MELENDEZ | AYUDANTE DE OBRA | Bogotá | 29-ene-25 | N/A | OBRAS CIVILES | T | T | T | T | T | T | |
| 7 | EDGAR NIETO ROJAS | AYUDANTE DE OBRA | Bogotá | 11-jun-25 | N/A | OBRAS CIVILES | T | T | T | T | T | T | |
| 8 | LUIS FELIPE MEDINA SALCEDO | OFICIAL DE OBRA | Bogotá | 1-ago-25 | N/A | OBRAS CIVILES | T | T | T | T | T | T | |
| 9 | JORGE BARRETO | AYUDANTE DE OBRA | Bogotá | 25-ago-25 | N/A | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| SUBCONTRATISTA CUBIMET | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DARIO ALBEIRO CRUZ | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 4-abr-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 2 | EDWIN ALEXANDER GONZALEZ CRUZ | COODINADOR ALTURAS | Bogotá | 4-abr-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 3 | MOISES GABRIEL CRUZ RODRIGUEZ | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 4-abr-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 4 | CARLOS ALBERTO LOPEZ NIÑO | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 5 | EFRAIN ANTONIO DOMINGUEZ | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 6 | CARLOS OCTAVIO PERDOMO YONDA | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 7 | DAGOBERTO HERRERA SANCHEZ | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 8 | IVAN ALEJANDRO OCAMPO VALENCIA | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 9 | JOSE JULIAN HERRERA SANCHEZ | AUXILIAR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 10 | LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ QUIJANO | AUXILIAR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 11 | BRAYAN DAVID TRIANA CRUZ | INGENIERO ESTRUCTURA | Bogotá | 25-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 12 | ESNEIDER JAVIER BELTRAN ESPINOSA | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 13 | JHON ESNEYDER TELLEZ | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |
| 14 | LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ | OFICIAL INSTALADOR | Bogotá | 1-jul-25 | N/A | EST. METALICA | | | | | | | |

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Teléfono: 763 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

| PERSONAL DE OBRA | | | | | | | Semana | | | | | | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DEL INFORME | 16-mar-26 | AL | 22-mar-26 | | | | 16-mar-26 | | | AL | | | 22-mar-26 |
| SEMANA REPORTADA | | 59 | | | | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| NUMERO | NOMBRE | CARGO | PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO) | INGRESO | RETIRO | EJECUCION DEL PROYECTO | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | JAIR ALFONSO LOPEZ CRIOLLO | TÉCNICO ELÉCTRICO | **Bogotá** | 26-jun-25 | 30-sep-25 | ELECTRICAS | | | | | | | |
| 2 | MISAEL MORA CAÑAS | TÉCNICO ELÉCTRICO | **Bogotá** | 26-jun-25 | 30-sep-25 | ELECTRICAS | | | | | | | |
| 3 | CARLOS MORA CAÑAS | TÉCNICO ELÉCTRICO | **Bogotá** | 26-jun-25 | 30-sep-25 | ELECTRICAS | | | | | | | |
| 4 | EDWIN FERNANDO RUBIANO YOSSA | TÉCNICO ELÉCTRICO | **Bogotá** | 1-oct-25 | N/A | ELECTRICAS | | | | | | | |
| 5 | CARLOS GIOVANNI BEJARANO | TÉCNICO ELÉCTRICO | **Bogotá** | 1-oct-25 | N/A | ELECTRICAS | | | | | | | |
| 6 | JEFERSON DAMIAN TORRES | TÉCNICO ELÉCTRICO | **Bogotá** | 1-oct-25 | N/A | ELECTRICAS | | | | | | | |
| 7 | JUAN CARLOS TORRES ROMERO TECNICO | TÉCNICO ELÉCTRICO | **Bogotá** | 1-oct-25 | N/A | ELECTRICAS | | | | | | | |
| INSTALADORES PASARELAS Y LINEAS DE VIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MAYERLIS CAROLINA GONZALEZ VIVANCO | INSPECTOR SST | **Bogotá** | 17-sep-25 | N/A | INSPECTOR SST | | | | | | | |
| 2 | HERNAN DAVID GONZALEZ VIVANCO | TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR | **Bogotá** | 18-sep-25 | N/A | ANDAMIERO | | | | | | | |
| 3 | JOEL ISAAC VIVANCO MONTOYA | TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR | **Bogotá** | 19-sep-25 | N/A | ANDAMIERO | | | | | | | |
| 4 | VICTOR MANUEL VIVANCO MONTOYA | TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR ANDAMIERO | **Bogotá** | 20-sep-25 | N/A | ANDAMIERO | | | | | | | |
| 5 | HERNAN ENRIQUE GONZALEZ GUZMAN | TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR ANDAMIERO | **Bogotá** | 21-sep-25 | N/A | ANDAMIERO | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| **RETIRADO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Enuar Enrique Jimenez Gonzalez | Auxiliar | **Bogotá** | **29-ene-25** | **10-mar-25** | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 2 | Edwin Stewar Alvarado ALvarez | Auxiliar | **Bogotá** | **29-ene-25** | **14-mar-25** | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 3 | Wilmar Campos Cárdenas | Auxiliar | **Bogotá** | **29-ene-25** | **14-mar-25** | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 4 | Andys Andrés Videz Bazanta | Tec. Eléctrico | **Bogotá** | **29-ene-25** | **19-mar-25** | ELECTRICOS | | | | | | | |
| 5 | Jairo Antonio Sierra Villamil | Auxiliar | **Bogotá** | **29-ene-25** | **4-abr-25** | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 6 | Yaison Lima Peña | Auxiliar | **Bogotá** | **4-abr-25** | **22-may-25** | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 7 | Joser Esteban Ospina marulanda | Oficial pilotes | **Bogotá** | **4-abr-25** | **29-may-25** | PILOTES | | | | | | | |
| 8 | Gabriel Andrés Pabon Ospina | Oficial pilotes | **Bogotá** | **4-abr-25** | **29-may-25** | PILOTES | | | | | | | |
| 9 | David Alexander Marulanda | Oficial pilotes | **Bogotá** | **4-abr-25** | **29/05/2025** | PILOTES | | | | | | | |
| 10 | Jonathan Arley Bustos Lopez | Oficial pilotes | **Bogotá** | **4-abr-25** | **29-may-25** | PILOTES | | | | | | | |
| 11 | Luis Eduardo Pulido | Operario | **Bogotá** | **4-jun-25** | **25-jun-25** | MINICARGADOR | | | | | | | |
| 12 | Abelardo Corredor Camacho | Oficial de obra | **Bogotá** | **29-ene-25** | **30-jun-25** | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 13 | DAMAR JOSE BARRAZA TORRENEGRA | AYUDANTE DE OBRA | **Bogotá** | **16-jun.25** | 15-ago-25 | OBRAS CIVILES | | | | | | | |
| 14 | JAIR ALFONSO LOPEZ CRIOLLO | TÉCNICO ELÉCTRICO | **Bogotá** | 26-jun-25 | 30-sep-25 | ELECTRICAS | | | | | | | |

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Teléfono: 763 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

| PERSONAL DE OBRA | | | | | | | Semana | | | | | | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DEL INFORME | 16-mar-26 | AL | 22-mar-26 | | | | 16-mar-26 | | | AL | | | 22-mar-26 |
| SEMANA REPORTADA | | 59 | | | | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| NUMERO | NOMBRE | CARGO | PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO) | INGRESO | RETIRO | EJECUCION DEL PROYECTO | | | | | | | |
| 15 | MISAEL MORA CAÑAS | COMPONENTE SST:<br><br>Durante la semana comprendida entre el 16 y el 21 de marzo de 2026, en el marco del seguimiento realizado por la Interventoría al contrato en ejecución, se registraron dos (2) ingresos y dos (2) retiros de personal reportados por el profesional SST del contratista. El promedio de personal en obra durante el periodo evaluado fue de diez (10) trabajadores.<br><br>En desarrollo de las actividades de inspección y control en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenciaron condiciones inseguras de trabajo, identificándose falta de señalización en áreas intervenidas y presencia de vacíos que representan riesgos para el personal en obra.<br><br>Asimismo, durante la semana evaluada se verificaron las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, evidenciándose cumplimiento parcial en los diferentes frentes intervenidos.<br><br>En cuanto al reporte de accidentalidad, no se presentaron accidentes laborales ni casos de enfermedad laboral; sin embargo, se reportó un (1) caso de ausentismo por causa médica.<br><br>Finalmente, se recomienda al contratista fortalecer las medidas de señalización, control | **COMPONENTE SST:**<br><br>**Durante la semana comprendida entre el 16 y el 21 de marzo de 2026, en el marco del seguimiento realizado por la Interventoría al contrato en ejecución, se registraron dos (2) ingresos y dos (2) retiros de personal reportados por el profesional SST del contratista. El promedio de personal en obra durante el periodo evaluado fue de diez (10) trabajadores.**<br><br>**En desarrollo de las actividades de inspección y control en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenciaron condiciones inseguras de trabajo, identificándose falta de señalización en** | COMPONENTE SST:<br><br>Durante la semana comprendida entre el 16 y el 21 de marzo de 2026, en el marco del seguimiento realizado por la Interventoría al contrato en ejecución, se registraron dos (2) ingresos y dos (2) retiros de personal reportados por el profesional SST del contratista. El promedio de personal en obra durante el periodo evaluado fue de diez (10) trabajadores. | COMPONENTE SST:<br><br>Durante la semana comprendida entre el 16 y el 21 de marzo de 2026, en el marco del seguimiento realizado por la Interventoría al contrato en ejecución, se registraron dos (2) ingresos y dos (2) retiros de personal reportados por el profesional SST del contratista. El promedio de personal en obra durante el periodo evaluado fue de diez (10) trabajadores. | COMPONENTE SST:<br><br>Durante la semana comprendida entre el 16 y el 21 de marzo de 2026, en el marco del seguimiento realizado por la Interventoría al contrato en ejecución, se registraron dos (2) ingresos y dos (2) retiros de personal reportados por el profesional SST del contratista. El promedio de personal en obra durante el periodo evaluado fue de diez (10) trabajadores.<br><br>En desarrollo de las actividades de inspección y | | | | | | | |
| 16 | CARLOS MORA CAÑAS | TÉCNICO ELÉCTRICO | **Bogotá** | 26-jun-25 | 30-sep-25 | ELECTRICAS | | | | | | | |

| OBSERVACIÓN: |
|---|
| (T): TRABAJANDO |
| (D): DISPONIBLE |
| ( ): RETIRADO |
| (V): VISITA OBRA DE UNO A VARIOS DÍAS |
| (I): INCAPACITADO |
| (A): PERSONAL ADMINISTRATIVO |
