Consorcio Urbano Interventores Calle 45A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Teléfono: 753 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO Informe semanal de interventoria			INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3	

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 60 **DEL** 23/03/2026 **AL** 29/03/2026

CONTRATO No No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO CO1.PCCNTR.7119721 No.784 de fecha 13 de diciembre de 2024

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL OBRAS CYZ **NIT** 901.898.137-2

INTERVENTOR CABA INTERVENTORÍA SAS **NIT** 901.463.604-3

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION ING. HUMBERTO CARLOS NOYA ROMERO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 29 **DE** ENERO **DE** 2025


FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 28 **DE** MARZO **DE** 2026

Contrato de Obra	
Valor Inicial	$ 2.325.484.185,00
Valor Actualizado	$ 3.485.493.547,00
No. empleos Directos generados	47
No. empleos Indirectos generados	102

Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 314.215.530,00
Valor Actualizado	$ 471.323.295,00
No. empleos Directos generados	15
No. empleos Indirectos generados	10

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,23%	100,00%	Trabajo Ejecutado	2,00%	97,02%
Valor del Trabajo Programado	$ 8.016.635,16	$ 3.156.777.390	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 69.709.870,94	$ 3.374.673.700

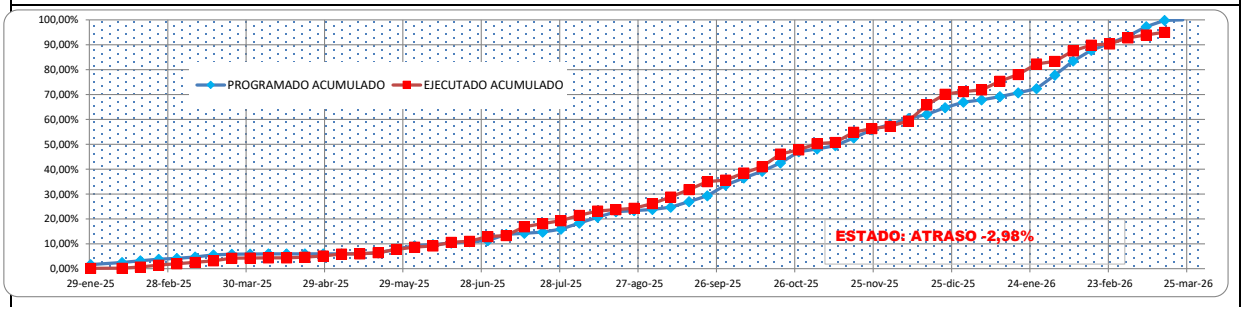

Consorcio Urbano Interventores Calle 46A No. 51 - 47 Barrio La Esmeralda Telefono: 753 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO			INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria			
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3	

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 60 **DEL** 23/03/2026 **AL** 29/03/2026

CONTRATO No No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTADO GENERAL DEL CONTRATO	100,00%	97,02%	-2,98%	SE PRESENTA ATRASO DE EN DIAS POR LA FALTA DE ENTREGA DE DISEÑOS ELECTRICOS POR PARTE DE LA ENTIDAD LO QUE ATRASA LA FINALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS ETAPA 1
APROPIACION DE DISEÑO	100%	100%	0,00%	PENDIENTE APROPIACION DE DISEÑOS
Pulida y brillada de pisos en granito	100%	90%	-10,00%	LA ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMACION DEBE ESTAR TERMINADA PERO SE ENCUENTRA EN ENECIUCION AUN POR TEMAS DE ACTIVIDADES ELECTRICAS PENDIENTES
Mediacaña en granito pulido h = 0.10 m	100%	100%	0,00%	ACTIVIDAD CULMINADA PARA LA FECHA DEL INFORME SEMANAL
Intalacion de vinilo tipo 1 a tres manos	100%	100%	0,00%	ESTA ACTIVIDAD ESTA CULMINADA DEJANDO CLARIDAD QUE FALTAN REMATES PENDIENETES
Suministro e instalacion de estuco sobre pañete	100%	100%	0,00%	ESTA ACTIVIDAD AUN SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y PRESENTA ATRASO SEGÚN PROGRAMACION PRESENTRADA POR EL CONTRATISTA
Piso Tipo 1 Baldosa Granito 40 X 40 Similar al existente.	100%	100%	0,00%	ACTIVIDAD TERMINADA
Actividades electricas	100%	80%	-20,00%	SE PRESENTAN ATRASOS DEBIDO A LA ENTREA TARDIA DE LOS DISEÑOS POR PARTE DE LA ENTIDAD ALA FECHA DEL INMFORME YA SE NECUENTRA APROVADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL DISEÑO ELECTRICO , EL CONBTRATIUSTA PRESENTO UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ADELANBATR ZONAS DE TRABAJO Y LOAGRAR TERMINAR EL CONTRATO ACABALIDAD

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO:
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:
COMPONENTE TÉCNICO:
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:
•Pintura electroestática puerta entamborada tipo persiana
•Instalación de tablero MONOFASICO de 12 circuitos local
•Instalación de muro en drywall altura 2,02 mts eje 8 local señor faminio
•Corte para salida de luminarias en cielorraso PVC local eje 10
•Instalación de soportes en tubería EMT para tomas de locales eje 8 y 7
•Instalación de estructura metálica local huevos eje 8
•Instalación de estructura metálica local 131 y 132 eje 9
•Verificación de cantidad de tomas, alturas y ubicación del medidor por parte de obra y el comerciante local 131 y 132 eje 9
•Entrega de local al comerciante 131 y 132 eje 9 y ubicación de tomas y punto de agua a comerciante choconta.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:
•se realizó el comité de cierre correspondiente a la entrega de actividades del contrato de obra (recorrido presencial interventoría, contratista IPES)
•se dejan fechas de entrega informe final y liquidación ante el contratista
•el contratista presenta a la entidad e interventoría una solicitud de suspensión de obra debido a no culminación al 100% de las actividades del componente eléctrico. Esta se encuentra en revisión de la entidad
•se generan observaciones al contratista del informe técnico No 14 por parte de la interventoría

FECHA DE PRESENTACION DE ACTAS PARCIALE 25 DE CADA MES.
COMPONENTE SOCIAL:
•Se encuentra pendiente reparaciones generales señora Tatiana local pollos
•Se entrego por parte del contratista el informe mensual de obra No 14, se encuentra en revisión por parte de interventoría

Consorcio Urbano Interventores Calle 46A No. 51 - 47 Ramo La Esmeralda Telefono: 753 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO			INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria			
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3	

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 60 **DEL** 23/03/2026 **AL** 29/03/2026

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**

COMPONENTE SST: Durante la semana comprendida entre el 16 y el 21 de febrero de 2026, en el marco del seguimiento realizado por la Interventoría al contrato en ejecución, se registraron dos (2) ingresos correspondientes a auxiliares para el desarme de andamios. No se presentaron retiros de personal (0) reportados por el SST del contratista. El promedio de personal en obra durante el periodo evaluado fue de doce (12) trabajadores. Se recuerda al contratista que, conforme a lo notificado mediante oficio IPES-INT-437, es obligatorio reportar oportunamente el personal que se encuentra en obra y retiro del personal en obra.
En desarrollo de las actividades de inspección y control en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se realizó por parte de la interventorías y el contratista el acompañamiento de las actividades que se requieren en desmonte de luminarias red eléctrica existente entre otras
En cuanto a condiciones de orden y aseo, se solicitó al profesional SST realizar jornada de limpieza en el acceso al área de trabajo de la plaza, debido al arrastre de material en la zona. Se evidenció cumplimiento en el área aledaña a los campamentos de obra, donde se realizó limpieza adecuada. Asimismo, se verificó correcta instalación, señalización y acceso a los implementos del plan de emergencias (botiquín, camilla y extintor), así como señalización visible, preventiva e informativa en las áreas intervenidas.
Para la semana evaluada se reportan cero (0) accidentes laborales y cero (0) casos de enfermedad laboral; sin embargo, se presentó un (1) caso de ausentismo por causa médica.
En conclusión, se recomienda al profesional SST continuar con el acompañamiento permanente a las actividades ejecutadas en obra y diligenciar de manera completa, idónea y profesional los formatos de permisos de trabajo y ATS correspondientes a las actividades a autorizar, recordando que el principio del SST se fundamenta en velar por la seguridad y salud de los trabajadores vinculados al proyecto.

COMPONENTE AMBIENTAL

En el componente ambiental, durante la semana objeto de seguimiento se evidenciaron mejoras en el manejo del punto de acopio de materiales, con adecuada segregación y clasificación de residuos. Se observó control de emisiones atmosféricas mediante co bertura con plástico negro.

Al interior de la zona de trabajo se evidenció acopio de materiales (sacos de cemento) bajo parámetros ambientales adecuados, señalizados y protegidos para evitar el contacto directo con el suelo.
Se solicita a la administración acompañamiento en el área de acopio ubicada en la zona de descargue, dado que se evidencian desechos y residuos ajenos al contratista, asociados a alimentos comercializados en la plaza.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

NO SE PRSENTAN SOLICITUDES DE ITEMS NO PREVISTOS PARA LA EJECICION DEL CONTRATO

Consorcio Urbano Interventores Calle 46A No. 51 - 47 Ramo La Esmeralda Telefono: 753 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO Informe semanal de interventoria			INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3	

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 60 **DEL** 23/03/2026 **AL** 29/03/2026

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**

5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1 .

Pintura electroestatica puerta entamborada tipo persiana



Descripción Foto 2

Instalacion de tablero MONOFASICO de 12 circuitos local pescados



Descripción Foto 3 y 4

Intalacion de muro en drywall altura 2.02 mts, incluye laminas , estuco y pintura tipo vinilo a tres manos



Descripción Foto 5

Corte para salida de limunarias en cieloraso PVC local eje 10 pescaderia eje 1'0

Consorcio Urbano Interventores Calle 46A No. 51 - 47 Ramo La Esmeralda Telefono: 753 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO			INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria			
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3	

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 60 **DEL** 23/03/2026 **AL** 29/03/2026

CONTRATO No **No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024**



Descripción Foto 6

Instalacion de soportes en tuberia EMT para tomas de locales



Descripción Foto 7

Instalacion de de estructura metalica local huevos eje 8



Descripción Foto 8

Instalacion de estructura metalica local 131 y 132 eje 9



Descripción Foto 9

Verificacion de cantidad de tomas , alturas y ubicación del medidor por parte de obra y el comerciante local 131 y 132 eje 9

Consorcio Urbano Interventores Calle 46A No. 51 - 47 Ramo La Esmeralda Telefono: 753 0396 CABA INTERVENTORÍA SAS	FORMATO			INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
	Informe semanal de interventoria			
	CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	CABA-IPES-09	Ejecucion del proyecto	3	

ENTIDAD CONTRATANTE INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

SEMANA N. 60 **DEL** 23/03/2026 **AL** 29/03/2026

CONTRATO No No CO1.PCCNTR.7162568 No.800 de fecha 23 de diciembre de 2024



Descripción Foto 10 y 11

Inmage 10 entrega de local al comerciante 131 y 132 eje 9, Imagen 11 ubicación de tomas y punto de agua a comerciante , administracion en acompañamiento de la interventoria y contratista.



Descripción Foto 12 y 13

Imagen 12 instalacion de tablero MONOFASICO en local comerciante 131 y 132, Imagen 13 pintura en muros drywall



Descripción Foto 14

Observacion al contratista organizar mas la obra ya que los elementos de cableados estan propensos a tropiezos con los trabajadores y personal tecnico



Descripción Fotos 15

Observaciones al contratista por falta de señalizacion en cajas hidrahulicas en corredores ejes 8 y 9

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTINIEVE 29 días del mes de MARZO de 2026

ING. DIANA RAMIREZ ZABALA
Director de Interventoría.
CABA INTERVENTORÍA SAS

ARQ. CARLOS A. MARQUEZ FEDUYO
Residente Interventoría.
CABA INTERVENTORÍA SAS

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Telefono: 753 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERIODO DEL INFORME: 23/03/2026 AL 29/03/2026

SEMANA REPORTADA: 60

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT	CARGO	INGRESO	SALIDA	DIK	EN CAMPO
1	DIANA RAMIREZ	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	25%	Oficina
2	CARLOS MARQUES	1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	7:00 a. m.	5:00 p. m.	100%	Trabajo en campo
3	FABER ALI PARRA RAMÍREZ	1	TECNICO O TECNOLOGO ELECTRICO	N/A	N/A	20%	Trabajo en campo
4	FABIAN FAJARDO	1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	N/A	N/A	10%	Trabajo en campo
5	GINA PAOLA GARZÓN CHINCHILLA	1	PROFESIONAL SISOMA	N/A	N/A	40%	Trabajo en campo
6	ANDREA ORTEGA TABARES	1	GESTOR SOCIAL	N/A	N/A	40%	Trabajo en campo
7	JHON DIAZ LUNA	1	TECNICO O TECNOLOGO HIDROSANITARIO	N/A	N/A	20%	Trabajo en campo
8	SERGIO ARANDA	1	COORDINADOR DE PROYECTO	N/A	N/A	50%	Trabajo en campo
9	ANGELICA MARIA GUERRERO	1	CONTADORA	N/A	N/A	10%	Oficina

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Teléfono: 763 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

PERSONAL DE OBRA							Semana						60
PERIODO DEL INFORME	23-mar-26	AL	29-mar-26										
SEMANA REPORTADA			60										
NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	EJECUCION DEL PROYECTO	23-mar-26			AL		29-mar-26	
							LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
							23	24	25	26	27	28	1
PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA													
1	FELIPE PULIDO GOMEZ	DIRECTOR DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	A	A	A	A	A	A	
2	LAURA DANIELA FUENTES AVILA	COORDINADOR DE PROYECTOS	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
3	TOVAR BERMEO JULIO CESAR	RESIDENTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	10-feb-26	ADMINISTRA							
4	LISNEY PAEZ	SISOMA	Bogotá	13-nov-25	N/A	ADMINISTRA	T	T	T	T	T	T	
5	TORRES BARRERA MARIA ALEJANDRA	PROFESIONAL SOCIAL	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	T	T	T	T	T	D	
6	FREDDY ALEXANDER ORDOÑEZ GONZALEZ	ASESOR ESTRUCTURAL	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
7	OSCAR LEONARDO ROMERO	TECNICO ELECTRICISTA	Bogotá	D TECNOLOGO E	N/A	ADMINISTRA	I	I	I	I	I	I	
8	CAMILO ANDRES PULIDO VILLAMIL	TECNICO HIDROSANITARIO	Bogotá	29-ene-25	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
9	ANDY ANDRES VIDEZ BAZANTA	TECNICO ELÉCTRICO	Bogotá	OFESIONAL SISO	N/A	ADMINISTRA	D	D	D	D	D	D	
10	CESAR AUGUSTO PULIDO NIÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Bogotá	GESTOR SOCIAL	N/A	ADMINISTRA	A	A	A	A	A	A	
	7	JHON DIAZ LUNA	1	CNOLOGO HIDR	N/A	N/A							
11	8												
12	9												
PERSONAL OPERATIVO													
CIMENTACION SUPERFICIAL													
1	HEREDIA ORDOÑEZ WILSON MANUEL	OFICIAL DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
2	PAEZ MELVIS CARINA	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES							
3	RUBIANO LOPEZ PEDRO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
4	SANDOVAL VALBUENA NILSON	OFICIAL DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES							
5	SANDOVAL VALBUENA ROSELINO	MAESTRO	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
6	CRISTIAN DAVID ALVARES MELENDEZ	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	29-ene-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
7	EDGAR NIETO ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	11-jun-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
8	LUIS FELIPE MEDINA SALCEDO	OFICIAL DE OBRA	Bogotá	1-ago-25	N/A	OBRAS CIVILES	T	T	T	T	T	T	
9	JORGE BARRETO	AYUDANTE DE OBRA	Bogotá	25-ago-25	N/A	OBRAS CIVILES							
10													
11													
12													
13													
14													
SUBCONTRATISTA CUBIMET													
1	DARIO ALBEIRO CRUZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	4-abr-25	N/A	EST. METALICA							
2	EDWIN ALEXANDER GONZALEZ CRUZ	COODINADOR ALTURAS	Bogotá	4-abr-25	N/A	EST. METALICA							
3	MOISES GABRIEL CRUZ RODRIGUEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	4-abr-25	N/A	EST. METALICA							
4	CARLOS ALBERTO LOPEZ NIÑO	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
5	EFRAIN ANTONIO DOMINGUEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
6	CARLOS OCTAVIO PERDOMO YONDA	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
7	DAGOBERTO HERRERA SANCHEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
8	IVAN ALEJANDRO OCAMPO VALENCIA	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
9	JOSE JULIAN HERRERA SANCHEZ	AUXILIAR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
10	LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ QUIJANO	AUXILIAR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
11	BRAYAN DAVID TRIANA CRUZ	INGENIERO ESTRUCTURA	Bogotá	25-jul-25	N/A	EST. METALICA							
12	ESNEIDER JAVIER BELTRAN ESPINOSA	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
13	JHON ESNEYDER TELLEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							
14	LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	OFICIAL INSTALADOR	Bogotá	1-jul-25	N/A	EST. METALICA							

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Consorcio Urbano Interventores
Calle 45A No. 51 - 47
Barrio La Esmeralda
Teléfono: 763 0396
CABA INTERVENTORÍA SAS

PERSONAL DE OBRA							Semana						60
PERIODO DEL INFORME	23-mar-26	AL	29-mar-26				23-mar-26			AL			29-mar-26
SEMANA REPORTADA		60					LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA (DEPARTAMENTO)	INGRESO	RETIRO	EJECUCION DEL PROYECTO	23	24	25	26	27	28	1
INSTALACIONES ELECTRICAS													
1	JAIR ALFONSO LOPEZ CRIOLLO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
2	MISAEL MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
3	CARLOS MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
4	EDWIN FERNANDO RUBIANO YOSSA	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
5	CARLOS GIOVANNI BEJARANO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
6	JEFERSON DAMIAN TORRES	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
7	JUAN CARLOS TORRES ROMERO TECNICO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	1-oct-25	N/A	ELECTRICAS							
INSTALADORES PASARELAS Y LINEAS DE VIDA													
1	MAYERLIS CAROLINA GONZALEZ VIVANCO	INSPECTOR SST	**Bogotá**	17-sep-25	N/A	INSPECTOR SST							
2	HERNAN DAVID GONZALEZ VIVANCO	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR	**Bogotá**	18-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
3	JOEL ISAAC VIVANCO MONTOYA	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR	**Bogotá**	19-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
4	VICTOR MANUEL VIVANCO MONTOYA	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR ANDAMIERO	**Bogotá**	20-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
5	HERNAN ENRIQUE GONZALEZ GUZMAN	TÉCNICO OPERATIVO E INSTALADOR ANDAMIERO	**Bogotá**	21-sep-25	N/A	ANDAMIERO							
6													
RETIRADO													
1	Enuar Enrique Jimenez Gonzalez	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**10-mar-25**	OBRAS CIVILES							
2	Edwin Stewar Alvarado ALvarez	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**14-mar-25**	OBRAS CIVILES							
3	Wilmar Campos Cárdenas	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**14-mar-25**	OBRAS CIVILES							
4	Andys Andrés Videz Bazanta	Tec. Eléctrico	**Bogotá**	**29-ene-25**	**19-mar-25**	ELECTRICOS							
5	Jairo Antonio Sierra Villamil	Auxiliar	**Bogotá**	**29-ene-25**	**4-abr-25**	OBRAS CIVILES							
6	Yaison Lima Peña	Auxiliar	**Bogotá**	**4-abr-25**	**22-may-25**	OBRAS CIVILES							
7	Joser Esteban Ospina marulanda	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29-may-25**	PILOTES							
8	Gabriel Andrés Pabon Ospina	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29-may-25**	PILOTES							
9	David Alexander Marulanda	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29/05/2025**	PILOTES							
10	Jonathan Arley Bustos Lopez	Oficial pilotes	**Bogotá**	**4-abr-25**	**29-may-25**	PILOTES							
11	Luis Eduardo Pulido	Operario	**Bogotá**	**4-jun-25**	**25-jun-25**	MINICARGADOR							
12	Abelardo Corredor Camacho	Oficial de obra	**Bogotá**	**29-ene-25**	**30-jun-25**	OBRAS CIVILES							
13	DAMAR JOSE BARRAZA TORRENEGRA	AYUDANTE DE OBRA	**Bogotá**	**16-jun.25**	15-ago-25	OBRAS CIVILES							
14	JAIR ALFONSO LOPEZ CRIOLLO	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
15	MISAEL MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							
16	CARLOS MORA CAÑAS	TÉCNICO ELÉCTRICO	**Bogotá**	26-jun-25	30-sep-25	ELECTRICAS							

OBSERVACIÓN:
(T): TRABAJANDO
(D): DISPONIBLE
( ): RETIRADO
(V): VISITA OBRA DE UNO A VARIOS DÍAS
(I): INCAPACITADO
(A): PERSONAL ADMINISTRATIVO
