INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

CQ Ingeniería & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe N°	2	Periodo comprendido entre el :	1 de marzo de 2026	y el:	31 de marzo de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Objeto:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".		
Contrato N°:	513 DE 2025		
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	C.C:	79,142,300
Plazo Inicial:	CUATRO	4	MESES
Plazo adicional 1:	N/A		
Plazo total:	CUATRO	4	MESES
Fecha de Inicio:	22 de enero de 2026		
Fecha de Terminación:	22 de mayo de 2026		
Fecha Suspensión 1:	N/A		
Fecha Reinicio 1:	N/A		
Valor Inicial:	$		53,597,600.00
Valor adicional 1:	$		-
Valor total:	$		53,597,600.00
Valor pagado:	$		24,365,468.96
Valor por pagar:	$		29,232,131.04
Nombre Supervisor:	JAVIER CARDOSO GUTIÉRREZ		

CONTRATO DE OBRA

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSIÓN DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA.		
Contrato N°:	114 DE 2026		
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	**Nit.:**	902.021.671-4
Plazo Inicial:	CUATRO	4	MESES
Plazo adiciona 1:	N/A		
Plazo total:	CUATRO	4	MESES
Fecha de Inicio:	22 de enero de 2026		
Fecha de Terminación:	22 de mayo de 2026		
Fecha de Suspensión:	N/A		
Fecha de Reinicio:	N/A		
Valor Inicial:	$		515,733,326.54
Valor adicional 1:	$		-
Valor total:	$		515,733,326.54
Valor pagado:	$		234,476,600.02
Valor por pagar:	$		281,256,726.52
Nombre Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/01/2026	23/11/2026	$ 16,079,280.00
Prestaciones sociales	22/01/2026	23/05/2029	$ 5,359,760.00
Calidad del servicio	22/05/2026	22/05/2031	$ 5,359,760.00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	22/01/2026	22/11/2026	$ 154,719,998.10
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.laborales	22/01/2026	22/01/2029	$ 154,719,998.10
Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses		$ 206,293,330.80
Calidad del servicio	22/01/2026	22/05/2027	$ 154,719,998.10
Responsabilidad civil extracontractual	22/01/2026	22/05/2026	$ 350,181,000.00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1		$ 24,365,468.96

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1	6/04/2026	$ 234,476,600.02

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

Ingenieria & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	12.80%	29.37%	42.17%
% Ejecutado	45.46%	34.54%	80.00%
Diferencia	32.66%	5.17%	37.83%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 66,020.53	$ 151,449.67	$ 217,470.20	42.17%
% Ejecutado	$ 234,476.60	$ 234,476.60	$ 468,953.20	80.00%
Diferencia	$ 168,456.07	$ 83,026.94	$ 251,483.00	37.83%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Durante el periodo informado se realizó proceso constructivo de 2 secaderos de cafe, 3 sistemas sépticos para aguas residuales domésticas y 3 composteras. Se inicio construccion de biodigestores


2. PERSONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	2		100.00%	0.00%	2
TÉCNICO			0.00%	0.00%	0
M.O.N.C			0.00%	0.00%	0
TOTAL	2	0	100.00%	0.00%	2
TOTALES	2		100.00%		

CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	0	3	0.00%	30.00%	3
TÉCNICO	1	1	10.00%	10.00%	2
M.O.N.C.	4	1	40.00%	10.00%	5
TOTAL	5	5	50.00%	50.00%	10
TOTALES	10		100.00%		










INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2

Ingenieria & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

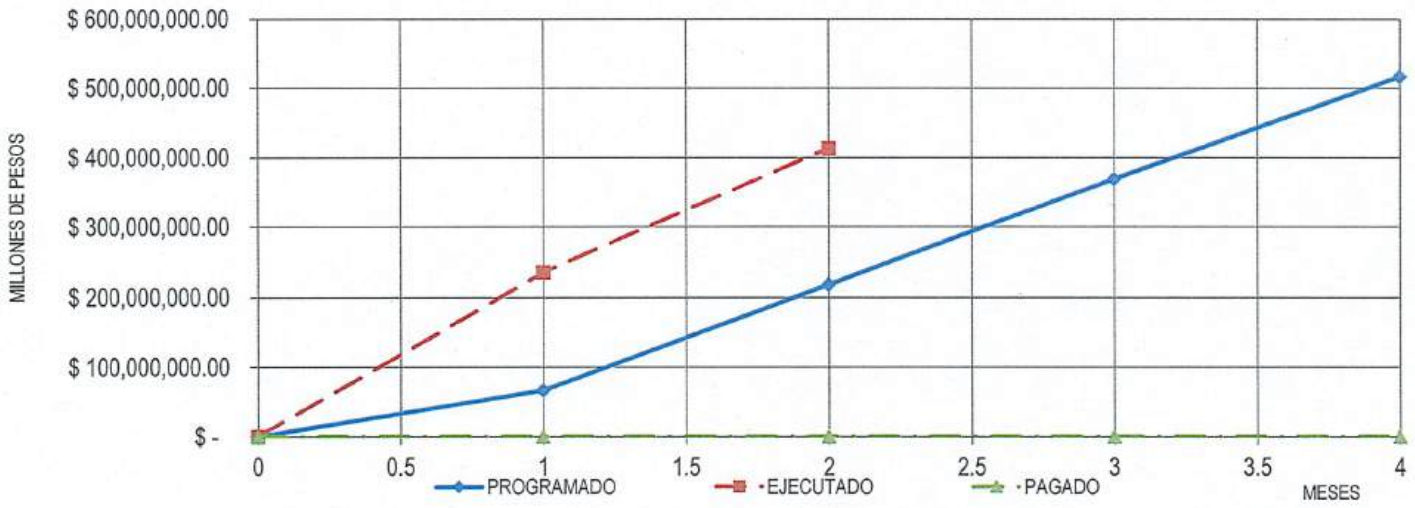

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

La interventoria en este periodo realizó seguimiento y control a las actividades ejecutadas por el contratista, las cuales se realizaron de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se ha contado con el acompañamiento de la supervisión para el seguimiento de la ejecución de los trabajos.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: WILLIAM PARRA OLAYA Cargo: Residente de Interventoria	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Cargo: Director Interventoría	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO Cargo: Contratista de Interventoria

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

Ingeniería & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato N°:	114 DE 2026	**Contratista:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
Periodo:	1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN	**Residente de Interventoría:**	WILLIAM PARRA OLAYA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	Construcción de cuatro (4) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo cerramiento negro de 1 1/2 de diametro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.												
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	99.0	$ 11,676.00	$ 1,155,924.00	49.50	49.50	99.00	$ 577,962.00	$ 577,962.00	$ 1,155,924.00		
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	3.2	$ 46,640.00	$ 149,248.00	1.60	1.60	3.20	$ 74,624.00	$ 74,624.00	$ 149,248.00		
1.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3.	M3	3.2	$ 1,032,296.00	$ 3,303,347.20	1.60	1.60	3.20	$ 1,651,673.60	$ 1,651,673.60	$ 3,303,347.20		
1.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABÓLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 mm X 6 MTS DE LONGITUD Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS. TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES INTERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	4.0	$ 7,712,348.00	$ 30,849,392.00	2.00	2.00	4.00	$ 15,424,696.00	$ 15,424,696.00	$ 30,849,392.00		
1.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	4.0	$ 3,812,766.00	$ 15,251,064.00	2.00	2.00	4.00	$ 7,625,532.00	$ 7,625,532.00	$ 15,251,064.00		
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	4.0	$ 2,004,530.00	$ 8,018,120.00	2.00	2.00	4.00	$ 4,009,060.00	$ 4,009,060.00	$ 8,018,120.00		
1.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna. Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	UND	32.0	$ 888,980.00	$ 28,447,360.00	16.00	16.00	32.00	$ 14,223,680.00	$ 14,223,680.00	$ 28,447,360.00		
1.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.0	$ 1,408,080.00	$ 5,632,320.00	2.00	2.00	4.00	$ 2,816,160.00	$ 2,816,160.00	$ 5,632,320.00		
1.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	78.0	$ 101,088.00	$ 7,884,864.00	16.00	62.00	78.00	$ 1,617,408.00	$ 6,267,456.00	$ 7,884,864.00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
2	**Construcción de tres (3) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.**												
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	75.0	$ 11,676.00	$ 875,700.00	75.00		75.00	$ 875,700.00	$ -	$ 875,700.00		
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	2.4	$ 46,640.00	$ 111,936.00	2.40		2.40	$ 111,936.00	$ -	$ 111,936.00		
2.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	2.4	$ 1,032,297.00	$ 2,477,512.80	2.40		2.40	$ 2,477,512.80	$ -	$ 2,477,512.80		
2.4	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	3.0	$ 7,928,648.00	$ 23,785,944.00	3.00		3.00	$ 23,785,944.00	$ -	$ 23,785,944.00		
2.5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 1/8 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 1/8 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	3.0	$ 3,812,766.00	$ 11,438,298.00	3.00		3.00	$ 11,438,298.00	$ -	$ 11,438,298.00		
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	3.0	$ 2,004,530.00	$ 6,013,590.00	3.00		3.00	$ 6,013,590.00	$ -	$ 6,013,590.00		
2.7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE GRANO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CAFE COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	UND	24.0	$ 888,980.00	$ 21,335,520.00	24.00		24.00	$ 21,335,520.00	$ -	$ 21,335,520.00		
2.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3.0	$ 1,408,080.00	$ 4,224,240.00	3.00		3.00	$ 4,224,240.00	$ -	$ 4,224,240.00		
2.9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE		$ 101,088.00	$ -					$ -	$ -		
3	**Construcción de cuatro (4) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**												
3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	52.0	$ 11,676.00	$ 607,152.00					$ -	$ -	52.00	$ 607,152.00
3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	2.0	$ 46,640.00	$ 93,280.00					$ -	$ -	2.00	$ 93,280.00
3.3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC PRESIÓN BLANCA 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	4.0	$ 970,730.00	$ 3,882,920.00					$ -	$ -	4.00	$ 3,882,920.00
3.4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3,71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90).	UND	4.0	$ 3,778,750.00	$ 15,115,000.00					$ -	$ -	4.00	$ 15,115,000.00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 5 M DE DIÀMETRO; 1,1 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	4.0	$ 4,309,063.00	$ 17,236,252.00					$ -	$ -	4.00	$ 17,236,252.00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA, INCLUYE CLIP PARA POLISOMBRA Y SOGA DE AMARRE	UND	4.0	$ 675,768.00	$ 2,703,072.00					$ -	$ -	4.00	$ 2,703,072.00
3.7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2.0	$ 1,408,080.00	$ 2,816,160.00					$ -	$ -	2.00	$ 2,816,160.00
3.8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE		$ 101,088.00	$ -					$ -	$ -		
4	**Construcción de cuatros (4) sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**												
4.1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**												
4.1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	16.0	$ 11,676.00	$ 186,816.00	4.00	12.00	16.00	$ 46,704.00	$ 140,112.00	$ 186,816.00		
4.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	26.8	$ 46,640.00	$ 1,249,952.00	6.70	20.10	26.80	$ 312,488.00	$ 937,464.00	$ 1,249,952.00		
4.1.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	56.8	$ 184,907.00	$ 10,502,717.60	14.20	42.60	56.80	$ 2,625,679.40	$ 7,877,038.20	$ 10,502,717.60		
4.1.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DIÁMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	200.0	$ 22,881.00	$ 4,576,200.00	50.00	150.00	200.00	$ 1,144,050.00	$ 3,432,150.00	$ 4,576,200.00		
4.1.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	16.0	$ 151,721.00	$ 2,427,536.00	4.00	12.00	16.00	$ 606,884.00	$ 1,820,652.00	$ 2,427,536.00		
4.1.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	16.0	$ 163,945.00	$ 2,623,120.00	4.00	12.00	16.00	$ 655,780.00	$ 1,967,340.00	$ 2,623,120.00		
4.1.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UN	4.0	$ 542,465.00	$ 2,169,860.00	1.00	3.00	4.00	$ 542,465.00	$ 1,627,395.00	$ 2,169,860.00		
4.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	2.8	$ 544,650.00	$ 1,525,020.00	0.70	2.10	2.80	$ 381,255.00	$ 1,143,765.00	$ 1,525,020.00		
4.1.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	4.0	$ 206,132.00	$ 824,528.00	1.00	3.00	4.00	$ 206,132.00	$ 618,396.00	$ 824,528.00		
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	14.0	$ 49,102.00	$ 687,428.00	6.00	8.00	14.00	$ 294,612.00	$ 392,816.00	$ 687,428.00		
4.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	UNIDAD		$ 288,453.00	$ -					$ -	$ -		
4.2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**												
4.2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	2.56	$ 11,676.00	$ 29,890.56	0.64	1.92	2.56	$ 7,472.64	$ 22,417.92	$ 29,890.56		
4.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	1.74	$ 46,639.00	$ 81,151.86	0.87	0.87	1.74	$ 40,575.93	$ 40,575.93	$ 81,151.86		
4.2.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	4.0	$ 956,563.00	$ 3,826,252.00	1.00	3.00	4.00	$ 956,563.00	$ 2,869,689.00	$ 3,826,252.00		
4.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4.0	$ 152,905.00	$ 611,620.00	1.00	3.00	4.00	$ 152,905.00	$ 458,715.00	$ 611,620.00		
4.2.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	ML	16.9	$ 39,438.00	$ 666,502.20	6.00	10.90	16.90	$ 236,628.00	$ 429,874.00	$ 666,502.00		
4.3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40**												
4.3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0.64	$ 11,676.00	$ 7,472.64	0.16	0.48	0.64	$ 1,868.16	$ 5,604.48	$ 7,472.64		
4.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0.380	$ 46,640.00	$ 17,723.20	0.10	0.285	0.380	$ 4,430.80	$ 13,292.40	$ 17,723.20		
4.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	4	$ 767,339.00	$ 3,069,356.00	1.00	3.00	4.00	$ 767,339.00	$ 2,302,017.00	$ 3,069,356.00		
4.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4	$ 152,905.00	$ 611,620.00	1.00	3.00	4.00	$ 152,905.00	$ 458,715.00	$ 611,620.00		
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del item 4.2.5.	ML	11.70	$ 39,438.00	$ 461,424.60	6.00	5.70	11.70	$ 236,628.00	$ 224,797.00	$ 461,425.00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
4.4	FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.												
4.4.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	26.68	$ 11,676.00	$ 311,515.68	6.67	20.01	26.68	$ 77,879.00	$ 233,637.00	$ 311,516.00		
4.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	12.0	$ 46,640.00	$ 559,680.00	3.00	9.00	12.00	$ 139,920.00	$ 419,760.00	$ 559,680.00		
4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE HASTA FOSA DE INFILTRACION. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	32.0	$ 38,908.00	$ 1,245,056.00	8.00	24.00	32.00	$ 311,264.00	$ 933,792.00	$ 1,245,056.00		
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	2.0	$ 442,150.00	$ 884,300.00	0.50	1.50	2.00	$ 221,075.00	$ 663,225.00	$ 884,300.00		
4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	2.0	$ 431,850.00	$ 863,700.00	0.50	1.50	2.00	$ 215,925.00	$ 647,775.00	$ 863,700.00		
4.4.6	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.0	$ 1,408,080.00	$ 5,632,320.00	1.00	3.00	4.00	$ 1,408,080.00	$ 4,224,240.00	$ 5,632,320.00		
4.4.7	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	70.0	$ 101,088.00	$ 7,076,160.00		70.00	70.00		$ 7,076,160.00	$ 7,076,160.00		
5	Construcción de cuatro (4) composteras de residuos en ladrillo macizo, estructura metálica en tubo de cerriento negro de 1 1/2" de diametro x 1,9 mm, correas en perfil cerrado rectangular negro 40 x 20 de 1,1 mm y acabado en anticorrosivo gris, con cubierta en teja ondulada de zinc.												
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	48.00	$ 11,676.00	$ 560,448.00	12.00	36.00	48.00	$ 140,112.00	$ 420,336.00	$ 560,448.00		
5.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	3.08	$ 46,640.00	$ 143,651.20	0.77	2.31	3.08	$ 35,912.80	$ 107,738.40	$ 143,651.20		
5.3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.42, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	M3	1.96	$ 1,032,297.00	$ 2,023,302.12	0.49	1.47	1.96	$ 505,826.00	$ 1,517,476.00	$ 2,023,302.00		
5.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS	M2	43.60	$ 149,574.00	$ 6,521,426.40	10.90	32.70	43.60	$ 1,630,357.00	$ 4,891,069.00	$ 6,521,426.00		
5.5	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M=188 (0.80 MM C/ 35M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE ACERO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	Kg	75.20	$ 16,530.00	$ 1,243,056.00	18.80	56.40	75.20	$ 310,764.00	$ 932,292.00	$ 1,243,056.00		
5.6	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	37.60	$ 184,906.00	$ 6,952,465.60	9.40	28.20	37.60	$ 1,738,116.40	$ 5,214,349.20	$ 6,952,465.60		
5.7	CONCRETO DE 3000 PSI (20,7 Mpa) PARA COLUMNETAS.	M3	0.80	$ 1,257,715.00	$ 1,006,172.00	0.21	0.59	0.80	$ 264,120.00	$ 742,052.00	$ 1,006,172.00		
5.8	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 3/8 FY 60,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA).	KG	103.48	$ 22,881.00	$ 2,367,726.00	25.87	77.61	103.48	$ 591,931.47	$ 1,775,794.53	$ 2,367,726.00		
5.9	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJES DIAMETRO 1/4 FY 37,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA) FLEJES CADA 15 CM	KG	55.44	$ 16,552.00	$ 917,642.88	13.86	41.58	55.44	$ 229,410.72	$ 688,232.16	$ 917,642.88		
5.10	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMPOSTERAS EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS. Nota: el contratista debe cuando se requiera utilizar y soldar el sobrante de perfil para completar algún elemento. Nota 2: los elementos estructurales para la cubierta deben estar soldados en los 4 cantos, no se da por recibido perfiles superpuestos.	UND	4.00	$ 3,447,961.00	$ 13,791,844.00	1.00	3.00	4.00	$ 3,447,961.00	$ 10,343,883.00	$ 13,791,844.00		
5.11	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC ONDULADA CALIBRE 34	M2	43.20	$ 56,361.00	$ 2,434,795.20	10.80	32.40	43.20	$ 608,698.80	$ 1,826,096.40	$ 2,434,795.20		
5.12	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.00	$ 1,408,080.00	$ 5,632,320.00	1.00	3.00	4.00	$ 1,408,080.00	$ 4,224,240.00	$ 5,632,320.00		
5.13	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	80.00	$ 101,088.00	$ 8,087,040.00	8.00	72.00	80.00	$ 808,704.00	$ 7,278,336.00	$ 8,087,040.00		
6	Construcción de Tres (3) biodigestores anaérobios de doble capa de flujo continuo con cubierta en plástico agolene calibre 6 resistente a rayos UV con estructura de cubierta en tubo pvc 1/2" presión												
6.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	120.00	$ 11,676.00	$ 1,401,120.00				$ -	$ -	$ -	120.00	$ 1,401,120.00
6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	12.00	$ 46,640.00	$ 559,680.00				$ -	$ -	$ -	12.00	$ 559,680.00
6.3	CONSTRUCCIÓN BIODIGESTOR DOBLE CAPA DE 8 METROS DE LONGITUD UTIL, EN BOLSA TUBULAR DÍAMETRO 2 METROS, INCLUYE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA CARGUE Y SALIDA DE EFLUENTE, Y TUBERÍA DE 1/2 PULGADA PARA SUMINITRO DE BIOGAS AL QUEMADOR	UND	3.00	$ 3,382,987.00	$ 10,148,961.00				$ -	$ -	$ -	3.00	$ 10,148,961.00
6.4	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FILTRO DE SULFUROS (H2S) EN PVC	UND	3.00	$ 191,693.00	$ 575,079.00				$ -	$ -	$ -	3.00	$ 575,079.00
6.5	ESTRUCTURA TUBULAR PARA CUBIERTA EB TUBO DE PVC DE RIEGO A PRESIÓNY ZÓCALO EN MADERA EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA PARA AJUSTE DE LA CUBIERTA	UND	3.00	$ 627,350.00	$ 1,882,050.00				$ -	$ -	$ -	3.00	$ 1,882,050.00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CALIBRE 6 DE 6 METROS DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV.	UND	3.00	$ 759,834.00	$ 2,279,502.00				$ -	$ -	$ -	3.00	$ 2,279,502.00
6.7	CAJA EN LADRILLO TOLETE 0,07 X0,12X 0,24, INCLUYE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. DIMENSIONES 0,80 X0,80 X0,6 DE PROFUNDIDAD	UND	6.00	$ 823,137.00	$ 4,938,822.00				$ -	$ -	$ -	6.00	$ 4,938,822.00
6.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MATERIALES	VIAJE	3.00	$ 1,408,080.00	$ 4,224,240.00				$ -	$ -	$ -	3.00	$ 4,224,240.00
6.9	TRANSPORTE ANIMAL DE MATERIALES	VIAJE		$ 101,088.00	$ -				$ -	$ -	$ -		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
7	Mantenimiento instalaciones La Colonia												
7.1	**ARREGLO DE HUMEDADES Y MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO** **Nota: La Corproación aporta el vinilo**												
7.1.1	DEMOLICIÓN DE PAÑETE O REVOQUE	M2	48.00	$ 26,376.00	$ 1,266,048.00	48.00		48.00	$ 1,266,048.00	$ -	$ 1,266,048.00		
7.1.2	PAÑETE DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	48.00	$ 69,248.00	$ 3,323,904.00	48.00		48.00	$ 3,323,904.00	$ -	$ 3,323,904.00		
7.1.3	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO	M2	48.00	$ 17,948.00	$ 861,504.00	48.00		48.00	$ 861,504.00	$ -	$ 861,504.00		
7.1.4	MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO Nota: La Corporación aporta la pintura	M2	786.21	$ 20,010.00	$ 15,732,062.00	786.21		786.21	$ 15,732,062.00	$ -	$ 15,732,062.00		
7.2	**PISOS Y ENCHAPES**												
7.2.1	GUARDAESCOBA EN GRES O CERÁMICA	ML		$ 31,725.00	$ -				$ -	$ -	$ -		
7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA TIPO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	21.43	$ 117,266.00	$ 2,513,010.00				$ -	$ -	$ -	21.43	$ 2,513,010.00
7.3	**CARPINTERIA MADERA**												
7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBLERADA CON ACABADO MELÁMINICO	UND	1.00	$ 623,330.00	$ 623,330.00				$ -	$ -	$ -	1.00	$ 623,330.00
7.3.2	APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE LIJADA Y DISOLVENTE THINNER)	M2	133.96	$ 22,265.00	$ 2,982,728.64	98.14		98.14	$ 2,185,087.10	$ -	$ 2,185,087.10	35.82	$ 797,641.54
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE POMA MADERA	UND	6.00	$ 130,250.00	$ 781,500.00	6.00		6.00	$ 781,500.00	$ -	$ 781,500.00		
7.4	**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SÉPTICO**												
7.4.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	4.00	$ 11,676.00	$ 46,704.00	4.00		4.00	$ 46,704.00	$ -	$ 46,704.00		
7.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	6.70	$ 46,640.00	$ 312,488.00	6.70		6.70	$ 312,488.00	$ -	$ 312,488.00		
7.4.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14.20	$ 184,906.00	$ 2,625,665.20	14.20		14.20	$ 2,625,665.20	$ -	$ 2,625,665.20		
7.4.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	50.00	$ 22,881.00	$ 1,144,050.00	50.00		50.00	$ 1,144,050.00	$ -	$ 1,144,050.00		
7.4.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4.00	$ 151,721.00	$ 606,884.00	4.00		4.00	$ 606,884.00	$ -	$ 606,884.00		
7.4.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4.00	$ 163,945.00	$ 655,780.00	4.00		4.00	$ 655,780.00	$ -	$ 655,780.00		
7.4.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UN	1.00	$ 542,465.00	$ 542,465.00	1.00		1.00	$ 542,465.00	$ -	$ 542,465.00		
7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0.70	$ 544,650.00	$ 381,255.00	0.70		0.70	$ 381,255.00	$ -	$ 381,255.00		
7.4.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1.00	$ 206,132.00	$ 206,132.00	1.00		1.00	$ 206,132.00	$ -	$ 206,132.00		
7.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	6.00	$ 49,102.00	$ 294,612.00	6.00		6.00	$ 294,612.00	$ -	$ 294,612.00		
7.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	UND		$ 288,453.00	$ -				$ -	$ -	$ -		
7.5	**TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**									$ -	$ -		
7.5.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0.64	$ 11,676.00	$ 7,472.64	0.64		0.64	$ 7,472.64	$ -	$ 7,472.64		
7.5.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0.87	$ 46,639.00	$ 40,669.21	0.87		0.87	$ 40,669.21	$ -	$ 40,669.21		
7.5.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	1.00	$ 956,563.00	$ 956,563.00	1.00		1.00	$ 956,563.00	$ -	$ 956,563.00		
7.5.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1.00	$ 152,905.00	$ 152,905.00	1.00		1.00	$ 152,905.00	$ -	$ 152,905.00		
7.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	ML	6.00	$ 39,438.00	$ 236,628.00	6.00		6.00	$ 236,628.00	$ -	$ 236,628.00		
7.6	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**												
7.6.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0.16	$ 11,675.00	$ 1,868.00	0.16		0.16	$ 1,868.00	$ -	$ 1,868.00		
7.6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0.22	$ 46,638.00	$ 10,073.81	0.22		0.22	$ 10,073.81	$ -	$ 10,073.81		
7.6.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	1.00	$ 767,339.00	$ 767,339.00	1.00		1.00	$ 767,339.00	$ -	$ 767,339.00		
7.6.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1.00	$ 152,905.00	$ 152,905.00	1.00		1.00	$ 152,905.00	$ -	$ 152,905.00		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del ítem 7.5.5.	ML	6.00	$ 39,438.00	$ 236,628.00	6.00		6.00	$ 236,628.00	$ -	$ 236,628.00		
7.7	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**												
7.7.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9.00	$ 11,676.00	$ 105,084.00	9.00		9.00	$ 105,084.00	$ -	$ 105,084.00		
7.7.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	3.00	$ 46,640.00	$ 139,920.00	3.00		3.00	$ 139,920.00	$ -	$ 139,920.00		
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE EN HASTA FOSA DE INFILTRACION.	MI	8.00	$ 38,908.00	$ 311,264.00	8.00		8.00	$ 311,264.00	$ -	$ 311,264.00		
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	0.50	$ 442,150.00	$ 221,075.00	0.50		0.50	$ 221,075.00	$ -	$ 221,075.00		
7.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	UND	0.50	$ 431,850.00	$ 215,925.00	0.50		0.50	$ 215,925.00	$ -	$ 215,925.00		
7.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4.00	$ 1,408,080.00	$ 5,632,320.00	4.00		4.00	$ 5,632,320.00	$ -	$ 5,632,320.00		
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 387,917,243.24**				**$ 181,905,818.48**	**$ 133,614,153.22**	**$ 315,519,971.70**		**$ 72,397,271.54**
				ADMINISTRACIÓN 12%	$ 46,550,069.19				$ 21,828,698.22	$ 16,033,698.39	$ 37,862,396.60		$ 8,687,672.58
				IMPREVISTOS 5%	$ 19,395,862.16				$ 9,095,290.92	$ 6,680,707.66	$ 15,775,998.59		$ 3,619,863.58
				UTILIDAD 10%	$ 38,791,724.32				$ 18,190,581.85	$ 13,361,415.32	$ 31,551,997.17		$ 7,239,727.15
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	$ 7,370,427.62				$ 3,456,210.55	$ 2,538,668.91	$ 5,994,879.46		$ 1,375,548.16
				TOTAL COSTOS DE EQUIPAMIENTO RURALES	**$ 500,025,326.54**				**$ 234,476,600.02**	**$ 172,228,643.50**	**$ 406,705,243.52**		**$ 93,320,083.02**
B	SENSIBILIZACIÓN SOCIAL COMUNITARIO												
B	Talleres de sensibilización social comunitario	TALLER	16.00	$ 825,000.00	$ 13,200,000.00		6.00	6.00	$ -	$ 4,950,000.00	$ 4,950,000.00	10.00	$ 8,250,000.00
				IVA 19%	$ 2,508,000.00				$ -	$ 940,500.00	$ 940,500.00		$ 1,567,500.00
				TOTAL COSTOS JORNADA SENSIBILIZACIÓN	**$ 15,708,000.00**				$ -	$ 5,890,500.00	$ 5,890,500.00		$ 9,817,500.00
				TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL DE CONTRATACIÓN	**$ 515,733,326.54**				**$ 234,476,600.02**	**$ 178,119,143.50**	**$ 412,595,743.52**		**$ 103,137,583.02**
											80.00%		

RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 515,733,326.54
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 515,733,326.54

V/R ANTICIPO:
% ANTICIPO:
% RETE GARANTÍA:

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	Acta parcial No 1		Por pagar	$ 234,476,600.02		$ -		$ 234,476,600.02	$ 281,256,726.52	45.46%
						$ -		$ -	$ 281,256,726.52	
						$ -		$ -	$ -	
	TOTAL			**$ 234,476,600.02**		$ -		$ -	**$ 281,256,726.52**	**45.46%**

RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 53,597,600.00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 53,597,600.00

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: N/A
% RETE GARANTÍA:

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	Acta parcial No 1	100	Por pagar	$ 24,365,468.96		$ -		$ 24,365,468.96	$ 29,232,131.04	45.46%
						$ -		$ -	$ 29,232,131.04	
						$ -		$ -	$ -	
	TOTAL			$ -		$ -		$ -	**$ 29,232,131.04**	**45.46%**

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1	2	Ingeniería & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES					
Contrato Nº:	114 DE 2026			Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
Periodo:	1 de marzo de 2026	al	31 de marzo de 2026	Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN			Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA

CLÁUSULA 2	ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
A	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		%
1	Realizar las obras a ejecutar en las cantidades y sitios indicados a continuación: Nota: Consultar anexo de lista de beneficiarios Nota: El constructor debe realizar el primer cargue de los biodigestores y realizar una prueba de encendido de la cocineta doméstica. Nota: La descripción, cantidades y valores unitarios son parte del Estudio del Sector.	El contratista realiza las obras en las cantidades y sitios indicados.	80.00%
2	Realizar quince (16) talleres de sensibilización social comunitaria en área del POMCA río Loro, río Las Ceibas y otros Directos al Magdalena, relacionados en el cuadro 1.	El contratista realiza los talleres de sensibilización social comunitaria en el area del POMCA conforme a la programación y lineamientos establecidos en el contrato.	
3	Ejecutar las actividades contratadas conforme a lo dispuesto en el cronograma de actividades.	El contratista ejecuta las actividades conforme con el cronograma aprobado dando cumplimiento a la programación definida para el desarrollo del contrato.	80.00%
4	Utilizar materiales y/o productos de acuerdo a las características y/o especificaciones técnicas exigidos por la Corporación.	El contratista esta manejando los materiales que cumple con las características establecidas por la Corporación.	80.00%
5	Solicitar a la Corporación los archivos en formato DWG de las obras a realizar.	El contratista solicita a la Corporación los archivos en formato DWG, con el fin de garantizar la adecuada planificación y desarrollo de las actividades.	80.00%
6	Presentar acta de recibo de cada obra, suscrita a satisfacción por el beneficiario y avalado por el interventor.	El contratista presenta el acta de la obra ejecutada, dejando constancia de la entrega.	80.00%
7	Velar por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato	El contratista coordina las labores del proyecto garantizando el cumplimiento del objeto y responsabilidades contractuales.	80.00%
8	Retirar y disponer de forma adecuada cualquier tipo de residuo generado, tales como bolsas plásticas, bolsas de cemento, etc.	El contratista de obra gestiona la disposición adecuada de los residuos, generadas por las actividades.	80.00%
9	Vincular al personal que requiera y utilice para dar alcance al objeto contractual	El contratista vincula al personal necesario para la ejecución de la oba, dando cumplimiento al objeto y obligaciones del contrato.	80.00%
10	No causar daños a personas y bienes de terceros o de la CAM; y responder por los daños eventuales que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o a sus trabajadores.	El contratista garantiza la protección asumiendo la responsabilidad por cualquier daño ocasionados por acciones propias o de su personal durante la ejecución de sus labores.	80.00%
11	Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad industrial y bioseguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades.	El contratista dota a su personal con los elementos requeridos.	80.00%
12	Vincular a todo el personal en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.	El contratista vincula al personal al sistema de seguridad social en salud y realiza oportunamente los pagos de aportes y obligaciones parafiscales.	80.00%
13	Actualizar las pólizas con las actas que haya a lugar, tales como el acta de inicio, actas de reinicio y/o acta de recibo final.	El contratista cuenta con las pólizas actualizadas conforme a las actas generadas durante la ejecución del contrato.	80.00%
14	Presentar al Supervisor informes de ejecución física y financiera cada mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio y un informe final consolidado. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Interventoria.	El contratista presenta al supervisor los informes mensuales de ejecución física y financiera conforme al contrato, incluyendo el detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo, junto con los registros fotográficos y soportes requeridos por la interventoría.	80.00%
15	Mantener indemne a la Corporación ante cualquier reclamación laboral o civil de sus dependientes.	El contratista manifiene indemne a la Corporación ante cualquier reclamación laboral o civil que pueda presentarse por parte de su personal vinculado a la ejecución del contrato.	80.00%
16	Acreditar el cumplimiento en el pago de sus aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión, ARP) y parafiscales, según lo establecido en el artículo 1 del parágrafo 2 de la Ley 828 del 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	El contratista acredita el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales con el personal vinculado al contrato.	80.00%
17	Aplicar los protocolos de bioseguridad según lo establecido por el Ministerio de Salud en la normatividad legal vigente, para el desarrollo de las actividades propias del contrato.	El contratista aplica los protocolos de bioseguridad, garantizando la protección del personal.	80.00%
18	El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, la CAM, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita.	El contratista vincula mano de obra conforme al porcentaje establecido en el contrato, incluyendo población en condición de vulnerabilidad, garantizando a su vez las condiciones de calidad requeridas para la ejecución del objeto contractual.	80.00%
19	En la ejecución el contratista deberá aplicar los REQUISITOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN T-CAM-150. Versión 4 Junio 5 de 2025 (CAM), que aplicará al desarrollo del objeto del contrato, el cual, será verificado por la interventoría y/o supervisión. Justificación: Está orientado de acuerdo con la disposición del ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, el cual fomentó a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	El contratista implementa los requisitos del Sistema Integrado de Gestión T-CAM-150, cumpliendo con las normas aplicables y siendo verificado por la Interventoría.	80.00%
B	OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA		
1	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por la CAM, el Supervisor o de los organismos de control.	El contratista atiende las observaciones y requerimientos formulados por la CAM, el Supervisor y los organismos de control durante la ejecución del contrato.	80.00%
2	Presentar informes mensuales y finales que contengan como mínimo la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Supervisor.	El contratista presenta los informes mensuales y el informe final con la información requerida para los pagos parciales, conforme a lo establecido en el contrato.	80.00%
3	Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá llevar una Bitácora (libro) en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el Supervisor, en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Supervisor. Los responsables de mantener al día este diario serán los residentes de obra.	El contratista de obra lleva la bitÁcora al día con todas las actividades realizadas en el periodo.	80.00%
4	Presentar a la Interventoría contratada, los informes conforme lo requieran la Corporación, para cada pago parcial que se efectúe y uno al final de la ejecución del contrato. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Interventoría.	El contratista presenta a la Interventoría los informes de cada pago parcial y el informe final, incluyendo el detalle de las actividades realizadas, registros fotográficos y demás soportes requeridos.	80.00%
5	Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.	El contratista elabora y presenta con la Interventoría las actas de entrega mensual, final de obra y liquidación del contrato.	80.00%
6	El contratista deberá publicar todos los documentos derivados de la ejecución contractual, a través de la plataforma transaccional del SECOP II. Nota: La aprobación por parte de la CAM de algún procedimiento o método utilizado por el Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte de la CAM. El Contratista es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	El contratista publica en SECOP II los documentos derivados del contrato, manteniendo la responsabilidad plena sobre el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	80.00%
C	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA		
1	Dar estricto y cabal cumplimiento a las actividades y cantidades enunciadas en las condiciones técnicas exigidas y contempladas en el análisis técnico del presente documento, y con las especificaciones y lugares allí enunciados.	El contratista cumple estrictamente con las actividades, cantidades, especificaciones y lugares establecidos en las condiciones técnicas del contrato.	80.00%
2	Presentar informes: a. De ejecución, el cual se computa desde la suscripción del acta de inicio. b. De ejecución para cuando solicite pago parcial o el pago final y publicar dicho documento con los respectivos soportes en la plataforma del SECOP II. c. De avance de obra ejecutada para cuando le sea solicitado por la interventoría o la supervisión. Dicho informe estará soportado con registros fotográficos, actas, entre otros que se puedan anexar.	El contratista presenta los informes conforme a los requerimientos exigidos.	80.00%
3	De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, el contratista deberá cumplir con la facturación electrónica si a ello estuviere obligado conforme la reglamentación vigente.	El contratista cumple con la facturación electrónica conforme a las obligaciones establecidas por la DIAN y la normativa vigente.	80.00%

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1	2	Ingeniería & Construcción

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

Contrato N°:	114 DE 2026			Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
Periodo:	1 de marzo de 2026	al	31 de marzo de 2026	Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN			Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA

CLÁUSULA 2	ACTIVIDAD O PRODUCTO	OBSERVACIONES	AVANCE
4	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la Corporación o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	El contratista responde ante las autoridades competentes por los actos u omisiones durante la ejecución del contrato que puedan generar perjuicio a la Corporación o a terceros.	80.00%
5	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra la CAM, por causa o con ocasión del contrato.	El contratista está dispuesto a responder cualquier tipo de reclamo por asuntos relacionados con el contrato.	80.00%
6	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, según cronograma.	El contratista programa las actividades conforme al cronograma, cumpliendo con el objeto del contrato.	80.00%
7	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y/o la interventoría contratada para tal fin.	El contratista atiende las instrucciones impartidas por la entidad contratante y la interventoría.	80.00%
8	Notificar a la CAM en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.	El contratista notificara cuando se presente uno de los casos.	80.00%
9	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	El contratista de obra asume los riesgos previsibles de la ejecucion del contrato.	80.00%
10	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	El contratista de obra ejecutó la obra de acuerdo a las condiciones ofrecidas desde el inicio del contrato.	80.00%
11	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor o Supervisor.	El contratista presento todos los documentos requeridos para la suscripción de acta de inicio.	80.00%
12	Coordinar el equipo interdisciplinario solicitado en el acápite 5.1.3.9 "PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO", garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios señalados en el presente estudio previo.	El contratista coordina el equipo asegurando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios establecidos en el estudio previo.	80.00%
13	Ante la necesidad de prescindir de los servicios profesionales de alguno de los integrantes del equipo técnico propuesto en la oferta técnica, deberá informar por escrito a la Corporación y reemplazarlo por otro que cumpla las mismas características a las exigidas en el Pliego de Condiciones, anexando hoja de vida con los respectivos soportes, tanto de formación académica como los de experiencia, para revisión y aprobación de la interventoría y presentar la respectiva vinculación al sistema de seguridad social una vez haya sido verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Corporación en el Pliego de Condiciones. De igual forma deberá vincular el personal adicional que requiera necesario para dar cumplimiento al objeto contractual dentro del término establecido.	El contratista informa cualquier reemplazo de personal del equipo técnico y vincula a los nuevos profesionales cumpliendo los requisitos del Pliego de Condiciones y la seguridad social, asegurando la aprobación de la Interventoría.	80.00%
14	Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.	El contratista asume la responsabilidad e indemniza por cualquier daño causado a terceros o al personal vinculado para la ejecución del contrato.	80.00%
15	El hospedaje de obreros, alimentación de los mismos, sitio de campamentos, vigilancia de equipos y demás gastos a que incurra en la ejecución del objeto contractual, serán asumidos en su totalidad por parte del contratista y mantendrá indemne a la corporación ante cualquier reclamación por este aspecto.	El contratista asume en su totalidad los gastos de hospedaje, alimentación, campamentos y vigilancia, manteniendo indemne a la corporación frente a cualquier reclamación.	80.00%
16	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2033, Ley 1122 de 2007, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concertantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	El contratista da cumplimiento oportuna con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales según la normativa vigente.	80.00%
17	El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación, generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, la CAM, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita.	El contratista vincula mano de obra conforme al porcentaje establecido en el contrato, incluyendo población en condición de vulnerabilidad, garantizando a su vez las condiciones de calidad requeridas para la ejecución del objeto contractual.	80.00%
18	Al contratista le queda prohibido y deberá de abstenerse de realizar cualquier conducta que afecte la correcta administración pública o la comisión de delitos relacionados con actos de corrupción, debido que la ejecución contractual debe estar moralmente fundamentado en su ética profesional y, lealtad para con la entidad estatal como principio fundamental constitucional. Nota: La aprobación por parte de la CAM de algún procedimiento o método utilizado por el Contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte de la CAM. El Contratista es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	El contratista se abstiene de realizar conductas que afecten la correcta administración pública o impliquen corrupción, cumpliendo con los principios de ética y lealtad profesional en la ejecución del contrato.	80.00%
D	OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TRANSVERSAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA		
1	Cumplir con la normativa vigente incluidas las directrices dispuestas en el Programa de Transparencia y Ética Pública de la CAM.	El contratista cumple con la normativa vigente y sigue las directrices del Programa de Transparencia y Ética Pública de la CAM.	80.00%
2	Actuar con Honestidad en el desarrollo de nuestras obligaciones y responsabilidades contractuales con ética, evitando cualquier conducta, omisión o extralimitación que pueda comprometer nuestra integridad o la de la CAM.	El contratista actúa con honestidad y ética en la ejecución del contrato, evitando conductas que puedan afectar su integridad o la de la CAM.	80.00%
3	Prevenir dentro de la CAM, el riesgo del Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo, mediante una Debida Diligencia con nuestros beneficiarios, accionistas, contribuyentes, proveedores o socios comerciales.	El contratista aplica medidas de debida diligencia para prevenir cualquier tipo de los riesgos mencionados.	80.00%
4	Denunciar toda irregularidad, reportando de manera oportuna cualquier situación que contravenga las políticas y valores de transparencia y ética pública establecidas por la CAM.	El contratista informa oportunamente cualquier irregularidad que pueda contravenir las políticas y valores de transparencia y ética pública de la CAM.	80.00%
E	CONDICIONES TÉCNICAS (VER ESTUDIO PREVIO Y ESTUDIO DEL SECTOR)		
F	OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
1	Vincular y mantener en la ejecución de la obra, la totalidad del personal requerido y propuesto para tal fin.	El contratista vincula y mantiene durante la ejecución de la obra la totalidad del personal requerido y propuesto.	80.00%
2	Como requisito para la suscripción del acta de inicio deberá presentar: a) Afiliación al sistema de seguridad social del personal ofertado en el proceso de selección y del personal adicional que disponga para la ejecución del objeto contractual, en donde acredite que el personal empleado aparece como dependiente del ejecutor del contrato de obra derivado del presente proceso de contratación.	El contratista mantiene la afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal vinculado al contrato.	80.00%
3	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y; dotación de calzado y vestido de labor.	El contratista cumple con las normas de seguridad industrial y dotación de elementos de protección para el personal en obra.	80.00%
4	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.	El contratista de obra cumplió con los pagos a seguridad social del personal contratado. Entregados en los informes mensuales de obra.	80.00%
5	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra la CAM, por causa o con ocasión del contrato.	El contratista ésta dispuesto a responder cualquier tipo de reclamo por asuntos relacionados con el contrato.	80.00%
6	No contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.	El contratista no contrata ni permite la subcontratación de menores de edad, cumpliendo la normativa nacional e internacional sobre derechos de los niños.	80.00%

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: WILLIAM PARRA OLAYA	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Nombre: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director Interventoría	Cargo: Contratista de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2


2

Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA
Fecha del registro fotográfico:	1 de marzo de 2026	al	31 de marzo de 2026

FOTOGRAFÍA No.1

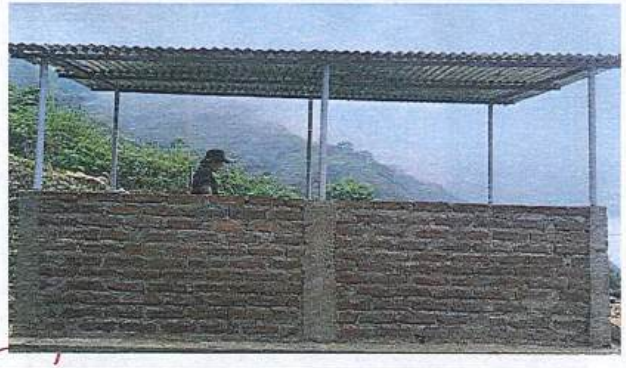

COMPOSTERA - ASOCIACION MUJERES AGROPECUARIAS Y EMPREDEDORAS DE LA VDA LA LINDOSA

FOTOGRAFÍA No.2



COMPOSTERA - KAREN LIZETH OLIVEROS MURCIA

FOTOGRAFÍA No.3



COMPOSTERA - JUAN CAMILO PEREZ

FOTOGRAFÍA No.4



SECADERO DE CAFÉ BENEFICIARIO LUIS JAIBER TOVAR

FOTOGRAFÍA No.5



SECADERO DE CAFÉ BENEFICIARIO JHON ALCIBER YAGUE

FOTOGRAFÍA No.6



SISTEMA SEPTICO - LUIS FERNEY LOSADA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

2

Ingeniería & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025	Director de obra:	OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Residente de Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA
Fecha del registro fotográfico:	1 de marzo de 2026	al	31 de marzo de 2026

FOTOGRAFÍA No.7



SISTEMA SEPTICO - LUIS FERNEY LOSADA

FOTOGRAFÍA No.8



SISTEMA SEPTICO - WILINTON GASCA

FOTOGRAFÍA No.9



SISTEMA SEPTICO - WILINTON GASCA

FOTOGRAFÍA No.10



SISTEMA SEPTICO - ARVEY GUEVARA MOTTA

FOTOGRAFÍA No.11



SISTEMA SEPTICO - ARVEY GUEVARA MOTTA

FOTOGRAFÍA No.12



EXCAVACION PARA BIODIGESTOR

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.114 DE 2026

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN:	9 de marzo de 2026	PERIODO No.	6	DEL	2/03/2026	AL	8/03/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva y Rivera - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	513 DE 2025				CONTRATO No.:	114 DE 2026			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025			
NIT / C.C.:	79,142,300				NIT / C.C.:	902.021.671- 4			
PLAZO INICIAL:	4		MESES		PLAZO INICIAL:	4		MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de enero de 2026				FECHA DE INICIACIÓN:	22 de enero de 2026			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:			MESES		PLAZO ADICIONAL:	-		MESES	
DÍAS POR EJECUTAR	75				DÍAS POR EJECUTAR	75			
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2026				FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2026			
PLAZO ACTUALIZADO:	120		DIAS		PLAZO ACTUALIZADO:	120		DIAS	
PLAZO TRANSCURRIDO:	45	DIAS	EQUIVALE AL	37.5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	45	DIAS	EQUIVALE AL	37.5%
VALOR INICIAL :	$			53,597,600.00	VALOR INICIAL :	$			515,733,326.54
VALOR ADICION(ES):	$			-	VALOR ADICION(ES):	$			-
VALOR ACTUALIZADO:	$			53,597,600.00	VALOR ACTUALIZADO:	$			515,733,326.54
VALOR PAGADO:	$			-	VALOR PAGADO:	$			-
VALOR POR PAGAR:	$			53,597,600.00	VALOR POR PAGAR:	$			515,733,326.54

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	22/01/2026	22/01/2026	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS			no iniciado
1	Construcción de cuatro (4) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo cerramiento negro de 1 1/2 de diametro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agricola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.	9/02/2026	11/02/2026	-2
2	Construcción de tres (3) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agricola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.	9/03/2026	11/02/2026	26
3	Construcción de cuatro (4) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de paneles laterales de lamina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tuberia pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv	9/02/2026		no iniciado
4	Construcción de cuatros (4) sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas	9/03/2026	23/02/2026	14
5	Construcción de cuatro (4) composteras de residuos en ladrillo macizo, estructura metálica en tubo de cerriento negro de 1 1/2" de diametro x 1,9 mm, correas en perfil cerrado rectangular negro 40 x 20 de 1,1 mm y acabado en anticorrosivo gris, con cubierta en teja ondulada de zinc.	16/03/2026	23/02/2026	21
6	Construcción de Tres (3) biodigestores anaérobios de doble capa de flujo continuo con cubierta en plástico agolene calibre 6 resistente a rayos UV con estructura de cubierta en tubo pvc 1/2" presión	2/03/2026	3/03/2026	-1
7	Mantenimiento instalaciones La Colonia	9/02/2026	16/02/2026	-7

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 85,514,968.00	16.58%	36.56%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 274,041,473.49	53.14%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchán	93,399,584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1,110,544,123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26,968,272	Psicóloga social comunitario
Yon Geimar Quinayas Peña	83,029,595	Inspector de obra
Nemesio Urueña Palma	93,020,393	Maestro de obra
Eliene Ninco	36,346,433	Administrativa
Deiver Fabian Tovar Saldaña	1,075,235,146	Ayudante
Kevin Santiago Rojas Vanegas	1,076,904,489	Ayudante
Yimy Lozano Bonilla	7,705,681	Ayudante
Claudia Andrea Parra Cortes	36,189,163	Ayudante
Olga Lucia Rojas	36,182,639	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0.00%	27.27%	3
	TECNICO	1	2	9.09%	18.18%	3
	M.O/N.C	4	1	36.36%	9.09%	5
	TOTALES	**5**	**6**	**45.45%**	**54.55%**	**11**
	TOTAL	11		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista de obra continuo entrega de materiales para las diferentes obras en el municipio de Neiva y Rivera. Se realizó la construccion en el municipio de Neiva, una compostera y un sistema séptico. Se inicio excavacion para biodigestor en el municipio de Rivera

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se realizó seguimiento a las obras objeto del contrato de obra No.114 de 2026, las cuales se realizan de acuerdo a las especificaciones tecnicas.


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Sistema septico - Luis Ferney Losada



Sistema septico - Luis Ferney Losada

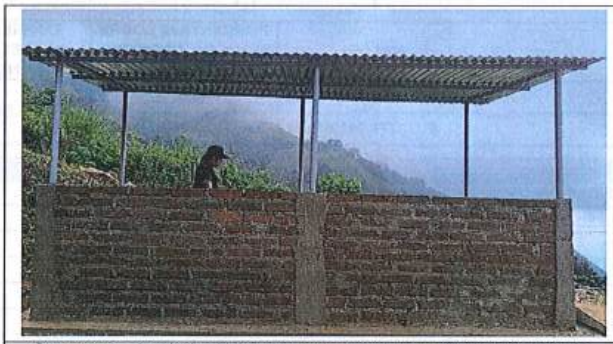

Compostera - Asociacion Mujeres Agropecuarias y empredeoras de la vda La Lindosa



Compostera - Asociacion Mujeres Agropecuarias y empredeoras de la vda La Lindosa

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR ENCARGADO
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.114 DE 2026

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN:	16 de marzo de 2026	PERIODO No.	7	DEL	9/03/2026	AL	15/03/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva y Rivera - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	513 DE 2025				CONTRATO No.:	114 DE 2026			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025			
NIT / C.C.:	79,142,300				NIT / C.C.:	902.021.671- 4			
PLAZO INICIAL:	4	MESES			PLAZO INICIAL:	4	MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de enero de 2026				FECHA DE INICIACIÓN:	22 de enero de 2026			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:		MESES			PLAZO ADICIONAL:	-	MESES		
DÍAS POR EJECUTAR	68				DÍAS POR EJECUTAR	68			
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2026				FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2026			
PLAZO ACTUALIZADO:	120	DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:	120	DIAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	52	DIAS	EQUIVALE AL	43.3%	PLAZO TRANSCURRIDO:	52	DIAS	EQUIVALE AL	43.3%
VALOR INICIAL :	$	53,597,600.00			VALOR INICIAL :	$	515,733,326.54		
VALOR ADICION(ES):	$	-			VALOR ADICION(ES):	$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	53,597,600.00			VALOR ACTUALIZADO:	$	515,733,326.54		
VALOR PAGADO:	$	-			VALOR PAGADO:	$	-		
VALOR POR PAGAR:	$	53,597,600.00			VALOR POR PAGAR:	$	515,733,326.54		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	22/01/2026	22/01/2026	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS			no iniciado
1	Construcción de cuatro (4) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo cerramiento negro de 1 1/2 de diametro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agricola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.	9/02/2026	11/02/2026	-2
2	Construcción de tres (3) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agricola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.	9/03/2026	11/02/2026	26
3	Construccion de cuatro (4) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de paneles laterales de lámina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tuberia pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv	9/02/2026		no iniciado
4	Construcción de cuatros (4) sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas	9/03/2026	23/02/2026	14
5	Construcción de cuatro (4) composteras de residuos en ladrillo macizo, estructura metálica en tubo de cerriento negro de 1 1/2" de diametro x 1,9 mm, correas en perfil cerrado rectangular negro 40 x 20 de 1,1 mm y acabado en anticorrosivo gris, con cubierta en teja ondulada de zinc.	16/03/2026	23/02/2026	21
6	Construcción de Tres (3) biodigestores anaérobios de doble capa de flujo continuo con cubierta en plástico agolene calibre 6 resistente a rayos UV con estructura de cubierta en tubo pvc 1/2" presión	2/03/2026	3/03/2026	-1
7	Mantenimiento instalaciones La Colonia	9/02/2026	16/02/2026	-7

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 122,678,469.66	23.79%	38.33%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 320,343,181.67	62.11%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchán	93,399,584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1,110,544,123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26,968,272	Psicóloga social comunitario
Yon Geimar Quinayas Peña	83,029,595	Inspector de obra
Nemesio Urueña Palma	93,020,393	Maestro de obra
Eliene Ninco	36,346,433	Administrativa
Deiver Fabian Tovar Saldaña	1,075,235,146	Ayudante
Kevin Santiago Rojas Vanegas	1,076,904,489	Ayudante
Yimy Lozano Bonilla	7,705,681	Ayudante
Claudia Andrea Parra Cortes	36,189,163	Ayudante
Olga Lucia Rojas	36,182,639	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0.00%	27.27%	3
	TECNICO	1	2	9.09%	18.18%	3
	M.O/N.C	4	1	36.36%	9.09%	5
	TOTALES	**5**	**6**	**45.45%**	**54.55%**	**11**
	TOTAL	11		100%		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista de obra continuo entrega de materiales para las diferentes obras en el municipio de Neiva y Rivera. Se realizó la construccion en el municipio de Neiva, una compostera y un secadero de cafe.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se realizó seguimiento a las obras objeto del contrato de obra No.114 de 2026, las cuales se realizan de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Secadero de cafe - Luis Jaiber Tovar



Secadero de cafe - Luis Jaiber Tovar



Compostera - Karen Lizeth Oliveros



Compostera - Karen Lizeth Oliveros

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR ENCARGADO
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.114 DE 2026

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN:	24 de marzo de 2026	PERIODO No.	8	DEL	16/03/2026	AL	22/03/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva y Rivera - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	513 DE 2025				CONTRATO No.:	114 DE 2026			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025			
NIT / C.C.:	79,142,300				NIT / C.C.:	902.021.671- 4			
PLAZO INICIAL:	4	MESES			PLAZO INICIAL:	4	MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de enero de 2026				FECHA DE INICIACIÓN:	22 de enero de 2026			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:		MESES			PLAZO ADICIONAL:	-	MESES		
DÍAS POR EJECUTAR	61				DÍAS POR EJECUTAR	61			
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2026				FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2026			
PLAZO ACTUALIZADO:	120	DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:	120	DIAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	59	DIAS	EQUIVALE AL	49.2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	59	DIAS	EQUIVALE AL	49.2%
VALOR INICIAL :	$	53,597,600.00			VALOR INICIAL :	$	515,733,326.54		
VALOR ADICION(ES):	$	-			VALOR ADICION(ES):	$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	53,597,600.00			VALOR ACTUALIZADO:	$	515,733,326.54		
VALOR PAGADO:	$	-			VALOR PAGADO:	$	-		
VALOR POR PAGAR:	$	53,597,600.00			VALOR POR PAGAR:	$	515,733,326.54		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	22/01/2026	22/01/2026	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS			no iniciado
1	Construcción de cuatro (4) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo cerramiento negro de 1 1/2 de diametro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.	9/02/2026	11/02/2026	-2
2	Construcción de tres (3) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.	9/03/2026	11/02/2026	26
3	Construcción de cuatro (4) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de paneles laterales de lamina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tuberia pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv	9/02/2026		no iniciado
4	Construcción de cuatros (4) sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas	9/03/2026	23/02/2026	14
5	Construcción de cuatro (4) composteras de residuos en ladrillo macizo, estructura metálica en tubo de cerriento negro de 1 1/2" de diametro x 1,9 mm, correas en perfil cerrado rectangular negro 40 x 20 de 1,1 mm y acabado en anticorrosivo gris, con cubierta en teja ondulada de zinc.	16/03/2026	23/02/2026	21
6	Construcción de Tres (3) biodigestores anaérobios de doble capa de flujo continuo con cubierta en plástico agolene calibre 6 resistente a rayos UV con estructura de cubierta en tubo pvc 1/2" presión	2/03/2026	3/03/2026	-1
7	Mantenimiento instalaciones La Colonia	9/02/2026	16/02/2026	-7

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 170,074,333.21	32.98%	35.47%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 353,006,013.33	68.45%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchán	93,399,584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1,110,544,123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26,968,272	Psicóloga social comunitario
Yon Geimar Quinayas Peña	83,029,595	Inspector de obra
Nemesio Urueña Palma	93,020,393	Maestro de obra
Eliene Ninco	36,346,433	Administrativa
Deiver Fabian Tovar Saldaña	1,075,235,146	Ayudante
Kevin Santiago Rojas Vanegas	1,076,904,489	Ayudante
Yimy Lozano Bonilla	7,705,681	Ayudante
Claudia Andrea Parra Cortes	36,189,163	Ayudante
Olga Lucia Rojas	36,182,639	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0.00%	27.27%	3
	TECNICO	1	2	9.09%	18.18%	3
	M.O/N.C	4	1	36.36%	9.09%	5
	TOTALES	**5**	**6**	**45.45%**	**54.55%**	**11**
	TOTAL	11		100%		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista de obra continuo entrega de materiales para las diferentes obras en el municipio de Neiva y Rivera. Se realizó la construccion en el municipio de Rivera de dos sistemas septicos de tratamiento de aguas residuales domesticas.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se realizó seguimiento a las obras objeto del contrato de obra No.114 de 2026, las cuales se realizan de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Sistema septico - Wilinton Gasca



Sistema septico - Wilinton Gasca



Sistema septico - Arvey Guevara Motta



Sistema septico - Arvey Guevara Motta

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBO SUPERVISOR ENCARGADO
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No.114 DE 2026

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN:	30 de marzo de 2026	PERIODO No.	9	DEL	23/03/2026	AL	29/03/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipios de Neiva y Rivera - Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	513 DE 2025				CONTRATO No.:	114 DE 2026			
CONTRATISTA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO				CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025			
NIT / C.C.:	79,142,300				NIT / C.C.:	902.021.671- 4			
PLAZO INICIAL:	4	MESES			PLAZO INICIAL:	4	MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de enero de 2026				FECHA DE INICIACIÓN:	22 de enero de 2026			
**FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE SUSPENSIÓN:				
**FECHA DE REINICIACIÓN:					FECHA DE REINICIACIÓN:				
PLAZO ADICIONAL:		MESES			PLAZO ADICIONAL:	-	MESES		
DÍAS POR EJECUTAR	54				DÍAS POR EJECUTAR	54			
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2026				FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de mayo de 2026			
PLAZO ACTUALIZADO:	120	DIAS			PLAZO ACTUALIZADO:	120	DIAS		
PLAZO TRANSCURRIDO:	66	DIAS	EQUIVALE AL	55.0%	PLAZO TRANSCURRIDO:	66	DIAS	EQUIVALE AL	55.0%
VALOR INICIAL :	$	53,597,600.00			VALOR INICIAL :	$	515,733,326.54		
VALOR ADICION(ES):	$	-			VALOR ADICION(ES):	$	-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	53,597,600.00			VALOR ACTUALIZADO:	$	515,733,326.54		
VALOR PAGADO:	$	-			VALOR PAGADO:	$	-		
VALOR POR PAGAR:	$	53,597,600.00			VALOR POR PAGAR:	$	515,733,326.54		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	22/01/2026	22/01/2026	0
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS			no iniciado
1	Construcción de cuatro (4) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo cerramiento negro de 1 1/2 de diametro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agricola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.	9/02/2026	11/02/2026	-2
2	Construcción de tres (3) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agricola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.	9/03/2026	11/02/2026	26
3	Construccion de cuatro (4) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de paneles laterales de lamina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tuberia pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv	9/02/2026		no iniciado
4	Construcción de cuatros (4) sistemas sépticos para agua residual doméstica en mamposteria de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas	9/03/2026	23/02/2026	14
5	Construcción de cuatro (4) composteras de residuos en ladrillo macizo, estructura metálica en tubo de cerriento negro de 1 1/2" de diametro x 1,9 mm, correas en perfil cerrado rectangular negro 40 x 20 de 1,1 mm y acabado en anticorrosivo gris, con cubierta en teja ondulada de zinc.	16/03/2026	23/02/2026	21
6	Construcción de Tres (3) biodigestores anaérobios de doble capa de flujo continuo con cubierta en plástico agolene calibre 6 resistente a rayos UV con estructura de cubierta en tubo pvc 1/2" presión	2/03/2026	3/03/2026	-1
7	Mantenimiento instalaciones La Colonia	9/02/2026	16/02/2026	-7

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 217,470,196.76	42.17%	37.83%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 412,595,743.52	80.00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
Oscar Iván Reinoso Merchán	93,399,584	Director de obra
Ricardo Hernández Guzmán	1,110,544,123	Residente de obra
María Sorley Hernández Barragán	26,968,272	Psicóloga social comunitario
Yon Geimar Quinayas Peña	83,029,595	Inspector de obra
Nemesio Urueña Palma	93,020,393	Maestro de obra
Eliene Ninco	36,346,433	Administrativa
Deiver Fabian Tovar Saldaña	1,075,235,146	Ayudante
Kevin Santiago Rojas Vanegas	1,076,904,489	Ayudante
Yimy Lozano Bonilla	7,705,681	Ayudante
Claudia Andrea Parra Cortes	36,189,163	Ayudante
Olga Lucia Rojas	36,182,639	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0.00%	27.27%	3
	TECNICO	1	2	9.09%	18.18%	3
	M.O/N.C	4	1	36.36%	9.09%	5
	TOTALES	**5**	**6**	**45.45%**	**54.55%**	**11**
	TOTAL	11		100%		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista de obra continuo entrega de materiales para las diferentes obras en el municipio de Neiva y Rivera. Se realizó la construccion en el municipio de Neiva de un secadero de cafe y una compostera

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA


6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se realizó seguimiento a las obras objeto del contrato de obra No.114 de 2026, las cuales se realizan de acuerdo a las especificaciones tecnicas. El dia 27 de marzo se realizó aprobacion de balance de mayores y menores cantidades sin adicion de valor del contrato 114 de 2026, mediante comite tecnico con la interventoria y la supervision

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

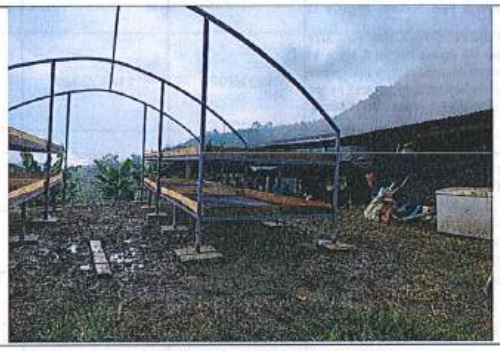

Secadero de cafe - Jhon Alciber Yague



Secadero de cafe - Jhon Alciber Yague



Compostera - Juan Camilo Perez



Compostera - Juan Camilo Perez

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: INTERVENTOR
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*VoBo SUPERVISOR ENCARGADO
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.6	CONTRATO DE OBRA No.114 DE 2026

PROYECTO: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
OSCAR REINOSO MERCHAN (OR) - Director de obra.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).

II. OBJETO

Seguimiento desarrollo contractual

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

V. TEMAS TRATADOS

OR informa que se ha iniciado la construcción del biodigestor en las instalaciones de la Asociacion de Jóvenes Emprendedores de Rivera - CORCACAO ubicada en la Ulloa, municipio de Rivera el cual ha presentado material rocoso y ha dificultado el avance y se continúa con los demás procesos constructivos

CQ Informa que se está realizando la inspección de obras, mediciones y verificación de cantidades de obra para el trámite al acta de recibo parcial de obra No.1 del contrato de obra No.114 de 2026. Se estima un avance de aproximadamente el 53%.

JC manifiesta satisfacción con el avance en los trabajos y recomienda la observancia a las especificacions técnicas y demás requisitos contractuales para el cumplimiento del objeto contractual.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Visita sitio de trabajos	CAM, interventoría, contratista	Por definir

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los seis (06) días del mes de marzo de 2026.

LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: COMITE TECNICO DE OBRA No. 6

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

SITIO DEL EVENTO: SALA DE JUNTAS | MUNICIPIO: NEIVA | FECHA: 04 - MARZO - 2026 | HORA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO				No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
		M	F	NB	O								
1	Carlos A. Quiza C.	X				7B.142300	INT.	DIRECTOR	NEIVA	310.321.4229	cquizac@gmail.com	SI	
2	Oscar I Reinoso	X					Obra	Director	Neiva			Si	
3	Javier Custodio Gutierrez	X				7694584	CAM	PMSGA	Neiva	3107557010	Mecheladas@camgroup	Si	
4	Lindsey Diaz Salgado		X			49.609.707	Interv.	Profes. Apoyo	Neiva	3185826935	Cquizac@gmail.com	✓	

En la casilla Sexo F: Femenino M: Masculino NB: No Binario O: Interesexual

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: _____ MUJERES: _____

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.7	CONTRATO DE OBRA No.114 DE 2026

PROYECTO: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
OSCAR REINOSO MERCHAN (OR) - Director de obra.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).

II. OBJETO

Seguimiento desarrollo contractual

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

V. TEMAS TRATADOS

OR informa que se ha continuado la construcción los secaderos de café y las composteras, municipio de Neiva y por temas de lluvias no se ha podido avanzar en el biodigestor en el municipio de Rivera. Ademas de acuerdo a las mediciones realizadas se requiere revisar cantidades de obra, ya que para la contruccion de composteras, secaderos de cafe y sistemas septicos se requieren mayor cantidad de transporte mular y por otro lado en biodigestores, tanqes australianos y secaderos de cacao no se requiere dicho transporte.

CQ Informa que se está realizando la inspección de obras, mediciones y verificación de cantidades de obra . Se evidencia un avance a la fecha de 62%. De acuerdo a lo expuesto por OR se le solicita realizar un balance de mayores y menores cantidades para ser revisado junto con la supervision del contrato.

JC manifiesta satisfacción con el avance en los trabajos y recomienda entregar el balance de mayores y menores cantidades en el menor tiempo posible para determinar la viabilidad de los cambios en las cantidades del contrato No. 114 de 2026.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar balance de mayores y menores cantidades	contratista e interventoria	Por definir

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los trece (13) días del mes de marzo de 2026.

LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: Comité técnico de obra N°7

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

SITIO DEL EVENTO: Sala de juntas | MUNICIPIO: Neiva | FECHA: 13 - marzo - 2026 | HORA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	SEXO NB	SEXO O	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Carlos A. Quiza	X				75.142380	INTER.	Director	Neiva	310.3214229	cquizac@gmail.com	Si	
2	Lindsay Daza Salgado		X			49.609.707	Inter.	Profes Apoyo	Neiva	3185826935	cquizac@gmail.com	Si	
	Oscar I Ramos	X					Obra	Director	Neiva			Si	
4	Jaime A.D Cabrera	X				7691787	CAM	Pu554	Neiva	3107758709		Si	

En la casilla Sexo F: Femenino M: Masculino NB: No Binario O: Interesexual

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: _____ MUJERES: _____

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.8	CONTRATO DE OBRA No.114 DE 2026

PROYECTO: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
OSCAR REINOSO MERCHAN (OR) - Director de obra.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).

II. OBJETO

Seguimiento desarrollo contractual

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

V. TEMAS TRATADOS

OR informa que se en el ejercicio de entrega de materiales, cuando se le iba a entregar los materiales para la construccion de un tanque Australiano al señor Honorio Bonilla el señor manifesto el desistimiento del beneficio por motivos personales

JC manifiesta la necesidad de proceder a realizar la sustitucion del beneficiario y obra de manera inmediata para garantizar el normal desarollo de la ejecución del contrato de obra No.114 de 2026.

CQ Informa que a la fecha se evidencia un avance a la fecha de 68%. De acuerdo a lo manifestado por la supervision, se realizara la verificacion del nuevo beneficiario que sea entregado, el cual debe cumplir con parametros para la construccion de tanque australiano.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2026.

LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: COMITÉ TECNICO DE OBRA No 8

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

SITIO DEL EVENTO: SALA DE JUNTAS | MUNICIPIO: NEIVA | FECHA: 20 - MARZO - 2026 | HORA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	SEXO NB	SEXO O	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Carlos A. Quiroz	X				79.142300	INT.	DIRECTOR	NEIVA	310.321.4229	cquirozc@gmail.com	Si	
2	Oscar I Ramos	X					Obra	Director	Neiva			Si	
3	Javier Andres Cabrera	X				7690 [illegible]	CAM	PUBSA	Neiva	3107887098		Si	
4	Lindsay Daza Salgado		X			49609.707	Interv	Profes. Apoy	Neiva	3183826935	cquizac@gmail.com	Si	

En la casilla Sexo F: Femenino M: Masculino NB: No Binario O: Interesexual

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: MUJERES:

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.9	CONTRATO DE OBRA No.114 DE 2026

PROYECTO: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EQUIPAMIENTO RURAL Y EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
FREDY MEDINA ARCE (FM) - Profesional apoyo Supervisión CAM.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
OSCAR REINOSO MERCHAN (OR) - Director de obra.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).
CARLOS QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría.	Firma listado de asistencia adjunto (formato CAM).

II. OBJETO

Seguimiento desarrollo contractual

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

V. TEMAS TRATADOS

OR informa que se se continua con la construccion de los secaderos de café y composteras, se tiene un avance aproximadamente del 80% en ejecucion del contrato 14 de 2026

CQ Informa que el contratista entregó el balance de mayores y menores cantidades sin adicion de recursos al contrato de obraa 114 de 2026, el cual se revisó y se entregó a la supervision para su verificacion y aprobacion.

JC manifiesta ante la información presentada una vez verificada se decide aprobar las novedades de obra. del contrato de obra No.114 de 2026.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026.

LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: Comite Tecnico de obra No. 9

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

SITIO DEL EVENTO:

MUNICIPIO:

FECHA: 27-Marzo-2026

HORA:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	SEXO NB	SEXO O	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
	Freddy Tejada Arce	X				7685185	CAM	Prof. Apoyo	Neiva	3166819140	arcefm31@gmail.com	si	
	Oscar Reinoso M.	X				93399.584	CONTRATISTA	DIRECTOR	Neiva	3134994973	arquitectoreinoso@gmail.com	Si.	
	Carlos A. Quiza Lc	X				79.142300	Ukn.	Director	Neiva	310.3214229	cquizac@gmail.com	Si	
	Javier Cordoba Gutierrez	X				7694587	CAM	PMSCA	Neiva	3107557090	proyectoscam@gmail.com	Si	

En la casilla Sexo F: Femenino M: Masculino NB: No Binario O: Interesexual

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: MUJERES:

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36763092	I	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	267.200	6.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36763092	2026-04-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	2.000.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	250.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	3	260.500	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36763092	I	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	267.200	6.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36763092	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.000.000	2.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	6.400	0	256.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	6.400	0	256.400
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	300	0	10.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.500	0	300	0	10.800
Gran Total					260.500	0	6.700	0	267.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37392458	E	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.643.100	41.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37392458	2026-04-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 12123891	PARRA OLAYA WILLIAM	4.500.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.500.000	180.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.500.000	180.000	4.500.000	313.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	1	673.200	S	5711001
2	CC 12192272	VARGAS CADENA NELSON	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37392458	E	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.643.100	41.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37392458	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	480.000	0	12.300	0	492.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	480.000	0	12.300	0	492.300
EPS(Administradoras: 2)				2	300.000	0	7.700	0	307.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	120.000	0	3.100	0	123.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	180.000	0	4.600	0	184.600
ARP(Administradoras: 1)				2	522.000	0	13.400	0	535.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	2	522.000	0	13.400	0	535.400
CCF(Administradoras: 1)				2	300.000	0	7.700	0	307.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	300.000	0	7.700	0	307.700
Gran Total					1.602.000	0	41.100	0	1.643.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
NIT. 902.021.671-4

ACTA DE DESISTIMIENTO DE BENEFICIO

ASUNTO: **DESISTIMIENTO VOLUNTARIO, PARA RECIBIR EL BENEFICIO.**

Yo Edilberto Polanco Q., mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. Palermera, domiciliado(a) en la vereda 17113089 del municipio de Neiva, actuando como beneficiario(a), en el marco del desarrollo del contrato de obra No. 114 de 2026, firmado entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM** y el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**. Manifiesto de manera libre y voluntaria, que **DESISTO** de mi participación en el proceso antes mencionado, que consiste en ***la construcción y entrega de un(a)*** Po.

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO:

No cuenta con espacio suficiente contiguo al beneficiadero para la construcción de la obra.

Para todos sus efectos, la presente acta, se firma a los 04 días, del mes de Febrero del año 2026.

Firma,

BENEFICIARIO
C.C. No. 17113089
CELULAR: 3214542020

RESIDENTE DE OBRA
C.C. No. 1.110.544.123

DIRECTOR DE OBRA
C.C. No. 93'397.584.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
NIT. 902.021.671-4

ACTA DE DESISTIMIENTO DE BENEFICIO

ASUNTO: **DESISTIMIENTO VOLUNTARIO, PARA RECIBIR EL BENEFICIO.**

Yo Bernardo Villalba Villalba, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 4932 105, domiciliado(a) en la vereda Honda del municipio de Rivera, actuando como beneficiario(a), en el marco del desarrollo del contrato de obra No. 114 de 2026, firmado entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM** y el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**. Manifiesto de manera libre y voluntaria, que **DESISTO** de mi participación en el proceso antes mencionado, que consiste en ***la construcción y entrega de un(a)*** secadero de cacao.

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO:

No se cuenta con area suficiente para la construcción cuenta con aproximadamente 0.5 ha de cacao y espacio disponible de 4m x 2m

Para todos sus efectos, la presente acta, se firma a los 18 días, del mes de Febrero del año 2026.

Firma,

Bernardo Villalba

BENEFICIARIO 4932.105
C.C. No. 7
CELULAR: 3053257934

RESIDENTE DE OBRA
C.C. No. 1.110.544.123

DIRECTOR DE OBRA
C.C. No. 93'399.584

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
NIT. 902.021.671-4

ACTA DE DESISTIMIENTO DE BENEFICIO

ASUNTO: **DESISTIMIENTO VOLUNTARIO, PARA RECIBIR EL BENEFICIO.**

Yo Yasmary Claros Escarpeta, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 83042784., domiciliado(a) en la vereda Las Juntas. del municipio de Rivera. (H), actuando como beneficiario(a), en el marco del desarrollo del contrato de obra No. 114 de 2026, firmado entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM** y el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**. Manifiesto de manera libre y voluntaria, que **DESISTO** de mi participación en el proceso antes mencionado, que consiste en ***la construcción y entrega de un(a)*** Sistema Septico.

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO:

El beneficiario realizo la instalación del sistema septico con recursos propios durante el año 2025

Para todos sus efectos, la presente acta, se firma a los 18 días, del mes de Febrero del año 2026.

Firma,

Yasmary Claros Scarpeta
BENEFICIARIO
C.C. No. 83042784
CELULAR: 3118504982

RESIDENTE DE OBRA
C.C. No. 1.110.544.123

DIRECTOR DE OBRA
C.C. No. 93'399.584

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
NIT. 902.021.671-4

ACTA DE DESISTIMIENTO DE BENEFICIO

ASUNTO: **DESISTIMIENTO VOLUNTARIO, PARA RECIBIR EL BENEFICIO.**

Yo ODAIR CASTRO HERNANDEZ, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 7.698 934, domiciliado(a) en la vereda BUENA VISTA. del municipio de RIVERA, actuando como beneficiario(a), en el marco del desarrollo del contrato de obra No. 114 de 2026, firmado entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM** y el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**. Manifiesto de manera libre y voluntaria, que **DESISTO** de mi participación en el proceso antes mencionado, que consiste en ***la construcción y entrega de un(a)*** BIODIGESTOR.

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO:

Venta de predio y cese de actividad productiva

Para todos sus efectos, la presente acta, se firma a los 19 días, del mes de Febrero. del año 2026.

Firma,

ODAIR CASTRO H.
BENEFICIARIO
C.C. No. 7698 934
CELULAR: 3219663982

RESIDENTE DE OBRA
C.C. No. 1.110.544.123

DIRECTOR DE OBRA
C.C. No. 93391.584.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA – NO VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SECADERO DE CAFÉ, COMPOSTERA Y SISTEMA SÉPTICO

Conforme a la revisión técnica realizada en el área propuesta para la implementación de un secadero de café, una unidad de compostaje y un sistema séptico de ARD, en la vereda San Bartolo del municipio de Neiva, predio denominado El Portillo Lote 1 del señor Wilson Osorio Chalarca, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.736.899; se determina que no es técnicamente viable desarrollar dichas infraestructuras en el sitio evaluado, debido a limitaciones geotécnicas, topográficas y espaciales que comprometen su estabilidad, operatividad y cumplimiento normativo.

1. CONDICIONES TOPOGRÁFICAS DESFAVORABLES

El predio presenta una pendiente elevada y topografía abrupta, evidenciándose taludes naturales con inclinaciones considerables y ausencia de plataformas estables. Esta condición implica un alto riesgo para la ejecución de obras civiles, ya que cualquier infraestructura de este tipo requiere superficies niveladas o, en su defecto, obras de contención, cortes y rellenos debidamente diseñados.

La intervención del terreno bajo estas características incrementaría significativamente la probabilidad de:

- Deslizamientos superficiales.
- Erosión acelerada.
- Inestabilidad de taludes.
- Asentamientos diferenciales.
- Pérdida de capacidad portante del suelo.

Todo lo anterior representa un riesgo estructural y funcional para las unidades proyectadas.

2. LIMITACIONES GEOTÉCNICAS Y COMPORTAMIENTO DEL SUELO

En el área evaluada se observan signos de erosión activa y pérdida del estrato vegetal, lo cual indica procesos de degradación del suelo. En este contexto, el terreno no garantiza condiciones adecuadas de soporte para cimentaciones superficiales ni para excavaciones requeridas, especialmente en estructuras como sistemas sépticos que demandan confinamiento seguro.

La alta pendiente favorece además la acumulación de escorrentía superficial, aumentando la saturación del suelo durante periodos de lluvia, lo que podría generar fallas por inestabilidad o colapso de excavaciones.

3. NO DISPONIBILIDAD DE ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO

Adicionalmente, el área útil disponible no cumple con los requerimientos dimensionales necesarios para la adecuada localización de:

- Secadero de café (zona plana, ventilada y accesible).
- Compostera (aislamiento sanitario, manejo de lixiviados).

- Sistema séptico (área de infiltración, distancias de seguridad).

Estas infraestructuras requieren condiciones de accesibilidad, operación y mantenimiento, así como distancias mínimas respecto a fuentes hídricas, viviendas y taludes, lo cual no es posible garantizar en el terreno evaluado debido a su configuración restringida y pendiente pronunciada.

4. RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES EN SISTEMAS SÉPTICOS

En particular, para el sistema séptico, la normativa técnica exige suelos con capacidad de infiltración controlada y condiciones estables. La ubicación en un terreno inclinado podría provocar:

- Migración de efluentes por escorrentía.
- Falla del sistema por colapso estructural.

Por tanto, su implementación en este sitio no cumple criterios técnicos mínimos de seguridad sanitaria y ambiental.

CONCLUSIÓN TÉCNICA

En consecuencia, desde el punto de vista técnico, se concluye que el terreno evaluado en la vereda San Bartolo del municipio de Neiva, predio denominado El Portillo Lote 1 del señor Wilson Osorio Chalarca, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.736.899; **NO ES APTO** para la construcción de un secadero de café, una compostera ni un sistema séptico, debido a su **pendiente elevada, inestabilidad geotécnica, procesos de erosión y falta de espacio funcional mínimo**, recomendándose evaluar un predio alternativo que cumpla con las condiciones topográficas, normativas y técnicas requeridas para este tipo de infraestructura rural.

Para todos sus efectos, la presente acta, se firma a los cuatro (4) días, del mes de febrero del año 2026.

Firma,

PROFESIONAL PROYECTO CEIBAS-CAM
C.C. No. 7698[illegible] Neiva,

RESIDENTE DE OBRA
C.C. No. 1110538228

INTERVENTORÍA
C.C. No.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
NIT. 902.021.671-4

ACTA DE DESISTIMIENTO DE BENEFICIO

ASUNTO: **DESISTIMIENTO VOLUNTARIO, PARA RECIBIR EL BENEFICIO.**

Yo Honorio Bonilla Tello., mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 12.102.879, domiciliado(a) en la vereda La Plata del municipio de Neiva, actuando como beneficiario(a), en el marco del desarrollo del contrato de obra No. 114 de 2026, firmado entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM** y el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**. Manifiesto de manera libre y voluntaria, que **DESISTO** de mi participación en el proceso antes mencionado, que consiste en ***la construcción y entrega de un(a)*** Tanque Australiano.

DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO:

El propietario desiste voluntariamente del beneficio porque el área destinada para dicha obra decidio utilizarla para otro fin.

Para todos sus efectos, la presente acta, se firma a los 27 días, del mes de marzo del año 2026.

Firma,

Honorio Bodilla
BENEFICIARIO
C.C. No. 12.102.879
CELULAR: 302-836-53-80

RESIDENTE DE OBRA
C.C. No. 1 120 538 229

DIRECTOR DE OBRA
C.C. No.

Powered by CamScanner

	OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA							
	CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025		INTERVENTOR	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		ACTA MODIFICATORIA 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA SIN ADICION EN VALOR Y PLAZO	
	VALOR OBRA	$ 615.192.918,00		VALOR INTERVENTORIA				
	PLAZO	4	MESES	PLAZO	4			
	F. INICIO / TERMINACION	22/01/2026	21/05/2026	22/01/2026	21/05/2026		FECHA ACTA	27/03/2026

	CONDICIONES INICIALES					MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**								
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100,0	$ 11.676,00	$ 1.167.600,00	-1,00	$ (11.676,00)	99,00	1.155.924,00
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	3,2	$ 46.640,00	$ 149.248,00	0,00	$ -	3,20	149.248,00
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	3,2	$ 1.032.296,00	$ 3.303.347,20	0,00	$ -	3,20	3.303.347,20
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 mm X 6 MTS DE LONGITUD Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS. TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	4,0	$ 7.712.348,00	$ 30.849.392,00	0,00	$ -	4,00	30.849.392,00
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	4,0	$ 3.812.766,00	$ 15.251.064,00	0,00	$ -	4,00	15.251.064,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	4,0	$ 2.004.530,00	$ 8.018.120,00	0,00	$ -	4,00	8.018.120,00
1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	UND	32,0	$ 888.980,00	$ 28.447.360,00	0,00		32,00	28.447.360,00
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4,0	$ 1.408.080,00	$ 5.632.320,00	0,00	$ -	4,00	5.632.320,00
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	32,0	$ 101.088,00	$ 3.234.816,00	46,00	$ 4.650.048,00	78,00	7.884.864,00
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**								
2,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	75,0	$ 11.676,00	$ 875.700,00	0,00	$ -	75,00	875.700,00

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	2,4	$ 46.640,00	$ 111.936,00	0,00	$ -	2,40	111.936,00
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	M3	2,4	$ 1.032.297,00	$ 2.477.512,80	0,00	$ -	2,40	2.477.512,80
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	UND	3,0	$ 7.928.648,00	$ 23.785.944,00	0,00	$ -	3,00	23.785.944,00
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6M INCLUYE INSTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	UND	3,0	$ 3.812.766,00	$ 11.438.298,00	0,00	$ -	3,00	11.438.298,00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	UND	3,0	$ 2.004.530,00	$ 6.013.590,00	0,00	$ -	3,00	6.013.590,00
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE GRANO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA (TABLA BURRA CEPILLADA) DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO SOLAR. INCLUYE 8 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CAFE COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, QUE CUBRA SUPERFICIE DE LA PASERA. INCLUYE DIVISORIO DE CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISA MALLA Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna Nota 3: Incluye divisorio en madera de 5cm de alto para instalar en la mitad de la pasera para soporte.	UND	24,0	$ 888.980,00	$ 21.335.520,00	0,00	$ -	24,00	21.335.520,00
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	3,0	$ 1.408.080,00	$ 4.224.240,00	0,00	$ -	3,00	4.224.240,00
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	24,0	$ 101.088,00	$ 2.426.112,00	-24,00	$ (2.426.112,00)	0,00	-
3	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 5 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**								
3,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	52,0	$ 11.676,00	$ 607.152,00	0,00	$ -	52,00	607.152,00
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	2,0	$ 46.640,00	$ 93.280,00	0,00	$ -	2,00	93.280,00
3,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC PRESIÓN BLANCA 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	UND	4,0	$ 970.730,00	$ 3.882.920,00	0,00	$ -	4,00	3.882.920,00

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 3,71 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90).	UND	4,0	$ 3.778.750,00	$ 15.115.000,00	0,00	$ -	4,00	15.115.000,00
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 5 M DE DIÁMETRO; 1,1 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	UND	4,0	$ 4.309.063,00	$ 17.236.252,00	0,00	$ -	4,00	17.236.252,00
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, PEGADA Y COCIDA CON FIBRA, INCLUYE CLIP PARA POLISOMBRA Y SOGA DE AMARRE	UND	4,0	$ 675.768,00	$ 2.703.072,00	0,00	$ -	4,00	2.703.072,00
3,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	2,0	$ 1.408.080,00	$ 2.816.160,00	0,00	$ -	2,00	2.816.160,00
3,8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	32,0	$ 101.088,00	$ 3.234.816,00	-32,00	$ (3.234.816,00)	0,00	-
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**								
4,1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	16,0	$ 11.676,00	$ 186.816,00	0,00	$ -	16,00	186.816,00
4,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	26,8	$ 46.640,00	$ 1.249.952,00	0,00	$ -	26,80	1.249.952,00
4,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	56,80	$ 184.907,00	$ 10.502.717,60	0,00	$ -	56,80	10.502.717,60
4,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	Kg	200,0	$ 22.881,00	$ 4.576.200,00	0,00	$ -	200,00	4.576.200,00
4,1,5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	16,0	$ 151.721,00	$ 2.427.536,00	0,00	$ -	16,00	2.427.536,00
4,1,6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	16,0	$ 163.945,00	$ 2.623.120,00	0,00	$ -	16,00	2.623.120,00
4,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UN	4,0	$ 542.465,00	$ 2.169.860,00	0,00	$ -	4,00	2.169.860,00
4,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	2,8	$ 544.650,00	$ 1.525.020,00	0,00	$ -	2,80	1.525.020,00
4,9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	4,0	$ 206.132,00	$ 824.528,00	0,00	$ -	4,00	824.528,00
4,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	24,0	$ 49.102,00	$ 1.178.448,00	-10,00	$ (491.020,00)	14,00	687.428,00
4,1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	UNIDAD	4,0	$ 288.453,00	$ 1.153.812,00	-4,00	$ (1.153.812,00)	0,00	-
4,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**								
4.2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	2,56	$ 11.676,00	$ 29.890,56	0,00	$ -	2,56	29.890,56
4.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	3,49	$ 46.639,00	$ 162.676,83	-1,75	$ (81.524,97)	1,74	81.151,86
4.2.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	4,0	$ 956.563,00	$ 3.826.252,00	0,00	$ -	4,00	3.826.252,00
4.2.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4,0	$ 152.905,00	$ 611.620,00	0,00	$ -	4,00	611.620,00
4.2.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	ML	24,0	$ 39.438,00	$ 946.512,00	-7,10	$ (280.010,00)	16,90	666.502,00
4,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**								
4.3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0,64	$ 11.676,00	$ 7.472,64	0,00	$ -	0,64	7.472,64
4.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0,3840	$ 46.640,00	$ 17.909,76	-0,004	$ (186,56)	0,380	17.723,20
4.3.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	4	$ 767.339,00	$ 3.069.356,00	0,00	$ -	4,00	3.069.356,00
4.3.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	4	$ 152.905,00	$ 611.620,00	0,00	$ -	4,00	611.620,00

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del item 4.2.5.	ML	24	$ 39.438,00	$ 946.512,00	-12,30	$ (485.087,00)	11,70	461.425,00
4,4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**								-
4.4.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	36,0	$ 11.676,00	$ 420.336,00	-9,32	$ (108.820,00)	26,68	311.516,00
4.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	12,0	$ 46.640,00	$ 559.680,00	0,00	$ -	12,00	559.680,00
4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE HASTA FOSA DE INFILTRACION. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	Ml	32,0	$ 38.908,00	$ 1.245.056,00	0,00	$ -	32,00	1.245.056,00
4.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	2,0	$ 442.150,00	$ 884.300,00	0,00	$ -	2,00	884.300,00
4.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	UND	2,0	$ 431.850,00	$ 863.700,00	0,00	$ -	2,00	863.700,00
4.4.6	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4,0	$ 1.408.080,00	$ 5.632.320,00	0,00	$ -	4,00	5.632.320,00
4.4.7	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	24,0	$ 101.088,00	$ 2.426.112,00	46,00	$ 4.650.048,00	70,00	7.076.160,00
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL**								
5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	48,00	$ 11.676,00	$ 560.448,00	0,00	$ -	48,00	560.448,00
5,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	8,00	$ 46.640,00	$ 373.120,00	-4,92	$ (229.468,80)	3,08	143.651,20
5,3	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.42, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	M3	2,00	$ 1.032.297,00	$ 2.064.594,00	-0,04	$ (41.292,00)	1,96	2.023.302,00
5,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS	M2	44,00	$ 149.574,00	$ 6.581.256,00	-0,40	$ (59.830,00)	43,60	6.521.426,00
5,5	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M=188 (0.80 MM C/ 35M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE ACERO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	Kg	75,20	$ 16.530,00	$ 1.243.056,00	0,00	$ -	75,20	1.243.056,00
5,6	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	37,60	$ 184.906,00	$ 6.952.465,60	0,00	$ -	37,60	6.952.465,60
5,7	CONCRETO DE 3000 PSI (20,7 Mpa) PARA COLUMNETAS.	M3	0,80	$ 1.257.715,00	$ 1.006.172,00	0,00	$ -	0,80	1.006.172,00
5,8	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 3/8 FY 60,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA).	KG	112,00	$ 22.881,00	$ 2.562.672,00	-8,52	$ (194.946,00)	103,48	2.367.726,00
5,9	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJES DIAMETRO 1/4 FY 37,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA) FLEJES CADA 15 CM	KG	72,00	$ 16.552,00	$ 1.191.744,00	-16,56	$ (274.101,12)	55,44	917.642,88
5,1	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COMPOSTERAS EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 1.9 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40X20 DE 1.1mm X 6 MTS Y ACABADO CON ANTICORROSIVO GRIS. Nota: el contratista debe cuando se requiera utilizar y soldar el sobrante de perfil para completar algún elemento. Nota 2: los elementos estructurales para la cubierta deben estar soldados en los 4 cantos, no se da por recibido perfiles superpuestos.	UND	4,00	$ 3.447.961,00	$ 13.791.844,00	0,00	$ -	4,00	13.791.844,00
5,11	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC ONDULADA CALIBRE 34	M2	43,20	$ 56.361,00	$ 2.434.795,20	0,00		43,20	2.434.795,20
5,12	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4,00	$ 1.408.080,00	$ 5.632.320,00	0,00		4,00	5.632.320,00
5,13	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	VIAJE	32,00	$ 101.088,00	$ 3.234.816,00	48,00	$ 4.852.224,00	80,00	8.087.040,00
6	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) BIODIGESTORES ANAÉROBIOS DE DOBLE CAPA DE FLUJO CONTINUO CON CUBIERTA EN PLÁSTICO AGOLENE CALIBRE 6 RESISTENTE A RAYOS UV CON ESTRUCTURA DE**								-
6,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	M2	120,00	$ 11.676,00	$ 1.401.120,00	0,00	$ -	120,00	1.401.120,00
6,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	12,00	$ 46.640,00	$ 559.680,00	0,00	$ -	12,00	559.680,00
6,3	CONSTRUCCIÓN BIODIGESTOR DOBLE CAPA DE 8 METROS DE LONGITUD UTIL, EN BOLSA TUBULAR DÍAMETRO 2 METROS, INCLUYE TUBERIA SANITARIA DE PVC PARA CARGUE Y SALIDA DE EFLUENTE, Y TUBERÍA DE 1/2 PULGADA PARA SUMINITRO DE BIOGAS AL QUEMADOR	Unidad	3,00	$ 3.382.987,00	$ 10.148.961,00	0,00	$ -	3,00	10.148.961,00
6,4	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FILTRO DE SULFUROS (H2S) EN PVC	Unidad	3,00	$ 191.693,00	$ 575.079,00	0,00	$ -	3,00	575.079,00
6,5	ESTRUCTURA TUBULAR PARA CUBIERTA EB TUBO DE PVC DE RIEGO A PRESIÓNY ZÓCALO EN MADERA EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA PARA AJUSTE DE LA CUBIERTA	Unidad	3,00	$ 627.350,00	$ 1.882.050,00	0,00	$ -	3,00	1.882.050,00
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CALIBRE 6 DE 6 METROS DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV.	Unidad	3,00	$ 759.834,00	$ 2.279.502,00	0,00	$ -	3,00	2.279.502,00
6,7	CAJA EN LADRILLO TOLETE 0,07 X0,12X 0,24, INCLUYE PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR. DIMENSIONES 0,80 X0,80 X0,6 DEPROFUNDIDAD	Unidad	6,00	$ 823.137,00	$ 4.938.822,00	0,00	$ -	6,00	4.938.822,00
6,9	TRANSPORTE AUTOMOTOR DE MATERIALES	Viaje	3,00	$ 1.408.080,00	$ 4.224.240,00	0,00	$ -	3,00	4.224.240,00
6,1	TRANSPORTE ANIMAL DE MATERIALES	Viaje	18,00	$ 101.088,00	$ 1.819.584,00	-18,00	$ (1.819.584,00)	0,00	-

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7									
7,1	ARREGLO DE HUMEDADES Y MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO Nota: La Corproación aporta el vinilo								
7.1.1	DEMOLICIÓN DE PAÑETE O REVOQUE	M2	48,00	$ 26.376,00	$ 1.266.048,00	0,00	$ -	48,00	1.266.048,00
7.1.2	PAÑETE DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	48,00	$ 69.248,00	$ 3.323.904,00	0,00	$ -	48,00	3.323.904,00
7.1.3	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MURO	M2	48,00	$ 17.948,00	$ 861.504,00	0,00	$ -	48,00	861.504,00
7.1.4	MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO Nota: La Corporación aporta la pintura	M2	822,00	$ 20.010,00	$ 16.448.220,00	-35,79	$ (716.158,00)	786,21	15.732.062,00
7,2	ENCHAPES Y PISOS								
7.2.1	GUARDAESCOBA EN GRES O CERÁMICA	ML	64,56	$ 31.725,00	$ 2.048.094,09	-64,56	$ (2.048.094,09)	0,00	-
7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA TIPO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	30,00	$ 117.266,00	$ 3.517.980,00	-8,57	$ (1.004.970,00)	21,43	2.513.010,00
7,3	CARPINTERIA EN MADERA								
7.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBLERADA CON ACABADO MELÁMINICO	UND	1,00	$ 623.330,00	$ 623.330,00	0,00	$ -	1,00	623.330,00
7.3.2	APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE LIJADA Y DISOLVENTE THINNER)	M2	98,14	$ 22.265,00	$ 2.185.087,10	35,82	$ 797.641,54	133,96	2.982.728,64
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA DE POMA MADERA	UND	6,00	$ 130.250,00	$ 781.500,00	0,00	$ -	6,00	781.500,00
7,4	CONSTRUCCION DE SISTEMA SEPTICO								
7.4.1	LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELACION	M2	4,00	$ 11.676,00	$ 46.704,00	0,00	$ -	4,00	46.704,00
7.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	6,70	$ 46.640,00	$ 312.488,00	0,00	$ -	6,70	312.488,00
7.4.3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	M2	14,20	$ 184.906,00	$ 2.625.665,20	0,00	$ -	14,20	2.625.665,20
7.4.4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM	Kg	50,00	$ 22.881,00	$ 1.144.050,00	0,00	$ -	50,00	1.144.050,00
7.4.5	TAPA DE TANQUE EN CONCRETO PARA DE 21 MPA (3000 P.S.I) E=0.05M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4,00	$ 151.721,00	$ 606.884,00	0,00	$ -	4,00	606.884,00
7.4.6	PLACA DE FONDO PARA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	M2	4,00	$ 163.945,00	$ 655.780,00	0,00	$ -	4,00	655.780,00
7.4.7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	UN	1,00	$ 542.465,00	$ 542.465,00	0,00	$ -	1,00	542.465,00
7.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	M3	0,70	$ 544.650,00	$ 381.255,00	0,00	$ -	0,70	381.255,00
7.4.9	PLACA PERFORADA DEL FAFA, PERFORACIONES DE 1" E=0.10M EN CONCRETO DE 3000 P.S.I, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL. LADO 1MT X LADO 1MT	M2	1,00	$ 206.132,00	$ 206.132,00	0,00	$ -	1,00	206.132,00
7.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	ML	6,00	$ 49.102,00	$ 294.612,00	0,00	$ -	6,00	294.612,00
7.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	UNIDAD	1,00	$ 288.453,00	$ 288.453,00	-1,00	$ (288.453,00)	0,00	-
7,5	TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80								
7.5.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0,64	$ 11.676,00	$ 7.472,64	0,00	$ -	0,64	7.472,64
7.5.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0,87	$ 46.639,00	$ 40.669,21	0,00	$ -	0,87	40.669,21
7.5.3	TRAMPA DE GRASAS 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	UND	1,00	$ 956.563,00	$ 956.563,00	0,00	$ -	1,00	956.563,00
7.5.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1,00	$ 152.905,00	$ 152.905,00	0,00	$ -	1,00	152.905,00
7.5.5	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	ML	6,00	$ 39.438,00	$ 236.628,00	0,00	$ -	6,00	236.628,00
7,6	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60								
7.6.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	0,16	$ 11.675,00	$ 1.868,00	0,00	$ -	0,16	1.868,00
7.6.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	M3	0,216	$ 46.638,00	$ 10.073,81	0,00	$ -	0,216	10.073,81
7.6.3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TAPA REFORZADA	UND	1,00	$ 767.339,00	$ 767.339,00	0,00	$ -	1,00	767.339,00
7.6.4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA CAJILLAS EN GENERAL	UND	1,00	$ 152.905,00	$ 152.905,00	0,00	$ -	1,00	152.905,00
7.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del item 7.5.5.	ML	6,00	$ 39.438,00	$ 236.628,00	0,00	$ -	6,00	236.628,00
7,7	FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.								
7.7.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	9,00	$ 11.676,00	$ 105.084,00	0,00	$ -	9,00	105.084,00

CONDICIONES INICIALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.7.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	M3	3,00	$ 46.640,00	$ 139.920,00	0,00	$ -	3,00	139.920,00
7.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4" DE EFLUENTE EN HASTA FOSA DE INFILTRACION.	MI	8,00	$ 38.908,00	$ 311.264,00	0,00	$ -	8,00	311.264,00
7.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	0,50	$ 442.150,00	$ 221.075,00	0,00	$ -	0,50	221.075,00
7.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1" Nota: Altura de Grava 50 cm	M3	0,50	$ 431.850,00	$ 215.925,00	0,00	$ -	0,50	215.925,00
7.7.8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	VIAJE	4,00	$ 1.408.080,00	$ 5.632.320,00	0,00	$ -	4,00	5.632.320,00
				COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	**$ 387.917.243,24**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 387.917.243,24**
				ADMINISTRACION 12% =	$ 46.550.069,19	ADMINISTRACION 12% =	$ -	ADMINISTRACION 12% =	$ 46.550.069,19
				IMPREVISTOS 5% =	$ 19.395.862,16	IMPREVISTOS 5% =	$ -	IMPREVISTOS 5% =	$ 19.395.862,16
				UTILIDAD 10% =	$ 38.791.724,32	UTILIDAD 10% =	$ -	UTILIDAD 10% =	$ 38.791.724,32
				IVA % sobre utilidad 19% =	$ 7.370.427,62	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 7.370.427,62
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	**$ 112.108.083,30**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ -**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 112.108.083,30**
				TOTAL COSTOS EQUIPAMENTO RURAL (Directos + Indirectos)	**$ 500.025.326,54**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ -**	**TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)**	**$ 500.025.326,54**
B	SENCIBILIZACION SOCIAL COMUNITARIO								
	Talleres de sensibilización social comunitario	TALLER	16	$ 825.000,00	$ 13.200.000,00	0,00	$ -	16,00	$ 13.200.000,00
					$ -		$ -		
				IVA % sobre utilidad 19% =	$ 2.508.000,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ -	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 2.508.000,00
TOTAL COSTOS JORNADA DE SENSIBILIZACION					**$ 15.708.000,00**		**$ -**		**$ 15.708.000,00**
				TOTAL COSTO DE CONSTRUCCION	**$ 515.733.326,54**		**$ -**		**$ 515.733.326,54**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
1,1	Luz Albenis González Vega	5,50	4,50		24,75	1,00	**24,75**
	Ernesto Alarcon Silva	5,50	4,50		24,75	1,00	**24,75**
	Luis Jaiber Tovar	5,50	4,50		24,75	1,00	**24,75**
	Jhon Alciber Yague	5,50	4,50		24,75	1,00	**24,75**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**99,00**

TOTAL	**99,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**99,00**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) SECADEROS SOLARES DE CAFÉ PARABOLICO EN ESTRUCTURA TUBO CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2 DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
1,9	TRANSPORTE MULAR Luz Albenis					26,00	**26,00**
	TRANSPORTE MULAR Ernesto Alarcon					26,00	**26,00**
	TRANSPORTE MULAR JHON					26,00	**26,00**
						TOTAL	**78,00**

TOTAL	**78,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**78,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) SECADORES SOLARES DE CACAO PARABOLICO EN TUBO DE CERRAMIENTO DE NEGRO DE 1/12 DE DIAMETRO X 2.5 MM (INCLUYE VENTILA DE AIRE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA Y GUAYAS DE SUJECIÓN), CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, CUBIERTA EN PLASTICO AGROLEN DE 6 MM ANCLADA CON TORNILLO AUTOPERFORANTE SOBRE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA DE 1/2, PASERAS EN ÁNGULO DE 2" X 1/8, RETICULA EN ALAMBRE GALVANIZADO DE CALIBRE 12 PARA ELA POYO DE LA MALLA DE SECADO NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO, ORIFICIO TIPO ROMBO. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALCIÓN DE 8 PASERAS EN MADERA. VER PLANOS.**	
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
2,9	TRANSPORTE MULAR						**0,00**
							0,00
						TOTAL	**0,00**

TOTAL	**0,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**-**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 5 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**	
3,8	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
3,8	TRANSPORTE MULAR						**0,00**
							0,00
						TOTAL	**0,00**

TOTAL	**0,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**-**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
4.1.10	ARVEY GUEVARA	5,00				1,00	**5,00**
	WILLINTON GASCA	6,00				1,00	**6,00**
	LUIS FERNEY LOSADA	2,00				1,00	**2,00**
	SERAFIN AYA	1,00				1,00	**1,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**14,00**

TOTAL	**14,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**14,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**	
4,1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
4,1,11	ARVEY GUEVARA						**0,00**
	WILLINTON GASCA						**0,00**
	LUIS FERNEY LOSADA						**0,00**
	SERAFIN AYA						**0,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,00**

TOTAL	**0,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**-**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
4.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
4.2.2	luis ferney losada	1,00	1,00	0,87	0,87	1,00	**0,87**
	serafin aya	1,00	1,00	0,87	0,87	1,00	**0,87**
	willimton gasca	0,00	0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
	arvey guevara	0,00	0,00	0	0,00	0,00	**0,00**
							0,00
							0,00
					TOTAL		**1,74**

TOTAL	**1,74**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,74**



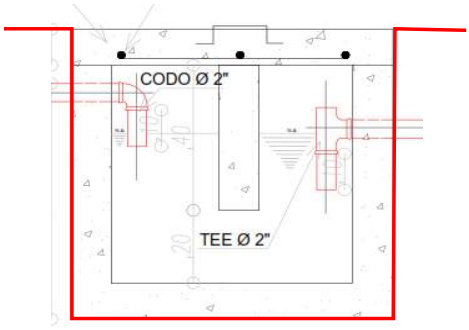

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**	
4.2.5	SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se instalan como efluente, no se conectan de la trampa de grasa al sistema séptico.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
4.2.5	arvey guevara					1,50	**1,50**
	WILLINTON GASCA					6,00	**6,00**
	LUIS FERNEY LOSADA					4,20	**4,20**
	SERAFIN AYA					5,20	**5,20**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**16,90**

TOTAL	**16,90**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**16,90**



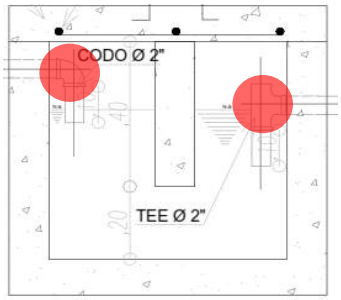

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
4.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
4.3.2	ARVEY GUEVARA	0,46	0,45	0,46	0,10	1,00	**0,095**
	WILLINTON GASCA	0,46	0,45	0,46	0,10	1,00	**0,095**
	LUIS FERNEY LOSADA	0,46	0,45	0,46	0,095	1,00	**0,095**
	SERAFIN AYA	0,46	0,45	0,46	0,095	1,00	**0,095**
						TOTAL	**0,380**

TOTAL	**0,38**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**0,38**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**		**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA		**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 515.733.326,54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL:	$ 515.733.326,54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO:	$ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60**	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA DE 2" Nota: Los 6 metros de tubería sanitaria se emplean como conexión entre la caja de inspección hasta la trampa de grasa, en caso de no emplearse toda la tubería se instala como tubería del item 4.2.5.	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
4.3.5	ARVEY GUEVARA	2,70				1,00	**2,70**
	WILLINTON GASCA	6,00				1,00	**6,00**
	LUIS FERNEY LOSADA	1,80				1,00	**1,80**
	SERAFIN AYA	1,20				1,00	**1,20**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**11,70**

TOTAL	**11,70**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**11,70**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4,4	**FOSA DE INFILTRACIÓN 1X1X1 M: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DESDE SISTEMA SÉPTICO HASTA FOSA DE INFILTRACIÓN.**	
4.4.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
4.4.1	LECHO FFILTRANTE	8,72	0,60		5,23	1,00	**5,23**
	FOSA DE INFILTRACION	1,20	1,20		1,44	1,00	**1,44**
	LECHO FFILTRANTE	8,72	0,60		5,23	1,00	**5,23**
	FOSA DE INFILTRACION	1,20	1,20		1,44	1,00	**1,44**
	LECHO FFILTRANTE	8,72	0,60		5,23	1,00	**5,23**
	FOSA DE INFILTRACION	1,20	1,20		1,44	1,00	**1,44**
	LECHO FFILTRANTE	8,72	0,60		5,23	1,00	**5,23**
	FOSA DE INFILTRACION	1,20	1,20		1,44	1,00	**1,44**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**26,68**

TOTAL	**26,68**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**26,68**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)


REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUATROS (4) SISTEMAS SÉPTICOS PARA AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TOLETE COMÚN, CON FILTRO DE FLUJO ASCENDENTE EN GRAVILLA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 80 X 80 CM, TRAMPA DE GRASAS DE 40 X 40 Y CAMPO DE INFILTRACIÓN Y LA RESPECTIVA TUBERÍA DE 2" Y 4" Y SUS ACCESORIOS Y REFUERZO EN 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES CADA 20 CM TANTO PARA PLACA DE FONDO COMO PARA TAPAS DEL SISTEMA Y CAJILLAS**	
4.4.7	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
4.4.7	TRANSPORTE MULAR LUIS FERNEY					35,00	**35,00**
	TRANSPORTE MULAR WILLIAM					35,00	**35,00**
						TOTAL	**70,00**

TOTAL	**70,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**70,00**



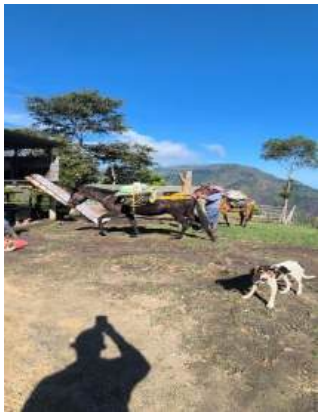

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
5,2	ernesto	0,45	0,45	0,55	0,11	7,00	**0,77**
	camilo	0,45	0,45	0,55	0,11	7,00	**0,77**
	grupo asociativo mujeres emprendedoras	0,45	0,45	0,55	0,11	7,00	**0,77**
	karen oliveros	0,45	0,45	0,55	0,11	7	0,77
						TOTAL	**3,08**

TOTAL	**3,08**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**3,08**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,3	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.42, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	**M3**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
5,3	LUIS ERNESTO ALARCON	0,40	0,40	0,42	0,07	7,00	**0,49**
		0,40	0,40	0,42	0,07	7,00	**0,49**
		0,40	0,40	0,42	0,07	7,00	**0,49**
		0,40	0,40	0,42	0,07	7	0,49
						TOTAL	**1,96**

TOTAL	**1,96**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**1,96**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 Mpa E= 0.08. INCLUYE ELABORACIÓN DE PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (UND)
5,4	LUIS ERNESTO ALARCON	4,45	2,45		10,90	1,00	**10,90**
		4,45	2,45		10,90	1,00	**10,90**
		4,45	2,45		10,9	1,00	**10,90**
		4,45	2,45		10,9	1	10,90
						TOTAL	**43,60**

TOTAL	**43,60**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**43,60**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
¡Cuida tu naturaleza!	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,8	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 3/8 FY 60,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA).	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	PESO	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
5,8	ernesto	1,65		0,56	0,92	28,00	**25,87**
	camilo	1,65		0,56	0,92	28,00	**25,87**
	grupo asociativo mujeres emprendedoras	1,65		0,56	0,92	28,00	**25,87**
	karen oliveros	1,65		0,56	0,924	28	25,87
						TOTAL	**103,48**

TOTAL	**103,48**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**103,48**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR NEGRO 40 X 20 DE 1,1 MM Y ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS, CON CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE ZINC.**	
5,9	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJES DIAMETRO 1/4 FY 37,000 PSI PARA COLUMNETAS.(INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA ARMADURA DE LA COLUMNETA) FLEJES CADA 15 CM	**KG**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	PESO (KG)	TOTAL(KG)	CANTIDAD	TOTAL (KG)
5,9	ernesto	0,66		0,25	0,165	84,00	**13,86**
	camilo	0,66		0,25	0,165	84,00	**13,86**
	grupo asociativo mujeres emprendedoras	0,66		0,25	0,165	84,00	**13,86**
	karen oliveros	0,66		0,25	0,165	84,00	**13,86**
						TOTAL	**55,44**

TOTAL	**55,44**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**55,44**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) COMPOSTERAS DE RESIDUOS EN LADRILLO MACIZO, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE CERRIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DÍAMETRO X 1,9 MM, CORREAS EN PERFIL CERRADO**	
5,13	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	**VIAJE**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (VIAJE)
5,13	TRANSPORTE MULAR ERNESTO					40,00	**40,00**
	TRANSPORTE MULAR ASOCIASIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS					40,00	**40,00**
							0,00
						TOTAL	**80,00**

TOTAL	**80,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**80,00**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**		**FECHA DE REINICIO 1:** **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL:	$ 515.733.326,54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL:	$ 515.733.326,54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO:	$ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) BIODIGESTORES ANAÉROBIOS DE DOBLE CAPA DE FLUJO CONTINUO CON CUBIERTA EN PLÁSTICO AGOLENE CALIBRE 6 RESISTENTE A RAYOS UV CON ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN TUBO PVC 1/2" PRESIÓN**	
6,1	TRANSPORTE ANIMAL DE MATERIALES	**Viaje**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M3)
6,1							**0,00**
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,00**

TOTAL	**0,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**-**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA	**FECHA DE REINICIO 1: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN**
		FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
		FECHA DE REINICIO 2: N/A	
		FECHA DE SUSPENSION 3: N/A	**FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1**
		FECHA DE REINICIO 3: N/A	
		FECHA DE SUSPENSION 4: N/A	**27/03/2026**
		FECHA DE REINICIO 4: N/A	
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO: $ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,1	**ARREGLO DE HUMEDADES Y MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO Nota: La Corproación aporta el vinilo**	
7.1.4	MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO Nota: La Corporación aporta la pintura	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
7.1.4	MURO FACHADA	9,60		3,6	34,56	1,00	**34,56**
	DESCONTAR VENTANA	-0,54		1,58	-0,85	4,00	**-3,40**
	MURO FACHADA	19,05		2,53	48,20	1,00	**48,20**
	DESCONTAR VENTANA	-1,34		1,11	-1,49	1,00	**-1,49**
	DESCONTAR VENTANA	-0,98		1,57	-1,54	1,00	**-1,54**
	DESCUENTO PUERTA	-2,13		1,9	-4,05	1,00	**-4,05**
	DESCUENTO VENTANA	-2,34		0,55	-1,29	1,00	**-1,29**
	DESCUENTO VENTANA	-2,40		1,58	-3,79	2,00	**-7,58**
	MURO LATERAL	5,10		2,53	12,90	1,00	**12,90**
	PASILLO	18,90		2,53	47,82	1,00	**47,82**
	DESCUENTO PUERTA	-1,20		2,14	-2,57	1,00	**-2,57**
	DESCUENTO PUERTA	-1,51		2,14	-3,23	1,00	**-3,23**
	DESCUENTOS COLUMNETAS MADERA	-0,20		2,17	-0,43	3,00	**-1,29**
	DESCUENTO PUERTA	-0,90		2,14	-1,93	1,00	**-1,93**
	DESCUENTO PUERTA	-1,19		2,14	-2,55	1,00	**-2,55**
	DESCUENTO PUERTA	-1,36		2,14	-2,91	1,00	**-2,91**
	MURO PASILLO	6,80		5,4	36,72	1,00	**36,72**
	DESCUENTO PUERTA	-0,85		2,14	-1,82	1,00	**-1,82**
	DESCUENTO PUERTA	-0,60		2,14	-1,28	1,00	**-1,28**
	DESCUENTO PUERTA	-0,65		2,14	-1,39	1,00	**-1,39**
	DESCUENTO COLIMNETA MADERA	-0,20		2,17	-0,43	2,00	**-0,86**
	DESCUENTO PUERTA	-0,90		2,14	-1,93	1,00	**-1,93**
	AUDITORIO ENTRADA PRINCIPAL	8,95		2,53	22,64	1,00	**22,64**
	DESCUENTO VENTANA	-2,40		1,58	-3,79	2,00	**-7,58**
	AUDITORIO ENTRADA PRINCIPAL	5,00		2,53	12,65	2,00	**25,30**
	AUDITORIO ENTRADA PRINCIPAL	8,95		2,53	22,64	1,00	**22,64**
	DESCONTAR PUERTA	-1,20		2,14	-2,57	1,00	**-2,57**
	DESCONTAR PUERTA	-1,35		2,14	-2,89	1,00	**-2,89**
	DESCUENTO COLUMNETA MADERA	-0,20		2,17	-0,43	2,00	**-0,86**
	DESCUENTO VENTANA	-0,70		2,12	-1,48	1,00	**-1,48**
	CUANRTO ENTRE AUDITORIO Y ENTRADA PRINCIAPL	8,26		2,53	20,90	1,00	**20,90**
	DESCUENTO VENTANA	-0,54		2,38	-1,29	1,00	**-1,29**
	DESCUENTO PUERTA	-0,70		2,12	-1,48	2,00	**-2,96**
	ENTRADA PRINCIPAL	18,26		2,53	46,20	1,00	**46,20**
	DESCUENTO PUERTA	-1,50		2,14	-3,21	1,00	**-3,21**
	DESCUENTO PUERTA	-1,90		2,14	-4,07	1,00	**-4,07**
	DESCUENTO VENTANA	-1,02		1,58	-1,61	1,00	**-1,61**
	DESCUENTO PUERTA	-0,70		2,12	-1,48	1,00	**-1,48**
	AUDITORIO 2 REPTILES	29,26		2,53	74,03	2,00	**148,06**
	DESCUENTO PUERTA	-1,18		2,14	-2,53	1,00	**-2,53**
	DESCUENTO PUERTA	-1,40		2,14	-3,00	2,00	**-6,00**
	DESCUENTO PUERTA	-0,80		2,14	-1,71	1,00	**-1,71**
	DESCUENTO VENTANA	-1,35		1,2	-1,62	1,00	**-1,62**
	AUDITORIO 2 REPTILES	3,50		2,83	9,91	2,00	**19,82**
	DESCUENTO PUERTA	-0,68		2,14	-1,46	2,00	**-2,92**
	CUARTO ASEO	10,74		2,53	27,17	1,00	**27,17**
	DESCUENTO VENTANA	-1,33		1,11	-1,48	1,00	**-1,48**
	DESCUENTO PUERTA	-1,22		2,14	-2,61	1,00	**-2,61**
	CUARTO ASEO	5,74		2,53	14,52	2,00	**29,04**
	DESCUENTO PUERTA	-0,88		2,14	-1,88	1,00	**-1,88**
	CUARTO ASEO	5,00		4,28	21,40	1,00	**21,40**
	DORMITORIO 1	12,15		3,6	43,74	1,00	**43,74**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
	DESCUENTO PUERTA	-0,85		2,14	-1,82	1,00	**-1,82**
	DESCUENTO PUERTA	-0,53		1,6	-0,85	2,00	**-1,70**
	DORMITORIO 1	6,29		2,53	15,91	1,00	**15,91**
	DORMITORIO 1	5,40		1,8	9,72	1,00	**9,72**
	DORMITORIO 2	8,94		2,53	22,62	1,00	**22,62**
	DORMITORIO 3	4,84		3,6	17,42	1,00	**17,42**
	DESCONTAR VENTANA	-0,55		1,58	-0,87	2,00	**-1,74**
	DORMITORIO 3	12,84		3,6	46,22	1,00	**46,22**
	DESCUENTO VENTANA	-1,30		1,45	-1,89	1,00	**-1,89**
	DESCUENTO PUERTA	-0,94		2,14	-2,01	1,00	**-2,01**
	DORMITORIO 3	8,35		2,53	21,13	1,00	**21,13**
	DORMITORIO 3	2,32		1,45	3,36	1,00	**3,36**
	DORMITORIO 3	0,50		2,32	1,16	1,00	**1,16**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	5,40		4,6	24,84	1,00	**24,84**
	DESCUENTO PUERTA	-0,85		2,14	-1,82	1,00	**-1,82**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	5,75		3,35	19,26	1,00	**19,26**
	DESCUENTO VENTANA	-1,32		1,59	-2,10	1,00	**-2,10**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	6,36		3,45	21,94	1,00	**21,94**
	DESCUENTO VENTANA	-1,23		1,45	-1,78	1,00	**-1,78**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	10,55		3,45	36,40	2,00	**72,80**
	DESCUENTO VENTANA	-1,32		1,59	-2,10	1,00	**-2,10**
	DESCUENTO COLUMNETA MADERA	-0,30		2,7	-0,81	1,00	**-0,81**
	DESCUENTO VENTANA	-0,53		1,59	-0,84	1,00	**-0,84**
	PASILLO EXTERIOR HABITACION	10,55		1,25	13,19	1,00	**13,19**
						TOTAL	**786,21**







TOTAL	786,21
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	786,21





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1:** **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,2	**ENCHAPES Y PISOS**	
7.2.1	GUARDAESCOBA EN GRES O CERÁMICA	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M3)	CANTIDAD	TOTAL (ML)
7.2.1					0,00	0,00	**0,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						TOTAL	**0,00**

TOTAL	**0,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**-**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**		**FECHA DE INICIO:**30/12/2024 **FECHA DE SUSPENSION 1:**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**		**FECHA DE REINICIO 1:** **FECHA DE SUSPENSION 2:** **FECHA DE REINICIO 2:** **FECHA DE SUSPENSION 3:** **FECHA DE REINICIO 3:** **FECHA DE SUSPENSION 4:** **FECHA DE REINICIO 4:**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL:	$ 515.733.326,54	**CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	VALOR TOTAL:	$ 515.733.326,54	**ADICIÓN EN PLAZO:**	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	0%	**CUATRO (4) MESES**	**REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**
	VALOR ANTICIPO:	$ -		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,2	**ENCHAPES Y PISOS**	
7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA TIPO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL (M2)
7.2.2		2	1,70		3,40	1,00	**3,40**
		2,00	0,95		1,90	1,00	**1,90**
		2,00	1,63		3,26	1,00	**3,26**
		1,80	1,05		1,89	1,00	**1,89**
		2,65	1,10		2,92	1,00	**2,92**
		2,60	1,10		2,86	1,00	**2,86**
		2,60	2,00		5,20	1,00	**5,20**
							0,00
						TOTAL	**21,43**

TOTAL	**21,43**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**21,43**



OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,3	**CARPINTERIA EN MADERA**	
7.3.2	APLICACIÓN DE PINTURA PARA PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE LIJADA Y DISOLVENTE THINNER)	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.3.2	VENTANA FACHADA PRINCIPAL	1,58		0,5300	0,84	10,00	**8,40**
	VENTANA FACHADA PRINCIPAL	2,40		1,58	3,79	4,00	**15,16**
	VENTANA FACHADA PRINCIPAL	2,34		0,54	1,26	2,00	**2,52**
	VENTANA MURO LATERAL	1,58		0,98	1,55	2,00	**3,10**
	VENTANA AUDITORIO 1	1,34		1,11	1,49	2,00	**2,98**
	VENTANA AUDITORIO 2	1,34		1,2	1,61	4,00	**6,44**
	VENTANA DORMITORIO	1,58		1,32	2,09	4,00	**8,36**
	VENTANA DORMITORIO	1,46		1,32	1,93	4,00	**7,72**
	PUERTA PRINCIPAL	1,90		2,14	4,07	2,00	**8,14**
	PUERTA ENTRDA AUDITORIO	1,50		2,14	3,21	2,00	**6,42**
	PUERTA BAÑO	0,68		2,14	1,46	4,00	**5,84**
	PUERTA AUDITORIO	1,18		2,14	2,53	4,00	**10,12**
	PUERTA AUDITORIO	1,20		2,14	2,57	2,00	**5,14**
	PUERTA BAÑO 1	0,84		2,14	1,8	2,00	**3,60**
	PUERTA BAÑO 2	0,60		2,14	1,28	4,00	**5,12**
	PUERTA ASEO	0,88		2,14	1,88	4,00	**7,52**
	PUERTA HABITACION	0,87		2,14	1,86	2,00	**3,72**
	PUERTA HABITACION	1,23		2,14	2,63	2,00	**5,26**
	PUERTA HABITACION	1,43		2,14	3,06	4,00	**12,24**
	PUERTA HABITACION	0,72		2,14	1,54	4,00	**6,16**
						TOTAL	**133,96**

TOTAL	**133,96**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**133,96**





OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA

ACTA MODIFICATORIA 1 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA)

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**CONTRATO No.114 DE 2026**	**FECHA DE INICIO:** 22/01/2026 **FECHA DE SUSPENSION 1: N/A**	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025**
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL COMO ESTRATEGIA DE RECONVERSION DE SECTORES PRODUCTIVOS A LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL PREDIO LA COLONIA**	**FECHA DE REINICIO 1: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 2: N/A** **FECHA DE REINICIO 2: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 3: N/A** **FECHA DE REINICIO 3: N/A** **FECHA DE SUSPENSION 4: N/A** **FECHA DE REINICIO 4: N/A**	**REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN** **FECHA ACTA MODIFICATORIA No. 1** **27/03/2026**
	VALOR INICIAL: $ 515.733.326,54 VALOR TOTAL: $ 515.733.326,54 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% VALOR ANTICIPO: $ -	**CUATRO (4) MESES** **ADICIÓN EN PLAZO:** **CUATRO (4) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO** **REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES LA COLONIA**	
7,4	**CARPINTERIA EN MADERA**	
7.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE EVACUACIÓN DE LODOS DEL SISTEMA SÉPTICO A CIELO ABIERTO	**M2**

ITEM	DESCRIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	TOTAL(M2)	CANTIDAD	TOTAL
7.4.11							
						TOTAL	**0,00**

TOTAL	**0,00**
ANTERIORES ACTAS	
PRESENTE ACTA	**-**

OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RURAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
INTERVENTORIA
