
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. 005 – DIRAF – GUINF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

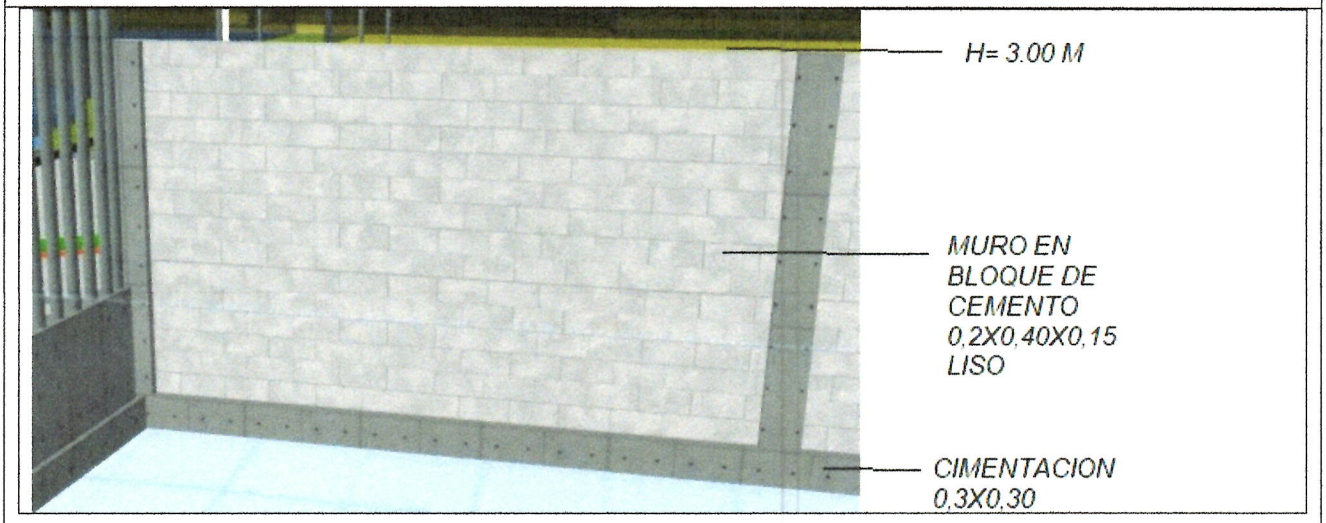

ESTOS TIPOS DE CERRAMIENTO SE DISTRIUBUIRAN ASI EN EL PROYECTO:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA


ACTA No. 005 – DIRAF – GUINF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

C. <u>Sobre ensayos de calidad de concretos y sub base granular,</u>

- El Contratista y la Interventoría visitan el día 02-10-2020 laboratorio en Montería Córdoba, El cual es viabilizado

- El Contratista presenta, PLAN DE CALIDAD, frecuencia de ensayos de CBR, Vigas de MR 40 y cilindros para Concreto de 4000 y 3000 psi, el cual está enmarcado dentro de las normas Invias, y considerando que el concreto se prepara en sitio.

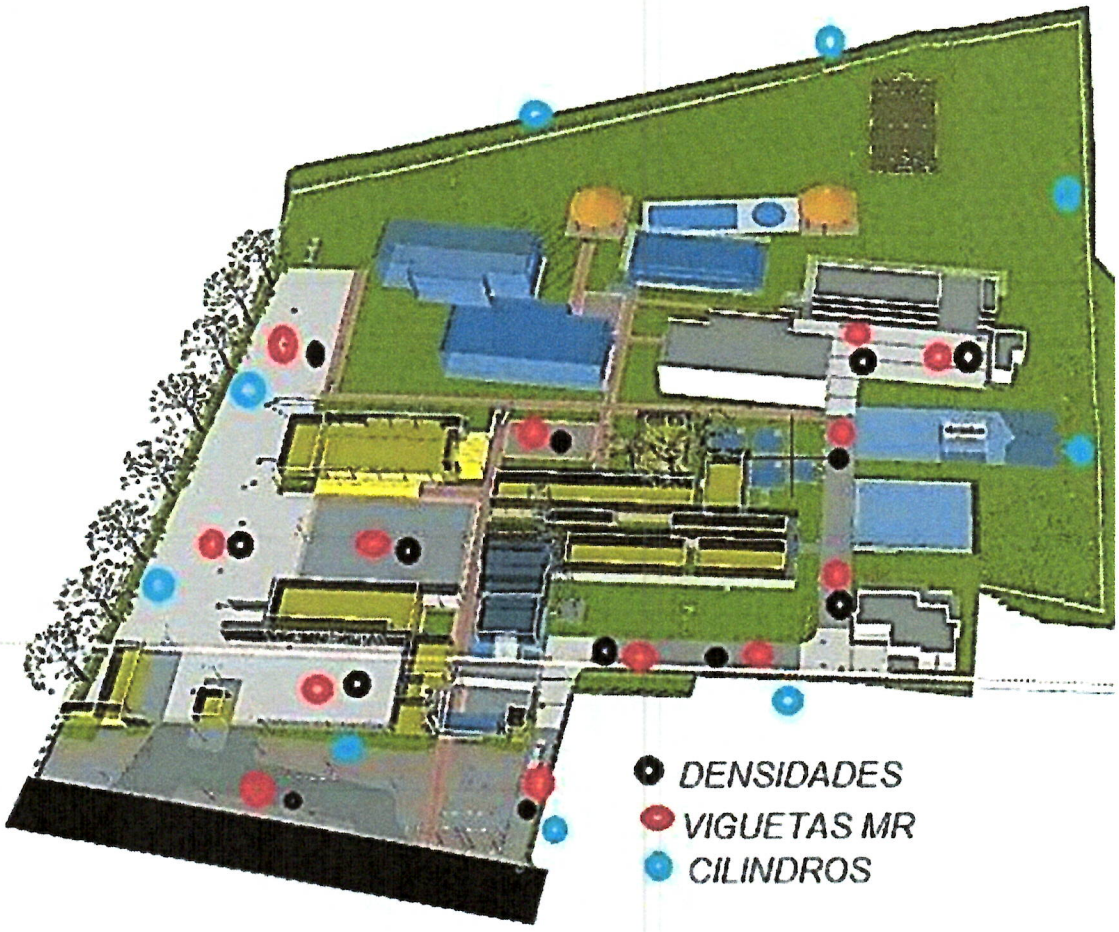

- La Interventoría le solicita al Contratista disponer del almacenamiento de suficiente agua, para desarrollar la actividad de concretos hechos en sitio.
- Así mismo la Interventoría le recalca al contratista que debe garantizar el fraguado de estos concretos.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. 005 – DIRAF – GUINF


OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

- El Contratista presentará a la Interventoría plano de despiece del corte de la zona de parqueadero y vías, el día 21-10-2020. Este detalle considerara especificaron de la junta flexible (corte a H/3 de la sección de la placa de pavimento rígido, limpieza con Poblete del corte, inyección de junta en plástica de sello, aplicación de sikaflex.
- La Interventoría solicita al Contratista que la actividad de Parqueadero, vías, cerramiento perimetral tengan un acompañamiento oportuno de control topográfico.
- Hasta la fecha del presente Comité de obra, el Contratista no ha entregado diseño de mezclas, ni caracterización de sub-base granular-

.

D. <u>Sobre el ítem de redes eléctricas de media tensión.</u>

- La DIRAF El Contratista y la Interventoría hacen comité de redes eléctricas el día lunes 19-10-2020

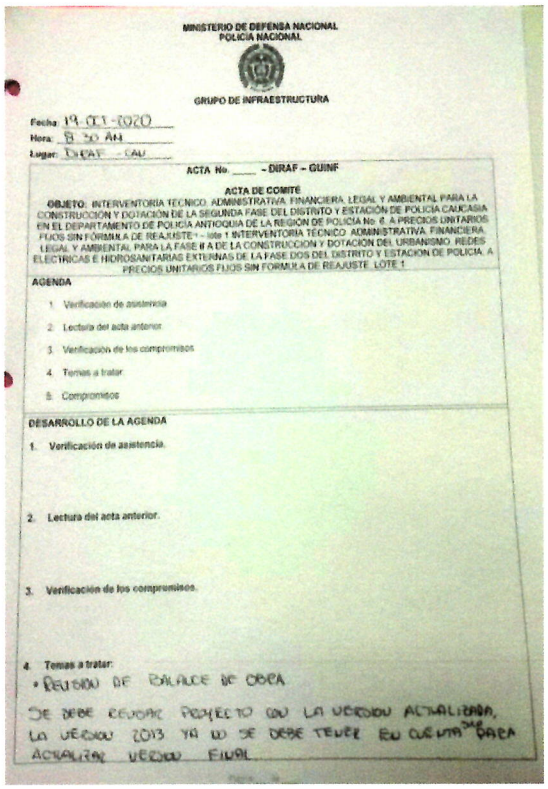
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 19-OCT-2020
Hora: 8:30 AM
Lugar: DIRAF - CAU

ACTA No. ____ – DIRAF – GUINF

ACTA DE COMITÉ

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA DE LA REGION DE POLICIA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1


AGENDA

1. Verificación de asistencia
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar
5. Compromisos

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación de asistencia.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar:
- REVISIÓN DE BALANCE DE OBRA

SE DEBE REVISAR PERFECTO QUE LA VERSION ACTUALIZADA, LA VERSION 2013 YA NO SE DEBE TENER EN CUENTA PARA ACTUALIZAR VERSION FINAL

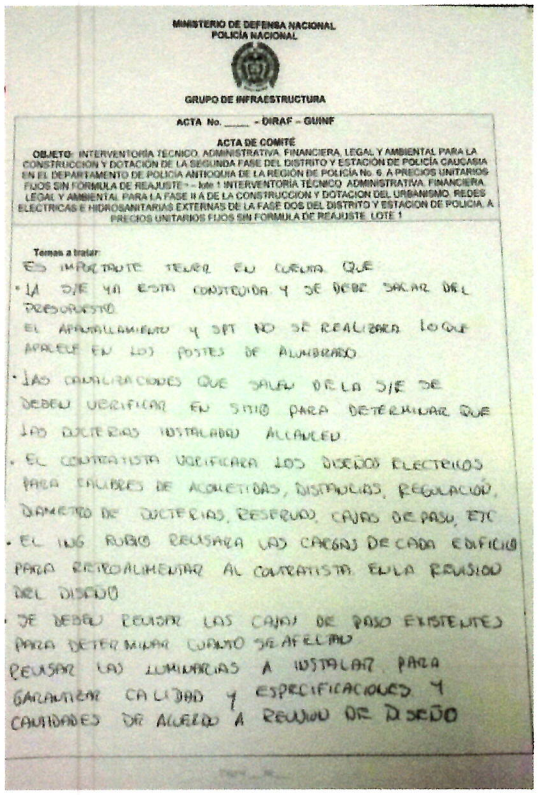
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. ____ – DIRAF – GUINF

ACTA DE COMITÉ

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA DE LA REGION DE POLICIA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

Temas a tratar:


ES IMPERATIVO TENER EN CUENTA QUE
- LA S/E YA ESTA CONSTRUIDA Y SE DEBE SACAR DEL PRESUPUESTO.
EL APANTALLAMIENTO Y SPT NO SE REALIZARA LO QUE APARECE EN LOS POSTES DE ALUMBRADO.
- LAS CANALIZACIONES QUE SALEN DE LA S/E SE DEBEN VERIFICAR EN SITIO PARA DETERMINAR QUE LAS DUCTERIAS INSTALADAS ALCANCEN.
- EL CONTRATISTA VERIFICARA LOS DISEÑOS ELECTRICOS PARA CAMBIOS DE ACOMETIDAS, DISPAROS, REGULACION, DIAMETRO DE DUCTERIAS, RESERVAS, CAJAS DE PASO, ETC
- EL ING RUBIO REVISARA LAS CARGAS DE CADA EDIFICIO PARA RETROALIMENTAR AL CONTRATISTA EN LA REVISION DEL DISEÑO
- SE DEBEN REVISAR LAS CAJAS DE PASO EXISTENTES PARA DETERMINAR CUANTO SE AFECTARA
REVISAR LAS LUMINARIAS A INSTALAR PARA GARANTIZAR CALIDAD Y ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE ACUERDO A REVISION DE DISEÑO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. 005 – DIRAF – GUINF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

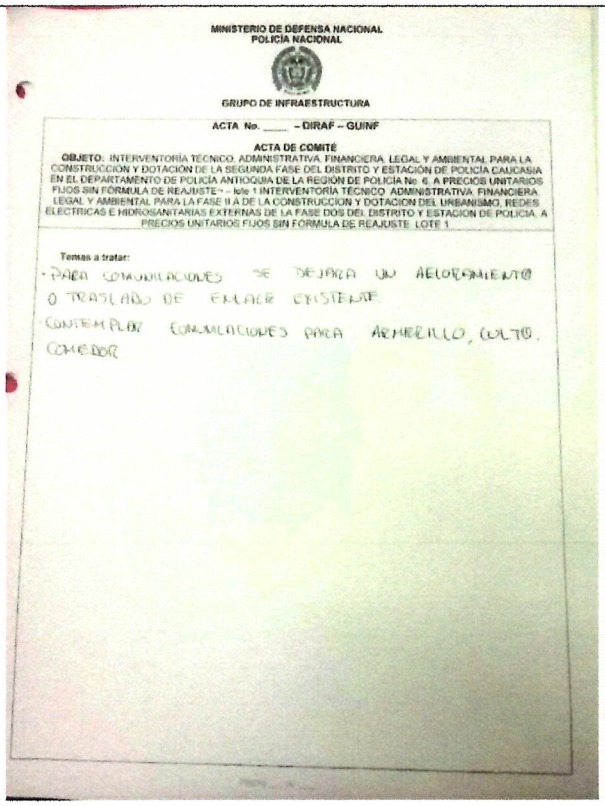

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA


ACTA No. ____ – DIRAF – GUINF

ACTA DE COMITÉ

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

Temas a tratar:

- PARA CANALIZACIONES SE DEJARA UN ALOJAMIENTO O TRASLADO DE EMLACE EXISTENTE
CONTEMPLAR CANALIZACIONES PARA ARMERILLO, COCTO. COMEDOR

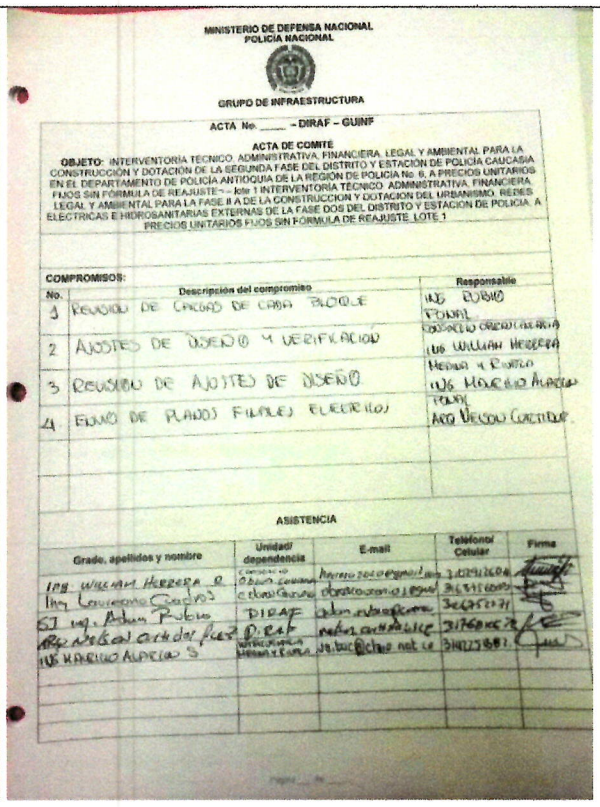

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. ____ – DIRAF – GUINF

ACTA DE COMITÉ

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

COMPROMISOS:

No.	Descripción del compromiso	Responsable
1	REVISIÓN DE CALIDAD DE CADA BLOQUE	ING RUBIO
2	AJUSTES DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN	ING WILLIAM HERRERA
3	REVISIÓN DE AJUSTES DE DISEÑO	ING MAURICIO ALARCÓN
4	ENVIO DE PLANOS FINALES ELECTRICOS	ARQ VELASCO CONSTRUR

ASISTENCIA

Grado, apellidos y nombre	Unidad/ dependencia	E-mail	Teléfono/ Celular	Firma
ING WILLIAM HERRERA R				
Ing LAURENTINO SIERRA				
SI ing. Adam Rubio	DIRAF			
ING MAURICIO ALARCÓN S				

Se establece que:

- Los ítems de la sub-estación no se deben relacionar en el presupuesto.
- No se relacionarán el apantallamiento de la portería.
- Se debe verificar las canalizaciones a cada edificio.
- Se debe revisar los calibres de los cables de acometidas a cada edificio y además verificar las cargas diseñadas para los mismos.
- Se debe verificar en sitio el estado de la subestación y sus equipos instalados.
- Se debe programar mesa de trabajo con el Contratista del lote 2 Edificación, para determinar carga mínima por edificio y alcance de llegada de la acometida de los mismos.
- Se debe verificar el diseño para las acometidas eléctricas de los posibles equipos hidroneumáticos que se lleguen a instalar

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. 005 – DIRAF – GUINF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

E. <u>Sobre tanques de almacenamiento.</u>

- Se hace replanteo topográfico de los tanques y se evidencia que no es afectado por ningún árbol próximo, por lo tanto, se puede dar inicio a su actividad.
- El Contratista presentara detalle de pasa muros, rebose, cárcamo de limpieza, escaleras, escotilla, flotador de acceso, etc.) para su revisión e implementación. Y que para tal caso se solicita evaluara la posibilidad de unir las paredes de los tanques y construir un cuarto de máquinas sobre una de las placas de los tanques, para mejor funcionamiento y mantenimiento.

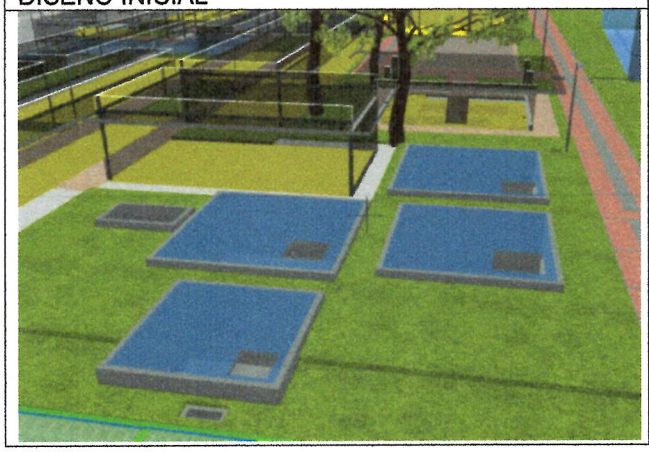DISEÑO INICIAL	MODIFICACION PLANTEADA
	

- El A.P.U del concreto de 4000 psi para tanques debe incluir, formaleta metálica, estructura de alineación y parales, distanciadores y desmoldante.
- El Contratista manifiesta que el diseño de la red contra incendio es muy escueto y no da claridad sobre el alcance del mismo. Por lo tanto, se debe definir el alcance que tendrá el tanque y el equipo de bombeo de la red contra incendio. Por lo que se debe programar una mesa de trabajo para establecer una aproximación al diseño
- Sobre los equipos:
  **EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA LLUVIA TRATADA, COMPUESTO POR DOS BOMBAS TRIFASICAS DE 2HP, CDT DE 34 MCA, CAUDAL 2.21, TANQUE HIDROACUMULADOR DE 200 LTS, TABLERO, INCLUYE ACCESORIOS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA DE INSTALACION*

  ***EQUIPO DE BOMBEO DE RED CONTRAINCENDIOS, COMPUESTO POR UNA BOMBAS PRINCIPAL TRIFASICA DE 81HP, CDT DE 83 MCA, CAUDAL 1000 GPM, UNA BOMBA JOCKEY TRIFASICA DE 8HP, CDT DE 83 MCA, CAUDAL 100 GPM, TABLERO, INCLUYE ACCESORIOS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA DE INSTALACION*

  Se deben relacionar en el balance por el ítem XXIII EQUIPOS, solo cuando ya existe una revisión por parte del especialista para definir su especificación y alcance

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. 005 – DIRAF – GUINF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

F. La Interventoría solicita al Contratista reforzar de manera prioritaria, los siguientes frentes de trabajo:

CERRAMIENTO PERIMETRAL-	• Ajustar diseño del cerramiento, considerando *viga de cimentación, **muro en mampostería en bloque de cemento, ***dados en concreto para parales, **** pie de amigos al cerramiento*****sub-base mejoramientos de terreno. Se debe establecer los A.P.U para estas actividades NO previstas y presentar un detalle constructivo para revisión y visto bueno de la interventoría y Supervisión del Proyecto
PARQUEADERO ZONA ALOJAMIENTOS EXISTENTES	• Se debe considerar el ajuste del nivel de las cajas eléctricas y de redes hidrosanitarias que afectan esta zona. • Se debe considerar que estas obras corresponden a la garantía de la fase 1. • El Contratista debe garantizar el almacenamiento de agua suficiente para hacer concretos en obra • El Contratista debe garantizar el curado del concreto.
TANQUES EN CONCRETO ALMACENAMIENTO AGUA	• El Contratista debe dar inicio a esta actividad una vez se haya definido la propuesta de unir los tanques y manejar un cuarto de maquinas elevado.

G. El Contratista debe tener como parámetro de actuación los TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO, para el alquiler de la maquinaria que utilizara en la ejecución de las actividades de obra. No obstante, lo anterior, el Contratista manifiesta la dificultan para contratar maquinaria de modelos recientes. La Interventoría manifiesta, que, si bien se puede buscar maquinaria con un rango de obsolescencia no superior a los 10 años de diferencia con respecto a lo estipulado, se debe garantizar el óptimo estado del equipo y la idoneidad del operario.

H. La entidad contratante recalca la necesidad de hacer un modificatorio al proyecto, por lo tanto, el Contratista debe dar prioridad a la Estructuración de los Análisis de Precios Unitarios de las Actividades No Prevista.

I. **Sobre aspectos socio-ambientales.**

- La Interventoría le solicita al Contratista agilizar la ubicación de la batería de baños, así como el punto de hidratación de los obreros que vinculara al proyecto.
- Que la hoja de ruta para la vinculación de obreros al proyecto debe ser la siguiente:
  a. Estudio de seguridad hecho por la Policía Nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. 005 – DIRAF – GUINF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

b. Examen de ingreso
c. Vinculación a EPS y ARL y pensiones.
d. Constancia de capacitación de ingreso.
e. Constancia de suministro de dotación

- Todo obrero vinculado al proyecto debe portar carnet a la vista
- Sobre la arborización existente en la estación de policía.
- La Interventoría recalca que se dará prioridad a la integridad de los individuos arbóreos existentes al interior del área de trabajo.
- Así mismo que dentro del paisajismo inherente al diseño del proyecto, se enfatizara en el componente ambiental
- **Mediante oficio M&R- 436 – 031– 2020 La Interventoría, de manera respetuosa, se permite hacer las siguientes precisiones:**
- **1. Según la programación de obra, para la presente semana se tiene la siguiente información: PORCENTAJE GENERAL EJECUTADO 1,00% PORCENTAJE GENERAL PROGRAMADO 5,25% DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO -4,25%**
- **2. Que la curva de programación indica que semanalmente se tiene programado un avance de 5% en promedio. Lo que indica que el punto de inflexión de la curva es de solo ascenso en la producción.**
- **3. Que, de 130 días de plazo contractual, se llevan consumidos 58 días (45%) y restan 72 días, en donde el contratista tiene que ejecutar el 99% del proyecto.**
- **4. Que el Contratista debe considerar que las siguientes actividades que van a generar conflicto con las actividades de obra del Lote 2 (edificación); • Plazoleta exterior • Peatonal Principal interior • Plazoleta frente a oratorio • Plazoleta entre Comedor y Sala de retenidos • Parqueadero sobre zona de acceso vehicular principal**
- **5. Por lo tanto, el Contratista debe armonizar la programación de obra con esta circunstancia y presentar un plan de trabajo para las mismas.**
- **Por lo anteriormente relacionado, la Interventoría considera que el proyecto se encuentra en una situación altamente crítica, que compromete seriamente la posibilidad de ejecutar el 100% de las actividades dentro del plazo establecido contractualmente. Por lo anterior, se conmina al Contratista a generar un panorama de ejecución más optimista y productivo y a la presentación del plan de contingencia antes del próximo 22 de octubre de 2020**

HASTA AQUÍ LOS TEMAS TRATADOS EN EL COMITÉ DE OBRA DEL DIA **21-10-2020==========**.

COMPROMISOS:

No.	Descripción del compromiso	Responsable
1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS para OBRAS NO PREVISTAS	CONTRATISTA
2		CONTRATISTA-INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. 005 – DIRAF – GUINF

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA DE LA REGIÓN DE POLICÍA No. 6, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE¬ – lote 1 INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA FASE II A DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 1

	PROYECCION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	
3	IMPLEMENTACION DE TRES FRENTES DE TRABAJO: * CERRAMIENTO PERIMETRAL (EN PROCESO) *PARQUEADERO ZONA DE ALOJAMIENTOS EXISTENTES* TANQUES EN CONCRETO	CONTRATISTA
4	PLAN DE CONTINGENCIA PARA MEJORAR PRODUCTIVIDAD EN OBRA	CONTRATISTA

ASISTENCIA

Grado, apellidos y nombre	Unidad/ dependencia	E-mail	Teléfono/ Celular	Firma
NELSON ANTONIO CURTIDOR PAEZ	DIRAF	nelson.curtidor1012@correo.policia.gov.co		
LAUREANO	CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	laureanocm@gmail.com		
EVER JOSÉ SALGADO SALGADO	Representante legal-CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109	everjsal2006@yahoo.es		
SANDRO SEGURA	Director Obra-CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109			
ERIKA DEL ROSARIO SANDOVAL CABALLERO	Directora Interventoría MEDINA Y RIVERA	interventoria1@medinayrivera.com.co		
DIEGO HERNANDO ORTIZ ALTURO	Residente Interventoría MEDINA Y RIVERA	diegoalturo@hotmail.com	3108815180	







ANEXO 3: CONTROL DE PERSONAL

BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL Cr. 15A # 121-12
OFICINA 318
Tel PBX: 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

BOYACA
TUNJA- CRA 4 N° 41-40
BARRIO SANTA INES
Tel: (57) (8) 7469988

CHIA
AV. CHILACOS, CRA 15 #17-128
BARRIO RIO FRIO
Fijo: (57) (1) 8852535

MEDINA & RIVERA
INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.S

CONTROL DE PERSONAL EN PROYECTO

CODIGO	FC-CON-03
VERSION No	04
FECHA	30/05/2018

YECTO 436-20 CTO PN DIRAF No 06-6-10076-20 INICIO 24/08/2020 TERMINACION 31/12/2020 PLAZO 129

Mes: Octubre | Periodo: MENSUAL | Asistencia

Datos					Documentación							Sem 1				Sem 2							Sem 3							Sem 4							sema 5							Horas extras
Nombre completo	Fechas Inicio	Fechas Retiro	Cedula	Cargo	Cert. ARL	Afiliación EPS	Cert. AFP	Examen medico	Planilla Pagos	Cert. Entrega EPPs	Inducción	Certificado de alturas (cuando aplique)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
INTERVENTORÍA																																												
o Hernando Ortiz Afturo	31/08/2020		14.249.420	Residente Interventoria	SURA	Sanitas	Protección	27/08/2020		Si	Si	C.R	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK									
n Lallany Simanca Solórzano	19/09/2020		32.376.407	Residente SST	SURA	Coosalud	Porvenir	17/09/2020		Si	Si	Si	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK									
CONTRATISTA - ADMINISTATIVO																																												
dro Segura Sanchez			79.657.546	Direct. De Obra	SURA	Compensar	Porvenir	Pend	Pend	Pend	Pend	Pend	x					x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x									
nia Rafaela Arrieta Madera	28/09/2020		39.289.296	Coord. SST	SURA	Savia Salud	Porvenir	1/10/2020		Si	Si	No	x	x	x		X	X	X	X	X	X			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x									
el Hernando Julio			15.621.423	Topografo	SURA	Medimas	Colfondos	No		No		NA	OK							OK							OK																		
cis Yamir Mosquera Pajaro			1.033.377.068	Topografo	SURA	Nueva EPS	Porvenir	No		No		NA	OK							OK																								
CONTRATISTA - OPERATIVO																																												
vey Camilo Lozano Roman	29/09/2020		1.038.093.260	Ayudante	SURA	Nueva EPS	Protección	28/09/2020		Si	Si	No	X	X	X		X	X	X	X	X	X			OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK									
n Bautista Avila Mercado	29/09/2020		78.110.580	Ayudante	SURA	Medimas	Porvenir	28/09/2020		Si	Si	No	X	X	X		X	X	X	X	X	X			OK	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK	OK									
ario Andres Hernandez Garces	29/09/2020		1.038.125.930	Ayudante	SURA	Savia Salud	Porvenir	28/09/2020		Si	Si	No	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	EC	EC			EC	EC	EC	EC	EC									
n David Guzman Altamiranda	10/10/2020		1.003.358.089	Oficial	SURA	Famisanar	Porvenir	6/10/2020		Si	Si	NA										X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X									
o Javier Bautista Bohorquez	9/10/2020		80.116.115	Oficial	SURA	Salud Total	Porvenir	6/10/2020		Si	Si	NA										X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X									
er Antonio Bolaño Martinez	13/10/2020		1.069.485.479	Oficial	SURA	Nueva EPS	Protección	7/10/2020		Si	Si	NA													X	X	X	X	X			X	X	X	X	X									
o Fernando Bohorquez Alfonso	9/10/2020		16.553.565	Oficial	SURA	Famisanar	Colpensiones	6/10/2020		Si	Si	NA										X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X									
aider Gomez Moreno	9/10/2020		1.003.166.016	Oficial	SURA	Famisanar	Protección	6/10/2020		Si	Si	NA										X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X									
y David Lazaro Vertel	19/10/2020		1.038.116.286	Ayudante	SURA	Nueva EPS	Colfondos	13/10/2020		Si	Si	NA																									X	X	X	X	X					
Augusto Angulo Mesa	19/10/2020		98.652.769	Operador-Retroexcavadora	Positiva	Medimas	Protección		18983900																											X	X	X	X	X					
on Arleis Marquez Julio	21/10/2020		1.038.118.578	Ayudante	SURA	Coosalud	Protección	13/10/2020		Si	Si	NA																										X	X	X						
rico Antonio Garrido Benedetti	21/10/2020		1.149.450.916	Ayudante	SURA	Nueva EPS	Protección	13/10/2020		Si	Si	NA																										X	X	X						
rson Pérez Contreras	21/10/2020		1.038.436.867	Ayudante	SURA	Coosalud	Porvenir	13/10/2020		Si	Si	NA																										X	X	X						

Observaciones

ún colaborador sin documentos de Arl podrá ingresar a la obra, ningún colaborador en estado de embriaguez o bajo sustancias psicotrópica podrá a ingresar a la obra

Criterios

F	Llamado de atención por falta de EPPs
✓	Presente y con EPPs
OK	ok presente con epp y documentos en obra
Pend	Tiene algún pendiente
Au	Ausente
Ec	Enfermedad comun
IL	Incapacidad laboral

ANEXO 4: CORRESPONDENCIA ENVIADA

BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL Cr. 15A # 121-12
OFICINA 318
Tel PBX: 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

BOYACA
TUNJA- CRA 4 N° 41-40
BARRIO SANTA INES
Tel: (57) (8) 7469988

CHIA
AV. CHILACOS, CRA 15 #17-128
BARRIO RIO FRIO
Fijo: (57) (1) 8852535

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	CORRESPONDENCIA ENVIADA	CODIGO	FC-CER-05
		VERSION No	00
		FECHA	5/12/2011

PROYECTO: 436-20

SEDE: CAUCASIA

CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A:	ENVIADO POR:	ASUNTO	ANEXOS	FECHA DE RADICACIÓN	RECIBIDO POR:	OBSERVACIONES
M&R-436-021	29/09/2020	Consorcio Obras Caucasia 109	ERIKA DEL ROSARIO SANDOVAL CABALLERO, Directora Interventoría	CONTRATO PN DIRAF No. 06-6-10076-20./ Requerimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	NO	29/09/2020	Consorcio Obras Caucasia 109, físico en Bogotá, recibido en obra	Primer oficio en requrimientos de documentación en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
M&R-436-026	7/10/2020	Alcaldia Municipal de Caucasia, Secretaría de salud y desarrollo social	CESAR AUGUSTO CARMARGO CAMARGO, Representante Legal	CONTRATO No. 06-3-10082-20. Adopción protocolo de bioseguridad para apertura de obras civiles.	Un (1) folio	07/1072020	Alcaldia Municipal de Caucasia, Secretaría de salud y desarrollo social. Físico en Bogotá, recibido en Caucasia	Oficio en adopción de protocolos de bioseguridad
M&R-436-028	9/10/2020	Consorcio Obras Caucasia 109	ERIKA DEL ROSARIO SANDOVAL CABALLERO, Directora Interventoría	CONTRATO PN DIRAF No. 06-6-10076-20./ Solicitud de documentación faltante radicada en el oficio M&R-436-021, del 29 de septiembre de 2020, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para la implementación en el área de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.	NO	9/10/2020	Consorcio Obras Caucasia 109, físico en Bogotá, recibido en obra	Segundo oficio en requrimientos de documentación en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
M&R-436-030	20/10/2020	Consorcio Obras Caucasia 109	ERIKA DEL ROSARIO SANDOVAL CABALLERO, Directora Interventoría	CONTRATO PN DIRAF No. 06-6-10076-20. Imcumplimiento a requisitos solicitados en los oficios M&R-436-021 y M&R-436-028.	Anexos fotográficos	20/10/2020	Consorcio Obras Caucasia 109, físico en Bogotá, recibido en obra	Tercer oficio en requrimientos de documentación en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

ANEXO 5: CORRESPONDENCIA RECIBIDA

BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL Cr. 15A # 121-12
OFICINA 318
Tel PBX: 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

BOYACA
TUNJA- CRA 4 N° 41-40
BARRIO SANTA INES
Tel: (57) (8) 7469988

CHIA
AV. CHILACOS, CRA 15 #17-128
BARRIO RIO FRIO
Fijo: (57) (1) 8852535

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CODIGO	FC-CER-02
		VERSION No	01
		FECHA	19/12/2012

PROYECTO: 436-20 SEDE: **CAUCASIA**

FECHA DE RECIBIDO	No CONSECUTIVO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	ASUNTO	RECIBIDO POR	ANEXOS	ENTREGADO A:	REQUIERE RESPUESTA	OBSERVACIONES
21/10/2020	**COC109-PRY-003**	SANDRO SEGURA SÁNCHEZ, Ing. Director de Proyecto	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S	Respuesta a oficio M&R-436-030 del 20 de octubre de 2020. Implementación PMA.	**ERIKA DEL ROSARIO SANDOVAL CABALLERO, Directora Interventoría**	Con anexo, evidencias fotográficas			Se anexa lista de chequeo

ANEXO 6: SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL Cr. 15A # 121-12
OFICINA 318
Tel PBX: 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

BOYACA
TUNJA- CRA 4 N° 41-40
BARRIO SANTA INES
Tel: (57) (8) 7469988

CHIA
AV. CHILACOS, CRA 15 #17-128
BARRIO RIO FRIO
Fijo: (57) (1) 8852535

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900669602	0	GRUPO MEDIR ING SAS.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICNCIPAL	Cr 15 a N121 12 ofi.318	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6203317	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	766380597	9411522154	E	2020/10/02	2020/10/08	BANCOLOMBIA	6	$24,962,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRICNCIPAL (20 Afiliados)																							$46,858,750	$7,736,400			$47,736,553	$1,984,200			$46,858,750	$1,874,400			$47,736,553	$2,399,200		$0	$0		$13,994,200
Centro de Trabajo: 0,522 (6 Afiliados)																							$14,350,000	$2,386,000			$14,350,000	$574,000			$14,350,000	$574,000			$14,350,000	$75,200		$0	$0		$3,609,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$14,350,000	$2,386,000			$14,350,000	$574,000			$14,350,000	$574,000			$14,350,000	$75,200		$0	$0		$3,609,200
1	CC	1003335912	DUARTE KEVIN																		231001	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0	Si	$269,800
2	CC	1033781707	PAVAS PAULA																		230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-11	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,200
3	CC	1000319898	PRIETO ALISON																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
4	CC	52979880	RODRIGUEZ ALCIRA																		25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,276,100
5	CC	79155612	VARELA JORGE																		25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0	Si	$1,020,900
6	CC	79945531	ZAPATA CESAR																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: 6,96 (14 Afiliados)																							$32,508,750	$5,350,400			$33,386,553	$1,410,200			$32,508,750	$1,300,400			$33,386,553	$2,324,000		$0	$0		$10,385,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																							$32,508,750	$5,350,400			$33,386,553	$1,410,200			$32,508,750	$1,300,400			$33,386,553	$2,324,000		$0	$0		$10,385,000
7	CC	1019120653	CAÑAS JUAN																			0	$0	$0	EPS002	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$61,100	0	$0	$0	No	$170,900
8	CC	74377935	CARDENAS EDGAR																		25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,598,000
9	CC	1109413091	DEVIA FREDY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	1019020109	HERNANDEZ RAY																		230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
11	CC	1057598525	LOPEZ DIEGO																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
12	CC	1049644495	MARTINEZ YULAND																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
13	CC	79370325	MENDEZ CARLOS																		230301	30	$1,608,750	$257,400	EPS008	30	$1,608,750	$64,400	CCF24	30	$1,608,750	$64,400	14-11	30	$1,608,750	$112,000	30	$0	$0	Si	$498,200
14	CC	26948135	MORELO LENYS	X																	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
15	CC	63334656	PEREZ CLAUDIA																		230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS017	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
16	CC	1049621170	RODRIGUEZ MARLON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
17	CC	1032427580	ROZO GABRIEL																		25-14	30	$3,900,000	$663,000	EPS005	30	$3,900,000	$156,000	CCF24	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	$271,500	30	$0	$0	Si	$1,246,500
18	CC	53071669	RUBIO DEXY																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
19	CC	1020791469	RUNSERIA ANDREA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
20	CC	32785895	SANDOVAL ERIKA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MAGDALENA (5 Afiliados)																							$16,150,000	$2,681,600			$16,150,000	$646,000			$16,150,000	$646,000			$16,150,000	$1,124,200		$0	$0		$5,097,800
Centro de Trabajo: 6,96 (5 Afiliados)																							$16,150,000	$2,681,600			$16,150,000	$646,000			$16,150,000	$646,000			$16,150,000	$1,124,200		$0	$0		$5,097,800
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (5 Afiliados)																							$16,150,000	$2,681,600			$16,150,000	$646,000			$16,150,000	$646,000			$16,150,000	$1,124,200		$0	$0		$5,097,800
21	CC	84457490	CAMPO DIMAS																		25-14	30	$3,750,000	$637,600	EPS005	30	$3,750,000	$150,000	CCF33	30	$3,750,000	$150,000	14-11	30	$3,750,000	$261,000	30	$0	$0	Si	$1,198,600
22	CC	72052177	DE LA HOZ LAZARO																		230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF33	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
23	CC	84451832	DIAZ WALTER																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF33	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
24	CC	1051887671	RAMIREZ YISEL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF33	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
25	CC	57305302	SALAS CARMEN																		230201	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF33	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOLIMA (1 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$928,800

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900669602	0	GRUPO MEDIR ING SAS.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICNCIPAL	Cr 15 a N121 12 ofi.318	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6203317	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	766380597	9411522154	E	2020/10/02	2020/10/08	BANCOLOMBIA	6	$24,962,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$13,494,300	$0	$0	$13,494,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$176,000	$0	$0	$176,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$6,388,200	$0	$0	$6,388,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,192,100	$0	$0	$4,192,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,738,000	$0	$0	$2,738,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$4,823,500	$0	$0	$4,823,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$4,823,500	$0	$0	$4,823,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$3,267,500	$0	$0	$3,267,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	$646,000	$0	$0	$646,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$627,100	$0	$0	$627,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	19	$1,874,400	$0	$0	$1,874,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	$3,377,300	$0	$0	$3,377,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,400	$0	$0	$64,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$20,400	$0	$0	$20,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$800,000	$0	$0	$800,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$412,000	$0	$0	$412,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$264,000	$0	$0	$264,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$165,800	$0	$0	$165,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,616,000	$0	$0	$1,616,000
TOTAL				32	$24,962,600	$0	$0	$24,962,600

2020/10/09 11:45 AM

901







ANEXO 7: BITÁCORA DE OBRA

BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL Cr. 15A # 121-12
OFICINA 318
Tel PBX: 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

BOYACA
TUNJA- CRA 4 N° 41-40
BARRIO SANTA INES
Tel: (57) (8) 7469988

CHIA
AV. CHILACOS, CRA 15 #17-128
BARRIO RIO FRIO
Fijo: (57) (1) 8852535

4

28-Sep-2020 / El contratista vincula a los Profesional en seguridad / operacional SST
La interventoría le solicita al contratista dar prioridad a dejar operativo
al menos 3 frentes de trabajo (CERRAMIENTO PERIMETRAL / TANQUES y
PARQUEADERO y APU en sitio de alojamientos. Aun NO HAY personal
operativo en obra. A LA FECHA SE ADELANTA PARCIAL DE DEMANDA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR. LAS PLANEACIONES INICIALES / NO HAN SIDO APROBADAS AL NO HABER LA INVERSIÓN DE CONTRATO
CONSORCIO OBRAS CAUCASIA 109 MEDINA y RIVERA Interventoría

ING SANDRA [illegible] - director cdg diego h ortiz alfaro

29-Sep-2020 / Segunda FASE - LOTE 1 - CAUCASIA - URBANISMO
Estado del Tiempo: AM Seminublado / PM - Seminublado
Personal en Obra: Director Obra 1 / Profesional Seg Ind 1 / Operativo 3
Interventoría - 2 (No hay maquinaria en obra)
ACTIVIDADES: Se adecua para oficinas provisional, campamento existente
de los contratistas / Se despeja planta de contrapiso de campamento de contratista que se adecuara como bodegas y campamento definitivo
• Se visita planta de suministro de arena y triturado para elaboración de concreto en obra. SE RECOGEN MUESTRAS PARA LLEVAR A LABORATORIO
MEDINA y RIVERA - Interventoría

SANDRA - DIRECTOR CONSTRUCCION cdg. diego h. ortiz alfaro

30-Sep-2020 / Segunda FASE LOTE 1 - URBANISMO
Estado del Tiempo: Nublado en la madrugada AM Seminublado / PM Seminublado
Personal en Obra: Director 1 / Prof Seg Ind 1 / Operativos 3 / Interventoría 2
EQUIPO EN OBRA: Ninguno MATERIALES: Ninguno
ACTIVIDADES: Se trabaja en construcción de cerramiento norte de obra, sobre planta de contrapiso existente.
• SE HACE COMITE DE OBRA (Virtual)
MEDINA y RIVERA - Interventoría

SANDRA - DIRECTOR CONSTRUCCION cdg diego h ortiz alfaro

01 Octubre/20 / Segunda FASE - LOTE 1 - URBANISMO
Estado del tiempo: Nublado en la madrugada AM Seminublado PM Seminublado
Personal en Obra: Director 1 / SISO 1 / Operativo 3 / Interventoría 2
Equipo en obra: Ninguno / MATERIALES: ninguno

ACTIVIDADES La interventoria viabiliza instalacion de camaras, se inicia actividad de instalacion con 2 operarios. Se aclara que esta actividad es responsabilidad de la interventoria El contratista continua con la construccion del campamento La interventoria le recuerda al contratista la necesidad prioritaria de iniciar la curacion para almacenar agua, para las actividades de concreto hecho en obra

SANDRA ESCAMILLA SANCHEZ
DIRECTOR COD 109

MEDINA y RIVERA - Interventoria
arq. diego h. ortiz alfaro

02 Octubre/2020 / SEGUNDA FASE - LOTE 1 - URBANISMO

Estado del tiempo: llovio en la madrugada AM Seminublado/PM Nublado
Personal en obra: Director 1 / Sso 1 / Operativos 3 / Interventoria 2 / Camaras 2

ACTIVIDADES • La interventoria y el contratista llevan materiales para caracterizacion de sub-base y concretos MDR40 y 3000 psi y 4000 psi. a laboratorio en Monteria. • Se espera documentacion de acreditacion de este laboratorio. SEGUN 3 UNO DE BIENVE EN URBANISMO • Se continua con la construccion del campamento de obra • La interventoria continua con la instalacion de las camaras de estatales, para control de obra de la DIRAT.

SANDRA ESCAMILLA SANCHEZ
DIRECTOR COD 109

MEDINA y RIVERA - Interventoria
arq. diego h. ortiz alfaro

03 Octubre/2020 / SEGUNDA FASE - LOTE 1 - URBANISMO

Estado del tiempo: AM Seminublado / PM Seminublado

ACTIVIDADES

• Se continua con la construccion del campamento de obra
• El contratista de la instalacion de camaras, no tiene autorizacion para trabajar, la Estacion no permite trabajos de esta index, los fines de semana

SANDRA ESCAMILLA SANCHEZ
DIRECTOR C.O.D 109

MEDINA y RIVERA - Interventoria
arq. diego h. ortiz alfaro
