

Id	Modi de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
1			**CONSTRUCCIÓN TEATRO MUNICIPAL SESQUILÉ II ETAPA**		**662 días**		**$ 6.428.247.120,28**	**lun 3/11/25**	**jue 25/05/28**
2			**INICIO**		**0 días**		**$ 0,00**	**lun 3/11/25**	**lun 3/11/25**
3			**ETAPA PRECONTRACTUAL**		**120 días**		**$ 0,00**	**mar 4/11/25**	**jue 23/04/26**
4			**ETAPA CONSTRUCTIVA**		**542 días**		**$ 6.428.247.120,28**	**jue 23/04/26**	**jue 25/05/28**
5		**1**	**PRELIMINARES**		**38 días**		**$ 35.985.565,56**	**jue 23/04/26**	**jue 18/06/26**
6		1,10	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	150,00	7 días	2	$ 13.529.425,70	jue 23/04/26	lun 4/05/26
7		1,07	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	24,00	5 días	1	$ 3.619.772,10	mar 5/05/26	lun 11/05/26
8		1,04	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	0,70	2 días	1	$ 3.712.534,00	jue 7/05/26	vie 8/05/26
9		1,05	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA PROVISIONAL LONG=50M(INCLUYE MATERIALES)	0,50	4 días	1	$ 1.532.955,00	sáb 9/05/26	jue 14/05/26
10		1,06	CAMPAMENTO 18 M2	0,35	3 días	1	$ 2.950.756,00	jue 14/05/26	mié 20/05/26
11		1,01	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	59,00	1 día	1	$ 465.130,78	mié 20/05/26	jue 21/05/26
12		1,02	DEMOLICIÓN DE PLACA PISO 0.20M	4,70	2 días	1	$ 413.428,74	jue 21/05/26	sáb 23/05/26
13		1,03	DESMONTE MUROS SECOS	12,00	15 días	2	$ 6.344.605,50	lun 25/05/26	mar 16/06/26
14		1,08	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	100,00	1 día	1	$ 634.927,23	mar 16/06/26	mié 17/06/26
15		1,09	SOBRE ACARREO DE SOBRANTES DISTANCIA MAYOR A 5KM	100,00	1 día	1	$ 2.782.030,51	mié 17/06/26	jue 18/06/26
16		**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		**3 días**		**$ 3.723.786,68**	**jue 21/05/26**	**mar 26/05/26**
17		2,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	11,00	2 días	1	$ 1.566.686,68	jue 21/05/26	sáb 23/05/26
18		2,02	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	200,00	1 día	1	$ 2.157.100,00	lun 25/05/26	mar 26/05/26
19		**3**	**CIMENTACIÓN (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)**		**57 días**		**$ 20.287.543,52**	**mar 26/05/26**	**sáb 15/08/26**
20		3,01	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	12,00	1 día	1	$ 563.036,40	mar 26/05/26	mié 27/05/26
21		3,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EN POLIETILENO CAL.6	45,00	2 días	1	$ 703.024,20	mié 27/05/26	vie 29/05/26
22		3,02	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	1,10	16 días	1	$ 1.999.370,40	vie 29/05/26	lun 22/06/26
23		3,03	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	1,10	16 días	1	$ 3.357.860,94	mar 23/06/26	mié 15/07/26
24		3,05	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	8,00	5 días	1	$ 3.023.635,20	mié 15/07/26	mié 22/07/26
25		2,03	AFIRMADO (NORMA INVIAS 311)	280,00	1 día	1	$ 4.861.688,14	mié 22/07/26	jue 23/07/26
26		3,06	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	10,39	16 días	1	$ 5.778.928,24	jue 23/07/26	sáb 15/08/26
27		**4**	**ESTRUCTURA (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)**		**68 días**		**$ 53.935.913,66**	**mié 27/05/26**	**mié 2/09/26**
28		4,01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	320,00	4 días	1	$ 8.447.113,50	mié 27/05/26	lun 1/06/26
29		4,02	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	400,00	1 día	1	$ 3.480.583,92	mar 2/06/26	mar 2/06/26
30		4,03	COLUMNAS 3500 PSI	0,70	16 días	1	$ 2.909.211,48	sáb 30/05/26	mar 23/06/26
31		4,04	VIGA AÉREA 3500 PSI	0,65	16 días	1	$ 4.661.004,60	mié 24/06/26	jue 16/07/26
32		4,06	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	11,70	5 días	1	$ 5.783.940,32	jue 16/07/26	jue 23/07/26
33		4,07	CORTE DILATACIONES EN CONCRETO CON PULIDORA (JUNTA PARA LOSA DE CONCRETO)	48,00	19 días	1	$ 13.224.479,52	jue 23/07/26	jue 20/08/26
34		4,08	SELLADO DE JUNTAS CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	48,00	19 días	1	$ 15.429.580,32	mié 5/08/26	mié 2/09/26
35		**5**	**MAMPOSTERIA**		**16 días**		**$ 170.860.534,15**	**mié 2/09/26**	**mié 23/09/26**
36		5,01	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	320,00	9 días	1	$ 142.121.623,79	mié 2/09/26	lun 14/09/26
37		5,02	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL)	320,00	1 día	1	$ 1.439.501,90	sáb 12/09/26	lun 14/09/26
38		5,03	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	320,00	1 día	1	$ 3.040.206,52	mar 15/09/26	mar 15/09/26
39		5,04	MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M	320,00	1 día	1	$ 15.236.596,80	mié 16/09/26	mié 16/09/26
40		5,08	ANCLAJE 1/2" L=50CM	320,00	1 día	1	$ 429.102,00	mié 16/09/26	mié 16/09/26
41		5,07	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	320,00	1 día	1	$ 390.312,00	jue 17/09/26	jue 17/09/26
42		5,05	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	320,00	1 día	1	$ 4.428.935,60	vie 18/09/26	vie 18/09/26
43		5,06	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	320,00	1 día	1	$ 1.610.301,00	sáb 19/09/26	lun 21/09/26
44		4,05	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	8,00	2 días	1	$ 2.163.954,54	lun 21/09/26	mié 23/09/26
45		**6**	**PAÑETES**		**80 días**		**$ 178.528.274,57**	**mié 23/09/26**	**lun 18/01/27**
46		6,01	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	18,00	77 días	3	$ 109.087.662,09	mié 23/09/26	mié 13/01/27
47		6,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	26,00	3 días	1	$ 1.337.171,56	vie 8/01/27	mié 13/01/27
48		6,03	FILOS O DILATACIONES S/MURO	35,00	61 días	2	$ 45.934.689,12	vie 16/10/26	mié 13/01/27
49		6,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	18,00	33 días	1	$ 18.265.544,82	vie 16/10/26	mié 2/12/26
50		6,05	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	25,00	3 días	1	$ 1.091.550,70	mié 2/12/26	sáb 5/12/26
51		6,06	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM	15,00	4 días	1	$ 1.650.404,64	sáb 5/12/26	vie 11/12/26
52		6,07	GOTERA EN MORTERO 1:4	33,00	3 días	1	$ 1.161.251,64	mié 13/01/27	lun 18/01/27
53		**8**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		**54 días**		**$ 250.946.866,00**	**mié 2/09/26**	**mar 17/11/26**
54		**8.5**	**ALIMENTADORES ELÉCTRICOS**		**18 días**		**$ 64.268.400,00**	**mié 2/09/26**	**vie 25/09/26**
55		8,5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE AL HFFR-LS 3X300F + 1x250AWG N + 4/0T. INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANSFERENCIA GENERAL	2,00	6 días	3	$ 39.441.600,00	mié 2/09/26	jue 10/09/26
56		8,5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE AL HFFR-LS 3x1/0F + 1x1/0 AWG N + 2T. INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA TABLERO DE TRANSFERENCIA RCI	2,00	4 días	3	$ 10.407.600,00	jue 10/09/26	mar 15/09/26
57		8,5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE AL HFFR-LS 3x1/0F + 1x1/0 AWG N + 2T. INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. DESDE TRANSFERENCIA RCI A TABLERO BCI	2,00	2 días	2	$ 3.964.800,00	mié 16/09/26	jue 17/09/26
58		8,5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE AL HFFR-LS 3x1/0F + 1x1/0 AWG N + 2T. EN TUBO DE 2"INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. DESDE TRANSFERENCIA GENERAL A TGAA	2,00	2 días	2	$ 3.964.800,00	vie 18/09/26	lun 21/09/26
59		8,5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE AL HFFR-LS 3x2F + 1x2 AWG N + 4T. EN TUBO DE 2"INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. DESDE TRANSFERENCIA GENERAL A TGD	2,00	2 días	2	$ 3.244.800,00	lun 21/09/26	mié 23/09/26

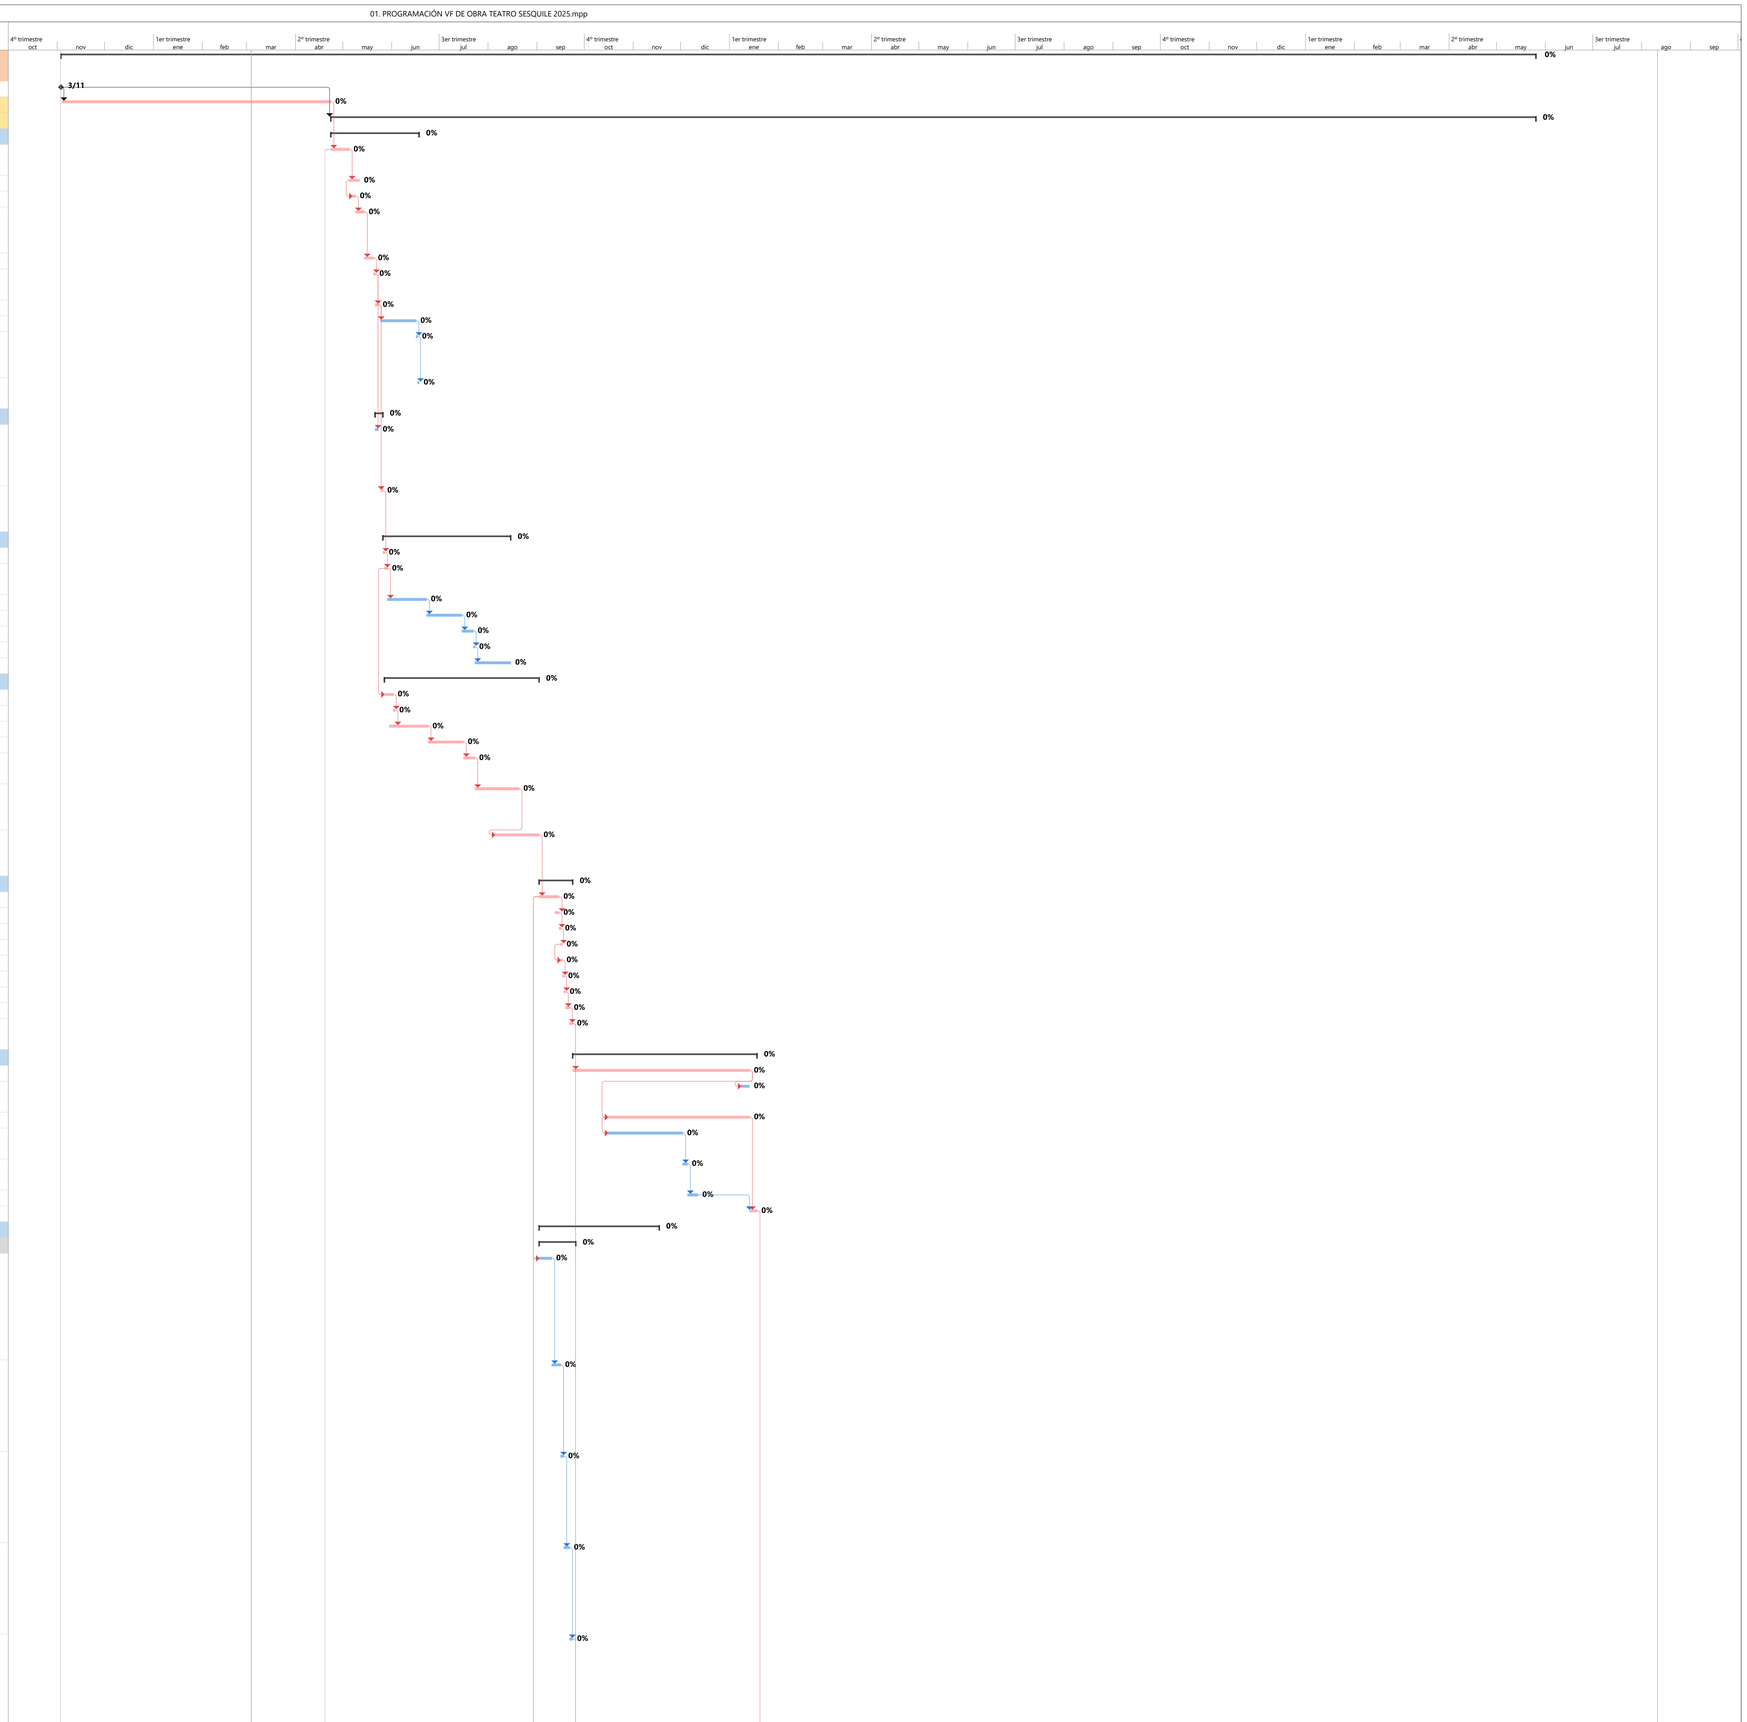


Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
60		8,5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE AL HFFR-LS 3x4F + 1x4AWG N + 6T. POR BANDEJA PORTACABLE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. DESDE TRANSFERENCIA GENERAL A TDA	2,00	2 días	2	$ 3.244.800,00	mié 23/09/26	vie 25/09/26
61		**8,6**	**TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS**		**5 días**		**$ 17.402.515,00**	**mié 2/09/26**	**mié 9/09/26**
62		8,6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERAL PARA 300 A. TGD SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	1,00	1 día	1	$ 8.956.364,00	mié 2/09/26	jue 3/09/26
63		8,6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA GENERAL PARA RCI 175 A. TGD SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	2,00	1 día	1	$ 1.836.537,00	jue 3/09/26	vie 4/09/26
64		8,6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS PARA AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE VENTILACION TGAA. TGAA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	2,00	1 día	1	$ 2.936.538,00	vie 4/09/26	sáb 5/09/26
65		8,6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS TGD. TGD SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	2,00	1 día	1	$ 1.836.538,00	lun 7/09/26	mar 8/09/26
66		8,6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS TDA. TDA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	2,00	1 día	1	$ 1.836.538,00	mar 8/09/26	mié 9/09/26
67		**8,1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS Y LUMINARIAS**		**32 días**		**$ 84.259.528,00**	**mié 9/09/26**	**jue 22/10/26**
68		8.1.1	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA (TIPO R1 Y AVISO SALIDA) EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1 ,5 M CABLE ENCAUCHET	8,50	2 días	2	$ 4.708.850,00	mié 9/09/26	vie 11/09/26
69		8.1.2	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDEN	8,50	1 día	1	$ 376.708,00	mié 9/09/26	jue 10/09/26
70		8.1.3	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL (15W) EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1 ,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDEN	8,50	2 días	2	$ 3.390.372,00	jue 10/09/26	sáb 12/09/26
71		8.1.4	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL (24W) EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1 ,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDEN	8,50	3 días	1	$ 4.520.496,00	jue 10/09/26	lun 14/09/26
72		8.1.5	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL (35W) EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1 ,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDEN	8,50	2 días	1	$ 3.013.664,00	mar 15/09/26	mié 16/09/26
73		8.1.6	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL (10W) EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1 ,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDEN	8,50	3 días	2	$ 7.534.160,00	mar 15/09/26	jue 17/09/26
74		8.1.7	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA REFLECTOR LED EN TUBERÍA CONDUIT IMC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDENCIA DE: CURVA	4,00	2 días	1	$ 2.266.320,00	vie 18/09/26	lun 21/09/26
75		8.1.8	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BALA EN TUBERÍA CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA, CON TAPA, PRENSAESTOPA 1/2", 1,5 M CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. E INCIDENCIA	8,50	4 días	3	$ 16.951.860,00	lun 21/09/26	vie 25/09/26
76		8.1.9	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 2X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO,	6,50	4 días	3	$ 11.703.155,00	vie 25/09/26	jue 1/10/26

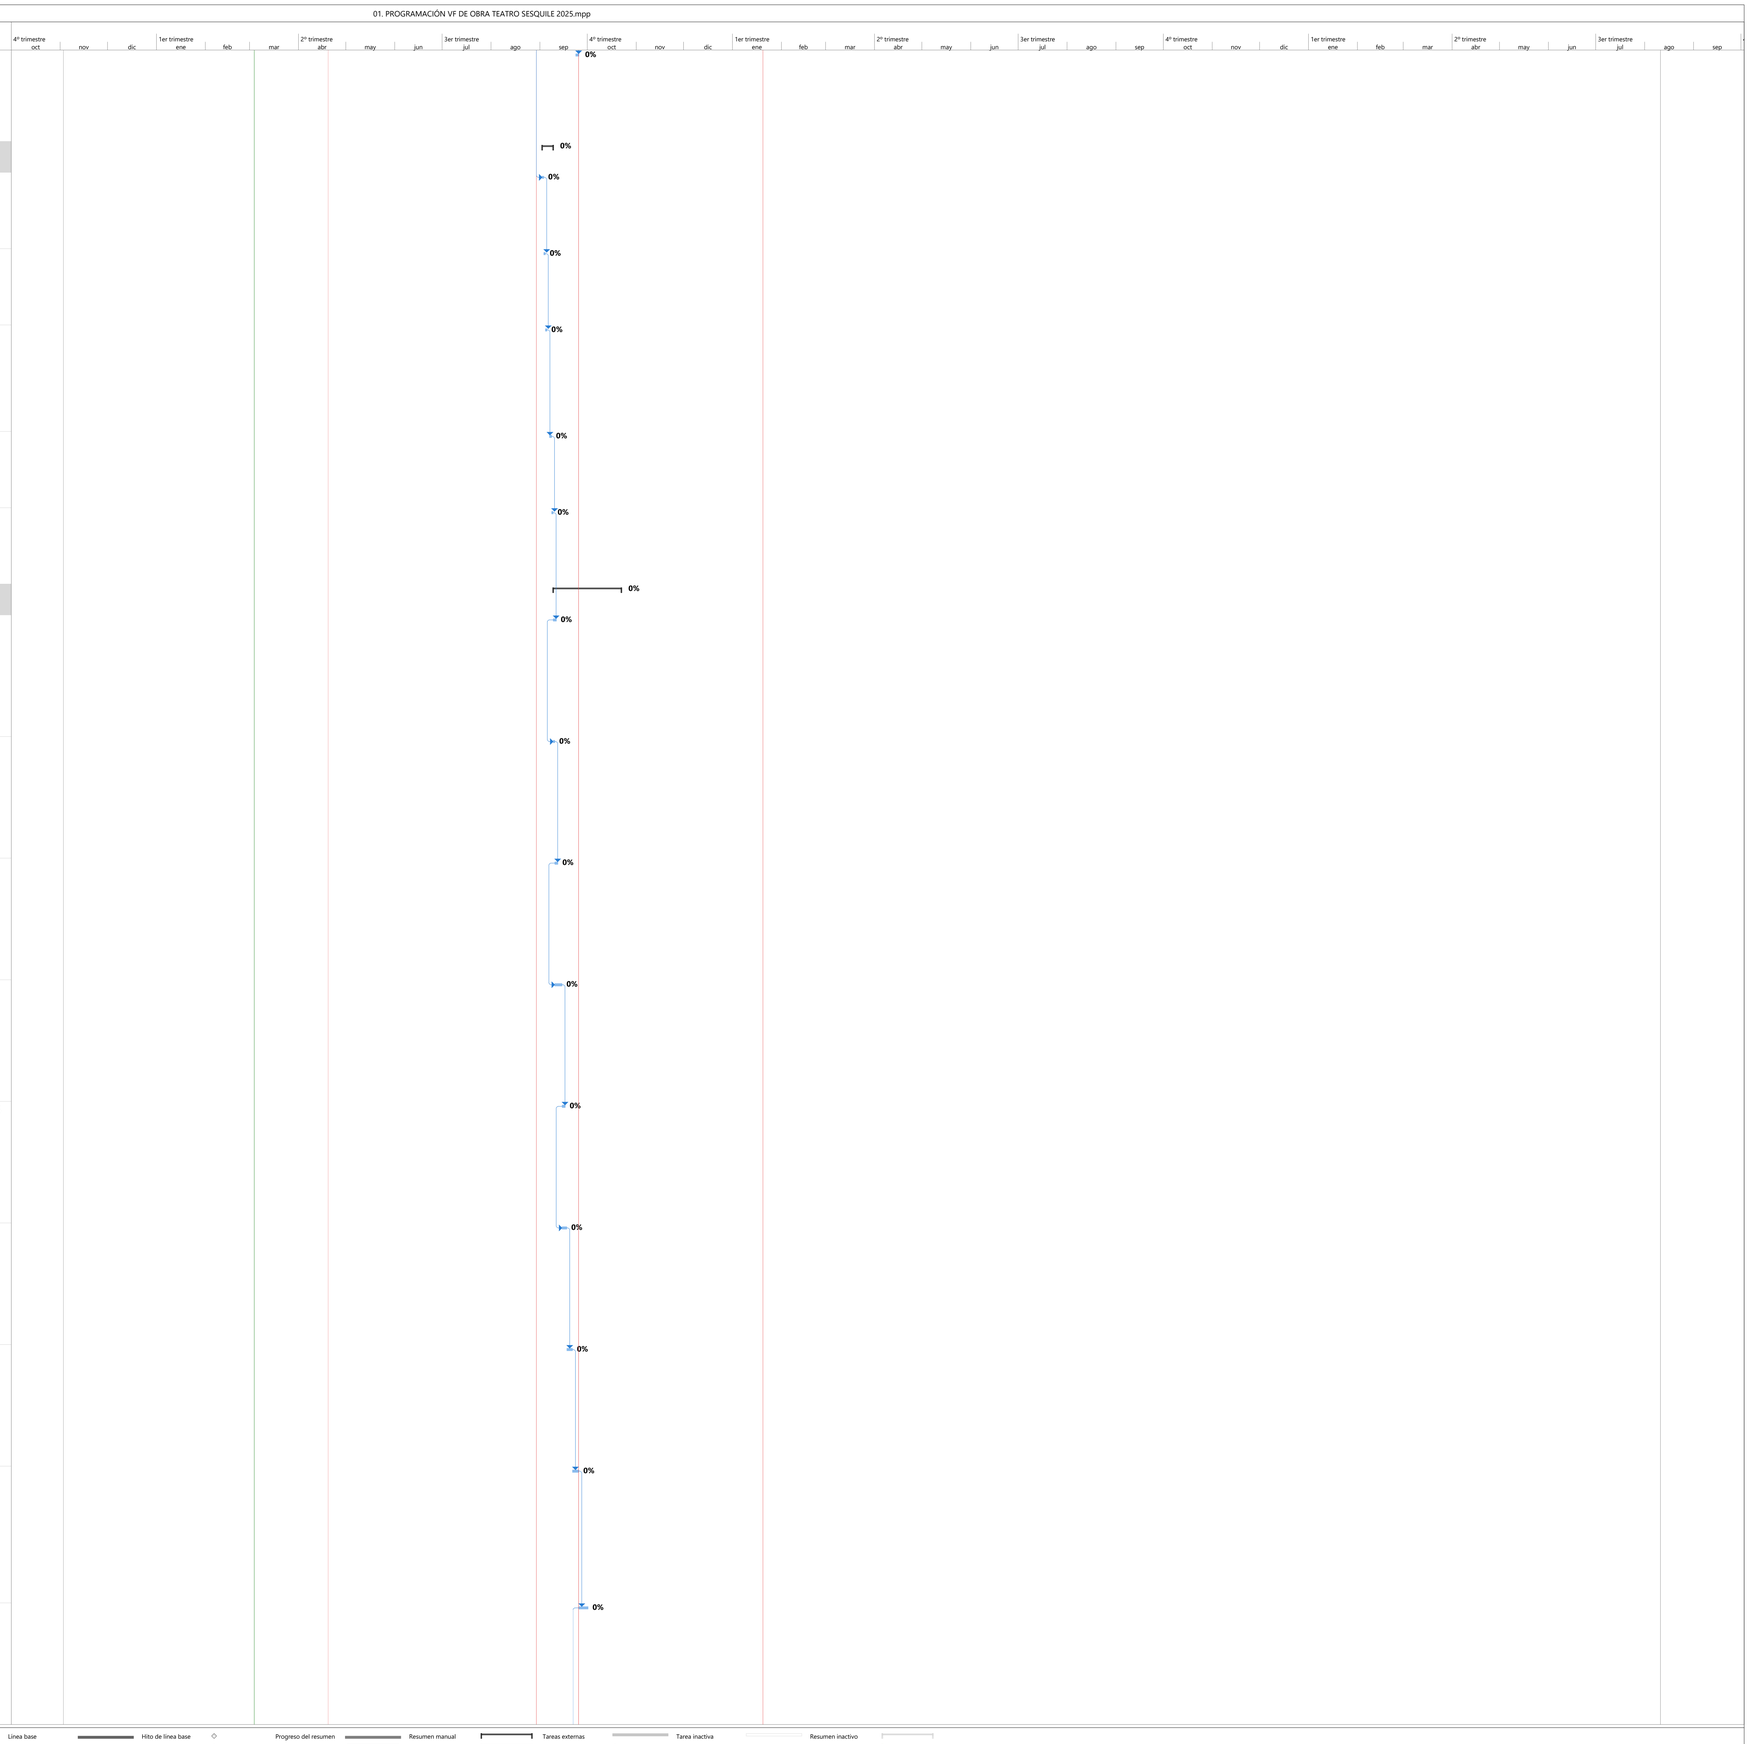

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
77		8.1.1(	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SU	10,00	1 día	1	$ 1.112.425,00	vie 25/09/26	lun 28/09/26
78		8.1.1:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 4X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS	6,00	1 día	1	$ 1.020.932,00	lun 28/09/26	mar 29/09/26
79		8.1.1:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJ	6,00	1 día	2	$ 418.828,00	mar 29/09/26	mié 30/09/26
80		8.1.1:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL EN MURO O PISO EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, TAPA CON EMPAQUE , CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADO	9,00	2 días	2	$ 5.008.788,00	mar 29/09/26	jue 1/10/26
81		8.1.1-	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SECA MANOS RED NORMAL EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. NO INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO,	9,00	1 día	1	$ 278.266,00	jue 1/10/26	vie 2/10/26
82		8.1.1!	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI RED NORMAL EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE	7,00	2 días	1	$ 1.559.824,00	vie 2/10/26	mar 6/10/26
83		8.1.1(	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE CU HFFR-LS NO. 3X12, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PASO, SUPLEMENTOS, M	7,00	2 días	1	$ 2.614.346,00	mar 6/10/26	jue 8/10/26
84		8.1.1'	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICA RED NORMAL EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO SIN GRADO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA DOBLE FONDO 2400	6,00	2 días	1	$ 1.828.976,00	jue 8/10/26	sáb 10/10/26
85		8.1.1!	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA RED NORMAL EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO 32A SIN GRADO DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 5X12 AWG, CAJA METÁLICA DOBLE FONDO	5,00	1 día	1	$ 1.122.432,00	mar 13/10/26	mar 13/10/26
86		8.1.1!	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL DE PISO PARA CARGADOR DE BATERÍAS PLANTA ELÉCTRICA PROYECTADO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO CON TAPA PARA INSTALACIÓN EN PISO, CABLE TRENZADO DE C	3,50	2 días	2	$ 6.875.710,00	mié 14/10/26	jue 15/10/26
87		8.1.2(	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED REGULADA EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PAS	6,00	1 día	1	$ 1.144.434,00	vie 16/10/26	vie 16/10/26
88		8.1.2:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED REGULADA EN MURO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA METÁLICA E INCIDENCIA DE: CURVAS, ADAPTADOR TERMINAL, CAJAS DE PAS	4,00	2 días	2	$ 3.165.528,00	vie 16/10/26	lun 19/10/26
89		8.1.2:	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED UPS EN CANALIZACIÓN PERIMETRAL. INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, TAPA , MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 3	12,00	1 día	2	$ 671.352,00	lun 19/10/26	mar 20/10/26

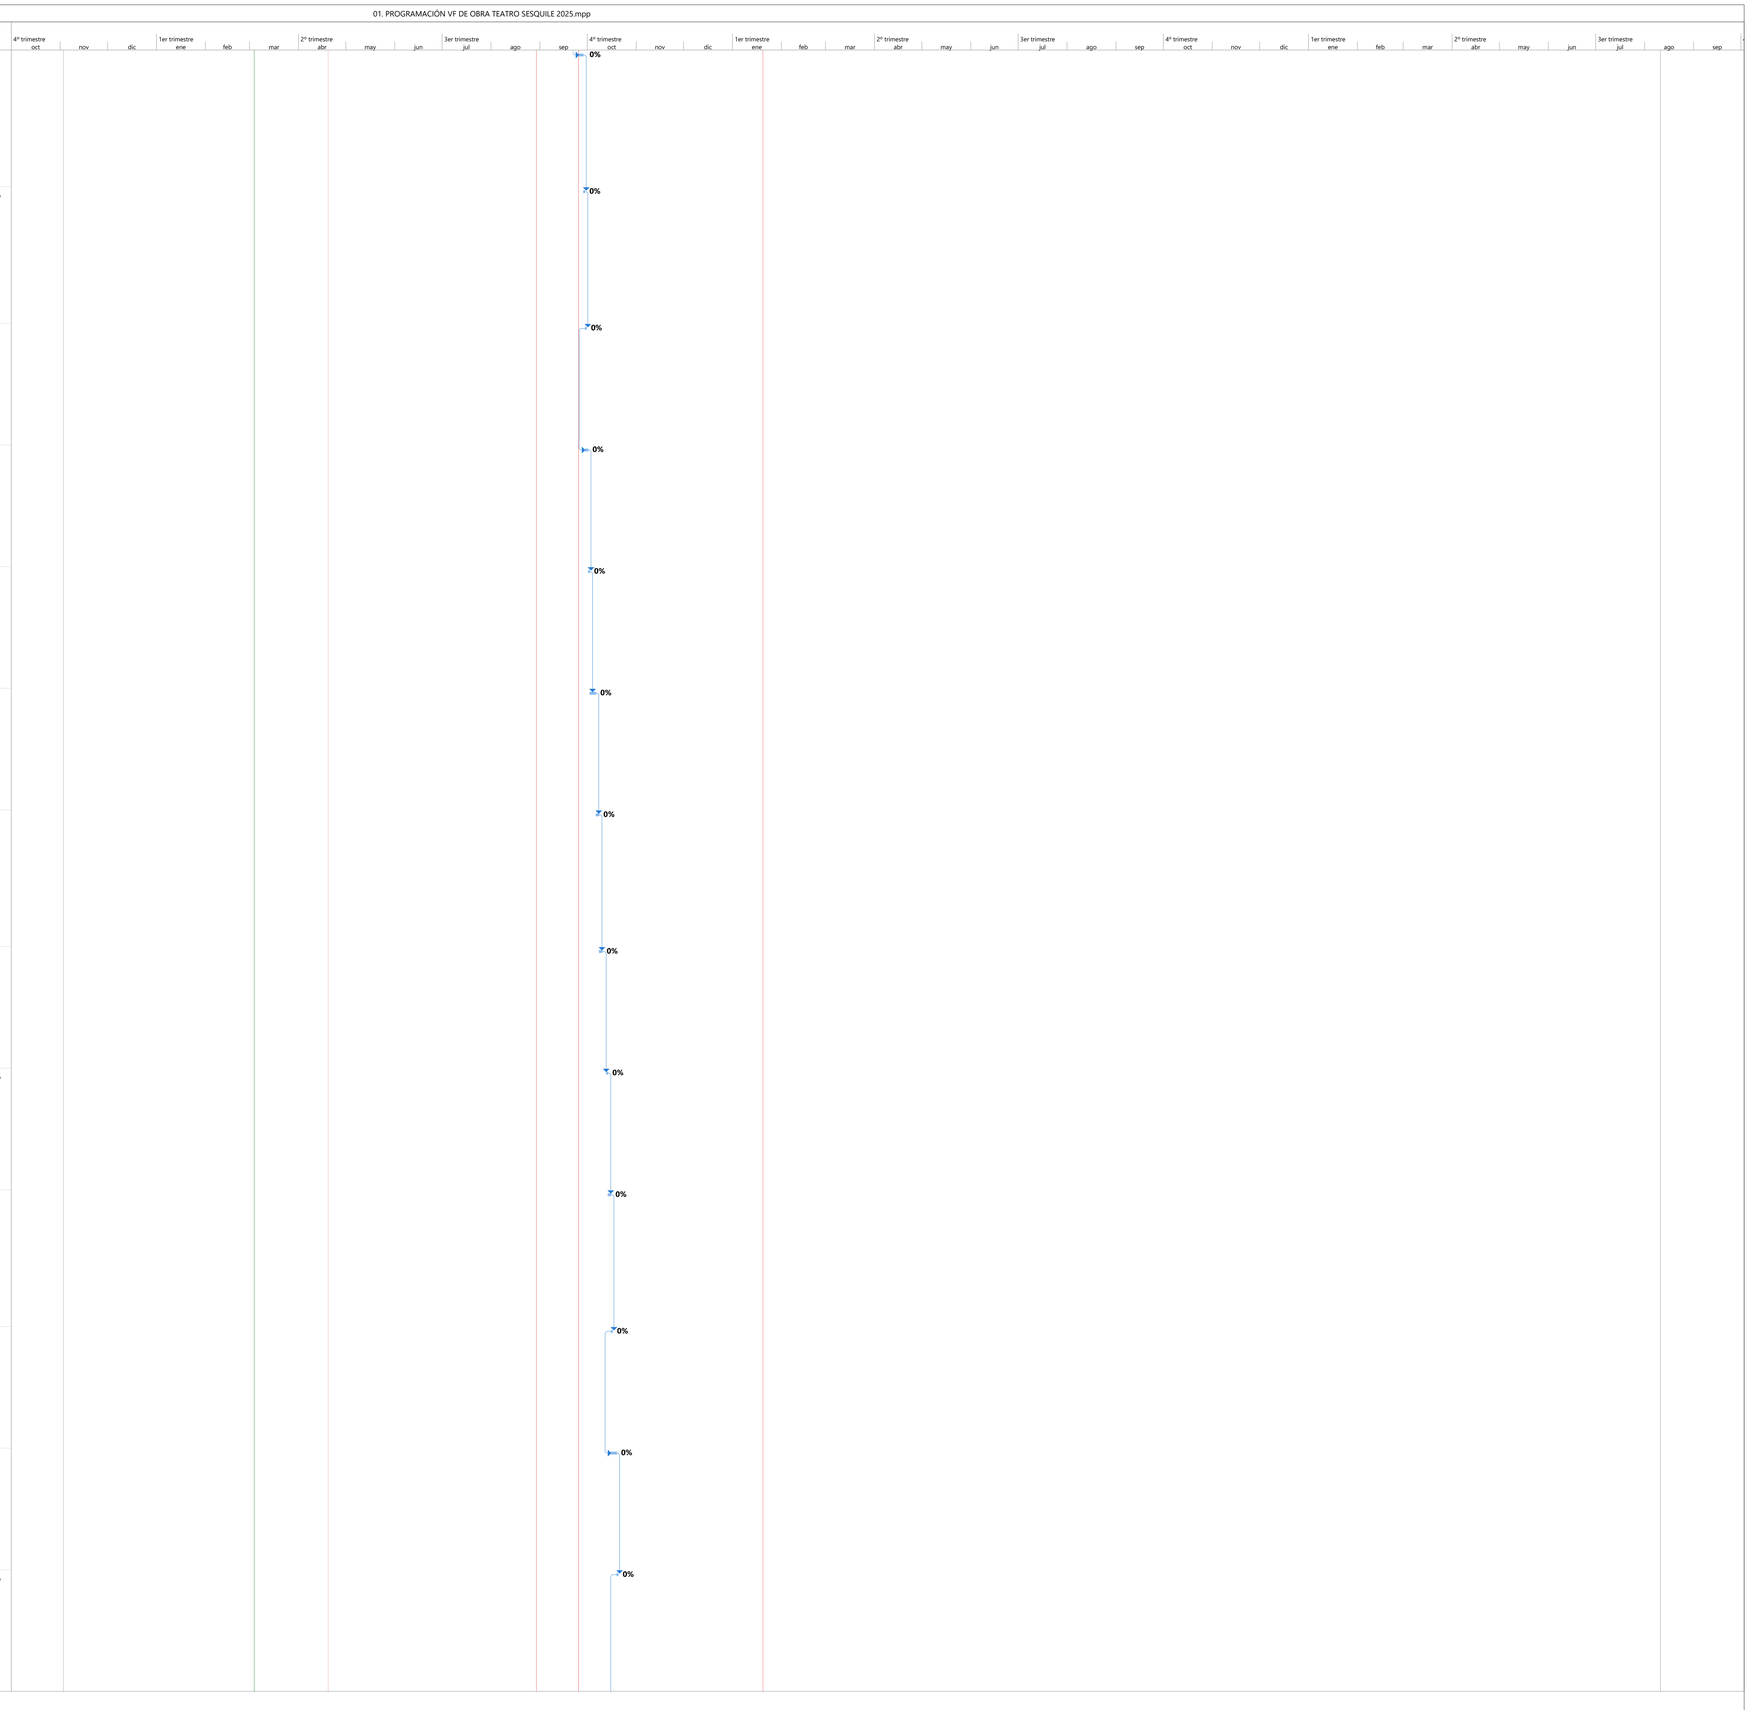


Tareas críticas | División crítica | Tarea | Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | División | Tarea manual | solo el comienzo | solo fin | solo duración | Línea base | División de la línea base | Hito de línea base | Hito | Progreso del resumen | Resumen | Resumen manual | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Fecha límite

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
90		8.1.23	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL EN CANALIZACIÓN PERIMETRAL. INCLUYE APARATO, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, TAPA , MARQUILLADO, CONECTORES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. - PROMEDIO 3	15,00	1 día	1	$ 370.240,00	lun 19/10/26	mar 20/10/26
91		8.1.24	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO EN TUBERÍA CONDUIT EMT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE SENSOR CON CONFIGURACIÓN DÍA/NOCHE Y TEMPORIZADOR , CABLE CU HFFR-LS NO. 2X12 + 1X12 AWG DESNUDO, CAJA METÁLICA E INCID	4,00	2 días	1	$ 1.753.338,00	mar 20/10/26	jue 22/10/26
92		8.1.25	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE RED NORMAL EN PISO TIPO EXTERIOR EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE APARATO, TAPA TIPO INTEMPERIE, CABLE DE CU HFFR-LS NO. 3X12 AWG, CAJA PLÁSTICA E INCIDENCIA DE: CURVAS	6,50	1 día	1	$ 848.524,00	lun 19/10/26	mar 20/10/26
93		**8.4**	**CANALIZACIONES CIVILES**		**17 días**		**$ 46.069.745,00**	**mié 21/10/26**	**vie 13/11/26**
94		8.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS275., EXCAVACIÓN, MAMPOSTERÍA Y PAÑETE, MARCO Y TAPA HOMOLOGADA, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.	0,50	1 día	2	$ 3.359.971,00	mié 21/10/26	jue 22/10/26
95		8.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS274., EXCAVACIÓN, MAMPOSTERÍA Y PAÑETE, MARCO Y TAPA HOMOLOGADA, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.	0,75	3 días	2	$ 8.040.008,00	vie 23/10/26	mié 28/10/26
96		8.4.3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CUARTOS TÉCNICOS, CON DIMENSIONES DE ALTURA 40 X 40 CM ANCHO. INCLUYE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR.	2,50	2 días	2	$ 8.002.460,00	mié 28/10/26	vie 30/10/26
97		8.4.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DE 4Φ6". INCLUYE PASACABLES DE BAJA TENSIÓN, EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMAS CODENSA, ARENA, RECEBO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, TERMINALES TIPO CAMPAN	1,50	2 días	2	$ 4.419.150,00	vie 30/10/26	mié 4/11/26
98		8.4.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTO IMC DE Φ4" , SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	5,00	2 días	1	$ 2.197.806,00	vie 30/10/26	mié 4/11/26
99		8.4.6	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC DE 3Φ3" .INCLUYE EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERÍAS SEGÚN NORMAS CODENSA, RELLENO , TERMINALES TIPO CAMPANA PARA DUCTOS.	6,00	5 días	2	$ 11.048.150,00	mié 4/11/26	mar 10/11/26
100		8.4.7	SUMINISTRO DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30 cm x 8 cm DE ALTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	7,00	3 días	2	$ 9.002.200,00	mié 11/11/26	vie 13/11/26
101		**8,2**	**CANALIZACIONES ELÉCTRICAS**		**18 días**		**$ 38.946.678,00**	**mié 21/10/26**	**mar 17/11/26**
102		8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE DE 30 X 8 CM DUCTO CERRADO COLOR BLANCO, CON DIVISIÓN INTERNA PARA CABLEADO DE POTENCIA Y DE DATOS, INCLUYE RIEL ESTRUCTURAL, VARILLA ROSCADA, UNIONES, LÍNEA SPT CABLE NO. 8 DESNUDO. INCIDENCIA DE ACCESORIOS DE	7,00	2 días	2	$ 4.996.725,00	mié 21/10/26	vie 23/10/26
103		8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE DE 40 X 8 CM DUCTO CERRADO COLOR BLANCO, CON DIVISIÓN INTERNA PARA CABLEADO DE POTENCIA Y DE DATOS, INCLUYE RIEL ESTRUCTURAL, VARILLA ROSCADA, UNIONES, LÍNEA SPT CABLE NO. 8 DESNUDO. INCIDENCIA DE ACCESORIOS DE	5,00	2 días	2	$ 3.889.712,00	vie 23/10/26	mar 27/10/26
104		8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALIZACIÓN PERIMETRAL METÁLICA DE 12 X 5 CM DUCTO CERRADO COLOR BLANCO, CON DIVISIÓN INTERNA PARA CABLEADO DE POTENCIA Y DE DATOS, INCLUYE LÍNEA SPT CABLE NO. 10 DESNUDO. INCIDENCIA DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN, FIJACIÓN Y SOPORT	35,00	1 día	1	$ 816.432,00	mar 27/10/26	mié 28/10/26
105		8.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3". SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	11,50	2 días	2	$ 6.686.540,00	mar 27/10/26	jue 29/10/26
106		8.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 2" SUBIENTES A TABLEROS. SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	20,00	2 días	1	$ 3.246.280,00	jue 29/10/26	mar 3/11/26
107		8.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1 1/2" . SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	30,00	1 día	1	$ 1.495.475,00	mar 3/11/26	mié 4/11/26
108		8.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1 1/4" . SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	30,00	1 día	1	$ 1.039.661,00	mié 4/11/26	jue 5/11/26
109		8.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1" A TABLEROS. SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	40,00	1 día	1	$ 690.976,00	jue 5/11/26	vie 6/11/26




Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
110		8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 20X20X15 CM. SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA, VARILLAS DE FIJACIÓN, ELABORACIÓN DE APERTURAS DE DUCTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	12,00	1 día	1	$ 526.716,00	vie 6/11/26	sáb 7/11/26
111		8.2.1(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 15X15X10 CM. SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA, VARILLAS DE FIJACIÓN, ELABORACIÓN DE APERTURAS DE DUCTOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	18,00	1 día	1	$ 232.988,00	vie 6/11/26	sáb 7/11/26
112		8.2.1:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1Ø1". SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	40,00	2 días	1	$ 2.481.232,00	sáb 7/11/26	mar 10/11/26
113		8.2.1:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4". SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	40,00	3 días	2	$ 5.378.932,00	sáb 7/11/26	mié 11/11/26
114		8.2.1:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT IMC 3/4" PARA RAMALES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	30,00	2 días	2	$ 3.962.870,00	jue 12/11/26	vie 13/11/26
115		8.2.1-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". NO INCLUYE REGATA EN PISO NI RESANES DE OBRA CIVIL. SE INCLUYE INCIDENCIA DE CURVAS, TERMINALES, SOPORTERÍA, ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y FIJACIÓN.	50,00	2 días	2	$ 2.146.998,00	jue 12/11/26	vie 13/11/26
116		8.2.1!	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 4"X4" TIPO INTEMPERIE PARA CAMBIO DE BAJANTE ACERO A CU, INCLUYE COLA DE CABLE PARA CONEXIÓN A ESTRUCTURA DE ACUERDO A DETALLE. SE INCLUYE INCIDENCIA DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN, CONECTOR BIMETÁLICO PARA CABLE AL 1/0 A CU 1/0	11,00	1 día	1	$ 505.636,00	sáb 14/11/26	mar 17/11/26
117		8.2.1(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE DE 20 X 8 CM DUCTO CERRADO COLOR BLANCO, CON DIVISIÓN INTERNA PARA CABLEADO DE POTENCIA Y DE DATOS, INCLUYE RIEL ESTRUCTURAL, VARILLA ROSCADA, UNIONES, LÍNEA SPT CABLE NO. 8 DESNUDO. INCIDENCIA DE ACCESORIOS DE	8,50	1 día	1	$ 849.505,00	sáb 14/11/26	mar 17/11/26
118		**8,3**	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA**		**9 días**		**$ 51.788.932,00**	**mar 17/11/26**	**sáb 28/11/26**
119		8.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE Y PUNTA CAPTADORA DE 100 CM, SE INCLUYE BASE CON ÁNGULO AJUSTABLE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN.	4,50	3 días	1	$ 4.167.240,00	mar 17/11/26	vie 20/11/26
120		8.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN AL 8MM, SE INCLUYE INCIDENCIA DE CONECTORES SNAP O PARECIDOS, SE INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN .	130,00	3 días	1	$ 8.255.400,00	mar 17/11/26	vie 20/11/26
121		8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACERO GALVANIZADO 10MM DIAMETRO, PARA INSTALACIÓN DENTRO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYES ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN PARA ANILLO SUPERIORES, INFIERIOR Y BAJANTES POR COMPONENTE NATURAL ESTRUCTURAL.	20,00	4 días	2	$ 9.785.125,00	jue 19/11/26	mié 25/11/26
122		8.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE Y PUNTA CAPTADORA DE 60 CM, SE INCLUYE BASE CON ÁNGULO AJUSTABLE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SUJECIÓN.	9,00	1 día	1	$ 372.136,00	jue 19/11/26	vie 20/11/26
123		8.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU 1/0, SE INCLUYE INCIDENCIA DE CONECTORES DE CABLE CU 1/0 A CU 2/0.	20,00	2 días	1	$ 2.814.240,00	vie 20/11/26	mar 24/11/26
124		8.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU 2/0, SE INCLUYE INCIDENCIA DE CONECTORES PARA EMPALMES PARA EQUIPOTENCIALIZAR LAS MALLAS DE PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.	22,00	4 días	2	$ 10.333.050,00	vie 20/11/26	jue 26/11/26
125		8.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE 2,4 MTS X 5/8", INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA CON CABLE CU 1/0 DENTRO DE CAJA AP274 PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.	3,50	3 días	1	$ 5.330.288,00	vie 20/11/26	mié 25/11/26
126		8.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PUESTA A TIERRA SISTEMA DE POTENCIA DE 6X6M, 16 GRILLAS, DE CABLE CU 2/0 DESNUDO, 4 VARILLAS COBRE 2,4 M X 5/8", INCLUYE 4 CAJAS AE 281 PARA INSPECCIÓN, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN NECESARIA APROX. 75 CM PR	3,50	1 día	1	$ 7.937.237,00	mié 25/11/26	jue 26/11/26
127		8.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN AE 281 30X30 CM PARA INSPECCIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA.	8,00	1 día	1	$ 1.494.552,00	jue 26/11/26	vie 27/11/26
128		8.3.1(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÁSTIL DE 2 M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN A PISO Y BASE PARA PUNTA CAPTADORA	7,00	1 día	1	$ 1.299.664,00	vie 27/11/26	sáb 28/11/26
129		**9**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIOS**		**90 días**		**$ 269.848.106,63**	**mié 2/09/26**	**vie 8/01/27**
130		**9,1**	**RED HIDRÁULICA**		**22 días**		**$ 19.727.273,64**	**mié 2/09/26**	**jue 1/10/26**
131		9,1,1	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	60,00	2 días	1	$ 1.229.037,03	mié 2/09/26	vie 4/09/26
132		9,1,2	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	24,00	1 día	1	$ 163.963,98	vie 4/09/26	sáb 5/09/26
133		9,1,3	RED SUMINISTRO PVC 1"	45,00	2 días	1	$ 1.093.521,87	lun 7/09/26	mié 9/09/26
134		9,1,4	TUBERIA PVCP-SCH40 1-1/4"	8,00	6 días	2	$ 11.509.731,76	mié 9/09/26	mié 16/09/26

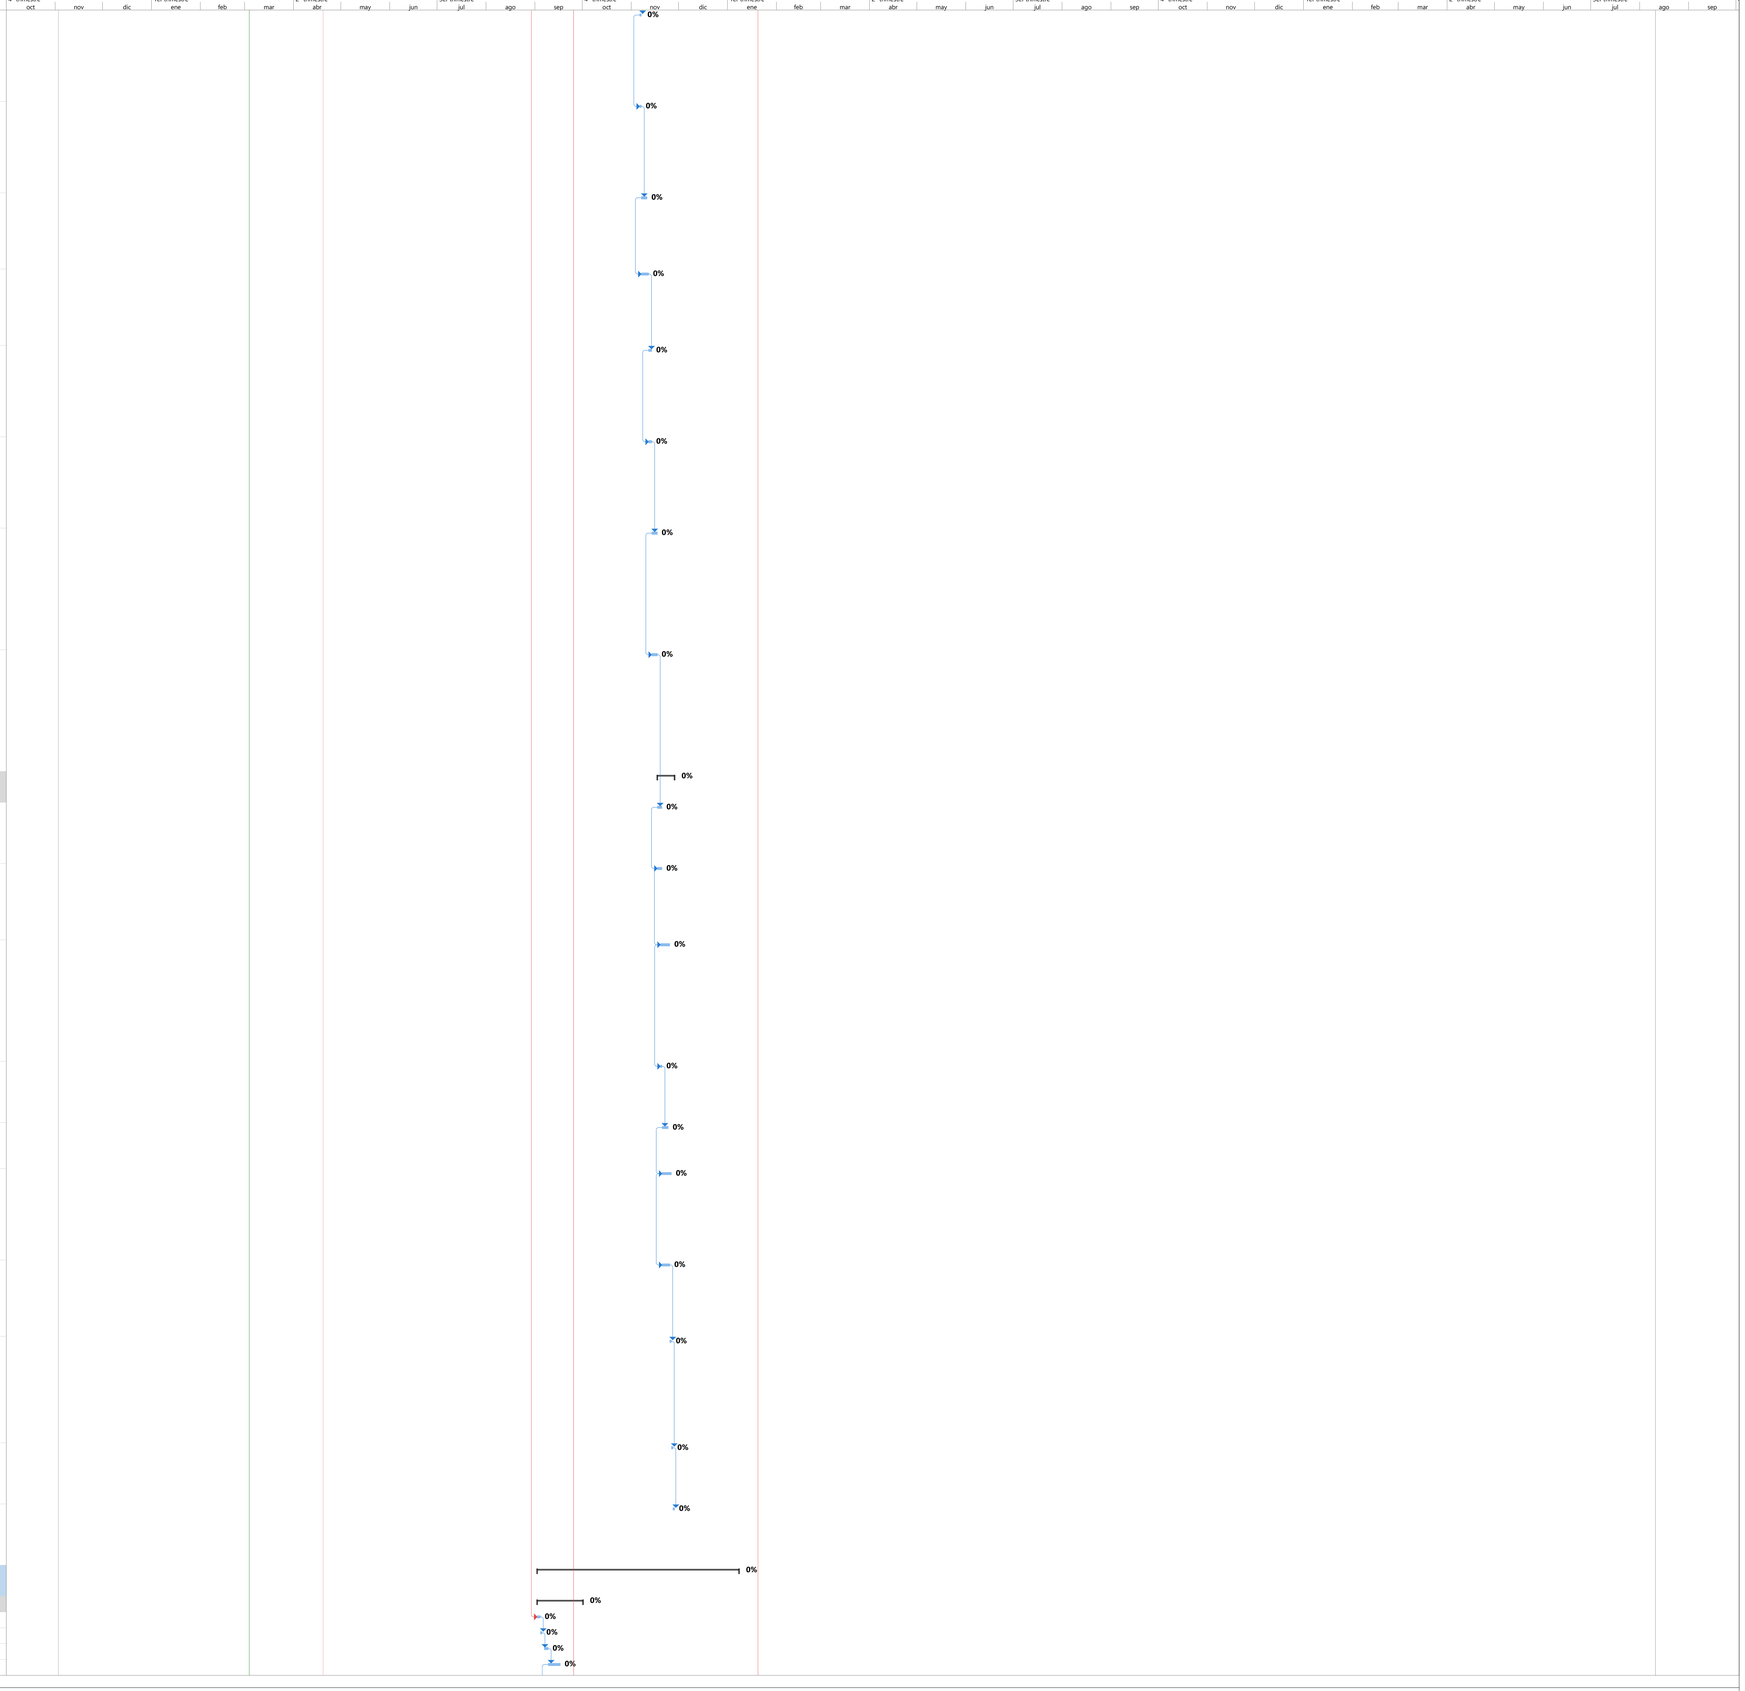


Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
135		9,1,5	CODO PVCP-SCH40 1/2" 45º	300,00	1 día	1	$ 5.123,00	mié 9/09/26	jue 10/09/26
136		9,1,6	CODO PVCP-SCH40 1-1/4" 45º	4,50	1 día	1	$ 21.508,00	jue 10/09/26	vie 11/09/26
137		9,1,7	BUJE PVCP-SCH40 1" x 3/4"	250,00	1 día	1	$ 16.449,00	vie 11/09/26	sáb 12/09/26
138		9,1,8	BUJE PVCP-SCH40 3/4" x 1/2"	250,00	1 día	1	$ 13.719,00	sáb 12/09/26	lun 14/09/26
139		9,1,9	BUJE PVCP-SCH40 1-1/4" x 1"	250,00	1 día	1	$ 21.498,00	mar 15/09/26	mar 15/09/26
140		9,1,10	BUJE PVCP-SCH40 1" x 1/2"	250,00	1 día	1	$ 21.932,00	mié 16/09/26	mié 16/09/26
141		9,1,11	BUJE PVCP-SCH40 1-1/4" x 3/4"	250,00	1 día	1	$ 7.166,00	mié 16/09/26	mié 16/09/26
142		9,1,12	BUJE PVCP-SCH40 1-1/4" x 1/2"	250,00	1 día	1	$ 7.166,00	mié 16/09/26	mié 16/09/26
143		9,1,13	TEE PVCP-SCH40 REDUCIDA 3/4" x 1/2"	250,00	1 día	1	$ 20.307,00	mié 16/09/26	mié 16/09/26
144		9,1,14	TEE PVCP-SCH40 REDUCIDA 1-1/4" x 1"	250,00	1 día	1	$ 24.608,00	jue 17/09/26	jue 17/09/26
145		9,1,15	TEE PVCP-SCH40 REDUCIDA 1-1/4" x 1/2"	250,00	1 día	1	$ 36.912,00	vie 18/09/26	vie 18/09/26
146		9,1,16	TEE PVCP-SCH40 1/2"	250,00	1 día	1	$ 24.520,00	sáb 19/09/26	lun 21/09/26
147		9,1,17	TEE PVCP-SCH40 1"	250,00	1 día	1	$ 15.568,00	lun 21/09/26	mar 22/09/26
148		9,1,18	TEE PVCP-SCH40 REDUCIDA 1" x 1/2"	250,00	1 día	1	$ 186.162,00	mar 22/09/26	mié 23/09/26
149		9,1,19	REGISTRO 1/2"	16,00	1 día	1	$ 172.882,00	mar 22/09/26	mié 23/09/26
150		9,1,20	REGISTRO 3/4"	16,00	1 día	1	$ 108.157,00	sáb 12/09/26	lun 14/09/26
151		9,1,21	REGISTRO 1"	10,00	1 día	1	$ 461.100,00	mar 15/09/26	mar 15/09/26
152		9,1,22	VALVULA DE COMPUERTA 3/4"	16,00	1 día	1	$ 108.157,00	mié 16/09/26	mié 16/09/26
153		9,1,23	VALVULA DE COMPUERTA 1"	10,00	1 día	1	$ 153.700,00	jue 17/09/26	jue 17/09/26
154		9,1,24	REGISTRO 1-1/2"	10,00	1 día	1	$ 255.580,00	vie 18/09/26	vie 18/09/26
155		9,1,25	CAJA PARA VALVULA EN PISO	20,00	1 día	1	$ 128.848,00	sáb 19/09/26	lun 21/09/26
156		9,1,26	VALVULA EXPULSORA DE AIRE	20,00	1 día	1	$ 420.717,00	sáb 19/09/26	lun 21/09/26
157		9,1,27	PUNTO PARAL HIDRAULICO Ø1/2" PARA LAVAMANOS	5,00	4 días	1	$ 1.662.800,00	lun 21/09/26	vie 25/09/26
158		9,1,28	PUNTO PARAL HIDRAULICO Ø1/2" PARA INODORO	5,00	3 días	1	$ 1.247.100,00	vie 25/09/26	mié 30/09/26
159		9,1,29	PUNTO PARAL HIDRAULICO Ø1/2" PARA ORINAL	5,00	1 día	1	$ 311.775,00	mié 30/09/26	jue 1/10/26
160		9,1,30	PUNTO PARAL HIDRAULICO Ø1/2" PARA LAVAPLATOS	1,60	1 día	1	$ 103.925,00	mié 23/09/26	jue 24/09/26
161		9,1,31	TAPA REGISTRO 20 x 20	26,67	1 día	1	$ 173.640,00	jue 24/09/26	vie 25/09/26
162		**9,2**	**REDES SANITARIAS**		**17 días**		**$ 26.087.669,33**	**vie 25/09/26**	**mar 20/10/26**
163		9,2,1	RED SUMINISTRO 3"	30,00	1 día	1	$ 1.176.771,76	vie 25/09/26	lun 28/09/26
164		9,2,2	RED SANITARIA PVC-S 2"	30,00	1 día	1	$ 551.517,75	lun 28/09/26	mar 29/09/26
165		9,2,3	RED SANITARIA PVC-S 4"	20,00	2 días	1	$ 2.736.321,77	mar 29/09/26	jue 1/10/26
166		9,2,4	REVENTILACIÓN 2"	36,00	2 días	1	$ 1.255.379,40	mar 29/09/26	jue 1/10/26
167		9,2,5	REVENTILACIÓN 3"	30,00	1 día	1	$ 27.375,57	jue 1/10/26	vie 2/10/26
168		9,2,6	TUBERIA PVC-V 4"	30,00	1 día	1	$ 1.086.034,08	jue 1/10/26	vie 2/10/26
169		9,2,7	CODO PVC-S 2" 45º	220,00	1 día	1	$ 240.093,00	jue 1/10/26	vie 2/10/26
170		9,2,8	CODO PVC-S 4" 45º	165,00	1 día	1	$ 304.645,00	vie 2/10/26	lun 5/10/26
171		9,2,9	YEE PVC-S 2"	190,00	1 día	1	$ 326.718,00	vie 2/10/26	lun 5/10/26
172		9,2,10	YEE PVC-S 4"	120,00	1 día	1	$ 516.505,00	vie 2/10/26	lun 5/10/26
173		9,2,11	TEE PVC-S 4"	190,00	1 día	1	$ 263.856,00	lun 5/10/26	mar 6/10/26
174		9,2,12	YEE REDUCIDA PVC-S 4" x 2"	215,00	1 día	1	$ 619.380,00	lun 5/10/26	mar 6/10/26
175		9,2,13	CODO PVCP-SCH40 2" 90º	190,00	1 día	1	$ 244.110,00	mar 6/10/26	mié 7/10/26
176		9,2,14	UNIÓN UNIVERSAL PVC 3"	205,00	1 día	1	$ 478.934,00	mar 6/10/26	mié 7/10/26
177		9,2,15	VALVULA DE COMPUERTA 3"	18,00	1 día	1	$ 837.286,00	mié 7/10/26	jue 8/10/26
178		9,2,16	CHEQUE HIDRAULICO 3"	150,00	1 día	1	$ 2.184.954,00	jue 8/10/26	vie 9/10/26
179		9,2,17	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	6,00	2 días	2	$ 2.168.140,00	vie 9/10/26	mar 13/10/26
180		9,2,18	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	6,00	2 días	1	$ 1.661.688,00	mié 14/10/26	jue 15/10/26
181		9,2,19	POZO EYECTOR INCLUYE 2 BOMBAS SUMERGIBLES	3,00	1 día	1	$ 8.632.148,00	vie 16/10/26	vie 16/10/26
182		9,2,20	CAJA DE INSPECCION 60 cm x 60 cm	1,80	2 días	1	$ 775.812,00	sáb 17/10/26	mar 20/10/26
183		**9,3**	**REDES DE AGUAS LLUVIAS**		**7 días**		**$ 21.974.893,84**	**mar 20/10/26**	**jue 29/10/26**
184		9,3,1	RED SANITARIA PVC-S 4"	20,00	1 día	1	$ 1.358.021,18	mar 20/10/26	mié 21/10/26
185		9,3,2	TUBERIA PVC-S 6"	35,00	2 días	2	$ 15.917.627,66	mié 21/10/26	vie 23/10/26
186		9,3,3	CODO PVC-S 4" 45º	150,00	1 día	1	$ 193.865,00	vie 23/10/26	lun 26/10/26
187		9,3,4	CODO PVC-S 6" 45º	200,00	1 día	1	$ 2.063.160,00	lun 26/10/26	mar 27/10/26
188		9,3,5	YEE REDUCIDA PVC-S 6" x 4"	70,00	1 día	1	$ 1.151.634,00	lun 26/10/26	mar 27/10/26
189		9,3,6	YEE PVC-S 6"	70,00	1 día	1	$ 803.804,00	lun 26/10/26	mar 27/10/26
190		9,3,7	TAPON DE INSPECCION 6"	350,00	1 día	1	$ 98.876,00	mar 27/10/26	mié 28/10/26
191		9,3,8	CAJA DE INSPECCION 60 cm x 60 cm	1,80	1 día	1	$ 387.906,00	mié 28/10/26	jue 29/10/26
192		**9,4**	**REDES CONTRA INCENDIO**		**48 días**		**$ 202.058.269,82**	**jue 29/10/26**	**vie 8/01/27**
193		9,4,1	RED SUMINISTRO PVC 1/2""	60,00	1 día	1	$ 192.632,85	jue 29/10/26	vie 30/10/26
194		9,4,2	TUBERIA PVCP-SCH40 1-1/4"	8,00	4 días	1	$ 3.457.577,12	vie 30/10/26	vie 6/11/26
195		9,4,3	TEE PVCP-SCH40 1-1/4" 90º	230,00	1 día	1	$ 14.319,00	vie 6/11/26	sáb 7/11/26
196		9,4,4	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	35,00	3 días	3	$ 15.369.811,47	vie 6/11/26	mar 10/11/26
197		9,4,5	TUBERIA ACERO GALVANIZADO SCH-40 1-1/4"	50,00	1 día	1	$ 796.866,84	jue 29/10/26	vie 30/10/26
198		9,4,6	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	30,00	6 días	1	$ 11.936.408,90	jue 29/10/26	sáb 7/11/26
199		9,4,7	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	15,00	1 día	1	$ 1.194.522,01	jue 29/10/26	vie 30/10/26
200		9,4,8	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	12,00	7 días	2	$ 8.551.147,00	vie 30/10/26	mar 10/11/26
201		9,4,9	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	7,00	7 días	2	$ 13.747.157,00	mar 10/11/26	jue 19/11/26
202		9,4,10	TUTUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	5,00	1 día	1	$ 242.205,63	jue 19/11/26	vie 20/11/26
203		9,4,11	CODO AC 2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	50,00	1 día	1	$ 50.244,00	jue 19/11/26	vie 20/11/26
204		9,4,12	CODO AC 2-1/2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 1.822.568,00	jue 19/11/26	vie 20/11/26
205		9,4,13	CODO AC 3" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 1.517.333,00	vie 20/11/26	lun 23/11/26
206		9,4,14	CODO AC 4" INCLUYE UNION FLEXIBLE	4,00	1 día	2	$ 80.634,00	lun 23/11/26	mar 24/11/26
207		9,4,15	TEE MECANICA 2-1/2" x 1"	55,00	1 día	1	$ 902.232,00	mar 24/11/26	mié 25/11/26
208		9,4,16	TEE MECANICA 2-1/2" x 1-1/4"	45,00	1 día	1	$ 194.979,00	mié 25/11/26	jue 26/11/26
209		9,4,17	TEE MECANICA 2-1/2" x 1-1/2"	45,00	1 día	1	$ 1.169.874,00	jue 26/11/26	vie 27/11/26
210		9,4,18	TEE MECANICA 2" x 1"	45,00	1 día	1	$ 75.186,00	vie 27/11/26	sáb 28/11/26
211		9,4,19	TEE AC 2-1/2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 920.088,00	lun 30/11/26	mar 1/12/26
212		9,4,20	TEE AC 2-1/2" x 1-1/2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	2	$ 92.622,00	mar 1/12/26	mié 2/12/26
213		9,4,21	TEE AC 2-1/2" x 2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	2	$ 92.622,00	mié 2/12/26	jue 3/12/26
214		9,4,22	TEE AC 3" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 1.302.045,00	jue 3/12/26	vie 4/12/26
215		9,4,23	TEE AC 3" x 2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 500.218,00	vie 4/12/26	sáb 5/12/26
216		9,4,24	TEE AC 3" x 2-1/2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 250.109,00	sáb 5/12/26	lun 7/12/26
217		9,4,25	TEE AC 4" x 2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 251.034,00	mié 9/12/26	mié 9/12/26
218		9,4,26	TRANSICION AC 2" x 1-1/2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 90.276,00	jue 10/12/26	jue 10/12/26

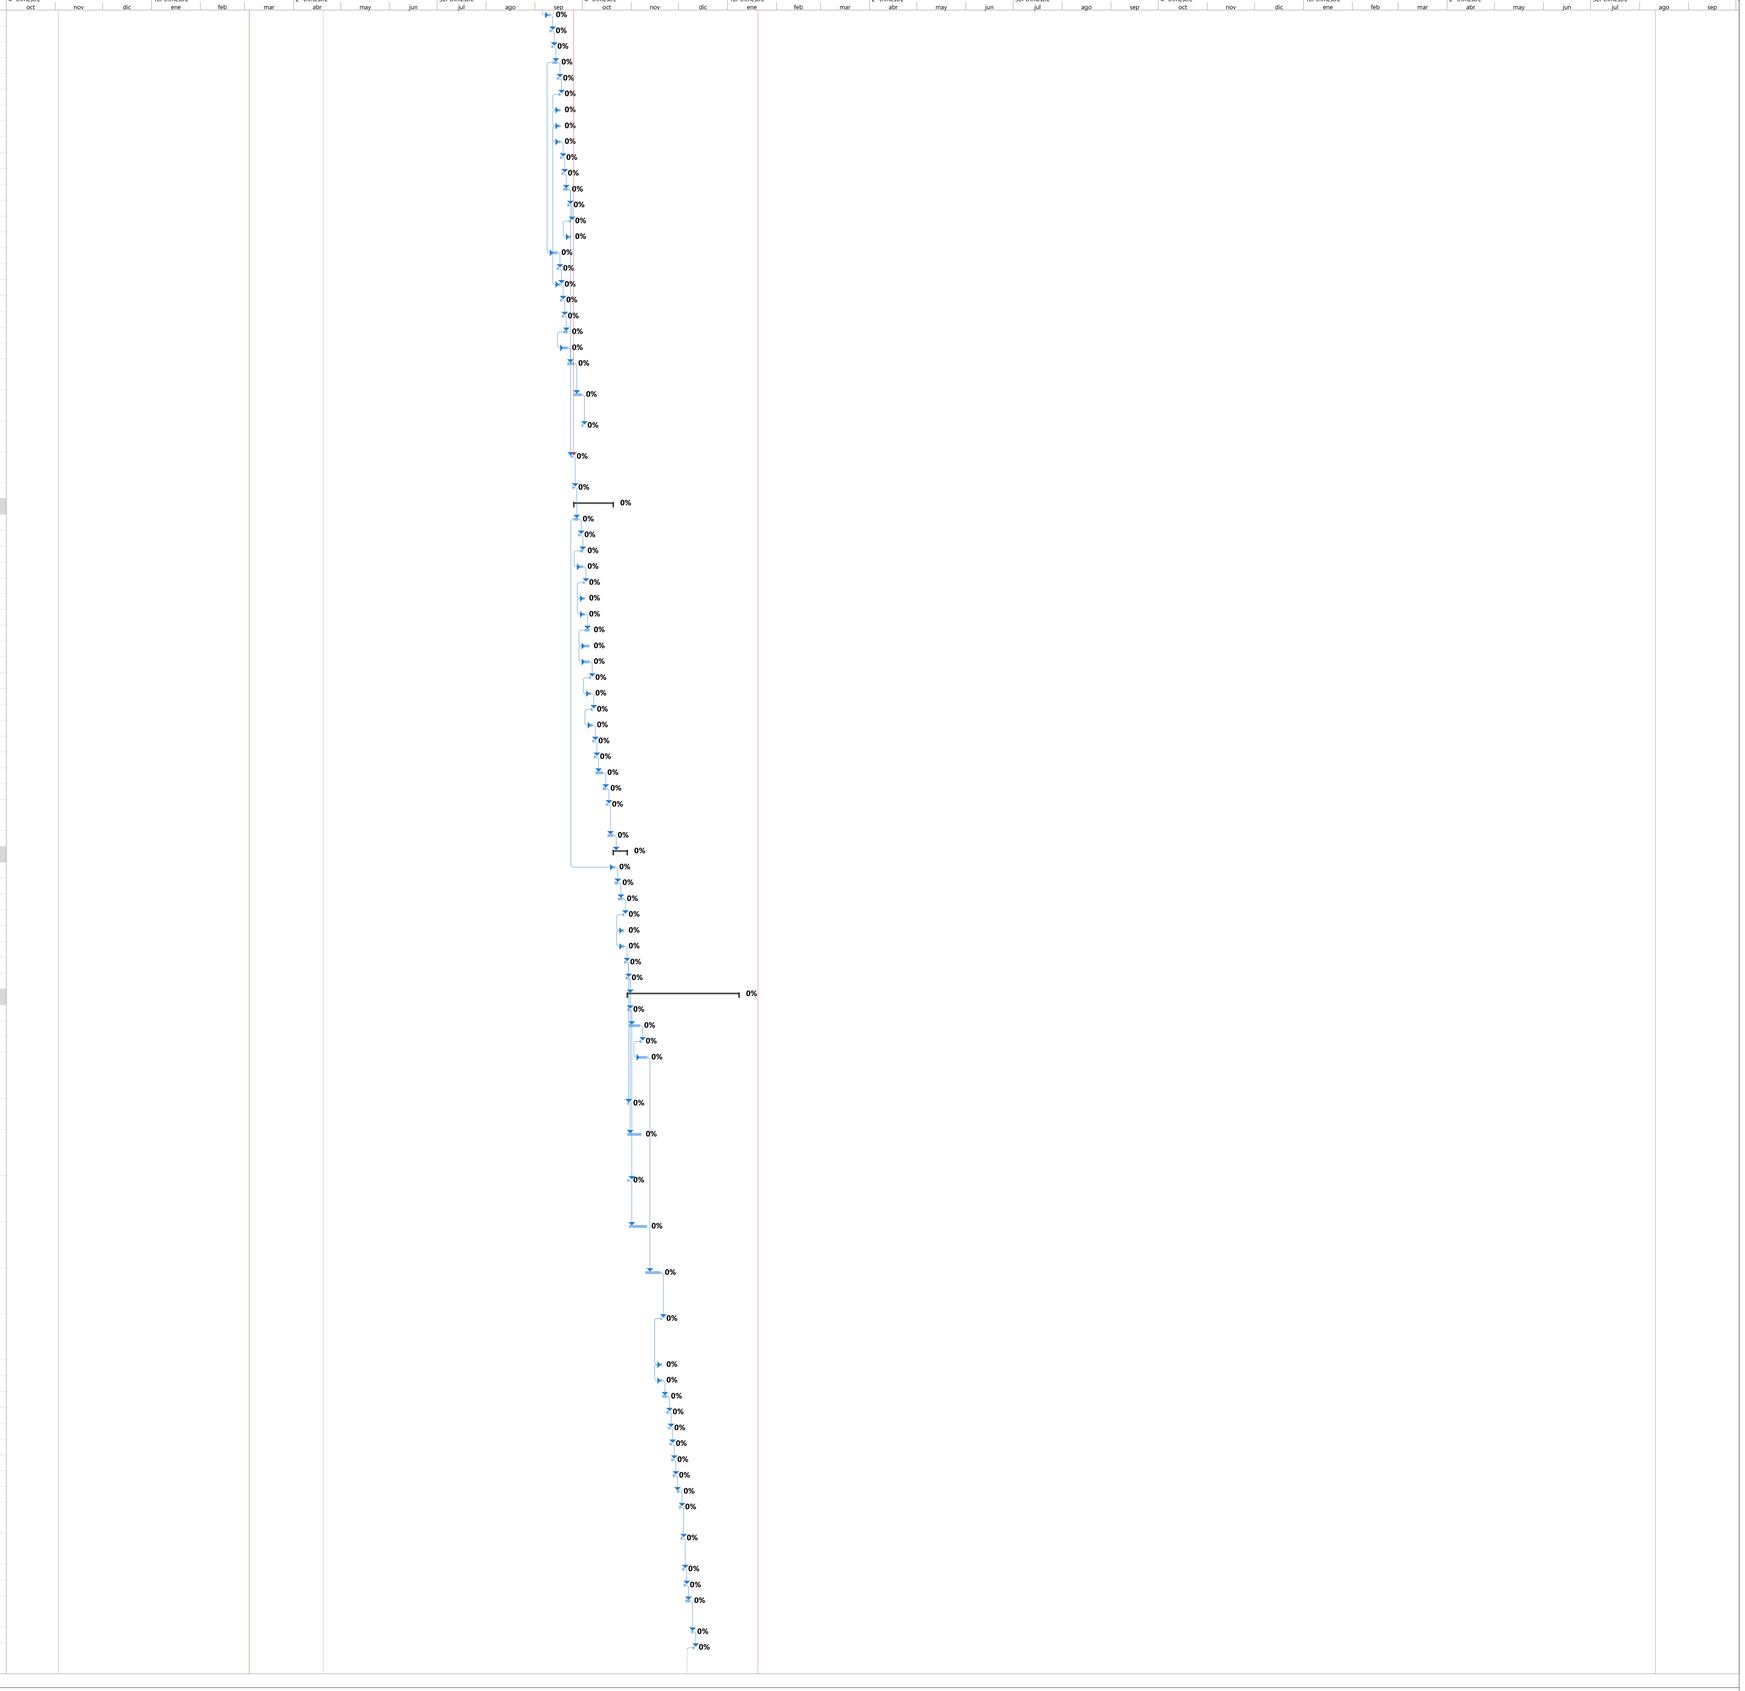


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
219		9,4,2	TRANSICION AC 2-1/2" x 1-1/4" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 90.976,00	jue 10/12/26	jue 10/12/26
220		9,4,2	TRANSICION AC 2-1/2" x 1-1/2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	1	$ 277.173,00	jue 10/12/26	jue 10/12/26
221		9,4,2	TRANSICION AC 3" x 2-1/2" INCLUYE UNION FLEXIBLE	55,00	1 día	2	$ 320.427,00	jue 10/12/26	jue 10/12/26
222		9,4,3	CODO A.G. 1"	45,00	2 días	1	$ 3.221.817,00	vie 11/12/26	lun 14/12/26
223		9,4,3	CODO A.G. 1-1/4"	45,00	1 día	1	$ 44.479,00	vie 11/12/26	vie 11/12/26
224		9,4,3	CODO A.G. 1-1/2"	45,00	1 día	1	$ 630.287,00	sáb 12/12/26	lun 14/12/26
225		9,4,3	TEE A.G. 1"	45,00	1 día	1	$ 301.860,00	sáb 12/12/26	lun 14/12/26
226		9,4,3	TEE A.G. 1-1/4"	45,00	1 día	1	$ 142.751,00	lun 14/12/26	mar 15/12/26
227		9,4,3	TEE A.G. 1-1/2"	45,00	2 días	1	$ 1.325.545,00	mar 15/12/26	jue 17/12/26
228		9,4,3	TRANSICION A.G. 1-1/4" x 1"	45,00	1 día	1	$ 1.152.411,00	lun 14/12/26	mar 15/12/26
229		9,4,3	TRANSICION A.G. 1-1/2" x 1"	45,00	2 días	1	$ 5.850.702,00	mar 15/12/26	jue 17/12/26
230		9,4,3	TRANSICION A.G. 1-1/2" x 1-1/4"	45,00	1 día	1	$ 177.294,00	mar 15/12/26	mié 16/12/26
231		9,4,3	REDUCCION EXCENTRICA 4" x 2-1/2"	34,00	1 día	1	$ 83.864,00	mié 16/12/26	jue 17/12/26
232		9,4,4	JUNTA ANTIVIBRATORIA 2"	24,00	1 día	1	$ 167.352,00	jue 17/12/26	vie 18/12/26
233		9,4,4	PLACA ANTI VORTICE 15 X 15 PARA 4"	3,75	1 día	1	$ 547.643,00	vie 18/12/26	lun 21/12/26
234		9,4,4	ESTACION DE CONTROL	1,85	2 días	1	$ 17.271.472,00	vie 18/12/26	mar 22/12/26
235		9,4,4	CHEQUE HIDRAULICO 2"	130,00	1 día	1	$ 89.813,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
236		9,4,4	CHEQUE HIDRAULICO 3"	130,00	1 día	1	$ 138.813,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
237		9,4,4	FLOTADOR MECANICO	5,50	1 día	1	$ 474.250,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
238		9,4,4	VALVULA DE COMPUERTA 2"	4,75	1 día	1	$ 956.052,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
239		9,4,4	VALVULA OS&Y 3"	3,75	1 día	1	$ 3.437.604,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
240		9,4,4	VALVULA OS&Y 4"	3,75	1 día	1	$ 1.368.368,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
241		9,4,4	VALVULA DE ALIVIO 2"	5,50	1 día	1	$ 1.216.736,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
242		9,4,5	VALVULA MARIPOSA 3"	2,00	2 días	1	$ 2.688.615,00	mar 22/12/26	jue 24/12/26
243		9,4,5	SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2"	2,00	1 día	1	$ 2.943.974,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
244		9,4,5	MEDIDOR DE AGUA 1/2" INCLUYE CAJILLA	2,00	1 día	1	$ 1.248.728,00	mié 23/12/26	jue 24/12/26
245		9,4,5	FLUJOMETRO 2"	2,00	1 día	1	$ 713.236,00	jue 24/12/26	lun 28/12/26
246		9,4,5	ROCIADOR MONTANTE K 5.6 RESPUESTA RAPIDA	20,00	7 días	2	$ 14.345.750,00	jue 24/12/26	mié 6/01/27
247		9,4,5	ROCIADOR COLGANTE K 5.6 RESPUESTA RAPIDA	20,00	7 días	2	$ 14.345.750,00	jue 24/12/26	mié 6/01/27
248		9,4,5	GABINETE CLASE II	2,00	2 días	1	$ 4.165.470,00	mié 6/01/27	vie 8/01/27
249		9,4,5	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	20,00	1 día	1	$ 420.717,00	mié 6/01/27	jue 7/01/27
250		9,4,5	BOMBA VERTICAL EN LINEA UL/FM 250 GPM	1,00	1 día	1	$ 41.845.676,00	mié 23/12/26	jue 24/12/26
251		9,4,5	BOMBA JOCKEY	1,00	1 día	1	$ 6.802.312,00	mié 23/12/26	jue 24/12/26
252		9,4,6	CABEZAL DE PRUEBAS 1 SALIDA EN 2-1/2"	1,00	1 día	1	$ 3.221.472,00	mié 23/12/26	jue 24/12/26
253		9,4,6	SOPORTERIA SISMORESISTENTE LONGITUDINAL	30,00	1 día	1	$ 2.018.388,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
254		9,4,6	SOPORTERIA SISMORESISTENTE TRASVERSAL	30,00	1 día	1	$ 3.195.781,00	mar 22/12/26	mié 23/12/26
255		**7**	**PISOS**		**60 días**		**$ 141.060.917,68**	**lun 18/01/27**	**lun 12/04/27**
256		7,01	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	20,00	43 días	2	$ 45.885.866,21	lun 18/01/27	mar 16/03/27
257		7,02	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	17,78	6 días	1	$ 5.057.773,70	mar 9/03/27	mar 16/03/27
258		7,08	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	9,09	8 días	1	$ 7.441.027,40	mar 9/03/27	jue 18/03/27
259		7,03	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	12,00	23 días	1	$ 23.906.142,68	mar 9/03/27	lun 12/04/27
260		7,04	PISO VINILO TRÁFICO PESADO	19,13	13 días	2	$ 33.069.612,06	mar 9/03/27	mar 30/03/27
261		7,05	GUARDAESCOBA PVC CEDRO	145,00	4 días	1	$ 9.354.754,29	sáb 20/03/27	mar 30/03/27
262		7,06	PIRLANES ALUMINIO	26,67	13 días	1	$ 4.069.493,39	sáb 20/03/27	sáb 10/04/27
263		7,07	MEDIA CAÑA EN GRANITO	25,00	5 días	1	$ 12.276.247,95	sáb 20/03/27	mié 31/03/27
264		**10**	**RED DE VOZ Y DATOS**		**56 días**		**$ 333.670.728,00**	**mié 31/03/27**	**jue 17/06/27**
265		**10,1**	**EQUIPOS ACTIVOS**		**18 días**		**$ 115.886.724,00**	**mié 31/03/27**	**vie 23/04/27**
266		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DURO 6 TB ESPECIALIZADO PARA CCTV	1,00	2 días	1	$ 2.430.604,00	mié 31/03/27	vie 2/04/27
267		10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED 43", MOUSE Y TECLADO PARA MANEJO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV.	1,00	1 día	1	$ 6.002.478,00	mié 31/03/27	jue 1/04/27
268		10,1,3	SWITCH POE 48 PUERTOS MÍN. 300 W, PUERTOS GIGA CAPA 2, QOS, SOPORTE IPV6, ADMINISTRABLE (WEB, CLI, PROTOCOLO SNMP), APILAMIENTO VIRTUAL Y TIPO RACK.	5,00	1 día	1	$ 21.091.662,00	mié 31/03/27	jue 1/04/27
269		10,1,4	SWITCH POE 24 PUERTOS MÍN. 300 W, PUERTOS GIGA CAPA 2, QOS, SOPORTE IPV6, ADMINISTRABLE (WEB, CLI, PROTOCOLO SNMP), APILAMIENTO VIRTUAL Y TIPO RACK.	5,00	1 día	1	$ 4.954.447,00	jue 1/04/27	vie 2/04/27
270		10,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BULLET 2 MP - 1080 P - FHD, CAPACIDAD DE 25 FPS, LENTE FOCAL 3,8 MM, INFRARROJA, SENSIBILIDAD MÍN. 0,09 COLOR Y 1,6 B/W. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	8,00	4 días	1	$ 18.417.325,00	jue 1/04/27	mié 7/04/27
271		10,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO FISHEYE 3MP H.264 WDR PRO IP CAMERA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	8,00	1 día	1	$ 1.790.929,00	jue 1/04/27	vie 2/04/27
272		10,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO MINIDOMO 2 MP - 1080 P - FHD, CAPACIDAD DE 25 FPS, LENTE FOCAL 2,8 MM, INFRARROJA, SENSIBILIDAD MÍN. 0,09 COLOR Y 1,6 B/W. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	8,00	1 día	1	$ 1.451.642,00	vie 2/04/27	sáb 3/04/27
273		10,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT IEEE 802,11G, 2,4 - 5 GHZ, 300 MBPS, CONFIGURABLE A MODO CLIENTE, PUENTE Y REPETIDOR Y/O DUAL	8,00	1 día	1	$ 9.783.152,00	lun 5/04/27	mar 6/04/27
274		10,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO MULTIZONA MÍNIMO 3 ZONAS, AMPLIFICADOR RANGO DE POTENCIA 1500 W O SIMILAR.	8,00	1 día	1	$ 4.363.572,00	lun 5/04/27	mar 6/04/27

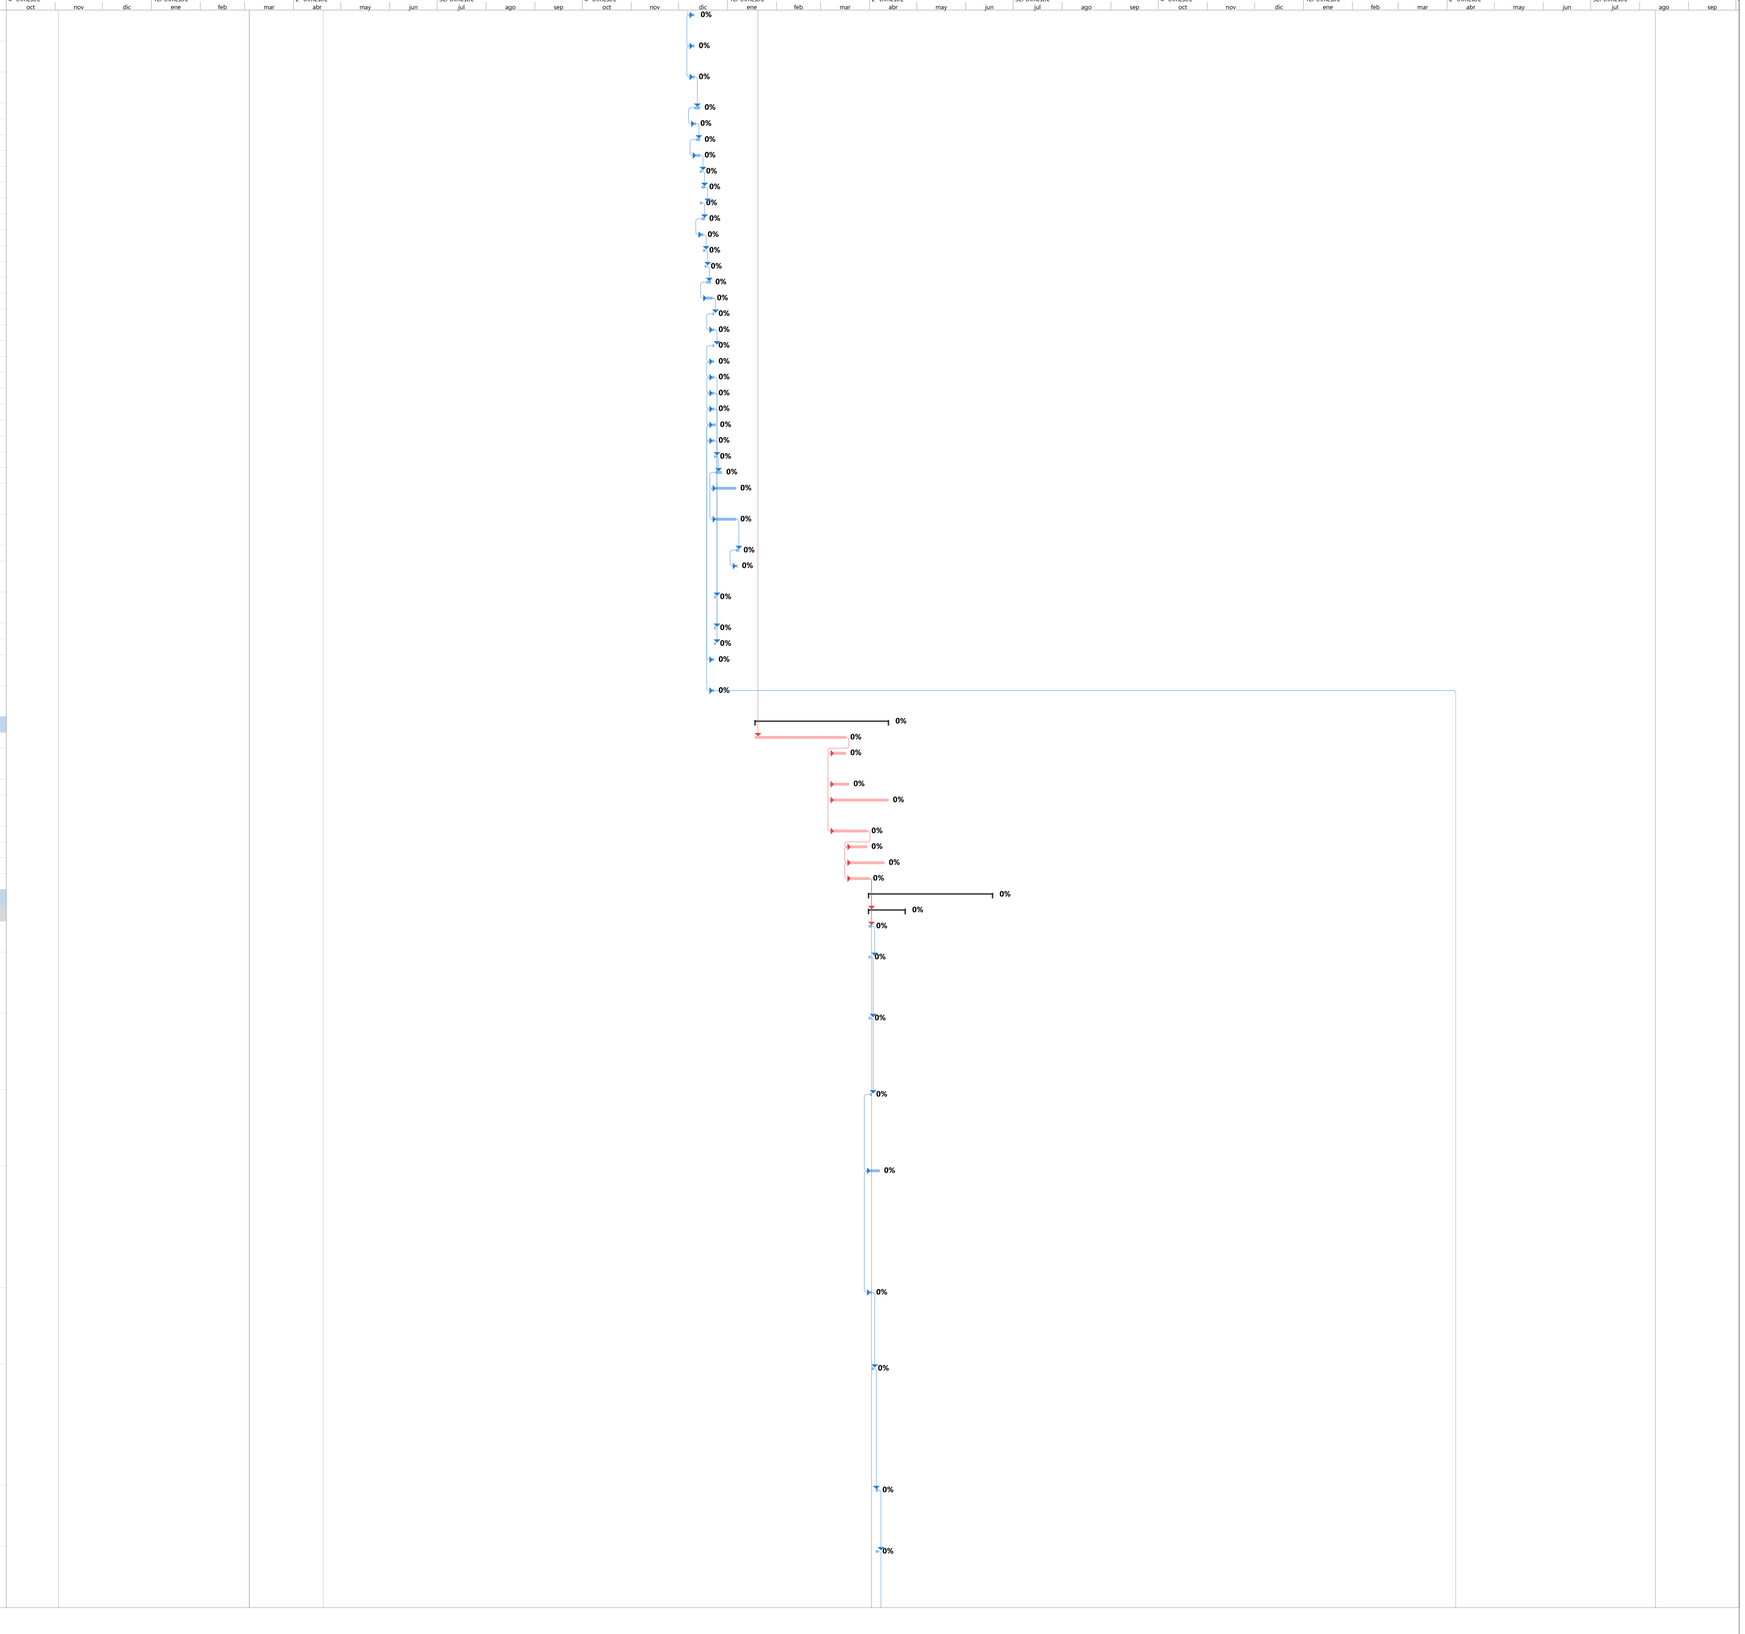


Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
275		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA O COFRE TIPO INTERIOR CON AMPLIFICADOR PARA SEÑAL COMUNITARIA TV, CON AJUSTE DE GANANCIA Y REGULACIÓN DE PENDIENTE, AMPLIFICADOR DE CANALES ANALÓGICOS Y DIGITALES (TD), INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN, FIJACIÓN Y CONEXIÓN,	15,00	1 día	1	$ 550.170,00	mar 6/04/27	mié 7/04/27
276		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK DE PISO CON 42 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	8,00	1 día	1	$ 12.002.834,00	mar 6/04/27	mié 7/04/27
277		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK DE PISO DE 36 UR INCLUYE, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	8,00	1 día	1	$ 3.825.089,00	mié 7/04/27	jue 8/04/27
278		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2 UR	20,00	1 día	1	$ 599.924,00	mié 7/04/27	jue 8/04/27
279		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	20,00	1 día	1	$ 8.931.552,00	jue 8/04/27	vie 9/04/27
280		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	20,00	1 día	1	$ 3.441.134,00	jue 8/04/27	vie 9/04/27
281		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA EQUIPOS. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	10,00	1 día	1	$ 642.837,00	jue 8/04/27	vie 9/04/27
282		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE FIBRA DE 12 HILOS OM4. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	10,00	1 día	1	$ 4.487.967,00	vie 9/04/27	sáb 10/04/27
283		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA CONECTORES DE FIBRA	30,00	1 día	1	$ 771.741,00	sáb 10/04/27	lun 12/04/27
284		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT FAN OUT LC/LC PARA FIBRA MULTIMODO OM4. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. (POR PAR)	10,00	1 día	1	$ 1.071.660,00	sáb 10/04/27	lun 12/04/27
285		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC PARA FIBRA MULTIMODO, INCLUYE CONECTORIZACION (PAR)	80,00	1 día	1	$ 133.320,00	mar 13/04/27	mar 13/04/27
286		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PDU VERTICAL PARA RACK, CON 10 TOMACORRIENTES	10,00	1 día	1	$ 849.873,00	mié 14/04/27	mié 14/04/27
287		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI DE 12 MTS (VISUALIZACIÓN CCTV)	30,00	1 día	1	$ 78.154,00	mié 14/04/27	mié 14/04/27
288		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA LC/LC (PAR)	10,00	1 día	1	$ 375.051,00	mié 14/04/27	mié 14/04/27
289		10,1,1	CERTIFICACIÓN DE CONECTORIZACION DE FIBRA ÓPTICA (POR PAR)	1,00	6 días	1	$ 365.256,00	mié 14/04/27	mié 21/04/27
290		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE PASIVO PARA TECHO REDONDO 100W O SIMILAR, CON SENSIBILIDAD DE 90 DB O MÁS. (PARA INSTALAR EN EL AUDITORIO/ AULA MÚLTIPLE)	10,00	1 día	1	$ 1.440.957,00	mié 21/04/27	jue 22/04/27
291		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE PASIVO PARA TECHO/MURO 100W O SIMILAR, CON SENSIBILIDAD DE 90 DB O MÁS. (PARA INSTALAR EN PASILLOS)	10,00	1 día	1	$ 1.921.276,00	mié 21/04/27	jue 22/04/27
292		10,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK DE MURO DE 13 UR INCLUYE, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	10,00	1 día	1	$ 2.697.718,00	jue 22/04/27	vie 23/04/27
293		10,1,1	CONFIGURACIÓN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.	1,00	1 día	1	$ 1.414.400,00	jue 22/04/27	vie 23/04/27
294		**10,2**	**SALIDAS DE COMUNICACIONES**		**4 días**		**$ 15.301.050,00**	**vie 23/04/27**	**jue 29/04/27**
295		10,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS/TEL VOIP PARA TOMA RJ 45 CAT 6A, INCLUYE GALVANZIDA CON TAPA, FACEPLATE SENCILLO, JACKCAT 6A AZUL, 3 MTS DE TUBERÍA EMT 3/4" , 3 MTS DE CABLE UTP CAT 6A	10,00	2 días	1	$ 2.349.828,00	vie 23/04/27	mar 27/04/27
296		10,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS/TEL VOIP PARA TOMA RJ 45 CAT 6A EN CANALETA, INCLUYE TROQUEL LÓGICO, FACEPLATE SENCILLO, JACKCAT 6A DATOS, 3 MTS DE TUBERÍA EMT 3/4" , 3 MTS DE CABLE UTP CAT 6A	10,00	1 día	1	$ 704.416,00	vie 23/04/27	lun 26/04/27
297		10,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE SONIDO, INCLUYE CAJA GALVANIZADA CON TAPA, FACEPLATE SENCILLO, 4 MTS DE TUBERÍA EMT 3/4" , 3 MTS DE CABLE UTP CAT 6A	10,00	3 días	1	$ 3.501.864,00	lun 26/04/27	jue 29/04/27
298		10,2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA HDMI, INCLUYE CAJA GALVANIZADA DOBLE FONDO CON TAPA, FACEPLATE PARA HDMI, CONECTORIZACION DE CONECTOR HEMBRA HDMI, 5 MTS DE TUBERÍA EMT 1 1/4" , 6 MTS DE CABLE HDMI	10,00	2 días	1	$ 4.746.600,00	lun 26/04/27	mié 28/04/27
299		10,2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA VACÍA PARA TOMA DE TV, INCLUYE APARATO, INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", CAJA FUNDIDA EN ALUMINIO Y TAPACIEGA, NO INCLUYE CABLEADO.	10,00	1 día	1	$ 495.486,00	lun 26/04/27	mar 27/04/27
300		10,2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE 5 FT (PARA CADA SALIDA Y DENTRO DEL GABINETE)	70,00	1 día	1	$ 1.481.376,00	mar 27/04/27	mié 28/04/27

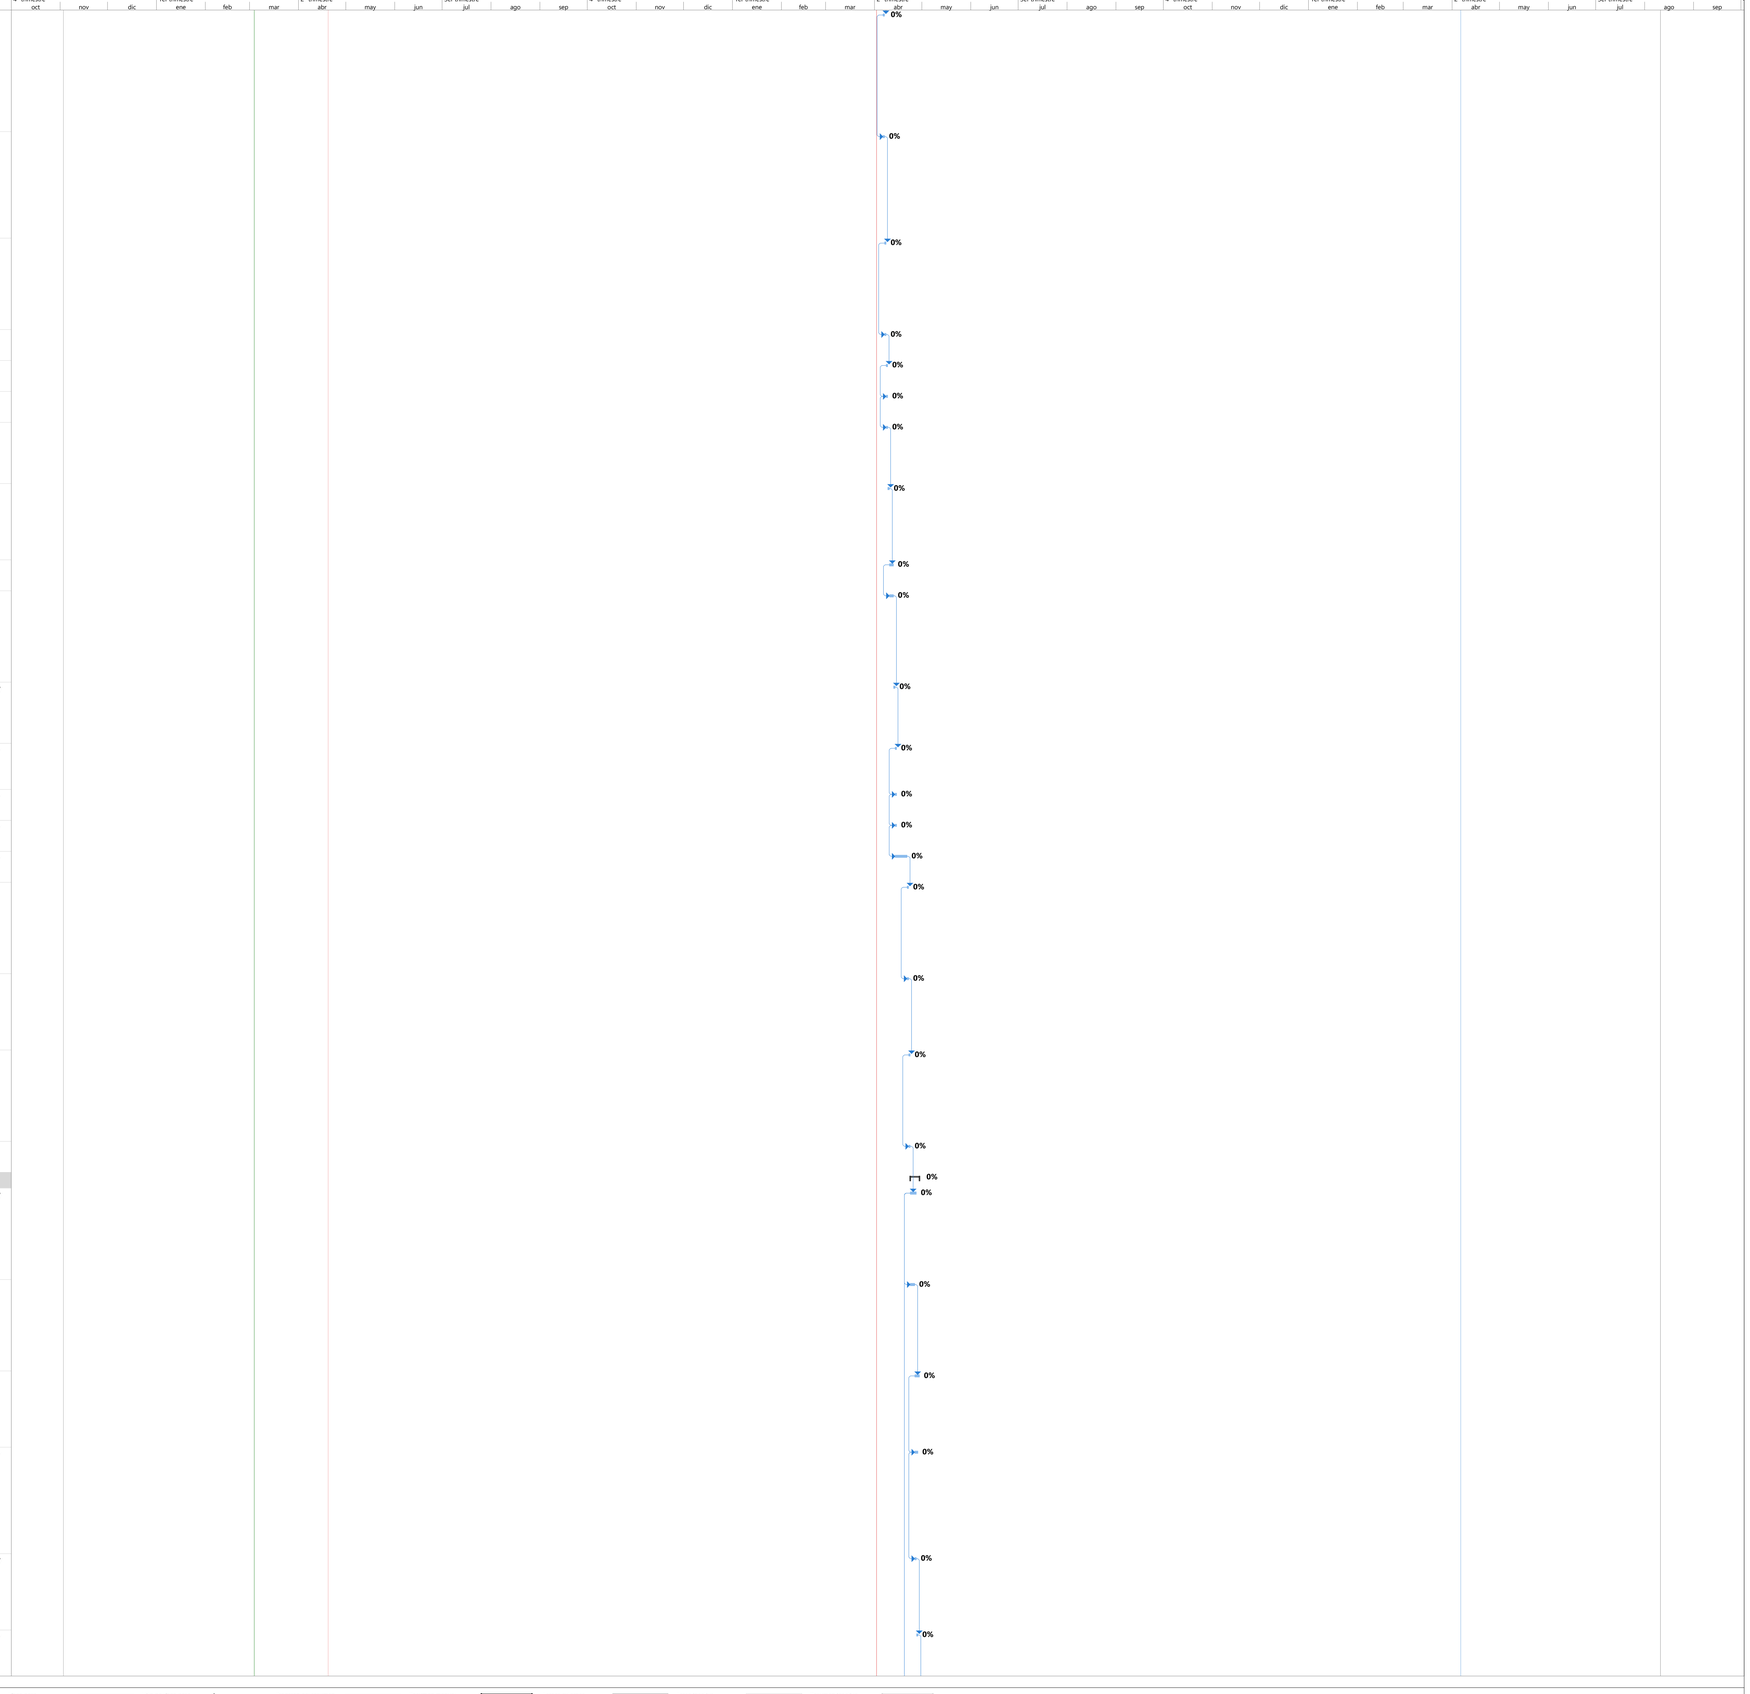


Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Id	Modi de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
301		10,2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA VACÍA DE DATOS/DMX PARA CONTROL SONIDO Y E ILUMINACIÓN AUDITORIO PARA TOMA RJ 45 CAT 6A, INCLUYE CAJA FUNDIDA EN ALUMINIO 4X4" CON TAPA, FACEPLATE SENCILLO, 3 MTS DE TUBERÍA EMT 3/4"	15,00	1 día	1	$ 2.021.480,00	mié 28/04/27	jue 29/04/27
302		**10,3**	**SALIDAS DE COMUNICACIONES PARA SONIDO**		**38 días**		**$ 66.416.366,00**	**vie 23/04/27**	**jue 17/06/27**
303		10,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 2" ENTRE RACK Y DUCTO CERRADO, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	30,00	1 día	1	$ 1.580.500,00	vie 23/04/27	lun 26/04/27
304		10,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	30,00	1 día	1	$ 979.200,00	lun 26/04/27	mar 27/04/27
305		10,3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	30,00	1 día	2	$ 420.712,00	lun 26/04/27	mar 27/04/27
306		10,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" (UTP COMPARTIDO COAXIAL), INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	30,00	6 días	2	$ 10.207.600,00	lun 26/04/27	mar 4/05/27
307		10,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" , INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	30,00	11 días	2	$ 16.630.880,00	lun 26/04/27	mié 12/05/27
308		10,3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3/4" EN PISO O MURO , INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CAJAS DE PASO, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES, NO INCLUYE RESANE DE OBRA CIVIL O REGATA EN PISO.	150,00	1 día	1	$ 820.875,00	mié 12/05/27	jue 13/05/27
309		10,3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1 1/2" EN PISO O MURO , INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CAJAS DE PASO, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES, NO INCLUYE RESANE DE OBRA CIVIL O REGATA EN PISO.	120,00	1 día	1	$ 1.380.995,00	mié 12/05/27	jue 13/05/27
310		10,3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A LSZH.	150,00	10 días	2	$ 16.235.000,00	mié 12/05/27	mar 25/05/27
311		10,3,9	CERTIFICACIÓN DE PUNTO DATOS CAT 6A	1,00	16 días	2	$ 473.976,00	mié 26/05/27	jue 17/06/27
312		10,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA MULTIMODO OM4 TIPO INTERIOR/EXTERIOR, 12 HILOS	50,00	3 días	1	$ 2.986.320,00	mié 26/05/27	vie 28/05/27
313		10,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4" PARA CABLEADO DE TV (SOLO CANALIZACIÓN NO SE CONTEMPLA CABLE COAXIAL NI UTP), INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN COMO CHAZOS, ABRAZADERAS DOBLE ALA, UNIONES Y TERMINALES	30,00	2 días	1	$ 1.069.128,00	mié 26/05/27	jue 27/05/27
314		10,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 3/4" PARA CABLEADO DE SONIDO (SOLO CANALIZACIÓN NO SE CONTEMPLA CABLE), INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN COMO CHAZOS, ABRAZADERAS DOBLE ALA, UNIONES Y TERMINALES	30,00	7 días	2	$ 11.879.200,00	vie 28/05/27	mié 9/06/27
315		10,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL RG6, INCLUYE ACCESOS DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN. SPLITTERS ENTRE OTROS. (PUEDE CAMBIAR DEPENDIENDO EL SERVICIO U OPERADOR).	400,00	1 día	1	$ 366.000,00	mié 9/06/27	jue 10/06/27
316		10,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE SONIDO 2X16AWG DESOXIGENADO LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE ACCESOS DE CONEXIÓN.	400,00	1 día	2	$ 1.385.980,00	mié 9/06/27	jue 10/06/27
317		**10,4**	**SISTEMA DE GENERACIÓN FOTO VOLTAICO**		**12 días**		**$ 104.750.089,00**	**mié 26/05/27**	**sáb 12/06/27**
318		10,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 600 W , 48 V, 13 A, INCLUYE PAR DE CONECTORES MC4 MACHO/HEMBRA PARA PANELES SOLARES.	10,00	4 días	1	$ 31.854.108,00	mié 26/05/27	mar 1/06/27
319		10,4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PANEL SOLAR EN ALUMINIO PARA CUBIERTA PLANA, CON 10° INCLINACIÓN SUR	10,00	2 días	2	$ 17.411.394,00	mié 26/05/27	jue 27/05/27
320		10,4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 3/4", INCLUYE CAJAS DE PASO TIPO EXTERIOR Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	50,00	2 días	1	$ 2.624.969,00	vie 28/05/27	mar 1/06/27
321		10,4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA 3/4", INCLUYE CAJAS DE PASO TIPO EXTERIOR Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, UNIONES Y CURVAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN	50,00	1 día	1	$ 991.683,00	mar 1/06/27	mié 2/06/27
322		10,4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO XLPE TIPO SOLAR FV PARA 1 KV, 90°C, 2X10 AWG + 12 DESNUDO TIERRA PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES, INCLUYE CONECTORES Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.	50,00	2 días	1	$ 2.932.974,00	mar 1/06/27	jue 3/06/27
323		10,4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO XLPE TIPO SOLAR FV PARA 1 KV, 90°C, 2X6 AWG + 10 DESNUDO TIERRA PARA CONEXIÓN DE PANELES SOLARES, INCLUYE CONECTORES Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.	50,00	1 día	1	$ 398.630,00	mar 1/06/27	mié 2/06/27

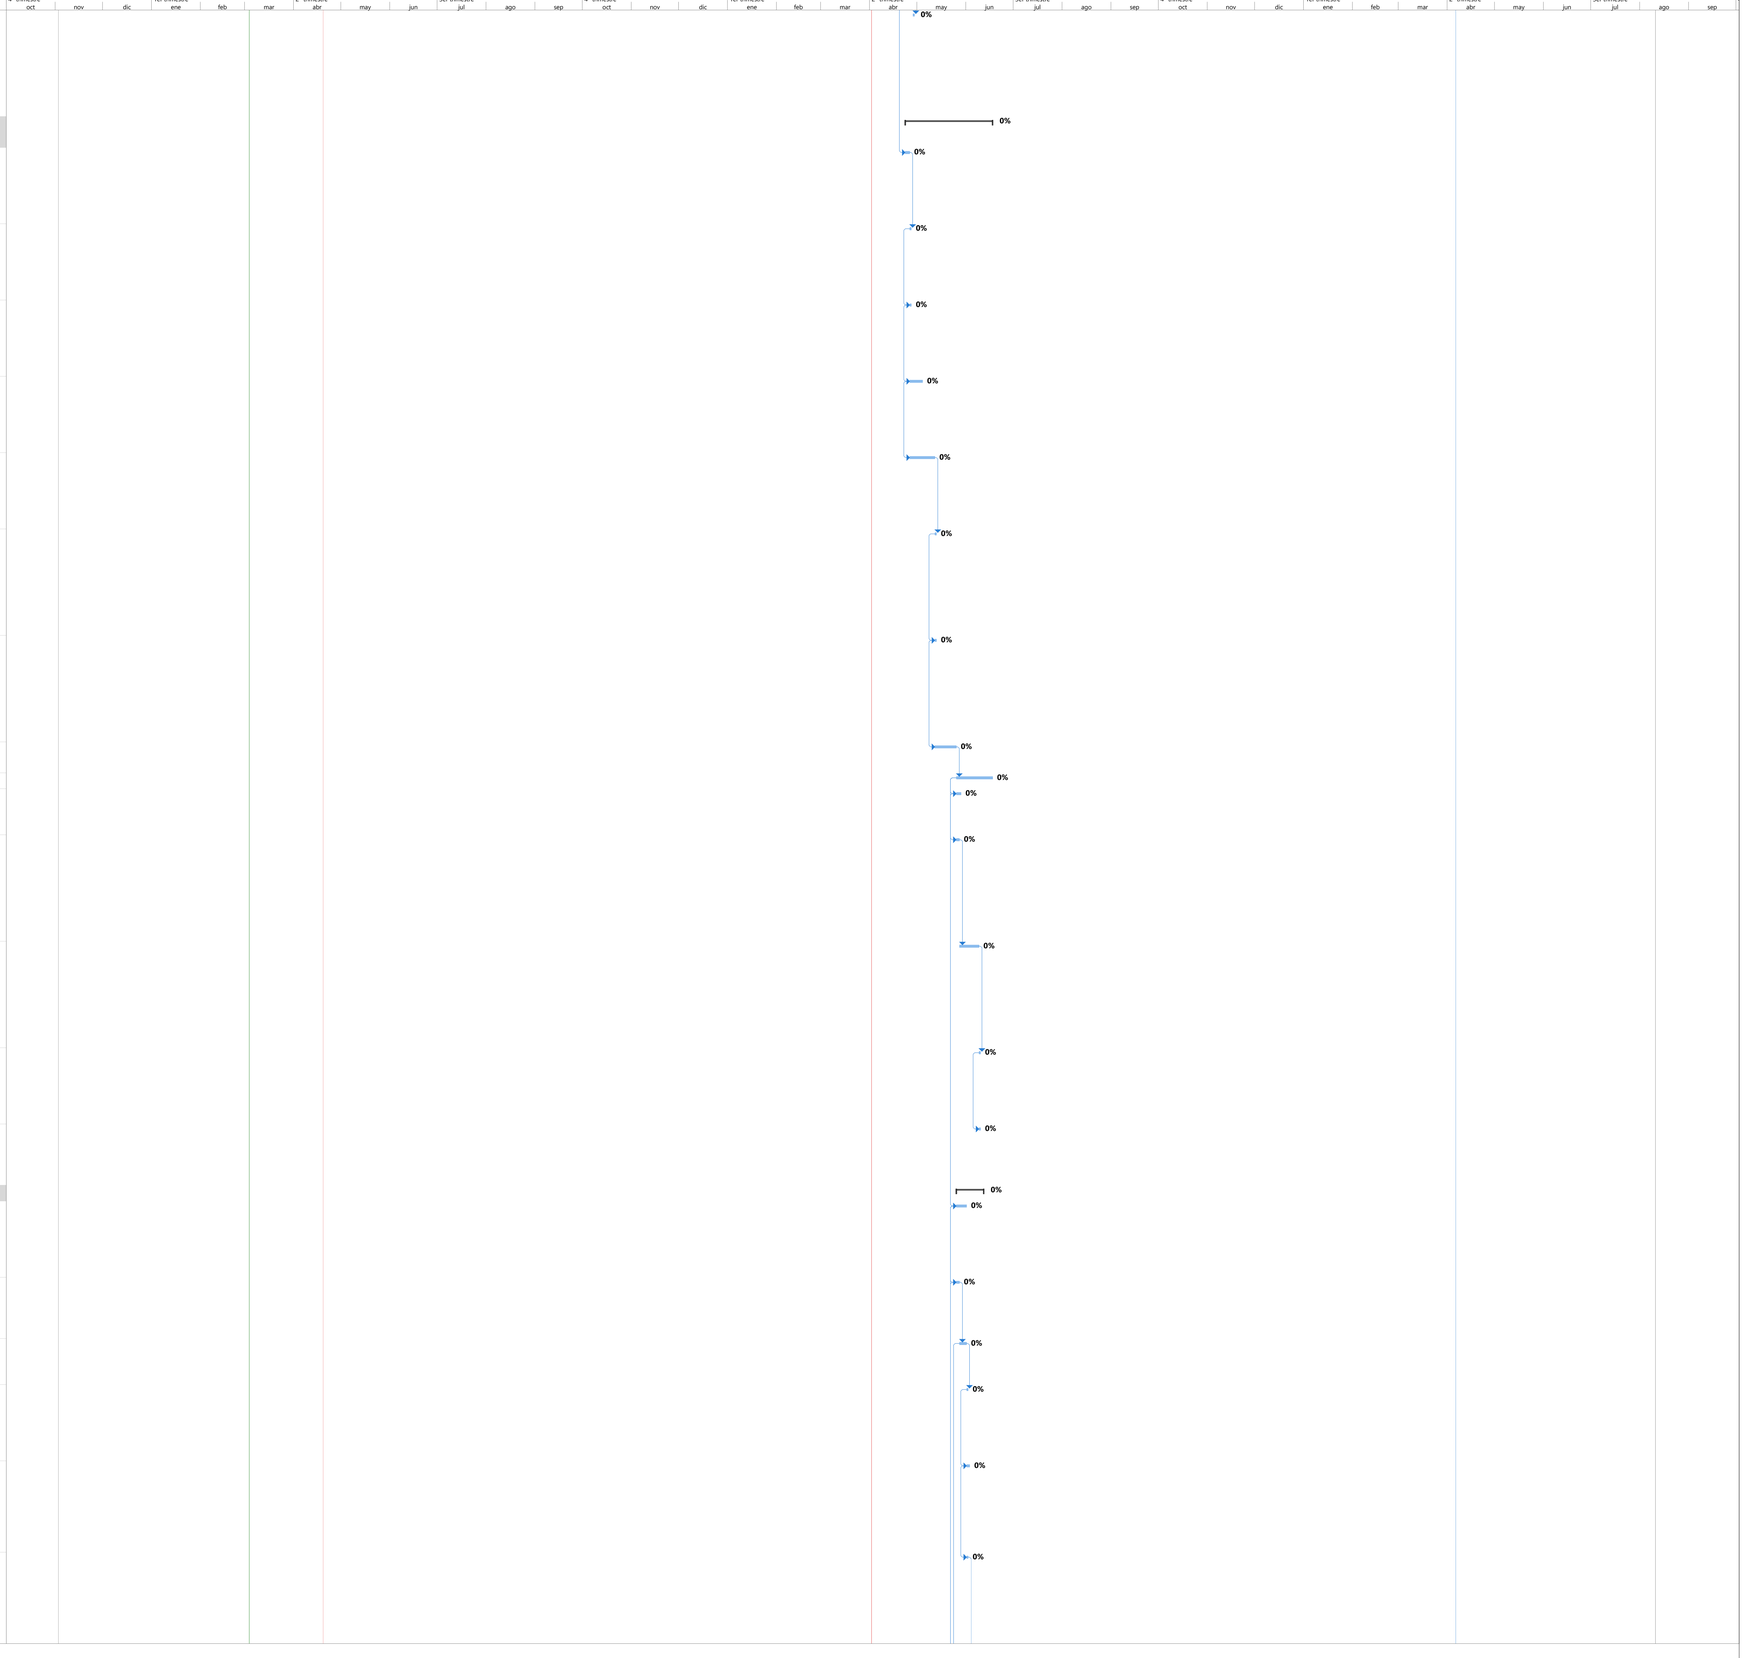


Tareas críticas | División crítica | Tarea | Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | División | Tarea manual | solo el comienzo | solo fin | solo duración | Línea base | División de la línea base | Hito de línea base | Hito | Progreso del resumen | Resumen | Resumen manual | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Fecha límite

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
324		10,4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBINER BOX O CAJA DE CONEXIONES, CON FUSIBLES DE 15 A, INTERRUPTOR DC DE 2X16A, DPS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR.	10,00	1 día	1	$ 3.466.309,00	mié 2/06/27	jue 3/06/27
325		10,4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR TIPO ON-GRID 30 KW	10,00	1 día	1	$ 26.555.856,00	jue 3/06/27	vie 4/06/27
326		10,4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1 1/2" ENTRE INVERSOR Y TABLEROS, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES	130,00	1 día	1	$ 4.119.680,00	vie 4/06/27	mar 8/06/27
327		10,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE CU HFFR-LS 3X4 AWG F + 4 AWG N + 8 T DE INVERSOR A TGD. INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	10,00	5 días	2	$ 8.356.964,00	vie 4/06/27	sáb 12/06/27
328		10,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MOLDEADA Y BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A PARA INVERSOR.	10,00	1 día	2	$ 794.020,00	vie 4/06/27	mar 8/06/27
329		10,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SMART METER EN CAJA METÁLICA, INCLUYE CABLEADO APANTALLADO 3X16 AWG HASTA EL INVERSOR, INCIDENCIA DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.	10,00	1 día	2	$ 3.389.997,00	mar 8/06/27	mié 9/06/27
330		10,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1 1/2" EN PISO O MURO , INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIÓN Y FIJACIÓN, ABRAZADERAS, CAJAS DE PASO, CHAZOS, INCIDENCIA DE TERMINALES Y UNIONES, NO INCLUYE RESANE DE OBRA CIVIL O REGATA EN PISO.	130,00	1 día	1	$ 243.705,00	mié 9/06/27	jue 10/06/27
331		10,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE APANTALLADO 3X16AWG PARA SMART METER, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	130,00	1 día	1	$ 1.609.800,00	jue 10/06/27	vie 11/06/27
332		**10,5**	**TABLEROS ELÉCTRICOS ESPECIALES CONTROL**		**3 días**		**$ 23.083.941,00**	**mié 26/05/27**	**vie 28/05/27**
333		10,5,1	[TE-001] TABLERO DE FUERZA Y CONTROL SISTEMA DE VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN (CAL. 12 NEMA 12 60X60X20CM). SUMINISTRO E INSTALACION	5,00	1 día	1	$ 7.694.647,00	mié 26/05/27	mié 26/05/27
334		10,5,2	[TE-101] TABLERO DE FUERZA Y CONTROL SISTEMA DE VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN (CAL. 12 NEMA 12 60X60X20CM). SUMINISTRO E INSTALACION	5,00	1 día	1	$ 7.694.647,00	mié 26/05/27	mié 26/05/27
335		10,5,3	[TE-501] TABLERO DE FUERZA Y CONTROL SISTEMA DE VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN (CAL. 12 NEMA 12 60X60X20CM). SUMINISTRO E INSTALACION	5,00	1 día	1	$ 7.694.647,00	vie 28/05/27	vie 28/05/27
336		**10,6**	**ELEMENTOS DE CONTROL**		**4 días**		**$ 8.232.558,00**	**mié 26/05/27**	**mar 1/06/27**
337		10,6,1	CONTROLADOR PRINCIPAL 8UI6UO (BAC-5901C KMC CONTROLS O SIMILAR APROBADO)	5,00	1 día	1	$ 7.459.844,00	mié 26/05/27	mié 26/05/27
338		10,6,2	[SCO] SENSOR EN ZONA D MONÓXIDO DE CARBONO (STE-9501 KMC O SIMILAR APROBADO). SUMINISTRO E INSTALACION	5,00	1 día	1	$ 363.402,00	mié 26/05/27	mié 26/05/27
339		10,6,3	TRANSFORMADOR 120 VAC - 24 VAC; 96 VA (XEE-6111-050 KMC CONTROLS O SIMILAR APROBADO). SUMINISTRO E INSTALACION	5,00	1 día	1	$ 409.312,00	sáb 29/05/27	mar 1/06/27
340		**11**	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**		**22 días**		**$ 64.706.323,49**	**mié 31/03/27**	**jue 29/04/27**
341		11,01	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	13,33	9 días	1	$ 12.160.288,40	mié 31/03/27	lun 12/04/27
342		11,02	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	14,00	6 días	1	$ 3.451.744,30	mié 31/03/27	jue 8/04/27
343		11,03	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	16,00	17 días	1	$ 19.302.491,97	mié 31/03/27	jue 22/04/27
344		11,04	CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO PLANO DRYWALL RH (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE ANCLAJE)	15,00	3 días	1	$ 4.495.134,72	jue 22/04/27	mar 27/04/27
345		11,05	CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO EN MADERA PLÁSTICA TIPO H-10-30 (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE ANCLAJE)	40,00	4 días	1	$ 15.891.647,05	jue 22/04/27	mié 28/04/27
346		11,06	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	12,00	5 días	1	$ 4.593.359,65	jue 22/04/27	jue 29/04/27
347		11,07	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	16,00	4 días	1	$ 4.811.657,40	jue 22/04/27	mié 28/04/27
348		**8,7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS**		**30 días**		**$ 127.393.956,00**	**mié 28/04/27**	**vie 11/06/27**
349		8,7,1	BALA SATURNO GS 32 W 4000 K	4,00	5 días	3	$ 33.383.380,00	mié 28/04/27	mié 5/05/27
350		8,7,2	BALA SATURNO GS 32 W 4000 K DIMERIZADA AL 70 %	8,00	3 días	1	$ 9.958.440,00	mié 5/05/27	mar 11/05/27
351		8,7,3	BALA SATURNO GS 32 W 4000 K DIMERIOZADA AL 50%	12,00	3 días	1	$ 9.480.640,00	mar 11/05/27	vie 14/05/27
352		8,7,4	CINTA LED 9,6 W METRO LINEAL	4,00	4 días	3	$ 17.678.740,00	vie 14/05/27	jue 20/05/27
353		8,7,5	BALA LED DE EMERGENCIA DE 1 W DE INCRUSTAR	6,50	2 días	2	$ 11.630.750,00	vie 14/05/27	mar 18/05/27
354		8,7,6	AVISO DE SALIDA LED 3,8 W	3,20	4 días	2	$ 12.259.450,00	mar 18/05/27	sáb 22/05/27
355		8,7,7	BALA DE PISO LED 2W	50,00	1 día	1	$ 829.873,00	sáb 22/05/27	lun 24/05/27
356		8,7,8	LUMINARIA TIPO GUIA LED 8W	4,00	3 días	2	$ 4.073.904,00	mar 25/05/27	jue 27/05/27
357		8,7,9	PANEL LED DE 40 W	3,25	2 días	2	$ 3.457.795,00	vie 28/05/27	mar 1/06/27
358		8,7,10	PANEL LED DE 18 W	4,20	3 días	1	$ 2.829.105,00	mar 1/06/27	vie 4/06/27
359		8,7,11	LUMINARIA DE EMERGENCIA APLIQUE DE 4 W	20,00	1 día	1	$ 1.433.417,00	vie 4/06/27	mar 8/06/27
360		8,7,12	BALA DE INCRUSTAR DE 15 W	12,00	2 días	1	$ 2.112.408,00	mar 8/06/27	jue 10/06/27
361		8,7,13	LUMINARIA HERMETICA DE 36 W	5,50	1 día	1	$ 1.634.595,00	mar 8/06/27	mié 9/06/27
362		8,7,14	LUMINARIA LINEAL LED DE 38 W	8,00	3 días	1	$ 4.178.358,00	mar 8/06/27	vie 11/06/27
363		8,7,15	LUMINARIA LINEAL LED DE 9W	6,50	1 día	1	$ 1.207.086,00	mar 8/06/27	mié 9/06/27
364		8,7,16	BALA LED RECESADA STIL DE 36 W	6,50	2 días	1	$ 2.212.991,00	mar 8/06/27	jue 10/06/27
365		8,7,17	LUMINARIA STIL LED BAÑADOR PARA MURO	6,50	3 días	1	$ 3.420.077,00	mar 8/06/27	vie 11/06/27
366		8,7,18	LUMINARIA LED TIPO MOMO PARA EXTERIORES DE 15 W	7,00	2 días	1	$ 1.086.376,00	mar 8/06/27	jue 10/06/27
367		8,7,19	BALA TIPO LED DE INCRUSTAR GU10D DE 7 W	6,00	3 días	1	$ 3.017.715,00	mar 8/06/27	vie 11/06/27

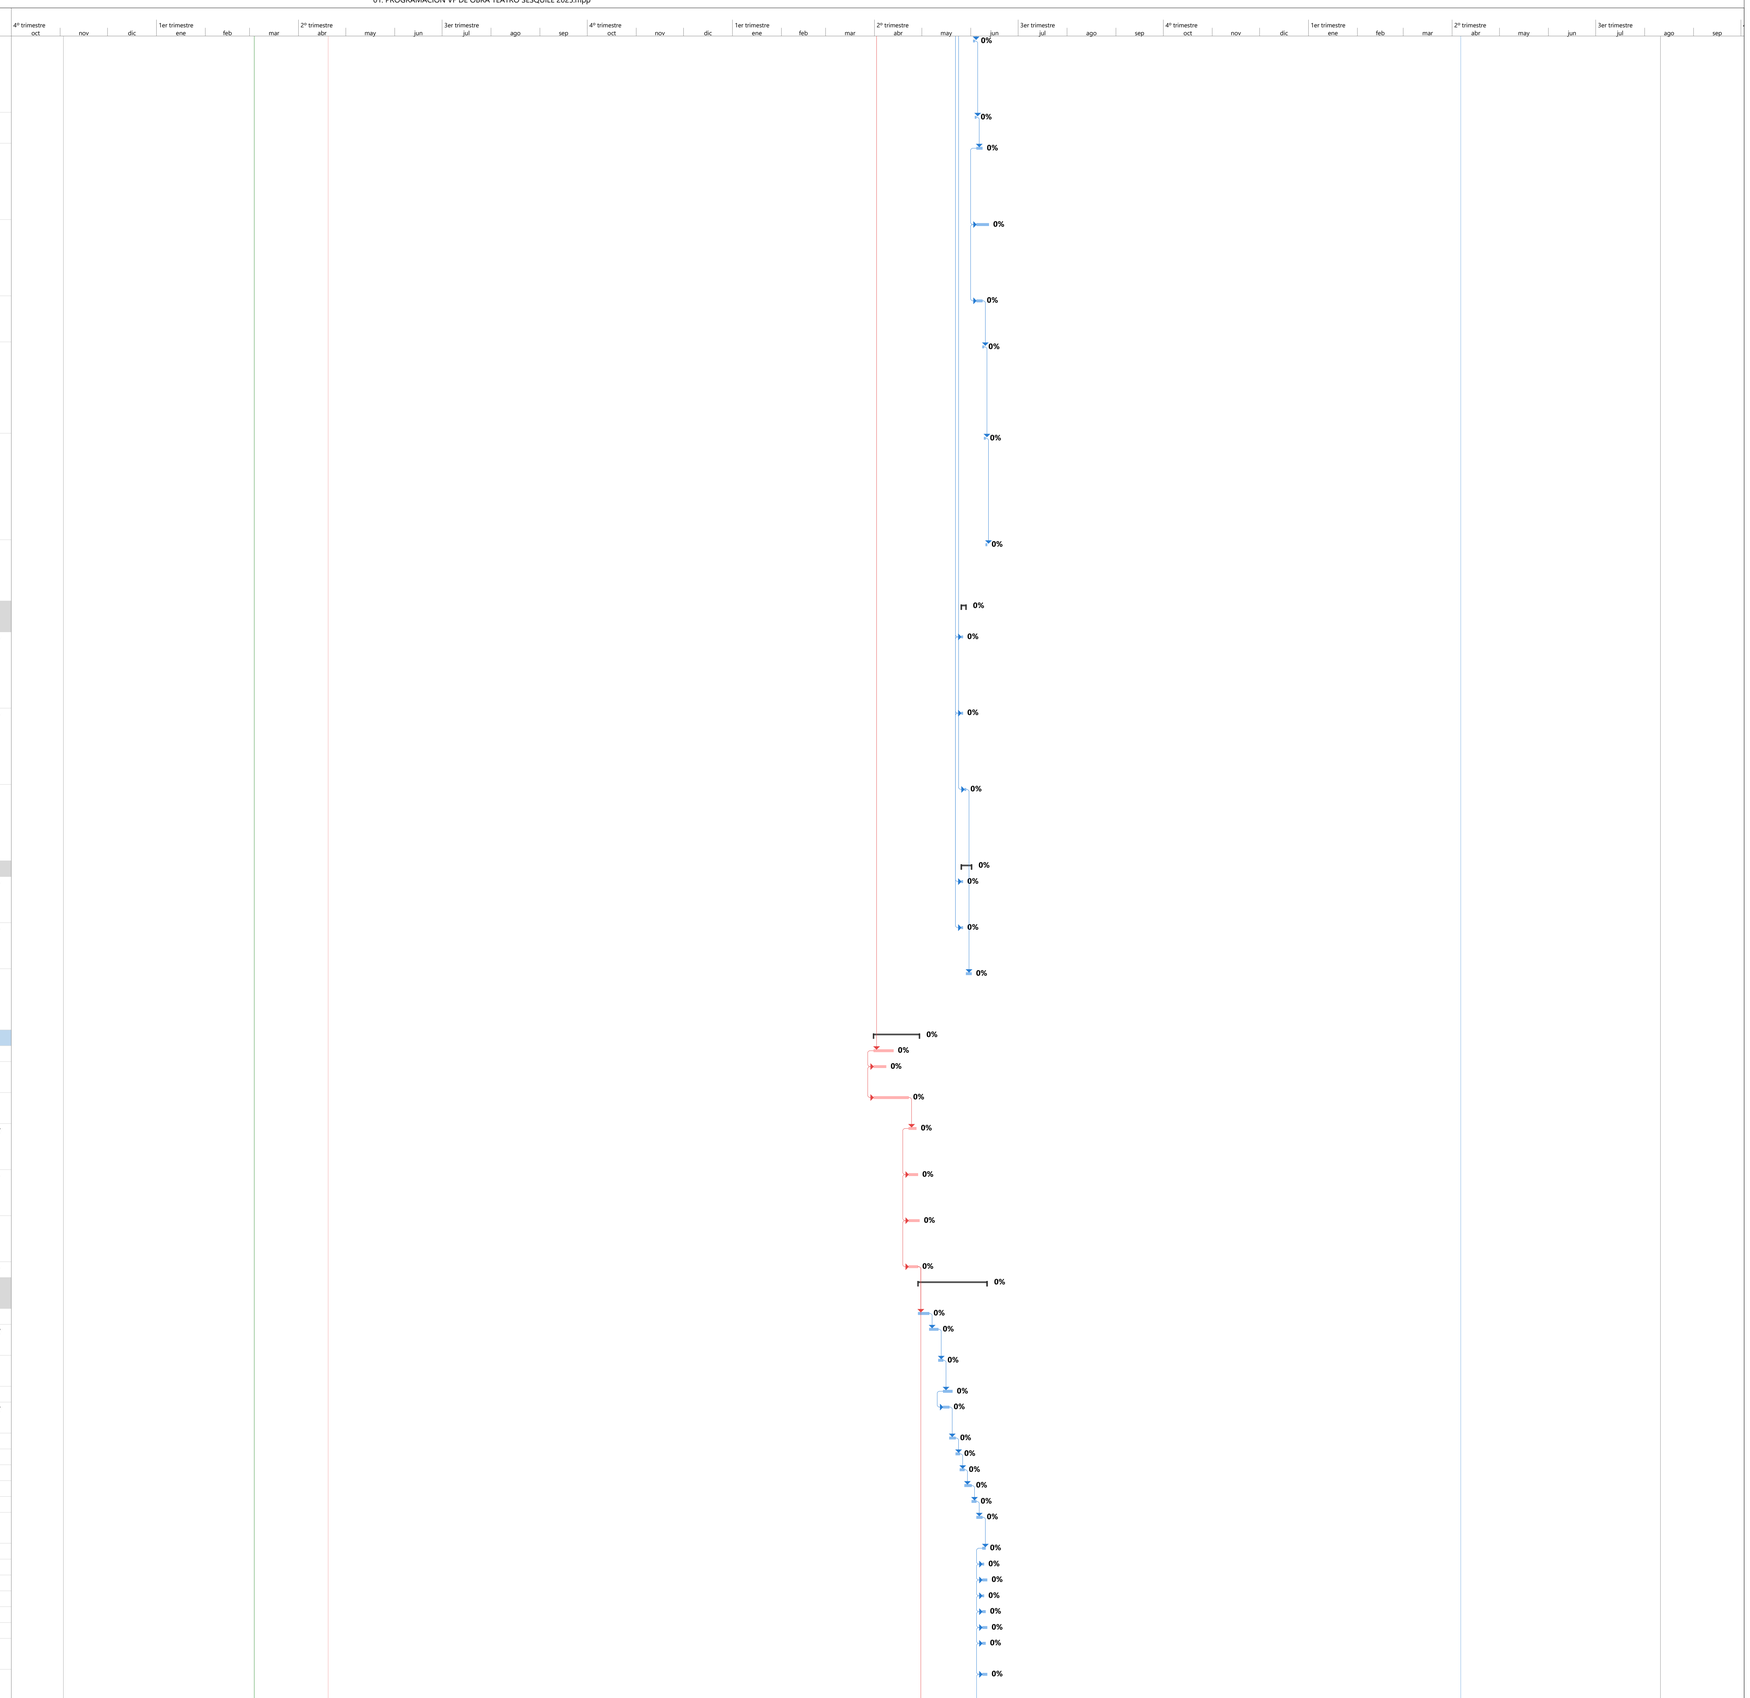


Tareas críticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | solo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite

Id	Modi de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
368		8,7,2(	BALA TIPO TORTUGA PARA TERRAZA 18 W	5,50	1 día	1	$ 1.508.856,00	mar 8/06/27	mié 9/06/27
369		**14**	**PINTURA**		**120 días**		**$ 166.973.860,02**	**mié 28/04/27**	**jue 14/10/27**
370		14,02	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	22,22	60 días	2	$ 94.982.909,31	mié 28/04/27	vie 23/07/27
371		14,03	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	32,00	3 días	1	$ 1.214.811,08	lun 19/07/27	vie 23/07/27
372		14,04	CONSTRUCCIÓN DE ACABADO DE FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	50	43 días	2	$ 41.121.621,54	sáb 22/05/27	vie 23/07/27
373		12,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO EN PVC PARA MURO	50	23 días	1	$ 8.503.890,95	mié 7/07/27	lun 9/08/27
374		14,05	CONSTRUCCIÓN DE ACABADO EN ESTUCO Y PINTURA BAJO PLACA (TRES MANOS)	16	4 días	1	$ 1.657.676,64	lun 2/08/27	vie 6/08/27
375		14,01	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	16,00	50 días	2	$ 19.492.950,50	vie 6/08/27	jue 14/10/27
376		**13**	**ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS INTERNOS**		**40 días**		**$ 68.976.447,72**	**lun 2/08/27**	**sáb 25/09/27**
377		13,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	9,41	20 días	1	$ 14.946.282,00	lun 2/08/27	lun 30/08/27
378		13,02	REMATES BOCEL ALUMINIO	28,00	3 días	1	$ 1.038.609,00	lun 30/08/27	jue 2/09/27
379		13,03	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	5,33	3 días	1	$ 3.470.838,00	lun 30/08/27	jue 2/09/27
380		13,04	ACABADO EN ENCHAPE LÁMINA MADERA MURO (INCLUYE PEGANTE Y ACCESORIOS DE ANCLAJE)	8,00	20 días	1	$ 49.520.718,72	lun 30/08/27	sáb 25/09/27
381		**12**	**CARPINTERÍA MADERA Y METÁLICA**		**17 días**		**$ 275.034.458,27**	**sáb 25/09/27**	**mié 20/10/27**
382		12,01	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MURO CORTINA FACHADA CON PERFILERÍA EN ALUMINIO - VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO 3+3 (INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, VENTANA CORREDIZA/PROYECTANTE Y PAPEL VINILO OPALIZADO COLORES SEGÚN DISEÑO)	8,00	11 días	1	$ 61.368.094,55	sáb 25/09/27	lun 11/10/27
383		12,02	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE VENTANA FACHADA EN PERFIL ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 3+3 PARA FACHADA (INCLUYE VENTANA CORREDIZA SELLO NEOPRENO Y ACCESORIOS DE ANCLAJE)	8,00	5 días	1	$ 26.840.750,90	sáb 25/09/27	vie 1/10/27
384		12,12	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE DIVISIONES PARA OFICINAS VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM (INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE)	12,00	3 días	1	$ 12.156.997,05	sáb 25/09/27	mié 29/09/27
385		12,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOS ABRAS BATIENTE CON PERFIL DE ALUMINIO INFERIOR Y SUPERIOR 03B, VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO 5+5 (INCLUYE BISAGRAS, HERRAJES, CERRADURA DE SOBREPONER DOBLE VIDRIO FUSIÓN LLAVE LLAVE, CERRADURA DE PISO, PASADOR DE TECHO	8,00	2 días	1	$ 9.484.269,73	mar 28/09/27	mié 29/09/27
386		12,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DIÁM. 2" (INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE)	75,00	3 días	1	$ 44.438.344,50	mar 28/09/27	jue 30/09/27
387		12,08	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO 4+4 CON PARALES Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE ACCESORIOS Y HERRAJES DE ANCLAJE)	10,00	3 días	1	$ 18.833.196,00	mar 28/09/27	jue 30/09/27
388		12,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA CORTAFUEGO METÁLICA GALVANIZADA RESISTENCIA AL FUEGO 90 MINUTOS CERTIFICACION UL CALIBRE 20.(INCLUYE CERRADURA Y BARRA ANTIPÁNICO, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE ANCLAJE)	5,00	6 días	1	$ 48.101.855,00	mar 28/09/27	mar 5/10/27
389		12,13	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PUERTA METÁLICA CON REJILLA HOJA EN LÁMINA CAL 18 EN CELOSÍA DE ACERO CR E=1.1 mm ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE MARCO Y CERRADURA SEGÚN DISEÑO CUARTO ELECTRICO)	10,00	2 días	1	$ 6.418.193,50	jue 30/09/27	vie 1/10/27
390		12,04	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	11,43	2 días	1	$ 7.603.368,00	sáb 2/10/27	mar 5/10/27
391		12,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA ORINAL 148X46 (INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE	12,00	1 día	1	$ 2.000.440,00	mar 5/10/27	mié 6/10/27
392		12,06	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	4,50	9 días	1	$ 36.372.177,92	mar 5/10/27	mar 19/10/27
393		12,09	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	16,00	1 día	1	$ 1.416.771,12	mar 19/10/27	mié 20/10/27
394		**15**	**DISEÑO ACUSTICO**		**130 días**		**$ 1.626.112.231,70**	**mié 20/10/27**	**sáb 15/04/28**
395		15,01	MADERA PERFORADA MDF 12 MM CON PERFORACIONES CIRCULARES, ACABADO EN FORMICA Y RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO TIPO BLACK THEATER 1", INCLUYE ESTRUCTURA PARA INSTALACION.	5,00	38 días	1	$ 235.884.028,38	mié 20/10/27	mar 14/12/27
396		15,02	MADERA LISA MDF 12 MM, CON ACABADO EN FORMICA. INCLUYE ESTRUCTURA PARA INSTALACION Y RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO.	5,00	58 días	1	$ 283.206.119,34	mié 20/10/27	lun 10/01/28
397		15,04	PUERTA ACUSTICA SENCILLA STC 43. PUERTA ENTAMBORADA REFORZADA CON MEMBRANA ACUSTICA Y RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE UMBRAL AUTOMATICO DE PISO Y CERRADURA SENCILLA. ACABADO EN FORMICA. DIMENSIONES 1,15X2,5 M.	0,50	6 días	1	$ 39.323.223,00	lun 10/01/28	mar 18/01/28
398		15,05	PUERTA ACUSTICA DOBLE STC - 43. PUERTA ENTAMBORADA REFORZADA CON MEMBRANA ACUSTICA Y RELLENO EN FIBRA DE VISRIO. INCLUYE UMBRAL AUTOMATICO DE PISO, CERRADURA ANTIPANICO Y CIERRA PUERTAS. ACABADO EN FORMICA . DIMENSIONES 2,0 X 2,5 M.	0,50	4 días	1	$ 53.751.070,00	mié 12/01/28	mar 18/01/28
399		15,07	CIELORRASO DE AISLAMIENTO. DOBLE LÁMINA DE DRYWALL ST 1/2" CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO (D=10KG/M3, E =2.5"). INCLUYE PERFILERIA CL 20 , TRATAMIENTO DE JUNTAS ACABADO CON PINTURA BLANCA T2.	4,00	66 días	3	$ 334.109.860,58	mar 18/01/28	sáb 15/04/28

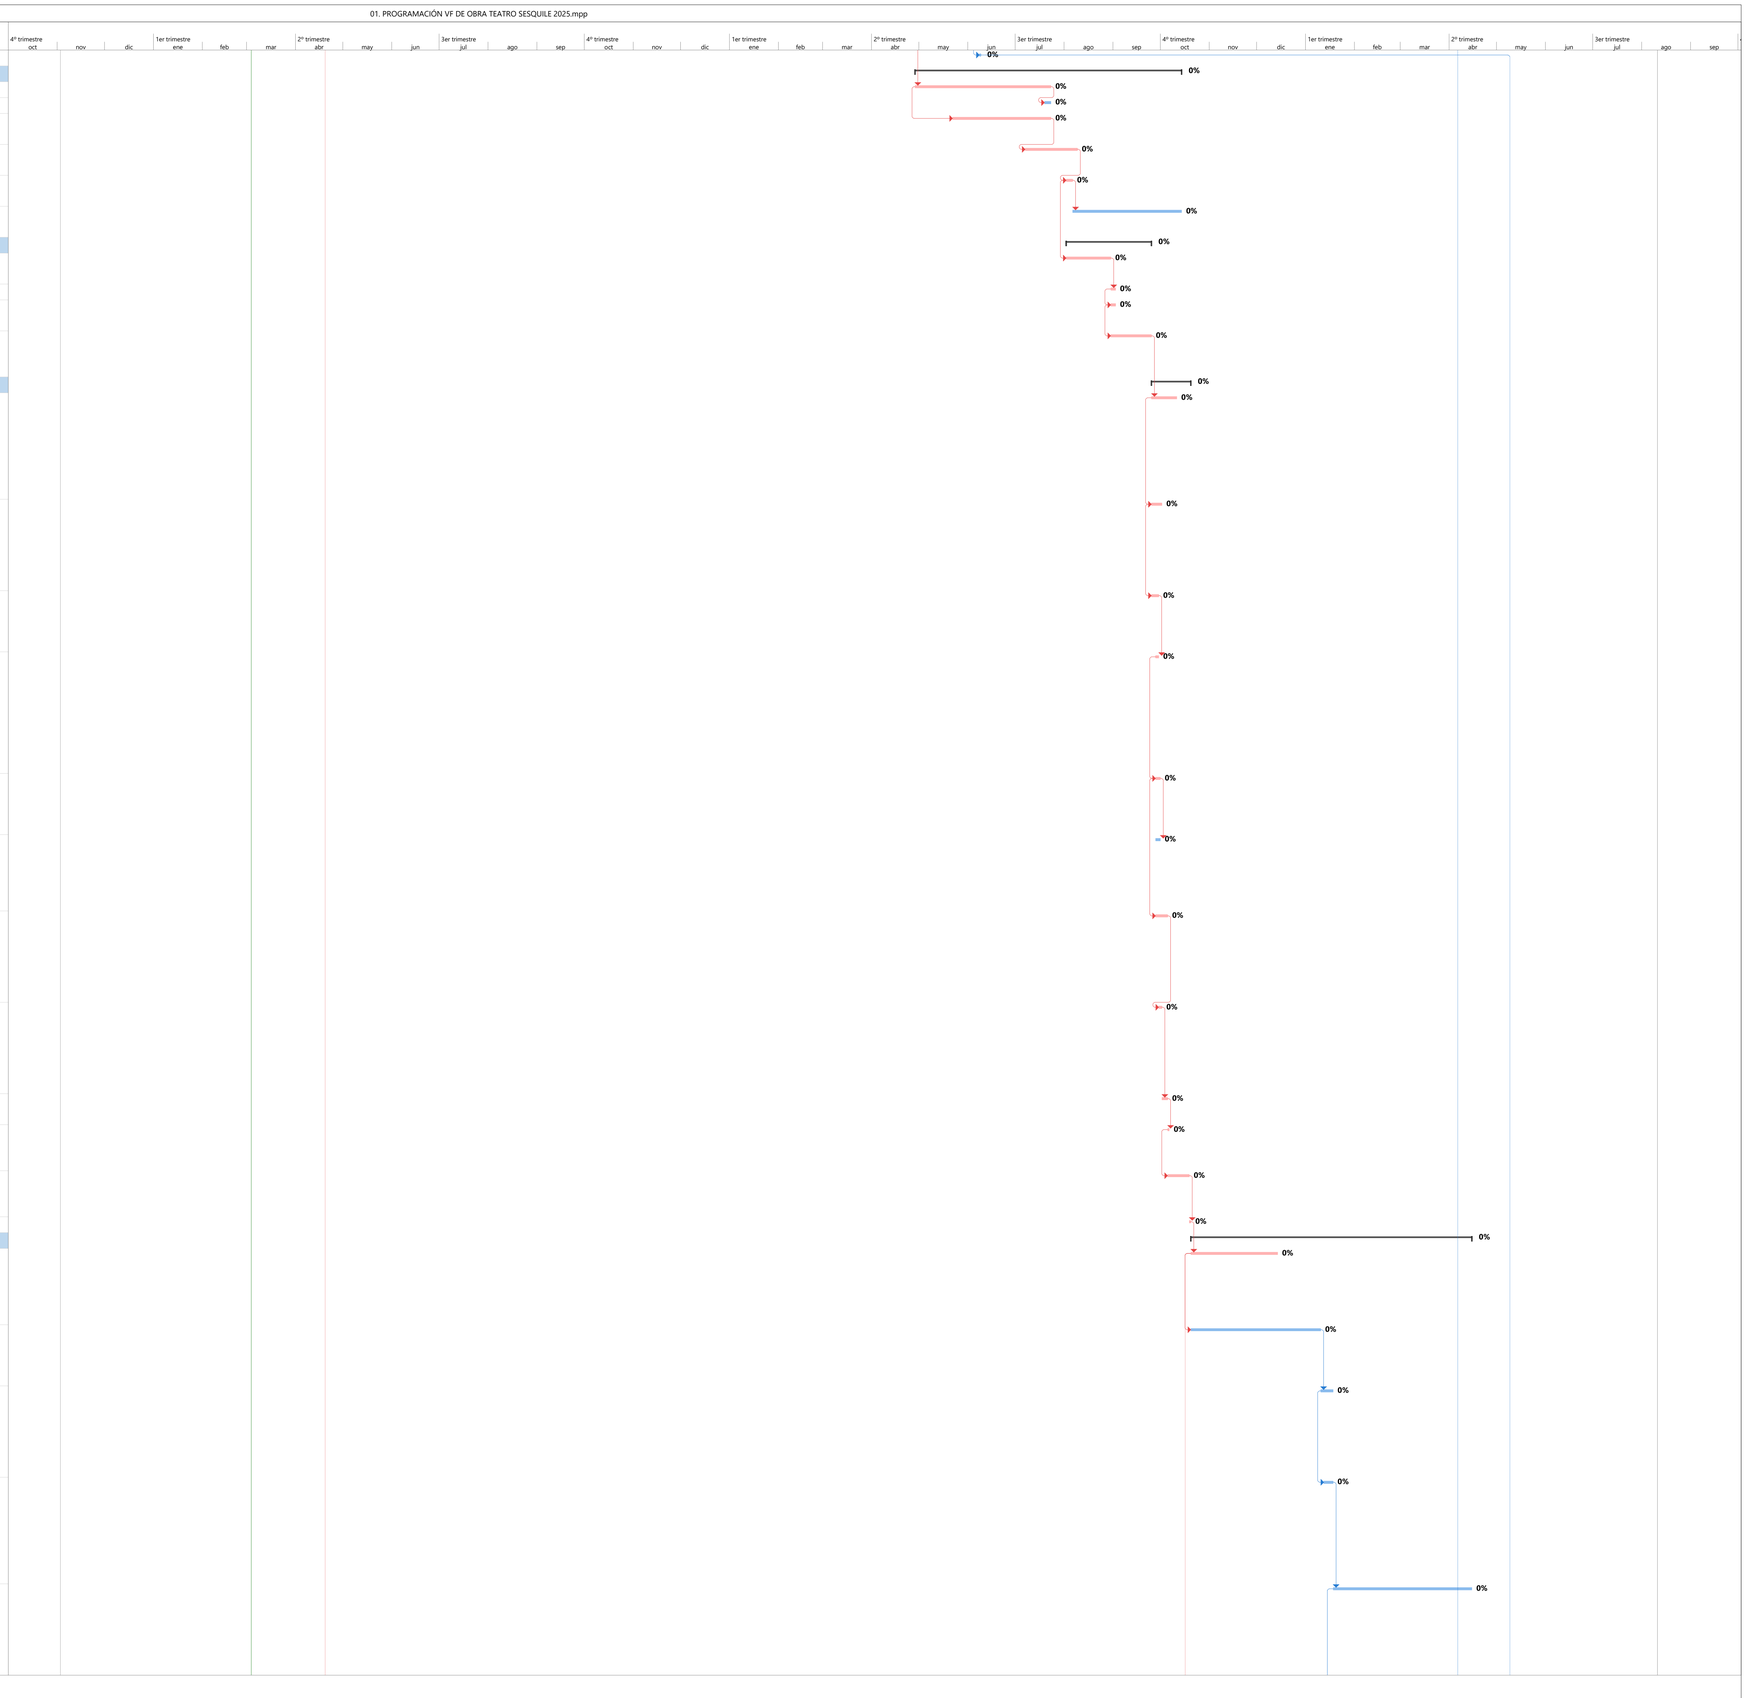

Tareas críticas | División crítica | Progreso de tarea crítica | Tarea | División | Progreso de tarea | Tarea manual | solo el comienzo | solo fin | solo duración | Línea base | División de la línea base | Hito de línea base | Hito | Progreso del resumen | Resumen | Resumen manual | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Fecha límite

Id	Modi de tarea	ITEM	Nombre de tarea	RENDIMIENTO	Duración	# DE CUADRILLAS	Costo	Comienzo	Fin
400		15,03	CIELO RASO ACÚSTICO (AUDIENCIAS Y ESCENARIO). PLAFONES EN MADERA MDF 12 MM CON ACABDO EN FORMICA. DESCOLGADO DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR CON GUAYAS.	4,00	37 días	3	$ 498.425.410,40	mar 18/01/28	mié 8/03/28
401		15,06	VISOR ACUSTICO. DOBLE VIDRIO LAMINADO SEPARADOS CON UNA CAMARA DE AIRE Y RELLENO EN SILICA. MARCO EN MADERA MACIZA Y ACABADO EN FORMICA. AREA MAXIMA 1 M2.	1,25	1 día	1	$ 6.478.017,00	mié 8/03/28	jue 9/03/28
402		15,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE ACABADO EN ALFOMBRA TRÁFICO ALTO PARA PISO AUDITORIO	4,00	63 días	2	$ 174.934.503,00	mar 4/01/28	mar 28/03/28
403		**16**	**OBRAS DE FACHADA**		**77 días**		**$ 249.784.129,20**	**mié 20/10/27**	**vie 4/02/28**
404		16,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE FACHADA EN SISTEMA LIVIANO ECOLOGICO TERMO ACUSTICOS EN PLACA DE YESO SINTETICO O SIMILAR REVESTIDA CON FIBRA DE VIDRIO Y NUCLEO DE YESO MODIFICADO EN LA CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO SIN TERMINADO Y PLACA RF DE 12.7	6,00	70 días	3	$ 207.814.041,60	mié 20/10/27	mié 26/01/28
405		16,03	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN MADERA PLASTICA H100-30 (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE ANCLAJE)	30,00	5 días	1	$ 25.129.790,40	mié 26/01/28	mié 2/02/28
406		16,04	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO ACABADO SEGUN INDIQUE PLANOS (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE ANCLAJE	30,00	2 días	1	$ 4.097.457,20	mié 2/02/28	vie 4/02/28
407		16,02	FABRICACIÓN Y MONTAJE LETRAS INSTITUCIONALES SOBRE FACHADA "AUDITORIO TEATRO MUNICIPAL SESQUILÉ" EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 20. E= 5 CM (INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGÚN DISEÑO Y ACCESORIOS DE ANCLAJE).	30,00	2 días	1	$ 12.742.840,00	mié 2/02/28	vie 4/02/28
408		**17**	**OBRAS DE EXTERIORES Y URBANISMO**		**52 días**		**$ 51.007.153,45**	**vie 4/02/28**	**vie 14/04/28**
409		17,01	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	8,00	43 días	2	$ 47.547.641,75	vie 4/02/28	lun 3/04/28
410		17,02	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	15,00	9 días	1	$ 3.459.511,70	lun 3/04/28	vie 14/04/28
411		**18**	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**		**3 días**		**$ 10.212.359,12**	**lun 3/04/28**	**jue 6/04/28**
412		18,01	CERRAMIENTO TUBULAR H=2,70 (SISTEMA DE CERCADO MODULAR CON TUBOS DE ACERO CON CORTE A 45° CON UN ANCLAJE A VARILLA CORRUGADA)	55,00	3 días	1	$ 10.212.359,12	lun 3/04/28	jue 6/04/28
413		**19**	**MOBILIARIO AUDITORIO**		**32 días**		**$ 220.697.568,00**	**mar 28/03/28**	**mié 10/05/28**
414		19,01	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS PARA TEATRO TIPO CHEZ EN POLIURETANO GRIS	10,00	32 días	1	$ 220.697.568,00	mar 28/03/28	mié 10/05/28
415		**20**	**EQUIPAMIENTO SONIDO AUDITORIO**		**11 días**		**$ 597.138.919,20**	**mar 28/03/28**	**mié 12/04/28**
416		20,13	SUM. E INSTALACIÓN RACK CABINA DE CONTROL Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE SONIDO	1,50	1 día	1	$ 21.017.181,20	mar 28/03/28	mié 29/03/28
417		20,12	SUM. E INSTALACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	5,00	1 día	1	$ 4.600.000,00	mié 29/03/28	jue 30/03/28
418		20,06	SUM. E INSTALACIÓN CONSOLA DE MEZCLADO SI PERFORMER 3	3,00	1 día	1	$ 40.221.986,00	jue 30/03/28	vie 31/03/28
419		20,07	SUM. E INSTALACIÓN CAJA DE CONEXIONES EN TARIMA MSB 16i	5,00	1 día	1	$ 17.020.000,00	vie 31/03/28	lun 3/04/28
420		20,11	SUM. E INSTALACIÓN ENRUTADOR DE RED JH016a	3,00	1 día	1	$ 1.067.296,00	lun 3/04/28	mar 4/04/28
421		20,05	SUM. E INSTALACIÓN DSP Y ANTIFEEDBACK DRIVERACK 260	2,00	1 día	1	$ 4.950.000,00	mar 4/04/28	mié 5/04/28
422		20,1	SUM. E INSTALACIÓN ALTAVOZ MONITOR DE ESCRITORIO LSR305	3,00	2 días	1	$ 5.400.000,00	mié 5/04/28	vie 7/04/28
423		20,01	SUM. E INSTALACIÓN ALTAVOZ am7215/95 CON KIT DE MONTAJE Y CABLEADO	10,00	1 día	1	$ 94.743.888,00	mié 5/04/28	jue 6/04/28
424		20,04	SUM. E INSTALACIÓN ALTAVOZ MONITOR DE ESCENARIO PRX415M	8,00	1 día	1	$ 13.738.568,00	jue 6/04/28	vie 7/04/28
425		20,02	SUM. E INSTALACIÓN AMPLIFICADOR CDi2-1200	10,00	2 días	1	$ 237.600.000,00	vie 7/04/28	mar 11/04/28
426		20,03	SUM. E INSTALACIÓN AMPLIFICADOR CDi4-300	10,00	1 día	1	$ 116.100.000,00	vie 7/04/28	sáb 8/04/28
427		20,08	SUM. E INSTALACIÓN MICRÓFONO INALÁMBRICO BLX24R/B58	5,00	1 día	1	$ 18.000.000,00	lun 10/04/28	mar 11/04/28
428		20,09	SUM. E INSTALACIÓN MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA SLX14/84	8,00	1 día	1	$ 22.680.000,00	mar 11/04/28	mié 12/04/28
429		**21**	**ASEO GENERAL**		**7 días**		**$ 5.093.377,65**	**vie 5/05/28**	**mar 16/05/28**
430		21,01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	160,00	7 días	1	$ 5.093.377,65	vie 5/05/28	mar 16/05/28
431			**PRUEBA HIDROSTÁTICA Y DE APARATOS SANITARIOS (RED POTABLE)**		**10 días**		**$ 0,00**	**jue 6/04/28**	**mié 19/04/28**
432			**PRUEBA HIDROSTÁTICA , PRUEBA DE FLUJO, PRUEBA DE BOMBAS, PRUEBA DE SISTEMA DE DETECCION (RED CONTRAINCENDIOS)**		**10 días**		**$ 0,00**	**jue 20/04/28**	**mié 3/05/28**
433			**PRUEBA DE ESTANQUEIDAD (REDES SANITARIAS Y VENTILACIÓN)**		**10 días**		**$ 0,00**	**mié 3/05/28**	**mié 17/05/28**
434			**PRUEBAS Y CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP**		**10 días**		**$ 0,00**	**mar 9/05/28**	**lun 22/05/28**
435			**AIU (29,24%)**		**542 días**		**$ 1.454.479.168,01**	**jue 23/04/26**	**jue 25/05/28**
436			**ETAPA POSTCONTRACTUAL**		**60 días**		**$ 0,00**	**mar 23/05/28**	**jue 10/08/28**
437			**FIN**		**0 días**		**$ 0,00**	**jue 10/08/28**	**jue 10/08/28**

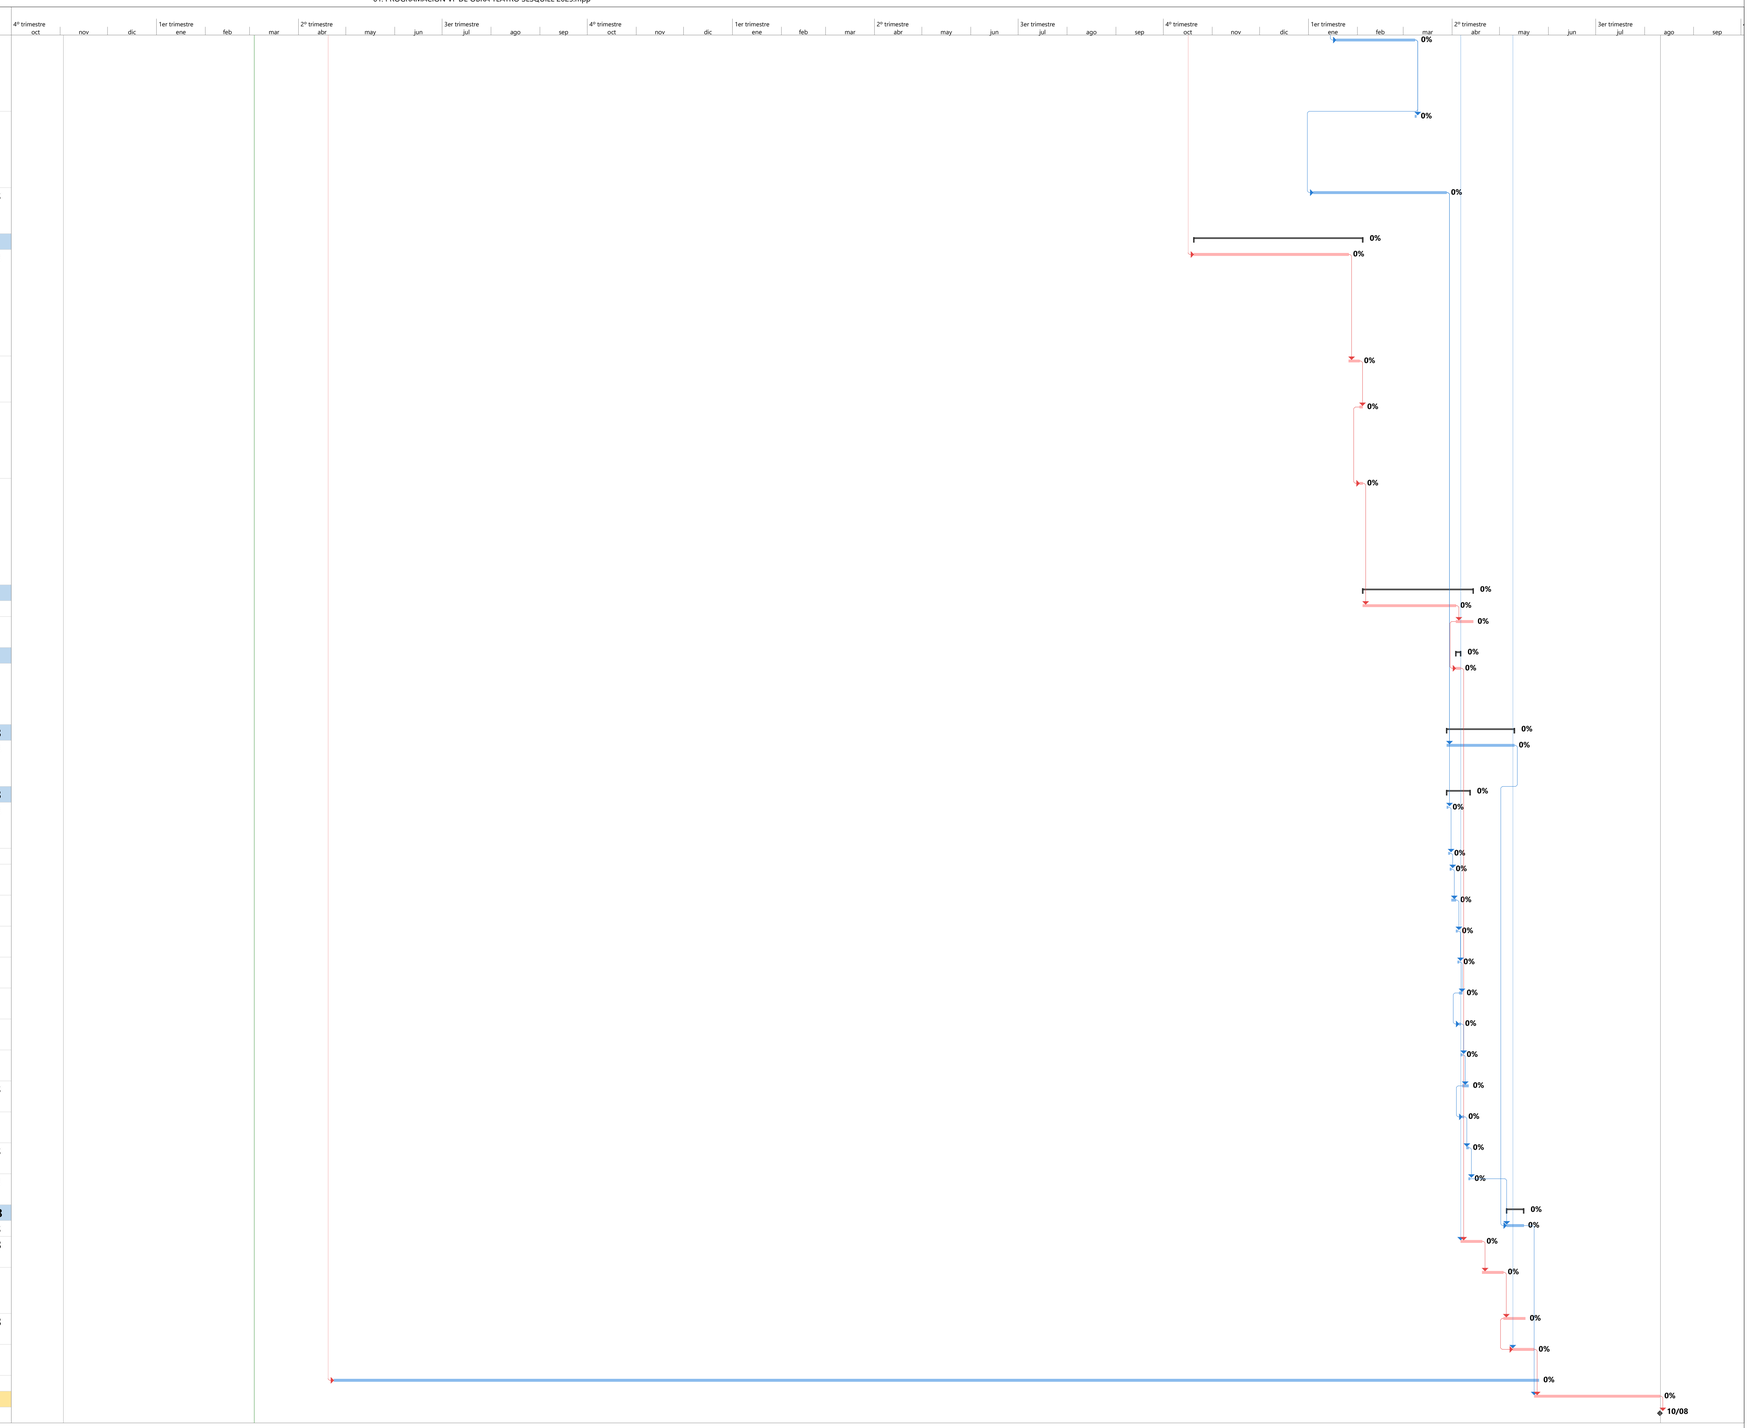

Ing. Oscar Andrés Plazas Roldán
Profesional de Presupuestos

Ing. Oscar Eduardo Teatino Vargas
Director de Consultoría

Tareas críticas · División crítica · Tarea crítica · Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · División · Tarea manual · Progreso de tarea · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite
