MUNICIPIO DE MESETAS – META

PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SAN ISIDRO

CONTRATO DE OBRA No.: 1716 DE 2025 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 *"ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MESETAS DEL DEPARTAMENTO DEL META."*



INFORME PARCIAL N°01

FECHA DEL INFORME
21 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 25 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATANTE: Empresa Social del estado- Departamento del Meta E.S.E - Solución Salud
CONTRATISTA DE OBRA: INNOVA TRADE R&G SAS NIT: 901.086.462-7 R/L. DIANA CONSUELO RUEIZ BEJARANO C.C 1.119.889921

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER SALUD 07 (NIT 901.996.229-1) / R.L. PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 4
   2.1 GENERALIDADES 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
4. PRESUPUESTO GENERAL 7
5. CONDICIONES ACTUALIZADAS 11
6. JUSTIFICACIÓN ACTA PARCIAL N°01. 15
7. CRONOGRAMA INICIAL 22
8. CRONOGRAMA ACTUALIZADO 22
9. AVANCE FINANCIERO (Programado vs Ejecutado): 22
10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 24
    10.1 ACTAS GENERADAS 24
    10.2 CONTROL DE PÓLIZAS 25
11. SEGURIDAD SOCIAL 27
12. CONCLUSIONES 28

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud con NIT. 822006595-1, mediante Resolución No. 580 del 14 de agosto del 2025, adjudico la convocatoria Publica **ESESS-CP-004-2025** a INNOVA TRADE R&G SAS, identificado con NIT. 901.086.462-7y representado legalmente por DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO identificada con CC No. 1.119.889.921 de Cumaral (Meta), cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MESETAS DEL DEPARTAMENTO DEL META."**, suscribiendo para ello el contrato de Obra Pública No.1716 DE 2025, el día 11 de septiembre del 2025.

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, adelanto el proceso **ESESS-CP-004-2025** cuyo objeto es **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MESETAS DEL DEPARTAMENTO DEL META."**, el cual requiere interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, social y ambiental del contrato en mención.

Que, el 10 de octubre del 2025, la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud con NIT. 822006595-1 y el CONSORCIO INTERSALUD 07 identificado con NIT No. 901.996.229-1 y representado legalmente por PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO identificada con CC. No. 1.121.903.443 de Villavicencio suscribieron el contrato de interventoría No. 1985 de 2025, cuyo objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS RURALES ALTO DE CAFRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA, AGUA LINDA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA, SAN ISIDRO Y BRISAS DEL DUDA DEL MUNICIPIO DE MESETAS Y EL MUNICIPIO LOCAL DE PUERTO LLERAS".**

Una vez verificados los requisitos para el inicio del proyecto, el día 21 de octubre de 2025, fue suscrita el acta de inicio del contrato de Obra Pública **No.1716 DE 2025** y el contrato de Interventoría **No. 1985 de 2025**, dando inicio formal a las actividades y obligaciones establecidas.

La modificación No. 01, se detalló toda la información técnica de mayores y menores cantidades e ítems no previstos que se identificaron durante la revisión del presupuesto del CONTRATO DE OBRA No.: 1716 DE 2025 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, que tiene por objeto **"ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MESETAS DEL DEPARTAMENTO DEL META".**

Para la presente Acta Parcial No. 01 se presenta un avance en ejecución física y financiera del 71.27%, equivalente a $279,382,109.53, Se considera para pago las actividades ejecutadas de acuerdo con lo previsto en el contrato en los capítulos antes mencionados del contrato.

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

2.1 GENERALIDADES

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, creada mediante Decreto 307 del 1 de agosto del 2003 emanado de la Gobernación del Meta, tiene como misión la prestación de servicios de atención primaria y complementarios, mediante un modelo de atención integral resolutiva con un enfoque de gestión del riesgo que busca mejorar las condiciones de salud de población urbana y rural del Departamento del Meta, con énfasis en la promoción y mantenimiento de la salud, articulando las actividades asistenciales con las académico- científicas en el marco de una cultura de atención humanizada y de seguridad del paciente que garantiza la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad de la empresa.

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, es una institución Prestadora de servicios de Salud de primer nivel, la cual atiende en su gran mayoría la población afiliada al régimen subsidiad. Actualmente tiene una cobertura en la prestación de servicios de diecisiete (17) municipios del departamento del Meta, los cuales se circunscriben a Barranca de Upia, Cabuyaro, Cumaral, El Calvario, El Castillo, Mapiripan, Mesetas, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Restrepo, San Juan de Arama, San Juanito y Vistahermosa, en los cuales cuenta con una infraestructura de salud tipología C, C1 y de mediana complejidad para sus hospitales locales y tipología A para sus puestos de salud.

El sistema General de Seguridad Social está orientado a generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud, para esto concurrirán acciones de salud pública, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de una estrategia de atención primaria en salud, sean necesarias para promover de manera constante la salud de la población.

Para lograr este propósito, se unificará el plan de beneficios para todos los residentes, *"(…) se garantizará la universalidad del aseguramiento, la portabilidad o prestación de beneficios en cualquier lugar del país y se preservará la sostenibilidad financiera del sistema, entre otros. Ley 1438 de 2011."*
Así las cosas, la Empresa Social del estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud es consciente que las condiciones de la infraestructura sanitaria destinada a la prestación de los servicios de salud baja la complejidad a la comunidad urbana y rural del municipio de mesetas, siendo inadecuadas para el caso específico las del puesto de salud de la vereda San isidro, situación derivada del deterioro de la planta física, haciéndose visible las filtraciones, humedad, hongos, moho y demás desgastes, degradaciones y averías presentes en las paredes, pisos, cubiertas, cielos rasos, baterías sanitarias, etc., originado lo anterior por las in suficientes intervenciones de mantenimiento realizadas para la rehabilitación física del puesto de salud, circunstancias que a su vez deriva el incremento de los factores de riesgo para los pacientes, sobre todo a nivel transmisión de virus o infecciones que pueden surgir tanto de componentes externos como de las enfermedades que presentan los pacientes y que

no logran ser mitigados por los procesos de limpieza y desinfección de la institución hospitalaria, lo que arroja el incremento y prevalencia de enfermedades infectocontagiosas así como una baja oportunidad de los servicios de salud brindados a la población del municipio, propiciando un clima de inconformidad y malestar tanto en la población objeto del servicio como en el personal administrativo y asistencial, todo lo anterior en detrimento de la calidad del servicio de la salud del municipio de Mesetas, Meta.

Sin limitarse a lo anterior, la Interventoría a cargo del CONSORCIO INTERSALUD 07 identificado con NIT No. 901.996.229-1 y representado legalmente por PAOLA ANDREA GAVIRIA RESTREPO identificado con CC. No. 1.121.903.443 de Villavicencio debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.

En los siguientes cuadros, se resumen los aspectos relevantes tanto del Contrato de Obra, como el Contrato de Interventoría:

CONTRATO DE OBRA PÚBICA No.1716 del 2025:

CONTRATANTE:	**Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud** NIT. 822006595-1
CONTRATISTA	**INNOVA TRADE R&G SAS** NIT No. 901.086.462-7 **R/L. DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO** CC No. 1.119.889.921 de Cumaral (Meta)
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MESETAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($392.096.488,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN:	ONCE (11) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA INICIO:	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	VEINTE (20) DE ENERO DE 2026
FECHA DE PRORROGA N° 01	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUAL SEGÚN PRORROGA N°01	19 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRORROGA N° 02	19 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINACION ACTUAL SEGÚN PRORROGA N°02	6 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN	17 DE FEBRERO DE 2026

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MESETAS ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"**, se ubica en el Centro Poblado San Isidro, el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, a 141 km aproximadamente de Villavicencio, municipio capital del departamento del Meta.





El predio para intervenir se ubica en las coordenadas Geográficas 2° 59'0.30"N – 74°11'28.53"O

Las actividades objeto del Contrato de Obra No.1716 del 2025, las cuales están siendo supervisadas en cumplimiento del Contrato de Interventoría No.1985 DE 2025, se resumen en el siguiente cuadro:

4. PRESUPUESTO GENERAL

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**				
	DESMONTE Y LIMPIEZA				
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	128,00	10.437,00	$ 1.335.936,00
	DEMOLICIÓN Y DESMONTE				
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINALIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	208,73	8.014,00	$ 1.672.770,00
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DEZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIODE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25,00	8.520,00	$ 213.000,00
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTOCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	208,73	26.525,00	$ 5.536.590,00
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	79,10	30.268,00	$ 2.394.078,00

1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	44,79	16.699,00	$ 747.948,00
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	52.186,00	$ 313.116,00
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	8,00	112.201,00	$ 897.608,00
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	41.749,00	$ 250.494,00
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	20.874,00	$ 20.874,00
				SUBTOTAL	**$ 13.382.414,00**
2	**REALIZAR EXCAVACIONES**				
	EXCAVACION MANUAL				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE	M3	8,00	93.936,00	$ 751.488,00
				SUBTOTAL	**$ 751.488,00**
3	**REALIZAR CIMENTACÍON PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO**				
	CIMIENTOS				
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0,40	1.021.131,00	$ 408.452,00
	MUROS DE CONTENCION EN CONTRETO				
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,30	1.845.855,00	$ 7.937.177,00
3.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa(3500PSI)MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,27	1.446.046,00	$ 1.835.900,00
				SUBTOTAL	**$ 10.181.529,00**
4	**SUMINISTRAR E INSTALAR HIDROSANITARIAS**				
	TUBERÍAS ACCESORIOS PVC-S				
4.1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	38.633,00	$ 463.596,00
4.2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	19.760,00	$ 316.160,00
	REGISTROS - VÁLVULAS				
4.3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	16,00	571.248,00	$ 9.139.968,00
	VARIOS RED HIDRAULICA				
4.4	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS.INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR,CHEQUEYVÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	5,00	1.289.970,00	$ 6.449.850,00
				SUBTOTAL	**$ 16.369.574,00**
5	**SUMINISTRAR E INSTALAR REDES ELÉCTRICAS**				
	AIRE ACONDICIONADO				
5.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	1,00	2.830.844,00	$ 2.830.844,00
5.2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	3.582.993,00	$ 14.331.972,00
	CAJAS Y CANALIZACIONES				

5.3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1,00	5.375.024,00	$ 5.375.024,00
5.4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	201.661,00	$ 201.661,00
5.5	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	23,00	135.136,00	$ 3.108.128,00
5.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO ATIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18,00	124.992,00	$ 2.249.856,00
	SUMINISTRAR E INSTALAR ILUMINARIA				
5.7	PANEL LED 60X60 W	UN	20,00	165.634,00	$ 3.312.680,00
				SUBTOTAL	**$ 31.410.165,00**
6	**REALIZAR MAMPOSTERIA**				
	MAMPOSTERIA SECA O PREFABRICADA				
6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	15,68	197.124,00	$ 3.090.904,00
				SUBTOTAL	**$ 3.090.904,00**
7	**NISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**				
	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS				
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	394,68	20.639,00	$ 8.145.697,00
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	434,61	14.125,00	$ 6.138.866,00
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	212,49	16.698,00	$ 3.548.158,00
	ESMALTE, DEMARCACION, BARNIZ				
7.4	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	134,10	29.477,00	$ 3.952.866,00
				SUBTOTAL	**$ 21.785.587,00**
8	**REALIZAR PISOS (PLACAS)**				
	PAVIMENTOS ARTICULADOS				
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,80	1.094.951,00	$ 8.540.618,00
				SUBTOTAL	**$ 8.540.618,00**
9	**SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS**				
	PISOS EN CERAMICA Y BALDOSA				
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	43,10	90.897,00	$ 3.917.661,00
9.2	TABLETA 0.25 X 0.25 PESCADERO	M2	54,57	85.187,00	$ 4.648.655,00
	AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, GUARDAESCOBAS				
9.3	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	M2	182,00	45.429,00	$ 8.268.078,00
				SUBTOTAL	**$ 16.834.394,00**
10	**SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO**				
	PUERTAS				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10 M TABLA TRIPE X2.0 X 1.0 A 1-1/2	UND	6,00	429.658,00	$ 2.577.948,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UND	16,00	177.170,00	$ 2.834.720,00
				SUBTOTAL	**$ 5.412.668,00**
11	**SUMINISTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL**				
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	201,75	115.837,00	$ 23.370.115,00
				SUBTOTAL	**$ 23.370.115,00**
12	**SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA**				
	PUERTAS METALICAS				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UND	1,00	204.104,00	$ 204.104,00

				SUBTOTAL	**$ 204.104,00**
13	**SUMINISTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
	APARATOS SANITARIOS				
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	5,00	457.506,00	$ 2.287.530,00
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00	1.012.747,00	$ 1.012.747,00
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	6,00	567.149,00	$ 3.402.894,00
	GRIFERIA Y VARIOS				$ -
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	1,00	181.830,00	$ 181.830,00
	REJILLAS				$ -
13.5	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UND	8,00	24.932,00	$ 199.456,00
				SUBTOTAL	**$ 7.084.457,00**
14	**SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS**				
	CUBIERTA				
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC-ALUZINCCAL 26 TIPOSANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	207,00	261.353,00	$ 54.100.071,00
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M3	23,50	114.241,00	$ 2.684.755,00
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	28,00	89.643,00	$ 2.510.004,00
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	28,00	33.708,00	$ 943.824,00
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	14,00	72.435,00	$ 1.014.090,00
14.6	PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500	ML	103,00	116.031,00	$ 11.951.193,00
				SUBTOTAL	**$ 73.203.937,00**
15	**REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO**				
	CERRAMIENTO				
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	163,80	130.528,00	$ 21.380.486,00
15.2	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	58,50	347.482,00	$ 20.327.697,00
15.3	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,41	2.101.739,00	$ 861.713,00
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10,53	1.811.569,00	$ 19.075.822,00
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	43,00	99.918,00	$ 4.296.474,00
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,03	1.695.291,00	$ 1.746.150,00
				SUBTOTAL	**$ 67.688.342,00**

SUB-TOTAL OBRA		**$ 299.310.296,00**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACIÓN	26,0%	$ 77.820.677,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 2.993.103,00

UTILIDAD	4,0%	$ 11.972.412,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 392.096.488,00**

5. CONDICIONES ACTUALIZADAS

De acuerdo con las justificaciones presentadas de la modificación de los ítems del Contrato de Obra Pública a continuación, se relaciona las condiciones actualizadas:

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	
1	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**											
	DESMONTE Y LIMPIEZA											
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	128.00	$ 10,437.00	$ 1,335,936.00	128.00	$ 1,335,936.00	128.00	$ 1,335,936.00	128.00	$1,335,936.00	100.00%
	DEMOLICIONES Y DESMONTES											
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINALIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	208.73	$ 8,014.00	$ 1,672,770.00	208.73	$ 1,672,770.23	208.73	$ 1,672,770.23	208.73	$1,672,770.23	100.00%
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DEZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIODE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25.00	$ 8,520.00	$ 213,000.00	25.00	$ 213,000.00	25.00	$ 213,000.00	25.00	$213,000.00	100.00%
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTOCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	208.73	$ 26,525.00	$ 5,536,590.00	208.73	$ 5,536,589.78	208.73	$ 5,536,589.78	208.73	$5,536,589.78	100.00%
1.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	79.10	$ 30,268.00	$ 2,394,078.00		$ -		$ -		$ -	
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	44.79	$ 16,699.00	$ 747,948.00		$ -		$ -		$ -	
1.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6.00	$ 52,186.00	$ 313,116.00		$ -		$ -		$ -	
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	8.00	$ 112,201.00	$ 897,608.00	6.00	$ 673,206.00	6.00	$ 673,206.00	6.00	$673,206.00	100.00%
1.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6.00	$ 41,749.00	$ 250,494.00		$ -		$ -		$ -	
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00	$ 20,874.00	$ 20,874.00	1.00	$ 20,874.00	1.00	$ 20,874.00	1.00	$20,874.00	100.00%
2	**REALIZAR EXCAVACIONES**											
	EXCAVACION MANUAL											
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE	M3	8.00	$ 93,936.00	$ 751,488.00	8.00	$ 751,488.00	8.00	$ 751,488.00	8.00	$751,488.00	100.00%
3	**REALIZAR CIMENTACIÓN PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO**											

	CIMIENTOS											
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	0.40	$ 1,021,131.00	$ 408,452.00		$ -		$ -		$ -	
	MUROS DE CONTENCION EN CONTRETO											
3.2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI)MEZCLAENOBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4.30	$ 1,845,855.00	$ 7,937,177.00		$ -		$ -		$ -	
3.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa(3500PSI)MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.27	$ 1,446,046.00	$ 1,835,900.00		$ -		$ -		$ -	
4	**SUMINISTRAR E INSTALAR HIDROSANITARIAS**											
	TUBERÍAS ACCESORIOS PVC-S											
4.1	TUBERÍA CPVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12.00	$ 38,633.00	$ 463,596.00		$ -		$ -		$ -	
4.2	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16.00	$ 19,760.00	$ 316,160.00		$ -		$ -		$ -	
	REGISTROS - VÁLVULAS											
4.3	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 571,248.00	$ 9,139,968.00		$ -		$ -		$ -	
	VARIOS RED HIDRAULICA											
4.4	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS.INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1",FLOTADOR,CHEQUEYVÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 1,289,970.00	$ 6,449,850.00		$ -		$ -		$ -	
5	**SUMINISTRAR E INSTALAR REDES ELECTRICAS**											
	AIRE ACONDICIONADO											
5.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD	UN	1.00	$ 2,830,844.00	$ 2,830,844.00		$ -		$ -		$ -	
5.2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 3,582,993.00	$ 14,331,972.00		$ -		$ -		$ -	
	CAJAS Y CANALIZACIONES											
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA BARNES M.HE 375-3 (2020HCE)	UN	1.00	$ 5,375,024.00	$ 5,375,024.00		$ -		$ -		$ -	
5.4	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1.00	$ 201,661.00	$ 201,661.00		$ -		$ -		$ -	
5.5	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	23.00	$ 135,136.00	$ 3,108,128.00	23.00	$ 3,108,128.00		$ -		$ -	
5.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO ATIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	18.00	$ 124,992.00	$ 2,249,856.00	18.00	$ 2,249,856.00		$ -		$ -	
	SUMINISTRAR E INSTALAR ILUMINARIA											
5.7	PANEL LED 60X60 W	UN	20.00	$ 165,634.00	$ 3,312,680.00	20.00	$ 3,312,680.00		$ -		$ -	
6	**REALIZAR MAMPOSTERIA**											
	MAMPOSTERIA SECA O PREFABRICADA											

6.1	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	15.68	$ 197,124.00	$ 3,090,904.00		$ -		$ -		$ -	
7	**SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**											
	PINTURA VINILO, ESTUCO											
7.1	ESTUCO PLASTICO	M2	394.68	$ 20,639.00	$ 8,145,697.00	394.68	$ 8,145,697.33		$ -		$ -	
7.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	434.61	$ 14,125.00	$ 6,138,866.00	434.61	$ 6,138,866.25		$ -		$ -	
7.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	212.49	$ 16,698.00	$ 3,548,158.00	212.49	$ 3,548,158.02		$ -		$ -	
	ESMALTE, DEMARCACION, BARNIZ											
7.4	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	134.10	$ 29,477.00	$ 3,952,866.00	477.06	$ 14,062,297.62	477.06	$ 14,062,297.62	477.06	$ 14,062,297.62	100.00%
8	**REALIZAR PISOS (PLACAS)**											
	PAVIMENTOS ARTICULADOS											
8.1	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7.80	$ 1,094,951.00	$ 8,540,618.00	7.80	$ 8,540,617.80		$ -		$ -	
9	**SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS**											
	PISOS EN CERAMICA Y BALDOSA											
9.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	43.10	$ 90,897.00	$ 3,917,661.00		$ -		$ -		$ -	
9.2	TABLETA 0.25 X 0.25 PESCADERO	M2	54.57	$ 85,187.00	$ 4,648,655.00		$ -		$ -		$ -	
	AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, GUARDAESCOBAS											
9.3	GUARDA ESCOBA EN GRANITO PULIDO	M2	182.00	$ 45,429.00	$ 8,268,078.00		$ -		$ -		$ -	
10	**SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO**											
	PUERTAS											
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO E=0.10 M TABLA TRIPE X2.0 X 1.0 A 1-1/2	UN	6.00	$ 429,658.00	$ 2,577,948.00	6.00	$ 2,577,948.00		$ -		$ -	
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	16.00	$ 177,170.00	$ 2,834,720.00	16.00	$ 2,834,720.00		$ -		$ -	
11	**SUMINISTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL**											
	CIELORASOS											
11.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	201.75	$ 115,837.00	$ 23,370,115.00		$ -		$ -		$ -	
12	**SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA**											
	PUERTAS METALICAS											
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 5X1.70	UN	1.00	$ 204,104.00	$ 204,104.00		$ -		$ -		$ -	
13	**SUMINISTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**											
	APARATOS SANITARIOS											
13.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	5.00	$ 457,506.00	$ 2,287,530.00		$ -		$ -		$ -	
13.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1.00	$ 1,012,747.00	$ 1,012,747.00		$ -		$ -		$ -	
13.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6.00	$ 567,149.00	$ 3,402,894.00		$ -		$ -		$ -	

	GRIFERIAS Y VARIOS											
13.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	1.00	$ 181,830.00	$ 181,830.00		$ -		$ -		$ -	
	REJILLAS											
13.5	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	8.00	$ 24,932.00	$ 199,456.00	8.00	$ 199,456.00		$ -		$ -	
14	**SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS**											
	CUBIERTA.											
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC-ALUZINCCAL 26 TIPOSANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	207.00	$ 261,353.00	$ 54,100,071.00	350.69	$ 91,653,779.03	294.01	$ 76,839,951.23	294.01	$ 76,839,951.23	83.84%
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	23.50	$ 114,241.00	$ 2,684,755.00		$ -		$ -		$ -	
14.3	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	28.00	$ 89,643.00	$ 2,510,004.00		$ -		$ -		$ -	
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	28.00	$ 33,708.00	$ 943,824.00		$ -		$ -		$ -	
14.5	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	14.00	$ 72,435.00	$ 1,014,090.00		$ -		$ -		$ -	
14.6	PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500	ML	103.00	$ 116,031.00	$ 11,951,193.00	305.28	$ 35,421,943.68	305.28	$ 35,421,943.68	305.28	$ 35,421,943.68	100.00%
15	**REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO**											
	CERRAMIENTO											
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	163.80	$ 130,528.00	$ 21,380,486.00	154.00	$ 20,101,312.00	154.00	$ 20,101,312.00	154.00	$ 20,101,312.00	100.00%
15.2	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	58.50	$ 347,482.00	$ 20,327,697.00	55.00	$ 19,111,510.00	55.00	$ 19,111,510.00	55.00	$ 19,111,510.00	100.00%
15.3	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.41	$ 2,101,739.00	$ 861,713.00	0.39	$ 819,678.21	0.39	$ 819,678.21	0.39	$ 819,678.21	100.00%
15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10.53	$ 1,811,569.00	$ 19,075,822.00	10.53	$ 19,075,821.57	10.53	$ 19,075,821.57	10.53	$ 19,075,821.57	100.00%
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	43.00	$ 99,918.00	$ 4,296,474.00	43.00	$ 4,296,474.00	43.00	$ 4,296,474.00	43.00	$ 4,296,474.00	100.00%
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.03	$ 1,695,291.00	$ 1,746,150.00	1.03	$ 1,746,149.73	1.03	$ 1,746,149.73	1.03	$ 1,746,149.73	100.00%
	ITEM NO PREVISTOS											
NP-1	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		$ 9,754.06	$ -	1,188.20	$ 11,589,783.85	1188.20	$ 11,589,783.85	1,188.20	$ 11,589,783.85	100.00%
NP-2	CIELO RASO PVC	M2		$ 119,531.38		240.01	$ 28,688,726.51		$ -		$ -	
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 2.20X2.30	UN		$ 1,168,932.93		1.00	$ 1,168,932.93		$ -		$ -	

NP-4	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 624,873.27		1.00	$ 624,873.27		$ -		$ -	
SUB-TOTAL OBRA					**$ 299,310,296.00**		**$ 299,221,273.81**		**$ 213,268,785.90**		**$ 213,268,785.90**	
COSTOS INDIRECTOS												
ADMINISTRACIÓN			26.0%		$ 77,820,677.00		$ 77,797,531.19		$ 55,449,884.33		$ 55,449,884.33	
IMPREVISTOS			1.0%		$ 2,993,103.00		$ 2,992,212.74		$ 2,132,687.86		$ 2,132,687.86	
UTILIDAD			4.0%		$ 11,972,412.00		$ 11,968,850.95		$ 8,530,751.44		$ 8,530,751.44	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$ 392,096,488.00**		**$ 391,979,868.69**		**$ 279,382,109.53**		**$ 279,382,109.53**	**71.27%**

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 392,096,488.00
VALOR FINAL SEGUN MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 391,979,868.69
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1	$ 279,382,109.53
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO	71.27%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 112,597,759.16
PORCENTAJE AVANCE PENDIENTE POR EJECUTAR	28.73%

6. JUSTIFICACIÓN ACTA PARCIAL N°01.

Las actividades desarrolladas por el contratista en este periodo fueron las siguientes:

CAPITULO N° 1 REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION

ITEM 1.1 DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
1	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**											
	DESMONTE Y LIMPIEZA											
1.1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	128.00	$ 10,437.00	$ 1,335,936.00	128.00	$ 1,335,936.00	128.00	$ 1,335,936.00	128.00	$ 1,335,936.00	100.00%

JUSTIFICACION

Cantidad ejecutada perimetral del terreno a intervenir con el fin de realizar la construcción de la viga de cimentación.

ITEM 1.2 DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINALIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	

	DEMOLICIONES Y DESMONTES											
1.2	DESMONTE DE CIELORASO EN LAMINALIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	208.73	$ 8,014.00	$ 1,672,770.00	208.73	$ 1,672,770.23	208.73	$ 1,672,770.23	208.73	$ 1,672,770.23	100.00%

JUSTIFICACION

Actividad ejecutada que se desarrolló desmontando el cielo raso existente, y ubicado en un área de la obra para ser retirado y depositado en la escombrera más cercana.

ITEM 1.3 DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DEZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIODE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	
	DEMOLICIONES Y DESMONTES											
1.3	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DEZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIODE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25.00	$ 8,520.00	$ 213,000.00	25.00	$ 213,000.00	25.00	$ 213,000.00	25.00	$ 213,000.00	100.00%

JUSTIFICACION

Teja ubicada en la fachada frontal y en el pasillo que separa el centro de salud y los consultorios.

ITEM 1.4 DESMONTE DE TEJA ASBESTOCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	
	DEMOLICIONES Y DESMONTES											
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTOCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	208.73	$ 26,525.00	$ 5,536,590.00	208.73	$ 5,536,589.78	208.73	$ 5,536,589.78	208.73	$ 5,536,589.78	100.00%

JUSTIFICACION

Esta actividad se desarrolló desmontando la teja en asbesto cemento, es de tener presente que se hizo esta actividad por tramos con el fin de que no se deteriorara los muros por condiciones de la lluvia.

ITEM 1.8 DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
	DEMOLICIONES Y DESMONTES											
1.8	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	8.00	$ 112,201.00	$ 897,608.00	6.00	$ 673,206.00	6.00	$ 673,206.00	6.00	$ 673,206.00	100.00%

JUSTIFICACION

Actividad que se desarrolló teniendo en cuenta el desmonte de las puertas con sus correspondientes marcos, teniendo especial cuidado de no dañar las áreas aledañas (muros y pisos construidos). El desmonte se hizo con el mayor cuidado utilizando herramientas adecuadas para este tipo de actividad. Una vez desmontadas, ubicaron en uno de los consultorios.

ITEM 1.10 DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
	DEMOLICIONES Y DESMONTES											
1.10	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00	$ 20,874.00	$ 20,874.00	1.00	$ 20,874.00	1.00	$ 20,874.00	1.00	$ 20,874.00	100.00%

JUSTIFICACION

Se realizo desmonte, desconexión y retiro del elemento (duchas), que se encuentra instalado en el baño, dentro del centro de salud.

CAPITULO N° 2 REALIZAR EXCAVACIONES

ITEM 2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
2	REALIZAR EXCAVACIONES											

	EXCAVACION MANUAL											
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE	M3	8.00	$ 93,936.00	$ 751,488.00	8.00	$ 751,488.00	8.00	$ 751,488.00	8.00	$ 751,488.00	100.00%

JUSTIFICACION

Excavación manual en material común que se realizó con el fin de construir la viga de cimentación.

CAPITULO N° 7 SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS

ITEM 7.4 ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	
7	**SUMINISTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**											
	ESMALTE, DEMARCACION, BARNIZ											
7.4	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	134.10	$ 29,477.00	$ 3,952,866.00	477.06	$ 14,062,297.62	477.06	$ 14,062,297.62	477.06	$ 14,062,297.62	100.00%

JUSTIFICACION

Esta actividad se realizó limpiando la superficie del perfil con una estopa limpia, para poder realizar el procedimiento e instalación de la pintura en esmalte sintético.

CAPITULO N° 14 SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS

14.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC-ALUZINCCAL 26 TIPOSANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	
14	**SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS**											
	CUBIERTA.											

14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC-ALUZINCCAL 26 TIPOSANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	207.00	$ 261,353.00	$ 54,100,071.00	350.69	$ 91,653,779.03	294.01	$ 76,839,951.23	294.01	$ 76,839,951.23	83.84%

JUSTIFICACION

Esta actividad se realizó instalando la cubierta con su respectivo traslapo indicado por las especificaciones técnicas del fabricante.

ITEM 14.6 PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	
14	**SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS**											
	CUBIERTA.											
14.6	PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500	ML	103.00	$ 116,031.00	$ 11,951,193.00	305.28	$ 35,421,943.68	305.28	$ 35,421,943.68	305.28	$ 35,421,943.68	100.00%

JUSTIFICACION

Esta actividad se realizó desmontando la perfilería existente e instalando la perfilería nueva con el fin de mejorar su estructura y reubicar la perfilería antigua en espacios de menor resistencia.

CAPITULO N° 15 REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO

ITEM 15.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	
15	**REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO**											
	CERRAMIENTO											
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA ESLABONADA CORR TUBO GALVANIZADO (L), TAPAS, < PL	M2	163.80	$ 130,528.00	$ 21,380,486.00	154.00	$ 20,101,312.00	154.00	$ 20,101,312.00	154.00	$ 20,101,312.00	100.00%

JUSTIFICACION

Esta actividad se desarrolló localizando y midiendo los espacios entre los tubos que separa el cerramiento, y calcular el área de los módulos que se van a construir en malla eslabonada.

ITEM 15.2 MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO											
	CERRAMIENTO											
15.2	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	58.50	$ 347,482.00	$ 20,327,697.00	55.00	$ 19,111,510.00	55.00	$ 19,111,510.00	55.00	$ 19,111,510.00	100.00%

JUSTIFICACION

Actividad desarrollada utilizando un mortero 1:3 para pega, realizando una limpieza posterior al pegue del mismo.

ITEM 15.3 ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO											
	CERRAMIENTO											
15.3	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.41	$ 2,101,739.00	$ 861,713.00	0.39	$ 819,678.21	0.39	$ 819,678.21	0.39	$ 819,678.21	100.00%

JUSTIFICACION

Una vez instalado el ladrillo a la vista se procedió a la instalación de la alfajía conservando perfectamente la estructura plomados y alineados entre si dentro de la tolerancia permitida por la norma NSR10.

ITEM 15.4 VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO											
	CERRAMIENTO											

15.4	VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10.53	$ 1,811,569.00	$ 19,075,822.00	10.53	$ 19,075,821.57	10.53	$ 19,075,821.57	10.53	$ 19,075,821.57	100.00%

JUSTIFICACION

Se realizo el fundido de la viga en concreto de 27.6 Mpa para cimentación perimetral del cerramiento.

ITEM 15.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO											
	CERRAMIENTO											
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" GALV L=3M; INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UN	43.00	$ 99,918.00	$ 4,296,474.00	43.00	$ 4,296,474.00	43.00	$ 4,296,474.00	43.00	$ 4,296,474.00	100.00%

JUSTIFICACION

Esta actividad se desarrolló una vez se localizó los espacios del cerramiento, teniendo en cuenta que estuvieran plomados y alineados

ITEM 15.6 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
15	REALIZAR MURO DE CERRAMIENTO											
	CERRAMIENTO											
15.6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.03	$ 1,695,291.00	$ 1,746,150.00	1.03	$ 1,746,149.73	1.03	$ 1,746,149.73	1.03	$ 1,746,149.73	100.00%

JUSTIFICACION

Esta actividad se desarrolló para las columnetas que separan los módulos del cerramiento con el fin de confinar los muros del cerramiento y el portón principal del cerramiento.

ITEM NO PREVISTOS

ITEM NP-1 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		PRESENTE ACTA PARCIAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PORCENTAJE EJECUCION
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
	ITEM NO PREVISTOS											
NP-1	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		$ 9,754.06	$ -	1,188.20	$ 11,589,783.85	1188.20	$ 11,589,783.85	1,188.20	$ 11,589,783.85	100.00%

JUSTIFICACION
Esta actividad se desarrolló una vez se revisaron los diseños del refuerzo para la viga de cimentación y las columnetas del cerramiento.

7. CRONOGRAMA INICIAL

El Contrato de Obra Pública No. 1716 DE 2025 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, según las actividades según el Cronograma inicial:

(CRONOGRAMA PROGRAMADO CON FECHA DE TERMINACION DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026).

8. CRONOGRAMA ACTUALIZADO


El Contrato de Obra Pública No. 1716 DE 2025 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, según el Cronograma actualizado según modificatoria No. 1:
(CRONOGRAMA PROGRAMADO CON FECHA DE TERMINACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026).

9. AVANCE FINANCIERO (Programado vs Ejecutado):


El Contrato de Obra Pública No. 1716 DE 2025 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, según las actividades relacionadas en el numeral anterior, presenta el siguiente Avance Financiero:

MES	VALOR CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EJECUTADON ACTA PARCIAL N°01	MES	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN ACTA PARCIAL N°01
21 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 25 DE FEBRERO DE 2026	$ 391,979,868.69	$ 279,382,109.53	21 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 25 DE FEBRERO DE 2026	100.00%	71.21%

9.1 VALOR PROGRAMADO VS VALOR EJECUTADO

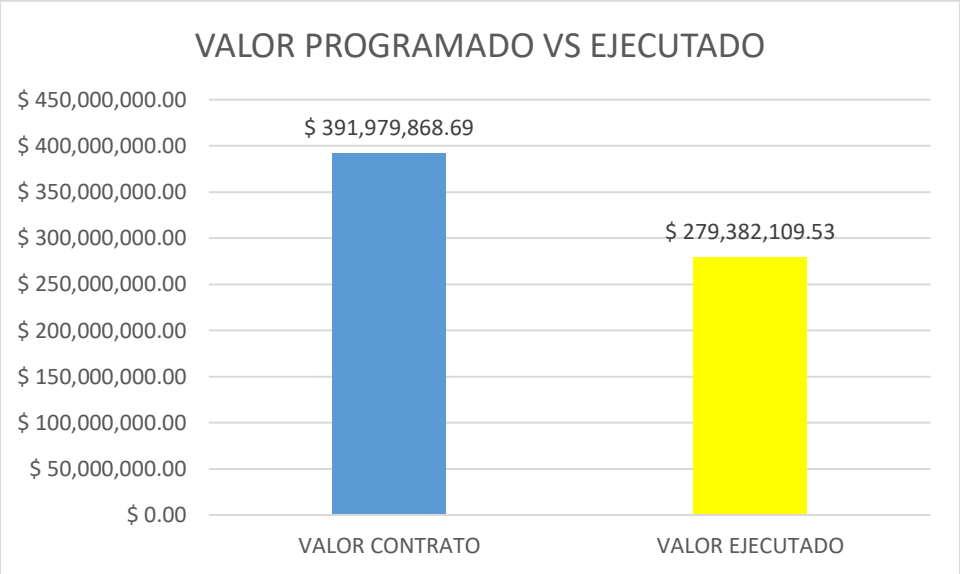


9.2 PORCENTAJE PROGRAMADO VS PORCENTAJE EJECUTADO.

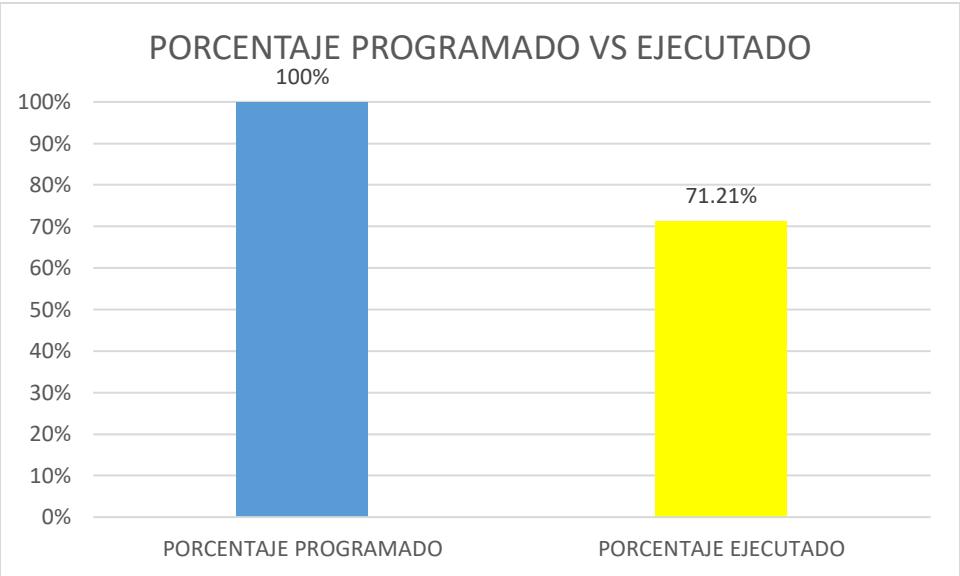

9.3 VALOR PROGRAMADO VS EJECUTADO

INFORME N°	MES		VALOR CONTRATO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE PROGRAMADO MES N°03	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE RETRASADO ACUMULADO
1	martes, 21 de octubre de 2025	jueves, 20 de noviembre de 2025	**$ 392,096,488.00**	$ 159,700,899.56	**$ 13,060,686.91**	40.73%	8.18%	**32.55%**
2	viernes, 21 de noviembre de 2025	sábado, 20 de diciembre de 2025	**$ 392,096,488.00**	$ 140,645,010.25	**$ 306,374.94**	35.87%	0.22%	**68.20%**
3	domingo, 21 de diciembre de 2025	lunes, 19 de enero de 2026	**$ 392,096,488.00**	$ 91,750,578.19	**$ 7,600,030.50**	23.40%	8.28%	**83.32%**
PRORROGA N°01	martes, 20 de enero de 2026	jueves, 19 de febrero de 2026	**$ 392,096,488.00**	$ 371,129,395.65	**$ 8,056,032.33**	83.32%	2.17%	**81.15%**
PRORROGA N°02	jueves, 19 de febrero de 2026	viernes, 06 de marzo de 2026	**$ 391,979,868.69**	$ 362,956,744.01	**$281,188,496.62**	81.15%	77.47%	**3.68%**

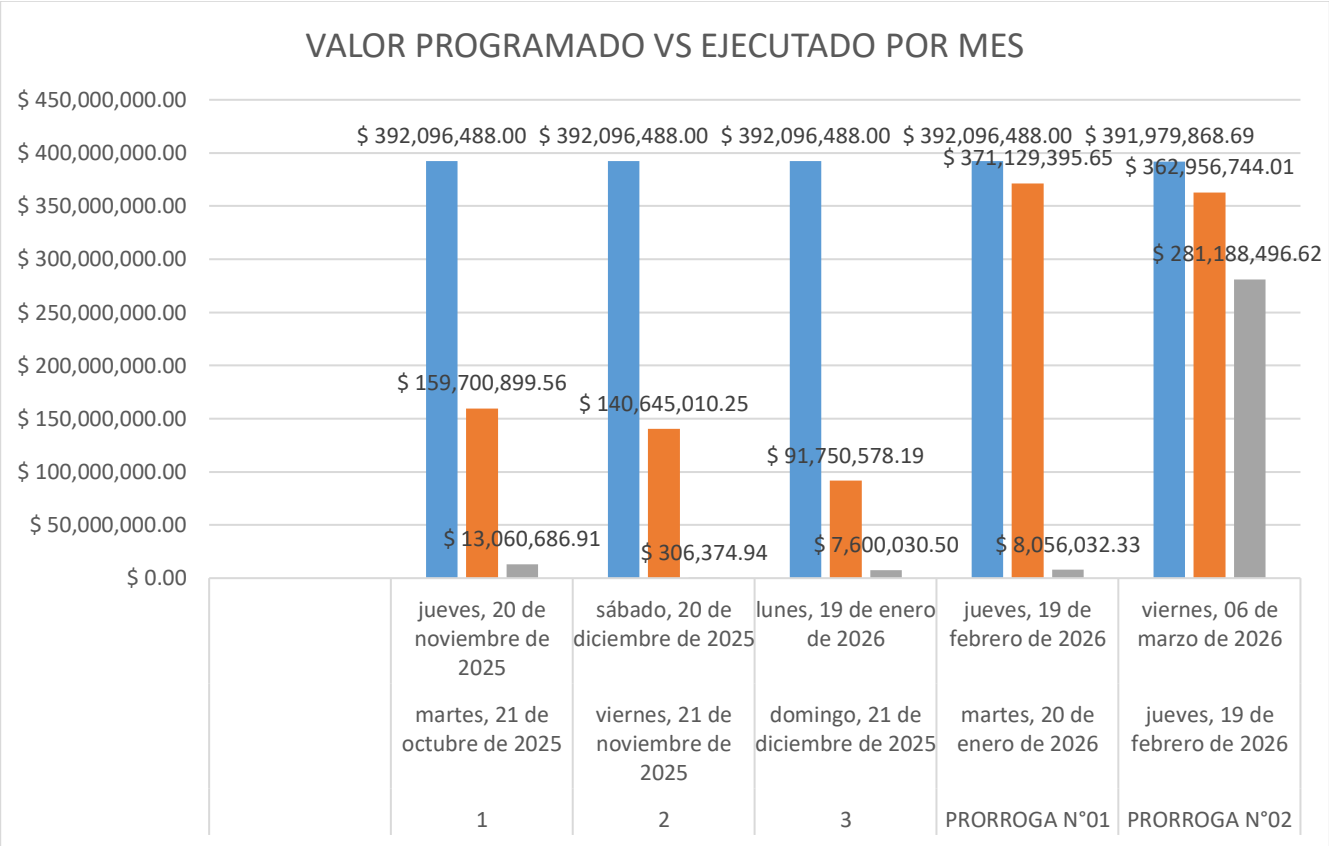

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

10.1 ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha del presente informe, se han generado por parte del contratista e Interventoría las siguientes actas:

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO DE OBRA	21/10/2025
ACTA DE VISITA DE OBRA NO. 1	31/10/2025
FECHA DE PRORROGA N°01	19/ENERO/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUAL SEGÚN PRORROGA N°01	19/FEBRERO/2026
FECHA DE PRORROGA N°02	19/FEBRERO/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUAL SEGÚN PRORROGA N°02	6/MARZO/2026
APROBACION ACTA DE MODIFICACION N°01	17/FEBRERO/2026

10.2 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de Obra No. 1716 DE 2025 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, de acuerdo con la suscripción del Contrato y modificadas con el Acta de Inicio, la cual amplio en plazos y recursos las condiciones iniciales.

EXPEDICIÓN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Nombre De la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Fecha de Expedición:** 22/09/2025
Póliza de Cumplimiento No.: 620-47-994000058166 ANEXO-0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	11/09/2025	11/04/2026	$ 78.419.297,60
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	11/09/2025	11/12/2028	$ 78.419.297,60
Calidad del bien	11/09/2025	11/12/2026	$ 78.419.297,60
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		

Nombre De la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Fecha de Expedición:** 22/09/2025
Póliza de Cumplimiento No.: 620-47-994000013747 ANEXO-0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	11/09/2025	11/12/2025	$ 284.700.000,00

ACTUALIZACIÓN CON EL ACTA DE INICIO

Nombre De la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Fecha de Expedición:** 17/12/2025
Póliza de Cumplimiento No.: 620-47-994000058166 ANEXO-1

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	20/05/2026	$ 78.419.297,60
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	20/01/2029	$ 78.419.297,60
Calidad del bien	21/10/2025	20/01/2027	$ 78.419.297,60
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		

POLIZAS PRORROGA 1
Nombre De la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Fecha de Expedición:** 25/02/2026
Póliza de Cumplimiento No.: 620-47-994000058166 ANEXO-2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	19/06/2026	$ 78.419.297,60
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	19/02/2029	$ 78.419.297,60
Calidad del bien	21/10/2025	19/02/2027	$ 78.419.297,60
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		

Nombre De la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Fecha de Expedición:** 25/02/2026
Póliza de Cumplimiento No.: 620-47-994000013747 ANEXO-2

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	20/01/2026	19/02/2026	$ 284.700.000,00

POLIZAS PRORROGA 2

Nombre De la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Fecha de Expedición:** 10/03/2026
Póliza de Cumplimiento No.: 620-47-994000058166 ANEXO-3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	21/10/2025	06/07/2026	$ 78.419.297,60
Pago de salarios, prestaciones sociales Legales e indemnizaciones laborales.	21/10/2025	06/03/2029	$ 78.419.297,60

Calidad del bien	21/10/2025	06/03/2027	$ 78.419.297,60
Estabilidad y Calidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses y -1 días		

Nombre De la Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Fecha de Expedición:** 13/03/2026
Póliza de Cumplimiento No.: 620-47-994000013747 ANEXO-3

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	19/02/2026	06/03/2026	$ 284.700.000,00

11. SEGURIDAD SOCIAL

INNOVA TRADE R&G SAS - OCTUBRE					
NOMBRE	**No. DE CEDULA**	**CARGO**	**No. DE PLANILLA**	**PERIODO PAGO**	
				SALUD	**PENSION**
COLMENARES JOSE AURELIANO	17320262	AYUDANTE	35292555	2025-10	2025-11
LONDOÑO VARGAS ORLANDO ALBEIRO	71876129	MAESTRO	35292555	2025-10	2025-11
PULGARIN SUAREZ YAMIR	86013051	AYUDANTE	35292555	2025-10	2025-11
PICO GARCIA JEFFERSON MAURICIO	1000689160	AYUDANTE	35292555	2025-10	2025-11
BELLON CAICEDO VICTOR ALFREDO	1012335534	AYUDANTE	35292555	2025-10	2025-11
BARRERA USECHE RONAL ANDRES	1123564568	AYUDANTE	35292555	2025-10	2025-11
ARDILA SEDANO NOHEMI	40334279	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	35433944	2025-10	2025-10

INNOVA TRADE R&G SAS - NOVIEMBRE					
NOMBRE	**No. DE CEDULA**	**CARGO**	**No. DE PLANILLA**	**PERIODO PAGO**	
				SALUD	**PENSION**
PULGARIN SUAREZ WILLINTONG ANDRES	1119946885	TRABAJADOR	35813349	2025-11	2025-12
LONDOÑO PULGARIN HECTOR FABIO	1121419588	AYUDANTE	35813349	2025-11	2025-12
ARDILA SEDANO NOHEMI	40334279	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	35436485	2025-11	2025-11
JHON JAIRO SANCHEZ FLOREZ	79955979	RESIDENTE DE OBRA	1078164342	2025-11	2025-11

INNOVA TRADE R&G SAS - DICIEMBRE				
NOMBRE		**CARGO**		**PERIODO PAGO**

	No. DE CEDULA		No. DE PLANILLA	SALUD	PENSION
PICO GARCIA JEFFERSON MAURICIO	1000689160	AYUDANTE	35831167	2025-12	2026-01
BELTRAN RAMIREZ DARWIN YAMID	1006658576 2	AYUDANTE	35831167	2025-12	2026-01
BELLON CAICEDO VICTOR ALFREDO	1012335534	AYUDANTE	35831167	2025-12	2026-01
ORJUELA ABRIL JARRINSON	1119948174 4	AYUDANTE	35831167	2025-12	2026-01
ORTIZ RONCANCIO ANDRES MAURICIO	1123530692	AYUDANTE	35831167	2025-12	2026-01
BARRERA USECHE RONAL ANDRES	1123564568 6	AYUDANTE	35831167	2025-12	2026-01
PULGARIN SUAREZ WILLINTONG ANDRES	1119946885	AYUDANTE	35813396	2025-12	2026-01
LONDOÑO PULGARIN HECTOR FABIO	1121419588	MAESTRO	35813396	2025-12	2026-01
ARDILA SEDANO NOHEMI	40334279	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	35691718	2025-12	2025-12
JHON JAIRO SANCHEZ FLOREZ	79955979	RESIDENTE DE OBRA	1078164873	2025-12	2025-12

INNOVA TRADE R&G SAS - ENERO					
NOMBRE	**No. DE CEDULA**	**CARGO**	**No. DE PLANILLA**	**PERIODO PAGO**	
				SALUD	**PENSION**
ARDILA SEDANO NOHEMI	40334279	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	36490014	2026-01	2026-01
JHON JAIRO SANCHEZ FLOREZ	79955979	RESIDENTE DE OBRA	1079899842	2026-01	2026-01
COLMENARES JOSE AURELIANO	17320262	AYUDANTE	36340765	2026-01	2026-01
LONDOÑO VARGAS ORLANDO ALBEIRO	71876129	MAESTRO	36340765	2026-01	2026-01

12. CONCLUSIONES

Se ha dado cumplimiento al programa de obra desarrollando las actividades y avanzando en la construcción de la adecuación menor del puesto de salud de la vereda San Isidro del Municipio de Mesetas del Departamento del Meta.

Cumplimiento a la Normatividad Sismo Resistente NSR-10, plan de manejo ambiental y las medidas compensatorias ambientales, hemos respetado los protocolos de calidad de los materiales y de construcción para la ejecución de la viga de cimentación, columnas y columnetas del cerramiento.

La ejecución de estos componentes representa actividades de alto impacto técnico y constructivo, cuyo desarrollo permitirá alcanzar la culminación satisfactoria del contrato, garantizando la calidad y funcionalidad de la obra conforme a los objetivos establecidos.

Mediante el presente informe se solicita el pago de la presente Acta Parcial N°01 por un valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($279,382,109.53), MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

En el municipio de mesetas (meta) a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2026.

DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO
C.C 1.119.889921
INNOVA TRADE R&G SAS
NIT: 901.086.462-7 R/L.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522		INNOVATRADERG@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35292555	E	2025-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.906.900	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35292555	2025-11-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 17320262	COLMENARES JOSE AURELIANO	1.423.500	F		X														0			0	16	16	16	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	759.200	30.400	COFREM-CCF34	759.200	30.400	759.200	52.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	113.700	S	5429001
2	CC 71876129	LONDOÑO VARGAS ORLANDO ALBEIRO	1.423.500	F		X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	759.200	121.500	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	759.200	30.400	COFREM-CCF34	759.200	30.400	759.200	52.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	235.200	S	5429001
3	CC 86013051	PULGARIN SUAREZ YAMIR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
4	CC 1000689160	PICO GARCIA JEFFERSON MAURICIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
5	CC 1012335534	BELLON CAICEDO VICTOR ALFREDO	1.423.500	F		X														0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	1.091.350	174.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.091.350	43.700	COFREM-CCF34	1.091.350	43.700	1.091.350	76.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	338.100	S	5429001
6	CC 1123564568	BARRERA USECHE RONAL ANDRES	1.423.500	F		X														0			23	23	23	23	PROTECCION-230201	1.091.350	174.700	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.091.350	43.700	COFREM-CCF34	1.091.350	43.700	1.091.350	76.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	338.100	S	5429001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522			INNOVATRADERG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35292555	E	2025-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.906.900	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35292555	2025-11-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.788.900	6.548.100	6.548.100	6.548.100	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	926.500	0	0	0	926.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	751.800	0	0	0	751.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	174.700	0	0	0	174.700
EPS(Administradoras: 3)				6	262.200	0	0	0	262.200
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	4	148.200	0	0	0	148.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				6	456.000	0	0	0	456.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	456.000	0	0	0	456.000
CCF(Administradoras: 1)				6	262.200	0	0	0	262.200
COFREM	CCF34	892000146	3	6	262.200	0	0	0	262.200
Gran Total					1.906.900	0	0	0	1.906.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522			INNOVATRADERG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35831167	E	2025-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.323.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35831167	2026-01-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1000689160	PICO GARCIA JEFFERSON MAURICIO	1.423.500	F	X	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COFREM-CCF34	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5429001
2	CC 1006658576	BELTRAN RAMIREZ DARWIN YAMID	1.423.500	F	X	X														0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	28.500	COFREM-CCF34	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5429001
3	CC 1012335534	BELLON CAICEDO VICTOR ALFREDO	1.423.500	F	X	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	711.750	28.500	COFREM-CCF34	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5429001
4	CC 1119948174	ORJUELA ABRIL JARRINSON	1.423.500	F	X	X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	711.750	113.900	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	711.750	28.500	COFREM-CCF34	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5429001
5	CC 1123530692	ORTIZ RONCANCIO ANDRES MAURICIO	1.423.500	F	X	X														0			15	15	15	15	COLFONDOS-231001	711.750	113.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	711.750	28.500	COFREM-CCF34	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5429001
6	CC 1123564568	BARRERA USECHE RONAL ANDRES	1.423.500	F	X	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	711.750	28.500	COFREM-CCF34	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5429001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522			INNOVATRADERG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35831167	E	2025-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.323.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35831167	2026-01-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				6	683.400	0	0	0	683.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	113.900	0	0	0	113.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	113.900	0	0	0	113.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	113.900	0	0	0	113.900
PORVENIR	230301	800224808	8	3	341.700	0	0	0	341.700
EPS(Administradoras: 4)				6	171.000	0	0	0	171.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	28.500	0	0	0	28.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	28.500	0	0	0	28.500
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	3	85.500	0	0	0	85.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	28.500	0	0	0	28.500
ARP(Administradoras: 1)				6	297.600	0	0	0	297.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	297.600	0	0	0	297.600
CCF(Administradoras: 1)				6	171.000	0	0	0	171.000
COFREM	CCF34	892000146	3	6	171.000	0	0	0	171.000
Gran Total					1.323.000	0	0	0	1.323.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40334279	0	NOHEMI ARDILA SEDANO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4731	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-313	CL 30 6 85		6598176			NOHEMI.ARDILA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35433944	I	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	464.400	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35433944	2025-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40334279	ARDILA SEDANO NOHEMI	1.600.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	200.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	464.400	N	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40334279	0	NOHEMI ARDILA SEDANO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4731	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-313	CL 30 6 85		6598176			NOHEMI.ARDILA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	35433944	I	2025-11-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	464.400	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35433944	2025-11-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	256.000	0	0	0	256.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	256.000	0	0	0	256.000
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	0	0	200.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	200.000	0	0	0	200.000
ARP(Administradoras: 1)				1	8.400	0	0	0	8.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.400	0	0	0	8.400
Gran Total					464.400	0	0	0	464.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522			INNOVATRADERG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35813349	E	2025-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	890.400	8.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35813349	2025-12-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1119946885	PULGARIN SUAREZ WILLINTONG ANDRES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
2	CC 1121419588	LONDOÑO PULGARIN HECTOR FABIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COFREM-CCF34	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522			INNOVATRADERG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35813349	E	2025-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	890.400	8.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35813349	2025-12-15	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	455.600	0	4.400	0	460.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	2.200	0	230.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	2.200	0	230.000
EPS(Administradoras: 2)				2	114.000	0	1.200	0	115.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	600	0	57.600
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	57.000	0	600	0	57.600
ARP(Administradoras: 1)				2	198.200	0	1.900	0	200.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	198.200	0	1.900	0	200.100
CCF(Administradoras: 1)				2	114.000	0	1.100	0	115.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COFREM	CCF34	892000146	3	2	114.000	0	1.100	0	115.100
Gran Total					881.800	0	8.600	0	890.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40334279	0	NOHEMI ARDILA SEDANO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4731	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-313	CL 30 6 85		6598176			NOHEMI.ARDILA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35436485	I	2025-11-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	464.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35436485	2025-12-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40334279	ARDILA SEDANO NOHEMI	1.600.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	200.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.600.000	8.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	464.400	N	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40334279	0	NOHEMI ARDILA SEDANO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4731	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-313	CL 30 6 85		6598176			NOHEMI.ARDILA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35436485	I	2025-11-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	464.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35436485	2025-12-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	256.000	0	0	0	256.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	256.000	0	0	0	256.000
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	0	0	200.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	200.000	0	0	0	200.000
ARP(Administradoras: 1)				1	8.400	0	0	0	8.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.400	0	0	0	8.400
Gran Total					464.400	0	0	0	464.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40334279	0	NOHEMI ARDILA SEDANO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4731	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-313	CL 30 6 85		6598176			NOHEMI.ARDILA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35691718	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	232.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35691718	2026-01-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 40334279	ARDILA SEDANO NOHEMI	1.600.000			X														0			15	15	0	15	PORVENIR-230301	800.000	128.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	800.000	100.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	800.000	4.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	232.200	N	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40334279	0	NOHEMI ARDILA SEDANO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4731	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-313	CL 30 6 85		6598176			NOHEMI.ARDILA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35691718	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	232.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35691718	2026-01-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
800.000	800.000	800.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	128.000	0	0	0	128.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	128.000	0	0	0	128.000
EPS(Administradoras: 1)				1	100.000	0	0	0	100.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	100.000	0	0	0	100.000
ARP(Administradoras: 1)				1	4.200	0	0	0	4.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	4.200	0	0	0	4.200
Gran Total					232.200	0	0	0	232.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522			INNOVATRADERG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35813396	E	2025-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	764.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35813396	2026-01-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1119946885	PULGARIN SUAREZ WILLINTONG ANDRES	1.423.500	F		X														0			26	26	26	26	COLPENSIONES-25-14	1.233.700	197.400	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.233.700	49.400	COFREM-CCF34	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	5429001
2	CC 1121419588	LONDOÑO PULGARIN HECTOR FABIO	1.423.500	F		X														0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.233.700	197.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.233.700	49.400	COFREM-CCF34	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522			INNOVATRADERG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35813396	E	2025-12-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	764.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	35813396	2026-01-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.467.400	2.467.400	2.467.400	2.467.400	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	394.800	0	0	0	394.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	197.400	0	0	0	197.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	197.400	0	0	0	197.400
EPS(Administradoras: 2)				2	98.800	0	0	0	98.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	49.400	0	0	0	49.400
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	49.400	0	0	0	49.400
ARP(Administradoras: 1)				2	171.800	0	0	0	171.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	171.800	0	0	0	171.800
CCF(Administradoras: 1)				2	98.800	0	0	0	98.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COFREM	CCF34	892000146	3	2	98.800	0	0	0	98.800
Gran Total					764.200	0	0	0	764.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40334279	0	NOHEMI ARDILA SEDANO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4731	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-313	CL 30 6 85		6598176			NOHEMI.ARDILA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	36490014	I	2026-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	624.400	3.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36490014	2026-02-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 40334279	ARDILA SEDANO NOHEMI	1.750.905		X															0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	621.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40334279	0	NOHEMI ARDILA SEDANO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4731	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-313	CL 30 6 85		6598176			NOHEMI.ARDILA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	36490014	I	2026-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	624.400	3.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36490014	2026-02-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.500	0	281.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	1.500	0	281.700
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	1.200	0	220.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	218.900	0	1.200	0	220.100
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	700	0	122.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	121.900	0	700	0	122.600
Gran Total					621.000	0	3.400	0	624.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522			INNOVATRADERG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36340765	E	2026-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	804.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36340765	2026-02-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 17320262	COLMENARES JOSE AURELIANO	1.750.905	F	X															0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	5	262.100	S	5429001
2	CC 71876129	LONDOÑO VARGAS ORLANDO ALBEIRO	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901086462	7	INNOVA TRADE R&G SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-330	CALLE 7 #6-43		3212735522			INNOVATRADERG@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36340765	E	2026-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	804.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36340765	2026-02-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	3.501.810	3.501.810	3.501.810	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				2	140.200	0	0	0	140.200
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	2	140.200	0	0	0	140.200
ARP(Administradoras: 1)				2	243.800	0	0	0	243.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	243.800	0	0	0	243.800
CCF(Administradoras: 1)				2	140.200	0	0	0	140.200
COFREM	CCF34	892000146	3	2	140.200	0	0	0	140.200

Gran Total	804.400	0	0	0	804.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO
